

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**AVENIDA CENTENARIO**	**930 días**	**lun 2/01/23**	**sáb 20/12/25**
2		INICIO LOTE 2 - DESDE CARRERA 55 HASTA LA CARRERA 69F	0 días	lun 2/01/23	lun 2/01/23
3		**ETAPA DE PRECONSTRUCCION**	**157 días**	**lun 2/01/23**	**lun 3/07/23**
4		ADECUACIÓN CAMPAMENTOS	20 días	mar 30/05/23	mié 21/06/23
5		APROPIACIÓN/ACTUALIZACIÓN/AJUSTE DE DISEÑOS	157 días	lun 2/01/23	lun 3/07/23
6		TRAMITES Y LICENCIAS (ambiental, Social, transito y licencia de construcción, tramites empresas de servicios publicos)	40 días	jue 18/05/23	lun 3/07/23
7		**ETAPA DE CONSTRUCCION**	**723 días**	**mar 4/07/23**	**jue 23/10/25**
8		**OBRAS PREVIAS**	**174 días**	**mar 4/07/23**	**lun 22/01/24**
9		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	174 días	mar 4/07/23	lun 22/01/24
10		**CORREDOR VIAL DESDE CARRERA 55 HASTA CARRERA 68D**	**617 días**	**mié 2/08/23**	**lun 21/07/25**
11		**ETAPA 1 CALZADA NORTE**	**164 días**	**mié 2/08/23**	**jue 8/02/24**
12		**CONSTRUCCION REDES SECAS**	**100 días**	**mié 2/08/23**	**sáb 25/11/23**
13		EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	100 días	mié 2/08/23	sáb 25/11/23
14		RELLENOS	80 días	lun 14/08/23	mar 14/11/23
15		**REDES ELÉCTRICAS**	**80 días**	**lun 14/08/23**	**mar 14/11/23**
16		CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS	80 días	lun 14/08/23	mar 14/11/23
17		CONSTRUCCIÓN DE CAJAS	80 días	lun 14/08/23	mar 14/11/23
18		ALUMBRADO PÚBLICO	80 días	lun 14/08/23	mar 14/11/23
19		**REDES DE TELECOMUNICACIONES**	**67 días**	**mar 29/08/23**	**mar 14/11/23**
20		CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS	67 días	mar 29/08/23	mar 14/11/23
21		CONSTRUCCIÓN DE CAJAS	67 días	mar 29/08/23	mar 14/11/23
22		**REDES DE GAS**	**60 días**	**mié 6/09/23**	**mar 14/11/23**
23		CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS	60 días	mié 6/09/23	mar 14/11/23
24		CONSTRUCCIÓN DE CAJAS	60 días	mié 6/09/23	mar 14/11/23
25		**CONSTRUCCIÓN REDES HÚMEDAS**	**84 días**	**mié 2/08/23**	**mar 7/11/23**
26		EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	80 días	mié 2/08/23	jue 2/11/23
27		RELLENOS	80 días	lun 7/08/23	mar 7/11/23
28		RED DE ACUEDUCTO	80 días	lun 7/08/23	mar 7/11/23
29		RED DE ALCANTARILLADO	80 días	lun 7/08/23	mar 7/11/23
30		**ESPACIO PÚBLICO**	**140 días**	**mié 30/08/23**	**jue 8/02/24**
31		ANDENES	140 días	mié 30/08/23	jue 8/02/24
32		MOBILIARIO	140 días	mié 30/08/23	jue 8/02/24
33		VEGETACIÓN Y PAISAJISMO	140 días	mié 30/08/23	jue 8/02/24
34		CULATAS	60 días	mié 30/08/23	mar 7/11/23
35		**CONSTRUCCIÓN VÍAS**	**123 días**	**mié 30/08/23**	**vie 19/01/24**
36		EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	120 días	mié 30/08/23	mar 16/01/24
37		ESTABILIZACIÓN DE LA SUB RASANTE	110 días	lun 11/09/23	mar 16/01/24
38		SUB BASE GRANULAR	110 días	mar 12/09/23	mié 17/01/24
39		BASE GRANULAR	110 días	mié 13/09/23	jue 18/01/24
40		PAVIMENTO RÍGIDO	85 días	vie 13/10/23	vie 19/01/24
41		**SEÑALIZACIÓN**	**20 días**	**vie 5/01/24**	**sáb 27/01/24**
42		SEÑALIZACIÓN VERTICAL	20 días	vie 5/01/24	sáb 27/01/24
43		SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	12 días	lun 15/01/24	sáb 27/01/24
44		**ETAPA 2 CALZADA SUR**	**162 días**	**mar 6/02/24**	**lun 12/08/24**
45		**CONSTRUCCIÓN REDES SECAS**	**100 días**	**mar 6/02/24**	**vie 31/05/24**
46		EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	100 días	mar 6/02/24	vie 31/05/24
47		RELLENOS	80 días	sáb 17/02/24	lun 20/05/24
48		**REDES ELÉCTRICAS**	**80 días**	**sáb 17/02/24**	**lun 20/05/24**
49		CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS	80 días	sáb 17/02/24	lun 20/05/24
50		CONSTRUCCIÓN DE CAJAS	80 días	sáb 17/02/24	lun 20/05/24
51		ALUMBRADO PÚBLICO	80 días	sáb 17/02/24	lun 20/05/24
52		**REDES DE TELECOMUNICACIONES**	**67 días**	**lun 4/03/24**	**lun 20/05/24**
53		CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS	67 días	lun 4/03/24	lun 20/05/24

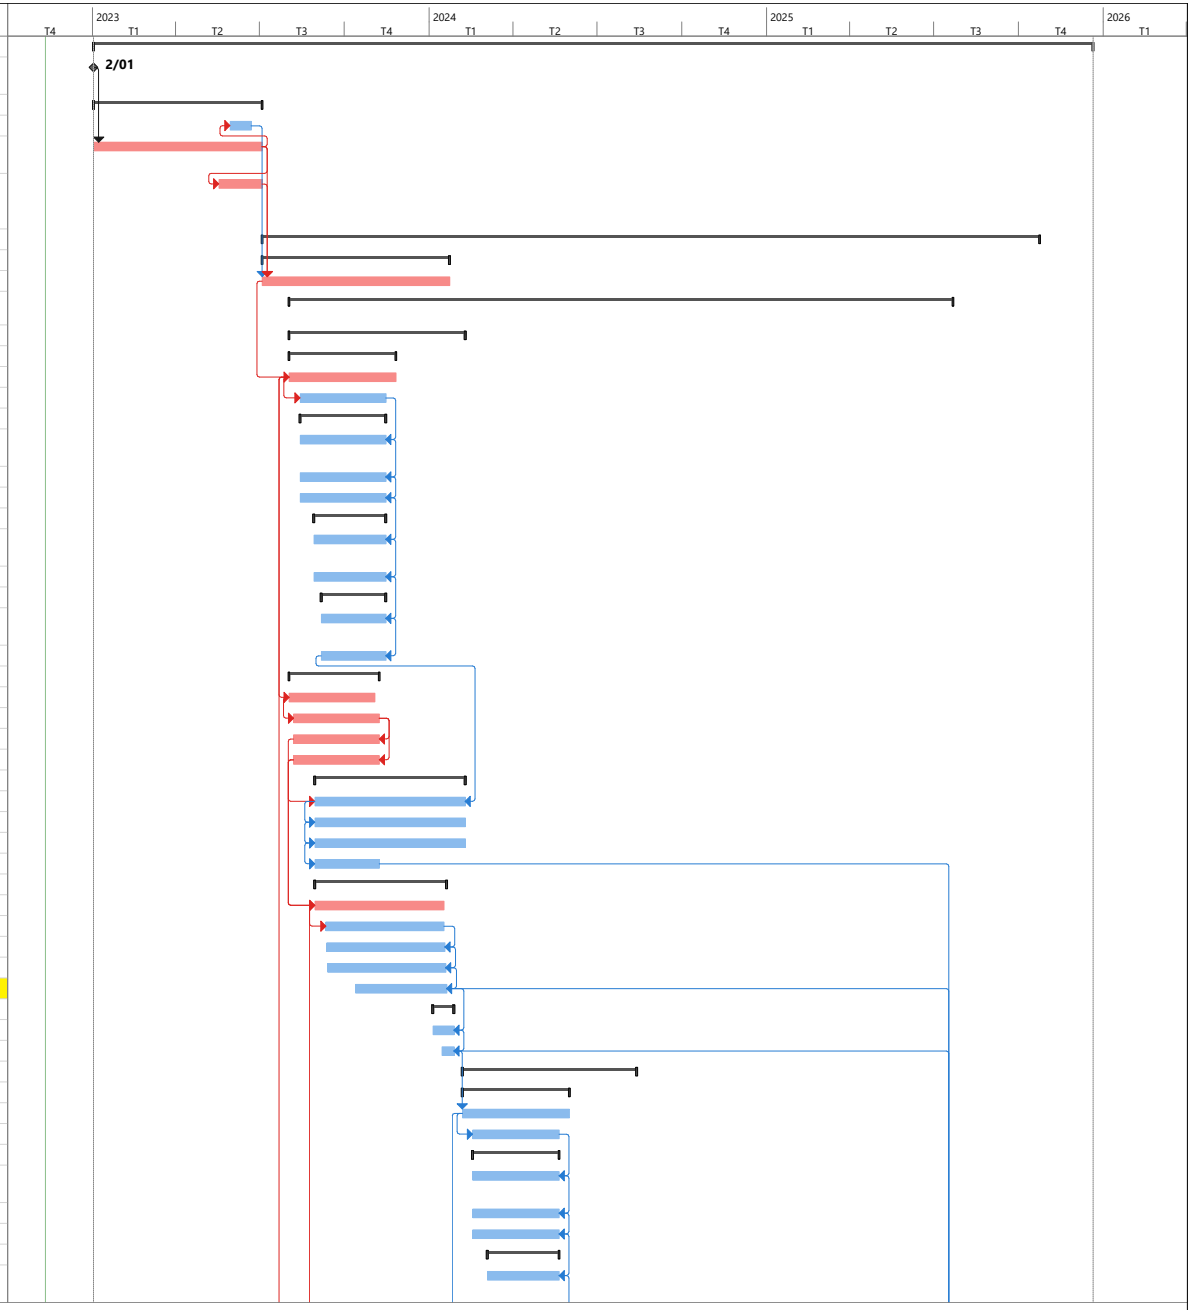

Proyecto: LOTE 2 - Desde la car
Fecha: vie 11/11/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
54		CONSTRUCCIÓN DE CAJAS	67 días	lun 4/03/24	lun 20/05/24
55		**REDES DE GAS**	**60 días**	**mar 12/03/24**	**lun 20/05/24**
56		CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS	60 días	mar 12/03/24	lun 20/05/24
57		CONSTRUCCIÓN DE CAJAS	60 días	mar 12/03/24	lun 20/05/24
58		**CONSTRUCCIÓN REDES HÚMEDAS**	**83 días**	**mar 6/02/24**	**sáb 11/05/24**
59		EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	80 días	mar 6/02/24	mié 8/05/24
60		RELLENOS	80 días	vie 9/02/24	sáb 11/05/24
61		RED DE ACUEDUCTO	80 días	jue 8/02/24	vie 10/05/24
62		RED DE ALCANTARILLADO	80 días	jue 8/02/24	vie 10/05/24
63		**ESPACIO PÚBLICO**	**140 días**	**sáb 2/03/24**	**lun 12/08/24**
64		ANDENES	140 días	sáb 2/03/24	lun 12/08/24
65		MOBILIARIO	140 días	sáb 2/03/24	lun 12/08/24
66		VEGETACIÓN Y PAISAJISMO	140 días	sáb 2/03/24	lun 12/08/24
67		CULATAS	60 días	mar 4/06/24	lun 12/08/24
68		**CONSTRUCCIÓN VÍAS**	**122 días**	**lun 4/03/24**	**mar 23/07/24**
69		EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	110 días	lun 4/03/24	mar 9/07/24
70		ESTABILIZACIÓN DE LA SUB RASANTE	110 días	vie 15/03/24	sáb 20/07/24
71		SUB BASE GRANULAR	110 días	sáb 16/03/24	lun 22/07/24
72		BASE GRANULAR	110 días	sáb 16/03/24	lun 22/07/24
73		PAVIMENTO RÍGIDO	82 días	vie 19/04/24	mar 23/07/24
74		**SEÑALIZACIÓN**	**20 días**	**mar 9/07/24**	**mié 31/07/24**
75		SEÑALIZACIÓN VERTICAL	20 días	mar 9/07/24	mié 31/07/24
76		SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	12 días	jue 18/07/24	mié 31/07/24
77		**ETAPA 3 CALZADA CENTRAL**	**350 días**	**sáb 8/06/24**	**lun 21/07/25**
78		**CORREDOR BRT**	**350 días**	**sáb 8/06/24**	**lun 21/07/25**
79		**ESPACIO PÚBLICO**	**90 días**	**jue 1/08/24**	**mié 13/11/24**
80		ANDENES	80 días	jue 1/08/24	vie 1/11/24
81		MOBILIARIO	80 días	vie 9/08/24	sáb 9/11/24
82		VEGETACIÓN Y PAISAJISMO	80 días	mar 13/08/24	mié 13/11/24
83		**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS**	**164 días**	**jue 1/08/24**	**vie 7/02/25**
84		EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	133 días	jue 1/08/24	jue 2/01/25
85		ESTABILIZACIÓN DE LA SUB RASANTE	133 días	mar 13/08/24	mar 14/01/25
86		SUB BASE GRANULAR	133 días	mié 21/08/24	mié 22/01/25
87		BASE GRANULAR	133 días	jue 29/08/24	jue 30/01/25
88		PAVIMENTO RÍGIDO	70 días	mar 19/11/24	vie 7/02/25
89		**ESTACIONES BRT**	**214.33 días**	**sáb 17/08/24**	**jue 24/04/25**
90		**ESTACIÓN CAR. 55**	**147 días**	**sáb 17/08/24**	**mar 4/02/25**
91		ESTACIÓN CAR. 55 - FABRICACIÓN	80 días	sáb 17/08/24	mar 19/11/24
92		INFRAESTRUCTURA	20 días	mar 19/11/24	mié 11/12/24
93		ESTACIÓN CAR. 55	27 días	mar 19/11/24	jue 19/12/24
94		ACABADOS	40 días	vie 20/12/24	mar 4/02/25
95		**ESTACIÓN CAR. 65**	**147 días**	**mié 18/09/24**	**vie 7/03/25**
96		ESTACIÓN CAR. 65 - FABRICACIÓN	80 días	mié 18/09/24	vie 20/12/24
97		INFRAESTRUCTURA	20 días	vie 20/12/24	sáb 11/01/25
98		ESTACIÓN CAR. 65	27 días	vie 20/12/24	lun 20/01/25
99		ACABADOS	40 días	mar 21/01/25	vie 7/03/25
100		**ESTACIÓN CAR. 68**	**180.33 días**	**jue 26/09/24**	**jue 24/04/25**
101		ESTACIÓN CAR. 68 - FABRICACIÓN	100 días	jue 26/09/24	mar 21/01/25
102		INFRAESTRUCTURA	23 días	mar 21/01/25	sáb 15/02/25
103		ESTACIÓN CAR. 68	27 días	mar 21/01/25	jue 20/02/25
104		ACABADOS	53.33 días	vie 21/02/25	jue 24/04/25
105		**PUENTES PEATONALES**	**350 días**	**sáb 8/06/24**	**lun 21/07/25**
106		**PUENTE ESTACIÓN CAR. 55**	**117 días**	**sáb 2/11/24**	**mar 18/03/25**
107		PUENTE PEATONAL CRUCE AV. 68 - FABRICACIÓN	67 días	sáb 2/11/24	lun 20/01/25
108		INFRAESTRUCTURA	30 días	lun 20/01/25	sáb 22/02/25
109		PUENTE ESTACIÓN CAR. 55	70 días	mar 19/11/24	vie 7/02/25
110		ACABADOS	20 días	lun 24/02/25	mar 18/03/25
111		**PUENTE ESTACIÓN CAR. 65**	**197 días**	**lun 2/09/24**	**vie 18/04/25**
112		PUENTE ESTACIÓN CAR. 55 - FABRICACIÓN	67 días	lun 2/09/24	mar 19/11/24

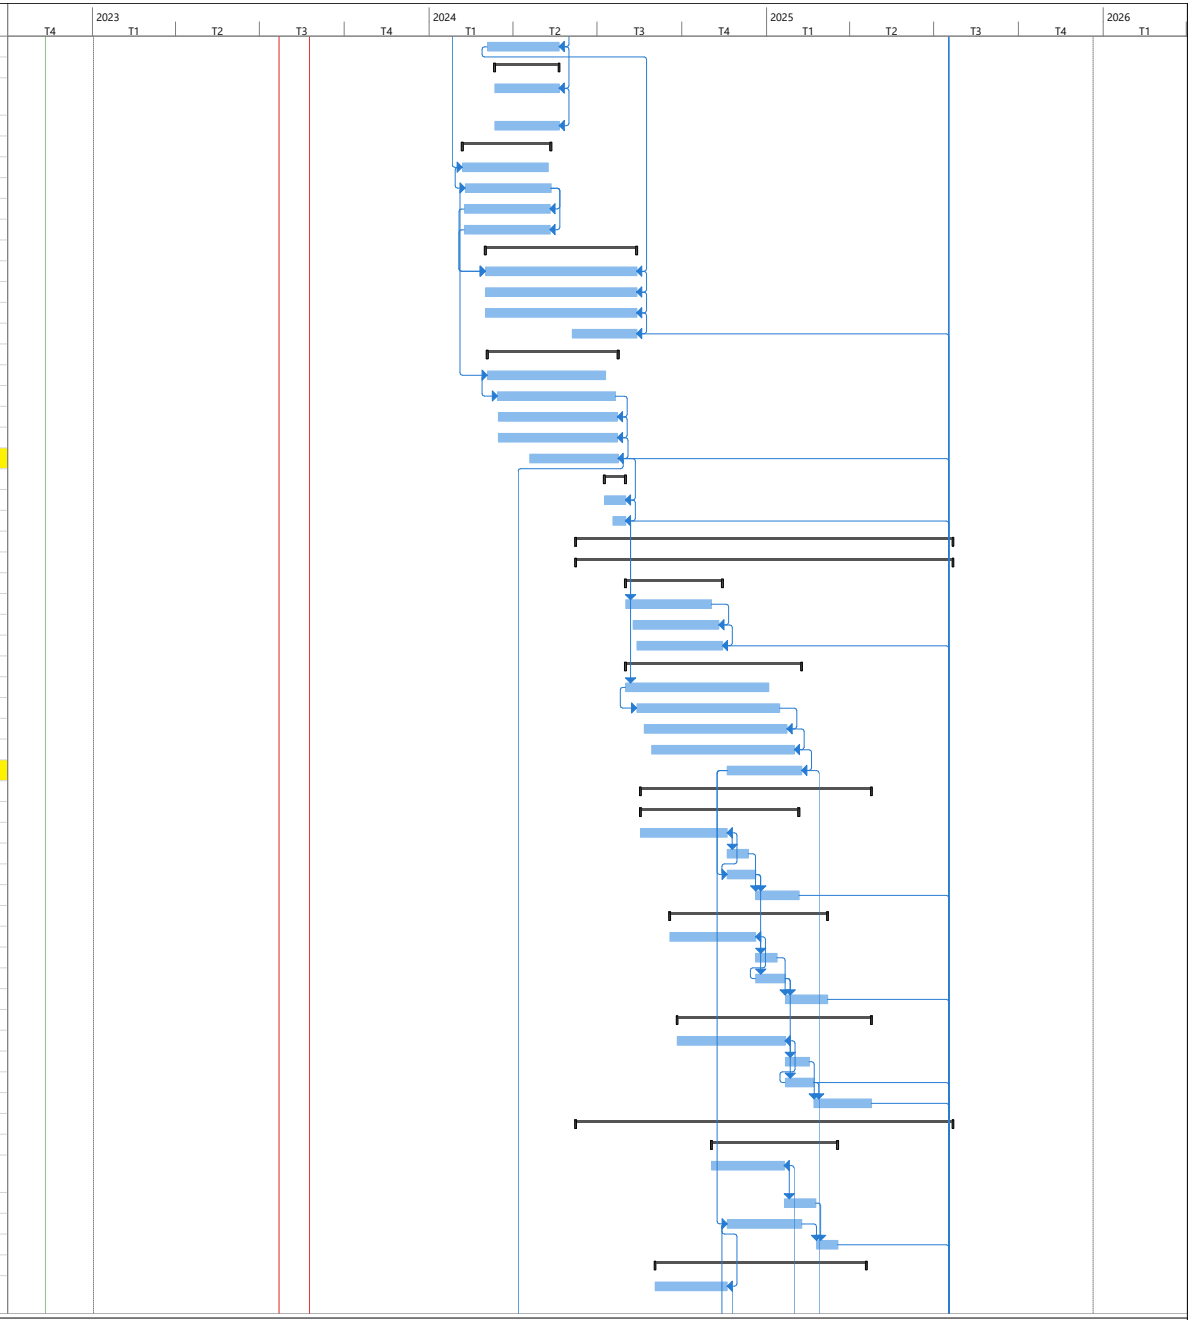

Proyecto: LOTE 2 - Desde la car
Fecha: vie 11/11/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
113		INFRAESTRUCTURA	30 días	mar 19/11/24	lun 23/12/24
114		PUENTE ESTACIÓN CAR. 65	70 días	sáb 4/01/25	mié 26/03/25
115		ACABADOS	20 días	jue 27/03/25	vie 18/04/25
116		**PUENTE ESTACIÓN CAR. 68 ORIENTAL**	**197 días**	**vie 18/10/24**	**mié 4/06/25**
117		PUENTE ESTACIÓN CAR. 65 - FABRICACIÓN	67 días	vie 18/10/24	sáb 4/01/25
118		INFRAESTRUCTURA	30 días	sáb 4/01/25	vie 7/02/25
119		PUENTE ESTACIÓN CAR. 68 ORIENTA	70 días	jue 20/02/25	lun 12/05/25
120		ACABADOS	20 días	mar 13/05/25	mié 4/06/25
121		**PUENTE ESTACIÓN CAR. 68 OCCIDENT**	**197 días**	**mié 4/12/24**	**lun 21/07/25**
122		PUENTE ESTACIÓN CAR. 68 ORIENTAL - FABRICACIÓN	67 días	mié 4/12/24	jue 20/02/25
123		INFRAESTRUCTURA	30 días	jue 20/02/25	mié 26/03/25
124		PUENTE ESTACIÓN CAR. 68 OCCIDE	70 días	mar 8/04/25	vie 27/06/25
125		ACABADOS	20 días	sáb 28/06/25	lun 21/07/25
126		**PUENTE PEATONAL CRUCE AV. 68**	**290 días**	**mar 2/07/24**	**mié 4/06/25**
127		PUENTE ESTACIÓN CAR. 68 OCCIDENTE - FABRICACIÓN	67 días	lun 20/01/25	mar 8/04/25
128		INFRAESTRUCTURA	30 días	mar 8/04/25	lun 12/05/25
129		PUENTE PEATONAL CRUCE AV. 68	70 días	mar 2/07/24	vie 20/09/24
130		ACABADOS	20 días	mar 13/05/25	mié 4/06/25
131		**RAMPA PEATONAL ACCESO OCCIDENTE ESTACION CARRERA**	**70 días**	**sáb 8/06/24**	**mié 28/08/24**
132		RAMPA ESTACIÓN CAR. 69 OCCIDENTE - FABRICACIÓN	20 días	sáb 8/06/24	mar 2/07/24
133		INFRAESTRUCTURA	10 días	mar 2/07/24	vie 12/07/24
134		RAMPA ACCESO OCCIDENTAL	23 días	jue 25/07/24	mar 20/08/24
135		ACABADOS	7 días	mié 21/08/24	mié 28/08/24
136		**SEÑALIZACIÓN**	**60 días**	**lun 9/12/24**	**sáb 15/02/25**
137		SEÑALIZACIÓN VERTICAL	60 días	lun 9/12/24	sáb 15/02/25
138		SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	60 días	lun 9/12/24	sáb 15/02/25
139		FIN CORREDOR VIAL CRA55 -CRA 68D	0 días	lun 21/07/25	lun 21/07/25
140		**CORREDOR VIAL DESDE CARRERA 68D HASTA CARRERA 69F**	**357 días**	**sáb 15/07/23**	**mar 3/09/24**
141		**ETAPA 1 CALZADA NORTE**	**100 días**	**sáb 15/07/23**	**mié 8/11/23**
142		**CONSTRUCCIÓN REDES SECAS**	**85 días**	**mié 2/08/23**	**mié 8/11/23**
143		EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	67 días	mié 2/08/23	mié 18/10/23
144		RELLENOS	75 días	lun 14/08/23	mié 8/11/23
145		**REDES ELÉCTRICAS**	**53 días**	**vie 8/09/23**	**mié 8/11/23**
146		CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS	53 días	vie 8/09/23	mié 8/11/23
147		CONSTRUCCIÓN DE CAJAS	53 días	vie 8/09/23	mié 8/11/23
148		ALUMBRADO PÚBLICO	53 días	vie 8/09/23	mié 8/11/23
149		**REDES DE TELECOMUNICACIONES**	**47 días**	**vie 15/09/23**	**mié 8/11/23**
150		CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS	47 días	vie 15/09/23	mié 8/11/23
151		CONSTRUCCIÓN DE CAJAS	47 días	vie 15/09/23	mié 8/11/23
152		**REDES DE GAS**	**40 días**	**sáb 23/09/23**	**mié 8/11/23**
153		CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS	40 días	sáb 23/09/23	mié 8/11/23
154		CONSTRUCCIÓN DE CAJAS	40 días	sáb 23/09/23	mié 8/11/23
155		**CONSTRUCCIÓN REDES HÚMEDAS**	**35 días**	**mié 2/08/23**	**lun 11/09/23**
156		EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	35 días	mié 2/08/23	lun 11/09/23
157		RELLENOS	30 días	sáb 5/08/23	vie 8/09/23
158		RED DE ACUEDUCTO	30 días	sáb 5/08/23	vie 8/09/23
159		RED DE ALCANTARILLADO	30 días	sáb 5/08/23	vie 8/09/23
160		**ESPACIO PÚBLICO**	**60 días**	**jue 31/08/23**	**mié 8/11/23**
161		ANDENES	60 días	jue 31/08/23	mié 8/11/23
162		MOBILIARIO	60 días	jue 31/08/23	mié 8/11/23
163		VEGETACIÓN Y PAISAJISMO	60 días	jue 31/08/23	mié 8/11/23
164		CULATAS	40 días	sáb 23/09/23	mié 8/11/23
165		**CONSTRUCCIÓN VÍAS**	**58 días**	**sáb 15/07/23**	**mié 20/09/23**
166		EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	27 días	mié 9/08/23	vie 8/09/23

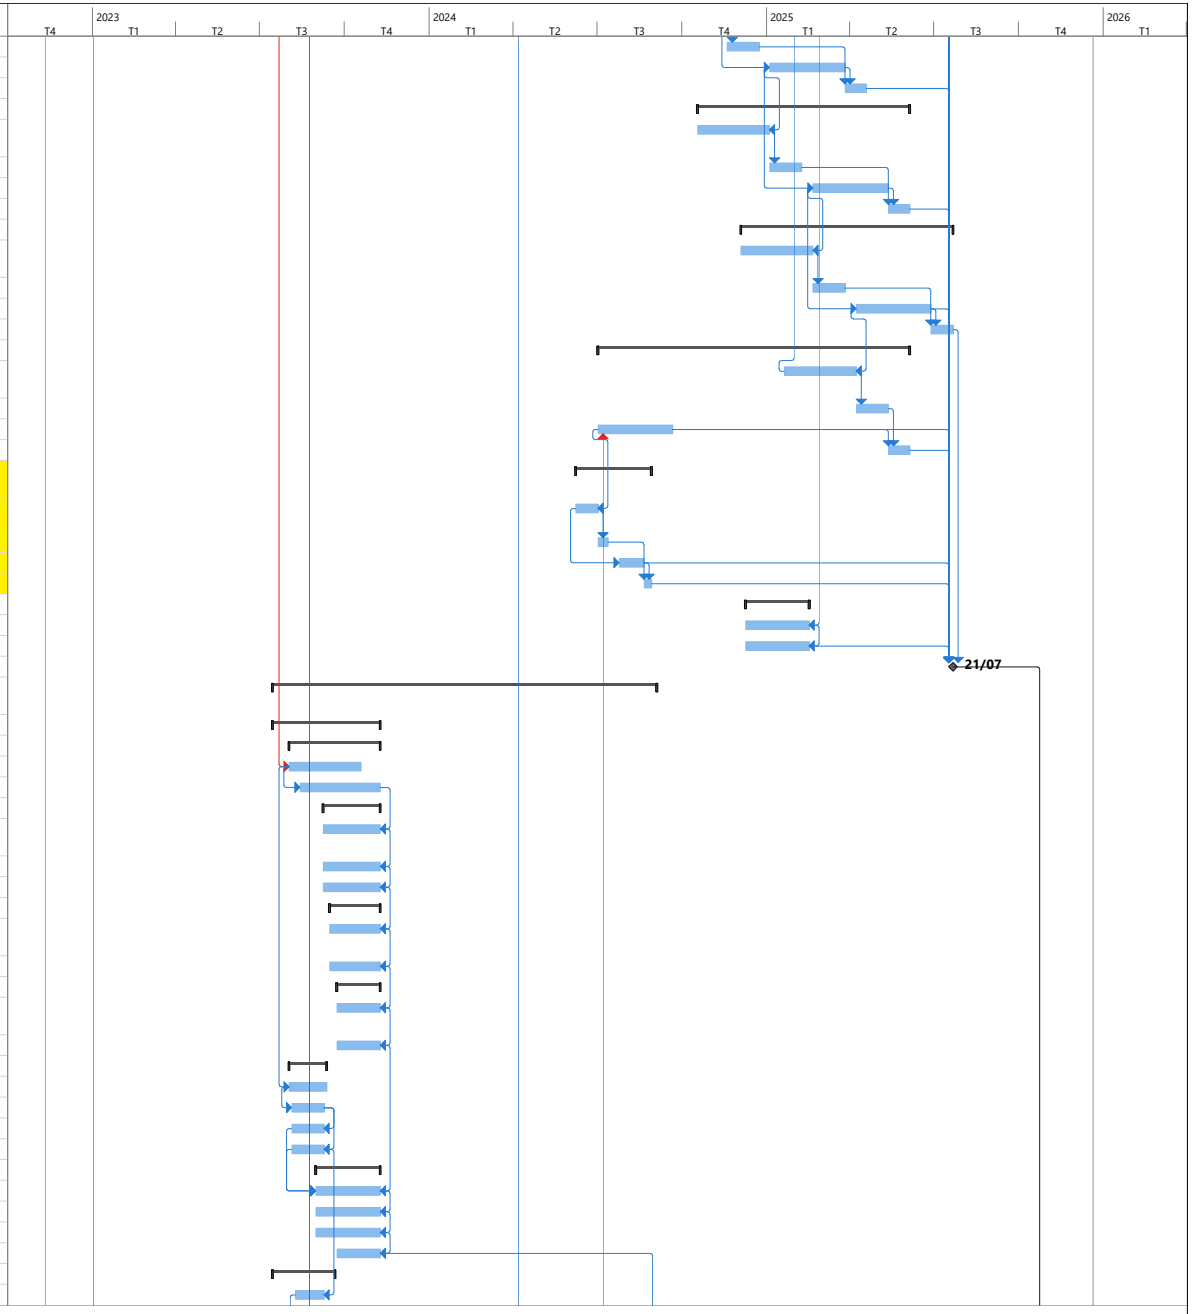

Proyecto: LOTE 2 - Desde la car
Fecha: vie 11/11/22

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual		
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas			
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica			
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
167		ESTABILIZACIÓN DE LA SUB RASANTE	25 días	lun 21/08/23	lun 18/09/23
168		SUB BASE GRANULAR	25 días	mar 22/08/23	mar 19/09/23
169		BASE GRANULAR	25 días	mar 22/08/23	mar 19/09/23
170		PAVIMENTO RÍGIDO	58 días	sáb 15/07/23	mié 20/09/23
171		**SEÑALIZACIÓN**	**10 días**	**lun 18/09/23**	**jue 28/09/23**
172		SEÑALIZACIÓN VERTICAL	10 días	lun 18/09/23	jue 28/09/23
173		SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	10 días	lun 18/09/23	jue 28/09/23
174		**ETAPA 2 CALZADA SUR**	**110 días**	**mar 26/09/23**	**mié 31/01/24**
175		**CONSTRUCCIÓN REDES SECAS**	**70 días**	**mar 26/09/23**	**vie 15/12/23**
176		EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	60 días	sáb 7/10/23	vie 15/12/23
177		RELLENOS	40 días	jue 19/10/23	lun 4/12/23
178		**REDES ELÉCTRICAS**	**40 días**	**jue 19/10/23**	**lun 4/12/23**
179		CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS	40 días	jue 19/10/23	lun 4/12/23
180		CONSTRUCCIÓN DE CAJAS	40 días	jue 19/10/23	lun 4/12/23
181		ALUMBRADO PÚBLICO	40 días	jue 19/10/23	lun 4/12/23
182		**REDES DE TELECOMUNICACIONES**	**40 días**	**jue 19/10/23**	**lun 4/12/23**
183		CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS	40 días	jue 19/10/23	lun 4/12/23
184		CONSTRUCCIÓN DE CAJAS	40 días	jue 19/10/23	lun 4/12/23
185		**REDES DE GAS**	**60 días**	**mar 26/09/23**	**lun 4/12/23**
186		CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS	60 días	mar 26/09/23	lun 4/12/23
187		CONSTRUCCIÓN DE CAJAS	60 días	mar 26/09/23	lun 4/12/23
188		**CONSTRUCCIÓN REDES HÚMEDAS**	**80 días**	**sáb 7/10/23**	**lun 8/01/24**
189		EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	60 días	sáb 7/10/23	vie 15/12/23
190		RELLENOS	70 días	jue 19/10/23	lun 8/01/24
191		RED DE ACUEDUCTO	80 días	sáb 7/10/23	lun 8/01/24
192		RED DE ALCANTARILLADO	80 días	sáb 7/10/23	lun 8/01/24
193		**ESPACIO PÚBLICO**	**46 días**	**sáb 9/12/23**	**mié 31/01/24**
194		ANDENES	40 días	sáb 16/12/23	mié 31/01/24
195		MOBILIARIO	40 días	sáb 16/12/23	mié 31/01/24
196		VEGETACIÓN Y PAISAJISMO	40 días	sáb 16/12/23	mié 31/01/24
197		CULATAS	46 días	sáb 9/12/23	mié 31/01/24
198		**CONSTRUCCIÓN VÍAS**	**54 días**	**sáb 18/11/23**	**vie 19/01/24**
199		EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	27 días	vie 8/12/23	lun 8/01/24
200		ESTABILIZACIÓN DE LA SUB RASANTE	25 días	mié 20/12/23	mié 17/01/24
201		SUB BASE GRANULAR	25 días	jue 21/12/23	jue 18/01/24
202		BASE GRANULAR	25 días	jue 21/12/23	jue 18/01/24
203		PAVIMENTO RÍGIDO	54 días	sáb 18/11/23	vie 19/01/24
204		**SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN**	**10 días**	**mié 17/01/24**	**sáb 27/01/24**
205		SEÑALIZACIÓN VERTICAL	10 días	mié 17/01/24	sáb 27/01/24
206		SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	10 días	mié 17/01/24	sáb 27/01/24
207		**ETAPA 3 CALZADA CENTRAL**	**217 días**	**mar 26/12/23**	**mar 3/09/24**
208		**CORREDOR BRT**	**217 días**	**mar 26/12/23**	**mar 3/09/24**
209		**ESPACIO PÚBLICO**	**70 días**	**lun 29/01/24**	**jue 18/04/24**
210		ANDENES	60 días	lun 29/01/24	sáb 6/04/24
211		MOBILIARIO	60 días	mar 6/02/24	lun 15/04/24
212		VEGETACIÓN Y PAISAJISMO	60 días	vie 9/02/24	jue 18/04/24
213		**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS**	**56 días**	**lun 29/01/24**	**mar 2/04/24**
214		EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	27 días	lun 29/01/24	mié 28/02/24
215		ESTABILIZACIÓN DE LA SUB RASAN	25 días	vie 9/02/24	vie 8/03/24
216		SUB BASE GRANULAR	25 días	sáb 17/02/24	sáb 16/03/24
217		BASE GRANULAR	25 días	lun 26/02/24	lun 25/03/24
218		PAVIMENTO RÍGIDO	41 días	jue 15/02/24	mar 2/04/24
219		**ESTACIONES BRT**	**143 días**	**mar 26/12/23**	**sáb 8/06/24**
220		ESTACIÓN CAR. 69 - FABRICACIÓN	67 días	mar 26/12/23	mié 13/03/24
221		INFRAESTRUCTURA	23 días	jue 15/02/24	mar 12/03/24
222		ESTACIÓN CAR. 69	26 días	mié 13/03/24	jue 11/04/24
223		ACABADOS	50 días	vie 12/04/24	sáb 8/06/24
224		**PUENTE PEATONAL**	**157 días**	**mar 5/03/24**	**mar 3/09/24**

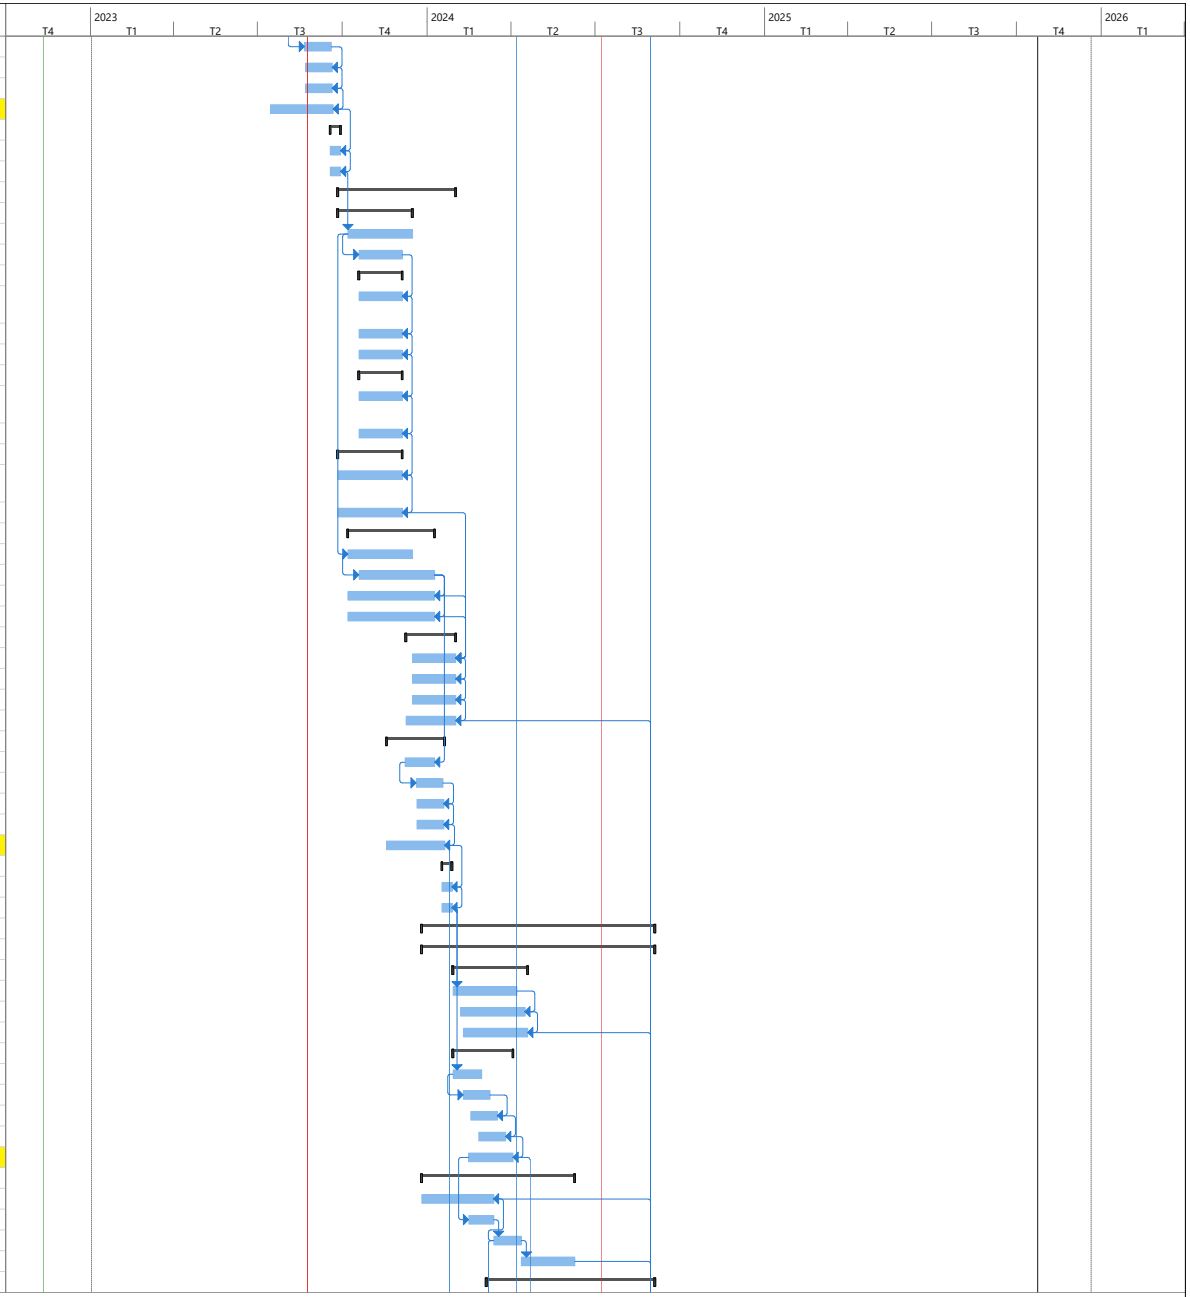

Proyecto: LOTE 2 - Desde la car
Fecha: vie 11/11/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
225		PUENTE ESTACIÓN CAR. 69 - FABRICACION	67 días	mar 5/03/24	mié 22/05/24
226		INFRAESTRUCTURA	20 días	lun 29/04/24	mar 21/05/24
227		PUENTE ESTACIÓN CAR. 69 - INSTALACION	70 días	mié 22/05/24	sáb 10/08/24
228		ACABADOS	20 días	lun 12/08/24	mar 3/09/24
229		**SEÑALIZACIÓN**	**10 días**	**sáb 30/03/24**	**mié 10/04/24**
230		SEÑALIZACIÓN VERTICAL	10 días	sáb 30/03/24	mié 10/04/24
231		SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	10 días	sáb 30/03/24	mié 10/04/24
232		FIN SUBTRAMO CRA CRA 68D A CRA 69F	0 días	mar 3/09/24	mar 3/09/24
233		**CORREDOR VIAL DESDE LA CARRERA 68D HASTA CARRERA 69F**	**165 días**	**jue 11/01/24**	**sáb 20/07/24**
234		**ETAPA 1 CALZADA SUR**	**71 días**	**jue 11/01/24**	**mar 2/04/24**
235		**CONSTRUCCIÓN REDES SECAS**	**57 días**	**sáb 20/01/24**	**mar 26/03/24**
236		EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	57 días	sáb 20/01/24	mar 26/03/24
237		RELLENOS	45 días	jue 1/02/24	sáb 23/03/24
238		**REDES ELÉCTRICAS**	**40 días**	**mié 7/02/24**	**sáb 23/03/24**
239		CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS	40 días	mié 7/02/24	sáb 23/03/24
240		CONSTRUCCIÓN DE CAJAS	40 días	mié 7/02/24	sáb 23/03/24
241		ALUMBRADO PÚBLICO	40 días	mié 7/02/24	sáb 23/03/24
242		**REDES DE TELECOMUNICACIONES**	**40 días**	**mié 7/02/24**	**sáb 23/03/24**
243		CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS	40 días	mié 7/02/24	sáb 23/03/24
244		CONSTRUCCIÓN DE CAJAS	40 días	mié 7/02/24	sáb 23/03/24
245		**REDES DE GAS**	**30 días**	**lun 19/02/24**	**sáb 23/03/24**
246		CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS	30 días	lun 19/02/24	sáb 23/03/24
247		CONSTRUCCIÓN DE CAJAS	30 días	lun 19/02/24	sáb 23/03/24
248		**CONSTRUCCIÓN REDES HÚMEDAS**	**39 días**	**sáb 20/01/24**	**mar 5/03/24**
249		EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	30 días	sáb 20/01/24	vie 23/02/24
250		RELLENOS	36 días	mié 24/01/24	mar 5/03/24
251		RED DE ACUEDUCTO	36 días	mié 24/01/24	mar 5/03/24
252		RED DE ALCANTARILLADO	36 días	mié 24/01/24	mar 5/03/24
253		**ESPACIO PÚBLICO**	**40 días**	**vie 16/02/24**	**mar 2/04/24**
254		ANDENES	40 días	vie 16/02/24	mar 2/04/24
255		MOBILIARIO	40 días	vie 16/02/24	mar 2/04/24
256		VEGETACIÓN Y PAISAJISMO	40 días	vie 16/02/24	mar 2/04/24
257		CULATAS	30 días	mié 28/02/24	mar 2/04/24
258		**CONSTRUCCIÓN VÍAS**	**54 días**	**jue 11/01/24**	**mié 13/03/24**
259		EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	25 días	mar 6/02/24	mar 5/03/24
260		ESTABILIZACIÓN DE LA SUB RASANTE	20 días	sáb 17/02/24	lun 11/03/24
261		SUB BASE GRANULAR	20 días	lun 19/02/24	mar 12/03/24
262		BASE GRANULAR	20 días	lun 19/02/24	mar 12/03/24
263		PAVIMENTO RÍGIDO	54 días	jue 11/01/24	mié 13/03/24
264		**SEÑALIZACIÓN**	**12 días**	**vie 8/03/24**	**jue 21/03/24**
265		SEÑALIZACIÓN VERTICAL	10 días	lun 11/03/24	jue 21/03/24
266		SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	12 días	vie 8/03/24	jue 21/03/24
267		**ETAPA 2 CALZADA NORTE**	**101 días**	**sáb 9/03/24**	**jue 4/07/24**
268		**CONSTRUCCIÓN REDES SECAS**	**55 días**	**sáb 30/03/24**	**sáb 1/06/24**
269		EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	45 días	sáb 30/03/24	mar 21/05/24
270		RELLENOS	45 días	jue 11/04/24	sáb 1/06/24
271		**REDES ELÉCTRICAS**	**40 días**	**mié 17/04/24**	**sáb 1/06/24**
272		CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS	40 días	mié 17/04/24	sáb 1/06/24
273		CONSTRUCCIÓN DE CAJAS	40 días	mié 17/04/24	sáb 1/06/24
274		ALUMBRADO PÚBLICO	40 días	mié 17/04/24	sáb 1/06/24
275		**REDES DE TELECOMUNICACIONES**	**40 días**	**mié 17/04/24**	**sáb 1/06/24**
276		CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS	40 días	mié 17/04/24	sáb 1/06/24
277		CONSTRUCCIÓN DE CAJAS	40 días	mié 17/04/24	sáb 1/06/24
278		**REDES DE GAS**	**30 días**	**lun 29/04/24**	**sáb 1/06/24**

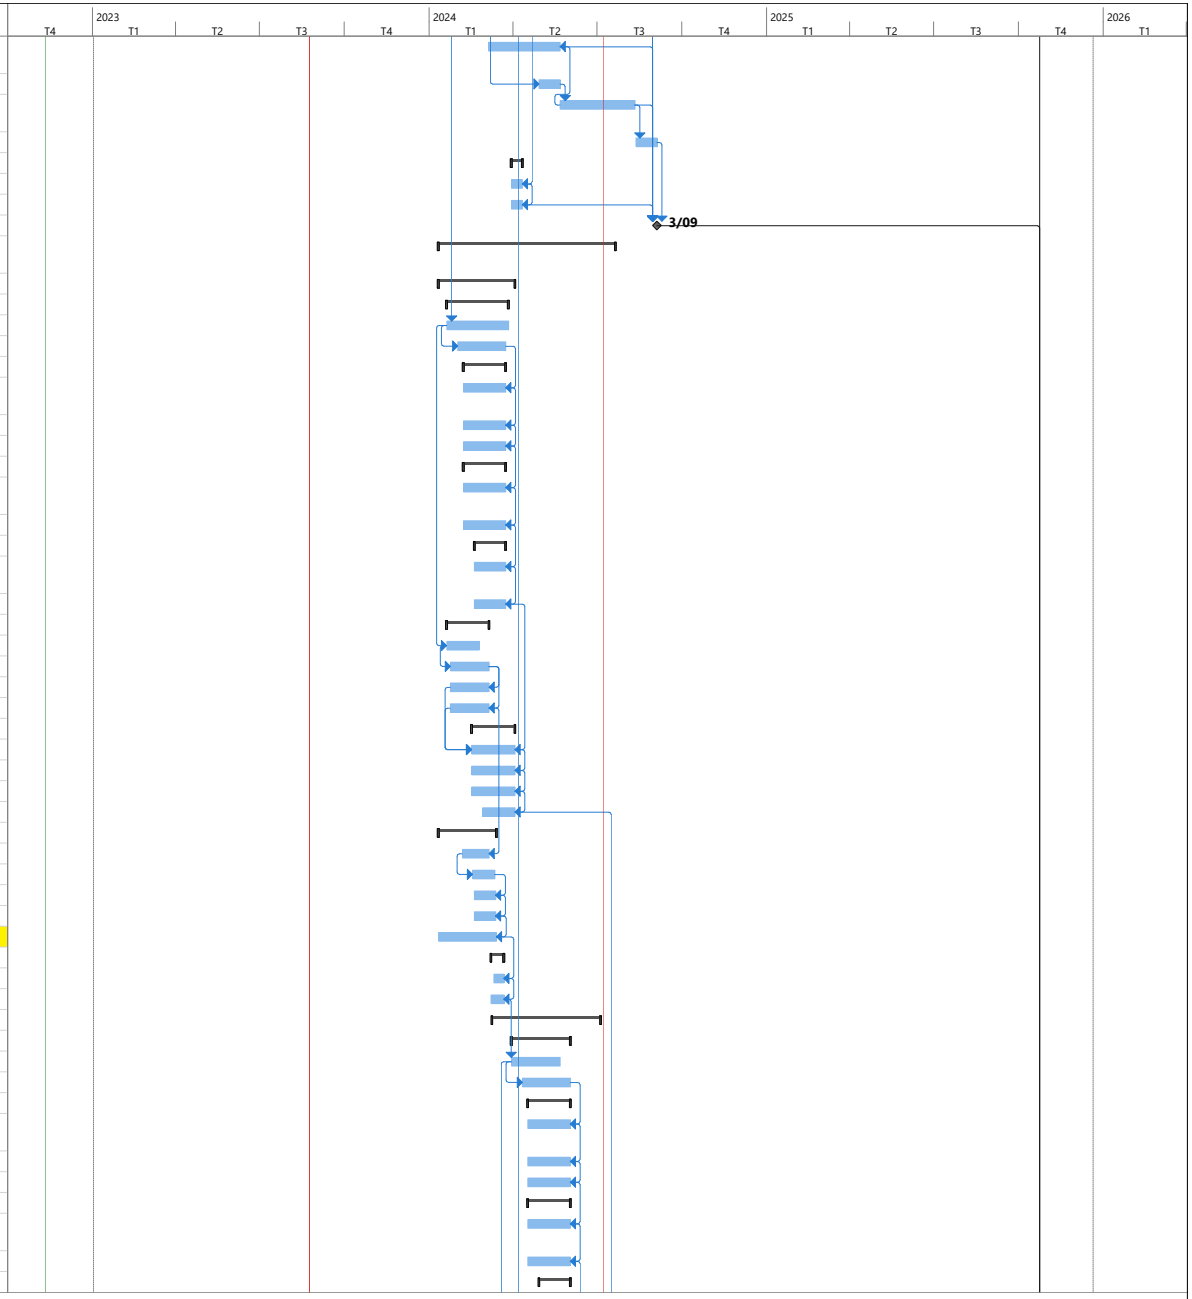

Proyecto: LOTE 2 - Desde la car
Fecha: vie 11/11/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
279		CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS	30 días	lun 29/04/24	sáb 1/06/24
280		CONSTRUCCIÓN DE CAJAS	30 días	lun 29/04/24	sáb 1/06/24
281		**CONSTRUCCIÓN REDES HÚMEDAS**	**35 días**	**sáb 30/03/24**	**jue 9/05/24**
282		EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	35 días	sáb 30/03/24	jue 9/05/24
283		RELLENOS	30 días	mié 3/04/24	mar 7/05/24
284		RED DE ACUEDUCTO	30 días	mié 3/04/24	mar 7/05/24
285		RED DE ALCANTARILLADO	30 días	mié 3/04/24	mar 7/05/24
286		**ESPACIO PÚBLICO**	**60 días**	**vie 26/04/24**	**jue 4/07/24**
287		ANDENES	60 días	vie 26/04/24	jue 4/07/24
288		MOBILIARIO	60 días	vie 26/04/24	jue 4/07/24
289		VEGETACIÓN Y PAISAJISMO	60 días	vie 26/04/24	jue 4/07/24
290		CULATAS	40 días	lun 20/05/24	jue 4/07/24
291		**CONSTRUCCIÓN VÍAS**	**58 días**	**sáb 9/03/24**	**mié 15/05/24**
292		EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	25 días	mar 9/04/24	mar 7/05/24
293		ESTABILIZACIÓN DE LA SUB RASANTE	20 días	sáb 20/04/24	lun 13/05/24
294		SUB BASE GRANULAR	20 días	sáb 20/04/24	lun 13/05/24
295		BASE GRANULAR	20 días	lun 22/04/24	mar 14/05/24
296		PAVIMENTO RÍGIDO	58 días	sáb 9/03/24	mié 15/05/24
297		**SEÑALIZACIÓN**	**10 días**	**lun 13/05/24**	**jue 23/05/24**
298		SEÑALIZACIÓN VERTICAL	10 días	lun 13/05/24	jue 23/05/24
299		SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	10 días	lun 13/05/24	jue 23/05/24
300		**ETAPA 3 CALZADA CENTRAL**	**66 días**	**lun 6/05/24**	**sáb 20/07/24**
301		**CORREDOR BRT**	**66 días**	**lun 6/05/24**	**sáb 20/07/24**
302		**ESPACIO PÚBLICO**	**50 días**	**vie 24/05/24**	**sáb 20/07/24**
303		ANDENES	40 días	vie 24/05/24	mar 9/07/24
304		MOBILIARIO	40 días	sáb 1/06/24	mié 17/07/24
305		VEGETACIÓN Y PAISAJISMO	40 días	mié 5/06/24	sáb 20/07/24
306		**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS**	**41 días**	**lun 6/05/24**	**vie 21/06/24**
307		EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	25 días	vie 24/05/24	vie 21/06/24
308		ESTABILIZACIÓN DE LA SUB RASAN	20 días	mar 28/05/24	mié 19/06/24
309		SUB BASE GRANULAR	20 días	mar 28/05/24	mié 19/06/24
310		BASE GRANULAR	20 días	mié 29/05/24	jue 20/06/24
311		PAVIMENTO RÍGIDO	41 días	lun 6/05/24	vie 21/06/24
312		**SEÑALIZACIÓN**	**10 días**	**mar 18/06/24**	**sáb 29/06/24**
313		SEÑALIZACIÓN VERTICAL	10 días	mar 18/06/24	sáb 29/06/24
314		SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	10 días	mar 18/06/24	sáb 29/06/24
315		FIN SUBTRAMO CRA 68D-CRA 69F	0 días	sáb 20/07/24	sáb 20/07/24
316		**INTERSECCIÓN CARRERA 68**	**639 días**	**lun 9/10/23**	**jue 23/10/25**
317		**OBRAS PREVIAS**	**130 días**	**lun 9/10/23**	**vie 8/03/24**
318		INICIO INTERSECCIÓN AV. 68	0 días	lun 9/10/23	lun 9/10/23
319		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	120 días	mar 10/10/23	lun 26/02/24
320		DEMOLICIONES Y RETIROS PREDIALES	120 días	sáb 21/10/23	vie 8/03/24
321		**FASE 1 - COSTADO NORTE (A NIVEL)**	**58 días**	**jue 2/11/23**	**lun 8/01/24**
322		**CONSTRUCCIÓN VÍAS**	**58 días**	**jue 2/11/23**	**lun 8/01/24**
323		EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	40 días	jue 2/11/23	lun 18/12/23
324		ESTABILIZACIÓN DE LA SUB RASANTE	30 días	sáb 25/11/23	vie 29/12/23
325		SUB BASE GRANULAR	30 días	sáb 25/11/23	vie 29/12/23
326		BASE GRANULAR	30 días	jue 30/11/23	mié 3/01/24
327		PAVIMENTO FLEXIBLE	30 días	mar 5/12/23	lun 8/01/24
328		**FASE 2 - COSTADO NORTE (A DESNIVEL)**	**190 días**	**mar 9/01/24**	**vie 16/08/24**
329		**SUBESTRUCTURAS**	**90 días**	**mar 9/01/24**	**lun 22/04/24**
330		PILOTAJE (INCLUYE EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PILOTE)	80 días	mar 9/01/24	mié 10/04/24
331		CONSTRUCCIÓN DADOS	80 días	sáb 20/01/24	lun 22/04/24
332		**SUPERESTRUCTURA**	**120 días**	**mar 13/02/24**	**lun 1/07/24**
333		CONCRETO ESTRUCTURAL	120 días	mar 13/02/24	lun 1/07/24
334		ACERO ESTRUCTURAL	120 días	mar 13/02/24	lun 1/07/24
335		POSTENSIONAMIENTO PARA SUPERESTRUCTURA	120 días	mar 13/02/24	lun 1/07/24
336		**OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**80 días**	**jue 16/05/24**	**vie 16/08/24**
337		MAMPOSTERÍA EN BLOQUE	40 días	mar 2/07/24	vie 16/08/24

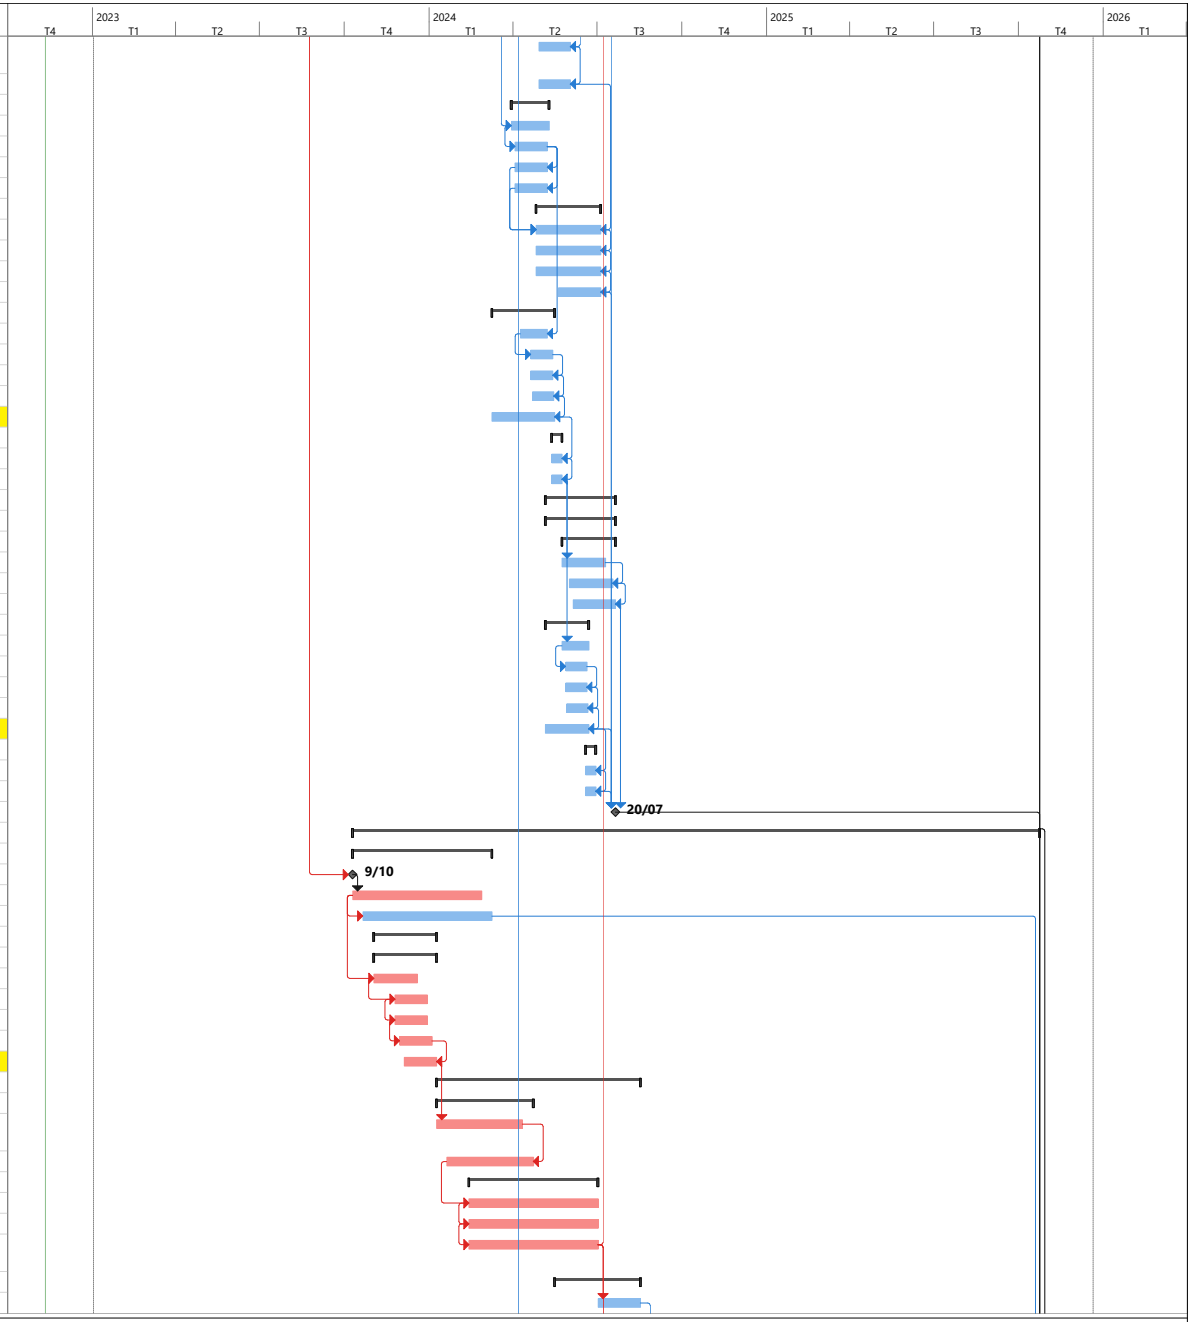

Proyecto: LOTE 2 - Desde la car
Fecha: vie 11/11/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
338		PISOS, PARAPETOS Y BARANDAS	80 días	jue 16/05/24	vie 16/08/24
339		**FASE 3 - COSTADO SUR (A NIVEL Y DESNIVEL)**	**266 días**	**mar 2/07/24**	**mié 7/05/25**
340		**REDES SECAS**	**92 días**	**mar 2/07/24**	**mié 16/10/24**
341		REDES ELÉCTRICAS	85 días	mar 2/07/24	mar 8/10/24
342		ALUMBRADO PÚBLICO	85 días	mié 10/07/24	mié 16/10/24
343		REDES DE TELECOMUNICACIONES	40 días	sáb 31/08/24	mié 16/10/24
344		REDES DE GAS	30 días	jue 12/09/24	mié 16/10/24
345		**REDES HÚMEDAS**	**85 días**	**mar 2/07/24**	**mar 8/10/24**
346		ACUEDUCTO	85 días	mar 2/07/24	mar 8/10/24
347		ALCANTARILLADO	85 días	mar 2/07/24	mar 8/10/24
348		**CONSTRUCCIÓN VÍAS**	**68 días**	**jue 12/09/24**	**vie 29/11/24**
349		EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	50 días	jue 12/09/24	vie 8/11/24
350		ESTABILIZACIÓN DE LA SUB RASANTE	40 días	sáb 5/10/24	mié 20/11/24
351		SUB BASE GRANULAR	40 días	sáb 5/10/24	mié 20/11/24
352		BASE GRANULAR	40 días	jue 10/10/24	lun 25/11/24
353		PAVIMENTO FLEXIBLE	40 días	mar 15/10/24	vie 29/11/24
354		**PUENTE COSTADO SUR**	**136 días**	**sáb 30/11/24**	**mié 7/05/25**
355		**SUBESTRUCTURAS**	**90 días**	**sáb 30/11/24**	**vie 14/03/25**
356		PILOTAJE (INCLUYE EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PILOTE)	80 días	sáb 30/11/24	lun 3/03/25
357		CONSTRUCCIÓN DADOS	80 días	jue 12/12/24	vie 14/03/25
358		**SUPERESTRUCTURA**	**66 días**	**sáb 4/01/25**	**vie 21/03/25**
359		CONCRETO ESTRUCTURAL	66 días	sáb 4/01/25	vie 21/03/25
360		ACERO ESTRUCTURAL	66 días	sáb 4/01/25	vie 21/03/25
361		POSTENSIONAMIENTO PARA SUPERESTRUCTURA	66 días	sáb 4/01/25	vie 21/03/25
362		**OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**80 días**	**mar 4/02/25**	**mié 7/05/25**
363		MAMPOSTERÍA EN BLOQUE	40 días	sáb 22/03/25	mié 7/05/25
364		PISOS, PARAPETOS Y BARANDAS	80 días	mar 4/02/25	mié 7/05/25
365		**FASE 4 - PUENTE CALZADA CENTRAL**	**185 días**	**sáb 22/03/25**	**jue 23/10/25**
366		DEMOLICIÓN PUENTE EXISTENTE	80 días	sáb 22/03/25	lun 23/06/25
367		**SUBESTRUCTURAS**	**90 días**	**mar 20/05/25**	**lun 1/09/25**
368		PILOTAJE (INCLUYE EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PILOTE)	80 días	mar 20/05/25	mié 20/08/25
369		CONSTRUCCIÓN DADOS	80 días	sáb 31/05/25	lun 1/09/25
370		**SUPERESTRUCTURA**	**80 días**	**mar 24/06/25**	**mié 24/09/25**
371		CONCRETO ESTRUCTURAL	80 días	mar 24/06/25	mié 24/09/25
372		ACERO ESTRUCTURAL	80 días	mar 24/06/25	mié 24/09/25
373		POSTENSIONAMIENTO PARA SUPERESTRUCTURA	80 días	mar 24/06/25	mié 24/09/25
374		**OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**80 días**	**mié 23/07/25**	**jue 23/10/25**
375		MAMPOSTERÍA EN BLOQUE	35 días	sáb 13/09/25	jue 23/10/25
376		PISOS, PARAPETOS Y BARANDAS	80 días	mié 23/07/25	jue 23/10/25
377		**SEÑALIZACIÓN**	**35 días**	**sáb 13/09/25**	**jue 23/10/25**
378		SEÑALIZACIÓN VERTICAL	27 días	sáb 13/09/25	mar 14/10/25
379		SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	27 días	sáb 13/09/25	mar 14/10/25
380		FIN INTERSECCIÓN AV. 68	0 días	jue 23/10/25	jue 23/10/25
381		**PASO ELEVADO AV. CONSTITUCIÓN**	**450 días**	**lun 22/04/24**	**sáb 27/09/25**
382		**OBRAS PRELIMINARES**	**200 días**	**lun 22/04/24**	**mar 10/12/24**
383		Inicio intersección Av. Constitución	0 días	lun 22/04/24	lun 22/04/24
384		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	40 días	lun 22/04/24	jue 6/06/24
385		DEMOLICIONES Y RETIROS PREDIALES	40 días	lun 27/05/24	jue 11/07/24
386		ADECUACIÓN DE DESVÍOS	200 días	lun 22/04/24	mar 10/12/24
387		**PASO ELEVADO AV. CONSTITUCIÓN - COSTADO OCCIDENTAL**	**241 días**	**lun 27/05/24**	**lun 3/03/25**
388		**REDES SECAS**	**51 días**	**lun 27/05/24**	**mié 24/07/24**
389		REDES ELÉCTRICAS	51 días	lun 27/05/24	mié 24/07/24
390		ALUMBRADO PÚBLICO	51 días	lun 27/05/24	mié 24/07/24
391		REDES DE TELECOMUNICACIONES	37 días	mié 12/06/24	mié 24/07/24
392		REDES DE GAS	30 días	jue 20/06/24	mié 24/07/24
393		**REDES HÚMEDAS**	**51 días**	**lun 27/05/24**	**mié 24/07/24**
394		ACUEDUCTO	51 días	lun 27/05/24	mié 24/07/24

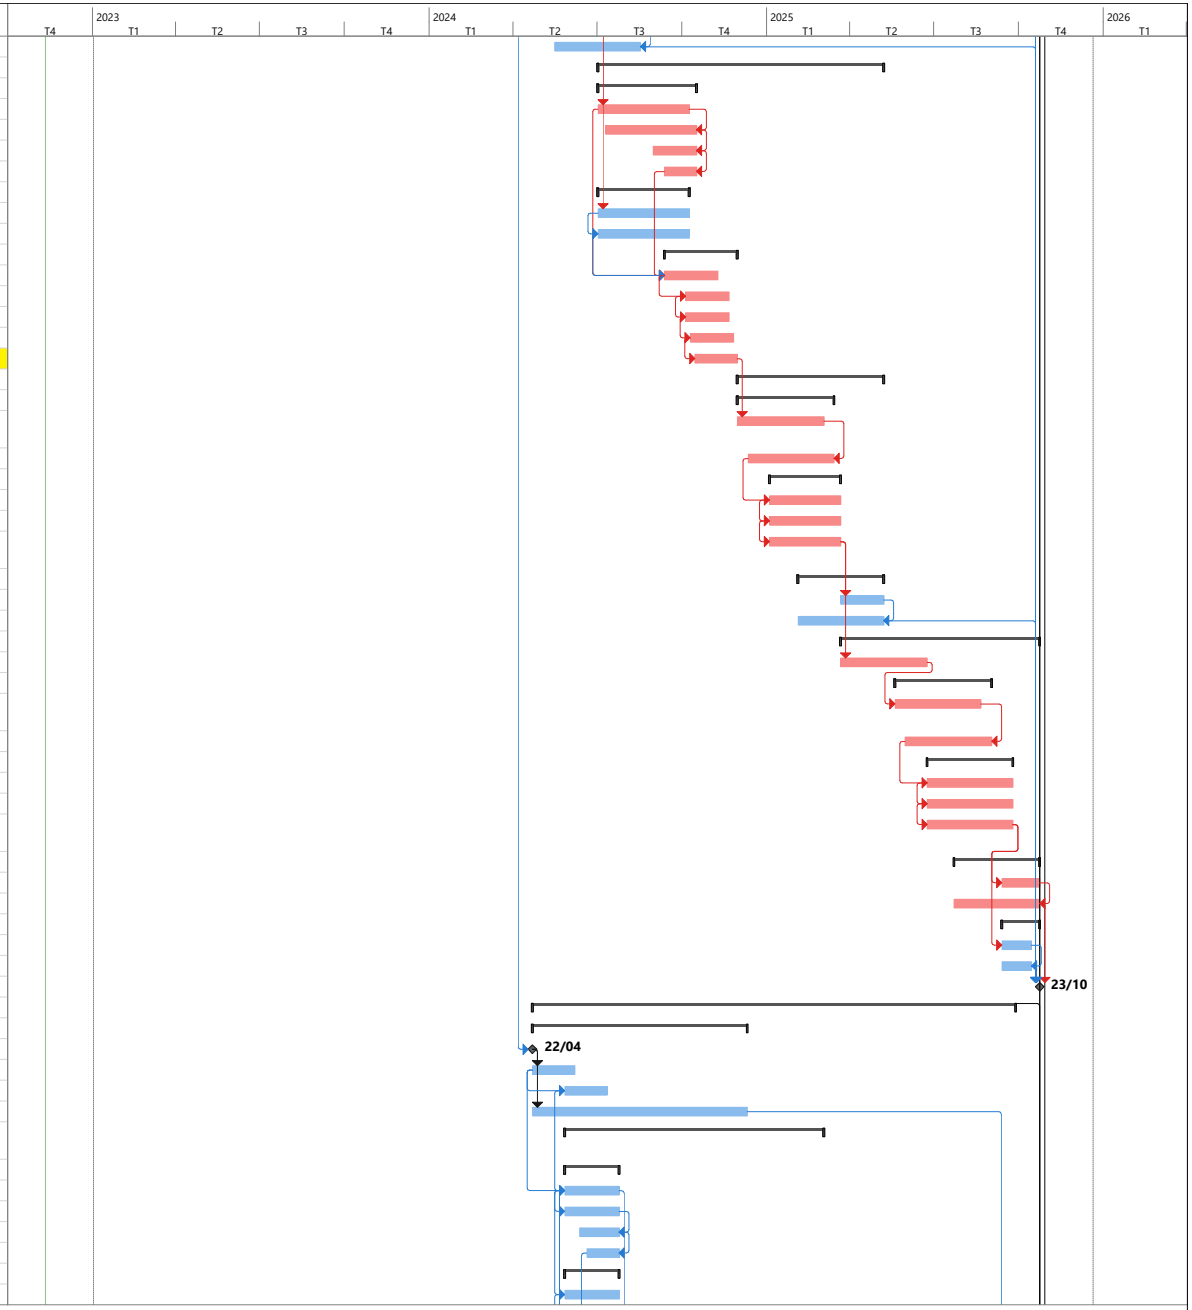

Proyecto: LOTE 2 - Desde la car
Fecha: vie 11/11/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
395		ALCANTARILLADO	51 días	lun 27/05/24	mié 24/07/24
396		**CONSTRUCCIÓN VÍAS**	**58 días**	**vie 12/07/24**	**mar 17/09/24**
397		EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	40 días	vie 12/07/24	mar 27/08/24
398		ESTABILIZACIÓN DE LA SUB RASANTE	30 días	lun 5/08/24	sáb 7/09/24
399		SUB BASE GRANULAR	30 días	lun 5/08/24	sáb 7/09/24
400		BASE GRANULAR	30 días	vie 9/08/24	jue 12/09/24
401		PAVIMENTO FLEXIBLE	30 días	mié 14/08/24	mar 17/09/24
402		**PUENTE**	**190 días**	**jue 25/07/24**	**lun 3/03/25**
403		**SUBESTRUCTURAS**	**90 días**	**jue 25/07/24**	**mié 6/11/24**
404		PILOTAJE (INCLUYE EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PILOTE)	80 días	jue 25/07/24	vie 25/10/24
405		CONSTRUCCIÓN DADOS	80 días	mar 6/08/24	mié 6/11/24
406		**SUPERESTRUCTURA**	**120 días**	**jue 29/08/24**	**mié 15/01/25**
407		CONCRETO ESTRUCTURAL	120 días	jue 29/08/24	mié 15/01/25
408		ACERO ESTRUCTURAL	120 días	jue 29/08/24	mié 15/01/25
409		POSTENSIONAMIENTO PARA SUPERESTRUCTURA	120 días	jue 29/08/24	mié 15/01/25
410		**OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**67 días**	**lun 16/12/24**	**lun 3/03/25**
411		MAMPOSTERÍA EN BLOQUE	40 días	jue 16/01/25	lun 3/03/25
412		PISOS, PARAPETOS Y BARANDAS	67 días	lun 16/12/24	lun 3/03/25
413		**PASO ELEVADO AV. CONSTITUCIÓN - COSTADO ORIENTAL**	**189 días**	**jue 16/01/25**	**sáb 23/08/25**
414		**REDES SECAS**	**52 días**	**jue 16/01/25**	**lun 17/03/25**
415		REDES ELÉCTRICAS	52 días	jue 16/01/25	lun 17/03/25
416		ALUMBRADO PÚBLICO	52 días	jue 16/01/25	lun 17/03/25
417		REDES DE TELECOMUNICACIONES	37 días	lun 3/02/25	lun 17/03/25
418		REDES DE GAS	30 días	mar 11/02/25	lun 17/03/25
419		**REDES HÚMEDAS**	**51 días**	**jue 16/01/25**	**sáb 15/03/25**
420		ACUEDUCTO	51 días	jue 16/01/25	sáb 15/03/25
421		ALCANTARILLADO	51 días	jue 16/01/25	sáb 15/03/25
422		**CONSTRUCCIÓN VÍAS**	**58 días**	**mar 4/03/25**	**vie 9/05/25**
423		EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	40 días	mar 4/03/25	vie 18/04/25
424		ESTABILIZACIÓN DE LA SUB RASANTE	30 días	jue 27/03/25	mié 30/04/25
425		SUB BASE GRANULAR	30 días	jue 27/03/25	mié 30/04/25
426		BASE GRANULAR	30 días	mar 1/04/25	lun 5/05/25
427		PAVIMENTO FLEXIBLE	30 días	sáb 5/04/25	vie 9/05/25
428		**PUENTE**	**137 días**	**mar 18/03/25**	**sáb 23/08/25**
429		**SUBESTRUCTURAS**	**90 días**	**mar 18/03/25**	**lun 30/06/25**
430		PILOTAJE (INCLUYE EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PILOTE)	80 días	mar 18/03/25	mié 18/06/25
431		CONSTRUCCIÓN DADOS	80 días	sáb 29/03/25	lun 30/06/25
432		**SUPERESTRUCTURA**	**67 días**	**mar 22/04/25**	**mar 8/07/25**
433		CONCRETO ESTRUCTURAL	67 días	mar 22/04/25	mar 8/07/25
434		ACERO ESTRUCTURAL	67 días	mar 22/04/25	mar 8/07/25
435		POSTENSIONAMIENTO PARA SUPERESTRUCTURA	67 días	mar 22/04/25	mar 8/07/25
436		**OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**69 días**	**jue 5/06/25**	**sáb 23/08/25**
437		MAMPOSTERÍA EN BLOQUE	40 días	mié 9/07/25	sáb 23/08/25
438		PISOS, PARAPETOS Y BARANDAS	69 días	jue 5/06/25	sáb 23/08/25
439		**PASO A NIVEL AV. CENTENARIO**	**60 días**	**mié 9/07/25**	**mar 16/09/25**
440		CALZADA NORTE	20 días	mié 9/07/25	jue 31/07/25
441		CALZADA SUR	20 días	vie 1/08/25	sáb 23/08/25
442		CALZADA CENTRAL	20 días	lun 25/08/25	mar 16/09/25
443		FIN INTERSECCIÓN AV. CONSTITUCIÓN	0 días	mar 16/09/25	mar 16/09/25
444		**SEÑALIZACIÓN**	**30 días**	**lun 25/08/25**	**sáb 27/09/25**
445		SEÑALIZACIÓN VERTICAL	27 días	lun 25/08/25	mié 24/09/25
446		SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	27 días	lun 25/08/25	mié 24/09/25
447		COLOCACIÓN ELEMENTOS FÍSICOS (SEMÁFOROS)	30 días	lun 25/08/25	sáb 27/09/25
448		CONTROL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (SEMÁFOROS)	30 días	lun 25/08/25	sáb 27/09/25
449		**RECIBO DE OBRA**	50 días	vie 24/10/25	sáb 20/12/25

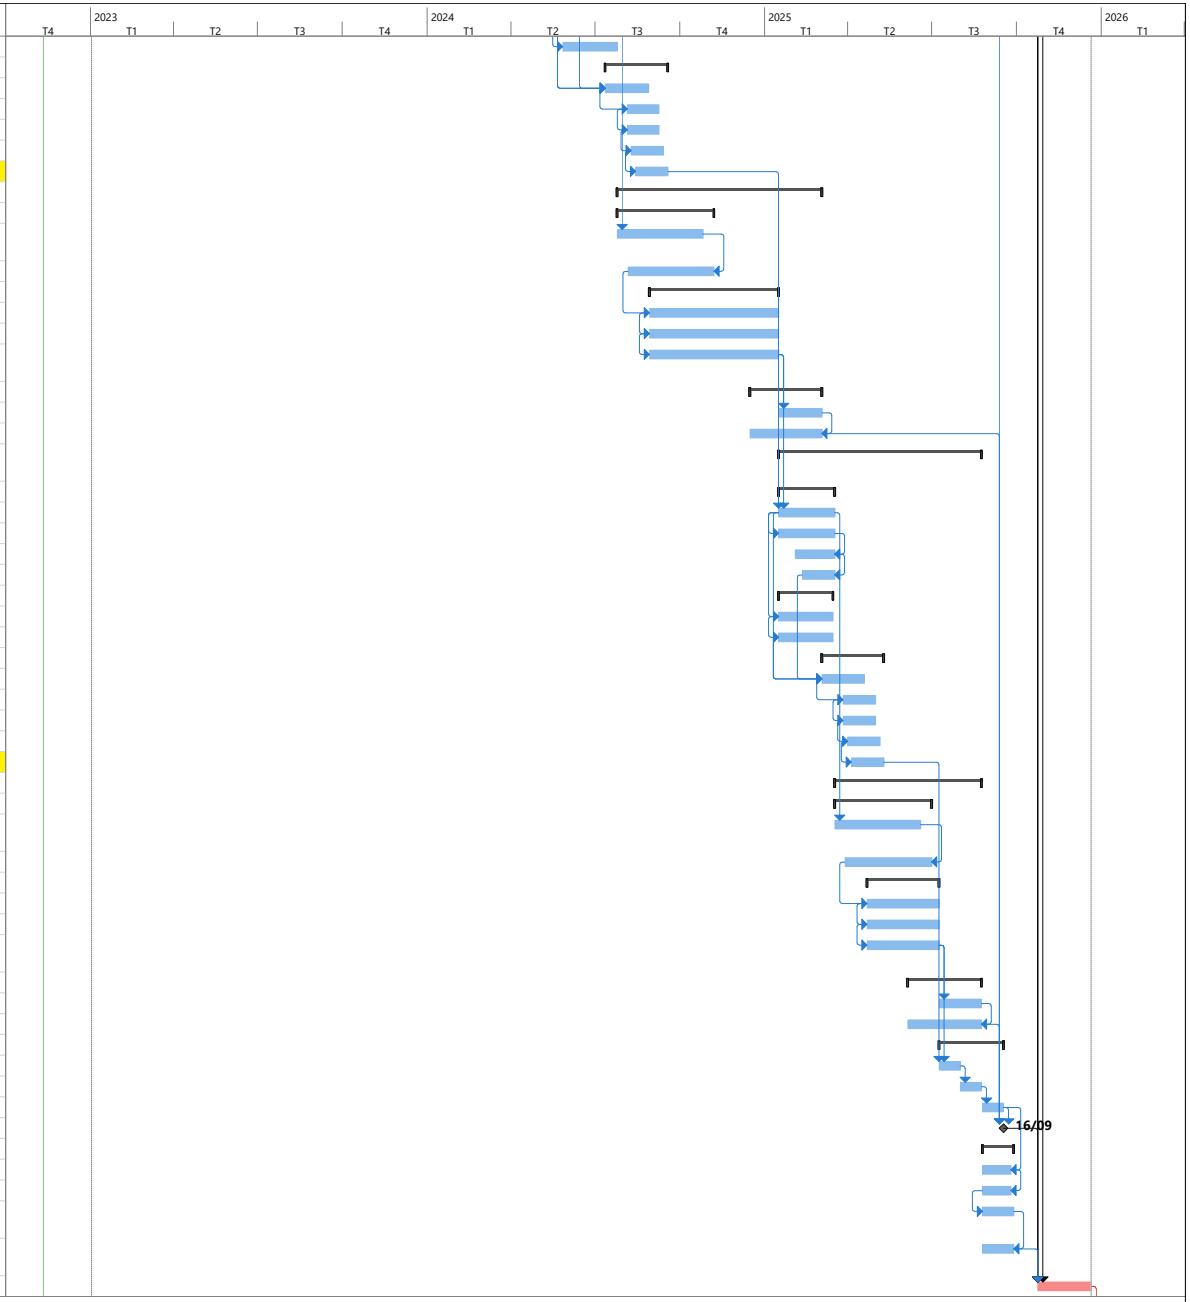

Proyecto: LOTE 2 - Desde la car
Fecha: vie 11/11/22

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual		
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas			
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica			
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
450		FIN LOTE 2 - Desde la carrera 56 hasta la Avenida Boyacá	0 días	sáb 20/12/25	sáb 20/12/25



Proyecto: LOTE 2 - Desde la car
Fecha: vie 11/11/22

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas	
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica	
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso	
