
CTO DE OBRA No.:	706 DE 2022				**MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA**
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.				
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	**VALOR INICIAL:**	$	560,381,443	**PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**
INTERVENTOR	ETICARQ S.A.S.	**VR ADICIONAL No. 1:**	$	-	
REP. LEGAL:	Ing. FERNANDO LOZANO CALDERÓN	**VALOR TOTAL:**	$	560,381,443	


CAPÍTULO:	Preliminares	**ÍTEM**	1,1,1 Cerramiento perimetral en lona verde h=2.10 m incluye estructura de soport, retiro a final de obra	**UNIDAD**	ml	UBICACIÓN	**PARQUE 20 DE JULIO**	


ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:










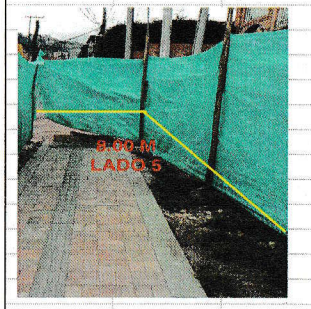

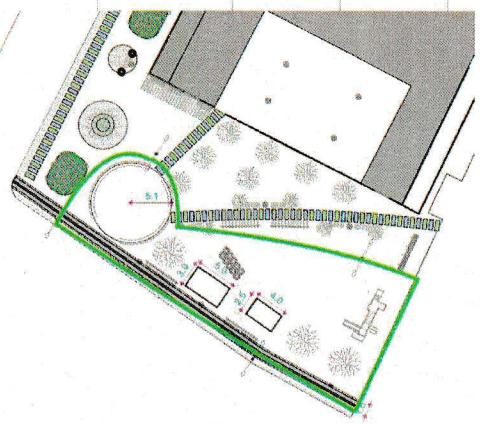

Localización		Largo (m)	Ancho o Espesor (m)	Altura (m)	Área (m2) o Cantidad	Long Total
Cerramiento lona verde	Lado 1	51.00				51.00
cerramiento lona verde	Lado 2	14.00				14.00
cerramiento lona verde	Lado 3	4.00				4.00
cerramiento lona verde	Lado 4	43.00				43.00
cerramiento lona verde	Lado 5	8.00				8.00
						-
Cantidad Total						120.00
Menos Cantidad pagada a la fecha						-
Cantidad Total Presente Acta						**120.00**

OBSERVACIONES:

ETICARQ SAS

Contratista de obra:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	ING. LAURA TENJO	Interventoría:	ING. CAROLINA BELLO RAMIREZ
Mat. Profesional:	25202-18979	25202-372059	Mat. Profesional	091037-0563226


VoBo.


CTO DE OBRA No.:	706 DE 2022				MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.				
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	VALOR INICIAL:	$	560,381,443	
INTERVENTOR	ETICARQ S.A.S.	VR ADICIONAL No. 1:	$	-	PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES
REP. LEGAL:	Ing. FERNANDO LOZANO CALDERÓN	VALOR TOTAL:	$	560,381,443	

CAPÍTULO:	Preliminares	ÍTEM	1,2,1 Excavación manual, (incluye, retiro y disposición final en sitio autorizado), cimentación, tanque, cerramiento	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	PARQUE 20 DE JULIO

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:



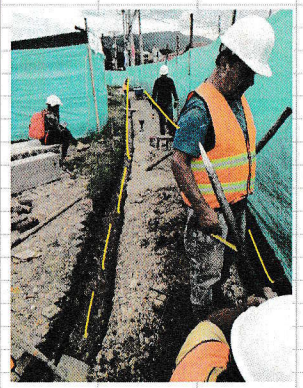

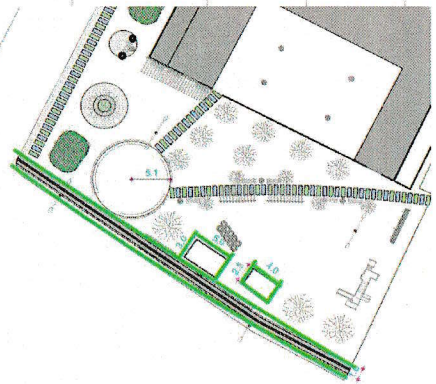

Localización		Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (und)	Long Total
EXCAVACION BORDILLO	EXC. 1	50.57	0.30	0.50	2.00	15.17
EXCAVACION ADOQUIN	EXC. 2	47.75	1.20	0.10	1.00	5.73
EXCAVACION MESAS	EXC. 3	3.90	2.36	0.30	2.00	5.52
EXC. MESA PIN PON	EXC.4	4.72	2.74	0.30	1.00	3.88
EXCAVACION RAMPA 1	EXC. 5	1.00	1.20	0.30	1.00	0.36
EXCVACION RAMPA 2	EXC. 6	1.82	1.20	0.30	1.00	0.66
Cantidad Total						31.32
Menos Cantidad pagadas a la fecha						-
Cantidad Total Presente Acta						**31.32**

OBSERVACIONES:

ETICARQ SAS

VoBo.

Contratista de obra:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	ING. LAURA TENJO	Interventoría:	ING. CAROLINA BELLO RAMIREZ	
Mat. Profesional:	25202-18979	25202-372059	Mat. Profesional	091037-0563226	

CTO DE OBRA No.:	706 DE 2022				
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.				
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	VALOR INICIAL:	$	560,381,443	
INTERVENTOR	ETICARQ S.A.S.	VR ADICIONAL No. 1:	$	-	
REP. LEGAL:	Ing. FERNANDO LOZANO CALDERÓN	VALOR TOTAL:	$	560,381,443	

MUNICIPIO DE CHÍA
CUNDINAMARCA


PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES


CAPÍTULO:	Preliminares	ÍTEM	1,2,4 Relleno con SUB-BASE GRANULAR (Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación 95% del Proctor.). (NORMA INVIAS 320)	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	PARQUE 20 DE JULIO

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:







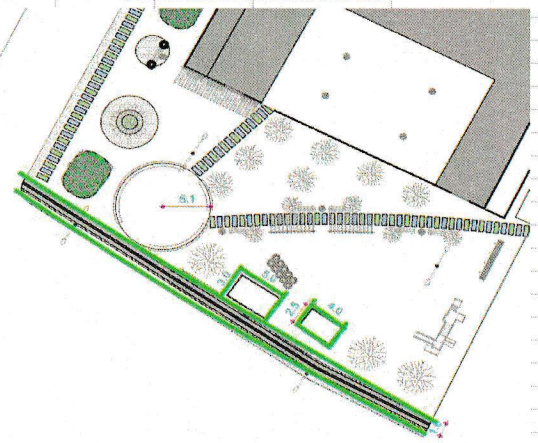

Localización		Largo (m)	Ancho (m)	espesor (m)	Cantidad (und)	Long Total
relleno bordillo	R 1	50.57	0.30	0.15	2.00	4.55
relleno adoquin	R 2	47.75	1.20	0.10	1.00	5.73
relleno mesas ajedrez	R 3	3.90	2.36	0.30	2.00	5.52
relleno mesa pin pon	R 4	4.72	2.74	0.30	1.00	3.88
relleno rampa 1	R 5	1.00	1.20	0.20	1.00	0.24
relleno rampa 2	R 6	1.82	1.20	0.20	1.00	0.44
Cantidad Total						20.36
Menos Cantidad pagada a la fecha						-
Cantidad Total Presente Acta						**20.36**

OBSERVACIONES:

ETICARQ SAS


VoBo.


Contratista de obra:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	ING. LAURA TENJO	Interventoría:	ING. CAROLINA BELLO RAMIREZ
Mat. Profesional:	25202-18979	25202-372059	Mat. Profesional	091037-0563226


CTO DE OBRA No.:	706 DE 2022				**MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA**
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.				
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	**VALOR INICIAL:**	$	560,381,443	**PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**
INTERVENTOR	ETICARQ S.A.S.	**VR ADICIONAL No. 1:**	$	-	
REP. LEGAL:	Ing. FERNANDO LOZANO CALDERÓN	**VALOR TOTAL:**	$	560,381,443	


CAPÍTULO:	Estructuras	**ÍTEM**	2,1,1 Placa de contrapiso en concreto 3000 psi e= 8cm, incluye Polietileno, no incluye refuerzo	**UNIDAD**	m2	UBICACIÓN	**PARQUE 20 DE JULIO**	


ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:

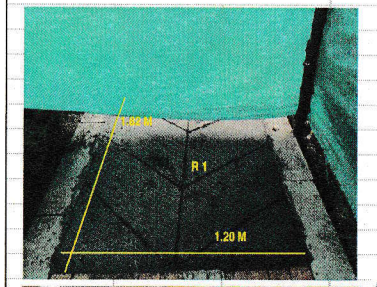





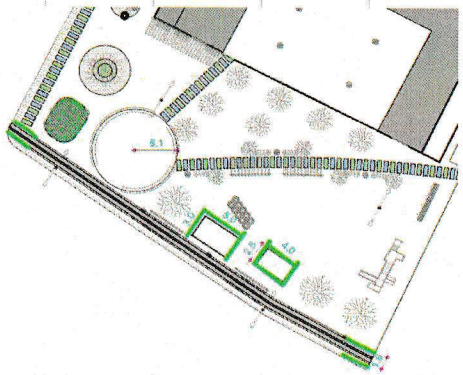

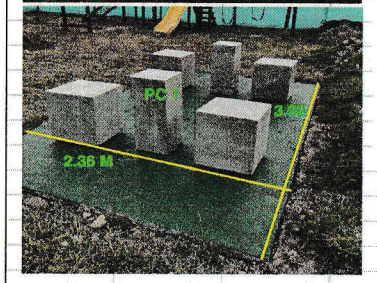

Localización		Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Cantidad (und)	Long Total
PLACA MESAS AJEDREZ	PC 1	3.90	2.36		1.00	9.20
PLACA MESA PIN PON	PC2	4.72	2.74		1.00	12.93
RAMPA 1	R 1	1.82	1.20		1.00	2.18
RAMPA 2	R 2	1.00	1.20		1.00	1.20
						-
						-
						-
Cantidad Total						25.52
Menos Cantidad pagada a la fecha						-
Cantidad Total Presente Acta						**25.52**

OBSERVACIONES:

ETICARQ SAS


VoBo.


Contratista de obra:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	ING. LAURA TENJO	Interventoría:	ING. CAROLINA BELLO RAMIREZ	
Mat. Profesional:	25202-18979	25202-372059	Mat. Profesional	091037-0563226	

CTO DE OBRA No.:	706 DE 2022			**MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA**	
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.				
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	**VALOR INICIAL:**	$ 560,381,443	**PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**	
INTERVENTOR	ETICARQ S.A.S.	**VR ADICIONAL No. 1:**	$ -		
REP. LEGAL:	Ing. FERNANDO LOZANO CALDERÓN	**VALOR TOTAL:**	$ 560,381,443		

CAPÍTULO:	Estructuras	**ÍTEM**	2,1,2 instalación de Malla electrosoldada	**UNIDAD**	Kg	UBICACIÓN	**PARQUE 20 DE JULIO**	

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:

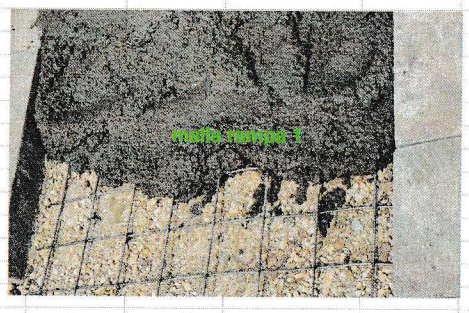

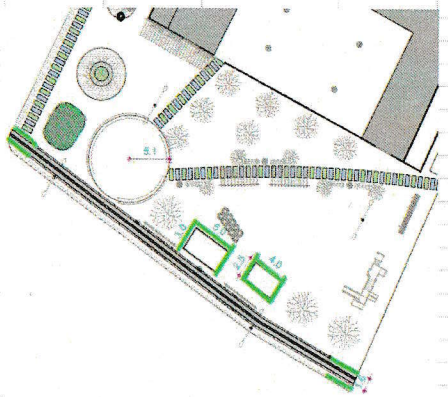

Localización	Largo (m)	Ancho o Espesor (m)	Peso (kg)	Área (m2) o Cantidad	Long Total
MALLA E. MESA AJEDREZ	3.90	2.36	2.96		27.24
MALLA E. MESA PIN PON	4.72	2.74	2.96		38.28
MALLA E. RAMPA 1	1.82	1.20	2.96		6.46
MALL E. RAMPA 2	1.00	1.20	2.96		3.55
					-
					-
					-
Cantidad Total					75.54
Menos Cantidad pagada a la fecha					-
Cantidad Total Presente Acta					**75.54**

OBSERVACIONES:


ETICARQ SAS

VoBo.

Contratista de obra:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	ING. LAURA TENJO	Interventoría:	ING. CAROLINA BELLO RAMIREZ
Mat. Profesional:	25202-18979	25202-372059	Mat. Profesional	091037-0563226

CTO DE OBRA No.:	706 DE 2022			**MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA**	
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.				
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	**VALOR INICIAL:**	$ 560,381,443	**PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**	
INTERVENTOR	ETICARQ S.A.S.	**VR ADICIONAL No. 1:**	$ -		
REP. LEGAL:	Ing. FERNANDO LOZANO CALDERÓN	**VALOR TOTAL:**	$ 560,381,443		

CAPÍTULO:	Urbanismo y Obras exteriores	**ÍTEM**	3,2,1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN, INCLUYE SELLO DE JUNTAS BARRIDO Y RETIRO DE CAPA VEGETAL	**UNIDAD**	m2	UBICACIÓN	**PARQUE 20 DE JULIO**		
EMAS Y FOTOGRAFÍAS:				Localización	Largo (m)	Ancho o Espesor (m)	Altura (m)	Cantidad (und)	Long Total
				Reparación y Mantenimiento Juegos Madera				2.00	2.00
									-
									-
									-
									-
									-

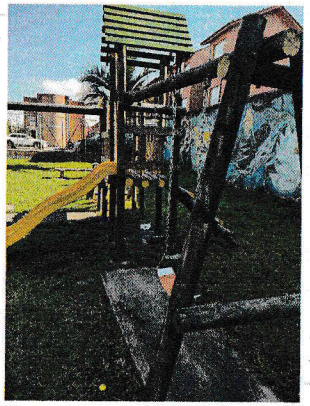



OBSERVACIONES:	**Cantidad Total**			2.00
	Menos Cantidad pagada a la fecha			-
	Cantidad Total Presente Acta			**2.00**

ETICARQ SAS

Contratista de obra:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	ING. LAURA TENJO	Interventoría:	ING. CAROLINA BELLO RAMIREZ
Mat. Profesional:	25202-18979	25202-372059	Mat. Profesional	091037-0563226

VoBo.


CTO DE OBRA No.:	706 DE 2022				MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.				
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	VALOR INICIAL:	$ 560,381,443		PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES
INTERVENTOR	ETICARQ S.A.S.	VR ADICIONAL No. 1:	$ -		
REP. LEGAL:	Ing. FERNANDO LOZANO CALDERÓN	VALOR TOTAL:	$ 560,381,443		


CAPÍTULO:	Urbanismo y Obras exteriores	ÍTEM	3,2,3 INSTALACION BANCA CONCRETO GRC 21 MP PIGMENTADO	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	PARQUE 20 DE JULIO	
ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:			Localización	Largo (m)	Ancho o Espesor (m)	Altura (m)	Cantidad (und)	Long Total
			BANCAS DE CONCRETO				7.00	7.00
								-
								-
								-
								-
								-

CTO DE OBRA No.:	706 DE 2022				MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.				
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	VALOR INICIAL:	$	560,381,443	
INTERVENTOR	ETICARQ S.A.S.	VR ADICIONAL No. 1:	$	-	PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES
REP. LEGAL:	Ing. FERNANDO LOZANO CALDERÓN	VALOR TOTAL:	$	560,381,443	

CAPÍTULO:	Urbanismo y Obras exteriores	**ÍTEM**	3,2,7 PINTURA EXTERIOR		**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	PARQUE 20 DE JULIO		
ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:				Localización	Largo (m)	Ancho o Espesor (m)	Altura (m)	Área (m2) o Cantidad	Long Total
				PASOS 1 AMARILLO	1.20	0.35		105.00	44.10
				PASOS 2 VERDE	0.80	0.35		40.00	11.20
									-
									-
									-
									-
									-
				Cantidad Total					55.30
				Menos Cantidad Pagada a la fecha					-
				Cantidad Total Presente Acta					**55.30**



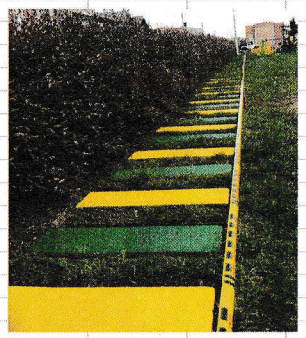

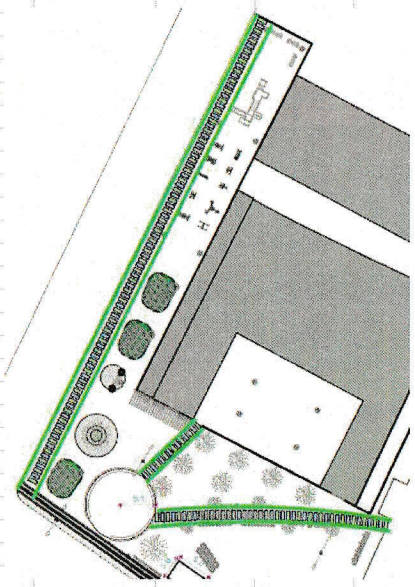

OBSERVACIONES:

ETICARQ SAS

Contratista de obra:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	ING. LAURA TENJO	Interventoría:	ING. CAROLINA BELLO RAMIREZ
Mat. Profesional:	25202-18979	25202-372059	Mat. Profesional	091037-0563226

VoBo.


CTO DE OBRA No.:	706 DE 2022				**MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA**
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.				
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	**VALOR INICIAL:**	$	560,381,443	**PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**
INTERVENTOR	ETICARQ S.A.S.	**VR ADICIONAL No. 1:**	$	-	
REP. LEGAL:	Ing. FERNANDO LOZANO CALDERÓN	**VALOR TOTAL:**	$	560,381,443	

CAPÍTULO:	Urbanismo y Obras exteriores	**ÍTEM**	3,2,8 instalación piso en adoquín 20x10x6cm (incluye base 4cm arena nivelación y arena de sello)	**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	PARQUE 20 DE JULIO	

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:





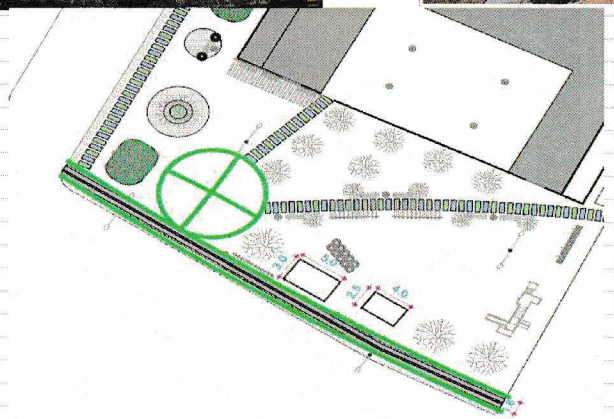

Localización	Largo (m)	Ancho o Espesor (m)	Altura (m)	Área (m2) o Cantidad	Long Total
ADOQUIN PEATONAL NUEVO	5.00	1.20		4.00	24.00
ADOQUIN PEAT. ANDEN	47.75	1.20			57.30
Cantidad Total					81.30
Menos Cantidad pagada a la fecha					-
Cantidad Total Presente Acta					**81.30**

OBSERVACIONES:

ETICARQ SAS

Contratista de obra:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	ING. LAURA TENJO	Interventoría:	ING. CAROLINA BELLO RAMIREZ
Mat. Profesional:	25202-18979	25202-372059	Mat. Profesional	091037-0563226

VoBo.

CTO DE OBRA No.:	706 DE 2022				**MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA**
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.				
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	**VALOR INICIAL:**	$	560,381,443	
INTERVENTOR	ETICARQ S.A.S.	**VR ADICIONAL No. 1:**	$	-	**PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**
REP. LEGAL:	Ing. FERNANDO LOZANO CALDERÓN	**VALOR TOTAL:**	$	560,381,443	

CAPÍTULO:	Urbanismo y Obras exteriores	**ÍTEM**	3,2,10 LUMINARIAS SOLAR DE 4000 LUMENES/ PANEL SOLAR/ SENSOR DE MOVIMIENTO (3 NIVELES DE ILUMINACION)	**UNIDAD**	Un	**UBICACIÓN**	PARQUE 20 DE JULIO		

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:







Localización	Largo (m)	Ancho o Espesor (m)	Altura (m)	Cantidad (und)	Long Total
LUMINARIAS SOLAR DE 4000 LUMENES				3.00	3.00
					-
					-
					-
					-
					-
Cantidad Total					3.00
Menos Cantidad Pagadas a la fecha					-
Cantidad Total Presente Acta					**3.00**


OBSERVACIONES:

ETICARQ SAS

Contratista de obra:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	ING. LAURA TENJO	Interventoría:	ING. CAROLINA BELLO RAMIREZ
Mat. Profesional:	25202-18979	25202-372059	Mat. Profesional	091037-0563226

VoBo.

CTO DE OBRA No.:	706 DE 2022			**MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA**	
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.				
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	**VALOR INICIAL:**	$ 560,381,443		
INTERVENTOR	ETICARQ S.A.S.	**VR ADICIONAL No. 1:**	$ -	**PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**	
REP. LEGAL:	Ing. FERNANDO LOZANO CALDERÓN	**VALOR TOTAL:**	$ 560,381,443		

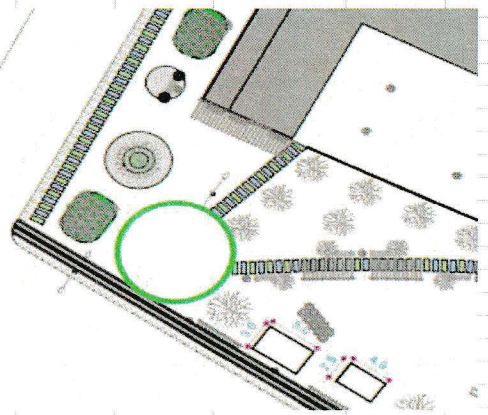CAPÍTULO:	Urbanismo y Obras exteriores	**ÍTEM**	NP 3,2,7,1 DESMONTE,CORTE Y REINSTALACION ADOQUIN EXISTENTE	**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	PARQUE 20 DE JULIO		
ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:			Localización	Largo (m)	Ancho o Espesor (m)	Altura (m)	Área (m2) o Cantidad	Long Total
			DESMONTE,CORTE Y REINSTALACION ADOQUIN EXISTENTE				78.54	78.54
								-
								-
								-
								-
								-
								
OBSERVACIONES:			**Cantidad Total**					78.54
			Menos Cantidad pagada a la fecha					-
			Cantidad Total Presente Acta					**78.54**

ETICARQ SAS

Contratista de obra:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	ING. LAURA TENJO	Interventoría:	ING. CAROLINA BELLO RAMIREZ
Mat. Profesional:	25202-18979	25202-372059	Mat. Profesional	091037-0563226


VoBo.


CTO DE OBRA No.:	706 DE 2022		MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.		
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	VALOR INICIAL: $ 560,381,443	PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES
INTERVENTOR	ETICARQ S.A.S.	VR ADICIONAL No. 1: $ -	
REP. LEGAL:	Ing. FERNANDO LOZANO CALDERÓN	VALOR TOTAL: $ 560,381,443	

CAPÍTULO:	Urbanismo y Obras exteriores	ÍTEM	NP 3,2,8,1 Bordillo prefabricado tipo A80 (Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI).	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	PARQUE 20 DE JULIO

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:





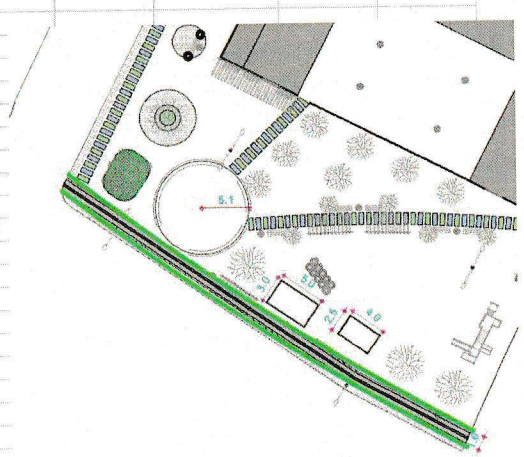Localización		Largo (m)	Ancho o Espesor (m)	Altura (m)	Área (m2) o Cantidad	Long Total
						-
BORDILLO 1	B1	1.82			2.00	3.64
BORDILLO 2	B2	4.40			2.00	8.80
BORDILLO 3	B3	11.10			2.00	22.20
BORDILLO 4	B4	18.20			2.00	36.40
BORDILLO 5	B5	7.10			2.00	14.20
BORDILLO 6	B6	7.95			2.00	15.90
Cantidad Total						101.14
Menos Cantidad pagada a la fecha						-
Cantidad Total Presente Acta						**101.14**

OBSERVACIONES:

ETICARQ SAS

Contratista de obra:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	ING. LAURA TENJO	Interventoría:	ING. CAROLINA BELLO RAMIREZ	
Mat. Profesional:	25202-18979	25202-372059	Mat. Profesional	091037-0563226	

VoBo.

CTO DE OBRA No.:	706 DE 2022				**MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA**
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.				
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	**VALOR INICIAL:**	$	560,381,443	**PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**
INTERVENTOR	ETICARQ S.A.S.	**VR ADICIONAL No. 1:**	$	-	
REP. LEGAL:	Ing. FERNANDO LOZANO CALDERÓN	**VALOR TOTAL:**	$	560,381,443	

CAPÍTULO:	Preliminares	**ÍTEM**	1,1,1 Cerramiento perimetral en lona verde h=2.10 m incluye estructura de soporte, retiro a final de obra	**UNIDAD**	ml	UBICACIÓN	**PARQUE CASA DE LA CULTURA**		
ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:				Localización		Largo (m)	Ancho o Espesor (m)	Altura (m)	Área (m2) o Cantidad	Long Total
				Cerramiento lona verde	Lado 1	15.00				15.00
				cerramiento lona verde	Lado 2	5.00				5.00
				cerramiento lona verde	Lado 3	13.00				13.00
				cerramiento lona verde	Lado 4	10.00				10.00
				cerramiento lona verde	Lado 5	8.00				8.00
										-







Cantidad Total		51.00
Menos Cantidad pagada a la fecha		-
Cantidad Total Presente Acta		**51.00**

OBSERVACIONES:


ETICARQ SAS


Contratista de obra:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	ING. LAURA TENJO	Interventoría:	ING. CAROLINA BELLO RAMIREZ
Mat. Profesional:	25202-18979	25202-372059	Mat. Profesional	091037-0563226

VoBo.

CTO DE OBRA No.:	706 DE 2022				**MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA**
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.				
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	**VALOR INICIAL:**	$	560,381,443	**PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**
INTERVENTOR	ETICARQ S.A.S.	**VR ADICIONAL No. 1:**	$	-	
REP. LEGAL:	Ing. FERNANDO LOZANO CALDERÓN	**VALOR TOTAL:**	$	560,381,443	

CAPÍTULO:	Preliminares	**ÍTEM**	1,2,1 Excavación manual, (incluye, retiro y disposición final en sitio autorizado), cimentación, tanque, cerramiento	**UNIDAD**	m3	UBICACIÓN	**PARQUE CASA DE LA CULTURA**		
ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:				Localización	CANT	Largo (m)	Ancho o Espesor (m)	Altura (m)	Área (m2) o Cantidad	Long Total
				MESAS PIN-PON	2.00	5.00	2.00	0.50		10.00
				MESAS AJEDREZ	3.00	2.00	1.00	0.50		3.00
										-
										-
										-
										-
				Cantidad Total						13.00
				Menos Cantidad pagada a la fecha						-
				Cantidad Total Presente Acta						**13.00**

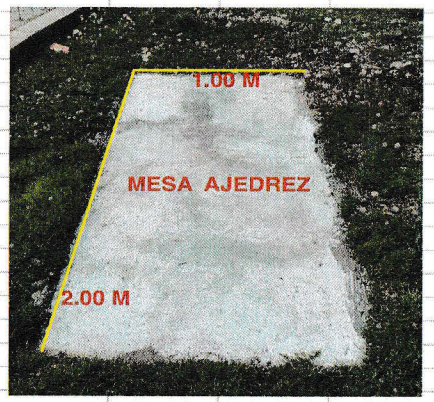

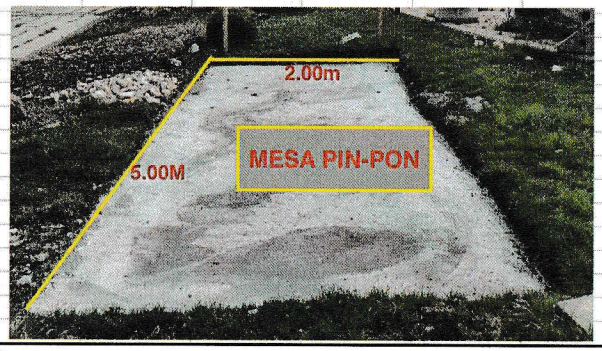

OBSERVACIONES:

Contratista de obra:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	ING. LAURA TENJO	Interventoría:	ING. CAROLINA BELLO RAMIREZ
Mat. Profesional:	25202-18979	25202-372059	Mat. Profesional	091037-0563226


ETICARQ SAS


VoBo.

CTO DE OBRA No.:	706 DE 2022				**MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA**
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.				
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	**VALOR INICIAL:**	$ 560,381,443		**PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**
INTERVENTOR	ETICARQ S.A.S.	**VR ADICIONAL No. 1:**	$ -		
REP. LEGAL:	Ing. FERNANDO LOZANO CALDERÓN	**VALOR TOTAL:**	$ 560,381,443		

CAPÍTULO:	Preliminares	**ÍTEM**	1,2,4 Relleno con SUB-BASE GRANULAR (Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación 95% del Proctor.). (NORMA INVIAS 320)	**UNIDAD**	m3	UBICACIÓN	**PARQUE CASA DE LA CULTURA**

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:

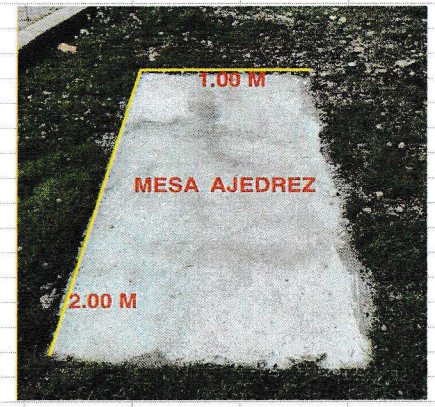

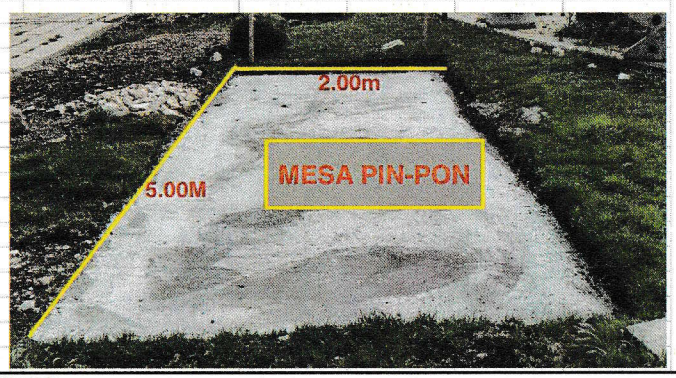

Localización	CANT	Largo (m)	Ancho o Espesor (m)	Altura (m)	Área (m2) o Cantidad	Long Total
MESAS DE PIN-PON	2.00	5.00	2.00	0.40		8.00
MESAS DE AJEDREZ	3.00	2.00	1.00	0.40		2.40
						-
						-
						-
						-
Cantidad Total						10.40
Menos Cantidad pagada a la fecha						-
Cantidad Total Presente Acta						**10.40**

OBSERVACIONES:

ETICARQ SAS

Contratista de obra:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	ING. LAURA TENJO	Interventoría:	ING. CAROLINA BELLO RAMIREZ	
Mat. Profesional:	25202-18979	25202-372059	Mat. Profesional	091037-0563226	

VoBo.
