**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**FE4**
Forma de pago: CONTADO
Fecha: 30/12/2022
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda / TRM: COP / $0

**CONSORCIO ANGEL**
**NIT 901647192-1**
Bogota, D.c. Colombia
Fecha generación: 30/12/2022 10:16:14
Fecha expedición: 30/12/2022 10:16:15

**DATOS DE FACTURACION**
MUNICIPIO DE LA TEBAIDA
NIT 890000564-1
CRA 6 12-36
La Tebaida Colombia
TEL: 3154106189
hacienda@latebaida-quindio.gov.co
PRINCIPAL

CUFE: b5df5d4fb5828ad5faa52f48cb237a46cf7a8ee528d2c26c9becb58a628be33979f3a0121ea0ea8c1bee780669c16242

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | U/M | VR.UNITARIO | IMP. | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 COSTO DIRECTO | 1 | 94 | $211,165,565 | 0 | 0% | $211,165,565 |
| 2 | 002 ADMINISTRACION 25% | 1 | 94 | $52,791,391 | 0 | 0% | $52,791,391 |
| 3 | 003 IMPREVISTOS 2% | 1 | 94 | $4,223,312 | 0 | 0% | $4,223,312 |
| 4 | 004 UTILIDADES 5% | 1 | 94 | $10,558,278 | 0 | 0% | $10,558,278 |

Total cantidad : 4
PAGO ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA 001 DE 2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR OBRAS DE EXPANSION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS PUBLICOS, PARQUES Y ESCENARIOS PUBLICOS ABIERTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDIO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $278,738,546 |
| **TOTAL FACTURA** | **$278,738,546** |
| **TOTAL NETO** | **$278,738,546** |

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

Vo. Bo. Interventoría

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764040468361 vigencia de 30/11/2022 al 30/11/2023 rango del 1 al 100 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099058-5 - www.aliaddo.com

Bancolombia

Armenia, octubre 26 de 2022


**Señores:**
**A QUIEN PUEDA INTERESAR**
**Armenia**

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **CONSORCIO ANGEL** identificado con NIT **901647192,** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto | Numero Producto | Fecha de Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA CORRIENTE | 069-000054-59 | 2022/10/26 | ACTIVA |

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono **7358019** de Armenia, o en nuestras oficinas ubicadas en la dirección **Calle 20 Cra 17 esquina** en el momento que así lo estimen conveniente.

Atentamente,




**JORGE LUIS CHACON GARZON**
**Asesor Pyme**
**Armenia Centro**

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

S&B CONSULTORES ASOCIADOS

Claudia Johanna Valencia Ospina identificada con cedula de ciudadanía No. 1.094.886.002 de Armenia, Quindío. En calidad de Contador Público con tarjeta profesional No 169535-T

**CERTIFICAN QUE:**

El CONSORCIO ANGEL identificado con NIT. 901647192- 1 ha cumplido durante los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaramos que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Esta certificación se emite en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Armenia, a los (26) días del mes de diciembre de 2022.

**CLAUDIA JOHANNA VALENCIA OSPINA**
C.c. 1.094.886.002
Matricula profesional: 169535T
Contador Público

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.094.886.002
NUMERO

VALENCIA OSPINA
APELLIDOS

CLAUDIA JOHANNA
NOMBRES

Claudia Johanna Valencia
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 28-ABR-1986
ARMENIA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

20-ENE-2005 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ HENAO LOPEZ

O'CE DERECHO



P-2600100-58135505-F-1094886002-20050323 0150305081A 02 183541675

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



**169535-T**

**CLAUDIA JOHANNA**
**VALENCIA OSPINA**
**C.C. 1094886002**
**RESOLUCION INSCRIPCION 250 FECHA 02/08/2017**
**UNIVERSIDAD DEL QUINDIO**

**PRESIDENTE**

**DANIEL SARMIENTO PAVAS** **174443**

**97121**

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede

CONSORCIO ANGEL

NIT. 901.647.192

# • ACTA FINAL .

Cra 13 N° 19-33 Of 11 Edif La Plazuela Tel: (6)7323880 Armenia-Q. Cel: 310-4031309. E-mail: consorcioangel2022@gmail.com

# ACTA FINAL

**MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO.**

**Secretaria de Planeación e infrestructura**

**CONTRATO DE OBRA No.001 de 2022**

**OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LAS OBRAS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y ESCENARIOS PÚBLICOS ABIERTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023."**

**Armenia, Diciembre 20 de 2022**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE INICIO | | 28 DE OCTUBRE DE 2022 | FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL | | 25 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL | | Sesenta (60) dias | FECHA DE SUSPENSION CONTRATO | | NA |
| VALOR INICIAL CONTRATO | $ | 543,254,365.00 | FECHA DE REINICIO CONTRATO | | NA |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | | NA | ADICIONAL TIEMPO | | NA |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 543,254,365.00 | FECHA DE REPORTE | | 25 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| VALOR OBRA EJECUTADA | $ | 543,199,039.00 | FECHA DE TERMINACION CONTRATO FINAL | | NA |

| Item | Actividad | OBRA CONTRATADA | | | | BALANCE | | | | ACTA 01 | | ACTA FINAL | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Un | Cant. | Valor Unitario | Valor Total | Mayores Cantidades | Menores Cantidades | Cantidades Definitivas | VR/TOTAL | CANT | VR/TOTAL | CANT | VR/TOTAL | CANT | VALOR |
| | **PARQUE PÚBLICO BARRIO NUEVA TEBAIDA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.1 | Campamento de obra | M2 | 20 | 138,200.00 | 2,764,000.00 | | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 0.2 | Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h= 1.5 mts | ML | 330 | 6,120.00 | 2,019,600.00 | | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 1 | **RED BAJA TENSION** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Suministro e instalación medidor Bifásico + caja contador policarbonato + protección + cable concentrico 2x8+8 + puesta a tierra medidor | UND | 1 | 1,926,200.00 | 1,926,200.00 | | | 1.00 | 1,926,200.00 | 0.00 | $ 0.00 | 1.00 | $ 1,926,200.00 | 1.00 | $ 1,926,200.00 |
| 1.2 | Suministro e instalación cofre uso exterior con proteccion y temporizador de control de encendido de luminarias | UND | 1 | 893,680.00 | 893,680.00 | | | 1.00 | 893,680.00 | 0.00 | $ 0.00 | 1.00 | $ 893,680.00 | 1.00 | $ 893,680.00 |
| 2 | **MONTAJE POSTES Y PROYECTORES 320 W 30°** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Suministro e instalación poste metalico certificado de 14 mts x 80 kgf, con estructura para montaje de proyectores | UND | 4 | 8,897,400.00 | 35,589,600.00 | | | 4.00 | 35,589,600.00 | 2.00 | $ 17,794,800.00 | 2.00 | $ 17,794,800.00 | 4.00 | $ 35,589,600.00 |
| 2.2 | Suministro e instalación luminaria proyector led | UND | 16 | 2,775,100.00 | 44,401,600.00 | | | 16.00 | 44,401,600.00 | 8.00 | $ 22,200,800.00 | 8.00 | $ 22,200,800.00 | 16.00 | $ 44,401,600.00 |
| 2.3 | Suministro e instalacion estructura y base anclaje para montaje de poste de 14 mts metalico, incluye (estudio de suelos) | UND | 4 | 5,348,700.00 | 21,394,800.00 | | | 4.00 | 21,394,800.00 | 0.00 | $ 0.00 | 4.00 | $ 21,394,800.00 | 4.00 | $ 21,394,800.00 |
| NP-001 | Construcción de pilote d=30cm en concreto de 3000 PSI acelerado a 3 dias, para anclaje de postes de 14mts | ML | | 353,623.00 | | 12.00 | | 12.00 | 4,243,476.00 | | | 12.00 | $ 4,243,476.00 | 12.00 | $ 4,243,476.00 |
| 3 | **TABLERO, CANALIZACIONES Y REDES ELÉCTRICAS DE ALIMENTACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Suministro e instalación 2 ductos o tubería eléctrica 2" PVC excavación a 50 cms y llenado alimentación iluminación en postes metálicos, excavación a 40 cm prof x 30 cm de ancho, llenado y compactado | ML | 280 | 64,580.00 | 18,082,400.00 | | 30.00 | 250.00 | 16,145,000.00 | 250.00 | $ 16,145,000.00 | 0.00 | $ 0.00 | 250.00 | $ 16,145,000.00 |
| 3.2 | Suministro e instalación recamara electrica de inspección de 50x50 libres en concreto | UND | 8 | 641,740.00 | 5,133,920.00 | | | 8.00 | 5,133,920.00 | 0.00 | $ 0.00 | 8.00 | $ 5,133,920.00 | 8.00 | $ 5,133,920.00 |
| 3.3 | Suministro e instalación alimentador desde medidor a recamaras de proyectores en cable Al serie 8000 aislado 2F #4 + 1T #6 AWG | ML | 370 | 20,458.00 | 7,569,460.00 | 20.00 | | 390.00 | 7,978,620.00 | 0.00 | $ 0.00 | 390.00 | $ 7,978,620.00 | 390.00 | $ 7,978,620.00 |
| 3.4 | Suministro e instalación alimentador desde recamara a mastiles de proyectores en cable Cu aislado 2F #10 + 1T #10 AWG | ML | 80 | 21,554.00 | 1,724,320.00 | | | 80.00 | 1,724,320.00 | 0.00 | $ 0.00 | 80.00 | $ 1,724,320.00 | 80.00 | $ 1,724,320.00 |
| 3.5 | Suministro e instalación conector en Gel GHFC-1, conexión red alimentadora a iluminación en postes metalicos | ML | 21 | 56,187.00 | 1,179,927.00 | | | 21.00 | 1,179,927.00 | 0.00 | $ 0.00 | 21.00 | $ 1,179,927.00 | 21.00 | $ 1,179,927.00 |
| | **ESCENARIO PÚBLICO BARRIO CANTARITO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.1 | Campamento de obra | M2 | 20 | 138,200.00 | 2,764,000.00 | | | 20.00 | 2,764,000.00 | 20.00 | $ 2,764,000.00 | 0.00 | $ 0.00 | 20.00 | $ 2,764,000.00 |
| 0.2 | Cerramiento provisional con guadua y lona de cerramiento h= 1.5 mts | **ML** | **360.00** | 6,120.00 | 2,203,200.00 | | 1.43 | 358.57 | 2,194,448.40 | 358.57 | $ 2,194,448.40 | 0.00 | $ 0.00 | 358.57 | $ 2,194,448.40 |
| 1 | **RED BAJA TENSION** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Suministro e instalación medidor Bifásico + caja contador policarbonato + protección + cable concentrico 2x8+8 + puesta a tierra medidor | UND | 1 | 1,926,200.00 | 1,926,200.00 | | | 1.00 | 1,926,200.00 | 0.00 | $ 0.00 | 1.00 | $ 1,926,200.00 | 1.00 | $ 1,926,200.00 |
| 1.2 | Suministro e instalación cofre uso exterior con proteccion y temporizador de control de encendido de luminarias | UND | 1 | 893,680.00 | 893,680.00 | | | 1.00 | 893,680.00 | 0.00 | $ 0.00 | 1.00 | $ 893,680.00 | 1.00 | $ 893,680.00 |

# ACTA FINAL

MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO.

Secretaria de Planeación e Infrestructura

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **MONTAJE POSTES Y LUMINARIAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Poste cilindrico para Garden 3" de 4m de altura Incluye sistema de anclaje, pintura electrostatica | UND | 37 | 1,859,200.00 | 68,790,400.00 | | | 37.00 | 68,790,400.00 | 12.00 | $ 22,310,400.00 | 25.00 | $ 46,480,000.00 | 37.00 | $ 68,790,400.00 |
| 2.2 | Luminaria stil led Garden Light de 40w SL58-SA40W 4380 Lm, IP65 con chip multivoltaje | UND | 37 | 2,486,700.00 | 92,007,900.00 | | | 37.00 | 92,007,900.00 | 12.00 | $ 29,840,400.00 | 25.00 | $ 62,167,500.00 | 37.00 | $ 92,007,900.00 |
| 2.3 | Suministro e instalación pedestal poste cilindrico Garden de 3" x 4 mts | UND | 37 | 278,200.00 | 10,293,400.00 | | | 37.00 | 10,293,400.00 | 20.00 | $ 5,564,000.00 | 17.00 | $ 4,729,400.00 | 37.00 | $ 10,293,400.00 |
| 3 | **TABLERO, CANALIZACIONES Y REDES ELÉCTRICAS DE ALIMENTACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Suministro e instalación 2 ductos 2" PVC excavación a 50 cm prof x 30 cms ancho y llenado, compactado, para red de iluminación en postes metalicos | ML | 400 | 64,580.00 | 25,832,000.00 | 195.89 | | 595.89 | 38,482,576.20 | 525.89 | $ 33,961,976.20 | 70.00 | $ 4,520,600.00 | 595.89 | $ 38,482,576.20 |
| 3.2 | Suministro e instalación 1 ducto 3/4" PVC excavación a 40 cm prof x 30 cms ancho y llenado, compactado, para red de alimentación luminaria en postes metalicos | ML | 450 | 26,230.00 | 11,803,500.00 | | 133.00 | 317.00 | 8,314,910.00 | 0.00 | $ 0.00 | 317.00 | $ 8,314,910.00 | 317.00 | $ 8,314,910.00 |
| 3.3 | Suministro e instalación recamara electrica de inspección de 50x50 libres en concreto | UND | 20 | 641,740.00 | 12,834,800.00 | 4.00 | | 24.00 | 15,401,760.00 | 10.00 | $ 6,417,400.00 | 14.00 | $ 8,984,360.00 | 24.00 | $ 15,401,760.00 |
| 3.4 | Suministro e instalación alimentador y/o acometida para luminarias de alumbrado publico en cable Al serie 8000 aislado 2F #4 + 1T #6 AWG | ML | 450 | 20,458.00 | 9,206,100.00 | 190.00 | | 640.00 | 13,093,120.00 | 0.00 | $ 0.00 | 640.00 | $ 13,093,120.00 | 640.00 | $ 13,093,120.00 |
| 3.5 | Suministro e instalación cable encauchetado 3x14 AWG alimentacion luminaria | ML | 600 | 16,385.00 | 9,831,000.00 | | 80.00 | 520.00 | 8,520,200.00 | 0.00 | $ 0.00 | 520.00 | $ 8,520,200.00 | 520.00 | $ 8,520,200.00 |
| 3.6 | Suministro e instalación conector en Gel GHFC-1, conexión red alimentadora a iluminación en postes metalicos | ML | 150 | 56,187.00 | 8,428,050.00 | | 72.00 | 78.00 | 4,382,586.00 | 0.00 | $ 0.00 | 78.00 | $ 4,382,586.00 | 78.00 | $ 4,382,586.00 |
| 3.7 | Suministro e instalacion puesta a tierra postes metalicos para alumbrado publico, con varilla de cobre de 2.4 mts x 5/8" y conector TGC con cable de Cu 8 desnudo hasta base del poste | UND | 22 | 548,300.00 | 12,062,600.00 | | 15.00 | 7.00 | 3,838,100.00 | 0.00 | $ 0.00 | 7.00 | $ 3,838,100.00 | 7.00 | $ 3,838,100.00 |
| | **TOTAL COSTO DE OBRA** | | | | **411,566,337.00** | | | | **411,514,424.00** | | **169,193,224.80** | | **282,321,199.00** | | **411,514,423.80** |

| | **DESCRIPCIÓN** | | | **VALOR TOTAL** | | | **VALOR TOTAL** | | **VALOR TOTAL** | | **VALOR TOTAL** | | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRACIÓN | 25.00% | | 102,889,084.00 | | | 102,878,606.00 | | 39,798,306.00 | | 63,080,300.00 | | $ 102,878,606.00 |
| | IMPREVISTOS | 2% | | 8,231,127.00 | | | 8,230,288.00 | | 3,183,864.00 | | 5,046,424.00 | | $ 8,230,288.00 |
| | UTILIDADES | 5% | | 20,577,817.00 | | | 20,575,721.00 | | 7,959,661.00 | | 12,616,060.00 | | $ 20,575,721.00 |
| | **VALOR TOTAL AIU** | **32.00%** | | **131,699,028.00** | | | **131,684,616.00** | | **50,941,831.00** | | **80,742,784.00** | | **$ 131,684,615.00** |
| | **VALOR TOTAL OBRA** | | | **543,254,365.00** | | | **543,199,039.00** | | **210,135,056.00** | | **333,063,983.00** | | **543,199,039.00** |

| | |
|---|---|
| ADMINISTRACIÓN | 25.00% |
| IMPREVISTOS | 2% |
| UTILIDADES | 5% |

Nota: Se deberán adicionar o eliminar las columnas correspondientes a las actas, dependiendo del número de actas que lleven a la fecha de elaboración de la presente acta.

| | | |
|---|---|---|
| Valor Obra contratada | | $ 543,254,365.00 |
| Valor Obra Ejecutada | | $ 543,199,039.00 |
| Saldo del Contrato | | $ 55,326.00 |
| Valor pagado acta anterior | | $ 210,135,056.00 |
| Valor Acta Actual | | $ 333,063,983.00 |
| - El 10% para pago recibo a satisfación (*Ver nota aclaratoria) | | $ 54,325,437.00 |
| Valor definitivo acta actual | | $ 278,738,546.00 |
| Anticipo Recibido | | NA |
| **VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA** | | **$ 278,738,546.00** |

**SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE.**

**Nota Aclaratoria: Según forma de pago del contrato de obra: "Un último pago, correspondiente al diez por ciento (10%) restante del valor total y/o del balance final del contrato, que será cancelado al contratista previo a la entrega y recibido final a satisfacción de las actividades del objeto contratado."**

**ING. FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ**
REP. LEGAL CONSORCIO ANGEL
CONTRATISTA DE OBRA

**ING. JHONJAIRO SANDOVAL GALINDO**
SUPERVISOR/O INTERVENTOR

**ARQ. ANDERSON ANDREY OSORIO**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE LA TEBAIDA

CONSORCIO ANGEL

NIT. 901.647.192

| Construcción de pilote d=30cm en concreto de 3000 PSI acelerado a 3 días, para anclaje de postes de 14mts. | | | | | | ML |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MATERIALES** | | | | | | |
| DESCRIPCION | UND | CANT | VR.UNIT | PARCIAL | | |
| Concreto 3000 PSI | m3 | 0.10 | 565,000 | 56,500 | | |
| Sika Set L | kg | 0.20 | 530,000 | 106,000 | | |
| Acero de refuerzo | kg | 7.00 | 12,000 | 84,000 | | |
| Madera | und | 1.00 | 25,000 | 25,000 | | |
| Ventonita | Kg | 3.41 | 2,500 | 8,525 | | |
| | | | | VALOR MATERIALES | | 280,025 |
| **HERRAMIENTA Y EQUIPO** | | | | | | |
| TIPO | TARIFA/HORA | | RENDIMIENTO | VR. UNIT | | |
| Herramienta Menor | 60,272 | | 5% | 3,014 | | |
| Vibrador de concreto | 6,300 | | 1 | 3,150 | | |
| Concretadora 1 saco | 42,320 | | 0.07 | 2,962 | | |
| Equipo de perforación | 28,000 | | 0.15 | 4,200 | | |
| | | | | VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO | | 13,326 |
| **OBRA DE MANO** | | | | | | |
| TRABAJADORES | JORNAL | PRESTAC | TOTAL | RENDIM | VR.UNIT | |
| 2 Ayudantes | 95,850 | 57,510 | 153,360 | 0.141 | 21,670 | |
| Oficial Prácito | 85,200 | 51,120 | 136,320 | 0.141 | 19,262 | |
| Aportes Parafiscales | 40,932 | | 14,326 | 1.350 | 19,340 | |
| | | | | VALOR OBRA DE MANO | | 60,272 |
| | | | | COSTO DIRECTO TOTAL | | 353,623 |

CONSORCIO ANGEL
R.L: FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ

| ACTA DE PACTACION DE PRECIOS |
|---|
| ALCALDIA MUNICIPAL DE TEBAIDA |
| CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 001 DE 2022 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** "REALIZAR LAS OBRAS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y ESCENARIOS PÚBLICOS ABIERTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023." |

**Fecha**: Diciembre 19 de 2022

| | |
|---|---|
| CONTRATANTE: | ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA TEBAÍDA |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO ANGEL |
| REPRESENTANTE LEGAL: | FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ |
| NIT O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 18.391.737 DE CALARCA |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 543,254,365.00 |
| PLAZO CONTRACTUAL: | Sesenta (60) días a partir de la suscripción del acta de inicio |
| FECHA DE INICIO: | 26 de Octubre de 2022 |
| FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: | 25 de Diciembre de 2022 |

El día diecinueve (19) del mes de Diciembre de 2022, se reunieron en la Oficina de la Secretaria de Infraestructura de La Tebaída, el arquitecto **ANDERSON ANDREY OSORIO**, en calidad de supervisor de la entidad contratante, el ingeniero **JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO** en calidad de interventor y el Ingeniero **FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ**, en calidad de contratista, con el fin de suscribir el **Acta de Pactación de Precios No. 01,** toda vez que se requiere una actividad adicional a las inicialmente contratadas para el total cumplimiento del objeto contractual. El precio que se pacta corresponde a las siguientes actividades:

| ITEM | ACTIVIDAD | UND | VALOR UNITARIO | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|
| NP-001 | Construcción de pilote d=30cm en concreto de 3000 PSI acelerado a 3 días, para anclaje de postes de 14mts.. | ML | $ 353.623.00 | Conforme lo recomendando en el estudio de suelos hecho en la cancha de la nueva tebaida se requiere una profundidad de pilotes igual 6m para 2 de ellos y 2 de 3m para los dos restantes. |

Se anexa y hace parte de la presente acta el análisis de precio unitario presentado por el contratista y revisados por el interventor. Dando claridad que dicho análisis no afecta el balance del proyecto ya que se revisaron las cantidades mayores y menores del mismo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:

**ANDERSON ANDREY OSORIO**
Secretario Infraestructura
Municipio de la Tebaida

**JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO**
Interventor Contrato de Obra 001 de 2022

**FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ**
Contratista

CONSORCIO ANGEL

NIT. 901.647.192

# • MEMORIAS DE CÁLCULO CON REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Cra 13 N° 19-33 Of 11 Edif La Plazuela Tel: (6)7323880 Armenia-Q. Cel: 310-4031309. E-mail: consorcioangel2022@gmail.com

| Contrato No. | 001 | Año | 2022 | Objeto | "REALIZAR LAS OBRAS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y ESCENARIOS PÚBLICOS ABIERTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023." |
|---|---|---|---|---|---|

| Item: | 1,1 | Descripción | Suministro e instalación medidor Bifásico + caja contador policarbonato + protección + cable concentrico 2x8+8 + puesta a tierra | Cantidad Total: | 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad: | UND | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra) | Instalado en poste frente a la esquina con dirección Cra 7 con Calle 19 | 1 | | | | | | 1,00 | 1,00 |
|  | | | | | | | | | |

Nota: en la casilla de Unidad: Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tubería etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$). Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

| Observaciones: | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Firma | | | | | | | | | | | |
| | Nombre | ING. FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ | | | | | ING. JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO | | | | | |
| | Fecha | AA | 2022 | 12 | DD | 26 | AA | 2022 | MM | 12 | DD | 26 |
| | Cargo | Contratista | | | | | Supervisor y/o Interventor | | | | | |


**MEMORIAS DE CALCULOS**

MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO.
Secretaría de Planeación e infrestructura



| Contrato No. | 001 | Año | 2022 | Objeto | "REALIZAR LAS OBRAS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y ESCENARIOS PÚBLICOS ABIERTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023." |
|---|---|---|---|---|---|

| Item: | 1,2 | Descripción | Suministro e instalación cofre uso exterior con proteccion y temporizador de control de encendido de luminarias | Cantidad Total: | 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|
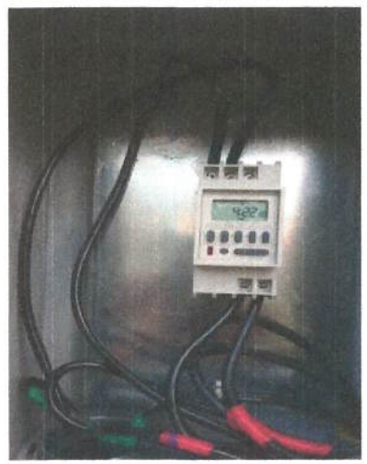
| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad: | UND | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| **Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)** | Instalado en poste frente a la esquina con dirección Cra 7 con Calle 19 | 1 | | | | | | 1,00 | 1,00 |
|  | | | | | | | | | |

Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

| Observaciones: | | | |
|---|---|---|---|
| | Firma | | |
| | Nombre | ING. FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ | ING. JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO |
| | Fecha | AA 2022 MM 12 DD 26 | AA 2022 MM 12 DD 26 |
| | Cargo | Contratista | Supervisor y/o Interventor |

**MEMORIAS DE CALCULOS**

MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO.
Secretaría de Planeación e infrestructura



| Contrato No. | 001 | Año | 2022 | Objeto | "REALIZAR LAS OBRAS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y ESCENARIOS PÚBLICOS ABIERTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023." |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | 2,1 | Descripción | Suministro e instalación poste metalico certificado de 14 mts x 80 kgf, con estructura para montaje de proyectores | Cantidad Total: | 2,00 |
|---|---|---|---|---|---|

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad: | UND | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| **Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)** | | | | | | | | | |
| | Tiros de esquina al fondo de la cancha | 2 | | | | | | 2,00 | 2,00 |





Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tubería etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$). Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Firma | | | | | | | | | | | | |
| | Nombre | ING. FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ | | | | | | ING. JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO | | | | | |
| | Fecha | AA | 2022 | MM | 12 | DD | 26 | AA | 2022 | MM | 12 | DD | 26 |
| | Cargo | Contratista | | | | | | Supervisor y/o Interventor | | | | | |

**MEMORIAS DE CALCULOS**

MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO.
Secretaria de Planeación e infrestructura



| Contrato No. | 001 | Año | 2022 | Objeto | "REALIZAR LAS OBRAS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y ESCENARIOS PÚBLICOS ABIERTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023." |
|---|---|---|---|---|---|

| Item: | 2,2 | Descripción | Suministro e instalación luminaria proyector led | Cantidad Total: | 8,00 |
|---|---|---|---|---|---|

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad: | UND | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| **Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)** | Tiros de esquina al fondo de la cancha | 8 | | | | | | 8,00 | 8,00 |
| | | | | | | | | | |












Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o mi de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$). Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Firma | | | | | | | | | | | | |
| | Nombre | ING. FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ | | | | | | ING. JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO | | | | | |
| | Fecha | AA | 2022 | MM | 12 | DD | 26 | AA | 2022 | MM | 12 | DD | 26 |
| | Cargo | Contratista | | | | | | Supervisor y/o Interventor | | | | | |


**MEMORIAS DE CALCULOS**

MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO.
Secretaría de Planeación e infrestructura



| Contrato No. | 001 | Año | 2022 | Objeto | "REALIZAR LAS OBRAS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y ESCENARIOS PÚBLICOS ABIERTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023." |
|---|---|---|---|---|---|

| Item: | 2,3 | Descripción | Suministro e instalacion estructura y base anclaje para montaje de poste de 14 mts metalico, incluye (estudio de suelos). | Cantidad Total: | 4,00 |
|---|---|---|---|---|---|

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad: | UND | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra) | Tiros de esquina de la cancha. | 4 | | | | | | 4,00 | 4,00 |
|    | | | | | | | | | |

Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Firma | | | | | | | | | | | | |
| | Nombre | ING. FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ | | | | | | ING. JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO | | | | | |
| | Fecha | AA | 2022 | MM | 12 | DD | 26 | AA | 2022 | MM | 12 | DD | 26 |
| | Cargo | Contratista | | | | | | Supervisor y/o Interventor | | | | | |

**MEMORIAS DE CALCULOS**

MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO.
Secretaría de Planeación e infrestructura



| Contrato No. | 001 | Año | 2022 | Objeto | "REALIZAR LAS OBRAS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y ESCENARIOS PÚBLICOS ABIERTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023." |
|---|---|---|---|---|---|

| Item: | NP-001 | Descripción | Construcción de pilote d=30cm en concreto de 3000 PSI acelerado a 3 días, para anclaje de postes de 14mts. | Cantidad Total: | 12,00 |
|---|---|---|---|---|---|

**Croquis y Record Fotográfico**

**Récor Fotográfico de la Obra**
**(antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)**



| Descripción | Unidad: Cantidad | ML Área | ML Volumen | Dimensiones Largo | Dimensiones Ancho | Dimensiones Alto | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Para pilotes de 6 m de profundidad | 2 | | | 4,5 | | | 9,00 | 9,00 |
| Para pilotes de 3 m de profundidad | 2 | | | 1,5 | | | 3,00 | 3,00 |

Nota: en la casilla de Unidad: Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc. Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

Observaciones:

| | | |
|---|---|---|
| Firma | | |
| Nombre | ING. FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ | ING. JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO |
| Fecha | AA 2022 MM 12 DD 26 | AA 2022 MM 12 DD 26 |
| Cargo | Contratista | Supervisor y/o Interventor |

**MEMORIAS DE CALCULOS**

MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO.
Secretaría de Planeación e infrestructura



| Contrato No. | 001 | Año | 2022 | Objeto | "REALIZAR LAS OBRAS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y ESCENARIOS PÚBLICOS ABIERTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023." |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | 3,2 | Descripción | Suministro e instalación recamara electrica deinspección de 50x50 libres en concreto | Cantidad Total: | 8,00 |
|---|---|---|---|---|---|

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad: | UND | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| **Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)** | En el perimetro de la cancha | 8 | | | | | | 8,00 | 8,00 |
|  | | | | | | | | | |

Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

Observaciones:

| | | |
|---|---|---|
| Firma | | |
| Nombre | ING. FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ | ING. JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO |
| Fecha | AA 2022 MM 12 DD 26 | AA 2022 MM 12 DD 26 |
| Cargo | Contratista | Supervisor y/o Interventor |


**MEMORIAS DE CALCULOS**

MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO.
Secretaría de Planeación e infrestructura



| Contrato No. | 001 | Año | 2022 | Objeto | "REALIZAR LAS OBRAS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y ESCENARIOS PÚBLICOS ABIERTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023." |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | 3,3 | Descripción | Suministro e instalación alimentador desde medidor a recamaras de proyectores en cable Al serie 8000 aislado 2F #4 + 1T #6 AWG | Cantidad Total: | 390,00 |
|---|---|---|---|---|---|
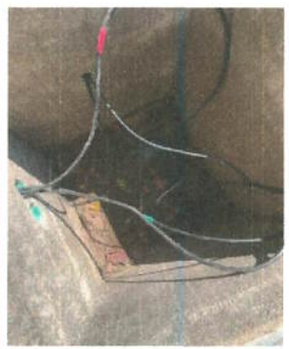
| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad: | ML | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| **Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)** | Desde el medidor, alrededor del perímetro de la cancha, pasando por cada una de las 8 recamaras instaladas. | 390 | | | | | | 1,00 | 390,00 |
|   | | | | | | | | | |

Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tubería etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

| Observaciones: | | | |
|---|---|---|---|
| | Firma | | |
| | Nombre | ING. FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ | ING. JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO |
| | Fecha | AA 2022 MM 12 DD 26 | AA 2022 MM 12 DD 26 |
| | Cargo | Contratista | Supervisor y/o Interventor |

**MEMORIAS DE CALCULOS**

MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO.
Secretaría de Planeación e infrestructura



| Contrato No. | 001 | Año | 2022 | Objeto | "REALIZAR LAS OBRAS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y ESCENARIOS PÚBLICOS ABIERTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023." |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | 3,4 | Descripción | Suministro e instalación alimentador desde recamara a mastiles de proyectores en cable Cu aislado 2F #10 + 1T#10 AWG | Cantidad Total: | 80,00 |
|---|---|---|---|---|---|

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad: | ML | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| **Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)** | Instalado en el interior de los 4 postes hasta la caja de distribución. | 80 | | | | | | 1,00 | 80,00 |
|  | | | | | | | | | |

Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Firma | | | | | | | | | | | | |
| | Nombre | ING. FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ | | | | | | ING. JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO | | | | | |
| | Fecha | AA | 2022 | MM | 12 | DD | 26 | AA | 2022 | MM | 11 | DD | 26 |
| | Cargo | Contratista | | | | | | Supervisor y/o Interventor | | | | | |

**MEMORIAS DE CALCULOS**

MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO.
Secretaría de Planeación e infrestructura



| Contrato No. | 001 | Año | 2022 | Objeto | "REALIZAR LAS OBRAS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y ESCENARIOS PÚBLICOS ABIERTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023." |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | 3,5 | Descripción | Suministro e instalación conector en Gel GHFC-1,conexión red alimentadora a iluminación en postes metalicos | Cantidad Total: | 21,00 |
|---|---|---|---|---|---|

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad: | ML | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| **Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)** | Dentro de las 8 recamaras realizadas | 21 | | | | | | 1,00 | 21,00 |
|  | | | | | | | | | |

Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Firma | | | | | | | | | | | | |
| | Nombre | ING. FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ | | | | | | | ING. JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO | | | | |
| | Fecha | AA | 2022 | MM | 12 | DD | 26 | | AA | 2022 | MM | 11 | DD | 26 |
| | Cargo | Contratista | | | | | | | Supervisor y/o Interventor | | | | |

**MEMORIAS DE CALCULOS**

MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO.
Secretaría de Planeación e infrestructura



| Contrato No. | 001 | Año | 2022 | Objeto | "REALIZAR LAS OBRAS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y ESCENARIOS PÚBLICOS ABIERTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023." |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | 1,1 | Descripción | Suministro e instalación medidor Bifásico + caja contador policarbonato + protección + cable concentrico 2x8+8 + puesta a tierra medidor | Cantidad Total: | 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad: | UND | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra) | Ubicado en el poste dentro del parque frente a la Casa Manzana 2 # 9 | 1 | | | | | | 1,00 | 1,00 |





Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Firma | | | | | | | | | | | | |
| | Nombre | ING. FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ | | | | | | ING. JHON JAIRO SANDOBAL GALINDO | | | | | |
| | Fecha | AA | 2022 | MM | 12 | DD | 26 | AA | 2022 | MM | 11 | DD | 26 |
| | Cargo | Contratista | | | | | | Supervisor y/o Interventor | | | | | |

**MEMORIAS DE CALCULOS**

MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO.
Secretaría de Planeación e infrestructura



| Contrato No. | 001 | Año | 2022 | Objeto | "REALIZAR LAS OBRAS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y ESCENARIOS PÚBLICOS ABIERTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023." |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | 1,2 | Descripción | Suministro e instalación cofre uso exterior con proteccion y temporizador de control de encendido de luminarias | Cantidad Total: | 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad: | UND | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra) | Ubicado en el poste dentro del parque frente a la Casa Manzana 2 # 9 | 1 | | | | | | 1,00 | 1,00 |
|   | | | | | | | | | |

Nota: en la casilla de Unidad: Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

| Observaciones: | | | |
|---|---|---|---|
| | Firma | | |
| | Nombre | ING. FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ | ING. JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO |
| | Fecha | AA 2022 MM 12 DD 26 | AA 2022 MM 12 DD 26 |
| | Cargo | Contratista | Supervisor y/o Interventor |

**MEMORIAS DE CALCULOS**

MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO.
Secretaría de Planeación e infrestructura



| Contrato No. | 001 | Año | 2022 | Objeto | "REALIZAR LAS OBRAS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y ESCENARIOS PÚBLICOS ABIERTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023." |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | 2,1 | Descripción | Poste cilindrico para Garden 3" de 4m de altura Incluye sistema de anclaje, pintura electrostatica | Cantidad Total: | 25,00 |
|---|---|---|---|---|---|

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad: | UND | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra) | Distribuidos en el área perimetral e interior del parque | 25 | | | | | | 25,00 | 25,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |





Nota: en la casilla de Unidad: Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o mi de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Firma | | | | | | | | | | | | |
| | Nombre | ING. FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ | | | | | | ING. JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO | | | | | |
| | Fecha | AA | 2022 | MM | 12 | DD | 26 | AA | 2022 | MM | 12 | DD | 26 |
| | Cargo | Contratista | | | | | | Supervisor y/o Interventor | | | | | |

**MEMORIAS DE CALCULOS**

MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO.
Secretaría de Planeación e infrestructura



| Contrato No. | 001 | Año | 2022 | Objeto | "REALIZAR LAS OBRAS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y ESCENARIOS PÚBLICOS ABIERTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023." |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | 2,2 | Descripción | Luminaria stil led Garden Light de 40w SL58-SA40W 4380 Lm, IP65 con chip multivoltaje | Cantidad Total: | 25,00 |
|---|---|---|---|---|---|

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad: | UND | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| **Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)** | Distribuidos en el área perimetral y al interior del parque | 25 | | | | | | 25,00 | 25,00 |
|      | | | | | | | | | |

Nota: en la casilla de Unidad: Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tubería etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

Observaciones:

| | | |
|---|---|---|
| Firma | | |
| Nombre | ING. FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ | ING. JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO |
| Fecha | AA 2022 MM 12 DD 26 | AA 2022 MM 12 DD 26 |
| Cargo | Contratista | Supervisor y/o Interventor |

**MEMORIAS DE CALCULOS**

MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO.
Secretaría de Planeación e infrestructura



| Contrato No. | 001 | Año | 2022 | Objeto | "REALIZAR LAS OBRAS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y ESCENARIOS PÚBLICOS ABIERTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023." |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | 2,3 | Descripción | Suministro e instalación pedestal poste cilindrico Garden de 3" x 4 mts | Cantidad Total: | 17,00 |
|---|---|---|---|---|---|

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad: | UND | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra) | Distribuidos en el área perimetral y al interior del parque | 17 | | | | | | 17,00 | 17,00 |
|  | | | | | | | | | |

Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tubería etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

| Observaciones: | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Firma | | | | | | | | | | | |
| | Nombre | ING. FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ | | | | | | ING. JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO | | | | |
| | Fecha | AA | 2022 | MM | 12 | DD | 26 | AA | 2022 | MM | 12 | DD 26 |
| | Cargo | Contratista | | | | | | Supervisor y/o Interventor | | | | |

**MEMORIAS DE CALCULOS**

MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO.
Secretaría de Planeación e infrestructura



| Contrato No. | 001 | Año | 2022 | Objeto | "REALIZAR LAS OBRAS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y ESCENARIOS PÚBLICOS ABIERTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023." |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | 3,1 | Descripción | Suministro e instalación 2 ductos 2" PVC excavación a 50 cm prof x 30 cms ancho y llenado, compactado, para red de iluminación en postes metalicos. | Cantidad Total: | 70,00 |
|---|---|---|---|---|---|

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad: | ML | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| **Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)** | | | | | | | | | |
|   | Ducto de 2" PVC en la distribución frente al colegio hacia el interior del parque. | 70 | | | | | | 1,00 | 70,00 |

Nota: en la casilla de Unidad: Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tubería etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Firma | | | | | | | | | | | | |
| | Nombre | ING. FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ | | | | | | ING. JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO | | | | | |
| | Fecha | AA | 2022 | MM | 12 | DD | 26 | AA | 2022 | MM | 12 | DD | 26 |
| | Cargo | Contratista | | | | | | Supervisor y/o Interventor | | | | | |

**MEMORIAS DE CALCULOS**

MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO.
Secretaría de Planeación e infrestructura



| Contrato No. | 001 | Año | 2022 | Objeto | "REALIZAR LAS OBRAS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y ESCENARIOS PÚBLICOS ABIERTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023." |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | 3,2 | Descripción | Suministro e instalación 1 ducto 3/4" PVC excavación a 40 cm prof x 30 cms ancho y llenado, compactado, para red de alimentación luminaria en postes metalicos. | Cantidad Total: | 317,00 |
|---|---|---|---|---|---|

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad: | ML | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| **Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)** | Instalado en la distribución interna del parque desde las recamaras hasta los postes | 317 | | | | | | 1,00 | 317,00 |
|  | | | | | | | | | |

Note: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Firma | | | | | | | | | | | | |
| | Nombre | ING. FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ | | | | | | ING. JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO | | | | | |
| | Fecha | AA | 2022 | MM | 12 | DD | 26 | AA | 2022 | MM | 12 | DD | 26 |
| | Cargo | Contratista | | | | | | Supervisor y/o Interventor | | | | | |

**MEMORIAS DE CALCULOS**

MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO.
Secretaría de Planeación e infrestructura



| Contrato No. | 001 | Año | 2022 | Objeto | "REALIZAR LAS OBRAS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y ESCENARIOS PÚBLICOS ABIERTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023." |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | 3,3 | Descripción | Suministro e instalación recamara electrica de inspección de 50x50 libres en concreto | Cantidad Total: | 14,00 |
|---|---|---|---|---|---|

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad: | UND | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| **Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)** | En diferentes puntos dentro del parque | 14 | | | | | | 1,00 | 14,00 |
|   | | | | | | | | | |

Nota: en la casilla de Unidad: Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

| Observaciones: | | | |
|---|---|---|---|
| | Firma | | |
| | Nombre | ING. FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ | ING. JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO |
| | Fecha | AA 2022 MM 12 DD 26 | AA 2022 MM 12 DD 26 |
| | Cargo | Contratista | Supervisor y/o Interventor |

**MEMORIAS DE CALCULOS**

MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO.
Secretaría de Planeación e infrestructura



| Contrato No. | 001 | Año | 2022 | Objeto | "REALIZAR LAS OBRAS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y ESCENARIOS PÚBLICOS ABIERTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023." |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | 3,4 | Descripción | Suministro e instalación alimentador y/o acometida para luminarias de alumbrado público. en cable Al serie 8000 aislado 2F #4 + 1T #6 AWG | Cantidad Total: | 640,00 |
|---|---|---|---|---|---|

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad: | ML | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| **Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)** | Distribuido por toda la red electrica en el perimetro e interior del parque desde el medidor hasta los postes. | 640 | | | | | | 1,00 | 640,00 |
|    | | | | | | | | | |

Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tubería etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Firma | | | | | | | | | | | | |
| | Nombre | ING. FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ | | | | | | ING. JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO | | | | | |
| | Fecha | AA | 2022 | MM | 12 | DD | 26 | AA | 2022 | MM | 12 | DD | 26 |
| | Cargo | Contratista | | | | | | Supervisor y/o Interventor | | | | | |

**MEMORIAS DE CALCULOS**

MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO.
Secretaría de Planeación e infrestructura



| Contrato No. | 001 | Año | 2022 | Objeto | "REALIZAR LAS OBRAS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y ESCENARIOS PÚBLICOS ABIERTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023." |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | 3,5 | Descripción | Suministro e instalación cable encauchetado 3x14 AWG alimentacion luminaria | Cantidad Total: | 520,00 |
|---|---|---|---|---|---|

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad: | ML | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| **Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)** | Instalado desde cada recamara hasta cada luminaria a traves del inteior del poste. | 520 | | | | | | 1,00 | 520,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |





Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$). Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Firma | | | | | | | | | | | | |
| | Nombre | ING. FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ | | | | | | ING. JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO | | | | | |
| | Fecha | AA | 2022 | MM | 12 | DD | 26 | AA | 2022 | MM | 12 | DD | 26 |
| | Cargo | Contratista | | | | | | Supervisor y/o Interventor | | | | | |

**MEMORIAS DE CALCULOS**

MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO.
Secretaría de Planeación e infrestructura



| Contrato No. | 001 | Año | 2022 | Objeto | "REALIZAR LAS OBRAS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y ESCENARIOS PÚBLICOS ABIERTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023." |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | 3,6 | Descripción | Suministro e instalación conector en Gel GHFC-1, conexión red alimentadora a iluminación en postes metalicos | Cantidad Total: | 78,00 |
|---|---|---|---|---|---|

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad: | ML | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| **Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)** | Instalados en el interior de cada recamara | 78 | | | | | | 1,00 | 78,00 |
|   | | | | | | | | | |

Nota: en la casilla de Unidad: Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

Observaciones:

| | | |
|---|---|---|
| Firma | | |
| Nombre | ING. FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ | ING. JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO |
| Fecha | AA 2022 MM 12 DD 26 | AA 2022 MM 12 DD 26 |
| Cargo | Contratista | Supervisor y/o Interventor |

**MEMORIAS DE CALCULOS**

MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO.
Secretaría de Planeación e infrestructura

La Tebaida Diferente



| Contrato No. | 001 | Año | 2022 | Objeto | "REALIZAR LAS OBRAS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y ESCENARIOS PÚBLICOS ABIERTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023." |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | 3,7 | Descripción | Suministro e instalacion puesta a tierra postes metalicos para alumbrado publico, con varilla de cobre de 2.4 mts x 5/8" y conector TGC con cable de Cu 8 desnudo hasta base del poste | Cantidad Total: | 7,00 |
|---|---|---|---|---|---|

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad: | UND | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra) | Instalados en el interior de 7 recamaras | 7 | | | | | | 1,00 | 7,00 |
|   | | | | | | | | | |

Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de lapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$). Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Firma | | | | | | | | | | | | |
| | Nombre | ING. FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ | | | | | | ING. JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO | | | | | |
| | Fecha | AA | 2022 | MM | 12 | DD | 26 | AA | 2022 | MM | 12 | DD | 26 |
| | Cargo | Contratista | | | | | | Supervisor y/o Interventor | | | | | |

CONSORCIO ANGEL

NIT. 901.647.192

- **COPIA BITÁCORA.**

Cra 13 N° 19-33 Of 11 Edif La Plazuela Tel: (6)7323880 Armenia-Q. Cel: 310-4031309. E-mail: consorcioangel2022@gmail.com

Regimen de Lluvias: Tiempo Seco - A.M
Tiempo Seco - P.M.

Equipo de Obra: Herramiento Menor
Concretadora

Personal de Obra: Oficial - Ayudantes

Por el Contratista Por la Interventoria

Viernes 25 de Noviembre de 2022

Actividades de Obra.
Escenario Parque Barrio El Cantarito
Fundicion Dados en Concreto para Instalacion
de Postes de luz
Fundicion Piso Recámaras Electricas

Regimen de Lluvias: Tiempo Seco - A.M.
Tiempo Seco P.M.

Por el Contratista Por la Interventoria

Sabado 26 de Noviembre de 2022

Actividades de Obra
Escenario Parque Barrio El Cantarito
Fundicion Paredes Recamaras Electricas

Regimen de Lluvias: Tiempo Seco - A.M

Equipo de Obra: Herramienta Menor
Concretadora

Personal de Obra: Oficial - Ayudantes

Por el Contratista — Por la Interventoría

Lunes 28 de Noviembre de 2022
Escenario Parque Barrio El Contento.
Actividades del Dia
Escenario
Fundición de Recamaras Eléctricas
Fundición Dados en Concreto pura
Instalación Postes de luz

Regimen de Lluvias: Tiempo Seco-AM
Tiempo Seco-PM

Equipo de Obra: Herramienta Menor
Concretadora

Personal de Obra: Oficial - Ayudantes

Por el Contratista — Por la Interventoría

Martes 29 de Noviembre de 2022.

Actividades del Dia

Escenario Cancha Barrio La Nueva Tebaida.

Excavaciones para Construcción de Recamaras Eléctricas.

Regimen de Lluvias: Tiempo Seco - A.M.
Tiempo Seco - P.M.

Equipo de Obra: Herramienta Menor
Concretadora

Personal de Obra: Oficial - Ayudantes

Por el Contratista

Por la Interventoria

Miercoles 30 de Noviembre de 2022

Actividades del Dia

Escenario Cancha Barrio la Nueva Tebaida

Excavaciones para Construcción de Recamaras Eléctricas

Regimen de Lluvias: Tiempo Seco - A.M.
Tiempo Seco - P.M

Equipo de Obra: Herramienta Menor

Personal de Obra: Oficial - Ayudantes

Por el Contratista

Por la Interventoría

Jueves 01 de Diciembre de 2022
Viernes 02 de Diciembre de 2022
Actividades del Día.

Se realiza el Comité de Obra No. 3. Dentro de los compromisos adquiridos por el Contratista entre el Plan de Acción para adelantar las Actividades de la Instalación de los Puntos con su correspondiente cableado para el Parque del Barrio El Cantarito antes del 15 de Diciembre.

Personal de Obra: Oficial - Ayudantes.

Equipo de Obra: Herramienta Menor.

Regimen de Lluvias: Tiempo Seco - A.M.

Tiempo Seco - P.M

Por el Contratista

Por la Interventoría

Viernes 02 de diciembre de 2022.

Actividades del Dia.
Escenario Deportivo Barrio La Nueve Tubarda.
Excavaciones para Construccion Recámeres Electricas.

Escenario Parque Barrio El Cantarito.

Fundicion de Recameres y Dedos faltantes.

Regimen de Lluvias: Tiempo Seco. A.M.
Tiempo Seco - P.M.

Equipo de Obra: Herramienta Menor.

Regimen de Lluvias: Tiempo Seco - A.M.
Tiempo Seco - P.M

Personal de Obra: Obrero Ayudantes.

Por el Contratista

Por la Interventoria

Lunes 05 de diciembre de 2022

Actividades del Dia

Escenario Parque Barrio El Cantarito

Fundición de Recámeras y Dados faltantes.

Regimen de Lluvias: Tiempo Seco. A.M

Trompo Seco - P.M

Equipo de Obra: Herramiente Menor.
Concretadora
Personal de Obra: Oficial-Ayudante

Por el Contratista

Por la Interventoria

Martes 06 de Diciembre de 2022

Actividades del Diz.

Escenario Cancha Deportive Barrio La Nueve Tebaida

Excavaciones para Recamaras Electricas

Escenario Parque Barrio El Pantarita

Fundiciones Recamaras Eléctricas Faltantes

Regimen de Lluvia: Tiempo Seco - D.M.
Tiempo Seco - P.M.

Equipo de Obra: Herramiente Menor
Concretadora

Personal de Obra: Oficial-Ayudante.

Por el Contratista

Por la Interventoria

Miercoles 07 de Diciembre de 2022

Actividades del Dia.

Escenario Parque Barrio El Cantarito.

Fundicion Recamaras Electricas Faltantes.

Regimen de lluvias: Tiempo Seco A.M.
Tiempo Seco P.M.

Equipo de Obra: Herramienta Menor.
Concretadora.

Personal de Obra: Oficial Ayudantes.

Por el Contratante Supervisor Interventoria

Jueves 08 de Diciembre de 2022

No se laboro en este dia.

Viernes 09 de Diciembre de 2022

Actividades del Dia

Escenario Parque Barrio el Cantarito.

Fundicion Recamaras y dados Faltantes

Regimen de Lluvias: Tiempo Seco AM
Tiempo Seco PM

Equipo de Obra: Herramiente Menor.
Concretadora

Personal de Obra: Oficial-Ayudantes

Por el Contratista Por la Interventoria

Lunes 12 de Diciembre de 2022.

Actividades del Dia
Escenario Cancha Deportiva Barrio La Nueve Tebay
Excavaciones para Pilotaje. Cimentacion
Profunda para Instalacion de Postes de Luz

Regimen de Lluvias: Tiempo Seco-P.M.
Tiempo Seco-P.M.

Equipo de Obra: Herramiente Menor-Barrio Nue

Personal de Obra: Oficial-Ayudantes

Por el Contratista Por la Interventoria

Martes 13 de Diciembre de 2022.

Actividades de Obra

Escenario Parque El Cantarito

Suministro e Instalacion de Cableado para Cancha

electrica Recámaras

Escenario Cancha Deportiva Barrio La Nueva Tebaida


Excavaciones para Pilotaje Cimentación. Profunda para Instalación Postes de Luz

Regimen de Lluvias: Tiempo Seco - A.M.
Tiempo Seco - P.M.

Equipo de Obra: Herramienta Menor - Barreno Hechizo

Personal de Obra: Oficial - Ayudante

Por el Contratista



Miercoles 11 de Octubre de 2023

Actividades del Dia

Escenario Parque El Centro

Suministro e Instalación de Cable para Canalización Electrica Recámaras

Escenario Cancha Deportiva Barrio La Nueva Tebaida.

Armado de Acero para Pilotes a construir

Regimen de Lluvias: Tiempo Seco - A.M
Tiempo Seco - P.M

Equipo de Obra: Herramiente Menor
Barreno Mecanico

Jueves 15 de Diciembre de 2022

Actividades de Obra y Administrativas

Se realiza Comite de Obra Nro 04 en las dependencias de la Secretaria de Infraestructura del Municipio.

Dentro de los compromisos adquiridos por el Contratista esta la Entrega de la Obra en el Sector del Parque El Contento para el dia Jueves 22.

De igual forma se define por parte de la Interventoria que el Concreto para el Pilotaje y la Estructura de Cimentacion que le servira de Soporte Estructural a los Postes de Luz para la Cancha del Barrio La Nueva Jerusalen sera acelerado a 3 dias con el fin de agilizar las Actividades faltantes del Contrato en este Sector.

Reitera la Interventoria que el Plazo contractual va hasta el 25 de Diciembre y que no se le dara mas tiempo al Contratista mas tiempo contractual.

Actividades de Obra


Escenario. Parque Barrio El Cantarito

Alambrado Canalización Recámara

Regimen de Lluvias: Tiempo Seco - A.M.
Tiempo Seco - P.M

Equipo de Obra: Herramienta Menor

Personal de Obra: Oficial - Ayudantes



Por el Contratista Por la Interventoria

Viernes 16 de Diciembre de 2022

Actividades de Obra

Escenario Parque Barrio El Cantarito

Alambrado Canalización. Recámara
Instalación de Postes de luz y Lámparas

Regimen de Lluvias: Tiempo Seco - A.M.
Tiempo Seco - P.M.

Equipo de Obra: Herramienta Menor

Personal de Obra: Oficial - Ayudantes

Por el Contratista

Por la Interventoria

Sabado 17 de Diciembre de 2022.

Actividades del Dia

Escenario Parque Barrio El Contento

Alambrado Canalizacion Recamara
Instalacion de Postes de luz y Lamparas

Regimen de lluvias: Tiempo Seco - A.M
Tiempo Seco - P.M

Equipo de Obra: Herramienta Menor

Personal de Obra: Oficial - Ayudantes

Por el Contratista

Por la Interventoria

Lunes 19 de Diciembre de 2022

Actividades del Dia

Escenario - Estadio Barrio La Nueva Tebaida

Fundiciones Pilotes y Dados en Concreto para Empotrar
Postes de luz a Instalar.

Escenario Parque Barrio El Cantarito

Alambrado Canalización Recamara
Instalación de Postes y luminarias.

Regimen de Lluvias Tiempo Seco- A.M.
Tiempo Seco- P.M

Equipo de Obra: Herramiente Menor.
Concretadora.
Personal de Obra- Oficiales-Ayudantes

Por el Contratista Por la Interventoria

Martes 20 de Diciembre de 2022

Actividades del Dia

Escenario Parque Barrio El Cantarito

Alambrado Canalización Recámara
Instalación de Postes de luz y luminarias.

Escenario Estadio Barrio La Nueva Tebaida

Fundiciones Pilotes y Padon en Concreto
para Cimentación y Posterior Postes de
luz a Instalar.

Regimen de lluvias: Tiempo Seco- AM
Tiempo Seco- P.M

Regimen de Lluvias: Tiempo Seco.
Tiempo Seco.

Equipo de Obra: Herramiente Menor

Personal de Obra: Oficial - Ayudante

Por el Contratista

Por la Interventoria

Sábado 24 de Diciembre de 2022

Fin de la Obra. Entregada a Entera Satisfacción tanto a la Interventoria como a la Supervisión del Contrato

CONSORCIO ANGEL

NIT. 901.647.192

# • PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL – PERSONAL ADMINISTRATIVO.

**Director de Obra – Fernando Arturo Angel**
**Residente de Obra – Leivy Giraldo Mejia**
**Tecnólogo en Obras Civiles – Samuel Hernandez Yepes**
**SISO – Yulieth Gómez López**

Cra 13 N° 19-33 Of 11 Edif La Plazuela Tel: (6)7323880 Armenia-Q. Cel: 310-4031309. E-mail: consorcioangel2022@gmail.com

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2022-12-01, 05:00:10 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 59433637

**Periodo Cotización:** noviembre de 2022 **Periodo Servicio:** noviembre de 2022

## PAGADO 01/12/2022

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ | | |
| **Documento** | CC18391737 | **Dirección** | CRA 13 NRO. 19-33 OFICINA 10 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 7412539 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | ARMENIA | **Departamento** | QUINDIO |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | NINGUNA ARP |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 18391737 | FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ | 03 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 0 | (25-14) COLPENSIONES | $ 6.800.000 | $ 1.156.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 6.800.000 | $ 850.000 | 0,000 | $ 0 | $ 0 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.006.000 |

### III. TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 6.800.000 | $ 6.800.000 | $ 0 | $ 0 | $ 1.156.000 | $ 850.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.006.000 | $ 0 | $ 2.006.000 |



ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

# P' )illa Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 25026592 | | GIRALDO MEJIA LEIVY YURI | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | B Jose hilario Mz E CS 3 | QUIMBAYA-QUINDIO | 7527006 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-11 | 2022-11 | 1830092757 | 9444543746 | I | 2022/12/22 | 2022/12/26 | BANCO DAVIVIENDA | 4 | $400,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 25026592 | GIRALDO MEJIA LEIVY YURI | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,400,000 | $224,000 | EPS005 | 30 | $1,400,000 | $175,000 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | No | $399,000 |
| Total | Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,400,000 | $224,000 | | | $1,400,000 | $175,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 | | $399,000 |

$1.400.000
IBC



2022/12/23 08:34 PM

aportes en línea

# P' illa Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 25026592 | | GIRALDO MEJIA LEIVY YURI | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | B Jose hilario Mz E CS 3 | QUIMBAYA-QUINDIO | 7527006 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-11 | 2022-11 | 1830092757 | 9444543746 | I | 2022/12/22 | 2022/12/26 | BANCO DAVIVIENDA | 4 | $400,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $224,000 | $1,000 | $0 | $225,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $224,000 | $1,000 | $0 | $225,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $175,000 | $800 | $0 | $175,800 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $175,000 | $800 | $0 | $175,800 |
| TOTAL | | | | 1 | $399,000 | $1,800 | $0 | $400,800 |



2022/12/23 08:34 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 24607136 | | GOMEZ LOPEZ YULIETH | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cra 7 9 16 | CIRCASIA-QUINDIO | 3166433 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-11 | 2022-11 | 43180082 | 9443180082 | I | 2022/12/12 | 2022/12/01 | BANCO AV VILLAS | 0 | $354,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 24607136 | GOMEZ LOPEZ YULIETH | 230201 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $125,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $0 | $0 | | | $1,000,000 | $69,600 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $160,000 | $0 | $0 | $160,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $160,000 | $0 | $0 | $160,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $69,600 | $0 | $0 | $69,600 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $69,600 | $0 | $0 | $69,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $125,000 | $0 | $0 | $125,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $125,000 | $0 | $0 | $125,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $354,600 | $0 | $0 | $354,600 |



2022/12/07 07:36 AM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 24607136 | | GOMEZ LOPEZ YULIETH | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cra 7 9 16 | CIRCASIA-QUINDIO | 3166433 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-11 | 2022-11 | 1822019499 | 9444363800 | N | 2022/12/12 | 2022/12/20 | BANCOLOMBIA | 8 | $71,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 24607136 | GOMEZ LOPEZ YULIETH | 230201 | 30 | ($1,000,000) | ($160,000) | EPS037 | 30 | ($1,000,000) | ($125,000) | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | ($1,000,000) | ($69,600) | 0 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 24607136 | GOMEZ LOPEZ YULIETH | 230201 | 30 | $1,200,000 | $192,000 | EPS037 | 30 | $1,200,000 | $150,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,200,000 | $83,600 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $200,000 | $32,000 | | | $200,000 | $25,000 | | | $0 | $0 | | | $200,000 | $14,000 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $32,000 | $300 | $0 | $32,300 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $32,000 | $300 | $0 | $32,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $14,000 | $200 | $0 | $14,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $14,000 | $200 | $0 | $14,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $25,000 | $300 | $0 | $25,300 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $25,000 | $300 | $0 | $25,300 |
| TOTAL | | | | 1 | $71,000 | $800 | $0 | $71,800 |



2022/12/23 11:59 AM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1097032818 | | HERNANDEZ YEPES SAMUEL ANDRES | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cra 7 9 16 | CIRCASIA-QUINDIO | 3166433 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-11 | 2022-11 | 43180082 | 9443180088 | I | 2022/12/12 | 2022/12/01 | BANCO AV VILLAS | 0 | $354,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1097032818 | HERNANDEZ YEPES SAMUEL ANDRES | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $125,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-2 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $0 | $0 | | | $1,000,000 | $69,600 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $160,000 | $0 | $0 | $160,000 |
| PROTECCION | 230301 | 800,229,739 | D | 1 | $160,000 | $0 | $0 | $160,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $69,600 | $0 | $0 | $69,600 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $69,600 | $0 | $0 | $69,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $125,000 | $0 | $0 | $125,000 |
| SANITAS | EPS005 | 900,156,264 | 2 | 1 | $125,000 | $0 | $0 | $125,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $354,600 | $0 | $0 | $354,600 |



2022/12/28 08:43 AM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 18391737 | | ANGEL PELAEZ FERNANDO ARTURO | A - 200 O MAS COTIZANTES | TEBAIDA | CRA 13 19 33 | TEBAIDA-QUINDIO | 3233249353 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-11 | 2022-11 | 1822011926 | 94443650?9 | Y | 2022/12/20 | 2022/12/20 | BANCOLOMBIA | 0 | $139,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 18391737 | ANGEL PELAEZ FERNANDO ARTURO | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 0 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1099708122 | LLANO MORALES JENNIFER | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 2)** | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $2,000,000 | $139,200 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $139,200 | $0 | $0 | $139,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 2 | $139,200 | $0 | $0 | $139,200 |
| TOTAL | | | | 2 | $139,200 | $0 | $0 | $139,200 |



2022/12/27 05:13 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 18391737 | | ANGEL PELAEZ FERNANDO ARTURO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PLANTA MULTI | CRA 13 19 33 | ARMENIA-QUINDIO | 3233249353 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-11 | 2022-11 | | 9443542894 | Y | 2022/12/12 | | | 0 | |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 25026592 | GIRALDO MEJIA LEIVY YURI | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 0 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 24939743 | SARRIA CORREA LUZ ADRIANA | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 2)** | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $2,000,000 | $139,200 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $139,200 | $0 | $0 | $139,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 2 | $139,200 | $0 | $0 | $139,200 |
| TOTAL | | | | 2 | $139,200 | $0 | $0 | $139,200 |



2022/12/27 05:00 PM

CONSORCIO ANGEL

NIT. 901.647.192

- **PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL – PERSONAL DE OBRA.**
- **PLANILLA CONTRATISTA PARA CONSTRUCCIÓN DE PILOTES.**

Cra 13 N° 19-33 Of 11 Edif La Plazuela Tel: (6)7323880 Armenia-Q. Cel: 310-4031309. E-mail: consorcioangel2022@gmail.com

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901647192 | 1 | CONSORCIO ANGEL | A - 200 O MAS COTIZANTES | OBRA LA TEBAIDA | CRA 13 19 33 | LA TEBAIDA-QUINDIO | 3233249353 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-11 | 2022-12 | 46208246 | 9444020803 | E | 2022/12/22 | 2022/12/12 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $1,449,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1096039364 | BETANCURT MORALES AUGUSTO | 230301 | 28 | $933,334 | $149,400 | EPS041 | 28 | $933,334 | $37,400 | CCF43 | 28 | $933,334 | $37,400 | 14-11 | 28 | $933,334 | $4,900 | 28 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1004827409 | CANTOR ECHEVERRY LEANDRO | 230301 | 8 | $266,667 | $42,700 | EPS041 | 8 | $266,667 | $10,700 | CCF43 | 8 | $266,667 | $10,700 | 14-11 | 8 | $266,667 | $1,400 | 8 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1005160467 | CANTOR ECHEVERRY RONALDO | 230301 | 15 | $500,000 | $80,000 | EPS041 | 15 | $500,000 | $20,000 | CCF43 | 15 | $500,000 | $20,000 | 14-11 | 15 | $500,000 | $2,700 | 15 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 1094943024 | FLOREZ TORO YEISSON | 230301 | 15 | $500,000 | $80,000 | EPS041 | 15 | $500,000 | $20,000 | CCF43 | 15 | $500,000 | $20,000 | 14-11 | 15 | $500,000 | $2,700 | 15 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 1096035169 | MORALES BEDOYA JUAN DANIEL | 230301 | 28 | $933,334 | $149,400 | EPS041 | 28 | $933,334 | $37,400 | CCF43 | 28 | $933,334 | $37,400 | 14-11 | 28 | $933,334 | $4,900 | 28 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 1046903316 | RESTREPO OQUENDO ARLEY DAVID | 230301 | 28 | $933,334 | $149,400 | EPS017 | 28 | $933,334 | $116,700 | CCF43 | 28 | $933,334 | $37,400 | 14-11 | 28 | $933,334 | $4,900 | 28 | $933,334 | $46,800 |
| 7 | CC | 9805205 | RODRIGUEZ BATERO HECTOR HERNAN | | 0 | $0 | $0 | EPS041 | 28 | $933,334 | $37,400 | CCF43 | 28 | $933,334 | $37,400 | 14-11 | 28 | $933,334 | $4,900 | 28 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 1094885175 | ZUÑIGA CUELLAR JAVIER EDERLEY | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS002 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF43 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 8)** | | | | | $5,066,669 | $810,900 | | | $6,000,003 | $319,600 | | | $6,000,003 | $240,300 | | | $6,000,003 | $31,700 | | $933,334 | $46,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $810,900 | $0 | $0 | $810,900 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 7 | $810,900 | $0 | $0 | $810,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 8 | $31,700 | $0 | $0 | $31,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 8 | $31,700 | $0 | $0 | $31,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 8 | $240,300 | $0 | $0 | $240,300 |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 8 | $240,300 | $0 | $0 | $240,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 8 | $319,600 | $0 | $0 | $319,600 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $116,700 | $0 | $0 | $116,700 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 6 | $162,900 | $0 | $0 | $162,900 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $40,000 | $0 | $0 | $40,000 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $28,100 | $0 | $0 | $28,100 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | $28,100 | $0 | $0 | $28,100 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $18,700 | $0 | $0 | $18,700 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | $18,700 | $0 | $0 | $18,700 |
| TOTAL | | | | 8 | $1,449,300 | $0 | $0 | $1,449,300 |



2022/12/23 12:01 PM

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 900739668 | 7 | SUELOS Y PERFORACIONES AB SAS | B | 0 | ARL SURA - 14-11 | ÚNICA | 4390 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | EMAIL | | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 63-1 | LA ADIELA MZ 17 CASA 15 | | 7352330 | | ASESORIASCONTABLESAYG@HOTMAIL.COM | | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO PENSIÓN | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2022-11 | 2022-12 | 25102971 | E | 2022-12-19 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 3.097.900 | 10.700 | BANCO CAJA SOCIAL BCSC |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 19 | 25102971 | 2022-12-16 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | DIAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | APRT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | | | |
| 1 | CC 9731190 | FORERO CANO OMAR AUGUSTO | 1.000.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | COLFONDOS-231001 | 300.000 | 48.000 | 0 | 0 | SOS-EPS-EPS018 | 300.000 | 12.000 | COMFENALCO QUINDIO-CCF43 | 300.000 | 12.000 | 300.000 | 20.900 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 92.900 | S | 5453002 |
| 2 | CC 18492089 | FRANCO VARGAS JOSE LUIS | 1.000.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | PORVENIR-230301 | 66.667 | 10.700 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | 66.667 | 2.700 | COMFENALCO QUINDIO-CCF43 | 66.667 | 2.700 | 66.667 | 4.700 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 20.800 | S | 5453002 |
| 3 | CC 72253232 | PAJARO BOLAÑO RAMON MANUEL | 1.000.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 1.000.000 | 40.000 | COMFENALCO QUINDIO-CCF43 | 1.000.000 | 40.000 | 1.000.000 | 69.600 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 309.600 | S | 5453002 |
| 4 | CC 89003660 | MONTOYA LOPEZ HUMBERTO | 1.000.000 | F | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | COLPENSION ES-25-14 | 33.334 | 5.400 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 33.334 | 1.400 | COMFENALCO QUINDIO-CCF43 | 33.334 | 1.400 | 33.334 | 2.400 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 10.600 | S | 5453002 |
| 5 | CC 94461420 | MARROQUIN ROMERO MILTON CESAR | 1.000.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.000.000 | 40.000 | COMFENALCO QUINDIO-CCF43 | 1.000.000 | 40.000 | 1.000.000 | 69.600 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 309.600 | S | 5453002 |
| 6 | CC 1005096108 | GARCIA REYES MAICOL ESTEBAN | 1.000.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | PORVENIR-230301 | 300.000 | 48.000 | 0 | 0 | ESSC ASMET SALUD-ESSC62 | 300.000 | 12.000 | COMFENALCO QUINDIO-CCF43 | 300.000 | 12.000 | 300.000 | 20.900 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 92.900 | S | 5453002 |
| 7 | CC 1007288599 | LENGUA OSPINA JEFFERSON JESUS | 1.000.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | 1.000.000 | 40.000 | COMFENALCO QUINDIO-CCF43 | 1.000.000 | 40.000 | 1.000.000 | 69.600 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 309.600 | S | 5453002 |
| 8 | CC 1094883536 | SALAZAR MONTOYA RICHARD | 1.000.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 1.000.000 | 40.000 | COMFENALCO QUINDIO-CCF43 | 1.000.000 | 40.000 | 1.000.000 | 69.600 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 309.600 | S | 5453002 |
| 9 | CC 1094887921 | GUACHETA RIVERA VICTOR ALFONSO | 1.000.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 14 | 14 | 14 | 14 | PORVENIR-230301 | 466.667 | 74.700 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 466.667 | 18.700 | COMFENALCO QUINDIO-CCF43 | 466.667 | 18.700 | 466.667 | 32.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 144.600 | S | 5453002 |
| 10 | CC 1094886621 | ACOSTA PIEDRAHITA JONNATAN | 1.000.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 28 | 28 | 28 | 28 | PORVENIR-230301 | 933.334 | 149.400 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 933.334 | 37.400 | COMFENALCO QUINDIO-CCF43 | 933.334 | 37.400 | 933.334 | 65.000 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 289.200 | S | 5453002 |
| 11 | CC 1094920965 | LOPEZ PIÑEROS JONATHAN | 1.000.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | PROTECCION-230201 | 300.000 | 48.000 | 0 | 0 | FAMISANAR-EPS017 | 300.000 | 12.000 | COMFENALCO QUINDIO-CCF43 | 300.000 | 12.000 | 300.000 | 20.900 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 92.900 | S | 5453002 |
| 12 | CC 1094931006 | RAMIREZ SANCHEZ JULIAN ALBERTO | 1.000.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | PORVENIR-230301 | 300.000 | 48.000 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 300.000 | 12.000 | COMFENALCO QUINDIO-CCF43 | 300.000 | 12.000 | 300.000 | 20.900 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 92.900 | S | 5453002 |
| 13 | CC 1094978538 | GARCIA MORENO JUAN DAVID | 1.000.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | PROTECCION-230201 | 300.000 | 48.000 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 300.000 | 12.000 | COMFENALCO QUINDIO-CCF43 | 300.000 | 12.000 | 300.000 | 20.900 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 92.900 | S | 5453002 |
| 14 | CC 1114731555 | GOMEZ SUAREZ ERNESTO | 1.000.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 16 | 16 | 16 | 16 | PORVENIR-230301 | 533.334 | 85.400 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 533.334 | 21.400 | COMFENALCO QUINDIO-CCF43 | 533.334 | 21.400 | 533.334 | 37.200 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 165.400 | S | 5453002 |
| 15 | CC 1129488216 | GUTIERREZ BARRAZA JHON JAIRO | 1.000.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 29 | 29 | 29 | 29 | PROTECCION-230201 | 966.667 | 154.700 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 966.667 | 38.700 | COMFENALCO QUINDIO-CCF43 | 966.667 | 38.700 | 966.667 | 67.300 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 299.400 | S | 5453002 |
| 16 | CC 1143854999 | ALVAREZ GAVIRIA JUAN SEBASTIAN | 1.000.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | PORVENIR-230301 | 300.000 | 48.000 | 0 | 0 | SOS-EPS-EPS018 | 300.000 | 12.000 | COMFENALCO QUINDIO-CCF43 | 300.000 | 12.000 | 300.000 | 20.900 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 92.900 | S | 5453002 |
| 17 | CC 1192719607 | GONZALEZ HERNANDEZ DAVID STIVEN | 1.000.000 | F | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | PORVENIR-230301 | 400.000 | 64.000 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 400.000 | 16.000 | COMFENALCO QUINDIO-CCF43 | 400.000 | 16.000 | 400.000 | 27.900 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 123.900 | S | 5453002 |
| 18 | PE 7320857281219999 | PUMERO ORTUNO YOFER ALEJANDRO | 1.000.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | COLPENSION ES-25-14 | 300.000 | 48.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 300.000 | 12.000 | COMFENALCO QUINDIO-CCF43 | 300.000 | 12.000 | 300.000 | 20.900 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 92.900 | S | 5453002 |
| 19 | PT 4884089 | HERNANDEZ ROJAS FENDERSON JOSE | 1.000.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 14 | 14 | 14 | 14 | PORVENIR-230301 | 466.667 | 74.700 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 466.667 | 18.700 | COMFENALCO QUINDIO-CCF43 | 466.667 | 18.700 | 466.667 | 32.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 144.600 | S | 5453002 |

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 900739658 | 7 | SUELOS Y PERFORACIONES AB SAS | B | 0 | ARL SURA - 14-11 | ÚNICA | 4390 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | EMAIL | | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 63-1 | LA ADIELA MZ 17 CASA 15 | | 7352330 | | ASESORIASCONTABLESAYG@HOTMAIL.COM | | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO PENSIÓN | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2022-11 | 2022-12 | 25102971 | E | 2022-12-19 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 3.097.900 | 10.700 | BANCO CAJA SOCIAL BCSC |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 19 | 25102971 | | Pagada | | | | | | | |

| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 9.966.670 | 9.966.670 | 9.966.670 | 9.966.670 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 4) | | | | 19 | 1.595.000 | 0 | 5.400 | 0 | 1.600.400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 3 | 213.400 | 0 | 700 | 0 | 214.100 |
| COLFONDOS | 231001 | 800227940 | 6 | 1 | 48.000 | 0 | 200 | 0 | 48.200 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 12 | 1.082.900 | 0 | 3.600 | 0 | 1.086.500 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 3 | 250.700 | 0 | 900 | 0 | 251.600 |
| EPS(Administradoras: 8) | | | | 19 | 399.000 | 0 | 1.700 | 0 | 400.700 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800130907 | 4 | 6 | 140.100 | 0 | 500 | 0 | 140.600 |
| SOS-EPS | EPS018 | 805001157 | 2 | 2 | 24.000 | 0 | 100 | 0 | 24.100 |
| EPS SURA | EPS010 | 800088702 | 2 | 1 | 40.000 | 0 | 200 | 0 | 40.200 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830003564 | 7 | 1 | 12.000 | 0 | 100 | 0 | 12.100 |
| NUEVA E.P.S. S.A. MOV | EPS041 | 900156264 | 2 | 2 | 42.700 | 0 | 200 | 0 | 42.900 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 2 | 41.400 | 0 | 200 | 0 | 41.600 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 4 | 86.800 | 0 | 300 | 0 | 87.100 |
| ESSC ASMET SALUD | ESSC62 | 900935126 | 7 | 1 | 12.000 | 0 | 100 | 0 | 12.100 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 19 | 694.200 | 0 | 2.300 | 0 | 696.500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890903790 | 5 | 19 | 694.200 | 0 | 2.300 | 0 | 696.500 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 19 | 399.000 | 0 | 1.300 | 0 | 400.300 |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890000381 | 0 | 19 | 399.000 | 0 | 1.300 | 0 | 400.300 |
| Gran Total | | | | | 3.087.200 | 0 | 10.700 | 0 | 3.097.900 |
