Building SAS / INPLAYCO S.A.S. Ingenieros Constructores e Interventores	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. · Secretaría del Hábitat · Bogotá

SEMANA No. 11 (Consecutivo) **DEL** 12/11/2022 (dd-mm-aa) **AL** 18/11/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 1009 de 2022

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 – 2022"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 - 2022."

CONTRATISTA DE OBRA: BUILDING SAS **NIT** 804.002.715-3

INTERVENTOR: INPLAYCO SAS **NIT** 860.524.168-8

CONTRATO DE OBRA	
Valor Inicial	$ 3.600.000.000
Valor Adicional 1	N.A
Valor Adicional 2	N.A
Valor Actualizado	$ 3.600.000.000
Plazo Inicial	4 Meses
Plazo Prórroga 1	N.A.
Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	4 Meses
Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2022
Fecha de Terminación según Prórroga	N.A.
Fecha de Terminación según Prórroga	N.A.
Fecha de Terminación Actual	31/12/2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 432.000.000
Valor Adicional 1	N.A
Valor Adicional 2	N.A
Valor Actualizado	$ 432.000.000
Plazo Inicial	5 Meses
Plazo Prorroga 1	N.A.
Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	5 Meses
Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/01/2023
Fecha de Terminación según	N.A.
Fecha de Terminación según	N.A.
Fecha de Terminación Actual	31/01/2023


SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: CAMILA CORTES DAZA


2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA


2.1. AVANCES DE EJECUCIÓN VALIDACIONES

AVANCE FÍSICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

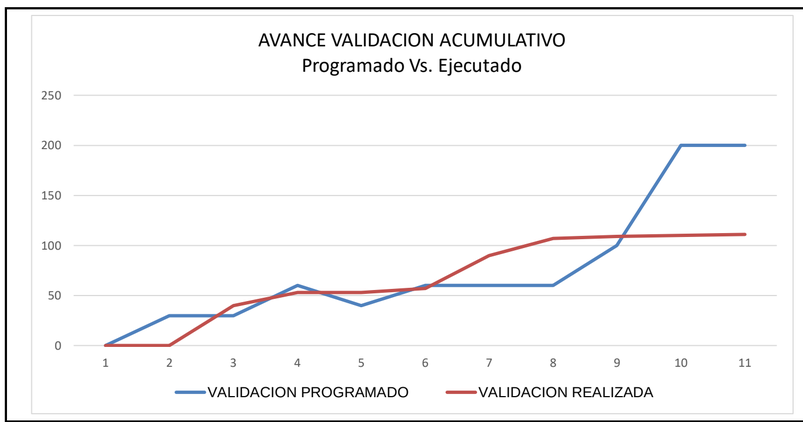

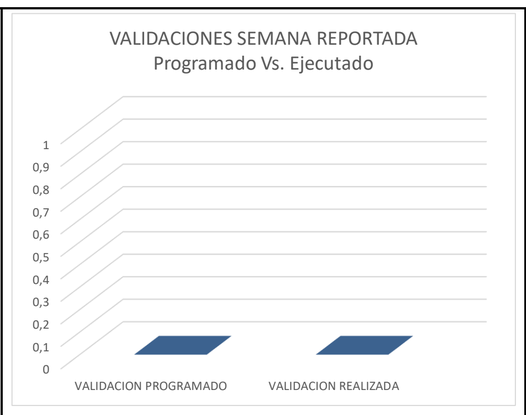

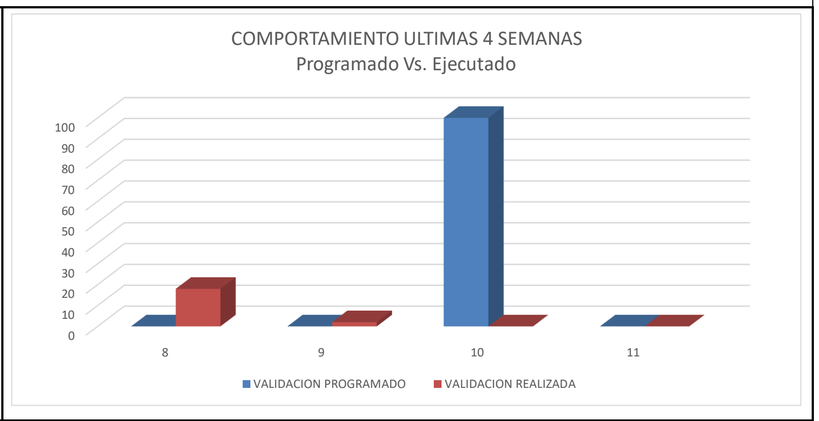

Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)						
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso
Cantidad Validaciones	**200**	**100%**	**111**	**55,5%**	**0,00%**	**-44,50%**

Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)			
Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso
0	**0**	**0,00%**	**0%**

Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
SEM 8	Prog.	Ejec.	**SEM 9**	Prog.	Ejec.	**SEM 10**	Prog.	Ejec.	**SEM 11**	Prog.	Ejec.
	0	**17**		**40**	**2**		**100**	**0**		**0**	**0**


OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

1. Se evidencia que con respecto a la ultima semana de ejecucion el Contratista de obra no realizo validaciones, con esto se mantienen los 111 MV validados lo que refiere a un 55,5% que según lo programado tiene un atraso general del contrato del 44,5%
2. Con respecto a la grafica No. 2 la cual indica el porcentaje de validación durante la semana, esta no presenta ninguna atraso teniendo en cuenta que segun la programacion esta semana no correspondia adelanto de validaciones ya que la ultima semana de esta estapa inicial correspondia a semana anterior (Semana 10)
3. Según la programación actual se evidencia que a la fecha el contratista de obra presenta un atraso general del 44,5% del total de las viviendas adjudicadas al contrato 994 de 2022.


2.2. AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES

AVANCE FÍSICO APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

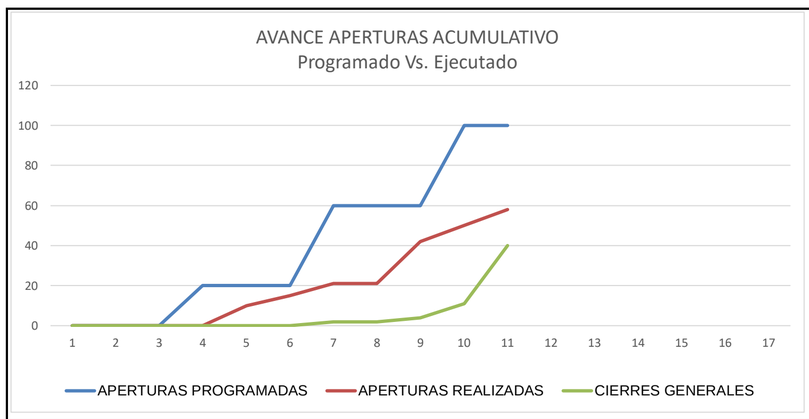



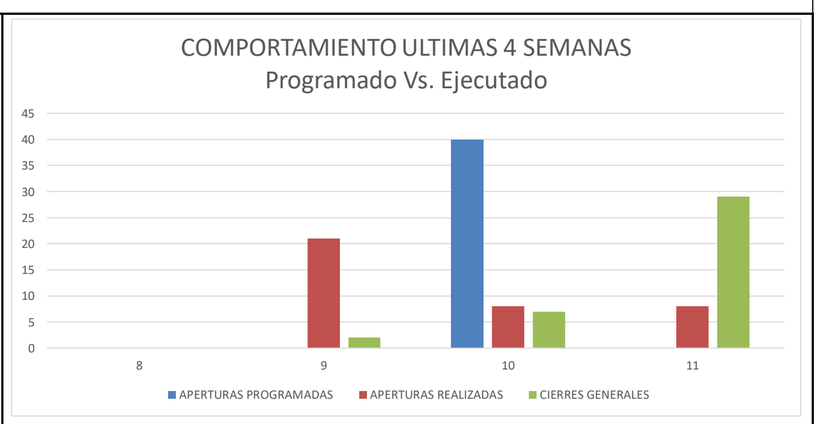

Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)						
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso
Cantidad de Aperturas	**100**	**50%**	**58**	**29,0%**	**0,0%**	**-21,00%**

Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)			
Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso
0	**8**	**4,0%**	**0,00%**

Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
SEM 8	Prog.	Ejec.	**SEM 9**	Prog.	Ejec.	**SEM 10**	Prog.	Ejec.	**SEM 11**	Prog.	Ejec.
	0	**0**		**0**	**20**		**40**	**8**		**0**	**8**

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

1. El Contratista de obra durante la ultima semana no presenta aperturas según la programacion de las cuales se realizo apertura de 8 MV, esto generando un avance del 4% frente al avance semanal.
2. Según la programación de obra ajustada que presento el Contratista Building SAS, indica que a la fecha segun dicha programacion se deben tener 100 viviendas aperturadas de las cuales se aperturaron 58 viviendas, teniendo 40 mv entregados a satisfaccion y 18 viviendas en ejecucion, esto presenta un atraso del 21,00%


Building SAS / INPLAYCO S.A.S. Ingenieros Constructores e Interventores	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. · Secretaría del Hábitat · Bogotá

SEMANA No. 11 (Consecutivo) **DEL** 12/11/2022 (dd-mm-aa) **AL** 18/11/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 1009 de 2022

2.3. AVANCES DE EJECUCIÓN FINANCIERO

AVANCE DE EJECUCION FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

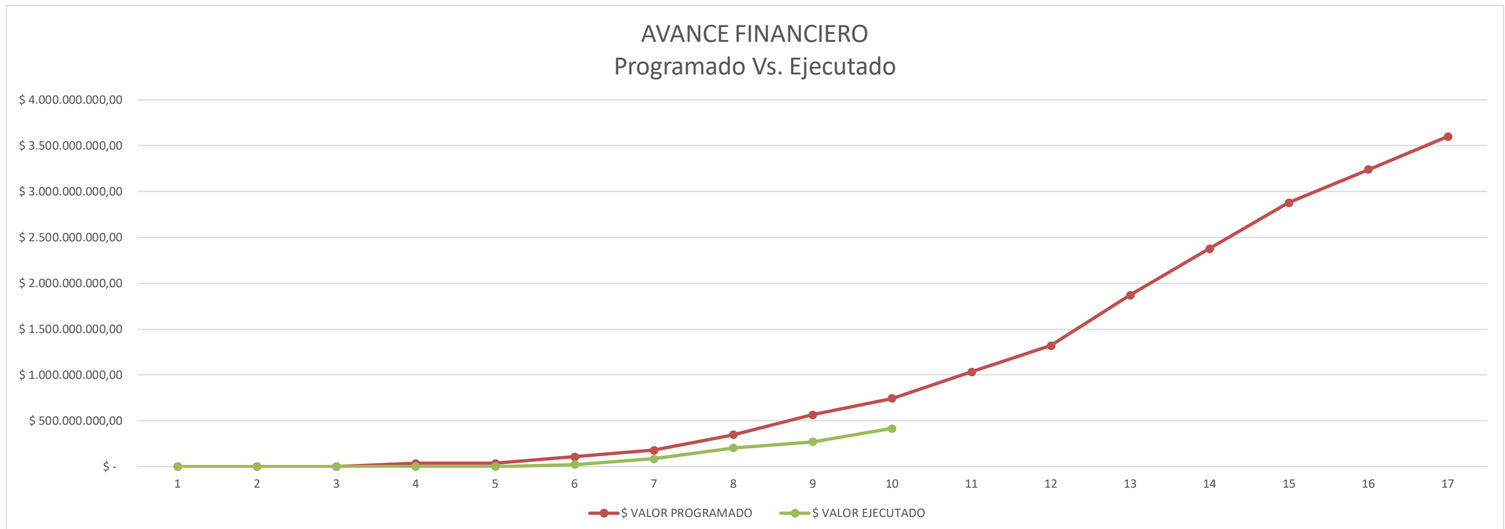

VALOR INVERSION SEGÚN FLUJO DE CAJA

INVERSION SEMANAL

PROGRAMADA	VS.	EJECUTADA
$ 288.000.000		**$ 173.424.917,74**
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
8,00%		**4,82%**

INVERSION ACUMULADA

PROGRAMADA	VS.	EJECUTADA
$ 1.032.000.000		**$ 598.045.568,18**
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
28,67%		**16,61%**

ATRAZO O ADELANTO GENERAL EN PESOS ($): **$ 433.954.431,82**

ATRAZO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%): **-12,05%**

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para

1. Según el ajuste a la programación y flujo de caja presentados por el Contratista de obra, a la fecha se esta presentando un atraso según lo ejecutado de $433.954.431,82 lo que hace referencia a un -12,05% de atraso frente al valor total del contrato.

3. ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

	ID_MV	DESCRIPCION DEL ASUNTO	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA EN EL PERIODO	N/A	N/A	N/A	N/A
SEMANA X				
SEMANA X				

4. RELACIÓN DE RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativas)

	ID_MV	MOTIVO DE LA RENUNCIA Y/O NO EJECUCIÓN	No. DE RADICADO A LA SDHT Y FECHA
SEMANA 2	MVBF_801	BENEFICIARIA AMPARO TIQUE ROMERO IDENTIFICADA CON C.C. 52152205, SE RECIBE INFORMACION DE RENUNCIA REALIAZADA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT.	1-2022-39168 - 22 /09/ 2022
	MVBF_1100	BENEFICIARIA OLGA LUCIA LOZANO CERQUERA IDENTIFICADA CON C.C. 26473801, SE RECIBE INFORMACION DE RENUNCIA REALIAZADA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT.	1-2022-38912 - 22/09/2022
SEMANA X			
SEMANA X			

5. RELACION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativas)

	ID_MV	BREVE DESCRIPCION DE LA PQR (anexar copia del PQR)	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA EN EL PERIODO				
SEMANA X				
SEMANA X				

Building SAS / INPLAYCO S.A.S. Ingenieros Constructores e Interventores	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. · Secretaría del Hábitat · Bogotá

SEMANA No. 11 (Consecutivo) **DEL** 12/11/2022 (dd-mm-aa) **AL** 18/11/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 1009 de 2022

6. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORIA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

1. ATENCIÓN A LA COMUNIDAD ATENCIÓN PAC: 16-11-22, Se acerca el señor Luis Quintero a verificar si salió beneficiario del programa pero no se encuentra allí. Se le recomienda acercarse a la secretaria del hábitat para verificar su proceso.

2. ACOMPAÑAMIENTO A VALIDACIONES: No se realizaron durante la semana.

3. ACOMPAÑAMIENTO APERTURAS DE OBRA: se realizò acompañamiento y supervisiòn desde el area social de la interventoria a las **8 apertura** de obras, con los siguientes mv:
MVBF_0531, MVBF_0719, MVBF_1118, MVBF_0840, MVBF_0321, MVBF_1339, MVBF_1311, MVBF_0841.

4. ACOMPAÑAMIENTO A ENTREGAS: se realizò acompañamiento y supervisiòn desde el area social de la interventoria en las **29 entregas** realizadas durante la semana,
MVBF_1197
MVBF_1117
MVBF_1338
MVBF_1343
MVBF_1354
MVBF_948
MVBF_964
MVBF_0840
MVBF_0841
MVBF_0924
MVBF_0966
MVBF_0984
MVBF_1110
MVBF_1141
MVBF_0975
MVBF_0979
MVBF_1061
MVBF_1098
MVBF_1155
MVBF_1166
MVBF_1167
MVBF_1187
MVBF_1427
MVBF_1358

5. SEGUIMIENTOS A VIVIENDAS RELEVANTES: MVBF_1462 Se realizó vista de seguimiento a compromisos establecidos en acta #1 realizada el día 13 de octubre de 2022 donde quedo estipulado que la beneficiaria por cuenta propia mandaría a realizar unos arreglos locativos a su vivienda y que el día 15 de noviembre la vivienda estaría lista y desocupada para ser intervenida. Se evidencio que un no están terminados dichos arreglos y se amplió el palo para que la beneficiaria termine dichos arreglos y poder realizar apertura de obra lo más pronto posible. **MVBF_1081** Se hace visita al predio por parte del contratista e interventoría en el cuál, el beneficiario manifiesta inconformidad ya que refiere que los maestros no están realizando adecuadamente las actividades. El sábado no los dejo entrar a la vivienda. El día de hoy el señor le comento al personal de obra que no dejaría entrar si no hablaba con los profesionales antes. Parte técnica de interventoría y contratista revisa actividades y solicita ajuste en algunas. Se le recuerda al beneficiario los canales de comunicación y el contacto es directo con los profesionales de las chaquetas azules. Se levanta acta y la bitácora no se encuentra, el beneficiario manifiesta que la buscara.

6. La Interventoria solicita ingresar mas personal operativo y presentar el debido plan de contigencia teniendo en cuenta los atrasos que se estan presentando en el Contrato.

7. COMPONENTE AMBIENTAL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

DISPOSICIÓN RCD M3		ESCOMBRERA (indicar nombre y No. Autorización)	No. DE VALE ESCOMBRERA, PIN Y PLACA VOLQUETA
SEMANA 11	**6 M3**	Se hizo disposición en CEMEX - Tunjuelo, RES.1480 Del 04 de diciembre de 2014 - ANLA	VALE _ FOLIO: 222415670 PIN: 2115 PLACA: SBH284
MES	**Noviembre**		
SECTOR	**BF**		

CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	**6**	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	**12**

DISPOSICION RESIDUOS PELIGROSOS M3		CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA
SEMANA 11	**0 M3**	Se evicencia la recolección de empaques de cemento y pegante cerámico en la bodega No se ha realizado disposición de RESPEL
MES	**Noviembre**	
SECTOR	**BF**	

CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	**0 M3**	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	**0 M3**

- Se refuerza al personal operativo con la Uso adecuado herramientas manuales y Contaminación ambiental, residuos peligrosos
- Cumplimiento con las inspecciones programadas en el plan de trabajo
- Hubo 31 ingresos de personal de obra y se realiza verificación de seguridad social vigente e inducción al personal.
- Por efecto de la lluvia los sitios de disposición final, no han contado con servicio permanente de recibo de RCD, razon por la cual se continua con la recolección y acopio en la bodega y se estará enviando a sitio de siposición con posterioridad, se recibio vale con dispoisición realizada de 6m3 en Cemex Tunjuelo, reallizada inicio del mes - 5 nov-2022.
- Actualmente se cuenta con personas extranjeras activas debidamente legalizadas con PPT o equivalente.
- Se verificaron los EPP del personal y la dotación de overol.
- La interventoría recibe charla sobre Uso correcto de EPP, en las viviendas ejecutadas, con el fin que se identifiquen los peligros y a la vez se recalque a los maestros para evitar accidentes al ejecutar las actividades.
- Se hace acompañamiento SST-MA en las aperturas y seguimientos de vivienda, se ha recalcado el cuidado especial que se debe tener por el riesgo publico inminente en el sector.
- Se deja anotación en Bitacora sobre las prevenciones que debe tomar el con tratista paa actividades con riesgo de caida a diferente nivel.

8. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

CONTRATISTA DE OBRA						INTERVENTORIA					
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	2	CAPACITACIONES REALIZADAS	2	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0	CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CAPACITACIONES REALIZADAS	1	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBREROS)			32	PERSONAL ADMINISTRATIVO	13	CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORIA					12
PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	31	PERSONAL OBRERO	31	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2						
PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2						

9. ANEXOS

ANEXO 1: CONSOLIDADO TECNICO
ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SOCIAL.

Nota: Si lo requiere.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas previamente, en Bogotá, D.C., a los **VEINTIUNO** (Día en letras) **21** (Día en números) días del mes del **NOVIEMBRE** (Mes en letras) de **2022** (Año de firma del informe)

Firma

Nombre (Nombre) Arq. CESAR A FUENMAYOR.
Cargo: Director de Interventoría

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO 1

Consolidado Técnico

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL			Fecha	15-nov-22

BUILDING SAS			
Contrato de Obra	994 - 2022	Fecha de Inicio	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Objeto	"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 – 2022"	Fecha de Terminacion	31 DE DICIEMBRE DE 2022
		Plazo Inicial	CUATRO (4) MESES
		Valor del contrato	TRES MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.600.000.000) M/Cte

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.			
Contrato de interventoría	1009 - 2022	Fecha de Inicio	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Objeto	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 - 2022."	Fecha de Terminacion	31 DE ENERO DE 2023
		Plazo Inicial	CINCO (5) MESES
		Valor del contrato	CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($432.000.000) M/Cte

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT							Fase 2: Ejecución de obras					
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validacion		Ejecución					
					Validada	V/Por Validar	En Ejecución	Terminadas	Renuncias	Por	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	Arq Leonardo Solano	BELLA FLOR	50	200	29	21	4	8	0	38	17,26%	8
	Arq Luisa Franco		50		36	14	5	14	0	31	29,18%	14
	Ing Martha Neira		50		26	24	5	11	0	34	25,90%	11
	Arq. Edwin Baez		50		19	31	4	7	0	39	14,80%	7
Subtotal			**200**	**200**	**110**	**90**	**18**	**40**	**0**	**142**	**21,79%**	**40**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL											NOVIEMBRE
Proyecto Ciudad Bolívar				FASE I		Tiempo Programación				% ACUMULADO	SEMANA DEL 12 AL 18
No. Etiq.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos	Valor Inicial	Valor Liquidado	Fecha Validacion	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		SEMANA 11
BARRIO BELLA FLOR											
GRUPO No. 1											
1	MVBF_1220	CL 73C BIS A SUR 26F 27 MJ	MARIA NOHEMY MATTA LOZANO			21-sep-22			VALIDADA	0,00%	0,00%
2	MVBF_1228	KR 27 73C 32 SUR	SANDRA YANETH REY VANEGAS			21-sep-22			VALIDADA	0,00%	0,00%
3	MVBF_1213	CL 73D BIS SUR 26G 02 MJ	NORMA CONSTANZA MELO			21-sep-22			VALIDADA	0,00%	0,00%
4	MVBF_1195	KR 27 BIS A 73D 87 SUR MJ	DOLY ARGENIS RIVERA AVIRAMA			20-sep-22			VALIDADA	0,00%	0,00%
5	MVBF_1196	KR 27 BIS A 73D 83 SUR MJ	INES SOFIA REYES CASTRO	$ 14.369.650,00	$ 14.395.216,00	19-sep-22	12/10/2022	8/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
6	MVBF_1197	KR 27 BIS A 73D 79 SUR MJ 1	LEIDY ALEJANDRA PALACIOS REYES	$ 13.769.930,00	$ 14.370.476,00	19-sep-22	7/10/2022	16/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
7	MVBF_1200	KR 27 BIS A 73D 75 SUR	SANDRA PAOLA BEJARANO REYES	$ 14.396.371,00		19-sep-22	2/11/2022		EJECUCION	15,44%	10,44%
8	MVBF_1198	CL 73D BIS A SUR 27 33 MJ	CARMEN ELVIRA REYES CARO			19-sep-22			VALIDADA	0,00%	0,00%

9	MVBF_1201	CL 73D BIS A SUR 27 39 MJ	MARIANA ALEXANDRA VELANDIA VASQUEZ			20-sep-22			VALIDADA	0,00%	0,00%
10	MVBF_1166	CL 73D BIS A SUR 27 28	MERCEDES VASQUEZ BONILLA	$ 14.399.376,00	$ 14.399.379,00	20-sep-22	5/10/2022	16/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	2,00%
11	MVBF_1167	CL 73D BIS A SUR 27 22 MJ	NICOL JOHANA SUNCE GUARNIZO	$ 14.358.554,00	$ 14.400.000,00	19-sep-22	21/10/2022	16/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	2,00%
12	MVBF_1149	CL 73D SUR 27 75	GUSTAVO MONROY FONSECA	$ 14.258.458,00	$ 14.399.470,00	20-sep-22	5/10/2022	8/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
13	MVBF_1155	CL 73D BIS A SUR 27A 50	ANA FELIZ DIAZ PATIÑO	$ 14.381.322,00	$ 14.381.382,00	20-sep-22	5/10/2022	16/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	2,00%
14	MVBF_1191	KR 27B 74A 06 SUR	CARMEN ELISA TOLOSA CEPEDA	$ 14.397.146,00		20-sep-22	21/10/2022		EJECUCION	10,00%	-10,00%
41	MVBF_1330	CL 73B SUR 26C 90	MAYERLY HERNANDEZ MENDEZ			21/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
42	MVBF_1324	CL 73 B SUR 26 C 74	PURIFICACION CORTES			19/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
43	MVBF_1302	CL 73A SUR 26F 33 MJ	ANGIE YURLEY RUIZ VEGA	$ 14.381.643,00		19/10/2022	4/11/2022		EJECUCION	16,68%	5,11%
44	MVBF_1303	CL 73A SUR 26F 45 MJ	ANAYIBE CASTRO	$ 14.398.840,00		19/10/2022	4/11/2022		EJECUCION	20,86%	11,87%
45	MVBF_1314	CL 73B SUR 26F 38	MARIELA SANDOVAL VERA			19/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
46	MVBF_1315	CL 73B SUR 26F 32	MARIA TERESA MONTOYA DE BERMUDEZ			19/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
47	MVBF_1264	CL 73B SUR 26F15 MJ	JOSÉ ALONSO MUÑOZ SCARPETTA			27/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
48	MVBF_1270	CL 73B SUR 26F 03	ANA AURORA BECERRA VARGAS			27/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
49	MVBF_1306	CL 73B SUR 26F 02 MJ	LUZ STELLA BETANCOURTH GIRALDO			27/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
50	MVBF_1295	KR 26F 73B 16 SUR	VIRGELINA RODRIGUEZ			31/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
51	MVBF_1280	CL 73C SUR 26F 02	MARINA NAVAS ROJAS			27/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
52	MVBF_1276	CL 73C SUR 26F 38	ELIZABETH SEPULVEDA DIAZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
53	MVBF_1240	CL 73 C BIS A SUR 26F 02 MJ 1	HEBERT FREDY ARIAS BELTRAN						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
54	MVBF_1255	CL 73C BIS A SUR 26C 90	DIANA ALEJANDRA ORJUELA VIVAS						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
55	MVBF_1234	CL 73C SUR 26F 03 MJ	WILLIANS GONZALEZ PEDROZA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
101	MVBF_1187	KR 27B 74 14 SUR MJ	MARIA OLINDA SARMIENTO CASTRO	$ 13.396.482,00	$ 14.352.138,00	13/10/2022	21/10/2022	15/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	21,63%
102	MVBF_1427	CL 74 SUR 27B 06	MARY LUZ ARREDONDO GONZALEZ	$ 14.400.000,00	$ 14.398.350,00	13/10/2022	21/10/2022	17/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
103	MVBF_1424	CL 74 SUR 27B 36	CARLOS RODRIGUEZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
104	MVBF_1462	CL 74A SUR 27B 25	ANGIE ESMERALDA ROJAS ALAYON			13/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
105	MVBF_1464	CL 74A SUR 27B 55	MARIA ESCILDA CABEZAS GALINDEZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%

106	MVBF_1465	CL 74A SUR 27B 61	SANTIAGO OLAYA BOLAÑOS						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
107	MVBF_1455	CL 74B SUR 27B 24	FLOR HERELIA ESCOBAR VARGAS			13/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
108	MVBF_0558	CL 73C SUR 27B 26	MONICA ANDREA CRISTANCHO QUIMBAYO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
109	MVBF_552	CLL 73C SUR 27B 62	ORFANIDES LOSADA PERDOMO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
110	MVBF_549	CL 73 C SUR 27 B 78	MILLER ALEJANDRO HURTADO SAENZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
111	MVBF_0540	CL 73B SUR 27C 29	LUZ STELLA FRANCO DIAZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
112	MVBF_567	CL 73B SUR 27C 24	FLORENTINO PICO BASTILLA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
113	MVBF_605	DG 73A BIS SUR 27C 28	MISAEL MACANA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
114	MVBF_0592	DG 73A BIS SUR 27C 34	MARIA HELENA BAQUERO MACANA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
115	MVBF_0570	TV 27H 73A 36 SUR	JOSE ANTONIO MOYA ZAMORA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
161	MVBF_0157	CL 75 SUR 27 33	ANA MILENA ABAUNZA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
162	MVBF_158	CL 75 SUR 27 39	ISABELINA PATIÑO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
163	MVBF_154	CL 75 SUR 27 A 05	CLAUDIA SMIT LUCAS TANGARIFE						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
166	MVBF_085	CL 75A SUR 27 63	LUCIA HERRERA QUINTERO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
	MVBF_0482	CL 73D BIS SUR 27F 14	MARIA DAISSY BEJARANO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
	MVBF_495	CL 73D BIS SUR 27M 52	MARIA FABIOLA GUEVARA ISAZA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
GRUPO No. 2											
15	MVBF_1148	CL 73 D SUR 27 45	LUZ MARINA PIRAGAUTA GRANADOS			28/9/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
16	MVBF_1130	CL 73D SUR 27 50	JUAN DE JESUS SEDANO AYALA	$ 14.394.664,00	$ 14.396.664,00	26/9/2022	11/11/2022	18/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	85,00%
17	MVBF_1128	CL 73D SUR 27 62	ISMELDA PEREZ GARCIA	$ 14.392.074,00	$ 14.395.263,00	26/9/2022	13/10/2022	2/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
18	MVBF_1141	CL 73 D SUR 27 91	BLANCA FLOR RINCON	$ 14.397.445,00	$ 14.398.134,00	28/9/2022	20/10/2022	15/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	30,00%
19	MVBF_1121	CL 73 C BIS SUR 27 77	MARIA ELBA ARIAS BONILLA			26/9/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
20	MVBF_1110	CL 73 D SUR 27 86	FLOR TRIANA AVILA	$ 14.399.088,00	$ 14.397.014,00	26/9/2022	18/10/2022	15/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	5,00%
21	MVBF_1108	CL 73C BIS SUR 27A 23	MARIA ODILIA MARTINEZ CABRERA	$ 14.390.758,00	$ 14.399.950,00	26/9/2022	13/10/2022	11/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
22	MVBF_1124	CL 73C BIS SUR 27A 11	HECTOR HERNANDO VELOSA	$ 14.000.000,00	$ 14.399.644,00	26/9/2022	5/10/2022	21/10/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
23	MVBF_1111	CL 73C BIS SUR 27 61 MJ	PAOLA ANDREA ORJUELA VIVAS	$ 14.000.000,00	$ 14.026.239,00	28/9/2022	7/10/2022	21/10/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
24	MVBF_1118	CL 73 C BIS SUR 27 55	LUIS ALBERTO CHITIVA CORTES			26/9/2022	15/11/2022		EJECUCION	0,00%	0,00%

25	MVBF_1117	CL 73C BIS SUR 27 49	RAFAEL RODRIGUEZ ZAMORA	$ 14.398.893,00	$ 14.398.893,00	26/9/2022	11/11/2022	18/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	80,00%
26	MVBF_1073	KR 27 A 73 46 SUR	LEOPOLDO LEON MORALES	$ 14.397.782,00	$ 14.397.074,00	28/9/2022	7/10/2022	11/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
27	MVBF_1072	KR 27A 73 38 SUR MJ	MARIA AURORA PEREZ AVELLA	$ 14.000.000,00	$ 14.268.863,00	25/9/2022	7/10/2022	2/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
56	MVBF_948	KR 26G BIS 72 G 11 SUR	ALEXANDRA PATRICIA LAVERDE CUADROS	$ 14.390.362,00	$ 14.392.796,00	19/9/2022	31/10/2022	17/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	70,00%
57	MVBF_950	KR 27 72G 24 SUR	LUIS LIBARDO LONDOÑO VELAZQUEZ	$ 14.398.603,00		19/9/2022	11/11/2022		EJECUCION	0,00%	0,00%
58	MVBF_964	KR 27 72G 17 SUR	ANA SILVIA AGUILAR BARRERA	$ 14.392.970,00	$ 14.398.864,00	19/9/2022	31/10/2022	15/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	40,00%
59	MVBF_0966	KR 27 72G 09 SUR	MELEIDY TORIFIO VALENCIA	$ 14.393.909,00	$ 14.398.643,00	19/9/2022	31/10/2022	17/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	45,00%
60	MVBF_0952	KR 27 BIS 72G 10 SUR MJ	MAYERLY ELSY ARIAS GONZALEZ			18/10/2022	1/11/2022		EJECUCION	30,00%	10,00%
61	MVBF_0984	KR 27 BIS 72G 11 SUR	INGRIT MAYERLY SALAMANCA VALLARINO		$ 14.396.936,00	18/10/2022	1/11/2022	17/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	70,00%
62	MVBF_983	KR 27 BIS 72G 15 SUR	HERIBERTO VARGAS CAPERA			18/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
63	MVBF_0990	CL 72G SUR 27A 01 IN 2 MJ1	GILBERTO INFANTE MARINO	$ 14.394.679,00		20/10/2022	11/11/2022		EJECUCION	0,00%	0,00%
64	MVBF_0987	KR 27 BIS B 72G 16 SUR	QUERUBIN TIRADO MEDINA			19/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
65	MVBF_0985	KR 27 BIS B 72G 08 SUR	JOSE DEMETRIO CRUZ VELANDIA			19/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
66	MVBF_0731	KR 27A 72D 02 SUR	MARIA DEL CARMEN VALLEJO RUANO			19/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
67	MVBF_0719	KR 27A BIS 72D 08 SUR	URIEL CASALLAS MURCIA			19/10/2022	15/11/2022		EJECUCION	0,00%	0,00%
68	MVBF_0727	KR 27A 72C 34 SUR MJ	SALOMON URREA BAQUERO			19/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
69	MVBF_0741	KR 27A 72C 22 SUR	MARIA ELIZABETH CEDANO BURBANO			28/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
70	MVBF_0694	CR 27A BIS 72D 05 SUR	ALEJANDRINO ESPAÑA GARCIA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
116	MVBF_0789	KR 27 72C 12 SUR	OSCAR HENRY MISNAZA RIVERA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
117	MVBF_791	CR27 H 72C 34 SUR	MARIA LIGIA ROJAS						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
118	MVBF_0780	KR 27 72C 40 SUR	ELIZABETH GIRALDO DELGADO			19/9/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
119	MVBF_0793	KR 27 72C 70 SUR	ARISTOBULO TRIANA GARZON			21/9/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
120	MVBF_0758	KR 27 72C 45 SUR	ARACELLY LIEVANO DE MAHECHA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
121	MVBF_0760	KR 27 72C 33 SUR	FERMIN MADRIGAL TIQUE			20/9/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
122	MVBF_0749	KR 27 72C 27 SUR	ESTHER MARINA YARA TIQUE			20/9/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
123	MVBF_0761	KR 27 72C 21 SUR	GILDARDO MORALES VELEZ			20/9/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%

124	MVBF_0767	KR 27 BIS 72C 22 SUR	ROSALBA PACANCHIQUE DE MARTINEZ			21/9/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
125	MVBF_0730	KR 27 BIS 72C 15 SUR	MARIA ELVIA ARERO COTRINA			20/9/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
126	MVBF_0737	KR 27 BIS 72C 27 SUR	EVANGELINA MADRIGAL TAPIA			20/9/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
127	MVBF_0736	KR 27 BIS 72C 33 SUR	LUIS ALFONSO PIAY						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
128	MVBF_745	KR 27 BIS 72C 38 SUR MJ 1	OLGA LUCILA RIVEROS HIGUERA			20/9/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
129	MVBF_0753	KR 27 BIS 72C 44 SUR	LUZ DARY ALONSO PACHON						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
130	MVBF_770	KR 27 BIS 72C 50 SUR	HERMINIA FORERO BUSTOS						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
171	MVBF_113	KR 26G 75 A SUR 22	SANDRA PATRICIA SANABRIA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
172	MVBF_094	KR 26G 75A 08 SUR	ZOILA ROSA GONZALEZ CASTRO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
173	MVBF_107	KR 26F 75A 31 SUR	CELINA CARAVALI GONZALEZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
174	MVBF_106	KR 26F 75A 35 SUR	CARMEN SEMANATE						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
177	MVBF_223	TV 26C BIS A 75B 45 SUR	OMAR FERNEY NIÑO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
178	MVBF_232	TV 26C BIS A 75B 93 SUR	HERMENCIA CHITIVA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
179	MVBF_0294	TV 26C BIS 75C 16 SUR	MIGUELINA GOMEZ HOYOS						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
GRUPO No. 3											
29	MVBF_1049	CL 73 SUR 27 43 MJ	YAMILE DARLEY LONDOÑO			19-sep-22			VALIDADA	0,00%	0,00%
30	MVBF_1083	KR 27 73B 15 SUR	ROSA ELENA GOMEZ QUINTERO	$ 14.374.413,00	$ 14.227.821,00	20-sep-22	13/10/2022	8/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
35	MVBF_1096	KR 27 BIS A 73 22 SUR	LUCILA TRUJILLO	$ 13.862.187,32		20-sep-22	31/10/2022		EJECUCION	100,00%	10,00%
37	MVBF_1061	KR 27 BIS A 73 31 SUR	FLORENTINO JUEZ BARRETO	$ 14.400.000,00	$ 14.391.266,00	19-sep-22	10/10/2022	18/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	2,00%
38	MVBF_1052	KR 27A 73 26 SUR	OFELIA MEDINA ARCILA	$ 14.152.874,42	$ 14.382.156,00	19-sep-22	1/11/2022	17/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	37,00%
40	MVBF_1068	KR 27A 73 06 SUR	LUIS ALIRIO CORREA LOPEZ	$ 14.003.597,43	$ 14.392.594,00	20-sep-22	1/11/2022	15/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	30,00%
86	MVBF_0924	CL 73 SUR 26F 40	ROSALBA ROJAS ROJAS		$ 14.374.629,00	19/10/2022	10/11/2022	18/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	55,00%
87	MVBF_1343	CL 73 SUR 26F 09	AMANDA BERNAL ORTIZ		$ 14.350.983,00	19/10/2022	10/11/2022	18/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	70,00%
88	MVBF_1338	CL 73 SUR 26F 03 MJ	IRIS SOTO	$ 14.397.837,00	$ 14.397.384,00	19/10/2022	31/10/2022	17/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	50,00%
89	MVBF_0925	CL 73 SUR 26F 16	MARIA EVA PULIDO CELIS			19/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
90	MVBF_894	KR 26F 72H 60 SUR	LUZ ANGELA RODRIGUEZ MESA			19/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
91	MVBF_1358	CL 73A SUR 26D 16	JOSE GERMAN GARAVITO YATE	$ 14.358.302,00	$ 14.377.649,00	19/10/2022	31/10/2022	15/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	50,00%
92	MVBF_1362	CL 73A SUR 26D 08	ALICIA CARREÑO			1/11/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%

93	MVBF_1363	CL 73A SUR 26D 04	MARIA CRISTINA QUIROGA RUGE			21/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
94	MVBF_1321	CL 73A SUR 26D 07	TEOFILDE FORERO AGUILAR			21/10/2022	15/11/2022		EJECUCION	5,00%	5,00%
95	MVBF_1329	CL 73A SUR 26D 19	JULIO CESAR BUILES MURIEL			21/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
96	MVBF_1354	CL 73A SUR 26F 02	JISEL SARIME LOZANO CERQUERA	$ 14.389.630,00	$ 14.363.094,00	21/10/2022	1/11/2022	15/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	10,00%
97	MVBF_1337	CL 73A SUR 26F 08 MJ	LUZ MIRIAM MARULANDA RODRIGUEZ	$ 14.307.907,00		21/10/2022	31/10/2022		EJECUCION	55,00%	5,00%
98	MVBF_1339	CL 73A SUR 26F 20 MJ	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ			21/10/2022	15/11/2022		EJECUCION	5,00%	5,00%
99	MVBF_1307	CL 73 A SUR 26F 15	EMPERATRIZ RAMIREZ BOHORQUEZ			26/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
100	MVBF_1311	CL 73A SUR 26F 27	JULIA MARTINEZ SEGURA			26/10/2022	15/11/2022		EJECUCION	30,00%	30,00%
146	MVBF_808	CL 72C SUR 26C 59	JOSE FERMIN ROCHA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
147	MVBF_805	CL 72 C SUR No. 26 C 69	MANUEL MONCADA FANDIÑO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
148	MVBF_820	KR 26F 72D 14 SUR	LUIS CARLOS LOMBANA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
149	MVBF_835	CL 72D BIS A SUR 26D 21	NURY ESPERANZA MELO			28/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
150	MVBF_0837	KR 26 D 72D 45 SUR	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
151	MVBF_0841	CL 72 D BIS A SUR 26C 79	ELIZABETH OSPINA CAICEDO		$ 14.398.748,00	28/10/2022	15/11/2022	18/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	100,00%
152	MVBF_0840	CL 72 F SUR 26C 74 MJ	MARIA HEMIR TAPIA HERNANDEZ		$ 14.399.367,00	28/10/2022	15/11/2022	18/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	100,00%
153	MVBF_850	CL 72F SUR 26C 69	GUSTAVO RODRIGUEZ RODRIGUEZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
154	MVBF_853	CL 72F SUR 26D 23	CINDY JASBLEIDY DUARTE MUÑOZ			28/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
155	MVBF_854	CL 72F SUR 26F 05	ANA LEONORA RUIZ MENDEZ			28/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
156	MVBF_0972	KR 27 BIS 72G 38 SUR	PABLO ENRIQUE CALDERON						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
157	MVBF_0953	KR 27 BIS 72G 34 SUR	LUIS MORENO VIUCHE						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
158	MVBF_0938	KR 27 72G 68 SUR	BLANCA MARINA MARTINEZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
159	MVBF_1347	KR 27 73 02 SUR	MARIA NANCY CANACUE ROMERO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
160	MVBF_0946	CL 73 SUR 26G 08	DEYANIRA FRANCO MONTENEGRO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
189	MVBF_149	CL 75A BIS SUR 26F 53	LASTENIA PALACIOS MURILLO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
190	MVBF_145	CL 75A BIS SUR 26F 47	BERENICE RINCON TELLEZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
191	MVBF_0183	CL 75A BIS SUR 26F 60	DORIS HERNANDEZ HERNANDEZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%

192	MVBF_241	KR 27 75 24 SUR	MARIA LUCIA BARREÑO AGUDELO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
193	MVBF_235	CL 75A SUR 26F 60 MJ	JOSE SAUL MONROY MARTINEZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
194	MVBF_172	CL 75A BIS SUR 26F 18 MJ	LAURENTINO BURGOS RINCON						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
195	MVBF_236	CL 75 SUR 26F 29	LILIANA RENDON LOZANO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
196	MVBF_287	CL 74B BIS A SUR 26F 38	CARMEN ROSA GONZALEZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
197	MVBF_0286	CL 74B BIS A SUR 26F 28 MJ	RAQUEL MENDEZ PEÑA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
198	MVBF_312	DG 74 B BIS A SUR 26 C 41	VIRGINIA CORTES PARDO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
164	MVBF_0155	CL 75A SUR 27 22	SONIA MILENA GIRALDO HERRERA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
165	MVBF_075	CL 75A SUR 27 27	JAIDI RIAÑOS						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
175	MVBF_1496	TV 26C BIS A 75A 03 SUR	BLANCA ELVIRA RAMIREZ MONTES						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
176	MVBF_0225	TV 26C BIS B 75A 10 SUR	CARMEN ELENA SOCARRAZ QUIROZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
GRUPO No. 4											
28	MVBF_0975	KR 27 BIS B 72G 28 SUR	LUIS HERNANDO SALCEDO	$ 14.350.659,00	$ 14.381.817,00	21-sep-22	10/11/2022	18/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	55,00%
31	MVBF_1084	KR 27 73B 09 SUR	FIDEL ANTONIO TELLEZ ESCARRAGA	$ 13.883.096,82	$ 14.389.392,00	21-sep-22	13/10/2022	9/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
32	MVBF_1078	KR 27 BIS A 73 64 SUR	MARIA NUBIA LOZANO CERQUERA			20-sep-22			VALIDADA	0,00%	0,00%
33	MVBF_1080	KR 27 BIS A 73 34 SUR MJ	MARIA DEL ROSARIO BAEZ	$ 14.329.132,00	$ 14.397.966,00	21-sep-22	10/11/2022	18/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	60,00%
34	MVBF_1081	KR 27 BIS A 73 28 SUR	MELQUISEDEC ORTIZ	$ 14.388.713,09		19-sep-22	1/11/2022		EJECUCION	5,00%	0,00%
36	MVBF_1050	KR 27 BIS A 73 39 SUR MJ 1	FRANQUELINA BALLESTEROS			19-sep-22			VALIDADA	0,00%	0,00%
39	MVBF_1048	KR 27A 73 18 SUR MJ	MARIA GLADYS TRIANA	$ 14.128.717,42	$ 14.028.825,00	21-sep-22	7/10/2022	8/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
71	MVBF_0979	KR 27 BIS 72G 27 SUR MJ	LUZ MARINA TRIBIÑO RAMIREZ	$ 14.397.127,18	$ 14.377.332,00	20/10/2022	2/11/2022	15/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	35,00%
72	MVBF_1098	KR 27 BIS A 73 52 SUR	JULIO CESAR LEMUS ZULETA	$ 14.365.960,30	$ 1.439.854,00	18/10/2022	2/11/2022	17/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	25,00%
73	MVBF_1045	KR 27A BIS 73 10 SUR	MARIELA CARDONA CARDONA	$ 14.000.000,00	$ 14.397.361,00	20/10/2022	2/11/2022	18/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	30,00%
74	MVBF_1000	KR 27A BIS 73 11 SUR MJ 1	JORGE ELIECER HUERTAS GIL			18/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
75	MVBF_1007	CL 73 SUR 27A 21	NUBIA HERRERA QUINTERO			18/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
76	MVBF_1001	KR 27A BIS 73 23 SUR MJ	MARIA ELIA MENESES GOMEZ			18/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
77	MVBF_1014	KR 27A BIS 73 27 SUR	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
78	MVBF_1013	KR 27B 73A 16 SUR	EMILIANO PEREZ AVELLA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%


79	MVBF_0679	TV 27H 72D 14 SUR	POSIDIO HUERTA HUERTAS						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
80	MVBF_675	KR 27 B 72D 23 SUR	CELIMO PADILLA VEGA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
81	MVBF_0677	KR 27B 72D 05 SUR	ANA GLADYS PACHON CHURQUE						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
82	MVBF_0715	KR 27B 72C 20 SUR	JORGE ENRIQUE QUINONES						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
83	MVBF_676	KR 27B 72 D 11 SUR	AMPARO ARIAS OGONZALEZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
84	MVBF_0669	KR 27B 72D 29 SUR	MARIA CLAUDIA MRTINEZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
85	MVBF_1076	KR 27 BIS A 73 40 SUR MJ	ESPERANZA CASTILLO ALTURO			27/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
131	MVBF_536	CL 73B SUR 27B 21	CLAUDIA MARTINEZ CLAVIJO			20/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
132	MVBF_530	CL 73B 27B 33 MJ	OMAR MEDINA ORTEGA			27/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
133	MVBF_0531	CL 73B SUR 27C 05	INES DIAZ			28/10/2022	15/11/2022		EJECUCION	0,00%	0,00%
134	MVBF_589	CL 73B SUR 27B 34	LUISA FERNANDA TAPIERO TRUJILLO	$	14.000.000,00	27/10/2022	2/11/2022		EJECUCION	10,00%	10,00%
135	MVBF_588	CL 73B SUR 27B 40	JANETH MEDINA DIAZ	$	14.000.000,00	27/10/2022	2/11/2022		EJECUCION	25,00%	25,00%
136	MVBF_0595	DG 73A SUR 27C 57 MJ	ANA DELIA GONZALEZ MATEUS						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
137	MVBF_631	TV 27H 73 34 SUR	LEIDY SABOGAL RAMIREZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
138	MVBF_0657	DG 73 BIS SUR 27B 36	SERGIO TORO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
139	MVBF_660	DG 73 SUR 27B 13 MJ	CUSTODIA LUGO QUESADA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
140	MVBF_645	DG 73 SUR 27B 11	MARIA SIXTA HURTADO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
141	MVBF_0622	DG 73 BIS SUR 27B 03	MARIBEL HURTADO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
142	MVBF_650	DG 73 SUR 27B 59	JULY ANDREA SANCHEZ ALONSO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
143	MVBF_0649	DG 73 SUR 27B 53	OLGA MARIA ALONSO MORENO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
144	MVBF_683	DG 73 SUR 27B 54	JOSE ALFONSO MORA AREVALO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
145	MVBF_585	CL 73A SUR 27B 17	ANDREA HERRERA RANGEL						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
180	MVBF_0072	CL 74A BIS A SUR 27 22	JORGE LUIS PEREZ IBAÑEZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
181	MVBF_071	CL 75A BIS A SUR 27 28	JOSE JAVIER OLARTE MAHECHA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
182	MVBF_058	CL 75A BIS A SUR 27 64	BEATRIZ BRYITH CANGREJO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
183	MVBF_047	CL 75B SUR 27 52	ANIBAL MORENO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%

184	MVBF_046	CL 75B SUR 27 58	MAGDALENA LEMUS CHAPARRO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
185	MVBF_027	CL 76 SUR 26H 04	LEONOR CHISCO SARAY						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
186	MVBF_022	KR 26H 75B 19 SUR MJ	MARTHA HELENA PARDO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
187	MVBF_117	KR 26G 75A 38 SUR	MARIA EUGENIA GONZALEZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
188	MVBF_096	KR 26 G No. 75 A 26 SUR	MARISOL LATORRE DEVIA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
167	MVBF_054	CL 75A BIS SUR 27 15	MAYERLY SANCHEZ MENDOZA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
168	MVBF_066	CL 75A BIS SUR 27 39	GUMERSINDO SOLER SILVA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
169	MVBF_089	CL 75A BIS SUR 27 46	MARIA CONSUELO PEREZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
170	MVBF_087	CL 75A BIS SUR 27 58	MARIA RUTH CORTES LOSADA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO 2

Registro fotográfico componente social

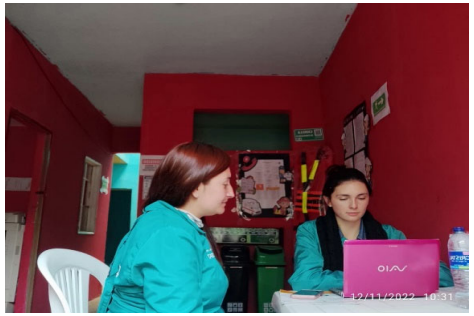REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES SOCIALES			
			
Actividad: Seguimiento de obra MVBF_1200 Fecha: 15/11/2022	Actividad: Seguimiento de obra MVBF_1302 Fecha: 15/11/2022	Actividad: Seguimiento de obra MVBF_1303 Fecha: 15/11/2022	Actividad: Entrega de MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MVBF_1155 Fecha:16/11/2022
			
Actividad: Entrega de MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MVBF_1166 Fecha: 16/11/2022	Actividad: Seguimiento a compromisos pactados en acta en validación social y técnica. MVBF_1462 Fecha:16/11/2022	Actividad: Seguimiento de obra MVBF_1191 Fecha: 16/11/2022	Actividad: Atención PAC Fecha: 12/11/2022
			
Actividad: Seguimiento de obra MVBF_1081 Fecha: 15/11/2022	Actividad: Seguimiento de obra MVBF_588 Fecha: 16/11/2022	Actividad: Seguimiento de obra MVBF_1096 Fecha: 18/11/2022	Actividad: Apertura de obra MVBF_0840 Fecha: 18/11/2022

			
Actividad: Entrega de MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MVBF_1061 Fecha: 18/11/2022	Actividad: Apertura de obra MVBF_1339 Fecha: 15/11/2022	Actividad: Apertura de obra MVBF_1311 Fecha: 15/11/2022	Actividad: Apertura de obra MVBF_0531 Fecha 16/11/2022
			
Actividad: Apertura de obra MVBF_1321 Fecha: 16/11/2022	Actividad: Apertura de vivienda MVBF_0719 Fecha: 15/11/2022	Actividad: Apertura de vivienda MVBF_1118 Fecha: 15/11/2022	Actividad: Apertura de vivienda MVBF_1110 Fecha: 15/11/2022
			
Actividad: Seguimiento de obra MVBF_0952 Fecha : 17/11/2022	Actividad: Seguimiento de obra MVBF_950 Fecha : 17/11/2022		
