GIRÓN	ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN	Código:	PT –F.03 / Pág. 1 de 1
		Versión	00
		Fecha de Aprobación:	30-9-2019
		DIRECCION DE PRESUPUESTO	
		Proceso: GESTIÓN DE LAS FINANZAS PUBLICAS	

ORDEN DE PAGO

Fecha: 2-12-2022		Hora:			Evidencias:	SI	NO	FOLIOS:			
BENEFICIARIO:	GILBERTO PARRA PATIÑO										
C.C. o NIT:	91,231,841 DE BUCARAMANGA										
VALOR EN PESOS:	4.000.000,00			VALOR EN LETRAS:	CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE						
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		Nº 657		Fecha:	30/03/2022	
	Adicional		Otro				No.		Fecha:		
OBJETO DEL CONTRATO:ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA POR INUNDACION Y REALIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y OPTIMIZACION TECNOLOGICA PARA EL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER							NÚMERO SSEPI (Para proyectos de Inversión)		2022683070043		
DOCUMENTOS ANEXOS:	Pago Seguridad Social y Parafiscales:			X	Certificación Bancaria:	X	Certificación Aportes Sena en Contratos de Obra				
	Entrada a Almacén:				Reembolso de Caja Menor:		Resolución:				
	Otros (Describir):										
CDP No.	22-00872	RP No.	22-01142	Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.008.04.45.4503.04		Vigencia:	2022			
Período a cobrar	DEL: 06-08-2022		HASTA: 28/12/2022		Acta:	X	Parcial:				
					Informe de Supervisión:	X	Final:	X		FINAL	
CONCEPTO:	Anticipo		Desembolso				Pago Anticipado				
	ACTA DE PAGO FINAL 2022										

RESPONSABLES:

GILBERTO PARRA PATIÑO 91231841
CONTRATISTA
C.C. 91,231,841 DE BUCARAMANGA

CRISTIAN GENARO CALDERON PINTO
Supervisor
Secretario de Seguridad, Convivencia y Gestión del Riesgo

PEDIDO ☐ FACTURA ☒
REMISIÓN ☐ CUENTA DE COBRO
COTIZACIÓN ☐ No. 018

Señor: ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON 28 DIC 2022
Dirección: PLAZA PRINCIPAL **Tel:** 6076463030
Ciudad: GIRON **Forma de Pago:**

CANTIDAD	DETALLE	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	MANTENIMIENTO GENERAL	4.000.000	4.000.000
	ALCALDIA MUNICIPAL GIRON		
	NIT : 890 204 802-6		
	CONTRATO :		
	# 657 30/03/2022		

La presente Factura de venta por sí sola, surte los efectos de un título valor, cumplimiento en lo establecido en la Ley 1231 de 2008. **TOTAL $** 4.000.000

CLIENTE

VENDEDOR

91231841 Bucaramanga

ACTA DE PAGO

ACTA DE PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 657 DEL 30 DE MARZO DE 2022

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No. Y FECHA:	657 DEL 30 DE MARZO DE 2022
CONTRATISTA:	**GILBERTO PARRA PATIÑO**
Nit o C.C. No.	91.231.841 DE BUCARAMANGA
OBJETO:	**"ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA POR INUNDACION Y REALIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y OPTIMIZACION TECNOLOGICA PARA EL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER.**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($39.000.000)
PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES
SUPERVISOR	CRISTIAN GENARO CALDERON PINTO, SECRETARIO DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y GESTION DEL RIESGO
FECHA DE INICIACION:	01 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA	28 DE DICIEMBRE DE 2022.
MUNICIPIO:	GIRON SANTANDER
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y GESTION DEL RIESGO
VALOR ACTA DE PAGO FINAL	$4.000.000
PERIODO A COBRAR	06 DE AGOSTO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022

En Girón, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2022, en las instalaciones de la Alcaldía de Girón Santander se reunieron, **CRISTIAN GENARO CALDERON PINTO, SECRETARIO DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y GESTION DEL RIESGO**, en calidad de Supervisor y **GILBERTO PARRA PATIÑO**, quien comparece como Contratista, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos, con el fin de elaborar la presenta Acta de Pago final-2022 del periodo del 06-08-2022 al 28-12-2022 del presente CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 657 DEL 30 DE MARZO DE 2022, cumpliendo con los parámetros legales y determinando el cumplimiento de los compromisos: Factura Cuenta de cobro Régimen simplificado N° 018 de fecha 28 de diciembre de 2022, informe de actividades del periodo del 06 de agosto al 28 de diciembre de 2022, además acredita sus compromisos frente al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022 mediante planillas N° 8620516645, 8621037764, 8621483684, 8621959917, 8622522613 de fecha de pago 09 de agosto, 09 de septiembre, 07 de octubre, 09 de noviembre y 09 de diciembre de 2022, Certificado de la Cuenta de ahorros del Bancolombia número 28891354080.

Se deja constancia que se cumplió con los requerimientos contenidos en **PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 657 DEL 30 DE MARZO DE 2022**, con relación al rubro presupuestal de PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES Y EMERGENCIAS (FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DEL RIESGO – 1% SOBRE EL RECAUDO DE LOS ICLD – ACUERDO 020 DEL 30 DE NOV DE 2012).

CODIGO	REGISTRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL RUBRO	FUENTE	CODIGO META	VALOR TOTAL RP	VALOR DESCONTADO ACTA PARCIAL NUMERO 01-2022	VALOR DESCONTADO ACTA DE PAGO PARCIAL - 002-2022	VALOR DESCONTADO ACTA DE PAGO FINAL 2022	VALOR POR EJECUTAR
2.3.2.02.02.008.04.45.4503.04	22-01142 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2022	PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES Y EMERGENCIAS – FONDO DE GESTION DEL RIESGO – 1% SOBRE EL RECAUDO DE LOS ICLD – ACUERDO	RECURSOS PROPIOS	200966	$39.000.000,00	$25.000.000,00	$10.000.000,00	$4.000.000,00	$00

		020 DEL 30 DE NOV DE 2012).							
				TOTAL	$39.000.000,00	$25.000.000,00	$10.000.000,00	$4.000.000,00	$00

BALANCE DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:

VALOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:	**$39.000.000,00**	
VALOR A PAGAR ACTA DE PAGO FINAL		**$ 4.000.000,00**
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL · 01,02		**$35.000.000,00**
SALDO POR EJECUTAR		**$ 00**
	$39.000.000,00	**$39.000.000,00**

VALOR ACTA DE PAGO FINAL: CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($4.000.000,00).

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022 mediante planillas N° 8620516645, 8621037764, 8621483684, 8621959917, 8622522613 de fecha de pago 09 de agosto, 09 de septiembre, 07 de octubre, 09 de noviembre y 09 de diciembre de 2022.

Para constancia de lo anterior de firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2022.

GILBERTO PARRA PATIÑO"
CONTRATISTA

CRISTIAN GENARO CALDERON PINTO
Secretario de Seguridad, Convivencia y Gestión del Riesgo
SUPERVISOR

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	GILBERTO PARRA PATIÑO
IDENTIFICACION:	CC-91231841
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-12-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-11-10
FECHA DE PAGO:	2022-10-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERIODO PENSION:	2022-10
PERIODO SALUD:	2022-10
NUMERO PLANILLA:	8621483684
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8675011666
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 5.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 290.300

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: GILBERTO PARRA F
Identificación CC - 91231841
Sucursal 1
Periodo Pensión 2022-11
Periodo Salud 2022-11
Fecha Pago Planilla 2022-11-09

Tipo Identificación	CC
Número Identificación	91231841
Nombre	GILBERTO PARRA PATIÑO
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	50210594917
Referencia de Pago(PSE)	2875011868
Tipo Planilla	
Periodo Pensión	2022-11
Periodo Salud	2022-11
Tipo Cotizante	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
Subtipo de Cotizante	No aplica

E-S	Fecha INS	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Ini SLN	Fecha Fin SLN	IGE	Fecha Ini IGE	Fecha Fin IGE	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Ini	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1,000,000	0.1250000	$ 125,000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1,000,000	0.1600000	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1,000,000	0.0052200	$ 5,300	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatoria	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatoria
0	0	0.0000000	$ 0	0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	GILBERTO PARRA PATIÑO
IDENTIFICACION:	CC-91231841
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-12-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-12-12
FECHA DE PAGO:	2022-11-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERIODO PENSION:	2022-11
PERIODO SALUD:	2022-11
NUMERO PLANILLA:	8621959917
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8675011666
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 5.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 290.300

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social:	GILBERTO PARRA F
Identificación	CC - 91231841
Sucursal	1
Período Pensión	2022-12
Período Salud	2022-12
Fecha Pago Planilla	2022-12-09

Tipo Identificación	CC
Número Identificación	91231841
Nombre	GILBERTO PARRA PATIÑO
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	5622522613
Referencia de Pago(PIN)	5675011695
Tipo Planilla	
Periodo Pensión	2022-12
Periodo Salud	2022-12
Tipo Cotizante	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
Subtipo de Cotizante	No aplica

IGE	Fecha IGE Inicio	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCF	Fecha VCF Inicio	Fecha VCF Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1,000,000	0.1250000	$ 125,000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1,000,000	0.1600000	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1,000,000	0.0052200	$ 5,300	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0.0000000	$ 0	0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	GILBERTO PARRA PATIÑO
IDENTIFICACION:	CC-91231841
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-12-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-01-07
FECHA DE PAGO:	2022-12-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2022-12
PERIODO SALUD:	2022-12
NUMERO PLANILLA:	8622522613
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8675011666
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 5.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 290.300

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social:	GILBERTO PARRA P
Identificación	CC - 91231841
Sucursal	1
Período Pensión	2022-09
Período Salud	2022-09
Fecha Pago Planilla	2022-09-09

Tipo Identificación	CC
Número Identificación	91231841
Nombre	GILBERTO PARRA PATIÑO
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	86210377 64
Referencia de Pago(PIN)	86750118 85
Tipo Planilla	
Período Pensión	2022-09
Período Salud	2022-09
Tipo Cotizante	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCI	Fecha VCI Inicio	Fecha VCI Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1,000,000	0.1250000	$ 125,000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1,000,000	0.1600000	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1,000,000	0.0052200	$ 5,300	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0.0000000	$ 0	0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	GILBERTO PARRA PATIÑO
IDENTIFICACION:	CC-91231841
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-12-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-10-11
FECHA DE PAGO:	2022-09-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2022-09
PERIODO SALUD:	2022-09
NUMERO PLANILLA:	8621037764
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8675011666
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 5.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 290.300

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: GILBERTO PARRA P
Identificación CC - 91231841
Sucursal 1
Período Pensión 2022-08
Período Salud 2022-08
Fecha Pago Planilla 2022-08-09

Tipo Identificación	CC
Número Identificación	91231841
Nombre	GILBERTO PARRA PATIÑO
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	3620516645
Referencia de Pago(PIN)	3875011695
Tipo Planilla	
Período Pensión	2022-08
Período Salud	2022-08
Tipo Cotizante	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
Subtipo de Cotizante	No aplica

IRG	Fecha INGR	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1,000,000	0.1250000	$ 125,000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1,000,000	0.1600000	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1,000,000	0.0052200	$ 5,300	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0.0000000	$ 0	0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social:	GILBERTO PARRA PA[illegible]
Identificación	CC - 91231841
Sucursal	1
Período Pensión	2022-10
Período Salud	2022-10
Fecha Pago Planilla	2022-10-07

Tipo Identificación	CC
Número Identificación	91231841
Nombre	GILBERTO PARRA PATIÑO
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	5621483884
Referencia de Pago(PIN)	5675011565
Tipo Planilla	
Período Pensión	2022-10
Período Salud	2022-10
Tipo Cotizante	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
Subtipo de Cotizante	No aplica

IHQ	Fecha IHQ	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1,000,000	0.1250000	$ 125,000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1,000,000	0.1600000	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1,000,000	0.0052200	$ 5,300	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0.0000000	$ 0	0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	GILBERTO PARRA PATIÑO
IDENTIFICACION:	CC-91231841
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-12-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-09-09
FECHA DE PAGO:	2022-08-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2022-08
PERIODO SALUD:	2022-08
NUMERO PLANILLA:	8620516645
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8675011666
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 5.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 290.300

INFORME DEL CONTRATISTA

INFORME DE ACTIVIDADES FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 657 DEL 30 DE MARZO DE 2022

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No. Y FECHA:	657 DEL 30 DE MARZO DE 2022
CONTRATISTA:	**GILBERTO PARRA PATIÑO**
Nit o C.C. No.	91.231.841 DE BUCARAMANGA
OBJETO:	**"ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA POR INUNDACION Y REALIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y OPTIMIZACION TECNOLOGICA PARA EL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER.**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($39.000.000)
PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES
SUPERVISOR	CRISTIAN GENARO CALDERON PINTO, SECRETARIO DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y GESTION DEL RIESGO
FECHA DE INICIACION:	01 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA	28 DE DICIEMBRE DE 2022.
MUNICIPIO:	GIRON SANTANDER
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y GESTION DEL RIESGO
VALOR ACTA DE PAGO FINAL	$4.000.000
PERIODO A COBRAR	06 DE AGOSTO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022

En atención a las actividades ejecutadas en el presente contrato de PRESTACION DE SERVICIOS y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Girón, por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($4.000.000,00). correspondiente al valor del acta FINAL DE 2022.

DOCUMENTOS ANEXOS

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato me permito adjuntar y dando cumplimiento con el objeto contractual del mismo, en el periodo comprendido del periodo del 06-06-2022 al 05-08-2022 del presente CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 657 DEL 30 DE MARZO DE 2022, cumpliendo con los parámetros legales y determinando el cumplimiento de los compromisos: Factura Cuenta de cobro Régimen simplificado N° 018 de fecha 28 de diciembre de 2022, informe de actividades del periodo del 06 de agosto al 28 de diciembre de 2022, además acredita sus compromisos frente al Sistema de Seguridad Social en Salud y

INFORME DEL CONTRATISTA

Pensión de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022 mediante planillas N° 8620516645, 8621037764, 8621483684, 8621959917, 8622522613 de fecha de pago 09 de agosto, 09 de septiembre, 07 de octubre, 09 de noviembre y 09 de diciembre de 2022, Certificado de la Cuenta de ahorros del Bancolombia número 28891354080:

ITEM	DESCRIPCION	ACTIVIDADES GENERALES
1	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO Y SOSTENIBILIDAD DEL CONTRATO	MES DE AGOSTO: MANTENIMIENTO MEDIDOR NIVEL DE AGUA PEÑAS VIA ZAPATOCA: PROCESO: • Ya era de noche cuando se hizo el trabajo • No se giró el soporte pues se iba a reemplazar únicamente la batería, ya el medidor se había limpiado en el mantenimiento anterior. • Se reemplazó la batería por otra nueva. • Se revisó la orientación de la antena. • Se verificó el funcionamiento en Plataforma MANTENIMIENTO MEDIDOR NIVEL DE AGUA PUENTE FRIGORIFICO RIO FRIO: PROCESO: • Se saco el medidor de nivel del puente. • Se verificó el sensor ultrasónico y se limpio • No se cambió batería sellada pues estaba en buen estado • Se reviso panel y estaba en buen estado • Se volvió a instalar el medidor en el puente • Se verifico el funcionamiento en Plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO VIA ZAPATOCA PEÑAS: PROCESO: • Se limpio el balancín del pluviómetro • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y estaba correcta • Se limpio por fuera el chasis del equipo • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO PIEDECUESTA CENTRO: PROCESO: • Se bajo el pluviómetro del tejado • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y está en buen estado • Se limpio por fuera el pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO PIEDECUESTA CABECERA: PROCESO: • Se reviso el pluviómetro en el poste • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y sigue con energía • Se limpio la carcasa del pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA LIMONCITO: PROCESO: • Se reviso el pluviómetro en el poste • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y tiene energía a intervalos • Se limpio la carcasa del pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA DEFENSA CIVIL: PROCESO: • Se reviso en el techo de la defensa civil • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería con multímetro y aún tiene vida útil • Se limpio la parte externa del pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO SISTEMA DE PERIFONEO BAMBUES: PROCESO: • Se reviso el estado de la batería de 18amp 12v y el voltaje está bien • Se reviso el radio modem que recibe llamadas y funciona • Se limpio la antena del radio modem • Se reviso el regulador solar y está funcionando bien • Se revíso el amplificador y está en buen estado de funcionamiento • Se reviso el voltaje del panel solar y está en el nivel adecuado • Se hizo prueba de funcionamiento y el sonido de sirena y voz está bien MANTENIMIENTO SISTEMA DE PERIFONEO LA ISLA: PROCESO: • Se revisaron entradas de agua en la caja metálica • Se reviso el radio modem que recibe llamadas • Se limpio la antena externa • Se reviso el regulador solar y está encendido • Se reviso el amplificador y no tiene daños • Se reviso si funciona el panel solar • Se hizo prueba de funcionamiento y esta correcto REVISION DEL MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA DEL PUENTE METALICO VENDIDO ESTE AÑO: PROCESO: • Se revisaron las soldaduras del punto de unión al puente y están bien • Se revisaron signos de vandalismo e intento de robo y nos los hay • Se reviso la transmisión a la plataforma y esta correcta y sin interrupciones • En términos generales, el medidor continua bien su funcionamiento REVISION DEL MEDIDOR DE LA CAMARA DEL PUENTE METALICO VENDIDA ESTE AÑO: PROCESO: • Se revisaron la estructura de instalación y continua en buen estado • Los candados continúan en buen estado • No hay entrada de agua en la cámara, ya que tiene una carcasa metálica • La cámara está operativa transmitiendo bien sus imágenes diariamente • En términos generales, la cámara continua bien su funcionamiento. MES DE SEPTIEMBRE: MANTENIMIENTO MEDIDOR NIVEL DE AGUA PEÑAS VIA ZAPATOCA: PROCESO: • Se reviso el medidor y no tiene insectos • Se giro el soporte y se devolvió a su punto normal • Se dejo la batería reemplazada en agosto • Se revisó la orientación de la antena y el viento no la ha movido • Se verificó el funcionamiento en Plataforma MANTENIMIENTO MEDIDOR NIVEL DE AGUA PUENTE FRIGORIFICO RIO FRIO: PROCESO: • Se limpio el soporte anclado en el puente • Se uso WD40 para limpiar tuercas del soporte • No se cambió batería sellada pues estaba en buen estado • Se reviso panel y estaba en buen estado • Se verifico el funcionamiento en Plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO VIA ZAPATOCA PEÑAS: PROCESO: • Se limpio el balancín del pluviómetro • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y estaba correcta • Se limpio por fuera el chasis del equipo • Se comprobó transmisión normal en

INFORME DEL CONTRATISTA

		plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO PIEDECUESTA CENTRO: PROCESO: • Se bajo el pluviómetro del tejado • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y está en buen estado • Se limpio por fuera el pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO PIEDECUESTA CABECERA: PROCESO: • Se reviso el pluviómetro en el poste • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y tiene energía a intervalos • Se limpio la carcasa del pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA LIMONCITO: PROCESO: • Se reviso el pluviómetro en el poste • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y tiene energía a intervalos • Se limpio la carcasa del pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA DEFENSA CIVIL: PROCESO: • Se reviso en el techo de la defensa civil • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería con multímetro y aún tiene vida útil • Se limpio la parte externa del pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO SISTEMA DE PERIFONEO BAMBUES: PROCESO: • Se reviso el estado de la batería de 18amp 12v y el voltaje está bien • Se reviso el radio modem que recibe llamadas y funciona • Se limpio la antena del radio modem • Se reviso el regulador solar y está funcionando bien • Se reviso el amplificador y está en buen estado de funcionamiento • Se reviso el voltaje del panel solar y está en el nivel adecuado • Se hizo prueba de funcionamiento y el sonido de sirena y voz está bien MANTENIMIENTO SISTEMA DE PERIFONEO LA ISLA: PROCESO: • Se revisaron entradas de agua en la caja metálica • Se reviso el radio modem que recibe llamadas • Se limpio la antena externa • Se reviso el regulador solar y está encendido • Se reviso el amplificador y no tiene daños • Se reviso si funciona el panel solar • Se hizo prueba de funcionamiento y esta correcto REVISION DEL MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA DEL PUENTE METALICO VENDIDO ESTE AÑO: PROCESO: • Se revisaron las soldaduras del punto de unión al puente y están bien • Se revisaron signos de vandalismo e intento de robo y nos los hay • Se reviso la transmisión a la plataforma y esta correcta y sin interrupciones • En términos generales, el medidor continua bien su funcionamiento REVISION DEL MEDIDOR DE LA CAMARA DEL PUENTE METALICO VENDIDA ESTE AÑO: PROCESO: • Se revisaron la estructura de instalación y continua en buen estado • Los candados continúan en buen estado • No hay entrada de agua en la cámara, ya que tiene una carcasa metálica • La cámara está operativa transmitiendo bien sus imágenes diariamente • En términos generales, la cámara continua bien su funcionamiento. MES DE OCTUBRE: MANTENIMIENTO MEDIDOR NIVEL DE AGUA PEÑAS VIA ZAPATOCA: PROCESO: • Se reviso el medidor y está bien • Se limpio el soporte. • Se dejo la batería reemplazada en agosto • Se revisó la orientación de la antena y el viento no la ha movido • Se verificó el funcionamiento en Plataforma MANTENIMIENTO MEDIDOR NIVEL DE AGUA PUENTE FRIGORIFICO RIO FRIO: PROCESO: • Se limpio el soporte anclado en el puente • Se uso WD40 para limpiar tuercas del soporte • No se cambió batería sellada pues estaba en buen estado • Se reviso panel y estaba en buen estado • Se verifico el funcionamiento en Plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO VIA ZAPATOCA PEÑAS: PROCESO: • Se limpio el balancin del pluviómetro • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y estaba correcta • Se limpio por fuera el chasis del equipo • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO PIEDECUESTA CENTRO: PROCESO: • Se bajo el pluviómetro del tejado • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y está en buen estado • Se limpio por fuera el pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO PIEDECUESTA CABECERA: PROCESO: • Se reviso el pluviómetro en el poste • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y tiene energía a intervalos • Se limpio la carcasa del pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA LIMONCITO: PROCESO: • Se reviso el pluviómetro en el poste • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y tiene energía a intervalos • Se limpio la carcasa del pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA DEFENSA CIVIL: PROCESO: • Se reviso en el techo de la defensa civil • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería con multímetro y aún tiene vida útil • Se limpio la parte externa del pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO SISTEMA DE PERIFONEO BAMBUES: PROCESO: • Se reviso el estado de la batería de 18amp 12v y el voltaje está bien • Se reviso el radio modem que recibe llamadas y funciona • Se limpio la antena del radio modem • Se reviso el regulador solar y está funcionando bien • Se reviso el amplificador y está en buen estado de funcionamiento • Se reviso el voltaje del panel solar y está en el nivel adecuado • Se hizo prueba de funcionamiento y el sonido de sirena y voz está bien MANTENIMIENTO SISTEMA DE PERIFONEO LA ISLA: PROCESO: • Se revisaron entradas de agua en la caja metálica • Se reviso el radio modem que recibe llamadas • Se limpio la antena externa • Se reviso el regulador solar y está encendido • Se reviso el amplificador y no tiene daños • Se reviso si funciona el panel solar • Se hizo prueba de funcionamiento y esta correcto REVISION DEL MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA DEL PUENTE METALICO VENDIDO ESTE AÑO: PROCESO: • Se revisaron las soldaduras del punto de unión al puente y están bien • Se revisaron signos de vandalismo e

INFORME DEL CONTRATISTA

		fuera el pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO PIEDECUESTA CABECERA: PROCESO: • Se reviso el pluviómetro en el poste • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y tiene energía a intervalos • Se limpio la carcasa del pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA LIMONCITO: PROCESO: • Se reviso el pluviómetro en el poste • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y tiene energía a intervalos • Se limpio la carcasa del pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA DEFENSA CIVIL: PROCESO: • Se reviso en el techo de la defensa civil • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería con multímetro y aún tiene vida útil • Se limpio la parte externa del pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO SISTEMA DE PERIFONEO BAMBUES: PROCESO: • Se reviso el estado de la batería de 18amp 12v y el voltaje está bien • Se reviso el radio modem que recibe llamadas y funciona • Se limpio la antena del radio modem • Se reviso el regulador solar y está funcionando bien • Se reviso el amplificador y está en buen estado de funcionamiento • Se reviso el voltaje del panel solar y está en el nivel adecuado • Se hizo prueba de funcionamiento y el sonido de sirena y voz está bien MANTENIMIENTO SISTEMA DE PERIFONEO LA ISLA: PROCESO: • Se revisaron entradas de agua en la caja metálica • Se reviso el radio modem que recibe llamadas • Se limpio la antena externa • Se reviso el regulador solar y está encendido • Se reviso el amplificador y no tiene daños • Se reviso si funciona el panel solar • Se hizo prueba de funcionamiento y esta correcto REVISION DEL MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA DEL PUENTE METALICO VENDIDO ESTE AÑO: PROCESO: • Se revisaron las soldaduras del punto de unión al puente y están bien • Se revisaron signos de vandalismo e intento de robo y nos los hay • Se reviso la transmisión a la plataforma y esta correcta y sin interrupciones • En términos generales, el medidor continua bien su funcionamiento REVISION DEL MEDIDOR DE LA CAMARA DEL PUENTE METALICO VENDIDA ESTE AÑO: PROCESO: • Se revisaron la estructura de instalación y continua en buen estado • Los candados continúan en buen estado • No hay entrada de agua en la cámara, ya que tiene una carcasa metálica • La cámara está operativa transmitiendo bien sus imágenes diariamente • En términos generales, la cámara continua bien su funcionamiento. SE ADJUNTO REGISTRO FOTOGRAFICO.

Así mismo se deja constancia de los siguientes pagos:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**AGOSTO 2022**	**SEPTIEMBRE 2022**	**OCTUBRE 2022**	**NOVIEMBRE 2022**	**DICIEMBRE 2022**
	Fecha de pago	09-08-2022	09-09-2022	07-10-2022	09-11-2022	09-12-2022
	Nº de Planilla	8620516645	8621037764	8621483684	8621959917	8622522613
	IBC	**$1.000.000**	**$1.000.000**	**$1.000.000**	**$1.000.000**	**$1.000.000**
	Valor liquidado	**$125.000**	**$125.000**	**$125.000**	**$125.000**	**$125.000**
	EPS	NUEVA EPS S.A	NUEVA EPS S.A	NUEVA EPS S.A	NUEVA EPS S.A	NUEVA EPS S.A
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**AGOSTO 2022**	**SEPTIEMBRE 2022**	**OCTUBRE 2022**	**NOVIEMBRE 2022**	**DICIEMBRE 2022**
	Fecha de pago	09-08-2022	09-09-2022	07-10-2022	09-11-2022	09-12-2022
	Nº de Planilla	8620516645	8621037764	8621483684	8621959917	8622522613
	IBC	**$1.000.000**	**$1.000.000**	**$1.000.000**	**$1.000.000**	**$1.000.000**
	Valor liquidado	**$160.000**	**$160.000**	**$160.000**	**$160.000**	**$160.000**

INFORME DEL CONTRATISTA

		intento de robo y nos los hay • Se reviso la transmisión a la plataforma y esta correcta y sin interrupciones • En términos generales, el medidor continua bien su funcionamiento REVISION DEL MEDIDOR DE LA CAMARA DEL PUENTE METALICO VENDIDA ESTE AÑO: PROCESO: • Se revisaron la estructura de instalación y continua en buen estado • Los candados continúan en buen estado • No hay entrada de agua en la cámara, ya que tiene una carcasa metálica • La cámara está operativa transmitiendo bien sus imágenes diariamente • En términos generales, la cámara continua bien su funcionamiento. MES DE NOVIEMBRE: MANTENIMIENTO MEDIDOR NIVEL DE AGUA PEÑAS VIA ZAPATOCA: PROCESO: • Se reviso el medidor y está bien • Se limpio el soporte. • Se dejo la batería reemplazada en agosto • Se revisó la orientación de la antena y el viento no la ha movido • Se verificó el funcionamiento en Plataforma MANTENIMIENTO MEDIDOR NIVEL DE AGUA PUENTE FRIGORIFICO RIO FRIO: PROCESO: • Se limpio el soporte anclado en el puente • Se uso WD40 para limpiar tuercas del soporte • No se cambió batería sellada pues estaba en buen estado • Se reviso panel y estaba en buen estado • Se verifico el funcionamiento en Plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO VIA ZAPATOCA PEÑAS: PROCESO: • Se limpio el balancín del pluviómetro • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y estaba correcta • Se limpio por fuera el chasis del equipo • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO PIEDECUESTA CENTRO: PROCESO: • Se bajo el pluviómetro del tejado • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y está en buen estado • Se limpio por fuera el pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO PIEDECUESTA CABECERA: PROCESO: • Se reviso el pluviómetro en el poste • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y tiene energía a intervalos • Se limpio la carcasa del pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA LIMONCITO: PROCESO: • Se reviso el pluviómetro en el poste • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y tiene energía a intervalos • Se limpio la carcasa del pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA DEFENSA CIVIL: PROCESO: • Se reviso en el techo de la defensa civil • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería con multímetro y aún tiene vida útil • Se limpio la parte externa del pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO SISTEMA DE PERIFONEO BAMBUES: PROCESO: • Se reviso el estado de la batería de 18amp 12v y el voltaje está bien • Se reviso el radio modem que recibe llamadas y funciona • Se limpio la antena del radio modem • Se reviso el regulador solar y está funcionando bien • Se reviso el amplificador y está en buen estado de funcionamiento • Se reviso el voltaje del panel solar y está en el nivel adecuado • Se hizo prueba de funcionamiento y el sonido de sirena y voz está bien MANTENIMIENTO SISTEMA DE PERIFONEO LA ISLA: PROCESO: • Se revisaron entradas de agua en la caja metálica • Se reviso el radio modem que recibe llamadas • Se limpio la antena externa • Se reviso el regulador solar y está encendido • Se reviso el amplificador y no tiene daños • Se revíso si funciona el panel solar • Se hizo prueba de funcionamiento y esta correcto REVISION DEL MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA DEL PUENTE METALICO VENDIDO ESTE AÑO: PROCESO: • Se revisaron las soldaduras del punto de unión al puente y están bien • Se revisaron signos de vandalismo e intento de robo y nos los hay • Se reviso la transmisión a la plataforma y esta correcta y sin interrupciones • En términos generales, el medidor continua bien su funcionamiento REVISION DEL MEDIDOR DE LA CAMARA DEL PUENTE METALICO VENDIDA ESTE AÑO: PROCESO: • Se revisaron la estructura de instalación y continua en buen estado • Los candados continúan en buen estado • No hay entrada de agua en la cámara, ya que tiene una carcasa metálica • La cámara está operativa transmitiendo bien sus imágenes diariamente • En términos generales, la cámara continua bien su funcionamiento. MES DE DICIEMBRE: MANTENIMIENTO MEDIDOR NIVEL DE AGUA PEÑAS VIA ZAPATOCA: PROCESO: • Se reviso el medidor y está bien • Se limpio el soporte. • Se dejo la batería reemplazada en agosto • Se revisó la orientación de la antena y el viento no la ha movido • Se verificó el funcionamiento en Plataforma MANTENIMIENTO MEDIDOR NIVEL DE AGUA PUENTE FRIGORIFICO RIO FRIO: PROCESO: • Se limpio el soporte anclado en el puente • Se uso WD40 para limpiar tuercas del soporte • No se cambió batería sellada pues estaba en buen estado • Se reviso panel y estaba en buen estado • Se verifico el funcionamiento en Plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO VIA ZAPATOCA PEÑAS: PROCESO: • Se limpio el balancín del pluviómetro • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y estaba correcta • Se limpio por fuera el chasis del equipo • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO PIEDECUESTA CENTRO: PROCESO: • Se bajo el pluviómetro del tejado • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y está en buen estado • Se limpio por

INFORME DEL CONTRATISTA

	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES	COLPENSIONES	COLPENSIONES	COLPENSIONES	COLPENSIONES
APORTE RIESGOS "ARL"	Periodo de cotización	**AGOSTO 2022**	**SEPTIEMBRE 2022**	**OCTUBRE 2022**	**NOVIEMBRE 2022**	**DICIEMBRE 2022**
	Fecha de pago	09-08-2022	09-09-2022	07-10-2022	09-11-2022	09-12-2022
	Nº de Planilla	8620516645	8621037764	8621483684	8621959917	8622522613
	IBC	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000
	Valor liquidado	**$5.300**	**$5.300**	**$5.300**	**$5.300**	**$5.300**
	ARL	**POSITIVA**	**POSITIVA**	**POSITIVA**	**POSITIVA**	**POSITIVA**
APORTES PARAFISCALES	Periodo de cotización	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Fecha de pago					
	Nº de Planilla					
	IBC					
	Valor liquidado					
	SENA, CAJA DE COMPESANCION, ICBF					

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2022.

GILBERTO PARRA PATIÑO"
CONTRATISTA

Certificado
Bancario

Lunes, 06 de junio de 2022

Señor(a)
ALCALDÍA DE GIRÓN

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GILBERTO PARRA PATIÑO identificado(a) con CC 91231841, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	28891354080	2012/12/12	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Bancolombia

Bucaramanga, agosto 20 de 2022

Doctor
CRISTIAN GENARO CALDERÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRÓN
E. S. D.

Referencia: mantenimientos de CONTRATO # 657 30/03/2022

MANTENIMIENTO MEDIDOR NIVEL DE AGUA PEÑAS VIA ZAPATOCA:

PROCESO:

- *Ya era de noche cuando se hizo el trabajo*
- *No se giró el soporte pues se iba a reemplazar únicamente la batería, ya el medidor se había limpiado en el mantenimiento anterior.*
- *Se reemplazó la batería por otra nueva.*
- *Se revisó la orientación de la antena.*
- *Se verificó el funcionamiento en Plataforma*

MANTENIMIENTO MEDIDOR NIVEL DE AGUA PUENTE FRIGORIFICO RIO FRIO:

PROCESO:

- *Se saco el medidor de nivel del puente.*
- *Se verificó el sensor ultrasónico y se limpio*
- *No se cambió batería sellada pues estaba en buen estado*
- *Se reviso panel y estaba en buen estado*
- *Se volvió a instalar el medidor en el puente*
- *Se verifico el funcionamiento en Plataforma*

MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO VIA ZAPATOCA PEÑAS:

PROCESO:

- *Se limpio el balancín del pluviómetro*
- *Se limpio el embudo del pluviómetro*
- *Se reviso la batería y estaba correcta*
- *Se limpio por fuera el chasis del equipo*
- *Se comprobó transmisión normal en plataforma*

MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO PIEDECUESTA CENTRO:

PROCESO:

- *Se bajo el pluviómetro del tejado*
- *Se limpio el embudo del pluviómetro*
- *Se reviso la batería y está en buen estado*
- *Se limpio por fuera el pluviómetro*
- *Se comprobó transmisión normal en plataforma*

MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO PIEDECUESTA CABECERA:

PROCESO:

- *Se reviso el pluviómetro en el poste*
- *Se limpio el embudo del pluviómetro*
- *Se reviso la batería y sigue con energía*
- *Se limpio la carcasa del pluviómetro*
- *Se comprobó transmisión normal en plataforma*

MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA LIMONCITO:

PROCESO:

- *Se reviso el pluviómetro en el poste*
- *Se limpio el embudo del pluviómetro*
- *Se reviso la batería y tiene energía a intervalos*
- *Se limpio la carcasa del pluviómetro*
- *Se comprobó transmisión normal en plataforma*

MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA DEFENSA CIVIL:

PROCESO:

- *Se reviso en el techo de la defensa civil*
- *Se limpio el embudo del pluviómetro*
- *Se reviso la batería con multímetro y aún tiene vida útil*
- *Se limpio la parte externa del pluviómetro*
- *Se comprobó transmisión normal en plataforma*

MANTENIMIENTO SISTEMA DE PERIFONEO BAMBUES:

PROCESO:

- *Se reviso el estado de la batería de 18amp 12v y el voltaje está bien*
- *Se reviso el radio modem que recibe llamadas y funciona*
- *Se limpio la antena del radio modem*
- *Se reviso el regulador solar y está funcionando bien*
- *Se reviso el amplificador y está en buen estado de funcionamiento*
- *Se reviso el voltaje del panel solar y está en el nivel adecuado*
- *Se hizo prueba de funcionamiento y el sonido de sirena y voz está bien*

MANTENIMIENTO SISTEMA DE PERIFONEO LA ISLA:

PROCESO:

- *Se revisaron entradas de agua en la caja metálica*
- *Se reviso el radio modem que recibe llamadas*
- *Se limpio la antena externa*
- *Se reviso el regulador solar y está encendido*
- *Se reviso el amplificador y no tiene daños*
- *Se reviso si funciona el panel solar*
- *Se hizo prueba de funcionamiento y esta correcto*

REVISION DEL MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA DEL PUENTE METALICO VENDIDO ESTE AÑO:

PROCESO:

- *Se revisaron las soldaduras del punto de unión al puente y están bien*
- *Se revisaron signos de vandalismo e intento de robo y nos los hay*
- *Se reviso la transmisión a la plataforma y esta correcta y sin interrupciones*
- *En términos generales, el medidor continua bien su funcionamiento*

REVISION DEL MEDIDOR DE LA CAMARA DEL PUENTE METALICO VENDIDA ESTE AÑO:

PROCESO:

- *Se revisaron la estructura de instalación y continua en buen estado*
- *Los candados continúan en buen estado*
- *No hay entrada de agua en la cámara, ya que tiene una carcasa metálica*
- *La cámara está operativa transmitiendo bien sus imágenes diariamente*
- *En términos generales, la cámara continua bien su funcionamiento*

Cordialmente:

GILBERTO PARRA PATIÑO
CC No. 91.231.841
Contratista – Desarrollador
Tel: 3156753396
avanxar@gmail.com

Bucaramanga, septiembre 21 de 2022

Doctor
CRISTIAN GENARO CALDERÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRÓN
E. S. D.

Referencia: mantenimientos de CONTRATO # 657 30/03/2022

MANTENIMIENTO MEDIDOR NIVEL DE AGUA PEÑAS VIA ZAPATOCA:

PROCESO:
- *Se reviso el medidor y no tiene insectos*
- *Se giro el soporte y se devolvió a su punto normal*
- *Se dejo la batería reemplazada en agosto*
- *Se revisó la orientación de la antena y el viento no la ha movido*
- *Se verificó el funcionamiento en Plataforma*

MANTENIMIENTO MEDIDOR NIVEL DE AGUA PUENTE FRIGORIFICO RIO FRIO:

PROCESO:
- *Se limpio el soporte anclado en el puente*
- *Se uso WD40 para limpiar tuercas del soporte*
- *No se cambió batería sellada pues estaba en buen estado*
- *Se reviso panel y estaba en buen estado*
- *Se verifico el funcionamiento en Plataforma*

MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO VIA ZAPATOCA PEÑAS:

PROCESO:

- *Se limpio el balancín del pluviómetro*
- *Se limpio el embudo del pluviómetro*
- *Se reviso la batería y estaba correcta*
- *Se limpio por fuera el chasis del equipo*
- *Se comprobó transmisión normal en plataforma*

MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO PIEDECUESTA CENTRO:

PROCESO:

- *Se bajo el pluviómetro del tejado*
- *Se limpio el embudo del pluviómetro*
- *Se reviso la batería y está en buen estado*
- *Se limpio por fuera el pluviómetro*
- *Se comprobó transmisión normal en plataforma*

MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO PIEDECUESTA CABECERA:

PROCESO:

- *Se reviso el pluviómetro en el poste*
- *Se limpio el embudo del pluviómetro*
- *Se reviso la batería y tiene energía a intervalos*
- *Se limpio la carcasa del pluviómetro*
- *Se comprobó transmisión normal en plataforma*

MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA LIMONCITO:

PROCESO:

- *Se reviso el pluviómetro en el poste*
- *Se limpio el embudo del pluviómetro*
- *Se reviso la batería y tiene energía a intervalos*
- *Se limpio la carcasa del pluviómetro*
- *Se comprobó transmisión normal en plataforma*

MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA DEFENSA CIVIL:

PROCESO:

- *Se reviso en el techo de la defensa civil*
- *Se limpio el embudo del pluviómetro*
- *Se reviso la batería con multímetro y aún tiene vida útil*
- *Se limpio la parte externa del pluviómetro*
- *Se comprobó transmisión normal en plataforma*

MANTENIMIENTO SISTEMA DE PERIFONEO BAMBUES:

PROCESO:

- *Se reviso el estado de la batería de 18amp 12v y el voltaje está bien*
- *Se reviso el radio modem que recibe llamadas y funciona*
- *Se limpio la antena del radio modem*
- *Se reviso el regulador solar y está funcionando bien*
- *Se reviso el amplificador y está en buen estado de funcionamiento*
- *Se reviso el voltaje del panel solar y está en el nivel adecuado*
- *Se hizo prueba de funcionamiento y el sonido de sirena y voz está bien*

MANTENIMIENTO SISTEMA DE PERIFONEO LA ISLA:

PROCESO:

- *Se revisaron entradas de agua en la caja metálica*
- *Se reviso el radio modem que recibe llamadas*
- *Se limpio la antena externa*
- *Se reviso el regulador solar y está encendido*
- *Se reviso el amplificador y no tiene daños*
- *Se reviso si funciona el panel solar*
- *Se hizo prueba de funcionamiento y esta correcto*

REVISION DEL MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA DEL PUENTE METALICO VENDIDO ESTE AÑO:

PROCESO:

- *Se revisaron las soldaduras del punto de unión al puente y están bien*
- *Se revisaron signos de vandalismo e intento de robo y nos los hay*
- *Se reviso la transmisión a la plataforma y esta correcta y sin interrupciones*
- *En términos generales, el medidor continua bien su funcionamiento*

REVISION DEL MEDIDOR DE LA CAMARA DEL PUENTE METALICO VENDIDA ESTE AÑO:

PROCESO:

- *Se revisaron la estructura de instalación y continua en buen estado*
- *Los candados continúan en buen estado*
- *No hay entrada de agua en la cámara, ya que tiene una carcasa metálica*
- *La cámara está operativa transmitiendo bien sus imágenes diariamente*
- *En términos generales, la cámara continua bien su funcionamiento*

Cordialmente:

GILBERTO PARRA PATIÑO
CC No. 91.231.841
Contratista – Desarrollador
Tel: 3156753396
avanxar@gmail.com

Bucaramanga, octubre 23 de 2022

Doctor
CRISTIAN GENARO CALDERÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRÓN
E. S. D.

Referencia: mantenimientos de CONTRATO # 657 30/03/2022

MANTENIMIENTO MEDIDOR NIVEL DE AGUA PEÑAS VIA ZAPATOCA:

PROCESO:
- *Se reviso el medidor y está bien*
- *Se limpio el soporte.*
- *Se dejo la batería reemplazada en agosto*
- *Se revisó la orientación de la antena y el viento no la ha movido*
- *Se verificó el funcionamiento en Plataforma*

MANTENIMIENTO MEDIDOR NIVEL DE AGUA PUENTE FRIGORIFICO RIO FRIO:

PROCESO:
- *Se limpio el soporte anclado en el puente*
- *Se uso WD40 para limpiar tuercas del soporte*
- *No se cambió batería sellada pues estaba en buen estado*
- *Se reviso panel y estaba en buen estado*
- *Se verifico el funcionamiento en Plataforma*

MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO VIA ZAPATOCA PEÑAS:

PROCESO:

- *Se limpio el balancín del pluviómetro*
- *Se limpio el embudo del pluviómetro*
- *Se reviso la batería y estaba correcta*
- *Se limpio por fuera el chasis del equipo*
- *Se comprobó transmisión normal en plataforma*

MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO PIEDECUESTA CENTRO:

PROCESO:

- *Se bajo el pluviómetro del tejado*
- *Se limpio el embudo del pluviómetro*
- *Se reviso la batería y está en buen estado*
- *Se limpio por fuera el pluviómetro*
- *Se comprobó transmisión normal en plataforma*

MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO PIEDECUESTA CABECERA:

PROCESO:

- *Se reviso el pluviómetro en el poste*
- *Se limpio el embudo del pluviómetro*
- *Se reviso la batería y tiene energía a intervalos*
- *Se limpio la carcasa del pluviómetro*
- *Se comprobó transmisión normal en plataforma*

MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA LIMONCITO:

PROCESO:

- *Se reviso el pluviómetro en el poste*
- *Se limpio el embudo del pluviómetro*
- *Se reviso la batería y tiene energía a intervalos*
- *Se limpio la carcasa del pluviómetro*
- *Se comprobó transmisión normal en plataforma*

MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA DEFENSA CIVIL:

PROCESO:

- *Se reviso en el techo de la defensa civil*
- *Se limpio el embudo del pluviómetro*
- *Se reviso la batería con multímetro y aún tiene vida útil*
- *Se limpio la parte externa del pluviómetro*
- *Se comprobó transmisión normal en plataforma*

MANTENIMIENTO SISTEMA DE PERIFONEO BAMBUES:

PROCESO:

- *Se reviso el estado de la batería de 18amp 12v y el voltaje está bien*
- *Se reviso el radio modem que recibe llamadas y funciona*
- *Se limpio la antena del radio modem*
- *Se reviso el regulador solar y está funcionando bien*
- *Se reviso el amplificador y está en buen estado de funcionamiento*
- *Se reviso el voltaje del panel solar y está en el nivel adecuado*
- *Se hizo prueba de funcionamiento y el sonido de sirena y voz está bien*

MANTENIMIENTO SISTEMA DE PERIFONEO LA ISLA:

PROCESO:

- *Se revisaron entradas de agua en la caja metálica*
- *Se reviso el radio modem que recibe llamadas*
- *Se limpio la antena externa*
- *Se reviso el regulador solar y está encendido*
- *Se reviso el amplificador y no tiene daños*
- *Se reviso si funciona el panel solar*
- *Se hizo prueba de funcionamiento y esta correcto*

REVISION DEL MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA DEL PUENTE METALICO VENDIDO ESTE AÑO:

PROCESO:

- *Se revisaron las soldaduras del punto de unión al puente y están bien*
- *Se revisaron signos de vandalismo e intento de robo y nos los hay*
- *Se reviso la transmisión a la plataforma y esta correcta y sin interrupciones*
- *En términos generales, el medidor continua bien su funcionamiento*

REVISION DEL MEDIDOR DE LA CAMARA DEL PUENTE METALICO VENDIDA ESTE AÑO:

PROCESO:

- *Se revisaron la estructura de instalación y continua en buen estado*
- *Los candados continúan en buen estado*
- *No hay entrada de agua en la cámara, ya que tiene una carcasa metálica*
- *La cámara está operativa transmitiendo bien sus imágenes diariamente*
- *En términos generales, la cámara continua bien su funcionamiento*

Cordialmente:



GILBERTO PARRA PATIÑO
CC No. 91.231.841
Contratista – Desarrollador
Tel: 3156753396
avanxar@gmail.com

Bucaramanga, noviembre 18 de 2022

Doctor
CRISTIAN GENARO CALDERÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRÓN
E. S. D.

Referencia: mantenimientos de CONTRATO # 657 30/03/2022

MANTENIMIENTO MEDIDOR NIVEL DE AGUA PEÑAS VIA ZAPATOCA:

PROCESO:
- *Se reviso el medidor y está bien*
- *Se limpio el soporte.*
- *Se dejo la batería reemplazada en agosto*
- *Se revisó la orientación de la antena y el viento no la ha movido*
- *Se verificó el funcionamiento en Plataforma*

MANTENIMIENTO MEDIDOR NIVEL DE AGUA PUENTE FRIGORIFICO RIO FRIO:

PROCESO:
- *Se limpio el soporte anclado en el puente*
- *Se uso WD40 para limpiar tuercas del soporte*
- *No se cambió batería sellada pues estaba en buen estado*
- *Se reviso panel y estaba en buen estado*
- *Se verifico el funcionamiento en Plataforma*

MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO VIA ZAPATOCA PEÑAS:

PROCESO:

- *Se limpio el balancín del pluviómetro*
- *Se limpio el embudo del pluviómetro*
- *Se reviso la batería y estaba correcta*
- *Se limpio por fuera el chasis del equipo*
- *Se comprobó transmisión normal en plataforma*

MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO PIEDECUESTA CENTRO:

PROCESO:

- *Se bajo el pluviómetro del tejado*
- *Se limpio el embudo del pluviómetro*
- *Se reviso la batería y está en buen estado*
- *Se limpio por fuera el pluviómetro*
- *Se comprobó transmisión normal en plataforma*

MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO PIEDECUESTA CABECERA:

PROCESO:

- *Se reviso el pluviómetro en el poste*
- *Se limpio el embudo del pluviómetro*
- *Se reviso la batería y tiene energía a intervalos*
- *Se limpio la carcasa del pluviómetro*
- *Se comprobó transmisión normal en plataforma*

MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA LIMONCITO:

PROCESO:

- *Se reviso el pluviómetro en el poste*
- *Se limpio el embudo del pluviómetro*
- *Se reviso la batería y tiene energía a intervalos*
- *Se limpio la carcasa del pluviómetro*
- *Se comprobó transmisión normal en plataforma*

MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA DEFENSA CIVIL:

PROCESO:

- *Se reviso en el techo de la defensa civil*
- *Se limpio el embudo del pluviómetro*
- *Se reviso la batería con multímetro y aún tiene vida útil*
- *Se limpio la parte externa del pluviómetro*
- *Se comprobó transmisión normal en plataforma*

MANTENIMIENTO SISTEMA DE PERIFONEO BAMBUES:

PROCESO:

- *Se reviso el estado de la batería de 18amp 12v y el voltaje está bien*
- *Se reviso el radio modem que recibe llamadas y funciona*
- *Se limpio la antena del radio modem*
- *Se reviso el regulador solar y está funcionando bien*
- *Se reviso el amplificador y está en buen estado de funcionamiento*
- *Se reviso el voltaje del panel solar y está en el nivel adecuado*
- *Se hizo prueba de funcionamiento y el sonido de sirena y voz está bien*

MANTENIMIENTO SISTEMA DE PERIFONEO LA ISLA:

PROCESO:

- *Se revisaron entradas de agua en la caja metálica*
- *Se reviso el radio modem que recibe llamadas*
- *Se limpio la antena externa*
- *Se reviso el regulador solar y está encendido*
- *Se reviso el amplificador y no tiene daños*
- *Se reviso si funciona el panel solar*
- *Se hizo prueba de funcionamiento y esta correcto*

REVISION DEL MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA DEL PUENTE METALICO VENDIDO ESTE AÑO:

PROCESO:

- *Se revisaron las soldaduras del punto de unión al puente y están bien*
- *Se revisaron signos de vandalismo e intento de robo y nos los hay*
- *Se reviso la transmisión a la plataforma y esta correcta y sin interrupciones*
- *En términos generales, el medidor continua bien su funcionamiento*

REVISION DEL MEDIDOR DE LA CAMARA DEL PUENTE METALICO VENDIDA ESTE AÑO:

PROCESO:

- *Se revisaron la estructura de instalación y continua en buen estado*
- *Los candados continúan en buen estado*
- *No hay entrada de agua en la cámara, ya que tiene una carcasa metálica*
- *La cámara está operativa transmitiendo bien sus imágenes diariamente*
- *En términos generales, la cámara continua bien su funcionamiento*

Cordialmente:

GILBERTO PARRA PATIÑO
CC No. 91.231.841
Contratista – Desarrollador
Tel: 3156753396
avanxar@gmail.com

Bucaramanga, diciembre 15 de 2022

Doctor
CRISTIAN GENARO CALDERÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRÓN
E. S. D.

Referencia: mantenimientos de CONTRATO # 657 30/03/2022

MANTENIMIENTO MEDIDOR NIVEL DE AGUA PEÑAS VIA ZAPATOCA:

PROCESO:
- *Se reviso el medidor y está bien*
- *Se limpio el soporte.*
- *Se dejo la batería reemplazada en agosto*
- *Se revisó la orientación de la antena y el viento no la ha movido*
- *Se verificó el funcionamiento en Plataforma*

MANTENIMIENTO MEDIDOR NIVEL DE AGUA PUENTE FRIGORIFICO RIO FRIO:

PROCESO:
- *Se limpio el soporte anclado en el puente*
- *Se uso WD40 para limpiar tuercas del soporte*
- *No se cambió batería sellada pues estaba en buen estado*
- *Se reviso panel y estaba en buen estado*
- *Se verifico el funcionamiento en Plataforma*

MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO VIA ZAPATOCA PEÑAS:

PROCESO:

- *Se limpio el balancín del pluviómetro*
- *Se limpio el embudo del pluviómetro*
- *Se reviso la batería y estaba correcta*
- *Se limpio por fuera el chasis del equipo*
- *Se comprobó transmisión normal en plataforma*

MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO PIEDECUESTA CENTRO:

PROCESO:

- *Se bajo el pluviómetro del tejado*
- *Se limpio el embudo del pluviómetro*
- *Se reviso la batería y está en buen estado*
- *Se limpio por fuera el pluviómetro*
- *Se comprobó transmisión normal en plataforma*

MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO PIEDECUESTA CABECERA:

PROCESO:

- *Se reviso el pluviómetro en el poste*
- *Se limpio el embudo del pluviómetro*
- *Se reviso la batería y tiene energía a intervalos*
- *Se limpio la carcasa del pluviómetro*
- *Se comprobó transmisión normal en plataforma*

MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA LIMONCITO:

PROCESO:

- *Se reviso el pluviómetro en el poste*
- *Se limpio el embudo del pluviómetro*
- *Se reviso la batería y tiene energía a intervalos*
- *Se limpio la carcasa del pluviómetro*
- *Se comprobó transmisión normal en plataforma*

MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA DEFENSA CIVIL:

PROCESO:

- *Se reviso en el techo de la defensa civil*
- *Se limpio el embudo del pluviómetro*
- *Se reviso la batería con multímetro y aún tiene vida útil*
- *Se limpio la parte externa del pluviómetro*
- *Se comprobó transmisión normal en plataforma*

MANTENIMIENTO SISTEMA DE PERIFONEO BAMBUES:

PROCESO:

- *Se reviso el estado de la batería de 18amp 12v y el voltaje está bien*
- *Se reviso el radio modem que recibe llamadas y funciona*
- *Se limpio la antena del radio modem*
- *Se reviso el regulador solar y está funcionando bien*
- *Se reviso el amplificador y está en buen estado de funcionamiento*
- *Se reviso el voltaje del panel solar y está en el nivel adecuado*
- *Se hizo prueba de funcionamiento y el sonido de sirena y voz está bien*

MANTENIMIENTO SISTEMA DE PERIFONEO LA ISLA:

PROCESO:

- *Se revisaron entradas de agua en la caja metálica*
- *Se reviso el radio modem que recibe llamadas*
- *Se limpio la antena externa*
- *Se reviso el regulador solar y está encendido*
- *Se reviso el amplificador y no tiene daños*
- *Se reviso si funciona el panel solar*
- *Se hizo prueba de funcionamiento y esta correcto*

REVISION DEL MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA DEL PUENTE METALICO VENDIDO ESTE AÑO:

PROCESO:

- *Se revisaron las soldaduras del punto de unión al puente y están bien*
- *Se revisaron signos de vandalismo e intento de robo y nos los hay*
- *Se reviso la transmisión a la plataforma y esta correcta y sin interrupciones*
- *En términos generales, el medidor continua bien su funcionamiento*

REVISION DEL MEDIDOR DE LA CAMARA DEL PUENTE METALICO VENDIDA ESTE AÑO:

PROCESO:

- *Se revisaron la estructura de instalación y continua en buen estado*
- *Los candados continúan en buen estado*
- *No hay entrada de agua en la cámara, ya que tiene una carcasa metálica*
- *La cámara está operativa transmitiendo bien sus imágenes diariamente*
- *En términos generales, la cámara continua bien su funcionamiento*

Cordialmente:


GILBERTO PARRA PATIÑO
CC No. 91.231.841
Contratista – Desarrollador
Tel: 3156753396
avanxar@gmail.com

IMAGENES DEL CONTRATO # 657 30/03/2022

OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA POR INUNDACION Y REALIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y OPTIMIZACION TECNOLOGICA PARA EL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER

CAMARA PUENTE METALICO



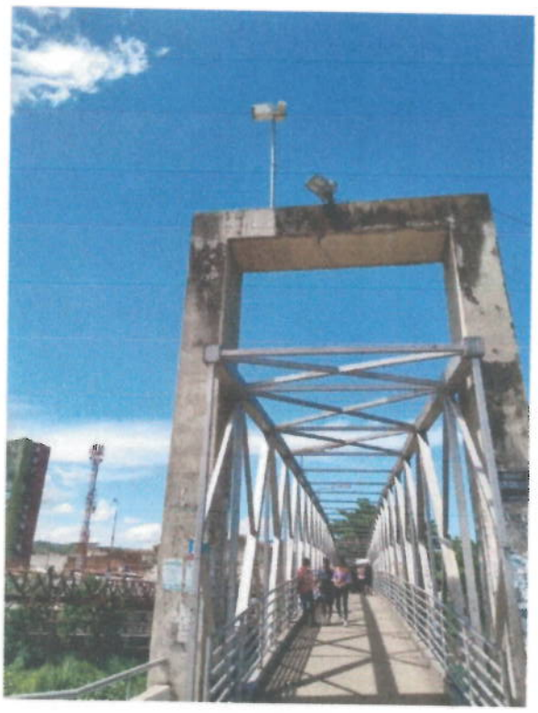



NIVEL DE AGUA PEÑAS









NIVEL DE AGUA RIO FRIO








NIVEL DE AGUA PUENTE METALICO



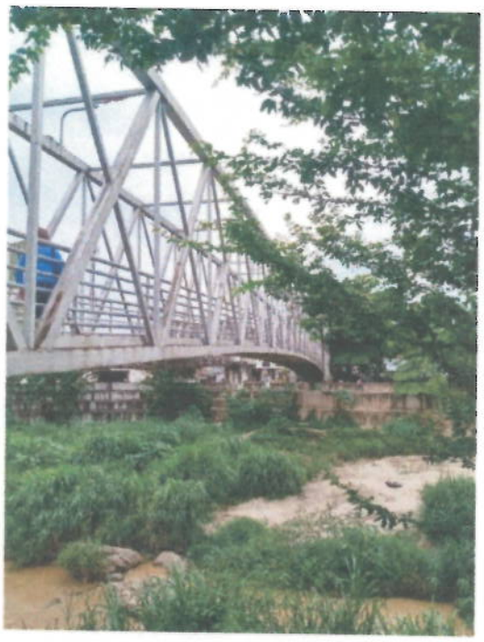




PERIFONEO BAMBUES







PERIFONEO LA ISLA

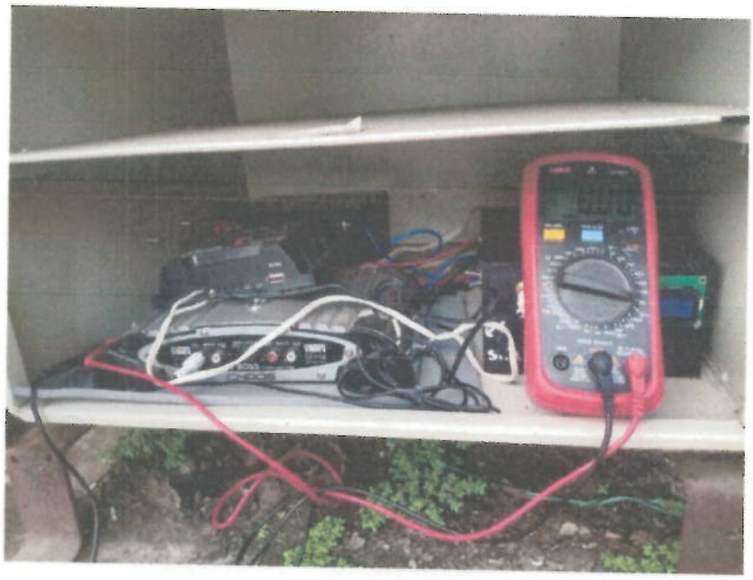





PLUVIOMETRO CENTRO PIEDECUESTA









PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA DEFENSA CIVIL










PLUVIOMETRO CABECERA PIEDECUESTA







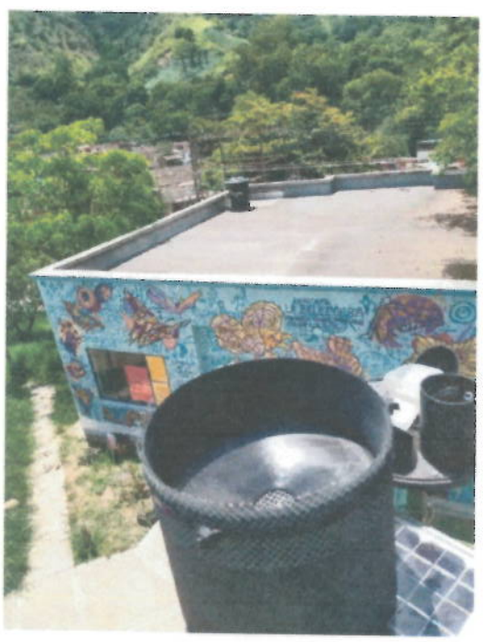

PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA JARDIN DE LIMONCITO








PLUVIOMETRO PEÑAS






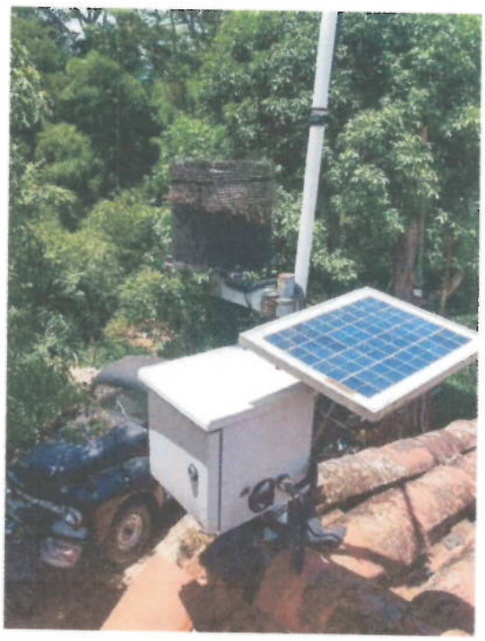

ACTUALIZACION DE IMAGEN Y NOMBRE EN PUNTOS DE LA PLATAFORMA E INCLUSION DEL NUEVO LOGO DE COLOR AZUL



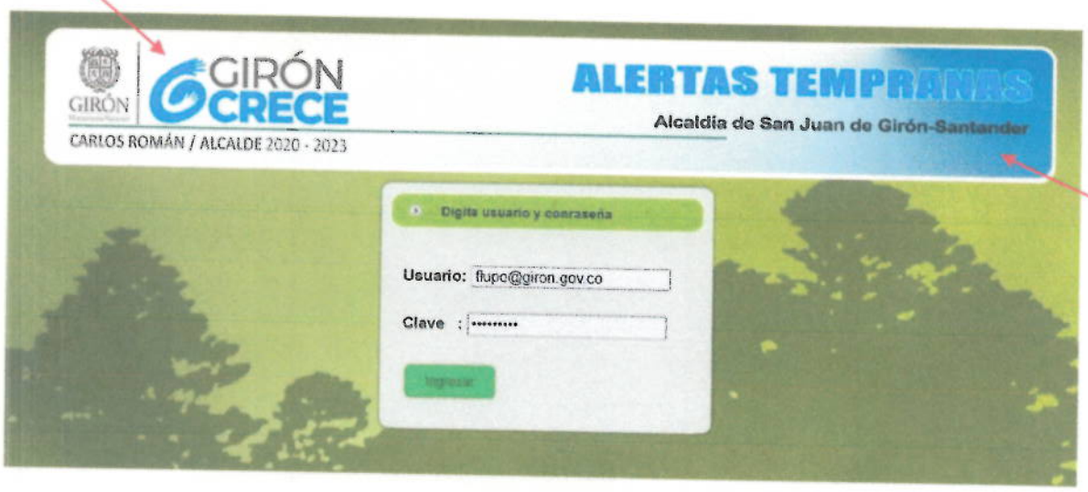

9/23/24
