LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO, identificado con **CC** No. **19399373**, cumplió a satisfacción técnica, administrativa, financiera y jurídicamente con el objeto y las obligaciones del contrato de **CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 3010/2022**, en la forma y oportunidad pactadas.

En caso que se haya generado un pago anterior en virtud del contrato, CERTIFICO que el informe de ejecución correspondiente a dicho periodo se encuentra publicado en SECOP II.(1)

Por lo anterior, se genera registro de reevaluación al proveedor donde autoriza cancelar la suma de **$ 33.413.051,00 "TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL CINCUENTA Y UNO PESOS M/Cte.";** correspondientes al **Tercer Pago** y tras previa verificación del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales.

Afecta los siguientes usos presupuestales:

No. COMPROMISO	RUBRO	USO	VALOR
819422	C-3302-1603-10-0-3302018-02	A-02-02-02-008-003-09	$33.413.051,00
T O T A L			**$33.413.051,00**

Se expide en Bogotá, D.C. a los 20 días del mes de diciembre de 2022

MARCELA CRISTINA CUELLAR SANCHEZ
DIRECTOR(A) DE PATRIMONIO Y MEMORIA
Supervisor

Vo. Bo.: MARCOS VILLANUEVA RODRÍGUEZ

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19399373		TOVAR BAQUERO ENRIQUE ALONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 47A N 95 - 56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8051341	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1815946059	9444310607	N	2023/01/18	2022/12/16	BANCOLOMBIA	0	$3,945,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	19399373	TOVAR ENRIQUE								A										230201	30	($1,000,000)	($160,000)	EPS008	30	($1,000,000)	($125,000)	CCF24	30	($1,000,000)	($20,000)	14-11	30	($1,000,000)	($69,600)	30	$0	$0	No	($374,600)
2	CC	19399373	TOVAR ENRIQUE								C	X									230201	30	$11,231,278	$1,909,500	EPS008	30	$11,231,278	$1,404,000	CCF24	30	$11,231,278	$224,700	14-11	30	$11,231,278	$781,700	30	$0	$0	No	$4,319,900
Total	**Afiliados(1)**																						$10,231,278	$1,749,500			$10,231,278	$1,279,000			$10,231,278	$204,700			$10,231,278	$712,100		$0	$0		$3,945,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19399373		TOVAR BAQUERO ENRIQUE ALONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 47A N 95 - 56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8051341	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1815946059	9444310607	N	2023/01/18	2022/12/16	BANCOLOMBIA	0	$3,945,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,749,500	$0	$0	$1,749,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$1,749,500	$0	$0	$1,749,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$712,100	$0	$0	$712,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$712,100	$0	$0	$712,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$204,700	$0	$0	$204,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$204,700	$0	$0	$204,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,279,000	$0	$0	$1,279,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$1,279,000	$0	$0	$1,279,000
TOTAL				**1**	**$3,945,300**	**$0**	**$0**	**$3,945,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901149923	2	ATICCO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 47 A No. 95-56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8051341	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1809133574	9444174999	E	2022/12/07	2022/12/13	BANCO DAVIVIENDA	6	$1,203,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)							$4,000,000	$640,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000		$155,100		$0	$0		$1,195,100
Centro de Trabajo: SURA I (3 Afiliados)							$2,000,000	$320,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$15,900		$0	$0		$575,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)							$2,000,000	$320,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$15,900		$0	$0		$575,900
1	CC	52956724	MORENO RUTH		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	Si	$245,300
2	CC	1233492165	SALCEDO SHARON		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	Si	$245,300
3	CC	41753518	TOVAR NINNA			0	$0	$0	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	Si	$85,300
Centro de Trabajo: SURA V (2 Afiliados)							$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$139,200		$0	$0		$619,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)							$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$139,200		$0	$0		$619,200
4	CC	80074674	RODRIGUEZ JUAN		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
5	CC	1002364950	TORRES ANGIE		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
Total	**Afiliados(5)**						$4,000,000	$640,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000		$155,100		$0	$0		$1,195,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901149923	2	ATICCO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 47 A No. 95-56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8051341	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1809133574	9444174999	E	2022/12/07	2022/12/13	BANCO DAVIVIENDA	6	$1,203,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$640,000	$4,300	$0	$644,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$1,100	$0	$161,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$480,000	$3,200	$0	$483,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$155,100	$1,100	$0	$156,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$155,100	$1,100	$0	$156,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$200,000	$1,300	$0	$201,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$200,000	$1,300	$0	$201,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$200,000	$1,500	$0	$201,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$80,000	$600	$0	$80,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$40,000	$300	$0	$40,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$40,000	$300	$0	$40,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$40,000	$300	$0	$40,300
TOTAL				**5**	**$1,195,100**	**$8,200**	**$0**	**$1,203,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900690767	4	ARQUISAN S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	BARRIO LIBERTADORES	TUMACO-NARIÑO	3452344	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01		9444252137	E	2023/01/17			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600
Ciudad: TUMACO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600
1	CC	1086724434	YELA ABRAHAM	X	X															230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF35	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
Total	**Afiliados(1)**																					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900690767	4	ARQUISAN S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	BARRIO LIBERTADORES	TUMACO-NARIÑO	3452344	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01		9444252137	E	2023/01/17			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$69,600	$0	$0	$69,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$69,600	$0	$0	$69,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$40,000	$0	$0	$40,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$0	$0	$40,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
TOTAL				**1**	**$309,600**	**$0**	**$0**	**$309,600**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085310828		PANTOJA NOGALES BRIAM DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio Maria Auxiliadora	TUMACO-NARIÑO	7274562	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1802106594	9443462296	I	2022/12/07	2022/12/09	BANCO DAVIVIENDA	2	$310,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1085310828	PANTOJA BRIAM	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$400	$0	$160,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$400	$0	$160,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$100	$0	$24,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$24,400	$100	$0	$24,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$300	$0	$125,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$125,000	$300	$0	$125,300
TOTAL				1	$309,400	$800	$0	$310,200

2022/12/09 11:02 AM

Powered by CamScanner

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3

“REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA No. LP 004-2022 CON OBJETO DE CONTRATAR POR SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS ESPECIFICAS PARA LA ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO”

24/11/2022



TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 2
INTRODUCCIÓN 3
1. DATOS GENERALES 3
2. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA 3
3. DATOS DE LA INTERVENTORÍA 4
4. NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA 4
5. ACTIVIDADES DEL MES 5
5.1. Actividades por hitos. 6
5.2. Seguimiento al plan de compras 6
5.3. Seguimiento al cumplimiento del cronograma 7
5.4 Seguimiento al avance financiero contrato objeto de interventoría 7
5.5 Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría 7
5.6 Informes semanales 7
5.4. Plan de Calidad 7
5.4.1. Control de inspección y ensayos: 8
5.4.2. Control de Maquinaria y Equipo: 8
5.5. Plan de seguridad y salud en el trabajo: 8
5.6. Plan ambiental: 8
6. CONTROL DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 8
7. IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES 8
8. CONTROL DE PERSONAL 9
9. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO. 10
10. COMITÉS DE SEGUIMIENTO. 11
11. REGISTRO FOTOGRÁFICO 11
12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 13

INTRODUCCIÓN

El contrato objeto de la interventoría hace referencia a la CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA TALLER EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. El proyecto se compone por 4 bloques (cocina tradicional, taller de joyería, salón de danza y computo, y cocina de emprendimiento), zonas comunes, y la conexión entre los bloques existentes y nuevos en estructura deck.

El tiempo establecido contractualmente para la ejecución de la obra es de cuatro (4) meses, contados a partir de 24 de agosto de 2022 fecha en que se suscribió el acta de inicio.

1. DATOS GENERALES

FECHA:	24/11/2022	**INFORME No.**	**3**

PERIODO No.	3	**DEL**:	**24/10/2022**	**AL**:	**24/11/2022**

OBJETO DEL CONTRATO:	*"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA No. LP 004-2022 CON OBJETO DE CONTRATAR POR SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS ESPECIFICAS PARA LA ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO"*
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	*MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO*

2. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE:	OBRA
CONTRATO No.:	*3004-2022*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VYNSAP*
PLAZO INICIAL:	*CUATRO (4) MESES*
FECHA DE INICIO:	*24/08/2022*
FECHA DE TERMINACIÓN:	*24/12/2022*
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas*):	*CUATRO (4) MESES*
PLAZO TRANSCURRIDO:	*TRES (3) MESES*

CONTRATO DE:	OBRA
VALOR INICIAL:	*MIL OCHOCIENTOS SETANTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 1.878.582.837)*
VALOR ADICIONES:	*N/A*
VALOR ACTUALIZADO (*Incluido adiciones***):**	*MIL OCHOCIENTOS SETANTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 1.878.582.837)*

3. DATOS DE LA INTERVENTORÍA

CONTRATO DE:	**INTERVENTORÍA**
CONTRATO No.:	*3010-2022*
CONTRATISTA:	*ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO*
PLAZO INICIAL:	*CINCO (5) MESES*
FECHA DE INICIO:	*24/08/2022*
FECHA DE TERMINACIÓN:	*30 DE DICIEMBRE DE 2022*
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas***):**	*CINCO (5) MESES*
PLAZO TRANSCURRIDO:	*TRES (3) MESES*
VALOR INICIAL:	*CIENTO OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO ($108.237.938) M/CTE.,*
VALOR ADICIONES:	*N/A*
VALOR ACTUALIZADO (*Incluido adiciones***):**	*CIENTO OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO ($108.237.938) M/CTE.,*

4. NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA

NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA				
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	***Desde***	***Hasta***	***Comité técnico / fiduciario donde se aprueba***
		N/A	*N/A*	
	Prórroga a la suspensión No.	*N/A*	*N/A*	
	Reinicio No. 1	*N/A*		


NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA			
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	*N/A*		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	*N/A*	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS			
ADICIONES	*N/A*	*N/A*	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	*N/A*		

5. ACTIVIDADES DEL MES

Durante el tercer mes, se continuo la ejecución de actividades relacionadas con el encofrado y fundición de placas para los bloques de cocina y orfebrería, igualmente se realizó el encofrado del bloque de danzas. Se instalaron las divisiones de las unidades sanitarias y se inició el proceso de pintura e instalación de la estructura metálica. Por otro lado, se fundieron los pilotes de cimentación de la estructura de los tanques.

Aun así, se sigue presentando un retraso en las actividades ejecutadas respecto a las programadas de acuerdo con la programación inicial remitida por el contratista.

PROGRAMADO VS EJECUTADO

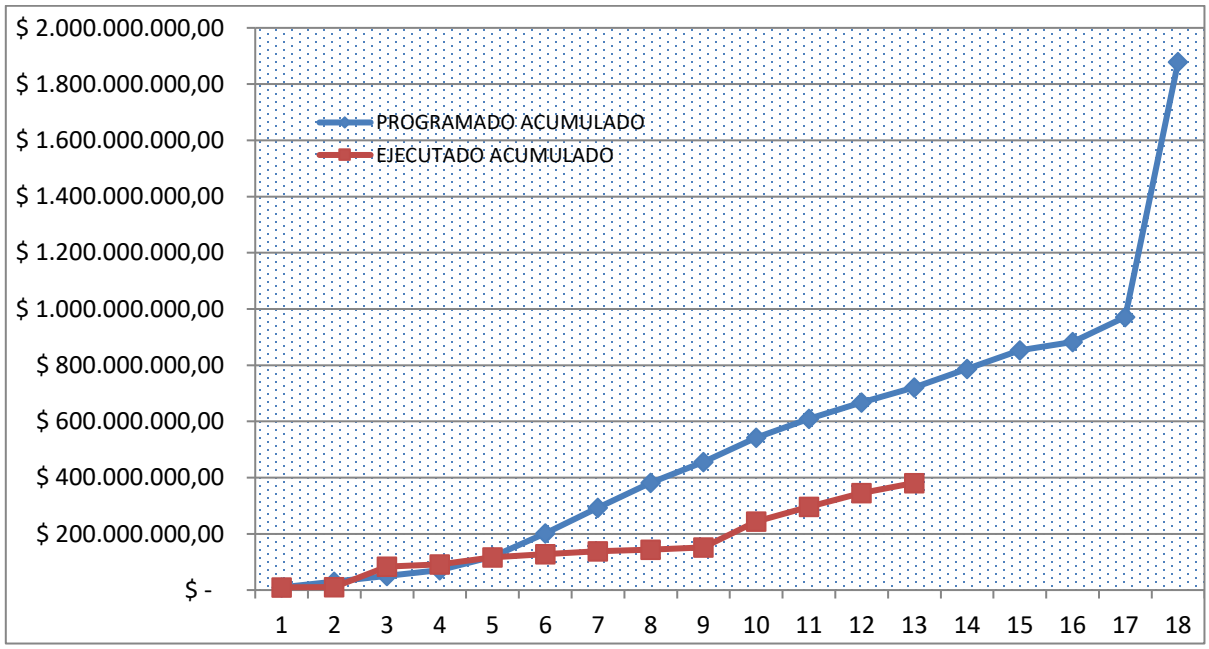

Nuevamente se evidencia un retraso significativo en la obra. Teniendo en cuenta la programación remitida por el contratista el valor ejecutado en la semana 13 correspondería a $ 721.287.766.00 M/CTE, sin embargo, este mes las actividades adelantadas no corresponden a la inversión programada, y el valor ejecutado cierra en $ 381.082.611.94 M/CTE.

Aun no se ha logrado obtener la definición de diseño de la cimentación, se espera respuesta por parte del Ministerio para ajustar la programación y que la interventoría finalmente puede dar un seguimiento real y efectivo a la ejecución de la obra.

5.1. Actividades por hitos.

MINISTERIO DE CULTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO
	CAPITULO 1: ACTIVIDADES PRELIMINARES						SEMANA 13				
1.1	Localización y replanteo.	M2	393,12	$ 11.157,00	$ 4.386.040,00		$ -	0,00%	393,12	$ 4.386.039,84	100,00%
1.2	Descapote del terreno e=0,20m	M2	403,12	$ 6.647,00	$ 2.679.539,00		$ -	0,00%	403,12	$ 2.679.538,64	100,00%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 7.065.579,00**		**$ -**	**0,00%**		**$ 7.065.578,48**	
	CAPITULO 2: CIMENTACION										
2.1	Excavacion manual	M3	49,00	$ 41.883,00	$ 2.052.267,00		$ -		87,32	$ 3.657.223,56	178%
2.2	Pilotes hincados S=25cm x 25cm (incluye excavación, Concreto 3500 psi, Acero 60000psi, Bentonita, cargue y retiro de escombros	ML	417,00	$ 171.995,00	$ 71.721.915,00		$ -		373,50	$ 64.240.132,50	90%
2.3	Demolición de cabezas de pilotes	M3	2,02	$ 561.749,00	$ 1.134.733,00		$ -		3,02	$ 1.696.481,98	150%
2.4	Concreto de limpieza (2000 psi) e=0.10m	M3	4,47	$ 373.513,00	$ 1.669.603,00		$ -		4,56	$ 1.703.219,28	102%
2.5	Zarpa o dados en concreto para amarre de pilotes hincados en concreto premesclado de 3000psi (incluye formaleta y concreto)	M3	15,91	$ 536.803,00	$ 8.540.536,00		$ -		13,95	$ 7.488.401,85	88%
2.6	Acero Zarpa de Amarre (Incluye figurado e instalación)	KG	2929,80	$ 4.939,00	$ 14.470.282,00		$ -		2945,16	$ 14.546.145,24	101%
2.7	Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye formaleteado y concreto)	M3	9,03	$ 601.049,00	$ 5.427.472,00		$ -		11,72	$ 7.044.294,28	130%
2.8	Acero Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye figurado e instalación)	KG	1838,02	$ 4.939,00	$ 9.077.981,00		$ -		1727,43	$ 8.531.776,77	94%
2.9	Viga de Amarre cimentación concreto 3000 psi (Incluye Formaleta y concreto)	M3	41,98	$ 595.979,00	$ 25.019.198,00		$ -		14,47	$ 8.623.816,13	34%
2.10	Acero viga de Amarre Cimentación (Incluye figurado e instalación)	KG	5557,46	$ 5.093,00	$ 28.304.144,00		-		4291,91	$ 21.858.697,63	77%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 167.418.131,00**		**$ -**	**0,00%**		**$ 139.390.189,22**	
	CAPITULO 3: CONCRETOS Y ACEROS										
3.1	Concreto losa maciza	M2	315,12	$ 117.085,00	$ 36.895.825,00		$ -		172,91	$ 20.245.167,35	55%
3.2	Suministro e instalación de Estructura en Acero	KG	19120,80	$ 10.791,00	$ 206.332.553,00	946,87	$ 10.217.674,17		4563,40	$ 49.243.649,40	24%
3.3	Acero placa maciza	KG	2761,00	$ 5.274,00	$ 14.561.514,00	634,25	$ 3.345.034,50		2466,22	$ 13.006.844,28	89%
3.4	Aplicación de mortero de relleno y nivelación para anclajes columnas estructura	LT	129,50	$ 9.494,00	$ 1.229.473,00		$ -	0,00%		$ -	
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 259.019.365,00**		**$ 13.562.708,67**			**$ 82.495.661,03**	
	CAPITULO 4: CUBIERTA										
4.1	Teja termoacustica	M2	450,20	$ 112.691,00	$ 50.733.488,00		$ -	0,00%		$ -	0%
4.2	Correa en Perfil metalico PHR S=12cm x 6cm	ML	424,38	$ 76.949,00	$ 32.655.617,00	193,31	$ 14.875.011,19	1,00%	193,31	$ 14.875.011,19	0%
4.3	Canoeras en lamina galvanizada cal. 20, incl. Ganchos soportes, pintura anticorrosivo y de acabado	ML	45,50	$ 51.902,00	$ 2.361.541,00		$ -	0,00%		$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 85.750.646,00**		**$ 14.875.011,19**			**$ 14.875.011,19**	
		COSTOS DIRECTOS		**%**	**$ 1.491.530.637,00**		**$ 28.437.719,86**	**1,91%**		**$ 302.566.583,52**	**20,29%**
		ADMINISTRACION		19,00%	$ 283.390.821,00		$ 5.403.166,77			$ 57.487.690,87	
		IMPREVISTOS		1,00%	$ 14.915.306,00		$ 284.377,20			$ 3.025.665,84	
		UTILIDAD		5,00%	$ 74.576.532,00		$ 1.421.885,99			$ 15.128.329,18	
		IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%	$ 14.169.541,00		$ 270.158,34			$ 2.874.382,54	
							$ 7.379.588,30			**$ 78.516.028,42**	
		SUBTOTAL COSTO INDIRECTO			**$ 387.052.200**		**$ 35.817.308,16**			**$ 381.082.611,94**	
		TOTAL			**$ 1.878.582.837**		**$ 35.817.308,16**			**$ 381.082.611,94**	

Teniendo en cuenta el anterior cuadro, 5.1 Actividades por Hitos en donde se relacionan las cantidades ejecutadas hasta la semana 13, la interventoría evidencia que el valor ejecutado en este periodo es de $ 228.890.830.26 M/CTE, correspondientes a los capítulos 2, 3, 4 y 5 (Cimentación, concretos y aceros, cubierta y muros).

5.2. Seguimiento al plan de compras

Teniendo en cuenta que la entidad aprobó la modificación de las secciones de las IPE, el contratista realizo la respectiva compra y ya está en obra parte de la estructura, igualmente se adquirió la madera correspondiente a los paneles de los bloques. Finalmente se realizó la compra e instalación de las divisiones de las unidades sanitarias.

5.3. Seguimiento al cumplimiento del cronograma

Durante este tercer mes se avanzó en las actividades de corte y figurado de aceros de vigas de cimentación, se fundieron las placas de los bloques de cocina y orfebrería y se continua con el curado de estas. Se inicio la instalación de la perfilería metálica de vigas columnas y se instalan las correas metálicas para cubiertas en el bloque de cocina. El desarrollo de las anteriores actividades corresponde al 20.29% de avance de la obra.

Al igual que los meses anteriores, no se ha podido evidenciar una programación definitiva y coherente debido a la falta de definición de varios temas técnicos que impiden el ajuste de la programación original, se continua a la espera de la entrega de estos temas por parte del Ministerio.

5.4 Seguimiento al avance financiero contrato objeto de interventoría

No. DE ACTA	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
Acta 1- (6.28%)	06/10/2022	$113.271.075.74	
Acta 2- (9.52%)	10/11/2022	$178.934.783.29	

De acuerdo con los cortes realizados a la fecha, se han efectuado dos pagos al contrato de obra.

5.5 Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría

No. DE ACTA	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
Acta 1- (6.28%)	07/10/2022	$ 6.797.343	
Acta 2- (9.52%)	10/11/2022	$ 10.304.252	

Al igual que el avance financiero del contrato de obra, se han efectuado dos pagos al contrato de interventoría de acuerdo con los cortes radicados.

5.6 Informes semanales

Se reportaron los siguientes informes semanales:

INFORMES SEMANALES	
No.	PERIODO
10	24 al 30 de octubre de 2022
11	31 de octubre al 06 de noviembre de 2022
12	07 al 13 de noviembre de 2022
13	14 al 20 de noviembre de 2022

Se anexan los cuatro informes semanales relacionados.

5.4. Plan de Calidad

Se continúa realizando las verificaciones semanalmente y aprobando los materiales que se vienen utilizando hasta el momento, los cuales hacen referencia a cemento, material de cantera,

madera y los aceros de refuerzo, de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas, y teniendo en cuenta que se esta desarrollando la actividad de estructura metálica, la interventoría solicita la verificación técnica de las soldaduras que se están realizando y la respectiva certificación de tintas de dichas soldaduras.

5.4.1. Control de inspección y ensayos:

Se realizo la respectiva revisión a los ensayos de laboratorio correspondientes a las muestras tomadas en obra de los elementos de zapatas y pedestales, se evidencia que los resultados muestran una resistencia nominal por encima de los 3000 PSI.

5.4.2. Control de Maquinaria y Equipo:

Al igual que en el mes anterior, durante este periodo se utilizaron los equipos necesarios para la fundición de placas *(mezcladora, pulidora, y herramienta menor para el amarre y figurado de hierro)*

5.5. Plan de seguridad y salud en el trabajo:

Este plan se encuentra revisado por el profesional de interventoría y se anexa el informe. *(ver anexo)*

5.6. Plan ambiental:

Nuevamente la interventoría hace las respectivas verificaciones y observaciones en los informes semanales de este periodo de acuerdo con el plan entregado inicialmente por el contratista.

6. CONTROL DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Durante este periodo no se recibió definición alguna con respecto los ajustes técnicos solicitados desde el inicio al Ministerio relacionados con la cimentación del deck.

7. IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES

En este tercer mes las actividades se vienen desarrollando de acuerdo con las cantidades contratadas y no se han generado mayores cantidades de obra, sin embargo, a medida que se ha avanzado se han tenido que realizar actividades no previstas, el contratista de acuerdo con sus obligaciones ha remitido a la interventoría dichas actividades no previstas, las cuales a la fecha se encuentran revisadas y aprobadas.

8. CONTROL DE PERSONAL

Se deja constancia de las hojas de vida aprobadas, teniendo en cuenta con lo establecido en los términos de referencia y/o documentos contractuales que soportan la contratación, las cuales se relacionan a continuación:

PERSONAL DE OBRA

INGRESO DE PERSONAL

		RELACION PERSONAL EN OBRA						Novedades
	Cedula	Nombre	ARL	EPS	AFP	Cargo		Fecha de Afiliación
1	1.085.273.318	CAMILA ALEXANDRA TELLO ROSERO	POSITIVA	SANITAS	COLPENSIONES	RESIDENTE SST		1/09/2022
2	13.054.008	EVER DE JESUS MARTINEZ CORTEZ	POSITIVA	NUEVA EPS	PROTECCION	MAESTRO		1/09/2022
3	71.787.108	JORGE ISAC SALAZAR HERRERA	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	RESIDENTE DE OBRA		1/10/2022
1	1.087.118.776	JOSE ALFREDO CAICEDO ALBAN	SURA	EMSSANAR	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA		22/09/2022
2	87.140.082	JOSE DANILO PRECIADO PRECIADO	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA		30/08/2022
6	1.087.779.147	CARLOS DANILO JIMENEZ BUILA	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA		7/09/2022
10	1.087.794.537	KEVIN ANGULO FERRIN	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA		
13	1.046.346.905	WILMER MORENO GONZALEZ	SURA	SANITAS	PORVENIR	MAESTRO		24/10/2022
14	7.062.601	LUIS ALIRIO RINCON RAMIREZ	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		24/10/2022
15	1.046.346.779	ARGILIO VILLA SABALZA	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		24/10/2022
16	1.087.207.475	CARLOS EDUARDO GONZALEZ MEZA	SURA	FAMISANAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		
17	1.121.956.280	ARNOLD DAVID LOZANNO FAJARDO	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	ORNAMENTADOR		1/11/2022
18	1.121.938.065	LUIS FERNANDO ALFONSO LEON	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	ORNAMENTADOR		1/11/2022
19	1.004.671.507	ANDRES FELIPE SINISTERRA CORTES	SURA	EMSSANAR	PORVENIR	AYUDANTE		1/11/2022
20	1.087.784.580	DARWIN SAMIR GUEVARA ARBOLEDA	SURA	EMSSANAR	PORVENIR	AYUDANTE		10/11/2022
21	1004612316	DANIEL PORTOCARRERO MONTAÑO	POSITIVA	EMSSARNAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022
22	1087193746	JAIME MANUEL CASTRO ARBOLEDA	POSITIVA	EMSSARNAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022
23	1004614676	JEAN ALEJANDRO GUERRERO NAZARENO	POSITIVA	EMSSARNAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022
24	1004608490	ALVARO JAVIER ORTIZ ZUÑIGA	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022
25	1087187312	MARIO FERNANDO HURTADO RODRIGUEZ	POSITIVA	EMSSARNAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022
26	1087201484	YOVER FERIN CASTILLO HERNANDO	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022
27	1086049372	JHON FLEIDER ORTIZ CABEZAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022
28	1004618623	DAVID ORLANDO OVIEDO ENRIQUEZ	POSITIVA	EMSSARNAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022
29	1087808819	EDWIN FABIAN JIMENEZ BUILA	POSITIVA	EMSSARNAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022
30	1087205194	CHRISTIAN GIOVANNY SEVILLANO GUEVAR	POSITIVA	EMSSARNAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022
31	1192899496	CARLOS DANIEL ESPINOSA OROBIO	POSITIVA	EMSSARNAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022

RETIRO DE PERSONAL

		RELACION PERSONAL EN OBRA					Novedades	
	Cedula	Nombre	ARL	EPS	AFP	Cargo	Fecha de Afiliación	RETIRO
1	1.085.273.318	CAMILA ALEXANDRA TELLO ROSERO	POSITIVA	SANITAS	COLPENSIONES	RESIDENTE SST	1/09/2022	
2	13.054.008	EVER DE JESUS MARTINEZ CORTEZ	POSITIVA	NUEVA EPS	PROTECCION	MAESTRO	1/09/2022	
3	71.787.108	JORGE ISAC SALAZAR HERRERA	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	RESIDENTE DE OBRA	1/10/2022	
1	1.087.118.776	JOSE ALFREDO CAICEDO ALBAN	SURA	EMSSANAR	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	22/09/2022	30/11/2022
2	87.140.082	JOSE DANILO PRECIADO PRECIADO	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	30/08/2022	30/11/2022
6	1.087.779.147	CARLOS DANILO JIMENEZ BUILA	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA	7/09/2022	30/11/2022
10	1.087.794.537	KEVIN ANGULO FERRIN	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA		
13	1.046.346.905	WILMER MORENO GONZALEZ	SURA	SANITAS	PORVENIR	MAESTRO	24/10/2022	
14	7.062.601	LUIS ALIRIO RINCON RAMIREZ	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA	24/10/2022	
15	1.046.346.779	ARGILIO VILLA SABALZA	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA	24/10/2022	
16	1.087.207.475	CARLOS EDUARDO GONZALEZ MEZA	SURA	FAMISANAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		
17	1.121.956.280	ARNOLD DAVID LOZANNO FAJARDO	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	ORNAMENTADOR	1/11/2022	
18	1.121.938.065	LUIS FERNANDO ALFONSO LEON	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	ORNAMENTADOR	1/11/2022	
19	1.004.671.507	ANDRES FELIPE SINISTERRA CORTES	SURA	EMSSANAR	PORVENIR	AYUDANTE	1/11/2022	
20	1.087.784.580	DARWIN SAMIR GUEVARA ARBOLEDA	SURA	EMSSANAR	PORVENIR	AYUDANTE	10/11/2022	16/11/2022
21	1004612316	DANIEL PORTOCARRERO MONTAÑO	POSITIVA	EMSSARNAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA	23/11/2022	23/11/2022
22	1087193746	JAIME MANUEL CASTRO ARBOLEDA	POSITIVA	EMSSARNAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA	23/11/2022	23/11/2022
23	1004614676	JEAN ALEJANDRO GUERRERO NAZARENO	POSITIVA	EMSSARNAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA	23/11/2022	23/11/2022
24	1004608490	ALVARO JAVIER ORTIZ ZUÑIGA	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA	23/11/2022	23/11/2022
25	1087187312	MARIO FERNANDO HURTADO RODRIGUEZ	POSITIVA	EMSSARNAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA	23/11/2022	23/11/2022
26	1087201484	YOVER FERIN CASTILLO HERNANDO	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA	23/11/2022	23/11/2022
27	1086049372	JHON FLEIDER ORTIZ CABEZAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA	23/11/2022	23/11/2022
28	1004618623	DAVID ORLANDO OVIEDO ENRIQUEZ	POSITIVA	EMSSARNAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA	23/11/2022	23/11/2022
29	1087808819	EDWIN FABIAN JIMENEZ BUILA	POSITIVA	EMSSARNAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA	23/11/2022	23/11/2022
30	1087205194	CHRISTIAN GIOVANNY SEVILLANO GUEVAR	POSITIVA	EMSSARNAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA	23/11/2022	23/11/2022
31	1192899496	CARLOS DANIEL ESPINOSA OROBIO	POSITIVA	EMSSARNAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA	23/11/2022	23/11/2022

PERSONAL INTERVENTORÍA

CARGO	NOMBRE DE CONTACTO	DIRECCIÓN OFICINA	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Juan Carlos Rodríguez	CRA 47ª No.95-56	25%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Abraham Yela García	CRA 47ª No.95-56	100%
PROFESIONAL HSQ	Brian David Pantoja	CRA 47ª No.95-56	100%

9. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO.

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO OBJETO DE OBRA

Póliza No.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Valor Aseg.	Expedición	Observaciones
14-44-101158678	SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	24/08/2022-24/04/2023	$ 375.716.567.40	09/09/2022	
14-44-101158678	SEGUROS DEL ESTADO	SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/08/2022-25/12/2025	$ 93.929.141.85	09/09/2022	
14-44-101158678	SEGUROS DEL ESTADO	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS	$ 375.716.567.40	09/09/2022	
14-44-101158678	SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	AMPARA 4 AÑOS, 4 MESES Y 2 DIAS	$ 375.716.567.40	09/09/2022	
14-40-101047088	SEGUROS DEL ESTADO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	24/08/2022-25/12/2022	$ 300.000.000.00	09/09/2022	
14-40-101047088	SEGUROS DEL ESTADO	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA	24/08/2022-25/12/2022	$ 300.000.000.00	09/09/2022	
14-40-101047088	SEGUROS DEL ESTADO	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	24/08/2022-25/12/2022	$ 300.000.000.00	09/09/2022	
14-40-101047088	SEGUROS DEL ESTADO	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	24/08/2022-25/12/2022	$ 300.000.000.00	09/09/2022	
14-40-101047088	SEGUROS DEL ESTADO	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	24/08/2022-25/12/2022	$ 300.000.000.00	09/09/2022	
14-40-101047088	SEGUROS DEL ESTADO	PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	24/08/2022-25/12/2022	$ 300.000.000.00	09/09/2022	

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Póliza No.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Valor Aseg.	Expedición	Observaciones
21-44-101389183	SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	25/07/2022-30/06/2023	$ 21.647.587,60	28/07/2022	
21-44-101389183	SEGUROS DEL ESTADO	SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/07/2022-30/12/2025	$ 5.411.896,90	28/07/2022	
21-44-101389183	SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD DEL SERVICIO	30/12/2022-30/12/2027	$ 21.647.587,60	28/07/2022	
21-44-101389183	SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	24/08/2022-30/07/2023	$ 21.647.587,60	07/09/2022	
21-44-101389183	SEGUROS DEL ESTADO	SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/082022-29/01/2026	$ 5.411.896,90	07/09/2022	
21-44-101389183	SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD DEL SERVICIO	29/01/2023-29/01/2028	$ 21.647.587,60	07/09/2022	

10. COMITÉS DE SEGUIMIENTO.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO		
FECHA Y No ACTA	**TEMA**	**COMPROMISOS**
No 07 **27/10/2022**	1. Reporte visita de obra y avance del proyecto	• Envió corte de obra • Definir ubicación del pozo • Gestionar aprobación relacionada con la estructura metálica • Envió al contratista definición de la plaza de los tanques y estructura de los tanques elevados • Aclarar longitud de los pilotes el tanque
No. 08 **03/11/2022**	2. Reporte avance de la semana	• Enviar levantamiento en tres dimensiones para reajuste del diseño de la estructura de los tanques • Enviar videos y fotografías de la zona posterior de la escuela taller • Gestionar reunión para revisar y definir APU del sistema de almacenamiento • Enviar al contratista definición de la estructura de la placa de los tanques y estructura de los tanques elevados, aclarar la longitud y profundidad de los pilotes • Enviar diseño de cimentación del deck
No. 09 **10/11/2022**	3. Estado actual del proceso	• Enviar factura electrónica • Enviar No Previstos • Enviar Diseño y cimentación deck • Viabilizar propuesta de ubicación del tanque, aprobar y enviar diseños • Reiterar a la coordinación de la escuela taller el tema relacionado a la pintura de la estructura metálica

Se anexan copia de actas de comités llevados a cabo en este periodo.

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se anexa el seguimiento fotografico de las actividades desarrolladas en la obra durante este periodo.





















12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

A pesar que durante el presente mes se ha incrementado el avance de la obra debido a la ejecución de forma simultánea de actividades relacionadas con el amarre de vigas y el armado

de las formaletas para la placa de contrapiso en el bloque de danzas, la fundida de placas de contrapiso e instalación de estructura metálica en los bloques de cocina y orfebrería, no ha sido posible recuperar los atrasos por cuanto aun no se ha podido iniciar con la cimentación de la totalidad del piso en deck, actividad que determina la ruta crítica del proyecto y que también se podría estar llevando a cabo desde hace tiempo.

Lo anterior teniendo en cuenta que aún no hay un pronunciamiento positivo por parte del Ministerio respectó al esclarecimiento desde lo técnico del sistema constructivo de la cimentación del piso, y en la medida que se siga retrasando esta definición como ha sucedido hasta el momento, continuara siendo incierta la fecha definitiva de terminación de la obra ya que el contratista depende de este pronunciamiento de la entidad, para realizar los ajustes necesarios, proponer un plan de contingencia y reprogramar las demás actividades que se encuentran pendientes por realizar.
Esta situación incide directamente en el avance del proceso, teniendo en cuenta que el contratista tiene que realizar la compra de materiales específicos que requieren de un tiempo prudencial para tener claro los tiempos en que se tendrían que hacer las negociaciones, dependiendo de la disposición de los proveedores y subcontratistas.

Por lo tanto, este punto y la demora en la definición de otros temas técnicos han generado que a un mes de cumplirse la entrega de la obra el contratista no va a cumplir con la obligación contractual de hacer la entrega para el veinticuatro (24) de diciembre de 2022.



ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR ASIGNADO

ANEXOS:
Informes semanales de interventoría
Bitácoras

DOCUMENTO:	INFORME DE GESTIÓN SST
CONTRATANTE:	MINISTERIO DE CULTURA
CONTRATISTA:	ENRIQUE ALFONSO TOVAR
CONTRATO DE OBRA N°:	3004 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS ESPECIFICAS PARA LA ESCUELA TALLER DE TUMACO, EN NARIÑO",
PERIODO INFORME:	24/OCTUBRE/2022 – 24/NOVIEMBRE/2022
RESPONSABLE DEL INFORME INTERVENTORIA SST OBRA	BRIAM PANTOJA

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. INTRODUCCION 3

2. OBJETIVO GENERAL 4

2.1 Objetivos específicos 4

GENERALIDADES DEL CONTRATO 5

3.1 Contrato:3004 de 2022 5

3.2 Descripción del proyecto 6

3.3 localización del proyecto 7

3.4 Estructura de la obra 8

3.5 Política SST y reglamento de higiene y seguridad industrial. 9

4. AFILICACION AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL. 10

5. INGRESO DEL PERSONAL 18

6. RETIRO DEL PERSONAL 19

7. INDICADORES DE GESTIÓN 20

8. PROGRAMA DE INSPECCION 22

9. ANEXOS 23

10. CONCLUSIONES 23

1. INTRODUCCION

La empresa “CONSORCIO VYNSAP” en cumplimiento a lo establecido en la ley 1562 de 2012 y la normatividad vigente, ha estructurado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), que tiene como propósito la aplicación de medidas de seguridad y salud en el trabajo (SST), a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.

Para su efecto, “CONSORCIO VYNSAP”, aborda la prevención de las lesiones y enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud de los trabajadores, a través de la implementación de un método lógico por etapas cuyo principio se basa en el ciclo PHVA (PLANEAR, HACER, VERIFICAR Y ACTUAR) Y que incluye una política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoria y acciones de mejora.

Este informe describe las actividades realizadas durante el periodo del 24 octubre hasta el 24 de noviembre de 2022 en cumplimiento con los parámetros establecido y la normativa vigente.

2. OBJETIVO GENERAL

Describir las actividades desarrolladas dentro del mecanismo de seguridad y salud en el trabajo respecto al desarrollo, verificación y seguimiento correspondiente del proceso desarrollado por el CONSORCIO VYNSAP, atendiendo las actividades establecidas dentro del SG-SST.

2.1 Objetivos específicos

- Verificar el cumplimiento de los requisitos expuestos en la resolución 0312 de 2019 y lo correspondientes que apliquen dentro de lo establecido en el contrato 3004 de 2022

- Describir las actividades de seguridad y salud en el trabajo del contrato 3004 de 2022 adelantadas durante el periodo comprendido 24 octubre hasta el 24 de noviembre de 2022

- Presentar documentación del personal, equipo y maquinaria que desarrolla actividades para el cumplimiento del contrato.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO

3.1 Contrato:3004 de 2022

CONTRATO No 3004 DE 2022	
Objeto	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS ESPECIFICAS PARA LA ESCUELA TALLER DE TUMACO, EN NARIÑO
Contratista	*Consorcio VYNSAP NIT 901.608.766-2*
Representante legal	*HERLEY RINCON*
Dirección	Aeropuerto – Barrio la Florida
Estado actual	*Vigente*
Estado iniciación	*Agosto 24 de 2022*
Estado de terminación	*Diciembre 29 de 2022*

3.2 Descripción del proyecto

El proyecto de la ampliación de la Escuela Taller de San Andrés de Tumaco contempla una disposición espacial de 4 módulos de 1 piso. La nueva intervención atiende la ampliación de 3 módulos más de 1 piso conservando la fachada estética de los módulos existentes.

La Escuela Taller de San Andrés de Tumaco cuenta con módulos de 1 piso con áreas de formación en cocina y restaurante, orfebrería y danza. A treves del proceso de formación los cursos técnicos de construcción han aportado en la realización de la sede.

3.3 localización del proyecto




tomado de Google Maps

Datos del distrito especial San Andrés de Tumaco

- Departamento: Nariño
- Superficie: 3760 km 2
- Altitud promedio: 2 mts
- Temperatura: 28°
- Población: habitantes 257052
- Coordenadas: 1°48´24N – 78°45´53”O
- Distancia de la capital del departamento: 1100,7 km
- Gentilicio: Tumaqueño/a

3.4 Estructura de la obra

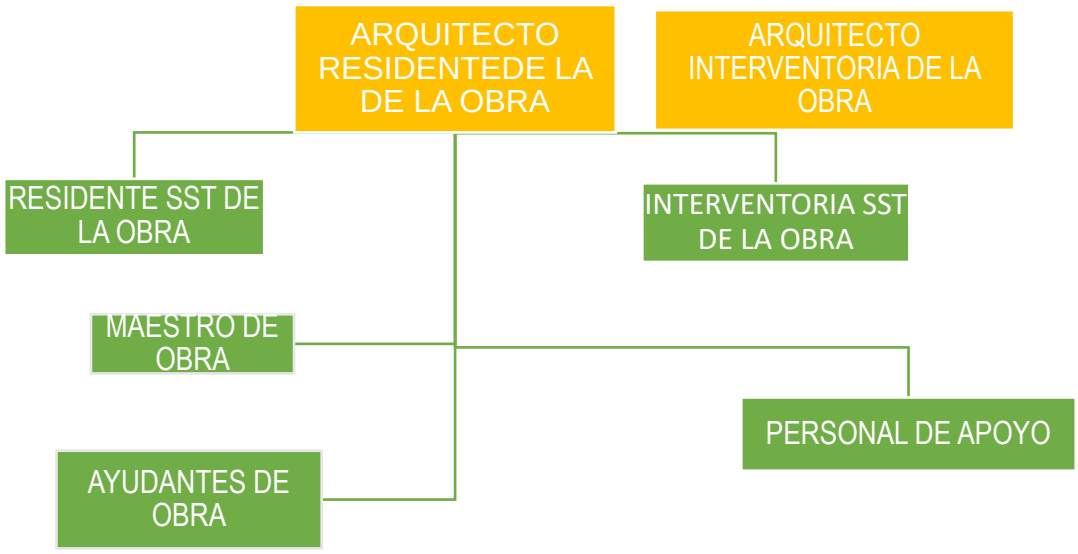

3.5 Política SST y reglamento de higiene y seguridad industrial.

Durante el periodo que se comprende desde el 24 de octubre hasta el 24 de noviembre 2022, realizó la divulgación del SG-SST al personal en obra. Realizando la inducción al personal donde se divulgó la política integral y los lineamientos del SG-SST al personal.

Observación: la divulgación de la política SST y reglamento de higiene y seguridad industrial se encuentra en la inducción del personal.

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
prevención por accidente de riesgo mecánico.	Reglas básicas de seguridad y medidas preventivas sobreesfuerzo.

 Charla de reporte de actos y condiciones inseguras	 Comunicación asertiva y trabajo en equipo

se realizaron las capacitaciones para todo el personal en obra, se dio inicio en el mes de noviembre: comunicación asertiva y trabajo en equipo, reglas básicas de seguridad y medidas preventivas sobreesfuerzo, prevención por riesgo de accidente mecánico, reporte de actos y condiciones inseguras.

Anexo 1. Registros de inducción.

A la fecha no se ha generado ninguna alteración en el ambiente laboral.

4. AFILICACION AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.

Durante el periodo que se comprende desde el 24 de octubre hasta el 24 de noviembre 2022, realizó la verificación de contratación del personal necesario para la realización de las actividades iniciales de esta etapa de ejecución de obra, acorde a la normativa vigente. Seguridad social de: interventoría, contratista VYNSAP, personal de apoyo en obra y personal de soldadura.

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1086724434
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ABRAHAM RODOLFO YELA GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUMACO	DEPARTAMENTO:	NARIÑO
DIRECCIÓN:	CL SUCRE	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO


DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4474403395**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/11/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9992265119

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 160.000
SUBTOTAL:			1	**$ 160.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 125.000
SUBTOTAL:			1	**$ 125.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 69.600
SUBTOTAL:			1	**$ 69.600**

TOTAL PAGADO:	**$ 354.600**



aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085310828		PANTOJA NOGALES BRIAM DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio Maria Auxiliadora	TUMACO-NARIÑO	7274562	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1740757235	94417144827	I	2022/11/08	2022/11/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$309,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
1	CC 1085310828	PANTOJA BRIAM	230301	30	$1,000,000	$160,000		EPS037	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0	
Total	**Afiliados(1)**				$1,000,000	$160,000				$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0	


RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$0	$0	$24,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$24,400	$0	$0	$24,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$309,400	$0	$0	$309,400

Página 1 de 1

2022/11/04 11:31 AM

El empleador liderará y se comprometerá con la aplicación de los Estándares Mínimos y la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, así como el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas para identificar las fallas y oportunidades de mejora al interior del SG-SST. (Resolución 0312 de 2019 Art.21)

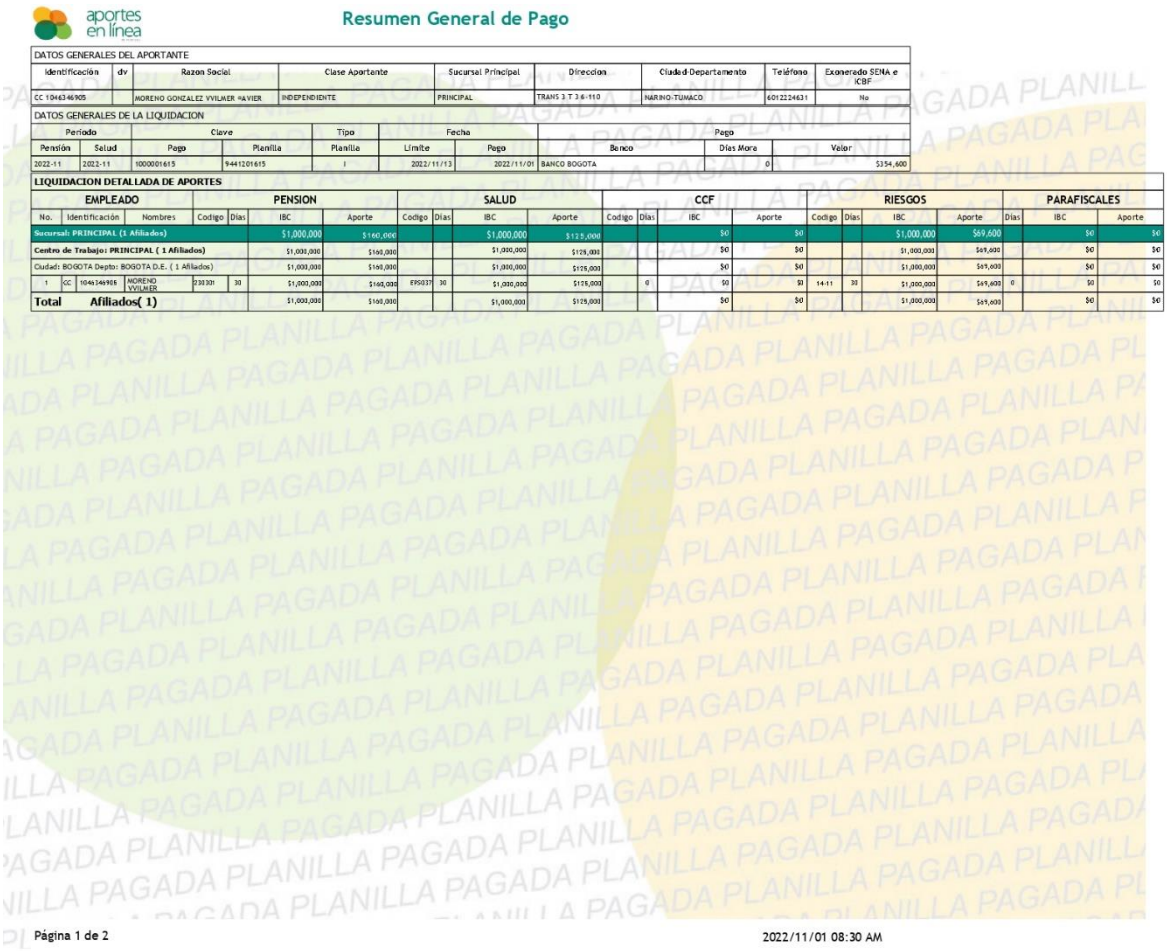

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1046346905		MORENO GONZALEZ YVILMER XAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANS 3 T 3 6-110	NARINO-TUMACO	6012224631	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1000001615	94412O1615	I	2022/11/13	2022/11/01	BANCO BOGOTA	0	$354,600


LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0
1	CC 1046346905	MORENO YVILMER	230301	30	$1,000,000	$160,000	ERS037	30	$1,000,000	$125,000	0		$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$69,600	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0

Página 1 de 2

2022/11/01 08:30 AM

El empleador liderará y se comprometerá con la aplicación de los Estándares Mínimos y la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, así como el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas para identificar las fallas y oportunidades de mejora al interior del SG-SST. (Resolución 0312 de 2019 Art.21)

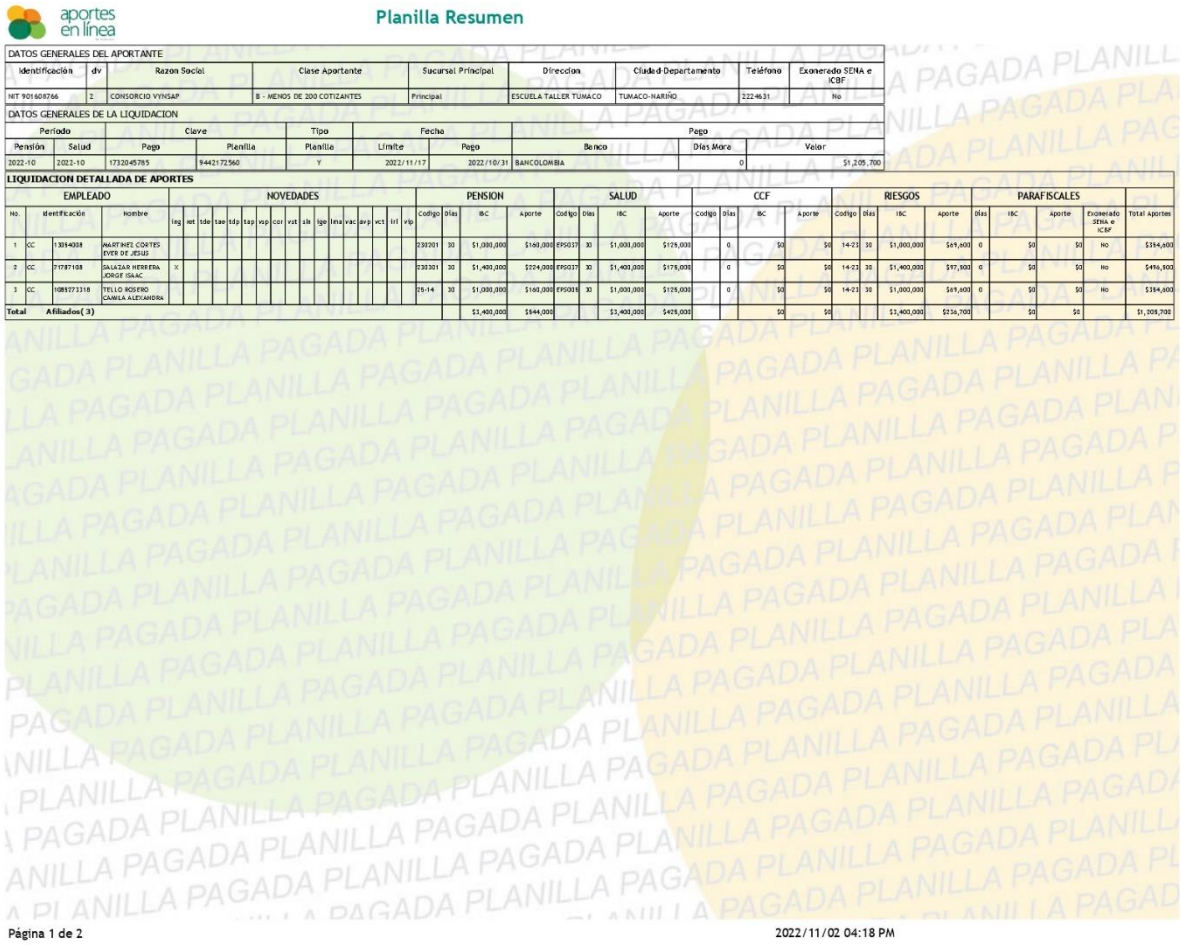

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901608766	2	CONSORCIO VYNSAP	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	ESCUELA TALLER TUMACO	TUMACO-NARIÑO	2224631	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2022-10	2022-10	1732045785	94421725 60	Y	2022/11/17	2022/10/31	BANCOLOMBIA	0	$1,205,700	


LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 13854088	MARTINEZ CORTES EVER DE JESUS																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$69,600	0	$0	$0	No	$354,600
2	CC 71787108	SALAZAR HERRERA JORGE ISAAC	X																	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	$97,600	0	$0	$0	No	$496,600
3	CC 1089773118	TELLO ROSERO CAMILA ALEJANDRA																		28-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$69,600	0	$0	$0	No	$354,600
Total Afiliados(3)																						$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$425,000			$0	$0			$3,400,000	$236,700		$0	$0		$1,205,700

Página 1 de 2

2022/11/02 04:18 PM

El empleador liderará y se comprometerá con la aplicación de los Estándares Mínimos y la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, así como el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas para identificar las fallas y oportunidades de mejora al interior del SG-SST. (Resolución 0312 de 2019 Art.21)

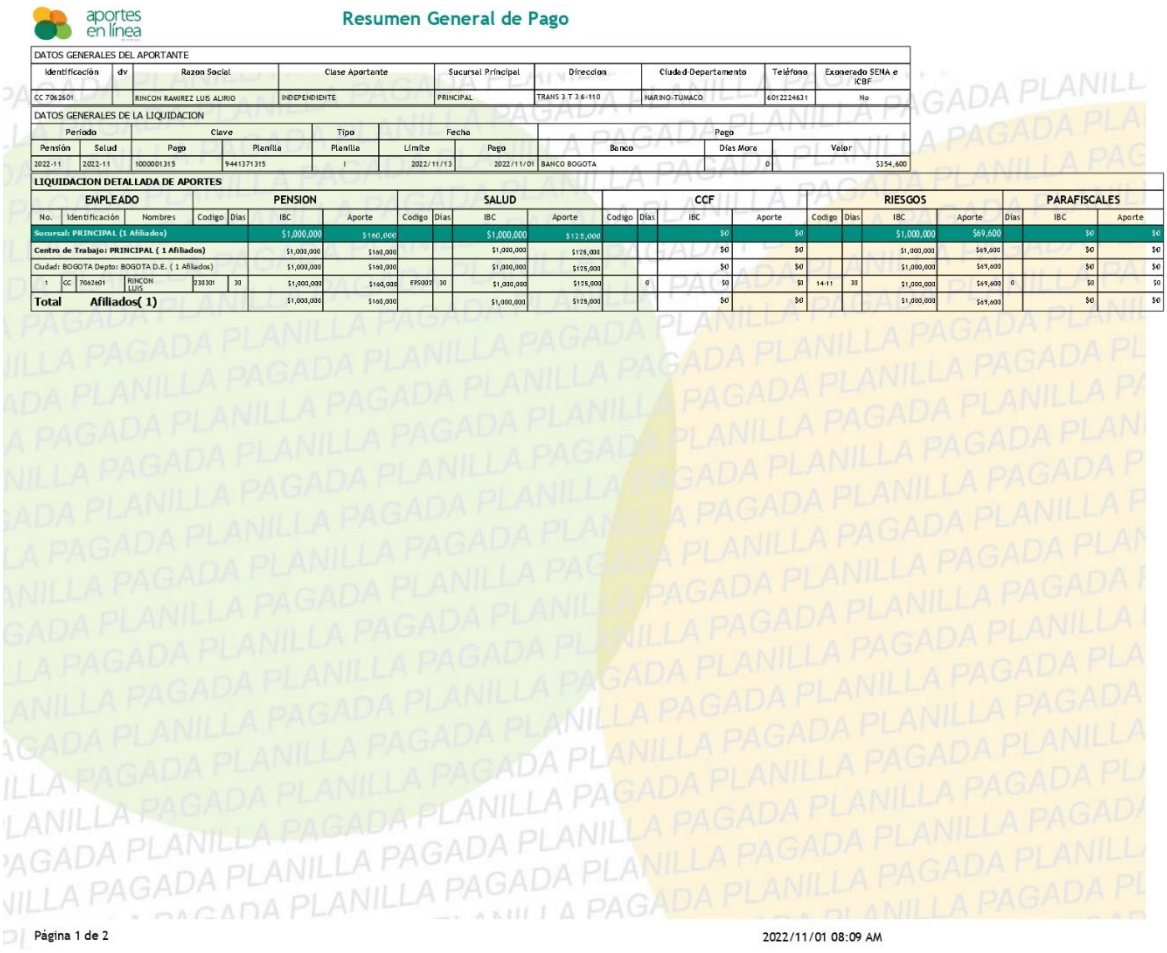

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7062601		RINCON RAMIREZ LUIS ALIRIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANS 3 T 3 6-110	NARINO-TUMACO	6012224631	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2022-11	2022-11	1000001315	94413713I5	I	2022/11/13	2022/11/01	BANCO BOGOTA	0	$354,600	


LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$129,000			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$129,000			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$129,000			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0
1	CC 7062601	RINCON LUIS	230301	30	$1,000,000	$160,000	ERS003	30	$1,000,000	$129,000	0		$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$69,600	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$129,000			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0

Página 1 de 2

2022/11/01 08:09 AM

El empleador liderará y se comprometerá con la aplicación de los Estándares Mínimos y la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, así como el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas para identificar las fallas y oportunidades de mejora al interior del SG-SST. (Resolución 0312 de 2019 Art.21)

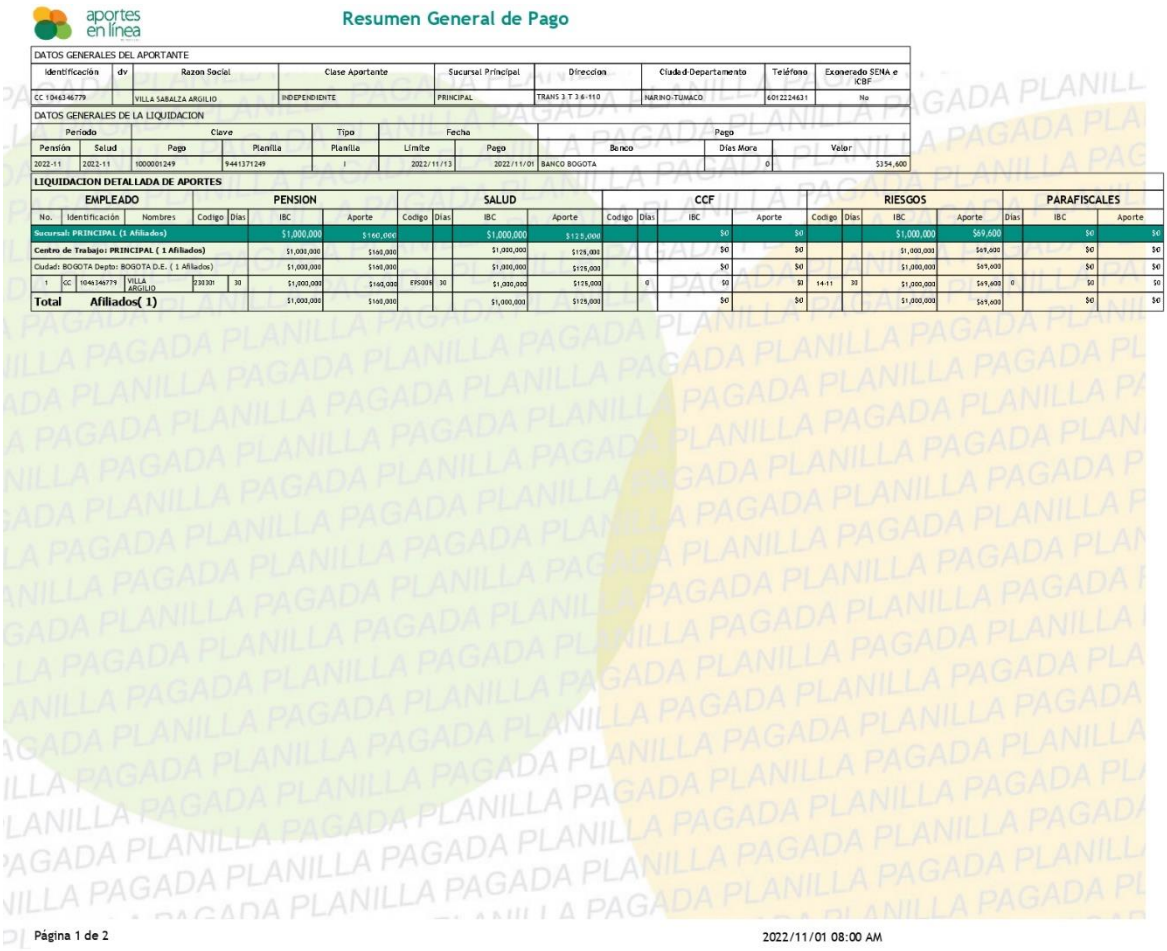

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1046346779		VILLA SABALZA ARGILIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANS 3 T 3 6-110	NARINO-TUMACO	6012224631	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1000001249	9441371249	I	2022/11/13	2022/11/01	BANCO BOGOTA	0	$354,600


LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0
1	CC 1046346779	VILLA ARGILIO	230301	30	$1,000,000	$160,000	ERS008	30	$1,000,000	$125,000	0		$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$69,600	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0

Página 1 de 2

2022/11/01 08:00 AM

El empleador liderará y se comprometerá con la aplicación de los Estándares Mínimos y la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, así como el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas para identificar las fallas y oportunidades de mejora al interior del SG-SST. (Resolución 0312 de 2019 Art.21)

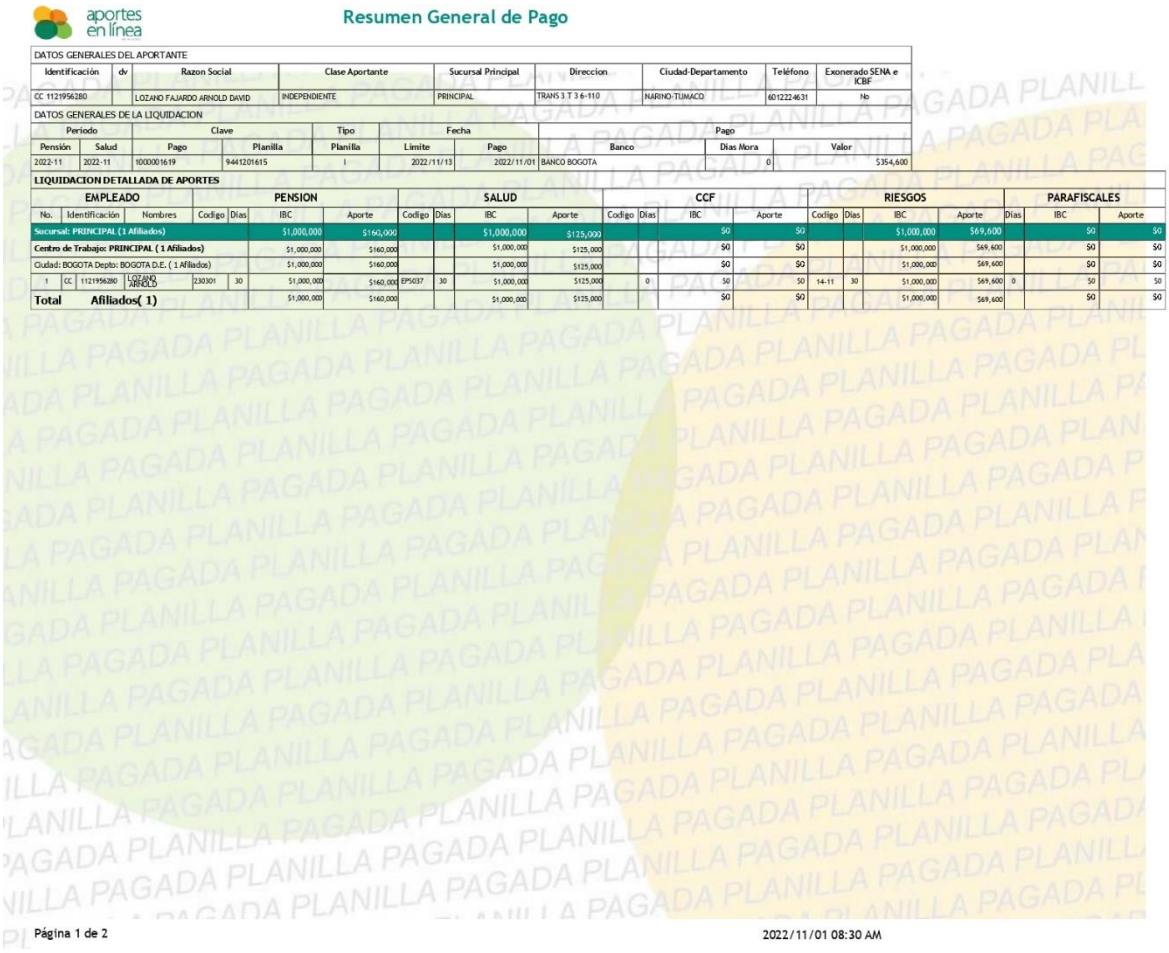

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121956280		LOZANO FAJARDO ARNOLD DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANS 3 T 3 6-110	NARIÑO-TUMACO	6012224631	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1000001619	94412O1615	I	2022/11/13	2022/11/01	BANCO BOGOTA	0	$354,600


LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0
1	CC 1121956280	LOZANO ARNOLD	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$69,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0

Página 1 de 2

2022/11/01 08:30 AM

El empleador liderará y se comprometerá con la aplicación de los Estándares Mínimos y la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, así como el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas para identificar las fallas y oportunidades de mejora al interior del SG-SST. (Resolución 0312 de 2019 Art.21)

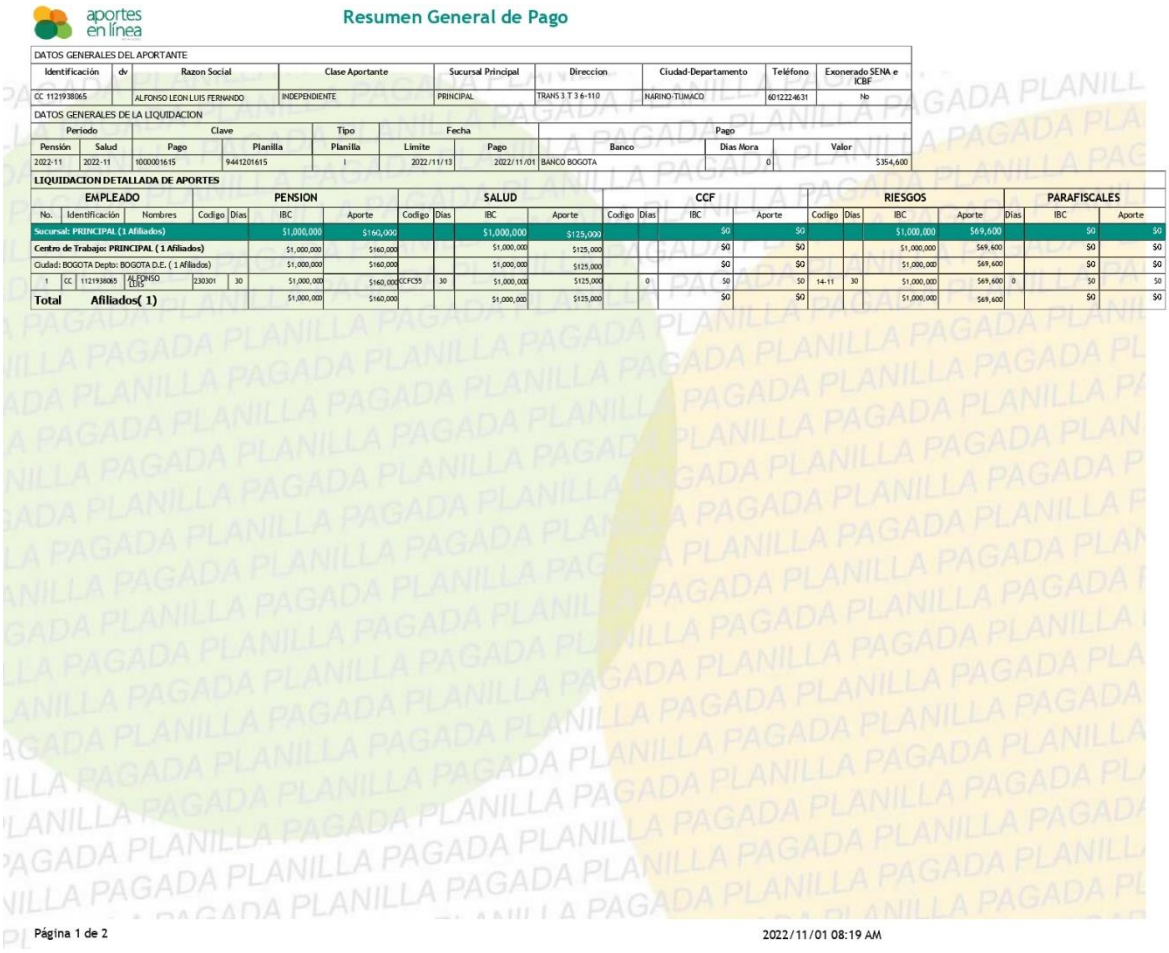

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121938065		ALFONSO LEON LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANS 3 T 3 6-110	NARINO-TUMACO	6012224631	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1000001615	9441201615	I	2022/11/13	2022/11/01	BANCO BOGOTA	0	$354,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0
1	CC 1121938065	ALFONSO LEON LUIS	230301	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$69,600	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0

Página 1 de 2

2022/11/01 08:19 AM

Anexo 2. Afiliaciones de seguridad social

5. INGRESO DEL PERSONAL

A continuación, se presenta la relación del personal que ingresó en el periodo desde el 24 de octubre hasta el 24 de noviembre 2022, y se registra la información pertinente, el personal de apoyo para el día de fundición de losa del módulo de danza.

El empleador liderará y se comprometerá con la aplicación de los Estándares Mínimos y la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, así como el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas para identificar las fallas y oportunidades de mejora al interior del SG-SST. (Resolución 0312 de 2019 Art.21)

			RELACION PERSONAL EN OBRA					Novedades
	Cedula	Nombre	ARL	EPS	AFP	Cargo		Fecha de Afiliación
1	1.085.273.318	CAMILA ALEXANDRA TELLO ROSERO	POSITIVA	SANITAS	COLPENSIONES	RESIDENTE SST		1/09/2022
2	13.054.008	EVER DE JESUS MARTINEZ CORTEZ	POSITIVA	NUEVA EPS	PROTECCION	MAESTRO		1/09/2022
3	71.787.108	JORGE ISAC SALAZAR HERRERA	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	RESIDENTE DE OBRA		1/10/2022
1	1.087.118.776	JOSE ALFREDO CAICEDO ALBAN	SURA	EMSSANAR	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA		22/09/2022
2	87.140.082	JOSE DANILO PRECIADO PRECIADO	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA		30/08/2022
6	1.087.779.147	CARLOS DANILO JIMENEZ BUILA	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA		7/09/2022
10	1.087.794.597	KEVIN ANGULO FERRIN	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA		
13	1.046.346.905	WILMER MORENO GONZALEZ	SURA	SANITAS	PORVENIR	MAESTRO		24/10/2022
14	7.062.601	LUIS ALIRIO RINCON RAMIREZ	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		24/10/2022
15	1.046.346.779	ARGILIO VILLA SABALZA	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		24/10/2022
16	1.087.207.475	CARLOS EDUARDO GONZALEZ MEZA	SURA	FAMISANAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		
17	1.121.956.280	ARNOLD DAVID LOZANNO FAJARDO	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	ORNAMENTADOR		1/11/2022
18	1.121.938.065	LUIS FERNANDO ALFONSO LEON	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	ORNAMENTADOR		1/11/2022
19	1.004.611.507	ANDRES FELIPE SINISTERRA CORTES	SURA	EMSSANAR	PORVENIR	AYUDANTE		1/11/2022
20	1.087.784.580	DARWIN SAMIR GUEVARA ARBOLEDA	SURA	EMSSANAR	PORVENIR	AYUDANTE		10/11/2022
21	1004612316	DANIEL PORTOCARRERO MONTAÑO	POSITIVA	EMSSARNAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022
22	1087193746	JAIME MANUEL CASTRO ARBOLEDA	POSITIVA	EMSSARNAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022
23	1004614676	JEAN ALEJANDRO GUERRERO NAZARENO	POSITIVA	EMSSARNAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022
24	1004608490	ALVARO JAVIER ORTIZ ZUÑIGA	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022
25	1087187312	MARIO FERNANDO HURTADO RODRIGUEZ	POSITIVA	EMSSARNAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022
26	1087201484	YOVER FERIN CASTILLO HERNANDO	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022
27	1086043972	JHON FLEIDER ORTIZ CABEZAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022
28	1004618623	DAVID ORLANDO OVIEDO ENRIQUEZ	POSITIVA	EMSSARNAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022
29	1087808819	EDWIN FABIAN JIMENEZ BUILA	POSITIVA	EMSSARNAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022
30	1087205194	CHRISTIAN GIOVANNY SEVILLANO GUEVAR	POSITIVA	EMSSARNAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022
31	1192899496	CARLOS DANIEL ESPINOSA OROBIO	POSITIVA	EMSSARNAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022

Anexo 3. Ingreso del personal

6. RETIRO DEL PERSONAL

A continuación se presenta la relación del retiro de personal desde el 24 de octubre hasta el 24 de noviembre de 2022, se realizo el retiro del personal de apoyo para fundición de losa de modulo de danzas .

A continuación, se encuentra subrayado en rojo.

			RELACION PERSONAL EN OBRA					Novedades	
	Cedula	Nombre	ARL	EPS	AFP	Cargo		Fecha de Afiliación	RETIRO
1	1.085.273.318	CAMILA ALEXANDRA TELLO ROSERO	POSITIVA	SANITAS	COLPENSIONES	RESIDENTE SST		1/09/2022	
2	13.054.008	EVER DE JESUS MARTINEZ CORTEZ	POSITIVA	NUEVA EPS	PROTECCION	MAESTRO		1/09/2022	
3	71.787.108	JORGE ISAC SALAZAR HERRERA	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	RESIDENTE DE OBRA		1/10/2022	
1	1.087.118.776	JOSE ALFREDO CAICEDO ALBAN	SURA	EMSSANAR	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA		22/09/2022	30/11/2022
2	87.140.082	JOSE DANILO PRECIADO PRECIADO	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA		30/08/2022	30/11/2022
6	1.087.779.147	CARLOS DANILO JIMENEZ BUILA	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA		7/09/2022	30/11/2022
10	1.087.794.537	KEVIN ANGULO FERRIN	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYDANTE DE OBRA			
13	1.046.346.905	WILMER MORENO GONZALEZ	SURA	SANITAS	PORVENIR	MAESTRO		24/10/2022	
14	7.062.601	LUIS ALIRIO RINCON RAMIREZ	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		24/10/2022	
15	1.046.346.779	ARGILIO VILLA SABALZA	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		24/10/2022	
16	1.087.207.475	CARLOS EDUARDO GONZALEZ MEZA	SURA	FAMISANAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA			
17	1.121.956.280	ARNOLD DAVID LOZANNO FAJARDO	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	ORNAMENTADOR		1/11/2022	
18	1.121.938.065	LUIS FERNANDO ALFONSO LEON	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	ORNAMENTADOR		1/11/2022	
19	1.004.611.507	ANDRES FELIPE SINISTERRA CORTES	SURA	EMSSANAR	PORVENIR	AYUDANTE		1/11/2022	
20	1.087.784.580	DARWIN SAMIR GUEVARA ARBOLEDA	SURA	EMSSANAR	PORVENIR	AYUDANTE		10/11/2022	16/11/2022
21	1004612316	DANIEL PORTOCARRERO MONTAÑO	POSITIVA	EMSSANAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022	23/11/2022
22	1087193746	JAIME MANUEL CASTRO ARBOLEDA	POSITIVA	EMSSANAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022	23/11/2022
23	1004614676	JEAN ALEJANDRO GUERRERO NAZARENO	POSITIVA	EMSSANAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022	23/11/2022
24	1004608490	ALVARO JAVIER ORTIZ ZUÑIGA	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022	23/11/2022
25	1087187312	MARIO FERNANDO HURTADO RODRIGUEZ	POSITIVA	EMSSANAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022	23/11/2022
26	1087201484	YOVER FERIN CASTILLO HERNANDO	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022	23/11/2022
27	1086043972	JHON FLEIDER ORTIZ CABEZAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022	23/11/2022
28	1004618623	DAVID ORLANDO OVIEDO ENRIQUEZ	POSITIVA	EMSSANAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022	23/11/2022
29	1087808819	EDWIN FABIAN JIMENEZ BUILA	POSITIVA	EMSSANAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022	23/11/2022
30	1087205194	CHRISTIAN GIOVANNY SEVILLANO GUEVAR	POSITIVA	EMSSANAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022	23/11/2022
31	1192899496	CARLOS DANIEL ESPINOSA OROBIO	POSITIVA	EMSSANAR	PORVENIR	AYUDANTE DE OBRA		23/11/2022	23/11/2022


Anexo 4. Retiro del personal.

7. INDICADORES DE GESTIÓN

En el presente periodo que se comprende desde el 24 de octubre hasta 24 de noviembre **No** se presentaron ausentismo por enfermedad laboral.

En el presente periodo que se comprende desde el 24 de octubre hasta 24 de noviembre **SI** se presentó un accidente laboral en sitio de obra, la siso residente en jornada de la mañana el día 21 de noviembre sufrió una caída fracturándose el radio de la mano derecha, ya se está realizando el proceso correspondiente.

En el presente periodo que se comprende desde el 24 de septiembre hasta 24 de octubre **No** se presentaron incidentes laborales.

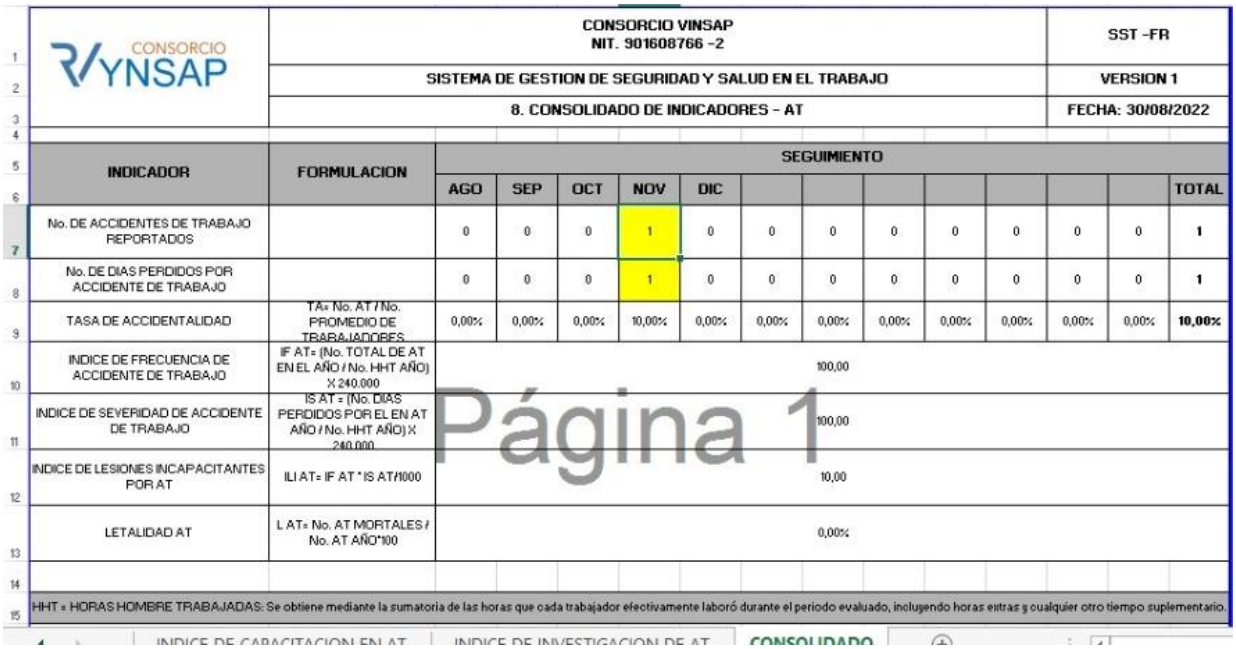


CONSORCIO VYNSAP	CONSORCIO VINSAP NIT. 901608766 -2	SST -FR
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION 1
	8. CONSOLIDADO DE INDICADORES – AT	FECHA: 30/08/2022

INDICADOR	FORMULACION	SEGUIMIENTO												
		AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								TOTAL
No. DE ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
No. DE DIAS PERDIDOS POR ACCIDENTE DE TRABAJO		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TASA DE ACCIDENTALIDAD	TA= No. AT / No. PROMEDIO DE TRABAJADORES	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**10,00%**
INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTE DE TRABAJO	IF AT= (No. TOTAL DE AT EN EL AÑO / No. HHT AÑO) X 240.000	100,00												
INDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTE DE TRABAJO	IS AT = (No. DIAS PERDIDOS POR EL EN AT AÑO / No. HHT AÑO) X 240.000	100,00												
INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES POR AT	ILI AT= IF AT * IS AT/1000	10,00												
LETALIDAD AT	L AT= No. AT MORTALES / No. AT AÑO*100	0,00%												

HHT = HORAS HOMBRE TRABAJADAS: Se obtiene mediante la sumatoria de las horas que cada trabajador efectivamente laboró durante el periodo evaluado, incluyendo horas extras y cualquier otro tiempo suplementario.

Página 1

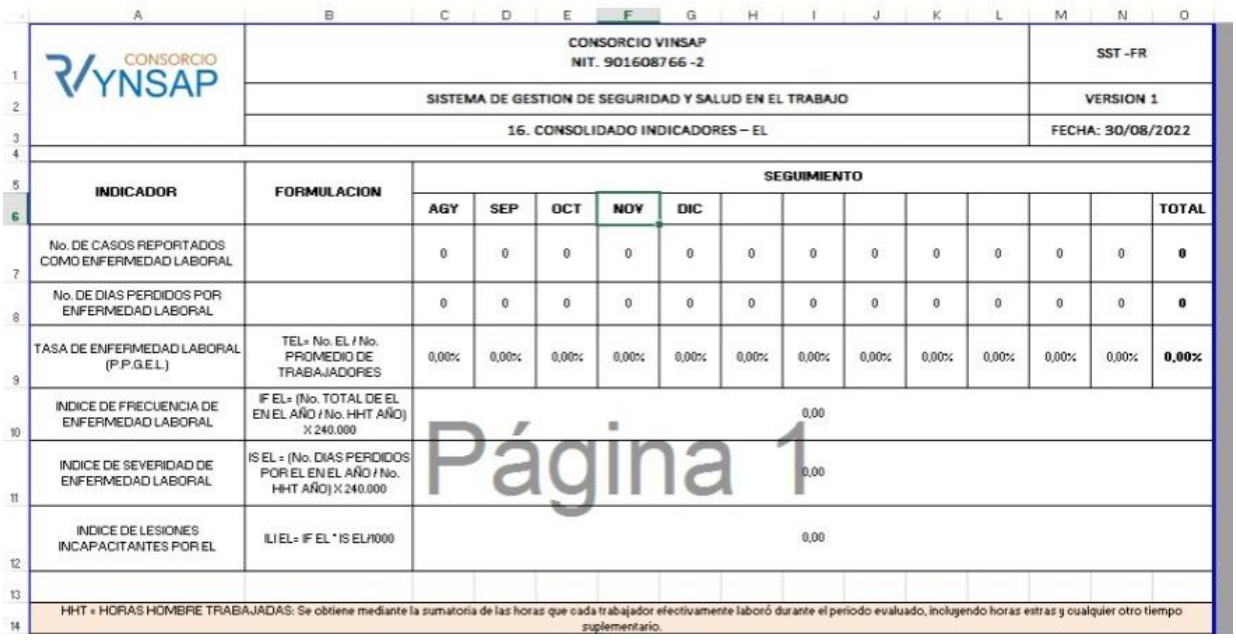

CONSORCIO VYNSAP	CONSORCIO VINSAP NIT. 901608766 -2	SST -FR
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION 1
	16. CONSOLIDADO INDICADORES – EL	FECHA: 30/08/2022

INDICADOR	FORMULACION	SEGUIMIENTO												
		AGY	SEP	OCT	NOV	DIC								TOTAL
No. DE CASOS REPORTADOS COMO ENFERMEDAD LABORAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
No. DE DIAS PERDIDOS POR ENFERMEDAD LABORAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TASA DE ENFERMEDAD LABORAL (P.P.G.E.L.)	TEL= No. EL / No. PROMEDIO DE TRABAJADORES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
INDICE DE FRECUENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL	IF EL= (No. TOTAL DE EL EN EL AÑO / No. HHT AÑO) X 240.000	0,00												
INDICE DE SEVERIDAD DE ENFERMEDAD LABORAL	IS EL = (No. DIAS PERDIDOS POR EL EN EL AÑO / No. HHT AÑO) X 240.000	0,00												
INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES POR EL	ILI EL= IF EL * IS EL/1000	0,00												

HHT = HORAS HOMBRE TRABAJADAS: Se obtiene mediante la sumatoria de las horas que cada trabajador efectivamente laboró durante el periodo evaluado, incluyendo horas extras y cualquier otro tiempo suplementario.


Página 1

Anexo 5. Indicadores de gestión

El empleador liderará y se comprometerá con la aplicación de los Estándares Mínimos y la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, así como el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas para identificar las fallas y oportunidades de mejora al interior del SG-SST. (Resolución 0312 de 2019 Art.21)

8. PROGRAMA DE INSPECCION

En este periodo se realizaron las correspondientes inspecciones de: locativas, preoperacional de maquinaria y equipos, equipos de emergencia y elementos de protección personal establecidos dentro del programa de inspecciones.

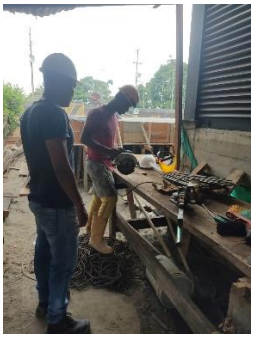REGISTRO FOTOGRAFICO	
 Inspección de obra (señalización)	 Acopio de material
 Uso correcto de los EPP	 Manejo de herramientas eléctricas (pulidora, cierra circular)

Anexo 6. Registro de inspecciones

El empleador liderará y se comprometerá con la aplicación de los Estándares Mínimos y la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, así como el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas para identificar las fallas y oportunidades de mejora al interior del SG-SST. (Resolución 0312 de 2019 Art.21)

9. ANEXOS

Anexo 1. Inducción

Anexo 2. Afiliaciones de seguridad social

Anexo 3. Ingreso del personal

Anexo 4. Retiro del personal

Anexo 5. Indicadores de gestión

Anexo 6. Registro de inspecciones

10. CONCLUSIONES

A continuación, en el periodo que se comprende desde 24 de septiembre hasta el 24 de octubre 2022.

Todo el personal cuenta con afiliaciones de seguridad social.

Todo el personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP)

Se realizan registro de asistencia y se tiene desarrollando las actividades de seguridad industrial y de higiene, de la misma forma se evidencio la accidentalidad llegando al cumplimiento de 10% lo que indica los controles de implementados en el SST.

Durante este periodo no se presentaron ausentismo por enfermedad laborales.

MINISTERIO DE CULTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

FECHA:	Semana: **10**	**24/10/2022**	**30/10/2022**	
OBJETO:	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS ESPECIFICAS PARA LA ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO**			
CONTRATO DE OBRA No.:	3004	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:**	3010	
CONTRATISTA	CONSORCIO VYNSAP	**INTEVENTOR**	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.878.582.837,00	**VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	$ 108.237.938,00	
FECHA DE INICIO OBRA:	24 DE AGOSTO DE 2022	**FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:**	24 DE AGOSTO DE 2022	
FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:	N/A	**FECHA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA:**	N/A	
FECHA DE REINICIO DE OBRA:	N/A	**FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:**	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:	24 DE DICIEMBRE DE 2022	**FECHA DE TER/CIÓN INICIAL DE IN/TORIA:**	31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NUEVE FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:	N/A	**NUEVE FECHA DE TER/CIÓN DE IN/TORIA:**	N/A	
PLAZO DE DURACIÓN OBRA:	4 MESES	**PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:**	5 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	


3. Descripción Obras ejecutadas

EN LA SEMANA 10 SE TERMINA LA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE VIGAS DE CIMENTACION DE LOSA DEL BLOQUE COCINA , SE REALIZA LA INSTALACION DE DIVISIONES PARA SANITARIOS, DUCHAS Y ORINALES, EN LÁMINA FENÓLICA SE CONTINUA CON EL CORTE E INSTALACION DE ENTABLADO EN MADERA PARA EL SOPORTE DE LOSA DEL BLOQUE DE ORFEBRERIA. SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE VARILLAS DE 5/8 EN ACERO GALVANIZADO PARA ANCLAJES DE ESTRUCTURA METALICA, LLEGA AL SITIO DE LA OBRA LA PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURAR DOS MODULOS SEGUN MANIFIESTA EL CONTRATISTA. SE CONTINUA ACTIVIDADES DE CORTE, FIGURADO Y AMARRE DE VIGAS DE AEREAS LOSA DEL BLOQUE DE ORFEBRERIA Y DANZAS . SE REALIZA LA INSTALACION DE BAJANTES HIDROSANITARIAS Y DE GAS DEL BLOQUE DE COCINA. SE REALIZA LA FUNDIDA DE LA LOSA DEL BLOQUE DE COCINA, PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD FUE NECESARIO VINCULAR MAYOR PERSONAL EL DIA SABADO AUMENTADO 6 PERSONAS LAS CUALES TRABAJARON ESPECIFICAMENTE EN ESTA PLACA.

1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de viasuales escogidos para reportar el registro fotografico semana a semana.

<ángulo visual 1>

<ángulo visual 2>



<ángulo visual 3>

<ángulo visual 4>

E Curva "S"




Gráfico porcent ejecutadas vs programadas




Gráfico cantid ejecutadas vs programadas

2. Registro Fotográfico



Visual 1



Visual 2



Visual 3



Visual 4

5. Control Avance de Obra

ESTADO DEL PLAZO	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	68	**55,28%**
	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	**$ 542.732.712,0**	**31,90%**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	**$ 244.385.362,7**	**13,01%**
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	**-$ 298.347.349,31**	**-18,89%**
Se presenta un atraso en la Obra		
ESTADO DE AVANCE EN DÍAS (Retraso)	**-23**	

6. Personal de obra e interventoria

	CARGO	CANT
INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
	PROFESIONAL HSQ	1
	CARGO	**CANT**
CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA	
	RESIDENTE DE OBRA	1
	PROFESIONAL HSQ	1
	ALMACENISTA	
	MAESTRO DE OBRA	1
	AYUDANTES	5
	OFICIALES	2
	HERREROS	
TOTAL PERSONAL VINCULADO EN OBRA		**12**

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA:


ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR


PORCENTAJES SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%
2	1,10%	1,62%	0,05%	0,57%
3	1,09%	2,71%	3,88%	4,45%
4	1,07%	3,78%	0,41%	4,86%
5	2,56%	6,34%	1,35%	6,21%
6	4,42%	10,76%	0,58%	6,79%
7	4,81%	15,57%	0,57%	7,36%
8	7,75%	23,32%	0,29%	7,65%
9	3,92%	27,24%	0,45%	8,10%
10	4,66%	31,90%	4,91%	13,01%
11	3,55%	35,45%		
12	3,07%	38,52%		
13	2,88%	41,40%		
14	2,49%	43,89%		
15	3,53%	47,42%		
16	1,55%	48,97%		
17	4,37%	53,34%		
18	46,66%	100,00%		

CANTIDADES SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	$ 9.762.565,00	$ 9.762.565,00	$ 9.780.498,05	$ 9.780.498,05
2	$ 20.705.168,00	$ 30.467.733,00	$ 1.007.556,30	$ 10.788.054,34
3	$ 20.388.155,00	$ 50.855.888,00	$ 72.840.833,43	$ 83.628.887,78
4	$ 20.147.663,00	$ 71.003.551,00	$ 7.736.604,85	$ 91.365.492,63
5	$ 48.113.256,00	$ 119.116.807,00	$ 25.297.356,79	$ 116.662.849,42
6	$ 83.049.878,00	$ 202.166.685,00	$ 10.810.856,23	$ 127.473.705,66
7	$ 90.275.460,00	$ 292.442.145,00	$ 10.741.797,67	$ 138.215.503,33
8	$ 89.149.998,00	$ 381.592.143,00	$ 5.529.681,41	$ 143.745.184,73
9	$ 73.595.606,00	$ 455.187.749,00	$ 8.446.596,95	$ 152.191.781,69
10	$ 87.544.963,00	$ 542.732.712,00	$ 92.193.581,00	$ 244.385.362,69
11	$ 66.715.538,00	$ 609.448.250,00		
12	$ 57.664.344,00	$ 667.112.594,00		
13	$ 54.175.172,00	$ 721.287.766,00		
14	$ 65.572.294,00	$ 786.860.060,00		
15	$ 66.369.512,00	$ 853.229.572,00		
16	$ 29.208.430,00	$ 882.438.002,00		
17	$ 88.908.022,00	$ 971.346.024,00		
18	$ 907.236.814,00	$ 1.878.582.838,00		

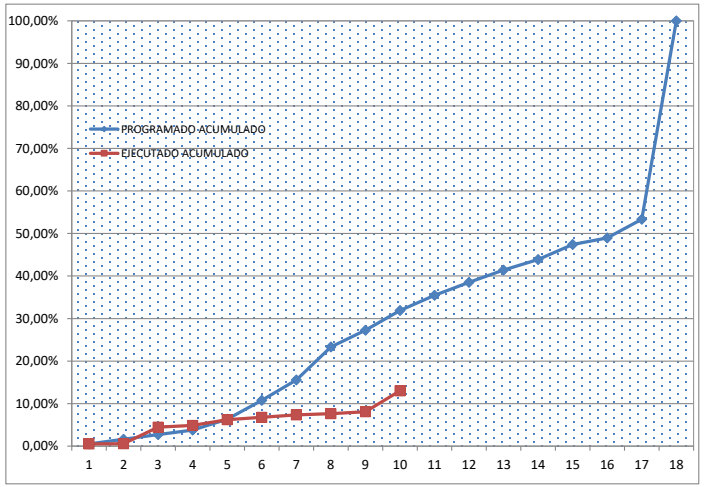

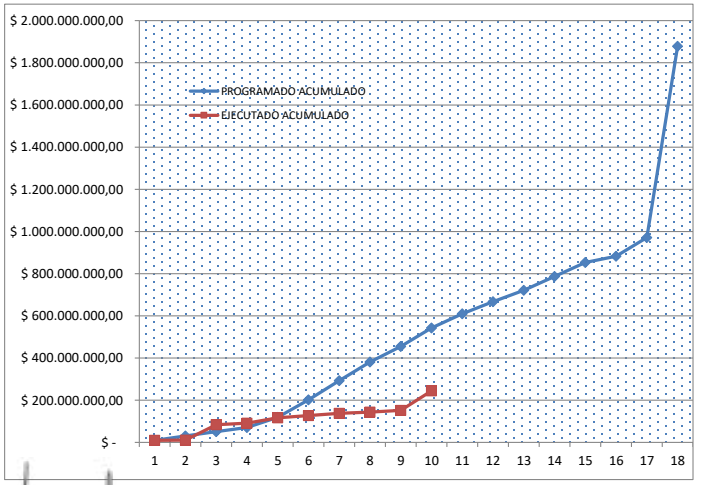

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

ANEXO 3

Proyecto Nº.	3004 de 2022	
Interventor:	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	
Constructor:	CONSORCIO VYNSAP	
Semana Reportada:	10	
Perido de Informe:	24/10/2022	30/10/2022

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS



Almacenamiento de madera para actividades de encofrado.



Corte de madera para encofrado de losa en el modulo de cocina.

2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA



Disposición por parte del contratista para el almacenamiento de residuos de madera en la parte posterior del bloque de cocina. Se reutilizan madera para encoframiento de los otros modulos.





Disposición por parte del contratista para el almacenamiento de residuos de sacos de cemento, la empresa del municipo hace disposicion para el desalojo dicho de residuo en sitio de obra.

3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.

No se ha realizado actividades que se requiera adquisición de materiales para relleno.

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentia y Residuales

N/A

5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas

Se realizó la captación de agua por medio de bombeo con electrobomba en pozo profundo para la fundición de losa en el modulo de cocina.

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:

	De acuerdo con lo diseños enviados por el ministerio, ya esta definido el cerramiento propuesto para mitigar la afectaccion negativa de los desechos sobre el manglar.

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

ANEXO 4

Proyecto Nº.		
Interventor:	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	
Constructor:	CONSORCIO VYNSAP	
Semana Reportada:	10	
Perido de Informe:	24/10/2022	30/10/2022

REPORTE DE LA GESTION DE CALIDAD

1. CALIDAD DE MATERIALES

La interventoría Certifica la Calidad de los Materiales utilizados en la obra.
Según Formato No. _____

SI	**NO**
x	

Liste los materiales a los cuales se les verificó el cumplimiento de los standares exigidos de Calidad:
ACERO, AGREGADOS, CEMENTO, MADERA PARA FORMALETAS

2. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

La interventoría Certifica la calibración de Equipos utilizados en obra.
Según Formato No. _____

SI	**NO**
x	

Enumere los equipos calibrados: PULIDORA, TROMPO Y RANA

3. ENSAYOS

La interventoría certifica la realización de los ensayos necesarios para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales.
Según Formato No. _____

SI	**NO**
x	

Liste los ensayos realizados para la verificación de la Calidad de los materiales:

Nuevamente se solicita al contratista los resultados de laboratorios de los concretos, la interventoria aun se encuentra a la espera de estos para la verificacion final de la resistencia de los concretos utilizados en pilotes, dados y pedestales.

























MINISTERIO DE CULTURA	SECRETARIA GENERAL MINISTERIO DE CULTURA FORMATO DE PRESUPUESTO

INFORMACION BASICA			
FECHA REG.	24 DE OCTUBRE HASTA EL 30 DE OCTUBRE	DEPARTAMENTO	NARIÑO
SEMANA No.	10	OBJETO	PUBLICO - EDUCACIONAL - CULTURAL
NOMBRE DEL INMUEBLE O SEDE		ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO	

BALANCE DE OBRA

MINISTERIO DE CULTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO
	CAPITULO 1: ACTIVIDADES PRELIMINARES						SEMANA 10				
1.1	Localización y replanteo.	M2	393,12	$ 11.157,00	$ 4.386.040,00		$ -	0,00%	393,12	$ 4.386.039,84	100,00%
1.2	Descapote del terreno e=0,20m	M2	403,12	$ 6.647,00	$ 2.679.539,00		$ -	0,00%	403,12	$ 2.679.538,64	100,00%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 7.065.579,00**		**$ -**	**0,00%**		**$ 7.065.578,48**	
	CAPITULO 2: CIMENTACION										
2.1	Excavacion manual	M3	49,00	$ 41.883,00	$ 2.052.267,00		$ -	0,00%	49,00	$ 2.052.267,00	100%
2.2	Pilotes hincados S=25cm x 25cm (incluye excavación, Concreto 3500 psi, Acero 60000psi, Bentonita, cargue y retiro de escombros	ML	417,00	$ 171.995,00	$ 71.721.915,00		$ -	0,00%	373,50	$ 64.240.132,50	90%
2.3	Demolición de cabezas de pilotes	M3	2,02	$ 561.749,00	$ 1.134.733,00		$ -	0,00%	1,56	$ 876.328,44	77%
2.4	Concreto de limpieza (2000 psi) e=0.10m	M3	4,47	$ 373.513,00	$ 1.669.603,00		$ -	0,00%	1,37	$ 511.712,81	31%
2.5	Zarpa o dados en concreto para amarre de pilotes hincados en concreto premesclado de 3000psi (incluye formaleta y concreto)	M3	15,91	$ 536.803,00	$ 8.540.536,00		$ -	0,00%	13,43	$ 7.209.264,29	84%
2.6	Acero Zarpa de Amarre (Incluye figurado e instalación)	KG	2929,80	$ 4.939,00	$ 14.470.282,00		$ -	0,00%	2465,72	$ 12.178.191,08	84%
2.7	Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye formaleteado y concreto)	M3	9,03	$ 601.049,00	$ 5.427.472,00		$ -	0,00%	11,72	$ 7.044.294,28	130%
2.8	Acero Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye figurado e instalación)	KG	1838,02	$ 4.939,00	$ 9.077.981,00		$ -	0,00%	1087,32	$ 5.370.273,48	59%
2.9	Viga de Amarre cimentación concreto 3000 psi (Incluye Formaleta y concreto)	M3	41,98	$ 595.979,00	$ 25.019.198,00	11,78	$ 7.020.632,62	0,47%	11,78	$ 7.020.632,62	28%
2.10	Acero viga de Amarre Cimentación (Incluye figurado e instalación)	KG	5557,46	$ 5.093,00	$ 28.304.144,00		$ -	0,00%	2805,23	$ 14.287.036,39	50%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 167.418.131,00**		**$ 7.020.632,62**	**0,47%**		**$ 120.790.132,89**	
	CAPITULO 3: CONCRETOS Y ACEROS										
3.1	Concreto losa maciza	M2	315,12	$ 117.085,00	$ 36.895.825,00	103,12	$ 12.073.805,20	0,81%	103,12	$ 12.073.805,20	33%
3.2	Suministro e instalación de Estructura en Acero	KG	19120,80	$ 10.791,00	$ 206.332.553,00			0,00%		$ -	
3.3	Acero placa maciza	KG	2761,00	$ 5.274,00	$ 14.561.514,00	743,04	$ 3.918.792,96	0,26%	743,04	$ 3.918.792,96	
3.4	Aplicación de mortero de relleno y nivelación para anclajes columnas estructura de	LT	129,50	$ 9.494,00	$ 1.229.473,00			0,00%			
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 259.019.365,00**		**$ 15.992.598,16**			**$ 15.992.598,16**	
	CAPITULO 4: CUBIERTA										
4.1	Teja termoacustica	M2	450,20	$ 112.691,00	$ 50.733.488,00		$ -	0,00%		$ -	0%
4.2	Correa en Perfil metalico PHR S=12cm x 6cm	ML	424,38	$ 76.949,00	$ 32.655.617,00		$ -	0,00%		$ -	0%
4.3	Canoeras en lamina galvanizada cal. 20, incl. Ganchos soportes, pintura anticorrosivo y de acabado	ML	45,50	$ 51.902,00	$ 2.361.541,00		$ -	0,00%		$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 85.750.646,00**		**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 5: MUROS										
5.1	Perfil en acero galvanizado base 9 para muros	M2	171,00	$ 30.326,00	$ 5.185.746,00		$ -	0,00%		$ -	0%
5.2	Lamina en SUPERBOARD para muros	M2	114,30	$ 49.239,00	$ 5.628.018,00		$ -	0,00%		$ -	0%
5.3	Muro persiana con listones en madera s=11cm x 2cm	M2	195,00	$ 357.473,00	$ 69.707.235,00		$ -	0,00%		$ -	0%
5.4	Muro doble en Drywall	M2	45,00	$ 84.472,00	$ 3.801.240,00		$ -	0,00%		$ -	0%
5.5	Pintura muros en vinilo tipo 1	M2	125,00	$ 11.290,00	$ 1.411.250,00		$ -	0,00%		$ -	0%
5.6	Aplicación imprimante para proteccion de muros, puertas y ventanas en madera sapan,	M2	308,00	$ 28.634,00	$ 8.819.272,00		$ -	0,00%		$ -	0%
5.7	Riel en acero para puerta - ventana plegable (incluye riel superior e inferior)	ML	56,00	$ 105.628,00	$ 5.915.168,00		$ -	0,00%		$ -	0%
5.8	Divisiones para sanitarios, duchas y orinales, en lámina fenólica (incluye instalación) h=1.50 m	GL	1,00	$ 50.185.325,00	$ 50.185.325,00	1,00	$ 50.185.325,00	3,36%	1,00	$ 50.185.325,00	100%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 150.653.254,00**		**$ 50.185.325,00**			**$ 50.185.325,00**	
	COSTOS DIRECTOS		**%**		**$ 1.491.530.637,00**		**$ 73.198.555,78**	**4,91%**		**$ 194.033.634,53**	**13,01%**
	ADMINISTRACION		19,00%		$ 283.390.821,00		$ 13.907.725,60			$ 36.866.390,56	
	IMPREVISTOS		1,00%		$ 14.915.306,00		$ 731.985,56			$ 1.940.336,35	
	UTILIDAD		5,00%		$ 74.576.532,00		$ 3.659.927,79			$ 9.701.681,73	
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		$ 14.169.541,00		$ 695.386,28			$ 1.843.319,53	
							$ 18.995.025,22			**$ 50.351.728,16**	
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO				**$ 387.052.200**		**$ 92.193.581,00**			**$ 244.385.362,69**	
	TOTAL				**$ 1.878.582.837**		**$ 92.193.581,00**			**$ 244.385.362,69**	

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

MINISTERIO DE CULTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No.	**10**				
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	24/10/2022	**Y EL**	30/10/2022	**PLAZO:**	55
CONTRATISTA:	CONSORCIO VYNSAP			**CONTRATO No.**	3004
INTERVENTOR:	ENRIQUEALONSO TOVAR BAQUERO			**CONTRATO No.**	3010

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES OCTUBRE																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
CARGO																															
DIRECTOR																															
ESPECIALISTAS																															
RESIDENTE																								4	4	4	4	4	4		
MAESTRO DE OBRA																								1	1	1	1	1	1		
OFICIAL																								2	2	2	2	2	6		
AYUDANTE																								5	5	5	5	5	9		
PERSONAL CONTRATISTA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**20**	**0**	**0**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBRA

NOMBRE	CARGO	DEDICACION
HERLEY RINCON LEGUIZAMON	DIRECTOR DE OBRA	%
JORGE SALAZAR	RESIDENTE DE OBRA	100%
CAMILA TELLO ROSERO	PROFESIONAL HSQ	100%
EVER DE JESUS MARTINEZ CORTEZ	MAESTRO	100%
JOSE ALFREDO CAICEDO ALBAN	AYUDANTE DE OBRA	100%
JOSE DANILO PRECIADO PRECIADO	AYUDANTE DE OBRA	100%
NAYDER ALEXIS VALVERDE VALENCIA	AYUDANTE DE OBRA	100%
BRAYAN DAVID CABEZAS QUIÑONES	AYUDANTE DE OBRA	100%
CARLOS DANILO JIMENES BUILA	AYUDANTE DE OBRA	100%
ELLIN ALEJANDRO GRANJA TORRES	AYUDANTE DE OBRA	100%
LUIS ANGEL CHINGAL JARAMILLO	AYUDANTE DE OBRA	100%

INTERVENTORIA

NOMBRE	CARGO	DEDICACION
JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	25%
ABRAHAM YELA GARCIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%
BRIAM DAVID PANTOJA	PROFESIONAL HSQ	100%

MINISTERIO DE CULTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado


FECHA:	Semana: 11	31/10/2022	6/11/2022	
OBJETO:	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS ESPECIFICAS PARA LA ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO**			
CONTRATO DE OBRA No.:	3004	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:**	3010	
CONTRATISTA	CONSORCIO VYNSAP	**INTEVENTOR**	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.878.582.837,00	**VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	$ 108.237.938,00	
FECHA DE INICIO OBRA:	24 DE AGOSTO DE 2022	**FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:**	24 DE AGOSTO DE 2022	
FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:	N/A	**FECHA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA:**	N/A	
FECHA DE REINICIO DE OBRA:	N/A	**FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:**	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:	24 DE DICIEMBRE DE 2022	**FECHA DE TER/CIÓN INICIAL DE IN/TORIA:**	31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NUEVE FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:	N/A	**NUEVE FECHA DE TER/CIÓN DE IN/TORIA:**	N/A	
PLAZO DE DURACIÓN OBRA:	4 MESES	**PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:**	5 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	

3. Descripción Obras ejecutadas

SE REALIZA EL CURADO DE LOSA BLOQUE COCINA, SE TERMINA LA INSTALACION DE ENTABLADO EN MADERA PARA EL SOPORTE DE LOSA DEL BLOQUE DE ORFEBRERIA, SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE VARILLAS DE 5/8 EN ACERO GALVANIZADO PARA ANCLAJES DE ESTRUCTURA METALICA, SE TERMINA EL AMARRE DE VIGAS Y LOSA DEL BLOQUE DE ORFEBRERIA. SE INICIAN CON LA LIMPIEZA DE PERFILES METALICOS, SE REALIZA CERRAMIENTO PROVISIONAL DEL SITIO DONDE TRABAJARAN LOS SOLDADORES, PARA EVITAR QUE LA PINTURA DE LOS PERFILES SE PROPAGUE PARA EL AREA DE LA COCINA DE ESCUELA TALLER, IGUALMENTE INICIAN TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA DE LOS PERFILES METALICOS, SE REALIZA FUNDICION DE VIGAS Y LOSA DEL BLOQUE DE ORFEBRERIA, SE CONTINUA CON EL CORTE, FIGURADO Y AMARRE DE VIGAS DE DANZAS PARA LA FUNDICION DE LOSA FUE NECESARIO VINCULAR MAYOR PERSONAL EL DIA SABADO AUMENTADO 4 PERSONAS ESPECIFICAMENTE PARA ESTA ACTIVIDAD.

1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de viasuales escogidos para reportar el registro fotografico semana a semana.

<ángulo visual 1>



<ángulo visual 2>

<ángulo visual 3>

<ángulo visual 4>

E Curva "S"




Gráfico porcent ejecutadas vs programadas




Gráfico cantid ejecutadas vs programadas

2. Registro Fotográfico



Visual 1



Visual 2



Visual 3



Visual 4

5. Control Avance de Obra

ESTADO DEL PLAZO	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	75	**60,98%**
	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	**$ 609.448.250,0**	**35,45%**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	**$ 266.619.665,5**	**14,19%**
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	**-$ 342.828.584,51**	**-21,26%**
Se presenta un atraso en la Obra		
ESTADO DE AVANCE EN DÍAS (Retraso)	**-26**	

6. Personal de obra e interventoria

	CARGO	CANT
INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
	PROFESIONAL HSQ	1
	CARGO	**CANT**
CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA	
	RESIDENTE DE OBRA	1
	PROFESIONAL HSQ	1
	ALMACENISTA	
	MAESTRO DE OBRA	1
	AYUDANTES	5
	OFICIALES	2
	HERREROS	6
TOTAL PERSONAL VINCULADO EN OBRA		**18**

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA:


ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR


PORCENTAJES SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%
2	1,10%	1,62%	0,05%	0,57%
3	1,09%	2,71%	3,88%	4,45%
4	1,07%	3,78%	0,41%	4,86%
5	2,56%	6,34%	1,35%	6,21%
6	4,42%	10,76%	0,58%	6,79%
7	4,81%	15,57%	0,57%	7,36%
8	7,75%	23,32%	0,29%	7,65%
9	3,92%	27,24%	0,45%	8,10%
10	4,66%	31,90%	4,91%	13,01%
11	3,55%	35,45%	1,18%	14,19%
12	3,07%	38,52%		
13	2,88%	41,40%		
14	2,49%	43,89%		
15	3,53%	47,42%		
16	1,55%	48,97%		
17	4,37%	53,34%		
18	46,66%	100,00%		

CANTIDADES SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	$ 9.762.565,00	$ 9.762.565,00	$ 9.780.498,05	$ 9.780.498,05
2	$ 20.705.168,00	$ 30.467.733,00	$ 1.007.556,30	$ 10.788.054,34
3	$ 20.388.155,00	$ 50.855.888,00	$ 72.840.833,43	$ 83.628.887,78
4	$ 20.147.663,00	$ 71.003.551,00	$ 7.736.604,85	$ 91.365.492,63
5	$ 48.113.256,00	$ 119.116.807,00	$ 25.297.356,79	$ 116.662.849,42
6	$ 83.049.878,00	$ 202.166.685,00	$ 10.810.856,23	$ 127.473.705,66
7	$ 90.275.460,00	$ 292.442.145,00	$ 10.741.797,67	$ 138.215.503,33
8	$ 89.149.998,00	$ 381.592.143,00	$ 5.529.681,41	$ 143.745.184,73
9	$ 73.595.606,00	$ 455.187.749,00	$ 8.446.596,95	$ 152.191.781,69
10	$ 87.544.963,00	$ 542.732.712,00	$ 92.193.581,00	$ 244.385.362,69
11	$ 66.715.538,00	$ 609.448.250,00	$ 22.234.302,80	$ 266.619.665,49
12	$ 57.664.344,00	$ 667.112.594,00		
13	$ 54.175.172,00	$ 721.287.766,00		
14	$ 65.572.294,00	$ 786.860.060,00		
15	$ 66.369.512,00	$ 853.229.572,00		
16	$ 29.208.430,00	$ 882.438.002,00		
17	$ 88.908.022,00	$ 971.346.024,00		
18	$ 907.236.814,00	$ 1.878.582.838,00		

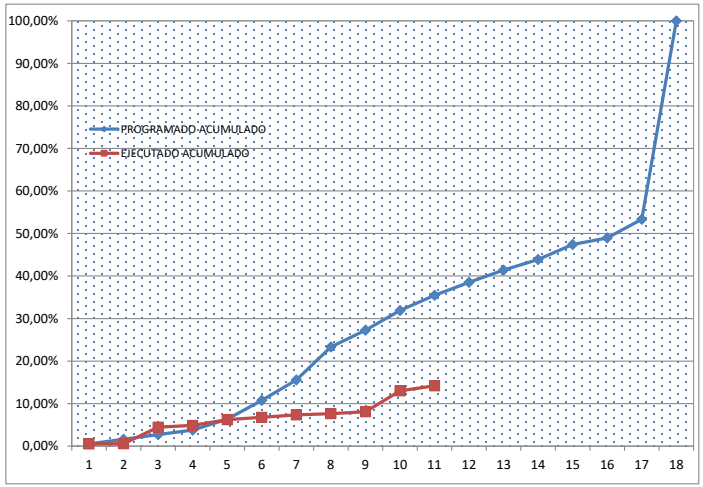

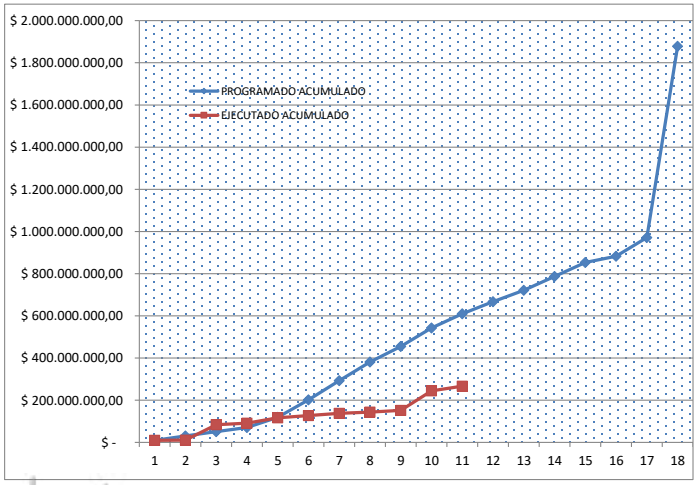

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

ANEXO 3

Proyecto Nº.	3004 de 2022	
Interventor:	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	
Constructor:	CONSORCIO VYNSAP	
Semana Reportada:	11	
Perido de Informe:	31/10/2022	6/11/2022

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS



Corte de madera para enconfrado de losa en el modulo de orfebreria



Fundicion de losa del modulo de orfebreria.

2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA



Disposición por parte del contratista para el almacenamiento de residuos de madera en la parte posterior del bloque de cocina. Se reutilizan madera para encoframiento de los otros modulos.



Disposición por parte del contratista para el almacenamiento de residuos de sacos de cemento, la empresa municipal de aseo realiza el desalojo dicho de residuo en sitio de obra.

3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.

No se ha reaizado actividades que se requiera adquisición de materiales para relleno.

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentia y Residuales

N/A

5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas

No se realizó la captación de agua por medio de bombeo con electrobomba en pozo profundo ya para la fundicion del losa en el modulo de orfebreria

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:



Se identifica un impacto ambiental negativo en la parte posterior de obra en zona de manglar cerca al modulo de cocina, la ausencia del cerramiento permite el ingreso y acumulación de residuos en grandes cantidades debido al arrastre del mar. en consecuencia a esta situacion se presenta adescomposición lenta con baja presencia de oxígeno generando malos olores y emanación de gases contaminantes.

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

ANEXO 4

Proyecto Nº.		
Interventor:	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	
Constructor:	CONSORCIO VYNSAP	
Semana Reportada:	11	
Perido de Informe:	31/10/2022	6/11/2022

REPORTE DE LA GESTION DE CALIDAD

1. CALIDAD DE MATERIALES

La interventoría Certifica la Calidad de los Materiales utilizados en la obra.
Según Formato No. _____

SI	**NO**
x	

Liste los materiales a los cuales se les verificó el cumplimiento de los standares exigidos de Calidad:
ACERO, AGREGADOS, CEMENTO, MADERA PARA FORMALETAS

2. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

La interventoría Certifica la calibración de Equipos utilizados en obra.
Según Formato No. _____

SI	**NO**
x	

Enumere los equipos calibrados: PULIDORA, TROMPO Y RANA

3. ENSAYOS

La interventoría certifica la realización de los ensayos necesarios para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales.
Según Formato No. _____

SI	**NO**
x	

Liste los ensayos realizados para la verificación de la Calidad de los materiales:

La interventoria aun se encuentra a la espera de estos para la verificacion final de la resistencia de los concretos utilizados.

























MINISTERIO DE CULTURA	SECRETARIA GENERAL MINISTERIO DE CULTURA FORMATO DE PRESUPUESTO

INFORMACION BASICA			
FECHA REG.	31 DE OCTUBRE HASTA EL 06 DE NOVIEMBRE	DEPARTAMENTO	NARIÑO
SEMANA No.	11	OBJETO	PUBLICO - EDUCACIONAL - CULTURAL
NOMBRE DEL INMUEBLE O SEDE		ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO	
BALANCE DE OBRA			

MINISTERIO DE CULTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO
	CAPITULO 1: ACTIVIDADES PRELIMINARES					SEMANA 11					
1.1	Localización y replanteo.	M2	393,12	$ 11.157,00	$ 4.386.040,00		$ -	0,00%	393,12	$ 4.386.039,84	100,00%
1.2	Descapote del terreno e=0,20m	M2	403,12	$ 6.647,00	$ 2.679.539,00		$ -	0,00%	403,12	$ 2.679.538,64	100,00%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 7.065.579,00**		**$ -**	**0,00%**		**$ 7.065.578,48**	
	CAPITULO 2: CIMENTACION										
2.1	Excavacion manual	M3	49,00	$ 41.883,00	$ 2.052.267,00		$ -	0,00%	49,00	$ 2.052.267,00	100%
2.2	Pilotes hincados S=25cm x 25cm (incluye excavación, Concreto 3500 psi, Acero 60000psi, Bentonita, cargue y retiro de escombros	ML	417,00	$ 171.995,00	$ 71.721.915,00		$ -	0,00%	373,50	$ 64.240.132,50	90%
2.3	Demolición de cabezas de pilotes	M3	2,02	$ 561.749,00	$ 1.134.733,00		$ -	0,00%	1,56	$ 876.328,44	77%
2.4	Concreto de limpieza (2000 psi) e=0.10m	M3	4,47	$ 373.513,00	$ 1.669.603,00		$ -	0,00%	1,37	$ 511.712,81	31%
2.5	Zarpa o dados en concreto para amarre de pilotes hincados en concreto premesclado de 3000psi (incluye formaleta y concreto)	M3	15,91	$ 536.803,00	$ 8.540.536,00		$ -	0,00%	13,43	$ 7.209.264,29	84%
2.6	Acero Zarpa de Amarre (Incluye figurado e instalación)	KG	2929,80	$ 4.939,00	$ 14.470.282,00		$ -	0,00%	2465,72	$ 12.178.191,08	84%
2.7	Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye formaleteado y concreto)	M3	9,03	$ 601.049,00	$ 5.427.472,00		$ -	0,00%	11,72	$ 7.044.294,28	130%
2.8	Acero Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye figurado e instalación)	KG	1838,02	$ 4.939,00	$ 9.077.981,00		$ -	0,00%	1087,32	$ 5.370.273,48	59%
2.9	Viga de Amarre cimentación concreto 3000 psi (Incluye Formaleta y concreto)	M3	41,98	$ 595.979,00	$ 25.019.198,00	8,9	$ 5.304.213,10	0,36%	20,68	$ 12.324.845,72	49%
2.10	Acero viga de Amarre Cimentación (Incluye figurado e instalación)	KG	5557,46	$ 5.093,00	$ 28.304.144,00		$ -	0,00%	2805,23	$ 14.287.036,39	50%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 167.418.131,00**		**$ 5.304.213,10**	**0,36%**		**$ 126.094.345,99**	
	CAPITULO 3: CONCRETOS Y ACEROS										
3.1	Concreto losa maciza	M2	315,12	$ 117.085,00	$ 36.895.825,00	78,43	$ 9.182.976,55	0,62%	181,55	$ 21.256.781,75	58%
3.2	Suministro e instalación de Estructura en Acero	KG	19120,80	$ 10.791,00	$ 206.332.553,00		$ -	0,00%		$ -	
3.3	Acero placa maciza	KG	2761,00	$ 5.274,00	$ 14.561.514,00	600,32	$ 3.166.087,68	0,21%	1343,36	$ 7.084.880,64	
3.4	Aplicación de mortero de relleno y nivelación para anclajes columnas estructura	LT	129,50	$ 9.494,00	$ 1.229.473,00		$ -	0,00%		$ -	
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 259.019.365,00**		**$ 12.349.064,23**			**$ 28.341.662,39**	
	COSTOS DIRECTOS		**%**	**$ 1.491.530.637,00**		**$ 17.653.277,33**	**1,18%**		**$ 211.686.911,86**	**14,19%**	
	ADMINISTRACIÓN		19,00%	$ 283.390.821,00		$ 3.354.122,69			$ 40.220.513,25		
	IMPREVISTOS		1,00%	$ 14.915.306,00		$ 176.532,77			$ 2.116.869,12		
	UTILIDAD		5,00%	$ 74.576.532,00		$ 882.663,87			$ 10.584.345,59		
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%	$ 14.169.541,00		$ 167.706,13			$ 2.011.025,66		
						$ 4.581.025,47			**$ 54.932.753,63**		
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO			**$ 387.052.200**		**$ 22.234.302,80**			**$ 266.619.665,49**		
	TOTAL			**$ 1.878.582.837**		**$ 22.234.302,80**			**$ 266.619.665,49**		

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

MINISTERIO DE CULTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No.	**11**				
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	31/10/2022	**Y EL**	6/11/2022	**PLAZO:**	48
CONTRATISTA:	CONSORCIO VYNSAP			**CONTRATO No.**	3004
INTERVENTOR:	ENRIQUEALONSO TOVAR BAQUERO			**CONTRATO No.**	3010

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES OCTUBRE																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CARGO																																
DIRECTOR																																
ESPECIALISTAS																																
RESIDENTE	4	4	4	4	4																										4	
MAESTRO DE OBRA	1	1	1	1	1																										1	
OFICIAL	2	2	2	2	2																										2	
AYUDANTE	5	6	6	6	11																										5	
PERSONAL CONTRATISTA	**12**	**13**	**13**	**13**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**TOTAL PERIODO** 81

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	**MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE***	**SUMATORIA**	**PORCENTAJE**	**CUMPLE S/N**
MANO OBRA NO CALIFICADA		**0**	**0,00%**	
De la región		0	0,00%	
De fuera de la región		0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA		**0**	**0,00%**	
De la región	3 3 3 3 3 3	18	22,22%	
De fuera de la región	1 1 1 1 1 1	6	7,41%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS		**0**	**0,00%**	
De la región	6 6 6 6 11 6	41	50,62%	
De fuera de la región		0	0,00%	
POBLACIÓN VULNERABLE		**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social		0	0,00%	
En condición de desplazamiento		0	0,00%	
MUJERES		**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada		0	0,00%	
Mano de Obra Calificada		0	0,00%	
Profesionales - Técnicos		0	0,00%	
PROVEEDORES				
Local				
Nacional				
Internacional				

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:



ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

OBRA

NOMBRE	CARGO	DEDICACION
HERLEY RINCON LEGUIZAMON	DIRECTOR DE OBRA	%
JORGE SALAZAR	RESIDENTE DE OBRA	100%
CAMILA TELLO ROSERO	PROFESIONAL HSQ	100%
EVER DE JESUS MARTINEZ CORTEZ	MAESTRO	100%
JOSE ALFREDO CAICEDO ALBAN	AYUDANTE DE OBRA	100%
JOSE DANILO PRECIADO PRECIADO	AYUDANTE DE OBRA	100%
NAYDER ALEXIS VALVERDE VALENCIA	AYUDANTE DE OBRA	100%
BRAYAN DAVID CABEZAS QUIÑONES	AYUDANTE DE OBRA	100%
CARLOS DANILO JIMENES BUILA	AYUDANTE DE OBRA	100%
ELLIN ALEJANDRO GRANJA TORRES	AYUDANTE DE OBRA	100%
LUIS ANGEL CHINGAL JARAMILLO	AYUDANTE DE OBRA	100%

INTERVENTORIA

NOMBRE	CARGO	DEDICACION
JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	25%
ABRAHAM YELA GARCIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%
BRIAM DAVID PANTOJA	PROFESIONAL HSQ	100%

MINISTERIO DE CULTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

FECHA:	Semana: 12	7/11/2022	13/11/2022	
OBJETO:	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS ESPECIFICAS PARA LA ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO**			
CONTRATO DE OBRA No.:	3004	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:**	3010	
CONTRATISTA	CONSORCIO VYNSAP	**INTEVENTOR**	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.878.582.837,00	**VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	$ 108.237.938,00	
FECHA DE INICIO OBRA:	24 DE AGOSTO DE 2022	**FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:**	24 DE AGOSTO DE 2022	
FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:	N/A	**FECHA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA:**	N/A	
FECHA DE REINICIO DE OBRA:	N/A	**FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:**	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:	24 DE DICIEMBRE DE 2022	**FECHA DE TER/CIÓN INICIAL DE IN/TORIA:**	31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NUEVE FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:	N/A	**NUEVE FECHA DE TER/CIÓN DE IN/TORIA:**	N/A	
PLAZO DE DURACIÓN OBRA:	4 MESES	**PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:**	5 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	


3. Descripción Obras ejecutadas

SE CONTINUA CON EL CURADO DE LOSA BLOQUE COCINA Y ORFEBRERIA, IGUALMENTE EL CONSORCIO SIGUE INSTALANDO EL ENTABLADO EN MADERA PARA EL SOPORTE DE LOSA DEL BLOQUE DE DANZAS, SE INSTALAN VARILLAS DE 5/8 EN ACERO GALVANIZADO PARA ANCLAJES DE ESTRUCTURA METALICA EN EL BLOQUE DANZAS, SE DESARROLLAN LABORES DE LIMPIEZA DE PERFILES METALICOS Y PINTURAS DE LOS MISMOS, IGUALMENTE INICIAN TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA DE LOS PERFILES METALICOS, SE INSTALAN COLUMNAS METALICAS EN EL BLOQUE DE COCINA Y DE LAS VIGAS PRINCIPALES DE ESTE MISMO BLOQUE. SE CONTINUA CON EL CORTE, FIGURADO Y AMARRE DE VIGAS DE DANZAS, SE REALIZA EL ENCOFRADO Y FUNDICION DE PILOTES EN CONCRETO REFORZADO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACEMANIENTO.

1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de visuales escogidos para reportar el registro fotográfico semana a semana.

<ángulo visual 1>

<ángulo visual 2>



<ángulo visual 3>

<ángulo visual 4>

E Curva "S"




Gráfico porcent ejecutadas vs programadas




Gráfico cantid ejecutadas vs programadas

2. Registro Fotográfico



Visual 1



Visual 2



Visual 3



Visual 4

5. Control Avance de Obra

ESTADO DEL PLAZO	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	89	**72,36%**
	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	**$ 667.112.594,0**	**38,52%**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	**$ 345.265.303,8**	**18,38%**
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	**-$ 321.847.290,22**	**-20,14%**
Se presenta un atraso en la Obra		
ESTADO DE AVANCE EN DÍAS (Retraso)	**-25**	

6. Personal de obra e interventoría

	CARGO	CANT
INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
	PROFESIONAL HSQ	1
	CARGO	**CANT**
CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA	
	RESIDENTE DE OBRA	1
	PROFESIONAL HSQ	1
	ALMACENISTA	
	MAESTRO DE OBRA	1
	AYUDANTES	5
	OFICIALES	2
	HERREROS	6
TOTAL PERSONAL VINCULADO EN OBRA		**18**

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA:

El contratista ha incrementado el volumen de trabajo y a partir de la presente semana ya se puede evidenciar la acometida de actividades de forma simultanea relacionadas con la fundide de pilotes para la cimentación de los tanques, armado de hierro para las vigas del bloque de danzas, fundida de vigas y placas de piso en los otros dos módulos y la iniciación del montaje de la estructura metálica como la actividad mas representativa realizada en la presente semana, sin embargo se continua a la espera de la definición por parte del Ministerio de la cimentación para el piso en deck, para de esta manera poder reprogramar la obra y tener claro los tiempos de entrega de la misma, es de anotar que se presenta afectación del suministro de materiales debido a circunstancias de orden publico sucedidas en la vía Pasto Tumaco


ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR


PORCENTAJES SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%
2	1,10%	1,62%	0,05%	0,57%
3	1,09%	2,71%	3,88%	4,45%
4	1,07%	3,78%	0,41%	4,86%
5	2,56%	6,34%	1,35%	6,21%
6	4,42%	10,76%	0,58%	6,79%
7	4,81%	15,57%	0,57%	7,36%
8	7,75%	23,32%	0,29%	7,65%
9	3,92%	27,24%	0,45%	8,10%
10	4,66%	31,90%	4,91%	13,01%
11	3,55%	35,45%	2,75%	15,76%
12	3,07%	38,52%	2,62%	18,38%
13	2,88%	41,40%		
14	2,49%	43,89%		
15	3,53%	47,42%		
16	1,55%	48,97%		
17	4,37%	53,34%		
18	46,66%	100,00%		

CANTIDADES SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	$ 9.762.565,00	$ 9.762.565,00	$ 9.780.498,05	$ 9.780.498,05
2	$ 20.705.168,00	$ 30.467.733,00	$ 1.007.556,30	$ 10.788.054,34
3	$ 20.388.155,00	$ 50.855.888,00	$ 72.840.833,43	$ 83.628.887,78
4	$ 20.147.663,00	$ 71.003.551,00	$ 7.736.604,85	$ 91.365.492,63
5	$ 48.113.256,00	$ 119.116.807,00	$ 25.297.356,79	$ 116.662.849,42
6	$ 83.049.878,00	$ 202.166.685,00	$ 10.810.856,23	$ 127.473.705,66
7	$ 90.275.460,00	$ 292.442.145,00	$ 10.741.797,67	$ 138.215.503,33
8	$ 89.149.998,00	$ 381.592.143,00	$ 5.529.681,41	$ 143.745.184,73
9	$ 73.595.606,00	$ 455.187.749,00	$ 8.446.596,95	$ 152.191.781,69
10	$ 87.544.963,00	$ 542.732.712,00	$ 92.193.581,00	$ 244.385.362,69
11	$ 66.715.538,00	$ 609.448.250,00	$ 51.726.725,29	$ 296.112.087,98
12	$ 57.664.344,00	$ 667.112.594,00	$ 49.153.215,80	$ 345.265.303,78
13	$ 54.175.172,00	$ 721.287.766,00		
14	$ 65.572.294,00	$ 786.860.060,00		
15	$ 66.369.512,00	$ 853.229.572,00		
16	$ 29.208.430,00	$ 882.438.002,00		
17	$ 88.908.022,00	$ 971.346.024,00		
18	$ 907.236.814,00	$ 1.878.582.838,00		

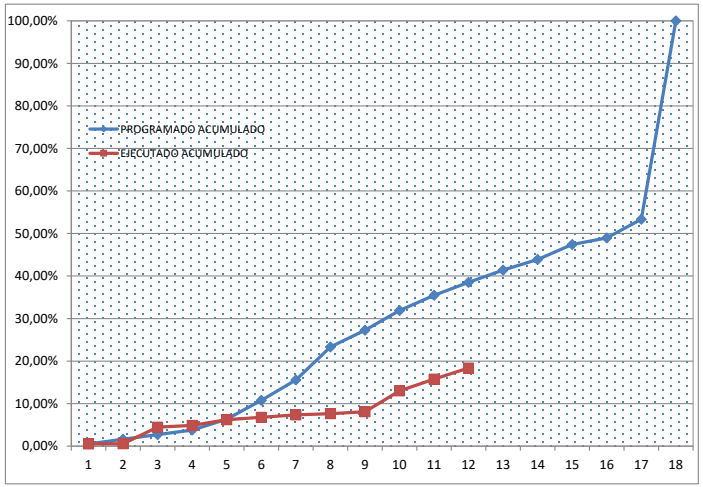

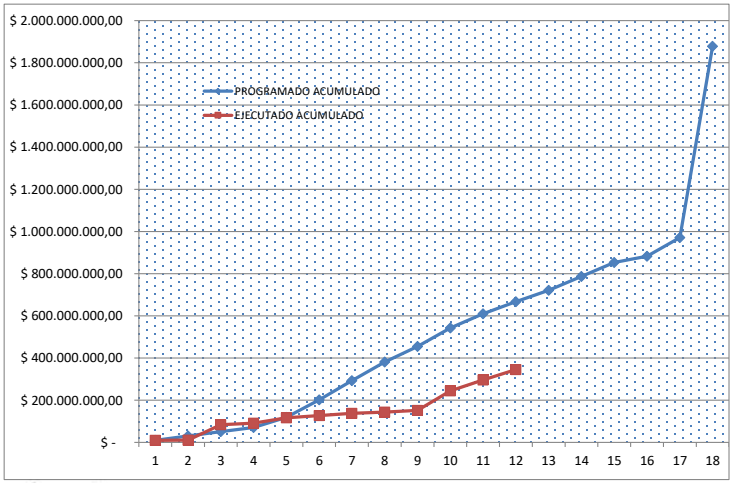

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

ANEXO 3

Proyecto Nº.	3004 de 2022	
Interventor:	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	
Constructor:	CONSORCIO VYNSAP	
Semana Reportada:	12	
Perido de Informe:	7/11/2022	13/11/2022

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS



Corte de madera para encofrado de losa en el modulo de danza.

2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA



Durante esta semana se continua con la disposición y almacenamiento de residuos de madera en la parte posterior del bloque de cocina. Se reutiliza la madera para encoframiento de los otros modulos.



Almacenamiento de residuos de sacos de cemento, la empresa municipal de aseo realiza el desalojo dicho de residuo en sitio de obra.

3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.

No se ha reaizado actividades que se requiera adquisición de materiales para relleno.

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentia y Residuales

N/A

5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas

Se realizó la captación de agua por medio de bombeo con electrobomba en pozo profundo para la fundicion de pilotes

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:



Se identifica un **impacto ambiental negativo** en la parte posterior de obra, se realizaron actividades de soldadura en modulo de cocina, los humos de soldadura es una mezcla variada de gases que es transportada por aire en particulas finas, con el aire contaminado puede ocasionar en corto plazo irritaciones en los ojos, nariz y ocasionando problemas respiratorios..

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

ANEXO 4

Proyecto Nº.		
Interventor:	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	
Constructor:	CONSORCIO VYNSAP	
Semana Reportada:	12	
Perido de Informe:	7/11/2022	13/11/2022

REPORTE DE LA GESTION DE CALIDAD

1. CALIDAD DE MATERIALES

La interventoría Certifica la Calidad de los Materiales utilizados en la obra.
Según Formato No. _____

SI	**NO**
x	

Liste los materiales a los cuales se les verificó el cumplimiento de los standares exigidos de Calidad:
ACERO, AGREGADOS, CEMENTO, MADERA PARA FORMALETAS Y LOS PERFILES METALICOS PARA LA FABRICACION DE LA ESTRUCTURA METALICA DE LOS TRES MODULOS

2. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

La interventoría Certifica la calibración de Equipos utilizados en obra.
Según Formato No. _____

SI	**NO**
x	

Enumere los equipos calibrados: PULIDORA, TROMPO Y RANA, Y EL EQUIPO DE SOLDADURA Y COMPRESOR PARA LA PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA

3. ENSAYOS

La interventoría certifica la realización de los ensayos necesarios para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales.
Según Formato No. _____

SI	**NO**
x	

Liste los ensayos realizados para la verificación de la Calidad de los materiales:

La interventoria aun se encuentra a la espera de estos para la verificacion final de la resistencia de los concretos utilizados.


















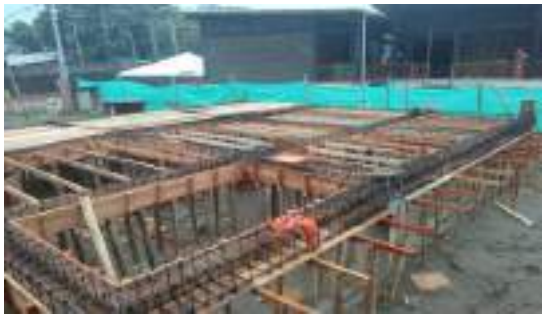







MINISTERIO DE CULTURA	SECRETARIA GENERAL MINISTERIO DE CULTURA FORMATO DE PRESUPUESTO

INFORMACION BASICA			
FECHA REG.	DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE	DEPARTAMENTO	NARIÑO
SEMANA No.	12	OBJETO	PUBLICO - EDUCACIONAL - CULTURAL
NOMBRE DEL INMUEBLE O SEDE		ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO	

BALANCE DE OBRA

MINISTERIO DE CULTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO
	CAPITULO 1: ACTIVIDADES PRELIMINARES					SEMANA 12					
1.1	Localización y replanteo.	M2	393,12	$ 11.157,00	$ 4.386.040,00		$ -	0,00%	393,12	$ 4.386.039,84	100,00%
1.2	Descapote del terreno e=0,20m	M2	403,12	$ 6.647,00	$ 2.679.539,00		$ -	0,00%	403,12	$ 2.679.538,64	100,00%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 7.065.579,00**		**$ -**	**0,00%**		**$ 7.065.578,48**	
	CAPITULO 2: CIMENTACION										
2.1	Excavacion manual	M3	49,00	$ 41.883,00	$ 2.052.267,00				87,32	$ 3.657.223,56	178%
2.2	Pilotes hincados S=25cm x 25cm (incluye excavación, Concreto 3500 psi, Acero 60000psi, Bentonita, cargue y retiro de escombros	ML	417,00	$ 171.995,00	$ 71.721.915,00				373,50	$ 64.240.132,50	90%
2.3	Demolición de cabezas de pilotes	M3	2,02	$ 561.749,00	$ 1.134.733,00				3,02	$ 1.696.481,98	150%
2.4	Concreto de limpieza (2000 psi) e=0.10m	M3	4,47	$ 373.513,00	$ 1.669.603,00				4,56	$ 1.703.219,28	102%
2.5	Zarpa o dados en concreto para amarre de pilotes hincados en concreto premesclado de 3000psi (incluye formaleta y concreto)	M3	15,91	$ 536.803,00	$ 8.540.536,00				13,95	$ 7.488.401,85	88%
2.6	Acero Zarpa de Amarre (Incluye figurado e instalación)	KG	2929,80	$ 4.939,00	$ 14.470.282,00				2945,16	$ 14.546.145,24	101%
2.7	Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye formaleteado y concreto)	M3	9,03	$ 601.049,00	$ 5.427.472,00				11,72	$ 7.044.294,28	130%
2.8	Acero Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye figurado e instalación)	KG	1838,02	$ 4.939,00	$ 9.077.981,00				1727,43	$ 8.531.776,77	94%
2.9	Viga de Amarre cimentación concreto 3000 psi (Incluye Formaleta y concreto)	M3	41,98	$ 595.979,00	$ 25.019.198,00		$ -		14,47	$ 8.623.816,13	34%
2.10	Acero viga de Amarre Cimentación (Incluye figurado e instalación)	KG	5557,46	$ 5.093,00	$ 28.304.144,00				4291,91	$ 21.858.697,63	77%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 167.418.131,00**		**$ -**	**0,00%**		**$ 139.390.189,22**	
	CAPITULO 3: CONCRETOS Y ACEROS										
3.1	Concreto losa maciza	M2	315,12	$ 117.085,00	$ 36.895.825,00				172,91	$ 20.245.167,35	55%
3.2	Suministro e instalación de Estructura en Acero	KG	19120,80	$ 10.791,00	$ 206.332.553,00	3616,53	$ 39.025.975,23		3616,53	$ 39.025.975,23	19%
3.3	Acero placa maciza	KG	2761,00	$ 5.274,00	$ 14.561.514,00				1831,97	$ 9.661.809,78	66%
3.4	Aplicación de mortero de relleno y nivelación para anclajes columnas estructura	LT	129,50	$ 9.494,00	$ 1.229.473,00		$ -	0,00%		$ -	
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 259.019.365,00**		**$ 39.025.975,23**			**$ 68.932.952,36**	
	CAPITULO 5: MUROS										
5.1	Perfil en acero galvanizado base 9 para muros	M2	171,00	$ 30.326,00	$ 5.185.746,00		$ -	0,00%		$ -	0%
5.2	Lamina en SUPERBOARD para muros	M2	114,30	$ 49.239,00	$ 5.628.018,00		$ -	0,00%		$ -	0%
5.3	Muro persiana con listones en madera s=11cm x 2cm	M2	195,00	$ 357.473,00	$ 69.707.235,00		$ -	0,00%		$ -	0%
5.4	Muro doble en Drywall	M2	45,00	$ 84.472,00	$ 3.801.240,00		$ -	0,00%		$ -	0%
5.5	Pintura muros en vinilo tipo 1	M2	125,00	$ 11.290,00	$ 1.411.250,00		$ -	0,00%		$ -	0%
5.6	Aplicación imprimante para proteccion de muros, puertas y ventanas en madera sapan,	M2	308,00	$ 28.634,00	$ 8.819.272,00		$ -	0,00%		$ -	0%
5.7	Riel en acero para puerta - ventana plegable (incluye riel superior e inferior)	ML	56,00	$ 105.628,00	$ 5.915.168,00		$ -	0,00%		$ -	0%
5.8	Divisiones para sanitarios, duchas y orinales, en lámina fenólica (incluye instalación) h=1.50 m	GL	1,00	$ 50.185.325,00	$ 50.185.325,00		$ -	0,00%	1,00	$ 50.185.325,00	100%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 150.653.254,00**		**$ -**			**$ 50.185.325,00**	
	NO PREVISTOS										
NP 1	CERRAMIENTO PROVISIONAL	M	45,00	$ 16.138,00	$ 726.210,00				45,00	$ 726.210,00	100%
NP 2	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC-4". Incluye excavación manual y relleno.	M	10,00	$ 57.000,00	$ 570.000,00				10,00	$ 570.000,00	100%
NP 3	Suministro e instalación de acometida eléctrica.	UN	1,00	$ 5.217.000,00	$ 5.217.000,00				1,00	$ 5.217.000,00	100%
NP 4	RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN.	M3	68,19	$ 29.940,00	$ 2.041.609,00				68,19	$ 2.041.608,60	100%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 8.554.819,00**		**$ -**			**$ 8.554.818,60**	
	COSTOS DIRECTOS		**%**		**$ 1.491.530.637,00**		**$ 39.025.975,23**	**2,62%**		**$ 274.128.863,66**	**18,38%**
	ADMINISTRACION		19,00%		$ 283.390.821,00		$ 7.414.935,29			$ 52.084.484,10	
	IMPREVISTOS		1,00%		$ 14.915.306,00		$ 390.259,75			$ 2.741.288,64	
	UTILIDAD		5,00%		$ 74.576.532,00		$ 1.951.298,76			$ 13.706.443,18	
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		$ 14.169.541,00		$ 370.746,76			$ 2.604.224,20	
							$ 10.127.240,57			**$ 71.136.440,12**	
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO				**$ 387.052.200**		**$ 49.153.215,80**			**$ 345.265.303,78**	
	TOTAL				**$ 1.878.582.837**		**$ 49.153.215,80**			**$ 345.265.303,78**	

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

MINISTERIO DE CULTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

INFORMACION GENERAL

SEMANA No.	**12**				
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	7/11/2022	**Y EL**	13/11/2022	**PLAZO:**	34
CONTRATISTA:	CONSORCIO VYNSAP			**CONTRATO No.**	3004
INTERVENTOR:	ENRIQUEALONSO TOVAR BAQUERO			**CONTRATO No.**	3010

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES NOVIEMBRE																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CARGO																																
DIRECTOR																																
ESPECIALISTAS																																
RESIDENTE							4	4	4	4	4	4																				
MAESTRO DE OBRA							3	3	3	3	3	3																				
OFICIAL							4	4	4	4	4	4																				
AYUDANTE							5	5	5	5	5	5																				
PERSONAL CONTRATISTA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL PERIODO** 96

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	**MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE***	**SUMATORIA**	**PORCENTAJE**	**CUMPLE S/N**
MANO OBRA NO CALIFICADA		**0**	**0,00%**	
De la región		0	0,00%	
De fuera de la región		0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA		**0**	**0,00%**	
De la región		18	18,75%	
De fuera de la región		6	6,25%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS		**18**	**18,75%**	
De la región		18	18,75%	
De fuera de la región		0	0,00%	
POBLACIÓN VULNERABLE		**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social		0	0,00%	
En condición de desplazamiento		0	0,00%	
MUJERES		**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada		0	0,00%	
Mano de Obra Calificada		0	0,00%	
Profesionales - Técnicos		0	0,00%	
PROVEEDORES				
Local				
Nacional				
Internacional				

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

En la semana se ha incrementado la mano de obra gracias a las cuadrillas nuevas de ornamentadores y pintores que inician con la instalacion de las estructuras metalicas de los dos primeros modulos.



ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

OBRA

NOMBRE	CARGO	DEDICACION
HERLEY RINCON LEGUIZAMON	DIRECTOR DE OBRA	%
JORGE SALAZAR	RESIDENTE DE OBRA	100%
CAMILA TELLO ROSERO	PROFESIONAL HSQ	100%
EVER DE JESUS MARTINEZ CORTEZ	MAESTRO	100%
JOSE ALFREDO CAICEDO ALBAN	AYUDANTE DE OBRA	100%
JOSE DANILO PRECIADO PRECIADO	AYUDANTE DE OBRA	100%
NAYDER ALEXIS VALVERDE VALENCIA	AYUDANTE DE OBRA	100%
BRAYAN DAVID CABEZAS QUIÑONES	AYUDANTE DE OBRA	100%
CARLOS DANILO JIMENES BUILA	AYUDANTE DE OBRA	100%
ELLIN ALEJANDRO GRANJA TORRES	AYUDANTE DE OBRA	100%
LUIS ANGEL CHINGAL JARAMILLO	AYUDANTE DE OBRA	100%

INTERVENTORIA

NOMBRE	CARGO	DEDICACION
JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	25%
ABRAHAM YELA GARCIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%
BRIAM DAVID PANTOJA	PROFESIONAL HSQ	100%

MINISTERIO DE CULTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado


FECHA:	Semana: 13	14/11/2022	20/11/2022	
OBJETO:	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS ESPECIFICAS PARA LA ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO**			
CONTRATO DE OBRA No.:	3004	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:**	3010	
CONTRATISTA	CONSORCIO VYNSAP	**INTEVENTOR**	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.878.582.837,00	**VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	$ 108.237.938,00	
FECHA DE INICIO OBRA:	24 DE AGOSTO DE 2022	**FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:**	24 DE AGOSTO DE 2022	
FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:	N/A	**FECHA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA:**	N/A	
FECHA DE REINICIO DE OBRA:	N/A	**FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:**	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:	24 DE DICIEMBRE DE 2022	**FECHA DE TER/CIÓN INICIAL DE IN/TORIA:**	31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NUEVE FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:	N/A	**NUEVE FECHA DE TER/CIÓN DE IN/TORIA:**	N/A	
PLAZO DE DURACIÓN OBRA:	4 MESES	**PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:**	5 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	

3. Descripción Obras ejecutadas

SE CONTINUA EL CURADO DE LOSA BLOQUE COCINA Y ORFEBRERIA SE TERMINA LA INSTALACION Y ENTABLADO EN MADERA PARA EL SOPORTE DE LOSA DEL BLOQUE DE DANZAS, SE INICIA Y SE TERMINA LA INSTALACION DE VARILLAS DE 3/8 PARA LA MALLA DE LOSA INCLUIDO LOS BASTONES SE TERMINA LA INSTALACION DE PERFILERIA METALICOS Y PINTURAS DE LOS MISMOS DE VIGAS COLUMNAS. SE INICIA Y SE TERMINA LA INSTALACION DE CORREAS METALICAS PARA LA CUBIERTA DEL BLOQUE COCINA. SE CONTINUA CON EL CORTE, FIGURADO Y AMARRE LOSA EN BLOQUE DE DANZAS, SE REALIZA EL ENCOFRADO Y FUNDICION DE PILOTES EN CONCRETO REFORZADO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACEMANIENTO. SE REALIZA LA INSTALACION DE POZO PROFUNDO. SE INICIA CON EL CORTE DE PERFILERIA METALICA PARA EL BLOQUE DE ORFEBRERIA.

1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de visuales escogidos para reportar el registro fotográfico semana a semana.

<ángulo visual 1>



<ángulo visual 2>

<ángulo visual 3>

<ángulo visual 4>

E Curva "S"




Gráfico porcent ejecutadas vs programadas




Gráfico cantid ejecutadas vs programadas

2. Registro Fotográfico



Visual 1



Visual 2



Visual 3



Visual 4

5. Control Avance de Obra

ESTADO DEL PLAZO	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	89	**72,36%**
	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	**$ 721.287.766,0**	**41,40%**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	**$ 381.082.611,9**	**20,29%**
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	**-$ 340.205.154,06**	**-21,11%**
Se presenta un atraso en la Obra		
ESTADO DE AVANCE EN DÍAS (Retraso)	**-26**	

6. Personal de obra e interventoria

	CARGO	CANT
INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
	PROFESIONAL HSQ	1
	CARGO	**CANT**
CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA	
	RESIDENTE DE OBRA	1
	PROFESIONAL HSQ	1
	ALMACENISTA	
	MAESTRO DE OBRA	3
	AYUDANTES	4
	OFICIALES	4
	HERREROS	1
TOTAL PERSONAL VINCULADO EN OBRA		**16**

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA:

El contratista continua avanzando en el desarrollo de actividades relacionadas con la fundicion de placas y el curado de las mismas, sin embargo se continua evidenciando un retraso significtivo en la ejecucion de la obra, por lo tanto la inteventoria nuevamente sugiere la implementacion de personal para cubrir varios frentes de trabajo. Sin embargo es necesario contar con los diseños estructurales del piso deck, para continuar con el programa de obra segun lo establecido por el contratista inicialmente. Esto con el fin de iniciar el desarrollo de las actividades de la ruta critica


ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR


PORCENTAJES SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%
2	1,10%	1,62%	0,05%	0,57%
3	1,09%	2,71%	3,88%	4,45%
4	1,07%	3,78%	0,41%	4,86%
5	2,56%	6,34%	1,35%	6,21%
6	4,42%	10,76%	0,58%	6,79%
7	4,81%	15,57%	0,57%	7,36%
8	7,75%	23,32%	0,29%	7,65%
9	3,92%	27,24%	0,45%	8,10%
10	4,66%	31,90%	4,91%	13,01%
11	3,55%	35,45%	2,75%	15,76%
12	3,07%	38,52%	2,62%	18,38%
13	2,88%	41,40%	1,91%	20,29%
14	2,49%	43,89%		
15	3,53%	47,42%		
16	1,55%	48,97%		
17	4,37%	53,34%		
18	46,66%	100,00%		

CANTIDADES SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	$ 9.762.565,00	$ 9.762.565,00	$ 9.780.498,05	$ 9.780.498,05
2	$ 20.705.168,00	$ 30.467.733,00	$ 1.007.556,30	$ 10.788.054,34
3	$ 20.388.155,00	$ 50.855.888,00	$ 72.840.833,43	$ 83.628.887,78
4	$ 20.147.663,00	$ 71.003.551,00	$ 7.736.604,85	$ 91.365.492,63
5	$ 48.113.256,00	$ 119.116.807,00	$ 25.297.356,79	$ 116.662.849,42
6	$ 83.049.878,00	$ 202.166.685,00	$ 10.810.856,23	$ 127.473.705,66
7	$ 90.275.460,00	$ 292.442.145,00	$ 10.741.797,67	$ 138.215.503,33
8	$ 89.149.998,00	$ 381.592.143,00	$ 5.529.681,41	$ 143.745.184,73
9	$ 73.595.606,00	$ 455.187.749,00	$ 8.446.596,95	$ 152.191.781,69
10	$ 87.544.963,00	$ 542.732.712,00	$ 92.193.581,00	$ 244.385.362,69
11	$ 66.715.538,00	$ 609.448.250,00	$ 51.726.725,29	$ 296.112.087,98
12	$ 57.664.344,00	$ 667.112.594,00	$ 49.153.215,80	$ 345.265.303,78
13	$ 54.175.172,00	$ 721.287.766,00	$ 35.817.308,16	$ 381.082.611,94
14	$ 65.572.294,00	$ 786.860.060,00		
15	$ 66.369.512,00	$ 853.229.572,00		
16	$ 29.208.430,00	$ 882.438.002,00		
17	$ 88.908.022,00	$ 971.346.024,00		
18	$ 907.236.814,00	$ 1.878.582.838,00		

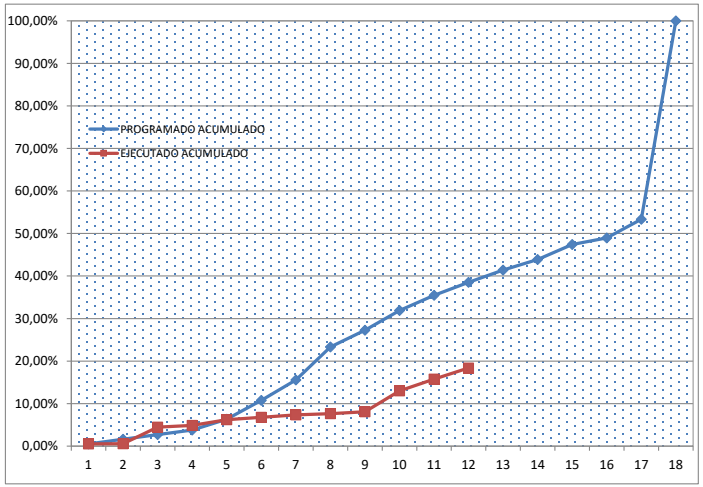

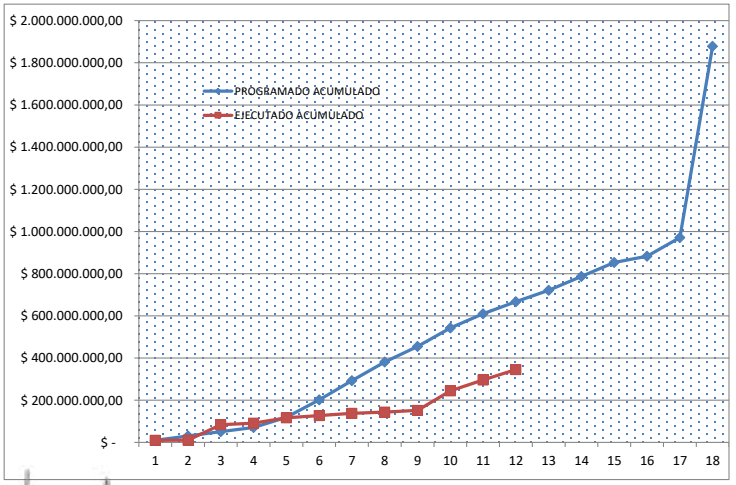

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

ANEXO 3

Proyecto Nº.	3004 de 2022	
Interventor:	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	
Constructor:	CONSORCIO VYNSAP	
Semana Reportada:	13	
Perido de Informe:	14/11/2022	20/11/2022

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS



Corte de hierro para encofrado de losa en el modulo de danza.



Corte de madera para encofrado de losa en el modulo de danza.

2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA



Disposición por parte del contratista para el almacenamiento de residuos de madera en la parte posterior del bloque de cocina. Se reutilizan madera para encoframiento de pilotes.



Disposición por parte del contratista para el almacenamiento de residuos de sacos de cemento, la empresa municipal de aseo realiza el desalojo dicho de residuo en sitio de obra.

3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.

No se han realizado actividades que se requiera adquisición de materiaes para relleno.

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentia y Residuales

N/A

5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas

Se realizó la captación de agua por medio de bombeo con electrobomba en pozo profundo para la fundicion de pilotes.

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:



Se identifica un impacto ambiental negativo en la parte posterior de obra, se continua actividades de soldadura en modulo de cocina, los humos de soldadura es una mezcla variada de gases que es transportada por aire en particulas finas, con el aire contaminado puede ocasionar en corto plazo irritaciones en los ojos, nariz y ocasionando problemas respiratorios.

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

ANEXO 4

Proyecto Nº.		
Interventor:	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	
Constructor:	CONSORCIO VYNSAP	
Semana Reportada:	13	
Perido de Informe:	14/11/2022	20/11/2022

REPORTE DE LA GESTION DE CALIDAD

1. CALIDAD DE MATERIALES

La interventoría Certifica la Calidad de los Materiales utilizados en la obra.
Según Formato No. _____

SI	**NO**
x	

Liste los materiales a los cuales se les verificó el cumplimiento de los standares exigidos de Calidad:
ACERO, AGREGADOS, CEMENTO, MADERA PARA FORMALETAS Y LOS PERFILES METALICOS PARA LA FABRICACION DE LA ESTRUCTURA METALICA DE LOS TRES MODULOS

2. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

La interventoría Certifica la calibración de Equipos utilizados en obra.
Según Formato No. _____

SI	**NO**
x	

Enumere los equipos calibrados: PULIDORA, TROMPO Y RANA, Y EL EQUIPO DE SOLDADURA Y COMPRESOR PARA LA PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA

3. ENSAYOS

La interventoría certifica la realización de los ensayos necesarios para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales.
Según Formato No. _____

SI	**NO**
x	

Liste los ensayos realizados para la verificación de la Calidad de los materiales:

Se continua haciendo el seguimiento de la calidad de los concretos en la presente semana, el laboratorio envia la evidencia de los analisis realizados hasta el momento, y por cuestiones tecnicas no ha sido posible que se remita un oficio certificando lo verificado en los registros fotograficos































MINISTERIO DE CULTURA	SECRETARIA GENERAL MINISTERIO DE CULTURA FORMATO DE PRESUPUESTO

INFORMACION BASICA			
FECHA REG.	DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE	DEPARTAMENTO	NARIÑO
SEMANA No.	13	OBJETO	PUBLICO - EDUCACIONAL - CULTURAL
NOMBRE DEL INMUEBLE O SEDE		ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO	

BALANCE DE OBRA

MINISTERIO DE CULTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO
	CAPITULO 1: ACTIVIDADES PRELIMINARES						SEMANA 13				
1.1	Localización y replanteo.	M2	393,12	$ 11.157,00	$ 4.386.040,00		$ -	0,00%	393,12	$ 4.386.039,84	100,00%
1.2	Descapote del terreno e=0,20m	M2	403,12	$ 6.647,00	$ 2.679.539,00		$ -	0,00%	403,12	$ 2.679.538,64	100,00%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 7.065.579,00**		**$ -**	**0,00%**		**$ 7.065.578,48**	
	CAPITULO 2: CIMENTACION										
2.1	Excavacion manual	M3	49,00	$ 41.883,00	$ 2.052.267,00		$ -		87,32	$ 3.657.223,56	178%
2.2	Pilotes hincados S=25cm x 25cm (incluye excavación, Concreto 3500 psi, Acero 60000psi, Bentonita, cargue y retiro de escombros	ML	417,00	$ 171.995,00	$ 71.721.915,00		$ -		373,50	$ 64.240.132,50	90%
2.3	Demolición de cabezas de pilotes	M3	2,02	$ 561.749,00	$ 1.134.733,00		$ -		3,02	$ 1.696.481,98	150%
2.4	Concreto de limpieza (2000 psi) e=0.10m	M3	4,47	$ 373.513,00	$ 1.669.603,00		$ -		4,56	$ 1.703.219,28	102%
2.5	Zarpa o dados en concreto para amarre de pilotes hincados en concreto premesclado de 3000psi (incluye formaleta y concreto)	M3	15,91	$ 536.803,00	$ 8.540.536,00		$ -		13,95	$ 7.488.401,85	88%
2.6	Acero Zarpa de Amarre (Incluye figurado e instalación)	KG	2929,80	$ 4.939,00	$ 14.470.282,00		$ -		2945,16	$ 14.546.145,24	101%
2.7	Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye formaleteado y concreto)	M3	9,03	$ 601.049,00	$ 5.427.472,00		$ -		11,72	$ 7.044.294,28	130%
2.8	Acero Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye figurado e instalación)	KG	1838,02	$ 4.939,00	$ 9.077.981,00		$ -		1727,43	$ 8.531.776,77	94%
2.9	Viga de Amarre cimentación concreto 3000 psi (Incluye Formaleta y concreto)	M3	41,98	$ 595.979,00	$ 25.019.198,00		$ -		14,47	$ 8.623.816,13	34%
2.10	Acero viga de Amarre Cimentación (Incluye figurado e instalación)	KG	5557,46	$ 5.093,00	$ 28.304.144,00				4291,91	$ 21.858.697,63	77%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 167.418.131,00**		**$ -**	**0,00%**		**$ 139.390.189,22**	
	CAPITULO 3: CONCRETOS Y ACEROS										
3.1	Concreto losa maciza	M2	315,12	$ 117.085,00	$ 36.895.825,00		$ -		172,91	$ 20.245.167,35	55%
3.2	Suministro e instalación de Estructura en Acero	KG	19120,80	$ 10.791,00	$ 206.332.553,00	946,87	$ 10.217.674,17		4563,40	$ 49.243.649,40	24%
3.3	Acero placa maciza	KG	2761,00	$ 5.274,00	$ 14.561.514,00	634,25	$ 3.345.034,50		2466,22	$ 13.006.844,28	89%
3.4	Aplicación de mortero de relleno y nivelación para anclajes columnas estructura	LT	129,50	$ 9.494,00	$ 1.229.473,00		$ -	0,00%		$ -	
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 259.019.365,00**		**$ 13.562.708,67**			**$ 82.495.661,03**	
	CAPITULO 4: CUBIERTA										
4.1	Teja termoacustica	M2	450,20	$ 112.691,00	$ 50.733.488,00		$ -	0,00%		$ -	0%
4.2	Correa en Perfil metalico PHR S=12cm x 6cm	ML	424,38	$ 76.949,00	$ 32.655.617,00	193,31	$ 14.875.011,19	1,00%	193,31	$ 14.875.011,19	0%
4.3	Canoeras en lamina galvanizada cal. 20, incl. Ganchos soportes, pintura anticorrosivo y de acabado	ML	45,50	$ 51.902,00	$ 2.361.541,00		$ -	0,00%		$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 85.750.646,00**		**$ 14.875.011,19**			**$ 14.875.011,19**	
	CAPITULO 5: MUROS										
5.1	Perfil en acero galvanizado base 9 para muros	M2	171,00	$ 30.326,00	$ 5.185.746,00		$ -	0,00%		$ -	0%
5.2	Lamina en SUPERBOARD para muros	M2	114,30	$ 49.239,00	$ 5.628.018,00		$ -	0,00%		$ -	0%
5.3	Muro persiana con listones en madera s=11cm x 2cm	M2	195,00	$ 357.473,00	$ 69.707.235,00		$ -	0,00%		$ -	0%
5.4	Muro doble en Drywall	M2	45,00	$ 84.472,00	$ 3.801.240,00		$ -	0,00%		$ -	0%
5.5	Pintura muros en vinilo tipo 1	M2	125,00	$ 11.290,00	$ 1.411.250,00		$ -	0,00%		$ -	0%
5.6	Aplicación imprimante para proteccion de muros, puertas y ventanas en madera sapan,	M2	308,00	$ 28.634,00	$ 8.819.272,00		$ -	0,00%		$ -	0%
5.7	Riel en acero para puerta - ventana plegable (incluye riel superior e inferior)	ML	56,00	$ 105.628,00	$ 5.915.168,00		$ -	0,00%		$ -	0%
5.8	Divisiones para sanitarios, duchas y orinales, en lamina fenolica (incluye instalación) h=1.50 m	GL	1,00	$ 50.185.325,00	$ 50.185.325,00		$ -	0,00%	1,00	$ 50.185.325,00	100%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 150.653.254,00**		**$ -**			**$ 50.185.325,00**	
	COSTOS DIRECTOS			**%**	**$ 1.491.530.637,00**		**$ 28.437.719,86**	**1,91%**		**$ 302.566.583,52**	**20,29%**
	ADMINISTRACION			19,00%	$ 283.390.821,00		$ 5.403.166,77			$ 57.487.650,87	
	IMPREVISTOS			1,00%	$ 14.915.306,00		$ 284.377,20			$ 3.025.665,84	
	UTILIDAD			5,00%	$ 74.576.532,00		$ 1.421.885,99			$ 15.128.329,18	
	IVA SOBRE UTILIDAD			19,00%	$ 14.169.541,00		$ 270.158,34			$ 2.874.382,54	
							$ 7.379.588,30			**$ 78.516.028,42**	
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO				**$ 387.052.200**		**$ 35.817.308,16**			**$ 381.082.611,94**	
	TOTAL				**$ 1.878.582.837**		**$ 35.817.308,16**			**$ 381.082.611,94**	

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

MINISTERIO DE CULTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

INFORMACION GENERAL

SEMANA No.	**13**				
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	14/11/2022	**Y EL**	20/11/2022	**PLAZO:**	34
CONTRATISTA:	CONSORCIO VYNSAP			**CONTRATO No.**	3004
INTERVENTOR:	ENRIQUEALONSO TOVAR BAQUERO			**CONTRATO No.**	3010

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES NOVIEMBRE																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CARGO																																
DIRECTOR																																
ESPECIALISTAS																																
RESIDENTE														4	4	4	4	4	4													
MAESTRO DE OBRA														3	3	3	3	3	3													
OFICIAL														4	4	4	4	4	4													
AYUDANTE														5	5	5	5	5	5													
PERSONAL CONTRATISTA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL PERIODO** **96**

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*	SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA		**0**	**0,00%**	
De la región		0	0,00%	
De fuera de la región		0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA		**0**	**0,00%**	
De la región	3 3 3 3 3 3	18	18,75%	
De fuera de la región	1 1 1 1 1 1	6	6,25%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS		**0**	**0,00%**	
De la región	3 3 3 3 3 3	18	18,75%	
De fuera de la región	3 3 3 3 3 3	18	18,75%	
POBLACIÓN VULNERABLE		**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social		0	0,00%	
En condición de desplazamiento		0	0,00%	
MUJERES		**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada		0	0,00%	
Mano de Obra Calificada		0	0,00%	
Profesionales - Técnicos		0	0,00%	
PROVEEDORES				
Local				
Nacional				
Internacional				

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Durante esta semana continuan el desarrollo de las actividades con la misma cantidad de cuadrillas que la semana anterior, sin e



ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

OBRA

NOMBRE	CARGO	DEDICACION
HERLEY RINCON LEGUIZAMON	DIRECTOR DE OBRA	%
JORGE SALAZAR	RESIDENTE DE OBRA	100%
CAMILA TELLO ROSERO	PROFESIONAL HSQ	100%
EVER DE JESUS MARTINEZ CORTEZ	MAESTRO	100%
JOSE ALFREDO CAICEDO ALBAN	AYUDANTE DE OBRA	100%
JOSE DANILO PRECIADO PRECIADO	AYUDANTE DE OBRA	100%
NAYDER ALEXIS VALVERDE VALENCIA	AYUDANTE DE OBRA	100%
BRAYAN DAVID CABEZAS QUIÑONES	AYUDANTE DE OBRA	100%
CARLOS DANILO JIMENES BUILA	AYUDANTE DE OBRA	100%
ELLIN ALEJANDRO GRANJA TORRES	AYUDANTE DE OBRA	100%
LUIS ANGEL CHINGAL JARAMILLO	AYUDANTE DE OBRA	100%

INTERVENTORIA

NOMBRE	CARGO	DEDICACION
JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	25%
ABRAHAM YELA GARCIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%
BRIAM DAVID PANTOJA	PROFESIONAL HSQ	100%

- Se construyeron tableros laterales en madera para la parte interna de las vigas aereas.

Jorge L. Salazar Mc.
Residente Obra.

Res. Interventoría

Octubre - 25 - 2022

- Se instalarón camaras en la obra para la seguridad
- Se siguio armando la parrilla de acero de refuerzo de la losa, tambien se inicio la instalación de los bastones de la losa del blogue de cocina
- Se inicio la colocación de los niveles de las vigas aereas en el blogue de dauzas
- Se cortó y se figuro acero de refuerzo para los bastones de la losa de Cocina.
- Se instaló tableros laterales en las vigas aereas del bloque de orfebreria.
- Se inicio la instalación de varengas soportados con tacos de guaduas para el empisado de la losa del blogue de orfebreria.
- Una vez mas se informa o se hace la observación sobre la cantidad de refuerzo de las vigas aereas de los bloques, porque segun el despiece del acero solo lleva 1 baston en un solo vano de la Viga longitudinal y en el otro vano no lleva, sabiendo que tiene la misma distancia.
- Entre los residentes de Interventoria y Obra se decidio no vaciar el concreto en la losa del blogue de cocina hasta que lleguen de Bogota la funcionaria del Ministerio, el director de Interventoria y el Director de Obra para revisión de las observaciones que tenemos respecto al diseño estructural.

Jorge L Salazar Mc
Residente Obra.

Res. Interventoría

Powered by CamScanner

Octubre - 26 - 2022

- Hace presencia en obra, los directores de obra y de interventoria. Arq. Arley y Arq. Juan Carlos. Se realiza un recorrido a la obra, en la cual se evidencian varios inconvenientes a resolver para dar continidad a la obra; Es necesario aclarar la disposición de los tanques teniendo en cuenta que el diseño presentado cuenta con unas dimensiones que no coinciden con el espacio libre en obra. Se recomienda el acompañamiento del diseñador estructural, Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita al contratista hacer un levantamiento que permita conocer las dimensiones reales. Ajuste diseño estructural de tanque elevado.
- Se revisa el diseño estructural del tanque de reserva, el cual se plantea que el mismo sea bajo tierra, sin embargo esta estructura en la zona no es conveniente, por lo tanto, se analizó la alternativa de construir similar a los modulos, mediante pilotes, zapata y placas, quedando el tanque expuesto en superficie 1.60 mts. aproximadamente, quedando la tapa de este a la misma altura de la placa de los modulos. Se requiere revisar dimensiones de los elementos estructurales para iniciar su construcción.
- Durante el recorrido se evidencia que en el costado occidental del lote, donde se encuentra el manglar, el mar ha venido socavando el terreno, presentando un riesgo latente de afectación sobre el (tanque) pozo séptico, en lo posible buscar una alternativa tecnica que evite esta situación.
- Respecto al cerramiento se recomienda acatar los niveles batimetricos de la zona, con el proposito de establecer si los 2 metros de altura de los postes existentes son suficientes.

16/10/22

NKA

Con la presencia del Director de Interventoria y el Director de obra, los residentes de interventoria y de obra volvieron hacer la solicitud de la revisión estructural delas vigas aereas de la losa de los bloques en construcción por un especialista en estructura, por lo cual respondieron que ya habian hecho la solicitud al ministerio y la respuesta dela entidad Contratante que que se construyera como estaba los diseños.
En Vista de esto los directores de Interventoria y de obra dieron la aprobación de continuar con la construeción y el vaciado del concreto en la losa de los respectivos bloques de Cocina, Orpebreria y Duzzas.

- Se inicio la instalación de divisiones para sanitarios duchas y orinales en lámina Fenolica en el bloque de los bbaños existentes.
- Se siguio instalando los bastones en 3/8" para la losa maciza del bloque de cocina

Jorge L. Salazar M
Residente Obra

Residente Interventoría

Octubre 27-2022

- Se inicio a colocar los tableros laterales en madera para la losa del bloque de Cocina, estos se alinearon y se asegoraron con madera.
- Se inició a empizar la losa con madera del bloque de orpebreria
- Se continuo con la instalacion delas divisiones de los sanitarios duchas y orinales en lamina Fenolica en el bloque de los baños existentes
- Se inicio la construcción de la rampa en madera provisional para el acceso a vaciar el concreto en la losa del bloque de cocina.

Powered by CamScanner

- Se continua cortando y figurando acero para las vigas del bloque de dauzas
- Se continua armando castillos en acero para las vigas aereas del bloque de danza, esta actividad se realiza guiandonos de planos estructurales no firmados, sin ninguna carta de responsabilidad que envian por medio magnetico.

Jorge L. Salazar Mb.
Residente Obra.

Res. Interventoría

Octubre 28-2022

- Se siguio empizando con madera la losa del bloque de orfebreria
- Se inicio con la instalación del acero de la Parrilla de la losa en 3/8" de acuerdo como dice el plano en el bloque de orfebreria.
- Se continua armando castillos en acero en el bloque de dauzas para las vigas aereas
- Llego Cemento gris a la obra para la fundicion de la losa, como tambien las mezcladoras de concreto.
- Se sigue cortando y figurando acero para las vigas aereas del bloque de dauzas.
- Se reviso los niveles con un equipo laser con supervisión Interventoria

Jorge L. Salazar Mb
Residente Obra.

Res. Interventoría

Octubre 29-2022.

- Se preparó, se transporto y se vacio concreto en las vigas aereas y la losa del bloque de cocina.
- Se fundieron Vigas aereas y la losa de la cocina, a medida que se vaciaba la mezcla de concreto se Vibraba utilizando el Vibrador a gasolina.

Powered by CamScanner

- Se hicieron cilindros de concreto para la prueba de resistencia a la compresión.
- Se le agrego a la losa cuando estuvo fallada un producto de Sika llamado Antisol con un aspersor manual. En este dia la temperatura estuvo muy alta, demasiado Sol hizo durante la jornada de fundición, hubo la necesidad de rosarle agua a la losa maciza fundida.

Jorge L. Salazar M.
Residente Obra.

Res. Interventoría

Octubre 31 - 2022

- Se continuo con el armado de los castillos de las vigas aereas del blogue de Oficinas
- Se le agrego agua a la losa fundida de la Cocina
- Se continuo cortando y figurando acero para las vigas aereas y la losa de Orfebreria.
- Se instalaron bastones de la losa del blogue de orfebreria
- Se instalaron los pernos en U para asegurar y fijar la platina para las columnas metalicas.

Jorge A Salazar M.
Residente Obra.

Res. Interventoría

Noviembre 01 - 2022

- Se inicio con el armado de la parrilla para la losa del blogue de orfebreria de acuerdo al detalle estructural correspondiente en varilla 3/8"
- Se continua con el armado de los castillos de las vigas aereas en acero del blogue de Oficinas.
- Se corto y se figuro acero para la parrilla de la losa de orfebreria y para las vigas aereas del blogue

Powered by CamScanner

de danzas

Ing. J. Salazar Mo.
Residente Obra.

Res. Interventoría

Noviembre 02-2022.

- Se arreglo la puerta de ingreso de los baños de mugeres existente, la cual estaba dañada desde que se inicio la obra.
- Se continua con el armado de los castillos de las vigas aereas del bloque de danzas.
- Se hizo excavación a mano para revisar la cimentación existente del muro perimetral de cerramiento del lote y Construcción vecina.
- Se término de colocar todos los bastones de la losa del bloque de orfebreria
- Se tomo la desición de utilizar formaleta metálica para encofrar la losa maciza del bloque de orfebreria.

Ing. J. Salazar Mo.
Residente Obra.

Res. Interventoría

Noviembre 03-2022

- Se instalaron formaleta metalica lateraleo para la losa maciza del bloque de orfebreria, se alineo, se aplomo y se aseguro con varengas de madera.
- Se inicio la elaboración de los sitios con su respectivos cerramientos en tela polisombra Verde, madera y plastico negro para realizar los trabajos de limpieza y pintura de los elementos metalicos, Corte y soldadura de los mismos como son los perfiles, las IPE etc.
- Se sigue armando los castillos de las vigas aereas del

Powered by CamScanner

bloque de duchas

- Se hicieron tableros en madera para los fondos de las vigas aereas del bloque de duchas.
- Se reviso con la interventoria los niveles de vigas y losa utilizando lasers.

Jorge L. Salazar M.
Residente Obra.

Res. Interventoría

Noviembre 04- 2022.

- Se realizo limpieza y pintura de los perfiles metalicos utilizando Gratas, thiner y anticorrosivo.
- Se preparó la mezcla de Concreto, se transporto en buggis a traves de la rampla en madera y se vacio primero en las vigas aereas, a medida que se iba llenando las vigas se vibraba la mezcla utilizando un Vibrador a gasolina.
- Luego se paso el nivel de la losa y se empezo a realizar la maestra y el llenado de la placa maciza, se vibraba la mezcla de Concreto y se tallaba.
- Se hicieron cilindros en concreto para la prueba de resistencia a la compresión.
- Por la alta temperatura se le agrego agua chispiada a la losa tallada.
- Se fundieron vigas aereas y losa maciza del bloque de orfebreria.

Jorge L. Salazar M.
Residente Obra.

Res. Interventoría

Noviembre 05-2022

- Se le agrego suficiente agua a la losa para realizar el curado del concreto, se le dejó con agua que toda la losa quedo sumergida
- Se limpio y se pinto perlines metalicos con pintura

Powered by CamScanner

anticorrosiva.

- Se corto y figuro acero para los estribos de los pilotes para el deposito o tanque para almacenar agua.
- Se continuo haciendo formaleta en madera para los fondos de las vigas aereas del blogue de danzas
- Se continua armando los castillos de las vigas aereas del blogue de danzas.

Jorge L Salazar U.
Residente Obra.

Ced. Interventoría

Noviembre 8 - 2022.

- Se continuo con el corte y figurado de acero para los estribos de los pilotes para el tanque de almacenamiento de agua.
- Se inicio la instalación de las platinas metalicas para posteriormente instalar la columna metalica, estas platinas se nivelaron y se colocaron a una determinada altura o nivel con referencia al nivel de la platina instalada en el blogue de los baños.
- Se continuo con la instalación de los tableros en madera para los fondos de las vigas, se le colocaron los tacos de guaduas para su respectivo soporte.
- Se presento en las horas de la tarde una situación de incomodidad con la directora de la Escuela Taller Tumaco, debido al dolor que se presento en la obra cuando se está pintando los elementos metalicos de la estructura utilizando un compresor de aire.
  Ella manifiesta que se debe pintar los fines de semana porque de lunes a viernes se trabaja en la cocina de la escuela.
- Para evitar mas inconvenientes se tomo la desición

de pintar con brocha o rodillos los elementos metalicos de la estructura.

- Se continua amarrando y armando los castillos de las Vigas aereas del bloque de dauzas
- Se agrego agua con una electrobomba a la losa maciza fundida del bloque de orfebreria, de esta manera se hizo el curado del concreto, Se le hecho suficiente agua.
- Se pintaron con pintura anticorrosiva los elemento metalicos como las columnas.

Jorge L. Salazar H.
Residente Obra

Res. Interventoría

Noviembre 9 - 2022

- Se inicio la construcción de formaletas en madera para los laterales de las vigas aereas del bloque de dautas.
- Se sigue pintando con brocha los elementos metalicos de la estructura metálica.
- Se continue armando castillos de las vigas aereas en acero. del bloque de dautas.
- Se sigue cortando y figurando acero para fleges de los pilotes para el tanque de almacenamiento de agua.
- Se volvio agregar sopresente agua a la losa maciza del bloque de orfebreria

Jorge L. Salazar H.
Residente Obra.

Res. Interventoría

Noviembre 10 - 2022

- Se continua la construcción de formaletas en madera para los laterales de las vigas aereas del bloque de dauzas

Powered by CamScanner

- Se inicio la construcción de formaleta en madera para los pilotes del tanque de agua.
- Se inicio la instalación de tableros laterales en madera para las vigas aereas del bloque de danzas.
- Se sigue figurando acero para los estribos de los pilotes
- Se pinto y se corto columnas metalicas para los bloques.

Jorge I. Salazar Ll.
Residente Obra.

Ros. Interventoría

Noviembre 11-2022.

- Se armo los castillos en acero para los pilotes del tanque de almacenamiento de agua.
- Se encofro con formaleta de madera los pilotes del tanque de almacenamiento de agua, se dejo 7 encofrados.
- Se sigue construyendo formaletas en madera para los laterales de las Vigas aereas del bloque de danzas.
- Se continua colocando los tableros de los fondos de las Vigas aereas del bloque de danzas
- Se inicio a embarengar la losa del bloque de danzas.
- Se continua con la instalación de los tableros laterales en madera de las vigas aereas del bloque de danzas
- Se instalaron columnas metálicas en el bloque de cocina.

Jorge I. Salazar Ll.
Residente Obra.

Ros Interventoría

Noviembre 12-2022

- Se preparó, se transporto en buggis la mezcla de concreto y se vacio en los pilotes encofrados
- Se construyeron 7 pilotes en concreto reforzado de 0,25 x 0,25 m.
- Se continuo con la instalación de columnas metálicas

Powered by CamScanner

en el bloque de Cocina.

- Se continua pintando con anticorrosiva los elementos metálicos
- Se sigue construyendo tableros en madera para los laterales de las Vigas aereas del bloque de danzas
- Se sigue instalando los tableros de fondos de las vigas aereas del bloque de danzas, luego se colocaron los tacos de guaduas para soportar la viga, se colocó un pedazo de madera para evitar que el taco de guadua se entierre por el peso ya que el suelo es arena suelta.
- Se le ha agregado agua al suelo para que este aumente su resistencia a la penetracción
- Se sigue instalando tableros laterales en madera para las vigas aereas por la parte interna en el bloque de danzas.
- Se sigue embarrengando la losa del bloque de danzas para posteriormente colocar el empizado de la misma.
- Por cuestiones de violencia la carretera esta cerrada, no hay transporte.

Jorge A. Salazar Bb-
Residente Obra.

Por Interventoria

Noviembre 15 de 2022.

- Por cuestiones de inseguridad en la Via Pasto - Tumaco donde se presentarón hechos de violencia en dias anteriores la carretera estuvo cerrada, impidiendo el Transporte de Pasajeros y Mercancia. Esto ocasiono que materiales de Construcción para la obra como Acero y Cemento etc. se retrasaran, que no llegaran a tiempo al sitio de la obra, presentandose retrasos en las actividades programados en la Construcción de la obra.
- la Carretera estubo cerrada por 2 dias sin transporte.
- Se continua con la instalación de varengas para el empizado de la losa del bloque de danzas.
- Se sigue instalando el empizado en madera para la

Powered by CamScanner

losa del bloque de danzas.

- Se sigue suministrando e instalando la Estructura Metálica del bloque de Cocina.
- Se Corto y se figuro Acero de refuerzo para los pilotes del tanque de Almacenamiento de Agua.

Jorge A. Salazar M.
Residente Obra.

Por Interventoría

Noviembre 16 - 2022.

- Se continua con la instalación de la Estructura metálica del bloque de Cocina.
- Se término de instalar los varengas para el empizado de la losa de danzas.
- Se termino de instalar el empizado de la losa de danzas.
- Se inicio con el corte y figurado del Acero de la losa de danzas.
- Se inicio con la instalación y armado de la parrilla en 3/8" de la losa del bloque de danzas.
- Está parrilla en Acero de 3/8" para la losa se instala de acuerdo a detalles de los planos enviados por medio de internet, estos planos no están firmados, ni tienen una carta de responsabilidad civil. No se tienen unos planos en Físico definitivos y firmados en el sitio de la obra.
- Se sigue con el figurado del Acero para pilotes del tanque de Almacenamiento de Agua.
- Tampoco hay unos planos firmados y con carta de responsabilidad de los pilotes que se van a construir tanto para el tanque de Almacenamiento como para la Torre de los tanques elevados.
- Se trabaja con planos que nos envian por medio

Powered by CamScanner

magnetico o internet los cuales en muchas ocasiones tienen errores.

- Se armaron castillos para pilotes de acuerdo al archivo de planos enviado
- Se encofro con madera para fundición de pilotes.

Jorge I Salazar M
Residente Obra.

Res. Interventoría

Noviembre 17 - 2022.

- Se continuo armando castillos en Acero para pilotes del tanque de Almacenamiento y la Torre de tanque elevados.
- Se sigue encofrando con madera los pilotes dela Torre para los tanques elevados
- Se Continua instalando la estructura metálica en el bloque de Cocina.
- Se continuo armando la parrilla en 3/8" para la losa del bloque de Baños.
- Se preparó, se transportó en Buggis y se vacio la mezcla de Concreto en los pilotes que estaban encofrados, a medida que se iba llenando los pilotes con la mezcla de concreto se vibraba utilizando un Vibrador a gasolina.
- Se fundieron 13 pilotes de 0,25x0,25 en concreto reforzado.

Jorge I Salazar M
Residente obra.

Res. Interventoría

Noviembre 18 - 2022.

- Se cortó, se peguro Acero de refuerzo para los pilotes.

Powered by CamScanner

de la Torre para los tanques elevados.
- Se continua armando castillos en Acero para los pilotes de acuerdo a planos enviados.
- Se continua con la instalación de la estructura metálica en el bloque de Cocina.
- Se sigue armando la parrilla de la losa del bloque de danzas.
- se corto y se figuro Acero para los bastones en 3/8" de la losa del bloque de danzas.
- Se desencofro pilotes fundidos y se volvio a encofrar pilotes para fundir.

Jorge A. Salazar M.
Residente Obra.

Por. Interventoría

Noviembre 19. 2022.

- Se armó castillos en Acero para pilotes para la torre de los tanques elevados
- Se término de encofrar en madera pilotes para fundir en concreto reforzado.
- Se preparó mezcla de Concreto, se transporto en Buggis y se vacio en los pilotes encofrados. A medida que se iba llenando con mezcla se vibraba el concreto utilizando un Vibrador a gasolina
- Se fundieron 13 pilotes de 0,25X0,25 en concreto reforzado
- Se sigue instalando la estructura metálica del bloque de Cocina
- Se inicio a colocar bastones en 3/8" para la losa del bloque de danzas, también se hizo la instalación del poso propando de 4"
- Se inicio la construcción de los tableros laterales para la losa del bloque de danzas.

Jorge L. Salazar M.
Residente Obra.

Res. Interventoría

Noviembre 21-2022

- Se inicio la instalación de los tableros laterales de 40cm de la losa del bloque de aulas.
- Se revisa de nuevo el nivel de las Vigas y losa del bloque de aulas utilizando un nivel laser.
- Se corto, se figuro Acero para los pilotes de la torre de los tanques elevados.
- Se presento un accidente laboral con una trabajadora, la cual es la Encargada de la Seguridad en el trabajo y la Salud, se resbalo y se cayo desde su propia altura fracturandose un hueso de la muñeca derecha.
  Se inmovilizó con una perula el brazo lastimado y se traslado hasta un centro de salud mas cercano. donde le prestarón la atención medica pertinente.
  Se hizo el reporte del Accidente laboral ante la ARL.
- Se continuo instalando bastones para la losa del bloque de aulas de acuerdo como lo estipula o muestra el plano.
- Se continua con la instalación de la estructura metálica del bloque de Cocina.
- Se armo castillos en Acero para los pilotes de la torre de los tanques elevados.
- Se desencofro los pilotes fundidas para reutilizar la formaleta de madera.
- La Escuela Taller informa que el dia 22 de Noviembre -2022 tiene una actividad en el sitio, por lo cual solicita respetuosamente posponer alguna actividad de Construcción que genere ruido como es la fundicion de Concreto.
- Se pospone la fundición de la losa del bloque de aulas para el dia 23 de Noviembre de 2022.

Powered by CamScanner

Jorge L. Salazar M.
Residente Obra.

Ing. Interventoría

Noviembre 22 - 2022

- Se continuo armando castillos para los pilotes de la torre de los tanques elevados
- Se encofro con formaleta de madera algunos pilotes para fundir
- Se construyó la rampa en madera para la fundición de la losa del bloque de danzas.
- Se inicio la instalación de la estructura metálica del bloque de orfebrería.
- Se termino de instalar los bastones en Acero de 3/8" para la losa del bloque danzas.
- Se realizo todo lo de afiliación para los trabajadores adicionales que van a trabajar en la fundición de la obra.
- Se dejo listo la logistica para la fundación de la losa del bloque de danzas, incluyendo revisión niveles de vigas y losa.

Jorge L. Salazar M
Residente Obra.

Ing. Interventoría

Noviembre 23 de 2022.

- Se preparó mezcla de Concreto, se transporto en Buggis y se inicio el vaciado del concreto en las vigas y luego se hizo las maestras para la losa maciza. A medida que se vaciaba el concreto se vibraba la mezcla utilizando un Vibrador a gasolina.
- Cuando se construyo la losa maciza se le agrego con un aspersor manual Antisol el aval es un producto para la protección del Concreto ante los rayos solares

- Se hicieron cilindros de Concreto para las pruebas de resistencia a la compresión.
- Se continuo con la instalación de la estructura metálica del bloque de orfebreria.
- Se fundieron Vigas de Amarre o Aereas y losa Maciza de una forma monolitica del bloque de cautas.

Jorge L. Salazar Ub.
Residente obra.

Res. Interventoria

NOV - 24 - 2022

- Se Armo castillos en Acero para los pilotes de la Torre de tanques elevados
- Se encofro con madera pilotes para fundir
- Se preparó mezcla de concreto, se transporto en Buggis y se vacio en los pilotes encofrados, a medida que se iba llenando los pilotes se vibraba la mezcla utilizando un Vibrador de Gasolina
- Se continua con la instalación de la Estructura metálica del bloque de orfebreria
- Se le agrego suficiente agua en la mañana y la tarde a la losa del bloque de cautas aunque se le había agregado Antisol

Jorge L. Salazar Ub.
Residente Obra

Res. Interventoria

NOV - 25 - 2022

- Se realizo limpieza de la obra, recogiendo y almacenando materiales sobrantes que no se reutilizaran.

Powered by CamScanner

- Se realizo el relleno y nivelación con mortero y Grava de los soportes de las platinas de las columnas metalicas en el bloque de Cocina y Orfebreria.
- Se sigue instalando la estructura metálica en el bloque de orfebreria.
- Con la ayuda de un trabajador de la Escuela Taller se destapó la tuberia sanitaria existente que está en funcionamiento la cual se encontraba obstruida.
- Se le agrego agua suficiente a los pilotes fundidos utilizando una manguera y tuberia de 1/2"
- Se le volvio agregar agua suficiente a la loza del bloque de danzas para el curado del concreto porque estaba haciendo demasiado Sol.
- La Estación de bombeo no presenta pilotes en su diseño Estructural. por lo que se solicita revisión

Jorge I. Salazar Mc.
Residente Obra.

Noviembre 26-2022.

- Se cortó y se figuró Acero de 3/8" para los pleges de pilotes de la Estación de Bombas. ó Bombeo.
- Se inicio el armado de los castillos de los pilotes para la Estación de Bombas
- Se continuo con la instalación de la Estructura metálica del bloque de Orfebreria.
- Se inició el armado de los castillos en Acero de las columnas de 0,35x0,35 para la Torre de los tanques elevados de acuerdo al detalle estructural enviado por internet.

Jorge I. Salazar Mc
Residente Obra.

Res. Interventoria

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14833758062

(415)7707212489984(8020) 000001483375806 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 3 9 9 3 7 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 3 9 9 3 7 3	1 9 7 8 1 1 1 6

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TOVAR	BAQUERO	ENRIQUE	ALONSO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 119 50 50 IN 5 AP 303

42. Correo electrónico: TOVARQUITECTO@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 8 7 8 7 1 1 3	6 0 1 8 0 3 4 3 4 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	1 9 9 3 1 1 0 1	4 3 1 1	1 9 9 3 1 1 0 1	4 3 9 0				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	8	5	2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 06 - 16 / 15 : 16: 42

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre TOVAR BAQUERO ENRIQUE ALONSO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
CC: 19399373

Bogotá D.C. CARRERA 47A # 95-56 Of. 501
Teléfono 8051341
Correo Electrónico arqetb@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

E 12

RESOLUCION DIAN 18764031672375 FECHA 26-07-2022 AL 26-01-2023 NUMERACION AUTORIZADA CON PREFIJO E QUE HABILITA DESDE EL NUMERO 02 AL 100
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica

Cliente: MINISTERIO DE CULTURA | **NIT:** 830034348 - 5
Dirección: CARRERA 8 No. 8 - 55
Ciudad: Bogotá D.C. | **Teléfono:** 3424100
Fecha: 15/12/2022 | **Vencimiento:** 15/01/2023 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
Por Concepto de:
FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	01	INTERVENTORIA DE PROYECTOS	und	1	28.078.194	0	19	5.334.857	28.078.194
2	15	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA	und	1	0	0	19	0	0
3	16	DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA No. LP 004-2022 CON OBJETO DE CONTRATAR POR SISTEMA DE PRECIOS	und	1	0	0	19	0	0
4	17	UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS ESPECIFICAS PARA LA ESCUELA TALLER DE TUMACO	und	1	0	0	19	0	0
5	27	EN NARIÑO CORRESPONDIENTE AL 30.87%	und	1	0	0	19	0	0

Valor en Letras

TREINTA Y TRÉS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL CINCUENTA Y UN PESOS

Favor Consignar en la cuenta de ahorros No 219-638459-92 De BANCOLOMBIA a nombre de ENRIQUE A. TOVAR BAQUERO

TOTAL LINEAS O ITEMS	5
SUBTOTAL	**$ 28.078.194**
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 5.334.857
TOTAL OPERACION	$ 33.413.051
RETEFUENTE	$ 0
RETEIVA	$ 0
RETEICA	$ 0
TOTAL DOCUMENTO	**$ 33.413.051**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2022-12-15 13:41:58

CUFE: c575409dcf66dae3e87650fa48150cad0fc33d1c51ec1406cd8410a71c41820d2ca488a6190fc299ca9fa7c94f8a9dea--Expedición:16/12/2022 10:28 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
