EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

CONTRATO DE OBRA No. 2220569

CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2220586

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

CONTRATO No. 2220586

DOCUMENTO No. I 130
Informe Mensual - No. 08

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
Del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022

VERSIÓN 01
VOLUMEN 1 DE 1
ORIGINAL

LISTA DE DISTRIBUCIÓN



Copias de este documento han sido entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREA O DEPENDENCIA		No. DE COPIAS
Copia No. 1	ENTERRITORIO	1
Copia No. 2	Biblioteca del proyecto	1

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

ÍNDICE VERSIÓN	CAPÍTULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
0		-	Versión original

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

TITULO DOCUMENTO:			INFORME MENSUAL No. 08 – diciembre de 2022		
DOCUMENTO No:			I 130		
APROBACIÓN	NUMERO DE REVISIÓN		0	1	2
	RESPONSABLE POR ELABORACIÓN “Ingeniero Residente”	Nombre:	Jaime Barrios Contreras		
		Firma:			
		Fecha:	02/01/2023		
	RESPONSABLE REVISIÓN “Coordinador Proyecto”	Nombre:	Juan Camilo Pertuz		
		Firma:			
		Fecha:	02/01/2023		
	RESPONSABLE APROBACIÓN	Nombre:	William Jiménez Martínez		
		Firma:			
		Fecha:	03/01/2023		

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE

CLIENTE:		EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio
RESPONSABLE APROBACIÓN	Nombre:	Erika Marcela Gutiérrez Gaitán.
	Cargo:	Supervisora Contrato de Interventoría.
	Firma:	
	Fecha:	

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 6
1. INFORME EJECUTIVO 7
2. INFORMACIÒN GENERAL DEL PROYECTO 7
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
2.2. LOCALIZACIÓN 7
2.3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 9
3. GENERALIDADES DEL CONTRATO 12
3.1. CONTRATOS SUSCRITOS 12
3.1.1. Contrato de Obra 12
3.1.2. Contrato de Interventoría. 12
3.2. CONTROL DE PÓLIZAS 13
3.2.1. Pólizas contrato de Obra 13
3.2.2. Pólizas contrato de Interventoría 13
3.3. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO 14
3.3.1. Información de índole presupuestal. 14
3.3.2. Manejo de anticipo 14
3.3.3. Actas parciales. 15
3.4. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 15
3.4.1. Personal Autorizado por el Cliente 15
3.4.2. Personal de la Interventoría 15
3.4.3. Personal del Contratista 16
3.5. CONTROL DE RECURSOS Y PERSONAL 16
3.5.1. Control de equipos 16
3.5.2. Control de personal 17
3.6. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO 17
3.6.1. Comités de Seguimiento. 17
3.6.2. Comités de Aprobación. 18
3.6.3. Correspondencia 20
4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA 21

4.1. ACTIVIDADES DE ORDEN TÉCNICO 21
4.1.1. Actividad 1. 21
4.1.2. Actividad 2. 21
4.1.3. Actividad 3. 23
4.1.4. Avance general del proyecto. 47
4.2. SITUACIONES ESPECIALES OCURRIDAS DURANTE EL PERIODO 49
4.3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 49
4.4. PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO – SST 49
4.5. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL. 51
4.6. BITÁCORA 51
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 52
5.1. CONCLUSIONES. 52
5.2. RECOMENDACIONES. 52
ANEXOS 53

RELACIÓN DE TABLAS.

TABLA 1. LUGAR DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES. 7
TABLA 2. CAPÍTULOS E ÍTEMS A EJECUTAR EN OBRA. 9
TABLA 3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA. 12
TABLA 4. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 12
TABLA 5. PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA 13
TABLA 6. PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 13
TABLA 7. CDP – CRP SALDO PRESUPUESTAL 14
TABLA 8. SEGUIMIENTO ANTICIPO 14
TABLA 9. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 14
TABLA 10. ACTAS PARCIALES 15
TABLA 11. PERSONAL ENTERRITORIO. 15
TABLA 12. PERSONAL INTERVENTORÍA. 15
TABLA 13. PERSONAL CONTRATISTA. 16
TABLA 14. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y OFIMÁTICOS. 16
TABLA 15. CONTROL DE EQUIPOS. 17
TABLA 16. RELACIÓN DE COMITES DE SEGUIMIENTO 17
TABLA 17. RELACIÓN DE COMITES DE APROBACIÒN 18
TABLA 18. RELACIÓN DE APROBACIÒN DE DIAGNÓSTICOS 20
TABLA 19. SEGUIMIENTO DE INTERVENCIÓN DE VIVIENDAS. 23
TABLA 20. RELACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS. 47
TABLA 21. AVANCE DEL PROYECTO – INFORMES SEMANALES. 47
TABLA 22. GRÁFICA AVANCE ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 48
TABLA 23. CONTROL DE PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA. 49
TABLA 24. CONTROL DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA. 50
TABLA 25. CONTROL DE PERSONAL DEL PROYECTO. 50

INTRODUCCIÓN

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

El proyecto nace de la necesidad de acceso a Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que se presenta en algunas comunidades que conforman el casco urbano del Municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar). Estas viviendas carecen de las instalaciones Hidrosanitarias internas impidiendo conectarse de manera efectiva a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado existentes en las vías de los barrios priorizados. Es por ello por lo que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio decidió implementar un Programa de Conexiones Intradomiciliarias que permita cubrir en un porcentaje mayor al actual, las deficiencias al acceso de agua potable y disminuir la posibilidad de adquirir enfermedades de tipo gastrointestinal.

En el alcance del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 934 de 2021 suscrito entre ENTerritorio y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el 07 de julio de 2021, se proyectan el CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR – 10, para proceder con el DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN, y con ellos la EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS. Durante todo este proceso debe llevarse a cabo PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 1,2 y 3.

1. INFORME EJECUTIVO

En el **Anexo 1,** se presenta el informe ejecutivo correspondiente al presente mes.

2. INFORMACIÒN GENERAL DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto busca “Fomentar el acceso a los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado mediante la construcción o mejoramiento de las conexiones Intradomiciliarias y domiciliarias de estos servicios cuando técnicamente se requieran, por medio de aportes presupuestales de la Nación y/o de las entidades territoriales en calidad de contrapartida que cubran sus costos, en los inmuebles objeto del programa.”

El beneficio principal del PCI es impactar de manera positiva en la calidad de vida y en la salud de los beneficiados, desarrollando hábitos saludables de higiene y disminuyendo el riesgo de adquirir enfermedades gastrointestinales, catalogadas como las principales causas de muerte a nivel mundial, adicionalmente, en la actualidad, impactará positivamente en la reducción del riesgo de contraer COVID 19.

El Proyecto pretende implementar las Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico, dirigido a atender las necesidades de instalación de equipos Hidrosanitarios en viviendas de la población de El Carmen de Bolívar, el cual fue priorizado por el ministerio de vivienda, ciudad y territorio, por lo anterior y de acuerdo con las obligaciones de ENTerritorio en el Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 934 de 2021 (Numeración ENTerritorio 221005).

2.2. LOCALIZACIÓN

El Carmen de Bolívar es un municipio del departamento de Bolívar, Colombia. Se ubica a 114 km al sudeste de Cartagena de Indias, capital departamental, en el sistema orográfico de los montes de María, muy cerca del litoral Caribe colombiano. Limita al norte con San Jacinto, al Este con Zambrano, Sureste con Córdoba Tetón, al Sur con Ovejas (sucre), al Suroeste con Chalán y Colosó (sucre) y al Oeste con San Onofre (Sucre).

TABLA 1. LUGAR DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES.

PROYECTO	DEPARTAMENTO	SUB-REGIÓN	DISTRITO/MUNICIPIO
PCI – EL CARMEN DE BOLÍVAR	**BOLÍVAR**	**MONTES DE MARÍA**	**EL CARMEN DE BOLÍVAR**

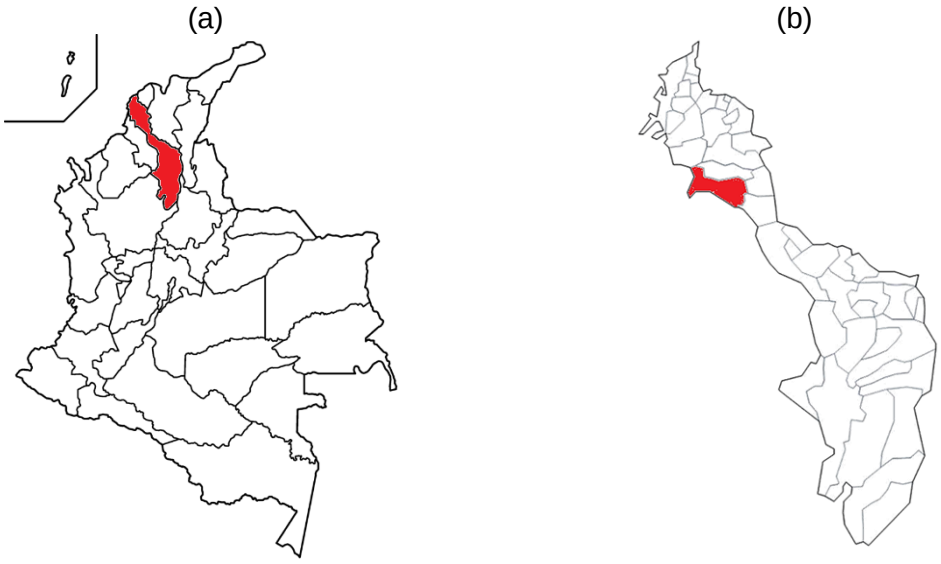


Ilustración 1 Localización del proyecto: (a) Departamento de Bolívar (b) Municipio de El Carmen de Bolívar.
Fuente: *Elaboración Propia - Google Earth.*

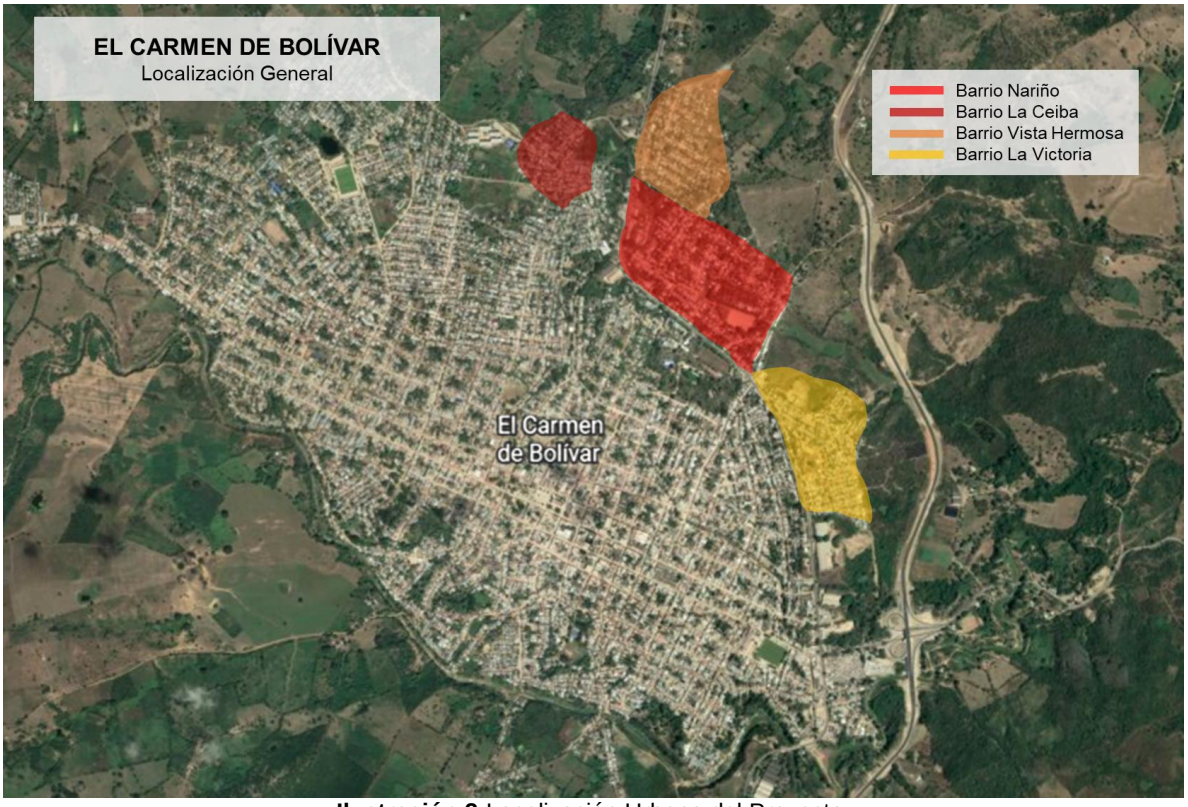


Ilustración 2 Localización Urbana del Proyecto.
Fuente: *Elaboración Propia - Google Earth.*

2.3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

De acuerdo con el Programa de Conexiones Intradomiciliarias se aprobaron los capítulos e ítems a ejecutar en obra descritos a continuación:

TABLA 2. CAPÍTULOS E ÍTEMS A EJECUTAR EN OBRA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
1	**PRELIMINAR**	
1.1	CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR – 10.	Und
1.2	DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.	Und
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	
	REDES HIDROSANITARIAS	
2.1	Redes intradomiciliarias de acueducto de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	ML
2.2	Redes intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	ML
2.3	Red Intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	ML
	PUNTOS HIDROSANITARIOS	
2.4	Punto HIDROSANITARIO **(INODORO).** Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und
2.5	Punto HIDROSANITARIO de **DUCHA.** Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und
2.6	Punto HIDROSANITARIO de **LAVAMANOS CON PEDESTAL.** Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und
2.7	Punto HIDROSANITARIO de **LAVADERO ESTANDAR** Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und
2.8	Punto HIDROSANITARIO de **LAVAPLATOS** Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und
	APARATOS	
2.9	Suministro e instalación de **SANITARIO (INODORO)**, incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und
2.10	Suministro e instalación de **LAVAMANOS CON PEDESTAL,** incluye grifería	Und
2.11	Suministro e instalación de **LAVADERO ESTANDAR** incluye llave de chorro macho para lavadero	Und
2.12	Suministro e instalación de **LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA** (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und
	CAJAS DE INSPECCIÓN	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para **INTRADOMICILIARIAS** (incluye acero de refuerzo)	m
	UNIDADES SANITARIAS	
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (**No incluye:** Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (**No incluye**: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (**No incluye:** Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre. (**No incluye**: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und
	CIMENTACIÓN	
3.5	Relleno compactado con material de sitio	m3
3.6	Relleno con material seleccionado (recebo)	m3
	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS	
3.7	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	m3
3.8	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	Kg
3.9	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2
3.10	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	m2
3.11	Concreto ciclópeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	m3
	MAMPOSTERIA	
3.12	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	m2
3.13	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und
	MORTEROS	
3.14	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	m2
3.15	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	m2
3.16	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso ducha de 1:4 y 0,03 metros de espesor	m2
	ELEMENTOS	
3.17	Suministro e instalación de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo y Pintura en Esmalte Sintético	Und
3.18	Suministro e instalación de juego de incrustaciones para baño	Und
3.19	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und
3.20	Suministro e instalación de registro de cierre metálico	Und

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
3.21	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metálico C120x60x1.2mm	m2
3.22	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	m
3.23	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red Intradomiciliaria.	Und
	ACABADOS	
3.24	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	m2
3.25	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2
3.26	Recuperación de piso esmaltado, incluye antisol y endurecedor.	m2
3.27	Enchape pared blanco (0.20 X 0.20) metros	m2
3.28	Enchape piso antideslizante blanco (0,20 x 0,20) metros	m2
3.29	Carburo blanco para muro exterior (3 manos)	m2
	CONEXIONES	
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und
	INTERVENCIONES VARIAS	
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	m2
	CAJAS DE INSPECCION	
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para **DOMICILIARIA**, (incluye acero de refuerzo)	m

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO

3.1. CONTRATOS SUSCRITOS

3.1.1. Contrato de Obra

TABLA 3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

CONTRATISTA:	HMM S.A.S.
NIT.	892.201.182-1
CONTRATO No.	2220569 de 2022
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIO ENRIQUE GARCIA DURAN
CONTACTO:	(5) 282 4223
FECHA DE INICIO	18 DE ABRIL DE 2022
SUSPENSIÓN N° 01:	N.A.
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 01	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	18 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No. 01 DEL CONTRATO:	N.A.
FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN No 01:	N.A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 6.120.295.592,00
ADICIÓN No. 01:	$ 1.828.773.582,67
VALOR FINAL DEL CONTRATO SEGÚN ADICIÓN No. 01:	$ 7.949.069.174,67
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES
PRÓRROGA No. 01:	TRES (3) MESES
PLAZO FINAL DEL CONTRATO SEGÚN PRÓRROGA No. 01:	ONCE (11) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	18 DE MARZO DE 2023

3.1.2. Contrato de Interventoría.

TABLA 4. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

CONTRATISTA:	DAIMCO S.A.S.
NIT.	900.021.482-1
CONTRATO No.	2220586 de 2022
REPRESENTANTE LEGAL:	SHEIRY CHARIN DAHJER HERRERA
CONTACTO:	BOGOTÁ 57 1 – 7020798
FECHA DE INICIO	18 DE ABRIL DE 2022
SUSPENSIÓN N° 01:	N.A.
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 01	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	18 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No. 01 DEL CONTRATO:	N.A.
FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN No 01:	N.A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 590.289.763,29
ADICIÓN No. 01:	$ 221.358.661,23
VALOR FINAL DEL CONTRATO SEGÚN ADICIÓN No. 01:	$ 811.648.424,52
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES
PRÓRROGA No. 01:	TRES (3) MESES
PLAZO FINAL DEL CONTRATO SEGÚN PRÓRROGA No. 01:	ONCE (11) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	18 DE MARZO DE 2023

En el **Anexo 4,** se presentan las actas de inicio suscritas

3.2. CONTROL DE PÓLIZAS

3.2.1. Pólizas contrato de Obra

TABLA 5. PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	65-45-10107448		
FECHA DE EXPEDICIÓN	27/04/2022		
TOMADOR	HMM S.A.S		
	VR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 1.836.088.677,60	2022/04/18	2023/08/18
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	$ 1.196.023.495,00	2022/04/18	2023/08/18
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 612.029.559,20	2022/04/18	2025/12/19
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	$ 612.029.559,20	SI AMPARA, 1 AÑO	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 1.836.088.677,60	SI AMAPA, 3 AÑOS	
RCE	$ 612.029.559,20	2022/04/18	2022/12/19
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 612.029.559,20	2022/04/18	2022/12/19
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 306.014.779,00	2022/04/18	2022/12/19
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 306.014.779,00	2022/04/18	2022/12/19
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	$ 306.014.779,00	2022/04/18	2022/12/19
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	$ 306.014.779,00	2022/04/18	2022/12/19
GASTOS MÉDICOS	$ 200.000.000,00	2022/04/18	2022/12/19
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	$ 612.029.559,20	2022/04/18	2022/12/19
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$ 612.029.559,20	2022/04/18	2022/12/19

3.2.2. Pólizas contrato de Interventoría

TABLA 6. PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	21-45-101366162		
FECHA DE EXPEDICIÓN	04/04/2022		
TOMADOR	DAIMCO S.A.S		
	VR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 177.086.928,99	2022/04/01	2023/08/01
CALIDAD DE LOS SERVICIOS	$ 118.057.952,66	2022/12/01	2027/12/01
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 29.514.488,16	2022/04/01	2025/12/01
RCE	$ 250.000.000,00	2022/04/18	2022/12/18
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 250.000.000,00	2022/04/18	2022/12/18
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 125.000.000,00	2022/04/18	2022/12/18
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	$ 125.000.000,00	2022/04/18	2022/12/18
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 125.000.000,00	2022/04/18	2022/12/18
GASTOS MÉDICOS	$ 200.000.000,00	2022/04/18	2022/12/18
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	$ 125.000.000,00	2022/04/18	2022/12/18

3.3. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO

3.3.1. Información de índole presupuestal.

El contrato de interventoría No. 2220586 tiene un valor total de $ 811.648.424,52 el cual hace parte del contrato suscrito entre el DAIMCO S.A.S. y ENTerritorio. Así mismo el contrato de Obra No. 2220569 tiene un valor total de $ 7.949.069.174,67 el cual hace parte del contrato suscrito entre el HMM S.A.S. y ENTerritorio.

TABLA 7. CDP – CRP SALDO PRESUPUESTAL

CONTRATO	CDP	CRP	SALDO PRESUPUESTAL
INTERVENTORIA	$ 622.133.098,00	$ 590.289.763,29	$ 31.843.334,71
OBRA	$ 6.127.518.229,01	$ 6.120.295.592,00	$ 7.222.637,01

3.3.2. Manejo de anticipo

El contrato de interventoría No. 2220586 no cuenta con anticipo, mientras que el contrato No. 2220569 cuenta con un anticipo de $1.196.023.494,20, el cual se encuentra consignado en la fiducia.

TABLA 8. SEGUIMIENTO ANTICIPO

CONTRATO	CUENTA	ENTIDAD	SALDO PRESUPUESTAL
INTERVENTORIA	N/A	N/A	N/A
OBRA	040-71942371	Bancolombia	$ 1.196.023.494,20

En el **Anexo 25,** se presenta el formato correspondiente al Plan de Inversión del Anticipo.

TABLA 9. DESEMBOLSOS DE ANTICIPO

CONTRATO	No.	FECHA	V. TOTAL
CTA OBRA	01	18/07/2022	$ 200.420.673,00
	02	26/07/2022	$ 210.338.003,00
	03	29/08/2022	$ 114.491.959,00
	04	20/09/2022	$ 310.270.980,70
	05	07/10/2022	$ 262.532.955,70
	06	08/11/2022	$ 80.724.134.79
	TOTAL		**$ 1.196.023.494,20**

TABLA 10. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

CONTRATO	AMORTIZADO			PENDIENTE POR AMORTIZAR
	Acta No.	Fecha	Valor	
INTERVENTORIA	N/A	N/A	N/A	N/A
OBRA	01	25/08/2022	$ 79.684.615,81	$ 1.116.338.878,39
	02	22/09/2022	$ 98.495.814,77	$ 1.017.843.063,62
	03	24/10/2022	$ 253.828.253,10	$ 764.014.810,52
	04	18/11/2022	$ 190.817.225,10	$ 573.197.585,42
	05	03/12/2022	$ 72.931.597,48	$ 500.265.987,94

3.3.3. Actas parciales.

A la fecha de corte del presente la interventoría y contratista presentan las siguientes actas.

TABLA 11. ACTAS PARCIALES

CONTRATO	No.	V. TOTAL	V. NETO
INTERVENTORIA	01	$ 59.028.976,33	$ 59.028.976,33
	02	$ 49.171.137,28	$ 49.171.137,28
	03	$ 29.514.488,16	$ 29.514.488,16
	04	$ 53.834.426,41	$ 53.834.426,41
	05	$ 92.144.232,05	$ 92.144.232,05
	06	$ 76.590.096,79	$ 76.590.096,79
CTA OBRA	01	$ 372.277.394,00	$ 372.277.394,00
	02	$ 456.671.194,87	$ 456.671.194,87
	03	$ 1.169.261.678,84	$ 1.169.261.678,84
	04	$ 879.687.212,56	$ 879.687.212,56
	05	$ 334.834.961,32	$ 334.834.961,32

En el **Anexo 3,** se presentan las actas parciales suscritas en este contrato.

3.4. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

3.4.1. Personal Autorizado por el Cliente

TABLA 12. PERSONAL ENTERRITORIO**.**

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE DEL PROFESIONAL
Gerente de Contrato	Carlos Andrés Bravo
Coordinadora	Karol Javela Pérez
Supervisor	Erika Gutiérrez Gaitán
Supervisor Social.	Lina Otálvaro López

3.4.2. Personal de la Interventoría

TABLA 13. PERSONAL INTERVENTORÍA.

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE DEL PROFESIONAL
Director de Interventoría	William Jiménez Martínez
Residente de Interventoría	Jaime Alfonso Barrios Contreras
Profesional HSEQ	Carlos Alberto Morales Samper
Especialista Estructural	Robespierre Sánchez Manjarrés
Especialista Hidrosanitario	Alberto Federico Mouthon Bello
Profesional Social	Eliana Correa Marimón
Auxiliar Social	Lina Del Rosario Gamarra Moreno.
Profesional Costos Y Presupuestos	Juan Camilo Eduardo Pertuz Rodas
Inspector De Interventoría	Jesús José Pertuz Ortiz
Inspector De Interventoría	Luis Ángel Díaz Mendoza
Inspector De Interventoría	María Camila Orozco Camargo
Inspector De Interventoría	Jairo Leonel Gómez Anchundia

3.4.3. Personal del Contratista

TABLA 14. PERSONAL CONTRATISTA.

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE DEL PROFESIONAL
Director de Obra	Frank David Mancilla González
Residente de Obra	Manuel Garrido Severiche
Profesional PGIO	José Antonio Puentes Díaz
Profesional Técnico de Diagnósticos	Oscar Narváez Moguea
Especialista Estructural	José Guillermo Assia De La Rosa
Especialista Hidrosanitario	Irina Alejandra Támara
Profesional Social	Isabel Garces Puello
Profesional Social	Leidys Pérez Díaz
Profesional Calidad	Jesús Hernández Paternina
Profesional Costos y Presupuestos	Cristian Alberto Pérez Espitia
Maestro de Obra	Yhon Jairo Arrieta Paternina

3.5. CONTROL DE RECURSOS Y PERSONAL

3.5.1. Control de equipos

TABLA 15. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y OFIMÁTICOS.

EQUIPO REQUERIDO	EQUIPO APROBADO PARA EL PERIODO	EQUIPO UTILIZADO EN EL PERIODO
Equipos de Medición	Flexómetros y cinta métrica	Se cuenta con flexómetros y cintas métricas para la medición de las viviendas
Equipo Fotográfico	Teléfonos con cámara	Para obtener el Registro Fotográficos del estado actual de las viviendas.
Equipo de teléfono GPS	Teléfono GPS	Teniendo en cuenta que se debe tener la georreferenciación de las viviendas a intervenir se cuenta con teléfono con GPS.
Equipo de Computo	Computadores Portátiles	Para recolección y almacenamiento de la información, comunicación y entrega de los Diagnósticos.
Equipo de Impresión	Impresoras	Suministra la información recolectada, para entregas y comités.
Equipo de Red	Internet	Ayuda a la comunicación continua entre entidad contratante contratista e Interventoría, envío de información.
Plataformas Virtuales	Aplicaciones	Conexiones entre entidad contratante, contratista e interventoría para facilitar seguimiento de actividades
Equipos de Comunicación	Celulares	Para comunicación continua entre contratista, entidad contratante, interventoría y personal administrativo y en campo.
Consola de sonido	Equipo de perifoneo	Para la divulgación de información relacionada con programa a la comunidad

Durante este periodo no se realizó actividad con maquinaria pesada, debido a que las obras son actividades constructivas menores e internas en las viviendas. Se empleó el equipo relacionado a continuación:

TABLA 16. CONTROL DE EQUIPOS.

CANT	EQUIPO	OBSERVACIONES
1	Camioneta Chevrolet	Transporte de materiales a las viviendas. Vehículo con placa: STV 065
1	Camioneta Ford	Transporte de materiales a las viviendas. Vehículo con placa: CRS 560
5	Motocarro VAISAND DB300ZH	Transporte de materiales a las viviendas. Vehículos con placas: 941 AEO - 942 AEO - 265 AAR - 267 AAR - 290 AAR
1	Camión Chevrolet	Transporte de materiales a las viviendas. Vehículo con placa: LCL 482

En el **Anexo 14,** se presenta el formato correspondiente al control de relación y equipos utilizados en obra

3.5.2. Control de personal

En el **Anexo 16,** se presenta el formato correspondiente al control de personal del contratista e interventoría.

3.6. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO

3.6.1. Comités de Seguimiento.

Durante el periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022 se realizaron los comités de seguimiento relacionados en la siguiente tabla.

TABLA 17. RELACIÓN DE COMITES DE SEGUIMIENTO

ACTA No.	FECHA	TEMA	ASISTENTES
031	02/12/2022	Aspectos Técnicos y Sociales del contrato. Seguimiento Actividad 2, 3, 4 y Compromisos del proyecto. Semana 32 y 33.	- Erika Gutiérrez Gaitán – ENTerritorio. Supervisora - Lina Otálvaro López. – ENTerritorio. Supervisora Social. - William Jiménez M. – DAIMCO S.A.S. Director de Interventoría. - Jaime Barrios C. – DAIMCO S.A.S. Residente de Interventoría. - Eliana Correa M – DAIMCO S.A.S. Prof. social de Interventoría. - Frank Mancilla – HMM S.A.S. Director de Obra - Manuel Garrido – HMM S.A.S. Residente de Obra - Isabel Garces Puello – HMM S.A.S. Prof. Social de Obra
032	09/12/2022	Aspectos Técnicos y Sociales del contrato. Seguimiento Actividad 2, 3, 4 y Compromisos del proyecto. Semana 33 y 34.	- Erika Gutiérrez Gaitán – ENTerritorio. Supervisora - Lina Otálvaro López. – ENTerritorio. Supervisora Social. - William Jiménez M. – DAIMCO S.A.S. Director de Interventoría. - Jaime Barrios C. – DAIMCO S.A.S. Residente de Interventoría. - Eliana Correa M – DAIMCO S.A.S. Prof. social de Interventoría. - Frank Mancilla – HMM S.A.S. Director de Obra - Manuel Garrido – HMM S.A.S. Residente de Obra - Isabel Garces Puello – HMM S.A.S. Prof. Social de Obra

ACTA No.	FECHA	TEMA	ASISTENTES
033	14/12/2022 - 16/12/2022	Visita de ENTerritorio y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	- Erika Gutiérrez Gaitán – ENTerritorio. Supervisora. - William Jiménez M. – DAIMCO S.A.S. Director de Interventoría. - Jaime Barrios C. – DAIMCO S.A.S. Residente de Interventoría. - Eliana Correa M – DAIMCO S.A.S. Prof. social de Interventoría. - Frank Mancilla – HMM S.A.S. Director de Obra - Manuel Garrido – HMM S.A.S. Residente de Obra - Isabel Garces Puello – HMM S.A.S. Prof. Social de Obra
034	28/12/2022	Aspectos Técnicos y Sociales del contrato. Seguimiento Actividad 2, 3, 4 y Compromisos del proyecto. Semana 36 y 37.	- Erika Gutiérrez Gaitán – ENTerritorio. Supervisora - Lina Otálvaro López. – ENTerritorio. Supervisora Social. - William Jiménez M. – DAIMCO S.A.S. Director de Interventoría. - Jaime Barrios C. – DAIMCO S.A.S. Residente de Interventoría. - Eliana Correa M – DAIMCO S.A.S. Prof. social de Interventoría. - Frank Mancilla – HMM S.A.S. Director de Obra - Manuel Garrido – HMM S.A.S. Residente de Obra - Isabel Garces Puello – HMM S.A.S. Prof. Social de Obra

***En el* Anexo 23,** se presentan las copias de las actas relacionadas

3.6.2. Comités de Aprobación.

Durante el periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022 se realizaron los comités de aprobación relacionados en la siguiente tabla.

TABLA 18. RELACIÓN DE COMITES DE APROBACIÒN

ACTA No.	FECHA	TEMA	ASISTENTES
038	01/12/2022	Comité de aprobación de diagnósticos	- William Jiménez Martínez – DAIMCO S.A.S. Director de Interventoría - Jaime Barrios Contreras. – DAIMCO S.A.S. Residente de Interventoría - María Camila Orozco C. – DAIMCO S.A.S. Inspector de Interventoría - Frank Mancilla G. – HMM S.A.S. Director de Obra - Manuel Garrido S. – HMM S.A.S. Residente de Obra - Oscar Narváez M. – HMM S.A.S. Profesional Técnico de Diagnósticos
039	01/12/2022	Comité de aprobación de diagnósticos	- William Jiménez Martínez – DAIMCO S.A.S. Director de Interventoría - Jaime Barrios Contreras. – DAIMCO S.A.S. Residente de Interventoría - María Camila Orozco C. – DAIMCO S.A.S. Inspector de Interventoría - Frank Mancilla G. – HMM S.A.S. Director de Obra - Manuel Garrido S. – HMM S.A.S. Residente de Obra - Oscar Narváez M. – HMM S.A.S. Profesional Técnico de Diagnósticos
040	02/12/2022	Comité de aprobación de diagnósticos	- William Jiménez Martínez – DAIMCO S.A.S. Director de Interventoría - Jaime Barrios Contreras. – DAIMCO S.A.S. Residente de Interventoría - María Camila Orozco C. – DAIMCO S.A.S. Inspector de Interventoría - Frank Mancilla G. – HMM S.A.S. Director de Obra - Manuel Garrido S. – HMM S.A.S. Residente de Obra - Oscar Narváez M. – HMM S.A.S. Profesional Técnico de Diagnósticos
041	05/12/2022	Comité de aprobación de diagnósticos	- William Jiménez Martínez – DAIMCO S.A.S. Director de Interventoría - Jaime Barrios Contreras. – DAIMCO S.A.S. Residente de Interventoría - María Camila Orozco C. – DAIMCO S.A.S. Inspector de Interventoría - Frank Mancilla G. – HMM S.A.S. Director de Obra - Manuel Garrido S. – HMM S.A.S. Residente de Obra - Oscar Narváez M. – HMM S.A.S. Profesional Técnico de Diagnósticos

ACTA No.	FECHA	TEMA	ASISTENTES
042	07/12/2022	Comité de aprobación de diagnósticos	- William Jiménez Martínez – DAIMCO S.A.S. Director de Interventoría - Jaime Barrios Contreras. – DAIMCO S.A.S. Residente de Interventoría - María Camila Orozco C. – DAIMCO S.A.S. Inspector de Interventoría - Frank Mancilla G. – HMM S.A.S. Director de Obra - Manuel Garrido S. – HMM S.A.S. Residente de Obra - Oscar Narváez M. – HMM S.A.S. Profesional Técnico de Diagnósticos
043	10/12/2022	Comité de aprobación de diagnósticos	- William Jiménez Martínez – DAIMCO S.A.S. Director de Interventoría - Jaime Barrios Contreras. – DAIMCO S.A.S. Residente de Interventoría - María Camila Orozco C. – DAIMCO S.A.S. Inspector de Interventoría - Frank Mancilla G. – HMM S.A.S. Director de Obra - Manuel Garrido S. – HMM S.A.S. Residente de Obra - Oscar Narváez M. – HMM S.A.S. Profesional Técnico de Diagnósticos
044	13/12/2022	Comité de aprobación de diagnósticos	- William Jiménez Martínez – DAIMCO S.A.S. Director de Interventoría - Jaime Barrios Contreras. – DAIMCO S.A.S. Residente de Interventoría - María Camila Orozco C. – DAIMCO S.A.S. Inspector de Interventoría - Frank Mancilla G. – HMM S.A.S. Director de Obra - Manuel Garrido S. – HMM S.A.S. Residente de Obra - Oscar Narváez M. – HMM S.A.S. Profesional Técnico de Diagnósticos
045	17/12/2022	Comité de aprobación de diagnósticos	- William Jiménez Martínez – DAIMCO S.A.S. Director de Interventoría - Jaime Barrios Contreras. – DAIMCO S.A.S. Residente de Interventoría - María Camila Orozco C. – DAIMCO S.A.S. Inspector de Interventoría - Frank Mancilla G. – HMM S.A.S. Director de Obra - Manuel Garrido S. – HMM S.A.S. Residente de Obra - Oscar Narváez M. – HMM S.A.S. Profesional Técnico de Diagnósticos
046	23/12/2022	Comité de aprobación de diagnósticos	- William Jiménez Martínez – DAIMCO S.A.S. Director de Interventoría - Jaime Barrios Contreras. – DAIMCO S.A.S. Residente de Interventoría - María Camila Orozco C. – DAIMCO S.A.S. Inspector de Interventoría - Frank Mancilla G. – HMM S.A.S. Director de Obra - Manuel Garrido S. – HMM S.A.S. Residente de Obra - Oscar Narváez M. – HMM S.A.S. Profesional Técnico de Diagnósticos
047	29/12/2022	Comité de aprobación de diagnósticos	- William Jiménez Martínez – DAIMCO S.A.S. Director de Interventoría - Jaime Barrios Contreras. – DAIMCO S.A.S. Residente de Interventoría - María Camila Orozco C. – DAIMCO S.A.S. Inspector de Interventoría - Frank Mancilla G. – HMM S.A.S. Director de Obra - Manuel Garrido S. – HMM S.A.S. Residente de Obra - Oscar Narváez M. – HMM S.A.S. Profesional Técnico de Diagnósticos

***En el* Anexo 23,** se presentan las copias de las actas relacionadas

TABLA 19. RELACIÓN DE APROBACIÒN DE DIAGNÓSTICOS

FECHA	VALOR TOTAL, DIAGNOSTICOS ($)	VALOR TOTAL OBRA ($)	NÚMERO DE DIAGNOSTICOS APROBADOS	VALOR TOTAL APROBADOS ($)	VALOR COMPROMETIDO ($)	SALDO POR COMPROMETER ($)
1/12/2022	$ 3.039.576,54	$ 63.960.177,21	17	$ 66.999.753,75	$ 5.224.967.708,73	$ 2.724.101.465,94
1/12/2022	$ 1.787.986,20	$ 30.375.065,48	10	$ 32.163.051,68	$ 5.257.130.760,41	$ 2.691.938.414,26
2/12/2022	$ 4.291.166,88	$ 94.455.806,61	24	$ 98.746.973,49	$ 5.355.877.733,90	$ 2.593.191.440,77
5/12/2022	$ 5.542.757,22	$ 185.691.834,66	31	$ 191.234.591,88	$ 5.547.112.325,78	$ 2.401.956.848,89
7/12/2022	$ 3.218.375,16	$ 102.843.220,50	18	$ 106.061.595,66	$ 5.653.173.921,44	$ 2.295.895.253,23
10/12/2022	$ 1.072.791,72	$ 21.366.102,10	6	$ 22.438.893,82	$ 5.675.612.815,26	$ 2.273.456.359,41
13/12/2022	$ 1.966.784,82	$ 50.979.457,38	11	$ 52.946.242,20	$ 5.728.559.057,46	$ 2.220.510.117,21
17/12/2022	$ 2.681.979,30	$ 73.680.535,61	15	$ 76.362.514,91	$ 5.804.921.572,37	$ 2.144.147.602,30
23/12/2022	$ 1.609.187,58	$ 55.826.888,57	9	$ 57.436.076,15	$ 5.862.357.648,52	$ 2.086.711.526,15
29/12/2022	$ 1.787.986,20	$ 65.374.550,61	10	$ 67.162.536,81	**$ 5.929.520.185,33**	**$ 2.019.548.989,34**
	$ 26.998.591,62	**$ 744.553.638,73**	**151**	**$ 771.552.230,35**		

3.6.3. Correspondencia

En el **Anexo 22,** se presentan la relación de correspondencia enviada y recibida.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

4.1. ACTIVIDADES DE ORDEN TÉCNICO

4.1.1. Actividad 1.

Actividad 1: Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el reglamento Colombiano de construcción sismo resistente NSR – 10.

La actividad No. 1 ha culminado, la interventoría dio aval a la actividad mediante los comunicados ICB-ENTERRITORIO-2022-019 con radicado No. 20224300185852 del 16 de mayo de 2022 e ICB-ENTERRITORIO-2022-022 con radicado No. 20224300191472 del 19 de mayo de 2022.

4.1.2. Actividad 2.

Actividad 2: Diagnóstico, Validación Preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención.

Esta actividad se inicia con el Plan de Gestión Social y sus líneas de intervención, para ello se realizaron socializaciones casa a casa, entrega de volantes con los requisitos documentales del Programa, perifoneo y demás estrategias de divulgación del Programa.

La elaboración de los diagnósticos en el Municipio de El Carmen de Bolívar se viene realizando por calles y carreras, que consiste en realizar barridos por calles y carreras mientras se visitan las viviendas. A la fecha se han realizado 404 visitas, en el barrio Nariño de las cuales se han aprobado 384, se recibió 1 renuncia al beneficio y se han clasificado 18 viviendas como no efectivas; en el barrio La Ceiba donde se han realizado 216 visitas, de las cuales se han aprobado 200 y se han clasificado 16 viviendas como no efectivas; en el barrio Vista Hermosa donde se han realizado 242 visitas, de las cuales se han aprobado 181 y se han clasificado 56 viviendas como no efectivas; y en el barrio La Victoria donde se han realizado 134 visitas, de las cuales se han aprobado 128, se recibieron 2 renuncias al beneficio y se han clasificado 4 viviendas como no efectivas

La actividad se desarrolla de la siguiente manera:

- ✓ Revisar la matriz principal, para la verificar que la vivienda se encuentre beneficiada por el PCI.
- ✓ Desinfección del personal, consiste en aplicarse alcohol en gel en las manos, alcohol liquido en la ropa
- ✓ Diligenciar el Formato PCI – 003, encuesta Potenciales Beneficiarios a cada una de las viviendas intervenidas, con el fin de categorizar las viviendas como unidades efectivas o no efectivas.
- ✓ Determinar las cantidades de puntos requeridos por la vivienda y tipo de intervención de acuerdo con los establecidos en el presente proceso.
- ✓ Realizar el registro fotográfico del antes de las viviendas, evidenciando las condiciones vulnerables de todos los aparatos existentes a intervenir, especialmente cuando se propone reposición por mal estado.

- ✓ Realizar el plan de intervención, con esquemas en los cuales se definieron la necesidad y obra a realizarse en cada vivienda.
- ✓ Definir el presupuesto de cada vivienda cumpliendo con las estructuras presupuestales.
- ✓ Obtener por parte del ocupante, propietario o poseedor de los inmuebles, la Firma del Anexo 2 de la Resolución 494 (Acta de concertación) plasmado en el formato PCI 009.
- ✓ Instalar los adhesivos en las puertas de cada vivienda visitada con la respectiva codificación.

Resumen de diagnósticos radicados entre el 01 de diciembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2022:

- ✓ Se recibió por parte del contratista oficio sin consecutivo con fecha del 28 de noviembre de 2022, en el cual se relacionan 17 diagnósticos los cuales cumplen en su totalidad con los requisitos exigidos, por lo cual se les da aprobación a través de comité de aprobación el día 01 de diciembre de 2022.
- ✓ Se recibió por parte del contratista oficio sin consecutivo con fecha del 28 de noviembre de 2022, en el cual se relacionan 10 diagnósticos los cuales cumplen en su totalidad con los requisitos exigidos, por lo cual se les da aprobación a través de comité de aprobación el día 01 de diciembre de 2022.
- ✓ Se recibió por parte del contratista oficio sin consecutivo con fecha del 30 de noviembre de 2022, en el cual se relacionan 24 diagnósticos los cuales cumplen en su totalidad con los requisitos exigidos, por lo cual se les da aprobación a través de comité de aprobación el día 02 de diciembre de 2022.
- ✓ Se recibió por parte del contratista oficio sin consecutivo con fecha del 03 de diciembre de 2022, en el cual se relacionan 31 diagnósticos los cuales cumplen en su totalidad con los requisitos exigidos, por lo cual se les da aprobación a través de comité de aprobación el día 05 de diciembre de 2022.
- ✓ Se recibió por parte del contratista oficio sin consecutivo con fecha del 05 de diciembre de 2022, en el cual se relacionan 18 diagnósticos los cuales cumplen en su totalidad con los requisitos exigidos, por lo cual se les da aprobación a través de comité de aprobación el día 07 de diciembre de 2022.
- ✓ Se recibió por parte del contratista oficio sin consecutivo con fecha del 06 de diciembre de 2022, en el cual se relacionan 6 diagnósticos los cuales cumplen en su totalidad con los requisitos exigidos, por lo cual se les da aprobación a través de comité de aprobación el día 10 de diciembre de 2022.
- ✓ Se recibió por parte del contratista oficio sin consecutivo con fecha del 09 de diciembre de 2022, en el cual se relacionan 11 diagnósticos los cuales cumplen en su totalidad con los requisitos exigidos, por lo cual se les da aprobación a través de comité de aprobación el día 13 de diciembre de 2022.
- ✓ Se recibió por parte del contratista oficio sin consecutivo con fecha del 16 de diciembre de 2022, en el cual se relacionan 15 diagnósticos los cuales cumplen en su totalidad con los requisitos exigidos, por lo cual se les da aprobación a través de comité de aprobación el día 17 de diciembre de 2022.

- ✓ Se recibió por parte del contratista oficio sin consecutivo con fecha del 22 de diciembre de 2022, en el cual se relacionan 9 diagnósticos los cuales cumplen en su totalidad con los requisitos exigidos, por lo cual se les da aprobación a través de comité de aprobación el día 23 de diciembre de 2022.
- ✓ Se recibió por parte del contratista oficio sin consecutivo con fecha del 27 de diciembre de 2022, en el cual se relacionan 10 diagnósticos los cuales cumplen en su totalidad con los requisitos exigidos, por lo cual se les da aprobación a través de comité de aprobación el día 29 de diciembre de 2022.

En el **Anexo 5,** se presentan las actas de concertación aprobadas.
En el **Anexo 6,** se presentan las actas de vecindad levantadas.
En el **Anexo 11,** se presenta el registro fotográfico de las viviendas visitadas.

4.1.3. Actividad 3.

Actividad 3: Ejecución de las obras de las Conexiones Intradomiciliarias y Domiciliarias Acta de Entrega y Recibo de las obras.

A la fecha de corte de este informe el contratista de obra cuenta con 893 diagnósticos aprobados por la interventoría, 714 viviendas iniciadas, de las cuales 538 se encuentran terminadas, 70 listas sin enchape y 106 en ejecución. La interventoría realiza a diario verificación de las actividades contractuales y que se cumplan de acuerdo con las especificaciones Técnicas entregadas por ENTerritorio.

Se relaciona cuadro de ejecución y avance de obras hasta la fecha:

TABLA 20. SEGUIMIENTO DE INTERVENCIÓN DE VIVIENDAS.

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
1	B-CB-N-M20-VE-001	100%	Adecuación	$3.969.702,73	$3.969.702,73	7/08/2022	TERMINADO	**10/08/2022**	14/08/2022
2	B-CB-N-M18-VE-002	100%	Caseta T1	$7.481.934,04	$7.481.934,04	6/07/2022	TERMINADO	**11/07/2022**	17/07/2022
3	B-CB-N-M18-VE-003	100%	Adecuación	$1.941.065,78	$1.941.065,78	7/08/2022	TERMINADO	**10/08/2022**	14/08/2022
4	B-CB-N-M16-VE-004	260%	Adecuación	$1.447.511,07	$3.770.302,87	1/09/2022	TERMINADO	**4/09/2022**	25/09/2022
5	B-CB-N-M16-VE-005	100%	Caseta T1	$8.063.104,79	$8.063.104,79	7/06/2022	TERMINADO	**12/06/2022**	4/07/2022
6	B-CB-N-M16-VE-006	100%	Caseta T1	$6.953.020,57	$6.953.020,57	9/06/2022	TERMINADO	**14/06/2022**	4/07/2022
7	B-CB-N-M17-VE-007	100%	Adecuación	$3.943.068,88	$3.943.068,88	26/06/2022	TERMINADO	**29/06/2022**	17/07/2022
8	B-CB-N-M17-VE-008	100%	Adecuación	$1.594.328,96	$1.594.328,96	7/08/2022	TERMINADO	**10/08/2022**	17/08/2022
9	B-CB-N-M17-VE-009	100%	Caseta T1	$7.932.534,21	$7.932.534,21	10/06/2022	TERMINADO	**15/06/2022**	4/07/2022
10	B-CB-N-M17-VE-010	100%	Caseta T1	$8.213.565,95	$8.213.565,95	15/06/2022	TERMINADO	**20/06/2022**	4/07/2022
11	B-CB-N-M18-VE-011	122%	Adecuación	$3.280.683,37	$3.997.656,66	5/09/2022	TERMINADO	**8/09/2022**	25/09/2022
12	B-CB-N-M18-VE-012	100%	Caseta T1	$7.713.713,37	$7.713.713,37	14/06/2022	TERMINADO	**19/06/2022**	4/07/2022

13	B-CB-N-M19-VE-013	100%	Caseta T1	$7.656.760,90	$7.656.760,90	16/06/2022	TERMINADO	**21/06/2022**	4/07/2022
14	B-CB-N-M19-VE-014	171%	Adecuación	$2.281.138,76	$3.901.438,74	7/08/2022	TERMINADO	**10/08/2022**	25/09/2022
15	B-CB-N-M19-VE-015	128%	Adecuación	$2.994.464,57	$3.822.380,47	16/08/2022	TERMINADO	**19/08/2022**	30/08/2022
16	B-CB-N-M21-VE-016	100%	Caseta T1	$7.041.382,22	$7.041.382,22	14/06/2022	TERMINADO	**19/06/2022**	4/07/2022
17	B-CB-N-M21-VE-017	100%	Caseta T2	$5.725.640,17	$5.725.640,17	21/06/2022	TERMINADO	**26/06/2022**	4/07/2022
18	B-CB-N-M21-VE-018	100%	Caseta T2	$7.649.315,97	$7.649.315,97	21/06/2022	TERMINADO	**26/06/2022**	4/07/2022
19	B-CB-N-M21-VE-019	149%	Adecuación	$2.589.009,71	$3.845.338,03	16/08/2022	TERMINADO	**19/08/2022**	30/08/2022
20	B-CB-N-M21-VE-020	107%	Adecuación	$2.912.296,98	$3.112.829,14	23/07/2022	TERMINADO	**26/07/2022**	24/07/2022
21	B-CB-N-M02-VE-021	102%	Caseta T1	$3.289.899,35	$3.357.780,70	18/10/2022	TERMINADO	**23/10/2022**	30/10/2022
22	B-CB-N-M02-VE-022	100%	Caseta T1	$7.554.300,00	$7.554.300,00	16/06/2022	TERMINADO	**21/06/2022**	4/07/2022
23	B-CB-N-M02-VE-023	87%	Adecuación	$2.492.571,86	$2.157.612,90	7/08/2022	TERMINADO	**10/08/2022**	25/09/2022
24	B-CB-N-M02-VE-024	100%	Caseta T1	$6.890.204,61	$6.890.204,61	16/06/2022	TERMINADO	**21/06/2022**	4/07/2022
25	B-CB-N-M02-VE-025	119%	Adecuación	$3.175.408,65	$3.780.064,63	18/10/2022	TERMINADO	**21/10/2022**	30/10/2022
26	B-CB-N-M02-VE-026	100%	Caseta T1	$7.399.588,59	$7.399.588,59	18/06/2022	TERMINADO	**23/06/2022**	4/07/2022
27	B-CB-N-M02-VE-027	100%	Adecuación	$2.795.704,81	$2.795.704,81	7/08/2022	TERMINADO	**10/08/2022**	30/08/2022
28	B-CB-N-M04-VE-028	129%	Adecuación	$2.926.399,11	$3.773.839,42	16/08/2022	TERMINADO	**19/08/2022**	30/08/2022
29	B-CB-N-M04-VE-030	57%	Adecuación	$1.749.493,32	$1.003.071,35	8/10/2022	TERMINADO	**11/10/2022**	30/10/2022
30	B-CB-N-M04-VE-031	114%	Adecuación	$4.163.124,02	$4.743.713,45	8/09/2022	TERMINADO	**11/09/2022**	18/12/2022
31	B-CB-N-M04-VE-032	100%	Caseta T2	$6.890.540,49	$6.890.540,49	27/06/2022	TERMINADO	**2/07/2022**	9/07/2022
32	B-CB-N-M06-VE-033	100%	Caseta T1	$7.716.189,86	$7.716.189,86	15/07/2022	TERMINADO	**20/07/2022**	25/07/2022
33	B-CB-N-M04-VE-034	101%	Caseta T1	$7.557.058,79	$7.607.947,90	21/06/2022	TERMINADO	**26/06/2022**	4/07/2022
34	B-CB-N-M05-VE-035	100%	Caseta T1	$7.725.921,38	$7.725.921,38	23/06/2022	TERMINADO	**28/06/2022**	9/07/2022
35	B-CB-N-M05-VE-036	100%	Caseta T1	$7.159.051,42	$7.159.051,42	21/06/2022	TERMINADO	**26/06/2022**	4/07/2022
36	B-CB-N-M07-VE-037	184%	Adecuación	$2.530.285,02	$4.655.895,64	2/12/2022	NO TERMINADO	**5/12/2022**	
37	B-CB-N-M07-VE-038	100%	Caseta T1	$7.291.584,15	$7.291.584,15	1/07/2022	TERMINADO	**6/07/2022**	9/07/2022
38	B-CB-N-M04-VE-039	103%	Caseta T1	$7.858.384,93	$8.113.399,74	4/07/2022	TERMINADO	**9/07/2022**	19/07/2022
39	B-CB-N-M05-VE-040	82%	Caseta T1	$7.216.166,60	$5.943.482,59	1/09/2022	TERMINADO	**6/09/2022**	25/09/2022
40	B-CB-N-M04-VE-041	100%	Caseta T2	$5.382.242,21	$5.382.242,21	5/07/2022	TERMINADO	**10/07/2022**	17/07/2022
41	B-CB-N-M05-VE-042	170%	Caseta T1	$3.810.454,96	$6.491.970,51	14/09/2022	TERMINADO	**19/09/2022**	30/10/2022
42	B-CB-N-M05-VE-044	100%	Caseta T1	$7.534.259,23	$7.534.259,23	26/06/2022	TERMINADO	**1/07/2022**	9/07/2022

43	B-CB-N-M05-VE-045	100%	Caseta T1	$6.506.628,47	$6.506.628,47	26/06/2022	TERMINADO	**1/07/2022**	9/07/2022
44	B-CB-N-M04-VE-046	100%	Caseta T2	$6.483.569,95	$6.483.569,95	24/06/2022	TERMINADO	**29/06/2022**	4/07/2022
45	B-CB-N-M04-VE-047	100%	Caseta T2	$6.292.406,50	$6.292.406,50	24/06/2022	TERMINADO	**29/06/2022**	4/07/2022
46	B-CB-N-M06-VE-048	25%	Adecuación	$4.050.702,70	$1.012.675,68	16/12/2022	NO TERMINADO	**19/12/2022**	
47	B-CB-N-M05-VE-049	106%	Adecuación	$3.086.791,66	$3.284.060,64	5/09/2022	TERMINADO	**8/09/2022**	9/10/2022
48	B-CB-N-M06-VE-050	110%	Caseta T1	$7.096.208,83	$7.791.328,84	7/08/2022	TERMINADO	**12/08/2022**	30/10/2022
49	B-CB-N-M08-VE-052	100%	Caseta T1	$8.047.309,12	$8.047.309,12	28/06/2022	TERMINADO	**3/07/2022**	4/07/2022
50	B-CB-N-M06-VE-053	100%	Caseta T1	$6.760.973,95	$6.760.973,95	1/07/2022	TERMINADO	**6/07/2022**	17/07/2022
51	B-CB-N-M08-VE-054	100%	Caseta T1	$6.857.811,82	$6.857.811,82	1/07/2022	TERMINADO	**6/07/2022**	9/07/2022
52	B-CB-N-M08-VE-055	100%	Caseta T1	$7.671.554,25	$7.671.554,25	1/07/2022	TERMINADO	**6/07/2022**	17/07/2022
53	B-CB-N-M08-VE-056	105%	Caseta T1	$7.769.282,32	$8.177.937,17	1/09/2022	TERMINADO	**6/09/2022**	30/10/2022
54	B-CB-N-M07-VE-057	100%	Caseta T1	$7.732.943,95	$7.729.250,84	1/10/2022	TERMINADO	**6/10/2022**	9/10/2022
55	B-CB-N-M06-VE-058	100%	Caseta T2	$6.697.105,43	$6.697.105,43	1/07/2022	TERMINADO	**6/07/2022**	17/07/2022
56	B-CB-N-M09-VE-059	95%	Caseta T1	$7.511.544,56	$7.135.967,33	30/08/2022	TERMINADO	**4/09/2022**	23/10/2022
57	B-CB-N-M10-VE-060	100%	Caseta T1	$7.561.885,91	$7.561.885,91	1/07/2022	TERMINADO	**6/07/2022**	9/07/2022
58	B-CB-N-M09-VE-061	100%	Caseta T1	$6.772.308,85	$6.772.308,85	7/07/2022	TERMINADO	**12/07/2022**	18/07/2022
59	B-CB-N-M10-VE-062	100%	Caseta T1	$6.118.878,54	$6.118.878,54	9/07/2022	TERMINADO	**14/07/2022**	19/07/2022
60	B-CB-N-M09-VE-063	92%	Adecuación	$5.152.296,93	$4.765.360,63	30/11/2022	NO TERMINADO	**3/12/2022**	
61	B-CB-N-M10-VE-064	216%	Adecuación	$3.482.814,44	$7.529.670,17	20/11/2022	TERMINADO	**23/11/2022**	4/12/2022
62	B-CB-N-M10-VE-065	100%	Caseta T1	$7.539.908,21	$7.539.908,21	13/07/2022	TERMINADO	**18/07/2022**	19/07/2022
63	B-CB-N-M11-VE-066	65%	Caseta T1	$7.673.904,85	$4.988.115,75		NO TERMINADO		
64	B-CB-N-M11-VE-067	134%	Caseta T1	$5.590.948,09	$7.501.404,72		TERMINADO		11/12/2022
65	B-CB-N-M41-VE-068	100%	Caseta T1	$7.267.983,56	$7.267.983,56	11/07/2022	TERMINADO	**16/07/2022**	19/07/2022
66	B-CB-N-M11-VE-069	100%	Caseta T2	$5.866.572,38	$5.866.572,38	11/07/2022	TERMINADO	**16/07/2022**	20/07/2022
67	B-CB-N-M06-VE-070	119%	Adecuación	$4.190.018,15	$4.994.426,06	4/12/2022	NO TERMINADO	**7/12/2022**	
68	B-CB-N-M09-VE-071	151%	Caseta T1	$4.997.176,61	$7.557.820,70		TERMINADO		4/12/2022
69	B-CB-N-M09-VE-072	100%	Caseta T1	$7.665.439,25	$7.665.439,25	15/08/2022	TERMINADO	**20/08/2022**	25/09/2022
70	B-CB-N-M18-VE-074	100%	Caseta T1	$7.221.567,66	$7.221.567,66	2/07/2022	TERMINADO	**7/07/2022**	17/07/2022
71	B-CB-N-M18-VE-075	100%	Caseta T1	$7.972.543,09	$7.972.543,09	26/06/2022	TERMINADO	**1/07/2022**	4/07/2022
72	B-CB-N-M16-VE-076	100%	Caseta T1	$7.608.540,16	$7.608.540,16	2/07/2022	TERMINADO	**7/07/2022**	17/07/2022

73	B-CB-N-M19-VE-077	100%	Caseta T1	$7.734.155,16	$7.734.155,16	9/07/2022	TERMINADO	**14/07/2022**	19/07/2022
74	B-CB-N-M18-VE-078	100%	Caseta T1	$6.774.174,14	$6.774.174,14	2/07/2022	TERMINADO	**7/07/2022**	17/07/2022
75	B-CB-N-M18-VE-079	100%	Caseta T1	$8.053.224,81	$8.053.224,81	4/07/2022	TERMINADO	**9/07/2022**	9/07/2022
76	B-CB-N-M20-VE-080	100%	Caseta T1	$7.022.267,26	$7.022.267,26	11/07/2022	TERMINADO	**16/07/2022**	31/07/2022
77	B-CB-N-M19-VE-081	100%	Caseta T1	$7.895.993,82	$7.895.993,82	5/07/2022	TERMINADO	**10/07/2022**	17/07/2022
78	B-CB-N-M22-VE-082	100%	Caseta T1	$6.614.437,32	$6.614.437,32	22/07/2022	TERMINADO	**27/07/2022**	16/08/2022
79	B-CB-N-M19-VE-083	100%	Caseta T1	$7.477.550,94	$7.477.550,94	6/07/2022	TERMINADO	**11/07/2022**	17/07/2022
80	B-CB-N-M22-VE-084	95%	Caseta T1	$7.679.083,58	$7.295.129,40		NO TERMINADO		
81	B-CB-N-M20-VE-085	102%	Caseta T1	$7.872.964,29	$8.014.752,04	15/07/2022	TERMINADO	**20/07/2022**	30/07/2022
82	B-CB-N-M19-VE-087	100%	Caseta T1	$7.953.298,01	$7.953.298,01	14/07/2022	TERMINADO	**19/07/2022**	3/08/2022
83	B-CB-N-M30-VE-088	100%	Caseta T1	$7.454.929,22	$7.454.929,22	15/07/2022	TERMINADO	**20/07/2022**	2/08/2022
84	B-CB-N-M16-VE-089	100%	Caseta T1	$7.510.305,06	$7.510.305,06	30/06/2022	TERMINADO	**5/07/2022**	9/07/2022
85	B-CB-N-M30-VE-090	100%	Caseta T1	$7.690.908,30	$7.690.908,30	19/07/2022	TERMINADO	**24/07/2022**	31/07/2022
86	B-CB-N-M16-VE-091	96%	Adecuación	$2.681.287,31	$2.564.010,47	7/12/2022	NO TERMINADO	**10/12/2022**	
87	B-CB-N-M30-VE-092	100%	Caseta T1	$7.704.038,45	$7.704.038,45	20/07/2022	TERMINADO	**25/07/2022**	1/08/2022
88	B-CB-N-M23-VE-093	100%	Caseta T1	$7.900.993,68	$7.900.993,68	1/07/2022	TERMINADO	**6/07/2022**	9/07/2022
89	B-CB-N-M30-VE-094	100%	Caseta T2	$5.945.233,74	$5.945.233,74	11/07/2022	TERMINADO	**16/07/2022**	31/07/2022
90	B-CB-N-M23-VE-095	100%	Caseta T1	$7.605.104,53	$7.605.104,53	2/07/2022	TERMINADO	**7/07/2022**	9/07/2022
91	B-CB-N-M30-VE-096	100%	Caseta T1	$7.126.858,52	$7.126.858,52	22/07/2022	TERMINADO	**27/07/2022**	21/08/2022
92	B-CB-N-M23-VE-097	56%	Adecuación	$6.210.273,49	$3.450.882,84	16/11/2022	NO TERMINADO	**19/11/2022**	
93	B-CB-N-M30-VE-098	100%	Caseta T1	$7.396.524,24	$7.396.524,24	11/07/2022	TERMINADO	**16/07/2022**	20/07/2022
94	B-CB-N-M30-VE-100	29%	Adecuación	$3.499.532,79	$1.028.895,19	4/12/2022	NO TERMINADO	**7/12/2022**	
95	B-CB-N-M22-VE-101	100%	Caseta T1	$6.645.995,09	$6.645.995,09	14/07/2022	TERMINADO	**19/07/2022**	31/07/2022
96	B-CB-N-M30-VE-102	100%	Caseta T1	$6.995.767,14	$6.995.767,14	15/07/2022	TERMINADO	**20/07/2022**	24/07/2022
97	B-CB-N-M29-VE-103	95%	Adecuación	$6.995.767,14	$6.645.978,78	19/09/2022	TERMINADO	**22/09/2022**	9/10/2022
98	B-CB-N-M29-VE-104	95%	Caseta T1	$6.995.767,14	$6.645.978,78	2/08/2022	TERMINADO	**7/08/2022**	9/10/2022
99	B-CB-N-M30-VE-105	100%	Caseta T1	$6.752.771,85	$6.752.771,85	16/07/2022	TERMINADO	**21/07/2022**	31/07/2022
100	B-CB-N-M20-VE-107	100%	Caseta T1	$7.619.764,75	$7.636.577,83	23/07/2022	TERMINADO	**28/07/2022**	2/08/2022
101	B-CB-N-M29-VE-106	100%	Caseta T1	$6.701.483,49	$6.701.483,49	21/07/2022	TERMINADO	**26/07/2022**	31/07/2022
102	B-CB-N-M29-VE-108	100%	Caseta T1	$6.509.525,31	$6.509.525,31	21/07/2022	TERMINADO	**26/07/2022**	5/09/2022

103	B-CB-N-M04-VE-109	109%	Adecuación	$3.769.811,09	$4.117.182,92		TERMINADO		20/11/2022
104	B-CB-N-M19-VE-110	196%	Caseta T1	$3.782.163,82	$7.412.993,29		TERMINADO		30/10/2022
105	B-CB-N-M20-VE-111	100%	Caseta T1	$7.574.979,38	$7.574.979,38	12/07/2022	TERMINADO	**17/07/2022**	20/07/2022
106	B-CB-N-M19-VE-112	100%	Caseta T1	$7.080.057,71	$7.080.057,71	13/07/2022	TERMINADO	**18/07/2022**	21/07/2022
107	B-CB-N-M29-VE-113	100%	Caseta T1	$7.110.972,36	$7.110.972,36	16/07/2022	TERMINADO	**21/07/2022**	1/08/2022
108	B-CB-N-M20-VE-114	100%	Caseta T1	$7.067.384,78	$7.067.384,78	11/07/2022	TERMINADO	**16/07/2022**	19/07/2022
109	B-CB-N-M29-VE-115	100%	Caseta T1	$7.398.324,37	$7.398.324,37	21/07/2022	TERMINADO	**26/07/2022**	2/10/2022
110	B-CB-N-M19-VE-116	100%	Caseta T1	$7.270.314,65	$7.270.314,65	13/07/2022	TERMINADO	**18/07/2022**	31/07/2022
111	B-CB-N-M29-VE-117	110%	Adecuación	$3.244.599,69	$3.579.064,89	8/09/2022	TERMINADO	**11/09/2022**	19/09/2022
112	B-CB-N-M29-VE-118	100%	Caseta T1	$7.515.706,29	$7.515.706,29	12/07/2022	TERMINADO	**17/07/2022**	31/07/2022
113	B-CB-N-M22-VE-119	215%	Caseta T1	$3.465.399,14	$7.449.555,42	8/09/2022	TERMINADO	**13/09/2022**	9/10/2022
114	B-CB-N-M22-VE-120	100%	Caseta T2	$6.908.023,67	$6.908.023,67	15/07/2022	TERMINADO	**20/07/2022**	31/07/2022
115	B-CB-N-M22-VE-121	96%	Caseta T1	$7.726.065,21	$7.405.644,04	31/07/2022	TERMINADO	**5/08/2022**	25/09/2022
116	B-CB-N-M22-VE-122	97%	Caseta T1	$7.603.368,74	$7.344.014,61	2/08/2022	TERMINADO	**7/08/2022**	9/10/2022
117	B-CB-N-M17-VE-123	77%	Adecuación	$3.499.958,60	$2.689.912,21	18/09/2022	TERMINADO	**21/09/2022**	25/09/2022
118	B-CB-N-M23-VE-124	95%	Caseta T2	$7.603.739,30	$7.223.552,34	21/07/2022	TERMINADO	**26/07/2022**	9/10/2022
119	B-CB-N-M23-VE-125	113%	Caseta T2	$5.971.711,82	$6.768.512,07	21/07/2022	TERMINADO	**26/07/2022**	14/08/2022
120	B-CB-N-M23-VE-126	101%	Caseta T1	$7.274.897,66	$7.370.077,61	21/07/2022	TERMINADO	**26/07/2022**	14/08/2022
121	B-CB-N-M23-VE-127	101%	Caseta T2	$6.279.806,34	$6.324.767,59	21/07/2022	TERMINADO	**26/07/2022**	14/08/2022
122	B-CB-N-M23-VE-128	101%	Caseta T1	$7.499.824,24	$7.604.934,85	21/07/2022	TERMINADO	**26/07/2022**	14/08/2022
123	B-CB-N-M23-VE-129	95%	Adecuación	$3.445.220,00	$3.278.303,85	1/08/2022	TERMINADO	**4/08/2022**	10/08/2022
124	B-CB-N-M16-VE-130	100%	Caseta T1	$7.603.151,01	$7.625.369,65	22/07/2022	TERMINADO	**27/07/2022**	14/08/2022
125	B-CB-N-M16-VE-131	100%	Caseta T1	$7.513.645,49	$7.513.645,49	21/07/2022	TERMINADO	**26/07/2022**	14/08/2022
126	B-CB-N-M16-VE-132	94%	Caseta T1	$8.496.612,33	$7.984.826,62	21/07/2022	TERMINADO	**26/07/2022**	14/08/2022
127	B-CB-N-M16-VE-133	67%	Adecuación	$3.790.644,00	$2.542.057,78		TERMINADO		20/11/2022
128	B-CB-N-M24-VE-134	100%	Caseta T1	$6.786.534,02	$6.786.534,02	21/07/2022	TERMINADO	**26/07/2022**	31/07/2022
129	B-CB-N-M28-VE-135	100%	Caseta T1	$8.037.559,01	$8.037.559,01	21/07/2022	TERMINADO	**26/07/2022**	14/08/2022
130	B-CB-N-M24-VE-136	102%	Caseta T1	$7.759.234,12	$7.888.383,80	21/07/2022	TERMINADO	**26/07/2022**	1/08/2022
131	B-CB-N-M24-VE-137	100%	Caseta T1	$7.392.203,11	$7.392.203,11	21/07/2022	TERMINADO	**26/07/2022**	4/08/2022
132	B-CB-N-M24-VE-138	100%	Caseta T1	$7.192.735,86	$7.192.735,86	21/07/2022	TERMINADO	**26/07/2022**	9/08/2022

133	B-CB-N-M24-VE-139	93%	Adecuación	$2.804.079,17	$2.602.584,80	2/12/2022	NO TERMINADO	**5/12/2022**	
134	B-CB-N-M24-VE-140	239%	Caseta T1	$2.732.060,54	$6.540.043,92	2/12/2022	NO TERMINADO	**7/12/2022**	
135	B-CB-N-M28-VE-141	107%	Caseta T1	$7.531.022,33	$8.090.860,79	21/07/2022	TERMINADO	**26/07/2022**	9/10/2022
136	B-CB-N-M28-VE-142	203%	Caseta T1	$3.233.538,95	$6.564.776,96		NO TERMINADO		
137	B-CB-N-M28-VE-143	100%	Caseta T1	$7.525.776,94	$7.525.776,94	27/07/2022	TERMINADO	**1/08/2022**	14/08/2022
138	B-CB-N-M28-VE-144	99%	Caseta T1	$7.260.716,80	$7.196.151,18		TERMINADO		13/11/2022
139	B-CB-N-M28-VE-145	96%	Caseta T1	$7.795.034,08	$7.449.018,44		TERMINADO		13/11/2022
140	B-CB-N-M28-VE-146	93%	Caseta T1	$8.299.177,80	$7.759.385,29	14/08/2022	TERMINADO	**19/08/2022**	30/08/2022
141	B-CB-N-M35-VE-147	100%	Caseta T1	$7.227.026,84	$7.227.026,84	27/07/2022	TERMINADO	**1/08/2022**	9/08/2022
142	B-CB-N-M35-VE-148	106%	Caseta T4	$8.296.700,34	$8.792.124,08	28/07/2022	TERMINADO	**2/08/2022**	2/08/2022
143	B-CB-N-M35-VE-149	95%	Caseta T1	$7.679.864,56	$7.295.871,33	20/09/2022	TERMINADO	**25/09/2022**	9/10/2022
144	B-CB-N-M35-VE-150	102%	Caseta T1	$7.785.418,13	$7.904.685,97	28/07/2022	TERMINADO	**2/08/2022**	27/11/2022
145	B-CB-N-M35-VE-151	100%	Caseta T1	$6.765.763,36	$6.765.763,36	30/07/2022	TERMINADO	**4/08/2022**	5/09/2022
146	B-CB-N-M35-VE-152	97%	Caseta T1	$7.762.557,69	$7.505.122,25	30/07/2022	TERMINADO	**4/08/2022**	9/10/2022
147	B-CB-N-M34-VE-153	102%	Caseta T1	$7.454.780,26	$7.628.834,92		TERMINADO		23/10/2022
148	B-CB-N-M35-VE-154	95%	Caseta T1	$9.355.773,26	$8.887.984,60	28/07/2022	TERMINADO	**2/08/2022**	25/09/2022
149	B-CB-N-M35-VE-155	97%	Caseta T1	$7.491.011,70	$7.284.332,43	10/08/2022	TERMINADO	**15/08/2022**	9/10/2022
150	B-CB-N-M35-VE-156	100%	Caseta T1	$6.577.720,90	$6.577.720,90	28/07/2022	TERMINADO	**2/08/2022**	14/08/2022
151	B-CB-N-M36-VE-157	100%	Caseta T1	$7.264.669,67	$7.264.669,67	28/07/2022	TERMINADO	**2/08/2022**	2/08/2022
152	B-CB-N-M36-VE-158	100%	Caseta T1	$6.914.609,55	$6.914.609,55	30/07/2022	TERMINADO	**4/08/2022**	14/08/2022
153	B-CB-N-M37-VE-159	87%	Caseta T1	$7.541.795,32	$6.562.458,83	6/10/2022	NO TERMINADO	**11/10/2022**	
154	B-CB-N-M36-VE-160	100%	Caseta T1	$8.002.298,58	$8.002.298,58	31/07/2022	TERMINADO	**5/08/2022**	9/08/2022
155	B-CB-N-M38-VE-161	101%	Caseta T1	$7.818.320,74	$7.908.666,91	8/08/2022	TERMINADO	**13/08/2022**	2/10/2022
156	B-CB-N-M37-VE-162	100%	Caseta T1	$7.424.030,72	$7.424.030,72	31/07/2022	TERMINADO	**5/08/2022**	25/09/2022
157	B-CB-N-M37-VE-163	95%	Caseta T1	$7.597.016,14	$7.217.165,33	3/08/2022	TERMINADO	**8/08/2022**	27/11/2022
158	B-CB-N-M37-VE-164	115%	Caseta T1	$6.894.085,75	$7.920.886,00	31/07/2022	TERMINADO	**5/08/2022**	2/10/2022
159	B-CB-N-M38-VE-165	95%	Caseta T1	$8.429.655,54	$8.008.172,76		NO TERMINADO		
160	B-CB-N-M13-VE-166	100%	Caseta T1	$7.171.469,17	$7.171.469,17	16/08/2022	TERMINADO	**21/08/2022**	30/08/2022
161	B-CB-N-M27-VE-167	95%	Caseta T1	$8.080.596,20	$7.676.566,39		TERMINADO		23/10/2022
162	B-CB-N-M38-VE-168	99%	Caseta T1	$7.320.986,92	$7.256.307,19	3/09/2022	TERMINADO	**8/09/2022**	2/10/2022

163	B-CB-N-M13-VE-169	100%	Caseta T1	$7.458.314,55	$7.458.314,55	3/08/2022	TERMINADO	**8/08/2022**	21/08/2022
164	B-CB-N-M13-VE-170	90%	Caseta T2	$8.229.125,93	$7.406.213,34		TERMINADO		20/11/2022
165	B-CB-N-M13-VE-171	114%	Adecuación	$2.886.249,42	$3.300.006,73	4/12/2022	NO TERMINADO	**7/12/2022**	
166	B-CB-N-M13-VE-172	99%	Caseta T1	$7.270.587,03	$7.224.770,69		TERMINADO		20/11/2022
167	B-CB-N-M13-VE-173	195%	Caseta T1	$3.932.858,21	$7.679.751,18	14/11/2022	NO TERMINADO	**19/11/2022**	
168	B-CB-N-M06-VE-174	102%	Adecuación	$4.884.354,45	$4.963.132,21	12/12/2022	NO TERMINADO	**15/12/2022**	
169	B-CB-N-M13-VE-175	90%	Caseta T1	$9.012.007,19	$8.110.806,47		NO TERMINADO		
170	B-CB-N-M27-VE-176	85%	Caseta T1	$7.720.615,77	$6.569.437,59	18/10/2022	NO TERMINADO	**23/10/2022**	
171	B-CB-N-M27-VE-177	74%	Caseta T1	$7.314.946,45	$5.379.405,37	6/10/2022	NO TERMINADO	**11/10/2022**	
172	B-CB-N-M27-VE-178	87%	Caseta T1	$7.935.982,03	$6.929.441,80	6/10/2022	NO TERMINADO	**11/10/2022**	
173	B-CB-N-M13-VE-179	99%	Caseta T1	$7.325.841,56	$7.216.431,29		TERMINADO		18/12/2022
174	B-CB-N-M27-VE-180	89%	Caseta T1	$7.895.371,03	$7.025.558,29		NO TERMINADO		
175	B-CB-N-M13-VE-181	85%	Caseta T1	$7.612.716,77	$6.453.841,43	6/10/2022	NO TERMINADO	**11/10/2022**	
176	B-CB-N-M38-VE-182	73%	Caseta T1	$7.180.420,36	$5.256.561,82	11/10/2022	NO TERMINADO	**16/10/2022**	
177	B-CB-N-M13-VE-183	90%	Caseta T1	$7.784.688,23	$7.006.219,41		NO TERMINADO		
178	B-CB-N-M27-VE-184	94%	Caseta T1	$7.542.683,94	$7.073.400,28		NO TERMINADO		
179	B-CB-N-M35-VE-185	95%	Caseta T1	$8.427.309,71	$8.005.944,22		TERMINADO		9/10/2022
180	B-CB-N-M13-VE-186	87%	Caseta T1	$8.168.190,01	$7.083.096,48	6/10/2022	NO TERMINADO	**11/10/2022**	
181	B-CB-N-M36-VE-187	77%	Caseta T1	$7.404.436,21	$5.735.176,66	7/12/2022	NO TERMINADO	**12/12/2022**	
182	B-CB-N-M36-VE-188	72%	Caseta T1	$8.112.332,81	$5.843.930,95	7/12/2022	NO TERMINADO	**12/12/2022**	
183	B-CB-N-M28-VE-189	90%	Caseta T1	$7.764.697,67	$6.993.823,27		NO TERMINADO	**5/01/1900**	
184	B-CB-N-M25-VE-190	98%	Caseta T1	$7.542.159,42	$7.373.776,73		TERMINADO		20/11/2022
185	B-CB-N-M27-VE-191	111%	Caseta T1	$6.727.993,31	$7.440.443,08		TERMINADO		18/12/2022
186	B-CB-N-M37-VE-192	89%	Caseta T1	$7.678.430,98	$6.862.238,54	11/10/2022	NO TERMINADO	**16/10/2022**	
187	B-CB-N-M38-VE-193	118%	Caseta T1	$6.711.195,46	$7.886.909,00		TERMINADO		20/11/2022
188	B-CB-N-M25-VE-194	95%	Caseta T1	$9.326.944,17	$8.860.596,96		NO TERMINADO		
189	B-CB-N-M25-VE-195	101%	Caseta T1	$7.276.590,31	$7.344.831,76		TERMINADO		20/11/2022
190	B-CB-N-M26-VE-196	161%	Adecuación	$2.949.510,67	$4.749.730,81	10/12/2022	NO TERMINADO	**13/12/2022**	
191	B-CB-N-M27-VE-197	96%	Caseta T1	$7.868.312,33	$7.536.226,00		TERMINADO		20/11/2022
192	B-CB-N-M26-VE-198	95%	Adecuación	$7.105.142,43	$6.749.885,31		NO TERMINADO		

193	B-CB-N-M40-VE-199	95%	Caseta T1	$7.783.435,41	$7.394.263,64		TERMINADO		23/10/2022
194	B-CB-N-M26-VE-201	95%	Caseta T1	$8.043.429,93	$7.641.258,43	19/08/2022	TERMINADO	**24/08/2022**	30/10/2022
195	B-CB-N-M26-VE-202	95%	Caseta T1	$8.666.869,36	$8.233.525,89	27/09/2022	TERMINADO	**2/10/2022**	30/10/2022
196	B-CB-N-M39-VE-203	78%	Caseta T1	$7.992.296,31	$6.202.796,27		NO TERMINADO		
197	B-CB-N-M40-VE-204	97%	Caseta T1	$7.853.612,54	$7.616.404,23		TERMINADO		30/10/2022
198	B-CB-N-M40-VE-205	95%	Caseta T1	$7.808.346,79	$7.417.929,45		TERMINADO		30/10/2022
199	B-CB-N-M40-VE-206	90%	Caseta T1	$7.659.470,07	$6.893.523,06		TERMINADO		30/10/2022
200	B-CB-N-M40-VE-207	90%	Caseta T1	$7.930.395,18	$7.137.355,66		TERMINADO		30/10/2022
201	B-CB-N-M26-VE-209	90%	Caseta T1	$8.486.474,81	$7.604.544,07		TERMINADO		23/10/2022
202	B-CB-N-M40-VE-210	94%	Caseta T1	$7.677.243,56	$7.182.420,51	13/09/2022	TERMINADO	**18/09/2022**	30/10/2022
203	B-CB-N-M14-VE-211	95%	Caseta T1	$7.552.754,06	$7.152.605,06	13/09/2022	TERMINADO	**18/09/2022**	20/11/2022
204	B-CB-N-M14-VE-212	100%	Caseta T1	$7.714.264,62	$7.746.407,10		TERMINADO		20/11/2022
205	B-CB-N-M26-VE-213	90%	Caseta T1	$7.421.509,46	$6.679.358,51	16/09/2022	NO TERMINADO	**21/09/2022**	
206	B-CB-N-M14-VE-214	94%	Caseta T1	$7.871.007,20	$7.367.864,93	16/09/2022	TERMINADO	**21/09/2022**	20/11/2022
207	B-CB-N-M14-VE-215	95%	Caseta T1	$8.053.543,96	$7.650.866,76	15/09/2022	TERMINADO	**20/09/2022**	2/10/2022
208	B-CB-N-M14-VE-216	102%	Caseta T1	$7.435.343,20	$7.548.734,84	16/09/2022	TERMINADO	**21/09/2022**	23/10/2022
209	B-CB-N-M14-VE-217	104%	Caseta T1	$6.936.906,58	$7.188.001,75	3/10/2022	TERMINADO	**8/10/2022**	30/10/2022
210	B-CB-N-M14-VE-218	95%	Adecuación	$3.156.776,05	$2.995.414,76	3/10/2022	TERMINADO	**6/10/2022**	13/11/2022
211	B-CB-N-M40-VE-219	90%	Caseta T1	$7.878.058,82	$7.090.252,94		TERMINADO		23/10/2022
212	B-CB-N-M40-VE-220	114%	Adecuación	$2.445.719,53	$2.780.636,21	10/12/2022	NO TERMINADO	**13/12/2022**	
213	B-CB-N-M40-VE-221	127%	Caseta T1	$6.294.804,86	$8.006.804,70		TERMINADO		23/10/2022
214	B-CB-N-M40-VE-222	70%	Caseta T1	$3.971.613,32	$2.765.109,02		TERMINADO		30/10/2022
215	B-CB-N-M40-VE-223	110%	Caseta T1	$7.498.041,95	$8.212.338,69		TERMINADO		23/10/2022
216	B-CB-N-M40-VE-224	90%	Caseta T1	$9.102.909,73	$8.192.618,76	11/09/2022	TERMINADO	**16/09/2022**	23/10/2022
217	B-CB-N-M40-VE-225	93%	Caseta T1	$8.247.151,14	$7.649.978,11		TERMINADO		30/10/2022
218	B-CB-N-M40-VE-226	102%	Caseta T1	$7.691.185,50	$7.810.730,32		TERMINADO		23/10/2022
219	B-CB-N-M40-VE-227	125%	Caseta T1	$6.452.183,34	$8.075.944,27		TERMINADO		23/10/2022
220	B-CB-N-M40-VE-228	90%	Caseta T1	$9.599.375,32	$8.639.437,79		TERMINADO		23/10/2022
221	B-CB-N-M41-VE-229	102%	Caseta T1	$7.979.476,74	$8.132.227,96		TERMINADO		30/10/2022
222	B-CB-N-M41-VE-230	90%	Caseta T1	$8.326.670,16	$7.494.003,14		TERMINADO		30/10/2022

223	B-CB-N-M41-VE-231	96%	Caseta T1	$7.973.566,99	$7.684.344,47		TERMINADO		30/10/2022
224	B-CB-N-M41-VE-232	103%	Caseta T1	$7.997.329,65	$8.198.153,78		TERMINADO		30/10/2022
225	B-CB-N-M41-VE-233	90%	Caseta T1	$7.922.806,99	$7.130.526,29	11/10/2022	TERMINADO	**16/10/2022**	30/10/2022
226	B-CB-N-M41-VE-234	92%	Caseta T1	$7.673.435,92	$7.076.935,70		TERMINADO		30/10/2022
227	B-CB-N-M41-VE-235	90%	Caseta T1	$8.645.800,54	$7.781.220,49		TERMINADO		23/10/2022
228	B-CB-N-M41-VE-236	110%	Caseta T1	$6.650.580,56	$7.328.120,69		TERMINADO		23/10/2022
229	B-CB-N-M14-VE-237	90%	Caseta T1	$7.370.722,69	$6.633.650,42		NO TERMINADO		
230	B-CB-N-M10-VE-238	94%	Adecuación	$4.243.117,36	$3.988.770,33	4/12/2022	NO TERMINADO	**7/12/2022**	
231	B-CB-N-M41-VE-239	102%	Adecuación	$3.145.882,21	$3.199.684,84	4/12/2022	NO TERMINADO	**7/12/2022**	
232	B-CB-N-M41-VE-240	95%	Caseta T1	$7.690.399,70	$7.305.879,72		TERMINADO		23/10/2022
233	B-CB-N-M34-VE-241	55%	Adecuación	$3.906.398,68	$2.138.144,60		NO TERMINADO		
234	B-CB-N-M41-VE-242	110%	Caseta T1	$7.230.970,87	$7.921.824,81		TERMINADO		30/10/2022
235	B-CB-N-M34-VE-243	101%	Caseta T1	$7.330.636,77	$7.403.081,09		TERMINADO		30/10/2022
236	B-CB-N-M34-VE-244	98%	Caseta T1	$7.823.674,14	$7.690.349,66		TERMINADO		30/10/2022
237	B-CB-N-M31-VE-245	101%	Caseta T1	$7.968.820,52	$8.024.949,51	12/08/2022	TERMINADO	**17/08/2022**	30/10/2022
238	B-CB-N-M34-VE-246	110%	Caseta T1	$7.170.084,80	$7.894.443,34		TERMINADO		23/10/2022
239	B-CB-N-M34-VE-247	90%	Caseta T1	$8.605.995,85	$7.745.396,27		TERMINADO		30/10/2022
240	B-CB-N-M34-VE-248	108%	Caseta T1	$6.977.863,16	$7.547.337,07		TERMINADO		30/10/2022
241	B-CB-N-M34-VE-249	90%	Caseta T1	$8.925.620,90	$8.033.058,81		TERMINADO		30/10/2022
242	B-CB-N-M10-VE-250	90%	Caseta T1	$7.519.307,60	$6.767.376,84		TERMINADO		23/10/2022
243	B-CB-N-M41-VE-251	98%	Adecuación	$4.539.859,35	$4.445.196,07		NO TERMINADO		
244	B-CB-N-M10-VE-253	99%	Caseta T1	$7.813.173,43	$7.770.476,28		TERMINADO		30/10/2022
245	B-CB-N-M12-VE-254	99%	Caseta T1	$7.903.501,78	$7.817.733,82		TERMINADO		20/11/2022
246	B-CB-N-M10-VE-255	99%	Caseta T2	$7.683.529,39	$7.612.453,01		TERMINADO		23/10/2022
247	B-CB-N-M10-VE-257	97%	Caseta T1	$7.950.382,83	$7.721.747,48		TERMINADO		23/10/2022
248	B-CB-N-M32-VE-258	98%	Caseta T1	$7.427.841,93	$7.279.285,09	6/08/2022	TERMINADO	**11/08/2022**	9/10/2022
249	B-CB-N-M32-VE-259	103%	Caseta T1	$8.207.386,03	$8.416.674,37	3/08/2022	TERMINADO	**8/08/2022**	9/10/2022
250	B-CB-N-M32-VE-260	90%	Caseta T1	$8.212.488,35	$7.391.239,52	4/08/2022	TERMINADO	**9/08/2022**	9/10/2022
251	B-CB-N-M32-VE-261	33%	Adecuación	$5.885.587,77	$1.937.612,45	13/12/2022	NO TERMINADO	**16/12/2022**	
252	B-CB-N-M32-VE-262	102%	Caseta T1	$7.303.626,29	$7.485.486,58	4/08/2022	TERMINADO	**9/08/2022**	9/10/2022

253	B-CB-N-M32-VE-263	103%	Caseta T1	$7.524.320,56	$7.727.585,54	3/08/2022	TERMINADO	**8/08/2022**	9/10/2022
254	B-CB-N-M32-VE-264	95%	Caseta T1	$8.322.431,95	$7.906.310,35	3/08/2022	TERMINADO	**8/08/2022**	9/10/2022
255	B-CB-N-M33-VE-265	95%	Caseta T1	$7.760.311,02	$7.372.295,47		TERMINADO		9/10/2022
256	B-CB-N-M33-VE-266	95%	Caseta T1	$7.759.561,48	$7.389.381,42	4/08/2022	TERMINADO	**9/08/2022**	30/10/2022
257	B-CB-N-M33-VE-267	96%	Caseta T1	$7.980.481,88	$7.696.620,11		TERMINADO		30/10/2022
258	B-CB-N-M33-VE-268	105%	Caseta T1	$7.472.276,34	$7.858.396,83		TERMINADO		16/10/2022
259	B-CB-N-M33-VE-269	99%	Caseta T1	$7.513.659,83	$7.437.106,24	3/08/2022	TERMINADO	**8/08/2022**	13/11/2022
260	B-CB-N-M33-VE-270	101%	Caseta T1	$7.051.350,48	$7.115.159,56	3/11/2022	TERMINADO	**8/11/2022**	18/12/2022
261	B-CB-N-M33-VE-271	36%	Adecuación	$5.376.187,06	$1.937.612,45	13/12/2022	NO TERMINADO	**16/12/2022**	
262	B-CB-N-M31-VE-272	168%	Caseta T1	$4.371.537,09	$7.336.851,50	26/11/2022	NO TERMINADO	**1/12/2022**	
263	B-CB-N-M34-VE-273	102%	Caseta T1	$7.745.410,79	$7.910.388,04		TERMINADO		16/10/2022
264	B-CB-N-M14-VE-274	39%	Adecuación	$3.968.212,21	$1.536.548,13	17/12/2022	NO TERMINADO	**20/12/2022**	
265	B-CB-N-M28-VE-275	92%	Caseta T1	$7.193.328,52	$6.598.057,54	20/10/2022	NO TERMINADO	**25/10/2022**	
266	B-CB-N-M16-VE-276	85%	Caseta T1	$7.583.435,45	$6.457.165,78	21/10/2022	NO TERMINADO	**26/10/2022**	
267	B-CB-N-M07-VE-277	104%	Caseta T1	$8.026.053,03	$8.345.591,73		TERMINADO		13/11/2022
268	B-CB-N-M20-VE-278	90%	Caseta T1	$8.015.775,54	$7.195.563,87	2/11/2022	NO TERMINADO	**7/11/2022**	
269	B-CB-N-M31-VE-279	71%	Caseta T1	$7.623.571,29	$5.401.260,76	31/10/2022	NO TERMINADO	**5/11/2022**	
270	B-CB-N-M28-VE-280	93%	Caseta T1	$6.798.321,84	$6.291.031,14	2/11/2022	TERMINADO	**7/11/2022**	18/12/2022
271	B-CB-N-M01-VE-283	85%	Caseta T1	$6.907.447,53	$5.855.685,47	19/10/2022	TERMINADO	**24/10/2022**	13/11/2022
272	B-CB-N-M17-VE-284	100%	Caseta T1	$7.385.169,18	$7.419.158,42	10/11/2022	NO TERMINADO	**15/11/2022**	
273	B-CB-N-M01-VE-285	188%	Adecuación	$2.940.192,34	$5.538.005,53	10/12/2022	NO TERMINADO	**13/12/2022**	
274	B-CB-N-M01-VE-286	109%	Caseta T1	$7.367.601,82	$8.001.501,20	24/11/2022	NO TERMINADO	**29/11/2022**	
275	B-CB-N-M03-VE-288	84%	Caseta T2	$7.210.499,00	$6.027.037,53	19/11/2022	NO TERMINADO	**24/11/2022**	
276	B-CB-N-M02-VE-289	115%	Adecuación	$4.044.062,78	$4.647.873,56		TERMINADO		13/11/2022
277	B-CB-N-M06-VE-290	93%	Caseta T1	$7.643.173,63	$7.139.780,57	23/11/2022	NO TERMINADO	**28/11/2022**	
278	B-CB-N-M05-VE-291	25%	Adecuación	$2.212.763,46	$553.190,87	30/11/2022	NO TERMINADO	**3/12/2022**	
279	B-CB-N-M22-VE-292	90%	Caseta T1	$7.384.185,16	$6.645.766,64		TERMINADO		16/10/2022
280	B-CB-N-M20-VE-293	92%	Caseta T1	$9.403.250,78	$8.655.240,85		TERMINADO		9/10/2022
281	B-CB-N-M17-VE-294	90%	Caseta T1	$7.207.933,70	$6.503.803,04	28/10/2022	NO TERMINADO	**2/11/2022**	
282	B-CB-N-M31-VE-295	84%	Caseta T2	$8.781.396,14	$7.350.444,49	27/11/2022	NO TERMINADO	**2/12/2022**	

283	B-CB-N-M29-VE-296	58%	Caseta T1	$7.077.563,46	$4.080.630,69	26/12/2022	NO TERMINADO	**31/12/2022**	
284	B-CB-N-M21-VE-297	101%	Caseta T1	$3.421.009,59	$3.467.017,31		NO TERMINADO		
285	B-CB-N-M19-VE-298	75%	Caseta T1	$7.596.664,29	$5.697.498,22	30/09/2022	NO TERMINADO	**5/10/2022**	
286	B-CB-N-M22-VE-299	96%	Caseta T1	$7.520.705,32	$7.242.891,89	26/10/2022	TERMINADO	**31/10/2022**	13/11/2022
287	B-CB-N-M09-VE-300	116%	Caseta T1	$6.232.373,41	$7.222.303,48		TERMINADO		16/10/2022
288	B-CB-N-M21-VE-301	89%	Caseta T1	$7.781.967,61	$6.937.689,70	11/10/2022	TERMINADO	**16/10/2022**	13/11/2022
289	B-CB-N-M08-VE-302	101%	Caseta T1	$6.981.895,84	$7.063.014,53	20/11/2022	NO TERMINADO	**25/11/2022**	
290	B-CB-N-M21-VE-303	84%	Caseta T1	$7.637.340,60	$6.378.343,73	11/10/2022	TERMINADO	**16/10/2022**	13/11/2022
291	B-CB-N-M09-VE-304	90%	Caseta T1	$9.286.320,78	$8.357.688,70		TERMINADO		23/10/2022
292	B-CB-N-M41-VE-306	117%	Caseta T1	$7.116.713,11	$8.360.702,69		TERMINADO		30/10/2022
293	B-CB-N-M41-VE-307	80%	Adecuación	$7.363.355,54	$5.890.684,43	28/10/2022	NO TERMINADO	**31/10/2022**	
294	B-CB-N-M10-VE-308	101%	Caseta T1	$6.877.465,65	$6.930.486,88		TERMINADO		13/11/2022
295	B-CB-N-M31-VE-309	107%	Caseta T1	$6.873.634,68	$7.341.298,30	31/10/2022	NO TERMINADO	**5/11/2022**	
296	B-CB-N-M09-VE-310	99%	Caseta T1	$7.238.378,04	$7.131.564,69		TERMINADO		23/10/2022
297	B-CB-N-M19-VE-311	121%	Adecuación	$2.828.388,56	$3.412.670,08	17/11/2022	TERMINADO	**20/11/2022**	4/12/2022
298	B-CB-N-M17-VE-312	91%	Caseta T1	$7.344.788,18	$6.691.890,79	1/11/2022	NO TERMINADO	**6/11/2022**	
299	B-CB-N-M13-VE-313	65%	Caseta T1	$8.340.980,49	$5.421.637,32	6/10/2022	NO TERMINADO	**11/10/2022**	
300	B-CB-N-M26-VE-314	85%	Caseta T1	$6.816.776,93	$5.817.877,86	3/10/2022	NO TERMINADO	**8/10/2022**	
301	B-CB-N-M19-VE-315	168%	Caseta T1	$3.454.475,61	$5.802.551,46	4/12/2022	TERMINADO	**9/12/2022**	18/12/2022
302	B-CB-N-M19-VE-316	106%	Caseta T1	$6.898.001,44	$7.310.335,15	11/11/2022	TERMINADO	**16/11/2022**	18/12/2022
303	B-CB-N-M04-VE-317	37%	Adecuación	$3.114.291,40	$1.140.812,19	2/12/2022	NO TERMINADO	**5/12/2022**	
304	B-CB-N-M04-VE-318	176%	Adecuación	$3.156.776,05	$5.561.663,96	7/11/2022	TERMINADO	**10/11/2022**	13/11/2022
305	B-CB-N-M24-VE-319	74%	Caseta T1	$8.906.126,27	$6.562.452,84	28/10/2022	NO TERMINADO	**2/11/2022**	
306	B-CB-N-M04-VE-327	95%	Caseta T1	$6.720.899,73	$6.378.343,73	7/10/2022	TERMINADO	**12/10/2022**	13/11/2022
307	B-CB-N-M03-VE-329	108%	Caseta T1	$7.226.493,28	$7.799.700,52	4/10/2022	TERMINADO	**9/10/2022**	13/11/2022
308	B-CB-N-M02-VE-330	104%	Caseta T1	$7.367.765,93	$7.662.641,07	4/10/2022	TERMINADO	**9/10/2022**	13/11/2022
309	B-CB-N-M04-VE-331	100%	Caseta T1	$7.412.495,22	$7.436.952,94	5/10/2022	TERMINADO	**10/10/2022**	13/11/2022
310	B-CB-N-M02-VE-332	139%	Caseta T1	$5.660.650,29	$7.889.019,66	14/12/2022	NO TERMINADO	**19/12/2022**	
311	B-CB-N-M02-VE-333	100%	Caseta T1	$7.896.745,01	$7.884.656,55		TERMINADO		13/11/2022
312	B-CB-N-M02-VE-334	73%	Adecuación	$2.097.272,88	$1.536.548,13	21/12/2022	NO TERMINADO	**24/12/2022**	

313	B-CB-N-M02-VE-335	97%	Caseta T1	$7.859.712,49	$7.610.411,09		TERMINADO		13/11/2022
314	B-CB-N-M16-VE-336	90%	Caseta T1	$7.590.561,36	$6.809.440,36	11/10/2022	NO TERMINADO	**16/10/2022**	
315	B-CB-N-M10-VE-337	100%	Caseta T1	$6.851.677,65	$6.864.900,65		NO TERMINADO		
316	B-CB-N-M25-VE-338	60%	Caseta T1	$7.165.829,30	$4.325.747,45	6/12/2022	NO TERMINADO	**11/12/2022**	
317	B-CB-N-M17-VE-340	109%	Adecuación	$2.627.619,69	$2.862.932,96	7/12/2022	NO TERMINADO	**10/12/2022**	
318	B-CB-N-M17-VE-341	108%	Caseta T1	$6.969.798,36	$7.501.590,45	31/10/2022	TERMINADO	**5/11/2022**	18/12/2022
319	B-CB-N-M06-VE-343	103%	Caseta T2	$6.550.845,53	$6.737.692,35	19/10/2022	TERMINADO	**24/10/2022**	6/11/2022
320	B-CB-N-M04-VE-344	117%	Caseta T1	$7.230.457,44	$8.425.836,75	12/10/2022	TERMINADO	**17/10/2022**	6/11/2022
321	B-CB-N-M04-VE-345	113%	Caseta T1	$7.098.436,51	$8.007.830,06	12/10/2022	TERMINADO	**17/10/2022**	30/10/2022
322	B-CB-N-M36-VE-346	82%	Caseta T1	$7.893.055,65	$6.443.866,33	13/11/2022	NO TERMINADO	**18/11/2022**	
323	B-CB-N-M02-VE-347	35%	Adecuación	$3.890.460,18	$1.361.661,06	15/12/2022	NO TERMINADO	**18/12/2022**	
324	B-CB-N-M07-VE-348	107%	Caseta T1	$7.175.837,18	$7.673.080,27	24/11/2022	NO TERMINADO	**29/11/2022**	
325	B-CB-N-M07-VE-349	115%	Caseta T1	$7.253.840,18	$8.321.686,33	13/11/2022	TERMINADO	**18/11/2022**	18/12/2022
326	B-CB-N-M19-VE-351	37%	Caseta T1	$8.826.406,03	$3.266.485,15	19/12/2022	NO TERMINADO	**24/12/2022**	
327	B-CB-N-M16-IN-001	101%	Caseta T1	$7.372.277,46	$7.421.697,94	4/11/2022	TERMINADO	**9/11/2022**	4/12/2022
328	B-CB-N-M09-IN-002	86%	Caseta T1	$7.403.115,60	$6.371.532,30		NO TERMINADO		
329	B-CB-N-M04-IN-003	106%	Caseta T1	$7.688.380,91	$8.137.218,46	4/11/2022	TERMINADO	**9/11/2022**	4/12/2022
330	B-CB-N-M02-IN-004	153%	Adecuación	$1.494.697,30	$2.294.203,01	16/11/2022	TERMINADO	**19/11/2022**	27/11/2022
331	B-CB-N-M08-IN-005	99%	Caseta T1	$7.213.171,30	$7.169.726,24	17/11/2022	TERMINADO	**22/11/2022**	4/12/2022
332	B-CB-N-M27-IN-006	86%	Caseta T1	$7.809.990,36	$6.754.581,81	26/10/2022	NO TERMINADO	**31/10/2022**	
333	B-CB-N-M24-IN-007	85%	Caseta T2	$6.459.478,11	$5.502.265,77	14/11/2022	TERMINADO	**19/11/2022**	18/12/2022
334	B-CB-N-M40-IN-008	100%	Caseta T1	$7.696.811,01	$7.676.310,75	30/11/2022	TERMINADO	**5/12/2022**	4/12/2022
335	B-CB-N-M01-IN-009	19%	Adecuación	$3.986.806,12	$739.747,88	19/12/2022	NO TERMINADO	**22/12/2022**	
336	B-CB-N-M20-IN-010	110%	Caseta T1	$7.179.558,77	$7.887.750,87	23/11/2022	TERMINADO	**28/11/2022**	18/12/2022
337	B-CB-N-M33-IN-011	104%	Caseta T1	$7.036.167,26	$7.289.425,68	17/11/2022	TERMINADO	**22/11/2022**	4/12/2022
338	B-CB-N-M29-IN-012	102%	Caseta T1	$7.543.806,17	$7.709.031,35	23/11/2022	TERMINADO	**28/11/2022**	4/12/2022
339	B-CB-N-M21-IN-015	62%	Caseta T1	$7.354.975,52	$4.586.475,04	11/12/2022	NO TERMINADO	**16/12/2022**	
340	B-CB-N-M21-IN-016	111%	Caseta T1	$6.488.928,66	$7.171.420,43	14/11/2022	TERMINADO	**19/11/2022**	4/12/2022
341	B-CB-N-M21-IN-017	110%	Caseta T1	$7.258.796,79	$7.975.661,76	14/11/2022	NO TERMINADO	**19/11/2022**	
342	B-CB-N-M21-IN-018	104%	Caseta T1	$7.364.189,41	$7.677.186,54	14/11/2022	TERMINADO	**19/11/2022**	4/12/2022

343	B-CB-N-M21-IN-019	106%	Caseta T1	$6.759.286,45	$7.186.964,78	14/11/2022	TERMINADO	**19/11/2022**	11/12/2022
344	B-CB-N-M18-IN-020	84%	Caseta T1	$6.982.917,41	$5.880.634,25	14/11/2022	TERMINADO	**19/11/2022**	11/12/2022
345	B-CB-N-M28-IN-022	96%	Caseta T1	$8.451.088,13	$8.149.549,50		TERMINADO		20/11/2022
346	B-CB-N-M21-IN-023	99%	Caseta T1	$7.387.045,31	$7.297.522,20	17/11/2022	TERMINADO	**22/11/2022**	4/12/2022
347	B-CB-N-M06-IN-024	78%	Caseta T1	$7.077.271,88	$5.500.336,45	19/12/2022	NO TERMINADO	**24/12/2022**	
348	B-CB-N-M21-IN-025	103%	Caseta T1	$7.734.705,27	$7.951.071,35	6/12/2022	NO TERMINADO	**11/12/2022**	
349	B-CB-N-M11-IN-026	70%	Caseta T1	$7.271.289,68	$5.082.843,31	15/11/2022	TERMINADO	**20/11/2022**	4/12/2022
350	B-CB-N-M02-IN-027	28%	Adecuación	$3.363.759,82	$940.280,04	26/12/2022	NO TERMINADO	**29/12/2022**	
351	B-CB-N-M04-IN-028	155%	Adecuación	$1.166.026,09	$1.809.834,70	28/11/2022	NO TERMINADO	**1/12/2022**	
352	B-CB-N-M25-IN-030	96%	Caseta T1	$7.521.764,56	$7.210.951,93	23/11/2022	NO TERMINADO	**28/11/2022**	
353	B-CB-N-M24-IN-031	86%	Caseta T1	$7.035.683,99	$6.080.274,82	23/11/2022	NO TERMINADO	**28/11/2022**	
354	B-CB-N-M13-IN-032	88%	Caseta T2	$7.510.839,37	$6.646.214,40	26/12/2022	NO TERMINADO	**31/12/2022**	
355	B-CB-N-M36-IN-033	72%	Caseta T1	$7.138.636,07	$5.122.547,70	23/11/2022	NO TERMINADO	**28/11/2022**	
356	B-CB-N-M32-IN-035	106%	Caseta T1	$7.191.114,70	$7.652.816,29	17/11/2022	NO TERMINADO	**22/11/2022**	
357	B-CB-N-M41-IN-037	105%	Caseta T1	$7.702.528,32	$8.108.750,79	10/11/2022	NO TERMINADO	**15/11/2022**	
358	B-CB-N-M28-IN-040	86%	Caseta T1	$8.050.399,43	$6.913.501,49	17/11/2022	NO TERMINADO	**22/11/2022**	
359	B-CB-N-M35-IN-041	88%	Caseta T1	$8.102.801,13	$7.124.746,82	3/11/2022	TERMINADO	**8/11/2022**	20/11/2022
360	B-CB-N-M25-IN-042	95%	Caseta T1	$8.315.019,87	$7.924.896,43	14/11/2022	TERMINADO	**19/11/2022**	11/12/2022
361	B-CB-N-M21-IN-044	84%	Caseta T1	$7.451.368,08	$6.247.934,20	30/11/2022	NO TERMINADO	**5/12/2022**	
362	B-CB-N-M17-IN-043	33%	Adecuación	$4.118.587,07	$1.356.636,60	19/12/2022	NO TERMINADO	**22/12/2022**	
363	B-CB-N-M17-IN-045	87%	Caseta T1	$7.534.450,09	$6.533.165,96	24/11/2022	NO TERMINADO	**29/11/2022**	
364	B-CB-N-M21-IN-046	95%	Caseta T1	$6.734.405,10	$6.406.640,18	24/11/2022	NO TERMINADO	**29/11/2022**	
365	B-CB-N-M30-IN-047	105%	Caseta T2	$7.137.890,88	$7.470.395,95	17/11/2022	NO TERMINADO	**22/11/2022**	
366	B-CB-N-M23-IN-048	102%	Caseta T1	$7.688.806,38	$7.838.630,00	25/11/2022	NO TERMINADO	**30/11/2022**	
367	B-CB-N-M41-IN-049	96%	Caseta T2	$7.306.763,47	$7.050.449,20	30/11/2022	TERMINADO	**5/12/2022**	18/12/2022
368	B-CB-N-M21-IN-050	44%	Caseta T1	$7.355.778,89	$3.266.485,15	26/12/2022	NO TERMINADO	**31/12/2022**	
369	B-CB-N-M36-IN-052	44%	Caseta T1	$7.384.990,89	$3.266.485,15	26/12/2022	NO TERMINADO	**31/12/2022**	
370	B-CB-C-M04-VE-003	119%	Adecuación	$3.192.259,93	$3.783.487,09	9/08/2022	TERMINADO	**12/08/2022**	14/08/2022
371	B-CB-C-M04-VE-004	100%	Caseta T2	$7.108.460,34	$7.109.768,95	6/08/2022	TERMINADO	**11/08/2022**	14/08/2022
372	B-CB-C-M05-VE-005	100%	Caseta T2	$7.326.078,52	$7.326.078,52	8/08/2022	TERMINADO	**13/08/2022**	21/08/2022

373	B-CB-C-M04-VE-006	107%	Caseta T1	$7.149.178,97	$7.642.631,78	8/08/2022	TERMINADO	**13/08/2022**	2/10/2022
374	B-CB-C-M05-VE-007	108%	Caseta T1	$6.655.807,16	$7.200.987,25	15/08/2022	TERMINADO	**20/08/2022**	2/10/2022
375	B-CB-C-M05-VE-009	103%	Caseta T1	$7.152.143,92	$7.380.361,25	10/08/2022	TERMINADO	**15/08/2022**	2/10/2022
376	B-CB-C-M05-VE-010	100%	Caseta T1	$7.468.263,95	$7.463.444,46	9/08/2022	TERMINADO	**14/08/2022**	2/10/2022
377	B-CB-C-M08-VE-011	100%	Caseta T1	$7.493.868,70	$7.460.454,45	8/08/2022	TERMINADO	**13/08/2022**	2/10/2022
378	B-CB-C-M05-VE-012	145%	Adecuación	$2.733.056,81	$3.958.887,65	11/08/2022	TERMINADO	**14/08/2022**	21/08/2022
379	B-CB-C-M08-VE-013	93%	Caseta T1	$7.360.374,90	$6.858.052,68	8/08/2022	TERMINADO	**13/08/2022**	2/10/2022
380	B-CB-C-M05-VE-014	96%	Caseta T2	$6.574.083,96	$6.304.677,87	10/08/2022	TERMINADO	**15/08/2022**	2/10/2022
381	B-CB-C-M08-VE-015	99%	Caseta T1	$6.975.985,84	$6.901.741,85	10/08/2022	TERMINADO	**15/08/2022**	2/10/2022
382	B-CB-C-M08-VE-016	125%	Adecuación	$3.106.599,38	$3.897.171,93	10/08/2022	TERMINADO	**13/08/2022**	2/10/2022
383	B-CB-C-M08-VE-017	102%	Caseta T1	$7.295.158,91	$7.420.168,43	8/08/2022	TERMINADO	**13/08/2022**	2/10/2022
384	B-CB-C-M08-VE-018	80%	Caseta T2	$8.430.035,12	$6.744.028,10	15/08/2022	TERMINADO	**20/08/2022**	9/10/2022
385	B-CB-C-M08-VE-019	104%	Caseta T1	$7.098.008,30	$7.412.640,35	13/08/2022	TERMINADO	**18/08/2022**	2/10/2022
386	B-CB-C-M08-VE-020	101%	Caseta T1	$7.407.950,37	$7.447.303,70	15/08/2022	TERMINADO	**20/08/2022**	9/10/2022
387	B-CB-C-M08-VE-021	99%	Caseta T1	$7.527.778,59	$7.472.748,16	13/08/2022	TERMINADO	**18/08/2022**	9/10/2022
388	B-CB-C-M08-VE-022	105%	Caseta T4	$7.195.464,88	$7.577.412,01	13/08/2022	TERMINADO	**18/08/2022**	9/10/2022
389	B-CB-C-M08-VE-023	97%	Caseta T1	$7.289.657,67	$7.047.962,54	14/08/2022	TERMINADO	**19/08/2022**	9/10/2022
390	B-CB-C-M08-VE-024	98%	Caseta T1	$7.546.738,01	$7.389.161,60	17/08/2022	TERMINADO	**22/08/2022**	9/10/2022
391	B-CB-C-M08-VE-025	83%	Caseta T2	$7.548.986,36	$6.282.922,69	24/08/2022	TERMINADO	**29/08/2022**	9/10/2022
392	B-CB-C-M08-VE-026	103%	Caseta T1	$7.209.052,12	$7.449.365,74	25/08/2022	TERMINADO	**30/08/2022**	16/10/2022
393	B-CB-C-M08-VE-027	95%	Caseta T2	$6.966.217,75	$6.603.132,29	18/08/2022	TERMINADO	**23/08/2022**	9/10/2022
394	B-CB-C-M08-VE-028	98%	Caseta T1	$7.292.247,55	$7.140.397,24	22/08/2022	TERMINADO	**27/08/2022**	9/10/2022
395	B-CB-C-M08-VE-029	108%	Caseta T1	$6.737.049,06	$7.245.476,31	18/08/2022	TERMINADO	**23/08/2022**	9/10/2022
396	B-CB-C-M08-VE-030	65%	Adecuación	$3.677.997,18	$2.390.698,17	1/10/2022	TERMINADO	**4/10/2022**	9/10/2022
397	B-CB-C-M08-VE-031	92%	Caseta T1	$7.234.196,35	$6.638.424,74	22/08/2022	TERMINADO	**27/08/2022**	9/10/2022
398	B-CB-C-M08-VE-032	82%	Caseta T2	$7.083.892,90	$5.825.882,65	6/09/2022	TERMINADO	**11/09/2022**	9/10/2022
399	B-CB-C-M06-VE-033	96%	Caseta T1	$6.704.877,15	$6.421.690,36	25/08/2022	TERMINADO	**30/08/2022**	9/10/2022
400	B-CB-C-M08-VE-034	94%	Caseta T2	$5.586.422,39	$5.275.945,87	26/08/2022	TERMINADO	**31/08/2022**	9/10/2022
401	B-CB-C-M06-VE-035	107%	Caseta T1	$7.091.244,24	$7.578.364,27	25/08/2022	TERMINADO	**30/08/2022**	9/10/2022
402	B-CB-C-M08-VE-036	105%	Caseta T1	$6.728.899,76	$7.035.145,60	25/08/2022	TERMINADO	**30/08/2022**	9/10/2022

403	B-CB-C-M08-VE-037	105%	Caseta T1	$7.671.594,00	$8.081.668,01	26/08/2022	TERMINADO	**31/08/2022**	9/10/2022
404	B-CB-C-M06-VE-038	100%	Caseta T1	$7.082.271,49	$7.060.717,48	26/08/2022	TERMINADO	**31/08/2022**	9/10/2022
405	B-CB-C-M06-VE-039	109%	Caseta T1	$6.470.412,48	$7.032.334,63	25/08/2022	TERMINADO	**30/08/2022**	9/10/2022
406	B-CB-C-M06-VE-040	99%	Caseta T1	$7.927.235,68	$7.808.855,47	30/08/2022	TERMINADO	**4/09/2022**	9/10/2022
407	B-CB-C-M06-VE-041	86%	Caseta T1	$7.619.305,21	$6.560.586,40	29/08/2022	TERMINADO	**3/09/2022**	16/10/2022
408	B-CB-C-M06-VE-042	80%	Adecuación	$5.046.567,33	$4.037.253,86	16/09/2022	TERMINADO	**19/09/2022**	16/10/2022
409	B-CB-C-M06-VE-043	138%	Caseta T2	$5.353.735,99	$7.378.861,68	31/08/2022	TERMINADO	**5/09/2022**	16/10/2022
410	B-CB-C-M06-VE-044	111%	Caseta T1	$6.811.303,81	$7.564.938,52	31/08/2022	TERMINADO	**5/09/2022**	16/10/2022
411	B-CB-C-M06-VE-045	80%	Adecuación	$5.353.735,99	$4.282.988,79	10/09/2022	TERMINADO	**13/09/2022**	16/10/2022
412	B-CB-C-M04-VE-046	108%	Caseta T2	$6.563.773,35	$7.075.004,72	31/08/2022	TERMINADO	**5/09/2022**	16/10/2022
413	B-CB-C-M06-VE-047	118%	Adecuación	$3.993.806,06	$4.706.408,00	16/08/2022	TERMINADO	**19/08/2022**	16/10/2022
414	B-CB-C-M04-VE-048	110%	Caseta T2	$6.997.259,99	$7.726.341,07	31/08/2022	TERMINADO	**5/09/2022**	16/10/2022
415	B-CB-C-M07-VE-049	95%	Adecuación	$3.378.351,83	$3.193.947,44	16/08/2022	TERMINADO	**19/08/2022**	2/10/2022
416	B-CB-C-M06-VE-050	64%	Adecuación	$2.513.846,50	$1.600.447,72	28/09/2022	TERMINADO	**1/10/2022**	16/10/2022
417	B-CB-C-M07-VE-051	84%	Caseta T1	$8.011.545,45	$6.737.972,61	3/09/2022	TERMINADO	**8/09/2022**	16/10/2022
418	B-CB-C-M06-VE-052	98%	Adecuación	$5.157.717,23	$5.039.185,20	16/08/2022	TERMINADO	**19/08/2022**	2/10/2022
419	B-CB-C-M07-VE-053	100%	Adecuación	$5.335.107,15	$5.335.107,15	16/08/2022	TERMINADO	**19/08/2022**	2/09/2022
420	B-CB-C-M07-VE-054	101%	Caseta T1	$7.356.095,16	$7.442.235,26	2/09/2022	TERMINADO	**7/09/2022**	16/10/2022
421	B-CB-C-M07-VE-055	90%	Caseta T1	$7.847.977,43	$7.063.179,69	1/09/2022	TERMINADO	**6/09/2022**	16/10/2022
422	B-CB-C-M07-VE-056	94%	Caseta T1	$7.783.131,32	$7.304.149,81	2/09/2022	TERMINADO	**7/09/2022**	16/10/2022
423	B-CB-C-M07-VE-057	104%	Caseta T1	$7.202.405,66	$7.523.531,15	2/09/2022	TERMINADO	**7/09/2022**	16/10/2022
424	B-CB-C-M07-VE-058	68%	Adecuación	$2.250.923,41	$1.536.548,13	18/11/2022	TERMINADO	**21/11/2022**	23/12/2022
425	B-CB-C-M07-VE-059	105%	Caseta T2	$7.207.150,49	$7.554.767,10	4/09/2022	TERMINADO	**9/09/2022**	16/10/2022
426	B-CB-C-M04-VE-060	25%	Adecuación	$3.615.081,31	$903.770,33	9/11/2022	NO TERMINADO	**12/11/2022**	
427	B-CB-C-M07-VE-061	96%	Caseta T2	$7.157.175,62	$6.835.307,83	3/09/2022	TERMINADO	**8/09/2022**	16/10/2022
428	B-CB-C-M07-VE-063	99%	Caseta T1	$6.974.576,36	$6.902.275,37	8/09/2022	TERMINADO	**13/09/2022**	16/10/2022
429	B-CB-C-M09-VE-064	90%	Caseta T2	$6.743.250,85	$6.100.652,24	10/09/2022	TERMINADO	**15/09/2022**	23/10/2022
430	B-CB-C-M09-VE-065	90%	Adecuación	$4.208.914,85	$3.788.023,37	6/09/2022	NO TERMINADO	**9/09/2022**	
431	B-CB-C-M07-VE-066	109%	Caseta T1	$7.009.804,00	$7.653.782,44	7/09/2022	TERMINADO	**12/09/2022**	23/10/2022
432	B-CB-C-M09-VE-067	45%	Adecuación	$4.121.183,65	$1.854.532,64	28/10/2022	TERMINADO	**31/10/2022**	27/11/2022

433	B-CB-C-M07-VE-068	126%	Caseta T1	$5.545.313,82	$6.999.453,32	10/09/2022	TERMINADO	**15/09/2022**	23/10/2022
434	B-CB-C-M09-VE-069	97%	Caseta T1	$7.185.996,19	$7.000.407,48	10/09/2022	TERMINADO	**15/09/2022**	23/10/2022
435	B-CB-C-M09-VE-070	104%	Caseta T1	$7.252.402,35	$7.568.791,94	9/09/2022	TERMINADO	**14/09/2022**	23/10/2022
436	B-CB-C-M07-VE-071	90%	Caseta T1	$9.588.121,94	$8.629.309,75	10/09/2022	TERMINADO	**15/09/2022**	23/10/2022
437	B-CB-C-M09-VE-072	99%	Caseta T1	$7.466.257,30	$7.407.847,35	12/09/2022	TERMINADO	**17/09/2022**	23/10/2022
438	B-CB-C-M09-VE-073	91%	Caseta T1	$7.929.572,62	$7.218.324,71	16/09/2022	TERMINADO	**21/09/2022**	30/10/2022
439	B-CB-C-M09-VE-074	102%	Caseta T1	$7.289.256,38	$7.469.406,36	9/09/2022	TERMINADO	**14/09/2022**	23/10/2022
440	B-CB-C-M07-VE-075	90%	Caseta T1	$7.386.217,69	$6.647.595,92	16/09/2022	TERMINADO	**21/09/2022**	23/10/2022
441	B-CB-C-M09-VE-076	104%	Caseta T1	$7.521.534,27	$7.851.390,32	11/09/2022	TERMINADO	**16/09/2022**	23/10/2022
442	B-CB-C-M07-VE-077	40%	Adecuación	$3.308.964,13	$1.323.585,65	28/10/2022	TERMINADO	**31/10/2022**	23/12/2022
443	B-CB-C-M09-VE-078	115%	Caseta T1	$7.189.104,04	$8.253.042,27	11/09/2022	TERMINADO	**16/09/2022**	23/10/2022
444	B-CB-C-M09-VE-079	96%	Caseta T1	$7.650.164,89	$7.363.743,45	20/09/2022	TERMINADO	**25/09/2022**	23/10/2022
445	B-CB-C-M09-VE-080	108%	Caseta T1	$7.225.898,75	$7.777.567,67	14/09/2022	TERMINADO	**19/09/2022**	23/10/2022
446	B-CB-C-M09-VE-081	99%	Caseta T1	$7.497.212,80	$7.386.489,18	14/09/2022	TERMINADO	**19/09/2022**	30/10/2022
447	B-CB-C-M09-VE-082	102%	Caseta T1	$7.290.706,22	$7.420.739,69	12/09/2022	TERMINADO	**17/09/2022**	30/10/2022
448	B-CB-C-M09-VE-083	115%	Caseta T1	$6.485.429,66	$7.487.599,15	16/09/2022	TERMINADO	**21/09/2022**	23/10/2022
449	B-CB-C-M09-VE-085	89%	Caseta T1	$7.811.467,61	$6.931.128,09	21/09/2022	TERMINADO	**26/09/2022**	23/10/2022
450	B-CB-C-M15-VE-086	67%	Caseta T1	$8.226.914,11	$5.488.952,80	11/10/2022	TERMINADO	**16/10/2022**	30/10/2022
451	B-CB-C-M18-VE-087	96%	Caseta T1	$7.178.338,72	$6.863.358,62	17/09/2022	TERMINADO	**22/09/2022**	23/10/2022
452	B-CB-C-M15-VE-088	94%	Caseta T1	$7.983.142,03	$7.472.382,80	28/09/2022	TERMINADO	**3/10/2022**	30/10/2022
453	B-CB-C-M15-VE-089	90%	Caseta T1	$7.969.047,40	$7.136.922,06	23/09/2022	TERMINADO	**28/09/2022**	23/10/2022
454	B-CB-C-M18-VE-090	100%	Caseta T1	$7.095.707,27	$7.065.118,86	21/09/2022	TERMINADO	**26/09/2022**	23/10/2022
455	B-CB-C-M15-VE-091	90%	Caseta T4	$7.948.873,18	$7.152.273,86	25/09/2022	TERMINADO	**30/09/2022**	23/10/2022
456	B-CB-C-M18-VE-092	85%	Caseta T1	$7.688.873,22	$6.535.542,24	21/09/2022	TERMINADO	**26/09/2022**	23/10/2022
457	B-CB-C-M18-VE-093	105%	Caseta T1	$7.866.079,12	$8.284.799,35	17/09/2022	TERMINADO	**22/09/2022**	30/10/2022
458	B-CB-C-M18-VE-094	100%	Caseta T1	$7.621.273,64	$7.616.515,41	22/09/2022	TERMINADO	**27/09/2022**	30/10/2022
459	B-CB-C-M18-VE-095	90%	Caseta T1	$7.879.343,87	$7.091.409,48	21/09/2022	TERMINADO	**26/09/2022**	30/10/2022
460	B-CB-C-M18-VE-096	103%	Caseta T1	$7.263.740,89	$7.492.130,91	23/09/2022	TERMINADO	**28/09/2022**	30/10/2022
461	B-CB-C-M18-VE-097	97%	Caseta T1	$7.458.231,12	$7.223.670,95	24/09/2022	TERMINADO	**29/09/2022**	30/10/2022
462	B-CB-C-M18-VE-098	104%	Caseta T1	$7.472.565,88	$7.807.683,58	4/10/2022	TERMINADO	**9/10/2022**	30/10/2022

463	B-CB-C-M15-VE-099	97%	Caseta T1	$7.539.462,20	$7.335.305,87	26/09/2022	TERMINADO	**1/10/2022**	6/11/2022
464	B-CB-C-M18-VE-100	102%	Caseta T1	$7.009.731,67	$7.161.852,57	30/09/2022	TERMINADO	**5/10/2022**	30/10/2022
465	B-CB-C-M18-VE-101	88%	Adecuación	$3.355.883,22	$2.940.027,11	4/10/2022	NO TERMINADO	**7/10/2022**	
466	B-CB-C-M18-VE-102	98%	Caseta T1	$7.696.997,41	$7.516.937,69	1/10/2022	TERMINADO	**6/10/2022**	30/10/2022
467	B-CB-C-M07-VE-103	90%	Caseta T1	$8.044.574,25	$7.240.116,83	1/10/2022	TERMINADO	**6/10/2022**	6/11/2022
468	B-CB-C-M18-VE-104	98%	Caseta T1	$7.415.962,46	$7.280.688,87	2/10/2022	TERMINADO	**7/10/2022**	6/11/2022
469	B-CB-C-M12-VE-105	96%	Caseta T1	$7.408.554,27	$7.116.668,20	1/10/2022	TERMINADO	**6/10/2022**	6/11/2022
470	B-CB-C-M18-VE-106	101%	Caseta T4	$7.296.505,88	$7.401.146,72	6/10/2022	TERMINADO	**11/10/2022**	6/11/2022
471	B-CB-C-M12-VE-107	95%	Caseta T1	$7.324.861,28	$6.971.716,39	2/10/2022	TERMINADO	**7/10/2022**	6/11/2022
472	B-CB-C-M12-VE-108	98%	Caseta T1	$7.377.406,89	$7.244.637,32	30/09/2022	TERMINADO	**5/10/2022**	6/11/2022
473	B-CB-C-M12-VE-110	99%	Caseta T1	$6.997.759,56	$6.925.407,41	30/09/2022	TERMINADO	**5/10/2022**	6/11/2022
474	B-CB-C-M12-VE-111	97%	Caseta T1	$8.211.977,71	$7.972.718,52	6/10/2022	TERMINADO	**11/10/2022**	6/11/2022
475	B-CB-C-M12-VE-112	101%	Caseta T1	$6.756.692,56	$6.801.420,06	6/10/2022	TERMINADO	**11/10/2022**	6/11/2022
476	B-CB-C-M14-VE-113	99%	Caseta T1	$7.968.575,61	$7.884.736,29	10/10/2022	TERMINADO	**15/10/2022**	6/11/2022
477	B-CB-C-M14-VE-114	79%	Adecuación	$5.694.422,16	$4.472.855,83	8/10/2022	TERMINADO	**11/10/2022**	27/11/2022
478	B-CB-C-M14-VE-115	99%	Caseta T1	$7.700.664,12	$7.602.075,65	8/10/2022	TERMINADO	**13/10/2022**	6/11/2022
479	B-CB-C-M14-VE-116	107%	Caseta T1	$7.396.797,59	$7.882.464,60	8/10/2022	TERMINADO	**13/10/2022**	6/11/2022
480	B-CB-C-M14-VE-117	97%	Caseta T1	$7.806.199,57	$7.607.011,72	8/10/2022	TERMINADO	**13/10/2022**	6/11/2022
481	B-CB-C-M14-VE-119	99%	Caseta T2	$6.506.893,72	$6.416.377,11	16/10/2022	TERMINADO	**21/10/2022**	6/11/2022
482	B-CB-C-M11-VE-121	100%	Caseta T1	$7.501.725,56	$7.517.155,98	10/10/2022	TERMINADO	**15/10/2022**	13/11/2022
483	B-CB-C-M14-VE-122	96%	Caseta T1	$7.539.711,36	$7.239.521,36	19/10/2022	TERMINADO	**24/10/2022**	27/11/2022
484	B-CB-C-M11-VE-123	102%	Caseta T1	$7.422.938,92	$7.583.390,28	17/10/2022	TERMINADO	**22/10/2022**	13/11/2022
485	B-CB-C-M14-VE-124	35%	Adecuación	$1.301.742,89	$455.610,01	11/11/2022	NO TERMINADO	**14/11/2022**	
486	B-CB-C-M10-VE-125	91%	Caseta T1	$8.040.261,54	$7.351.466,56	17/10/2022	TERMINADO	**22/10/2022**	13/11/2022
487	B-CB-C-M11-VE-126	104%	Caseta T1	$7.597.693,22	$7.870.563,93	10/10/2022	TERMINADO	**15/10/2022**	13/11/2022
488	B-CB-C-M10-VE-127	99%	Caseta T1	$7.465.753,24	$7.375.998,79	16/10/2022	TERMINADO	**21/10/2022**	13/11/2022
489	B-CB-C-M12-VE-128	101%	Caseta T1	$7.361.989,93	$7.438.104,73	16/10/2022	TERMINADO	**21/10/2022**	13/11/2022
490	B-CB-C-M11-VE-129	110%	Caseta T1	$6.675.761,14	$7.330.822,84	10/10/2022	TERMINADO	**15/10/2022**	13/11/2022
491	B-CB-C-M11-VE-130	94%	Caseta T1	$6.844.222,70	$6.441.532,06	10/10/2022	TERMINADO	**15/10/2022**	13/11/2022
492	B-CB-C-M13-VE-131	91%	Caseta T1	$7.315.096,44	$6.637.956,27	18/10/2022	TERMINADO	**23/10/2022**	13/11/2022

493	B-CB-C-M10-VE-132	95%	Caseta T1	$7.421.999,16	$7.077.515,81	26/10/2022	TERMINADO	**31/10/2022**	13/11/2022
494	B-CB-C-M16-VE-133	105%	Caseta T1	$7.503.404,01	$7.865.630,85	19/10/2022	TERMINADO	**24/10/2022**	13/11/2022
495	B-CB-C-M13-VE-134	94%	Caseta T1	$7.377.579,19	$6.940.027,17	18/10/2022	TERMINADO	**23/10/2022**	13/11/2022
496	B-CB-C-M13-VE-136	103%	Caseta T1	$7.059.253,63	$7.266.769,90	18/10/2022	TERMINADO	**23/10/2022**	13/11/2022
497	B-CB-C-M16-VE-137	90%	Caseta T1	$7.385.432,57	$6.658.800,80	20/10/2022	TERMINADO	**25/10/2022**	13/11/2022
498	B-CB-C-M13-VE-138	104%	Caseta T1	$6.948.535,88	$7.224.686,48	18/10/2022	TERMINADO	**23/10/2022**	13/11/2022
499	B-CB-C-M07-VE-139	129%	Caseta T1	$4.943.134,00	$6.367.760,20	25/11/2022	TERMINADO	**30/11/2022**	23/12/2022
500	B-CB-C-M16-VE-140	103%	Caseta T1	$7.272.378,63	$7.477.553,74	20/10/2022	TERMINADO	**25/10/2022**	13/11/2022
501	B-CB-C-M16-VE-141	101%	Caseta T1	$8.023.564,76	$8.128.650,62	21/10/2022	TERMINADO	**26/10/2022**	13/11/2022
502	B-CB-C-M16-VE-142	96%	Caseta T1	$7.054.170,59	$6.805.035,55	26/10/2022	TERMINADO	**31/10/2022**	13/11/2022
503	B-CB-C-M16-VE-143	99%	Caseta T1	$6.661.020,15	$6.624.579,51	26/10/2022	TERMINADO	**31/10/2022**	13/11/2022
504	B-CB-C-M16-VE-144	112%	Caseta T1	$7.101.027,15	$7.935.472,81	26/10/2022	TERMINADO	**31/10/2022**	13/11/2022
505	B-CB-C-M18-VE-145	73%	Adecuación	$3.998.114,55	$2.901.175,58	9/11/2022	TERMINADO	**12/11/2022**	27/11/2022
506	B-CB-C-M16-VE-146	97%	Caseta T1	$7.630.480,45	$7.432.664,08	26/10/2022	TERMINADO	**31/10/2022**	13/11/2022
507	B-CB-C-M18-VE-147	105%	Caseta T1	$7.675.026,28	$8.080.398,59	1/11/2022	TERMINADO	**6/11/2022**	27/11/2022
508	B-CB-C-M14-VE-148	101%	Caseta T1	$7.258.872,02	$7.307.157,08	1/11/2022	TERMINADO	**6/11/2022**	27/11/2022
509	B-CB-C-M04-VE-149	101%	Caseta T1	$7.070.338,29	$7.154.841,54	28/10/2022	TERMINADO	**2/11/2022**	20/11/2022
510	B-CB-C-M16-VE-150	102%	Caseta T1	$6.797.741,17	$6.901.041,54	28/10/2022	TERMINADO	**2/11/2022**	27/11/2022
511	B-CB-C-M14-VE-151	100%	Caseta T1	$7.524.955,84	$7.536.866,96	28/10/2022	TERMINADO	**2/11/2022**	27/11/2022
512	B-CB-C-M14-VE-152	105%	Caseta T1	$7.199.373,60	$7.569.351,38	1/11/2022	TERMINADO	**6/11/2022**	27/11/2022
513	B-CB-C-M14-VE-153	99%	Caseta T1	$7.179.780,37	$7.078.050,37	2/11/2022	TERMINADO	**7/11/2022**	27/11/2022
514	B-CB-C-M08-VE-154	92%	Caseta T1	$7.363.156,33	$6.747.677,62	6/11/2022	TERMINADO	**11/11/2022**	27/11/2022
515	B-CB-C-M04-VE-155	50%	Caseta T2	$6.570.241,81	$3.266.485,15	6/11/2022	TERMINADO	**11/11/2022**	27/11/2022
516	B-CB-C-M09-VE-156	210%	Adecuación	$834.715,58	$1.756.434,81	6/11/2022	TERMINADO	**9/11/2022**	27/11/2022
517	B-CB-C-M09-VE-157	90%	Adecuación	$2.880.518,59	$2.590.878,82	2/11/2022	TERMINADO	**5/11/2022**	27/11/2022
518	B-CB-C-M04-VE-158	89%	Caseta T1	$7.676.025,74	$6.802.777,38	20/11/2022	TERMINADO	**25/11/2022**	23/12/2022
519	B-CB-C-M16-VE-159	103%	Caseta T1	$7.775.090,47	$8.013.171,58	31/10/2022	TERMINADO	**5/11/2022**	27/11/2022
520	B-CB-C-M13-VE-160	102%	Caseta T1	$7.495.955,89	$7.680.227,46	2/11/2022	TERMINADO	**7/11/2022**	27/11/2022
521	B-CB-C-M07-VE-161	63%	Caseta T2	$7.495.956,89	$4.752.084,02	17/11/2022	NO TERMINADO	**22/11/2022**	
522	B-CB-C-M03-IN-001	101%	Caseta T1	$6.932.616,45	$7.013.865,64	11/11/2022	NO TERMINADO	**16/11/2022**	

523	B-CB-C-M03-IN-002	106%	Caseta T1	$6.853.960,60	$7.260.624,63	11/11/2022	TERMINADO	**16/11/2022**	23/12/2022
524	B-CB-C-M03-IN-003	77%	Caseta T1	$7.910.931,55	$6.097.223,62	11/11/2022	TERMINADO	**16/11/2022**	23/12/2022
525	B-CB-C-M03-IN-004	88%	Caseta T1	$8.369.375,84	$7.339.204,72	11/11/2022	TERMINADO	**16/11/2022**	23/12/2022
526	B-CB-C-M03-IN-005	114%	Caseta T1	$6.748.734,67	$7.662.268,16	11/11/2022	TERMINADO	**16/11/2022**	23/12/2022
527	B-CB-C-M04-IN-006	82%	Caseta T1	$7.544.728,04	$6.216.029,95	17/11/2022	TERMINADO	**22/11/2022**	23/12/2022
528	B-CB-C-M04-IN-007	83%	Caseta T1	$8.846.279,23	$7.334.706,24	2/12/2022	TERMINADO	**7/12/2022**	23/12/2022
529	B-CB-C-M03-IN-008	100%	Caseta T1	$7.398.738,27	$7.407.879,66	20/11/2022	TERMINADO	**25/11/2022**	23/12/2022
530	B-CB-C-M09-IN-009	88%	Caseta T1	$7.783.844,24	$6.824.710,30	4/12/2022	TERMINADO	**9/12/2022**	23/12/2022
531	B-CB-C-M19-IN-010	25%	Adecuación	$3.384.700,34	$846.175,09	13/12/2022	NO TERMINADO	**16/12/2022**	
532	B-CB-C-M20-IN-011	100%	Caseta T2	$5.780.728,27	$5.799.408,53	17/11/2022	TERMINADO	**22/11/2022**	23/12/2022
533	B-CB-C-M20-IN-012	25%	Adecuación	$2.743.664,55	$685.916,14	13/12/2022	NO TERMINADO	**16/12/2022**	
534	B-CB-C-M20-IN-014	107%	Caseta T1	$7.553.787,08	$8.087.606,71	20/11/2022	TERMINADO	**25/11/2022**	23/12/2022
535	B-CB-C-M14-IN-015	87%	Caseta T1	$6.985.419,26	$6.056.217,62	10/12/2022	TERMINADO	**15/12/2022**	23/12/2022
536	B-CB-C-M03-IN-017	87%	Caseta T1	$8.387.421,70	$7.317.934,96	20/11/2022	TERMINADO	**25/11/2022**	23/12/2022
537	B-CB-C-M14-IN-018	25%	Adecuación	$2.691.642,66	$672.910,67		NO TERMINADO		
538	B-CB-C-M03-IN-019	114%	Caseta T1	$7.193.390,35	$8.197.550,06	20/11/2022	TERMINADO	**25/11/2022**	23/12/2022
539	B-CB-C-M09-IN-021	73%	Caseta T1	$9.298.905,47	$6.771.462,23	25/11/2022	TERMINADO	**30/11/2022**	23/12/2022
540	B-CB-C-M08-IN-023	105%	Caseta T1	$6.855.232,41	$7.193.987,42	26/11/2022	TERMINADO	**1/12/2022**	23/12/2022
541	B-CB-C-M09-IN-024	27%	Adecuación	$2.822.696,12	$762.127,95		NO TERMINADO		
542	B-CB-C-M14-IN-025	104%	Caseta T1	$7.391.211,43	$7.695.735,45	28/11/2022	TERMINADO	**3/12/2022**	23/12/2022
543	B-CB-C-M17-IN-026	93%	Caseta T1	$8.311.014,62	$7.696.231,61	25/11/2022	TERMINADO	**30/11/2022**	23/12/2022
544	B-CB-C-M11-IN-029	114%	Caseta T1	$6.939.774,70	$7.928.488,44	29/11/2022	TERMINADO	**4/12/2022**	23/12/2022
545	B-CB-C-M08-IN-030	99%	Caseta T1	$7.461.424,09	$7.400.554,37	24/11/2022	TERMINADO	**29/11/2022**	23/12/2022
546	B-CB-C-M19-IN-031	107%	Caseta T1	$7.173.822,77	$7.695.139,94	24/11/2022	TERMINADO	**29/11/2022**	23/12/2022
547	B-CB-C-M04-IN-032	105%	Caseta T1	$7.308.714,28	$7.702.936,01	28/11/2022	TERMINADO	**3/12/2022**	23/12/2022
548	B-CB-C-M20-IN-033	97%	Caseta T1	$7.756.435,16	$7.552.898,68	24/11/2022	TERMINADO	**29/11/2022**	23/12/2022
549	B-CB-C-M09-IN-035	102%	Caseta T1	$7.313.400,77	$7.431.222,43	24/11/2022	TERMINADO	**29/11/2022**	23/12/2022
550	B-CB-C-M05-IN-036	113%	Caseta T1	$7.108.372,44	$8.050.529,17	2/12/2022	TERMINADO	**7/12/2022**	23/12/2022
551	B-CB-C-M19-IN-037	74%	Caseta T1	$9.088.986,75	$6.753.296,76	28/11/2022	TERMINADO	**3/12/2022**	23/12/2022
552	B-CB-C-M04-IN-038	95%	Caseta T2	$7.309.774,44	$6.943.052,23	2/12/2022	TERMINADO	**7/12/2022**	23/12/2022

553	B-CB-C-M15-IN-040	92%	Caseta T1	$8.796.370,53	$8.128.750,77	30/11/2022	TERMINADO	**5/12/2022**	23/12/2022
554	B-CB-C-M15-IN-041	95%	Caseta T1	$9.093.920,14	$8.673.279,51	2/12/2022	TERMINADO	**7/12/2022**	23/12/2022
555	B-CB-C-M02-IN-042	86%	Caseta T2	$8.544.118,13	$7.359.296,78	2/12/2022	TERMINADO	**7/12/2022**	23/12/2022
556	B-CB-C-M28-IN-043	106%	Caseta T1	$7.155.257,96	$7.588.786,28	2/12/2022	TERMINADO	**7/12/2022**	23/12/2022
557	B-CB-C-M03-IN-047	96%	Caseta T1	$7.664.440,08	$7.360.909,39	2/12/2022	TERMINADO	**7/12/2022**	23/12/2022
558	B-CB-C-M03-IN-049	83%	Caseta T1	$7.031.189,57	$5.852.823,92	9/12/2022	NO TERMINADO	**14/12/2022**	
559	B-CB-C-M06-IN-050	93%	Caseta T2	$7.043.121,52	$6.537.345,41	6/12/2022	NO TERMINADO	**11/12/2022**	
560	B-CB-C-M02-IN-051	92%	Caseta T1	$7.465.098,75	$6.861.597,06	5/12/2022	NO TERMINADO	**10/12/2022**	
561	B-CB-C-M08-IN-052	98%	Caseta T1	$6.691.832,67	$6.540.006,31	5/12/2022	NO TERMINADO	**10/12/2022**	
562	B-CB-C-M15-IN-053	57%	Caseta T1	$7.275.739,03	$4.125.215,29	11/12/2022	NO TERMINADO	**16/12/2022**	
563	B-CB-C-M17-IN-055	62%	Caseta T2	$7.233.717,11	$4.510.962,29	19/12/2022	NO TERMINADO	**24/12/2022**	
564	B-CB-VH-M01-VE-001	60%	Caseta T1	$7.530.288,05	$4.530.951,57	14/09/2022	TERMINADO	**19/09/2022**	30/10/2022
565	B-CB-VH-M02-VE-002	100%	Caseta T1	$7.097.935,12	$7.112.061,99	22/09/2022	TERMINADO	**27/09/2022**	30/10/2022
566	B-CB-VH-M01-VE-003	100%	Caseta T1	$6.967.489,42	$6.964.153,07	14/09/2022	TERMINADO	**19/09/2022**	30/10/2022
567	B-CB-VH-M02-VE-004	100%	Caseta T1	$7.311.772,60	$7.288.843,66	13/09/2022	TERMINADO	**18/09/2022**	30/10/2022
568	B-CB-VH-M02-VE-006	100%	Caseta T1	$7.185.516,09	$7.213.284,02	13/09/2022	TERMINADO	**18/09/2022**	30/10/2022
569	B-CB-VH-M01-VE-007	113%	Adecuación	$2.473.098,90	$2.801.891,04	7/10/2022	TERMINADO	**10/10/2022**	16/10/2022
570	B-CB-VH-M02-VE-008	63%	Adecuación	$6.761.563,02	$4.259.131,21	27/09/2022	TERMINADO	**30/09/2022**	16/10/2022
571	B-CB-VH-M02-VE-009	97%	Caseta T1	$7.184.529,39	$6.955.346,99	24/09/2022	TERMINADO	**29/09/2022**	30/10/2022
572	B-CB-VH-M03-VE-010	103%	Caseta T2	$7.765.779,93	$8.023.358,08	20/09/2022	TERMINADO	**25/09/2022**	30/10/2022
573	B-CB-VH-M04-VE-011	125%	Caseta T1	$6.852.690,40	$8.585.451,96	22/09/2022	TERMINADO	**27/09/2022**	30/10/2022
574	B-CB-VH-M05-VE-013	93%	Caseta T1	$7.925.480,24	$7.336.487,90	4/10/2022	TERMINADO	**9/10/2022**	6/10/2022
575	B-CB-VH-M05-VE-014	104%	Caseta T1	$7.573.425,40	$7.870.321,40	22/09/2022	TERMINADO	**27/09/2022**	30/10/2022
576	B-CB-VH-M05-VE-015	95%	Caseta T1	$7.302.874,02	$6.968.786,39	21/09/2022	TERMINADO	**26/09/2022**	6/10/2022
577	B-CB-VH-M05-VE-016	79%	Adecuación	$4.545.740,87	$3.609.911,29	14/10/2022	TERMINADO	**17/10/2022**	6/10/2022
578	B-CB-VH-M05-VE-017	85%	Caseta T1	$8.386.380,85	$7.128.423,72	24/09/2022	TERMINADO	**29/09/2022**	13/11/2022
579	B-CB-VH-M06-VE-018	64%	Adecuación	$5.420.365,16	$3.444.722,48	13/10/2022	TERMINADO	**16/10/2022**	6/10/2022
580	B-CB-VH-M06-VE-019	85%	Caseta T1	$1.809.591,53	$1.533.438,24	21/10/2022	TERMINADO	**26/10/2022**	13/11/2022
581	B-CB-VH-M06-VE-020	75%	Caseta T1	$3.212.476,34	$2.409.357,26	22/10/2022	TERMINADO	**27/10/2022**	13/11/2022
582	B-CB-VH-M06-VE-021	97%	Caseta T2	$7.319.788,91	$7.069.932,20	27/09/2022	TERMINADO	**2/10/2022**	13/11/2022

583	B-CB-VH-M04-VE-023	100%	Caseta T1	$7.110.372,77	$7.117.954,59	27/09/2022	TERMINADO	**2/10/2022**	30/10/2022
584	B-CB-VH-M06-VE-024	103%	Caseta T1	$6.835.073,75	$7.020.433,92	3/10/2022	TERMINADO	**8/10/2022**	13/11/2022
585	B-CB-VH-M06-VE-026	78%	Caseta T1	$6.750.117,47	$5.264.308,53	11/10/2022	NO TERMINADO	**16/10/2022**	
586	B-CB-VH-M07-VE-029	100%	Caseta T1	$7.189.674,85	$7.165.170,92	29/09/2022	TERMINADO	**4/10/2022**	13/11/2022
587	B-CB-VH-M07-VE-031	106%	Caseta T1	$6.390.564,61	$6.756.078,85	11/10/2022	TERMINADO	**16/10/2022**	13/11/2022
588	B-CB-VH-M07-VE-032	105%	Caseta T1	$7.212.355,78	$7.564.381,74	30/09/2022	TERMINADO	**5/10/2022**	13/11/2022
589	B-CB-VH-M07-VE-034	91%	Caseta T1	$7.559.464,83	$6.860.288,28	30/09/2022	TERMINADO	**5/10/2022**	13/11/2022
590	B-CB-VH-M07-VE-035	105%	Caseta T1	$7.125.749,42	$7.501.568,61	29/09/2022	NO TERMINADO	**4/10/2022**	
591	B-CB-VH-M07-VE-036	107%	Caseta T1	$6.885.917,45	$7.399.535,61	19/10/2022	NO TERMINADO	**24/10/2022**	
592	B-CB-VH-M07-VE-037	94%	Caseta T1	$7.506.726,96	$7.042.594,97	18/10/2022	NO TERMINADO	**23/10/2022**	
593	B-CB-VH-M08-VE-038	98%	Caseta T1	$6.888.396,07	$6.745.772,70	3/10/2022	TERMINADO	**8/10/2022**	13/11/2022
594	B-CB-VH-M08-VE-039	98%	Caseta T1	$7.506.804,91	$7.324.684,20	14/10/2022	TERMINADO	**19/10/2022**	4/12/2022
595	B-CB-VH-M08-VE-040	100%	Caseta T1	$7.563.652,13	$7.589.204,74	14/10/2022	TERMINADO	**19/10/2022**	4/12/2022
596	B-CB-VH-M09-VE-043	101%	Caseta T1	$7.112.704,93	$7.215.114,79	19/10/2022	TERMINADO	**24/10/2022**	20/11/2022
597	B-CB-VH-M08-VE-044	98%	Caseta T1	$6.764.497,39	$6.648.057,93	13/10/2022	TERMINADO	**18/10/2022**	4/12/2022
598	B-CB-VH-M09-VE-045	84%	Caseta T1	$6.528.467,76	$5.488.952,80	19/10/2022	TERMINADO	**24/10/2022**	4/12/2022
599	B-CB-VH-M09-VE-052	94%	Caseta T2	$7.448.056,34	$6.985.807,48	16/10/2022	TERMINADO	**21/10/2022**	20/11/2022
600	B-CB-VH-M13-VE-054	95%	Caseta T1	$6.977.487,10	$6.621.232,70	19/10/2022	TERMINADO	**24/10/2022**	4/12/2022
601	B-CB-VH-M13-VE-055	81%	Caseta T1	$7.264.305,05	$5.860.280,07	19/10/2022	NO TERMINADO	**24/10/2022**	
602	B-CB-VH-M15-VE-056	97%	Caseta T1	$7.857.641,87	$7.596.450,52	8/10/2022	TERMINADO	**13/10/2022**	4/12/2022
603	B-CB-VH-M15-VE-057	97%	Caseta T1	$7.389.336,52	$7.192.974,05	8/10/2022	TERMINADO	**13/10/2022**	4/12/2022
604	B-CB-VH-M14-VE-058	93%	Caseta T1	$6.808.144,55	$6.352.359,00	6/10/2022	TERMINADO	**11/10/2022**	4/12/2022
605	B-CB-VH-M16-VE-060	94%	Caseta T1	$7.464.503,72	$7.025.843,23	14/10/2022	TERMINADO	**19/10/2022**	4/12/2022
606	B-CB-VH-M15-VE-062	125%	Caseta T1	$6.104.049,63	$7.655.488,55	13/10/2022	TERMINADO	**18/10/2022**	4/12/2022
607	B-CB-VH-M16-VE-063	99%	Caseta T1	$6.688.438,66	$6.626.740,07	11/10/2022	TERMINADO	**16/10/2022**	4/12/2022
608	B-CB-VH-M16-VE-064	98%	Caseta T1	$6.994.456,13	$6.872.692,88	27/10/2022	TERMINADO	**1/11/2022**	18/12/2022
609	B-CB-VH-M16-VE-065	56%	Caseta T4	$7.227.869,74	$4.023.184,40	26/11/2022	NO TERMINADO	**1/12/2022**	
610	B-CB-VH-M16-VE-066	99%	Caseta T1	$7.124.075,37	$7.022.028,59	26/10/2022	TERMINADO	**31/10/2022**	18/12/2022
611	B-CB-VH-M17-VE-067	99%	Caseta T1	$7.059.068,77	$6.956.171,66	27/10/2022	TERMINADO	**1/11/2022**	18/12/2022
612	B-CB-VH-M17-VE-068	97%	Caseta T2	$6.892.806,77	$6.680.607,03	27/10/2022	TERMINADO	**1/11/2022**	18/12/2022

613	B-CB-VH-M18-VE-069	102%	Caseta T1	$7.376.342,75	$7.545.050,58	1/11/2022	TERMINADO	**6/11/2022**	4/12/2022
614	B-CB-VH-M18-VE-070	91%	Caseta T1	$8.164.048,61	$7.392.181,04	1/11/2022	TERMINADO	**6/11/2022**	4/12/2022
615	B-CB-VH-M16-VE-072	81%	Caseta T1	$9.285.968,35	$7.526.944,30	28/10/2022	TERMINADO	**2/11/2022**	18/12/2022
616	B-CB-VH-M08-VE-073	103%	Caseta T1	$7.153.850,50	$7.352.775,53	1/11/2022	TERMINADO	**6/11/2022**	4/12/2022
617	B-CB-VH-M18-VE-074	98%	Caseta T1	$6.966.100,45	$6.850.679,21	1/11/2022	TERMINADO	**6/11/2022**	4/12/2022
618	B-CB-VH-M13-VE-075	97%	Caseta T1	$6.780.696,61	$6.543.933,00	4/11/2022	TERMINADO	**9/11/2022**	4/12/2022
619	B-CB-VH-M18-VE-076	103%	Caseta T1	$7.380.122,18	$7.635.419,32	4/11/2022	TERMINADO	**9/11/2022**	4/12/2022
620	B-CB-VH-M19-VE-078	90%	Caseta T2	$7.167.261,44	$6.417.827,17	9/11/2022	TERMINADO	**14/11/2022**	18/12/2022
621	B-CB-VH-M19-VE-079	89%	Caseta T1	$7.546.663,95	$6.690.783,83	10/11/2022	TERMINADO	**15/11/2022**	18/12/2022
622	B-CB-VH-M19-VE-082	99%	Caseta T1	$7.016.445,82	$6.950.201,81	11/11/2022	TERMINADO	**16/11/2022**	23/12/2022
623	B-CB-VH-M19-VE-083	92%	Caseta T2	$7.019.108,67	$6.441.700,34	9/11/2022	TERMINADO	**14/11/2022**	23/12/2022
624	B-CB-VH-M20-VE-084	101%	Caseta T1	$7.273.637,66	$7.356.501,12	7/11/2022	TERMINADO	**12/11/2022**	18/12/2022
625	B-CB-VH-M20-VE-085	97%	Caseta T1	$7.210.106,01	$6.960.163,26	7/11/2022	TERMINADO	**12/11/2022**	18/12/2022
626	B-CB-VH-M20-VE-086	89%	Caseta T1	$7.075.779,69	$6.314.104,90	7/11/2022	TERMINADO	**12/11/2022**	23/12/2022
627	B-CB-VH-M20-VE-087	93%	Caseta T1	$7.097.946,60	$6.594.824,92	11/11/2022	TERMINADO	**16/11/2022**	23/12/2022
628	B-CB-VH-M20-VE-089	88%	Caseta T1	$7.369.164,62	$6.480.310,13	9/11/2022	TERMINADO	**14/11/2022**	23/12/2022
629	B-CB-VH-M21-VE-090	100%	Caseta T1	$7.594.789,05	$7.563.769,25	13/11/2022	TERMINADO	**18/11/2022**	23/12/2022
630	B-CB-VH-M19-VE-091	99%	Caseta T1	$7.359.646,86	$7.262.663,10	7/11/2022	TERMINADO	**12/11/2022**	23/12/2022
631	B-CB-VH-M21-VE-092	96%	Caseta T1	$8.182.144,53	$7.887.397,73	15/11/2022	TERMINADO	**20/11/2022**	23/12/2022
632	B-CB-VH-M21-VE-093	99%	Caseta T1	$7.427.237,60	$7.331.229,05	15/11/2022	TERMINADO	**20/11/2022**	23/12/2022
633	B-CB-VH-M21-VE-095	103%	Caseta T2	$6.015.766,81	$6.177.363,64	17/11/2022	TERMINADO	**22/11/2022**	23/12/2022
634	B-CB-VH-M21-VE-096	100%	Caseta T2	$6.784.215,24	$6.758.495,64	15/11/2022	TERMINADO	**20/11/2022**	23/12/2022
635	B-CB-VH-M03-VE-097	93%	Caseta T1	$7.438.303,89	$6.950.704,99	17/11/2022	TERMINADO	**22/11/2022**	23/12/2022
636	B-CB-VH-M21-VE-098	79%	Caseta T2	$6.114.765,24	$4.833.088,39	17/11/2022	TERMINADO	**22/11/2022**	23/12/2022
637	B-CB-VH-M21-VE-100	74%	Caseta T1	$8.379.519,36	$6.177.811,57	17/11/2022	TERMINADO	**22/11/2022**	30/12/2022
638	B-CB-VH-M23-VE-101	93%	Caseta T1	$7.708.757,92	$7.144.869,88	19/11/2022	TERMINADO	**24/11/2022**	23/12/2022
639	B-CB-VH-M23-VE-102	100%	Caseta T1	$7.671.554,06	$7.662.907,71	23/11/2022	TERMINADO	**28/11/2022**	30/12/2022
640	B-CB-VH-M24-VE-104	90%	Caseta T1	$6.666.698,93	$6.032.784,24	19/11/2022	TERMINADO	**24/11/2022**	23/12/2022
641	B-CB-VH-M24-VE-105	81%	Caseta T1	$6.777.569,46	$5.488.952,80	23/11/2022	TERMINADO	**28/11/2022**	30/12/2022
642	B-CB-VH-M21-VE-106	84%	Caseta T1	$6.879.572,54	$5.760.850,53	23/11/2022	TERMINADO	**28/11/2022**	30/12/2022

643	B-CB-VH-M21-VE-107	87%	Caseta T1	$6.649.693,65	$5.786.362,45	23/11/2022	TERMINADO	**28/11/2022**	30/12/2022
644	B-CB-VH-M23-VE-108	89%	Caseta T1	$7.602.414,00	$6.728.957,17	23/11/2022	TERMINADO	**28/11/2022**	30/12/2022
645	B-CB-VH-M25-VE-109	95%	Caseta T1	$7.267.056,70	$6.911.195,89	29/11/2022	TERMINADO	**4/12/2022**	30/12/2022
646	B-CB-VH-M25-VE-110	97%	Caseta T1	$7.124.509,04	$6.946.345,84	26/11/2022	TERMINADO	**1/12/2022**	30/12/2022
647	B-CB-VH-M25-VE-111	96%	Caseta T1	$7.141.676,69	$6.891.335,76	26/11/2022	TERMINADO	**1/12/2022**	30/12/2022
648	B-CB-VH-M25-VE-112	97%	Caseta T1	$7.623.594,83	$7.424.211,78	29/11/2022	TERMINADO	**4/12/2022**	30/12/2022
649	B-CB-VH-M26-VE-113	93%	Caseta T1	$7.743.073,74	$7.163.161,54	26/11/2022	TERMINADO	**1/12/2022**	30/12/2022
650	B-CB-VH-M26-VE-114	97%	Caseta T1	$7.539.273,76	$7.277.444,90	24/11/2022	TERMINADO	**29/11/2022**	30/12/2022
651	B-CB-VH-M26-VE-115	98%	Caseta T1	$7.069.975,20	$6.925.822,04	24/11/2022	TERMINADO	**29/11/2022**	30/12/2022
652	B-CB-VH-M26-VE-116	91%	Caseta T1	$7.114.143,39	$6.490.696,29	29/11/2022	TERMINADO	**4/12/2022**	30/12/2022
653	B-CB-VH-M26-VE-117	92%	Caseta T1	$7.535.330,34	$6.938.851,79	24/11/2022	TERMINADO	**29/11/2022**	30/12/2022
654	B-CB-VH-M26-VE-118	88%	Caseta T1	$7.165.008,40	$6.340.721,53	24/11/2022	TERMINADO	**29/11/2022**	30/12/2022
655	B-CB-VH-M26-VE-119	94%	Caseta T1	$6.957.260,60	$6.521.818,79	26/11/2022	TERMINADO	**1/12/2022**	30/12/2022
656	B-CB-VH-M26-VE-120	84%	Caseta T1	$7.288.578,20	$6.141.478,57	25/11/2022	TERMINADO	**30/11/2022**	30/12/2022
657	B-CB-VH-M26-VE-121	87%	Caseta T1	$7.224.024,73	$6.285.753,05	3/12/2022	TERMINADO	**8/12/2022**	30/12/2022
658	B-CB-VH-M27-VE-122	89%	Caseta T1	$6.938.069,60	$6.177.811,57	3/12/2022	TERMINADO	**8/12/2022**	30/12/2022
659	B-CB-VH-M27-VE-123	88%	Caseta T1	$6.994.576,06	$6.177.811,57	3/12/2022	TERMINADO	**8/12/2022**	30/12/2022
660	B-CB-VH-M26-VE-124	88%	Caseta T1	$7.148.661,18	$6.285.753,05	3/12/2022	TERMINADO	**8/12/2022**	30/12/2022
661	B-CB-VH-M28-VE-125	90%	Caseta T1	$6.862.232,35	$6.177.811,57	4/12/2022	TERMINADO	**9/12/2022**	30/12/2022
662	B-CB-VH-M28-VE-127	89%	Caseta T1	$6.934.695,23	$6.177.811,57	5/12/2022	TERMINADO	**10/12/2022**	30/12/2022
663	B-CB-VH-M28-VE-128	65%	Caseta T4	$7.726.193,38	$4.996.733,09	5/12/2022	NO TERMINADO	**10/12/2022**	
664	B-CB-VH-M28-VE-129	67%	Caseta T1	$6.604.403,88	$4.447.341,40	5/12/2022	NO TERMINADO	**10/12/2022**	
665	B-CB-VH-M28-VE-130	76%	Caseta T1	$6.882.324,28	$5.244.141,65	11/12/2022	NO TERMINADO	**16/12/2022**	
666	B-CB-VH-M16-VE-151	64%	Caseta T1	$8.037.831,78	$5.136.200,17	10/12/2022	NO TERMINADO	**15/12/2022**	
667	B-CB-VH-M01-VE-152	74%	Caseta T1	$6.973.301,08	$5.136.200,17	12/12/2022	NO TERMINADO	**17/12/2022**	
668	B-CB-VH-M18-VE-153	70%	Caseta T1	$7.524.188,19	$5.244.141,65	12/12/2022	NO TERMINADO	**17/12/2022**	
669	B-CB-VH-M27-VE-156	71%	Caseta T1	$7.410.062,14	$5.244.141,65	12/12/2022	NO TERMINADO	**17/12/2022**	
670	B-CB-VH-M31-VE-159	69%	Caseta T1	$7.425.736,24	$5.136.200,17	13/12/2022	NO TERMINADO	**18/12/2022**	
671	B-CB-VH-M34-VE-160	71%	Caseta T1	$7.436.066,65	$5.244.141,65	13/12/2022	NO TERMINADO	**18/12/2022**	
672	B-CB-VH-M35-VE-161	71%	Caseta T1	$7.206.461,05	$5.136.200,17	15/12/2022	NO TERMINADO	**20/12/2022**	

673	B-CB-VH-M34-VE-162	73%	Caseta T4	$7.951.969,04	$5.793.533,34	16/12/2022	NO TERMINADO	**21/12/2022**	
674	B-CB-VH-M34-VE-163	62%	Caseta T1	$7.196.235,64	$4.447.341,40	16/12/2022	NO TERMINADO	**21/12/2022**	
675	B-CB-VH-M34-VE-164	69%	Caseta T1	$7.411.799,27	$5.136.200,17	16/12/2022	NO TERMINADO	**21/12/2022**	
676	B-CB-VH-M35-VE-165	72%	Caseta T1	$7.144.837,61	$5.136.200,17	17/12/2022	NO TERMINADO	**22/12/2022**	
677	B-CB-VH-M34-VE-166	69%	Caseta T1	$7.570.063,03	$5.244.141,65	17/12/2022	NO TERMINADO	**22/12/2022**	
678	B-CB-VH-M27-VE-167	73%	Caseta T1	$7.039.904,34	$5.136.200,17	17/12/2022	NO TERMINADO	**22/12/2022**	
679	B-CB-VH-M16-VE-169	74%	Caseta T1	$6.934.695,23	$5.136.200,17	17/12/2022	NO TERMINADO	**22/12/2022**	
680	B-CB-VH-M17-VE-170	74%	Caseta T1	$7.114.857,84	$5.244.141,65	18/12/2022	NO TERMINADO	**23/12/2022**	
681	B-CB-VH-M20-VE-173	70%	Caseta T1	$7.290.151,10	$5.136.200,17	18/12/2022	NO TERMINADO	**23/12/2022**	
682	B-CB-VH-M34-VE-174	58%	Caseta T1	$7.398.624,03	$4.277.470,03	19/12/2022	NO TERMINADO	**24/12/2022**	
683	B-CB-VH-M23-VE-175	67%	Caseta T1	$7.682.885,59	$5.136.200,17	20/12/2022	NO TERMINADO	**25/12/2022**	
684	B-CB-VH-M04-VE-176	61%	Caseta T1	$7.213.133,35	$4.385.411,51	19/12/2022	NO TERMINADO	**24/12/2022**	
685	B-CB-VH-M01-VE-178	71%	Caseta T1	$7.275.229,86	$5.136.200,17	20/12/2022	NO TERMINADO	**25/12/2022**	
686	B-CB-VH-M26-VE-182	45%	Caseta T1	$7.934.663,70	$3.588.611,26	22/12/2022	NO TERMINADO	**27/12/2022**	
687	B-CB-VH-M17-VE-186	67%	Caseta T1	$7.885.012,25	$5.244.141,65	19/12/2022	NO TERMINADO	**24/12/2022**	
688	B-CB-VH-M18-VE-187	74%	Caseta T1	$7.101.447,40	$5.244.141,65	22/12/2022	NO TERMINADO	**27/12/2022**	
689	B-CB-VH-M36-VE-192	55%	Caseta T1	$7.805.902,57	$4.277.470,03	23/12/2022	NO TERMINADO	**28/12/2022**	
690	B-CB-VH-M36-VE-193	61%	Caseta T1	$6.970.926,68	$4.277.470,03	23/12/2022	NO TERMINADO	**28/12/2022**	
691	B-CB-VH-M36-VE-194	56%	Caseta T1	$7.605.186,82	$4.277.470,03	23/12/2022	NO TERMINADO	**28/12/2022**	
692	B-CB-VH-M36-VE-195	61%	Caseta T1	$6.970.926,68	$4.277.470,03	23/12/2022	NO TERMINADO	**28/12/2022**	
693	B-CB-VH-M36-VE-196	60%	Caseta T1	$7.132.094,66	$4.277.470,03	31/12/2022	NO TERMINADO	**5/01/2023**	
694	B-CB-VH-M38-VE-198	56%	Caseta T1	$7.642.759,13	$4.277.470,03	30/12/2022	NO TERMINADO	**4/01/2023**	
695	B-CB-V-M02-VE-002	159%	Adecuación	$2.474.432,07	$3.942.655,01	16/12/2022	NO TERMINADO	**19/12/2022**	
696	B-CB-V-M02-VE-003	133%	Adecuación	$2.923.130,19	$3.891.219,73	12/12/2022	NO TERMINADO	**15/12/2022**	
697	B-CB-V-M02-VE-004	109%	Adecuación	$1.275.515,50	$1.384.268,26	12/12/2022	TERMINADO	**15/12/2022**	23/12/2022
698	B-CB-V-M03-VE-005	93%	Caseta T2	$7.099.610,25	$6.631.695,89	9/12/2022	NO TERMINADO	**14/12/2022**	
699	B-CB-V-M03-VE-006	129%	Adecuación	$2.637.468,82	$3.410.217,35	13/12/2022	NO TERMINADO	**16/12/2022**	
700	B-CB-V-M03-VE-007	58%	Adecuación	$2.628.169,82	$1.536.548,13	20/12/2022	NO TERMINADO	**23/12/2022**	
701	B-CB-V-M03-VE-011	58%	Caseta T1	$7.134.896,90	$4.125.215,29	18/12/2022	NO TERMINADO	**23/12/2022**	
702	B-CB-V-M04-VE-013	70%	Caseta T2	$6.446.752,13	$4.510.962,29	9/12/2022	NO TERMINADO	**14/12/2022**	

703	B-CB-V-M04-VE-019	76%	Caseta T2	$7.002.925,30	$5.319.568,13	11/12/2022	NO TERMINADO	**16/12/2022**	
704	B-CB-V-M04-VE-021	148%	Adecuación	$1.664.884,05	$2.467.028,85	14/12/2022	NO TERMINADO	**17/12/2022**	
705	B-CB-V-M04-VE-022	149%	Adecuación	$2.784.594,05	$4.143.594,99	12/12/2022	NO TERMINADO	**15/12/2022**	
706	B-CB-V-M04-VE-023	37%	Adecuación	$2.316.016,27	$851.000,19	20/12/2022	NO TERMINADO	**23/12/2022**	
707	B-CB-V-M04-VE-026	94%	Caseta T1	$7.918.228,97	$7.474.969,30	16/12/2022	NO TERMINADO	**21/12/2022**	
708	B-CB-V-M05-VE-032	91%	Caseta T1	$7.496.998,60	$6.795.529,12	19/12/2022	NO TERMINADO	**24/12/2022**	
709	B-CB-V-M05-VE-043	85%	Caseta T1	$7.676.875,29	$6.555.631,65	19/12/2022	NO TERMINADO	**24/12/2022**	
710	B-CB-V-M05-VE-044	63%	Caseta T1	$7.581.779,43	$4.814.074,06	19/12/2022	NO TERMINADO	**24/12/2022**	
711	B-CB-V-M05-VE-045	83%	Caseta T2	$6.524.097,38	$5.412.311,80	17/12/2022	NO TERMINADO	**22/12/2022**	
712	B-CB-V-M05-VE-048	64%	Caseta T1	$7.697.269,78	$4.922.015,55	26/12/2022	NO TERMINADO	**31/12/2022**	
713	B-CB-V-M05-VE-049	71%	Caseta T1	$6.772.278,24	$4.814.074,06	26/12/2022	NO TERMINADO	**31/12/2022**	
714	B-CB-V-M06-VE-053	52%	Caseta T2	$7.288.792,47	$3.763.400,64	26/12/2022	NO TERMINADO	**31/12/2022**	

Adicionalmente, durante la ejecución de la Actividad 3, la interventoría tomó las muestras de concreto relacionadas en la siguiente tabla.

TABLA 21. RELACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS.

FECHA	TIPO DE MUESTRAS	No. DE MUESTRAS	ENSAYO A APLICAR
01/12/2022	Cilindros de concreto para cimentación de 4” de diámetro.	4	NTC 673 - Resistencia del concreto a compresión

En el **Anexo 13,** se presentan pruebas y ensayos realizados

4.1.4. Avance general del proyecto.

De acuerdo con las actividades realizadas por el contratista de obra, se presenta el avance general del proyecto durante el periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.


Teniendo en cuenta la programación, se presenta un atraso en la obra del -15.44%, debido a que a la fecha de corte de este informe se encuentran terminadas 538 viviendas, en comparación con las 784 establecidas en la programación actualizada derivada de la novedad contractual de adición.

TABLA 22. AVANCE DEL PROYECTO – INFORMES SEMANALES.

AVANCE DE ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DURANTE EL PERIODO				
INFORME No	**PERIODO**	**PROGRAMADO ACUMULADO**	**EJECUTADO APROBADO**	**ATRASO**
33	Del 28 de noviembre de 2022 al 04 de diciembre de 2022.	93,27% $5.708.399.745,78	65,52% $4.009.967.657,31	-27.75%

AVANCE DE ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DURANTE EL PERIODO				
INFORME No	**PERIODO**	**PROGRAMADO ACUMULADO**	**EJECUTADO APROBADO**	**ATRASO**
34	Del 05 de diciembre de 2022 al 18 de diciembre de 2022.	94,52% $5.784.676.754,34	69,20% $4.235.042.921,51	-26.83%
35	Del 12 de diciembre de 2022 al 18 de diciembre de 2022.	94,52% $5.784.676.754,34	72,48% $4.435.905.236,34	22.04%
36	Del 19 de diciembre de 2022 al 25 de diciembre de 2022.	74,97% $5.959.406.361,82	58,28% $4.632.608.081,80	-16.69%
37	Del 26 de diciembre de 2022 al 01 de enero de 202 .	74,97% $5.959.406.361,82	59,53% $4.732.145.192,15	-15.44%

TABLA 23. GRÁFICA AVANCE ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA

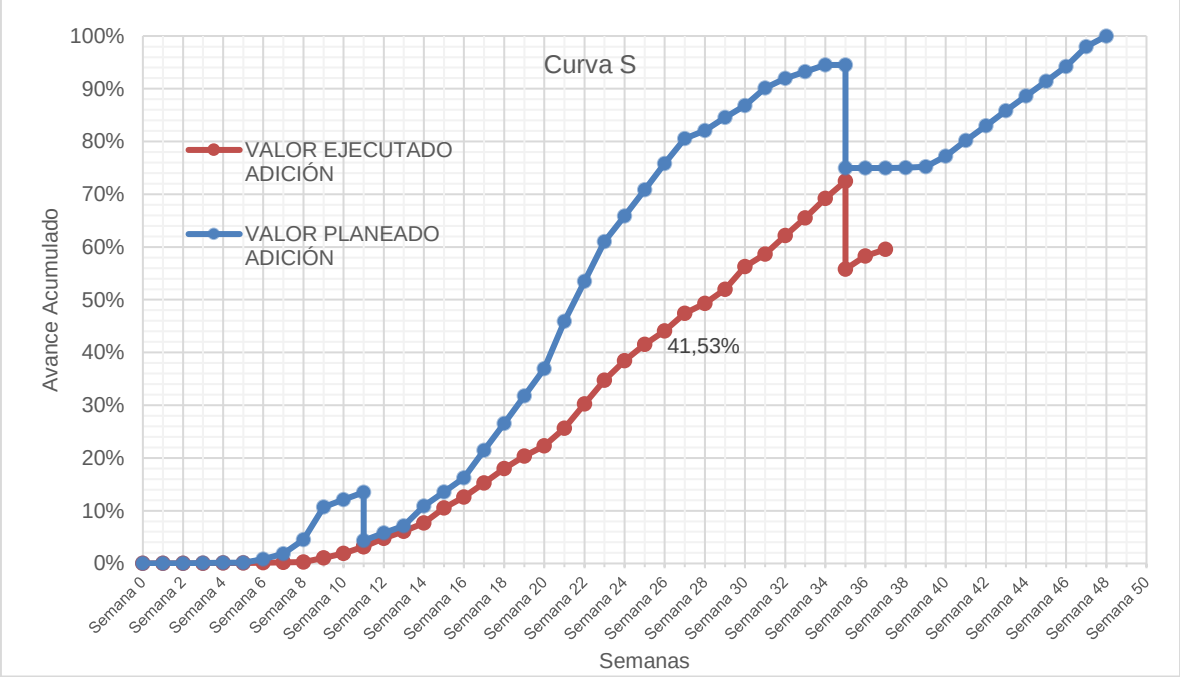

TRAZABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN: Luego de revisada la programación remitida por el contratista de obra en respuesta al plan de contingencia solicitada, el equipo técnico de DAIMCO S.A.S. dio aval el día 22 de julio de 2022, mediante comunicado ICB-ENTERRITORIO-2022-072, con radicado No. 20224300276912.

Luego de revisado el plan de acción presentado por el contratista de obra en respuesta a la solicitud emitida por la interventoría, el equipo técnico de DAIMCO S.A.S. remitió observaciones al plan el 12 de octubre de 2022 vía correo electrónico, mediante

comunicado ICB-ENTERRITORIO-2022-134. A la fecha de corte de este informe, la interventoría no ha recibido respuesta por parte del contratista, por lo cual la interventoría ha reiterado su solicitud de subsanación a estas observaciones a través de los comités de seguimiento semanal No. 25 y No. 26, llevados a cabo el 22 de octubre de 2022 y 28 de octubre de 2022, respectivamente.

Adicionalmente, Las líneas base del proyecto han cambiado teniendo en cuenta que se firmó una adición al contrato, donde el valor del contrato asciende a $ 7.949.069.174,67, por lo cual tiene una variación de $ 1.828.773.582,67, y el tiempo del contrato tiene una prorrogación del plazo hasta el 18 de marzo de 2023, por lo cual tiene una variación de 90 días. Teniendo en cuenta esta novedad contractual de adición que presenta el proyecto se ha ajustado la programación del proyecto, teniendo en cuenta la novedad contractual que se ha presentado. La interventoría da aval a la reprogramación derivada de la novedad contractual del proyecto el 02 de diciembre del presente año mediante comunicado ICB-ENTERRITORIO-2022-166 con radicado No. 20224300463902.

En el **Anexo 17,** se presentan los informes semanales de interventoría.
En el **Anexo 26,** se presentan los Análisis de Precios Unitarios.

4.2. SITUACIONES ESPECIALES OCURRIDAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo de este informe, continuó la ejecución de las viviendas en el barrio Vista Hermosa, Nariño, La Ceiba y la Victoria, se recibieron 3 renuncias al beneficio y 2 diagnósticos de inclusión del barrio La Ceiba fuero reclasificados, dado que inicialmente se recibió concepto favorable de Inclusión por parte de la secretaría de planeación e infraestructura municipal, estas viviendas fueron visitadas, sin embargo, luego de esto se recibió un nuevo concepto, el cual manifestaba que las viviendas No podían ser incluidas por encontrarse fuera del perímetro del barrio La Ceiba.

Por otro lado, el 9 de diciembre de 2022 inicia a la actividad No. 3 en el barrio La Victoria.

4.3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

En el **Anexo 20,** se presenta el informe social correspondiente al presente mes.

4.4. PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO – SST

El contratista cumple con lo estipulado en el protocolo de bioseguridad y vacunación del personal. El contratista de obra reporta la afiliación del personal al sistema de seguridad social, sin embargo, se encuentran 58 trabajadores sin afiliación a ARL, Esta situación se le ha notificado al contratista el 29 de septiembre mediante el oficio ICB- ENTERRITORIO-2022-127 con el asunto: Notificación de incumplimiento al Art. 161 de la Ley 100 de 1993 Sistema de seguridad social – deberes de los empleadores– de obligatorio cumplimiento en la ejecución del Contrato de Obra No. 2220569 y el 28 de noviembre mediante el oficio ICB-ENTERRITORIO-2022- 164, con el asunto: Notificación de incumplimiento al Art. 161 de la Ley 100 de 1993 Sistema de seguridad social – deberes de los empleadores– de obligatorio cumplimiento en la ejecución del Contrato de Obra No. 2220569.

TABLA 24. CONTROL DE PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA		
PERSONAL		**CANT.**
Personal Administrativo	Director de Obra - Frank David Mancilla González	1
	Residente de Obra **-** Manuel Garrido Severiche	1
	Profesional PGIO - José Antonio Puentes Díaz	1
	Profesional Técnico de Diagnósticos - Oscar Narváez Moguea	1
	Profesional Costos y Presupuestos - Cristian Pérez Espitia	1
	Especialista Estructural - José Assia De La Rosa	1
	Especialista Hidrosanitario **-** Irina Alejandra Támara	1
	Profesional Social **–** Isabel Garces Puello y Leidys Pérez Díaz	3
	Profesional Calidad **-** Jesús Hernández Paternina	1
	Inspector de Obra	5
	Almacenista	1
	Auxiliar de almacén	1
Personal Operativo	Maestro de obra - Yhon Jairo Arrieta Paternina	4
	Auxiliar de Maestro de obra	3
	Oficial de obra	53
	Ayudante de obra	32
	Ayudante de Vehículos	2
	Ayudante de Motocarros	5
	Pintor	1
	Conductor	4
	Conductor Motocarro	5
Total		**127**

TABLA 25. CONTROL DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA.

PERSONAL INTERVENTORÍA		
PERSONAL		**CANT.**
Personal Interventoría	Director de Interventoría **-** William Jiménez Martínez	1
	Residente de Interventoría – Jaime Barrios Contreras	1
	Profesional HSEQ - Carlos Morales Samper	1
	Especialista Estructural - Robespierre Sánchez	1
	Especialista Hidrosanitario - Alberto Mouthon Bello	1
	Profesional Social - Eliana Correa Marimón	1
	Auxiliar Social - Lina Gamarra Moreno	1
	Profesional Costos Y Presupuestos - Juan Pertuz Rodas	1
	Inspector De Interventoría: Jesús José Pertuz - Luis Ángel Díaz - María Camila Orozco – Jairo Gómez Anchundia	4
Total		**12**

TABLA 26. CONTROL DE PERSONAL DEL PROYECTO.

PERSONAL INTERVENTORÍA	
PERSONAL	**CANTIDAD**
Contratista de Obra	127
Interventoría	12
Total	**139**

En el **Anexo 18,** se presenta el informe del programa de salud y seguridad en trabajo y se presenta el control de seguridad industrial.

En el **Anexo 24,** se presentan las copias de planillas parafiscales.

4.5. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL.

En el **Anexo 19** se presenta informe de gestión ambiental.

4.6. BITÁCORA

El contratista de Obra e Interventoría han diligenciado conjuntamente la bitácora de Obra, en el **Anexo 15,** se presenta copia de la bitácora de obra.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES.

- La interventoría viene realizando control a la programación presentada por el contratista a fecha de corte del presente informe el porcentaje programado es de un 74,97% con un valor de $ 5.959.406.361,82 y el porcentaje es de ejecución de 59,53% equivalentes a $ 4.732.145.192,15 lo cual arroja un atraso de obra de 15,44%, debido a que a la fecha de corte de este informe se encuentran en terminadas 538 viviendas, en comparación con las 784 establecidas en la programación actualizada derivada de la novedad contractual.

- ENTerritorio realiza una adición al proyecto por un valor de $1.828.773.582,67 quedando con un valor total de $7.949.069.174,67 y además una prórroga en tiempo por 90 días con lo que la nueva fecha de terminación del proyecto es el 18 de marzo de 2023. Contratista de obras presenta una reprogramación teniendo en cuenta estos dos aspectos, la interventoría da aval a la reprogramación presentada el 02 de diciembre de 2022 mediante comunicado ICB-ENTERRITORIO-2022-166 con radicado No. 20224300463902

- El personal de la interventoría ha venido realizando seguimiento y control a las actividades realizadas por el contratista, donde se destaca el inicio de la actividad No. 3 en el barrio La Victoria.

- El personal de subcontratista no cuenta con afiliación a seguridad social, 58 trabajadores, se ha solicitado al contratista subsanar este incumplimiento a las normas laborales. En vista de lo anterior, la interventoría ha comunicado al contratista las falencias presentadas mediante oficio ICB-ENTERRITORIO-2022-143 con asunto: Incumplimiento del plan de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo– Contrato de obra No 2220569 del 24 de octubre de 2022. Adicionalmente, realizará seguimiento semanal a las afiliaciones del personal durante el mes de septiembre; y oficio ICB-ENTERRITORIO-2022-164 con asunto: Notificación de incumplimiento al Art. 161 de la Ley 100 de 1993 Sistema de seguridad social – deberes de los empleadores– de obligatorio cumplimiento en la ejecución del Contrato de Obra No. 2220569.

5.2. RECOMENDACIONES.

- El funcionamiento del Punto de Atención Comunitario – PAC, es fundamental para el normal desarrollo del proyecto.
- Es indispensable que el personal de Obra cuente con todos los Elementos de Protección Individual – EPI con el fin de mantener la seguridad y salud de los trabajadores y minimizar al máximo el riesgo de accidentes. La interventoría realizará seguimiento semanal a las afiliaciones del personal, pago de parafiscales y cumplimiento del porte de los Elementos de Protección Individual – EPI durante el mes de enero de 2023.

ANEXOS

Anexo 1. INFORME EJECUTIVO.
Anexo 2. INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO.
Anexo 3. ACTAS PARCIALES Y BALANCE PRESUPUESTAL.
Anexo 4. ACTAS DE INICIO.
Anexo 5. ACTAS DE CONCERTACIÓN PCI 009.
Anexo 6. ACTAS DE VECINDAD.
Anexo 7. AVANCE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
Anexo 8. MEMORIA DE CÁLCULOS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.
Anexo 9. RELACIÓN DE PLANOS
Anexo 10. RELACIÓN DE DOCUMENTOS
Anexo 11. REGISTRO FOTOGRÁFICO.
Anexo 12. VIDEOS DEL AVANCE DEL PROYECTO.
Anexo 13. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE ENSAYOS DE MATERIALES.
Anexo 14. CALIBRACIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS.
Anexo 15. FOTOCOPIA DE BITÁCORA.
Anexo 16. RELACIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Anexo 17. INFORMES SEMANALES
Anexo 18. INFORME PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Anexo 19. INFORME PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.
Anexo 20. INFORME DE GESTIÓN SOCIAL.
Anexo 21. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE EL AVANCE DEL PROYECTO
Anexo 22. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.
Anexo 23. ACTAS DE SEGUIMIENTO Y APROBACIÓN DEL CONTRATO.
Anexo 24. ACREDITACIÓN DE APORTES PARAFISCALES.
Anexo 25. PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO.
Anexo 26. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
