gatos, cerchas, formaletas, buggys y herramientas menores.

Residente Interventoria

Residente de obra

Fecha: 15 de diciembre del 2022
Proyecto: conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Saneamiento básico en Sincelejo.
Contratista: Consorcio Turquia
Interventoria: Gavinco Ingenieros consultores S.A.S.
Personal en obra: Residente de obra, Inspectores de obra, equipo social, inspectores siso, maestro de obra, oficiales y ayudantes
Actividades: Se realizo suministro de materiales en las diferentes intervenciones, se realizó recorrido ticnico Para verificar la calidad y avance en la construcción de las unidades sanitarias, y se hizo seguimiento a las viviendas con respecto a la fecha de apertura y en el estado que se encuentran, también se recibio la visita del ministerio de Vivienda, en horas de la mañana se inicia con una reunión en las instalaciones de la alcaldia en donde se habla del avance del Proyecto y en horas de la tarde se realizó recorrido en donde se visitan 13 viviendas y el ministerio queda satisfecho Por la calidad en los acabados.
Equipos y Herramientas: motocargadores, taladros, Pulidoras, Andamios, gatos, cerchas, formaletas, buggys y herramientas menores.

Residente Interventoria

Residente de obra

Fecha: 16 de diciembre del 2022
Proyecto: conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Saneamiento básico en Sincelejo.
Contratista: Consorcio Turquia.
Interventoria: Gavinco Ingenieros consultores S.A.S
Personal en obra: Se realizó suministro de materiales en las

diferentes intervenciones, se realizó recorrido técnico Para verificar la calidad y avance en la construcción de las Unidades sanitarias, se realizan actividades generales constructivas, observaciones: Por medio el recorrido técnico se Pudo evidenciar Pegas mayores a 2cm, grietas en el Pañete, machones desPlomados, Losa con fisuras y medidas menores a las del diseño.

Equipos y Herramientas: motocargadores, taladros, Pulidoras, Andamios, gatos, cerchas, formaletas, buggys y herramientas menores.

Residente Interventoría

Residente de obra

Fecha: 14 de diciembre del 2022

Proyecto: conexiones intradomiciliarias de agua Potable y Saneamient básico en Sincelejo.

Contratista: consorcio Turquía

Interventoria: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S

Personal en obra: Residente de obra, Inspectores de obra, equipo social, inspectores sisg, maestro de obra, oficiales y Ayudantes.

Actividades: se realizó suministro de materiales en las diferentes intervenciones y se continua con la construcción de las casetas, se realizó recorrido técnico Para verificar la calidad y avance en la construcción de las unidades sanitarias y tambien se verificó que el contratista Subsano las observaciones que se le hicieron

Equipos y Herramientas: motocargadores, taladros, Pulidoras, Andamio gatos, cerchas, formaletas, buggys y herramientas menores.

Residente Interventoría

Residente de obra

fecha: 19 de diciembre del 2022
Proyecto: Conexiones intradomiciliarias de agua Potable y Saneamiento básico en Sincelejo.
Contratista: Consorcio Turquia.
Interventoria: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
Personal en obra: Residente de obra, Inspectores de obra, equipo social, inspectores siso, maestro de obra, oficiales y Ayudantes.
Actividades: Se realizó suministro de materiales en las diferentes intervenciones y se continua con la construcción de las casetas, se realizó recorrido técnico Para verificar la calidad y avance en la construcción de las unidades sanitarias, tambien se Pudo evidenciar que el contratista demolio las losa que tenian un mal Proceso constructivo,
observaciones: corregir junta de levante,
equipos y herramientas: motocargadores, taladros, Pulidoras, Andamios, gatos, cerchas, formaletas, buggys y herramientas menores.

Residente Interventoria

Residente de obra

fecha: 20 de diciembre del 2022
Proyecto: conexiones intradomiciliarias de agua Potable y Saneamiento básico en sincelejo.
contratista: consorcio Turquia
Interventoria: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
Personal en obra: Residente de obra, Inspectores de obra, equipo social, inspectores siso, maestro de obra, oficiales y Ayudantes.
Actividades: Suministro de materiales en general a las intervenciones en ejecución, se realiza actividades de construcción en general, se realizaron aperturas de viviendas Para comenzar a intervenir y a ejecutar el baño y se recibio 1 vivienda a satisfacción del beneficiario y todo en buen estado y funcionando muy bien. equipos y Herramientas: motocargadores, taladros, Pulidoras

Andamios, gatos, cerchas, formaletas, buggys y herramientas menores

Residente Interventoria

Residente de obra

Fecha: 21 de diciembre del 2022

Proyecto: Conexiones intradomiciliarias de agua Potable y saneamiento básico en Jiguamo.

Contratista: Consorcio Turquia.

Interventoria: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S.

Personal en obra: Residente de obra, Inspectores de obra, equipo Social, Inspectores Siso, maestro de obra, oficiales y Ayudantes.

* Actividades: Suministro de material a la Viviendas a perturar y Vivienda en ejecución, levante de muros en ladrillo Pañete, Fundición de Vigas, machones. Pintura, Subsunucion de detalles a Unidades Por entregar, enchape, instalacion de tuberia hidraulica Sanitaria, excavaciones, ancoramiento de columnas y placa para tanq

* Equipos y herramientas:
Cerchas, gatos metalico, Andamios Formaletas, moto cosa, Pulidora Taladros, Cortadora de enchape, bogg Vehiculos tipo Camioneta.

* Personal en Obra:
Residentes de Obras, Residente de Interventoria, Personal Social, Siso Subcontratista, Inspectores de Obra Inspector de Interventoria, 64 oficiales de Obra, 24 Ayudantes de albanileri

* Observaciones:

Subsanacion de detalles de pintura, Reparacion de filos en los piñetes, limpieza de tejas en asbesto cemento, Reparación de fisuras en los piñetes, Recubrimiento de tuberia, Corregir al momento de fundir o formaleteo la losa para tanque, las dimensiones

Residente Interventoria Residente de Obra.

Fecha: 22 de diciembre del 2022
Proyecto: Conexiones intradomiciliaria de agua potable y Saneamiento basico en Sincelejo.
Contratista: Consorcio Turguia
Interventoria: Gaviuco ingenieros Consultores S.A.S

* Personal de Obra: Residentes de Obra del contratista, Residente de interventoria, Inspectores de Obra del contratista y Subcontratista. Inspectores de Obra interventoria, Profesionales Sociales, SISO, 54 Oficiales de albañileria, 34 ayudantes, incluye Pintores, plomeros y enchapadores.
* Actividades: Suministro de material en sitio a diferentes intervenciones de unidades Sanitarias, excavaciones, levante de ladrillos, Piñete, Pintura. Resanes de Observaciones de detalles, Fundicion de plantilla, muchones viga y formaleteo de Columnas, Placa

Para tunque, instalacion de tuberia hidraulica y Sanitaria, instalacion de aparatos Sanitarios, inscrustaciones instalacion de Cubierta en teja en asbestocemento, instalacion de tunque

* Equipo y herramientas: Cerchas metalicas Datos metalicos, Formaleta de madera; fundidores, Pulidores, Cortadora de enchapemoto Carro, Vehiculo tipo camioneta, bog

Residente de interventoria. Residente de Obra

Fecha: 23 de diciembre 2022

Proyecto: Conexiones intradomiciliarias de Agua potable y Saneamiento basico en la ciudad de Sincelejo

Contratista: Consorcio turgua

interventoria: Gaviria ingenieros consultores S.A.S

* Personal en Obra: Residentes de obra del contratista. e inspectores, Residente de interventoria. e inspectores y Social Profecional SISO, Profecional Social Contratista, Subcontratistas, 55 Oficiales de albañileria y 27 ayudantes.

* Actividades: Suministro de material en Sitio a las viviendas en ejecucion Suministro de material a viviendas a perfurar, instalacion de Cubierta, levante de de muros en ladrillo, Pañete, Excavaciones, Pintura; instalacion de tuberia hidraulica y Sanitaria Enchapes de detalles, y Observaciones

* Equipos y herramienta: Gatos metalicos Cerchas metalicas, Formaletas metalicas Para corregir Formaletas en madera buggy, taladro, Pulidoras, Cortadora de enchape, moto carro, Vehiculo tipo Camioneta.

Residente de Interventoria. Residente de Obra

* Fecha: 24 de diciembre 2022
* Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento basico en la ciudad de Sincelejo
* Contratista: Consorcio turistica
Interventoria: Gauco Ingenieros Consultores S.A.S.
* Personal en obra: Residentes de obra, e Inspectores, Residente de Interventoria e Inspectores y sociales, Profesional SISO, Subcontratistas, 55 oficiales y 27 ayudantes.
* Actividades: Suministro de material en el barrio el Poblado a las unidades Sanitarias en ejecución, Para el dia de hoy el contratista realiza actividades de levante de muro, Pañete, Pintura, Instalacion de tuberias. El contratista queda en compromiso de entregar viviendas a satisfacion de presentar detalles.
* Equipos y Herramientas: gatos Metalicos, cerchas metalicas, formaletas en madera, buggy, taladro, pulidoras, cortadora de enchape, moto carro, vehiculo tipo camioneta.

Residente Interventoria

Residente de obra

* Fecha: 26 de diciembre 2022
* Proyecto: Conexiones intradomiciliaria de agua potable y Saneamiento basico.
* Contratista: Consorcio turquia
* Interventoria: Gavinco ingeniero Consultores S.A.S
* Personal en Obra: Residente de Obra y Sus inspectores, interventoria e inspectores, trabajadores Sociales, SISO y Auxiliares, 55 oficiales y 33 ayudantes de albanileria.
* Actividades en Obra: Suministro de materiales de levante de ladrillo, Pañete, instalacion de cubierta en asbesto cemento, instalacion de tuberia Hidraulica y Sanitaria, instalacion de puerta, instalacion de Sanitarios enchape, excavacion, pintura y Subsanacion
* Equipos y herramientas: gatos metalicos cuchara, formaletas de madera, andamios, moto carro, camioneta, Pulidora, taladro cortadora de enchape, boggy y herramientas menores.

Residente de interventoria Residente de Obra.

* Fecha: 27 de diciembre 2022
* Proyecto: Conexiones intradomiciliaria de agua potable y Saneamiento basico.
* Contratista: Consorcio turquia
* Interventoria: Gavinco ingeniero Consultores. S.A.S.
* Personal en Obra: Residentes de Obra

e inspectores, interventoría e inspectores S.S.O, Personal Social y Auxiliares, Auxiliares Ambiental 40 oficiales de Albañilería, 20 Ayudantes de albañilería.

* Actividades Realizadas: Suministro de material a las viviendas en ejecución, y a Sitio, excavaciones, levantes de muros en ladrillos, Pañete, Fundición de muchos y columnas, Formaleteo de placa Pata tunque, instalación de puerta, cubierta, Pintura de muro, Fundición de losa para piso, instalación de Sanitario o Combo Sanitario, Subsanación de detalles, Relleno con material Seleccionado.
* Equipo y Herramientas: gatos metálicos, cerchas metálicas, formaletas de madera, Andamios, moto carro, camioneta, boggy cortadora de enchape, taladros, pulidora y herramientas menores.

Residente de interventoría Residente de Obra.

* Fecha: 28 de diciembre. 2022
* Proyecto: Conexiones intradomiciliarias de agua potable y Saneamiento básico.
* Contratista: Consorcio Turquia
* Interventoría: Covinco ingeniero Consultor S.A.S.
* Personal en Obra: interventoría e inspectores Personal Social, Residente de Obra. e inspector S.S.O, Auxiliares ambientales, 57 oficiales de, Albañilería, 20 Ayudantes de albañilería
* Actividades en Obra: Suministro de materia

a Viviendas en ejecución, fraguado, excavaciones, fundición de cimentación, levantamiento de muros con ladrillos, pañete, instalación de Cubierta, pintura, instalación de enchape, instalación de Combo Sanitarios, Fundición de Columna para tanque, instalación de Tuvo platos, lavadero, instalación de puerta, Subsanación de detalles, entregas de Unidades Sanitarias a beneficiarios.

* Equipo y Herramientas: moto Carro camioneta, cerchas metálicas, gatos metálico, formaletas de madera, Andamios, baggy, Pulidoras, taladros, Caladoras para enchape y herramientas menores
* Personal en Obra: Residente de Obra e inspectores, interventoria e inspectores Siso y Auxiliares ambientales, Personal Social, 57 oficiales de albañilería, 20 Ayudantes.

Residente interventoria

Residente de Obra

* Fecha 29 de diciembre 2022
* Proyecto: Conexiones intradomiciliarias de Agua potable y Saneamiento basico
* Contratista: Consorcio Turquia
* Interventoria: Gavinco ingenieros Consultores S.A.S
* Personal en Obra: Residente de Obra Residente de interventoria e inspectores, inspectores Consorcio, Profesional SST - contratista, Personal Social, Siso, Auxiliares Ambientales, 53 oficiales, 22 ayud

tes de albanileria
Actividades en Obra: Suministro de material a viviendas en ejecucion, excavacion para cimentacion, Fundiciones para Cimentacion, levante con ladrillo, instalacion de cubierta. instalaciones de tuberia Sanitaria y hidraulica; Pañete, instalacion de puerta. Pintura de muros, Subsanacion de detalles, instalacion de Combo Sanitario, incrustaciones. entrega de viviendas terminadas.
* equipos y herramientas: moto carro, Camioneta, cercha metalicas, gatos, Formaleta de madera, Andamios tubulars, boggy, Pulidora taladros Cortadoras de cuchara y herramientas menors.
* Personal de Obra: Residentes de Obra inspectors de Obra, interventoria e inspectors, Siso, Auxiliars ambiental, Personal Social, 53 oficials y 22 Ayudants de albanileria

Residente de interventoria Residente de Obra

* Fecha: 30 de diciembre
* Proyecto: Conexions intradomiciliaria de Agua potable y Saneamiento basico.
Contratista: Consorcio Surgir
Interventoria: Cavinco ingenieros Constructors S.A.S
* Personal en Obra: Residente de Obra, Residente de interventoria, e inspectors, Personal Social Profesionals Subcontratista. Siso, Auxiliars Ambientals 50 oficials y 24 ayudantes

de albañilería
Actividades en Obra: Suministro de material, excavaciones, levante de muro, Pañete, instalacion de cubierta instalacion de puerta, instalación de tubería Sanitaria y hidraulica, Subsanación de detalles.

* @quipo y herramienta: cerchas, gatos mecanicos, Andamios, Formuletas de madera moto carro, camioneta, boggy, Pulidora; taladros, Cortadora de enchape.

Residente interventoria — Residente de Obra.

Fecha: 31 Diciembe, 01 Enero, 02 Enero, 03 Enero del 2023. El Contratista No laboró por ser estos dias fenal de año, y la mano de obra dispuesta a laborar en estos dos fué escasa. Se reanudaron las actividades el 04 Enero de 2023.

Fecha: 4 de Enero 2023
Proyecto: Conexiones intradomiciliaria de Saneamiento basico y Agua Potable en Sincelejo (Sucre)
Contratista: Consorcio Turquia
Interventoria: Gavinco ingenieros Consultores S.A.S
Personal en Obra: Residente de Obra del contratista, interventoria e inspectores de Obra, SISO y Auxiliares Ambientales, Personal Social, Profesional de Subcontratista.

Actividad en Obra: Suministro de materia a viviendas en intervenciones, Excavaciones

Anexo 10. Relación de correspondencia

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	CÓDIGO:	F-GG-11
eterritorio		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

Informe No. **9** **Fecha Informe** **3/12/2022** **Periodo comprendido entre** **1/12/2022** **y** **31/12/2022**

TIPO DE CONTRATO:	Interventoría
NÚMERO DE CONTRATO:	2220585
OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.
CONTRATISTA:	Consorcio Turquía
INTERVENTOR:	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
SUPERVISOR:	Juan David Amon

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
29/03/2022	GA-DOMI-001-22	Solicitud documentacion inicial de obra	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
5/04/2022	GA-DOMI-002-22	Solicitud cumplimiento compromisos de entrega de la documentación inicial	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
5/04/2022	GA-DOMI-003-22	Traslado correo electrónico, valla institucional para el proyecto de conexiones	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
6/04/2022	GA-DOMI-004-22	Remisión documentos previos a la firma del Acta de Inicio - Grupo 1: Sincelejo,	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
6/04/2022	GA-DOMI-005-22	Remisión póliza de garantía única de Cumplimiento y de RCE del contrato de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
11/04/2022	GA-DOMI-006-22	Remisión hoja de vida del contrato de Interventoría 2220585	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
11/04/2022	GA-DOMI-007-22	Remisión requisitos para suscripción de acta de inicio del contrato de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
11/04/2022	GA-DOMI-008-22	Remisión requisitos para suscripción de acta de inicio del contrato de obra N°.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
18/04/2022	GA-DOMI-009-22	Actividad 1. Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
19/04/2022	GA-DOMI-010-22	Cambio hojas de vida Inspector 1, Inspector 3 y Auxiliar Social del Contrato de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
19/04/2022	GA-DOMI-011-22	Remisión plan de inversión de anticipo del contrato de obra firmado.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
20/04/2022	GA-DOMI-012-22	Remisión actualización pólizas del contrato de interventoría respecto al Acta	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
25/04/2022	GA-DOMI-013-22	Remisión Informe Semanal No. 01 periodo del 13 al 24 de abril de 2022	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
25/04/2022	GA-DOMI-014-22	Codificación viviendas para diagnósticos del barrio El Poblado	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
27/04/2022	GA-DOMI-016-22	Solicitud entrega productos Actividad 1. Chequeo y validación de diseño de los	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
4/04/2022	20222200064831	Socialización de los actores vinculados en la ejecución del Programa de Co-	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
13/04/2022	20222200071361	Aprobación del personal mínimo requerido para ejecución del contrato de	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
13/04/2022	20222200071371	Entrega documentación para la ejecución del contrato de interventoría No.	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
5/04/2022	CONS-TUR-SINC-008	Remisión de soportes preliminares para acta de inicio.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
21/04/2022	CONS-TUR-SINC-011	MINUTA DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA	CONSORICO TURQUIA	Enterritorio
29/04/2022	CONS-TUR-SINC-013	Entrega de Productos ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACION DE DISEÑO	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
27/04/2022	GA-DOMI-016-22	Solicitud entrega productos Actividad 1. Chequeo y validación de diseño de los	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
2/05/2022	GA-DOMI-017-22	Remisión Informe Semanal No. 02 periodo del 25 de abril de 2022 al 01 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
3/05/2022	GA-DOMI-018-22	Solicitud disponibilidad de materiales de construcción – Actividad 3. Ejecución	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
4/05/2022	GA-DOMI-019-22	Remisión Informe Mensual Técnico de Interventoría No. 01 periodo del 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
5/05/2022	GA-DOMI-020-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-013, Entrega de Productos	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
5/05/2022	GA-DOMI-021-22	Solicitud remisión soportes de implementación de protocolo de bioseguridad	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
5/05/2022	GA-DOMI-022-22	Remisión actualización póliza RCE del contrato de interventoría.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
5/05/2022	GA-DOMI-023-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-017.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
9/05/2022	GA-DOMI-024-22	Solicitud Ajustes productos Actividad 1: chequeo y validación de diseño de los	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
9/05/2022	GA-DOMI-025-22	Remisión Informe Semanal No. 03 periodo del 02 de mayo de 2022 al 08 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
11/05/2022	GA-DOMI-026-22	Cambio hoja de vida personal del Contrato de Interventoría - Profesional	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
11/05/2022	GA-DOMI-027-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-018.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
13/05/2022	GA-DOMI-028-22	Resp comunicación CONS-TUR-SINC-020	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
13/05/2022	GA-DOMI-029-22	Solicitud diagnosticos	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
16/05/2022	GA-DOMI-030-22	Aprobación diseño estructural con observaciones - Actividad 1. Chequeo y	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
17/08/2022	GA-DOMI-031-22	Remisión Informe Semanal No. 04 periodo del 09 de mayo de 2022 al 15 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
18/05/2022	GA-DOMI-032-22	Solicitud cumplimiento de los compromisos adquiridos en comité de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
24/05/2022	GA-DOMI-033-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 1. De Interventoría. Periodo facturado del	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
20/05/2022	GA-DOMI-034-22	Segunda solicitud cumplimiento compromisos comité de seguimiento N°. 5.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
24/05/2022	GA-DOMI-035-22	Remisión Informe Semanal No. 05 periodo del 16 de mayo de 2022 al 22 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
24/05/2022	GA-DOMI-036-22	Remision solicitud desembolso anticipo contrato de obra	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
25/05/2022	GA-DOMI-037-22	Solicitud inclusión para nuevos posible beneficiario del Programa de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Alcaldia Sincelejo
26/05/2022	GA-DOMI-038-22	Respuesta comunicaciones CONS-TUR-SINC-029 y CONS-TUR-SINC-028	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
26/05/2022	GA-DOMI-039-22	Obligaciones actividad 3 ejecución de obra y forma de pago.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
9/05/2022	CONS-TUR-SINC-018	CAMBIOS EN EL DOCUMENTO INICIAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
10/05/2022	CONS-TUR-SINC-019	Entrega de planos y memorias de casetas tipo.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
12/05/2022	CONS-TUR-SINC-020	CANTIDADES DE OBRA – ELEMENTOS ESTRUCTURALES	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
11/05/2022	CONS-TUR-SINC-020	Entrega de diagnósticos Paquete 01.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
12/05/2022	CONS-TUR-SINC-021	Entrega de diagnósticos Paquete 02.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
17/05/2022	CONS-TUR-SINC-022	Entrega de diagnósticos Paquete 03.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
18/05/2022	CONS-TUR-SINC-023	Entrega de diagnósticos Paquete 04.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
19/05/2022	CONS-TUR-SINC-024	Entrega de diagnósticos Paquete 05	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
23/05/2022	CONS-TUR-SINC-025	Entrega de diagnósticos Paquete 06	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
23/05/2022	CONS-TUR-SINC-026	Robo de micromedidores Barrio El Poblado, Sincelejo –Sucre.	CONSORICO TURQUIA	VEOLIA
24/05/2022	CONS-TUR-SINC-027	Entrega de diagnósticos Paquete 07.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
24/05/2022	CONS-TUR-SINC-028	Escasez de cerámica a nivel nacional	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
24/05/2022	CONS-TUR-SINC-029	Cambio especificaciones técnicas cerámica.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
26/05/2022	CONS-TUR-SINC-030	Entrega de diagnósticos Paquete 08	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Informe No. **9** **Fecha Informe** **3/12/2022** **Periodo comprendido entre** **1/12/2022** **y** **31/12/2022**

27/05/2022	CONS-TUR-SINC-031	Cambio de especificación técnica ítems 3.27 y 3.28	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
27/05/2022	CONS-TUR-SINC-032	Cambio en planimetría enviada de Casetas 1, 2, 3 y 4.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
18/05/2022	20222200093481	Aprobación Informe mensual de Interventoría No. 1, correspondiente al mes	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
26/05/2022	GA-DOMI-039-22	Obligaciones actividad 3 ejecución de obra y forma de pago.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
31/05/2022	GA-DOMI-040-22	Complemento y aprobación actividad 1. Chequeo y Validación prototipos	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
31/05/2022	GA-DOMI-041-22	Solicitud inclusión para nuevos posible beneficiario del Programa de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
31/05/2022	GA-DOMI-042-22	Comunicaciones CONS-TUR-SINC-028, CONS-TUR-SINC-029 y CONS-TUR-	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
1/06/2022	GA-DOMI-043-22	Remisión Informe Semanal No. 06 periodo del 23 de mayo de 2022 al 29 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
3/06/2022	GA-DOMI-044-22	Almacenamiento inadecuado de materiales de construcción en viviendas	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
3/06/2022	GA-DOMI-045-22	Solicitud mayor disponibilidad de materiales de construcción – Actividad 3.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
3/06/2022	GA-DOMI-046-22	Atraso cronograma de obra.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
3/06/2022	GA-DOMI-047-22	Recomendaciones para la ejecución de las obras	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
6/06/2022	GA-DOMI-048-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 02 periodo del 01 de mayo de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
6/06/2022	GA-DOMI-049-22	Comunicaciones CONS-TUR-SINC-034.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
8/06/2022	GA-DOMI-050-22	Remisión Informe Semanal No. 07 periodo del 30 de mayo de 2022 al 05 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
8/06/2022	GA-DOMI-051-22	Solicitud verificación predio en zona de riesgo – manzana 60 lote 8.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
8/06/2022	GA-DOMI-052-22	Solicitud cumplimiento compromisos comité de seguimiento N°. 8.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
9/06/2022	GA-DOMI-053-22	Solicitud inclusión para nuevos posible beneficiario del Programa de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
10/06/2022	GA-DOMI-054-22	Observaciones ejecución de la obra.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
10/06/2022	GA-DOMI-055-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-035	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
10/06/2022	GA-DOMI-056-22	Solicitud verificación de predio en zona de riesgo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
15/06/2022	GA-DOMI-057-22	Remisión Informe Semanal No. 08 periodo del 06 de junio de 2022 al 12 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
15/06/2022	GA-DOMI-058-22	Solicitud inclusión para nuevos posibles beneficiarios del Programa de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
15/06/2022	GA-DOMI-059-22	Solicitud verificación de predio en zona de riesgo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
15/06/2022	GA-DOMI-060-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-040 del 13 de junio de 2022.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
15/06/2022	GA-DOMI-061-22	Compromiso de entrega de las 13 viviendas inicialmente intervenidas.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
22/06/2022	GA-DOMI-062-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-045 del 17 de junio de 2022	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
22/06/2022	GA-DOMI-063-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 2. De Interventoría. Periodo facturado del	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
23/06/2022	GA-DOMI-064-22	Remisión Informe Semanal No. 09 periodo del 13 de junio de 2022 al 19 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
24/06/2022	GA-DOMI-065-22	Aprobación cambio de especificaciones tecnicas	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
24/06/2022	GA-DOMI-066-22	Solicitud inclusión para nuevos posibles beneficiarios del Programa de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
24/06/2022	GA-DOMI-067-22	Solicitud inclusión para nuevos posibles beneficiarios del Programa de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
28/06/2022	GA-DOMI-068-22	Solicitud verificación de predio en zona de riesgo No. 04	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
28/06/2022	GA-DOMI-069-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-049	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
29/06/2022	GA-DOMI-070-22	Solicitud cumplimiento de dimensiones de las placas aéreas de soporte del	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
30/06/2022	GA-DOMI-071-22	Seguimiento Plan de Contingencia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
1/07/2022	GA-DOMI-072-22	Solicitud inclusión N°. 7 para nuevos posible beneficiario del Programa de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
1/07/2022	GA-DOMI-073-22	Solicitud verificación de predio en zona de riesgo No. 6	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
1/07/2022	GA-DOMI-074-22	CONS-TUR-SINC-053	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
1/07/2022	GA-DOMI-075-22	Cambio hojas de vida personal del Contrato de Interventoría.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
5/07/2022	GA-DOMI-076-22	Respuesta oficio 20222200120441 plan de contingencia	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
5/07/2022	GA-DOMI-077-22	Observaciones unidades de viviendas en ejecución para entrega.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
6/07/2022	GA-DOMI-078-22	Remisión Informe Semanal No. 11 periodo del 27 de junio de 2022 al 03 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
7/07/2022	GA-DOMI-079-22	Resp oficio 20222200118481	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
3/06/2022	CONS-TUR-SINC-033	Envio Paquete 10 - Diagnosticos	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
6/06/2022	CONS-TUR-SINC-034	Cambio especificaciones técnicas cerámica.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
6/06/2022	CONS-TUR-SINC-035	Envío de documentación para aprobación de desembolso de anticipo	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
7/06/2022	CONS-TUR-SINC-036	Respuesta oficio GA-DOMI-044-22.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
9/06/2022	CONS-TUR-SINC-038	Entrega de diagnósticos Paquete 11.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
10/06/2022	CONS-TUR-SINC-039	Respuesta oficio GA-DOMI-046-22.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
13/06/2022	CONS-TUR-SINC-040	Solicitud de aprobación de hoja de vida de residente de obra Actividad 3.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
16/06/2022	CONS-TUR-SINC-041	Envío diagnósticos Paquete 12	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
15/06/2022	CONS-TUR-SINC-042	Respuesta oficio GA-DOMI-047-22 - Recomendaciones para la ejecución de	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
16/06/2022	CONS-TUR-SINC-044	Entrega de diagnósticos Paquete 13.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
17/06/2022	CONS-TUR-SINC-045	Respuesta oficio GA-DOMI-054-22 Observaciones ejecución de la obra.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
18/06/2022	CONS-TUR-SINC-046	Carta relación de beneficiarios que no cuentan con documento FOVIS	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
19/06/2022	CONS-TUR-SINC-047	Entrega de diagnósticos Paquete 14a	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
20/06/2022	CONS-TUR-SINC-048	Entrega de diagnósticos Paquete 14b	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
21/06/2022	CONS-TUR-SINC-049	Cambio de Profesional Social Proyecto Conexiones Intradomiciliarias	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
22/06/2022	CONS-TUR-SINC-050	Entrega de diagnósticos Paquete 15	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
23/06/2022	CONS-TUR-SINC-051	Entrega de diagnósticos Paquete 15a	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
24/06/2022	CONS-TUR-SINC-052	Información Contrato de Alcantarillado barrio Puerto Arturo	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
25/06/2022	CONS-TUR-SINC-053	Entrega de diagnósticos Paquete 15c	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
22/06/2022	20222200117251	Aprobación Informe mensual de Interventoría No. 2, correspondiente al mes de	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
11/07/2022	GA-DOMI-080-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 03 periodo del 01 de junio de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
12/07/2022	GA-DOMI-081-22	Solicitud No. 7 de verificación de predio en zona de riesgo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
12/07/2022	GA-DOMI-082-22	Solicitud inclusión para nuevos posible beneficiario del Programa de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
12/07/2022	GA-DOMI-083-22	Seguimiento ejecucion del contrato y plan de contingencia	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
12/07/2022	GA-DOMI-084-22	Remisión Informe Semanal No. 12 periodo del 04 de julio de 2022 al 10 de julio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio

Informe No. **9** **Fecha Informe** **3/12/2022** **Periodo comprendido entre** **1/12/2022** **y** **31/12/2022**

18/07/2022	GA-DOMI-085-22	Respuesta CONS-TUR-SINC-061	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/07/2022	GA-DOMI-086-22	Respuesta CONS-TUR-SINC-061	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/07/2022	GA-DOMI-087-22	Respuesta CONS-TUR-SINC-053	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/07/2022	GA-DOMI-088-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-062	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
21/07/2022	GA-DOMI-089-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 3. De Interventoría. Periodo facturado del	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/07/2022	GA-DOMI-090-22	Solicitud inclusión para nuevos posible beneficiario del Programa de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
21/07/2022	GA-DOMI-091-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-062	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
21/07/2022	GA-DOMI-092-22	Remisión Informe Semanal No. 13 periodo del 11 de julio de 2022 al 17 de julio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
22/07/2022	GA-DOMI-093-22	Trabajadores laborando sin Elementos de Protección Personal, EPP	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
22/07/2022	GA-DOMI-094-22	Seguimiento ejecucion del contrato y plan de contingencia	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
25/07/2022	GA-DOMI-095-22	Solicitud materiales suficientes para terminación de viviendas	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
25/07/2022	GA-DOMI-096-22	Remisión Informe Semanal No. 14 periodo del 18 de julio de 2022 al 24 de julio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
27/07/2022	GA-DOMI-097-22	Aprobación ordenes de giro No. 01 y 02	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
27/07/2022	GA-DOMI-098-22	Solicitud de entrega del estado de los 192 diagnósticos faltantes.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
27/07/2022	GA-DOMI-099-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-064	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
28/07/2022	GA-DOMI-100-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-066 y CONS-TUR-SINC-067 del 27 de julio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
28/07/2022	GA-DOMI-101-22	Respuesta CONS-TUR-SINC-065	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
1/07/2022	CONS-TUR-SINC-053	Información Contrato de Alcantarillado barrio Puerto Arturo.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
6/07/2022	CONS-TUR-SINC-056	Entrega de diagnósticos Paquete 16	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
2/07/2022	CONS-TUR-SINC-054	Oficio 053 - Respuesta comunicación GA-DOMI-071-22	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
6/07/2022	CONS-TUR-SINC-057	Información aprobación de micromedidores de ½"	CONSORICO TURQUIA	VEOLIA ESP
11/07/2022	CONS-TUR-SINC-059	Acompañamiento pruebas técnicas.	CONSORICO TURQUIA	VEOLIA ESP
11/07/2022	CONS-TUR-SINC-060	Entrega de diagnósticos Paquete 17	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
16/07/2022	CONS-TUR-SINC-061	Entrega de informes mensuales 01 y 02.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
21/07/2022	CONS-TUR-SINC-063	Entrega de diagnósticos Paquete 18	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
24/06/2022	20222200118481	Solicitud información sobre el cumplimiento del cronograma para el contrato de	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
29/06/2022	20222200120441	Solicitud información de acuerdo al plan de contingencia remitido mediante radi-	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
22/07/2022	20222200133451	Devolución Factura Electrónica de venta No. FV-2-1 del 21/07/2022	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
7/07/2022	20222200124601	Aprobación cambio de personal mínimo requerido para ejecución del contrato	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
2/08/2022	GA-DOMI-102-22	Remisión Informe Semanal No. 15 periodo del 25 de julio de 2022 al 31 de julio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
3/08/2022	GA-DOMI-103-22	Solicitud materiales de obra.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
3/08/2022	GA-DOMI-104-22	Seguimiento Plan de Contingencia semana 15	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
4/08/2022	GA-DOMI-105-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-062 y CONS-TUR-SINC-068	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
5/08/2022	GA-DOMI-106-22	Recomendación aplicación clausula 16 apremio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
5/08/2022	GA-DOMI-107-22	Remision oficio 20222200141481	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
8/08/2022	GA-DOMI-108-22	Solicitud diagnosticos pendientes	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
9/08/2022	GA-DOMI-109-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 04 periodo del 01 de julio de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
11/08/2022	GA-DOMI-110-22	Solicitud de inclusion pendientes de respuesta	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
11/08/2022	GA-DOMI-111-22	Remisión Informe Semanal No. 16 periodo del 01 de agosto de 2022 al 07 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
12/08/2022	GA-DOMI-112-22	Solicitud acompañamiento para verificación de predios.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
16/08/2022	GA-DOMI-113-22	Solicitud información contraloría general de la republica	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
17/08/2022	GA-DOMI-114-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 4. De Interventoría. Periodo facturado del	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
17/08/2022	GA-DOMI-115-22	Remision actas de reunion Contraloria, Ministerio y enterritorio.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/08/2022	GA-DOMI-116-22	Remisión Informe Semanal No. 17 periodo del 08 de agosto de 2022 al 14 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
18/08/2022	GA-DOMI-117-22	Seguimiento Plan de Contingencia semana 17.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
19/08/2022	GA-DOMI-118-22	Observaciones en la ejecución de las unidades sanitarias próximas	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
19/08/2022	GA-DOMI-119-22	Aprobación informe mensual 3 (1.Jul.22 al 31.Jul.22)	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
22/08/2022	GA-DOMI-120-22	Resp comunicacion CONS-TUR-SINC-077	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
22/08/2022	GA-DOMI-121-22	Acta de recibo parcial de obra No. 02.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
23/08/2022	GA-DOMI-122-22	PQR 192, 196 y 194 de solicitud de inclusión.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
24/08/2022	GA-DOMI-123-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-073	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
24/08/2022	GA-DOMI-124-22	Remisión Informe Semanal No. 18 periodo del 15 de agosto de 2022 al 21 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
24/08/2022	GA-DOMI-125-22	Seguimiento Plan de Contingencia	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
24/08/2022	GA-DOMI-126-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-076	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
29/08/2022	GA-DOMI-127-22	Solicitud exámenes de Egreso y certificados de paz y salvo con trabajadores.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
29/08/2022	GA-DOMI-128-22	Solicitud remisión Informe de accidente y reporte a la ARL	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
29/08/2022	GA-DOMI-129-22	Traslado petición del Sr. José Alfredo Pen Ayala	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
30/08/2022	GA-DOMI-130-22	Remisión Informe Semanal No. 19 periodo del 22 de agosto de 2022 al 28 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
31/08/2022	GA-DOMI-131-22	Viviendas priorizadas pendienes de entrega	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
16/08/2022	CONS-TUR-SINC-077	RUTA DE TRABAJO PARA ENTREGA DE MATERIALES E INICIO DE	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
29/08/2022	CONS-TUR-SINC-089	Entrega de diagnósticos Paquete 19B	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
20/07/2022	20222200131921	Aprobación Informe mensual de Interventoría No. 3, correspondiente al mes de	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
4/08/2022	20222200141471	Visita técnica solicitada por parte de la Contraloría General de la Nación	Enterritorio	CONSORICO TURQUIA
24/08/2022	20222200156751	Aprobación Informe mensual de Interventoría No. 4, correspondiente al mes de	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
1/09/2022	GA-DOMI-132-22	Personal en obra laborando sin Elementos de Protección Personal (EPP)	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
2/09/2022	GA-DOMI-133-22	Seguimiento Plan de Contingencia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
2/09/2022	GA-DOMI-134-22	Solicitud cumplimiento compromisos del acta de seguimiento No. 24	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
2/09/2022	GA-DOMI-135-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-093	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Veolia
7/09/2022	GA-DOMI-136-22	Remisión Informe Semanal No. 20 periodo del 29 de agosto de 2022 al 04 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	CÓDIGO:	F-GG-11
eterritorio		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

Informe No. **9** **Fecha Informe** **3/12/2022** **Periodo comprendido entre** **1/12/2022** **y** **31/12/2022**

9/09/2022	GA-DOMI-137-22	Seguimiento Plan de Contingencia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
9/09/2022	GA-DOMI-138-22	Fecha de radicación facturación - Septiembre 2022	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
9/09/2022	GA-DOMI-139-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 05 periodo del 01 de agosto de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
12/09/2022	GA-DOMI-140-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 5. De Interventoría. Periodo facturado del	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
12/09/2022	GA-DOMI-141-22	Situaciones evidenciadas en obra	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
14/09/2022	GA-DOMI-142-22	Solicitud de pago a SSI y parafiscales	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
14/09/2022	GA-DOMI-143-22	Actualización Plan de contingencia ejecución actividad 3	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
15/09/2022	GA-DOMI-144-22	Remisión Informe Semanal No. 21 periodo del 05 de septiembre de 2022 al 11	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
16/09/2022	GA-DOMI-145-22	Seguimiento Plan de Contingencia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
16/09/2022	GA-DOMI-146-22	Respuesta oficio SPM-1300.10.02.1414	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
20/09/2022	GA-DOMI-147-22	Solicitud de respuestas PQR 192, 193, 194.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
21/09/2022	GA-DOMI-148-22	Remisión Informe Semanal No. 22 periodo del 12 de septiembre de 2022 al 18	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
20/09/2022	GA-DOMI-149-22	Acta de recibo parcial de obra No. 03.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/09/2022	GA-DOMI-150-22	Seguimiento compromisos comité de seguimiento No. 28	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
21/09/2022	GA-DOMI-151-22	Aprobación informe mensual 4 (1.Ago.22 al 31.Ago.22)	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
21/09/2022	GA-DOMI-152-22	Resp oficio 20222200162301	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/09/2022	GA-DOMI-153-22	Seguimiento Plan de Contingencia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
22/09/2022	GA-DOMI-154-22	Aclaración de solicitud de inclusión emitido en el informe de visita técnica N°2.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
23/09/2022	GA-DOMI-155-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-105	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
26/09/2022	GA-DOMI-156-22	Solicitud de visita y concepto de linderos.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
27/09/2022	GA-DOMI-157-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-111	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
28/09/2022	GA-DOMI-158-22	Remisión Informe Semanal No. 23 periodo del 19 de septiembre de 2022 al 25	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
28/09/2022	GA-DOMI-159-22	Seguimiento compromisos comité de seguimiento No. 29	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
28/09/2022	GA-DOMI-160-22	Seguimiento Plan de Contingencia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
30/09/2022	GA-DOMI-161-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-119 del 29 de septiembre de 2022.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
30/09/2022	GA-DOMI-162-22	Solicitud acta de recibo parcial de obra No. 04 e informe mensual de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
1/09/2022	CONS-TUR-SINC-093	viviendas para instalación de micromedidores.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
13/09/2022	CONS-TUR-SINC-105	Entrega de diagnósticos Paquete 20	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
26/09/2022	CONS-TUR-SINC-114	Relación de códigos para apertura para la semana 26/09/2022 al 2/10/2022.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
2/09/2022	20222200162301	Observaciones visita de seguimiento del 09 al 12 de agosto de 2022.	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
3/10/2022	GA-DOMI-163-22	Seguimiento compromisos comité de seguimiento No. 30	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
3/10/2022	GA-DOMI-164-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-121 del 03 de octubre de 2022.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
4/10/2022	GA-DOMI-165-22	Remisión Informe Semanal No. 24 periodo del 26 de septiembre de 2022 al 02	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
4/10/2022	GA-DOMI-166-22	Solicitud liquidacion Contrato de Fiducia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
5/10/2022	GA-DOMI-167-22	Remisión segundas observaciones paquete 20	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
5/10/2022	GA-DOMI-168-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-122	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
6/10/2022	GA-DOMI-169-22	Solicitud acompañamiento para verificación de predios.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
7/10/2022	GA-DOMI-170-22	Solicitud de visita y concepto a la vivienda ubicada en Mz 41 – Lote 1	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
10/10/2022	GA-DOMI-171-22	Llamado de atención por no terminación de viviendas priorizadas.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
13/10/2022	GA-DOMI-172-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 06 periodo del 01 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/10/2022	GA-DOMI-173-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 6. De Interventoría. Periodo facturado del	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
12/10/2022	GA-DOMI-174-22	Solicitud planillas de seguridad social y parafiscales del mes de septiembre de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
12/10/2022	GA-DOMI-175-22	Resp oficio CONS-TUR-SINC-127	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
12/10/2022	GA-DOMI-176-22	Remisión Informe Semanal No. 25 periodo del 03 de octubre de 2022 al 09 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
13/10/2022	GA-DOMI-177-22	Traslado comunicación CONS-TUR-SINC-134	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	VEOLIA
14/10/2022	GA-DOMI-178-22	Remisión observaciones paquete 20 y paquete 20B	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
20/10/2022	GA-DOMI-179-22	Remisión Informe Semanal No. 26 periodo del 10 de octubre de 2022 al 16 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
20/10/2022	GA-DOMI-180-22	Solicitud ensayos de granulometría de materiales pétreos	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
20/10/2022	GA-DOMI-181-22	Solicitud certificados de nomenclatura	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
20/10/2022	GA-DOMI-182-22	Reconocimiento de la junta de Acción Comunal N°. 2 del barrio el Poblado del	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	GOBERNACION SUCRE
21/10/2022	GA-DOMI-183-22	Respuesta aprobación informe mensual 5	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
21/10/2022	GA-DOMI-184-22	Solicitud de concertación y aprobación de vivienda con domiciliaria.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	VEOLIA
21/10/2022	GA-DOMI-185-22	Situaciones evidenciadas en obra, octubre de 2022	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/10/2022	GA-DOMI-186-22	Acta de recibo parcial de obra No. 04.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/10/2022	GA-DOMI-187-22	Recomendación aplicación clausula 16 apremio Informe presunto	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
26/10/2022	GA-DOMI-188-22	Remisión Informe Semanal No. 27 periodo del 17 de octubre de 2022 al 23 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
26/10/2022	GA-DOMI-189-22	Solicitud remisión paquetes de viviendas ejecutadas Actas de Recibo Parcial 3	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
28/10/2022	GA-DOMI-190-22	Alcance radicado 2022CO5829 del 20 de octubre de 2022 comunicación GA-	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
28/10/2022	GA-DOMI-191-22	Solicitud exámenes de egreso, certificados de paz y salvo del personal.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
28/10/2022	GA-DOMI-192-22	Personal laborando sin EPP	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
31/10/2022	GA-DOMI-193-22	Carta CONS-TUR-SINC-144	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
12/10/2022	CONS-TUR-SINC-132	Entrega de diagnósticos subsanados del Paquete 20	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
7/10/2022	CONS-TUR-SINC-126	Entrega del paquete 20B de diagnósticos para aprobación	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
8/11/2022	GA-DOMI-194-22	Respuesta oficio 20222200200761	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
2/11/2022	GA-DOMI-195-22	Remisión Informe Semanal No. 28 periodo del 24 de octubre de 2022 al 30 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
3/11/2022	GA-DOMI-196-22	Remisión observaciones paquete 21.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
4/11/2022	GA-DOMI-197-22	Seguimiento compromisos comité de seguimiento No. 34	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
5/11/2022	GA-DOMI-198-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 7. De Interventoría. Periodo facturado del	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
4/11/2022	GA-DOMI-199-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-145	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	CÓDIGO:	F-GG-11
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

Informe No. **9** **Fecha Informe** **3/12/2022** **Periodo comprendido entre** **1/12/2022** **y** **31/12/2022**

8/11/2022	GA-DOMI-200-22	Solicitud liquidacion Contrato de Fiducia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
8/11/2022	GA-DOMI-201-22	Solicitud informe mensual de obra - octubre	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
9/11/2022	GA-DOMI-202-22	Solicitud entrega paquetes actas 3 y 4	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
10/11/2022	GA-DOMI-203-22	Remisión Informe Semanal No. 29 periodo del 31 de octubre de 2022 al 06 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
10/11/2022	GA-DOMI-204-22	Personal laborando sin afiliación a seguridad social integral.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
11/11/2022	GA-DOMI-205-22	Solicitud de prorroga Contrato de obra	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
11/11/2022	GA-DOMI-206-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 07 periodo del 01 de octubre	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
15/11/2022	GA-DOMI-207-22	Remisión observaciones paquete 20, 20B y 21.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
15/11/2022	GA-DOMI-208-22	Observaciones en la ejecución de las unidades sanitarias próximas a entregar	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
15/11/2022	GA-DOMI-209-22	Solicitud de paz y salvo y comprobantes de pago	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
16/11/2022	GA-DOMI-210-22	Observaciones SST	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
16/11/2022	GA-DOMI-211-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-122 problemática de tipo social y	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
16/11/2022	GA-DOMI-212-22	Remisión Informe Semanal No. 30 periodo del 07 de noviembre de 2022 al 13	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
16/11/2022	GA-DOMI-213-22	Personal laborando sin afiliación a seguridad social integral.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
17/11/2022	GA-DOMI-214-22	Seguimiento compromisos comité de seguimiento No. 37	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
21/11/2022	GA-DOMI-215-22	Observaciones emitidas por la entidad contratante ENTerritorio en el recorrido	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
21/11/2022	GA-DOMI-216-22	Remisión observaciones paquete 18B y 19B	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
22/11/2022	GA-DOMI-217-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-163	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
22/11/2022	GA-DOMI-218-22	Remisión Informe Semanal No. 31 periodo del 14 de noviembre de 2022 al 20	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/11/2022	GA-DOMI-219-22	Aprobación informe mensual 7 (01 de octubre de 22 al 31 de octubre de 22)	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
23/11/2022	GA-DOMI-220-22	Acta de recibo parcial de obra No. 05.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
23/11/2022	GA-DOMI-221-22	Llamado de atención por personal laborando sin afiliación a seguridad social	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
24/11/2022	GA-DOMI-222-22	Solicitud certificados de paz y salvo y comprobantes de pago de trabajadores	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
28/11/2022	GA-DOMI-223-22	Remisión observaciones diagnóstico comunicacion CONS-TUR-SINC-164	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
29/11/2022	GA-DOMI-224-22	Observaciones en la ejecución de unidades sanitarias por entregar y viviendas	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
29/11/2022	GA-DOMI-225-22	Remisión Informe Semanal No. 32 periodo del 21 de noviembre de 2022 al 27	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
29/11/2022	GA-DOMI-226-22	Alcance solicitud porroga y adicion interventoria	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
30/11/2022	GA-DOMI-227-22	Observaciones ejecución de unidades sanitarias	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
30/11/2022	GA-DOMI-228-22	Personal laborando sin afiliación a seguridad social integral.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
2/12/2022	GA-DOMI-229-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 8. De Interventoría. Periodo facturado del	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
9/12/2022	GA-DOMI-230-22	Acta de recibo parcial de obra No. 06.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
6/12/2022	GA-DOMI-231-22	Aprobación informe mensual 8 (01 de noviembre de 22 al 30 de noviembre de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
6/12/2022	GA-DOMI-232-22	Remisión Informe Semanal No. 33 periodo del 28 de noviembre de 2022 al 04	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
7/12/2022	GA-DOMI-233-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 08 periodo del 01 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
13/12/2022	GA-DOMI-234-22	Observaciones vivienda	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
14/12/2022	GA-DOMI-235-22	Solicitud planillas de seguridad social y parafiscales del mes de noviembre de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
15/12/2022	GA-DOMI-236-22	Remisión Informe Semanal No. 34 periodo del 05 de diciembre de 2022 al 11	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
19/12/2022	GA-DOMI-237-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-156	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
19/12/2022	GA-DOMI-238-22	Solicitud respuesta requerimientos en buzón de sugerencias por no pago de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
19/12/2022	GA-DOMI-239-22	Solicitud respuesta Derecho de Petición Veeduría barrio El Poblado.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
19/12/2022	GA-DOMI-240-22	Solicitud actualización link informativo Alcaldía de Sincelejo (Sucre).	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
20/12/2022	GA-DOMI-241-22	Remisión Informe Semanal No. 35 periodo del 12 de diciembre de 2022 al 18	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/12/2022	GA-DOMI-242-22	Respuesta oficio 202222003741	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/12/2022	GA-DOMI-243-22	Observaciones en la ejecución de las unidades de sanitarias en las viviendas	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
27/12/2022	GA-DOMI-244-22	Remisión póliza de garantía única de Cumplimiento y de RCE del contrato de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
29/12/2022	GA-DOMI-245-22	Remisión Informe Semanal No. 36 periodo del 19 de diciembre de 2022 al 25	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
29/12/2022	GA-DOMI-246-22	Solicitud planillas de seguridad social y parafiscales del mes de noviembre de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
30/12/2022	GA-DOMI-247-22	Seguimiento compromisos comité de seguimiento No. 43	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA

Firma:

Nombre: Edgar Aragon Otero
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo 11. Relación de documentos

Contratista

enterritorio	**RELACIÓN DE DOCUMENTOS**	CÓDIGO:	**F-GG-19**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2010-10-12**

CONTRATO No. :	2220577
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
1	HOJAS DE VIDA PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO	1	1		Interventoria		X	X	
2	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN PROJECT CON SU FLUJO DE INVERSIÓN EN EXCEL.	1	1		Interventoria		X	X	
3	PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	1	1		Interventoria		X	X	
4	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	1	1		Interventoria		X	X	
5	PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL.	1	1		Interventoria		X	X	
6	PLAN DE CALIDAD	1	1		Interventoria		X	X	
7	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD APROBADO POR LA ARL Y RADICADO EN EL ENTE TERRITORIAL.	1	1		Interventoria		X	X	
8	ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO	1	1		Interventoria		X	X	
9	METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO	1	1		Interventoria		X	X	
10	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y LISTADO DE PRECIOS DE LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS PRESENTADOS EN LA OFERTA ECONOMÍA PARA LA ACTIVIDAD 3	1	1		Interventoria		X	X	
11	PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	1	1		Interventoria		X	X	
12	FLUJO DE INVERSIÓN DEL CONTRATO	1	1		Interventoria		X	X	

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	**RECIBE**
NOMBRE: JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES (R/L)	**NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO (R/L)**
Fecha: 12 de abril de 2022	Fecha: 12 de abril de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Interventoría

enterritorio	RELACIÓN DE DOCUMENTOS	CÓDIGO:	F-GG-19
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-10-12

CONTRATO No. :	2220585
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Titulo del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
1	MATRIZ DE EVALUACION DE ENCUETAS PCI, SINCELEJO, SUCRE.	1	1		Juan David Amon R			x	
2	CARTA DE PRESENTACION PCI, MUNICIPIO DE SINCELEJO, SUCRE.	1	1		Juan David Amon R		x	x	
3	RESUMEN PROYECTO INTRADOMICILIARIAS.	1	1		Juan David Amon R		x	x	
4	CERTIFICACION ESTADO DE LEGALIDAD DE LOS BARRIOS.	1	1		Juan David Amon R		x	x	
5	CERTIFICADO NO ZONA DE RIESGO BARRIO EL POBLADO	1	1		Juan David Amon R		x	x	
6	CERTIFICADO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BARRIO EL POBLADO	1	1		Juan David Amon R		x	x	
7	PLAN DE GESTION SOCIAL	1	1		Juan David Amon R	x		x	
8	ESPECIFICACIONES TECNICAS	1	1		Juan David Amon R	x		x	Especificaciones técnicas generales, Capitulo I, Capitulo II, Capitulo III, Capitulo IV,
9	FORMATOS PCI								PCI-001_Lista de chequeo para aprobación Diagnóstico
									PCI-002_Lista de chequeo para Aprobación Intervención
									PCI-003 Encuesta portanciales beneficiarios
									PCI-004_Carta de Compromiso Prop
									PCI-004a_Acta de rechazo
									PCI-005_Carta de Concertación propiet o poseedor
									PCI-006_Matriz_Suministrada por Municipio
									PCI-007_Plan de Intervención Beneficiario. Presupuesto
									PCI-008_Plan de intervención. Presupuesto
									PCI-009_Acta de concertacion para fa intervención
									PCI-010_Autorizacion inicio de obra
									PCI-011_Ajustes al Diagnóstico Inicial
									PCI-012 Cambio Plan de Intervención
									PCI-013_Acta de pruebas Técnicas
									PCI-014_Acta Recibo beneficiario6
									PCI-015_Acta de cierre e historico vivienda
									PCI-016_Verificación de viviendas visitadas
									PCI-017_Cronograma general de ejecución
									PCI-018_Cronograma especifico de ejecución
									PCI-019 Lineamientos para la inclusión de potenciales beneficiarios
									PCI-020 Plantilla Informe Quincenal
									PCI-021_Informe Mensual
									PCI-022_Lista de asistencia beneficiarios
									PCI-023_Lista de Convocatoria a beneficiarios
									PCI-024_ Solicitud del Ciudadano PQR
									PCI-025_Registro y Seguimiento PQR
									PCI-026_Criterios de planeación, Ej y Ev Reuniones con la comunidad
									PCI-027_Plantilla Agenda de Capacitación Educación Sanitaria
									PCI-028_Orientaciones y formatos MEMORIAS PCI
									PCI-029_Indicador de Empleo Mensual

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ	**NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO (R/L)**
Fecha: 06 de abril de 2022	Fecha: 05 de abril de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Entrega Informe Mensual de Interventoría

	RELACIÓN DE DOCUMENTOS	CÓDIGO:	F-GG-19
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-10-12

CONTRATO No. :	2220585
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.		Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
1		**INFORME MENSUAL N°. 9 V-0**	1	1		Juan David Amon R			X	
	CONTENIDO INFORME MENSUAL N°. 9 V-0	1. RESUMEN EJECUTIVO	N/A						X	
		F-GG-08 - Informe Ejecutivo Mensual de Interventoría	N/A						X	
		2. INFORME BÁSICO	N/A						X	
		2.1 ANEXO ADMINISTRATIVO	N/A						X	
		F-GG-04 - Acta de Vecindad	N/A						X	
		F-GG-09 - Acta de seguimiento de contrato	N/A						X	
		F-GG-09 - Acta de seguimiento de contrato - Actas de aprobación.	N/A						X	
		F-GG-10 - Control de personal	N/A						X	
		F-GG-11 - Relación de correspondencia	N/A						X	
		PCI-009 - Actas de concertación	N/A						X	
		2.2. ANEXO TECNICO	N/A						X	
		F-GG-19 - Relación de documentos	N/A						X	
		F-GG-20 - Relación de planos	N/A						X	
		F-GG-24 - Control de seguridad industrial	N/A						X	
		F-GG-25 - Formato de registro fotográfico	N/A						X	
		F-GG-21 - Análisis de Precios Unitarios	N/A						X	
		Cumplimiento normatividad ambiental	N/A						X	
		2.3. ANEXO PRESUPUESTAL	N/A						X	
		F-GG-32 - Acta de recibo parcial y balance presupuestal	N/A						X	
		F-GG-33 - Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos	N/A						X	
		Fotocopia de la bitácora o libro de obra de toda la ejecución del proyecto.	N/A						X	
		Informe de gestión social del proyecto.	N/A						X	
		Planillas de Seguridad Social	N/A						X	
	ANEXOS INFORME MENSUAL N°. 9 V-0	Anexo 0. Aplicación y cumplimiento de requisitos del informe mensual de interventoría	N/A						X	
		Anexo 1. Informe Ejecutivo Mensual de Interventoría (Formato F-GG-08)	N/A						X	
		Anexo 2. Contrato de Interventoría y Contratista	N/A						X	
		Anexo 3. Pólizas contrato de Obra e Interventoría	N/A						X	
		Anexo 4. Acta de inicio contratos de Obra e Interventoría	N/A						X	
		Anexo 5. Análisis de Precios Unitarios	N/A						X	
		Anexo 6. Plan de inversión del anticipo	N/A						X	
		Anexo 7. Acta de seguimiento de contrato	N/A						X	
		Anexo 8. Formato de registro fotográfico	N/A						X	
		Anexo 9. Bitácora de Obra	N/A						X	
		Anexo 10. Relación de correspondencia	N/A						X	
		Anexo 11. Relación de documentos	N/A						X	
		Anexo 12. Relación de planos	N/A						X	
		Anexo 13. Acreditación pagos al sistema de seguridad social	N/A						X	
		Anexo 14. Control de personal	N/A						X	
		Anexo 15. Control de seguridad industrial	N/A						X	
		Anexo 16. Cumplimiento ambiental	N/A						X	
		Anexo 17. Informes semanales	N/A						X	
		Anexo 18. Informe de gestión social	N/A						X	
		Anexo 19. Diagnósticos aprobados.	N/A						X	
		Anexo 20. Certificaciones de materiales.	N/A						X	
		Anexo 21. Acta de Vecindad	N/A						X	
		Anexo 22. Actas de concertación	N/A						X	
		Anexo 23. Acta de recibo parcial y balance presupuestal de interventoría	N/A						X	
		Anexo 24. Control de equipos	N/A						X	
		Anexo 25. Control de inspección y ensayos	N/A						X	
		Anexo 26. Cambio especificación	N/A						X	
		Anexo 27. Acta de Recibo parcial y cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados (Matriz Tres Momentos Ejecución)	N/A						X	

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 02 días del el mes de enero del 2023.

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO (R/L)	**NOMBRE: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ**
Fecha: 02 de enero de 2023	Fecha: 02 de enero de 2023

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Anexo 12. Relación de planos

Contratista

	RELACIÓN DE PLANOS	CÓDIGO	F-GG-20
eterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-12

CONTRATO No. :	2220577
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Plano #	Versión	Fecha	Contenido	Remplaza Plano #	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	PLANO 1-2	1	abr-22	PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTA DE VIGAS DE CUBIERTA, DETALLES DE VIGAS CIMIENTO Y DE CUBIERTA, CORTE ESTRUCTURAL, PLANTILLA, LOSA MACIZA Y MACHONES. DE CASETAS T1 Y T2. Y DETALLES DE COLUMNA DE TANQUE.	N/A	N/A	Interventoría	Producto Actividad 1. Chequeo y validación de prototipos.
2	PLANO 2-2	1	abr-22	PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTA DE VIGAS DE CUBIERTA, DETALLES DE VIGAS CIMIENTO Y DE CUBIERTA, CORTE ESTRUCTURAL, PLANTILLA, LOSA MACIZA Y MACHONES. DE CASETAS T1 Y T2	N/A	N/A	Interventoría	Planos proceso INA 032 2021

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES (R/L)	**NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO**
Fecha: 31 de mayo de 2022	Fecha: 31 de mayo de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

	RELACIÓN DE PLANOS	CÓDIGO	F-GG-20
enterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-12

CONTRATO No. :	2220577
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Plano #	Versión	Fecha	Contenido	Remplaza Plano #	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo I	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
2	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo II	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
3	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo III	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
4	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo IV	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO	**NOMBRE: JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES (R/L)**
Fecha: 05 de abril de 2022	Fecha: 05 de abril de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría


Interventoría

eterritorio	RELACIÓN DE PLANOS	CÓDIGO	F-GG-20
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-12

CONTRATO No. :	2220585
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Plano #	Versión	Fecha	Contenido	Remplaza Plano #	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	CASETA	1		Tipología caseta Tipo I	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
2	CASETA	1		Tipología caseta Tipo II	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
3	CASETA	1		Tipología caseta Tipo III	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
4	CASETA	1		Tipología caseta Tipo IV	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
	
NOMBRE: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ	**NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO (R/L)**
Fecha: 05 de abril de 2022	Fecha: 05 de abril de 2022



Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

	RELACIÓN DE PLANOS	CÓDIGO	F-GG-20
eterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-12

CONTRATO No. :	2220577
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Plano #	Versión	Fecha	Contenido	Remplaza Plano #	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	PLANO 1-2	1	abr-22	PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTA DE VIGAS DE CUBIERTA, DETALLES DE VIGAS CIMIENTO Y DE CUBIERTA, CORTE ESTRUCTURAL, PLANTILLA, LOSA MACIZA Y MACHONES. DE CASETAS T1 Y T2. Y DETALLES DE COLUMNA DE TANQUE.	N/A	N/A	Interventoría	Producto Actividad 1. Chequeo y validación de prototipos.
2	PLANO 2-2	1	abr-22	PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTA DE VIGAS DE CUBIERTA, DETALLES DE VIGAS CIMIENTO Y DE CUBIERTA, CORTE ESTRUCTURAL, PLANTILLA, LOSA MACIZA Y MACHONES. DE CASETAS T1 Y T2	N/A	N/A	Interventoría	Planos proceso INA 032 2021

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
	
NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO	**NOMBRE: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ**
Fecha: 31 de mayo de 2022	Fecha: 31 de mayo de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Anexo 13. Acreditación pagos al sistema de seguridad social

Contratista

CONSORCIO TURQUIA
NIT 901 570934-7

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE

SEGURIDAD SOCIAL Y DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA

CERTIFICACIÓN

Certifico que la persona jurídica **CONSORCIO TURQUIA** con **NIT No. 901.570.934 - 7,** ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los últimos (6) meses.

Expedida el dieciocho (18) del mes de enero 2023

JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES
C.C No 1.117.491.406 DE FLORENCIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TURQUIA

JAIME RICARDO MARQUEZ CONTRERAS
T.P No. 111052-T
C.C. No. 72.246.947 DE BARRANQUILLA
CONTADOR PÚBLICO

Calle 16 No 14 – 71 loca 2 Sincelejo Sucre
Teléfono: 6052791552- 3205287023
coordinadorturquiapci@gmail.com, consorcioturquia@gmail.com

CEDULA DE CIUDADANIA



COPIA VALIDAD PARA: _____

Powered by CamScanner

TARJETA PROFESIONAL





COPIA VALIDA PARA: _____

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo **ISAIAS VARGAS GONZALEZ** Actuando en nombre propio, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.710.012, me permito certificar que he efectuado el pago y me encuentro a paz y salvo por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos Laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 797 y 828 de 2003 y Decreto 510 de 2003.

Dada en Sincelejo a los diecisiete (17) días del mes de enero de 2023

Atentamente,

ISAIAS VARGAS GONZALEZ.
CC. 7.710.012 de Neiva Huila
Representante Legal

MARIA BERNARDA RAMOS JARABA
CC. 1102840197 de Sincelejo
CONTADOR PUBLICO
TP. 244730-T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

El suscrito Representante legal de **V&M INGENIERIA S.A.S**, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.713.933, se permite certificar que la compañía ha efectuado el pago y se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos Laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 797 y 828 de 2003 y Decreto 510 de 2003.

Dada en Sincelejo a los diecisiete (17) días del mes de enero de 2023


Atentamente,

YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
CC. 7.713.933 de Neiva Huila
Representante Legal

MARIA BERNARDA RAMOS JARABA
CC. 1102840197 de Sincelejo
CONTADOR PUBLICO
TP. 244730-T

TARJETA PROFESIONAL



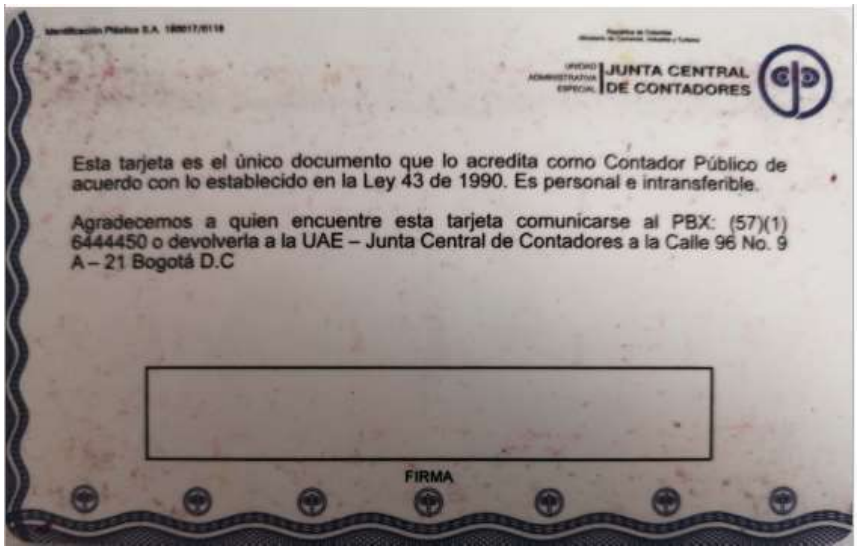

DOCUMENTO DE IDENTIDAD





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9020898008B96AA22

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA BERNARDA RAMOS JARABA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102840197 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 244730-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Interventoría

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NIT 900.916.608-4

CERTIFICAN QUE:

A la fecha, la firma **GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**, Se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar de sus empleados, durante los últimos doce (12) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide a solicitud de la compañía a los 04 días del mes de enero del 2023.

Atentamente,

LUZ ANDREA FAJARDO C.
Representante Legal
GAVINCO S.A.S.

MARIA ALEJANDRA GARZON RUBIO
Revisor Fiscal
T.P 260106-T



FECHA DE NACIMIENTO 15-JUL-1995

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

19-JUL-2013 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1500150-00461133-F-1018477519-20130827 0034579202A 1 40169267

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.477.519

GARZON RUBIO

APELLIDOS

MARIA ALEJANDRA

NOMBRES

FIRMA

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



260106-T

MARIA ALEJANDRA
GARZÓN RUBIO
C.C. 1018477519
RES. INSCRIPCION 385 DEL 08/07/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

271024 **290395**

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0D9426F95740220

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA ALEJANDRA GARZÓN RUBIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018477519 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 260106-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Anexo 14. Control de personal

Interventoría

	CONTROL DE PERSONAL	CÓDIGO:	F-GG-10
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/12/2022 Y EL 31/12/2022 PLAZO: 11 meses

INTERVENTOR: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS CONTRATO No. 2220577

SUPERVISOR JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ CONTRATO No. 2220585

PERSONAL DEL CONTRATISTA (INTERVENTORIA)

FECHA	MES 9																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CARGO																																
Director de Interventoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Residente de Interventoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Especialista en Estructuras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Profesional Social	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Profesional HSEQ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Especialista Hidrosanitario	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Profesional Costos y Presupuesto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Auxiliar social	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Inspector de Interventoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Inspector de Interventoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Inspector de Interventoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
PERSONAL CONTRATISTA	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**TOTAL PERIODO** 341

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*																													SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA																														**0**	**0,00%**	
De la región																														0	0,00%	
De fuera de la región																														0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA																														**0**	**0,00%**	
De la región																														0	0,00%	
De fuera de la región																														0	0,00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS																														**0**	**0,00%**	
De la región	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	155	45,45%	**S**
De fuera de la región	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	186	54,55%	**S**
POBLACIÓN VULNERABLE																														**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social																														0	0,00%	
En condición de desplazamiento																														0	0,00%	
MUJERES																														**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada																														0	0,00%	
Mano de Obra Calificada																														0	0,00%	
Profesionales - Técnicos	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		150	43,99%	**S**
PROVEEDORES																																
Local																																
Nacional																																
Internacional																																

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: Edgar Aragon Otero
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO identificado(a) con CC 1022363189

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	29
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	1
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	29
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	1
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-12	29
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-12	1
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-12	29
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-12	1
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-12	29
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-12	1
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-12	29
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-12	1
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	29
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	1
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	29
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	1

Este certificado se expide el día 2023-01-07 a las 10:31.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES identificado(a) con CC 1049796249

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	29
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	1
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	29
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	1
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-12	29
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-12	1
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-12	29
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-12	1
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-12	29
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-12	1
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-12	29
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-12	1
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	29
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	1
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	29
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	1

Este certificado se expide el día 2023-01-07 a las 10:31.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SANDRA PATRICIA CONTRERAS NAVARRO identificado(a) con CC 1102854339

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	30

Este certificado se expide el día 2023-01-07 a las 10:32.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA identificado(a) con CC 11052258

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	28
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	2
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	28
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	2
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-12	28
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-12	2
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-12	28
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-12	2
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-12	28
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-12	2
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-12	28
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-12	2
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	28
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	2
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	28
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	2

Este certificado se expide el día 2023-01-07 a las 10:33.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RAFAEL ANTONIO LOPEZ MOLINA identificado(a) con CC 1102874551

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	EPS	CCFC33	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	30

Este certificado se expide el día 2023-01-07 a las 10:35.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LEIDER DE JESUS SUAREZ OZUNA identificado(a) con CC 1103109623

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	EPS	CCFC33	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	30

Este certificado se expide el día 2023-01-07 a las 10:34.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LEANDRA MARIA OROZCO TOUS identificado(a) con CC 1026565862

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	30

Este certificado se expide el día 2023-01-07 a las 10:34.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JULY PAULIN RIOS ANAYA identificado(a) con CC 1102813002

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	30

Este certificado se expide el día 2023-01-07 a las 10:33.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAIRO ANDRES MEZA ROSAS identificado(a) con CC 13874430

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	30

Este certificado se expide el día 2023-01-07 a las 10:32.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAIRO ALONSO ZORRO ROA identificado(a) con CC 1031120730

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	29
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	1
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	29
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	1
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-12	29
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-12	1
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-12	29
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-12	1
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-12	29
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-12	1
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-12	29
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-12	1
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	29
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	1
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	29
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	1

Este certificado se expide el día 2023-01-07 a las 10:33.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ISAAC MANUEL MARTINEZ MARTINEZ identificado(a) con CC 92530837

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	30
9445110789	1848375340	E	2023-01-04	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	30

Este certificado se expide el día 2023-01-07 a las 10:35.

Contratista

	CONTROL DE PERSONAL	CÓDIGO:	F-GG-10
eterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/12/2022 Y EL 31/12/2022 PLAZO: 11

CONTRATISTA: Consorcio Turquia — CONTRATO No. 2220577

INTERVENTOR: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS — CONTRATO No. 2220585

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES 9																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CARGO																																
Especialista estructural	1	1	1	NA	1	1	1	NA	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	Actividad 1, 2 y 3
Especialista Hidrosanitario	1	1	1	NA	1	1	1	NA	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	Actividad 2 y 3
Profesional costos y presupuesto	1	1	1	NA	1	1	1	NA	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	Actividad 1, 2 y 3
Profesional Social	3	3	3	NA	3	3	3	NA	3	3	NA	3	3	3	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	3	Actividad 1, 2 y 3
Director de obra	1	1	1	NA	1	1	1	NA	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	Actividad 1, 2 y 3
Residente de obra	3	3	3	NA	3	3	3	NA	3	3	NA	3	3	3	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	3	Actividad 2y 3
Profesional de calidad	1	1	1	NA	1	1	1	NA	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	Actividad 2 y 3
Tecnico PGIO	1	1	1	NA	1	1	1	NA	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	Actividad 2 y 3
Inspector de obra	5	5	5	NA	5	5	5	NA	5	5	NA	5	5	5	5	5	5	NA	5	5	5	5	5	5	NA	5	5	5	5	5	5	Actividad 3
Maestro de obra	3	3	3	NA	3	3	3	NA	3	3	NA	3	3	3	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	3	Actividad 3
oficiales	54	60	60	NA	64	64	65	NA	56	64	NA	58	61	64	56	63	62	NA	58	54	64	54	55	55	NA	55	40	57	53	50	50	Actividad 3
ayudantes	34	34	30	NA	34	33	32	NA	32	30	NA	30	27	30	36	30	30	NA	32	22	24	34	27	26	NA	33	20	20	22	24	24	Actividad 3
almacenista	1	1	1	NA	1	1	1	NA	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	Actividad 3
herrero	6	6	6	NA	6	6	6	NA	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	Actividad 3
Auxiliar de bodega	6	6	6	NA	6	6	6	NA	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	Actividad 3
																																Actividad 3
PERSONAL CONTRATISTA	**121**	**127**	**123**	**NA**	**131**	**130**	**130**	**NA**	**121**	**127**	**NA**	**121**	**121**	**127**	**125**	**126**	**125**	**NA**	**123**	**109**	**121**	**121**	**115**	**114**	**NA**	**121**	**93**	**110**	**108**	**107**	**107**	**TOTAL PERIODO**	**3104**
PROCEDENCIA / CONDICIÓN	**MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE***																															**SUMATORIA**	**PORCENTAJE**	**CUMPLE S/N**
MANO OBRA NO CALIFICADA																																**0**	**0,00%**	
De la región	100	106	102	NA	110	109	109	NA	100	106	NA	100	100	106	104	105	104	NA	102	88	100	100	94	93	NA	100	72	89	87	86	86	2558	82,41%	
De fuera de la región	0	0	0	NA	0	0	0	NA	0	0	NA	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA																																**0**	**0,00%**	
De la región	21	21	21	NA	21	21	21	NA	21	21	NA	21	21	21	21	21	21	NA	21	21	21	21	21	21	NA	21	21	21	21	0	21	525	16,91%	
De fuera de la región	0	0	0	NA	0	0	0	NA	0	0	NA	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS																														0		**0**	**0,00%**	
De la región	21	21	21	NA	21	21	21	NA	21	21	NA	21	21	21	21	21	21	NA	21	21	21	21	21	21	NA	21	21	21	21	0	21	525	16,91%	
De fuera de la región	0	0	0	NA	0	0	0	NA	0	0	NA	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
POBLACIÓN VULNERABLE																																**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social																																0	0,00%	
En condición de desplazamiento																																0	0,00%	
MUJERES																																**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada																																0	0,00%	
Mano de Obra Calificada	8	8	8	NA	8	8	8	NA	8	8	NA	8	8	8	8	8	8	NA	8	8	8	8	8	8	NA	8	8	8	8	8	8	208	6,70%	
Profesionales - Técnicos	8	8	8	NA	8	8	8	NA	8	8	NA	8	8	8	8	8	8	NA	8	8	8	8	8	8	NA	8	8	8	8	8	8	208	6,70%	
PROVEEDORES																																		
Local																																		
Nacional																																		
Internacional																																		

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: Edgar Aragon Otero

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901570934	7	CONSORCIO TURQUIA	B	2	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4220	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CARRERA 4 2 85 KM 3-2	2365738	JORGEMENDEZSIERRA14@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-11	25067815	Y	2022-12-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.860.900	39.300	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
30	25067815	2022-12-09	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 1102832921	ACOSTA SILVA JORGE ELIECER	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
2	CC 1005425553	ALVAREZ ACOSTA DANIEL ENRIQUE	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
3	CC 92511621	ALVAREZ D LUYZ JUAN CARLOS	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	33.334	2.400	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	2.400	N	1234567
4	CC 92531207	ARRIETA BELTRAN MARCOS TULIO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
5	CC 1102881027	ARRIETA MARQUEZ DANILO JOSE	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	**0**	**0**	SIN EPS-SINEPS	**0**	**0**	SIN CCF-SINCCF	**0**	**0**	**366.667**	**25.600**	0,06960	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59**	**0**	**25.600**	N	1234567
6	CC 1003261430	ARROYO MENDOZA YONEIDER	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0		0	SIN EPS-SINEPS	**0**	**0**	SIN CCF-SINCCF	**0**	**0**	**366.667**	**25.600**	0,06960	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59**	**0**	**25.600**	N	1234567
7	CC 1102882900	CARO RUBIO ANGEE PAOLA	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
8	CC 1102869731	CONTRERAS NAVARRO CARLOS ALBERTO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
9	CC 1102887000	DIAZ GAMERO BRAYAN ALFONSO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
10	CC 1005582597	GARAY LUNA JOSE JORGE	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
11	CC 92259364	HERRERA FLOREZ ARCADIO JOSE	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
12	CC 1102814417	JARABA BADILLO DIEGO ALONSO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
13	CC 1102861895	JULIO BARON INES AMINTA	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
14	CC 92153696	LOPEZ CAMARGO JAIRO EUSDAV	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	33.334	2.400	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	2.400	N	1234567
15	CC 1143459999	LOPEZ VEGA CARLOS ALBERTO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
16	CC 1102863514	MANJARREZ CALDERA SUANY DEL CARMEN	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
17	CC 1005575084	MARTINEZ ALGARIN VICTOR MANUEL	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
18	CC 1003644646	MEDINA ARRIETA JESUS ALBERTO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
19	CC 1005663805	OVIEDO TALAIGUA YOLBIS JAVIER	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
20	CC 1102850002	PATERNINA VITOLA ESTEFANY	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
21	CC 1102823989	PATRON MOGUEA CARMEN ADRIANA	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
22	CC 1102873557	PEDRAZA PERALTA MARTHA LUCIA	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
23	CC 1102867631	PERALTA ANAYA ALBERTO MARIO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
24	CC 92526944	RAMIREZ ATENCIA WILLIAM RAFAEL	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
25	CC 1102832978	SILGADO BERTEL FRANCISCO JAVIER	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
26	CC 1007259741	SILGADO MORENO GERDUIN MANUEL	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
27	CC 92522136	SOLANO COLON GUSTAVO ADOLFO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
28	CC 1102863131	SUAREZ MARTINEZ JESUS DAVID	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
29	CC 1005665160	TALAIGUA PEREZ YOINER DAVID	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	366.667	25.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	25.600	N	1234567
30	CC 1016067853	TOVAR QUIROZ MARISOL	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901570934	7	CONSORCIO TURQUIA	B	2	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CARRERA 4 2 85 KM 3-2		2365738		JORGEMENDEZSIERRA14@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-11	25067815	Y	2022-12-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.860.900	39.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
30	25067815		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	26.166.669	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				30	1.821.600	0	39.300	0	1.860.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	30	1.821.600	0	39.300	0	1.860.900
Gran Total					1.821.600	0	39.300	0	1.860.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 6889769	0	WILBERTO ECHAVARRIA REYES	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4390	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CARRERA 16 J 43H 12		3135840905			WILBERTOECHAVARRIA539@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-11	24981135	Y	2022-12-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.305.200	59.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
61	24981135	2022-12-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 1193559075	ACOSTA CANOLES JESUS DAVID	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
2	CC 10966190	AGAMEZ ARCIRIA SOVEID LUIS	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
3	CC 1100392548	AGUILAR TOVAR JULIO EMIRO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
4	CC 1102838410	ALVAREZ LUNA OSCAR MANUEL	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
5	CC 92230842	ALVAREZ SIERRA DAVINSON	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
6	CC 1005662496	ARAUJO ROJA WALTER ENRIQUE	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
7	CC 1102881938	ARIAS PEREZ ANDERSON	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
8	CC 1050968666	ARROYO RODRIGUEZ PEDRO ANTONIO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
9	CC 1193393466	ATENCIA RIOS ELIUT DAVID	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
10	CC 8827655	BADILLO HERAZO JORGE	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
11	CC 1102851480	BASILIO CRUZ LUIS ALBERTO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
12	CC 1005627908	BELEÑO BASILIO RONALDO ENRIQUE	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
13	CC 1193077432	BELTRAN BUELVAS MARIO ANDRES	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
14	CC 92498976	BERTEL MARTINEZ FIDEL ANTONIO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
15	CC 92504346	BURGOS OCHOA APOLINAR MANUEL	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
16	CC 1102583890	CHARRY TOVAR EDUARDO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
17	CC 1148439080	CRUZ PEÑA VICTOR FAVIO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
18	CC 1062963206	CUADRADO PEREZ ALEX	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
19	CC 1148946197	DELGADO RUIZ LUIS ALBERTO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
20	CC 1193280561	DELGADO RUIZ LUIS ANDRES	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
21	PT 6062156	DIAZ GLECIANO JAMPIER JOSE	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
22	CC 79678813	ESCALANTE SARMIENTO GIOVANNY	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
23	CC 1102873396	GENES CELIS JESUS YEISON	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
24	CC 1193030959	GUERRA MERCADO SEBASTIAN	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
25	CC 1102867851	HERNANDEZ SEPULVEDA JOSE ALFREDO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
26	CC 1005661546	HERNANDEZ SEPULVEDA VICTOR JOSE	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
27	PT 5204587	JOSEPH PABON JIMMY RICHARDSON	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
28	CC 9111316	LAMBRAÑO MADRID LUIS MIGUEL	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
29	CC 92642055	MARQUEZ PEREZ JORGE ANTONIO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
30	CC 92534051	MARTINEZ BELEÑO JORGE LUIS	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
31	CC 1102878746	MARTINEZ MONTERROZA CARLOS ARTURO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
32	CC 1102830896	MARTINEZ MORALES JORGE LUIS	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
33	CC 23179538	MEDINA FLOREZ CAROLINA	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
34	CC 1102870774	MEJIA JARABA CHAINY	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
35	CC 1005676913	MEJIA JARABA JOSE RAFAEL	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
36	CC 1103120815	MERCADO ACOSTA JAVIER EDUARDO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
37	CC 1102827337	MONTAÑO ALVAREZ JULIO CESAR	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
38	CC 92506202	NOVOA GUERRERO LEONEL ENRIQUE	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
39	CC 92523882	PADILLA ARRIETA RAFAEL IGNACIO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
40	PT 5366516	PADRON LINARES JOSE PASCUAL	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
41	CC 92559348	PATERNINA CONTRERAS JADER DEL CRISTO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
42	CC 1102825040	PEREZ MOLINA JULIO CESAR	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
43	CC 92508067	PINEDA RODRIGUEZ JUAN JOSE	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
44	CC 1102852168	POLO PADILLA FRAN YAIR	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
45	CC 2000011564	RAMOS MERCADO ERIC SAUL	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1941201
46	CC 1005573866	RODRIGUEZ BALDOVINO JOSE ARMANDO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
47	CC 92538620	ROMERO BETIN MANUEL ANTONIO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
48	CC 1104257364	ROMERO RODRIGUEZ LUIS MANUEL	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
49	CC 1102880282	RUIZ SOLAR RONALD DAVID	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
50	CC 1101440773	SANCHEZ MERCADO PEDRO MANUEL	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
51	CC 1193077399	SANTOS VASQUEZ MARLON DAVID	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
52	CC 1102884547	SEVERICHE ROBLES DANIEL EDUARDO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
53	CC 1102795970	SIMANCA ESCORCIA LEDER FRANCISCO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
54	CC 92544100	SUAREZ LOBO NEL DE JESUS	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
55	CC 92538565	SUAREZ LOBO NELSON MANUEL	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
56	CC 92276415	TORRES PITALUA EVER ENRIQUE	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
57	CC 1102868865	VANEGAS MORALES DEINER JOSE	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
58	CC 92641557	VERGARA MONTALVO YAN CARLOS	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
59	CC 92521934	VILLALBA CASTILLO JOSE LUCIANO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
60	CC 1102863211	VILLEGAS BOLAÑOS YAN CARLOS	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
61	CC 1102804144	VILORIA ARIAS LUIS ALFONSO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 6889769	0	WILBERTO ECHAVARRIA REYES	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4390	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CARRERA 16 J 43H 12		3135840905		WILBERTOECHAVARRIA539@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-11	24981135	Y	2022-12-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.305.200	59.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
61	24981135		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	61.000.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				61	4.245.600	0	59.600	0	4.305.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	61	4.245.600	0	59.600	0	4.305.200
Gran Total					4.245.600	0	59.600	0	4.305.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901570934	7	CONSORCIO TURQUIA	B	2	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CARRERA 4 2 85 KM 3-2		2365738			JORGEMENDEZSIERRA14@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-11	25067815	Y	2022-12-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.860.900	39.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
30	25067815	2022-12-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 1102832921	ACOSTA SILVA JORGE ELIECER	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
2	CC 1005425553	ALVAREZ ACOSTA DANIEL ENRIQUE	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
3	CC 92511621	ALVAREZ D LUYZ JUAN CARLOS	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	33.334	2.400	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	2.400	N	1234567
4	CC 92531207	ARRIETA BELTRAN MARCOS TULIO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
5	CC 1102881027	ARRIETA MARQUEZ DANILO JOSE	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	366.667	25.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	25.600	N	1234567
6	CC 1003261430	ARROYO MENDOZA YONEIDER	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	366.667	25.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	25.600	N	1234567
7	CC 1102882900	CARO RUBIO ANGEE PAOLA	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
8	CC 1102869731	CONTRERAS NAVARRO CARLOS ALBERTO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
9	CC 1102887000	DIAZ GAMERO BRAYAN ALFONSO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
10	CC 1005582597	GARAY LUNA JOSE JORGE	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
11	CC 92259364	HERRERA FLOREZ ARCADIO JOSE	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
12	CC 1102814417	JARABA BADILLO DIEGO ALONSO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
13	CC 1102861895	JULIO BARON INES AMINTA	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
14	CC 92153696	LOPEZ CAMARGO JAIRO EUSDAV	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	33.334	2.400	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	2.400	N	1234567
15	CC 1143459999	LOPEZ VEGA CARLOS ALBERTO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
16	CC 1102863514	MANJARREZ CALDERA SUANY DEL CARMEN	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
17	CC 1005575084	MARTINEZ ALGARIN VICTOR MANUEL	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
18	CC 1003644646	MEDINA ARRIETA JESUS ALBERTO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
19	CC 1005663805	OVIEDO TALAIGUA YOLBIS JAVIER	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
20	CC 1102850002	PATERNINA VITOLA ESTEFANY	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
21	CC 1102823989	PATRON MOGUEA CARMEN ADRIANA	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
22	CC 1102873557	PEDRAZA PERALTA MARTHA LUCIA	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
23	CC 1102867631	PERALTA ANAYA ALBERTO MARIO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
24	CC 92526944	RAMIREZ ATENCIA WILLIAM RAFAEL	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
25	CC 1102832978	SILGADO BERTEL FRANCISCO JAVIER	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
26	CC 1007259741	SILGADO MORENO GERDUIN MANUEL	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
27	CC 92522136	SOLANO COLON GUSTAVO ADOLFO	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
28	CC 1102863131	SUAREZ MARTINEZ JESUS DAVID	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
29	CC 1005665160	TALAIGUA PEREZ YOINER DAVID	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	366.667	25.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	25.600	N	1234567
30	CC 1016067853	TOVAR QUIROZ MARISOL	1.000.000																							SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901570934	7	CONSORCIO TURQUIA	B	2	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4220	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CARRERA 4 2 85 KM 3-2	2365738	JORGEMENDEZSIERRA14@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-11	25067815	Y	2022-12-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.860.900	39.300	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
30	25067815		Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	26.166.669	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				30	1.821.600	0	39.300	0	1.860.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	30	1.821.600	0	39.300	0	1.860.900
Gran Total					1.821.600	0	39.300	0	1.860.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901570934	7	CONSORCIO TURQUIA	B	2	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CARRERA 4 2 85 KM 3-2		2365738			JORGEMENDEZSIERRA14@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-11	25066138	Y	2022-12-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	284.500	6.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	25066138	2022-12-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 10967082	JIMENEZ FUENTES FRANCISCO MANUEL	1.000.000																								SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.60	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
2	CC 85165700	LOBO ARBELAEZ NELSON ENRIQUE	1.000.000																								SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
3	CC 1102812202	VELASQUEZ CARE JESUS MANUEL	1.000.000																								SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
4	CC 1100688788	VELASQUEZ MARQUEZ FREDY	1.000.000																								SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901570934	7	CONSORCIO TURQUIA	B	2	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CARRERA 4 2 85 KM 3-2		2365738			JORGEMENDEZSIERRA14@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-11	25066138	Y	2022-12-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	284.500	6.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	25066138		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	4.000.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				4	278.400	0	6.100	0	284.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	278.400	0	6.100	0	284.500
Gran Total					278.400	0	6.100	0	284.500

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 10967082	JIMENEZ FUENTES FRANCISCO MANUEL	1.000.000		R															0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
2	CC 85165700	LOBO ARBELAEZ NELSON ENRIQUE	1.000.000		R															0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
3	CC 1102812202	VELASQUEZ CARE JESUS MANUEL	1.000.000		R															0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567
4	CC 1100688788	VELASQUEZ MARQUEZ FREDY	1.000.000		R															0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	69.600	N	1234567

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901570934	7	CONSORCIO TURQUIA	B	2	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CARRERA 4 2 85 KM 3-2		2365738		JORGEMENDEZSIERRA14@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-11	25066138	Y	2022-12-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	284.500	6.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	25066138		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	4.000.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				4	278.400	0	6.100	0	284.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	278.400	0	6.100	0	284.500
Gran Total					278.400	0	6.100	0	284.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901570934	7	CONSORCIO TURQUIA	B	2	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CARRERA 4 2 85 KM 3-2		2365738			JORGEMENDEZSIERRA14@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-11	25066526	Y	2022-12-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	21.800	500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	25066526	2022-12-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 92495462	CORCHO OSORIO JOSE GREGORIO RAFAEL	1.000.000																								SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	33.334	2.400	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	2.400	N	1234567
2	CC 1102842754	LUNA LUNA DAIRO	1.000.000																								SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	33.334	2.400	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	2.400	N	1234567
3	CC 1102804282	MENDOZA CANTERO LEONARDO JOSE	1.000.000																								SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	33.334	2.400	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	2.400	N	1234567
4	CC 1102827337	MONTAÑO ALVAREZ JULIO CESAR	1.000.000																								SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	33.334	2.400	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	2.400	N	1234567
5	CC 1100631231	MULETH VARGAS DIEGO ANDRES	1.000.000																								SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	133.334	9.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	9.300	N	1234567
6	CC 78031251	VERTEL TRUJILLO ARMANDO ANTONIO	1.000.000																								SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	33.334	2.400	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	2.400	N	1234567

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901570934	7	CONSORCIO TURQUIA	B	2	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CARRERA 4 2 85 KM 3-2		2365738			JORGEMENDEZSIERRA14@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-11	25066526	Y	2022-12-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	21.800	500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	25066526		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	300.004	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				6	21.300	0	500	0	21.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	6	21.300	0	500	0	21.800
Gran Total					21.300	0	500	0	21.800

ASOPAGOS
s.a.

PAGADO

Anexo 15. Control de seguridad industrial

	CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	CÓDIGO:	F-GG-24
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-19

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA					
NÚMERO DE CONTRATO:	2220585	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	1/12/2022	**Y EL**	31/12/2022	
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA					
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES					

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	x		Durante el mes de diciembre de 2022, el Contratista dispuso de tres camiones y dos camionetas que distribuyen los materiales desde la bodega principal hacia puntos de acopio localizados directamente en el barrio El Poblado o a las viviendas intervenidas. También se cuenta con un mini cargador y dos motocarros en obra, los cuales distribuyen los materiales desde los diferentes puntos de acopios temporales hacia las viviendas intervenidas. . En el periodo utilizó cortadoras y pulidoras para el corte de ladrillos, acero, ceramica, estos se encontraban en buen estado.
- Regularidad del mantenimiento	x		
- Vibraciones /Ruidos	x		Las vibraciones y ruidos generados en la ejecucion de actividades constructivas no son relevantes. Los trabajadores utilizan proteccion auditiva en el uso de cortadoras y pulidoras.
- Protecciones / Guardas / Frenos	x		Se realizan los preoperacionales a vehiculos y maquinaria en obra
- Idoneidad operarios	x		Los operarios de los vehiculos y maquinaria cuentan con licencia de conduccion requerida.
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	X		El campamento cuenta con puntos de atención de emergencias y primeros auxilios, conformados por camillas, botiquín, extintores, kid antiderrames. Durante el periodo evaluado se mantuvo rdenado y se observó un correcto almacenamiento de materiales.
- Buen estado	X		
- Fácil acceso y operación	X		En dias de lluvias se dificulya un poco el acceso a las bodegas localizadas en el Barrio el Poblado, teniendo en cuenta que las calles del barrio se afectan considerablemente
DOTACIÓN DEL PERSONAL			

	CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	CÓDIGO:	F-GG-24
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-19

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA					
NÚMERO DE CONTRATO:	2220585	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	1/12/2022	**Y EL**	31/12/2022	
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA					
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES					

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
- Dotación completa	X		El Contratista realizó entrega de dotación y Elementos de Protección al personal que se vinculó al proyecto y aquellos trabajadores que no contaban con EPP requeridos, sin embargose pudo evidenciar en recorridos de obra realizados por interventoría que, en algunas viviendas en intervención, el personal no contaba con los EPP requeridos para la ejecución de actividades constructivas, razón por la cual la Interventoría mediante correo electrónico de fecha 21 de diciembre de 2022, solicitó al Contratista retirar de la obra a estos trabajadores hasta tanto no se les suministrara los EPP necesarios para el desarrollo de sus actividades y dar cumplimiento al SGSST con el fin de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
- Buen estado	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		Se presentaron mejoras en el acopio y almacenamiento de materiales en las viviendas a intervenir. Sin embargo, se siguen presentando casos puntuales en donde no se realiza un manejo adecuado de las excavaciones realizadas durante las actividades constructivas, razón por la cual se le ha solicitado al contratista implementar todas las medidas contempladas en el procedimiento de manejo de excavaciones establecido en el SGSST, en relación a la señalización y demarcación de las mismas para minimizar los riesgos de accidentes, sobre todo en viviendas donde habiten niños y adultos mayores
- Uso según zona de trabajo	X		
VIGILANCIA			
- Personal suficiente	X		Se mantuvo personal suficiente para la vigilancia en el area administrativa y en el campamento
- Diurna	X		
- Nocturna	X		
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia	X		

enterritorio	**CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**	CÓDIGO:	**F-GG-24**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-19**

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA				
NÚMERO DE CONTRATO:	2220585	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	1/12/2022	**Y EL**	31/12/2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA				
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES				

DESCRIPCIÓN	**ESTADO**		**OBSERVACIONES**
	Bueno	**Deficiente**	
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		El personal que ingresó a trabajar en el mes de diciembre de 2022 en el proyecto fue afiliado a seguridad social integral

Firma: _____

Nombre: Edgar Aragon Otero

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo 16. Cumplimiento ambiental

CONTROL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA				
NÚMERO DE CONTRATO:	2220585	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	01/12/2022	**Y EL**	31/12/2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA				
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES				

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
PERMISOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES			
Se cuenta con licencia ambiental y registro minero de las canteras donde se extare el material petereo	x		Los materiales pétreos utilizados en el proyecto durante el mes de octubre fueron suministrados por el proveedor GRANITOS Y CALIZAS DE COLOMBIA S.A.S. Este cuenta con los permisos, autorizaciones, licencias ambientales vigentes, de las canteras donde se extraen estos materiales.
Cuenta con autorizacion para la disposicion de RCD	x		Los escombros son donados a la comundad para el areglo de vias o para rellenos de patios, lo anterior con previa solicitud del propietario.
MAJEJO DE SEÑALIZACION			
Los frentes de trabajo se encuentran señalizados y demarcados	X		
Los materiales almacenados en los frentes de obra están ubicados y acordonados dentro de la señalización del frente de obra y no deberán obstaculizar el tránsito vehicular y peatonal.	X		El Contratista realiza el almacenamiento de materiales en tres bodegas; una ubicada en el campamento principal y dos ubicadas en el Barrio El Poblado. Durante el periodo se evidencio un almacenamiento adecuado, orden y aseo en cada una de ellas. Los materiales son trasladados directamente a las viviendas no afectando el transito vehicular y peatonal.
Los materiales de obra y los escombros, se ubicarán en sitios que no interfieran con el tránsito peatonal.	X		Los escombros son donados a la comundad para el areglo de vias o para rellenos de patios, lo anterior con previa solicitud del propietario.
MANEJO DE MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS			
Los vehículos que se encuentran operando actualmente en el proyecto cuentan con las revisiones técnico-mecánicas, vigentes y expedidas en un sitio autorizado por la autoridad competente.	X		Durante el periodo se realizaron los preoperacionales a la maquinaria y equipos que se encuentran operando en la obra.
Las volquetas utilizan carpas para cubrir los materiales para la construccion el transporte de los mismos.	X		Las volquetas que realizaron el transporte de materiales hasta la bodega principal y hacia los puntos de acopio localizados en el Barrio el Poblado, utilizaron carpas, cumpliendo con todas las normas y disposiciones de la Secretaría tránsito Municipal y de la Resolución N° 0472 de 2017 y Resolución N° 1257 de 2021 de Minambiente, para la realización de esta actividad.
Las operaciones de mantenimiento de la maquinaria se adelantan únicamente en sitios autorizados	X		
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS			
Se cuenta con recipientes adecuados para el almcacenamiento y separacion de los residuos solidos que se generen en el proyecto.	X		El Contratista durante el mes de octubre de 2022, mantuvo en obra puntos ecológicos para el almacenamiento y separación de los residuos sólidos que se generan en el proyecto. estos son trasladados al campamento principal para que posteriormente sean recolectados por la Empresa de Aseo INTERASEO SA ESP para su disposición final en sitios autorizados por las autoridades ambientales competentes.s.
se realiza disposicion final adecuada de los residuos generados en el proyecto	X		
CONTROL DE AGREGADOS PETREOS			
Se realiza un correcto almacenamiento de los materiales petreos que se utilizan en la ejecucion de actividades constructivas.	X		se observo mejoras en el almacenamiento de materiales en las viviendas.

Los materiales dispuestos temporalmente serán cubiertos para evitar emisiones a la atmosfera y arrastre por efectos de la lluvia	X		El contratista realizó acopio temporal de materiales pétreos en el campamento principal, estos materiales permanecen cubiertos con plástico para evitar la emisión de polvo, material particulado y el arrastre del material por efecto de las aguas lluvias mientras son trasladados al barrio el Poblado para la distribución a las viviendas intervenidas.
Los sitios de acopio de materiales granulares se encuentran retirados de cuerpos de agua o zonas de vegetación.	X		
El cemento es acopiado en un lugar seco y aislados del suelo.	X		Se cumple con este aspecto.
CAMPAMENTOS Y AREA DE ALMACENES			
El campamento o almcenes se encuentran ordenados, aseados y señalizados de forma correcta	X		El contratistta presento mejoras en el periodo en cuanto al orden y aseo en las bodegas
El campamento cuenta con equipos para control de incendios –extintores	X		Los campamentos principales cuentan con equipos de control de incendios.
El campamento cuenta con punto de atencion de primeros auxilios	X		Se cuenta con punto de primeros auxilios
MANEJO DE ESCOMBROS			
Ese realiza un manejo adecuado de los escombros que se generan en el proyecto	X		Los escombros son reutilizados para el relleno de patios o lotes. Se generan pcos escombros en el proyecto.
CAPACITACIONES			
Se realiza capacitación permanente, para sensibilizar y evitar acciones que atenten contra el equilibrio ambiental de la zona donde se desarrolla el proyecto.	X		Se realizan charlas permanentes a los trabajadores

Firma: _____

Nombre: Edgar Aragon Otero

Director de Interventoria

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-01 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION

FECHA: 3/02/2022
CIUDAD: Sincelejo

Yo Enelvis Ruiz estrada, identificado con CC 1102829594 de Sincelejo solicito formalmente al **CONSORCIO TURQUIA**, contratista de las obras **"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005" GRUPO 1: SINCELEJO (SUCRE)"**, que los residuos de escombros y/o excavación generados por las actividades de construcción sean donados y dispuestos en la siguiente dirección: Manza 72 Vivienda 549 y los cuales serán utilizados para:

estabilizacion y relleno del terreno

Agradezco la atencion Prestada

Enelvis Ruiz

FIRMA

CC: 1102829594

Powered by CamScanner

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-01 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION

FECHA: 26/12/2022
CIUDAD: Sincelejo

Yo Sixto Manuel Fuente Sneider identificado con CC 4.835.943 de Tierra Alta solicito formalmente al **CONSORCIO TURQUIA,** contratista de las obras **"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005" GRUPO 1: SINCELEJO (SUCRE)",** que los residuos de escombros y/o excavación generados por las actividades de construcción sean donados y dispuestos en la siguiente dirección: Manzana 66 Casa 564 y los cuales serán utilizados para:

Relleno y estabilización del terreno

Agradezco la atencion Prestada

Sixto

FIRMA

CC: 4.835.943

Powered by CamScanner

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-02 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DONACION DE MATERIAL

Se reunieron el Señor (a) Sixto Ramon Benitez Fuentes identificado con Cedula de Ciudadanía N° 4.835.913 de Tierra alta y Endry Mary Benitez en calidad de Técnico PGIO en nombre de CONSORCIO TURQUÍA, con el fin de entregar por parte del Consorcio material de Escombro. Este material es solicitado por el Señor (a) en mención, así mismo el propietario del predio donde se dispondrá este material deberá cumplir con los siguientes compromisos:

1. La conformación del material donado estará a cargo del propietario del predio.
2. El beneficiario no podrá acopiar el material en lugares donde pueda afectar a fuentes hídricas o causar daños al medio ambiente.
3. Los materiales no pueden ser negociados o vendidos a terceros.
4. El propietario será el único responsable de afectación o daños a terceros ya sea económica y/o ambientalmente.
5. Teniendo en cuenta que el material no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para la construcción de obras de infraestructura como viviendas, locales comerciales entre otros, no se podrá utilizar para tal fin.

Quien recibe el material se compromete a darle un manejo adecuado al mismo, en su predio sin responsabilidad alguna del CONSORCIO TURQUÍA. El volumen dispuesto es 0,7 m³

Se entrega a satisfacción del propietario sin reclamo alguno en tiempos posteriores.

Se firma a los 26 días del mes Dic de 2022.

SIXTO RAMON BENITEZ FUENTES

Nombre y firma de quien recibe.

4.835913

Nombre y firma de quien entrega

Cargo: Técnico PGIO

Powered by CamScanner

Anexo 17. Informes semanales

Bogotá D.C, 06 de diciembre de 2022

Señor
JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
Supervisor
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio
Calle 26 N°. 13-19
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría N°. 2220585 "Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre"**

Asunto: **Remisión Informe Semanal No. 33 periodo del 28 de noviembre de 2022 al 04 de diciembre de 2022**

Apreciado señor,

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, anexo, se remite el informe semanal de Interventoría No. 33 del contrato de la referencia para el período comprendido entre el 28 de noviembre de 2022 al 04 de diciembre de 2022.

Anexo se remite como soporte al Informe Semanal N°. 33; bitácora de obra, Lista de chequeo seguimiento estado de salud de Interventoría y Obra, Acta de seguimiento, Acta de comité de aprobación de diagnóstico, Informe social, Estado del clima en la semana reporte IDEAM, Resumen de avance y Matriz Tres Momentos.

Cordialmente,

EDGAR ALFONSO ARAGÓN OTERO
Director de Interventoría
Anexos: Lo enunciado en treinta y ocho (38) folios y archivos en magnético.
C.C.: Ing. Juan David Amón – Supervisor del contrato Convenio Inter administrativo 221005; Enterritorio.
Archivo.
Elaboró: MJ.
Revisó: EAO.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial FECHA 7/12/2022 HORA: 8:51:07 a. m.
20224300471082

INFORME SEMANAL

Cra. 48 No. 101A – 29 Bogotá, Colombia Tel: (57 1) 236 7974 – 621 5383
E-mail: info@gavinco.com www.gavinco.com

enterritorio	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 32

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **28/11/2022** al **4/12/2022** | Fecha **5/12/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

código PROYECTO	2220577
OBJETO DEL PROYECTO	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** SUCRE — **MUNICIPIO** SINCELEJO
GERENCIA A CARGO	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1
SUPERVISOR	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
ESTADO DEL PROYECTO	En ejecución.

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220577		
Contratista	CONSORCIO TURQUIA		
Valor inicial	$ 5.034.941.972,00		
Valor actual	$ 5.034.941.972,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial (Días)	244 Días		
Plazo actual (Días)	244 Días		100,00%
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	13/12/2022		
Tiempo Transcurrido (días)	232		95,08%
Días remanentes del Contrato	8		3,28%
Acumulado a última acta pagada	$ 2.050.349.690,38		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

2.2 CONTRATO DE Interventoría

Contrato No.	2220585		
Interventor	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.		
Valor inicial	$ 542.723.071,00		
Valor actual	$ 542.723.071,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial	244 Días		
Plazo actual	244 Días		100,00%
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	13/12/2022		
Ejecución del Contrato	232		95,08%
Días remanentes del Contrato	8		3,28%
Acumulado a última acta pagada	$ 339.826.050,90		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPENO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 5.034.941.972,00

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 4.886.160.727,52	97,05%	$ 2.503.373.148,48	49,72%	-$ 2.382.787.579,04	-47,33%
Durante el Periodo	$ 85.017.853,99	1,69%	$ 316.745.183,75	6,29%	$ 231.727.329,76	4,60%
Acumulado a la Fecha	**$ 4.971.178.581,51**	**98,73%**	**$ 2.820.118.332,23**	**56,01%**	**-$ 2.151.060.249,28**	**-42,72%**

Semáforo

Desviación en días: -104 Días

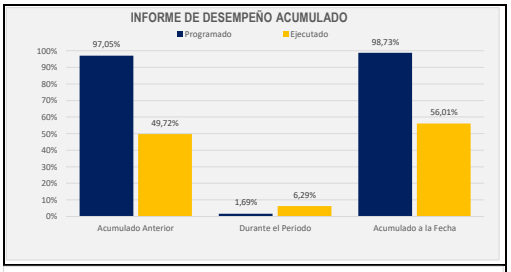

Observaciones al desempeño del proyecto


** **Actividad 1.** Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquia. Aprobado por interventoria con cartas GA-DOMI-040-22 del dia 31 de mayo de 2022 y radicado en ENTerritorio bajo el N°. 20224300206752 y GA-DOMI-030-22 radicado N°. 20224300189742.*


** **Actividad 2.** Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoría, por el Contratista de obra, un total de 644 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 632 diagnósticos acumulados. Hay 46 diagnósticos no efectivos y Tres (3) renuncias.*

** **Actividad 3.** A corte de este informe el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 415 viviendas, de las cuales 344 están terminadas, 71 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 288 para inicio de actividades.*

** **Actividad 4.** Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.*

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

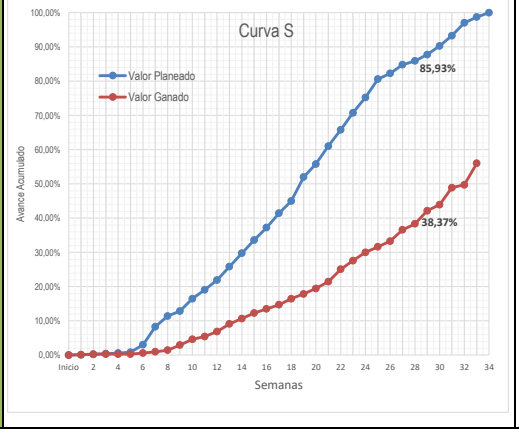

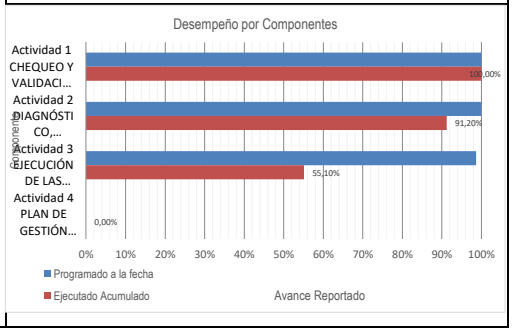

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE


DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

Se ajusta la curva S del proyecto conforme a la capacitación dada el 28 de abril de 2022 por parte del supervisor de ENTerritorio.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado %	Ejecutado %	Desviación %	Semáforo
Acumulado Anterior	97,05%	49,72%	-47,33%	
Durante el Periodo	1,69%	6,29%	4,60%	
Acumulado a la Fecha	**98,73%**	**56,01%**	**-42,72%**	

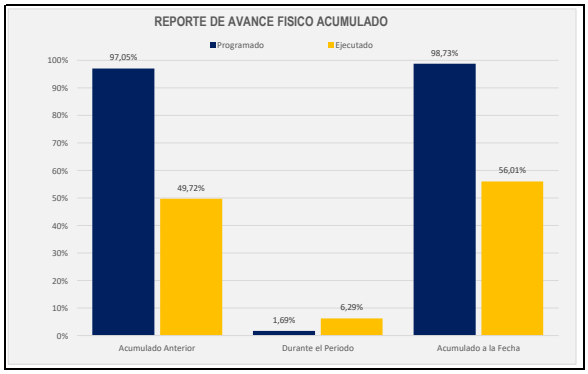

AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 5.034.941.972,00	$ 5.034.941.972,00	$ -	$ 981.956.213,60	$ 591.095.536,97	$ 390.860.676,63

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
5	$ 2.050.349.690,38	40,72%	5	$ 2.050.349.690,38	40,72%	9/11/2022	$ 455.490.237,16








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 542.723.071,00	$ 542.723.071,00	$ -	N/A	N/A	N/A

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
8	$ 339.826.050,90	62,61%	7	$ 285.336.654,58	52,58%	24/11/2022	$ 69.495.689,24







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA APROBADO.

* Actividad 1. Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, se presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía.

* Actividad 2. Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoría, por el Contratista de obra, un total de 644 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 632 diagnósticos acumulados. Interventoría emitió observaciones a un total de 7 diagnósticos mediante la comunicación GA-DOMI-216-22 del día 21 de noviembre de 2022. Está pendiente de entrega 12 diagnósticos los cuales son predios que no se han diagnosticado por el contratista de obra. De acuerdo al informe técnico entregado por el FOVIS de las manzanas 40A, 38A Y 38, hay once (11) diagnósticos que pasarían a ser no efectivos ya que

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 32

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **28/11/2022** al **4/12/2022** Fecha **5/12/2022**

las viviendas se encuentran en zona de riesgo, por lo tanto, el total de diagnósticos no efectivos se eleva a 46 y tres (3) renuncias.

* Actividad 3. A corte de este informe, el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 415 viviendas, de las cuales 344 están terminadas, 71 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 229 para inicio de actividades.

* Actividad 4. Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE CONTINGENCIA

Actividad 2.

Diagnósticos programación inicial: 693
Diagnósticos programados acumulados Plan de Contingencia: 693
Diagnósticos Aprobados acumulados: 632
Se evidenció una diferencia en 63 diagnósticos por debajo a la meta establecida.
Viviendas con observaciones de diagnóstico: 7
Viviendas efectivas: 644
Viviendas no efectivas: 46
Renuncias: 3
Viviendas Pendientes por diagnosticar: 12

Actividad 3.

Viviendas programación inicial: 684
Viviendas programadas acumuladas Plan de Contingencia: 684
Viviendas terminadas: 344
Viviendas en ejecución: 71
Viviendas totales iniciadas: 415

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

* El día 30 de noviembre de 2022 con carta GA-DOMI-228-22 se procedió a realizar un llamado de atención al contratista de obra por personal laborando sin afiliación en seguridad social integral y se solicitó el retiro de la obra.

* Con carta GA-DOMI-227-22 del día 01 de diciembre de 2022 se reiteró al Consorcio Turquía las observaciones de las unidades sanitarias que se encuentran en ejecución.

* Conforme la solicitud expresada por el Consorcio Turquía el día 21 de noviembre de 2022 mediante la comunicación CONS-TUR-SINC-163 de prorrogar el contrato del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado por un periodo de tres (3) meses, dando como fecha de terminación el próximo 13 de marzo de 2023, esto teniendo en cuenta que el contrato de obra se encuentra en atraso y con el fin de implementar un plan de trabajo propuesto en dicho documento que permitiría culminar las actividades objeto del contrato. Agregando a lo anterior, el contratista de obra asumirá el costo de la interventoría que permite realizar el seguimiento de dicho plan y de las actividades de obra.

Una vez realizado el análisis por esta Interventoría a las pretensiones del Consorcio Turquía, se procedió a emitir concepto, mediante la comunicación GA-DOMI-217-22 del día 22 de noviembre de 2022 radicado No. 20224300453802, mencionado que se ve viable la propuesta para la subsanación del atraso de las actividades de obra y que permiten el cumplimiento del objeto contractual, ya que las metas fijadas en el documento están acorde con los rendimientos actuales en la ejecución de las obras. En cuanto a los costos de interventoría por los tres (3) meses adicionales ascienden a $150.072.084, los cuales serán asumidos por el contratista de obra.

En consecuencia, al corte del presente informe semanal la Entidad se encuentra estudiando la solicitud de prórroga al contrato de obra y la adición y prorroga de interventoría.

ACTIVIDADES EN CAMPO

* El día 28 de noviembre de 2022 el Consorcio Turquía continuó con las actividades de levante de muros, excavación para zapatas, fundida de registros sanitarios y suministro de materiales. No se realizaron aperturas.

* El día 29 de noviembre de 2022, el contratista de obra continuó con las actividades de fundida de registros sanitarios, instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros, fundida de machones y columnas, instalación de enchape y aparatos sanitarios.

* El día 30 de noviembre de 2022, el contratista continuó con las actividades de instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención, instalación de enchape, pintura y atendiendo detalles de la casetas terminadas. El 30 de noviembre de 2022 se realizaron aperturas.

* El día 01 de diciembre de 2022, el Contratista de Obra continuó con las actividades de levante de muros, fundida de machones, fundida de plantilla, pañete interno y externo, registros sanitarios, enchape e instalación de aparatos sanitarios. El día 01 de diciembre de 2022 se realizaron once (11) aperturas bajo los sigueintes códigos:

1. M55-053
2. M01-082
3. M02-443
4. M01-444
5. M62-495
6. M72-545
7. M58-604
8. M06-641
9. M25-668
10. M58-683
11. M72-549

* El día 02 de diciembre de 2022, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. Para el día de hoy en horas de la mañana se realizó el comité de seguimiento en donde se cuenta con la presencia de la entidad contratante, contratista e interventoría. Por otra parte, en el día de hoy se realiza recorrido con el director de interventoría para revisar el estado de las viviendas en ejecución.

* El día 03 de diciembre de 2022 se continuó con las actividades de obra como levante de muros, excavación de cimentaciones, fundida de machones, fundida de plantilla, armado del acero para las columnas y vigas. Para el día de hoy se reciben cuatro (4) viviendas a satisfacción por parte del beneficiario. Por otra parte también se realizó un recorrido con la veeduría, interventoría y contratista, con el fin de verificar el estado de las viviendas entregadas.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

* Se continuará con la intervención de las viviendas en el barrio El Poblado en Sincelejo Sucre.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	149	0	149	71,6%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	35	0	35	16,8%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	8	0	8	3,8%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál? Orden público	16	0	16	7,7%
	Total	**208**	**0**	**208**	**100,00%**



En la semana no se presentaron lluvias.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
Tipología PQR	Radicado por	Fecha		Asunto	Dirigido a	Respuesta Alcaldía / FOVIS
Inclusión	No. de PQR 1 Yessica Cantello	20 mayo del 2022		El/La señor(a) Yessica Cantello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 2 Betilda Gonzales	25 mayo del 2022		El/La señor(a) Betilda Gonzales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 40 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 3 Luz Dary Ruiz	25 mayo del 2022		El/La señor(a) Luz Dary Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 4 Jorge Guerra Arrieta	25 mayo del 2022		El/La señor(a) Jorge Guerra Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45a 16j - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 5 Emir Elias Pren M	26 mayo del 2022		El/La señor(a) Emir Elias Pren M solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 15 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 6 Andrea Beltran Vides	26 mayo del 2022		El/La señor(a) Andrea Beltran Vides solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 4 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 7 Jader Perez Molina	26 mayo del 2022		El/La señor(a) Jader Perez Molina solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17e 45 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 8 Oscar Gamarro	26 mayo del 2022		El/La señor(a) Oscar Gamarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 50 - lote 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 9 Manuel Mercado A	26 mayo del 2022		El/La señor(a) Manuel Mercado A solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17d 45 -06.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 10 Humberto Atencia Sierra	27 mayo del 2022		El/La señor(a) Humberto Atencia Sierra solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 62 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 11 Erika Blanco	27 mayo del 2022		El/La señor(a) Erika Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	El contratista reliza el cierre d ela solicitud teniendo en cuenta el concepto del
Inclusión	No. de PQR 12 Yuris Paola Suarez	31 mayo del 2022		El/La señor(a) Yuris Paola Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 38 lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	zona de riesgo.El predio tiene un area dentro de la vivienda que presenta

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 32

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **28/11/2022** al **4/12/2022** Fecha **5/12/2022**

Inclusión	No. de PQR 13 Katerine Benitez Villalba	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Katerine Benitez Villalba solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 50 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 14 Jose Joaquin Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Jose Joaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 15 Ana Isabel Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 16 Marileys Molina Alvarado	01 junio del 2022	El/La señor(a) Marileys Molina Alvarado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 17 Jeraldine Yepe Lasmar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Jeraldine Yepe Lasmar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 18 Enna Maria Lamar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Enna Maria Lamar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 19 Nauded Alvarez Maurez	02 junio del 2022	El/La señor(a) Nauded Alvarez Maurez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 20 Henoc Jose Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Henoc Jose Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 F 45- 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 21 Brenda Galvan Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Brenda Galvan Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 61 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 22 Sindy Rodriguez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Sindy Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 23 Luz Dary Martinez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 24 Jose Juaquin Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Juaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 25 Ana Milena Vergara	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Milena Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 20 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 26 Maria Alejandra Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Alejandra Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 27 Oswaldo jimenez Ramirez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Oswaldo jimenez Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 28 Hernan Jimenez Marin	06 junio del 2022	El/La señor(a) Hernan Jimenez Marin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 14 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 29 Carmen Carpintero	06 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 30 Ana Isabel Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	Cabe aclarar que la PQR # 30 se recepciono dos veces, a nombre de la
Inclusión	No. de PQR 31 Edilma Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 45 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 32 Silvio David Morelo	06 junio del 2022	El/La señor(a) Silvio David Morelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 57 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 33 Norelis Zabaleta	06 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Zabaleta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 59 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 34 Darin Blanco Fuentes	6 junio del 2022	El/La señor(a) Darin Blanco Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	definir con planeacion si esta en zona de riesgo.
Inclusión	No. de PQR 35 Deivi Jose Miranda	8 junio del 2022	El/La señor(a) Deivi Jose Miranda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 36 Gertrudis Lopez Herazo	8 junio del 2022	El/La señor(a) Gertrudis Lopez Herazo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 37 Sandra Cruz Peña	10 junio del 2022	El/La señor(a) Sandra Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 73.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 38 Gina Salcedo Ruiz	10 junio del 2022	El/La señor(a) Gina Salcedo Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 39 Yesica Cabrera Lora	10 junio del 2022	El/La señor(a) Yesica Cabrera Lora solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 40 Walter Arrieta	10 junio del 2022	El/La señor(a) Walter Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 41 Ana Luisa Contreras	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Luisa Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 32.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 42 Andres Bruno Benavidez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Bruno Benavidez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 43 Bertina Montes	15 junio del 2022	El/La señor(a) Bertina Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 39 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 44 Emistocle Bertel Avila	15 junio del 2022	El/La señor(a) Emistocle Bertel Avila solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 14.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 45 Griseida Arrieta Betin	15 junio del 2022	El/La señor(a) Griseida Arrieta Betin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 53 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 46 Nadin Carvajal	15 junio del 2022	El/La señor(a) Nadin Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 47 Carmen Carpintero	15 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 48 Martha Regino Herrera	15 junio del 2022	El/La señor(a) Martha Regino Herrera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 2 - lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 49 Blanca Avilez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Blanca Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 50 Luz Marina Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Marina Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 51 Gabriel Julio Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Julio Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 43 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 52 Luis rodriguez Rivero	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luis rodriguez Rivero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 53 Maria Monroy	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Monroy solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 54 Dani Velazquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Dani Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 55 Edith Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 9.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 56 Maryiris Navarro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maryiris Navarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 57 Santiago Troncoso Reyes	16 junio del 2022	El/La señor(a) Santiago Troncoso Reyes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45A - 157.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 58 Milagro Niebles Castro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Milagro Niebles Castro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 28 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 59 Elena Peña Pineda	16 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Peña Pineda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 60 Ever Luis Marquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ever Luis Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 121.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 61 Ramona Rosa Diaz	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ramona Rosa Diaz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 42 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 62 Andres Murillo Perez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 54 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 63 Heriberto Fernandez Lopez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Heriberto Fernandez Lopez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 17A 45B 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 64 Gabriel Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16I 45C 74.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 65 Denys Herrera Alvarez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Denys Herrera Alvarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 66 Alicia Conde Morales	16 junio del 2022	El/La señor(a) Alicia Conde Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45 A 65.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 67 Gregoria Marzan Solar	17 junio del 2022	El/La señor(a) Gregoria Marzan Solar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 01.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 68 Lina Martinez Zuñiga	17 junio del 2022	El/La señor(a) Lina Martinez Zuñiga solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 69 Carmerlo Castro Novoa	17 junio del 2022	El/La señor(a) Carmerlo Castro Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 48 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 70 Nicolasa Padilla	17 junio del 2022	El/La señor(a) Nicolasa Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 20A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 71 Jose Miguel Lopez Bravo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Miguel Lopez Bravo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 20.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 32

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **28/11/2022** al **4/12/2022** Fecha **5/12/2022**

Inclusión	No. de PQR 72 Vicente Villamizar Campo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Vicente Villamizar Campo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 73 Ely Causil Martinez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Ely Causil Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 74 Padro Ramos	17 junio del 2022	El/La señor(a) Padro Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 75 Dagoberto Mendoza Mercado	17 junio del 2022	El/La señor(a) Dagoberto Mendoza Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	PRESENTA RIESGO POR DESLIZAMIENTO , NO CUMPLE CON
Inclusión	No. de PQR 76 Iris Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 77 Maria Carlota Menco	17 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Carlota Menco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 78 Iris Murillo Perez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 79 Edilsa Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Edilsa Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 80 Alejandra Loaiza Corrales	17 junio del 2022	El/La señor(a) Alejandra Loaiza Corrales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 29 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 81 Grey Montes Rodriguez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Grey Montes Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 82 Marlenys arroyo Quintero	21 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenys arroyo Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 83 Rodolfo Gonzalez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Rodolfo Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 41 - lote 38.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 84 Elida Pinto Morales	21 junio del 2022	El/La señor(a) Elida Pinto Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 85 Nelfi Calle Mejia	21 junio del 2022	El/La señor(a) Nelfi Calle Mejia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 86 Jorge Ramos Osorio	21 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Ramos Osorio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 87 Manuel Solano Almario	21 junio del 2022	El/La señor(a) Manuel Solano Almario solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 88 Carmen Perez Contreras	21 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Perez Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 89 Estefany Buelvas	21 junio del 2022	El/La señor(a) Estefany Buelvas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 22 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 90 Omaida Villadiego	22 junio de(2022	El/La señor(a) Omaida Villadiego solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 41.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 91 Rosa Isabel Alba Llanares	22 junio de(2022	El/La señor(a) Rosa Isabel Alba Llanares solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 92 Carmen Arroyo Ramos	22 junio de(2022	El/La señor(a) Carmen Arroyo Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 28.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 93 Alvaro Macea Rivera	22 junio de(2022	El/La señor(a) Alvaro Macea Rivera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 12 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 94 Maria Quiroz Goez	23 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Quiroz Goez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrea 17f 45B - 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 95 Luis Alberto Quiroz	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Alberto Quiroz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 64 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 96 Aracelis Zuñiga Salcedo	23 junio del 2022	El/La señor(a) Aracelis Zuñiga Salcedo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 59.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 97 Luz Velazquez Villareal	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Velazquez Villareal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 98 Luis Felipe Galeano	24 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Felipe Galeano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 99 Rosalba Barragan Barbosa	24 junio del 2022	El/La señor(a) Rosalba Barragan Barbosa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 100 Teresa Santana Peralta	24 junio del 2022	El/La señor(a) Teresa Santana Peralta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A - 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 101 Etelvina Lobo Cuello	24 junio del 2022	El/La señor(a) Etelvina Lobo Cuello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 102 Maria Gonzalez	24 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 16 - lote .	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 103 Elena Perez Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 104 Edith Quintero	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 31 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 105 Edilma Gonzalez	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C 53.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 106 Karen Campo Cruz	27 junio del 2022	El/La señor(a) Karen Campo Cruz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16c 46B - 69.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 107 Libia Solar Orozco	27 junio del 2022	El/La señor(a) Libia Solar Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 108 Irma Baquero Fuentes	27 junio del 2022	El/La señor(a) Irma Baquero Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 -19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 109 Yuliet Perez Mendoza	27 junio del 2022	El/La señor(a) Yuliet Perez Mendoza solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 - 16C - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 110 Ibeth Vergara	29 junio del 2022	El/La señor(a) Ibeth Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 19A - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 111 Josefa Lazo Solano	29 junio del 2022	El/La señor(a) Josefa Lazo Solano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 112 Grisela Videz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Grisela Videz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 113 Juan Velazquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 60.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 114 Inogenes Carmona	29 junio del 2022	El/La señor(a) Inogenes Carmona solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46C - 52.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 115 Jesus Beltran Franco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jesus Beltran Franco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16B 46A - 51.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 116 Marina Benitez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marina Benitez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 117 Jorge Hoyos Otero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Hoyos Otero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 118 Yasmira Tovar Aguas	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yasmira Tovar Aguas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 119 Yerlis Salas Tovar	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Salas Tovar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 120 Jose Peñate Orozco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Peñate Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 121 Jorge Petro	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Petro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C 66.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 122 Francisco Romero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Francisco Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46 - 37.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 123 Luz Pajaro Garcia	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pajaro Garcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 55.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 124 Marlenis Delgado	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenis Delgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 125 Miguel Galindo	28 junio del 2022	El/La señor(a) Miguel Galindo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 126 Rubiela Gonzalez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Rubiela Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 48 B - 81.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 127 Norelis Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 55 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 128 Nohelia Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Nohelia Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 6 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 129 Esmeralda Marquez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Esmeralda Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 130 Gil Blanco Yubis	28 junio del 2022	El/La señor(a) Gil Blanco Yubis solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 23.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 32

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **28/11/2022** al **4/12/2022** Fecha **5/12/2022**

Inclusión	No. de PQR 131 Adis Arias Carvajal	29 junio del 2022	El/La señor(a) Adis Arias Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 76.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 132 Jaime Galindo Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime Galindo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 54.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 133 Luisa Noriega Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luisa Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 134 Silvia Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Silvia Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 135 Vianey Pelaez Vasquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Vianey Pelaez Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 145C - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 136 Yalitza Meza Montes	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yalitza Meza Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 137 Fredy Florian Pornefz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Fredy Florian Pornefz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 138 Segundo Novoa	29 junio del 2022	El/La señor(a) Segundo Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 35 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 139 Eduardo de Hoyo	29 junio del 2022	El/La señor(a) Eduardo de Hoyo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 140 Nohemi Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Nohemi Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 49.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 141 Yeline Molina Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeline Molina Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 45 - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 142 Yeison Ozuna Jimenez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeison Ozuna Jimenez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 11 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 143 Henry Contrera Rios	30 junio del 2022	El/La señor(a) Henry Contrera Rios solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 04.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 144 Dorys Yepez Suarez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dorys Yepez Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17D 45 - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 145 Jaime de Avila Syago	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime de Avila Syago solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 146 Hernando Trujillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Hernando Trujillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 147 Karina Marrugo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karina Marrugo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 148 Elisena Solar Orrozco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elisena Solar Orrozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 149 Bilma Salgado	30 junio del 2022	El/La señor(a) Bilma Salgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45B - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 150 Luz Fernandez Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Fernandez Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 151 Keider Avilez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keider Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 152 Rafael Bertel Bertel	30 junio del 2022	El/La señor(a) Rafael Bertel Bertel solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 153 Luz Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 43 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 154 Karol Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karol Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B - 136.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 155 Pabla Teran Romerin	30 junio del 2022	El/La señor(a) Pabla Teran Romerin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16H 45 - 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 156 Yadira Basilio Castillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yadira Basilio Castillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46a - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 157 Marqueza Padilla	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marqueza Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 36 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 158 Ruth Perez Perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ruth Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 159 Jose Carey Julio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Carey Julio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 160 Maria Manjarrez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Manjarrez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 161 Marleidis Bolaño	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marleidis Bolaño solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 162 Luis Manuel Murillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Manuel Murillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 163 Juan Perez Muslaco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Perez Muslaco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46A - 99.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 164 Keila Marquez Acosta	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keila Marquez Acosta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 33 - Lote 3A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 165 Nalfis Marquez David	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nalfis Marquez David solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 166 Yorlenis Tapia Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yorlenis Tapia Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 167 Ana Maria Tamara Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Maria Tamara Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 168 Elkin Zabala Vasquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elkin Zabala Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 169 Eder Hurtado Carpio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Eder Hurtado Carpio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 170 Dionicio Nieto	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dionicio Nieto solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 8 - Lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 171 Nerys Cruz Peña	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nerys Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 172 Consuelo Florez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Consuelo Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 173 Yonadis Tapias	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yonadis Tapias solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 16 - Lote 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 174 Jose Banquet perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Banquet perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 34 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 175 Alma Almentero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alma Almentero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 176 Luz Estela Escorcia	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Estela Escorcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 A 45A - 58.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 177 Celia Vega Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Celia Vega Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 136 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 178 Norelis Ortiz Rodelo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Ortiz Rodelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 179 Luis Julio Romero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Julio Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 48 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 180 Carmelina Gomez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Carmelina Gomez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 64 - Lote 29A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 181 Yerlis Muñoz	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Muñoz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17H 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 182 Andry Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Andry Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16E 46 - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 183 Emid Vega Bula	30 junio del 2022	El/La señor(a) Emid Vega Bula solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 184 Jhon Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jhon Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45C - 07.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 185 Alfonso Dieteben Ortega	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alfonso Dieteben Ortega solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 114.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 186 Luis Rosario Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Rosario Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 47 - 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 187 Frank Martinez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Frank Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16G 48A - 111.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 188 Ana Delgado Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Delgado Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 189 Ana Sofia Beltran	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Sofia Beltran solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45A 16G - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 32

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **28/11/2022** al **4/12/2022** Fecha **5/12/2022**

Inclusión	No. de PQR 190 Etilsa Suarez Ciprian	30 junio del 2022	El/La señor(a) Etilsa Suarez Ciprian solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45C - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
Atraso en las actividades de ejecución de obra	Plan de contingencia	*El Contratista mediante carta CONS-TUR-SINC-045 del día 17 de junio de 2022, remitió el plan de contingencia donde se comprometió a nivelar las actividades de los diagnósticos el día 30 de junio de 2022. Respecto a las actividades de ejecución, el Contratista de obra presenta un plan de trabajo en el cual informa que se nivelará con la programación a más tardar el día 14 de julio de 2022. * De acuerdo con la reunión el día 30 de junio de 2022 en conjunto con ENTerritorio, Interventoría y Contratista de Obra, en donde se llegó a un acuerdo de realizar una actualización al plan de contingencia inicial entregada por el Consorcio Turquía, dándole respuesta al informe de seguimiento de documento entregado con la comunicación de interventoría GA-DOMI-071-22. Conforme a esto, el día 02 de julio de 2022 con carta CONS-TUR-SINC-054 el contratista de obra entregó la actualización del plan de contingencia conforme a las situaciones presentadas en las dos últimas semanas. * De acuerdo con el atraso reportado y teniendo en cuenta que el Plan de Contingencia presentado por el Contratista de Obra mediante la comunicación CONS-TUR-SINC-045 del día 17 de junio de 2022 y CONS-TUR-SINC-054 del día 02 de julio de 2022 y en vista que esta Interventoría no evidencia mejoras en los rendimientos de la ejecución de las actividades del contrato y avances por parte del contratista, se realizó reunión, el día 26 de julio de 2022 con los Representantes Legales del Consorcio Turquía, Interventoría y Supervisor de ENTerritorio, con el fin de revisar los avances del contratista de obra en la ejecución de la obra y la capacidad que cuenta de apertura, terminación y entrega de viviendas que permitan la nivelación del cronograma de obra y la Entidad realizó la solicitud a Interventoría de iniciar el proceso de presunto incumplimiento por el atraso reportado. * Conforme a lo solicitado por la Entidad y en vista que esta Interventoría no evidenció mejoras en los rendimientos de la ejecución de las actividades del contrato y avances por parte del contratista, se recomendó a la Entidad contratante con carta GA-DOMI-106-22 del día 04 de agosto de 2022 radicado N°. 20224300293272 llevar a cabo los trámites administrativos correspondientes conforme la cláusula 16 PENAL DE APREMIO, teniendo en cuenta el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales. * El día 31 de octubre de 2022 se remitió carta GA-DOMI-187-22 con destino a la Entidad (ENTerritorio) con número de radicado 20224300416252, en la cual se le recomienda a la Entidad contratante llevar a cabo los trámites administrativos correspondientes conforme a la cláusula 16 penal de apremio del contrato N°. 2220577 de 2022, teniendo en cuenta el no cumplimiento de las obligaciones contractuales. Una vez realizado el análisis por esta Interventoría a las pretensiones del Consorcio Turquía, se procedió a emitir concepto, mediante la comunicación GA-DOMI-217-22 del día 22 de noviembre de 2022 radicado No. 20224300453802, mencionado que se ve viable la propuesta de la solicitud de prórroga por un término de tres (3) meses para la subsanación del atraso de las actividades de obra, mediante un plan de trabajo que permite dar cumplimiento con el objeto contractual, ya que las metas fijadas en dicho documento están acorde con los rendimientos actuales de ejecución de las obras. Es de anotar	Consorcio Turquía	Plan de contingencia carta CONS-TUR-SINC-045 Actualización Plan de Contingencia GA-DOMI-071-22	17/06/2022
Mal estado de vías de acceso.	Solicitud adecuación de vías por parte de Alcaldía.	* Teniendo en cuenta la reunión realizada el día 31 de mayo de 2022 se concertó con la Alcaldía, a través del Ministerio de Vivienda, la disponibilidad de la maquinaria para llevar a cabo las adecuaciones de las vías de acceso al barrio El Poblado.	Alcaldía Sincelejo	El 22 de junio 2022 hizo presencia la maquinaria de la Alcaldía de Sincelejo para el inicio de las adecuaciones en la carrera 16 I con	22/06/2022
Contrato de acueducto	Coordinación entre contratos	El Contratista realizó los acercamientos pertinentes, no obstante a la fecha no se ha definido el fecha de inicio y fin de intervención de la vía 16 J	Alcaldía Sincelejo	N/A	N/A

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA





INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 32

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **28/11/2022** al **4/12/2022** Fecha **5/12/2022**





9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

* El Consorcio Turquía continuó con la Actividad 2 en las visitas de los diagnósticos de las viviendas objeto del programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en el barrio El Poblado, por lo tanto, a la fecha de corte del presente informe semanal se tiene aprobado seiscientos treinta y dos (632) diagnósticos acumulados.

* De acuerdo con las diferentes reuniones sostenidas con el Contratista e Interventoría para la revisión de la Matriz Inicial, se realizó el balance de los posibles beneficiarios del programa de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Sincelejo - Sucre, en contraste con los recorridos de verificación en campo, plano del barrio El Poblado de caracterización de zonas de riesgo y los diferentes informes emitidos por el FOVIS, se obtuvo un potencial neto de 644 viviendas efectivas, 46 no efectivas y 3 renuncias, tal y como se muestra a continuación:

Viviendas efectivas: 644
Viviendas diagnóstico aprobado: 632
Viviendas con observaciones de diagnóstico: 12
Viviendas no efectivas: 46
Renuncias: 3
Viviendas Pendientes por diagnosticar: 12
Viviendas terminadas: 344
Viviendas en ejecución: 71
Viviendas iniciadas: 415

* Para la Actividad 3 se han iniciado un total de cuatrocientos quince (415) viviendas, de las cuales trescientos cuarenta y cuatro (344) están terminadas, setenta y uno (71) en ejecución. En las viviendas aperturadas en la semana, se realizaron actividades de verificación de medidas, demarcaciones de zonas de excavaciones, figurado de acero, fundida de cimentaciones, columnas, machones, y el levante de muros.

* Con respecto a la Actividad 4, se han recibido ciento noventa (190) solicitudes de inclusiones, de las cuales ciento cinco (105) han sido avaladas por la Alcaldía de Sincelejo, ochenta y cuatro (84) no fueron aprobadas y una (01) en la cual el FOVIS no dio una respuesta clara de aprobación. Se continuará con las visitas vivienda a vivienda así como reuniones sectorizadas para dar a conocer a los potenciales beneficiarios toda la información referente a este proyecto.

* Conforme lo anterior, en la presente semana se tiene un porcentaje ejecutado acumulado de 56,01% y un porcentaje programado acumulado de 98,73% lo cual representa un atraso de 42,72% en las actividades de ejecución del Programa de Conexión Intradomiciliaria, sin embargo, esta Interventoría aclara que por factores climáticos, estado de las vías de acceso al barrio El Poblado para el acarreo de los materiales de obra a cada una de las viviendas en ejecución y orden público ocasionado por grupos al margen de Ley, se presentaron pérdidas en tiempo que impidió la adecuada ejecución de las actividades programadas, por lo tanto, al realizar el análisis de incidencia según el seguimiento a dichos inconvenientes se estableció que el porcentaje no imputable al Consorcio Turquía es de 10,25% y el restante 32,48% si son responsabilidad del contratista de obra.

Una vez realizado el análisis por esta Interventoría a las pretensiones del Consorcio Turquía, se procedió a emitir concepto, mediante la comunicación GA-DOMI-217-22 del día 22 de noviembre de 2022 radicado No. 20224300453802, mencionado que se ve viable la propuesta de la solicitud de prórroga por un término de tres (3) meses para la subsanación del atraso de las actividades de obra, mediante un plan de trabajo que permite dar cumplimiento con el objeto contractual, ya que las metas fijadas en dicho documento están acorde con los rendimientos actuales de ejecución de las obras. Es de anotar que los costos de interventoría por el tiempo adicional ascienden a $150.702.084, los cuales serán asumidos por el contratista de obra.

Así mismo, el día 25 de noviembre de 2022 se reanudo la audiencia de incumplimiento por el atraso de las obras a cargo del Consorcio Turquía, en donde se informó que se tramito ante ENTerritorio el plan de trabajo y la solicitud de prórroga de los contratos de obra e Interventoría, de acuerdo a los compromisos fijados en reuniones previas.

A corte del presente informe semanal la Entidad se encuentra realizando la revisión jurídica y técnica de la solicitud de prórroga del contrato de obra y de adición y prorroga de interventoría por el término de tres (3) meses, mas sin embargo el plazo contractualmente establecido se agota el día 13 de diciembre de 2022, de no proceder con la suscripción del trámite administrativo.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	Firma	Firma
Nombre EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Nombre HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Nombre
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Profesional Costos y Presupuesto <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Bogotá D.C, 15 de diciembre de 2022

Señor
JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
Supervisor
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio
Calle 26 N°. 13-19
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría N°. 2220585 "Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre"**

Asunto: **Remisión Informe Semanal No. 34 periodo del 05 de diciembre de 2022 al 11 de diciembre de 2022**

Apreciado señor,

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, anexo, se remite el informe semanal de Interventoría No. 34 del contrato de la referencia para el período comprendido entre el 05 de diciembre de 2022 al 11 de diciembre de 2022.

Anexo se remite como soporte al Informe Semanal N°. 34; bitácora de obra, Lista de chequeo seguimiento estado de salud de Interventoría y Obra, Acta de seguimiento, Acta de comité de aprobación de diagnóstico, Informe social, Estado del clima en la semana reporte IDEAM, Resumen de avance y Matriz Tres Momentos.

Cordialmente,

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial FECHA 15/12/2022 HORA: 2:33:51 p. m.
20224300493492

EDGAR ALFONSO ARAGÓN OTERO
Director de Interventoría
Anexos: Lo enunciado en treinta y ocho (38) folios y archivos en magnético.
C.C.: Ing. Juan David Amón – Supervisor del contrato Convenio Inter administrativo 221005; Enterritorio.
Archivo.
Elaboró: MJ.
Revisó: EAO.

INFORME SEMANAL

Cra. 48 No. 101A – 29 Bogotá, Colombia Tel: (57 1) 236 7974 – 621 5383
E-mail: info@gavinco.com www.gavinco.com

enterritorio	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 34

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **5/12/2022** al **11/12/2022** | Fecha **12/12/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

código PROYECTO	2220577		
OBJETO DEL PROYECTO	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO**	SUCRE	**MUNICIPIO** SINCELEJO
GERENCIA A CARGO	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1		
SUPERVISOR	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ		
ESTADO DEL PROYECTO	En ejecución.		

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220577		
Contratista	CONSORCIO TURQUIA		
Valor inicial	$ 5.034.941.972,00		
Valor actual	$ 5.034.941.972,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial (Días)	244 Días		
Plazo actual (Días)	244 Días		100,00%
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	13/12/2022		
Tiempo Transcurrido (días)	239		97,95%
Días remanentes del Contrato	1		0,41%
Acumulado a última acta pagada	$ 2.820.263.489,10		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

2.2 CONTRATO DE Interventoría

Contrato No.	2220585		
Interventor	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.		
Valor inicial	$ 542.723.071,00		
Valor actual	$ 542.723.071,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial	244 Días		
Plazo actual	244 Días		100,00%
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	13/12/2022		
Ejecución del Contrato	239		97,95%
Días remanentes del Contrato	1		0,41%
Acumulado a última acta pagada	$ 339.826.050,90		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPENO


Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 5.034.941.972,00

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 4.971.178.581,51	98,73%	$ 2.820.070.998,52	56,01%	$ 2.151.107.582,99	-42,72%
Durante el Periodo	$ 14.665.579,81	0,29%	$ 280.598.267,79	5,57%	$ 265.932.687,97	5,28%
Acumulado a la Fecha	**$ 4.985.844.161,32**	**99,02%**	**$ 3.100.669.266,31**	**61,58%**	**-$ 1.885.174.895,01**	**-37,44%**

Desviación en días: -91 Días

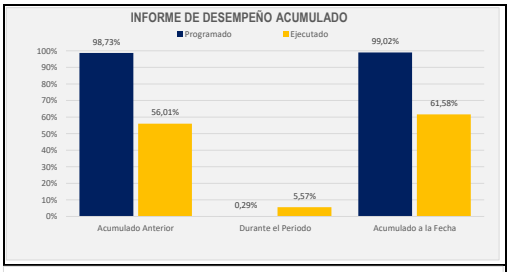

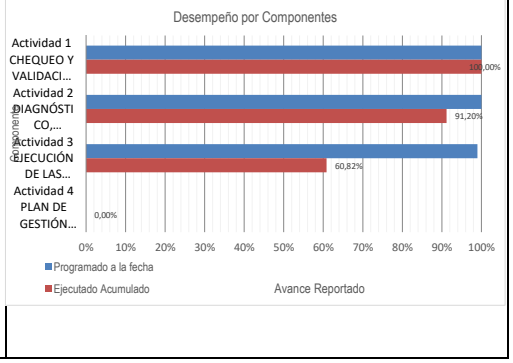

Observaciones al desempeño del proyecto


** **Actividad 1.** Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquia. Aprobado por interventoria con cartas GA-DOMI-040-22 del dia 31 de mayo de 2022 y radicado en ENTERRITORIO bajo el N°. 20224300206752 y GA-DOMI-030-22 radicado N°. 20224300189742.*

** **Actividad 2.** Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoría, por el Contratista de obra, un total de 64 4 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 632 diagnósticos acumulados. Hay 46 diagnósticos no efectivos y Tres (3) renuncias.*

** **Actividad 3.** A corte de este informe el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 416 viviendas, de las cuales 414 están terminadas, 2 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 216 para inicio de actividades.*

** **Actividad 4.** Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas, y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.*

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

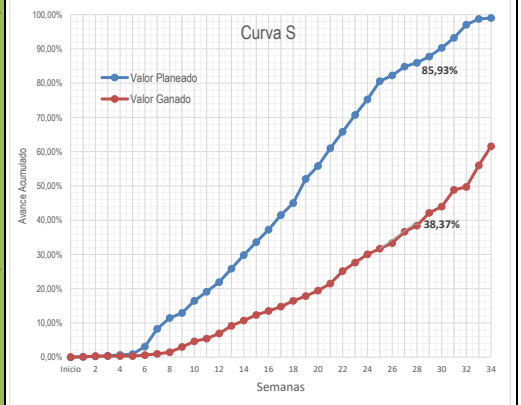

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE


DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

Se ajusta la curva S del proyecto conforme a la capacitación dada el 28 de abril de 2022 por parte del supervisor de ENTERRITORIO

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	98,73%	56,01%	-42,72%	
Durante el Periodo	0,29%	5,57%	5,28%	
Acumulado a la Fecha	**99,02%**	**61,58%**	**-37,44%**	

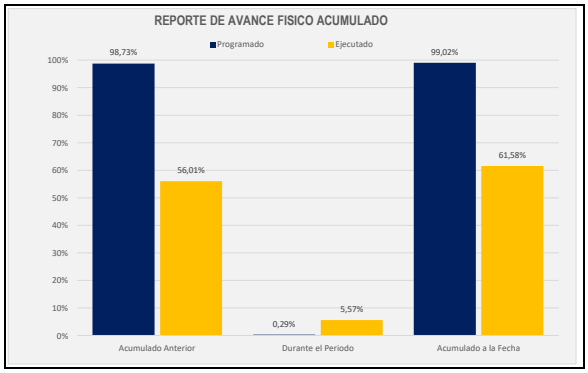


AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 5.034.941.972,00	$ 5.034.941.972,00	$ -	$ 981.956.213,60	$ 841.887.956,54	$ 140.068.257,06

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
6	$ 2.820.263.489,10	56,01%	5	$ 2.050.349.690,38	40,72%	9/11/2022	$ 455.490.237,16







AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 542.723.071,00	$ 542.723.071,00	$ -	N/A	N/A	N/A

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
8	$ 339.826.050,90	62,61%	7	$ 285.336.654,58	52,58%	24/11/2022	$ 69.495.689,24







INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 34

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **5/12/2022** al **11/12/2022** Fecha **12/12/2022**

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA APROBADO.

* Actividad 1. Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, se presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía.

* Actividad 2. Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoría, por el Contratista de obra, un total de 644 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 632 diagnósticos acumulados. Interventoría emitió observaciones a un total de 7 diagnósticos mediante la comunicación GA-DOMI-216-22 del día 21 de noviembre de 2022. Está pendiente de entrega 12 diagnósticos los cuales son predios que no se han diagnosticado por el contratista de obra. De acuerdo al informe técnico entregado por el FOVIS de las manzanas 40A, 38A Y 38, hay once (11) diagnósticos que pasarían a ser no efectivos ya que las viviendas se encuentran en zona de riesgo, por lo tanto, el total de diagnósticos no efectivos se eleva a 46 y tres (3) renuncias.

* Actividad 3. A corte de este informe, el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 416 viviendas, de las cuales 414 están terminadas, 2 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 227 para inicio de actividades.

* Actividad 4. Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE CONTINGENCIA

Actividad 2.	**Actividad 3.**
Diagnósticos programación inicial: 693	Viviendas programación inicial: 693
Diagnósticos programados acumulados Plan de Contingencia: 693	Viviendas programadas acumuladas Plan de Contingencia: 693
Diagnósticos Aprobados acumulados: 632	Viviendas terminadas: 414
Se evidenció una diferencia en 63 diagnósticos por debajo a la meta establecida.	Viviendas en ejecución: 2
Viviendas con observaciones de diagnóstico: 7	Viviendas totales iniciadas: 416
Viviendas efectivas: 644	
Viviendas no efectivas: 46	
Renuncias: 3	
Viviendas Pendientes por diagnosticar: 12	

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

• Se remitió al contratista de obra la carta GA-DOMI-231-22 del día 06 de diciembre de 2022, donde se procedió a informar acerca de la aprobación del informe mensual 8 de obra correspondiente al periodo comprendido del 01 de noviembre de 22 al 30 de noviembre del 22.

• Mediante la comunicación GA-DOMI-232-22del día 06 de diciembre del año en curso, con radicado 20224300472342dirigido a enterritorio, se procedió a realizar la presentación del informe semanal número 33 de interventoría, correspondiente al periodo comprendido del 28 de noviembre de 2022 al 04 de Diciembre de 2022.

• Mediante la comunicación GA-DOMI-233-22del día 07 de diciembre del año en curso, con radicado 20224300472342dirigido a enterritorio, se procedió a realizar la presentación del informe mensual 08 de interventoría, correspondiente al periodo del 01 de noviembre de 2022 al 30 de noviembre de 2022

ACTIVIDADES EN CAMPO

* El día 05 de diciembre de 2022 el Consorcio Turquía continuó con las actividades de levante de muros, excavación para zapatas, fundida de registros sanitarios y suministro de materiales. No se realizaron aperturas.

* El día 06 de diciembre de 2022, el contratista de obra continuó con las actividades de fundida de registros sanitarios, instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros, fundida de machones y columnas, instalación de enchape y aparatos sanitarios.

* El día 07 de diciembre de 2022, el contratista continuó con las actividades de instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención, instalación de enchape, pintura y atendiendo detalles de la casetas terminadas. El 07 de diciembre de 2022 no se realizaron aperturas.

* El día 09 de diciembre de 2022, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. Para el día de hoy en horas de la tarde se realizó el comité de seguimiento en donde se cuenta con la presencia de la entidad contratante, contratista e interventoría. Para el día de hoy no se realizaron aperturas.

* El día 10 de diciembre de 2022 se continuó con las actividades de obra como levante de muros, excavación de cimentaciones, fundida de machones, fundida de plantilla, armado del acero para las columnas y vigas. Por otra parte también se realizó un recorrido con la veeduría, interventoría y contratista, con el fin de verificar el estado de las viviendas entregadas.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

* Se continuará con la intervención de las viviendas en el barrio El Poblado en Sincelejo Sucre.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	149	0	149	71,6%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	35	0	35	16,8%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	8	0	8	3,8%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál? Orden público	16	0	16	7,7%
	Total	**208**	**0**	**208**	**100,00%**



En la semana no se presentaron lluvias.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
Tipología PQR	Radicado por		Fecha	Asunto	Dirigido a	Respuesta Alcaldía / FOVIS
Inclusión	No. de PQR 1 Yessica Cantello		20 mayo del 2022	El/La señor(a) Yessica Cantello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 2 Betilda Gonzales		25 mayo del 2022	El/La señor(a) Betilda Gonzales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 40 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 3 Luz Dary Ruiz		25 mayo del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 4 Jorge Guerra Arrieta		25 mayo del 2022	El/La señor(a) Jorge Guerra Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45a 16j - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 5 Emir Elias Pren M		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Emir Elias Pren M solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 15 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 6 Andrea Beltran Vides		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Andrea Beltran Vides solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 4 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 7 Jader Perez Molina		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Jader Perez Molina solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17e 45 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 8 Oscar Gamarro		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Oscar Gamarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 50 - lote 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 9 Manuel Mercado A		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Manuel Mercado A solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17d 45 -06.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 10 Humberto Atencia Sierra		27 mayo del 2022	El/La señor(a) Humberto Atencia Sierra solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 62 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 11 Erika Blanco		27 mayo del 2022	El/La señor(a) Erika Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	El contratista reliza el cierre d ela solicitud teniendo en cuenta el concepto del FOVIS.
Inclusión	No. de PQR 12 Yuris Paola Suarez		31 mayo del 2022	El/La señor(a) Yuris Paola Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 38 lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	zona de riesgo.El predio tiene un area dentro de la vivienda que presenta
Inclusión	No. de PQR 13 Katerine Benitez Villalba		31 mayo del 2022	El/La señor(a) Katerine Benitez Villalba solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 50 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 14 Jose Joaquin Florez		31 mayo del 2022	El/La señor(a) Jose Joaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 15 Ana Isabel Florez		31 mayo del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 16 Marileys Molina Alvarado		01 junio del 2022	El/La señor(a) Marileys Molina Alvarado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 17 Jeraldine Yepe Lasmar		01 junio del 2022	El/La señor(a) Jeraldine Yepe Lasmar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 18 Enna Maria Lamar		01 junio del 2022	El/La señor(a) Enna Maria Lamar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 34

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **5/12/2022** al **11/12/2022** Fecha **12/12/2022**

Inclusión	No. de PQR 19 Nauded Alvarez Maurez	02 junio del 2022	El/La señor(a) Nauded Alvarez Maurez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 20 Henoc Jose Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Henoc Jose Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 F 45- 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 21 Brenda Galvan Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Brenda Galvan Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 61 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 22 Sindy Rodriguez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Sindy Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 23 Luz Dary Martinez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 24 Jose Juaquin Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Juaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 25 Ana Milena Vergara	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Milena Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 20 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 26 Maria Alejandra Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Alejandra Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 27 Oswaldo jimenez Ramirez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Oswaldo jimenez Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 28 Hernan Jimenez Marin	06 junio del 2022	El/La señor(a) Hernan Jimenez Marin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 14 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 29 Carmen Carpintero	06 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 30 Ana Isabel Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	Cabe aclarar que la PQR # 30 se recepcionó dos veces, a nombre de la
Inclusión	No. de PQR 31 Edilma Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 45 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 32 Silvio David Morelo	06 junio del 2022	El/La señor(a) Silvio David Morelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 57 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 33 Norelis Zabaleta	06 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Zabaleta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 59 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 34 Darin Blanco Fuentes	6 junio del 2022	El/La señor(a) Darin Blanco Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	definir con planeacion si esta en zona de riesgo.
Inclusión	No. de PQR 35 Deivi Jose Miranda	8 junio del 2022	El/La señor(a) Deivi Jose Miranda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 36 Gertrudis Lopez Herazo	8 junio del 2022	El/La señor(a) Gertrudis Lopez Herazo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 37 Sandra Cruz Peña	10 junio del 2022	El/La señor(a) Sandra Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 73.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 38 Gina Salcedo Ruiz	10 junio del 2022	El/La señor(a) Gina Salcedo Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 39 Yesica Cabrera Lora	10 junio del 2022	El/La señor(a) Yesica Cabrera Lora solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 40 Walter Arrieta	10 junio del 2022	El/La señor(a) Walter Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 41 Ana Luisa Contreras	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Luisa Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 32.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 42 Andres Bruno Benavidez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Bruno Benavidez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 43 Bertina Montes	15 junio del 2022	El/La señor(a) Bertina Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 39 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 44 Emistocle Bertel Avila	15 junio del 2022	El/La señor(a) Emistocle Bertel Avila solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 14.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 45 Griseida Arrieta Betin	15 junio del 2022	El/La señor(a) Griseida Arrieta Betin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 53 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 46 Nadin Carvajal	15 junio del 2022	El/La señor(a) Nadin Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 47 Carmen Carpintero	15 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 48 Martha Regino Herrera	15 junio del 2022	El/La señor(a) Martha Regino Herrera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 2 - lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 49 Blanca Avilez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Blanca Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 50 Luz Marina Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Marina Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 51 Gabriel Julio Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Julio Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 43 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 52 Luis rodriguez Rivero	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luis rodriguez Rivero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 53 Maria Monroy	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Monroy solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 54 Dani Velazquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Dani Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 55 Edith Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 9.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 56 Maryiris Navarro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maryiris Navarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 57 Santiago Troncoso Reyes	16 junio del 2022	El/La señor(a) Santiago Troncoso Reyes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45A - 157.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 58 Milagro Niebles Castro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Milagro Niebles Castro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 28 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 59 Elena Peña Pineda	16 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Peña Pineda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 60 Ever Luis Marquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ever Luis Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 121.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 61 Ramona Rosa Diaz	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ramona Rosa Diaz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 42 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 62 Andres Murillo Perez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 54 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 63 Heriberto Fernandez Lopez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Heriberto Fernandez Lopez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 17A 45B 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 64 Gabriel Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16I 45C 74.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 65 Denys Herrera Alvarez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Denys Herrera Alvarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 66 Alicia Conde Morales	16 junio del 2022	El/La señor(a) Alicia Conde Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45 A 65.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 67 Gregoria Marzan Solar	17 junio del 2022	El/La señor(a) Gregoria Marzan Solar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 01.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 68 Lina Martinez Zuñiga	17 junio del 2022	El/La señor(a) Lina Martinez Zuñiga solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 69 Carmerlo Castro Novoa	17 junio del 2022	El/La señor(a) Carmerlo Castro Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 48 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 70 Nicolasa Padilla	17 junio del 2022	El/La señor(a) Nicolasa Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 20A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 71 Jose Miguel Lopez Bravo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Miguel Lopez Bravo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 20.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 72 Vicente Villamizar Campo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Vicente Villamizar Campo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 73 Ely Causil Martinez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Ely Causil Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 74 Padro Ramos	17 junio del 2022	El/La señor(a) Padro Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 75 Dagoberto Mendoza Mercado	17 junio del 2022	El/La señor(a) Dagoberto Mendoza Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	PRESENTA RIESGO POR DESLIZAMIENTO , NO CUMPLE CON
Inclusión	No. de PQR 76 Iris Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 77 Maria Carlota Menco	17 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Carlota Menco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 34

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **5/12/2022** al **11/12/2022** Fecha **12/12/2022**

Inclusión	No. de PQR 78 Iris Murillo Perez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 79 Edilsa Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Edilsa Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 80 Alejandra Loaiza Corrales	17 junio del 2022	El/La señor(a) Alejandra Loaiza Corrales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 29 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 81 Grey Montes Rodriguez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Grey Montes Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 82 Marlenys arroyo Quintero	21 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenys arroyo Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 83 Rodolfo Gonzalez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Rodolfo Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 41 - lote 38.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 84 Elida Pinto Morales	21 junio del 2022	El/La señor(a) Elida Pinto Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 85 Nelfi Calle Mejia	21 junio del 2022	El/La señor(a) Nelfi Calle Mejia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 86 Jorge Ramos Osorio	21 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Ramos Osorio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 87 Manuel Solano Almario	21 junio del 2022	El/La señor(a) Manuel Solano Almario solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 88 Carmen Perez Contreras	21 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Perez Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 89 Estefany Buelvas	21 junio del 2022	El/La señor(a) Estefany Buelvas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 22 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 90 Omaida Villadiego	22 junio de(2022	El/La señor(a) Omaida Villadiego solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 41.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 91 Rosa Isabel Alba Llanares	22 junio de(2022	El/La señor(a) Rosa Isabel Alba Llanares solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 92 Carmen Arroyo Ramos	22 junio de(2022	El/La señor(a) Carmen Arroyo Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 28.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 93 Alvaro Macea Rivera	22 junio de(2022	El/La señor(a) Alvaro Macea Rivera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 12 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 94 Maria Quiroz Goez	23 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Quiroz Goez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrea 17f 45B - 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 95 Luis Alberto Quiroz	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Alberto Quiroz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 64 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 96 Aracelis Zuñiga Salcedo	23 junio del 2022	El/La señor(a) Aracelis Zuñiga Salcedo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 59.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 97 Luz Velazquez Villareal	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Velazquez Villareal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 98 Luis Felipe Galeano	24 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Felipe Galeano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 99 Rosalba Barragan Barbosa	24 junio del 2022	El/La señor(a) Rosalba Barragan Barbosa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 100 Teresa Santana Peralta	24 junio del 2022	El/La señor(a) Teresa Santana Peralta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A - 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 101 Etelvina Lobo Cuello	24 junio del 2022	El/La señor(a) Etelvina Lobo Cuello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 102 Maria Gonzalez	24 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 16 - lote .	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 103 Elena Perez Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 104 Edith Quintero	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 31 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 105 Edilma Gonzalez	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C 53.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 106 Karen Campo Cruz	27 junio del 2022	El/La señor(a) Karen Campo Cruz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16c 46B - 69.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 107 Libia Solar Orozco	27 junio del 2022	El/La señor(a) Libia Solar Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B .47 - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 108 Irma Baquero Fuentes	27 junio del 2022	El/La señor(a) Irma Baquero Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 -19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 109 Yuliet Perez Mendoza	27 junio del 2022	El/La señor(a) Yuliet Perez Mendoza solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 - 16C - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 110 Ibeth Vergara	29 junio del 2022	El/La señor(a) Ibeth Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 19A - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 111 Josefa Lazo Solano	29 junio del 2022	El/La señor(a) Josefa Lazo Solano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 112 Grisela Videz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Grisela Videz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 113 Juan Velazquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 60.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 114 Inogenes Carmona	29 junio del 2022	El/La señor(a) Inogenes Carmona solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46C - 52.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 115 Jesus Beltran Franco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jesus Beltran Franco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16B 46A - 51.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 116 Marina Benitez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marina Benitez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 117 Jorge Hoyos Otero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Hoyos Otero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 118 Yasmira Tovar Aguas	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yasmira Tovar Aguas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 119 Yerlis Salas Tovar	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Salas Tovar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 120 Jose Peñate Orozco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Peñate Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 121 Jorge Petro	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Petro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C 66.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 122 Francisco Romero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Francisco Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46 - 37.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 123 Luz Pajaro Garcia	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pajaro Garcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 55.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 124 Marlenis Delgado	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenis Delgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 125 Miguel Galindo	28 junio del 2022	El/La señor(a) Miguel Galindo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 126 Rubiela Gonzalez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Rubiela Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 48 B - 81.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 127 Norelis Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 55 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 128 Nohelia Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Nohelia Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 6 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 129 Esmeralda Marquez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Esmeralda Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 130 Gil Blanco Yubis	28 junio del 2022	El/La señor(a) Gil Blanco Yubis solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 23.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 131 Adis Arias Carvajal	29 junio del 2022	El/La señor(a) Adis Arias Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 76.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 132 Jaime Galindo Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime Galindo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 54.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 133 Luisa Noriega Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luisa Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 134 Silvia Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Silvia Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 135 Vianey Pelaez Vasquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Vianey Pelaez Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 145C - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 136 Yalitza Meza Montes	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yalitza Meza Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 34

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **5/12/2022** al **11/12/2022** Fecha **12/12/2022**

Inclusión	No. de PQR 137 Fredy Florian Pornnefz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Fredy Florian Pornnefz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 138 Segundo Novoa	29 junio del 2022	El/La señor(a) Segundo Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 35 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 139 Eduardo de Hoyo	29 junio del 2022	El/La señor(a) Eduardo de Hoyo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 140 Nohemi Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Nohemi Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 49.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 141 Yeline Molina Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeline Molina Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 45 - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 142 Yeison Ozuna Jimenez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeison Ozuna Jimenez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 11 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 143 Henry Contrera Rios	30 junio del 2022	El/La señor(a) Henry Contrera Rios solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 04.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 144 Dorys Yepez Suarez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dorys Yepez Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17D 45 - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 145 Jaime de Avila Syago	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime de Avila Syago solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 146 Hernando Trujillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Hernando Trujillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 147 Karina Marrugo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karina Marrugo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 148 Elisena Solar Orrozco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elisena Solar Orrozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 149 Bilma Salgado	30 junio del 2022	El/La señor(a) Bilma Salgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45B - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 150 Luz Fernandez Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Fernandez Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 151 Keider Avilez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keider Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 152 Rafael Bertel Bertel	30 junio del 2022	El/La señor(a) Rafael Bertel Bertel solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 153 Luz Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 43 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 154 Karol Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karol Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B - 136.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 155 Pabla Teran Romerin	30 junio del 2022	El/La señor(a) Pabla Teran Romerin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16H 45 - 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 156 Yadira Basilio Castillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yadira Basilio Castillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46a - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 157 Marqueza Padilla	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marqueza Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 36 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 158 Ruth Perez Perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ruth Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 159 Jose Carey Julio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Carey Julio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 160 Maria Manjarrez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Manjarrez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 161 Marleidis Bolaño	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marleidis Bolaño solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 162 Luis Manuel Murillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Manuel Murillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 163 Juan Perez Muslaco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Perez Muslaco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46A - 99.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 164 Keila Marquez Acosta	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keila Marquez Acosta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 33 - Lote 3A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 165 Nalfis Marquez David	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nalfis Marquez David solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 166 Yorlenis Tapia Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yorlenis Tapia Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 167 Ana Maria Tamara Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Maria Tamara Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 168 Elkin Zabala Vasquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elkin Zabala Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 169 Eder Hurtado Carpio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Eder Hurtado Carpio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 170 Dionicio Nieto	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dionicio Nieto solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 8 - Lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 171 Nerys Cruz Peña	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nerys Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 172 Consuelo Florez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Consuelo Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 173 Yonadis Tapias	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yonadis Tapias solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 16 - Lote 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 174 Jose Banquet perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Banquet perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 34 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 175 Alma Almentero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alma Almentero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 176 Luz Estela Escorcia	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Estela Escorcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 A 45A - 58.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 177 Celia Vega Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Celia Vega Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 136 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 178 Norelis Ortiz Rodelo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Ortiz Rodelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 179 Luis Julio Romero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Julio Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 48 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 180 Carmelina Gomez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Carmelina Gomez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 64 - Lote 29A .	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 181 Yerlis Muñoz	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Muñoz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17H 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 182 Andry Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Andry Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16E 46 - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 183 Emid Vega Bula	30 junio del 2022	El/La señor(a) Emid Vega Bula solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 184 Jhon Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jhon Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45C - 07.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 185 Alfonso Dieteben Ortega	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alfonso Dieteben Ortega solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 114.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 186 Luis Rosario Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Rosario Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 47 - 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 187 Frank Martinez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Frank Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16G 48A - 111.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 188 Ana Delgado Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Delgado Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 189 Ana Sofia Beltran	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Sofia Beltran solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45A 16G - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 190 Etilsa Suarez Ciprian	30 junio del 2022	El/La señor(a) Etilsa Suarez Ciprian solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45C - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 34

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **5/12/2022** al **11/12/2022** Fecha **12/12/2022**

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
Atraso en las actividades de ejecución de obra	Plan de contingencia	*El Contratista mediante carta CONS-TUR-SINC-045 del día 17 de junio de 2022, remitió el plan de contingencia donde se comprometió a nivelar las actividades de los diagnósticos el día 30 de junio de 2022. Respecto a las actividades de ejecución, el Contratista de obra presenta un plan de trabajo en el cual informa que se nivelará con la programación a más tardar el día 14 de julio de 2022. * De acuerdo con la reunión el día 30 de junio de 2022 en conjunto con ENTerritorio, Interventoría y Contratista de Obra, en donde se llegó a un acuerdo de realizar una actualización al plan de contingencia inicial entregada por el Consorcio Turquía, dándole respuesta al informe de seguimiento de documento entregado con la comunicación de interventoría GA-DOMI-071-22. Conforme a esto, el día 02 de julio de 2022 con carta CONS-TUR-SINC-054 el contratista de obra entregó la actualización del plan de contingencia conforme a las situaciones presentadas en las dos últimas semanas. * De acuerdo con el atraso reportado y teniendo en cuenta que el Plan de Contingencia presentado por el Contratista de Obra mediante la comunicación CONS-TUR-SINC-045 del día 17 de junio de 2022 y CONS-TUR-SINC-054 del día 02 de julio de 2022 y en vista que esta Interventoría no evidencia mejoras en los rendimientos de la ejecución de las actividades del contrato y avances por parte del contratista, se realizó reunión, el día 26 de julio de 2022 con los Representantes Legales del Consorcio Turquía, Interventoría y Supervisor de ENTerritorio, con el fin de revisar los avances del contratista de obra en la ejecución de la obra y la capacidad que cuenta de apertura, terminación y entrega de viviendas que permitan la nivelación del cronograma de obra y la Entidad realizó la solicitud a Interventoría de iniciar el proceso de presunto incumplimiento por el atraso reportado. * Conforme a lo solicitado por la Entidad y en vista que esta Interventoría no evidenció mejoras en los rendimientos de la ejecución de las actividades del contrato y avances por parte del contratista, se recomendó a la Entidad contratante con carta GA-DOMI-106-22 del día 04 de agosto de 2022 radicado N°. 20224300293272 llevar a cabo los trámites administrativos correspondientes conforme la cláusula 16 PENAL DE APREMIO, teniendo en cuenta el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales. * El día 31 de octubre de 2022 se remitió carta GA-DOMI-187-22 con destino a la Entidad (ENTerritorio) con número de radicado 20224300416252, en la cual se le recomienda a la Entidad contratante llevar a cabo los trámites administrativos correspondientes conforme a la cláusula 16 penal de apremio del contrato N°. 2220577 de 2022, teniendo en cuenta el no cumplimiento de las obligaciones contractuales. Una vez realizado el análisis por esta Interventoría a las pretensiones del Consorcio Turquía, se procedió a emitir concepto, mediante la comunicación GA-DOMI-217-22 del día 22 de noviembre de 2022 radicado No. 20224300453802 mencionado que se ve viable la propuesta de la solicitud de prórroga por un término de tres (3) meses para la subsanación del atraso de las actividades de obra, mediante un plan de trabajo que permite dar cumplimiento con el objeto contractual, ya que las metas fijadas en dicho documento están acorde con los rendimientos actuales de ejecución de las obras. Es de anotar	Consorcio Turquía	Plan de contingencia carta CONS-TUR-SINC-045 Actualización Plan de Contingencia GA-DOMI-071-22	17/06/2022
Mal estado de vías de acceso.	Solicitud adecuación de vías por parte de Alcaldía.	* Teniendo en cuenta la reunión realizada el día 31 de mayo de 2022 se concertó con la Alcaldía, a través del Ministerio de Vivienda, la disponibilidad de la maquinaria para llevar a cabo las adecuaciones de las vías de acceso al barrio El Poblado.	Alcaldía Sincelejo	El 22 de junio 2022 hizo presencia la maquinaria de la Alcaldía de Sincelejo para el inicio de las adecuaciones en la carrera 16 I con	22/06/2022
Contrato de acueducto	Coordinación entre contratos	El Contratista realizó los acercamientos pertinentes, no obstante a la fecha no se ha definido el fecha de inicio y fin de intervención de la vía 16 J	Alcaldía Sincelejo	N/A	N/A

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA





INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 34

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **5/12/2022** al **11/12/2022** Fecha **12/12/2022**





9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

* El Consorcio Turquía continuó con la Actividad 2 en las visitas de los diagnósticos de las viviendas objeto del programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en el barrio El Poblado, por lo tanto, a la fecha de corte del presente informe semanal se tiene aprobado seiscientos treinta y dos (632) diagnósticos acumulados.

* De acuerdo con las diferentes reuniones sostenidas con el Contratista e Interventoría para la revisión de la Matriz Inicial, se realizó el balance de los posibles beneficiarios del programa de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Sincelejo - Sucre, en contraste con los recorridos de verificación en campo, plano del barrio El Poblado de caracterización de zonas de riesgo y los diferentes informes emitidos por el FOVIS, se obtuvo un potencial neto de 644 viviendas efectivas, 46 no efectivas y 3 renuncias, tal y como se muestra a continuación:

Viviendas efectivas: 644
Viviendas diagnóstico aprobado: 632
Viviendas con observaciones de diagnóstico: 12
Viviendas no efectivas: 46
Renuncias: 3
Viviendas Pendientes por diagnosticar: 12
Viviendas terminadas: 414
Viviendas en ejecución: 2
Viviendas iniciadas: 416

* Para la Actividad 3 se han iniciado un total de cuatrocientos seis (416) viviendas, de las cuatrocientos catorce (414) están terminadas, dos (2) en ejecución. En las viviendas aperturadas en la semana, se realizaron actividades de verificación de medidas, demarcaciones de zonas de excavaciones, figurado de acero, fundida de cimentaciones, columnas, machones, y el levante de muros.

* Con respecto a la Actividad 4, se han recibido ciento noventa (190) solicitudes de inclusiones, de las cuales ciento cinco (105) han sido avaladas por la Alcaldía de Sincelejo, ochenta y cuatro (84) no fueron aprobadas y una (01) en la cual el FOVIS no dio una respuesta clara de aprobación. Se continuará con las visitas vivienda a vivienda así como reuniones sectorizadas para dar a conocer a los potenciales beneficiarios toda la información referente a este proyecto.

* Conforme lo anterior, en la presente semana se tiene un porcentaje ejecutado acumulado de 61,58% y un porcentaje programado acumulado de 100% lo cual representa un atraso de 38,42% en las actividades de ejecución del Programa de Conexión Intradomiciliaria, sin embargo, esta Interventoría aclara que por factores climáticos, estado de las vías de acceso al barrio El Poblado para el acarreo de los materiales de obra a cada una de las viviendas en ejecución y orden público ocasionado por grupos al margen de Ley, se presentaron pérdidas en tiempo que impidió la adecuada ejecución de las actividades programadas, por lo tanto, al realizar el análisis de incidencia según el seguimiento a dichos inconvenientes se estableció que el porcentaje no imputable al Consorcio Turquía es de 10,25% y el restante 28,17% si son responsabilidad del contratista de obra.

Una vez realizado el análisis por esta Interventoría a las pretensiones del Consorcio Turquía, se procedió a emitir concepto, mediante la comunicación GA-DOMI-217-22 del día 22 de noviembre de 2022 radicado No. 20224300453802, mencionado que se ve viable la propuesta de la solicitud de prórroga por un término de tres (3) meses para la subsanación del atraso de las actividades de obra, mediante un plan de trabajo que permite dar cumplimiento con el objeto contractual, ya que las metas fijadas en dicho documento están acorde con los rendimientos actuales de ejecución de las obras. Es de anotar que los costos de interventoría por el tiempo adicional ascienden a $150.702.084, los cuales serán asumidos por el contratista de obra.

A corte del presente informe semanal la Entidad Contratante se encuentra realizando la revisión jurídica y técnica de la solicitud de prórroga del contrato de obra y de adición y prorroga de interventoría por el término de tres (3) meses, mas sin embargo el plazo contractualmente establecido se termina el día 13 de diciembre de 2022, de no proceder con la suscripción del trámite administrativo. Se espera contar con el concepto de la Entidad de la prórroga de tres (3) meses de los contratos de obra e Interventoría en los próximos dos días con el fin de continuar con las actividades que permitan dar cumplimiento con el objeto contractual.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	Firma	Firma
Nombre EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Nombre HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Nombre
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Profesional Costos y Presupuesto <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Bogotá D.C, 20 de diciembre de 2022

Señor
JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
Supervisor
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio
Calle 26 N°. 13-19
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría N°. 2220585 "Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre"**

Asunto: **Remisión Informe Semanal No. 35 periodo del 12 de diciembre de 2022 al 18 de diciembre de 2022**

Apreciado señor,

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, anexo, se remite el informe semanal de Interventoría No. 35 del contrato de la referencia para el período comprendido entre el 12 de diciembre de 2022 al 18 de diciembre de 2022.

Anexo se remite como soporte al Informe Semanal N°. 35; bitácora de obra, Lista de chequeo seguimiento estado de salud de Interventoría y Obra, Acta de seguimiento, Acta de comité de aprobación de diagnóstico, Informe social, Resumen de avance y Matriz Tres Momentos.

Cordialmente,

EDGAR ALFONSO ARAGÓN OTERO
Director de Interventoría
Anexos: Lo enunciado en treinta y ocho (38) folios y archivos en magnético.
C.C.: Ing. Juan David Amón – Supervisor del contrato Convenio Inter administrativo 221005; Enterritorio.
Archivo.
Elaboró: MJ.
Revisó: EAO.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 20/12/2022
HORA: 4:42:30 p. m.
20224300497902

INFORME SEMANAL

Cra. 48 No. 101A – 29 Bogotá, Colombia Tel: (57 1) 236 7974 – 621 5383
E-mail: info@gavinco.com www.gavinco.com

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 35

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **12/12/2022** al **18/12/2022** Fecha **19/12/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

código PROYECTO	2220577
OBJETO DEL PROYECTO	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** SUCRE **MUNICIPIO** SINCELEJO
GERENCIA A CARGO	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1
SUPERVISOR	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
ESTADO DEL PROYECTO	En ejecución.

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220577		
Contratista	CONSORCIO TURQUIA		
Valor inicial	$ 5.034.941.972,00		
Adición No. 1	N/A		
Valor actual	$ 5.034.941.972,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial (Días)	244 Días		
Prorroga No. 1	90 Días		
Plazo actual (Días)	334 Días		100,00%
Variación en plazo	90 Días		
Fecha Contractual de terminación	13/03/2023		
Tiempo Transcurrido (días)	246		73,65%
Días remanentes del Contrato	84		25,15%
Acumulado a última acta pagada	$ 2.820.263.489,10		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

2.2 CONTRATO DE Interventoría

Contrato No.	2220585		
Interventor	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.		
Valor inicial	$ 542.723.071,00		
Adición No. 1	$ 150.072.084,00		
Valor actual	$ 692.795.155,00		
Variación del valor	$ 150.072.084,00		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial	244 Días		
Prorroga No. 1	90 Días		
Plazo actual	334 Días		100,00%
Variación en plazo	90 Días		
Fecha Contractual de terminación	13/03/2023		
Ejecución del Contrato	246		73,65%
Días remanentes del Contrato	84		25,15%
Acumulado a última acta pagada	$ 339.826.050,90		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO


Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 5.034.941.972,00

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 4.985.844.161,32	99,02%	$ 3.100.517.266,36	61,58%	-$ 1.885.326.894,96	-37,44%
Durante el Periodo	-$ 2.071.034.923,23	-41,13%	$ 23.350.014,96	0,46%	$ 2.094.384.938,19	41,60%
Acumulado a la Fecha	**$ 2.914.809.238,09**	**57,89%**	**$ 3.123.867.281,32**	**62,04%**	**$ 209.058.043,23**	**4,15%**

Semáforo

Desviación en días

10 Días

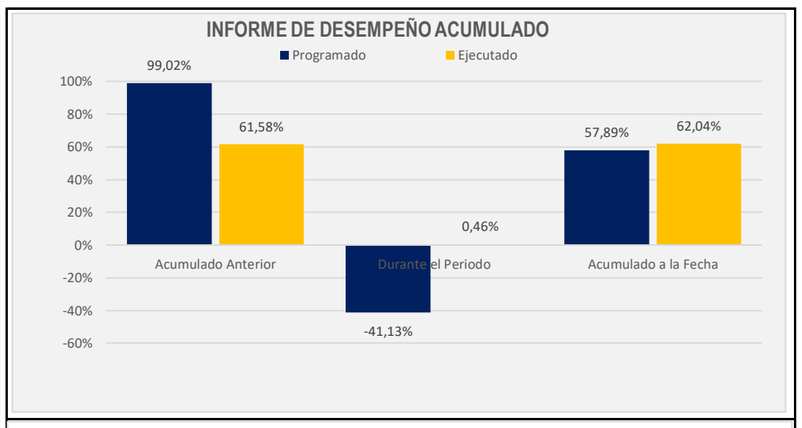

Observaciones al desempeño del proyecto


** **Actividad 1.** Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía. Aprobado por interventoría con cartas GA-DOMI-040-22 del día 31 de mayo de 2022 y radicado en ENTERRITORIO bajo el N°. 20224300206752 y GA-DOMI-030-22 radicado N°. 20224300189742.*


** **Actividad 2.** Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoría, por el Contratista de obra, un total de 644 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 640 diagnósticos acumulados. Hay 46 diagnósticos no efectivos y Tres (3) renuncias.*

** **Actividad 3.** A corte de este informe el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 416 viviendas, de las cuales 414 están terminadas, 2 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 224 para inicio de actividades.*

** **Actividad 4.** Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas, y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.*

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

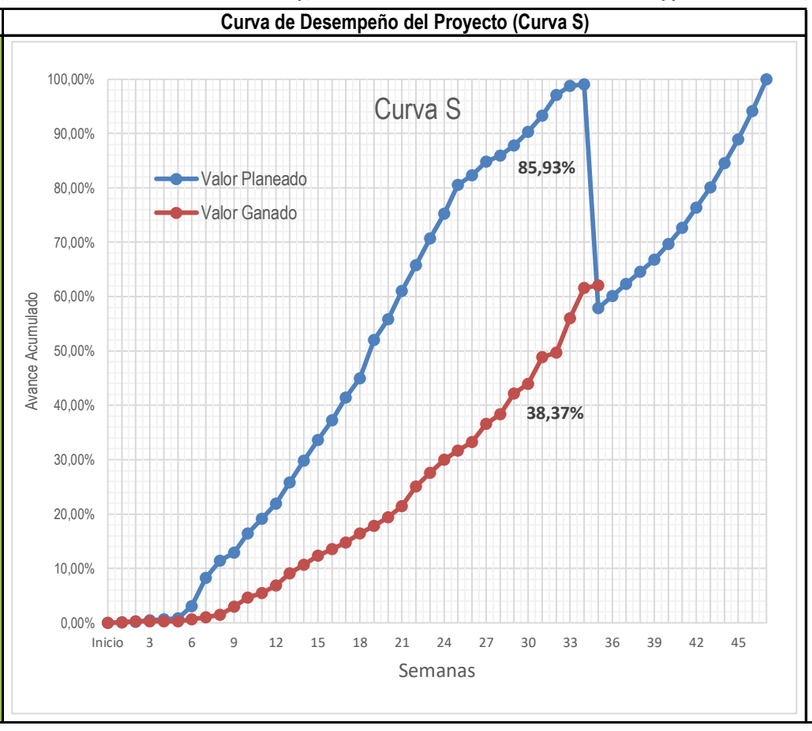

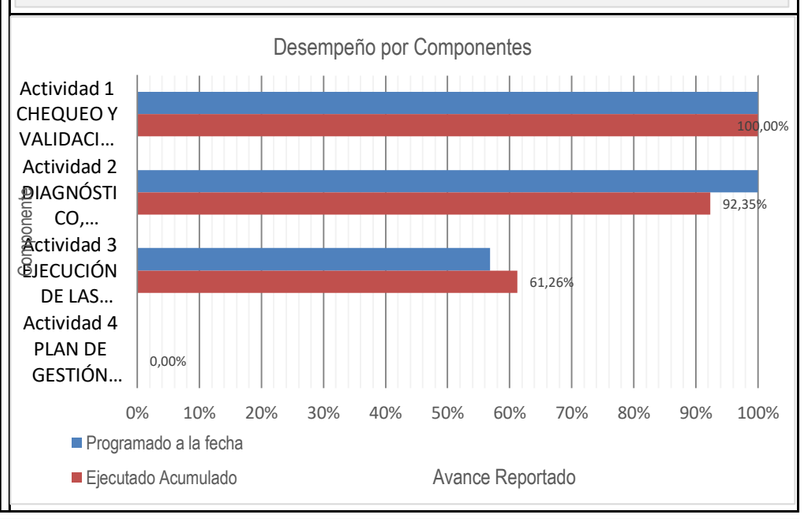

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)


* Se ajusta la curva S del proyecto conforme a la capacitación dada el 28 de abril de 2022 por parte del supervisor de ENTERRITORIO.

* La Entidad mediante la suscripción del Modificatorio No. 1 del 13 de diciembre de 2022 se da aval a ampliar el plazo de la ejecución de las obras hasta el día 13 de marzo de 2023, tiempo que no generará costos adicionales a la Entidad y el contratista de obra asume el costo de mayor permanencia de Interventoría. Por consiguiente se realiza el ajuste de la curva S de las actividades de obra conforme a la reprogramacion realizada por el Consorcio Turquía con carta CONS-TUR-SINC-163 del 21 de noviembre de 2022, la cual fue revisada por Interventoría y avalada con la comunicación GA-DOMI-217-22 del día 25 de noviembre de 2022 radicado No. 20224300453802.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado %	Ejecutado %	Desviación %	Semáforo
Acumulado Anterior	99,02%	61,58%	-37,44%	
Durante el Periodo	-41,13%	0,46%	41,60%	
Acumulado a la Fecha	**57,89%**	**62,04%**	**4,15%**	

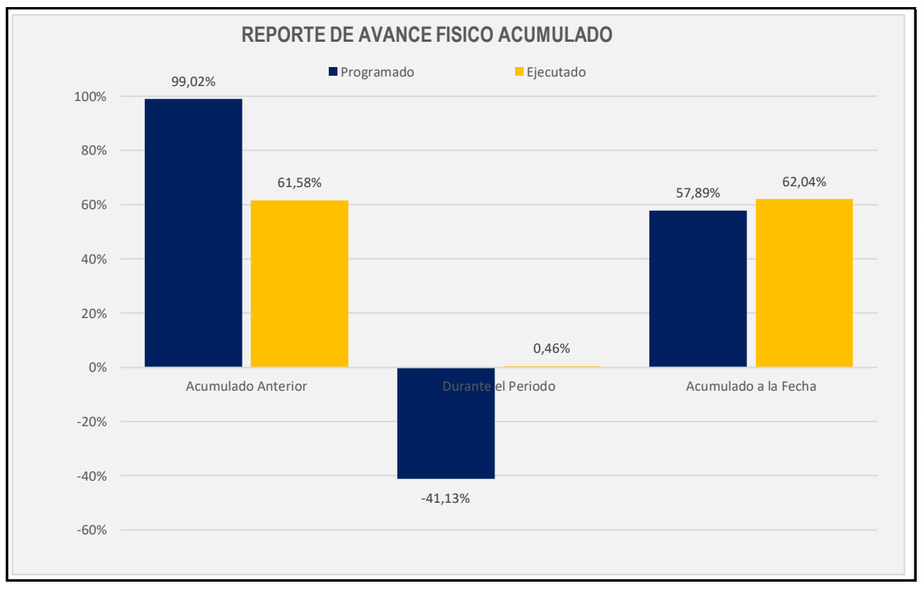



AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 5.034.941.972,00	$ 5.034.941.972,00	$ -	$ 981.956.213,60	$ 841.887.956,54	$ 140.068.257,06

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
6	$ 2.820.263.489,10	56,01%	5	$ 2.050.349.690,38	40,72%	9/11/2022	$ 455.490.237,16










AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 542.723.071,00	$ 692.795.155,00	$ 150.072.084,00	N/A	N/A	N/A

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
8	$ 339.826.050,90	49,05%	7	$ 285.336.654,58	41,19%	24/11/2022	$ 69.495.689,24







INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 35

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **12/12/2022** al **18/12/2022** Fecha **19/12/2022**

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA APROBADO.

* Actividad 1. Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, se presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía.

* Actividad 2. Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoría, por el Contratista de obra, un total de 644 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 640 diagnósticos acumulados. Está pendiente de entrega 4 diagnósticos los cuales son predios que no se han diagnosticado por el contratista de obra. De acuerdo al informe técnico entregado por el FOVIS de las manzanas 40A, 38A Y 38, hay once (11) diagnósticos que pasarían a ser no efectivos ya que las viviendas se encuentran en zona de riesgo, por lo tanto, el total de diagnósticos no efectivos se eleva a 46 y tres (3) renuncias.

* Actividad 3. A corte de este informe, el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 416 viviendas, de las cuales 414 están terminadas, 2 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 227 para inicio de actividades.

* Actividad 4. Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.

SEGUIMIENTO AVANCE

Actividad 2.	**Actividad 3.**
Diagnósticos programación inicial: 693	Viviendas programación inicial: 693
Diagnósticos reprogramación: 693	Viviendas reprogramación: 375
Diagnósticos Aprobados acumulados: 640	Viviendas terminadas: 414
Viviendas con observaciones de diagnóstico: 3	Viviendas en ejecución: 2
Viviendas efectivas: 644	Viviendas totales iniciadas: 416
Viviendas no efectivas: 46	
Renuncias: 3	

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

• Con la carta GA-DOMI-234-22 del día 13 de diciembre de 2022 se procedió a emitir observaciones a la vivienda S-SC-EP-M58-VE-450 por deterioro en el pañete y se requirió su subsanación.

• El día 14 de diciembre de 2022 con la carta GA-DOMI-235-22 se solicitó al Consorcio Turquía la remisión de las planillas de pago de la seguridad social integral y de parafiscales del personal que laboró en el mes de noviembre de 2022.

• Mediante la comunicación GA-DOMI-236-22 del día 15 de diciembre de 2022, con radicado 20224300493492 dirigido a enterritorio, se procedió a realizar la presentación del informe semanal número 34 de interventoría, correspondiente al periodo comprendido del 05 de diciembre de 2022 al 11 de Diciembre de 2022.

ACTIVIDADES EN CAMPO

* El día 12 de diciembre de 2022 el Consorcio Turquía continuó con las actividades de levante de muros, excavación para zapatas, fundida de registros sanitarios y suministro de materiales. No se realizaron aperturas. Para el día de hoy se recibe la visita de la entidad contratante y se realizó recorrido en el barrio en el poblado con el supervisor de ENTerritorio, interventoría y contratista, con el fin de verificar el estado de las viviendas que se encuentran en ejecución y/o con observaciones postventa, en total se visitaron 30 viviendas.

* El día 13 de diciembre de 2022, el contratista de obra continuó con las actividades de fundida de registros sanitarios, instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros, fundida de machones y columnas, instalación de enchape y aparatos sanitarios. El día de hoy no se realizó aperturas de nuevas viviendas para ejecución. Se retomó el recorrido de obra con el supervisor de ENTerritorio, interventoría y contratista con la verificaron de 10 viviendas en horas de la mañana y la tarde se realizó la reunión de cierre de esta visita, en donde la entidad realizó recomendaciones con respecto a la ejecución de las unidades sanitarias.

* El día 14 de diciembre de 2022, el contratista continuó con las actividades de instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención, instalación de enchape, pintura y atendiendo detalles de la casetas terminadas. El 14 de diciembre de 2022 no se realizaron aperturas.

* El día 15 de diciembre de 2022, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. Para el día de hoy en horas de la tarde se realizó el comité de seguimiento en donde se cuenta con la presencia de la entidad contratante, contratista e interventoría. Para el día de hoy no se realizaron aperturas. Para este mismo día se recibe la visita del ministerio de vivienda, se realiza una reunión de seguimiento del contrato en las instalaciones de la alcaldía de Sincelejo, y en hora de la tarde se realiza recorrido de obra en el barrio el poblado se contó con la compañía de representantes de la alcaldía, veolia, fovis, ministerio de vivienda, contratista, interventoría, veedores y junta comunal. En general, el ministerio expreso que se siente satisfecho por los excelentes acabados de las unidades sanitarias y por el avance social que se ha realizado dentro del barrio el poblado.

* El día 16 de diciembre de 2022 se continuó con las actividades de obra como levante de muros, excavación de cimentaciones, fundida de machones, fundida de plantilla, armado del acero para las columnas y vigas. Para el día de hoy no se realizaron aperturas.

* El día 17 de diciembre de 2022 se continuó con las actividades de obra como levante de muros, fundida de machones, fundida de plantilla, armado del acero para las columnas y vigas. Para el día de hoy no se realizaron aperturas.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

' Se continuará con la intervención de las viviendas en el barrio El Poblado en Sincelejo Sucre.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0

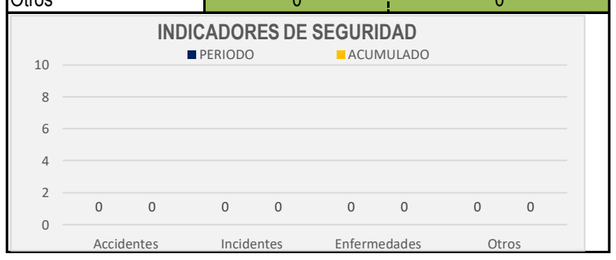

Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	149	0	149	71,6%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	35	0	35	16,8%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	8	0	8	3,8%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál? Orden público	16	0	16	7,7%
	Total	**208**	**0**	**208**	**100,00%**

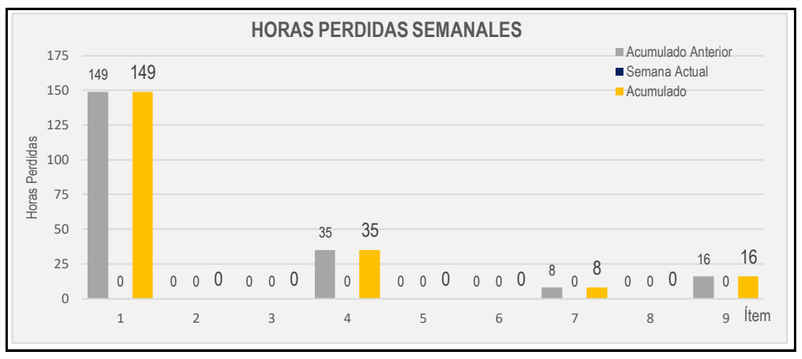

En la semana no se presentaron lluvias.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
Tipología PQR	Radicado por		Fecha	Asunto	Dirigido a	Respuesta Alcaldía / FOVIS
Inclusión	No. de PQR 1 Yessica Cantello		20 mayo del 2022	El/La señor(a) Yessica Cantello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 2 Betilda Gonzales		25 mayo del 2022	El/La señor(a) Betilda Gonzales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 40 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 3 Luz Dary Ruiz		25 mayo del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 4 Jorge Guerra Arrieta		25 mayo del 2022	El/La señor(a) Jorge Guerra Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45a 16i - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 5 Emir Elias Pren M		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Emir Elias Pren M solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 15 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 6 Andrea Beltran Vides		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Andrea Beltran Vides solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 4 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 7 Jader Perez Molina		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Jader Perez Molina solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17e 45 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 8 Oscar Gamarro		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Oscar Gamarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 50 - lote 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 9 Manuel Mercado A		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Manuel Mercado A solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17d 45 -06.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 10 Humberto Atencia Sierra		27 mayo del 2022	El/La señor(a) Humberto Atencia Sierra solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 62 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 11 Erika Blanco		27 mayo del 2022	El/La señor(a) Erika Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	El contratista reliza el cierre d ela solicitud teniendo en cuenta el concepto del FOVIS,
Inclusión	No. de PQR 12 Yuris Paola Suarez		31 mayo del 2022	El/La señor(a) Yuris Paola Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 38 lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	zona de riesgo.El predio tiene un area dentro de la vivienda que presenta
Inclusión	No. de PQR 13 Katerine Benitez Villalba		31 mayo del 2022	El/La señor(a) Katerine Benitez Villalba solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 50 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 14 Jose Joaquin Florez		31 mayo del 2022	El/La señor(a) Jose Joaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 15 Ana Isabel Florez		31 mayo del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 16 Marileys Molina Alvarado		01 junio del 2022	El/La señor(a) Marileys Molina Alvarado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 35

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **12/12/2022** al **18/12/2022** Fecha **19/12/2022**

Inclusión	No. de PQR 17 Jeraldine Yepe Lasmar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Jeraldine Yepe Lasmar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 18 Enna Maria Lamar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Enna Maria Lamar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 19 Nauded Alvarez Maurez	02 junio del 2022	El/La señor(a) Nauded Alvarez Maurez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 20 Henoc Jose Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Henoc Jose Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 F 45- 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 21 Brenda Galvan Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Brenda Galvan Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 61 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 22 Sindy Rodriguez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Sindy Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 23 Luz Dary Martinez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 24 Jose Juaquin Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Juaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 25 Ana Milena Vergara	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Milena Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 20 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 26 Maria Alejandra Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Alejandra Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 27 Oswaldo jimenez Ramirez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Oswaldo jimenez Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 28 Hernan Jimenez Marin	06 junio del 2022	El/La señor(a) Hernan Jimenez Marin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 14 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 29 Carmen Carpintero	06 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 30 Ana Isabel Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	Cabe aclarar que la PQR # 30 se recepciono dos veces, a nombre de la
Inclusión	No. de PQR 31 Edilma Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 45 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 32 Silvio David Morelo	06 junio del 2022	El/La señor(a) Silvio David Morelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 57 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 33 Norelis Zabaleta	06 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Zabaleta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 59 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 34 Darin Blanco Fuentes	6 junio del 2022	El/La señor(a) Darin Blanco Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	definir con planeacion si esta en zona de riesgo.
Inclusión	No. de PQR 35 Deivi Jose Miranda	8 junio del 2022	El/La señor(a) Deivi Jose Miranda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 36 Gertrudis Lopez Herazo	8 junio del 2022	El/La señor(a) Gertrudis Lopez Herazo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 37 Sandra Cruz Peña	10 junio del 2022	El/La señor(a) Sandra Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 73.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 38 Gina Salcedo Ruiz	10 junio del 2022	El/La señor(a) Gina Salcedo Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 39 Yesica Cabrera Lora	10 junio del 2022	El/La señor(a) Yesica Cabrera Lora solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 40 Walter Arrieta	10 junio del 2022	El/La señor(a) Walter Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 41 Ana Luisa Contreras	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Luisa Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 32.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 42 Andres Bruno Benavidez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Bruno Benavidez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 43 Bertina Montes	15 junio del 2022	El/La señor(a) Bertina Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 39 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 44 Emistocle Bertel Avila	15 junio del 2022	El/La señor(a) Emistocle Bertel Avila solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 14.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 45 Griseida Arrieta Betin	15 junio del 2022	El/La señor(a) Griseida Arrieta Betin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 53 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 46 Nadin Carvajal	15 junio del 2022	El/La señor(a) Nadin Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 47 Carmen Carpintero	15 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 48 Martha Regino Herrera	15 junio del 2022	El/La señor(a) Martha Regino Herrera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 2 - lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 49 Blanca Avilez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Blanca Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 50 Luz Marina Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Marina Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 51 Gabriel Julio Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Julio Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 43 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 52 Luis rodriguez Rivero	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luis rodriguez Rivero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 53 Maria Monroy	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Monroy solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 54 Dani Velazquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Dani Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 55 Edith Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 9.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 56 Maryiris Navarro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maryiris Navarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 57 Santiago Troncoso Reyes	16 junio del 2022	El/La señor(a) Santiago Troncoso Reyes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45A - 157.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 58 Milagro Niebles Castro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Milagro Niebles Castro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 28 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 59 Elena Peña Pineda	16 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Peña Pineda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 60 Ever Luis Marquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ever Luis Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 121.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 61 Ramona Rosa Diaz	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ramona Rosa Diaz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 42 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 62 Andres Murillo Perez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 54 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 63 Heriberto Fernandez Lopez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Heriberto Fernandez Lopez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 17A 45B 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 64 Gabriel Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16I 45C 74.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 65 Denys Herrera Alvarez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Denys Herrera Alvarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 66 Alicia Conde Morales	16 junio del 2022	El/La señor(a) Alicia Conde Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45 A 65.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 67 Gregoria Marzan Solar	17 junio del 2022	El/La señor(a) Gregoria Marzan Solar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 01.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 68 Lina Martinez Zuñiga	17 junio del 2022	El/La señor(a) Lina Martinez Zuñiga solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 69 Carmerlo Castro Novoa	17 junio del 2022	El/La señor(a) Carmerlo Castro Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 48 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 70 Nicolasa Padilla	17 junio del 2022	El/La señor(a) Nicolasa Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 20A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 71 Jose Miguel Lopez Bravo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Miguel Lopez Bravo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 20.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 72 Vicente Villamizar Campo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Vicente Villamizar Campo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 73 Ely Causil Martinez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Ely Causil Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 74 Padro Ramos	17 junio del 2022	El/La señor(a) Padro Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 35

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **12/12/2022** al **18/12/2022** Fecha **19/12/2022**

Inclusión	No. de PQR 75 Dagoberto Mendoza Mercado	17 junio del 2022	El/La señor(a) Dagoberto Mendoza Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	PRESENTA RIESGO POR DESLIZAMIENTO , NO CUMPLE CON
Inclusión	No. de PQR 76 Iris Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 77 Maria Carlota Menco	17 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Carlota Menco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 78 Iris Murillo Perez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 79 Edilsa Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Edilsa Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 80 Alejandra Loaiza Corrales	17 junio del 2022	El/La señor(a) Alejandra Loaiza Corrales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 29 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 81 Grey Montes Rodriguez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Grey Montes Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 82 Marlenys arroyo Quintero	21 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenys arroyo Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 83 Rodolfo Gonzalez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Rodolfo Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 41 - lote 38.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 84 Elida Pinto Morales	21 junio del 2022	El/La señor(a) Elida Pinto Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 85 Nelfi Calle Mejia	21 junio del 2022	El/La señor(a) Nelfi Calle Mejia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 86 Jorge Ramos Osorio	21 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Ramos Osorio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 87 Manuel Solano Almario	21 junio del 2022	El/La señor(a) Manuel Solano Almario solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 88 Carmen Perez Contreras	21 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Perez Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 89 Estefany Buelvas	21 junio del 2022	El/La señor(a) Estefany Buelvas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 22 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 90 Omaida Villadiego	22 junio de{ 2022	El/La señor(a) Omaida Villadiego solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 41.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 91 Rosa Isabel Alba Llanares	22 junio de{ 2022	El/La señor(a) Rosa Isabel Alba Llanares solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 92 Carmen Arroyo Ramos	22 junio de{ 2022	El/La señor(a) Carmen Arroyo Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 28.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 93 Alvaro Macea Rivera	22 junio de{ 2022	El/La señor(a) Alvaro Macea Rivera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 12 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 94 Maria Quiroz Goez	23 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Quiroz Goez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrea 17f 45B - 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 95 Luis Alberto Quiroz	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Alberto Quiroz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 64 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 96 Aracelis Zuñiga Salcedo	23 junio del 2022	El/La señor(a) Aracelis Zuñiga Salcedo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 59.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 97 Luz Velazquez Villareal	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Velazquez Villareal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 98 Luis Felipe Galeano	24 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Felipe Galeano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 99 Rosalba Barragan Barbosa	24 junio del 2022	El/La señor(a) Rosalba Barragan Barbosa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 100 Teresa Santana Peralta	24 junio del 2022	El/La señor(a) Teresa Santana Peralta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A - 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 101 Etelvina Lobo Cuello	24 junio del 2022	El/La señor(a) Etelvina Lobo Cuello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 102 Maria Gonzalez	24 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 16 - lote .	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 103 Elena Perez Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 104 Edith Quintero	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 31 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 105 Edilma Gonzalez	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C 53.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 106 Karen Campo Cruz	27 junio del 2022	El/La señor(a) Karen Campo Cruz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16c 46B - 69.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 107 Libia Solar Orozco	27 junio del 2022	El/La señor(a) Libia Solar Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 108 Irma Baquero Fuentes	27 junio del 2022	El/La señor(a) Irma Baquero Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 -19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 109 Yuliet Perez Mendoza	27 junio del 2022	El/La señor(a) Yuliet Perez Mendoza solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 - 16C - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 110 Ibeth Vergara	29 junio del 2022	El/La señor(a) Ibeth Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 19A - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 111 Josefa Lazo Solano	29 junio del 2022	El/La señor(a) Josefa Lazo Solano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 112 Grisela Videz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Grisela Videz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 113 Juan Velazquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 60.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 114 Inogenes Carmona	29 junio del 2022	El/La señor(a) Inogenes Carmona solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46C - 52.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 115 Jesus Beltran Franco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jesus Beltran Franco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16B 46A - 51.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 116 Marina Benitez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marina Benitez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 117 Jorge Hoyos Otero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Hoyos Otero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 118 Yasmira Tovar Aguas	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yasmira Tovar Aguas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 119 Yerlis Salas Tovar	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Salas Tovar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 120 Jose Peñate Orozco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Peñate Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 121 Jorge Petro	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Petro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C 66.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 122 Francisco Romero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Francisco Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46 - 37.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 123 Luz Pajaro Garcia	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pajaro Garcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 55.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 124 Marlenis Delgado	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenis Delgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 125 Miguel Galindo	28 junio del 2022	El/La señor(a) Miguel Galindo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 126 Rubiela Gonzalez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Rubiela Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 48 B - 81.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 127 Norelis Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 55 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 128 Nohelia Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Nohelia Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 6 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 129 Esmeralda Marquez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Esmeralda Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 130 Gil Blanco Yubis	28 junio del 2022	El/La señor(a) Gil Blanco Yubis solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 23.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 131 Adis Arias Carvajal	29 junio del 2022	El/La señor(a) Adis Arias Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 76.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 132 Jaime Galindo Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime Galindo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 54.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 35

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **12/12/2022** al **18/12/2022** Fecha **19/12/2022**

Inclusión	No. de PQR 133 Luisa Noriega Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luisa Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 134 Silvia Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Silvia Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 135 Vianey Pelaez Vasquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Vianey Pelaez Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 145C - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 136 Yalitza Meza Montes	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yalitza Meza Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 137 Fredy Florian Pornnefz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Fredy Florian Pornnefz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 138 Segundo Novoa	29 junio del 2022	El/La señor(a) Segundo Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 35 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 139 Eduardo de Hoyo	29 junio del 2022	El/La señor(a) Eduardo de Hoyo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 140 Nohemi Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Nohemi Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 49.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 141 Yeline Molina Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeline Molina Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 45 - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 142 Yeison Ozuna Jimenez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeison Ozuna Jimenez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 11 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 143 Henry Contrera Rios	30 junio del 2022	El/La señor(a) Henry Contrera Rios solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 04.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 144 Dorys Yepez Suarez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dorys Yepez Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17D 45 - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 145 Jaime de Avila Syago	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime de Avila Syago solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 146 Hernando Trujillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Hernando Trujillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 30 .	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 147 Karina Marrugo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karina Marrugo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 148 Elisena Solar Orrozco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elisena Solar Orrozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 149 Bilma Salgado	30 junio del 2022	El/La señor(a) Bilma Salgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45B - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 150 Luz Fernandez Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Fernandez Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 151 Keider Avilez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keider Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 152 Rafael Bertel Bertel	30 junio del 2022	El/La señor(a) Rafael Bertel Bertel solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 153 Luz Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 43 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 154 Karol Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karol Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B - 136.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 155 Pabla Teran Romerin	30 junio del 2022	El/La señor(a) Pabla Teran Romerin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16H 45 - 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 156 Yadira Basilio Castillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yadira Basilio Castillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46a - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 157 Marqueza Padilla	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marqueza Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 36 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 158 Ruth Perez Perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ruth Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 159 Jose Carey Julio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Carey Julio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 160 Maria Manjarrez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Manjarrez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 161 Marleidis Bolaño	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marleidis Bolaño solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 162 Luis Manuel Murillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Manuel Murillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 163 Juan Perez Muslaco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Perez Muslaco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46A - 99.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 164 Keila Marquez Acosta	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keila Marquez Acosta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 33 - Lote 3A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 165 Nalfis Marquez David	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nalfis Marquez David solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 166 Yorlenis Tapia Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yorlenis Tapia Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 167 Ana Maria Tamara Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Maria Tamara Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 39 .	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 168 Elkin Zabala Vasquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elkin Zabala Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 169 Eder Hurtado Carpio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Eder Hurtado Carpio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 170 Dionicio Nieto	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dionicio Nieto solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 8 - Lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 171 Nerys Cruz Peña	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nerys Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 172 Consuelo Florez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Consuelo Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 173 Yonadis Tapias	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yonadis Tapias solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 16 - Lote 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 174 Jose Banquet perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Banquet perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 34 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 175 Alma Almentero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alma Almentero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 176 Luz Estela Escorcia	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Estela Escorcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 A 45A - 58.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 177 Celia Vega Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Celia Vega Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 136 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 178 Norelis Ortiz Rodelo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Ortiz Rodelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 179 Luis Julio Romero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Julio Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 48 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 180 Carmelina Gomez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Carmelina Gomez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 64 - Lote 29A .	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 181 Yerlis Muñoz	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Muñoz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17H 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 182 Andry Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Andry Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16E 46 - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 183 Emid Vega Bula	30 junio del 2022	El/La señor(a) Emid Vega Bula solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 184 Jhon Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jhon Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45C - 07.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 185 Alfonso Dieteben Ortega	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alfonso Dieteben Ortega solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 114.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 186 Luis Rosario Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Rosario Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 47 - 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 187 Frank Martinez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Frank Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16G 48A - 111.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 188 Ana Delgado Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Delgado Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 189 Ana Sofia Beltran	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Sofia Beltran solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45A 16G - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 190 Etilsa Suarez Ciprian	30 junio del 2022	El/La señor(a) Etilsa Suarez Ciprian solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45C - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 35

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **12/12/2022** al **18/12/2022** Fecha **19/12/2022**

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
Atraso en las actividades de ejecución de obra	Plan de contingencia	Teniendo en cuenta los atrasos que se presentaban en obra, se dio inicio al proceso de incumplimiento al Consorcio Turquía mediante mesa de trabajo del 21 de noviembre de 2022.	Consorcio Turquía	Plan de contingencia carta CONS-TUR-SINC-045 Actualización Plan de Contingencia GA-DOMI-071-22 Mesa de trabajo con aseguradora y aprobacion de modificatorio No. 01 del contrato de obra, mediante el cuals e prorroga por tres (3) meses más, es decir hasta el 13/03/2023.	13/12/2022
Mal estado de vías de acceso.	Solicitud adecuación de vías por parte de Alcaldía.	* Teniendo en cuenta la reunión realizada el día 31 de mayo de 2022 se concertó con la Alcaldía, a través del Ministerio de Vivienda, la disponibilidad de la maquinaria para llevar a cabo las adecuaciones de las vías de acceso al barrio El Poblado.	Alcaldía Sincelejo	El 22 de junio 2022 hizo presencia la maquinaria de la Alcaldía de Sincelejo para el inicio de las adecuaciones en la carrera 16 I con	22/06/2022
Contrato de acueducto	Coordinación entre contratos	El Contratista realizó los acercamientos pertinentes, no obstante a la fecha no se ha definido el fecha de inicio y fin de intervención de la vía 16 J	Alcaldía Sincelejo	N/A	N/A

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

* El Consorcio Turquía continuó con la Actividad 2 en las visitas de los diagnósticos de las viviendas objeto del programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en el barrio El Poblado, por lo tanto, a la fecha de corte del presente informe semanal se tiene aprobado seiscientos cuarenta (640) diagnósticos acumulados.

* De acuerdo con las diferentes reuniones sostenidas con el Contratista e Interventoría para la revisión de la Matriz Inicial, se realizó el balance de los posibles beneficiarios del programa de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Sincelejo - Sucre, en contraste con los recorridos de verificación en campo, plano del barrio El Poblado de caracterización de zonas de riesgo y los diferentes informes emitidos por el FOVIS, se obtuvo un potencial neto de 644 viviendas efectivas, 46 no efectivas y 3 renuncias, tal y como se muestra a continuación:

Viviendas efectivas: 644
Viviendas diagnóstico aprobado: 640
Viviendas con observaciones de diagnóstico: 3
Viviendas no efectivas: 46
Renuncias: 3
Viviendas Pendientes por diagnosticar: 12
Viviendas terminadas: 414
Viviendas en ejecución: 2
Viviendas iniciadas: 416

* Para la Actividad 3 se han iniciado un total de cuatrocientos seis (416) viviendas, de las cuatrocientos catorce (414) están terminadas, dos (2) en ejecución. En la semana no se realizaron aperturas.

* Con respecto a la Actividad 4, se han recibido ciento noventa (190) solicitudes de inclusiones, de las cuales ciento cinco (105) han sido avaladas por la Alcaldía de Sincelejo, ochenta y cuatro (84) no fueron aprobadas y una (01) en la cual el FOVIS no dio una respuesta clara de aprobación. Se continuará con las visitas vivienda a vivienda así como reuniones sectorizadas para dar a conocer a los potenciales beneficiarios toda la información referente a este proyecto.

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 35

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **12/12/2022** al **18/12/2022** Fecha **19/12/2022**

* De acuerdo con la solicitud del contratista de obra realizada con la comunicación CONS-TUR-SINC-163 del 21 de noviembre de 2022 de prorrogar el contrato de obra No. 220577 por un término de tres (3) meses, del cual una vez revisado los argumentos expuestos se dio concepto favorable por esta Interventoría con la carta GA-DOMI-217-22 del día 25 de noviembre de 2022 radicado No. 20224300453802, la Entidad contratante EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio mediante la suscripción del modificatorio No. 1 se dio aval de ampliar el plazo de ejecución para la terminación de las obras, con el fin de dar cumplimiento con el alcance del contrato.

Se prorroga el contrato de interventoría por el mismo plazo con el fin de hacer seguimiento a las labores que lleva adelantando el Consorcio Turquía; de igual manera, el costo de la mayor permanencia de Interventoría que asciende a la adición No. 1 de $150.072.084,00, es asumido por el contratista de obra y será descontando mediante las actas de avance parcial de obra No. 7 y 08, en una proporción del 50% por cada pago, monto que no afectará ni limitará el buen desarrollo de las actividades.

De acuerdo a todo lo anterior, se procede a realizar una reprogramación de las actividades a ejecutar por parte del Consorcio Turquía incluyendo el periodo adicional de tres (3) meses que permitan culminar las obras contratadas.

No obstante, lo aprobado en la prorroga No. 1 al contrato de obra y sin perjuicio a la Entidad contratante, está Interventoría al evidenciar nuevos incumplimientos por parte del Consorcio Turquía reanudará los trámites administrativos pertinentes, si estos se presentasen.

En conclusión, a corte del presente informe semanal se tiene un porcentaje ejecutado acumulado de 62,04% y un porcentaje programado acumulado de 57,89%, producto del tiempo adicional de los tres (3) meses para la culminación de las obras.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	**Firma**	**Firma**
Nombre EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Nombre HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Nombre
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Profesional Costos y Presupuesto <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista. Interventoría

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial FECHA 29/12/2022 HORA: 10:23:06 a. m.
20224300505562

Bogotá D.C, 29 de diciembre de 2022

Señor
JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
Supervisor
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio
Calle 26 N°. 13-19
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría N°. 2220585 "Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre"**

Asunto: **Remisión Informe Semanal No. 36 periodo del 19 de diciembre de 2022 al 25 de diciembre de 2022**

Apreciado señor,

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, anexo, se remite el informe semanal de Interventoría No. 36 del contrato de la referencia para el período comprendido entre el 19 de diciembre de 2022 al 25 de diciembre de 2022.

Anexo se remite como soporte al Informe Semanal N°. 36; bitácora de obra, Lista de chequeo seguimiento estado de salud de Interventoría y Obra, Acta de seguimiento, Acta de comité de aprobación de diagnóstico, Informe social, Resumen de avance y Matriz Tres Momentos.

Cordialmente,

EDGAR ALFONSO ARAGÓN OTERO
Director de Interventoría
Anexos: Lo enunciado en treinta y ocho (38) folios y archivos en magnético.
C.C.: Ing. Juan David Amón – Supervisor del contrato Convenio Inter administrativo 221005; Enterritorio.
Archivo.
Elaboró: MJ.
Revisó: EAO.

INFORME SEMANAL

Cra. 48 No. 101A – 29 Bogotá, Colombia Tel: (57 1) 236 7974 – 621 5383
E-mail: info@gavinco.com www.gavinco.com

enterritorio	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 36

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **19/12/2022** al **25/12/2022** | Fecha **26/12/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

código PROYECTO	2220577			
OBJETO DEL PROYECTO	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO**	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO
GERENCIA A CARGO	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1			
SUPERVISOR	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ			
ESTADO DEL PROYECTO	En ejecución.			

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220577		
Contratista	CONSORCIO TURQUIA		
Valor inicial	$ 5.034.941.972,00		
Adición No. 1	N/A		
Valor actual	$ 5.034.941.972,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial (Días)	244 Días		
Prorroga No. 1	90 Días		
Plazo actual (Días)	334 Días		100,00%
Variación en plazo	90 Días		
Fecha Contractual de terminación	13/03/2023		
Tiempo Transcurrido (días)	253		75,75%
Días remanentes del Contrato	77		23,05%
Acumulado a última acta pagada	$ 2.820.263.489,10		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

2.2 CONTRATO DE Interventoría

Contrato No.	2220585		
Interventor	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.		
Valor inicial	$ 542.723.071,00		
Adición No. 1	$ 150.072.084,00		
Valor actual	$ 692.795.155,00		
Variación del valor	$ 150.072.084,00		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial	244 Días		
Prorroga No. 1	90 Días		
Plazo actual	334 Días		100,00%
Variación en plazo	90 Días		
Fecha Contractual de terminación	13/03/2023		
Ejecución del Contrato	253		75,75%
Días remanentes del Contrato	77		23,05%
Acumulado a última acta pagada	$ 339.826.050,90		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPENO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 5.034.941.972,00

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 2.914.809.238,09	57,89%	$ 3.123.677.999,43	62,04%	$ 208.868.761,34	4,15%
Durante el Periodo	$ 111.585.933,36	2,22%	$ 13.341.916,90	0,26%	$ -98.244.016,47	-1,95%
Acumulado a la Fecha	**$ 3.026.395.171,45**	**60,11%**	**$ 3.137.019.916,33**	**62,30%**	**$ 110.624.744,87**	**2,20%**

Semáforo

Desviación en días: 5 Días

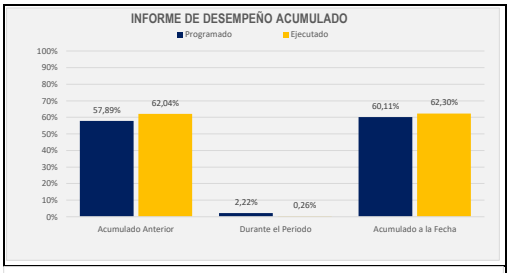

Observaciones al desempeño del proyecto


Actividad 1. *Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquia. Aprobado por interventoria con cartas GA-DOMI-040-22 del dia 31 de mayo de 2022 y radicado en ENTERRITORIO bajo el N°. 20224300206752 y GA-DOMI-030-22 radicado N°. 20224300189742.*


Actividad 2. *Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoria, por el Contratista de obra, un total de 64 4 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 640 diagnósticos acumulados. Hay 46 diagnósticos no efectivos y Tres (3) renuncias.*

Actividad 3. *A corte de este informe el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 420 viviendas, de las cuales 414 están terminadas, 6 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 220 para inicio de actividades.*

Actividad 4. *Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas, y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.*

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

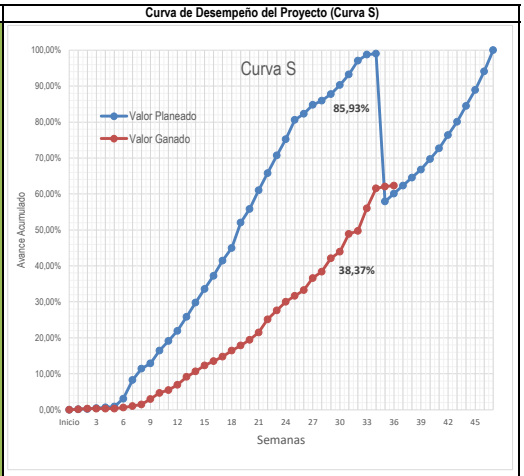

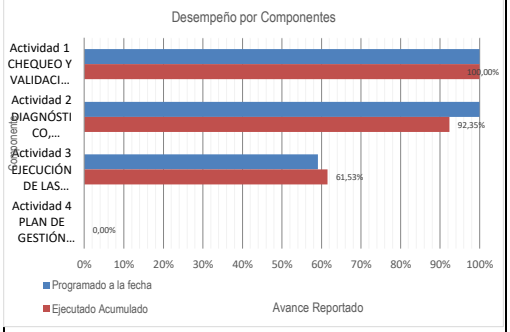

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE


DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

* Se ajusta la curva S del proyecto conforme a la capacitación dada el 28 de abril de 2022 por parte del supervisor de ENTERRITORIO.
* La Entidad mediante la suscripción del Modificatorio No. 1 del 13 de diciembre de 2022 se da aval a ampliar el plazo de la ejecución de las obras hasta el día 13 de marzo de 2023, tiempo que no generará costos adicionales a la Entidad y el contratista de obra asume el costo de mayor permanencia de Interventoría. Por consiguiente se realiza el ajuste de la curva S de las actividades de obra conforme a la reprogramacion realizada por el Consorcio Turquía con carta CONS-TUR-SINC-163 del 21 de noviembre de 2022, la cual fue revisada por Interventoría y avalada con la comunicación GA-DOMI-217-22 del día 25 de noviembre de 2022 radicado No. 20224300453802.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	57,89%	62,04%	4,15%	
Durante el Periodo	2,22%	0,26%	-1,95%	
Acumulado a la Fecha	**60,11%**	**62,30%**	**2,20%**	

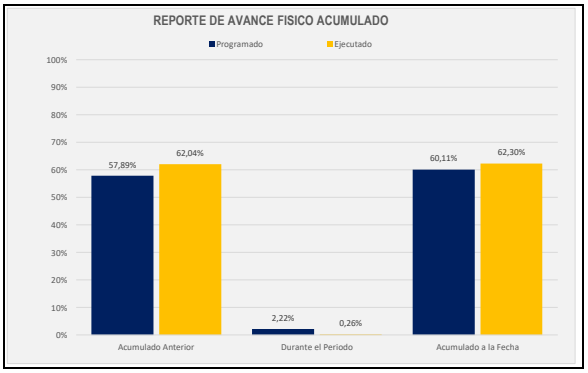

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 5.034.941.972,00	$ 5.034.941.972,00	$ -	$ 981.956.213,60	$ 841.887.956,54	$ 140.068.257,06

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
6	$ 2.820.263.489,10	56,01%	6	$ 2.820.263.489,10	56,01%	9/12/2022	$ 769.913.798,72








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 542.723.071,00	$ 692.795.155,00	$ 150.072.084,00	N/A	N/A	N/A

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
8	$ 339.826.050,90	49,05%	8	$ 339.826.050,90	49,05%	12/12/2022	$ 54.489.396,32







enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 36

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **19/12/2022** al **25/12/2022** Fecha **26/12/2022**

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA APROBADO.

* Actividad 1. Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, se presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía.

* Actividad 2. Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoría, por el Contratista de obra, un total de 644 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 640 diagnósticos acumulados. Está pendiente de atención de observaciones de 3 diagnóstico y uno (1) por realizar la visita para diagnosticar la vivienda. De acuerdo al informe técnico entregado por el FOVIS de las manzanas 40A, 38A Y 38, hay once (11) diagnósticos que pasarían a ser no efectivos ya que las viviendas se encuentran en zona de riesgo, por lo tanto, el total de diagnósticos no efectivos se eleva a 46 y tres (3) renuncias.

* Actividad 3. A corte de este informe, el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 420 viviendas, de las cuales 414 están terminadas, 6 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 220 para inicio de actividades.

* Actividad 4. Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.

Actividad 2.

Diagnósticos programación inicial: 693
Diagnósticos reprogramación: 693
Diagnósticos Aprobados acumulados: 640
Viviendas con observaciones de diagnóstico: 3
Viviendas efectivas: 644
Viviendas no efectivas: 46
Renuncias: 3

Actividad 3.

Viviendas programación inicial: 693
Viviendas reprogramación: 390
Viviendas terminadas: 414
Viviendas en ejecución: 6
Viviendas totales iniciadas: 420

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

• El día 19 de diciembre de 2022 con carta GA-DOMI-239-22 se solicitó al Consorcio Turquía dar respuesta al Derecho de Petición interpuesto por la veeduría del barrio El Poblado el pasado 15 de diciembre del año 2022 en donde manifiestan quejas e inconformidades de la comunidad respecto a las intervenciones.
• Teniendo en cuenta que el contratista de obra con carta CONS-TUR-SINC-156 remitió los paquetes de viviendas terminadas de las actas 1 a la 4, las cuales una vez realizada la revisión por esta Interventoría se dio respuesta con observaciones mediante la carta GA-DOMI-237-22 del día 19 de diciembre de 2022.
• Con carta GA-DOMI-243-22 del día 21 de diciembre de 2022, esta interventoría procedió a realizar observaciones al Consorcio Turquía por falencias e inadecuados procesos constructivos de las unidades sanitarias de las manzanas 71 y 74.

ACTIVIDADES EN CAMPO

* El día 19 de diciembre de 2022 el Consorcio Turquía continuó con las actividades de levante de muros, fundida de registros sanitarios y suministro de materiales. No se realizaron aperturas.

* El día 20 de diciembre de 2022, el contratista de obra continuó con las actividades de fundida de registros sanitarios, instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros, fundida de machones y columnas, instalación de enchape y aparatos sanitarios. El día de hoy no se realizó aperturas de nuevas viviendas para ejecución.

* El día 21 de diciembre de 2022, el contratista continuó con las actividades de instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención, instalación de enchape, pintura y atendiendo detalles de la casetas terminadas. El 21 de diciembre de 2022 se realizaron dos (2) aperturas. Para el día de hoy en horas de la mañana se realizó el comité de seguimiento de obra con la asistencia de la entidad contratante, contratista e interventoria.

* El día 22 de diciembre de 2022, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. Para el día de hoy se realizaron dos (2) aperturas. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. En horas de la tarde el Consorcio Turquía realizo una actividad social para la entrega de regalos a los niños del barrio el poblado en compañía de la veeduría e interventoría.

* El día 23 de diciembre de 2022 se continuó con las actividades de obra como levante de muros, excavación de cimentaciones, fundida de machones, fundida de plantilla, armado del acero para las columnas y vigas. Para el día de hoy no se realizaron aperturas.

* El día 24 de diciembre de 2022 se continuó con las actividades de obra como levante de muros, fundida de machones, fundida de plantilla, armado del acero para las columnas y vigas. Para el día de hoy no se realizaron aperturas.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

* Se continuará con la intervención de las viviendas en el barrio El Poblado en Sincelejo Sucre.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	149	0	149	71,6%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	35	0	35	16,8%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	8	0	8	3,8%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál? Orden público	16	0	16	7,7%
	Total	208	0	208	100,00%



En la semana no se presentaron lluvias.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
Tipología PQR	Radicado por		Fecha	Asunto	Dirigido a	Respuesta Alcaldía / FOVIS
Inclusión	No. de PQR 1	Yessica Cantello	20 mayo del 2022	El/La señor(a) Yessica Cantello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 2	Betilda Gonzales	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Betilda Gonzales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 40 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 3	Luz Dary Ruiz	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 4	Jorge Guerra Arrieta	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Jorge Guerra Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45a 16i - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 5	Emir Elias Pren M	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Emir Elias Pren M solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 15 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 6	Andrea Beltran Vides	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Andrea Beltran Vides solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 4 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 7	Jader Perez Molina	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Jader Perez Molina solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17e 45 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 8	Oscar Gamarro	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Oscar Gamarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 50 - lote 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 9	Manuel Mercado A	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Manuel Mercado A solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17d 45 -06.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 10	Humberto Atencia Sierra	27 mayo del 2022	El/La señor(a) Humberto Atencia Sierra solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 62 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 11	Erika Blanco	27 mayo del 2022	El/La señor(a) Erika Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	El contratista reliza el cierre d ela solicitud teniendo en cuenta el concepto del FOVIS.
Inclusión	No. de PQR 12	Yuris Paola Suarez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Yuris Paola Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 38 lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	zona de riesgo El predio tiene un area dentro de la vivienda que presenta
Inclusión	No. de PQR 13	Katerine Benitez Villalba	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Katerine Benitez Villalba solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 50 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 14	Jose Joaquin Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Jose Joaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 15	Ana Isabel Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 16	Marileys Molina Alvarado	01 junio del 2022	El/La señor(a) Marileys Molina Alvarado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 17	Jeraldine Yepe Lasmar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Jeraldine Yepe Lasmar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 18	Enna Maria Lamar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Enna Maria Lamar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 36

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **19/12/2022** al **25/12/2022** Fecha **26/12/2022**

Inclusión	No. de PQR 19 Nauded Alvarez Maurez	02 junio del 2022	El/La señor(a) Nauded Alvarez Maurez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 20 Henoc Jose Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Henoc Jose Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 F 45- 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 21 Brenda Galvan Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Brenda Galvan Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 61 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 22 Sindy Rodriguez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Sindy Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 23 Luz Dary Martinez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 24 Jose Juaquin Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Juaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 25 Ana Milena Vergara	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Milena Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 20 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 26 Maria Alejandra Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Alejandra Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 27 Oswaldo jimenez Ramirez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Oswaldo jimenez Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 28 Hernan Jimenez Marin	06 junio del 2022	El/La señor(a) Hernan Jimenez Marin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 14 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 29 Carmen Carpintero	06 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 30 Ana Isabel Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	Cabe aclarar que la PQR # 30 se recepciono dos veces, a nombre de la
Inclusión	No. de PQR 31 Edilma Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 45 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 32 Silvio David Morelo	06 junio del 2022	El/La señor(a) Silvio David Morelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 57 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 33 Norelis Zabaleta	06 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Zabaleta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 59 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 34 Darin Blanco Fuentes	6 junio del 2022	El/La señor(a) Darin Blanco Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	definir con planeacion si esta en zona de riesgo
Inclusión	No. de PQR 35 Deivi Jose Miranda	8 junio del 2022	El/La señor(a) Deivi Jose Miranda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 36 Gertrudis Lopez Herazo	8 junio del 2022	El/La señor(a) Gertrudis Lopez Herazo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 37 Sandra Cruz Peña	10 junio del 2022	El/La señor(a) Sandra Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 73.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 38 Gina Salcedo Ruiz	10 junio del 2022	El/La señor(a) Gina Salcedo Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 39 Yesica Cabrera Lora	10 junio del 2022	El/La señor(a) Yesica Cabrera Lora solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 40 Walter Arrieta	10 junio del 2022	El/La señor(a) Walter Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 41 Ana Luisa Contreras	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Luisa Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 32.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 42 Andres Bruno Benavidez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Bruno Benavidez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 43 Bertina Montes	15 junio del 2022	El/La señor(a) Bertina Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 39 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 44 Emistocle Bertel Avila	15 junio del 2022	El/La señor(a) Emistocle Bertel Avila solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 14.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 45 Griseida Arrieta Betin	15 junio del 2022	El/La señor(a) Griseida Arrieta Betin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 53 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 46 Nadin Carvajal	15 junio del 2022	El/La señor(a) Nadin Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 47 Carmen Carpintero	15 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 48 Martha Regino Herrera	15 junio del 2022	El/La señor(a) Martha Regino Herrera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 2 - lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 49 Blanca Avilez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Blanca Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 50 Luz Marina Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Manna Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 51 Gabriel Julio Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Julio Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 43 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 52 Luis rodriguez Rivero	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luis rodriguez Rivero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 53 Maria Monroy	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Monroy solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 54 Dani Velazquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Dani Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 55 Edith Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 9.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 56 Maryiris Navarro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maryiris Navarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 57 Santiago Troncoso Reyes	16 junio del 2022	El/La señor(a) Santiago Troncoso Reyes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45A - 157.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 58 Milagro Niebles Castro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Milagro Niebles Castro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 28 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 59 Elena Peña Pineda	16 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Peña Pineda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 60 Ever Luis Marquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ever Luis Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 121.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 61 Ramona Rosa Diaz	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ramona Rosa Diaz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 42 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 62 Andres Murillo Perez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 54 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 63 Heriberto Fernandez Lopez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Heriberto Fernandez Lopez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 17A 45B 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 64 Gabriel Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16I 45C 74.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 65 Denys Herrera Alvarez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Denys Herrera Alvarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 66 Alicia Conde Morales	16 junio del 2022	El/La señor(a) Alicia Conde Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45 A 65.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 67 Gregoria Marzan Solar	17 junio del 2022	El/La señor(a) Gregoria Marzan Solar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 01.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 68 Lina Martinez Zuñiga	17 junio del 2022	El/La señor(a) Lina Martinez Zuñiga solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 69 Carmerlo Castro Novoa	17 junio del 2022	El/La señor(a) Carmerlo Castro Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 48 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 70 Nicolasa Padilla	17 junio del 2022	El/La señor(a) Nicolasa Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 20A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 71 Jose Miguel Lopez Bravo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Miguel Lopez Bravo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 20.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 72 Vicente Villamizar Campo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Vicente Villamizar Campo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 73 Ely Causil Martinez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Ely Causil Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 74 Padro Ramos	17 junio del 2022	El/La señor(a) Padro Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 75 Dagoberto Mendoza Mercado	17 junio del 2022	El/La señor(a) Dagoberto Mendoza Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	PRESENTA RIESGO POR DESLIZAMIENTO , NO CUMPLE CON
Inclusión	No. de PQR 76 Iris Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 77 Maria Carlota Menco	17 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Carlota Menco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 36

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **19/12/2022** al **25/12/2022** Fecha **26/12/2022**

Inclusión	No. de PQR 78 Iris Murillo Perez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 79 Edilsa Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Edilsa Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 80 Alejandra Loaiza Corrales	17 junio del 2022	El/La señor(a) Alejandra Loaiza Corrales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 29 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 81 Grey Montes Rodriguez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Grey Montes Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 82 Marlenys arroyo Quintero	21 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenys arroyo Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 83 Rodolfo Gonzalez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Rodolfo Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 41 - lote 38.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 84 Elida Pinto Morales	21 junio del 2022	El/La señor(a) Elida Pinto Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 85 Nelfi Calle Mejia	21 junio del 2022	El/La señor(a) Nelfi Calle Mejia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 86 Jorge Ramos Osorio	21 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Ramos Osorio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 87 Manuel Solano Almario	21 junio del 2022	El/La señor(a) Manuel Solano Almario solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 88 Carmen Perez Contreras	21 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Perez Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 89 Estefany Buelvas	21 junio del 2022	El/La señor(a) Estefany Buelvas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 22 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 90 Omaida Villadiego	22 junio de(2022	El/La señor(a) Omaida Villadiego solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 41.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 91 Rosa Isabel Alba Llanares	22 junio de(2022	El/La señor(a) Rosa Isabel Alba Llanares solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 92 Carmen Arroyo Ramos	22 junio de(2022	El/La señor(a) Carmen Arroyo Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 28.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 93 Alvaro Macea Rivera	22 junio de(2022	El/La señor(a) Alvaro Macea Rivera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 12 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 94 Maria Quiroz Goez	23 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Quiroz Goez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrea 17f 45B - 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 95 Luis Alberto Quiroz	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Alberto Quiroz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 64 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 96 Aracelis Zuñiga Salcedo	23 junio del 2022	El/La señor(a) Aracelis Zuñiga Salcedo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 59.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 97 Luz Velazquez Villareal	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Velazquez Villareal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 98 Luis Felipe Galeano	24 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Felipe Galeano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 99 Rosalba Barragan Barbosa	24 junio del 2022	El/La señor(a) Rosalba Barragan Barbosa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 100 Teresa Santana Peralta	24 junio del 2022	El/La señor(a) Teresa Santana Peralta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A - 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 101 Etelvina Lobo Cuello	24 junio del 2022	El/La señor(a) Etelvina Lobo Cuello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 102 Maria Gonzalez	24 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 16 - lote .	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 103 Elena Perez Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 104 Edith Quintero	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 31 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 105 Edilma Gonzalez	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C 53.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 106 Karen Campo Cruz	27 junio del 2022	El/La señor(a) Karen Campo Cruz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16c 46B - 69.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 107 Libia Solar Orozco	27 junio del 2022	El/La señor(a) Libia Solar Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 108 Irma Baquero Fuentes	27 junio del 2022	El/La señor(a) Irma Baquero Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 -19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 109 Yuliet Perez Mendoza	27 junio del 2022	El/La señor(a) Yuliet Perez Mendoza solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 - 16C - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 110 Ibeth Vergara	29 junio del 2022	El/La señor(a) Ibeth Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 19A - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 111 Josefa Lazo Solano	29 junio del 2022	El/La señor(a) Josefa Lazo Solano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 112 Grisela Videz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Grisela Videz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 113 Juan Velazquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 60.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 114 Inogenes Carmona	29 junio del 2022	El/La señor(a) Inogenes Carmona solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46C - 52.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 115 Jesus Beltran Franco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jesus Beltran Franco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16B 46A - 51.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 116 Marina Benitez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marina Benitez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 117 Jorge Hoyos Otero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Hoyos Otero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 118 Yasmira Tovar Aguas	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yasmira Tovar Aguas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 119 Yerlis Salas Tovar	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Salas Tovar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 120 Jose Peñate Orozco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Peñate Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 121 Jorge Petro	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Petro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C 66.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 122 Francisco Romero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Francisco Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46 - 37.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 123 Luz Pajaro Garcia	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pajaro Garcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 55.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 124 Marlenis Delgado	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenis Delgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 125 Miguel Galindo	28 junio del 2022	El/La señor(a) Miguel Galindo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 126 Rubiela Gonzalez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Rubiela Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 48 B - 81.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 127 Norelis Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 55 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 128 Nohelia Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Nohelia Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 6 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 129 Esmeralda Marquez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Esmeralda Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 130 Gil Blanco Yubis	28 junio del 2022	El/La señor(a) Gil Blanco Yubis solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 23.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 131 Adis Arias Carvajal	29 junio del 2022	El/La señor(a) Adis Arias Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 76.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 132 Jaime Galindo Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime Galindo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 54.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 133 Luisa Noriega Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luisa Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 134 Silvia Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Silvia Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 135 Vianey Pelaez Vasquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Vianey Pelaez Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 145C - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 136 Yalitza Meza Montes	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yalitza Meza Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 36

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **19/12/2022** al **25/12/2022** Fecha **26/12/2022**

Inclusión	No. de PQR 137 Fredy Florian Pornnefz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Fredy Florian Pornnefz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 138 Segundo Novoa	29 junio del 2022	El/La señor(a) Segundo Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 35 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 139 Eduardo de Hoyo	29 junio del 2022	El/La señor(a) Eduardo de Hoyo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 140 Nohemi Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Nohemi Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 49.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 141 Yeline Molina Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeline Molina Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 45 - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 142 Yeison Ozuna Jimenez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeison Ozuna Jimenez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 11 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 143 Henry Contrera Rios	30 junio del 2022	El/La señor(a) Henry Contrera Rios solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 04.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 144 Dorys Yepez Suarez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dorys Yepez Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17D 45 - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 145 Jaime de Avila Syago	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime de Avila Syago solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 146 Hernando Trujillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Hernando Trujillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 147 Karina Marrugo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karina Marrugo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 148 Elisena Solar Orrozco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elisena Solar Orrozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 149 Bilma Salgado	30 junio del 2022	El/La señor(a) Bilma Salgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45B - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 150 Luz Fernandez Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Fernandez Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 151 Keider Avilez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keider Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 152 Rafael Bertel Bertel	30 junio del 2022	El/La señor(a) Rafael Bertel Bertel solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 153 Luz Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 43 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 154 Karol Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karol Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B - 136.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 155 Pabla Teran Romerin	30 junio del 2022	El/La señor(a) Pabla Teran Romerin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16H 45 - 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 156 Yadira Basilio Castillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yadira Basilio Castillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46a - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 157 Marqueza Padilla	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marqueza Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 36 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 158 Ruth Perez Perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ruth Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 159 Jose Carey Julio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Carey Julio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 160 Maria Manjarrez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Manjarrez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 161 Marleidis Bolaño	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marleidis Bolaño solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 162 Luis Manuel Murillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Manuel Murillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 163 Juan Perez Muslaco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Perez Muslaco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46A - 99.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 164 Keila Marquez Acosta	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keila Marquez Acosta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 33 - Lote 3A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 165 Nalfis Marquez David	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nalfis Marquez David solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 166 Yorlenis Tapia Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yorlenis Tapia Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 167 Ana Maria Tamara Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Maria Tamara Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 168 Elkin Zabala Vasquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elkin Zabala Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 169 Eder Hurtado Carpio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Eder Hurtado Carpio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 170 Dionicio Nieto	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dionicio Nieto solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 8 - Lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 171 Nerys Cruz Peña	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nerys Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 172 Consuelo Florez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Consuelo Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 173 Yonadis Tapias	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yonadis Tapias solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 16 - Lote 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 174 Jose Banquet perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Banquet perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 34 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 175 Alma Almentero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alma Almentero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 176 Luz Estela Escorcia	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Estela Escorcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 A 45A - 58.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 177 Celia Vega Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Celia Vega Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 136 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 178 Norelis Ortiz Rodelo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Ortiz Rodelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 179 Luis Julio Romero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Julio Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 48 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 180 Carmelina Gomez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Carmelina Gomez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 64 - Lote 29A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 181 Yerlis Muñoz	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Muñoz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17H 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 182 Andry Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Andry Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16E 46 - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 183 Emid Vega Bula	30 junio del 2022	El/La señor(a) Emid Vega Bula solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 184 Jhon Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jhon Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45C - 07.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 185 Alfonso Dieteben Ortega	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alfonso Dieteben Ortega solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 114.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 186 Luis Rosario Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Rosario Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 47 - 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 187 Frank Martinez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Frank Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16G 48A - 111.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 188 Ana Delgado Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Delgado Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 189 Ana Sofia Beltran	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Sofia Beltran solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45A 16G - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 190 Etilsa Suarez Ciprian	30 junio del 2022	El/La señor(a) Etilsa Suarez Ciprian solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45C - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
		Teniendo en cuenta los atrasos que se presentaban en obra, se		Plan de contingencia carta CONS-TUR-SINC-045 Actualización Plan de Contingencia GA-DOMI-071-22	

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 36

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **19/12/2022** al **25/12/2022** Fecha **26/12/2022**

Atraso en las actividades de ejecución de obra	Plan de contingencia	dio inicio al proceso de incumplimiento al Consorcio Turquía mediante mesa de trabajo del 21 de noviembre de 2022.	Consorcio Turquía	Mesa de trabajo con aseguradora y aprobacion de modificatorio No. 01 del contrato de obra, mediante el cuals e prorroga por tres (3) meses más, es decir hasta el 13/03/2023.	13/12/2022
Mal estado de vías de acceso.	Solicitud adecuación de vías por parte de Alcaldía.	* Teniendo en cuenta la reunión realizada el dia 31 de mayo de 2022 se concertó con la Alcaldía, a través del Ministerio de Vivienda, la disponibilidad de la maquinaria para llevar a cabo las adecuaciones de las vías de acceso al barrio El Poblado.	Alcaldía Sincelejo	El 22 de junio 2022 hizo presencia la maquinaria de la Alcaldía de Sincelejo para el inicio de las adecuaciones en la carrera 16 I con	22/06/2022
Contrato de acueducto	Coordinación entre contratos	El Contratista realizó los acercamientos pertinentes, no obstante a la fecha no se ha definido el fecha de inicio y fin de intervención de la vía 16 J	Alcaldía Sincelejo	N/A	N/A

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

* El Consorcio Turquía continuó con la Actividad 2 en las visitas de los diagnósticos de las viviendas objeto del programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en el barrio El Poblado, por lo tanto, a la fecha de corte del presente informe semanal se tiene aprobado seiscientos cuarenta (640) diagnósticos acumulados.

* De acuerdo con las diferentes reuniones sostenidas con el Contratista e Interventoría para la revisión de la Matriz Inicial, se realizó el balance de los posibles beneficiarios del programa de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Sincelejo - Sucre, en contraste con los recorridos de verificación en campo, plano del barrio El Poblado de caracterización de zonas de riesgo y los diferentes informes emitidos por el FOVIS, se obtuvo un potencial neto de 644 viviendas efectivas, 46 no efectivas y 3 renuncias, tal y como se muestra a continuación:

Viviendas efectivas: 644
Viviendas diagnóstico aprobado: 640
Viviendas con observaciones de diagnóstico: 3
Viviendas no efectivas: 46
Renuncias: 3
Viviendas Pendientes por diagnosticar: 12
Viviendas terminadas: 414
Viviendas en ejecución: 6
Viviendas iniciadas: 420

* Para la Actividad 3 se han iniciado un total de cuatrocientos veinte (420) viviendas, de las cuatrocientos catorce (414) están terminadas, seis (6) en ejecución. En la semana se realizaron 4 aperturas.

* Con respecto a la Actividad 4, se han recibido ciento noventa (190) solicitudes de inclusiones, de las cuales ciento cinco (105) han sido avaladas por la Alcaldía de Sincelejo, ochenta y cuatro (84) no fueron aprobadas y una (01) en la cual el FOVIS no dio una respuesta clara de aprobación. Se continuará con las visitas vivienda a vivienda así como reuniones sectorizadas para dar a conocer a los potenciales beneficiarios toda la información referente a este proyecto.

A corte del presente informe semanal se tiene un porcentaje ejecutado acumulado de 62,30% y un porcentaje programado acumulado de 60,11%, producto del tiempo adicional de los tres (3) meses para la culminación de las obras.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	Firma	Firma
Nombre EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Nombre HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Nombre
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Profesional Costos y Presupuesto <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contraloría, Interventoría

Bogotá D.C, 04 de enero de 2023

Señor
JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
Supervisor
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio
Calle 26 N°. 13-19
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría N°. 2220585 "Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre"**

Asunto: **Remisión Informe Semanal No. 37 periodo del 26 de diciembre de 2022 al 01 de enero de 2023**

Apreciado señor,

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, anexo, se remite el informe semanal de Interventoría No. 37 del contrato de la referencia para el período comprendido entre el 26 de diciembre de 2022 al 01 de enero de 2023.

Anexo se remite como soporte al Informe Semanal N°. 37; bitácora de obra, Lista de chequeo seguimiento estado de salud de Interventoría y Obra, Acta de seguimiento, Acta de comité de aprobación de diagnóstico, Informe social, Resumen de avance y Matriz Tres Momentos.

Cordialmente,

EDGAR ALFONSO ARAGÓN OTERO
Director de Interventoría
Anexos: Lo enunciado en treinta y ocho (38) folios y archivos en magnético.
C.C.: Ing. Juan David Amón – Supervisor del contrato Convenio Inter administrativo 221005; Enterritorio.
Archivo.
Elaboró: MJ.
Revisó: EAO.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 4/01/2023
HORA: 4:22:22 p. m.
20234300002572

INFORME SEMANAL

Cra. 48 No. 101A – 29 Bogotá, Colombia Tel: (57 1) 236 7974 – 621 5383
E-mail: info@gavinco.com www.gavinco.com

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 37

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **26/12/2022** al **1/01/2022** | Fecha **2/01/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

código PROYECTO	2220577			
OBJETO DEL PROYECTO	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO**	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO
GERENCIA A CARGO	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1			
SUPERVISOR	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ			
ESTADO DEL PROYECTO	En ejecución.			

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220577	
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	
Valor inicial	$ 5.034.941.972,00	
Adición No. 1	N/A	
Valor actual	$ 5.034.941.972,00	
Variación del valor	$ -	
Fecha de Inicio	13/04/2022	
Plazo inicial (Días)	244 Días	
Prorroga No. 1	90 Días	
Plazo actual (Días)	334 Días	100,00%
Variación en plazo	90 Días	
Fecha Contractual de terminación	13/03/2023	
Tiempo Transcurrido (días)	-101	-30,24%
Días remanentes del Contrato	435	130,24%
Acumulado a última acta pagada	$ 2.820.263.489,10	
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -	

2.2 CONTRATO DE Interventoría

Contrato No.	2220585	
Interventor	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.	
Valor inicial	$ 542.723.071,00	
Adición No. 1	$ 150.072.084,00	
Valor actual	$ 692.795.155,00	
Variación del valor	$ 150.072.084,00	
Fecha de Inicio	13/04/2022	
Plazo inicial	244 Días	
Prorroga No. 1	90 Días	
Plazo actual	334 Días	100,00%
Variación en plazo	90 Días	
Fecha Contractual de terminación	13/03/2023	
Ejecución del Contrato	-101	-30,24%
Días remanentes del Contrato	435	130,24%
Acumulado a última acta pagada	$ 339.826.050,90	
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -	

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPENO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 5.034.941.972,00

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 3.026.395.171,45	60,11%	$ 3.136.768.848,56	62,30%	$ 110.373.677,10	2,19%
Durante el Periodo	$ 111.585.933,36	2,22%	$ 37.455.625,40	0,74%	$ -74.130.307,96	-1,47%
Acumulado a la Fecha	$ 3.137.981.104,82	**62,32%**	$ 3.174.224.473,95	**63,04%**	$ 36.243.369,14	**0,72%**

Semáforo

Desviación en días: 2 Días

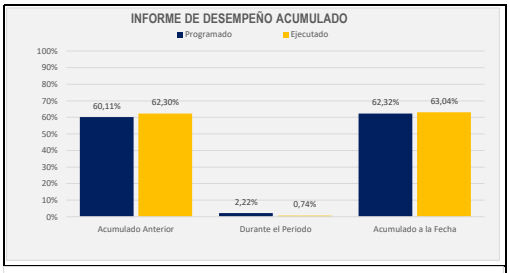

Observaciones al desempeño del proyecto


Actividad 1. *Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquia. Aprobado por interventoria con cartas GA-DOMI-040-22 del dia 31 de mayo de 2022 y radicado en ENTERRITORIO bajo el N°. 20224300206752 y GA-DOMI-030-22 radicado N°. 20224300189742.*


Actividad 2. *Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoria, por el Contratista de obra, un total de 64 4 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 640 diagnósticos acumulados. Hay 46 diagnósticos no efectivos y Tres (3) renuncias.*

Actividad 3. *A corte de este informe el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 426 viviendas, de las cuales 417 están terminadas, 9 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 214 para inicio de actividades.*

Actividad 4. *Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas, y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.*

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

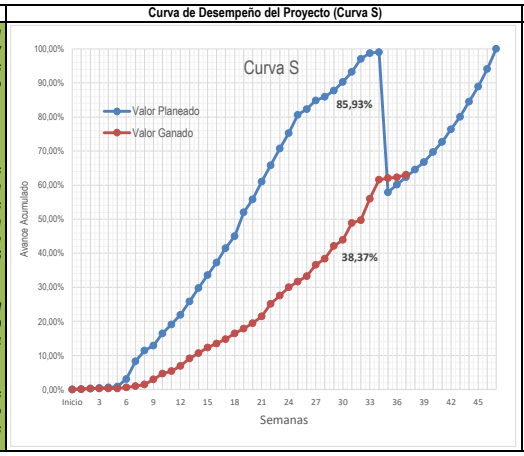

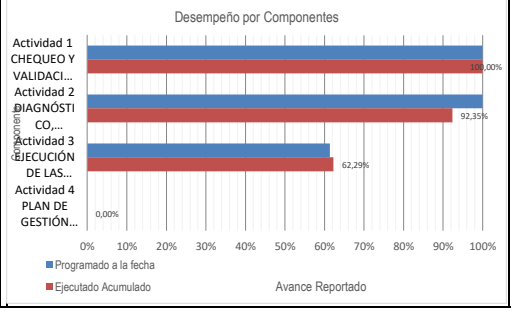

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE


DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

* Se ajusta la curva S del proyecto conforme a la capacitación dada el 28 de abril de 2022 por parte del supervisor de ENTERRITORIO.
* La Entidad mediante la suscripción del Modificatorio No. 1 del 13 de diciembre de 2022 se da aval a ampliar el plazo de la ejecución de las obras hasta el día 13 de marzo de 2023, tiempo que no generará costos adicionales a la Entidad y el contratista de obra asume el costo de mayor permanencia de Interventoría. Por consiguiente se realiza el ajuste de la curva S de las actividades de obra conforme a la reprogramacion realizada por el Consorcio Turquía con carta CONS-TUR-SINC-163 del 21 de noviembre de 2022, la cual fue revisada por Interventoría y avalada con la comunicación GA-DOMI-217-22 del día 25 de noviembre de 2022 radicado No. 20224300453802.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	60,11%	62,30%	2,19%	
Durante el Periodo	2,22%	0,74%	-1,47%	
Acumulado a la Fecha	**62,32%**	**63,04%**	**0,72%**	

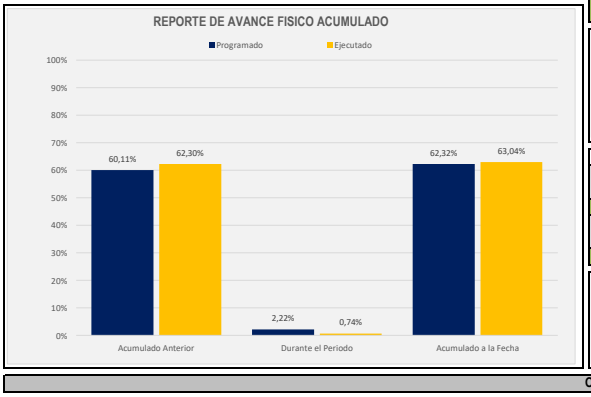

AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 5.034.941.972,00	$ 5.034.941.972,00	$ -	$ 981.956.213,60	$ 841.887.956,54	$ 140.068.257,06

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
6	$ 2.820.263.489,10	56,01%	6	$ 2.820.263.489,10	56,01%	9/12/2022	$ 769.913.798,72








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 542.723.071,00	$ 692.795.155,00	$ 150.072.084,00	N/A	N/A	N/A

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
8	$ 339.826.050,90	49,05%	8	$ 339.826.050,90	49,05%	12/12/2022	$ 54.489.396,32







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA APROBADO.

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 37

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **26/12/2022** al **1/01/2022** Fecha **2/01/2022**

* Actividad 1. Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, se presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía.

* Actividad 2. Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoría, por el Contratista de obra, un total de 644 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 640 diagnósticos acumulados. Está pendiente de atención de observaciones de 3 diagnóstico y uno (1) por realizar la visita para diagnosticar la vivienda. De acuerdo al informe técnico entregado por el FOVIS de las manzanas 40A, 38A Y 38, hay once (11) diagnósticos que pasarían a ser no efectivos ya que las viviendas se encuentran en zona de riesgo, por lo tanto, el total de diagnósticos no efectivos se eleva a 46 y tres (3) renuncias.

* Actividad 3. A corte de este informe, el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 426 viviendas, de las cuales 417 están terminadas, 9 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 214 para inicio de actividades.

* Actividad 4. Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.

Actividad 2.

Diagnósticos programación inicial: 693
Diagnósticos reprogramación: 693
Diagnósticos Aprobados acumulados: 640
Viviendas con observaciones de diagnóstico: 3
Viviendas efectivas: 644
Viviendas no efectivas: 46
Renuncias: 3

Actividad 3.

Viviendas programación inicial: 693
Viviendas reprogramación: 405
Viviendas terminadas: 417
Viviendas en ejecución: 9
Viviendas totales iniciadas: 426

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

• El día 29 de diciembre de 2022 se recibió la carta CONS-TUR-SINC-175 con la respuesta dada a las observaciones emitidas por Interventoría en los detalles de las unidades sanitarias terminadas.
• El día 29 de diciembre de 2022 se recibe respuesta con comunicación CONS-TUR-SINC-177, respecto al derecho de petición enviado por la veeduría.
• Con carta GGA-DOMI-245-22 del día 29 de diciembre de 2022, esta interventoría procedió a enviar el informe semanal # 36.
• El día 30 de diciembre de 2022 esta interventoría mediante la carta GA-DOMI-247-22 se realizó seguimiento a los compromisos fijados en el comité de seguimiento No. 43 y se solicitó al Consorcio Turquía dar estricto cumplimiento de cada uno de ellos en los tiempos fijados.

ACTIVIDADES EN CAMPO

* El día 26 de diciembre de 2022 el Consorcio Turquía continuó con las actividades de levante de muros, fundida de registros sanitarios y suministro de materiales. Se realizaron 2 aperturas bajo los códigos N°. S-SC-EP-M71-VE-089 y S-SC-EP-M30-VE-669.
* El día 27 de diciembre de 2022, el contratista de obra continuó con las actividades de fundida de registros sanitarios, instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros, fundida de machones y columnas, instalación de enchape y aparatos sanitarios. El día de hoy no se realizó aperturas de nuevas viviendas para ejecución.
* El día 28 de diciembre de 2022, el contratista continuó con las actividades de instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención, instalación de enchape, pintura y atendiendo detalles de la casetas terminadas. El 21 de diciembre de 2022 se realizaron dos (2) aperturas bajo los códigos N°. S-SC-EP-M71-VE-616 y S-SC-EP-M71-VE-617.
* El día 29 de diciembre de 2022, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado.
* El día 30 de diciembre de 2022 se continuó con las actividades de obra como levante de muros, excavación de cimentaciones, fundida de machones, fundida de plantilla, armado del acero para las columnas y vigas. Para el día de hoy no se realizaron aperturas.
* El día 31 de diciembre de 2022 se continuó con las actividades de obra como levante de muros, fundida de machones, fundida de plantilla, armado del acero para las columnas y vigas. Para el día de hoy no se realizaron aperturas.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

* Se continuará con la intervención de las viviendas en el barrio El Poblado en Sincelejo Sucre.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	149	0	149	71,6%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	35	0	35	16,8%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	8	0	8	3,8%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cual? Orden público	16	0	16	7,7%
	Total	**208**	**0**	**208**	**100,00%**



En la semana no se presentaron lluvias.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
Tipología PQR	Radicado por		Fecha	Asunto	Dirigido a	Respuesta Alcaldía / FOVIS
Inclusión	No. de PQR 1 Yessica Cantello		20 mayo del 2022	El/La señor(a) Yessica Cantello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 2 Betilda Gonzales		25 mayo del 2022	El/La señor(a) Betilda Gonzales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 40 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 3 Luz Dary Ruiz		25 mayo del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 4 Jorge Guerra Arrieta		25 mayo del 2022	El/La señor(a) Jorge Guerra Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45a 16i - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 5 Emir Elias Pren M		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Emir Elias Pren M solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 15 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 6 Andrea Beltran Vides		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Andrea Beltran Vides solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 4 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 7 Jader Perez Molina		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Jader Perez Molina solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17e 45 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 8 Oscar Gamarro		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Oscar Gamarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 50 - lote 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 9 Manuel Mercado A		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Manuel Mercado A solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17d 45 -06.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 10 Humberto Atencia Sierra		27 mayo del 2022	El/La señor(a) Humberto Atencia Sierra solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 62 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 11 Erika Blanco		27 mayo del 2022	El/La señor(a) Erika Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	El contratista reliza el cierre d ela solicitud teniendo en cuenta el concepto del FOVIS.
Inclusión	No. de PQR 12 Yuris Paola Suarez		31 mayo del 2022	El/La señor(a) Yuris Paola Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 38 lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	zona de riesgo El predio tiene un area dentro de la vivienda que presenta
Inclusión	No. de PQR 13 Katerine Benitez Villalba		31 mayo del 2022	El/La señor(a) Katerine Benitez Villalba solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 50 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 14 Jose Joaquin Florez		31 mayo del 2022	El/La señor(a) Jose Joaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 15 Ana Isabel Florez		31 mayo del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 16 Marileys Molina Alvarado		01 junio del 2022	El/La señor(a) Marileys Molina Alvarado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 17 Jeraldine Yepe Lasmar		01 junio del 2022	El/La señor(a) Jeraldine Yepe Lasmar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 18 Enna Maria Lamar		01 junio del 2022	El/La señor(a) Enna Maria Lamar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 19 Nauded Alvarez Maurez		02 junio del 2022	El/La señor(a) Nauded Alvarez Maurez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 20 Henoc Jose Mercado		03 junio del 2022	El/La señor(a) Henoc Jose Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 F 45- 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 21 Brenda Galvan Mercado		03 junio del 2022	El/La señor(a) Brenda Galvan Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 61 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 37

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **26/12/2022** al **1/01/2022** Fecha **2/01/2022**

Inclusión	No. de PQR 22 Sindy Rodriguez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Sindy Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 23 Luz Dary Martinez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 24 Jose Juaquin Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Juaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 25 Ana Milena Vergara	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Milena Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 20 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 26 Maria Alejandra Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Alejandra Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 27 Oswaldo jimenez Ramirez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Oswaldo jimenez Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 28 Hernan Jimenez Marin	06 junio del 2022	El/La señor(a) Hernan Jimenez Marin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 14 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 29 Carmen Carpintero	06 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 30 Ana Isabel Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	Cabe aclarar que la PQR # 30 se recepcionó dos veces, a nombre de la
Inclusión	No. de PQR 31 Edilma Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 45 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 32 Silvio David Morelo	06 junio del 2022	El/La señor(a) Silvio David Morelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 57 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 33 Norelis Zabaleta	06 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Zabaleta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 59 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 34 Darin Blanco Fuentes	6 junio del 2022	El/La señor(a) Darin Blanco Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	definir con planeacion si esta en zona de riesgo.
Inclusión	No. de PQR 35 Deivi Jose Miranda	8 junio del 2022	El/La señor(a) Deivi Jose Miranda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 36 Gertrudis Lopez Herazo	8 junio del 2022	El/La señor(a) Gertrudis Lopez Herazo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 37 Sandra Cruz Peña	10 junio del 2022	El/La señor(a) Sandra Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 73.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 38 Gina Salcedo Ruiz	10 junio del 2022	El/La señor(a) Gina Salcedo Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 39 Yesica Cabrera Lora	10 junio del 2022	El/La señor(a) Yesica Cabrera Lora solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 40 Walter Arrieta	10 junio del 2022	El/La señor(a) Walter Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 41 Ana Luisa Contreras	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Luisa Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 32.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 42 Andres Bruno Benavidez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Bruno Benavidez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 43 Bertina Montes	15 junio del 2022	El/La señor(a) Bertina Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 39 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 44 Emistocle Bertel Avila	15 junio del 2022	El/La señor(a) Emistocle Bertel Avila solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 14.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 45 Griseida Arrieta Betin	15 junio del 2022	El/La señor(a) Griseida Arrieta Betin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 53 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 46 Nadin Carvajal	15 junio del 2022	El/La señor(a) Nadin Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 47 Carmen Carpintero	15 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 48 Martha Regino Herrera	15 junio del 2022	El/La señor(a) Martha Regino Herrera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 2 - lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 49 Blanca Avilez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Blanca Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 50 Luz Marina Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Marina Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 51 Gabriel Julio Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Julio Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 43 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 52 Luis rodriguez Rivero	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luis rodriguez Rivero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 53 Maria Monroy	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Monroy solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 54 Dani Velazquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Dani Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 55 Edith Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 9.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 56 Maryiris Navarro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maryiris Navarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 57 Santiago Troncoso Reyes	16 junio del 2022	El/La señor(a) Santiago Troncoso Reyes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45A - 157.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 58 Milagro Niebles Castro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Milagro Niebles Castro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 28 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 59 Elena Peña Pineda	16 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Peña Pineda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 60 Ever Luis Marquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ever Luis Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 121.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 61 Ramona Rosa Diaz	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ramona Rosa Diaz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 42 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 62 Andres Murillo Perez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 54 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 63 Heriberto Fernandez Lopez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Heriberto Fernandez Lopez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 17A 45B 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 64 Gabriel Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16I 45C 74.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 65 Denys Herrera Alvarez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Denys Herrera Alvarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 66 Alicia Conde Morales	16 junio del 2022	El/La señor(a) Alicia Conde Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45 A 65.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 67 Gregoria Marzan Solar	17 junio del 2022	El/La señor(a) Gregoria Marzan Solar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 01.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 68 Lina Martinez Zuñiga	17 junio del 2022	El/La señor(a) Lina Martinez Zuñiga solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 69 Carmerlo Castro Novoa	17 junio del 2022	El/La señor(a) Carmerlo Castro Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 48 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 70 Nicolasa Padilla	17 junio del 2022	El/La señor(a) Nicolasa Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 20A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 71 Jose Miguel Lopez Bravo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Miguel Lopez Bravo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 20.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 72 Vicente Villamizar Campo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Vicente Villamizar Campo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 73 Ely Causil Martinez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Ely Causil Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 74 Padro Ramos	17 junio del 2022	El/La señor(a) Padro Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 75 Dagoberto Mendoza Mercado	17 junio del 2022	El/La señor(a) Dagoberto Mendoza Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	PRESENTA RIESGO POR DESLIZAMIENTO , NO CUMPLE CON
Inclusión	No. de PQR 76 Iris Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 77 Maria Carlota Menco	17 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Carlota Menco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 78 Iris Murillo Perez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 79 Edilsa Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Edilsa Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 80 Alejandra Loaiza Corrales	17 junio del 2022	El/La señor(a) Alejandra Loaiza Corrales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 29 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 37

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **26/12/2022** al **1/01/2022** Fecha **2/01/2022**

Inclusión	No. de PQR 81 Grey Montes Rodriguez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Grey Montes Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 82 Marlenys arroyo Quintero	21 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenys arroyo Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 83 Rodolfo Gonzalez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Rodolfo Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 41 - lote 38.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 84 Elida Pinto Morales	21 junio del 2022	El/La señor(a) Elida Pinto Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 85 Nelfi Calle Mejia	21 junio del 2022	El/La señor(a) Nelfi Calle Mejia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 86 Jorge Ramos Osorio	21 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Ramos Osorio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 87 Manuel Solano Almario	21 junio del 2022	El/La señor(a) Manuel Solano Almario solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 88 Carmen Perez Contreras	21 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Perez Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 89 Estefany Buelvas	21 junio del 2022	El/La señor(a) Estefany Buelvas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 22 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 90 Omaida Villadiego	22 junio de(2022	El/La señor(a) Omaida Villadiego solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 41.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 91 Rosa Isabel Alba Llanares	22 junio de(2022	El/La señor(a) Rosa Isabel Alba Llanares solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 92 Carmen Arroyo Ramos	22 junio de(2022	El/La señor(a) Carmen Arroyo Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 28.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 93 Alvaro Macea Rivera	22 junio de(2022	El/La señor(a) Alvaro Macea Rivera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 12 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 94 Maria Quiroz Goez	23 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Quiroz Goez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrea 17f 45B - 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 95 Luis Alberto Quiroz	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Alberto Quiroz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 64 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 96 Aracelis Zuñiga Salcedo	23 junio del 2022	El/La señor(a) Aracelis Zuñiga Salcedo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 59.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 97 Luz Velazquez Villareal	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Velazquez Villareal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 98 Luis Felipe Galeano	24 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Felipe Galeano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 99 Rosalba Barragan Barbosa	24 junio del 2022	El/La señor(a) Rosalba Barragan Barbosa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 100 Teresa Santana Peralta	24 junio del 2022	El/La señor(a) Teresa Santana Peralta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A - 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 101 Etelvina Lobo Cuello	24 junio del 2022	El/La señor(a) Etelvina Lobo Cuello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 102 Maria Gonzalez	24 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 16 - lote .	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 103 Elena Perez Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 104 Edith Quintero	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 31 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 105 Edilma Gonzalez	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C 53.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 106 Karen Campo Cruz	27 junio del 2022	El/La señor(a) Karen Campo Cruz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16c 46B - 69.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 107 Libia Solar Orozco	27 junio del 2022	El/La señor(a) Libia Solar Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 108 Irma Baquero Fuentes	27 junio del 2022	El/La señor(a) Irma Baquero Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 -19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 109 Yuliet Perez Mendoza	27 junio del 2022	El/La señor(a) Yuliet Perez Mendoza solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 - 16C - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 110 Ibeth Vergara	29 junio del 2022	El/La señor(a) Ibeth Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 19A - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 111 Josefa Lazo Solano	29 junio del 2022	El/La señor(a) Josefa Lazo Solano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 112 Grisela Videz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Grisela Videz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 113 Juan Velazquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 60.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 114 Inogenes Carmona	29 junio del 2022	El/La señor(a) Inogenes Carmona solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46C - 52.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 115 Jesus Beltran Franco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jesus Beltran Franco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16B 46A - 51.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 116 Marina Benitez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marina Benitez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 117 Jorge Hoyos Otero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Hoyos Otero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 118 Yasmira Tovar Aguas	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yasmira Tovar Aguas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 119 Yerlis Salas Tovar	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Salas Tovar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 120 Jose Peñate Orozco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Peñate Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 121 Jorge Petro	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Petro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C 66.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 122 Francisco Romero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Francisco Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46 - 37.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 123 Luz Pajaro Garcia	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pajaro Garcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 55.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 124 Marlenis Delgado	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenis Delgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 125 Miguel Galindo	28 junio del 2022	El/La señor(a) Miguel Galindo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 126 Rubiela Gonzalez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Rubiela Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 48 B - 81.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 127 Norelis Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 55 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 128 Nohelia Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Nohelia Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 6 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 129 Esmeralda Marquez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Esmeralda Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 130 Gil Blanco Yubis	28 junio del 2022	El/La señor(a) Gil Blanco Yubis solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 23.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 131 Adis Arias Carvajal	29 junio del 2022	El/La señor(a) Adis Arias Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 76.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 132 Jaime Galindo Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime Galindo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 54.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 133 Luisa Noriega Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luisa Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 134 Silvia Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Silvia Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 135 Vianey Pelaez Vasquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Vianey Pelaez Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 145C - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 136 Yalitza Meza Montes	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yalitza Meza Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 137 Fredy Florian Pornnefz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Fredy Florian Pornnefz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 138 Segundo Novoa	29 junio del 2022	El/La señor(a) Segundo Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 35 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 139 Eduardo de Hoyo	29 junio del 2022	El/La señor(a) Eduardo de Hoyo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 37

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **26/12/2022** al **1/01/2022** Fecha **2/01/2022**

Inclusión	No. de PQR 140 Nohemi Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Nohemi Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 49.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 141 Yeline Molina Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeline Molina Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 45 - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 142 Yeison Ozuna Jimenez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeison Ozuna Jimenez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 11 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 143 Henry Contrera Rios	30 junio del 2022	El/La señor(a) Henry Contrera Rios solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 04.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 144 Dorys Yepez Suarez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dorys Yepez Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17D 45 - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 145 Jaime de Avila Syago	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime de Avila Syago solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 146 Hernando Trujillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Hernando Trujillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 147 Karina Marrugo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karina Marrugo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 148 Elisena Solar Orrozco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elisena Solar Orrozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 149 Bilma Salgado	30 junio del 2022	El/La señor(a) Bilma Salgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45B - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 150 Luz Fernandez Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Fernandez Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 151 Keider Avilez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keider Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 152 Rafael Bertel Bertel	30 junio del 2022	El/La señor(a) Rafael Bertel Bertel solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 153 Luz Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 43 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 154 Karol Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karol Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B - 136.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 155 Pabla Teran Romerin	30 junio del 2022	El/La señor(a) Pabla Teran Romerin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16H 45 - 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 156 Yadira Basilio Castillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yadira Basilio Castillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46a - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 157 Marqueza Padilla	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marqueza Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 36 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 158 Ruth Perez Perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ruth Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 159 Jose Carey Julio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Carey Julio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 160 Maria Manjarrez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Manjarrez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 161 Marleidis Bolaño	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marleidis Bolaño solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 162 Luis Manuel Murillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Manuel Murillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 163 Juan Perez Muslaco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Perez Muslaco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46A - 99.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 164 Keila Marquez Acosta	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keila Marquez Acosta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 33 - Lote 3A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 165 Nalfis Marquez David	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nalfis Marquez David solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 166 Yorlenis Tapia Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yorlenis Tapia Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 167 Ana Maria Tamara Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Maria Tamara Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 168 Elkin Zabala Vasquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elkin Zabala Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 169 Eder Hurtado Carpio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Eder Hurtado Carpio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 170 Dionicio Nieto	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dionicio Nieto solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 8 - Lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 171 Nerys Cruz Peña	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nerys Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 172 Consuelo Florez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Consuelo Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 173 Yonadis Tapias	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yonadis Tapias solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 16 - Lote 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 174 Jose Banquet perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Banquet perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 34 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 175 Alma Almentero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alma Almentero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 176 Luz Estela Escorcia	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Estela Escorcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 A 45A - 58.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 177 Celia Vega Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Celia Vega Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 136 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 178 Norelis Ortiz Rodelo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Ortiz Rodelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 179 Luis Julio Romero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Julio Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 48 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 180 Carmelina Gomez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Carmelina Gomez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 64 - Lote 29A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 181 Yerlis Muñoz	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Muñoz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17H 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 182 Andry Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Andry Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16E 46 - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 183 Emid Vega Bula	30 junio del 2022	El/La señor(a) Emid Vega Bula solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 184 Jhon Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jhon Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45C - 07.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 185 Alfonso Dieteben Ortega	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alfonso Dieteben Ortega solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 114.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 186 Luis Rosario Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Rosario Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 47 - 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 187 Frank Martinez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Frank Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16G 48A - 111.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 188 Ana Delgado Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Delgado Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 189 Ana Sofia Beltran	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Sofia Beltran solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45A 16G - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 190 Etilsa Suarez Ciprian	30 junio del 2022	El/La señor(a) Etilsa Suarez Ciprian solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45C - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
Atraso en las actividades de ejecución de obra	Plan de contingencia	Teniendo en cuenta los atrasos que se presentaban en obra, se dio inicio al proceso de incumplimiento al Consorcio Turquía mediante mesa de trabajo del 21 de noviembre de 2022.	Consorcio Turquía	Plan de contingencia carta CONS-TUR-SINC-045 Actualización Plan de Contingencia GA-DOMI-071-22 Mesa de trabajo con aseguradora y aprobacion de modificatorio No. 01 del contrato de obra, mediante el cuals e prorroga por tres (3) meses más, es decir hasta el 13/03/2023.	13/12/2022

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 37

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **26/12/2022** al **1/01/2022** Fecha **2/01/2022**

Mal estado de vías de acceso.	Solicitud adecuación de vías por parte de Alcaldía.	* Teniendo en cuenta la reunión realizada el día 31 de mayo de 2022 se concertó con la Alcaldía, a través del Ministerio de Vivienda, la disponibilidad de la maquinaria para llevar a cabo las adecuaciones de las vías de acceso al barrio El Poblado.	Alcaldía Sincelejo	El 22 de junio 2022 hizo presencia la maquinaria de la Alcaldía de Sincelejo para el inicio de las adecuaciones en la carrera 16 I con	22/06/2022
Contrato de acueducto	Coordinación entre contratos	El Contratista realizó los acercamientos pertinentes, no obstante a la fecha no se ha definido el fecha de inicio y fin de intervención de la vía 16 J	Alcaldía Sincelejo	N/A	N/A

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

* El Consorcio Turquía continuó con la Actividad 2 en las visitas de los diagnósticos de las viviendas objeto del programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en el barrio El Poblado, por lo tanto, a la fecha de corte del presente informe semanal se tiene aprobado seiscientos cuarenta (640) diagnósticos acumulados.

* De acuerdo con las diferentes reuniones sostenidas con el Contratista e Interventoría para la revisión de la Matriz Inicial, se realizó el balance de los posibles beneficiarios del programa de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Sincelejo - Sucre, en contraste con los recorridos de verificación en campo, plano del barrio El Poblado de caracterización de zonas de riesgo y los diferentes informes emitidos por el FOVIS, se obtuvo un potencial neto de 644 viviendas efectivas, 46 no efectivas y 3 renuncias, tal y como se muestra a continuación:

Viviendas efectivas: 644
Viviendas diagnóstico aprobado: 640
Viviendas con observaciones de diagnóstico: 3
Viviendas no efectivas: 46
Renuncias: 3
Viviendas Pendientes por diagnosticar: 1
Viviendas terminadas: 417
Viviendas en ejecución: 9
Viviendas iniciadas: 426

* Para la Actividad 3 se han iniciado un total de cuatrocientos veinte y seis (426) viviendas, de las cuatrocientos diecisiete (417) están terminadas, nueve (9) en ejecución. En la semana se realizaron 4 aperturas.

* Con respecto a la Actividad 4, se han recibido ciento noventa (190) solicitudes de inclusiones, de las cuales ciento cinco (105) han sido avaladas por la Alcaldía de Sincelejo, ochenta y cuatro (84) no fueron aprobadas y una (01) en la cual el FOVIS no dio una respuesta clara de aprobación. Se continuará con las visitas vivienda a vivienda así como reuniones sectorizadas para dar a conocer a los potenciales beneficiarios toda la información referente a este proyecto.

A corte del presente informe semanal se tiene un porcentaje ejecutado acumulado de 63,04% y un porcentaje programado acumulado de 62,32%, producto del tiempo adicional de los tres (3) meses para la culminación de las obras. Teniendo en cuenta la modificación contractual se realizó el trámite de actualización de las pólizas del contrato de Interventoría remitidas a la Entidad mediante la comunicación GA-DOMI-244-22 del día 27 de diciembre de 2022 radicado No. 20224300503732, así mismo se realizó el cargue correspondiente en la plataforma del SECOP II.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	Firma	Firma
Nombre EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Nombre HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Nombre
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Profesional Costos y Presupuesto <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, interventoria

Anexo 18. Informe de gestión social

Municipio	SINCELEJO	**Contrato:**		2220577
Contratista de obra	CONSORCIO TURQUIA	**Contratista de interventoría**		GAVINCO
Fecha:	Diciembre	**Elaboró:**	Candelaria Gózales Medina	**Revisó:** July Paulin Rios Anaya

1. LÍNEA DE COMUNICACIÓN

Acompañamiento a Visitas de obra:

Durante el periodo del mes de noviembre del año en curso, se realizaron visitas de socialización casa a casa en las aperturas de viviendas hasta la fecha de cierre de este informe se tiene un total de 38 viviendas visitadas en el barrio el Poblado, para la actividad de socialización casa a casa en las aperturas. Esta actividad se realizó con el acompañamiento del área técnica y social de la interventoría, y de la veeduría

Cabe resaltar que los beneficiarios se encuentran muy interesados y felices con la llegada del Programa a sus viviendas, los profesionales técnicos y sociales de obra e interventoría realizan explicación clara y veraz del alcance del Programa a los beneficiarios. Asimismo, se concertó el lugar de intervención en cada vivienda.

Fecha	Barrios	Asistentes	Lugar	Acciones y Principales resultados	Responsable	Evidencias
Del 1 al 31 de diciembre	El Poblado	Contratistas de obra e interventoría Veedores	El Poblado	Socialización del PCI, se despejaron dudas e inquietudes	Contratistas Interventoría	asistencia y registro fotográficos

Diseñar, publicar y distribuir material publicitario:

Durante este periodo se llevó a cabo entregas, folletos informativos y volantes de invitación, con el fin de invitar a la comunidad a la capacitación sectorizada en educación sanitaria, se realizó convocatoria casa a casa, con entregas de volantes de invitación

Por otra parte, se continuó con la entrega de folletos informativos en las diferentes actividades realizada, como son las socializaciones y capacitaciones sectorizadas. De igual forma, se realizaron perifoneos locales en las diferentes manzanas del barrio el Poblado, con el fin de mantener a la

comunidad informada sobre la continuación de las intervenciones durante el mes de diciembre en cada una de las viviendas benefciadas.

Material Utilizado	Descripción medio de divulgación implementado	Relación de las Evidencias
Material para las socializaciones	----------	---------
Material para las Capacitaciones	Folletos y volantes	Folletos escáner del volante
Material Informativoy/o de convocatoria	Perifoneo local	Video de los perifoneos y audios
Otras actividades dedivulgación: Cuñas radiales, prensa local, perifoneo, entre otras)	N/A	----------

LÍNEA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Punto de Atención: El punto de atención la profesional social brinda atención personalizada, a 4 personas que se acercaron porque tenían dudas e inquietudes por la fecha de entrega de materiales e intervención de sus viviendas, a lo cual el área social suministra toda la información solicitada, dejando claridad sobre las dudas presentadas, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad. Cabe informar que durante este periodo se realizó la instalación de dos puntos de atención móviles atención, con el fin de cubrir la totalidad de las manzanas del barrio.

Los puntos de atención se encuentran ubicados en la calle 9 manzana 32- lote 38, casa del beneficiario José tiran y el segundo punto de atención se encuentra ubicado en la dirección Carrera 17 D# 45 A 05, en la casa de la beneficiaria Luz Mery Rivera. las atenciones a la comunidad se están brindando los días lunes, martes y jueves de 8:00am a 12:00pm y de 2:00 a 4:00 pm. De igual forma se cuenta con un número de contacto para que la comunidad pueda comunicarse a la línea 3015973080 con el fin de evitar aglomeraciones y minimizar el riesgo de contagio.

Adicionalmente, es de señalar que los Puntos de Atención a la Comunidad dispone de un cartel Informativo para que la comunidad tenga orientación donde están ubicadas las instalaciones del Programa, en el mismo se encuentran plasmados los días y horario de atención. (Debidamente validado por ENTerritorio).

Barrios	Punto de información	PQRS recibidas	PQRS atendidas	PQRS pendientes oen trámite	Producto	Observaciones
El Poblado	Calle 9 MZ 32-lote 38 Carrea 17D # 45ª -05	195	188	4	Formato PCI 024 .	Por solicitud de inclusión hay 3 en traite y por quejas 3 abiertas, las cuales deben ser atendidas por el Fovis, para poder cerrarlas a satisfacción

BUZÓN DE PQRS:

Para este periodo no se encontró ninguna PQR en el buzón de sugerencias, cabe resaltar que el mismo se revisa semanalmente con el acompañamiento de la veeduría

. **Relación de evidencias:** registro fotográfico

Recepción y trámite de las PQRS: En el mes de diciembre del año en curso, no se realizó recepción de PQRS.

A la fecha de cierre de este informe se cuenta con un consolidado de la relación de las PQR recepcionadas durante el tiempo de ejecución del Programa, Total de PQR, recepcionadas en el barrio el Poblado, (195) de las cuales (190) correspondientes a solicitudes de inclusión y (5) por quejas de aspectos técnicos, donde la comunidad las ha interpuesto por inconformidad antes mencionada. De las (190) solicitudes para inclusión hay (189) PQR que cuentan con respuesta por parte de los Entes Territoriales, las mismas se encuentran cerradas a satisfacción y (1) están en trámite aún se espera respuesta por parte de los Entes Territoriales. hasta la fecha hay (2) PQR por quejas cerradas por la parte técnica del contratista y (3) abiertas la cuales se espera respuesta de cierre por parte del FOVIS.

Es importante informar que, a corte de este informe aún está pendiente el concepto claro de la PQR #34 a nombre de Darin Blanco Fuentes.

Relación de evidencias: Formatos PCI 024 con su respectivo cierre, 025 actualizados y cartas de respuesta firmadas por los solicitantes.

Cuadro acumulativo de PQRS:

Periodo Registrado	N° PQR recepcionadas		N° PQR cerradas	N° PQR en tramite	Reporte PQR en trámite del periodo anterior			Observación general / motivo
3er. Informe	9		0	9	N° de PQR	Estado		
4° Informe	24		0	24	9	Abiertas	Solicitud de inclusión	
5° informe	54		7	54	24	Abiertas	Solicitud de inclusión	
6° informe	0		41	0	54	cerrada	Solicitudes de inclusión	
7° informe	0		41	0	0	Cerradas	Solicitud de inclusión	
8° informe	0		41	149	149	Abiertas	Solicitud de inclusión	
9° informe	5		85	6	149			
						Abiertas	Solicitud de inclusión y quejas	
TOTAL	195		191	4	191	Abiertas	Solicitud y quejas	

Acercamiento con la JAC

El 20 de diciembre del año en curso, se realizó una reunión con los miembros de la JAC, se contó con la participación de las profesionales sociales de obra e interventoría, en donde se logró socializar el avance y alcance del Programa y de la obra, barrido de la matriz inicial, plan de contingencia, para el avance de la obra, acompañamiento de los líderes en alguna vivienda en donde, el beneficiario tenga dudas o inquietudes. Asimismo, se atendieron las recomendaciones y sugerencias para la logística del evento con los niños el día 22 de diciembre y para el caso de las fechas especiales del mes de diciembre, por otra parte, los asistentes manifestaron, estar dispuestos a realizar el acompañamiento a las actividades, para el avance del Proyecto.

Relación de evidencias: asistencia y registro fotográfico

Recorrido de Obra:

- El 3 de diciembre del año en curso, en horas de la mañana, se realizaron dos recorridos de obra, con la participación de los miembros de la veeduría, profesionales técnicos y sociales de obra e interventoria, se visitaron viviendas en ejecución, por apertura y terminadas, con el fin de validar el avance y calidad de las obras, del mismo modo, se resolvieron dudas e inquietudes referente a la entrega de materiales, para el cierre de manzanas, la actividad se realizó sin dificultades.

  Relación de evidencia: Acta, asistencia y registro fotográfico.

- El 11 de noviembre del año en curso, se realizó un recorrido de obra con los miembros de la veeduría, en donde se contó con los profesionales técnicos y sociales de obra e interventoria, durante esta actividad se pude evidenciar el avance de las obras y la satisfacción de los beneficiarios con el desarrollo del Programa y la intervención en sus viviendas. Asimismo, se logró realizar la selección de las viviendas, para la visita de la Entidad Contratante, los días 17 y 18 de noviembre del año en curso.

  Relación de evidencias: Acta, asistencia y registro fotográfico

- El 12 de diciembre del año en curso, se realizó un recorrido de obra con la participación, de la supervisión de la Entidad contratante, miembros de la veeduría profesionales técnicos y sociales de obra e interventoria, durante esta actividad realzada en los diferentes sectores del barrio, se evidencio el avance, calidad de las obras y la satisfacción de los beneficiarios con el desarrollo del Programa y la intervención en sus viviendas. Asimismo, se logró evidenciar la satisfacción y felicidad de los beneficiarios con el avance de las obras.

  Relación de evidencias: Acta, asistencia y registro fotográfico.

- El 15 de diciembre del año en curso, se llevó a cabo un recorrido de obra con la participación del Ministerio de vivienda Ciudad y Territorio, Alcaldía municipal, profesionales técnicos y sociales de obra e interventoria, miembros de la veeduría y líderes de la JAC, en donde se logró visitar 21 viviendas en diferente proceso

constructivo, Del mismo modo, la supervisión técnica del Ministerio de vivienda, atendió la solicitud que realizo la JAC, de manera verbal, que validaran tres códigos que según ellos tenían inconvenientes técnicos, sin embargo el Ministerio evidencio la satisfacción de los tres beneficiarios visitadas, quienes afirmaron que no tenían inconvenientes en sus viviendas. Se logró realizar la visita a dos viviendas seleccionadas, para la memoria social en donde el Ministerio realizo el video del después y evidencio la felicidad de las beneficiarias con las visitas, de igual forma, se visitaron dos viviendas en donde los beneficiarios decoraron las unidades sanitarias, para el respectivo registro fotográfico

Relación de evidencias: Asistencia y registro fotográfico

Reunión con veeduría:

El 6 de diciembre del presente año, se realizó una reunión con los cinco miembros de la veeduría, en donde se contó con la participación de las profesionales sociales de obra e interventoría, con el fin de darles a conocer el avance de la obra y las actividades realizadas desde el componente social, Asimismo, se logró unificar criterios para, organizar la actividad con los niños del barrio el Poblado.

Relación de evidencias: Acta, asistencia y registro fotográfico

Línea de Capacitación:

Capacitación sectorizada y casa a casa en Educación Sanitaria e instalación de Acrílico.

Se realizó una capacitación sectorizadas el 7 de diciembre, en donde se socializaron a los beneficiarios las líneas de intervención que conforma el Plan de Gestión Social y los conceptos claves en Educación Sanitaria como lo son la salud, la higiene, con una ayuda didáctica como fueron los folletos informativos, donde se les explicó las diferentes intervenciones y los concejos e iniciativas de mejoramiento. Seguidamente las profesionales sociales de obra continuaron, con las capacitación realizando

recomendaciones para el cuidado de los equipos que contienen agua como son, no usar productos ácidos o detergentes agresivos para la limpieza, no golpear los equipos, también se habló del manejo adecuado de las casetas, como lo es limpiar el baño regularmente, cerrar la tapa del inodoro, no usar el inodoro como caneca de basura, de igual forma también es importante el mantenimiento básico de los equipos sanitarios de agua como lo es la revisión de la instalación, las reparaciones e implementar métodos sencillos que puedan establecer si existe algún escape de agua. Otro tema a tratar fue el almacenamiento, manipulación y uso adecuado del agua potable.

se realizaron (24) capacitaciones casa a casa e instalación de acrílicos.

Relación de evidencias: Acta, asistencias y registro fotográfico

Capacitación Masiva/ Sectorizada / Casa a Casa	**Fecha**	**Barrio**	**N° de Asistentes**	**Entidades de Apoyo**	**Relación Evidencias**
Capacitaciones sectorizadas	7 de diciembre del 2022	El Poblado	38	Contratista e Interventoría. Veeduría	Acta, Asistencia, Registro Fotográfico.
Capacitación Casa a Casa	15-31 de diciembre del 2022	El Poblado	24	Contratista e Interventoría.	Asistencia, Registro Fotográfico.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Cuadro 12. Memoria Social del Programa

Nombre del Beneficiario	Teléfono	Código de la vivienda	Tipo de Intervención	Fecha Visita N° 1	Fecha Visita N°2	Fecha Visita N°3	Relación de Evidencias
Milena Suarez Ríos	N/A	S-SC-EP-M 5-VE-132	Tipo 3	------	------	10/12/22	Fotografía, video, formato

Ana fortich Polo	N/A	S.SC.EP-M45-VE-427	Tipo3	-----	-----	20712/2022	Fotos, video y formatos

Durante este periodo se logró realizar la tercera visita a la vivienda seleccionada, para la memoria social del Programa, en donde se evidencio la felicidad de la beneficiaria en la realización de los videos, en la toma de los registros fotográficos, y diligenciamiento del formato.

- El 22 de diciembre del presente año, se realizaron dos eventos en el barrio el Poblado, en horas de la mañana se realizó una actividad recreativa y un desayuno a todo el personal de mano de obra no calificada, en donde se evidencio el agradecimiento y satisfacción de los trabadores, de igual forma, en horas de la tarde se realizó el evento recreativo con los niños de diferentes manzanas del barrio, para esta actividad se contó con el acompañamiento de los todos los miembros de la veeduría y equipo social de obra e interventoria, y algunos beneficiarios., durante esta actividad se evidenció la satisfacción y felicidad de los niños y acompañantes.

  Relación de evidencias: registro fotográfico

Capacitación al personal de obra

- Se realizaron dos capacitaciones al personal de mano de obra no calificada, desde el área social, se realizaron recomendaciones sobre el buen trato a los beneficiarios, el respeto a niños, niñas, y adolescentes, en cada una de las viviendas intervenidas, resolución de conflictos, entre otras recomendaciones generales referente al ingreso a cada vivienda,

Generación de Empleo

Durante este periodo el Contratista de obra viene vinculando personal de mano de obra no calificada al Proyecto aportando al desarrollo económico del municipio y minimizando la tasa de desempleo en la región, generado satisfacción ante la comunidad beneficiada.

Cuadro 8. Empleo.

Barrios	No. de trabajadores	No. de empleos generados	No. empleos indirectos generados
El Poblado	80	80	80

Mes	No. de MONC del municipio	No. de MONC femenino	No. MONC en condición de desplazamiento
9	85	1	5

RECOMENDACIONES GENERALES:

- Se recomienda la articulación permanente con Entes Territoriales con el fin de lograr los objetivos propuestos en la ejecución del PCI.

- Es importante mencionar que se necesita más acto de presencia y apoyo por parte de los Entes Territoriales frente a la problemática que se está presentando con los directivos de la JAC y la señora Doris Upegui.

CONCLUSIONES:

- Se concluye que para este periodo se ha dado continuidad a las actividades programadas en cada una de las líneas de intervención, para la implementación del PGS, lo cual ha permitido la articulación entre la comunidad, veedores, líderes de JAC y el contratista de obra e Interventoría.

- Se continúa con la implementación de los protocolos de bioseguridad por parte de las profesionales sociales y del equipo técnico que se encuentran trabajando en campo, manteniendo el distanciamiento social en las visitas de socialización casa a casa.

- Se contó con el apoyo de la veeduría en todas las actividades realizadas y/o acompañamiento a los equipos técnicos y sociales de obra.

- En este periodo, se dio continuidad a las estrategias del cronograma de actividades del PGS, entre ellas el acercamiento con los líderes de la JAC. Cabe informar que muy a pesar de todos los esfuerzos del equipo social y técnico por avanzar en el buen desarrollo del Proyecto, el mismo se ve entorpecido por el vicepresidente de la JAC, quien, con su comportamiento inadecuado con todos los profesionales, veedores y beneficiarios, no permite avanzar con seguridad y tranquilidad con las actividades en la obra.

Candelaria González Medina
Profesional social

July Paulin Rios Anaya
Profesional social de obra Interventoría

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
PROGRAMA CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

INFORME QUINCENAL N°16

Introducción

El Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico está dirigido a atender las necesidades de instalación de equipos hidrosanitarios en viviendas para el estrato 1 y 2, que cumplan con los criterios de focalización establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; es necesario implementar el Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico, que permita cubrir en un mayor porcentaje al actual, las deficiencias al acceso de agua potable y disminuir la posibilidad de adquirir enfermedades de tipo gastrointestinal.

Con el fin de llevar el Programa a más Municipio necesitado, fue priorizado el barrio El Poblado del Municipio de Sincelejo en el departamento de Sucre.

Dentro de las actividades contempladas en el Plan de Gestión Social del Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico en el barrio el Poblado, durante el periodo del 1 al 15 de diciembre del 2022, en la línea de participación comunitaria se han realizado recorridos de obra con la veeduría, Entidad contratante, MVCT, donde se ha evidenciado la satisfacción de los beneficiarios con sus intervenciones, por otra parte, en la línea de capacitación se realizaron capacitaciones casa a casa e instalación de acrílicos, capacitación sectorizada en educación sanitaria y recomendaciones para el buen uso y mantenimiento de las unidades sanitaria, atención al ciudadano en puntos de atención móviles, con el fin de atender cualquier PQR presentada, resolver de manera inmediata, dudas e inquietudes de la comunidad.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

FECHA DE INICIO DE OBRAS:					
NOMBRE DEL MUNICIPIO	NOMBRE BARRIOS A INTERVENIR	NOMBRE BARRIOS INTERVENIDOS	FECHA DE INFORME	N° DE VIVIENDAS A INTERVENIR POR BARRIO	N° DE VIVIENDAS INTERVENIDAS POR BARRIO
Sincelejo	El poblado	El poblado	Del 1 al 15 de Diciembre	693	414

INFORMACIÓN POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN

Línea de Comunicación:

Socializaciones:

Visita Casa a Casa:

Durante el periodo reportado los contratistas de obra e interventoría realizaron 23 socializaciones casa a casa en las aperturas de viviendas con el fin de iniciar el proceso constructivo, en esta actividad las profesionales sociales, socializaron el alcance del Programa, a cada uno de los beneficiarios visitados, cabe resaltar que se contó con el acompañamiento del área técnica, quien a su vez concertaban con los beneficiarios el lugar para la intervención del Programa.

Se evidenció la satisfacción de los beneficiarios frente al Proyecto.

Cuadro 1. Socializaciones.

Socialización (Lideres/ Masiva/ Sectorizada)	Fecha	Barrio	N° de Asistentes	Relación de Evidencias
Socialización casa a casa en aperturas de vi8viendas	Del 1al 15 de diciembre	El Poblado	23	asistencia y registro fotográfico

Diseño y distribución de material publicitario: los materiales publicitarios que se han utilizado en las actividades desarrolladas han sido, folletos informativos los cuales fueron distribuidos durante las capacitaciones casa a casa, así mismo, se realizó entrega de volantes de invitación a las capacitaciones sectorizadas que se llevó a cabo el 7 de diciembre, se realizó perifoneo locales en diferentes manzanas, con el fin de poder, informar a la comunidad beneficiada, que el Consorcio Turquía, trabajara todo el mes de diciembre, para que estén atentos en sus viviendas. De igual forma, se realizó invitaciones voz a voz, a través de la veeduría para las capacitaciones.
Relación de evidencias: escáner de los volantes

Cuadro 2. Material divulgativo

Material Utilizado	Descripción medio de divulgación implementado	Relación de las Evidencias
Material para las socializaciones	N/A	----------
Material para las capacitaciones	Folletos informativos	Escáner del folleto
Material Informativo y/o de convocatoria	Volantes de invitación	Escáner de los oficios
Instalación valla informativa	N/A	----------
Otras actividades de divulgación: *Cuñas radiales, prensa local, perifoneo, entre otras)*	Perifoneo local en diferentes manzanas del Barrio el Poblado	Video del perifoneos.

Línea de Participación Comunitaria:

Puntos de Atención: Durante este periodo se realizó atención al ciudadano en el punto # 1 a dos personas la cual se acercaron a solicitar información referente al estado de su diagnóstico y entrega de materiales en su vivienda. Cabe resaltar, que se logró atender todas las dudas e inquietudes en las diferentes visitas casa a casa y recorridos de obra, para este periodo se instaló un punto de atención móvil, con el acompañamiento de la veeduría, en la calle principal del Barrio, como estrategia y con el fin de tener mayor cubrimiento a la atención al ciudadano, se logró atender a dos beneficiarios quienes solicitaron información sobre la entrega de materiales en sus viviendas.
Relación de videncias: registro fotográfico y asistencia

Buzón de sugerencias: Durante este periodo se realizó la revisión del buzón de sugerencias semanalmente, con el acompañamiento de un miembro de la Veeduría, no se encontró PQR. Cabe informar que se logró dar cierre a las solicitudes de los dos trabajadores las cuales fueron reportadas en el informe anterior.
Relación de evidencias: escáner de las respuestas de cierre de las dos solicitudes

Cuadro 5. Puntos de Atención

Dirección del Punto de Atención	Barrio	Horarios de Atención		N° de Buzones Instalados	Relación de Evidencias
		Día	Hora		
Manzana 32 lote 38 Manzana 55 calle principal	El poblado	Lunes a jueves	2:pm a 4:pm	1	asistencias y Registro Fotográfico

Recepción y trámite de las PQRS:

Es importante informar que, a corte del presente informe, aún se encuentra (1) PQR, por solicitud de inclusión abierta y (3) PQR, por quejas en trámite a cargo del FOVIS para la respuesta de cierre. Se requiere dar respuesta a los solicitantes.se excedieron los tiempos de respuesta estipulados en el protocolo de inclusión. NOTA: es importante contar con el cierre de estas PQR.

Recepción y trámite de las PQRS:

Periodo Registrado	N° PQR recepcionadas	N° PQR cerradas	N° PQR en tramite	Reporte PQR en trámite del periodo anterior		Observación general / motivo
3er. Informe	9	0	9	N° de PQR	Estado	
4° Informe	24	0	24	9	Abiertas	Solicitud de inclusión
5° informe	54	7	54	24	Abiertas	Solicitud de inclusión
6° informe	0	41	0	54	cerrada	Solicitudes de inclusión
7° informe	0	41	0	0	Cerradas	Solicitud de inclusión
8° informe	0	41	149	149	Abiertas	Solicitud de inclusión

9° informe 10° informe	5 0	85 2	6 4	149 6	Abiertas	Solicitud de inclusión y quejas
TOTAL	195	191	4	4	Abiertas	Solicitud de inclusión y quejas

Recorrido de obra

- El 3 de diciembre del año en curso, en horas de la mañana, se realizaron dos recorridos de obra, con la participación de los miembros de la veeduría, profesionales técnicos y sociales de obra e interventoria, se visitaron viviendas en ejecución, por apertura y terminadas, con el fin de validar el avance y calidad de las obras, del mismo modo, se resolvieron dudas e inquietudes referente a la entrega de materiales, para el cierre de manzanas, la actividad se realizó sin dificultades.

  Relación de evidencia: Acta, asistencia y registro fotográfico.

- El 12 de diciembre del año en curso, se realizó un recorrido de obra con la participación, de la supervisión de la Entidad contratante, miembros de la veeduría profesionales técnicos y sociales de obra e interventoria, durante esta actividad realzada en los diferentes sectores del barrio, se evidencio el avance, calidad de las obras y la satisfacción de los beneficiarios con el desarrollo del Programa y la intervención en sus viviendas. Asimismo, se logró evidenciar la satisfacción y felicidad de los beneficiarios con el avance de las obras.

  Relación de evidencias: Acta, asistencia y registro fotográfico.

  - El 15 de diciembre del año en curso, se llevó a cabo un recorrido de obra con la participación del Ministerio de vivienda Ciudad y Territorio, Alcaldía municipal, profesionales técnicos y sociales de obra e interventoria, miembros de la veeduría y líderes de la JAC, en donde se logró

visitar 21 viviendas en diferente proceso constructivo, Del mismo modo, la supervisión técnica del Ministerio de vivienda, atendió la solicitud que realizo la JAC, de manera verbal, que validaran tres códigos que según ellos tenían inconvenientes técnicos, sin embargo el Ministerio evidencio la satisfacción de los tres beneficiarios visitadas, quienes afirmaron que no tenían inconvenientes en sus viviendas. Se logró realizar la visita a dos viviendas seleccionadas, para la memoria social en donde el Ministerio realizo el video del después y evidencio la felicidad de las beneficiarias con las visitas, de igual forma, se visitaron dos viviendas en donde los beneficiarios decoraron las unidades sanitarias, para el respectivo registro fotográfico

Relación de evidencias: Asistencia y registro fotográfico

Reunión con veeduría:

El 6 de diciembre del presente año, se realizó una reunión con los cinco miembros de la veeduría, en donde se contó con la participación de las profesionales sociales de obra e interventoría, con el fin de darles a conocer el avance de la obra y las actividades realizadas desde el componente social, Asimismo, se logró unificar criterios para, organizar la actividad con los niños del barrio el Poblado.

Relación de evidencias: Acta, asistencia y registro fotográfico

Cuadro 7. Recorridos de obra

Barrio	Fecha	N° de personas que acompañan el recorrido	Entidades que acompañan la jornada	Situaciones Evidenciadas	Relación de Evidencias
El poblado	3/12/2022 12/12/2022 15/12/2022	8 15 11	Contratistas de obra e interventoria, veeduría, ENterritorio MVCT, Alcaldía, obra e interventoria	Viviendas de matriz inicial en buen proceso de ejecución, calidad de la obra y satisfacción de los beneficiarios	Acta, asistencia y registro fotográfico Asistencia y registro fotográfico

Línea de capacitación

- Capacitaciones sectorizadas casa a casa en Educación Sanitaria:

Se realizó una capacitación sectorizadas el 7 de diciembre, en donde se socializaron a los beneficiarios las líneas de intervención que conforma el Plan de Gestión Social y los conceptos claves en Educación Sanitaria como lo son la salud, la higiene, con una ayuda didáctica como fueron los folletos informativos, donde se les explicó las diferentes intervenciones y los concejos e iniciativas de mejoramiento. Seguidamente las profesionales sociales de obra continuaron, con las capacitación realizando recomendaciones para el cuidado de los equipos que contienen agua

como son, no usar productos ácidos o detergentes agresivos para la limpieza, no golpear los equipos, también se habló del manejo adecuado de las casetas, como lo es limpiar el baño regularmente, cerrar la tapa del inodoro, no usar el inodoro como caneca de basura, de igual forma también es importante el mantenimiento básico de los equipos sanitarios de agua como lo es la revisión de la instalación, las reparaciones e implementar métodos sencillos que puedan establecer si existe algún escape de agua. Otro tema a tratar fue el almacenamiento, manipulación y uso adecuado del agua potable.

se realizaron (7) capacitaciones casa a casa e instalación de acrílicos.

Relación de evidencias: asistencias y registro fotográfico

Cuadro 9. Capacitaciones en Educación Sanitaria

Capacitación Masiva/ Sectorizada / Casa a Casa	Fecha	Barrio	N° de Asistentes	Entidades de Apoyo	Relación Evidencias
Capacitación sectorizada	0712-2022	El Poblado	30	Contratistas de obra, interventoria y veeduría	Acta, listado de asistencia y registro fotográfico.
Capacitaciones casa a casa	1 al 15 de diciembre del 2022	El Poblado	7	Contratista de obra	Asistencia

Reporte de Actividades Complementarias

Cuadro 12. Memoria Social del Programa

Nombre del Beneficiario	Teléfono	Código de la vivienda	Tipo de Intervención	Fecha Visita N° 1	Fecha Visita N°2	Fecha Visita N°3	Relación de Evidencias
Milena Suarez Ríos	N/A	S-SC-EP-M 5-VE-132	Tipo 3	16/11/22	28/12/2022	6/12/2022	Fotografía, video, formato

Durante este periodo se logró realizar la tercera visita a la vivienda seleccionada, para la memoria social del Programa, en donde se evidencio la felicidad de la beneficiaria en la realización de los videos, en la toma de los registros fotográficos, y diligenciamiento del formato del después

Reunión de cierre de actividades de ENterritorio:

El 13 de diciembre del año en curso, se realizó la reunión de cierre de actividades, por parte de la supervisión técnica de la Entidad contratante, en las instalaciones del consorcio Turquía, se contó con la participación de los profesionales técnicos y sociales de obra e interventoria, se recibieron recomendaciones, para continuar con la buena calidad y acabados finales en cuanto la pintura de las unidades sanitarias, de igual forma, se recibieron buenos comentarios y felicitaciones por parte de la Entidad y la invitación seguir realizando el acercamiento con los beneficiarios que se van a intervenir en enero del año 2023.
Relación de evidencias: Asistencia y registro fotográfico.

Reunión de cierre de actividades con MVCT:

El 15 de diciembre del año en curso, se llevó acabo, la reunión de cierre de actividades, liderada por la supervisión técnica del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, en donde se contó con la participación de los profesionales técnicos y sociales de obra e interventoria, de igual forma, la ingeniera Sindy Castro, expresó sus agradecimientos a los equipos de trabajo, por el acompañamiento y el avance de las obras, del mismos modo, realizo la recomendación de seguir manteniendo la calidad y acabados finales de las intervenciones, las cuales le habían gustado mucho.

Relación de evidencias: Asistencia y registro fotográfico

Capacitación al personal de obra

Generación de Empleo

Cabe resaltar que durante este periodo el Contratista de obra vinculó al Proyecto aportando al desarrollo económico del municipio y sus alrededores, esto ha generado satisfacción ante la comunidad beneficiada. Asimismo, se ha generado empleo en la zona aportando a la inclusión laboral.

Cuadro 8. Empleo.

Barrios	**No. de trabajadores**	**No. de empleos generados**	**No. empleos indirectos generados**
El Poblado	80	80	80

Mes	No. de MONC del municipio	No. de MONC femenino	No. MONC en condición de desplazamiento

10	118	1	5

RECOMENDACIONES GENERALES:

- Se recomienda la articulación permanente con Entes Territoriales en especial con la Alcaldía municipal, con el fin de lograr los objetivos propuestos en la ejecución del PCI del barrio el Poblado.

CONCLUSIONES:

Se concluye que para este periodo se ha dado continuidad a las estrategias planteadas con el fin de empoderar el componente social en cada una de las actividades programadas por líneas de intervención, para la implementación del PGS, lo cual ha permitido la articulación entre la comunidad, líderes y el Contratista de Obra e Interventoría.

Se continúa con la implementación de los protocolos de bioseguridad por parte de las profesionales sociales y del equipo técnico que se encuentran trabajando en campo, manteniendo el distanciamiento social en las visitas casa a casa.

En este periodo, se dio continuidad a las estrategias del cronograma de actividades del PGS, entre ellas el acercamiento con los líderes de la JAC.Cabe informar que muy a pesar de todos los esfuerzos del equipo social y técnico por avanzar en el buen desarrollo del Proyecto, el mismo se ve entorpecido por el vicepresidente de la JAC,

quien con su comportamiento inadecuado con todos los profesionales y beneficiarios, no permite avanzar con seguridad y tranquilidad con las actividades en la obra. Situación que desde el componente social vemos con mucha preocupación, Puesto que, ahora cuenta con el apoyo de los demás miembros de la JAC, y continúan lanzando amenazas y exigiendo empleo, para todos sin ejercer ninguna actividad. Según ellos por mérito y desinformando a los beneficiarios referente al plazo contractual y la instalación de los cinco elementos en todas las viviendas.

Candelaria Gonzalez
profesional social de obra

July Rios Anaya

July Paulin Rios Anaya
Profesional social Interventoría

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
PROGRAMA CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

INFORME QUINCENAL N°17

Introducción

El Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico está dirigido a atender las necesidades de instalación de equipos hidrosanitarios en viviendas para el estrato 1 y 2, que cumplan con los criterios de focalización establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; es necesario implementar el Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico, que permita cubrir en un mayor porcentaje al actual, las deficiencias al acceso de agua potable y disminuir la posibilidad de adquirir enfermedades de tipo gastrointestinal.

Con el fin de llevar el Programa a más Municipio necesitado, fue priorizado el barrio El Poblado del Municipio de Sincelejo en el departamento de Sucre.

Dentro de las actividades contempladas en el Plan de Gestión Social del Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico en el barrio el Poblado, durante el periodo del 15 al 31 de diciembre del 2022, en la línea de participación comunitaria se han realizado visitas casa a casa con la veeduría, por otra parte, en la línea de capacitación se realizaron capacitaciones casa a casa e instalación de acrílicos, atención al ciudadano en punto de atención y visitas casa a casa, con el fin de atender cualquier PQR presentada, resolver de manera inmediata, dudas e inquietudes de la comunidad.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

FECHA DE INICIO DE OBRAS:					
NOMBRE DEL MUNICIPIO	NOMBRE BARRIOS A INTERVENIR	NOMBRE BARRIOS INTERVENIDOS	FECHA DE INFORME	N° DE VIVIENDAS A INTERVENIR POR BARRIO	N° DE VIVIENDAS INTERVENIDAS POR BARRIO
Sincelejo	El poblado	El poblado	Del 15 al 31 de Diciembre	693	462

INFORMACIÓN POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN

Línea de Comunicación:

Socializaciones:

Visita Casa a Casa:

Durante el periodo reportado los contratistas de obra e interventoría realizaron vivitas de socializaciones casa a casa en las aperturas de viviendas con el fin de iniciar el proceso constructivo, en esta actividad las profesionales sociales, socializaron el alcance del Programa, a cada uno de los beneficiarios visitados, cabe resaltar que se contó con el acompañamiento del área técnica, quien a su vez concertaban con los beneficiarios el lugar para la intervención del Programa.

Se evidenció la satisfacción de los beneficiarios frente al Proyecto.

Cuadro 1. Socializaciones.

Socialización (Lideres/ Masiva/ Sectorizada)	Fecha	Barrio	N° de Asistentes	Relación de Evidencias
	Del 15 al 31 de diciembre	El Poblado	15	registro fotográfico

Diseño y distribución de material publicitario: los materiales publicitarios que se han utilizado en las actividades desarrolladas han sido, folletos informativos los cuales fueron distribuidos durante las capacitaciones casa a casa.

Relación de evidencias: escáner de los volantes.

Cuadro 2. Material divulgativo

Material Utilizado	Descripción medio de divulgación implementado	Relación de las Evidencias
Material para las socializaciones	N/A	----------
Material para las capacitaciones	Folletos informativos	Escáner del folleto
Material Informativo y/o de convocatoria	N/A	----------
Instalación valla informativa	N/A	----------
Otras actividades de divulgación: *Cuñas radiales, prensa local, perifoneo, entre otras)*	N/A	----------.

Línea de Participación Comunitaria:

Puntos de Atención: Durante este periodo se realizó atención al ciudadano en el punto # 1 a dos personas la cual se acercaron a solicitar información referente al estado de su diagnóstico y entrega de materiales en su vivienda. Cabe resaltar, que se logró atender todas las dudas e inquietudes en las diferentes visitas casa a casa y recorridos de obra con el acompañamiento de la veeduría, en la calle principal del Barrio, como estrategia.

Relación de videncias: registro fotográfico y asistencia

Buzón de sugerencias: Durante este periodo se realizó la revisión del buzón de sugerencias semanalmente, con el acompañamiento de un miembro de la Veeduría, no se encontró PQR.

Relación de evidencias: escáner de las respuestas de cierre de las dos solicitudes

Cuadro 5. Puntos de Atención

Dirección del Punto de Atención	Barrio	Horarios de Atención		N° de Buzones Instalados	Relación de Evidencias
		Día	Hora		
Manzana 32 lote 38 Manzana 55 calle principal	El poblado	Lunes a jueves	2:pm a 4:pm	1	asistencias y Registro Fotográfico

Recepción y trámite de las PQRS:

Es importante informar que, a corte del presente informe, aún se encuentra (1) PQR, por solicitud de inclusión abierta y (3) PQR, por quejas en trámite a cargo del FOVIS para la respuesta de cierre. Se requiere dar respuesta a los solicitantes.se excedieron los tiempos de respuesta estipulados en el protocolo de inclusión. NOTA: es importante contar con el cierre de estas PQR.

Recepción y trámite de las PQRS:

Periodo Registrado	N° PQR recepcionadas	N° PQR cerradas	N° PQR en tramite	Reporte PQR en trámite del periodo anterior		Observación general / motivo
3er. Informe	9	0	9	N° de PQR	Estado	
4° Informe	24	0	24	9	Abiertas	Solicitud de inclusión
5° informe	54	7	54	24	Abiertas	Solicitud de inclusión
6° informe	0	41	0	54	cerrada	Solicitudes de inclusión
7° informe	0	41	0	0	Cerradas	Solicitud de inclusión
8° informe	0	41	149	149	Abiertas	Solicitud de inclusión
9° informe	5	85	6	149		
10° informe	0	2	4	6	Abiertas	Solicitud de inclusión y quejas
TOTAL	195	191	4	4	Abiertas	Solicitud de inclusión y quejas

Recorrido de obra: N/A

Línea de capacitación

- Capacitaciones casa a casa en Educación Sanitaria:

Se realizaron capacitaciones casa a casa en donde se socializaron a los beneficiarios las líneas de intervención que conforma el Plan de Gestión Social y los conceptos claves en Educación Sanitaria como lo son la salud, la higiene, con una ayuda didáctica como fueron los folletos informativos, donde se les explicó las diferentes intervenciones y los concejos e iniciativas de mejoramiento. Seguidamente las profesionales sociales de obra continuaron, con las capacitación realizando recomendaciones para el cuidado de los equipos que contienen agua como son, no usar productos ácidos o detergentes agresivos para la limpieza, no golpear los equipos, también se habló del manejo adecuado de las casetas, como lo es limpiar el baño regularmente, cerrar la tapa del inodoro, no usar el inodoro como caneca de basura, de igual forma también es importante el mantenimiento básico de los equipos sanitarios de agua como lo es la revisión de la instalación, las reparaciones e implementar métodos sencillos que puedan establecer si existe algún escape de agua. Otro tema a tratar fue el almacenamiento, manipulación y uso adecuado del agua potable.

se realizaron (18) capacitaciones casa a casa e instalación de acrílicos.

Relación de evidencias: asistencias y registro fotográfico

Cuadro 9. Capacitaciones en Educación Sanitaria

Capacitación Masiva/ Sectorizada / Casa a Casa	Fecha	Barrio	N° de Asistentes	Entidades de Apoyo	Relación Evidencias
Capacitaciones casa a casa	1 al 15 de diciembre del 2022	El Poblado	18	Contratistas de obra, interventoría y veeduría	asistencia y registro fotográfico.

Reporte de Actividades Complementarias

- El 22 de diciembre del presente año, se realizaron dos eventos en el barrio el Poblado, en horas de la mañana se realizó una actividad recreativa y un desayuno a todo el personal de mano de obra no calificada, en donde se evidencio el agradecimiento y satisfacción de los trabadores, de igual forma, en horas de la tarde se realizó el evento recreativo con los niños de diferentes manzanas del barrio, para esta actividad se contó con el acompañamiento de los todos los miembros de la veeduría y

equipo social de obra e interventoria, y algunos beneficiarios., durante esta actividad se evidenció la satisfacción y felicidad de los niños y acompañantes.

Relación de evidencias: registro fotográfico

Cuadro 12. Memoria Social del Programa

Nombre del Beneficiario	Teléfono	Código de la vivienda	Tipo de Intervención	Fecha Visita N° 1	Fecha Visita N°2	Fecha Visita N°3	Relación de Evidencias
ANA FARTIC POLO	N/A	S-SC-EP-M 46-VE-427	Tipo 3	-----	----	20/12/2022	Fotografía, video, formato

Durante este periodo se logró realizar la tercera visita a la vivienda seleccionada, para la memoria social del Programa, en donde se evidencio la felicidad de la beneficiaria en la realización de los videos, en la toma de los registros fotográficos, y diligenciamiento del formato del después

Capacitación al personal de obra

Generación de Empleo

Cabe resaltar que durante este periodo el Contratista de obra vinculó al Proyecto aportando al desarrollo económico del municipio y sus alrededores, esto ha generado satisfacción ante la comunidad beneficiada. Asimismo, se ha generado empleo en la zona aportando a la inclusión laboral.

Cuadro 8. Empleo.

Barrios	No. de trabajadores	No. de empleos generados	No. empleos indirectos generados
El Poblado	85	80	80

Mes	No. de MONC del municipio	No. de MONC femenino	No. MONC en condición de desplazamiento
9	85	1	5

RECOMENDACIONES GENERALES:

- Se recomienda la articulación permanente con Entes Territoriales en especial con la Alcaldía municipal, con el fin de lograr los objetivos propuestos en la ejecución del PCI del barrio el Poblado.

CONCLUSIONES:

Se concluye que para este periodo se ha dado continuidad a las estrategias planteadas con el fin de empoderar el componente social en cada una de las actividades programadas por líneas de intervención, para la implementación del PGS, lo cual ha permitido la articulación entre la comunidad, líderes y el Contratista de Obra

e Interventoría.

Se continúa con la implementación de los protocolos de bioseguridad por parte de las profesionales sociales y del equipo técnico que se encuentran trabajando en campo, manteniendo el distanciamiento social en las visitas casa a casa.

En este periodo, se dio continuidad a las estrategias del cronograma de actividades del PGS, entre ellas el acercamiento con los líderes de la JAC.Cabe informar que muy a pesar de todos los esfuerzos del equipo social y técnico por avanzar en el buen desarrollo del Proyecto, el mismo se ve entorpecido por el vicepresidente de la JAC, quien con su comportamiento inadecuado con todos los profesionales y beneficiarios, no permite avanzar con seguridad y tranquilidad con las actividades en la obra. Situación que desde el componente social vemos con mucha preocupación, Puesto que, ahora cuenta con el apoyo de los demás miembros de la JAC, y continúan lanzando amenazas y exigiendo empleo, para todos sin ejercer ninguna actividad. Según ellos por mérito y desinformando a los beneficiarios referente al plazo contractual y la instalación de los cinco elementos en todas las viviendas.

July Rios Anaya

Candelaria González
profesional social de obra

July Paulin Rios Anaya
Profesional social Interventoría

Anexo 19. Diagnósticos aprobados.

Anexo 20. Certificaciones de materiales.

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO
ULTRACEM S.A.S

CEMENTO GRIS TIPO UG DE USO GENERAL

F.V: 01-03-2017

VERSIÓN 3.

Código 205

PLANTA:	ULTRACEM S.A.S
DIRECCIÓN:	Km 2.5 VIA CORDIALIDAD,GALAPA
FECHA DE PRODUCCIÓN:	1/05/2022 — 15/05/2022
PRESENTACIÓN:	GRANEL/ENSACADO
CLIENTE:	

ENSAYOS FÍSICOS	METODO DE ENSAYO	RESULTADO	NTC 121	ASTM C 1157	ULTRACEM
Contenido de Aire en volumen, %	NTC 224	8,55	Max. 12,0	Max. 12,0	Max. 12,0
Finura (permeabilidad al aire), cm^2/g	NTC 33	5248	—	—	—
Finura en tamiz N° 325 (45µm), %	NTC 294	92,60	—	—	—
Expansión en autoclave, %	NTC 107	0,01	Max. 0,80	Max. 0,80	Max. 0,80
Expansión barras de Mortero (14 dias), %	NTC 4927	0,006	Max. 0,020	Max. 0,020	Max. 0,020
Resistencia a la Compresión					
1 Dia, MPa (psi)	NTC 220	6,1 (880)	—	—	—
3 Dias, MPa (psi)	NTC 220	12,9 (1870)	Min. 8,0 (1160)	Min. 13,0 (1890)	Min. 8,0 (1160)
7 Dias, MPa (psi)	NTC 220	18,3 (2660)	Min. 15,0 (2176)	Min. 20,0 (2900)	Min. 15,0 (2176)
28 Dias, MPa (psi)	NTC 220	0 ()	Min. 24,0 (3481)	Min. 28,0 (4060)	Min. 24,0 (3481)
Tiempo de Fraguado (Vicat) METODO A					
Tiempo inicial de fraguado, min	NTC 118	235	Min. 45; Max. 420	Min. 45; Max. 420	Min. 45; Max. 420
Tiempo final de fraguado, min	NTC 118	320	—	—	—

Se certifica que el CEMENTO ULTRACEM GRIS TIPO USO GENERAL cumple con la norma Técnica Colombiana NTC 121 para Cemento tipo UG.

Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los métodos de muestreo y ensayos de acuerdo con las frecuencias e instructivos establecidos en el PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PARA LA GESTIÓN DE PRODUCCIÓN DE CEMENTO de Ultracem S.A.S. Aplica para las producciones realizadas durante el periodo comprendido en "Fecha de Producción".

FIRMA: ***Cargo: Gerente de Calidad Cementos***

Escaneado con CamScanner

FICHA TÉCNICA / VERSIÓN 9

CEMENTO GRIS DE USO GENERAL



Imagina todo lo que podemos
CONSTRUIR JUNTOS

ARGOS

CEMENTO GRIS DE USO GENERAL

Es un cemento que se puede usar para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados para la construcción en general.

Las especificaciones del Cemento Gris de Uso General cumplen con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo UG).

USOS:

- Morteros para pisos, nivelaciones, lechadas y emboquillados.
- Reparaciones, remodelaciones, pequeñas obras y diversas aplicaciones domésticas.
- Producción de elementos prefabricados de pequeño y mediano formato.
- Morteros para mampostería, pega de cerámicos, enchapes, acabados, recubrimientos interiores y para fachadas.
- Todo tipo de elementos de concreto que no requieran características especiales.

BENEFICIOS:

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS

- Es un producto versátil, con muchas posibilidades de aplicación.

VENTAJAS EN SOSTENIBILIDAD

Al utilizar el "Cemento Gris de Uso General" de Argos, se garantiza el uso de un producto suministrado por una empresa responsable en materia ambiental, social y económica, y transparente con sus grupos de interés, tal y como se evidencia en el reporte de sostenibilidad corporativo "Reporte Integrado" que Argos realiza anualmente con base en el Global Reporting Initiative (GRI), en el cual presenta los resultados de su desempeño y sus planes de acción, en relación a cada uno de los aspectos más relevantes para la sostenibilidad del negocio y sus grupos de interés. Este reporte se puede encontrar en la página web de la compañía (https://argos.co/), en la sección "Sostenibilidad".

Dentro de las características de sostenibilidad generales del "Cemento Gris de Uso General", se destacan:

Material con contenido reciclado, disminuyendo de esta manera el consumo de recursos naturales no renovables en su fabricación.
Nota: Los porcentajes de contenido reciclado pre-consumo pueden variar de acuerdo al tipo de producto y la disponibilidad del material. Algunos productos o plantas pueden no tener dicha adición.

Producto fabricado en la región: a 160 km o menos de distancia del punto de venta o de la obra.
Nota: Esta distancia puede variar dependiendo de la ubicación geográfica de la obra.

Se cuenta con diferentes alternativas amigables con el ambiente para el transporte de este producto, incluyendo vehículos eléctricos y vehículos a gas.

Producto de bajas emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles, lo que contribuye a una mejor calidad ambiental de los interiores.

El empaque de este producto podrá ser devuelto a la compañía para aprovechamiento del material, de acuerdo a las condiciones específicas del programa Sacos Verdes y la ubicación de la obra.

Material con Análisis de Ciclo de Vida (LCA, por sus siglas en inglés) y Auto-Declaración Ambiental de Producto (EPD, por sus siglas en inglés).
Nota: Aplica para "Cemento Gris de Uso General" producido en Plantas Rioclaro y Sogamoso.

Teniendo en cuenta lo anterior, este producto, combinado con las estrategias de diseño y construcción de la edificación, puede contribuir a obtener puntos en las siguientes certificaciones de construcción sostenible:

CERTIFICACIÓN	LEED® V4.1	CASA COLOMBIA V2.1
CRITERIO	**Materiales y Recursos:** · Transparencia y optimización de productos de construcción fuentes de materias primas. · Transparencia y optimización de productos de construcción - EPD. · Reducción del impacto en el ciclo de vida de la edificación - LCA de la edificación. **Calidad Ambiental Interiores:** · Materiales de baja emisión. (Hasta 7 puntos)	**Sostenibilidad en obra:** · Manejo de residuos de construcción. **Eficiencia en materiales:** · Origen de los materiales y productos. · Productos y materiales de bajo impacto ambiental. · Productos con atributos múltiples de sostenibilidad. · Productos y materiales con LCA. (Hasta 7 puntos)

Para conocer las características de sostenibilidad específicas del cemento suministrado a tu proyecto y los detalles de la contribución a la obtención de las certificaciones mencionadas anteriormente, puedes solicitar el certificado correspondiente a través de nuestros canales de atención.

PRESENTACIÓN:

- Sacos de: 1 kg - 5 kg - 25 kg - 50 kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PARÁMETROS FÍSICOS		NORMA DE ENSAYO	NTC 121 TIPO UG
Finura	Blaine, min. (cm^2/gr)	NTC 33	A
	Retenido Tamiz 45 µm (%)	NTC 294	A
Cambio de longitud por autoclave, expansión, máx. (%)		NTC 107	0.80
Tiempo de fraguado, Ensayo de Vicat[B]	No menos de, minutos	NTC 118	45
	No mas de, minutos	NTC 118	420
Contenido de Aire en Volumen de mortero, máx. (%)		NTC 224	12
Expansión de barras de mortero a 14 días, máx.		NTC 4927	0.020
RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN (MPa)			
3 días		NTC 220	8.0
7 días		NTC 220	15.0
28 días		NTC 220	24.0

A: Los resultados de estos ensayos deben ser informados en todos los reportes que sean solicitados.
B: El tiempo de fraguado se refiere al tiempo de fraguado inicial en la NTC 118.

RECOMENDACIONES:

- En la elaboración de concretos se recomienda la revisión y aplicación de la NTC 3318 y Norma Sismo Resistente Colombiana vigente; requisitos de producción, calidad y durabilidad.
- Almacenar el cemento en un lugar seco, cubierto y alejado de zonas húmedas.
- Conservar el cemento sobre estibas y no sobre el suelo.
- Una vez abierto el saco se debe consumir de manera inmediata.

ESTAMOS PARA AYUDAR

En ARGOS estamos comprometidos a ayudarte a construir grandes obras y sacar el mejor provecho de nuestros productos. Si tienes preguntas o reclamos sobre este producto comunícate con nuestros canales de atención:

DESDE TELÉFONO FIJO: **018000527467**

DESDE CELULAR: **#250**

Asesoría técnica:
ASESORVIRTUAL@ARGOS.COM.CO

Para aprender sobre la tecnología y aplicaciones de este producto, ingresa a:
WWW.360ENCONCRETO.COM

Para mayor información acerca de nuestros productos y servicios, consulta nuestra página web: **COLOMBIA.ARGOS.CO**



ARGOS

Empresa de cemento del GRUPO ARGOS

icontec

Sello con Reglamento Técnico

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

BARRAS CORRUGADAS DE ACERO DE BAJA ALEACIÓN PARA REFUERZO DE CONCRETO

Fabricado por **DIACO S.A.**, en la **Planta Muña:** Autopista Sur Kilometro 25 Vía Bogotá, Sibate; **Planta Tuta:** Carretera Central del Norte, Kilómetro 27 Vía Tunja, Paipa, Boyaca **Planta Tocancipá:** Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá-Zipaquirá Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia

Manufactured by **DIACO S.A.**, in the **Planta Muña:** Autopista Sur Kilometro 25 Vía Bogotá, Sibate; **Planta Tuta:** Carretera Central del Norte, Kilómetro 27 Vía Tunja, Paipa, Boyaca **Planta Tocancipá:** Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá-Zipaquirá Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución 1856 del 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Reglamento aplicable a barras corrugadas de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia
Regulation applicable to low alloy corrugated bars for concrete reinforcement in seismic resistant constructions that are manufactured, imported or commercialized in Colombia

SECTOR ICS 77.140.60

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSR-CER710306
Certificate

Fecha de Aprobación: 2019-09-03
Approval Date:
Fecha de Renovación:
Renewal Date:
Fecha Última Modificación: 2020-03-13
Last Modification Date:
Fecha de Vencimiento: 2025-09-02
Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

icontec

ANSI ACCREDITED
ID #0677
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

DIACO S.A.

Resolución 1856 del 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Anexo Certificado **CSR-CER710306**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2019-09-03**
Approval Date:

Fecha Última Modificación: **2020-03-13**
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: **2025-09-02**
Expiration Date:

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 de la Resolución 1856 de 04 de octubre de 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	5/8 Pulgada	5/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	9.0 mm	9.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	11.0 mm	11.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	12.0 mm	12.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	1/4 Pulgada	1/4 Pulgada	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia

DIACO S.A.

Resolución 1856 del 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Anexo Certificado **CSR-CER710306**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2019-09-03**
Approval Date:

Fecha Última Modificación: **2020-03-13**
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: **2025-09-02**
Expiration Date:

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 de la Resolución 1856 de 04 de octubre de 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	8.5 mm	8.5 mm	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	9.0 mm	9.0 mm	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/4 Pulgadas	1/4 Pulgadas	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	8.5 mm	8.5 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	9.0 mm	9.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia

DIACO S.A.

Resolución 1856 del 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Anexo Certificado **CSR-CER710306**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2019-09-03**
Approval Date:

Fecha Última Modificación: **2020-03-13**
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: **2025-09-02**
Expiration Date:

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 de la Resolución 1856 de 04 de octubre de 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	5/8 Pulgada	5/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/4 Pulgada	3/4 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	7/8 Pulgada	7/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1 Pulgada	1 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	12 mm	12 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADOS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1 ¼ Pulgada	1 ¼ Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia

DIACO S.A.

Resolución 1856 del 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Anexo Certificado **CSR-CER710306**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2019-09-03**
Approval Date:

Fecha Última Modificación: **2020-03-13**
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: **2025-09-02**
Expiration Date:

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 de la Resolución 1856 de 04 de octubre de 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/4 Pulgada	3/4 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	7/8 Pulgada	7/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1 Pulgada	1 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1 ¼ Pulgada	1 ¼ Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	8.5 mm	8.5 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: CONCREACEROS SAS
Dirección: CL 38 4A150 PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 2743303

Fecha Impresión 22/03/06
No. Remisión: 82441679
Página: 1 de 7

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5379572	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.12	0.19	0.018	0.020	0.001	0.46	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5379573	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.12	0.19	0.018	0.020	0.001	0.46	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5385527	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.16	0.21	0.013	0.019	0.003	0.50	0.03	0.02	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5385555	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.16	0.21	0.013	0.019	0.003	0.50	0.03	0.02	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5385559	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.16	0.21	0.013	0.019	0.003	0.50	0.03	0.02	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391113	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391117	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391118	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391145	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391146	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391154	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433256	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433257	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433262	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433263	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433264	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433383	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.21	0.009	0.019	0.002	0.48	0.03	0.02	0.05

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Jefe Sector Verificaciones y Laboratorios

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Escaneado con CamScanner

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: CONCREACEROS SAS
Dirección: CL 38 4A150 PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 2743303

Fecha Impresión 22/03/06
No. Remisión: 82441679
Página: 1 de 7

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5379572	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.12	0.19	0.018	0.020	0.001	0.46	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5379573	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.12	0.19	0.018	0.020	0.001	0.46	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5385527	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.16	0.21	0.013	0.019	0.003	0.50	0.03	0.02	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5385555	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.16	0.21	0.013	0.019	0.003	0.50	0.03	0.02	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5385559	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.16	0.21	0.013	0.019	0.003	0.50	0.03	0.02	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391113	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391117	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391118	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391145	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391146	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391154	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433256	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433257	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433262	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433263	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433264	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433383	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.21	0.009	0.019	0.002	0.48	0.03	0.02	0.05

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Jefe Sector Verificaciones y Laboratorios

Escaneado con CamScanner

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: CONCREACEROS SAS
Dirección: CL 38 4A150 PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 2743303

Fecha Impresión 22/03/05
No. Remisión: 82441330
Página: 1 de 7

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5387964	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.20	0.006	0.020	0.002	0.48	0.03	0.02	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5387965	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.20	0.006	0.020	0.002	0.48	0.03	0.02	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5387966	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.20	0.006	0.020	0.002	0.48	0.03	0.02	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5387976	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.20	0.006	0.020	0.002	0.48	0.03	0.02	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5388216	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.14	0.19	0.009	0.016	0.002	0.48	0.03	0.02	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5388239	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.14	0.19	0.009	0.016	0.002	0.48	0.03	0.02	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5388245	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.14	0.19	0.009	0.016	0.002	0.48	0.03	0.02	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5388259	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.14	0.19	0.009	0.016	0.002	0.48	0.03	0.02	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5388267	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.14	0.19	0.009	0.016	0.002	0.48	0.03	0.02	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5392654	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.21	0.011	0.019	0.002	0.48	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5392655	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.21	0.011	0.019	0.002	0.48	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5392674	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.21	0.011	0.019	0.002	0.48	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5392675	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.21	0.011	0.019	0.002	0.48	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5392676	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.21	0.011	0.019	0.002	0.48	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433242	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433268	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433269	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Jefe Sector Verificaciones y Laboratorios

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Escaneado con CamScanner

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: CONCREACEROS SAS
Dirección: CL 38 4A150 PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 2743303

Fecha Impresión 22/04/19
No. Remisión: 82458852
Página: 1 de 6

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2400991	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.09	0.26	0.007	0.021	0.001	0.47	0.05	0.02	0.02
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448117	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448119	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448120	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448124	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448125	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448129	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448131	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448132	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448134	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448138	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448140	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448142	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448143	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448145	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448147	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448150	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Jefe Sector Verificaciones y Laboratorios

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Escaneado con CamScanner

PazdelRío

Votorantim

REPORTE DE CALIDAD

FECHA: Belencito, 10.02.2022
HORA: 22:52:22
PÁGINA: 1 / 1

ISO 9001 icontec · I Net · Sello de Calidad icontec · Sello de Calidad icontec · Sello de Calidad icontec · Sello con Reglamento Técnico icontec

PRODUCTO: 6110776 - BARRA CORRU ENDE (M) N.2X6M
CLIENTE: 5083437 / CONCREACEROS S.A.S.
DIRECCIÓN: CL 38 4A 150

REPORTE: 30.297
ORDEN DE ENTREGA: 8086690523
PLACA: TJZ925

Análisis Químico y Propiedades Físicas Garantizadas

Propiedad:	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%Nb	% V	%Ceq	Rs(MPa)	FI (MPa)	AL(%)	DOBLADO	D/metro	Empa.Res.	Altura Re.
												%	MPa	MPa	%		#	mm	mm
Mínimo:	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00								550.00	420.00	14.00		294		0.25
Máximo:	0.30	1.50	0.035	0.045	0.50							0.550		540.00				6.45	

Lote/Colada	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%Nb	% V	%Ceq	Rs(MPa)	FI (MPa)	AL(%)	DOBLADO	D/metro	Empa.Res.	Altura Re
												%	MPa	MPa	%		#	mm	mm
B51965-21	0,27	0,97	0,020	0,015	0,15	0,023	0,016	0,014	0,002	0,000	0,018	0,428	605,69	437,33	14,74	B	249	6,20	0,33
C48598-21	0,29	0,91	0,015	0,027	0,13	0,028	0,020	0,020	0,003	0,000	0,018	0,443	630,87	460,73	15,04	B	295	6,28	0,43
E20051-21	0,27	0,92	0,017	0,033	0,16	0,272	0,150	0,135	0,014	0,003	0,020	0,446	636,92	471,69	14,83	B	243	6,11	0,32
E20551-21	0,28	0,90	0,010	0,027	0,18	0,344	0,084	0,075	0,010	0,000	0,019	0,443	634,98	450,07	15,35	B	249	6,20	0,38
B51495-21	0,29	0,89	0,016	0,022	0,16	0,029	0,022	0,014	0,002	0,002	0,021	0,451	648,79	472,11	14,93	B	250	6,18	0,41

Caracteristicas: Rs(MPa) - RESISTENCIA FI (MPa) - FLUENCIA AL(%) - ELONGACION (%) DOBLADO - B: BUENO

Método Determinación composición química: Espectrómetro de Emisión NTC 5192
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo y barra corrugada: Tracción NTC-3353,Doblado, Peso Masa NTC - 2289.
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo liso: Tracción NTC - 2, Doblado NTC - 1
Método Medición dimensional: Alambrón NTC - 330
Muestreo: Manual por Colada en Rollo y barra corrugada NTC 2289.
Muestreo: Manual por Colada en Alambrón.
Muestreo: Manual por Colada en Rollo Liso NTC 161.

Declaramos que los productos descritos, fueron inspeccionados y analizados conforme a lo especificado y los resultados cumplen con la norma citada. Los análisis aquí reportados corresponden a la muestra del lote Reportado.

Firma Autorizada: ING WILLIAM HURTADO SIABATO
Coordinador Calidad Productos

Km 6 Via Nobsa - Belencito
Planta Industrial.

Escaneado con CamScanner

aceros turia Colombia	INFORME DE ENSAYOS SEGÚN NTC 115 VERSION 2019-19-11	CODIGO: PE-CAL-R-5
		VERSION: 2
		VIGENTE DESDE: 24/09/2020
		PAGINA 1 DE 1

TEMPERATURA AMBIENTAL EN GRADOS CENTIGRADOS			21	HUMEDAD AMBIENTAL EN %			76	
FECHA DE REALIZACION DEL ENSAYO			jueves, 21 de abril de 2022	COLADA MUESTREADA		H-81	TIPO DE ACERO USADO	AISI 1566
DESIGNACION			ALAMBRE TREFILADO; NEGRO; 1,47mm (17 BWG)				"CONFORME";"NO CONFORME"	
DIAMETRO MAYOR mm 1,47+-0,03	Maximo	1,50	Medicion 1	Medicion 2	Medicion 3	Promedio	CONFORME	
	Minimo	1,44	1,49	1,49	1,48	1,487		
			Desviacion estandar			0,005		
DIAMETRO MENOR mm 1,47+-0,03	Maximo	1,50	Medicion 1	Medicion 2	Medicion 3	Promedio	CONFORME	
	Minimo	1,44	1,46	1,47	1,49	1,473		
			Desviacion estandar			0,012		
TOLERANCIA EN EL OVALAMIENTO (+-0,03) mm							CONFORME	
MAXIMA RESISTENCIA A LA TRACCION (Mpa)	415		400,84				CONFORME	
ASPECTO SUPERFICIAL	LIBRE DE DEFECTOS SUPERFICIALES OXIDACION						CUMPLE	
	LIBRE DE DEFECTOS SUPERFICIALES RAYADURAS						CUMPLE	
	LIBRE DE DEFECTOS SUPERFICIALES AGRETAMIENTO						CUMPLE	
	LIBRE DE DEFECTOS SUPERFICIALES EXFOLIACIONES						CUMPLE	
VERIFICACION ETIQUETADO	SE VERIFICO QUE LA ETIQUETA CUMPLIESE LO RESPECTIVO A ROTULADO SEGÚN NUMERAL 16 NTC 115						CUMPLE	

ELABORÓ	INGENIERO DE LABORATORIO	JULIETH RADA	APROBÓ	GUILLERMO BONETT-JEFE PLANTA

ACEROS TURIA
DIRECCION:KM 5 VIA MALAMBO-CARACOLI-BARRANQUILLA
TELEFONO: 3118572
EMAIL: ADMINTCO2@GRUPOTURIACO.COM

EL CERTIFICADO PERTENECE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS
Procedimiento de muestreo segun numeral 12,1 NTC 115
Ensayo mecanico: Metodo NTC 3353
CERTIFICADO MAQUINA TRACCION NUM 44071 EMITIDO POR LABQUIMEC

FIN DEL CERTIFICADO


Escaneado con CamScanner

aceros turia Colombia	INFORME DE ENSAYOS MALLA ELECTROSOLDADA NTC 5806 VERSION 2019	CODIGO: PE-CAL-R-1.1 VERSION 7 VIGENTE DESDE:01/09/2019 EL CERTIFICADO CONSTA DE 2 PAGINAS

INFORME NUMERO M470

TEMPERATURA AMBIENTAL DENTRO DEL LABORATORIO >= 16°C			20	HUMEDAD RELATIVA DENTRO DEL LABORATORIO >20%<=80%		79	INFORME PARA LA PLANTA: ACEROS TURIA BARRANQUILLA
ORDEN PRODUCCION	M-20	Turno	2	Fecha de realizacion del ensayo			16-abr-22
DESIGNACION: MALLA ESTANDAR	XX-084		Coladas Utilizadas	TZF-00110			

DESCRIPCION DE ATRIBUTOS	REQUISITO SEGÚN NTC 5806	OBTENIDO	OBSERVACIONES
Resistencia a la tracción Mpa Metodo de ensayo NTC 3353	550	759,9	CUMPLE
Resistencia a la fluencia Mpa Metodo de ensayo NTC 3353	485	668,7	CUMPLE
ESFUERZO CORTANTE EN NEWTON Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 8.3.2	1528	Probeta 1: 7342 | Probeta 2: 5925 | Probeta 3: 6190 | Probeta 4: 6689 | Promedio: 6536 Desviacion estandar: 623,671	CUMPLE

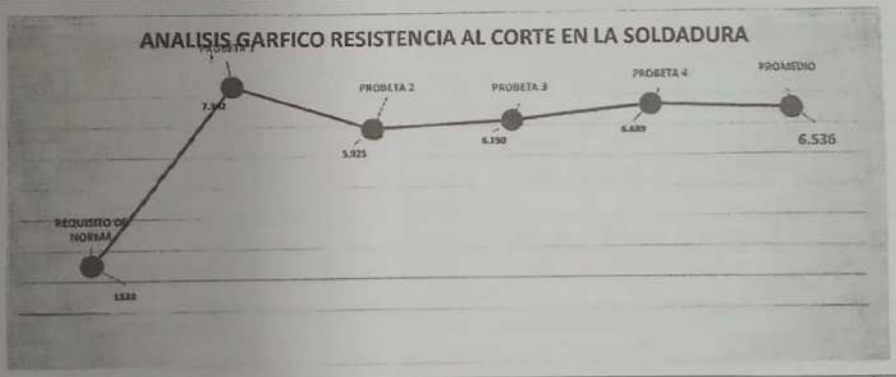

Promedio de Velocidad del ensayo maximo en minutos NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 9.3	609	519					CUMPLE
Ensayo de doblado Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 6.3	No presenta Grietas	No presenta Grietas					CUMPLE
Peso del grafil en gramos /metro Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 10.5	93,06	Pesaje 1	Pesaje 2	Pesaje 3	Pesaje 4	Promedio	CUMPLE
		96,20	96,20	96,20	96,20	96,2	
		Desviacion estandar: 0,00					
Soldaduras rotas "Unidades" Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 13.3	6	0					CUMPLE
Oxido Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 13.6	No presenta	No Presenta					CUMPLE

Escaneado con CamScanner

Ancho 235 cm **Maximo 237,5** **Minimo 232,5** Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 10.1		235	Medicion 1	Medicion 2	Medicion 3	Medicion 4	Promedio	CUMPLE
			233,4	234,0	233,6	234,0	233,8	
			Desviacion estandar			0,30		
Longitud 600 cm **Maximo 606** **Minimo 594** Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 10.2		600	Medicion 1	Medicion 2	Medicion 3	Medicion 4	Promedio	CUMPLE
			603,0	602,0	603,0	602,0	602,5	
			Desviacion estandar			0,58		
Numero de barras exacto en unidades Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 10.7	LONGITUDINAL	16	16					CUMPLE
	TRANSVERSAL	40	40					CUMPLE
Diametro del alambre de grafil en mm Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 10.7 tabla 11	LONGITUDINAL	4	4					CUMPLE
	TRANSVERSAL	4	4					CUMPLE
Separacion en cm Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 10.7 tabla 11	MIN	14,4	Medicion 1	Medicion 2	Medicion 3	Medicion 4	Promedio	CUMPLE
	LONGITUDINAL		15,0	15,0	15,5	15,0	15,1	
	MAX	15,6	Desviacion estandar			0,00		
	MIN	14,4	Medicion 1	Medicion 2	Medicion 3	Medicion 4	Promedio	CUMPLE
	TRANSVERSAL		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
	MAX	15,6	Desviacion estandar			0,00		
Longitud pelos en cm Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 10.7 tabla 11	LONGITUDINAL maximo	8	Medicion 1	Medicion 2	Medicion 3	Medicion 4	Promedio	CUMPLE
			7,8	8,0	8,0	7,0	7,7	
			Desviacion estandar			0,48		
	TRANSVERSAL maximo	5,0	Medicion 1	Medicion 2	Medicion 3	Medicion 4	Promedio	CUMPLE
			4,0	4,5	4,0	4,3	4,2	
			Desviacion estandar			0,24		
ETIQUETADO NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 15.4 RESOLUCION 0277 NUMERAL 6.1	**LA ETIQUETA DEBE CONTENER** NOMBRE DEL FABRICANTE PAIS DE ORIGEN DESCRIPCION DEL MATERIAL LOTE DE FABRICACION DESIGNACION DE LA NORMA DE FABRICACION OTRA INFORMACION		**LA ETIQUETA VERIFICADA CONTENIA** NOMBRE DEL FABRICANTE PAIS DE ORIGEN DESCRIPCION DEL MATERIAL LOTE DE FABRICACION DESIGNACION DE LA NORMA DE FABRICACION OTRA INFORMACION					CUMPLE

ELABORO	ING. DE CALIDAD	JULIETH RADA	APROBO	JEFE . PLANTA CRISTIAN HENAO

ACEROS TURIA DE COLOMBIA SAS
DIRECCION: CALLE 3 SUR NUM 36-10
MEDELLIN-ANTIOQUIA
TELEFONO: 3118572
EMAIL: ADMINTCO@GRUPOTURIACO.COM

EL CERTIFICADO PERTENECE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS
PROCEDIMIENTO DE MUESTREO SEGÚN NTC 5806

FIN DEL CERTIFICADO

Escaneado con CamScanner

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD
BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

icontec Sello de Calidad — NTC 2289:2020 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reglamento Técnico — Res 1856:2017 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

No. MAL-38045

FECHA: DD/MM/AA
15/07/2022

CLIENTE	**FERROMATERIALES SAN CARLOS S.A.S**	**DESTINO**	SINCELEJO
		VEHÍCULO No.	SUB 789

PEDIDO No.	17095
REMISIÓN No.	17089
FACTURA No.	0

						ENSAYOS FÍSICOS				COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.													DIMENSIONES DE PROCESO			
							ENSAYOS DE TRACCIÓN																				
PRODUCTO	**LONGITUD (metros)**	**COLADA**	**PAQUETES**	**UNIDADES**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO METRO (kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO (mm)**	**ANCHO DE VENAS (mm)**
R - No. 4	6	20221616	2	3024	✓	463.8	605.4	17.2	1.31	0.26	1.24	0.0095	0.036	0.19	0.14	0.06	0.06	0.015	0.00020	0.0022	0.48	0.957	1.060	8.380	1.620
		20221624	3		✓	480.2	622.0	17.7	1.30	0.27	1.20	0.0086	0.035	0.20	0.16	0.06	0.05	0.013	0.00020	0.0022	0.48	0.975	0.850	8.350	1.600
		20221251	4		✓	497.2	637.8	15.5	1.28	0.25	1.19	0.0117	0.033	0.19	0.18	0.08	0.06	0.017	0.00031	0.0022	0.46	0.980	0.740	8.440	1.700
R - 12M	6	20221525	2	2256	✓	495.2	639.2	16.9	1.29	0.25	1.20	0.0079	0.036	0.20	0.16	0.07	0.08	0.012	0.00091	0.0020	0.46	0.871	0.870	7.970	2.010
		20221522	4		✓	487.6	629.6	16.9	1.29	0.25	1.19	0.0127	0.032	0.19	0.16	0.07	0.08	0.013	0.00020	0.0020	0.46	0.879	0.940	8.060	2.420
R - No. 5	6	20221256	2	432	✓	491.0	628.3	15.9	1.28	0.24	1.21	0.0136	0.034	0.19	0.20	0.07	0.07	0.017	0.00020	0.0021	0.46	1.518	1.010	10.380	2.160
ESPECIFICACIONES DE NORMA																									
R - No. 4						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50								Max: 0.55	(0.934 - 0.994)	Min: 0.51	Max: 8.9	Max: 4.9
R - 12M						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50								Max: 0.55	(0.835 - 0.888)	Min: 0.48	Max: 8.4	Max: 4.71
R - No. 5						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50								Max: 0.55	(1.459 - 1.552)	Min: 0.71	Max: 11.1	Max: 6.1

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

Enviado: ferromaterialessancarlos@gmail.com

Durman by aliaxis
Km 27 Vía Fontibón – Facatativá -
Los Alpes + 400 m. Vía Barley – El Colegio
Lote 3
Madrid, Cundinamarca
Colombia

+57 1 8 200 200
laboratorioco@aliaxis-la.com
durman.com.co

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO : TUBOS PRESION
NTC- APLICABLE : NTC- 382
REFERENCIA : 1/2" RDE 13.5
LOTE : 10393T
FECHA : 20 de agosto de 2021

REQUISITOS	ESPECIFICACIONES			PROMEDIO OBTENIDO
	Mínimo	Máximo	Unidad	
Longitud del tubo	6000	-	mm	6010
Diámetro Exterior	21.24	21.44	mm	21.32
Ovalamiento	-	0.41	mm	0.47
Espesor de pared	1.57	2.08	mm	1.79
Variación espesor de pared	0	12	%	1.87
Presión Sostenida	970	-	psi	CUMPLE
Presión de Rotura	1000		psi	1100
Resistencia al Aplastamiento	40	-	%	CUMPLE
Impacto	13.6	-	Julios	CUMPLE
Calidad de Extrusión (ACETONA)	20	-	minutos	CUMPLE

Realizado por



GUSTAVO MATEUS
Inspector de Calidad
Telefono+571.8200200 Ext-3112
gmateus@aliaxis-la.com

Revisado por




LUIS FERNANDO GONZALEZ PINZON
Jefe de Calidad
Telefono+571.8200200 Ext-3116
lgonzalez@aliaxis-la.com

GEOTECNIA-CONCRETOS - CONSTRUCCION

GEOCRON SAS

UNIDADES DE MAMPOSTERÍA DE ARCILLA COCIDA, LADRILLOS Y BLOQUES CERÁMICOS. NTC 4205



I. DATOS INICIALES

Proyecto	Ensayo de carcaterización mecánica en unidades de arcilla	**Elemento**	1
Localización	Municipio de Sincelejo, Departamento Sucre.	**Muestra**	5
Peticionario	Ladrillos y arcillas San José Zomac SAS		
Direccion de Peticionario	Corregimiento La Palmira. Municipio de Toluviejo		

II. REFERENCIA DE CILINDROS

FECHA DE RECIBO		30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022
FECHA DE FABRICACION				
FECHA DE PRUEBA		1/07/2022	1/07/2022	1/07/2022
EDAD (Dias)		Sin referencia	Sin referencia	Sin referencia

III. NUMERACION DE BLOQUES.

PARAMETRO	UND	1	2	3.00	4.00	5.00
Largo L	cm	39.90	40.30	40.50	40.00	40.10
Ancho B	cm	9.74	9.74	9.80	9.81	9.70
Altura	cm	20.60	20.70	20.60	20.60	20.70
Seción 1	cm	5.51	5.44	5.58	5.34	5.57
Seción 2	cm	7.63	7.92	7.77	7.75	7.70
Espesor medio	cm	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07
Masa	Kg	4.982	5.070	5.11	5.11	4.95
Densidad	gr/cm3	1.89	1.89	1.91	1.93	1.87
Area bruta en planta	cm2	388.63	392.52	396.90	392.40	388.97
Area de cavidades	cm2	304.44	319.18	314.69	310.00	308.77
Area neta	cm2	84.19	73.35	82.22	82.40	80.20

IV. NIVELES DE CARGA Y RESULTADOS DE ESFUERZOS

		1	2	3	4	5
Velocidad de carga	Mpa/s	0.02	0.02	0.03	0.2	0.04
Carga de falla	KN	20.04	24.5	23.8	20.63	22.61
Esfuerzo de rotura	Kg-f/cm2	23.804	33.403	28.948	25.036	28.192
	PSI	340.051	477.190	413.550	357.663	402.743
Resultados individuales	**Kg-f/cm2**	**23.80**	**33.40**	**28.95**	**25.04**	**28.19**
	MPa	**2.38**	**3.34**	**2.89**	**2.50**	**2.82**
Resistencia promedio	**MPa**	**2.87**				

V. VALORES DE REFERENCIA DE ACUERDO A LA NTC 4025 PARA MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL. Tabla 2

Condición a valorar		Resistencia a compresión
Resistencia individual mínima requerida	kg-f/cm2	2.0
resistencia promedio minima requerida	kg-f/cm2	3.0

Alex Jose Bracamonte Miranda
Ingeniero Civil Esp. MSc
Director

Calle 36 # 16D - 60, Barrio Las Mercedes. Sincelejo_Sucre_Colombia.
Fijo (57+5) 2808911, Movil (+57) 3002333852, secretaria@geocron.com.co director@geocron.com.co


Prohibida la reproduccion total o parcial de este informe, sin la aprobacion por escrito del laboratorio Geocron SAS, según Ley 23 de 1982, Ley 1403 de 2010 y Articulo 61 de la Constitucion Politica de Colombia de 1991.

Cerámicas El Cinco®
Ladrillos bien hechos

FICHA TÉCNICA
PRODUCTOS FABRICADOS

NOMBRE DEL PRODUCTO:
BLOQUE No. 4

DIMENSIONES	
Largo	40 cm
Ancho	9 cm
Alto	20 cm
TOLERANCIA DIMENSIONAL	
Largo	± 8 mm
Ancho	± 2 mm
Alto	± 4 mm

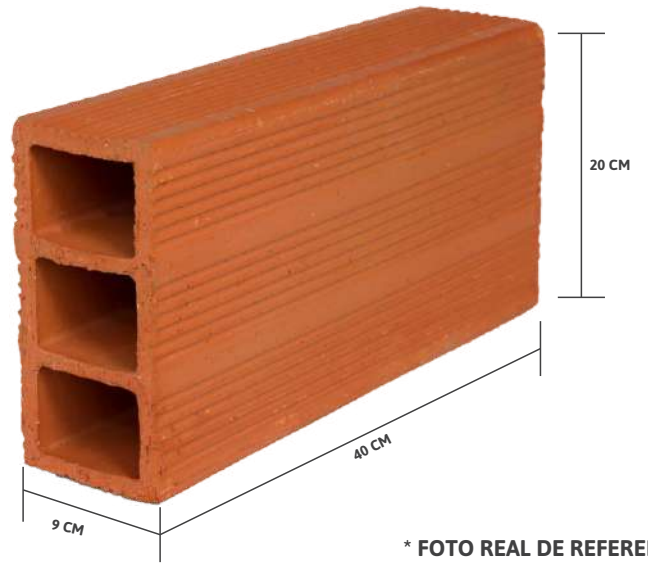

* FOTO REAL DE REFERENCIA.

Color	Terracota
Textura	Rayado
Paredes	10 mm
Tabiques	8 mm
Peso/unidad	4.75 kg Aprox.
Rendimiento	12 Unidades/m²
Aplicación	Mampostería Confinada
Clasificación	PH (Perforación Horizontal), NE (No Estructural)
Resistencia a la compresión	4.57 Mpa
Absorción de agua	11.5 %
Normas aplicadas	ICONTEC NTC 4205 - 4017

WWW.CERAMICASELCINCO.COM
SECTOR EL CINCO KM 1 VARIANTE LA GALLERA - BREMEN (SINCELEJO)
CONMUTADOR: 323 563 9125 321 563 0105
VENTAS@CERAMICASELCINCO.COM CERAMICASELCINCO

Sello con Reglamento Técnico

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBO CONDUIT TIPO LIVIANO, CURVAS CONDUIT, TUBO DUCTO CORRUGADO ELÉCTRICO Y TELEFÓNICO, ACCESORIOS CONDUIT, TUBO DUCTO TELEFÓNICO Y ELÉCTRICO (DB Y EB), CURVAS DUCTO TELEFÓNICO Y ELÉCTRICO, ACCESORIOS DUCTO TELEFÓNICO Y ELÉCTRICO

Fabricado por **P.V.C. GERFOR S.A.**, en la **Autopista Medellín 22-21 Autopista Medellín, Kilometro 2, 600 metros Entrada Parcelas Cota, Cota, Cundinamarca, Colombia,** identificada con **número de NIT 860.502.509-1**

Manufactured by **P.V.C. GERFOR S.A.**, in the **Autopista Medellín 22-21 Autopista Medellín, Kilometro 2, 600 metros Entrada Parcelas Cota, Cota, Cundinamarca, Colombia**, identified with **NIT number 860.502.509-1**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.6 y 20.6.1.1

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.6 y 20.6.1.1

Technical Regulations for Electrical Installations RETIE 2013 - Chapter 3, Sections 20.6 y 20.6.1.1

SECTOR ICS 23,040,20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado y se deben presentar como un solo documento.

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certified

Certificado CSR-CER317106
Certificate

Fecha de Aprobación: 2014-06-18
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Renovación: 2020-08-14
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2023-08-16
Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

icontec

ANSI ACCREDITED
ID #0677
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO

Expediente: FFU-142

RMN: FFU-142

MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Vigencia Desde: 16/02/2010 Hasta: 16/02/2040

Fecha y Hora de Registro: 16/02/2010 00:00:00

TITULARES: IDENTIFICACIÓN

GRANITOS Y CALIZAS DE COLOMBIA S.A.S. N 9004686153

AREA TOTAL: 109 Hectárea(s) y 7134 mt(s)2 MUNICIPIOS: TOLUVIEJO-SUCRE

MINERALES: DOLOMITA\ ARCILLA\ CALIZA\ GRAVA\ ARENA

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

AREA: 1

PUNTO ARCIFINIO: INTERSECCISN DEL ARROYO GRANDE CON LA VMA QUE VA DE TOLUVIEJO A MACAJANA

NORTE: 1542415,0000

ESTE: 852090,0000

PLANCHA IGAC: 44

ALINDERACIÓN

Coordenada Norte	Coordenada Este
1541529,6330	853373,9360
1539683,9580	853373,9360
1539523,9980	853127,0000
1539457,9990	852709,9990
1539457,6310	852707,0480
1539457,6310	852701,9990
1539459,9980	852701,9990
1539459,9980	852700,0000
1539724,0020	852683,0020
1540060,0010	852662,0020
1540055,9990	852659,9990
1540153,0000	852680,9990
1540965,0000	852852,9980
1541143,9990	852991,0010
1541529,6330	853286,7850

ANOTACIONES

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO	Expediente: FFU-142 RMN: FFU-142
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)	
Vigencia Desde: 16/02/2010 Hasta: 16/02/2040	Fecha y Hora de Registro: 16/02/2010 00:00:00

16/02/2010

TIPO ANOTACIÓN:	CONTRATO UNICO DE CONCESION	FECHA EJECUTORIA:	22/01/2010
DOCUMENTO	CONTRATO	NÚMERO:	1113255
EXPEDIDO POR:	REGIONAL BOGOTA	FECHA DOCUMENTO:	22/01/2010
LUGAR:	BOGOTÁ, D.C.		

ESPECIFICACIÓN: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MINERO NACIONAL DEL CONTRATO ÚNICO DE CONCESIÓN No.FFU-142 (EL CONTRATO DE CONCESION MINERA SE SUSCRIBE PARA LOS MINERALES DE CALIZA, DOLOMITA ARCILLA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN CONTRATO FFU-142).

ANOTACIÓN:	2	FECHA ANOTACIÓN:	04/08/2015
TIPO ANOTACIÓN:	MODIFICA ETAPAS CONTRATO /RENUNCIA A ETAPA /EXPT. ANTICIPADA	FECHA EJECUTORIA:	14/09/2012
DOCUMENTO	RESOLUCION	NÚMERO:	GTRM-351
EXPEDIDO POR:	PAR MEDELLIN	FECHA DOCUMENTO:	14/05/2012
LUGAR:	MEDELLÍN		

ESPECIFICACIÓN: ACEPTAR LA RENUNCIA A LAS ETAPAS DE EXPLORACION(PRIMERO Y SEGUNDO AÑO) Y A LA TOTALIDAD DE CONSTRUCCION Y MONTAJE, POR LO CUAL EL PRESENTE TITULO MINERO EN LA ETAPA DE EXPLOTACION DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012, FECHA EN LA CUAL SE CONCEDIO LA LICENCIA AMBIENTAL.

ANOTACIÓN:	3	FECHA ANOTACIÓN:	28/01/2016
TIPO ANOTACIÓN:	CESION TOTAL DE DERECHOS	FECHA EJECUTORIA:	09/12/2015
DOCUMENTO	RESOLUCION	NÚMERO:	002423
EXPEDIDO POR:	PAR CENTRO	FECHA DOCUMENTO:	06/10/2015
LUGAR:	BOGOTÁ, D.C.		

ESPECIFICACIÓN: ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR PERFECCIONADA LA CESIÓN TOTAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES emanadas del Contrato de Concesión No. FFU-142, que le corresponden a MARIA DEL CARMEN FADUL CHADID a favor de la sociedad GRANITOS Y CALIZAS DE COLOMBIA S.A.S., con Nit. 900.468.615-3.

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez inscrita en el Registro Minero Nacional la presente Resolución téngase a la sociedad GRANITOS Y CALIZAS DE COLOMBIA S.A.S., como ÚNICA TITULAR del Contrato de Concesión No. FFU-142, y responsable ante la Agencia Nacional de Minería, de todas las obligaciones que se deriven del mismo.

De conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la Resolución No. 002423 de fecha 06 de Octubre de 2015.

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO	Expediente: FFU-142 RMN: FFU-142
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)	
Vigencia Desde: 16/02/2010 Hasta: 16/02/2040	Fecha y Hora de Registro: 16/02/2010 00:00:00

NOTA ACLARATORIA

De acuerdo con la circular Número 0010 del 18 de junio de 2015 expedida por la Agencia Nacional de Minería ANM -, se fija la directriz relacionada con la inscripción de prendas mineras, donde se determina que "Por disposición de la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 400 de 2014 las garantías mineras o cualquier gravamen que recaiga sobre el derecho a explorar y explotar en los términos de la señalada norma, deben ser consultadas en el registro de Garantías Mobiliarias, el cual se desarrollará por parte de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecamaras)".

********** FIN DE ESTE DOCUMENTO **********

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Ana María González Borrero
Coordinadora de Catastro y Registro Minero

ICONTEC

MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL - ISO
MEMBER OF THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION - ISO

Member of IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

ICONTEC

CERTIFICADO
DE GESTION
DE LA CALIDAD

CERTIFICADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
CERTIFICATE OF QUALITY MANAGEMENT

ICONTEC certifica que el sistema de calidad de:
ICONTEC certifies that the quality system of:

ETERNIT COLOMBIANA S.A.

Planta El Muña Km 1. Vía Silvana, Bogota D.C. - Colombia

ha sido evaluado y aprobado con respecto a la norma internacional:
has been assessed and approved based on the international quality standard:

ISO 9001:2000 - NTC-ISO 9001:2000

Este Certificado es aplicable a las siguientes actividades:
This certificate is applicable to the following activities:

Fabricación de cubiertas y tubos de fibrocemento, tanques para almacenamiento de agua y tanques sépticos de polietileno fabricados por proceso de rotomoldeo

Manufacturing of roof tiles and fiber cement tubes, water storage tanks and septic tanks of polyethylene manufactured by rotomolding process

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de calidad se mantenga de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma, lo cual será verificado por el ICONTEC
This approval is subject to the maintenance of the quality system according to the requirements established in the above mentioned standard, which will be verified by ICONTEC.

Certificado N° 023-1
Certificate N°

Fecha de Aprobación: Approval date:	1994 09 19	**Fecha Última Modificación:** Last modification date	
Fecha de Renovación: Renewal date:	2004 12 16	**Fecha de Vencimiento:** Expiration date	2007 12 16

Director Ejecutivo
Executive Director

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accredited by:

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
RES. 36966 NOV. 09 DE 2001

Deutscher Akkreditierungs Rat
DAR
TGA - ZM - 34 - 96 - 00

INN - CHILE
SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION
ACREDITACIÓN SC 003 R

indecopi
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
Res. 0045-2002

CERTIFICADOS DE CALIDAD

Los productos Eternit cumplen con las normas nacionales e internacionales de calidad y protección al medio ambiente.

Eternit Colombiana S.A.







Eternit Pacífico S.A.







Eternit Atlántico S.A.











ROMA

DECLARACION DE CONFORMIDAD	AÑO:2022

A QUIEN PUEDA INTERESAR

CORDIAL SALUDO

SENCO COLOMBIANA S.A.S es una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos de porcelana sanitaria, bajo la marca **ROMA** nuestro propósito es tener relaciones estrechas con nuestros aliados estratégicos y clientes finales, con productos que satisfagan sus necesidades, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos de la norma ICONTEC NTC 920 “APARATOS SANITARIOS DE CERAMICA”

Todos los productos de porcelana sanitaria marca **ROMA.** En caso de presentarse un defecto de fabricación o mal desempeño del Producto estará amparado por su respectiva garantía siempre se cumplan todas las condiciones previstas, se reparará o remplazará a su discreción y criterio técnico, el respectivo Producto y/o pieza objeto de la reclamación una vez esta le sea notificada

En el cuadro anexo se encuentran descritos los porcentajes permitidos por la norma NTC 920 “APARATOS SANITARIOS DE CERAMICA”

y la conformidad de los productos ROMA respecto a la norma

Senco Colombiana S.A.S
NIT: 890.926.628-9
PBX: + 60 4 475 45 60
sencolombiana@sencolombiana.com
KM 25 Autopista Medellín – Bogotá, Guarne - Antioquia

ROMA

FICHA APARATOS SANITARIOS DE CERAMICA NTC-920

CARACTERISTICAS	NORMA NTC 920	SENCO COLOMBIANA
ABSORCION	MENOR O IGULA A 0.5%	0.3% - 0.5%
CUARTEADO	NO SE PERMITE	NO PRESENTA
ESPESOR	MAYOR O IGUAL A 6mm	TAZA MIXTA 12 – 13 mm LAVAMANOS 8.5-9mm TANQUES 12 – 13 mm PEDESTAL 8.5-9.5mm
AGUJEROS, AMPOLLAS Y PUSADURAS BURBUJAS, MANCHAS Y PECAS	NO MAS DE 5 TOTAL NO MAS DE 5 EN CUADRADO DE ALFARERIA, TOTAL 10	CUMPLE POR INSPECCION VISUAL SEGÚN NORMA DISTANCIA 24 PULG.
CARGA (MOR)	2.2KN	CUMPLE
ESPEJO DE AGUA	125mm x 100mm	CUMPLE
DIAMETRO DE PASO DE BOLA POR SIFON	BOLA DE 38mm DE DIAMETRO	CUMPLE
ALTURA TAZA	343mm	CUMPLE (390.5mm)
TAMAÑO DE ACOPLE	TAZA OPERADAS POR VALVULA FLUXOMETRO 38 mm o 32 mm ORIFICIOS PARA CUBIERTAS 14mm	CUMPLE (63.4mm) 13.8mm
HUECOS LAVAMANO	PERFORACIONES PARA GRIFERIA DE LLAVES Min 25 mm - Max 38. mm	LAV. OCEANO 30 mm LAV. Gaira 36 mm LAV. Vessel 37 mm
HUECOS TANQUES	TANQUES POR GRAVE- DAD ACOPLADOS: VAL- VULA DE DESCARGA 60 – 70 mm	TANQ. OCEANO 63 mm TANQ. AWA 63 mm
CONSUMO DE AGUA	ALTA EFICIENCIA 4.5 LTS	4.5 LTS / DESCARGA
DESACARGA MISO		Min 350 Gr – Max 700 Gr Dependiendo de la referencia.

Especificaciones Técnicas:

Senco Colombiana S.A.S
NIT: 890.926.628-9
PBX: + 60 4 475 45 60
sencolombiana@sencolombiana.com
KM 25 Autopista Medellín – Bogotá, Guarne - Antioquia

Material	Porcelana Sanitaria
Rango de presión de agua	20 PSI – 100 PSI
Sistema descarga	Descarga por Gravedad
Consumo de Agua	4.5 Lpf – 4.8 Lpf
Espejo de Agua	190 mm x 200 mm
Altura de Sello	60 mm
Medida Instalación	30,5 cm (Pared Terminada)
Dimensión Producto Empacado	0.080 M 3
Peso Empacado	19 Kg +/- 1 Kg

Requisitos Técnicos Cerámicos

a. Porcelana:

- Absorción de Agua: el valor obtenido es inferior al 0.5 %.
- Núcleo Negro: La producción debe estar libre de este defecto de cocción

b. Esmalte:

- Resistencia al Ataque Químico: Determinación de la Resistencia a Sustancias Químicas ASTM C650-04
- Acople pasta / esmalte: compresión, por lo cual debe pasar la Prueba de Craquelado

Grifería Tanque

- GARANTIA: 18 meses por defectos de fabricación o defecto significativo. No cubre daños físicos o mecánicos generados por errores en instalación del producto o daños por instalar con herramientas. No aplica garantía, a los componentes que sufren desgaste por el funcionamiento normal del producto como son empaques y partes que sufren manipulación

- Los repuestos de la Grifería, Válvula de entrada, Agua stop entre otros son homologados con otras marcas, así mismo a nuestros sanitarios le sirve griferías nacionales como ; Gerfor, Grival, Gricol

Senco Colombiana S.A.S
NIT: 890.926.628-9
PBX: + 60 4 475 45 60
sencolombiana@sencolombiana.com
KM 25 Autopista Medellín – Bogotá, Guarne - Antioquia

Senco Colombiana S.A.S
NIT: 890.926.628-9
PBX: + 60 4 475 45 60
sencolombiana@sencolombiana.com
KM 25 Autopista Medellín – Bogotá, Guarne - Antioquia

ROMA

GARANTIA PORCELANA SANITARIA

¡Felicitaciones! Usted acaba de adquirir un Producto ROMA 100 % colombiano diseñado y fabricado por SENCO COLOMBIANA S.A.S el Producto objeto de la garantía está libre de defectos de fabricación y su desempeño cumple las normas de calidad colombiana NTC -920 SANITARIOS DE CERAMICA y la Norma Internacional ASME A 112.19.2 - 2008

Con el propósito de dar validez a su garantía le solicitamos tenga en cuenta las siguientes apreciaciones:

Instrucciones de instalación y mantenimiento

- **El sanitario deberá ser instalado con brida o anillo de cera y en la unión entre la taza y el piso deberá utilizar selladores a base de Silicón.**
- **Por ningún motivo utilice cemento para la instalación y cemento y/o yeso para sellar la unión, ya que existe el riesgo de romper la taza ó que esta misma presente fisura por la contracción del cemento sobre la porcelana.**
- **En caso de requerir levantar la taza ó sanitario para hacer reparaciones por taponamiento ocasionados por agentes externos ó pruebas de funcionalidad se corre el riesgo de quebrar la taza al ser instalada con cemento, El no seguir esta instrucción de instalación anula por completo la garantía del producto.**
- **Siga las instrucciones de instalación expresadas en los documentos entregados con los productos correspondientes.**
- **Para el mantenimiento, limpie las superficies externas con una solución de agua jabonosa y el área interna de la taza ó pozo con un limpiador no abrasivo, Las áreas de acabados cromados deben limpiarse con jabón suave y el secado y brillo con un paño de algodón limpio y no deben estar expuestos a la intemperie.**

Cobertura de la Garantía.

La GARANTIA cubre todos los productos de marca ROMA en porcelana sanitaria, sobre cualquier defecto relacionado con la calidad intrínseca e idoneidad del producto, es decir por la calidad ofrecida y por su capacidad de funcionamiento y los acabados de los componentes cerámicos siempre y cuando se cumplan las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento.

Obligación de SENCO COLOMBIANA S.A.S

En caso de presentarse un defecto de fabricación o mal desempeño del Producto amparado por la presente garantía y de cumplirse todas las condiciones previstas, SENCO COLOMBIANA S.A.S reparará o remplazará a su discreción y criterio técnico, el respectivo Producto y/o pieza objeto de la reclamación una vez esta le sea notificada, con productos y/o piezas iguales o similares, de acuerdo a la disponibilidad en su inventario.

Tiempo de la Garantía.

Todos los productos de porcelana sanitaria ROMA están garantizados de por vida en su funcionamiento, siempre y cuando sean instalados de acuerdo con los procedimientos y normas especificados en los manuales de instalación adjuntos y sean utilizados dentro de las condiciones para las cuales fueron diseñados.

A los componentes producidos por otros fabricantes y representados ó distribuidos por SENCO COLOMBIANA S.A.S tales como: Porcelana sanitaria importada (de por vidad), asientos sanitarios (1 año), griferías y/o herrajes de tanque y griferías para lavamanos (1 año) y accesorios plásticos (1 año) les aplicará el tiempo de la garantía ofrecida por el respectivo fabricante siempre y cuando se sigan las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento de cada uno de ellos.

Exoneraciones.

ROMA, no asumirá daños indirectos, incidentales o que sean consecuencia de algún imperfecto que se genere como consecuencia de:

- **Culpa exclusiva del cliente y/o de terceros.**
- **Hechos ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor, es decir cualquier hecho u concurrencia imprevisible no imputable a SENCO COLOMBINA S.A.S y que no sea consecuencia de culpa suya ni concurra con ella, y que coloque a SENCO COLOMBIANA S.A.S en la imposibilidad absoluta de cumplir la garantía.**
- **No aplicara la garantía por Mal funcionamiento en los herrajes del tanque u otros componentes del Producto cuando sean causados ya sea por sedimentos generados por la falta de purga inicial de las tuberías, uso de cloraminas, sedimentos u otros minerales no retirados en el tratamiento de los abastecimientos de agua pública o por limpiadores de taza tipo tanque que contengan hipoclorito cálcico (cloro), acido fluorhídrico y/u otros productos químicos, utilización de pegantes o siliconas en la instalación de los herrajes que deterioran los sellos de caucho o por un mal funcionamiento de los mismos al no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento.**
- **Accesorios de grifería cromados como, Push del tanque , llave de lavamanos, no podrán ser limpiados con hipoclorito de cálcico (cloro), acido fluorhídrico y/u otros productos químicos tipo abrasivo ; puestos afectan la apariencia final de la pieza**
- **Daños que ocurran al Producto durante su transporte o instalación y que no hayan estado a cargo de SENCO COLOMBIANA S.A.S**
- **Los reclamos relativos a la apariencia, forma y color deben ser previos a la instalación.**

COMO HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para hacer efectiva la Garantía es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

- **El Producto se debe haber instalado conforme a las instrucciones indicadas por ROMA**
- **El mantenimiento y limpieza del Producto debe haberse hecho evitando elementos abrasivos o químicos fuertes (ácidos y/o cloro y/o derivados del cloro y/o amoniacos usados en el tratamiento de abastecimiento de agua o para limpieza de tanques sanitarios, bases o disolventes).**
- **Comunicarse con la línea de servicio al cliente: (57) (4) 4754560 , CEL : 315.300.51.67**
- **Presentar la factura de compra o comprobante de compra de los productos para verificar la fecha de adquisición.**

La responsabilidad que vincula a SENCO COLOMBIANA S.A.S con cada uno de sus DISTRIBUIDORES es de naturaleza contractual con base en el acto de ejecución que le dio origen; en tanto que con cualquier tercero que llegare a reclamar será de naturaleza extracontractual, surgida exclusivamente por ser el fabricante o productor del bien en cuestión, sin perjuicio, adicionalmente, de la responsabilidad contractual que llegare a existir entre ese tercero y el DISTRIBUIDOR de quien adquirió el producto…

QUES PLÁSTICOS
COPLAST

FDA

Tanques plásticos fabricados con polietileno de la mejor calidad, para garantizar productos livianos, resistentes y libres de elementos contaminantes, usando materias primas grado FDA


Higiénicos
No se corroen, no sueltan partículas, tienen superficies lisas y fáciles de limpiar

Resistentes
El material de los tanques plásticos está especificado para estar expuesto a la intemperie



Los Tanques Plásticos Ecoplast son fabricados en dos capas de color negro que impiden el paso de rayos solares inhibiendo el proceso de fotosíntesis necesario para el crecimiento de algas.

Cumplen con la norma técnica colombiana NTC 4384 de Tanques de Polietileno para Almacenamiento Fabricados por el Proceso de Rotomoldeo.

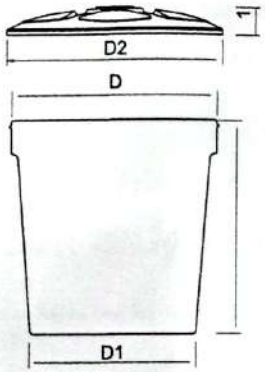

Volumen Bruto Litros	Dimensiones del tanque mm			Dimensiones de la tapa mm	
	D	D1	H	D2	H1
500	931	758	934	975	170
1000	1.232	1.031	1.030	1.275	236
2000	1.520	1.220	1.550	1.585	280

Transporte, almacenamiento y manipulación.

Cantidad máxima por arrume	
Litros	Tanques
2000	5
1000	8
500	12

- Los tanques se pueden transportar en arrumes verticales, en las cantidades indicadas en el cuadro.
- Los arrumes pueden colocarse sobre la plataforma del camión o sobre otros productos teniendo la precaución de hacerlo sobre cartón para evitar daños por rozamiento y vibración durante el viaje.
- Cuando el espacio en la altura no es suficiente, los tanques se pueden cargar acostados y encajados uno entre otro, siempre colocando cartones para evitar daños.


NOTA: En el descargue de los tanques Ecoplast se debe evitar cualquier tipo de golpe, caída o arrastrarlos ya que esto pueden ocasionar fisuras en el producto afectando su desempeño.

Cumplimos con los requisitos exigidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4384

Garantía
Eternit
CONSTRUCCIÓN EN EVOLUCIÓN

Escaneado con CamScanner

idráulica
instalación hidráulica

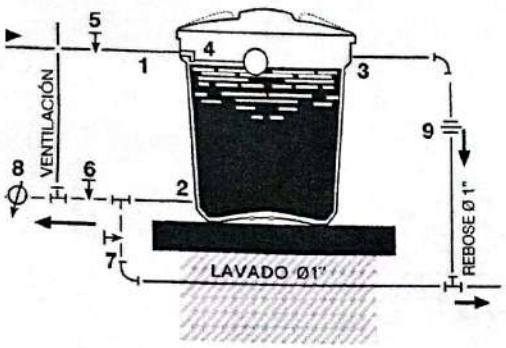

ecesarios:

entrada ø 1/2".

salida ø 1".

rebose ø 1".

ntrada ø 1/2 " y flotador.

paso directo para interrumpir la entrada del agua en caso de lavado de tanque.

aso para interrumpir la salida al servicio en caso de reparación o de tanque.

aso, se abre solamente para lavar el tanque.

paso directo o bypass (8A), para aprovechar la presión del acue-ed interna de servicio.

rsal.

-V1 / NOV2021

Instrucciones para la instalación

- Antes de instalar el tanque se recomienda lavar el interior con un desinfectante y enjuagar.
- La superficie que va a soportar el tanque debe ser totalmente horizontal, limpia y sin irregularidades que generen apoyos puntuales que lo deterioren o deformen.
- El área de la plataforma de apoyo debe ser mayor al diámetro de la tapa del tanque para que no queden partes por fuera.
- La estructura de apoyo debe soportar un peso mayor al peso del tanque lleno. (Tener en cuenta la densidad del líquido).
- No almacene líquidos derivados del petróleo o solventes ya que pueden deteriorar el tanque.
- Las tuberías o mangueras empleadas para las instalaciones hidráulicas no deben estar torcidas, ni deben generar fuerzas o tensiones sobre el tanque.
- Siempre utilice las conexiones y accesorios suministrados.
- No hacer conexiones con tuberías torcidas o mangueras que halen el tanque.
- No enterrar el tanque bajo tierra.


NOTA:

- La instalación debe ser realizada por personal calificado y certificado para trabajo en alturas.
- El tanque debe permancer bien tapado y con los conductos de ventilación sin obstrucciones.
- Realice inspecciones al menos una vez al año para verificar el correcto funcionamiento y limpieza.
- No instale los tanques cerca de fuentes de calor.


Para mayor información comuníquese
a nuestra Línea de Servicio al Cliente
018000 1156 60 o visite www.eternit.com.co

Fabricado por:
Eternit
CONSTRUCCIÓN EN EVOLUCIÓN


Conexiones para tanques plásticos
Localización de las conexiones

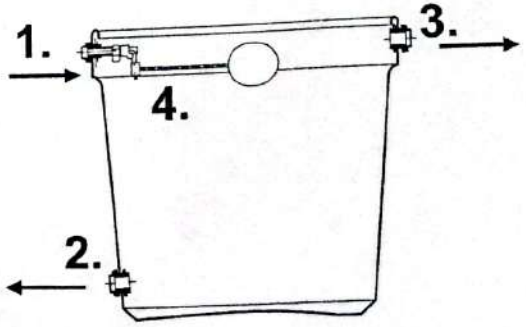

Conexión de entrada Ø 1/2"




2. Conexión de salida al servicio Ø 1"




A. Empaque de caucho
B. Flanche
C. Arandela y empaque
D. Tuerca espigo

Conexión de rebose Ø 1"



4. Válvula con varilla



Escaneado con CamScanner

Certificado

Registro Único de Comercializadores de Minerales
RUCOM

Registro **RUCOM-201607077329**

En cumplimiento del Capítulo 6º del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que AGREGADOS Y CANTERAS DEL NORTE S.A.S. con NIT número 900473048 acredita la calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales.

La presente certificación permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos y tiene una vigencia del 21-05-2021 hasta el 31-07-2022. Durante el mes de mayo de 2022 el interesado debe realizar los trámites de renovación indicada en el Decreto 1073 de 2015.

Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y consultar en la Base de datos de Confecámaras.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUTORIZA AL COMERCIALIZADOR A REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

Dado en Bogotá D.C., a los 21 dias del mes de mayo del año 2021.

PABLO ROBERTO BERNAL LOPEZ
Gerente de Proyecto - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

EDWIN ALFONSO COY GONZALEZ
21-05-2021 10:42

Este documento ha sido firmado digitalmente con un certificado provisto por una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999, y 15 del Decreto 1747 de 2000. La firma digital aquí impuesta es el equivalente electrónico de la firma manuscrita.
La autenticidad del presente certificado podrá ser validada ingresando a www.anm.gov.co, con el número Registro RUCOM disponible en este certificado.

Durman by aliaxis
Km 27 Vía Fontibón – Facatativá -
Los Alpes + 400 m. Vía Barley – El Colegio
Lote 3
Madrid, Cundinamarca
Colombia

+57 1 8 200 200
laboratorioco@aliaxis-la.com
durman.com.co

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO : TUBOS SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS
NTC – APLICABLE : NTC - 1087
REFERENCIA : 2" 60 mm
LOTE : 10618T
FECHA : 07 de Mayo de 2022

REQUISITOS	ESPECIFICACIONES			PROMEDIO OBTENIDO
	Mínimo	Máximo	Unidad	
Longitud del tubo	6000	-	mm	6010
Diámetro Exterior	60.17	60.47	mm	60.39
Ovalamiento	-	1.60	mm	0.41
Espesor de pared	2.92	3.43	mm	3.38
Variación espesor de pared	-	12	%	1.14
Impacto	81	-	Julios	CUMPLE
Calidad de Extrusión (ACETONA)	20	-	minutos	CUMPLE
Presión de Rotura	500	-	Psi	584
Resistencia Química	-	0.5	%	CUMPLE
Resistencia al Aplastamiento	40	-	%	CUMPLE
Absorción de Agua	-	0.3	%	CUMPLE

Realizado por

GUSTAVO MATEUS.
TECNICO DE ENSAYOS.

Revisado por

ING. LUIS FERNANDO G.
DIRECTOR TECNICO.

Durman by aliaxis
Km 27 Vía Fontibón – Facatativá -
Los Alpes + 400 m. Vía Barley – El Colegio
Vereda El Corzo Lote 3
Madrid, Cundinamarca
Colombia

+57 1 8 200 200
laboratorioco@aliaxis-la.com
www.durman.com.co

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO : **TUBOS SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS**
NTC – APLICABLE : **NTC - 1087**
REFERENCIA : **4”**
LOTE : **10625T**
FECHA : **15 de mayo de 2022**

REQUISITOS	ESPECIFICACIONES			PROMEDIO OBTENIDO
	Mínimo	Máximo	Unidad	
Longitud del tubo	6000	-	mm	6010
Diámetro Exterior	114.07	114.53	mm	114.30
Ovalamiento	-	2.40	mm	0.62
Espesor de pared	3.30	3.81	mm	3.66
Variación espesor de pared	-	12	%	9.82
Impacto	81	-	Julios	CUMPLE
Calidad de Extrusión (ACETONA)	20	-	minutos	CUMPLE
Presión de Rotura	360	-	Psi	430
Resistencia Química	0	0.5	%	CUMPLE
Resistencia al Aplastamiento	40	-	%	CUMPLE
Absorción de Agua	0	0.3	%	CUMPLE

REALIZADO POR:



AlVARO ENRIQUE PAVA
TECNICO DE ENSAYOS

REVISADO POR:



ING. LUIS FERNANDO G
JEFE DE CALIDAD

Anexo 21. Acta de Vecindad

Anexo 22. Actas de concertación

Anexo 23. Acta de recibo parcial y balance presupuestal de interventoría

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	F-GG-32
eterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

ACTA No. 8

TIPO DE CONTRATO: Interventoria **CONTRATO No.** 2220585

OBJETO: Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre

CONTRATISTA : Gavinco Ingenieros Consultores

SUPERVISOR: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

PERÍODO A PAGAR: **DEL 13/11/2022 AL 13/12/2022**

En Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de diciembre del año 2022 se reunieron Luz Andrea Fajardo Corredor Representante legal de Interventoría y Juan David Amón Rodriguez Supervisor del Contrato , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	PAGOS MENSUALES IGUALES (40% DEL VALOR DEL CONTRATO)	MESES	8	$ 22.803.490,38	$ 182.427.923,02	7,00	1,00	8,00	$ 159.624.432,65	$ 22.803.490,37	$ 182.427.923,02	-	$ -
2	PAGOS POR AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA (50% DEL VALOR DEL CONTRATO)	GLB	1	$ 228.034.903,78	$ 228.034.903,78	0,3515	0,1008	0,4523	$ 80.154.268,68	$ 22.985.918,30	$ 103.140.186,98	0,55	$ 124.894.716,80
3	PAGO POR LIQUIDACION (10% DEL VALOR DEL CONTRATO)	GLB	1	$ 45.606.980,756	$ 45.606.980,76	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 45.606.980,76
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 456.069.807,56**				**$ 239.778.701,33**	**$ 45.789.408,67**	**$ 285.568.110,00**		**$ 170.501.697,56**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 86.653.263,44**				**$ 45.557.953,25**	**$ 8.699.987,65**	**$ 54.257.940,90**		**$ 32.395.322,54**
	ADMINISTRACIÓN				N/A				N/A	N/A	N/A		N/A
	IMPREVISTOS				N/A				N/A	N/A	N/A		N/A
	UTILIDAD				N/A				N/A	N/A	N/A		N/A
	IVA 19	**19%**			$ 86.653.263,44				$ 45.557.953,25	$ 8.699.987,65	$ 54.257.940,90		$ 32.395.322,54
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**$ 542.723.071,00**				**$ 285.336.654,58**	**$ 54.489.396,32**	**$ 339.826.050,90**		**$ 202.897.020,10**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRAT	**$ 542.723.071,00**	**V/R ANTICIPO:**	**N/A**
V/R ADICIONES:	$ -	**% ANTICIPO :**	**N/A**
V/R ACTUAL CONTRA	$ 542.723.071,00	**% RETEGARANTIA :**	**N/A**

Valor Actividad No.3 del Cto de Obra	**$ 4.989.781.068,00**
Valor Actividad No. 3 ejecutado segun Acta Parcial No. 5 del Cto de Obra	**$ 494.719.018,00**
Porcentaje de Avance Actividad No. 3	**10,08%**

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta No. 01 de pago del 40% del Mes 1 de Interventoría comprendido al periodo del 13 de abril de 2022 al 13 de mayo de 2022	3-may.-22	$ 27.136.153,55	5,000%	N/A	N/A	N/A	$ 27.136.153,55	$ 515.586.917,45	5,000%
2	Acta No. 02 de pago del 40% del Mes 2 de Interventoría comprendido al periodo del 13 de mayo de 2022 al 13 de junio de 2022	6-jul.-22	$ 27.136.153,55	5,000%	N/A	N/A	N/A	$ 27.136.153,55	$ 488.450.763,90	10,000%
3	Acta No. 03 de pago del 40% del Mes 3 de Interventoría comprendido al periodo del 13 de junio de 2022 al 12 de julio de 2022	3-ago.-22	$ 27.136.153,55	5,000%	N/A	N/A	N/A	$ 27.136.153,55	$ 461.314.610,35	15,000%
4	Acta No. 04 de pago del 40% del Mes 4 de Interventoría comprendido al periodo del 13 de julio de 2022 al 12 de agosto de 2022 y 50% de avance de obra del periodo del 13 de abril de 2022 al 01 de agosto de 2022	5-sep.-22	$ 36.878.032,68	6,795%	N/A	N/A	N/A	$ 36.878.032,68	$ 424.436.577,67	21,795%
5	Acta No. 05 de pago del 40% del Mes 5 de Interventoría comprendido al periodo del 13 de agosto de 2022 al 12 de septiembre de 2022 y 50% de avance de obra del periodo del 02 de agosto de 2022 al 21 de agosto de 2022	3-oct.-22	$ 48.329.489,48	8,905%	N/A	N/A	N/A	$ 48.329.489,48	$ 376.107.088,20	30,700%
6	Acta No. 06 de pago del 40% del Mes 6 de Interventoría comprendido al periodo del 13 de septiembre de 2022 al 12 de octubre de 2022 y 50% de avance de obra del periodo del 21 de agosto de 2022 al 19 de septiembre de 2022	28-oct.-22	$ 49.224.982,54	9,070%	N/A	N/A	N/A	$ 49.224.982,54	$ 326.882.105,66	39,770%
7	Acta No. 07 de pago del 40% del Mes 7 de Interventoría comprendido al periodo del 13 de octubre de 2022 al 12 de noviembre de 2022 y 50% de avance de obra del periodo del 20 de septiembre de 2022 al 19 de octubre de 2022	28-nov.-22	$ 69.495.689,24	12,805%	N/A	N/A	N/A	$ 69.495.689,24	$ 257.386.416,42	52,575%
8	Acta No. 08 de pago del 40% del Mes 8 de Interventoría comprendido al periodo del 13 de noviembre de 2022 al 13 de diciembre de 2022 y 50% de avance de obra del periodo del 20 de octubre de 2022 al 21 de noviembre de 2022		$ 54.489.396,32	10,040%	N/A	N/A	N/A	$ 54.489.396,32	$ 202.897.020,10	62,615%
TOTAL			**$ 339.826.050,90**	**62,615%**	-	-	-	**$ 339.826.050,90**	**$ 202.897.020,10**	**62,615%**

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACIÓN: 09 de diciembre de 2022

Elaboró
INTERVENTOR:

Firma:
Nombre: LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
REP. LEGAL DE INTERVENTORIA - GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

Aprobó

Firma:
Nombre: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
SUPERVISOR

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:

Nombre: NO APLICA

Nota 1:

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

Anexo 24. Control de equipos

enterritorio	**CONTROL DE EQUIPOS**	CÓDIGO	**F-GG-22**
		VERSIÓN	**01**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA	**2020-10-19**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **1/12/2022** **Y EL** **31/12/2022** **FECHA INICIO** **13/04/2022**

CONTRATISTA: CONSORCIO TURQUIA **CONTRATO No.** 2220577

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS **CONTRATO No.** 2220585

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
CORTADORA MARCA MAKITA M 2401 120V-15A (50 -60 Hz)	X	X	X		Bodega principal	Corte de acero, alambres, ladrillos, ceramimica	
PULIDORA 1 MARCA INCCO 8600 RPM	X	X	X		Bodega ubicada en el Barrio El Poblado.	Corte de acero, alambres, ladrillos, ceramimica	Este equipo tambien se traslada a las viviendas intervenidas donde se requiera su uso para la actividad descrita.
PULIDORA 2 MARCA INCCO 8600 RPM	X	X	X		Bodega ubicada en el Barrio El Poblado.	Corte de acero, alambres, ladrillos, ceramimica	Este equipo tambien se traslada a las viviendas intervenidas donde se requiera su uso para la actividad descrita.

Firma:

Nombre: Edgar Aragon Otero

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

M2401B *Tronzadora*



203 191953-5

Potencia de entrada	2.000 W
Diámetro del disco	355 mm (14")
Velocidad sin carga (rpm)	3,8
Dimensiones (L x A x A)	500 x 280 x 620 mm
Peso	1.2 kg
Cable de conexión	2.5 m

Disco de corte, llave.

PULIDORA 9" INDUSTRIAL

DWE490

Potencia	2200W
Voltaje	120V
Velocidad (RPM)	6.500
Tamaño Disco	9" (230 mm)
Velocidad Variable	No
Peso	5,2 Kg



INCLUYE: Guarda Protectora, Flanges y Mango Lateral.

GARANTÍA HERRAMIENTA

3 AÑOS Garantía Limitada

1 AÑO Mantenimiento Gratis

90 DÍAS Satisfacción Garantizada

DEWALT

Anexo 25. Control de inspección y ensayos

	CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS	CÓDIGO:	F-GG-23
enterritorio		VERSIÓN:	1
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-19

FECHA DE PRESENTACIÓN:		**INFORME MENSUAL DEL**	**1-dic**	**AL**	**31-dic**
CONTRATO No. :	INA-032-2021				
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre				
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA				
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.				
SUPERVISOR:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERROTORIO				

MEDIANTE EL PRESENTE FORMATO, EL INTERVENTOR CERTIFICA QUE LOS ÍTEMS DE PROYECTO QUE SE PAGARÁN, CUMPLEN EN TODOS LOS CASOS CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS APLICABLES Y CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1595 DE 2015 LOS QUE LE MODIFIQUEN O SUSTITUYAN

1. Si para el producto (bien o servicio), proceso o procedimiento se exigen requisitos por un Reglamento Técnico, decreto o ley (página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), obligatoriamente se declarará la conformidad y será entregable verificado previa presentación del certificado de conformidad de producto, sello de calidad o ensayos en laboratorio acreditado.

2. Si el producto (bien o servicios) proceso o procedimiento no está regido por un Reglamento técnico obligatorio, decreto o ley pero el contrato en su texto, en una especificación, el diseño, los planos u otro documento o requisito contractual cualquiera que sea se indica el cumplimiento de una norma (NTC, internacional, nacional o sectorial) o requisito particular o general, para declarar conforme ese bien o servicio y declararse entregable verificado, debe contar obligatoriamente con ensayo o cumplimiento de protocolo donde conste la conformidad con el requisito exigido.

1. LABORATORIOS ACREDITADOS Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

La Interventoría de Contrato CERTIFICA que la totalidad de los resultados de conformidad que se relacionan en este informe y anexan (anexo digital), se obtuvieron: en laboratorios acreditados cuando el bien o servicio está especificado y/o normado por un Reglamento Técnico Obligatorio, ley o decreto; cuando el proceso, procedimiento, bien o servicio no esta regido por un Reglamento técnico obligatorio, ley o decreto pero el Contrato lo exige, la conformidad de calidad se declaró mediante ensayo realizado con equipos de medición calibrados o verificación de cumplimiento de protocolo, bajo el control y seguimiento de un profesional capacitado e idóneo quien suscribe el registro del ensayo o protocolo en particular (anexo digital); en este último caso, se incluye en este formato la acreditación del laboratorio (anexo digital) si así lo exige el Contrato o acuerdo entre las partes. A continuación se relacionan los laboratorios acreditados y no acreditados donde se realizaron los ensayos y certificados de calibración de equipos utilizados (anexo digital).

1. 1. LABORATORIOS ACREDITADOS -EXIGIDO CUANDO EL BIEN O SERVICIO SE RIGE POR REGLAMENTO TÉCNICO OBLIGATORIO, LEY O DECRETO

Laboratorio		Certificado de Acreditación	Vigencia de la acreditación		Ensayos realizados en este laboratorio
Código (1)	Nombre		Desde	Hasta	
N/A	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	NO APLICA	N/A	N/A	COMPRESION DE CILINDROS
	Adicione las filas necesarias				

(1) Para efectos de trazabilidad y control, asignar a cada laboratorio un código LAC (Laboratorio Acreditado) seguido de un número consecutivo, sin repetir y sin anular desde el inicio del proyecto hasta el final.

1.1.1. EQUIPOS - Certificados de calibración

Laboratorio (3)	Serial equipo (2)	Descripción del equipo	Número de Certificado de Calibración	Vigencia certificado de calibración	
				Desde	Hasta
N/A	1-052-9-2-029	TRANSDUCTOR DE FUERZA	No. CNM-6917-85/19	26/01/2022	26/01/2022

(2) Para efectos de trazabilidad y control, relacionar el serial del equipo calibrado, sin repetir desde el inicio del proyecto hasta el final.
(3) Indique en esta casilla, el código del laboratorio donde se encuentra el equipo cuyo certificado de calibración se está informando.

2. ENSAYOS, SELLOS DE CALIDAD, CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD O REGISTRO DE ENSAYO EN LABORATORIO Y/O PROTOCOLOS APLICADOS

Los resultados de ensayos realizados y que se pagan parcial o totalmente en este periodo o períodos posteriores, son los que a continuación se relacionan.

Con el fin de tener trazabilidad de los ensayos, estos se numeran con dos dígitos XX-YY donde XX es el número del periodo del mes de ejecución del Proyecto y YY es el número en estricto orden cronológico del ensayo o certificado; para el primer informe el número de orden XX será 01, para el segundo informe 02 y así sucesivamente.

2.1. ENSAYOS REALIZADOS y/o PROTOCOLOS APLICADOS EN ESTE PERÍODO

No. de Orden			Ensayo			Resultado del Ensayo
XX	YY	Fecha ensayo o aplicac. protocolo	Norma, protocolo o requisito técnico aplicable (exigido)	Nombre de la norma, protocolo o requisito	Código de Laboratorio donde se realizó el ensayo	Observaciones (la observación no pude condicionar la conformidad)
01	4	16/12/2022	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**MACHON 103,79% DE LA RESISTENCIA**
02	4	16/12/2022	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**MACHON 102,74% DE LA RESISTENCIA**
03	4	16/12/2022	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**MACHON 103,94% DE LA RESISTENCIA**
04	4	16/12/2022	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**MACHON 106,20% DE LA RESISTENCIA**
05	4	22/12/2022	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-14	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**MACHON 106,47% DE LA RESISTENCIA**
06	4	20/12/2022	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-15	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**VIGA CORONA 106,47% DE LA RESISTENCIA**

07	4	20/12/2022	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-15	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**VIGA CORONA** **102,43% DE LA RESISTENCIA**
08	4	20/12/2022	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-15	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**VIGA CORONA** **106,78% DE LA RESISTENCIA**
09	4	20/12/2022	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-15	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**VIGA CORONA** **104,36% DE LA RESISTENCIA**
10	4	26/12/2022	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-16	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**VIGA CORONA** **105,39% DE LA RESISTENCIA**

2.2. CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO Y SELLOS DE CALIDAD RECIBIDOS EN ESTE PERIODO

No. de orden		No. Certificado o sello de calidad	Vigencia del Certificado o del sello de calidad		Certificador (entidad acreditada para expedir certificado)	Este sello de calidad o certificado de conformidad ampara los siguientes
XX	YY		Desde	Hasta		
		Certificado 82441679 Acero de refuerzo de 3/8" y 1/2"	3/06/2022	N/A	Ternium	NTC 2289 GR60
		Tanque Plastico Ecoplast	N/A	N/A	ECOPLAST	Norma Tecnica Colombiana NTC 4384
		205 Certificado de calidad cemento gris tipo UG de uso general	N/A	N/A	ULTRACEM	Norma Tecnica Colombiana NTC 121
		Ficha tecnica Bloque No. 04	N/A	N/A	Ceramicas el Cinco	ICONTEC NTC 4205-4017
		Certificado MAL-38045 Acero No. 04	N/A	N/A	Grupo Siderurgico Reyna	NTC 2289
		Tubos de Presion 1/2" RDE 13,5	20 de agosto de 2021	N/A	DURMAN	NTC- 382
		TUBOS SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS 2"	7/05/2022	N/A	DURMAN	NTC- 1087
		TUBOS SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS 4"	15/05/2022	N/A	DURMAN	NTC- 1087

CONTROL DE CONFORMIDAD DE CALIDAD POR ÍTEMS DE CONTRATO OBJETO DE PAGO

A continuación se relacionan los ítems de contrato que el Interventor avala para pago en este período, para lo cual se requiere como condición previa que la Interventoría los haya declarado entregables verificados mediante certificados de conformidad de producto y/o sellos de calidad recibidos y/o los ensayos que recibió de un laboratorio acreditatado.

A continuación se resumen los requisitos y trazabilidad de conformidad de los ítems que cumplen calidad para pago en el presente período

Ítems de contrato que se incluirán en el acta y/o factura y/o cuenta del presente período		Normas técnicas (ley, decreto, resolución, reglamento) exigidas a cada ítem en particular		La conformidad con la norma se demuestra mediante	Número de orden del documento (certificado, ensayo, sello) que evidencia objetivamente
# del ítem según contrato	Descripción del ítem	Numero de norma (4)	Descripción de la norma, reglamento, ley, decreto, resolución u otro exigible		

(4) Si un ítem está sujeto a mas de una norma o protocolo, utilice tantas filas como sean necesarias e indique una sola norma o protocolo por fila.
(5) El número de orden puede ser de ensayo, protocolo o certificado obtenido en este período o periodos anteriores.
(6) El Interventor llevará control de las cantidades, baches o volúmenes de productos, procesos o procedimientos que certifica que cumplen calidad, de manera que garantice la trazabilidad de calidad para cada entregable evitando que se aplique un certificado vencido, o se aplique un ensayo excediendo su alcance en frecuencia, cantidad o tiempo. El Supervisor ENTerritorio exigirá esta trazabilidad en cualquier momento.

TRAZABILIDAD: Para efectos de trazabilidad, el Interventor anexa a este formato un archivo digital que contiene una carpeta denominada "Control inspección y ensayo Periodo XXX) con la información del período. Esta carpeta contiene tantas subcarpetas como subcapítulos contiene este formato y en cada una de esas subcarpetas se están incluyendo la totalidad de documentos que soportan lo certificado. El Interventor declara que no ha aceptado ningún laboratorio acreditado, calibración de equipo o ensayo del cual no dispone de trazabilidad que anexa a este informe. No se aceptan excepciones ni entregas de trazabilidad posteriores a la radicación de este formato. Este formato incluye como ítems verificados para pago únicamente aquellos que cumplen todos los requisitos establecidos.

Firma	Firma
NOMBRE Edgar Aragon Otero	NOMBRE: CARLOS AUGUSTO DEMERA GACHARNÁ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (no se acepta firma "por" o "en nombre de")	DIRECTOR DE OBRA (no se acepta firma "por" o "en nombre de")


GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS** **NTC - 673 - 2010**	CODIGO: FT - LAB - 043 VERSION: 00 APROBADO: 2018-01-05

CLIENTE: CONSORCIO TURQUÍA **FECHA DE INFORME:** 31/08/2022

PROYECTO: PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO EL POBLADO **LOCALIZACION:** BARRIO EL PLOBADO

Nro.	ELEMENTO	FECHA FUNDICIÓN	DIAMETRO PROMEDIO CILINDRO 6"	FECHA ENSAYO A LOS 7 DIAS	FECHA ENSAYO A LOS 14 DIAS	FECHA ENSAYO A LOS 28 DIAS	ESPECIFICACION DEL CONCRETO	TIPO DE CONCRETO	CARGA (KN) PARA 7 DIAS	CARGA (KN) PARA 14 DIAS	CARGA (KN) PARA 28 DIAS	ESFUERZO A LA COMPRESION (PSI) EDAD DEL CILINDRO 7	14	28
1	MACHÓN MANZANA 2 CASA No. 203	14/08/2022	15.24	21/08/2022	28/08/2022		3000	NORMAL	254.07	333.12		2020.1	2648.6	
												67.34%	88.29%	
2	VIGA CORONA 502 MANZANA 2 CASA No. 203	15/08/2022	15.24	22/08/2022	29/08/2022		3000	NORMAL	261.32	348.52		2077.8	2771.1	
												69.26%	92.37%	
3	MACHÓN MANZANA 4 CASA No. 164	14/08/2022	15.24	21/08/2022	28/08/2022		3000	NORMAL	276.07	347.12		2195.0	2760.0	
												73.17%	92.00%	
4	VIGA CORONA 502 MANZANA 4 CASA No.164	15/08/2022	15.24	22/08/2022	29/08/2022		3000	NORMAL	271.65	335.12		2159.9	2664.5	
												72.00%	88.82%	
5														
6														
7														
8														
9														

TIPOS DE FALLA:



GEOTECNIA Y PAVIMENTO S.A.S. NIT 900.862.824-5

I.C JEISSON ESPAÑA DIAZ
DIR. TECNICO

GEOTECNIA Y PAVIMENTOS

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS
NTC - 673 - 2010

CODIGO: FT - LAB - 043
VERSION: 00
APROBADO: 2018-01-05

CLIENTE: CONSORCIO TURQUÍA

FECHA DE INFORME: 19/09/2022

PROYECTO: PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO EL POBLADO

LOCALIZACION: BARRIO EL PLOBADO

Nro.	ELEMENTO	FECHA FUNDICIÓN	DIAMETRO PROMEDIO CILINDRO 6"	FECHA ENSAYO A LOS 7 DIAS	FECHA ENSAYO A LOS 14 DIAS	FECHA ENSAYO A LOS 28 DIAS	ESPECIFICACION DEL CONCRETO	TIPO DE CONCRETO	CARGA (KN) PARA 7 DIAS	CARGA (KN) PARA 14 DIAS	CARGA (KN) PARA 28 DIAS	ESFUERZO A LA COMPRESION (PSI) EDAD DEL CILINDRO		
												7	14	28
1	MACHÓN MANZANA 2 CASA No. 203	14/08/2022	15.24	21/08/2022	28/08/2022	11/09/2022	3000	NORMAL	254.07	333.12	385.12	2020.1	2648.6	3062.1
												67.34%	88.29%	102.07%
2	VIGA CORONA 502 MANZANA 2 CASA No. 203	15/08/2022	15.24	22/08/2022	29/08/2022	12/09/2022	3000	NORMAL	261.32	348.52	395.32	2077.8	2771.1	3143.2
												69.26%	92.37%	104.77%
3	MACHÓN MANZANA 4 CASA No. 164	14/08/2022	15.24	21/08/2022	28/08/2022	11/09/2022	3000	NORMAL	276.07	347.12	393.47	2195.0	2760.0	3128.5
												73.17%	92.00%	104.28%
4	VIGA CORONA 502 MANZANA 4 CASA No.164	15/08/2022	15.24	22/08/2022	29/08/2022	12/09/2022	3000	NORMAL	271.65	335.12	390.76	2159.9	2664.5	3106.9
												72.00%	88.82%	103.56%
5														
6														
7														
8														
9														

TIPOS DE FALLA:



GEOTECNIA Y PAVIMENTO S.A.S. NIT 900.862.824-5

I.C JEISSON ESPAÑA DIAZ
DIR. TÉCNICO


GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS** **NTC - 673 - 2010**	CODIGO: FT - LAB - 043 VERSION: 00 APROBADO: 2018-01-05

CLIENTE: CONSORCIO TURQUÍA **FECHA DE INFORME:** 30/11/2022

PROYECTO: PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO EL POBLADO **LOCALIZACION:** BARRIO EL PLOBADO

Nro.	ELEMENTO	FECHA FUNDICIÓN	DIAMETRO PROMEDIO CILINDRO 6"	FECHA ENSAYO A LOS 7 DIAS	FECHA ENSAYO A LOS 14 DIAS	FECHA ENSAYO A LOS 28 DIAS	ESPECIFICACION DEL CONCRETO	TIPO DE CONCRETO	CARGA (KN) PARA 7 DIAS	CARGA (KN) PARA 14 DIAS	CARGA (KN) PARA 28 DIAS	ESFUERZO A LA COMPRESION (PSI) EDAD DEL CILINDRO		
												7	14	28
1	COD: V.427 - S - SC - EP - M54 - VE427 VIVIENDA No. 427 VIGA CIMENTACIÓN 101	25/10/2022	15.24	01/11/2022	08/11/2022	22/11/2022	3000	NORMAL	255.94	343.12	391.21	2035.0	2728.2	3110.5
												67.83%	90.94%	103.68%
2	COD: V.427 - S - SC - EP - M54 - VE427 VIVIENDA No. 427 MACHÓN	29/10/2022	15.24	05/11/2022	12/11/2022	26/11/2022	3000	NORMAL	257.93	340.84	385.64	2050.8	2710.0	3066.2
												68.36%	90.33%	102.21%
3	COD: V.455 - S - SC - EP - M58 - VE455 VIVIENDA No. 458 MACHÓN	01/11/2022	15.24	08/11/2022	15/11/2022	29/11/2022	3000	NORMAL	241.21	335.01	383.06	1917.9	2663.7	3045.7
												63.93%	88.79%	101.52%
4	COD: V.455 - S - SC - EP - M58 - VE455 VIVIENDA No. 458 VIGA AMARRE SUPERIOR	08/11/2022	15.24	15/11/2022	22/11/2022		3000	NORMAL	249.31	345.85		1982.3	2749.9	
												66.08%	91.66%	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

TIPOS DE FALLA:



GEOTECNIA Y PAVIMENTO S.A.S. NIT 900.862.824-5

I.C JEISSON ESPAÑA DIAZ
DIR. TÉCNICO

GEOTECNIA Y PAVIMENTOS

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS
NTC - 673 - 2010

CODIGO: FT - LAB - 043
VERSION: 00
APROBADO: 2018-01-05

CLIENTE: CONSORCIO TURQUÍA

FECHA DE INFORME: 11/10/2022

PROYECTO: PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO EL POBLADO

LOCALIZACION: BARRIO EL PLOBADO

Nro.	ELEMENTO	FECHA FUNDICIÓN	DIAMETRO PROMEDIO CILINDRO 6"	FECHA ENSAYO A LOS 7 DIAS	FECHA ENSAYO A LOS 14 DIAS	FECHA ENSAYO A LOS 28 DIAS	ESPECIFICACION DEL CONCRETO	TIPO DE CONCRETO	CARGA (KN) PARA 7 DIAS	CARGA (KN) PARA 14 DIAS	CARGA (KN) PARA 28 DIAS	ESFUERZO A LA COMPRESION (PSI)		
												EDAD DEL CILINDRO		
												7	14	28
1	MACHÓN MANZANA 69 CASA No. 541	17/08/2022	15.24	24/08/2022	31/08/2022	14/09/2022	3000	NORMAL	258.32	325.17	387.14	2053.9	2585.4	3078.2
												68.46%	86.18%	102.61%
2	VIGA CORONA 502 MANZANA 69 CASA No. 541	19/08/2022	15.24	26/08/2022	02/09/2022	16/09/2022	3000	NORMAL	259.14	327.00	385.28	2060.4	2600.0	3063.4
												68.68%	86.67%	102.11%
3	MACHÓN MANZANA 69 CASA No. 109	01/09/2022	15.24	08/09/2022	15/09/2022	29/09/2022	3000	NORMAL	256.21	335.12	390.79	2037.1	2664.5	3107.2
												67.90%	88.82%	103.57%
4	VIGA CORONA 502 MANZANA 69 CASA No. 109	05/09/2022	15.24	12/09/2022	19/09/2022	03/10/2022	3000	NORMAL	285.12	339.45	398.46	2267.0	2699.0	3168.2
												75.57%	89.97%	105.61%
5	MACHÓN MANZANA 52 CASA No. 368	06/09/2022	15.24	13/09/2022	20/09/2022	04/10/2022	3000	NORMAL	270.32	338.97	391.49	2149.3	2695.2	3112.7
												71.64%	89.84%	103.76%
6	VIGA CORONA 502 MANZANA 52 CASA No.368	06/09/2022	15.24	13/09/2022	20/09/2022	04/10/2022	3000	NORMAL	260.94	332.18	389.78	2074.7	2641.2	3099.1
												69.16%	88.04%	103.30%
7	MACHÓN MANZANA 26 CASA No. 068	07/09/2022	16.24	14/09/2022	21/09/2022	05/10/2022	3001	NORMAL	258.23	330.21	395.00	2053.2	2625.5	3140.7
												68.42%	87.49%	104.65%
8	VIGA CORONA 502 MANZANA 26 CASA No.068	07/09/2022	17.24	14/09/2022	21/09/2022	05/10/2022	3002	NORMAL	259.64	333.99	394.65	2064.4	2655.6	3137.9
												68.77%	88.46%	104.53%
9														

TIPOS DE FALLA:



GEOTECNIA Y PAVIMENTO S.A.S.
NIT 900.862.824-5

I.C JEISSON ESPAÑA DIAZ
DIR. TÉCNICO

GEOTECNIA
Y PAVIMENTOS

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS
NTC - 673 2010

CODIGO: FT - LAB - 043
VERSION: 00
APROBADO: 2018-01-05

CLIENTE: CONSORCIO TURQUÍA


FECHA DE INFORME: 30/12/2022

PROYECTO: PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO EL POBLADO

LOCALIZACIÓN: BARRIO EL POBLADO

Nro.	ELEMENTO	FECHA FUNDICIÓN	DIAMETRO PROMEDIO CILINDRO 6"	FECHA ENSAYO A LOS 7 DIAS	FECHA ENSAYO A LOS 14 DIAS	FECHA ENSAYO A LOS 28 DIAS	ESPECIFICACION DEL CONCRETO	TIPO DE CONCRETO	CARGA (KN) PARA 7 DIAS	CARGA (KN) PARA 14 DIAS	CARGA (KN) PARA 28 DIAS	ESFUERZO A LA COMPRESION (PSI) EDAD DEL CILINDRO		
												7	14	28
1	MACHÓN S-SC-EP-M23-VE-131	18/11/2022	15,24	25/11/2022	2/12/2022	16/12/2022	3000	NORMAL	247,06	248,01	353,83	2001,2	2678,5	3113,7
												66,71%	89,28%	103,79%
2	MACHÓN S-SC-EP-M41-VE-676	18/11/2022	15,24	25/11/2022	2/12/2022	16/12/2022	3000	NORMAL	249,61	245,54	350,26	2021,9	2651,8	3082,3
												67,40%	88,39%	102,74%
3	MACHÓN S-SC-EP-M44-VE-639	18/11/2022	15,24	25/11/2022	2/12/2022	16/12/2022	3000	NORMAL	247,51	249,49	354,34	2004,8	2694,5	3118,2
												66,83%	89,82%	103,94%
4	MACHÓN S-SC-EP-M45-VE-332	18/11/2022	15,24	25/11/2022	2/12/2022	16/12/2022	3001	NORMAL	250,26	247,09	362,04	2027,1	2668,6	3186,0
												67,57%	88,95%	106,20%
5	VIGA CORONA S-SC-EP-M23-VE-131	21/11/2022	15,24	29/11/2022	6/12/2022	20/12/2022	3002	NORMAL	247,43	242,72	362,96	2004,2	2621,4	3194,1
												66,81%	87,38%	106,47%
6	VIGA CORONA S-SC-EP-M41-VE-676	21/11/2022	15,24	29/11/2022	6/12/2022	20/12/2022	3003	NORMAL	246,55	249,55	349,21	1997,0	2695,1	3073,0
												66,57%	89,84%	102,43%
7	VIGA CORONA S-SC-EP-M44-VE-639	21/11/2022	15,24	29/11/2022	6/12/2022	20/12/2022	3004	NORMAL	244,08	243,67	364,01	1977,0	2631,7	3203,3
												65,90%	87,72%	106,78%
8	VIGA CORONA S-SC-EP-M45-VE-332	21/11/2022	15,24	29/11/2022	6/12/2022	20/12/2022	3000	NORMAL	241,51	245,76	355,77	1956,2	2654,2	3130,8
												65,21%	88,47%	104,36%
9	MACHÓN S-SC-EP-M72-VE-558	24/11/2022	15,24	1/12/2022	8/12/2022	22/12/2022	3000	NORMAL	241,17	240,32	362,97	1953,4	2595,4	3194,1
												65,11%	86,51%	106,47%
10	VIGA CORONA S-SC-EP-M72-VE-558	28/11/2022	15,24	5/12/2022	12/12/2022	26/12/2022	3000	NORMAL	241,46	244,22	359,29	1955,8	2637,5	3161,7
												65,19%	87,92%	105,39%

TIPOS DE FALLA:



GEOTECNIA - PAVIMENTO S.A.S.
NIT 900.862.814-5

ING. JEISSON ESPAÑA DIAZ DIR. TÉCNICO
DIR. TÉCNICO

Anexo 26. Cambio especificación

enterritorio	**ACTA DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES**	CÓDIGO:	**F-GG-29**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-20**

Nota: este formato aplicará cuando el cambio de especificacion no implique ajuste al precio. El insumo a modificar debe ser de calidad equivalente al inicialmente propuesto.

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220577 **DE** **OBRA** **FECHA INICIO** **11/04/2022** **FECHA TERMINACIÓ** **11/11/2022**

OBJETO DEL CONTRATO: Chequeo, validación de prototipos y diagnostico, concertación, intervención y gestion social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre

CONTRATISTA: CONSORCIO TURQUIA

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

SUPERVISOR: Ing. Juan David Amón

Me permito solicitar cambio de especificaciones al contrato en referencia de acuerdo con las siguientes consideraciones:

B. ESPECIFICACIÓN INICIAL VS. CAMBIO PROPUESTO

ESPECIFICACIÓN INICIAL					CAMBIO PROPUESTO				
Ítem	Unidad	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Ítem	Unidad	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario
3,1	un	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lava- manos)	1	$ 4.225.606,11	3,1	un	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lava- manos)	1	$ 4.225.606,11
3,2	un	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	1	$ 3.761.340,61	3,2	un	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	1	$ 3.761.340,61
3,3	un	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	1	$ 4.767.497,39	3,3	un	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	1	$ 4.767.497,39
3,4	un	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta	1	$ 4.898.390,93	3,4	un	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta	1	$ 4.898.390,93
3,27	m2	ENCHAPE PARED BLANCO FOR. 20*20	1,05	$ 51.443,02	3,27	m2	ENCHAPE PARED BLANCO ACUARELA BLANCO 40X40	1,05	$ 51.443,02
3,28	m2	ENCHAPE DE PISO - ANTIDESLIZANTE FOR. 20*20	1,05	$ 62.169,00	3,28	m2	ENCHAPE DE PISO - ANTIDESLIZANTE ACUARELA BLANCO 40X40	1,05	$ 62.169,00

C. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS

La instalación de este producto se realizará en la pared de la zona de ducha con 4 hiladas completas desde el piso hacia arriba. (1.60m). En el piso se iniciara desde el piso de la ducha en la pared posterior a la ubicación de los puntos hidraulicos hacia el acceso del baño para garantizar la linea de juntas.

D. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN EL CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN PROPUESTO

Debido a la pandemia que azotó en el año 2020 y 2021 a nivel mundial se presentaron diferentes factores a nivel de producción que afectaron de manera considerable la fabricación de diferentes elementos a sectores productivos. Este fenomeno ha causado inconveniente en la producción en masas de materiales para la construcción, mas especificamente la ceramica y que por demanda el formato con referencia 20,5cm x 20,5cm ha presentado escases en su producción, lo que dificulta el desarrollo y terminación del proyecto que se ejecuta.

E. REGISTROS DE SOLICITUD DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES

Solicitante	No. Oficio	Fecha
CONSORCIO TURQUIA	CONS-TUR-SINC-031	27/05/2022
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA

F. AVAL Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, a los seis ( ) días, del mes junio del año 2022.

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventor

Anexo 27. Acta de Recibo parcial y cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados (Matriz Tres Momentos Ejecución)

eterritorio	**ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL**	CODIGO:	**F-GG-32**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-20**

ACTA No. 6 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA - SINCELEJO, SUCRE

TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No.** 2220577

OBJETO: "Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el Municipio de Sincelejo, Departamento de Sucre"

CONTRATISTA : CONSORCIO TURQUÍA (NIT: 901.390.795 - 7)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. (NIT: 901.390.795 - 7)

PERÍODO A PAGAR: **DEL 22 de noviembre de 2022 al 9 de diciembre de 2022**

En Sincelejo, Sucre, a los nueve (09) días del mes de diciembre del año 2022 se reunieron José Ignacio Cárdenas Meneses Representante Legal del Contratist a y Luz Andrea Fajardo Corredor Representante Legal de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

Nota 1: El valor unitario de la Actividad No.2 corresponde a: $ 144.902,5392

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	ACTIVIDAD 1												
1.1	CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR-10	UN	1,00	$ 4.759.770,59	$ 4.759.770,59	1,00	-	1,00	$ 4.759.770,59	$ -	$ 4.759.770,59	-	$ -
	IVA 19% SOBRE ACTIVIDAD No.1				$ 904.356,41				$ 904.356,41	$ -	$ 904.356,41		$ -
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD No.1 + IVA (19%)				**$ 5.664.127,00**				**$ 5.664.127,00**	**$ -**	**$ 5.664.127,00**	-	$ -
	ACTIVIDAD 2												
1.2	DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.	UN	693	$ 144.902,5392	$ 100.417.459,66	301,00	113,00	414,00	$ 43.615.664,30	$ 16.373.986,93	$ 59.989.651,23	279	$ 40.427.808,44
	IVA 19% SOBRE ACTIVIDAD No. 2				$ 19.079.317,34			-	$ 8.286.976,22	$ 3.111.057,52	$ 11.398.033,73	-	$ 7.681.283,60
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD No.2 + IVA (19%)				**$ 119.496.777,00**				**$ 51.902.640,52**	**$ 19.485.044,45**	**$ 71.387.684,96**	-	$ 48.109.092,04
	ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE OBRA												
	REDES HIDROSANITARIAS												
2.1	Red intradomiciliaria de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	M	1,00	$ 14.370,00	$ 14.370,00	5.326,71	2.155,56	7.482,27	$ 76.544.822,70	$ 30.975.397,20	$ 107.520.219,90	-	-
2.2	Red intradomiciliaria de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	M	1,00	$ 57.385,00	$ 57.385,00	2.839,62	1.179,00	4.018,62	$ 162.951.593,70	$ 67.656.915,00	$ 230.608.508,70	-	-
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	M	1,00	$ 29.682,00	$ 29.682,00	386,23	210,80	597,030	$ 11.464.078,86	$ 6.256.965,60	$ 17.721.044,46	-	-
	PUNTOS HIDROSANITARIOS			-									
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	UN	1,00	$ 123.661,00	$ 123.661,00	298,00	113,00	411,00	$ 36.850.978,00	$ 13.973.693,00	$ 50.824.671,00	-	-
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	UN	1,00	$ 150.802,00	$ 150.802,00	299,00	113,00	412,00	$ 45.089.798,00	$ 17.040.626,00	$ 62.130.424,00	-	-
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UN	1,00	$ 110.519,00	$ 110.519,00	298,00	113,00	411,00	$ 32.934.662,00	$ 12.488.647,00	$ 45.423.309,00	-	-
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UN	1,00	$ 116.841,00	$ 116.841,00	33,00	20,00	53,00	$ 3.855.753,00	$ 2.336.820,00	$ 6.192.573,00	-	-
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UN	1,00	$ 185.833,00	$ 185.833,00	34,00	10,00	44,00	$ 6.318.322,00	$ 1.858.330,00	$ 8.176.652,00	-	-
	APARATOS			-									
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	UN	1,00	$ 192.852,00	$ 192.852,00	299,00	113,00	412,00	$ 57.662.748,00	$ 21.792.276,00	$ 79.455.024,00	-	-
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	UN	1,00	$ 148.176,00	$ 148.176,00	299,00	113,00	412,00	$ 44.304.624,00	$ 16.743.888,00	$ 61.048.512,00	-	-
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	UN	1,00	$ 239.081,00	$ 239.081,00	33,00	20,00	53,00	$ 7.889.673,00	$ 4.781.620,00	$ 12.671.293,00	-	-
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	UN	1,00	$ 228.983,00	$ 228.983,00	34,00	10,00	44,00	$ 7.785.422,00	$ 2.289.830,00	$ 10.075.252,00	-	-
	CAJAS DE INSPECCIÓN			-									
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	M	1,00	$ 226.866,00	$ 226.866,00	263,40	99,30	362,70	$ 59.756.504,40	$ 22.527.793,80	$ 82.284.298,20	-	-
	UNIDADES SANITARIAS			-									
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UN	1,00	$ 3.325.416,00	$ 3.325.416,00	2,00	-	2,00	$ 6.650.832,00	$ -	$ 6.650.832,00	-	-
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UN	1,00	$ 2.960.054,00	$ 2.960.054,00	82,00	21,00	103,00	$ 242.724.428,00	$ 62.161.134,00	$ 304.885.562,00	-	-
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UN	1,00	$ 3.751.867,00	$ 3.751.867,00	176,00	72,00	248,00	$ 660.328.592,00	$ 270.134.424,00	$ 930.463.016,00	-	-
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UN	1,00	$ 3.854.876,00	$ 3.854.876,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	-
	CIMENTACIÓN			-									
3.5	Relleno compactado con material de sitio	M3	1,00	$ 16.092,00	$ 16.092,00	5,46	-	5,46	$ 87.862,32	$ -	$ 87.862,32	-	-
3.6	Relleno con material seleccionado (recebo)	M3	1,00	$ 49.479,00	$ 49.479,00	98,04	63,24	161,28	$ 4.850.921,16	$ 3.129.051,96	$ 7.979.973,12	-	-
	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS			-									
3.7	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	M3	1,00	$ 704.327,00	$ 704.327,00	73,876	25,99	99,867	$ 52.032.861,45	$ 18.306.163,06	$ 70.339.024,51	-	-
3.8	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	KG	1,00	$ 6.655,00	$ 6.655,00	8.524,80	3.161,74	11.686,54	$ 56.732.544,00	$ 21.041.379,70	$ 77.773.923,70	-	-
3.9	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	M2	1,00	$ 68.432,00	$ 68.432,00	54,92	75,81	130,73	$ 3.758.148,58	$ 5.187.829,92	$ 8.945.978,50	-	-
3.10	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	M2	1,00	$ 71.036,00	$ 71.036,00	195,20	65,60	260,80	$ 13.866.227,20	$ 4.659.961,60	$ 18.526.188,80	-	-
3.11	Concreto ciclópeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	M3	1,00	$ 235.590,00	$ 235.590,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	-
	MAMPOSTERIA			-									
3.12	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	M2	1,00	$ 35.344,00	$ 35.344,00	185,28	169,08	354,36	$ 6.548.536,32	$ 5.975.963,52	$ 12.524.499,84	-	-
3.13	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	UN	1,00	$ 8.032,00	$ 8.032,00	7,00	-	7,00	$ 56.224,00	$ -	$ 56.224,00	-	-
	MORTEROS			-									
3.14	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	M2	1,00	$ 16.234,00	$ 16.234,00	463,46	218,29	681,75	$ 7.523.809,64	$ 3.543.719,86	$ 11.067.529,50	-	-
3.15	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	M2	1,00	$ 17.058,00	$ 17.058,00	338,56	176,28	514,84	$ 5.775.156,48	$ 3.006.984,24	$ 8.782.140,72	-	-
3.16	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	M2	1,00	$ 20.301,00	$ 20.301,00	41,94	-	41,94	$ 851.423,94	$ -	$ 851.423,94	-	-
	ELEMENTOS												
3.17	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo y Pintura en Esmalte Sintético	UN	1,00	$ 383.416,00	$ 383.416,00	39,00	20,00	59,00	$ 14.953.224,00	$ 7.668.320,00	$ 22.621.544,00	-	-
3.18	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	UN	1,00	$ 59.183,00	$ 59.183,00	39,00	20,00	59,00	$ 2.308.137,00	$ 1.183.660,00	$ 3.491.797,00	-	-
3.19	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UN	1,00	$ 246.067,00	$ 246.067,00	122,00	41,00	163,00	$ 30.020.174,00	$ 10.088.747,00	$ 40.108.921,00	-	-
3.20	Suministro e instalación de registro de cierre metálico	UN	1,00	$ 24.525,00	$ 24.525,00	90,00	20,00	110,00	$ 2.207.250,00	$ 490.500,00	$ 2.697.750,00	-	-
3.21	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm	M2	1,00	$ 65.320,00	$ 65.320,00	16,45	-	16,45	$ 1.074.514,00	$ -	$ 1.074.514,00	-	-
3.22	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	M	1,00	$ 25.877,00	$ 25.877,00	4,00	-	4,00	$ 103.508,00	$ -	$ 103.508,00	-	-
3.23	Rotura y adecuación de caja de inpección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	UN	1,00	$ 40.300,00	$ 40.300,00	274,00	99,00	373,00	$ 11.042.200,00	$ 3.989.700,00	$ 15.031.900,00	-	-
	ACABADOS			-									
3.24	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	M2	1,00	$ 41.074,00	$ 41.074,00	5,53	-	5,53	$ 227.139,22	$ -	$ 227.139,22	-	-

3.25	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	M2	1,00	$ 26.000,00	$ 26.000,00	262,32	99,49	361,81	$ 6.820.320,00	$ 2.586.740,00	$ 9.407.060,00	-	-
3.26	Recuperación de piso esmaltado	M2	1,00	$ 20.215,00	$ 20.215,00	119,27	52,14	171,41	$ 2.411.043,05	$ 1.054.010,10	$ 3.465.053,15	-	-
3.27	Enchape pared blanco (0.20 X 0.20) metros	M2	1,00	$ 40.484,00	$ 40.484,00	170,53	79,63	250,16	$ 6.903.736,52	$ 3.223.740,92	$ 10.127.477,44	-	-
3.28	Enchape piso antideslizante blanco (0,20 x 0,20) metros	M2	1,00	$ 48.925,00	$ 48.925,00	113,80	52,51	166,31	$ 5.567.713,93	$ 2.569.051,75	$ 8.136.765,68	-	-
3.29	Carburo blanco para muro exterior (3 manos)	M2	1,00	$ 6.616,00	$ 6.616,00	664,11	344,52	1.008,63	$ 4.393.751,76	$ 2.279.344,32	$ 6.673.096,08	-	-
	CONEXIONES												
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	UN	1,00	$ 155.488,00	$ 155.488,00	24,00	-	24,00	$ 3.731.712,00	$ -	$ 3.731.712,00	-	-
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	UN	1,00	$ 171.923,00	$ 171.923,00	1,00	-	1,00	$ 171.923,00	$ -	$ 171.923,00	-	-
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	UN	1,00	$ 36.602,00	$ 36.602,00	4,00	-	4,00	$ 146.408,00	$ -	$ 146.408,00	-	-
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	UN	1,00	$ 35.954,00	$ 35.954,00	2,00	-	2,00	$ 71.908,00	$ -	$ 71.908,00	-	-
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	M	1,00	$ 101.003,00	$ 101.003,00	146,10	-	146,10	$ 14.756.538,30	$ -	$ 14.756.538,30	-	-
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13,5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	M	1,00	$ 17.875,00	$ 17.875,00	28,50	-	28,50	$ 509.437,50	$ -	$ 509.437,50	-	-
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro	UN	1,00	$ 209.226,00	$ 209.226,00	14,00	-	14,00	$ 2.929.164,00	$ -	$ 2.929.164,00	-	-
	INTERVENCIONES VARIAS				-								
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	M2	1,00	$ 91.825,00	$ 91.825,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	-
	CAJAS DE INSPECCIÓN				-								
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA. (incluye acero de refuerzo)	M	1,00	$ 305.967,00	$ 305.967,00	29,50	-	29,50	$ 9.026.026,50	$ -	$ 9.026.026,50	-	-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 3.835.167.214,50**				**$ 1.734.572.375,53**	**$ 653.003.227,55**	**$ 2.387.575.603,08**		**$ 1.447.591.611,42**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 1.074.613.853,50**				**$ 486.027.179,59**	**$ 182.971.504,36**	**$ 668.998.683,95**		**$ 405.615.169,55**
	ADMINISTRACIÓN	**21,07%**			$ 808.069.732,10				$ 365.474.399,52	$ 137.587.780,04	$ 503.062.179,56		$ 305.007.552,54
	IMPREVISTOS	**1,0%**			$ 38.351.672,14				$ 17.345.723,75	$ 6.530.032,28	$ 23.875.756,03		$ 14.475.916,11
	UTILIDAD	**5%**			$ 191.758.360,72				$ 86.728.618,76	$ 32.650.161,38	$ 119.378.780,14		$ 72.379.580,58
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD	**19%**			$ 36.434.088,54				$ 16.478.437,56	$ 6.203.530,66	$ 22.681.968,22		$ 13.752.120,32
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (ACTIVIDAD 3)					**$ 4.909.781.068,00**				**$ 2.220.599.555,12**	**$ 835.974.731,91**	**$ 3.056.574.287,03**		**$ 1.853.206.780,97**
VALOR TOTAL ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3					**$ 5.034.941.972,00**				**$ 2.278.166.322,63**	**$ 855.459.776,36**	**$ 3.133.626.098,99**		**$ 1.901.315.873,00**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**$ 5.034.941.972,00**	**V/R ANTICIPO:**	**$ 981.956.213,60**
V/R ADICIONES:		**% ANTICIPO :**	**20%**
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 5.034.941.972,00	**% RETEGARANTIA :**	

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 1 - SINCELEJO	9-sep.-22	$ 167.258.412,19	3,3220%	-	$ 35.208.027,34	$ 946.748.186,26	$ 132.050.384,85	$ 4.867.683.559,81	3,3220%
2	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 2 - SINCELEJO	9-sep.-22	$ 353.326.921,98	7,0175%	-	$ 134.266.614,91	$ 812.481.571,35	$ 219.060.307,07	$ 4.514.356.637,83	10,3395%
3	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 3 - SINCELEJO	5-oct.-22	$ 368.027.756,01	7,3095%	-	$ 119.882.487,52	$ 692.599.083,83	$ 248.145.268,49	$ 4.146.328.881,82	17,6489%
4	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 4 - SINCELEJO	4-nov.-22	$ 706.246.363,04	14,0269%		$ 153.322.521,78	$ 539.276.562,05	$ 552.923.841,26	$ 3.440.082.518,78	31,6758%
5	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 5 - SINCELEJO	Tramite	$ 455.490.237,16	9,0466%		$ 148.415.885,42	$ 390.860.676,63	$ 307.074.351,74	$ 2.984.592.281,62	40,7224%
6	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 6 - SINCELEJO		$ 769.913.798,72	15,2914%		$ 250.792.419,57	$ 140.068.257,06	$ 519.121.379,15	$ 2.214.678.482,90	56,0138%
					-					
	TOTAL		**$ 2.820.263.489,10**	**56,0138%**	**-**	**$ 841.887.956,54**	**$ 140.068.257,06**	**$ 519.121.379,15**	**$ 2.214.678.482,90**	**56,0138%**

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACIÓN: 9 DE DICIEMBRE DE 2022

Elaboró
CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: JOSE IGNACIO CÁRDENAS MENESES
REP. LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO TURQUIA

Aprobó
INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
REPRESENTANTE LEGAL
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:

Nombre: No Aplica

Anexo 28. Formatos diarios de inspeccion

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

		Codigo vivienda	S-SC-EP-M-54	VE	424	Tipologia	T3
Fecha de inspeccion	26 - 11 - 2022	fecha de inicio de la intervencion					
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha final de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1'2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO APLICA // //
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar				NO APLICA // //
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	90	✓		Corregir filos de calados
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		corregir filos de muro
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	95	✓		Limpiar tejas
4,13	Suministro e instalacion de tanque acreo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	60	✓		Pintar Puerta y marco
5	ACABADOS Y PINTURA				NO APLICA
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				// //
5,2	Recuperacion de piso en concreto				// //
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	80	✓		Terminar Pintura interna y externa
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1'2"				NO APLICA
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1'2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Sandra Contreras
Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Rafael López
Nombre Rafael López
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	26 - 11 - 2022	Codigo vivienda	9-RC-PP-M- 11 VF 62 Tipologia 13
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de protocipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			/	Sin Ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			/	// //
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			/	// //
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)			/	Sin Ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)			/	// //
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)			/	// //
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				// //
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)			/	Sin Ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)			/	// //
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			/	// //
3,4	Instalacion de lavadero estandar				NO APLICA
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				// //
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			/	Sin Ejecutar
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	/		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	/		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	40	/		En ejecución
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas			/	Sin Ejecutar
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			/	// //
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			/	// //
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	/		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			/	Sin Ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			/	// //
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			/	// //
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			/	Sin Ejecutar
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			/	// //
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluyo anl, y pintura			/	// //
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				// //
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				// //
5,4	Enchape para parad blanco 0,20*,020			/	Sin Ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			/	// //
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			/	// //
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				NO APLICA
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Centeno
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Dafael López
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	26 - 11 - 2022	Codigo vivienda	S-SC-FP-M- 66 VF 568 Tipologia T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	/		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	/		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	/		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	100	/		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	/		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	/		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO APlica
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				// //
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)	100	/		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	/		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	/		
3,4	Instalacion de lavadero estandar				No APlica
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				// //
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	/		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	/		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	/		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	/		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	/		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	/		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	/		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	/		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	/		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	/		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	/		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	/		Limpiar tejas
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	/		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluyo ant, y pintura	80	/		Detalles de Pintura Y limpiar Puerta
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APlica
5,2	Recuperacion de piso en concreto				// //
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				// //
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	/		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	/		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	90	/		Corregir detalles de Pintura
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				NO APlica
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Contreras. Nombre Rafael López Nombre

Cargo: Residente de Interventoria Cargo: Inspector de interventoria Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	26 - 11 - 2022	Codigo vivienda	9-SC-FP-M-11 VF 610 Tipologia T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validacion de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	40	✓		terminar de instalarla a la ducha
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				// //
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)			✓	Sin Ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	// //
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	// //
3,4	Instalacion de lavadero estandar				NO APLICA
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				// //
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto				
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas				
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		NO APLICA
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado			✓	Sin Ejecutar
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			✓	// //
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			✓	Sin Ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque acreo plastico de 500lt			✓	Sin Ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	// //
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				// //
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				// //
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin Ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	// //
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	// //
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				APLICA
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				NO
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra contera
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael López
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre

Cargo: residente

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	30-NOV-2022	Codigo vivienda	B-SC-EP-M- 5	VE	120	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		V	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		V	"
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		V	"
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**inodoro**)	0		V	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	0		V	"
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	0		V	"
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		V	"
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		V	"
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	0		V	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0		V	"
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		V	"
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		V	"
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		V	"
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		V	"
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	V		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	V		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	80	V		Sin viga de amarre
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas			V	Sin ejecutar
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			V	"
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			V	"
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado			V	Columnas fundidas.
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			V	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			V	"
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			V	"
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			V	"
4,13	Suministro e instalacion de tanque acroo plastico de 500lt			V	"
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura			V	"
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			V	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto			V	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			V	"
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			V	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			V	"
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			V	"
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria			V	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria			V	"
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"			V	"
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 12"			V	"
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"			V	"
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m			V	"

* Paralizada sin trabajadores.

Nombre: Sandra Cortes
Residente de Interventoria

Nombre Isaac Nestor
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
Ingenieros Consultores

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	30-AGO-2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-05	VE	653	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		Se vacea solo
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	100	✓		
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchepe piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con cerburo blanco para muro exterior y interior	80	✓		falta homogenizar
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

*Sin trabajadores ni materiales. Paralizo la administración.

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Isaac Martinez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	30-NOV-2022	Codigo vivienda	S-SC-FP-M- 1	VP	083	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validacion de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		✓	//
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		✓	
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (**inodoro**)	0		✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	0		✓	
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	0		✓	
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0		✓	
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		✓	
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	0		✓	Sin ejecutar
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	0		✓	fundida de columnas hoy
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		✓	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluyo ant, y pintura	0		✓	
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0			N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0			//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0			
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0			Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0			//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0			
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	30-ABR-2022	Codigo vivienda	B-SC-PP-M-	2	VF	211	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion						
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnostico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre							

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			V	Sin ejecutar
1.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			V	//
1.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			V	//
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2.4	Punto Hidrosanitario (inodoro)			V	Sin ejecutar
2.5	Punto Hidrosanitario (ducha)			V	//
2.6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)			V	//
2.7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)			V	//
2.8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)			V	//
3	APARATOS				
3.1	Instalacion de sanitario (inodoro)			V	Sin ejecutar
3.2	Instalacion de (ducha)			V	//
3.3	Instalacion de lavamanos con pedestal			V	//
3.4	Instalacion de lavadero estandar			V	//
3.5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer			V	//
3.6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			V	//
4	UNIDAD SANITARIA				
4.1	Excavacion para cimentacion	100	V		Ejecutandose hoy
4.2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	V		Ejecutandose hoy
4.3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	0		V	Sin ejecutar
4.4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		V	//
4.5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0.02mt espesor	0		V	//
4.6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0.02mt espesor	0		V	//
4.7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	0		V	//
4.8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		V	//
4.9	Concreto para plantilla de piso baño	0		V	//
4.10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	0		V	//
4.12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		V	//
4.13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		V	//
4.14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		V	//
5	ACABADOS Y PINTURA				
5.1	Recuperacion de piso en ceramica	0		V	N/A
5.2	Recuperacion de piso en concreto	0		V	//
5.3	Recuperacion de piso esmaltado	0		V	//
5.4	Enchape para pared blanco 0.20*.020	0		V	//
5.5	Enchape piso anticeslizante blanco 0.20*.020	0		V	//
5.6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		V	//
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6.1	Excavacion para domiciliaria	0		V	N/A
6.2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		V	//
6.3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		V	//
6.4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		V	//
6.5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		V	//
6.6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0.60 m	0		V	//

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Ismael Martinez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	30-NOV-2022	Codigo vivienda	B-SC-EP-M- 3	VE	168	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100		✓	N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100		✓	N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	100	✓		Cerradura averiada.
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape pare pared blanco 0,20*,020	0		✓	
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0			N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0			
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0			
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0			
6,5	Suministro e instalación de micromedidor de 1/2"	0			
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0.60 m	0			

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	30-NOV-2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M- 1	VE	1891	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		Falta cerrado y pintar peladuras
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	"
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	Sin ejecutar
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliario	0		✓	"
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	"
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	"
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	"
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	"

Nombre: Sandra Cantero
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	20-NOV-2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-24	VE	682	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1'2"	0		✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		✓	//
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		✓	
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)	0		✓	//
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	0		✓	//
3,4	Instalacion de lavadero estander	0		✓	//
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	//
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	//
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	50	✓		
4,7	Excavación y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		✓	Columna Fundida
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		Ejecutandose hoy
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	Sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	50		✓	Suministrado
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	Sin ejecutar
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	Sin ejecutar
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	//
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1'2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1'2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	//

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Isaac Martinez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre:
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	30-NOV-2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-28	VR	692	Tipologia	A de
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0			
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0			
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	0			
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	0			
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	0			
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0			
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	0	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	
4,13	Suministro e instalacion de tanque acero plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	80	✓		Falta mano de pintura
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	100	✓		En ejecucion hoy
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	100	✓		
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	100	✓		
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	50	✓		Excavandose hoy

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIERIA CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	30-NOV-2022	Codigo vivienda	B-SC-EP-M- 41	VE	666	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1"	0		V	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		V	"
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		V	
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	0		V	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	0		V	"
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	0		V	"
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		V	"
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		V	"
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	0		V	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)	0		V	"
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	0		V	"
3,4	Instalacion de lavadero estendar	0		V	"
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		V	"
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		V	"
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	V		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	V		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	V		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo reglilla	0		V	Sin ejecutar
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		V	Ejecutando hoy
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		V	"
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	V		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	V		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		V	
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		V	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	V		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		V	
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		V	
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		V	
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		V	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		V	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		V	
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		V	
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		V	
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		V	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		V	"
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		V	"
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1"	0		V	"
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1"	0		V	"
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		V	"

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael Lopez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	20-nov-2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-24	VE	106	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			✓	
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			✓	
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			✓	
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)		✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)		✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)		✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)			✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)			✓	
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			✓	
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	
3,4	Instalacion de lavadero estandar			✓	
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer			✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion		✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo		✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4		✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas		✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor		✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor		✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado		✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque		✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño		✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			✓	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento		✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt		✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura		✓		falta pintar
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			✓	
5,2	Recuperacion de piso en concreto			✓	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	50	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	50	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	100		✓	Ejecutandose hoy
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	100		✓	"
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	100	✓		"
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"			✓	N/A
6,5	Suministro e instalacion de micromadidor de 1/2"			✓	"
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	Excavacion hoy

Nombre Sindra contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael Lopez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	20 - NOV - 2022	Codigo vivienda	B-SC-EP-M-24	VE	086	Tipologia	Ade
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	100	✓		
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	100	✓		
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar	100	✓		
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	100	✓		
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavación para cimentacion	0		✓	N/A
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	0		✓	"
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	0		✓	"
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	"
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	50	✓		Instalacion hoy - Falta pintar
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	100	✓		
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	50	✓		Falta mano de pintura
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	"
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	"
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	"
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	"
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	"

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael Lopez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	30-NOV-2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-5	VE	116	Tipologia	Ade
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario do (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario do (**lavadero estandar**)	100	✓		
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	Sin ejecutar
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	100	✓		
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	Sin ejecutar
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	0		✓	N/A
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	0		✓	"
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n° 4	0		✓	"
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	N/A
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		Pintan Jose Luis
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	100	✓		
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	"
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	"
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	"
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	"
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	"

Nombre Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael Lopez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
Ingenieros Consultores

CONTROL DIARIO DE OBRA

Recibida.

Fecha de inspeccion	07-DIC-2022	Codigo vivienda		S-SC-EP-M-54	VE	419	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion						
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre							

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1'2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibro cemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	100	✓		Falta retoque
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		Falta retoque.
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1'2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1'2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Recibida

Fecha de inspeccion	01-DIC-2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-54	VE	421	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"		✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"		✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"		✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)		✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)		✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)		✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)			✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)			✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)		✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)		✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**		✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**			✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**			✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto		✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion		✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo		✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4		✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas		✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor		✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor		✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado		✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque		✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño		✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño		✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento		✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt		✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura		✓		Falta retoque. y cerradero.
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			✓	
5,2	Recuperacion de piso en concreto			✓	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020		✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020		✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior		✓		Falta retoque
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria			✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria			✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"			✓	
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"			✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"			✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m			✓	

Nombre: Sandra Cortes
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	02-DIC-2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M- 38	VE	195	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1"2"	100	✓		Baño conectado desde medidor
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		Fundida hoy.
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓	✓	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	Sin conexion al baño.
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	Sin pintar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	"
5,4	Enchape para pared blanco 0.20*.020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*.020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	Sin ejecutar
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	"
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	"
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1"2"	0		✓	"
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1"2"	0		✓	"
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	"

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de Inspeccion	02-DIC-2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-38	VE	196	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1'2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0	✗	✓	N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	100	✓		Se instala hoy - falta pintura
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	Sin ejecutar
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1'2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1'2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael López
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	02-Dic-2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-78	VE	194	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1'2"	50	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	11
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)	100	✓	✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓	✓	11
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓	✓	11
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100		✓	Fundida de columna hoy.
4,8	Loss en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		✓	
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	N/A Sin ejecutar.
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	Sin ejecutar N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque acreo plastico de 500lt	0		✓	
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	50	✓	'	Falta pintar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0			N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0			11
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0			11
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	50	✓		Ejecutandose hoy
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		Ejecutando hoy
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	Sin ejecutar.
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	11
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	11
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1'2"	0		✓	11
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1'2"	0		✓	11
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de ,60 m x 0,60 m	0		✓	11

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suárez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
Ingeniería Consultores

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	03-DIC-2022	Codigo Vivienda		S-SC-EP-M-	39	VP	193	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion							
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion							
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre								

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0			N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque acreo plastico de 500lt	100			Falta Chegue
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	100			Falta instalar.
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	50	✓		Falta mano de pintura.
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez.
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
Ingenieros consultores

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	05 - 12 - 2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-70	VE	312	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			/	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			/	" "
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			/	" "
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)			/	Sin Ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)			/	" "
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)			/	" "
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO APlica
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				" "
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			/	Sin Ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)			/	" "
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			/	" "
3,4	Instalacion de lavadero estandar				NO APlica
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			/	Sin Ejecutar
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	/		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	/		Cimentación no cumple con las medidas
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4			/	Sin Ejecutar
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas			/	" "
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			/	Sin Ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			/	" "
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	/		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			/	Sin Ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			/	" "
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			/	" "
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			/	Sin Ejecutar
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			/	" "
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			/	" "
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APlica
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			/	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			/	" "
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			/	" "
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				NO APlica
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .80 m x 0,60 m				

Nombre: Shelma Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael López
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	05 - 12 - 2022	Codigo vivienda	S-SC-FP-M 52	VF	311	Tipologia	Adc.
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestion social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		Tubería no es Pesada
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	100	✓		
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				NO APLICA
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar	100	✓		
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				NO APLICA
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavación para cimentacion				NO APLICA
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo				" "
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4				" "
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas				NO APLICA
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		Falos corregir detalles
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento				NO APLICA
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				NO APLICA
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*0,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*0,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				NO APLICA
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sinchi Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael López
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	05 - 12 - 2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-70	VE	585	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1'2"			✓	Sin Ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			✓	" "
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			✓	" "
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)			✓	Sin Ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)			✓	" "
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)			✓	" "
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO Aplica
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				" "
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)			✓	Sin Ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	" "
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	" "
3,4	Instalacion de lavadero estandar				NO Aplica
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin Ejecutar
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas			✓	Sin Ejecutar
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	" "
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	" "
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			✓	Sin Ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			✓	" "
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			✓	" "
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			✓	Sin Ejecutar
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	" "
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura			✓	" "
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO Aplica
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin Ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	" "
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	" "
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1'2"				NO Aplica
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1'2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Cristian Colon
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael López
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de Inspeccion	05 - 12 - 2022	Codigo vivienda		9-SC-FP-M-	33	VF	604	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion							
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion							
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre								

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			/	Sin Ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			/	" "
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			/	" "
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)			/	Sin Ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)			/	" "
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)			/	" "
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				No Aplica
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				" "
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)			/	Sin Ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)			/	" "
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			/	" "
3,4	Instalacion de lavadero estandar				No Aplica
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				Sin " "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			/	Sin Ejecutar
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	/		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	/		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	/		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	/		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			/	Sin Ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			/	" "
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	/		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			/	Sin Ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			/	" "
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			/	Sin Ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			/	" "
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			/	" "
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluyo anl, y pintura			/	Sin Ejecutar
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				No Aplica
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			/	Sin Ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			/	" "
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			/	" "
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				No Aplica
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .80 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Cantero
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael López
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	09 - 12 - 2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-30	VE	332	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

USTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			/	Sin Ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			/	" "
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			/	" "
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)			/	Sin Ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)			/	" "
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)			/	" "
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO APlica
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				" "
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			/	Sin Ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)			/	" "
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			/	" "
3,4	Instalacion de lavadero estandar				NO APlica
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			/	Sin Ejecutar
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	/		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	/		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	30	/		Estan ejecución del levantamiento del muro
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regilla			/	Sin Ejecutar
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			/	" "
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			/	" "
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	/		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			/	Sin Ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			/	" "
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			/	" "
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			/	Sin Ejecutar
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			/	" "
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			/	" "
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APlica
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			/	Sin Ejecutar
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			/	" "
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			/	Sin Ejecutar
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			/	" "
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				NO APlica
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Luchmi Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael López
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	01-12-2022	Codigo vivienda		S-SC-EP-M-44	VE	639	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion						
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre							

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	50	/		falta Conectarla al medidor
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			/	Sin Ejecutar
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	/		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	/		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	/		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	/		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				// //
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	/		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	/		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	/		
3,4	Instalacion de lavadero estandar				NO APLICA
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				// //
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	/		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	/		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	/		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	/		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	/		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	/		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	/		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	/		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	/		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	/		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	/		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	/		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	/		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	100	/		
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				// -/
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				// //
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	/		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	/		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	50	/		falta mano interno y externo
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 6" para domicilliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: [signature] Nombre Rafael López Nombre

Cargo: Residente de Interventoria Cargo: Inspector de Interventoria Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	09 - 12 - 2022	Codigo vivienda		S-SC-EP-M- 06	VE	560	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion						
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre							

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			✓	Sin Ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			✓	" "
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			✓	" "
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)			✓	Sin Ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)			✓	" "
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)			✓	" "
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				No Aplica
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				" "
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			✓	Sin Ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	" "
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	" "
3,4	Instalacion de lavadero estandar				No Aplica
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin Ejecutar
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02ml espesor			✓	Sin Ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02ml espesor			✓	" "
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			✓	Sin Ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			✓	" "
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			✓	" "
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			✓	Sin Ejecutar
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	" "
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	" "
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				No Aplica
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin Ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	" "
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	" "
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				No Aplica
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Rafael Lopez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre:
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIERIA CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	21 - 12 - 2022	Codigo vivienda	B-SC-EP-M- 66 VE 054 Tipologia T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			✓	Sin Ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			✓	〃 〃
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			✓	〃 〃
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)			✓	Sin Ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)			✓	〃 〃
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)			✓	〃 〃
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				〃 〃
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)			✓	Sin Ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	〃 〃
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	〃 〃
3,4	Instalacion de lavadero estandar				NO APLICA
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				〃 〃
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin Ejecutar
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regilas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	Sin Ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	〃 〃
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			✓	Sin Ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			✓	〃 〃
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			✓	〃 〃
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			✓	Sin Ejecutar
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	〃 〃
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	〃 〃
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				〃 〃
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				〃 〃
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin Ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	〃 〃
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	〃 〃
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				NO APLICA
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,80 m				

Nombre: Brenda Cantero
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael Lopez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	09 - 12 - 2022	Codigo vivienda	R-SC-EP-M- 38	VE	250	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)		✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)		✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)		✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				" "
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	90	✓		el agua del tanque desagua por el sanitario
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar				NO APLICA
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	90	✓		el tanque llena pero se bacea
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 6" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				NO APLICA
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Jeancin Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael López
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	5 - 12 - 2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M- 58 VE 24/9 Tipologia T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		Cubrir tubería
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				No Aplica
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				" "
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	✓		el agua del tanque desagua por el sanitario
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar				No Aplica
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de caledos tipo regilas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	95	✓		falta por instalar la del Papel
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	90	✓		Tanque se hacen solo
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				No Aplica
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso asmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	50	✓		falta Pintura interna y externa
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				No Aplica
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto do ,60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Cortes	Nombre Rafael Lopez	Nombre
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Inspector de interventoria	Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	09 - 12 - 2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M- 38	VE	25A	Tipologia	13
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				" "
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)			✓	Sin instalar Porque no hay cambio sanitario
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	" " " " "
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	Sin instalar Porque no hay cambio sanitario
3,4	Instalacion de lavadero estandar				NO APLICA
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			✓	Sin instalar no hay en campo
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	50	✓		Sin Pintar
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	90	✓		Falta Por Poner Pieza de la ducha
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	Sin Ejecutar
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				NO APLICA
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael Lopez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	09 - 12 - 2022	Codigo vivienda	B-SC-EP-M- 44	VE	345	Tipologia	Adc
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			V	Sin Ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			/	V "
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			/	" "
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)			/	Sin Ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)			/	V "
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)			/	" "
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)			/	" /
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			/	Sin Ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)			/	" "
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			/	" "
3,4	Instalacion de lavadero estandar			/	V "
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			/	Sin Ejecutar
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion				NO APLICA
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo				" "
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n° 4				" "
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas				" "
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			/	Sin Ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			/	" "
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	/		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			/	Sin Ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño				
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			/	Sin Ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento				NO APLICA
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			V	Sin Ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			V	" "
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				V "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			/	Sin Ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			V	V "
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			/	V "
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				APLICA
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				NO
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Contreras — Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael Lopez — Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre — Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	10 - 12 - 2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-38	VE	251	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			✓	Sin Ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			✓	" "
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			✓	" "
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)			✓	Sin Ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)			✓	" "
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)			✓	" "
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				" "
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			✓	Sin Ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	" "
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	" "
3,4	Instalacion de lavadero estandar				NO APLICA
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin " Ejecutar
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	95	✓		Faltan 2 hiladas
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas			✓	Sin Ejecutar
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	" "
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	" "
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			✓	Sin Ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			✓	" "
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			✓	" "
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			✓	Sin Ejecutar
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	" "
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura			✓	" "
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin Ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	" "
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	" "
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				NO APLICA
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sindy Cortes	Nombre Rafael López	Nombre
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Inspector de interventoria	Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
ingenieros consultores

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	10 - 12 - 2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M- 41	VE	676	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivado sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				" "
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			✓	Sin instalar
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	Sin instalar
3,4	Instalacion de lavadero estandar				NO aplica
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocación de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0.02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0.02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	100	✓		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO Aplica
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	50	✓		Falta acabado interno
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				NO APLICA
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0.60 m				

Nombre: Cesar Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael López
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	30 - 12 - 2022	Codigo vivienda	B-SC-EP-M-38	VE	252	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1"2"			✓	Sin Ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			✓	" "
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			✓	" "
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)			✓	Sin Ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)			✓	" "
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)			✓	" "
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO Aplica
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				" "
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			✓	Sin Ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	" "
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	" "
3,4	Instalacion de lavadero estandar				NO Aplica
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobraponar				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin Ejecutar
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		machones Presenta deformaciones
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	90	✓		mamposteria Presenta mal Proceso constructivo
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas			✓	Sin Ejecutar
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	" "
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	" "
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			✓	Sin Ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			✓	" "
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			✓	" "
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			✓	Sin Ejecutar
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	" "
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura			✓	" "
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO Aplica
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin Ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	" "
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	" "
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1"2"				NO APLICA
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1"2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0.60 m				

Nombre: Brendon Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael Lopez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	10 - 12 - 2022	Codigo vivienda	B-SC-EP-M-33	VIS	333	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			/	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			/	" "
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			/	" "
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)			/	Sin Ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)			/	" "
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)			/	" "
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				No Aplica
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				" "
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			/	Sin Ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)			/	" "
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			/	" "
3,4	Instalacion de lavadero estandar				No Aplica
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			/	Sin Ejecutar
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	/		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	/		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4			/	Sin Ejecutar
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas			/	" "
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			/	" "
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			/	" "
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	/		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			/	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			/	" "
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			/	" "
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			/	Sin ejecutar
4,13	Suministro e instalacion de tanque sereo plastico de 500lt			/	" "
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura			/	" "
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO Aplica
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			/	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			/	" "
5,6	Pintura con cerburo blanco para muro exterior y interior			/	" "
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				No Aplica
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .80 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael López
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	12-12-2022	Codigo vivienda	581	B-SC-EP-M- 73	VR 581	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			✓	//
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			✓	
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)			✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)			✓	//
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)			✓	
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)			✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)			✓	N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	//
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	
3,4	Instalacion de lavadero estandar			✓	N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer			✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin ejecutar
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		3 Unidades Sobrevuelo - Viga Corona.
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	0		✓	Sin ejecutar
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	//
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02ml espesor	0		✓	
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02ml espesor	0		✓	
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	0		✓	
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		✓	
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre: Sandra Contreras	Nombre: Leider Suarez	Nombre
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Inspector de Interventoria	Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	12-12-2022	Codigo vivienda	B-SC-EP-M-66	VE	554	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		V	Sin Ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		V	//
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		V	//
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	0		V	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	0		V	//
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	0		V	//
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		V	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		V	N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	0		V	Sin Ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)	0		V	//
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	0		V	//
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		V	N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		V	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		V	Sin ejecutar
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	V		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	V		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	V		se fundio Viga de amarre.
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regilles	100	V		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		V	Sin ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		V	Sin ejecutar
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	V		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		V	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		V	//
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		V	//
4,12	Suministro e instalacion de cuberta en teja ondulada fibrocemento	0		V	//
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		V	//
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		V	//
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		V	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		V	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		V	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		V	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		V	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		V	//
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		V	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 6" para domiciliaria	0		V	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		V	//
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		V	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		V	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de ,60 m x 0,60 m	0		V	//

Nombre: Jaider Cantero
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Jesus Martinez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	17-12-2021	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-62	VE	597	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		✓	//
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		✓	//
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	0		✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	0		✓	//
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	0		✓	//
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	//
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	//
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)	0		✓	//
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	0		✓	//
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	//
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	//
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	//
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	50	✓		Falta Viga eimiento Sin ejecutar
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	0			Sin ejecutar
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	//
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	//
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	//
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		✓	Fundida de columnas
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	Sin ejecutar
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	//
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	//
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	//
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	0		✓	//
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	//
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro o instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	//

Nombre: Carlos Cartagena	Nombre: Leider Suarez	Nombre
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Inspector de Interventoria	Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	12-12-2022	Codigo vivienda		S-SC-EP-M-62	VE	504	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion						
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre							

USTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	50	✓		Falta conectarla al tanque
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO Aplica
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				" "
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar				NO APLICA
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regilas	85	✓		Filos de calados y limpieza de calados
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	Sin instalar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	" "
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	Sin Ejecutar
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				NO APLICA
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de ,60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Rafael López
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre:
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	12 - 12 - 2022	Codigo vivienda	S-BC-EP-M-66	VE	560	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			/	Sin Ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			/	" "
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			/	" "
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)			/	Sin Ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)			/	" "
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)			/	" "
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				" "
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			/	Sin Ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)			/	" "
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			/	" "
3,4	Instalacion de lavadero estandar				NO APLICA
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			/	Sin Ejecutar
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	/		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	/		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	/		mamposteria altura de viga
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regilas			/	Sin Ejecutar
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02ml espesor			/	" "
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02ml espesor			/	" "
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	/		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			/	Sin Ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			/	" "
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			/	" "
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			/	Sin Ejecutar
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			/	" "
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			/	" "
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			/	Sin Ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			/	" "
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			/	" "
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				NO APLICA
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Contreras	Nombre Rafael Lopez	Nombre
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Inspector de Interventoria	Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	12 - 12 - 2022	Codigo vivienda	B-BC-EP-M-51 VE 161 Tipologia T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				// //
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)				Sin Ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)				// //
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal				// //
3,4	Instalacion de lavadero estandar				NO APLICA
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				// //
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02ml espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02ml espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			✓	Sin instalar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	90	✓		Tanque no esta centrado
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura			✓	Sin instalar
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				// //
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				// //
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	10	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	Sin Ejecutar
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				NO APLICA
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Cortes
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael Lopez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	12-12-2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-57 VE 434 Tipologia T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	50	/		Falta conectarla al medidor
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	/		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	/		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	/		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	/		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	/		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				// //
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	/		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	/		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	/		
3,4	Instalacion de lavadero estandar				NO APLICA
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				// //
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	/		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	/		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	/		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	/		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regilla	95	/		Corregir filos de calados
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	/		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	/		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	/		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	80	/		le falto revestimiento de concreto acero se ve
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	/		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			/	Sin instalar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	90	/		corregir encorrotado
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	/		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	50	/		falta Pintar Puerta
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				// //
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				// //
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	90	/		ceramicas hurecas
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	90	/		// //
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			/	Sin ejecutar
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 6" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				NO APLICA
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael Lopez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	12 - 12 - 2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M- 66 VE 369 Tipologia T-3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				" "
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	90	✓		Lavamano Presenta Fuga
3,4	Instalacion de lavadero estandar				NO APLICA
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	50	✓		Falta Pintar Puerta
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con cerburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 3" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				NO APLICA
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0.60 m				

Nombre: Residente contem
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael López
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	13 - 12 - 2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-93	VE	58	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			✓	Sin Ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			✓	" "
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitario de 2"			✓	" "
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)			✓	Sin Ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)			✓	" "
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)			✓	" "
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				" "
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			✓	Sin Ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	" "
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	" "
3,4	Instalacion de lavadero estandar				NO APLICA
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin Ejecutar
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	85	✓		En Ejecución
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas			✓	NO APLICA
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	Sin Ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	" "
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado			✓	" "
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			✓	" "
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			✓	Sin ejecutar
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			✓	" "
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento				NO APLICA
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	Sin Ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura			✓	" "
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin Ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	" "
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	" "
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 3" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				APLICA
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				NO
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Leudnis Contreras	Nombre Rafael López	Nombre
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Inspector de Interventoria	Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	12-12-2021	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-70	VE	572	Tipologia	
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		V	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		V	//
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		V	//
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	0		V	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	0		V	//
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	0		V	//
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		V	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		V	N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	0		V	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)	0		V	//
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	0		V	//
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		V	N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		V	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		V	Sin ejecutar
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	V		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	V		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	50	V		Paralizada por materiales
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regilles	0		V	Sin ejecutar
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		V	//
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		V	//
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	V		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		V	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		V	//
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		V	//
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		V	//
4,13	Suministro e instalacion de tanque sereo plastico de 500lt	0		V	//
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		V	//
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		V	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		V	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		V	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		V	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		V	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		V	//
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		V	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 6" para domiciliaria	0		V	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		V	//
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		V	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		V	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		V	//

Nombre: Brenda Cantillo	Nombre: Leider Suarez	Nombre
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Inspector de Interventoria	Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
Ingenieros Consultores

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	12-12-2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M- 70	VE	505	Tipologia	73
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		✓	"
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		✓	
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	0		✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	0		✓	"
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	0		✓	
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)	0		✓	"
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	0		✓	
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	Sin ejecutar
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regilles	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		Espesor de 5cm.
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	Sin ejecutar
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	"
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	"
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	"
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	"
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	"
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	"
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	"
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .80 m x 0,60 m	0		✓	"

Nombre: Leider Cortes	Nombre: Leider Suarez	Nombre
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Inspector de Interventoria	Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	12-12-2022	Codigo vivienda		S-SC-EP-M-	VE	581	Tipologia
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			✓	//
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			✓	
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)			✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)			✓	//
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)			✓	
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)			✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)			✓	N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	//
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	
3,4	Instalacion de lavadero estandar			✓	N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer			✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin ejecutar
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		3 hiladas, Sobrecimiento - Viga corona.
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	0		✓	Sin ejecutar
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	//
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02ml espesor	0		✓	
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02ml espesor	0		✓	
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	0		✓	
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		✓	
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre: Sandra Contreras	Nombre Leider Suarez	Nombre
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Inspector de Interventoria	Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	12-12-2022	Codigo vivienda	B-SC-EP-M-55	VE	409	Tipologia	A de
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	sin ejecutar
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	sin ejecutar
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	sin ejecutar
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	sin ejecutar
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	0		✓	N/A
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	0		✓	"
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	0		✓	"
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	0		✓	sin instalar
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	"
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	50	✓		Falta interno
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 6" para domiciliaria	0		✓	"
6,3	Suministro e instalacion de Tubena sanitaria PVC de 6"	0		✓	"
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	"
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	"
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	"

Nombre: Sandra Cantero
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Isaac Martinez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
Ingenieros Consultores

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	17-12-2022	Codigo vivienda	B-SC-EP-M-55	VE	416	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		En ejecucion
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		medida interna de 2,16m,
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Sin ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	"
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		En ejecución
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	"
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	"
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	"
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	"
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	"
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	"
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	"

Nombre: Gerardo Cardenas — Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Isaac Martinez — Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre: — Cargo: residente / Inspector de obra

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	13-12-2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-	VE	538	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			✓	//
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			✓	
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**inodoro**)			✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)			✓	
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)			✓	//
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)			✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)			✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)			✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)			✓	
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**			✓	//
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**			✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**			✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion		✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo		✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4		✓		Desmontar 3 hiladas.
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas			✓	N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	Sin ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado			✓	//
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			✓	
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			✓	
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			✓	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			✓	
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			✓	Sin ejecutar
5,2	Recuperacion de piso en concreto			✓	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria			✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria			✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"			✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"			✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"			✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m			✓	

*Paralizada sin materiales. Demolar hiladas desplomadas

Nombre: Sandra Contreras	Nombre Leider Suarez	Nombre
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Inspector de interventoria	Cargo: residente / Inspector de obra

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	13-12-2022	Codigo vivienda		S-SC-EP-M-66	VE	564	Tipologia	Adc.
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion						
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre							

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			✓	//
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			✓	
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**inodoro**)			✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)			✓	
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)			✓	//
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)			✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)			✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)			✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)			✓	
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**			✓	//
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**			✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**			✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion			✓	
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo			✓	
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4			✓	Medidas de 1,90 x 1,30 m
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas			✓	
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	En ejecución
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	En ejecución
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado			✓	
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			✓	
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			✓	
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			✓	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			✓	
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			✓	Sin ejecutar
5,2	Recuperacion de piso en concreto			✓	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria			✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria			✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"			✓	
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"			✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"			✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m			✓	

Nombre: Sandra Cantero
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez.
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	13-12-2022	Codigo vivienda		S-SC-EP-M-	62	VE	508	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion							
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion							
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre								

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1'2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓	✗ ✓	
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	0	✗	✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0		✓	"
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		✓	"
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	Sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	Sin ejecutar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto			✓	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			✓	"
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020		✓		En ejecucion
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020		✓		"
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	Sin ejecutar
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	100	✓		
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	100	✓		
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	100	✓		
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1'2"	0		✓	N/A
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1'2"	0		✓	N/A
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	100	✓		

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	13/Dic/2021	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-70	VE	582	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			✓	//
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			✓	
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**inodoro**)			✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)			✓	//
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)			✓	//
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)			✓	//
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)			✓	//
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)			✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)			✓	//
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**			✓	//
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**			✓	//
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**			✓	//
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	//
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion		✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo		✓		3 hiladas sobrenivel-bloque 015
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4			✓	Sin ejecutar
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas			✓	//
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	//
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	//
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado		✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			✓	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			✓	//
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			✓	//
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			✓	//
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	//
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	//
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			✓	Sin ejecutar
5,2	Recuperacion de piso en concreto			✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	//
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	//
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria			✓	Sin ejecutar
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria			✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"			✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"			✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"			✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m			✓	//

* Beneficiario aporto los bloques 015 y pide reembolso.

Nombre: Sandra Contreras	Nombre Leider Suarez	Nombre
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Inspector de interventoria	Cargo: residente / Inspector de obra

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	13-02-2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-62	VE	507	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"		✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"		✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"		✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**inodoro**)		✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)		✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)		✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)			✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)			✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)		✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)		✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**		✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**			✓	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**			✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto		✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion		✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo		✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4		✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas		✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor		✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor		✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado		✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque		✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño		✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño		✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento		✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt		✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	Sin ejecutar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto			✓	N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			✓	N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020		✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020		✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	50	✓		En ejecución
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria			✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria			✓	N/A
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"			✓	N/A
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"			✓	N/A
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"			✓	N/A
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m			✓	N/A

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Julio Suarez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	13-dic-2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M- 62	VE	5091	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"		✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"		✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"		✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**inodoro**)		✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)		✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)		✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)			✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)			✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)		✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)		✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**		✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**			✓	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**			✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto		✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion		✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo		✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4		✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas		✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor		✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor		✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado		✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque		✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño		✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño		✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento		✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt		✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	Sin especificar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto			✓	N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			✓	N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020		✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020		✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior		✓		Falta mano de pintura
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria			✓	
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria			✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"			✓	
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"			✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"			✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m			✓	

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	14-12-2022	Codigo vivienda	8-SC-EP-M-03	VE	657	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		✓	//
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		✓	//
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)	0		✓	
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	0		✓	
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		✓	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	//
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	//
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	//
4,13	Suministro e instalacion de tanque sereo plastico de 500lt	0		✓	//
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	0		✓	//
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	Sin ejecutar
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	//
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla yee de 6" a 6" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	//

Sandra Contreras

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Leider Suarez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	15-12-2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M- 13	VE	131	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		✓	
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	50		✓	Ejecucion.
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		✓	
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	0		✓	
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	0		✓	
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	0		✓	
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	0		✓	
3,2	Instalacion de (ducha)	0		✓	
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	0		✓	
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria [redacted] de arcilla nº 4 [redacted]	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	Sin ejecutar
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	"
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	"
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		✓	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	0		✓	
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	Sin ejecutar
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla yee de 6" a 6" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .80 m x 0,80 m	0		✓	

*Paralizada sin obreros.

Sandra Contreras
Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Leider Suárez
Nombre Leider Suárez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

72 558 73

Fecha de inspeccion	15-12-2022	Codigo vivienda		S-SC-EP-M-558	VE		Tipologia
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estander)				
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			✓	Sin instalar
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	Sin instalar
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	Sin instalar
3,4	Instalacion de lavadero estander				
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin ejecutar
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		Pero NO tiene Escuadra de Seguridad
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	Sin ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	Sin ejecutar
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			✓	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			✓	Sin instalar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			✓	" "
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	Sin ejecutar
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	" " "
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	" "
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla yo de 6" a 8" para domiciliaria				N/A
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				N/A
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"				N/A
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				N/A
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .80 m x 0,60 m				

Sandra Contreras — Nombre: Sandra Contreras — Cargo: Residente de Interventoria

Isaac Martinez — Nombre Isaac Martinez — Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre — Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	15-12-2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-69	VE	539	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			✓	
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			✓	
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"				N/A
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)			✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)			✓	" " "
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)			✓	" " "
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)			✓	" " "
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)			✓	Sin ejecutar
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	" " "
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	" " "
3,4	Instalacion de lavadero estandar				
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin ejecutar
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	50	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas			✓	Sin ejecutar
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	" " "
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	Sin ejecutar
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	160	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			✓	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			✓	" " "
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			✓	" " "
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibro cemento			✓	" " "
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	" " "
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	" " "
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	" " "
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	Sin ejecutar
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 6" para domiciliaria				N/A
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				N/A
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"				N/A
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				N/A
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				N/A

Sandra Contreras

Nombre: Sandra Contreras J
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre 9263088
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	15-12-2022	Codigo vivienda		B-SC-EP-M-69	VE	537	Tipologia 3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			✓	Sin ejecutar
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"				
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)			✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)			✓	Sin ejecutar
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)			✓	Sin ejecutar
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)			✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	" " "
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	" " "
3,4	Instalacion de lavadero estandar				N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto				N/A
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	80	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regilas			✓	Sin ejecutar
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	Sin Ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	" " "
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100			
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	-	-	—	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			✓	" " "
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			✓	" " "
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			✓	" " "
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 600lt			✓	" " "
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	Sin ejecutar
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	Sin ejecutar
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	Sin ejecutar.
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				N/A
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				N/A
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"				N/A
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				N/A
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				N/A

Sandra Contreras — Ismael Murillo

Nombre: Sandra Contreras — Nombre: Ismael Murillo — Nombre

Cargo: Residente de Interventoria — Cargo: Inspector de Interventoria — Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	15-12-2022	Codigo vivienda	0-SC-EP-M-66 VE 563 Tipologia F2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"				N/A
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	" "
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	" "
3,4	Instalacion de lavadero estandar				
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	80	✓		Falta tapa
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100		✓	Sin ejecutar
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100		✓	Sin ejecutar
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n° 4	100		✓	" " "
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas				N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	Sin ejecutar.
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	" " "
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	50	✓		" " "
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			✓	" " "
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			✓	Sin ejecutar
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			✓	Sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			✓	" " "
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	" " "
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	Sin ejecutar
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	Sin ejecutar
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	Sin ejecutar
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla yee de 6" a 8" para domiciliaria				N/A
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				N/A
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				N/A
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				N/A
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				N/A

Sandra Contreras — Nombre: Sandra Contreras — Cargo: Residente de Interventoria

Jsaac Alvarez — Nombre: Jsaac Alvarez — Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre — Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	15-12-2022	Codigo vivienda		S-SC-EP-M-45	VE	344	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion						
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre							

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	50	✓		En ejecución
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		Falta pintar
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		Falta mano de pintura.
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 3" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	

Sandra Contreras — Leider Suarez

Nombre: Sandra Contreras — Nombre: Leider Suarez — Nombre

Cargo: Residente de Interventoria — Cargo: Inspector de Interventoria — Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	16-12-2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-45	VE	728	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			✓	sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			✓	//
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			✓	
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)			✓	sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)			✓	//
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)			✓	//
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)			✓	//
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)			✓	//
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			✓	sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	//
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	//
3,4	Instalacion de lavadero estandar			✓	//
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer			✓	//
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	//
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion		✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo		✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	50	✓		En ejecucion
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas			✓	sin ejecutar
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	//
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	//
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado		✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			✓	sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			✓	//
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			✓	//
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			✓	//
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	//
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura			✓	//
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			✓	sin ejecutar
5,2	Recuperacion de piso en concreto			✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	//
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	//
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria			✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 6" para domiciliaria			✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"			✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"			✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"			✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m			✓	//

Sandra Contreras

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	12-12-2022	Codigo vivienda	R-SC-SP-M- 70	VE	583	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, Validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Tolucolejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		✓	
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		✓	
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	0		✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	0		✓	
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	0		✓	
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0		✓	
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		✓	
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		3 hiladas de sobrenivel.
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	0		✓	Sin ejecutar
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	0		✓	
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		✓	
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	0		✓	
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	Sin ejecutar
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	

*Paralizada sin obreros.

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez.
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspección	13-12-2012	Codigo vivienda	S-SC-SF-M-45 VR JyY Tipologia T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	Fecha de inicio de la intervención	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	Fecha final de la intervención	
Objetivo	Chequeo, validación de protolipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión en sitio para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1"	100	✓		
1.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2.4	Punto Hidrosanitario (**lavadero**)	100	✓		
2.5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2.6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2.7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	NIA
2.8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	NIA
3	**APARATOS**				
3.1	Instalacion de sanitario (**lavadero**)	100	✓		
3.2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3.3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3.4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	NIA
3.5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	NIA
3.6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4.1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4.2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4.3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4.4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4.5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0.02mt espesor	100	✓		
4.6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0.02mt espesor	100	✓		
4.7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4.8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4.9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4.10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4.12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4.13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4.14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	50	✓		sin pintar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5.1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	NIA
5.2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5.3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5.4	Enchape para pared blanco 0.20*.020	100	✓		
5.5	Enchape piso antideslizante blanco 0.20*.020	100	✓		
5.6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6.1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	NIA
6.2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6.3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6.4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6.5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6.6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez.
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	13-12-2022	Codigo vivienda	S-SC-SP-M-74	VE	592	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	Sin entregar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	0		✓	Sin entregar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		En ejecucion
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		//
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0			N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" x 6" para domiciliaria	0			//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0			//
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0			//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0			//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0.60 m	0			//

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

		Codigo vivienda	S-SC-EP-M- 77	VE	588	Tipologia	T2
Fecha de inspeccion	17-12-2022	fecha de inicio de la intervencion					
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha final de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	0	✓	✓	Sin Ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0		✓	//
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		✓	//
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	//
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	//
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	//
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	0		✓	Sin ejecutar
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		✓	//
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	//
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	Sin Ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,6	Pintura con cartuno blanco para muro exterior y interior	0		✓	//
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" x 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	//

Paralizada sin materiales.

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Paula Franco
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	14-12-2021	Codigo vivienda		S-SC-SP-M- 31	VIS	607	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	Fecha de inicio de la intervencion						
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	Fecha final de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre							

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		✓	"
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		✓	"
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**lavadero**)	0		✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	0		✓	"
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	0		✓	"
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	"
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	"
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**lavadero**)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0		✓	
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		✓	
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Sin ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor		✓		Mayor a 3 cm.
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0	✓	✓	No cumple dimensiones.
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	Sin ejecutar
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	"
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	"
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	"
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	"
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	"
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	"
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	"
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	"
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	"
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	"
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	"
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	"

Nombre Sandra Carreño
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Yender Suarez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	19-abr-2022	**Codigo vivienda**	B-SC-EP-M-45 VE 330 **Tipologia** T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			✓	Sin ejecutar
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"				
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)			✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)			✓	Sin ejecutar
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)			✓	Sin ejecutar
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)				
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)			✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)			✓	Sin ejecutar
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**			✓	Sin ejecutar
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				S
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin ejecutar
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regilas			✓	Sin instalar
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			—	
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓	—	
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓	—	
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓	—	
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			✓	Sin ejecucion
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			✓	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			✓	
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	Sin ejecucion
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			—	
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	
5,6	Pinturs con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0,60 m				N/A

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Isaac Martinez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	14-12-2022	**Codigo vivienda**		S-SC-EP-M	50	VE	606	**Tipologia** 13
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion						
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre							

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		✓	//
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		✓	//
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	0		✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	0		✓	//
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	0		✓	//
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	//
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	//
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0		✓	//
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		✓	//
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	//
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	//
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	//
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	0		✓	Sin ejecutar
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	//
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	//
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	//
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	0		✓	//
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		✓	//
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	//
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	//
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	//
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	//
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	//
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	//
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0.60m	0		✓	//

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Isaac Montes
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	19-12-2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-50 VE 353 +3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"				
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)				
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)				
3,2	Instalacion de (**ducha**)				
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**				
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto				
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		muro en algunos pega presentan observaciones
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de colados tipo regillas			✓	sin ejecutar
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	" " "
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	" " "
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado		✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque		✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño		✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			✓	sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento		✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque sereo plastico de 500lt		✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	
5	**ACABADOS Y PINTURA**				N/A
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				N/A
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" x 6" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				N/A

Nombre Sandra Cortes
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Jesus Martinez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIERIA CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	19-12-2022	Codigo vivienda	S-SC-EF-M-71	VE	576	Tipologia	T1
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		✓	"
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**lavadero**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**lavadero**)	100	✓	✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓	✓	"
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓	✓	"
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	"
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	"
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n° 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	Sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	Sin ejecutar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	"
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	50	✓		En ejecucion
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	50	✓		"
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	Sin ejecutar
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" x 8" para domiciliaria	0		✓	"
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	"
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	"
6,5	Suministro e instalacion de micromodidor de 1/2"	0		✓	"
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	"

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Guerra
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	19-12-2021	**Codigo vivienda**	S-SC-EP-M-74	**VE**	591	**Tipologia**	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarios de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	NIA
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	NIA
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	NIA
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	NIA
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	NIA
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	NIA
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	0		✓	
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	NIA
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		2 PAREDES CON VOLOS.
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	NIA
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" x 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	//

Nombre Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Julio Suarez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	20 - 12 - 2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M- 029	VE	0975	Tipologia	Ade
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de ½"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"				NO APLICA
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	100	✓		
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	100	✓		
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	100	✓		
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	100	✓		
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion				NO APLICA
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo				" "
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4				" "
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas				" "
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor				NO APLICA
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	100	✓		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020				" "
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x ½"				NO APLICA
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de ½"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Firma: Fontanero Nombre: Rafael López Nombre:

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	20 - 12 - 2022	Codigo vivienda	S SC PP M 50 VR 122 Tipologia T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			✓	Sin Ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			✓	" "
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			✓	" "
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)			✓	Sin Ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)			✓	" "
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)			✓	" "
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				" "
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)			✓	Sin Ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)			✓	" "
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**			✓	" "
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				NO APLICA
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin Ejecutar
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto. Incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4			✓	Sin Ejecutar
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas			✓	" "
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	" "
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	" "
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			✓	Sin Ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			✓	" "
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			✓	" "
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			✓	" "
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	" "
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura			✓	" "
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin Ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	" "
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	" "
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				NO APLICA
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0.60 m				

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael Lopez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	30 - 12 - 2022	**Codigo vivienda**	S-SC-EP-M- 54 VE 428 Tipologia T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de protolipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			✓	Sin Ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			✓	" "
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			✓	" "
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)			✓	Sin Ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)			✓	" "
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)			✓	" "
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				" "
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)			✓	Sin Ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)			✓	" "
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**			✓	" "
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				NO APLICA
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin Ejecutar
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	90	✓		En levante altura de viga
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	Sin Ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	" "
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			✓	Sin Ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			✓	" "
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			✓	" "
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			✓	" "
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	Sin Ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	" "
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin Ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	" "
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	" "
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				NO APLICA
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Contreras — Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Rafael López — Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre: _____ — Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	20 - 12 - 2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-53	VE	463	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			✓	Sin Ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			✓	" "
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			✓	" "
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)			✓	Sin Ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)			✓	" "
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)			✓	" "
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)				No Aplica
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				" "
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)			✓	Sin Ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)			✓	" "
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**			✓	" "
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				No Aplica
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin Ejecutar
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	90	✓		En levante
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas			✓	No Aplica
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	" "
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	" "
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado			✓	Sin Ejecutar
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			✓	" "
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			✓	" "
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			✓	" "
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			✓	No Aplica
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	Sin Ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	" "
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				No Aplica
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin Ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	" "
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	" "
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				No Aplica
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre Rafael López
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspección	20 - 12 - 2022	Código vivienda	B.SC.EP.M.50	VR	22	Tipología	73
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	Fecha de inicio de la intervención					
Interventoría	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	Fecha final de la intervención					
Objetivo	Chequeo, validación de procesos y diagnóstico, conexiones, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			✓	Sin Ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			✓	" "
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			✓	" "
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)			✓	Sin Ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)			✓	" "
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)			✓	" "
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				" "
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)			✓	Sin Ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)			✓	" "
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**			✓	" "
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				NO APLICA
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin Ejecutar
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4			✓	Sin Ejecutar
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas			✓	" "
4,5	Peñete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	" "
4,6	Peñete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	" "
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			✓	Sin Ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			✓	" "
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			✓	" "
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			✓	" "
4,13	Suministro e instalacion de tanque sereo plastico de 500lt			✓	" "
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	" "
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin Ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	" "
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	" "
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla yu de 6" x 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				NO APLICA
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Jsendraconterm
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael Lopez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	23 - 12 - 2022	Codigo vivienda	B-SC-EP-M-63	VE	469	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	/		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	/		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	/		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**inodoro**)	100	/		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	/		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	/		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				" "
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	100	/		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	/		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	/		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				NO APLICA
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	/		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	/		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	/		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	/		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	95	/		corregir filos de calados
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	/		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	/		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	/		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	98	/		Losa con espesor de 10cm
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	/		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	/		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	98	/		Limpiar tejas sucias
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	/		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	/		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	/		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	/		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	95	/		acabado no uniforme
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				NO APLICA
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael López
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	21 - 12 - 2022	Codigo vivienda	8-SC-EP-M-55	VE	409	Tipologia	A6c
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de Y2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				No Aplica
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				" "
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar	100	✓		
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				No Aplica
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion				No Aplica
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo				" "
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4				" "
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas				" "
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento				No Aplica
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				No Aplica
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	90	✓		Falta Por terminar
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				No Aplica
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Contreras — Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael Lopez — Cargo: Inspector de interventoria

Nombre — Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	21 - 12 - 2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M- 67	VE	628	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				" "
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar				NO APLICA
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regilla	98	✓		corregir filos de Calados
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	98	✓		Pañete presenta fisura
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	98	✓		" " "
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	98	✓		Losa con espesor de 10cm
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	98	✓		tejas sucias de concreto
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	100	✓		
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 6" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				NO APLICA
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de ,60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael López
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	21 - 12 - 2022	Codigo vivienda	6-BC-EP-M- 71	VE	613	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO Aplica
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				" "
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar				NO Aplica
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	98	✓		Piso te Presenta Fisura
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	98	✓		" " "
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	98	✓		Losa con exposor de 10cm
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	98	✓		Tejas sucias de Concreto
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO Aplica
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	95	✓		
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				NO APLICA
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Contom	Nombre Rafael López	Nombre
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Inspector de interventoria	Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
Ingenieros consultores

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	23 - 12 - 2022	Codigo vivienda	8-SC-EP-M-63	VE	469	Tipologia	T3	
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion						
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre							

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	/		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	/		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	/		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	/		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	/		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	/		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				" "
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	/		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	/		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	/		
3,4	Instalacion de lavadero estandar				NO APLICA
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	/		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	/		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	/		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	/		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	95	/		corregir filos de calados
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	/		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	/		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	/		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	98	/		Losa con espesor de 10cm
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	/		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	/		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	98	/		Limpiar tejas sucias
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	/		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	/		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	/		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	/		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	95	/		acabado no uniforme
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				NO APLICA
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Contreras	Nombre Rafael López	Nombre
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Inspector de Interventoria	Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	22 - 12 - 2022	Codigo vivienda	B-SC-EP-M- 66	VE	359	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				" "
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar				NO APLICA
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	SIN EJECUTAR
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de ,60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Contreras — Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Rafael Lopez — Cargo: Inspector de interventoria

Nombre: — Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	22 - 12 - 2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-66	VE	554	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				No Aplica
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				" "
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			✓	Sin instalar
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	" "
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	" "
3,4	Instalacion de lavadero estandar				No Aplica
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	70	✓		Falta Por terminar 2 cara
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			✓	Sin instalar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura			✓	Sin instalar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				No Aplica
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin Ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	" "
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	" "
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				No Aplica
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de ,60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael Lopez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	22 - 12 - 2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-38	VE	250	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estendar)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				" "
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estendar				NO APLICA
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regilas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	100	✓		
5,2	Recuperacion de piso en concreto				NO APLICA
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				NO APLICA
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Sandra Contreras
Nombre: Sandra Contreras.
Cargo: Residente de Interventoria

Rafael Lopez
Nombre Rafael López
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	12 - 12 - 2022	Codigo vivienda	B-SC-EP-M- 38	VE	249	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				// //
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar				NO APLICA
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				// //
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto	100	✓		
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				NO APLICA
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				NO APLICA
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Contreras	Nombre Rafael Lopez	Nombre
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Inspector de Interventoria	Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	23 - 12 - 2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-93	VE	SAFA	Tipologia	T2	
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion						
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre							

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de Y2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				" "
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			✓	Sin instalar
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	" "
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	" "
3,4	Instalacion de lavadero estandar				NO APLICA
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		corregir filos
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas				NO APLICA
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			✓	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			✓	Sin instalar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento				NO APLICA
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	Sin instalar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	" "
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	" "
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	" "
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				NO APLICA
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0.60 m				

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael López
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre

Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIERIA CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	23 - 12 - 2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-70	VE	581	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	50	✓		Falta conectarla al tanque
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	50	✓		falta conectarla a la domiciliaria
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO Aplica
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				// //
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)			✓	Sin instalar
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	// //
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	// //
3,4	Instalacion de lavadero estandar				NO Aplica
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				// //
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	50	✓		falta por hacer otro registro
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	20	✓		en ejecucion
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	20	✓		// //
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			✓	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			✓	Sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			✓	// //
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	// //
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura			✓	// //
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO Aplica
5,2	Recuperacion de piso en concreto				// //
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				// //
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	// //
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	// //
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				NO Aplica
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0.60 m				

Sandra Contreras — Rafael López

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Rafael López
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	27 - 12 - 2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-39	VE	196	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO Aplica
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				" "
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar				NO Aplica
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas				NO Aplica
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	98	✓		Corregir calos
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	98	✓		" "
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO Aplica
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	95	✓		Corregir acabado
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				NO Aplica
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .80 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Cantero
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael Lopez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	27 - 12 - 2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-38	VE	195	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1'2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO APlica
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				// //
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar				NO APlica
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				// //
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas				NO APlica
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	98	✓		corregir filos
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	98	✓		// //
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	95	✓		Tanque no llena
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	100	✓		
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APlica
5,2	Recuperacion de piso en concreto				// //
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				// //
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	95	✓		corregir detalles de acabado
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1'2"				NO APlica
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1'2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Cortes
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael López
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de ob

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	27 - 12 - 2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-50	VE	353	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			✓	Sin instalar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			✓	" "
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				" "
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)			✓	Sin instalar
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	" "
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	" "
3,4	Instalacion de lavadero estandar				NO APLICA
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin ejecutar
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		Corregir Pañete
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			✓	Sin instalar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	Sin instalar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	" "
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	50	✓		En ejecucion
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	Sin ejecutar
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				NO APLICA
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Cerdio Cortes	Nombre: Rafael López	Nombre:
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Inspector de interventoria	Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	27 - 12 - 2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-50	VE	606	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1"2"			/	Sin instalar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			/	" "
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	/		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	100	/		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	/		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	/		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				" "
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)			/	Sin instalar
3,2	Instalacion de (ducha)			/	" "
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			/	" "
3,4	Instalacion de lavadero estandar				NO APLICA
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			/	Sin ejecutar
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	/		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	/		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	/		Pegas mayor a 2cm
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	/		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			/	Sin ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	50	/		En ejecucion
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	/		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	/		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	/		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			/	Sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	/		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			/	Sin instalar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			/	" "
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			/	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			/	" "
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			/	" "
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1"2"				NO APLICA
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1"2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Cortes
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael Lopez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	29 - 12 - 2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-50	VE	349	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			✓	" "
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			✓	" "
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	50	✓		En ejecucción
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	50	✓		" "
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	50	✓		" "
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				No Aplica
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				" "
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			✓	Sin instalar
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	" "
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	" "
3,4	Instalacion de lavadero estandar				No Aplica
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin ejecutar
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	80	✓		muros desplomados
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		Pegas sin lleno total
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	Sin ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	" "
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	50	✓		en ejecucción
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			✓	Sin ejecutar
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			✓	Sin instalar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			✓	" "
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	" "
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	" "
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				No Aplica
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	" "
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	" "
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				NO Aplica
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Cortes
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael López
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	27 - 12 - 2022	Codigo vivienda	B-SC-EP-M-50	VE	350	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1'2"			✓	Sin instalar
1,2	Red intradomiciliarias de alcanterillado de 4"			✓	" "
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO APlica
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				" "
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			✓	Sin instalar
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	" "
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	" "
3,4	Instalacion de lavadero estandar				NO APlica
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin ejecutar
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	95	✓		acero de Losa expuesto
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			✓	Sin instalar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	80	✓		En ejecución
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	sin instalar
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APlica
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	" "
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	" "
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1'2"				NO APlica
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1'2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael Lopez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner
