Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -Interventoría de obra pública de infraestructura de transporte			
Código	CCE-EICP-FM-70	**Versión**	1

FORMULARIO 1 - DETALLADO

[La entidad puede utilizar este formulario para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que puedan modificarlo o presenten la oferta económica con un formulario distinto. Es presentado a modo ilustrativo y como una sugerencia]

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	DEDICACION	PARTICIPACIÓN (h - mes)	VALOR PARCIAL ($)
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*((2)+(3))*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
PERSONAL PROFESIONAL					
1	Director de proyectos de consultoria	$ 4.900.000,00	50%	2,00	$ 4.900.000,00
1	Residente de interventoria especialista	$ 3.800.000,00	100%	2,00	$ 7.600.000,00
1	Especialista en transito	$ 4.500.000,00	60%	1,00	$ 2.700.000,00
1	Profesional ambiental	$ 3.000.000,00	100%	2,00	$ 6.000.000,00
1	Profesional social especialista	$ 2.597.000,00	100%	2,00	$ 5.194.000,00
1	Inspector de interventoria	$ 1.900.000,00	100%	2,00	$ 3.800.000,00
1	Profesional especialista en salud ocupacional y/o salud ocupacional	$ 2.500.000,00	100%	2,00	$ 5.000.000,00
1	Contador	$ 2.400.000,00	80%		$ -
1	Abogado especialista	$ 3.000.000,00	70%		$ -
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)	**$ 35.194.000,00**
				FACTOR MULTIPLICADOR (7)	**2,2**
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)	**$ 77.426.800,00**

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)
(8)			(9)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS					
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA					
1	Transporte (Camioneta)	mes	$ 4.200.000	2,00	$ 8.400.000,00
1	Ensayos de laboratorio a la mezcla asfaltica (todos los ensayos que requiera los materiales y la estructura de pavimento.)	und	$ 600.000	2,47	$ 1.484.560,50
1	Comisión de topografía (Incluye personal,equipos y transporte)	mes	$ 4.500.000	2,00	$ 9.000.000,00
				SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)	**$ 18.884.560,50**
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	**$ 77.426.800,00**
				VALOR TOTAL BASICO	**$ 96.311.360,50**
				IVA = 19% * (E) = (F)	**$ 18.299.158,50**
				COSTO TOTAL = (E) + (F)	**$ 114.610.519,00**

FIRMAS:

Nombre y firma del representante legal del proponente	Nombre del proponente

INP SERVICIOS SAS

Barranquilla, 30 de diciembre de 2022

CINP–522–146–5271

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
Atte. Ing. Karina Betancourt Gómez
Secretaria de Infraestructuras
secretariainfraestructura@popayan.gov.co
Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21
Popayán – Cauca

REF.: CONTRATO No. 20211800024217 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

Cordial saludo Ingeniera Karina,

Dando alcance al comunicado CINP-522-145-5207 del 27 de diciembre del presente año remitimos para su conocimiento y fines pertinentes el formulario 1 de la propuesta de costos de Interventoría debidamente firmado por parte del representante legal de Interventoría según prórroga hasta el 28 de febrero de 2023 y adición al contrato de la referencia por valor de CIENTO CATORCE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE. ($114.610.519,00)

Atentamente,

INP SERVICIOS S.A.S

ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Director de Interventoría

Anexos: Formulario Costos de interventoría

Elaboró: PMZ
Aprobó: AMA

Calle 77B No.57-103 Of 905
Edificio Green Towers
Contacto: (57) 3205662503
E-mail.: info@inpservicios.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -Interventoría de obra pública de infraestructura de transporte			
Código	CCE-EICP-FM-70	**Versión**	1

FORMULARIO 1 - DETALLADO

[La entidad puede utilizar este formulario para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que puedan modificarlo o presenten la oferta económica con un formulario distinto. Es presentado a modo ilustrativo y como una sugerencia]

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	DEDICACION	PARTICIPACIÓN (h - mes)	VALOR PARCIAL ($)
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*((2)+(3))*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
PERSONAL PROFESIONAL					
1	Director de proyectos de consultoria	$ 4.900.000,00	50%	2,00	$ 4.900.000,00
2	Residente de interventoria especialista	$ 3.800.000,00	100%	2,00	$ 15.200.000,00
1	Especialista en transito	$ 4.500.000,00	35%	1,00	$ 1.575.000,00
1	Profesional ambiental	$ 3.000.000,00	50%	2,00	$ 3.000.000,00
1	Profesional social especialista	$ 2.597.000,00	40%	2,00	$ 2.077.600,00
1	Inspector de interventoria	$ 1.900.000,00	100%	2,00	$ 3.800.000,00
1	Profesional especialista en salud ocupacional y/o salud ocupacional	$ 2.500.000,00	100%	2,00	$ 5.000.000,00
1	Contador	$ 2.400.000,00	40%	1,00	$ 960.000,00
1	Abogado especialista	$ 3.000.000,00	30%	1,00	$ 900.000,00
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)	$ 37.412.600,00
				FACTOR MULTIPLICADOR (7)	2,2
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)	$ 82.307.720,00

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)
(8)			(9)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS					
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA					
1	Transporte (Camioneta)	mes	$ 4.200.000	2,00	$ 8.400.000,00
1	Ensayos de laboratorio a la mezcla asfaltica (todos los ensayos que requiera los materiales y la estructura de pavimento.)	und	$ 600.000	1,84	$ 1.103.640,50
1	Comisión de topografía (Incluye personal,equipos y transporte)	mes	$ 4.500.000	1,00	$ 4.500.000,00
				SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)	$ 14.003.640,50
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	$ 82.307.720,00
				VALOR TOTAL BASICO	$ 96.311.360,50
				IVA = 19% * (E) = (F)	$ 18.299.158,50
				COSTO TOTAL = (E) + (F)	$ 114.610.519,00

FIRMAS:

PEDRO GUTIERREZ VISVAL
CC 17.190.137 de Bogota

Nombre del proponente

INP SERVICIOS SAS

Barranquilla, 31 de diciembre de 2022

CINP–522–147–5273

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
Atte. Ing. Karina Betancourt Gómez
Secretaria de Infraestructuras
secretariainfraestructura@popayan.gov.co
Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21
Popayán – Cauca

REF.: CONTRATO No. 20211800024217 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

Cordial saludo Ingeniera Karina,

Dando alcance a nuestro comunicado CINP-522-145-5207 del 27 de diciembre del presente año confirmamos que, con el fin de continuar con las actividades de control y seguimiento al contrato de obra, esta interventoría solicita amablemente se gestione para nuestro contrato de interventoria, una adición de recursos por valor de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE. ($100.000.000,00) y una prórroga hasta el 28 de febrero de 2023.

Atentamente,

INP SERVICIOS S.A.S

ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Director de Interventoría

C.C. - Ing. Luis Fernando Tobar – Supervisor Alcaldía Popayán

Calle 77B No.57-103 Of 905
Edificio Green Towers
Contacto: (57) 3205662503
E-mail.: info@inpservicios.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

INP SERVICIOS SAS

Barranquilla, 2 de enero de 2023

CINP–522–148–0018

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
Atte. Ing. Karina Betancourt Gómez
Secretaria de Infraestructuras
secretariainfraestructura@popayan.gov.co
Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21
Popayán – Cauca

REF.: CONTRATO No. 20211800024217 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

Cordial saludo Ingeniera Karina,

Dando alcance al comunicado CINP–522–147–5273 del 31 de diciembre de 2022 remitimos para su conocimiento y fines pertinentes el formulario 1 de la propuesta de costos de Interventoría debidamente firmado por parte del representante legal de Interventoría según prórroga hasta el 28 de febrero de 2023 y adición al contrato de la referencia por valor de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE. ($100.000.000,00)

Atentamente,

INP SERVICIOS S.A.S

ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Director de Interventoría

Anexos: Formulario Costos de interventoría

Elaboró: PMZ
Aprobó: AMA

Calle 77B No.57-103 Of 905
Edificio Green Towers
Contacto: (57) 3205662503
E-mail.: info@inpservicios.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -Interventoría de obra pública de infraestructura de transporte			
Código	CCE-EICP-FM-70	Versión	1

FORMULARIO 1 - DETALLADO

[La entidad puede utilizar este formulario para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que puedan modificarlo o presenten la oferta económica con un formulario distinto. Es presentado a modo ilustrativo y como una sugerencia]

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	DEDICACION	PARTICIPACIÓN (h - mes)	VALOR PARCIAL ($)
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*((2)+(3))*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
PERSONAL PROFESIONAL					
1	Director de proyectos de consultoria	$ 4.900.000,00	40%	2,00	$ 3.920.000,00
2	Residente de interventoria especialista	$ 3.800.000,00	100%	2,00	$ 15.200.000,00
1	Especialista en transito	$ 4.500.000,00	35%		$ -
1	Profesional ambiental	$ 3.000.000,00	40%	2,00	$ 2.400.000,00
1	Profesional social especialista	$ 2.597.000,00	30%	2,00	$ 1.558.200,00
1	Inspector de interventoria	$ 1.900.000,00	100%	2,00	$ 3.800.000,00
1	Profesional especialista en salud ocupacional y/o salud ocupacional	$ 2.500.000,00	100%	2,00	$ 5.000.000,00
1	Contador	$ 2.400.000,00	40%		$ -
1	Abogado especialista	$ 3.000.000,00	30%		$ -
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)	$ 31.878.200,00
				FACTOR MULTIPLICADOR (7)	2,2
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)	**$ 70.132.040,00**

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)
(8)			(9)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS					
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA					
1	Transporte (Camioneta)	mes	$ 4.200.000	2,00	$ 8.400.000,00
1	Ensayos de laboratorio a la mezcla asfaltica (todos los ensayos que requiera los materiales y la estructura de pavimento.)	und	$ 600.000	1,67	$ 1.001.573,45
1	Comisión de topografia (Incluye personal,equipos y transporte)	mes	$ 4.500.000	1,00	$ 4.500.000,00
				SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)	**$ 13.901.573,45**
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	**$ 70.132.040,00**
				VALOR TOTAL BASICO	**$ 84.033.613,45**
				IVA = 19% * (E) = (F)	**$ 15.966.386,55**
				COSTO TOTAL = (E) + (F)	**$ 100.000.000,00**

FIRMAS:

PEDRO GUTIERREZ VISBAL
CC 17.190.137 de Bogota

Nombre del proponente

INP SERVICIOS SAS

Barranquilla, 3 de enero de 2023

CINP–522–149–0023

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
Atte. Ing. Luis Fernando Tobar Mellizo
Supervisor
luisfernandotobarmellizo@yahoo.com
Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21
Popayán – Cauca

REF.: CONTRATO No 20221800011697 DEL 2022 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

Cordial saludo ingeniero Tobar,

Por medio del presente remitimos para su conocimiento y fines pertinentes el informe semanal de interventoría No 37 correspondiente al periodo del 19 al 25 de diciembre de 2022, del contrato de obra No 20211800024217 del 2021 – cuyo objeto es Mantenimiento de la malla vial del municipio en el marco del proyecto "apoyo al programa de infraestructura para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o conservación vial en el sector urbano del municipio de Popayán 2021"

Atentamente,

INP SERVICIOS S.A.S

ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Director de Interventoría.

Anexo: Lo enunciado en un (1) archivo digital (4) folios

Elaboró: PMZ
Aprobó: AMA

Calle 77B No.57-103 Of 905
Edificio Green Towers
Contacto: (57) 3205662503
E-mail.: info@inpservicios.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

INP SERVICIOS SAS

Barranquilla, 3 de enero de 2023

CINP–522–150–0025

Señores
EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.
Atte. ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO
Representante Legal.
Dirección: Av. Carrera 24 No 40-69 Of. 303
Bogotá D.C.

REF.: CONTRATO No. 20211800024217 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

Cordial saludo Ingeniero Cárdenas.

Teniendo en cuenta que las comunicaciones que corresponden a un derecho de petición, requieren de una respuesta oportuna dentro del tiempo estipulado por la Ley, se hace el **REQUERIMIENTO AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO,** en la atención a la solicitud enviada por la Señora GLORIA CORTES CERÓN, Identificada con cédula de ciudadanía No. 34.533.784, teléfono 3004817457, E-mail: gcorcer@gmail.com, cuya residencia se encuentra en la dirección Calle 27N # 4-84 del Barrio Yambitará, remitida por esta Interventoría mediante comunicado No. CINP-522-131-4795 Rad. 28-11-2022, el cual, a su vez, anexa el oficio No. 20221400489571 de la Entidad Contratante, cuyo asunto es "Remisión petición 20221150314692 y 20221150315592 – reparación zona encharcamiento Yambitará".

Dejamos constancia, que adicional al comunicado enviado por la Interventoría citado anteriormente, se dejó notas de solicitud de atención a este derecho de petición, en comités de obra llevados a cabo los días 29-11-2022, 06-12-2022, 13-12-2022, 21-12-2022, 27-12-2022, sin que, a la fecha, se haya obtenido respuesta por parte del contratista de la obra.

De acuerdo con lo anterior, se **CONMINA AL CONTRATISTA**, para que en un plazo no mayor a **TRES (3) DÍAS CALENDARIO**, proceda a realizar la atención al derecho de petición de la Sra. GLORIA CORTES CERÓN, so pena de solicitar a la Entidad Contratante, la aplicación de las sanciones a que haya lugar, por incumplimiento de términos estipulados por la ley para la atención de este derecho de petición e incumplimiento de compromisos contractuales, en cuanto al componente social, en su programa B3 Participación y Atención

Calle 77B No.57-103 Of 905
Edificio Green Towers
Contacto: (57) 3205662503
E-mail.: info@inpservicios.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Ciudadana, puesto que esta petición se considera una PQRS y puede generar repercusiones legales ante la Entidad Contratante.

Atentamente,

INP SERVICIOS S.A.S

ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Director de Interventoría

C.C. Ing. Karina Betancourt Gómez - Secretaria de Infraestructura
Ing. Luis Fernando Tobar – Supervisor Alcaldía Popayán

Elaboró: SLP - PMZ
Aprobó: AMA

Calle 77B No.57-103 Of 905
Edificio Green Towers
Contacto: (57) 3205662503
E-mail.: info@inpservicios.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

INP SERVICIOS SAS

Barranquilla, 5 de enero de 2023

CINP–522–151–0059

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
Atte. Ing. Karina Betancourt Gómez
Secretaria de Infraestructura
secretariainfraestructura@popayan.gov.co
Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21
Popayán – Cauca

REF.: CONTRATO No 20221800011697 DEL 2022 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

Cordial saludo Ingeniera Karina,

Por medio del presente remitimos para su conocimiento y fines pertinentes los documentos relacionados a continuación:

- Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal No 85-44-101115315, Anexo 10 y 11, la cual se encuentra ajustada según Modificatorio No 3 del contrato de la referencia.
- Recibo de pago No 1000043671259.
- Pantallazo de Cargue en SECOP II.

Atentamente.

INP SERVICIOS S.A.S.

ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Director de interventoria

C.C. Ing. Luis Fernando Tobar – Supervisor Alcaldía Popayán

Elaboró: AOD
Aprobó: AMA

Calle 77B No.57-103 Of 905
Edificio Green Towers
Contacto: (57) 3205662503
E-mail.: info@inpservicios.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-44-101115315	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	01	2023	07	04	2022	00:00	07	11	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
INP SERVICIOS S.A.S.		NIT: 901.300.211-3
DIRECCIÓN: CLL 77 B NO 57-103	CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO: 3681111

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT: 891.580.006-4
DIRECCIÓN: CR 6 N NRO. 4 - 21 EDIFC CAM	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	TELÉFONO 8243075
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 20221800011697 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO APOYO A/P ROBRANA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACION VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO DE LA OBRA

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	07/04/2022	30/04/2023	$24,844,592.00	$24,844,592.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/04/2022	30/04/2023	$70,813,466.50	$60,813,466.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/04/2022	31/12/2025	$35,406,733.25	$30,406,733.25
CALIDAD DEL SERVICIO	07/11/2022	07/11/2027	$141,626,933.00	$121,626,933.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SE PRORROGA LA VIGENCIA HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2023 Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO DE MODIFICATORIO No. 03 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 20221800011697 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYN E INP SERVICIOS S.A.S.

//

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA DURACION DE CINCO AÑOS CONTADOS APARTIR DEL ACTA DE ENTREGA.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****242,998.00	$ **********0.00	$ ******46,169.00	$ **********289,168.00	$ ******272,691,724.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
GLOBALAS LIMITADA	143671	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681070 - BARRANQUILLA

85-44-101115315

FIRMA AUTORIZADA Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-44-101115315	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	01	2023	07	04	2022	00:00	07	11	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
INP SERVICIOS S.A.S.			NIT: 901.300.211-3
DIRECCIÓN: CLL 77 B NO 57-103	**CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO	**TELEFONO:**	3681111

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE POPAYAN			NIT: 891.580.006-4
DIRECCIÓN: CR 6 N NRO. 4 - 21 EDIFC CAM	**CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA	**TELÉFONO:**	8243075

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-44-101115315

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

JULIOARRIETA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	65	85-44-101115315	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	01	2023	07	04	2022	00:00	28	02	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
INP SERVICIOS S.A.S.		NIT: 901.300.211-3
DIRECCIÓN: CLL 77 B NO 57-103	CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO: 3681111

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT: 891.580.006-4
DIRECCIÓN: CR 6 N NRO. 4 - 21 EDIFC CAM	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	TELÉFONO 8243075

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUSION, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 20221800011697 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACION VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO DE LA OBRA

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	07/04/2022	30/06/2023	$24,844,592.60	$24,844,592.60
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/04/2022	30/06/2023	$70,813,466.50	$70,813,466.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/04/2022	28/02/2026	$35,406,733.25	$35,406,733.25
CALIDAD DEL SERVICIO	07/11/2022	07/11/2027	$141,626,933.00	$141,626,933.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SE PRORROGA LA VIGENCIA HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026 Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO DE MODIFICATORIO No. 03 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 20221800011697 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN E INP SERVICIOS S.A.S.
//
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA DURACION DE CINCO AÑOS CONTADOS APARTIR DEL ACTA DE ENTREGA.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******45,600.00	$ *******8,000.00	$ ******10,182.00	$ **********63,773.00	$ *****272,991,724.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
GLOBALAM LIMITADA	143691	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-44-101115315

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante D. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-44-101115315	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	01	2023	07	04	2022	00:00	28	02	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
INP SERVICIOS S.A.S.		NIT: 901.300.211-3	
DIRECCIÓN: CLL 77 B NO 57-103	**CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO	**TELÉFONO:**	3681111

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT: 891.580.008-4	
DIRECCIÓN: CR 6 N NRO. 4 - 21 EDIFICIAM	**CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA	**TELÉFONO:**	8243075

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-44-101115315

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

JULIOARRIETA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670043671 25

Nit: 860009576-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000043671259

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA	
04/01/2023 04:35p.m.	

RECIBIMOS DE: INP SERVICIOS S.A.S. — NIT. 901.300.211

LA SUMA DE: Trescientos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y un pesos **********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000043671259

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
BARRANQUILLA-44-101115315-10-1	$242,998.00		$46,170.00	$289,168.00
BARRANQUILLA-44-101115315-11-1	$53,591.00		$10,182.00	$63,773.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 352,941.00

EFECTIVO:	
CHEQUE:	
TARJETA:	
BD:	352,941.00
OTROS:	$352,941.00

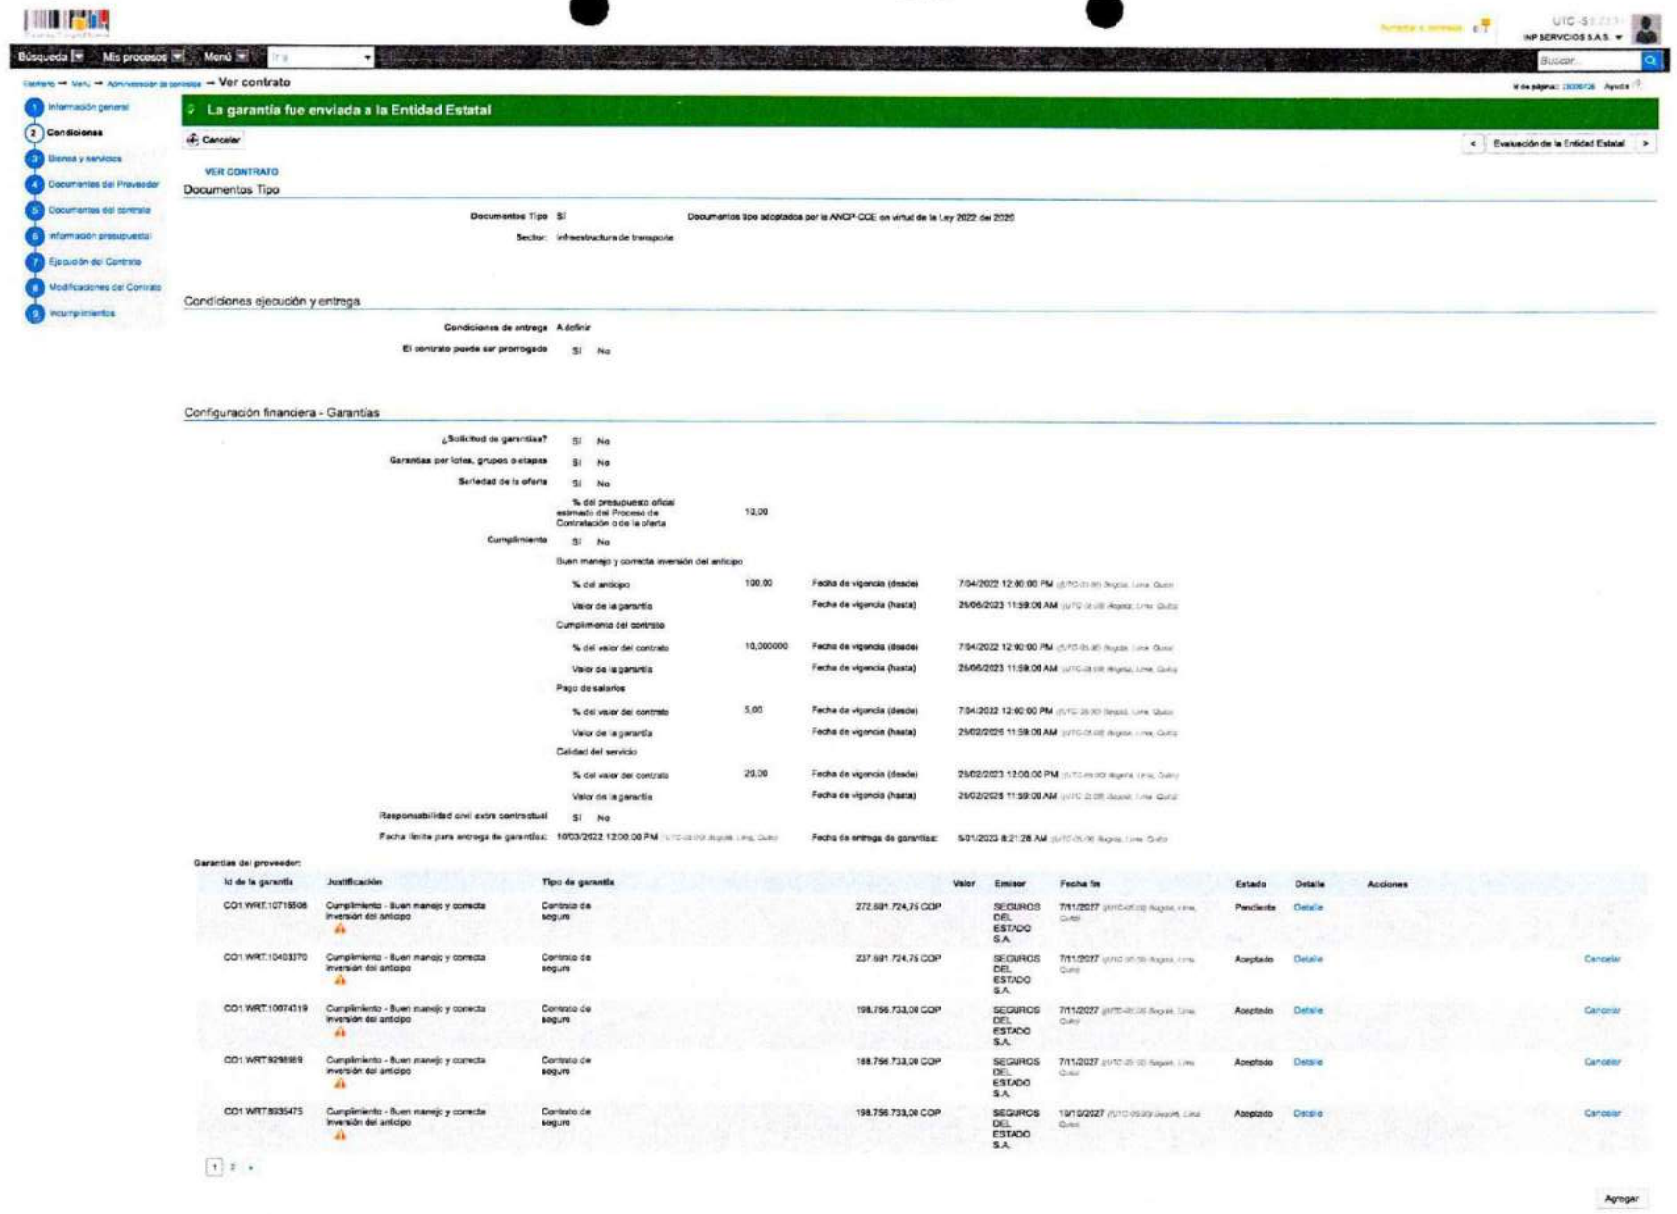
TRANSACCION: 0004367125

TOTAL: $352,941.00

CAJERO: PAGUESTADO

1/4/2023 4:35:32PM

172.16.10.23



Búsqueda | Mis procesos | Menú

Contrato → Ver, → Administrador de contratos → Ver contrato

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. Ejecución del Contrato
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

La garantía fue enviada a la Entidad Estatal

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Documentos Tipo

Documentos Tipo: SI — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector: Infraestructura de transporte

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado: SI No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? SI No

Garantías por lotes, grupos o etapas: SI No

Seriedad de la oferta: SI No

% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10,00

Cumplimiento: SI No

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

% del anticipo: 100,00 — Fecha de vigencia (desde): 7/04/2022 12:00:00 PM — Fecha de vigencia (hasta): 25/06/2023 11:59:00 AM

Valor de la garantía

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato: 10,000000 — Fecha de vigencia (desde): 7/04/2022 12:00:00 PM — Fecha de vigencia (hasta): 25/06/2023 11:59:00 AM

Valor de la garantía

Pago de salarios

% del valor del contrato: 5,00 — Fecha de vigencia (desde): 7/04/2022 12:00:00 PM — Fecha de vigencia (hasta): 25/02/2025 11:59:00 AM

Valor de la garantía

Calidad del servicio

% del valor del contrato: 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 25/02/2023 12:00:00 PM — Fecha de vigencia (hasta): 25/02/2025 11:59:00 AM

Valor de la garantía

Responsabilidad civil extra contractual: SI No

Fecha límite para entrega de garantías: 10/03/2022 12:00:00 PM — Fecha de entrega de garantías: 5/01/2023 8:21:28 AM

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle	Acciones
CO1.WRT.10715506	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	272.691.724,75 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	7/11/2027	Pendiente	Detalle	
CO1.WRT.10403370	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	237.691.724,75 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	7/11/2027	Aceptado	Detalle	Cancelar
CO1.WRT.10074519	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	198.756.733,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	7/11/2027	Aceptado	Detalle	Cancelar
CO1.WRT.9298989	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	198.756.733,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	7/11/2027	Aceptado	Detalle	Cancelar
CO1.WRT.8935475	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	198.756.733,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	19/12/2027	Aceptado	Detalle	Cancelar

1 2 »

Agregar

Configuración financiera - Pago de anticipos

Editar

Definir Plan de Pagos? [redacted]

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Comentarios

Anexos del contrato

	Descripción		
☐	resolución 2022110002094.pdf	Descargar	Detalle
☐	RESOLUCION ADJUDICACION INTERVENTORIA PARCHEO.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones: CRA 5 4-21

Ubicación: CO-CAU-19001 - Popayán

País: COLOMBIA

Departamento: Cauca

Municipio: Popayán

Dirección: CRA 5 4-21

Código postal: 190001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CR 5 # 4-21	COLOMBIA > Cauca > Popayán

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

INP SERVICIOS SAS

Barranquilla, 06 de enero de 2023

CINP–522–152–0087

Señores
EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.
Atte. ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO
Representante Legal.
Dirección: Av. Carrera 24 No 40-69 Of. 303
Bogotá D.C.

REF.: CONTRATO No. 20211800024217 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

Cordial saludo Ingeniero Cárdenas.

Teniendo en cuenta que desde el pasado 12-12-2022, se encuentran suspendidas injustificadamente las obras de intervención en la Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN del Barrio La Paz, **SE REITERA EL REQUERIMIENTO AL CONTRATISTA**, de reiniciar de manera inmediata las obras de rehabilitación de pavimentos en este sector, toda vez, que se debe dar cumplimiento a la totalidad de las obras dentro del plazo contractual vigente 28-02-2023, y se debe culminar esta intervención, para habilitar el servicio de la vía que es requerido para mejorar las condiciones de movilidad, seguridad y bienestar de los habitantes del Barrio La Paz y ciudadanía en general.

De igual forma, se reitera dar atención a las observaciones y solicitudes realizadas por esta interventoría mediante oficios No. CINP–522–134–4928 radicado el pasado 07-12-2022 y No. CINP–522–136–5019 Radicado el 15-12-2022, las cuales se relacionan nuevamente a continuación:

- Respecto a la capa de material de mejoramiento instalada, se hace la observación que el proceso de instalación y compactación no ha sido el adecuado, se evidencian sectores con exceso de humedad, sectores con problemas de acolchonamiento y sectores con presencia de fallos, que requieren de intervención inmediata para realizar las correcciones correspondientes. Se le recuerda al contratista, que la capa de material de mejoramiento será recibida por medio de la toma de densidades, a entera satisfacción por parte de la Interventoría.

- El daño que se presentó en tubería de alcantarillado pluvial, que conduce las aguas de un sumidero a una cámara, y que fue reparado de manera inapropiada, continúa sin corregirse. No se ha enviado personal para que realice la debida reparación.

Calle 77B No.57-103 Of 905
Edificio Green Towers
Contacto: (57) 3205662503
E-mail.: info@inpservicios.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

- La revisión solicitada por la Interventoría, al estado del colector principal del alcantarillado, en el sector donde se hundió una volqueta (día 06-12-2022), para descartar que se haya presentado algún daño sobre el tubo, no ha sido realizada. Sobre este tema, se solicitó una respuesta de manera oficial, la cual no ha sido enviada.

Es importante mencionar, adicionalmente, que en comité de obra realizado el 21-12-2022, la Entidad Contratante solicitó, que una vez se termine la vía que se está interviniendo en el Barrio La Paz (Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN), se dé inicio a la rehabilitación de la Calle 71 Norte entre Carreras 1 y 2 del Barrio Matamoros, para dar cumplimiento a la Sentencia No. 07 de enero 28 del 2022, solicitud que fue reiterada por la Entidad, en comité de obra llevado a cabo el 03-01-2023.

Se le recuerda al Contratista, que el contrato exige la utilización de dos frentes de obra independientes, de acuerdo con lo indicado en la CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, Numeral 24) El Contratista deberá contar con mínimo dos (2) frentes de trabajo al tiempo con personal y maquinaria propios cada uno. De igual forma, se le recuerda al Contratista, que, para la fecha de terminación de las obras, el 28-02-2023, deben estar terminadas al 100%, incluidas las actividades del capítulo VII (señalización y seguridad), que incluye la línea de demarcación con pintura en frio y marca vial con pintura en frio, las cuales no han sido iniciadas y son necesarias para mejorar las condiciones de seguridad vial en los tramos intervenidos, en cuanto a señalización se refiere.

Atentamente,

INP SERVICIOS S.A.S

ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Director de Interventoría

C.C. - Ing. Karina Betancourt Gómez - Secretaria de Infraestructura
- Ing. Luis Fernando Tobar – Supervisor Alcaldía Popayán

Elaboró: PMZ
Aprobó: AMA

Calle 77B No.57-103 Of 905
Edificio Green Towers
Contacto: (57) 3205662503
E-mail.: info@inpservicios.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

INP SERVICIOS SAS

Barranquilla, 10 de enero de 2023

CINP–522–153–0106

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
Atte. Ing. Luis Fernando Tobar Mellizo
Supervisor
luisfernandotobarmellizo@yahoo.com
Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21
Popayán – Cauca

REF.: CONTRATO No 20221800011697 DEL 2022 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

Cordial saludo ingeniero Tobar,

Por medio del presente remitimos para su conocimiento y fines pertinentes el informe semanal de interventoría No 38 correspondiente al periodo del 26 de diciembre de 2022 al 01 de enero de 2023, del contrato de obra No 20211800024217 del 2021 – cuyo objeto es Mantenimiento de la malla vial del municipio en el marco del proyecto "apoyo al programa de infraestructura para la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o conservación vial en el sector urbano del municipio de Popayán 2021"

Atentamente,

INP SERVICIOS S.A.S

ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Director de Interventoría.

Anexo: Lo enunciado en un (1) archivo digital (4) folios

Elaboró: PMZ
Aprobó: AMA

Calle 77B No.57-103 Of 905
Edificio Green Towers
Contacto: (57) 3205662503
E-mail.: info@inpservicios.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

INP SERVICIOS SAS	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA: RECIBIDA [X] ENVIADA [ ]	FP-35-00 (10/05/2013)

TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA
NÚMERO DE CONTRATO:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".
CONTRATISTA:	EDIFICACIONES Y VÍAS S.A
INTERVENTOR:	INP SERVICIOS S.A.S.
SUPERVISOR:	LUIS FERNANDO TOBAR

CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	REFERENCIA /	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
12/12/2022	E-24217-084	SOLICITUD DE RECURSOS ADICIONALES.	EDVIAL S.A.	SECRETARIA INFRAESTRUCTURAS - INP SERVICIOS S.A.S.
16/12/2022	E-24217-085	ENTREGA PREACTA 7	EDVIAL S.A.	INP SERVICIOS S.A.S.
27/12/2022	E-24217-088	SOLICITUD DE RECURSOS ADICIONALES	EDVIAL S.A.	SECRETARIA INFRAESTRUCTURAS - INP SERVICIOS S.A.S.
3/01/2023	E-24217-089	ENTREGA ENSAYOS MDC-19 DICIEMBRE 2022.	EDVIAL S.A.	INP SERVICIOS S.A.S.
5/01/2023	E-24217-090	RESPUESTA DERECHO DE PETICION	EDVIAL S.A.	INP SERVICIOS S.A.S.
6/01/2023	E-24217-091	POLIZAS MODIFICATORIO 4	EDVIAL S.A.	INP SERVICIOS S.A.S.

Firma:

Nombre: ANSELMO MARTINEZ A

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Edivial S.A.
EDIFICACIONES Y VIAS

E-24217-084

Bogotá, D.C., 12 de diciembre de 2022.

Ingeniera:
KARINA BETANCOURT GOMEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN
Ciudad

Señores:
INP SERVICIOS S.A.S
Atte. Ing. Anselmo Martínez Ariza
Gerente de Proyectos
info@inpservicios.com
Calle 77B No. 57 – 103 Edificio Green Towers Of 907
Barranquilla

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 – OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSOS ADICIONALES.

Respetados ingenieros,

De manera atenta y respetuosa nos permitimos elevar ante la entidad contratante y la interventoría del proyecto, la presente petición de solicitud de recursos adicionales con base en los siguientes argumentos:

1.- Dentro de la estructura de la Administración Municipal de la Alcaldía de Popayán se encuentra la Secretaria de Infraestructura, dependencia encargada de diseñar, construir, dotar, poner en funcionamiento y conservar la infraestructura de uso público, edificaciones e instalaciones del municipio de Popayán en los sectores rural y urbano que lo componen. Además, se encarga de proveer la infraestructura física del municipio de Popayán y de controlar la preparación, ejecución y consolidación de las obras públicas que se contraten para su ejecución dentro de la ciudad.

En aras de dar alcance a sus objetivos, la Administración Municipal y la Secretaria de infraestructura cuentan con un plan vial en el que se encuentra inmerso el proyecto **MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO " APOYO AL PROGRAMA DE**

Edivial S.A.
EDIFICACIONES Y VIAS

INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACION VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021", Proyecto que ejecuta actualmente la empresa Edificaciones y Vías S.A. Mediante el contrato de la referencia.

Durante la ejecución del contrato se han intervenido varios sectores abarcando varias comunas del Municipio de las 9 que lo componen, no obstante, el alto deterioro de la malla vial actual no han permitido llegar a todas ellas. Por lo anterior se hace necesario continuar con el mantenimiento de las vías mediante el programa de parcheo y garantizar a los usuarios mejores tiempos de desplazamiento, evitar accidentes y mitigar el deterioro actual de la estructura del pavimento de la zona urbana del Municipio de Popayán. A la fecha se evidencia que con el monto actual del contrato no es posible abarcar todas las comunas del Municipio y que con el objeto y alcance del contrato No. 20211800024217, es posible atender las necesidades de la ciudad de Popayán, para asi incluir las arterias viales más importantes de la ciudad y mejorar sus condiciones de transitabilidad.

En recorrido de obra el 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 de la interventoría del proyecto y la entidad contratante y contratista, se priorizan las siguientes vías para intervención:

1.- CARRERA 5 ENTRE CALLES 2 Y 3

2.- CALLE 2 ENTRE CARRERA 5 Y PUENTE DEL HUMILALDERO)

3.- CALLE 3 ENTRE CARRERA 3 Y 4

4.- CALLE 1 ENTRE CARRERA 2 Y 3

6.- CALLE 1 ENTRE CARRERA 1 Y 2

7.- CARRERA 1ª ENTRE CARRERA 1 Y 2

Con base en lo anterior, muy respetuosamente se eleva la siguiente:

SOLICITUD

1.- Con base en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, bajo el cual la entidad estatal puede acordar con el contratista las modificaciones que resulten necesarias para orientar el cumplimiento de la finalidad del contrato, y las razones anteriormente expuestas, muy respetuosamente se solicita al Municipio de la ciudad de Popayán, y con el aval de la interventoría, proceda a aprobar la solicitud de **RECURSOS ADICIONALES** del contrato No. 20211800024217 DE 2021 **"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"."**, por un valor de **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000.oo)**

Edivial S.A.
EDIFICACIONES Y VIAS

y un término adicional **HASTA EL 15 DE ENERO DE 2022**, contados a partir del vencimiento del plazo contractual actual para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

Cordialmente,

ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO
Gerente
EDIVIAL S.A.
Copia a la Alcaldía

Anexo: Presupuesto para el valor de la adición solicitada y reprogramación de obra.

Edivial S.A.
EDIFICACIONES Y VIAS

E-24217-085

Bogotá, D.C., 16 de diciembre de 2022.

Señores:
INP SERVICIOS S.A.S
Atte. Ing. Anselmo Martínez Ariza
Gerente de Proyectos
info@inpservicios.com
Calle 77B No. 57 – 103 Edificio Green Towers Of 907
Barranquilla

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 – OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"**

ASUNTO: ENTREGA PREACTA 07.

Por medio del presente comunicado, realizamos entrega de la preacta parcial de obra No. 07 correspondiente al mes de diciembre de 2022, lo anterior para su revisión y tramite.

Cordialmente,

ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO
Gerente
EDIVIAL S.A.
Copia a la Alcaldía

Documentos anexos: Archivo en Excel con lo enunciado

Edivial S.A.
EDIFICACIONES Y VIAS

E-24217-088

Bogotá, D.C., 27 de diciembre de 2022.

Ingeniera:
KARINA BETANCOURT GOMEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN
Ciudad

Señores:
INP SERVICIOS S.A.S
Atte. Ing. Anselmo Martínez Ariza
Gerente de Proyectos
info@inpservicios.com
Calle 77B No. 57 – 103 Edificio Green Towers Of 907
Barranquilla

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 – OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSOS ADICIONALES.

Respetados ingenieros,

De manera atenta y respetuosa nos permitimos elevar ante la entidad contratante y la interventoría del proyecto, la presente petición de solicitud de recursos adicionales con base en los siguientes argumentos:

1.- Dentro de la estructura de la Administración Municipal de la Alcaldía de Popayán se encuentra la Secretaria de Infraestructura, dependencia encargada de diseñar, construir, dotar, poner en funcionamiento y conservar la infraestructura de uso público, edificaciones e instalaciones del municipio de Popayán en los sectores rural y urbano que lo componen. Además, se encarga de proveer la infraestructura física del municipio de Popayán y de controlar la preparación, ejecución y consolidación de las obras públicas que se contraten para su ejecución dentro de la ciudad.

Edivial S.A.
EDIFICACIONES Y VIAS

En aras de dar alcance a sus objetivos, la Administración Municipal y la Secretaria de infraestructura cuentan con un plan vial en el que se encuentra inmerso el proyecto **MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO " APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACION VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021",** Proyecto que ejecuta actualmente la empresa Edificaciones y Vías S.A. Mediante el contrato de la referencia.

Durante la ejecución del contrato se han intervenido varios sectores abarcando varias comunas del Municipio de las 9 que lo componen, no obstante, el alto deterioro de la malla vial actual no han permitido llegar a todas ellas. Por lo anterior se hace necesario continuar con el mantenimiento de las vías mediante el programa de parcheo y garantizar a los usuarios mejores tiempos de desplazamiento, evitar accidentes y mitigar el deterioro actual de la estructura del pavimento de la zona urbana del Municipio de Popayán. A la fecha se evidencia que con el monto actual del contrato no es posible abarcar todas las comunas del Municipio y que con el objeto y alcance del contrato No. 20211800024217, es posible atender las necesidades de la ciudad de Popayán, para así incluir las arterias viales más importantes de la ciudad y mejorar sus condiciones de transitabilidad.

En recorrido de obra el 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 de la interventoría del proyecto y la entidad contratante y contratista, se priorizan las siguientes vías para intervención:

1.- CARRERA 5 ENTRE CALLES 2 Y 3

2.- CALLE 2 ENTRE CARRERA 5 Y PUENTE DEL HUMILALDERO)

3.- CALLE 3 ENTRE CARRERA 3 Y 4

4.- CALLE 1 ENTRE CARRERA 2 Y 3

6.- CALLE 1 ENTRE CARRERA 1 Y 2

7.- CARRERA 1ª ENTRE CARRERA 1 Y 2

8.- VÍAS BARRIOS LOS NARANJOS Y LA MARIA

Con base en lo anterior, muy respetuosamente se eleva la siguiente:

SOLICITUD

1.- Con base en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, bajo el cual la entidad estatal puede acordar con el contratista las modificaciones que resulten necesarias para orientar el cumplimiento de la finalidad del contrato, y las razones anteriormente expuestas, muy respetuosamente se solicita al Municipio de la ciudad de Popayán, y con el aval de la interventoría, proceda a aprobar la solicitud de **RECURSOS ADICIONALES_** del contrato No. 20211800024217 DE 2021 **"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO**

Edivial S.A.
EDIFICACIONES Y VIAS

EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".", por un valor de **MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.957.514.538.oo)** y un término adicional **HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2023**, contados a partir del vencimiento del plazo contractual actual para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

Agradezco la atención prestada.
Cordialmente,

ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO
C.C. No. 88.201.334 de Cúcuta (Norte de Santander)
Representante Legal
EDIFICACIONES Y VIAS S.A.

Copia a la Alcaldía

Anexo: Presupuesto para el valor de la adición solicitada y reprogramación de obra.

Edivial S.A.
EDIFICACIONES Y VIAS

E-24217-093

Bogotá, D.C., 11 de enero de 2023.

Ingeniero:
ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Director de interventoría
INP SERVICIOS SAS
Calle 77B No 57 -103 Of. 905
Barranquilla - Colombia

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 – OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"**

ASUNTO: Daño en tapa de redes seca - Barrio la Esmeralda.

Cordial saludo:

En atención a la solicitud realiza el día martes 3 de enero en comité de obra, donde por parte de la interventoría del proyecto, se solicita al contratista realizar una revisión, en una de las áreas de trabajo del barrio la esmeralda, sobre la calle 7A con carrera 19 esquina, donde presuntamente durante las obras de parcheo, se afecta la tapa de redes de telecomunicaciones, situada en dicho lugar. Respecto a ellos se aclaran los siguientes aspectos;

1. Dicho elemento se encontraba en buen estado, previo al inicio de las actividades.
2. Según lo manifiesta el residente de obra y el ingeniero auxiliar, durante y después de las labores constructivas, la tapa estaba en buen estado y en ningún momento presento, afectación alguna.
3. Cabe resaltar que en el sitio se hizo presencia en dos oportunidades, la primera para los últimos días del mes de octubre (30-31) y al finalizar estas jornadas, la interventoría no notifico ningún daño, como es costumbre, antes de retirarse del sector, ya que no se presentó. Entre los días 12 y 13 de diciembre retornamos al sector y la tapa ya presentaba deterioro.
4. Por medio del grupo informativo de WhatsApp "Mantenimiento malla vial "el día 29/11/2022 se envían unas imágenes, donde se evidencia la afectación en la tapa de dicha caja, un mes después de haber culminado las actividades de la primera intervención, lo cual no nos hace responsables de este daño, ya que en el trascurso de los días y por el alto transito vehicular del sector, otro vehículo pudo haberlo causado.

Edivial S.A.
EDIFICACIONES Y VIAS

Es así, como el contratista de obra, manifiesta no es atribuible en daño y por ello no responderá por su reposición.

Agradecemos su atención,

Cordialmente,

ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO
Gerente
EDIVIAL S.A.

Anexo: registro fotográfico

Edivial S.A.
EDIFICACIONES Y VIAS

Registro fotográfico.

<table>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>Tapa en buen estado-jornada 31/11/2022</td><td>Tapa en buen estado-jornada 31/11/2022</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Imágenes un mes despues 29/11/2022</td><td>Imágenes un mes despues 29/11/2022</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Img interventoria 28/12/2022</td><td>Img interventoria 28/12/2022</td></tr>
</table>

Edivial S.A.
EDIFICACIONES Y VIAS

E-24217-089

Bogotá, D.C., 03 de enero de 2023.

Señores:
INP SERVICIOS S.A.S
Atte. Ing. Anselmo Martínez Ariza
Gerente de Proyectos
info@inpservicios.com
Calle 77B No. 57 – 103 Edificio Green Towers Of 907
Barranquilla

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 – OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"**

ASUNTO: Entrega ensayos MDC-19 diciembre 2022.

Por medio del presente comunicado, realizamos entrega de los ensayos de mezcla asfáltica y agregados en frío correspondientes del mes de diciembre de 2022.

Anexo ensayos de mezcla y agregados en frío

Cordialmente,

ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO
Gerente
EDIVIAL S.A.
Copia a la Alcaldía

Documentos anexos: Ensayos de laboratorio (4 archivos comprimidos en un archivo .RAR)

Edivial S.A.
EDIFICACIONES Y VIAS

E-24217-090

Popayán, 05 de enero de 2023.

Señora
GLORIA ANANCEY CORTES CERON
Calle 27N. 4-84 Barrio Yambitará
Tel: 3004817457
E-mail: gcorcer@gmail.com
E.S.D.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 – OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

ASUNTO: RESPUESTA DERECHO DE PETICION RAD: 20221150315592 Y 20221150314692 – GRUPO ATENCION AL CIUDADANO DE LA ALCALDIA DE POPAYAN.

Cordial saludo:

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo, Ley 1755 de 2015 y pertinente desarrollo jurisprudencial sobre la materia, por medio del presente memorial damos respuesta al derecho de petición en interés particular radicado por usted, en el cual plantea las siguientes inquietudes:

1.- solicita la peticionaria el arreglo inmediato del presunto mal trabajo de pavimentación que llevaron a cabo en la calle 27 norte con carrera 4 (última cuadra del barrio villa docente) primer cuadra del barrio Yambitará.

2.- Indica la peticionaria que dejaron desnivel para las viviendas de Yambitará y que ella arreglo con cemento al frente de su vivienda dado que arriba del lote del salón comunal baja toda el agua barro que se queda justo frente a la casa y otras vecinas donde también arreglaron frente a sus viviendas.

3.- Manifiesta que del municipio fueron a arreglar y le dañaron el arreglo que había hecho con cemento indicando que se estanca el agua y que cuando pasan los carros arroja el agua al antejardín puerta y muro del frente.

El derecho de petición es por excelencia una figura que opera frente a autoridades o entidades de carácter Público y frente a particulares, sean personas naturales o jurídicas cuando presten un servicio público o de interés general, se afecte gravemente el interés

colectivo o se afecte gravemente algún derecho fundamental con respecto a aquella, siempre que la persona natural tenga una posición o función dominante ante el peticionario. Ello siempre que el ejercicio del derecho de petición persiga el objetivo de materializar los derechos fundamentales del solicitante.

En este orden de ideas **EDIVIAL S.A.**, en modo alguno en ejercicio de sus funciones ha inobservado derechos fundamentales, ni presta servicios públicos y de ninguna manera ostenta la calidad de autoridad pública, así como tampoco cuenta ni ha contado con delegación de funciones públicas; no obstante y atendiendo lo preceptuado en el artículo 32 y subsiguientes de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), y ley 1755 de 30 de junio de 2015, el derecho de petición contra particulares procede para garantizar derechos fundamentales del peticionario; luego en aras de atender la solicitud presentada le manifestamos y de acuerdo a las evidencias existentes y al análisis realizado acerca de su situación se puede determinar lo siguiente:

1.- En visita de campo llevada a cabo por personal técnico de **EDIVIAL S.A.** y personal de la interventoría **INP SERVICIOS S.A.S.**, de fecha 7 de diciembre de 2022, se evidencia la escorrentía superficial directa correspondiente a la pendiente longitudinal de la vía, siendo normal el flujo de agua en el sector.





Lo anterior obedece a que la pendiente longitudinal de la calle 27 norte con carrera 4 (ultima cuadra del barrio villa docente) primer cuadra del barrio Yambitará, es casi nula, razón por la cual la escorrentía superficial directa corra muy despacio.

Edivial S.A.
EDIFICACIONES Y VIAS

2.- Teniendo en cuenta que el efecto de la escorrentía no obedece a las obras de mantenimiento del sector, sino a la estructura de la calle intervenida, no se identifica la necesidad técnica de corrección de presuntos desniveles.

Por las razones anteriormente expuestas, no es posible acceder a la solicitud contenida en el derecho de petición de la referencia.

De esta manera damos respuesta de manera clara, oportuna y de fondo respecto a las respetuosas peticiones elevadas ante la **ALCALDIA DE POPAYAN – ATENCION AL CIUDADANO**, trasladada a la empresa **EDIVIAL S.A,** mediante comunicado No. CINP-522-131-4795 Rad. 28-11-2022.

Sin otro particular, me suscribo atentamente,

ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO
Gerente
EDIVIAL S.A.

Copia a la Alcaldía

Edivial S.A.
EDIFICACIONES Y VIAS

E-24217-091

Bogotá, D.C., 6 de enero de 2023.

Señores:
INP SERVICIOS S.A.S
Atte. Ing. Anselmo Martínez Ariza
Gerente de Proyectos
Calle 77B No. 57 – 103 Edificio Green Towers Of 907
Barranquilla

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021 – OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"**

ASUNTO: ENTREGA PÓLIZAS ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 4

Por medio del presente comunicado, realizamos entrega de copia de las siguientes pólizas:

- Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 21-44-101372699, Anexos 7 y 8, expedidos por Seguros del Estado S.A.
- Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101179920, Anexo 6, expedida por Seguros del Estado S.A.

Las pólizas originales fueron radicadas el 6 de enero de 2023 en el portal SECOP II, quedando pendiente la aprobación de la entidad, como se observa en la imagen:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle	Acciones
CO1.WRT.10721296	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	5.363.615.213,90 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	28/02/2026	Pendiente	Detalle	
CO1.WRT.10721287	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	5.363.615.213,90 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/12/2025	Pendiente	Detalle	
CO1.WRT.10721675	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	500.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	28/02/2023	Pendiente	Detalle	
CO1.WRT.10353426	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	500.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	5 días de tiempo transcurrido	Caducado	Detalle	

Cordialmente,

ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO
Gerente
EDIVIAL S.A.
Copia a la Alcaldía

Documentos anexos: Anexos de las pólizas en tres (3) documentos.

ANEXO 9
INFORMES SEMANALES

	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	INFORME	35
		FECHA	12/12/2022
		PAGINA	1 de 4

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE POPAYÁN. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — FECHA: 12 / 12 / 2022

Semana Número: 35 — Del: 5 de diciembre de 2022 — Al: 11 de diciembre de 2022

Suspensión No. 1: — Reinicio No. 1:

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 249 DIAS

Nombre del Supervisor: ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,794%	98,605%	Obra Física Ejecutada (%)	5,40%	85,397%
Valor de la Obra programada:	$ 321.188.170,26	$ 8.426.301.125,26	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 53.951.680,00	$ 8.050.880.705,00

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"		OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"	
Contratista:	EDIFICACIONES Y VÍAS S.A	Interventor:	INP SERVICIOS S.A.S.
Contrato No	20211600024217 DE DICIEMBRE DEL 2021	Contrato No.	20221600011697 DE MARZO DEL 2022
Valor Inicial	$ 8.466.769.110,00	Valor Inicial:	$ 496.891.830,00
Valor Final:	$ 10.386.788.922,00	Valor Final:	$ 608.134.665,00
Plazo Inicial:	Seis (6) meses	Plazo Inicial:	Siete (7) meses
Prórroga No. 1	Quince (15) días	Prórroga No. 1	Quince (15) días
Prórroga No. 2	Un (1) Mes		
Adición y Prórroga No. 3	Adición $ 1.899.999.812 y Prórroga 31-12-2022	Adición y Prórroga No. 2	Adición $ 111.242.835 y Prórroga 31-12-2022
Fecha de Iniciación:	7 de abril de 2022	Fecha de Iniciación:	7 de abril de 2022
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2022	Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2022

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ASPECTOS TÉCNICOS: Se desarrollan actividades de obra en la Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN del Barrio La Paz, se termina la instalación del cerramiento perimetral con polisombra, continuan las actividades de excavación (capa), necesarias para la instalación de una estructura de pavimento, que incluye material de mejoramiento, subbase granular y base granular, se procede con la instalación y compactación de la capa de material de mejoramiento. Durante la semana, se presentaron lluvias que afectaron el avance en la instalación del material de mejoramiento, generando exceso de humedad en algunos sectores y fallos localizados. La interventoría solicitó al Contratista, realizar las correcciones pertinentes, toda vez que la capa debe ser recibida previa verificación de las densidades.

ASPECTOS AMBIENTALES: El día lunes 05 de diciembre de 2022, el contratista envía por medio de correo electrónico el Informe N°8 correspondiente al mes de noviembre de 2022.
De igual forma, se llevó a cabo visita en el Barrio La Paz, donde se realizó recorrido con la profesional ambiental, se verificó la instalación de polisombra, cubrimiento de algunos sumideros, señalización vertical preventiva. Se solicitó al contratista realizar el cubrimiento de los sumideros faltantes y la limpieza de estos, se solicitó realizar la instalación de la señal de los pasos peatonales y la dotación de la paleta de pare y siga para el controlador de tráfico.
Se realizó la aprobación del acta PIPMA N°5 (v2) por parte de la interventoría, enviando al correo electrónico al contratista para su conocimiento.
El día Martes 06 de diciembre, se envió el ACTA PIPMA N°5 (v2), al profesional ambiental de la Alcaldía, para su conocimiento y fines pertinentes.
Se radicó en la CRC, el Informe de aprovechamiento forestal y solicitud de cierre del expediente ambiental, por el árbol afectado en el Barrio Ciudad Jardín. Se informa que se está a la espera de respuesta por parte de la corporación.
El día viernes 09 diciembre, se realizó recorrido en el Barrio El Guayabal, verificando la señalización que quedó instalada, como los malletines y la señalización de la maquinaria en el sitio, ya que para la fecha no se estaba realizando actividad de parcheo en el lugar.
En recorrido del Barrio La Paz, el contratista realizó la instalación de los senderos peatonales faltantes y se realizó la verificación del cargado de los voiquetas con material que se lleva a la escombrera autorizada. El contratista informa que adelanta la elaboración del acta PIPMA N°9.

ASPECTOS SOCIALES: Durante la Semana No. 35 del 5 al 11 de Diciembre de 2022, fueron desarrolladas las siguientes actividades: 1. **Programa B1 Divulgación e Información a la Comunidad:** Durante la semana no se llevan a cabo actividades de socialización, debido a que estas, se realizaron en su totalidad en los tramos en intervención.
Las socializaciones se realizaron casa a casa, de forma verbal entregando el volante informativo aprobado por la Entidad contratante en casas de habitación, locales comerciales, restaurantes y cafeterías. 2. **Programa B2 Restitución de Bienes Afectados.** A fin de conocer el estado de los bienes aledaños a las zonas de intervención, la Residente Social del Contratista con el acompañamiento de la Profesional Social de Interventoría, llevó a cabo el levantamiento de actas de vecindad sobre los predios ubicados en la Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN del Barrio La Paz, como parte del proceso previo de inicio de obra. 3. **Programa B3 Atención y Participación Ciudadana:** El Área Social realiza acompañamiento en las labores de rehabilitación de la vía en el Barrio La Paz, manteniendo así contacto permanente y atención personalizada con la comunidad del sector en el cual se esta desarrollando la intervención, con la cual se logra la atención de dudas, inquietudes o peticiones. Se realiza revisión continua del correo electrónico edvsocpiona@gmail.com, en el cual la comunidad puede manifestar sus inquietudes, solicitud de información y demás, a fin de dar una respuesta oportuna y en corto tiempo a las inquietudes que puedan presentarse. Durante la semana correspondiente al presente informe, se llevan a cabo encuentros con los líderes del sector a fin de informar respecto de las actividades desarrolladas hasta el momento, puesto que ellos se encargan de difundir la información a los habitantes del sector mediante los grupos de whatsapp creados para este fin. Se informa que por medio de comunicado No. CINP-522-127 4730 remitido a la Entidad por parte de la interventoría, se emite el concepto solicitado en comunicado de Secretaría de Infraestructura número 20221400487761 referente a daño de domiciliaria en el Sector de José María Obando (predio de la propietaria, Señora Ana Belina Campo Ruiz identificada con cedula de ciudadanía 34.524.665 Numero de Celular 3148950649 y correo electrónico diana-8121@hotmail.com). Una vez recibido el comunicado No. 20221400489571, enviado por la Entidad Contratante a esta Interventoría, cuyo asunto es "Remisión petición 20221150314692 y 20221150315592 - reparación zona encharcamiento Yambitará", procedemos a remitir dicha petición al Contratista para su revisión y corrección correspondiente mediante oficio No. CINP-522-131-4705. El Derecho de Petición fue interpuesto por la Señora GLORIA AMANCEY CORTES CERON residente del barrio Yambitara dirección calle 27 N 4-84. Se encuentra pendiente respuesta por parte del contratista.
4. Programa B4 Mano de Obra: No se ha contratado personal nuevo para la obra.

ASPECTOS SST: Se inspecciona el uso adecuado de los elementos de protección personal a todos los colaboradores en obra.
- Se verifica la señalización fija de acuerdo al PMT en el sector del Barrio la Paz.
- Instalación de pendones peatonales, para informar a la comunidad sobre los pasos transitables en el sector intervenido
- Cierre con polisombra en toda la Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN del Barrio La Paz, para minimizar los posibles riesgos de accidentes y/o incidentes de la comunidad aledaña a la vía
- Se solicita nuevamente al contratista, hacer entrega de impermeables a los trabajadores, debido a que nos encontramos en temporada invernal.
- Hasta el momento no se han presentado accidentes laborales

SEGUIMIENTO A COMITÉS DE OBRA:

Comité de obra 06-12-2022: Se presenta una descripción de zonas intervenidas. Se realiza comité de obra en oficinas de la Secretaría de Infraestructura, que cuenta con asistencia de la Entidad, Contratista e Interventoría. El contratista informa que tuvo personal disponible para hacer documentos contractuales, pero no pudo realizar la actividad por falta de la carpeta de la primera carpeta que es responsabilidad de la Alcaldía. El contratista presentó la programación de la acción, la cual está en revisión de la interventoría. El contratista informa que el derecho de petición del Barrio Yambitará, se encuentra en revisión del área jurídica, es importante tener en cuenta los plazos establecidos por la ley para la atención del derecho de petición. Las obras en la Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN del Barrio La Paz, iniciaron el pasado 05-12-2022. El contratista informa que no ha sido notificado por la Entidad referente a la queja del predio ubicado en el Barrio José María Obando Carrera 23 # 8-09. La Entidad se encuentra en definición de las vías a intervenir en el sector del centro. De acuerdo con solicitud de la Entidad, se realizó intervención en la Calle 8 entre Carreras 18 y 19. Se encuentra pendiente corrección de empozamiento de agua en la Calle 10 entre Calles 2 y 3. Se está trabajando en un solo frente de intervención en el Barrio La Paz, se solicita al contratista reactivar el frente de parcheo. La Entidad autoriza intervenir la Carrera 19 entre Calles 5 y 7. Se realizaran obras en el sector Campamento, Prendiguando, Entrada a Pueblenje, Carlos Primero y sector La María - Los Naranjos. La Entidad remite documentación con líneas a intervenir con demarcación vial suministrada por Secretaría de Tránsito para que se dé inicio a la actividad. Se leen los temas del área social, ambiental y SST, se anexan las actas. Se hace solicitud urgente de reposición de tapa de sumidero en la Calle 69N con Carrera 6 Barrio La Paz para evitar se presente algún tipo de accidente. La interventoría hace observaciones y recomendaciones al contratista sobre las obras en el Barrio La Paz, referentes a cubrir con plástico el material para evitar se sature de agua, correcciones sobre la capa del material de mejoramiento, corrección en arreglo de tubo de sumidero, revisar el estado de colector de alcantarillado, se recomienda inspeccionar prudentemente cámaras y sumideros para minimizar daños en las redes. Se realizaron obras en el Barrio Guayabal y una vía en el Barrio La Esmeralda Calle 8 entre Carrera 18 y 19.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra No. 20211600024217 de diciembre del 2021 y el contrato de interventoría No. 20221600011697 de marzo del 2022, tienen fecha de inicio 7 de abril de 2022. Estado del contrato: En Ejecución. Se presenta un atraso en la ejecución del contrato de 5,40%. De acuerdo con el Modificatorio No. 3 al contrato de obra y Modificatorio No. 2 al contrato de Interventoría, los contratos fueron adicionados en valor y tienen fecha de terminación 31-12-2022. En la presente semana, se realiza intervención de rehabilitación del pavimento en la vía ubicada en la Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN del Barrio La Paz.

5,40%	ATRASO	equivalente a	$	457.905.707

OBSERVACIONES	INTERVENTORÍA
El Área de localización intervenida acumulada a la fecha, corresponde a 85.274 m2. La fecha de terminación de los contratos de obra y de interventoría es 31-12-2022. Durante la semana se presentaron lluvias que afectaron el avance de las obras de excavación e instalación de material de mejoramiento en el Barrio La Paz. En la presente semana, se realizan obras en un solo frente de intervención ubicado en el Barrio La Paz. El frente de obra de parche no se encuentra activo, razón por la cual, la interventoría solicita al contratista en comité de obra del día 06-12-2022, reactivar de manera inmediata este frente de intervención.	Firma: ING. ANSELMO MARTINEZ A. Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ASPECTO TÉCNICO



06-12-2022 Comité de obra. Asiste Entidad, Contratista e Interventoría.



Instalación de cerramiento perimetral con polisombra. Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz



Excavación para instalación de estructura de pavimento. Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz



Control de topografía para excavaciones. Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz



Instalación capa de material de mejoramiento. Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz



Instalación capa de material de mejoramiento. Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ASPECTO TÉCNICO



Instalación y compactación de material de mejoramiento. Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz



Instalación y compactación de material de mejoramiento. Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz



Excavación para instalación de estructura de pavimento, sector final Carrera 6 con Calle 70BN. Barrio La Paz



Instalación y compactación de material de mejoramiento. Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz



Instalación y compactación de material de mejoramiento. Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz



Instalación y compactación de material de mejoramiento. Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	INFORME	35
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA	12/12/2022
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	PAGINA	4 de 4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ASPECTO SOCIAL - SST - AMBIENTAL





Actividad de atención a líderes de la comunidad sector Barrio La Paz. Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN





Señalización peatonal y de aproximancion vial sector Barrio la Paz.
Charlas SST en obra






Verificación limpieza y protección de sumideros. Verificación señalización de obras y pasos peatonales. Verificación PIPMA en los Barrios El Guayabal y La Paz

	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	INFORME	36
		FECHA	19/12/2022
		PAGINA	1 de 5

UNIDAD EJECUTORA:	MUNICIPIO DE POPAYÁN. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA	19	12	2022

Semana Número: 36 Del: 12 de diciembre de 2022 Al: 18 de diciembre de 2022

Suspensión No. 1: Reinicio No. 1:

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 256 DIAS

Nombre del Supervisor: ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,257%	93,953%
Valor de la Obra programada:	$ 336.276.201,38	$ 9.758.571.327,14

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	5,935%	91,234%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 616.447.647,30	9.476.328.352,00

CONTRATO DE OBRA:

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

Contratista:	EDIFICACIONES Y VÍAS S.A
Contrato No	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021
Valor Inicial:	$ 8.496.789.110,00
Valor Final:	$ 10.396.788.922,00
Plazo inicial:	Seis (6) meses
Prórroga No. 1	Quince (15) días
Prórroga No. 2	Un (1) Mes
Adición y Prórroga No. 3	Adición $ 1.899.999.812 y Prórroga 31-12-2022
Fecha de Iniciación:	7 de abril de 2022
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

Interventor:	INP SERVICIOS S.A.S.
Contrato No.	20221800011697 DE MARZO DEL 2022
Valor Inicial:	$ 496.691.830,00
Valor Final:	$ 628.134.665,00
Plazo inicial:	Siete (7) meses
Prórroga No. 1	Quince (15) días
Adición y Prórroga No. 2	Adición $ 111.242.835 y Prórroga 31-12-2022
Fecha de Iniciación:	7 de abril de 2022
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2022

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ASPECTOS TÉCNICOS: Durante la presente semana, se realizan obras de intervención en el Barrio El Guayabal, por medio del fresado de carpeta asfáltica en mal estado, imprimación, e instalación de mezcla asfáltica MDC-19 en la Carrera 21 entre Calles 7 y 8 (extremo hasta la Calle 7), y en la Carrera 20B entre Calles 7A y 8, en el tramo de la Calle 8 entre Carreras 21 y 21 A, se termina un sector faltante por medio de la instalación de la carpeta asfáltica. De igual forma, se ejecutan obras en el Barrio La Esmeralda en la Calle 7 entre Carreras 22 y 18, en donde se intervienen sectores que presentan deterioro en su capa de rodadura, por medio del reemplazo de la misma con mezcla asfáltica MDC-19. Posteriormente, se interviene el tramo de la Carrera 19 entre Calles 6 y 7, en donde se realiza el reemplazo total de la carpeta asfáltica de rodadura, por encontrarse en malas de condiciones. Se realiza la priorización de vías en el Barrio El Retiro, específicamente en la Carrera 22 entre Calles 10 y 11, y en la Carrera 23 entre Calles 9 y 10A, las cuales presentan un avanzado deterioro de su capa de rodadura, con presencia de baches de gran tamaño y pérdida sectorizada de la carpeta asfáltica. En la primera, se realiza el fresado de carpeta asfáltica en mal estado, imprimación, e instalación de mezcla asfáltica MDC-19 en su totalidad, en la Carrera 23, se interviene de igual forma entre las Calles 10 y 10A, el tramo entre Calles 9 y 10, se interviene hasta el momento con el fresado de carpeta asfáltica existente. En otro tramo, Calle 10 entre Carrera 22 y 23, se realiza reemplazo de la carpeta de rodadura en mezcla asfáltica MDC-19.

ASPECTOS AMBIENTALES: El día lunes 12 de diciembre de 2022 por medio de correo electrónico, se realizó aprobación del Acta PIPMA N°5 por parte del Profesional ambiental de la Alcaldía.
El día martes 13 de diciembre se realizó recorrido de obra con la profesional ambiental del contratista en el Barrio José María Obando, el sector escuela la policía y guayabal, donde se realizaron observaciones sobre residuos de obra y manchado de antejardines, el contratista para el mismo día dispuso de una cuadrilla y el lunes para recolección y limpieza de las vías habilitadas.
El día jueves se realizó requerimiento en el barrio el retiro bajo, sobre limpieza y selección de punto ecológico, el contratista realizó la recolección de material y dispuso a personal BOAL a realizar selección de residuos.
El día viernes 16 de diciembre, se entregó el informe del mes de noviembre 2022, por parte de la interventoría a la entidad. De igual forma, se realizó recorrido en el sector La Paz para verificar señales, pasos peatonales y cerramiento de la obra, debido a que que el sector presenta alto flujo de habitantes y comercio.
El día sábado 17 de diciembre, se envió requerimiento por residuos de la obra en andenes del barrio retiro bajo, el contratista realizó la limpieza el día lunes 19 diciembre.
El contratista informa que aceleran la elaboración del acta PIPMA N°6.

ASPECTOS SOCIALES: Durante la Semana No. 36 del 12 al 18 de Diciembre de 2022 en cuanto al componente social, fueron desarrolladas las siguientes actividades: **1. Programa B1 Divulgación e Información a la Comunidad:** Socializaciones sectores El Guayabal, Esmeralda y Retiro Bajo, se realizan casa a casa, entregando el volante informativo acordado por la Entidad Contratante en casas de habitación, locales comerciales, restaurantes y cafeterías. De igual forma, el Componente Social realiza gestión con la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía, a fin de que sean divulgadas por las redes sociales, los sectores de cierre de vías por intervención de obras. **2. Programa B2 Restitución de Bienes Afectados.** Se realiza registro fotográfico en los sectores a intervenir, teniendo en cuenta sumideros, tapas de alcantarillas, andenes y fachadas. **3. Programa B3 Atención y Participación Ciudadana:** El Área Social realiza acompañamiento en las labores de parcheo en el sector de La Esmeralda, manteniendo contacto permanente y atención personalizada con la comunidad del sector en el cual se está desarrollando la intervención, con lo cual se logra la aclaración de dudas, inquietudes o peticiones. Se realiza revisión continua del correo electrónico edvisppima@gmail.com, en el cual la comunidad puede manifestar sus inquietudes, solicitar de información y demás, a fin de dar una respuesta oportuna y en corto tiempo a las inquietudes que puedan presentarse. Por medio de comunicado No. CINP–522–127-4230 remitido a la Entidad por parte de la interventoría, se emitió el concepto solicitado en comunicado de la Secretaría de Infraestructura número 20221400487781, referente a daño de domiciliario en el Sector de José María Obando igualo de la propietaria, Señora Ana Belisa Campo Ruiz identificada con cedula de ciudadanía 34.524.865 Número de Celular 3148938548 y correo electrónico dana-8171@hotmail.com), se encuentra pendiente la notificación de la Entidad al Contratista, informando su decisión al respecto. Por medio de oficio No. CINP–522–131-4795, la Interventoría remitió el derecho de petición que fue interpuesto por la Señora GLORIA ANANCEY CORTES CERON habitante del barrio Yambitara dirección calle 27 N 4-84, enviado por la Entidad Contratante a esta Interventoría mediante comunicación No. 20221400468571, cuyo asunto es "Remisión petición 20221150314582 y 20221150315582 – reparación zona enchevamiento Yambitará". Se encuentra pendiente respuesta por parte del contratista. En Comité de obra realizado el día martes 13-12-2022, se le recuerda al contratista que se debe dar cumplimiento al tiempo estipulado por ley para la emisión de la correspondiente respuesta, a lo que el contratista refiere que el tema se encuentra en manos de la Jurídica de la empresa.
4. Programa B4 Mano de Obra: No se ha contratado personal nuevo para la obra.

ASPECTOS SST: - Se verifica el uso adecuado de los elementos de protección personal a todos los colaboradores en obra y de esta manera evitar enfermedades y accidentes laborales.
- Se inspecciona la señalización que se encuentre instalada de acuerdo al PMT en el sector del Barrio La Esmeralda y Retiro Bajo.
- Se evidencia que la volqueta SHN – 946, no cuenta pito de reversa, le cual podría generar un accidente y/o incidente realizando sus labores cotidianas de transporte de RCD. Por tal razón, se solicitó al contratista proceder de manera inmediata con la instalación de este pito de reversa.
- Hasta el momento no se han presentado accidentes laborales.

SEGUIMIENTO A COMITÉS DE OBRA:

Comité de obra 13-12-2022. Se presenta una descripción de temas tratados: Se realiza comité en el sector de intervención de las obras del Barrio La Esmeralda, que cuenta con asistencia de la Entidad, Contratista e Interventoría. Se debe agilizar la presentación de las actas de obra en el mes de Diciembre. La Entidad se compromete para el próximo comité de obra del día 20-12-2022, a entregar el radicado de pavimentos de la vía Carrera 6 entre Calles 69N y 70N del Barrio La Paz. Se realizaron obras en el Barrio La Paz, excavaciones y material de mejoramiento, se hace la observación al contratista, que esta capa presenta exceso de humedad y en sectores acolchonamiento y fallos, se debe hacer correcciones para resolución de densidades y tener en cuenta los tiempos y fecha de terminación del contrato. Se le recuerda al Contratista, que se deben tener dos frentes de obra independientes simultáneos. Se solicita al contratista corregir arreglo de un tubo de sumidero de 8", el cual no es aceptado por la interventoría, el contratista informa que el arreglo es provisional. El día de mañana 14-12-2022 la Entidad entregará municipare con las vías a intervenir en el centro histórico de la ciudad. Con corte a 11-12-2022, % programado 80,78 ($ 9.420.301.126), % ejecutado 85,30 ($ 8.859.860.705), atraso 5,4%. Se leen los temas del área social, ambiental y SST, se anexan las actas correspondientes. Se solicita al contratista agilizar la respuesta al derecho de petición del Barrio Yambitará, teniendo en cuenta que la Entidad debe dar respuesta de igual forma.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra No. 20211800024217 de diciembre del 2021 y el contrato de interventoría No. 20221800011697 de marzo del 2022, tienen fecha de inicio 7 de abril de 2022. Estado del contrato: En Ejecución. Se presenta un atraso en la ejecución del contrato de 2,72%. De acuerdo con el Modificatorio No. 3 al contrato de obra y Modificatorio No. 2 al contrato de interventoría, los contratos fueron adicionados en valor y tienen fecha de terminación 31-12-2022. En la presente semana, se realizaron intervenciones de instalación de mezcla asfáltica en los Barrios Guayabal, La Esmeralda y Retiro Bajo.

2,72%	ATRASO	equivalente a	$	230.613.775

OBSERVACIONES

El área de localización Intervenida acumulada a la fecha, corresponde a 95.625 m2. La fecha de terminación de los contratos de obra y de interventoría es 31-12-2022. En la presente semana, se realizan obras de instalación de carpeta asfáltica MDC-19 en los Barrios Guayabal, La Esmeralda y Retiro Bajo con el frente de intervención de parcheo. Por medio de comunicado No. CINP–522–136–5018, remitido al contratista por parte de la interventoría, se solicita realizar correcciones en la capa de mejoramiento instalada en la Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN del Barrio La Paz, y el inicio de las actividades de obra en este sector, toda vez, que no se realizaron actividades en esta semana.

INTERVENTORÍA

Firma:

ING. ANSELMO MARTINEZ A.
Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ASPECTO TÉCNICO



13-12-2022 Comité de obra sector La Esmeralda. Asiste Entidad, Contratista e Interventoría.



Instalación de mezcla asfáltica MDC-19 en la Carrera 21 entre Calles 7 y 8. Barrio Guayabal



Instalación de carpeta asfáltica MDC-19. Calle 7 entre Carreras 21 y 22



Instalación de carpeta asfáltica MDC-19. Calle 7 entre Carreras 20 y 21



Instalación de carpeta asfáltica MDC-19. Calle 7 entre Carreras 19 y 20. Barrio La Esmeralda



Reemplazo de carpeta asfáltica MDC-19. Intersección Calle 7 con Carrera 19. Barrio La Esmeralda

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ASPECTO TÉCNICO



Instalación de carpeta asfáltica MDC-19. Carrera 19 entre Calles 6 y 7. Barrio La Esmeralda



Instalación de carpeta asfáltica MDC-19. Carrera 19 entre Calles 6 y 7. Barrio La Esmeralda



Reemplazo de carpeta asfáltica MDC-19. Carrera 20B entre Calles 7A y 8. Barrio Guayabal



Instalación de mezcla asfáltica MDC-19 en la intersección de la Calle 11 con Carrera 22. Barrio El Retiro



Estado inicial pavimento totalmente deteriorado. Carrera 22 entre Calles 10 y 11. Barrio Retiro Bajo



Vía intervenida con instalación de mezcla asfáltica. Carrera 22 entre Calles 10 y 11. Barrio Retiro Bajo

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ASPECTO TÉCNICO



Estado inicial pavimento con presencia de baches. Carrera 22 entre Calles 10 y 11. Barrio Retiro Bajo



Vía intervenida con instalación de mezcla asfáltica. Carrera 22 entre Calles 10 y 11. Barrio Retiro Bajo



Estado inicial pavimento con presencia de baches. Carrera 22 entre Calles 10 y 11. Barrio Retiro Bajo



Vía intervenida con instalación de mezcla asfáltica. Carrera 22 entre Calles 10 y 11. Barrio Retiro Bajo



Instalación de mezcla asfáltica MDC-19 en la Calle 10 entre Carreras 21 y 22. Barrio Retiro Bajo



Instalación de mezcla asfáltica. Carrera 23 entre Calles 10 y 10A. Barrio Retiro Bajo

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ASPECTO SOCIAL - SST - AMBIENTAL



Atención a la comunidad y visita de obra en el Barrio La Esmeralda.
Actividad de socialización de obras Sector Retiro Bajo.



Señalización de aproximanción vial. Reunión equipo PIPMA
Uso adecua de EPPs



Verificación de señalización y cierre Barrio La Paz. Verificación carpado de volquetas. Requerimiento al contratista para limpieza en zonas intervenidas. Verificación PIPMA Barrio La Esmeralda

	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	INFORME	37
		FECHA	26/12/2022
		PAGINA	1 de 4

UNIDAD EJECUTORA:	MUNICIPIO DE POPAYÁN. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA	26	12	2022

Semana Numero: 37 Del: 19 de diciembre de 2022 Al: 25 de diciembre de 2022

Suspensión No. 1: Reinicio No. 1:

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 263 DIAS

Nombre del Supervisor: ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,257%	97,206%
Valor de la Obra programada:	$ 336.270.261,96	$ 10.096.941.629,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,034%	93,172%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 201.257.754,00	$ 9.677.586.106,00

CONTRATO DE OBRA:

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

Contratista:	EDIFICACIONES Y VÍAS S.A
Contrato No	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021
Valor inicial:	$ 9.466.789.116,00
Valor Final:	$ 10.386.789.022,00
Plazo Inicial:	Seis (6) meses
Prórroga No. 1	Quince (15) días
Prórroga No. 2	Un (1) Mes
Adición y Prórroga No. 3	Adición $ 1.899.999.812 y Prórroga 31-12-2022
Fecha de Iniciación:	7 de abril de 2022
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

Interventor:	INP SERVICIOS S.A.S.
Contrato No.	20221800011097 DE MARZO DEL 2022
Valor Inicial:	$ 496.891.830,00
Valor Final:	$ 608.134.665,00
Plazo Inicial:	Siete (7) meses
Prórroga No. 1	Quince (15) días
Adición y Prórroga No. 2	Adición $ 111.242.835 y Prórroga 31-12-2022
Fecha de Iniciación:	7 de abril de 2022
Fecha de Vencimiento	31 de diciembre de 2022

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ASPECTOS TÉCNICOS: En la presente semana, se termina la intervención en el Barrio El Retiro Bajo, por medio de la instalación de carpeta asfáltica MDC-19 en el tramo de la Carrera 2D entre Calles 9 y 10, que se había fresado e imprimado previamente la semana anterior. Posteriormente, las obras se dirigen al Sector Centro de la ciudad de Popayán, realizando el fresado de carpeta asfáltica deteriorada, imprimación e instalación de mezcla asfáltica en caliente en la Calle 6 entre Carreras 4 y 5 que presentaba un elevado deterioro por reposición de redes de alcantarillado, en la Carrera 5 entre Calles 6 y 7, en la Carrera 5 entre Calles 5 y 6, y finalmente, en el Carrera 5 entre Calles 4 y 5.

ASPECTOS AMBIENTALES: De acuerdo a requerimiento dado el día sábado17-12-2022 en recorrido, sobre residuos de la obra en andenes del barrio retiro bajo, el contratista realizó la limpieza el día lunes 19 diciembre 2022

El día lunes 19 de diciembre de 2022, se entregó por parte del contratista para revisión de Interventoría, el acta PIPMA N°6 correspondiente al mes de noviembre de 2022.

El día martes 20 de diciembre se envió por parte de interventoría el contratista, observaciones al acta PIPMA N°6 correspondiente al mes de noviembre de 2022.

Se realizó recorrido con la profesional ambiental en la zona centro para la verificación de la obra en el tema PIPMA, donde se evidenció la falta de cultura ciudadana, teniendo en cuenta que, a pesar de estar las máquinas y el cierre preventivo de la obra, algunos habitantes o comerciantes formales e informales se atraviesan e ingresan sin importar el riesgo.

El día miércoles 21-12-2022, se realizó requerimiento en el barrio centro, sobre limpieza y selección de punto ecológico, el contratista realizó la recolección de material y dispuso a un personal BOAL a realizar selección de residuos.

El día viernes 23 de diciembre de 2022, se realizó capacitación PIPMA a todo el personal de obra.

El contratista informa que adelanta la elaboración del informe PIPMA del mes de diciembre 2022.

ASPECTOS SOCIALES: Durante la Semana No. 37 del 19 al 25 de Diciembre de 2022 en cuanto al componente social, fueron desarrolladas las siguientes actividades: 1. **Programa B1 Divulgación e Información a la Comunidad:** Socializadores en el sector Centro Calle 6 entre Carreras 4 y 5. Carreras 4 y 5. Carrera 5 entre calle 4 y 6, y Barrio Pandiguando, se realizan casa a casa, entregando el volante informativo aprobado por la Entidad Contratante en casas de habitación, locales comerciales, restaurantes y cafeterías. **Programa B2 Restitución de Bienes Afectados:** Se realiza registro fotográfico en los sectores a intervenir, teniendo en cuenta sumideros, tapas de alcantarillas, andenes y fachadas Centro y Pandiguando. **3. Programa B3 Atención y Participación Ciudadana:** El Área Social realiza acompañamiento en las labores de parcheo, manteniendo así contacto permanente y atención personalizada con la comunidad del sector en el cual se esta desarrollando la intervención, sectores Centro y Barrio Pandiguando, con lo cual se logra la atención de dudas, inquietudes o peticiones.Se realiza revisión continua del correo electrónico edvisapipma@gmail.com, en el cual la comunidad puede manifestar sus inquietudes, solicitud de información y demás, a fin de dar una respuesta oportuna y en corto tiempo. - Por medio de comunicado No. CNP- 522 127 4730 remitido a la Entidad por parte de la Interventoría, se emitió el concepto solicitado en comunicado de la Secretaria de Infraestructura número 20221400487781, referente a daño de domiciliaria en el Sector de José María Obando (queja de la propietaria, Señora Ana Belisa Campo Ruiz identificada con cedula de ciudadanía 34 534 665 Numero de Celular 3148958549 y correo electrónico diana.8171@hotmail.com), se encuentra pendiente la notificación de la Entidad al Contratista, informando su decisión al respecto. - Por medio de oficio No. CNP-522-131-4795, la Interventoría remitió el derecho de petición que fue interpuesto por la Señora GLORIA ANANCEY CORTES CERON habitante del barrio Yambitará dirección calle 27 N 4-84, enviado por la Entidad Contratante a esta Interventoría mediante comunicado No. 20221400486571, cuyo asunto es "Remisión petición 20221150314692 y 20221150315092 - reparación zona enchanelamiento Yambitará". Se encuentra pendiente respuesta por parte del contratista. En Comité de obra realizado el día martes 21-12-2022, se le recuerda al contratista que se debe dar cumplimiento al tiempo estipulado por ley para la emisión de la correspondiente respuesta. Se reciben por parte del Contratista actas de vecindad de inicio del Barrio La Paz, las cuales serán remitidas por el Área social de Interventoría para posterior firma del Residente Técnico de Interventoría. 4. **Programa B4 Mano de Obra:** Durante la presente semana el contratista reporta ingreso de dos trabajadores al frente de obra.

ASPECTOS SST: -Se verifica la instalación de señalización en la zona intervenida del centro de la ciudad, debido a que es un sector demasiado concurrido por la comunidad y tráfico vehicular.

-El contratista hace entrega de impermeables a todos sus colaboradores, ya que el invierno es una de las estaciones del año más complicadas para los trabajadores que desarrollan su actividad laboral al aire libre y con estos elementos pueden minimizar las enfermedades laborales.

- De acuerdo a que el contratista debe garantizar la seguridad en la obra, donde incluya el personal que realiza labores constructivas, automotores y peatones que transiten por los diferentes sectores intervenidos, se deben tomar los respectivos controles donde se evalúa los riesgos laborales y analizar si los controles con los que cuentan, son o no los pertinentes. En caso de que no sea así, será necesario definir nuevos controles o bien mejorar los existentes y de esta manera evitar que sucedan posibles accidentes y/o accidentes en la jornada laboral.

- Hasta el momento no se han presentado accidentes laborales.

SEGUIMIENTO A COMITES DE OBRA:

Comité de obra 13-12-2022: Se presenta una descripción de los temas tratados: Se realiza comité en oficinas de la Secretaría de Infraestructura, que cuenta con asistencia de la Entidad, Contratista e Interventoría. Se hace la recomendación a la Entidad, de informar con suficiente antelaridad sobre cambio de la rutas que se van a intervenir, para evitar se generen inconvenientes con la comunidad por las socializaciones realizadas, logística en el movimiento de maquinaria y tramos que puedan quedar sin intervención. Se solicita al contratista con carácter urgente, dar atención al derecho de petición de la Sra. Gloria Anancey Cortés del Barrio Yambitará, se debe cumplir con los plazos que estipula la Ley. Respecto a la solicitud de revisión de apozamiento en la Calle 10 entre Carrera 2 y 3, el contratista manifiesta que la solución es hacer un sumidero, la interventoría solicita dar respuesta por escrito sustentando técnicamente la solución propuesta; la Entidad solicita celeridad para solucionar el problema, so pena de solicitar aplicación de póliza de responsabilidad civil en el evento que la propietaria de predio vecino afectado decida hacer efectiva una demanda que ha manifestado verbalmente. Teniendo en cuenta los trabajos en el sector centro con mucho flujo de peatones, se solicita al contratista tomar todas las precauciones que sean necesarias para evitar cualquier tipo de accidente. La Interventoría solicitó al Contratista el reinicio inmediato de las obras en el sector de La Paz Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN y realizar las correcciones solicitadas en cajas de mejoramiento y tubería de sumidero. La Entidad solicita que una vez se terminen las obras en la Paz, se de inicio a la rehabilitación de la Calle 71 Norte entre Cra. 1 y 2 del Barrio Mallamoras en cumplimiento de la sentencia No. 07 de Enero 28 del 2022. Se solicita con carácter urgente al contratista remitir los documentos firmados de la solicitud de adición de 500 millones. La Entidad autorizó intervención en la Carrera 5 Sector del Centro, previa consulta con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán. Corte de obra 13-12-2022: % programado 93,96 ($ 9.758.571.327), % ejecutado 91,23 ($ 9.476.328.352). La Entidad informa que se entregará el Rediseño de la vía de La Paz, la próxima semana.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra No. 20211800024217 de diciembre del 2021 y el contrato de interventoría No. 20221800011697 de marzo del 2022, tienen fecha de inicio 7 de abril de 2022. Estado del contrato: En Ejecución. Se presenta un atraso en la ejecución del contrato de 4,04%. De acuerdo con el Modificatorio No. 3 al contrato de obra y Modificatorio No. 2 al contrato de interventoría, los contratos fueron adicionados en valor y tienen fecha de terminación 31-12-2022. El contratista se encuentra realizando la solicitud de adición por 500 millones de pesos. La Entidad previamente informó, que cuenta con estos recursos para adicionar el contrato de obra, teniendo en cuenta el mal estado en que se encuentran muchas vías de la ciudad ubicadas en las nueve comunas, y que requieren Intervención

4,04%	ATRASO	equivalente a	$	342.583.268

OBSERVACIONES

El área de localización intervenida acumulada a la fecha, corresponde a 96.926 m2. La fecha de terminación de los contratos de obra y de interventoría es 31-12-2022. En la presente semana, se realizan obras de instalación de carpeta asfáltica MDC-19 en los Barrios Retiro Bajo y Sector Centro. En comité de obra realizado el día 21-12-2022, la interventoría solicitó al Contratista el reinicio inmediato de las obras en el sector de La Paz Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN y realizar las correcciones solicitadas en la cajas de mejoramiento y tubería de sumidero. Se le recuerda que debe tener dos frentes de obra activos independientes

INTERVENTORÍA

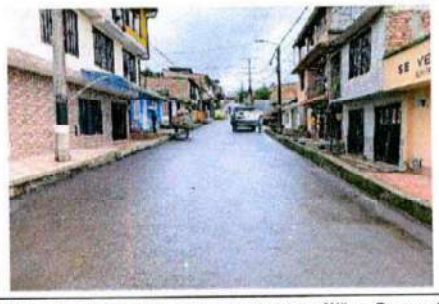
Firma:

ING. ANSELMO MARTINEZ H.

Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO


ASPECTO TÉCNICO




Vía terminada con instalación de mezcla asfáltica. Carrera 22 entre Calles 10 y 11. Barrio Retiro Bajo



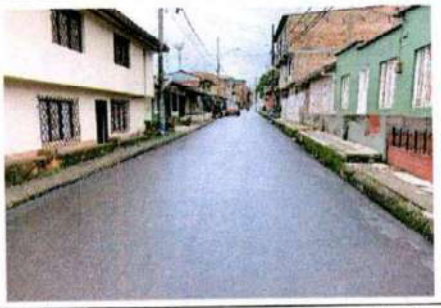Vía intervenida con instalación de mezcla asfáltica. Carrera 23 entre Calles 9 y 10. Barrio Retiro Bajo



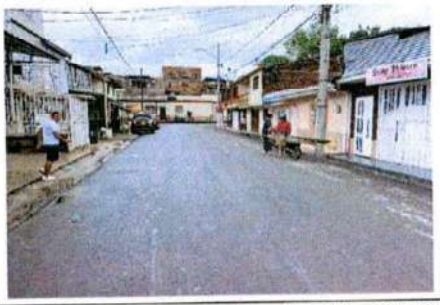Instalación de carpeta asfáltica MDC-19. Carrera 23 entre Calles 10 y 10A. Barrio Retiro Bajo



Vía intervenida con instalación de mezcla asfáltica. Calle 10 entre Carreras 22 y 23. Barrio Retiro Bajo



Vía con deterioro de capa de rodadura por instalación de redes de alcantarillado. Calle 6 entre Carreras 4 y 5



Vía intervenida con carpeta asfáltica MDC-19. Calle 6 entre Carreras 4 y 5. Sector Centro

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	INFORME	37
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA	26/12/2022
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	PAGINA	3 de 4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ASPECTO TÉCNICO



Instalación de carpeta asfáltica MDC-19. Carrera 5 entre Calles 6 y 7. Barrio Centro



Instalación de carpeta asfáltica MDC-19. Carrera 5 entre Calles 6 y 7. Barrio Centro



Actividades de fresado e imprimación. Carrera 5 entre Calles 5 y 6. Barrio Centro



Instalación de carpeta asfáltica MDC-19. Carrera 5 entre Calles 5 y 6. Barrio Centro



Instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19. Carrera 5 entre Calles 4 y 5. Barrio Centro



Instalación de carpeta asfáltica MDC-19. Carrera 5 entre Calles 4 y 5. Barrio Centro

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ASPECTO SOCIAL - SST - AMBIENTAL



Atención a la comunidad y actividades de socialización de obras en el Sector Centro de la ciudad



Señalización de aproximanción vial
Entrega de Impermeables a todo el personal de obra y uso adecuado de EPPs



Verificación de limpieza por requerimiento en Barrio Retiro Bajo. Capacitación PIPMA a personal de obra. Verificación PIPMA, limpieza de obra

	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA**	INFORME	38
		FECHA	26/12/2022
		PAGINA	1 de 4

UNIDAD EJECUTORA:	MUNICIPIO DE POPAYÁN, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA	2	1	2023

Semana Número: 38 Del: 26 de diciembre de 2022 Al 1 de enero de 2023

Suspensión No. 1: Reinicio No. 1:

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 270 DIAS

Nombre del Supervisor: ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,274%	82,348%
Valor de la Obra programada:	$ 33.912.375,45	$ 10.063.329.153,58

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,023%	82,012%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 345.036.609,03	10.022.624.805,00

CONTRATO DE OBRA:

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

Contratista:	EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.
Contrato No.	20211809024217 DE DICIEMBRE DEL 2021
Valor Inicial:	$ 8.486.769.110,00
Valor Final:	$ 12.220.867.913,00
Plazo inicial:	Seis (6) meses
Prórroga No. 1	Quince (15) días
Prórroga No. 2	Un (1) Mes
Adición y Prórroga No. 3	Adición $ 1.899.999.612 y Prórroga 31-12-2022
Adición y Prórroga No. 4	Adición $ 1.834.098.651 y Prórroga 28-02-2023
Fecha de Iniciación:	7 de abril de 2022
Fecha de Vencimiento:	28 de febrero de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

Interventor:	INP SERVICIOS S.A.S.
Contrato No.	20221809011697 DE MARZO DEL 2022
Valor Inicial:	$ 406.901.630,00
Valor Final:	$ 708.134.665,00
Plazo inicial:	Siete (7) meses
Prórroga No. 1	Quince (15) días
Adición y Prórroga No. 2	Adición $ 111.342.835 y Prórroga 31-12-2022
Adición y Prórroga No. 3	Adición $ 100.000.000 y Prórroga 28-02-2023
Fecha de Iniciación:	7 de abril de 2022
Fecha de Vencimiento:	28 de febrero de 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ASPECTOS TÉCNICOS: En la semana correspondiente al presente informe, se realizan actividades de obra en el Barrio Pandiguando, específicamente en la Calle 3 entre Carreras 17 (autopista) y Carrera 21, realizando el fresado de carpeta asfáltica que se encuentra deteriorada, imprimación e instalación de mezcla asfáltica MDC-19 como capa de rodadura. Se realiza la instalación de la carpeta de rodadura en mezcla asfáltica sobre el puente de la Carrera 6 sobre el Río Cauca.

ASPECTOS AMBIENTALES: El día lunes 26 de diciembre, se realizó visita en el Barrio La Esmeralda, por solicitud de la comunidad, para verificación de posibles escombros dejados por el proyecto de mantenimiento vial, el visitar la vivienda con la profesional ambiental del contratista, se constató que los escombros hacen parte de un antejardín y no del proyecto.
En recorrido en el Barrio Pandiguando, se realizó verificación de cargado de las volquetas, se solicitó al contratista realizar limpieza de escombros grandes dispuestos en antejardines. De igual forma, se realizó verificación y firma de formatos ambientales PPMA, para informe del contratista.
El día martes 27-12-2022, se realizó la revisión, aprobación y firma de los formatos mensuales del mes de diciembre, referentes al componente ambiental PPMA, para anexar el informe N°9.
El día miércoles, se realizó recorrido de obra en el Barrio El Guayabal, donde se evidenció material del fresado y pavimento en algunos antejardines, lo cual se informó al contratista. El contratista subsanó de acuerdo a lo requerido en el mismo día.
El contratista informa que adelanta la elaboración del informe PPMA del mes de diciembre 2022, el cual debe ser entregado la primera semana de enero de 2023.

ASPECTOS SOCIALES: Durante la Semana No. 38 del 26 de Diciembre de 2022 al 1 de Enero de 2023 en cuanto al componente social, fueron desarrolladas las siguientes actividades: 1. Programa B1 Divulgación e Información a la Comunidad: Socializaciones sector Pandiguando, se realizan casa a casa, entregando el volante informativo aprobado por la Entidad Contratante en casas de habitación, locales comerciales y carteleras. Programa B2 Restitución de Bienes Afectados: Se realiza registro fotográfico en el sector de Pandiguando, tomando en cuenta numeración, tapas de alcantarillas, andenes y fachadas. 3. Programa B3 Atención y Participación Ciudadana: El Área Social realiza acompañamiento en las labores de parcheo, mantenimiento del contacto permanente y atención personalizada con la comunidad del sector en el cual se esta desarrollando la intervencion en el Barrio Pandiguando, con lo cual se logra la atención de dudas, inquietudes o peticiones. Se realiza revisión continua del correo electrónico activaplomo@gmail.com, en el cual la comunidad puede manifestar sus inquietudes, solicitud de información y demás, a fin de dar una respuesta oportuna y en corto tiempo. Por medio de comunicado No CINP-522-127-4733 remitido a la Entidad por parte de la interventoría, se emitió el concepto solicitado en comunicado de la Secretaria de Infraestructura número 20221400487781, referente a cesta de comisitaria en el Sector de José María Obando (quija de la propietaria, Señora Ana Belisa Campo Ruiz identificada con cedula de ciudadanía 34.524.665 Numero de Celular 3146656540 y correo electrónico elena-8171@hotmail.com); se encuentra pendiente la notificación de la Entidad al Contratista, informando su decisión al respecto. Por medio de oficio No. CINP-522-131-4795, la interventoría remitió el derecho de petición que fue interpuesto por la Señora GLORIA ANANCEY CORTES CERON habitante del barrio Yambitará dirección calle 27N # 4-84, enviado por la Entidad Contratante a esta Interventoría mediante comunicado No 20221400486521, cuyo asunto es "Remisión petición 20221150314692 y 20221150315092 – reparación zona encharcamiento Yambitará". Se encuentra pendiente respuesta por parte del contratista. En Comité de obra realizado el día 27-12-2022, se solicita al contratista agilizar la respuesta a este derecho de petición. Se reciben por parte del Contratista, las actas de vecindad de inicio pendientes correspondientes al Barrio La Paz, se realiza revisión con la Profesional Social del contratista para remitir al Residente Técnico de Interventoría, para su correspondiente revisón. 4. Programa B4 Mano de Obra: Durante la presente semana, el contratista no reporta ingreso de trabajadores al frente de obra.

ASPECTOS SST: - Se verifica la señalización móvil para las obras de intervención en el Barrio Pandiguando y de esta manera evitar posibles riesgos de accidentalidad en la zona interveníde.
- Se inspecciona el buen uso de los EPP's de todo el personal colaborador en obra.
- Se verifica el equipo de primeros auxilios que se encuentre vigente y completo.
- Hasta el momento no se han presentado accidentes laborales.

SEGUIMIENTO A COMITÉS DE OBRA:

Comité de obra 27-12-2022. Se presenta una descripción de los temas tratados: Se realiza comité de obra en oficinas de la Secretaría de Infraestructura, que cuenta con asistencia de la Entidad Contratista e Interventoría. La Entidad solicitó intervenir la Calle 3 entre Carreras 17 y 21C del Barrio Pandiguando. La Entidad informa que el valor a adicionar en el mes de diciembre para obra es $1.957.514.536, con base en esta información el contratista debe presentar la solicitud de adición. La Entidad solicita intervenir la Carrera 20 entre Calles 3 y 4 del Barrio Pandiguando. La comunidad del sector Pandiguando, solicita consultar si se puede intervenir la Carrera 18 entre Calle 3 y 4. Se solicita a la Entidad, definir la ruta de intervención que se continuará en los primeros días del mes de enero de 2023. Con respecto a las obras en la Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN del Barrio La Paz, las obras se reanudarán los primeros días del mes de enero de 2023, el contratista pondrá maquinaria en el sitio. Se retira la solicitud al contratista, de dar inicio a las actividades de señalización y demarcación vial. Con relación a la solicitud de la Entidad, de intervenir la Calle 71N entre Carreras 1 y 2 del Barrio Matamoros, se solicita presentar el diseño de pavimentos. Se retira la solicitud al contratista, de agilizar la respuesta al derecho de petición de la Sra. Gloda Anancey Cortés Cerón del Barrio Yambitará. El contratista no cumplió con el compromiso de revisar y dar respuesta al encharcamiento que se observe en la Calle 10 entre Carreras 2 y 3. Se encuentra pendiente el radicado de pavimentos por parte de la Entidad, de la Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN del Barrio La Paz. Corte de obra con fecha 25-12-2022: % programado 97,21, % Ejecutado 93,17, Atraso 4,04%. Se leen los temas de obra: social, ambiental y SST, se anexan las actas correspondientes. Se informa que la semana anterior, se realizaron obras en la zona centro de la ciudad, Carrera 5 entre Calles 4 y 7, y en la Calle 6 entre Carreras 4 y 5, en la presente semana se realizan obras en la Calle 3 entre Carreras 17 y 21C del Barrio Pandiguando. Se solicita al contratista, arreglo de dos daños en anclenes, en la Carrera 5 entre 4 y 5, y andén de la esquina Carrera 5 con Calle 6 del sector centro. Se informa que se está realizando instalación de mezcla asfáltica en el puente viejo de la Carrera Sexta (puente viejo Cauca).

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra No. 20211809024217 de diciembre del 2021 y el contrato de interventoría No. 20221800011697 de marzo del 2022, tienen fecha de inicio 7 de abril de 2022. Estado del contrato: En Ejecución. Se presenta un atraso en la ejecución del contrato de 0,33%. Los contratos de obra y de interventoría, tuvieron adiciones en valor y fueron prorrogadas hasta el 28 de febrero de 2023, para continuar con la atención de vías que se encuentran en mal estado y que son priorizadas por la Entidad Contratante para su intervención, el contrato de obra mediante el Modificatorio No. 4, y el contrato de interventoría mediante el Modificatorio No. 3.

0,33%	ATRASO	equivalente a	$ 28.267.182

OBSERVACIONES

El área de localización intervenida acumulada a la fecha, corresponde a 100.467 m2. El contrato de obra tuvo una adición de $ 1.834.098.651 y prórroga hasta el 28-02-2023; el contrato de interventoría, tuvo un adición de $ 100.000.000 y prórroga hasta el 28-02-2023. En la presente semana, se realizan obras de instalación de carpeta asfáltica MDC-19 en el Barrio Pandiguando, mejorando considerablemente las condiciones de seguridad y movilidad para los usuarios de las vías. Las obras se desarrollan de acuerdo a la priorización de nuevas vías, por parte de la Entidad Contratante. Se hace la advertencia que los porcentajes de avance programado y ejecutado disminuyen respecto a la semana anterior, toda vez, que en la presente semana, se cambian con respecto a nuevos valores según las adiciones de los contratos y nueva programación de obras con fecha de finalización 28-02-2023.

INTERVENTORÍA

Firma:

ING. ANSELMO MARTINEZ A.
Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ASPECTO TÉCNICO



27-12-2022 Comité de obra. Asiste Entidad, Contratista e Interventoría.



Instalación de mezcla asfáltica MDC-19. Calle 3 entre Carreras 17 y 18. Barrio Pandiguando



Estado incial de la vía con baches y piel de cocodrilo. Calle 3 entre Carreras 18 y 19. Barrio Pandiguando



Vía intervenida con instalación de mezcla asfáltica. Calle 3 entre Carreras 18 y 19. Barrio Pandiguando



Instalación de mezcla asfáltica MDC-19. Intersección Calle 3 con Carrera 19. Barrio Pandiguando



Instalación de carpet asfáltica MDC-19. Calle 3 entre Carreras 19 y 20. Barrio Pandiguando

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ASPECTO TÉCNICO



Estado incial con baches y fisuramientos. Calle 3 entre Carreras 20 y 20A. Barrio Pandiguando



Vía intervenida con instalación de mezcla asfáltica. Calle 3 entre Carreras 20 y 20A. Barrio Pandiguando



Estado incial con baches y piel de cocodrilo. Calle 3 entre Carreras 20A y 20B. Barrio Pandiguando



Vía intervenida con instalación de mezcla asfáltica. Calle 3 entre Carreras 20A y 20B. Barrio Pandiguando



Vía intervenida con instalación de mezcla asfáltica. Calle 3 entre Carreras 20B y 21. Barrio Pandiguando



Instalación de la carpeta de rodadura en mezcla asfáltica sobre el puente de la Carrera 6 sobre el Rio Cauca.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ASPECTO SOCIAL - SST - AMBIENTAL





Actividades de socialización de obras en el Barrio Pandiguando. Recepción y revisión de actas de vecindad, entrega realizada por parte de la profesional social del contratista





Señalización de aproximancion vial. Uso adecuado de EPPs durante las actividades de obra.
Reunión Equipo PIPMA en obra







Atención de queja por supuestos escobros de la obra (Barrio La Esmeralda), donde constató que no pertenecen a la obra. Verificación carpado de volquetas y punto de acopio. Verificación de limpieza de antejardines. Revisión, aprobación y firma de formatos ambientales PIPMA.

	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	INFORME	39
		FECHA	9/01/2023
		PAGINA	1 de 4

UNIDAD EJECUTORA:	MUNICIPIO DE POPAYÁN, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA	9	1	2023

Semana Número: 39 Del: 2 de enero de 2023 Al: 8 de enero de 2023

Suspensión No 1: Reinicio No. 1:

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 277 DIAS

Nombre del Supervisor: ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,758%	84,169%	Obra Física Ejecutada (%)	2,164%	84,176%
Valor de la Obra programada:	$ 214.450.482,94	$ 10.277.708.648,48	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 264.405.572,00	10.287.660.577,00

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"		OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"	
Contratista:	EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.	Interventor:	IMP SERVICIOS S.A.S.
Contrato No:	2021860034217 DE DICIEMBRE DEL 2021	Contrato No.	2022180001697 DE MARZO DEL 2022
Valor inicial:	$ 8.486.788.110,00	Valor Inicial:	$ 466.891.858,00
Valor Final:	$ 12.226.852.973,00	Valor Final:	$ 708.154.565,00
Plazo Inicial:	Seis (6) meses	Plazo Inicial:	Siete (7) meses
Prórroga No. 1:	Quince (15) días	Prórroga No. 1	Quince (15) días
Prórroga No. 2:	Un (1) Mes		
Adición y Prórroga No. 3:	Adición $ 1.599.906.817 y Prórroga 31-12-2022	Adición y Prórroga No. 2:	Adición $ 111.247.835 y Prórroga 31-12-2022
Adición y Prórroga No. 4:	Adición $ 1.854.868.051 y Prórroga 28-02-2023	Adición y Prórroga No. 3:	Adición $ 130.068.600 y Prórroga 28-02-2023
Fecha de Iniciación:	7 de abril de 2022	Fecha de Iniciación:	7 de abril de 2022
Fecha de Vencimiento:	28 de febrero de 2023	Fecha de Vencimiento	28 de febrero de 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ASPECTOS TÉCNICOS: Continúan las obras hasta las terminar las actividades en el Barrio Pandiguando, realizando el fresado de carpeta asfáltica que se encuentra deteriorada, imprimación e instalación de mezcla asfáltica MDC-19 en los siguientes sectores: Calle 3 entre Carreras 21, 21A, 21B y 21C, y en la intersección Calle 3 con Carrera 20B, se realiza parche adicional en la Carrera 21C entre Calles 3 y 2, y actividades de fresado, imprimación con emulsión asfáltica e instalación de mezcla asfáltica en la Carrera 21C entre Calles 2 y 4. De igual forma, se realiza intervención en la vía Carrera 6A entre Calles 17N y 18N del Barrio El Recuerdo, realizando el reemplazo de la carpeta asfáltica que presentaba un elevado deterioro. Posteriormente, las obras se dirigen al Barrio Antonio Nariño, donde se realiza el fresado, imprimación e instalación de carpeta asfáltica en la intersección de la Carrera 10 con Calle 17N y en la Calle 17N entre Carreras 10 y 9A. Durante las actividades de obra, se presentaron lluvias que afectaron considerablemente el avance de las mismas.

ASPECTOS AMBIENTALES: El día miércoles 04 de enero de 2023, se realizó la aprobación del acta PIPMA N° 6 (V2) por parte de la interventoría, por medio de correo electrónico para continuar su debido proceso. El día jueves 05 de enero de 2023, el contratista realizó el envió por medio de correo electrónico para revisión y aprobación de interventoría, el informe mensual correspondiente a diciembre de 2022.
En el Barrio Pandiguando, se realizó la revisión y solicitud de limpieza de las vías habilitadas, debido a que el personal culminaba labores en la zona.
El día viernes 06 de enero de 2023, se realizó la limpieza del frente de obra en el Barrio El Recuerdo, como solicitud por fiestas del Municipio. El contratista dispuso el Vactor y personal SOAT para la recolección de material sobrante para dejar limpia la zona.
Se realizó inspección de la maquinaria y de los vehículos que hacen parte de la ejecución del proyecto, con el objetivo de dar cumplimiento a la política de seguridad vial, de igual forma se solicitó al contratista realizar la adecuada y preventiva señalización de la maquinaria que quedará cerca a los posibles sitios de juego de las fiestas de Pubenza.
De igual forma, hubo plena participación en comités, mesas de trabajo y recorridos programados en los cuales se evaluó el avance de la gestión ambiental del proyecto, se acuerdaron observaciones, compromisos y recomendaciones pertinentes para dar cumplimiento a lo estipulado en el PIPMA.

ASPECTOS SOCIALES: Durante la Semana No. 39 del 2 al 9 de Enero de 2023 en cuanto a componente social, fueron desarrolladas las siguientes actividades: **1. Programa B1 Divulgación e Información a la Comunidad:** Socializaciones sector Pandiguando, El Recuerdo y Antonio Nariño, se realizo casa a casa, entregando el volante informativo aprobado por la Entidad Contratante en casas de habitación, locales comerciales y colegios. **Programa B2 Restitución de Bienes Afectados:** Se realiza registro fotográfico en los Sectores de Pandiguando, El Recuerdo y Antonio Nariño, teniendo en cuenta sumideros, tapas de alcantarillas, andenes y fachadas. **3. Programa B3 Atención y Participación Ciudadana:** El Área Social realiza acompañamiento en las labores de parches, manteniendo así contacto permanente y atención personalizada con la comunidad del sector en el cual se esta desarrollando la intervención en el Barrio Pandiguando, El Recuerdo y Antonio Nariño, con lo cual se logra la atención de dudas, inquietudes o peticiones. Se realiza revisión continua del correo electrónico edvisapipma@gmail.com, en el cual la comunidad puede manifestar sus inquietudes, solicitud de información y demás, a fin de dar una respuesta oportuna y en corto tiempo. Por medio de comunicado No. CINP-522-127-4738 remitido a la Entidad por parte de la Interventoría, se envió el concepto solicitado en comunicado de la Secretaria de Infraestructura número 20221400487781, referente a cafio de domiciliaria en el Sector de José María Obando (queja de la propietaria, Señora Ana Belen Campo Ruiz identificada con cédula de ciudadanía 34.524.905, Número de Celular 3146952649 y correo electrónico diana.8121@hotmail.com); se encuentra pendiente la notificación de la Entidad al Contratista, informando su decisión. Respecto del Derecho de Petición interpuesto por la Señora GLORIA ANANCEY CORTES CERON, habitante del Barrio Yanbiland, correspondiente al comunicado No. 20221400486871 enviado por la Entidad Contratante, cuyo asunto es "Revisión petición 20221150314692 y 20221150315582 – reparación zona enchancamiento Yanbiland", el Contratista emite respuesta mediante comunicado E-24217-590 del 5 de Enero de 2023, el cual se anexa al presente informe. **4. Programa B4 Mano de Obra:** Durante la presente semana, el contratista no reporta ingreso de trabajadores en la obra.

ASPECTOS SST: - Se realiza un inventario de las señales de aproximación móvil, encontrando únicamente 16 en obra, se solicita al contratista hacer la reposición de las que han sido hurtadas y/o que se encuentran deterioradas.
- Se debe hacer entrega de tapabocas al personal que acompaña los equipos, para evitar la absorción de gases y polvo generados por los mismos equipos, de igual manera, hacer la reposición de guantes y tapa oídos al personal que los tiene deteriorados.
- Hasta el momento no se han presentado accidentes laborales.

RESUMIENTO A COMITES DE OBRA:

Comité de obra 03-01-2023: Se realiza comité de obra en oficinas de la Secretaría de Infraestructura, que cuenta con asistencia de la Entidad, Contratista e Interventoría. A continuación se presenta una descripción de los temas tratados: Las obras 2 y 3 de enero de 2023 no se realizan actividades, el contratista informa que el día de mañana reinicia el frente de parches en Pandiguando. La Entidad solicita intervenir los Carreras 18, 20 y 21C entre Calles 3 y 4, y la esquina Carrera 20B entre 2 y 3 (Pandiguando). La Entidad solicita intervenir la Carrera 6A entre Calles 17N y 18N que ya tiene cambio de rasantes, incluir también Calle 17N entre Carrera 9 y 10 y la Intersección Carrera 10 con Calle 17N, posteriormente, según con el sector de Campamento. Corte de obra a 01-01-2023, valor ejecutado $ 10.022.024.925 (82,01%), valor programado $ 10.062.329.154 (82,33%). Se trae la solicitud el contratista, de retirar las obras en el Barrio La Paz Carrera 7 entre Calles 69N y 70N, toda vez que se deben terminar dentro de plazo contractual. La Entidad informa la necesidad de intervenir la vía del Barrio Mallamas Calle 71N entre Carrera 1 y 2. Se solicita al contratista, realizar registro fotográfico inicial de caja de redes secas en la Cra. 10 con Calle 2A, para definir responsable del daño de la tapa y presentar soportes por escrito, comprometio para 06-01-2023. Con respecto al derecho de petición de la Sra. Gloria Carlos Ceron del Barrio Yanbiland, la Interventoría envió al contratista el comunicado CINP-522-150-2025 solicitando su atención, se anexa el comunicado. Respecto a dos arreglos de acometidas en la Carrera 5, el contratista informa que realizará los arreglos entre el 11 y 13 de enero 2023. Se tocan temas del área social, ambiental y SST, se anexan las actas. Se solicita al contratista, la actualización de la resolución de PMT, con carácter urgente.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra No. 2021860034217 de diciembre del 2021 y el contrato de Interventoría No. 2022180001697 de marzo del 2022, tienen fecha de inicio 7 de abril de 2022. Estado del contrato: En Ejecución. La ejecución de la obra, no presenta atraso respecto a la programación. Se encuentra vigente el Modificatorio No. 4 para el contrato de obra y el Modificatorio No. 3 para el contrato de interventoría, los cuales indican la fecha de finalización para el 28-02-2023.

0,08%	ADELANTO	equivalente a	$	9.241.731

OBSERVACIONES	INTERVENTORIA
El área de localización intervenida acumulada a la fecha, corresponde a 102.312 m2. Los contratos de obra y de interventoría, tienen fecha de finalización 28-02-2023. En la presente semana, se terminan las obras de instalación de carpeta asfáltica MDC-19 en el Barrio Pandiguando, se intervino una vía en el Barrio El Recuerdo que se encontraba en mal estado (Carrera 6A entre Calles 17N y 18N), y se adelantan obras en el Barrio Antonio Nariño, vías que fueron priorizadas por la Entidad Contratante para su intervención. Durante la semana del presente informe, se presentaron lluvias de larga duración e intensidad, que afectaron el normal avance de las obras. Las obras se realizan, de acuerdo con la priorización de vías por parte de la Entidad Contratante.	Firma: ING. ANSELMO MARTINEZ A. Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ASPECTO TÉCNICO



03-01-2023 Comité de obra. Asiste Entidad, Contratista e Interventoría.



Instalación de mezcla asfáltica MDC-19. Intersección Calle 3 con Carrera 20B. Barrio Pandiguando



Instalación de carpet asfáltica MDC-19. Carrera 20 entre Calles 3 y 4. Barrio Pandiguando



Instalación de carpeta asfáltica MDC-19. Calle 3 entre Carreras 21A y 21B. Barrio Pandiguando



Instalación de carpeta asfáltica MDC-19. Calle 3 entre Carreras 21B y 21C. Barrio Pandiguando




Se realiza parche ubicado en la Carrera 21C entre Calles 3 y 2. Barrio Pandiguando


	ALCALDÍA DE POPAYÁN	INFORME	39
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA	9/01/2023
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	PAGINA	3 de 4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

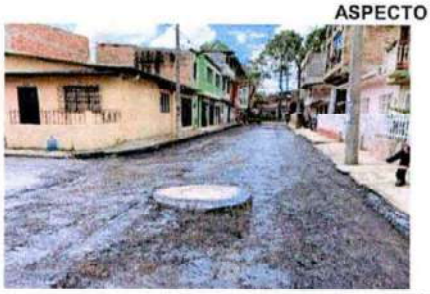ASPECTO TÉCNICO



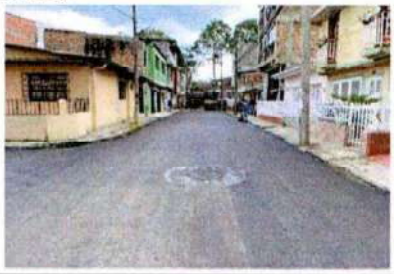Actividades de fresado e imprimación con emulsión asfáltica. Carrera 21C entre Calles 3 y 4



Instalación de carpeta asfáltica MDC-19. Carrera 21C entre Calles 3 y 4



Instalación de carpeta asfáltica en la intersección de la Carrera 10 con Calle 17N. Barrio Antonio Nariño



Vía intervenida con instalación de mezcla asfáltica. Calle 17N entre Carreras 10 y 9A. Barrio Antonio Nariño



Vía intervenida con instalación de mezcla asfáltica. Carrera 6A entre Calles 17N y 18N. Barrio El Recuerdo



Vía intervenida con instalación de mezcla asfáltica. Carrera 6A entre Calles 17N y 18N. Barrio El Recuerdo

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ASPECTO SOCIAL - SST - AMBIENTAL



Actividades de socialización Sectores Pandiguando, El Recuerdo y Antonio Nariño
Visita a la obra por parte de la Entidad Contratante



Señalización de aproximacion vial. La interventoría solicitó al contratista,
el uso adecuado del tapabocas por parte del personal que realiza trabajos en las diferentes actividades de obra



Verificación de limpieza de obra. Verificación carpado de volquetas y limpieza de vias de acceso. Verificación de limpieza Barrio El Recuerdo. Visita de verificación PIPMA.

ANEXO 10
INFORMES PIPMA

INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE INTERVENTORIA No. 09

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

CONTRATO No. 20221800011697 de marzo del 2022









POPAYÁN, ENERO DE 2023

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. OBJETIVOS 5

1.1 OBJETIVO GENERAL 5

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5

2. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS 6

3. INFORME MENSUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 6

3.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA INP SERVICIOS SAS 6

3.2 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN AMBIENTAL COMPONENTES A, B, C, D, E Y F 7

3.2.1 Componente A – Sistema de Gestión Ambiental 7

Programa A1: Estructura del Sistema de Gestión Ambiental 7

Programa A2: Programa de Implementación del PMA (PIPMA) 8

3.2.2 COMPONENTE B – GESTIÓN SOCIAL 8

Programa B1: Divulgación e información a la comunidad. 9

Programa B2: Restitución de bienes afectados. 9

Programa B3: Atención y participación ciudadana 10

Programa B4. Vinculación de mano de obra. 11

Programa B5: Capacitación del personal de obra. 14

Componente D – Gestión ambiental en actividades constructivas 15

3.2.4. Programa D1: Manejo de demoliciones, escombros y desechos de construcción 15

Programa D2: Almacenamiento y manejo de materiales de construcción 16

Programa D3: Manejo de maquinaria y equipos de transporte 16

Programa D4: Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites Y Sustancias Químicas 18

Programa D5: Manejo de estructuras y aseo de la obra 18

Programa D6: Manejo de aguas superficiales 20

Programa D7: Manejo de excavaciones y rellenos 21

Programa D8: Control de emisiones atmosféricas y ruido 22

Programa D9: Manejo de redes de servicios públicos 22

3.2.5 Componente E - Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 22

Programa E1: Seguridad y Salud en el Trabajo .....

Programa E2: Plan de contingencia etapa de construcción .....

3.2.5 Componente F - Señalización Y Manejo De Tráfico .....

Programa F2: Manejo de Tráfico .....

4. PRESUPUESTO PIPMA 32

LISTA DE TABLAS

Pág.

TABLA 1 DATOS BÁSICOS DE LOS CONTRATOS DE INTERVENTORÍA Y DE OBRA. .6
TABLA 2 PROFESIONALES IMPLEMENTACIÓN DE PIPMA.....09
TABLA 3 CAPACITACIONES ÁREA AMBIENTAL 8
TABLA 4 SOCIALIZACIONES. 12
TABLA 5 RELACIÓN ACTAS DE VECINDAD Y DE ENTORNO.....15
TABLA 6. PQRS.....18
TABLA 7. REPARACIONES 20
TABLA 8 PERSONAL EDIFICACIONES Y VÍAS SAS.....17
TABLA 9 SUB – CONTRATISTAS 19
TABLA 10. PORCENTAJE DE CONTRATACIÓN 19
TABLA 9. RELACIONES PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIA .20
TABLA 10. PLAN DE CAPACITACIÓN MENSUAL..... 21
TABLA 11. MATERIALES Y ESCOMBROS GENERADOS..... .22
TABLA 12 LISTADO DE MAQUINARIA DE OBRA. 23
TABLA 13. VOLUMEN DE RESIDUOS SÓLIDOS..... 26
TABLA 14 INDUCCIONES Y CAPACITACIONES..... 34
TABLA 15 ELEMENTOS PLAN DE EMERGENCIA..... 35

INTRODUCCIÓN

El Alcalde Juan Carlos López Castrillón como representante legal del Municipio de Popayán, mediante contrato N° 202218000242 del 2021 adjudico el proyecto MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021.

De acuerdo a lo anterior se realizó el proceso de licitación Pública para la ejecución de la interventoría cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021", el cual se adjudicó al contratista de Interventoria **INP SERVICIOS S.A.S**. el cual fue adjudicado al por medio del Contrato No. 20221800011697 de marzo del 2022 ,con un plazo de ejecución inicial meses (06) meses.

Mediante modificatorio No 1 la Alcaldía de Popayán otorga una PRORROGA al contrato de obra No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021, de15 días contados a partir del 7 de octubre del 2022 y hasta el 22 de octubre del 2022.

Mediante el modificatorio No 2 al contrato de obra pública No 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021, se otorga una prórroga de un mes, del 23 de octubre al 23 de noviembre del 2022.

La contratación de la interventoría se realizó con el objeto de ejecutar la supervisión y seguimiento externo al contrato de obra, así como también para propender por un cumplimiento adecuado y oportuno de su respectivo objeto.

Para dar cumplimiento a los requisitos contractuales INP SERVICIOS SAS elaboro el presente informe de seguimiento y evaluación de la Gestión Socio-Ambiental desarrollada por el Contratista de Obra EDIFICACIONES Y VÍAS S.A durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2022, verificando el cumplimiento de las obligaciones socio-ambientales durante el periodo mencionado anteriormente.

A continuación, se presenta toda la información sobre el seguimiento de la implementación del plan de manejo ambiental presentado por el contratista de obra en sus componentes ambiental, social, SST y manejo de tráfico.

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar a la Alcaldía del Municipio de Popayán, el informe número 05 del seguimiento a la gestión socio ambiental desarrollada por el contratista durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2022.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar los resultados del seguimiento a las actividades socios ambientales desarrollados para minimizar, prevenir y compensar los impactos ambientales generados durante la ejecución de las obras en los lugares intervenidos.

- Demostrar el seguimiento a las actividades de carácter ambiental, social y SST, implementadas para el cumplimiento del Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambienta- PIPMA de este proyecto.

- Verificar el cumplimiento a los requisitos legales establecidos por la Autoridad Ambiental competente, para el trámite y obtención de los permisos necesarios requeridos para el desarrollo de las actividades constructivas.

2. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS

En la Tabla No. 1 se presenta la información básica de los contratos de interventoría y de obra.

Tabla 1 Datos básicos de los contratos de interventoria y de obra.

CONTRATANTE:	Alcaldia Municipal de la Ciudad de Popayán.	
ENTIDADES	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	**CONTRATO DE OBRA**
CONTRATO No:	**20221800011697 de marzo del 2022**	**20211800024217 de diciembre de 2021**
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"	MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"
CONTRATISTA:	INP SERVICIOS SAS	EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.S.
PLAZO JECUCIÓN:	06 MESES DESDE EL ACTA DE INICIO	06 MESES DESDE EL ACTA DE INICIO

3. INFORME MENSUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

El Contratista entregó la versión No. 1 del informe de gestión socio ambiental correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2022, por medio de correo electrónico el día 03 de enero 2022, enviando la interventoría aprobación por medio de correo electrónico el día 05 enero de 2023.

En los siguientes ítems se describen las actividades ejecutadas por la Interventoría en el marco de seguimiento de los componentes socio ambientales durante el período en cuestión.

3.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA INP SERVICIOS SAS

A continuación, se relacionan las actividades generales ejecutadas en los Componentes Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo y de Señalización como parte del seguimiento al PIPMA.

- Durante el periodo el realizó visitas diarias a los frentes de obra habilitados, donde se realizó el seguimiento e inspección al cumplimiento de las actividades socio ambientales desarrolladas por el contratista de obra.
- Se realizó recorridos diarios en conjunto con el personal del contratista en las áreas correspondientes al plan de manejo ambiental establecido para la ejecución de las actividades. Lo anterior con el objetivo de la verificación del cumplimiento de lo establecido en los temas ambientales, sociales y SST.
- Visitas de seguimiento e inspección semanal en conjunto con personal del contratista.
- Seguimiento al personal dispuesto en obra y su afiliación al sistema integral en salud.
- Revisión y seguimiento de PQRS que se generaron durante el periodo correspondiente al presente informe.
- Inspección de retiro de señalización.
- Revisión semanal de formatos implementados por el contratista de obra para el cumplimiento socio ambiental.
- Diligenciamiento de formatos de interventoría.
- Seguimiento a disposición de escombros, orden, aseo y limpieza de la obra.

3.2 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN AMBIENTAL COMPONENTES A, B, C, D, E Y F

3.2.1 Componente A – Sistema de Gestión Ambiental

Programa A1: Estructura del Sistema de Gestión Ambiental

Para este periodo INP SERVICIOS SAS realizó el seguimiento, inspección, control y acompañamiento a las actividades desarrolladas por el contratista de obra dando cumplimiento a los programas que conforman el PIPMA.

Se verificó la vinculación de los profesionales del contratista encargados de ejecutar las actividades socio-ambientales de acuerdo con los requerimientos del pliego de condiciones, para este periodo el contratista cumplió con la contratación total del personal según lo establecido contractualmente.

Durante la etapa de mantiene la Brigada de Orden, Aseo y Limpieza – BOAL, diariamente al inicio de la jornada el equipo ambiental del Contrato, dio instrucción a esta brigada acerca de las actividades a desarrollar, dando prioridad antes de la jornada de aseo a aquellas situaciones a ser atendidas de manera inmediata.

De igual forma hubo plena participación en comités de obra (6, 13 21 y 27 de diciembre) mesas de trabajo y recorridos programados por parte de la Alcaldía de Popayán y contratista en los cuales se evaluó el avance de la gestión ambiental del proyecto, se expusieron observaciones, compromisos y recomendaciones pertinentes para dar cumplimiento a lo estipulado en el PIPMA.

Fotografía 1 Comité integrado de obra



Tabla 2 Profesionales implementación de PIPMA

INTEGRANTES EQUIPO DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL Y SST		
NOMBRE	**CARGO**	**RESPONSABILIDAD**
Anderson Viveros	Director de obra.	Aprobación de recursos, coordinación, seguimiento y control a la ejecución del PIPMA.
Sirlena Medina Plaza	Residente Ambiental de Obra.	Ejecución, seguimiento y control al desarrollo de la gestión ambiental.
Cristina Quilindo Arboleda	Residente Social de Obra	Ejecución, seguimiento y control al desarrollo de la gestión social.

Claudet Guerrero Pacheco	Residente S.S. T	Apoyo en la ejecución, seguimiento y control al desarrollo de la gestión ambiental, ejecución de PSO y cumplimiento de la normatividad SST aplicable al proyecto.
Laura Pilar Velasco Vásquez.	Auxiliar S.S. T	Apoyo en la ejecución, seguimiento y control al desarrollo de la gestión ambiental, ejecución de PSO y cumplimiento de la normatividad SST aplicable al proyecto.

Fuente: Edificaciones y Vías SA

Programa A2: Programa de Implementación del PMA (PIPMA)

A continuación, se enuncian las charlas y/o capacitaciones dadas al personal de obra durante este periodo

Tabla 3 Capacitaciones mes octubre 2022.

N°	TEMA	METODOLOGIA	LUGAR	FECHA	DIRIGIDO A	RESPONSABLE
			SST			
1	Medidas de seguridad integradas en las maquinas, equipo y/o herramientas	Capacitación	Obra	16 de diciembre del 2022	Todo el personal	**Área SST**
			AMBIENTAL			
1	Ambiente y conciencia Vs Consumismo	Capacitación	Obra	23 de diciembre del 2022	Todo el personal	**Área Ambiental**
			SOCIAL			
1	Comunicación asertiva	Capacitación	Obra	23 de diciembre del 2022	Todo el personal	**Área social**

De igual forma se realizaron las siguientes capacitaciones y charlas diarias con el personal del área SST:

FECHA	TEMA DE CAPACITACIÓN	N° PERSONAS PROGRAMADAS	N° DE ASISTENTS	HORAS DE CAPACITACION	EMPRESA
16/12/22	CAPACITACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD INTEGRADAS EN LAS MAQUINAS, EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	37	37	1 Hora	ING. DE VIAS
23/12/22	CONTROL DE RIESGO PEATONAL Y VIAL	37	37	1 Hora	ING. DE VIAS
23/12/22	MATRIZ DE PELIGROS	37	37	1 Hora	ING. DE VIAS

3.2.2 Componente B – Gestión Social

Programa B1: Divulgación e información a la comunidad.

Durante el periodo correspondiente al presente informa se llevan a cabo socializaciones de cierres viales y de inicio de labores operativas en cada uno de los sectores donde se desarrollan las intervenciones por obras de parcheo; de la siguiente manera:

Tabla 4. Socializaciones.

Socializaciones con la comunidad del AID				
No.	**Fecha**	**Lugar**	**Descripción**	**Piezas entregadas**
1	13/12/2022	Barrio la Esmeralda Carrera 17 entre calles 6 - 4	Se lleva a cabo socialización puerta a puerta informando sobre el cierre vial, que se realizará por labores de mantenimiento de malla vial, horarios y días estipulados de ejecución.	Volantes
2	15/12/2022	Barrio El Retiro	Se lleva a cabo socialización puerta a puerta informando sobre el cierre vial, que se realizará por labores de mantenimiento de malla vial, horarios y días estipulados de ejecución.	Volantes
3	19/12/2022 20/12/2022	Barrio centro	Se lleva a cabo socialización puerta a puerta informando sobre el cierre vial, que se realizará por labores de mantenimiento de malla vial, horarios y días estipulados de ejecución.	Volantes

Fuente: EDIFICACIONES Y VIAS SAS

Reuniones con Interventoría y Alcaldía:

No. 1. el día 06 de diciembre del 2022. se realiza comité de obra en secretaria de infraestructura Municipal. La parte social asiste, no se presenta novedad por parte del área.

No. 2. el día 21 de diciembre del 2022. Asistencia a comité de obra en secretaria de infraestructura Municipal. Una vez tratado el tema con la interventoría del proyecto, se acuerda que las socializaciones a la comunidad se realizaran una vez la maquinaria inicie las labores operativas en el punto de obra, toda vez que, en repetidas ocasiones, se ha dado información previa a la comunidad de inicio de labores, y por directriz del ente gestor, cambian las rutas de intervención y no se realizan labores, creando falsas expectativas a la comunidad. Se acuerda entonces, realizar la socialización al mismo momento en que se inicia la operación de la maquinaria.

No. 3. el día 27 de diciembre del 2022.en el comité de obra semanal, se reitera por parte de la interventoría y la entidad contratante, que, por parte del contratista, se dé respuesta al derecho de petición de la señora Ana Belisa Campo Ruiz, referente al daño de domiciliaria en el sector del barrio José María Obando.

Indicador de Cumplimiento

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	
INDICADOR	**% Volantes entregados**
FORMULA	$\frac{N° \text{ de volantes entregados}}{N° \text{ de volantes programados al mes}} \frac{152}{200} X100 = 76\%$

Programa B2: Restitución de bienes afectados.

Las Actas de vecindad son un instrumento utilizado con el fin de conocer el estado previo de los inmuebles y verificar la presencia de deterioro preexistente, para evitar que éste sea imputado posteriormente por los propietarios a actividades de la obra. Se elaboran en el área de influencia directa del contrato de obra. El acta es un instrumento que permite la participación ciudadana y va acompañado con registro fotográfico.

Para el momento, aún no se han intervenido tramos de rehabilitación vial completa, que requieran el levantamiento de acta de vecindad de inicio.

Por su parte el acta de vecindad de entorno se realizará con el registro fotográfico de las fachadas y andenes de las viviendas colindantes, directamente con el área de intervención, es una herramienta interna que proporcionará una evidencia previa del espacio externo y como soporte ante alguna posible reclamación, por alguno de los moradores del sector.

Actividades

- ✓ El proceso de registro fotográfico para actas de entorno empezó ejecutarse el día 20 del mes de mayo del 2022.

Tabla 5. Relación actas de vecindad y de entorno.

N	DIRECCIÓN	N° FOLIOS	OBSERVACIONES
42	Carrera 19 entre calles 6-7 Barrio la Esmeralda		Se realizo levantamiento de acta de entorno, aun no se ha radicado a interventoria.
43	Barrio el Retiro		Se realizo levantamiento de acta de entorno, aun no se ha radicado a interventoria.
44	Calle 6 entre carraras 4 -5 Barrio Centro		Se realizo levantamiento de acta de entorno, aun no se ha radicado a interventoria.
45	Calle 3 entre carreras 17A - 19 Barrio el Pandiguando		Se realizo levantamiento de acta de entorno, aun no se ha radicado a interventoria.

Programa B3: Atención y participación ciudadana

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre del 2022, se verifico la realización de actividades de atención a la comunidad durante los acompañamientos a las jornadas de parcheo, contando con atención personalizada de la profesional social del contratista.

Durante el periodo se presentan dos solicitudes de habitantes de sectores en los cuales se llevaron a cabo intervenciones:

Por medio de comunicado No. CINP–522–127-4730 remitido a la Entidad por parte de la Interventoría, se emitió el concepto solicitado en comunicado de la Secretaria de Infraestructura número 20221400487781, referente a daño de domiciliaria en el Sector de José María Obando (queja de la propietaria, Señora Ana Belisa Campo Ruiz identificada con cedula de ciudadanía 34.524.665 Numero de Celular 3146959549 y correo electrónico diana-8171@hotmail.com); se encuentra pendiente la notificación de la Entidad al Contratista, informando su decisión al respecto.

Por medio de oficio No. CINP–522–131–4795, la Interventoría remitió el derecho de petición que fue interpuesto por la Señora GLORIA ANANCEY CORTES CERON habitante del barrio Yambitara dirección calle 27 N 4-84, enviado por la Entidad Contratante a esta Interventoría mediante comunicado No. 20221400489571, cuyo asunto es "Remisión petición 20221150314692 y 20221150315592 – reparación zona encharcamiento Yambitará". Se encuentra pendiente respuesta por parte del contratista. En Comité de obra realizado el día martes 13-12-2022, se le recuerda al contratista que se debe dar cumplimiento al tiempo estipulado por ley para la emisión de la correspondiente respuesta,

a lo que el contratista refiere que el tema se encuentra en manos de la Jurídica de la empresa.

INDICADOR	**% PQR:**
FORMULA	$\frac{N°\ de\ pqr\ cerradas}{N°\ de\ pqr\ total}\ \frac{3}{3}\ X100\ \ 100\%$

SEGUIMIENTO Y MONITOREO QUEJAS	
INDICADOR	**% QUEJAS:**
FORMULA	$\frac{N°\ de\ quejas\ atendidas}{N°\ de\ quejas\ interpuestas}\ \frac{0}{0}\ X100\ \ = 0\%$

SEGUIMIENTO Y MONITOREO RECLAMOS	
INDICADOR	**% RECLAMOS:**
FORMULA	$\frac{N°\ de\ reclamos\ atendidos}{N°\ de\ reclamos\ interpuestos}\ \frac{0}{0}\ X100\ \ = 0\%$

Programa B4. Vinculación de mano de obra.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de diciembre del 2022, se encuentran vinculadas 37 personas al proyecto, 36 hacen parte de la nómina del contratista y uno a la empresa subcontratista.

Tabla 8. Personal Edificaciones y Vías SAS

No	CONTRATISTA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	RESIDENCIA
1	EDIFICACIONES Y VIAS SA	EDGAR JAVIER CAICEDO	76314250	PROFESIONAL DE APOYO	POPAYAN
2	EDIFICACIONES Y VIAS SA	CLAUDED PACHECO GUERRERO	52494521	RESIDENTE SST	BOGOTA
3	EDIFICACIONES Y VIAS SA	ANDERSON ALVARO VIVEROS CERON	15816639	DIRECTOR DE OBRA	POPAYAN
4	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JAIME OSWALDO PRECIADO	4615854	RESIDENTE DE OBRA	POPAYAN
5	EDIFICACIONES Y VIAS SA	SIRLENA MEDINA PLAZA	1061713662	PROFESIONAL DE APOYO AMBIENTAL	POPAYAN
6	EDIFICACIONES Y VIAS SA	LIZETH CRISTINA QUILINDO ARBOLEDA	1061747020	RESIDENTE SOCIAL	TIMBIO
7	EDIFICACIONES Y VIAS SA	LAURA PILAR VELAZCO	34329960	AUXILIAR SST	POPAYAN
8	EDIFICACIONES Y VIAS SA	ANYELO YAMITH SANCHEZ ALVAREZ	10295742	INSPECTOR DE OBRA	POPAYAN
9	EDIFICACIONES Y VIAS SA	ELDER LENIN CUENE ALCALO	1064431522	OFICIOS VARIOS	POPAYAN
10	EDIFICACIONES Y VIAS SA	LUIS CARLOS HERNANDEZ OREJUELA	1061742623	CONTROLADOR DE TRAFICO	ROSAS
11	EDIFICACIONES Y VIAS SA	EMILIO CHILITO MACIAS	1061797781	OFICIOS VARIOS	POPAYAN
12	EDIFICACIONES Y VIAS SA	WILDER FERNANDO VELASCO MERA	1002954050	OFICIOS VARIOS	ROSAS

13	EDIFICACIONES Y VIAS SA	SCHARLIS ACOSTA GUERRERO	1061701342	OFICIOS VARIOS	TIMBIO
14	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JAIRO TALAGA ZEMATATE	76150449	OFICIOS VARIOS	ROSAS
15	EDIFICACIONES Y VIAS SA	ANDERSON FABIAN OBANDO BOLAÑOS	1003163614	CONTROLADOR DE TRAFICO	ROSAS
16	EDIFICACIONES Y VIAS SA	CARLOS ANDRES VELASCO ORTEGA	1079409048	BOAL	POPAYAN
17	EDIFICACIONES Y VIAS SA	OSCAR EDUARDO MENESES ORDOÑEZ	1061601364	OFICIOS VARIOS	ROSAS
18	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JESUS ANDRES LLANTEN	10291656	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	POPAYAN
19	EDIFICACIONES Y VIAS SA	OMAR ALEJANDRO AGREDO HURTADO	1061598911	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	ROSAS
20	EDIFICACIONES Y VIAS SA	DANNY ALEXIS URIBE ANDRADE	1061780010	CONTROLADOR DE TRAFICO	POPAYAN
21	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JHON ALEXANDER JIMENEZ ITAZ	1058788777	OFICIOS VARIOS	LA VEGA
22	EDIFICACIONES Y VIAS SA	OSCAR EDUARDO SEGUE BOYOCUE	1067521620	OFICIAL	POPAYAN
23	EDIFICACIONES Y VIAS SA	FABIAN ANDRES AGREDO POLINDARA	1061737458	OFICIOS VARIOS	POPAYAN
24	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JUAN PABLO QUIÑONEZ ESPINOSA	1004709684	CONTROLADOR DE TRAFICO	POPAYAN
25	EDIFICACIONES Y VIAS SA	NELSON AGUILERA	77081823	OPERARIO FINISHER	POPAYAN
26	EDIFICACIONES Y VIAS SA	BREYNER ANDRES AGUILERA	1065915543	OFICIOS VARIOS	POPAYAN
27	EDIFICACIONES Y VIAS SA	DIEGO LEITON	4612402	CONDUCTOR VOLQUETA	POPAYAN
28	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JOSE HERMES SALAZAR CAMACHO	10293621	CONDUCTOR VOLQUETA	POPAYAN
29	EDIFICACIONES Y VIAS SA	ALVEAR ANACONA AURELIO	94072283	OFICIOS VARIOS	POPAYAN
30	EDIFICACIONES Y VIAS SA	MACA MOMPOTES EDWIN ANDRES	1061735767	OFICIOS VARIOS	POPAYAN
31	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JAIME VARGAS	94429732	OPERADOR FRESADORA	POPAYAN
32	EDIFICACIONES Y VIAS SA	VICTOR ALBERTO ARGOTE	10593970	OPERADOR RETRO	POPAYAN
33	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JHONNY BALANTA MENESES	4738487	OPERADOR MOTONIVELADORA	POPAYAN
34	EDIFICACIONES Y VIAS SA	LUIS CARLOS DORADO	1061592504	TOPOGRAFO	POPAYAN
35	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JONATAN PULGARIN	1087554528	CADENERO 1RO	POPAYAN
36	EDIFICACIONES Y VIAS SA	YANGANA RIVERA EDWAR SANTIAGO	1002776741	BOAL	POPAYAN

Tabla 9. Sub – Contratistas

No	CONTRATISTA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	RESIDENCIA	TELEFONO
1	VOLVOS DEL SUR	LUIS EDUARDO BURBANO MUÑOZ	1002791943	CONDUCTOR VOLQUETA	POPAYAN	3107130862

Tabla 10. Porcentaje de contratación

PERSONAL CONTRATADO DICIEMBRE 2022							
CARGO	Categoría		Procedencia		Genero		Cantidad Total
	MOC	MONC	De la Región	Externo	FEM	MASC	
Director de obra	1	0	1	0	0	1	1
Profesional de apoyo	1	0	1	0	0	1	1
Residente de obra	1	0	1	0	0	1	1
Residente Social	1	0	1	0	1	0	1
Profesional de apoyo ambiental	1	0	1	0	1	0	1
Residente SST	1	0		1	1	0	1
Auxiliar SST	1	0	1	0	1	0	1
Topografo	1		1			1	1
Cadenero 1ro	1		1			1	1
Inspector de obra	1	0	1	0	0	1	1
Oficios Varios		11	11	0	0	11	11
Oficial		1	1		0	1	1
Conductores		3	3		0	2	3
Controladores de trafico		4	4			4	4
Boal		2	2			2	2
Operadores	6		6		0	6	6
TOTALES	16	21	36	1	4	32	37
PORCENTAJE %	43%	57%	97%	3%	11%	86%	100%

Se reporta un total de 37 trabajadores activos discriminados de la siguiente manera:

- Personal calificado: 16 personas
- Personal no calificado: 21 personas
- Personal del área de influencia directa: 36 personas
- Personal foráneo: 1 personas
- Personal femenino: 4 personas

- Personal masculino: 32 personas

Tabla 11. Relaciones planillas de pago de seguridad social mes de octubre

N°	N° PLANILLA	EMPLEADOR	N° TRABAJADORES	VALOR
1	1050653394	Edificaciones y Vías SAS	28	$ 22.769.800
2	1050651502	Edificaciones y Vías SAS	4	$ 2.143.300
3	1050654320	Edificaciones y Vías SAS	2	$ 1.180.400
TOTAL				26.093.500

Indicadores de Cumplimiento

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Vinculación de mano de obra diciembre
FORMULA	$\frac{N° \text{ de trabajadores vinculados con cumplimiento de requerimientos de ley}}{N° \text{ de trabajadores requeridos}} \frac{37}{37} X\ 100 = 100\%$
INDICADOR	% Vinculación de mano de obra
FORMULA	$\frac{N° \text{ de mujeres contratradas}}{N° \text{ total de trabajadores contratados}} \frac{4}{37} X\ 100 = 10{,}81\%$

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Generación de empleo diciembre
FORMULA	$\frac{N° \text{ de empleos generados en la zona de influencia directa}}{N° \text{ de empleos generados por le proyecto}} \frac{36}{37} X\ 100 = 97.14\%$
INDICADOR	% Generación de empleo diciembre
FORMULA	$\frac{N° \text{ de empleos mano de obra no calificada}}{N° \text{ total de empleados requeridos}} \frac{21}{37} X\ 100 = 56{,}75\%$
INDICADOR	% Generación de empleo diciembre
FORMULA	$\frac{N° \text{ de empleos mano de obra calificada}}{N° \text{ total de empleados requeridos}} \frac{16}{37} X\ 100 = 43{,}24\%$

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
CONTRATISTA	
INDICADOR	% Trabajadores vinculados al sistema de seguridad social diciembre:
FORMULA	$\frac{N° \text{ de trabajadores vinculado al sistema de seguridad social}}{No \text{ de trabajadores contratados}} \frac{37}{37} X100 = 100\%$

Programa B5: Capacitación del personal de obra.

Durante este periodo la Profesional Social del Contratista realizó la capacitación del área social descritas en la siguiente actividad, de acuerdo al plan de capacitaciones mensual.

Tabla 12. Plan de capacitación mensual

Fecha	Tema	Metodología	Asistentes
23/12/2022	Comunicación asertiva	Conversatorio participativo	32

Con referencia a los componentes ambiental y SST en cada componente correspondiente se anexa el plan de capacitación desarrollado. Es de resaltar que cada área dio cumplimiento al cronograma inicial pactado de una capacitación mensual.

Indicadores de Cumplimiento

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Formación:
FORMULA	$\frac{N° \text{ de trabajadores capacitados } 32}{N° \text{ de trabajadores contratados } 37} X100 = 86,48\,\%$

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Formación:
FORMULA	$\frac{N° \text{ de capacitaciones realizados } 1}{N° \text{ de capacitaciones programados } 1} X100 = 100\%$

Componente D – Gestión ambiental en actividades constructivas

3.2.4. Programa D1: Manejo de demoliciones, escombros y desechos de construcción

En los lugares de obra se adelantaron actividades de fresado de carpeta existente y posterior recolección de escombros, los frentes de obra intervenidos en este periodo son José María Obando, la ladera, la esmeralda y el guayabal.

El manejo de escombros se realizó, reciclando directamente el material fresado (RAP) con el equipo a la volqueta e inmediatamente es trasladado a los talleres del municipio de Popayán un total de 776 m^3 Ver ficha F-04-GA-1. Disposición de escombros y se trasladó un total de 784 m^3 en el RCD La Lajita.

Tabla 13. Materiales y escombros generados

PERIODO	RCD LA LAJITA(m^3)	RAP TALLERES MUNICIPALES (m^3)	RAP REUTILIZADO EN OBRA (m^3)	CASA DE LA MONEDA (m^3)	TOTAL (m^3)
7 de abril al 6 de mayo del 2022	0	0	0		0
7 de mayo al 6 de junio del 2022	0	780	0		780
7 de junio al 6 de julio del 2022	0	1.255	0		1.255
7 de julio al 31 de julio 2022	30	946			976
1 al 31 de agosto del 2022	0	955	0	188	1.143
1 al 30 de septiembre del 2022	0	2.136	0	0	2.136
1 al 31 de octubre del 2022	0	1.828	0	0	1828
1 al 30 de noviembre del 2022	0	760	0	0	760
1 al 31 de diciembre del 2022	784	776	0	0	1560
TOTAL	814	8436	0	188	9.438

Fotografía 2. Reciclado del Pavimento Asfaltico -RAP



Fuente: Edificaciones y Vías SA

Indicadores de cumplimiento.

A continuación, se muestra el indicador de seguimiento y monitoreo de periodo del presente informe:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% Volumen de disposición**
FORMULA	$\frac{Vol.de\ escombros\ entregados\ al\ SIT\ adecuadamente\ (m3)}{Vol.de\ escombros\ totales\ generados\ (m3)} \frac{1560}{1560} x\ 100 = 100\%$

Programa D2: Almacenamiento y manejo de materiales de construcción

En el periodo del informe no se almacenaron materiales de construcción, esta etapa precontractual se utilizó para identificar los proveedores de materiales, se identificaron las plantas de asfalto de la empresa Ingeniería de Vías SAS: Las plantas de producción de mezcla asfáltica Galíndez y Popayán.

Indicadores de cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% Protección de materiales almacenados**
FORMULA	$\frac{Vol.de\ de\ material\ protegido\ \left(\frac{m3}{dia}\right)}{Vol.de\ de\ material\ almacenado\ \left(\frac{m3}{dia}\right)} \frac{N/A}{N/A} X\ 100 = N/A$

Programa D3: Manejo de maquinaria y equipos de transporte

En el periodo del informe se realizaron cuatro (04) mantenimientos a maquinaria y equipos.

Se contó con cuatro (04) volquetas para el transporte de fresado y de mezcla asfáltica con todos los documentos vigentes.

En recorridos de obra se evidencio la falta de carpado de las diferentes volquetas encargadas de llevar el material de fresado, lo cual se dio a conocer al contratista inmediatamente y se dejó escrito por medio de informes semanales presentados a la entidad y comités de obra semanales.

Tabla 14 Listado de Maquinaria de obra.

No.	EQUIPO	REFERENCIA/ PLACA	CANTIDAD	FECHA DE MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Terminadora de Asfalto	F2500 F DYNAPAC	1		
2	Vibro compactador de Neumático	HAMM	1	26 de diciembre 2022	
3	Vibro compactador de Rodillo Cilindro	HAMM 137HD190	1	28 de diciembre 2022	
4	Fresadora	Writgen	1	27 de diciembre del 2022	
5	Retroexcavadora de orugas	KOBELCO	1		
6	Motoniveladora	P-07-140H-009-01	1		
7	Vibrocompactador	GAT 08-C5S533-007-01	1		
8	Volqueta doble troque	WLL417	1	19 de diciembre del 2022	
9	Volqueta doble troque	TLO742	1		
10	Volqueta doble troque	UZN 181	1		
11	Volqueta doble troque	WFV217	1		

Fuente. EDIFICACIONES Y VÍAS S.A

Fotografía 3 Vehículos



Fotografía 4 Maquinaria





Indicadores de cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% de mantenimiento**
FORMULA	$\frac{No\ de\ mantenimientos:\ No\ de\ mantenimientos\ realizados}{Número\ de\ mantenimientos\ programados}\frac{4}{4} X\ 100 = 100\%$
INDICADOR	**% de Certificación Técnico mecánica y de gases vigente**
FORMULA	$\frac{No\ de\ certific\ Tecnomecánica\ y\ de\ gases\ vigente:\ No\ de\ vehoculos\ con\ certifi\ Tecnic}{Numero\ total\ de\ vehículos}\frac{4}{4} X\ 100 = 100\%$

Programa D4: Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites Y Sustancias Químicas

En la obra no se manejan aguas residuales ya que el servicio de baño se alquila con viviendas cercanas al sector, cuyas sanitarias están conectadas a la red de alcantarillado de la ciudad.

Durante el periodo del presente informe, No se generaron residuos peligrosos.

En obra solo se almacenan sustancias químicas correspondientes a las usadas en la herramienta menor (Gasolina). Ver Formato F-11-GA-1, lista de chequeo productos químicos

Registro de cumplimiento.

Formato F-11-GA-1 lista de chequeo de productos químicos.

Indicador de cumplimiento.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% de Residuos peligrosos**
FORMULA	$\frac{Cantidad\ de\ residuos\ peligrosos\ generados}{Cantidad\ de\ residuos\ dispuestos\ en\ empresa\ autorizada}\frac{N/A}{N/A} X\ 100\% = N/A$

Programa D5: Manejo de estructuras y aseo de la obra

Se realiza recorridos con el contratista en las vías habilitadas de la obra, revisando cada sector para verificar la limpieza de estos y/o realizar observación si se requiere. En el mes de octubre, se verifico los barrios Ciudad Jardín y el recuerdo.

El contratista cuenta con una (1) BOAL -Brigada de Orden Limpieza y Aseo, una persona para cada obra, los cuales tienen las siguientes funciones y está conformado de la siguiente manera:

- Instalación, verificación y reposición del cerramiento del proyecto.
- Limpieza de los frentes de trabajo habilitados.
- Instalación, verificación y reposición de los senderos de los frentes de obra del proyecto.
- Adecuación y limpieza del campamento de la obra.
- Limpieza de sumideros.
- Instalación y verificación de la señalización vertical del PMT.
- Mantenimiento de la señalización en obra (Arreglo de colombinas, cintas, maletines y señales móviles).

Nombre	Identificación
CARLOS ANDRES VELASCO ORTEGA	107949048
YANGARA RIVERA EDWAR SANTIAGO	1002776741

La brigada BOAL, al igual que el personal de obra realiza el ingreso a obra a partir de las 6:00 A.M, se revisan los elementos de protección personal y de ser necesario se realiza el cambio (monogafas, guantes, tapa oídos, tapa bocas), se dan instrucciones acerca de las actividades de tipo urgente, se realiza la retroalimentación acerca de algún suceso en la obra o de relaciones interpersonales, de igual forma diariamente los residentes encargados ambiental y SST comparten temas del documento PIPMA para las charlas de cinco minutos y a las 6.30 p.m. se disponen a dar inicio a las actividades regulares en la obra. Al finalizar la jornada 4:00 p.m., la brigada organiza las herramientas utilizadas en el día y manifiestan las diligencias que por la dinámica de la obra requieren algún tipo de tratamiento especial para dar prioridad al día siguiente.

Para la disposición de residuos, se instalaron dos (2) puntos ecológicos, los cuales constan de cuatro (3) canecas metálicas, rotuladas y debidamente protegidas contra la acción del agua.

Se realiza verificación del punto ecológico, siempre que se realiza recorrido y muchas ocasiones se verifico la incorrecta clasificación de los desechos, informando al contratista, sin presentar mejoría en el tema.

Los residuos sólidos son recopilados diariamente y con apoyo de las rutas que transitan por el sector para la recolección y disposición final de residuos ordinarios, se hace la entrega a la empresa URBASER esta empresa no entrega un soporte de evacuación de los residuos, los datos calculados hacen referencia al volumen aproximado generado por una bolsa de 65 cm de ancho x 90 cm de largo. Por lo general durante el periodo, la empresa URBASER se encontró realizando la recolección los días lunes, miércoles y viernes.

Tabla 15. Volumen de residuos sólidos

SEMANA		DÍAS HÁBILES DE RECOLECCIÓN	N° BOLSAS ENTREGADAS POR DÍA DE RECOL.	N° BOLSAS TOTAL	PESO APROX C/U KG	PESO TOTAL KG
1	1 al 8 7 de diciembre del 2022	3	1	3	3	9
2	8 al 14 de diciembre del 2022	3	1	3	3	9
3	15 al 21 de diciembre del 2022	3	2	6	3	18
4	Del 22 al 31 de diciembre del 2022	3	2	6	3	18
TOTAL, PESO DE BASURA SUELTA (Kg)						**54**
TOTAL, VOLUMEN DE BASURA SUELTA (m^3)						1.68

Fotografía 5 Punto Ecológico



Fotografía 6 Estructuras de aseo



Fuente Edificaciones y Vlas SA

Indicadores de cumplimiento

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% de Generación de residuos peligrosos**
FORMULA	$\frac{Volumen\ residuos\ peligrosos\ dispuestos\ 0}{Volumen\ residuos\ peligrosos\ generados\ 0} X\ 100 = \%$
INDICADOR	**% de Generación de residuos ordinarios**
FORMULA	$\frac{Volumen\ residuos\ ordinarios\ dispuestos\ 54kg}{Volumen\ residuos\ ordinarios\ generados\ 54\ kg} X\ 100 = 100\%$
INDICADOR	**% de Generación de residuos de papel, cartón y plástico**
FORMULA	$\frac{Volumen\ de\ residuos\ ordinarios\ dispuestos\ 0}{Volumen\ de\ residuos\ ordinarios\ generados\ 0} X\ 100 = NA\%$
INDICADOR	**% Brigadas realizadas**
FORMULA	$\frac{Volumen\ residuos\ de\ papel\ y\ carton\ dispuestos\ \ 0Kg}{Volumen\ residuos\ de\ papel\ y\ carton\ generados\ \ 0\ Kg} X\ 100 = 100\%$

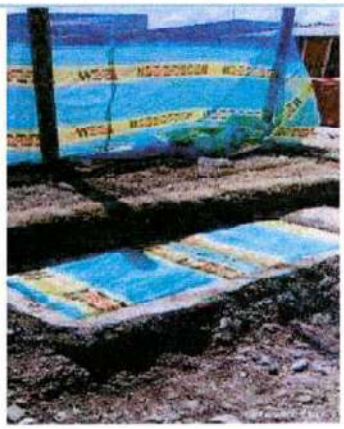
Programa D6: Manejo de aguas superficiales

En el periodo del informe se pagaron el servicio de agua cruda para abastecimiento de la maquinaria y equipo.

El material de construcción no se cubrió en obra, ya que se utilizan inmediatamente.

En el periodo del informe se cubrieron 6 sumideros en el barrio La Paz.

Registro fotográfico

Fotografía 2 Sumideros	Fotografía 3 Sumideros
	

Fuente Edificaciones y Vlas SA

Indicadores de cumplimiento.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% de Sumideros protegidos**

FORMULA	$\frac{N°.de\ facturas\ pagadas\ \frac{1}{1}}{N°\ de\ facturas\ emitidas\ \frac{1}{1}} X\ 100 = 100\%$

Programa D7: Manejo de excavaciones y rellenos

Se verifico el material producto de excavaciones y demoliciones RAP (Reciclado Asfaltico de Pavimento) el cual se transportó en las volquetas del contratista; que cuentan con sus respectivas carpas para evitar la dispersión de materiales cuando se encuentran en movimiento; las cueles están aprobadas para su labor y tienen el análisis pre-operacional al inicio de cada jornada laboral.

Cerca de la finalización de cada jornada de trabajo se inspeccionan áreas donde se requiere señalización de excavaciones y/o zonas de riesgo, esta actividad es implementada en compañía del residente SST, ambiental y con apoyo del personal de la BOAL, del contratista.

Durante la jornada laboral se verifico las áreas aíslan de trabajo (Excavaciones) con las señales del PMT, maletines, colombinas, cinta de señalización y conos viales. En general las áreas de excavación en el frente habilitado se encontraron acondicionadas para evitar el ingreso de personal ajeno a la obra como la instalación de señalización preventiva para evitar accidentes.

Al finalizar las jornadas laborales, las áreas y frentes de trabajo se dejan debidamente, transitables y se retira la señalización preventiva y la BOAL se encarga diariamente de dejar las zonas de trabajo acondicionadas y seguras para el personal que transita por las zonas aledañas.

Se verifico que no hubo la necesidad de realizar ningún acopio de material, el RAP, ya que se evacua inmediatamente de obra.

La excavaciones realizadas y señalizadas en el periodo del informe fueron las siguientes:

- Excavación en excavación barrio La Paz.

Indicadores de cumplimiento.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% de excavaciones señalizadas**
FORMULA	$\frac{N°\ de\ excavaciones\ señalizadas\ \frac{1}{1}}{N°\ de\ excavaciones\ existentes\ \frac{1}{1}} X\ 100 = 100\%$

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% de Material de excavación acondicionado**
FORMULA	$\frac{No.de\ acopios\ de\ material\ acondicionado\ \frac{NA}{NA}}{No.de\ acopios\ establecidos} X\ 100 = NA$

Fotografía 8. Excavación Señalizada



Programa D8: Control de emisiones atmosféricas y ruido

En el periodo del informe no se realizó el monitoreo de ruido.

En el periodo del informe se continúa verificando que los vehículos utilizados en la obra cuenten con la revisión tecno mecánica.

Indicador de cumplimiento

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% de Revisiones tecno mecánicas**
FORMULA	$\frac{N°\ de\ revisiones\ tecnomecanicas}{N°\ de\ Vehiculos}\frac{4}{4} X\ 100 = 100\%$

Programa D9: Manejo de redes de servicios públicos

En el periodo del informe se presentaron (02) dos daños en el sector intervenido:

- 11 de diciembre del 2022 daño Acueducto sector barrio La Paz.
- 2 de diciembre del 2022 daño de alcantarillado carrera 8 entre 21 y 21 A.

Indicadores de cumplimiento.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% de Suspensiones**
FORMULA	$\frac{N°\ suspensiones\ servicios\ públicos\ presentados}{N°\ suspensiones\ de\ servicios\ públicos\ programadas}\frac{0}{0} X\ 100 = NA$
INDICADOR	**% de Suspensiones de servicio de acueducto**
FORMULA	$\frac{N°\ suspensiones\ de\ servicio\ acueducto\ presentados}{N°\ suspensiones\ de\ servicio\ acueducto\ programadas}\frac{0}{0} X\ 100 = NA$

3.2.5 Componente E - Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Por parte de la interventoría para este componente se realiza el seguimiento en los temas de seguridad y salud en el trabajo que corresponde con la normativa a aplicar por parte del contratista, además de verificar los lineamientos planteados en el PIPMA para garantizar las salud y seguridad de los colaboradores que desempeñan labores propias del contrato de obra.

Programa E1: Seguridad y Salud en el Trabajo

En el periodo evaluado no ingresaron trabajadores, de igual manera cuando ingresan se verifica que todo el personal relacionado cuente con sus exámenes de ingreso, inducciones y afiliaciones a la seguridad social. Ver Anexo componente E.

En el periodo del informe hay tres (3) trabajadores retirados del proyecto - periodo del 01 de diciembre al 30 de diciembre de 2022.

Registro de accidentes morbilidad y ausentismo: Para este periodo el contratista, no reporto accidentes laborales ni ausentismo laboral.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA RETIRO
1	JHON ALEXANDER BEDOYA	1061600993	CONDUCTOR VOLQUETAC	01/12/2022
2	CESAR ANDRES MONTENEGRO	1061718568	CONDUCTOR DT	01/12/2022
3	NIK JHONATAN SOLARTE SOLARTE	1061088708	ING. AUX RESIDENTE OBRA	01/12/2022

RESUMEN DE PERSONAL DEL CONTRATO

- Personal que ingresa: 5
- Personal retirado: 3
- Personal activo: 37 colaboradores

Fotografía 9	Fotografía 10
	
Fotografía 11	**Fotografía 12**



Fotografía 13



Fotografía 14



Fotografía 15



Fotografía 16



DEMARCACION DE TRAMOS A INTERVENIR.

Indicadores de cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**Índice de frecuencia: I.F**
FORMULA	$\frac{Número\ de\ casos\ reportados\ x\ 240.000}{Número\ de\ horas\ hombre\ trabajados} \quad \frac{0}{13280} = 0$
DEFINICIÓN	El índice de frecuencia es la relación entre el número de casos (incidentes relacionados con el trabajo, accidentes de trabajo y enfermedades laborales

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	Índice de Severidad:
FORMULA	$\frac{N°\ días\ perdidos\ o\ cargados\ por\ AT\ en\ el\ período\ x\ 240.000}{Número\ de\ horas\ hombre\ trabajados} \frac{0}{13280} = 0$
DEFINICIÓN	El índice de severidad es la relación entre el número de días perdidos o cargados por lesiones durante un período de tiempo y las horas-hombre trabajadas durante el mismo

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	Índice Medio de Días Perdidos por Lesiones:
FORMULA	$\frac{No\ de\ días\ perdidos\ o\ cargados\ por\ causa\ de\ lesiones\ en\ un\ periodo}{Total\ de\ casos\ con\ tirmpo\ perdido} — = 0$
DEFINICIÓN	El índice medio de días perdidos por lesiones se define como la relación entre el índice de severidad y el índice de frecuencia. El índice medio de días perdidos puede ser aplicado para los casos reportados con tiempo perdido de accidente de trabajo y de enfermedad profesional

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	Índice de Lesión Incapacitante (ILI):
FORMULA	$\frac{Indice\ de\ frecuencia\ X\ Severidad}{1000} \frac{0}{1000} = 0$
DEFINICIÓN	El índice de Lesión Incapacitante, ILI por ATEP, como indicador relaciona número de accidentes de trabajo registrados o enfermedades profesionales diagnosticadas que han generado incapacidad, el número de días de incapacidad y la pérdida de capacidad laboral o muertes que generaron dichos eventos.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	Tasa de Incidencia (IT):
FORMULA	$\frac{(No\ de\ accidentes + No\ de\ incidentes)\ X\ K}{No\ Total\ de\ trabvajadores\ expuestos} \frac{0}{35} = 0$
DEFINICIÓN	La tasa de incidencia de los accidentes de trabajo corresponde al número de incidentes y accidentes de trabajo que ocurrieron dentro de un período de tiempo determinado, en relación con el número de personal expuesto durante el mismo período. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 100.000 personas según el tamaño del denominador.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	Tasa de Ausentismo (AT) – Accidente de Trabajo:
FORMULA	$\frac{No\ de\ horas\ perdidas\ por\ AT\ X\ K}{No\ de\ horas\ trabajadas} \frac{0}{13280} = 0$
DEFINICIÓN	La tasa de ausentismo por accidente de trabajo corresponde al número de horas perdidas por accidentes de trabajo que ocurren dentro de un período de tiempo determinado, con relación al número total de horas trabajadas durante el mismo periodo. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 100.000 (K) horas hombre trabajadas y su resultado indica que por cada K personas se pierden un determinado número de horas por accidente de trabajo.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	Tasa de Incidencia Especifica (EP):
FORMULA	$\frac{Casos\ nuevos\ que\ presentan\ patología\ por\ expocicion\ X\ K}{No\ de\ horas\ trabajadas\ total\ expuestas\ al\ riesgo} \frac{0}{13280} = 0$
DEFINICIÓN	La tasa de incidencia específica por enfermedad profesional corresponde al número de nuevos casos por enfermedad profesional que ocurren dentro de un período de tiempo determinado y su relación con el número total de trabajadores expuestos al riesgo en el mismo período. La tasa se expresa por 1000, 10.000 o 100.000 (K) personas

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	Tasa de Ausentismo (EP) – Enfermedad Profesional:
FORMULA	$\frac{Número\ de\ horas\ perdidas\ por\ enfermedad\ profesional\ X\ K}{No\ de\ horas\ trabajadas} \frac{0}{13280} = 0$

DEFINICIÓN	La tasa de ausentismo por enfermedad profesional corresponde al número de horas perdidas por enfermedad profesional que ocurren dentro de un periodo de tiempo determinado, con relación al número total de horas trabajadas durante el mismo período. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 100.000 (K) horas hombre trabajadas y su resultado indica que por cada K personas se pierden un determinado número de horas por enfermedad profesional.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**Tasa de Ausentismo (EC) – Enfermedad Común:**
FORMULA	$\frac{N°\ de\ horas\ perdidas\ por\ enfermedad\ comun\ \ X\ K}{No\ de\ horas\ trabajadas}\ \frac{0}{13280}\ X100\ = \mathbf{0}$
DEFINICIÓN	La tasa de ausentismo por enfermedad común corresponde al número de horas perdidas por enfermedad común que ocurren dentro de un período de tiempo determinado, con relación al número total de horas trabajadas durante el mismo período. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 100.000 (K) horas hombre trabajadas y su resultado indica que por cada K personas se pierde un determinado número de horas por enfermedad común

Reunión del COPASST: Ingeniería **EDIFICACIONES Y VIAS S.A** cuenta con un Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo, dando cumplimiento a la resolución 2013 de 1986 y Decreto 1072 de 2015 donde se realizan las reuniones correspondientes a cada mes durante la ejecución del proyecto, en la cual se presenta la gestión del área SST, socialización de la accidentalidad y ausentismo, indicadores, inspecciones y capacitaciones.

El contratista para el mes de **diciembre** adjunta acta de reunión del COPASST realizada en el **25 de diciembre de 2022**. Donde se dan a conocer los indicadores SST, seguimiento a actividades desarrolladas durante el periodo, y socialización actividades programadas basadas en el plan de trabajo.

Afiliaciones al sistema de seguridad social Durante el periodo y como parte del seguimiento de interventoría se realizó la verificación de las afiliaciones del personal que ejecuta labores, comprobando que el contratista tuvo para este periodo a **35** colaboradores afiliados al sistema de seguridad social.

Exámenes médicos para este periodo el contratista presenta la realización de un examen médico de ingreso.

Indicadores de cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% Trabajadores vinculados al sistema de seguridad social:**
FORMULA	$\frac{N°\ de\ \ trabajadores\ vinculado\ al\ sistema\ de\ seguridad\ social}{No\ \ de\ trabajadores\ contratados}\ \frac{37}{37}\ X100\ = \mathbf{100\%}$

Inducción y Capacitación: Durante este periodo el contratista **EDIFICACIONES Y VIAS S.A** no realizó inducciones

Cuando se realizan inducciones tiene una duración de 1 hora donde se explican los siguientes temas: Política SISOMA, COPASST, Plan de Emergencia y Brigadistas, Reporte de Incidentes y Accidentes de Trabajo, examen de ingreso, notificación del riesgo, inducción al cargo, uso de EPP.

el objeto de garantizar el cumplimiento del plan de capacitaciones y dar las instrucciones conforme a la normativa colombiana en materia de seguridad y salud en el trabajo se dan las capacitaciones en los temas establecidos y se brindan las charlas de seguridad. A continuación, en la siguiente tabla se relacionan las capacitaciones en el área de SST durante el periodo.

Tabla 14 Inducciones y capacitaciones

No.	Fecha	Tema
1	16/12/2022	CAPACITACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD INTEGRADAS EN LAS MAQUINAS, EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS
2	23/12/2022	CONTROL DE RIESGO PEATONAL Y VIAL
3	23/12/2022	MATRIZ DE PELIGROS

FUENTE: EDIFICACIONES Y VIAS S.A

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Capacitaciones SST
FORMULA	$\frac{\text{No de eventos de capacitacion realizados } 3}{\text{Numero de eventos programados } 3} X\ 100 = 100\%$
	%Trabajadores presentes en capacitaciones
FORMULA	$\frac{\text{Promedio de trabajadores presentes en capaciatciones } 37}{\text{Numero total de trabajadores en obra } 37} \text{ X } 100 = 100\%$

Elementos de protección personal y dotación: Durante el periodo el contratista entrega y reposición de elementos de protección personal, está pendiente la entrega de copas auditivas y respiradores para el personal que acompañan los equipos.

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% EPP
FORMULA	$\frac{\text{Numero de trabajadores dotados con EPP } 37}{\text{Numero de trabajadaores contratados } 37} X\ 100 = 100\%$

Fotografía 17	Fotografía 18
	

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL.

Notificación de riesgos: Para este periodo el contratista **EDIFICACIONES Y VIAS S.A** realizó la notificación de riesgos a **5** colaboradores que ingresó a realizar labores propias del contrato de obra.

Actividades de alto riesgo: Durante este periodo no se desarrollaron actividades de alto **riesgo.**

Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo: El contratista realiza diferentes inspecciones en el lugar de trabajo ya que se considera una actividad preventiva que se incluye las técnicas generales de seguridad previas al accidente analíticas debido a que su objetivo es el de detectar las conductas y las acciones que pueden resultar peligrosas.

Fotografía 19	Fotografía 20	Fotografía 21





Fotografía 22	Fotografía 23	Fotografía 24





INSPECCIÓN, SUMINISTRO, REPOSICIÓN Y ENTREGA DE EPP. Y DOTACION

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% EPP**
FORMULA	$\frac{Numero\ de\ \text{inspecciones planeadas}\quad 6}{Numero\ de\ \text{inspecciones ejecutadas}\quad 6} X\ 100 = \mathbf{100\%}$

Programa E2: Plan de contingencia etapa de construcción

Plan de emergencias y contingencias.

Para el periodo evaluado el contratista instala el botiquín, camilla de emergencias y extintor en el frente de obra (1). A continuación, se presenta la información correspondiente a los elementos con los que cuenta el contratista para la atención de emergencias.

Tabla 15 Elementos plan de emergencia

EQUIPO	CANTIDAD	UBICACIÓN
Botiquines primeros auxilios	1	PAC
Camilla rigida	1	PAC
Extintores Multipropósito	1	FRESADORA FINISHER VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO y LLANTAS
Kits anti derrames	0	

Fotografía 25	Fotografía 26	Fotografía 27



Fotografía 28



Fotografía 29



Fotografía 30







INSPECCION EPP, ELEMENTOS DE EMERGENCIA.HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, SEÑALIZACION

Brigada de emergencias: El contratista **EDIFICACIONES Y VIAS S.A**, durante este periodo tiene vigente la brigada unificada de emergencias. la cual está conformada de la siguiente manera:

RECURSO HUMANO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA			
NOMBRE	N° CEDULA	CARGO	TELEFONO
LAURA PILAR VELASCO	34329960	RESIDENTE SST	3233659189
SIRLENA MEDINA	1061713662	RESIDENTE AMBIENTAL	3164983492
CRISTINA QUILINDO	1061747020	RESIDENTE SOCIAL	3146427734
JAIME PRECIADO	4615854	RESIDENTE DE OBRA	3162546425
ANDRES QUIÑONEZ.	1061699008	INSPECTOR DE OBRA.	3116747974.
FABIAN ANDRES AGREDO	1061737458	OFICIOS VARIOS	3126021524
OSCAR EDUARDO SECUE	1067521620	OFICIOS VARIOS	3162536954
JUAN PABLO QUIÑOÑEZ	1004709684	OFICIOS VARIOS	3144476194
JOSE ROELFI GONZALEZC	94429021	CONDUCTOR	3148121700
CARLOS ANDRES VELASCO	1079409048	OFICIOS VARIOS	3113785280
JHON ALBERTO OBANDO	1061599352	OFICIOS VARIOS	3006735497
OSCAR EDUARDO MENESES	1061601364	OFICIOS VARIOS	3017896533
JHON ALEXANDER JIMENEZ	1058788777	OFICIOS VARIOS	3103581074
OMAR ALEJANDRO AGREDO	1061598911	OPERADOR VIBRO	3206298224

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% Capacidad de respuesta**
FORMULA	$\frac{Numero\ de\ emergencias\ atendidas\ oportunamente}{Numero\ de\ emergencias\ presentadas}\frac{0}{0} X\ 100 = N.A.$
INDICADOR	**% de simulacros realizados**
FORMULA	$\frac{Numero\ de\ simulacros\ efectuados}{Numero\ de\ simulacros\ programados} X\ 100 = N.A$

3.2.5 Componente F - Señalización Y Manejo De Tráfico

Se realiza seguimiento a los estándares en materia de seguridad vial, verificando la implementación de señalización que cumple con los requerimientos de las normas nacionales del ministerio de transporte, INVIAS y secretaria de tránsito municipal de Popayán. En el presente componente la interventoría realizo las siguientes actividades:

- En el periodo del informe se tiene aprobado la ampliación del documento PMT por medio de la resolución 20221500024217 de noviembre 24 de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022 por tránsito municipal.
- Seguimiento a la implementación de medidas estipuladas den el plan de manejo ambiental referente al componente F.
- Inspección de frentes de obra y verificación de actividades de señalización para garantizar la seguridad del peatón.
- Verificación de desvíos, senderos peatonales, excavaciones señalizadas y disposición de personal para manejo de tráfico.
- Elaboración de requerimientos de acuerdo al seguimiento en la materia.

Para el periodo del presente informe el contratista **EDIFICACIONES Y VIAS S.A** cuenta con tres (6) personas para regulación de tráfico para el manejo de las actividades en obra, estas personas están ubicadas en:

- Verificación de instalación de señalización requerida en el PMT aprobado para el desarrollo de las obras del contrato.
- Seguimiento a la implementación de medidas estipuladas den el plan de manejo ambiental referente al componente F.
- Inspección de frentes de obra y verificación de actividades de señalización para garantizar la seguridad del peatón.
- Verificación de desvíos y disposición de personal para manejo de tráfico.
- Elaboración de requerimientos de acuerdo al seguimiento en la materia.

Señalización nocturna: En el presente mes las labores nocturnas que se desarrollaron fueron mínimas, y cuando se requirió se utilizó las exploradoras instaladas en cada equipo.

Fotografía 31



Fotografía 32



Fotografía 33



Fotografía 34

Fotografía 34

Fotografía 35





SEÑALIZACION

Programa F2: Manejo de Tráfico

Para este periodo el contratista cuenta con el plan de manejo de tráfico aprobado por la secretaria de tránsito mediante Resolución 20221500001894 del 18 de enero de 2022, lo cual permitió iniciar con la intervención de los sectores mencionados en la fase I del contrato de obra.

Para el periodo del presente informe el contratista **EDIFICACIONES Y VIAS S.A** cuenta con cuatro a seis (4 - 6) personas para regulación de tráfico y manejo de movilidad en obra, estas personas están ubicadas en las diferentes intersecciones intervenidas con sus respectivas elementos preventivos e informativos.

Señales instaladas en obra: Para el periodo **EDIFICACIONES Y VIAS S.A** continuó con las señales preventivas requeridas en obra. El contratista utilizo delineadores tubulares, barricadas metálicas y maletines plásticos de acuerdo a la norma de manual de señalización vial del instituto nacional de vías – INVIAS, para la canalización de tráfico en los sectores donde se requirió de esta actividad. Para este periodo se tienes disponibles 100 señales verticales requeridas para intervenir los diferentes sectores de la ciudad.

DESCRIPCION	UNIDAD
Barreras plásticas	30
Señalización kit de aproximación	36
Demarcación de áreas con cinta de señalización	6
Delineadores tubulares	22
Conos	6

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% de N° de señales utilizadas fase I etapa I
FORMULA	$\frac{N°\ de\ señales\ preventivas\ puestas\ en\ obra}{N°\ de\ señales\ exigidas\ en\ el\ Plan\ de\ Manejo\ de\ Tráfico} \frac{45}{60} X\ 100 = 75\%$

SEGUIMIENTO COVID-19

Durante el periodo del 01 de diciembre al 30 de diciembre NO se presentaron caso relacionados con COVID- 19.

4. PRESUPUESTO PIPMA

El contrato 202218000242 del 2021 que tiene como objeto MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021., cuenta con un presupuesto para el desarrollo de las actividades Socio-Ambientales descritas en el programa de implementación del plan de manejo ambiental - PIPMA de $ 131.647.040,00 pesos, dispuesto de la siguiente manera:

- Presupuesto PMA: $ 80.085.076,00
- Presupuesto PMT: $ 51.561.964,00

ANEXO11
BITÁCORA DE OBRA

4. Sector Campamento, La Villa, Batallón
5. Pandiguando
6. Entrada a Puelenje
7. los naranjos

Por confirmar - Barrio Caldas
- Cra 7 entre Calles 16AN y 17N B1 El recuerdo
- Loma de la Virgen Cra 12 entre Carrera 17 y Calles 17, Calle 22, 26, 29 y 30

Juan Camilo Gil Pinzón
Residente de Obra

Eugoberto Quintero C.
Reside. Interventor.

Miercoles 7 de dic/2022.
Estado del tiempo Lluvias intensas de 4:00am - 5:00am y de 1:00 pm - 3:00 pm, moderadas de 9:00pm - 12pm
Equipos: frente 2 (1 retroexcavadora, 1 motoniveladora, 1 compactador, 3 volquetas, 2 NPR, 1 Equipo de Topografia.
Personal: 1 Ing. Residente, 17 oficios Varios, 1 Topografo, 3 operadores, 5 conductores, 2 vigilantes
Actividades: Se continua con trabajos de excavación y llenos con material de mejoramiento KOTO60 a KOTO70
Sector Cra 6 calles 69N y 70BN La Paz.

Juan Camilo Gil
Residente de Obra

Eugoberto Quintero C.

Jueves 8 de Diciembre de 2022
Estado del tiempo: lluvias 5:00 - 6:00am y 7:00 - 8:00pm Mod.
Equipo: 1 Retroexcav, 1 motoniveladora, 1 Compactador 1 NPR.
Personal: 1 Ing. Residente, 6 oficios Varios, 1 topografo, 3 operadores, 2 Conductores, 2 vigilantes.
Actividades: Excavación y mejoramiento KOTO70 a KOT 080. (La Paz)
Nota: se trabaja hasta las 11:00 am

Eugoberto Quintero C.

Powered by CamScanner

Nota
Se solicita a la interventoría y a la supervisión de las vías para realizar la intervención de la mejor manera se requieren todas las cordenas de una manera especifica las vías a ser intervenidas
Jaime Osvaldo C.
Residente de obra

Viernes 9 de Diciembre de 2022
Estado del Tiempo: Lluvias Intensas 3:00 pm - 4:00 pm
Equipo: 1 Retroexcavadora, 1 Compactador, 1 motoniveladora, 3 Volquetas, 2 NPR, 1 Equipo de Topografía
Personal: 1 Ing. Residente, 1 Topografo, 12 oficios Varios, 3 operadores, 5 conductores, 2 vigilantes
Nota: Frente de obra 1: Sin Actividad.
Actividades: Se continua con excavaciones y mejoramiento K0+070 - K0+095 en el Sector de la Paz Cruce entre Clles 69N y 70BN
- El Contratista Instala Señals de Sendero Peatonal, El estado del Cerramiento es bueno.
Jaime Osvaldo C. Residente de Obra Hugoberto Quintero

Sabado 10 de Diciembre de 2022
Estado del Tiempo: No se presentan lluvias.
Equipo: 1 Retroexcavadora, 1 Compactador de gramilares, 3 Volquetas doble troque, 2 NPR, 1 Equipo de Topografia.
Personal: 1 Ing. Residente, 1 Topografo, 12 oficios Varios, 3 operadores, 5 conductores, 2 vigilantes.
Nota: Frente 1 (Guayabal). Sin Actividad.
Actividades: Se Continua con excavaciones y mejoramiento K0+095 al K0+115
Nota: Se presenta daño en tuberia domiciliaria

Powered by CamScanner

al parecer aguas lluvias del antiguo Pio-Pio (Bandare) ese es Carrera 6 Calle 70BN esquina, Acueducto Suguiere Suspender (Nal El Contratista lo Suspende. (Tapón).

Nota: Interventoria hace la observación que hay Sectores con exceso de humedad y fallos (acolchonamientos) que deberan Ser corregidos

Rugoberto Quintero C
Res. Interv.

Domingo 11 de Diciembre de 2022

Estado del Tiempo: Lluvias fuertes. 3:15 - 4:00 pm

Equipo: 1 Retroexcavadora, 1 Compactador, 3 volquetas, 2 NPR, 1 Equipo de topografia.

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Topografo, 6 oficios Varios 2 Operadores, 5 Conductores, 2 vigilantes.

Actividades: Se termina la excavación y lleno con material de mejoramiento K0+115 al K0+127 El K0+000 se ubica en la Calle 69N y El K0+127 sobre la Calle 70BN, de la Cra 6 Barrio la Paz.

Nota: El director de obra Ing. Anderson Viveros informa que el dia de mañana Lunes se reactivan los trabajos de reparches (Barrio El guayabal)

Rugoberto Quintero C.
Res. Interventoria.

Lunes 12 de Diciembre de 2022

Estado del tiempo: Lluvias Intensas de 3:00 - 4:00 pm y de 5:00 - 6:00 pm.

Equipo: Frente 1 - 1 Retroexcavadora de Orugas, 1 Rana

Frente 2: 1 finisher, 1 fresadora, 2 Compactadores, 7 Volquetas, 2 Turbos, 2 Extendedoras, 1 Equipo de Topografia.

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Inspector, 5 operadores, 9 Conductores, 2 vigilantes (frente 1) 2 vigilantes (frente 2), 17 oficios Varios.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Actividades: Se fresa e Instala mezcla Asfaltica
- Intersección Carrera 21 con calle 7
- Carrera 7 entre Calles 20 y 21 (Jose Mª obando)
Fresado Carrera 20B entre Calles 7A y 8A Guayaba.
Nota: Se socializa intervención en Carrera 19 entre Calles 6 y 7 B/La Esmeralda
Nota: Reparación de tubería alcantarillado Sanitario) pluvial entre Sumidero y Cámara del K0+125 B/La Paz.

Jaime Ovalle Gil — Rugoberto Quintero C
Residente de Obra — Res. Interventoría.

Martes 13 de Diciembre de 2022
Estado del Tiempo: Lluvias Intensas de 3:00-5:00 pm
Equipo: 1 finisher, 1 Fresadora, 2 compactadores 2 NPR, 7 Volquetas.
Personal: 1 Residente, 1 Inspector, 4 operadores, 17 oficios Varios, 9 conductores, 2 Vigilantes
Actividades: Fresado y Mezcla Cra 19 entre Calles 6 y 7 B/La Esmeralda.
Fresado: - Calle 7 entre Cra 19 y 20
- Se termina de fresar Cra 20B entre calles 7A y 8A.
Nota: Se realiza comité técnico en obra, Cra 19 con Clle 7 esquina B/La esmeralda.
Nota: Se informa al contratista que para el Acta de obra 7 Se debe tener en cuenta que la alcaldía retiene el 10% para liquidación del Contrato.

Jaime Ovalle Gil — Rugoberto Quintero C
Residente de Obra

Miercoles 14 de Diciembre de 2022
Estado del tiempo: No se presentan lluvias.
Equipos: 1 finisher, 1 fresadora, 2 compactadores, 2 NPR, 7 Volquetas.

Powered by CamScanner

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Inspector, 4 Operadores 9 Conductores, 17 Oficios Varios.
Actividades: Se termina de Instalar mezcla en Calle 7 entre Cras 19 y 20 (B/la Esmeralda)
- Mezcla Asfaltica en Carrera 20B entre Calles 7A y 8A barrio El Guayabal, carril occidente,

Nota: Acueducto y Alcantarillado atienden daño socavación en intersección Cra 19 con Calle 7 B/ La Esmeralda

Jaime Eduardo P. M
Residente de Obra

Rugoberto Quiñonez C.
Res. Interventoria.

Jueves 15 de Diciembre de 2022.
Estado del tiempo: Lluvias Intensas de 5:00-6:00 pm
Equipo: 1 Fresadora, 1 Finisher, 2 compactadores 2NPR, 7 Volquetas
Personal: 1 Ing. Residente, 1 Inspector, 4 operadores, 9 Conductores, 14 oficios Varios, 1 Residente Social, 2 Vigilantes,
Actividades: - Se termina la Instalación de mezcla en la Carrera 20B entre Calles 7A y 8A B/ El Guayabal.
Fresado: Cra 22 entre Calles 10 y 11 B/ El retiro
también se inicia Instalación de Mezcla desde Calle 11 hacia calle 10.
Nota: Daño de domiciliaria de Acueducto Cra 22 Calle 3C 36 Barrio El retiro, El cual es atendido por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán,
Nota: El area Social realiza actividades de Información a la Comunidad y registro fotografico en el Barrio El retiro.

Jaime Eduardo Del
Residente de Obra

Rugoberto Quiñonez C.
Res. Interventoria.

Viernes 16 de Diciembre de 2022
Estado del tiempo: No se presentan lluvias.
Equipo: 1 finisher, 1 fresadora, 2 Compactadores,

Powered by CamScanner

2 Turbos, 1 marmita, 7 Volquetas.
Personal: 1 Ing. Residente, 1 Inspector, 4 operadores, 10 conductores, 17 oficios varios.
Actividades: Fresado Carrera 23 entre Calles 10 y 10A
Mezcla asfaltica: Carrera 22 entre Calles 10 y 11 (Se termina).
Daño de acueducto Carrera 22 Casa #10-38
Es atendido por la Empresa de Acueducto. terminando la tarde se presenta daño en planta de Asfalto.
Residente de Obra — Rugoberto Quintero C. Resi. Interventoria.

Sabado, 17 de Diciembre de 2022
Estado del tiempo: No Lluvias
Equipo: 1 fresadora, 1 finisher, 2 compactadores, 7 volquetas, 1 marmita, ZNPR.
Personal: 1 Ing. Residente, 1 Residente Social, 1 Residente Siso, 1 Inspector, 17 oficio Varios, 2 Vigilantes, 10 Conductores.
Actividades: Fresado Calle 10 entre Carrera 22 y 23; Carrera 23 entre Calle 10 y 10A
Asfalto: Se termina Carrera 22 entre 10 y 11 se realiza Asfalto en calle 10 entre Cra 22 y 23 y se inicia instalación desde Calle 10A hacia la 10 de la Carrera 23 (Retiro Bajo)
Residente de Obra — Rugoberto Quintero C. Residente Interv.

Domingo 18 de Diciembre de 2022
Estado del tiempo: lluvias moderadas de 5:00-6:00 am y de 4:00pm-5:00pm.
No se programan Actividades.
Lunes 19 de Diciembre de 2022 — Rugoberto Quintero C.
Estado del tiempo: lluvias Intensas 5pm-6pm.
Equipo: 1 fresadora, 1 finishes, 2 compacta-

Powered by CamScanner

dores, 1 marmita, -
Personal: 1 Residente de obra, Residente Social, Residente Ambientas, 17 oficios varios, 2 vigilantes, 7 volquetes, (Conductores), 4 operadores.
Actividades: Se termina instalación asfalto Carrera 23 entre Calle 9 y 10 Retiro bajo
- Se inician Actividades en el B/El Centro Calle 6 entre Carrera 4 y 5 (Parqueadero Exito)
- Se realiza Socialización de Intervención en Calle 6 entre Cras 5 y 4 y Cra 5 entre calles 12 y 2.

Residente de Obra — Rugoberto Quiñonez C. Res. Interventoria.

Martes 20 de Diciembre de 2022
Estado del Tiempo: lluvias intensas. 6:30 - 7:30 Pm.
Equipo: 1 finisher, 1 fresadora, 1 marmita, 2 compactadores, 2HPR, 7 Volquetas (4 Asfalto, 3 fresado)
Personal: 1 Residente obra, 1 Inspector, 1 Residente Social, 1 Residente SISO, 1 Residente Ambiental, 2 Vigilantes, 4 operadores, 17 oficios Varios
Actividades: Fresado: Calle 6 entre Cras 4 y 5 B/El Centro Carrera 5 entre Calles 5, 6 y 7
Asfalto: Se instala asfalto en las calles fresadas
Nota: Se autoriza Calle 9 entre Cras 4 y 5 (Supervisión) y toda la Cra 5 desde Calle 2 hasta Calle 12.
Nota: La Supervisión informa que el Cómite tecnico del dia de hoy se aplaza para el dia de mañana a las 11 am por disponibilidad de salon.
Nota: Se Solicita mayor atención por parte del Area Social en este sector debido al alto flujo Peatonal.

Residente de Obra — Rugoberto Quiñonez C. Residente Interv.

Miercoles 21 de Diciembre de 2022
Estado del tiempo: No Se presentan lluvias
Equipo: 1 finisher, 1 fresadora, 2 compactadores

Powered by CamScanner

2 Turbos, 1 marmita, 2 NPR, 6 volquetas,
Personal: 1 Ing. Residente, 1 Inspector, 4 operadores, 17 oficios Varios, 9 conductores.
Actividades: Fresado Carrera 5 entre Calle 4 y 5
Asfalto: Cra 5 entre Calle 6 y 7
Cra 5 entre Calle 4 y 5
Calle 5 entre Cras 4 y 5 (puntualizado)
Nota: Acueducto suministra brocales y tapas para acueducto faltantes. Sec L.
Cra 5 entre Calles 4 y 5
Nota: Se realiza Comité de obra en el cual se recomienda al personal técnico del Contratista tomar las medidas que sean necesarias para evitar que los peatones se expongan a un accidente con la maquinaria de
Nota: Los Vendedores ambulantes son bastante intensos en el sector con respecto a obstaculizar la movilidad de peatones y maquinaria del Contratista.

Jaime Osorio Ch
Residente Obra

Ing Roberto Quintero C
Res. Interventoría.

Jueves 22 de diciembre de 2022
- El Contratista recoge la maquinaria del Sector el Centro.
Estado del tiempo: llovizna moderada de 4:00-6:00pm
- Nota: se informa que se retomaran Actividades el día lunes 26 de diciembre de 2022 en el Sector Calle 3 entre Carrera 17 y 21C Barrio Pandiguando por Solicitud de la Supervisión Este vie es alterno por cierre de la Calle 5 a el Sector de la esmeralda. (trabajos de pavimental)

Jaime Osorio Ch
Residente de Obra

Ing Roberto Quintero C.

Powered by CamScanner

Viernes 23 de Dic / 2022
Estado del tiempo No se presentan lluvias
Sin Actividad en obra.
Sabado 24 de Dic / 2022
Estado del tiempo : lluvias intensas de 3:00pm a 6:00pm.
Sin Actividad en obra.
Domingo 25 de Dic / 2022 (Festivo)
Estado del tiempo : lluvias moderadas 11:00 am - 1pm.
Sin Actividad en obra.
Jairo Guerrero Ord
Residente de Obra
Rugoberto Quintero C.
Res. Interventoria.
Lunes 26 de diciembre / 2022.
Estado del tiempo: lluvias moderadas Fuertes 3:00 - 4:00 Pm 0:00 - 6:00 am
Equipo: 1 finisher, 1 fresadora, 2 Compactadores, 7 volquetas, 2 NPR, 1 Marmita, 7 Volquetas
Personal: 1 Ing. Residente, 1 Inspector, 4 operadores, 17 oficios varios, 10 Conductores, 2 vigilantes. 1 Social Resid.
Actividades: Socializacion - Calle 3 Carrera 17 a 21 C B/ Pandiguando.
Fresado: Calle 3 entre Cras 17, 18 y 19 B/ Pandiguando
Asfalto - Calle 3 entre Cra 17, 18 y 19 Barrio Pandiguando.
- Puente Viejo de Cauca Cra 6 desde 47N
Nota: Alcantarillado repone una tapa de Sumidero en Calle 5 con Cra 5
Jairo Guerrero Ord
Rugoberto Quintero C
Martes 27 de diciembre de 2022.
Estado del tiempo: lluvias moderadas 6:00 - 8:00 pm
Equipo: 1 finisher, 1 fresadora, 2 Compactadores 3 NPR, 1 Marmita, 7 volquetas (4 Asfalto, 2 fresado + 1 sencilla fresado)
Personal: 1 Ing. Residente, 1 Inspector, 17 oficios

Powered by CamScanner

Varios, 2 vigilantes, 4 operadores, 11 Conductores,
Actividades: fresado Calle 3 entre Cras 19, 20, 20A y 21 B/ Pandiguando.
Asfalto Calle 3 entre Cras 19, y 20 - Puente viejo de Cauca.
Nota: La Supervisión contratista intervenir.
Cra 20 entre Calle 3 y 4 Pandiguando
Se informa en Cómite que se asignan recursos para adición del contrato de obra e interventoría. Obra: 1957'514.538 plazo: hasta 28 de febrero/2023

Jaime Ricardo Gil
Residente de Obra

Eugeberto Quintero C.
Res. Interventoría

Miercoles 28 de Dic / 2022
Estado del tiempo: lluvias moderadas 1:30 - 2:30pm.
Equipo: 1 finisher, 1 fresadora, 3 NPR, 1 marmita, 2 compactadores, 7 volquetas.
Personal: 1 Ing. Residente, 1 Inspector, 17 oficios Varios, 2 vigilantes, 4 operadores, 11 Conductores.
Actividades: fresado: Calle 3 Cras 20B y 21
Asfalto: Calle 3 Cras. 20 y 21 Pandiguando
Nota: Acueducto y Alcantarillado atienden daños de redes tanto de Acueducto como Alcant. en la cra 20 y 21.

Jaime Ricardo Gil
Residente de Obra

Eugeberto Quintero C.
Res. Interventoría

Jueves 29 de DIC/2022
Estado del tiempo: No se presentan lluvias.
No hay actividad en obra.
Viernes 30 de DIC/2022
Estado del tiempo: lluvias intensas 3:00pm - 4:05pm
No hay actividad en obra.

Eugeberto Quintero C.
Res. Interventoría

Powered by CamScanner

Sabado 31 de DIC/2022
Estado del tiempo: lluvias intensas de 5:00pm - 7:00pm
No hay actividad en obra.
Domingo 01 de Enero /2023
Estado del tiempo. lluvias moderadas de 2:00pm - 4:00pm
No hay actividad en obra.
Lunes 02 de Enero /2023
No se presentan lluvias
No hay actividad en obra

Rogoberto Chilito C.
Res. Inter.

Martes 03 de Enero de 2023
Estado del tiempo: lluvias moderadas de 11:00am - 1:00pm
- Equipo: 1 fresadora, 1 finisher, 1 marmita, 2 HPR
- Personal: 1 Ing. Residente, 1 Inspector, 16 oficios Varios, 2 Vigilantes, 4 operadores, 3 Conductores.
- Nota: Se suspenden Actividades por falta de Volquetas, las Volquetas las disponen para el transporte de triturado desde Planta Calindez a Planta Popayán.

Nota: se realiza comité técnico en oficinas de Infraestructura, se autoriza intervenir Carrera 13 entre calles 3 y 4 (moto Pits)
La nueva ruta de trabajo por ordenes de Supervisión.
1) Continuar y terminar trabajos en Pandiguando
2) Intervenir Carrera 6A entre calles 17 y 18 B/ El recuerdo.
3) Campamento.
Nota: La Supervisión confirma que el 31 de DIC/ fueron adicionados recursos por: $1834'069.051 para Obra y $100'000.000 Interventoría, y plazo hasta el 29 de febrero de 2023

Rogoberto Chilito C
Res. Inter.

Powered by CamScanner

Miercoles 4 de Enero / 2023
Estado del tiempo: lluvias moderadas 3:00 - 5:00 pm
Equipo: 1 fresadora, 1 finisher, 2 compactadores
1 marmita, 4 Volquetas doble troque (Asfalto), 1 Volq. doble troque (fresado) 3 Volquetas sencillas (fresado)
Personal: 1 Residente, 1 Inspector, 19 oficios Varios, 2 vigilante, 4 operadores, 8 Conductores de Volqueta y 3 de NPR,
Actividad: Fresado y Asfalto en Cra 18 entre Calle 3 y 4; Cra 20 entre Calle 3 y 4; Calle 3 entre Cra 21 y 21B.

Rugobert Chirinos C.
Res. Interv.

Jueves 5 de Enero / 2023
Estado del tiempo: lluvias intensas 2-3pm moderadas de 3:00pm -
Equipo: 1 fresadora, 1 finisher, 2 compactadores, 2 NPR, 1 marmita, 6 volquetas (5 doble troque y 1 sencilla)
Personal: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Res. Ambiental, oficios Varios, 2 vigilantes, 9 Conductores.
Actividades: fresado: Carrera 21C, entre calles 3 y 4
Asfalto: Calle 3 entre Cras 21B y 21C y Cra 21C entre Calle 3 y 4 B) Pandiguando.

Rugobert Chirinos C

Viernes 6 de Enero / 2023.
Estado del tiempo: lluvias intensas 3:00 - 4:00 pm moderadas de 4:00pm - 8:00pm
Equipo: 1 fresadora, 1 finisher, 2 compactadores
1 marmita, 3 NPR (1 de Agua, 2 Transportes), 7 Volquetas
Personal: 18 oficios Varios, 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente Social, 1 Res. ambiental, 1 Residente Siso, 4 operadores, 11 Conductores, 2 vigilantes
Actividades: Socialización de trabajos en el Sector el remanso.

Powered by CamScanner

Fresado y Asfalto Carrera 6A entre Calles 17N y 18N Barrio el recuerdo

Nota: Se Solicita al Contratista realizar arreglo en pavimento Carrera 7 entre Calles 16N y 17N y realizar parcheo lado oriente de la Carrera 7 entre Calles 16N y 17N (pendiente de intervención anterior).

- Se fresa Intersección Cra 10 Con calle 17N B/ Antonio Nariño Se fresa calle 17N entre Cras 9 y 10; Asfalto Cra 9 y 9A
- Supervisión Autoriza intervenir Calle 17N entre Carreras 10 y 11 B/ Antonio Nariño.

Ingeniero Gualteros C.
Res. Interv.

Sabado 7 de Enero de 2023
Estado del tiempo: Lluvias moderadas 8:00-11:00am y de 3:00-4:00pm.
No se registra actividad en obra.
Domingo 8 de Enero de 2023
Estado del tiempo: Lluvias moderadas de 11:00-12:00m
No se realizan actividades en obra
Lunes 9 de Enero de 2023 (FESTIVO)
Estado del tiempo: Lluvias intensas 2:00pm-3:00pm y moderadas de 3:00pm-6:00pm
No se realizan actividades en obra
Nota. Cierre total de la Via nacional 2003 (Mayor-Peñuelas por derrumbes)

Ingeniero Gualteros C
RES INTERV

Martes 10 de Enero de 2023
Estado del tiempo: Lluvias intensas de 3:00-4:00pm moderadas de 11:00am-2:00pm
Equipo: 1 finisher, 1 fresadora, 2 compactadores 1, marmita, 3 RRR, 8 Volqueta (5 Doble troque en mezcla asfaltica, 1 doble troque fresado, 2 Sencillo fresado)
Personal. 16 Oficiales varios, 1 Residente, 1 Inspec.

Powered by CamScanner

ANEXO 12
REGISTRO FOTOGRÁFICO

	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 REGISTRO FOTOGRAFICO	INP SERVICIOS SAS FECHA: 06 DE ENERO DE 2023

Contratista:	EDIFICACIONES Y VÍAS S.A
Contrato No.:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021
Interventor:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021

Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

AREA TECNICA

FOTO No. 1		FOTO No. 2	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz	UBICACIÓN:	Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz
COMENTARIOS:	Excavación para instalación de estructura de pavimento	COMENTARIOS:	Control de topografía para excavaciones.

FOTO No. 3		FOTO No. 4	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz	UBICACIÓN:	Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz
COMENTARIOS:	Instalación capa de material de mejoramiento.	COMENTARIOS:	Instalación capa de material de mejoramiento.

FOTO No. 5		FOTO No. 6	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz	UBICACIÓN:	Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz
COMENTARIOS:	Instalación y compactación de material de mejoramiento	COMENTARIOS:	Instalación y compactación de material de mejoramiento

	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 REGISTRO FOTOGRAFICO	INP SERVICIOS SAS FECHA: 06 DE ENERO DE 2023

Contratista:	EDIFICACIONES Y VÍAS S.A	Objeto:	MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".
Contrato No.:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021		
Interventor:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021		

AREA TECNICA

FOTO No. 7		FOTO No. 8	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 22 entre Calles 10 y 11. Barrio Retiro Bajo	UBICACIÓN:	Carrera 22 entre Calles 10 y 11. Barrio Retiro Bajo
COMENTARIOS:	Estado inicial pavimento con presencia de baches	COMENTARIOS:	Vía intervenida con instalación de mezcla asfáltica

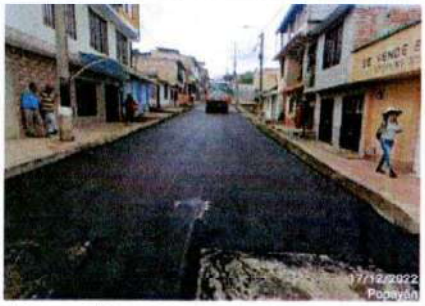
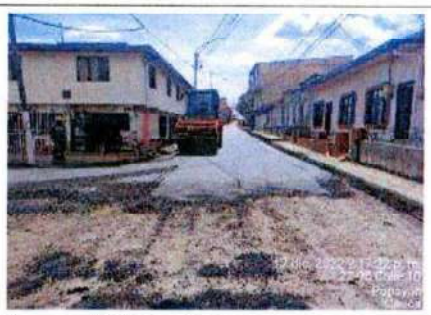
FOTO No. 9		FOTO No. 10	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 22 entre Calles 10 y 11. Barrio Retiro Bajo	UBICACIÓN:	Carrera 22 entre Calles 10 y 11. Barrio Retiro Bajo
COMENTARIOS:	Estado inicial pavimento con presencia de baches	COMENTARIOS:	Vía intervenida con instalación de mezcla asfáltica

FOTO No. 11		FOTO No. 12	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Calle 10 entre Carreras 21 y 22. Barrio Retiro Bajo	UBICACIÓN:	Carrera 23 entre Calles 10 y 10A. Barrio Retiro Bajo
COMENTARIOS:	Instalación de mezcla asfáltica MDC-19	COMENTARIOS:	Instalación de mezcla asfáltica MDC-19

	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 REGISTRO FOTOGRAFICO	INP SERVICIOS SAS FECHA: 06 DE ENERO DE 2023

Contratista:	EDIFICACIONES Y VIAS S.A
Contrato No.:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021
Interventor:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021
Objeto:	MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021"

AREA TECNICA

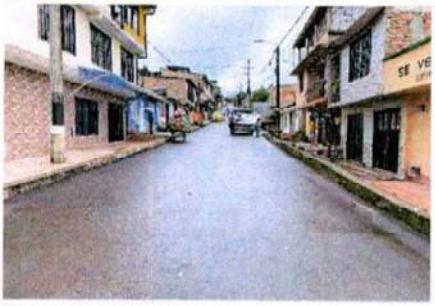
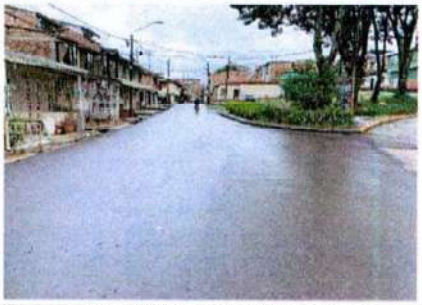
FOTO No. 13		FOTO No. 14	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 22 entre Calles 10 y 11. Barrio Retiro Bajo	UBICACIÓN:	Carrera 23 entre Calles 9 y 10. Barrio Retiro Bajo
COMENTARIOS:	Vía terminada con instalación de mezcla asfáltica.	COMENTARIOS:	Vía terminada con instalación de mezcla asfáltica.

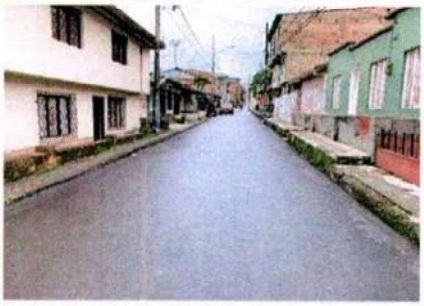
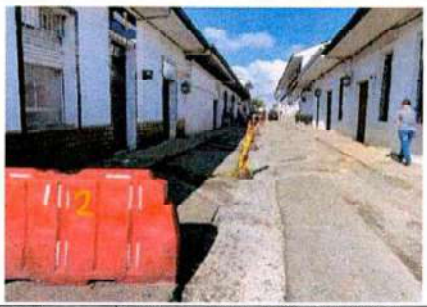
FOTO No. 15		FOTO No. 16	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 23 entre Calles 10 y 10A. Barrio Retiro Bajo	UBICACIÓN:	Calle 10 entre Carreras 22 y 23. Barrio Retiro Bajo
COMENTARIOS:	Instalación de carpeta asfáltica MDC-19	COMENTARIOS:	Instalación de carpeta asfáltica MDC-19

FOTO No. 17		FOTO No. 18	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Calle 6 entre Carreras 4 y 5. Sector Centro	UBICACIÓN:	Calle 6 entre Carreras 4 y 5. Sector Centro
COMENTARIOS:	Vía con deterioro de capa de rodadura por instalación de redes de alcantarillado	COMENTARIOS:	Vía intervenida con carpeta asfáltica MDC-19

	ALCALDIA DE POPAYAN **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9** **REGISTRO FOTOGRAFICO**	**INP SERVICIOS SAS** FECHA: 06 DE ENERO DE 2023

Contratista:	EDIFICACIONES Y VÍAS S.A	**Objeto:**	MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".
Contrato No.:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021		
Interventor:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021		

AREA TECNICA

FOTO No. 19		**FOTO No. 20**	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022	**FECHA FOTOGRAFÍA:**	SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 5 entre Calles 6 y 7. Barrio Centro	**UBICACIÓN:**	Carrera 5 entre Calles 6 y 7. Barrio Centro
COMENTARIOS:	Instalación de mezcla asfáltica MDC-19	**COMENTARIOS:**	Instalación de mezcla asfáltica MDC-19
FOTO No. 21		**FOTO No. 22**	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022	**FECHA FOTOGRAFÍA:**	SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 5 entre Calles 5 y 6. Barrio Centro	**UBICACIÓN:**	Carrera 5 entre Calles 5 y 6. Barrio Centro
COMENTARIOS:	Actividades de fresado e imprimación	**COMENTARIOS:**	Instalación de mezcla asfáltica MDC-19
FOTO No. 23		**FOTO No. 24**	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022	**FECHA FOTOGRAFÍA:**	SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 5 entre Calles 4 y 5. Barrio Centro	**UBICACIÓN:**	Carrera 5 entre Calles 4 y 5. Barrio Centro
COMENTARIOS:	Instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19	**COMENTARIOS:**	Instalación de mezcla asfáltica MDC-19

ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9
REGISTRO FOTOGRAFICO

INP SERVICIOS SAS

FECHA: 06 DE ENERO DE 2023

Contratista:	EDIFICACIONES Y VÍAS S A
Contrato No.:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021
Interventor:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021

Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

AREA TECNICA

FOTO No. 25



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 26 DIC. DE 2022 AL 01 ENE DE 2023
UBICACIÓN:	Calle 3 entre Carreras 18 y 19. Barrio Pandiguando
COMENTARIOS:	Estado incial de la vía con baches y piel de cocodrilo

FOTO No. 26



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 26 DIC. DE 2022 AL 01 ENE DE 2023
UBICACIÓN:	Calle 3 entre Carreras 18 y 19. Barrio Pandiguando
COMENTARIOS:	Vía intervenida con instalación de mezcla asfáltica

FOTO No. 27



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 26 DIC. DE 2022 AL 01 ENE DE 2023
UBICACIÓN:	Intersección Calle 3 con Carrera 19, Pandiguando
COMENTARIOS:	Instalación de mezcla asfáltica MDC-19

FOTO No. 28




FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 26 DIC. DE 2022 AL 01 ENE DE 2023
UBICACIÓN:	Intersección Calle 3 con Carrera 19, Pandiguando
COMENTARIOS:	Instalación de mezcla asfáltica MDC-19

FOTO No. 29



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 26 DIC. DE 2022 AL 01 ENE DE 2023
UBICACIÓN:	Calle 3 entre Carreras 20 y 20A. Barrio Pandiguando
COMENTARIOS:	Estado incial con baches y fisuramientos

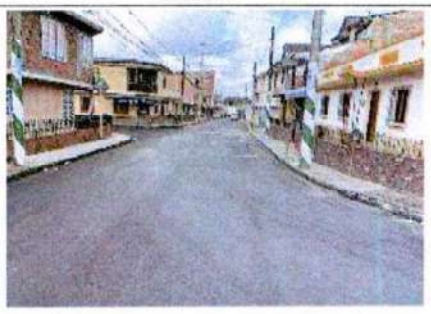FOTO No. 30



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 26 DIC. DE 2022 AL 01 ENE DE 2023
UBICACIÓN:	Calle 3 entre Carreras 20 y 20A. Barrio Pandiguando
COMENTARIOS:	Vía intervenida con instalación de mezcla asfáltica

ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9
REGISTRO FOTOGRAFICO

INP SERVICIOS SAS


FECHA: 06 DE ENERO DE 2023

Contratista: EDIFICACIONES Y VIAS S.A
Contrato No.: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021
Interventor: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021

Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021".

AREA TECNICA

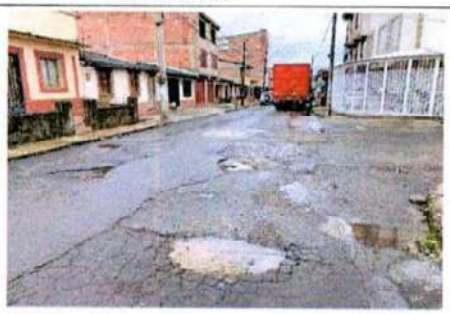FOTO No. 31



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 26 DIC. DE 2022 AL 01 ENE DE 2023
UBICACIÓN:	Calle 3 entre Carreras 20A y 20B. Barrio Pandiguando
COMENTARIOS:	Estado inicial con baches y piel de cocodrilo

FOTO No. 32



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 26 DIC. DE 2022 AL 01 ENE DE 2023
UBICACIÓN:	Calle 3 entre Carreras 20A y 20B. Barrio Pandiguando
COMENTARIOS:	Vía intervenida con instalación de mezcla asfáltica

FOTO No. 33



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 26 DIC. DE 2022 AL 01 ENE DE 2023
UBICACIÓN:	Puente de la Carrera 6 sobre el Rio Cauca.
COMENTARIOS:	Instalación de la carpeta de rodadura en mezcla asfáltica

FOTO No. 34



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 26 DIC. DE 2022 AL 01 ENE DE 2023
UBICACIÓN:	Puente de la Carrera 6 sobre el Rio Cauca.
COMENTARIOS:	Instalación de la carpeta de rodadura en mezcla asfáltica

FOTO No. 35



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 26 DIC. DE 2022 AL 01 ENE DE 2023
UBICACIÓN:	Calle 3 entre carreras 20 y 21 Barrio Pandiguando
COMENTARIOS:	Atención de la empresa de acueducto y Alcantarilla a daño de redes

FOTO No. 36



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 26 DIC. DE 2022 AL 01 ENE DE 2023
UBICACIÓN:	Carrera 5 entre calles 4 y 5 barrio El Centro
COMENTARIOS:	Vía intervenida con carpeta asfaltica MDC-19

	ALCALDIA DE POPAYAN **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9** **REGISTRO FOTOGRAFICO**	**INP SERVICIOS SAS** FECHA: 06 DE ENERO DE 2023

Contratista:	EDIFICACIONES Y VIAS S.A	**Objeto:** MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".
Contrato No.:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021	
Interventor:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021	

AREA SOCIAL, SST Y AMBIENTAL

FOTO No. 1



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Secretaria de Infraestrutura
COMENTARIOS:	06-12-2022 Comité de obra. Asiste Entidad, Contratista e Interventoria.

FOTO No. 2



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz
COMENTARIOS:	Instalación de cerramiento perimetral con polisombra

FOTO No. 3



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz
COMENTARIOS:	Actividad de atención a lideres de la comunidad

FOTO No. 4



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz
COMENTARIOS:	Actividad de atención a lideres de la comunidad

FOTO No. 5



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz
COMENTARIOS:	Señalización peatonal y de aproximancion vial

FOTO No. 6



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz
COMENTARIOS:	Señalización peatonal y de aproximancion vial

	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 REGISTRO FOTOGRAFICO	INP SERVICIOS SAS FECHA 06 DE ENERO DE 2023

Contratista:	EDIFICACIONES Y VÍAS S.A	**Objeto:**	MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".
Contrato No.:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021		
Interventor:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021		

AREA SOCIAL, SST Y AMBIENTAL

FOTO No. 7		FOTO No. 8	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022	**FECHA FOTOGRAFÍA:**	SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz	**UBICACIÓN:**	Carrera 6 entre Calles 69N y 70BN Barrio La Paz
COMENTARIOS:	Punto de aseo	**COMENTARIOS:**	Verificación, limpieza y protección de sumideros

FOTO No. 9		FOTO No. 10	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022	**FECHA FOTOGRAFÍA:**	SEMANA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Barrio La Esmeralda	**UBICACIÓN:**	Barrio La Esmeralda
COMENTARIOS:	Atención a la comunidad y visita de obra	**COMENTARIOS:**	Atención a la comunidad y visita de obra

FOTO No. 11		FOTO No. 12	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022	**FECHA FOTOGRAFÍA:**	SEMANA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Sector Retiro Bajo	**UBICACIÓN:**	Sector Retiro Bajo
COMENTARIOS:	Actividad de socialización de obras	**COMENTARIOS:**	Actividad de socialización de obras

	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 REGISTRO FOTOGRAFICO	INP SERVICIOS SAS FECHA: 06 DE ENERO DE 2023

Contratista: EDIFICACIONES Y VÍAS S.A

Contrato No.: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021

Interventor: 20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021

Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

AREA SOCIAL, SST Y AMBIENTAL

FOTO No. 13



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Barrio La Esmeralda
COMENTARIOS:	Señalización de aproximanción vial

FOTO No. 14



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Barrio La Esmeralda
COMENTARIOS:	Reunión equipo PIPMA

FOTO No. 15



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Barrio La Esmeralda
COMENTARIOS:	Verificación carpado de volquetas

FOTO No. 16



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Barrio La Paz
COMENTARIOS:	Verificación de señalización y cierre

FOTO No. 17



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Sector Centro de la ciudad
COMENTARIOS:	Atención a la comunidad y actividades de socialización de obras

FOTO No. 18



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Sector Centro de la ciudad
COMENTARIOS:	Atención a la comunidad y actividades de socialización de obras

	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 REGISTRO FOTOGRAFICO	INP SERVICIOS SAS FECHA: 06 DE ENERO DE 2023

Contratista:	EDIFICACIONES Y VÍAS S.A	**Objeto:**	MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".
Contrato No.:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021		
Interventor:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021		

AREA SOCIAL, SST Y AMBIENTAL

FOTO No. 19		**FOTO No. 20**	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022	**FECHA FOTOGRAFÍA:**	SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Sector Centro de la ciudad	**UBICACIÓN:**	Sector Centro de la ciudad
COMENTARIOS:	Señalización de aproximación vial	**COMENTARIOS:**	Entrega de impermeables a todo el personal de obra y uso adecuado de EPPs
FOTO No. 21		**FOTO No. 22**	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022	**FECHA FOTOGRAFÍA:**	SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	Sector Centro de la ciudad	**UBICACIÓN:**	Sector Retiro Bajo
COMENTARIOS:	Capacitación PIPMA a personal de obra	**COMENTARIOS:**	Verificación PIPMA, limpieza de obra
FOTO No. 23		**FOTO No. 24**	
			
FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 26 DIC. DE 2022 AL 01 ENE DE 2023	**FECHA FOTOGRAFÍA:**	SEMANA DEL 26 DIC. DE 2022 AL 01 ENE DE 2023
UBICACIÓN:	Oficina de Infraestructuta de la alcaldia municipal	**UBICACIÓN:**	Oficina de Infraestructuta de la alcaldia municipal
COMENTARIOS:	27-12-2022 Comité de obra.	**COMENTARIOS:**	Revisión, aprobación y firma de formatos ambientales PIPMA.

ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9
REGISTRO FOTOGRAFICO

INP SERVICIOS SAS

FECHA: 05 DE ENERO DE 2023

Contratista:	EDIFICACIONES Y VÍAS S.A
Contrato No.:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021
Interventor:	20211800024217 DE DICIEMBRE DEL 2021

Objeto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

AREA SOCIAL, SST Y AMBIENTAL

FOTO No. 25



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 26 DIC. DE 2022 AL 01 ENE DE 2023
UBICACIÓN:	Barrio Pandiguando
COMENTARIOS:	Actividades de socialización de obras

FOTO No. 26



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 26 DIC. DE 2022 AL 01 ENE DE 2023
UBICACIÓN:	Barrio Pandiguando
COMENTARIOS:	Actividades de socialización de obras

FOTO No. 27



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 26 DIC. DE 2022 AL 01 ENE DE 2023
UBICACIÓN:	Barrio La Paz
COMENTARIOS:	Recepción y revisión de actas de vecindad, entrega realizada por parte de la profesional social del contratista

FOTO No. 28



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 26 DIC. DE 2022 AL 01 ENE DE 2023
UBICACIÓN:	Carrera 17 con calle 3 Barrio Pandiguando
COMENTARIOS:	Señalización de aproximancion vial

FOTO No. 29



FECHA DE FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 26 DIC. DE 2022 AL 01 ENE DE 2023
UBICACIÓN:	Barrio La Esmeralda
COMENTARIOS:	Atención de queja por supuestos escobros de la obra, se constató que no pertenecen a la obra

FOTO No. 30



FECHA FOTOGRAFÍA:	SEMANA DEL 26 DIC. DE 2022 AL 01 ENE DE 2023
UBICACIÓN:	Barrio Pandiguando
COMENTARIOS:	Verificación carpado de volquetas y punto de acopio
