FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUAL-EPFAC

FECHA INFORME: Día: 27 Mes AGOSTO Año 2018.

CONTRATO N° 020-00-P-EPFAC-GRUAL-2018

CONTRATISTA: INVERSIONES RESEÑAL S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $ 14.603.680

FORMA DE PAGO:

No. PAGOS	VALOR DE PAGO	PAC MES
1	$ 14.603.680	PAC MES DE OCTUBRE DE 2018

FECHA FIRMA: Día 18 Mes AGOSTO. Año 2018.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESCUDOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA, ESCUELA DE POSTGRADOS Y LETRAS PARA EL EDIFICIO "CT. JOSÉ EDMUNDO SANDOVAL" DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día: 03 Mes JULIO. Año 2018.

CONTRATO MODIFICATORIO: NO APLICA

FECHA DE FIRMA: NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 28-JULIO-2018 hasta el 30-AGOSTO-2018

Porcentaje Avance en tiempo: 98.9%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: NINGUNO

Porcentaje de pagos realizados: 0.0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
No aplica

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No _X_ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí _X_

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Se tomó contacto directo con el señor Manuel Fonseca, representante legal de Inversiones Reseñal SAS, desde el inicio de proceso hasta entrega de los elementos.

Se realizó visita de verificación por parte del contratista para verificar espacio de ubicación de los bienes adquiridos.

Se realizó entrega e instalación de los elementos desde el 23 al 27 de agosto de 2018, cumpliendo antes de la fecha de entrega pactada para el 30 de agosto del corriente, atendiendo a los requerimientos y control del Gerente y Supervisor del Proceso. (se anexan fotos del proceso, Anexo No. 1).

Se realizó visita de verificación por parte del Gerente y Supervisor del Proceso, en las instalaciones del contratista para verificar el estado y avance de cumplimiento de los bienes adquiridos. (se anexa listado asistencia, donde se verificó el día 22 de agosto de 2018 el estado de avance y la verificación de los bienes para su aprobación para entrega, Anexo No. 2).

Se entregaron las certificaciones pertinentes en trabajo en las alturas de las personas encargadas de la Instalación de los elementos (Anexo 3 y 4).

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No aplica. No se ha realizado el pac Programado PAC OCTUBRE 2018

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se realizó oficio No. 20185880024403 del 23-agosto-2018 solicitando el ingreso de los elementos adquiridos mediante proceso No. 020-00-P-EPFC-GRUAL-2018, así mismo la entrada al centro de costos de la EPFAC, pendiente entrega de documentación correspondiente al almacén misceláneos COFAC, ubicado en las Instalaciones del comando aéreo de Transporte militar, por parte del supervisor para su debido trámite.

Pendiente entrega de documentación correspondiente para pago programado PAC OCTUBRE 2018 por valor de $ 14.603.680.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.


NOMBRE SUPERVISOR: ST. JEISON LIBARDO CARDONA CASTAÑEDA

FIRMA:

C.C. No. 1.075.259.851


DEPENDENCIA: EPFAC-GRUAL


ANEXO No. 1

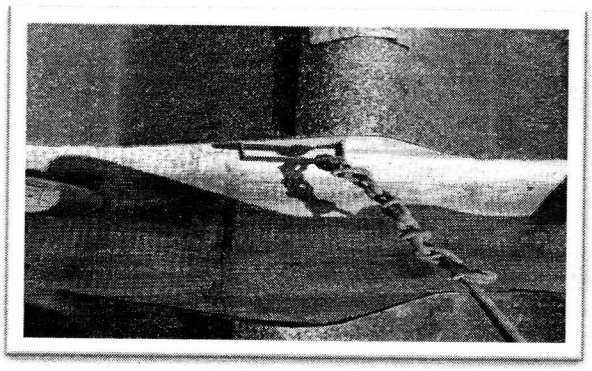







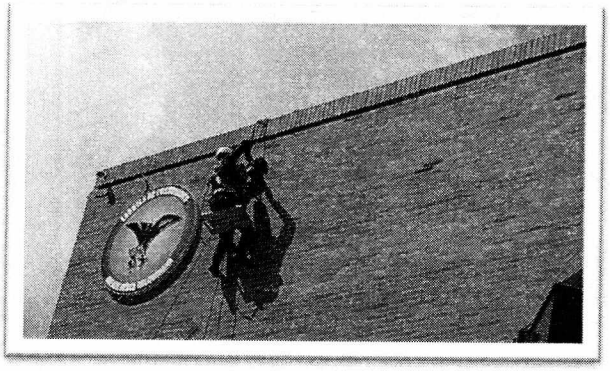

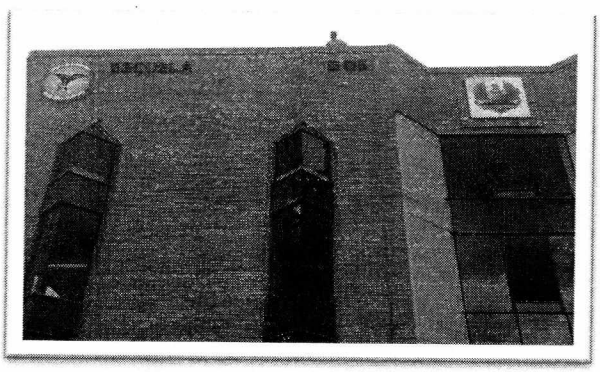


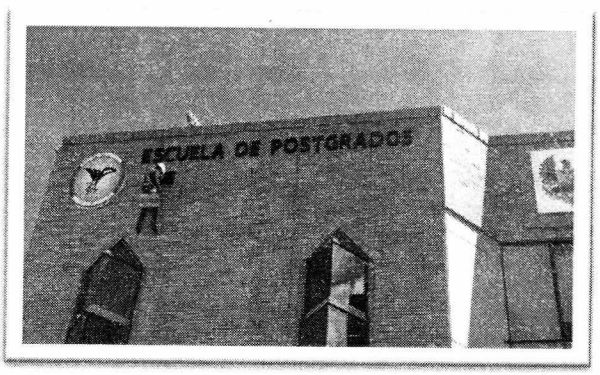




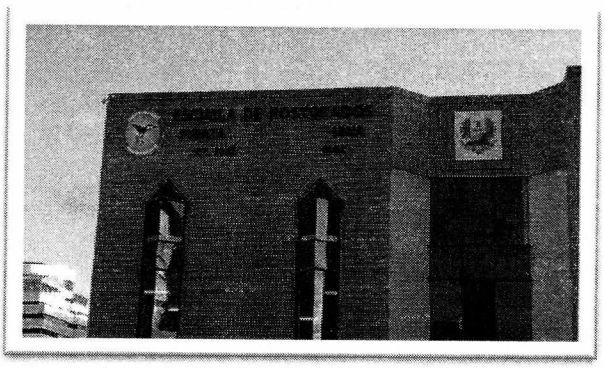


ESCUELA DE POSTGRADOS

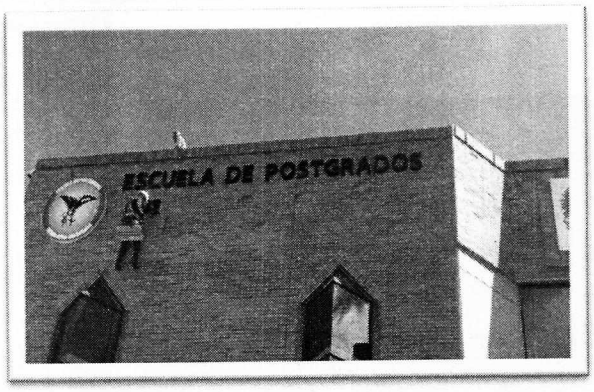
ESCUELA DE POSTGRADOS




ESCUELA DE POSTGRADOS

ANEXO 2

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión No:	2
	Implementación:	27-Enero-2016
	Código:	DE-FR-48
	Tipo de Documento:	Formato

TEMA REUNIÓN: Visita Verificación

OFICINA PRODUCTORA: GRUAL - Supervisor y Gerente Proceso

LUGAR Y FECHA: Bogota D.C., 22-Agosto-2018

HORA: 15:00

ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		Manuel Fonseca	RESENAL SAS	5486368	mfonseca@resenal.com	
2	ST	Jeison Libardo Cardona Castañeda	EPFAC-GRUAL	6206518-1058	jeison.cardona@epfac.edu.co	
3	TC.	Oscar F. Zuñiga M	GRUAL	1055	oscar.zuniga@epfac.edu.co	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

ANEXO 3

TRABAJO EN ALTURAS
MEDILABORAL

MEDICINA LABORAL SAS

OTORGADO A

JHON ALEXANDER RODRIGUEZ RODRIGUEZ

CC 80252444

Certificado No. 0390

Cursó y aprobó la accion de formación:

TRABAJO SEGURO EN LAS ALTURAS

REENTRENAMIENTO

Con una intensidad de 20 horas

En testimonio de lo anterior se hace firmar en la ciudad:

Dra Maria Teresa Salazar Ch.

ING EDGAR PEREZ LSO 9539
Licencia

Medicina Laboral SAS NIT 830.142.721-2
Resolución SENA 006691
Licencia Seguridad y Salud en el trabajo No. 5256 de 05/05/2016

Carrera 90 # 135b - 08 Rincón, Suba. Bogora d.c.
www.alturas.medilaboral.com
318 846 64 46

Fecha 29/08/2017

ANEXO 4

TRABAJO EN ALTURAS
MEDILABORAL

MEDICINA LABORAL SAS

OTORGADO A

EMILIANO CABEZAS MOLINA

CC 93150832

Certificado No. 0391

Cursó y aprobó la accion de formación:

TRABAJO SEGURO EN LAS ALTURAS

REENTRENAMIENTO

Con una intensidad de 20 horas

En testimonio de lo anterior se hace firmar en la ciudad:

Maria Teresa Salazar Ch.

Dra Maria Teresa Salazar Ch.

ING EDGAR PEREZ LSO 9539
Licencia

Medicina Laboral SAS NIT 830.142.721-2
Resolución SENA 006691
Licencia Seguridad y Salud en el trabajo No. 5256 de 05/05/2016

Carrera 90 # 135b - 08 Rincón, Suba. Bogora d.c.
www.alturas.medilaboral.com
318 846 64 46

Fecha 29/08/2017
