
"CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA"

CONSORCIO GAMER SOACHA

INFORME MENSUAL TÉCNICO N° 04
01 DE NOVIEMBRE 2022 AL 30 NOVIEMBRE 2022

CUADRO DE CONTROL REVISIONES

ÀREA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
		Técnica	Interventoría
Cargo	Arq. Área técnica	Director de Obra	Director de Interventoría
Nombre	Arq. Nubia Rivera	Ing. Milton Rivera	Ing. Edgar Uribe
Firma			

CONTROL DE MODIFICACIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
00		Versión inicial
		Versión final

TABLA DE CONTENIDO

CUADRO DE CONTROL REVISIONES 1

1. INFORMACIÓN DE CONTRATO DE OBRA 3

1.1. CONTRATO DE OBRA No. 024-2022 3

1.2 GENERALIDADES 4

2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 5

2.1 LOCALIZACIÓN 5

3. POLIZAS DEL CONTRATO 8

4. CAPITULO FINANCIERO 9

5. VIAS ASIGNADAS 16

6. ACTIVIDADES REALIZADAS 18

7. ESTADO DEL CLIMA 35

8. COMITES TECNICOS 37

9. CORRESPONDENCIA ENVIADA 37

10. CONCLUSIONES 38

11. ANEXOS 39

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 .Localizacion 4

Ilustración 2.Localizacion general 6

Ilustración 3. Localización Cazuca 6

1. INFORMACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

1.1. CONTRATO DE OBRA No. 024-2022

El contrato de obra 024-2022 celebrado entre la empresa pública de municipio de Soacha EPUXUA AVANZA E.I.C.E y El consorcio Gamer Soacha se deriva del contrato interadministrativo 3443-2021, a continuación información relevante del contrato obra.


NOMBRE DEL CONTRATISTA	**CONSORCIO GAMER SOACHA**
NO. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**3443-2021**
TIPO DE PROCESO	DE OBRA PÚBLICA
NO. CONTRATO	024 DE 2022
OBJETO:	"CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA".
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	NIT 901.537.901-5
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	MILTON EDUARDO RIVERA RODRIGUEZ 79.947.081
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATÓ	04 DE MAYO DE 2022
FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO 2022
SUSPENSIÓN	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES
PRÓRROGA	No Aplica
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE ENERO 2023

VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 4.506.567.898,67) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMAS COSTOS, GASTOS Y DEMAS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN CON OCASIÓN A LA CELEBRACION,EJECICIÓN.
VALOR ADICIÓN	No Aplica
MODIFICATORIO 1	MODIFICATORIO DEL ANEXO TECNICO DEBIDO A INCLUCION DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022
CESION DE DERECHOS ECONOMICOS	11 DE OCTUBRE DE 2022

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

1.2 GENERALIDADES

El proyecto de obra está ubicado en el municipio de Soacha en la Comuna 4-Cazuca donde gran parte de las vías de esta comuna están sin pavimentar y se accede desde el norte Quintanares (calle 48) y La Zona Industrial de Cazucá (calle 56), por el oeste por Terreros (Avenida Terreros) y por el oriente desde la localidad bogotana de Ciudad Bolívar a través de la frontera entre los barrios Balcanes-La Estancia (intersección calle 61 Soacha con la calle 59 Sur Bogotá), Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro-El Espino (Calles 60 y 61 Soacha/Carrera 77C Bogotá) finalizando en el barrio Santo Domingo y Los Robles-Caracolí (Calle 41 y 42 Soacha/Calles 76A y 77 Sur Bogotá).

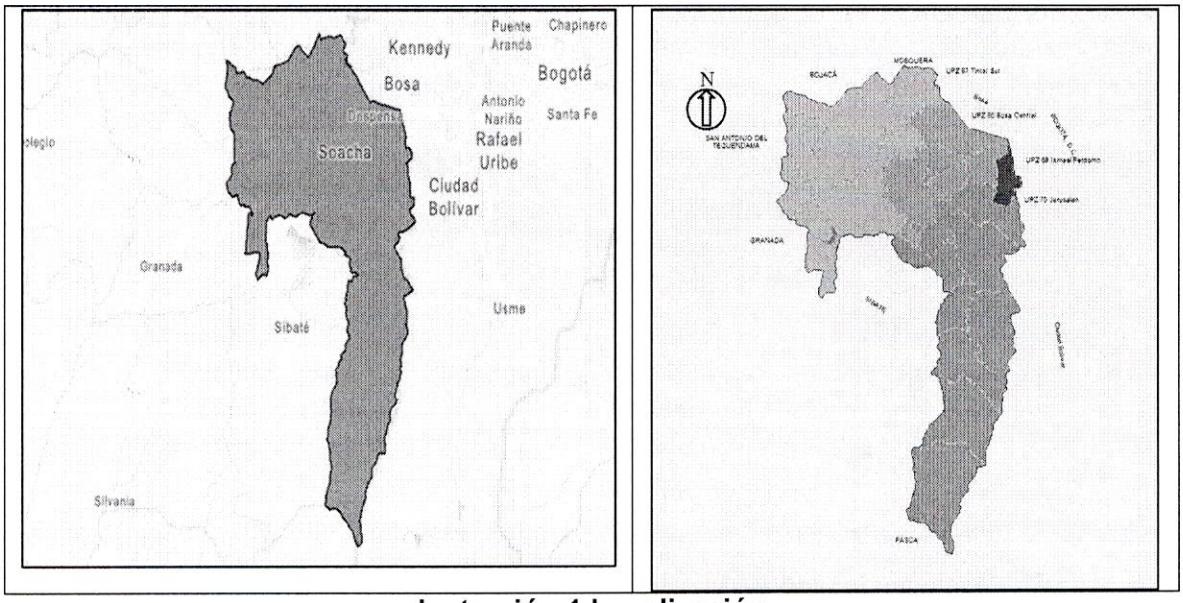

lustración 1.Localización

Fuente: https://ider.cundinamarca.gov.co/maps/a0a93737419a4789a38e87d898bc263f

Teniendo en cuenta el objeto del contrato de obra 024 del 4 de Mayo de 2022 que es " **CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA"** donde se describen la ejecución de las actividades de rehabilitación del proyecto a ejecutar, estas actividades se determinan mediante la evaluación del estado actual de la vía a intervenir, basados en los diagnósticos y diseños entregados por Epuxua y la secretaría de infraestructura de la Alcaldía del municipio de Soacha.


En el presente Informe Técnico Mensual No 04, durante al periodo comprendido entre 01 al 30 noviembre de 2022, se resume la Información del contrato, la Información general del proyecto (la localización y descripción de las obras), las actividades ejecutadas en el mes por el CONSORCIO GAMER SOACHA contratista ejecutor de la obra, el personal, el control de calidad, asignación de vías, certificados de calidad de los materiales, avance físico y financiero del contrato de obra CTO 024-2022.

2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO


2.1 LOCALIZACIÓN

El área en el que se desarrollara el **CONTRATO DE OBRA No 024-2022**, ejecutado por el **CONSORCIO GAMER SOACHA** que tiene por objeto "**CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA".** El proyecto se

encuentra localizado en el Municipio Soacha que es el municipio más poblado del departamento de Cundinamarca en Colombia. Su área es de 184 km² (kilómetros cuadrados), y su población es de 660 179 (2018).2 Su área urbana está conurbada con la del Distrito Capital de Bogotá, siendo parte de su área metropolitana. Es la capital de la Provincia de Soacha, de la que solo forman parte dos municipios: Soacha y Sibaté.

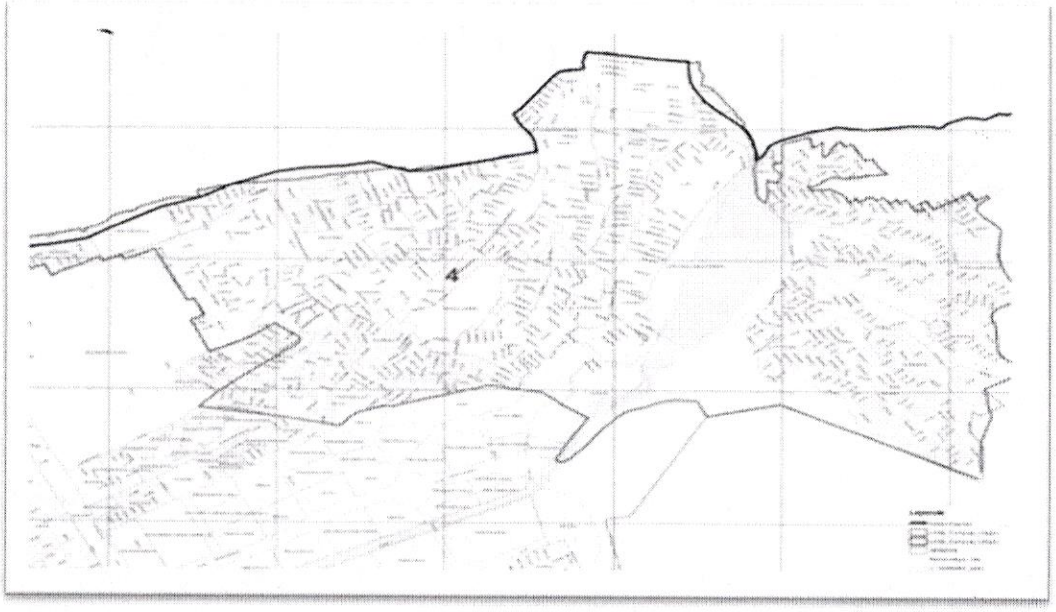

Lustración 2.Localización General

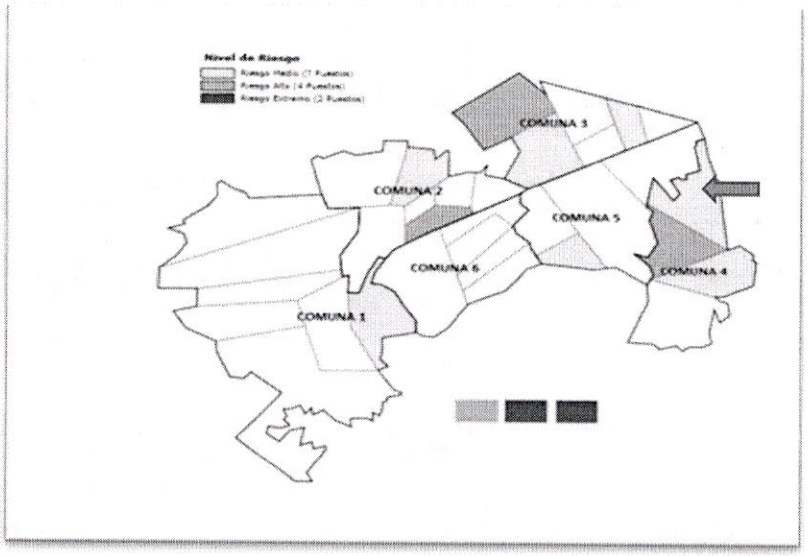

Lustración 3.Localización Cazuca
CAZUCA COMUNA 4.

BARRIÓ SANTO DOMINGO

Fuente: Google

La Comuna 4 de Soacha, es la cuarta de las seis comunas del casco urbano del municipio de Soacha (Cundinamarca), localizado al extremo oriente de la ciudad. Recibe su nombre del asentamiento popular y orográfico, Altos de Cazucá. Tienen 69 350 habitantes, es una zona de extrema vulnerabilidad social y cuenta con las siguientes vías de acceso.

Vías de Acceso a la comuna 4 - Cazuca

- Calle 48 (Cazucá)
- Transversal 9 este - Carrera 1 (Julio Rincón - Cazucá)
- Avenida Terreros (Calle 38)
- Calles 41 y 42 (El Oasis - Los Robles - Caracolí)
- Transversal 33 Este / Diagonal 40 I (Los Pinos - Rincón del Lago - La Isla)
- Carrera 39 Este.

Para el desarrollo y ejecución del contrato se cuenta con el personal administrativo cumpliendo con lo requerido contractualmente.

Tabla 1. Personal CTO 024-2022

PERSONAL CONTRATO DE OBRA No 024 DE 2022 CONSORCIO GAMER SOACHA.

NOMBRE	*CARGO*	*DEDICACIÓN*	*CORREO ELECTRÓNICO*
MILTON EDUARDO RIVERA RINCON.	*DIRECTOR DE OBRA*	*100 %*	*consorciogamer024@gmail.com*
ILMER ENRIQUE POLO CARMONA	*RESIDENTE DE OBRA*	*100 %*	*consorciogamer024@gmail.com*
NUBIA CONSUELO RIVERA RINCON	*INSPECTOR 1*	*100 %*	*consorciogamer024@gmail.com*
SERGIO DARIO TORRES RIVERA	*INSPECTOR 2*	*100 %*	*consorciogamer024@gmail.com*
DEICY LORENA BELLO RIVERA	*PROFESIONAL HSEQ*	*100 %*	*consorciogamer024@gmail.com*
CATHERINE MUÑOZ MANCIPE	*TOPOGRAFO*	*100 %*	*consorciogamer024@gmail.com*

3. POLIZAS DEL CONTRATO

A la fecha contamos con las siguientes pólizas del contrato, verificadas por la interventoría Cocosering SAS y aprobadas por la empresa pública del Municipio de Soacha Epuxua Avanza E.I.C.E.

Tabla 2. Pólizas

Anexo 0 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$901.313.579,73	02/05/2022	02/11/2022
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$901.313.579,73	02/05/2022	02/11/2022

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	$2.703.940.739,2	02/05/2022	02/11/2027
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$901.313.579,73	02/05/2022	02/05/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$450.656.789,87	02/05/2022	02/11/2025
	Estabilidad de la obra.		$1.351.970.369,60	02/11/2022	02/11/2027

Anexo 2 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	$2.703.940.739,2	01/08/2022	02/02/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$901.313.579,73	01/08/2022	01/08/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$450.656.789,87	01/08/2022	01/02/2026
	Estabilidad de la obra.		$1.351.970.369,60	01/02/2023	02/11/2028

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

4. CAPITULO FINANCIERO

El valor del contrato es CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE SENTAVOS (4.506.567.898,67) MCTE INCLUIDO IVA , COSTOS , GASTOS Y DEMAS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN CON OCASIÓN DE LA CELEBRACION EJECUCION Y LIQUIDACIONB DEL CONTRATO .

En el mes en reporte se radico por parte del consorico Gamer Soacha el acta N° 2 por un valor de $ 727.213.483,00 se radicada el 12 de noviembre a la entidad para

la respectiva verificación, validación y aprobación, la misma fue pagada el 30 de noviembre de 2022

Tabla 3. Avance de financiero

AVANCE FINANCIERO CONTARTO DE OBRA024-2022	
Valor total del contrato de Obra	$ 4.506.567.898,67
Acta por cobrar No. 1	$ 649.396.434,19
Acta por cobrar No.	$ 727.213.483,00
Saldo Actual	$ 3.129.957.981,48

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

Para el contrato de obra se cuenta con las siguientes actividades contractuales y sus respectivos valores monetarios de cada una de ellas y actividades No previstas aprobadas desde el mes de agosto para la buena ejecución del proyecto.

ITEM	ITEM ICCU	DESCRIPCION	UND	CAN	V/UNITARIO	V/ TOTAL
1	**1.25**	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M	M2	1	$ 11 419.00	$ 11 419.00
2	**1.26**	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	1	$ 18 397.00	$ 18 397.00
3	**1.27**	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	1	$ 28 043.00	$ 28 043.00
4	**1.28**	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	M2	1	$ 46 104.00	$ 46 104.00
5	**1.29**	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	M3	1	$ 285 090.00	$ 285 090.00
6	**1.45**	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	1	$ 10 110.00	$ 10 110.00

7	**4.13**	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	1	$ 160 620.00	$ 160 620.00
8	**16.1**	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA DE MATERIAL COMUN	M3	1	$ 6 242.00	$ 6 242.00
9	**16.3**	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	1	$ 33 159.00	$ 33 159.00
10	**16.4**	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$ 54 134.00	$ 54 134.00
11	**16.5**	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$ 62 173.00	$ 62 173.00
12	**16.6**	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	0	$ 106 162.00	$ -
13	**16.7**	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	1	$ 23 110.00	$ 23 110.00
14	**16.8**	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0	$ 70 034.00	$ -
15	**16.9**	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	1	$ 68 748.00	$ 68 748.00

16	**16.1**	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	0	$ 169 782.00	$ -
17	**16.11**	AFRIMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	1	$ 64 443.00	$ 64 443.00
18	**16.12**	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	M3	1	$ 143 715.00	$ 143 715.00
19	**16.13**	BASE GRANULAR BG1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 330)	M3	1	$ 164 131.00	$ 164 131.00
20	**3.22**	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	1	$ 89 046.00	$ 89 046.00
21	**2.1**	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	1	$ 12 930.00	$ 12 930.00
22	**201 P**	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	1	$ 173 358.00	$ 173 358.00
23	**201 P**	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	1	$ 60 755.00	$ 60 755.00
24	**210.1.1**	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN,	M3	1	$ 10 724.00	$ 10 724.00

		CANALES Y PRÉSTAMOS				
25	**210.2.1**	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	1	$ 37 319.00	$ 37 319.00
26	**210.2.2**	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	1	$ 9 838.00	$ 9 838.00
27	**220.1**	TERRAPLENES	M3	1	$ 16 634.00	$ 16 634.00
28	**221.1**	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	1	$ 14 575.00	$ 14 575.00
29	**221.2**	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	1	$ 8 398.00	$ 8 398.00
30	**230.1**	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	1	$ 538.00	$ 538.00
31	**230.2**	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	1	$ 14 340.00	$ 14 340.00
32	**600.1**	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$ 23 279.00	$ 23 279.00
33	**600.2**	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$ 69 968.00	$ 69 968.00
34	**600.3**	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A	M3	1	$ 86 694.00	$ 86 694.00

		UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)				
35	**600.4**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$ 21 165.00	$ 21 165.00
36	**600.5**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$ 34 893.00	$ 34 893.00
37	**630.4**	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	1	$ 595 230.00	$ 5 230.00
38	**630.4**	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	1	$ 710 725.00	$ 710 725.00
39	**640.1**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1	$ 7 832.00	$ 7 832.00
40	**671.1**	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	1	$ 478 443.00	$ 478 443.00
41	**630.6**	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	1	$ 377 439.00	$ 377 439.00
42	**630.7**	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	1	$ 387 723.00	$ 387 723.00
43	**630.7**	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	1	$ 396 324.00	$ 396 324.00
44	**630 P**	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI	M3	1	$ 402 949.00	$ 402 949.00

		40% RAJÓN PARA BASES				
45	**630 P**	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	1	$ 411 550.00	$ 411 550.00
46	**681.1**	GAVIÓN	M3	1	$ 191 010.00	$ 91 010.00
47	**681.1**	GAVIÓN MALLA PVC	M3	1	$ 195 311.00	$ 195 311.00
48	**672.1**	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	1	$ 46 667.00	$ 46 667.00
49	**4.4**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	1	$ 7 922.00	$ 7 922.00
50	**311.1**	AFIRMADO	M3	1	$ 64 443.00	$ 64 443.00
51	***	AFIRMADO (EQUIPOS MENORES)	M3	1	$ 52 770.00	$ 52 770.00
52	****	AFIRMADO MANUAL	M3	1	$ 80 625.00	$ 80 625.00
53	**2.7**	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1	$ 687 261.00	$ 687 261.00
54	**5.1**	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	m2	1	$ 80 087.00	$ 80 087.00

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

ACTIVIDADES NO PREVISTAS

Para el presente periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2022, se continúan con las mismas actividades no previstas.

NP 1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	1	$ 3 825.00	$ 3 825.00
NP 2	MORTERO 1:4	M3	1	$ 475 586.00	$ 475 586.00
NP3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO DE CONFINAMIENTO PREFABRICADO EN CONCRETO DE	UN	1	$ 72 370.00	$ 72 370.00

	B=20CM, H=35CM (A-80).				
NP4	CONCRETOS CLASE D, F´C =3500 PSI (BASES)	M3	1	$ 597 667.70	$ 597 667.70
NP 5	CONCRETOS CLASE D, F´C =3500 PSI (ELEVACIONES)	M3	1	$ 713 258.00	$ 713 258.00
NP 6	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 E=15 CM	KG	1	$ 9 986.00	$ 9 986.00
NP 7	CAJA INSECCION 60*60	UN	1	$ 285 348.00	$ 285 348.00
NP 8	REPARACION ACOMETIDA	UN	1	$ 74 291.00	$ 74 291.00
NP 9	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/K	1	$ 1 444.00	$ 1 444.00
NP 10	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.7M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	1	$ 250. 235	$ 250. 235.00
NP 11	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	M3	1	$ 759.999	$ 759.999.00
NP 12	INSTALACION DE ADOQUIN EN ARCILLA DE 20*10*6CM NO INCLUYE MORTERO DE PEGA	M2	1	$ 33.539	$ 33.539.00

5. VIAS ASIGNADAS

El municipio de Soacha se presenta un déficit alto en infraestructura vial, siendo esta una de las principales problemáticas en la Comuna 4 Cazuca.

Con relación a la movilidad vehicularen en el municipio no existe conexión directa entre las diferentes comunas a excepción del trazado de la denominada Autopista sur, siendo esta también un inconveniente en la comunicación entre los sectores o las comunas ubicadas en el norte y el sur. La mayoría de las vías locales no tienen continuidad y solamente tienen conexión con la Autopista por cuatro vías. En los

barrios ubicados en Altos de Cazucá, no es posible identificar corredores viales específicos, teniendo en cuenta la crítica topografía de la zona.

- **Inventario de vías Comuna 4.**

Teniendo en cuenta el déficit de infraestructura vial existente en la comuna 4 Cazuca se relacionan a continuación las vías en intervención asignadas desde la empresa Epuxua Avanza E.I.C.E y La Secretaría de infraestructura:

Tabla 4. Inventario de vías

Santo Domingo	CRA 32A CLL59 A CLL54
	CRA 32A CLL54 A CLL53
	CRA 32A CLL53 A CLL50
	CRA 32A CLL50 A CLL48
	CRA 32A CLL48 A CLL44
	CLL 48 CRA32A HASTA CRA30
	CLL 50 CRA32A HASTA CRA30
	CLL 54 CRA32A A CRA32
	CRA 32 CLL54 A CLL53
	TRANS 35 DIAGO 44
	TRANS 35 DIAGO44 A CLL44J
	TRANS 35 DIAG 44
	CLL 37 TALUD HASTA DIAGO 44
	CLL 37 DIAG 44 A VIA BOGOTÁ
	TRANS 34 DESDE DIAGO 44A HASTA CLL 44J
	TRANS 34 HASTA DIAGONAL 44A
	DIAG 44A CON TRANS 34 (COLEGIO)
	CRA 28 CON CLL56
Luis Carlos Galán II	CLL 53 CRA30
	CRA 30 CLL53 HASTA CLL 50
	CRA 30 CLL48 HASTA CLL44
	CLL 48 CRA30
	CRA 30 CLL43F
	CLL 53 CRA30

Los sistemas implementados en las vías durante este periodo en reporte son ejecutados con base y lineamiento de la empresa Pública Epuxua Avanza E.I.C.E y los diseños son entregados por la secretaría de infraestructura previa aprobación y aceptación de los interesados, Epuxua en calidad de gerenciamiento del contrato, el contratista de obra en calidad de ejecutor e interventoría en calidad de supervisor mancomunada con la empresa pública del municipio Soacha Epuxua.

Durante este periodo se entregaron topografía y diseños propios de las vías, TRANS 35 DIAGO 44, TRANS 35 DIAGO44 A CLL44J, TRANS 35 DIAG 44, CLL 37 TALUD HASTA DIAGO 44, CLL 37 DIAG 44 A VIA BOGOTÁ, TRANS 34 DESDE DIAGO 44A HASTA CLL 44J, TRANS 34 HASTA DIAGONAL 44A, DIAG 44A CON TRANS 34 (COLEGIO), CRA 28 CON CLL56, CLL 53 CRA30, CRA 30 CLL53 HASTA CLL 50, CRA 30 CLL48 HASTA CLL44, CLL 48 CRA30, CRA 30 CLL43F, CLL 53 CRA30.


6. ACTIVIDADES REALIZADAS


Se ha realizado la intervención de las vías que han sido entregadas por la entidad en cuanto a Topografía y Diseños de las mismas. Se hace la salvedad que siendo este un contrato monto agotable su porcentaje de ejecución va relacionado directamente con las vías u obras entregadas e intervenidas en la Comuna 4, priorizadas por la empresa Epuxua Avanza E.I.C.E.

Durante el periodo del presente informe se realizó actividades constructivas relacionadas a continuación con las respectivas vías intervenidas:

- Localización, replanteo con elementos de presión con el lineamiento entregado de la secretaría de infraestructura "niveletas", excavaciones varias, manuales, en roca y conglomerados de acuerdo con la tipología de las vías entregadas (Barrio Santo Domingo), en las vías relacionadas a continuación:

1. Cll 37 con Diago 44se continua con actividades de excavacion.
2. Trasv 35 se realiza excavacion para cuneta lateral.
3. Se reanudan las excavaciones manuales de la via Cll 43 F con Cra. 30.
4. Cra 30 con Cll 53 excavacion y replante de la vía
5. Continuidad con la excavación manual al final de la vía la Cra 17 con Cll 60

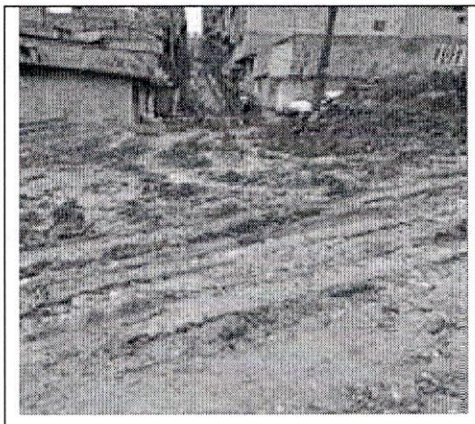

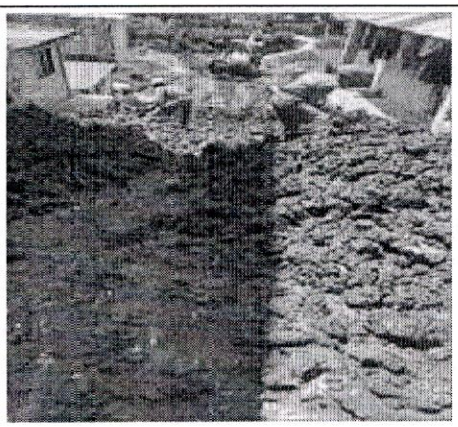

Excavacion manual Cr 17con cll 60, que debido a las lluvias se ha dificultado la ejeuccion de la actividad







Cra 17 con Cll 60 continuidad de excavación

- Se realizaron instalación de Sub base para estructura de la vía en las cuadras referenciadas en este informe de los barrios Santo Domingo, e igualmente se realizaron excavaciones e instalación de Sub base en Luis Carlos Galán II y Casa Loma, instalación, para concretar en la nivelación y compactación de los mismos.

1. Se realizó la instalacion y compactacion de subbase luego de arreglar el fallo de la Cra 17 con Cll 60 A
2. nivelacion y compactacion de la subbase en la vía Cll 48 con Cra. 32 a.
3. Cll 43f con Cra 30 nivelacion de la subrasante y en la abscisa 25 a la 50 se realizó la nivelacion y compactación de la sub base.
4. Cll 53 con Cra 30 se realiza nivelacion de Pozo
5. Cll 48 con Cra 30 nivelacion y compatacion dedicha vía para entrega a la interventoría para la intervención de la comunidad con la isntalacion de adoquin

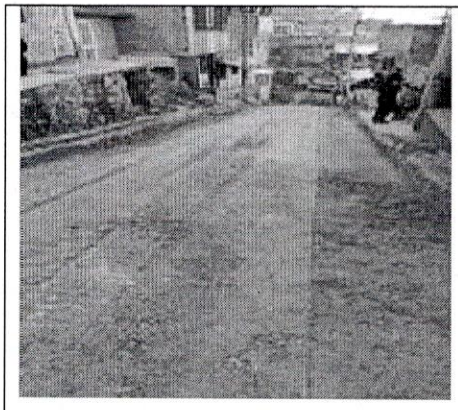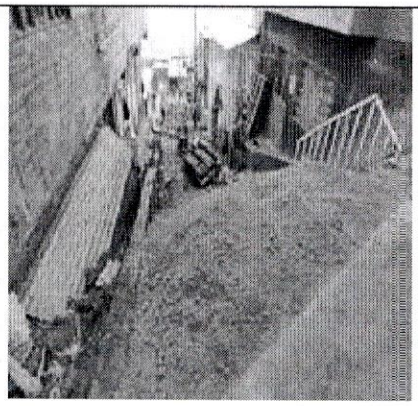
	
Instalación, nivelacion de Sub-base en la Cra 17 con Cll 604.	Cll 50 con Cra 32A nivelacion de la subbase





- Arreglo de acometidas.

  1. Cll 43f con Cra 30 en las abscisas 60,63,70,75 y 83

- Se realizó excavación manual e instalación de Bordillo B10 en las siguientes cuadras:

  1. Cll 48 entre Cra 32 A este y Cra 31 continuidad de esta actividad.
  2. Diagonal 44 con trasv 34 para confinar la cuneta al costado de la via
  3. Tras 34 se realiza la instalacion de bordillo cerrando la via en la Cll 44a
  4. Cll37 con Diagonal 44ª para la escalera
  5. Cll 50 con Cra 32ª se instaló bordillo de confinamiento
  6. Cll 73 Dig 44 A se realizan los remates en concreto y se instalan 5 ml de bordillo

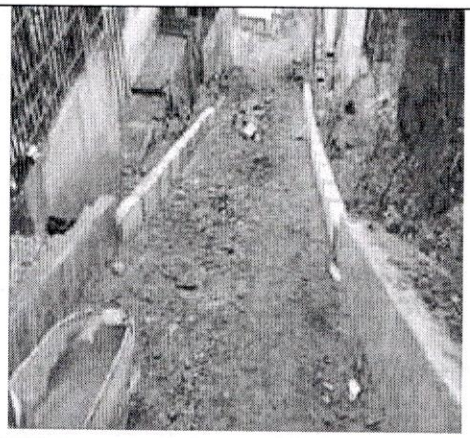
	

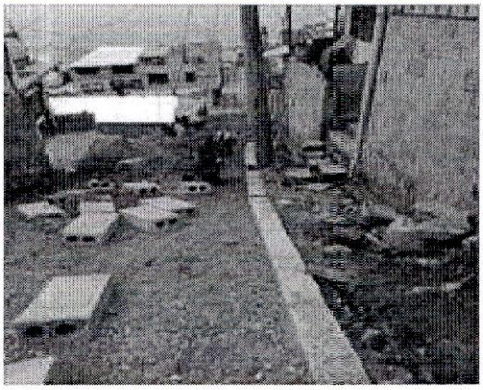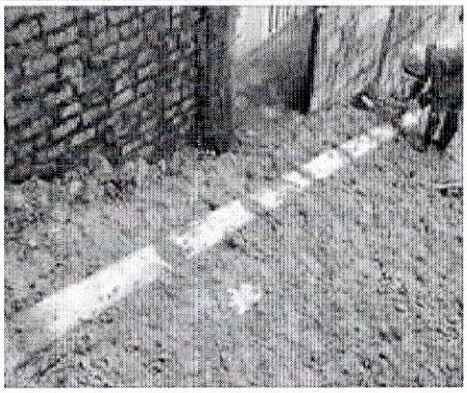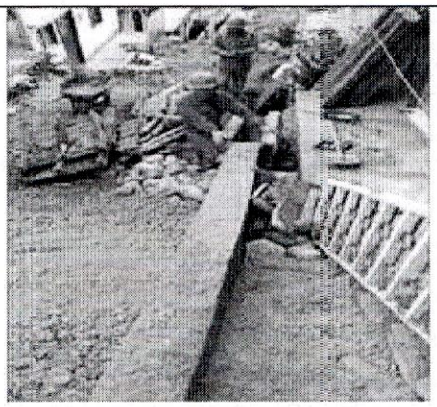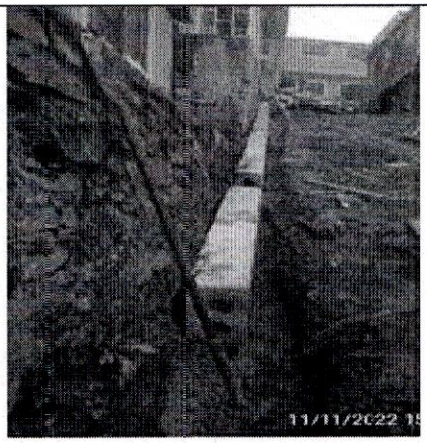	
Continuidad de instalacion de bordillos de confinamiento en Cll 48 entre Cra 32 A este y Cra 31.	
	
En la Cll 50 con Cra 32A se continua con la instalacion de Bordillo de confinamiento	Cll 48 con Cra 32ª continua con la instalacion de Bordillo de confinamiento

- Se realizó nivelación de pozos de pozos en las cuadras:

  1. Cll 37 con Diag 44 se realiza nivelacion de pozos de aguas sanitarias
  2. Cra 17 con Cll 50A se realiza nivelacion de pozos de inspeccion



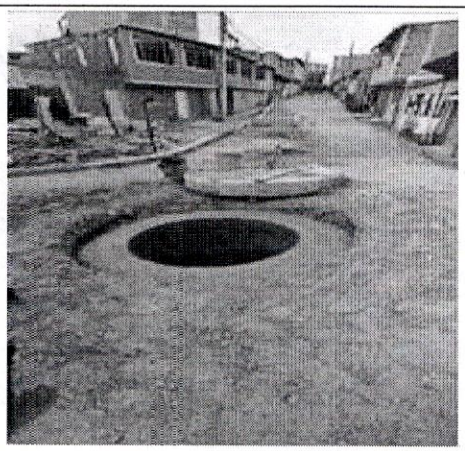

Re nivelación de pozos Trasv 35 por cambios de topografía






Cra 17 con Cll 50A se realiza nivelacion de pozos de inspeccion


- Se realizó la instalación de Concreto de 3000 psi para huellas y riostras en las vías:

1. Cra 28 con Cll 56 fundida de huellas y entrada de la vía y cintas de confinamiento para el adoquin
2. Transv 34 se da continuidad a la fundida de cuneta reforzada.
3. Cll 37 con Diago 44 fundidad e la viga de confinamiento y cunetas y se excava zanja para fundir viguetas de confinamiento laterlales.
4. Contruccion y fundida de escaleras en la trasv 35 en la absisa 130 y placa ara darconfinamiento al terreno.
5. Fundición de cunetas de confinamiento y huellas en las trasv 34 y 35
6. Fundida de huellas de la via Cra 17 con Cll 60
7. Diag 44 A con Trasv. 34 se realizó fundida del sumidero en la abscisa 0 solicitado por la secretaria de Infraestructura y Epuxua para dar salida al agua que recoge esta via
8. Cra 17con Cll 5ª se fundio huellas.


9. Cra 17 con Cll 50A se realizo armado de encofrado para la fundida de las huellas.
10. Cll 53 con Cra 30 fundicion de placa huella.
11. Cll 50 con Cra 30 fundicion de cunetas por los dos costados de la vía
12. Cll 48 con Cra 30 se inició la fundida de cintas de confinamiento y cunetas laterales

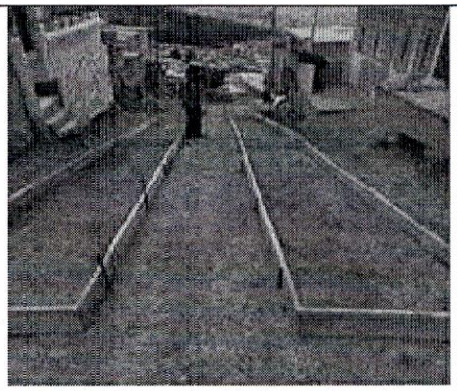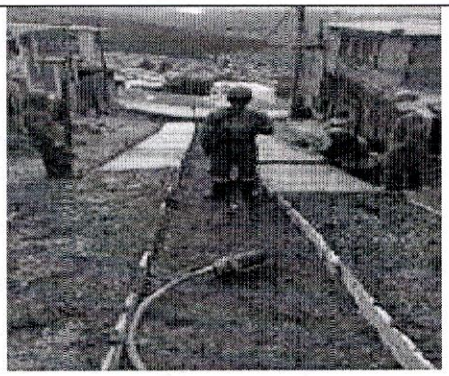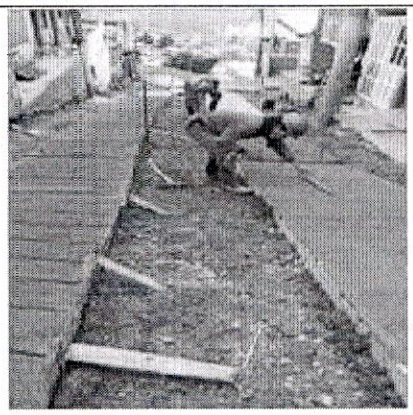
Cra 28 con Cll 56 fundida de huellas

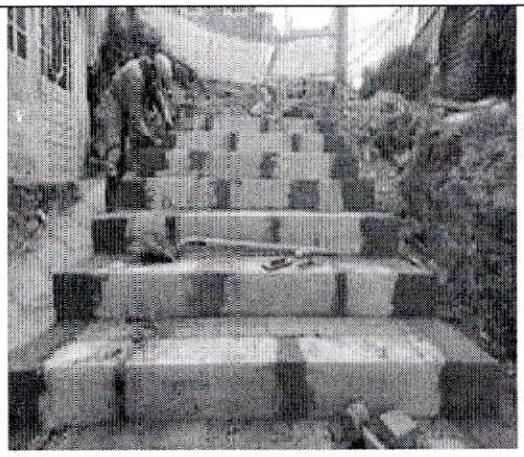




Escaleras en bordillo en la Trasv 35 y fundicion de placa



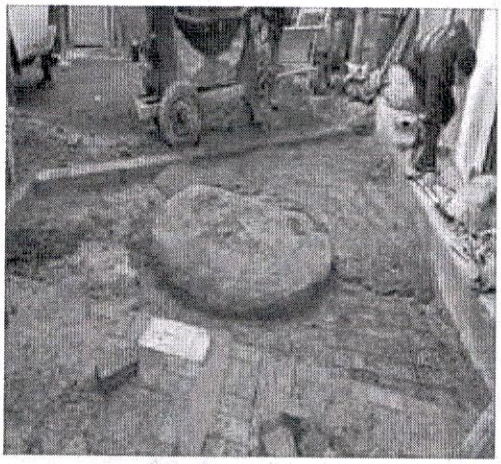



Tras 34 con Cll 44 se realiza fundida de cintas de confinamiento y cuadros de pozos.

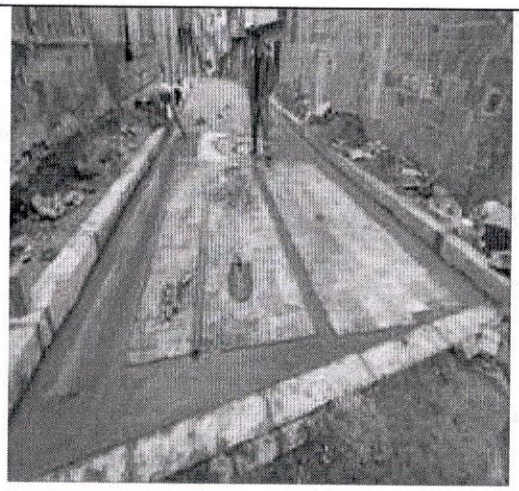

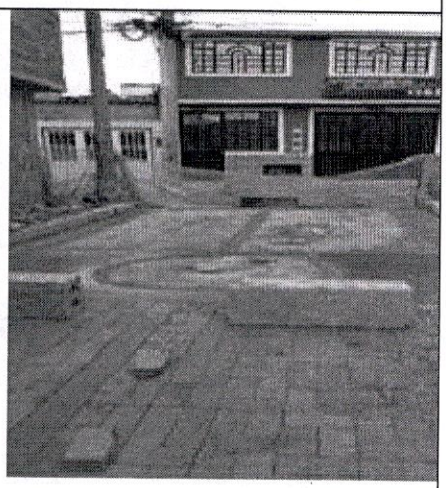


Tras 35 con Cll 44 se realiza fundida de cintas de confinamiento y cuadros de pozos

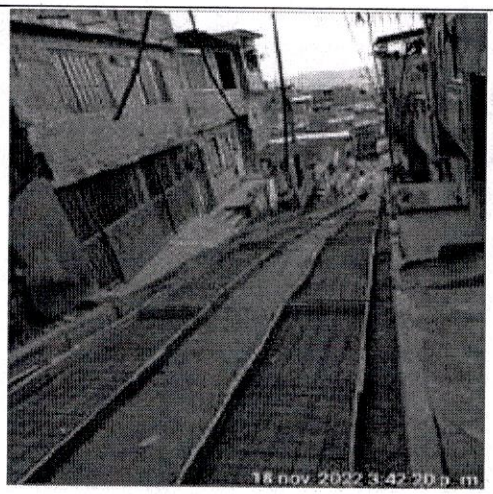

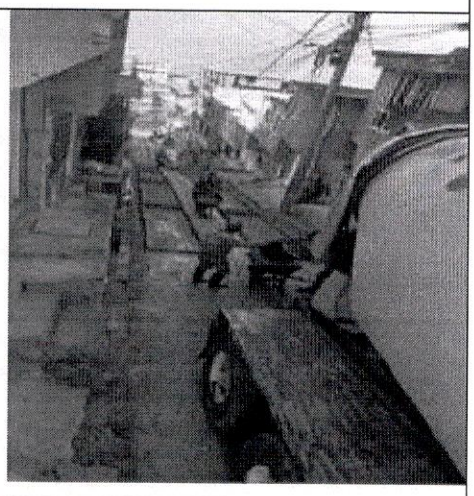

Cra 17con Cll 5ª fundida de placa huella

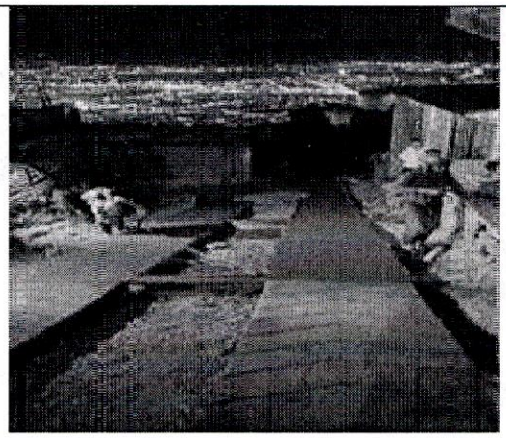





Cra 30 con Cll 53, se continua con la fundida de placa huella todo el tramo hasta la Cll 48


- Se realizó la instalación de Adoquín y fundida de cuneta central en concreto de 2500 psi para huellas en las vías:


1. Cll 37 con Diago 44 se continua la instalacion de adoquin
2. Trasv 34 y Trasv 45 se da continuidad a la instalacion de adoquin.
3. Cll 50 con Cra 30 instalacion de adoquin
4. Cra 17con Cll 50 se instaló paños de adoquin y fundió de cinta central para confinamiento

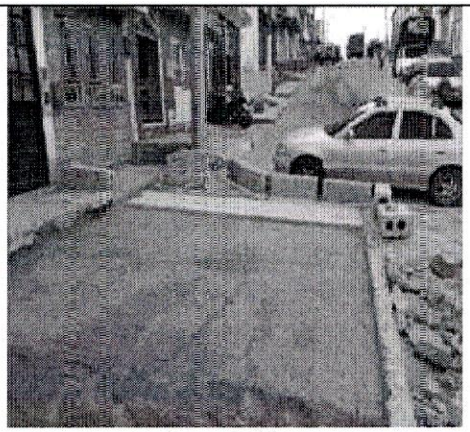

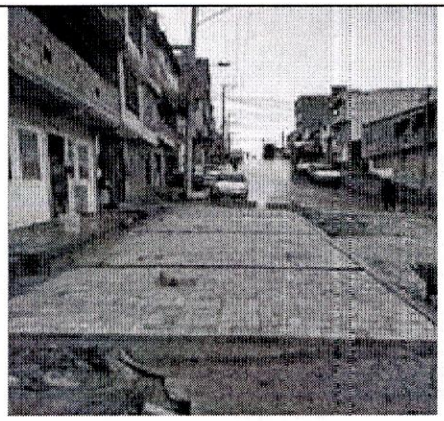



Instalación adoquín Cll 37 35 con Diag.44

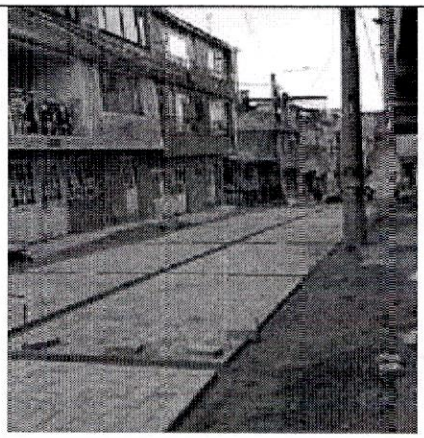

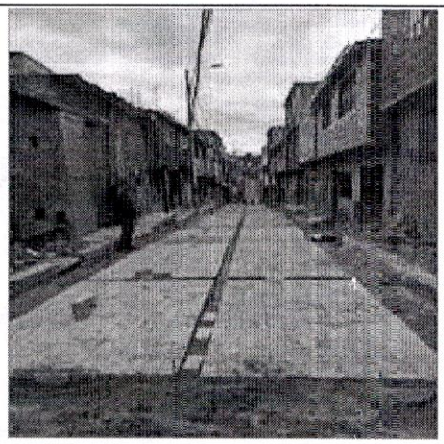



Continuidad de la actividad en la Trasv 35

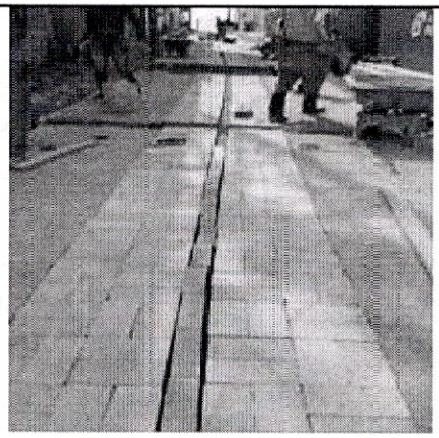

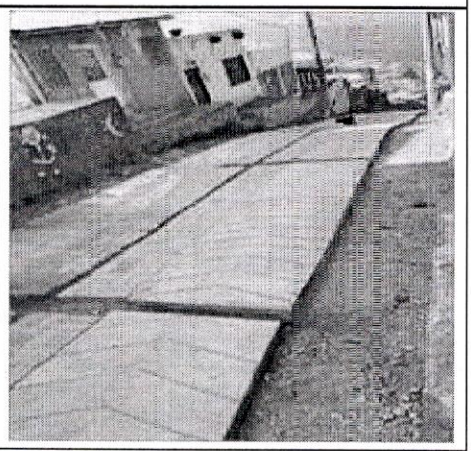


Instalación adoquín en la Cra 28 con Cll 56 A

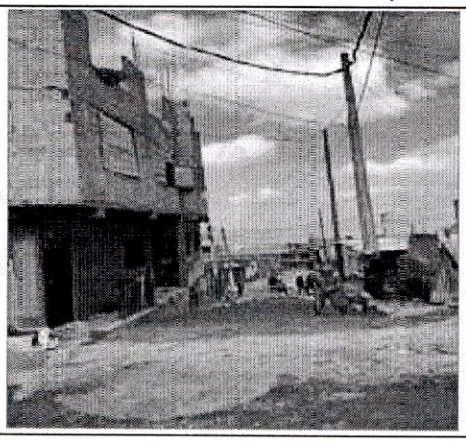


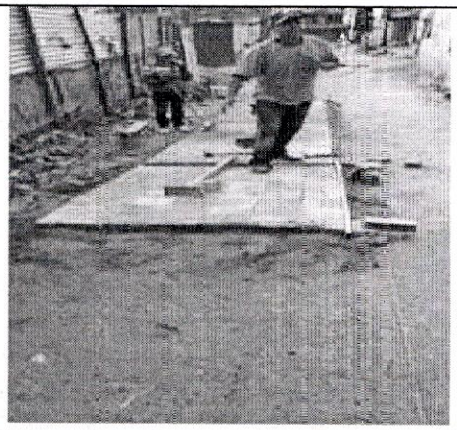


- Se realizó la fundida de los muros ciclópeos y/o de confinamiento necesarios por el estado actual de las cuadras.


1. En la trasv 35 con Cll 44A, se realizan los muros de confinamiento para la escalera en adoquin.
2. Cll 50 con Cra 32 se funden los muros ciclopeos para el confinamiento

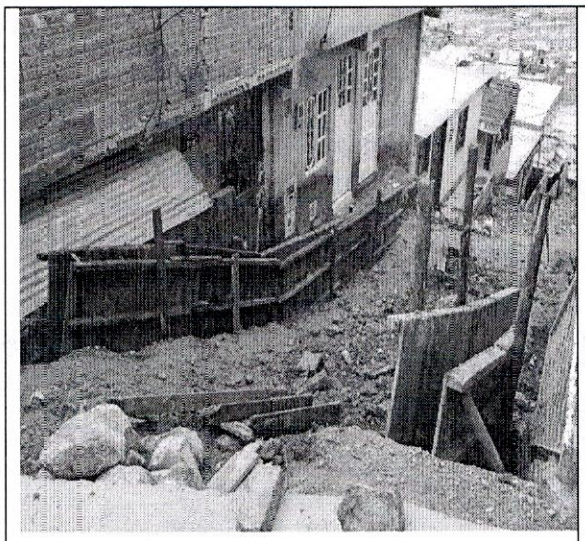

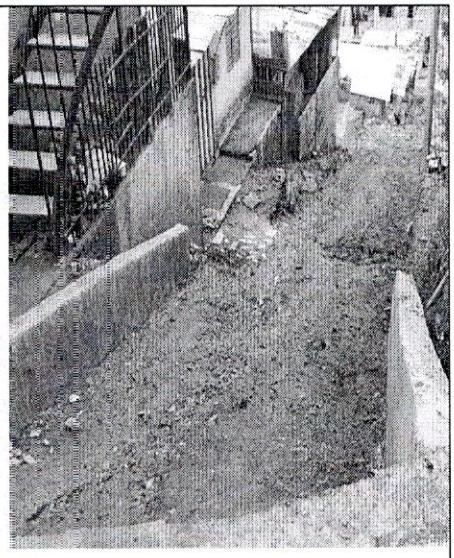



Fundida de muros ciclopeos Cll 48 entre Cra 32 A este y Cra 31, Cll 50 entre Cra 32 A este y Cra 31.

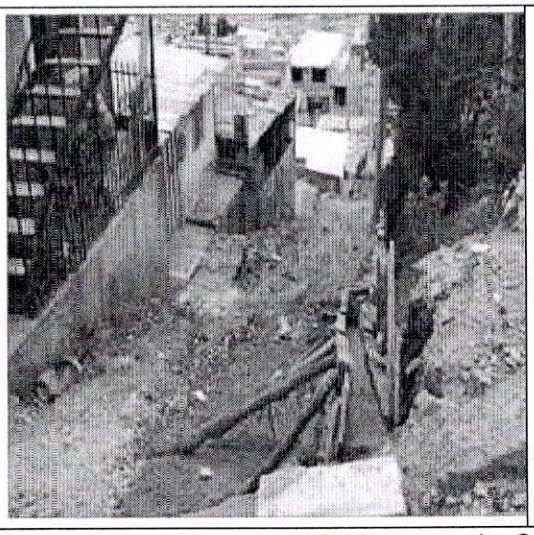

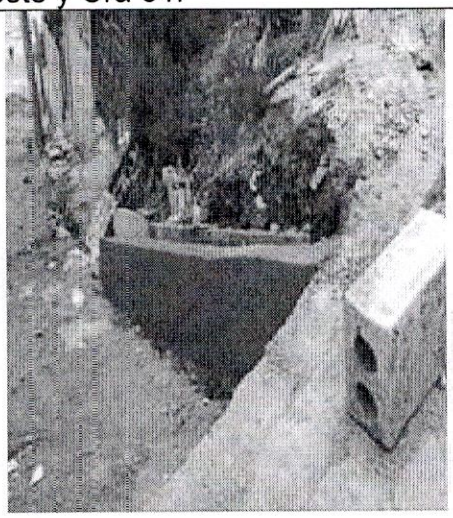

Fundida de muro ciclópeo en la Cll 48 entre Cra 32 A y Cra 32

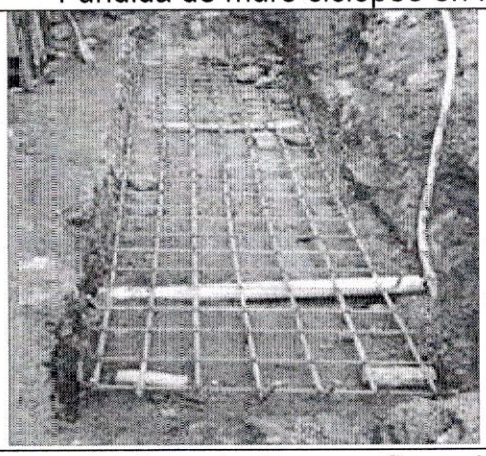


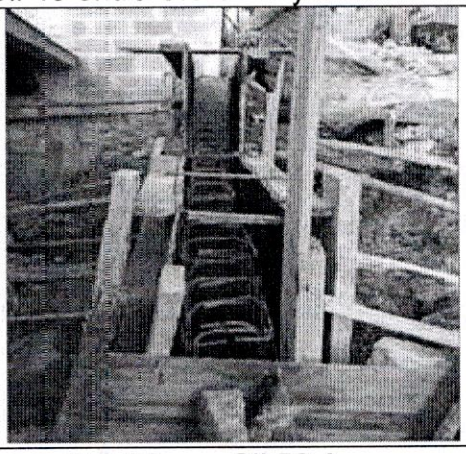


Armado de acero figurado muro Cra 28 con Cll 56 A


- Se evidencia fallo en las siguientes cuadras relacionadas:

  1. Cra 17 con Cll 60 se realiza la instalacion de rajo al final de la via por fallo
  2. Cra 30 con Cll 44 se realiza estabilizacion en la subrrasante con rajon desde la abscisa 0 a la 30.

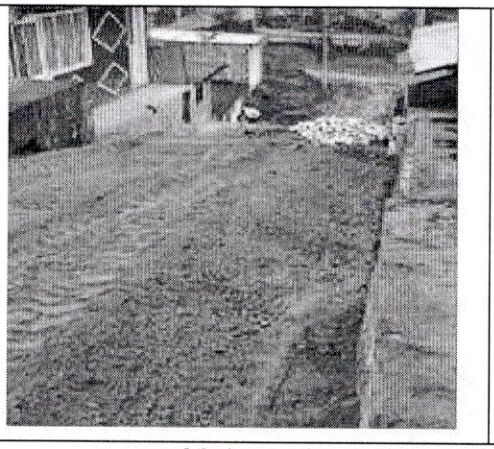

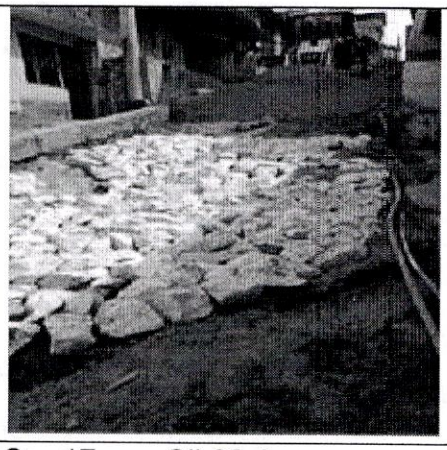

Mejoramiento con Rajo Cra 17 con Cll 60 A

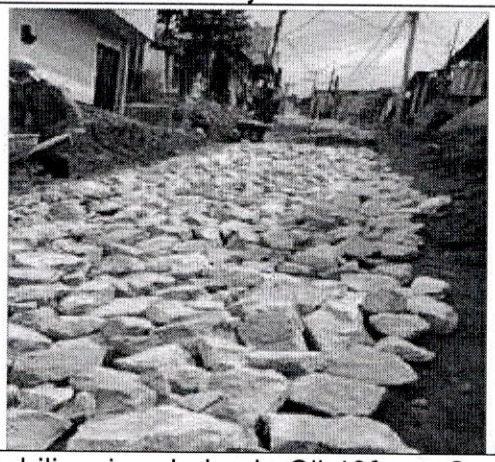



Estabilizacion de la via Cll 43f con Cra 30

- Debido a los reprocesos que genera el fuerte impacto del factor climático se generan actividades tales como:


  1. Renivelación de la Sub base en la Cra 26 para poder proceder con el armado de madera para la fundida de las huellas.
  2. Trasv 35 se desarrollaron actividades de reparación de la cuneta dañada por las lluvias del dia anterior.
  3. Debido a la ola invernal fue necesario renivelar y compactar la via Cra 17 con Cll 60
  4. Cll 53 con Cra 30 se realiza renivelacion de subbase por afectacion de lluvuias hasta el empalme con la Cra 28.


5. Cra 30 con Cll56 a la Cll 44 presentan afeactaciones por las lluvias socavando el material instalado

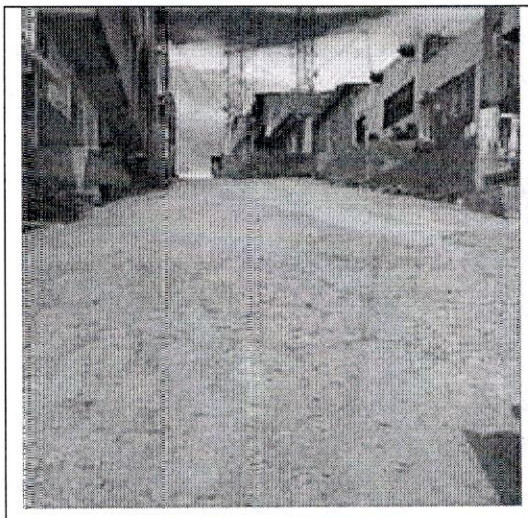

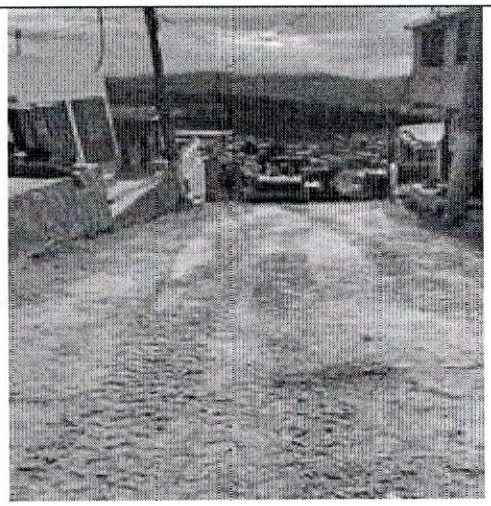



En la Cra 28 con Cll 56 se realiza re nivelación de la Subbase instalada debido a los daños causados por las lluvias

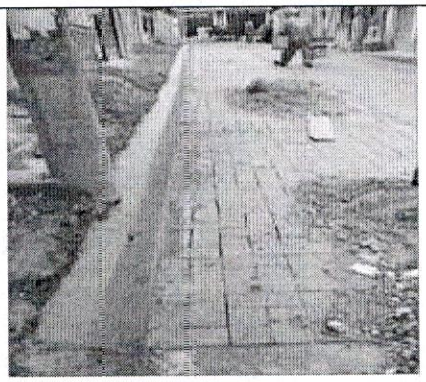

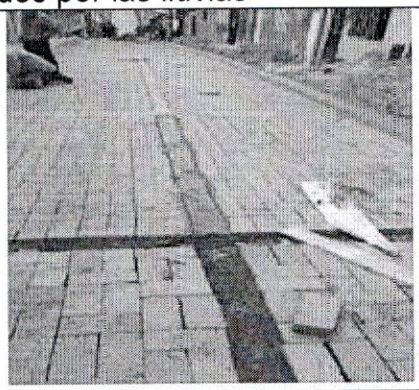

Trasv 35 con diagonal 44 reparacion de cunetas por ola invernal

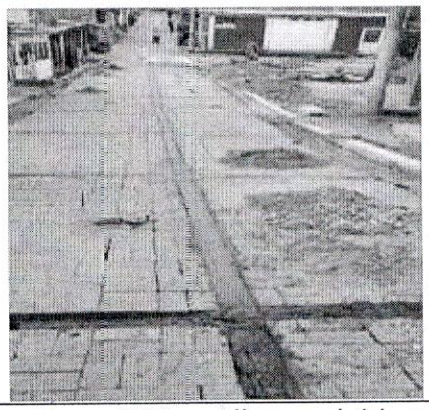


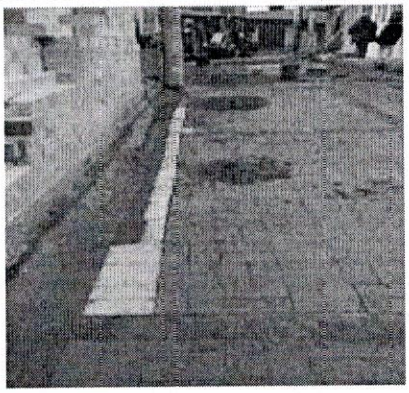

Trasv 34 con diagonal 44 reparacion de cunetas por ola invernal

- Limpieza y emboquillada


1. limpieza al sumidero y protección de los mismos
2. limpeza en la Tras 34 Diag 44 se realiza la emboquillada con mortero y arena en adoquin

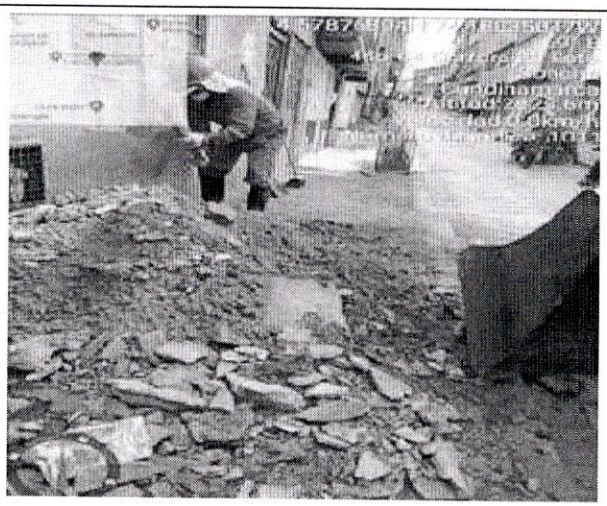

Actividades de limpieza de las cuadra

- Afectaciones a terceros

1. En la Cll 37 se realiza la reinstalacion de 12 m2 de adoquin por afectaciones causadas por un vehiculo de la comunidad.
2. la Cll 48 con Cra 32 A, se renivela caja de inspeccion ya que se encontro derrumbada

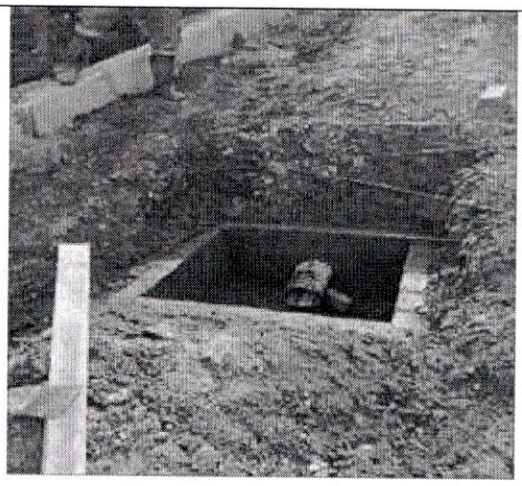



la Cll 48 con Cra 32 A renivelacion de caja de inspección


- Toma de muestras

1. Densidades para los laboratorios de la Subbase de la Cra 30 con Cll 44, Cll 48 con Cra 30 y Cll 53 con Cra 30


Para el periodo en mención del informe el CONSORCIO GAMER SOACHA, ha ejecutado a satisfacción la instalación de adoquín en las cuadras:

Cra32a Cll59 a Cll54, Cra32a Cll54 a Cll53, Cra32a Cll53 a Cll50, Cra32a Cll50 a Cll48, Cra32a Cll48 a Cll44, Cll54 Cra32a a Cra32, Cra32 Cll54 a Cll53 del Barrio Santo Domingo cumpliendo con las de actividades contempladas y especificaciones técnicas dadas para estas vías con la intervención de placa huellas.

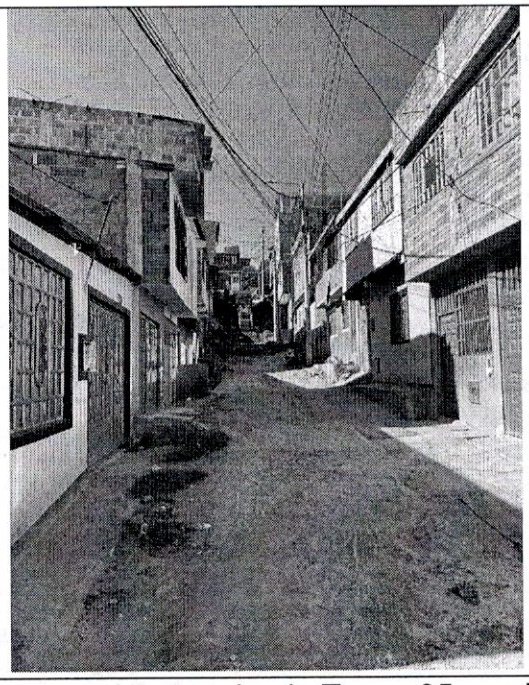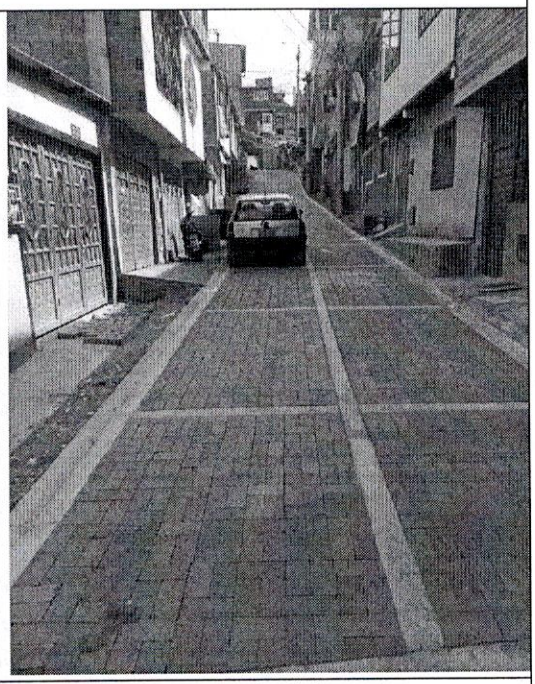
VÍAS CULMINADAS	
ANTES	AHORA
	
Via terminada Trasv. 35 con Diagonal 44 Paños de Adoquin	

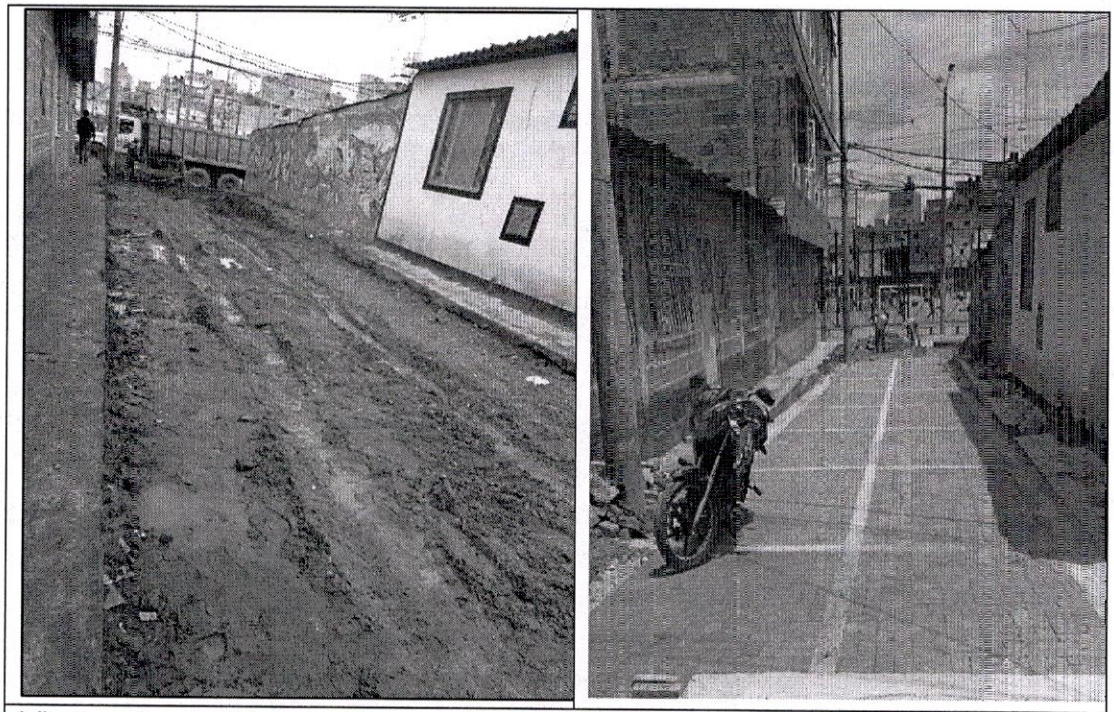


Via terminada Diagonal 44 a entre cra 37 este y trasv 35 Paños de Adoquin.

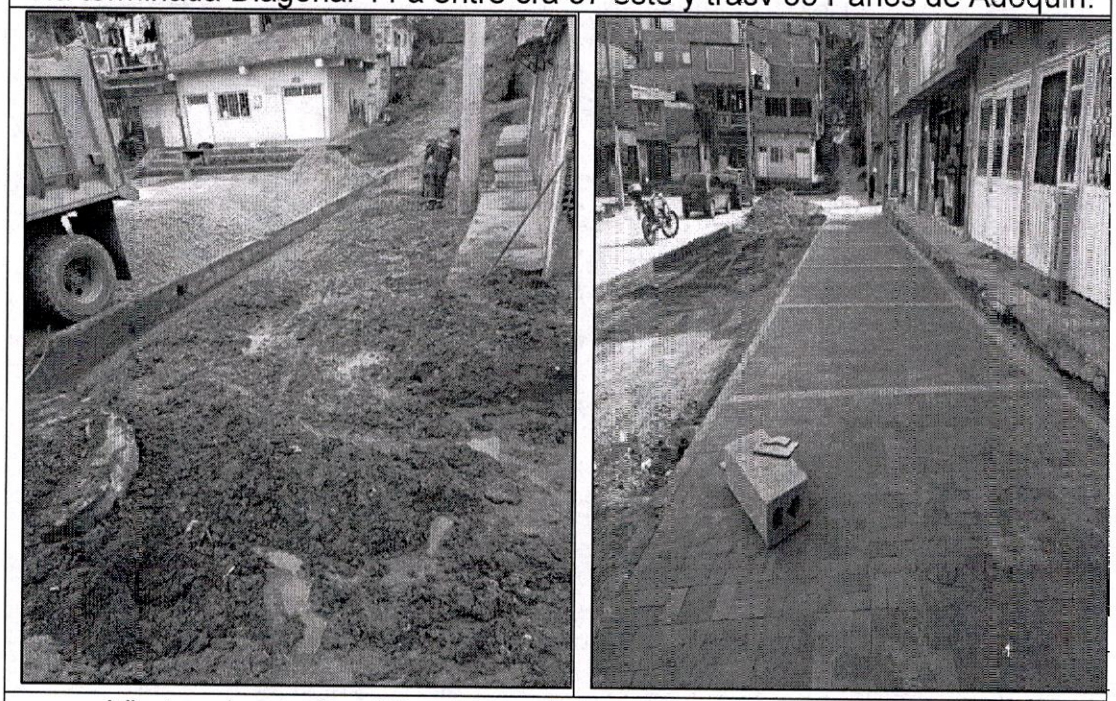



Via terminada Cra 37 este con Diagonal 44 a paños de adoquin

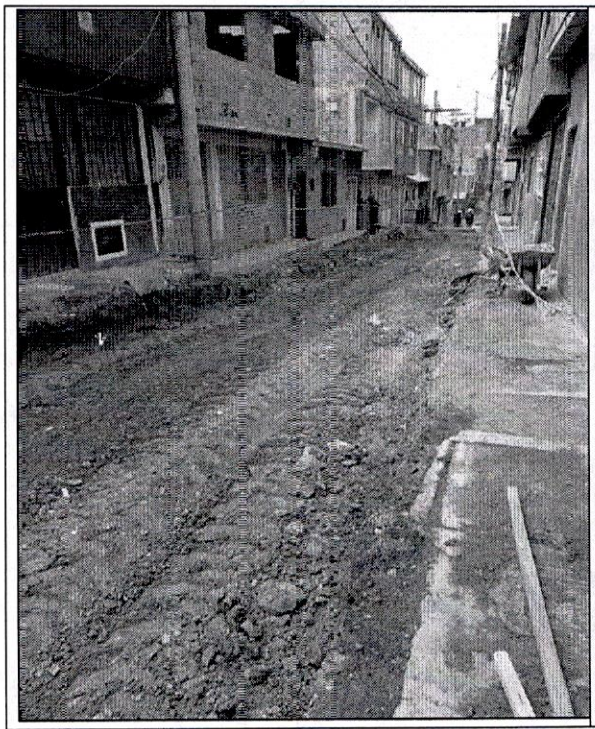

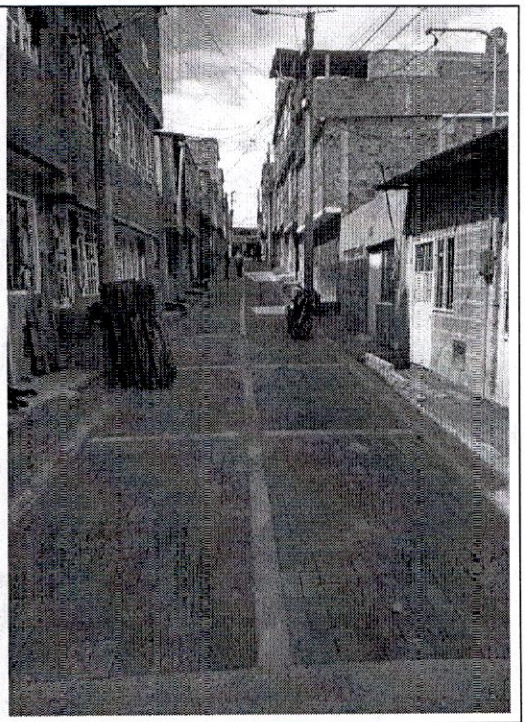


Via terminada Trasv. 35 entre Diagonal 44 y Cra 37 paños de adoquin

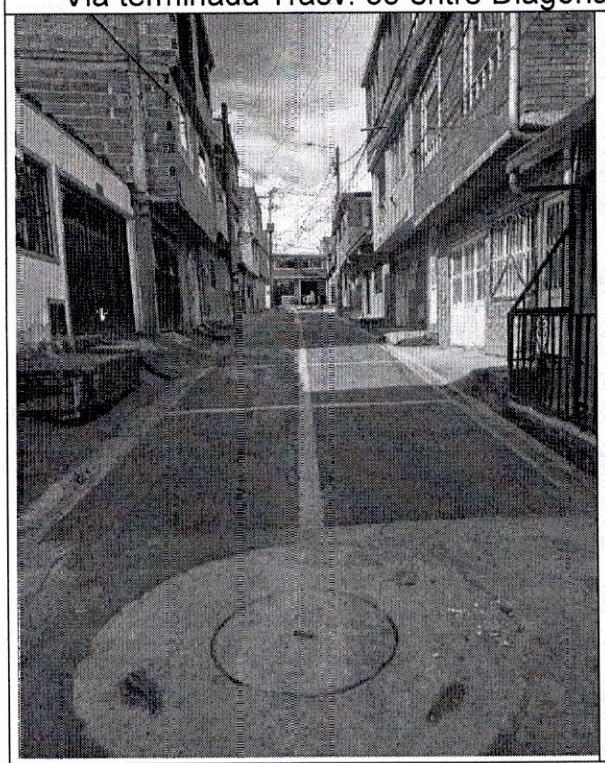


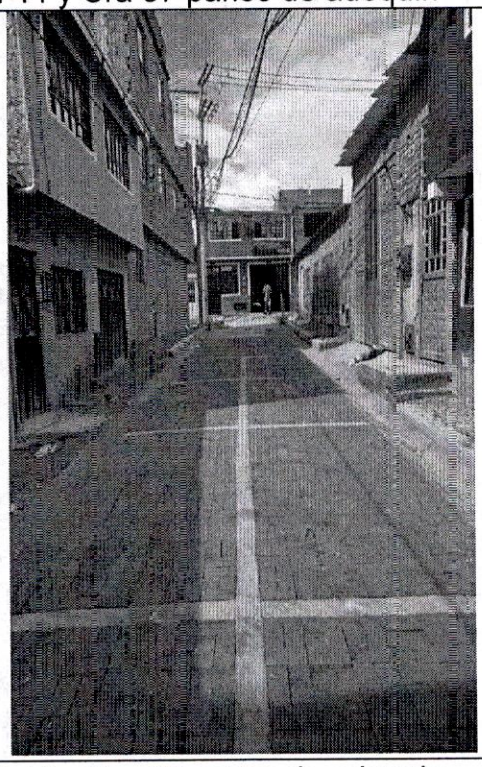


Via terminada Trasv. 35 entre Diagonal 44 y Cra 37 paños de adoquin

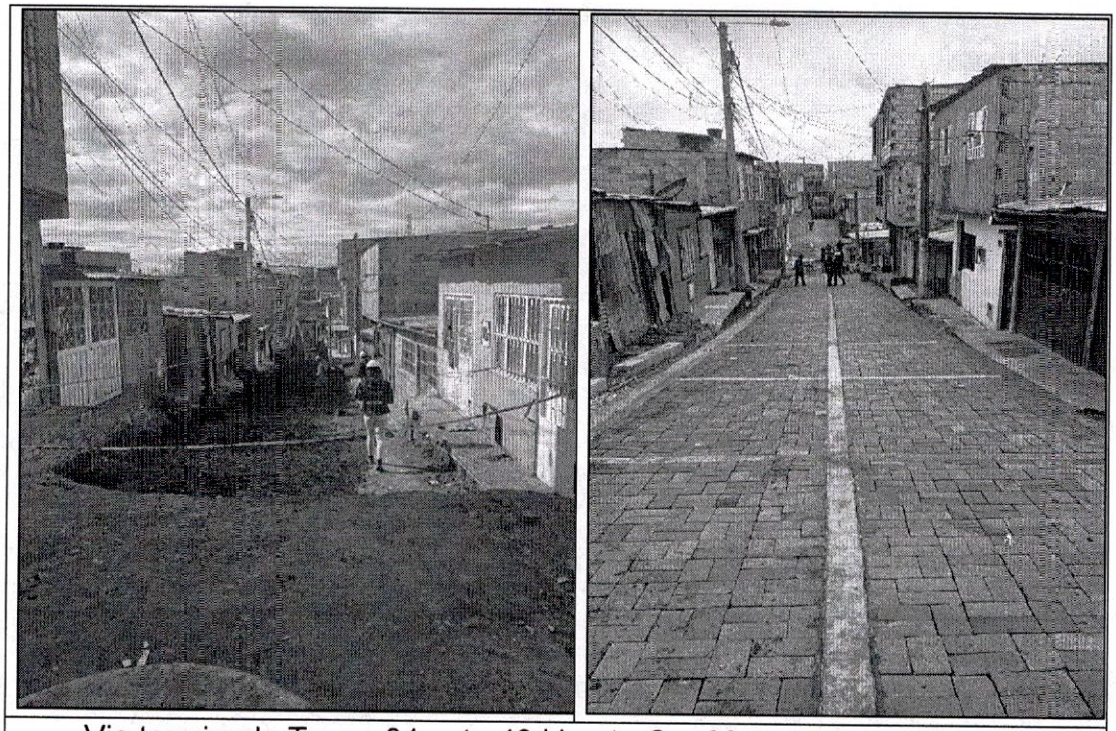

Via terminada Trasv. 34 este 43 j hasta Cra 33 a paños de adoquin

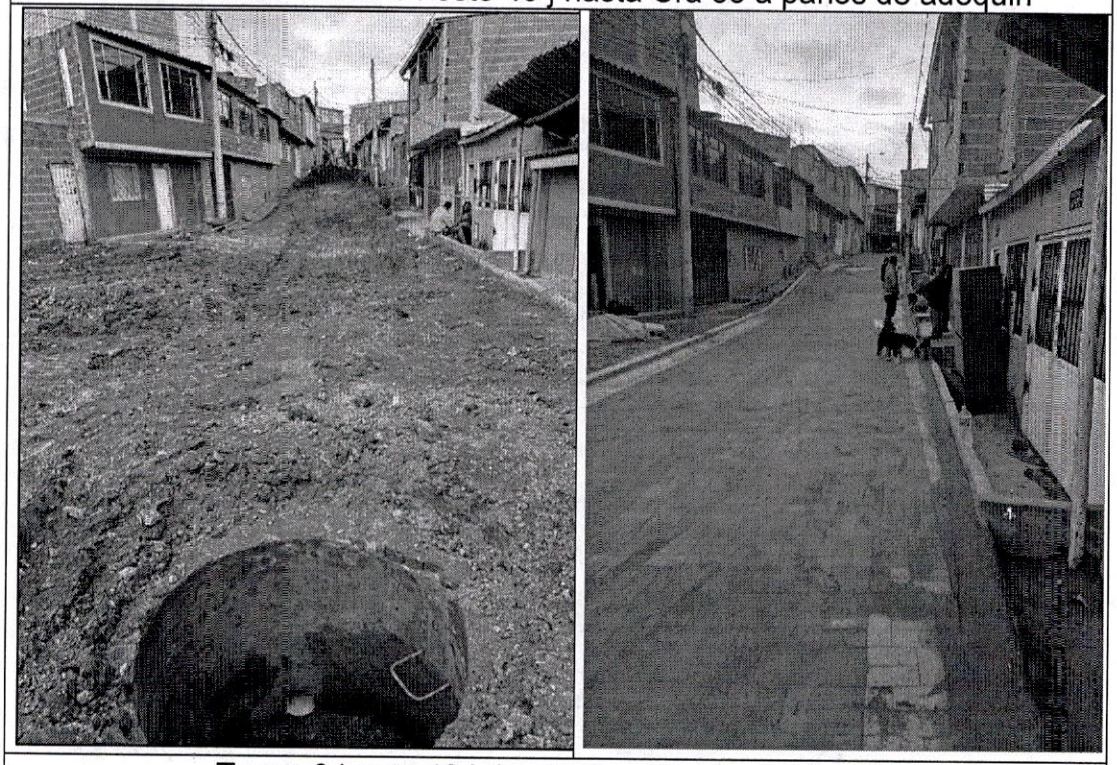

Trasv. 34 este 43 j desde Cra 33 a hasta Cra 37

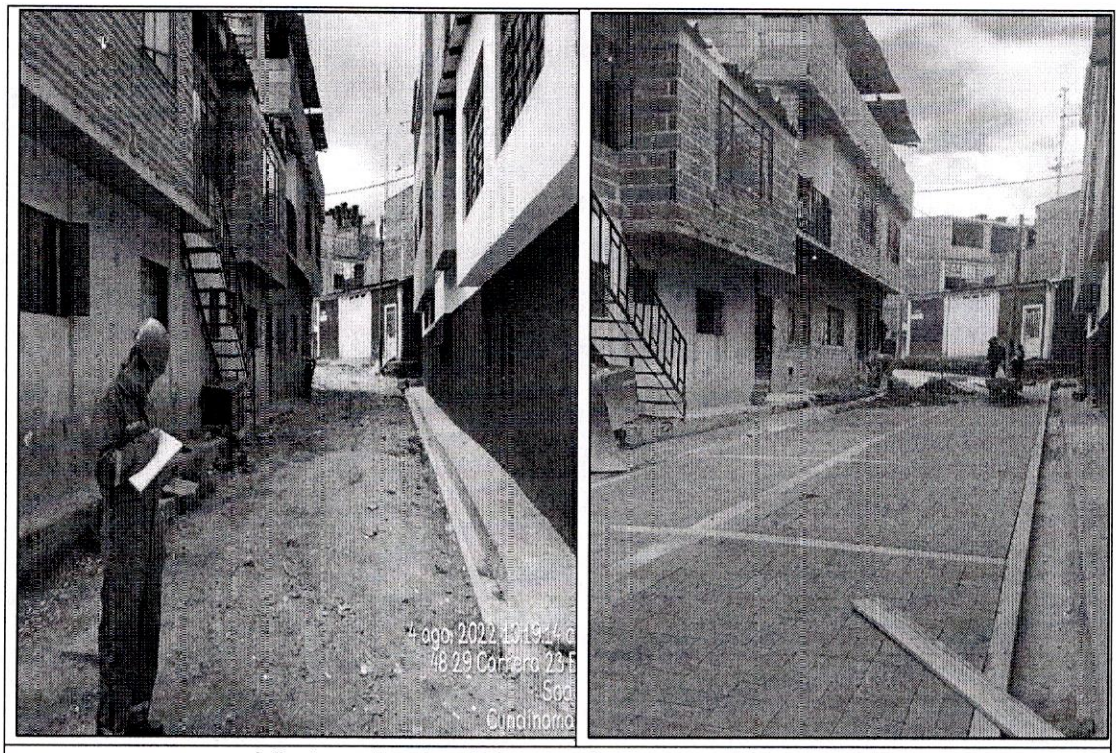

Via terminada Diagonal 44 a con Cra 33 a

7. ESTADO DEL CLIMA

A continuación, se relaciona el resumen del estado del clima para el período del 1 noviembre al 30 noviembre donde se evidencia altas precipitaciones afectando el periodo en referencia en un 33 % la ejecución de actividad, generando reprocesos en las actividades de la obra que afecta directamente el cronograma de las actividades a ejecutar, debido a que por las fuertes lluvias 10 días laborales se vio afectada la buena ejecución del contrato siendo necesario el cese de las actividades.

Tabla 5. Estado del clima

FECHA	MAÑANA	TARDE	¿La lluvia detuvo los trabajos?			
FECHA	MAÑANA	TARDE	¿La lluvia detuvo los trabajos?			
01/11/2022	NUBLADO	LLOVIZNA	SI		NO	X
02/11/2022	NUBLADO	LLOVIZNA	SI		NO	X
03/11/2022	LLOVIZNA	LLOVIZNAS	SI	X	NO	
04/11/2022	LLUVIAS FUERTES	NUBLADO	SI	X	NO	
05/11/2022	NUBLADO-LLUVIA	LLUVIAS FUERTE	SI		NO	X

FECHA	MAÑANA	TARDE	¿La lluvia detuvo los trabajos?			
FECHA	MAÑANA	TARDE	¿La lluvia detuvo los trabajos?			
06/11/2022			SI		NO	
07/11/2022	NUBLADO	LLUVIAS FUERTE	SI	X	NO	
08/11/2022	NUBLADO	LLUVIAS FUERTE	SI	X	NO	
09/11/2022	NUBLADO	LLOVIZNA	SI		NO	X
10/11/2022	SOLEADO	LLUVIAS FUERTE	SI		NO	X
11/11/2022	SOLEADO	SOLEADO	SI		NO	X
12/11/2022	SOLEADO	LLUVIAS FUERTES	SI		NO	X
13/11/2022			SI		NO	
14/11/2022			SI		NO	
15/11/2022	NUBLADO	LLUVIAS FUERTES	SI	X	NO	
16/11/2022	NUBLADO	LLUVIAS FUERTES	SI	X	NO	
17/11/2022	NUBLADO	LLUVIAS FUERTES	SI		NO	
18/11/2022	SOLEADO	LLUVIAS FUERTES	SI	X	NO	
19/11/2022	SOLEADO	LLUVIAS FUERTES	SI	X	NO	
20/11/2022			SI		NO	
21/11/2022	LLUVIA	SOLEADO	SI		NO	X
22/11/2022	NUBLADO	NUBLADO	SI		NO	X
23/11/2022	NUBLADO	LLOVIZNA	SI		NO	
24/11/2022	NUBLADO	LLUVIAS FUERTES	SI	X	NO	
25/11/2022	SOLEADO	SOLEADO	SI		NO	X
26/11/2022	LLUVIAS FUERTES	NUBLADO	SI	X	NO	
27/11/2022			SI		NO	
28/11/2022	SOLEADO	LLUVIAS FUERTES	SI	x	NO	
29/11/2022	NUBLADO	LLUVIAS FUERTES	SI	X	NO	
30/11/2022	NUBLADO	NUBLADO	SI		NO	x

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

Para el período del presente informe, se puede observar que debido a la presencia de la ola invernal, factor ajeno e impredecible por el Consorcio Gamer Soacha, se

obtuvo una afectación sobre las labores diarias correspondiente a 10 días y consolidándolo con el periodo de agosto,septiembre y octubre son 56 días.

Tabla 6. Reporte en días por factor climático

Mes	Cese de actividades en días por factor climático
Agosto	12 días
Septiembre	18 días
Octubre	16 días
Noviembre	10 días

8. COMITES TECNICOS

Durante el presente informe se realizaron los siguientes comités:

Tabla 7. Comités

COMITÉ N.	FECHA
10	04/11/2022
11	10/11/2022
12	18/11/2022

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

9. CORRESPONDENCIA ENVIADA

Durante el presente informe se radico la siguiente correspondencia:

Tabla 8. Correspondencia Enviada

CONTRATO INT. NO 24-2022				
NO CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÒN	ENTIDAD Y/O DIRIGIDO	ASUNTO	ENVIADO POR
CON-GAMER024-25/ 2022.	11-11-2022	COCOSERING SAS	SOLICITUD PEDIDO	CONSORCIO GAMER SOACHA
CON-GAMER024-26/2022.	14-11-2022	COCOSERING SAS	NP 13,14,15	CONSORCIO GAMER SOACHA

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

10. CONCLUSIONES

- Se permanece realizando excavaciones con la extracción de materiales en sitios definidos, siguiendo especificaciones dada por la empresa Pública del municipio de Soacha Epuxua Avanza E.I.C.E y la interventoría Cocosering SAS, priorizados por la secretaría de infraestructura del municipio en mención, empleando, métodos y recursos, previamente determinados en los documentos contractuales.

- Se reitera la importancia de contar con entregas constantes y sus respectivos lineamientos técnicos como lo son, sistemas constructivos, levantamientos topográficos, diseños, actas de vecindad y demás necesarios para la correcta ejecución del contrato.

- La ejecución de las vías asignadas se ha desarrollado con lo especificado en los comités y visitas de obra por parte de la Epuxua y la supervisión de la Alcaldía, se persiste con hallazgos donde es indispensable estabilizar la subrasante con Rajón, con el fin de garantizar el soporte necesario para la estructura, ya que en estos puntos presentaba un alto nivel de humedad.


- Es válido aclarar que el factor climático es ajeno e imposible de predecir por el Consorcio Gamer Soacha, debido a esto, los rendimientos se ven directamente afectados puesto que se han presentado durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre reprocesos constructivos, dificultades de acceso, atascamientos de maquinaria y la intervención solo se puede retomar cuando el terreno no se encuentre saturado, por lo que las lluvias han dificultado el buen rendimiento del contrato de obra 024-2022. Remítase al capítulo 8 tabla 3 del presente informe.

- Debido a las incongruencias de la topografía entregada por parte de Epuxua Avanza E.I.C.E. se ha tenido reproceso en la ejecución de la obra, debido a esta situación se generó un primer informe consolidando las afectaciones que se anexa al informe técnico N° 3

- Por lineamiento de Epuxua, el proyecto al tener un enfoque social se define que el contratista Consorcio Gamer Soacha realizara actividades hasta la instalacion, nivelacion de subbase, fundida de cunetas y cintas de confinamiento, y la instalacion de los paños los realizara la comunidad, en las cuadras que se estipule como sistema constrcutivo adoquinamiento y el adoquin será suministrado por el municipio.

11. ANEXOS

Aportes del mes en reporte
Pólizas
Actas de comité técnicos
Laboratorios de materiales y certificaciones
Soporte de pago Acta 2.



Milton Eduardo Rivera Rincón
R.L Consorcio Gamer Soacha

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901587366-8	CONSORCIO GAMER SOACHA	CLL 44C 45-53 IN 2 AP 601	3158369463	gamersoacharrhh@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	12/12/2022	63839264	$9.993.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	312.200	0		0		0	0	0	0	312.200	9
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	332.000	0		0		0	0	0	0	332.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	10.700	0		0		0	0	0	0	10.700	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	89.600	0		0		0	0	0	0	89.600	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	249.600	0		0		0	0	0	0	249.600	8
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	42.000	0		0		0	0	0	0	42.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	87.400	0		0		0	0	0	0	87.400	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	42.000	0		0		0	0	0	0	42.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	32.200	0		0		0	0	0	0	32.200	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	106.000	0		0		0	0	0	0	106.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.457.600	0	0	22.500	22.500	0	0		1.502.600	6
230301	Porvenir	800224808-8	3.303.800	0	0	0	0	0	0		3.303.800	21
231001	Colfondos	800227940-6	382.700	0	0	0	0	0	0		382.700	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	61.600	0	0	0	0	0	0		61.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.184.000				2.184.000	0	0	2.184.000			21.840	2.184.000	32

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.254.700	0	0	1.254.700	32

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901587366-8	CONSORCIO GAMER SOACHA		CLL 44C 45-53 IN 2 AP 601	3158369463	gamersoacharrhh@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	12/12/2022	63839264	$9.993.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	1.303.700	1.303.700
Pensión	4	5.250.700	5.250.700
Riesgos Laborales	1	2.184.000	2.184.000
CCF	1	1.254.700	1.254.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	16	9.993.100	9.993.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901587366-8	CONSORCIO GAMER SOACHA	CLL 44C 45-53 IN 2 AP 601	3158369463	gamersoacharrhh@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 32 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-12	2022-11	E	12/12/2022	63839264	$9.993.100

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estampado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1002524721	CARO BERNAL YENI CLEMENCIA	1	0			S																	230301	1.050.000	168.000	0	0	0	0	EPS010	1.050.000	42.000	14-11	1.050.000	5	73.100	CCF24	1.050.000	42.000	0	0	0	0	0
CC	1016714270	VALENCIA VERGARA EINER STIVEN	1	0			S	x																230301	945.000	151.200	0	0	0	0	EPS002	945.000	37.800	14-11	945.000	5	65.800	CCF24	945.000	37.800	0	0	0	0	0
CC	1018475315	DEVIA VARGAS IVAN LEONARDO	1	0			S																	230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
CC	1024577975	GUZMAN CRUZ BRAYAN STICK	1	0			S	x																230301	210.000	33.600	0	0	0	0	EPS037	210.000	8.400	14-11	210.000	5	14.700	CCF24	210.000	8.400	0	0	0	0	0
CC	1024596136	MOLINA GARCIA EDUARD FERNANDO	1	0			S																	230301	1.050.000	168.000	0	0	0	0	EPS018	1.050.000	42.000	14-11	1.050.000	5	73.100	CCF24	1.050.000	42.000	0	0	0	0	0
CC	1031144648	BARACALDO ANTONIO VICTOR ALONSO	1	0			S																	230301	1.050.000	168.000	0	0	0	0	EPS002	1.050.000	42.000	14-11	1.050.000	5	73.100	CCF24	1.050.000	42.000	0	0	0	0	0
CC	74753816	JIMENEZ PINTO DARIO REINALDO	1	0			S	x	x															25-14	385.000	61.600	0	0	0	0	EPS002	385.000	15.400	14-11	385.000	5	26.800	CCF24	385.000	15.400	0	0	0	0	0
CC	79413201	QUEVEDO QUIROGA LUIS GUILLERMO	1	0			S	x																230301	105.000	16.800	0	0	0	0	EPSC34	105.000	4.200	14-11	105.000	5	7.400	CCF24	105.000	4.200	0	0	0	0	0
CC	79413201	QUEVEDO QUIROGA LUIS GUILLERMO	1	0			S															20		230301	700.000	112.000	0	0	0	0	EPSC34	700.000	28.000	14-11	700.000	5	0	CCF24	700.000	0	0	0	0	0	0
CC	19366842	RODIRGUEZ DAZA ISIDRO	1	4			S	x	x																0	0	0	0	0	0	EPS017	53.334	2.200	14-11	53.334	5	3.800	CCF24	53.334	2.200	0	0	0	0	0
CC	4268084	MENJURA JOSE ALQUIMINIO	1	0			S																	230301	525.000	84.000	0	0	0	0	EPS017	525.000	21.000	14-11	525.000	5	36.600	CCF24	525.000	21.000	0	0	0	0	0
CC	4268084	MENJURA JOSE ALQUIMINIO	1	0			S										x							230301	525.000	84.000	0	0	0	0	EPS017	525.000	21.000	14-11	525.000	5	0	CCF24	525.000	0	0	0	0	0	0
PT	5245318	VERA INFANTE JOHNNY ADRIAN	1	0			S	x																230301	455.000	72.800	0	0	0	0	EPS017	455.000	18.200	14-11	455.000	5	31.700	CCF24	455.000	18.200	0	0	0	0	0
PT	5393159	VERA INFANTE JEAN CARLOS	1	0			S	x																230301	1.050.000	168.000	0	0	0	0	EPS017	1.050.000	42.000	14-11	1.050.000	5	73.100	CCF24	1.050.000	42.000	0	0	0	0	0
CC	5973396	MORENO TIQUE JOSE YONNY	1	0			S																	230301	1.050.000	168.000	0	0	0	0	EPS002	1.050.000	42.000	14-11	1.050.000	5	73.100	CCF24	1.050.000	42.000	0	0	0	0	0
CC	71173433	GONZALEZ OSORIO JAIR	1	0			S		x															231001	266.667	42.700	0	0	0	0	EPS008	266.667	10.700	14-11	266.667	5	18.600	CCF24	266.667	10.700	0	0	0	0	0
CC	1093734641	GARCIA MENDOZA IGNACIO DE JESUS	1	0			S	x																230301	373.334	59.800	0	0	0	0	EPS037	373.334	15.000	14-11	373.334	5	26.000	CCF24	373.334	15.000	0	0	0	0	0
CC	1104384548	GARCIA VILLADIEGO IGNACIO DE JESUS	1	0			S		x															230201	140.000	22.400	0	0	0	0	EPS010	140.000	5.600	14-11	140.000	5	9.800	CCF24	140.000	5.600	0	0	0	0	0
CC	80320554	SOTO MARROQUIN FERNANDO HORACIO	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
CC	80741817	MORA PEREZ JHON JAIRO	1	0			S																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS017	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
CC	14318492	DEVIA RAMON	1	0			S																	230301	1.050.000	168.000	0	0	0	0	EPS002	1.050.000	42.000	14-11	1.050.000	5	73.100	CCF24	1.050.000	42.000	0	0	0	0	0
CC	14678073	OLAYA CETRE EDINSON	1	0			S																	230301	1.050.000	168.000	0	0	0	0	EPS002	1.050.000	42.000	14-11	1.050.000	5	73.100	CCF24	1.050.000	42.000	0	0	0	0	0
CC	1051316221	PACHECO QUINTANA LUIS ALEJANDRO	1	0			S	x	x															230301	455.000	72.800	0	0	0	0	EPS002	455.000	18.200	14-11	455.000	5	31.700	CCF24	455.000	18.200	0	0	0	0	0
CC	1053122613	MONTERO MARIMON MARCOS JOSE	1	0			S																	230201	1.050.000	168.000	0	0	0	0	ESSC24	1.050.000	42.000	14-11	1.050.000	5	73.100	CCF24	1.050.000	42.000	0	0	0	0	0
CC	52017004	RIVERA RINCON NUBIA CONSUELO	1	0			S							x										230201	4.500.000	720.000	0	0	22.500	22.500	EPS005	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF24	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
CC	52097239	SANDOVAL RIVERA ANGELA PATRICIA	1	0			S		x															231001	525.000	84.000	0	0	0	0	EPS017	525.000	21.000	14-11	525.000	5	36.600	CCF24	525.000	21.000	0	0	0	0	0
CC	1073705826	CHARRY ALVARAN BRAYAN ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.050.000	168.000	0	0	0	0	EPS002	1.050.000	42.000	14-11	1.050.000	5	73.100	CCF24	1.050.000	42.000	0	0	0	0	0
CC	1083458561	LARA RIQUEL MOISES SEGUNDO	1	0			S	x	x															230201	770.000	123.200	0	0	0	0	EPS002	770.000	30.800	14-11	770.000	5	53.600	CCF24	770.000	30.800	0	0	0	0	0
CC	1065858804	MINOTTA SOTO CLEOFAS SEGUNDO	1	0			S																	230301	1.050.000	168.000	0	0	0	0	EPS041	1.050.000	42.000	14-11	1.050.000	5	73.100	CCF24	1.050.000	42.000	0	0	0	0	0
CC	1073689139	MAYORGA MAYORGA ROYER SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.050.000	168.000	0	0	0	0	EPS017	1.050.000	42.000	14-11	1.050.000	5	73.100	CCF24	1.050.000	42.000	0	0	0	0	0
CC	1148444398	ALOMIA RIASCOS DAVINSON HARLEY	1	0			S	x																230301	455.000	72.800	0	0	0	0	EPS017	455.000	18.200	14-11	455.000	5	31.700	CCF24	455.000	18.200	0	0	0	0	0
CC	13707389	HERNANDEZ HERREÑO GIOVANNY	1	0			S																	231001	1.600.000	256.000	0	0	0	0	ESSC24	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
CC	1032392691	MARIN CORDOBA JOHN CAMILO	1	0			S																	230201	1.050.000	168.000	0	0	0	0	EPS010	1.050.000	42.000	14-11	1.050.000	5	73.100	CCF24	1.050.000	42.000	0	0	0	0	0
CC	1045166865	BOLAÑO MORALES JAMES ONAYER	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

NOV

XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUXUA AVANZA E.I.C.E. FORMATO COMITÉ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA · EL CAMBIO AVANZA

LUGAR DE REUNIÓN:	Epuxca	HORA DE INICIO:	8:14 am.
FECHA:	04 de Noviembre	HORA DE TERMINACIÓN:	9:30
ELABORADO POR:	Interventoria	NUMERO DE COMITE:	
TIPO DE COMITÉ	TÉCNICO ☒	GERENCIA ☐	10

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
	Control y Seguimiento de cto 8443 con los contratos derivado 024-2022 y 025-2022.

AGENDA PROPUESTA	
1.	Verificación Compromisos del Acta anterior
2.	Verificación del porcentaje de avance a la fecha.
3.	Actas de Veeridad.
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se inicia el comite a las 8:14 am, con la revisión y verificación del acta anterior y con los compromisos que estaban pendientes. donde se verifica la instalación de sello de arena en los paños de adoquin de las Transv. 34 y 35. para lo que la supervisión solicita hacer entrega del registro fotografico. de esta actividad. Se Solicita al contratista incluir todas la cuadras entregadas por la entidad. dentro del Cronograma de Obra. Se aclara que para el barrio luis Carlos galan II en las vías de instalación de paños de adoquin la instalacion del mismo lo va a realizar la comunidad. para las cll 50 y cll 48 entre Cra 32A este y Cra 32 se realizara

huellas de 0,70 mts, con cunetas laterales de mínimo 30 cms.

Se continúa con la revisión del Diseño de escalera entregado por la entidad al contratista. y se revisa la Propuesta del contratista de obra donde se presenten un sistema constructivo de bordillo y adoquín y se realizará este sistema en la transv. 35. teniendo en cuenta que la actividad no cuenta con ítems contractuales (unidad ML). Para el día miércoles 09 de Noviembre se realizará el recorrido y entrega de las cuadras correspondientes a las transv. 34 y 35. y Cra 34.

Se revisa el tema de las actas de vecindad entregadas a la interventoría, por parte de la entidad, la Social informa que se devolverán 20 de las actas por falta de información y firmas.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93	62	62-40-101008792	0

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	05	2022	02	05	2022	00:00	02	11	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO GAMER SOACHA

DIRECCION: CL 44 C 45 53 IN 2 AP 601 — IDENTIFICACION: NIT. 901.587.366-8

CIUDAD: BOGOTA D.C. DISTRITO CAPITAL — TELEFONO: 3016341049

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E. Y-O MUNICIPIO DE SOACHA

DIRECCION: CL 12 NRO. 8 A - 36 — IDENTIFICACION NIT: 901.511.522-4

BENEFICIARIO: 901511522 - EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E. Y-O MUNICIPIO DE SOACHA — CIUDAD: SOACHA, CUNDINAMARCA — TELEFONO: 6060000

ADICIONAL: ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A. GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS, EL PAGO DE MULTAS, CLAUSULA PENAL PECUNIARIA Y DEMAS SANCIONES IMPUESTAS, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL A EMPLEAR, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SEGUN CONTRATO DE OBRA No. 024-2022 DENTRO DEL PROCESO No. LP 005-2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA.

-ASEGURADO EPUXUA AVANZA, E.I.C.E. NIT 901.511.522-4 Y EL MUNICIPIO DE SOACHA NIT. 860.094.193-7
BENEFICIARIO EPUXUA AVANZA, E.I.C.E. NIT 901.511.522-4 Y EL MUNICIPIO DE SOACHA NIT. 860.095.750-7 Y TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	02/05/2022	02/11/2022	$901,313,579.73

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
RIVERA RINCON MILTON EDUARDO	79205.062-0	50.00
CAMEVINO CONSTRUCCION SAS	901092172-8	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,135,902.00	$ ******20,000.00	$ *****219,621.00	$ *********1,375,523.00	$ ******901,313,579.73	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
NOFAL LTDA AGENCIA DE SEGUROS	72937	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

62-40-101008792

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860 009 578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93	62	62-45-101021351	0

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	05	2022	02	05	2022	00:00	02	11	2027	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO GAMER SOACHA — IDENTIFICACION: NIT 901.587.366-8

DIRECCION: CL 44 C 45 53 IN 2 AP 601 — CIUDAD: BOGOTA D.C. DISTRITO CAPITAL — TELEFONO: 5016341045

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA E.I.C.E. — IDENTIFICACION: NIT 901.511.522-4

DIRECCION: CL 12 NRO 8 A - 36 — CIUDAD: SOACHA CUNDINAMARCA — TELEFONO: 6060000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A. GARANTIZA

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES, EL PAGO DE MULTAS, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Y DEMÁS SANCIONES IMPUESTAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL GARANTIZADO A FAVOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE DE OBRA NO [illegible] DEL PROCESO NO. LP-005-2021, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, REPARETIZACIÓN DE LAS VIAS Y OBRAS [illegible] SOACHA CUNDINAMARCA.

NOTA: LA VIGENCIA CUBRA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (05) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA E.I.C.E. NIT. 901.511.522-4 Y EL MUNICIPIO DE SOACHA NIT. 860.024.761-5

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	02/05/2022	02/05/2023	$901,313,579.73
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	02/05/2022	02/11/2025	$450,656,789.87
ESTABILIDAD DE LA OBRA	02/11/2022	02/11/2027	$1,351,970,369.60

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
RIVERA RINCON WILSON RICARDO	79695702 0	50.00
CAMPUZANO CONSTRUCCION SAS	901082172-4	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **16.641.458.00	$ ******25,000.00	$ ***3,166,627.00	$ ********19,833,086.00	$ ****2.703.940.739.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NOGAL LTDA AGENCIA DE SEGUROS	12937	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

62-45-101021351

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM — OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2188977 — LIZETHGARZON — 1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93	62	62-40-101008792	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	08	2022	01	08	2022	00:00	01	02	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO GAMER SOACHA	NIT: 901.587.366-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 44 C 45 53 IN 2 AP 601	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3016341049

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E. Y-O MUNICIPIO DE SOACHA	NIT: 901.511.522-4

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 12 NRO. 8 A - 36	SOACHA, CUNDINAMARCA	6060000

BENEFICIARIO: 901511522 - EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E. Y-O MUNICIPIO DE SOACHA — ADICIONAL: — ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS, EL PAGO DE MULTAS, CLAUSULA PENAL PECUNIARIA Y DEMAS SANCIONES IMPUESTAS, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL A EMPLEAR, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SEGUN CONTRATO DE OBRA NO. 024-2022 DENTRO DEL PROCESO NO. IP 005-2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA.

-ASEGURADO EPUXUA AVANZA, E.I.C.E. NIT 901.511.522-4 Y EL MUNICIPIO DE SOACHA NIT. 800.094.755-7
BENEFICIARIO EPUXUA AVANZA, E.I.C.E. NIT 901.511.522-4 Y EL MUNICIPIO DE SOACHA NIT. 800.094.755-7 Y TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/08/2022	01/02/2023	$901,313,579.73	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA VIGENCIA PARA LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO A ACTA DE INICIO DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022 QUEDANDO TAL Y COMO FIGURA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,135,902.00	$ ******20,000.00	$ *****219,621.00	$ *********1,375,523.00	$ ******901,313,579.73	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
NOPAL LTDA AGENCIA DE SEGUROS	72937	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

62-40-101008792
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zaranto B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93	62	62-40-101008792	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	08	2022	01	08	2022	00:00	01	02	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO GAMER SOACHA	NIT: 901.587.366-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 44 C 45 53 IN 2 AP 601	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3016341049

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E. Y-O MUNICIPIO DE SOACHA	NIT: 901.511.522-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 12 NRO. 8 A - 36	SOACHA, CUNDINAMARCA	6060000

BENEFICIARIO: 901511522 - EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA E.I.C.E. ADICIONAL: ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS

P GUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros de Vida del Estado Cuenta Corriente 008465452

Grupo Bancolombia — Seguros de Vida del Estado Cuenta Convenio 47190

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,135,902.00	$ ******20,000.00	$ *****219,621.00	$ *********1,375,523.00	$ ******901,313,579.73	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
NOPAL LTDA AGENCIA DE SEGUROS	72937	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)110211024034313(3900)0000013755231(96)20230801

REFERENCIA PAGO: 1102110240343-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93	62	62-40-101008792	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	08	2022	01	08	2022	00:00	01	02	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO GAMER SOACHA	NIT: 901.587.356-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 44 C 45 53 IN 2 AP 601	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3016341049

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E. Y-O MUNICIPIO DE SOACHA	NIT: 901.511.522-4

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 12 NRO. 8 A - 36	SOACHA, CUNDINAMARCA	6060000

BENEFICIARIO: 901511522 - EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E. Y-O MUNICIPIO DE SOACHA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
RIVERA RINCON MILTON EDUARDO	79205702-0	50.00
GAMEVING CONSTRUCCION SAS	901082172-8	50.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

62-40-101008792

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93	62	62-45-101021351	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	08	2022	01	08	2022	00:00	01	02	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO GAMER SOACHA	NIT: 901.587.366-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 44 C 45 53 IN 2 AP 601	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3016341049

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA E.I.C.E.	NIT: 901.511.522-4

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 12 NRO. 8 A - 36	SOACHA, CUNDINAMARCA	6060000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS, EL PAGO DE MULTAS, CLAUSULA PENAL PECUNIARIA Y DEMAS SANCIONES IMPUESTAS, PAGO DE SALARIES, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL A EMPLEAR, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SEGUN CONTRATO DE OBRA NO. 024-2022 DENTRO DEL PROCESO NO. IP 005-2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA.

NOTA: LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIN DEL ACTA DE RECIBO FINAL

ASEGURADO/BENEFICIARIO EPUXUA AVANZA, E.I.C.E. NIT 901.511.522-4 Y EL MUNICIPIO DE SOACHA NIT. 800.094.755-7

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	01/08/2022	01/08/2023	$901,313,579.73	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	01/08/2022	01/02/2026	$450,656,789.87	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	01/02/2023	01/02/2028	$1,351,970,369.60	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA VIGENCIA PARA LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO A ACTA DE INICIO DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022 QUEDANDO TAL Y COMO FIGURA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **16,641,458.00	$ *****25,000.00	$ ***3,166,627.00	$ ********19,833,086.00	$ ****2,703,940,739.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
NOPAL LTDA AGENCIA DE SEGUROS	72937	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

62-45-101021351

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93	62	62-45-101021351	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	08	2022	01	08	2022	00:00	01	02	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO GAMER SOACHA		NIT: 901.587.356-8
DIRECCIÓN: CL 44 C 45 53 IN 2 AP 601	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3016341049

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA E.I.C.E.		NIT: 901.511.522-4
DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 8 A - 36	CIUDAD: SOACHA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO 6060000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA · MasterCard · Diners Club International · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia · éxito

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros de Vida del Estado Cuenta Corriente 008465452

Grupo Bancolombia — Seguros de Vida del Estado Cuenta Convenio 47190

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **16,641,458.00	$ ******25,000.00	$ ***3,166,627.00	$ ********19,833,086.00	$ ****2,703,940,739.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
NOPAL LTDA AGENCIA DE SEGUROS	72937	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)110211024034 15(3900)0000198300 86(96)20230801

REFERENCIA PAGO: 1102110240341-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93	62	62-45-101021351	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	08	2022	01	08	2022	00:00	01	02	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO GAMER SOACHA		NIT: 901.587.366-8
DIRECCIÓN: CL 44 C 45 53 IN 2 AP 601	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3016341049

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA E.I.C.E.		NIT: 901.511.522-4
DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 8 A - 36	**CIUDAD:** SOACHA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	6060000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
RIVERA RINCON MILTON EDUARDO	79205702-0	50.00
GAMEVING CONSTRUCCION SAS	901082172-8	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

62-45-101021351

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

XUÁ Empresa Pública de Aseo de Soacha	EPUXUA AVANZA E.I.C.E. FORMATO COMITÉ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA — EL CAMBIO AVANZA

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD:	**RESPONSABLE:**	**FECHA:**
Para el día de hoy 04 de Noviembre se hará entrega del informe de afectación climatica antes del medio día a epuxua	Contratista de Obra.	04 de Noviembre.
entrega de un listado de las vías a intervenir en el barrio luis Carlos Galan II. por parte de la comunidad.	Secretaria de Infraestructura.	09 de Noviembre 2022.
Para el 15 de Noviembre 2022 entrega de Subsanaciones de la entrega de Vías cr 32.	Contratista Obra	13 de Noviembre 2022.

XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUXUA AVANZA E.I.C.E. FORMATO COMITÉ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA — EL CAMBIO AVANZA

PARTICIPANTES			
NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Milton Rivera	Contratista	315 3467636	
Antonio Lara	Apoyo a la supervisión.	3124126320	
Stella Respeck	Coreosering SAS interventoría	3134699929	
Nubia Ruiz	Contratista	3102935197	
Juan Pablo	Epuxua	3124821454	
Andrea Rubiano	Epuxua	3103425601	
Lorena Cifuentes	Residente Interventoría	3105709036	

XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUEXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

LUGAR DE REUNIÓN: Cajuca	HORA DE INICIO: 8:00am.
FECHA: 17 NOV - 2022	HORA DE TERMINACIÓN: 12:00
ELABORADO POR: Andrea Rubiano	NUMERO DE ACTA: 11

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
	Seguimiento y recorrido de obra.

AGENDA PROPUESTA	
1.	· Recorrido de vías intervenidas.
2.	· Seguimiento
3.	- Temas varios
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se inicia comité en acompañamiento del secretario de infra. Ing Jhon Vargas, el cual indica que debe darsele prioridad a las vías donde la comunidad cuenta con adoquín y alternadamente las asignadas en los recorridos por el supervisor y apoyo desde la secret de infraest.
- Se entregara a Epuxua la información relevante a las cuadras que tienen entregado adoquín por el ordenador del gasto para poder incluirlas en el cronograma de ejecución.
- las cuadras a las que la S.I entrego material, la comunidad y la S.I es responsable de entregar al momento de la instalación y en caso que

Calle 13 N° 7-30 Soacha - Cundinamarca
Tel: 57 - 1 - 7305600 Fax: 57 - 1 - 5770580
contactenos@alcaldiasoacha.gov.co

no entrante o falte material la Alcaldía no será responsable, ni el contratista, ni epuexua, se debe aclarar a Epuexua quien complementara el suministro. toda vez que el material en algunos Barrios es custodiado por la comunidad.

- Referente a las tapas de los pozos serán suministradas por la administración y lo instala el contratista de obra. previa identificación de la necesidad en contratista de obra emitira el requerimiento para trasladarlo "Tapas y cuentapas y de coryse"
- S.I hara entrega de posterior a la verificación para identificar la correctividad entre las juntas ejecutadas por Epuexua. Cll 33 Est entre cll 44 colindando hasta Bodytech y se proyecta en placa huella e inclusio adoquín., Centra en evaluación por S.I 1- para el proximo comite se define
- Durante el recorrido por las vias, puntualmente Casa loma G, ITA y J, el contratista de obra ya dio inicio a la demolición, sin embargo se evidencia el terreno saturado por lo que no es viable continuar. Se medio con la comunidad para poder construir el sistema incluyendo cunetas laterales. la comunidad no ha hecha trabajos relevantes a manejo de aguas con los bajantes de casa viviendo.

Calle 13 N° 7-30 Soacha - Cundinamarca
Tel: 57 - 1 - 7505500 Ext: 57-1 5770580
contactenos@alcaldiasoacha.gov.co

XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUEXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:

PARTICIPANTES			
NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONC DE CONTACTO	FIRMA
Antonio Lara Hernandez	Apoyo a la supervisión Equipamiento.	3124126320	
Juan Pablo Cañón	Epoxua	3124821154	
Sibila Cespedes	cocoserving SAS	3134699929	
Milton Rincon	Contratista	315 3467636	
Catherine Muñoz	Contratista	3219443913	
Andrea Robiano	Epoxua	3103425601	
Nidia	Contratista	3102935197	
Blanca Oliva	social infraestructura	3147156938	Blanca Oliva

Calle 13 Nº 2-30 Soacha - Cundinamarca
Tel: 57 - 1 - 7305500 Fax 57 - 1 - 5770580
contactenos@alcaldiasoacha.gov.co

XUÁ
Empresa Pública de Soacha

INFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3443-2021

Soacha, Cundinamarca, 05 Julio de 2022

Ingenieros

JHON MARIO VARGAS RUIZ – Secretario de Infraestructura.

SIMÓN MEJÍA - Supervisor Contrato 3443-2021

Alcaldía Municipal de Soacha.

E. S. D.

ASUNTO: Rendición informe actividades visitas en cumplimiento al Contrato Interadministrativo N° 3443-2021.

Respetados Ingenieros:

En cumplimiento a lo sugerido por parte de la Secretaría de Infraestructura, en comité del pasado 10 de mayo de 2022; me permito remitir informe técnico, conforme a las visitas realizadas de manera conjunta con personal de la secretaría de infraestructura, y de lo cual se consolidó la información obtenida de las visitas tecnicas realizadas durante el mes de junio de 2022 en la comuna 4 del Municipio de Soacha Cundinamarca, así: 1

BARRIO VILLA MERCEDES 1:

- CRC 18 ENTRE CLL 48 C Y CLL 49
- CRA 24 ENTRE CLL 49 Y CLL 50
- CLL 48 C ENTRE CRA 17 B Y CRA 17 C
- CRA 19 ENTRE CLL 49 Y CLL 50
- CLL 48 B ENTRE CRA 19 Y CRA 21 A
- CRA 21 B ENTRE CLL 48 Y CLL 50

BARRIO LOMA LINDA: – Adoquin suministrado por S.I. 12.000 u

- Cll 49 entre Cra 19 y Cra 17 B
- Cll 50 entre Cra 19 y Cra 17 B

- CRA 23 ENTRE CLL 50 Y CLL 54
- CRA 19 ENTRE CLL 49 Y CLL 50
- CRA 22 A ENTRE CLL 50 Y CLL 54

BARIO CARLOS PIZARRO:

- Cra 21 A entre Cll 54 y Cll 56 A

BARRIO CASA LOMA:

- Cll 59 D entre Cra 21 A y Cll 60

BARRIO LUIS CARLOS GALAN 1 → Alcantarillado entregado a la comunidad.

- Cra 24 B entre Cll 59 y Cll 60
- Cra 24 B entre Cll 59 y Cll 57
- CRA 26 ENTRE CLL 59 Y CLL 56 B
- CRA 26 C ENTRE CLL 53 Y CLL 55

BARRIO LUIS CARLOS GALAN 2

- CLL 43 F ENTRE CRA 30 Y CRA 27 B
- CLL 43 F/D ENTRE CRA 27
- CLL 48 CON CRA 31 Y CRA 32 A

BARRIO VILLA MERCEDES → Alcantarillado suministrado por SI.

- CLL 56 B ENTRE CRA 24 A Y CRA 25
- CRA 25 ENTRE CLL 57 Y CLL 56

BARRIO MINUTO DE DIOS

- CRA 22 B ENTRE CLL 59 Y CLL 56 A

Calle 12 # 8A – 36 Soacha - Cundinamarca
epuxua@alcaldiasoacha.gov.co

BARRIO EL PROGRESO

- CRA 26 B ENTRE CLL 38 Y CLL 40
- CRA 30A ENTRE CLL 40 A Y CLL 41
- CRA 28 A ENTRE CLL 40 A Y CLL 41

BARRIO VILLA SANDRA

- Cll 43 entre Cr 19 y Reserva Forestal

BARRIO EL OASIS

- CRA 35 CON CLL 42
- CRA 36 ENTRE CLL 42 Y 42 A
- CRA 39 ENTRE CLL 40 J
- Cra 39 entre Cll 42 y 42 A

BARRIO LOS ROBLES

- CRA 48 ENTRE CLL 41 Y CLL 42
- CRA 47 ENTRE CRA 41 Y 42
- CRA 49 CON CLL 41 Y CLL 42

BARIO ALTOS DEL PINO


- TRNSV 48 CON CALL 42ª

BARRIO SANTO DOMINGO

- CRA 32 A / CLL 53

Calle 12 # 8A – 36 Soacha - Cundinamarca
epuxua@alcaldiasoacha.gov.co

UBICACIÓN VIAS A INTERVENIR

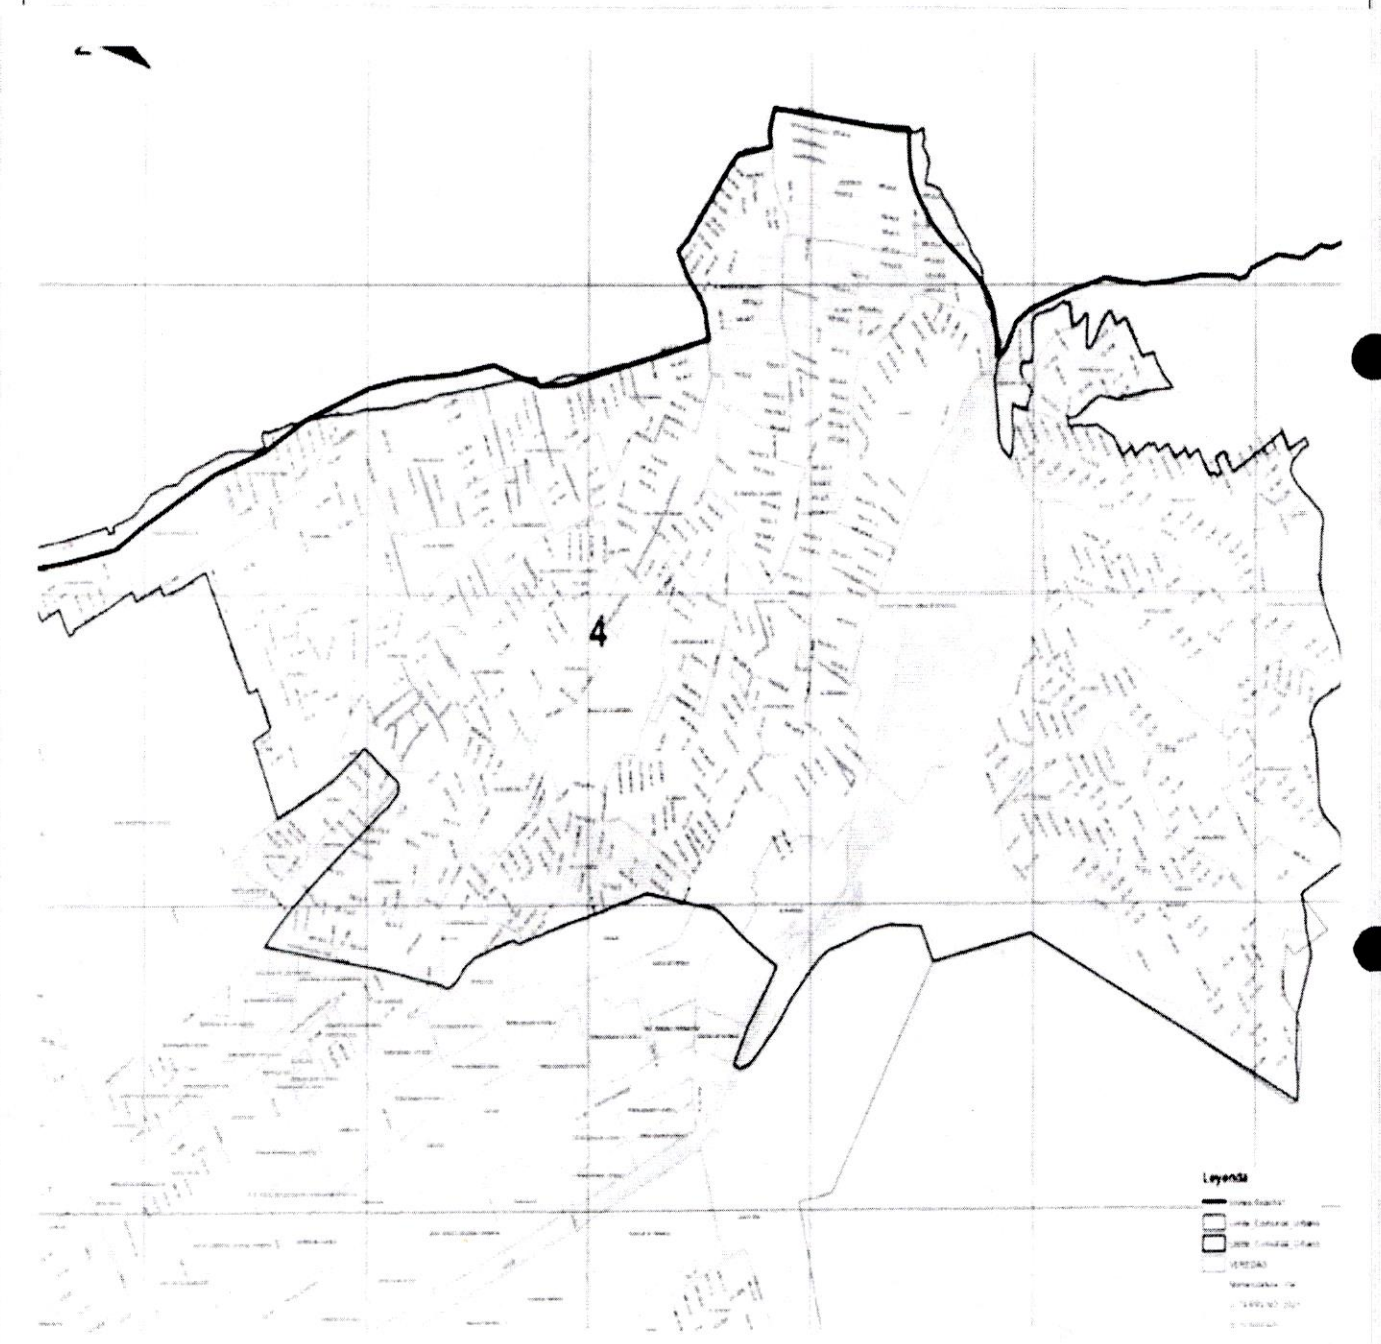

Calle 12 # 8A – 36 Soacha - Cundinamarca
epuxua@alcaldiasoacha.gov.co

XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

LUGAR DE REUNIÓN: Epuxca.	HORA DE INICIO: 8:28 am.
FECHA: 18 de Noviembre	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR: Residente Interventoria	NUMERO DE ACTA: 12

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	

AGENDA PROPUESTA	
1.	Verificación del Acta Anterior.
2.	Verificación del estado actual de la Obra
3.	Cronograma.
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia el comite de obra con la verificación de los compromisos consignados en el acta anterior, se verifica el estado actual del contrato encontrandose en un 31% a la fecha, se requiere el aumento de personal para la entrega de vias del 25 de Noviembre el dia de hoy se realizaran recorrido para verificar los muros necesarios en las vias.

Se realizara recorrido en las 4 vias nuevas, donde tiene la comunidad adoquin.

Se realizara el traslado de tapa para mejoramiento en las vias Villa (Sandra) Mercedes por solicitud de la secretaria de Infraestructura.

Calle 13 Nº 7-30 Soacha - Cundinamarca
Tel: 57 - 1 - 7305500 Fax 57-1-5770580
contactenos@alcaldiasoacha.gov.co

Epuxua hace entrega de 68 actas de vecindad, estas fueron entregadas por Sec. Infraestructura. Se entrega a la inventaria.

Calle 13 Nº 7-30 Soacha - Cundinamarca
Tel: 57 - 1 - 7305500 Fax 57-1-5770580
contactenos@alcaldiasoacha.gov.co

XUÁ
Empresa Pública de Soacha

EPUXUA AVANZA I.E.C.E.

ACTA DE COMITÉ TECNICO

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD:	**RESPONSABLE:**	**FECHA:**
Actualización del cronograma de obra incluyendo las vías nuevas entregadas por la entidad esta semana.	Contratista de Obra	21 de Noviembre 2022.
Informes Mensuales del contratista.	Contratista de Obra	25 de Noviembre 2021.
El día 25 se realizara la entrega de todas las vías del barrio Santo Domingo.	Contratista de Obra	25 de Noviembre 2022.


PARTICIPANTES			
NOMBRE	**DEPENDENCIA / ENTIDAD**	**TELÉFONO DE CONTACTO**	**FIRMA**
Karen Ortegon	Residente interventoria	3105709036	
Arq. Ma Jose H.	Ing Apoyo a la supervisión.	3124126320	
Andrea Rubiano	Epuxua	3103425601	
Nicolas Ruiz	Contratista	3102935197	
EDGAR URIBE	GEOSOLUCIONES INTERVENTORIA.	3108032525	
Juan Pablo Cano	Epuxua	3124821154	

Calle 13 Nº 7-30 Soacha - Cundinamarca
Tel 57 - 1 - 7305500 Fax 57-1-5770580
contactenos@alcaldiasoacha.gov.co

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA

Calle 13 Nº 7-30 Soacha - Cundinamarca
Tel: 57 - 1 - 7305500 Fax 57-1-5770580
contactenos@alcaldiasoacha.gov.co

Comparación de precios para sello de juntas en adoquin

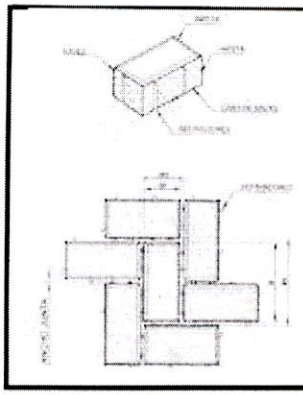


ADOQUIN		
Longitud	0,2	m
Ancho	0,1	m
Altura	0,06	m

M2 de ADOQUIN		
Paño de m2	50	und
Dilatación	15	ml

Boquilla para adoquin	L (m)	A (m)	H (m)	DESPERDICIO	Total (m3/m2)
	15	0,005	0,6	3%	0,04635

	Total	Und	Vlr Unitario		Vlr m2
Arena de peña	0,04635	m3	$ 148.700,00	$	**6.892,25**
Mortero 1:4	0,04635	m3	$ 356.052,00	$	**16.503,01**

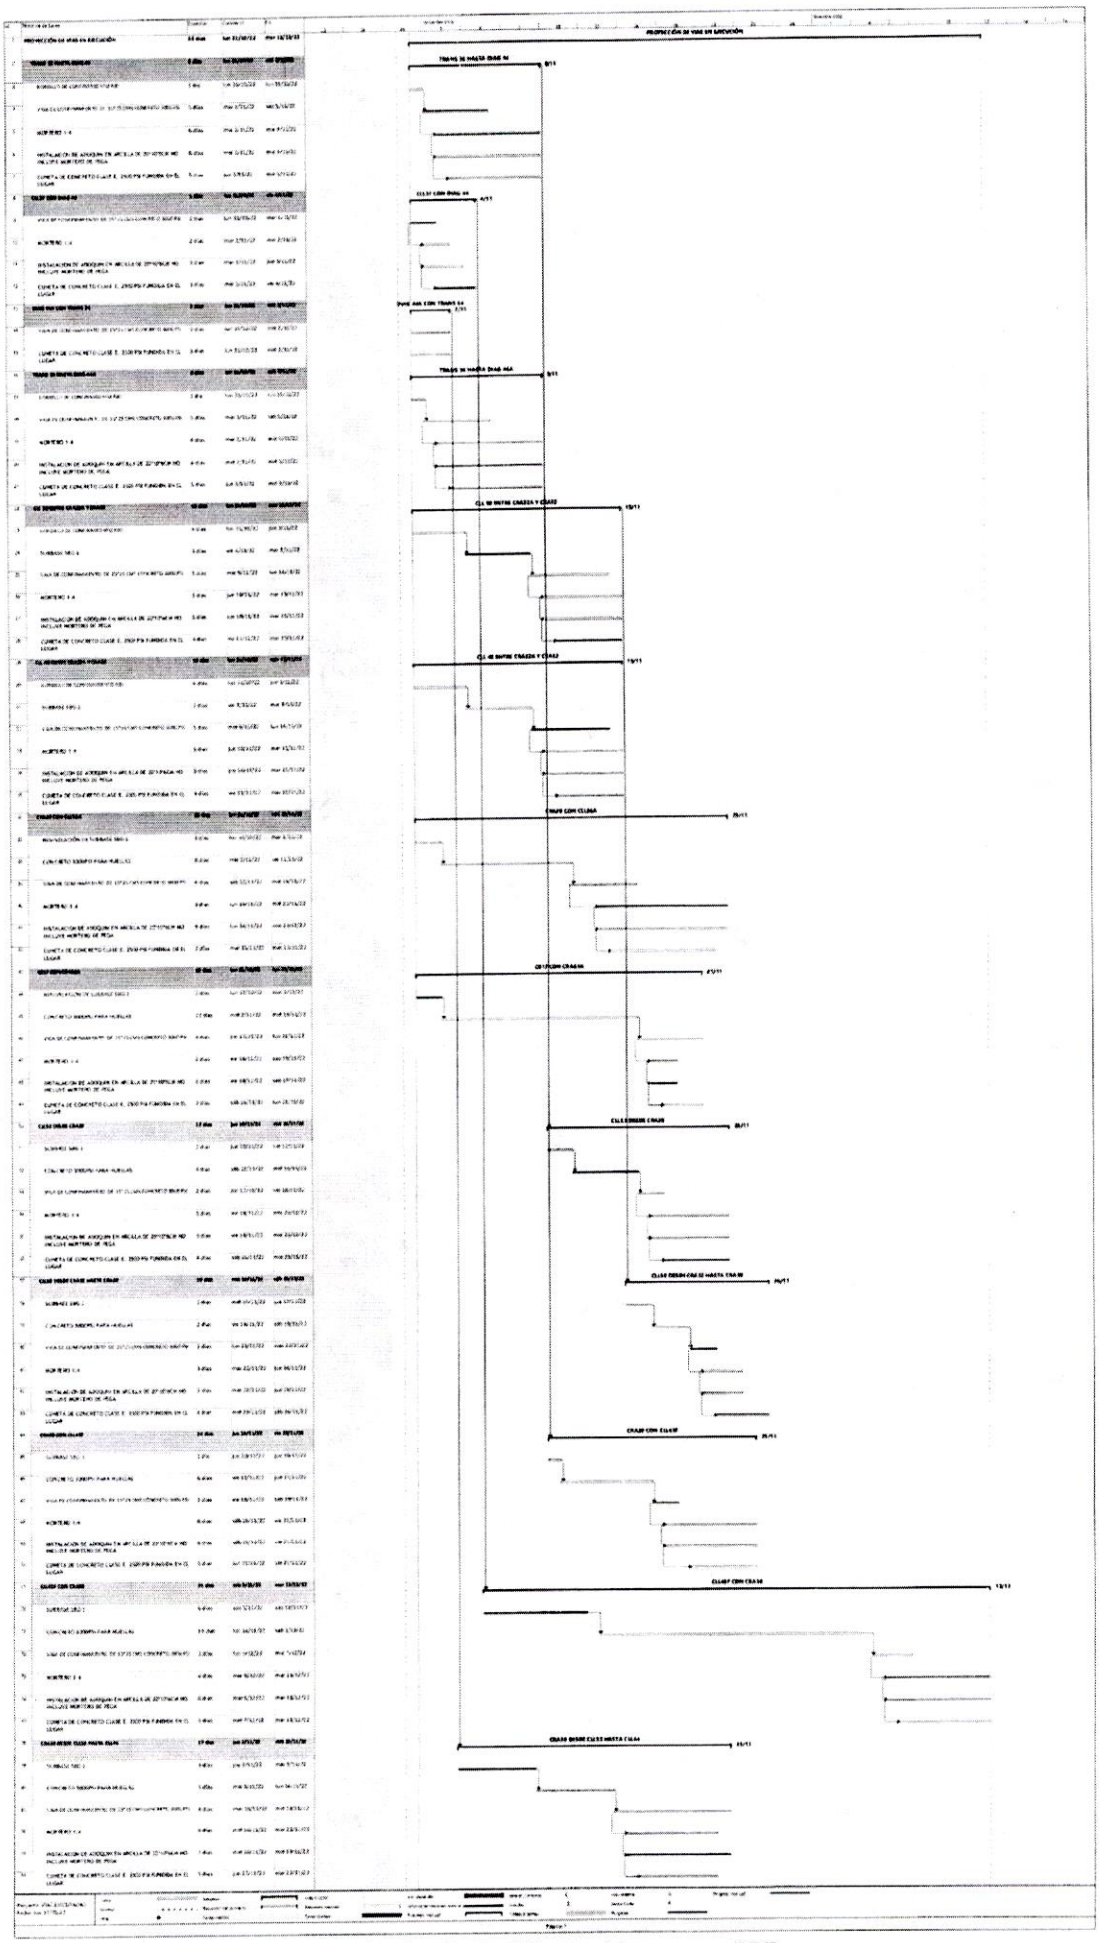

14 cuadras

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.

Bogotá D.C.04 de Noviembre de 2022

Señores:
EMPRESA PUBLICA DE SOACHA - EPUXUA
Atn: Ingeniero JUAN PABLO CAÑON
Supervisor de Contrato.
Soacha - Cundinamarca

Referencia: Contrato 025 de 2022 cuyo objeto es la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE-DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3443-2021".

Asunto: Traslado de Informe Climático mes de Octubre de 2022.

Respetado Ingeniero:

Nos dirigimos muy cordialmente a usted con el fin dar traslado al informe de afectaciones por lluvia presentado parte del contratista de obra del mes de Octubre del año 2022, para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedamos atentos a sus comentarios y observaciones

Cordialmente,

Edgar Eduardo Uribe Cárdenas
Director de Interventoría.
COCOSERING SAS.

Bogotá D.C.04 de Noviembre de 2022

Señores:
EMPRESA PUBLICA DE SOACHA - EPUXUA
Atn: Ingeniero JUAN PABLO CAÑON
Supervisor de Contrato.
Soacha - Cundinamarca

Referencia: Contrato 025 de 2022 cuyo objeto es la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE-DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3443-2021".

Asunto: Traslado de Informe Climático mes de Octubre de 2022.

Respetado Ingeniero:

Nos dirigimos muy cordialmente a usted con el fin dar traslado al informe de afectaciones por lluvia presentado parte del contratista de obra del mes de Octubre del año 2022, para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedamos atentos a sus comentarios y observaciones

Cordialmente,

Edgar Eduardo Uribe Cárdenas
Director de Interventoría.
COCOSERING SAS.

CARGUES NOVIEMBRE A DICIEMBRE 14

CONTRATO	UBICACIÓN OBRA	N°de RECIBO
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	11945
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	39516
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	39514
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	39545
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	39541
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	39542
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	11950
Consorcio Gamer Soacha 024-2023	Comuna 4 Soacha	39548
Consorcio Gamer Soacha 024-2024	Comuna 4 Soacha	11948
Consorcio Gamer Soacha 024-2023	Comuna 4 Soacha	11947
Consorcio Gamer Soacha 024-2024	Comuna 4 Soacha	11949
Consorcio Gamer Soacha 024-2023	Comuna 4 Soacha	39549
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	39543
Consorcio Gamer Soacha 024-2023	Comuna 4 Soacha	39550
Consorcio Gamer Soacha 024-2024	Comuna 4 Soacha	39544
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	11946
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	1648
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	1643
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	1644
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	1645
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	1646
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	39546
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	12631

Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	12628
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	12629
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	12630
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	1647
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	1101
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	1102
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	39545
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	12632
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7378
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7379
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	12633
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	12634
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8201
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8202
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	12635
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8203
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8204
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8205
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8208
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8212
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8211
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8210
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8213
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8214
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8246

Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8209
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	12637
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8215
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8216
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7380
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8220
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8219
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8218
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8217
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8248
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8247
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8249
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8206
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	82207
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8250
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8251
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	1103
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	1104
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	1105
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8252
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	82253
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8254
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8255
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8256
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8257

Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8258
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8259
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8260
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8261
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8262
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8263
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8264
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8265
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8266
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8267
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8268
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8269
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8270
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8271
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8272
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8273
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8274
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8275
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8276
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8277
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8278
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8279
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8280
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8281
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8282

Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8283
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8284
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8285

XUÁ
Empresa Pública de Soacha

253

Soacha, 4 de mayo de 2022

Ingeniero
JUAN PABLO CAÑON RODRÍGUEZ
Director de Servicios Públicos
Empresa Pública del Municipio de Soacha – EPUXUA AVANZA E.I.C.E.
Soacha, Cundinamarca

Asunto: Designación supervisor (a) de contrato (s)

De manera atenta le informo que ha sido designado (a) supervisor (a) de los siguiente (s) contrato(s):

NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONTRATO N°	OBJETO	N° REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL
COSORCIO GAMER SOACHA	024-2022	**CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA.** (PROCESO INVITACIÓN A PRESELECCIONADOS N° IP 005-2022)	2022-077	02/05/2022
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18354580&isFromPublicArea=True&isModal=False				

En consideración a la responsabilidad que genera el ejercicio de esta, de manera general se indican algunos parámetros a tener en cuenta para su ejercicio:

En su actuación como Supervisor, está en la obligación de mantener un estricto control sobre la ejecución del objeto y obligaciones contractuales, por cuanto de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993, la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de 2011, el supervisor responderá disciplinaria, fiscal, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos de la Constitución y la Ley. Adicionalmente estará obligado a dar estricto cumplimiento a las obligaciones que defina EPUXUA AVANZA E.I.C.E. a través del Manual de Contratación, el Manual de Supervisión y las circulares que expida la Secretaría General y/o la Gerencia, respecto de los asuntos referidos a la ejecución contractual y la etapa postcontractual.

Los supervisores están obligados a expedir los informes de supervisión y demás documentos de la ejecución contractual los cuales deberán presentarse dentro del término que se señale en el clausulado contractual o cuando sea requerido por el ordenador del gasto y remitirse a la Secretaría General para que reposen en el expediente contractual de la Entidad, dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición.

Dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecución, de las obligaciones y del cronograma de actividades, si lo hubiere, así como informar a la Secretaría General cualquier acontecimiento que impida el normal desarrollo del contrato o convenio, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la documentación e información que estime pertinente y necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones como supervisor, exigir la acreditación del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el sistema de seguridad social integral y parafiscales según sea el caso, aprobar las solicitudes de pago, y todas las demás obligaciones que deban cumplir las partes y/o el contratista, señaladas en el respectivo contrato o convenio.

Una vez finalice el contrato 024-2022 cuya supervisión le corresponda, tendrá la obligación de expedir un informe final de supervisión, la certificación final de cumplimiento del objeto contractual y proyectar el acta de liquidación respectiva, en los casos que aplique.


Cordialmente,

DARLIN LENIS ESPITIA

246

TREMIX COLOMBIA

CURVA DE DESARROLLO CONCRETOS CONVENCIONAL Y BOMBEABLE

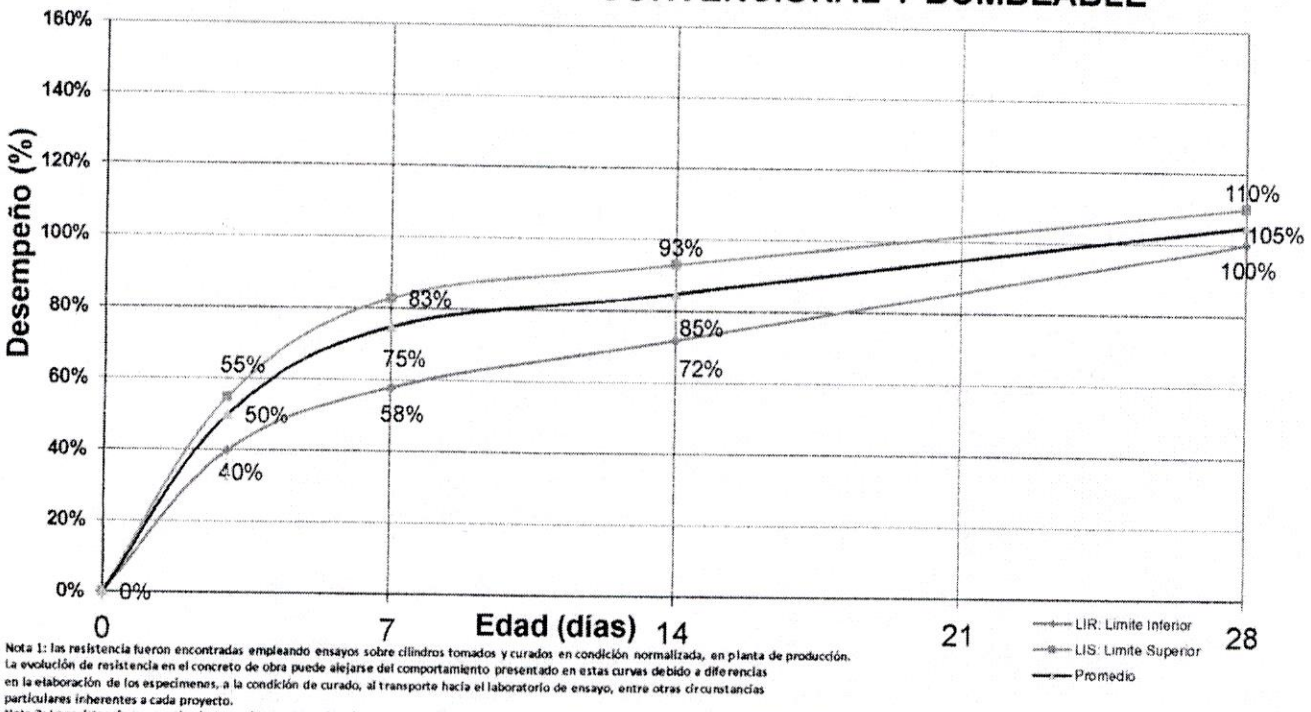

Nota 1: las resistencia fueron encontradas empleando ensayos sobre cilindros tomados y curados en condición normalizada, en planta de producción. La evolución de resistencia en el concreto de obra puede alejarse del comportamiento presentado en estas curvas debido a diferencias en la elaboración de los especimenes, a la condición de curado, al transporte hacia el laboratorio de ensayo, entre otras circunstancias particulares inherentes a cada proyecto.

Nota 2: La resistencia que puede alcanzar el concreto en los elementos fundidos en obra, estará influenciada además de las propiedades inherentes a la mezcla suministrada, las condiciones de colocación, a su curado, al vibrado, a la temperatura de colocación y curado, a la presencia de cargas externas, entre otras condiciones particulares.

Nota 3: La información suministrada en esta publicación es de propiedad intelectual de concretera Tremix S.A.S, se suministra al cliente para su lectura y efectos técnicos de análisis, sin por ello ceder la propiedad de ninguna parte de la información aquí expuesta.

Elaboro: Area tecnica - calidad Concretera Tremix

No se autoriza la reproducción total o parcial de la información contenida en esta publicación sin la aprobación expresa de concretera Tremix S.A.S

95

TREMIX COLOMBIA

POLIMIX COLOMBIA

icontec ISO 9001

SC764-1

ESPECIFICACIONES TECNICAS

	UNIDAD	CARACTERISTICAS	TOLERANCIA
Código		CONV -(*1) -(*2) -(1) - 15	
Resistencia de especificación (*2)	Kg/cm^2	105-140-175-210-245-280-315-350-385-420	
Edad de Especificación	Días	28	
Tamaño Máximo de la Grava	Pulgada (Milimetros)	1" (25,4) - 1/2 (12,5)	
Tiempo de Manejabilidad	Hora	5	±1,0
Asentamiento de Diseño	Cm (Pulg)	10.16 (4) - 15,24 (6)	±1
Densidad	Kg/m^3	2250 a 2450	
Contenido de Aire	%	Máximo 2,0	±1

***La información contenida en este material informativo es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendaciones técnicas.**
***Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de los productos**
***Cada uno de los productos ofrecidos deben utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un efecto diseñador calificado para el efecto.**
***El tiempo de manejabilidad es a partir de la hora de salida de planta y puede variar según el sistema de colocación**
***Los tiempos de fraguados puede variar con la temperatura ambiente**
***Cualquier características puede ser adicionada por requerimiento del cliente de acuerdo con sus necesidades y viabilidad técnica, con previo aviso**

84 226

TREMIX COLOMBIA · POLIMIX COLOMBIA

SC764-1

PRECAUCIONES

- No se debe dosificar ninguna materia prima por parte de la obra, esto afectará el Diseño y los resultados finales de resistencia.
- Establecer las prácticas y recomendaciones existentes en la NSR 2010 y ACI American Concrete, para los procedimientos de colocación, vibrado, manejo, curado, protección y control del concreto en obra.
- Curar el concreto para prevenir las fisuras por retracción plástica.
- La aceptación o rechazo del concreto es el asentamiento de llegada a la obra, se debe medir dentro de los **15 minutos** de llegado el concreto a la obra NTC 396
- El curado de las muestras debe iniciarse antes de que transcurran 30 minutos después de retirados los moldes (NTC 550), deben permanecer completamente
- Sumergidas y se deben ensayar a las horas indicadas de acuerdo con lo contenido en la norma NTC2871.
- Humedecer la formaleta si esta se encuentra caliente esto ayuda a disminuir los cambios térmicos del concreto.
- Esta clase de concreto no se recomienda utilizarlo en pisos industriales. La descarga vertical debe ser mínimo de 1m de caída libre máxima permisible, si sobrepasa se debe tener previsto para evitar segregación.

TREMIX COLOMBIA POLIMIX COLOMBIA

icontec ISO 9001

SC764-1

CONCRETO CONVENCIONAL BOMBEABLE RESISTENCIA A SULFATOS

Este concreto cuenta con una composición química y física específica que disminuye o elimina el ataque o fisuración por sulfatos, incrementando la durabilidad de las estructuras.

Con una relación agua/cementante igual o inferior a 0,40.

USOS

- Tanques de almacenamiento de aguas residuales.
- Cimentaciones en contacto con aguas con altas cargas de sulfato (hasta 10.000 ppm expresado como SO4).
- Concretos especificados por la norma NSR-10 con la categoría de exposición de sulfatos S1 o S2.
- Estructuras en contacto con agua marina, como cimentaciones y plataformas de muelles.
- En suelos o terrenos con presencia de sulfatos o aguas subterráneas.

VENTAJAS

- Reducción de la permeabilidad de líquidos y gases, evitando el ingreso de sustancias nocivas al interior del concreto.
- Incremento de la vida útil de la estructura sometida al ataque químico.
- Debido a su diseño, contiene baja cantidad de elementos necesarios para las reacciones expansivas del sulfato.
- Acabado superior y viscosidad mejorada con respecto a un concreto convencional.
- Protección del acero de refuerzo


Análisis de Materiales e Ingeniería Civil S.A.S
Laboratorio de Suelos - Pavimentos – Concretos.
NIT – 900.260.470-8

COMPACTACION MODIFICADA	CODIGO
NORMA(S) APLICADA(S) : INV. E - 142	VERSION
	FECHA


PROYECTO : CONTRATO 024 2022
SECTOR : COMUNA 4
SITIO : CAZUCA SOACHA
SOLICITANTE: CONSORCIO GAMER SOACHA
DESCRIPCION: Grava limo arcillosa amarilla oscura
ORDEN TRABAJO: **434-135-01-2022**
ORDEN DE SERVICIO **129**
TIPO DE MATERIAL: SUBRASANTE

MUESTRA : 1
PROFUNDIDAD:
FECHA ENSAYO: 22-11-22
FECHA ENTREGA: 28-11-22

PRUEBA	1	2	3	4
No. de presiones	56	56	56	56
Molde No	C-88	C-88	C-88	C-88
Peso de la muestra hum. (g.)	4163	4407	4623	4643
Peso de la muestra hum. y molde (g.)	7940	8184	8400	8420
Peso molde (g.)	3777	3777	3777	3777
Peso de la muestra hum. (g.)	4163	4407	4623	4643
Humedad de Compactación (%)	8,6	11,6	14,6	17,6
Peso de la muestra seca (g.)	3832	3949	4033	3948
Volumen del molde (cm³)	2086	2086	2086	2086
Densidad muestra seca (g/cm³)	**1,837**	**1,893**	**1,934**	**1,893**

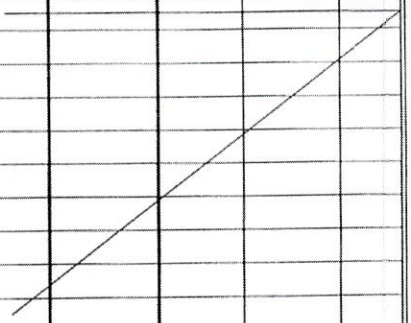

CURVA DE PROCTOR

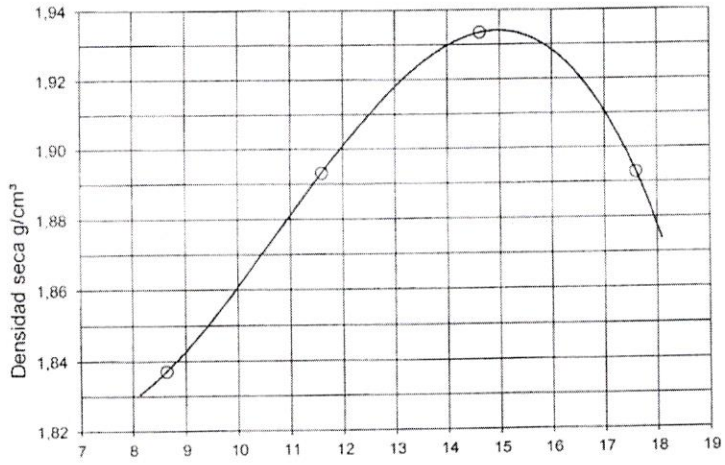

RESULTADOS

Dens. max	**1,934**	**g/ cm³**
Hum. óptima	**15,0**	**%**
Lb/ft³	120,8	
PESO MART.:	10 lb	
No CAPAS :	5	
H. CAÍDA:	18"	
No GOLPES :	56	
Metodo Compactacion	C	

Observaciones :

ELABORO	CESAR CORTES	REVISO	ANGEL CASTRO	APROBO	ANGEL CASTRO
CARGO	TECNICO LAB	CARGO	JEFE DE LAB	CARGO	JEFE DE LAB
FIRMA		FIRMA		FIRMA	

310

Análisis de Materiales e Ingeniería Civil S.A.S.
Laboratorio de Suelos - Pavimentos - Concretos
NIT – 900.268.470-8

DENSIDAD DE CAMPO METODO DEL CONO Y ARENA

NORMA(S) APLICADA(S) :

INV. E - 161

ORDEN No. 434-135-01-2022

Página 1 de 1

PROYECTO: CONTRATO 024 2022
SITIO: CARRERA 17este
SOLICITANTE : CONSORCIO GAMER SOACHA
DESCRIPCION : Grava limo arcilloso amarillo

OSC: 129
TIPO . SUBBASE TPO C
FECHA DE ENSAYO : 22-nov-22
FECHA ENTREGA: 23-nov-22
CAPA: ULTIMA

Densidad N°		1	2				
Capa		ULTIMA	ULTIMA				
Profundidad	m	0,15	0,15				
Abscisa		K0+005	K0+025				
Sector		SBG	SUBRASANTE				
Margen		EJE	EJE				
Peso frasco y arena inicial	gr	6186	6120				
Peso frasco y arena restante	gr	2770	2584				
Peso arena total usada	gr	3416	3536				
Constante del cono	gr	1592	1592				
Peso arena en el hueco	gr	1824	1944				
Densidad de la arena	gr/cm³	1,360	1,360				
Volumen del hueco	gr	1341	1429				
Peso material extraido húmedo	gr	3020	3069				
Humedad	%	8,2	14,0				
Peso material extraido seco	gr	2791	2692				
Densidad del material	gr/cm³	2,081	1,883				
Densidad max. laboratorio	gr/cm³	2,063	1,934				
Humedad óptima laboratorio	%	8,1	15,0				
Compactación en el terreno	%	100,9	97,4				
Compactación especificada	%	95,0	95,0				

OBSERVACIONES:

ELABORO	CESAR CORTES	REVISO	ANGEL CASTRO	APROBO	ANGEL CASTRO
CARGO	TECNICO LAB	CARGO	JEFE DE LAB	CARGO	JEFE DE LAB
FIRMA		FIRMA		FIRMA	

Análisis de Materiales e Ingeniería Civil S.A.S
Laboratorio de Suelos - Pavimentos – Concretos.
NIT – 900.260.470 -8

DENSIDAD DE CAMPO METODO DEL CONO Y ARENA

NORMA(S) APLICADA(S) :

INV. E - 161

ORDEN No. 434-135-01-2022

Página 1 de 1

PROYECTO: CONTRATO 024 2022
SITIO: CARRERA 30 ESTE
SOLICITANTE: CONSORCIO GAMER SOACHA
DESCRIPCION: Grava limo arcilloso amarillo

OSC: 129
TIPO: SUBBASE TPO C
FECHA DE ENSAYO: 22-nov-22
FECHA ENTREGA: 23-nov-22
CAPA: ULTIMA

Densidad N°				3	4		
Capa				ULTIMA	ULTIMA		
Profundidad	m			0,15	0,15		
Abscisa				K0+010	K0+040		
Sector				SBG	SBG		
Margen				EJE	EJE		
Peso frasco y arena inicial	gr			6160	6105		
Peso frasco y arena restante	gr			2570	2582		
Peso arena total usada	gr			3590	3523		
Constante del cono	gr			1592	1592		
Peso arena en el hueco	gr			1998	1931		
Densidad de la arena	gr/cm³			1,360	1,360		
Volumen del hueco	gr			1469	1420		
Peso material extraido humedo	gr			3120	3190		
Humedad	%			8,1	8,2		
Peso material extraido seco	gr			2886	2948		
Densidad del material	gr/cm³			1,965	2,076		
Densidad max. laboratorio	gr/cm³			2,063	2,063		
Humedad óptima laboratorio	%			8,1	8,1		
Compactación en el terreno	%			**95,2**	**100,7**		
Compactación especificada	%			**95,0**	**95,0**		

OBSERVACIONES:

ELABORO	CESAR CORTES	REVISO	ANGEL CASTRO	APROBO	ANGEL CASTRO
CARGO	TECNICO LAB	CARGO	JEFE DE LAB	CARGO	JEFE DE LAB
FIRMA		FIRMA		FIRMA	

Análisis de Materiales e Ingeniería Civil S.A.S.
Laboratorio de Suelos – Pavimentos – Concretos.
NIT – 900.260.470 -8

DENSIDAD DE CAMPO METODO DEL CONO Y ARENA

NORMA(S) APLICADA(S) :

INV. E - 161

ORDEN No. 434-135-01-2022

Página 1 de 1

PROYECTO: CONTRATO 024 2022
SITIO: CALLE 48 / CARRERA 30 ESTE
SOLICITANTE : CONSORCIO GAMER SOACHA
DESCRIPCION : Grava limo arcilloso amarillo

OSC: 129
TIPO . SUBBASE TPO C
FECHA DE ENSAYO : 22-nov-22
FECHA ENTREGA: 23-nov-22
CAPA: ULTIMA

Densidad N°		5					
Capa		ULTIMA					
Profundidad	m	0,15					
Abscisa		K0+020					
Sector		SBG					
Margen		EJE					
Peso frasco y arena inicial	gr	6096					
Peso frasco y arena restante	gr	2552					
Peso arena total usada	gr	3544					
Constante del cono	gr	1592					
Peso arena en el hueco	gr	1952					
Densidad de la arena	gr/cm³	1,360					
Volumen del hueco	gr	1435					
Peso material extraído húmedo	gr	3174					
Humedad	%	8,2					
Peso material extraído seco	gr	2933					
Densidad del material	gr/cm³	2,044					
Densidad max. laboratorio	gr/cm³	2,063					
Humedad óptima laboratorio	%	8,1					
Compactación en el terreno	%	**99,1**					
Compactación especificada	%	**95,0**					

OBSERVACIONES:

ELABORO	CESAR CORTES	REVISO	ANGEL CASTRO	APROBO	ANGEL CASTRO
CARGO	TECNICO LAB	CARGO	JEFE DE LAB	CARGO	JEFE DE LAB
FIRMA		FIRMA		FIRMA	

E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S

ONAC

Laboratorio de Control de Calidad

Dirección: Carrera 29C No. 71A – 30
Teléfonos: 2255814 – 6304515 - 2315608
Bogotá, D.C. - Colombia

CALIDAD QUE GENERA CONFIANZA

INFORME DE ENSAYO
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO


Norma	Control de documentos	Revisión No.	4
NTC 673:2010	EIE-F-03-41	Fecha de edición	2022-01-07

Compañía:	**ARKA PREFABRICADOS**
Dirección:	Km 5 Vereda Pubenza Via Soplaviento
Obra:	Planta
Código de obra:	2982
Atención:	Ing. Miriam Franco

INFORME-EIE-INF/LAB-022-2982-001

Cilindro No.	Localización	Fecha toma AAAA-MM-DD	Fecha ensayo AAAA-MM-DD	Edad (Días)	Resistencia nominal PSI (lbf/in²)	Carga Máx. (N)	Diámetro mm	Longitud mm	Area mm²	L/D	Factor de Corrección	Resistencia rotura MPa	Resistencia rotura kg/cm²	Resistencia rotura PSI (lbf/in²)	% Desarrollo	Tipo de fractura	Masa kg	Densidad kg/m³	Fecha de entrada/ Orden de trabajo/Observaciones
01	Sardinel, Bordillo, Cartuchó	2022-04-11	2022-05-16	35	3500	309660	153.9	304.9	18598.2	1.98	1.00	27.4	280	3975	114	T5			2022-05-16 / O.T. 32497
01	Sardinel, Bordillo, Cartuchó	2022-04-11	2022-05-16	35	3500	325270	153.9	304.5	18599.0	1.97	1.00	27.5	281	3990	114	T5			2022-05-16 / O.T. 32497
01	Sardinel, Bordillo, Cartuchó	2022-04-11	2022-05-16	35	3500	313940	154.2	305.1	18681.7	1.98	1.00	27.6	282	4005	114	T5			2022-05-16 / O.T. 32497

TIPOS DE FRACTURA



CONDICIONES CUARTO DE CURADO	EQUIPAMIENTO UTILIZADO		CONDICIONES AMBIENTALES
23.0 °C. 96.2 %HR	EQUIPAMIENTO	VIGENTE (SI / NO)	25.1 °C. 58.2 %HR
	Maquina a compresion	SI	
	Pie de rey	SI	
	Balanza (cuando aplique)	SI	

OBSERVACIONES:

FECHA DE EMISIÓN DE INFORME	REVISÓ	APROBÓ	
2022-05-17	Ing. Aleneil L. Gradnez Toledo	Ing. Gerardo Bravo Plata	
	Coordinador de Concretos	Director Técnico	FIRMA Y SELLO

NOTA 1: La información suministrada por el cliente que puede afectar la validez de los resultados es: Ninguna. Fecha de Entrega: 2022-05-16. La(s) muestra(s) fue(ron) identificada(s) por el laboratorio EIE de acuerdo a lo indicado por el cliente en el ítem: Ninguna


NOTA 2: Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S

NOTA 3: Este documento es válido únicamente para el objeto del solicitante y la firma que aparece en el mismo. Los resultados corresponden únicamente a la muestra suministrada.

Fin del Informe

TREMIX COLOMBIA

CURVA DE DESARROLLO CONCRETOS CONVENCIONAL Y BOMBEABLE

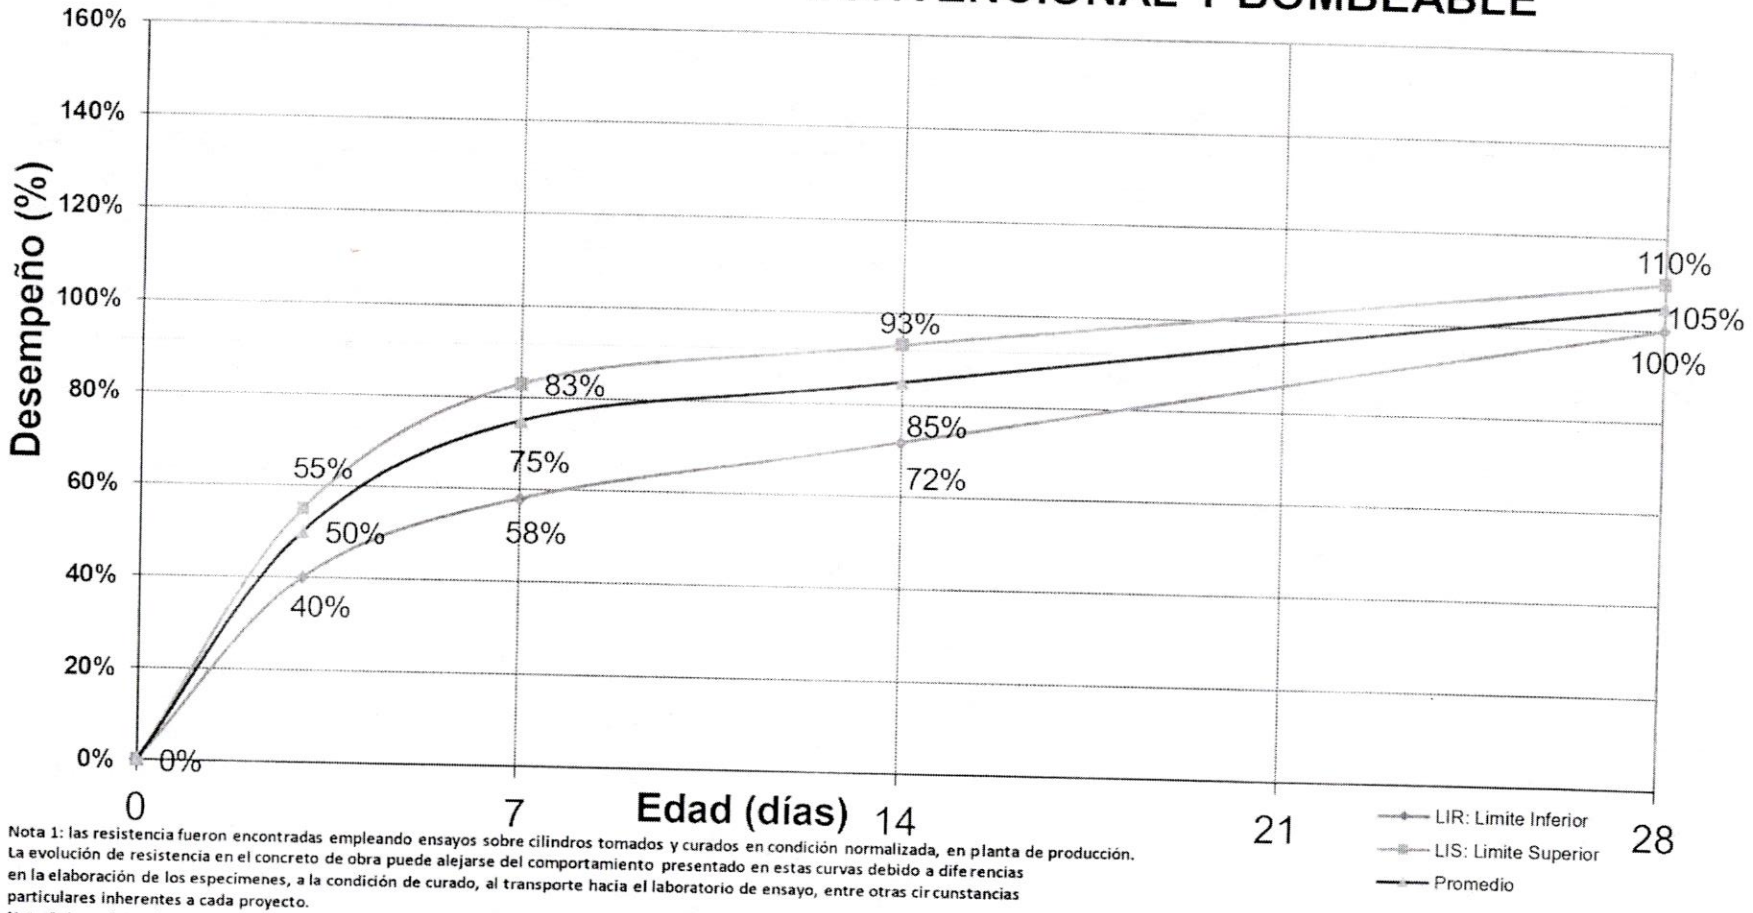

Nota 1: las resistencia fueron encontradas empleando ensayos sobre cilindros tomados y curados en condición normalizada, en planta de producción. La evolución de resistencia en el concreto de obra puede alejarse del comportamiento presentado en estas curvas debido a diferencias en la elaboración de los especimenes, a la condición de curado, al transporte hacia el laboratorio de ensayo, entre otras circunstancias particulares inherentes a cada proyecto.

Nota 2: La resistencia que puede alcanzar el concreto en los elementos fundidos en obra, estará influenciada además de las propiedades inherentes a la mezcla suministrada, las condiciones de colocación, a su curado, al vibrado, a la temperatura de colocación y curado, a la presencia de cargas externas, entre otras condiciones particulares.

Nota 3: La información suministrada en esta publicación es de propiedad intelectual de concretera Tremix S.A.S, se suministra al cliente para su lectura y efectos técnicos de análisis, sin por ello ceder la propiedad de ninguna parte de la información aquí expuesta.

No se autoriza la reproducción total o parcial de la información contenida en esta publicación sin la aprobación expresa de concretera Tremix S.A.S

Elaboro: Area tecnica - calidad Concretera Tremix

328

DAVIVIENDA

EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AV ANZA E.I.C.I
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO DOS CTO 2022-024 CONSORCIO GAMER SOACHA - CESION DERECHOS ECONOMICOS GAMEVING	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	44121176		
Origen de los Fondos	OFICIAL - 550002300309339		
Fecha de Creacion	30/11/2022	**Fecha de Pago**	30/11/2022 17:16
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 643.583.933,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 643.583.933,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9010821728	0000000901511522	Corriente	32111635	AV VILLAS	$ 643.583.933,00	Pendiente de Respuesta	

XUÁ	EPUXUA AVANZA E.I.C.E. HOJA DE RUTA	SOACHA EL CAMBIO AVANZA

CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA - NIT.: 901587366-8
SUPERVISOR	JUAN PABLO CAÑON RODRIGUEZ - DIRECTOR DE EJECUCION DE PROYECTOS
CONTRATO	CONTRATO 024 DE 2022 - CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

Documento	Observación
Factura o Cuenta de Cobro	CUMPLE - FACTURA CGS 2 - 22/11/2022 - FOLIO 2
Informe de Actividades del Contratista	CUMPLE - FOLIO 156 AL 158 - FIRMA SUPERVISOR
Informe de Supervisión	CUMPLE - FOLIO 146 AL 148 - PENDIENTE FIRMA SUPERVISOR
Certificación de Cumplimiento	CUMPLE - FOLIO 149
Certificación de pago de aportes a la seguridad social y Aportes parafiscales PJ	CUMPLE - FOLIO 149 - FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Cedula de Ciudadania Representante Legal	CUMPLE
Cedula de Ciudadanía Revisor Fiscal	CUMPLE
Tarjeta Profesional Revisor Fiscal	CUMPLE
Certificado de Antecedentes Revisor Fiscal	NA
Certificación Bancaria	NA
Planillas de pago parafiscales PN	CUMPLE - FOLIO 153 AL 152
Declaración Decreto 1070 de 2013	NA
RUT	NA
RIT - Registro de información tributaria	NA
Recibido de Elementos	NA
Formato de Seguimiento a ejecución de Contratos	CUMPLE - FOLIO 155 - FIRMA SUPERVISOR
Acta de manejo de anticipo	NA
Contrato de Fiducia de Anticipo	NA
Certificación Bancaria Fiducia	NA
Acta de liquidación	NA
Acta de Terminación Anticipada	NA
Cesión de Contrato	NA
Paz y Salvo	NA
Acta de Inicio	NA
Acta parcial de Recibido o Avance de Obra	CUMPLE - FOLIO 2 AL 5 - PENDIENTE FIRMA SUPERVISOR
Acta de Recibido de Obra	NA
Copia de Contrato	NA
Copia Garantias	NA
Copia Aprobacion de garantias	NA
Delegación de Supervisión	NA

	Recibido 1			Recibido 2			Recibido 3		
Dependencia/Oficina	**Recibió**	**Fecha**	**Hora**	**Recibió**	**Fecha**	**Hora**	**Recibió**	**Fecha**	**Hora**
RADICADO Y REVISION FACTURA	**Fernando**	23/11/2022	8:11						
CONTABILIDAD									
TESORERÍA									
SUBGERENCIA ADM, FIN. Y GESTIÓN HUMANO									
RECIBIÓ DEVOLUCIÓN									

1. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:	
2. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:	
3. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:	

EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

NIT 901.511.522-4

ORDEN DE PAGO 478 **FECHA** 23 de noviembre de 2022

NUMERO FACTURA CGS 2 FECHA FACTURA 16 de noviembre de 2022

NOMBRE	CONSORCIO GAMER SOACHA
NIT	901587366-8
PROVEEDOR	CONSORCIO GAMER SOACHA
ORDEN DE COMPRA	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3443-2021 - CONTRATO DE OBRA 024-2022
FECHA INICIO	
CONCEPTO	CONTRATO DE OBRA N° 024-2022

CDP 044-2022 RP 077-2022

PAGO DE SEGUNDO PAGO. CONTRATO 024-2022 CON UN AVANCE DEL30,55% CERTIFICADO POR LA SUPERVISION

CONCEPTO		CANTIDAD	DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
SEGUNDO PAGO. CONTRATO 024-2022 CON UN AVANCE DEL30,55% CERTIFICADO POR LA SUPERVISION		1	$ 559.394.987,00		
A=	24%		$ 134.254.797,00		
I=	1%		$ 27.969.749,00		
U=	5%		$ 5.593.950,00		
RETEFUENTE	2%			$ 14.544.270,00	
RETE ICA (5 * 1000)	0,5%			$ 3.636.067,00	
Estampilla Pro Cultura (1%)	1%			$ 7.272.135,00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%)	3%			$ 21.816.404,00	
Fondo de seguridad- Art 138. Acuerdo 030	5%			$ 36.360.674,00	
TOTAL			**$ 727.213.483,00**	**$ 83.629.550,00**	**$ 643.583.933,00**

Nota: La empresa según lo informado
Actividad economica 4290

IVA ?

Contabilizó:

Alberto Moreno Betancourt
Contador

Reviso:

Eduard Albeiro Lara Velásquez
Subgerente Administrativo, Financiero y Gestión Humana

CONSORCIO GAMER SOACHA

NIT.901.587.366-8

CON-GAMER024-10-2022

Bogotá, Noviembre 12 de 2022

Señores
COCOSERING SAS
Attn: Ing. Edgar Eduardo Uribe
Director Interventoría
Correo.interxua0252022@gmail.com

Referencia: Contrato 024 de 2022 cuyo objeto es la "CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA".

Apreciado Ingeniero.

Con la presente hacemos entrega de el ACTA No. 2 , Para su revision y previa radicacion

1. Factura
2. Acta parcial No 2 , memoria de cantidades
3. Informe actividades contratista y anexos
4. Infore supervision
5. Certificado de cumpliiento
6. Certificado de pago de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales
7. Formato de seguimiento
8. Descripcion actividades

Atentamente

CONSORCIO GAMER SOACHA
MILTON RIVERA
C.C.No. 79.205.702 de Soacha
Director de Obra

GERDAU
DIACO

DIACO S/A
Carretera Central del Norte Km 27 Via Tunja Paipa,
Tuta, Colombia. C.P - 99999 Tel/Fax: 7426350

REPORTE DE ENSAYOS

Nº: 10008124042897

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
ANDRES MARTINEZ LIMITADA	9005769857/20	OC CV- 941	9271434/000020	NTC 2289 - NTC 2289	34.000

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	COMPOSICION QUIMICA (%) Ensayo según método ASTM E415											
				C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8" 6m	1724642103	GR60	0,28	0,90	0,012	0,036	0,19	0,32	0,15	0,15	0,04	0,015	0,001	0,450
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8" 6m	1724145902	GR60	0,27	1,05	0,011	0,038	0,16	0,29	0,08	0,11	0,002	0,03	0,008	0,470
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8" 6m	1723750302	GR60	0,29	1,07	0,013	0,032	0,19	0,29	0,09	0,09	0,002	0,03	0,009	0,490
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8" 6m	1724750402	GR60	0,27	1,06	0,017	0,033	0,19	0,27	0,12	0,10	0,002	0,04	0,008	0,470
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8" 6m	1723750502	GR60	0,28	1,05	0,019	0,033	0,21	0,30	0,10	0,10	0,002	0,03	0,006	0,480
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,500%	máx 0,035%	máx 0,045%	máx 0,500%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	PROPIEDADES MECÁNICAS Ensayo según método NTC3353						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R.Fluencia	R.Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Separa		
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8" 6m	1723642103	GR60	496	650	1,31	18,31	0,559	OK	6,44	0,58	1,99		
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8" 6m	1723750202	GR60	452	623	1,38	19,26	0,550	OK	6,43	0,52	1,98		
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8" 6m	1723750302	GR60	477	648	1,36	15,52	0,554	OK	6,42	0,55	2,12		
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8" 6m	1724750402	GR60	461	629	1,37	18,66	0,548	OK	6,42	0,51	1,98		
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8" 6m	1724750502	GR60	462	643	1,39	17,41	0,547	OK	6,43	0,56	1,95		
Rangos de referencia según norma				420 - 540 MPa	min 550 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 0,526 kg/m						

OBSERVACIONES

DESIGNACIÓN DE BARRAS CORRUGADAS:
1/4"=2;3/8"=3; 1/2"=4; 5/8"=5; 3/4"=6; 7/8"=7;
1"=8;1-1/4"=10; 8.5MM=8.5MM=9M; 11MM=11M; 12MM=12M.
Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad

RESPONSABLE DE CALIDAD

TUTA. 20.02.2021

PAOLA KATHERIN MATEUS

GERDAU
DIACO

DIACO S/A
Km 25 Via Bogota Sibate, Sibate, Colombia. C.P - 99999 Tel/Fax: 3118760266

REPORTE DE ENSAYOS

Nº: 10018122595367

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS	9005469179/10	OC 723	9168148/000010	NTC2289 - NTC_2289	33.721

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	COMPOSICION QUIMICA (%) Ensayo según método ASTM E415											
				C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1723429903	GR60												
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1723430102	GR60	0,27	0,95	0,009	0,023	0,23	0,24	0,12	0,10	0,02	0,017	0,300	0,453
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1723521804	GR60	0,28	0,94	0,013	0,034	0,21	0,33	0,12	0,11	0,02	0,016	0,301	0,460
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1723521902	GR60	0,28	0,92	0,012	0,032	0,16	0,26	0,09	0,10	0,03	0,014	0,301	0,450
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1723522003	GR60	0,28	0,91	0,020	0,040	0,17	0,31	0,09	0,17	0,02	0,016	0,301	0,460
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	2711033104	GR60	0,27	1,11	0,017	0,014	0,21	0,01	0,01	0,01	0,01	0,017	0,303	0,460
Rangos de referencia según norma															

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	PROPIEDADES MECÁNICAS Ensayo según método NTC3353						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R.Fluencia	R.Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Separa		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1723493402	GR60	469	680	1,46	18,21	0,553	OK	6,80	0,57	2,19		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1723430102	GR60	456	701	1,54	18,11	0,562	OK	6,85	0,61	2,12		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1723521804	GR60	501	675	1,36	14,88	0,564	OK	6,85	0,58	2,14		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1723521902	GR60	488	679	1,39	14,92	0,551	OK	6,56	0,57	2,02		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1723522003	GR60	467	700	1,50	15,57	0,560	OK	6,65	0,59	2,21		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	2711033104	GR60	478	643	1,34	16,38	0,549	OK	6,50	0,54	2,14		
Rangos de referencia según norma				420 - 540 MPa	min 550 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 0,528 kg/m						

OBSERVACIONES

DESIGNACIÓN DE BARRAS CORRUGADAS:
1/4"=2;3/8"=3; 1/2"=4; 5/8"=5; 3/4"=6; 7/8"=7;
1"=8;1-1/4"=10; 8.5MM=8,5M/M=9M; 11MM=11M; 12MM=12M.
Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad

RESPONSABLE DE CALIDAD

SIBATÉ. 31.03.2021

IVAN ANDRES PORTILLO CUADROS

CERTIFICACION JURAMENTADA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

Bogotá, noviembre 15 de 2.022

Yo, **MILTON EDUARDO RIVERA RINCON,** identificado con la cedula de ciudadanía No. **79.205.702** de **Soacha**, actuando como Representante Legal del **CONSORCIO GAMER SOACHA** identificado con **NIT. No.901.587.366-8;** y yo **ADRIANA BONILLA en** mi calidad de Contadora, certificamos, que se han venido pagando oportunamente las Obligaciones Laborales, durante los últimos seis (6) meses y que a la fecha me encuentro a paz y salvo por todo concepto.

En constancia, se firma en **BOGOTA**, a los **quince (15)** días del mes de **NOVIEMBRE** de 2022.

MILTON EDUARDO RIVERA RINCON
C. C. No.79.205.702
Representante Legal

ADRIANA BONILLA
TP 55341-T
Contadora
