CONSORCIO GAMER SOACHA

NIT.901.587.366-8

CON-GAMER024-33-2022

Bogotá, Diciembre 16 de 2022

Señores
COCOSERING SAS
Attn: Ing. Edgar Eduardo Uribe
Director Interventoria
Correo.interxua0252022@gmail.com

Referencia: Contrato 024 de 2022 cuyo objeto es la "CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA".

Apreciado Ingeniero.

Con la presente hacemos entrega de el ACTA No. 3 , Para su revision y previa radicacion

1. Factura
2. Acta parcial No 3 , memoria de cantidades
3. Informe actividades contratista y anexos
4. Informe supervision
5. Certificado de cumplimiento
6. Certificado de pago de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales
7. Formato de seguimiento
8. Descripcion actividades

Atentamente

CONSORCIO GAMER SOACHA
MILTON RIVERA
C.C.No. 79.205.702 de Soacha
Director de Obra

Recibido 16/12/2022

Factura Electrónica De Venta No

CGS No. 4

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764031299403 que habilita desde CGS 1 hasta CGS 200. Vence 2023-07-16

CONSORCIO GAMER SOACHA

Nit 901587366 - 8

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4290 7.12 X 1000

CLIENTE	EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXU		
NIT	901511522 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 12 8 A 36	Soacha		

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
21/12/2022	21/12/2022	VENDY ESTEFANIA ZULUAGA GONZALEZ	Credito

Item	**Código**	**Descripción**	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	C.D.	ACTA N° 3 - CTO N. 024-2022 OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA COSTO DIRECTO	1	Und.	771.948.054	0%	0	771.948.054
2	C.I.	COSTO INDIRECTO	1	Und.	231.584.417	0%	0	231.584.417

ADMINISTRACION	24%	$ 185.267.533
IMPREVISTOS	1%	$ 7.719.481
UTILIDAD	5%	$ 38.597.403

SUBTOTAL	**1.003.532.471**
DESCUENTO	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.003.532.471**

Total lineas o items: 2

Valor en Letras

MIL TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/12/2022 14:57:38

CL 44 C 45 53 Teléfono 3016341049 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidadgrupoica@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2) ...Fecha y Hora de Expedición: 21/12/2022 3:02:27 p. m.
CUFE: e5bc05b4cf13ad2b8736de61419c292fe49a99f65971c0d842b316e359f94fdf9a328b3163e18209e804c1c33d0a7f0...

	ETUXUA	Version	Codigo	Fecha de aprobación
	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	1	GC-00-030	

ACTA No. 3

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA — CONTRATO No.

OBJETO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA,CUNDINAMARCA .

CONTRATISTA : CONSORCIO GAMER SOACHA

INTERVENTOR: COCOSERING SAS

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO DD/MM/AA 4/05/2022

PERIODO A PAGAR: 13 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE de 2022

En Soacha, a los Dieciseis (16) dias del mes de Diciembre del año 2022 se reunieron HILTON EDUARDO RIVERA Director de Obra del Contratista y EDGAR URIBE Directora de Interventoria , para dejar constancia por medio de la presente acta de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o prelacitas contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
								0	-	-	-	0.00	$ -
1.25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M	M2	1	$ 11,419.00	$ 11,419.00	-		0				0.00	$ -
1.26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	1	$ 18,197.00	$ 18,197.00	79.57		79.57	$ 1,463,849.29	$ -	$ 1,463,849.00	0.00	$ -
1.27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	1	$ 28,043.00	$ 28,043.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
1.28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	M2	1	$ 46,104.00	$ 46,104.00	1,031.67	106.09	137.76	$ 47,564,113.68	$ 11,190,808.62	$ 68,754,922.00		
1.29	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	M3	1	$ 285,090.00	$ 285,090.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -		
1.45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	1	$ 10,095.00	$ 10,095.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -		
4.13	NIVELACION DE POZOS DE INSPECCION D=1.20M, E=3.25M, H=0.21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICION)	UN	1	$ 160,620.00	$ 160,620.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -		
16.1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA DE MATERIAL COMÚN	M3	1	$ 6,241.00	$ 6,241.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -		
16.2	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	1	$ 33,159.00	$ 33,159.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -		
16.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE) A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM	M3	1	$ 54,134.00	$ 54,134.00	1,338.14	779.82	2117.95	$ 72,468,881.87	$ 42,214,613.48	$ 114,382,495.14	0.00	$ -
16.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$ 62,173.00	$ 62,173.00	526.63	640.62	1167.24	$ 32,734,172.33	$ 39,836,521.80	$ 72,570,694.12	0.00	$ -
16.6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	1	$ 106,162.00	$ 106,162.00	165.45	115.59	281.04	$ 17,565,735.30	$ 12,270,245.50	$ 29,835,980.80	0.00	$ -
16.7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	1	$ 33,110.00	$ 33,110.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	1	$ 70,034.00	$ 70,034.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
16.9	RELLENO GRAVILLA DE RIO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	1	$ 68,748.00	$ 68,748.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
16.1	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	1	$ 169,782.00	$ 169,782.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
16.11	APISONADO (NORMA INVAS 211)	M3	1	$ 64,443.00	$ 64,443.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
16.11	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVAS 320)	M3	1	$ 143,715.00	$ 143,715.00	1,759.47	1,033.15	2793.13	$ 252,934,490.95	$ 148,479,727.11	$ 401,414,218.06	0.00	$ -
16.11	BASE GRANULAR BG1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVAS 330)	M3	1	$ 164,131.00	$ 164,131.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
3.23	RASON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	1	$ 89,846.00	$ 89,846.00	52.0	26.88	78.88	$ 4,648,231.30	$ 2,393,536.48	$ 7,041,767.68	0.00	$ -
3.1	ESTABADO TIPO 1 (CAPA DE NIVELACION)	M2	1	$ 32,930.00	$ 32,930.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
201 P	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	1	$ 173,358.00	$ 173,358.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
201 P	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	1	$ 60,755.00	$ 60,755.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	1	$ 10,724.00	$ 10,724.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	1	$ 37,319.00	$ 37,319.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	1	$ 9,838.00	$ 9,838.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
220.1	TERRAPLENES	M3	1	$ 16,634.00	$ 16,634.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
221.1	REPARLEN COMPACTO	M3	1	$ 14,575.00	$ 14,575.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
221.3	REPARLÉN SUELTO	M3	1	$ 8,398.00	$ 8,398.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	1	$ 538.00	$ 538.00	5,537.92	3,707.93	9245.85	$ 3,979,432.47	$ 1,994,865.13	$ 4,974,267.59	0.00	$ -
230.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO UNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	1	$ 14,340.00	$ 14,340.00	-		0.00	$ -	$ -			$ -

	EPUXUA	Versión	Código	Fecha de Aprobación
	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	1	GC-00-050	

ACTA No. 3

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA — CONTRATO No.

OBJETO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA,CUNDINAMARCA .

CONTRATISTA : CONSORCIO GAMER SOACHA

INTERVENTOR: COCOSERING SAS

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO DD/MM/AA 4/05/2022

PERIODO A PAGAR: 13 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE de 2022

600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$ 23,279.00	$ 23,279.00	314.92	382.99	697.91	$ 7,331,069.24	$ 8,915,670.77	$ 16,246,740.01	0.00	$ -
600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$ 69,968.00	$ 69,968.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
600.3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$ 86,694.00	$ 86,694.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
600.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$ 21,165.00	$ 21,165.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
600.5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$ 34,893.00	$ 34,893.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	1	$ 595,230.00	$ 595,230.00	217.02	178.02	395.04	$ 129,175,392.00	$ 105,962,844.60	$ 235,138,236.60	0.00	$ -
630.5	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	1	$ 710,725.00	$ 710,725.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1	$ 7,832.00	$ 7,832.00	4,079.43	368.44	4447.87	$ 31,950,111.42	$ 2,885,602.50	$ 34,835,713.92	0.00	$ -
671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	MJ	1	$ 478,443.00	$ 478,443.00	57.33	127.82	185.15	$ 27,431,134.69	$ 61,152,670.49	$ 88,583,805.18	0.00	$ -
630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	1	$ 377,439.00	$ 377,439.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	1	$ 387,723.00	$ 387,723.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	1	$ 396,324.00	$ 396,324.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
629 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	1	$ 402,949.00	$ 402,949.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	1	$ 411,550.00	$ 411,550.00	6.28	1.93	8.21	$ 2,584,534.00	$ 794,703.05	$ 3,379,237.05	0.00	$ -
681.1	GAVIÓN	M3	1	$ 191,010.00	$ 191,010.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
681.1	GAVIÓN MALLA PVC	M3	1	$ 195,311.00	$ 195,311.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E. 2500 PSI	ML	1	$ 46,667.00	$ 46,667.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	1	$ 7,922.00	$ 7,922.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
311.1	AFIRMADO	M3	1	$ 64,443.00	$ 64,443.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
***	AFIRMADO (EQUIPOS MENORES)	M3	1	$ 52,770.00	$ 52,770.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
****	AFIRMADO MANUAL	M3	1	$ 80,625.00	$ 80,625.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1	$ 687,261.00	$ 687,261.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
5.1	ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X6CM	m2	1	$ 80,087.00	$ 80,087.00	1,184.98	565.02	1750.00	$ 94,901,888.49	$ 45,250,756.74	$ 140,152,645.23	0.00	$ -
NP 1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	1	$ 3,825.00	$ 3,825.00	6,982.24	3,423.53	10405.77	$ 26,707,081.06	$ 13,094,993.57	$ 39,802,074.63	0.00	$ -
NP 2	MORTERO 1:4	M3	1	$ 475,586.00	$ 475,586.00	115.75	165.78	281.53	$ 55,048,705.45	$ 78,842,989.50	$ 133,891,694.95	0.00	
NP3	Suministro e instalacion de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UN	1	$ 72,370.00	$ 72,370.00	1,074	689	1762.74	$ 77,693,154.97	$ 49,876,499.38	$ 127,569,654.35	0.00	$ -
NP4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3500 PSI (BASES)	M3	1	$ 597,667.70	$ 597,668.00	1.19		1.19	$ 710,029.23	$ -	$ 710,029.23	0.00	
NP5	CONCRETOS CLASE D, f´c =3500 PSI (ELEVACIONES)	M3	1	$ 713,258.00	$ 713,258.00	1.31		1.31	$ 937,221.01	$ -	$ 937,221.01	0.00	$ -
NP6	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	KG	1	$ 9,986.00	$ 9,986.00	8,151.42	8,381.80	16533.23	$ 81,400,125.93	$ 83,700,679.89	$ 165,100,805.82	0.00	$ -
NP7	CAJA INSECCION 60*60	UN	1	$ 285,348.00	$ 285,348.00	-		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	
NP8	REPARACION ACOMETIDA	UN	1	$ 34,390.00	$ 34,390.00	91.00	81.00	172.00	$ 3,129,490.00	$ 2,785,590.00	$ 5,915,080.00	0.00	$ -
NP9	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA EXPLANACION, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/K	1	$ 1,444.00	$ 1,444.00	33,075.00	17,445.00	50520.00	$ 47,760,300.00	$ 25,190,580.00	$ 72,950,880.00	0.00	$ -
NP10	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCION Di=1.7M, E=0.25M, H=0,21M)(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICION)	UN	1	$ 250,235.00	250,235.00	16.00	33.00	49.00	$ 4,003,760.00	$ 8,257,755.00	$ 12,261,515.00	0.00	$ -
NP11	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*15 CMS CONCRETO 3000 PSI	MJ	1	$ 759,999.00	759,999.00	38.19	15.41	53.60	$ 29,024,361.81	$ 11,710,634.59	$ 40,734,996.40	0.00	$ -

	EPLIKUA	Versión	Codigo	Fecha de Aprobación
	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	1	GC-00-050	

ACTA No. 3

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA — CONTRATO No.

OBJETO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA,CUNDINAMARCA .

CONTRATISTA : CONSORCIO GAMER SOACHA

INTERVENTOR: COCOSERING SAS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DD/MM/AA 4/05/2022

PERIODO A PAGAR: 13 NOVIEMBRE AL 15 D CIEMBRE de 2022

NP62	INSTALACION DE ADOQUIN EN ARCILLA DE 20*10*6CM NO INCLUYE MORTERO DE PEGA	M2	1	$ 33,539.00	33,539.00	209.56	395.17	602.73	$ 7,028,432.84	$ 13,186,545.40	$ 20,214,978.24	0.00	$ -	
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS									$ 1,058,915,039.00	$ 771,948,054.00	$ 1,830,863,093.00	$ -	$ -	
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS									$ 117,674,513.00	$ 231,564,417.00	$ 349,238,929.00	$ -	$ -	
	ADMINISTRACION	24.00%							$ 254,139,609.36	$ 185,267,533.00	$ 439,407,142.00	$ -	$ -	
	IMPREVISTOS	1.00%							$ 10,589,150.39	$ 7,719,481.00	$ 18,308,631.00	$ -	$ -	
	UTILIDAD	5.00%							$ 52,945,751.96	$ 38,597,403.00	$ 91,543,155.00	$ -	$ -	
									$ -	$ -		$ -		
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS									$ 1,176,589,551.00	$ 1,003,512,471.00	$ 2,180,122,022.00		$ -	

BALANCE PRESUPUESTAL

V/I INICIAL CONTRATO:	$ 4,506,567,899	V/R ANTICIPO:	N/A
V/I ADICIONES:	-	% ANTICIPO :	N/A
V/I ACTUAL CONTRATO:	$ 4,506,567,899	% RETEGARANTIA :	N/A

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	VALOR CONTRATO	SALDO POR AMORTIZAR		VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
	ACTA 1		649,376,868.00	14.41%	4,506,567,898.67		-	649,376,868.00	3,857,191,030.67	14.41%
	ACTA 2		727,213,483.00	16.14%			-	727,213,483.00	3,129,978,147.67	16.14%
	ACTA 3		1,003,532,471.00	22.27%			-	1,003,532,471.00	2,126,445,676.67	22.27%
	TOTAL		2,380,122,022.00	52.83%	4,506,567,898.67			2,380,122,022.00	2,126,445,876.67	

(*) Descripción de la etapa o el periodo facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

(Esta parte va únicamente en la última página)

EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: MILTON EDUARDO RIVERA RINCON
DIRECTOR DE OBRA

16 de diciembre de 2022
FECHA DE ELABORACIÓN

EL INTERVENTOR:

Firma:
Nombre: EDGAR URIBE
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: JUAN PABLO CAÑON

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	15	MM	12	AA	2022	CORTE N°	3	CONSORCIO GAMER SOACHA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2021

ACTIVIDAD	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	ITEM	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	UNID.	M2





CARRERA 17B ENTRE CALLE 61 Y CALLE 60

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+110	95.00	3.01	-	1.00	286.09
				TOTAL	286.09
				TOTAL	286.09

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de Interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	15	MM	12	AA	2022	CORTE N°	3	CONSORCIO GAMER SOACHA
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA								
INTERVENTOR	COCOSERING SAS						NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N° 025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA						NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N° 024 DE 2022

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3





CALLE 50 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 31

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+042					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	4.22	0.53	-	100.07
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
Descuento Acta No 2					- 63.18
				TOTAL	36.89

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3





CALLE 48 ENTRE CARRERA 32A Y CARRERA 31

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	4.12	0.601	-	139.29
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
Descuento Acta No 2					- 89.70
				TOTAL	49.59

OBSERVACIONES:

121

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3





CALLE 53 ENTRE CARRERA 30E Y CARRERA 29

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
CUADRO CONCRETO	4.80	0.90	0.100	1.00	0.43
CUADRO CONCRETO	3.30	0.90	0.100	1.00	0.30
CUADRO CONCRETO	3.30	5.10	0.100	1.00	1.68
CONCRETO CUADRADO	7.50	0.90	0.100	1.00	0.68
EMPALME CENTRAL	4.80	0.90	0.100	1.00	0.43
EMPALME CENTRAL	2.50	0.90	0.100	1.00	0.23
TOTAL					3.74

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3





CALLE 217 ENTRE CARRERA 43D Y CARRERA 44

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	4.55	0.485	-	96.28
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					96.28

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0 2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CALLE 43C ENTRE CARRERA 27F Y CARRERA 27D

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	2.07	0.323	-	16.31
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					16.31

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CALLE 43D CRA 27 ESTE Y CRA 27D ESTE

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	3.50	0.424	-	37.09
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFIA					
TOTAL					37.09

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3





CRA 24B ESTE ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	3.55	0.337	-	59.77
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
				TOTAL	59.77

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3





CRA 24B ESTE ENTRE CALLE 57 Y CALLE 58

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	4.50	0.376	-	98.31
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
				TOTAL	98.31

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CRA 26A ESTE ENTRE CALLE 56B Y CALLE 59

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	3.50	0.363	-	166.44
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					166.44

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CARRERA 26B ENTRE CALLE 56A Y CALLE 59

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	3.81	0.305	-	47.14
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					47.14

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3





CARRERA 26C ENTRE CALLE 53 Y CALLE 55

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	6.10	0.462	-	62.16
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
				TOTAL	62.16

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CARRERA 27D ENTRE CALLE 43D Y CALLE 43F

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	4.02	0.312	-	34.69
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
				TOTAL	34.69

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CALLE 41F ENTRE CARRERA 27D Y CARRERA 27B

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
KO+000 A KO+060					
FALLO	7.00	3.20	0.30	1.00	6.72
			TOTAL		6.72
			TOTAL		379.82

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de Interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	15	MM	12	AA	2022	CORTE N°	3	CONSORCIO GAMER SOACHA
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA								
INTERVENTOR	COCOSERING SAS						NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N° 025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA						NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N° 024 DE 2022

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CALLE 27F ENTRE CARRERA 43D Y CARRERA 44

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
KD+000 - KD+056 ALTO Y ANCHO PROMEDIO MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA	-	4.55	0.48	-	120.35
TOTAL					120.35

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3





CARRERA 17A ESTE ENTRE CALLE 60A Y CALLE 61

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
KD+000 - KD+056 ALTO Y ANCHO PROMEDIO MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA	-	6.05	0.416	-	80.90
INSTALACIÓN BORDILLO	6.00	0.50	0.50	-	1.50
RIOSTRAS DE PAÑOS PLACA HUE	5.60	0.20	0.30	22.00	7.39
CUENTA TRAMO	107.50	0.35	0.20	2.00	15.05
TOTAL					104.85

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CARRERA 178 ESTE ENTRE CALLE 60A Y CALLE 61

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	3.01	0.403	-	34.49
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
RIOSTRAS DE PAÑOS PLACA HUE	2.80	0.20	0.30	22.00	3.70
CUENTA TRAMO	107.00	0.35	0.20	2.00	14.98
TOTAL					53.16

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CARRERA 268 ENTRE CALLE 56A Y CALLE 59

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	3.81	0.305	-	47.14
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					47.14

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CARRERA 27D ENTRE CALLE 43F Y CALLE 44

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	4.02	0.260	-	28.85
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFIA					
				TOTAL	28.85

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CALLE 43F ENTRE CARRERA 27F Y CARRERA 27D

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 A K0+060					
FALLO	35.00	3.20	0.32	1.00	35.84
				TOTAL	35.84

OBSERVACIONES:

34

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CARRERA 26C ENTRE CALLE 53 Y CALLE 55

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	6.10	0.462	-	62.16
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					62.16

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CALLE 53 ENRE CARRERA 30E Y CARRERA 29

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+050					
INSTALACIÓN DE BORDILLO	10.00	0.50	0.40	-	2.00
CUNETA EXTERIOR CURVA DE VI	40.00	0.35	0.20	1.00	2.80
CUNETA INTERIOR CURVA DE VI	35.00	0.35	0.20	1.00	2.45
TOTAL					7.25

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CALLE 48 ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 31 E

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 A K0+060					
INSTALACION DE BORDILLO	18.00	0.50	0.40	-	3.60
TRAMO 1	26.00	0.45	0.20	2.00	4.68
TRAMO 2	3.80	0.65	0.20	1.00	0.49
EMPALMES	2.50	0.65	0.20	1.00	0.33
VIGA AJUSTE FINAL	2.00	1.05	0.20	1.00	0.42
			TOTAL		9.52

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CARRERA 30 ENTRE CALLE 48 Y CALLE 44

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 - K0+060					
INSTALACION BORDILLO	13.50	0.50	0.40	-	2.70
CUNETA TRAMO 1	62.20	0.65	0.20	2.00	16.17
CUNETA TRAMO 2	62.20	0.45	0.20	2.00	11.20
			TOTAL		30.07

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CARRERA 30 CON CALLE 43F (CAMPAMENTO)

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+060					
INSTALACIÓN BORDILLO	15.75	0.50	0.40	-	3.15
RIOSTRAS DE PAÑOS PLACA HUE	2.80	0.20	0.35	12.00	2.35
CUNETA TRAMO	58.40	0.45	0.20	2.00	10.51
TOTAL					16.01

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CALLE 43F ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+060					
INSTALACIÓN BORDILLO	36.00	0.50	0.40	-	7.20
RIOSTRAS DE PAÑOS PLACA HUE	2.80	0.25	0.35	12.00	2.94
CUNETA CUADRA No 1	56.75	0.45	0.20	2.00	10.22
TOTAL					20.36

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CALLE 43F ENTRE CARRERA 28 Y CARRERA 27F

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 A K0+060					
INSTALACIÓN BORDILLO	10.50	0.50	0.40	-	2.10
RIOSTRAS DE PAÑOS PLACA HUE	2.80	0.15	0.25	12.00	1.26
CUADRA No 2	56.75	0.40	0.15	2.00	6.81
TOTAL					10.17

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CALLE 43F ENTRE CARRERA 27F Y CARRERA 27D

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 A K0+060					
INSTALACIÓN BORDILLO	14.50	0.50	0.40	-	2.90
RIOSTRAS DE PAÑOS PLACA HUE	2.70	0.15	0.25	12.00	1.22
TRAMO CUNETA CUADRA No 3	56.75	0.40	0.15	2.00	6.81
TOTAL					10.93

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CALLE 43F ENTRE CARRERA 27D Y CARRERA 27B

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 A K0+060					
INSTALACIÓN BORDILLO	14.80	0.50	0.40	-	2.96
RIOSTRAS DE PAÑOS PLACA HUE	2.80	0.20	0.30	12.00	2.02
TRAMO CUNETA CUADRA No 4	56.75	0.45	0.20	2.00	10.22
TOTAL					15.19

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CARRERA 17 ENTRE CALLES 60 Y 61

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 A K0+060					
INSTALACIÓN BORDILLO	8.50	0.50	0.40	-	1.70
TRAMO CUNETA	125.70	0.30	0.15	2.00	11.31
TOTAL					13.01

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CARRERA 30 ENTRE CALLE 53 Y CALLE 48

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 - K0+110					
INSTALACIÓN BORDILLO	3.80	0.50	0.40	-	0.76
CUNETA 1	58.00	0.45	0.20	1.00	5.22
CUNETA 2	58.00	0.65	0.20	1.00	7.54
EMPALME ENTRE CUNETA 1	4.00	0.45	0.20	1.00	0.36
EMPALME ENTRE CUNETA 2	4.00	0.65	0.20	1.00	0.52
				TOTAL	14.40

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CALLE 50 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 31

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 A K0+042					
RIOSTRAS DE PANOS PLACA HUELL	2.70	0.20	0.30	8.00	1.30
TRAMOS CUNETA	42.00	0.40	0.15	2.00	5.04
				TOTAL	6.34

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CARRERA 30 ENTRE CALLE 48 Y CALLE 53

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+060					
RIOSTRAS DE PAÑOS PLACA HUE	2.70	0.20	0.300	11.00	1.78
TOTAL					1.78

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CRA 28 ENTRE CALLE 56A A CALLE 59

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+120					
CUNETA	120.00	0.45	0.20	2.00	21.60
TERMINACION CUNETA	4.00	0.45	1.20	1.00	2.16
TOTAL					23.76

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CALLE 48 ENTRE CARRERA 32A Y CARRERA 31

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 - K0+056					
TRAMOS CUNETA	55.40	0.45	0.200	2.00	9.97
				TOTAL	9.97

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	0.000	ITEM	0	UNID.	0



VIA EUGENIO DIAS

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 - K0+110					
	400.00	0.80	0.20	1.00	64.00
				TOTAL	64.00
				TOTAL	640.42

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD 15	MM 12	AA 2022	CORTE N°	3	CONSORCIO GAMER SOACHA	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA						
INTERVENTOR	COCOSERING SAS			NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA			NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	ITEM	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	UNID.	M3





OBSERVACIONES:

CRA 28 ENTRE CALLE 56A A CALLE 59

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+120					
CUNETA	120.00	0.40	0.15	2.00	14.40
TERMINACIÓN CUNETA	4.00	0.40	1.15	1.00	1.84
TOTAL					16.24

ACTIVIDAD	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	ITEM	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	UNID.	M3




OBSERVACIONES:

CALLE 50 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 31

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+042					
TRAMOS CUNETA	42.00	0.40	0.15	2.00	5.04
TOTAL					5.04

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	15	MM	12	AA	2022	CORTE N°	3	CONSORCIO GAMER SOACHA
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA								
INTERVENTOR	COCOSERING SAS						NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N° 025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA						NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N° 024 DE 2022

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	ITEM	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	UNID.	M3



CALLE 48 ENTRE CARRERA 32A Y CARRERA 31

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
TRAMOS CUNETA	55.40	0.40	0.150	2.00	6.65
TOTAL					6.65

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	ITEM	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	UNID.	M3



CALLE 53 ENTRE CARRERA 30 ESTE Y CARRERA 29 ESTE

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+040					
CUNETA EXTERIOR CURVA DE V	40.00	0.30	0.150	1.00	1.80
CUNETA INTERIOR CURVA DE V	35.00	0.30	0.150	1.00	1.58
TOTAL					3.38

OBSERVACIONES:

324

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

FECHA DD 15 MM 12 AA 2022	CORTE N° 3	CONSORCIO GAMER SOACHA			
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

CONSORCIO GAMER SOACHA | MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	ITEM	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	UNID.	M3





CARRERA 30 ENTRE CALLE 48 Y CALLE 51

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+060					
CUNETA 1	58.00	0.40	0.150	1.00	3.48
CUNETA 2	58.00	0.60	0.150	1.00	5.22
EMPALME ENTRE CUNETA 1	4.00	0.40	0.150	1.00	0.24
EMPALME ENTRE CUNETA 2	4.00	0.60	0.150	1.00	0.36
			TOTAL		9.30

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	ITEM	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	UNID.	M3





CALLE 48 ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 31 ESTE

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+060					
TRAMO 1	26.00	0.40	0.150	2.00	3.12
TRAMO 2	3.80	0.60	0.150	1.00	0.34
EMPALMES	2.50	0.60	0.150	1.00	0.23
			TOTAL		3.69

OBSERVACIONES:

324

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

FECHA	DD 15 MM 12 AA 2022	CORTE N°	3	CONSORCIO GAMER SOACHA	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

CONSORCIO GAMER SOACHA | MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	ITEM	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	UNID.	M3





CARRERA 30 ENTRE CALLE 48 Y CALLE 44

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+060					
CUNETA TRAMO 1	62.20	0.60	0.150	2.00	11.20
CUNETA TRAMO 2	62.20	0.40	0.150	2.00	7.46
TOTAL					18.66

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	ITEM	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	UNID.	M3




CARRERA 30 CON CALLE 43F (CAMPAMENTO)

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+060					
CUNETA TRAMO	58.40	0.40	0.150	2.00	7.01
TOTAL					7.01

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

FECHA	DD 15 MM 12 AA 2022	CORTE N°	3	CONSORCIO GAMER SOACHA	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

CONSORCIO GAMER SOACHA | MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	ITEM	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	UNID.	M3



CALLE 43F ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+060					
CUADRA No 1	56.75	0.40	0.150	2.00	6.81
TOTAL					6.81

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	ITEM	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	UNID.	M3



CALLE 43F ENTRE CARRERA 28 Y CARRERA 27F

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+060					
CUADRA No 2	56.75	0.40	0.150	2.00	6.81
TOTAL					6.81

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

FECHA	DD 15 MM 12 AA 2022	CORTE N°	3	CONSORCIO GAMER SOACHA	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

CONSORCIO GAMER SOACHA | MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	ITEM	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	UNID.	M3



CALLE 43F ENTRE CARRERA 27F Y CARRERA 27D

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+060 CUADRA No 3	56.75	0.40	0.150	2.00	6.81
			TOTAL		6.81

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	ITEM	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	UNID.	M3



CALLE 43F ENTRE CARRERA 27D Y CARRERA 27B

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+060 CUADRA No 4	56.75	0.40	0.150	2.00	6.81
			TOTAL		6.81

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

FECHA	DD 15 MM 12 AA 2022	CORTE N°	1	CONSORCIO GAMER SOACHA	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

CONSORCIO GAMER SOACHA | MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	ITEM	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	UNID.	M3






CARRERA 17 ENTRECALLE 60 Y CALLE 61

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+126	125.70	0.30	0.150	2.00	11.31
				TOTAL	11.31

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	ITEM	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	UNID.	M3

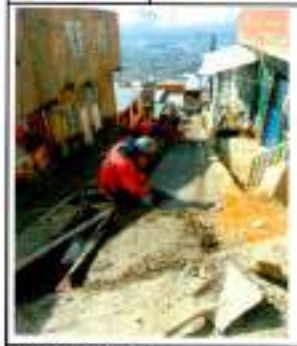


CARRERA 17A ENTRE CALLE 61 Y CALLE 60A

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+110	107.50	0.30	0.15	2.00	9.68
				TOTAL	9.68

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

FECHA DD 15 MM 12 AA 2022	CORTE N° 3	CONSORCIO GAMER SOACHA			
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

CONSORCIO GAMER SOACHA | MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	ITEM	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	UNID.	M3





CARRERA 17B ENTRE CALLE 61 Y CALLE 60

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
KD+000 A KD+110					
	107.00	0.30	0.15	2.00	9.63
				TOTAL	9.63
				TOTAL	127.82

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de Interventoría:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	15	MM	12	AA	2022	CORTE N°	2	CONSORCIO GAMER SOACHA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CARRERA 17A ESTE ENTRE CALLE 60A Y CALLE 61

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	6.05	0.416	-	80.90
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					80.90

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CARRERA 17B ESTE ENTRE CALLE 60A Y CALLE 61

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	3.01	0.403	-	34.49
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					34.49
TOTAL					115.39

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de interventoría:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	15	MM	12	AA	2022	CORTE N°	3	CONSORCIO GAMER SOACHA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	ITEM	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3





CRA 28 ENTRE CALLE 56A A CALLE 59

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
KD+000 A KD+115 Nivelación adequin	111.00	0.90	0.05	1.00	5.00
TOTAL					5.00

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	ITEM	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3





CALLE 50 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 31

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
KD+000 A KD+042 Nivelación adequin	40.80	0.90	0.05	1.00	1.84
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	4.27	0.35	-	63.88
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFIA					
Descuento Acta No 2					- 38.34
TOTAL					27.38

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	ITEM	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3





CALLE 48 ENTRE CARRERA 32A Y CARRERA 31

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
Nivelación adoquin	54.00	0.90	0.050	1.00	2.43
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	4.12	0.601	-	72.34
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
Descuento Acta No 2					- 63.40
			TOTAL		11.37

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	ITEM	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3




CALLE 53 ENTRE CARRERA 30E Y CARRERA 29

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
Nivelación adoquin	34.80	0.90	0.050	1.00	1.57
CUADRO CONCRETO	4.80	0.90	0.100	1.00	0.43
CUADRO CONCRETO	3.30	0.90	0.100	1.00	0.30
CUADRO CONCRETO	3.30	5.10	0.100	1.00	1.68
CONCRETO CUADRADO	7.50	0.90	0.100	1.00	0.68
EMPALME CENTRAL	4.80	0.90	0.100	1.00	0.43
EMPALME CENTRAL	2.50	0.90	0.100	1.00	0.23
			TOTAL		5.31

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	ITEM	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3





CARRERA 30 ENTRE CALLE 53 Y CALLE 48

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
Nivelación adoquín	56.35	0.90	0.050	1.00	2.54

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	ITEM	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3





CARRERA 30 CON CALLE 43F (CAMPAMENTO)

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
Nivelación adoquin	56.35	0.90	0.050	1.00	2.54
Nivelación adoquin	56.35	1.00	0.050	1.00	2.82
			TOTAL		5.35

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	ITEM	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3





CALLE 43F ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
Nivelación adoquin	55.10	0.90	0.050	1.00	2.48
			TOTAL		2.48

OBSERVACIONES:



29

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	ITEM	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3



CALLE 43F ENTRE CARRERA 28 Y CARRERA 27F

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
Nivelación adoquin	55.10	0.90	0.050	1.00	2.48

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	ITEM	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3



CALLE 43F ENTRE CARRERA 27D Y CARRERA 27B

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+060					
Nivelación adoquin	55.10	0.90	0.05	1.00	2.48
FALLO	7.00	3.20	0.10	1.00	2.24
TOTAL					4.72

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	ITEM	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3

CALLE 27F ENTRE CARRERA 43D Y CARRERA 44

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+060					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	4.55	0.21	-	124.08
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					124.08

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

ACTIVIDAD	SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	ITEM	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3





CARRERA 28 ENTRE CALLE 43F

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+0XX					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	2.56	0.235	-	15.47
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					15.47

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	ITEM	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3





CALLE 43C ENTRE CARRERA 27F Y CARRERA 27D

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+0XX					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	2.07	0.218	-	11.24
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					11.24

OBSERVACIONES:

324

154

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	ITEM	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3





CALLE 43D CRA 27 ESTE Y CRA 27D ESTE

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+0XX					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	3.50	0.221	-	15.44
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					15.44

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	ITEM	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3





CARRERA 17A ENTRE CALLE 61 Y CALLE 60A

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+0XX					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO		6.05	0.328	-	213.27
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
Nivelación de adoquin	104.00	0.90	0.050	2.00	9.36
TOTAL					222.63

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	ITEM	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3





CARRERA 179 ESTE ENTRE CALLE 60A Y CALLE 61

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	3.01	0.297	-	84.84
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					84.84

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	ITEM	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3





CRA 248 ESTE ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	3.55	0.235	-	46.39
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					46.39

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	ITEM	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3





CRA 24B ESTE ENTRE CALLE 57 Y CALLE 58

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	4.50	0.220	-	63.97
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					63.97

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	ITEM	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3





CRA 26A ESTE ENTRE CALLE 56B Y CALLE 59

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	3.50	0.215	-	111.60
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					111.60

OBSERVACIONES:

F29

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	ITEM	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3





CARRERA 26B ENTRE CALLE 56A Y CALLE 59

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
KD+000 - KD+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	3.81	0.218	-	83.82
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
				TOTAL	83.82

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	ITEM	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3



CARRERA 26C ENTRE CALLE 53 Y CALLE 55

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
KD+000 - KD+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	6.10	0.217	-	73.02
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
				TOTAL	73.02

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	ITEM	SUBBASE GRAMULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3





CARRERA 27D ENTRE CALLE 43D Y CALLE 43F

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	4.02	0.253	-	27.02
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
			TOTAL		27.02

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	ITEM	SUBBASE GRAMULAR SBG-1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 320)	UNID.	M3





CARRERA 27D ENTRE CALLE 43F Y CALLE 44

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	4.02	0.210	-	23.96
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
			TOTAL		23.96
			TOTAL		1,033.15

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	15	MM	12	AA	2022	CORTE N°	3	CONSORCIO GAMER SOACHA
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA								
INTERVENTOR	COCOSERING SAS						NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N° 025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA						NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N° 024 DE 2022

ACTIVIDAD	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	ITEM	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	UNID.	M3





CALLE 43F ENTRE CARRERA 27F Y CARRERA 27D

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
KO+000 A KO+060 FALLO	35.00	3.20	0.20	1.00	22.40
				TOTAL	22.40

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	ITEM	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	UNID.	M3





CALLE 43F ENTRE CARRERA 27D Y CARRERA 27B

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
KO+000 A KO+060 FALLO	7.00	3.20	0.20	1.00	4.48
				TOTAL	4.48
				TOTAL	26.88

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

FECHA	DD	15	MM	12	AA	2022	CORTE N°	3	CONSORCIO GAMER SOACHA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.567.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	ITEM	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	UNID.	M2





CALLE 27F ENTRE CARRERA 43D Y CARRERA 44

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+110					
ANCHO PROMEDIO	129.00	4.55	-	-	587.43
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					587.43

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	ITEM	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	UNID.	M2





CARRERA 28 ENTRE CALLE 43F

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+110					
ANCHO PROMEDIO	25.70	2.56	-	-	65.79
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					65.79

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

ACTIVIDAD	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	ITEM	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	UNID.	M2





CALLE 43C ENTRE CARRERA 27F Y CARRERA 27D

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 A K0+110					
ANCHO PROMEDIO	25.00	2.07	-	-	51.69
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					51.69

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	ITEM	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	UNID.	M2



CALLE 43D CRA 27 ESTE Y CRA 27D ESTE

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 A K0+110					
ANCHO PROMEDIO	34.70	3.50	-	-	121.45
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					121.45

OBSERVACIONES:


124

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	ITEM	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	UNID.	M2



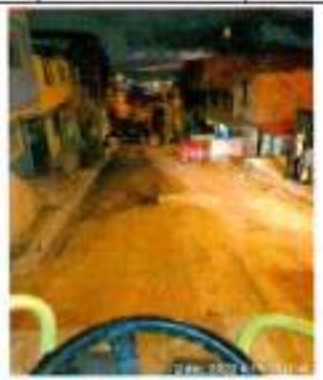

CARRERA 17A ENTRE CALLE 61 Y CALLE 60A

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+110 ANCHO PROMEDIO	107.00	6.05	-	-	647.84
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					647.84

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	ITEM	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	UNID.	M2





CARRERA 17B ESTE ENTRE CALLE 60A Y CALLE 61

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056 ANCHO PROMEDIO	95.00	3.01	-	-	286.09
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					286.09

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

ACTIVIDAD	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	ITEM	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	UNID.	M2



CRA 24B ESTE ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 - K0+056					
ANCHO PROMEDIO	55.84	3.55	-	-	198.19
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					198.19

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	ITEM	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	UNID.	M2





CRA 24B ESTE ENTRE CALLE 57 Y CALLE 58

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	63.20	4.50	-	-	284.40
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					284.40

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

ACTIVIDAD	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	ITEM	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	UNID.	M2






CRA 26A ESTE ENTRE CALLE 56B Y CALLE 59

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	148.40	3.50	-	-	519.40
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					519.40

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	ITEM	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	UNID.	M2





CARRERA 26B ENTRE CALLE 56A Y CALLE 59

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	101.10	3.81	-	-	385.14
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					385.14

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

ACTIVIDAD	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	ITEM	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	UNID.	M2





CARRERA 26C ENTRE CALLE 53 Y CALLE 55

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	55.15	6.10	-	-	336.42
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					336.42

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	ITEM	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	UNID.	M2





CARRERA 27D ENTRE CALLE 43D Y CALLE 43F

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	27.30	4.02	-	-	109.68
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					109.68

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

ACTIVIDAD	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	ITEM	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	UNID.	M2





CARRERA 27D ENTRE CALLE 43F Y CALLE 44

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	28.48	4.02	-	-	114.42
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
				TOTAL	114.42
				TOTAL	3,707.93

OBSERVACIONES:

Firma: Directer de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	15	MM	12	AA	2022	CORTE N°	3	CONSORCIO GAMER SOACHA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CALLE 43F ENTRE CARRERA 27F Y CARRERA 27D

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+110 A K0+160 Levantamiento topografico	35.00	3.20	0.320	-	35.84
TOTAL					35.84

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3





CARRERA 17A ENTRE CALLE 61 Y CALLE 60A

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+060 ALTO Y ANCHO PROMEDIO MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA	-	6.05	0.42	-	107.87
TOTAL					107.87

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CARRERA 17B ESTE ENTRE CALLE 60A Y CALLE 61

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
KD+000 - KD+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	3.01	0.403	-	45.98
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					45.98

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3





CARRERA 14B ESTE ENTRE 59-5B

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
KD+000 A KD+OOX					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	4.50	0.38	-	109.23
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					109.23

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3



CRA 24B ESTE ENTRE CALLE 57 Y CALLE 58

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	4.50	0.376	-	10.92
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					10.92

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3





CRA 26A ESTE ENTRE CALLE 56B Y CALLE 59

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	3.50	0.363	-	18.49
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					18.49

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3





CARRERA 26B ENTRE CALLE 56A Y CALLE 59

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	3.81	0.305	-	23.57
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					23.57

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ITEM	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3





CARRERA 26C ENTRE CALLE 53 Y CALLE 55

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	-	6.10	0.462	-	31.08
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					31.08
TOTAL					382.99

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de Interventoría:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD 15	MM 12	AA 2022	CORTE N°	3	CONSORCIO GAMER SOACHA	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA						
INTERVENTOR	COCOSERING SAS			NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA			NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	ITEM	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	UNID.	M3





CRA 28 ENTRE CALLE 56A A CALLE 59

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
KO+00 A KO+0120					
CUADRO DE CONCRETO	3.00	2.70	0.15	1.00	1.22
CURVA TRAMO FINAL	2.70	1.80	0.15	1.00	0.73
TOTAL					1.94

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	ITEM	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	UNID.	M3




CALLE 50 ENTRE CARRERA 32A Y CARRERA 31

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
KO+000 - KO+042					
	40.80	1.40	0.150	1.00	8.57
TOTAL					8.57

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	ITEM	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	UNID.	M3





CALLE 48 ENTRE CARRERA 32A Y CARRERA 31

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
CONCRETO CARGUE	1.25	0.90	0.150	2.00	0.34
CONCRETO TERMINACIÓN	2.45	0.60	0.150	2.00	0.44
TOTAL					0.78

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	ITEM	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	UNID.	M3




CALLE 53 ENTRE CARRERA 30 ESTE Y CARRERA 29 ESTE

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+040					
CUADRO CONCRETO	4.80	0.90	0.150	1.00	0.65
CUADRO CONCRETO	3.30	0.90	0.150	1.00	0.45
CUADRO CONCRETO	3.30	5.10	0.150	1.00	2.52
CONCRETO CUADRADO	7.50	0.90	0.150	1.00	1.01
EMPALME CENTRAL	4.80	0.90	0.150	1.00	0.65
EMPALME CENTRAL	2.50	0.90	0.150	1.00	0.34
CARGUES POZO	3.00	2.50	0.150	1.00	1.13
TOTAL					6.74

OBSERVACIONES:

324

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	ITEM	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	UNID.	M3





CARRERA 30 ENTRE CALLE 48 Y CALLE 53

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 - K0+060					
EMPALME CENTRAL 48 - 44 POZ	2.30	0.90	0.150	2.00	0.62
TOTAL					0.62

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	ITEM	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	UNID.	M3





CARRERA 30 CON CALLE 43F (CAMPAMENTO)

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 - K0+060					
	56.35	1.80	0.150	1.00	15.21
TOTAL					15.21

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	ITEM	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	UNID.	M3



CALLE 43F ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 - K0+060					
PLACA HUELLA	55.45	1.80	0.150	1.00	14.97
TOTAL					14.97

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	ITEM	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	UNID.	M3



CALLE 43F ENTRE CARRERA 28 Y CARRERA 27F

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 - K0+060					
PLACA HUELLA	55.10	1.80	0.150	1.00	14.88
TOTAL					14.88

OBSERVACIONES:

124

124

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	ITEM	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	UNID.	M3



CALLE 43F ENTRE CARRERA 27F Y CARRERA 27D

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
KD+000 - KD+060					
PLACA HUELLA	55.10	1.80	0.150	1.00	14.88
				TOTAL	14.88

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	ITEM	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	UNID.	M3



CALLE 43F ENTRE CARRERA 27D Y CARRERA 27B

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
KD+000 - KD+060					
PLACA HUELLA	55.10	1.80	0.150	1.00	14.88
				TOTAL	14.88

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	ITEM	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	UNID.	M3



CARRERA 17A ENTRE CALLE 61 Y CALLE 60A

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
KD+000 A KD+110	104.40	0.90	0.15	4.00	56.38
				TOTAL	56.38

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	ITEM	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	UNID.	M3





CARRERA 17B ENTRE CALLE 61 Y CALLE 60

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
KD+000 A KD+110	104.35	0.90	0.15	2.00	28.17
				TOTAL	28.17
				TOTAL	178.02

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de Interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	15	MM	12	AA	2022	CORTE N°	3	CONSORCIO GAMER SOACHA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	034 DE 2022

ACTIVIDAD	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	ITEM	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UNID.	KG



CARRERA 30 CON CALLE 43F (CAMPAMENTO)

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+060					
FLEJES	0.25	19.00	0.25	12.00	19.75
LONGITUDINAL 3/8	2.80	2.00	0.56	12.00	20.82
TOTAL					40.57

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	ITEM	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UNID.	KG



CALLE 43F ENTRE CARRERA 30 - CARRERA 28

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+060					
FLEJES	0.25	19.00	0.25	12.00	19.75
VARILLA LONGITUDINAL 3/8	2.80	2.00	0.6	12.00	20.82
TOTAL					40.57

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	ITEM	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UNID.	KG



CALLE 43F ENTRE CARRERA 28 Y CARRERA 27F

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 - K0+060					
FLEJES	0.25	19.00	0.25	12.00	19.75
VARILLA LONGITUDINAL 3/8	2.80	2.00	0.6	12.00	20.82
TOTAL					40.57

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	ITEM	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UNID.	KG



CALLE 43F ENTRE CARRERA 27F Y CARRERA 27D

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 - K0+060					
FLEJES	0.25	19.00	0.25	12.00	19.75
VARILLA LONGITUDINAL 3/8	2.80	2.00	0.6	12.00	20.82
TOTAL					40.57

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	ITEM	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UNID.	KG



CALLE 63F ENTRE CARRERA 17D Y CARRERA 17B

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
KD+000 - KD+060					
FLEJES	0.25	19.00	0.25	12.00	19.75
VARILLA LONGITUDINAL 3/8	2.80	2.00	0.56	12.00	20.82
TOTAL					40.57

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	ITEM	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UNID.	KG





CARRERA 17A ENTRE CALLE 61 Y CALLE 60A

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
KD+000 - KD+110					
FLEJES	0.25	38.00	0.25	22.00	39.38
VARILLA LONGITUDINAL 3/8	5.60	2.00	0.56	22.00	70.99
TOTAL					110.37

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

ACTIVIDAD	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	ITEM	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UNID.	KG





CARRERA 17B ENTRE CALLE 61 Y CALLE 60

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+110					
FLEJES	0.25	19.00	0.25	21.00	20.31
VARILLA LONGITUDINAL 3/8	2.80	2.00	0.56	21.00	34.93
			TOTAL		55.24
			TOTAL		368.44

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	15	MM	12	AA	2022	CORTE N°	3	CONSORCIO GAMER SOACHA
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA								
INTERVENTOR	COCOSERING SAS						NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N° 025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA						NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N° 024 DE 2022

ACTIVIDAD	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	ITEM	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	UNID.	M3





CRA 28 ENTRE CALLE 56A A CALLE 59

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+120					
CONSTRUCCION DE MUROS	1.80	0.20	0.45	1.00	0.16
TOTAL					0.16

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	ITEM	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	UNID.	M3





CALLE 50 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 31 ESTE

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+040					
CONSTRUCCION DE MURO 1 E	4.50	0.60	0.2	1.00	0.54
CONSTRUCCION DE MURO 2 E	2.90	0.60	0.2	1.00	0.35
CONSTRUCCION DE MURO 3 E	3.20	0.60	0.2	1.00	0.38
CONSTRUCCION DE MURO 4 E	3.55	0.70	0.2	1.00	0.50
TOTAL					1.77
TOTAL					1.93

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de Interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD 15	MM 12	AA 2022	CORTE N°	3	CONSORCIO GAMER SOACHA	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA						
INTERVENTOR	CDCOSERING SAS			NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA			NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	ITEM	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	UNID.	m2





CRA 28 ENTRE CALLE 56A A CALLE 59

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+00 A K0+0120	111.00	0.90	-	1.00	99.90
				TOTAL	99.90

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	ITEM	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	UNID.	m2







CALLE 48 ENTRE CARRERA 32A Y CARRERA 31

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056	54.00	0.90	-	1.00	48.60
Se decuenta area por adoquin de comunidad					- 6.48
				TOTAL	42.12

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

ACTIVIDAD	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	ITEM	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	UNID.	m2





CALLE 53 ENTRE CARRERA 30 ESTE Y CARRERA 29 ESTE

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 - K0+040 CENTRO DE VIA	34.80	0.90	-	1.00	31.32
				TOTAL	31.32

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	ITEM	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	UNID.	m2





CARRERA 17 ENTRECALLE 60 Y CALLE 61

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 - K0+126	122.00	0.90	-	1.00	109.80
				TOTAL	109.80

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

ACTIVIDAD	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	ITEM	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM.	UNID.	m2





CARRERA 17 A ENTRE CALLE 61 Y CALLE 60A

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 - K0+110	104.40	0.90	-	2.00	187.92
			TOTAL		187.92

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	ITEM	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UNID.	#¡REF!



CARRERA 17 B ENTRE CALLE 61 Y CALLE 60

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 - K0+110	104.40	0.90	-	1.00	93.96
			TOTAL		93.96
			TOTAL		365.02

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de Interventoría:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	15	MM	12	AA	2022	CORTE N°	3	CONSORCIO GAMER SOACHA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	ITEM	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	UNID.	M2



CALLE 37F ENTRE CARRERA 43D Y CARRERA 44

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+110 ANCHO PROMEDIO	129.00	4.55	-	-	587.43
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
			TOTAL		587.43

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	ITEM	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	UNID.	M2



CARRERA 28 ENTRE CALLE 43F

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+110 ANCHO PROMEDIO	25.70	2.56	-	-	65.79
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
			TOTAL		65.79

OBSERVACIONES:

F24

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	ITEM	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	UNID.	M2





CALLE 43C ENTRE CARRERA 27F Y CARRERA 27D

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
KD+000 A KD+110					
ANCHO PROMEDIO	25.00	2.07	-	-	51.69
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
				TOTAL	51.69

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	ITEM	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	UNID.	M2



CALLE 43D CRA 27 ESTE Y CRA 27D ESTE

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
KD+000 A KD+110					
ANCHO PROMEDIO	34.70	3.50	-	-	121.45
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
				TOTAL	121.45

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	ITEM	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	UNID.	M2





CARRERA 17A ENTRE CALLE 61 Y CALLE 60A

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+110					
ANCHO PROMEDIO	107.00	6.05	-	-	647.84
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					647.84

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	ITEM	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	UNID.	M2



CARRERA 17B ESTE ENTRE CALLE 60A Y CALLE 61

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ANCHO PROMEDIO	95.00	3.01	-	-	286.09
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					286.09

OBSERVACIONES:

F24

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	ITEM	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	UNID.	M2





CRA 24B ESTE ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ANCHO PROMEDIO	55.84	3.55	-	-	198.19
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
			TOTAL		198.19

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	ITEM	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	UNID.	M2



CRA 26A ESTE ENTRE CALLE 58B Y CALLE 59

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	148.40	3.50	-	-	519.40
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
			TOTAL		519.40

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	ITEM	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	UNID.	M2



CARRERA 26B ENTRE CALLE 56A Y CALLE 59

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	101.10	3.81	-	-	385.14
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					385.14

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	ITEM	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	UNID.	M2





CARRERA 26C ENTRE CALLE 53 Y CALLE 55

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	55.15	6.10	-	-	336.42
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
TOTAL					336.42

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	ITEM	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	UNID.	M2



CARRERA 27D ENTRE CALLE 43D Y CALLE 43F

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	27.30	4.02	-	-	109.68
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
				TOTAL	109.68

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	ITEM	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	UNID.	M2



CARRERA 27D ENTRE CALLE 43F Y CALLE 44

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
ALTO Y ANCHO PROMEDIO	28.48	4.02	-	-	114.42
MEDIDA TOTAL DADA POR CARTERA DE TOPOGRAFÍA					
				TOTAL	114.42
				TOTAL	3,423.53

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de interventoría:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	15	MM	12	AA	2022	CORTE N°	3	CONSORCIO GAMER SOACHA
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA								
INTERVENTOR	COCOSERING SAS					NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA					NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	ITEM	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	UNID.	KG



CALLE 48 ENTRE CARRETA 30 Y CARRERA 31E

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+060					
REFUERZO CUNETA	26.00	0.30	4.30	2.00	67.13
REFUERZO CUNETA	6.30	0.30	4.30	2.00	16.27
TOTAL					83.39

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	ITEM	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	UNID.	KG



CARRERA 30 ENTRE CALLES 48 Y CALLE 44

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+060					
REFUERZO CUNETA	62.20	0.50	4.30	1.00	133.82
REFUERZO CUNETA	62.20	0.30	4.30	1.00	80.29
TOTAL					214.12

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	ITEM	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	UNID.	KG



CARRERA 30 CON CALLE 43F (CAMPAMENTO)

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+060					
REFUERZO PLACA HUELLA	56.35	0.90	4.30	2.00	436.45
REFUERZO CUNETAS	58.40	0.35	4.30	2.00	175.91
TOTAL					612.36

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	ITEM	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	UNID.	KG



CALLE 43F ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+060					
REFUERZO PLACA HUELLA	55.10	0.90	4.30	2.00	426.77
REFUERZO CUNETA	55.10	0.35	4.30	2.00	165.97
TOTAL					592.74

OBSERVACIONES:

324

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

ACTIVIDAD	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	ITEM	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	UNID.	KG



CALLE 43F ENTRE CARRERA 28 Y CARRERA 27F

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+060					
REFUERZO PLACA HUELLA	55.10	0.90	4.30	2.00	426.77
REFUERZO CUNETA	55.10	0.35	4.30	2.00	165.97
TOTAL					592.74

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	ITEM	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	UNID.	KG



CALLE 43F ENTRE CARRERA 27F Y CARRERA 27D

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+060					
REFUERZO PLACA HUELLA	55.10	0.90	4.30	2.00	426.77
REFUERZO CUNETA	55.10	0.35	4.30	2.00	165.97
TOTAL					592.74

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	ITEM	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	UNID.	KG



CALLE 43F ENTRE CARRERA 27D Y CARRERA 27B

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
KD+000 A KD+060					
REFUERZO PLACA HUELLA	55.10	0.90	4.30	2.00	426.77
REFUERZO CUNETA	55.10	0.35	4.30	2.00	165.97
TOTAL					592.74

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	ITEM	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	UNID.	KG





CARRERA 17 ESTRE ENTRE CALLE 60 Y CALLE 61

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
KD+000 A KD+060					
REFUERZO CUNETA	126.00	0.25	4.30	2.00	271.09
REFUERZO CARGUE POZO	2.36	2.80	4.30	1.00	28.43
REFUERZO CARGUE POZO	2.72	2.72	4.30	1.00	31.84
REFUERZO CARGUE POZO	2.82	2.05	4.30	1.00	24.88
REFUERZO CARGUE POZO	1.90	3.40	4.30	1.00	27.80
TOTAL					384.03

OBSERVACIONES:

F29

193

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	ITEM	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	UNID.	KG





CARRERA 17 ESTRE ENTRE CALLE

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+060					
REFUERZO PLACA HUELLA	104.40	0.90	4.30	4.00	1,617.24
REFUERZO CUNETA	104.40	0.25	4.30	2.00	224.62
TOTAL					1,841.86

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	ITEM	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	UNID.	KG




CARRERA 17A ESTRE ENTRE CALLE 61 Y CALLE 60A

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+060					
REFUERZO PLACA HUELLA	104.40	0.90	4.30	4.00	1,617.24
REFUERZO CUNETA	104.40	0.25	4.30	2.00	224.62
TOTAL					1,841.86

OBSERVACIONES:

324

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	ITEM	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e=15 cm	UNID.	KG





CARRERA 17B ENTRE ENTRE CALLE 61 Y CALLE 60

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
KO+000 A KO+060					
REFUERZO PLACA HUELLA	104.40	0.90	4.30	2.00	808.62
REFUERZO CUNETA	104.40	0.25	4.30	2.00	224.62
			TOTAL		1,033.24
			TOTAL		8,381.80

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD 15	MM 12	AA 2022	CORTE N°	3	CONSORCIO GAMER SOACHA	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA						
INTERVENTOR	COCOSERING SAS			NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA			NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	ITEM	MORTERO 1:4	UNID.	M3





CRA 28 ENTRE CALLE 56A A CALLE 59

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+00 A K0+0120					
MORTETO DE PEGA	111.00	0.94	0.04	1.00	4.17
SELLO CON MORTETO	111.00	0.94	0.04	1.00	4.17
			TOTAL		8.35

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	ITEM	MORTERO 1:4	UNID.	M3




CALLE 50 ENTRE CARRERA 32A Y CARRERA 31

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+042					
MORTERO DE PEGA	40.80	0.94	0.040	1.00	1.53
MORTETERO DE SELLADO	40.80	0.94	0.040	1.00	1.53
			TOTAL		3.07

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	ITEM	MORTERO 1:4	UNID.	M3





CALLE 48 ENTRE CARRERA 32A Y CARRERA 31

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056					
MORTERO DE PEGA	54.00	0.94	0.040	1.00	2.03
MORTERO DE SELLADO	54.00	0.94	0.040	1.00	2.03
TOTAL					4.06

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	ITEM	MORTERO 1:4	UNID.	M3





CALLE 53 ENTRE CARRERA 30 ESTE Y CARRERA 29 ESTE

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+040					
MORTERO	34.80	0.94	0.040	1.00	1.31
SELLO DE MORTERO	34.80	0.94	0.040	1.00	1.31
TOTAL					2.62

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	ITEM	MORTERO 1:4	UNID.	M3





CARRERA 30 ENTRE CALLE 48 Y CALLE 53

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+060					
MORTERO DE PEGA	56.35	0.90	0.040	1.00	2.03
MORTERO PARA SELLADO	56.35	0.90	0.040	1.00	2.03
			TOTAL		4.06

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	ITEM	MORTERO 1:4	UNID.	M3







CALLE 48 ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 31 ESTE

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+060					
MORTERO DE PEGA	25.00	0.90	0.060	1.00	1.35
MORTETO DE SELLADO	25.00	0.90	0.040	1.00	0.90
			TOTAL		2.25

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	ITEM	MORTERO 1:4	UNID.	M3



CARRERA 30 ENTRE CALLE 48 Y CALLE 44

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+060					
MORTERO DE PEGA	56.40	3.70	0.040	1.00	8.35
TOTAL					8.35

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	ITEM	MORTERO 1:4	UNID.	M3



CARRERA30 CON CALLE 43F (CAMPAMENTO)

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+060					
TRAMO 1					
MORTERO DE PEGA	56.35	0.90	0.04	1.00	2.03
MORTETO DE SELLADO	56.35	0.90	0.04	1.00	2.03
TRAMO 2					
MORTERO DE PEGA	56.35	1.00	0.04	1.00	2.25
MORTETO DE SELLADO	56.35	1.00	0.04	1.00	2.25
TOTAL					8.57

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	ITEM	MORTERO 1:4	UNID.	M3



CALLE 43F ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
KD+000 A KD+060					
MORTERO DE PEGA	55.10	0.90	0.04	1.00	1.98
MORTETO DE SELLADO	55.10	0.90	0.04	1.00	1.98
TOTAL					3.97

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	ITEM	MORTERO 1:4	UNID.	M3



CALLE 43F ENTRE CARRERA 28 Y CARRERA 27F

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
KD+000 A KD+060					
MORTERO DE PEGA	55.10	0.90	0.04	1.00	1.98
MORTETO DE SELLADO	55.10	0.90	0.04	1.00	1.98
TOTAL					3.97

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	ITEM	MORTERO 1:4	UNID.	M3



CALLE 43F ENTRE CARRERA 27F Y CARRERA 27D

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+060					
MORTERO DE PEGA	55.10	0.90	0.04	1.00	1.98
MORTETO DE SELLADO	55.10	0.90	0.04	1.00	1.98
			TOTAL		3.97

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	ITEM	MORTERO 1:4	UNID.	M3



CALLE 43F ENTRE CARRERA 27D Y CARRERA 27B

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+060					
MORTERO DE PEGA	55.10	0.90	0.04	1.00	1.98
MORTETO DE SELLADO	55.10	0.90	0.04	1.00	1.98
			TOTAL		3.97

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	ITEM	MORTERO 1:4	UNID.	M3



CARRERA 17 ENTRECALLE 60 Y CALLE 61

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+126					
MORTERO DE PEGA	122.00	0.90	0.040	1.00	4.39
MORTETO DE SELLADO	122.00	0.90	0.040	1.00	4.39
			TOTAL		8.78

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	ITEM	MORTERO 1:4	UNID.	M3



CARRERA 17 A ENTRE CALLE 61 Y CALLE 60A

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+110					
MORTERO DE PEGA	104.40	0.90	0.040	2.00	7.52
MORTETO DE SELLADO	104.40	0.90	0.040	2.00	7.52
			TOTAL		15.03

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	ITEM	MORTERO 1:4	UNID.	M3



CARRERA 17 B ENTRE CALLE 61 Y CALLE 60

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+110					
MORTERO DE PEGA	104.40	0.90	0.040	1.00	3.76
MORTETO DE SELLADO	104.40	0.90	0.040	1.00	3.76
TOTAL					7.52

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	ITEM	MORTERO 1:4	UNID.	M3



CRA 26A ESTE ENTRE CALLE 56B Y CALLE 59

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+110					
MORTERO DE PEGA	148.40	2.60	0.040	1.00	15.43
MORTETO DE SELLADO	148.40	2.60	0.040	1.00	15.43
TOTAL					30.87

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	ITEM	MORTERO 1:4	UNID.	M3



CARRERA 26B ENTRE CALLE 56A Y CALLE 59

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
KD+000 - KD+110					
MORTERO DE PEGA	101.10	2.90	0.040	1.00	11.73
MORTETO DE SELLADO	101.10	2.90	0.040	1.00	11.73
			TOTAL		23.46

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	MORTERO 1:4	ITEM	MORTERO 1:4	UNID.	M3



CARRERA 26C ENTRE CALLE 53 Y CALLE 55

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
KD+000 - KD+110					
MORTERO DE PEGA	55.15	5.20	0.040	1.00	11.47
MORTETO DE SELLADO	55.15	5.20	0.040	1.00	11.47
			TOTAL		22.94
			TOTAL		165.78

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de Interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	15	MM	12	AA	2022	CORTE N°	3	CONSORCIO GAMER SOACHA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	ITEM	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UNID.	UN





CALLE 48 ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 31 ESTE

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 A K0+060 INSTALACION DE BORDILLO	18.00	0.80	-	22.50	22.50
TOTAL					22.50

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	ITEM	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UNID.	UN







CALLE 53 ENRE CARRERA 30E Y CARRERA 29

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 A K0+060 INSTALACION DE BORDILLO	10.00	0.80	-	12.50	12.50
TOTAL					12.50

OBSERVACIONES:

324

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	ITEM	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UNID.	UN



CARRERA 30 ENTRE CALLE 48 Y CALLE 44

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 - K0+060					
INSTALACIÓN BORDILLO	13.50	0.80	-	16.875	16.88
			TOTAL		16.88

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	ITEM	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UNID.	UN



CARRERA30 CON CALLE 43F (CAMPAMENTO)

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 - K0+060					
INSTALACIÓN BORDILLO	15.75	0.80	-	19.69	19.69
			TOTAL		19.69

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	ITEM	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UNID.	UN



CALLE 43F ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+060	36.00	0.80	-	45.00	45.00
			TOTAL		45.00

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	ITEM	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UNID.	UN



CALLE 43F ENTRE CARRERA 28 Y CARRERA 27F

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+060	10.50	0.80	-	13.13	13.13
			TOTAL		13.13

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	ITEM	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UNID.	UN



CALLE 43F ENTRE CARRERA 27F Y CARRERA 27D

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 A K0+060	14.50	0.80	-	18.13	18.13
TOTAL					18.13

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	ITEM	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UNID.	UN



CALLE 43F ENTRE CARRERA 27D Y CARRERA 27B

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 A K0+060	14.80	0.80	-	18.50	18.50
TOTAL					18.50

OBSERVACIONES:

EA

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	ITEM	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UNID.	UN






CARRERA 17 ENTRE CALLES 60 Y 61

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 A K0+060					
	8.50	0.80	-	10.63	10.63
				TOTAL	10.63

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	ITEM	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UNID.	UN



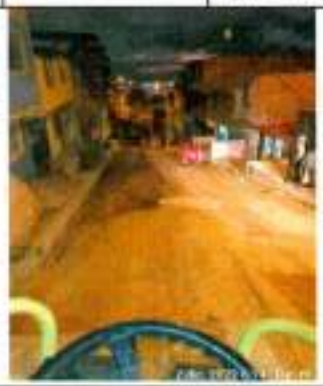

CARRERA 17 A ENTRE CALLE 61 Y CALLE 60A

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 - K0+110					
	6.00	0.80	-	7.50	7.50
				TOTAL	7.50

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	ITEM	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UNID.	UN



CARRERA 30 ENTRE CALLE 53 Y CALLE 58

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
KD+000 - KD+110					
	3.80	0.80	-	4.75	4.75
				TOTAL	4.75

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	ITEM	Suministro e instalación de Bordillo de confinamiento prefabricado en concreto de b=20cm, h=35cm (A-80).	UNID.	UN



VIA EUGENIO DIAS

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
KD+000 - KD+110					
	400.00	0.80	-	500.00	500.00
				TOTAL	500.00
				TOTAL	689.19

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: NILTON RIVERA

Firma de interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD 15	MM 12	AA 2022	CORTE N°	3	CONSORCIO GAMER SOACHA	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA						
INTERVENTOR	COCOSERING SAS			NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA			NIT O C.C.	901.587.364-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	REPARACION ACOMETIDA	ITEM	REPARACION ACOMETIDA	UNID.	UN



CARRERA 10 ENTRE CALLE 48 Y CALLE 53

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+060 ACOMETIDAS REPARADAS	-	-	-	1.00	1.00
			TOTAL		1.00

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	REPARACION ACOMETIDA	ITEM	REPARACION ACOMETIDA	UNID.	UN





CALLE 43F ENTRE CARRERA 27D Y CARRERA 27B

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+060	-	-	-	8.00	8.00
			TOTAL		8.00

OBSERVACIONES:

217

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

ACTIVIDAD	REPARACION ACOMETIDA	ITEM	REPARACION ACOMETIDA	UNID.	UN



CARRERA 27F ENTRE CALLE 43D Y CALLE 44

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 A K0+060					
	-	-	-	7.00	7.00
				TOTAL	7.00

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	REPARACION ACOMETIDA	ITEM	REPARACION ACOMETIDA	UNID.	UN



CALLE 43C ENTRE CARRERA 27F ESTE Y CARRERA 27D

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 A K0+060					
	-	-	-	7.00	7.00
				TOTAL	7.00

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

ACTIVIDAD	REPARACION ACOMETIDA	ITEM	REPARACION ACOMETIDA	UNID.	UN



CALLE 430 ENTRE CARRERA 27 Y CARRERA 270

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 A K0+060	-	-	-	7.00	7.00
				TOTAL	7.00

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	REPARACION ACOMETIDA	ITEM	REPARACION ACOMETIDA	UNID.	UN





CARRERA 17 ENTRE CALLES 60 Y 61

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 A K0+060	-	-	-	4.00	4.00
				TOTAL	4.00

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	REPARACIÓN ACOMETIDA	ITEM	REPARACION ACOMETIDA	UNID.	UN





CARRERA 17 A ENTRE CALLE 61 Y CALLE 60A

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+110	-	-	-	16.00	16.00
			TOTAL		16.00

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	REPARACION ACOMETIDA	ITEM	REPARACION ACOMETIDA	UNID.	UN




CRA 24 ESTE ENTRE CALLE 59 Y CALLE 58

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+110	-	-	-	7.00	7.00
			TOTAL		7.00

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

ACTIVIDAD	REPARACION ACOMETIDA	ITEM	REPARACION ACOMETIDA	UNID.	UN





CARRERA 248 ESTE ENTRE 59-58

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+0XX	-	-	-	8.00	8.00
			TOTAL		8.00

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	REPARACION ACOMETIDA	ITEM	REPARACION ACOMETIDA	UNID.	UN







CRA 248 ESTE ENTRE CALLE 57 Y CALLE 58

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+056	-	-	-	16.00	16.00
			TOTAL		16.00
			TOTAL		81.00

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: NILTON RIVERA

Firma de Interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

FECHA	DD	15	MM	12	AA	2022	CORTE N°	3	CONSORCIO GAMER SOACHA
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA								
INTERVENTOR	COCOSERING SAS						NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N° 025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA						NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N° 024 DE 2022

ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	ITEM	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UNID.	UN



CALLE 50 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 31

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
KD+000 A KD+050					
NIVELACION DE POZO	-	-	-	1.00	1.00
			TOTAL		1.00

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	ITEM	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UNID.	UN





CALLE 48 ENTRE CARRERA 32A Y CARRERA 31

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
KD+000 A KD+050					
CAJA CENTRAL CRA 32	-	-	-	1.00	1.00
EMPALME TERMINACION 31E	-	-	-	1.00	1.00
			TOTAL		2.00

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	ITEM	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UNID.	UN



CALLE 53 ENTRE CARRERA 30 E Y CARRERA 29

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
KD+000 A KD+050	-	-	-	1.00	1.00
TOTAL					1.00

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	ITEM	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UNID.	UN





CARRERA 30 ENTRE CALLE 48 Y CALLE 53

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
KD+000 A KD+060 NIVELACIÓN DE POZO	-	-	-	2.00	2.00
TOTAL					2.00

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.7M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	ITEM	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.7M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UNID.	UN



CARRERA 27F ENTRE CALLE 43D Y CALLE 44

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
KD+000 A KD+060					
NIVELACIÓN DE POZO	-	-	-	3.00	3.00

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	ITEM	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UNID.	UN



CALLE 430 ENTRE CARRERA 27 Y CARRERA 270

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 A K0+060					
NIVELACIÓN DE POZO	-	-	-	3.00	3.00

ONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.7M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	ITEM	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.7M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UNID.	UN



CARRERA 17 A ENTRE CALLE 61 Y CALLE 60A

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 - K0+110					
NIVELACIÓN DE POZO	-	-	-	3.00	3.00
				TOTAL	3.00

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.7M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	ITEM	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.7M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UNID.	UN



CRA 14 ESTE ENTRE CALLE 59 Y CALLE 58

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 - K0+110					
NIVELACIÓN DE POZO	-	-	-	3.00	3.00
				TOTAL	3.00

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	ITEM	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UNID.	UN



CALLE 43F ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 - K0+110					
NIVELACIÓN DE POZO	-	-	-	3.00	3.00
				TOTAL	3.00

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	ITEM	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.7M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UNID.	UN



CARRERA 24B ESTE ENTRE 59-58

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 A K0+0XX					
	-	-	-	3.00	3.00
				TOTAL	3.00

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

ACTIVIDAD	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.7M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	ITEM	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.7M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UNID.	UN



CRA 248 ESTE ENTRE CALLE 57 Y CALLE 58

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 - K0+056	-	-	-	3.00	3.00
			TOTAL		3.00
			TOTAL		33.00

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de Interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	15	MM	12	AA	2022	CORTE N°	3	CONSORCIO GAMER SOACHA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	ITEM	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	UNID.	M3



CALLE 50 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 31

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+042					
RIOSTRAS DE PAÑOS PLACA HUE	2.70	0.15	0.25	8.00	0.81
TOTAL					0.81

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	ITEM	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	UNID.	M3



CARRERA 30 ENTRE CALLE 48 Y CALLE 53

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+060					
RIOSTRAS DE PAÑOS PLACA HUE	2.70	0.15	0.250	11.00	1.11
TOTAL					1.11

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	ITEM	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	UNID.	M3



CARRERA 30 CON CALLE 43F (CAMPAMENTO)

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 - K0+060					
RIOSTRAS DE PAÑOS PLACA HUE	2.80	0.15	0.25	12.00	1.26
TOTAL					1.26

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	ITEM	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	UNID.	M3



CALLE 43F ENTRE CARRERA 30 - CARRERA 28

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 - K0+060					
RIOSTRAS DE PAÑOS PLACA HUE	2.80	0.15	0.25	12.00	1.26
TOTAL					1.26

OBSERVACIONES:

- 324

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	ITEM	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	UNID.	M3



CALLE 43F ENTRE CARRERA 28 Y CARRERA 27F

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+060					
RIOSTRAS DE PAÑOS PLACA HUE	2.80	0.15	0.25	12.00	1.26
TOTAL					1.26

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	ITEM	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	UNID.	M3



CALLE 43F ENTRE CARRERA 27F Y CARRERA 27D

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+060					
RIOSTRAS DE PAÑOS PLACA HUE	2.70	0.15	0.25	12.00	1.22
TOTAL					1.22

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	ITEM	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	UNID.	M3



CALLE 43F ENTRE CARRERA 27D Y CARRERA 27B

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+060					
RIOSTRAS DE PAÑOS PLACA HUE	2.80	0.15	0.25	12.00	1.26
TOTAL					1.26

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	ITEM	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	UNID.	M3





CARRERA 17A ENTRE CALLE 61 Y CALLE 60A

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+110					
RIOSTRAS DE PAÑOS PLACA HUE	5.60	0.15	0.25	22.00	4.62
TOTAL					4.62

OBSERVACIONES:

F24

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	ITEM	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	UNID.	M3



CARRERA 17B ENTRE CALLE 61 Y CALLE 60

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+110					
RIOSTRAS DE PAÑOS PLACA HUE	2.80	0.15	0.25	22.00	2.31
				TOTAL	2.31

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	ITEM	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 15*25 CMS CONCRETO 3000 PSI	UNID.	M3



CALLE 48 ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA31 ESTE

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+110					
VIGA AJUSTE FINAL	2.00	1.00	0.15	1.00	0.30
				TOTAL	0.30
				TOTAL	15.41

OBSERVACIONES:

Firma: Director de obra:

Nombre: MILTON RIVERA

Firma de Interventoria:

NOMBRE: EDGAR URIBE

CONSORCIO GAMER SOACHA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD 15 MM 12 AA 2022	CORTE N°	3	CONSORCIO GAMER SOACHA	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA				
INTERVENTOR	COCOSERING SAS	NIT O C.C.	900.104.779-0	CONTRATO N°	025 DE 20222
CONTRATISTA	CONSORGIO GAMER SOACHA	NIT O C.C.	901.587.366-8	CONTRATO N°	024 DE 2022

ACTIVIDAD	INSTALACION DE ADOQUIN EN ARCILLA DE 20*10*6CM NO INCLUYE MORTERO DE PEGA	ITEM	INSTALACION DE ADOQUIN EN ARCILLA DE 20*10*6CM NO INCLUYE MORTERO DE PEGA	UNID.	M2





CALLE 50 ENTRE CARRERA 32A Y CARRERA 31

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+042	40.80	0.90	-	1.00	36.72
TOTAL					36.72

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	INSTALACION DE ADOQUIN EN ARCILLA DE 20*10*6CM NO INCLUYE MORTERO DE PEGA	ITEM	INSTALACION DE ADOQUIN EN ARCILLA DE 20*10*6CM NO INCLUYE MORTERO DE PEGA	UNID.	M2





CARRERA30 ENTRE CALLE 48 Y CALLE 53

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 - K0+060	56.35	0.90	-	1.00	50.72
EMPALME CENTRAL 48 - 44 POZ	2.30	0.90	0.150	1.00	0.31
TOTAL					51.03

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

ACTIVIDAD	INSTALACION DE ADOQUIN EN ARCILLA DE 20*10*6CM NO INCLUYE MORTERO DE PEGA	ITEM	INSTALACION DE ADOQUIN EN ARCILLA DE 20*10*6CM NO INCLUYE MORTERO DE PEGA	UNID.	M2



CARRERA 30 CON CALLE 43F (CAMPAMENTO)

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+060					
TRAMO1	56.35	0.90	-	1.00	50.72
TRAMO 2	56.35	1.00	-	1.00	56.35
			TOTAL		107.07

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	INSTALACION DE ADOQUIN EN ARCILLA DE 20*10*6CM NO INCLUYE MORTERO DE PEGA	ITEM	INSTALACION DE ADOQUIN EN ARCILLA DE 20*10*6CM NO INCLUYE MORTERO DE PEGA	UNID.	M2



CALLE 43F ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28

OBSERVACIONES	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
K0+000 A K0+060	55.10	0.90	-	1.00	49.59
			TOTAL		49.59

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

ACTIVIDAD	INSTALACION DE ADOQUIN EN ARCILLA DE 20*10*6CM NO INCLUYE MORTERO DE PEGA	ITEM	INSTALACION DE ADOQUIN EN ARCILLA DE 20*10*6CM NO INCLUYE MORTERO DE PEGA	UNID.	M2



CALLE 43F ENTRE CARRERA 28 Y CARRERA 27F

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 A K0+060	55.10	0.90	-	1.00	49.59
TOTAL					49.59

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD	INSTALACION DE ADOQUIN EN ARCILLA DE 20*10*6CM NO INCLUYE MORTERO DE PEGA	ITEM	INSTALACION DE ADOQUIN EN ARCILLA DE 20*10*6CM NO INCLUYE MORTERO DE PEGA	UNID.	M2



CALLE 43F ENTRE CARRERA 27F Y CARRERA 27D

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
K0+000 A K0+060	55.10	0.90	-	1.00	49.59
TOTAL					49.59

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GAMER SOACHA	MEMORIA DE CÁLCULO	

ACTIVIDAD	INSTALACION DE ADOQUIN EN ARCILLA DE 20*10*6CM NO INCLUYE MORTERO DE PEGA	ITEM	INSTALACION DE ADOQUIN EN ARCILLA DE 20*10*6CM NO INCLUYE MORTERO DE PEGA	UNID.	M2



CALLE 41F ENTRE CARRERA 27D Y CARRERA 27B

OBSERVACIONES	Dimensiones			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
KO+000 A KO+060					
	55.10	0.90	-	1.00	49.59

CONTRATO	UBICACIÓN OBRA	N°de RECIBO	METROS ³
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	11945	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	39516	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	39514	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	39545	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	39541	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	39542	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	11950	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2023	Comuna 4 Soacha	39548	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2024	Comuna 4 Soacha	11948	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2023	Comuna 4 Soacha	11947	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2024	Comuna 4 Soacha	11949	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2023	Comuna 4 Soacha	39549	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	39543	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2023	Comuna 4 Soacha	39550	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2024	Comuna 4 Soacha	39544	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	11946	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	1648	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	1643	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	1644	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	1645	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	1646	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	39540	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	12631	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	12628	15

Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	12629	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	12630	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	1647	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	1101	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	1102	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	39545	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	12632	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7378	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7379	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	12633	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	12634	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8201	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8202	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	12635	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8203	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8204	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8205	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8208	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8212	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8211	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8210	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8213	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8214	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8246	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8209	15

Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	12637	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8215	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8216	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7380	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8220	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8219	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8218	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8217	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8248	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8247	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8249	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8206	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	82207	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8250	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8251	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	1103	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	1104	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	1105	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8252	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	82253	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8254	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8255	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8256	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8257	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8258	7

Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8259	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8260	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8261	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8262	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8263	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8264	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8265	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8266	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8267	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8268	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8269	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8270	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8271	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8272	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8273	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8274	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8275	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8276	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8277	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8278	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8279	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8280	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8281	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8282	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8283	7

Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8284	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8285	7
			1163
		M/K	15
			17445

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisos Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2018

FECHA

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08261

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisos Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2018

FECHA

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08260

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alpica, Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

CEL.: 321 206 0710
TEL.: 721 1555

REMISIÓN EF 09257

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	M3
PLACA VEHICULO	
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08254

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

M3

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08256

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL

PLACA VEHICULO

M3

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08253

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	M3
PLACA VEHICULO	
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08255

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	M3
PLACA VEHICULO	
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

FUNDACION SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO
NIT. 900.877.671-0
Proyecto de aplicación y Recuperación de Suelos
Resolución CAR DGEN No 20207109963 de 18 SEPT.2020

CONTRATISTA

Nº B 1105

VOLQUETA SENCILLA

Placa No. KYO 773

Fecha 6 12 22

Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
semillerosdeempredimiento@gmail.com

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Africo Residuos Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA 5 12 22

CEL.: 321 206 0710
TEL.: 721 1555

REMISIÓN EF 08252

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Comercio Grupo Syscar
OBRA	Francisco
DIRECCION	Soacha
MATERIAL	Francisco
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	Duco
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición

743

FUNDACION SEMILLER
DE EMPRENDIMIENT
de Emprendimiento
NIT 900877871-6
Proyecto de educación a
Restauración de Suelos
Resolución CAR DGEN No 20207100963 de 18 SE

CONTRATISTA

Nº **B** 1103

VOLQUETA SENCILLA

Placa No. BAK 59

Fecha 06 12 2

Celular: 313 352 6600 - 31387712
3106135580
usemillerosdeempredimiento@gmail.

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Secretaría Municipal de Medio Ambiente
Alcaldía Municipal de Soacha
21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA 6 12 22

REMISIÓN EF 08251

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion

FUNDACION SEMILLEROS
DE EMPRENDIMIENTO
de Emprendimiento
NIT 900877871-6
Proyecto de educación a
Restauración de Suelos
Resolución CAR DGEN No 20207100963 de 18 SEPT.2020

CONTRATISTA

Nº **B** 1104

VOLQUETA SENCILLA

Placa No. KYO 773

Fecha 6 12 22

Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
usemillerosdeempredimiento@gmail.com

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Secretaría Municipal de Medio Ambiente
Alcaldía Municipal de Soacha
21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA 6 12 22

REMISIÓN EF 08250

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición
Final de Escombros

Escombrera Municipal
El Alico. Resolución
Alcaldía Municipal de
Soacha 1202 del
21 de Diciembre de 2016

FECHA
D | M | A

ORDEN CLIENTE No.

CEL.: 321 206 0710
TEL.: 721 1555

REMISIÓN EF 08207

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion
Final de Escombros

245

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alico. Resolución Alcaldía Municipal de Suaita 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08249

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	M3
PLACA VEHICULO	
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alico. Resolución Alcaldía Municipal de Suaita 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08206

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	M3
PLACA VEHICULO	
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición
Final de Escombros

Escombrera Municipal
El Alisos Resolución
Alcaldía Municipal de
Soacha 1202 del
21 de Diciembre de 2016

FECHA

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08248

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición
Final de Escombros

Escombrera Municipal
El Alisos Resolución
Alcaldía Municipal de
Soacha 1202 del
21 de Diciembre de 2016

FECHA

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08247

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

FECHA

CEL.: 321 206 0710
TEL.: 721 1555

REMISIÓN EF 08218

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

FECHA

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08217

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición

248

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisos, Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2018

FECHA 02 10 13

CEL.: 321 206 0710
TEL.: 721 1555

REMISIÓN EF 08219

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Bodega 7

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA 02 12

CEL.: 321 206 0710
TEL.: 721 1555

REMISIÓN EF 07380

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIÓ

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA 4

CEL.: 321 206 0710
TEL.: 721 1555

REMISIÓN EF 08220

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIÓ

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

FUNDACION SEMILLEROS
Fundición Semilleros
de Emprendimiento
NIT 900.877.674-0
RE
olución CAR DGEN No 20207100363 del 15 SEPT 2020

CONTRATISTA

Nº D12637

QUETA SOBLE ROQUE

Placa No. VNG792

Fecha 02 12 2021

lar: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
illerosdeemprendimiento@gmail.com

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alto, Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL.: 721 1555

REMISIÓN EF 08215

FECHA 02 12 21

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	Cordoba cra 7022
DIRECCION	Carrera 4 Soacha
MATERIAL	Excavacion
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alto, Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL.: 721 1555

REMISIÓN EF 08216

FECHA 02 12 21

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	Cordoba cra 7022
DIRECCION	Carrera 4 Soacha
MATERIAL	Excavacion
PLACA VEHICULO	
CONDUCTOR	M3
DESPACHADO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alcaparro Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 23 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL.: 721 1555

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN EF 08209

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Operador

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alhelí, Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08214

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	M3
PLACA VEHICULO	
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alhelí, Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08246

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	M3
PLACA VEHICULO	
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alpico Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08210

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alpico Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA

CEL.: 321 206 0710
TEL.: 721 1555

REMISIÓN EF 08213

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisos, Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1292 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA 01 12 22

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08212

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	M3
PLACA VEHICULO	
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisos, Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1292 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA 01 12 22

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08211

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	M3
PLACA VEHICULO	
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticó, Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08208

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticó, Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA

CEL.: 321 206 0710
TEL.: 721 1555

REMISIÓN EF 08205

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alto de Bendición Alcaldía Municipal de Soacha 2202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA: 29 | 11 | 22

REMISIÓN: EF 08203

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio Canaan Soacha
OBRA	Contrato 024-2022
DIRECCION	Soacha
MATERIAL	Excavados
PLACA VEHICULO	WYO713 — 8 M3
CONDUCTOR	Hector
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alto de Bendición Alcaldía Municipal de Soacha 2202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA: 29 | 11 | 22

REMISIÓN: EF 08204

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio Canaan Soacha
OBRA	Contrato 024-2022
DIRECCION	Soacha
MATERIAL	Excavados
PLACA VEHICULO	WSC-292 — 8 M3
CONDUCTOR	Hernando
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisos, Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08201

FECHA 28 | 11 | 22

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio Green Soacha
OBRA	Contrato 024-2022
DIRECCION	Soacha
MATERIAL	Excavacion
PLACA VEHICULO	WGZ 292 — 11 M3
CONDUCTOR	Hernan
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisos, Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08202

FECHA 28 | 11 | 22

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio Green Soacha
OBRA	Contrato 024-2022
DIRECCION	Soacha
MATERIAL	Excavacion
PLACA VEHICULO	WGZ 292 — 11 M3
CONDUCTOR	Hernan
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

FUNDACION SEMILLEROS de Emprendimiento
NIT 901127661-0
Resolución CAR DGEN No 2020TT1309(3 de 18 SEPT 2020)

CONTRATISTA
Nº D12635

Placa No. WGZ 292
Fecha 28 | 11 | 2022

VOLQUETA DOBLE TROQUE

Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
usemillerosdeemprendimiento@gmail.com



CONTRATISTA

Nº D12634

VOLQUETA DOBLE TROQUE

Placa No. WGT 292

Fecha 26 | 11 | 2022

Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
usemillerosdeemprendimiento@gmail.com

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisco. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA 24 | 11 | 22

CEL.: 321 206 0710
TEL.: 721 1555

REMISIÓN EF 07378

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio Cuarta Soacha
OBRA	Cuarta 028-2022
DIRECCION	Soacha
MATERIAL	Escombro / Suelo
PLACA VEHICULO	EHB 199 / 2 M3
CONDUCTOR	Pinino
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposicion Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisco. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA 24 | 11 | 22

CEL.: 321 206 0710
TEL.: 721 1555

REMISIÓN EF 07379

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio Cuarta Soacha
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	Suelo
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

CONTRATISTA
Nº D12633

Placa No. WJG 292

Fecha 25 | 11 | 2022

VOLQUETA DOBLE TROQUE

Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
usemilleros@emprendimiento@gmail.com

760

FUNDACION SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO
NIT. 900.877.671-5
Proyecto de adecuación y restauración de suelos
Resolución CAR DGEN No 20207100963 de 18 SEPT.2020

CONTRATISTA

Nº B 1102

VOLQUETA SENCILLA

Placa No. BAK 599

Fecha 24 / 11 / 2022

Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
fusemillerosdeempredimiento@gmail.com

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal "El Alcaraván" Resolución Ambiental Modificada No. 1202 del 23 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN Nº 39545

FECHA 24 / 11 / 22

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

FUNDACION SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO
Fundación Semilleros de Emprendimiento
NIT. 900.877.671-5
Proyecto de adecuación y restauración de suelos
Resolución CAR DGEN No 20207100963 de 18 SEPT.2020

CONTRATISTA

Nº D12632

VOLQUETA DOBLE TROQUE

Placa No. WGT 292

Fecha 22 / 11 / 2022

Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
fusemillerosdeempredimiento@gmail.com

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Carretera Municipal El Abrón Rondinación Alcaldía Municipal de Sopetrán 2020-2023 21 de Diciembre de 2019

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA 21 | 11 | 22

REMISIÓN Nº 39546

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

FUNDACION SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO
Fundación Semilleros de Emprendimiento
NIT. 900.877.671 - 0
Proyecto de adecuación y Restauración de Suelos
Resolución CAR DGEN No 20207100963 de 18 SEPT.2020

CONTRATISTA
Nº D12631
VOLQUETA DOBLE TROQUE
Placa No. WGT 292
Fecha 23 | 11 | 2022
Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
fusemillerosdeempredimiento@gmail.com

ayer

FUNDACION SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO
Fundación Semilleros de Emprendimiento
NIT. 900.877.671 - 0
Proyecto de adecuación y Restauración de Suelos
Resolución CAR DGEN No 20207100963 de 18 SEPT.2020

CONTRATISTA
Nº D12628
VOLQUETA DOBLE TROQUE
Placa No. WG2 292
Fecha 22 | 11 | 22
Celular: 313 352 6600 - 3138771274

FUNDACION SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO
Fundación Semilleros de Emprendimiento
NIT. 900.877.671 - 0
Proyecto de adecuación y Restauración de Suelos
Resolución CAR DGEN No 20207100963 de 18 SEPT.2020

CONTRATISTA
Nº D12629
VOLQUETA DOBLE TROQUE
Placa No. WG2 292
Fecha 23 | 11 | 22
Celular: 313 352 6600 - 3138771274

FUNDACION SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO
Fundación Semilleros de Emprendimiento
NIT. 900.877.671 - 0
Proyecto de adecuación y Restauración de Suelos
Resolución CAR DGEN No 20207100963 de 18 SEPT.2020

CONTRATISTA
Nº D12630
VOLQUETA DOBLE TROQUE
Placa No. WGT 292
Fecha 23 | 11 | 2022
Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
fusemillerosdeempredimiento@gmail.com

FUNDACION SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO
Fundación Semilleros de Emprendimiento
NIT. 900.877.671 - 0
Proyecto de adecuación y Restauración de Suelos
Resolución CAR DGEN No 20207100963 de 18 SEPT.2020

CONTRATISTA
Nº B 1647
VOLQUETA SENCILLA
Placa No. BAK 599
Fecha 22 | 11 | 22
Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
fusemillerosdeempredimiento@gmail.com

FUNDACION SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO
Fundación Semilleros de Emprendimiento
NIT. 900.877.671 - 0
Proyecto de adecuación y Restauración de Suelos
Resolución CAR DGEN No 20207100963 de 18 SEPT.2020

CONTRATISTA
Nº B 1101
VOLQUETA SENCILLA
Placa No. BAK 599
Fecha 23 | 11 | 22
Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
fusemillerosdeempredimiento@gmail.com

262

FUNDACION SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO
NIT. 900.877.671 - 0
Proyecto de adecuación y Restauración de Suelos
Resolución CAR DGEN No 20207100963 de 18 SEPT.2020

CONTRATISTA

Nº D 11946

VOLQUETA DOBLE TROQUE — Placa No. VW6Z292 — Fecha 21 / 11 / 22

Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
fusemillerosdeempredimiento@gmail.com

FUNDACION SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO
NIT. 900.877.671 - 0
Proyecto de adecuación y Restauración de Suelos
Resolución CAR DGEN No 20207100963 de 18 SEPT.2020

CONTRATISTA

Nº B 1648

VOLQUETA SENCILLA — Placa No. BAK 399 — Fecha 21 / 11 / 22

Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
fusemillerosdeempredimiento@gmail.com

FUNDACION SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO
NIT. 900.877.671 - 0
Proyecto de adecuación y Restauración de Suelos
Resolución CAR DGEN No 20207100963 de 18 SEPT.2020

CONTRATISTA

Nº B 1643

VOLQUETA SENCILLA — Placa No. WGZ 292 — Fecha 21 / 11 / 2022

Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
fusemillerosdeempredimiento@gmail.com

FUNDACION SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO
NIT. 900.877.671 - 0
Proyecto de adecuación y Restauración de Suelos
Resolución CAR DGEN No 20207100963 de 18 SEPT.2020

CONTRATISTA

Nº B 1644

VOLQUETA SENCILLA — Placa No. WGZ292 — Fecha 21 / 11 / 2022

Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
fusemillerosdeempredimiento@gmail.com

FUNDACION SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO
NIT. 900.877.671 - 0
Proyecto de adecuación y Restauración de Suelos
Resolución CAR DGEN No 20207100963 de 18 SEPT.2020

CONTRATISTA

Nº B 1645

VOLQUETA SENCILLA — Placa No. WGZ 292 — Fecha 21 / 11 / 22

Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
fusemillerosdeempredimiento@gmail.com

FUNDACION SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO
NIT. 900.877.671 - 0
Proyecto de adecuación y Restauración de Suelos
Resolución CAR DGEN No 20207100963 de 18 SEPT.2020

CONTRATISTA

Nº B 1646

VOLQUETA SENCILLA — Placa No. WGZ 292 — Fecha 21 / 11 / 22

Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
fusemillerosdeempredimiento@gmail.com

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alpes, Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 31 de Diciembre de 2010

FECHA

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN Nº 39550

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL M3

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alpes, Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 31 de Diciembre de 2010

FECHA

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN Nº 39544

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL M3

PLACA VEHICULO

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alto. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN Nº 39549

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE		
OBRA		
DIRECCION		
MATERIAL		
PLACA VEHICULO		M3
CONDUCTOR		
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alto. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA 15 11 22

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN Nº 39543

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE		
OBRA		
DIRECCION	SOACHA	
MATERIAL		
PLACA VEHICULO		M3 15
CONDUCTOR		
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición	

FUNDACION SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO

Fundación Semilleros de Emprendimiento
NIT 900.877.671 - 0

Resolución CAR DGEN No 20207100963 de 18 SEPT.2020

CONTRATISTA

Nº D11948

VOLQUETA DOBLE TROQUE	Placa No. WGZ 292
	Fecha 16 | 11 | 2022

Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
fusemillerosdeemprendimiento@gmail.com

FUNDACION SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO

Fundación Semilleros de Emprendimiento
NIT 900.877.671 - 0

Resolución CAR DGEN No 20207100963 de 18 SEPT.2020

CONTRATISTA

Nº D11947

VOLQUETA DOBLE TROQUE	Placa No. WGZ 292
	Fecha 16 | 11 | 2022

Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
fusemillerosdeemprendimiento@gmail.com

FUNDACION SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO

Fundación Semilleros de Emprendimiento
NIT 900.877.671 - 0

Resolución CAR DGEN No 20207100963 de 18 SEPT.2020

CONTRATISTA

Nº D11949

VOLQUETA DOBLE TROQUE	Placa No. WGZ 292
	Fecha 17 | 11 | 22

Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
fusemillerosdeemprendimiento@gmail.com

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisos Resolución Alcaldía Municipal de Sasaima y 2017 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL.: 721 1555

REMISIÓN Nº 39548

FECHA 11 11 22

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Mayorga Correa Jhonna		
OBRA	Contrato 024-2022		
DIRECCION	Sasaima		
MATERIAL	Excavacion / Escombro	7	M3
PLACA VEHICULO	BAK 599		
CONDUCTOR	Aimeno.		
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR S.A.S. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros		

FUNDACION SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO

Fundación Semilleros de Emprendimiento

NIT 900.877.671-0

RL 618105

Resolución [illegible] 15 SEPT 2020

CONTRATISTA

Nº D11950

VOLQUETA DOBLE TROQUE

Placa No. WGZ 292

Fecha 11 11 22

Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
fusemillerosdeemprendimiento@gmail.com

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion Final de Escombros

Escombrera Municipal El Africo. Resolución Ambiental No. Nacional de Sucha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA 10/11/22

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN Nº 39542

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Fanuel Eafit Garcia

OBRA Orlando 024-2022

DIRECCION Eafit

MATERIAL Excavacion 15 M3

PLACA VEHICULO U62787

CONDUCTOR Hicelio

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal
El Alisal- Resolución
Alcaldía Municipal de
Soacha (200 del
21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN Nº 39547

FECHA 9 11 22

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE CONSORCIO CONEX SOACHA
OBRA CONTRATO 024-2022
DIRECCION SOACHA
MATERIAL EXCAVACION / SUELO
PLACA VEHICULO BAK 579 M3 8
CONDUCTOR ALBERTO.

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion Final de Escombros

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal
El Alisal- Resolución
Alcaldía Municipal de
Soacha (200 del
21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN Nº 39541

FECHA 9 11 22

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE CONSORCIO CONEX SOACHA
OBRA CONTRATO 024-2022
DIRECCION SOACHA
MATERIAL EXCAVACION
PLACA VEHICULO WKZ292 M3 15
CONDUCTOR HUMBERTO

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion Final de Escombros

FUNDACION SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO
Fundición Semilleros de Emprendimiento
NIT 900.877.671-0
RECIBIDO

CONTRATISTA

Nº D11945

VOLQUETA DOBLE TROQUE

Placa No. W67 292

Fecha 08 11 22

Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
fusemillerosdeemprendimiento@gmail.com

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Secretaría Municipal El Alfiler, Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA 08 11 22

CEL.: 321 206 0710
TEL.: 721 1555

REMISIÓN Nº 39516

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

---

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Secretaría Municipal El Alfiler, Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA 08 11 22

CEL.: 321 206 0710
TEL.: 721 1555

REMISIÓN Nº 39514

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

"CONSTRUCCIÓN DE LA VIA SOACHA SIBATE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA "

SOACHA | EL CAMBIO AVANZA XUA

CONSORCIO GAMER SOACHA

INFORME MENSUAL TÉCNICO N° 03
DEL 13 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE DE 2022

CUADRO DE CONTROL REVISIONES

ÀREA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
		Técnica	Interventoría
Cargo	Arq. Área técnica	Director de Obra	Director de Interventoría
Nombre	Arq. Nubia Rivera	Ing. Milton Rivera	Ing. Edgar Uribe
Firma			

CONTROL DE MODIFICACIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
00		Versión inicial
		Versión final

294

TABLA DE CONTENIDO

CUADRO DE CONTROL REVISIONES 1
1. INFORMACIÓN DE CONTRATO DE OBRA 4
1.1. CONTRATO DE OBRA No. 024-2022... 4
1.2 GENERALIDADES 5
2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 5
2.1 LOCALIZACIÓN 5
3. POLIZAS DEL CONTRATO 6
4.CAPITULO FINANCIERO 8
4. DISEÑOS 8
6. ACTIVIDADES REALIZADAS 9
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO 11
8. ESTADO DEL CLIMA 17
9. ACTAS DE COMITÉ 17
10. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 18
11. CONCLUSIONES 19

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Polizas anteriores 6
Tabla 1. Polizas actuales .....
Tabla 2. Avance de obra mensual 8
Tabla 3. Estado del clima 17
Tabla 4. Comités 18
Tabla 5. Correspondencia enviada 18

273

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 .Localizacion 6
Ilustración 2.Diseño vias documento adjunto 9

LISTA DE ANEXOS

- Actas de comité.
- Correspondencia.
- Ensayos de laboratorio.
- Certificados de calidad.

274

1. INFORMACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

1.1. CONTRATO DE OBRA No. 024-2022

Objeto del Contrato	: **CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA".**
Localización de La Obra	: Soacha- Cundinamarca Cazuca – Comuna 4
Plazo de Ejecución	: Seis (6) meses.
Valor Total del Contrato	: $ 4.506.567.808,67
Contratista	: Consorcio Gamer Soacha
Interventor	: Cocosering sas
Supervisor	Ing. Juan Pablo Cañon

275

1.2 GENERALIDADES

Teniendo en cuenta el objeto del contrato de obra 024 del 4 de Mayo de 2022 que es " **CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA".**" donde se describen la ejecución de las actividades de rehabilitación del proyecto a ejecutar, estas actividades se determinan mediante la evaluación del estado actual de la vía a intervenir, basados en los diagnósticos y diseños tales como diseño entregas por epuxua y supervisor alcaldía

.

En el presente Informe Técnico Mensual No 03, durante al periodo comprendido entre 13 Noviembre al 15 Diciembre de 2022, se resume la Información del contrato, la Información general del proyecto (la localización y descripción de las obras), las actividades ejecutadas en el mes por el CONSORCIO GAMER SOACHA , el personal, el equipo, el control de calidad, los diseños y certificados de calidad de los materiales, las cantidades y costos de obra ejecutada, y el avance físico y financiero del contrato de obra.


2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN

El área en el que se desarrollara el **CONTRATO DE OBRA No 024-2022**, ejecutado por el **CONSORCIO GAMER SOACHA** que tiene por objeto "**CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA"..** El proyecto se encuentra localizado en el Municipio Soacha que es el municipio más poblado del departamento de Cundinamarca en Colombia. Su área es de 184 km² (kilómetros cuadrados), y su población es de 660 179 (2018).2 Su área urbana está conurbada con la del Distrito Capital de Bogotá, siendo parte de su área metropolitana. Es la capital de la Provincia de Soacha, de la que solo forman parte dos municipios: Soacha y Sibaté.

276

Ilustración 1.Localización

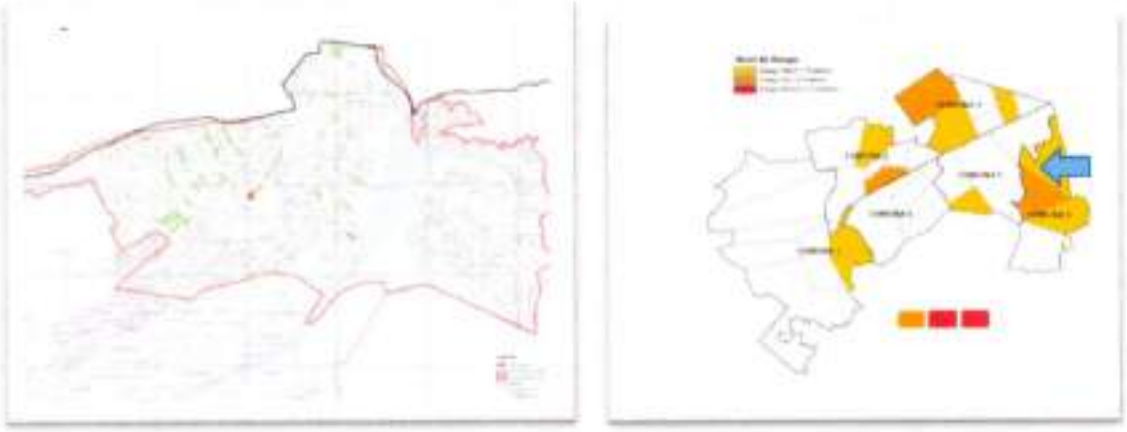

CAZUCA COMUNA 4.

BARRIO SANTO DOMINGO

Fuente: Google

3. POLIZAS DEL CONTRATO

A la fecha se realizaron las siguientes modificaciones de pólizas del contrato, esta modificación se realiza por motivo del cambio de los integrantes del CONSORCIO GAMER SOACHA , y el porcentaje de participación como se muestra en la tabla 3, estas son aprobadas por la interventoria y la Alcaldia Municipal de Soacha Cundinamarca.

Tabla 1. Pólizas anteriores

Anexo 0 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$901.313.579,73	02/05/2022	02/11/2022
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$901.313.579,73	02/05/2022	02/11/2022

277

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatalco	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	$2.703.940.739,2	02/05/2022	02/11/2027
	Cumplimiento del contrato		$901.313.579,73	02/05/2022	02/05/2023
Coberturas	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$450.656.789,87	02/05/2022	02/11/2025
	Estabilidad de la obra.		$1.351.970.369,60	02/11/2022	02/11/2027

Anexo 2 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	$2.703.940.739,2	01/08/2022	02/02/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$901.313.579,73	01/08/2022	01/08/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$450.656.789,87	01/08/2022	01/02/2026
	Estabilidad de la obra.		$1.351.970.369,60	01/02/2023	02/11/2028

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

278

4. CAPITULO FINANCIERO

El valor del cntrato es CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE SENTAVOS (4.506.567.898,67) MCTE INCLUIDO IVA , COSTOS , GASTOS Y DEMAS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN CON OCASIÓN DE LA CELEBRACION EJECUCION Y LIQUIDACIONB DEL CONTRATO .

Tabla 2. Avance de obra mensual

Mes	Fecha	Programado Acumulado	Ejecucion Acumulado	Financiero Programado	Financiero Ejecutado	Valor por ejecutar
1	Agosto	0	0			$ 4.506.567.898,67
2	Septiembre	$ 649.376.068	649.376.068		$ 649.376.068	$3.857.191.830.67
3	Octubre	0				
4	Noviembre	$727.213.483	1.376.589.555		$727.213.483	$3.129.978.347.67
5	Diciembre	$1.003.532.471	2.380.122.022		$1.003.532.471	$2.126.445.876.67
6	Enero					

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

5. DISEÑOS

El CONTRATO DE OBRA No 024 de 2022 , ejecutado por el CONSORCIO GAMER SOACHA que tiene por objeto " **CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA".**, estos fueron entregados por la supervisión de la alcaldía

279

CARRERA 30 ESTE CON 43F
CALLE 43 F ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28
CALLE 43F ENTRE CARRERA 28 Y CARRERA 27 F
CALLE 43F ENTRE CARRERA 27F CARRERA27D
CALLE 43F ENTRE CALLES 27 D Y CALLES 28B
CARRERA 28 ENTRE CALLE 43F
cra 27 F ENTRE 43 Y 44
CALLE 43 C ENTRE CARRERA 27F ESTE Y CARRERA 27D
CALLE 43D ENTRE CARRERA 27 Y CARRERA 27D
CARRERA 27D ENTRE CALLES 43D Y CALLE 43F
CARRERA 27D ENTRE CALLES 44 Y CALLE 43F
CARRERA 17A ENTRE CALLE 61 Y CALLE 60
CARERA 17B ENTRE CALLE 61 Y CALLE 60
CARRERA 26B ENTRE CALLE 59 Y CALLE 56A
CARRRA 24B ESTE ENTRE CALLE 61 Y CALLE 59
CARRRA 24B ESTE ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59
CARRERA 26C ESTE ENTRE CALLES 53A Y CALLE 55
CARRERA 26 A ESTE ENTRE CALELE 56B Y CALLE 59
CARRERA 26B ESTE ENTRE CALLE 56A Y CALLE 59

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

Ilustración 2.Diseño vias Santo Domingo y tipo escaleras

Estos diseños fueron entregados por la supervisión del cotrato por parte de la Alcaldia de Soacha y aprobación Epuxua Empresa Contratante .

6. CTIVIDADES REALIZADAS

Durante el periodo del presente informe se realizó las siguientes actividades constructivas:

- Localizacion y replanteo elementos de presión

280

- Excavaciones varias, manuales , en roca y conglomerados de acuerdo con la tipología de las vias entregadas Galan y Galan 2.
- Mejoramiento de Subrasantes
- Suministro e instalación de Sub base granulas SBG 1
- Compactacion de sub base .
- Se realizo la instalación bordillo
- Se realiza la nivela cion de pozos
- Se realiza reparaciones de acometidas
- Suministro e instalación de mallas , aceros para placa huellas
- Suministro e instalación concreto 3000 PSI
- Transporte de materiales
- Instalación de adoquin
- Instalación mortero
- Cunetas
- Viguetas de confimaniento
- Muros en conglomerado

783

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Demolicion de placa



Excavaciones Manuales en Material Comun

282



Excavacion Manual en Conglomerado



Excavacion Manual en Roca



Subbase granula SBG1



Mejoramiento de Subrasante involucrando suelo existente



Concreto clase D F c−3000 psi

284



Suministro, figurado y armado de acero figurado 60000 PSI



Cuneta de concreto clase E 2500 psi fundida en lugar



Concreto de 2500 psi 40% de Rajon para elevaciones



Localizacion y Replanteo con elemento de precisión



Adoquin en arcilla de 20*10*6



Morteo 1:4



Suministro e Instalacion Bordilllo A 80



Refuerzo de malla electrosoldada



Reparacion de Acometidas



Nivelacion de Pozos Inspeccion



Viga de confinamiento de 15*25 cms concreto 3000 psi

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

8.ESTADO DEL CLIMA

A continuación, se relaciona el resumen del estado del clima para el periodo del 13 de Noviembre al 15 Diciembre de 2022.

Tabla 3. Estado del clima

Adjuntamos informe ideam

9.ACTAS DE COMITÉ

Durante el presente informe se realizó los siguientes comités:

Tabla 4. Comités

COMITÉ No,	FECHA
11	NOVIEMBRE 11/2022
12	NOVIEMBRE 18/202
13	DICIEMBRE 5/2022

10.CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Durante el presente informe se radico la siguiente correspondencia:

Tabla 5 Correspondencia Enviada

CONTRATO INT. NO 24-2022				
NO CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	ENTIDAD Y/O DIRIGIDO	ASUNTO	ENVIADO POR
CON-GAMER024-33/ 2022.	14-12-2022	COCOSERING SAS	ALTERNATIVA PARA LA CLE 50	CONSORCIO GAMER SOACHA
CON-GAMER024-32/2022.	14-12-2022	COCOSERING SAS	NP 17 FILTRO	CONSORCIO GAMER SOACHA
CON-GAMER024-31/2022	12-12-2022	COCOSERING SAS	NP 16 CINTAS AJUSTE	CONSORCIO GAMER SOACHA
CON-GAMER024-30/2022	9-12-2022	COCOSERING SAS	NP 15	CONSORCIO GAMER SOACHA
CON-GAMER024-29/2022	7-12-2022	COCOSERING SAS	SOLICITUD PRORROGA	CONSORCIO GAMER SOACHA

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

10.CONCLUSIONES

- Se realizo la excavación con la extracción de materiales en sitios definidos, siguiendo un especificaciones dada por supervisores , utilizando métodos y recursos, también previamente determinados.
- Se realizan ajustes en la topografía de la cra 30 CON 53 , EN LA 43F , EN LA CRA 48 ENTRE 32 Y 31 ,CA 50 ENTRE 32 Y 32 , CARER 17 ENTRE 61 por lo cual se hace necesario la renivelacion del terreno ,
- Se continua con instalación de adoquin en las vías tanto adoquin como placa huellas suministrado por la comunidad , con sus correspondines cunetas y viguetas .
- Se realizan muros ciclópeo en l cra 50 y 48 entre 32 y 31
- en la cra 44ª con 33b se realiza la construcción de una caja sumidero para la recolección de aguas de la vía de la 34 no se reeliza conexión ya que no cuenta con pozos de aguas luvias, la entidad realizara esta actividad con la comunidad,
- De acuerdo a la programación entrega 2 a la fecha tenemos un porcentaje de ejecución del 52.81% con relación al porcentaje programado del 25 %, lo cual indica que tenemos un 19 % menos de avance a la fecha con relación a lo programado.
- Se realizan cobre de excavación en las vías de la 48 y 50 entre ca 32 y 31 , teniendo encuenta la renivelacion y topografía en sus empalmes al igual que los accesos de las casa.
- En la cra 50 se realiza placa huella y cunetas hasta la abcisa 035 , ya que desde esta hasta la abcisa 00 teniendo en cuenta que en este tramo se debe realizar un muro en conglomerado el cual a la fecha no a sido aprobado por la supervisión
  El contratista deja en comité de obra la anotación que las lluvias pueden afectar la vivienda donde se debe construir haciendo salvedad que de llegar a suceder no es responsabilidad del Consorco Gamer Soacha, el cual esta a la espera de una respuesta de la entidad.

En la cra 24 entre 59-61 barrio galan 2, es neceeario la instalación de un filtro para evitar daños futuros en las obras a ejecutar , el NP esta pendiente aprobación.

se entregan NP de cintas de ajuste y NP componente social a la fecha aun no se han aprobado por la entidad

Aun no a sido aprobado por la entidad el NP referente a PMT vias

Se aprueba ejecución escalera de la cra 24b entre 56-59 galan 2 en bordillo, pasos adoquin y muros en ciclópeo

Se aprueba el relleno en rajon y sub base para estabilización de la via en la parte final de la cra 30 con 44 donde la comunidad esta ejecutando una caja de pozo y tubería.

Codigoestacion	Nombreestación	Categoria	Entidad	Departamento	Municipio	Fechainstalacion	Fechasuspension	Idtiposensor	Fitiposensor	Descripcionsensor	Frecuencia	Fecha	Valor
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	1/11/2022 0:00	0
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	2/11/2022 0:00	1.1
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	3/11/2022 0:00	0.5
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	4/11/2022 0:00	1.1
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	5/11/2022 0:00	0.5
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	6/11/2022 0:00	1.1
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	7/11/2022 0:00	1.1
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	8/11/2022 0:00	1.1
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	9/11/2022 0:00	1.1
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	10/11/2022 0:00	1.5
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	11/11/2022 0:00	0
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	12/11/2022 0:00	5.6
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	13/11/2022 0:00	1
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	14/11/2022 0:00	26.1
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	15/11/2022 0:00	8
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	16/11/2022 0:00	3
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	17/11/2022 0:00	17.4
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	18/11/2022 0:00	18
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	19/11/2022 0:00	2.2
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	20/11/2022 0:00	0
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	21/11/2022 0:00	8.5
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	22/11/2022 0:00	0
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	23/11/2022 0:00	0
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	24/11/2022 0:00	0
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	25/11/2022 0:00	2.5
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	26/11/2022 0:00	4.4
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	27/11/2022 0:00	4.5
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	28/11/2022 0:00	1
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	29/11/2022 0:00	7.2
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	30/11/2022 0:00	0
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	1/12/2022 0:00	0
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	2/12/2022 0:00	0
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	3/12/2022 0:00	0
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	4/12/2022 0:00	2.9
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	5/12/2022 0:00	0
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	6/12/2022 0:00	13.8
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	7/12/2022 0:00	0
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	8/12/2022 0:00	0
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	9/12/2022 0:00	0
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	10/12/2022 0:00	0
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	11/12/2022 0:00	0
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	12/12/2022 0:00	0
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	13/12/2022 0:00	11.7
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	14/12/2022 0:00	0
21205720	SAN JORGE GRANJA [21205720]	Climatica Ordinaria	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Cundinamarca	Soacha	15/04/1960 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DA-pluviometro Diario	Diaria	15/12/2022 0:00	0

ANEXOS

ACTAS DE COMITÉ

XUÁ	EPUEXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

LUGAR DE REUNIÓN: Epuexua	HORA DE INICIO: 8:00am.
FECHA: 17 NOV 2022	HORA DE TERMINACIÓN: 12:00
ELABORADO POR: Andrea Lobiano	NUMERO DE ACTA: 11

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
	Seguimiento y recorrido de obra.

AGENDA PROPUESTA	
1.	Recorrido de vías intervenidas.
2.	Seguimiento
3.	Temas varios
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se inicia comité en acompañamiento del secretario de infra. Ing Johan Vargas, el cual indica que debe darsele prioridad a las vías donde la comunidad cuenta con adoquin y alternadamente las asignadas en los recorridos por el supervisor y apoyo desde la secret de infraest.
- Se entregara a Epuexua la información referente a las cuadras que tienen entregado adoquin por el ordenador del gasto para poder incluirlas en el cronograma de ejecución.
- las cuadras a las que la S.I entrego material, la comunidad y la S.I es responsable de entregar al momento de la instalación, y en caso que

pro alcance o falte material la Alcaldía no será responsable, ni el contratista, ni epuexua, se debe aclarar a Epuexua quien complementara el suministro. toda vez que el material en algunos barrios es costeado por la comunidad.

- Referente a las tapas de los pozos serán suministradas por la administración y la instala el contratista de obra. previa identificación de la necesidad en contratista de obra emitira el requerimiento para trasladarlo "tapas y aro tapas y de carga".
- S.I hara entrega de posteriores a la verificación para identificar la conectividad entre las redes ejecutadas por epuexua. cll 33est entre cll 44 colindando puerta de oro Y se proyecta en placa huella e incluso actoquia. Centro en evaluación por S.I 1- para el proximo cambio se digite
- Durante el recorrido por las vias, puntualmente Casa loma CVITA 1B, el contratista de obra ya dio inicio a la demolición, sin embargo se evidencia el terreno saturado por lo que no es viable continuar. Se medio con la comunidad para poder construir el sistema incluyendo cunetas laterales. la comunidad ha hecho trabajos relacionados a manejo de aguas con los bajantes de cada vivienda.

XUÁ	EPUEXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:

PARTICIPANTES			
NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Antonio Leon Hernandez	Apoyo a la supervisión equipamiento	3124126360	
Juan Pablo Cañón	Epuxua	3124821154	
Sirley Cespedes	cocoserving SAS	3134699929	
Milton Pineda	Contratista	315 3967636	
Catherine Muñoz	Contratista	3219943913	
Andres Robiano	Epuxua	3103425601	
Nelson	Contratista	3102935197	
Blanca Oliva	social infraestructura	3144756938	Blanca Oliva

XUÁ
Empresa Pública de Soacha

INFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3443-2021

Soacha, Cundinamarca, 05 Julio de 2022

Ingenieros

JHON MARIO VARGAS RUIZ – Secretario de Infraestructura.

SIMÓN MEJÍA - Supervisor Contrato 3443-2021

Alcaldía Municipal de Soacha.

E. S. D.

ASUNTO: Rendición informe actividades visitas en cumplimiento al Contrato Interadministrativo N° 3443-2021.

Respetados Ingenieros:

En cumplimiento a lo sugerido por parte de la Secretaría de Infraestructura, en comité del pasado 10 de mayo de 2022; me permito remitir informe técnico, conforme a las visitas realizadas de manera conjunta con personal de la secretaría de infraestructura, y de lo cual se consolidó la información obtenida de las visitas tecnicas realizadas durante el mes de junio de 2022 en la comuna 4 del Municipio de Soacha Cundinamarca, así:

BARRIO VILLA MERCEDES 1:

- CRC 18 ENTRE CLL 48 C Y CLL 49
- CRA 24 ENTRE CLL 49 Y CLL 50
- CLL 48 C ENTRE CRA 17 B Y CRA 17 C
- CRA 19 ENTRE CLL 49 Y CLL 50
- CLL 48 B ENTRE CRA 19 Y CRA 21 A
- CRA 21 B ENTRE CLL 48 Y CLL 50

BARRIO LOMA LINDA: – Adoquin suministrado por S.I. 12.000 u

- Cll 49 entre Cra 19 y Cra 17 B
- Cll 50 entre Cra 19 y Cra 17 B

297

- CRA 23 ENTRE CLL 50 Y CLL 54
- CRA 19 ENTRE CLL 49 Y CLL 50
- CRA 22 A ENTRE CLL 50 Y CLL 54

BARIO CARLOS PIZARRO:

- Cra 21 A entre Cll 54 y Cll 56 A

BARRIO CASA LOMA:

- Cll 59 D entre Cra 21 A y Cll 60

BARRIO LUIS CARLOS GALAN 1 → Alcaldía entregado a la comunidad.

- Cra 24 B entre Cll 59 y Cll 60
- Cra 24 B entre Cll 59 y Cll 57
- CRA 26 ENTRE CLL 59 Y CLL 56 B
- CRA 26 C ENTRE CLL 53 Y CLL 55

2

BARRIO LUIS CARLOS GALAN 2

- CLL 43 F ENTRE CRA 30 Y CRA 27 B
- CLL 43 F/D ENTRE CRA 27
- CLL 48 CON CRA 31 Y CRA 32 A

BARRIO VILLA MERCEDES → Alcaldía suministrado por SI.

- CLL 56 B ENTRE CRA 24 A Y CRA 25
- CRA 25 ENTRE CLL 57 Y CLL 56

BARRIO MINUTO DE DIOS

- CRA 22 B ENTRE CLL 59 Y CLL 56 A

248

BARRIO EL PROGRESO

- CRA 26 B ENTRE CLL 38 Y CLL 40
- CRA 30A ENTRE CLL 40 A Y CLL 41
- CRA 28 A ENTRE CLL 40 A Y CLL 41

BARRIO VILLA SANDRA

- Cll 43 entre Cr 19 y Reserva Forestal

BARRIO EL OASIS

- CRA 35 CON CLL 42
- CRA 36 ENTRE CLL 42 Y 42 A
- CRA 39 ENTRE CLL 40 J
- Cra 39 entre Cll 42 y 42 A

BARRIO LOS ROBLES

- CRA 48 ENTRE CLL 41 Y CLL 42
- CRA 47 ENTRE CRA 41 Y 42
- CRA 49 CON CLL 41 Y CLL 42


BARIO ALTOS DEL PINO

- TRNSV 48 CON CALL 42ª

BARRIO SANTO DOMINGO

- CRA 32 A / CLL 53

UBICACIÓN VIAS A INTERVENIR

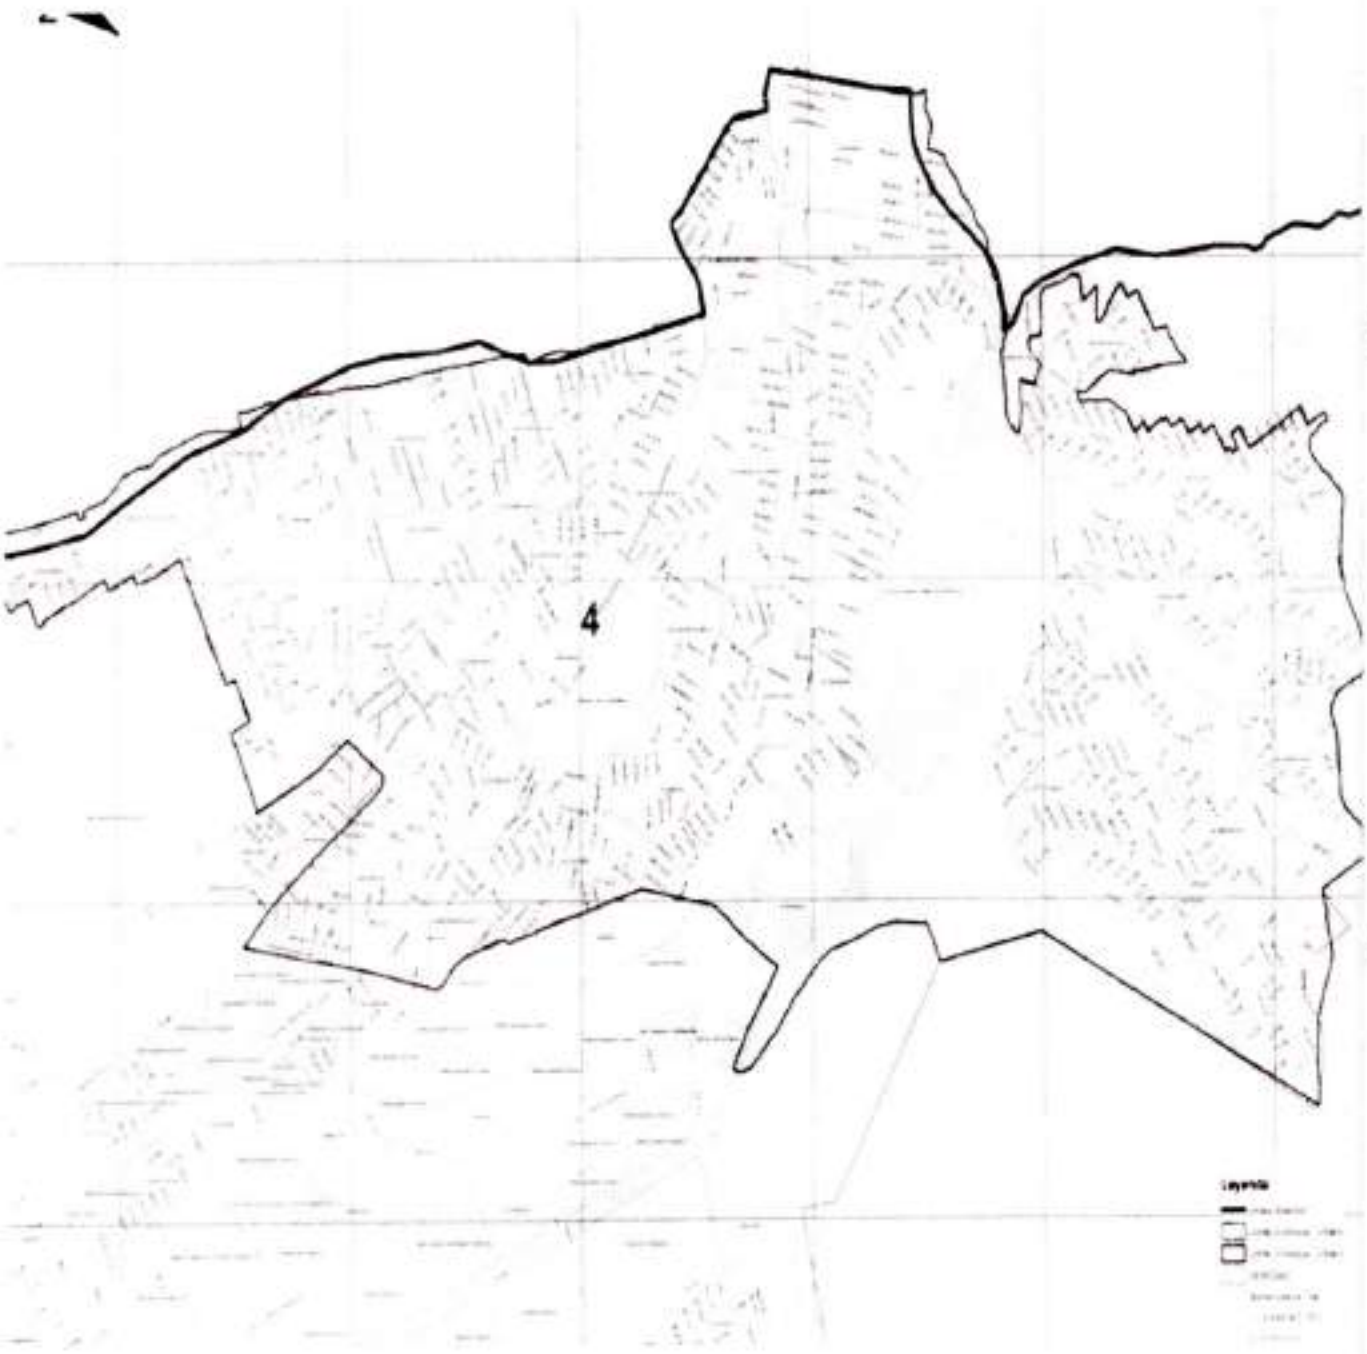

Calle 12 # 8A – 36 Soacha - Cundinamarca
epuxua@alcaldiasoacha.gov.co

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

LUGAR DE REUNIÓN: Epuxca	HORA DE INICIO: 8:20 am.
FECHA: 18 de Noviembre	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR: Residente Interventoria	NUMERO DE ACTA: 12

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	

AGENDA PROPUESTA	
1.	Verificación del Acta Anterior.
2.	Verificación del estado actual de la Obra.
3.	Cronograma.
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia el comite de obra con la verificación de los compromisos consignados en el acta anterior, se verifica el estado actual del contrato encontrandose en un 31% a la fecha, se requiere el aumento de personal para la entrega de vias del 25 de Noviembre el dia de hoy se realizara recorrido para verificar los muros necesarios en las vias.

Se realizara recorrido en las 4 vias nuevas, donde tiene la comunidad adoquin.

Se realizara el traslado de tapa para mejoramiento en las vias Villa Sandra) mercedes por solicitud de la secretaria de Infraestructura

Epuxua hace entrega de 60 cercas de vecindad, estas fueron entregadas por Secretaria de Infraestructura. Se entrega a la inventaria.

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:
Actualización del cronograma de obra incluyendo las vías nuevas entregadas por la entidad esta semana	Contratista de Obra	21 de Noviembre 2022.
Informes Mensuales del Contratista.	Contratista de Obra	25 de Noviembre 2022.
El día 25 se realizara la entrega de todas las vías del barrio Santo Domingo.	Contratista de Obra	25 de Noviembre 2022.

PARTICIPANTES			
NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Karen Cifuentes	Residente Interventoria	3145709036	
Arturo Lara H.	Ing Apoyo a la supervisión.	3124126320	
Andrea Rubiano	Epuxua	3103425621	
Nicolas Fuentes	Contratista	3102935197	
DIEGO URIBE	ASESORIAS INTERVENTORIA.	3108032525	
Juan Pablo Cano	Epuxua	3124821154	

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

LUGAR DE REUNIÓN: Epuxua	HORA DE INICIO: 7:52 am.
FECHA: 05 de Diciembre 2022.	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR: Interventoria	NUMERO DE ACTA: 13

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	

AGENDA PROPUESTA	
1.	Verificacion del Acta Anterior.
2.	Estado Actual de la Obra.
3.	
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se Inicia la reunión de comite con la verificacion del acta anterior y se validan los compromisos registrados que a la fecha no se han cumplido, se confirma con la intervención de la Arq. Nuda Rivera en representación del contratista donde pacta nuevas fechas de entrega a los pendientes, de la misma manera ella solicita la aprobación de los NP presentados (profesional Social, PMT y Cinta de reforzamiento de 3000 psi) a lo que la entidad responde que los dos primeros están muy costosos y deben nevelarsen y que el NP de Cintas sean presentados como concreto de 3000 PSI.

Se realizaría recorrido el dia 12 de diciembre para la entrega de las vias terminadas.

Se Solicita por parte del contratista e interventoria la entrega de topografia de las ultimas vias entregadas para hacer la valoracion de las normas. del barrio Luis Carlos Galan I.

En las Placa huellas a realizar se instalará el adoquin dorado por la alcaldía en las vias que cuenten con este suministro.

El Secretario de Infraestructura Presenta al nuevo supervisor del Contrato el Ing Alejandro Yate Por parte de la Secretaria de Infraestructura

El Ing Alejandro Solicita una presentación de parte del contratista de obra en los comites técnicos. para validar el avance semanal en la Obra y se Solicita comites con la comunidad para Socialización del Proyecto.
se Solicita educar tiempo a la comunidad para la entrega de las vias intervenidas Por la Comunidad.

Se realizará recorrido con el Ing Alejandro el dia miercoles 07 de diciembre para ver el estado actual de las vias.

Se realiza la devolución del Nº de cinta de confinamiento y se Solicita que se presentada en 2500 PSI.

Se realizará labor Social en la dll 50 entre Cra 30 A este y Cra 31. en donde la casa que Solicita muro de contención ya que la administración no cuenta con el recurso para la construcción de este muro. y se levantara un acta para dejar en conocimiento a la propietaria. en donde se aclarara que el Contratista no tiene responsabilidad.

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD:	**RESPONSABLE:**	**FECHA:**
Entrega del cronograma de Obra de parte del contratista.	Contratista de Obra.	05 de diciembre 2022.
Entrega de vias para el dia 12 de diciembre.	Contratista de obra, Contratistas de interventoria, epuxua e infraestructura	12 de diciembre 2022
Se cita al contratista la preparación en recorso de las vias en intervención	Contratista Obra.	12 de diciembre 2022

PARTICIPANTES			
NOMBRE	**DEPENDENCIA / ENTIDAD**	**TELÉFONO DE CONTACTO**	**FIRMA**
Jose Alberto Lora M.	Epuxua	3124126320	
Natalia Ruiz	Contratista	3102935197	
Stella Lospedes	Social Interv Accesorios SAS	3134699929	
Jorge Alejandro Yante	Equipamento	3139421556	
Christian Daza	Soc Interventor	3203403138	
Juan Pablo Cano	Epuxua	3124821154	
Andrea Rubiano	Epua	3103425601	
[illegible]	INTERVENTORIA COCOSERING	3108032525	

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Jovero Cifuentes Ronfel	Residente Interventoria	3105709035	

ENSAYOS DE LABORATORIO

309

Análisis de Materiales e Ingeniería Civil S.A.S.
Laboratorio de Suelos - Pavimentos - Concretos.
NIT – 900.260.478-8


COMPACTACION MODIFICADA	CODIGO
NORMA(S) APLICADA(S) : INV. E - 142	VERSION
	FECHA

PROYECTO : CONTRATO 024 2022
SECTOR : COMUNA 4
SITIO : CAZUCA SOACHA
SOLICITANTE: CONSORCIO GAMER SOACHA
DESCRIPCION: Grava limo arcillosa amarilla oscura
ORDEN TRABAJO: **434-135-01-2022**
ORDEN DE SERVICIO **129**
TIPO DE MATERIAL: SUBRASANTE

MUESTRA : 1
PROFUNDIDAD:
FECHA ENSAYO: *22-11-22*
FECHA ENTREGA: *28-11-22*

PRUEBA	1	2	3	4
No. de presiones	56	56	56	56
Molde No.	C-88	C-88	C-88	C-88
Peso de la muestra hum. (g.)	4163	4407	4623	4643
Peso de la muestra hum. y molde (g.)	7940	8184	8400	8420
Peso molde (g.)	3777	3777	3777	3777
Peso de la muestra hum. (g.)	4163	4407	4623	4643
Humedad de Compactación (%)	8,6	11,6	14,6	17,6
Peso de la muestra seca (g.)	3832	3949	4033	3948
Volumen del molde (cm^3)	2086	2086	2086	2086
Densidad muestra seca (g/cm^3)	**1,837**	**1,893**	**1,934**	**1,893**

CURVA DE PROCTOR

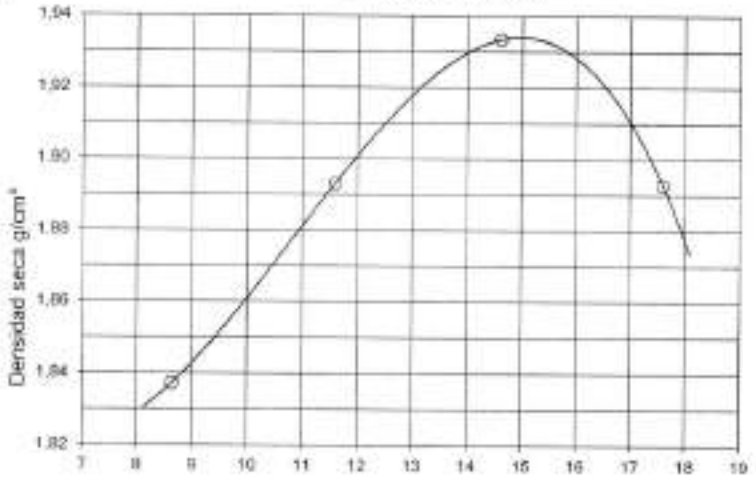

RESULTADOS

Dens. max.	**1,934** g/ cm³
Hum. óptima	**15,0** %
Lb/ft³	120,8
PESO MART.	10 lb
No CAPAS :	5
H. CAIDA:	18"
No GOLPES :	56
Metodo Compactacion:	C

Observaciones :

ELABORO	CESAR CORTES	REVISO	ANGEL CASTRO	APROBO	ANGEL CASTRO
CARGO	TECNICO LAB	CARGO	JEFE DE LAB	CARGO	JEFE DE LAB
FIRMA		FIRMA		FIRMA	

Análisis de Materiales e Ingeniería Civil S.A.S.
Laboratorio de Suelos - Pavimentos - Concretos
NIT - 900.700.470-8

DENSIDAD DE CAMPO METODO DEL CONO Y ARENA

NORMA(S) APLICADA(S) :

INV E - 161

ORDEN No.

434-135-01-2022

Página 1 de 1

PROYECTO: CONTRATO 024 2022

SITIO: CARRERA 17este

SOLICITANTE: CONSORCIO GAMER SOACHA

DESCRIPCION: Grava limo arcilloso amarillo

OSC: 129

TIPO: SUBBASE TIPO C

FECHA DE ENSAYO: 22-nov-22

FECHA ENTREGA: 23-nov-22

CAPA: ULTIMA

Densidad N°		1	2				
Capa		ULTIMA	ULTIMA				
Profundidad	m	0,15	0,15				
Abscisa		K0+005	K0+025				
Sector		SBG	SUBRASANTE				
Margen		EJE	EJE				
Peso frasco y arena inicial	gr	6186	6120				
Peso frasco y arena restante	gr	2770	2584				
Peso arena total usada	gr	3416	3536				
Constante del cono	gr	1592	1592				
Peso arena en el hueco	gr	1824	1944				
Densidad de la arena	gr/cm³	1,360	1,360				
Volumen del hueco	gr	1341	1429				
Peso material extraido húmedo	gr	3020	3069				
Humedad	%	8,2	14,0				
Peso material extraido seco	gr	2791	2692				
Densidad del material	gr/cm³	2,081	1,883				
Densidad max. laboratorio	gr/cm³	2,063	1,934				
Humedad óptima laboratorio	%	8,1	15,0				
Compactación en el terreno	%	**100,9**	**97,4**				
Compactación especificada	%	**95,0**	**95,0**				

OBSERVACIONES:

ELABORO	CESAR CORTES	REVISO	ANGEL CASTRO	APROBO	ANGEL CASTRO
CARGO	TECNICO LAB	CARGO	JEFE DE LAB	CARGO	JEFE DE LAB
FIRMA		FIRMA		FIRMA	

Análisis de Materiales e Ingeniería Civil S.A.S.
Laboratorio de Suelos - Pavimentos - Concretos.
NIT - 900.360.479 - 6

DENSIDAD DE CAMPO METODO DEL CONO Y ARENA

NORMA(S) APLICADA(S) :

INV. E - 161

ORDEN No.

434-135-01-2022

Página 1 de 1

PROYECTO: CONTRATO 024 2022
SITIO: CARRERA 30 ESTE
SOLICITANTE: CONSORCIO GAMER SOACHA
DESCRIPCION: Grava limo arcilloso amarillo

OSC: 129
TIPO: SUBBASE TIPO C
FECHA DE ENSAYO: 22-nov-22
FECHA ENTREGA: 23-nov-22
CAPA: ULTIMA

Densidad N°				3	4		
Capa				ULTIMA	ULTIMA		
Profundidad	m			0,15	0,15		
Abscisa				K0+010	K0+040		
Sector				SBG	SBG		
Margen				EJE	EJE		
Peso frasco y arena inicial	gr			6160	6105		
Peso frasco y arena restante	gr			2570	2582		
Peso arena total usada	gr			3590	3523		
Constante del cono	gr			1592	1592		
Peso arena en el hueco	gr			1998	1931		
Densidad de la arena	gr/cm³			1,360	1,360		
Volumen del hueco	gr			1469	1420		
Peso material extraido humedo	gr			3120	3190		
Humedad	%			8,1	8,2		
Peso material extraido seco	gr			2886	2948		
Densidad del material	gr/cm³			1,965	2,076		
Densidad max. laboratorio	gr/cm³			2,063	2,063		
Humedad optima laboratorio	%			8,1	8,1		
Compactación en el terreno	%			**95,2**	**100,7**		
Compactacion especificada	%			**95,0**	**95,0**		

OBSERVACIONES:

ELABORO	CESAR CORTES	REVISO	ANGEL CASTRO	APROBO	ANGEL CASTRO
CARGO	TECNICO LAB	CARGO	JEFE DE LAB	CARGO	JEFE DE LAB
FIRMA		FIRMA		FIRMA	

Análisis de Materiales e Ingeniería Civil S.A.S.
Laboratorio de Suelos - Pavimentos - Concretos
NIT - 900.360.470 -8

DENSIDAD DE CAMPO METODO DEL CONO Y ARENA

NORMA(S) APLICADA(S) :

INV. E - 161

ORDEN No.

434-135-01-2022

Página 1 de 1

PROYECTO: CONTRATO 024 2022

SITIO: CALLE 48 / CARRERA 30 ESTE

SOLICITANTE: CONSORCIO GAMER SOACHA

DESCRIPCION: Grava limo arcilloso amarillo

OSC: 129

TIPO: SUBBASE TIPO C

FECHA DE ENSAYO: 22-nov-22

FECHA ENTREGA: 23-nov-22

CAPA: ULTIMA

Densidad N°		5					
Capa		ULTIMA					
Profundidad	m	0,15					
Abscisa		KD+020					
Sector		SBG					
Margen		EJE					
Peso frasco y arena inicial	gr	6096					
Peso frasco y arena restante	gr	2552					
Peso arena total usada	gr	3544					
Constante del cono	gr	1592					
Peso arena en el hueco	gr	1952					
Densidad de la arena	gr/cm³	1,360					
Volumen del hueco	gr	1435					
Peso material extraido humedo	gr	3174					
Humedad	%	8,2					
Peso material extraido seco	gr	2933					
Densidad del material	gr/cm³	2,044					
Densidad max. laboratorio	gr/cm³	2,063					
Humedad optima laboratorio	%	8,1					
Compactacion en el terreno	%	99,1					
Compactacion especificada	%	95,0					

OBSERVACIONES:

ELABORO	CESAR CORTES	REVISO	ANGEL CASTRO	APROBO	ANGEL CASTRO
CARGO	TECNICO LAB	CARGO	JEFE DE LAB	CARGO	JEFE DE LAB
FIRMA		FIRMA		FIRMA	

CERTIFICADOS DE CALIDAD

314

TREMIX POLIMIX COLOMBIA

SC764-1

CONCRETO CONVENCIONAL BOMBEABLE RESISTENCIA A SULFATOS

Este concreto cuenta con una composición química y física especifica que disminuye o elimina el ataque o fisuración por sulfatos, incrementando la durabilidad de las estructuras.

Con una relación agua/cementante igual o inferior a 0,40.

USOS

- Tanques de almacenamiento de aguas residuales.
- Cimentaciones en contacto con aguas con altas cargas de sulfato (hasta 10.000 ppm expresado como SO4).
- Concretos especificados por la norma NSR-10 con la categoría de exposición de sulfatos S1 o S2.
- Estructuras en contacto con agua marina, como cimentaciones y plataformas de muelles.
- En suelos o terrenos con presencia de sulfatos o aguas subterráneas.

VENTAJAS

- Reducción de la permeabilidad de líquidos y gases, evitando el ingreso de sustancias nocivas al interior del concreto.
- Incremento de la vida útil de la estructura sometida al ataque químico.
- Debido a su diseño, contiene baja cantidad de elementos necesarios para las reacciones expansivas del sulfato.
- Acabado superior y viscosidad mejorada con respecto a un concreto convencional.
- Protección del acero de refuerzo

TREMIX POLIMIX COLOMBIA

SC764-1

PRECAUCIONES

- No se debe dosificar ninguna materia prima por parte de la obra, esto afectará el Diseño y los resultados finales de resistencia.
- Establecer las prácticas y recomendaciones existentes en la NSR 2010 y ACI American Concrete, para los procedimientos de colocación, vibrado, manejo, curado, protección y control del concreto en obra.
- Curar el concreto para prevenir las fisuras por retracción plástica.
- La aceptación o rechazo del concreto es el asentamiento de llegada a la obra, se debe medir dentro de los **15 minutos** de llegado el concreto a la obra NTC 396
- El curado de las muestras debe iniciarse antes de que transcurran 30 minutos después de retirados los moldes (NTC 550), deben permanecer completamente
- Sumergidas y se deben ensayar a las horas indicadas de acuerdo con lo contenido en la norma NTC2871.
- Humedecer la formaleta si esta se encuentra caliente esto ayuda a disminuir los cambios térmicos del concreto.
- Esta clase de concreto no se recomienda utilizarlo en pisos industriales. La descarga vertical debe ser mínimo de 1m de caída libre máxima permisible, si sobrepasa se debe tener previsto para evitar segregación.

TREMIX COLOMBIA


POLIMIX COLOMBIA

SC764-1

ESPECIFICACIONES TECNICAS

	UNIDAD	CARACTERISTICAS	TOLERANCIA
Código		CONV -(*1) -(*2) -(1) - 15	
Resistencia de especificación (*2)	Kg/cm^2	105-140-175-210-245-280-315-350-385-420	
Edad de Especificación	Días	28	
Tamaño Máximo de la Grava	Pulgada (Milimetros)	1" (25,4) - 1/2 (12,5)	
Tiempo de Manejabilidad	Hora	5	±1,0
Asentamiento de Diseño	Cm (Pulg)	10.16 (4) - 15,24 (6)	±1
Densidad	Kg/m^3	2250 a 2450	
Contenido de Aire	%	Máximo 2,0	±1

*La información contenida en este material informativo es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendaciones técnicas.
*Las especificaciones técnicas señaladas no sugieren la utilización de los productos
*Cada uno de los productos ofrecidos deben utilizarse bajo la recomendación y responsabilidad de un efecto diseñador calificado para el efecto.
*El tiempo de manejabilidad es a partir de la hora de salida de planta y puede variar según el sistema de colocación
*Los tiempos de fraguados puede variar con la temperatura ambiente
*Cualquier características puede ser adicionada por requerimiento del cliente de acuerdo con sus necesidades y viabilidad técnica, con previo aviso



FANNY ISABEL TEQUIA G.
Suministro y transporte de materiales para construcción
Nit. 39.662.669-9

SOACHA. (CUND), 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CANTERA CUEVA DEL ZORRO
CONTRATO DE CONCESIÓN DBE-111

CERTIFICA QUE:

Suministramos materiales en el periodo comprendido del 1 al 30 de Agosto de 2022 a nombre de CONSORCIO GAMER SOACHA S.A.S. Nit. 901.587.366-8 asi:

- SBG – 1 INVIAS 2007

Atentamente,

FANNY I. TEQUIA G.
C.C.No 39.662.669 Soacha
RESOLUCIÓN CAR 1558 24 DE DICIEMBRE DE 2003
No.02227

Cr 6 15 38 Brr San Luis – Soacha (CUND) Tel 7810041 Telefax 7814130
Email:Contacto@tequiaycia.com

E.I.E. Echeverry Ingeniería y Proyectos S.A.S

ONAC

Laboratorio de Control de Calidad

Dirección: Carrera 2RC No. 71A – 30
Teléfonos: 3205614 – 6304010 – 3113668
Bogotá, D.C. – Colombia

CALIDAD
QUE GENERA CONFIANZA

INFORME DE ENSAYO
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO

Norma: NTC 673:2010	Control de documentos: CB-FO-04	Revisión No.: 1	
		Fecha de emisión: 2022-07-07	

Cliente:	ÁREA PAVIMENTADA SAS
Dirección:	Km 3 Vereda Potrero Hondo Bajo
Obra:	Planta
Código de obra:	2962
Ensayado por:	Ing. Mauro Ramírez

INFORME-ESFUN(LAB-022-2962-SE)

Cilindro No.	Identificación	Fecha formo AAAA-MM-DD	Fecha ensayo AAAA-MM-DD	Edad (Días)	Resistencia nominal f'c (psi o kg/cm²)	Carga (Kips o Kg)	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Área (mm²)	L/D	Fecha de Conversión	Resistencia obtenida			% Conversión	Tipo de fractura	Masa kg	Densidad kg/m³	Fecha de entrega / Datos de Interés/Observaciones
												MPa	kg/cm²	PSI (Libra²)					
01	Cardinal, Rosalía, Cartagena	2022-04-07	2022-05-19	42	4000	38440	152.4	304.8	18238.1	2.00	2022-05-19	27.4	280	3973	114	2			2022-05-19 / O.E. 32447
02	Cardinal, Rosalía, Cartagena	2022-04-11	2022-05-19	38	3000	36870	152.4	304.8	18238.1	2.00	2022-05-19	26.1	267	3795	114	2			2022-05-19 / O.E. 32447
03	Cardinal, Rosalía, Cartagena	2022-04-11	2022-05-19	38	3000	33940	152.4	304.8	18238.1	2.00	2022-05-19	24.0	245	3492	114	2			2022-05-19 / O.E. 32447

TIPOS DE FRACTURA						
	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6


CONDICIONES (LUGAR) DE CURADO	EQUIPAMIENTO UTILIZADO		CONDICIONES AMBIENTALES
Cuarto Húmedo	Equipo de ensayo	Prensa hidráulica 200 Ton	21 °C, 78 %
	Instrumento complementario	Calibrador digital	
	Medio de ensayo	Cilindros de concreto	
	Software o sistema operativo	Control de ensayo	

OBSERVACIONES:

FECHA DE EMISIÓN DE INFORME	REVISÓ	APROBÓ	FIRMA Y SELLO
2022-07-17	Ing. Adriana L. Cárdenas Salazar	Ing. Gregorio Ruiz La Rosa	
	Coordinadora de Laboratorio	Director Técnico	

TREMIX COLOMBIA

CURVA DE DESARROLLO CONCRETOS CONVENCIONAL Y BOMBEABLE

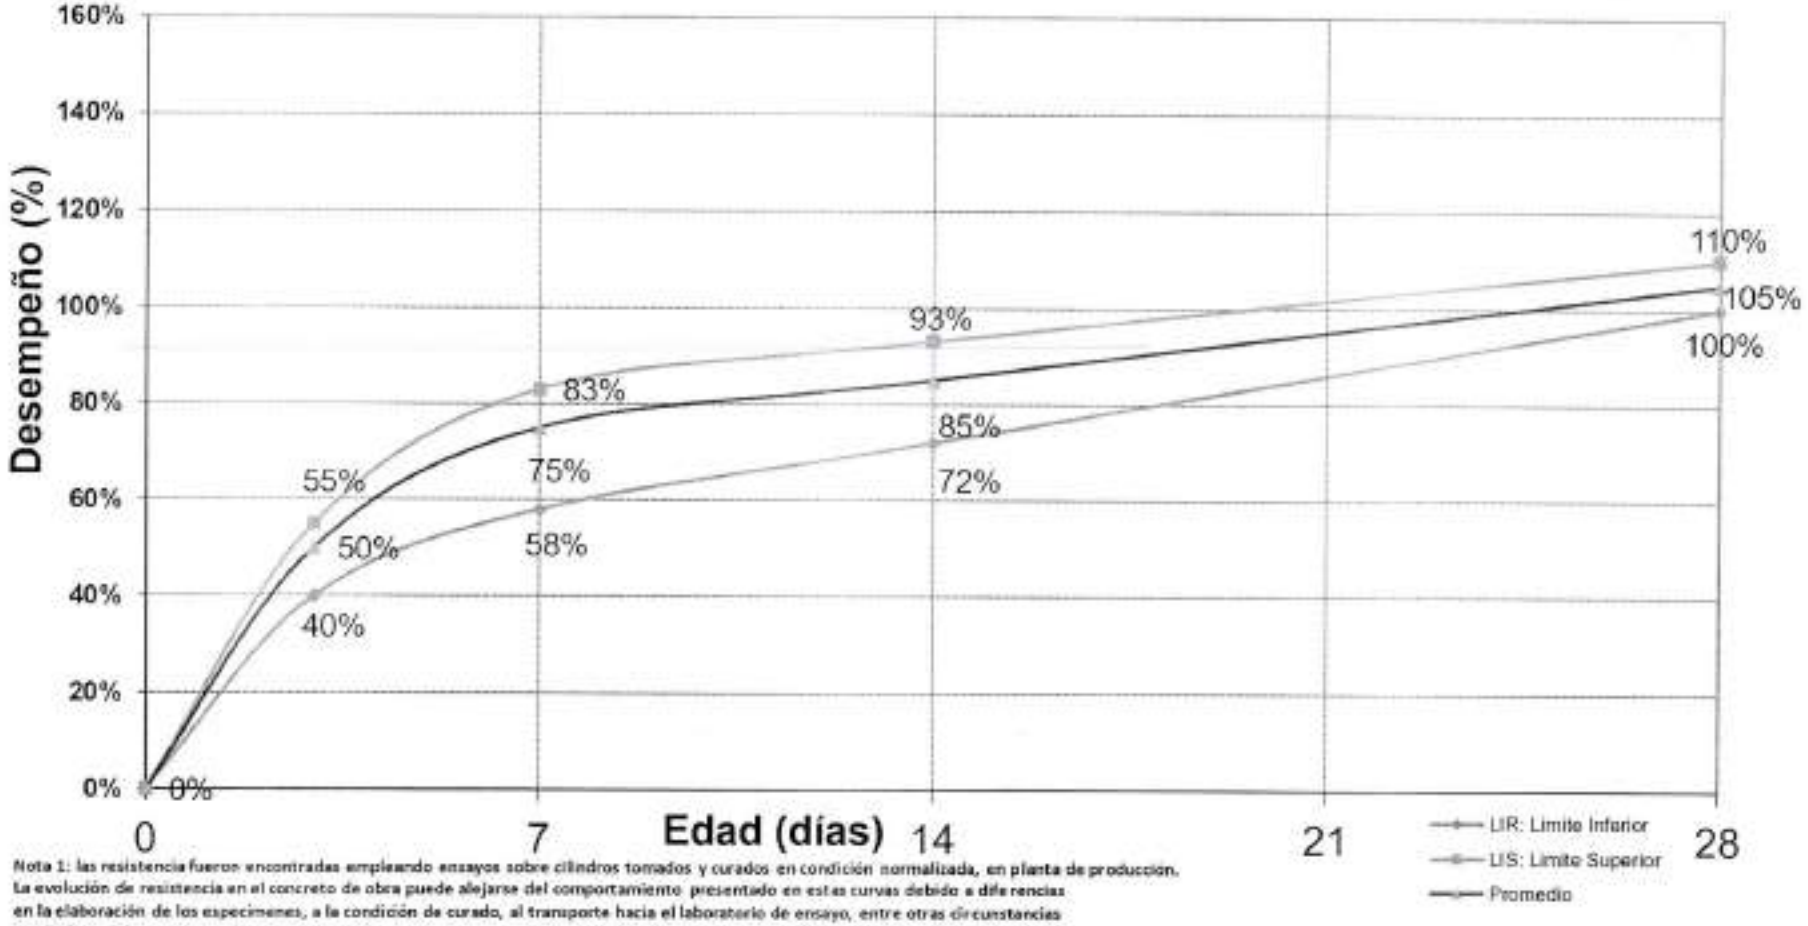

Nota 1: las resistencia fueron encontradas empleando ensayos sobre cilindros tomados y curados en condición normalizada, en planta de producción. La evolución de resistencia en el concreto de obra puede alejarse del comportamiento presentado en estas curvas debido a diferencias en la elaboración de los especimenes, a la condición de curado, al transporte hacia el laboratorio de ensayo, entre otras circunstancias particulares inherentes a cada proyecto.

Nota 2: La resistencia que puede alcanzar el concreto en los elementos fundidos en obra, estará influenciada además de las propiedades inherentes a la mezcla suministrada, las condiciones de colocación, a su curado, al vibrado, a la temperatura de colocación y curado, a la presencia de cargas externas, entre otras condiciones particulares.

Nota 3: La información suministrada en esta publicación es de propiedad intelectual de concretera Tremix S.A.S, se suministra al cliente para su lectura y efectos técnicos de análisis, sin por ello ceder la propiedad de ninguna parte de la información aquí expuesta.

No se autoriza la reproducción total o parcial de la información contenida en esta publicación sin la aprobación expresa de concretera Tremix S.A.S

Elaboro: Area tecnica - calidad Concretera Tremix

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO 024 DE 2021

Informe: Mensual 01 Parcial __ Final __ No. Del Informe: 03	
Periodo del Informe: 13 noviembre al 15 diciembre 2022	
Fecha de informe:	21 de Diciembre de 2022

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista:	CONSORCIO GAMER SOCHA
NIT / C.C.	901.587.366 8
Supervisor	JUAN PABLO CAÑON RODRIGUEZ
Objeto del Contrato:	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA
Fecha de suscripción de Contrato:	02/05/2022
Fecha de inicio del Contrato:	01/08/2022
Certificado de disponibilidad presupuestal Nota: Se relacionan el CDP inicial y CDPS de adiciones	044-2022
Registro presupuestal Nota: Se relacionan el RP inicial y RPS de adiciones	2022-0077
Valor de Contrato (Incluye adiciones o reducciones)	$ 4.506.567.898.67
Plazo de ejecución	SEIS MESES
Suspensión	N/A
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Plazo de ejecución final	HASTA EL 31 DE ENERO DE 2023
Cesión	N/A
Terminación anticipada	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES**	**PRODUCTOS**
(Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	(Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	(Con respecto a la actividad desarrollada.)
EJECUTAR EL CONTRATO EN EL PLAZO ESTABLECIDO CO TODAS LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS Y FINANCIERAS ESTIPULADAS EN LAS CLAUSULAS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO CON SU PROPUESTA	Ejecución de vias desde el 13 noviembre al 15 Diciembre del 2022	Ejecución de vias desde el 13 noviembre al 15 Diciembre del 2022

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES**	**PRODUCTOS**
(Las estipuladas como especificas en la minuta del contrato)	(Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	(Con respecto a la actividad desarrollada.)
GARANTIZAR QUE LOS SUMINISTROS D MATERIALES SEAN DE EXCELENTE CALIDAD AL IGUAL QUE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE CADA UNO DE LOS FRENTES DE OBRA	Toma de muestras	Certificados de laboratorios y de los materiales suministrados.
CONSTITUIR GARANTIAS PACTADAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO DENTRO DEL CONTRATO	Pólizas.	Garantias aprobadas y e firme
SUMINISTRAR TODOS LOS MATERIALES TRANSORTES EN GENERAL, QUIPOS HERRAMINIENTAS , OBRA DE MANO, MANEJO , VIGILANCIA , Y TODOS LOS ASPECTOS NECESARIOS QUE REQUIERA PARA GARANTIZAR LA CONSTRUCCION Y EJECUCION DE LAS OBRAS	Ejecución de vías desde el 13 noviembre al 15 Diciembre del 2022	Ejecución de vías desde el 13 noviembre al 15 Diciembre del 2022
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL CORRESPONDITE CUADRO DE CANTIDADES ,ADEMASA DESARROLLAR LA OBRA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, LAS CUALES HARAN PARTE INTEGRAR DE LA FUTURA CONTRATACION QUE NO PODRAN SER MODIFICADAS	Ejecución de cantidades de acuerdo a los pactado contractualmente	Ejecución de vías desde el 13 noviembre al 15 Diciembre del 2022
GARANTIZAR EL EQUIPO HERRAMIENTAS , RECURSO HUMANO, MATERIALES Y TODO LO NECEESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO EN LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, EN CADA FRENTE DE TRABAJO	Disposición en sitio de los equipos requeridos cumpliendo con las condiciones del terreno	Ejecución de vías desde el 13 noviembre al 15 Diciembre del 2022
SUMINISTRAR CON ANTICIPACION SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA, LAS MUESTRAS QUE SE REQUIEREN Y LAS PRUEBAS O ENSAYOS QUE ESTIME PERTINENTE EFECTUAR PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LOS MATERIAES , ELEMENTOS Y ACCESORIOS QUE CUMPLAN CON LO ESTIPULADO EN LOS TERMINOS , TODO LO CUL SERA POR CUANTA DEL CONTRATISTA. CUANDO EL MATERIAL O ELEMENTOS SE HAN RECHAZADOS POR LA INTERVENTORIA , EI CONTRATISTA A SU COSTA DEBERA RETIRARLO Y REMPLAZARLO EN FORMA INMEDIATA Y BAJO LAS CONDICIONES EXIGIDAS . AS APROBACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA A LOS MATERIALES, NO EXONERAN AL CONTRATISTA DE SU RES PONSABILIDAD POR LA CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS . POR LO TNTO ESTE DEBRA REAPARAR O RECONSTRUIR POR SU CUENTA LAS OBRAS DEFECTUSAS O QUE NO SE CIÑEN A LAS ESPECIFICACIONES.	Toma de muestras	Certificados de laboratorios y de los materiales suministrados.
REALIZAR PRUEBAS , LABORATORIOS Y ENSAYOS. TODAS LAS PRUEBAS , BABORATORIOS Y ENSAYOS TANTO DE MATERIALES DE LA OBRA EN GENERAL Y EN RELACIONDO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMEROS QUE ESTABLECEN LAS NORMAS TECNICAS, SE REGIRAN POR LO PREVISTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETERMIINADAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y ESTARAN A CARGO DEL CONTRATISTA . SI FUESE PRECISO , A JUICIO DE LA INTERVETORIA SE DEBERAN PRACTICAR PRUEBAS O ENSAYOS DIFERENTES A LOS PREVISTOS. ESTTAS PRUEBAS O ENSAYOS	Toma de muestras	Certificados de laboratorios y de los materiales suministrados.

www.epuxua.gov.co
Calle 12 No 8A – 36 Soacha – Cundinamarca
Tel: 601 5 203475 Email: epuxuaffbancadesoacha.gov.co

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES**	**PRODUCTOS**
(Las estipuladas como especificas en la minuta del contrato)	(Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	(Con respecto a la actividad desarrollada.)
ESTARAN A CARGO DE CONTRATISTA . CUALMENTE POR ORDEN DE LA INTERVENTORIA CON EL VISTO UENO DE EL ORDENADOR DEL GASTO SE PODRAN REPETIR LAS PRUEBAS O ENSAYOS QUE SE HUIERE HECHO E CAS DE DUDA, CL CONTRATISTA ASUMITA LOS COSTOS DC DICHAS PRUBASS		
SUMINISTRAR LOS MATERIIALES Y MAQUINARIA NECESARIA Y MANTENER DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LAS MISMAS A SATISFACCION DE EPUUA AVANCE E.I.C.E . TODO EL PERSONAL TANTO NO CALIFICADO COMO CALIFICADO , QUE SEE REQUIERE Y RESPECTO DE CAL DEVERA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL Y DEMAS A QUE HAYA LUGAR	Disposición en sitio de los equipos requeridos cumpliendo con las condiciones del terreno	Ejecución de vias desde el 13 noviembre al 15 Diciembre del 2022

1. AVANCE DE EJECUCIÓN

Avance	Porcentaje de avance
Fisico	52.81%
Financiero	52.61%

2. OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES

N/A

3. ANEXOS

INFORMES, CERTIFICACIONES ACTAS, ENTREGABLES

JUAN PABLO CAÑON RODRIGUEZ
Supervisor Cto 024-2022

www.epuxua.gov.co
Calle 12 No. 8A – 36 Soacha – Cundinamarca
Tel: 601 5 203475 Email: epuxua@alcaldiasoacha.gov.co

XUÁ	EPUXUA AVANZA E.I.C.E. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	SOACHA EL CAMBIO AVANZA

EL SUPERVISOR DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E DEL CONTRATO N° 3443-2021

CERTIFICA QUE

Dando cumplimiento al avance financiero y de ejecución del contrato de obra No. 024 – 2022 cuyo objeto es: CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHAE suscribió el contrato de obra derivado que relaciona a continuación:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO
No. 024-2022	CONSORCIO GAMER SOACHA	CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA

Una vez verificado el informe y la documentación aportada por el contratista, como soporte de la cuenta No.3, certifico el avance del contrato en mención del periodo comprendido entre 13 del mes de NOVEMBRE DE 2022 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022, relaciono número de factura y valor para su respectivo tramite.

PORCENTAJE DE AVANCE	NUMERO DE FACTURA	VALOR
52.81%	04	1,003,532,471.00

fuente, Contrato N. 3443 DE 2021 suscrito entre EPUXUA y secretaria de Infraestructura

SUBTOTAL FACTURA	$ 1,003,532,471.00
IVA	$ 0.00
TOTAL, FACTURA	$ 1,003,532,471.00

Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

Por lo anterior, se considera que el contratista cumple con los requisitos para efectuar el pago del contrato en mención. En constancia se firma a los veintiuno (21) dias del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022).

JUAN PABLO CAÑON RODRIGUEZ
Supervisor Contrato N° 024 DE 2022
EPUXUA AVANZA E.I.C.E

CERTIFICACION JURAMENTADA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

Bogotá, diciembre 16 de 2.022

Yo, **MILTON EDUARDO RIVERA RINCON,** identificado con la cedula de ciudadanía No. **79.205.702** de **Soacha**, actuando como Representante Legal del **CONSORCIO GAMER SOACHA** identificado con **NIT. No.901.587.366-8;** y yo **ADRIANA BONILLA en** mi calidad de Contadora, certificamos, que se han venido pagando oportunamente las Obligaciones Laborales, durante los últimos seis (6) meses y que a la fecha me encuentro a paz y salvo por todo concepto.

En constancia, se firma en **BOGOTA**, a los **dieciséis (16)** días del mes de **DICIEMBRE** de 2022.

MILTON EDUARDO RIVERA RINCON
C. C. No.79.205.702
Representante Legal

ADRIANA BONILLA
TP 55341-T
Contadora

325

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901587366-8	CONSORCIO OMNER (KIACHA	CLL 44C 45-53 IN 2 AP 601	3155358453	gamerssactamm@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B - empresas (ley 200 c			BOGOTA, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				32	8
					TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	12/12/2022	03833264	38 892 100	

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | |

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901567366-9	CONSORCIO GAMER SOACHA		CLL 44C 45-53 IN 2 AP 601	3104365463	gamersoacha1119@gmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			BOGOTA, D.C.	BOGOTA, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				32	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-12	2023-01	E	13/02/2023	85655264	$8.980.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	312.200	0		0		0	0	0	0	312.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	332.000	0		0		0	0	0	0	332.000	1
EPS008	Compensar EPS	830006842-7	10.700	0		0		0	0	0	0	10.700	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	89.600	0		0		0	0	0	0	89.600	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	249.600	0		0		0	0	0	0	249.600	8
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	830001167-2	42.000	0		0		0	0	0	0	42.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	87.400	0		0		0	0	0	0	87.400	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	42.000	0		0		0	0	0	0	42.000	1
EPSC34	Retirado SGP Capital Salud	900298372-3	32.200	0		0		0	0	0	0	32.200	1
EPSC39	EPS S Coosalud	900336715-3	109.000	0		0		0	0	0	0	109.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (INC + Protección)	800229739-6	1.457.600	0	0	22.500	22.900	0	0		1.302.600	0
230301	Porvenir	800224808-6	3.303.800	0	0	0	0	0	0		3.303.800	21
231001	Colfondos	800227940-4	382.700	0	0	0	0	0	0		382.700	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	81.600	0	0	0	0	0	0		81.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860067700-5	2.164.000				2.164.000	0	0	2.164.000			21.640	2.164.000	32

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066842-7	1.354.700	0	0	1.354.700	32

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	ENDOSADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901587388-9	CONSORCIO GAMER SOACHA		CLL 44C 49-55 IN 2 AP 601	3158809453	jarrenzacharria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	E – menos de 200 t			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	12/12/2022	93693264	$9.993.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	1.333.700	1.333.700
Pensión	4	5.250.700	5.250.700
Riesgos Laborales	1	2.184.000	2.184.000
CCF	1	1.254.700	1.254.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	16	9.993.100	9.993.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

BOGOTA
COLOMBIA 2022/07/29

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa CONSORCIO GAMER SOACHA
con Nit número 901587366 8
de BOGOTA D.C.-DISTRITO CAPITAL
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS (DAMAS)

Numero 009900345746
Fecha Apertura 2022/07/29

Cordialmente

DAVIVIENDA
0099 - OFICINA LA SOLEDAD

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **51.920.908**

BONILLA BERNAL

APELLIDOS

ADRIANA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-DIC-1968**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

20-FEB-1987 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00909962-F-0051920908-20170608 0055630499A 2 9910019145

XUÁ Empresa Pública de Soacha

INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA | EL CAMBIO AVANZA

INFORMACION DEL CONTRATO					
No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	024-2022	CDP RP	044-2022 2022-0077	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 4.506.57.898.67
NOMBRE DEL CONTRATISTA. CONSORCIO GAMER SOCHA				IDENTIFICACIÓN: 901.587.366 8	
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado				

OBJETO: CONSTRUCCION Y REHBILITACION DE LS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA	FECHA DE INICIO CONTRATO			FECHA TERMINACION DEL CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
	01	08	2022	31	ENERO	2023

SUBGERENCIA	Administrativa	Centro de Costo (área)	Administrativa
VALOR ADICIONES		N° CDP -FECHA	
PRORROGAS		FECHA	
MODIFICACIONES:		FECHA	

INFORMACIÓN SUPERVISOR			
NOMBRE DEL SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	JUAN PABLO CAÑON	NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO	N/A
CARGO	SUPERVISOR	CARGO	N/A

CERTIFICACION O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de prestación de servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones y/o actividades contratadas y estipuladas en el objeto de contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.

EJECUCION DEL CONTRATO			
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	$1.003.532.471	VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO:	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (12/11/2022)	CUENTA DE COBRO No.	CGS No 4
	HASTA (15/12/2022)	FECHA DE LA CUENTA DE COBRO	21 diciembre 2022
ANEXO: CUENTA DE COBRO, COMPROBANTE DE PAGO DE SALUD, PENSION Y ARL DEL MES DE			
EJECUCIÓN ACUMULADA:	$2.380.122.022	SALDO POR EJECUTAR	$2.126.445.876
Observaciones:			

INFORME DE ACTIVIDADES	
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	HORAS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

Calle 12 # 8A – 36 Soacha - Cundinamarca
epuxua@alcaldiasoacha.gov.co
Tel: 601 5 203475

INFORME DE ACTIVIDADES	
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**HORAS O ACTIVIDADES EJECUTADAS**
EJECUTAR EL CONTRATO EN EL PLAZO ESTABLECIDO CO TODAS LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS Y FINANCIERAS ESTIPULADAS EN LAS CLAUSULAS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO CON SU PROPUESTA	Se ejeculan según cronograma de obra
GARANTIZAR QUE LOS SUMINISTROS D MATERIALES SEAN DE EXCELENTE CALIDAD AL IGUAL QUE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE CADA UNO DE LOS FRENTES DE OBRA	Se verifica con interventoria cada uno de los materiales y se entregan certificados de estos .
CONSTITUIR GARANTIAS PACTADAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO DENTRO DEL CONTRATO	Se realiza durante el inicio de obra
SUMINISTRAR TODOS LOS MATERIALES TRANSORTES EN GENERAL, QUIPOS HERRAMINIENTAS , OBRA DE MANO, MANEJO , VIGILANCIA , Y TODOS LOS ASPECTOS NECESARIOS QUE REQUIERA PARA GARANTIZAR LA CONSTRUCCION Y EJECUCION DE LAS OBRAS	Se verifica con interventoria cada uno de los materiales y se entregan certificados de estos .
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL CORRESPONDITE CUADRO DE CANTIDADES ,ADEMASA DESARROLLAR LA OBRA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFIACIONES TECNICAS, LAS CUALES HARAN PARTE INTEGRAR DE LA FUTURA CONTRATACION QUE NO PODRAN SER MODIFICADAS	Se verifica con interventoria , según acta 3
GARANTIZAR EL EQUIPO HERRAMIENTAS , RECURSO HUMANO, MATERIALES Y TODO LO NECEESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO EN LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, EN CADA FRENTE DE TRABAJO	Se verifica con interventoria , personal utilizado en cada uno de los frentes de vias ejecutadas según acta 3-
SUMIINISTRAR CON ANTICIPACION SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA, LAS MUESTRAS QUE SE REQUIEREN Y LAS PRUEBAS O ENSAYOS QUE ESTIME PERTINENTE EFECTUAR PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LOS MATERIAES , ELEMENTOS Y ACCESORIOS QUE CUMPLAN CON LO ESTIPULADO EN LOS TERMINOS , TODO LO CUL SERA POR CUANTA DEL CONTRATISTA. CUANDO EL MATERIAL O ELEMENTOS SE HAN RECHAZADOS POR LA INTERVENTORIA , EL CONTRATISTA A SU COSTA DEBERA RETIRARLO Y REMPLAZARLO EN FORMA INMEDIATA Y BAJO LAS CONDICIONES EXIGIDAS . AS APROBACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA A LOS MATERIALES, NO EXONERAN AL CONTRATISTA DE SU RES´PONSABILIDAD POR LA CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS . POR LO TNTO ESTE DEBRA REAPARAR O RECONSTRUIR POR SU CUENTA LAS OBRAS DEFECTUSAS O QUE NO SE CIÑEN A LAS ESPECIFICACIONES.	Se verifica con interventoria , y se entregan certificados calidad, según acta 3

CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMEROS QUE ESTABLECEN LAS NORMAS TECNICAS, SE REGIRAN POR LO PREVISTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETERMINADAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y ESTARAN A CARGO DEL CONTRATISTA . SI FUESE PRECISO , A JUICIO DE LA INTERVETORIA SE DEBERAN PRACTICAR PRUEBAS O ENSAYOS DIFERENTES A LOS PREVISTOS. ESTTAS PRUEBAS O ENSAYOS ESTARAN A CARGO DE CONTRATISTA . CUALMENTE POR ORDEN DE LA INTERVENTORIA CON EL VISTO UENO DE EL ORDENADOR DEL GASTO SE PODRAN REPETIR LAS PRUEBAS O ENSAYOS QUE SE HUIERE HECHO E CAS DE DUDA, EL CONTRATISTA ASUMITA LOS COSTOS DE DICHAS PRUBASS	
SUMINISTRAR LOS MATERIIALES Y MAQUINARIA NECESARIA Y MANTENER DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LAS MISMAS A SATISFACCION DE EPUXUA AVANCE E.I.C.E . TODO EL PERSONAL TANTO NO CALIFICADO COMO CALIFICADO , QUE SEE REQUIERE Y RESPECTO DE CAL DEVERA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL Y DEMAS A QUE HAYA LUGAR	Se verifica con interventoria cada uno de los materiales y se entregan certificados de estos .

Se expide a los 21 días del mes de Diciembre de 2022

FIRMA CONTRATISTA
CONSORCIO GAMER SOACHA
NIT 901587366-8

FIRMA SUPERVISOR TECNICO
JUAN PABLO CAÑON

Calle 12 # 8A – 36 Soacha - Cundinamarca
epuxua@alcaldiasoacha.gov.co
Tel: 601 5 203475

FORMATO DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DE CONTRATOS

XUÁ

SOACHA EL CAMBIO AVANZA

CONTRATO No.	024 2022	FECHA	4/05/2022			PLAZO DE EJECUCION		180	
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMER SOACHA								
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA,CUNDINAMARCA .								
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN PABLO CAÑON								
CONTRATO FIRMADO	SI	POLIZA	SI	APROBACION POLIZA	SI	PARAFISCALES	SI	FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	1/08/2022
	DESDE	1/08/2022
	HASTA	31/01/2023
	TIEMPO DE EJECUCION EN DIAS	180
	TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	45

PRORROGA No. 01	FECHA		PRORROGA EN DIAS	0
PRORROGA No. 02	FECHA		PRORROGA EN DIAS	0
PRORROGA No. 03	FECHA		PRORROGA EN DIAS	0
PRORROGAS			TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
			FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
			TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

VALOR DEL CONTRATO			
ADICION No. 01	FECHA		
ADICION No. 02	FECHA		
ADICION No. 03	FECHA		
		VALOR TOTAL ADICIONES	SIN ADICIONES
		VALOR TOTAL CONTRATO	$ 4.506.567.898,00

VALOR FACTURA	FACTURA No.	PERIODO FACTURADO	FECHA DE RADICACION FACTURA	SALDO CONTRATO
$ 649.376.068,00	01	DEL 1 AGOSTO AL 10 OCTUBRE	10/09/2022	$ 3.857.191.830,00
$ 727.213.483,00	02	DEL 10 OCTUBRE AL 12 NOVIEMBRE	12/11/2022	$ 3.129.978.347,00
$ 1.003.532.471,00	04	DEL 13 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	$ 2.126.445.876,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	4.506.567.898,00	100%
TOTAL EJECUTADO	$	2.380.122.022,00	52,81%
TOTAL POR EJECUTAR	$	2.126.445.876,00	0,00%
VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	180		100%
TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	135		75%
TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	45		25%

EJECUCIÓN EN DINERO



EJECUCIÓN EN TIEMPO



JUAN PABLO CAÑON	21/12/2022
Nombre y Firma Supervisor	Fecha
