2022 CONSORCIO COLEGIO ERU 2022	**INFORME SEMANAL**	FT 300 VERSIÓN: 00 23/05/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	Contrato de obra no. 133 de 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.				
SEMANA No.	23	**DEL**	24 de octubre de 2022	**AL**	30 de octubre de 2022
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	160	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVAEZ		

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista	**Consorcio Colegio ERU 2022**	**Interventor**	**GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS**
Contrato No.	**133 de 2022**	**Contrato No.**	**134 DE 2022**
Fecha de suscripción del contrato	23/05/2022	**Fecha de suscripción del contrato**	5/05/2022
Valor Inicial	$ 43,322,137,680.00	**Valor Inicial**	$ 1,570,157,939.00
Plazo Inicial	17 MESES	**Plazo Inicial**	17 MESES
Plazo Actualizado	N/A	**Plazo Actualizado**	N/A
Fecha de Iniciación	23 de mayo de 2022	**Fecha de Iniciación**	23/05/2022
Fecha de Terminación*	23 de octubre de 2023	**Fecha de Terminación**	22/10/2022
No póliza contrato de obra	CBG-100035066	**No póliza contrato de interventoría**	15-46-101142716
Fecha aprobación	23 MAYO DE 2022	**Fecha aprobación**	12/09/2022

* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA


AMPARO	VIGENCIA (Desde- hasta)	VALOR	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DE OBRA	23/05/2022 hasta 23/04/2024	$ 6,064,427,536.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/05/2022 hasta 23/10/2026	$ 4,332,213,768.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	23/10/2023 hasta 23/10/2028	$ 10,830,534,420.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	23/05/2022 hasta 23/04/2024	$ 6,064,427,536.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL	05/05/2022 hasta 23/10/2023	$ 2,166,106,884.00	A la fecha no presenta ninguna novedad

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No.	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor total actividad costo directo	Valor programado acumulado a la semana	Valor Avance semana	Valor ejecutado acumulado	%avance	Descripción de la Actividad
1.1.1	Localización y Replanteo de Obras generales.	20/09/2022	EN PROCESO	$ 95,888,542.00	$ 43,097,499.39	$ 1,737,907.66	$ 45,966,776.68	1.82%	Se instalo el restante de la plazoleta de banderas
1.3.1	Descapote mecánico E=0.15 m. (Incluye cargue y retiro a botadero)	20/09/2022	EN PROCESO	$ 96,532,269.00	$ 75,701,887.74	$ 0.00	$ 68,529,468.27	0.00%	Se ha intervenido un área total de 10909.46m2, con un valor acumulado de $58,529,468.27, el área restante obedece a la zona del colegio que actualmente se encuentra en funcionamiento, reportando un atraso de 0.06% con respecto al valor total del presupuesto, no imputable al contratista
1.3.2	Excavaciones Mecánicas en Material Comun 0-2 M (Incluye cargue y retiro a botadero certificado)	27/09/2022	EN PROCESO	$ 604,331,461.00	$ 473,924,635.07	$ 2,503,339.87	$ 264,873,128.72	0.41%	Se adelantaron las actividades de las sobre anchas de los bloques. *La presente actividad con respecto a la programación reporta un atraso de alrededor del 0,8% con respecto al valor total del presupuesto, no imputable al contratista, toda vez que no requiere de su intervención, cuya nulra si puede ser usada en las zonas donde se ha identificado que es necesario realizar un mejoramiento del terreno.*
1.3.4	Relleno, conformación y compactación en Relleno base granular clase A Tipo INVIAS	8/09/2022	EN PROCESO	$ 289,821,457.00	$ 201,051,301.74	$ 0.00	$ 465,430,606.00	0.00%	Se presenta un avance con relación a la cantidad total de la actividad, se compactó una capa de 50 cm en total de los bloques A,B, C, D, E, L, M, N Rampa y escaleras. Se encuentra ejecutada la segunda capa de los módulos I, H, G, y O, los cuales no han sido concluidos dado que se encuentran en la zona de acceso vehicular, además de las lluvias constantes en horas de la tarde lo cual a imperido la toma de densidades.
2.1.1	Suministro y colocacion Concreto ciclópeo rajón 60% concreto 40% de 2,500 PSI (17.5 Mpa)	29/09/2022	EN PROCESO	$ 54,262,642.00	$ 14,759,379.00	$ 9,647,880.18	$ 47,828,886.02	17.76%	Se presenta diferencias con la descripción del item con lo requerido en los planos, ya que se estipula concreto de 3000 psi, lo cual es instalado en el módulo E Y Rampa
2.1.2	Suministro y colocación Concreto limpieza 1,500 PSI (10.5 Mpa)	13/09/2022	EN PROCESO	$ 232,947,620.00	$ 63,361,495.31	$ 25,203,980.25	$ 137,869,597.21	10.82%	Se instala en el acceso a la obra y en el bloque I.
2.1.3	Suministro y colocación Concreto para vigas de cimentación 3,000 PSI (21 Mpa)	16/09/2022	EN PROCESO	$ 1,430,775,096.00	$ 389,169,244.85	$ 0.00	$ 208,478,239.76	0.00%	
2.1.5	Construcción de Losa aligerada de fundación en concreto de 3000 PSI - 1 M (losata superior e inferior de 0.10 M)	12/09/2022	EN PROCESO	$ 1,208,625,151.00	$ 353,224,605.91	$ 0.00	$ 262,389,325.80	0.00%	
2.1.6	Suministro e instalación de Geotextil tejido 2,400	12/09/2022	EN PROCESO	$ 83,557,394.00	$ 22,727,518.81	$ 25.61	$ 81,629,080.36	0.00%	
2.3.1	Suministro e instalación de Acero de refuerzo figurado fy= 420 Mpa	12/09/2022	EN PROCESO	$ 1,968,908,032.00	$ 535,540,808.81	$ 21,863,250.86	$ 662,956,137.70	1.11%	Se continua con el armado del Bloque E y rampa, y se inicia con la parrilla del bloque N.
2.3.2	Suministro e instalación de Malla electrosoldada de refuerzo fy= 550 Mpa	28/09/2022	EN PROCESO	$ 265,423,296.00	$ 72,194,843.15	$ 10,551,188.00	$ 80,381,336.28	3.98%	Se instaló en el módulo C y D
3.1.2	Suministro e instalación de Tubería PVC sanitaria 4" (Por placa y ductos)	12/09/2022	EN PROCESO	$ 1,901,000.00	$ 1,413,307.77	$ 0.00	$ 1,901,000	0.00%	
3.1.4	Suministro e instalación de Tubería PVC sanitaria 3" (Por placa y ductos)	12/09/2022	EN PROCESO	$ 1,184,909.00	$ 307,126.19	$ 0.00	$ 257,471.32	0.00%	
3.1.6	Suministro e instalación de Tubería PVC sanitaria 2" (Por placa y ductos)	12/09/2022	EN PROCESO	$ 730,611.00	$ 192,624.39	$ 0.00	$ 730,611	0.00%	
4.1.1	Suministro y colocación de Concreto a la vista para columnas de 4,000 PSI (28 Mpa))	30/09/2022	EN PROCESO	$ 944,434,572.00	$ 397,527,932.18	$ 48,978,587.20	$ 138,505,156.81	5.19%	Se continúa con la fundida de los bloques A, B, C, y D.

4.2.2	Suministro e instalación de Acero de refuerzo Columnas figurado fy= 420 Mpa	19/09/2022	EN PROCESO	$ 999,772,067.00	$ 209,458,539.46	$ 47,485,196.04	$ 311,665,154.50	4.75%	Se continúa con el armado de los bloques A, B, C, y D.
4.4.1	Estructura metálica (suministro e instalación incluye anticorrosivo y acabado final esmalte sintético exteriores)	31/10/2022	EN PROCESO	$ 2,947,771,795.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,120,545.63	0.00%	
6.2.1.1	Suministro e instalación de punto sanitario 4" para Rotómetros y sanitarios de tanque	14/11/2022	EN PROCESO	$ 18,020,337.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,998,485.00	0.00%	
6.2.1.3	Suministro e instalación de punto sanitario 2" para sifones de piso, duchas, lavamanos, lavaplatos, orinales, bebederos, porcelas y puntos de desagüe para equipos de cocina	14/11/2022	EN PROCESO	$ 24,493,611.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,706,093.00	0.00%	
6.2.2.6	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	14/11/2022	EN PROCESO	$ 3,422,468.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,422,468.00	0.00%	
6.2.2.7	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	14/11/2022	EN PROCESO	$ 15,473,784.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 384,935.00	0.00%	
6.2.2.9	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 2" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	14/11/2022	EN PROCESO	$ 3,124,612.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 798,309.70	0.00%	
6.2.2.10	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 160 mm (Bajo tierra)	14/11/2022	EN PROCESO	$ 11,437,748.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 669,955.60	0.00%	
6.2.2.11	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 200 mm (Bajo tierra)	14/11/2022	EN PROCESO	$ 7,289,664.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,592,366.56	0.00%	
6.2.2.13	Suministro e instalación de pozo de inspección para red de aguas residuales (Altura promedio 2.20 m y. Diametro de cuerpo del pozo1.20 m) incluye cuerpo y cono de reducción hechos en mamposteria, placa superior, placa de base hechas en concreto reforzado, excavación y retiro de material	14/11/2022	EN PROCESO	$ 5,144,892.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,672,488.00	0.00%	
6.2.4.5	Suministro e instalación de tuberia PVC sanitaria 6" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	20/09/2022	EN PROCESO	$ 53,292,716.00	$ 14,050,633.63	$ 678,382.05	$ 12,466,581.21	1.27%	Se instala tubería en paralelo de los bloques B, C y D
6.2.4.8	Suministro e instalacion de tuberia PVC corrugada Novafort 355 mm (Bajo tierra)	12/09/2022	EN PROCESO	$ 30,199,104.00	$ 7,981,942.24	$ 0.00	$ 20,447,310.00	0.00%	
6.2.4.9	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 315 mm (Bajo tierra)	12/09/2022	EN PROCESO	$ 11,640,160.00	$ 3,068,908.36	$ 0.00	$ 8,724,299.92	0.00%	
6.2.4.10	Suministro e instalacion de tuberia PVC corrugada Novafort 250 mm (Bajo tierra)	12/09/2022	EN PROCESO	$ 38,424,243.00	$ 9,893,199.54	$ 0.00	$ 8,006,946.18	0.00%	
6.2.4.11	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 200 mm (Bajo tierra)	12/09/2022	EN PROCESO	$ 2,484,802.00	$ 655,183.69	$ 0.00	$ 2,329,880.00	0.00%	
6.2.4.15	Suministro e instalación de caja de inspección de sección cuadrada 0.80 m x 0.80 m y de altura promedio 1.50 m para aguas lluvias que incluye cuerpo, base, tapa, excavación y retiro de material; paredes de la caja en mamposteria simple, tapa y base en concreto reforzado	12/09/2022	EN PROCESO	$ 26,513,733	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,841,636.20	0.00%	
6.2.6.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	12/09/2022	EN PROCESO	$ 41,649,920	$ 11,033,699.66	$ 0.00	$ 9,151,279.30	0.00%	
6.2.6.2	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	12/09/2022	EN PROCESO	$ 49,336,110	$ 13,007,381.24	$ 36,284,627.35	$ 49,339,110.00	71.82%	Se instala tubería en paralelo de los bloques A, B, C y D
6.2.6.4	Retiro de material sobrante en volqueta de excavación de brecha para tubería	14/09/2022	EN PROCESO	$ 10,601,155	$ 2,768,611.58	$ 558,894.54	$ 10,601,155.00	5.32%	Se instala tubería en paralelo de los bloques A, B, C y D
7.1.2.1	Suministro e instalación de tubería bajo tierra PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento en uniones tubo a tubo	24/09/2022	EN PROCESO	$ 100,439,805	$ 26,062,673.03	$ 13,449,910.00	$ 13,449,910.00	12.64%	Se instala tubería en el bloque N.
7.1.2.2	Suministro e instalación de codo 90° para PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	24/09/2022	EN PROCESO	$ 28,188,882	$ 8,033,096.33	$ 7,188,252.00	$ 7,188,252.00	28.57%	Se instala tubería en el bloque N.
7.1.2.4	Suministro e instalación de tee para tubería PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	24/09/2022	EN PROCESO	$ 30,359,628	$ 8,004,284.10	$ 2,335,356.00	$ 2,335,356.00	7.69%	Se instala tubería en el bloque N.
7.1.3.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	24/09/2022	EN PROCESO	$ 6,903,904	$ 1,820,202.51	$ 185,525.76	$ 185,525.76	2.69%	Se instala tubería en el bloque N.
7.1.3.2	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	24/09/2022	EN PROCESO	$ 8,067,540	$ 2,126,993.19	$ 1,079,609.20	$ 1,079,609.20	13.38%	Se instala tubería en el bloque N.
7.1.3.4	Retiro de material sobrante en volqueta de excavación de brecha para tubería	24/09/2022	EN PROCESO	$ 1,733,524	$ 457,040.84	$ 232,025.52	$ 232,025.52	13.38%	Se instala tubería en el bloque N.
26.1	Aseo permanente en obra	23/05/2022	EN PROCESO	$ 46,448,640.00	$ 14,436,739.36	$ 725,799.00	$ 12,499,200.00	1.56%	Se realiza aseo permanente de obra
28.1	Mejoramiento de terreno y detección de fallos	1/09/2022	EN PROCESO	$ 11,998,209.82	$ 11,608,269.82	$ 0.00	$ 11,608,269.82	0.00%	
28.2	Tratamiento de fallos	2/09/2022	EN PROCESO	$ 175,567,735.08	$ 175,567,735.08	$ 0.00	$ 175,567,735.08	0.00%	

VALOR PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	SEMANAL	ACUMULADO PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	SEMANAL	ACUMULADO EJE.
$ 3,715,517,537.04	-$ 623,560,993.92	$ 3,091,956,543.12	$ 2,802,206,902.93	$ 229,569,560.19	$ 3,031,956,543
10.85%	1.77%	12.15%	8.13%	0.65%	8.78%

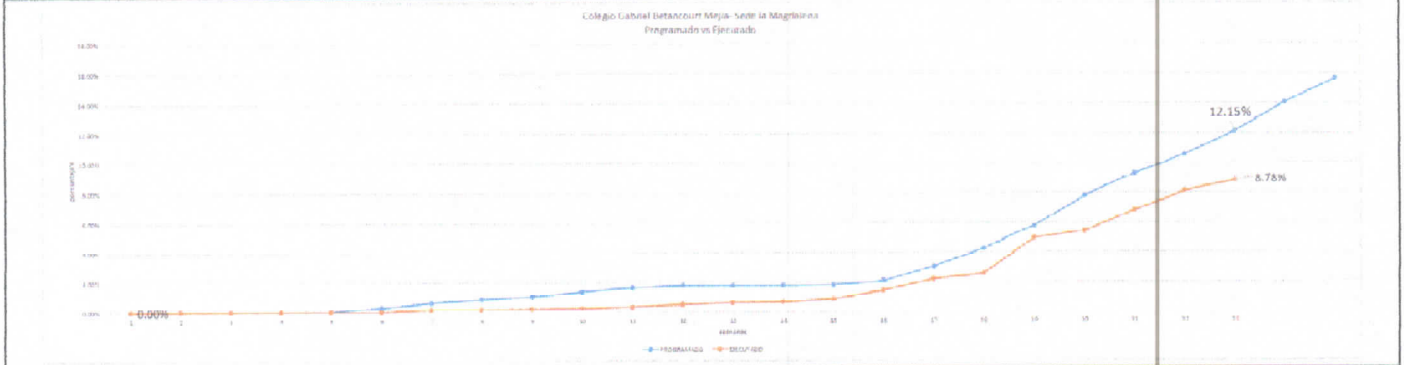

Seguimiento Ruta Crítica

Actividad	Fecha Programada Inicio	Fecha Inicio Real	Tiempo de holgura	Tiempo total de ejecucion de la actividad	Atraso con respecto al valor de la actividad programada	OBSERVACIONES
1.3.2 - Excavaciones Mecánicas en Material Común 0-2 M (incluye cargue y retiro a botadero certificado)	27/08/2022	13/08/2022		108	0.80%	Las areas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que actualmente se encuentran en uso por el colegio, atraso no imputable al contratista.
1.3.1 - Descapote mecánico E=0.15 m. (incluya cargue y retiro a botadero)	20/08/2022	13/08/2022		108	0.05%	Las areas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que actualmente se encuentran en uso por el colegio, atraso no imputable al contratista.
1.3.3 - Relleno, conformación y compactación en Relleno subbase granular clase A Tipo INVIAS a maquina	7/09/2022	Sin iniciar		108	0.76%	los exteriores estan siendo usados en zona de almacenamiento y/o campamentos razon por la que no pueden ser intervenidas de forma simultanea.
2.1.3 - Suministro y colocación Concreto para vigas de cimentación 3,000 PSI (21 Mpa)	12/09/2022	29/09/2022		108	0.51%	El acceso a obra se estaba realizando por el bloque E, razon por la que no se podia intervenir este bloque, se planteo la fundida de la zona para los dias 3 de noviembre de 2022 y 5 de noviembre de 2022.
2.1.4 - Suministro y colocación Concreto para zapatas de cimentación 3.000 PSI (21 Mpa)	12/09/2022	Sin iniciar		108	0.01%	Zona usada como punto de acopio actualmente.
2.1.5 - Construcción de Losa aligerada de fundación en concreto de 3000 PSI - 1 M (loseta superior e inferior de 0.10 M)	12/09/2022	26/09/2022		108	0.20%	El acceso a obra se estaba realizando por el bloque E, razon por la que no se podia intervenir este bloque, se planteo la fundida de la zona para los dias 3 de noviembre de 2022 y 5 de noviembre de 2022.
2.2 - RAMPA	13/09/2022	Sin iniciar		54	0.19%	Por logistica de obra No se podia intervenir de manera simultanea a los bloques C y D, ya que es esta zona se ubica la bomba para la fundida de concreto.
2.3.2 - Suministro e instalacion de Malla electrosoldada de refuerzo fy= 550 Mpa	12/09/2022	29/09/2022		108	0.03%	El acceso a obra se estaba realizando por el bloque E, razon por la que no se podia intervenir este bloque, se planteó la fundida de la zona para los dias 3 de noviembre de 2022 y 5 de noviembre de 2022.
4.1.1 - Suministro y colocación de Concreto a la vista para columnas de 4.000 PSI (28 Mpa)	3/10/2022			155	0.74%	El proveedor de formaletas, no ha cumplido las fechas de entrega, razon por la que se concerto con otro proveedor para recuperar los atrasos, adicionalmente se esta a la espera de aprobación del item de placa aligerada y poder continuar con la fundida de las columnas del segundo nivel.
4.1.2 - Suministro y colocación de Concreto a la vista para vigas aéreas de 3,000 PSI (21 Mpa)	3/10/2022	Sin iniciar		148	1.13%	El proveedor de formaletas, no ha cumplido las fechas de entrega, razon por la que se concerto con otro proveedor para recuperar los atrasos, adicionalmente se esta a la espera de aprobación del item de placa aligerada y poder continuar con la fundida de las columnas del segundo nivel.
4.1.3 - Suministro y colocación Concreto a la vista para escaleras de 3,000 PSI (21 Mpa)	3/10/2022	Sin iniciar		145	0.09%	
4.1.4 - Construcción de Placa aligerada a la vista en casetón de 0.30 M concreto 3,000 PSI (21 Mpa)	3/10/2022	Sin iniciar		145	0.44%	Se esta a la espera de aprobacion del item de placa aligerada y poder continuar con la fundida
4.2.1 - Suministro e instalación de Acero de refuerzo figurado fy= 420 Mpa vigas y losas entre-pisos	3/10/2022	Sin iniciar		149	1.08%	El proveedor de formaletas, no ha cumplido las fechas de entrega, razon por la que se concerto con otro proveedor para recuperar los atrasos, adicionalmente se esta a la espera de aprobacion del item de placa aligerada y poder continuar con la fundida
4.2.2 - Suministro e instalación de Acero de refuerzo Columnas figurado fy= 420 Mpa	3/10/2022			153	0.59%	actividad predecesora de de la losa de entrepiso
4.2.3 - Suministro e instalación de Malla electrosoldada de refuerzo fy= 550 Mpa	3/10/2022	Sin iniciar		145	0.14%	
21 - Obras exteriores, mobiliario urbano y paisajismo	27/08/2022	Sin iniciar		397	0.10%	Las areas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que actualmente se encuentran en uso por el colegio y/o en zona de campamentos.

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

Durante la semana 23 comprendidos entre los días 24 de octubre al 30 de octubre del 2022 se radicó el siguiente oficio:
1. El día 25 de octubre del 2022 se radicó el plano de organización de obra en el oficio CCERU-22-280
2. El día 26 de octubre del 2022 se radicó en el No. de oficio CCERU-22-279 la transitoria provisional de obra T.P.O del acueducto
3. El día 28 de octubre del 2022 se da respuesta al oficio CNGSERV_BTA_ERU_16_2021_217 con respecto a las observaciones de los informes semanales No. 19 y 20

Aspecto Financiero

Durante la semana presente se manifesto lo siguiente:
1. El día 25 de octubre se radicó la planilla No. 8 con un valor de $ 22.090.883. Se recibe el pago del acta parcial de obra número 2
2. El día 28 de octubre se radicó la planilla No. 9 y 10 por un valor $ 172.894.019 y $33.755.985

Aspecto Técnico

Durante la semana se radicaron los siguientes oficios:
1. El día 26 de octubre del 2022 se radicó con No. de oficio CCERU-22-278 los resultados de la muestra de cilindro de torta inferior y columnas del Módulo A
2. El día 26 de octubre del 2022 se radicó en No. de oficio CCERU-22-281 el APU de elemento de concreto reforzado de mamposteria. Se radica en No. de oficio CCERU-22-282 solicitud de aclaraciones estructurales escaleras 1 y 2. Se radica en No. de oficio CCERU-22-283 reparación de elementos estructurales del Bloque A

Se avanza con las siguientes actividades:
1. No se continúa con la compactación de la base granular por las fuertes lluvias que se presentan en jornadas de las tardes y en las madrugadas afectando el normal desarrollo de la obra.
2. Se presenta dificultad en el acceso de la obra debido a las fuertes lluvias presentadas durante la semana, razón por la que se adecua con rajón el acceso por la zona del bloque J, sin embargo aun con este material los vehículos de carga de materiales no logran pasar a los demás módulos.
2. Se inicia con el armado de la losa de entrepiso del bloque A, a la espera de aprobación del item para la ejecución de la actividad.
3. Se tiene armada la losa del bloque E y RAMPA, se ha tenido dificultades con la verticalidad del acero de las columnas lo que ha atrasado la ejecución de la actividad, ya que debe ser entregada a interventoría previa a su intervención.
4. Se realizan excavaciones y rellenos en zona de tuberías e instalación de tuberías de redes sanitarias, aguas lluvias y red contraincendios.
5. Se continúa con la fundida de las columnas del bloque A, B, C y D teniendo las mismas fundidas en un 85%, donde en 6 columnas se presentaron hormigueos para los cuales se va a aplicar el procedimiento de reparación con el fin de garantizar el acabado a la vista requerido.
6. Dada la cuantia de acero de las columnas y losa aligerada se presentan desplazamientos en el acero de las columnas los cuales son tolerables, razón por la que se priorizan los recubrimientos de acuerdo a la NSR-10.
7. simultáneamente se funde concreto pobre en el bloque I

Aspecto SST-Ambiental

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto Ambiental:
1. El día 24 de octubre del 2022 se solicita certificaciones materiales y servicios de unidades sanitarias de septiembre
2. El día 25 de octubre se hace recorrido de obra con contratista. Se hace limpieza de sumideros, recopilación de remisiones para consolidado de cantidades
3. El día 27 de octubre se hace recorrido de obra con interventoría y contratista. Se realiza recomendaciones por parte de la interventoría de realizar la demarcación de los materiales con cinta y protección de estos, así como también mejoras en cuanto al orden del acopio de materiales, capacitación al personal operativo. Ahorro y uso de eficiencia de agua y asistencia comité integral.
4. El día 28 y 29 de octubre del 2022 se realiza elaboración de informe mensual No. 5

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto SST:
1. El día 24 de octubre del 2022 se realizó preoperacionales y charla de seguridad
2. El día 25 de octubre del 2022 se realizó preoperacionales, inducciones, orden y aseo
3. El día 26 de octubre del 2022 se realizó preoperacionales, pausas activas, inducción, orden y aseo
4. El día 27 de octubre del 2022 se realizó preoperacionales, charla de seguridad e inducciones
5. El día 28 de octubre del 2022 se realizó preoperacionales, pausas activas, orden y aseo
6. El día 29 de octubre del 2022 se realizó preoperacionales, orden y aseo

Aspecto Social

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:
1. El día 27 de octubre del 2022 se realiza asistencia y participación en comité de seguimiento social. De igual manera se hace asistencia y participación en comité integral del contrato. Se realizó capacitación al personal en obra frente a mecanismos de atención al ciudadano, respeto, convivencia y pautas de convivencia (comunidad interna y externa).
2. El día 28 de octubre del 2022 se recibe a través de correo electrónico el PQRS No. 1 (reclamación por presunta afectación a puerta).
3. El día 29 de octubre del 2022 se realiza programación de visita de verificación para atender PQRS No 1, la cual se programa con conocimiento de la dirección de obra e interventoría para el martes 1 de noviembre de 2022, a las 10:00 am.

Entre el 24 al 29-10-22. Se garantizó la Atención a la Ciudadanía, conforme a los mecanismos de atención al ciudadano dispuestos (línea de atención telefónica, correo electrónico), así mismo, se efectuó atención en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) en el horario presencial establecido los días jueves entre la 1:00 pm y las 5:00 pm

Aspecto PMT

No se presento nada con relacion a este componente

Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación
25315 COI No. 27	2022612017084222* 2022612017480652*	8/07/2022	8/07/2023			
25316 COI No. 27	2022612017084222* 2022612017480652*	8/07/2022	8/07/2023			
35148 COI No. 37	2022612026123122	16/09/2022	22/12/2022			
35147 COI No. 37	2022612025766622	16/09/2022	14/09/2023			

* Opcional dependiendo de los requerimientos del contrato

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE OBRA
De acuerdo a corte de programación con fecha del día 30/10/2022, el avance programado semanal acumulado de 12,15% Vs avance ejecutado semanal acumulado de 8,78%, adicionalmente desde el área técnica y administrativa se adelantan actividades de contratación para las actividades que a la fecha, aún no inician, en conjunto con estrategias de compra de materiales. Al corte de programación con el presente informe se presenta un atraso del 3,38% representando en actividades de excavación en la zona que actualmente está en uso del colegio, rellenos en sub base granular en zonas comunes que no se pueden intervenir porque se encuentran en zona de campamentos y/o almacenamiento de material, placa aligerada dado que se ha tenido inconvenientes con los proveedores al no cumplir con las fechas pactadas, se presenta atrasos en la losa aligerada del bloque E por logística de obra entre otras actividades las cuales representan atrasos, pero son compensadas con el avance de otras actividades.	Firma
