	INFORME SEMANAL	FT 300
CONSORCIO COLEGIO ERU 2022		VERSIÓN: 00
		23/05/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	Contrato de obra no. 133 de 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.				
SEMANA No.	24	**DEL**	31 de octubre de 2022	**AL**	6 de noviembre de 2022
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	187	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**		ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ	

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista	Consorcio Colegio ERU 2022	**Interventor**	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Contrato No.	133 de 2022	**Contrato No.**	134 DE 2022
Fecha de suscripción del contrato	23/05/2022	**Fecha de suscripción del contrato**	5/05/2022
Valor Inicial	$ 43,322,137,680.00	**Valor Inicial**	$ 1,570,157,839.00
Plazo Inicial	17 MESES	**Plazo Inicial**	17 MESES
Plazo Actualizado	N/A	**Plazo Actualizado**	N/A
Fecha de Iniciación	23 de mayo de 2022	**Fecha de Iniciación**	23/05/2022
Fecha de Terminación*	23 de octubre de 2023	**Fecha de Terminación**	22/10/2022
No póliza contrato de obra	CBC-100035988	**No póliza contrato de interventoria**	15-45-101142718
Fecha aprobación	23 MAYO DE 2022	**Fecha aprobación**	12/05/2022

* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA


AMPARO	VIGENCIA (Desde- hasta)	VALOR	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DE OBRA	23/05/2022 hasta 23/04/2024	$ 8,664,427,536.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/05/2022 hasta 23/10/2026	$ 4,332,213,768.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	23/10/2023 hasta 23/10/2028	$ 10,830,534,420.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	23/05/2022 hasta 23/04/2024	$ 8,664,427,536.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL	05/05/2022 hasta 23/10/2023	$ 2,166,106,884.00	A la fecha no presenta ninguna novedad

III. ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA

No	Ubicación de la actividad	ESTADO	Valor Programado a la fecha	Valor total actividad costo directo	Valor ejecutado acumulado	%AVANCE	Descripción de la Actividad
1.1.1	Localización y Replanteo de Obras generales.	EJEUCIÓN	$ 43,087,499	$ 95,688,542.00	$ 45,966,777	48.04%	
1.3.1	Descapote mecánico E=0.15 m. (Incluye cargue y retiro a botadero)	EJEUCIÓN	$ 75,701,868	$ 96,532,269.00	$ 58,529,357	60.63%	
1.3.2	Excavaciones Mecanicas en Material Comun 0-2 M (Incuye cargue y retiro a botadero certificado)	EJEUCIÓN	$ 473,924,635	$ 604,331,481.00	$ 269,292,737	44.55%	Actividad realizada en bloque J
1.3.4	Relleno, conformación y compactación en Relleno base granular clase A Tipo INVIAS	EJEUCIÓN	$ 201,951,302	$ 269,021,457.00	$ 482,723,078	178.00%	Actividad realizada en bloque J
2.1.1	Suministro y colocación Concreto ciclópeo rajón 60% concreto 40% de 2,500 PSI (17.5 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 14,759,379	$ 54,262,642.00	$ 49,499,813	91.22%	Se realiza la instalación de concreto ciclópeo en el bloque E (CONTRAPESOS), de acuerdo con los planos estructurales.
2.1.2	Suministro y colocación Concreto limpieza 1,500 PSI (10.5 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 63,361,495	$ 232,947,020.00	$ 155,114,482	66.59%	Dadas las condiciones climáticas se presentaron inconvenientes con la zona además que se ubicaba en la zona de acceso de los bloques G y H, que únicamente se logran fundir hasta la semana 24.
2.1.3	Suministro y colocación Concreto para vigas de cimentación 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 389,169,245	$ 1,430,775,098.00	$ 282,123,166	19.72%	Por logistica de obra, el acceso a la obra por la zona del bloque E, lo que atraso la ejecución de la actividad, logrando el desarrollo de la actividad hasta la presente semana
2.1.5	Construcción de losa aligerada de fundación en concreto de 3000 PSI - 1 M (loseta superior e inferior de 0.10 M)	EJEUCIÓN	$ 353,224,606	$ 1,298,026,151.00	$ 321,028,259	24.72%	Por logística de obra, el acceso a la obra por la zona del bloque E, lo que atraso la ejecución de la actividad, logrando el desarrollo de la actividad hasta la presente semana
2.1.6	Suministro e instalación de Geotextil tejido 2,400	EJEUCIÓN	$ 22,727,519	$ 83,557,394.00	$ 61,629,980	73.76%	
2.2.1	Suministro y colocación de Concreto para vigas cimentación de rampa 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 6,821,576	$ 6,821,576.00	$ 6,821,576	100.00%	Actividad realizada en RAMPA
2.2.3	Construcción de Losa maciza en concreto 3,000 PSI (21 Mpa) 0.10 M	EJEUCIÓN	$ 35,078,819	$ 43,848,524.00	$ 27,835,870	63.48%	Actividad realizada en RAMPA
2.3.1	Suministro e instalación de Acero de refuerzo figurado fy= 420 Mpa	EJEUCIÓN	$ 535,540,809	$ 1,988,908,032.00	$ 720,050,979	36.57%	Actividad realizada en bloque A, L y N
2.3.2	Suministro e instalación de Malla electrosoldada de refuerzo fy= 550 Mpa	EJEUCIÓN	$ 72,194,843	$ 285,423,296.00	$ 103,216,471	38.89%	Actividad realizada en bloque E y RAMPA
3.1.2	Suministro e instalación de Tubería PVC sanitaria 4" (Por placa y ductos)	EJEUCIÓN	$ 596,902	$ 1,981,008.00	$ 1,981,008	100.00%	
3.1.4	Suministro e instalación de Tubería PVC sanitaria 3" (Por placa y ductos)	EJEUCIÓN	$ 351,001	$ 1,164,909.00	$ 257,471	22.10%	
3.1.6	Suministro e instalación de Tubería PVC sanitaria 2" (Por placa y ductos)	EJEUCIÓN	$ 220,142	$ 730,611.00	$ 730,611	100.00%	
3.1.8	Suministro e instalación de Tubería PVC Novafort 160 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 5,057,840	$ 16,785,372.00	$ 3,729,173	22.22%	Actividad realizada en áreas exteriores
4.1.1	Suministro y colocación de Concreto a la vista para columnas de 4,000 PSI (28 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 248,744,554	$ 944,434,572.00	$ 150,303,039	15.91%	Actividad realizada en columnas bloque C, D y E
4.2.1	Suministro e instalación de Acero de refuerzo figurado fy= 420 Mpa Vigas y Losas Entre pisos	EJEUCIÓN	$ 608,833,683	$ 1,839,526,478.00	$ 78,806,870	4.81%	Actividad realizada en bloque A
4.2.2	Suministro e instalación de Acero de refuerzo Columnas figurado fy= 420 Mpa	EJEUCIÓN	$ 283,310,307	$ 999,772,087.00	$ 335,490,315	33.56%	Actividad realizada en bloque E, N y RAMPA
4.4.1	Estructura metálica (suministro e instalación incluye anticorrosivo y acabado final esmalte sintético exteriores)	EJEUCIÓN	$ 46,094,089	$ 2,947,771,795.00	$ 3,070,095	0.12%	Platinas ubicadas en rampa para cubierta
6.2.1.1	Suministro e instalación de punto sanitario 4" para fluxómetros y sanitarios de tanque	EJEUCIÓN	$ -	$ 16,920,337.00	$ 3,597,237	21.26%	Actividad realizada en bloque E

6.2.1.3	Suministro e instalación de punto sanitario 2" para sifones de piso, duchas, lavamanos, lavaplatos, orinales, bebederos, pocetas y puntos de desagüe para equipos de cocina	EJECUCIÓN	$ -	$ 24,493,611.00	$ 4,440,788	18.13%	Actividad realizada en bloque E
6.2.2.6	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJECUCIÓN	$ -	$ 3,422,468.00	$ 4,011,621	117.21%	Actividad realizada en bloque E
6.2.2.7	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJECUCIÓN	$ -	$ 15,473,784.00	$ 2,586,277	16.71%	Actividad realizada en bloque E
6.2.2.8	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 3" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJECUCIÓN	$ -	$ 7,233,566.00	$ 279,907	3.87%	Actividad realizada en bloque E
6.2.2.9	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 2" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJECUCIÓN	$ -	$ 3,124,612.00	$ 1,617,103	51.75%	Actividad realizada en bloque E
6.2.2.10	Suministro e instalacion de tubería PVC corrugada Novafort 160 mm (Bajo tierra)	EJECUCIÓN	$ -	$ 11,457,748.00	$ 359,956	3.14%	
6.2.2.11	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 200 mm (Bajo tierra)	EJECUCIÓN	$ -	$ 7,269,664.00	$ 3,592,307	49.21%	
6.2.2.13	Suministro e instalación de pozo de inspección para red de aguas residuales (Altura promedio 2.20 m y Diametro de cuerpo del pozo1.20 m) incluye cuerpo y cono de reducción hechos en mamposteria, placa superior, placa de base hechas en	EJECUCIÓN	$ -	$ 5,144,032.00	$ 2,572,466	50.00%	
6.2.4.5	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJECUCIÓN	$ 16,067,753	$ 53,292,710.00	$ 12,456,581	23.37%	
6.2.4.8	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 355 mm (Bajo tierra)	EJECUCIÓN	$ 9,099,363	$ 30,199,104.00	$ 20,447,310	67.71%	
6.2.4.9	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 315 mm (Bajo tierra)	EJECUCIÓN	$ 3,507,324	$ 11,640,160.00	$ 10,847,174	93.19%	Actividad realizada en áreas exteriores
6.2.4.10	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 250 mm (Bajo tierra)	EJECUCIÓN	$ 10,976,074	$ 36,424,243.00	$ 5,485,127	15.09%	Actividad realizada en áreas exteriores
6.2.4.11	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 200 mm (Bajo tierra)	EJECUCIÓN	$ 746,759	$ 2,464,992.00	$ 2,320,880	97.75%	
6.2.4.15	Suministro e instalación de caja de inspección de sección cuadrada 0.80 m x 0.80 m y de altura promedio 1.60 m para aguas lluvias que incluye cuerpo, base, tapa, excavación y retiro de material; paredes de la caja en mampostería simple, tapa y base en concreto reforzado	EJECUCIÓN	$ -	$ 26,513,733.00	$ 4,641,838	18.26%	
6.2.4.16	Suministro e instalación de pozo de inspección para red de aguas lluvias (Altura promedio 2.20 m y Diametro de cuerpo del pozo1.20 m) incluye cuerpo y cono de reducción hechos en mamposteria, placa superior, placa de base hechas en concreto reforzado, excavación y retiro de material.	EJECUCIÓN	$ -	$ 25,152,194.00	$ 2,672,466	11.11%	Actividad realizada en áreas exteriores
6.2.6.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	EJECUCIÓN	$ 12,880,897	$ 41,849,920.00	$ 9,131,279	21.82%	
6.2.6.2	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	EJECUCION	$ 14,865,579	$ 49,336,110.00	$ 49,336,110	100.00%	
6.2.6.4	Retiro de material sobrante en volqueta de excavación de brecha para tubería	EJECUCIÓN	$ 3,184,126	$ 10,501,155.00	$ 10,501,155	100.00%	
7.1.2.1	Suministro e instalación de tubería bajo tierra PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento en uniones tubo a tubo	EJECUCION	$ 32,071,026	$ 106,439,805.00	$ 17,160,230	16.12%	Actividad realizada en áreas exteriores, Junto bloques N, M y L.
7.1.2.2	Suministro e instalación de codo 90° para PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	EJECUCIÓN	$ 7,560,662	$ 25,158,882.00	$ 7,188,252	28.57%	
7.1.2.4	Suministro e instalación de tee para tubería PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	EJECUCIÓN	$ 9,147,730	$ 30,360,628.00	$ 2,335,356	7.69%	
7.1.3.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	EJECUCIÓN	$ 2,080,231	$ 6,903,904.00	$ 185,628	2.69%	
7.1.3.2	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	EJECUCIÓN	$ 2,430,849	$ 8,067,540.00	$ 1,079,809	13.38%	
7.1.3.4	Retiro de material sobrante en volqueta de excavación de brecha para tubería	EJECUCIÓN	$ 522,332	$ 1,733,524.00	$ 232,026	13.38%	
26.1	Aseo Permanente en Obra	EJECUCIÓN	$ 15,084,424	$ 46,446,640.00	$ 13,547,520	29.17%	Actividad ejecutada permanente en obra
28.1	Mejoramiento de terreno y detección de fallas	EJECUCIÓN		$ 0.00	$ 12,019,739		Actividad ejecutada en bloque J
28.2	Tratamiento de fallas	EJECUCIÓN		$ 0.00	$ 175,567,735		
28.3	Reemplazo de material organico por Recebo Común	EJECUCIÓN		$ 0.00	$ -		
28.4	Suministro e Instalación de cerramiento en láminas de superboard de 8 mm, Altura 2.4m	EJECUCIÓN		$ 0.00	$ -		

VALOR PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	SEMANAL	ACUMULADO PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	SEMANAL	ACUMULADO EJE.	ATRASO
$ 4,280,928,709.76	$ 677,267,526.60	$ 4,958,194,236.36	$ 3,091,956,543.12	$ 447,088,756.19	$ 3,539,045,299	-$ 1,419,148,937.040910
12.15%	1.92%	14.07%	8.78%	1.27%	10.05%	4.03%

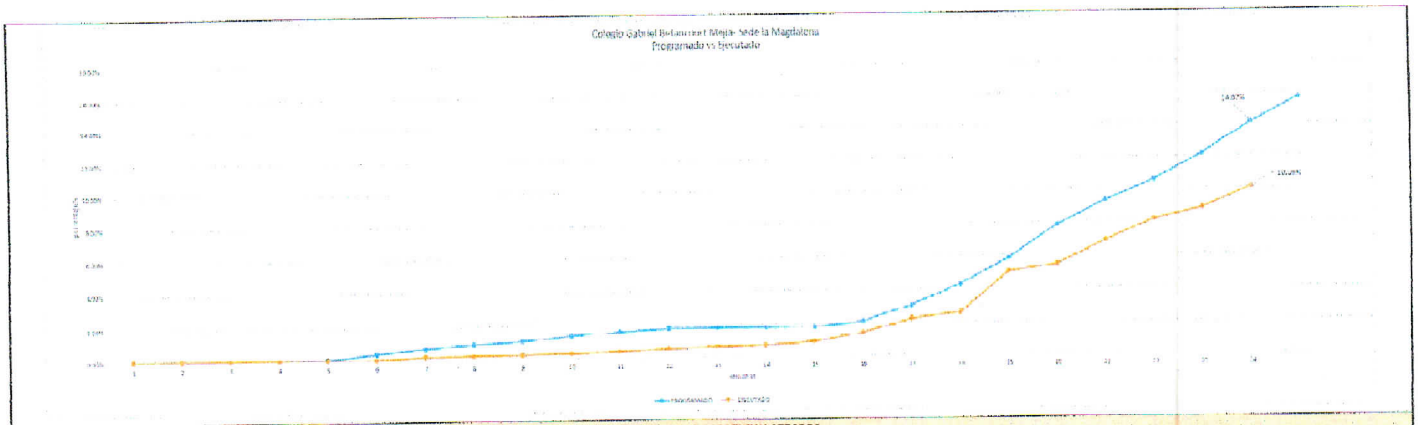

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASOS

Item	Actividad	Valor Programado a la fecha	Fecha de inicio	Fecha de terminacion	Atraso en dias respecto al inicio de la actividad	Atraso con respecto al presupuesto total	OBSERVACIONES
1.3.1	Descapote mecanico Be0.15 m (Incluye cargue y retiro a botadero)	$ 75.701.868	20/06/2022	10/03/2023	-139	-0.85%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que actualmente se encuentran en uso por el colegio, atraso no imputable al contratista.
1.3.2	Excavaciones Mecanicas en Material Comun 0-2 M (Incluye cargue y retiro a botadero certificado)	$ 473.024.635	27/06/2022	17/03/2023	-132	-0.58%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que actualmente se encuentran en uso por el colegio, atraso no imputable al contratista.
1.3.3	Relleno, conformación y compactación en Relleno subbase granular clase A Tipo INVIAS a maquina	$ 287.936.612	5/11/2022	3/07/2023	-1	-0.78%	Los exteriores están siendo usados en zona de almacenamiento y/o campamentos razón por la que no pueden ser intervenidas de forma simultánea.
2.1.3	Suministro y colocación Concreto para vigas de cimentación 3,000 PSI (21 Mpa)	$ 389.169.245	12/09/2022	5/03/2023	-55	-0.30%	Zona usada como punto de acopio actualmente.
2.1.4	Suministro y colocación Concreto para zapatas de cimentación 3,000 PSI (21 Mpa)	$ 4.124.807	12/09/2022	5/03/2023	-55	-0.01%	Zona usada como punto de acopio actualmente.
2.2.2	Construccion de zapatas de cimentación para rampa en concreto 3000 PSI (21 Mpa)	$ 15.885.812	7/11/2022	10/12/2022	1	-0.05%	Zona usada como punto de acopio actualmente.
4.1.1	Suministro y colocación de Concreto a la vista para columnas de 4,000 PSI (28 Mpa)	$ 248.744.564	19/09/2022	4/04/2023	-48	-0.28%	La actividad es posterior a la ejecución de la placa aligerada, ítem que se encuentra pendiente de aprobación de la entidad contratante para su ejecución
4.1.2	Suministro y colocación de Concreto a la vista para vigas aereas de 3,000 PSI (21 Mpa)	$ 530.037.243	3/10/2022	7/05/2023	-34	-1.50%	La actividad es posterior a la ejecución de la placa aligerada, ítem que se encuentra pendiente de aprobación de la entidad contratante para su ejecución.
4.1.4	Construcción de Placa aligerada a la vista en cubierta h= 0,30 M concreto 3,000 PSI (21 Mpa)	$ 208.388.750	3/10/2022	7/05/2023	-34	-0.59%	Se presenta variación con relación a la altura de la placa, razón por la cual se requirió una modificación del ítem, la cual se encuentra a la espera de aprobación de la ERU para su ejecución
4.2.3	Suministro e instalación de Malla electrosoldada de refuerzo fy= 550 Mpa	$ 67.088.189	3/10/2022	7/05/2023	-34	-0.19%	La actividad es posterior a la ejecución de la placa aligerada, ítem que se encuentra pendiente de aprobación de la entidad contratante para su ejecución.
6.1.3.1	Suministro e instalación de Tubería PVC presión 4" unión mecánica RDE 21 200 PSI	$ 2.670.179	12/11/2022	22/05/2023	6	-0.01%	La zona de intervención se encuentra actualmente en uso por el colegio
6.1.4.1	Excavación manual en material comun de brecha para tubería	$ 3.441.321	12/11/2022	22/05/2023	6	-0.01%	La zona de intervención se encuentra actualmente en uso por el colegio
6.1.4.2	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	$ 4.020.251	12/11/2022	22/05/2023	6	-0.01%	La zona de intervención se encuentra actualmente en uso por el colegio
6.1.4.3	Relleno de brecha con material de la obra (incluye compactación manual)	$ 3.004.902	12/11/2022	22/05/2023	6	-0.01%	La zona de intervención se encuentra actualmente en uso por el colegio
21.1.1	Excavación mecánica (incluye retiro de sobrantes)	$ 33.720.999	27/06/2022	18/03/2023	-132	-0.10%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que actualmente se encuentran en uso por el colegio, atraso no imputable al contratista, los exteriores están siendo usados en zona de almacenamiento y/o campamentos razón por la que no puedan ser intervenidas de forma simultánea

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

Durante la semana 24 comprendidas entre los días 31 de octubre al 06 de noviembre del 2022 se radico el siguiente oficio:
1. El día 31 de octubre del 2022 se da respuesta al oficio GNGSERV_RTA_ERU_16_2021_211 con No. de radicado CCERU-22-287 con respecto al APU del concreto reforzado en mampostería. Es da respuesta al oficio GNGSERV_RTA_ERU_16_2021_210 con No. de radicado CCERU-22-288 con respecto al nuevo trazado y ubicación de cajas del componente hidrosanitario.
2. El día 1 de noviembre del 2022 se radica en el No. de oficio CCERU-22-295 con respecto a la solicitud de aclaración de rellenos pinaleta acceso al colegio
3. El día 3 de noviembre del 2022 se radica el No. de oficio CCERU-22-297 con respecto a la radicación de no previstos
4. El día 4 de noviembre del 2022 se radica el oficio CCERU-22-301 acerca de la solución estructural y respuesta al supervisor. Se radica el oficio CCERU 22 302 con el plan parcial de intervención del colegio la magdalena

Aspecto Financiero

Durante la semana presente se manifestó lo siguiente:
1. El día 1 de noviembre del 2022 se da respuesta al oficio GNGSERV_RTA_ERU_16_2021_213 y GNGSERV_RTA_ERU_16_2021_214 con No. de radicado CCERU-22-293 con respecto al tema de los rendimientos de julio y agosto, inversión de anticipo del mes de agosto
2. El día 2 de noviembre del 2022 se radica con No. de oficio CCERU-22-296 la solicitud de ordenar o pagar de derechos económicos de las actas de avance parcial durante la ejecución del contrato

Aspecto Técnico

Durante la semana se radicaron los siguientes oficios:
1. El día 31 de octubre del 2022 se radica el No. de oficio CCERU-22-289 los resultados de laboratorio del arranque de columnas, columnas, losa aligerada del bloque A. Arranque de columnas, vigas, viguetas, torta superior del Bloque B y solado del Bloque M
2. El día 1 de noviembre del 2022 se radica el No. de oficio CCERU-22-292 los resultados de laboratorio de columnas del Bloque A, cimentación, columnas, torta inferior del Bloque C y cimentación, columnas y torta inferior del Bloque D
3. El día 4 de noviembre del 2022 se radica el No. de oficio CCERU-22-300 los resultados de laboratorio de la segunda capa del Bloque G, Bloque H y Bloque O y se adjunta muestra de cilindros de columnas Bloque B

Se inicia con las siguientes actividades.
1. No se continúa con la compactación de la base granular por las fuertes lluvias que se presentan en jornadas de las tardes y en las madrugadas afectando el normal desarrollo de la obra.
2. Se presenta dificultad en el acceso de la obra debido a las fuertes lluvias presentadas durante la semana, razón por la que se adecua con razón el acceso por la zona del bloque J, sin embargo aun con este material los vehículos de carga de materiales no logran pasar a los demás módulos.
2. Se continúa con el armado de la losa de entrepiso del bloque A, a la espera de aprobación del ítem para la ejecución de la actividad.
3. Se funde la losa del bloque E y RAMPA, se ha tenido dificultades con la verticalidad del acero de las columnas lo que ha atrasado la ejecución de la actividad, ya que debe ser entregada a interventoría previa a su intervención.
4. Se realizan excavaciones y rellenos en zona de tuberías e instalación de tuberías de redes sanitarias, aguas lluvias y red contra incendios.
5. Se continúa con el armado de acero del bloque N, se presentan inconsistencias con respecto a su despiece al no incluir la totalidad de los elementos y/ o secciones de vigas más cortas a las requeridas.
6. Dada la cuantía de acero de las columnas y losa aligerada se presentan desplazamientos en el acero de las columnas las cuales son tolerables, razón por la que se priorizan los recubrimientos de acuerdo a la NSR-10.
7. Simultáneamente se funde concreto pobre en el bloque G y H

Aspecto SST-Ambiental

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto Ambiental:
1. El día 31 de octubre del 2022 se hace entrega V1 de informe mensual ambiental No. 5 (Octubre) y adecuación cárcamo lavado de llantas.
2. El día 1 de noviembre del 2022 se hace recorrido de obra contratista, protección, demarcación de materiales, toma de registro de remisiones de materiales para finalizar consolidación de cantidades, visita atención al usuario SDA en donde la entidad indica que no se requiere de autorizaciones o pagos para la instalación de pendones e indican que la gestión debe realizarse con la alcaldía local de Kennedy.
3. El día 2 de noviembre del 2022 se hace comunicación con la alcaldía de Kennedy, indican que se debe enviar un oficio a la dependencia de Infraestructura de la Alcaldía local informando la instalación de los pendones en obra, para recibir una autorización de instalación.
4. El día 3 de noviembre del 2022 recibe correo electrónico del área administrativa con la información y pasos a seguir para la instalación de pendones de obra
5. El día 4 de noviembre del 2022 se realiza recorrido de obra contratista, mejoras en la señalización de los puntos ecológicos y ajustes cantidades de materiales de octubre.
6. El día 5 de noviembre del 2022 se finaliza el ajuste de cantidades y entrega de informe ambiental No. 5 a través de correo electrónico, desarrollo de protocolo de instalación, mantenimiento y desmonte de pendones de obra.

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto SST:
1. El día 31 de octubre del 2022 se realizo preoperacional de minicargador, orden y aseo, charla de seguridad e inducción
2. El día 1 de noviembre del 2022 se realizó preoperacional de minicargador, charla de seguridad, orden y aseo y trabajo de alto riesgo alturas
3. El día 2 de noviembre del 2022 se realizó preoperacional de minicargador, orden y aseo, trabajo de alto riesgo(alturas) e inducciones
4. El día 3 de noviembre del 2022 se realizó preoperacional de minicargador, inducciones, orden aseo y trabajo de alto riesgo(alturas)
5. El día 4 de noviembre del 2022 se realizo preoperacional de minicargador, charla de seguridad y trabajo de alto riesgo(alturas)
6. El día 5 de noviembre del 2022 se realizó preoperacional de minicargador y charla trabajo de alto riesgo(alturas)

Aspecto Social

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:
1. El día 31 de octubre del 2022 una vez aprobada por entidad contratante e interventoría, se remite a dirección Local de Educación el acta de reunión del Comité de Participación Ciudadana No 3, presentación y listados de asistencia.
2. El día 1 de noviembre del 2022 se realizó asistencia y participación en comité de seguimiento social. S efectúa visita de verificación para atender la PQRS No 1, en la cual se identifica problemas en la instalación de la soldadura en bisagras de puerta de acceso principal, se establece como compromiso remitir respuesta al peticionario. Se proyecta respuesta a la PQRS No 1, la cual se remite a la dirección de obra para complemento y aval. Se realiza remisión a interventoria para revisión y aval informe mensual social No 5.
3. El día 3 de noviembre del 2022 se realizo atención de observaciones al informe mensual social No. 5.
4. El día 4 de noviembre del 2022 se remite para revisión y aval de interventoría, oficio No CCERU-SOC-037 con la respuesta a la PQRS No 1.

Entre el 31 de octubre y 05 de noviembre de 2022. Se garantizó la Atención a la Ciudadanía, conforme a los mecanismos de atención al ciudadano disponibles (línea de atención telefónica, correo electrónico), tal mismo, la ciudad atendido en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) en el horario presencial establecido los días jueves entre la 1:00 pm y las 5:00 pm.

Aspecto PMT

No se presento nada con relacion al componente

Plan de Manejo de Trafico*						
Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación
25315 COI No. 27	20226120170842?* 20226120174665?*	8/07/2022	8/07/2023			
25316 COI No. 27	20226120170842?* 20226120174665?*	8/07/2022	8/07/2023			
35146 COI No. 37	20226120261231?*	16/09/2022	22/12/2022			
35147 COI No. 37	20226120257666?*	16/09/2022	14/09/2023			

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE OBRA
De acuerdo a corte de programación con fecha del día 06/11/2022 el presente informe se presenta un atraso del 4,03% representando en actividades de excavación en la zona que actualmente está en uso del colegio, rellenos en sub base granular en zonas comunes que no se pueden intervenir porque se encuentran en zona de campamentos y/o almacenamiento de material, respecto a la placa aligerada nos encontramos a la espera de aprobación de la entidad contratante para su aprobación.	Firma
