2022 CONSORCIO COLEGIO ERU 2022	**INFORME SEMANAL**	FT 300 VERSIÓN: 00 23/05/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	Contrato de obra no. 133 de 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.**				
SEMANA No.	26	**DEL**	14 de noviembre de 2022	**AL**	20 de noviembre de 2022
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	181	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**		ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ	

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista	**Consorcio Colegio ERU 2022**	**Interventor**	**GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS**
Contrato No.	**133 de 2022**	**Contrato No.**	**134 DE 2022**
Fecha de suscripción del contrato	23/05/2022	**Fecha de suscripción del contrato**	5/05/2022
Valor Inicial	$ 43,322,137,680.00	**Valor Inicial**	$ 1,570,157,939.00
Plazo Inicial	17 MESES	**Plazo Inicial**	17 MESES
Plazo Actualizado	N/A	**Plazo Actualizado**	N/A
Fecha de Iniciación	23 de mayo de 2022	**Fecha de Iniciación**	23/05/2022
Fecha de Terminación*	23 de octubre de 2023	**Fecha de Terminación**	22/10/2022
No póliza contrato de obra	CBC-100035966	**No póliza contrato de interventoria**	15-45-101142718
Fecha aprobación	23 MAYO DE 2022	**Fecha aprobación**	12/05/2022

* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA

AMPARO	VIGENCIA (Desde- hasta)	VALOR	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DE OBRA	23/05/2022 hasta 23/04/2024	$ 8,664,427,536.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/05/2022 hasta 23/10/2026	$ 4,332,213,768.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	23/10/2023 hasta 23/10/2028	$ 10,830,534,420.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	23/05/2022 hasta 23/04/2024	$ 8,664,427,536.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL	05/05/2022 hasta 23/10/2023	$ 2,166,106,884.00	A la fecha no presenta ninguna novedad


III. ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA

No	Ubicación de la actividad	ESTADO	Valor Programado a la fecha	Valor total actividad costo directo	Valor ejecutado acumulado	%AVANCE	Descripción de la Actividad
1.1.1	Localización y Replanteo de Obras generales.	EJEUCIÓN	$ 43,087,499	$ 95,688,542.00	$ 45,966,777	48.04%	
1.3.1	Descapote mecánico E=0.15 m. (Incluye cargue y retiro a botadero)	EJEUCIÓN	$ 75,701,868	$ 96,532,269.00	$ 58,529,357	60.63%	
1.3.2	Excavaciones Mecanicas en Material Comun G-2 M (Incuye cargue y retiro a botadero certificado)	EJEUCIÓN	$ 473,924,635	$ 604,331,461.00	$ 269,202,737	44.55%	
1.3.4	Relleno, conformación y compactación en Relleno base granular clase A Tipo INVIAS	EJEUCIÓN	$ 201,951,302	$ 942,475,330.00	$ 499,325,333	52.98%	Se tuvo una mejora en el clima, razón por la que se logra intervenir el bloque J por tramos, se da inicio a la primera capa
2.1.1	Suministro y colocacion Concreto ciclópeo rajón 60% concreto 40% de 2,500 PSI (17.5 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 14,759,379	$ 86,953,143.00	$ 55,408,471	63.72%	
2.1.2	Suministro y colocacion Concreto limpieza 1,500 PSI (10.5 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 63,361,495	$ 232,947,620.00	$ 155,114,482	66.59%	
2.1.3	Suministro y colocacion Concreto para vigas de cimentación 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 389,169,245	$ 1,430,775,096.00	$ 340,220,513	23.78%	
2.1.5	Construccion de Losa aligerada de fundación en concreto de 3000 PSI - 1 M (loseta superior e inferior de 0.10 M)	EJEUCIÓN	$ 353,224,606	$ 1,298,625,151.00	$ 347,036,512	26.72%	
2.1.6	Suministro e instalacion de Geotextil tejido 2,400	EJEUCIÓN	$ 22,727,519	$ 83,557,394.00	$ 67,092,380	80.29%	Se tuvo una mejora en el clima, razón por la que se logra intervenir el bloque J por tramos, se da inicio a la primera capa
2.2.1	Suministro y colocacion de Concreto para vigas cimentacion de rampa 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 6,821,576	$ 33,401,960.00	$ 33,401,960	100.00%	Se avanza en la rampa
2.2.3	Construcción de Losa maciza en concreto 3,000 PSI (21 Mpa) 0.10 M	EJEUCIÓN	$ 35,078,819	$ 43,848,524.00	$ 27,835,870	63.48%	
2.3.1	Suministro e instlación de Acero de refuerzo figurado fy= 420 Mpa	EJEUCIÓN	$ 535,540,809	$ 1,968,908,032.00	$ 851,383,075	43.24%	Se avanza en bloque L
2.3.2	Suministro e instalacion de Malla electrosoldada de refuerzo fy= 550 Mpa	EJEUCIÓN	$ 72,194,843	$ 265,423,296.00	$ 156,555,846	58.98%	Se instala en bloque N
3.1.2	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 4" (Por placa y ductos)	EJEUCIÓN	$ 596,902	$ 16,226,946.00	$ 4,764,808	29.36%	
3.1.4	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 3" (Por placa y ductos)	EJEUCIÓN	$ 351,001	$ 5,670,326.00	$ 1,053,051	18.57%	
3.1.6	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 2" (Por placa y ductos)	EJEUCIÓN	$ 220,142	$ 92,838,682.00	$ 1,291,853	1.39%	
3.1.8	Suministro e instalacion de Tubería PVC Novafort 160 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 5,057,640	$ 16,785,372.00	$ 3,729,173	22.22%	
4.1.1	Suministro y colocacion de Concreto a la vista para columnas de 4,000 PSI (28 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 248,744,554	$ 944,434,572.00	$ 192,480,884	20.38%	
4.1.2	Suministro y colocacion de Concreto a la vista para vigas aéreas de 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 530,037,243	$ 1,707,849,179.00	$ 69,747,127	4.08%	
4.2.1	Suministro e instalacion de Acero de refuerzofigurado fy= 420 Mpa Vigas y Losas Entre-pisos	EJEUCIÓN	$ 508,833,883	$ 1,639,528,478.00	$ 156,830,550	9.57%	Se continúa con armado del bloque B, C y D
4.2.2	Suministro e instalacion de Acero de refuerzo Columnas figurado fy= 420 Mpa	EJEUCIÓN	$ 263,319,307	$ 999,772,067.00	$ 366,719,728	36.68%	Armado arranque columnas módulo N, Bloque, Entre piso

4.2.3	Suministro e instalacion de Malla electrosoldada de refuerzo fy= 550 Mpa	EJEUCIÓN	$ 67,088,189	$ 216,166,901.00	$ 8,824,181	4.08%	
4.4.1	Estructura metálica (suministro e instalación incluye anticorrosivo y acabado final esmalte sintético exteriores)	EJEUCIÓN	$ 46,094,049	$ 2,947,771,795.00	$ 3,670,885	0.12%	
6.2.1.1	Suministro e instalación de punto sanitario 4" para fluxómetros y sanitarios de tanque	EJEUCIÓN	$ -	$ 16,920,337.00	$ 4,663,065	27.56%	
6.2.1.3	Suministro e instalación de punto sanitario 2" para sifones de piso, duchas, lavamanos, lavaplatos, orinales, bebederos, pocetas y puntos de desagüe para equipos de cocina	EJEUCIÓN	$ -	$ 24,493,611.00	$ 5,897,895	24.08%	
6.2.2.6	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ -	$ 20,153,447.00	$ 4,011,621	19.91%	
6.2.2.7	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ -	$ 15,473,784.00	$ 2,586,277	16.71%	
6.2.2.8	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 3" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ -	$ 7,233,588.00	$ 279,987	3.87%	
6.2.2.9	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 2" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ -	$ 3,124,612.00	$ 1,617,103	51.75%	
6.2.2.10	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 160 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ -	$ 11,457,748.00	$ 359,956	3.14%	
6.2.2.11	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 200 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ -	$ 7,299,664.00	$ 3,592,367	49.21%	
6.2.2.12	Suministro e instalación de caja de inspección de sección cuadrada 0.80 m x 0.80 m y de altura promedio 1.50 m para aguas residuales que incluye cuerpo, base, tapa, excavación y retiro de material; paredes de la caja en mampostería simple, tapa y base en concreto reforzado	EJEUCIÓN	$ -	$ 13,833,252.00	$ 4,611,084	33.33%	
6.2.2.13	Suministro e instalación de pozo de inspección para red de aguas residuales (Altura promedio 2.20 m y Diametro de cuerpo del pozo1.20 m) incluye cuerpo y cono de reducción hechos en mampostería, placa superior, placa de base hechas en concreto reforzado, excavación y retiro de material	EJEUCIÓN	$ -	$ 5,144,932.00	$ 2,572,466	50.00%	
6.2.4.1	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ -	$ 9,285,600.00	$ 354,888	3.82%	
6.2.4.2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ -	$ 43,440,600.00	$ 17,497,253	40.28%	
6.2.4.5	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 18,057,753	$ 53,292,716.00	$ 12,456,561	23.37%	
6.2.4.8	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 355 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 9,099,363	$ 30,199,104.00	$ 20,447,310	67.71%	
6.2.4.9	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 315 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 3,507,324	$ 11,640,186.00	$ 10,847,174	93.19%	
6.2.4.10	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 250 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 10,975,074	$ 36,424,243.00	$ 5,495,127	15.09%	
6.2.4.11	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 200 mm (Bajo tierra)	EJEUCIÓN	$ 748,759	$ 2,484,992.00	$ 2,329,680	93.75%	
6.2.4.13	Suministro e instalación de tragantes de aguas lluvias 6" x 4"	EJEUCIÓN	$ -	$ 5,235,537.00	$ 259,165	4.95%	
6.2.4.15	Suministro e instalación de caja de inspección de sección cuadrada 0.80 m x 0.80 m y de altura promedio 1.50 m para aguas lluvias que incluye cuerpo, base, tapa, excavación y retiro de material; paredes de la caja en mampostería simple, tapa y base en concreto reforzado	EJEUCIÓN	$ -	$ 26,513,733.00	$ 4,611,084	17.39%	
6.2.4.16	Suministro e instalación de pozo de inspección para red de aguas lluvias (Altura promedio 2.20 m y Diametro de cuerpo del pozo1.20 m) incluye cuerpo y cono de reducción hechos en mampostería, placa superior, placa de base hechas en concreto reforzado, excavación y retiro de material.	EJEUCIÓN	$ -	$ 23,152,194.00	$ 5,144,932	22.22%	
6.2.6.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	EJEUCIÓN	$ 12,609,897	$ 48,785,278.00	$ 9,131,279	18.72%	
6.2.6.2	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	EJEUCIÓN	$ 14,865,579	$ 227,154,621.00	$ 49,336,110	21.72%	
6.2.6.4	Retiro de material sobrante en volqueta de excavación de brecha para tubería	EJEUCIÓN	$ 3,164,128	$ 10,501,155.00	$ 10,501,155	100.00%	
7.1.2.1	Suministro e instalación de tubería bajo tierra PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento en uniones tubo a tubo	EJEUCIÓN	$ 32,071,626	$ 106,439,805.00	$ 27,827,400	26.14%	
7.1.2.2	Suministro e instalación de codo 90° para PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	EJEUCIÓN	$ 7,580,682	$ 25,158,882.00	$ 7,188,252	28.57%	
7.1.2.4	Suministro e instalación de tee para tubería PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	EJEUCIÓN	$ 9,147,730	$ 30,359,628.00	$ 2,335,356	7.69%	
7.1.3.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	EJEUCIÓN	$ 2,080,231	$ 6,903,904.00	$ 369,452	5.35%	

7.1.3.2	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	EJEUCIÓN	$ 2,430,849	$ 8,067,540.00	$ 1,722,110	21.35%	
7.1.3.3	Relleno de brecha con material de la obra (incluye compactación manual)	EJEUCIÓN	$ 1,277,371	$ 4,239,360.00	$ 44,237	1.04%	
7.1.3.4	Retiro de material sobrante en volqueta de excavación de brecha para tubería	EJEUCIÓN	$ 522,332	$ 1,733,524.00	$ 232,026	13.38%	
26.1	Aseo Permanente en Obra	EJEUCIÓN	$ 15,064,424	$ 46,446,640.00	$ 14,112,000	30.38%	
28.1	Mejoramiento de terreno y deseccion de fallos	EJEUCIÓN		$ 0.00	$ 12,019,739		
28.2	Tratamiento de fallos	EJEUCIÓN		$ 0.00	$ 253,626,157		Se instala en bloque J
28.3	Reemplazo de material organico por Recebo Común	EJEUCIÓN		$ 0.00	$ 3,218,741		
28.4	Suministro e Instalacion de cerramiento en laminas de superboard de 6 mm, Altura 2.4m	EJEUCIÓN		$ 0.00	$ 14,899,552		Se construye con el fin de mejorar el aislamiento entre el colegio que actualmente está en funcionamiento y la obra
28.5	Construcción de Placa aligerada en concreto 3,000 PSI (21 Mpa) a la vista con casetón en icopor h= 0.49m y bocel,	EJEUCIÓN		$ 823,130,556.36	$ 33,605,614		

VALOR PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	SEMANAL	ACUMULADO PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	SEMANAL	ACUMULADO EJE.	ATRASO
$ 5,514,145,708.57	$ 567,778,225.20	$ 6,081,923,933.77	$ 3,959,808,529.07	$ 308,183,445.84	$ 4,265,991,975	-$ 1,815,931,958.963620
15.65%	1.61%	17.26%	11.24%	0.87%	12.11%	-5.15%

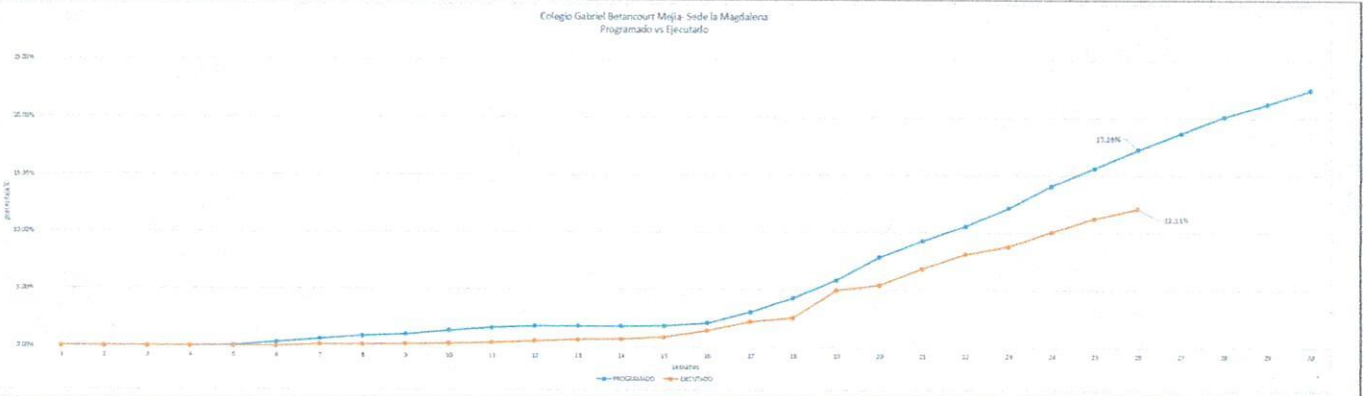

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASOS

Item	Actividad	Valor Programado a la fecha	Fecha de inicio	Fecha de terminacion	Atraso en dias respecto al inicio de la actividad	Atraso con respecto al presupuesto total	OBSERVACIONES
1.3.1	Descapote mecánico E=0.15 m. (Incluye cargue y retiro a botadero)	$ 75,701,868	20/06/2022	16/03/2023	-153	-0.05%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que actualmente se encuentran en uso por el colegio, atraso no imputable al contratista.
1.3.2	Excavaciones Mecanicas en Material Comun 0-2 M (Incuye cargue y retiro a botadero certificado)	$ 473,924,635	27/06/2022	17/01/2023	-146	-0.58%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que actualmente se encuentran en uso por el colegio, atraso no imputable al contratista.
1.3.3	Relleno, conformación y compactación en Relleno subbase granular clase A Tipo INVIAS a máquina	$ 287,936,612	5/11/2022	3/07/2023	-15	-0.76%	Los exteriores están siendo usados en zona de almacenamiento y/o campamentos razón por la que no pueden ser intervenidas de forma simultánea.
2.1.3	Suministro y colocacion Concreto para vigas de cimentación 3,000 PSI (21 Mpa)	$ 389,169,245	12/09/2022	5/01/2023	-69	-0.14%	Zona utilizada como punto de acopio actualmente.
2.1.4	Suministro y colocacion Concreto para zapatas de cimentacion 3,000 PSI (21 Mpa)	$ 4,124,867	12/09/2022	5/01/2023	-69	-0.01%	Zona utilizada como punto de acopio actualmente.
2.2.2	Construccion de Zapatas de cimentación para rampa en concreto 3000 PSI (21 Mpa)	$ 15,865,612	7/11/2022	10/12/2022	-13	-0.05%	Zona utilizada como punto de acopio actualmente.
4.1.1	Suministro y colocacion de Concreto a la vista para columnas de 4,000 PSI (28 Mpa)	$ 248,744,554	18/08/2022	4/04/2023	-62	-0.16%	La actividad Es posterior a la ejecución de la placa aligerada, ítem que la entidad informo que se podia ejecutar, que estaba pendiente documento de legalización
4.1.2	Suministro y colocacion de Concreto a la vista para vigas aéreas de 3,000 PSI (21 Mpa)	$ 530,037,243	3/10/2022	7/05/2023	-48	-1.31%	La actividad se debe desarrollar de forma simultánea con la placa aligerada, ítem que la entidad informo que se podia ejecutar, que estaba pendiente documento de legalización
4.1.4	Construcción de Placa aligerada a la vista en casetón h= 0.30 M concreto 3,000 PSI (21 Mpa)	$ 206,388,750	3/10/2022	7/05/2023	-48	-0.59%	Se presenta variación con relación a la altura de la placa, razón por la que se requirió una modificación del ítem, ítem que la entidad informo que se podia ejecutar, que estaba pendiente documento de legalización
4.2.1	Suministro e instalacion de Acero de refuerzofigurado fy= 420 Mpa Vigas y Losas Entre-pisos	$ 508,833,663	3/10/2022	7/05/2023	-48	-1.00%	La actividad se debe desarrollar de forma simultánea con la placa aligerada, ítem que la entidad informo que se podia ejecutar, que estaba pendiente documento de legalización
4.2.3	Suministro e instalacion de Malla electrosoldada de refuerzo fy= 550 Mpa	$ 67,086,189	3/10/2022	7/05/2023	-48	-0.17%	La actividad es posterior a la ejecución de la placa aligerada, ítem que la entidad informo que se podia ejecutar, que estaba pendiente documento de legalización
5.1.1	Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a dos caras. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo.	$ 136,662,386	24/10/2022	11/06/2023	-27	-0.39%	La actividad requiere que se desarrolle de manera simultánea con el ítem de dovelas, el cual no fue contemplado dentro del presupuesto, se encuentra en trámite y nos encontramos atentos a la aprobación del ítem para su ejecución.
5.1.2	Construccion de muro cortafuego en doble Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a una cara. Incluye mortero de pega y acero	$ 27,371,614	24/10/2022	11/06/2023	-27	-0.08%	La actividad requiere que se desarrolle de manera simultánea con el ítem de dovelas, el cual no fue contemplado dentro del presupuesto, se encuentra en trámite y nos encontramos atentos a la aprobación del ítem para su ejecución.
5.1.3	Construccion de Anclaje para reforzamiento en concreto y epóxico para ø 3/8" . de profundidad estándar (perforación - limpieza - epóxico)	$ 21,367,969	24/10/2022	11/06/2023	-27	-0.06%	La actividad requiere que se desarrolle de manera simultánea con el ítem de dovelas, el cual no fue contemplado dentro del presupuesto, se encuentra en trámite y nos encontramos atentos a la aprobación del ítem para su ejecución.
6.1.3.1	Suministro e instalación de Tubería PVC presión 4" unión mecánica RDE 21 - 200 PSI	$ 2,670,176	12/11/2022	23/05/2023	-8	-0.01%	La zona de intervención se encuentra actualmente en uso por el colegio
6.1.4.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	$ 3,341,221	12/11/2022	23/05/2023	-8	-0.01%	La zona de intervención se encuentra actualmente en uso por el colegio
6.1.4.2	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	$ 4,020,251	12/11/2022	22/05/2023	-9	-0.01%	La zona de intervención se encuentra actualmente en uso por el colegio
6.1.4.3	Relleno de brecha con material de la obra (incluye compactación manual)	$ 2,054,902	12/11/2022	23/05/2023	-8	-0.01%	La zona de intervención se encuentra actualmente en uso por el colegio
21.1.1	Excavación mecánica (incluye retiro de sobrantes)	$ 33,726,696	27/06/2022	18/03/2023	-146	-0.10%	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que actualmente se encuentran en uso por el colegio, atraso no imputable al contratista, los exteriores están siendo usados en zona de almacenamiento y/o campamentos razón por la que no pueden ser intervenidas de forma simultánea.

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

Durante la semana 28 comprendidos entre los días 14 de noviembre al 20 de noviembre del 2022, se radicó el siguiente oficio:
1. El día 15 de noviembre del 2022 se radica el Acta parcial de obra No. 4 con No. de radicado CCERU-22-318
2. El día 17 de noviembre del 2022 se radica el plan de choque - plan de contingencia en el oficio No. CCERU-22-323

Aspecto Financiero

Durante la semana presente se manifestó lo siguiente:
1. El día 15 de noviembre se radicó la planilla No. 13 con un valor de $ 1.250.093.494 para suministro de concreto y acero

Aspecto Técnico

Durante la semana se radicó los siguientes oficios:
1. El día 17 de noviembre se radica el balance de obra No. 5 con el No. de oficio CCERU-22-324. Se radica la ficha técnica del ladrillo en el No. de oficio CCERU-22-325

Se avanza con las siguientes actividades:
1. Se retoma la actividad de compactación de la base granular y mejoramiento en rajón en el bloque J y carreteable de acceso, se realiza por fases, ya que si bien mejoro las condiciones climáticas, aun se presentan lluvias en las jornadas laborales.
2. Con el visto bueno por parte de la entidad del ítem de placa aligerada, se procede a la ejecución de la actividad, es de tener en cuenta que la actividad fue aprobada hasta la semana 25 lo que genero un atraso en las actividades de placa.
3. Se continúa con el armado de la losa de entrepiso del bloque B, D, C. y armado de estructura del bloque E
4. Se realizan excavaciones y rellenos en zona de tuberías e instalación de tuberías de redes sanitarias, aguas lluvias y red contra incendios, e instalación e puntos y redes en bloque L y N.
5. Se continúa con el armado de acero del bloque L, se presentan inconsistencias con respecto a su despiece, lo que afecta el normal desarrollo de la actividad

Aspecto SST-Ambiental

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto Ambiental:
1. El día 17 de noviembre del 2022 se elabora la presentación de comité de participación ciudadana componente forestal y componente ambiental, limpieza de vías

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto SST:
1. El día 15 de noviembre del 2022 se realiza precperacional minicargador, charla de seguridad, lavado de baños y trabajo de alto riesgo(alturas)
2. El día 16 de noviembre del 2022 se realiza precperacional minicargador, charla de seguridad, lavado de baños, trabajo de alto riesgo(alturas) e inducción
3. El día 17 de noviembre del 2022 se realiza charla de seguridad, inspecciones, trabajo en alturas, trabajo en caliente y precperacional de minicargador
4. El día 18 de noviembre del 2022 se realiza precperacionales de minicargador, trabajo en alturas, trabajo en caliente, inspecciones, orden y aseo
5. El día 19 de noviembre del 2022 se realiza precperacional de minicargador, charla de seguridad, trabajo en alturas y caliente

Aspecto Social

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:
1. El día 14 de noviembre del 2022 se remite a través de correo electrónico, piezas informativas No 18 y 19 correspondientes a convocatoria para el Comité de participación Ciudadana No 5 (Rectoría, líderes del CPC Y administradores de conjuntos aledaños)
2. El día 17 de noviembre del 2022 se hace asistencia y participación en comité de seguimiento social.
3. El día 19 de noviembre del 2022 se remite a interventoría, relación de personal Mano de Obra No Calificada (MONCL) con corte al 19 de noviembre de 2022.

Entre el 14 y 19 de noviembre de 2022. Se garantizó la Atención a la Ciudadanía, conforme a los mecanismos de atención al ciudadano dispuestos (línea de atención telefónica, correo electrónico), así mismo, se efectuó atención en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) en el horario presencial establecido los días jueves entre la 1:00 pm y las 5:00 pm.

Aspecto PMT

No se presento ninguna actividad en este componente

Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación
25315 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			
25316 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			
35146 COI No. 37	202261202612312	16/09/2022	22/12/2022			
35147 COI No. 37	2022612025768&2*	16/09/2022	14/09/2023			

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE OBRA
De acuerdo a corte de programación con fecha del día 20/11/2022, a corte de programación con el presente informe se presenta un atraso del 5,15%, debido a que se tiene un atraso acumulado por las lluvias, lo cual afecto la actividad de rellenos, adicional a esto la actividad de losa aligerada se logró desarrollar hasta la presente semana, ya que estaba en revisión el ítem de placa aligerada por parte de la entidad contratante.	
	Firma
