PROGRESAR

CONTRATO DE OBRA Nº468-2022

"CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA RIVERA DEL BALNEARIO RIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR".

DICIEMBRE DE 2022

Powered by CamScanner

PROGRESAR

INFORME DE OBRA

La Jagua de Ibirico, 30 de diciembre de 2022

Señora
ANETH MARCELA AGUILAR VASQUEZ
Secretaria de medio ambiente y turismo
Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico
La Jagua de Ibirico – Cesar.


ASUNTO: INFORME UNICO DEL CONTRATO DE OBRA Nº 468 DE 2022.

Respetuosamente presento el informe del contrato de obra con el OBJETO **"CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA RIVERA DEL BALNEARIO RIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR"** durante el periodo comprendido desde el 29 de noviembre hasta el 29 de diciembre de 2022.

Atentamente,

CELSO ANTONIO SUÁREZ MORALES
S.M PROGRESAR S.A.S.
Representante legal

Powered by CamScanner

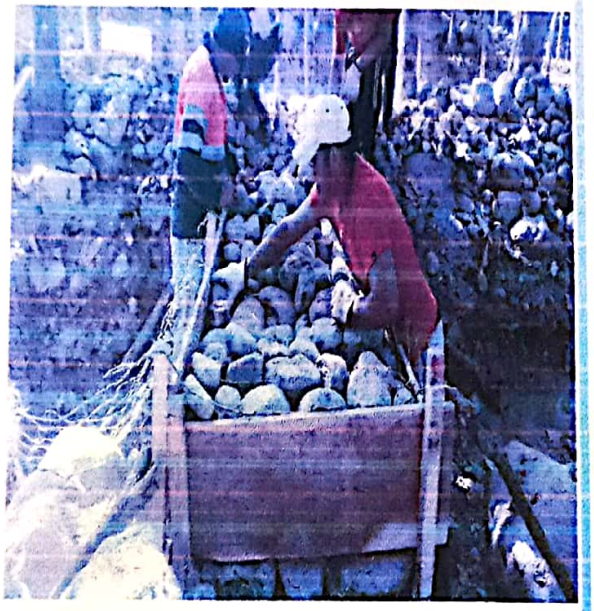

INFORME ÚNICO ACTIVIDADES.

CONTRATO DE OBRA N°468-2022

CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA RIVERA DEL BALNEARIO RIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Powered by CamScanner

INTRODUCCION.

1.- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO....3

2.-LOCALIZACIÓN. 5

3.- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS. 6

3.1.1.- Limpieza 6

3.1.2.- Trazado y Replanteo....6

3.1.3.- MANEJO DE AGUA....7

3.3.1.- SUMINISTRO DE PIEDRA PARA LLENADO DE GAVIÓN 8

3.3.2.- MALLA DE 2X1X1 M DE MALLA DE TRIPLE TORSIÓN, HEXAGONAL, DE 50X70 MM, DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO DE 2 MM DE DIÁMETRO, PARA GAVIÓN. 9

3.3.4.- TABLÓN DE MADERA DE 20X7,2 CM. PARA FORMALETA....10

3.4.1.-. FORRAJE CON GRAMINIA NATIVA PARA PROTECCIÓN DE LA EROCIÓN 11

3.4.2.- REFORESTACIÓN 11

4.- REPORTE ADMINISTRATIVO. 11

Tabla 7.- personal administrativo 12

4.1.-DOCUMENTACION DEL CONTRATO 12

4.1.1.-RELACION DE ACTAS....12

5.-REPORTE DE AVANCE TÉCNICO....13

Tabla 8.- avance técnico 13

Tabla 9: Avance Financiero....14

6.-INFORME FINANCIERO....14

6.1.-MANEJO DEL ANTICIPO 14

7.- CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES 15

Powered by CamScanner

La Jagua de Ibiríco, Cesar, 30 de diciembre del 2022.

Ingeniera,
ANETH MARCELA AGUILAR VÁSQUEZ
Secretaria de Medio Ambiente y Turismo
Alcaldía La Jagua de Ibirico, Cesar.

Asunto: Informe único de actividades
Contrato de Obra: No. 468 - 2022

Por medio del presente me dirijo a usted con el objetivo de presentarle el informe de cumplimiento. del Contrato de Obra No 468 de 2022 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA RIVERA DEL BALNEARIO RIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR".

1.- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

CONTRATO No.	**468 de 2022**
CLASE DE CONTRATO:	**Contrato de Obra**
CONTRATISTA:	**S.M PROGRESAR S.A.S.,** **NIT No. 900.382.912-5.** **Representado legalmente por,** **CELSO ANTONIO SUÁREZ MORALES** **CC. No.77.036.685** **Dirección: Diagonal 1# 4- Barrio Cinco de Marzo,** **Telefono: 3116848041** **La Jagua de Ibirico, Cesar**
OBJETO:	**"CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA RIVERA DEL BALNEARIO RIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR".**
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO: :	**CIENTO VEINTICUATRO MILLONES, NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 124.942.592,00)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**Un (01) MES**
FECHA DE INICIO:	**29 NOVIEMBRE DE 2022**

Powered by CamScanner

FECHA DE TERMINACIÓN: **29 de DICIEMBRE de 2022**

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
Inicial:	**001**
MODIFICACIONES REALIZADAS	
Adición valor del contrato:	**NO APLICA**
Valor del Contrato + Adicional:	**NO APLICA**
Adición valor del anticipo:	**NO APLICA**
Plazo de ejecución inicial:	**NO APLICA**
Fecha de inicio:	**29/11/2022**
Fecha de suspensión:	**NO APLICA**
Fecha de reinicio:	**NO APLICA**
Total, días transcurridos de suspensión (1,2,3 para cada caso):	**NO APLICA**
Fecha de Prorroga:	**NO APLICA**
Adición plazo:	**NO APLICA**
Plazo de ejecución modificado:	**NO APLICA**

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
INFORMACION FINANCIERA	
Acta parcial 1	**NO APLICA**
Acumulado	**NO APLICA**
Anticipo	**$ 49.977.036,80**
Anticipo desembolsado:	**40%**
Fecha de desembolso	**7/12/2022**
Amortización Acta parcial 1	**49.977.036,80**
Amortización Acta parcial 2	**NO APLICA**
Pendiente por amortizar	**NO APLICA**

TABLA 1,2 y 3.- Ficha Técnica del Contrato

CONDICIONES INICIALES					
GARANTIAS	NOMBRE DE LA ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURA DO
Cumplimiento de contrato	Seguros Mundial	B-100031079	25/11/2022	25/06/2023	$12,494,259.20

Powered by CamScanner

Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Seguros Mundial	B-100031079	25/11/2022	25/06/2023	$49.977.036,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	Seguros Mundial	B-100031079	25/11/2022	25/12/2025	$6.247.129,60
Calidad del servicio	Seguros Mundial	B-100031079	25/11/2025	25/06/2023	$12.494.259.20

2.-LOCALIZACIÓN.

El municipio de La Jagua de Ibiríco está, situado en el centro del departamento de Cesar. Al norte limita con el municipio de Becerril, al sur con Chiriguaná, al este con el país de Venezuela y al oeste con Chiriguaná y El Paso. Está a 118.4 kilómetros de la capital departamental, Valledupar. La actividad económica más importante es la explotación de carbón, siendo uno de los grandes centros mineros de Colombia, sin dejar de lado su potencialidad agropecuaria.

El proyecto se localiza geográficamente en jurisdicción rural del Municipio de La Jagua de Ibiríco, departamento del Cesar a 8,7 kilómetros aproximadamente del casco urbano, específicamente en el balneario San Antonio ubicada en la vereda San isidro.

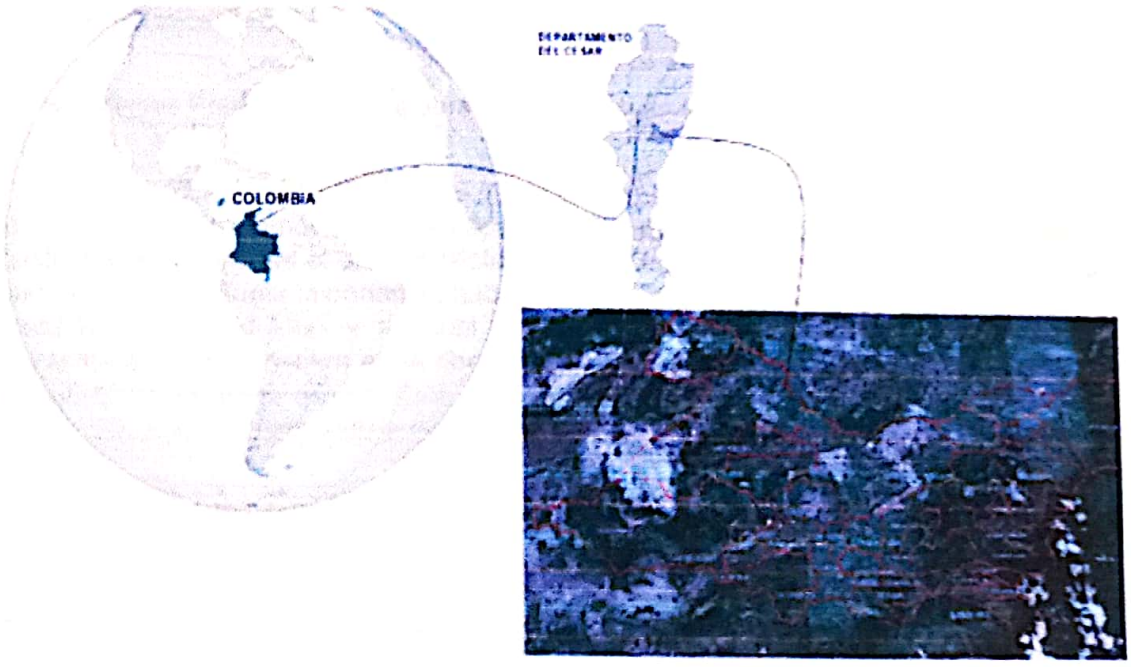


Imagen 1.- Localización del Proyecto

Powered by CamScanner

La preocupación de la geografía de nuestro municipio y la importancia en la neutralización de los problemas ocasionados por los efectos naturales con son las fuertes lluvias y esto nos lleva a querer realizar un enlace directo a la utilización de los gaviones como protección y estabilización de zonas de ribera, cuya solución es una de las más recurrentes por su simplicidad y economía, la importancia de la utilización de los gaviones, sin importar donde se quiera utilizar.

Las inundaciones, arrasamiento, cambios de cauces, entre otros, traen grandes consecuencias en nuestro municipio, debido a las características tan especiales de nuestros ríos, es por esto que se realizan obras de defensa fluvial como son las canalizaciones, muros de encauzamiento, bordes costeros, etc.

Los gaviones ofrecen, en muchos casos, una solución apropiada y económica a los problemas de modificación y control de cauces, ya que la mayoría de las estructuras hidráulicas son afectadas por la erosión y necesitan de una protección adecuada, para no ser deteriorada con tanta facilidad, además, de resistentes al empuje del terreno, eliminan los sistemas de drenaje subterráneo.

3.- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.

3.1 Replanteo.

Las actividades Preliminares de la obra se dividieron en tres componentes como son:

3.1.1.- Limpieza

En este proceso se removió toda la capa vegetal existente sobre toda el área donde se construirán los gaviones el cual consiste en ochocientos ochenta y nueve (889) metros cuadrados. Es de suma importancia hacer mención que la zona es un balneario popular donde la comunidad local y regional realizan actividades de pasadía en donde los habitantes arrojan su basura en la ribera del rio San Antonio, es decir, la basura queda acumulado en la ronda del rio. Este proceso se ejecutó en 2 días. Dejando el área en óptimas condiciones para realizar los trabajos siguientes.

3.1.2.- Trazado y Replanteo

En esta actividad se realizó nuevamente la toma de medidas con el apoyo del topógrafo encargado en la obra, una vez ya despejado todo el terreno para poder empezar con los trabajos de excavación y formación del gavión. Esto se hizo manualmente con cintas de medición, y equipos topográficos. El replante de la zona tardará 5 días

Powered by CamScanner



Imagen. - Toma de medidas con equipo topográfico.

3.1.3.- MANEJO DE AGUA

Con el fin de realizar los trabajos de nivelación y excavación se realizó trabajos de manejo y redireccionamiento de agua, el cual consiste en llenar sacos de polietileno para desviar de manera transitoria el cauce del rio, para realizar los trabajos en un lugar seco, esta actividad se realizó en el todo el tiempo de ejecución del proyecto

3.2.-EXCAVACION Y RELLENOS

3.2.1.- EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN A 0.50 M PARA ASENTAMIENTO GAVIÓN

Para este trabajo se excavo en el pie o base del talud aproximadamente 50 centímetros, quedando 50 centímetros por encima del nivel del suelo. Con el fin de preservar el equilibrio ecológico y no causar daños irreparables a la rio, se realizó los trabajos sin ayuda de maquinaria amarilla es decir que se empleó un total de 15 jornales para realizar los trabajos de excavación. Esta actividad se hizo con la ayuda de pico, barretones, pala y chorros de agua provenientes de motobomba, en esta actividad se realizó la excavación de 168 metros cúbicos.

Powered by CamScanner




3.3.-GAVIONES

3.3.1.- SUMINISTRO DE PIEDRA PARA LLENADO DE GAVIÓN

Se realizo el suministro de piedra de rio, con un diámetro mayor al ojo de la malla triple torsión no menor a 3 pulgadas para evitar que se salgan y se deforme el gavión.

Powered by CamScanner

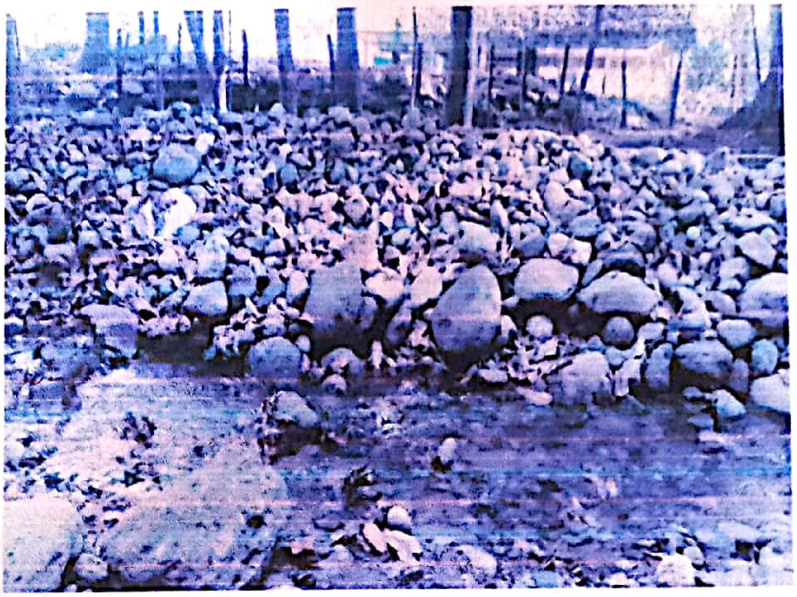

Estas piedras se colocaron en los costados o paredes de los gaviones y en la base, para después ser rellenados con piedras pequeñas para cubrir los espacios que pudiesen quedar entre piedras en total se suministros 128 metros cúbicos de material rocoso.

3.3.2.- MALLA DE 2X1X1 M DE MALLA DE TRIPLE TORSIÓN, HEXAGONAL, DE 50X70 MM, DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO DE 2 MM DE DIÁMETRO, PARA GAVIÓN.

Para dar cumplimiento a actividad se suministró un total de 64 mallas. Este tipo de malla, conocida como Malla para Gavión tiene una forma hexagonal que es utilizada para almacenar piedras en sitios de riesgo de deslizamiento, y de esta forma poder crear muros de contención debido a que está hecha de materiales de calidad que proporcionan durabilidad, resistencia a los elementos externos y es fácil de instala, los cuales fueron instalados en el costado derecho del rio San Antonio, específicamente en el balneario que se encuentra en la Vereda San Isidro

Powered by CamScanner



3.3.4.- TABLÓN DE MADERA DE 20X7,2 CM. PARA FORMALETA

Las formaletas son elementos que funcionan como moldes temporales, es uno de los principales factores para el rendimiento de para la construcción del gavion. Influyen directamente en la apariencia y la calidad de la superficie de la estructura.

Powered by CamScanner



3.4 EMPRADIZACION

3.4.1.-. FORRAJE CON GRAMINIA NATIVA PARA PROTECCIÓN DE LA EROCIÓN

La erosión es un proceso en que se va perdiendo la capa superficial del suelo, que proporciona a las plantas la mayoría de los nutrientes y el agua que necesitan. Por lo que se revegetalizarón un total de 889 metros cuadrados con forraje nativo de la zona para darle mayor protección a los suelos con el fin de evitar que la capa fértil se desplace

3.4.2.- REFORESTACIÓN

La importancia de la reforestación recae en que volver a sembrar árboles es una fuerza de empuje que revive al ecosistema local. De este modo, se le da hogar y protección a la fauna local como el caso de los monos aulladores que se encuentran en la zona de influencia y, a su vez, atraen polinizadores (como abejas), lo cual es muy beneficioso para la naturaleza.

4.- REPORTE ADMINISTRATIVO.

Para ejecución de las actividades del proyecto se cuenta con el personal contratado de acuerdo con lo establecido en la propuesta técnica AMJI SAMC 048 DE 2022, los cuales se relacionan a continuación.

Powered by CamScanner

CARGO	NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL	CELSO ANTONIO SUÁREZ MORALES
INGENIERO CIVIL	JHONNY CASTILLEJO RUIZ
INGENIERO FORESTAL	BENJAMIN ARAGON ESTRELLA

Tabla 7.- personal administrativo

Nota: En el anexo No 1, se presenta los pagos de la seguridad social y parafiscales correspondiente al personal contratado.

4.1.-DOCUMENTACION DEL CONTRATO

4.1.1.-RELACION DE ACTAS

ÍTEMS	TIPO DE ACTA	FECHA	DESCRIPCION
1	CONTRATO.	25/11/2022	**"CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA RIVERA DEL BALNEARIO RIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR."**
2	**ACTA DE INICIO.**	**29/11/2022**	**En La Jagua de Ibirico, a los 29 días del mes de NOVIEMBRE de 2022, se reunieron la Señora ANETH MARCELA AGUILAR VASQUEZ secretaria de medio ambiente y turismo en condición de supervisora y el señor CELSO ANTONIO SUAREZ MORALES como representante legal de S.M PROGRESAR S.A.S. del contrato con el fin de dar inicio al contrato 468- 2022, de acuerdo con los lineamientos expuestos en la minuta del contrato.**

Powered by CamScanner

5.-REPORTE DE AVANCE TÉCNICO

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	AVANCE %
PRELIMINARES			
LIMPIEZA	M2	889	100 %
TRAZADO Y REPLANTEO	M2	336	100 %
MANEJO DE AGUA	DIA	30	100 %
EXCAVACION Y RELLENOS			
EXCAVACION MATERIAL COMUN A 0.50 M PARA ACENTAMIENTO GAVION	M3	168	100 %
GAVIONES			
SUMINISTRO DE PIEDRA PARA LLENADO DE GAVION	M3	128	100 %
Malla de 2x1x1 m de malla de triple torsión, hexagonal, de 50x70 mm, de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro, para gavión.	UND	64	100 %
Cable de acero de 2 mm de diámetro, para sujeción de malla de triple torsión.	KG	5,9	100 %
Tablón de madera de 20x7,2 cm. PARA FORMALETA	UND	36	100 %
EMPRADIZACION			
FORRAJE CON GRAMINIA NATIVA PARA PROTECCION DE LA EROCION	M2	889	100 %
RESFORESTACION	HA	1	100 %

Tabla 8.- avance técnico

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/PARCIAL	AVANCE %
PRELIMINARES				
LIMPIEZA	M2	889	$ 35.976.052,00	100 %
TRAZADO Y REPLANTEO	M2	336	$ 2.676.912,00	100 %
MANEJO DE AGUA	DIA	30	$ 7.920.480,00	100 %
			$ 46.573.444,00	100 %
EXCAVACION Y				

Powered by CamScanner

RELLENOS				
EXCAVACION MATERIAL COMUN A 0.50 M PARA ACENTAMIENTO GAVION	M3	168	$ 3.930.528,00	100 %
			$ 3.930.528,00	100 %
GAVIONES				
SUMINISTRO DE PIEDRA PARA LLENADO DE GAVION	M3	128	$ 10.785.280,00	100 %
Malla de 2x1x1 m de malla de triple torsión, hexagonal, de 50x70 mm, de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro, para gavión.	UND	64	$ 6.872.384,00	100 %
Cable de acero de 2 mm de diámetro, para sujeción de malla de triple torsión.	KG	5,9	$ 160.468,20	100 %
Tablón de madera de 20x7,2 cm. PARA FORMALETA	UND	36	$ 1.789.272,00	100 %
			$ 19.607.404,20	100 %
EMPRADIZACION				
FORRAJE CON GRAMINIA NATIVA PARA PROTECCION DE LA EROCION	M2	889	$ 23.460.710,00	100 %
RESFORESTACION	HA	1	$ 2.537.600,00	100 %
			$ 25.998.310,00	100 %
		COSTO DIRECTO	**$ 96.109.686,20**	100 %
		AIU 30%	**$ 28.832.905,86**	100 %
		VALOR TOTAL	**$ 124.942.592**	100 %

Tabla 9: Avance Financiero

6.-INFORME FINANCIERO

6.1.-MANEJO DEL ANTICIPO

AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA EGRESO	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INICIAL	**$ 124.942.592,00**	N.A	100%

Powered by CamScanner

ANTICIPO (40%)	49,977,036,80	N/A	N/A
ACTA DE PAGO	**$ 124.942.592**	PENDIENTE	100%
PRIMERA AMORTIZACION	49,977,036,80	N.A	100%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	**$ 74,965,555,20**	N.A	100%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0	N.A	0%

7.- CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES

Con la realización del presente proyecto de construcción de gaviones se obtuvo la conclusión siguiente:

Se pudo reconocer el sistema de construcción, así como el diseño hidráulico correspondiente para la correcta construcción de gaviones. Donde se el tipo de gavión, el cual fue construido para evitar los posibles desbordamientos del rio en la temporada de invierno que se presenta el municipio, se tomaron los datos correspondientes para realizar el diseño correspondiente en autocad y su verificación, se revisó de manera detalla las amarraduras con alambre calibre 12 mm de acuerdo a las costuras, se colocaron piedras de rio en perfecto estado evitando colocar material con rajaduras, fisuras ni otros defectos., se usaron piedras de tamaños grandes en los costados y diferentes tamaños en el interior del gavión para asegurar su estabilidad y fácil drenaje.

En otro orden de ideas el proyecto fue muy bien aceptado por los visitantes a este centro recreativo que se encuentra en el sitio, sintiéndose seguros por la infraestructura realizada.

CELSO ANTONIO SUÁREZ MORALES
S.M PROGRESAR S.A.S.
Representante legal


Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 468 DE 2022	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA RIVERA DEL BALNEARIO RIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	FECHA DEL INFORME		
TIPO CONTRATO		D	M	A
OBRA		30	12	2022
CONTRATISTA		SECRETARIA LIDER		
S.M PROGRESAR S.A.S.		MEDIO AMBIENTE Y TURISMO		
		SUPERVISOR		
		ANETH MARCELA AGUILAR VASQUEZ		



FOTOGRAFIA 1.- ACTIVIDAD: SOCIALIZACION DEL PROYECTO

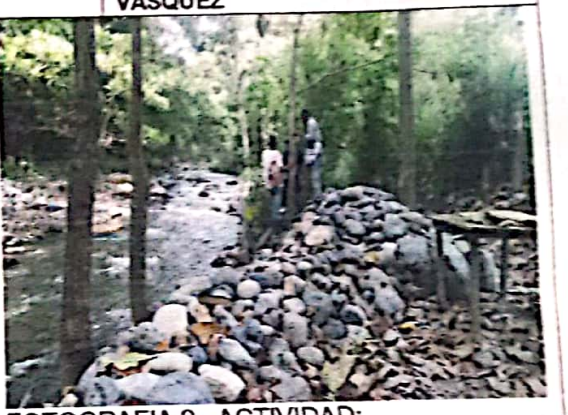

FOTOGRAFIA 2.- ACTIVIDAD: RECONOCIMIENTO DEL AREA



FOTOGRAFIA 3.- ACTIVIDAD: MANEJO DE AGUA.



FOTOGRAFIA 4.- ACTIVIDAD: CONSTUCCION DE GAVIONES

Powered by CamScanner



FOTOGRAFIA 5.- ACTIVIDAD: USOS DE FORMALETAS



FOTOGRAFIA 6.- ACTIVIDAD: USO DE ALAMBRE CALIBRE 12 Y MALLA TRIPLE TORCION



FOTOGRAFIA 7.- ACTIVIDAD: ARMADODO DE MALLA TRIPLE TORCION PARA GAVION



FOTOGRAFIA 8.- ACTIVIDAD: MALLA ARMADA PARA GAVION.



FOTOGRAFIA 9.- ACTIVIDAD:ESCAVACION MANUAL A 0,50 CM DE PROFUNDIDAD



FIGURA 10.- ACTIVIDAD: NIVELADO DE TERRENO.

Powered by CamScanner



FOTOGRAFIA 11.- ACTIVIDAD: ARMADO DE GAVION



FOTOGRAFIA 12.- ACTIVIDAD: USO DE FORMALETA



FOTOGRAFIA 13.- ACTIVIDAD:TEMPLADO Y AMARRE DE GAVION



FOTOGRAFIA 14.- ACTIVIDAD: AMARRE DE GAVIONES



FOTOGRAFIA 15.- ACTIVIDAD RELLENO DE CAPA VEGETAL



FOTOGRAFIA 16.- ACTIVIDAD: SIEMBRA REALIZADA

Powered by CamScanner



FOTOGRAFIA 17.- ACTIVIDAD: SIEMBRA REALIZADA




FOTOGRAFIA 18.- ACTIVIDAD: SIEMBRA REALIZAD.



FOTOGRAFIA 19.- ACTIVIDAD: SIEMBRA REALIZADA



FOTOGRAFIA 20.- ACTIVIDAD: GAVIONES CONSTRUIDAS

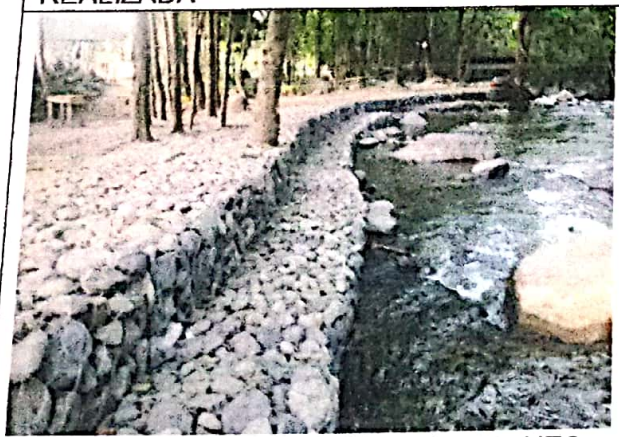


FOTOGRAFIA 21.- ACTIVIDAD: GAVIONES TERMINADOS




FOTOGRAFIA 22.- ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE GAVIONES

CELSO ANTONIO SUÁREZ MORALES
S.M PROGRESAR S.A.S.
Representante legal

Powered by CamScanner

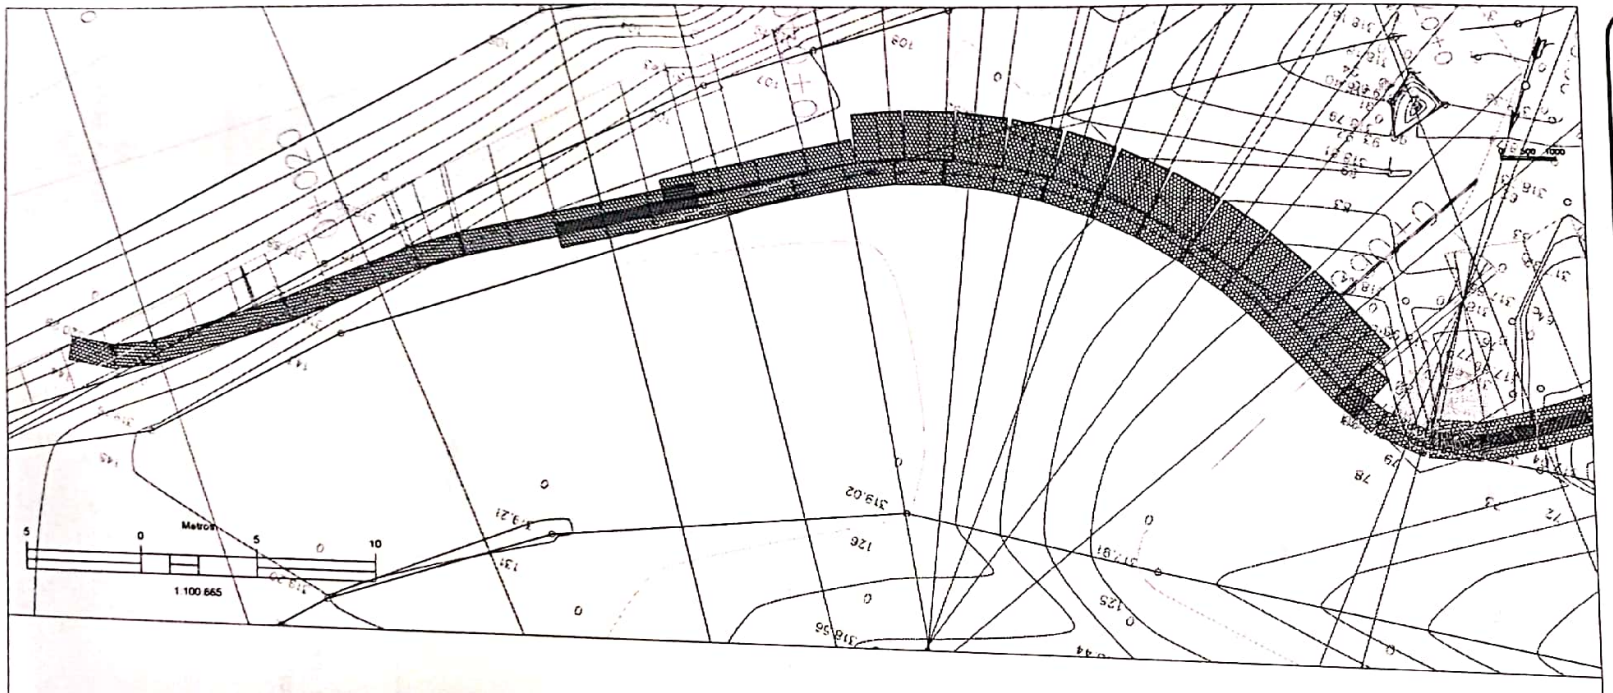

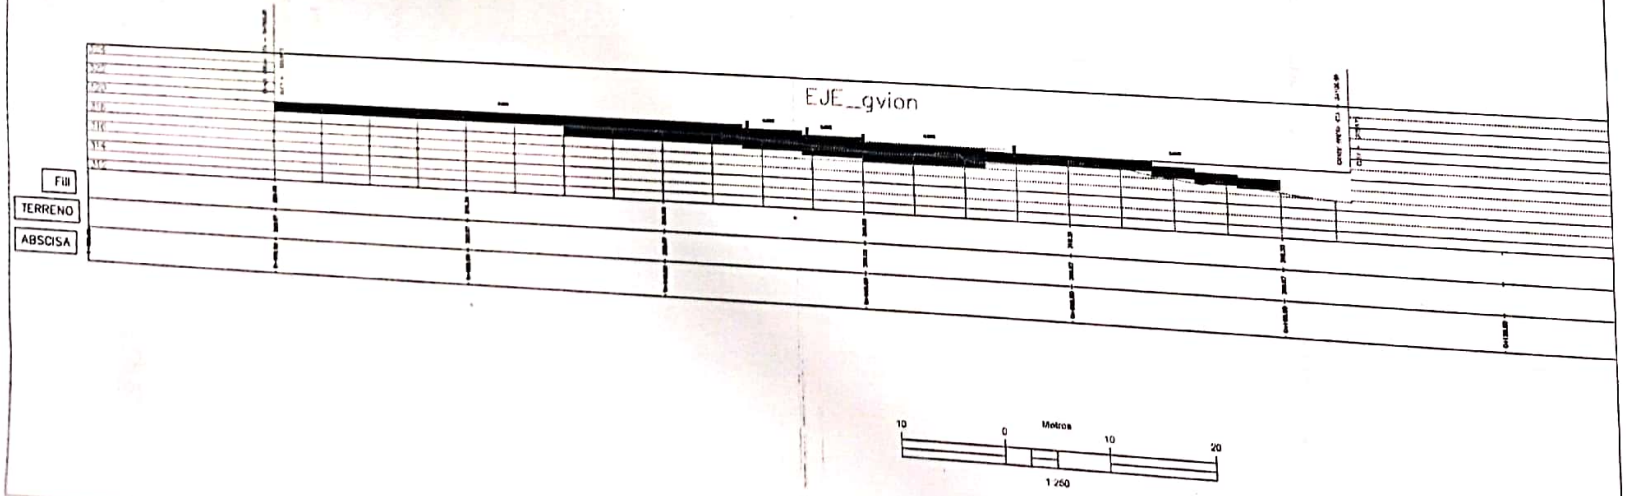

General Notes

OVELIO ENRIQUE JIMENEZ MACHADO
ALCALDE


ADALBERTO MUÑOS
SECRETARIO PLANEACION

MARYCARMEN OSPINA
SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA

PROYECTO
OBRAS DE CONTENCION Y PROTECCION RIVERA RIO SAN ANTONIO MARGEN DERECHA A LA ALTURA DEL PUENTE VEREDA LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE LA JAUA DE IBIRICO– CESAR.

PLANTA Y PERFIL

DEPARTAMENTO
CESAR



No.	Revision/Issue	Date

Firm Name and Address

Project Name and Address

Project

Sheet
1

Date
02.06.2022

Scale
1:500

Powered by CamScanner



FUNDACIÓN CAMINOS DE PROSPERIDAD
NIT 900.893.387-0
Calle 7 4 52
Tel: (035) 5769998
La Jagua De Ibirico - Colombia
espigasdetrigo@hotmail.com
www.fundacioncaminosdeprosperidad.com

Factura electrónica de venta
No. FC 60

Señores	S.M. PROGRESAR S.A.S.		
NIT	900.382.912-5	Teléfono	(605) 3116848041
Dirección	DG 1 4 125 BRR 5 DE MARZO	Ciudad	La Jagua De Ibirico - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/01/2023, 10:18
Expedición	13/01/2023, 10:19
Vencimiento	13/01/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE DE PIEDRA	128.00	10,785,280.00

Total items: 1

Total Bruto	10,785,280.00
Total a Pagar	10,785,280.00

Valor en Letras:
Diez millones setecientos ochenta y cinco mil doscientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 10,785,280.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGANAR A LA CUENTA DE AHORROS N 599-116415 A NOMBRE DE LA FUNDACION CAMINOS DE PPROSPERIDAD DEL BANCO DE BOGOTA SUCURSAL LA JAGUA DE IBIRICO.

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit. 830.043.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764035466944 aprobado en 20220902 prefijo FC desde el número 14 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 9
CUFE: 5b1a77848b05e94efe9abb48f791add1a447d83de6baa0f09a623a77d24c87b56d56cb00db972bcab862706d2cfa79ba

Powered by CamScanner
