INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 03 DEL CONTRATO No 170-ARC-CBN6-2022

LAPSO del 12 enero al 08 de febrero de 2022

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	No. 0170-ARC-CBN6-2022
CONTRATISTA	:	CONSORCIO SOCIAL
OBJETO DEL CONTRATO	:	CONTRATAR A PRECIO UNITARIO, FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL DE OFICIALES DE BOGOTÁ DE LA ARMADA DE COLOMBIA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	22-12-2022
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	31-01-2023
VALOR INICIAL	:	QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($536.793.595,00), INCLUIDO A.I.U Y DEMÁS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN.
REDUCCIÓN	:	SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE ($67.416.555)
VALOR TOTAL CONTRATO	:	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS M/CTE. ($469.377.040) INCLUIDO A.I.U Y DEMÁS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN, PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	INGENIERA CIVIL CON 8 AÑOS DE EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA.
SUPERVISOR INICIAL	:	TF MARCHENA AVILA DIANA CECILIA INGENIERA CIVIL OFICINA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA BNL06
SUPERVISOR FINAL	:	TK MONTAÑEZ NIÑO KATHY DAYANA ARQUITECTA OFICINA INGENIERIA Y ARQUITECTURA BNL06

En la ciudad de Bogotá, a los ocho (08) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023), en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 0170-ARC-CBN6-2022 suscrito con la empresa CONSORCIO SOCIAL NIT. 901651321-0, representada legalmente por JUAN FELIPE GONZALEZ y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2], 56º, Ley 1474 de 2011 [3], entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

2014 [4], la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 [5] y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 [6], modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de las obras entregadas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. **OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:** CONTRATAR A PRECIO UNITARIO, FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL DE OFICIALES DE BOGOTÁ DE LA ARMADA DE COLOMBIA

2. **CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.**

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
REDUCCIÓN, MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO Y PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN	21/12/2022	CONTRATAR A PRECIO UNITARIO, FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL DE OFICIALES DE BOGOTÁ DE LA ARMADA DE COLOMBIA	SI	N/A
PRÓRROGA	31/01/2023	CONTRATAR A PRECIO UNITARIO, FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL DE OFICIALES DE BOGOTÁ DE LA ARMADA DE COLOMBIA	N/A	N/A

3. **VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:**

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS M/CTE. ($469.377.040) incluido A.I.U y demás erogaciones que correspondan, para la correcta ejecución del contrato.	$469.377.040	$469.377.040	N/A	N/A	$469.377.040

[4] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

[6] *Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.*

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:	**No. 21-44-101398667 DE FECHA 23/11/2022**
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
FECHA DE APROBACIÓN:	**08/02/2023**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		X		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		08/02/2023	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		08/02/2023	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	X		08/02/2023	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	X		08/02/2023	
TODO RIESGO		X		
CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA	X		08/02/2023	
CALIDAD DEL SERVICIO	X		08/02/2023	

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
21-44-101398667	22/12/2022	15/12/2025	

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
parcial	2022	$101.568.439,71	92442	27/12/22	454181222	27/12/22	$101.568.439,71	$101.568.439,71	22%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN	AUTORIZACION MIN HACIENDA	AUTORIZACION DEPLAN	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
CONTRATO No 170-ARC-CBN6-2022	2022	77922 19/08/2022	$555.950.859	N/A	N/A	N/A	644922 16/11/2022	$469.377.040	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
	21/12/2022	$67.416.555	Modificación del anexo técnico por fuerza mayor

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
001	2022	Acta parcial 001	$101.568.439,71	FEV-2 21/12/2022	$101.568.439,71	001 22/12/2022	$101.568.439,71	N/A	N/A	Ninguna

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

N/A

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO
	PROYECTO BILLAR BOLERA		
1	**PRELIMINARES**		
1,01	DEMOLICION Y DESMONTE		
	Suministro e instalación de material para protección de pista de bolos	100%	$ 1.084.590,00
1,01,01	Desmonte de mobiliario de madera del sector del bar Dimensiones , incluye el retiro de escombros y sobrantes cargue y traslado al punto de acopio dispuesto por el contratante	100%	$ 526.957,00
1,01,02	Desmonte de lámparas y luminarias existentes sector salón de billar, incluye el retiro de escombros y sobrantes, cargue y traslado al punto de acopio dispuesto por el contratante.	100%	$ 52.212,00
1,01,03	Desmonte de puerta en madera, hoja sencilla de dimensiones (1,03x2,20m) (incluye: desmonte de marcos, accesorios, herrajes, retiro material sobrante hasta punto de acopio indicado por el contratante).	100%	$ 20.073,00
1,01,04	Desmonte de ventanas vitral, incluye: desmonte de marcos, accesorios, herrajes, retiro de escombros y sobrantes, cargue y traslado al punto de acopio dispuesto por el contratante.	100%	$ 42.274,00
1,01,05	Demolición de guarda escobas cerámica en área del billar, incluye retiro material sobrante hasta punto de acopio indicado por el contratante).	100%	$ 449.220,00
1,01,06	Demolición de piso de cerámica en área billar, Incluye retiro material sobrante hasta punto de acopio indicado por el contratante.	100%	$ 1.609.140,00
1,01,07	Demolición de Alistado y/o afinado de piso e= 0.5 m. incluye herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta punto de acopio indicado por el contratante	100%	$ 1.215.552,00
1,01,08	Demolición antepecho existente entre área billar y área bolera en mampostería. incluye el retiro de escombros y sobrantes, cargue y traslado al punto de acopio dispuesto por el contratante.	100%	$ 121.907,74
1,01,09	Desmonte y retiro de cielorraso sector bolera, incluye desmonte de estructura de soporte retiro de escombros y sobrantes, cargue y traslado al punto de acopio dispuesto por el contratante.	100%	$ 2.852.200,00
1,01,10	Retiro de alfombra área bolera, incluye cargue y traslado al punto de acopio dispuesto por el contratante.	100%	$ 167.874,00
1,01,11	Desmonte de piso de madera laminada área bolera, cargue y traslado al punto de acopio dispuesto por el contratante.	100%	$ 383.268,00

1,01,12	Desmonte de guarda escobas de madera en área bolera, incluye cargue y traslado al punto de acopio dispuesto por el contratante.	100%	$ 95.508,00
1,01,13	Demolición de materas a nivel de piso entre bolera y billar, incluye el retiro de escombros y sobrantes, cargue y traslado al punto de acopio dispuesto por el contratante.	100%	$ 290.434,95
1,01,14	Demolición de muro en Dary Wall fachada interior bolero, incluye desmonte de estructura de soporte, cargue y traslado al punto de acopio dispuesto por el contratante.	100%	$ 282.570,20
1,01,15	Demolición de muro en fachada bolera, incluye el retiro de escombros y sobrantes, cargue y traslado al punto de acopio dispuesto por el contratante.	100%	$ 471.041,78
1,01,16	Demolición de antepecho sector ventanal de vitral, incluye el retiro de escombros y sobrantes, cargue y traslado al punto de acopio dispuesto por el contratante.	100%	$ 36.829,65
	TOTAL, PRELIMINARES		
2	**INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION**		
2,01	PRELIMINARES ELECTRICAS		
2,01,01	Desmonte cableado existente iluminación y tomas. Incluye retiro de sobrantes, cargue y traslado al punto de acopio dispuesto por el contratante.	100%	$ 385.800,00
2,01,02	Retiro de puntos eléctricos existentes (Incluye regata en muro y retiro de escombros y sobrantes, cargue y traslado al punto de acopio dispuesto por el contratante.)	100%	$ 138.680,00
2	**SALIDAS ELECTRICAS**		
2,02,01	Salida para iluminación incluye tubería conduit 1/2" en área de Bolera por el techo, Suministro de instalación de puntos eléctricos para Iluminación, debe incluir caja de conexión metálica estándar 2400, 5 metros de cableado 2X12 AWG THWN (F-N), conectores eléctricos para unión o empalmes. (La actividad incluye el desarrollo de la regata y el resane posterior a la instalación de la tubería)	100%	$ 4.330.452,00
2,02,02	Salida para iluminación incluye tubería conducir 3/4 en área bar por piso, Suministro de instalación de puntos eléctricos para Iluminación, debe incluir caja de conexión metálica estándar 2400, 5 metros de cableado 2X12 AWG THWN (F-N), conectores eléctricos para unión o empalmes. (La actividad incluye el desarrollo de la regata y el resane posterior a la instalación de la tubería)	100%	$ 422.484,00
2,02,03	Salida para tomas eléctrica incluye tubería conducir 1/2" por piso en área bar, instalación de punto eléctricos para tomacorriente, este incluye caja de conexión 2X4, conectores para empalmes, tubería 1/2" PVC, hasta 5 metros de cableado 3X12 AWG THWN tomacorriente doble 2P+E ,15A, 120-220V con certificado RETIE. (La actividad incluye el desarrollo de la regata y el resane posterior a la instalación de la tubería)	100%	$ 236.036,00
2,02,04	Salida para iluminación incluye tubería conducir en área de Billar por el techo, para reubicación de lámparas mesas de billar, Suministro de instalación de puntos eléctricos para Iluminación, debe incluir caja de conexión metálica estándar 2400, 5 metros de cableado 2X12 AWG THWN (F-N), conectores eléctricos para unión o empalmes. (La actividad incluye el desarrollo de la regata y el resane posterior a la instalación de la tubería)	100%	$ 2.371.940,00

2,02,05	Salida para datos incluye tubería 1/2 conducir en área de Billar por el piso, en el bar Suministro e instalación Toma datos RJ45 Legrando blanca línea arquea o similar, área bar, incluye cableado dato con su respectivo conector terminar RJ45. (La actividad incluye el desarrollo de la regata y el resane posterior a la instalación de la tubería)	100%	$ 427.626,00
2,02,06	Salida para tomas eléctrica incluye tubería conducir 1/2 por pared en área billar, ubicación TV, incluye tubería conduit 1/2" en área de Bolera por el techo, Suministro de instalación de puntos eléctricos para Iluminación, debe incluir caja de conexión metálica estándar 2400, 5 metros de cableado 2X12 AWG THWN (F-N), conectores eléctricos para unión o empalmes. (La actividad incluye el desarrollo de la regata y el resane posterior a la instalación de la tubería)	100%	$ 2.170.696,00
2,02,07	Salida para iluminación incluye tubería conduit 1/2 en área billar por techo, reubicación de luminarias existentes, Suministro de instalación de puntos eléctricos para Iluminación, debe incluir caja de conexión metálica estándar 2400, 5 metros de cableado 2X12 AWG THWN (F-N), conectores eléctricos para unión o empalmes. (La actividad incluye el desarrollo de la regata y el resane posterior a la instalación de la tubería)	100%	$ 412.424,00
3	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**		
3,01	PRELIMINARES HIDROSANITARIAS		
3,01,01	Retiro punto Hidráulico existente (1/2", Incluye regata en muro - piso y retiro de escombros y sobrantes, cargue y traslado al punto de acopio dispuesto por el contratante.)	100%	$ 53.372,00
3,01,02	Retiro punto sanitario existente PVC Sanitaria (3"-2") Incluye regata en muro - piso y retiro de escombros y sobrantes, cargue y traslado al punto de acopio dispuesto por el contratante.)	100%	$ 57.526,00
3,01,03	Retiro Tubería Hidráulica existente (1"-1/2", Incluye regata en muro y retiro de material sobrante)	100%	$ 100.270,00
3,01,04	Retiro Tubería sanitaria existente PVC Sanitaria (4"-3"-2") incluye regata en piso Incluye regata en muro y retiro de material sobrante	100%	$ 114.120,00
3,02	INSTALACIONES HIDRAULICAS		
3,02,01	Punto hidráulico de 1/2" para lavaplatos, tubería PVC alto impacto (para desde techo) incluye regatas accesorias y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 9 315 PSI. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa hasta la te de salida en muro, cámara de aire y tapón de protección.	100%	$ 179.772,00
3,02,02	Suministro e instalación de Tubería PVC-presión RDE 9 PSI 315 1/2", incluye codos, uniones, tee, y demás accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. (La actividad incluye el desarrollo de la regata y el resane posterior a la instalación de la tubería)	100%	$ 94.398,00
3,03	INSTALACIONES SANITARIAS		
3,03,01	Salida sanitaria 2" para lavaplatos incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento	100%	$ 233.814,00
3,03,02	Salida sanitaria 2" para sifón de piso incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento	100%	$ 116.907,00

3,03,03	Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria 2", incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. (La actividad incluye el desarrollo de la regata y el resane posterior a la instalación de la tubería)	100%	$ 589.104,00
4	**MAMPOSTERÍA - PAÑETES - DRYWALL**		
4,01	MUROS		
4,01,02	Suministro e instalación de muro sencillo (01 cara) de súper bordo de 8 mm, incluye estructura de soporte en aluminio, accesorios para sujeción, ángulos de remate y contra muro color blanco. incluye sellado de juntas con malla y estuco y todos los elementos y herramientas necesarios para la correcta ejecución de la actividad. Acabados con tres manos de pintura vinilo tipo 1. Incluye construcción de cuatro (4) nichos para luz indirectas de 4 caras (0,30*2,20 m) , un nicho para luz indirecta dimensiones (2,4*1,8 m) y un nicho para empotrar mobiliario para bolas dimensiones (2,3*1,9 m)	100%	$ 8.975.427,60
4,02	PAÑETE MUROS		
4,02,01	Aplicación de Pañete en muros sectores intervenidos (bar, ventanera, columnas, materas) proporción 1:4, e=1,5 cm Incluye filos, dilataciones, aditivos, herramientas, materiales, equipos y personal necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.	6%	$ 221.815,00
4,03	CIELO RASO		
4,03,01	Suministro e instalación Cielo raso en doy Wall de 10 mm en sector de bolera, incluye todos los elementos para la fijación, anclaje, estuco y tres manos de pintura, según detalle arquitectónico	40%	$ 8.081.640,00
4,03,02	Suministro e instalación de lineal de cielo raso en doy Wall de 10 mm en sector bolera, incluye todos los elementos para la fijación, anclaje y terminado previo al acabado final. incluye tres manos de pintura, según detalle arquitectónico	26%	$ 367.740,00
4,03,03	Suministro e instalación de Dilatación Z (Perfiles plásticos para drywall) área bolera	62%	$ 474.160,00
4,03,04	Suministro e instalación Cielo raso en paneles aglomerado descolgadas en área bolera, color taroa	48%	$ 12.769.290,00
5	**ESTRUCTURA**		
5,01,01	Ejecución de losa maciza de contrapeso en concreto 3000 psi e=0.10m, incluye instalación de malla electro soldada de 5.5mm x 150mm x 150mm, distanciado res, juntas de retracción con una distancia máxima 3 m	100%	$ 545.661,44
5,01,03	Ejecución de escaleras de concreto 3000 psi reforzado ancho 2,75 m fundidas según indicaciones de los Planos Arquitectónicos. Se replantearán, balancearán y compensarán de acuerdo con los planos específicos de detalle y los acabados previstos incluye acero de refuerzo (para acceso bolera)	100%	$ 163.524,24
6	**ACABADOS**		
6,02	ALISTADOS		
6,02,01	Alistado para pisos e= 4 cm, en área billar, proporción 1:4. Incluye las herramientas, materiales, equipos y personal necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.	100%	$ 4.774.993,20
6,03	PORCELANATOS Y CERAMICOS		

6,03,02	Suministro e instalación de enchape en porcelanito, imitación madera, color café claro para pisos, dimensiones mínimas 19,5 x 88 cm, tráfico comercial, incluye ALFALISTO, o PEGACOR o similar y emboquillado de las juntas en boquilla plástica. En las aristas de los muros enchapados se instalarán esquineras de aluminio o pasticas acuerdo a diseño. para salón de billar	61%	$ 11.870.500,00
6,03,03	Suministro e instalación de enchape en porcelanito, imitación madera, color café claro para pisos, dimensiones mínimas 19,5 x 88 cm, tráfico comercial, incluye ALFALISTO, o PEGACOR o similar y emboquillado de las juntas en boquilla plástica. En las aristas de los muros enchapados se instalarán esquineras de aluminio o pasticas acuerdo a diseño. Área de bolera y salida a terraza	63%	$ 2.017.985,00
6,03,04	Suministro e instalación de huella y contra huella para escaleras área de bolera en alfombra modular 60 x 60 tipo institucional, tráfico pesado para el área de Bolera Incluye pégate y mastico de nivelación. Color y estampado a convenir	67%	$ 512.948,00
6,03,05	Suministro e instalación de guarda escobas de 8 cm en área de billar en porcelanito, imitación madera, color café claro para pisos tráfico comercial, incluye ALFALISTO, o PEGACOR o similar y emboquillado de las juntas en boquilla plástica. En las aristas de los muros enchapados se instalarán esquineras de aluminio o pasticas acuerdo a diseño.	25%	$ 435.525,00
6,03,06	Suministro e instalación de guarda escobas de 8 cm en área de bolera en porcelanito, imitación madera, color café claro para pisos tráfico comercial, incluye ALFALISTO, o PEGACOR o similar y emboquillado de las juntas en boquilla plástica. En las aristas de los muros enchapados se instalarán esquineras de aluminio o pasticas acuerdo a diseño.	31%	$ 290.350,00
PROYECTO: OBRA CIVIL Y ACABADOS BAÑOS TRABAJADORES			
1	**PRELIMINARES**		
1,01	DEMOLICION Y DESMONTE		
1,01,01	Desmonte de puertas en vidrio y divisiones de duchas y sanitarios incluye cargue y traslado al punto de acopio dispuesto por el contratante.	100%	$ 290.290,00
1,01,02	Desmonte puerta de acceso a W.C. y comedor empleados. incluye cargue y traslado al punto de acopio dispuesto por el contratante.	100%	$ 125.465,00
1,01,03	Demolición muros internos divisores ducha, sanitario, división vestir, vano depósito, incluye retiro de escombros y sobrantes cargue y traslado al punto de acopio dispuesto por el contratante.	100%	$ 2.049.713,79
1,01,04	Demolición dinteles, incluye retiro de escombros y sobrantes cargue y traslado al punto de acopio dispuesto por el contratante.	100%	$ 241.650,00
1,01,05	Demolición de enchapes de piso. Incluye retiro mortero de pega, picada y/o retiro de capa (s) de alistado deteriorado o desplomado si se requiere, lineales, cargue y retiro de escombros punto de acopio dispuesto por el contratante.	100%	$ 1.246.560,00
1,01,06	Demolición de enchapes en muro. Incluye retiro mortero de pega, picada y/o retiro de capa (s) de pañete deteriorado o desplomado si se requiere, lineales, cargue y retiro de escombros punto de acopio dispuesto por el contratante.	100%	$ 415.520,00
1,01,10	Demolición enchape cielo raso área de baños, Incluye retiro mortero de pega, picada y/o retiro de capa (s) de alistado deteriorado o desplomado si se requiere, lineales, cargue y retiro de escombros punto de acopio dispuesto por el contratante.	100%	$ 483.132,00

1,01,12	Desmonte aparatos sanitarios, lavamanos y griferías incluye cargue y traslado al dispuesto por el contratante, incluye retiro de escombros y sobrantes cargue y traslado al punto de acopio dispuesto por el contratante.	100%	$ 322.968,00
1,01,13	Demolición poceta de lavamanos de baños Incluye cargue y tras ciego al parqueadero, incluye retiro de escombros y sobrantes cargue y traslado al punto de acopio dispuesto por el contratante.	100%	$ 326.676,00
1,01,14	Desmonte mesones lavamanos con sus soportes, Incluye cargue y tras ciego al parqueadero, incluye retiro de escombros y sobrantes cargue y traslado al punto de acopio dispuesto por el contratante.	100%	$ 57.118,00
1,01,16	Desmonte espejos baños Incluye cargue y tras ciego al parqueadero, incluye retiro de escombros y sobrantes cargue y traslado al punto de acopio dispuesto por el contratante.	100%	$ 33.470,00
1,01,17	Desmonte de lámparas y luminarias existentes, incluye el retiro de escombros y sobrantes, cargue y traslado al punto de acopio dispuesto por el contratante.	100%	$ 623.656,00
2	**INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN**		
2,01	PRELIMINARES ELECTRICAS		
2,01,01	Desmonte cableado existente iluminación y tomas. Incluye retiro de sobrantes, cargue y traslado al punto de acopio dispuesto por el contratante.	100%	$ 64.300,00
2,01,02	Retiro de puntos eléctricos existentes (Incluye regata en muro y retiro de escombros y sobrantes, cargue y traslado al punto de acopio dispuesto por el contratante)	100%	$ 258.264,00
2,02,10	Desmonte del existente y Suministro e instalación de nuevo tablero eléctrico de 18 circuitos con puerto barraje trifásico (3F+N+T) tierra en cobre de 225A-240V, color blanco, certificado RETIE	100%	$ 693.298,00
3	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**		
3,01	PRELIMINARES HIDROSANITARIAS		
3,01,01	Retiro punto Hidráulico existente (1/2", Incluye regata en muro - piso y retiro de escombros y sobrantes, cargue y traslado al punto de acopio dispuesto por el contratante.)	100%	$ 63.590,00
3,01,02	Retiro punto sanitario existente PVC Sanitaria (3"-2") Incluye regata en muro - piso y retiro de escombros y sobrantes, cargue y traslado al punto de acopio dispuesto por el contratante.)	100%	$ 197.055,00
3,01,03	Retiro Tubería Hidráulica existente (1"-1/2", Incluye regata en muro y retiro de material sobrante)	100%	$ 1.384.640,00
3,01,04	Retiro Tubería sanitaria existente PVC Sanitaria (4"-3"-2") incluye regata en piso Incluye regata en muro y retiro de material sobrante	100%	$ 2.492.320,00
3,02	PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRÍA		
3,02,01	Punto hidráulico para lavamanos 1/2" incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 9 de alto impacto. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la te de salida en muro, cámara de aire y tapón de protección.(para desde techo 1/2")	100%	$ 898.860,00
3,02,02	Punto hidráulico para orinal 3/4" incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizará tubería y accesorios PVC presión de alto impacto RDE 9. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la te de salida en muro, cámara de aire y tapón de protección.(para desde techo 3/4")	100%	$ 414.928,00

3,02,03	Punto hidráulico para sanitario 1/2" incluye regatas accesorias y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizará tubería y accesorios PVC presión alto impacto RDE 9. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la te de salida en muro, cámara de aire y tapón de protección. (para desde techo 1/2")	100%	$ 898.860,00
3,02,04	Punto hidráulico para ducha 3/4" incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 11 alto impacto. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la te de salida en muro, cámara de aire y tapón de protección. (para desde techo 3/4")	100%	$ 207.464,00
3,03	REDES DE AGUA FRÍA PVC-P		
3,03,01	Suministro e instalación de Tubería hidráulica de 1/2", incluye accesorios (43 unidades), soportes, abrazaderas, llaves de paso metálicas y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 9 PSI 315. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la te de salida en muro, cámara de aire y tapón de protección.	100%	$ 425.313,00
3,03,02	Suministro e instalación de Tubería hidráulica de 3/4", incluye accesorios (21 unidades), soportes, abrazaderas, llaves de paso metálicas y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 13 PSI 400. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la te de salida en muro, cámara de aire y tapón de protección.	100%	$ 457.040,00
3,03,03	Suministro e instalación de Tubería hidráulica de 1", incluye accesorios (19 unidades), soportes, abrazaderas, llaves de paso metálicas y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 13 PSI 316. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la te de salida en muro, cámara de aire y tapón de protección.	100%	$ 448.096,00
3,03,04	Suministro e instalación de Tubería hidráulica de 1 1/4", incluye accesorios (3 unidades), soportes, abrazaderas, llaves de paso metálicas y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 21 PSI 203. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la te de salida en muro, cámara de aire y tapón de protección.	100%	$ 72.544,00
3,04	SALIDAS SANITARIAS PVC-S		
3,04,01	Salida sanitaria 2" para orinal incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento acuerdo planos de diseño hidrosanitario	100%	$ 384.544,00
3,04,02	Salida sanitaria 4" para sanitario incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento, incluye 03 tapones de inspección acuerdo planos de diseño hidrosanitario	100%	$ 1.265.670,00
3,04,03	Salida sanitaria 2" para lavamanos incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento acuerdo planos de diseño hidrosanitario	100%	$ 961.360,00
3,04,04	Salida sanitaria 3" para ducha incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento acuerdo planos de diseño hidrosanitario	100%	$ 225.442,00
3,04,06	Salida sanitaria 2" para sifón de piso incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento acuerdo planos de diseño hidrosanitario	100%	$ 274.143,00

3,04,08	Suministro e instalación de Salida de ventilación válvula de admisión minivan 2" incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento acuerdo planos de diseño hidrosanitario	100%	$ 448.376,00
3,05	REDES DE AGUA RESIDUALES		
3,05,01	Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria 2", incluye accesorios (37 unidades) y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento	100%	$ 977.213,00
3,05,02	Suministro e instalación de Tubería PVC liviana para re ventilación 2", incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento acuerdo planos de diseño hidrosanitario	100%	$ 267.276,00
3,05,03	Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria 3", incluye accesorios (15 unidades) y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento	100%	$ 1.211.232,00
3,05,04	Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria 4", incluye accesorios (28 unidades) y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento	100%	$ 1.415.160,00
4	**MAMPOSTERIA DRY WALL Y PAÑETE**		
4,01	MAMPOSTERIA		
4,01,02	Muro en bloque Nº 4 estriado, e= 0,10 cm. incluye (grafila de 5 mm, suministro de materiales, preparación, formaletas, acarreo, vaciado)	100%	$ 5.252.418,60
4,02	PAÑETE MUROS		
4,01,01	Aplicación de Pañete impermeabilizado en muros y placas de entrepiso internos proporción 1:4, e=1,5 cm Incluye filos, dilataciones, aditivos , herramientas, materiales, equipos y personal necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.	100%	$ 9.860.299,61
4,03	DRYWAL		
4,03,02	Suministro e instalación Cielo raso en súper bordo de 8 mm, incluye estructura de soporte y todos los elementos para la fijación, anclaje y terminado previo al acabado final. incluye acabado de tres manos de pintura tipo 1 color blanco	8%	$ 2.244.900,00
4,04	ALISTADOS		
4,04,01	Alistado para pisos e= 4 cm, en proporción 1:4 Incluye las herramientas, materiales, equipos y personal necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.	100%	$ 4.463.859,78
4,05	PORCELANATOS Y CERAMICOS		
4,05,01	Suministro e instalación de enchape en cerámico para pisos alta resistencia dimensiones mínimas 60 x 60 cm color hielo, incluye ALFALISTO, o PEGACOR o similar y emboquillado de las juntas en boquilla plástica.	68%	$ 9.520.000,00
4,05,03	Suministro e instalación de guarda escobas 10 cm de enchape en cerámico para pisos alta resistencia color hielo, incluye ALFALISTO, o PEGACOR o similar y emboquillado de las juntas en boquilla plástica.	25%	$ 716.280,00
4,06	ESTUCO Y PINTURA		
4,06,01	suministro y aplicación de revestimiento sobre muros y columnas interiores en estuco plástico de 2 a 3 manos hasta obtener una superficie lisa y uniforme.	22%	$ 702.500,00
3	**REDES DE AGUAS LLUVIAS**		

3,03	Construcción de caja de inspección dimensiones 0.8 m * 0.8 m h Max 1 m. en concreto reforzado sobre una placa de fondo de 15 cm de espesor en concreto de 210 Kg/cm2. Paredes revestidas interiormente con mortero impermeabilizado1:4 de 2 cm de espesor. incluye cañuela circular desde las bocas de entrada hasta la boca de salida de mortero 1:4 impermeabilizado. Las tapas serán en concreto reforzado de 210 Kg/cm2, de 8 centímetros de espesor con marco en ángulo de hierro de 2" x 2" x 1/8", debidamente anclado con pernos. Las tapas deberán estar previstas con sello hermético.	16%	$ 481.390,00
	RECUPERACIÓN RED SANITARIA EXTERIOR Y MANEJO AGUAS LLUVIAS		
9	Retiro de emboquillado existente cerámica terraza BBQ	100%	$ 2.254.200,00
10	Aplicación de emboquillado de mortero impermeable mejorado con polímeros con cualidades anti hongos, anti manchas y con resistencia al cloro tipo Sacacera® 650 Boquilla Plus o similar para uso especial en zonas húmedas o en inmersión. Con un alto desempeño a la abrasión y absorción de agua clasificada como CG2WA según la norma NTC6050-3.	100%	$ 2.601.000,00
	TOTAL	**29%**	**$ 134.358.687,58**

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

El día 13 de enero de 2023 me posesiono como supervisora del presente contrato, por ende, se realiza empalme con la supervisora anterior, recibiendo el contrato de la siguiente manera.

1. Se recibe archivos donde se demuestra el avance del contrato.
2. No se cuenta con la hoja de vida del personal de seguridad y salud en el trabajo.
4. No se cuenta con Plan de salud ocupacional y seguridad industrial.
5. No se cuenta con Cronograma de obra en "Microsoft Project.
6. No se cuenta con Plan de manejo ambiental.

Se realiza comité de obra en el cual el contratista solicita prorroga por situaciones imprevistas que se presentaron durante la ejecución del contrato, por lo tanto, el señor CBNL06 cita a reunión para tratar la situación del contrato. Se solicita al contratista un cronograma más especificado, cumplimiento en la entrega de los documentos faltantes y se realiza prorroga hasta el 15 de abril.
A la fecha no se han recibido los siguientes documentos:

1. Hojas de vida del personal profesional propuesto. Solo se ha recibido las hojas de vida del director de obra y de 01 residente de obra.
2. Programación de obra. El cronograma debe ser entregado en "Microsoft Project", cuyo software es utilizado para programación de proyectos para representar de manera gráfica la ruta crítica y la programación de actividades, especificar la jornada de trabajo a utilizar en el desarrollo de la obra (días y horas laborales de cada semana) y Programación detallada personal y equipo.
3. Plan de Manejo Ambiental que contenga: Objetivos, descripción del proyecto (actividades del proyecto, recursos para la ejecución del proyecto), Área de influencia, Evaluación de impactos ambientales, Plan de Manejo Ambiental y Programas de Manejo Ambiental y los formatos correspondientes.
4. Plan de salud ocupacional y seguridad industrial.

Se procede a realizar oficio informando al señor CBNL06.

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º

de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

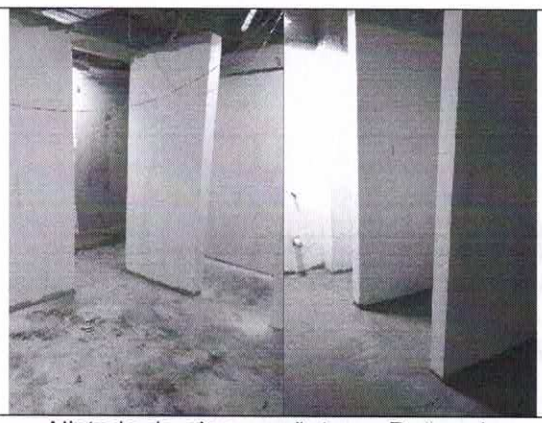
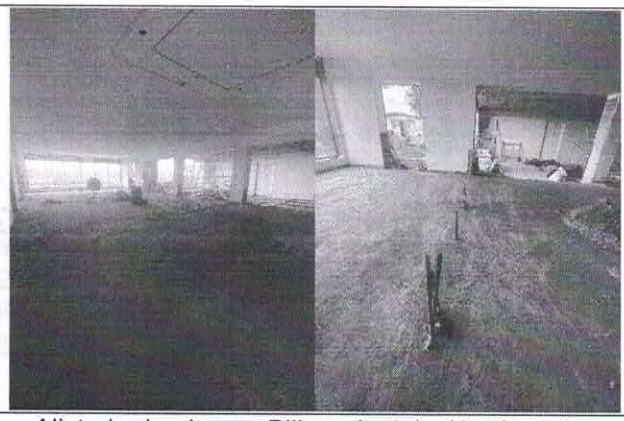
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista CONSORCIO SOCIAL frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.*", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que no se presenta incumplimiento.

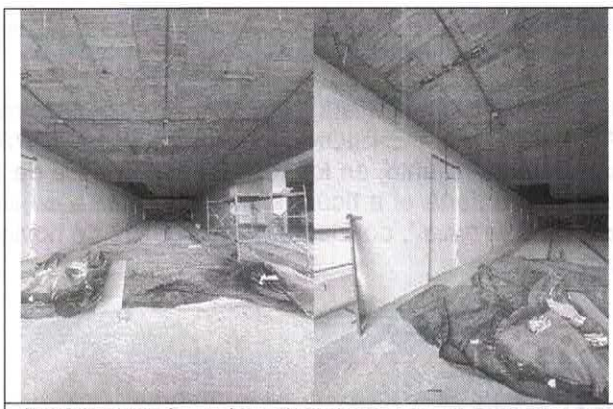
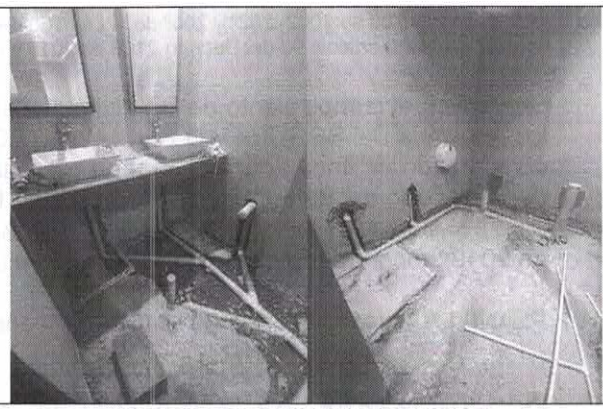
PLANILLA SUAPORTE No 60144877 de fecha 25 de enero de 2023

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que no existe materialización de los mismos.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Alistado de piso y pañete en Baños de Trabajadores	Alistado de piso en Billar e Instalación de redes eléctricas

	
Instalación de redes eléctricas y muro sencillo de super board en Bolera	Instalaciones Sanitarias Baños

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

N/A

15. REPORTE FINAL:

N/A

Atentamente,

TK Montañez Niño Kathy Dayana
C.C. 1090506318 de Cúcuta.
Base Naval ARC "Bogotá"
Kathy.montanez@armada.mil.co

SuAporte | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-01-25, 03:27:08 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 60144877

Periodo Cotización: diciembre de 2022 **Periodo Servicio:** enero de 2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO SOCIAL				
Documento	CC901651321	**Dirección**	CR 54 #75 AA - 16		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3128622511		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	9
Ciudad	ITAGUI	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades															Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 3226526	HERRERA INFANTE MIGUEL ENRIQUE	01	03																0	0	30	30	30	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	FAMISANAR EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	ARL SURA	$ 1.000.000	$ 69.600	COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.600
CC 70192443	GOMEZ MARTINEZ OSWALDO DE JESUS	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 4.000.000	$ 680.000	SALUD TOTAL EPS	$ 4.000.000	$ 160.000	ARL SURA	$ 4.000.000	$ 278.400	COMFAMA	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.278.400
CC 71788454	GONZALEZ VELEZ JUAN FELIPE	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	ARL SURA	$ 1.000.000	$ 69.600	COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 79780597	LADINO TOCASUCHE GONZALO ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	ARL SURA	$ 1.000.000	$ 69.600	COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 80195411	RINCON MENDEZ LEONARDO ANDRES	01	00	X															0	15	15	15	15	PROTECCION	$ 500.000	$ 80.000	SALUD TOTAL EPS	$ 500.000	$ 20.000	ARL SURA	$ 500.000	$ 34.800	COMFAMA	$ 500.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.800
CC 85464438	CHARRIS RUIZ LUIS ALFONSO	01	00	X															0	15	15	15	15	PROTECCION	$ 500.000	$ 80.000	NUEVA EPS	$ 500.000	$ 20.000	ARL SURA	$ 500.000	$ 34.800	COMFAMA	$ 500.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.800
CC 1001215575	HERRERA LIMAS LUIS CARLOS	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	ARL SURA	$ 1.000.000	$ 69.600	COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1032391980	HERRERA INFANTE ANDERSON ALAN	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	EPS SANITAS	$ 1.000.000	$ 40.000	ARL SURA	$ 1.000.000	$ 69.600	COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1128447287	CORDOBA ALVAREZ ZABULON ESTEBAN	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	ARL SURA	$ 1.000.000	$ 69.600	COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 10.000.000	$ 11.000.000	$ 11.000.000	$ 11.000.000	$ 1.640.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 440.000	$ 765.800	$ 440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.285.800	$ 74.900	$ 3.360.500

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

No. 20230024330376773 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-BNL06-OIARQ-29.25

Bogotá D.C. 04-02-2023

Señor Capitán de Navío
ALEJANDRO VARGAS VARGAS
Comandante Base Naval No.6 ARC "Bogotá"
Carrera 65 No.14-91Municipio, Departamento
Bogotá D.C

Asunto: Novedades contrato No.170-ARC-CBN6-2022.

Respetuosamente me dirijo al señor Capitán de Navío Comandante de la Base Naval No.6 ARC "Bogotá", en atención al contrato No. 170-ARC-CBN6-2022, con el fin de informar incumplimiento por parte del contratista en lo establecido en el literal 3.4.2. EXPERIENCIA del pliego definitivo del proceso del contrato en mención, el cual expresa: "EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL REQUERIDO: Se requiere para las obras de adecuación, DIRECTOR DE OBRA, DOS (02) RESIDENTES, UN PROFESIONAL, TÉCNICO O TECNÓLOGO EN SALUD OCUPACIONAL Y/O SEGURIDAD INDUSTRIAL Y/O SALUD EN EL TRABAJO HSEQ, los cuales deben cumplir con calidades que se estipulan a continuación: Se requieren un (01) COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO con disponibilidad de un 100% para atender los frentes de trabajo y que reúna el siguiente perfil: Profesión: Profesional especialista o tecnólogo en salud Ocupacional o Seguridad y salud en el Trabajo, o en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo (HSEQ), con experiencia profesional mínima de 02 años a partir de la de la fecha de grado o fecha de grado de especialista, documentación a soportar:

a) Fotocopia de Licencia en Salud Ocupacional.
b) Documento que acredite la experiencia solicitada.
c) Certificado de vigencia de la licencia en salud ocupacional.
d) Carta de compromiso que exprese una disponibilidad del 100% del tiempo para la permanencia en la obra."

A la fecha no se evidencia la presencia de la persona con las calidades anteriormente mencionadas, ni los documentos exigidos para verificarlo, a pesar de ser informada al contratista en varias ocasiones. Así mismo, no se han recibido los documentos mencionados en el literal 3.6. del pliego de condiciones, Documentos para entrega posterior a la adjudicación del contrato así:

1. Hojas de vida del personal profesional propuesto. A la fecha se ha recibido solo hojas de vida del director de obra y de 01 residente de obra.
2. Programación de obra. El cronograma debe ser entregado en "Microsoft Project", cuyo software es utilizado para programación de proyectos para representar de manera gráfica la ruta crítica y la programación de actividades, especificar la jornada de trabajo a utilizar en el desarrollo de la obra (días y horas laborales de cada semana) y Programación detallada personal y equipo.
3. Plan de Manejo Ambiental que contenga: Objetivos, descripción del proyecto (actividades del proyecto, recursos para la ejecución del proyecto), Área de influencia, Evaluación de impactos ambientales, Plan de Manejo Ambiental y Programas de Manejo Ambiental y los formatos correspondientes.
4. Plan de salud ocupacional y seguridad industrial.

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Carrera 65 No.14-91– Conmutador 3692000 Ext. 10622 Bogotá, Colombia
www.armada.mil.co – Kathy.montanez@armada.mil.co

Respetuosamente,

Teniente de Corbeta MONTAÑEZ NIÑO KATHY DAYANA
Supervisora contrato No.170-ARC-CBN6-2022

Anexo: Oficio Solicitud cumplimiento Obligaciones Contractuales Específicas (01)

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Carrera 65 No.14-91– Conmutador 3692000 Ext. 10622 Bogotá, Colombia
www.armada.mil.co – Kathy.montanez@armada.mil.co
