DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-017

Bogotá D.C. 19 de julio de 2018

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión Informe Mensual No 01

Respetados Señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir el informe mensual No. 01 de Interventoría, comprendido entre el siete (07) de junio de 2018 al treinta (30) de junio de 2018. La presente con el fin de informar a la entidad contratante el avance de ejecución del contrato.

Agradecemos de antemano su atención.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TÉCNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	*209 Folios + 1 Cd*	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	*Archivo – Contrato de interventoría*	

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

POLICÍA NACIONAL

POLICIA NACIONAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN NO.4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.



DAIMCO

CONTRATO No. PN DIRAF NO. 06-3-10051-18
DOCUMENTO No. I074-2017
Informe Mensual No. 01
INFORME DE INTERVENTORÍA
07 de Jun de 2018 - 30 de Jun de 2018
VERSIÓN 0
VOLUMEN 1 DE 1
ORIGINAL

INFORME MENSUAL No. 01 DE INTERVENTORIA

PROYECTO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN NO.4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

CONTRATO DE CONSULTORÍA PN DIRAF NO. 06-3-10051-18

TÍTULO:

INFORME MENSUAL No. 01

07 DE JUNIO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Realizo: TIRSO COSME. Director de Interventoría

_____

Aprobó: Ing. José Vicente Bocanegra – Gerente Técnico de Interventoría

_____

Tabla de contenido

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

INDICE DE MODIFICACIONES

ESTADO DE REVISIÓ Y APROBACIÓN

1.INTRODUCCIÓN 6

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6

2.ESTADO Y AVANCE DEL PROYECTO 13

2.1 AVANCE DOCUMENTAL 13

2.2AVANCE DE ACUERDO A LA PORGRAMACIÓN 14

2.3CRONOGRAMA DE OBRA 15

3.ESTADO DEL CONTRATO 16

3.1 ÁMBITO FINANCIERO 16

3.2 ÁMBITO PRESUPUESTAL 16

3.3 ANTICIPO 17

3.3.1 Informe Plan Anticipo 18

3.4 FACTURACIÓN MENSUAL 19

4.ACTAS PARCIALES DE OBRA 20

5.ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORIA 21

6.TRABAJOS EJECUTADOS 21

6.1 DESCRIPCION GENERAL DE LAS TAREAS 21

6.2 MODIFICACIONES DEL PROYECTO 27

7.CUMPLIMIENTO PAGOS PARAFISCALES 27

8.PERMANENCIA Y ESTADO DE LOS EQUIPOS 27

8.1 CONTROL PERSONAL CONTRATISTA 27

8.2CONTROL PERSONAL INTERVENTORIA 27

8.3CONTROL DE EQUIPOS 27

9.ASPECTOS VARIOS 27

9.1REGISTRO FOTOGRAFICO 27

9.2ESTADO DEL TIEMPO 27

9.3POLIZAS 27

10.CONCLUSIONES 28

LISTA DE TABLAS

Tabla No. 1 Avance del proyecto 15

Tabla No. 2 Hitos 15

Tabla No. 3 Estado Financiero 16

Tabla No. 4 Avance Fisico 16

Tabla No. 5 Actas Parciales Contrato de Obra 20

Tabla No. 6 Actas Parciales Contrato de Interventoria 21

Tabla No. 7 Actas de Comité 21

Tabla No. 8 Equipos interventoria 22

Tabla No. 9 Polizas Contrato de Obra 28

Tabla No. 10 Polizas Contrato de Interventoría 28

RELACIÓN DE ANEXOS

INFORME EJECUTIVO No. 01

Anexo No.1. Informes semanales

Anexo No.2. Relación de Correspondencia

Anexo No.3. Actas de comité del periodo

Anexo No.4. Plan de Anticipo

Anexo No.5. Seguridad Social

Anexo No.6. Control de personal del Contratista

Anexo No.7. Control de personal de la Interventoría

Anexo No.8. Control de Equipos

Anexo No.9. Registro fotográfico

Anexo No.10. Control de clima

Anexo No.11. Bitácora

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Las copias de este documento han sido entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREA O DEPENDENCIA		No. DE COPIAS
Copia No. 1	**Policía Nacional**	**1 (original)**
Copia No. 2	**Archivo Contrato de Interventoría No. PN DIRAF 06-3-10051-18**	**1**

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

ÍNDICE VERSIÓN	CAPÍTULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
0		-	Versión original

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

TITULO DOCUMENTO:		INFORME MENSUAL		
DOCUMENTO No:		No. 01		
NUMERO DE REVISIÓN		0	1	2
RESPONSABLE POR ELABORACIÓN "Director de Interventoría"	Nombre:	**Ing. Tirso Cosme**		
	Firma:			
	Fecha:	**3-07-2018**		
RESPONSABLE APROBACIÓN "Gerente Técnico de Interventoría"	Nombre:	**Ing. José Vicente Bocanegra**		
	Firma:			
	Fecha:	**5-06-2018**		
RESPONSABLE APROBACIÓN "Supervisora del contrato"	Nombre:	**Teniente Ingeniero Civil Andrea Carolina Cadena Lemus**		
	Firma:			
	Fecha:			

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe Mensual No 01, correspondiente al Periodo del 07 de JUNIO del 2018 al 30 de JUNIO de 2018, presentado en cumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en el Contrato de Interventoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18 suscrito entre **DAIMCO S.A.S** y **POLICIA NACIONAL – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Se presenta acorde al manual de Interventoría y exigencias de la Policía Nacional – Dirección administrativa y financiera, el Control realizado por nuestra empresa al Contratista **CONSORCIO BCS-GUTIERREZ**, encargado de la ejecución del Contrato de Obra No. PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Localización del Proyecto: Popayán, departamento de Cauca.

El municipio de Popayán limita por el norte con los municipios de Cajibío y Piendamó, por el sur con los municipios de Sotará y Puracé, por el oriente con el municipio de Totoró, Puracé y el Departamento del Huila, por el occidente con el municipio de El Tambo y Timbío, el proyecto se desarrollara en la Región No 4 DECAU MEPOY Comando Departamento de Policía Cauca en el predio con dirección Carrera 17 No 1 – 75 – Popayán - Cauca con matricula inmobiliaria 120-13255 con un área aproximada de 16 Hectáreas con 8.030 metros

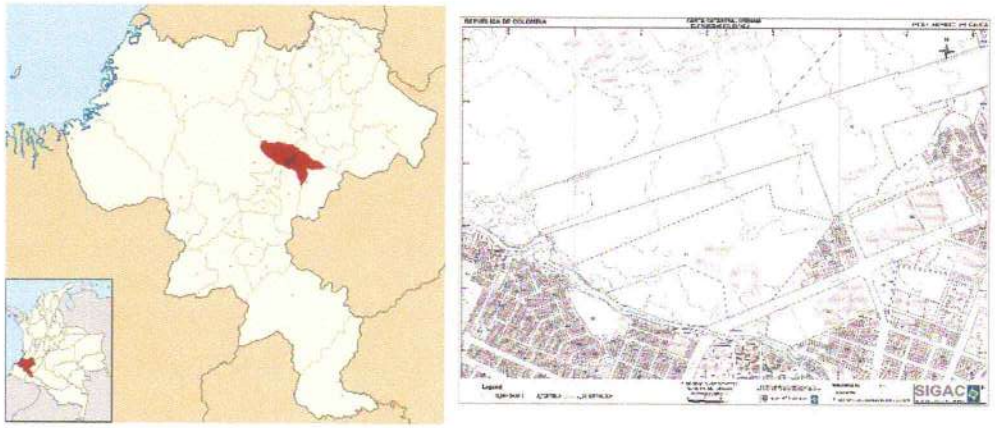


Ilustración 1. Localización general
Fuente. Equipo de Topografía

El proyecto se centra en la ejecución de las actividades para la **"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA**

DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE", de acuerdo a diseños de consultoría bajo el contrato No PN-DIRAF No 06-3-10041-15, el contrato de obra incluye la ejecución de actividades para el desarrollo de la Fase 4 – Edificio D de excavaciones, rellenos, estructura de concreto, mobiliario de oficinas, sistemas de detección de incendios, carpintería metálica y de madera, sistemas de ventilación mecánica y todas las adecuaciones urbanísticas eléctricas e hidráulicas internas y externas que permitan el correcto funcionamiento del edificio y el desarrollo de esta fase y de las fases futuras que comprenden el complejo de Policía del Cauca".

2. ESTADO Y AVANCE DEL PROYECTO

2.1 AVANCE DOCUMENTAL

Correspondencia Recibida

En el Anexo No. 2. Se relaciona y adjunta la correspondencia recibida del Contratista y de la Entidad contratante, durante el presente informe.

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento
D-2018-1064	Entrega de documentos proyecto	1	N.A	18/05/2018
D-2018-1110	Garantía	1	N.A	24/05/2018
D-2018-1202	Personal Profesional	1	N.A	01/06/2018
D-2018-1247	Notificación al interventor del contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18	1	N.A	08/06/2018
D-2018-1238	Fiducia Popular - Documentación Interventoría	1	N.A	07/06/2018
D-2018-1264	Fiducia Popular - Documentación Interventoría	1	N.A	12/06/2018
D-2018-1265	Acta de inicio y acta de entrega predio	1	N.A	12/06/2018
D-2018-1332	APU traslado de contenedores	1	N.A	20/06/2018
D-2018-1333	Aclaración Faltantes	1	N.A	20/06/2018

D-2018-1351	Solicitud mesa de trabajo	1	N.A	21/06/2018
D-2018-1391	Solicitud de respuesta a oficio 009 del contratista, de 22 de mayo de 2018 y observaciones adicionales	1	N.A	26/06/2018
D-2018-1398	Respuesta a oficio CPP-DIRAF-2018-009	1	N.A	27/06/2018
D-2018-1403	Notificación Modificatorio No 1	1	N.A	27/06/2018
D-2018-1406	Plan de Inversión del Anticipo	1	N.A	27/06/2018

Correspondencia Enviada

En el Anexo No. 2. Se relaciona y adjunta la correspondencia enviada al Contratista y a la Entidad contratante.

No.	**Título del Documento**	Versión #	Tomo No.	Fecha documento
CPP-DIRAF-2018-001	Legalización de contrato - Remisión de póliza inicial	1	N.A	29/05/2018
CPP-DIRAF-2018-002	Legalización de Contrato - Remisión Hojas de vida personal técnico y administrativo	1	N.A	20/04/2018
CPP-DIRAF-2018-003	Legalización contrato - Corrección póliza inicial	1	N.A	27/04/2018
CPP-DIRAF-2018-004	Autorización personal Técnico y Administrativo en campo	1	N.A	02/05/2018
CPP-DIRAF-2018-005	Remisión documentación fiduciaria	1	N.A	27/04/2018
CPP-DIRAF-2018-006	Remisión actas de inicio y entrega del predio	1	N.A	04/05/2018
CPP-DIRAF-2018-007	Radicación de documentos interventoría	1	N.A	12/05/2018

CPP-DIRAF-2018-008	Solicitud mesa de trabajo	1	N.A	16/05/2018
CPP-DIRAF-2018-009	Cumplimiento obligaciones contractuales	1	N.A	17/05/2018
CPP-DIRAF-2018-010	Solicitud Fiduciaria popular s.a	1	N.A	22/05/2018
CPP-DIRAF-2018-011	Respuesta al documento PN-DIRAF-POPAYAN-023 del 19 de junio de 2018 con radicado Daimco D-2018-1332 del 20 de junio de 2018. APU Traslado de contenedores	1	N.A	22/05/2018
CPP-DIRAF-2018-012	Respuesta al documento PN-DIRAF-POPAYAN-026 del 26 de junio de 2018 con radicado Daimco D-2018-1398 del 27 de junio de 2018. – Respuesta oficio CPP-DIRAF-2018-009	1	N.A	22/05/2018
CPP-DIRAF-2018-013	Respuesta al documento PN-DIRAF-POPAYAN-009 del 22 de mayo de 2018 con radicado Daimco D-2018-1333 del 20 de junio de 2018, y documento PN-DIRAF-POPAYAN-025 del 25 de junio de 2018 con radicado Daimco D-2018-1391 del 26 de junio de 2018 - Observaciones	1	N.A	18/05/2018

2.2 AVANCE DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN

De acuerdo con el presente informe mensual presentado a la Entidad, se evidencia que el avance del proyecto es el siguiente:

Tabla 1. AVANCE DEL PROYECTO

INFORME	CORTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
No 01	DEL 07 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2018.	0.00 %	0.42 %

A la fecha de corte, el Contratista se encuentra realizando los ajustes a la programación de acuerdo con su obligación contractual, lo anterior teniendo en cuenta que la programación entregada a través de correo electrónico no se ajusta a lo requerido.

Los informes semanales realizados en el periodo de 07 de junio a 30 de junio de 2018 se encuentran en el **anexo No. 1** del presente informe.

2.3 CRONOGRAMA DE OBRA

El cronograma del proyecto cuenta con la entrega de los siguientes hitos establecidos en el anexo técnico presupuesto de obra para la Fase 4 EDIFICIO ALOJAMIENTO D (DECAU):

Tabla 2. HITO S

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA
01	ACTIVIDADES PRELIMINARES	
02	DESMONTES Y DEMOLICIONES	
03	EXCAVACIONES Y RELLENOS	
04	CIMENTACIÓN	
05	PISOS – BASES	
06	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	
07	TANQUE DE RESERVA	
08	ESTRUCTURA METALICA	
09	MAMPOSTERÍA	
10	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	
11	PAÑETES	
12	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS	
13	INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEMATICAS Y AUTOMATIZACIÓN	

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA
14	PISOS – ACABADOS	
15	CARPINTERÍA MADERA	
16	CARPINTERÍA METÁLICA	
17	PINTURA	
18	CUBIERTAS	
19	CIELOS RASOS	
22	MUEBLES FIJOS	
23	ENCHAPES, ESPEJOS, MESONES Y DIVISIONES	
24	APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS	
26	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA	
27	MOBILIARIO DE OFICINAS	
28	DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS	
30	ASEO DE OBRA	

3. ESTADO DEL CONTRATO

3.1 ÁMBITO FINANCIERO

A la fecha de corte del presente informe mensual No 1 (07 de junio de 2018 al 30 de junio de 2018), se tiene que el avance financiero es el siguiente:

Tabla 3. ESTADO FINANCIERO


VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	$ 9.250.463.250,08
ADICION	N/A
VALOR ACTUALIZADO	$ 9.250.463.250,08
VALOR PROGRAMADO	N/A
VALOR EJECUTADO	$ 38.582.253,33

3.2 ÁMBITO PRESUPUESTAL

A la fecha de corte del presente informe mensual No 1 (07 de junio de 2018 al 30 de junio de 2018), se tiene que el avance programado es el siguiente:

Tabla 4. AVANCE FISICO

PORCENTAJE PROGRAMADO	**0.00 %**
PORCENTAJE EJECUTADO	**0.42 %**

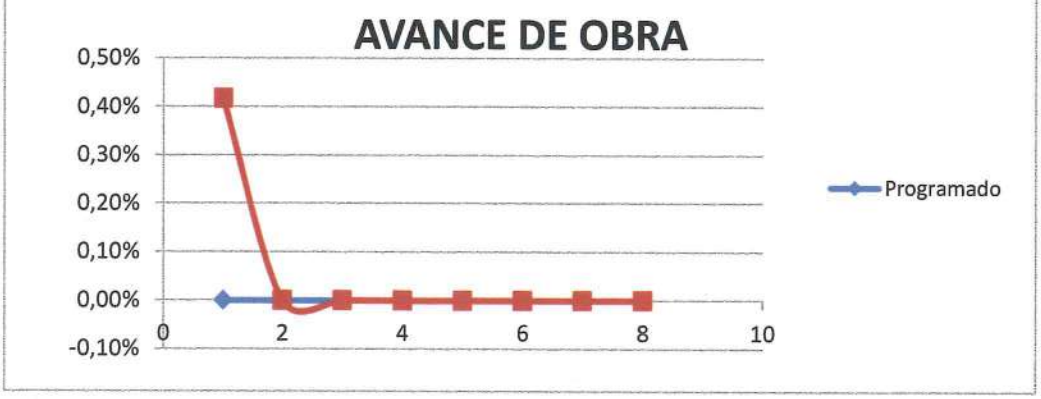

Se presenta la Gráfica de Control Avance de obra (Programado Vs Ejecutado) de acuerdo con la ejecución del proyecto durante el presente periodo con un % de ejecución 0.42% y

programación del 0.0 %, esto teniendo en cuenta que a la fecha no se encuentra la programación aprobada por la interventoría dado que el contratista de obra ha presentado la programación fuera de los tiempos contractuales establecidos y en las condiciones solicitadas por el contrato, sin embargo nos encontramos realizando la verificación de la programación a fin de realizar aprobación oficial.

3.3 ANTICIPO

Durante el presente periodo, se suscribió el contrato de Fiducia Mercantil entre CONSORCIO BCS-GUTIERREZ y FIDUCIARIA POPULAR S.A; para el manejo de los recursos del anticipo del contrato No 06-6-10044-18, se adjunta el plan de manejo del anticipo en el **anexo No. 4** aprobado por la Interventoría.

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO		Página 1de1
PROGRAMACIÓN INICIAL	FECHA	27-jun-18
REPROGRAMACIÓN	FECHA	
CONTRATO No.	PN DIRAF 06-6-10044-18	
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 9.250.463.250,08
CONTRATISTA	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ	
INTERVENTOR	DAIMCO SAS	
PLAZO	Hasta el 15 de Diciembre de 2018	
VALOR ANTICIPO		$ 1.850.092.650,02

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 555.027.795,01	30,00%
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 980.549.104,51	53,00%
3	Transporte y retiro de escombros	$ 185.009.265,00	10,00%
4	Descuentos y retenciones	$ 129.506.485,50	7,00%
TOTAL		$ 1.850.092.650,02	100,00%

Nota:

a) Plazo en días para la inversion del anticipo 150 días.

Para constancia de lo anterior, se firma y aprueba el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los veintisiete (27) días del mes de Junio de 2018

TE ANDREA CAROLINA CADENA LEMUS
Supervisora de Contrato
POLICIA NACIONAL-DIRAF

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

CARLOS JAVIER ROJAS BALOMINO
Representante Legal
DAIMCO SAS
INTERVENTORIA

3.3.1 Plan De Inversión Del Anticipo Aprobado:

A continuación, se presenta el informe del plan de Anticipo del Contratista,

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO			Página 1de1
PROGRAMACIÓN INICIAL		FECHA	27-jun-18
REPROGRAMACIÓN		FECHA	
CONTRATO No.		PN DIRAF 06-6-10044-18	
OBJETO		"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 9.250.463.250,08**	
CONTRATISTA		**CONSORCIO BCS-GUTIERREZ**	
INTERVENTOR		**DAIMCO SAS**	
PLAZO		Hasta el 15 de diciembre de 2018	
VALOR ANTICIPO			**$ 1.850.092.650,02**
DATOS ESPECÍFICOS			
No.	**Descripción**	**Valor ($)**	**Porcentaje**
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 555.027.795,01	30,00%
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 980.549.104,51	53,00%
3	Transporte y retiro de escombros	$ 185.009.265,00	10,00%
4	Pólizas, impuestos, administración	$ 129.506.485,50	7,00%
TOTAL		**$ 1.850.092.650,02**	**100,00%**

3.4 FACTURACIÓN MENSUAL

CONTRATO DE OBRA

La Policía Nacional-Dirección Administrativa y Financiera cancelará el valor del contrato en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma:

UN ANTICIPO:

Correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato principal, lo anterior teniendo en cuenta que el anticipo es un recurso de la entidad que permite una financiación de la ejecución del objeto contractual con recursos públicos, temporalmente administrados por el contratista, lo cual le convierte en un responsable fiscal.

NOTA 1: El contratista deberá constituir un contrato de fiducia con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera de Colombia, para

el manejo de los recursos provenientes del anticipo en los términos establecidos en los artículos 2.2.1.1.2.4.1 y 2.2.1.2.3.3.1 del Decreto 1082 de 2015, así mismo presentará a la interventoría la programación de inversión del anticipo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la aprobación de la garantía única, el cual debe estar aprobado por la interventoría y el supervisor de la interventoría, garantizando control permanente sobre el mismo.

NOTA 2: En los términos y condiciones del contrato de fiducia deberá quedar como obligación:

a) La entrega de un informe mensual por parte de la fiducia, donde se evidencien los pagos efectuados y los rendimientos mensuales a consignar en la cuenta que indique la entidad contratante.

b) Los desembolsos solicitados por el contratista de obra tomando como base el plan de manejo del anticipo, deberán ser autorizados por el representante legal de la interventoría.

El pago del anticipo se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la aprobación de la garantía única, una vez aprobados los documentos presentados y requerido 'por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y a la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

PAGOS PARCIALES:

Se realizarán. pagos parciales de acuerdo al porcentaje de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez, la Interventoría y Contratista hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias y que la Interventoría haya certificado la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinticinco (25) de cada mes.

Nota 1: En cada acta de corte parcial se amortizará proporcionalmente, el valor entregado al, contratista en calidad de anticipo, hasta amortizar el 100% de su valor.

Cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación.

Previo a la presentación de las actas parciales y a su ejecución, deberá estar aprobado por la DIRAF el balance de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos si los hay. Consolidado por el contratista de obra con los soportes documentales (y fotográficos de ser necesario), proyectado y avalado por la

interventoría. igual condición para el acta final, si hay modificaciones al balance aprobado.

Para cada una de las actas parciales, el pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles, una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del plan anual de caja (PAC), así:

- Acta de recibo parcial. (suscrita entre los contratistas de obra e interventoría) Factura de venta
- Balance de cantidades ejecutadas.
- Certificación de pagos parafiscales y seguridad social.
- Certificación pagos FIC
- Memoria de cantidades ejecutadas.

Y los demás documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera,

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o. si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección Administrativa y Financiera, programará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

JUSTIFICACIÓN DEL PAGO DE ANTICIPO:

En el presente proceso de contratación el Grupo de Seguimiento a Proyectos del Área de Infraestructura de la Dirección Administrativa y Financiera justifica el pago de anticipo al futuro contratista, con el fin de que el proyecto constructivo tenga la financiación suficiente y el constructor tenga la posibilidad de adquirir los insumos y bienes a los precios establecidos en el presente contrato.

Es de anotar que el giro de los recursos a una fiducia independiente genera el respaldo del manejo de los dineros evitándose la desviación de los mismos, toda vez que los desembolsos deberán ser autorizados por la interventoría.

Es importante aclarar que el anticipo deberá estar amparado por la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, acorde al Decreto 1082 de 2015 'por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional" en su Artículo 2.2.1.1.2.4.1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La Policía Nacional-Dirección Administrativa y Financiera cancelará el valor del contrato en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma:

PAGOS PARCIALES:

Se realizarán pagos parciales hasta completar el 95% del valor del contrato, sujetas al porcentaje de avance del contrato de obra que corresponderá al valor ejecutado en el respectivo periodo, las que se tramitarán una vez el supervisor e Interventor hayan suscrito el acta parcial correspondiente y se certifique la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, de igual manera el supervisor de la interventoría deberá certificar el cumplimiento de las funciones y obligaciones contractuales; las actas deberán presentarse a más tardar el día veinticinco (25) de cada mes.

Para cada uno de los pagos parciales, se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a, turno y la disponibilidad del plan anual de caja (PAC), así:

- Factura de venta
- Certificación de pagos parafiscales y seguridad social

Y los demás documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección Administrativa y Financiera, programará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

ACTA DE RECIBO FINAL

Su valor será del cinco por ciento 5% del valor total del contrato, una vez se certifique por parte del supervisor del contrato de interventoría el recibo a satisfacción del cien (100%) del valor del contrato. Se presentará una vez la interventoría certifique el recibo a satisfacción del cien por ciento (100%) del contrato de obra y se haya recibido a satisfacción el cien por cient (100%) del valor del contrato de interventoría en el cual se certifique el seguimiento y control adelantado por la interventoría al contrato de obra.

El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de las facturas del acta respectiva, junto con el recibo a satisfacción suscrito por la interventoría del contrato, con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa

y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección Administrativa y Financiera, programará el valor a , cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Nota: Es claro que el valor del contrato de interventoría y su pago, se realizará bajo objetivo ejecutado en el contrato de obra y no por la permanencia de los profesionales o el mayor tiempo de ejecución del contrato de obra en el desarrollo de los ítems con su valor contractual, por tal motivo la única forma de realizar una adición presupuestal al contrato de interventoría, 1 será siempre y cuando se realice alguna adición presupuestal al contrato de obra, el cual justifique la necesidad de tener mayor tiempo en su ejecución, para la realización de las actividades contempladas en la adición.

4. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Contrato de Obra

A la fecha el Contratista no ha presentado Acta parcial para aprobación de la interventoría:

Tabla 5. ACTAS PARCIALES CONTRATO DE OBRA No. 1053

No. Acta	Periodo	Valor Total del Acta	AMORTIZACIÓN	TOTAL, PAGADO
1	N/A	N/A	N/A	N/A

5. ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORÍA

Contrato de Interventoría

A la fecha la Interventoría no ha radicado Actas Parcial a la Entidad Contratante:

Tabla 6. ACTAS PARCIALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 835

No. Acta	Periodo	Valor Total del Acta
1	N/A	

6. TRABAJOS EJECUTADOS

6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS TAREAS

- ACTAS DE COMITÉ

Dentro de las tareas desarrolladas durante el periodo en evaluación, se encuentran la suscripción de actas de comité, las cuales se han realizado para el seguimiento de la POLICIA NACIONAL hacia el contrato de Interventoría y de comité de Interventoría hacia el contrato de obra. Dichas actas se indican a continuación y se encuentran en medio físicos en el **anexo No. 3** del presente informe:

Tabla 7. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CONCLUSIONES
13 de junio de 2018	Se realiza comité de seguimiento en campo a fin de tratar temas referentes a la ejecución de obra
19 de junio de 2018	Se realiza comité de seguimiento en campo a fin de tratar temas referentes a la ejecución de obra
26 de junio de 2018	Se realiza comité de seguimiento en las instalaciones de la POLICIA NACIONAL a fin de tratar temas referentes a la ejecución de obra, situación administrativa financiera etc.
28 de junio de 2018	Se realiza comité de seguimiento en campo a fin de tratar temas referentes a la ejecución de obra

- **ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

Dentro de las actividades efectuadas por el Consorcio BCS- Gutiérrez y la interventoría Daimco, durante el periodo de 07 de junio del 2018 al 30 de junio del 2018, se encuentran las siguientes:

- **Cumplimiento de Especificaciones técnicas, diseños, normas técnicas, cantidades, según contrato.**

  En el presente periodo se ha estado realizando la revisión de los paquetes de diseño entregado por la consultoría del proyecto a la DIRAF, se han presentado diferentes consultas y dudas de parte del contratista de obra e igualmente de parte de la interventoría, que han generado trabajo conjunto entre profesionales de parte de contratistas, interventoría y DIRAF.
  De acuerdo a planteamiento de contratista en oficio se solicitan aclarar dudas sobre el paquete de diseño, y adicionalmente, establece pregunta sobre el nivel de

construcción que deberá tener finalmente los edificios, respecto de las construcciones aledañas existentes y respecto de la via que se encuentra a nivel de base, lista para carpeta asfáltica, el contratista manifiesta que desde su punto de vista se debe autorizar elevar el nivel de piso de las edificaciones a realizar hasta el mismo nivel existente de los edificios construidos en fase

ACTIVIDADES ADELANTADAS:

- Se localiza ubicación de pases sobre via en construcción, para pase de red contraincendios.
- Se adelanta conjuntamente gestión para que el contratista pueda realizar la acometida provisional con la instalación de su respectivo medidor.

- Se hace seguimiento a la limpieza e instalación de la capa de sello para el concreto estampado de senderos peatonales.
- Se chequean ejes localizados por topografía del contratista y se les corrige la localización y se deja planteado mojón para amarre.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda al contratista adelantar y entregar la Ingeniería de detalle que han estudiado y entregar previa a las fecha de compromiso que por disposición en el contrato les corresponde al mes fe haber firmado el acta de inicio o sea el siete(07) de Julio.

EXTERIORES

- **Acciones adelantadas por la interventoría y supervisión actividades Eléctricas**

  Se adelanta visita el viernes veintidós 22 de julios de 2018, el Asesor Eléctrico de la DIRAF el Subintendente Adán Rubio, donde se determina desde donde se tomará la acometida para la Fase 4 y se define el recorrido a realizar.

- **Acciones adelantadas por la interventoría y supervisión actividades chequeo topografía**

  Se realiza la verificación del proyecto.

- **Acciones adelantadas por el contratista y supervisión ante el cumplimiento al Carácter Técnico.**

  El contratista entrega para revisión archivo de programación de obra, de forma incompleta, a lo cual se le envía oficio donde se le solicita de forma detallada, lo que debe entregar y forma.

- **Calidad de la Obra, Equipos, Bienes, Insumos, Ensayos o Pruebas.**

  El contratista en el mes de junio tuvo en obra, una (1) máquina retroexcavadora de orugas, (1) volquetas de planta y (1) buldócer, equipos utilizados para trabajos traslado de contenedores al área determinada por la entidad.

- **Novedades, observaciones y recomendaciones de carácter técnico.**

  La interventoría ha estado muy atenta en informar los posibles cambios del clima que podrían afectar los trabajos, para este periodo se presentaron lluvias variables y de corto periodo que no afectarían el desarrollo de trabajos.

6.2 MODIFICACIONES DEL PROYECTO

Durante el periodo en evaluación no se presentaron modificaciones al proyecto.

7. CUMPLIMIENTO PAGOS PARAFISCALES

En lo correspondiente al presente periodo, la interventoría ha realizado el seguimiento y control bajo los lineamientos de la normatividad sobre la materia (aspectos básicos legales):

- Seguimiento a las afiliaciones al sistema de seguridad social de los trabajadores que laboran en la obra. (Contratista entregó copias de las afiliaciones).
- Inspección en el desarrollo de las actividades la entrega de los elementos de protección personal –EPP y supervisión en el uso de los mismos.
- Solicitud al constructor sobre la entrega de los exámenes médicos de ingreso de salud ocupacional del personal que labora en el proyecto.

En el anexo No. 5 se muestran las planillas de pagos parafiscales de los profesionales involucrados en el proyecto del Contratista y la interventoría.

8. PERMANENCIA Y ESTADO DE LOS EQUIPOS

8.1 CONTROL PERSONAL CONTRATISTA

En el Anexo No. 6. Se diligenció el Formato Control del Personal, acorde a lo requerido por el contrato de obra No DIRAF 06-6-10044-18, para la ejecución de las actividades correspondientes al presente periodo.

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	Director de ing. obra	Ing. Julián Mauricio Giraldo
2	Residente 2 de ing. obra	Ing. María Teresa Ojeda Cabrera
4	Auxiliar administrativo	María Fernanda Benavidez
5	Residente ing. Ambiental y SISO	Evelyn Gutiérrez
7	Topógrafo 1	Margarita Eugenia Álvarez Fuentes
9	Auxiliar topografía	Alexandra Risueño
10	Maestro	Hernando José Arrieta
11	Ayudantes	2

8.2 CONTROL PERSONAL INTERVENTORIA

En el Anexo No. 7. Se encuentra el Formato Control del Personal de la Interventoría, para la ejecución de las actividades durante el periodo del contrato de interventoría No DIRAF 06-3-10051-18

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1	ING. TIRSO MARINO COSME OROZCO
4	RESIDENTE ING. CIVIL	ING. SANDRA LUCIA GUAUÑA PISSO

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
6	RESIDENTE AMBIENTAL ESP. SALUD OCUPACIONAL	Eduardo Andres Cepeda Cardoso
7	ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Javier Jose Carillo Ortega
8	RESIDENTE ING. TOPOGRAFO	Rigoberto Lozada Diaz
9	RESIDENTE ELÉCTRICO	Víctor Manuel Bocanegra García
11	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	Jose Armando Ruiz Angarita
12	ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA	Alberto Federico Mouthon Bello
14	ASESOR JURÍDICO	Pablo Manrique Convers
15	ASESOR CONTABLE	Pablo Emilio Guerrero Jimenez

8.3 CONTROL DE EQUIPOS

En el Anexo No. 08 se presenta el formato Control de Equipos, en el cual se reportan los equipos usados por el Contratista en obra durante dicho periodo.

Cuadro 8. Relación de Equipos de Interventoría

EQUIPOS	CANTIDAD
COMPUTADORES	2
CAMARA DIGITAL	2
IMPRESORA	1
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	1
EQUIPO ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS	1

9. ASPECTOS VARIOS

9.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO

El registro fotográfico se presenta en el anexo No. 9 del presente informe.

9.2 ESTADO DEL TIEMPO

En el Anexo No. 10 se presenta el formato control del clima, en el cual se reporta el estado del tiempo en la obra durante dicho periodo

9.3 POLIZAS

Contrato de Obra

En el siguiente cuadro se relacionan las pólizas del contrato de obra No DIRAF 06-6-10044-18

Tabla 9. POLIZAS CONTRATO DE OBRA

GARANTÍAS				
POLIZAS	COMPAÑÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
			Iniciación	Terminación
Anticipo	Seguros del Estado S.A.	1.850.092.650.02	18/05/2018	30/06/2019
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A.	1.850.092.650.02	18/05/2018	30/06/2019
Pago de salarios y prestaciones	Seguros del Estado S.A.	462.523.162.50	18/05/2018	30/04/2022
Estabilidad de la obra	Seguros del Estado S.A.	2.775.138.975.02	15/12/2018	15/12/2023
Calidad de los bienes	Seguros del Estado S.A.	329.371.500.00	18/05/2018	30/04/2020

Contrato de Interventoría

En el siguiente cuadro se relacionan las pólizas del contrato de Interventoría No. DIRAF 06-3-10051-18

Tabla 10. POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

GARANTÍAS				
POLIZAS	COMPAÑÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
			Iniciación	Terminación
Cumplimiento	Seguros Mundial	92.474.900.00	22/05/2018	15/02/2019
Calidad de Servicio	Seguros Mundial	231.187.250.00	15/12/2018	15/12/2023
Pago de salarios y prestaciones	Seguros Mundial	23.118.725.00	22/05/2018	15/12/2021

10. CONCLUSIONES

Se hace a diario control por parte de la interventoría, al uso de elementos de protección personal y equipos para trabajos seguros en alturas.

Se hace la solicitud de regar agua en las áreas de ingreso de la obra porque se genera mucha contaminación con el polvo por el tránsito pesado.

Se solicitó el retiro de escombros y material sobrante de excavación a sitio autorizado.

Se controló el desperdicio de agua con mangueras rotas.

En este periodo se solicita en reiteradas ocasiones la programación a presentar por el contratista de obra.

Se le ha pedido al contratista sustentar, con cálculos y topografías los volúmenes que argumentan serían necesarios para realizar un relleno adecuado.

De igual forma, se le recuerda al contratista la obligación de presentar la ingeniería de detalle para su revisión y aprobación.

DAIMCO S.A.S
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

RESUMEN EJECUTIVO INT-11:01

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

PERIODO DEL INFORME

DEL			AL		
7	6	2018	30	6	2018

No. DE INFORME 1 DE 2018

PLAZO TRANSCURRIDO

FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION		
7	6	2018	15	12	2018

TIEMPO CONTRACTUAL TRANSCURRIDO EN DIAS 23 DE 191

DATOS BASICOS

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
CONTRATO No.	06-6-10044-18
VALOR INICIAL	$9.250.463.250,08
VALOR ACTUALIZADO	$9.250.463.251,08
PLAZO INICIAL	15 DE DICIEMBRE DE 2018
PRORROGA	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	15 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE INICIACIÓN	07 DE JUNIO DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	DAIMCO S.A.S
CONTRATO No.	06-3-10051-18
VALOR INICIAL ESTUDIO Y DISEÑOS	N/A
VALOR ACTUALIZADO ESTUDIO Y DISEÑOS	N/A
VALOR INICIAL INTERVENTORIA	$462.374.500,00
VALOR ADICIONES	N/A
VALOR ACTUALIZADO INTERVENTORIA	$462.374.500,00
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2018
PRORROGA	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	15 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE INICIACIÓN INTERVENTORIA	07 DE JUNIO DE 2018
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	15 DE DICIEMBRE DE 2018

AVANCE DEL OBRA

		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
PROGRAMADO ACUMULADO	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Valor								
EJECUTADO ACUMULADO	%	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Valor	$ 38.582.253,33							

MANEJO DE ANTICIPO CONTRATO DE OBRA


ENTIDAD BANCARIA	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	
CIUDAD	BOGOTA D.C.	
SUCURSAL	BOGOTA D.C.	
No. DE CUENTA	220-050-11979-1	
FECHA APERTURA	26/06/2018	
No. DE CHEQUES GIRADOS EN EL PERIODO	0	
No. DE CHEQUES PAGADOS	0	
SALDO ANTERIOR	$	1.850.092.650,02
VALOR DE CHEQUE GIRADOS	$	-
VALOR AMORTIZADO EN ACTA	$	-
SALDO ACTUAL	$	1.850.092.650
FECHA CIERRE DE CUENTA		

CONTROL DE POLIZAS

AMPAROS	VALOR	VIGENCIA	
		SI	NO
CUMPLIMIENTO	1.850.092.650.02	X	
ANTICIPO	1.850.092.650.02	X	
SALARIOS Y PRESTACIONES	462.523.162.50	X	
CALIDAD DE LOS BIENES	329.371.500.00	X	
ESTABILIDAD	2.775.138.975.02	X	

OBSERVACIONES: APROBADA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

AVANCE DE OBRA

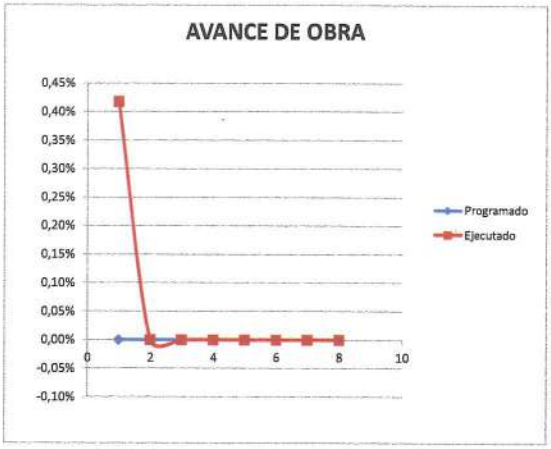

RESUMEN GENERAL

A la fecha solo el Contratista ha ejecutado las actividades de: LOCALIZACION Y REPLANTEO DE EJES Y NIVELES, CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA H=2.00 M, CAMPAMENTO CONTENEDOR (INCLUYE DOTACION Y DESMONTE), CAMPAMENTO (INCLUYE PLACA DE CONTRAPISO, PAREDES EN TABLA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO DE ZINC) 66M2, DEMOLICIONES PLACA CONTRAPISO Y DEMOLICIONDES DE MURO. Cuenta entre 9 y 10 personas en obra entre administrativos y personal de obra. Se lleva ejecutado un 0,42 % de obra en relacion estimada segun presupuesto de obra. Se dio inicio de actividades de demoliciones. A la fecha no se ha iniciado actividades de descapote. Interventoria indico el punto pase al contratista para red de contraincendio, pero aun no se ha iniciado su ejecucion.

ACTIVIDADES A REALIZAR EL PRÓXIMO MES POR EL CONTRATISTA

Descapote mecanico E=0,20 m, Excavacion manual, Perfilada del terreno, Instalaciones provisionales de energia y acueducto.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

(TIRSO COSME)

30	6	2018
DD	MM	AAAA

Anexo No. 1 Informes Semanales

DAIMCO S.A.S

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

INFORME SEMANAL INT-23:00

Semana Número: _ 1 Del: 12 Al: 16 DE JUNIO DE 2017

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 9

Nombre del Supervisor. POLICIA NACIONAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0	0
Valor de la Obra programada:	0	0

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,112%	0,112%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 10.368.060,00	$10.368.060,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
Contrato No.	06-6-10044-18
Valor Inicial:	$9.250.463.250,08
Valor Actualizado:	$9.250.463.250,08
Plazo Inicial:	15 de diciembre de 2018
Plazo Actualizado:	15 de diciembre de 2018
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Términación:	15 de diciembre de 2018

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	DAIMCO S.A.S
Contrato No.	06-3-10051-18
Valor Inicial:	$ 462.374.500,00
Valor Actualizado:	$ 462.374.500,00
Plazo Inicial:	15 de diciembre de 2018
Plazo Actualizado:	15 de diciembre de 2018
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Términación:	15 de diciembre de 2018

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* LOCALIZACION Y REPLANTEO DE EJES Y NIVELES. (ejecutados 500 M2)
* CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA H=2.00 M (ejecutados 371,18 m2)
* CAMPAMENTO CONTENEDOR (INCLUYE DOTACION Y DESMONTE) (acumulados 9 dias)
* CAMPAMENTO (INCLUYE PLACA DE CONTRAPISO, PAREDES EN TABLA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO DE ZINC) (ejecutados 1/4 UND)

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* DEMOLICIONES DE PLACA DE CONTRAPISO
* DESCAPOTE MECÁNICO E=0.20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS.
* INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGIA (incluye cable de alimentación desde la planta electrica hasta el punto del tablero general de obra, incluye 7 tableros secundarios, tomas a 110, 220v y trifasicas para equipo
* INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO L=50m (incluye bomba de presion y tuberia para tomar proveer agua y todos sus accesorios, adicionalmente mangeras y elementos de almacenamiento).

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contratista como interventoria se encuentran en revision tecnica de la documentacion del proyecto

Aun no ha realizado la entrega de la programacion según contrato ni APU´S

A la fecha El Contratista, no se ha iniciado actividades de demoliciones de placas de contrapiso existentes (3 placas), ni descapote

El contratista lleva acumulado 9 dias haciendo uso del campamento contenedor en relacion a 12 meses según presupuesto

OBSERVACIONES

Falta planos de tanques de alamacenamiento, detalles arquitectonico de carpinterias, planos hidrosanitarios del proyecto.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TASO COSME
Nombre

Firma

DAIMCO S.A.S

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

INFORME SEMANAL INT-23:00

Semana Número: _ 2 Del: 18 Al: 23 DE JUNIO DE 2017

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 16

Nombre del Supervisor. POLICIA NACIONAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0	0
Valor de la Obra programada:	0	0

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,141%	0,253%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 13.024.393,33	$23.392.453,33

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
Contrato No.	06-6-10044-18
Valor Inicial:	$9.250.463.250,08
Valor Actualizado:	$9.250.463.250,08
Plazo Inicial:	15 de diciembre de 2018
Plazo Actualizado:	15 de diciembre de 2018
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Términación:	15 de diciembre de 2018

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	DAIMCO S.A.S
Contrato No.	06-3-10051-18
Valor Inicial:	$ 462.374.500,00
Valor Actualizado:	$ 462.374.500,00
Plazo Inicial:	15 de diciembre de 2018
Plazo Actualizado:	15 de diciembre de 2018
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Términación:	15 de diciembre de 2018

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

CAMPAMENTO CONTENEDOR (INCLUYE DOTACION Y DESMONTE) (acumulados 9 dias)

CAMPAMENTO (INCLUYE PLACA DE CONTRAPISO, PAREDES EN TABLA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO DE ZINC) (ejecutados 1/4 UND)

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* DEMOLICIONES DE PLACA DE CONTRAPISO
* DESCAPOTE MECÁNICO E=0.20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS.
* INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGIA (incluye cable de alimentación desde la planta electrica hasta el punto del tablero general de obra, incluye 7 tableros secundarios, tomas a 110, 220v y trifasicas para equipo especial)
* INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO L=50m (incluye bomba de presion y tuberia para tomar proveer agua y todos sus accesorios, adicionalmente mangeras y elementos de almacenamiento).

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contratista como interventoria se encuentran en revision tecnica de la documentacion del proyecto

Aun no ha realizado la entrega de la programacion según contrato ni APU´S

A la fecha El Contratista, no se ha iniciado actividades de demoliciones de placas de contrapiso existentes (3 placas), ni descapote

El contratista lleva acumulado 13 dias haciendo uso del campamento contenedor en relacion a 12 meses según presupuesto

No se puede hacer un seguimiento en avance programado por la razon que aun no se tiene la programacion de obra.

OBSERVACIONES

Falta planos de tanques de almacenamiento, detalles arquitectonico de carpinterias, planos hidrosanitarios del proyecto.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TIESO COSME
Nombre

Firma

DAIMCO S.A.S

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

INFORME SEMANAL INT-23:00

Semana Número: _ 3 Del: 25 Al: 30 DE JUNIO DE 2017

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 23

Nombre del Supervisor. POLICIA NACIONAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0	0
Valor de la Obra programada:	0	0

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,31%	0,42%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 28.214.193,33	$38.582.253,33

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
Contrato No.	06-6-10044-18
Valor Inicial:	$9.250.463.250,08
Valor Actualizado:	$9.250.463.250,08
Plazo Inicial:	15 de diciembre de 2018
Plazo Actualizado:	15 de diciembre de 2018
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Términación:	15 de diciembre de 2018

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	DAIMCO S.A.S
Contrato No.	06-3-10051-18
Valor Inicial:	$ 462.374.500,00
Valor Actualizado:	$ 462.374.500,00
Plazo Inicial:	15 de diciembre de 2018
Plazo Actualizado:	15 de diciembre de 2018
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Términación:	15 de diciembre de 2018

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* CAMPAMENTO (INCLUYE PLACA DE CONTRAPISO, PAREDES EN TABLA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO DE ZINC) (ejecutados 3/4 UND)
* DEMOLICIÓN DE PLACAS DE CONTRAPISO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* DESCAPOTE MECÁNICO E=0.20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS.
* INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGIA (incluye cable de alimentación desde la planta electrica hasta el punto del tablero general de obra, incluye 7 tableros secundarios, tomas a 110, 220v y trifasicas para equipo especial)
* INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO L=50m (incluye bomba de presion y tuberia para tomar proveer agua y todos sus accesorios, adicionalmente mangeras y elementos de almacenamiento).

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

* Aun no ha realizado la entrega de la programacion según contrato ni APU´S en su totalidad
* Se dio inicio actividades de demoliciones de placas de contrapiso existentes
* Aun no se dado inicio de descapote
* No se puede hacer un seguimiento en avance programado por la razon que aun no se tiene la programacion de obra.

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TIRSO COSME

Nombre

Firma

DAIMCO S.A.S
Diseño, Asesorías, Interventorías, Manejo, Mantenimiento y Construcción

INFORME DIARIO DE INSPECCIÓN INT-8:00

PROYECTO	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE	CONTRATISTA	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
CONTRATANTE	POLICIA NACIONAL	FRENTE DE OBRA	FASE 4- ALOJAMIENTOS
INTERVENTOR	DAIMCO S.A.S	FECHA DE INFORME	L M M J V S D

PERSONAL (1)

CONTROL DE PERSONAL

CONTROL DE DOTACION (2)

CARGO	No. PERSONAS	NOMBRE	DOTACIÓN(3) UNIFORME	CHALECO	BOTAS	CASCO	"gafas"	T. OIDOS	T. BOCAS	GUANTES
DIRECTOR DE OBRA		ING. JULIAN MAURICIO GIRALDO			X	X				
RESIDENTE DE OBRA		ING. MARIA TERESA OJEDA			X	X				
ING. AMBIENTAL OBRA		ING. EVELYN ANDREA GUZMAN			X	X				
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SSTMA		MARIA FERNANDA BENAVIDES			X	X				

EQUIPO (1)

MAQUINARIA (4)	CANTIDAD (5)	TIEMPO(HORAS)

ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO DEL TIEMPO	NOCHE (6)	MAÑAÑA(HORAS)	TARDE(HORAS)	ESTADO DEL SUELO
SOLEADO		7-12 A.M	1-5 P.M	S
NUBLADO				
LLUVIA				

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIALES (7)

TIPO DE MATERIAL	PROVEEDOR	No DE RECIBO O LOTE	UBICACIÓN O INSTALACION	CANTIDAD (8)

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y OBRAS

ACTIVIDAD	LOCALIZACION	No. DE MUESTRAS	CODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	CANTIDAD
LOTE INTERVENIDO PARA FASE 4	CAMPAMENTO CONTENEDOR (INCLUYE DOTACION Y DESMONTE)	1 dia

OBSERVACIONES Y/O INSTRUCCIONES DEL ING. RESIDENTE

A la fecha El Contratista, no se ha iniciado actividades de demoliciones de placas de contrapiso existentes (3 placas)

Aun no ha realizado la entrega de la programacion

Elaboró	Revisó
SANDRA GUAUÑA	TIRSO COSME - DIRECTOR DE INTERVENTORIA

(1) CONTINUE EN OTRA HOJA SI REQUIERE MAS ESPACIO
(2) IDENTIFIQUE Y RELACIONE LAS PERSONAS QUE NO CUMPLEN CON LA DOTACION CORRESPONDIENTE
(3) INDIQUE CUMPLIMIENTO DE DOTACION
(4) RELACIONE EL EQUIPO QUE SE ESTÁ UTILIZANDO EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
(5) INDIQUE LA CANTIDAD DE MAQUINARIA RELACIONADA (4)
(6) ANOTAR SI LA NOCHE INMEDIATAMENTE ANTERIOR LLOVIÓ
(7) PARA EL CASO DE MEZCLA ASFALTICA UTILIZAR EL FORMATO INT-49
(8) ANOTAR LA CANTIDAD REPORTADA EN EL RECIBO, NO ES UNA CANTIDAD PARA PAGO

DAIMCO S.A.S
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

INFORME DIARIO DE INSPECCIÓN INT-8:00

PROYECTO	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE	CONTRATISTA	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
CONTRATANTE	POLICIA NACIONAL	FRENTE DE OBRA	FASE 4- ALOJAMIENTOS
INTERVENTOR	DAIMCO S.A.S	FECHA DE INFORME	DIA MES AÑO — L M M J V S D

PERSONAL (1)

CONTROL DE PERSONAL

CONTROL DE DOTACION (2)

CARGO	No. PERSONAS	NOMBRE	DOTACIÓN(3) UNIFORME	CHALECO	BOTAS	CASCO	GAFAS	T. OIDOS	T. BOCAS	GUANTES
DIRECTOR DE OBRA		ING. JULIAN MAURICIO GIRALDO			X	X				
RESIDENTE DE OBRA		ING. MARIA TERESA OJEDA			X	X				
ING. AMBIENTAL OBRA		ING. EVELYN ANDREA GUZMAN			X	X				
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SSTMA		MARIA FERNANDA BENAVIDES			X	X				
SUBCONTRATISTA		HERNANDO JOSE ARRIETA ANAYA			X	X				X
AYUDANTE		JHOYNER JESUS YANDE CAPOTE			X	X				X
AYUDANTE		EDUARDO ANDRES DIAZ GIL			X	X				X
AYUDANTE		EDGAR DE JESUS MORALES ESQUEDA			X	X				X

EQUIPO (1)

MAQUINARIA (4)	CANTIDAD (5)	TIEMPO(HORAS)

ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO DEL TIEMPO	NOCHE (6)	MAÑANA(HORAS)	TARDE(HORAS)	ESTADO DEL SUELO
SOLEADO		7-12 A.M	1-5 P.M	S
NUBLADO				
LLUVIA				

Nota: Estado del Suelo Seco (S), Saturado (SAT), Inundado (I)

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIALES (7)

TIPO DE MATERIAL	PROVEEDOR	No DE RECIBO O LOTE	UBICACIÓN O INSTALACION	CANTIDAD (8)

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y OBRAS

ACTIVIDAD	LOCALIZACION	No. DE MUESTRAS	CODIFICACION	OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	CANTIDAD
LOTE INTERVENIDO PARA FASE 4	CAMPAMENTO CONTENEDOR (INCLUYE DOTACION Y DESMONTE)	1 dia
LOTE INTERVENIDO PARA FASE 4	CAMPAMENTO (INCLUYE PLACA DE CONTRAPISO, PAREDES EN TABLA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO DE ZINC)	1/15 und

OBSERVACIONES Y/O INSTRUCCIONES DEL ING. RESIDENTE

A la fecha El Contratista, no se ha iniciado actividades de demoliciones de placas de contrapiso existentes (3 placas)

Aun no ha realizado la entrega de la programacion

Se realizo comité con Supervisión Teniente Andres Cadena, para tratar temas como: Traslado y reubicacion de los contenedores, Licencia Ambiental y de Construcción para su renovacion, y solicitud de socumentacion de planos que aun no se tiene en obra

Elaboró	Revisó
SANDRA GUAUÑA	

TIRSO COSME - DIRECTOR DE INTERVENTORIA

(1) CONTINUE EN OTRA HOJA SI REQUIERE MAS ESPACIO
(2) IDENTIFIQUE Y RELACIONE LAS PERSONAS QUE NO CUMPLEN CON LA DOTACION CORRESPONDIENTE
(3) INDIQUE CUMPLIMIENTO DE DOTACION
(4) RELACIONE EL EQUIPO QUE SE ESTÁ UTILIZANDO EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
(5) INDIQUE LA CANTIDAD DE MAQUINARIA RELACIONADA (4)
(6) ANOTAR SI LA NOCHE INMEDIATAMENTE ANTERIOR LLOVIÓ
(7) PARA EL CASO DE MEZCLA ASFALTICA UTILIZAR EL FORMATO INT-45
(8) ANOTAR LA CANTIDAD REPORTADA EN EL RECIBO, NO ES UNA CANTIDAD PARA PAGO

DAIMCO S.A.S
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

INFORME DIARIO DE INSPECCIÓN INT-8:00

PROYECTO	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE	CONTRATISTA	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
CONTRATANTE	POLICIA NACIONAL	FRENTE DE OBRA	FASE 4- ALOJAMIENTOS
INTERVENTOR	DAIMCO S.A.S	FECHA DE INFORME	L M M J V S D

PERSONAL (1)

CONTROL DE PERSONAL

CONTROL DE DOTACION (2)

CARGO	No. PERSONAS	NOMBRE	DOTACIÓN(3) UNIFORME	CHALECO	BOTAS	CASCO	"GAFA"	T. OIDOS	T. BOCAS	GUANTES
DIRECTOR DE OBRA		ING. JULIAN MAURICIO GIRALDO			X	X				
RESIDENTE DE OBRA		ING. MARIA TERESA OJEDA			X	X				
ING. AMBIENTAL OBRA		ING. EVELYN ANDREA GUZMAN			X	X				
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SST/MA		MARIA FERNANDA BENAVIDES			X	X				X
SUBCONTRATISTA		HERNANDO JOSE ARRIETA ANAYA			X	X				X
AYUDANTE		JHOYNER JESUS YANDE CAPOTE			X	X				X
AYUDANTE		EDUARDO ANDRES DIAZ GIL			X	X				X
AYUDANTE		EDGAR DE JESUS MORALES ESQUEDA			X	X				X

EQUIPO (4)

MAQUINARIA (4)	CANTIDAD (5)	TIEMPO(HORAS)

ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO DEL TIEMPO	NOCHE (6)	MAÑAÑA(HORAS)	TARDE(HORAS)	ESTADO DEL SUELO
SOLEADO		7-12 A.M	1-5 P.M	S
NUBLADO				
LLUVIA				

Nota: Estado del Suelo Seco (S), Saturado (ST), Inundado (I)

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIALES (7)

TIPO DE MATERIAL	PROVEEDOR	No DE RECIBO O LOTE	UBICACIÓN O INSTALACION	CANTIDAD (8)

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y OBRAS

ACTIVIDAD	LOCALIZACION	No. DE MUESTRAS	CODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	CANTIDAD
LOTE INTERVENIDO PARA FASE 4	CAMPAMENTO CONTENEDOR (INCLUYE DOTACION Y DESMONTE)	1 dia
LOTE INTERVENIDO PARA FASE 4	CAMPAMENTO (INCLUYE PLACA DE CONTRAPISO, PAREDES EN TABLA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO DE ZINC)	1/15 und

OBSERVACIONES Y/O INSTRUCCIONES DEL ING. RESIDENTE

A la fecha El Contratista, no se ha iniciado actividades de demoliciones de placas de contrapiso existentes (3 placas), ni descapote

Aun no ha realizado la entrega de la programacion según contrato

Elaboró	Revisó
SANDRA GUAUÑA	

TIRSO COSME - DIRECTOR DE INTERVENTORIA

(1) CONTINUE EN OTRA HOJA SI REQUIERE MAS ESPACIO
(2) IDENTIFIQUE Y RELACIONE LAS PERSONAS QUE NO CUMPLEN CON LA DOTACION CORRESPONDIENTE
(3) INDIQUE CUMPLIMIENTO DE DOTACION
(4) RELACIONE EL EQUIPO QUE SE ESTÁ UTILIZANDO EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
(5) INDIQUE LA CANTIDAD DE MAQUINARIA RELACIONADA (4)
(6) ANOTAR SI LA NOCHE INMEDIATAMENTE ANTERIOR LLOVIÓ
(7) PARA EL CASO DE MEZCLA ASFALTICA UTILIZAR EL FORMATO INT-49
(8) ANOTAR LA CANTIDAD REPORTADA EN EL RECIBO, NO ES UNA CANTIDAD PARA PAGO

DAIMCO S.A.S
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

INFORME DIARIO DE INSPECCIÓN INT-8:00

PROYECTO	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE	CONTRATISTA	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
CONTRATANTE	POLICIA NACIONAL	FRENTE DE OBRA	FASE 4- ALOJAMIENTOS
INTERVENTOR	DAIMCO S.A.S	FECHA DE INFORME	D: M: A: L M M J V S D

PERSONAL (1)

CONTROL DE PERSONAL

CONTROL DE DOTACION (2)

CARGO	No. PERSONAS	NOMBRE	DOTACIÓN(3) UNIFORME	CHALECO	BOTAS	CASCO	¨95/+	T. OIDOS	T. BOCAS	GUANTES
DIRECTOR DE OBRA		ING. JULIAN MAURICIO GIRALDO			X	X				
RESIDENTE DE OBRA		ING. MARIA TERESA OJEDA			X	X				
ING. AMBIENTAL OBRA		ING. EVELYN ANDREA GUZMAN			X	X				
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SSTMA		MARIA FERNANDA BENAVIDES			X	X				
SUBCONTRATISTA		HERNANDO JOSE ARRIETA ANAYA			X	X				X
AYUDANTE		JHOYNER JESUS YANDE CAPOTE			X	X				X
AYUDANTE		EDUARDO ANDRES DIAZ GIL			X	X				X
AYUDANTE		EDGAR DE JESUS MORALES ESQUEDA			X	X				X

EQUIPO (1)

MAQUINARIA (4)	CANTIDAD (5)	TIEMPO(HORAS)

ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO DEL TIEMPO	NOCHE (6)	MAÑAÑA(HORAS)	TARDE(HORAS)	ESTADO DEL SUELO
SOLEADO		7-12 A.M	——	S
NUBLADO				
LLUVIA				

Nota: Estado del Suelo Seco (S), Saturado (ST), Inundado (I)

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIALES (7)

TIPO DE MATERIAL	PROVEEDOR	No DE RECIBO O LOTE	UBICACIÓN O INSTALACION	CANTIDAD (8)

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y OBRAS

ACTIVIDAD	LOCALIZACION	No. DE MUESTRAS	CODIFICACION	OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	CANTIDAD
LOTE INTERVENIDO PARA FASE 4	CAMPAMENTO CONTENEDOR (INCLUYE DOTACION Y DESMONTE)	1 dia
LOTE INTERVENIDO PARA FASE 4	CAMPAMENTO (INCLUYE PLACA DE CONTRAPISO, PAREDES EN TABLA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO DE ZINC)	1/15 und

OBSERVACIONES Y/O INSTRUCCIONES DEL ING. RESIDENTE

A la fecha El Contratista, no se ha iniciado actividades de demoliciones de placas de contrapiso existentes (3 placas), ni descapote

Aun no ha realizado la entrega de la programacion según contrato

Se continua en revisiones del proyecto por parte del Contratista y de la Interventoria

El contratista lleva acumulado 9 dias haciendo uso del campamento contenedor

Elaboró	Revisó
SANDRA GUAUÑA	

TIRSO COSME - DIRECTOR DE INTERVENTORIA

(1) CONTINUE EN OTRA HOJA SI REQUIERE MAS ESPACIO
(2) IDENTIFIQUE Y RELACIONE LAS PERSONAS QUE NO CUMPLEN CON LA DOTACION CORRESPONDIENTE
(3) INDIQUE CUMPLIMIENTO DE DOTACION
(4) RELACIONE EL EQUIPO QUE SE ESTÁ UTILIZANDO EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
(5) INDIQUE LA CANTIDAD DE MAQUINARIA RELACIONADA (4)
(6) ANOTAR SI LA NOCHE INMEDIATAMENTE ANTERIOR LLOVIÓ
(7) PARA EL CASO DE MEZCLA ASFALTICA UTILIZAR EL FORMATO INT-49
(8) ANOTAR LA CANTIDAD REPORTADA EN EL RECIBO, NO ES UNA CANTIDAD PARA PAGO

DAIMCO S.A.S
Diseño, Asesorías, Interventorías, Manejo, Mantenimiento y Construcción

INFORME DIARIO DE INSPECCIÓN INT-8:00

PROYECTO	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE	CONTRATISTA	CONSORCIO NBCB-GUTIERREZ
CONTRATANTE	POLICIA NACIONAL	FRENTE DE OBRA	FASE 4- ALOJAMIENTOS
INTERVENTOR	DAIMCO S.A.S	FECHA DE INFORME	DIA MES AÑO — L M M J V S D

PERSONAL (1)

CONTROL DE PERSONAL

CONTROL DE DOTACION (2)

CARGO	No. PERSONAS	NOMBRE	DOTACIÓN(3)							
			UNIFORME	CHALECO	BOTAS	CASCO	"gri"	T. OIDOS	T. BOCAS	GUANTES
DIRECTOR DE OBRA		ING. JULIAN MAURICIO GIRALDO			X	X				
RESIDENTE DE OBRA		ING. MARIA TERESA OJEDA			X	X				
ING. AMBIENTAL OBRA		ING. EVELYN ANDREA GUZMAN			X	X				
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SSTMA		MARIA FERNANDA BENAVIDES			X	X				
SUBCONTRATISTA		HERNANDO JOSE ARRIETA ANAYA			X	X				X
AYUDANTE		JHOYNER JESUS YANDE CAPOTE			X	X				X
AYUDANTE		EDUARDO ANDRES DIAZ GIL			X	X				X
AYUDANTE		EDGAR DE JESUS MORALES ESQUEDA			X	X				X

EQUIPO (1)

MAQUINARIA (4)	CANTIDAD (5)	TIEMPO(HORAS)

ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO DEL TIEMPO	NOCHE (6)	MAÑAÑA(HORAS)	TARDE(HORAS)	ESTADO DEL SUELO
SOLEADO		7-12 A.M	1-6 P.M	S
NUBLADO				
LLUVIA				

Nota: Estado del Suelo Seco (S), Saturado (ST), Humedo (H)

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIALES (7)

TIPO DE MATERIAL	PROVEEDOR	No DE RECIBO O LOTE	UBICACIÓN O INSTALACION	CANTIDAD (8)

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y OBRAS

ACTIVIDAD	LOCALIZACION	No. DE MUESTRAS	CODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	CANTIDAD
LOTE INTERVENIDO PARA FASE 4	CAMPAMENTO CONTENEDOR (INCLUYE DOTACION Y DESMONTE)	1 dia
LOTE INTERVENIDO PARA FASE 4	CAMPAMENTO (INCLUYE PLACA DE CONTRAPISO, PAREDES EN TABLA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO DE ZINC)	1/15 und

OBSERVACIONES Y/O INSTRUCCIONES DEL ING. RESIDENTE

A la fecha El Contratista, no se ha iniciado actividades de demoliciones de placas de contrapiso existentes (3 placas), ni descapote

Aun no ha realizado la entrega de la programacion según contrato y APU'S contractuales por parte del Contratista.

Se continua en revisiones del proyecto por parte del Contratista y de la Interventoria

Elaboró	Revisó
SANDRA GUALIÑA	TIRSO COSME - DIRECTOR DE INTERVENTORIA

(1) CONTINUE EN OTRA HOJA SI REQUIERE MAS ESPACIO
(2) IDENTIFIQUE Y RELACIONE LAS PERSONAS QUE NO CUMPLEN CON LA DOTACION CORRESPONDIENTE
(3) INDIQUE CUMPLIMIENTO DE DOTACION
(4) RELACIONE EL EQUIPO QUE SE ESTÁ UTILIZANDO EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
(5) INDIQUE LA CANTIDAD DE MAQUINARIA RELACIONADA (4)
(6) ANOTAR SI LA NOCHE INMEDIATAMENTE ANTERIOR LLOVIÓ
(7) PARA EL CASO DE MEZCLA ASFALTICA UTILIZAR EL FORMATO INT-49
(8) ANOTAR LA CANTIDAD REPORTADA EN EL RECIBO, NO ES UNA CANTIDAD PARA PAGO

DAIMCO S.A.S
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montajes, Mantenimientos y Construcción

INFORME DIARIO DE INSPECCIÓN INT-8:00

PROYECTO	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE	CONTRATISTA	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
CONTRATANTE	POLICIA NACIONAL	FRENTE DE OBRA	FASE 4- ALOJAMIENTOS
INTERVENTOR	DAIMCO S.A.S	FECHA DE INFORME	DD MM AAAA — L M M J V S D

PERSONAL (1)

CONTROL DE PERSONAL

CONTROL DE DOTACION (2)

CARGO	No. PERSONAS	NOMBRE	DOTACIÓN(3) UNIFORME	CHALECO	BOTAS	CASCO	"497+	T. OIDOS	T. BOCAS	GUANTES
DIRECTOR DE OBRA		ING. JULIAN MAURICIO GIRALDO			X	X				
RESIDENTE DE OBRA		ING. MARIA TERESA OJEDA			X	X				
ING. AMBIENTAL OBRA		ING. EVELYN ANDREA GUZMAN			X	X				
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SSTMA		MARIA FERNANDA BENAVIDES			X	X				
SUBCONTRATISTA		HERNANDO JOSE ARRIETA ANAYA			X	X				X
AYUDANTE		JHOYNER JESUS YANDE CAPOTE			X	X				X
AYUDANTE		EDUARDO ANDRES DIAZ GIL			X	X				X
AYUDANTE		EDGAR DE JESUS MORALES ESQUEDA			X	X				X

EQUIPO (4)

MAQUINARIA (4)	CANTIDAD (5)	TIEMPO(HORAS)

ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO DEL TIEMPO	NOCHE (6)	MAÑANA(HORAS)	TARDE(HORAS)	ESTADO DEL SUELO
SOLEADO		7-12 A.M	1-6 P.M	S
NUBLADO				
LLUVIA				

Nota: Estado del Suelo Seco (S), Saturado (ST), Inundado (I)

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIALES (7)

TIPO DE MATERIAL	PROVEEDOR	No DE RECIBO O LOTE	UBICACIÓN O INSTALACION	CANTIDAD (8)

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y OBRAS

ACTIVIDAD	LOCALIZACION	No. DE MUESTRAS	CODIFICACION	OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	CANTIDAD
LOTE INTERVENIDO PARA FASE 4	CAMPAMENTO CONTENEDOR (INCLUYE DOTACION Y DESMONTE)	1 dia
LOTE INTERVENIDO PARA FASE 4	CAMPAMENTO (INCLUYE PLACA DE CONTRAPISO, PAREDES EN TABLA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO DE ZINC)	1/15 und

OBSERVACIONES Y/O INSTRUCCIONES DEL ING. RESIDENTE

A la fecha El Contratista, no se ha iniciado actividades de demoliciones de placas de contrapiso existentes (3 placas), ni descapote

Aun no ha realizado la entrega de la programacion según contrato y APU´S contractuales por parte del Contratista.

Se continua en revisiones del proyecto por parte del Contratista y de la interventoria

Se realizo visita por el director tecnico de Intrventoria al sitio de obra para referirse temas como: descapote, donde el contratista manifiesta tener según apiques espesores mayores a lo especificado; traslado de contenedores que aun no se ha realizado por parte del comando de policia; documentacion pendiente por entregar por parte del comando de policia, Avance de obra, Solicitud el contratista de la programacion de obra y APU´S contractuales.

Elaboró	Revisó
SANDRA GUAUÑA	TIRSO COSME - DIRECTOR DE INTERVENTORIA

(1) CONTINUE EN OTRA HOJA SI REQUIERE MAS ESPACIO
(2) IDENTIFIQUE Y RELACIONE LAS PERSONAS QUE NO CUMPLEN CON LA DOTACION CORRESPONDIENTE
(3) INDIQUE CUMPLIMIENTO DE DOTACION
(4) RELACIONE EL EQUIPO QUE SE ESTÁ UTILIZANDO EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
(5) INDIQUE LA CANTIDAD DE MAQUINARIA RELACIONADA (4)
(6) ANOTAR SI LA NOCHE INMEDIATAMENTE ANTERIOR LLOVIÓ
(7) PARA EL CASO DE MEZCLA ASFALTICA UTILIZAR EL FORMATO INT-49
(8) ANOTAR LA CANTIDAD REPORTADA EN EL RECIBO, NO ES UNA CANTIDAD PARA PAGO

DAIMCO S.A.S
Diseño, Asesoría, Interventoría, Montaje, Mantenimiento y Construcción

INFORME DIARIO DE INSPECCIÓN INT-8:00

PROYECTO	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE	CONTRATISTA	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
CONTRATANTE	POLICIA NACIONAL	FRENTE DE OBRA	FASE 4- ALOJAMIENTOS
INTERVENTOR	DAIMCO S.A.S	FECHA DE INFORME	L M M J V S D

PERSONAL (1)

CONTROL DE PERSONAL

CONTROL DE DOTACION (2)

CARGO	No. PERSONAS	NOMBRE	DOTACION(3)							
			UNIFORME	CHALECO	BOTAS	CASCO	**%?+	T. OIDOS	T. BOCAS	GUANTES
DIRECTOR DE OBRA		ING. JULIAN MAURICIO GIRALDO			X	X				
RESIDENTE DE OBRA		ING. MARIA TERESA OJEDA			X	X				
ING. AMBIENTAL OBRA		ING. EVELYN ANDREA GUZMAN			X	X				
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SSTMA		MARIA FERNANDA BENAVIDES			X	X				
SUBCONTRATISTA		HERNANDO JOSE ARRIETA ANAYA			X	X				X
AYUDANTE		JHOYNER JESUS YANDE CAPOTE			X	X				X
AYUDANTE		EDUARDO ANDRES DIAZ GIL			X	X				X
AYUDANTE		EDGAR DE JESUS MORALES ESQUEDA			X	X				X

EQUIPO (4)

MAQUINARIA (4)	CANTIDAD (5)	TIEMPO(HORAS)

ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO DEL TIEMPO	NOCHE (6)	MAÑÁ(HORAS)	TARDE(HORAS)	ESTADO DEL SUELO
SOLEADO		7-12 A.M	1-5 P.M	S
NUBLADO				
LLUVIA				

Nota: Estado del Cielo Seco (S), Saturado (ST), Anegadizo (A)

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIALES (7)

TIPO DE MATERIAL	PROVEEDOR	No DE RECIBO O LOTE	UBICACIÓN O INSTALACION	CANTIDAD (8)

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y OBRAS

ACTIVIDAD	LOCALIZACION	No. DE MUESTRAS	CODIFICACION	OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	CANTIDAD
LOTE INTERVENIDO PARA FASE 4	CAMPAMENTO CONTENEDOR (INCLUYE DOTACION Y DESMONTE)	1 dia
LOTE INTERVENIDO PARA FASE 4	CAMPAMENTO (INCLUYE PLACA DE CONTRAPISO, PAREDES EN TABLA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO DE ZINC)	1/15 und

OBSERVACIONES Y/O INSTRUCCIONES DEL ING. RESIDENTE

A la fecha El Contratista, no se ha iniciado actividades de demoliciones de placas de contrapiso existentes (3 placas), ni descapote

Aun no ha realizado la entrega de la programacion según contrato y APU´S contractuales por parte del Contratista.

Se continua en revisiones del proyecto por parte del Contratista y de la Interventoria

Se realizo visita por el director tecnico de interventoria al sitio de obra para reforzar temas como: descapote, donde el contratista manifiesta tener según apiques espesores mayores a lo especificado; traslado de contenedores que aun no se ha realizado por parte del comando de policia; documentacion pendiente por entregar por parte del comando de policia, Avance de obra, Solicitud al contratista de la programacion de obra y APU´S contractuales.

Elaboró	Revisó
SANDRA GUAUÑA	TIRSO COSME - DIRECTOR DE INTERVENTORIA

(1) CONTINUE EN OTRA HOJA SI REQUIERE MAS ESPACIO
(2) IDENTIFIQUE Y RELACIONE LAS PERSONAS QUE NO CUMPLEN CON LA DOTACION CORRESPONDIENTE
(3) INDIQUE CUMPLIMIENTO DE DOTACION
(4) RELACIONE EL EQUIPO QUE SE ESTÁ UTILIZANDO EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
(5) INDIQUE LA CANTIDAD DE MAQUINARIA RELACIONADA (4)
(6) ANOTAR SI LA NOCHE INMEDIATAMENTE ANTERIOR LLOVIO
(7) PARA EL CASO DE MEZCLA ASFALTICA UTILIZAR EL FORMATO INT-49
(8) ANOTAR LA CANTIDAD REPORTADA EN EL RECIBO, NO ES UNA CANTIDAD PARA PAGO

DAIMCO S.A.S
Diseño, Asesoría, Interventoría, Montaje, Mantenimiento y Construcción

INFORME DIARIO DE INSPECCIÓN INT-8:00

PROYECTO	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRICS FIJOS SIN REAJUSTE	CONTRATISTA	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
CONTRATANTE	POLICIA NACIONAL	FRENTE DE OBRA	FASE 4- ALOJAMIENTOS
INTERVENTOR	DAIMCO S.A.S	FECHA DE INFORME	D L M M J V S D

PERSONAL (1)

CONTROL DE PERSONAL

CONTROL DE DOTACION (2)

CARGO	No. PERSONAS	NOMBRE	DOTACIÓN(3) UNIFORME	CHALECO	BOTAS	CASCO	"95"	T. OIDOS	T. BOCAS	GUANTES
DIRECTOR DE OBRA		ING. JULIAN MAURICIO GIRALDO		X	X	X				
RESIDENTE DE OBRA		ING. MARIA TERESA OJEDA		X	X	X				
ING. AMBIENTAL OBRA		ING. EVELYN ANDREA GUZMAN		X	X	X				
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SSTMA		MARIA FERNANDA BENAVIDES		X	X	X				
SUBCONTRATISTA		HERNANDO JOSE ARRIETA ANAYA			X	X				X
AYUDANTE		JHOYNER JESUS YANDE CAPOTE			X	X				X
AYUDANTE		EDUARDO ANDRES DIAZ GIL			X	X				X
AYUDANTE		EDGAR DE JESUS MORALES ESQUEDA			X	X				X

EQUIPO (4)

MAQUINARIA (4)	CANTIDAD (5)	TIEMPO(HORAS)
Cargador	1	0 horas

ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO DEL TIEMPO	NOCHE (6)	MAÑANA(HORAS)	TARDE(HORAS)	ESTADO DEL SUELO
SOLEADO		7-12 A.M	1-5 P.M	S
NUBLADO				
LLUVIA				

Ver Escala de Estado del Tiempo, Estado del Suelo (7)

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIALES (7)

TIPO DE MATERIAL	PROVEEDOR	No DE RECIBO O LOTE	UBICACIÓN O INSTALACION	CANTIDAD (8)

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y OBRAS

ACTIVIDAD	LOCALIZACION	No. DE MUESTRAS	CODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	CANTIDAD
LOTE INTERVENIDO PARA FASE 4	CAMPAMENTO CONTENEDOR (INCLUYE DOTACION Y DESMONTE)	1 dia
LOTE INTERVENIDO PARA FASE 4	CAMPAMENTO (INCLUYE PLACA DE CONTRAPISO, PAREDES EN TABLA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO DE ZINC)	1/15 und

OBSERVACIONES Y/O INSTRUCCIONES DEL ING. RESIDENTE

A la fecha El Contratista, no se ha iniciado actividades de demoliciones de placas de contrapiso existentes (3 placas), ni descapote

Se realizó la entrega de la programacion por parte del Contratista pero no es acorde a la exigencia contractualy APU'S contractuales por parte del Contratista.

Esta pendiente la entrega de APU'S por parte del Contratista.

Se continua en revisiones del proyecto por parte del Contratista y de la Interventoria

Elaboró	Revisó
SANDRA GUALIÑA	TIRSO COSME - DIRECTOR DE INTERVENTORIA

(1) CONTINUE EN OTRA HOJA SI REQUIERE MAS ESPACIO
(2) IDENTIFIQUE Y RELACIONE LAS PERSONAS QUE NO CUMPLEN CON LA DOTACION CORRESPONDIENTE
(3) INDIQUE CUMPLIMIENTO DE DOTACION
(4) RELACIONE EL EQUIPO QUE SE ESTÁ UTILIZANDO EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
(5) INDIQUE LA CANTIDAD DE MAQUINARIA RELACIONADA (4)
(6) ANOTAR SI LA NOCHE INMEDIATAMENTE ANTERIOR LLOVIÓ
(7) PARA EL CASO DE MEZCLA ASFALTICA UTILIZAR EL FORMATO INT-49
(8) ANOTAR LA CANTIDAD REPORTADA EN EL RECIBO, NO ES UNA CANTIDAD PARA PAGO

DAIMCO S.A.S
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

INFORME DIARIO DE INSPECCIÓN INT-8:00

PROYECTO	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE	CONTRATISTA	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
CONTRATANTE	POLICIA NACIONAL	FRENTE DE OBRA	FASE 4- ALOJAMIENTOS
INTERVENTOR	DAIMCO S.A.S	FECHA DE INFORME	L M M J V S D

PERSONAL (1)

CONTROL DE PERSONAL

CARGO	No. PERSONAS
DIRECTOR DE OBRA	
RESIDENTE DE OBRA	
ING. AMBIENTAL OBRA	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SSTMA	
SUBCONTRATISTA	
AYUDANTE	
AYUDANTE	
AYUDANTE	

CONTROL DE DOTACION (2)

NOMBRE	DOTACIÓN(3) UNIFORME	CHALECO	BOTAS	CASCO	*97/+	T. OIDOS	T. BOCAS	GUANTES
ING. JULIAN MAURICIO GIRALDO		X	X	X				
ING. MARIA TERESA OJEDA		X	X	X				
ING. EVELYN ANDREA GUZMAN		X	X	X				
MARIA FERNANDA BENAVIDES		X	X	X				
HERNANDO JOSE ARRIETA ANAYA			X	X				X
JHOYNER JESUS YANDE CAPOTE			X	X				X
EDUARDO ANDRES DIAZ GIL			X	X				X
EDGAR DE JESUS MORALES ESQUEDA			X	X				X

EQUIPO (1)

MAQUINARIA (4)	CANTIDAD (5)	TIEMPO(HORAS)
Cargador	1	0 horas

ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO DEL TIEMPO	NOCHE (6)	MAÑANA(HORAS)	TARDE(HORAS)	ESTADO DEL SUELO
SOLEADO		7-12 A.M	1-5 P.M	S
NUBLADO				
LLUVIA				

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIALES (7)

TIPO DE MATERIAL	PROVEEDOR	No DE RECIBO O LOTE	UBICACIÓN O INSTALACION	CANTIDAD (8)

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y OBRAS

ACTIVIDAD	LOCALIZACION	No. DE MUESTRAS	CODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	CANTIDAD
LOTE INTERVENIDO PARA FASE 4	CAMPAMENTO (INCLUYE PLACA DE CONTRAPISO, PAREDES EN TABLA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO DE ZINC)	1/15 und

OBSERVACIONES Y/O INSTRUCCIONES DEL ING. RESIDENTE

A la fecha El Contratista, no se ha iniciado actividades de demoliciones de placas de contrapiso existentes (3 placas), ni descapote

Esta pendiente la entrega de la programacion por parte del Contratista según contrato.

Esta pendiente la entrega de APU´S por parte del Contratista.

Se continua en revisiones del proyecto por parte del Contratista y de la Interventoria

El contratista hace entrega del campamento contenedor a la Interventoria

E l contratista hizo uso del campamento contenedor 13 dias

Se realizo verificacion topografica del proyecto dentro del area a intervenir.

Elaboró	Revisó
SANDRA GUAUÑA	TIRSO COSME - DIRECTOR DE INTERVENTORIA

(1) CONTINUE EN OTRA HOJA SI REQUIERE MAS ESPACIO
(2) IDENTIFIQUE Y RELACIONE LAS PERSONAS QUE NO CUMPLEN CON LA DOTACION CORRESPONDIENTE
(3) INDIQUE CUMPLIMIENTO DE DOTACION
(4) RELACIONE EL EQUIPO QUE SE ESTÁ UTILIZANDO EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
(5) INDIQUE LA CANTIDAD DE MAQUINARIA RELACIONADA (4)
(6) ANOTAR SI LA NOCHE INMEDIATAMENTE ANTERIOR LLOVIÓ
(7) PARA EL CASO DE MEZCLA ASFALTICA UTILIZAR EL FORMATO INT-49
(8) ANOTAR LA CANTIDAD REPORTADA EN EL RECIBO, NO ES UNA CANTIDAD PARA PAGO

DAIMCO S.A.S
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

INFORME DIARIO DE INSPECCIÓN INT-8:00

PROYECTO	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE	CONTRATISTA	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
CONTRATANTE	POLICIA NACIONAL	FRENTE DE OBRA	FASE 4- ALOJAMIENTOS
INTERVENTOR	DAIMCO S.A.S	FECHA DE INFORME	DIA MES AÑO — L M M J V S D

PERSONAL (1)

CONTROL DE PERSONAL / CONTROL DE DOTACION (2)

CARGO	No. PERSONAS	NOMBRE	DOTACION(3) UNIFORME	CHALECO	BOTAS	CASCO	**G/+	T. OIDOS	T. BOCAS	GUANTES
DIRECTOR DE OBRA		ING. JULIAN MAURICIO GIRALDO		X	X	X				
RESIDENTE DE OBRA		ING. MARIA TERESA OJEDA		X	X	X				
ING. AMBIENTAL OBRA		ING. EVELYN ANDREA GUZMAN		X	X	X				
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SSTMA		MARIA FERNANDA BENAVIDES		X	X	X				
SUBCONTRATISTA		HERNANDO JOSE ARRIETA ANAYA			X	X				X
AYUDANTE		JHOYNER JESUS YANDE CAPOTE			X	X				X
AYUDANTE		EDUARDO ANDRES DIAZ GIL			X	X				X
AYUDANTE		EDGAR DE JESUS MORALES ESQUEDA			X	X				X

EQUIPO (1)

MAQUINARIA (4)	CANTIDAD (5)	TIEMPO(HORAS)
Cargador	1	0 horas

ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO DEL TIEMPO	NOCHE (6)	MAÑAÑA(HORAS)	TARDE(HORAS)	ESTADO DEL SUELO
SOLEADO		7-12 A.M		S
NUBLADO				
LLUVIA				

Nota: Estado del Suelo Seco (S), Húmedo (H), Inundado (I)

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIALES (7)

TIPO DE MATERIAL	PROVEEDOR	No DE RECIBO O LOTE	UBICACIÓN O INSTALACION	CANTIDAD (8)

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y OBRAS

ACTIVIDAD	LOCALIZACION	No. DE MUESTRAS	CODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	CANTIDAD
LOTE INTERVENIDO PARA FASE 4	CAMPAMENTO (INCLUYE PLACA DE CONTRAPISO, PAREDES EN TABLA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO DE ZINC)	1/15 und

OBSERVACIONES Y/O INSTRUCCIONES DEL ING. RESIDENTE

A la fecha El Contratista, no se ha iniciado actividades de demoliciones de placas de contrapiso existentes (3 placas), ni descapote

Esta pendiente la entrega de la programacion por parte del Contratista según contrato.

Esta pendiente la entrega de APU´S por parte del Contratista.

Elaboró	Revisó
SANDRA GUAUÑA	TIRSO COSME - DIRECTOR DE INTERVENTORIA

(1) CONTINUE EN OTRA HOJA SI REQUIERE MAS ESPACIO
(2) IDENTIFIQUE Y RELACIONE LAS PERSONAS QUE NO CUMPLEN CON LA DOTACION CORRESPONDIENTE
(3) INDIQUE CUMPLIMIENTO DE DOTACION
(4) RELACIONE EL EQUIPO QUE SE ESTÁ UTILIZANDO EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
(5) INDIQUE LA CANTIDAD DE MAQUINARIA RELACIONADA (4)
(6) ANOTAR SI LA NOCHE INMEDIATAMENTE ANTERIOR LLOVIÓ
(7) PARA EL CASO DE MEZCLA ASFALTICA UTILIZAR EL FORMATO INT-49
(8) ANOTAR LA CANTIDAD REPORTADA EN EL RECIBO, NO ES UNA CANTIDAD PARA PAGO

DAIMCO S.A.S
Diseño, Asesoría, Interventoría, Montaje, Mantenimiento y Construcción

INFORME DIARIO DE INSPECCIÓN INT-8:00

PROYECTO	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE	CONTRATISTA	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
CONTRATANTE	POLICIA NACIONAL	FRENTE DE OBRA	FASE 4- ALOJAMIENTOS
INTERVENTOR	DAIMCO S.A.S	FECHA DE INFORME	24 / 05 / 2018 — L M M J V S D

PERSONAL (1)

CONTROL DE PERSONAL / CONTROL DE DOTACION (2)

CARGO	No. PERSONAS	NOMBRE	DOTACIÓN(3) UNIFORME	CHALECO	BOTAS	CASCO	"ej"/+	T. CIDOS	T. BIDCAS	GUANTES
DIRECTOR DE OBRA		ING. JULIAN MAURICIO GIRALDO		X	X	X				
RESIDENTE DE OBRA		ING. MARIA TERESA OJEDA		X	X	X				
ING. AMBIENTAL OBRA		ING. EVELYN ANDREA GUZMAN		X	X	X				
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SSTMA		MARIA FERNANDA BENAVIDES		X	X	X				
SUBCONTRATISTA		HERNANDO JOSE ARRIETA ANAYA			X	X				X
AYUDANTE		JHOYNER JESUS YANDE CAPOTE			X	X				X
AYUDANTE		EDUARDO ANDRES DIAZ GIL			X	X				X
AYUDANTE		EDGAR DE JESUS MORALES ESQUEDA			X	X				X
AYUDANTE TOPOGRAFIA		MARGARITA EUGENIA ALVAREZ			X	X				
AUXILIAR TOPOGRAFIA		ALEXANDRA RISUEÑO			X	X				

EQUIPO (4)

MAQUINARIA (4)	CANTIDAD (5)	TIEMPO(HORAS)
Cargador	1	0 horas

ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO DEL TIEMPO	NOCHE (6)	MAÑANA(HORAS)	TARDE(HORAS)	ESTADO DEL SUELO
SOLEADO		7-12 A.M	1-5 P.M	S
NUBLADO				
LLUVIA				

Nota: Estado del Suelo (S), Saturado (ST), Inundado (I)

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIALES (7)

TIPO DE MATERIAL	PROVEEDOR	No DE RECIBO O LOTE	UBICACIÓN O INSTALACION	CANTIDAD (8)

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y OBRAS

ACTIVIDAD	LOCALIZACION	No. DE MUESTRAS	CODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	CANTIDAD
LOTE INTERVENIDO PARA FASE 4	CAMPAMENTO (INCLUYE PLACA DE CONTRPISO, PAREDES EN TABLA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO DE ZINC) 66M2	1/15 und

OBSERVACIONES Y/O INSTRUCCIONES DEL ING. RESIDENTE

A la fecha El Contratista, no se ha iniciado actividades de demoliciones de placas de contrapiso existentes (3 placas)

Aun no ha realizado la entrega de la programacion como se exige el contrato

Se encuentra un equipo cargador en sitio pero sin actividad alguna

Se hace entrega via magnetico de algunos APU'S

En la actividad de campamento, el Contratista se encuentra en la ejecucion de baños

Se hace entrega de psses para la red contraincendio por parte de la comision topografica para ser verificacdos y socializado con con el Contratista.

Elaboró	Revisó
SANDRA GUAUÑA	TIRSO COSME - DIRECTOR DE INTERVENTORIA

(1) CONTINUE EN OTRA HOJA SI REQUIERE MAS ESPACIO
(2) IDENTIFIQUE Y RELACIONE LAS PERSONAS QUE NO CUMPLEN CON LA DOTACION CORRESPONDIENTE
(3) INDIQUE CUMPLIMIENTO DE DOTACION
(4) RELACIONE EL EQUIPO QUE SE ESTÁ UTILIZANDO EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
(5) INDIQUE LA CANTIDAD DE MAQUINARIA RELACIONADA (4)
(6) ANOTAR SI LA NOCHE INMEDIATAMENTE ANTERIOR LLOVIÓ
(7) PARA EL CASO DE MEZCLA ASFALTICA UTILIZAR EL FORMATO INT-45
(8) ANOTAR LA CANTIDAD REPORTADA EN EL RECIBO, NO ES UNA CANTIDAD PARA PAGO

DAIMCO S.A.S
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

INFORME DIARIO DE INSPECCIÓN INT-8:00

PROYECTO	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE	CONTRATISTA	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
CONTRATANTE	POLICIA NACIONAL	FRENTE DE OBRA	FASE 4- ALOJAMIENTOS
INTERVENTOR	DAIMCO S.A.S	FECHA DE INFORME	L M M J V S D

PERSONAL (1)

CONTROL DE PERSONAL / CONTROL DE DOTACION (2)

CARGO	No. PERSONAS	NOMBRE	DOTACIÓN(3) UNIFORME	CHALECO	BOTAS	CASCO	"95" +	T. OIDOS	T. BOCAS	GUANTES
DIRECTOR DE OBRA		ING. JULIAN MAURICIO GIRALDO		X	X	X				
RESIDENTE DE OBRA		ING. MARIA TERESA OJEDA		X	X	X				
ING. AMBIENTAL OBRA		ING. EVELYN ANDREA GUZMAN		X	X	X				
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SSTMA		MARIA FERNANDA BENAVIDES		X	X	X				
SUBCONTRATISTA		HERNANDO JOSE ARRIETA ANAYA			X	X				X
AYUDANTE		JHOYNER JESUS YANDE CAPOTE			X	X				X
AYUDANTE		EDUARDO ANDRES DIAZ GIL			X	X				X
AYUDANTE		EDGAR DE JESUS MORALES ESQUEDA			X	X				X
AYUDANTE TOPOGRAFIA		MARGARITA EUGENIA ALVAREZ			X	X				
AUXILIAR TOPOGRAFIA		ALEXANDRA RISUEÑO			X	X				

EQUIPO (4)

MAQUINARIA (4)	CANTIDAD (5)	TIEMPO(HORAS)
Cargador	1	0 horas

ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO DEL TIEMPO	NOCHE (6)	MAÑANA(HORAS)	TARDE(HORAS)	ESTADO DEL SUELO
SOLEADO		7-12 A.M	1-5 P.M	S
NUBLADO				
LLUVIA				

Nota: Estado del Suelo seco (S), Saturado (ST), Inundado (I)

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIALES (7)

TIPO DE MATERIAL	PROVEEDOR	No DE RECIBO O LOTE	UBICACIÓN O INSTALACION	CANTIDAD (8)

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y OBRAS

ACTIVIDAD	LOCALIZACION	No. DE MUESTRAS	CODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	CANTIDAD
LOTE INTERVENIDO PARA FASE 4	CAMPAMENTO (INCLUYE PLACA DE CONTRPISO, PAREDES EN TABLA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO DE ZINC) 66M2	1/15 und

OBSERVACIONES Y/O INSTRUCCIONES DEL ING. RESIDENTE

A la fecha El Contratista, no se ha iniciado actividades de demoliciones de placas de contrapiso existentes (3 placas)

Aun no ha realizado la entrega de la programacion según contrato

Se encuentra un equipo cargador en sitio pero sin actividad alguna

En la actividad de campamento, el Contratista se encuentra en la ejecucion de baños

Elaboró	Revisó
SANDRA GUAUÑA	TIRSO COSME - DIRECTOR DE INTERVENTORIA

(1) CONTINUE EN OTRA HOJA SI REQUIERE MAS ESPACIO
(2) IDENTIFIQUE Y RELACIONE LAS PERSONAS QUE NO CUMPLEN CON LA DOTACION CORRESPONDIENTE
(3) INDIQUE CUMPLIMIENTO DE DOTACION
(4) RELACIONE EL EQUIPO QUE SE ESTÁ UTILIZANDO EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
(5) INDIQUE LA CANTIDAD DE MAQUINARIA RELACIONADA (4)
(6) ANOTAR SI LA NOCHE INMEDIATAMENTE ANTERIOR LLOVIÓ
(7) PARA EL CASO DE MEZCLA ASFALTICA UTILIZAR EL FORMATO INT-49
(8) ANOTAR LA CANTIDAD REPORTADA EN EL RECIBO, NO ES UNA CANTIDAD PARA PAGO

DAIMCO S.A.S
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

INFORME DIARIO DE INSPECCIÓN INT-8:00

PROYECTO	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE	CONTRATISTA	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
CONTRATANTE	POLICIA NACIONAL	FRENTE DE OBRA	FASE 4- ALOJAMIENTOS
INTERVENTOR	DAIMCO S.A.S	FECHA DE INFORME	27 / 06 / 2018 — L M **M** J V S D

PERSONAL (1)

CONTROL DE PERSONAL / CONTROL DE DOTACION (2)

CARGO	No. PERSONAS	NOMBRE	DOTACIÓN(3) UNIFORME	CHALECO	BOTAS	CASCO	**97+	T. OIDOS	T. BOCAS	GUANTES
DIRECTOR DE OBRA		ING. JULIAN MAURICIO GIRALDO		X	X	X				
RESIDENTE DE OBRA		ING. MARIA TERESA OJEDA		X	X	X				
ING. AMBIENTAL OBRA		ING. EVELYN ANDREA GUZMAN		X	X	X				
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SSTMA		MARIA FERNANDA BENAVIDES		X	X	X				
SUBCONTRATISTA		HERNANDO JOSE ARRIETA ANAYA			X	X				X
AYUDANTE		JHOYNER JESUS YANDE CAPOTE			X	X				X
AYUDANTE		EDUARDO ANDRES DIAZ GIL			X	X				X
AYUDANTE		EDGAR DE JESUS MORALES ESQUEDA			X	X				X

EQUIPO (1)

MAQUINARIA (4)	CANTIDAD (5)	TIEMPO(HORAS)
Cargador	1	9 horas
Camabaja	1	9 horas

ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO DEL TIEMPO	NOCHE (6)	MAÑANA(HORAS)	TARDE(HORAS)	ESTADO DEL SUELO
SOLEADO		7-12 A.M	1-4 P.M	S
NUBLADO				
LLUVIA			4-5 P.M	ST

Fecha Exacta del Último Evento de Lluvia (ST) en Horas: 5

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIALES (7)

TIPO DE MATERIAL	PROVEEDOR	No DE RECIBO O LOTE	UBICACIÓN O INSTALACION	CANTIDAD (8)

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y OBRAS

ACTIVIDAD	LOCALIZACION	No. DE MUESTRAS	CODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	CANTIDAD
LOTE INTERVENIDO PARA FASE 4	CAMPAMENTO (INCLUYE PLACA DE CONTRPISO, PAREDES EN TABLA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO DE ZINC) 66M2	1/15 und

OBSERVACIONES Y/O INSTRUCCIONES DEL ING. RESIDENTE

A la fecha El Contratista, no se ha iniciado actividades de demoliciones de placas de contrapiso existentes (3 placas)

Aun no ha realizado la entrega de la programacion aplicando formato exigido contractualmente

Se ejecuta el traslado de cuatro contenedores por parte del Contratista

En la actividad de campamento, el Contratista se encuentra en la ejecucion de baños

Elaboró	Revisó
SANDRA GUAUÑA	TIRSO COSME - DIRECTOR DE INTERVENTORIA

(1) CONTINUE EN OTRA HOJA SI REQUIERE MAS ESPACIO
(2) IDENTIFIQUE Y RELACIONE LAS PERSONAS QUE NO CUMPLEN CON LA DOTACION CORRESPONDIENTE
(3) INDIQUE CUMPLIMIENTO DE DOTACION
(4) RELACIONE EL EQUIPO QUE SE ESTÁ UTILIZANDO EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
(5) INDIQUE LA CANTIDAD DE MAQUINARIA RELACIONADA (4)
(6) ANOTAR SI LA NOCHE INMEDIATAMENTE ANTERIOR LLOVIÓ
(7) PARA EL CASO DE MEZCLA ASFALTICA UTILIZAR EL FORMATO INT-49
(8) ANOTAR LA CANTIDAD REPORTADA EN EL RECIBO, NO ES UNA CANTIDAD PARA PAGO

DAIMCO S.A.S
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

INFORME DIARIO DE INSPECCIÓN INT-8:00

PROYECTO	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE	CONTRATISTA	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
CONTRATANTE	POLICIA NACIONAL	FRENTE DE OBRA	FASE 4- ALOJAMIENTOS
INTERVENTOR	DAIMCO S.A.S	FECHA DE INFORME	15 / 05 / 2018 — L M M J V S D

PERSONAL (1)

CONTROL DE PERSONAL

CONTROL DE DOTACION (2)

CARGO	No. PERSONAS	NOMBRE	DOTACION(3) UNIFORME	CHALECO	BOTAS	CASCO	*97+	T. OIDOS	T. BOCAS	GUANTES
DIRECTOR DE OBRA		ING. JULIAN MAURICIO GIRALDO		X	X	X				
RESIDENTE DE OBRA		ING. MARIA TERESA OJEDA		X	X	X				
ING. AMBIENTAL OBRA		ING. EVELYN ANDREA GUZMAN		X	X	X				
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SSTMA		MARIA FERNANDA BENAVIDES		X	X	X				
SUBCONTRATISTA		HERNANDO JOSE ARRIETA ANAYA			X	X				X
AYUDANTE		JHOYNER JESUS YANDE CAPOTE			X	X				X
AYUDANTE		EDUARDO ANDRES DIAZ GIL			X	X				X
AYUDANTE		EDGAR DE JESUS MORALES ESQUEDA			X	X				X
AYUDANTE TOPOGRAFIA		MARGARITA EUGENIA ALVAREZ			X	X				
AUXILIAR TOPOGRAFIA		ALEXANDRA RISUEÑO			X	X				

EQUIPO (1)

MAQUINARIA (4)	CANTIDAD (5)	TIEMPO(HORAS)
Cargador	1	8 horas

ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO DEL TIEMPO	NOCHE (6)	MAÑANA(HORAS)	TARDE(HORAS)	ESTADO DEL SUELO
SOLEADO				
NUBLADO		7-12 A.M	1-5 P.M	S
LLUVIA				

Nota: Estado del Suelo Seco (S), Saturado (ST), Inundado (I)

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIALES (7)

TIPO DE MATERIAL	PROVEEDOR	No DE RECIBO O LOTE	UBICACIÓN O INSTALACION	CANTIDAD (8)
RECEBO			AREA DE REUBICACION DE CONTENEDORES	

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y OBRAS

ACTIVIDAD	LOCALIZACION	No. DE MUESTRAS	CODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	CANTIDAD
LOTE INTERVENIDO PARA FASE 4	CAMPAMENTO (INCLUYE PLACA DE CONTRPISO, PAREDES EN TABLA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO DE ZINC) 66M2	1/15 und

OBSERVACIONES Y/O INSTRUCCIONES DEL ING. RESIDENTE

A la fecha El Contratista, no se ha iniciado actividades de demoliciones de placas de contrapiso existentes (3 placas)

Aun no ha realizado la entrega de la programacion

Se encuentra un equipo cargador en sitio pero sin actividad alguna en demoliciones

En la actividad de campamento, el Contratista se encuentra en la ejecucion de baños

Se de inicio de la instalacion provisional de acueducto

Se realizo comité no. 3 con participantes supervision y personal electrico, contratista, interventoria, ing electrico contratista, para relacionar temas como: punto pase para RCI, revision red de gas, revision de instlacion de duchas electricas y lavadoras dentro de la instalacion electrica

Elaboró	Revisó
SANDRA GUAUÑA	

TIRSO COSME - DIRECTOR DE INTERVENTORIA

(1) CONTINUE EN OTRA HOJA SI REQUIERE MAS ESPACIO
(2) IDENTIFIQUE Y RELACIONE LAS PERSONAS QUE NO CUMPLEN CON LA DOTACION CORRESPONDIENTE
(3) INDIQUE CUMPLIMIENTO DE DOTACION
(4) RELACIONE EL EQUIPO QUE SE ESTÁ UTILIZANDO EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
(5) INDIQUE LA CANTIDAD DE MAQUINARIA RELACIONADA (4)
(6) ANOTAR SI LA NOCHE INMEDIATAMENTE ANTERIOR LLOVIÓ
(7) PARA EL CASO DE MEZCLA ASFALTICA UTILIZAR EL FORMATO INT-49
(8) ANOTAR LA CANTIDAD REPORTADA EN EL RECIBO, NO ES UNA CANTIDAD PARA PAGO

DAIMCO S.A.S
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

INFORME DIARIO DE INSPECCIÓN INT-8:00

PROYECTO	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE	CONTRATISTA	CONSORCIO HBCS-GUTIERREZ
CONTRATANTE	POLICIA NACIONAL	FRENTE DE OBRA	FASE 4- ALOJAMIENTOS
INTERVENTOR	DAIMCO S.A.S	FECHA DE INFORME	__/__/2019 — L M M J V S D

PERSONAL (1)

CONTROL DE PERSONAL

CONTROL DE DOTACION (2)

CARGO	No. PERSONAS	NOMBRE	DOTACION(3) UNIFORME	CHALECO	BOTAS	CASCO	*gjf+	T. OIDOS	T. BOCAS	GUANTES
DIRECTOR DE OBRA		ING. JULIAN MAURICIO GIRALDO		X	X	X				
RESIDENTE DE OBRA		ING. MARIA TERESA OJEDA		X	X	X				
ING. AMBIENTAL OBRA		ING. EVELYN ANDREA GUZMAN		X	X	X				
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SSTMA		MARIA FERNANDA BENAVIDES		X	X	X				
SUBCONTRATISTA		HERNANDO JOSE ARRIETA ANAYA			X	X				X
AYUDANTE		JHOYNER JESUS YANDE CAPOTE			X	X				X
AYUDANTE		EDUARDO ANDRES DIAZ GIL			X	X				X
AYUDANTE		EDGAR DE JESUS MORALES ESQUEDA			X	X				X
AYUDANTE TOPOGRAFIA		MARGARITA EUGENIA ALVAREZ			X	X				
AUXILIAR TOPOGRAFIA		ALEXANDRA RISUEÑO			X	X				

EQUIPO (1)

MAQUINARIA (4)	CANTIDAD (5)	TIEMPO(HORAS)
Cargador	1	8 horas
Pajarita	1	2 horas

ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO DEL TIEMPO	NOCHE (6)	MAÑANA(HORAS)	TARDE(HORAS)	ESTADO DEL SUELO
SOLEADO				
NUBLADO		7-12 A.M	1-5 P.M	S
LLUVIA				

Nota: Estado del Suelo Seco (S), Saturado (ST), Inundado (I)

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIALES (7)

TIPO DE MATERIAL	PROVEEDOR	No DE RECIBO O LOTE	UBICACIÓN O INSTALACION	CANTIDAD (8)

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y OBRAS

ACTIVIDAD	LOCALIZACION	No. DE MUESTRAS	CODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	CANTIDAD
LOTE INTERVENIDO PARA FASE 4	CAMPAMENTO (INCLUYE PLACA DE CONTRPISO, PAREDES EN TABLA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO DE ZINC) 66M2	1/15 und
LOTE INTERVENIDO PARA FASE 4	DEMOLICIÓN DE PLACAS DE CONTRAPISO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	315,37
LOTE INTERVENIDO PARA FASE 4	DEMOLICIÓN MUROS Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	60,57 M2
LOTE INTERVENIDO PARA FASE 4	DESMONTE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	16,89 m2
LOTE INTERVENIDO PARA FASE 4	DESCAPOTE MECÁNICO E=0.20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS.	318,14 m2

OBSERVACIONES Y/O INSTRUCCIONES DEL ING. RESIDENTE

Se inicio actividades de demoliciones de placas de contrapiso existentes

Aun no se ha realizado la entrega de la programacion según contrato

En la actividad de campamento, el Contratista aun se encuentra en la ejecucion de baños

Se inicia trabajos sobre la via para el pase de la RCI por parte del Contratista

Elaboró	Revisó
SANDRA GUAIÑA	TIRSO COSME - DIRECTOR DE INTERVENTORIA

(1) CONTINUE EN OTRA HOJA SI REQUIERE MAS ESPACIO
(2) IDENTIFIQUE Y RELACIONE LAS PERSONAS QUE NO CUMPLEN CON LA DOTACION CORRESPONDIENTE
(3) INDIQUE CUMPLIMIENTO DE DOTACION
(4) RELACIONE EL EQUIPO QUE SE ESTÁ UTILIZANDO EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
(5) INDIQUE LA CANTIDAD DE MAQUINARIA RELACIONADA (4)
(6) ANOTAR SI LA NOCHE INMEDIATAMENTE ANTERIOR LLOVIÓ
(7) PARA EL CASO DE MEZCLA ASFALTICA UTILIZAR EL FORMATO INT-49
(8) ANOTAR LA CANTIDAD REPORTADA EN EL RECIBO, NO ES UNA CANTIDAD PARA PAGO

DAIMCO S.A.S
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

INFORME DIARIO DE INSPECCIÓN INT-8:00

PROYECTO	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE	CONTRATISTA	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
CONTRATANTE	POLICIA NACIONAL	FRENTE DE OBRA	FASE 4- ALOJAMIENTOS
INTERVENTOR	DAIMCO S.A.S	FECHA DE INFORME	10 / 07 / 2015 — L M M J V S D

PERSONAL (1)

CONTROL DE PERSONAL / CONTROL DE DOTACION (2)

CARGO	No. PERSONAS	NOMBRE	DOTACIÓN(3) UNIFORME	CHALECO	BOTAS	CASCO	"GFA"	T. OIDOS	T. BOCAS	GUANTES
DIRECTOR DE OBRA		ING. JULIAN MAURICIO GIRALDO		X	X	X				
RESIDENTE DE OBRA		ING. MARIA TERESA OJEDA		X	X	X				
ING. AMBIENTAL OBRA		ING. EVELYN ANDREA GUZMAN		X	X	X				
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SSTMA		MARIA FERNANDA BENAVIDES		X	X	X				
SUBCONTRATISTA		HERNANDO JOSE ARRIETA ANAYA			X	X				X
AYUDANTE		JHOYNER JESUS YANDE CAPOTE			X	X				X
AYUDANTE		EDUARDO ANDRES DIAZ GIL			X	X				X
AYUDANTE		EDGAR DE JESUS MORALES ESQUEDA			X	X				X
AYUDANTE TOPOGRAFIA		MARGARITA EUGENIA ALVAREZ			X	X				
AUXILIAR TOPOGRAFIA		ALEXANDRA RISUEÑO			X	X				

EQUIPO (1)

MAQUINARIA (4)	CANTIDAD (5)	TIEMPO(HORAS)
Retroexcavadora	1	0 horas

ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO DEL TIEMPO	NOCHE (6)	MAÑANA(HORAS)	TARDE(HORAS)	ESTADO DEL SUELO
SOLEADO				
NUBLADO		(7-12) A.M		S
LLUVIA				

Nota: Estado del Suelo Seco (S), Saturado (ST), Inundado (I)

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIALES (7)

TIPO DE MATERIAL	PROVEEDOR	No DE RECIBO O LOTE	UBICACIÓN O INSTALACION	CANTIDAD (8)

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y OBRAS

ACTIVIDAD	LOCALIZACION	No. DE MUESTRAS	CODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	CANTIDAD
LOTE INTERVENIDO PARA FASE 4	CAMPAMENTO (INCLUYE PLACA DE CONTRPISO, PAREDES EN TABLA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO DE ZINC) 66M2	1/15 und
LOTE INTERVENIDO PARA FASE 4	INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO L=60m (incluye bomba de presion y tuberia para tomar proveer agua y todos sus accesorios, adicionalmente mangeras y elementos de almacenamiento).	1 glb

OBSERVACIONES Y/O INSTRUCCIONES DEL ING. RESIDENTE

Se realizo la instalacion del medidor de agua potable finalizando la instalacion provisional de acueducto.

Aun no se ha realizado la entrega de la programacion según contrato

En la actividad de campamento, el Contratista aun se encuentra en la ejecucion de baños

Se continua con los trabajos sobre la via para el pase de la RCI por parte del Contratista

El Contratista tramita oficio solicitando corte energetico para el dia 4 de julio para la instalacion de medidor energetico para la conexión provisional

Elaboró	Revisó
SANDRA GUALIÑA	TIRSO COSME - DIRECTOR DE INTERVENTORIA

(1) CONTINUE EN OTRA HOJA SI REQUIERE MAS ESPACIO
(2) IDENTIFIQUE Y RELACIONE LAS PERSONAS QUE NO CUMPLEN CON LA DOTACION CORRESPONDIENTE
(3) INDIQUE CUMPLIMIENTO DE DOTACION
(4) RELACIONE EL EQUIPO QUE SE ESTÁ UTILIZANDO EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
(5) INDIQUE LA CANTIDAD DE MAQUINARIA RELACIONADA (4)
(6) ANOTAR SI LA NOCHE INMEDIATAMENTE ANTERIOR LLOVIÓ
(7) PARA EL CASO DE MEZCLA ASFALTICA UTILIZAR EL FORMATO INT-49
(8) ANOTAR LA CANTIDAD REPORTADA EN EL RECIBO, NO ES UNA CANTIDAD PARA PAGO

Anexo No. 2 Relación de Correspondencia

Enviada

POLICÍA NACIONAL

DAIMCO

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

CONTRATO No. :	Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18
OBJETO:	"Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".
CONTRATISTA:	CONSORCIO BCS GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO S.A.S
SUPERVISOR:	Teniente Ingeniero Civil Andrea Carolina Cadena Lemus

No.	Titulo del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
CPP-DIRAF-2018-001	Legalizacion de contrato - Remision de poliza inicial	1	N.A	29/05/2018	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-002	Legalizacion de Contrato - Remision Hojas de vida personal tecnico y administrativo	1	N.A	20/04/2018	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-003	Legalizacion contrato - Correccion poliza inicial	1	N.A	27/04/2018	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-004	Autorizacion pérsonal Tecnico y Administrativo en campo	1	N.A	02/05/2018	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-005	Remision documentacion fiduciaria	1	N.A	27/04/2018	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO AL CONTRATISTA POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-006	Remision actas de inicio y entrega del predio	1	N.A	04/05/2018	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO AL CONTRATISTA POR PARTE DE DAIMCO
)IRAF-2018-007	Radicacion de documentos interventoria	1	N.A	12/05/2018	N.A	1	1	0	OFICIO REMISORIO AL CONTRATISTA POR PARTE DE DAIMCO, CON COPIA A LA ENTIDAD
CPP-DIRAF-2018-008	Solicitud mesa de trabajo	1	N.A	16/05/2018	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO AL CONTRATISTA POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-009	Cumplimiento obligaciones contractuales	1	N.A	17/05/2018	N.A	1	1	0	OFICIO REMISORIO AL CONTRATISTA POR PARTE DE DAIMCO, CON COPIA A LA ENTIDAD
CPP-DIRAF-2018-010	Solicitud Fiduciaria popular s.a	1	N.A	22/05/2018	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO AL CONTRATISTA POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-011	Respuesta al documento PN-DIRAF-POPAYAN-023 del 19 de junio de 2018 con radicado Daimco D-2018-1332 del 20 de junio de 2018. APU Traslado de contenedores	1	N.A	22/05/2018	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO AL CONTRATISTA POR PARTE DE DAIMCO, CON COPIA A LA ENTIDAD
CPP-DIRAF-2018-012	Respuesta al documento PN-DIRAF-POPAYAN-026 del 26 de junio de 2018 con radicado Daimco D-2018-1398 del 27 de junio de 2018. – Respuesta oficio CPP-DIRAF-2018-009	1	N.A	22/05/2018	N.A	1	1	0	OFICIO REMISORIO AL CONTRATISTA POR PARTE DE DAIMCO, CON COPIA A LA ENTIDAD
CPP-DIRAF-2018-013	Respuesta al documento PN-DIRAF-POPAYAN-009 del 22 de mayo de 2018 con radicado Daimco D-2018-1333 del 20 de junio de 2018, y documento PN-DIRAF-POPAYAN-025 del 25 de junio de 2018 con radicado Daimco D-2018-1391 del 26 de junio de 2018 - Observaciones	1	N.A	18/05/2018	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO AL CONTRATISTA POR PARTE DE DAIMCO, CON COPIA A LA ENTIDAD

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C. a los 30 días del mes junio del 2018.

ENTREGA
Firma
NOMBRE: TIRSO COSME (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)
Fecha: 30 de junio de 2018

RECIBE
Firma
NOMBRE: Teniente Ingeniero Civil Andrea Carolina Cadena Lemus
Fecha: 30 de junio de 2018

Original: POLICIA NACIONAL
Copias: Contratista, Interventoría

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-001

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL
VENTANILLA ÚNICA
DE RADICACIÓN Y CORRESPONDENCIA
FECHA 29 MAY 2018
HORA: _____ GUIA SI ☐ NO ☐
No. RADICACIÓN: 049870

Bogotá D.C. 29 de mayo de 2018

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Legalización de Contrato - Remisión de Póliza Inicial

Estimados Señores,

Por medio de la presente, y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales remitimos la póliza de seguro de cumplimento No. CSC-100000413 anexo 0, de la compañía Mundial de Seguros S.A. Quedamos atentos a la aprobación del documento en relación.

Cordialmente,

OMAR RAFAEL PERTUZ RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
DAIMCO S.A.S.

Anexos	*Lo enunciado en dos (2) folios*	
Vo. Bo.	*OPR - Representante Legal*	
Elaboro	*KMI - Directora Comercial*	
Copia 1.	*Archivo - Contrato de interventoría*	

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-002

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL
VENTANILLA ÚNICA
DE RADICACIÓN Y CORRESPONDENCIA
FECHA 01 JUN 2018
HORA: _____ GUIA SI [ ] NO [ ]
No. RADICACIÓN: 051521

Bogotá D.C. 01 de junio de 2018

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Legalización de Contrato - Remisión Hojas de Vida Personal Técnico y Administrativo

Estimados Señores,

Por medio de la presente, y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales nos permitimos enviar las Hojas de Vida del Personal Profesional que ejecutará el contrato de interventoría, como se relaciona a continuación:

Director de Interventoría – Tirso Marino Cosme Orozco
Residente Arquitecto de Interventoría – John Jarlis Moreno Cardenas
Residente Ingeniero de Interventoría – Sandra Lucía Guauña Pisso
Supervisor Técnico – Javier Jose Carrillo Ortega
Ingeniero Electricista – Victor Manuel Bocanegra García
Residente de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional – Eduardo Andrés Cepeda Cardoso
Ingeniero Topográfico – Rigoberto Lozada Díaz
Ingeniero Especialista en Geotecnia – Jose Armando Ruiz Angarita
Ingeniero Especialista en Hidráulica – Alberto Federico Mouthon Bello
Asesor Jurídico – Pablo Manrique Convers
Asesor Contable – Pablo Emilio Guerrero Jiménez

Cordialmente,

OMAR RAFAEL PERTUZ RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
DAIMCO S.A.S.

Anexos		
Vo. Bo.	*OPR - Representante Legal*	
Elaboro	*KMI - Directora Comercial*	
Copia 1.	*Archivo – Contrato de interventoría*	

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

52

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-003

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL
VENTANILLA ÚNICA
DE RADICACIÓN Y CORRESPONDENCIA
FECHA 01 JUN 2018
HORA: _____ GUIA SI [ ] NO [ ]
No. RADICACIÓN: 051749

Bogotá D.C. 01 de junio de 2018

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Legalización de Contrato - Corrección de Póliza Inicial

Estimados Señores,

Por medio de la presente, y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales remitimos la póliza de seguro de cumplimento No. CSC-100000413 anexo 1, de la compañía Mundial de Seguros S.A., de acuerdo a las correcciones solicitadas por medio electrónico el día 30 de mayo de 2018. Quedamos atentos a la aprobación del documento en relación.

Cordialmente,

Omar Restrepo.

OMAR RAFAEL PERTUZ RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
DAIMCO S.A.S.

Anexos	*Lo enunciado en tres (3) folios*	
Vo. Bo.	*OPR - Representante Legal*	
Elaboro	*KMI - Directora Comercial*	
Copia 1.	*Archivo – Contrato de interventoría*	

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-005

Bogotá D.C. 13 de junio de 2018

Señores
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
Aurelio Gutiérrez Castillo
Representante Legal
Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Remisión documentación fiduciaria

Respetado Ingeniero:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir la documentación correspondiente para el trámite de los desembolsos del anticipo del contrato en referencia:

- Formulario C-RG-055 – Formulario del Interventor
- Autorización para trámite de fideicomiso.
- Fotocopia cédula de ciudadanía – Carlos Javier Espitia Palomino
- Copia del contrato de interventoría.
- Fotocopia cédula de ciudadanía - José Vicente Bocanegra García.
- Tarjeta de Firmas FIDUCIARIA POPULAR

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
14 JUN 2018
HORA: 10:23 FIRMA:
ESTE DOCUMENTO SE RECIBE PARA POSTERIOR VERIFICACION

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	*Lo enunciado en 26 Folios*	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	*Archivo – Contrato de interventoría*	

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

55

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-006

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL
VENTANILLA ÚNICA
DE RADICACIÓN Y CORRESPONDENCIA
FECHA 14 JUN 2018
HORA: _____ GUIA SI ☐ NO ☐
No. RADICACIÓN: 055564

Bogotá D.C. 13 de junio de 2018

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión actas de inicio y entrega del predio

Estimados Señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y en atención a las instrucciones impartidas se remiten los siguientes documentos debidamente suscritos por el contratista y la interventoría:

- Acta de inicio del contrato de interventoría No. PN DIRAF No. 06-3-10051-18
- Acta de inicio del contrato de obra No PN DIRAF No 06-6-10044-18
- Acta de entrega del predio

De acuerdo con lo anterior solicitamos cordialmente, una vez suscritos estos documentos por parte de la entidad nos sea remitida la copia de estos documentos.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	*Lo enunciado en 6 Folios*	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	*Archivo – Contrato de interventoría*	

56

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-007

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL
VENTANILLA UNICA
DE RADICACION
FECHA 20 JUN 2018
HORA: _____ GUIA SI [ ] NO [ ]
No. RADICACIÓN: 057544

Bogotá D.C. 19 de junio de 2018

Señores
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
Aurelio Gutiérrez Castillo
Representante Legal
Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Radicación de documentos interventoria

Respetado Ingeniero:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, y con atención al contrato de la referencia, la interventoría con fines de mejorar la fluidez en las comunicaciones, solicitamos de manera atenta, todas las comunicaciones escritas deben ser radicadas en nuestras oficinas, es decir en la CALLE 44B No 57 A – 52 Barrio La Esmeralda, para efectos de los respectivos tramites.

Por otra parte, cuando se entreguen comunicaciones vía correo electrónico, estas deben venir dirigidas al correo electrónico jbocanegra@daimco.com.co, así mismo, es pertinente informar que dichos documentos se reciben vía correo electrónico a fin de agilizar las revisiones pertinentes, sin embargo, no se dará trámite formal hasta tanto, la correspondencia no sea debidamente radicada en nuestras oficinas

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
20 JUN 2018
HORA: 10.05am FIRMA:
ESTE DOCUMENTO SE RECIBE PARA POSTERIOR VERIFICACION

Anexos	*N/a*	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	*Archivo – Contrato de interventoría*	
Copia 2.	POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Directora Administrativa y Financiera - Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 – CAN – Teniente ANDREA CAROLINA CADENA LEMUS	

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-008

Bogotá D.C. 22 de junio de 2018

Señores
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
Aurelio Gutiérrez Castillo
Representante Legal
Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Solicitud mesa de trabajo

Respetado Ingeniero:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y en atención al contrato de la referencia, solicitamos la asistencia de una mesa de trabajo con la presencia de los profesionales que se encuentran realizando la ingeniería de detalle por parte del Contratista de obra; lo anterior para identificar las observaciones y la respuesta de las mismas por parte del personal de consultoría.

Por lo anterior, solicitamos la asistencia el día martes 26 de junio de 2018 a las 14:00 p.m. en las instalaciones del Área de Infraestructura de la DIRAF. Así mismo, allegar con plazo máximo del 23 de junio de 2018 al correo electrónico Andrea.cadena1187@correo.polici.gov.co todas las dudas, observaciones y/o documentación faltante del proyecto, esto con el fin de allegárselas al consultor con anticipación.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
C.C. 3400149
25 JUN 2018
HORA: _____ FIRMA: _____
ESTE DOCUMENTO SE RECIBE PARA POSTERIOR VERIFICACION

Anexos	*N/a*	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	*Archivo – Contrato de interventoría*	

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-009

Bogotá D.C. 25 de junio de 2018

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL
VENTANILLA ÚNICA
DE RADICACIÓN Y CORRESPONDENCIA
FECHA 29 JUN 2018
HORA: _____ GUIA SI [ ] NO [ ]
No. RADICACIÓN: 061158

Señores
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
Aurelio Gutiérrez Castillo
Representante Legal
Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Cumplimiento Obligaciones contractuales

Respetado Ingeniero:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, y según los plazos estipulados para LA PROGRAMACION DE OBRA (Pág. 36 de 40 del contrato de obra No 06-3-10051-18), el Interventor debe exigir al Contratista de obra, la programación de obra sin modificar plazo contractual, adicionalmente según NOTA 2 (Pág. 37 de 40), también deberá entregar a la interventoría para su revisión y aval, los Análisis de Precios Unitarios correspondientes a los valores unitarios del contrato de obra, estos documentos deberán entregarse dentro de los quince(15) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio.

A la fecha habiéndose firmado Acta de Inicio el día siete (07) de junio de 2018, no hemos recibido comunicación oficial de entrega de los mencionados documentos, por tal motivo solicitamos a ustedes, dicha documentación para la revisión y aval ya que estos a su vez son de importancia para el control y ejecución de la obra que nos compete.

Agradecemos su colaboración.

Cordialmente,

JOSÉ VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TÉCNICO
DAIMCO S.A.S.

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
29 JUN 2018
HORA: 11:09 FIRMA
ESTE DOCUMENTO SE RECIBE PARA POSTERIOR VERIFICACION

Anexos	*N/a*	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	*Archivo – Contrato de interventoria*	
Copia 2.	POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Directora Administrativa y Financiera - Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 – CAN – Teniente ANDREA CAROLINA CADENA LEMUS	

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021492 - 1

CPP-DIRAF-2018-010

Bogotá D.C. 25 de junio de 2018

Señores
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
Aurelio Gutiérrez Castillo
Representante Legal
Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Solicitud FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Respetado Ingeniero:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, y de acuerdo con lo solicitado, adjuntamos al presente certificado debidamente firmado por el Representante Legal de DAIMCO Ing. Carlos Javier Espitia Palomino, donde se indica, que a la fecha nos encontramos adelantando las gestiones pertinentes a fin de resolver los procesos reportados en el Boletín de Deudores Morosos del Estado – BDME.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
26 JUN 2018
HORA: 11:17 FIRMA
ESTE DOCUMENTO SE RECIBE PARA POSTERIOR VERIFICACION

Anexos	*N/a*	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	*Archivo – Contrato de interventoría*	

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-011

Bogotá D.C. 27 de junio de 2018

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL
VENTANILLA UNICA
RECIBIDO
FECHA 29 JUN 2018
HORA: GUIA SI NO
No. RADICACIÓN: 061155

Señores
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
Aurelio Gutiérrez Castillo
Representante Legal
Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Respuesta al documento PN-DIRAF-POPAYAN-023 del 19 de junio de 2018 con radicado Daimco D-2018-1332 del 20 de junio de 2018. APU Traslado de contenedores

Respetado Ingeniero:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, y de acuerdo con los temas tratados en los comités de seguimiento realizados en obra, en compañía del Ing. Julián Giraldo los días 19 y 20 de junio de 2018, nos permitimos manifestar que el traslado de los contenedores fue debidamente solucionado en campo por parte del equipo técnico de la interventoría y el contratista, razón por la cual, ya no es necesario el trámite del APU solicitado en el comunicado del asunto.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
26 JUN 2018
HORA: 11:54 FIRMA:
ESTE DOCUMENTO SE RECIBE PARA POSTERIOR VERIFICACION

Anexos	*N/a*	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	*Archivo – Contrato de interventoria*	
Copia 2.	POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Directora Administrativa y Financiera - Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 – CAN – Teniente ANDREA CAROLINA CADENA LEMUS	

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-012

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL
VENTANILLA UNICA
DIRAF
FECHA 29 JUN 2018
HORA: GUIA SIJ No.
No. RADICACIÓN: 061160

Bogotá D.C. 28 de junio de 2018

Señores
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
Aurelio Gutiérrez Castillo
Representante Legal
Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Respuesta al documento PN-DIRAF-POPAYAN-026 del 26 de junio de 2018 con radicado Daimco D-2018-1398 del 27 de junio de 2018. – Respuesta oficio CPP-DIRAF-2018-009

Respetado Ingeniero:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, y en respuesta a su oficio de la referencia, nos permitimos manifestar lo siguiente:

- La programación recibida vía email el día 21 de junio de 2018 y enviada por el Ingeniero Julián Mauricio Giraldo, Director de Obra, es un archivo en formato Excel el cual contiene las actividades del presupuesto a ejecutar que contiene lo siguiente:

    a. Fecha de inicio planeado
    b. Duración
    c. Fecha de finalización planeado.

    Al respecto, es pertinente aclarar, que se debe presentar una programación de acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato de obra de la referencia, específicamente en el Anexo No 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION Numeral 11 PROGRAMA DE OBRA, que indica:

    "El contratista deberá entregar dentro de los primeros (15) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato, la programación de obra sin modificar el plazo contractual, conforme a las observaciones que sobre la misma realice la interventoría y su respectivo aval, calendarizada en días por ítem para cada una de las actividades contempladas en este proceso, donde se muestre la ruta crítica, la ejecución simultanea de las actividades contempladas con frentes de trabajo independientes, el flujo de inversión diario, el avance diario frente al valor del contrato y al tiempo de ejecución establecido en este proceso, plasmado para su manejo en obra en las gráficas por el método de GANTT de Microsoft Project.

    La ejecución de todas las actividades correspondientes a la obra deberá ser adelantada con base en el cronograma avalado por la interventoría, el cual será inmodificable salvo casos de fuerza mayor previa autorización del interventor."

26 JUN 2018
HORA: 11:53 FIRMA:
ESTE DOCUMENTO SE RECIBE PARA POSTERIOR VERIFICACION

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

En cuanto a la presentación de la programación, se solicita esta sea de manera impresa y firmada por el Ing. Director; así mismo, se presente de manera impresa en formato pliego el diagrama de Gantt para el manejo en obra y mejor visualización y copia magnética.

Por lo anterior, solicitamos atender a nuestras observaciones a la mayor brevedad con el fin de dar trámite de aprobación frente a la documentación requerida en los términos exigidos contractualmente.

- En lo relacionado con los APUS, estos fueron recibidos vía email el día 25 de junio de 2018, en formato PDF, para nuestra revisión y aval. Con el propósito de brindar celeridad a la aprobación de estos, solicitamos de manera atenta remitir los APUS debidamente impresos y firmados, y con copia magnética del archivo en Excel.

Agradecemos su colaboración.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	*N/a*	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Ing. Tirso Cosme – Director de Interventoria.	
Copia 1.	*Archivo – Contrato de interventoria*	
Copia 2.	POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Directora Administrativa y Financiera - Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 – CAN – Teniente ANDREA CAROLINA CADENA LEMUS	

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-013

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL
VENTANILLA ÚNICA
DE RADICACIÓN Y CORRESPONDENCIA
FECHA 29 JUN 2018
HORA: _____ GUIA SI [ ] NO [ ]
No. RADICACIÓN: 061159

Bogotá D.C. 28 de junio de 2018

Señores
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
Aurelio Gutiérrez Castillo
Representante Legal
Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Respuesta al documento PN-DIRAF-POPAYAN-009 del 22 de mayo de 2018 con radicado Daimco D-2018-1333 del 20 de junio de 2018, y documento PN-DIRAF-POPAYAN-025 del 25 de junio de 2018 con radicado Daimco D-2018-1391 del 26 de junio de 2018 - Observaciones

Respetado Ingeniero:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, y en respuesta a su oficio de la referencia, nos permitimos manifestar lo siguiente:

- Las actas de inicio del contrato de obra, interventoría y acta de entrega del predio se encuentran suscritas por parte de la interventoría, y fueron remitidas a la entidad contratante a través del documento CPP-DIRAF-2018-006 radicado el 14 de junio de 2018. A la fecha nos encontramos a la espera de estos documentos suscritos por parte de la entidad. (se anexa comunicado)

- Con relación a la solicitud de la planimetría de:
  - Detalles de elementos no estructurales
  - Detalles de puertas, ventanas, rejas, muebles fijos y mobiliario
  - Planos hidrosanitarios digitales
  - Planos estructurales del tanque de agua potable
  - Planos de aire acondicionado

  Es pertinente aclarar que la DIRAF ha suministrado cada uno de estos componentes a través de correo electrónico, esto a fin de adelantar las revisiones conjuntas de cada uno de ellos y en reunión del 26 de junio de 2018, habilito a los funcionarios del contratista e interventoría, para ingresar a la planoteca y buscar cualquier plano que se considere faltante; no obstante, esa misma tarde la supervisión remitió los planos faltantes

- Respecto al componente ambiental y a la definición de la tala de árboles, a la fecha se adelanta la gestión pertinente con el fin de obtener la renovación de la LICENCIA AMBIENTAL otorgada por la

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
HORA: 11:56 FIRMA:
ESTE DOCUMENTO SE RECIBE PARA POSTERIOR VERIFICACION

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

64

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA, actividades de las cuales esta plenamente enterado el contratista.

- Respecto al diseño del tanque de la red contraincendios, se aclaró en la mesa de trabajo realizada el día 26 de junio de 2018 en las instalaciones de la DIRAF, que esta actividad no hace parte del alcance para la Fase 4 del contrato de la referencia; Por el contrario, se debe dejar un pase que permita la conexión con el tanque en una futura fase, lo anterior será definido en campo a fin de no afectar las obras aledañas a la intervención del contrato que nos compete.

- Respecto a su solicitud de clarificar la definición de los niveles definitivos del proyecto, este tema fue tratado en la mesa de trabajo anteriormente citada, en la cual, el consultor de estudios y diseños se comprometió en revisar y conceptuar respecto a los niveles definitivos del proyecto. (se adjunta acta)

- Respecto al componente eléctrico, durante la mesa de trabajo realizada, se reunieron los especialistas eléctricos del contratista la interventoría y la entidad, a fin de dar claridad respecto a las observaciones emitidas en su comunicado, así mismo, la DIRAF informó que nos apoyará el Sub Intendente Adán Rubio profesional eléctrico de la entidad con todo lo relacionado a este componente y se programo visita por parte de la DIRAF los días 28, 29 y 30 de junio de 2018.

- Con respecto a su solicitud de suspensión del contrato, nos permitimos manifestar que esta no es viable su solicitud, teniendo en cuenta que el contrato contemplo treinta (30) días calendario posteriores a la firma del acta de inicio del contrato, para desarrollar el informe de ingeniería de detalle, programación y apus para lo cual nos encontramos dentro de los plazos estipulados contractualmente para ello.

  Por otra parte, es pertinente aclarar, que existe la necesidad de ejecutar la demolición de las losas de concreto que se encuentran en el predio para la ejecución de las actividades de la Fase 4, actividad que no se podría realizar si el contrato se encuentra suspendido.

Agradecemos de antemano su atención y estaremos atentos a cualquier solicitud.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	*4 Folios*	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Ing. Tirso Cosme – Director de Interventoria.	
Copia 1.	*Archivo – Contrato de interventoría*	
Copia 2.	POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Directora Administrativa y Financiera - Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 – CAN – Teniente ANDREA CAROLINA CADENA LEMUS	

Recibida

POLICÍA NACIONAL

DAIMCO

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

CONTRATO No. :	Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18
OBJETO:	"Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".
CONTRATISTA:	CONSORCIO BCS GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO S.A.S
SUPERVISOR:	Teniente Ingeniero Civil Andrea Carolina Cadena Lemus

No.	Titulo del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
D-2018-1064	Entrega de docuemntos proyecto	1	N.A	18/05/2018	N.A	1	0	10	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2018-1110	Garantia	1	N.A	24/05/2018	N.A	1	1	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA, CON COPIA A LA ENTIDAD
D-2018-1202	Personal Profesional	1	N.A	01/06/2018	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA, CON COPIA A LA ENTIDAD
D-2018-1247	Notificacion al interventor del contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18	1	N.A	08/06/2018	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DE LA ENTIDAD
D-2018-1238	Fiducia Popular - Documentacion Interventoria	1	N.A	07/06/2018	N.A	1	1	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2018-1264	Fiducia Popular - Documentacion Interventoria	1	N.A	12/06/2018	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2018-1265	Acta de inicio y acta de entrega predio	1	N.A	12/06/2018	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2018-1332	APU traslado de contenedores	1	N.A	20/06/2018	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2018-1333	Aclaracion Faltantes	1	N.A	20/06/2018	N.A	1	1	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA, CON COPIA A LA ENTIDAD
D-2018-1351	Solicitud mesa de trabajo	1	N.A	21/06/2018	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DE LA ENTIDAD
D-2018-1391	Solicitud de respuesta a oficio 009 del contratista, de 22 de mayo de 2018 y observaciones adicionales	1	N.A	26/06/2018	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2018-1398	Respuesta a oficio CPP-DIRAF-2018-009	1	N.A	27/06/2018	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2018-1403	Notificacion Modificatorio No 1	1	N.A	27/06/2018	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DE LA ENTIDAD
D-2018-1406	Plan de Inversion del Anticipo	1	N.A	27/06/2018	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA

En constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C. a los 30 días del mes junio del 2018.

ENTREGA	RECIBE
Firma	Firma
NOMBRE: TIRSO COSME (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)	**NOMBRE: Teniente Ingeniero Civil Andrea Carolina Cadena Lemus**
Fecha: 30 de junio de 2018	Fecha: 30 de junio de 2018

Original: POLICIA NACIONAL
Copias: Contratista, Interventoría

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

Bogotá, mayo 17 de 2018

DAIMCO
MAYO 18- 2018 Hora: 11:43 a.m
Folios: 02 Anexos: 10CD-46 PLANOS
No.Radicado D-2018-1064
Radicado: Yesenia Homez 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

PN-DIRAF-POPAYAN-004

Señores
DAIMCO SAS
a/a José Vicente Bocanegra
Interventoria
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Calle 44B No 57ª-52, Barrio la Esmeralda
Bogotá

REF: **DIRAF SA MC 028 2018, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: **Entrega de documentación proyectos**

Por medio de la presente hacemos entrega de la siguiente documentación entregada por la Teniente Ing. Andrea Carolina Lemus:

Información magnética:
1. CD- Proyecto arquitectónico y urbano
2. CD- Mobiliario
3. Cd- diseño geométrico de vías
4. CD- PMT
5. CD- Diseño eléctrico
6. CD- Aire acondicionado y ventilación mecánica (DAÑADO)
7. CD- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
8. CD- Estudio de suelos
9. CD- Plan de manejo ambiental
10. CD- Estudio bioclimático

Planos físicos:
Urbanísticos:
1. MEPOY-U-F4-02
2. MEPOY-U-F4-03

Arquitectónicos:
1. MEPOY-A-F4-0000
2. MEPOY-A-F4-ED-101
3. MEPOY-A-F4-ED-102
4. MEPOY-A-F4-ED-103
5. MEPOY-A-F4-ED-104
6. MEPOY-A-F4-ED-105
7. MEPOY-A-F4-ED-106
8. MEPOY-A-F4-ED-201
9. MEPOY-A-F4-ED-301

Red de gas natural:
1. MEPOY-HYS-F4-430
2. MEPOY-HYS-F4-431

Hidráulicos y sanitarios:
1. MEPOY-HYS-F4-401
2. MEPOY-HYS-F4-402
3. MEPOY-HYS-F4-403
4. MEPOY-HYS-F4-407
5. MEPOY-HYS-F4-410
6. MEPOY-HYS-F4-412

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

7. MEPOY-HYS-F4-414
8. MEPOY-HYS-F4-415
9. MEPOY-HYS-F4-420
10. MEPOY-HYS-F4-423
11. MEPOY-HYS-F4-425
12. MEPOY-HYS-F4-428

Mobiliario

1. MEPOY-M-F4-ED-101
2. MEPOY-M-F4-ED-102
3. MEPOY-M-F4-ED-103
4. MEPOY-M-F4-ED-104

Eléctricos:

1. E-DM-3/4
2. E-RDCI-3/4
3. E-CC-1/1
4. E-UN-1/1
5. E-ILUM-3/10
6. E-ILUM4/10
7. E-ILUM-5/10
8. E-ILUM- 6/10
9. E TN- 3/10
10. E TN- 4/10
11. E TN- 5/10
12. E TN- 6/10

Aire acondicionado

1. MEPOY-A.A.ED.DE-160
2. MEPOY-A.A.ED.DE-161
3. MEPOY-A.A.ED.DE-162
4. MEPOY-A.A.ED.DE-163
5. MEPOY-A.A.ED.DE-164

Entrego 46 planos
entrego 10 CDS

Atentamente,

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal Suplente
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

Bogotá, mayo 23 de 2018

PN-DIRAF-POPAYAN-007

Señores
POLICIA NACIONAL-DIRAF
a/a PT Nicolás Moreno Gómez
Teléfono 5159000 Ext. 9537
Área de Contratación
Carrera 59 # 26 - 21 Piso 2
DAIMCO SAS
a/a RL Carlos Javier Espitia Palomino
Calle 44B NRO. 57 A -52 Barrio la Esmeralda, Bogotá
cespitia@daimcos.com
Interventoria
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Bogotá

DAIMCO
MAYO 24- 2018 Hora: 9:30 a.m
Folios: 01 Anexos:18
No.Radicado D-2018-1110
Radicado:Maria Londoño 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Referencia: **CONTRATO PN DIRAF 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: Garantía

En atención a la suscripción de contrato PN DIRAF 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE", hacemos entrega de las siguientes garantías a favor de la POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, con NIT 800.141.394-5:

- ✓ PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CON SEGUROS DEL ESTADO SA NRO. 96-44-101137868
- ✓ PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO NRO. 96-40-101048803
- ✓ CONSTANCIA DE PAGO
- ✓ CLAUSULADO CUMPLIMIENTO
- ✓ CLAUSULADO RCE

Atentamente,

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal Suplente
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

Bogotá, mayo 17 de 2018

PN-DIRAF-POPAYAN-005

Señores
POLICIA NACIONAL-DIRAF
a/a Teniente Ing. Andrea Carolina Cadena Lemus
Tel: 3125837538
DAIMCO SAS
a/a José Vicente Bocanegra
cespitia@daimcos.com
Interventoria
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Bogotá

DAIMCO
Junio 01- 2018 Hora: 11:10 a.m
Folios: 01 Anexos:20
No.Radicado D-2018-1202
Radicado: Maria Londoño 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

REF: **DIRAF SA MC 028 2018, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: **Personal Profesional**

De acuerdo a Pliego de condiciones en su página 53, el oferente adjudicatario deberá entregar a partir de la resolución de adjudicación y hasta la firma del acta de inicio del contrato , las certificaciones y demás documentos solicitados, avaladas por la entidad contratante, so pena de incurrir en incumplimiento , se obliga contar con el siguiente personal profesional y técnico mínimo para el normal desarrollo de la obra que cumpla con las características, tiempo y permanencias que se indica a continuación. Por lo anterior adjuntamos la documentación del siguiente personal:

DESCRIPCION	CANTIDAD	%DEDICACION	PROFESIONAL	PROFESION
DIRECTOR DE OBRA (Ingeniero civil o Arquitecto)	1	100%	JULIAN GIRALDO	ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA No. 1 (Ingeniero civil)	1	100%	MARIA TERESA OJEDA	ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA No. 2 (Arquitecto)	1	100%	RODRIGO BECERRA	ARQUITECTO
RESIDENTE DE OBRA No. 3 (Ingeniero electricista)	1	50%	FABIO CLAROS	ING. DE REDES ELECTRICAS
RESIDENTE DE OBRA No. 4 (Industrial, civil, ambiental)	1	100%	FEDERICO MONTEALEGRE	ING. INDUSTRIAL

Atentamente,

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal Suplente
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2018 - - 013324 DIRAF – ARCON 17.5

Bogotá D.C., 07 JUN 2018

CARLOS JAVIER ESPÍTIA PALOMINO
Representante Legal DAIMCO S.A.S.
Calle 44B No. 57ª – 52 Barrio La Esmeralda
Teléfono: 7020798 – 7030797 Celular: 3176699287
E-mail: comercial@daimcos.com – cespitia@daimco.com.co
Bogotá D.C.

Asunto: notificación al interventor del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10044-18

De manera respetuosa, me permito notificar de la suscripción del Contrato de obra PN DIRAF No. **06-6-10044-18** del 18/05/2018 cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"** debiendo realizar seguimiento y control a las obligaciones del contratista, anexos del acuerdo de voluntades y a las funciones establecidas en la Resolución 00090 del 15/01/2018 que se encuentra publicada en la guía de disposiciones de la POLIRED. Para tal efecto, el contrato citado y todos los documentos relacionados con el mismo, pueden ser consultados en el repositorio de la DIRAF en la POLIRED, a través del siguiente enlace: http://polired/Institucion/NivelAdministrativo/Diraf/ contratos/default.aspx. .

Igualmente y considerando que el proceso se desarrolló a través de SECOP II, esa supervisión deberá realizar la creación del usuario accediendo al siguiente link: https://community.secop.gov.co/Public/Users/UserRegister/Index?Page=login&Country=CO&SkinName=CCE; posteriormente, o en caso de tener usuario registrado se debe solicitar la asignación del proceso al buzón de correo diraf.arcon-jefat@policia.gov.co.

El seguimiento a la ejecución contractual se debe realizar conforme a lo establecido en la Guía para hacer la gestión contractual en el SECOP II, capítulo VI. Literales a, b y c; documento que puede ser consultado en el siguiente link: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170803_guia_gestion_contractual.pdf.

Nota: El informe de supervisión deberá ser presentado conforme se estableció en el contrato y en el formato predeterminado en la suite visión empresarial "informe de supervisores seguimiento contractual".

Atentamente,

Capitán **ROCÍO CUBILLOS RODRÍGUEZ**
Jefe Área de Contratación

DAIMCO
Junio 08- 2018 Hora: 12:53 p.m
Folios: 01 Anexos:00
No.Radicado D-2018-1247
Radicado:Maria Londoño 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Elaborado por: PT Nicolás Moreno Gómez
Revisado por: TE. Yuly Katherine Beltrán Gutiérrez
Ubicación: Z:\PT NICOLAS MORENO\NOTIFICACIONES

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos: 5159000 Ext 9816
nicolas.moreno3233@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

Bogotá, junio 6 de 2018

PN-DIRAF-POPAYAN-016

Señores
DAIMCO SAS
a/a RL Carlos Javier Espitia Palomino
Calle 448 NRO. 57 A -52 Barrio la Esmeralda, Bogotá
cespitia@daimcos.com
Interventoria
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Bogotá

DAIMCO
Junio 07- 2018 Hora: 11:20 a.m
Folios: 01 Anexos:02
No.Radicado D-2018-1238
Radicado:Maria Londoño I087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Referencia: **CONTRATO PN DIRAF 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: Fiducia Popular-Documentos Interventoría

Informamos que para el contrato PN DIRAF 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE", hemos seleccionado a FIDUCIA POPULAR para que realice el manejo del anticipo que se generará para el presente contrato.

Para formalizar el contrato con la Fiducia requerimos que Ustedes:

1- Diligencien el formato C-RG-055 Formulario Interventor, favor Imprimirlo, diligenciarlo y firmarlo.
2- RUT, cámara de comercio (no mayor a 30 días de expedida), contrato de interventoría suscrito con la Entidad, presentación corporativa, Cedula de ciudadanía del Representante Legal

Informarnos si el viernes 8 de junio de 2018 en horas de la mañana, nos podemos acercar por este formulario diligenciado y respectiva documentación.

Atentamente,

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

DAIMCO
Junio 12- 2018 Hora: 14:35 p.m
Folios: 01 Anexos:1tarjeta de fiducia
No.Radicado D-2018-1264
Radicado:Maria Londoño 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Bogotá, junio 6 de 2018

PN-DIRAF-POPAYAN-020

Señores
DAIMCO SAS
a/a RL Carlos Javier Espitia Palomino
Calle 44B NRO. 57 A -52 Barrio la Esmeralda, Bogotá
cespitia@daimcos.com
Interventoria
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Bogotá

Referencia: **CONTRATO PN DIRAF 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: Fiducia Popular-Documentos Interventoría

Dando alcance al oficio 016 radicado en Daimco, radicado en junio 7 de 2018

Adjuntamos tarjeta de Registro de Firmas Nro 0020813, favor su diligenciamiento, para adjuntar a los documentos requeridos para la Fiducia Popular que manejara los recursos de anticipo del contrato de referencia.

Atentamente,

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

Bogotá, junio 08 de 2018

DAIMCO
Junio 12- 2018 Hora: 14:35 p.m
Folios: 01 Anexos:4
No.Radicado D-2018-1265
Radicado:Maria Londoño 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

PN-DIRAF-POPAYAN-021

Señores
DAIMCO SAS
a/a RL Carlos Javier Espitia Palomino
cespitia@daimcos.com
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Bogotá

Referencia: **CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: Acta de inicio y acta de entrega predio.

Adjunto enviamos los siguientes documentos:

1. Acta de inicio firmada por representante legal de CONSORCIO BCS -GUTIERREZ.
2. Acta de entrega de predio firmada por representante legal de CONSORCIO BCS -GUTIERREZ.

Atentamente,

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal Suplente
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

DAIMCO
Junio 20- 2018 Hora: 10:40 a.m
Folios:01 Anexos:01
No.Radicado D-2018-1332
Radicado:Maria Londoño 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPUCA ACEPTACIÓN

Bogotá, junio 19 de 2018

PN-DIRAF-POPAYAN-023

Señores
DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-
Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Calle 44B No. 57 A-52, Barrio La Esmeralda
Bogotá

Referencia: **CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: APU Traslado de Contenedores

Adjunto enviamos los siguiente documento para su revisión y aprobación:

APU de traslado de contenedores

Atentamente,

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal Suplente
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

Bogotá, mayo 22 de 2018

PN-DIRAF-POPAYAN-009

Señores
POLICIA NACIONAL-DIRAF
a/a Teniente Ing. Andrea Carolina Cadena Lemus
Tel: 3125837538
DAIMCO SAS
a/a RL Carlos Javier Espitia Palomino
cespitia@daimcos.com
Interventoria
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Bogotá

DAIMCO
Junio 20- 2018 Hora: 10:40 a.m
Folios:03 Anexos:00
No.Radicado D-2018-1333
Radicado:Maria Londoño 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Referencia: **CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: .

Cordialmente solicito informen cuando se firma el acta de inicio? a su vez informo que ya tenemos la logística para empezar las obras el lunes 28 de Mayo, favor informar si el lunes 28 podemos iniciar con el cerramiento, el descapote, rellenos en recebo común compactado al 95% del Proctor modificado para iniciar ,necesitamos sean definidos los niveles tanto de descapote que en los sondeos del estudio de suelos aparece 80 centímetros y en obra lo estamos corroborando, sin embargo se necesita el aval de supervisión e interventoría en sitio, también es necesario sean definidos los niveles del recebo compactado que en el estudio de suelos señala 30 centímetros sobre el nivel de Fundación y al colocar la placa de 1 mt el edificio queda casi 50 centímetros por debajo de la cota de andén, que si bien hoy en día el terreno se inunda muy poco es debido al área que tiene una capa vegetal de 80 centímetros, al colocar zonas duras como los edificios, andenes, tanques, accesos y peatonales hay poca área para absorber el agua lluvia y de escorrentía causando humedades en los edificios.

Para empezar con el relleno común es necesario indiquen el nivel de subrasante o de placa de concreto de cimentación, en planos dice 30 centímetros de relleno común, sin embargo queda por debajo del andén, los otros edificios se han construido aproximadamente 40 cmts por encima del andén

Motivados

- Faltan que entreguen los siguientes planos:
    - Plano de detalles de elementos no estructurales.
    - Plano con el cuadro de convenciones de las especificaciones usadas en los diseños arquitectónicos, ya que existen especificaciones que aparecen en los planos y no están nombradas y tampoco aparecen, en su totalidad, en la relación de especificaciones del proyecto.
    - Detalles de baños, puertas, ventanas, rejas, muebles fijos y mobiliario.
    - Planos hidrosanitarios digitales.
    - Planos estructurales del tanque de reserva y cuartos de bombas con su respectiva localización.
    - Plano de cuarto de bombas aguas lluvias.
    - Planos de aire acondicionado, pues el CD entregado estaba dañado.
    - Planos Estructurales firmados.
    - Planos estructurales del tanque de la red de incendios y sitio de Ubicación.

Si la intervenoría y la supervisión autorizan empezar las obras antes del acta de inicio favor informar con quien coordinamos el inicio

77

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

No. S-2018 – 014480 / DIRAF – GUSEP

DAIMCO
Junio 21- 2018 Hora: 12:26 P.m
Folios:01 Anexos: 00
No.Radicado D-2018-1351
Radicado:Paola Dussan 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Bogotá D. C., 21 JUN 2018

Ingeniero
OMAR RAFAEL PERTUZ RESTREPO
Representante Legal DAIMCO S.A.S
Calle 44 B No. 57 A – 52 La Esmeralda
Ciudad

Asunto: solicitud mesa de trabajo

En atención al contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10044-18 "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No.4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE" (Alojamientos DECAU)", respetuosamente solicito la asistencia de una mesa de trabajo con la presencia de los profesionales que se encuentran realizando la ingeniería de detalle tanto de la interventoría como de obra; lo anterior para identificar las observaciones y la respuesta de las mismas por parte del personal de consultoría.

Por lo anterior solicito la asistencia el día 26/06/2018 a las 14:00 en las instalaciones del Área de Infraestructura de la DIRAF. Asimismo allegar con plazo máximo 23/06/2018 al correo electrónico andrea.cadena1187@correo.policia.gov.co todas las dudas observaciones y/o documentación faltante del proyecto, esto con el fin de allegárselas al consultor con anticipación.

Atentamente,

Teniente **ANDREA CAROLINA CADENA LEMUS**
Supervisora del contrato No. 06-3-10051-18

Elaboro: TE. Andrea Carolina Cadena Lemus
Reviso: MY Daniel Elias Silva Ibarra
Reviso: CR José Manuel Ortiz Meneses
Fecha de elaboración: 19/06/2018
Ubicación: "D" Arinf/GUSEP/Supervisión/MEPOY

Carrera 59 26-21, Bogotá
Teléfonos 3159154 – 3159157
diraf.arinf-gusep@policia.gov.co
www.policia.gov.co

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

Bogotá, junio 25 de 2018

PN-DIRAF-POPAYAN-025

Señores
DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-
Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Calle 44B No. 57 A-52, Barrio La Esmeralda
Bogotá

DAIMCO
Junio 26- 2018 Hora: 16:40 p.m
Folios:05 Anexos:00
No.Radicado D-2018-1391
Radicado:Maria Londoño I087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN


Referencia: **CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: **Solicitud de respuestas a oficio 009 del contratista, de 22 de mayo de 2018 y observaciones adicionales.**

Respetado Ingeniero,


El contratista se encuentra en la zona del proyecto desde el pasado 7 de mayo de 2018, con presencia de la Ing María Teresa Ojeda Cabrera, cuando realizo visita a la obra la Supervisora Teniente Andrea Cadena Lemus a quien en esa fecha se le solicito la entrega del predio y quien además informo que hasta tanto no se legalizaran pólizas y firma del Acta de inicio no es posible realizar la entrega oficial.


Como se observa en la foto a esa fecha parte del sitio de la obra se encuentra ocupado por contenedores, hay además presencia de postes y antenas de comunicaciones.

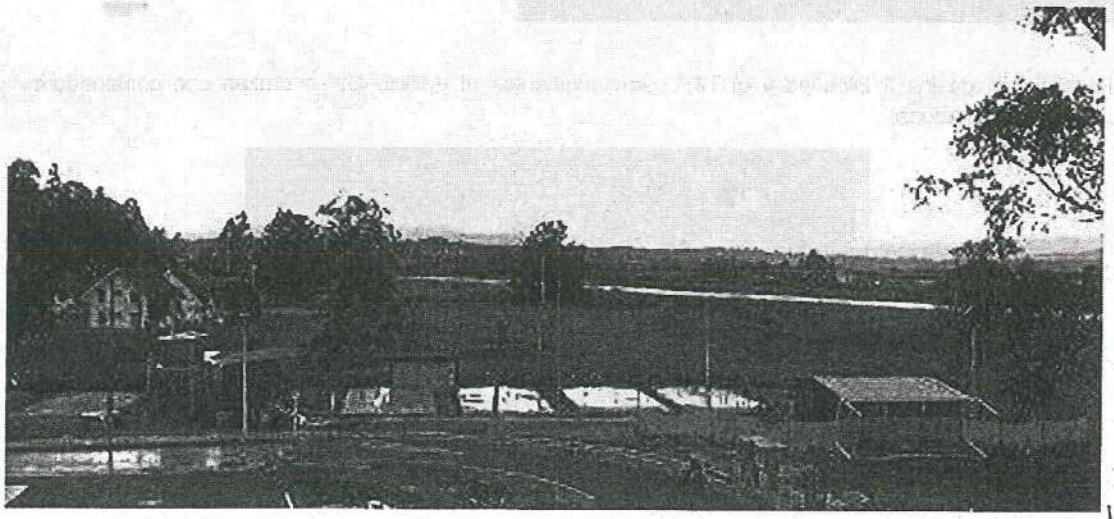


Recibido Lopez Diego 26/6/18 3:56 pm.


29

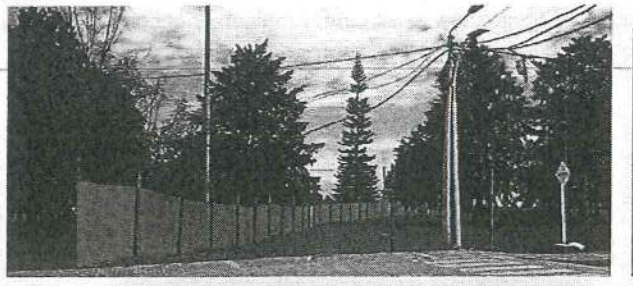

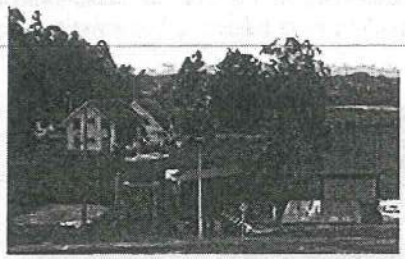

- Demolición para permitir el ingreso del Contenedor para oficina interventoría y Bodega.

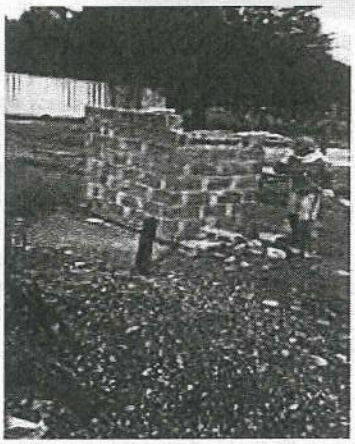

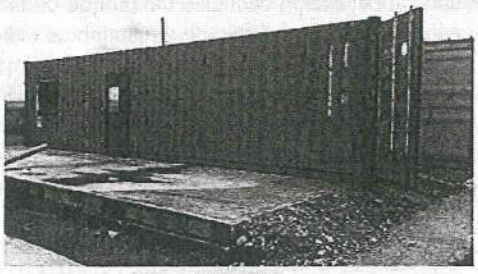

- Construcción de campamento.

A la fecha como se planteó en oficio 009 del contratista, del 22 de mayo de 2018, el contratista tiene diversas dudas que se manifestaron en dicho oficio y que, en su mayoría, no han sido resueltas, como sigue:

Del oficio 009:

- Plano de detalles de elementos no estructurales.
- Plano con el cuadro de convenciones de las especificaciones usadas en los diseños arquitectónicos, ya que existen especificaciones que aparecen en los planos y no están nombradas y tampoco aparecen, en su totalidad, en la relación de especificaciones del proyecto.
- Detalles de baños, puertas, ventanas, rejas, muebles fijos y mobiliario.
- Planos hidrosanitarios digitales.
- Planos estructurales del tanque de reserva y cuartos de bombas con su respectiva localización.
- Plano de cuarto de bombas aguas lluvias.
- Planos de aire acondicionado, pues el CD entregado estaba dañado.
- Planos Estructurales firmados.
- Planos estructurales del tanque de la red de incendios y sitio de Ubicación.


Del mismo oficio:

- Está pendiente la definición el manejo a los árboles que se van a intervenir para la ejecución del proyecto, en la zona correspondiente al Bloque de Oficiales que deben talar previo al inicio de las obras y en especial definir el manejo que se dará a los que están localizados en la zona donde está prevista la construcción del tanque de abastecimiento de agua para los alojamientos. Lo anterior se solicita debido que a la fecha no existe el Plan de aprovechamiento

puede observar, la estructura de los alojamientos por debajo de estas otras estructuras, con respecto a los edificio nuevos a **- 0.89 m** y con respecto al pompeyano 3 a **- 0.39 m.**

Esta situación preocupa al contratista, ya que esta es una zona inundable, que a simple vista no tiene la apariencia, debido a que la suave capa de material orgánica de 0.8 m. absorbe el agua. Después de una revisión a las estructuras de las viviendas aledañas al área del proyecto, las cuales se encuentra al mismo nivel de la cota de diseño del proyecto de alojamientos, se ha podido constatar que estas presentan grandes problemas de humedad.


Al mismo tiempo se deberían revisar los niveles de y diseños de las estructuras complementarias, como tanques de reserva, y subestaciones eléctricas, ya que según apiques realizados el nivel freático se encuentra a una profundidad de – 1.40 m. Situación que podría afectar la vida útil de estas estructuras.

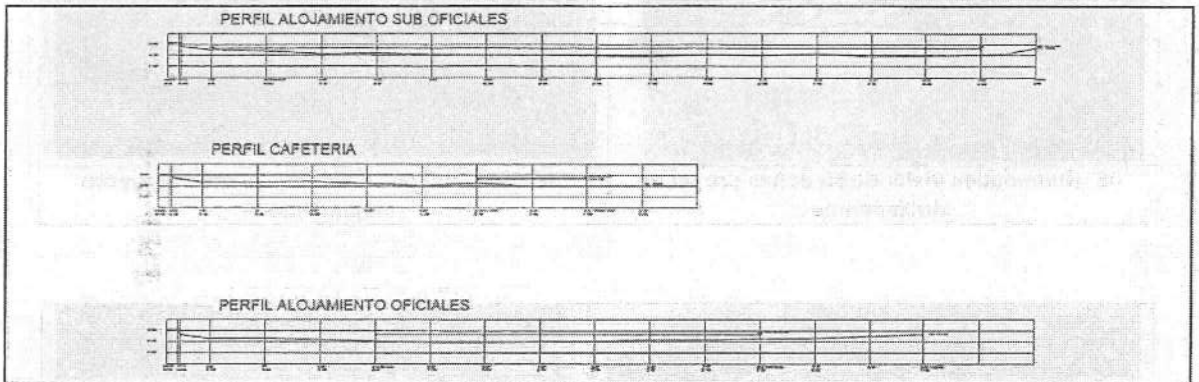


2. Perfiles cotas de diseño



03. Viviendas aledañas al proyecto alojamientos

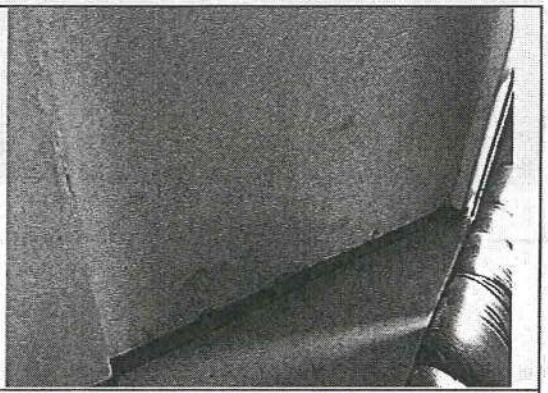

04. Humedades vivienda aledañas proyecto alojamientos

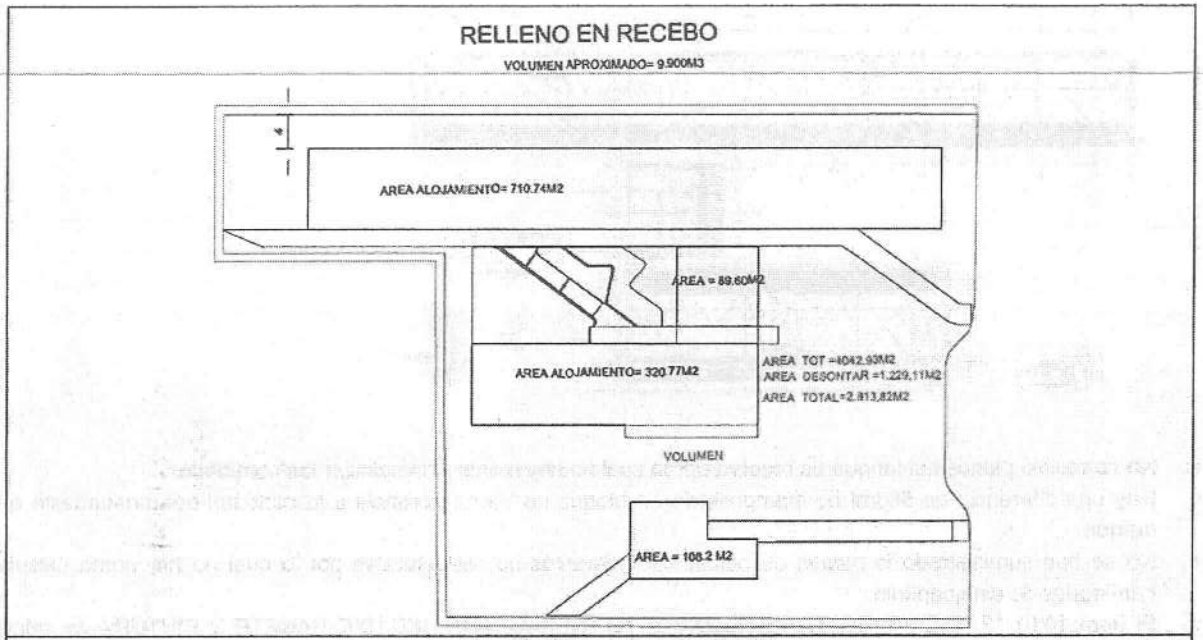

1. **Perfiles cotas de diseño**

Según revisión del profesional de arquitectura, que realiza revisión de la ingeniería de detalle, se tienen las siguientes observaciones:

Planos arquitectónicos:

- En los planos arquitectónicos las referencias no se encuentran relacionadas en convenciones por lo cual se desconoce el significado de las mismas.
- A criterio profesional desde el punto de vista arquitectónico la ventana tipo v-60 que esta sobre todas las fachadas no funciona pues es casi de piso a techo y abre en su totalidad de batiente sin baranda por lo cual es insegura y no tiene un funcionamiento correcto, se debería modificar el diseño de la ventana o añadir una baranda

Presupuesto:

- En el ítem 04.01.14 Cimentación ciclópea son 13,65 m3 y no 11m3 como esta en el presupuesto
- En el ítem 04.01.07 de cimentación nombra vigas de cimentación con unidad de m3 se calcularon 188m3 de vigas principales como parte de la cimentación de los tres Bloques y el ítem contempla tan solo 14m3.
- En el ítem 06.01.11 CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS AÉREAS DE CUBIERTA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) áreas de contorno rojo en la siguiente grafica al parecer hay una diferencia ya que las cantidades reales son aproximadamente 131 m3 mayores que las presupuestadas. En el ítem 06.01.13 CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CUBIERTA ALIGERADA CON ICOPOR INCLUYE RETIRO DE CASETON (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA), se contabiliza como si toda la cubierta fuera placa aligerada, al parecer hay una diferencia de como fue considerada la losa en el presupuesto con respecto a las áreas de este tipo de losa en los planos, siendo únicamente las áreas rellenadas en azul que se observan en la siguiente gráfica.

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

- ¿El diseño requiere o no aprobación por parte del operador de red? En este momento aparentemente el diseño no está aprobado.
- al final del proyecto, se debe coordinar con el operador de red corte de energía para conectar la subestación a la red existente?
- Se debe realizar algún trámite ante la empresa de energía tal como actualización de diseño, recibo de obra, ¿entre otros?
- Definición de Punto especifico de conexión por media tensión.
- Sitio especifico de la subestación.
- Sitio o espacio para construir malla de puesta a tierra (según diseño la malla es de 5 x 12 metros).
- Verificar tipo de celda de medida, ya que en el unifilar aparece celda de medida en Baja tensión, pero en el alcance aparece grupo de medida en media tensión.
- Definir cantidad de maniobras eléctricas en media tensión requeridas para realizar la instalación.
- Especificar si se debe incluir certificación Plena Retie y Retilap.
- Especificar las caracterizaras de la red contra incendios o aclarar si ya hay una existente.
- Dentro de las cantidades del presupuesto, no está incluida la obra civil del cuarto de la subestación. Este se debe definir e incluir.
- El calibre del cable de la acometida de MT en el plano está en # 2 cu AWG, pero en el presupuesto está en 4/0 awg.
- En el presupuesto se contempla celda triplex y celda de protección transformador, pero esta última no se necesitaría ya que la triplex incluye la protección.
- La celda de alojamiento para el transformador no está incluida en el presupuesto.
- El cable de la acometida (2 # 250 mcm x fase + 2 # 250 mcm neutro) de baja tensión esta dimensionado para el 80 % de la carga. Este debería estar como mínimo para el 100 % de la carga del transformador.
- El plano de canalizaciones nombrado en el documento MEMORIAS DE CALCULO TRANSFORMADOR, no aparece dentro de la información recibida.
- No aparece en los planos suministrados ni estudios ni el diseño del Apantallamiento y tampoco está incluido en el presupuesto.
- No hay claridad si el cableado a instalar debe ser libre de halógeno.
- Las mallas del sistema de puesta a tierra no están incluidas en el presupuesto.

Después de realizar un análisis a la situación actual, el contratista plantea la necesidad que se declare un aplazamiento al contrato, mientras se aclaran las dudas que se han venido presentando durante el proceso de preconstrucción y que a la fecha no han sido resueltas; además es necesario que nos suministren toda la información pendiente para poder realizar a dichos temas la correspondiente ingeniería de detalle.

Atentamente,

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

CC Archivo

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

Bogotá, junio 26 de 2018

PN-DIRAF-POPAYAN-026

Señores
DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-
Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Bogotá

DAIMCO
Junio 27- 2018 Hora: 09:00 a.m
Folios:01 Anexos:00
No.Radicado D-2018-1398
Radicado:Maria Londoño 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Referencia: **CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: Respuesta a oficio CPP-DIRAF-2018-009

En relación a su oficio CPP-DIRAF-2018-009 , nos permitimos responder:

1. La Programación de Obra, se envió por correo electrónico el jueves 21 de junio de 2018 al Director de Obra Ing. Tirso Cosme para su revisión y aval.
2. Los APUS de la misma manera se han estado enviando por correo electrónico al Director de Obra, para su revisión y aval.

Atentamente,

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal Suplente
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S – 2018- 015063 / DIRAF - ARCON – 29

Bogotá D. C., 26 JUN 2018

DAIMCO
Junio 27- 2018 Hora: 12:00 p.m
Folios:01 Anexos:02
No.Radicado D-2018-1403
Radicado:Maria Londoño I087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Señor
OMAR RAFAEL PERTUZ RESTREPO
Representante Legal suplente DAIMCO S.A.S.
Calle 44B No. 57A-52 Barrio La Esmeralda
Teléfono: (1) 7020798 7030797 Celular: 3176699287
E-MAIL: opertuz@daimco.com.co ; cespitia@daimcos.com.co ; pguerrero@daimco.com.co
Bogotá. D.C.

Asunto: notificación modificatorio No. 1

De manera atenta me permito remitir al señor Interventor, copia del documento que se relacionan a continuación, correspondiente al modificatorio No.1 del contrato de obra PN DIRAF No. 06–6-10044-18 celebrado entre la POLICÍA NACIONAL y el CONSORCIO BCS-GUTIÉRREZ, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

- Copia minuta

Lo anterior para que en su calidad de Interventor ejerza el control de la obra garantizando el cumplimiento del objeto a través de las funciones gerenciales de: planeación, organización, dirección, evaluación y retroalimentación, así mismo se disponga al acatamiento de las obligaciones de carácter técnico, administrativo, financiero, contable, legal y ambiental entre otros al contrato del asunto.

La Policía Nacional Dirección Administrativa y Financiera, le informa que como interventor le está prohíbo realizar cualquier tipo de modificación al contrato sin los debidos soportes legales, técnicos, financieros, etc., estas circunstancias deberán estar avaladas por el supervisor del contrato de interventoría designado y aprobado por esta Dirección.

En concordancia con los artículos 82, 83, 84, 85 y 86 de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", el interventor dispondrá del seguimiento oportuno al objeto contractual del asunto.

Atentamente,

Mayor **ROCIO CUBILLOS RODRÍGUEZ**
Jefe Área de Contratación

Elaborado por: IT. Héctor Hernán Cuervo
Revisado por: TE. Yuly Katherine Beltrán Gutiérrez
Fecha de elaboración:
Ubicación: Z:\

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos: 5159000 Ext 9816
hector.cuervo@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co

87

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

Bogotá, junio 26 de 2018

PN-DIRAF-POPAYAN-028

DAIMCO
Junio 27- 2018 Hora: 16:00 p.m
Folios:01 Anexos:01
No.Radicado D-2018-1406
Radicado:Maria Londoño 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Señores
DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-
Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Bogotá

Referencia: **CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: Plan de inversión del Anticipo

Enviamos PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO para su revisión y visto bueno.

Atentamente,

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

Anexo No. 3 Actas de comité

ACTA DE REUNIÓN N° 1

DAIMCO

A-P1-F3

FECHA: 13 - Junio - 2018

AREA O PROYECTO: FASE 4 - EDIFICIO D - ALOJAMIENTOS

SOCIOS ☐ CONSULTORIA ☐ OBRA ☒ OTROS ☐

I. PARTICIPANTES

Teniente Andrea Cadena
Ing Tirso Carme.
Ing Eduardo Andres Cepeda
Ing Sandra Lucia Guarin
Ing Julian Mauricio Giraldo
Ing Maria Teresa Ayala
Ing Evelin Guzman Gutierrez.

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

II. OBJETO

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN NRO. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

(La teniente Andrea Cadena solicita)

Scanned by CamScanner

IV. TEMAS TRATADOS

La Teniente Andrea Cadena Supervisora del proyecto manifiesta:
- Realizo el acta de vecindad con modelo propio del contratista o Interventoria y verifico el estado de las viviendas vecinas
- Gestionar la conexion de servicios públicos con registro fotografico de pago anteriores, instalar medidor de agua y energia.

El Ingeniero Julian Giraldo pregunta si el necesario concepto del transformador de 150 kva para el tendido de red media. La Teniente dice que si se puede, sino, buscar alternativa.

El Ingeniero Tirso Cosme pregunta de itens no previstos, la Teniente Andrea dice que se hace con un balance, la Coral Soluciones mediante documento ordenara el gasto.

El Contratista ha radicado observaciones del presupuesto que esta en manos de la Teniente Andrea.

La Teniente Andrea cursara oficio a las directivas de Interventoria, Consultoria solicitando reunion para el dia jueves 21 o viernes 22 de junio.

Se debe tener documento de soporte del detalle para asi ajustar el presupuesto, adjudicando por la policia. Llegado el caso de faltar dinero, se rectificara el presupuesto detallado para modificarlo.

Las modificaciones o alteraciones de vias externas para realizar los trabajos de obra, se debe dejar en su estado inicial, con solicitud de pago para realizarlas.

Scanned by CamScanner

Se debe tener cuidado con los asentamientos que se generen durante la ejecución del proyecto, manifiesta la Teniente Andrea.

La Interventora pregunta sobre los informes, la teniente Andrea dice que se debe subir al SECOP II y en lo posible entregarlo el primero (1) de cada mes a su correo para su respectiva revisión. antes de subirlo al SECOP.

Los comités semanales se deben hacer.

La teniente dice:

- Demoler edificaciones existente, mover contenedores por parte del contratista ya que jungla no lo hará., como también el contratista hará las actividades de adecuación para su nueva ubicación, generandose como item no previsto.
- Aprovechar el estado del clima para realizar las actividades necesarias.

El contratista manifiesta dificultad de ubicar escombrera o sitio de disposición de escombros., la teniente dice hablar con el interventor molina para ubicar material de relleno dentro de las instalaciones.

La Teniente Andrea solicita solo entenderse y que solo ella autorizara y solicitara información u otro requerimiento

La teniente Andrea deja claro que solo se hará la construcción o ejecución del objeto, nada de mantenimientos u otras actividades por fuera del proyecto.

El contratista manifiesta que hace falta documentación en cuanto planos del proyecto.

Scanned by CamScanner

(4)

La Ing. ambiental Evelin manifiesta que la licencia de aprovechamiento forestal ya se venció y para su renovación. se solicita nuevos requerimientos y que la responsabilidad de comando de policía presentar informe a la CRC quien dara su visto bueno la Teniente Andrea quien pide al contratista realizar el cargue del informe de los ingenieros forestales, la Teniente envían copia del contrato del consultores, cédula del Ingeniero Forestal, Presupuesto del proyecto en general, plan de manejo ambiental (presupuesto) costos de mano de obra calificada y no calificada, valores de servicios públicos

La Teniente Andrea solicita solo sacar la licencia correspondiente a lo que se va a ejecutar dentro de la fase IV, solicita también que la compensación forestal se pueda hacer con el paisajismo.

La Ingeniera Ambiental Evelyn del contratista solicita que se debe tener un plan de manejo de RSD.


La Ing Maria Teresa dice que la licencia SSOL de todo el proyecto esta para vencer y para renovarla se debe hacer un pago de un millon con una autorización o poder de la policía a la persona que va a realizarla, más acta de posesión y documentación del R.L de la empresa, en este caso de la policía.

El Contratista manifiesta las preocupaciones de niveles ya que con lo existente de edificaciones nuevas al terreno del proyecto esta por encima 80 cm.
La Teniente solicita verificarlo si se puede dejar el proyecto 30 cm por encima de la topografía o sino molado o cota de diseño


Scanned by CamScanner

El contratista solicita planos del cuarto de bombas y otros detalles a la Teniente Andrea quien pide hacer estas solicitudes por correo. (5)

Se finaliza cerrita 8:40 a.m.

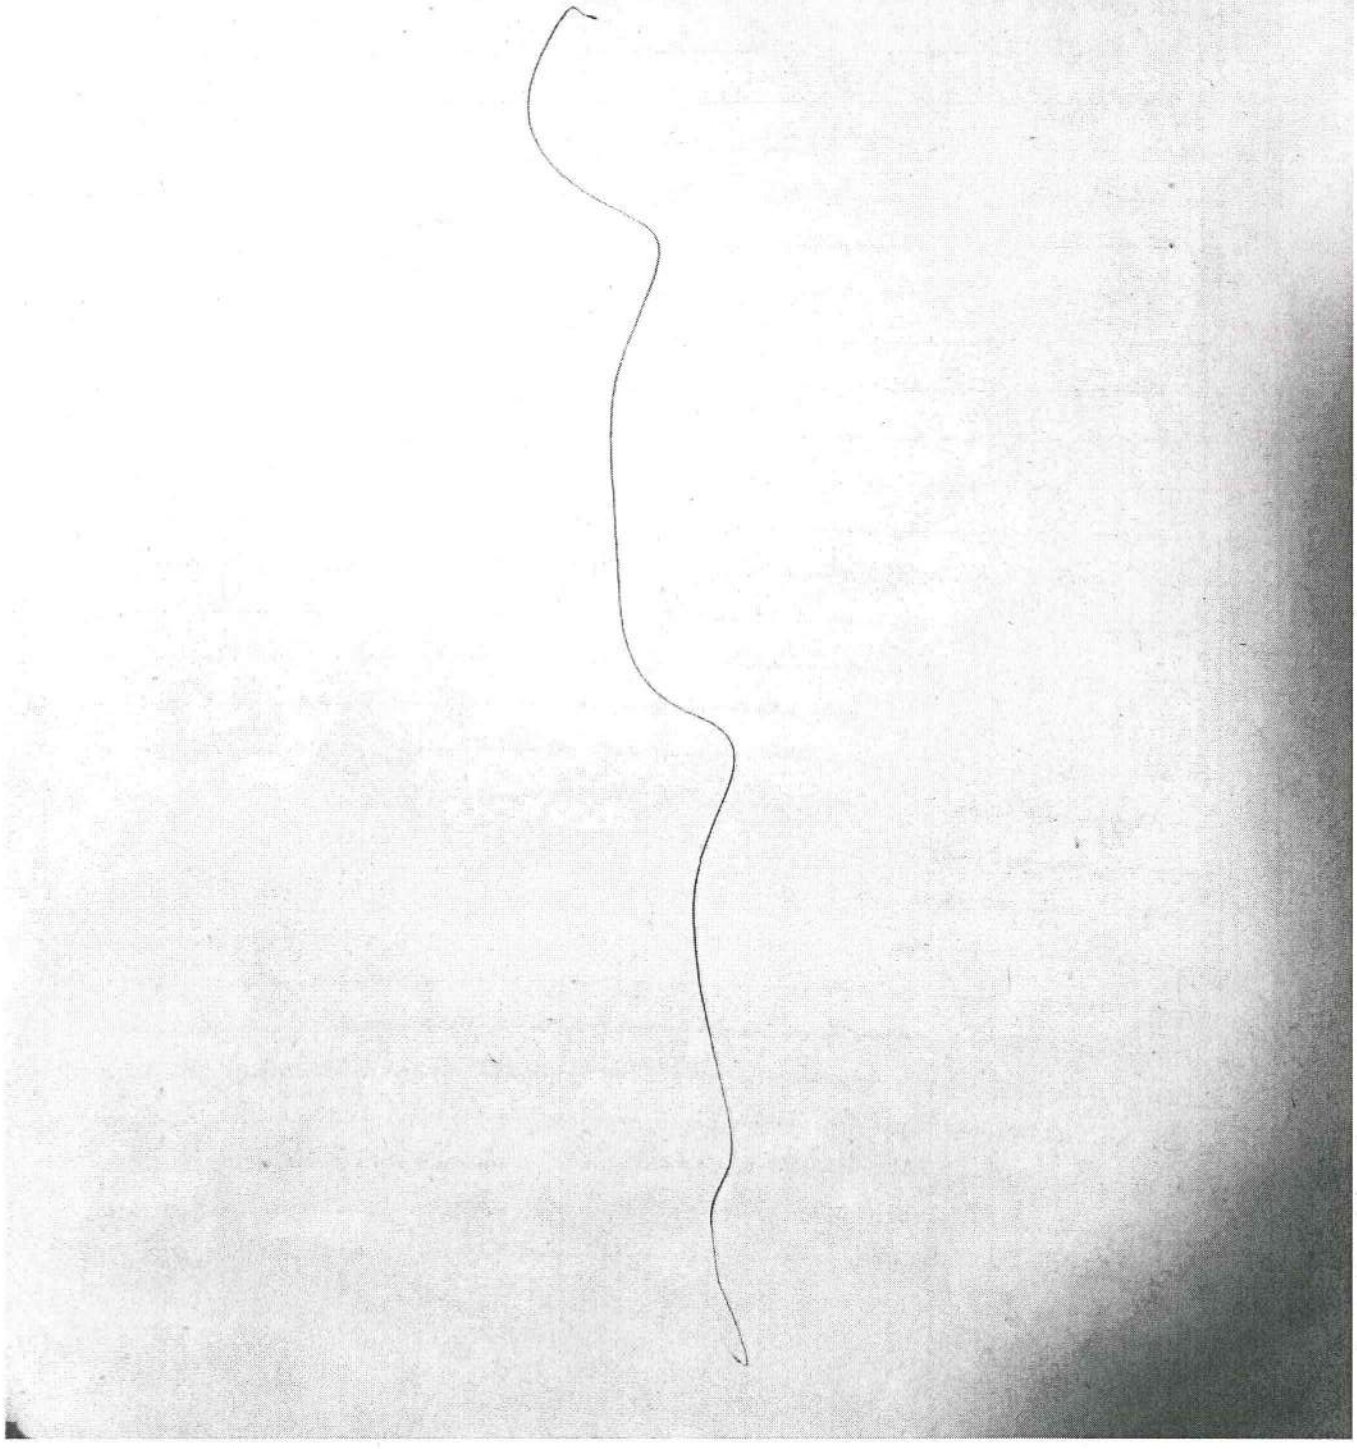

Scanned by CamScanner

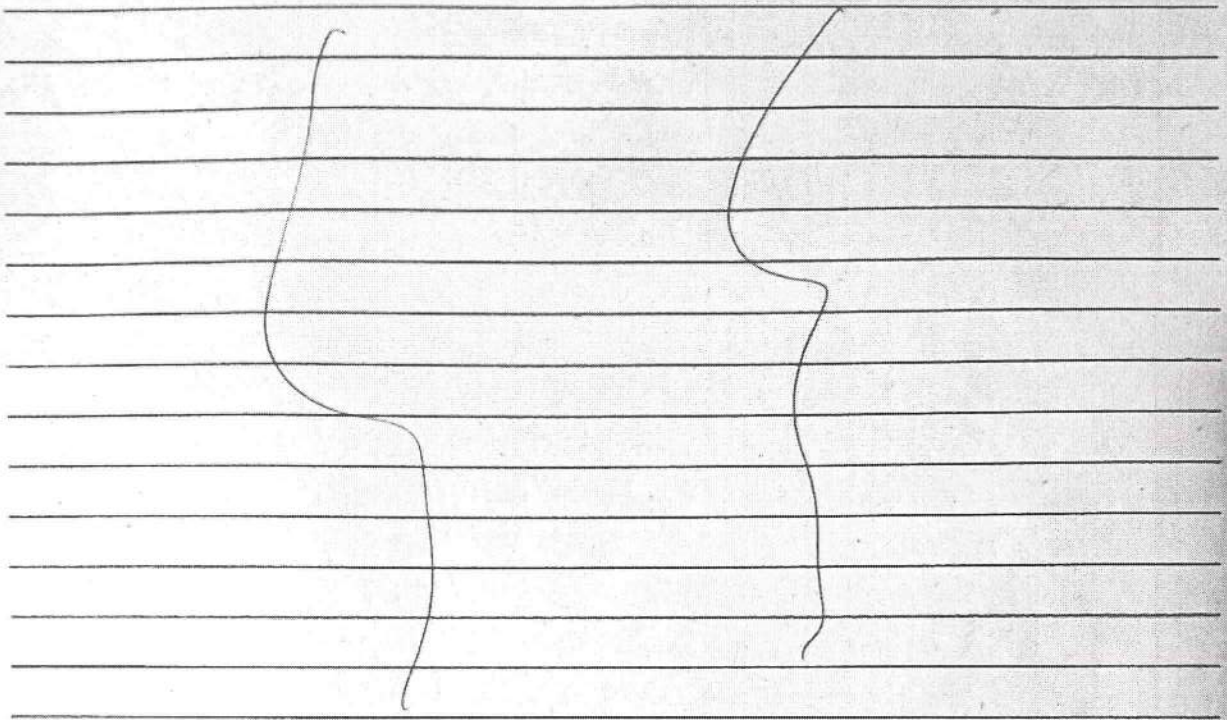

B. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
- El precio APU de traslado de contenedores y sus actividades anexas para su ubicación.	Contratista
- Realizar listado de documentación faltante del proyecto (planos)	Contratista
- Contacto de comunidad, cédula del ingeniero predial, presupuesto del proyecto en general, presupuesto plan de manejo ambiental, costo de mano de obra calificada y no calificada valores de servicios públicos	Triada Andina Cadena

Scanned by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN N° 2

DAIMCO

A-P1-F3

FECHA: 19 de Junio de 2018

AREA O PROYECTO: FASE 4 - EDIFICIO D - ALOJAMIENTOS

SOCIOS ☐ CONSULTORIA ☐ OBRA ☒ OTROS _____ ☐

I. PARTICIPANTES

Ing Juan Vicente Bocanegra
Ing Tirso Coral
Ing Sandra Inés Erazo
Ing Julian Mauricio Giraldo
Ing María Teresa Ojeda
10

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

II. OBJETO

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN NRO. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Scanned by CamScanner

IV. Temas tratados:

- Licencia ambiental no aplica al proyecto sino una autorización o permiso ambiental para ello se necesita una serie de requisitos
  - Contrato y demás documentos del Ingeniero forestal que se le serán solicitados a la DIRAF.
  - Presupuesto general del proyecto

No esta vigente el permiso de aprovechamiento forestal para lo cual el Contratista se pronunciara de manera escrita para hacer la solicitud a la DIRAF con copia a la Interventora

La Interventora solicita que toda solicitud por parte del Contratista se haga por escrito y no solo por correo electrónico

Se hace la consulta el tema del descapote, ya que el Contratista dice que según estudio de suelo contempla 20 cm de descapote pero según aforo en el estudio de suelos aparece un promedio de 0.80 cm

Se requiere solicito nuevamente los poderes a la teniente Andrea para la licencia de construcción que se vence el 22 de Julio pero se debe hacer un mes antes

Scanned by CamScanner

DAIMCO
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

ACTA DE SEGUIMIENTO INT-24:00

26	6	18
DD	MM	AA

CONTRATO No. Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18 "Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

ACTA No

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Jose V Bocanegra (DAIMCO SAS)	
Diego Esteban Lopez Lodwi	
Ing. MARIA TERESA OJEDA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ	
Arq. Rodrigo Becerra Mora Consorcio BCS-GUTIERREZ	
Aurelio Gutierrez Sanchez	
AURELIO GUTIERREZ JAIMES	
Alberto Cárdenas Mantilla	
PABLO ANDRES CUROS B.	
Victor Bocanegra B. - Daimco	
Te. Andrea Carolina Cadena Lemus	

II. OBJETO DEL CONTRATO

Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18 "Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

ACTA DE SEGUIMIENTO INT-24:00

26	06	18
DD	MM	AA

CONTRATO No. Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18 "Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

ACTA No

IV. TEMAS TRATADOS

*El consultor de estudios y diseños aclara que esta dispuesto a atender todas las solicitudes que se realicen por parte de la interventoria y el contratista de obra, con el fin de cumplir con el desarrollo de la Fase 4.

*La teniente andrea cadena Manifiesta que el señor sub Intendente aden rubio profesional electrico de la Entidad, nos apoyara con todo lo relacionado con el componente electrico.

*La policia nacional solicita revisar detalladamente las actividades de hierros y concretos para la ejecucion del proyecto

*La Interventoria solicita Uformacion sobre los Niveles de la Fase 4.

-El Consultor se compromete a revisar el proyecto, a fin de dar claridad con relacion a los Niveles del proyecto, por otra parte uforma que el proyecto contempla filtros a fin de Mitigar la posibilidad de Inundacion.

-Se manifesta por parte del contratista la preocupacion. una vez se de Inicio a las actividades

26	6	18
DD	MM	AA

CONTRATO No. Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18 "Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

ACTA No

la cercanía de dos cabañas al proyecto, las cuales pueden correr el riesgo de emerger de rotura, o debilitamiento estructural.

*~~La interventoría expone al contratista que no es viable realizar la suspensión del contrato, teniendo en cuenta que el contrato contempla 30 días para realizar la Ingeniería de detalle, para lo cual nos encontramos dentro de los tiempos y contamos con el mismo para cumplir con las actividades de demolición de placas en terreno.~~

*La interventoría y el contratista de obra solicita al consultor de estudios y diseños allegar la planimetría de detalle de elementos no estructurales.

*La interventoría solicita al consultor de estudios y diseños programar reunión con geotecnista en fin de discutir las observaciones encontradas al componente en geotecnia.

*La policía solicita a la interventoría entregar informe respecto al alcance de la red contraincendio.

DIMCO
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

ACTA DE SEGUIMIENTO INT-24:00

26	6	18
DD	MM	AA

CONTRATO No. Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18 "Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

ACTA No

*Se debe Verificar la ubicacion del pase para el llenado del tanque de agua potable, lo anterior con relacion al pase que se encuentra actualmente en obra.

*La Interventoria remite las observaciones emitidas al componente estructural a traves del documento GDI-2018-186.

*El contratista y la interventoria solicita al consultor de estudios y diseños dar claridad con relacion a la necesidad de implementar red de gas en la ejecucion de la Fase 4.

*Se debe revisar el diametro de la tuberia de la red de gas por parte del consultor de Estudios y diseños.

*La interventoria remitira la revision del componente hidraulico a la Diraf y al contratista de obra

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

ACTA DE SEGUIMIENTO INT-24:00

26	6	18
DD	MM	AA

CONTRATO No. Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18 "Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

ACTA No

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

ACTA DE SEGUIMIENTO INT-24:00

26	6	18
DD	MM	AA

CONTRATO No. Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18 "Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

ACTA No

V. DECISIONES TOMADAS

VI. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA ____ ____ ____

DIA MES AÑO

Nombre, Cargo y Firma del Responsable

Fecha de Aprobación de Formato INT-24:00, 30 de Abril de 2015

(1)

ACTA DE REUNIÓN N° 3

DAIMCO

FECHA: 28- Junio 2 2018 | A-P1-F3

AREA O PROYECTO: FASE 4 - EDIFICIO D - ALOJAMIENTOS

SOCIOS ☐ CONSULTORIA ☐ OBRA ☐ OTROS _____ ☐

I. PARTICIPANTES	CARGO
Ing Tirso Corne	Director Interventoría
Ing Sandra Lucía Gaviria	Residente Interventoría
Ing. Julian Mauricio Giraldo	Director Obra
Ing María Teresa Ojeda	Residente Obra
Teniente Andres Cadena	Supervisora Proyecto Fase 4
~~(Ing) (FISA)~~ Ing Fabio Andres Clavijo	Ing electrico Contratista
~~(Ing)~~. SJ Adan Rubio	Subintendente

II. OBJETO

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN NRO. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

- Acta recibida
- Conexion de servicios Publicos
- Posible conexion al Transformador de 150 KVA
- Traslado y Reubicacion de los contenedores
- Planos pendientes en obra del proyecto.
- Licencia de aprovechamiento forestal
- Licencia de construccion (renovacion)

Scanned by CamScanner

IV. TEMAS TRATADOS

Se realizo el recorrido electrico desde la subestacion cuarto electrico del Edificio 6 hasta la caja electrica ubicada en el lote a interconectar dentro de la fase 4, con resultado de 2 cajas CS 275 y una caja CS 276 norma cadena incluyendo construccion un banco de ducto ~~#~~ 4 DE Ø 6" reubicando el cuarto electrico, entre el área del costado norte del casino del proyecto.

Se analizara la carga de la planta electrica para determinar su potencia.

Se hara consulta de tendido de red de gas segun proyecto. si se justifica su instalacion y se dará manejo a ductos. (Se estudiara)

Se dejara solida electrica para duchas electricas con un estimativo de 59 duchas y 6 lavadoras

Se hará un redimensionamiento del TGA (Tablero general de acometidas)

La puesta a Tierra se ubicará conjuntamente con el cuarto electrico.

La Tecnista solicita verificar planos de diseño de gas, verificar posible reubicacion de los tanques de almacenamiento sin afectar los árboles. El Contratista propone correr 3 ml el proyecto hacia la punta del aeropuerto y ubicar el tanque de tal forma que se talen los árboles que estan en la ubicacion del tanque y evitar que el proyecto este tan cerca a las cabañas.

Scanned by CamScanner

Verificar el item de instalación provisional de energía si se ajusta o no. durante la ejecución del proyecto.


La Supervisora solicita ver el tema de señalización externa.

La supervisora informa que el tema de Domótica y cableado estructural no se ejecuta dentro del proyecto


La supervisora Teniente Andrea, dice que no ha recibido APU's contratados y Cronograma según contrato.

Para la licencia de aprovechamiento forestal se gestionará con el presupuesto de fase 4. y la Teniente Andrea solicita que la Ingeniera Ambiental entregue todo el diligenciamiento de la licencia.

Se Anexa copia de ubicación de cajas de distribución red eléctrica.

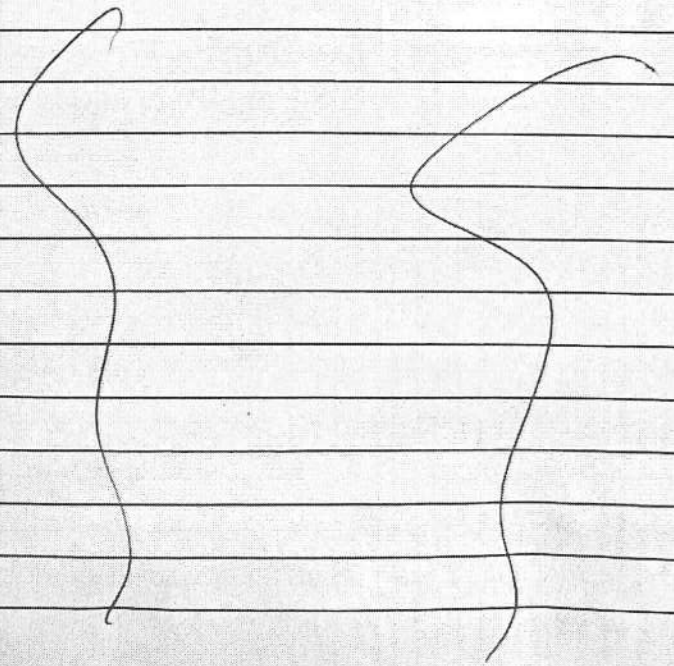

Scanned by CamScanner

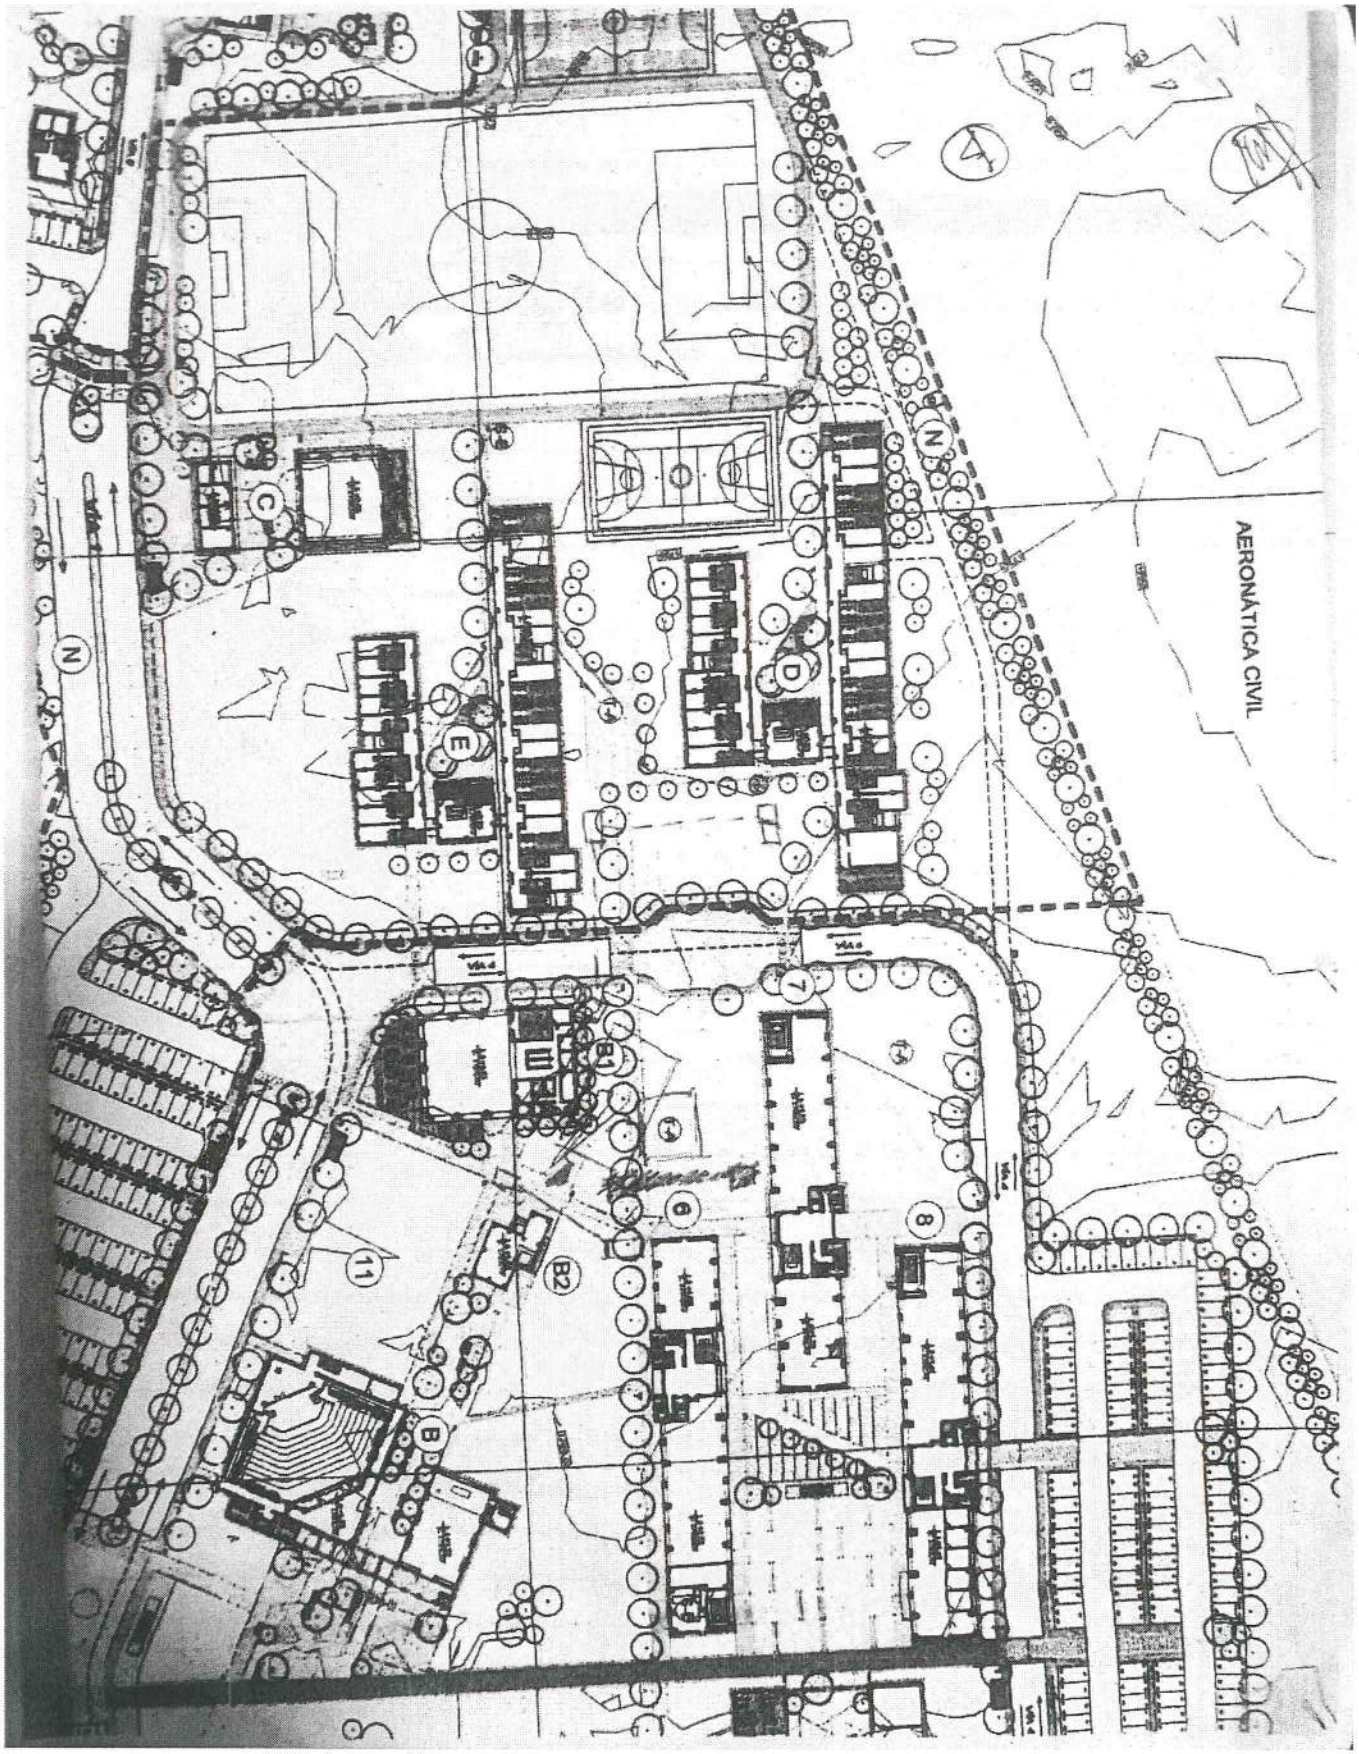


Scanned by CamScanner

(5)

A. DECISIONES TOMADAS

Realizar cuarto de frio hacia el área este del norte del campo del Proyecto para Y, (decisión por falta de supervisión)

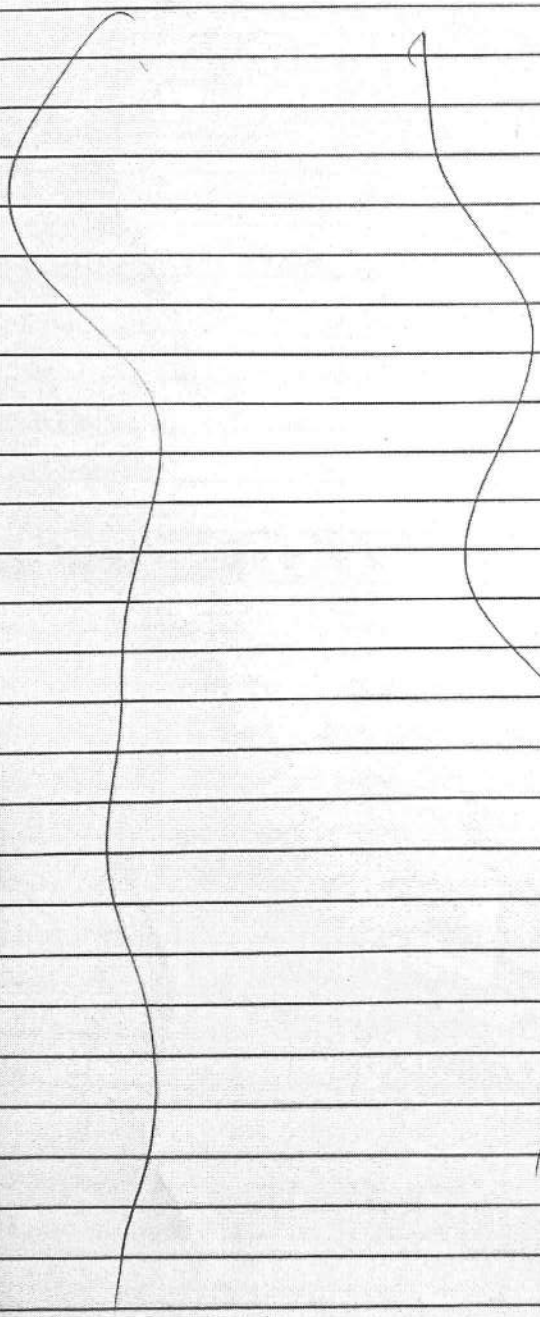

Scanned by CamScanner

Anexo No. 4 Plan de Anticipo

fiduciaria popular

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
NIT. 800.141.235-0

CERTIFICA:

Que el veintiséis (26) de junio de dos mil dieciocho (2018), se suscribió el contrato de Fiducia Mercantil entre el Fideicomitente – **CONSORCIO BCS-GUTIÉRREZ** y **FIDUCIARIA POPULAR S.A**; para el manejo de los recursos del anticipo del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PN DIRAF N° 06–6–10044-18** suscrito el dieciocho (18) de mayo de dos mil dieciocho (2018), entre **LA POLICIA NACIONAL** y **EL CONSORCIO BCS-GUTIÉRREZ** cuyo objeto consiste en "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Que los recursos objeto del contrato fiduciario, deben abonarse en la cuenta del Fideicomiso que relacionamos a continuación;

Cuenta de ahorros No. 220-050-11979-1 del Banco Popular.

A nombre de la cartera colectiva abierta Fiduliquidez con nit 900.247.285-8.

Agradecemos remitirnos el soporte de la consignación de los recursos del anticipo para su correspondiente contabilización en la cuenta del **PATRIMONIO AUTÓNOMO CONSORCIO BCS-GUTIÉRREZ** al correo gabriel.cely@fidupopular.com.co; camilo.delgado@fidupopular.com.co; lizeth.diaz@fidupopular.com.co

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los veintiséis (26) días del mes de junio de dos mil dieciocho (2018).

Cordialmente,

LEONARDO FABIO RAMIREZ MORALES
Vicepresidente comercial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ISO 9001 icontec

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO		Página
		1de1

PROGRAMACIÓN INICIAL	FECHA	27-jun-18
REPROGRAMACIÓN	FECHA	
CONTRATO No.	PN DIRAF 06-6-10044-18	
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 9.250.463.250,08
CONTRATISTA	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ	
INTERVENTOR	DAIMCO SAS	
PLAZO	Hasta el 15 de Diciembre de 2018	
VALOR ANTICIPO		$ 1.850.092.650,02

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 555.027.795,01	30,00%
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 980.549.104,51	53,00%
3	Transporte y retiro de escombros	$ 185.009.265,00	10,00%
4	Descuentosy retenciones	$ 129.506.485,50	7,00%
TOTAL		$ 1.850.092.650,02	100,00%

Nota:

a) Plazo en dias para la inversión del anticipo 150 dias.

Para constancia de lo anterior, se firma y aprueba el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los ventisiete (27) dias del mes de Junio de 2018

TE ANDREA CAROLINA CADENA LEMUS
Supervisora de Contrato
POLICIA NACIONAL-DIRAF

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO
Representante Legal
DAIMCO SAS
INTERVENTORIA

Anexo No. 5 Seguridad Social

Contrato de Obra

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) **EVELYN ANDREA GUZMAN GUTIERREZ**, identificado(a) con Cédula de Ciudadania **1,105,681,936**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 13 días del mes de Junio de 2018.

Gerente de Clientes

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) **JULIAN MAURICIO GIRALDO LOPEZ**, identificado(a) con Cédula de Ciudadania **15,908,656**, se encuentra afiliado(a) al **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR Y AL FONDO DE CESANTIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 13 días del mes de Junio de 2018.

Gerente de Clientes


porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) **MARIA FERNANDA BENAVIDES BELTRAN**, identificado(a) con Cédula de Ciudadania **34,315,134**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 13 días del mes de Junio de 2018.



Gerente de Clientes

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) **MARIA TERESA OJEDA CABRERA**, identificado(a) con Cédula de Ciudadania **34,555,320**, se encuentra afiliado(a) al **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR Y AL FONDO DE CESANTIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 13 días del mes de Junio de 2018.

Gerente de Clientes

ARL | sura

Medellín, 05 de Junio de 2018

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la circular externa 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera (título VI, numeral 1.5, literal g), se expide la presente constancia de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales.

Nombre o razón	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
Cédula de ciudadanía o Nit	N901177394
Fecha inicio de vigencia	06/06/2018 00:00:00
Fecha fin de vigencia	AFILIADA
Estado	POR INICIAR COBERTURA
Número de centros de trabajo	1
Número de afiliados dependientes	0
Número de afiliados independientes	0
Código de actividad principal	5451201
Clase de riesgo 5	Tasa de riesgo 6.96%

ACTIVIDAD ECONÓMICA: TRABAJOS DE PREPARACION DE TERRENOS PARA OBRAS CIVILES

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C340014501815641801

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A

Dirección IP: 190.24.125.82,

118

EPS | sura ARL | sura

Medellín, 05 de Junio de 2018

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO BCS-GUTIERREZ que se encuentra POR INICIAR COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL DC	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96%
C1105681936	GUZMAN GUTIERREZ EVELYN ANDREA	06/06/2018		220wu220

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C1105681936181568040 9

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 05/06/2018 22:20:09 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.53.186.22, 172.16.42.236

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 05 de Junio de 2018

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO BCS-GUTIERREZ que se encuentra POR INICIAR COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL DC, clase de riesgo 5, porcentaje de cotización 6.96%.

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin vigencia	Código de transacción	Fecha de proceso
C15908656	JULIAN MAURICIO GIRALDO LOPEZ	06/06/2018		14919121	05/06/2018 11:43:00

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C340014501815642754

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Dirección IP: 190.24.125.82, 172.16.42.236

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 05 de Junio de 2018

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO BCS-GUTIERREZ que se encuentra POR INICIAR COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL DC, clase de riesgo 5, porcentaje de cotización 6.96%.

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin vigencia	Código de transacción	Fecha de proceso
C34555320	MARIA TERESA OJEDA CABRERA	06/06/2018		146zo642	05/06/2018 11:46:47

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C340014501815642754

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Dirección IP: 190.24.125.82, 172.16.42.236

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 05 de Junio de 2018

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO BCS-GUTIERREZ que se encuentra POR INICIAR COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL DC, clase de riesgo 5, porcentaje de cotización 6.96%.

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin vigencia	Código de transacción	Fecha de proceso
C1105681936	EVELYN ANDREA GUZMAN GUTIERREZ	06/06/2018		220wu220	05/06/2018 11:50:00

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C340014501815642754

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Dirección IP: 190.24.125.82, 172.16.42.236

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

10

ARL | sura

Medellín, 05 de Junio de 2018

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO BCS-GUTIERREZ que se encuentra POR INICIAR COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL DC, clase de riesgo 5, porcentaje de cotización 6.96%.

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin vigencia	Código de transacción	Fecha de proceso
C34315134	MARIA FERNANDA BENAVIDES BELTRAN	06/06/2018		23419720	05/06/2018 11:51:10

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C340014501815642754

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Dirección IP: 190.24.125.82, 172.16.42.236

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EPS | sura

ARL | sura

Medellín, 05 de Junio de 2018

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO BCS-GUTIERREZ que se encuentra POR INICIAR COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL DC	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96%
C34315134	BENAVIDES BELTRAN MARIA FERNANDA	06/06/2018		23419720

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C343151341815680961

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 05/06/2018 22:29:21 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.53.186.22, 172.16.42.236

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EPS | sura ARL | sura

Medellín, 05 de Junio de 2018

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO BCS-GUTIERREZ que se encuentra POR INICIAR COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL DC	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96%
C34555320	OJEDA CABRERA MARIA TERESA	06/06/2018		146zo642

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C345553201815680865

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 05/06/2018 22:27:45 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.53.186.22, 172.16.42.236

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CAUCA
comfacauca
al servicio del trabajador y su familia

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL SUBSIDIO FAMILIAR

NIT. 891.500.182-0

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO AÑO 2018 MES 06 DIA 13

Diligencie este formulario en letra imprenta y tinta color negro

No. 811323

SOLICITUD INSCRIPCIÓN
- [X] INGRESO
- [ ] REINGRESO
- [ ] MODIFICACIÓN INSCRIPCIÓN

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN

TRABAJADOR DEPENDIENTE
- [ ] SUBSIDIO FAMILIAR MONETARIO
- [X] SUBSIDIO FAMILIAR EN SERVICIOS
- [ ] TRABAJADOR (A) SERVICIO DOMÉSTICO
- [ ] MADRES COMUNITARIAS

RÉGIMEN DE AFILIACIÓN VOLUNTARIA (ART.19 LEY 789/02)
- [ ] TRABAJADOR INDEPENDIENTE
- [ ] AFILIACIÓN VOLUNTARIOS 0,6%
- [ ] AFILIACIÓN FACULTATIVOS 2%
- [ ] PENSIONADOS POR FIDELIDAD
- [ ] PENSIONADOS 1.5 % SMLMV
- [ ] PENSIONADOS + 1.5% SMLMV

PARTE A — INFORMACION DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (Como figura en el RUT)	NIT [X] C.C [ ] T.I [ ] C.E [ ] PAS [ ]	DV
Consorcio BCE-Cotenez	No. 901178204	5

PARTE B — INFORMACION DEL TRABAJADOR (A)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO AÑO	MES	DIA	GÉNERO F	M
Guzman	Gutierrez	Evelyn	Andrea	1991	6	3	[X]	[ ]

C.C [X] T.I [ ] C.E [ ] PAS [ ] No. 1085261926 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN Popayan

ESTADO CIVIL: SOLTERO [X] CASADO [ ] (VIUDO [ ] UNIÓN LIBRE [ ] SEPARADO [ ] DIVORCIADO [ ])

SECTOR: URBANO [X] RURAL [ ]

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA / BARRIO / VEREDA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	PAIS	TEL	E-MAIL
Calle 2 # 2-28 El Cardillal	Popayán	Cauca	Colombia	3102973357	

INFORMACIÓN LABORAL

MUNICIPIO DONDE LABORA	FECHA DE INGRESO A SU EMPRESA AÑO	MES	DIA	CARGO QUE DESEMPEÑA	HORAS LABORADAS AL MES	SALARIO BÁSICO	COMISIONES	OTROS FACT	TOTAL DEVENGADO	JEFE DE HOGAR
Popayán	2018	06	05	Residente SST	192	2.000.000			2.000.000	SI [X] NO [ ]

TRABAJADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO SI [ ] NO [X]

ACTIVIDAD DESEMPEÑADA EN EL SECTOR AGROPECUARIO: AGRICULTURA [ ] SILVICULTURA [ ] GANADERÍA [ ] PESCA [ ] AVICULTURA [ ] APICULTURA [ ]

PARTE C — INFORMACION DEL (A) CONYUGE Y/O COMPAÑERO (A) ACTUAL

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO AÑO	MES	DIA	CONVIVEN SI [ ] NO [ ]

C.C [ ] T.I [ ] C.E [ ] PAS [ ] No. FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

TIPO DE RELACIÓN: CONYUGE [ ] COMPAÑERA(O) [ ]

OCUPACIÓN: HOGAR [ ] EMPLEADO [ ] INDEPENDIENTE [ ] PENSIONADO [ ] SIN EMPLEO [ ]

EMPRESA DONDE LABORA	NIT.	SUBSIDIO SI [ ] NO [ ]	POR CUAL CAJA RECIBE SUBSIDIO

PARTE D — DATOS DEL PADRE O MADRE BIOLOGICO (A) DE LOS HIJOS A INSCRIBIR QUE NO CONVIVE CON EL TRABAJADOR (A)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO AÑO	MES	DIA

C.C [ ] T.I [ ] C.E [ ] PAS [ ] No. FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

OCUPACIÓN: HOGAR [ ] EMPLEADO [ ] INDEPENDIENTE [ ] PENSIONADO [ ] SIN EMPLEO [ ]

EMPRESA DONDE LABORA	NIT.	SUBSIDIO SI [ ] NO [ ]	POR CUAL CAJA RECIBE SUBSIDIO

PARTE E — INFORMACION DE LAS PERSONAS A CARGO DEL TRABAJADOR (A)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO AÑO	MES	DIA	GENERO F	M	C.T. T. PARENTESCO DISC	HIJO	PDRE	HMNO	HJTR	IDENTIFICACIÓN C.C. T.I. C.E. PAS-REGISTRO CIVIL/NUIP Tipo	Número y fecha de expedición	USO EXCLUSIVO C.C.F.C. N/A

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CAUCA
comfacauca
Al Servicio del trabajador y su Familia

RELACIONA BENEFICIARIOS, NO ANEXA DOCUMENTOS PARA LA AFILIACIÓN.

2018-06-13

Auxiliar:
SUBSIDIO FAMILIAR

DISC: DISCAPACITADO HIJO: HIJO PDRE: PADRE HMNO: HERMANO HJTR: HIJASTRO

DECLARACIÓN: Declaramos que la información suministrada en el presente formulario es verdadera, cuenta con los soportes probatorios correspondientes y podrá ser verificada en cualquier momento por parte de la Caja de Compensación Familiar del Cauca COMFACAUCA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 21 de 1982. En el evento que la información suministrada cambie, me comprometo a reportar modificación de los datos a mas tardar el día 10 del mes siguiente de ocurrida la novedad. El suministro de datos falsos por parte del empleador, a la Caja o la violación de la norma sobre salarios mínimos, es causal de desafiliación según artículo 45 de la Ley 21 de 1982.

Conforme a lo establecido en la ley 1581 del 2012 y demás Decretos reglamentarios, autorizo a la Caja de Compensación Familiar del Cauca, COMFACAUCA, para el tratamiento y manejo de mis datos personales consignados en el presente formulario, el cual consiste en recolectar, almacenar, depurar, usar, analizar, circular y cruzar información propia, con el fin de facilitar la prestación de servicios, pago de cuotas monetarias, ejercer las gestiones de cobro, reportar a centrales de riesgo cuando corresponda y en general todas las acciones que se deriven de los servicios que de conformidad con la Ley presta esta Caja de Compensación Familiar. Declaro que soy responsable de la veracidad de mis datos suministrados. Así mismo autorizo a la Caja de Compensación Familiar del Cauca COMFACAUCA, a efectuar sus procedimientos de notificación y comunicación a la dirección de correspondencia y o correo electrónico antes mencionados. Declaro que he sido informado de los derechos que me asisten como titular de la identificación, dirección y teléfono del responsable del tratamiento de mis datos de conformidad con la ley 1581 del 2012 y sus decretos reglamentarios. La Caja garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos.

ESPACIO PARA RADICACIÓN COMFACAUCA
JUN 13 P 3:41

FIRMA DEL TRABAJADOR (A) C.C. 1085681936

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

OBSERVACIONES:

RECIBE	DIGITA	REVISA	DIGITALIZA
NOMBRE 13 JUN 2018	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
LUCEIDE ORDOÑEZ Asesor Subsidio Familiar	FECHA	FECHA	FECHA

PÁGINA 1

Scanned by CamScanner

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CAUCA
comfacauca
al servicio del trabajador y su familia

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL SUBSIDIO FAMILIAR

NIT. 891.500.192-0

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO AÑO 2018 MES 06 DÍA 13

Diligencie este formulario en letra imprenta y tinta color negro

No. 811322

SOLICITUD INSCRIPCIÓN
- [X] INGRESO
- [ ] REINGRESO
- [ ] MODIFICACIÓN INSCRIPCIÓN

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN

TRABAJADOR DEPENDIENTE
- [ ] SUBSIDIO FAMILIAR MONETARIO
- [X] SUBSIDIO FAMILIAR EN SERVICIOS
- [ ] TRABAJADOR (A) SERVICIO DOMÉSTICO
- [ ] MADRES COMUNITARIAS

RÉGIMEN DE AFILIACIÓN VOLUNTARIA (ART.19 LEY 789/02)
- [ ] TRABAJADOR INDEPENDIENTE
- [ ] AFILIACIÓN VOLUNTARIOS 0,6%
- [ ] AFILIACIÓN FACULTATIVOS 2%
- [ ] PENSIONADOS POR FIDELIDAD
- [ ] PENSIONADOS 1,5 % SMLMV
- [ ] PENSIONADOS > 1,5% SMLMV

PARTE A — INFORMACION DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (Como figura en el RUT): Consorcio BCS-Gutierrez

NIT [ ] C.C [ ] T.I [ ] C.E [ ] PAS [ ] No. 901177394-5 DV

PARTE B — INFORMACION DEL TRABAJADOR (A)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO AÑO	MES	DÍA	GÉNERO F	M
Grajales	Lopez	Julian	Mateo	1967	11	15	[ ]	[X]

C.C [X] T.I [ ] C.E [ ] PAS [ ] No. 16.216.552 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN: 25-MAR-1987 Popayan

ESTADO CIVIL: SOLTERO [X] (VIUDO [ ] UNIÓN LIBRE [ ] SEPARADO [ ] DIVORCIADO [ ]) CASADO [ ]

SECTOR: URBANO [X] RURAL [ ]

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA / BARRIO / VEREDA: Carrera 6 N #16N-52 Apto 204 Edificio Montana

MUNICIPIO: Popayan | DEPARTAMENTO: Cauca | PAIS: Colombia | TEL: 3116431046 | E-MAIL:

INFORMACIÓN LABORAL

MUNICIPIO DONDE LABORA	FECHA DE INGRESO A SU EMPRESA AÑO	MES	DÍA	CARGO QUE DESEMPEÑA	HORAS LABORADAS AL MES	SALARIO BÁSICO	JEFE DE HOGAR
Popayan	2015	06	05	Director de obra	192	5.000.000	SI [X] NO [ ]

COMISIONES: | OTROS FACT: | TOTAL DEVENGADO: 5.000.000

TRABAJADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO: SI [ ] NO [X]

ACTIVIDAD DESEMPEÑADA EN EL SECTOR AGROPECUARIO: AGRICULTURA [ ] SILVICULTURA [ ] GANADERÍA [ ] PESCA [ ] AVICULTURA [ ] APICULTURA [ ]

PARTE C — INFORMACIÓN DEL (A) CONYUGE Y/O COMPAÑERO (A) ACTUAL

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO AÑO	MES	DÍA	CONVIVEN SI	NO
							[ ]	[ ]

C.C [ ] T.I [ ] C.E [ ] PAS [ ] No. FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

TIPO DE RELACIÓN: CÓNYUGE [ ] COMPAÑERA(O) [ ]

OCUPACIÓN: HOGAR [ ] EMPLEADO [ ] INDEPENDIENTE [ ] PENSIONADO [ ] SIN EMPLEO [ ]

EMPRESA DONDE LABORA: | NIT: | SUBSIDIO SI [ ] NO [ ] | POR CUAL CAJA RECIBE SUBSIDIO:

PARTE D — DATOS DEL PADRE O MADRE BIOLÓGICO (A) DE LOS HIJOS A INSCRIBIR QUE NO CONVIVE CON EL TRABAJADOR (A)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO AÑO	MES	DÍA

C.C [ ] T.I [ ] C.E [ ] PAS [ ] No. FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

OCUPACIÓN: HOGAR [ ] EMPLEADO [ ] INDEPENDIENTE [ ] PENSIONADO [ ] SIN EMPLEO [ ]

EMPRESA DONDE LABORA: | NIT: | SUBSIDIO SI [ ] NO [ ] | POR CUAL CAJA RECIBE SUBSIDIO:

PARTE E — INFORMACION DE LAS PERSONAS A CARGO DEL TRABAJADOR (A)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO AÑO	MES	DÍA	GÉNERO F	M	T. PARENTESCO D	H	P	H	H	IDENTIFICACIÓN Tipo	Número y fecha de expedición	USO EXCLUSIVO C.C.F.C N/A

DISC: DISCAPACITADO HIJO: HIJO PDRE: PADRE HMNO: HERMANO HJTR: HIJASTRO

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CAUCA comfacauca Al Servicio del trabajador y su Familia

NO RELACIONA BENEFICIARIOS, NO ANEXA DOCUMENTOS PARA LA AFILIACIÓN.

2018-06-13

Auxiliar: SUBSIDIO FAMILIAR

DECLARACIÓN: Declaramos que la información suministrada en el presente formulario es verdadera, cuenta con los soportes probatorios correspondientes y podrá ser verificada en cualquier momento por parte de la Caja de Compensación Familiar del Cauca COMFACAUCA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 21 de 1982. En el evento que la información suministrada cambie, me comprometo a reportar modificación de los datos a más tardar el día 10 del mes siguiente de ocurrida la novedad. El suministro de datos falsos por parte del empleador, a la Caja o la violación de la norma sobre salarios mínimos, es causal de desafiliación según artículo 45 de la Ley 21 de 1982.

Conforme a lo establecido en la ley 1581del 2012 y demás Decretos reglamentarios, autorizo a la Caja de Compensación Familiar del Cauca, COMFACAUCA, para el tratamiento y manejo de mis datos personales consignados en el presente formulario, el cual consiste en recolectar, almacenar, depurar, usar, analizar, circular y cruzar información propia, con el fin de facilitar la prestación de servicios, pago de cuotas monetarias, ejercer las gestiones de cobro, reportar a centrales de riesgo cuando corresponda y en general todas las acciones que se deriven de los servicios que de conformidad con la Ley presta esta Caja de Compensación Familiar. Declaro que soy responsable de la veracidad de mis datos suministrados. Así mismo autorizo a la Caja de Compensación Familiar del Cauca COMFACAUCA, a efectuar sus procedimientos de notificación y comunicación a la dirección de correspondencia y /o correo electrónico antes mencionados. Declaro que he sido informado de los derechos que me asisten como titular de la identificación, dirección y teléfono del responsable del tratamiento de mis datos de conformidad con la ley 1581 del 2012 y sus decretos reglamentarios. La Caja garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos.

ESPACIO PARA RADICACIÓN COMFACAUCA
18 JUN 13 P 3:41
comfacauca

FIRMA DEL TRABAJADOR (A) C.C 16.216.552

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

OBSERVACIONES:

comfacauca

RECIBE	DIGITA	REVISA	DIGITALIZA
NOMBRE: 13 JUN 2018	NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
LUCEIDE ORDOÑEZ Auxiliar Subsidio Familiar	FECHA:	FECHA:	FECHA:

PÁGINA 1

Scanned by CamScanner

177

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CAUCA
comfacauca
al servicio del trabajador y su familia

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL SUBSIDIO FAMILIAR

NIT. 891.500.182-0

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: AÑO 2018 MES 06 DÍA 10

Diligencie este formulario en letra imprenta y tinta color negro

No. 811325

SOLICITUD INSCRIPCIÓN
- [X] INGRESO
- [ ] REINGRESO
- [ ] MODIFICACIÓN INSCRIPCIÓN

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN

TRABAJADOR DEPENDIENTE:
- [ ] SUBSIDIO FAMILIAR MONETARIO
- [X] SUBSIDIO FAMILIAR EN SERVICIOS
- [ ] TRABAJADOR (A) SERVICIO DOMÉSTICO
- [ ] MADRES COMUNITARIAS

RÉGIMEN DE AFILIACIÓN VOLUNTARIA (ART.19 LEY 789/02)
- [ ] TRABAJADOR INDEPENDIENTE
- [ ] AFILIACIÓN VOLUNTARIOS 0.6%
- [ ] AFILIACIÓN FACULTATIVOS 2%
- [ ] PENSIONADOS POR FIDELIDAD
- [ ] PENSIONADOS 1.5 % SMLMV
- [ ] PENSIONADOS + 1.5% SMLMV

PARTE A — INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (Como figura en el RUT)	NIT [X] C.C [ ] T.I [ ] C.E [ ] PAS [ ]	DV
Asesorías PCS-Cía Ltda	No. 900117394-5	

PARTE B — INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR (A)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO AÑO	MES	DÍA	GÉNERO F	M
Fernández	Bolaños	María	Fernanda	1981	12	23	[X]	[ ]

C.C [X] T.I [ ] C.E [ ] PAS [ ] No. 34315124 — FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN: 19-04-1999 Popayán

ESTADO CIVIL: SOLTERO [X] CASADO [ ] VIUDO [ ] UNIÓN LIBRE [ ] SEPARADO [ ] DIVORCIADO [ ]

SECTOR: URBANO [X] RURAL [ ]

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA / BARRIO / VEREDA: Carrera 5 # 21-02 B/Los comuneros

MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	PAÍS	TEL	E-MAIL
Popayán	Cauca	Colombia	3164759089	fernandezbolanos220@hotmail.com

INFORMACIÓN LABORAL

MUNICIPIO DONDE LABORA	FECHA DE INGRESO A SU EMPRESA AÑO	MES	DÍA	CARGO QUE DESEMPEÑA	HORAS LABORADAS AL MES	SALARIO BÁSICO	JEFE DE HOGAR
Popayán	2018	06	05	Auxiliar Administrativo 192		1.300.000	SI [X]
						COMISIONES	NO [ ]
						OTROS FACT	
						TOTAL DEVENGADO 1.300.000	

TRABAJADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO: SI [ ] NO [X]

ACTIVIDAD DESEMPEÑADA EN EL SECTOR AGROPECUARIO: AGRICULTURA [ ] SILVICULTURA [ ] GANADERÍA [ ] PESCA [ ] AVICULTURA [ ] APICULTURA [ ]

PARTE C — INFORMACIÓN DEL (A) CONYUGE Y/O COMPAÑERO (A) ACTUAL

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO AÑO	MES	DÍA	CONVIVEN SI	NO
							[ ]	[ ]

C.C [ ] T.I [ ] C.E [ ] PAS [ ] No. — FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

TIPO DE RELACIÓN: CÓNYUGE [ ] COMPAÑERA(O) [ ]

OCUPACIÓN: HOGAR [ ] EMPLEADO [ ] INDEPENDIENTE [ ] PENSIONADO [ ] SIN EMPLEO [ ]

EMPRESA DONDE LABORA	NIT.	SUBSIDIO SI [ ] NO [ ]	POR CUAL CAJA RECIBE SUBSIDIO

PARTE D — DATOS DEL PADRE O MADRE BIOLÓGICO (A) DE LOS HIJOS A INSCRIBIR QUE NO CONVIVE CON EL TRABAJADOR (A)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO AÑO	MES	DÍA

C.C [ ] T.I [ ] C.E [ ] PAS [ ] No. — FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

OCUPACIÓN: HOGAR [ ] EMPLEADO [ ] INDEPENDIENTE [ ] PENSIONADO [ ] SIN EMPLEO [ ]

EMPRESA DONDE LABORA	NIT.	SUBSIDIO SI [ ] NO [ ]	POR CUAL CAJA RECIBE SUBSIDIO

PARTE E — INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS A CARGO DEL TRABAJADOR (A)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO AÑO	MES	DÍA	GÉNERO F	M	C.T. T. PARENTESCO DISC	HIJO	PORE	HMNO	HJTR	IDENTIFICACIÓN C.C-T.I-C.E-PAS-REGISTRO CIVIL(N.UIP) Tipo	Número y fecha de expedición	USO EXCLUSIVO C.C.F.C
Nieto	Fernández	Natalia		2005	5	4	X			X				TI	1061697352 FECHA 24 MAY 2012	N/A
Bolaños		Dioselina		1948	11	7	X				X			CC	25268182 FECHA 30101969	N/A
Fernández	Cala	Jorge	Weiki	1956	8	26		X			X			CC	10529659 FECHA 17-ENE-1975	N/A

DISC: DISCAPACITADO HIJO: HIJO PORE: PADRE HMNO: HERMANO HJTR: HIJASTRO

DECLARACIÓN: Declaramos que la información suministrada en el presente formulario es verdadera, cuenta con los soportes probatorios correspondientes y podrá ser verificada en cualquier momento por parte de la Caja de Compensación Familiar del Cauca COMFACAUCA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 21 de 1982. En el evento que la información suministrada cambie, me comprometo a reportar modificación de los datos a mas tardar el día 10 del mes siguiente de ocurrida la novedad. El suministro de datos falsos por parte del empleador, a la Caja o la violación de la norma sobre salarios mínimos, es causal de desafiliación según artículo 45 de la Ley 21 de 1982.

Conforme a lo establecido en la ley 1581 del 2012 y demás Decretos reglamentarios, autorizo a la Caja de Compensación Familiar del Cauca- COMFACAUCA, para el tratamiento y manejo de mis datos personales consignados en el presente formulario, el cual consiste en recolectar, almacenar, depurar, usar, analizar, circular y cruzar información propia, con el fin de facilitar la prestación de servicios, pago de cuotas monetarias, ejercer las gestiones de cobro, reportar a centrales de riesgo cuando corresponda y en general todas las acciones que se deriven de los servicios que de conformidad con la Ley presta esta Caja de Compensación Familiar. Declaro que soy responsable de la veracidad de mis datos suministrados. Así mismo autorizo a la Caja de Compensación Familiar del Cauca COMFACAUCA, a efectuar sus procedimientos de notificación y comunicación a la dirección de correspondencia y al correo electrónico antes mencionados. Declaro que he sido informado de los derechos que me asisten como titular (Si la identificación, dirección y teléfono del responsable del tratamiento de mis datos de conformidad con la ley 1581 del 2012 y sus decretos reglamentarios. La Caja garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos.

ESPACIO PARA RADICACIÓN COMFACAUCA

JUN 13 P 3:41

FIRMA DEL TRABAJADOR(A) C.C. 34315124

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

OBSERVACIONES: Follow Incomplete

comfacauca

DIGITA	REVISA	DIGITALIZA
13 JUN 2018		
NOMBRE: LUCEIDE ORDOÑEZ	NOMBRE:	NOMBRE:
FECHA:	FECHA:	FECHA:

PÁGINA 1

Scanned by CamScanner

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CAUCA
comfacauca
el servicio del trabajador y su familia

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL SUBSIDIO FAMILIAR

NIT. 891.500.182-0

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO AÑO 20 MES 06 DÍA 13

Diligencie este formulario en letra imprenta y tinta color negro

No. 811324

SOLICITUD INSCRIPCIÓN
- [X] INGRESO
- [ ] REINGRESO
- [ ] MODIFICACIÓN INSCRIPCIÓN

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN

TRABAJADOR DEPENDIENTE:
- [ ] SUBSIDIO FAMILIAR MONETARIO
- [X] SUBSIDIO FAMILIAR EN SERVICIOS
- [ ] TRABAJADOR (A) SERVICIO DOMÉSTICO
- [ ] MADRES COMUNITARIAS

RÉGIMEN DE AFILIACIÓN VOLUNTARIA (ART.18 LEY 789/02)
- [ ] TRABAJADOR INDEPENDIENTE
- [ ] AFILIACIÓN VOLUNTARIOS 0,6%
- [ ] AFILIACIÓN FACULTATIVOS 2%
- [ ] PENSIONADOS POR FIDELIDAD
- [ ] PENSIONADOS 1,5% SMLMV
- [ ] PENSIONADOS + 1,5% SMLMV

PARTE A — INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (Como figura en el RUT): Consorcio PCE-Gutierrez

NIT [ ] C.C [ ] T.I [ ] C.E [ ] PAS [ ] No. 901147804-5 DV

PARTE B — INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR (A)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO AÑO	MES	DÍA	GÉNERO F	M
Cuesta	Cabrera	Maria	Teresa	69	7	19	X	

C.C [X] T.I [ ] C.E [ ] PAS [ ] No. 34555320 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN: 19-DIC-1986 Timbio

ESTADO CIVIL: SOLTERO [X] CASADO [ ] VIUDO [ ] UNIÓN LIBRE [ ] SEPARADO [ ] DIVORCIADO [ ]

SECTOR: URBANO [X] RURAL [ ]

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA / BARRIO / VEREDA: Calle 5 EN F 22-80 casa C4 3 Lomas de Cartio

MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	PAÍS	TEL	E-MAIL
Popayán	Cauca	Colombia	3218024442	

INFORMACIÓN LABORAL

MUNICIPIO DONDE LABORA	FECHA DE INGRESO A SU EMPRESA AÑO	MES	DÍA	CARGO QUE DESEMPEÑA	HORAS LABORADAS AL MES	SALARIO BÁSICO	JEFE DE HOGAR
Popayán	2019	06	05	Residente de obra	192	4.200.000	SI [X]
						COMISIONES	NO [ ]
						OTROS FACT.	
						TOTAL DEVENGADO 4.200.000	

TRABAJADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO: SI [ ] NO [X]

ACTIVIDAD DESEMPEÑADA EN EL SECTOR AGROPECUARIO: AGRICULTURA [ ] SILVICULTURA [ ] GANADERÍA [ ] PESCA [ ] AVICULTURA [ ] APICULTURA [ ]

PARTE C — INFORMACIÓN DEL (A) CONYUGE Y/O COMPAÑERO (A) ACTUAL

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO AÑO	MES	DÍA	CONVIVEN SI	NO
							[ ]	[ ]

C.C [ ] T.I [ ] C.E [ ] PAS [ ] No. FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

TIPO DE RELACIÓN: CONYUGE [ ] COMPAÑERA(O) [ ]

OCUPACIÓN: HOGAR [ ] EMPLEADO [ ] INDEPENDIENTE [ ] PENSIONADO [ ] SIN EMPLEO [ ]

EMPRESA DONDE LABORA: NIT: SUBSIDIO SI [ ] NO [ ] POR CUAL CAJA RECIBE SUBSIDIO

PARTE D — DATOS DEL PADRE O MADRE BIOLOGICO (A) DE LOS HIJOS A INSCRIBIR QUE NO CONVIVE CON EL TRABAJADOR (A)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO AÑO	MES	DÍA

C.C [ ] T.I [ ] C.E [ ] PAS [ ] No. FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

OCUPACIÓN: HOGAR [ ] EMPLEADO [ ] INDEPENDIENTE [ ] PENSIONADO [ ] SIN EMPLEO [ ]

EMPRESA DONDE LABORA: NIT: SUBSIDIO SI [ ] NO [ ] POR CUAL CAJA RECIBE SUBSIDIO

PARTE E — INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS A CARGO DEL TRABAJADOR (A)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO AÑO	MES	DÍA	GÉNERO F	M	C.T. DISC	PARENTESCO HIJO	PADRE	HNO	HJTR	IDENTIFICACIÓN C.C-T.I-C.E-PAS-REGISTRO CIVIL(NUIP) Tipo	Número y fecha de expedición	USO EXCLUSIVO C.C.F.C N/A

DISC: DISCAPACITADO HIJO: HIJO PADRE: PADRE HNO: HERMANO HJTR: HIJASTRO

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CAUCA comfacauca Al Servicio del trabajador y su Familia
RELACIONA BENEFICIARIOS, NO ANEXA DOCUMENTOS PARA LA AFILIACIÓN.
2019-06-13
Auxiliar: SUBSIDIO FAMILIAR

DECLARACIÓN: Declaramos que la información suministrada en el presente formulario es verdadera, cuenta con los soportes probatorios correspondientes y podrá ser verificada en cualquier momento por parte de la Caja de Compensación Familiar del Cauca COMFACAUCA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 21 de 1982. En el evento que la información suministrada cambie, me comprometo a reportar modificación de los datos a mas tardar el día 10 del mes siguiente de ocurrida la novedad. El suministro de datos falsos por parte del empleador, a la Caja o la violación de la norma sobre salarios mínimos, es causal de desafiliación según artículo 45 de la Ley 21 de 1982.

Conforme a lo establecido en la **ley 1581 del 2012** y demás Decretos reglamentarios, autorizo a la Caja de Compensación Familiar del Cauca, COMFACAUCA, para el tratamiento y manejo de mis datos personales consignados en el presente formulario, el cual consiste en recolectar, almacenar, depurar, usar, analizar, circular y cruzar información propia, con el fin de facilitar la prestación de servicios, pago de cuotas monetarias, ejercer las gestiones de cobro, reportar a centrales de riesgo cuando corresponda y en general todas las acciones que se deriven de los servicios que de conformidad con la Ley presta esta Caja de Compensación Familiar. Declaro que soy responsable de la veracidad de mis datos suministrados. Así mismo autorizo a la Caja de Compensación Familiar del Cauca COMFACAUCA, a efectuar sus procedimientos de notificación y comunicación a la dirección de correspondencia y /o correo electrónico antes mencionados. Declaro que he sido informado de los derechos que me asisten como titular de la identificación, dirección y teléfono del responsable del tratamiento de mis datos de conformidad con la ley 1581 del 2012 y sus decretos reglamentarios. La Caja garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos.

ESPACIO PARA RADICACIÓN COMFACAUCA
RECIBIDO JUN 13 P 3:41 comfacauca

María Teresa Cuesta C. — FIRMA DEL TRABAJADOR(A) C.C. 34'555 320 pop

Hernando Ramírez — FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

OBSERVACIONES:

	DIGITA	REVISA	DIGITALIZA
NOMBRE	13 JUN 2019	NOMBRE	NOMBRE
FECHA	LUCEIDE ORBONEZ Auxiliar Subsidio Familiar	FECHA	FECHA

PÁGINA 1

Scanned by CamScanner

129

medimás EPS No. 3013074135

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

(Lea las instrucciones que se encuentran al respaldo del formulario antes de diligenciarlo)

No. de Radicación: | Fecha de Radicación: 05/06/2018

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades ☒
2. Tipo de Afiliación: A. Individual - Cotizante o Cabeza de Familia ☒ - Beneficiario o afiliado adicional ☐ B. Colectiva ☐ C. Institucional ☐ D. De oficio ☐
3. Régimen: A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante ☒ B. Cabeza de familia ☐ C. Beneficiario ☐
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐
Código (a registrar por la EPS): 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
	Guzman	Gutierrez	Evelyn	Arango

7. Tipo documento de identidad: CC
8. Número del documento de identidad: 1105681936
9. Sexo: Femenino ☒ Masculino ☐
10. Fecha de nacimiento: 03/06/1991

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia:
12. Discapacidad: Tipo F N M / Condición T P
13. Puntaje SISBÉN:
14. Grupo de población especial:
15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL: Sura
16. Administradora de Pensiones: Porvenir
17. Ingreso base de cotización - IBC: 2'500.000

18. Residencia	Dirección	Teléfono fijo	Teléfono celular	Correo electrónico
	CL 2 # 2-28		3102933357	

Municipio/Distrito	Zona	Localidad/Comuna	Departamento
Popayan	Urbana ☒ Rural ☐		Cauca.

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad:
21. Número del documento de identidad:
22. Sexo: Femenino ☐ Masculino ☐
23. Fecha de nacimiento: D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo F	N	M	Condición: T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia: Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

EMPLEADOR

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C	Unporcion Mi Ips Popayan	589.
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número de documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
Consorcio BCS	NIT	901177392	1

39. Ubicación: Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio/Distrito	Departamento
Cr 16AN #0-94	3214941425		Bogota	Cundinamarca

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación. ☐
2. Corrección de datos básicos de identificación. ☐
3. Actualización del documento de identidad. ☐
4. Actualización y corrección de datos complementarios. ☐
5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código ☐
6. Reinscripción en la EPS. ☐
7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales. ☐
8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales. ☐
9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar ☒
10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando ☐
11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐
12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐
13. Movilidad: A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado ☐
14. Traslado: A. Mismo Régimen ☐ B. Diferente Régimen ☐
15. Reporte de fallecimiento. ☐
16. Reporte del trámite de protección al cesante. ☐
17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado. ☐
18. Reporte de la calidad de Pensionado. ☐

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad: | Número del documento de identidad: | Sexo: Femenino ☐ Masculino ☐ | Fecha de nacimiento: D D M M A A A A | 42. Fecha: 05/06/2018

43. EPS anterior:
44. Motivo de traslado Código:
45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones:

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales. ☐
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo Especial o de Excepción. ☐
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. ☐
49. Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud ☐
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales ☐
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. ☐
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. ☐
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. ☐

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario: Evelyn Arango Guzman Cc 1105681936
55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio: Fernanda Gutierrez

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad ☒ — Cantidad: CN | RC | TI | CC | PA | CE | CD | SC | Total: 1
57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente ☐
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. ☐
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. ☐
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor ☐
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia ☐
62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. ☐
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud ☐
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. ☐
65. Copia del acto administrativo o providencial de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. ☐

05 JUN 2018

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código de Municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBÉN: Número de ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos del funcionario que realiza la validación: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
Parra	Yanez	Diego	

Tipo documento de identidad: CC | Número del documento de identidad: 1030 3985. | 71. Firma del funcionario:

OBSERVACIONES:

Recuerda que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Scanned by CamScanner

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4002203398	2|7|0|6|2|0|1|8

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite	2.Tipo afiliacion		3.Regimen
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒	B. Colectiva ☐	A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ B. Institucional ☐ B. De oficio ☐	A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐
4. Tipo de afiliado	**5. Tipo de cotizante**		**Codigo** (a registrar por la EPS) 1
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐		

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
GIRALDO (Primer apellido)	LOPEZ (Segundo apellido)	JULIAN (Primer nombre)	MAURICIO (Segundo nombre)
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de Identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	15908656	Femenino ☐ Masculino ☒	0|5|0|9|1|9|6|7

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N M Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.	PORVENIR FPC	5500000

18.Residencia

Dirección	Telefono fijo	Telefono celular	Correo electronico
CR 17 A 4 B 45 AP 403	2570898		NT@HOTMAIL.COM

Municipio/Distrito	zona	Localidad / comuna	Departamento
MANIZALES	Urbana ☒ Rural ☐		CALDAS

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Seleccion de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	UAB CENTRO - UOD CENTRO	STCENTRO - UODCENTRO
B	-	-
B	-	-
B	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de docuemnto de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
CONSORCIO BCS GUTIERREZ	NIT	901177394	01

39.Ubicación				
CR 19 84 41 OF 401 (Dirección)	2570898 (Teleéfono)	AUXADMINISTRATIVO@AURELIOGUTIERREZ.COM (Correo electrónico)	BOGOTA (Municipio/distrito)	BOGOTA (Departamento)

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripcion en la EPS.
  Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14.Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16.Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino ☐ Masculino ☐		0|5|0|6|2|0|1|8

43.EPS anterior	44.Motivo de traslado Código:	45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- 48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- 49. ☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- 50. ☒ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- 51. ☒ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- 52. ☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- 53. ☐ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

Julian Mauricio Giraldo	Sandra M. Celis
54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	**55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio**

IX.ANEXOS

- ☐ 56.Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐
  Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 0
- 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61.Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62.Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63.Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64.Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65.Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN Número ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71.Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Coomeva | EPS

RADICADO

No. 22376890

Fecha de Radicación: 05 06 2018

Página 1 de 2

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que aparecen antes de diligenciar este formulario)

1. Tipo de Trámite	2. Tipo de Afiliacion		3. Regimen
A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]	A. Individual: Cotizante o Cabeza de Familia [X] / Beneficiario o afiliado adicional [ ]	B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]	C. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de Afiliado	5. Tipo de Cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	01

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
BENAVIDES (Primer apellido)	BELTRAN (Segundo apellido)	MARIA (Primer nombre)	FERNANDA (Segundo nombre)

7. Tipo documento de Identidad	8. Número del documento de Identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	34315134	Femenino [X] Masculino [ ]	23 08 1981

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
06	Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P]		09

15. Administradora de Riegos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de Cotización - IBC
CIA SURAMERICANA DE SEGUR	003 / PORVENIR	1,300,000

18. Residencia			
CR 5 # 21- 02 B/ LOS COM (Dirección)	3146689014 (Teléfono fijo)	3104759095 (Teléfono Celular)	ferchita8230@hotmail.com (Correo electrónico)

Municipio/Distrito	Zona	Localidad/Comuna	Departamento
19001 / POPAYAN	Urbana [X] Rural [ ]		19 / CAUCA

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyugue o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. fecha de Nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres				
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Numero del documento de identidad	27. Sexo		28. Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentescos	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Telefonofijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de los Servicios de Salud - IPS		Código de la IPS (a registrar por la EPS)	
C	SINERGIA UNIDAD BASICA POPAYAN - P P R	FUSION ODONTOLOGICA - P P R	10900454	10900462
B				
B				
B				

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO.

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
CONSORCIO BCS GUTIERREZ	NI	901177394	0 1

39. Ubicación				
CRA 19 # 84-41 OFIC 402 (Dirección)	2570898 (Teléfono)	consorciobcsgutierrez@gmail.com (Correo electronico)	BOGOTA D.C. (Municipio/Distrito)	BOGOTA D.C. (Departamento)

EPS-FT-144 Mod. May/2016

Coomeva | EPS

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y correcciónde datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS — Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de un entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo régimen [ ] B. Diferente régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A	0 5 0 6 2 0 1 8

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado — Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [X] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Regimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios
- [X] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de los Servicios de Salud
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- [X] 53. Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

- [X] 56. Anexo copia del documento de identidad:

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	Total
Cantidad:	0	0	0	1	0	0	0	0	1

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la teminación de la unión marital
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia
- [ ] 62. Documento en que conste la perdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Codigo del municipio	Código del departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70.Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones: _____

Marque con una (X) en la casilla de respuesta correspondiente a las siguientes preguntas:	SI	NO
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	( )	( )
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	( )	( )
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	( )	( )

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capitulo VII del formulario.

138

medimás EPS No. 3013074136

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

(Lea las instrucciones que se encuentran al respaldo del formulario antes de diligenciarlo)

No. de Radicación:

Fecha de Radicación: 05/06/2018

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades ☒

2. Tipo de Afiliación: A. Individual: - Cotizante o Cabeza de Familia ☒ - Beneficiario o afiliado adicional ☐ B. Colectiva ☐ C. Institucional ☐ D. De oficio ☐

3. Régimen: A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado: A. Cotizante ☒ B. Cabeza de familia ☐ C. Beneficiario ☐

5. Tipo de cotizante: A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐

Código (a registrar por la EPS): 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
	Ojeda	Cabrera	Maria	Teresa.

7. Tipo documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	34555320	Femenino ☒ Masculino ☐	19/07/1969.

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad (Tipo F N M / Condición T P)	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotización - IBC
SURA	Porvenir	4208333.

18. Residencia: Dirección	Teléfono fijo	Teléfono celular	Correo electrónico
Cl 5SN #22-80		3218024442	

Municipio/Distrito	Zona: Urbana / Rural	Localidad/Comuna	Departamento
Popayan	Urbana ☒ Rural ☐		Cauca.

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino ☐ Masculino ☐	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo: Femenino	27. Sexo: Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia: Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Zona: Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

EMPLEADOR

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C	Comfacauca M. Ips Popayan	588.
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número de documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registar por la EPS)
Consorcio BCS	NIT	9011773944	

39. Ubicación: Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio/Distrito	Departamento
Cl 18N #80-94	3214941425		Bogota	Cundinamarca

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- ☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- ☐ 3. Actualización del documento de identidad.
- ☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS.
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- ☒ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- ☐ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado ☐
- ☐ 14. Traslado: A. Mismo Régimen ☐ B. Diferente Régimen ☐
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento.
- ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- ☐ 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- ☐ 18. Reporte de la calidad de Pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
		Femenino ☐ Masculino ☐	D D M M A A A A	05/06/2018.

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado: Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- ☒ 46 Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- ☐ 47 Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo Especial o de Excepción.
- ☐ 48 Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- ☐ 49 Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- ☒ 50 Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- ☒ 51 Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- ☒ 52 Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- ☒ 53 Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario

55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

☒ 56 Anexo copia del documento de identidad — Cantidad: CN 0 | RC 0 | TI 0 | CC 1 | PA 0 | CE 0 | CD 0 | SC 0 | Total 1

- ☐ 57 Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- ☐ 58 Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- ☐ 59 Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- ☐ 60 Copias del certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61 Copias de la orden judicial o del acto administrativo de custodia
- ☐ 62 Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración ausente por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- ☐ 63 Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64 Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65 Copias del acto administrativo o providencias de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio	Código de departamento	67. Datos del SISBÉN: Número de ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos del funcionario que realiza la validación: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
Jaramillo	Jaramillo	Diego	

Tipo documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario
CC	1030...	

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

09 JUN 2018

Scanned by CamScanner

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) **ALEXANDRA RISUEÑO ZEMANATE**, identificado(a) con Cédula de Ciudadania **1,062,754,412**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 16 días del mes de Junio de 2018.

Gerente de Clientes

AXA COLPATRIA
reinventando / los seguros

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación: NIT
Número de documento: 901085056
Número Afiliación: 238734
Razón social: STRATEGY DESINGS SAS

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento: CÉDULA
Número de Documento 1062754412
Nombre: ALEXANDRA RISUEÑO ZEMANATE
Fecha Ingreso: 09/06/2018
Salario básico: 781.242
Nit empresa en misión: 0
Código Sucursal: 1
Centro de trabajo: 5
Tasa: 6,960
Fecha hora transacción: 08/06/2018 11:07:31 a.m.

Empresa Solidaria de Salud

Emssanar

¡Siempre cerca de Usted!

ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD DE NARIÑO E.S.S. 'EMSSANAR E.S.S.'

NIT: 814.000.337-1

HACE CONSTAR

Que el(la) señor(a) ALEXANDRA RISUEÑO ZEMANATE identificado(a) con Cédula de ciudadanía 1062754412, se encuentra Afiliado en el Plan Obligatorio de Salud POS, de ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD DE NARIÑO E.S.S. 'EMSSANAR E.S.S.' por la empresa STRATEGY DESINGS SAS NIT 901085056 en la calidad de Dependiente según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha de Afiliación	Fecha de Retiro
07/06/2018	No registrada

Informacion beneficiarios:

No hay beneficiarios en el grupo familiar.

El presente certificado se expide a solicitud de el(la) interesado(a) a los 13 días del mes de junio de 2018.

Observaciones

Con destino a: Solicitud del empleador

Información sujeta a verificación por parte de ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD DE NARIÑO E.S.S. 'EMSSANAR E.S.S.', cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea 018000129393 - Documento no valido como autorización de traslado - No es válido para aclarar situación de duplicidad en el SGSSS. Semanas de cotización según LEY 1122/07.

Coordialmente,

CARLOS FAJARDO PABON
GERENTE GENERAL

Scanned by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38362885		ALVAREZ FUENTES MARGARITA EUGENIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 6 # 5-21	IBAGUE-TOLIMA	2703702	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-05	2018-05	31717144	8479251962	I	2018/05/22	2018/05/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$222,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	38362885	ALVAREZ MARGARITA	25-14	30	$781,242	$125,000	EPS002	30	$781,242	$97,700		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$781,242	$125,000			$781,242	$97,700			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$97,700	$0	$0	$97,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$97,700	$0	$0	$97,700
TOTAL				1	$222,700	$0	$0	$222,700

PAGADO

2018/05/08 09:01 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38362885		ALVAREZ FUENTES MARGARITA EUGENIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 6 # 5-21	IBAGUE-TOLIMA	2703702	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-06	2018-06	53409257	8480530972	I	2018/06/22	2018/06/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$222,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	38362885	ALVAREZ MARGARITA	25-14	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$97,700		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$781,242	$125,000			$781,242	$97,700			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$97,700	$0	$0	$97,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$97,700	$0	$0	$97,700
TOTAL				1	$222,700	$0	$0	$222,700

PAGADO

140

2018/06/09 08:31 AM

E.P.S. Sanitas

Grupo Empresarial Sanitas Internacional

Bogotá miércoles, 23 de mayo de 2018

Señores
EMPLEADOR_INDEPENDIENTE
CIUDAD

38362885
38362885

Asunto: Afiliación a la E.P.S Sanitas

Nos permitimos informarle que la solicitud de traslado a nuestra EPS, de los funcionarios que a continuación relacionamos, quién (es) labora (n) para su empresa, fue aceptada por la EPS que se menciona y con la vigencia allí igualmente indicada.

	FUNCIONARIO	TIPO	IDENTIFICACION	EPS	VIGENCIA
1	MARGARITA EUGENIA ALVAREZ FUENTES	CC	38362885	SALUD TOTAL S.A. E.P.S	01/06/2018
2					
3					
4					
5					

Por lo anterior, solicitamos continúen realizando los aportes en Salud a nuestra entidad a partir de la fecha de vigencia relacionada.

Agradecemos el habernos escogido como su EPS.

Para mayor información comuníquese con FONOSANITAS 375 9000 en Bogotá ó al 01 8000 919100 para el resto del país.

Cordialmente,

Gerencia Operativa EPS Sanitas

Scanned by CamScanner

FORMULARIO UNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

E.P.S. Sanitas

NIT. 800.251.440-6

No. de Radicación | Fecha de Radicación (D D M M A A A A)

89005453

(Lea las instrucciones que se encuentran al respaldo antes de diligenciar este formulario)

I. DATOS DEL TRAMITE

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación | B. Reporte de Novedades → B

2. Tipo de Afiliación: A. Individual: Cotizante o Cabeza de Familia → A; Beneficiario o Afiliado adicional | B. Colectivo | C. Institucional | D. De Oficio

3. Régimen: A. Contributivo | B. Subsidiado

4. Tipo de Afiliado: A. Cotizante → A | B. Cabeza de Familia | C. Beneficiario

5. Tipo de Cotizante: A. Dependiente | B. Independiente | C. Pensionado → C

Código (a registrar por la EPS)

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
Alvarez	Fuentes	Mayra	Eugenia

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CN TI CE CD RC CC PA SC → CC	38362885	Femenino → Masculino	22 02 1984

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos Personales

11. Etnia	12. Discapacidad (Tipo F N M; Condición T P)	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de población especial

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotización - IBC
	Colpensiones	731242

18. Residencia

Dirección: Cra 67 22 29

Teléfono Fijo

Teléfono Celular | Correo Electrónico

Municipio / Distrito	Zona (Urbana → Rural)	Localidad / Comuna	Departamento
Bogotá		Usme	Cund

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos Básicos de Identificación del Cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad (CN TI CE CD RC CC PA SC)	21. Número del documento de identidad	22. Sexo (Femenino Masculino)	23. Fecha de nacimiento (D D M M A A A A)

Datos Básicos de Identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres

	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1	Pinto	Alvarez	Juan	Manuel
B2				
B3				
B4				
B5				

Datos Complementarios

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo (Femenino Masculino)	28. Fecha de nacimiento (D D M M A A A A)	29. Parentesco
B1	RC	1124944754	Femenino Masculino →	29 04 2018	HIJO
B2			Femenino Masculino		
B3			Femenino Masculino		
B4			Femenino Masculino		
B5			Femenino Masculino		

	30. Etnia	31. Discapacidad (Tipo F N M; Condición T P)	32. Datos de Residencia: Municipio/Distrito	Zona (Urbana Rural)	Departamento	Teléfono Fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del Afiliado Adicional (a registrar por la EPS)
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS

		Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
A		
B		
B		

Original: EPS - 1a Copia: EMPLEADOR - 2a Copia: AFILIADO

Scanned by CamScanner

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONES O DE OFICIO

35. Nombre o razón social

36. Tipo documento de identificación: NIT TI CE CC PA CD

37. Número del documento de identificación

39. Ubicación
Dirección

Teléfono Fijo

Correo Electrónico

Municipio - Distrito

Departamento

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
  Código
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo B. Régimen Subsidiado
- [x] 14. Traslado: [x] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación
Primer Apellido: [illegible] Segundo Apellido: [illegible] Primer Nombre: [illegible] Segundo Nombre:

Tipo de documento de identidad: CN RC TI CE CD PA CC SC

Número del documento de identidad

Sexo: Femenino Masculino

Fecha de nacimiento

42. Fecha: 01 2016

43. EPS anterior: Saludtal Activa Contributiva

44. Motivo de traslado
Código: 5

45. Caja de compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [x] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [x] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [x] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [x] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [x] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [x] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [x] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario

55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institución o de oficio

IX. ANEXOS

- [x] 56. Anexo copia del documento de identidad. Cantidad: CN 1, RC, TI, CC 1, PA, CE, CD, SC. TOTAL 2
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial
Código del Municipio | Código del Departamento

67. Datos del SISBEN
Número de ficha | Puntaje | Nivel

68. Fecha de Radicación

69. Fecha de Validación

70. Datos del funcionario que realiza la validación
Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

Tipo de documento | Número de documento de identidad

71. Firma del Funcionario

Observaciones: TC

Scanned by CamScanner

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

Riesgos Profesionales

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN
DEL DIA 12/06/2018

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de documento:	NIT	Numero de documento:	901187768	Usuario Empresa	eARL514400
Nombre:	ARRIETA SAS				
Dirección:	KR 11B 12 42				
Departamento:	SUCRE	Municipio:		SINCELEJO	
Correo electrónico:	HJA02@HOTMAIL.COM				
Teléfono:	3173636429	Tarifa:		6.96	
Acti. Económica Principal:	EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECN				
ICO INCLUYE SOLAMENTE EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE OBRA DE CONSTRUCCION, DIRECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION, ARQUITECTURA, IN					
GENIERIA Y AGRIMESURA, EXPLOTACION Y PROSPECCION GEOLOGICAS, ASESORAMIENTO TECNICO CONEXO INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A D					

DATOS USUARIO QUE REALIZA LA RADICACION

Cédula usuario	Nombres y apellidos del Usuario
1102841897	KEYLA ANDREA ARRIETA MARTINEZ

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo Vinculación
1	1	13/06/2018	C 19166044	MORALES ESQUEDA EDGAR DE JESUS	5	6.9600	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades.
Positiva Compañía de Seguros S.A.

Certificado impreso el día 12/06/2018 4:46:39 p. m. por el portal de ARL http://www.positivaenlinea.gov.co

axF d980edd3aaec667ff5a13588b4e053e9

144

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

Riesgos Profesionales

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN
DEL DIA 12/06/2018

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de documento:	NIT	Numero de documento:	901187768	Usuario Empresa	eARL514400
Nombre:	ARRIETA SAS				
Dirección:	KR 11B 12 42				
Departamento:	SUCRE	Municipio:		SINCELEJO	
Correo electrónico:	HJA02@HOTMAIL.COM				
Teléfono:	3173636429	Tarifa:		6.96	
Acti. Económica Principal:	EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECN				
ICO INCLUYE SOLAMENTE EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE OBRA DE CONSTRUCCION, DIRECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION, ARQUITECTURA, IN					
GENIERIA Y AGRIMESURA, EXPLOTACION Y PROSPECCION GEOLOGICAS, ASESORAMIENTO TECNICO CONEXO INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A D					

DATOS USUARIO QUE REALIZA LA RADICACION

Cédula usuario	Nombres y apellidos del Usuario
1102841897	KEYLA ANDREA ARRIETA MARTINEZ

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo Vinculación
1	2	13/06/2018	C 79699772	DIAZ GIL EDUARDO ANDRES	5	6.9600	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades.
Positiva Compañía de Seguros S.A.

Certificado impreso el día 12/06/2018 4:50:14 p. m. por el portal de ARL http://www.positivaenlinea.gov.co

axF b05325e6d1acb2d80e05101f268c6c89

145

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

Riesgos Profesionales

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN
DEL DIA 12/06/2018

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de documento:	NIT	Numero de documento:	901187768	Usuario Empresa	eARL514400
Nombre:	ARRIETA SAS				
Dirección:	KR 11B 12 42				
Departamento:	SUCRE	Municipio:		SINCELEJO	
Correo electrónico:	HJA02@HOTMAIL.COM				
Teléfono:	3173636429	Tarifa:		6.96	
Acti. Económica Principal:	EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECN				
ICO INCLUYE SOLAMENTE EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE OBRA DE CONSTRUCCION, DIRECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION, ARQUITECTURA, IN					
GENIERIA Y AGRIMESURA, EXPLOTACION Y PROSPECCION GEOLOGICAS, ASESORAMIENTO TECNICO CONEXO INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A D					

DATOS USUARIO QUE REALIZA LA RADICACION

Cédula usuario	Nombres y apellidos del Usuario
1102841897	KEYLA ANDREA ARRIETA MARTINEZ

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo Vinculación
1	3	13/06/2018	C 1061805873	YANDE CAPOTE JHOYNER	5	6.9600	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades.
Positiva Compañía de Seguros S.A.

Certificado impreso el día 12/06/2018 4:56:06 p. m. por el portal de ARL http://www.positivaenlinea.gov.co

axF 5e1575bcba2f181b2a2031738fff5182

146

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

Riesgos Profesionales

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN
DEL DIA 12/06/2018

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de documento:	NIT	Numero de documento:	901187768	Usuario Empresa	eARL514400
Nombre:	ARRIETA SAS				
Dirección:	KR 11B 12 42				
Departamento:	SUCRE	Municipio:		SINCELEJO	
Correo electrónico:	HJA02@HOTMAIL.COM				
Teléfono:	3173636429	Tarifa:		6.96	
Acti. Económica Principal:	EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECN				
ICO INCLUYE SOLAMENTE EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE OBRA DE CONSTRUCCION, DIRECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION, ARQUITECTURA, IN					
GENIERIA Y AGRIMESURA, EXPLOTACION Y PROSPECCION GEOLOGICAS, ASESORAMIENTO TECNICO CONEXO INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A D					

DATOS USUARIO QUE REALIZA LA RADICACION

Cédula usuario	Nombres y apellidos del Usuario
1102841897	KEYLA ANDREA ARRIETA MARTINEZ

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo Vinculación
1	5	13/06/2018	C 92509827	ARRIETA ANAYA HERNANDO JOSE	5	6.9600	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades.
Positiva Compañía de Seguros S.A.

Certificado impreso el día 12/06/2018 9:50:49 p. m. por el portal de ARL http://www.positivaenlinea.gov.co

axF 40bfc647a1b3d70c5857b52902e954ae

197

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Coomeva | EPS

RADICADO

No. 22276210

Fecha de Radicación: 13 06 2018

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que aparecen antes de diligenciar este formulario)

1. Tipo de Trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Regimen
A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]	A. Individual: Cotizante o Cabeza de Familia [X] / Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]	C. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de Afiliado	5. Tipo de Cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	01

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
DIAZ (Primer apellido)	GIL (Segundo apellido)	EDUARDO (Primer nombre)	ANDRES (Segundo nombre)

7. Tipo documento de Identidad	8. Número del documento de Identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	79699772	Femenino [ ] Masculino [X]	07 05 1974

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
06	Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P]		00

15. Administradora de Riegos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de Cotización - IBC
POSITIVA S.A.	081 / ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE P	781,242

18. Residencia			
CR 37 # 15 - 4 (Dirección)	3216264880 (Teléfono fijo)	3216264880 (Teléfono Celular)	Correo electrónico

Municipio/Distrito	Zona	Localidad/Comuna	Departamento
19001 / POPAYAN	Urbana [X] Rural [ ]		19 / CAUCA

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del conyugue o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. fecha de Nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres				
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Numero del documento de identidad	27. Sexo		28. Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentescos	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Telefonofijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de los Servicios de Salud - IPS		Código de la IPS (a registrar por la EPS)	
C	SINERGIA UNIDAD BASICA POPAYAN - P P R	FUSION ODONTOLOGICA - P P R	10900454	10900462
B				
B				
B				

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO.

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
ARRIETA S.A.S.	NI	901187768	01

39. Ubicación				
CR 11B # 12 - 42 (Dirección)	3013709609 (Teléfono)	hja02@hotmail.com (Correo electronico)	SINCELEJO (Municipio/Distrito)	SUCRE (Departamento)

148

Coomeva | EPS

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y correcciónde datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS — Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de un entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [x] 14. Traslado: [x] A. Mismo régimen [ ] B. Diferente régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A	D D M M A A A A

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
C62 / ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD-CM	Código [ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [x] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Regimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [x] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios
- [x] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de los Servicios de Salud
- [x] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [x] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [x] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- [x] 53. Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

- [x] 56. Anexo copia del documento de identidad:

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	Total
Cantidad:	0	0	0	1	0	0	0	0	1

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la teminación de la unión marital
- [x] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia
- [ ] 62. Documento en que conste la perdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [x] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [x] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [x] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Codigo del municipio	Código del departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70.Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones: _____

Marque con una (X) en la casilla de respuesta correspondiente a las siguientes preguntas:	SI	NO
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	( )	( )
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	( )	( )
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	( )	( )

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capitulo VII del formulario.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Coomeva | EPS

RADICADO

No. de Radicación: 22376138

Fecha de Radicación: 13 06 2018

Página 1 de 2

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que aparecen antes de diligenciar este formulario)

1. Tipo de Trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Regimen
A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]	A. Individual: Cotizante o Cabeza de Familia [X] Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]	C. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de Afiliado	5. Tipo de Cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	01

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
MORALES (Primer apellido)	ESQUEDA (Segundo apellido)	EDGAR (Primer nombre)	DE JESUS (Segundo nombre)

7. Tipo documento de Identidad	8. Número del documento de Identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	19166044	Femenino [ ] Masculino [X]	1 9 0 6 1 9 5 2

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
0 6	Tipo [F N M] Condición [T P]		0 0

15. Administradora de Riegos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de Cotización - IBC
POSITIVA S.A.	081 / ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE P	781,242

18. Residencia			
CR 12 # 11 - 19 (Dirección)	3173639263 (Teléfono fijo)	3173639263 (Teléfono Celular)	Correo electrónico

Municipio/Distrito	Zona	Localidad/Comuna	Departamento
19001 / POPAYAN	Urbana [X] Rural [ ]		19 / CAUCA

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyugue o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. fecha de Nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Numero del documento de identidad	27. Sexo		28. Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentescos	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Telefonofijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de los Servicios de Salud - IPS		Código de la IPS (a registrar por la EPS)	
C	SINERGIA UNIDAD BASICA POPAYAN - P P R	FUSION ODONTOLOGICA - P P R	10900454	10900462
B				
B				
B				

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO.

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
ARRIETA S.A.S.	NI	901187768	0 1

39. Ubicación				
CR 11B # 12 - 42 (Dirección)	3013709609 (Teléfono)	hja02@hotmail.com (Correo electronico)	SINCELEJO (Municipio/Distrito)	SUCRE (Departamento)

130

Coomeva | EPS

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y correcciónde datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS — Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de un entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [X] 14. Traslado: [X] A. Mismo régimen [ ] B. Diferente régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A	D D M M A A A A

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
S44 / MEDIMAS CM - SUBSIDIADO	Código 1	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [X] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Regimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [X] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios
- [X] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de los Servicios de Salud
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- [X] 53. Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

- [X] 56. Anexo copia del documento de identidad:

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	Total
Cantidad:	0	0	0	1	0	0	0	0	1

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la teminación de la unión marital
- [X] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia
- [ ] 62. Documento en que conste la perdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [X] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [X] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [X] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Codigo del municipio	Código del departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70.Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones: _____

Marque con una (X) en la casilla de respuesta correspondiente a las siguientes preguntas:	SI	NO
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	( )	( )
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	( )	( )
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	( )	( )

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capitulo VII del formulario.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Coomeva | EPS

RADICADO

No. de Radicado: 22376876

Fecha de Radicación: 13 06 2018

Página 1 de 2

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que aparecen al dorso del formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de Trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Regimen
A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]	A. Individual: Cotizante o Cabeza de Familia [X] / Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]	C. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de Afiliado	5. Tipo de Cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	01

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
ARRIETA (Primer apellido)	ANAYA (Segundo apellido)	HERNANDO (Primer nombre)	JOSE (Segundo nombre)

7. Tipo documento de Identidad	8. Número del documento de Identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	92509827	Femenino [ ] Masculino [X]	13 02 1967

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
06	Tipo [F N M] Condición [T P]		00

15. Administradora de Riegos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de Cotización - IBC
POSITIVA S.A.	003 / PORVENIR	781,242

18. Residencia			
CL 7 NORTE # 9A - 34 (Dirección)	3173639263 (Teléfono fijo)	3173639263 (Teléfono Celular)	(Correo electrónico)

Municipio/Distrito	Zona	Localidad/Comuna	Departamento
19001 / POPAYAN	Urbana [X] Rural [ ]		19 / CAUCA

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyugue o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			
(Primer apellido)	(Segundo apellido)	(Primer nombre)	(Segundo nombre)

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. fecha de Nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Numero del documento de identidad	27. Sexo		28. Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentescos	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo			Condición	
			F	N	M	T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia	Zona				33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
	Municipio/Distrito	Urbana	Rural	Departamento	Telefonofijo y/o Celular	
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de los Servicios de Salud - IPS		Código de la IPS (a registrar por la EPS)	
C	SINERGIA UNIDAD BASICA POPAYAN - P P R	FUSION ODONTOLOGICA - P P R	10900454	10900462
B				
B				
B				

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO.

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
ARRIETA S.A.S.	NI	901187768	01

39. Ubicación				
CR 11B # 12 - 42 (Dirección)	3013709609 (Teléfono)	hja02@hotmail.com (Correo electronico)	SINCELEJO (Municipio/Distrito)	SUCRE (Departamento)

EPS-FT-144

Mod. May/2016

152

Coomeva | EPS

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y correcciónde datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS — Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de un entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [X] 14. Traslado: [X] A. Mismo régimen [ ] B. Diferente régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A	D D M M A A A A

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
C15 / COMFACOR EPS - CCF DE CORDOBA	Código 1	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [X] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Regimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [X] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios
- [X] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de los Servicios de Salud
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- [X] 53. Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

- [X] 56. Anexo copia del documento de identidad:

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	Total
Cantidad:	0	0	0	1	0	0	0	0	1

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la teminación de la unión marital
- [X] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia
- [ ] 62. Documento en que conste la perdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [X] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [X] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [X] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Codigo del municipio	Código del departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70.Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones: _____

Marque con una (X) en la casilla de respuesta correspondiente a las siguientes preguntas:	SI	NO
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	( )	( )
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su púesto en el ranking?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	( )	( )
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	( )	( )

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capitulo VII del formulario.

157

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Coomeva | EPS

RADICADO

No. 28276231

Fecha de Radicación: 13 06 2018

Página 1 de 2

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones antes de diligenciar)

1.Tipo de Trámite	2.Tipo de Afiliación	3. Regimen
A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]	A.Individual: Cotizante o Cabeza de Familia [X] Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C.Institucional [ ] D.De oficio [ ]	C. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de Afiliado	5.Tipo de Cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	01

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
YANDE	CAPOTE	JHOYNER	JESUS
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

7. Tipo documento de Identidad	8. Número del documento de Identidad	9.Sexo	10.Fecha de nacimiento
CC	1061805873	Femenino [ ] Masculino [X]	24 12 1997

III.DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
06	Tipo [F N M] Condición [T P]		00

15. Administradora de Riegos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de Cotización - IBC
POSITIVA S.A.	010 / COLFONDOS	781,242

18. Residencia			
CR 20 # 59 - 83	3122024039	3122024039	
Dirección	Teléfono fijo	Teléfono Celular	Correo electrónico

	Zona		
19001 / POPAYAN	Urbana [X] Rural [ ]		19 / CAUCA
Municipio/Distrito		Localidad/Comuna	Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyugue o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. fecha de Nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Numero del documento de identidad	27. Sexo		28. Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentescos	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo			Condición	
			F	N	M	T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia	Zona				33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
	Municipio/Distrito	Urbana	Rural	Departamento	Telefonofijo y/o Celular	
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de los Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C	SINERGIA UNIDAD BASICA POPAYAN - P P R FUSION ODONTOLOGICA - P P R	10900454 10900462
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO.

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
ARRIETA S.A.S.	NI	901187768	01

39. Ubicación				
CR 11B # 12 - 42	3013709609	hja02@hotmail.com	SINCELEJO	SUCRE
Dirección	Teléfono	Correo electronico	Municipio/Distrito	Departamento

EPS-FT-144 Mod. May/2016

194

Coomeva | EPS

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y correcciónde datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS — Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de un entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [X] 14. Traslado: [X] A. Mismo régimen [ ] B. Diferente régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A	D D M M A A A A

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
S64 / Saludvida -Subsidiado	Código 1	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [X] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Regimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [X] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios
- [X] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de los Servicios de Salud
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- [X] 53. Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

- [X] 56. Anexo copia del documento de identidad:

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	Total
Cantidad:	0	0	0	1	0	0	0	0	1

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la teminación de la unión marital
- [X] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia
- [ ] 62. Documento en que conste la perdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [X] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [X] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [X] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Codigo del municipio	Código del departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70.Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones: _____

Marque con una (X) en la casilla de respuesta correspondiente a las siguientes preguntas:	SI	NO
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	( )	( )
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	( )	( )
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	( )	( )

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capitulo VII del formulario.

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) **JHOYNER JESUS YANDE CAPOTE**, identificado(a) con Cédula de Ciudadania **1,061,805,873**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 16 días del mes de Junio de 2018.

Gerente de Clientes

156


porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) **EDGAR DE JESUS MORALES ESQUEDA**, identificado(a) con Cédula de Ciudadania **19,166,044**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE CESANTIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 12 días del mes de Junio de 2018.



Gerente de Clientes

157

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) **EDUARDO ANDRES DIAZ GIL**, identificado(a) con Cédula de Ciudadania **79,699,772**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 09 días del mes de Junio de 2018.

Gerente de Clientes

Colpensiones

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de Afiliados, el Señor (a) **HERNANDO JOSE ARRIETA ANAYA** identificado (a) con **Cédula de Ciudadanía** número **92509827,** se encuentra afiliado (a) desde **25/09/1986** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida - RPM, administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES** y su estado es *INACTIVO.*

INFORMACIÓN HISTÓRICA DE AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES				
Novedad	Código Entidad	Entidad Definitiva	Fecha	MultivinculaciónDecreto 3995/2008
Traslado de Salida	2	PROTECCION S.A.	27/07/1994	
Asignado por multivinculación por Decreto 3995/2008	23	COLPENSIONES	12/12/1994	Afiliado con mayor número de cotizaciones entre 20070701 al 20071231 en COLPENSIONES

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 12 de junio de 2018.

Rosa Mercedes Niño Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Contrato de Interventoría

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito Representante Legal y Revisor Fiscal de DAIMCO S.A.S., certifica que DAIMCO S.A.S. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar, así como por concepto de pago de parafiscales. De los últimos seis (6) meses.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, deberá diligenciar la siguiente información:

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES		
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados	Si (x)	No ()

Dado en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de junio de 2018.

Atentamente,

CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO
C.C. 78.027.760 de Cerete
Representante Legal

MARCIA CECILIA ATENCIALOZANO
Contadora Público
TP 69499-T

16

Anexo No. 6 Control de Personal del Contratista

DAIMCO
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:00

PROYECTO: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

EMPRESA: CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ

PERIODO: 7 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018

FRENTE DE OBRA: POPAYAN - CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	ING. JULIAN MAURICIO GIRALDO	DO	15.908.656							1	1	0,5		1	1	1	1	1	0,5		1	1	1	1	1	0,5		1	1	1	1	1	0,5		19
2	ING. MARIA TERESA OJEDA	IR	34.555.320							1	1	0,5		1	1	1	1	1	0,5		1	1	1	1	1	0,5		1	1	1	1	1	0,5		19
3	ING. EVELYN ANDREA GUZMAN	IR	1.105.681.936							1	1	0,5		1	1	1	1	1	0,5		1	1	1	1	1	0,5		1	1	1	1	1	0,5		19
4	MARIA FERNANDA BENAVIDES	A	34.315.134							1	1	0,5		1	1	1	1	1	0,5		1	1	1	1	1	0,5		1	1	1	1	1	0,5		19
5	HERNANDO JOSE ARRIETA ANAYA	M	92.509.827														1	1	0,5		1	1	1	1	1	0,5		1	1	1	1	1	0,5		14
6	JHOYNER JESUS YANDE CAPOTE	A	1.061.805.873														1	1	0,5		1	1	1	1	1	0,5		1	1	1	1	1	0,5		14
7	EDUARDO ANDRES DIAZ GIL	A	79.699.772														1	1	0,5		1	1	1	1	1	0,5		1	1	1	1	1	0,5		14
8	EDGAR DE JESUS MORALES ESQUEDA	A	19.166.044														1	1	0,5		1	1	1	1	1	0,5		1	1	1	1	1	0,5		14
9	MARGARITA EUGENIA ALVAREZ	TA	38.362.885																									1	1		1				3
10	ALEXANDRA RISUEÑO	CI	1.062.754.412																									1	1		1				3
	TOTAL PERSONAL POR DIA			0	0	0	0	0	0	4	4	2	0	4	4	4	8	8	4	0	8	8	8	8	8	4	0	10	10	8	10	8	4	0	136

OBSERVACIONES

ING. RESIDENTE

Elaboró SANDRA GUAUÑA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - TIRSO COSME

Aprobó

CONVENCIONES DE CARGO

DO	DIRECTOR DE OBRA	**O**	OFICIAL
IR	INGENIERO RESIDENTE	**A**	AYUDANTE
TA	TECNICA AMBIENTAL	**I**	INSPECTOR
TA	TOPOGRAFO	**OP**	OPERADOR
CI	CADENERO I	**PL**	PALETEROS
CII	CADENERO II	**LB**	LABORATORISTA
M	MAESTRO		

Anexo No. 7 Control Personal de Interventoría

Diseño, Asesorias, Interventorias, Montaje, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DE LA INTERVENTORIA INT-40:00

PROYECTO: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

EMPRESA: CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ

PERIODO: 7 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018

FRENTE DE OBRA: POPAYAN - CAUCA

No	Nombre	Cargo	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	TIRSO MARINO COSME OROZCO	DI							1	1	0,5		1	1	1	1	1	0,5		1	1	1	1	1	0,5		1	1	1	1	1	0,5		19
2	SANDRA LUCIA GUAUÑA PISSO	IR							1	1	0,5		1	1	1	1	1	0,5		1	1	1	1	1	0,5		1	1	1	1	1	0,5		19
3	JAVIER JOSE CARILLO ORTEGA	E							1	1			1			1				1				1			1			1	1			9
4	RIGOBERTO LOZADA DIAZ	TA							1	1	0,5			1		1	1	0,5			1	1		1	0,5			1	1		1	0,5		13
5	VÍCTOR MANUEL BOCANEGRA GARCÍA	E										1				1	1						1	1	0,5				1					7
6	JOSE ARMANDO RUIZ ANGARITA	E										1			1		1		1	1								1			1			7
7	ALBERTO FEDERICO MOUTHON BELLO	E												1	1	1	1						1							1				6
8	PABLO MANRIQUE CONVERS	E									1		1										1						1					4
9	PABLO EMILIO GUERRERO JIMENEZ	E							1					1					1					1				1		1				6
	TOTAL PERSONAL POR DIA		0	0	0	0	0	0	5	4	3	2	4	5	4	6	6	2	2	4	3	3	5	6	2	0	3	5	5	5	5	2	0	90

OBSERVACIONES

ING. RESIDENTE

Elaboró SANDRA GUAUÑA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - TIRSO COSME

Aprobó

CONVENCIONES DE CARGO

DO	DIRECTOR DE OBRA	**O**	OFICIAL
IR	INGENIERO RESIDENTE	**A**	AYUDANTE
TA	TECNICA AMBIENTAL	**I**	INSPECTOR
TA	TOPOGRAFO	**OP**	OPERADOR
CI	CADENERO I	**PL**	PALETEROS
CII	CADENERO II	**LB**	LABORATORISTA
M	MAESTRO	**E**	ESPECIALISTA

Anexo No. 8 Control de Equipo

DAIMCO S.A.S.
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

EQUIPO DEL CONTRATISTA INT-41:01

PROYECTO
Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste

CONTRATANTE POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ

PERIODO: 7 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018

EQUIPO		(A)	(B)	(C) CLASE DE ACTIVIDAD EN CADA DIA																						
TIPO	MARCA -CAPACIDAD	ORIGEN	ESTADO	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	VOLQUETAS	A	B						1		1	1		1	1			1		1	1	1	1				
2	MINICARGADOR	A	B						1			1		1		1		1			1	1				1	
3	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	A	B											1				1					1			1	
4																											

(A) ORIGEN
P- Propio
A- Alquilado
S- Sub-contratado

(B) ESTADO
B-Bueno
R-Regular
M-Malo

(C) CLASE DE ACTIVIDAD
1. Movilización y Desmovilización
2. Localización, Replanteo y Control Topográfico
3. Demolición General
4. Excavaciones
5. Relleno Material Seleccionado
6. Hincado de Pilotes
7. Concreto _____ PSI
8.Acero de Refuerzo
9. Protección con Bolsacretos
10. Colchacretos

F.S. Fuera de Servicio
R. Reparación
D. Disponible

OBSERVACIONES

ING. RESIDENTE

Elaboró SANDRA GUAUÑA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - TIRSO COSME

Aprobó

Anexo No. 9 Registro Fotográfico

DAIMCO S.A.S.

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:01

POLICIA NACIONAL

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CÓDIGO: **PROYECTO:** 06-6-10044-18
Donde POPAYAN - CAUCA
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES: jun-18

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Foto No. 1 Fecha: 12-06-2018

DETALLE GENERAL AREA A INTERVENIR, SE EVIDENCIA LOSAS EN CONCRETO SIN DEMOLER

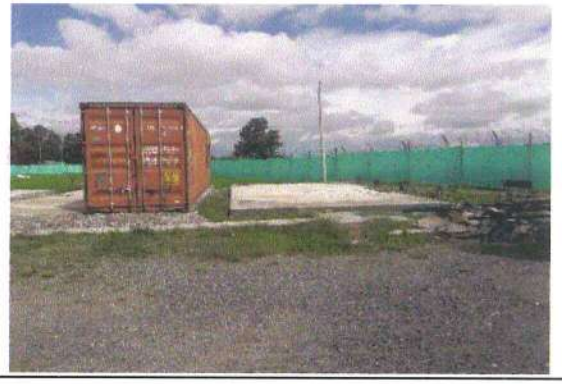


Foto No.2 Fecha: 12-06-2018

DETALLE GENERAL AREA UBICACIÓN CAMPAMENTO CONTENEDOR



Foto No.3 Fecha: 12-06-2018

DETALLE GENERAL AREA A INTERVENIR, SE EVIDENCIA LOSAS EN CONCRETO Y EDIFICACIONES SIN DEMOLER, COSTADO SUR



Foto No. 4 Fecha: 12-06-2018

DETALLE GENERAL AREA A INTERVENIR, SE EVIDENCIA LOSAS EN CONCRETO Y EDIFICACIONES SIN DEMOLER, COSTADO NORTE

DAIMCO S.A.S.
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:02

POLICIA NACIONAL

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CÓDIGO: **PROYECTO:** 06-6-10044-18
Donde POPAYAN - CAUCA
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES: jun-18

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Foto No.5 Fecha: 12-06-2018

DETALLE GENERAL AREA A INTERVENIR, SE EVIDENCIA ARBOLES A TALAR PARA LA EJECUCION PROYECTO, COSTADO ORIENTE



Foto No.6 Fecha: 19-06-2018

CONSTRUCCION CAMPAMENTO



Foto No.7 Fecha: 21-06-2018

SE EVIDENCIA MAQUINARIA DEL CONTRATISTA PARA INICIOS DE ACTIVIDADES DE DEMOLICIONES



Foto No.8 Fecha: 26-06-2018

AUN SE EVIDENCIA MAQUINARIA DEL CONTRATISTA SIN EJECUCION DE ACTIVIDADES DE DEMOLICIONES, Y CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO DE OBRA

DAIMCO S.A.S. *Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción*	**REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:03** **POLICIA NACIONAL** CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE **CÓDIGO:** **PROYECTO:** 06-6-10044-18 **Donde** POPAYAN - CAUCA **REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES:** jun-18	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Foto No.5 Fecha: 12-06-2018

DETALLE DE CARGUE DE CONTENEDOR



Foto No.6 Fecha: 19-06-2018

DETALLE DE TRASLADO DE CONTENEDOR 1.



Foto No.7 Fecha: 21-06-2018

DETALLE DE TRASLADO DE CONTENEDOR 2.



Foto No.8 Fecha: 26-06-2018

DETALLE DE TRASLADO DE CONTENEDOR 3.

DAIMCO S.A.S.

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:04

POLICIA NACIONAL

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CÓDIGO: **PROYECTO:** 06-6-10044-18
Donde POPAYAN - CAUCA
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES: jun-18

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Foto No.5 Fecha: 12-06-2018

DETALLE DE INSTALACION DE TRES CONTENEDORES



Foto No.6 Fecha: 19-06-2018

INICIO DE DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO



Foto No.7 Fecha: 21-06-2018

DETALLE DE DEMOLICION



Foto No.8 Fecha: 26-06-2018

DETALLE DE DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA

124

Anexo No. 10 Control de Clima

DAIMCO
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

CONTROL ATMOSFÉRICO INT-39:00

PROYECTO: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

CONSOLIDADO DEL PERIODO

MES	JUNIO																														
ESTADO DEL TIEMPO	V	S	D	L	MA	MI	J	V	S	D	L	MA	MI	J	V	S	D	L	MA	MI	J	V	S	D	L	MA	MI	J	V	S	TOTALES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
DIA SOLEADO												1	1	1	1	0,5		1	1	1	1	1	0,5		1	1	0,9				**12,9**
DIA NUBLADO																												1	1	0,5	**2,5**
LLUVIA																											0,1				**0,1**
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	
ESTADO DEL SUELO												S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	ST	ST	S	S	

Nota: Estado del Suelo Seco (S), Saturado (ST), Inundado (I)

OBSERVACIONES

Predomina tiempo seco

ING. RESIDENTE

Elaboró: SANDRA GUAUÑA

DIRECTOR DE OBRA - ING TIRSO COSME

Aprobó:

NOTAS

(1) INFORMACION RELACIONADA EN EL INFORME DIARIO DE INSPECCION **INT-8:00**

(2) CONTINÚE AL RESPALDO SI REQUIERE DE MAYOR ESPACIO

Anexo No. 11 Bitácora de Obra

BITACORA DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA - CAUCA. Y COMANDO DE REGION N°4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

CONTRATANTE : DIRAF
SUPERVISORA: TE. ANDREA CAROLINA CADENA L.
INTERVENTORIA: DAIMCO SAS.
CONTRATO N°: 06-3-10051-18
DIRECTOR INTERVENTORIA: ING. TIRSO COSME.
RESIDENTE INTERVENTORIA: ING. SANDRA GUAUÑA.

CONSTRUCTOR: CONSORCIO BCS- GUTIERREZ.
CONTRATO N°: 06-6-10044-18
DIRECTOR DE OBRA: ING. JULIAN MAURICIO GIRALDO.
RESIDENTE OBRA: ING. MARIA TERESA OJEDA C.

POPAYAN- 2018.

Scanned by CamScanner

EL CONTRATISTA DE OBRA HACE EVIDENCIA DE LAS INQUIETUDES PRESENTADAS A LA INTERVENTORIA DAIMCO SAS Y A LA SUPERVISION LA DIRAF. SE ADJUNTA OFICIO ENTREGADO A ELLOS. INICIALMENTE VIA CORREO ELECTRONICO. NAC.

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA
FECHA 23 JUN 2018
HORA: _____ GUIA SI ☐ NO ☐
No. RADICACIÓN: 057388

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

Bogotá, mayo 22 de 2018

PN-DIRAF-POPAYAN-009

Señores
POLICIA NACIONAL-DIRAF
a/a Teniente Ing. Andrea Carolina Cadena Lemus
Tel: 3125837538
DAIMCO SAS
a/a RL Carlos Javier Espitia Palomino
cespitia@daimcos.com
Interventoria
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Bogotá

DAIMCO
Junio 20- 2018 Hora: 10:40 a.m
Folios:03 Anexos:00
No.Radicado D-2018-1333
Radicado:Maria Londoño 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Referencia: **CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto:

Cordialmente solicito informen cuando se firma el acta de inicio? a su vez informo que ya tenemos la logística para empezar las obras el lunes 28 de Mayo, favor informar si el lunes 28 podemos iniciar con el cerramiento, el descapote, rellenos en recebo común compactado al 95% del Proctor modificado para iniciar ,necesitamos sean definidos los niveles tanto de descapote que en los sondeos del estudio de suelos aparece 80 centímetros y en obra lo estamos corroborando, sin embargo se necesita el aval de supervisión e interventoria en sitio, también es necesario sean definidos los niveles del recebo compactado que en el estudio de suelos señala 30 centímetros sobre el nivel de Fundación y al colocar la placa de 1 mt el edificio queda casi 50 centimetros por debajo de la cota de andén, que si bien hoy en dia el terreno se inunda muy poco es debido al área que tiene una capa vegetal de 80 centímetros, al colocar zonas duras como los edificios, andenes, tanques, accesos y peatonales hay poca área para absorber el agua lluvia y de escorrentía causando humedades en los edificios.

Para empezar con el relleno común es necesario indiquen el nivel de subrasante o de placa de concreto de cimentación, en planos dice 30 centímetros de relleno común, sin embargo queda por debajo del andén, los otros edificios se han construido aproximadamente 40 cmts por encima del andén

Motivados


- Faltan que entreguen los siguientes planos:
  - Plano de detalles de elementos no estructurales.
  - Plano con el cuadro de convenciones de las especificaciones usadas en los diseños arquitectónicos, ya que existen especificaciones que aparecen en los planos y no están nombradas y tampoco aparecen, en su totalidad, en la relación de especificaciones del proyecto.
  - Detalles de baños, puertas, ventanas, rejas, muebles fijos y mobiliario.
  - Planos hidrosanitarios digitales.
  - Planos estructurales del tanque de reserva y cuartos de bombas con su respectiva localización.
  - Plano de cuarto de bombas aguas lluvias.
  - Planos de aire acondicionado, pues el CD entregado estaba dañado.
  - Planos Estructurales firmados.
  - Planos estructurales del tanque de la red de incendios y sitio de Ubicación.

Si la intervenoría y la supervisión autorizan empezar las obras antes del acta de inicio favor informar con quien coordinamos el inicio

Scanned by CamScanner

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ


Debido a que desde el día sábado 5 de Mayo hemos realizado presencia en la obra y a la fecha observamos que aún no está el espacio destinado para la ejecución del Proyecto totalmente despejado tal como se puede observar en el Registro fotográfico adjunto.

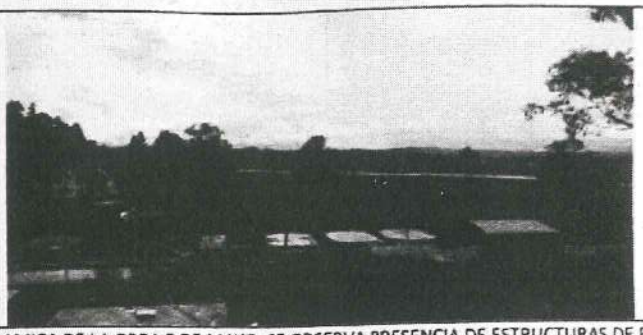


PANORAMICA DE LA OBRA 5 DE MAYO. SE OBSERVA PRESENCIA DE ESTRUCTURAS DE EMCAR



EN EL SITIO DE LA OBRA, EL PERSONAL DE LA DIJIN REALIZA HOY RETIRO E CABLEADO

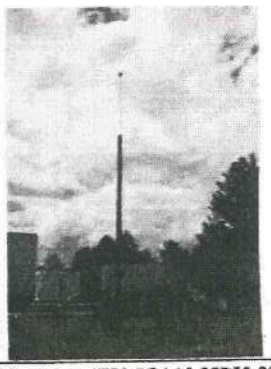

AUN SE ENCUENTRAN POSTES DE LAS REDES PERTENECIENTES A LA DIJIN

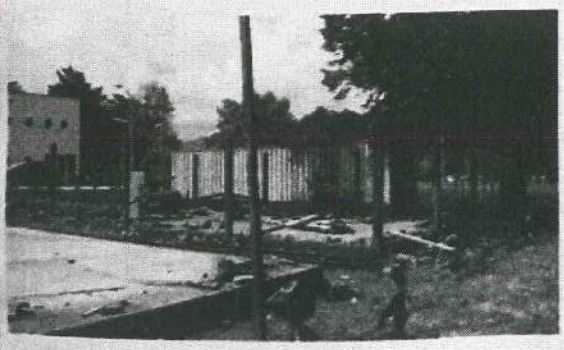


CONTINUA EN EL SITIO CONTENEDOR LARGO DE COLOR BLANCO




CONTINUAN EN EL SITIO CONTENEDOR CON DUCHAS, OTRO CON BATERIA SANITARIA, MUROS EN LADRILLO

Scanned by CamScanner

CONSORCIO BCS GUTIERREZ

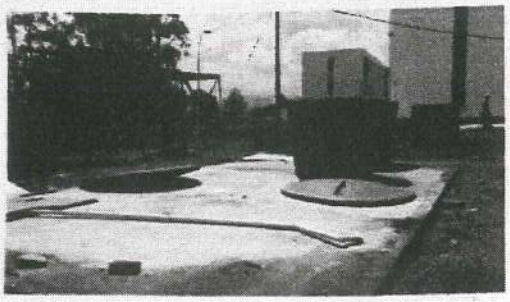


LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA FUERON COLOCADOS SOBRE UNA DE LAS LOSAS A DEMOLER

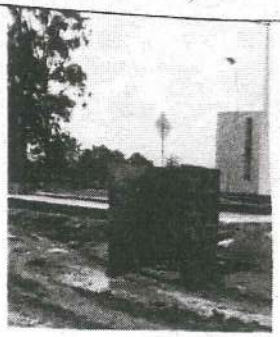


HAY CONTRUCCIONES EN BLOQUE DE CONCRETO QUE NO HAY SIDO DEMOLIDAS



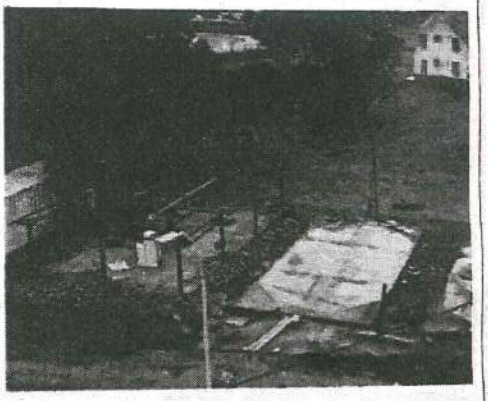

HAY ESTRUCTURAS QUE NO HAN SIDO DESARMADAS TOTALMENTE

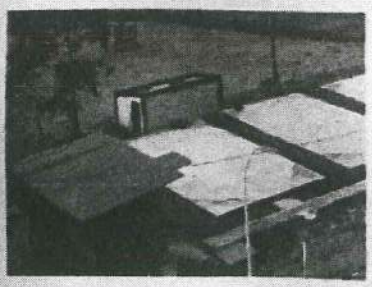

ESTRUCTURAS EN LADRILLO Y CUBIERTAS EN TEJA TERMOACUSTIC




HAY 2 CONTENEDORES AUN SIN RETIRAR


CONSORCIO BCS-GUTIERREZ, NIT 901.177.394-5
Carrera 19 # 84-41 Oficina 402, Bogota - Teléfono: 257 08 98, 3124509044, 3214941425 –
correo electrónico: administrativa@aureliogutierrez.com consorciobcs@aureliogutierrez.com

Scanned by CamScanner

Nos permitimos indicar que el Contrato indica en su CLAUSULA DECIMA. DERECHOS DEL CONTRATISTA: en general son derechos del Contratista..." 2.) *Tener acceso a los elementos físicos necesarios para desarrollar el objeto del contrato...*" (Negrilla subrayada fuera del texto original). Por lo anterior solicitamos que nos sea entregado el lote libre de todos los elementos referidos en el registro fotográfico y que a la fecha aún permanecen en el sitio obstaculizando el inicio de la construcción de las obras correspondientes al contrato de la referencia;


Aprovechamos la oportunidad para hacer evidencia que de acuerdo con las indicaciones recibidas en Obra por parte de la Te Ing Andrea Cadena Lemus, el ingreso al sitio de la obra se va a realizar desde el denominado Pompeyano n° 2.

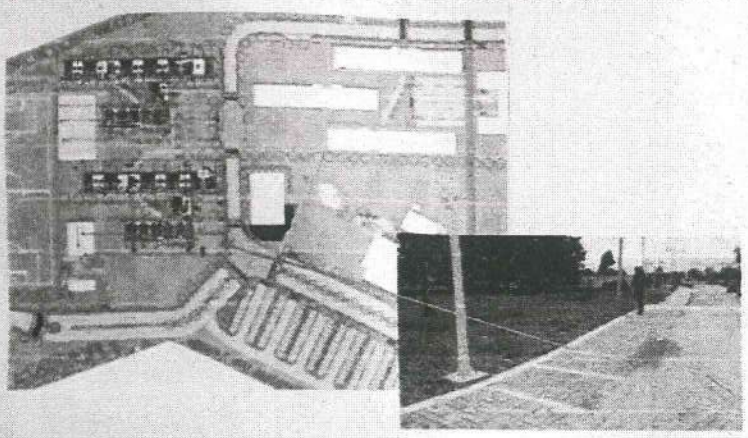




Recomendamos tener en consideración que se deberá solicitar al Contratista FERNANDO RAMIREZ SAS quien a la fecha ejecuta una de las etapas del Proyecto, que no instale bolardos en esta zona conforme ya se ejecutó en el Pompeyano # 3 debido a que no permitirían el tránsito vehicular hacia el área del lote.


Consideramos oportuno referir además que durante la visita de la Te Ing Andrea Cadena Lemus al sitio de la obra refirió que se desea no afectar los arboles de gran tamaño que se encuentra ubicados cerca al área del proyecto y uno de los cuales estaria directamente comprometido debido a que de acuerdo con los Planos del proyecto, en su misma posición se encuentra localizado el Tanque de Almacenamiento de Agua que debemos ejecutar en esta Fase.

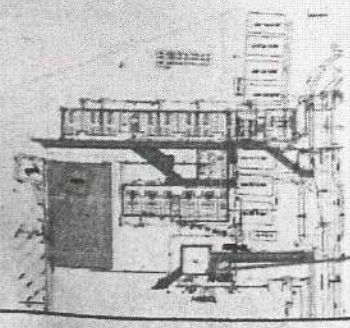	
PLANO CON UBICACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.	ARBOLES CERCA AL AREA DEL PROYECTO, EL CENTRAL COINCIDE CON LA POSICION DE TA

Scanned by CamScanner

EL CONTRATISTA HACE CONSULTA A LA DIRAF EN REFERENCIA A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA ZONA DEL PROYECTO Y LE REPORTAN QUE NO ESTAN PROGRAMADAS PARA SER DE-MOLIDAS HTEC.

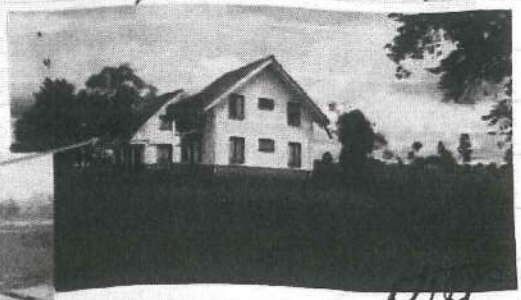

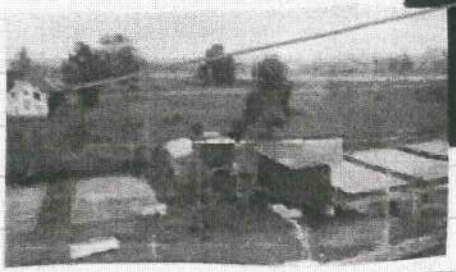



HTEC.

PARA PODER REALIZAR UNA PREVOCALIZACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL CONTRATISTA REALIZA UNA ROCERIA DEL LOTE, TAL Y COMO SE OBSERVA EN EL REGISTRO FOTOGRAFICO ADJUNTO A CONTINUACION. HTEC.







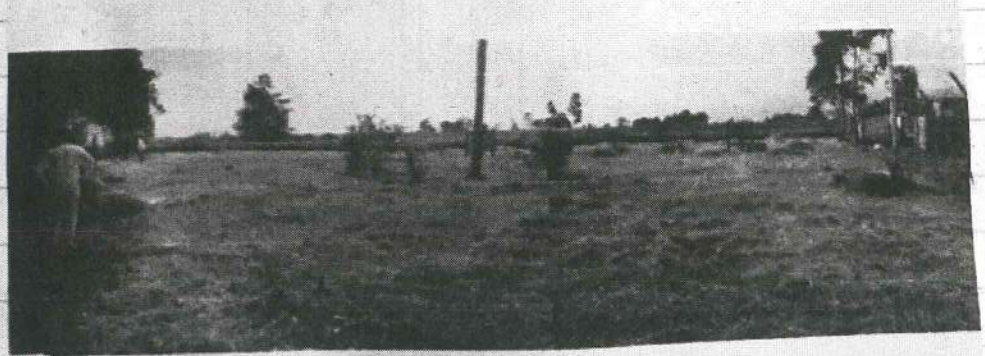







HTEC.

Scanned by CamScanner

SE REALIZA LA LOCALIZACION DE LOS 3 BLOQUES Y EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CONFORME SE OBSERVA EN LAS FOTOS ADJUNTAS.

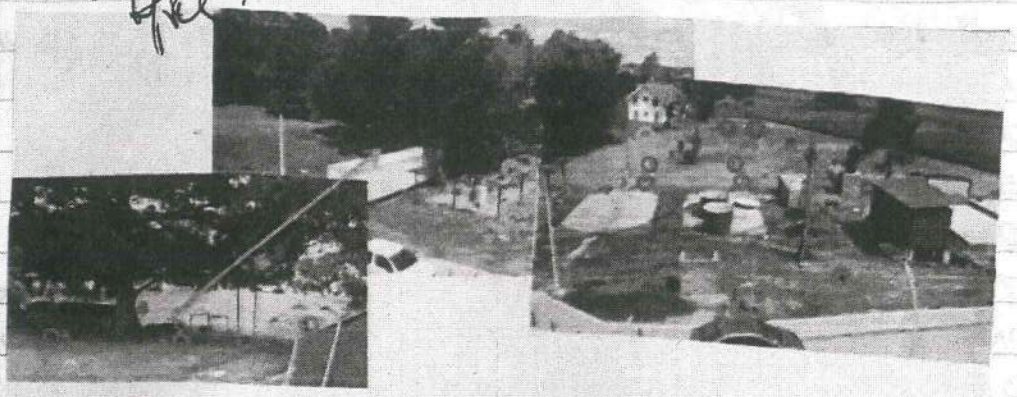


- CIRCULOS ROJOS Bloque #1 Lado deerecho
- CIRCULOS AZULES Bloque # 2 Centro
- CIRCULOS AMARILLOS Bloque # 3 Lado Izquierdo
- CIRCULOS NARANJA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA



- SE REALIZAN 3 APIQUES Y SE OBSERVA CAPA VEGETAL DE APROX. 80CM Y NIVEL FREATICO A 1.40 M DEL TERRENO.



- SE REALIZA RECORRIDO CON EL INTENDENTE LATTA DEL EHCAR DEL LOTE A DONDE REQUIEREN LES SEAN TRASLADADOS LOS CONTENEDORES, SE ESPERA AUTORIZACION PARA ESTE MOVIMIENTO.

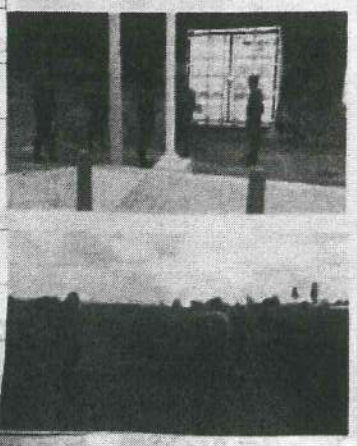







Scanned by CamScanner

EL CONTRATISTA DE OBRA HACE EVIDENCIA QUE DEBIDO A QUE EL TANQUE RCI APARECE AL OTRO LADO DE LA VIA NO TIENE COMUNICACION DIRECTA CON EL EDIFICIO OBJETO DE NUESTRO CONTRATO, SE OBSERVA ADEMAS QUE ESTARIA PARCIALMENTE UBICADO SOBRE UNA CONSTRUCCION EXISTENTE, ESPERAMOS INSTRUCCIONES, PROPONEMOS QUE SE CONSIDERE DEJAR UN PASE EN EL TRAMO DE VIA EN CONSTRUCCION PARA TENER UNA FUTURA CONEXION ENTRE FASE 4 y TANQUE. DE RCI QUE ALIMENTARIA LOS EDIFICIOS DE ESTE SECTOR.

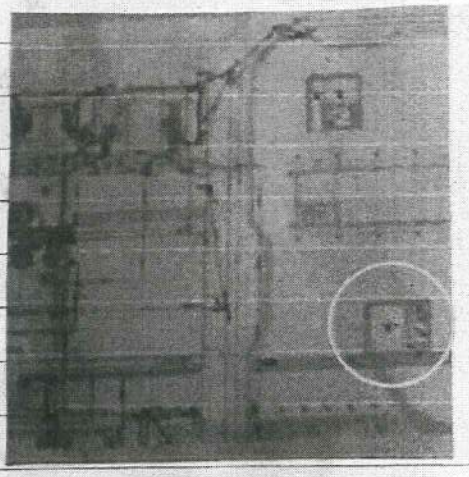

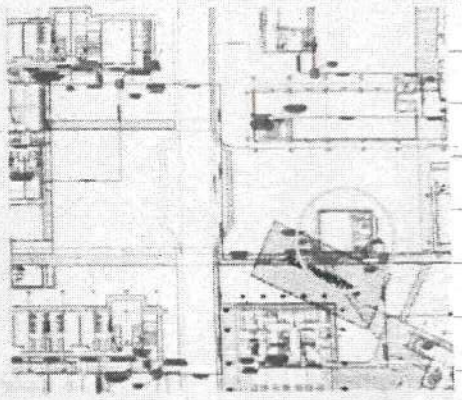

TAMBIEN NOS PERMITIMOS HACER EVIDENCIA DE LA APARENTE UBICACION DE LA SUBESTACION QUE ALIMENTA EL EDIFICIO D Y CUYA UBICACION AL PARECER COINCIDE CON LA PISCINA QUE ESTA FRENTE A LAS CABAÑAS.


A SU VEZ SE OBSERVA UNA APARENTE CONEXION CON LA SUBESTACION UBICADA Y CONSTRUIDA EN EL EDIFICIO 6. FASE 1.


DE IGUAL MANERA SE CONSULTARA CON LOS PROFESIONALES ELECTRICOS LA INQUIETUD A ESTE RESPECTO, LAS DEMAS REDES

minerva 50-02A Diseñada y actualizada según la Ley © por

Scanned by CamScanner

OBSERVADAS. [illegible]

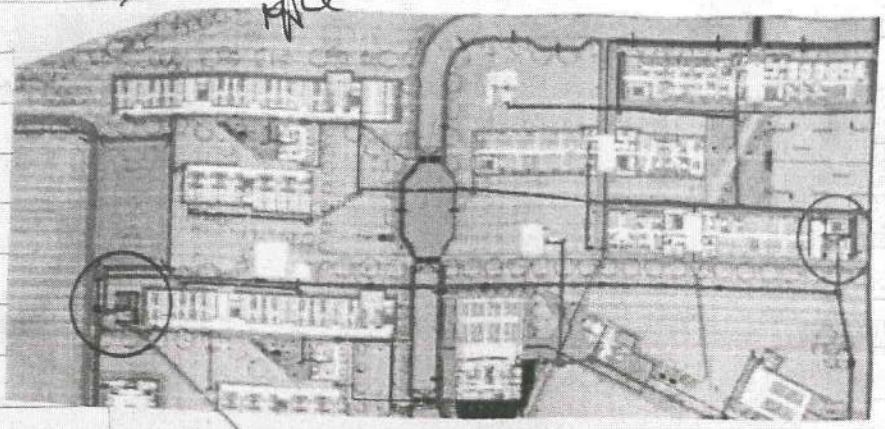

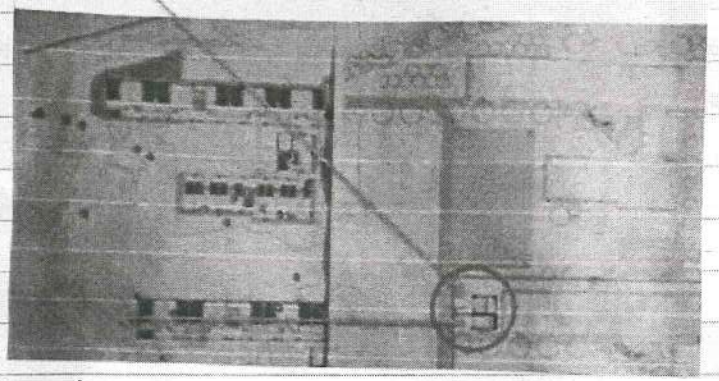

22 MAYO / 2018 -

LA TENIENTE ANDREA CADENA CITA A PERSONAL DE INTERVENTORIA Y OBRA. SE REALIZA INDICACIONES CON REFERENCIA A LA UBICACION DEL PROYECTO.




minerva Libreta Diseñada y actualizada según la Ley © por ISO


Scanned by CamScanner

POR PARTE DEL CONTRATISTA ESTA LA ING. MARIA TERESA OJEDA C. QUIEN SERA LA RESIDENTE Y, POR PARTE DE LA INTERVENTORIA ESTA.
SE ESTA A LA ESPERA DE LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

SABADO. 26 MAYO /2018

PARA PODER REALIZAR. EL INGRESO DEL CONTENEDOR HASTA LA OBRA ES NECESARIO DEMOLER UNOS MUROS EN BLOQUES DE CONCRETO EN FORMA DE C.
PARA SU EVIDENCIA SE ADJUNTAN FOTOS.

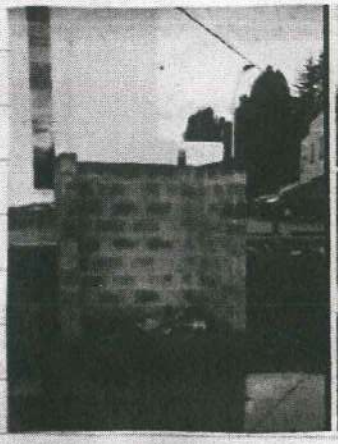

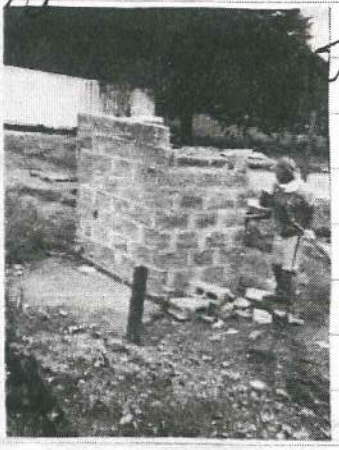

MARTES- 29 MAYO /2018

SE REALIZA INGRESO E INSTALACION DE CONTENEDOR, SE UBICA SOBRE UNA DE LAS LOSAS EXISTENTES EN EL SITIO.




Scanned by CamScanner

SABADO 2 JUNIO/2018

SE INICIA LA EJECUCION DEL CERRAMIENTO EN EL AREA AUTORIZADA HGS



PLANO LOCALIZACION GENERAL

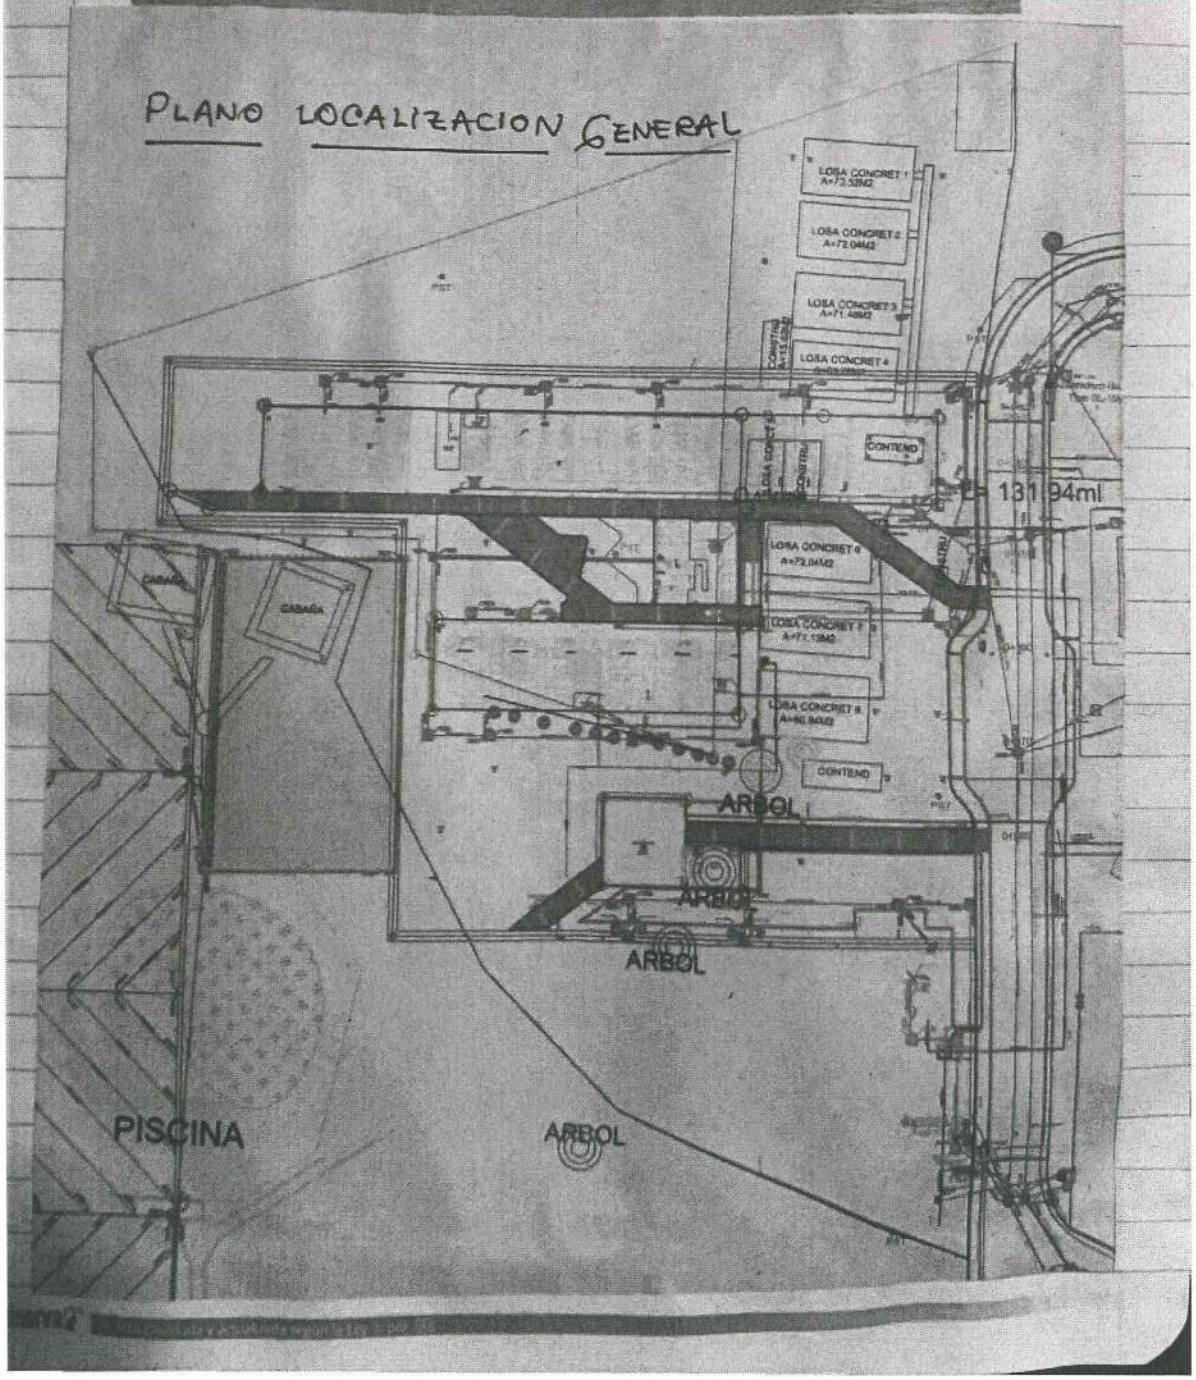

Scanned by CamScanner

14

LUNES 4 a MIERCOLES 6 JUNIO / 2018
SE ADELANTAN LABORES DE VERIFICACION DE PLANOS PARA IDENTIFICAR INGENIERIA DE DETALLE.
JUEVES 7 JUNIO / 2018

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AREA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	06-6-10044-18
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No.4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.
CONTRATANTE	: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA.
SUPERVISORA	: Teniente ANDREA CAROLINA CADENA LEMUS
CONTRATISTA	: CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
REP.LEGAL	: CLARA PATRICIA RODRIGUEZ ROMERO
INTERVENTORÍA	: DAIMCO S.A.S
REP. LEGAL	: CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO
VALOR	: $ 9.250.463.250.08 MONEDA LEGAL Incluido IVA
PLAZO	: Hasta el 15 de diciembre de 2018 a partir de la aprobación de la garantía única.
FECHA DE INICIACIÓN	: JUNIO 07 DE 2018
FECHA DE TERMINACION	: DICIEMBRE 15 DE 2018
PÓLIZAS:	Póliza de Cumplimiento No 96-44-1011377868 Anexo 0 del 23-05-2018 y Póliza de Seguro de Responsabilidad Extracontractual derivada de Cumplimiento No 96-40-101048803 Anexo 0 del 23-5-2018 Anexo 1 de 29-5-2018
ASEGURADORA	: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
REGISTRO PRESUPUESTAL	: No. 16518 DEL 09/02/2018 - RECURSO 11

A los siete días (07) días del mes de junio del año 2018, siendo las 9:00 a.m., en las instalaciones del Grupo de Seguimiento a Proyectos ubicadas en la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL, se reunieron la señora CLARA PATRICIA RODRIGUEZ ROMERO en calidad de Representante Legal de la firma CONSORCIO BCS-GUTIERREZ., Contratista de obra, el señor CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO en calidad de Representante Legal de la Interventoría a cargo de DAIMCO S.A.S y Teniente ANDREA CAROLINA CADENA LEMUS, en calidad de supervisora del contrato de interventoría por la Policía Nacional, con el fin de suscribir el Acta de Iniciación de la Obra:

Scanned by CamScanner

187

Se procede a dar inicio a las actividades del contrato como se describe a continuación:

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No.4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

Las especificaciones técnicas para el presente contrato, son las que se encuentran estipuladas en el contrato No.06-6-10044-18 e invitación PN DIRAF SA MC 028 2018, la cual hace parte integral del presente contrato.


Siendo las 9:00 A.M., se firma la presente acta a los siete días (07) días del mes de junio de 2018, por quienes en ella intervinieron.

CLARA PATRICIA RODRIGUEZ ROMERO
Representante Legal CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO
Representante Legal DAIMCO S.A.S

Teniente Ingeniero Civil ANDREA CAROLINA CADENA LEMUS
Supervisor del Contrato No. 06-3-10051-18

Carrera 59 26-21 CAN Bogota
Teléfonos 315 9154 - 3159786
Diraf.arinf-gusep@policia.gov.co
www.policia.gov.co



Scanned by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE ENTREGA DEL PREDIO

En el municipio de Popayán, Departamento de Cauca, a los 07 días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018), se reunieron las siguientes personas: de una parte, la señora **CLARA PATRICIA RODRIGUEZ ROMERO**, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 52.161.627 de Bogotá, como representante legal del **CONSORCIO BCS-GUTIÉRREZ**, con NIT 901.177.394-5 y de la otra, el señor **CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO**, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 78.027.760 de Cereté (Córdoba), como representante legal de la firma **DAIMCO S.A.S**, con NIT 900.021.482-1 y la **Teniente ANDREA CAROLINA CADENA LEMUS**, identificada con la C.C. No. 40.219.031 de Villavicencio (Meta), funcionaria del Grupo de seguimiento a proyectos de la Dirección Administrativa y Financiera en calidad de supervisora de Interventoria contrato PN-DIRAF No. 06-3-10051-18, en representación de la Nación Policía Nacional, quienes harán entrega y recibo del bien inmueble, predio ubicado en el municipio de Popayán – Cauca, con dirección alfa numérica: Carrera 17 No. 1 N – 75, previas las siguientes consideraciones:

1.-) Que mediante contrato PN DIRAF No. 06-3-10051-18, suscrito entre La Nación Policía Nacional y la empresa DAIMCO S.A.S de fecha 22 de mayo de 2018, se firmo el contrato de "Interventoria técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No. 4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

2.-) Que la empresa interventora DAIMCO S.A.S, a cargo del representante legal Señor CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO, recibirá por parte de la señora Teniente ANDREA CAROLINA CADENA LEMUS, funcionario del Grupo de Seguimiento a Proyectos de la Dirección Administrativa y Financiera en calidad de supervisor de interventoria y en representación de la Nación Policía Nacional el predio ubicado en la dirección alfa-numérica Carrera 17 No. 1 N – 75, identificado con matricula inmobiliaria No. 120-13255 en el municipio de POPAYÁN - CAUCA, en el cual se desarrollaran todas las actividades y obligaciones contractuales al proceso PN DIRAF No. 06-3-10051-18.

3.-) Se hace entrega del predio antes mencionado, con el fin que la ejecución de los trabajos termine durante la vigencia 2018, para lo cual, de acuerdo al plazo estimado contractualmente, se ha dispuesto como plazo de ejecución hasta el quince (15) de diciembre de 2018; a partir de la aprobación de la garantía única, fecha en la cual se suscribe acta de inicio, tiempo en el cual se debe superar toda clase de trámites internos y externos hasta lograr alcanzar la terminación de las actividades en la mencionada instalación policiales.

Scanned by CamScanner

Continuación Acta de Entrega predio ubicado en el municipio de Popayán – Cauca Carrera 17 No. 1 N-75 que hace la Nación–Policía Nacional a la firma interventora de obra DAIMCO, para el inicio de la construcción. **Hoja No. 2**

No siendo otro el objeto de la presente Acta de entrega, se firma por quienes en ella intervinieron, una vez leída y aprobada, tal como aparece, en dos (2) ejemplares originales, una para el que entrega y otra para el que recibe, a los siete (7) días del mes de junio de dos mil dieciocho (2018).

QUIEN ENTREGA EL PREDIO:

Teniente ANDREA CAROLINA CADENA LEMUS
Supervisor de Interventoria

QUIEN RECIBE EL PREDIO:

CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO
Representante Legal DAIMCO S.A.S

CLARA PATRICIA RODRIGUEZ ROMERO
Representante Legal CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

diraf.annf-gusep@policia.gov.co
Carrera 59 No 26-21 CAN Bogotá
Teléfonos 5159000 – 5159154
www.policia.gov.co

Scanned by CamScanner

JUEVES 7 JUNIO /2018.

PERSONAL EN OBRA: 1 DIRECTOR OBRA, 1 RESIDENTE OBRA, 1 ING. AMBIENTAL - SISO, 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVA.

- SE AVANZA EN LA EJECUCION DEL CERRAMIENTO PARA EL AREA DE LA OBRA.
- SE REALIZA VERIFICACION Y REPINTE DE LA NUMERACION DE LOS ARBOLES UBICADOS EN LA ZONA DE AFECTACION DEL PROYECTO. PARA IDENTIFICAR LOS ARBOLES A INCLUIR EN EL PLAN DE APROVECHAMIENTO Y COMPENSACION FORESTAL. MHC.



VIERNES 8 JUNIO /2018

PERSONAL EN OBRA: 1 DIRECTOR OBRA, 1 RESIDENTE OBRA 1 ING. AMBIENTAL - SISO, 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVA.

- LA ING. EVELYN GUZMAN PRESENTA ANTE LA CRC. EL PLAN DE APROVECHAMIENTO Y COMPENSACION PARA EL PROYECTO, EN LA CRC DEBIDO A LA NUEVA NORMATIVIDAD VIGENTE SOLICITAN UNA DOCUMENTACION ADICIONAL LA CUAL SE DEBE ADJUNTAR Y AJUSTAR EL PLAN, DE LO ANTERIOR SE DA INFORME A LA SUPERVISORA Y SE SOLICITAN DOCUMENTOS QUE SUMINISTRARIA LA CONSULTORIA.

MHC.


SABADO 9 JUNIO /2018

PERSONAL EN OBRA: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE OBRA ING. AMBIENTAL - SISO, 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVA.

LOS PROFESIONALES DEL PROYECTO AVANZAN

Scanned by CamScanner

EN LA INGENIERIA DE DETALLES IDENTIFICANDO LA INFORMACION FALTANTE DE LA CUAL SE REMITIRA OFICIO DE FORMA OPORTUNA.
SE REALIZA LA INSTALACION DE LA VALLA CONFORME A LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

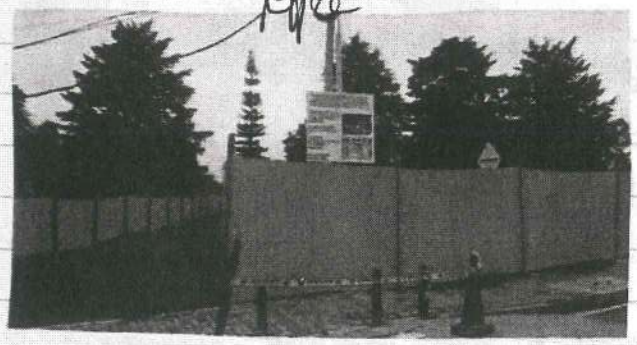

LUNES 11 JUNIO/2018.
EL GRUPO DE PROFESIONALES AVANZA EN LA ELABORACION DE INGENIERIA DE DETALLES DEL PROYECTO.
MARTES 12 JUNIO/2018.

- PERSONAL CONTRATISTA: Director de obra, Residente de obra, Ing. Ambiental, Auxiliar administrativo.
- PERSONAL INTERVENTORIA: Director de Interventoria. Residente de Interventorra, Ing. ambiental.
- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: Botas, casco, guantes
- CLIMA: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS:
- Localizacion y replanteo de ejes y niveles=
- Cerramiento provisional en lona H: 2.00M =
- Campamento contenedor. (Incluyé dotacion y desmonte) = 5 dias.
- OBSERVACIONES: SE hace revisiones pertinentes tanto del contratista como Interventorra a la documentacion correspondiente al proyecto en ejecución. Interventorra: Ing. Sand D Gon f
- EL CONTRATISTA DE OBRA HACE EVIDEN-

Scanned by CamScanner


CIA DE LA LLEGADA A LA OBRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL CAMPAMENTO MTTO.

MIERCOLES 13 JUNIO /2018

- PERSONAL CONTRATISTA: Director de obra, Residente de obra. Ing. Ambiental, Auxiliar Administrativo.
- PERSONAL INTERVENTORIA: Director de Interventoria Residente de Interventorra, Ing. Ambiental.
- IMPLEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL: BOTAS, CASCO, GUANTES.
- Clima: MAÑANA: Soleado TARDE: Soleado.
- Actividades ejecutadas
  - Campamentoconteneolor (Incluye dotacion y desmonte): Acumulado 6 dias.
- OBSERVACIONES:
  Se continua con revision sobre. documentacion del proyecto. tanto contratista como Interventorra, como tambien el contratista sigue en la logistica del proyecto. Ing. Interventoria.

- EL ING. FABIO CLARES RESIDENTE ELECTRICO DEL CONTRATISTA DENTRO DE LA VERIFICACION DE PLANOS Y PRESUPUESTO ELECTRICO PRESENTA COMO INQUIETUDES QUE SE CONFIRME LA EXISTENCIA DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y EL SITIO PARA SU UBICACION, ASI MISMO SE REQUIERE CONOCER EL SITIO PARA LA MALLA DE PUESTA A TIERRA
- SE REALIZA COMPRA DE MATERIALES Y SE INICIA LA EJECUCION DEL CAMPAMENTO ITEM 01.01.04.



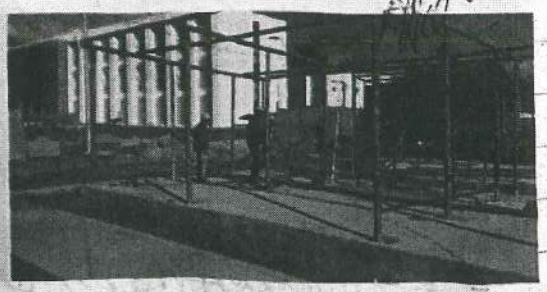

Scanned by CamScanner

- SE REALIZA COMITE DE OBRA #1 CON PRESENCIA DE LA SUPERVISORA TE. ANDREA CADENA POR PARTE DE LA DIRAF: SE ESTABLECE HACER ACTA DE VECINDAD DE CABAÑAS, DE LA VIA Y LA PISCINA.
- SE INDICA QUE LA PROXIMA SEMANA SE REALIZARA REUNION EN BOGOTA PARA PRESENTAR INQUIETUDES A LA CONSULTORIA.
- SE SOLICITA REALIZAR REGISTRO DE ASENTAMIENTOS DE LOS EDIFICIOS ALEDAÑOS DE FORMA MENSUAL.
- SE PRESENTARA LISTADO DE PLANOS FALTANTES COMO LOS HIDROSANITARIOS.
- LA ING. EVELYN GUZMAN INFORMA QUE PARA SACAR EL PLAN DE APROVECHAMIENTO Y COMPENSACION FORESTAL REQUIERE COPIA CEDULA Y TARJETA PROFESIONAL DE LOS ING. FORESTALES DE CONSULTORIA, SE DEBE DILIGENCIAR FORMATO DE PRESUPUESTO, ADJUNTAR INFORME DEL ANTERIOR APROVECHAMIENTO Y DETERMINAR EL COSTO DEL PLAN.
- SE SOLICITARA QUE EL PAISAJISMO SIRVA COMO PARTE DE LA COMPENSACION.
- PARA LA PROPUESTA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION LA ING. MARIA TERESA OJEDA INDICA QUE YA SACAMOS EL CERTIFICADO DE TRADICION, SE TIENE COPIA DE LOS DOCUMENTOS DEL GENERAL NIETO Y SE ESTA A LA ESPERA DEL PODER PARA PRESENTAR EL OFICIO CON LA SOLICITUD A LA CURADURIA URBANA #2.
- DURANTE EL COMITE EL DIRECTOR DE OBRA EXPONE SU INQUIETUD EN REFERENCIA AL NIVEL DEL PROYECTO QUE ESTA DISEÑADO APROXIMADAMENTE 80 CM. MAS BAJO QUE LOS BLOQUES #6, #7 y #8, SE REALIZARA UNA VERIFICACION DE POSIBLE VOLUMEN DE RELLENOS PREVIA CONSULTA AL GRUPO DE LA CONSULTORIA QUIENES DEFINEN SI ES CONVENIENTE CAMBIO DE NIVEL [illegible] condominio BOJ-6.

Scanned by CamScanner

JUEVES - 14 de junio de 2018

- Personal contratista: Director de Obra, Residente 1 de obra, Ing Ambiental, Auxiliar administrativa. Personal de subcontratista en ejecucion campamento.
- Personal interventoria: Director de interventoria, Residente de interventoria, Ing Ambiental.
- Implementos de seguridad industrial: Botas, cascos, guantes.
- CLIMA: Mañana: Soleado Tarde: Soleado.
- Actividades Ejecutadas:
  Campamento contenedor (Incluye dotacion y desmonte) acumulado 7 dias
  campamento (Incluye placa de contrapiso, paredes tabla, cubierta en fibrocemento).
- Observaciones:
  Se continua con revisiones en la documentacion del proyecto y logistica del proyecto por parte del contratista.

Sandra Ramirez Interventoria

- EL CONTRATISTA CONFIRMA LA EXISTENCIA EN UN SITIO CERCANO A LA OBRA DE UN TRANSFORMADOR EN USO DE 150 KVA, DESDE DONDE SE PODRIA REALIZAR LA ACOMETIDA PROVISIONAL PARA EL PROYECTO, SERIA NECESARIO VERIFICAR CARGAS.

CONSORCIO BCS-G.

VIERNES - 15 de junio / 2018

- PERSONAL CONTRATISTA: Director de Obra, Residente 1 de obra, Ing Ambiental, Auxiliar administrativa, Personal del subcontratista.
- PERSONAL INTERVENTORIA: Director de interventoria, Residente de interventoria, Ing Ambiental.
- Implementos de seguridad industrial: Botas, casco, guantes.
- CLIMA: Mañana: Soleado TARDE: Soleado.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS.
  - CAMPAMENTO CONTENEDOR (Incluye dotacion y desmonte) acumulado 8 dias
  - CAMPAMENTO (Incluye placa contrapiso, paredes en tabla, cubierta en fibrocemento.) 66 M2.

Scanned by CamScanner

• Observaciones:
- Aun sin ejecucion de demoliciones, descapote por parte del contratista.
- Continua construccion del campamento. Ing Sindy Lorena P Interventora.
- EL CONTRATISTA DE OBRA PRESENTARA COSTO DEL TRASLADO DE CONTENEDORES, ESTOS ELEMENTOS ESTAN UBICADOS DE MANERA QUE IMPIDEN EJECUTAR LA DEMOLICION DE LOSAS DE CONTRAPISO EXISTENTES.
- CONTINUAMOS A LA ESPERA DE LOS DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EL PLAN DE APROVECHAMIENTO Y COMPENSACION, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA VENCIDO NO ES POSIBLE TALAR LOS ARBOLES QUE PERMITIRIAN AVANZAR EN FRENTES COMO DESCAPOTE EN ZONA DE EDIFICIOS O EXCAVACION PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. MMC. CONSORCIO BCS-GUTIERREZ.

SABADO - 16 de JUNIO de 2018.

- Personal del Contratista: Director de Obra, Residente 1 de obra, Ing Ambiental, Auxiliar administrativa, Personal de subcontratista adelantando campamento.
- Implementos Seguridad Industrial: Botas, casco, guantes.
- Clima: Mañana: Soleado.
- Actividades ejecutadas:
• CAMPAMENTO CONTENEDOR (Incluye adecuacion y desmonte) = Acumulado 8 dias
• CAMPAMENTO (Incluye placa de contrapiso, paredes en tabla, cubierta en fibro cemento) 66 m2.
- Observaciones:
• De continua, el contratista en logistica de la obra y en revisiones del proyecto como tambien lo interventoria.
• NO hay aun inicio de demolicion de placa, ni descapote del area a intervenir.
• Se solicita al contratista la programacion de obra.
• Continua con la construccion del campamento. Ing Sindy Lorena Interventora
- EL CONTRATISTA REITERA A LA INTERVENTORIA QUE NO SE PUEDEN ADELANTAR OTRAS ACTIVIDA-

Scanned by CamScanner

DEJ POR LA PRESENCIA DE LOS CONTENEDORES, POR NO PODER TALAR LOS ARBOLES Y PORQUE AUN NO ES CLARO EL NIVEL DEFINITIVO DE TRABAJO. MYEC CONSORCIO BOG-BOYACA,

LUNES 18 de junio /2018

- Personal Contratista: Director de Obra, Residente 1 de obra, Ing Ambiental, Auxiliar administrativa, personal del Subcontratista campamento: Subcontratista y 3 Ayudantes.
- Personal de Interventoria: Director de Interventoria, Residente de Interventoria, Ing Ambiental.
- Implementos de Seguridad Industrial: Botas, casco.
- Clima mañana: soleado Tarde: soleado.
- Actividades Ejecutadas:
  - Campamento Contenedor (Incluye dotacion y desmonte) total 11 dias
  - Campamento (Incluye placa de contrapiso, paredes en tabla cubierta en fibrocemento) 66 m2.
- Observaciones:
  - Se continua las revisiones de la documentacion del proyecto por parte del contratista y de la Interventoria.
  - Sin ejecucion por parte del contratista de demoliciones de placa, ni descapote del Lote a intervenir.
  - Interventoria solicita APU's y Programacion de Obra.
  - Se continua con la construccion del campamento.

Ing Sud Interventoria

- EL CONTRATISTA SOLICITA QUE SE REALICE DE FORMA CONJUNTA LAS ACTAS DE VECINDAD DEL PROYECTO.
- LA COMISION DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA TOMA NIVELES PARA ELABORAR PERFIL DONDE SE EVIDENCIE LAS DIFERENCIA ENTRE LOS BLOQUES #6, #7, #8, LA VIA Y EL EDIFICIO D, SE SOLICITA LA TOPOGRAFIA DE LA INTERVENTORIA PARA VERIFICAR PRELOCALIZACION DEL PROYECTO. MYEC Consorcio BOG-B

Scanned by CamScanner

- EL CONTRATISTA PROPONE GENERAR UN PASE EN LA ZONA DE LA VIA EJE 4 QUE AUN ESTA EN CONSTRUCCION PARA EL POSIBLE PASO DE DE REDES DESDE ZONA DE FASE 1 O FASE 3 (TANQUE RCI) ofer.

Martes 19 de Junio /2018.

- Personal Contratista: Director de Obra, Residente 1 de obra, Ing Ambiental, Auxiliar administrativo, Personal Subcontratista campamento: 4 ayudantes.
- Personal Interventoria: Director de Interventoria, Residente de Interventoria, Residente seguridad industrial.
- Clima: mañana: soleado tarde: soleado.
- Actividades Ejecutadas:

- Campamento Contenedor (Incluye dotacion y desmonte).
- Campamento (Incluye placa contrapiso, paredes en tabla, cubierta en fibrocemento.) 66 m².

- Observaciones:

- Se continua con la revision tecnica del proyecto tanto del contratista como de Interventoria.
- Se hace una visita por parte del Residente Técnica del Proyecto de Interventoria Ing. Jose Vicente Bocanegra, al sitio de obra, para regerenciar tenga como:
  - Descapote, donde el Contratista manifiesta tener segon aprique espesores mayores a lo especificado.
  - Traslado de contenedores que aun permanecen en sitio, sin ser retirados por parte de la policia.
  - Documentacion pendiente por entregar por parte del comando de Policia.
  - Avance de Obra;
  - Solicitud al contratista de la programacion de obra y APUs Contractuales.

Ing Supervisor Interventoria

- EL CONTRATISTA REPORTA QUE SU TOPOGRAFA IDENTIFICO LA ZONA POSIBLE PARA REALIZAR PASO DE TUBERIA PARA RED TANQUE RCI, DE REPORTA ZONA A LA INTERVENTORIA.

Scanned by CamScanner



LA ING. EVELYN EN COMPAÑIA DEL ING. AMBIENTAL DE LA INTERVENTORIA REALIZAN ACTA DE VECINDAD A LAS CABAÑA QUE SE ENCUENTRAN CERCA A LA ZONA DEL PROYECTO. SE SUGIO ACOMPAÑAMIENTO DEL INTENDENTE MOLINA QUIEN NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE POR LO TANTO EL RECORRIDO SE REALIZA CON QUIENES HABITAN LAS CABAÑAS.

LA PRINCIPAL OBSERVACION ES LA HUMEDAD QUE A DETERIORADO PISOS, REPELLOS, MUROS ETC.

- DURANTE EL COMITE SE DEFINE EL MANEJO QUE SE DARA AL MOVIMIENTO DE CONTENEDORES PARA LIBERARNOS LA ZONA DE TRABAJO.
- EL ING. BOCANEGRA INFORMA QUE LA INTERVENTORIA SOLICITARA POR OFICIO A LA DIRAF, LOS DOCUMENTOS QUE FALTAN PARA PODER PRESENTAR EL PLAN DE COMPENSACION.
- EL CONTRATISTA EXPONE AL ING. BOCANEGRA, LA INQUIETUD EN REFERENCIA AL SOBRESPESOR DE MATERIA ORGANICA QUE SE IDENTIFICO EN LA ZONA.
- EL ING. BOCANEGRA COMENTA QUE PRESENTARAN OBSERVACIONES AL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO.
- SE LE REITERA A LA INTERVENTORIA QUE A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA A LAS INQUIETUDES PLANTEADAS EN EL OFICIO # 009 DEL 22 de MAYO ADJUNTO ENTRE LOS FOLIOS 2y 7 DE ESTA BITACORA.
- EL ING. DE INTERVENTORIA INFORMA QUE EL PROXIMO JUEVES VIENE EL ING. ELECTRICO DE LA INTERVENTORIA.

Scanned by CamScanner

- NO FUE POSIBLE QUE SE REALIZARA EL ACTA DE VECINDAD DE LAS 4 VIVIENDAS EN LAS 2 CABAÑAS EN SU TOTALIDAD POR NO ENCONTRARSE QUIENES LAS HABITAN; SE APLAZA LA TERMINACION. ~~EL~~ CONSORCIO DOS-BATALLER.

MIERCOLES, 20 JUNIO de 2018

- PERSONAL EN OBRA DEL CONTRATISTA: Director de Obra, Residente 1 de obra, Ing-Ambiental Residente de Seguridad Industrial. Auxiliar administrativa, Personal del subcontratista de campamento (4 ayudantes, 1 subcontratista).
- PERSONAL INTERVENTORIA: Director de Interventorra, Residente de Interventorra, Residente de Seguridad Industrial.
- CLIMA: Mañana: soleado Tarde: soleado.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS:
  - Campamento contenedor (Incluye excavación y desmonte)
  - Campamento (Incluye placa de contrapiso, paredes en tabla, cubierta de fibrocemento) 66m2
- Observaciones:
  - Se continua con las revisiones técnicas del Proyeto
  - Esta pendiente la entrega de la programación por parte del contratista y APUs para la revisión de Interventorra.

Ing Sand / Gest Interventora

- EL CONTRATISTA DE OBRA REITERA SU PREOCUPACION EN CUANTO A QUE NO HA RECIBIDO EL PODER PARA ADELANTAR LAS GESTIONES ANTE LA CURADURIA #2 PARA SOLICITAR LA PRORROGA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION QUE SE VENCE EL 22 DE julio de 2018. TAMPOCO A RECIBIDO NI EL PODER NI LOS DOCUMENTOS FALTANTES PARA EL TRAMITE ANTE LA CRC.
- EL CONTRATISTA ADJUNTA EN EL FOLIO # 28 COPIA DEL TEXTO ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO A JAIMLO POR PARTE DEL ING. ELECTRICO DEL CONTRATISTA

Scanned by CamScanner

Gmail

CONSORCIO BCS-GUTIERREZ <consorciobcsgutierrez@gmail.com>

INQUIETUDES INSTALACIONES ELECTRICAS DECAU PONAL POPAYAN

1 mensaje

CONSORCIO BCS-GUTIERREZ <consorciobcs@aurelliogutierrez.com> 20 de junio de 2018, 19:50
Para: vbocanegra@daimco.com.co
Cc: consorciobcs@aurelliogutierrez.com

Señores:

DAIMCO

a/a Ing. VICTOR BOCANEGRA
INTERVENTORIA DECAU

Cordial saludo

De acuerdo a lo conversado el día de hoy en reunión sostenida en sus oficinas en Bogotá, me permito transmitir algunas de las inquietudes respecto al proyecto en mención.

- Confirmar potencia de la red provisional de obra. En el presupuesto esta incluida una planta de 350 KVA para este servicio de obra.
- El diseño requiere o no aprobación por parte del operador de red? En este momento aparentemente el diseño no esta aprobado.
- al final del proyecto, se debe coordinar con el operador de red corte de energía para conectar la subestación a la red existente?
- Se debe realizar algún tramite ante la empresa de energía tal como actualización de diseño, recibo de obra, entre otros?
- Definición de Punto especifico de conexión por media tensión.
- Sitio especifico de la subestación.
- Sitio o espacio para construir malla de puesta a tierra (según diseño la malla es de 5 x 12 metros).
- Verificar tipo de celda de medida, ya que en el unifilar aparece celda de medida en Baja tensión pero en el alcance aparece grupo de medida en media tensión.
- Definir cantidad de maniobras eléctricas en media tensión requeridas para realizar la instalación.
- Especificar si se debe incluir certificación Plena Retie y Retilap.
- Especificar las caracterizaras de la red contra incendios o aclarar si ya hay una existente.
- Dentro de las cantidades del presupuesto, no esta incluida la obra civil del cuarto de la subestación. Este se debe definir e incluir.

Todas las cantidades de cable se deben verificar en terreno, principalmente las asociadas a las acometidas eléctricas.

Por el momento son las inquietudes y comentarios que han surgido.

Se continúa con la revisión del resto de la especificación y diseños de las redes internas y de otros servicios asociados a la red eléctrica.

FABIO ANDRES CLAROS
INGENIERO ELECTRICISTA--
BCS GUTIERREZ Logo

--

CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

consorcio BCS-G

Scanned by CamScanner

JUEVES 21 de junio de 2018

- Personal contratista: Director de Obra, Residente 1 de obra Ing Ambiental Residente. Seguridad Industrial. Personal subcontratista campamento (1 subcontratista, 4 ayudantes) 1 Aux. administrativa.
- Personal interventoria: Director de interventoria. Residente de interventoria.
- Clima Mañana: Soleado Tarde: Soleado.
- Actividades ejecutadas.
  - Campamento contenedor (Incluye detalleo y desmonte)
  - Campamento (Incluye placa de contrapiso paredes en tabla, cubierto en teja de fibrocemento).
- Observaciones.
  - se avanza en las revisiones del proyecto.

Ing. Sandra Guaña
Interventoria



- LA INGENIERA RESIDENTE SANDRA GUAÑA Y LA ING. EVELYN GUZMAN REALIZAN EL ACTA DE VECINDAD DE LAS CABAÑAS FALTANTES Y DE FORMA ADICIONAL REALIZAN ACTA DE VECINDAD A LA VIA Y EN ESPECIAL AL ANDEN EN LA ZONA DE INGRESO A LA OBRA DE LOS ALOJAMIENTOS; EN LA VIA SE REALIZA VERIFICACION Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE TODA LA VIA DESDE LA ABSCISA K0+000 EN LA ENTRADA PPAL HASTA EL SECTOR EJE 4 FRENTE AL NUEVO PROYECTO.
- LA REUNION CON LA CONSULTORIA SE APLAZO PARA LA PROXIMA SEMANA.
- AL DIA DE HOY NO HAN LLEGADO LOS PODERES PARA REALIZAR GESTIONES EN CURADURIA URBANA #2 y ANTE LA CRC. [illegible] CONSORCIO BG-GUTIERREZ.

Scanned by CamScanner


VIERNES 22 JUNIO /2018

- Personal Contratista: Director de obra, Residente Especialista industrial, Subcontratista (1 subcontratista y 4 ayudantes) 1 auxiliar administrativo, Comisión topográfica
- Personal interventoría: Director de interventoría, Residente interventoría, Residente seguridad industrial, Topografía
- Clima: Mañana Soleado Tarde Soleado
- Actividades ejecutadas:
  - Campamento (incluye placa de contrapiso, pared en tabla, cubierta en fibrocemento de zinc)
- Observaciones:
  - Se realizo por interventoría visita por la comisión topográfica para la verificación del proyecto (su ubicación) dentro del área a intervenir, como también los niveles
  - El contratista hace entrega del campamento instalado a la interventoría, quien hizo uso del contenedor 13 días en relación a un 1 mes según presupuesto.

Ing Supervisor de Obra Interventor

- EL CONTRATISTA DE OBRA ACLARA QUE EL CONTENEDOR FUE SUMINISTRADO - INSTALADO EN OBRA CONFORME LO INDICA EL PRESUPUESTO DONDE NO SE ESPECIFICA EL TIPO DE USO TAN SOLO SE INDICA QUE SU PAGO SERA MENSUAL
- SE REALIZA DE FORMA CONJUNTA EL ACTA DE VECINDAD DEL AREA DE LA PISCINA.





CONSORCIO BOS-GUTIERREZ

- LLEGA EL PODER AUTORIZANDO A LA ING. MARIA TERESA OJEDA PARA REALIZAR LA SOLICITUD DE PRORROGA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION SE REALIZA OFICIO CON LOS SOPORTES ADJUNTOS Y SE PRESENTA ANTE LA CURADURIA #2.

minerva SO-02A Diseñada y actualizada según la Ley © por SG

Scanned by CamScanner

PARA CONSTANCIA SE ADJUNTA OFICIO RADICADO EN LA CURADURIA # 2. LA RESPUESTA DEBERA 10 DIAS HABILES MHC.

Popayán, 22 de Junio de 2018

Arquitecto
ALEXANDER RICARDO VARGAS
CURADOR URBANO N° 2
Popayán, Cauca

Ref.: CONTRATO N° 06-6-10044-18 - CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN NRO. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA LICENCIA DE CONSTRUCCION N° 5881 22 de Julio de 2016

Cordial saludo.

En consideración con el Poder que me fue otorgado por la POLICIA NACIONAL, el cual adjunto, y en consideración al Contrato de la Referencia, respetuosamente solicito la prórroga de la licencia del Asunto la cual fue aprobada para ser expedida mediante Resolución N° 6540 de 29 de junio de 2016, para el predio identificado con la matricula inmobiliaria N° 120-13255 de propiedad de la Policía Nacional. La solicitud de renovación la presentó en virtud de que a la fecha la obra se encuentra aún en ejecución.

Adjunto a la presente los documentos a continuación relacionado:

- Poder para que María Teresa Ojeda Cabrera, solicite la Prorroga de la Licencia del asunto a nombre de la POLICIA NACIONAL.
- Acta de Posesión N° 0015-16 del Mayor general JOSE HERNANDO NIETO ROJAS, director general de la policía.
- Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía del Mayor general JOSE HERNANDO NIETO ROJAS
- Fotocopia de matricula profesional de la Ing María Teresa Ojeda Cabrera.
- Fotocopia de Cedula Ciudadanía de la Ing María Teresa Ojeda Cabrera.
- Fotocopia del Certificado de Tradición del Predio.
- Fotocopia de la Licencia N° 5881 de 22 de Julio de 2016
- Recibo de pago correspondiente a la Renovación de la Licencia.

Atentamente
María Teresa Ojeda C.
MARIA TERESA OJEDA CABRERA
INGENIERA CIVIL
CONSORCIO BCS - GUTIERREZ
CC. ARCHIVO

CURADURIA URBANA
MUNICIPIO DE POPAYAN
RECIBIDO
Fecha 22 JUN 2018
Hora 3:03 PM

CONSORCIO BCS-GUTIERREZ, NIT 901.177.394-5
Carrera 19 # 84-41 Oficina 402, Bogota - Teléfono: 257 08 98, 3124509044, 3214941425 –
correo electrónico: administrativa@aureliogutierrez.com consorciobcs@aureliogutierrez.com

MHC.

Scanned by CamScanner

Sabado 23 de Junio de 2018

- Personal contratista: Director de obra, Residente de obra, Residente seguridad industrial, laboratorista (1 laboratorista, 4 ayudantes) Un auxiliar administrativo; Cuadrilla topografica.
- personal interventoria: Director de interventoria, Residente de interventoria, (Residente)
- Clima: Mañana: soleado Tarde: —
- Actividades Ejecutadas:
- Campamento. (incluye placa de contrapiso, paredes en bloque, cubierta en fibrocemento de zinc).

Ing Sandra J Gomez
Interventora

- Observaciones:

EL DIA 22 DE JUNIO LA TOPOGRAFA DEL CONTRATISTA LE INDICA A LA INTERVENTORIA LA POSIBLE ZONA PARA REALIZAR EL PASE PARA FUTURA TUBERIA DE RCI.

- EL CONTRATISTA ENVIO VIA CORREO ELECTRONICO INQUIETUDES PARA QUE SEAN PRESENTADAS A LA CONSULTORIA EN EL COMITE QUE SE REALIZARA LA PROXIMA SEMANA EN BOGOTA. EN DICHO DOCUMENTO SE INSISTE QUE A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA AL OFICIO N°009 ENVIADO EN 22 DE MAYO. (Mirar folios 297 BITACORA). DE FORMA ADICIONAL SE REITERA LA INQUIETUD EN CUANTO A LOS NIVELES DEFINITIVOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, SE ESPERA QUE SE SUBA EL NIVEL PARA EVITAR LOS PROBLEMAS DE HUMEDAD QUE SE OBSERVAN EN LAS CABAÑAS. SE PRESENTAN INQUIETUDES RESPECTO A DETALLES ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES COMO EJEMPLO EL TIPO DE CUBIERTA, LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES DE LOS TANQUE QUE NO SE HAN RECIBIDO. EL PROFESIONAL ELECTRICO DEL CONTRATISTA PRESENTA VARIAS INQUIETUDES ENTRE LAS QUE ESTAN LA UBICACION DE LA SUBESTACION.

CONSORCIO BCS-GUTIERREZ.

Scanned by CamScanner


Mey | 25 de Junio de 2018

- Personal Contratista: Director de obra, Residente de obra, Residente Seguridad industrial, Subcontratista (1 soldador fit, 1 ayudantes) Un asistente administrativo, Comisión topográfica
- Personal Interventoría: Director de Interventoría, Residente de Interventoría
- Clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado
- Actividades Ejecutadas.
  - Campamento (Incluye placa de contrapiso, ponde en lata, cubierta en fibrocemento de zinc)
- Observaciones
  - Se realizo por la comisión topográfica la ubicación de los postes por ser contemplados en planos, para verificación en obra con el contratista
  - El contratista hace entrega vía magnética de APU's para su revisión por Interventoría, este pendiente otros APU's. Ingeniero Interventoría
  - LA INTERVENTORIA ESPERA SEGUN INFORMA DEFINICION DE BOGOTA PARA AUTORIZAR POSICION DE TUBERIA Y DIAMETRO DEL PASE QUE SE DEJARA EN LA VIA PARA RCI NTCC.
  - LA ING. MARIA TERESA OJEDA C. RESIDENTE DE OBRA VIAJA A BOGOTA PARA PARTICIPAR EN COMITE CON LA CONSULTORIA QUE SE REALIZARA MAÑANA EN LA DIRAF. NTCC CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
  - SE HACE REFERENCIA A QUE NO SE CUENTA CON PLANOS DEL TANQUE DE RESERVA, POR LO TANTO NO SE PUEDE REALIZAR LA INGENIERIA DE DETALLES.
  - HAY IDENTIFICADOS MUCHOS DETALLES ARQUITECTONICOS QUE NO TENEMOS EN PLANOS, POR EJEMPLO DE CIELO RASO, BAÑOS, VENTANAS, etc.
  - EN LA PARTE ELECTRICA DE IDENTIFICA QUE LA OBRA CIVIL DE LA SUBESTACION NO ESTA EN EL PRESUPUESTO, TAMPOCO LA MALLA TIERRA. NTCC CONSORCIO BCS-G

Scanned by CamScanner

Martes 26 de Junio de 2018

- Personal del Contratista: Director de obra, Residente de obra, Residente seguridad industrial, Subcontratista (1 subcontratista, 4 ayudantes), Un auxiliar administrativo, Comisión topografica.
- Personal de Interventoria: Director de Interventoria, Residente de Interventoria, Comisión Topografica
- Clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado
- Actividades Ejecutadas:
  - Campamento (incluye placa de contrapeso, pared en tabla, cubierta en fibro cemento de zinc) 60 m².
  - Se indica al contratista las dos trazas de los pases para la RCI pero aún, Interventoria deja radicado que se debe esperar una autorización para cualquiera de las dos trazas, porque, una de ellas se encuentra ubicada sobre vía recien construida que afectaría la garantia de estos trabajos y el otro trazo esta sobre la misma vía pero en un sector que aún esta en obra perteneciente a la ejecución de otra fase.

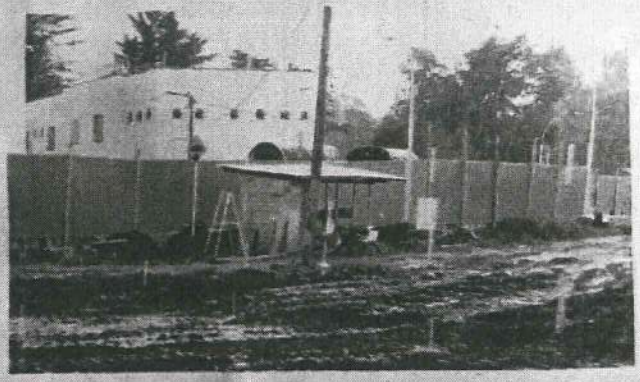



- REGISTRO FOTOGRAFICO DE TRABAJOS EN BATERIA SANITARIA

EL CONTRATISTA EXPONDRA EL TEMA DEL PASE PARA RED DE TUBERIA - RCI EN EL COMITÉ QUE SE REALIZA EN BOGOTA PARA TENER PRONTA DEFINICION AL RESPECTO. NTC.

EN EL COMITÉ SE TRATAN TEMAS COMO:

1. EL TANQUE RCI QUE SURTE A FASE 4 SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN FASE 3 POR LO TANTO NO ESTA INCLUIDO EN EL

Scanned by CamScanner

PRESUPUESTO Y NO SE EJECUTARA.

2. LOS DISEÑOS DE VENTANAS CORRESPONDEN A UN TEMA BIOCLIMATICO PERO SE VERIFICARAN LAS INQUIETUDES DEL ARQUITECTO DEL GRUPO DE OBRA.

3. VERIFICARA LA CONSULTORIA POSIBLE INCONSISTENCIA EN TIPO LOZA DE CUBIERTA.

4. EL SUBINTENDENTE RUBIO ESTARA EN OBRA JUEVES Y VIERNES PARA ACLARAR TEMAS ELECTRICOS Y EL ENLACE DE SUBESTACION DE FASE 4 CON OTRAS FASES.

5. SE REITERA LA IMPORTANCIA DE DEFINIR NIVELES Y QUE EL PROYECTO NO ESTE EN UNA ZONA INUNDABLE, LA CONSULTORIA INDICA QUE EN EL PROYECTO HAY CONTEMPLADO DIFERENTES NIVELES CONFORME AL TERRENO Y QUE ADEMAS SE TIENEN PREVISTOS VARIOS FILTROS

Ing Sub 6ª Subintendencia

6. SE REITERA POR PARTE DEL CONTRATISTA TENER EN CUENTA POSIBLE AFECTACION DE LAS CABAÑAS CERCANAS AL PROYECTO.

7. SE PROGRAMA REUNION DE GEOTECNISTAS CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y DIRAF PROXIMA SEMANA.

8. EL ING. ESTRUCTURAL DE DAIMCO PRESENTA INQUIETUD RESPECTO AL TIPO DE USO DEL PROYECTO.

9. SE PIDEN PLANOS QUE FALTAN EN MEDIO MAGNETICO, LA CONSULTORIA SE COMPROMETE A ENTREGARLOS. POR EJEMPLO LOS DEL T.A.

10. EL ASESOR HIDRO DE DAIMCO EMITIRA CONCEPTO RESPECTO AL PASE PARA RCI.

11. SE SOLICITAN PLANOS RED GAS.

12. SE SOLICITA AL CONSULTOR LOS DOCUMENTOS DEL ING. FORESTAL.

EL CONTRATISTA ENTREGA OFICIO Nº 25 CON

Scanned by CamScanner

LISTADO DE INQUIETUDES ANTES REFERIDAS Y UNAS ADICIONALES COMO LA MALLA A TIERRA, POSICION SUBESTACION. CONSORCIO BCJ - GUTIERREZ.

Scanned by CamScanner
