DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-098

Bogotà D.C. 14 de febrero de 2019.

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoria PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoria técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policia Metropolitana de Popayán, Departamento de Policia Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión Informe Mensual No 08.

Respetados Señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir el informe mensual No. 08 de interventoria, comprendido entre el primero (01) de enero de 2019 al treinta y uno (31) de enero de 2019. La presente con el fin de informar a la entidad contratante el avance de ejecución del contrato.

Agradecemos de antemano su atención.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	265 Folios	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego Lopez – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	Archivo – Contrato de interventoria	

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

POLICÍA NACIONAL

POLICIA NACIONAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN NO.4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.



DAIMCO

CONTRATO No. PN DIRAF NO. 06-3-10051-18

Informe Mensual No. **08**

INFORME DE INTERVENTORÍA
01 al 31 de Enero de 2019
VERSIÓN 0
VOLUMEN 1 DE 1
ORIGINAL

INFORME MENSUAL No 08 DE INTERVENTORIA

PROYECTO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN NO.4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

CONTRATO DE CONSULTORÍA PN DIRAF NO. 06-3-10051-18

TÍTULO:

INFORME MENSUAL No 08

01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2019.

Realizo: TIRSO COSME. Director de Interventoria

_____

Aprobó: Ing. José Vicente Bocanegra – Gerente Técnico de Interventoría

_____

Tabla de contenido

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

INDICE DE MODIFICACIONES

ESTADO DE REVISIÓ Y APROBACIÓN

1.INTRODUCCIÓN **6**

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6

2.ESTADO Y AVANCE DEL PROYECTO **13**

2.1 AVANCE DOCUMENTAL 13

2.2AVANCE DE ACUERDO A LA PORGRAMACIÓN 14

2.3CRONOGRAMA DE OBRA 15

3.ESTADO DEL CONTRATO **16**

3.1 ÁMBITO FINANCIERO 16

3.2 ÁMBITO PRESUPUESTAL 16

3.3 ANTICIPO 17

3.3.1 Informe Plan Anticipo 18

3.4 FACTURACIÓN MENSUAL 19

4.ACTAS PARCIALES DE OBRA **20**

5.ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORIA **21**

6.TRABAJOS EJECUTADOS **21**

6.1 DESCRIPCION GENERAL DE LAS TAREAS 21

6.2 MODIFICACIONES DEL PROYECTO 27

7.CUMPLIMIENTO PAGOS PARAFISCALES **27**

8.PERMANENCIA Y ESTADO DE LOS EQUIPOS **27**

8.1 CONTROL PERSONAL CONTRATISTA 27

8.2CONTROL PERSONAL INTERVENTORIA 27

8.3CONTROL DE EQUIPOS 27

9.ASPECTOS VARIOS **27**

9.1REGISTRO FOTOGRAFICO 27

9.2ESTADO DEL TIEMPO 27

9.3POLIZAS 27

10.CONCLUSIONES **28**

LISTA DE TABLAS

Tabla No. 1 Avance del proyecto 15

Tabla No. 2 Hitos 15

Tabla No. 3 Estado Financiero 16

Tabla No. 4 Avance Fisico 16

Tabla No. 5 Actas Parciales Contrato de Obra 20

Tabla No. 6 Actas Parciales Contrato de Interventoria 21

Tabla No. 7 Actas de Comité 21

Tabla No. 8 Equipos interventoria 22

Tabla No. 9 Polizas Contrato de Obra 28

Tabla No. 10 Polizas Contrato de Interventoría 28

RELACIÓN DE ANEXOS

INFORME EJECUTIVO No. 08

Anexo No.1. Informes semanales

Anexo No.2. Relación de Correspondencia

Anexo No.3. Actas de comité del periodo

Anexo No.4. Plan de Anticipo

Anexo No.5. Seguridad Social

Anexo No.6. Control de personal del Contratista

Anexo No.7. Control de personal de la Interventoría

Anexo No 8 Informe SISO

Anexo No.9. Control de Equipos-Ensayos

Anexo No.10. Registro fotográfico

Anexo No.11. Control de clima

Anexo No.12. Bitácora

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Las copias de este documento han sido entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREA O DEPENDENCIA		No. DE COPIAS
Copia No. 1	Policía Nacional	1 (original)
Copia No. 2	Archivo Contrato de Interventoria No. PN DIRAF 06-3-10051-18	1

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

ÍNDICE VERSIÓN	CAPÍTULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
0		-	Versión original

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

TITULO DOCUMENTO:		INFORME MENSUAL		
DOCUMENTO No:		No. 08		
NUMERO DE REVISIÓN		0	1	2
RESPONSABLE POR ELABORACIÓN "Director de Interventoría"	Nombre:	Ing. Tirso Cosme		
	Firma:			
	Fecha:	07-02-2019		
RESPONSABLE APROBACIÓN "Gerente Técnico de Interventoria"	Nombre:	Ing. José Vicente Bocanegra		
	Firma:			
	Fecha:	11-02-2019		
RESPONSABLE APROBACIÓN "Supervisora del contrato"	Nombre:	Capitán Ingeniero Civil Ángel Giovanni López Ostos		
	Firma:			
	Fecha:	_-02-2019		

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe Mensual No 08, correspondiente al Periodo del 01 de enero del 2019 al 31 de enero de 2019, presentado en cumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en el Contrato de Interventoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18 y los adicionales o prorrogas que se generen suscrito entre **DAIMCO S.A.S** y **POLICIA NACIONAL – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Se presenta acorde al manual de Interventoría y exigencias de la Policía Nacional – Dirección administrativa y financiera, el Control realizado por nuestra empresa al Contratista CONSORCIO CBS-GUTIERREZ, encargado de la ejecución del Contrato de Obra No. PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Localización del Proyecto: Popayán, departamento de Cauca.



El municipio de Popayán limita por el norte con los municipios de Cajibío y Piendamó, por el sur con los municipios de Sotará y Puracé, por el oriente con el municipio de Totoró, Puracé y el Departamento del Huila, por el occidente con el municipio de El Tambo y Timbio, el proyecto se desarrollara en la Región No 4 DECAU MEPOY Comando Departamento de

Policía Cauca en el predio con dirección Carrera 17 No 1 – 75 – Popayán - Cauca con matricula inmobiliaria 120-13255 con un área aproximada de 16 Hectáreas con 8.040 metros

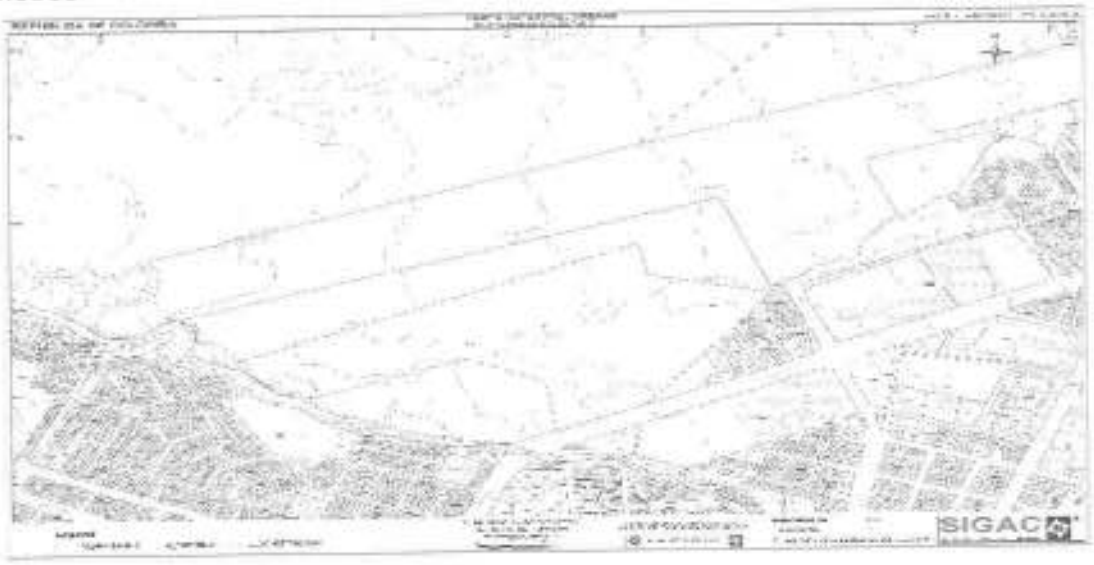


Ilustración 1. Localización general
Fuente. Equipo de Topografía

El proyecto se centra en la ejecución de las actividades para la "**CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE**", de acuerdo a diseños de consultoría bajo el contrato No PN-DIRAF No 06-3-10041-15, el contrato de obra incluye la ejecución de actividades para el desarrollo de la Fase 4 – Edificio D de excavaciones, rellenos, estructura de concreto, mobiliario de oficinas, sistemas de detección de incendios, carpintería metálica y de madera, sistemas de ventilación mecánica y todas las adecuaciones urbanísticas eléctricas e hidráulicas internas y externas que permitan el correcto funcionamiento del edificio y el desarrollo de esta fase y de las fases futuras que comprenden el complejo de Policía del Cauca".

2. ESTADO Y AVANCE DEL PROYECTO

2.1 AVANCE DOCUMENTAL

Correspondencia Recibida

En el Anexo No. 2. Se relaciona y adjunta la correspondencia recibida del Contratista y de la Entidad contratante, durante el presente informe.

No.	Titulo del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento
PN-DIRAF-POPAYAN-115	Orden de pago #11 y #12	1	N.A	11/01/2019 radicado el 11/01/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-119	Solicitud	1	N.A	17/01/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-120	Solicitud	1	N.A	17/01/2019 radicado el 18/01/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-125	Orden de pago #13 y #14	1	N.A	25/01/2019 radicado el 25/01/2019
No S-2019-002389-DIRAF-GUMAI-29	Solicitud concepto contrato de obra N0 06-6-10044-18	1	N.A	29/01/2019 radicado el 29/01/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-129	Orden de pago # 15	1	N.A	29/01/2019 radicado el 29/01/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-130	Orden de pago # 16	1	N.A	30/01/2019 radicado el 30/01/2019

Correspondencia Enviada

En el Anexo No. 2. Se relaciona y adjunta la correspondencia enviada al Contratista y a la Entidad contratante.

No.	Titulo del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento
CPP-DIRAF-2019-086	Informe mensual # 07	1	N.A	09/01/2019
CPP-DIRAF-2019-087	Observaciones tanque almacenamiento Fase 4	1	N.A	17/01/2019
CPP-DIRAF-2019-088	Remisión de pago #11	1	N.A	17/01/2019

CPP-DIRAF-20198-089	Remisión de pago #12	1	N.A	17/01/2019
CPP-DIRAF-20198-090	Remisión balance #2 y APU respectivos	1	N.A	18/01/2019
CPP-DIRAF-20198-091	Remisión orden de pago #13	1	N.A	28/01/2019
CPP-DIRAF-2019-092	Remisión orden de pago #14	1	N.A	28/01/2019
CPP-DIRAF-2019-093	Remisión orden de pago #15	1	N.A	30/01/2019
CPP-DIRAF-2019-094	Respuesta a oficio No S-2019-002389-DIRAF-GUMAI-29	1	N.A	30/01/2019

2.2 AVANCE DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN:

La nueva programación que deberá ser presentada por el contratista de acuerdo a la ampliación en plazo y adición presupuestal para la construcción del tanque de reserva de la Red Contra Incendios (RCI), a solicitud del supervisor del proyecto, debe ser por frente de trabajos, estipulando que estos frentes serán:

1. Edificio de Patrulleros
2. Edificio de oficiales
3. Casino
4. Subestación y tanque de reserva
5. Tanque reserva de red contra incendios RCI

Igualmente se seguirá presentado el porcentaje resumido y sumado de todos los frentes, que nos servirá de punto de referencia para determinar el avance del contrato, después de dos revisiones por parte de interventoría, se le solicito al contratista ajustar y presentar nuevamente para aprobación de esta.

Tabla 1. AVANCE DEL PROYECTO

INFORME	CORTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
No 08	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2019.	36.74%	35.02%

En el mes de enero se ejecutaron actividades de fundición de vigas aéreas de cubierta en edificio de oficiales, construcción de mampostería con bloque #5 en edificio de patrulleros

en primer y segundo piso además se realizaron construcción de viguetas y columnetas de amarre a la mamposteria, alfajías en concreto sobre culatas, pañetes 1:4 con sika sobre muros, construcción de estructura metálica de cubierta tanto en edificio de patrulleros como en el edificio de oficiales, se llevó a cabo la fundición del tanque de reserva del proyecto con concreto impermeabilizado de 4000PSI, esta actividad incluye la instalación de pases en los muros y la cinta PVC, colocación de pañetes en muros de la subestación y de casino, se adelantan conjuntamente regatas en muros para la instalación de tubería eléctrica, se continua relleno con material de recebo de acuerdo a especificaciones, en zonas aledañas a edificios, en el frente de la red contraincendios se realiza localización y cerramiento.

Los informes semanales realizados en el periodo de 01 al 31 de enero de 2019 se encuentran en el **anexo No. 1** del presente informe.

2.3 CRONOGRAMA DE OBRA

Según la nueva programación de obra y flujo de inversión entregado en enero por el contratista después de revisiones se le aprueba según corrección de flujos presentada el 25 de enero, el cronograma del proyecto cuenta con la ejecución de los siguientes hitos establecidos en el anexo técnico presupuesto de obra para la Fase 4 EDIFICIO ALOJAMIENTO D (DECAU):

Tabla 2. HITOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA
01	ACTIVIDADES PRELIMINARES	07 /JUNIO / 2018
02	DESMONTES Y DEMOLICIONES	07 /JUNIO/ 2018
04	EXCAVACIONES Y RELLENOS	19/JULIO / 2018
04	CIMENTACIÓN	15/SEPTIEMBRE / 2018
05	PISOS - BASES	11/ ENERO / 2019
07	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	21 / SEPTIEMBRE / 2018
07	TANQUE DE RESERVA	17 / SEPTIEMBRE / 2018
08	ESTRUCTURA METALICA	14 /ENERO / 2019

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA
09	MAMPOSTERÍA	30/ NOVIEMBRE / 2018
10	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	30/ NOVIEMBRE /2018
11	PAÑETES	27 / ENERO/ 2018
12	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS	04 / OCTUBRE / 2018
13	INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEMATICAS Y AUTOMATIZACIÓN	15 / ENRO / 2019
14	PISOS - ACABADOS	23/ ENERO / 2018
15	CARPINTERÍA MADERA	7/ MARZO / 2019
16	CARPINTERÍA METÁLICA	20 /MARZO / 2019
17	PINTURA	11 / FEBRERO / 2019
18	CUBIERTAS	21 / ENRERO / 2019
19	CIELOS RASOS	29 / ENERO / 2019
22	MUEBLES FIJOS	29 / ENERO / 2019
23	ENCHAPES, ESPEJOS, MESONES Y DIVISIONES	29 / ENERO / 2019
24	APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS	14/ MARZO / 2019
26	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA	28 / FEBRERO / 2019
27	MOBILIARIO DE OFICINAS	8/ ABRIL / 2019

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA
28	DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS	8/ ABRIL / 2019
30	ASEO DE OBRA	18/ ABRIL / 2019

3. ESTADO DEL CONTRATO

3.1 ÁMBITO FINANCIERO

A la fecha de corte del presente informe mensual No 07 (01 de ENERO de 2019 al 31 de ENERO de 2019), se tiene que el avance financiero es el siguiente:

Tabla 3. ESTADO FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	$ 9.250.463.250,08
ADICION	433.346.050.00
VALOR ACTUALIZADO	$ 9.683.809.300,31
VALOR PROGRAMADO	$3.557.428.959.92
VALOR EJECUTADO	$ 3.391.010.584.00


3.2 ÁMBITO PRESUPUESTAL

A la fecha de corte del presente informe mensual No 08 (01 de ENERO de 2018 al 31 de ENERO de 2019), se tiene que el avance físico es el siguiente:

Tabla 4. AVANCE FISICO

PORCENTAJE PROGRAMADO	**36.74 %**
PORCENTAJE EJECUTADO	**35.02 %**

En la gráfica apreciamos una curva descendente en la programación, que corresponde al adicional en tiempo que se le aprobó al contratista, por tal motivo Se presenta la Gráfica de Control Avance de obra (Programado Vs Ejecutado) en donde al final del periodo (Enero) con la reprogramación presentada por el contratista las cifras se equiparan en porcentajes muy cercanos, el porcentaje de programación a 31 enero de 2019 es de 36.74% y el porcentaje ejecutado se cuantifica en un 35-02%, se mantiene una pequeña diferencia que se espera que en este mes de febrero se logre superar para ir a delante de lo programado. Esto con plan de contingencia que el contratista ha propuesto implementar con trabajos extendidos a horarios nocturnos.

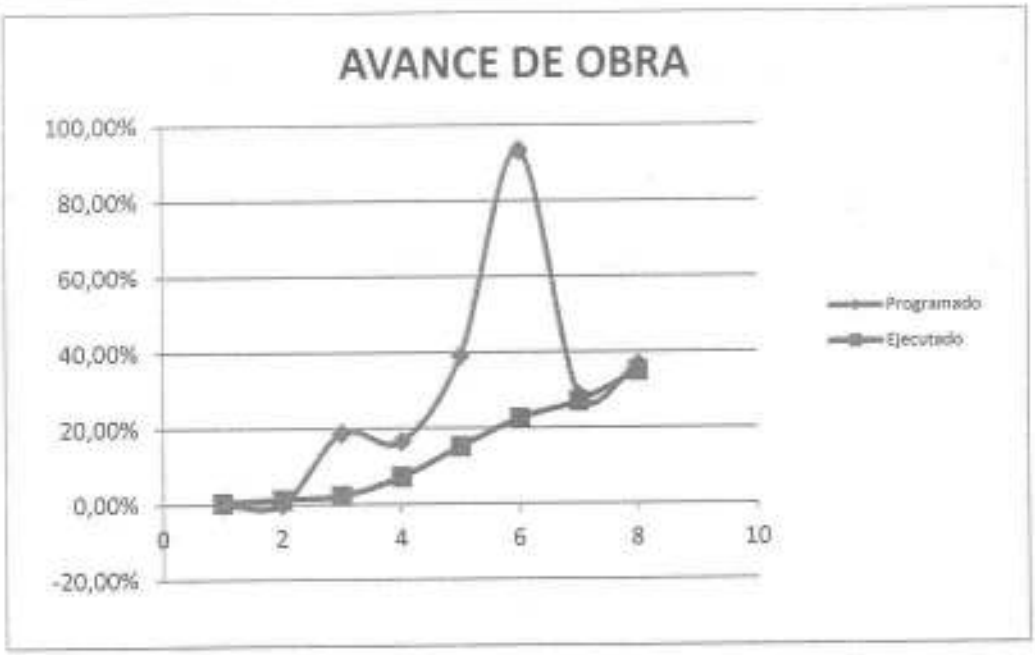

3.3 ANTICIPO

De acuerdo con los modificatorios # 1,2,3 y 4, generados en el mes de diciembre de 2018, se aprobó por parte de la entidad una ampliación del anticipo al contratista para un total del 50% del contrato principal de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, esto de acuerdo con la solicitud presentadas por el contratista y avalada por la interventoria.

PROYECCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO		Página Edad
PROGRAMACIÓN	FECHA	
CONTRATO No.	PN DIRAF 06-6-10044-18	
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 9.250.483.350,00
CONTRATISTA	CONSORCIO ACS-GUTIERREZ	
INTERVENTOR	DAIMCO SAS	
PLAZO	Hasta el 15 de Diciembre de 2018	
VALOR ANTICIPO	50%	$ 4.625.241.625,00

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 1.387.560.487,50	30,00%
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 2.915.895.953,78	63,00%
3	Transporte y retiro de escombros	$ 231.262.128,13	5,00%
4	Polizas, impuestos, administración	$ 92.524.052,50	2,00%
TOTAL		$ 4.625.241.625,00	100,00%

3.3.1 Plan De Inversión Del Anticipo Aprobado:

A continuación, se presenta el plan de Inversión del Anticipo aprobado a la fecha por la interventoria y la entidad contratante.

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO		Página 1 de1
PROGRAMACION	FECHA	18 ene. 19
CONTRATO No.	PN DIRAF 06-S-DIRAF-18	
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 9.250.462.250,08
CONTRATISTA	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ	
INTERVENTOR	DAIMCO SAS	
PLAZO	Hasta el 28 de Abril de 2019	
VALOR ANTICIPO	50%	$ 4.625.231.125,04

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 1.297.000.000,00	25,34%
2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	$ 2.813.895.822,78	62,00%
3	Transporte y retiro de escombros	$ 261.831.068,76	5,66%
4	Descuentos y retenciones	$ 92.504.932,50	2,00%
TOTAL		$ 4.625.231.826,04	100,00%

Nota:

a) Plazo en días para la inversión del anticipo 150 días.

Para constancia de lo anterior, se firma y aprueba el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los diecisiete (18) días del mes de enero de 2019

MY ANGEL GIOVANNY LOPEZ OSYOS
Supervisor de Contrato
POLICIA NACIONAL-DIRAF

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO
Representante Legal
DAIMCO SAS
INTERVENTORIA

3.4 FACTURACIÓN MENSUAL

CONTRATO DE OBRA

La Policía Nacional-Dirección Administrativa y Financiera cancelará el valor del contrato en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma:

UN ANTICIPO:

Disponible para el contratista desde el mes de diciembre de 2018, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato principal, lo anterior teniendo en

cuenta la solicitud que realizo el contratista toda vez que contractualmente la entidad había quedado de otorgarle el 20% de anticipo 30 días después que se legalizara el contrato y en esto no fue posible cumplirle al contratista, por tal motivo la entidad, aprobó el incremento del porcentaje.

NOTA 1: El contratista deberá constituir un contrato de fiducia con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera de Colombia, para el manejo de los recursos provenientes del anticipo en los términos establecidos en los artículos 2.2.1.1.2.4.1 y 2.2.1.2.3.3.1 del Decreto 1082 de 2015, así mismo presentará a la interventoria la programación de inversión del anticipo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la aprobación de la garantía única, el cual debe estar aprobado por la interventoría y el supervisor de la interventoría, garantizando control permanente sobre el mismo.

NOTA 2: En los términos y condiciones del contrato de fiducia deberá quedar como obligación:

a) La entrega de un informe mensual por parte de la fiducia, donde se evidencien los pagos efectuados y los rendimientos mensuales a consignar en la cuenta que indique la entidad contratante.

b) Los desembolsos solicitados por el contratista de obra tomando como base el plan de manejo del anticipo, deberán ser autorizados por el representante legal de la interventoría.

El pago del anticipo se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la aprobación de la garantía única, una vez aprobados los documentos presentados y requerido 'por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y a la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

PAGOS PARCIALES:

Se realizarán. pagos parciales de acuerdo al porcentaje de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez, la Interventoría y Contratista hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias y que la Interventoría haya certificado la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el dia veinticinco (25) de cada mes.

Nota 1: En cada acta de corte parcial se amortizará proporcionalmente, el valor entregado al, contratista en calidad de anticipo, hasta amortizar el 100% de su valor.

Cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación.

Previo a la presentación de las actas parciales y a su ejecución, deberá estar aprobado por la DIRAF el balance de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos si los hay. Consolidado por el contratista de obra con los soportes documentales (y fotográficos de ser necesario), proyectado y avalado por la interventoría. igual condición para el acta final, si hay modificaciones al balance aprobado.

Para cada una de las actas parciales, el pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles, una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del plan anual de caja (PAC), así:

- Acta de recibo parcial. (suscrita entre los contratistas de obra e interventoría) Factura de venta
- Balance de cantidades ejecutadas.
- Certificación de pagos parafiscales y seguridad social.
- Certificación pagos FIC
- Memoria de cantidades ejecutadas.

Y los demás documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera,

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o. si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección Administrativa y Financiera, programará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

JUSTIFICACIÓN DEL PAGO DE ANTICIPO:

En el presente proceso de contratación el Grupo de Seguimiento a Proyectos del Área de Infraestructura de la Dirección Administrativa y Financiera justifica el pago de anticipo al futuro contratista, con el fin de que el proyecto constructivo tenga la financiación suficiente y el constructor tenga la posibilidad de adquirir los insumos y bienes a los precios establecidos en el presente contrato.

Es de anotar que el giro de los recursos a una fiducia independiente genera el respaldo del manejo de los dineros evitándose la desviación de los mismos, toda vez que los desembolsos deberán ser autorizados por la interventoría.

Es importante aclarar que el anticipo deberá estar amparado por la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, acorde al Decreto 1082 de 2015 'por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional" en su Artículo 2.2.1.1.2.4.1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La Policía Nacional-Dirección Administrativa y Financiera cancelará el valor del contrato en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma:

PAGOS PARCIALES:

Se realizarán pagos parciales hasta completar el 95% del valor del contrato, sujetas al porcentaje de avance del contrato de obra que corresponderá al valor ejecutado en el respectivo periodo, las que se tramitarán una vez el supervisor e Interventor hayan suscrito el acta parcial correspondiente y se certifique la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, de igual manera el supervisor de la interventoría deberá certificar el cumplimiento de las funciones y obligaciones contractuales; las actas deberán presentarse a más tardar el día veinticinco (25) de cada mes.

Para cada uno de los pagos parciales, se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a, turno y la disponibilidad del plan anual de caja (PAC), así:

- Factura de venta
- Certificación de pagos parafiscales y seguridad social

Y los demás documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección Administrativa y Financiera, programará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

ACTA DE RECIBO FINAL

Su valor será del cinco por ciento 5% del valor total del contrato, una vez se certifique por parte del supervisor del contrato de interventoría el recibo a satisfacción del cien (100%) del valor del contrato. Se presentará una vez la interventoría certifique el recibo a satisfacción del cien por ciento (100%) del contrato de obra y se haya recibido a satisfacción el cien por ciento (100%) del valor del contrato de interventoria en el cual se certifique el seguimiento y control adelantado por la interventoría al contrato de obra.

El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de las facturas del acta respectiva, junto con el recibo a satisfacción suscrito por la interventoría del contrato, con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa

y Financiera, de acuerdo con el derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección Administrativa y Financiera, programará el valor a, cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Nota: Es claro que el valor del contrato de interventoría y su pago, se realizará bajo objetivo ejecutado en el contrato de obra y no por la permanencia de los profesionales o el mayor tiempo de ejecución del contrato de obra en el desarrollo de los ítems con su valor contractual, por tal motivo la única forma de realizar una adición presupuestal al contrato de interventoría, 1 será siempre y cuando se realice alguna adición presupuestal al contrato de obra, el cual justifique la necesidad de tener mayor tiempo en su ejecución, para la realización de las actividades contempladas en la adición.

4. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha presentado cuatro actas parciales para aprobación de la interventoría:

Tabla 5. ACTAS PARCIALES CONTRATO DE OBRA No. 07-6-10044-18

No. Acta	Periodo	Valor Total del Acta	AMORTIZACIÓN
1	7 de junio hasta 7 de julio de 2018	88.945.135.99	17.789.027,20
2	08 de Julio hasta 07 de agosto de 2018	99.764.316,74	19.952.863,35
3	08 de agosto hasta 07 de septiembre de 2018	271.551.766,01	54.31.353,20
4	08 de septiembre hasta 07 de octubre de 2018	385.070.488,89	77.012.097,78
5	08 de octubre hasta 07 de noviembre de 2018	614.366.847,81	122.873.369,56
6	08 de noviembre hasta 20 de diciembre de 2018	1.047.183.680,70	209.436.736,14
7	21 de diciembre de 2018 hasta el 29 de enero de 2019	884.138.348,38	442.069.174,19

ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORÍA

Contrato de Interventoría

A la fecha la Interventoría ha radicado Actas Parcial a la Entidad Contratante:

Tabla 6. ACTAS PARCIALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 07-3-10051-18

No. Acta	Periodo	Valor Total del Acta
1	7 – Jun / 7 Jul 2018	4.445.827,38
2	8 jul / 7 ago. 2018	4.986.612,54
3	8 ago. / 7 Sep. 2018	13.573.224,24
4	8 sep. / 7 Oct 2018	19.246.836,21
5	8Oct / 7 Nov 2018	30.708.469,01
6	8 Nov / 20 Dic 2018	52.342.354,94
7	20 dic 2018/ 29 ene 2019	44.192.708,59

5. TRABAJOS EJECUTADOS

5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS TAREAS

- ACTAS DE COMITÉ

Dentro de las tareas desarrolladas durante el periodo en evaluación, se encuentran la suscripción de actas de comité, las cuales se han realizado para el seguimiento de la POLICIA NACIONAL hacia el contrato de Interventoría y de comité de Interventoria hacia el contrato de obra. Dichas actas se indican a continuación y se encuentran en medio físicos en el **anexo No. 3** del presente informe:

Tabla 7. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

FECHA	CONCLUSIONES
09 de Enero de 2019	Acta # 23 En este comité se entrega de parte de interventoría esquema sobre el tanque de reserva pero aun así siguen faltando definición sobre este tema, reiteradamente se pone de manifiesto la falta de detalle en los planos suministrados del tanque de reserva, no hay certeza sobre los pases que aparecen en planos ni sobre los materiales de dichos pases, además se ha solicitado aclaren la altura a la que debe ir la cinta pvc en la fundición de muros del tanques; a la consultora del proyecto pero no se tiene respuesta adecuada.
20 de Enero de 2019	Acta # 24 Comité realizado en presencia del supervisor del proyecto el Mayor. Ángel Giovanny Lopez O., quien hace

FECHA	CONCLUSIONES
	entrega de documento expedido por la comisión de topografía de la DIRAF, el mayor solicita información verbal por frente de trabajo y solicita que haya más personal en frentes de trabajo además de iniciar prontamente las actividades en el tanque de la red contra incendios.
31 de Enero de 2019	Acta # 25 Interventoría solicita a contratista tomar medidas correctivas sobre algunas actividades como mampostería y fundición de columnetas y viguetas ya que vienen presentando unos terminados de mediana calidad. Respecto de la actividad de estructura de cubierta se deberá presentar por el contratista certificaciones de soldadores y ensayos que garanticen la calidad del trabajo realizado(ensayo de tintas)

- **ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

Dentro de las actividades efectuadas por el Consorcio BCS- Gutiérrez y la interventoría Daimco, durante el periodo de 01 de enero del 2019 al 31 de enero del 2019, se encuentran las siguientes:

- **Cumplimiento de Especificaciones técnicas, diseños, normas técnicas, cantidades, según contrato.**

  La DIRAF en cabeza del Supervisor del proyecto el Capitán Ángel Giovanny López Ostos adelantaron las gestiones y documentos pertinentes para la aprobación de modificatorios y prorrogas al contrato.

ACTIVIDADES ADELANTADAS:

- Se realiza trabajo conjunto de presentación de Análisis de Precios Unitarios no previstos y precios adicionales para obras de urbanismo, paisajismo y gimnasio que soportaran la solicitud de adición al presupuesto contractual.

- En cuanto a los oficios dirigidos a la entidad para aclarar las inconsistencias o dudas encontradas el Supervisor DIRAF, el Capitán Ángel Giovanny López Ostos, propicia reunión de contratista e Interventoría con el diseñador estructural de la consultoría para poder aclarar dudas que aún persisten

EXTERIORES

- **Acciones adelantadas por la interventoria y supervisión actividades Eléctricas**
  Se continúa realizando reuniones entre contratista e interventoría para acabar de definir aspectos del componente eléctrico, y sobre la iluminación de áreas urbanas

- **Acciones adelantadas por la interventoría y supervisión actividades chequeo topografía**

  Se envía datos de topografía sobre los rellenos a realizar para emparejar niveles de zonas aledañas a edificio, al Supervisor Capitán Giovanni López para la verificación del volumen a rellenar.
  Se realiza la verificación del proyecto en nivelación de cada uno de los niveles de losa de cimentación y verificación y corrección de la localización de columnas y demás elementos estructurales.

- **Acciones adelantadas por el contratista y supervisión ante el cumplimiento al Carácter Técnico.**

  Respecto de la fundición de tanque de reserva la interventoría realizo intentos variados y a pesar de haberse comunicado con la parte diseñadora del componente hidráulico de la consultoría no fue posible que esta organización entregara a tiempo respuestas a las dudas planteadas por contratista de obra y de interventoría, por tal situación estas decisiones con asesoria de subcontratista de redes hidráulicas del consorcio CBS-GUTIERREZ y la interventoría se tomaron decisiones al respecto.

- **Calidad de la Obra, Equipos, Bienes, Insumos, Ensayos o Pruebas.**
  El contratista en el mes de enero tuvo en obra, una (1) máquina retroexcavadora sobre llantas, (2) volquetas de planta y (1) Mini cargador, equipos utilizados para trabajos de excavación y regado de material.

- **Novedades, observaciones y recomendaciones de carácter técnico.**
  La interventoría ha estado muy atenta en informar los posibles cambios del clima que podrían afectar los trabajos, para este periodo se presentaron tiempo lluvioso y algunas tormentas que afectarian el desarrollo de trabajos. En la segunda quincena de enero se presentó un clima variado pero favorable en términos generales para la ejecución de obras.

6. CUMPLIMIENTO PAGOS PARAFISCALES

En lo correspondiente al presente periodo, la interventoría ha realizado el seguimiento y control bajo los lineamientos de la normatividad sobre la materia (aspectos básicos legales):

- Seguimiento a las afiliaciones al sistema de seguridad social de los trabajadores que laboran en la obra. (Contratista entregó copias de las afiliaciones).
- Inspección en el desarrollo de las actividades la entrega de los elementos de protección personal –EPP y supervisión en el uso de los mismos.
- Solicitud al constructor sobre la entrega de los exámenes médicos de ingreso de salud ocupacional del personal que labora en el proyecto.

En el anexo No. 5 se muestran las planillas de pagos parafiscales de los profesionales involucrados en el proyecto del Contratista y la interventoría.

7. PERMANENCIA Y ESTADO DE LOS EQUIPOS

8.1 CONTROL PERSONAL CONTRATISTA

En el Anexo No. 6. Se diligenció el Formato Control del Personal, acorde a lo requerido por el contrato de obra No DIRAF 07-6-10044-18, para la ejecución de las actividades correspondientes al presente periodo.

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	Director de ing. obra	Ing. Julián Mauricio Giraldo
2	Residente 2 de ing. obra	Ing. María Teresa Ojeda Cabrera
3	Residente de arquitectura	Arq., Edgar Enrique Calvete
4	Auxiliar administrativo	Maria Fernanda Benavidez
5	Residente ing. Ambiental y SISO	Federico Montealegre
7	Topógrafo 1	Margarita Eugenia Álvarez Fuentes
9	Auxiliar topografia	Alexandra Risueño
10	Maestro	Armando José Arrieta
11	Ayudantes	282

8.2 CONTROL PERSONAL INTERVENTORIA

En el Anexo No. 7. Se encuentra el Formato Control del Personal de la Interventoría, para la ejecución de las actividades durante el periodo del contrato de interventoría No DIRAF 07-3-10051-18

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1	ING. TIRSO MARINO COSME OROZCO
2	RESIDENTE ING. CIVIL	ING. SANDRA LUCIA GUAUÑA PISSO
3	RESIDENTE ARQUITECTURA	ARQ. MONICA LILIANA BENITEZ ANGEL
4	RESIDENTE AMBIENTAL ESP. SALUD OCUPACIONAL	ROSA DEL MAR RODRIGUEZ GALVIS
5	ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JAVIER JOSE CARRILLO O.
6	RESIDENTE ING. TOPOGRAFO	RIGOBERTO LOZADA DIAZ
7	RESIDENTE ELÉCTRICO	VICTOR MANUEL BOCANEGRA
8	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JOSE ARMANDO RUIZ ANGARITA
9	ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA	ALBERTO FEDERICO MOUTHON BELLO
10	ASESOR JURÍDICO	PABLO MANRIQUE CONVERS
11	ASESOR CONTABLE	PABLO EMILIO GUERRERO JIMENEZ

8.3 CONTROL DE EQUIPOS

En el Anexo No. 09 se presenta el formato Control de Equipos, en el cual se reportan los equipos usados por el Contratista en obra durante dicho periodo.

Cuadro 8. Relación de Equipos de Interventoria

EQUIPOS	CANTIDAD
COMPUTADORES	5
CAMARA DIGITAL	3
IMPRESORA	1
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	1
EQUIPO ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS	1

8. ASPECTOS VARIOS

8.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO

El registro fotográfico se presenta en el anexo No. 10 del presente informe.

9.2 ESTADO DEL TIEMPO

En el Anexo No. 11 se presenta el formato control del clima, en el cual se reporta el estado del tiempo en la obra durante dicho periodo

9.3 POLIZAS

Contrato de Obra

En el siguiente cuadro se relacionan las pólizas del contrato de obra No DIRAF 06-6-10044-18.

Tabla 9. POLIZAS CONTRATO DE OBRA

GARANTÍAS				
POLIZAS	COMPAÑÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
			Iniciación	Terminación
Anticipo	Seguros del Estado S.A.	1.850.092.650.02	18/05/2018	30/07/2019
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A.	1.850.092.650.02	18/05/2018	30/07/2019

Pago de salarios y prestaciones	Seguros del Estado S.A.	462.523.162.50	18/05/2018	30/04/2022
Estabilidad de la obra	Seguros del Estado S.A.	2.775.138.975.02	15/12/2018	15/12/2023
Calidad de los bienes	Seguros del Estado S.A.	329.371.500.00	18/05/2018	30/04/2020

Contrato de Interventoría

En el siguiente cuadro se relacionan las pólizas del contrato de Interventoría No. DIRAF 06 -3-10051-18

Tabla 10. POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

GARANTÍAS				
POLIZAS	COMPAÑÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
			Iniciación	Terminación
Cumplimiento	Seguros Mundial	92.474.900.00	22/05/2018	15/02/2019
Calidad de Servicio	Seguros Mundial	231.187.250.00	15/12/2018	15/12/2023
Pago de salarios y prestaciones	Seguros Mundial	23.118.725.00	22/05/2018	15/12/2021

9. CONCLUSIONES

El edificio de Patrulleros se ha realizado fundición desde losa de cimentación, columnas primer piso, losa de entrepiso, columnas de segundo piso hasta vigas de cubierta, se ha realizado mampostería en ladrillo tolete en pisos uno y dos, fundición de viguetas y columnetas, regatas para tubería eléctrica en ambos pisos, se ha realizado la instalación de estructura metálica para cubierta.

En edificio de Casino se ha realizado fundición de zapatas, placa de piso, columnas de primer piso, losa y columnas de segundo piso, losa de cubierta y mampostería de antepecho de cubierta.

El edificio de oficiales esta fundido hasta columnas de segundo piso.

El tanque de reserva de agua se realizó excavación, relleno con material de base, fundición de solado, tiene instalado el emparrillado de acero de losa de piso, se termina el flejado de acero de muros laterales, se instalan pasa muros y se coloca cinta PVC, finalmente se termina de fundir muros en concreto hidráulico de 4000psi y la tapa del tanque, igualmente se le aplica protección de muros con igoldenso.

Se hace a diario control por parte de la interventoría, al conteo de personal del contratista en obra, al uso de elementos de protección personal y equipos para trabajos seguros en piso y altura.

Se realiza chequeo con comisión de topografía de diferentes actividades que en obra van requerimiento de acuerdo con solicitud, pero también se hace a diario seguimiento de avance de obras.

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventoría, Gerencia, Mantenimiento y Construcción

RESUMEN EJECUTIVO INT-11:08

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

PERIODO DEL INFORME

DEL			AL		
1	1	2019	31	1	2019

No. DE INFORME: 5 DE 2019

PLAZO TRANSCURRIDO

FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION		
7	6	2018	29	4	2019

TIEMPO CONTRACTUAL TRANSCURRIDO EN DIAS: 238 DE 328

DATOS BASICOS

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ	
CONTRATO No.	06-6-10044-18	
VALOR INICIAL	$	9.250.463.250,08
VALOR ADICION NO 01	$	433.346.050,23
VALOR ACTUALIZADO	$	9.683.809.300,31
PLAZO INICIAL		191,00
PRORROGA		135,00
PLAZO ACTUALIZADO		326,00
FECHA DE INICIACIÓN		07 DE JUNIO DE 2018
FECHA DE TERMINACION		29 DE ABRIL DE 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	DAIMCO S.A.S	
CONTRATO No.	06-3-10051-18	
VALOR INICIAL ESTUDIO Y DISEÑOS		
VALOR ACTUALIZADO ESTUDIO Y DISEÑOS		
VALOR INICIAL INTERVENTORIA	$	462.374.500,00
VALOR ADICIONES	$	21.660.338,29
VALOR ACTUALIZADO INTERVENTORIA	$	484.034.838,29
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN		191,00
PRORROGA		135,00
PLAZO ACTUALIZADO		326,00
FECHA DE INICIACIÓN INTERVENTORIA		07 DE JUNIO DE 2018
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO		29 DE ABRIL DE 2019


AVANCE DE OBRA

		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
PROGRAMADO ACUMULADO	%	0,00%	0,00%	16,74%	16,52%	39,27%	93,38%	28,62%	36,74%
	Valor			$ 1.733.111.703,68	$ 1.528.032.015,61	$ 3.802.367.411,81	$ 9.038.887.935,78	$ 2.771.526.221,75	3.557.425.555,92
EJECUTADO ACUMULADO	%	0,417%	1,307%	2,256%	7,178%	15,15%	22,54%	25,05%	35,02%
	Valor	$ 39.592.253,33	$ 129.934.093,83	$ 208.688.853,11	$ 664.039.832,46	$ 1.401.461.934,57	$ 2.085.259.493,30	$ 2.903.261.422,37	$ 3.301.019.646,00

MANEJO DE ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

ENTIDAD BANCARIA	BANCO POPULAR	
CIUDAD	BOGOTÁ	
SUCURSAL	BOGOTÁ	
No. DE CUENTA	220-080-11979-1	
FECHA APERTURA	16 de mayo de 2108	
No. DE CHEQUES GIRADOS EN EL PERIODO	6	
No. DE CHEQUES PAGADOS		
SALDO ANTERIOR	$4.625.231.625,04	
VALOR DE ORDENES GIRADAS	1	$ 469.621.215,00
	2	$ 377.531.434,00
	3	$ 153.288.214,00
	4	$ 109.086.476,00
	5	$ 104.245.831,00
	6	$ 193.301.891,00
	7	$ 156.386.540,00
	8	$ 177.127.861,00
	9	$ 31.081.982,00
	10	$ 78.421.286,02
	11	$ 516.185.811,00
	12	$ 298.933.155,00
	13	$ 130.006.802,00
	14	$ 640.620.608,00
TOTAL	$	3.436.836.826,02
VALOR AMORTIZADO EN ACTAS	$	043.443.621,42
SALDO ACTUAL ANTICIPO	$	1.189.392.799,02
FECHA CIERRE DE CUENTA		

AVANCE DE OBRA

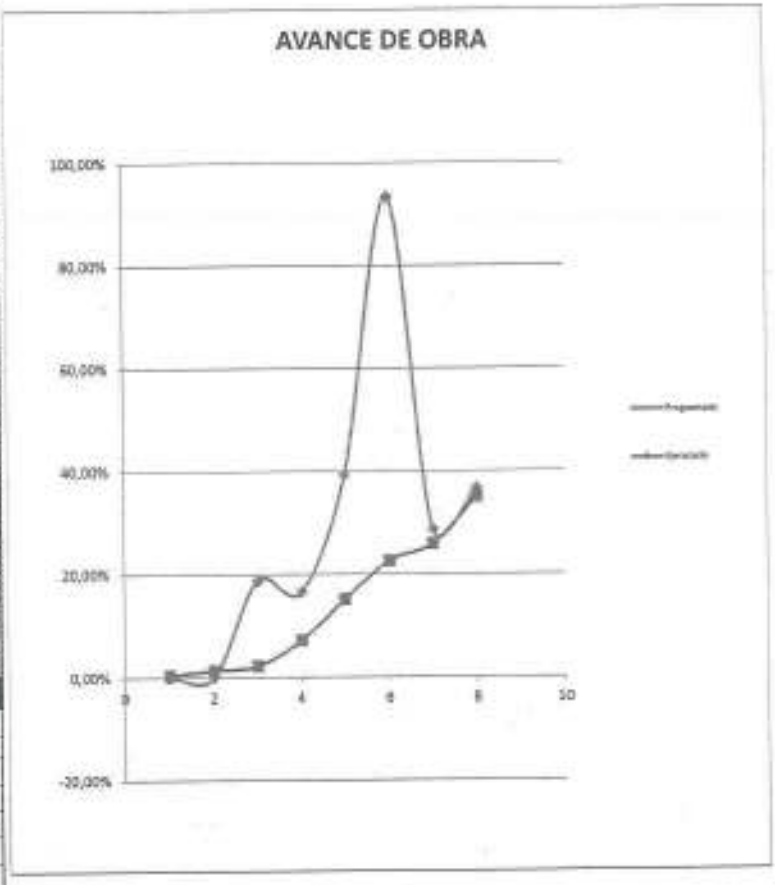

CONTROL DE POLIZAS

AMPAROS	VALOR	VIGENCIA SI	VIGENCIA NO
CUMPLIMIENTO	$ 1.936.761.861,06	X	
ANTICIPO	$ 4.841.904.651,00	X	
SALARIOS Y PRESTACIONES	$ 484.190.466,00	X	
RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 484.190.466,00	X	
ESTABILIDAD	$ 2.905.142.791,00	X	

OBSERVACIONES:

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventoría, Mantenimiento y Construcción

RESUMEN EJECUTIVO INT-11:08

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

PERIODO DEL INFORME						PLAZO TRANSCURRIDO					
DEL			AL			FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION		
1	1	2019	31	1	2019	7	6	2018	29	4	2019
No. DE INFORME	5	DE	2019			TIEMPO CONTRACTUAL TRANSCURRIDO EN DIAS			238	DE	328

RESUMEN GENERAL

En el presente periodo se tiene un avance ejecutado acumulado de 35.02% y un avance programado de 36.74%

Se fundio el dia 28 de enero muros de tanque de almacenamiento

El periodo entre el 30 de diciembre al 18 de enero de 2018, se ha disminuido el avance debido al ausentismo del personal por festividades de año.

Se solicita al Contratista no ejecutar repellos sin antes de realizar los trabajos electricos en bloque de oficiales, patrulleros

El dia 12 de enero Se solicito al Contratista proveer las pruebas de tinta a las soldaduras que se llevan a cabo en estructura metalica que se instala en bloque de casino

Se ejecuta mamposteria en bloque en el segundo piso del area de patrulleros

a ha chequeado plomos de muros en bloque de oficiales y patrulleros, algunos con desplome de 2.5 donde se ha realizado la correccion y en otros un desplome de 1.5 pendiente por correccion.

Se realiza actividades de estructura metalica en cubierta del bloque de patrulleros y en bloque de oficiales.

Se realiza actividades electricas en el bloque de patrulleros, oficiales y casino instalando cajas y tuberia

Se realiza observaciones an area de cubiros en bloque de oficiales y patrulleros tambien en terminado de cintas y alfajias

El dia 9 de enero realiza comité No 23 donde se entrega esquema de tanque de reserva aclarando algunos puntos y quedando pendiente materiales de pases

En el dia 10, Interventoria y Contratista realizaron visita al tanque de almacenamiento para observar las instalaciones hidraulicas, ya que en obra no se tiene la informacion para proceder de manera continua el proceso constructivo, con acompañamiento de un proveedor quien manifesto que los pases no deben ser en acero galvanizado por el proceso de corrosion que sufriria al estar en contacto con el agua potable.

Se entrego por parte de la consultoria respuesta de pasamuros en tanque de almacenamiento, informacion que se suministro al Contratista, el dia 9 de enero de 2019

Se realiza instalacion de tuberia sanitaria en areas externas del bloque de patrulleros

Nuevamente, se solicita al Contratista disponer de personal en casino ya que se observo sin ejecucion de obra civil, los dias 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31.

Se presento lluvias en horas de la tarde el dia 28 de enero, dificultando la fundicion del tanque, con descargas electricas, se inicio la observacion al Contratista de retrar al personal por el tiempo necesario, a lo cual respondio que prefarita continuar a tener que demoler tanque. Lo cual se hizo entendio que prevalece la vida humana.

Se realizo la toma de muestras de concreto en las diferentes fundiciones.

Se gestiono por parte de interventoria solicitud de permiso para retiro de cuatro postes para la ejecucion del proyecto.

Mediante oficio no.24 se socializo a la policia el inicio de actividades en el area donde estara el tanque de red contraincendio

Se inicio el dia 28 el cerramiento en el area de ejecucion del tanque de red contraincendio

Se presento lluvias en horas de la tarde los dias 28, 29 y 31 de enero

Se solicito al contratista el manejo de contagoteros debajo de la alfaja

Se informa al contratista sobre el manejo de alturas de las culatas de oficiales y patrulleros ya que no se contemplan con lo especificado en planos

Se hace la observacion al Contratista sobre la instalacion de cubierta sin la debida toma de pruebas de tinta y prueba visual, ya que al haber observaciones de subsanar, el contratista debera tomar las acciones pertinentes para su correccion.

Se observo detalles en la instalacion de estructura metalica en bloque de patrulleros, se manifesto al contratista

Se informo al contratista que no se debera demoler el muro del tanque para la construccion de la viga en la cubierta del tanque de almacenamiento se debera realizar los respectivos anclajes y posterior tratamiento de sello.

Se hizo observaciones al Contratista disponer de los equipos necesarios y seguros para que el personal acceda a los sitios de trabajo

Se realizo visita de obra por parte del supervisor de la DIRAF, Mayor Lopez los dias 21 y 22 de enero

Se realizo comite no. 24 donde se relacionaron los siguientes temas como: avance de obra, inio de tanque RCI, solicitud informacionde planos de gimnasio y ubicación del mismo, rellenos en recebo común en areas exteriores.

Se dara manejo de un ancho de 1 m de anden en la fachada posterior del bloque de patrulleros, esto con la aprobacion de la supervision del Mayor Lopez Cetce

Se fundio el dia 23 de enero la losa inferior y parcialmente muros del tanque de almacenamiento.

Se solicita al Contratista limpiar los cordones de soldadura y completar en areas donde se observa sin soldadura

Se solicita al Contratista realizar aseo de obra en areas de cubierta.

Se realizo el suministro de material de rellenos en el presente periodo

Se solicito al contratista el debido manejo de instalacion del ladrillo tolete

Se realiza las respectivas observaciones del armado del hierro de la cubieta del bloque de oficiales antes de la fundicion

Interventoria realizo la gestion logistica y tecnica de los rellenos posibles en zonas verdes, para minimizar costos y ya que esta interventoria no justifica tecnicamente el uso rellenos en recebo común, para ejecutar actividades de empradizado. El material a usar proviene de cantera que a la fecha cumple con los permisos ambientales expedidos por la CRC.

ACTIVIDADES A REALIZAR EL PROXIMO MES POR EL CONTRATISTA

18.01.01 TEJA METALICA SIN TRANSLAPO TIPO SANDWICH CON AISLAMIENTO TERMOACUSTICO EN POLIURETANO INYECTADO
* ACABADO EN PINTURA ESMALTADA AL HORNO INSTALADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA SEGUN PLANOS

18.01.03 IMPERMEABILIZACION EN ELAS/FOAM ELASTOMETRO DE URETANO DE 2MM APLICADA A 3 MANOS CON MAQUINA DE ALTA
* PRESIÓN (1500LBS) SISTEMA SPRAY EN SITIO SOBRE MORTERO
* 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)
* 11.01.02 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)
11.01.03 PAÑETE 1:4 CON SIKA 1 + DOS CAPAS DE MORTERO SIKA 101 Ó SIMILAR (incluye filos y dilataciones)
11.01.04 PAÑETE 1:4 CON SIKA 1 + DOS CAPAS DE MORTERO SIKA 101 Ó SIMILAR (incluye filos y dilataciones)
11.01.05 GOTERO DESCOLGADO
13.09.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL MONOFASICA F+N+T 110V
13.09.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFASICA F+N+T 110V
* 14.01.21 ALISTADO DE PISOS IMPERMEABILIZADOS E= 5 CM
*

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

31	1	2019
DD	MM	AAAA

Fecha de Aprobación de Formato INT-11:00, 30 de Abril de2015

Anexo No. 1 Informes Semanales

INFORME SEMANAL INT-23:30

Semana Número: 30 Del: 29 DE DICIEMBRE O Al: 5 DE ENERO DE 2019
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 212
Nombre del Supervisor: POLICIA NACIONAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,47%	29,42%
Valor de la Obra programada:	$ 135.624.831,49	$ 2.848.781.349,02

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,0523%	28,0900%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 1.093.471,71	$2.526.505.846,45

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
Contrato No.	06-6-10044-18
Valor Inicial:	$9.250.463.250,08
Valor adicional:	$433.346.050,23
Valor Actualizado:	$9.683.809.300,31
Plazo Inicial:	192 días
Plazo Actualizado:	327 días
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Terminación:	28 de Abril de 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	DAIMCO S.A.S
Contrato No.	06-3-10051-18
Valor Inicial:	$ 462.374.500,00
Valor Adicional:	$ 21.660.338,29
Valor Actualizado:	$ 484.034.838,29
Plazo Inicial:	192 días
Plazo Actualizado:	327 días
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Terminación:	28 de Abril de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- 09.01.01 MURO BLOQUE LISO No.5
- 09.01.02 MURO BLOQUE LISO No.5
- 09.01.05 MURO EN LADRILLO TOLETE 24X12X6(cubiertas)
- 09.01.06 MURO EN LADRILLO TOLETE 24X12X6(cubiertas)
- 10.01.02 ANCLAJES EN CONCRETO CON EPOXICO DE 1/2" Y 3/4"
- 10.01.03 COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 10.01.04 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 10.01.11 ALFAJÍAS CONCRETO A LA VISTA (sobre cubiertas)
- 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- 09.01.01 MURO BLOQUE LISO No.5
- 09.01.05 MURO EN LADRILLO TOLETE 24X12X6(cubiertas)
- 10.01.02 ANCLAJES EN CONCRETO CON EPOXICO DE 1/2" Y 3/4"
- 10.01.03 COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 10.01.04 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento) (cubiertas)
- 10.01.11 ALFAJÍAS CONCRETO A LA VISTA (sobre cubiertas)
- 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

- Se ejecuta mamposteria en bloque en las areas de patrulleros y casino
- Se ejecuta mamposteria en ladrillo tolete en cubiertas bloque patrulleros
- Se ejecuta pañetes en muros en bloque de casino.
- Se ejecuta columnetas en cubiertas (bloque patrulleros y en muros bloque casino
- El contratista entrego en el dia 4 de enero el flujo de caja a interventoria para su respectiva revision.
- Interventoria realiza nuevamente la consulta a la firma de diseño de las pendientes ficas, pero aun no se tiene respuesta de parte de ellos.
- Se han realizado observaciones en mortero de pega, plomos en la actividad de mamposteria.
- Periodo que se ha disminuido el avance debido al ausentismo del personal por festividades de año.

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TIRSO COSME OROZCO

Firma

INFORME SEMANAL INT-23:31

Semana Numero: 31 Del: 06 DE ENERO Al: 12 DE ENERO DE 2019
Turnos transcurridos desde la iniciación del contrato: 219
Nombre del Supervisor: POLICIA NACIONAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN REAJUSTE.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,34%	31,85%	Obra Física Ejecutada (%)	0,832%	26,922%
Valor de la Obra programada:	$ 219.987.543,61	$ 3.905.240.883,54	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 5.488.884,40	$2.597.147.872,31

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
Contrato No:	06-6-10046-18
Valor inicial:	$9.290.463.250,98
Valor adicional:	$433.346.050,23
Valor Actualizado:	$9.693.809.300,21
Plazo inicial:	192 días
Plazo Actualizado:	327 días
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Terminación:	28 de Abril de 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Interventor:	DAIMCO S.A.S
Contrato No.	06-3-10051-18
Valor inicial:	$ 462.379.500,00
Valor Adicional:	$ 21.660.338,29
Valor Actualizado:	$ 484.034.838,29
Plazo inicial:	192 días
Plazo Actualizado:	327 días
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Terminación:	28 de Abril de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- 03.02.03 RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS (INCLUYE
- 06.21.25 HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI (incluido)
- 08.02.01 ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO)
- 09.01.01 MURO BLOQUE USO No.5
- 09.01.02 MURO BLOQUE USO No.5
- 09.01.05 MURO EN LADRILLO TOLETE 24X12X6(incluidas)
- 09.01.06 MURO EN LADRILLO TOLETE 24X12X6
- 10.01.02 ANCLAJES EN CONCRETO CON EPOXICO DE 1/2" Y 3/4"
- 10.01.03 COLUMNETA DE CONFINACION EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 10.01.04 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 10.01.11 ALFAJÍAS CONCRETO A LA VISTA (sobre cubetas)
- 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)
- 11.01.02 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)
- 11.01.03 PAÑETE 1:4 CON SIKA 1 + DOS CAPAS DE MORTERO SIKA 101 Ó SIMILAR (incluye filos y dilataciones) (cubetas)
- 11.01.04 PAÑETE 1:4 CON SIKA 1 + DOS CAPAS DE MORTERO SIKA 101 Ó SIMILAR (incluye filos y dilataciones) (cubetas)

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- 09.01.01 MURO BLOQUE USO No.5
- 09.01.05 MURO EN LADRILLO TOLETE 24X12X6(incluidas)
- 10.01.02 ANCLAJES EN CONCRETO CON EPOXICO DE 1/2" Y 3/4"
- 10.01.03 COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 10.01.04 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento) (cubetas)
- 10.01.11 ALFAJÍAS CONCRETO A LA VISTA (sobre cubetas)
- 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

- Se ejecuta mampostería en bloque en las áreas de patrullero
- Se ejecuta mampostería en ladrillo tolete en cubetas bloque patrullero y en muros en subestación
- Se ejecuta enlucidos, dinteles y alfajías en cubetas bloque patrullero
- Se solicito al Contratista realizar aseo en áreas donde ya no se ejecuta actividades, como también asegurar las areas antes que el personal inicie labores
- Se realiza pañetes en muros en subestación
- Se realiza el armado de hierro de vigas de cubierta en bloque de oficiales
- Se solicita al Contratista terminar muros con sus columnetas y dinteles, ya que se observo el area de de casino sin personal los días 6, 9, 10, 11
- Se solicita al Contratista nuevamente en facilidades sacar los plomos sobre la cara externa
- Se entrego por parte de la consultoría respuesta de pasamuros en tercer de almacenamiento, información que se suministro al Contratista, el día 8 de enero
- Se ejecuta rellenos en recebo común en zonas perimetrales del bloque de patrullero
- Se ha solicitado al contratista asegurar las areas antes que el personal inicie labores
- Se han presentado Actas durante el presente periodo
- En el día 10, Interventoría y Contratista realizaron visita al tanque de almacenamiento para observar las instalaciones hidráulicas, ya que en ella no se tiene la información para proceder de realizar continuo el proceso constructivo, con acompañamiento de un proveedor quien manifiesto que los pases no deben ser en acero galvanizado por el proceso de corrosión que sufrirá al estar en contacto con el agua potable.
- Interventoría realizo la gestión logística y técnica de los rellenos pasibles en zonas verdes, para minimizar costos y ya que esta interventoría no justifica técnicamente el uso rellenos en recebo común, para ejecutar actividades de empradizado. El material a usar proviene de cantera que a la fecha cumple con los permisos ambientales expedidos por la CRC.
- Interventoría solicito al Contratista el inicio de trabajos electricos ya que se esta realizando pañetes en la cubicta destinada en electrica
- El día 12 de enero Se inicia la instalación de aparatos eléctricos como cajas en bloque de patrullero
- El día 12 de enero Se solicito al Contratista proveer las pruebas de Grita a las soldaduras que se llevan a cabo en soluciones metalica que se instala en bloque de casino

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TIRSO CISNE OROZCO

Firma

INFORME SEMANAL INT-23:32

Semana Número: 32 — Del: 10 DE ENERO — Al: 16 DE ENERO DE 2019
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 228
Nombre del Supervisor: POLICIA NACIONAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%):	0.45%	34.80%
Valor de la Obra programada:	$ 318.984.838,42	$ 3.394.213.799,60

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%):	1.21865%	38.14205%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 9.285.176,66	$2.725.253.892,32

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
Contrato No:	06-6-10049-18
Valor Inicial:	$9.250.463.250,08
Valor adicional:	$433.346.050,23
Valor Actualizado:	$9.683.809.300,31
Plazo Inicial:	192 días
Plazo Actualizado:	327 días
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Terminación:	28 de Abril de 2019

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventor:	DAIMCO S.A.S
Contrato No:	06-3-10051-18
Valor Inicial:	$ 462.374.500,00
Valor Adicional:	$ 21.660.338,29
Valor Actualizado:	$ 484.034.838,29
Plazo Inicial:	192 días
Plazo Actualizado:	327 días
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Terminación:	28 de Abril de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA:

- 06.01.11 CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS AEREAS DE CUBIERTA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)
- 06.01.13 CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CUBIERTA ALIGERADA CON ICOPOR (INCLUYE RETIRO DE CASETON (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)
- 06.02.01 ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO)
- 06.02.01 ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO)
- 09.01.01 MURO BLOQUE LISO No.5
- 09.01.02 MURO BLOQUE LISO No.9
- 09.01.05 MURO EN LADRILLO TOLETE 24X12X9(vidrios)
- 09.01.06 MURO EN LADRILLO TOLETE 24X12X9.
- 10.01.02 ANCLAJES EN CONCRETO CON EPOXICO DE 1/2" Y 3/4"
- 10.01.03 COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 10.01.04 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 10.01.11 ALFAJÍAS CONCRETO A LA VISTA (sobre cubetas)
- 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)
- 11.01.02 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)
- 11.01.03 PAÑETE 1:4 CON SIKA 1 + DOS CAPAS DE MORTERO SIKA 101 Ó SIMILAR (incluye filos y dilataciones) (cubetas)
- 11.01.04 PAÑETE 1:4 CON SIKA 1 + DOS CAPAS DE MORTERO SIKA 101 Ó SIMILAR (incluye filos y dilataciones) (cubetas)

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA:

- 09.01.01 MURO BLOQUE LISO No.5
- 09.01.05 MURO EN LADRILLO TOLETE 24X12X9(vidrios)
- 10.01.02 ANCLAJES EN CONCRETO CON EPOXICO DE 1/2" Y 3/4"
- 10.01.03 COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 10.01.04 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento) (cubetas)
- 10.01.11 ALFAJÍAS CONCRETO A LA VISTA (sobre cubetas)
- 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

- Se ejecuta mampostería en ladrillo tolete en subidas bloque patrulleros
- Se ejecuta mampostería en bloque y en ladrillo tolete en el segundo piso del área de patrulleros
- Se realiza actividades de estucado resanes en subidas del bloque de patrulleros
- Se realiza actividades electricas en el bloque de patrulleros primer piso como instalacion de caja y tuberia pvc
- Se realiza pañetes en muros fachadas en subestación
- Se realiza el armado de hierro de vigas de cubierta en Bloque de oficiales, se solicita nuevamente verificar altura de segundo piso, se realizaron algunas observaciones de armado
- Se realiza mampostería en bloque de oficiales y se realizo observaciones sobre plomos en el muro y volanteria
- Se continua con el suministro de material de relleno en sitio
- Se solicito al Contratista disponer de los equipos necesarios y seguros para que el personal acceda a los sitios de trabajo
- Nuevamente, se solicita al Contratista disponer de personal en cantro ya que se observo sin ejecucion alguna los días 14, 15, 16, 17, 18
- Se hace uso de las volquetas para retiro de cerchas y gatos hidraulicos y disponer de material para relleno.
- Se fundio cerramiento en subestación
- Se solicita al contratista ejecutar adecuadamente la pendiente de cubierta.
- Se recomienda nuevamente al Contratista humedecer las piezas de ladrillo tolete antes de su instalación
- Se realiza la impresion de cubierta de oficiales antes de su funcion y se solicita realizar las separaciones entre hierro y formaleta, y asegurar gatos hidraulicos
- Se solicita al Contratista realizar instalaciones electricas en los muros antes de instalar pañetes, ya que se observa pañetando muros sin la debida instalaciones. Esta interventoria solicita a la interventoria no realizar cortes sobre los pañetes para evitar posibles fisuras.
- Se realiza actividades electricas en el bloque de casino instalando cajas y tuberia

OBSERVACIONES:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:

TARSO COSME OROZCO

Firma

INFORME SEMANAL INT-23:33

Semana Numero: 03 — Del: 20 DE ENERO — Al: 26 DE ENERO DE 2019
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 223
Nombre del Supervisor: POLICIA NACIONAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN REAJUSTE.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%):	4,10%	35,86%
Valor de la Obra programada:	$ 370.882.643,19	$ 3.793.998.373,14

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%):	1,3863%	29,4898%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 6.877.365,43	$2.896.382.459,52

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
Contrato No:	06-6-10044-18
Valor Inicial:	$9.250.463.250,08
Valor adicional:	$433.346.050,23
Valor Actualizado:	$9.683.809.300,31
Plazo Inicial:	192 días
Plazo Actualizado:	327 días
Fecha de Inicación:	07 de junio de 2018
Fecha de Terminación:	28 de Abril de 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	DAMCO S.A.S
Contrato No:	06-3-10051-18
Valor Inicial:	$ 462.374.500,00
Valor Adicional:	$ 21.660.338,29
Valor Actualizado:	$ 484.034.838,29
Plazo Inicial:	192 días
Plazo Actualizado:	327 días
Fecha de Inicación:	07 de junio de 2018
Fecha de Terminación:	28 de Abril de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- 03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS (INCLUYE
- 07.01.04 CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA MUROS Y TAPAS DE TANQUE DE RESERVA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)
- 07.01.11 CINTA PVC 9-03
- 08.02.01 ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO)
- 08.02.01 ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO)
- 09.01.01 MURO BLOQUE LISO No.0
- 09.01.02 MURO BLOQUE LISO No.0
- 09.01.08 MURO EN LADRILLO TOLETE 24X12X6(cubierta)
- 10.01.02 ANCLAJES EN CONCRETO CON EPOXICO DE 1/2" Y 3/4"
- 10.01.03 COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 10.01.11 ALFAJIAS CONCRETO A LA VISTA (sobre cubetas)
- 11.01.03 PAÑETE 1:4 CON SIKA 1 + DOS CAPAS DE MORTERO SIKA 101 Ó SIMILAR (incluye fibra y dilataciones) (cubetas)
- 11.01.04 PAÑETE 1:4 CON SIKA 1 + DOS CAPAS DE MORTERO SIKA 101 Ó SIMILAR (incluye fibra y dilataciones) (cubetas)

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- 09.01.01 MURO BLOQUE LISO No.3
- 09.01.08 MURO EN LADRILLO TOLETE 24X12X6(cubierta)
- 10.01.02 ANCLAJES EN CONCRETO CON EPOXICO DE 1/2" Y 3/4"
- 10.01.03 COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 10.01.04 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento) (cubiertas)
- 10.01.11 ALFAJIAS CONCRETO A LA VISTA (sobre cubetas)
- 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye fibra y dilataciones)
- AD 01 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE EJES Y NIVELES para tanque RDI
- AD 02 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA H=2 MT - para tanque RDI
- AD 03 DESCAPOTE MECANICO ESPESOR 30 MT. ; INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS - para tanque RDI

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

- Se ejecuta mampostería en ladrillo tolete en cubetas bloque patrullero
- Se ejecuta mampostería en bloque en el segundo piso del area de patrulleros y en primer piso en bloque oficiales
- Se realiza actividades de estructura metalica en cubierta del bloque de patrulleros
- Se realiza actividades electricas en el bloque de patrulleros primer piso como instalacion de caja y tuberia pvc
- Se realiza pañetes en muros fachadas en subestacion
- Se solicita al contratista no ejecutar repellos sin antes de realizar las instalaciones electricas.
- Nuevamente se solicita al Contratista disponer de los equipos necesarios y seguros para que el personal acceda a los sitios de trabajo
- Se realiza visita de obra por parte del supervisor de la DIRAF, Mayor Lopez los dias 21 y 22 de enero
- Se solicita al contratista nuevamente disponer de mas personal ya que se ha observado aisas sin personal como en el casino, potreros el subcontratista debe disponer de mas personal y evitar el traslado de gente a otras areas, dejando tareas inconclusas en otras partes, particularmente en las actividades de mampostería
- Se realiza cierre ica 24 donde se realizaron los siguientes temas: avance de obra, inic de tanque RDI, solicitud informacionde planos de gimnasio y ubicación del relleno, rellenos se reciben somán en otras entidades
- Se solicita el retiro de la formaleteria de cubierta para en bloque de oficiales sobre el eje D-A para la respectiva verificacion de plomos, despues de tener resultados de resistencia.
- Se dara manejo de un ancho de 1 m de anden en la fachada posterior del bloque de patrulleros, esto con la aprobacion de la supervision del Mayor Lopez Ordoñez
- Se hace nuevamente la observacion de plomos en muros en cubetas instaladas en bloque de patrulleros y oficiales.
- Se fundio el dia 23 de enero la losa inferior y perimetrales muros del tanque de almacenamiento
- Se solicita al Contratista limpiar las cordones de soldadura y reinstalar en areas donde se observe sin soldadura
- Se realiza la toma de alturas de los funcionarios realizados en el presente periodo para su respectivo ensayo
- Se solicita al Contratista realizar toma de viga en areas de cubierta.

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TIRSO OSSME OROZCO

Firma

INFORME SEMANAL INT-23:34

Semana Numero: 34 — Del: 27 DE ENERO — Al: 31 DE ENERO DE 2019
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 238
Nombre del Supervisor: POLICIA NACIONAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2.54%	94.37%
Valor de la Obra programada:	$ 168.474.099,75	$ 3.939.931.811,99

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0.937476	90.48%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 4.096.032,00	$2.345.784.044,44

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
Contrato No:	06-8-10044-18
Valor Inicial:	$9.250.463.250,08
Valor adicional:	$430.346.050,23
Valor Actualizado:	$9.680.809.300,31
Plazo Inicial:	192 días
Plazo Actualizado:	327 días
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Terminación:	28 de Abril de 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Interventor:	DAIMCO S.A.S
Contrato No:	06-3-10051-18
Valor Inicial:	$ 462.374.500,00
Valor Adicional:	$ 21.660.338,29
Valor Actualizado:	$ 484.034.838,29
Plazo inicial:	192 días
Plazo Actualizado:	327 días
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Terminación:	28 de Abril de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- 03.03.02 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS (INCLUYE
- 07.01.04 CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA MUROS Y TAPAS DE TANQUE DE RESERVA. (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)
- 09.02.01 ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO)
- 09.01.01 MURO BLOQUE LISO No.5
- 09.01.02 MURO BLOQUE LISO No.9
- 10.01.02 ANCLAJES EN CONCRETO CON EPOXICO DE 1/2" Y 3/4"
- 10.01.03 COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 11.01.03 PAÑETE 1:4 CON SIKA 1 + DOS CAPAS DE MORTERO SIKA 101 Ó SIMILAR (incluye filos y dilataciones) (cubiertas)

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- 09.01.01 MURO BLOQUE LISO No.5
- 09.01.05 MURO EN LADRILLO TOLETE 24X12X6(cubiertas)
- 10.01.02 ANCLAJES EN CONCRETO,CON EPOXICO DE 1/2" Y 3/4"
- 10.01.03 COLUMNETA DE CONFINACION EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 10.01.04 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento) (cubiertas)
- 10.01.11 ALFAJIAS CONCRETO A LA VISTA (sobre cubiertas)
- 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)
- AD.01 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE EJES Y NIVELES-para tanque RO
- AD.02 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA (m2) MT - para tanque RO
- AD.03 DESCAPOTE MECANICO ESPESOR 20 MT. , INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS - para tanque RO

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

- Se ejecuta transporte en bestia sobre el cubetas bloque pabellones
- Se solicita al Contratista no ejecutar repellos sin antes de realizar los trabajos electricos en bloque de oficiales
- Se llenaba el dia 28 de enero muros de tanque de almacenamiento
- Se ejecuta mampostería en bloque en el segundo piso del area de patrulleros
- A la fecha no se ha recibido toda la formaleteria de cubierta en bloque de oficiales sobre el eje C-da para la respectiva verificacion de plomos, situacion que se ha solicitado con anterioridad al contratista despues de tener resultados de topografia
- Se realiza actividades de estructura metalica en cubierta del bloque de patrulleros e inicia en bloque de oficiales
- Se realiza actividades electricas en el bloque de patrulleros instalando cajas y tuberia
- Se realiza observaciones en area de cubiertas en bloque de oficiales como terminado de cintas
- Se realiza instalacion de tuberia sanitaria en areas externas del bloque de patrulleros
- Nuevamente, se solicita al Contratista disponer de personal en castillo ya que se observa sin ejecucion de obra civil
- Se presentaron lluvias en horas de la tarde obstruyendo la fundicion del tanque, con descargas electricas, se invita la observadora al Contratista de retirar el personal por el tiempo necesario, a lo cual responden que prefieren continuar a tener que destruir bahque. Lo cual se hizo reflejo que prevalece la vida humana.
- Se realiza la toma de muestras de concreto.
- Se gestiona por parte de interventoria solicitud de permiso para retiro de varios postes y reubicacion de un poste que contiene cableado electrico.
- Mediante oficio en 24 se solicita a la policia el retiro de solicitados en el area donde estara el tanque de red contraincendio.
- Se inicia el cerramiento en el area de ejecucion del tanque de red contraincendio.
- Se presentan lluvias en horas de la tarde los dias 29, 29 y 31 de enero
- Se solicita al contratista el manejo de cartageneros debajo de la alfajia
- Se informa al contratista sobre el manejo de alturas de los cubetas de oficiales ya que no se contemplan con la especificacion en planos
- Se hace la observacion al Contratista sobre la instalacion de cubierta con la debida toma de pruebas de tinta y prueba visual, ya que al hacer observaciones de bajantes, el contratista debera tomar las acciones pertinentes para su correccion
- Se observa detalles en la instalacion de estructura metalica en bloque de patrulleros
- Se informa al contratista que no se debera demoler el muro del tanque para la construccion de la viga en la cubierta del bloque de almacenamiento se debera realizar los respectivos anclajes y posterior tratamiento de sello.

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TIRSO COSME OROZCO

Firma

Anexo No. 2 Relación de Correspondencia

Enviada

POLICÍA NACIONAL

DAIMCO

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

CONTRATO No. :	Contrato de Consultoría PN-DIRAF No. 06-3-10051-18
OBJETO:	"Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Cantonamiento de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No. 6 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste"
CONTRATISTA:	CONSORCIO MCI GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO S.A.S
SUPERVISOR:	Mayor Ingeniero Civil Ángel Giovanni López Ochoa

No.	Titulo del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
CPP-DIRAF-2018-086	Remisión Informe Mensual No 07	1	N.A	09/01/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-087	Observaciones Tanque de almacenamiento Fase 4	1	N.A	18/01/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-088	Remisión orden de pago No. 11	1	N.A	18/01/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO AL CONTRATISTA CON COPIA A LA ENTIDAD CONTRATANTE POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-089	Remisión orden de pago No. 12	1	N.A	18/01/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO AL CONTRATISTA CON COPIA A LA ENTIDAD CONTRATANTE POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-090	Comunicado PN-DIRAF-POPAYAN-0120 del 17 de enero de 2019. Con radicado Daimco D:2019-0107 del 18 de enero de 2019- Solicitud inclusión Ítems No previstos - Remisión de Balance de Mayores, Menores Cantidades No 02 al Contrato de Obra No. PN DIRAF No 06-6-10044-18.	1	N.A	18/01/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-091	Remisión orden de pago No. 13	1	N.A	29/01/2019	N.A	1	1	0	OFICIO REMISORIO AL CONTRATISTA CON COPIA A LA ENTIDAD CONTRATANTE POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-092	Remisión orden de pago No. 14	1	N.A	29/01/2019	N.A	1	1	0	OFICIO REMISORIO AL CONTRATISTA CON COPIA A LA ENTIDAD CONTRATANTE POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-093	Remisión orden de pago No. 15	1	N.A	30/01/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO AL CONTRATISTA CON COPIA A LA ENTIDAD CONTRATANTE POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-094	Respuesta al documento S-2019-002389/DIRAF-GUMAI-29 con radicado Daimco D-2019-0181 del 29 de enero de 2019 – Solicitud concepto contrato de obra No 06-6-10044-18.	1	N.A	30/01/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C. a los 31 días del mes Enero del 2019.

ENTREGA
NOMBRE: TIRSO CESARE (DIRECTOR DE INTERVENTORIA)
Fecha: 31 de Enero de 2019

RECIBE
Firma
NOMBRE: Mayor Ingeniero Civil Ángel Giovanni López Ochoa
Fecha: 31 de Enero de 2019

Original: POLICIA NACIONAL
Copias: Contratista, Interventoría

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-086

POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa
RADICACION
E-001234
09 ENE 2019
Hora 10:45 Firma

Bogotá D.C. 9 de enero de 2019.

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoria técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión Informe Mensual No 07.

Respetados Señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir el informe mensual No. 07 de Interventoria, comprendido entre el primero (01) de diciembre de 2018 al treinta y uno (31) de diciembre de 2018. La presente con el fin de informar a la entidad contratante el avance de ejecución del contrato.

Agradecemos de antemano su atención.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	254 Folios	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	Archivo – Contrato de Interventoria	

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co

Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-087

Bogotá D.C. 17 de enero de 2019.

POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa
RADICACION
E-003651
18 ENE 2019
14:59 Firma

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Observaciones Tanque de almacenamiento Fase 4

Respetados Señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, y una vez revisada la documentación y diseños del Tanque de Almacenamiento de la Fase 4 se observa que persisten incertidumbres según plano E-02 de "TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ALOJAMIENTO; Las respuestas emitidas por la consultoría dadas mediante los documentos CC&D-MEPOP-HID-057 del 27 de diciembre de 2018 y CC&D-MEPOP-HID-058 del 8 de enero de 2019, generaron más inquietudes, ya que se observaron más instalaciones de las cuales no se muestra sus especificaciones.


Por lo anterior, el Contratista y la Interventoría realizaron una visita de inspección técnica al tanque de almacenamiento de la Fase 1, donde se pudo evidenciar y constatar que técnicamente se requiere ampliar la información suministrada por la consultoría, además, se observó accesorios en acero galvanizado con corrosión, situación que en el documento CC&D-MEPOP-HID-058 de la consultoría se manifiesto que:

> *"El Niple pasamuro, se encuentra descrito con el numeral 11, que, de acuerdo con las memorias de cálculo, es un niple pasamuro de 6" para las succiones de los equipos y de acuerdo a la respuesta emitida el 28 de diciembre es en acero galvanizado, mientras que los bastones de ventilación se encuentran descritos con el número 30, en diámetro de 4" para el tanque de alojamientos."*


Por tanto, solicitamos de la manera más atenta se aclare y se especifique al detalle el cuarto de bombas y toda la instalación hidráulica correspondiente al tanque de almacenamiento de la Fase No 4, a continuación, relacionamos situaciones contrarias encontradas en los diseños y en la visita realizada al tanque de la Fase 1, así:

1. Registro fotográfico del sistema de cuarto de bombas para el tanque de almacenamiento de la Fase 1, donde se observa instalaciones que no contamos especificada en la información de la Fase 4.

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

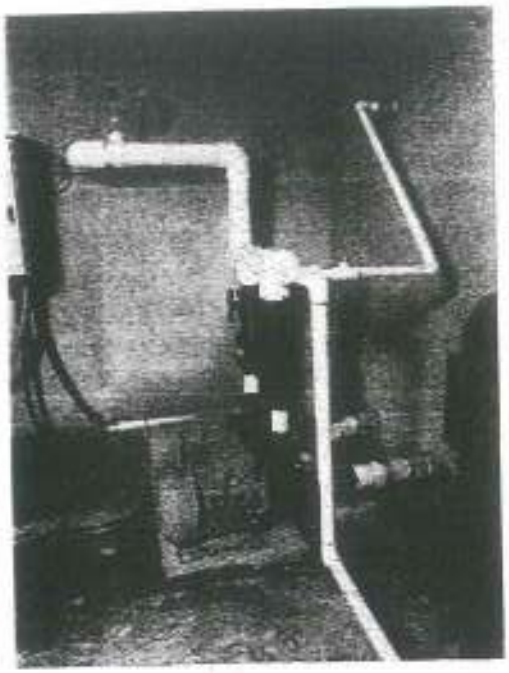



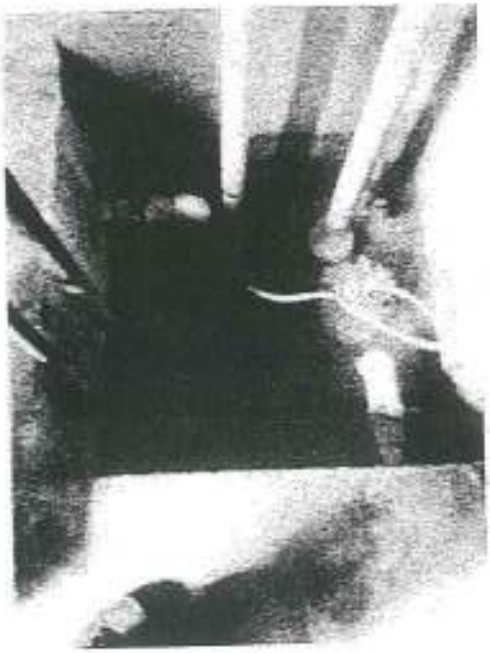




Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co

Calle 448 No. 57A – 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia






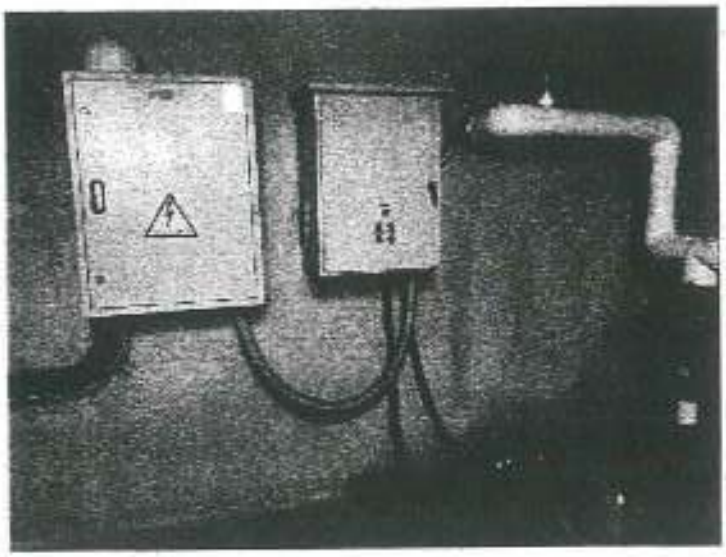


Equipos e instalaciones encontradas en visita técnica realizada por el contratista y la interventoría al tanque de almacenamiento de la Fase 1, especificaciones e información que presentan inconsistencias para la Fase No 4, a continuación se relaciona la información con que se cuenta para la ejecución del tanque de la Fase 4

- Plano en planta "TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ALOJAMIENTOS E:02"

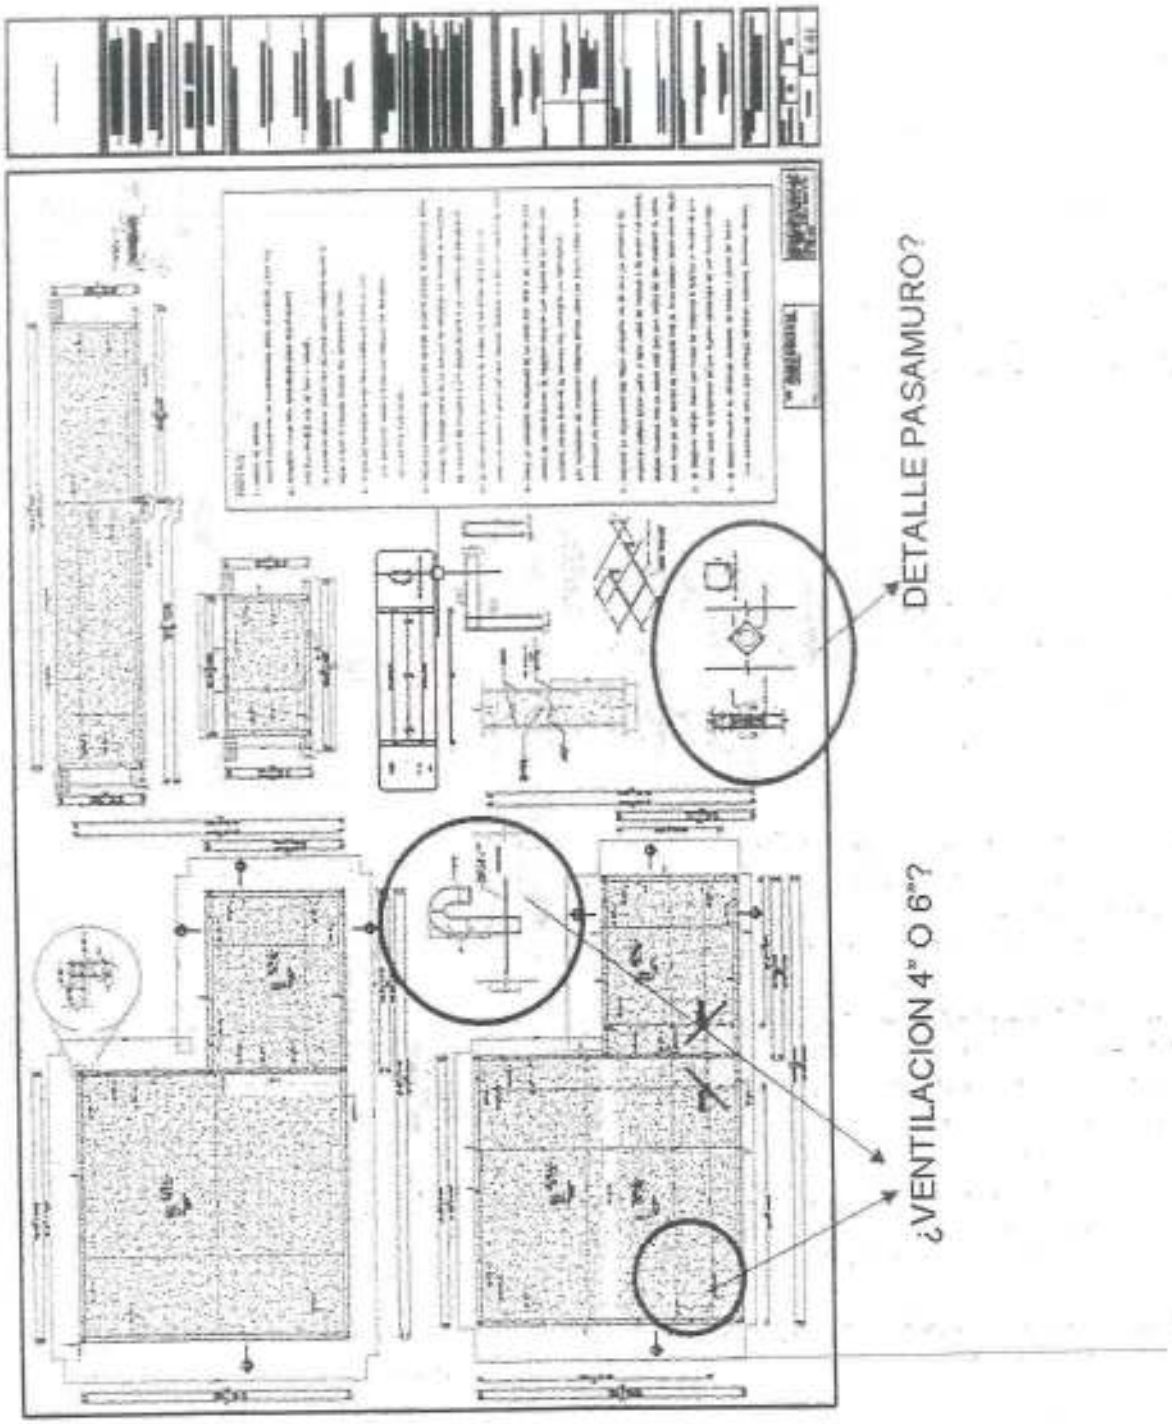

- Detalles de tanque de almacenamiento:

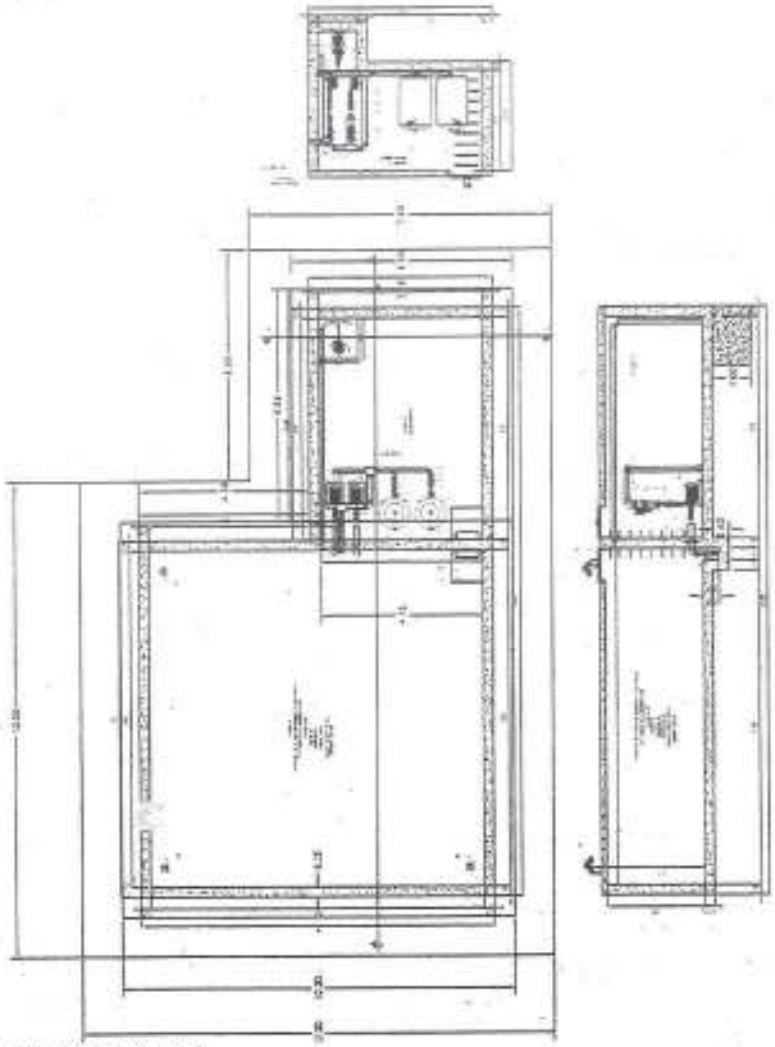

LISTADO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS

1 Unión Universal
2 Cheque perforado
3 Registro de corte
4 Válvula de alivio
5 Codo de 90°
6 Tee
7 Reducción excéntrica
8 Tee
9 Codo de 90°
10 Conexión flexible en caucho.
11 Niple pasa muro
12 Válvula de pie con coladera y lámina antivórtice
13 Válvula de pie con coladera y lámina antivórtice
14 Tee
15 Válvula de flotador
16 Flotador
17 Tapa de inspección
18 Escalera de gato

LISTADO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS

19 Registro de corte
20 Cheque Hidro con manómetro
21 Reducción concéntrica
22 Unión Universal
23 Indicador de presión de succión
24 Indicador de presión de descarga
25 Bomba jockey 3.0 HP

26 Bomba vertical en línea Aurora 2-383-9C 15HP o similar
27 Bomba Sumergible 2 HP
28 Hidroacumulador 300 lts
29 Bomba 5 HP Q=5.89 L/s CDT=32.40m
30 Ventilación
31 Niple pasa muro
32 Motor
33 Cheque
34 Base compacta
35 Tablero de control bomba principal red contra incendios.
36 Tablero de control bomba jockey
37 Succión
38 Descarga
39 Línea jockey
40 Soporte de tubería
41 Adaptador macho/ hembra
42 Válvula OS&Y
43 Cabezal de pruebas
44 Codo
45 Placa de identificación del sistema
46 Válvula OS&Y
47 Válvula mariposa
48 Cheque con válvula de prueba.
49 Cheque cortina

- Se observa dos hidro acumuladores de 300 lts. (#28) cuando en el diseño página.71 indica: ...*"se recomienda la instalación de dos hidroacumuladores de 500 L, con el fin de atender la demanda para caudales bajos o según recomendación del fabricante"*.

- Una Bomba 5 HP Q=5.89 L/s CDT=32.40m (#29), en el diseño, pagina. 69, se registra: de 20 HP.



INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS

Tabla 62. Cálculo de la Potencia de la Bomba fase 4.

η (%)	80%
Potencia (HP)	20.26
Potencia de diseño (HP)	20.00

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos ampliar de manera detallada la información del tanque de almacenamiento de la fase 4, a fin de avanzar óptimamente en la ejecución de las actividades y no generar retrasos a la programación de las actividades.

Agradecemos de antemano su atención.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	N
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Pastrapo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo
Copia 1.	Archivo – Contrato de interventoría

DAIMCO
NIT. 900021492 - 1

CPP-DIRAF-2018-088

Bogotá D.C. 17 de enero de 2019

POLICIA NACIONAL
E-003555
15:00 Firma

Señores
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
Aurelio Gutiérrez Castillo
Representante Legal
Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Remisión orden de pago No. 11

Respetado Ingeniero:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir debidamente firmado y verificado la orden de pago No. 11, correspondiente al documento No PN-DIRAF-POPAYAN-0115 con radicado Daimco No D-2019-0054 del 11 de enero de 2019, para continuar con su trámite ante la fiduciaria POPULAR.

- Orden de giro No. 11 - Devolución de aportes por pago de salarios, jornales y mano de obra, por un valor de $ 138.650.268.00
- Orden de giro No. 11 - Devolución de aportes por pago de materiales, dotación y alquiler de equipos, por un valor de $ 359.194.946.00
- Orden de giro No. 11 - Devolución de aportes por pago de transporte y retiro de escombros, por un valor de $ 11.674597.00
- Orden de giro No. 11 - Devolución de aportes por pago de descuentos y retenciones, por un valor de $ 6.666.000.00

Agradecemos de antemano su atención y estaremos atentos a cualquier solicitud.

17-I-19

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	150 folios	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego Lopez – Prof. Apoyo	
Copia 1.	Archivo – Contrato de interventoria	
Copia 2.	POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Directora Administrativa y Financiera - Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 – CAN Capitán – Angel Lopez Ostos – Supervisor	

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

46

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-089

Bogotá D.C. 17 de enero de 2019

E-003659
10 ENE 2019
15:03

Señores
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
Aurelio Gutiérrez Castillo
Representante Legal
Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Remisión orden de pago No. 12

Respetado Ingeniero:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir debidamente firmado y verificado la orden de pago No. 12, correspondiente al documento No PN-DIRAF-POPAYAN-0115 con radicado Daimco No D-2019-0054 del 11 de enero de 2019, para continuar con su trámite ante la fiduciaria POPULAR.

Cuentas por pagar a proveedores (Materiales y transporte)

- Orden de giro No. 12 - Pago de aportes por compra de materiales dotación u alquiler de equipos s a METAL B SAS, por un valor de $ 88.264.775.00
- Orden de giro No. 12 - Pago de aportes por compra de materiales dotación u alquiler de equipos s a CONEXPE SA, por un valor de $ 61.000.000.00
- Orden de giro No. 12 - Pago de aportes por compra de materiales dotación u alquiler de equipos s a CEMENTOS ARGOS SA, por un valor de $ 44.639.280.00
- Orden de giro No. 12 - Pago de aportes por transporte y retiro de escombros a AG3 INGENIERIA SAS, por un valor de $ 106.090.000.00

17-1-19

Agradecemos de antemano su atención y estaremos atentos a cualquier solicitud.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	26 folios
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal
Elaboro	Arq. Diego Lopez – Prof. Apoyo
Copia 1.	Archivo – Contrato de interventoria
Copia 2.	POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Directora Administativa y Financiera - Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 – CAN Capitán – Angel Lopez Cetos – Supervisor

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-090

Bogotá D.C. 18 de enero de 2019

POLICIA NACIONAL
GESTION
E-003663
10 ENE 2019
15:06 Firma

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18 "Interventoría técnico-administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Comunicado PN-DIRAF-POPAYAN-0120 del 17 de enero de 2019. Con radicado Daimco D:2019-0107 del 18 de enero de 2019- Solicitud inclusión Ítems No previstos - Remisión de Balance de Mayores, Menores Cantidades No 02 al Contrato de Obra No. PN DIRAF No 06-6-10044-18.

Respetados Señores

En cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos solicitar de la manera más atenta, la inclusión No 02 de ítems No previstos – y Balance de mayores y menores cantidades al Contrato de Obra No PN DIRAF No 06-6-10044-18 teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	POLICIA NACIONAL – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
CONTRATISTA	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
REP LEGAL	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
INTERVENTORIA	DAIMCO S.A.S.
REP LEGAL	CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO
SUPERVISOR POLICIA NACIONAL - DIRAF	MAYOR ÁNGEL GIOVANNI LÓPEZ OSTOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 9.250.463.250,08
VALOR ADICION 1	$ 433.346.050,23
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 9.683.809.300,31**
VALOR ANTICPO 20%	$ 1.850.092.650,02
VALOR ANTICIPO 30%	$ 2.775.138.975,02
TOTAL VALOR ANTICIPO 50 %	**$ 4.625.231.625,04**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	18 DE MAYO DE 2018
FECHA ACTA DE INICIO	07 DE JUNIO DE 2018
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
PRORROGA No 01	135 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	HASTA EL 29 DE ABRIL DE 2019

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

ANTECEDENTES:

De acuerdo con los diseños entregados por la entidad y con base a la revisión en campo de los ítem y actividades contractuales, se identificó en sitio que el contrato que nos compromete presenta inconsistencias en las cantidades previstas inicialmente, además, obras de urbanismo, obras complementarias dentro de la fase 4 e ítems no previstos que se requieren para el desarrollo del objeto contractual, estas mayores y menores actividades se justifican a continuación:

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:

Con el análisis, estudio y mediciones en planos y en obra, se tiene un balance sobre el alcance real del contrato, lo cual muestra un déficit de acuerdo a la revisión del presupuesto contractual, por tanto, se hace necesario ajustar e incluir las cantidades y actividades de las obras complementarias para la correcta ejecución de la Fase 4 y lograr llegar al balance del proyecto.

MAYORES CANTIDADES DE OBRA:

01.01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE EJES Y NIVELES - M2: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
01.01.02	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA H= 2.00 M – ML: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
01.01.03	CAMPAMENTO CONTENEDOR (INCLUYE DOTACIÓN Y DESMONTE) – MS: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
01.01.04	CAMPAMENTO (INCLUYE PLACA DE CONTRAPISO, PAREDES EN TABLA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO DE ZINC) 66 M2 – UN: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
01.01.05	DESCAPOTE MECÁNICO E=0.20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS. - M2: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
02.01.01	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO – UN: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo para ello se deben adecuar áreas para su construcción.
02.01.02	DESMONTE VENTANAS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO UN: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo para ello se deben adecuar áreas para su construcción.
02.01.03	DESMONTE DE LUMINARIAS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO – UN: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo para ello se deben adecuar áreas para su construcción.

02.01.04 DESMONTE APARATOS SANITARIOS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO – UN: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo para ello se deben adecuar áreas para su construcción.

02.01.05 DESMONTE DE REDES ELECTRICAS POR NIVEL INCLUYE SALIDAS TOMAS ELECTRICAS, VOZ Y DATOS RED REGULADA TABLEROS Y CAJAS DE PASO TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO - M2: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo para ello se deben adecuar áreas para su construcción.

02.01.06 DESMONTE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO - M2: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo para ello se deben adecuar áreas para su construcción.

02.01.07 DEMOLICIÓN MUROS Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO - M2: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo para ello se deben adecuar áreas para su construcción.

02.01.08 DEMOLICIÓN DE PLACAS DE ENTREPISO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO - M2: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo para ello se deben adecuar áreas para su construcción.

02.01.09 DEMOLICIÓN DE PLACAS DE CONTRAPISO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO - M2: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo para ello se deben adecuar áreas para su construcción.

03.01.01 EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO. CUANTIFICADA EN BANCO - M3: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo para ello se deben adecuar áreas para su construcción.

03.01.02 EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO - M3: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo para ello se deben adecuar áreas para su construcción.

03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS (INCLUYE POLIETILENO) - M3: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo que con soporte topográfico se debe llegar al nivel de cimentación.

04.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO POBRE DE 2000PSI PARA LIMPIEZA E=0.05m - M2: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio.

04.01.02	CONCRETO PREMEZCLADO POBRE DE 2000PSI PARA LIMPIEZA E=0.05m – ML: Ajustado según plano estructural E=03 y para obras complementarias como el gimnasio.
04.01.03	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS - M3: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio.
04.01.07	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - M3: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio.
04.01.12	HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI – KG: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio.
04.01.13	MALLA ELECTROSOLDADA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL – KG: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio.
05.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE AMARRE DE HIERRO Y MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) - M2: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio.
06.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) - M3: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio.
06.01.11	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS AEREAS DE CUBIERTA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) - M3: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio .
06.01.17	PLACA MACIZA DE CIRCULACIÓN DE CUBIERTA CONCRETO 3000PSI IMPERMEABILIZADO CON SIKA, ESPESOR= 15cm (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) - M2: Ajustado Según Plano Estructural E-05
06.01.25	HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI - KG: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio.
07.01.04	CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA MUROS Y TAPAS DE TANQUE DE RESERVA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) M3: Ajustado Según Plano Estructural De Tanque De Almacenamiento E-2
08.01.01	ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESCALERAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO) - KG: Ajustado Según Plano Arquitectónico Mepoy A-F4-Ed-101, Plano No. 11, Mepoy A-F4-Ed-201
08.02.01	ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO) - KG: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio.

08.02.01	ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTE DE EDIFICIOS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO) – KG: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio.
09.01.01	MURO BLOQUE LISO No.5 - M2: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio.
09.01.02	MURO BLOQUE LISO No.5 – ML: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio.
10.01.01	POYO EN CONCRETO DE H=10CM A 40CM – ML: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio.
10.01.02	ANCLAJES EN CONCRETO CON EPOXICO DE 1/2" Y 3/4" – UN: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio.
10.01.03	COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento) – ML: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio.
10.01.04	CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento) – ML: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio.
10.01.05	CONCRETO DE 3000 PSI PARA DINTELES (0.10x0.25m) (incluye reforzamiento) – ML: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio.
10.01.07	DILATACIÓN DE ICOPOR CON SELLO DE SILICONA – ML: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio.
10.01.11	ALFAJÍAS CONCRETO A LA VISTA – ML: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio.
11.01.01	PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones) - M2: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio.
11.01.02	PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones) – ML: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio.
11.01.03	PAÑETE 1:4 CON SIKA 1 + DOS CAPAS DE MORTERO SIKA 101 Ó SIMILAR (incluye filos y dilataciones) - M2: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio.
11.01.04	PAÑETE 1:4 CON SIKA 1 + DOS CAPAS DE MORTERO SIKA 101 Ó SIMILAR (incluye filos y dilataciones) – ML: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio.
11.01.05	GOTERO DESCOLGADO - ML: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio.

12.02.01	PUNTO SANITARIO PUSH PARAL DE PISO 1 1/4" – UN: Ajustado según plano hidráulico MEPOY-HYS-F4-401, MEPOY-HYS-F4-402 y por obras complementarias como el gimnasio
12.02.05	PUNTO LAVAMANOS PARAL DE PISO 1/2" – UN: Ajustado según plano hidráulico MEPOY-HYS-F4-401, MEPOY-HYS-F4-402 y por obras complementarias como el gimnasio
12.02.06	PUNTO DUCHA PARAL DE TECHO 1/2" – UN: Ajustado según plano hidráulico MEPOY-HYS-F4-401, MEPOY-HYS-F4-402 y por obras complementarias como el gimnasio
12.03.06	TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 1 1/ 2" – ML: Ajustado según plano hidráulico MEPOY-HYS-F4-401, MEPOY-HYS-F4-402 y por obras complementarias como el gimnasio
12.03.07	TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 1 1/ 4" – ML: Ajustado según plano hidráulico MEPOY-HYS-F4-401, MEPOY-HYS-F4-402 y por obras complementarias como el gimnasio
12.03.10	TUBERIA RDE 9 PVC PRESION 500 PSI 1/2" – ML: Ajustado según plano hidráulico MEPOY-HYS-F4-401, MEPOY-HYS-F4-402 y por obras complementarias como el gimnasio
12.03.16	ACCESORIO PVC PRESION 1 1/2" – UN: Ajustado según plano hidráulico MEPOY-HYS-F4-401, MEPOY-HYS-F4-402 y por obras complementarias como el gimnasio
12.03.17	ACCESORIO PVC PRESION 1 1/4" – UN: Ajustado según plano hidráulico MEPOY-HYS-F4-401, MEPOY-HYS-F4-402 y por obras complementarias como el gimnasio
12.03.20	ACCESORIO PVC PRESION 1/2" - UN: Ajustado según plano hidráulico MEPOY-HYS-F4-401, MEPOY-HYS-F4-402 y por obras complementarias como el gimnasio
12.03.24	SOPORTE TIPO PERA DE 1 1/2" - UN: Ajustado según plano hidráulico MEPOY-HYS-F4-401, MEPOY-HYS-F4-402 y por obras complementarias como el gimnasio
12.06.01	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4`` - UN: Ajustado según plano hidráulico MEPOY-HYS-F4-401, MEPOY-HYS-F4-402 y por obras complementarias como el gimnasio
12.06.03	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2`` - UN: Ajustado según plano hidráulico MEPOY-HYS-F4-401, MEPOY-HYS-F4-402 y por obras complementarias como el gimnasio
12.06.04	SALIDA SANITARIA DUCHA 2`` - UN: Ajustado según plano hidráulico MEPOY-HYS-F4-401, MEPOY-HYS-F4-402 y por obras complementarias como el gimnasio
12.08.02	TUBERIA PVC SANITARIA 4" – ML: Ajustado según plano hidráulico MEPOY-HYS-F4-401, MEPOY-HYS-F4-402 y por obras complementarias como el gimnasio
12.08.04	TUBERIA PVC SANITARIA 2" – ML: Ajustado según plano hidráulico MEPOY-HYS-F4-401, MEPOY-HYS-F4-402 y por obras complementarias como el gimnasio

12.08.07	ACCESORIO SANITARIO 4" – UN: Ajustado según plano hidráulico MEPOY-HYS-F4-401, MEPOY-HYS-F4-402 y por obras complementarias como el gimnasio
12.08.09	ACCESORIO SANITARIO 2" – UN: Ajustado según plano hidráulico MEPOY-HYS-F4-401, MEPOY-HYS-F4-402 y por obras complementarias como el gimnasio
12.08.10	SOPORTE TIPO PERA DE 4" – UN: Ajustado según plano hidráulico MEPOY-HYS-F4-401, MEPOY-HYS-F4-402 y por obras complementarias como el gimnasio
12.08.11	SOPORTE TIPO PERA DE 2" – UN: Ajustado según plano hidráulico MEPOY-HYS-F4-401, MEPOY-HYS-F4-402 y por obras complementarias como el gimnasio
12.13.02	TUBERIAPVC SANITARIA 6" – ML: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
12.13.03	TUBERIAPVC SANITARIA 4" – ML: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
12.13.10	ACCESORIO SANITARIO 6" – UN: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
12.13.11	ACCESORIO SANITARIO 4" – UN: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
12.13.14	SOPORTE TIPO PERA DE 4" – UN: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
12.15.01	MONTAJE DE SANITARIO PUSH - UN: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
12.15.04	MONTAJE DE LAVAMANOS – UN: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
12.15.05	MONTAJE DE DUCHAS – UN: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
12.21.03	CAJA INSPECCIÓN DE AGUA RESIDUAL 80x80 – UN: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
12.21.04	CAJA INSPECCIÓN DE AGUA LLUVIAS 80x80 – UN: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
12.22.01	EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO. - M3: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
12.22.03	RELLENO EN ARENA DE PEÑA - M3: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
12.22.06	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS - M3: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
13.09.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL MONOFASICA F+N+T 110V – UN: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio

13.09.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFASICA F+N+T 110V - UN: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
13.09.04	SALIDA PARA ILUMINACIÓN – UN: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
13.09.05	SALIDA PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA – UN: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
13.09.08	SALIDA PARA TV EN CABLE RG6 - UN: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
13.12.02	BALA LED 18W- UN: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
13.12.03	LAMPARA DE EMERGENCIA – UN: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
13.13.01	PANEL CENTRAL – UN: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
13.13.02	ANUNCIADOR REMOTO - UN: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
13.13.03	MODULO DE CONTROL DE DISPOSITIVO - UN: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
13.13.04	SENSOR FOTOELECTRICO CON BASE – UN: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
13.13.05	SENSOR DUAL- UN: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
13.13.06	ESTACION MANUAL – UN: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
13.13.07	SIRENA ESTROBOSCOPICA – UN: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
13.13.08	CABLE RETARDANTE A LA FLAMA 2X18 APANTALLADO – ML: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
13.13.09	TUBERIA IMC 3/4" – ML: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
13.13.10	MODULO RELÉ - UN: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
13.13.12	CAJA 10x10 DOBLE FONDO – UN: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
13.16.01	CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION SIMILAR A NORMA CODENSA CS274 – UN: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
13.16.02	CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 4 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 6" Y 2 DUCTOS PVC DE 3" – ML: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio

13.16.05	CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION DE M.T SIMILAR A NORMA CODENSA CS275 – UN: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
14.01.11	BALDOSA DE CERAMICA FORMATO 45X45 TRAFICO COMERCIAL ALTO ANTIDESLIZANTE COLOR PERLA REFERENCIA BEIRUT ALFA O SIMILAR - M2: Se ajusto según planos arquitectónicos
14.01.21	ALISTADO DE PISOS IMPERMEABILIZADOS E= 5 CM - M2: Se ajusto según planos arquitectónicos
14.01.29	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H=10CM (incluye fundida y pulimento) – ML: Se ajusto según planos arquitectónicos
16.01.23	P-47 MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16. EN BLANCO SEMI-MATE. PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA EN COLD ROLLED CAL. 20. CON PERSIANA INFERIOR EN LÁMINA CAL 18, EN BLANCO SEMI-MATE, DILATADA DE MUROS LATERALES. – UN: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
17.01.01	PINTURA SOBRE MURO 100% AGUA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE RUSTICO ACABADO FINAL - M2: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
17.01.02	PINTURA SOBRE MURO 100% AGUA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE RUSTICO ACABADO FINAL – ML: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
18.01.01	TEJA METALICA SIN TRANSLAPO TIPO SANDWICH CON AISLAMIENTO TERMOACUSTICO EN POLIURETANO INYECTADO ACABADO EN PINTURA ESMALTADA AL HORNO INSTALADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA SEGUN PLANOS M2: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
18.01.03	IMPERMEABILIZACION EN ELAS/FOAM ELASTOMETRO DE URETANO DE 2MM APLICADA A 3 MANOS CON MAQUINA DE ALTA PRESIÓN (1500LBS) SISTEMA SPRAY EN SITIO SOBRE MORTERO - M2: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
19.01.01	PLACAS SUSPENDIDAS DE CARTON YESO ESTANDAR 10MM, ACABADO LISO PINTURA A TRES MANOS ACRÍLICA COLOR BLANCO BLANCO, CON DILATACIONES DE PVC CONTRA LOS MUROS. DESCOLGADO, ENCINTADO, MASILLADO Y PULIDO (JUNTAS INVISIBLES). - M2: Ajustado por obras complementarias como el gimnasio
22.01.16	DMF-14 MUEBLE LAVAMANOS SOBREPONER 70CM – UN: Se ejecutara en obra según planos arquitectonicos
22.01.50	DMF-46 CLOSET ALOJAMIENTOS – UN: Se ejecutara en obra según planos arquitectonicos

22.01.51	DMF-47 BANCA VESTIER – UN: Se ejecutara en obra según planos arquitectonicos
22.01.52	DMF-48 BANCA VESTIER – UN: Se ejecutara en obra según planos arquitectonicos
22.01.53	DMF-49 CLOSET ALOJAMIENTOS SUBOFICIALES - UN: Se ejecutara en obra según planos arquitectonicos
22.01.54	DMF-50 BARRA COCINA SUIT – UN: Se ejecutara en obra según planos arquitectonicos
22.01.55	DMF-51 COCINA SUIT – UN: Se ejecutara en obra según planos arquitectonicos
22.01.57	DMF-52A BANCA BAÑO AUXILIARES – UN: Se ejecutara en obra según planos arquitectonicos
22.01.58	DMF-52B BANCA BAÑO AUXILIARES – UN: Se ejecutará en obra según planos arquitectónicos
22.01.59	DMF-53 CLOSET SUIT ALOJAMIENTOS – UN: Se ejecutará en obra según planos arquitectónicos
22.01.60	DMF-54 MUEBLE SALA SUIT – UN: Se ejecutará en obra según planos arquitectónicos
22.02.24	DMF-55 MUEBLE BAÑO DEPARTAMENTOS – UN: Se ejecutará en obra según planos arquitectónicos
22.02.25	MUEBLE BAJO EN AGLOMERADO CON ACABADO MELAMINICO PARA BAÑOS SEGUN DISEÑO - UN: Se ejecutará en obra según planos arquitectónicos
22.02.26	MUEBLE INFERIOR DE COCINA EN MADECOR 15 MM CON ENTREPAÑO ACABADO EN MELAMINA DECORATIVA HORNO MARCA VESPA O SIMILAR – UN: Se ejecutará en obra según planos arquitectónicos
23.01.05	ENCHAPE DE MURO EN TABLETA CERAMICA. BLANCO ARTICO, FORMATO DE 30 X 45 CM, BORDES RECTIFICADOS. INCLUYE BOQUILLA COLOR. H=1,90M. - M2: Se ejecutará en obra según planos arquitectónicos
23.01.14	ESPEJO INCLINADO. CON MARCO EN ALUMINIO PARA BAÑOS DISCAPACITADOS. M2: Se ejecutará en obra según planos hidrosanitarios
23.01.15	DIVISIÓN SANITARIA EN SISTEMA CANTILEVER. ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SATINADO, BORDES GRAFADOS EN FORMA DE U Y REMATADOS CON UN BOCEL A PRESIÓN, MEDIDAS SEGÚN DETALLE. PUERTA, PARAL, TABIQUE, COMPLEMENTOS PARA PREVENIR REGISTRO HACIA INTERIOR. - M2: Se ejecutará en obra según planos arquitectónicos
24.01.10	LAVAMANOS DE COLGAR. PORCELANA SANITARIA DE 46.8 X 36.1 CM, COLOR BLANCO, TIPO "MILANO" CORONA O SIMILAR -UN: Se ajusto según planos hidrosanitario

24.01.15	LAVAMANOS DE BAJOPONER. PORCELANA SANITARIA COLOR BLANCO. ANTIBACTERIAL. 49 CM X 41.5 CM X AL. 18.5 CM. TIPO SAN LORENZO CORONA O SIMILAR. – UN: Se ajusto según planos hidrosanitario
24.02.05	GRIFERIA DE MESON SISTEMA PUSH. TIPO "PRESSMATIC ALAFA" DOCOL O SIMILAR CICLO FIJO, ACABADO METALICO CROMADO, - UN: Se ajusto según planos hidrosanitario
24.03.02	INCRUSTACIONES CROMADAS. KIT TOALLERO, BARRA, PERCHERO, Y PAPELERA. TIPO MILÀN DE CORONA O SIMILAR. – UN: Se ajusto según planos hidrosanitario
24.03.06	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO. DE MESÓN. EN ACERO INOXIDABLE. CON PICO DE 6". LLAVE DE SEGURIDAD - UN: Se ajusto según planos hidrosanitario
24.03.10	BARRA DE SEGURIDAD EN L PARA SANITARIO, EN ACERO INOXIDABLE 304, CALIBRE 18", DIÁMETRO DE 1 ¼", DISTANCIA DE LA PARED 1 1/2" CON TORNILLOS ESCONDIDOS. NOTA: PARA LOS BAÑOS QUE NO CUENTAN CON BARANDA ABATIBLE SE DEBE INCLUIR ESPALDAR A LA BARRA . – UN: Se ajusto según planos hidrosanitario
24.03.13	BARANDA ABATIBLE, MURAL INODORO, TIPO GRICOL O SIMILAR - UN: Se ajusto según planos hidrosanitario
26.06.01	REJILLAS DE RETORNO TIPO CUBO 6" X 6" – UN: Ajustado por obras complementarias como el área del gimnasio
26.07.01	DUCTO LAMINA CAL 24 – ML: Ajustado por obras complementarias como el área del gimnasio
26.08.20	CABLE 7 hilos No 12 – ML: Ajustado por obras complementarias como el área del gimnasio
30.01.01	ASEO FINO DE FINAL DE OBRA - M2: Ajustado por obras complementarias como el área del gimnasio
NP - 001	SUB-BASE GRANULAR CLASE A ART. 320 INV-13 COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO - M3: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo para ello se deben adecuar áreas para su construcción
NP - 002	BASE GRANULAR ART. 330 INV-13 COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO M3: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo para ello se deben adecuar áreas para su construcción
NP - 012	BANDEJA TIPO MALLA 30 CM (ANCHO) X 8 CM (ANCHO) EN ACERO PARA INSTALACIÓN EN INTERIOR, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, SOPORTERIA. ML: Ajustado por obras complementarias como el área del gimnasio

DAIMCO
NIT: 900031462 - 1

CPP-DIRAF-2018-090

MENORES CANTIDADES DE OBRA:

En proceso de mediciones en obra han surgido menores cantidades de obra por diversas razones entre otras cantidades de obra que se sustraen del presupuesto para reemplazarlas por actividades que se ajusten a las necesidades de la obra y en otros casos debido a que han sido actividades que no hay necesidad de ejecutar por razones constructivas.

06.01.13	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CUBIERTA ALIGERADA CON ICOPOR INCLUYE RETIRO DE CASETON (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) - M2: Ajustado Según Plano Estructural E-05
12.17.01	TUBERIA 160mm PE RC TIPO FIRE SLIDE O SIMILAR LISTADO Y CERTIFICADO – ML: Se ajusto, es una actividad incluida dentro los Items no previstos según adición 1.
12.17.03	TUBERIA ACERO NEGRO 4" CALIBRE 10 – ML: Se ajusto, es una actividad incluida dentro los Items no previstos según adición 1.
12.17.05	TUBERIA ACERO NEGRO 2 1/2" CALIBRE 10 – ML: Se ajusto, es una actividad incluida dentro los Items no previstos según adición 1.
12.17.11	ACCESORIO 160mm PE RC TIPO FIRE SLIDE O SIMILAR LISTADO Y CERTIFICADO - UN: Se ajusto, es una actividad incluida dentro los Items no previstos según adición 1.
12.17.13	ACCESORIOS ACERO NEGRO 4" CALIBRE 40 – UN: Se ajusto, es una actividad incluida dentro los Items no previstos según adición 1.
12.17.15	ACCESORIOS ACERO NEGRO 2 1/2" CALIBRE 40 – UN: Se ajusto, es una actividad incluida dentro los Items no previstos según adición 1.
12.17.19	GABINETE TIPO III (Completo boquilla, válvula angular 1 1/2" y 2 1/2", manguera 30m llave spanner doble servicio, extintor) – UN: Se ajusto, es una actividad incluida dentro los Items no previstos según adición 1.
12.17.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIAMESA 2 1/2" X 4" X 2 1/2" – UN: Se ajusto, es una actividad incluida dentro los Items no previstos según adición 1.
12.17.23	CHEQUE RANURADO UL/FM 6" – UN: Se ajusto, es una actividad incluida dentro los Items no previstos según adición 1.
12.17.27	VALVULA REGULADORA DE PRESION ANGULAR 1.1/2" – UN: Se ajusto, es una actividad incluida dentro los Items no previstos según adición 1.
12.17.29	VALVULA INDICADORA – UN: Se ajusto, es una actividad incluida dentro los Items no previstos según adición 1.
12.17.30	SOPORTE SISMORESISTENTE 4" – UN: Se ajusto, es una actividad incluida dentro los Items no previstos según adición 1.
12.17.32	SOPORTE SISMORESISTENTE 2 1/2" – UN: Se ajusto, es una actividad incluida dentro los Items no previstos según adición 1.

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

12.17.33	SOPORTE TIPO PERA DE 4" – UN: Se ajusto, es una actividad incluida dentro los items no previstos según adición 1.
12.17.35	SOPORTE TIPO PERA DE 2 1/2" – UN: Se ajusto, es una actividad incluida dentro los items no previstos según adición 1.
14.01.07	PISO TECNICO EXTRUIDO TIPO NBK INDUSTRIAL (ESTRIADO) FORMATO 30X60 COLOR PERLA EMBOQUILLADO Y SELLADO SEGUN RECOMENDACIONES DE FABRICANTE. - M2: Por solicitud de Diraf, este item no se ejecuta por no ser necesario en este tipo de instalaciones.
14.01.22	GUARDA ESCOBA TIPO NBK SEGUN RECOMENDACIONES DE FABRICANTE – ML: Por solicitud de Diraf, este item no se ejecuta por no ser necesario en este tipo de instalaciones.
24.01.03	TAZA ALONGADA PARA FLUXÓMETRO LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO. CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH METÁLICA CROMADA. TIPO BÁLTICO EP ANTIBACTERIAL CORONA O SIMILAR. – UN: Se ajusto según planos hidrosanitario
24.01.09	LAVAMANOS TIPO VESSEL REF. TEMPO DE CORONA O SIMILAR DIÁMETRO 41CM. COLOR BLANCO. INCLUIR DESAGUE TIPO PUSH GRIVAL O SIMILAR. – UN: Se ajusto según planos hidrosanitario.

ACTIVIDADES NO PREVISTAS

En el análisis, estudios y situaciones presentadas durante la ejecución del proyecto, se genera la necesidad de incluir actividades no presupuestadas, necesarias para poder cumplir con el objeto contractual. Estas actividades se justifican a continuación:

NP - 016	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADORAS SEMI INDUSTRIALES – UND: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio
NP - 017	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA TIPO CUBIERTA DE EMPOTRAR ELECTRICA EN ACERO INOXIDABLE – UND: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio
NP - 018	TALA DE ARBOLES GRANDES DE ALTURA SUPERIOR A 8 MTS Y DIAMETRO DEL TRONCO MINIMO 80 CM, EXISTENTES, INCLUYE RETIRO DEL SITIO Y EXTRACCION DE RAIZ – UND: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo para ello se deben adecuar áreas para su construcción
NP - 019	TALA DE ARBOLES PEQUEÑOS DE ALTURA INFERIOR A 7.99 MTS Y DIAMETRO DEL TRONCO ENTRE 30 Y 79 CM, EXISTENTES, INCLUYE RETIRO DEL SITIO Y EXTRACCION DE RAIZ – UND: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo para ello se deben adecuar áreas para su construcción.
NP - 020	IMPERMEABILIZADO Y PROTECCION DE VIGAS DE CIMENTACION PLACA FLOTANTE CON EMULSION ASFALTICA - M2: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y demás áreas del proyecto.
NP - 021	MEDIA CAÑA EN MORTERO EN CUBIERTA 1:3 IMPERMEABILIZADO h= 0,15 – ML: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y demás áreas del proyecto.

NP - 022	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED - M2: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y demás áreas del proyecto.
NP - 023	AISLAMIENTOTERMICO EN FRESCASA DE 3 1/2 SIN PAPEL UBICADA ENTRE MUROS - M2: Ajustada según requerimientos de diseño.
NP - 024	SUMINISTRO E INSTALACION TAZA ALONGADA PARA FLUXÓMETRO LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO. CON FLUXOMETRO METÁLICO CROMADO. TIPO ADRIÁTICO EP ANTIBACTERIAL CORONA O SIMILAR. ENTRADA POSTERIOR CON MAYOR ALTURA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD O DISCAPACIDAD – UND: Ajustada según requerimientos de diseño.
NP - 025	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DISCAPACITADOS LÍNEA NACIONAL COLOR BLANCO. TIPO BARI GRICOL O SIMILAR. PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD O DISCAPACIDAD, INCLUYE GRIFERIA MONOCONTROL CELESTE BAJITA O SIMILAR. – UND: Ajustada según requerimientos de diseño.
NP - 026	SOBRE CIMIENTO IMPERMEABILIZADO EN LADRILLO ESPESOR 12 CM- M2: Ajustada según requerimientos de diseño.
NP - 027	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS CON EL NUEVO DISEÑO DE LA COCINA, - UND: Ajustada según requerimientos de diseño.
NP - 028	TAPA REGISTRO 20 X 20 PVC – UND: Ajustada según requerimientos de diseño.
NP - 029	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA IMPERMEABILIZANTE SIKALASTIC 1K PARA BAÑOS Y ZONAS HUMEDAS - M2: Ajustada según requerimientos de diseño.
NP - 030	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALLINERO EN MUROS DE MAMPOSTERIA, PARA POSTERIORMENTE PAÑETARLA - M2: Ajustada según requerimientos de diseño.
NP - 031	ESCALERA TIPO GATO EN ACERO INOXIDABLE DOS SECCIONES CON PROTECCION DE ESPALDA, ALTURA DE 4 MTS - UND: Ajustada según requerimientos de diseño.
NP - 032	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKADUR 32 PRIMER, UNION CONCRETOS - M2: Ajustada según requerimientos de diseño.
NP - 033	TAPA DE INSPECCION EN PERFILERIA Y TAPA DE ACUERDO A DETALLE DE CIELO RASOS - UND: Ajustada según requerimientos de diseño.
NP - 034	REJILLA TIPO GRANADA 6" x 4" BAJANTES AGUAS LLUVIAS – UND: Ajustada según requerimientos de diseño.
NP - 035	CAJA DE INSPECCION TIERRA 33 * 33 INTERNO CODENSA POLO A TIERRA – UND: Ajustada según requerimientos de diseño.
NP - 036	CORTE Y SELLADO DE JUNTA DE PAVIMENTO – ML: Ajustada según requerimientos de diseño.
NP - 037	SUB CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA. REFERENCIA V - 60A CON HOJA CORREDERA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE. MARCO DILATADO EN

PERFILERÍA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE VIDRIO PROTEC DE 0,80M X 2,25M. – UND: Ajustada según requerimientos de diseño.

NP - 038 PASAMURO DE 2" PVC PARA CONEXIÓN CASETONES EN LOSA FLOTANTE – UND: Ajustada según requerimientos de diseño.

NP - 039 PASAMURO DE 3" EN ACERO INOXIDABLE X 40 CM. PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA – UND: Ajustada según requerimientos de diseño.

NP - 040 PASAMURO DE 2" EN ACERO GALVANIZADO RANURADO PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA – UND: Ajustada según requerimientos de diseño.

NP - 041 PASAMURO DE 4" EN ACERO GALVANIZADO PARA VENTILACION DE TANQUE DE AGUA – UND: Ajustada según requerimientos de diseño.

NP - 042 LOSA EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, ACABADO ANTIDESLIZANTE Y A LA VISTA COLOR GRIS.ESPESOR 10 CM, PARA ANDENES EXTERIORES - M2: Ajustada según requerimientos de diseño.

NP - 043 ADOQUÍN CONCRETO PEATONAL 20 X 10 X 6 CM COLOR ARENA RESISTENCIA E INSTALACIONES DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE CARTILLA DE ANDENES SDP O SIMILAR - M2: Ajustada según requerimientos de diseño.

NP - 044 CONCRETO DE 3000 PSI ESTAMPADO COLOR GRIS MODULO MT-10 ADOQUIN - M2: Ajustada según requerimientos de diseño.

NP - 045 CANECA DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE PIVOTANTE – UNI: Ajustada según requerimientos de diseño.

NP - 046 RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDA EN SITIO ACABADO ANTIDESLIZANTE Y A LA VISTA COLOR GRIS - M2: Ajustada según requerimientos de diseño.

NP - 047 BALDOSA EN GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO 30X30CM FONDO BLANCO ESPESOR CARA ARISTA 15MM GRANO HOMOGENEO. INCLUYE: DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN - M2: Ajustada según requerimientos de la DIRAF

NP - 048 GUARDA ESCOBA RECTO EN GRANO DE MARMOL PULIDO 30X7.2-1 CM FONDO BLANCO – ML: Ajustada según requerimientos de la DIRAF

NP - 049 GUAYACAN DORADO – UND: Ajustado para la adecuación de las áreas de urbanismo.

NP - 050 ACACIA FORRAJERA – UND: Ajustado para la adecuación de las áreas de urbanismo.

NP - 051 CARBONERO ROJO – UND: Ajustado para la adecuación de las áreas de urbanismo.

NP - 052 NISPERO – UND: Ajustado para la adecuación de las áreas de urbanismo.

NP - 053 GUAYACAN DE MANIZALES – UND: Ajustado para la adecuación de las áreas de urbanismo.

NP - 054 CHACHAFRUTO - UND: Ajustado para la adecuación de las áreas de urbanismo.

NP - 055	MANGO - UND: Ajustado para la adecuación de las áreas de urbanismo.
NP - 056	CHICALA – UND: Ajustado para la adecuación de las áreas de urbanismo.
NP - 057	HELECHO ESPINA DE PESCADO - UND: Ajustado para la adecuación de las áreas de urbanismo.
NP - 058	MANI FORRAJERO – UND: Ajustado para la adecuación de las áreas de urbanismo.
NP - 059	DURANTA LIMON – UND: Ajustado para la adecuación de las áreas de urbanismo.
NP - 060	AJO DE SOCIEDAD – UND: Ajustado para la adecuación de las áreas de urbanismo.
NP - 061	BALSO – UND: Ajustado para la adecuación de las áreas de urbanismo.
NP - 062	YARUMO – UND: Ajustado para la adecuación de las áreas de urbanismo.
NP - 063	LIMON TAHITI – UND: Ajustado para la adecuación de las áreas de urbanismo.
NP - 064	AGAPANTO – UND: Ajustado para la adecuación de las áreas de urbanismo.
NP - 065	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CIMENTACIÓN INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO - M2: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 066	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA VIGAS AEREAS DE ENTREPISO (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) - M3: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 067	VIGA CANAL EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE CON FORMALETA, SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES ACABADOS A LA VISTA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) – ML: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 068	VALVULA DE BOLA PVC SOLDAR TIPO PESADO 1 1/2" – UN: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 069	VALVULA DE BOLA PVC SOLDAR TIPO PESADO 1 1/4" – UN: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 070	MEDIDOR PARA AGUA DE 1 1/2 "- UN: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 071	CAJA PARA 1 MEDIDOR - UN: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 072	EXTINTOR PORTATIL MULTIPROPOSITO CON AGENTE LIMPIO – UN: Necesarios por cambio de diseños iniciales (Avalados por la interventoria y por la DIRAF)

NP - 073	RELLENO GRAVA - M3: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 074	ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TN1 EN 4xNo8+8T+12D – ML: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 075	GABINETE METALICO DE SOBREPONER PARA 18 CIRCUITOS – UN: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 076	GABINETE METALICO DE SOBREPONER PARA 4 CIRCUITOS – UN: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 077	LAMPARA HERMETICA 2X54 T5 – UN: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 078	LAMPARA LED 150W – UN: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 079	TUBERIA EMT 1/2" ML: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 080	TUBERIA EMT 3/4" – ML: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 081	PISO EN BALDOSA DE 60X60 DE CAUCHO DE ALTO TRAFICO - M2: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 082	GUARDA ESCOBA EN PINO CARIBE 70X10 ACABADO LACA TRANSPARENTE MATE –ML: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 083	V - 51 - VENTANA CON HOJA BATIENTE EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE. MARCO DILATADO EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE ALFAJIA METALICA VIDRIO INCOLORO 4+4 PVB 0,38MM U=5,5 CS=0,38 G=0,33 %=50. – UN: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 084	MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE 2. PERSIANA DE MADERA TEKA + IMPERMEABILIZANTE (FIJA) - M2: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 085	MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE 2. PERSIANA DE MADERA TEKA + IMPERMEABILIZANTE (ACORDEÓN) - M2: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 086	PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) - M2: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 087	PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) – ML: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.

NP - 088	MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 4 CM ACABADO A LA VISTA SIMILAR A CONCRETO A LA VISTA FUNDIDO EN EL PROYECTO CON PENDIENTE MINIMA DEL 2% - M2: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 089	MESÓN EN LÁMINA DE GRANITO COLOR NEGRO SAN GABRIEL. FALDÓN FRONTAL 20CM. SALPICADERO CON CHAFLÁN H=10CM. APOYADO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA. – ML: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 090	LAVAMANOS DE COLGAR PORCELANA SANITARIA DE 48,8 X 36,1 CM COLOR BLANCO TIPO "MILANO" CORONA O SIMILAR – UND: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 091	GRIFERÍA DE DUCHA MONOCONTROL, KYMA O SIMILAR EN BRONCE CROMADO. - UN: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 092	SISTEMA DE DUCHA CON SISTEMA ABATIBLE PARA BAÑO ACCESIBLE – UN: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 093	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO. DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO, PARA ROLLO DE 200/400 MTS. CERRADURA CON LLAVE. – UN: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 094	SECADOR ELÉCTRICO PARA MANOS. TIPO MANOS LIBRES, CARCAZA OVALADA METÁLICA ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CALIBRE 1.2 MM, MOTOR SIN ESCOBILLAS, RANGO DE DETECCIÓN DEL SENSOR AJUSTABLE, DE 10 A 30 CMS APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 2 MINUTOS DE USO. – UN: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 095	TUBERIA COBRE TIPO K 1" – ML: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 096	TABLERO ON/ OFF DE TEMPERATURA – UN: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 097	TUBERIA 1/2" METALICA - ML: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 98	CASILLERO 45 X 90 – UN: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 99	BICICLETA ESTATICA – UN: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 100	CAMINADORA – UN: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.
NP - 101	MAQUINA GIMNASIO – UN: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.

NP - 102 BANCA GIMNASIO – UN: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.

NP - 103 MANCUERNAS – UN: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.

NP - 104 PESAS – UN: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio y áreas de urbanismo.

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE PRESUPUESTAL No. 2	
DESCRIPCION	VALORES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MOD 2 ACTIVIDADES CONTRACTUALES	$ 10.067.262.021,11
VALOR TOTAL TANQUE RCI MOD 2	$ 433.346.050,23
VALOR TOTAL ITEMS NO PREVISTOS No 01 MOD 2	$ 581.629.055,66
VALOR TOTAL ITEMS NO PREVISTOS No 02 MOD 2	$ 1.602.294.119,30
TOTAL COSTOS MOD 2	**$ 12.684.531.246,31**
DEFICIT	**$ 3.000.721.946,00**

JUSTIFICACION

El contratista en Cumpliendo de sus obligaciones contractuales y amparado en la "CLAUSULA DECIMA PRIMERA – OBLIGACIONES EL CONTRATISTA: ESPECIFICAS" del contrato de obra No PN DIRAF No 06-6-10044-18.numeral 12) "*Elaborar y entregar conjuntamente con la interventoria, el balance compensado de obra, cada vez que se requiera para aprobación del ordenador del gasto, en donde evidencie las obras contractuales, mayores, menores cantidades de obra y obras no previstas si las hay; este balance debe ir acompañado de las memorias de calculo y análisis de precios unitarios de las obras no previstas, esta actividad se deberá realizar antes de la ejecución de los items que generen mayores cantidades o no previstas*" y la interventoria en cumplimiento de sus obligaciones contractuales amparados en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA – GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE CARÁCTER TECNICO" numeral 10) *Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, balances del contrato, análisis de precios unitarios, actas de suspensión y reiniciación (cuando haya lugar para aprobación y firma del ordenador del gasto), el acta de corte de obra y dotación, el acta de recibo final de obra y dotación y el proyecto de liquidación del contrato de obra, revisarlas y suscribirlas. Cuando exista modificación de cantidades (mayor o menor cantidad de obra), obras complementarias y/o adicionales, no previstas, el interventor deberá previamente antes de su ejecución elaborar un informe técnico detallado donde conste la justificación de dichas modificaciones, con el objeto de solicitar su aprobación ante la entidad. Los balances, APU, actas de corte, de iniciación, (suspensión y reiniciación si las hay), informes mensuales y/o cuando se amerite impresos y fotografías a color, esta documentación referenciada la deben firmar los representantes legales de los contratos de obra e interventoria o quien en su efecto tenga poder autenticado para hacerlo, este poder lo autoriza el representante legal de cada contrato.* "amparados en estas cláusulas de los contratos respectivamente realizamos las acciones de orden administrativo y financiero entregados a la DIRAF mediante la comunicación del asunto.

Acorde con lo anterior, es de considerar que no existen hechos cumplidos en la ejecución de la obra, toda vez que, con base en los mecanismos contractuales, en ejercicio de las funciones de control y dirección del contrato, el contratista, la interventoria y la supervisión verificaron y registraron los aspectos de incidencia en la ejecución, para posteriormente proceder a la implementación de estos en la obra, todos de acuerdo con la responsabilidad que nos asiste.

Como se puede apreciar, en el caso que nos ocupa, la interventoria de manera previa a la ejecución de las respectivas actividades durante el desarrollo del contrato realizó como es su obligación junto con el contratista el control del balance financiero del contrato, encontrando un déficit de TRES MIL MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARETA Y SEIS PESOS M/CTE (3.000.721.496.00), lo anterior teniendo en cuenta, que existen mayores y menores cantidades de obra, así como actividades no previstas dentro del contrato y actividades complementarias de la Fase No 4 las cuales deben ser ajustadas e incluidas dentro del contrato, para lo cual en procura del control técnico y financiero de la obra se realizó el Acta de Mayores y Menores e Ítems No Previstos No. 2 y Balance No 02, los cuales posteriormente, servirán de base para el desarrollo de los trámites legales, administrativos y presupuestales pertinentes.

En concordancia con lo anterior, si la Entidad concede la adición al contrato de obra No. PN DIRAF No 06-6-10044-18, será necesario adicionar proporcionalmente el contrato de interventoría No PN DIRAF No. 06-3-10051-18.

Por lo expuesto, quedamos atentos a sus instrucciones con relación al procedimiento a seguir.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	Lo enunciado en 1 Tomo
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo
Copia 1.	Archivo – Contrato de interventoría

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-091

Bogotá D.C. 28 de enero de 2019

Señores
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
Aurelio Gutiérrez Castillo
Representante Legal
Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Remisión orden de pago No. 13

Respetado Ingeniero:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir debidamente firmado y verificado la orden de pago No. 13, correspondiente al documento No PN-DIRAF-POPAYAN-0125 con radicado Daimco No D-2019-0159 del 25 de enero de 2019, para continuar con su trámite ante la fiduciaria POPULAR.

Cuentas por pagar a proveedores (Materiales)

- Orden de giro No. 13 - Pago de aportes por compra de materiales dotación u alquiler de equipos s a METAL B SAS, por un valor de $ 10.200.000.00
- Orden de giro No. 13 - Pago de aportes por compra de materiales dotación u alquiler de equipos s a SODIMAC COLOMBIA SA, por un valor de $ 23.147.200.00
- Orden de giro No. 13 - Pago de aportes por compra de materiales dotación u alquiler de equipos s a CEMENTOS ARGOS SA, por un valor de $ 61.379.010.00
- Orden de giro No. 13 - Pago de aportes por compra de materiales dotación u alquiler de equipos s a ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR, por un valor de $ 13.891.133.00
- Orden de giro No. 13 - Pago de aportes por compra de materiales dotación u alquiler de equipos s a EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO S.A.S, por un valor de $ 7.242.536.00
- Orden de giro No. 13 - Pago de aportes por compra de materiales dotación u alquiler de equipos s a PREFABRICADOS JOVITA CASTRO S.A.S, por un valor de $ 14.146.723.00

Agradecemos de antemano su atención y estaremos atentos a cualquier solicitud.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Recibido 12:00 M. My. Angel Lopez
1508-2348
24-01-2019 29/01/2019 11:30

Anexos	41 folios
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal
Elaboro	Arq. Diego Lopez – Prof. Apoyo
Copia 1.	Archivo – Contrato de interventoria
Copia 2.	POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Directora Administrativa y Financiera - Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 – CAN Mayor – Angel Lopez Dolos – Supervisor

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 449 No. 57A – 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-092

Bogotá D.C. 28 de enero de 2019

Señores
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
Aurelio Gutiérrez Castillo
Representante Legal
Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Remisión orden de pago No. 14

Respetado Ingeniero:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir debidamente firmado y verificado la orden de pago No. 14, correspondiente al documento No PN-DIRAF-POPAYAN-0125 con radicado Daimco No D-2019-0159 del 25 de enero de 2019, para continuar con su trámite ante la fiduciaria POPULAR.

- Orden de giro No. 14 - Devolución de aportes por pago de salarios, jornales y mano de obra, por un valor de $ 26.452.900.00
- Orden de giro No. 14 - Devolución de aportes por pago de materiales, dotación y alquiler de equipos, por un valor de $ 36.744.104.00
- Orden de giro No. 14 - Devolución de aportes por pago de transporte y retiro de escombros, por un valor de $ 643.500.00
- Orden de giro No. 14 - Devolución de aportes por pago de descuentos y retenciones, por un valor de $ 24.007.000.00

Agradecemos de antemano su atención y estaremos atentos a cualquier solicitud.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Orlando Rebollo
80820548
24-01-2019

My Angel López
29/01/2019
11:31

Anexos	78 folios
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal
Elaboro	Arq. Diego Lopez – Prof. Apoyo
Copia 1	Archivo – Contrato de interventoria
Copia 2	POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Directora Administrativa y Financiera - Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 – CAN Capitán – Ángel Lopez Ostos – Supervisor

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A – 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021462 - 1

POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa
RADICACION
Radicado N° E-007582
Radicado el 30 ENE 2019
Hora 16:17 Firma

CPP-DIRAF-2018-093

Bogotá D.C. 30 de enero de 2019

Señores
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
Aurelio Gutiérrez Castillo
Representante Legal
Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Remisión orden de pago No. 15

Respetado Ingeniero:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir debidamente firmado y verificado la orden de pago No. 15, correspondiente al documento No PN-DIRAF-POPAYAN-0129 con radicado Daimco No D-2019-0182 del 29 de enero de 2019, para continuar con su trámite ante la fiduciaria POPULAR.

Cuentas por pagar a proveedores (Salarios, jornales y mano de obra – Compra de Materiales)

- Orden de giro No. 15 - Pago de aportes por compra de materiales dotación u alquiler de equipos s a ALFAGRES SA, por un valor de $ 268.957.548.00
- Orden de giro No. 15 - Pago de aportes por salarios, jornales y mano de obra a AG3 INGENIERIA SAS, por un valor de $ 371.663.060.00

Agradecemos de antemano su atención y estaremos atentos a cualquier solicitud.

Cordialmente

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Orlando Roberto C80[illegible] 30.01.2019

Anexos	Lo enunciado
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal
Elaboro	Arq. Diego Lopez – Prof. Apoyo
Copia 1.	Archivo – Contrato de interventoria
Copia 2.	POLICIA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Directora Administrativa y Financiera - Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 – CAN Mayor – Angel Lopez Ostos – Supervisor

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-094

E-007576
30 ENE 2019

Bogotá D.C. 30 de enero de 2019

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoria PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico-administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Respuesta al documento S-2019-002389/DIRAF-GUMAI-29 con radicado Daimco D-2019-0181 del 29 de enero de 2019 – Solicitud concepto contrato de obra No 06-6-10044-18.

Respetados Señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, y en respuesta al comunicado del asunto, a continuación, nos pronunciamos de la siguiente manera:

- La Fase No 4 contempla la construcción de alojamientos del edificio D, así mismo, las obras de urbanismo, el edificio del gimnasio y obras complementarias requeridas para la ejecución de la Fase 4.

- La interventoría a través del comunicado CPP-DIRAF-2018-090 del 18 de enero de 2019 con radicado de la entidad No E-003663, puso en conocimiento a la administración la necesidad de adicionar el contrato de obra No 06-6-10044-18.

  Como se puede apreciar, en el caso que nos ocupa, la interventoría de manera previa a la ejecución de las respectivas actividades realizó, junto con el contratista el control del balance financiero del contrato, ejercicio que arrojó como resultado, que es necesario para culminar las metas físicas e incluir el gimnasio, se adicione el contrato por un valor de TRES MIL MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARETA Y SEIS PESOS M/CTE (3.000.721.496.00), lo anterior teniendo en cuenta, que existen mayores y menores cantidades de obra, así como actividades no previstas dentro del contrato y actividades complementarias de la Fase No 4 las cuales deben ser ajustadas e incluidas dentro del contrato, para lo cual en procura del control técnico y financiero de la obra se remitió adjunto al comunicado en comento el Acta de Mayores y Menores e Ítems No Previstos No. 2 y Balance No 02, los cuales servirán de base para el desarrollo de los trámites legales, administrativos y presupuestales pertinentes.

- Teniendo en cuenta que el contrato de obra No 06-6-10044-18 y el de interventoría No PN DIRAF No. 06-3-10051-18 vence el 29 de abril de 2019, consideramos insuficiente el tiempo restante para la ejecución de las actividades referentes a la construcción del gimnasio, actividades no prevista y complementarias de la Fase No 4, razón por la cual para llevar a un feliz término el objeto contractual y poder ejecutar la totalidad de la obra contratada garantizando el buen funcionamiento del proyecto, será necesario que la entidad contratante conceda una prorroga a los contratos de obra e interventoría respectivamente, por un termino de 60 días calendario a partir del 29 del abril de 2019 tiempo que cobijara el contrato principal, sus adiciones y modificaciones contractuales, tal y como lo había solicitado el contratista en su comunicado PN-DIRAF-POPAYAN-0126 del 28 de enero de 2019 bajo el radicado de la entidad No E-2019-006500-DIRAF

DAIMCO
NIT. 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-094

Por lo anterior, consideramos viable conceder la adición y prorroga al contrato de obra No PN DIRAF No 06-6-10044-18, teniendo en cuenta el déficit evidenciado para la ejecución de las actividades complementarias de la Fase 4

En concordancia con lo anterior, si la Entidad concede la adición y prórroga al contrato de obra No. PN DIRAF No 06-6-10044-18, será necesario adicionar proporcionalmente y prorrogar el contrato de interventoria No PN DIRAF No. 06-3-10051-18 por un término de 60 días calendario a partir del 29 de abril de 2019, tiempo que cobijara el contrato principal, sus adicciones y modificaciones contractuales

Agradecemos de antemano su atención.

Cordialmente,

JOSE [illegible]
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	N/A
Vo. Bo.	Ing. Omar Perruz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo
Copia 1.	Archivo – Contrato de interventoria

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co

Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

Recibida

POLICIA NACIONAL

DAIMCO

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

CONTRATO No. :	Convenio de Consultoría 194 DIRAF No. 06-5-10033-18
OBJETO:	"Interventoría técnica administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste"
CONTRATISTA:	CONSORCIO BCA GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO S.A.S
SUPERVISOR:	Mayor Ingeniero Civil ángel Giovanni López Ostos

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
D-2019-0094	Orden de pago #11 y #12	1	N.A	11/01/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2019-0103	Solicitud	1	N.A	17/01/2019	N.A	1	1	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2019-0107	Solicitud	1	N.A	17/01/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
-19-0159	Orden de pago #13 y #14	1	N.A	25/01/2019	N.A	1	1	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2019-0161	Solicitud concepto contrato de obra N0 06-6-10044-18	1	N.A	29/01/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DE LA ENTIDAD
D-2019-0192	Orden de pago # 15	1	N.A	29/01/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2019-0194	Orden de pago # 16	1	N.A	30/01/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C. a los 31 días del mes Enero del 2019.

ENTREGA
Firma
NOMBRE: TIRSO COSME (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)
Fecha: 31 de Enero de 2019

RECIBE
Firma
NOMBRE: Mayor Ingeniero Civil ángel Giovanni López Ostos
Fecha: 31 de Enero de 2019

Original: POLICIA NACIONAL
Cor [illegible], Interventoría

Bogotá, enero 11 de 2018

DAIMCO
Enero 11- 2019 Hora: 14:52 p.m
Folios: 01 Anexos: 187
No.Radicado D-2019-0054
Radicado: Yesenia Homez 1087-2019
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

PN-DIRAF-POPAYAN-0115

Señores
DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Calle 448 No. 57A-52 Barrio La Esmeralda
Bogotá

Referencia: CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Orden de Pago #11 y 12

Por medio de la enviamos los siguientes documentos para su revisión y pago:

Orden de Pago 11 y 12 con respectivos soportes

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

DAIMCO
Enero 17- 2019 Hora: 15:03 p.m
Folios: 02 Anexos: 00
No.Radicado D-2019-0103
Radicado: Yesenia Homez 0087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO SUPUCA ACEPTACIÓN

Bogotá, enero 17 de 2018

PN-DIRAF-POPAYAN-0119

Señores
DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Calle 448 No. 57A-52 Barrio La Esmeralda
Bogotá

Referencia: CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Solicitud

Cordialmente enviamos el balance con mayores cantidades de obra y precios no previstos los cuales son necesarios para dar cumplimiento a la obra en su alcance.
Los precios no previstos solicitados con su respectivos Análisis de precios unitarios adjuntos son:

NP - 016	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADORAS SEMI INDUSTRIALES	UND
NP - 017	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA TIPO CUBIERTA DE EMPOTRAR ELECTRICA | SD6104 ACERO INOXIDABLE	UND
NP - 018	TALA DE ARBOLES GRANDES DE ALTURA SUPERIOR A 8 MTS Y DIAMETRO DEL TRONCO MINIMO 80 CM, EXISTENTES, INCLUYE RETIRO DEL SITIO Y EXTRACCION DE RAIZ	UND
NP - 019	TALA DE ARBOLES PEQUEÑOS DE ALTURA INFERIOR A 7.99 MTS Y DIAMETRO DEL TRONCO ENTRE 30 Y 79 CM, EXISTENTES, INCLUYE RETIRO DEL SITIO Y EXTRACCION DE RAIZ	UND
NP - 020	IMPERMEABILIZADO Y PROTECCION DE VIGAS DE CIMENTACION PLACA FLOTANTE CON EMULSION ASFALTICA	M2
NP - 021	MEDIA CAÑA EN MORTERO EN CUBIERTA 1:3 IMPERMEABILIZADO h= 0,15 -	ML
NP - 022	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED	M2
NP - 023	AISLAMIENTOTERMICO EN FRESCASA DE 3 1/2 SIN PAPEL UBICADA ENTRE MUROS	M2
NP - 024	SUMINISTRO E INSTALACION TAZA ALONGADA PARA FLUXÓMETRO LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO. CON FLUXOMETRO METÁLICO CROMADO. TIPO ADRIÁTICO EP ANTIBACTERIAL CORONA O SIMILAR. ENTRADA POSTERIOR CON MAYOR ALTURA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD O DISCAPACIDAD	UND

NP - 025	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DISCAPACITADOS LÍNEA NACIONAL COLOR BLANCO. TIPO BARI GRICOL O SIMILAR. PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD O DISCAPACIDAD, INCLUYE GRIFERIA MONOCONTROL CELESTE BAJITA O SIMILAR.	UND
NP - 026	SOBRE CIMIENTO IMPERMEABILIZADO EN LADRILLO ESPESOR 12 CM	M2
NP - 027	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS CON EL NUEVO DISEÑO DE LA COCINA,	UND
NP - 028	TAPA REGISTRO 20 X 20 PVC	UND
NP - 029	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA IMPERMEABILIZANTE SIKALASTIC 1K PARA BAÑOS Y ZONAS HUMEDAS	M2
NP - 030	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALLINERO EN MUROS DE MAMPOSTERIA, PARA POSTERIORMENTE PAÑETARLA	M2
NP - 031	ESCALERA TIPO GATO EN ACERO INOXIDABLE DOS SECCIONES CON PROTECCION DE ESPALDA, ALTURA DE 4 MTS	UND
NP - 032	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKADUR 32 PRIMER, UNION CONCRETOS	M2
NP - 033	TAPA DE INSPECCION EN PERFILERIA Y TAPA DE ACUERDO A DETALLE DE CIELO RASOS	UND
NP - 034	REJILLA TIPO GRANADA 6" x 4" BAJANTES AGUAS LLUVIAS	UND
NP - 035	CAJA DE INSPECCION TIERRA 33 * 33 INTERNO CODENSA POLO A TIERRA	UND
NP - 036	CORTE Y SELLADO DE JUNTA DE PAVIMENTO	ML
NP - 037	SUB CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA. REFERENCIA V - 60A CON HOJA CORREDERA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE. MARCO DILATADO EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE VIDRIO PROTEC DE 0,80M X 2,25M.	UND
NP - 038	PASAMURO DE 2" PVC PARA CONEXIÓN CASETONES EN LOSA FLOTANTE	UND
NP - 039	PASAMURO DE 3" EN ACERO INOXIDABLE X 40 CM. PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	UND
NP - 040	PASAMURO DE 2" EN ACERO GALVANIZADO RANURADO PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	UND
NP - 041	PASAMURO DE 4" EN ACERO GALVANIZADO PARA VENTILACION DE TANQUE DE AGUA	UND
NP - 042	LOSA EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, ACABADO ANTIDESLIZANTE Y A LA VISTA COLOR GRIS.ESPESOR 10 CM, PARA ANDENES EXTERIORES	M2
NP - 043	ADOQUÍN CONCRETO PEATONAL 20 X 10 X 6 CM COLOR ARENA RESISTENCIA E INSTALACIONES DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE CARTILLA DE ANDENES SDP O SIMILAR	M2
NP - 044	CONCRETO DE 3000 PSI ESTAMPADO COLOR GRIS MODULO MT-10 ADOQUIN	M2
NP - 045	CANECA DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE PIVOTANTE	UNI
NP - 046	RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDA EN SITIO ACABADO ANTIDESLIZANTE Y A LA VISTA COLOR GRIS	M2
NP - 047	BALDOSA EN GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO 30X30CM FONDO BLANCO ESPESOR CARA ARISTA 15MM GRANO HOMOGENEO. INCLUYE: DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN	M2
NP - 048	GUARDA ESCOBA RECTO EN GRANO DE MARMOL PULIDO 30X7.2-1 CM FONDO BLANCO	ML
NP - 049	GUAYACAN DORADO	UND
NP - 050	ACACIA FORRAJERA	UND

NP - 051	CARBONERO ROJO	UND
NP - 052	NISPERO	UND
NP - 053	GUAYACAN DE MANIZALES	UND
NP - 054	CHACHAFRUTO	UND
NP - 055	MANGO	UND
NP - 056	CHICALA	UND
NP - 057	HELECHO ESPINA DE PESCADO	UND
NP - 058	MANI FORRAJERO	UND
NP - 059	DURANTA LIMON	UND
NP - 060	AJO DE SOCIEDAD	UND
NP - 061	BALSO	UND
NP - 062	YARUMO	UND
NP - 063	LIMON TAHITI	UND
NP - 064	AGAPANTO	UND
NP - 065	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CIMENTACIÓN INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2
NP - 066	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA VIGAS AEREAS DE ENTREPISO (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)	M3
NP - 067	VIGA CANAL EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE CON FORMALETA, SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES ACABADOS A LA VISTA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)	ML
NP - 068	VALVULA DE BOLA PVC SOLDAR TIPO PESADO 1 1/2"	UN
NP - 069	VALVULA DE BOLA PVC SOLDAR TIPO PESADO 1 1/4"	UN
NP - 070	MEDIDOR PARA AGUA DE 1 1/2 "	UN
NP - 071	CAJA PARA 1 MEDIDOR	UN
NP - 072	EXTINTOR PORTATIL MULTIPROPOSITO CON AGENTE LIMPIO	UN
NP - 073	RELLENO GRAVA	M3
NP - 074	ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TN1 EN 4xNo8+8T+12D	ML
NP - 075	GABINETE METALICO DE SOBREPONER PARA 18 CIRCUITOS	UN
NP - 076	GABINETE METALICO DE SOBREPONER PARA 4 CIRCUITOS	UN
NP - 077	LAMPARA HERMETICA 2X54 T5	UN
NP - 078	LAMPARA LED 150W	UN
NP - 079	TUBERIA EMT 1/2"	ML
NP - 080	TUBERIA EMT 3/4"	ML
NP - 081	PISO EN BALDOSA DE 60X60 DE CAUCHO DE ALTO TRAFICO	M2
NP - 082	GUARDA ESCOBA EN PINO CARIBE 70X10 ACABADO LACA TRANSPARENTE MATE	ML
NP - 083	V - 51 - VENTANA CON HOJA BATIENTE EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE. MARCO DILATADO EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE ALFAJIA METALICA VIDRIO INCOLORO 4+4 PVB 0,38MM U=5,5 CS=0,38 G=0,33 %=50.	UN

NP - 084	MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE 2. PERSIANA DE MADERA TEKA + IMPERMEABILIZANTE (FIJA)	M2
NP - 085	MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE 2. PERSIANA DE MADERA TEKA + IMPERMEABILIZANTE (ACORDEÓN)	M2
NP - 086	PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA COLOR BLANCO BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (INCLUYE ESTUCO , FILOS Y DILATACIONES)	M2
NP - 087	PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA COLOR BLANCO BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	ML
NP - 088	MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 4 CM ACABADO A LA VISTA SIMILAR A CONCRETO A LA VISTA FUNDIDO EN EL PROYECTO CON PENDIENTE MINIMA DEL 2%	M2
NP - 089	MESÓN EN LÁMINA DE GRANITO COLOR NEGRO SAN GABRIEL. FALDÓN FRONTAL 20CM. SALPICADERO CON CHAFLÁN H=10CM. APOYADO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA.	ML
NP - 090	MESÓN EN LÁMINA DE GRANITO COLOR NEGRO SAN GABRIEL. FALDÓN FRONTAL 20CM. SALPICADERO CON CHAFLÁN H=10CM. APOYADO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA.	ML
NP - 091	LAVAMANOS DE COLGAR PORCELANA SANITARIA DE 48,8 X 36,1 CM COLOR BLANCO TIPO "MILANO" CORONA O SIMILAR	UND
NP - 092	GRIFERÍA DE DUCHA MONOCONTROL, KYMA O SIMILAR EN BRONCE CROMADO.	UN
NP - 093	SISTEMA DE DUCHA CON SISTEMA ABATIBLE PARA BAÑO ACCESIBLE	UN
NP - 094	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO. DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO, PARA ROLLO DE 200/400 MTS. CERRADURA CON LLAVE.	UN
NP - 095	SECADOR ELÉCTRICO PARA MANOS. TIPO MANOS LIBRES, CARCAZA OVALADA METÁLICA ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CALIBRE 1.2 MM, MOTOR SIN ESCOBILLAS, RANGO DE DETECCIÓN DEL SENSOR AJUSTABLE, DE 10 A 30 CMS APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 2 MINUTOS DE USO.	UN
NP - 096	TUBERIA COBRE TIPO K 1"	ML
NP - 097	TABLERO ON/ OFF DE TEMPERATURA	UN
NP - 098	TUBERIA 1/2" METALICA	ML
NP - 099	CASILLERO 45 X 90	UN
NP - 100	BICICLETA ESTATICA	UN
NP - 101	CAMINADORA	UN
NP - 102	MAQUINA GIMNASIO	UN
NP - 103	BANCA GIMNASIO	UN
NP - 104	MANCUERNAS	UN
NP - 105	PESAS	UN

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Represeptante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

Bogotá, enero 17 de 2019

PN-DIRAF-POPAYAN-0120

DAIMCO
Enero 18- 2019 Hora: 12:09 p.m
Folios: 03 Anexos: 00
No.Radicado D-2019-0107
Radicado: Yesenia Homez 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Señores:
DAIMCO S.A.S
a/a: Ing. José Vicente Bocanegra
Gerente técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel.: 317 659 4536 7020798 7030797
Calle 44B No. 57ª-52 Barrio La Esmeralda
Bogotá

Referencia: CONTRATO No 06-6-10044-18 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN NO 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

Asunto: Solicitud

Cordialmente enviamos el balance con mayores cantidades de obra y precios no previstos los cuales son necesarios para dar cumplimiento a la obra en su alcance.

Lo precios de No previstos a continuación:

ITEM	ACTIVIDAD	UN	VLR. TOTAL, CONSULTORIA	CORRECCION PROGRESIVA IPC 2016 (5,75%)	CORRECCION ACUMULADA IPC 2017 (4,09%)	CORRECCION ACUMULADA IPC 2018 (3,18%)
NP - 016	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADORAS SEMI INDUSTRIALES	UN				
NP - 017	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA TIPO CUBIERTA DE EMPOTRAR ELECTRICA ACERO INOXIDABLE	UN				
NP - 018	TALA DE ARBOLES GRANDES DE ALTURA SUPERIOR A 8 MTS Y DIAMETRO DEL TRONCO MINIMO 80 CM, EXISTENTES, INCLUYE RETIRO DEL SITIO Y EXTRACCION DE RAIZ	UN				
NP - 019	TALA DE ARBOLES PEQUEÑOS DE ALTURA INFERIOR A 7,99 MTS Y DIAMETRO DEL TRONCO ENTRE 30 Y 79 CM, EXISTENTES, INCLUYE RETIRO DEL SITIO Y EXTRACCION DE RAIZ	UN				
NP - 020	IMPERMEABILIZADO Y PROTECCION DE VIGAS DE CIMENTACION PLACA FLOTANTE CON EMULSION ASFALTICA	M2				
NP - 021	MEDIA CAÑA EN MORTERO EN CUBIERTA 1:3 IMPERMEABILIZADO h= 0.15 -	ML				

NP - 022	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED	M2				
NP - 023	AISLAMIENTOTERMICO EN FRESCASA DE 3 1/2 SIN PAPEL UBICADA ENTRE MUROS	M2				
NP - 024	SUMINISTRO E INSTALACION TAZA ALONGADA PARA FLUXÓMETRO LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO CON FLUXOMETRO METÁLICO CROMADO. TIPO ADRIÁTICO EP ANTIBACTERIAL CORONA O SIMILAR. ENTRADA POSTERIOR CON MAYOR ALTURA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD O DISCAPACIDAD	UN				
NP - 025	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DISCAPACITADOS LÍNEA NACIONAL COLOR BLANCO. TIPO BARI GRICOL O SIMILAR. PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD O DISCAPACIDAD, INCLUYE GRIFERIA MONOCONTROL CELESTE BAJITA O SIMILAR.	UN				
NP - 026	SOBRE CIMIENTO IMPERMEABILIZADO EN LADRILLO ESPESOR 12 CM	M2				
NP - 027	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS CON EL NUEVO DISEÑO DE LA COCINA.	UN				
NP - 028	TAPA REGISTRO 20 X 20 PVC	UN				
NP - 029	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA IMPERMEABILIZANTE SIKALASTIC 1K PARA BAÑOS Y ZONAS HUMEDAS	M2				
NP - 030	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALLINERO EN MUROS DE MAMPOSTERIA, PARA POSTERIORMENTE PAÑETARLA	M2				
NP - 031	ESCALERA TIPO GATO EN ACERO INOXIDABLE DOS SECCIONES CON PROTECCION DE ESPALDA, ALTURA DE 4 MTS	UN				
NP - 032	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKADUR 32 PRIMER, UNION CONCRETOS	M2				
NP - 033	TAPA DE INSPECCION EN PERFILERIA Y TAPA DE ACUERDO A DETALLE DE CIELO RASOS	UN				
NP - 034	REJILLA TIPO GRANADA 6" x 4" BAJANTES AGUAS LLUVIAS	UN				
NP - 035	CAJA DE INSPECCION TIERRA 33 * 33 INTERNO CODENSA POLO A TIERRA	UN				
NP - 036	CORTE Y SELLADO JUNTAS DE PAVIMENTO	ML				
NP - 037	SUB CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA REFERENCIA V - 60A CON HOJA CORREDERA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE. MARCO DILATADO EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE VIDRIO PROTEC DE 0,80M X 2.25M.	UN				
NP - 038	PASAMURO DE 2" PVC PARA CONEXIÓN CASETONES EN LOSA FLOTANTE	UN				
NP - 039	PASAMURO DE 3" EN ACERO INOXIDABLE X 40 CM. PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	UN				

NP - 040	PASAMURO DE 2" EN ACERO GALVANIZADO RANURADO PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	UN				
NP - 041	PASAMURO DE 4" EN ACERO GALVANIZADO PARA VENTILACION DE TANQUE DE AGUA	UN				
NP - 042	LOSA EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, ACABADO ANTIDESLIZANTE Y A LA VISTA COLOR GRIS ESPESOR 10 CM, PARA ANDENES EXTERIORES	M2				
NP - 043	ADOQUIN CONCRETO PEATONAL 20 X 10 X 6 CM COLOR ARENA RESISTENCIA E INSTALACIONES DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE CARTILLA DE ANDENES SDP O SIMILAR	M2				
NP - 044	CONCRETO DE 3000 PSI ESTAMPADO COLOR GRIS MODULO MT-10 ADOQUIN	M2				
NP - 045	CANECA DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE PIVOTANTE	UN				
NP - 046	RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDA EN SITIO ACABADO ANTIDESLIZANTE Y A LA VISTA COLOR GRIS	M2				
NP - 047	BALDOSA EN GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO 30X30CM FONDO BLANCO ESPESOR CARA ARISTA 15MM GRANO HOMOGENEO. INCLUYE: DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN	M2				
NP - 048	GUARDA ESCOBA RECTO EN GRANO DE MARMOL PULIDO 30X7.2-1 CM FONDO BLANCO	ML				
NP - 049	GUAYACAN DORADO	UN				
NP - 050	ACACIA FORRAJERA	UN				
NP - 051	CARBONERO ROJO	UN				
NP - 052	NISPERO	UN				
NP - 053	GUAYACAN DE MANIZALES	UN				
NP - 054	CHACHAFRUTO	UN				
NP - 055	MANGO	UN				
NP - 056	CHICALA	UN				
NP - 057	HELECHO ESPINA DE PESCADO	UN				
NP - 058	MANI FORRAJERO	UN				
NP - 059	DURANTA LIMON	UN				
NP - 060	AJO DE SOCIEDAD	UN				
NP - 061	BALSO	UN				
NP - 062	YARUMO	UN				
NP - 063	LIMON TAHITI	UN				
NP - 064	AGAPANTO	UN				
NP - 065	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CIMENTACIÓN INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	$ 74.561,00	$ 78.848,26	$ 82.073,15	$ 84.683,08
NP - 066	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA VIGAS AEREAS DE ENTREPISO (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)	M3	$ 776.825,00	$ 821.492,44	$ 855.091,48	$ 882.263,39



CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

NP - 067	VIGA CANAL EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE CON FORMALETA, SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES ACABADOS A LA VISTA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)	ML	$ 450.995,00	$ 476.927,21	$ 496.433,54	$ 512.220,12
NP - 068	VALVULA DE BOLA PVC SOLDAR TIPO PESADO 1 1/2"	UN	$ 56.344,00	$ 59.583,78	$ 62.020,76	$ 63.990,02
NP - 069	VALVULA DE BOLA PVC SOLDAR TIPO PESADO 1 1/4"	UN	$ 46.807,00	$ 49.496,40	$ 51.522,85	$ 53.161,31
NP - 070	MEDIDOR PARA AGUA DE 1 1/2 "	UN	$ 956.811,00	$ 1.011.827,63	$ 1.053.211,36	$ 1.086.703,50
NP - 071	CAJA PARA 1 MEDIDOR	UN	$ 123.904,00	$ 131.028,48	$ 136.387,54	$ 140.724,67
NP - 072	EXTINTOR PORTATIL MULTIPROPOSITO CON AGENTE LIMPIO	UN	$ 82.190,00	$ 86.915,93	$ 90.470,79	$ 93.347,76
NP - 073	RELLENO GRAVA	M3	$ 100.294,00	$ 106.060,91	$ 110.398,80	$ 113.909,48
NP - 074	ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TN1 EN 4xNo8+6T+12D	ML	$ 45.656,00	$ 48.281,22	$ 50.255,92	$ 51.854,06
NP - 075	GABINETE METALICO DE SOBREPONER PARA 18 CIRCUITOS	UN	$ 3.778.432,00	$ 3.995.691,84	$ 4.158.115,64	$ 4.291.375,51
NP - 076	GABINETE METALICO DE SOBREPONER PARA 4 CIRCUITOS	UN	$ 3.688.552,00	$ 3.900.643,74	$ 4.060.180,07	$ 4.189.293,80
NP - 077	LAMPARA HERMETICA 2X54 T5	UN	$ 231.183,00	$ 244.476,02	$ 254.475,09	$ 262.567,40
NP - 078	LAMPARA LED 150W	UN	$ 202.934,00	$ 214.602,71	$ 223.378,96	$ 230.483,44
NP - 079	TUBERIA EMT 1/2"	ML	$ 8.836,00	$ 9.344,07	$ 9.726,24	$ 10.035,54
NP - 080	TUBERIA EMT 3/4"	ML	$ 10.002,00	$ 10.577,12	$ 11.009,72	$ 11.359,83
NP - 081	PISO EN BALDOSA DE 60X60 DE CAUCHO DE ALTO TRAFICO	M2	$ 98.017,00	$ 103.652,98	$ 107.892,38	$ 111.323,36
NP - 082	GUARDA ESCOBA EN PINO CARIBE 70X10 ACABADO LACA TRANSPARENTE MATE	ML	$ 29.466,00	$ 31.160,30	$ 32.434,75	$ 33.463,18
NP - 083	V - 51 - VENTANA CON HOJA BATIENTE EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE. MARCO DILATADO EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE ALFAJIA METALICA VIDRIO INCOLORO 4+4 PVB 0,38MM U=5,5 CS=0,38 G=0,33 %=50.	UN	$ 370.650,00	$ 391.962,38	$ 407.993,64	$ 420.967,83
NP - 084	MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE 2. PERSIANA DE MADERA TEKA + IMPERMEABILIZANTE (FIJA)	M2	$ 876.688,00	$ 929.212,56	$ 967.217,35	$ 997.974,87
NP - 085	MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE 2. PERSIANA DE MADERA TEKA + IMPERMEABILIZANTE (ACORDEÓN)	M2	$ 876.688,00	$ 929.212,56	$ 967.217,35	$ 997.974,87
NP - 086	PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	$ 33.240,00	$ 35.151,30	$ 36.586,99	$ 37.752,52
NP - 087	PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	ML	$ 23.488,00	$ 24.838,56	$ 25.854,46	$ 26.678,63
NP - 088	MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 4 CM ACABADO A LA VISTA SIMILAR A CONCRETO A LA VISTA FUNDIDO EN EL PROYECTO CON PENDIENTE MINIMA DEL 2%	M2	$ 25.564,00	$ 27.033,83	$ 28.139,62	$ 29.034,46



NP - 089	MESON EN LÁMINA DE GRANITO COLOR NEGRO SAN GABRIEL. FALDON FRONTAL 20CM. SALPICADERO CON CHAFLÁN H=10CM. APOYADO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA.	ML	$ 1.061.789,00	$ 1.122.841,87	$ 1.188.766,10	$ 1.205.932,86
NP - 091	GRIFERÍA DE DUCHA MONDCONTROL, KYMA O SIMILAR EN BRONCE CROMADO.	UN	$ 332.200,00	$ 351.301,50	$ 365.669,73	$ 377.296,03
NP - 092	SISTEMA DE DUCHA CON SISTEMA ABATIBLE PARA BAÑO ACCESIBLE	UN	$ 38.500,00	$ 40.713,75	$ 42.378,94	$ 43.726,59
NP - 093	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO, PARA ROLLO DE 200/400 MTS, CERRADURA CON LLAVE.	UN	$ 135.300,00	$ 143.078,75	$ 148.931,71	$ 153.667,74
NP - 094	SECADOR ELÉCTRICO PARA MANOS, TIPO MANOS LIBRES, CARCAZA OVALADA METÁLICA ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CALIBRE 1.2 MM, MOTOR SIN ESCOBILLAS, RANGO DE DETECCIÓN DEL SENSOR AJUSTABLE, DE 10 A 30 CMS APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 2 MINUTOS DE USO.	UN	$ 611.600,00	$ 646.767,00	$ 673.219,77	$ 694.628,16
NP - 095	TUBERIA COBRE TIPO K 1"	ML	$ 50.015,00	$ 52.890,86	$ 55.054,10	$ 56.804,82
NP - 096	TABLERO ON/ OFF DE TEMPERATURA	UN	$ 570.500,00	$ 603.303,75	$ 627.978,87	$ 647.948,60
NP - 097	TUBERIA 1/2" METALICA	ML	$ 2.768,00	$ 2.927,16	$ 3.046,88	$ 3.143,77
NP - 098	CASILLERO 45 X 90	UN	$ 315.000,00	$ 333.112,50	$ 346.736,80	$ 357.763,03
NP - 099	BICICLETA ESTATICA	UN	$ 5.505.150,00	$ 5.821.696,13	$ 6.059.803,50	$ 6.252.505,25
NP - 100	CAMINADORA	UN	$ 4.872.000,00	$ 5.152.140,00	$ 5.362.862,53	$ 5.533.401,55
NP - 101	MAQUINA GIMNASIO	UN	$ 2.376.150,00	$ 2.512.778,63	$ 2.615.551,27	$ 2.698.725,80
NP - 102	BANCA GIMNASIO	UN	$ 2.376.150,00	$ 2.512.778,63	$ 2.615.551,27	$ 2.698.725,80
NP - 103	MANCUERNAS	UN	$ 254.440,00	$ 269.070,30	$ 280.075,28	$ 288.981,67
NP - 104	PESAS	UN	$ 254.440,00	$ 269.070,30	$ 280.075,28	$ 288.981,67

Gracias,

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO

Representante legal

Consorcio BCS – Gutiérrez

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

DAIMCO
Enero 25- 2019 Hora: 09:42 a.m
Folios: 01 Anexos: 115
No.Radicado D-2019-0159
Radicado: Yesenia Homes 1087-2019
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Bogotá, enero 25 de 2019

Señores

PN-DIRAF-POPAYAN-0125

DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Calle 44B No. 57A-52 Barrio La Esmeralda
Bogotá

Referencia: CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PREGIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Orden de pago 13 y 14

Por medio de la presente se adjunta los siguientes documentos para su revisión y visto bueno.

- Orden de pago 13
- Orden de pago 14
- Relación de órdenes de pago orden de pago 1 hasta la orden de pago 12

Cordialmente,

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

80

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No. S-2019- 002389 / DIRAF- GUMAI- 29

Bogotá D.C., 29 de enero de 2019

DAIMCO
Enero 29- 2019 Hora: 11:32 am
Folios: 01 Anexos: 02
No Radicado D-2019-0181
Radicado: Yesenia Homes 087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Señor
CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO
Representante legal DAINCO S.A.S
Carrera 43 No. 57A-52
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud concepto contrato de obra No. 06-6-10044-18

En atención al oficio PN-DIRAF-POPAYAN-0126 del 28 de enero de 2019, suscrito por el representante legal del CONSORCIO BCS-GUTIERREZ, dentro del cual manifiestan estar en la capacidad de ejecutar las obras de urbanismo y el gimnasio, bajo las siguientes condicione:

Plazo:
60 dias calendarios los cuales cobijaran el contratro principal, sus adiciones y modificaciones.

Forma de pago:
"La Policia Nacional-Dirección Administrativa y Financiera cancelará el valor del contrato en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma:

UN ANTICIPO:
Correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato principal, lo anterior teniendo en cuenta que el anticipo es un recurso de la entidad que permite una financiación de la ejecución del objeto contractual con recursos públicos, temporalmente administrados por el contratista, lo cual le convierte en un responsable fiscal.

NOTA 1: El contratista deberá constituir un contrato de fiducia con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera de Colombia, para el manejo de los recursos provenientes del anticipo en los términos establecidos en los artículos 2.2.1.1.2.4.1 y 2.2.1.2.3.3.1 del Decreto 1082 de 2015, así mismo presentará a la interventoría la programación de inversión del anticipo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la aprobación de la garantía única, el cual debe estar aprobado por la interventoría y el supervisor de la interventoría, garantizando control permanente sobre el mismo.

NOTA 2: En los términos y condiciones del contrato de fiducia deberá quedar como obligación:

a) La entrega de un informe mensual por parte de la fiducia, donde se evidencien los pagos efectuados y los rendimientos mensuales a consignar en la cuenta que indique la entidad contratante.
b) Los desembolsos solicitados por el contratista de obra tomando como base el plan de manejo del anticipo, deberán ser autorizados por el representante legal de la interventoría.

El pago del anticipo se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la aprobación de la garantía única, una vez aprobados los documentos presentados y requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y a la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

PAGOS PARCIALES:

Se realizarán pagos parciales de acuerdo al porcentaje de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez la Interventoría y Contratista hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias y que la Interventoría haya certificado la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinticinco (25) de cada mes.

Nota 1: En cada acta de corte parcial se amortizará proporcionalmente, el valor entregado al contratista en calidad de anticipo, hasta amortizar el 100% de su valor."

Por lo anterior solicito a ustedes como firma interventora del contrato de la referencia, analizar y emitir concepto de la conveniencia del planteamiento de contratistas, en el entendido que el mismo afectara la ejecución del proyecto constructivo y su interventoria.

Mayor **ÁNGEL GIOVANNI LÓPEZ OSTOS**
Supervisor Contrato de Interventoría PN-DIRAF 06-3-10051-18

Elaborado por: MY. Angel Giovanni Lopez Ostos
Revisado por: MY. Oliver Elias Silva Rueda

REVISIÓN DOCUMENTOS
Fecha de radicación: 10/07/2018
Ubicación: DATOS (FOLDER) - DIDS
CONTROL PROTECCIÓN SEGURIDAD
Carrera 59 26 – 21 CAN, Bogotá
Teléfonos 3159129 – 3159339
Diraf.arinf-dubir@policia.gov.co
www.policia.gov.co
10-07-2018
FECHA FIN
OBSERVACIONES

DAIMCO
Enero 29- 2019 Hora: 18:42 p.m
Folios: 01 Anexos: 23
No.Radicado D-2019-0182
Radicado: Yesenia Homes 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Bogotá, enero 29 de 2019

PN-DIRAF-POPAYAN-0129

Señores

DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Calle 448 No. 57A-52 Barrio La Esmeralda
Bogotá

Referencia: CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Orden de pago 15

Por medio de la presente se adjunta los siguientes documentos para su revisión y visto bueno.

- Orden de pago 15

Cordialmente,

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

65

Bogotá, enero 30 de 2019

DAIMCO
Enero 30- 2019 Hora: 15:48 p.m
Folios: 01 Anexos: 16
No.Radicado D-2019-0194
Radicado: Yesenia Homes 1087-2018
RECIBIDO PARA REVISIÓN NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Señores

PN-DIRAF-POPAYAN-0133

DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Calle 448 No. 57A-52 Barrio La Esmeralda
Bogotá

Referencia: CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Orden de pago 16

Por medio de la presente se adjunta los siguientes documentos para su revisión y visto bueno.

- Orden de pago 16

Cordialmente,

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

84

Anexo No. 3 Actas de comité

ACTA DE REUNIÓN N° 23

DAIMCO

09 - Enero - 2019

NOMBRE PARTICIPANTE	CARGO- EMPRESA	CELULAR	FIRMA ASISTENCIA
Jhon del Mar Rodriguez	Jefe del mp2	3015725028	
EDGAR CALVETE	ARQ. RESID.	2173823626	
Sandra Bravo P	Ing Residente Interventoria	3139202086	
Tirso M. Cortes O.	Dir. Interventoria	3104117701	
Julian Giraldo	Dir. Obra.	3156431046	
Monica Benitez	Residente Interv.	3146156619	

Scanned by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN N° 33

FECHA: 9-01-2019

Pag.

A-P1-F3

AREA O PROYECTO: FASE 4 - EDIFICIO D - ALOJAMIENTOS

SOCIOS ☐ CONSULTORIA ☐ OBRA ☐ OTROS _____ ☐

I. PARTICIPANTES

	CARGO
Ing Tirso Cano.	Dir. Interventoria
Ing Sandra Guerrero	Residente 1 Interventoria
Arq. Marcos Benitez Angel	Residente 2 Interventoria
Ing Rosa del Mar Ramirez.	Residente SISO interventoria
Arq Edgar Calvache	Residente Obra
Ing Julian Giraldo	Director Obra

II. OBJETO

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN NRO. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

* El contratista realiza propuesta de ítem de piso nuevo en grano de mármol dentro del paquete de apu nuevo.

- Respecto del retiro de perimetro alrededor de edificios se determina que el recebo que se esta utilizando es de buenas cualidades y por falta de conservacion de materiales con especificaciones similares pero pronunciados de contenidos debidamente aprobados y certificados se continuara con el que usa el contratista

Scanned by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN N° 23

FECHA: 04-01-2019

DAIMCO

Pag.

* En la inspección se realizaron diversas gestiones a través del Supervisor del Proyecto el Mayor Giovany Lopez G. con el fin de dar respuesta sobre los detalles faltantes del tanque de reserva pero aun no hay respuesta sobre tipo de material de pernos y oblea dada de parte del diseñador.

Scanned by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN N° 43 FECHA:	DAIMCO		PAG.

A. DECISIONES TOMADAS

* El contratista retiro la solicitud sobre la definición de pasos en mixer de tanque de reserva.

* Interventoría solicita entrega de flujos de inversión de acuerdos a los progresivos por frentes de trabajo.

* Se realizara conjuntamente revisión sobre APU pendientes para obra, en bombeo y pavimento.

* Se le hace entrega de esquema con definición de algunos pasos; queda pendiente
1. Retiro,
2. Purga
3. Descarga

Scanned by CamScanner

A-#23

B. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
* Mejoramiento en actividades de Mantenimiento	Contratista Obra

Scanned by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN N° 24

DAIMCO

20-ENERO-2018

NOMBRE PARTICIPANTE	CARGO- EMPRESA	CELULAR	FIRMA ASISTENCIA
Sandra Lucía Guarín P	Ing Residente Interventoría DAIMCO	3113920256	Sandra Lucía Guarín P
EDGAR E. CALVETO LOPEZ	ARQ. RESID. OBRA.	3173823629	
Julio Gómez Urbano	Residente SSTMA Consorcio Bco-Dutz	3184452094	
MARIA TERESA UJEDA	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO BCO-D	3218024492	
Aurelio Gutiérrez C.	Rep. Legal	3124509049	
TIRSO COSME OROZCO	Dir. Inter. DAIMCO	3104117761	
Mónica L. Benítez	Resid. Interventoría	3146156619	
MY Angel Gioconda López O	Supervisor Contrato 06-3-1005-14	3123047116	
Maria del Carmen Rodriguez G	Res. SSTMA DAIMCO	3143725028	
Julian M. Giraldo	Dir obra.	3114881046	

Scanned by CamScanner

ACTA #24

IV. TEMAS TRATADOS

- El mayor solicita las siguientes inquietudes
  - explicación general de la obra por frentes
  - capacidad de los almacenamientos
  - % de ejecución y programado
  - ubicación, ubicación e implantación del TK PCI y del Gimnasio

Dirigido al Cr. del DECAU. Pedro Alexander Rojas García.

- Por el Tanque de PCI no se hará acceso, El Mayor solicita al Contratista iniciar actividades en PCI. El Contratista se compromete a iniciar el día 28 de enero de 2018, en el sitio entre bloques foso 1 y edificio 1 contratista.
- En relación a la ubicación del gimnasio se trasladará a la distancia más conveniente entre el bloque del edificio E, para no afectar la piscina.
  El Mayor el día miércoles 23 de enero de 2018 se compromete a enviar el entrega planos de diseño.

- El Mayor solicita mas personal para ejecutar actividades constantes ya que, dice que, esta Interventoría manifiesta que se lleva tiempo sin ejecución.
  El bloque de pabellones → sin obra
  El bloque de ejecutivo → se encuentra en obra
  El Tanque de almacenamiento con la fundición guardura en un 78% de ejecutado

- El mayor hace entrega del oficio No S-2018-001291 sobre el calculo de movimiento de tierras donde Interventoría pagaría sobre profundidad de el topografo de la DIRAF

Scanned by CamScanner

hoja relacionada y hasta donde o cual genera los parámetros de los rellenos. El Mayor ingeniero hará entrega del esquema a cubrir de la documentación por el topógrafo. y que si se requiere más obra de relleno pasará al Bloque E, se tratará en obra.

Se hace claridad que los rellenos el topógrafo de la DIRAF contempla un sobreancho de 25 m perimetrales a los bloques otras, cantidades se aperturan ya que los rellenos cubrirán mayor área ya que el material de relleno contractualmente debe cumplir con certificación de calidad, lo que no cumple otros materiales para hacer los rellenos.

- El contratista pasará propuesta del manejo de cubierta donde hay áreas sin cubrir. (puntos fijos)
- El contratista pasará propuesta de iluminación externa.

Scanned by CamScanner

Acta # 24

4.

B. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
- Inicio actividades del Turno RCI 28 de enero de 2018	Contratista
- Plan de 20 de casa del gimnasio	Supervisor
- Propuesta manejo cubierta en área sin color de los blogues a 1 de febrero	Contratista e Interventoría

Scanned by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN N° 25

DAIMCO

Enero - 31 - 2019

NOMBRE PARTICIPANTE	CARGO- EMPRESA	CELULAR	FIRMA ASISTENCIA
EDGAR E. CALVETE	RESID. OBRA AMB	3173823	
Jhon del Mar Patiño	Residente SST HSE	3015925928	
Saul L Gamero P	Ing Res. Interventoria	3105920256	
Adrian Giraldo	Dir. Obra		
TIRSO COSME	DIR. INTERVENTORIA	3204447461	
Monica I. Benitez	Res Interventoria	3146156619	

Scanned by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN N° 25

FECHA: 31-01-2019

DAIMCO

Pag.

LECTURA Y OBSERVACIÓN DE ACTA ANTERIOR (#24)

* A la fecha el contratista realizo cerramiento del area donde se construira Tanque de ECI.

* El contratista ha puesto mas personal para ejecución de actividades como la instalación de cubierta

* La programación con flujos de inversión estan en analisis por la interventoria luego de 7 versiones que entrego el contratista y se tendrán para ajuste

* De la documentación entregada por el mayor sobre la topografía se. observe que las cantidades de obra y volumenes estan similares y que la calidad del relleno es bueno!

Scanned by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN N° 25 FECHA: 31-01-2021	DAIMCO		Pag.

A. DECISIONES TOMADAS

Observaciones:

- Esta interventoria solicita al contratista tomar en cuenta observaciones sobre corrección en mampostería, terminados de vigas y paredes.

- Se le solicita al Contratista realizar las respectivas cajuelas sobre los soldaduras de estructura de cubierta.

- El contratista solicita a interventoria acompañamiento en las actividades respecto de verificación de cotas, niveles y localización de torre T.C.I y otra posible para glamping.

- Para cortes tomarán medidas conjuntamente obra e interventoria

Scanned by CamScanner

Acta #25

B. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
* Chequeo topografico loz. tanque, posible sobrante Concreto	* Interventoria Domco
* Ensayos y pruebas de Soldadura para garantizar labores	Contratista CBS-gutierrez
* Entrega de certificaciones y QQC. de soldadores	Contratista
*	

Scanned by CamScanner

Anexo No. 4 Plan de Anticipo

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	Página 1 del

PROGRAMACIÓN	FECHA	18-ene-19
CONTRATO No.	PN DIRAF 06-6-10044-18	
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 9.250.463.250,08
CONTRATISTA	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ	
INTERVENTOR	DAIMCO SAS	
PLAZO	Hasta el 29 de Abril de 2019	
VALOR ANTICIPO	50%	$ 4.625.231.625,04

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 1.357.000.000,00	29,34%
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 2.913.895.923,78	63,00%
3	Transporte y retiro de escombros	$ 261.831.068,76	5,66%
4	Descuentos y retenciones	$ 92.504.632,50	2,00%
TOTAL		$ 4.625.231.625,04	100,00%

Nota:

a) Plazo en días para la inversión del anticipo 150 días.

Para constancia de lo anterior, se firma y aprueba el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los dieciocho (18) días del mes de enero de 2019

MY ANGEL GIOVANNY LÓPEZ OSTOS
Supervisor de Contrato
POLICIA NACIONAL-DIRAF

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO
Representante Legal
DAIMCO SAS
INTERVENTORIA

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO
	ORDEN DE PAGO 1
CONTRATO No. :	PN DEAP NO 6-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 6 A PRESTAR SUS TAREAS PARA MEJORAR LA FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$1.750.463.250,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DABICO SAS
PLAZO:	Hasta 15 de diciembre
VALOR ANTICIPO :	$1.650.001.650,00

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.877.002	1	Honorarios Pago de salarios y jornales, mano de obra
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.837.848	2	Honorarios Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.645.367	3	Honorarios Transporte y retiro de escombros
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.261.000	4	Honorarios Descuentos y retenciones
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	469.421.215,00		

RESUMEN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 555.027.795,01		$ 71.877.002,00	$ 71.877.002,00	$ 483.150.793,01
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 580.549.104,51		$ 376.837.848,00	$ 376.837.846,00	$ 203.711.258,51
3	Transporte y retiro de escombros	$ 185.009.265,00		$ 19.645.367,00	$ 19.645.367,00	$ 165.363.898,00
4	Descuentos y retenciones	$ 129.506.486,50		$ 1.261.000,00	$ 1.261.000,00	$ 128.245.486,50
	TOTALES	$ 1.850.092.650,01	$ -	$ 469.621.215,00	$ 469.621.215,00	$ 1.380.471.435,01

Firma:
Nombre: AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: JOSE MIGUEL [illegible]
DABICO S.A.S.
INTERVENTOR

	INFORME DE SUPERVISIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 3	

CONTRATO No. :	PN DIRAF 06-6-10045-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE FORTAL, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE BRIGADA No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$1.730.805.230,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO -CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DIAMCO SAS
PLAZO:	Hasta 15 de diciembre
VALOR ANTICIPO :	$1.730.031.910,01

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION ITEMS
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.871.001	1	Beneficiario Pago de salarios y jornales, mano de obra
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.837.846	2	Beneficiario Compra de materiales dotación y alquiler de equipos
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.649.367	3	Beneficiario Transporte y retiro de escombros
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.261.000	4	Beneficiario Descuentos y retenciones
2		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.501.921	1	Beneficiario Pago de salarios y jornales, mano de obra
2		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.542.569	2	Beneficiario Compra de materiales dotación y alquiler de equipos
2		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.313.990	3	Beneficiario Transporte y retiro de escombros
2		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.771.000	4	Beneficiario Descuentos y retenciones
			$ 847.333.649,00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 556.027.795,01	$ 71.877.001,00	$ 40.501.921,00	$ 112.378.922,00	$ 443.648.873,01
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 680.548.104,51	$ 376.837.846,00	$ 331.542.569,00	$ 708.380.409,00	$ 272.168.039,51
3	Transporte y retiro de escombros	$ 185.009.265,00	$ 19.649.367,00	$ 1.313.990,00	$ 20.955.357,00	$ 164.053.908,00
4	Descuentos y retenciones	$ 329.508.485,50	$ 1.261.000,00	$ 2.771.000,00	$ 4.054.000,00	$ 325.472.485,50
	TOTALES	$ 1.850.092.850,02	$ 469.625.214,00	$ 377.331.484,00	$ 847.333.649,00	$ 1.002.343.881,01

Firma:
Nombre: AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: JOSE VICENTE [illegible]
DIAMCO S.A.S
INTERVENTOR

187
101

INFORME DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ANTICIPO

LIBERACIÓN DE PAGO No. 1 of 5

CONTRATO No. :	SIC DENAR-SIC-E-189345-SIB
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A NIVEL DE OBRA GRIS"
VALOR:	$ 4.750.000.000,00
CONTRATISTA:	ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS GUTIERREZ
INTERVENTOR:	Exabeth SAS
PLAZO:	Hasta 15 de diciembre
VALOR ANTICIPO :	$ 1.900.000.000,00

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM
1		ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.877.900	1	Beneficios Pago de salarios y jornales, mano de obra
1		ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 328.837.494	2	Beneficios Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1		ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 59.695.300	3	Beneficios Transporte y retiro de escombros
1		ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.363.000	4	Beneficios Descuentos y retenciones
2		ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 60.581.823	1	Beneficios Pago de salarios y jornales, mano de obra
2		ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.912.569	2	Beneficios Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2		ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3.912.000	3	Beneficios Transporte y retiro de escombros
2		ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3.713.000	4	Beneficios Descuentos y retenciones
3		ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.026.500	1	Beneficios Pago de salarios y jornales, mano de obra
3		ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.817.845	2	Beneficios Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3		ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44.644.050	3	Beneficios Transporte y retiro de escombros
			$ 1.004.449.809,00		

RESUMEN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	VALOR ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 555.077.705,01	$ 112.370.925,00	$ 67.626.329,00	$ 180.005.254,00	$ 375.072.554,01
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 883.549.504,51	$ 108.781.409,00	$ 41.017.845,00	$ 149.798.754,00	$ 230.750.850,51
3	Transporte y retiro de escombros	$ 185.069.265,00	$ 21.958.317,00	$ 44.644.050,00	$ 66.602.367,00	$ 118.466.898,00
4	Descuentos y retenciones	$ 118.508.485,50	$ 4.034.000,00	$	$ 4.034.000,00	$ 114.474.485,50
	TOTALES	$ 1.800.000.000,00	$ 247.154.648,00	$ 153.288.224,00	$ 1.893.440.865,00	$ 849.684.787,00

Firma:
Nombre: ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
INTERVENTOR

162

CONTRATO No.:	
OBJETO:	
VALOR:	
CONTRATISTA:	
INTERVENTOR:	
PLAZO:	
VALOR ANTICIPO:	

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION GASTO
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71,677,333	1	Servicios Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 375,897,934	2	Servicios Compra de materiales, depósito y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 28,345,897	3	Servicios Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1,261,000	4	Servicios Diseminadores relacionistas
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 48,555,555	1	Servicios Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 201,342,333	2	Servicios Compra de materiales, depósito y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2,318,000	3	Servicios Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1,775,000	4	Servicios Diseminadores relacionistas
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 42,636,178	1	Servicios Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 91,017,849	2	Servicios Compra de materiales, depósito y alquiler de equipos
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 10,044,050	3	Servicios Transporte y retiro de escombros
4	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 5,881,700	1	Servicios Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 85,789,276	2	Servicios Compra de materiales, depósito y alquiler de equipos
4	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 345,000	3	Servicios Transporte y retiro de escombros
4	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1,796,909	4	Servicios Diseminadores relacionistas
			$ 1,108,017,209.00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE LIQUIDACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$70,614,888.00	$ 100,000,343.00	$ 9,850,760.00	$ 109,486,943.00	$ 89,130,286.00
2	Compra de materiales, depósito y alquiler de equipos	$ 322,342,708.00	$ 749,788,153.00	$ 95,760,276.00	$ 845,548,429.00	$ 476,794,279.00
3	Transporte y retiro de escombros	$ 23,204,483.00	$ 88,468,347.00	$ 681,500.00	$ 89,149,847.00	$ 65,944,653.00
4	Diseminadores relacionistas	$ 18,104,918.00	$ 1,084,080.00	$ 2,796,000.00	$ 3,880,080.00	$ 14,224,838.00
	TOTALES	$ 434,267,038.00	$ 1,000,440,923.00	$ 109,088,476.00	$ 1,108,017,209.00	$ 746,094,056.00

Firma:
Nombre: [illegible]
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: [illegible]
CONTRATANTE

CONTRATO No.	PR 084 DE 2018 CONVENIO
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL CRAI-CAM DE POLICÍA METROPOLITANA DE ITAGÜÍ, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y CENTRAMOS DE CESIÓN No. 44 PREDIOS UBICADOS EN LA METROPOLITANA DE ITAGÜÍ"
VALOR:	
CONTRATISTA:	
INTERVENTOR:	
PLAZO:	
VALOR ANTICIPO:	

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	DATOS BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION PARCIAL
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71,677,902	1	Amortizacion Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376,027,146	[redacted]	Amortizacion Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 18,345,847	[redacted]	Amortizacion Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1,161,669	[redacted]	Amortizacion Desmonte y retiro Cerca
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40,565,922	1	Amortizacion Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 101,142,843	[redacted]	Amortizacion Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2,033,369	[redacted]	Amortizacion Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3,773,838	[redacted]	Amortizacion Desmonte y retiro Cerca
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 97,605,719	1	Amortizacion Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 92,917,949	[redacted]	Amortizacion Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44,244,059	[redacted]	Amortizacion Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3,681,738	1	Amortizacion Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 85,788,176	[redacted]	Amortizacion Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 845,183	[redacted]	Amortizacion Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1,796,308	[redacted]	Amortizacion Desmonte y retiro Cerca
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 60,000,000	1	Amortizacion Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 76,345,831	[redacted]	Amortizacion Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
			$ 1,213,771,170.00		

ITEM	DESCRIPCION	RESUMEN PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACION	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	370,818,330.00	283,680,962.00	39,008,808.00	322,689,342.00	147,131,188.00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	1,161,068,708.00	845,503,420.00	71,248,841.00	916,595,161.00	415,267,647.00
3	Transporte y retiro de escombros	178,180,495.00	97,248,847.00	0.00	97,240,847.00	61,339,618.58
4	Desmonte y retiro Cerca	18,140,305.00	6,933,350.00	0.00	6,933,350.00	11,206,955.00
	TOTALES	1,618,202,838.00	1,268,327,169.00	110,257,649.00	1,213,771,170.00	636,318,408.58

Firma
Nombre: OSCAR AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO CAI-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre:
Interventoría
INTERVENTOR

CONTRATO No. :	
OBJETO:	
VIGENCIA:	
CONTRATISTA:	
INTERVENTOR:	
PLAZO:	
VALOR ANTICIPO :	

DESEM. No.	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALORES	ITEM	DESCRIPCION ITEM(S)
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71,177,000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 170,277,000	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 18,945,947	[redacted]	Reembolso Transporte y relleno de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1,181,000	[redacted]	Reembolso Desmonte y retiro de escombros
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40,501,431	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 231,342,943	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2,316,000	[redacted]	Reembolso Transporte y relleno de escombros
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3,778,000	[redacted]	Reembolso Desmonte y retiro de escombros
3	12/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67,426,118	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	12/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 10,817,945	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
3	12/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 18,944,000	[redacted]	Reembolso Transporte y relleno de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3,981,780	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 95,755,276	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643,500	[redacted]	Reembolso Transporte y relleno de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2,786,000	[redacted]	Reembolso Desmonte y retiro de escombros
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 88,936,000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71,345,031	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	9/11/18	EUGENETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 20,502,781	[redacted]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	9/11/18	CONAL COMERCIAL S.A	$ 18,367,897	[redacted]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 180,000,000	[redacted]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICOM IP SAS	$ 3,804,260	[redacted]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	9/11/18	SEGURIDAD DEL OCCIDENTE S.A.S MODC S.A.S	$ 35,080,000	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	9/11/18	ROJO ROBERVALDO CAMPOS	$ 5,467,893	[redacted]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	9/11/18	ADI INFRAESTRUCTURA SAS	$ 6,435,000	[redacted]	Transporte y relleno de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1,859,172	[redacted]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
			$ 1,467,075,085.00		

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	370,908,526.00	223,986,342.00	0.00	223,986,342.00	147,181,298.00
[redacted]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos	1,312,966,708.00	934,969,791.00	188,816,791.00	1,123,786,582.00	374,380,126.00
[redacted]	Transporte y relleno de escombros	126,508,485.50	67,396,907.50	8,435,000.00	75,831,907.50	50,676,577.50
[redacted]	Desmonte y retiro de escombros	97,100,929.50	5,833,964.00	0.00	5,833,964.00	91,266,965.50
	TOTALES	1,907,484,649.00	1,232,186,804.50	197,251,791.00	1,429,438,795.50	663,504,967.50

Firma
Nombre:
CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
INTERVENTOR

INFORME DE INTERVENTORIA Y SUPERVISION DEL CONTRATO

ORDENES DE PAGO No 1 A 7

CONTRATO No:

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUADRA TIPO DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CARGO Y COMANDO DE SESIÓN No. 4-4 PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

VALOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

PLAZO:

VALOR ANTICIPO:

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION ITEM(S)
1	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	71.127.000	1	Anticipo Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	776.027.848	2	Suministros Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	18.649.287	3	Suministros Transporte y redes de suministros
1	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1.161.500	4	Suministros Servicios temporales
2	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	18.281.521	1	Anticipo Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	121.642.565	2	Suministros Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1.232.858	3	Suministros Transporte y redes de suministros
2	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1.771.000	4	Suministros Servicios temporales
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	41.416.219	1	Anticipo Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	41.051.845	2	Suministros Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	68.644.000	3	Suministros Transporte y redes de suministros
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	9.691.704	1	Anticipo Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	85.796.276	2	Suministros Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	643.500	3	Suministros Transporte y redes de suministros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1.748.000	4	Suministros Servicios temporales
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	20.000.000	1	Anticipo Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	75.245.033	2	Suministros Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
5	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ OSORIO	19.913.794	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
5	9/11/18	CONVAL COMERCIAL S.A	19.337.001	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CONSERTOS ARGOS S.A	100.000.344	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ESMERILIZACION JP SAS	5.809.160	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELECTRONICA DEL OCCIDENTE S.A.S (ELOCC S.A.S	20.336.338	2	Suministros Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	8/11/18	JESUS ROMERO VELASCO CARPOTE	8.387.999	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	8/11/18	JESUS ROMERO VELASCO CARPOTE	6.423.209	3	Transporte y redes de suministros
6	9/11/18	AKD INGENIERIA SAS	5.681.372	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	8/11/18	CARLOS ADRIAN NAVARRO RODRIGUEZ	6.441.961	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	10/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ OSORIO	6.034.949	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	10/11/18	CONVAL COMERCIAL S.A	6.267.794	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	10/11/18	JESUS ROMERO VELASCO CARPOTE	88.875.000	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	10/11/18	LA GRELLERA MELENDEZ S.A.S	94.024.229	3	Transporte y redes de suministros
7	10/11/18	AKD INGENIERIA S.A.S	93.641.491	1	Anticipo Pago de salarios y jornales, mano de obra
7	10/11/18	ARMETA S.A.S			
			1.363.403.481,00		

ITEM	DESCRIPCIÓN	RECIBIDAS ANTICIPO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACION	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pagos de salarios y jornales, mano de obra	370.013.133,00	222.186.961,00	40.681.465,00	183.349.417,00	186.663.183,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	1.363.403.704,00	1.305.186.281,00	61.179.691,00	1.154.989.867,00	147.398.751,00
3	Transporte y redes de suministros	119.506.185,00	78.671.867,00	34.724.150,00	113.396.717,00	1.350.268,00
4	Servicios temporales	10.306.916,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	13.570.916,00
TOTALES		1.863.041.938,00	1.607.105.961,00	136.585.346,00	1.862.481.001,00	348.983.018,00

Firma
Nombre: [illegible]
CONTRATISTA

Firma
Nombre: [illegible]
CARGO: [illegible]
INTERVENTOR

CONTRATO No.:	[illegible]
OBJETO:	"CONSTRUCCION Y OBTENCION DE CUARTEL ANTE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 DE POLICIA UNIFORMADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y"
VALOR:	[illegible]
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO SCI-GUTIERREZ
CONTRATACION No.:	SCI-SANCE-040
CARTERA/FACTURA:	[illegible]
PLAZO:	[illegible]
VALOR ANTICIPO:	[illegible]

DESCRIPCION DE PAGO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION COMPLETA
1	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71,477,000	1	Suministros Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 270,307,309	[illegible]	Suministros Compra de materiales, alquiler y vigilancia de equipos
1	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 15,202,287	3	Suministros Transporte y cobro de movimientos
1	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1,361,000	[illegible]	Suministros Descripciones varias/otros
2	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40,301,951	1	Suministros Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 221,941,949	[illegible]	Suministros Compra de materiales, alquiler y vigilancia de equipos
2	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1,313,000	3	Suministros Transporte y cobro de movimientos
2	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2,173,000	[illegible]	Suministros Descripciones varias/otros
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 27,626,219	1	Suministros Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41,017,695	[illegible]	Suministros Compra de materiales, alquiler y vigilancia de equipos
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44,566,000	3	Suministros Transporte y cobro de movimientos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3,951,700	1	Suministros Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 65,745,178	[illegible]	Suministros Compra de materiales, alquiler y vigilancia de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 945,000	3	Suministros Transporte y cobro de movimientos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1,766,000	[illegible]	Suministros Descripciones varias/otros
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 23,000,000	1	Suministros Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 75,149,821	[illegible]	Suministros Compra de materiales, alquiler y vigilancia de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 28,912,780	[illegible]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 16,257,493	[illegible]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	9/11/18	CONCRETES AMIGOS S.A	$ 220,064,340	[illegible]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	9/11/18	PERMELECTRICOL JP SAS	$ 8,098,240	[illegible]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	9/11/18	SOLUCIONES DEL OCCIDENTE S.A.S. U.O.O.C.S.A.S	$ 10,690,320	[illegible]	Suministros Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
8	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 1,467,800	[illegible]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
8	9/11/18	JAES INGENIERIA SAS	$ 2,425,000	3	Transporte y cobro de movimientos
8	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1,486,170	[illegible]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
7	10/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2,441,992	[illegible]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
7	10/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 3,696,000	[illegible]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
7	10/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 3,267,790	[illegible]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
7	10/11/18	VALORIZAR INVERSIONES S.A.S	$ 26,575,000	[illegible]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
7	10/11/18	[illegible]	$ 56,704,000	3	Transporte y cobro de movimientos
7	10/11/18	JAES INGENIERIA S.A.S	$ 48,965,400	1	Suministros Pago de salarios y jornales, mano de obra
7	10/11/18	[illegible]	$ 98,284,214	[illegible]	Suministros Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
8		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 88,344,127	3	Transporte y cobro de movimientos
8		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 642,000	[illegible]	Suministros Descripciones varias/otros
8		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1,360,509,463.00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCION	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACION	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	278,018,300.00	208,343,412.00	71,674,888.00	280,018,300.00	78,312,479.00
2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos	1,183,365,308.81	1,184,665,457.00	82,348,137.00	1,266,713,594.00	82,651,714.81
3	Transporte y cobro de movimientos	126,004,680.00	118,190,117.00	8,000,000.00	126,190,117.00	844,763.00
4	Descripciones varias/otros	18,008,520.00	6,834,000.00	0.00	6,834,000.00	11,174,520.00
	TOTALES	1,604,396,808.81	1,360,509,463.00	171,023,025.00	1,540,535,963.00	109,900,196.81

Firma
Nombre: AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO SCI-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre:
CONTRATISTA
INTERVENTOR

115

113

GOBIERNO DE ANTIOQUIA Y ÁREA METROPOLITANA DE ANTIOQUIA

CRONOGRAMA DE PAGO No. 1 AÑO

CONTRATO No.: 4600078128 DE 2024

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA CUARTA FASE DEL CRAMBIDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE MEDELLÍN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA VALLE Y CENTRAMOS DE ABASTOS Etapa 1 A LA PRIMERA CENTRADO FUEZ EN FORMULA DE PAGUETE"

VALOR: $ 38.231.401.000,00

CONTRATISTA: CONSORCIO 2025 ANTIOQUIA

ANTICIPO (30%): $ 11.469.420.300,00

PLAZO: 12 MESES

% AMORTIZACIÓN:

DATOS CONTRATISTA

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BANCO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN
1	6/11/25	AURELIO GUTIÉRREZ CASTILLO	$ 172,477,400	1	Amortización Pago de salarios y parafiscales, mano de obra
1	6/11/25	AURELIO GUTIÉRREZ CASTILLO	$ 375,457,600	[redacted]	Amortización Compra de materiales, donación e alquiler de equipos
1	6/11/25	AURELIO GUTIÉRREZ CASTILLO	$ 38,695,457	1	Amortización Transporte y cargue de escombros
1	6/11/25	AURELIO GUTIÉRREZ CASTILLO	$ 1,343,000	[redacted]	Amortización Gastos Administrativos
2	6/11/25	AURELIO GUTIÉRREZ CASTILLO	$ 98,300,713	2	Amortización Pago de salarios y parafiscales, mano de obra
2	6/11/25	AURELIO GUTIÉRREZ CASTILLO	$ 825,345,300	[redacted]	Amortización Compra de materiales, donación e alquiler de equipos
2	6/11/25	AURELIO GUTIÉRREZ CASTILLO	$ 5,435,000	2	Amortización Transporte y cargue de escombros
2	6/11/25	AURELIO GUTIÉRREZ CASTILLO	$ 3,770,000	[redacted]	Amortización Gastos Administrativos
3	6/11/25	AURELIO GUTIÉRREZ CASTILLO	$ 97,000,218	3	Amortización Pago de salarios y parafiscales, mano de obra
3	6/11/25	AURELIO GUTIÉRREZ CASTILLO	$ 41,867,400	[redacted]	Amortización Compra de materiales, donación e alquiler de equipos
3	6/11/25	AURELIO GUTIÉRREZ CASTILLO	$ 34,344,000	3	Amortización Transporte y cargue de escombros
3	6/11/25	AURELIO GUTIÉRREZ CASTILLO	$ 3,881,700	3	Amortización Pago de salarios y parafiscales, mano de obra
4	6/11/25	AURELIO GUTIÉRREZ CASTILLO	$ 93,700,276	[redacted]	Amortización Compra de materiales, donación e alquiler de equipos
4	6/11/25	AURELIO GUTIÉRREZ CASTILLO	$ 660,000	4	Amortización Transporte y cargue de escombros
4	6/11/25	AURELIO GUTIÉRREZ CASTILLO	$ 2,790,000	[redacted]	Amortización Gastos Administrativos
5	6/11/25	AURELIO GUTIÉRREZ CASTILLO	$ 33,000,000	5	Amortización Pago de salarios y parafiscales, mano de obra
5	6/11/25	AURELIO GUTIÉRREZ CASTILLO	$ 71,100,000	[redacted]	Amortización Compra de materiales, donación e alquiler de equipos
6	6/11/25	ELIZABETH CRISTINA NUÑEZ ESCOBAR	$ 33,900,000	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	6/11/25	EDIVAL COMERCIAL S.A	$ 38,107,057	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	6/11/25	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 100,000,000	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	6/11/25	FERRELECTRICOM JP SAS	$ 3,809,360	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	6/11/25	INGENIERIA DEL OCCIDENTE S.A.S BIC	$ 33,000,000	[redacted]	Asamblea Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	6/11/25	JOSE BOSSE VILLEGAS CORTE	$ 5,407,940	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	6/11/25	A.S.E. INGENIERIA S.A.S	$ 6,425,500	6	Transporte y cargue de escombros
6	6/11/25	CARLOS ADRIAN MORALES BOTERO	$ 1,481,571	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	18/11/25	ELIZABETH CRISTINA NUÑEZ ESCOBAR	$ 6,442,860	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	18/11/25	EDIVAL COMERCIAL S.A	$ 6,284,000	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	18/11/25	JOSE BOSSE VILLEGAS CORTE	$ 5,407,294	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	18/11/25	CADELLERIA MATERIALES A.S	$ 38,678,000	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	18/11/25	A.S.E. INGENIERIA S.A.S	$ 34,324,750	[redacted]	Transporte y cargue de escombros
7	18/11/25	AMRITA S.A.S	$ 40,442,400	[redacted]	Gastos Administrativos, mano de obra
8	19/11/25	AURELIO GUTIÉRREZ CASTILLO	$ 98,324,324	[redacted]	Amortización Pago de salarios y parafiscales, mano de obra
8	19/11/25	AURELIO GUTIÉRREZ CASTILLO	$ 65,348,337	[redacted]	Amortización Compra de materiales, donación e alquiler de equipos
8	19/11/25	AURELIO GUTIÉRREZ CASTILLO	$ 845,000	[redacted]	Amortización Transporte y cargue de escombros
9		AURELIO GUTIÉRREZ CASTILLO	$ 55,001,000	[redacted]	Amortización Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
			$ 2,771,271,444.00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y parafiscales, mano de obra	$ 1,196,763,410.00	$ [redacted]	$ 0.00	$ [redacted]	$ 0.00
2	Compra de materiales, donación e alquiler de equipos	$ 1,087,717,286.57	$ 1,348,334,094.00	$ 0.00	$ 1,348,334,094.00	$ 0.00
3	Transporte y cargue de escombros	$ 1,126,694,717.00	$ 324,345,717.00	$ 0.00	$ 324,345,717.00	$ 0.00
4	Gastos administrativos	$ 3,000,000.00	$ 6,000,000.00	$ 0.00	$ 6,000,000.00	$ 0.00
	TOTALES	$ 4,000,000,000.00	$ [redacted]	$ [redacted]	$ [redacted]	$ [redacted]

Para constancia de lo anterior se firma en Bogotá, a los [redacted] días del mes de [redacted] de 2025

Firma:
Nombre: [redacted]
CONSORCIO 2025 ANTIOQUIA
CONTRATISTA

Nombre: [redacted]
CONSORCIO
INTERVENTOR



	DIAGRAMA DE INTERVENTORIA Y PAGOS MAYORES DE ANTICIPO ORDENES DE PAGO del 1 al 11	

CONTRATO No.:	PNCSMJ-SI-4-2044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL CORAMIENTO DE POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE POLICIA CASICA Y CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD SANITARIA EN PUESTO DE POLICIA EN LA RAMADA DE REMOLINO"
VALOR:	$4.334.442.173,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO MCL-SI-PONTE
INTERVENTOR:	CONTACTO SAS
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO:	$2.601.265.303,80

DATOS CONTRACTUALES

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION ABREVIADA
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 72.677.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 378.027.668	2	Reembolso compra de materiales, donación y alquiler de equipos
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 28.645.357	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.291.000	4	Reembolso Diseño/otros relacionados
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 60.951.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 311.993.398	2	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3.218.000	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.774.000	4	Reembolso Diseño/otros relacionados
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 97.655.158	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.811.845	2	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 68.644.000	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.881.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 92.795.176	2	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.786.000	4	Reembolso Diseño/otros relacionados
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.245.611	2	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
8	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 10.912.701	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
8	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 18.317.013	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
8	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 108.088.984	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
8	9/11/18	FERRELECTRICOM (F140)	$ 3.999.300	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
8	9/11/18	ELEPRUNIDA DEL OCCIDENTE S.A.E.S (ENOC S.A.E.)	$ 85.880.115	2	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
8	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.687.980	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
8	9/11/18	ABB INGENIERIA SAS	$ 6.429.300	3	Transporte y retiro de escombros
8	9/11/18	CARLOS ADRIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	$ 1.483.172	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	10/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.941.082	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	10/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 8.654.069	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	10/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 3.883.784	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	10/11/18	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$ 68.976.000	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	10/11/18	MGI INGENIERIA S.A.S	$ 16.114.200	3	Transporte y retiro de escombros
7	10/11/18	ARMITA S.A.S	$ 40.681.481	1	Salarios y jornales, mano de obra
8	10/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 93.134.334	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	10/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 83.348.137	2	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
8	10/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
8	10/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.091.961	2	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	10/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2.112.999	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	10/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 1.902.977	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	10/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 997.840	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	10/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A.	$ 75.606.470,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
11	12/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 108.000.308,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	12/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 356.134.940,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
11	12/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.675.359,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	12/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 5.500.000,00	4	Reembolso Diseño/otros relacionados
			$ 2.369.276.481,00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACION	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 1.347.509.487,51	$ 336.915.371,90	$ 194.692.268,00	$ 531.608.639,90	$ 815.900.847,61
2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	$ 2.410.899.434,79	$ 1.251.741.140,42	$ 356.134.940,00	$ 1.607.876.080,42	$ 802.923.354,37
3	Transporte y retiro de escombros	$ 131.291.541,21	$ 126.833.757,00	$ 11.675.359,00	$ 138.509.116,00	$ (7.217.574,79)
4	Diseño/otros relacionados	$ 101.704.611,50	$ 96.204.611,50	$ 5.500.000,00	$ 101.704.611,50	$ (0,00)
	TOTALES	$ 4.031.395.075,01	$ 1.811.695.880,82	$ 567.992.567,00	$ 2.379.688.447,82	$ 1.611.606.627,19

Para constancia firman quienes en la fecha intervienen y dan fe de lo aquí consignado, bajo la responsabilidad expresa de los que hacen firmar en ella, a los 23 días del mes de enero de 2019

Firma
Nombre: ING. AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO MCL-SI-PONTE
CONTRATISTA

Firma
Nombre: ING. JOSE MIGUEL E
CONTACTO
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 13	

CONTRATO No.:	FN DIRAF 08-9-10044-19
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE FONTIBÓN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE ESTACIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$ 19.150.483.263,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO 802-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO S.A.S
PLAZO:	Hasta 19 de abril de 2020
VALOR ANTICIPO:	$4.633.331.815,04

DATOS GENERALES

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO		VALOR	ITEM	DESCRIPCION GASTO
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	71.877.000	1	Honorarios Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	578.817.898	[redacted]	Honorarios Compra de materiales, [illegible]
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	18.445.267	3	Honorarios Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	1.201.900	4	Honorarios Descuentos retenciones
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	48.331.833	1	Honorarios Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	331.342.569	[redacted]	Honorarios Compra de materiales, [illegible]
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	1.919.990	3	Honorarios Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	1.773.000	4	Honorarios Descuentos retenciones
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	67.626.329	1	Honorarios Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	41.017.845	[redacted]	Honorarios Compra de materiales, [illegible]
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	44.544.000	3	Honorarios Transporte y retiro de escombros
4	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	9.861.780	1	Honorarios Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	89.781.378	[redacted]	Honorarios Compra de materiales, [illegible]
4	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	660.000	3	Honorarios Transporte y retiro de escombros
4	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	2.796.000	4	Honorarios Descuentos retenciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	10.000.000	1	Honorarios Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	71.245.801	[redacted]	Honorarios Compra de materiales, [illegible]
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$	20.913.701	[redacted]	Compra de materiales, alquiler y [illegible]
6	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$	19.387.287	[redacted]	Compra de materiales, alquiler y [illegible]
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$	100.066.188	[redacted]	Compra de materiales, alquiler y [illegible]
6	9/11/18	FERRELECTRICOM SAS	$	5.389.160	[redacted]	Compra de materiales, alquiler y [illegible]
6	9/11/18	INGENIERIA DEL OCCIDENTE S.A.S ESDOC S.A.S	$	15.680.135	[redacted]	Honorarios Compra de materiales, [illegible]
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$	5.467.980	[redacted]	Compra de materiales, alquiler y [illegible]
6	9/11/18	AGE INGENIERIA SAS	$	6.415.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS AZAMAR MORALES RODRIGUEZ	$	23.888.172	[redacted]	Compra de materiales, alquiler y [illegible]
7	10/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$	8.443.962	1	Compra de materiales, alquiler y [illegible]
7	10/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$	8.894.848	1	Compra de materiales, alquiler y [illegible]
7	10/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$	5.067.794	1	Compra de materiales, alquiler y [illegible]
7	10/11/18	LADRILLERA MEDELLIN S.A.S	$	38.976.000	1	Compra de materiales, alquiler y [illegible]
7	10/11/18	AGE INGENIERIA S.A.S	$	34.524.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	10/11/18	ARRIETA S.A.S	$	42.683.481	1	salarios y jornales, mano de obra
8	12/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	98.186.224	1	Honorarios Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	12/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	81.188.217	[redacted]	Honorarios Compra de materiales, [illegible]
8	12/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	660.000	3	Honorarios Transporte y retiro de escombros
9	26/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	31.881.982	[redacted]	Honorarios Compra de materiales, [illegible]
10	28/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$	2.315.969	[redacted]	Compra de materiales, alquiler y [illegible]
10	28/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$	1.903.877	[redacted]	Compra de materiales, alquiler y [illegible]
10	28/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$	997.812	[redacted]	Compra de materiales, alquiler y [illegible]
10	28/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$	78.806.480,00	[redacted]	Compra de materiales, alquiler y [illegible]
11	13/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	188.650.188,00	1	Honorarios Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	13/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	209.134.046,00	[redacted]	Compra de materiales, alquiler y [illegible]
11	13/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	11.674.787,00	3	Honorarios Transporte y retiro de escombros
11	13/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	6.665.000,00	4	Honorarios Descuentos retenciones
12	23/01/19	METAL 8 SAS	$	68.264.775,00	[redacted]	Compra de materiales, alquiler y [illegible]
12	23/01/19	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS S.A	$	65.000.000,00	[redacted]	Compra de materiales, alquiler y [illegible]
12	23/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$	66.668.280,00	[redacted]	Compra de materiales, alquiler y [illegible]
13	23/01/19	AGE INGENIERIA SAS	$	105.059.100,00	3	Honorarios Transporte y retiro de escombros
				2.468.221.636,00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCION	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	1.307.000.000,00	491.193.919,00			491.193.919,00	815.844.081,00
2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	$ 3.913.895.903,76	1.726.951.228,02	$	199.984.089,00	1.926.816.283,02	1.987.079.845,76
3	Transporte y retiro de escombros	181.891.048,76	140.104.154,00	$	105.000.180,00	245.808.414,00	16.287.854,76
4	Descuentos retenciones	$ 30.504.832,50	23.496.000,00			23.496.000,00	78.008.832,50
	TOTALES	5.429.291.625,00	2.381.778.401,02		304.984.269,00	2.686.311.616,00	2.960.000.009,00

Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, a los 23 días del mes de enero de 2019

Firma:
Nombre: [illegible]
CONSORCIO 802-GUTIERREZ

Firma:
Nombre: [illegible]
DAIMCO S.A.S

	INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 13	

CONTRATO No. :	PN DIRAF 06-6-10044- 18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE ASIGNACIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS PACTO SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	10.250.463.250,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIVCO SAS
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO :	54.625.231.425,00

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.877.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.837.848	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 18.845.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.181.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.501.911	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.941.563	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.313.950	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.773.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.826.519	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.017.845	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44.684.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	09/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.881.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	09/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 85.765.276	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	09/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.000	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	09/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.796.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
5	09/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	09/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.345.831	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	08/11/2018	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 10.912.701	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	08/11/2018	COVAL COMERCIAL S.A	$ 18.357.057	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	08/11/2018	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 100.099.386	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	08/11/2018	FERRELECTRICOM JP SAS	$ 5.909.260	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	09/11/2018	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$ 35.680.235	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	08/11/2018	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.467.840	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	08/11/2018	AG3 INGENIERIA SAS	$ 6.425.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	09/11/2018	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.483.172	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/2018	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.441.962	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/2018	COVAL COMERCIAL S.A	$ 8.694.040	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/2018	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.067.794	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/2018	LADRILLERA MILENIOEZ S.A.S	$ 38.976.000	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/2018	AG3 INGENIERIA S.A.S	$ 54.524.280	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/2018	ARRIETA S.A.S	$ 40.682.485	1	salarios y jornales, mano de obra
8	13/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 93.136.234	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	13/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 83.348.137	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	13/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
8	28/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.081.981	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/2018	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2.313.969	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/2018	COVAL COMERCIAL S.A	$ 1.302.977	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/2018	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 997.810	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/2018	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 79.806.450,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/2019	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 138.650.268,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	23/01/2019	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 359.194.948,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/2019	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.674.597,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	23/01/2019	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.686.000,00	4	Reembolso Descuentos y retenciones
12	23/01/2019	METAL S SAS	$ 88.264.775,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/2019	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETR	$ 61.000.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/2019	CEMENTOS ARGOS SA	$ 44.639.280,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/2019	AG3 INGENIERIA SAS	$ 105.029.100,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 13	

CONTRATO No. :	FM SNAF 06-E-10644-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.292.468.250,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO SCI-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAVINCI SAS
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO :	$4.638.231.625,00

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
13		METAL B SAS	$ 10.300.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		SODIMAC COLOMBIA SA	$ 33.147.200,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		CEMENTOS ARGOS SA	$ 61.379.010,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 13.895.133,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7.242.526,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 14.146.719,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
			$ 3.785.218.218,03		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	1.357.000.000,00	405.355.919,00		405.355.919,00	951.644.081,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 2.915.899.924,76	1.910.816.283,03	$ 130.006.602,00	2.040.822.885,03	874.077.038,76
3	Transporte y retiro de escombros	261.831.068,76	245.543.414,00		245.543.414,03	16.287.654,76
4	Descuentos retenciones	190.504.632,50	13.496.000,00		13.496.000,03	76.008.632,50
	TOTALES	4.825.391.625,00	2.005.211.818,03	130.006.602,00	2.785.218.218,03	1.830.013.407,03

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 28 días del mes de enero de 2019

Firma:
Nombre: ING. AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO SCI-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: ING. JOSE VICENTE [illegible]
DAVINCI SAS
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 14	

CONTRATO No.:	VIGENCIA 36-6-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$4.335.463.350,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO MCI-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAVIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO:	$4.335.231.425,24

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.827.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 678.837.844	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.645.267	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.181.008	4	Reembolso Descuentos y retenciones
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 48.501.015	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 311.942.583	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.313.550	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.773.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.028.319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.027.845	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44.644.960	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3.881.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 95.785.276	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 849.508	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.786.008	4	Reembolso Descuentos y retenciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 55.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.245.801	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 19.911.701	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 19.557.057	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 100.066.396	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICOM JP SAS	$ 1.969.260	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$ 26.680.235	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.467.380	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	AGS INGENIERIA SAS	$ 6.435.200	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.980.171	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.441.981	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 8.894.049	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.987.794	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$ 18.976.080	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	AGS INGENIERIA S.A.S	$ 54.524.253	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	ARRIETA S.A.S	$ 48.681.485	1	salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 83.136.124	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 83.348.337	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 943.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
9	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.081.882	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	19/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 1.515.989	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	19/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 1.392.977	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	19/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 987.810	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 18	

CONTRATO No.:	PPI 018 AF 08-4- 113044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$ 19.310.463.250,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO ECS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAJANCO SAS
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO:	$ 4.825.231.625,04

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
10	28/12/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 72.806.450,01	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	15/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 138.650.048,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	15/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 319.194.909,00	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	15/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.476.247,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	15/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.866.300,00	4	Reembolso Descuentos y retenciones
12	18/01/19	METAL 8 SAS	$ 88.164.770,00	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	18/01/19	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS	$ 61.008.000,00	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	18/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 44.638.280,00	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/19	AGD INGENIERIA SAS	$ 185.019.180,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
13		METAL 8 SAS	$ 19.000.000,00	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		SODIMAC COLOMBIA SA	$ 19.547.200,00	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		CEMENTOS ARGOS SA	$ 61.379.010,00	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 13.881.133,00	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7.241.516,00	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 14.146.713,00	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 26.452.980	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 36.144.104	[illegible]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 34.007.808	4	Reembolso Descuentos y retenciones
			$ 2.883.065.722,03		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 357.080.800,00	498.355.919,00	$ 26.452.980,00	524.808.899,00	832.192.181,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 2.915.899.923,76	2.940.822.889,03	$ 36.144.104,00	2.977.966.989,03	836.328.934,76
3	Transporte y retiro de escombros	261.931.068,76	249.543.414,00	$ 643.500,00	246.186.914,00	15.444.154,76
4	Descuentos retenciones	$ 90.504.612,50	13.690.800,00	$ 34.007.808,00	17.920.080,00	86.401.682,50
	TOTALES	4.825.231.625,04	2.796.218.218,92	87.847.504,00	3.883.065.722,03	1.742.165.903,01

Para constancia de lo estipulado, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 28 días del mes de enero de 2019

Firma
Nombre: ING AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO ECS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

[illegible]
[illegible]
DAJANCO SAS
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 10	

CONTRATO No. :	PN-DISEF-SE-4-2019-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE"
VALOR:	$ 3.790.483.156,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCI-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	[illegible] SAS
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO :	$ 1.137.144.947,00

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION GENERICO
1	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.877.000	1	Asambleas Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 676.817.846	[illegible]	Asambleas Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 10.045.307	3	Asambleas Transporte y retiro de escombros
1	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.161.000	4	Asambleas Descuentos y retenciones
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.501.911	1	Asambleas Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 321.042.503	[illegible]	Asambleas Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.313.998	3	Asambleas Transporte y retiro de escombros
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.773.000	4	Asambleas Descuentos y retenciones
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.626.319	1	Asambleas Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 43.037.845	[illegible]	Asambleas Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 10.866.000	3	Asambleas Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.891.780	1	Asambleas Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 93.765.276	[illegible]	Asambleas Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 661.200	3	Asambleas Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.786.000	4	Asambleas Descuentos y retenciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.920.000	1	Asambleas Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.345.021	[illegible]	Asambleas Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 20.952.709	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 18.167.857	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 100.084.388	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICOM JP SAS	$ 3.989.160	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	SUMINISTROS DEL OCCIDENTE S.A.S SUDOC S.A.S	$ 15.880.139	[illegible]	Asambleas Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAICEDO	$ 5.467.380	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	AGS INGENIERIA SAS	$ 6.424.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.888.172	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.441.902	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 8.094.859	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAICEDO	$ 5.067.704	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$ 38.976.800	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	AGS INGENIERIA S.A.S	$ 54.524.259	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	ARKETA S.A.S	$ 40.987.489	1	salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 99.196.324	1	Asambleas Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 65.388.137	[illegible]	Asambleas Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 661.200	3	Asambleas Transporte y retiro de escombros

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 15	

CONTRATO No.:	PN-DIRAT 004-2018-CD
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CASETA PASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.130.443.210,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO 043-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	CIAMACO SAS
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO:	$4.565.221.605,00

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN GASTOS
9	28/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.081.981	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2.313.969	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
20	28/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 1.830.977	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
30	28/11/18	JESUS ROGER VILLALOBO CASTRO	$ 907.819	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 75.806.450,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	13/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 168.450.289,00	3	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	25/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 359.184.540,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	25/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.874.987,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
13	25/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.965.000,00	4	Reembolso Descuentos y retenciones
12	25/02/19	METAL 8 SAS	$ 88.264.775,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	26/04/19	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS SA	$ 61.000.000,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	26/04/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 64.669.280,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	25/02/19	AGI INGENIERIA SAS	$ 120.019.200,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
13		METAL 8 SAS	$ 30.000.000,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		SIGMA AC COLOMBIA SA	$ 33.167.200,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		CEMENTOS ARGOS SA	$ 61.579.010,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 13.881.139,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7.193.036,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		PREFABRICADOS JO RITA CASTRO SAS	$ 14.146.723,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 26.652.000	3	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 46.744.104	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
13		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 16.007.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
15		ALFAGRES SA	$ 288.997.548,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
15		AGI INGENIERIA SAS	$ 571.653.392	3	salarios y jornales, mano de obra
			$ 1.823.888.393,00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 957.000.000,00	$ 324.808.810,00	$	971.663.080,00	$ 881.471.879,00	$ 881.528.121,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 3.913.895.914,76	$ 2.077.166.999,00	$	358.957.548,00	$ 3.436.124.547,00	$ 547.771.367,76
3	Transporte y retiro de escombros	$ 261.931.068,76	$ 146.188.914,00			$ 146.188.914,00	$ 15.646.154,76
4	Descuentos y retenciones	$ 91.504.693,50	$ 37.503.000,00			$ 37.503.000,00	$ 91.001.693,50
	TOTALES	$ 4.424.331.676,00	$ 2.585.665.723,00		$ 1.330.620.628,00	$ 4.515.088.339,00	$ 1.335.545.196,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, a los 30 días del mes de enero de 2019

Firma
Nombre: [redacted] AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO 043-GUTIERREZ
CONTRATISTA

[redacted]

Anexo No. 5 Seguridad Social

Contrato de Obra

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34214707		AMAYA PRADA CLAUDIA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle33 # 5-08	POPAYAN-CAUCA	8350556	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-12	2018-12	30254984	84842959	I	2018/12/14	2017/12/04	BANCOLOMBIA	0	$ 222,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$158,800
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1	$125,000	$0	$0	$158,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$97,700	$0	$0	$124,000
E.P.S. Sanitas S.A	EPS005	800.251.440-6	6	1	$97,700	$0	$0	$124,000
TOTAL				1	$222,700	$0	$0	$222,700

PAGADO P

2018/12/04 12:56 AM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	NIT NUMERO DE IDENTIFICACION:	901187758	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:		MISETA SAS	
U.B.E/MUNICIPIO:	FONAVIM DEPARTAMENTO	CAUCA	
DIRECCION:	CRA 1 #3 N 12 - 42 TELEFONO:	3333333	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	NUMERO DE LOS COTIZANTES	
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO	Cotizantes con otras formas de ingresos x ley	0
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (SI/TARIFA PORCENTAJE):			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	428381755	TIPO DE PLANILLA:						E EMPLEADOS: 2830
PERIODO COTIZACION OTROS:	MES	Semestre AÑO	2018	PERIODO COTIZACION SALUD:		MES	Semestre AÑO	
DIAS DE MORA:	0							
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				Diligenciado NUMERO AUTORIZACION:				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
51-14	51-14-COLPENSIONES	1	$ 486.816	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.286	$ 0	$ 489.102	$ 2.286	$ 491.388
52001	52001-PENSIONES (NO PRESTO C.)	1	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150	$ 0	$ 32.150	$ 150	$ 32.300
52001	52001-PORVENIR	1	$ 604.838	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.839	$ 0	$ 607.677	$ 2.839	$ 610.516
SUBTOTALES										$ 1.128.929	$ 5.275	$ 1.134.204

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	UPC	COTIZACION	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 15.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.300	$ 0	$ 0	$ 15.300
EPS018	EPS018-S.O.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 15.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.300	$ 0	$ 0	$ 15.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 31.620	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.620	$ 0	$ 0	$ 31.620
EPS040	EPS040-COMPARTA E.P.S.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 30.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.600	$ 0	$ 0	$ 30.600
EPS046	EPS046-MUTUAL SER. CAUCA A.I.C.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 31.300
EPS048	EPS048-COOMEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 31.300
EPS058	EPS058-SANITAS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 31.300
EPS091	EPS091-SALUD TOTAL EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.900	$ 0	$ 0	$ 114.900
SUBTOTALES													$ 341.100	$ 1.908	$ 0	$ 343.008

TOTAL APORTES A FONDOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	APORTES		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13		$ 0		$ 0	$ 480.300	$ 480.300	$ 0	$ 0	$ 480.300
SUBTOTALES								$ 480.300	$ 0	$ 0	$ 480.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CODIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF14	CCF14-COMFACAUCA	12	$ 183.000	$ 1.464	$ 184.464
CCF41	CCF41-COMFAMILIAR HUILA	1	$ 30.500	$ 244	$ 30.744
SUBTOTALES			$ 213.500	$ 1.708	$ 215.208

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO:
DIRECCIÓN:
TIPO APORTANTE:
TIPO EMPRESA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (PERSONAS TRIBUTARIAS):

Nº. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
DEPARTAMENTO:
TELÉFONO:
EMPLEADOR CLASE APORTANTE:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
UNICO

SOCIEDAD
ARDELIA SAS
CALICA
0000000
MEDIOS DE SOCIOTZ0001010
Constancia de oficio cobro de Ingresos civil

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 42628517758 TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES: Número AÑO: MES: Número AÑO:
SUCURSAL:
CÓDIGO NÚMERO AUTORIZACIÓN:

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | |

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901177384-5	CONSORCIO BCS - GUTIERREZ	CARRERA 19 N 86-41 OFICINA 402	2579906	administrativo@sucollegiobcs.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	ARP
					52	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-01	2019-12	E		33070379	$14.634.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	MT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	008130897-4	418.300	0		0		0	0	0	0	418.300	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	158.500	0		0		0	0	0	0	158.500	4
EPS008	Compensar EPS	900156264-2	14.600	0		0		0	0	0	0	14.600	1
EPS010	Coomeva EPS	805000427-1	103.200	0		0		0	0	0	0	103.200	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	156.600	0		0		0	0	0	0	156.600	4
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	830001157-2	183.300	0		0		0	0	0	0	183.300	3
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-6	46.000	0		0		0	0	0	0	46.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	349.500	0		0		0	0	0	0	349.500	12
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	14.600	0		0		0	0	0	0	14.600	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	258.888	0		0		0	0	0	0	258.888	3
EPSC33	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	830074184-5	19.800	0		0		0	0	0	0	19.800	1
ESSC10	EPS-S Emssanar	814000337-1	155.100	0		0		0	0	0	0	155.100	7
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	54.300	0		0		0	0	0	0	54.300	3
ESSC91	EPS ECOOPSOS S.A.S	901030845-9	11.500	0		0		0	0	0	0	11.500	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	MT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (INS + Protección)	800229739-8	1.862.600	0	0	17.500	17.500	0	0		1.897.600	13
230301	Porvenir	800224808-8	3.292.300	0	0	21.000	21.000	0	0		3.334.300	23
231601	Colfondos	800227940-4	266.908	0	0	0	0	0	0		266.908	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.865.500	0	0	27.500	27.500	0	0		2.920.500	8

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	MT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-26	ARP Sura	830054161-9	3.330.400				3.330.400	0	0	3.330.400			33.304	3.330.400	52

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	MT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Confamiliar	891500160-9	1.314.700	0	0	1.314.700	52

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION L . APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901177364-9	CONSORCIO BCS - GUTIERREZ		CARRERA 19 N 84-41 OFICINA 402	2576886	[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MPYME			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
					52	5
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-01	2019-02	E		32570378	$14.834.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ISIE, LSNA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	14	1.970.100	1.970.100
Pensión	4	7.619.300	7.619.300
Riesgos Laborales	1	3.330.400	3.330.400
CCF	1	1.914.700	1.914.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	20	14.834.500	14.834.500

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901177304-8	CONSORCIO BCS - GUTIERREZ		CARRERA 19 N 84-41 OFICINA 402	2570880	administrativa@ucrdeguiderres.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – EMPLEAD			BOGOTA D.C.	BOGOTÁ, D.C.		N

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	APC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				62	0
2019-01	2019-12	E		32576578	TOTAL A PAGAR	
					$14.034.599	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Colombiano en el exterior	Pensionado	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIAS COTIZADOS	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliada	Voluntario a Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días cotizados	Cód. ARL	IBC ARL	Tarifa de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005824439	OLIVEROS PRADO JORGE ANDRES	1	0			X	X													30	EPS017	360.414	43.700	0	0	0	0	EPS017	360.414	30	14-04	360.414	1	18.300	CCF14	360.414	18.000	0	0	0	0	0
2	CC	1000029810	ROMERO CARLOS ANDRES	1	0				X	X												30	EPS005	386.486	46.800	0	0	0	0	EPS005	386.486	30	14-01	386.486	4	20.000	CCF14	386.486	19.000	0	0	0	0	0
3	CC	1020800853	ATOY GUTIERREZ SHARON ORLANDO	1	0				X	X												30	ESS230	338.539	41.000	0	0	0	0	ESS230	338.539	30	14-08	338.539	3	23.000	CCF14	338.539	13.000	0	0	0	0	0
4	CC	1031118987	GARCIA PALACIO OSCAR HERNAN	1	0				X	X												30	EPS037	442.704	17.800	0	0	0	0	EPS037	442.704	30	14-29	442.704	5	30.000	CCF14	443.704	17.800	0	0	0	0	0
5	CC	1031 7282	SILVA MEDINA HERNAN	1	0				X													30	EPS037	726.900	29.200	0	0	0	0	EPS037	726.900	30	14-08	726.900	5	50.000	CCF14	730.900	29.200	0	0	0	0	0
6	CC	1031 7282	SILVA MEDINA HERNAN	1	0			X														2	EPS037	52.080	8.400	0	0	0	0	EPS037	52.080	2	14-08	52.080	5	0	CCF14	52.080	0	0	0	0	0	0
7	CC	1030767469	LUIS CHELYO SANCHEZ	1	0				X	X												30	EPS037	338.539	13.600	0	0	0	0	EPS037	338.539	30	14-08	338.539	5	23.000	CCF14	338.539	12.800	0	0	0	0	0
8	CC	1061666683	GOMEZ ROMERA JOSE DIDIER	1	0				X	X												30	EPS010	484.787	19.800	0	0	0	0	EPS010	484.787	30	14-08	484.787	5	34.000	CCF14	484.787	19.800	0	0	0	0	0
9	CC	1061865488	FLOR AYOY JOSELITO	1	0				X	X												30	EPS044	338.539	13.600	0	0	0	0	EPS044	338.539	30	14-08	338.539	5	23.600	CCF14	338.539	13.000	0	0	0	0	0
10	CC	1061716774	VELASCO CERON JULIAN DARIO	1	0				X													30	EPS018	300.000	32.800	0	0	0	0	EPS018	300.000	30	14-08	300.000	5	14.000	CCF14	300.000	8.000	0	0	0	0	0
11	CC	1061716774	VELASCO CERON JULIAN DARIO	1	0				X													30	EPS018	1.000.000	109.000	0	0	0	0	EPS018	1.000.000	30	14-08	1.000.000	5	6	CCF14	1.000.000	0	0	0	0	0	0
12	CC	1061725400	ANGUCHO CAMPO DIEGO HERNAN	1	0				X													30	EPS018	800.000	128.000	0	0	0	0	EPS018	800.000	30	14-08	800.000	5	33.700	CCF14	800.000	33.000	0	0	0	0	0
13	CC	1061725400	ANGUCHO CAMPO DIEGO HERNAN	1	0				X													30	EPS018	300.000	32.000	0	0	0	0	EPS018	300.000	30	14-08	300.800	5	0	CCF14	300.000	0	0	0	0	0	0
14	CC	1061786132	MONTENEGRO MONTENEGRO YEFER ADRIAN	1	0				X	X												30	EPS018	135.207	25.900	0	0	0	0	EPS018	135.207	30	14-08	135.207	5	9.300	CCF14	135.207	5.200	0	0	0	0	0
15	CC	1061785057	PINCHAO CAMAYA LEONARDO	1	0				X	X												30	EPS037	150.267	29.000	0	0	0	0	EPS037	150.267	30	14-08	150.267	5	9.300	CCF14	150.267	6.000	0	0	0	0	0
16	CC	1061786038	LOPEZ LAME IVAN JAVIER	1	0				X	X												30	EPS044	572.911	23.000	0	0	0	0	EPS044	572.911	30	14-08	572.911	5	38.800	CCF14	572.911	23.000	0	0	0	0	0
17	CC	1061786038	LOPEZ LAME IVAN JAVIER	1	0				X													30	EPS044	93.083	6.400	0	0	0	0	EPS044	93.083	3	14-08	93.083	5	0	CCF14	93.083	0	0	0	0	0	0
18	CC	1061790036	DUBLINDO CHAGUENDO YILMER DUVAN	1	0				X													30	EPS018	1.150.000	44.000	0	0	0	0	EPS018	1.150.000	30	14-08	1.150.000	5	78.000	CCF14	1.150.000	44.000	0	0	0	0	0
19	CC	1061797760	BERNALDEZ COBO ANDRES	1	0				X													30	ESS230	781.242	31.300	0	0	0	0	ESS230	781.242	30	14-08	781.242	5	54.400	CCF14	781.242	31.300	0	0	0	0	0
20	CC	1061838090	SALAZAR SALAZAR WILSON ANDRES	1	0				X													30	EPS037	781.242	31.300	0	0	0	0	EPS037	781.242	30	14-08	781.242	5	54.400	CCF14	781.242	31.300	0	0	0	0	0
21	CC	1061934648	AGREDO CRUZ JHON FREDY	1	0				X													30	EPS005	705.201	83.000	0	0	0	0	EPS005	705.201	30	14-08	705.201	5	52.000	CCF14	705.201	80.000	0	0	0	0	0
22	CC	1062304018	AGREDO CRUZ JHON FREDY	1	0				X													30	EPS005	38.043	1.500	0	0	0	0	EPS005	38.043	3	14-08	38.043	5	0	CCF14	38.043	0	0	0	0	0	0
23	CC	1062784413	REGUERO ZEMANATE KLEYANDRA	1	0				X													30	ESS018	781.242	31.300	0	0	0	0	ESS018	781.242	30	14-08	781.242	5	54.400	CCF14	781.242	31.300	0	0	0	0	0
24	CC	1062776738	GALEANO LUCUA ARIS	1	0				X													30	EPS037	1.150.000	44.000	0	0	0	0	EPS037	1.150.000	30	14-08	1.150.000	5	78.800	CCF14	1.150.000	44.000	0	0	0	0	0
25	CC	1063800681	MOSQUERA TINTINAGO RICHAR JOSE	1	0				X													30	EPS010	781.242	31.300	0	0	0	0	EPS010	781.242	30	14-08	781.242	5	54.400	CCF14	781.242	31.300	0	0	0	0	0
26	CC	1063813733	MORGUERA REGREGON DAMIAN	1	0				X													30	EPS018	781.242	31.300	0	0	0	0	EPS018	781.242	30	14-08	781.242	5	54.400	CCF14	781.242	31.300	0	0	0	0	0
27	CC	1063813731	ASTAIZA VALENCIA RENE ORLANDO	1	0				X	X												30	EPS037	572.911	23.000	0	0	0	0	EPS037	572.911	30	14-08	572.911	5	39.900	CCF14	572.911	23.000	0	0	0	0	0
28	CC	1063800170	GOMEZ VERANO YULI	1	0				X													30	EPS018	2.600.000	400.000	0	0	0	0	25-14	2.600.000	400.000	14-08	2.600.000	5	174.000	CCF14	2.600.000	180.000	0	0	0	0	0
29	CC	1066902440	PINEDA GIRALDO NELSON DANIEL	1	0				X													30	EPS037	800.000	128.000	0	0	0	0	EPS037	800.000	30	14-08	800.000	5	33.700	CCF14	800.000	33.000	0	0	0	0	0
30	CC	1066898374	PALOMINO GOMEZ BRYAN JESUS	1	0			X	X													30	EPS037	386.456	45.900	0	0	0	0	EPS037	386.456	30	14-29	386.456	5	20.000	CCF14	386.456	11.000	0	0	0	0	0
31	CC	1130888178	RODRIGUEZ PATIÑO DANIEL ANDREY	1	0			X	X													30	EPS037	386.456	46.800	0	0	0	0	EPS037	386.456	30	14-08	386.456	5	20.000	CCF14	386.456	11.000	0	0	0	0	0
32	CC	1130884468	ERAZO JOSE HECTOR	1	0			X	X													30	EPS018	78.125	3.200	0	0	0	0	EPS018	78.125	5	14-08	78.125	5	5.500	CCF14	78.125	3.200	0	0	0	0	0
33	CC	1433128	RODRIGUEZ AYALA JOSE MANUEL	1	0			X	X													30	EPS018	360.414	43.700	0	0	0	0	EPS018	360.414	30	14-08	360.414	5	18.300	CCF14	360.414	12.800	0	0	0	0	0
34	CC	1065	GIRALDO LOPEZ JULIAN MAURICIO	1	0				X													30	EPS037	5.500.000	660.000	0	0	0	0	26-14	5.500.000	660.000	14-08	5.500.000	1	383.400	CCF14	5.500.000	220.000	0	0	0	0	0
35	CC	1066	TORO CASTAÑO DARIO	1	0			X		X	X											2	EPS037	466.746	16.000	0	0	0	0	25-14	466.746	16.000	14-04	466.746	5	32.700	CCF14	466.746	18.600	0	0	0	0	0
36	CC	1066	GUARNIZO HUGO ANTONIO	1	0				X	X												30	EPS037	364.000	14.600	0	0	0	0	EPS037	364.000	30	14-08	364.000	5	25.400	CCF14	364.000	14.000	0	0	0	0	0
37	CC	1067	BAUTISTA BAUTISTA LUIS ALFREDO	1	0				X	X												30	EPS044	52.080	3.100	0	0	0	0	EPS044	52.080	3	14-08	52.080	5	3.700	CCF14	52.080	2.100	0	0	0	0	0
38	CC	1067	LEON CARLOS ENRIQUE	1	0				X	X												30	EPS037	364.000	14.600	0	0	0	0	25-14	52.080	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	CC	3434733	BENAVIDES DE TRIANA MARIA FERNANDA	1	0				X													30	EPS018	1.300.000	156.000	0	0	0	0	28/201	364.000	58.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	CC	24055333	OVIEDA CABRERA MARIA TERESA	1	0				X													30	EPS044	4.200.000	672.000	0	0	0	0	EPS044	4.200.000	30	14-08	4.200.000	1	310.400	CCF14	4.200.000	168.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901177394-5	CONSORCIO BCS - GUTIERREZ	CARRERA 19 N 84-41 OFICINA 402	2570888	administrativa@aurelioguterrez.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	E – MIPYME			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					52	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-01	2018-12	E		32574270	$14.534.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. ID Beneficiario	Apellidos y Nombres	Extranjero	Colombiano	Residente	Cotizante exterior	Pensionado	IGE	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	VAC	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario c. Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización	COD. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	4634995	HOYOS EVER ANTONIO	1	0			0																	ESSC18	781.242	125.000	0	0	0	0	ESSC18	781.242	31.300	14-08	781.242	5	94.400	CCF14	781.242	31.300	0	0	0	0	0
42	CC	4791640	HERNANDEZ OSORIO HUALTER ANTONIO	1	0			0																	EPS037	720.900	115.700	0	0	0	0	EPS037	720.900	28.900	14-08	720.900	5	86.500	CCF14	720.900	28.900	0	0	0	0	0
43	CC	4791640	HERNANDEZ OSORIO HUALTER ANTONIO	1	0			0																	EPS037	52.883	8.400	0	0	0	0	EPS037	52.883	2.100	14-08	52.883	5	0	CCF14	52.883	0	0	0	0	0	0
44	CC	6876040	CALVETE LOPEZ EDGAR ENRIQUE	1	0			0																	EPS053	3.500.000	560.000	0	0	17.500	17.500	EPS053	3.500.000	140.000	14-08	3.500.000	5	343.000	CCF14	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
45	CC	82342119	AGUDELO GALLO IVAN ARLEIDE	1	0			0	X																EPS041	784.000	94.000	0	0	0	0	EPS041	784.000	14.800	14-08	784.000	5	25.400	CCF14	784.000	14.800	0	0	0	0	0
46	CC	5978800	QUIRAMAYO JOSE SANTOS	1	0			0																	EPS037	2.416.667	96.700	0	0	0	0	EPS037	2.416.667	96.700	14-08	2.416.667	5	338.300	CCF14	2.416.667	96.700	0	0	0	0	0
47	CC	7201758	GORDILLO CONDORI LUIS ALFONSO	1	0			0	X																ESSC81	366.456	11.500	0	0	0	0	ESSC81	366.456	11.500	14-08	366.456	5	29.600	CCF14	366.456	11.500	0	0	0	0	0
48	CC	75085219	CASTAÑEDA PIÑEROS ARNULFO ALEJANDRO	1	0			0	X																EPS002	364.590	14.600	0	0	0	0	EPS002	364.590	14.600	14-08	364.590	5	28.400	CCF14	364.590	14.600	0	0	0	0	0
49	CC	75870731	RIBERA CARDENAS SILVIO	1	0			0		X															EPS002	330.000	51.200	0	0	0	0	EPS002	330.000	13.200	14-08	330.000	5	22.000	CCF14	330.000	13.200	0	0	0	0	0
50	CC	79083427	PINEDA CARDENAS JHON JAIRO	1	0			0																	EPS018	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS018	2.800.000	112.000	14-08	2.800.000	5	194.600	CCF14	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
51	CC	79233508	DOMINGUEZ JOSE EUSEBIO	1	0			0																	EPS037	781.242	125.000	0	0	0	0	EPS037	781.242	31.300	14-08	781.242	5	94.400	CCF14	781.242	31.300	0	0	0	0	0
52	CC	79344421	VALENCIA VALLEJILLA DIONISIO	1	0			0	X																EPS005	338.539	13.600	0	0	0	0	EPS005	338.539	13.600	14-08	338.539	5	23.600	CCF14	338.539	13.600	0	0	0	0	0
53	CC	79393311	PINILLOS BOHORQUEZ MILTON HUMBERTO	1	0			0																	ESSC18	781.242	125.000	0	0	0	0	ESSC18	781.242	31.300	14-08	781.242	5	94.400	CCF14	781.242	31.300	0	0	0	0	0
54	CC	80421341	PALOMINO ROJAS BRUNO TEODORO	1	0			0																	EPS017	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	120.000	14-08	3.000.000	5	208.800	CCF14	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
55	CC	80270008	CENTENO OROZCO LENIN EDUARDO	1	0			0																	EPS053	781.242	125.000	0	0	0	0	EPS053	781.242	31.300	14-08	781.242	5	94.400	CCF14	781.242	31.300	0	0	0	0	0
56	CC	80240074	CASTAÑEDA PIÑEROS WILLIAN	1	0			0	X																EPS002	364.590	14.600	0	0	0	0	EPS002	364.590	14.600	14-08	364.590	5	28.400	CCF14	364.590	14.600	0	0	0	0	0
57	CC	80408640	SOLARTE GONZALEZ GERARDO	1	0			0	X																EPS037	52.883	8.400	0	0	0	0	EPS037	52.883	2.100	14-08	52.883	5	0	CCF14	52.883	0	0	0	0	0	0
58	CC	98560605	HOYOS VARGAS HENRY	1	0			0																	EPS034	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS034	1.200.000	48.000	14-08	1.200.000	5	83.600	CCF14	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ALVAREZ FUENTES MARGARITA EUGENIA identificado(a) con CC 38362885 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARGARITA EUGENIA ALVAREZ FUENTES identificado(a) con CC 38362885

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
8487539586	401935672	I	2019-01-08	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-12	30																			$781,242	12.5%	$97,700
8487539586	401935672	I	2019-01-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-12	30																			$781,242	16%	$125,000
8487539586	401935672	I	2019-01-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2018-12	30																			$781,242		$0
8487539586	401935672	I	2019-01-08	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2018-12	30																			$781,242		$0
8487539586	401935672	I	2019-01-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACION VOLUNTARIA EMPLEADOR	2018-12	30																			$0	0%	$0
8487539586	401935672	I	2019-01-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2018-12	30																			$0	0%	$0

Este certificado se expide el día 2019-01-10 a las 12:18.

PAGADO

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que FELIX ISRAEL HERNANDEZ FIGUEROA identificado(a) con CC 5312113 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: REVELO ORLANDO EDMUNDO NI 12976085

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
8482907690	362388479	E	2018-08-21	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-08	30	X																
8482907690	362388479	E	2018-08-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-07	30	X																
8482907690	362388479	E	2018-08-21	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-07	30	X																
8482907690	362388479	E	2018-08-21	CCF	CCF14	COMFACAUCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-07	30	X																

PAGADO

Este certificado se expide el día 2018-08-22 a las 07:08.

Contrato de Interventoría

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito Representante Legal y Revisor Fiscal de DAIMCO S.A.S., certifica que DAIMCO S.A.S. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar, así como por concepto de pago de parafiscales. De los últimos seis (6) meses.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1819 de 2016 cumpliendo con el artículo 114-1, deberá diligenciar la siguiente información:

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados (artículo 114-1)	Si (x)	No ()

Dado en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de febrero de 2019.

Atentamente,

CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO
C.C. 78.027.760 de Cerete
Representante Legal

MARCIA CECILIA ATENCIALOZANO
Revisora Fiscal
TP 69499-T

13

Anexo No. 6 Control de Personal del Contratista

DAIMCO
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 08-6-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitana De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	AURELIO GUTIERREZ	REPRESENTANTE LEGAL		F																	1			1	1	1									
2	FABIO ANDRES CLAROS BAUTISTA	RESIDENTE ELECTRICO	79.921.075	F																															
3	FEDERICO MONTEALEGRE	ING COORDINADOR SSTMA	76.318.096	F	1	1					1	1	1	1			1	1	1	1	1														
4	JULIAN MAURICIO GIRALDO	DIRECTOR DE OBRA	15.908.656	F	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
5	MARIA TERESA OJEDA CABRERA	RESIDENTE DE OBRA	34.555.320	F	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
6	MARIA FERNANDA BENAVIDES BELTRAN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SSTMA	34.315.134	F		1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
7	EDGAR ENRIQUE CALVETE LOPEZ	ARQUITECTO	4.979.340	F	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
8	YULI GOMEZ URBANO	RESIDENTE SSTMA	1.080.900.176	F		1	1	1	1		1	1		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
9	JULIAN VELASCO	AUXILIAR SSTMA	1.061.716.774	F	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
10	MARGARITA EUGENIA ALVAREZ FUENTES	TOPOGRAFA	38.362.885	F							1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
11	ALEXANDRA RISUEÑO ZEMANATE	AUX. TOPOGRAFIA	1.062.754.412	F							1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
12	MILTON GUSTAVO CASTILLO BOJACA	CONDUCTOR	80.374.091	F							1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
13	RAUL ALEXANDER MORENO SUAREZ	CONDUCTOR	79.580.334	F							1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
14	YILVER DAIVAN QUILINDO	OPERADOR	1.061.783.125	F		1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
15	JOSE SANTO QUIMBAYA	INSPECTOR	5.879.690	F	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
16	JHON JAIRO PINEDA	INSPECTOR	75.082.427	F		1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	
17	DIEGO HERNAN ANGUCHO CAMPO	AUX. BODEGA	1.061.725.400	F	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	

DAIMCO
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN CIRAF No 06-6-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitana De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	C.C. / DIA		Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	TOTAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
18	WALTER ANTONIO HERNANDEZ OSORIO	AYUDANTE	4.751.640	F	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
19	HENRY HOYOS VARGAS	AYUDANTE	98.360.835	F		1	1				1	1	1	1	1			1	1																
20	ARIS QUIONDO ULCUE	AYUDANTE	1.062.776.138	F	1	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
21	AMALQUIRO ALEJANDRO CASTAÑEDA	MAMPOSTERO	75.003.219	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
22	CARLOS EDUVER LEON	OFICIAL	3.087.064	F		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	
23	EVA ARFILENI AGUDELO GALLO	MAMPOSTERO	52.242.119	F		1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1		1	1			1	1	1	1	
24	HUGO ANTONIO IDARRAGA	MAMPOSTERO	18.400.159	F		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25	WILLIAN CASTAÑEDA PINEROS	MAMPOSTERO	86.048.874	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
26	GERARDO SOLARTE GONZALEZ	OFICIAL	94.463.640	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
27	LUIS ALFREDO BAUTISTA BAUTISTA	OFICIAL	19.423.306	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1								
28	EDUAR FABIAN LEON	MAMPOSTERO	93.436.331	F			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
29	RAFAEL ANTONIO MENDEZ GARZON	MAMPOSTERO	1.106.308.450	F				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
30	JOHAN SEBASTIAN BAUTISTA GUERRERO	MAMPOSTERO	101.420.409	F										1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1								
31	JOSE MARIO DIAZ MORALES	MAMPOSTERO	1.083.838.643	F																		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
32	JORGE ANDRES OLIVEROS PENAGOS	MAMPOSTERO	1.005.929.429	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
33	JOSE MANUEL RODRIGUEZ AYALA	MAMPOSTERO	14.251.296	F		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1									
34	BRYAN JESUS PALOMINO GOMEZ	MAMPOSTERO	1.106.899.374	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Diseño, Asesoría, Interventoría, Montaje, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-8-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitano De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO:DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	C.C. / DIA		Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	TOTAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
35	CARLOS ANDRES ROMERO ROJAS	OFICIAL	1.005.929.823	F			1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1								
36	DANIEL ANDREY RODRIGUEZ PATIÑO	OFICIAL	1.110.506.178	F						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
37	LUIS ALFONSO GORDILLO LONDOÑO	MAMPOSTERO	7.251.758	F		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
38	JOSE HECTOR ERAZO	MAMPOSTERO	113.058.446	F			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				1	1	
39	ALVARO MILENA FERIA MONTEALEGRE	HIDRAULICOS	14.253.118	F									1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
40	LUIS EDUARDO LOZANO RICAURTE	HIDRAULICOS	14.253.561	F									1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1								
41	OSCAR ORLANDO CHASOY ORTEGA	OFICIAL	1.123.326.770	F										1	1	1		1	1	1	1	1	1		1											
42	RUSSEL WEIMAR GARCIA GRAJALES	OFICIALES	1.005.855.845	F											1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
43	YEFERSON GOMEZ RAYO	OFICIALES	1.106.893.622	F											1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
44	DIEGO FERNANDO BERMUDEZ ORTIZ	OFICIALES	1.070.815.596	F												1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
45	CAMILO ANDRES SANCHEZ GARCIA	OFICIALES	1.070.602.996	F												1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
46	JIMMY GAUNDO MARTINEZ	OFICALES	11.223.201	F												1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
47	LUIS ALBERTO DE LA CRUZ	OFICIAL	10.661.566	F																						1	1	1	1	1		1	1	1	1	
48	MARIO PAUL AVILA GUERRA	AYUDANTE	80.010.363	F																						1	1	1	1	1		1	1	1	1	
49	ALFREDO CHILITO MUÑOZ	AYUDANTE	1.058.789.787	F																							1	1	1	1		1	1	1	1	
50	HERNEY OIME	AYUDANTE	76.316.674	F																								1	1			1	1	1	1	
51	ERMINSON ARLEY MONTENEGRO MONTENEGRO	AYUDANTE	1.002.966.865	F																													1	1	1	

DAIMCO
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montajes, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-6-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitana De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
52	[redacted]	CONTRATISTA	80.421.341	F							1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
53	[redacted]	AYUDANTE	1.061.780.338	F		1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1									
54	[redacted]	AYUDANTE	1.062.324.018	F	1		1				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
55	[redacted]	AYUDANTE	1.061.569.653	F		1	1	1					1				1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
56	[redacted]	OFICIAL	85.270.068	F							1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
57	[redacted]	AYUDANTE	76.293.311	F								1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	1	
58	[redacted]	OFICIAL	108.380.968	F	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
59	[redacted]	OFICIAL	10.317.382	F							1	1	1		1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
60	[redacted]	AYUDANTE	1.012.363.595	F																												1	1	1	
61	[redacted]	AYUDANTE	1.117.486.145	F																												1	1	1	
62	ALEXANDER HUBERT LUCUMI PINO	AYUDANTE	16.840.385	F							1	1	1	1	1																				
63	BENITO EMIRO ORTIZ	OFICIAL	96.390.083	F							1	1	1	1	1																				
64	CRISTIAN CAMILO MOPAN	AYUDANTE	1.061.804.916	F		1	1																												
65	EDER AVELIDO ROSERO SANTOS	OFICIAL	1.085.314.949	F							1	1	1	1	1																				
66	EDINSON ANTONIO SANCHEZ	AYUDANTE	1.061.721.432	F								1	1	1	1																				
67	EDGAR ALBERTO QUIÑONEZ ROBLEDO	AYUDANTE	1.061.688.992	F								1	1	1	1																				
68	EUDER CALVACHE QUISOBONI	AYUDANTE	76.216.118	F								1	1	1	1																				

DAIMCO
Diseño, Asesoría, Interventoría, Montaje, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-6-10046-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitana De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
69	HILARIO ARIEL GURRUTE CEPEDA	AYUDANTE	17.644.541	F							1	1	1	1	1																			
70	JOHN EDINSON MARTINEZ PINO	OFICIAL	1.113.514.242	F		1	1						1	1	1																			
71	JOSE BOLIVAR BENAVIDEZ	OFICIAL	10.541.283	F							1	1	1	1	1																			
72	JOSE NORLES ANACONA	AYUDANTE	10.598.808	F							1	1	1	1	1																			
73	SERGIO ARMANDO SANCHEZ	AYUDANTE	1.061.797.830	F									1	1	1																			
74	WILLIAM ERNEY MELENJE	OFICIAL	76.215.459	F							1	1	1	1	1																			
75	ALEXANDRES CERTUCHE CASAMACHIN	AYUDANTE	10.292.183	F				1							1																			
76	ERMINSON ARLEY MONTENEGRO MONTENEGRO	AYUDANTE	1.002.966.865	F						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1										
77	FERNEY ALEXANDER MONTENEGRO MONTENEGRO	AYUDANTE	1.002.966.866	F		1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1		1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
78	JAMES ALBERTO GOMEZ GRIALEA	OFICIAL	10.696.850	F		1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
79	JHON ALEXIS BENAVIDES VALVERDE	AYUDANTE	1.063.818.358	F		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
80	LUIS ALBERTO DE LA CRUZ	OFICIAL	10.661.566	F							1	1	1	1	1		1	1		1	1													
81	MARIO PAUL AVILA GUERRA	AYUDANTE	80.010.363	F		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1												
82	DIDIVO ANOSAR ACOSTA MACIAS	AYUDANTE	1.058.970.334	F		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
83	EDGAR EUGENIO CAMPO SANCHEZ	AYUDANTE	1.061.713.631	F		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1	1													
84	HERNEY OIME	AYUDANTE	76.316.674	F		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1												
85	ALEXANDER HUBERT LUCUME PINO	AYUDANTE	16.840.385	F																1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	

DAIMCO
Diseño, Asesorías, Interventorías, Alistamiento, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-6-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitana De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO:DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.		Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	TOTAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
86	CRISTIAN CAMILO MOPAN	AYUDANTE	1.061.804.916	F																		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1		
87	JOHN EDINSON MARTINEZ PINO	OFICIAL	1.113.514.242	F																		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
88	CESAR PEREZ RONDON	OFICIAL	74.795.219	F																														1	1	
89	JOSE VILLAREVA VILLANUEVA	OFICIAL	10.009.619	F																														1	1	
90	ANDRES GONZALEZ COBO	AYUDANTE		F				1				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
91	JOSE ELIECER DOMINGUEZ	AYUDANTE	76.025.088	F				1				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
92	ROBINSON MOSQUERA	AYUDANTE	1.063.813.153	F			1	1				1	1	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1		
93	OSCAR HERNAN GARCIA PALACIO	AYUDANTE	1.031.140.081	F			1	1					1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	1	
94	WILSON ANDRES SALAZAR SALAZAR	AYUDANTE	1.061.808.030	F				1				1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
95	DANEYER UNI CHEITO	AYUDANTE	1.058.787.468	F			1	1																		1	1	1	1	1		1	1	1	1	
96	DIONICIO VALENCIA VALLECILLA	AYUDANTE	76.244.421	F			1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
97	JOSELITO FLOR ATOY	AYUDANTE	1.061.689	F			1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
98	RAMON ORLANDO ATOY GUTIERREZ	AYUDANTE	10.290.853	F				1				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
99	MILTON CESAR MACA	OPERADOR RETROEXCAVADORA	76.328.537	F									1																	1		1			
100	MIGUEL MONTAÑO LARGO	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	10.547.336	F										1	1				1						1	1	1	1	1	1		1	1	1	
101	JHON ALEXANDER GARCIA BARRETO	ESTRUCTURA METALICA	80.809.303	F									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
102	OMAR ANDRES CARRIAZO ZAMBRANO	ESTRUCTURA METALICA	106.652.223	F									1	1	1	1	1	1																	

DAIMCO
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-8-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitana De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.		Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	TOTAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
103	WILMER PATIÑO	ESTRUCTURA METALICA	103.244.791	F																	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
104	FRANK LEMES NIÑO	ESTRUCTURA METALICA	1.030.544.542	F																										1	1	1	1	1	1	
105	JAIRO YASIN BELTRAN RIAÑO	ESTRUCTURA METALICA	1.070.919.487	F																										1	1	1	1	1	1	
106	CRISTIAN ALFREDO VARGAS VASQUEZ	ELECTRICOS	1.023.874.971	F											1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
107	LUIS ALFREDO VARGAS BURGOS	ELECTRICOS	79.451.429	F											1	1	1	1	1	1	1	1	1							1		1	1	1	1	
108	JOSE VICENTE GUEPENDO VILLALOBOS	ELECTRICOS	91.345.165	F											1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
109	YUSEP MICHEL PISAMBIA PINZON	ELECTRICOS	1.061.782.586	F															1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
110	JORGE ARMANDO CHANTZO CAMACHO	ELECTRICOS	1.061.695.090	F																						1	1	1	1	1		1	1	1	1	
			TOTAL PERSONAL POR DIA		0	17	43	45	37	16	24	62	73	77	51	63	19	70	74	64	74	77	68	0	69	74	73	72	66	68	19	73	75	78	70	0

OBSERVACIONES

ING. RESIDENTE

Elaboró SANDRA GUAUÑA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - TIRSO COSME

Aprobó

CONVENCIONES DE CARGO

DO DIRECTOR DE OBRA
IR INGENIERO RESIDENTE
TA TECNICA AMBIENTAL
TA TOPOGRAFO
CI CADENERO I
CII CADENERO II
M MAESTRO
O OFICIAL
A AYUDANTE
I INSPECTOR
OP OPERADOR
PL PALETEROS
LB LABORATORISTA

DAIMCO
Diseño, Asesoría, Interventoría, Montaje, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 08-6-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Dal Comando De Policía Metropolitana De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	CLAUDIA ANDREA ANAYA PIAMBA	AUXILIAR SSTMA	34.324.707	F																				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	AMALQUIO ALEJANDRO CASTAÑEDA	MAMPOSTERO	75.003.219	F																				1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
3	CARLOS EDUVER LEON	OFICIAL	3.067.064	F																				1	1	1	1	1			1	1	1	1	
4	EVA ARFILENI AGUDELO GALLO	MAMPOSTERO	52.242.119	F																				1	1		1	1			1	1	1	1	
5	HUGO ANTONIO IDARRAGA	MAMPOSTERO	16.400.159	F																				1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
6	WILLIAN CASTAÑEDA PINEROS	MAMPOSTERO	86.048.874	F																				1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
7	EDUAR FABIAN LEON	MAMPOSTERO	93.436.331	F																				1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
8	JOSE MARIO DIAZ MORALES	MAMPOSTERO	1.083.838.643	F																				1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
9	JORGE ANDRES OLIVEROS PENAGOS	MAMPOSTERO	1.005.929.429	F																				1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
10	BRYAN JESUS PALOMINO GOMEZ	MAMPOSTERO	1.106.899.374	F																				1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
11	JHON ALEXANDER GARCIA BARRETO	ESTRUCTURA METALICA	80.803.303	F																				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12	WILMER PATIÑO	ESTRUCTURA METALICA	103.244.791	F																				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		TOTAL PERSONAL POR DIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	9	10	10	8	2	10	10	10	10	0

OBSERVACIONES

ING. RESIDENTE

Elaboró SANDRA GUAUÑA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - TIRSO COSME

Aprobó

CONVENCIONES DE CARGO

DO DIRECTOR DE OBRA
IR INGENIERO RESIDENTE
TA TECNICA AMBIENTAL
TA TOPOGRAFO
CI CADENERO I
CII CADENERO II
M MAESTRO
O OFICIAL
A AYUDANTE
I INSPECTOR
OP OPERADOR
PL PALETEROS
LB LABORATORISTA

Anexo No. 7 Control Personal de Interventoría

DAIMCO

Diseño, Asesoría, Interventoría, Ambiental, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DE LA INTERVENTORIA INT-40:00

PROYECTO: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE.

EMPRESA: DAIMCO S.A.S

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

FRENTE DE OBRA: POPAYAN - CAUCA

No	Nombre	Cargo	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	TIRSO MARINO COSME OROZCO	DI	0	1,0	1	1	1	0	0	1	1,0	1	1	1	0	1	1	1,0	1	1	1	0	1	1	1,0	1	1	1	0	1	1	1,0	1	25
2	SANDRA LUCIA GUAUÑA PISSO	IR	0	1,0	1	1	1	0	0	1	1,0	1	1	1	0	1	1	1,0	1	1	1	0	1	1	1,0	1	1	1	0	1	1	1,0	1	25
3	ROSA DEL MAR RODRIGUEZ GALVIS	SO	0	1,0	1	1	1	0	0	1	1,0	1	1	1	0	1	1	1,0	1	1	1	0	1	1	1,0	1	1	1	0	1	1	1,0	1	25
4	MONICA LILIANA BENITEZ ANGEL	AR	0	1,0	1	1	1	0	0	1	1,0	1	1	1	0	1	1	1,0	1	1	1	0	1	1	1,0	1	1	1	0	1	1	1,0	1	27
5	JAVIER JOSE CARILLO ORTEGA	E	0					0	0	1			1		0					1		0		1			1		0		1			6
6	RIGOBERTO LOZADA DIAZ	TA	0					0	0	1	0,5			1	0		1	0,5			1	0		1	0,5			1	0		1	0,5		11
7	VÍCTOR MANUEL BOCANEGRA GARCÍA	E	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0		1	1,0	1	1		0		1	0,5		1	1	0		1	1,0	1	21
8	JOSE ARMANDO RUIZ ANGARITA	E	0					0	0			1			0		1		1	1		0						1	0		1			4
9	ALBERTO FEDERICO MOUTHON BELLO	E	0					0	0					1	0		1					0							0					3
10	PABLO MANRIQUE CONVERS	E	0					0	0		1		1									0							0				1	4
11	PABLO EMILIO GUERRERO JIMENEZ	E	0	1	1	1		0	0	1	1	1	1	1			1	1	1	1		0		1		1	1	1			1	1	1	21
	TOTAL PERSONAL POR DIA		0	6	6	6	5	0	0	8	8	7	8	8	0	4	9	7	7	8	5	0	4	8	5	5	7	8	0	4	9	7	7	174

OBSERVACIONES

ING. RESIDENTE

Elaboró - SANDRA GUAUÑA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - TIRSO COSME

Aprobó

CONVENCIONES DE CARGO

DO	DIRECTOR DE OBRA	O	OFICIAL
IR	INGENIERO RESIDENTE	A	AYUDANTE
TA	TECNICA AMBIENTAL	I	INSPECTOR
TA	TOPOGRAFO	OP	OPERADOR
CI	CADENERO I	PL	PALETEROS
CII	CADENERO II	LB	LABORATORISTA
M	MAESTRO	E	ESPECIALISTA

Anexo No. 8 Informe SISO

INTERVENTORÍA TÉCNICA EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DEL MANEJO AMBIENTAL AL CONTRATO, PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REALIZADA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ EN LA CIUDAD DE POPAYÁN CAUCA.





PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 25 DE ENERO DE 2019

ELABORÓ:

ROSA DEL MAR RODRIGUEZ G.

RESIDENTE SISOMA

INTERVENTORÍA DAIMCO S.A.S

195

1. INTRODUCCIÓN

A continuación se presenta la recopilación y el análisis de la información proveniente de las actividades del **SG-SST** ejecutadas por el contratista **CONSORCIO BCS-GUTIERREZ** durante la ejecución del proyecto **CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN** ubicada en la ciudad de Popayán , con el fin de analizar y evaluar la protección y promoción de la salud de los trabajadores, condiciones de trabajo, gestión social con la comunidad y protección al medio ambiente de posibles impactos durante la ejecución del contrato.

2. OBJETIVO GENERAL

El objetivo del presente informe es evidenciar el trabajo respecto a la gestión en seguridad y salud en el trabajo (SST) establecido y aplicado por el contratista Consorcio BCS- GUTIERREZ en la ejecución del proyecto Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitana De Popayán; durante el periodo del 26 de Diciembre de 2018 al 25 de Enero de 2019. Así mismo analizar el avance de la implementación para evaluar resultados de este y establecer medidas que nos conlleven al mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo y el control eficaz de los peligros y riesgos, en materia de seguridad y salud en el trabajo.

3. METODOLOGÍA ÁREA SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SISOMA) o SG-SST y MA(Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente:

La metodología a implementar para fundamentar el presente informe se basa en la recopilación y registros de la información de las actividades establecidas por los subprogramas de medicina preventiva de trabajo, seguridad industrial, gestión de saneamiento básico y protección ambiental realizada según la estructura del SG-SST determinado en la presente obra.

4. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

146

4.1 Seguimiento a los hallazgos , se realizan los siguientes requerimientos en Seguridad y Salud en el trabajo al contratista:

- ✓ Seguir Manteniendo las áreas de circulación y rutas de evacuación limpias y despejadas.
- ✓ Rta: Se ha continuado con el programa de Orden y Aseo, se le ha estado realizando seguimiento al contratista de Mamposteria Carlos León, dado que las áreas que el tiene a cargo son las que han presentado mayor desorden en el manejo de Escombros.

- ✓ Cerrar el hallazgo de acuerdo a la inspección periódica realizada al minicargador LZ18, perteneciente al Consorcio, donde se evidencia que se requiere el cambio de una llanta e instalar los espejos y retrovisor.

- ✓ Rta: se realizó el cambio de llanta e instalaron los espejos y retrovisor, todo dando cumplimiento al seguimiento del programa de inspecciones planeadas.

4.2. Identificación de riesgos y peligros en áreas del proyecto:

- ✓ Realizada una inspección de campo en los diferentes frentes de trabajo que se encuentran en la obra Construcción y Dotación de la Cuarta Fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán.

- ✓ Aplicar medidas preventivas y correctivas identificadas en cada uno de los frentes de trabajo,

- ✓ Realizar seguimiento a la ejecución de los procedimientos seguros correspondiente a cada actividad que ejecuta el contratista en obra.

- ✓ Verificar que se tomen las medidas preventivas y correctivas a que haya lugar.

- ✓ Verificar el cumplimiento de los programa que hacen parte de la Gestión en SST- MA, los cuales garantizan la Seguridad y Salud de los trabajadores en obra.

147

5 . GESTIÓN HUMANA

5.1. INGRESOS - DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL

En el periodo comprendido entre el 26 de Diciembre de 2018 y el 25 de Enero de 2019 se realiza por parte de la interventoría al residente SISOMA de la Empresa Contratista Consorcio BCS- GUTIERREZ, la revisión de la carpeta de ingreso del personal contratistas y subcontratista, verificando que se cumpla con lo propuesto en el subprograma de medicina preventiva y del trabajo y el subprograma de higiene y seguridad industrial. Finalizada la verificación se evidencia que a la fecha se encuentran los siguientes documentos:

Se verifica los exámenes de ingreso, se realizaron 28 exámenes médicos de ingreso, al personal nuevo que ingreso para este periodo.

Para el presente periodo el contratista realizaron 24 solicitudes para que los trabajadores se realizaran los exámenes médicos de retiro, se hizo la socialización del derecho de examen de retiro a un total de 24 personas.

No se ejecutaron exámenes periódicos, dado que para el periodo no aplican.

Para el presente periodo se realizaron recomendaciones generales de salud en las inducciones realizadas al personal nuevo del proyecto, se generaron 2 recomendaciones médicas específicas, originadas de los exámenes de ingreso, para lo cual se notificó al trabajador correspondiente.

El contratista informa que dentro de las inducciones realizadas de acuerdo al ingreso de personal se socializan las políticas del SG-SST (Política del SG-SST y Política de no al consumo de sustancias psicoactivas, tabaco y alcohol) y los temas generales del SG-SST, dentro de las inducciones se incluyó el tema de la Política de Medio Ambiente.

Para el periodo de 26 Diciembre al 25 de Enero de 2019, se realizaron inducciones, con asistencia de 23 personas en total, las inducciones están soportadas con los registros y sus respectivas evaluaciones.

Los temas tratados en las inducciones son:

- Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
- Política de Tabaquismo, Alcoholismo
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Definición de AT y EL

148

- Uso de Elementos de protección personal
- Sistema General de Seguridad Social
- Notificación de Riesgos
- Plan de Emergencias
- Notificación al derecho de examen Médico ocupacional.

El contratista informa que dentro del SG-SST del consorcio, se implementa el manual de contratistas, el cual debe acogerse cada una de las organizaciones subcontratadas por el consorcio, con el fin de garantizar el cumplimiento a todo lo concerniente a la Seguridad y Salud en el Trabajo, es decir, que de acuerdo a la implementación del documento mencionado, se está cumpliendo con los procedimientos de inducción debidamente soportados y documentados.

Se verifica todas Hojas de vida de Consorcio BCS Gutiérrez, estas cumplen con los requerimientos establecidos.

Formato de hoja de vida con actualización de datos del trabajador.

Contratista:

AG3 INGENIERIA: Se cuenta con el 100% de las Hojas de Vida. Equivalente a Trabajadores

CONSORCIO BCS-GUTIERREZ: Cuenta con el 100% de las Hojas de Vida, equivalente de 33 Trabajadores, incluido el área administrativa.

A la fecha se cuenta con todas las hojas de vida del personal subcontratista que se encuentra en obra.

Hojas de Vida faltantes de Subcontratistas:

BRUNO: 2
CARLOS LEON: 7
DANEL RODRIGUEZ: 7
ORLANDO EDMUNDO REVELO: 2
ESTRUCTURA METALICA: 2

Aparte de los documentos pendientes se realizó las siguientes verificaciones:

- Se verifica que se realice a diario el registro del personal en el libro de

149

obra (bitácora) y formato personal de contratista y formato de Interventoría (int-8 F. Informe diario de inspección v0 y int-40 f. personal del contratista v0) , en el cual se registra todo el personal de obra, tanto de contratista y de interventoría, Control de Dotación y EPP, Equipos, Maquinaria, Estado del tiempo, Control de Sumistro de Materiales, Registro de Control de Calidad de Materiales y Obras, Descripción General de las Principales Actividades Desarrolladas, dicho formato lo diligencia la Ing Residente, en donde se relaciona el personal administrativo y operativo como: director de obra, ingeniero residente, residente SISOMA, Contratita Topografía: Margarita Álvarez, Subcontratista AG3 Ingeniería, Arrieta SAS, Albeiro Utima, Bruno Palomino, Contratista Mamposteria: Carlos Leon, Daniel Rodríguez, Contratista Tanque: Jhon Pineda, Contratista Eléctricos: DATALEC INGENIEROS, Contratista: Retroexcavadora: Orlando Edmundo Revelo, Contratista Cubierta: Metal B SAS.

Se evidencia la entrada del personal de lunes a viernes en la jornada de la mañana en el horario de 7:00 am y la salida en horario de la tarde 5:00 pm; con su respectiva horario de almuerzo de 12:00 M a 1:00 P.M. los días sábados de 7:00 am a 12:00 pm del medio día. Tanto contratista como subcontratista.

5.2. PERSONAL ACTUAL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

CONTRATISTA	ACTIVIDAD	# TRABAJADORES
CONSORCIO BCS- GUTIERREZ	ADMINISTRACIÓN	9
	OBRA	6
AG3 INGENIERIA	CONDUCTORES -2 DE VOLQUETAS), -1 PAGARITA	3
	TOTAL	18
SUB CONTRATISTA	**ACTIVIDAD**	**# TRABAJADORES**
MARGARITA ALVAREZ	Topografia	2
ARRIETA SAS	ESCAVACION (Movimientos de Tierra), Armado de Hierro, vaciado de concreto.	15
ALBEIRO UTIMA	Armado de Hierro, vaciado de concreto	12
BRUNO	Armado de Hierro, vaciado de concreto	10
	Mamposteria	13

CARLOS LEON		
DANIEL RODRIGUEZ	Mamposteria	18
JHON JAIRO PINEDA	Armado de Hierro, vaciado de concreto	9
DATALEC INGENIEROS	Mamposteria	5
METAL B SAS	Estructura Metalica	5
ORLANDO EDMUNDO REVELO	Retroexcavadora	2
Subcontratistas TOTAL		91

A la fecha el personal a tenido la siguiente rotación:

Nuevos = 26
Personal antiguo =45
Personal retirado = 22
Ingreso retiro = 2

6.SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

6.1. Señalización y demarcación:

- Se verifica que los frentes de trabajo de la obra se encuentren demarcados y señalizados, dando cumplimento a la resolución 1016 de 1989. Artículo 11 (Numeral 17).

- Se inspecciona que los extintores y botiquines del campamento y de los vehículos, se verifica que el extintor multipropósito (ABC) del contratista, (suministrado por el proveedor REPARAEQUIPOS MARTINEZ), esté cargado, presurizado, tenga el pasador de seguridad, tenga la fecha de recarga vigente, este rotulado, señalizado y se encuentre en un lugar visible, accesible y a disposición inmediata en caso de incendio.

- Se inspecciona que el botiquín de primeros auxilios que se encuentra en la obra, contenga los elementos establecidos por la RESOLUCIÓN 0705 DE 2007.

6.2. Vigilancia a las actividades propuestas para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

- Se verifica que el contratista realice actividades encaminadas a la prevención de accidentes y al mejoramiento de las condiciones laborales de acuerdo al cronograma de actividades de seguridad y salud en el trabajo (SST), que se ejecutan por el Residente SISOMA del contratista. Dando cumplimiento a la

resolución 1016/89 y al Decreto 1443 de 2012, Resolución 1111 de 2017

- Se inspecciona que en las inducciones a los trabajadores se traten los temas conforme a cumplimiento de la legislación vigente en seguridad y salud en el trabajo.

- Se verifica que en el proceso de inducción se incluya los temas ambientales socializar política de consumo de sustancia psicoactivas, política vial, plan emergencia, temas ambientales.

TABLA DE INDUCCIONES		
TEMAS	**PROGRAMADAS**	**REALIZADAS**
Marco legal en seguridad, salud en el Trabajo y Medio Ambiente.	De acuerdo al número de trabajadores que ingresen en el mes	5
Política del SG-SST y MA		

6.3. Capacitation y entrenamiento

Se revisa el cronograma de capacitación y entrenamiento teniendo en cuenta que estas se realicen de acuerdo a los procesos que se ejecutan en la obra, a la fecha la empresa contratista BCS GUTIERREZ, han realizado las capacitaciones de acuerdo al cronograma mensual y anual propuesto.

Dando cumplimiento al 100% de las capacitaciones programadas

Durante lo corrido del periodo que abarca este informe, se realizaron capacitaciones al personal de la obra, correspondiente a los siguientes temas:

TEMA	ORIENTADOR
Manejo de herramientas (Manuales y eléctricas)	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
*Consumo de sustancias psicoactivas	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
*Accidentes en construcciones	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
*Condiciones y actos Inseguros	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
*Identificación de actos y condiciones inseguras	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS

*Prevención de accidentes de trabajo en alturas	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
*Seguridad de trabajo en alturas	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS

6.3.1. Charlas de seguridad diaria y precalentamiento

Se siguen realizando las charlas los Martes o Miercoles, por grupos guiadas al componente de SST y MA total 4 charlas programadas .

6.3.2 Actividades de prevención personal sintomática.

Durante del desarrollo de este periodo CONSORCIO BCS-GUTIERREZ no se realizaron actividades de prevención de la enfermedad, ni promoción de la salud.

Línea base de condiciones de salud.

CONSORCIO BCS-GUTIERREZ realiza el seguimiento a la línea base de condiciones de salud en las áreas que serán programadas

6.4 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

La empresa realiza la Entrega, reposición, inspección y mantenimiento de elementos de protección personal (EPP).

Para el Periodo del 26 Diciembre al 25 de Enero de 2019 se realizó la entrega de los siguientes Elementos de Protección Personal.

ITEM	ELEMENT O	CANTIDAD
1	Casco de seguridad	20
2	Gafa lente oscuro	15
3	Gafa lente claro	18
4	Tapa boca	50
5	Guantes reforzados	85
6	Tapa oído inserción	20
7	Tapa oídos de copa	1
8	Protector respiratorio con	1

	filtros	
9	Guantes caucho	45
10	Guantes tela	25
11	Botas punteras en caucho	8
12	Barbuquejo	2
13	Guantes nitrilo	2

El contratista realiza las inspecciones planeadas de EPP de acuerdo al programa de inspecciones planeadas y se verifica el uso de EPP al personal en obra.

El contratista da cumplimiento constante en la obra a la inspección de utilización y estado de los EPP acordes a la tarea, se realiza cambio de EPP de acuerdo a la necesidad, sobre todo se realiza cambio de guantes de vaqueta, sencillos y reforzados , de caucho, hilaza y gafas y protección auditiva tipo inserción

Adicionalmente a la entrega de elementos de protección personal, el consorcio hace entrega de la siguiente relación de dotación:

ITEM	DOTACION	CANTIDAD
1	Bota punta de acero	22
2	Pantalón y camisa (logo consorcio)	18

Dicha dotación es entregada en su respectivo formato.

El contratista realiza inspecciones periódicas de EPP, Equipo y Herramientas, Orden Y Aseo, Botiquín Y Extintor, Vehículos/Maquinaria.

De las cuales el contratista adjunta su respectivo soporte.

Para el periodo del 26 de Diciembre de 2018 al 25 de Enero de 2019, se realizó trabajos con la Retro-Excavadora y el vibro compactador, del contratista Orlando Edmundo Revelo.

6.5 ACTIVIDADES DE SOPORTES DEL PLAN DE PREPARACIÓN Y ATENCIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA.

Se realizó inspección de extintor y botiquín de primeros auxilios ubicado en el campamento del contratista, almacen, volqueta Szp025, volqueta szp026 y minicargador.

7. DESCRIPCION GENERAL DE ACTIVIDADES.

Con el fin de dar a conocer las diferentes actividades que se desarrollan en el periodo se describe a continuación el avance de obra del área técnica, para tener un mejor entendimiento que debe realizar el área SST-MA, a continuación se describe las actividades del área técnica así:

- Excavación mecánica, cargue y desalojo de material.
- Localización de ejes y niveles
- Fundida de placa en cubierta
- Levante de muros
- Relleno de subestación eléctrica y base de tanque de almacenamiento de agua
- Instalación de cinta PVC en tanque
- Realización de pañetes casino, subestación y oficiales.
- Relleno con material en área de patrulleros.

8. INFORME GESTION SOCIAL.

8.1 ACTIVIDADES PRINCIPALES

No se cuenta con guarda de seguridad, dado que la obra se encuentra ubicada dentro de las instalaciones de la Policía Metropolitana de Popayán y cuenta con cerramiento perimetral en malla verde.

El contratista instalo Cámaras de Seguridad, para brindar mejor soporte referente al tema de seguridad.

Hasta le fecha no se registró sugerencias, quejas o reclamos del área externa.

9. INSPECCIONES

Durante el presente periodo se desarrollaron las siguientes inspecciones por parte de la interventoría SISOMA del Contratista BCS Gutierrez:

TIPO DE INSPECCIÓN	FRECUENCIA
Inspecciones de botiquín de primeros Auxilios	Mensual
Inspección de extintores	Mensual
Inspección de camilla	Mensual
Inspección orden y aseo	Semanal
Inspecciones de Equipos y Herramientas	Mensual
Inspección pre operacional de Vehículos y Maquinaria	Diaria
Inspección de elementos de protección Personal	Cada quince días
Inspección para Permisos de Trabajo en Alturas	De acuerdo a los trabajos ejecutados en Alturas
Inspección ambiental	Semanal
Inspección de observación de Comportamiento	Semanal

10. AUSENTISMO LABORAL GLOBAL

A continuación, se hace la relación de ausentismo general global discriminado de la siguiente manera:

Nota. La NTC 3793 en el numeral 3.2.1. De ausentismo laboral, manifiesta lo siguiente, "El periodo se puede tomar en meses o años, se recomiendan cortes mensuales.

ALG = AUSENTISMO LABORAL GLOBAL
Días perdidos no relacionados con la salud: 45 días= 360 horas
Días perdidos por accidentes de trabajo: 3 días = 24 horas
Días perdidos relacionados con enfermedad general 19 días: 152 horas
Total, días perdidos: 67 días = 536 horas.

Tiempo programado en el periodo: 31 días
Total, personal del proyecto en el periodo: 71 personas
Tiempo de trabajo programado en el periodo (trabajador x horas día x días semana x número semana) = 9.585
Tiempo de trabajo perdido en el periodo * 100
ALG = _____
Tiempo de trabajo programado en el mismo periodo

Para un total de 71 personas del contratista, significa que de cada 100 horas trabajadas se presenta el 5,6 % de pérdida de tiempo para el periodo

11. ACCIDENTALIDAD EN LA OBRA DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 25 DE ENERO DE 2019.

Durante este periodo se presentó 1 accidente laboral al siguiente señor:

El 30 de diciembre se presentó un accidente por caída en alturas al señor Jose Manuel Rodríguez oficial de obra.

A continuación, se presenta el listado de personal con la estadística

A continuación, se presenta el listado de personal con la estadística.

TABLA 1. ÍNDICES DE ACCIDENTALIDAD DEL MES DE 26 DICIEMBRE 2018 AL 25 ENERO 2019 Periodo	Total, trabajadores	Total, accidentes de trabajo	Accidentes mortales	HHT	No. Días perdidos acumulados	IF	IS	ILI	LETALIDAD
07 junio – 25 junio	12	0	0	1376	o	0.00	0.00	0.00	0.00
26 junio – 25 julio	22	0	0	4008	25,5	0.00	0.00	0.00	0.00
26 julio – 25 agosto	20	1	0	6884	47	1923,08	1923,08	3698,22	0.00
26 agosto – 25 septiembre 2018	70	0	0	15120	3	0.00	0.00	0.00	0.00
26 septiembre	75	1	0	10125	12	19,75	237	4,68	0.00

157

Periodo	Total, trabajadores	Total, accidentes de trabajo	Accidentes mortales	HHT	No. Días perdidos acumulados	IF	IS	ILI	LETALIDAD
– 25 octubre 2018									
26 octubre – 25 noviembre 2018	72	0	0	9720	20	0	412	0	0.00
26 noviembre - 25 diciembre 2018	74	2	0	9.990	54	40.04	1.081	43,29	0.00
[illegible] diciembre – 25 enero 2019	71	1	0	9585	67	20.87	1.398	29,17	0.00

F.: Indice de frecuencia: No. de accidentes/HHT*K
I.S.: Indice de severidad: No. días de perdidos ó Días cargados/HHT*K
I.L.I: Indice de lesiones incapacitantes: IF*IS/1000
K: 200000

12. BRIGADAS DE EMERGENCIA

Para este periodo no se realizó capacitación a la Brigada de Emergencia.

El Contratista cuenta con un Kit de Emergencia:

Campamento: 1 Botiquín, camilla inmovilizadora y extintor de 20 lb

Además cada vehículo cuenta con su respectivo extintor y botiquín.

La camilla de emergencia y el extintor se encuentran ubicados en el campamento a la entrada de fácil acceso, debidamente identificados y señalizados

158

13. SANEAMIENTO BÁSICO

Se da cumplimiento a los aspectos básicos de servicios sanitarios, para ello se cuenta con los siguientes servicios:

4 baterías sanitarias con la siguiente distribución:

1 batería sanitaria con lava manos destinada para el servicio de mujeres

1 batería sanitaria con lavamanos destinada a los ingenieros hombres de la obra

2 baterías sanitarias destinadas para el servicio de trabajadores en general

Un orinal en la parte de atrás de los baños.

Se hace aseo de acuerdo al procedimiento de orden y aseo cada 3 días o dependiendo de la necesidad.

14. COPASST DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Para lo corrido del presente periodo, el día el 26 de diciembre 2018 se realizó reunión con la participación de los integrantes que conforman el COPASST, donde se trataron los siguientes temas; Accidentalidad, orden y aseo, señalización, mejora continua, medidas de prevención y control, mejora continua al sistema, uso adecuado de EPP, uso de equipos para trabajo en alturas (Arnés, Eslinga, Líneas de vida). El personal fue atento y se comprometieron a dar cumplimiento a los temas tratados.

15. COMITÉ DE CONVIVENCIA

Para el presente periodo no se realizaron actividades relacionadas con el comité de convivencia.
A continuación, se presenta el seguimiento a las actividades desarrolladas por el contratista

16. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

PARAMETRO A EVALUAR	CALIFICACION MENSUAL	ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO

Todo el personal directo e indirecto que labora en la obra se encuentra afiliado a una ARL, EPS Y AFP, el ingreso a la obra, se encuentra al día en el pago, se lleva registro semanal en el formato correspondiente. Y se tiene el procedimiento para verificar la afiliación al sistema y este contiene las medidas a aplicar por el contratista en caso de incumplimiento en la obligación y se ejecuta según lo estipulado	100%	El 100% de los trabajadores cuentan con la seguridad social vigente
El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial se encuentra publicado en un lugar visible del campamento, está socializado y se cuenta con los soportes respectivos.	100%	El reglamento se encuentra publicado en la cartelera informativa del consorcio desde, de igual forma se hace la socialización en las Inducciones
La política SST, se socializa a todo el personal de la obra, firmada por el representante legal, se encuentra en lugar visible y se cuenta con los soportes respectivos	100%	El contratista realiza la socialización de la política de seguridad y salud en el trabajo en las inducciones
El COPASST o VIGIA, se reúne en forma mensual, cuenta con el cronograma de reuniones, Plan de Trabajo General de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión cumpliendo con la normatividad legal vigente	100%	Reunión con el COPASST
Se cumple el plan de Capacitación, Inducción y Entrenamiento.	100%	Se realizó inducción a todo el personal de la obra
Todos los trabajadores son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	100%	Se realizó la notificación de riesgos a todo el personal del proyecto.
Los contratistas cumplen con los compromisos adquiridos en los Comité SST-MA.	100%	Cumplimiento a las observaciones de la auditoria.
Se notifica a la Interventoría todas las novedades del personal (reingresos, cambios de cargo, cambios de empleador y retiro) inmediatamente se presentan	100%	El contratista hace entrega vía correo electrónico por solicitud de interventoría, la documentación correspondiente a seguridad social de trabajadores
Se efectúa examen médico de ingreso/periódico/egreso (este último el empleador entrega la orden al trabajador y la presenta a Interventoría), por cargo, se realiza por médico especialista en SST-MA. y con la información se mantiene actualizado el diagnostico de condiciones de salud del personal.	100%	Se presentaron exámenes médicos a todas las personas que permanecieron en la obra
Se cuenta con botiquín que contiene la dotación básica.	100%	El contratista cuenta en campamento con botiquín de primeros auxilios, con elementos necesarios para brindar el servicio ante cualquier eventualidad.
Se realizan actividades de promoción y prevención	N.A.	Para el periodo en mención no se realizaron actividades de promoción y prevención.
Las instalaciones provisionales cuentan con vistieres, donde los espacios son suficientes y adecuados para el manejo de ropas, implementos personales y EPP	100%	Se cuenta con tres vistieres, distribuidos uno para el personal de cada subcontratista.

Se posee 1 baño por cada 15 trabajadores y el baño recibe mantenimiento y limpieza periódica.	100%	Los baños se mantienen en buenas condiciones y estos se realizan los mantenimientos dos veces por semana, se cuenta con tramo 1=1, , tramo 2=2, , tramo 3= 1,tramo 4= 2; tramo 5=2, punto crea=2 baños fijos, total baños =10
Se entregan los EPP que cumplan con las normas de garantía de calidad, de acuerdo a la matriz aprobada y se lleva un registro formal de entrega.	100%	El contratista tiene los formatos de entrega de elementos de protección personal y se entrega la dotación a todo el personal en total se hizo 26 entregas de epps al personal de obra y se realiza reposición de acuerdo a la necesidad
Los trabajadores usan adecuadamente los EPP de acuerdo a la actividad y matriz aprobada.	100%	En los recorridos a diario que se realizan se verifica el uso de los elementos de protección personal, por tal motivo estos se encuentran en buen estado y lo usan
Las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con procedimientos de seguridad.	100%	Se cuenta con hojas de seguridad de las sustancias químicas utilizadas en el periodo se encuentra los siguientes: • • Cemento • • ACPM • • GASOLINA
Se implementan los permisos de trabajo para las labores de alto riesgo, y cumple los Procedimientos y/o estándares definidos.	100%	Se implementa permisos de trabajo en alturas
Se cuenta con procedimientos documentados y/o estándares de trabajo seguro por cada proceso constructivo u operación, los socializa, actualiza y se ejecutan según lo establecido.	100%	El contratista entrega todos procedimientos según los resultados de la matriz de peligros
Se tienen documentadas las estadísticas mensuales de ausentismo se presentan a interventoría con el análisis y acciones correctivas/preventivas correspondiente	100%	Para el presente periodo no se presentaron ausentismos relacionados con causas ATEP.
realizan las inspecciones establecidas en el programa	100%	Se realiza inspección a volquetas revisión, maquinaria, botiquín, extintor, uso de epp.
Se capacitan a todos los trabajadores en el plan de emergencia y tiene soportes.	100%	En las inducciones se realizó la socialización del plan de emergencias.
han conformado las Brigadas de emergencia, están activas, especializadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento mensual, se ejecuta y existen los soportes.	100%	Se encuentran identificadas

17. GESTIÓN DE MANEJO AMBIENTAL

17.1 MAQUINARIA EQUIPOS Y VEHICULOS.

Para el presente periodo ingresaron al proyecto los siguientes equipos vehículos y maquinaria.

VEHICULOS

TIPO DE VEHICULO	PLACA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	FECHA DE INGRESO
Volqueta	SZP 026	Milton Gustavo Castillo Bajaca	11/08/2018
Volqueta	SZP 025	Raúl Alexander Moreno Suarez	11/08/2018
Tractocamión	FLP894	Jairo Hernando Diaz	01/12/2018
Tractocamión	SWN046	William Cardono	07/12/2018
Camión	VAD086	Anderson López	15/12/2018
Volqueta	OYJ-223	Javier Oswaldo Bolaños	23/01/2019
Volqueta	CIZ-640	Nelson Olmedo Montilla	23/01/2019
Volqueta	GUE-408	Aurelio Oswaldo Bolaños	23/01/2019

17.2 MAQUINARIA

MAQUINARIA TIPO DE MAQUINARIA	REFERENCIA	NOMBRE OPERARIO	FECHA DE INGRESO
Minicargador	218	Yilver Duvan Quilindo	20/09/2018
Excavadora	420 E	Flavio Chañag	11/08/2018
Excavadora	PC200-5	Orlando Muñoz	14/11/2018
Excavadora	JCB214E	MILTON CESAR MACA	15/12/2018
Vibrocompactador	CA-15 DYNAPAC	MIGUEL MONTAÑO LAGO	18/12/2018
Excavadora	JCB214E	ORLANDO MUÑOZ	25/01/2019

Para el periodo objeto de este informe se tiene que se cuenta con los documentos de volquetas como:

Licencia de transito
*SOAT
*Tecno mecánica
*Licencia de conducción del señor Jeremías Garcés, Yilver Duvan Quilindo

167

Adicionalmente a las volquetas se adjunta la documentación de la maquinaria (ver anexo 4. Documentación Vehículos y maquinaria).

$$\frac{\text{No. De vehículos con documentos requeridos vigentes}}{\text{No. De vehículos en obra}} * 100 = 8/8 = 100\%$$

$$\frac{\text{No. De acciones cumplidas}}{\text{No. De acciones propuestas aplicables en el periodo}} * 100$$

Para este mes no se realizaron acciones que requirieran de cumplimiento, es por esta razón que el segundo indicador del programa no aplica.

18. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Se dispone en campamento tres recipientes para disposición de residuos ordinarios

$$\frac{\text{Cantidad de residuos especiales, peligrosos, reciclables entregados en empresa autorizada}}{\text{Cantidad de residuos especiales, peligrosos, reciclables generados en periodo}} * 100$$

$$= \frac{\text{100 kg (reciclable entregado)}}{\text{100 kg (reciclable generado)}} * 100 = 100\%$$

La entrega de material reciclable se hace a través de la asociación de recolectores de materiales reciclables de Popayán "aremarpo", quien para este periodo certifica la recolección.

$$= \frac{\text{50 kg (ordinario entregado)}}{\text{50 kg (ordinario generado)}} * 100 = 100\%$$

La entrega de residuos ordinarios se hace a través de la ruta de recolección que realiza la empresa Serví Aseo; como evidencia se presente registro fotográfico en el punto de recolección ubicado en zona del comando.

La entrega de residuos peligrosos o especiales se hace a través de la empresa ASERHI, dando cumplimiento al indicador.

85 Kg (Residuos peligrosos en obra)
_____ *100 = 100%
85 kg (Residuos peligrosos en obra)

La distribución de los recipientes corresponde a:

3 recipientes para recolección en oficina
4 recipientes para recolección de residuos en baños
5 recipientes del punto ecológico donde se hace la separación y clasificación de residuos según código de colores.

19. MANEJO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

Se realizan excavaciones movimiento de tierra en obra, el cual es dispuesto en la escombrera Revelo, quien cuenta con permiso, otorgado por la corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), (ver Anexo 4. Permiso escombrera y solicitud aprovechamiento)

Para el cual se tiene la siguiente relación:

ITEM	FECHA	PLACA	CAPACIDAD	MATERIAL	No. RECIBO	L. DISPOSICION	TOTAL X DIA
1	18/01/2019	SZP026	15	RESIDUOS ESTERILLA	233	REVELO	15
2	18/01/2019	SZP025	15	RESIDUOS ESTERILLA	234	REVELO	15
3	19/01/2019	SZP025	15	RESIDUOS ESTERILLA	235	REVELO	15
4	19/01/2019	SZP026	15	RESIDUOS ESTERILLA	236	REVELO	15
5	20/01/2019	SZP025	15	RESIDUOS ESTERILLA	237	REVELO	15
6	20/01/2019	SZP026	15	RESIDUOS ESTERILLA	238	REVELO	15
7	21/01/2019	SZP026	15	RESIDUOS ESTERILLA	239	REVELO	15
8	21/01/2019	SZP026	15	RESIDUOS ESTERILLA	240	REVELO	15
9	21/01/2019	SZP025	15	ESCOMBROS	241	REVELO	15
10	24/01/2019	SZP025	15	ESCOMBROS	256	REVELO	15
11	25/01/2019	SZP026	15	TIERRA	267	REVELO	15
12	25/01/2019	SZP026	15	TIERRA	268	REVELO	15
13	25/01/2019	SZP026	15	TIERRA	269	REVELO	15

VOLQUETA	N. DE VIAJES	CANTIDAD M3
SZP025	5	75 M3
SZP026	8	120 M3
TOTAL		255M3

MANEJO	No. VIAJES	CANT.M3
DISPOSICION FINAL	13	195
ARPOVECHA MIENTO	0	0
% DISPISICION FINAL	100%	



Cantidad de escombros y material de excavación dispuestos correctamente en m3
_____ *
100
Cantidad de escombros y material de excavación generados en el mes
= (195/195) *100= 100%

Cantidad de escombros aprovechados
_____ * 100 = (0/195) *100= 0%
Cantidad de generados

Los valores acumulados respecto al mes anterior son los siguientes:

MANEJO	No. VIAJES	CANT.M3
DISPOSICION FINAL	17	255
ARPOVECHA MIENTO	0	0
% DISPOSICIÓN FINAL	100%	

165



20. USO EFICIENTE DE AGUA

En este mes se hace disposición en la escombrera del señor Orlando Edmundo Revelo, de cual se anexa la documentación pertinente.

Dando cumplimiento a los lineamientos de la resolución 472 de 2017, el consorcio radicara ante la CRC el programa de manejo ambiental de RCD.

21. USO EFICIENTE DE AGUA

Se anexa lecturas del mes, que se han tomado conjuntamente con interventoría:

CONSUMO DE AGUA						
ITEM	FECHA LECTURA	No. INTERNO	MARCA	No. CONTADOR	LECTURA M3	CONSUMO MENSUAL (M3)
1	28/12/2019	# 1	COLTAVIRA S.A.	2942770	0498,9	119,50

Consumo de agua actual –consumo mes anterior
_____ x 100 = (119,50 -76,40/119,50) * 100 = 36,06%

Consumo de agua mes

Se evidencia que no se ha hecho una educación respecto al consumo de agua en el mes.

No. de eliminación de fugas
_____ * 100 = 2/2* 100 = 100%
No. de fugas halladas

Se presenta daño en manguera ubicada en zona de obra, el cual es reparado de inmediato

166

22. MANEJO DE FAUNA

No. de Nidos reubicados
_____ * 100
No. de nidos hallados

No. de especies entregadas a la CRC ó PCA
_____ * 100

No. de avistamiento de especies en obra sin manejo

Para el presente periodo no se realizó tala de árboles, tampoco identificación de posible de aves que aniden en algún árbol talados en el periodo anterior.

23. MANEJO DE FLORA

Para el siguiente periodo no se realizó trámite alguno con la Corporación Regional del Cauca, se está a la espera de la visita por funcionario de CRC para dar cierre a la compensación forestal

24. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL EN OBRA COMPONENTE AMBIENTAL

No. de charlas realizadas
_____* 100 = (2/2) * 100 = 100%
No. charlas programadas

No. de asistentes a las charlas de un promedio

_____*100 = (32/32) *100= 100%
No. de asistentes a obra

Ver anexo 5. Capacitación componente ambiental

167

25. TRABAJO EN ALTURAS

- ✓ Uso adecuado de ESTINGA y ARNES por cada trabajador que realiza dicha actividad.
- ✓ Hojas de vida de ARNES y ESLINGA usados y firmados por el trabajador.
- ✓ Permiso en alturas y con las respectivas firmas de los trabajadores antes de realizar las actividades.
- ✓ Uso de escaleras, las cuales cuentan con las condiciones y materiales necesarios para labor a desempeñar.
- ✓ Uso de andamios certificados para la labor, armado de forma completa, las actividades realizadas permiten asegurar el andamio a la estructura.
- ✓ Se cuenta con uso de líneas de vida horizontal para los trabajos en altura.
- ✓ Se usan ganchos como puntos de anclaje resistentes a la actividad.
- ✓ Los trabajadores usan sus epp apropiados para cada actividad a realizar.
- ✓ Se adecuan las áreas de ingreso, como son escalera, puentes, para acceso y cada una de las áreas, dando cumplimiento a PTSA.
- ✓ Actualmente se está utilizando una pluma, ubicado en el segundo piso del bloque de casino, para transporte de material, la cual esta operada por personal capacitado por parte del Consorcio para operarla, para lo cual el operador utiliza EPP para T.S.A.

26. OTROS

-Planilla por pago de Seguridad Social.
-Documentación Retroexacavadora
-Documentación Vibrocompactador

27. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJOS

La interventoría le solicita al contratista a través del residente SSTMA, el procedimiento y formatos mensuales utilizados para el control de accidentes e incidentes de trabajo, con el fin de verificar el cumplimiento que determina la Resolución 1401 del 2007 la cual tiene como objeto establecer obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, con el fin de identificar las causas, hechos y situaciones que los han generado, e implementar las medidas correctivas encaminadas a eliminar o minimizar condiciones de riesgo y evitar su recurrencia. Y al decreto 1072 DE 2015 donde se establece como componente la investigación de accidentes e incidentes, no conformidad y acciones correctivas y preventivas. **Se verificaron los formatos del informe de investigación de accidentes e incidentes de trabajos y se evidencia el cumpliendo con lo establecido en la resolución 156 de 2005.**

27.1 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

163

ACCIDENTALIDAD DEL PERIODO

Para el siguiente periodo se presentaron 1 accidentes de trabajo caída de alturas, de los cuales el contratista cuenta con su respectiva investigación, acciones correctivas y preventivas derivadas de la investigación.

28. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Par presente periodo, se presentó 1 A.T. para lo cual el contratista realizo la investigación del mismo, dando cumplimiento a la Resolución 1401 del 2007, se Realizo la respectiva socialización del evento, como proceso de retroalimentación al personal, todo con el propósito de que no se vuelvan a presentar este tipo de eventos.

- Se cumplió con la entrega y uso de elementos de protección personal, en lo referente a casco, gafas, guantes de vaqueta, caucho, tapabocas, botas de seguridad y de caucho con puntera y uniforme.

- El personal que realiza trabajo en alturas, se retroalimento frente al tema, para prevención de AT, por caída de alturas, se verifica que el personal utilice los EPP para TS.A. de forma adecuada, tales como Arnés, Eslinga, Cascos, andamios certificados.

- Se realiza disposición final de tierra de excavación generada en obra, en escombrera Rebelo autorizada por la autoridad ambiental competente.

- Se realiza disposición final de residuos de esterilla generados en obra, en escombrera Rebelo autorizada por la autoridad ambiental competente.

- Consorcio BCS- Gutiérrez Cumple con la correcta disposición de residuos generados en obra a través de los gestores autorizados.

- Diariamente se realiza jornada de aseo al finalizar las actividades en obra.

- Se realiza aseo a baños cada ocho días, baños permanecen limpios, lavado de llantas para que permanezca la vía limpia.

- Se da cumplimiento a inspecciones de vehículo/maquinaria, botiquín, extintor, uso de epp, orden y aseo, equipos y herramientas, permiso de trabajo para actividades en alturas diariamente.

- Se da cumplimiento a lo establecido en procedimiento de vehículos con la verificación documental de SOAT, Revisión técnico mecánica, Licencia de

119

conducción, inspecciones al vehículo y mejora de los mismos

24. Se realizan los siguientes requerimientos en Seguridad y Salud en el trabajo al contratista:

- ✓ Seguir Manteniendo las áreas de circulación y rutas de evacuación limpias y despejadas.
- ✓ Completar las hojas de vida pendientes, como son las 2 del personal de cubierta, Metal B- S.A.S, personal de Eléctricos y demás personal que vaya ingresando.

LISTA DE ANEXOS ENVIADOS POR EL CONTRATISTAS

ANEXO 1. Capacitaciones
ANEXO 2. Charla semanal
ANEXO 3 Exámenes de ingreso
ANEXO 4. Exámenes de retiro
ANEXO 5. Inducciones
ANEXO 6. Inspecciones
ANEXO 7. Maquinaria
ANEXO 8. Planilla
ANEXO 9. Recomendaciones
ANEXO 10. Volquetas

Se anexa informe mensual del contratista, con los soporte de indicadores mensuales, de SST y MA. Establecidos hasta el momento.

ELABORÓ:

ROSA DEL MAR RODRIGUEZ G.
RESIDENTE SISOMA

170

INTERVENTORÍA DAIMCO S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO # 1 Verificación de uso de EPP





Uso de EPP T.S.A



 # 2. Delimitación de Áreas



REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATISTA

Foto 3. Charla Accidentes en Construcciones	Foto 4. Charla Condiciones y actos inseguros
	

Foto 5. Charla en Prevención accidentes T.A	Foto 6. Charla Seguridad de trabajo en alturas
	

Foto 7. Reunión mensual COPASST	Foto 8. Capacitación Manejo de herramientas
	

Foto 9. Capacitación Accidentes en construcciones	Foto 10. Capacitación en Identificación de actos condiciones inseguras
	

Foto 11. Jornada de Orden y Aseo	Foto 12. Jornada orden, aseo y limpieza
	

Foto 13. Recolección de Residuos Peligrosos	Foto 14. Recolección de residuos reciclables
	

Foto 14. Componentes de Elementos de Primeros Auxilios



Anexo No. 9 control de Equipos y Ensayos.

DAEWOO
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

EQUIPO DEL CONTRATISTA INT-41:01

PROYECTO: CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

PERIODO: 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

EQUIPO		(A)	(B)	(C) CLASE DE ACTIVIDAD EN CADA DIA																																
TIPO	MARCA -CAPACIDAD			MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES
		ORIGEN	ESTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	MINICARGADOR NEW HOLLAND	P	B								C 1.5	C 1.5	C 1.5								C 1.5			C 1.5	C 1.5	C 1.5	C 1.5	C 1.5	C 1.5		C 1.5	C 1.5	C 1.5	C 1.5
2	VOLQUETA DAEWOO-16565	P	B								C 1.5	C 1.5	C 1.5	C 1.5	C 1.5		C 1.5	C 1.5	C 1.5		C 1.5	C 1.5		C 1.5	C 1.5	C 1.5	C 1.5	C 1.5	C 1.5		C 1.5	C 1.5	C 1.5	C 1.5
3	VOLQUETA DAEWOO-16565	P	B								C 1.5	C 1.5	C 1.5	C 1.5	C 1.5		C 1.5	C 1.5	C 1.5		C 1.5	C 1.5		C 1.5	C 1.5	C 1.5	C 1.5	C 1.5	C 1.5		C 1.5	C 1.5	C 1.5	C 1.5
4	RETROEXCAVADORA	A	B																									C 1.5	C 1.5		C 1.5			
5	VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO CA-15 DYNAPAC	A	B									C.5	C.5	C.5				C.5						C.5	C.5	C.5	C.5	C.5	C.5		C.5	C.5	C.5	C.5
6	VOLQUETA SUBCONTRATISTA Javier Oswaldo Bolaños Placa: OYJ-223 8 Mtrs3																									C 1.5	C 1.5	C 1.5	C 1.5		C 1.5	C 1.5	C 1.5	C 1.5
7	VOLQUETA SUBCONTRATISTA Nelson Olmedo Montilla Placa: CIZ-640 8 Mtrs3																									C 1.5	C 1.5	C 1.5	C 1.5		C 1.5	C 1.5	C 1.5	C 1.5
	VOLQUETA SUBCONTRATISTA Aurelio Oswaldo Bolaños Placa: GUE-408 8 Mtrs3																									C 1.5	C 1.5	C 1.5	C 1.5		C 1.5	C 1.5	C 1.5	C 1.5

(A) ORIGEN
P- Propio
A- Alquilado
S- Sub-contratado

(B) ESTADO
B-Bueno
R-Regular
M-Malo

(C) CLASE DE ACTIVIDAD
1. Movilización y Desmovilización
2. Localización, Replanteo y Control Topográfico
3. Demolición General
4. Excavaciones
5. Relleno Material Seleccionado
6. Hincado de Pilotes
7. Concreto PSI
8. Acero de Refuerzo
9. Protección con Bolsacretos
10. Colchacretos

F.S. Fuera de Servicio
R. Reparación
D. Disponible

OBSERVACIONES

La Volqueta de Placas OYJ-223 , que labora desde el 23 de Enero- pertenece al Subcontratista Javier Oswaldo Bolaños; La Volqueta de Placas CIZ-640 pertenece al Subcontratista Nelson Olmedo Montilla; La Volqueta de Placas GUE-408 pertenece al Subcontratista Aurelio Oswaldo Bolaños.

ING. RESIDENTE

Elaboró SANDRA GUAUÑA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - TIRSO COSME

Aprobó

Ensayos

Citec Ltda.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
Popayán - Cauca

REGISTRO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	Código:	CT-RCC-0801
	Versión:	1
	Páginas:	1 de 1
NORMAS REFERENCIA: INV. E-401, E-402, E-403, E-404, E-410, E-412 NTC 673	Fecha Formato:	12-ene-2010

FECHA INFORME: 22-ene-19

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN.

SECTOR: COMANDO REGIÓN N°4 POLICIA NACIONAL CAUCA, POPAYÁN.

INTERVENTOR: DAIMCO

CONSTRUCTOR: CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

SOLICITÓ: DAIMCO

FECHA ENTRADA: 21-ene-19

ODS: 911

RESISTENCIA DE DISEÑO: 3000 PSI

ESTRUCTURA: VARIAS

Ref. N°	Fecha Toma	Fecha Rotura	Edad días	Perímetro cm	Carga Lb	Resistencia KN	Resistencia kg/cm²	Resistencia MPa	Resistencia PSI	Tipo Falla	% CUMPLIMIENTO RESISTENCIA	DETALLE OBRA
1	17-ene	21-ene	4	48.2	93732	368.3	203	19.9	2885	1	96%	CONCRETO ACELERADO
2	17-ene	14-feb	28									
3	17-ene	14-feb	28									

OBSERVACIONES: MUESTRAS INGRESADAS AL LABORATORIO POR EL INTERESADO

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: EXPEDIDO POR: *Rossemberg & Reingeniería S.A.S*

FECHA DE EXPEDICIÓN: VIGENCIA: 12-ene-19

LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO APLICAN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA INGRESADA Y PROCESADA EN LABORATORIO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DE CALIDAD DE CITEC Ltda.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Geot. Luis Carlos Ponce	Ing. Hugo Daza Delgado	

Citec Ltda.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
Popayán - Cauca

REGISTRO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO		Codigo:	CT-RCC-0801
		Versión:	1
		Páginas:	1 de 1
NORMA REFERENCIA:	INV. E-401, E-402, E-403, E-404, E-410, E-412 MTC 673	Fecha Formato:	12-ene-2010

FECHA INFORME: 28-ene-19
OBRA: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN.
SECTOR: COMANDO REGIÓN N°4 POLICÍA NACIONAL CAUCA, POPAYÁN.
INTERVENTOR: DAIMCO
CONSTRUCTOR: CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
SOLICITÓ: DAIMCO
FECHA ENTRADA: 11-ene-19
ODS: 894

RESISTENCIA DE DISEÑO: 3000 PSI
ESTRUCTURA: VARIAS

Ref. Nº	Fecha Toma	Fecha Rotura	Edad días	Perímetro cm	Carga	Resistencia				Tipo Falla	% CUMPLIMIENTO RESISTENCIA	DETALLE OBRA
					Lb	kN	kg/cm²	MPa	PSI			
1	17-dic	14-ene	28	48.4	58077	228.2	125	12.2	1773	1	59%	SOLADO TANQUE
2	17-dic	14-ene	28	48.3	61971	243.5	134	13.1	1899	1	63%	
3	17-dic	11-feb	56								0%	
4	18-dic	15-ene	28	48.4	140891	553.6	303	29.7	4300	2	143%	VIGA CUBIERTA PATRULLEROS
5	18-dic	15-ene	28	48.4	140306	551.3	302	29.5	4282	2	143%	
6	18-dic	12-feb	56								0%	
7	20-dic	17-ene	28	48.4	114958	451.7	247	24.2	3509	1	117%	COLUMNA 2do PISO B3
8	20-dic	17-ene	28	48.4	119564	469.8	257	25.2	3649	1	122%	
9	20-dic	14-feb	56								0%	
10	21-dic	18-ene	28	48.4	141085	554.4	303	29.7	4306	2	144%	VIGAS COLUMNA PATRULLEROS
11	21-dic	18-ene	28	48.4	141477	555.9	304	29.8	4318	2	144%	
12	21-dic	15-feb	56								0%	
13	22-dic	19-ene	28	48.3	140688	552.8	304	29.7	4312	2	144%	COLUMNAS SUB OFICIALES
14	22-dic	19-ene	28	48.4	140077	550.4	301	29.5	4275	2	143%	
15	22-dic	16-feb	56								0%	
16	28-dic	25-ene	28	48.3	100069	393.2	216	21.2	3067	1	102%	PLACAS CONTRAPISO COLUMNAS SUB OAFICIALES
17	28-dic	25-ene	28	48.4	103073	405.0	222	21.7	3146	1	105%	
18	28-dic	22-feb	56								0%	

OBSERVACIONES: MUESTRAS INGRESADAS AL LABORATORIO POR EL INTERESADO

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: EXPEDIDO POR: Rossemberg & Raingeniería S.A.S
FECHA DE EXPEDICIÓN: VIGENCIA: 31-ene-19

LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO APLICAN UNICAMENTE A LA MUESTRA INGRESADA Y PROCESADA EN LABORATORIO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DE CALIDAD DE CITEC Ltda.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Geot. Luis Carlos Ponce	Ing. Hugo Daza Delgado	

Citec Ltda.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
Popayán - Cauca

REGISTRO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO												Código:	CT-ROC-0801
												Versión:	1
												Páginas:	1 de 1
NORMAS REFERENCIA:	INV. E-401, E-402, E-403, E-404, E-410, E-412						NTC-673					Fecha Formato:	12-ene-2010

FECHA INFORME: 22-ene-19
OBRA: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN.
SECTOR: COMANDO REGIÓN N°4 POLICIA NACIONAL CAUCA, POPAYÁN.
INTERVENTOR: DAIMCO
CONSTRUCTOR: CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
SOLICITÓ: DAIMCO
FECHA ENTRADA: 21-ene-19
ODS: 911

RESISTENCIA DE DISEÑO: 3000 PSI
ESTRUCTURA: VARIAS

Ref. N°	Fecha Toma	Fecha Rotura	Edad días	Perimetro cm	Carga Resistencia Lb	Carga Resistencia KN	Carga Resistencia kg/cm²	Carga Resistencia MPa	Carga Resistencia PSI	Tipo Falla	% CUMPLIMIENTO RESISTENCIA	DETALLE OBRA
1	17-ene	21-ene	4	48.2	93732	368.3	203	19.9	2885	1	96%	CONCRETO ACELERADO
2	17-ene	14-feb	28									
3	17-ene	14-feb	28									

OBSERVACIONES: MUESTRAS INGRESADAS AL LABORATORIO POR EL INTERESADO

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°: EXPEDIDO POR: Rossemberg & Reingeniería S.A.S
FECHA DE EXPEDICIÓN: VIGENCIA: 31-ene-19

LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO APLICAN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA INGRESADA Y PROCESADA EN LABORATORIO.
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DE CALIDAD DE CITEC Ltda.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Geot. Luis Carlos Ponce	Ing. Hugo Daza Delgado	

Citec Ltda.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
Popayán - Cauca

REGISTRO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO			Código:	CT-RCC-C801
			Versión:	1
			Páginas:	1 de 1
NORMA S REFERENCIA:	INV. E-401, E-402, E-403, E-404, E-410, E-412	NTC 673	Fecha Formato:	12-ene-2010

FECHA INFORME: 14-ene-19
OBRA: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN.
SECTOR: COMANDO REGIÓN N°4 POLICIA NACIONAL CAUCA, POPAYÁN.
INTERVENTOR: DAIMCO
CONSTRUCTOR: CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
SOLICITÓ: DAIMCO
FECHA ENTRADA: 01-dic-18
ODS: 369

RESISTENCIA DE DISEÑO: 3000 PSI
ESTRUCTURA: VARIAS

Ref. N°	Fecha Toma	Fecha Rotura	Edad días	Perímetro cm	Carga	Resistencia				Tipo	% CUMPLIMIENTO	DETALLE OBRA
					Lb	KN	kg/cm²	MPa	PSI	Falla	RESISTENCIA	
1	16-nov	01-dic	15	48.1	69962	274.9	152	14.9	2162	1	72%	LOSA CIMENTACION OFICIALES
2	16-nov	14-dic	28	48.4	112336	441.4	241	23.8	3429	1	114%	
3	16-nov	14-dic	28	48.6	95208	374.1	203	19.9	2882	1	96%	
4	16-nov	11-ene	56	48.6	122465	481.2	261	25.6	3707	1	124%	
5	19-nov	03-dic	14	48.0	67875	266.7	148	14.5	2106	1	70%	ENTREPISO PATRULLEROS
6	19-nov	17-dic	28	46.8	127428	500.7	293	28.7	4160	1	139%	
7	19-nov	17-dic	28	46.8	128217	503.8	295	28.9	4185	1	140%	
8	20-nov	04-dic	14	47.7	71336	280.3	158	15.5	2242	1	75%	LOSA ENTREPISO PATRULLEROS EJE A-B 7-14
9	20-nov	18-dic	28	46.6	95794	376.4	220	21.6	3127	1	104%	
10	20-nov	18-dic	28	46.8	101113	397.3	232	22.8	3301	1	110%	
11	22-nov	06-dic	14	48.1	76477	300.5	166	16.3	2363	1	79%	COLUMNAS OFICIALES
12	22-nov	20-dic	28	48.3	79455	312.2	171	16.8	2435	1	81%	
13	22-nov	20-dic	28	48.3	83858	329.5	181	17.7	2570	1	86%	
14	27-nov	04-dic	7	47.9	69224	272.0	152	14.9	2157	1	72%	COLUMNAS OFICIALES
15	27-nov	25-dic	28	48.0	97041	381.3	212	20.8	3011	1	100%	
16	27-nov	25-dic	28	48.0	99433	390.7	217	21.3	3086	1	103%	

OBSERVACIONES: MUESTRAS INGRESADAS AL LABORATORIO POR EL INTERESADO

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°:
FECHA DE EXPEDICIÓN:
EXPEDIDO POR: Rossemberg & Raingeniaria S.A.S
VIGENCIA: 31-ene-19

LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO APLICAN UNICAMENTE A LA MUESTRA INGRESADA Y PROCESADA EN LABORATORIO.
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DE CALIDAD DE CITEC Ltda.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Gebt. Luis Carlos Ponce	Ing. Hugo Deza Delgado	

vias95@hotmail.com www.citec.com.co Telefono: 8366256 Cel:310 8393670 - 301 3368684

182

Citec Ltda.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
Popayán - Cauca

REGISTRO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	Codigo:	CT-RCC-CED1
	Versión:	1
	Páginas:	1 de 1
NORMAS REFERENCIA: INV E-401, E-402, E-403, E-404, E-410, E-412 NTC 673	Fecha Formato:	12-ene-2010

FECHA INFORME: 08-ene-19

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN.

SECTOR: COMANDO REGIÓN N°4 POLICIA NACIONAL CAUCA, POPAYÁN.

INTERVENTOR: DAIMCO

CONSTRUCTOR: CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

SOLICITÓ: DAIMCO

FECHA ENTRADA: 01-dic-18

ODS: 869

RESISTENCIA DE DISEÑO: 3000 PSI

ESTRUCTURA: VARIAS

Ref. N°	Fecha Toma	Fecha Rotura	Edad días	Perimetro cm	Carga Lb	Resistencia kN	kg/cm²	MPa	PSI	Tipo Falla	% CUMPLIMIENTO RESISTENCIA	DETALLE OBRA
16	27-nov	04-dic	7	47.6	64083	251.6	141	13.8	2006	1	67%	COLUMNAS PATRULLEROS
17	27-nov	25-dic	28	48.0	98033	385.2	214	21.0	3042	1	101%	
18	27-nov	25-dic	28	48.0	98695	387.8	216	21.1	3063	1	102%	
19	29-nov	06-dic	7	47.5	77724	305.4	173	17.0	2463	1	82%	COLUMNAS PATRULLEROS
20	29-nov	27-dic	28	48.0	105821	415.8	231	22.6	3284	1	109%	
21	29-nov	27-dic	28	48.0	110097	432.6	241	23.6	3416	1	114%	
22	30-nov	07-dic	7	48.0	62276	244.7	136	13.3	1933	1	64%	CUBIERTA VIGAS Y LOSA
23	30-nov	28-dic	28	48.5	106305	417.7	228	22.3	3231	1	108%	
24	30-nov	28-dic	28	48.4	107603	422.8	231	22.7	3284	1	109%	
25	30-nov	07-dic	7	48.0	60317	237.0	132	12.9	1872	1	62%	COLUMNAS PATRULLEROS
26	30-nov	28-dic	28	48.4	127326	500.3	274	26.8	3886	2	130%	
27	30-nov	28-dic	28	48.4	128446	504.7	276	27.0	3920	2	131%	

OBSERVACIONES: MUESTRAS INGRESADAS AL LABORATORIO POR EL INTERESADO

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: EXPEDIDO POR: Rossemberg & Ruingeniería S.A.S

FECHA DE EXPEDICIÓN: VIGENCIA: 31-ene-19

LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO APLICAN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA INGRESADA Y PROCESADA EN LABORATORIO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DE CALIDAD DE CITEC Ltda.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Dept. Luis Carlos Ponce	Ing. Hugo Daza Delgado	

Citec Ltda.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
Popayán - Cauca

REGISTRO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO		Código:	CT-ROC-0801
		Versión:	1
		Páginas:	1 de 1
NORMAS REFERENCIA:	INV. E-401, E-402, E-403, E-404, E-410, E-412 NTC 673	Fecha Formato:	12-ene-2010

FECHA INFORME: *16-ene-19*

OBRA: *CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN*

SECTOR: *COMANDO REGIÓN N°4 POLICIA NACIONAL CAUCA, POPAYÁN.*

INTERVENTOR: *DAIMCO*

CONSTRUCTOR: *CONSORCIO BCS-GUTIERREZ*

SOLICITÓ: *DAIMCO*

FECHA ENTRADA: *17-dic-18*

ODS: 877

RESISTENCIA DE DISEÑO: 3000 *P si*

ESTRUCTURA: VARIAS

Ref. N°	Fecha Toma	Fecha Rotura	Edad días	Perímetro cm	Carga	Resistencia				Tipo Falla	% CUMPLIMIENTO RESISTENCIA	DETALLE OBRA
					Lb	KN	kg/cm²	MPa	PSI			
1	03-dic	17-dic	14	48.0	79786	313.5	174	17.1	2476	1	83%	COLUMNAS PATRULLEROS 2do PISO Geoacopio
2	03-dic	31-dic	28	48.4	100426	394.6	216	21.1	3065	1	102%	
3	03-dic	31-dic	28	48.4	99128	389.5	213	20.9	3025	1	101%	
4	11-dic	18-dic	7	47.7	63523	249.6	141	13.8	1996	1	67%	LOSA Y VIGAS CUBIERTA SUB ESTACION
5	11-dic	08-ene	28	48.3	99433	390.7	215	21.0	3047	1	102%	
6	11-dic	08-ene	28	48.6	103785	407.8	221	21.7	3142	1	105%	
7	14-dic	21-dic	7	47.9	65254	256.4	143	14.0	2033	1	68%	LOSA ENTREPISO OFICIALES
8	14-dic	11-ene	28	48.6	105694	415.3	225	22.1	3199	1	107%	
9	14-dic	11-ene	28	48.5	102971	404.6	220	21.6	3130	1	104%	

OBSERVACIONES: MUESTRAS INGRESADAS AL LABORATORIO POR EL INTERESADO

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°: EXPEDIDO POR: *Rosaemberg & Raingeniería S.A.S*

FECHA DE EXPEDICIÓN: VIGENCIA: *31-ene-19*

LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO APLICAN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA INGRESADA Y PROCESADA EN LABORATORIO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DE CALIDAD DE CITEC Ltda.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Geot. Juan Carlos Ponce	Ing. Hugo Daza Delgado	

Anexo No. 10 Registro Fotográfico

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:08

POLICIA NACIONAL

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CÓDIGO: **PROYECTO:** 06-6-10044-18
Donde POPAYAN - CAUCA
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES: ene-19

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Foto No. 1 Fecha: 04-01-2019

DETALLE DE MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE PATRULLEROS



Foto No.3 Fecha: 08-01-2019

DETALLE DE CULATAS EN MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE EN SUBESTACION



Foto No.2 Fecha: 08-01-2019

DETALLE DE ARMADO DE HIERRO EN COLUMNETA DE CONFINACION



Foto No. 4 Fecha: 08-01-2019

DETALLE DE CULATAS EN BLOQUE DE PATRULLEROS



Foto No.5 Fecha: 09-01-2019

DETALLE DE ARMADO DE HIERRO DE CUBIERTA EN BLOQUE DE OFICIALES

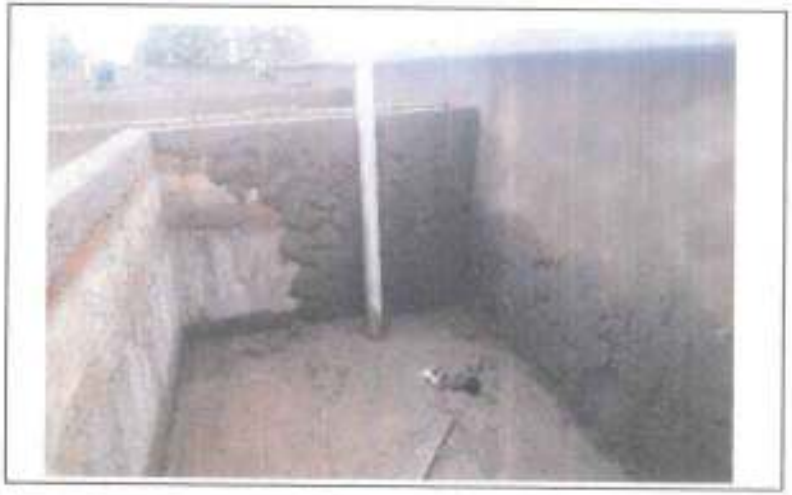


Foto No.6 Fecha: 09-01-2019

DETALLE DE REPELLO EXTERIOR EN CULATAS EN BLOQUE DE PATRULLEROS



Foto No.7 Fecha: 10-01-2019

DETALLE DE REPELLOS EXTERIORES EN CASINO



Foto No.8 Fecha: 11-01-2019

DETALLE DE ALFAJIAS EN CASINO



Foto No.9 Fecha: 12-01-2019

DETALLE DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE EN BLOQUE DE PATRULLEROS



Foto No.10 Fecha: 12-01-2019

DETALLE DE RELLENO EN RECEBO COMUN EN AREAS EXTERIORES BLOQUE PATRULLEROS



Foto No.11 Fecha: 15-01-2019

DETALLE DE DE CORDON DE SOLDADURA EN LA PERLINERIA DE CUBIERTA



Foto No.12 Fecha: 10-01-2019

DETALLE DE INSTALACIONES ELECTRICAS



Foto No.13 Fecha: 16-01-2019

DETALLE DE CASINO SIN INTERVENIR



Foto No.14 Fecha: 16-01-2019

DETALLE DE ARMADO DE VIGAS Y LOSA DE CUBIERTA LISTA PARA FUNDIR



Foto No.15 Fecha: 17-01-2019

DETALLE DE FUNDICION DE VIGAS Y LOSA DE CUBIERTA



Foto No.16 Fecha: 16-01-2019

DETALLE DE MAMPOSTERIA EN BLOQUE EN AREA DE PATRULLEROS SEGUNDO PISO



Foto No.17 Fecha: 21-01-2019

DETALLE DE ARMADO DE HIERRO E INSTALACION DE CINTA PVC EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO



Foto No.18 Fecha: 23-01-2019

DETALLE DE MAMPOSTERIA EN BLOQUE Y TOLETE EN AREA DE OFICIALES PRIMER PISO



Foto No.19 Fecha: 22-01-2019

DETALLE DE ESTRUCTURA METALICA EN CASINO



Foto No.20 Fecha: 23-01-2019

DETALLE DE CULATAS EN LADRILLO TOLETE EN BLOQUE DE OFICIALES

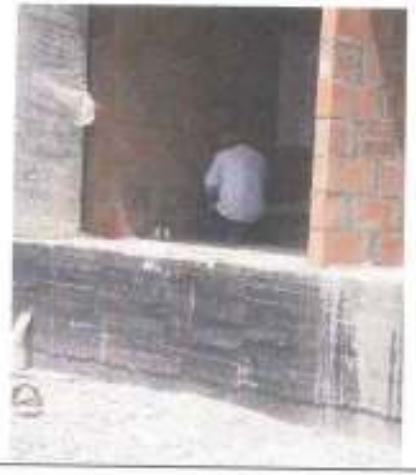


Foto No.21 Fecha: 23-01-2019

DETALLE DE TRABAJOS ELECTRICOS EN MUROS



Foto No.22 Fecha:23-01-2019

DETALLE DE FUNDICION DE LOSA INFERIOR Y Y H/3 DEL MURO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO



Foto No.23 Fecha: 23-01-2019

DETALLE DE PAÑETE INTERNO EN MUROS DE SUBESTACION



Foto No.24 Fecha:23-01-2019

DETALLE DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN BLOQUE DE OFICIALES



Foto No.25 Fecha: 28-01-2019

DETALLE DE INSTALACION DE UBERIA DE AGUAS LLUVIAS EN BLOQUE DE PATRULLEROS



Foto No.26 Fecha: 28-01-2019

DETALLE DE FUNDICION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO



Foto No.27 Fecha: 28-01-2019

DETALLE DE CERRAMIENTO EN AREA DE INTERVENCION TANQUE RCI



Foto No.28 Fecha: 31-01-2019

DETALLE DE DESCAPOTE EN AREA DE INTERVENCION PARA TANQUE RCI



Foto No.29 Fecha: 31-01-2019

DETALLE DE RELLENO EN RECEBO COMUN EN AREA ENTRE BLOQUES PATRULLERO, OFICILES Y CASINO



Foto No.30 Fecha: 2019

DETALLE GENERAL DE OBRA



Foto No.31 Fecha: 2019

DETALLE GENERAL DE OBRA



Foto No.32 Fecha: 2019

DETALLE GENERAL DE OBRA

Anexo No. 11 Control de Clima

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

CONTROL ATMOSFÉRICO INT-39:00

PROYECTO: CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

CONSOLIDADO DEL PERIODO

MES	ENERO																															TOTALES
ESTADO DEL TIEMPO	MA	MI	J	V	S	D	L	MA	MI	J	V	S	D	L	MA	MI	J	V	S	D	L	MA	MI	J	V	S	D	L	MA	MI	J	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
DIA SOLEADO	1	1	0,9	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,9	1	0,6	1	1	1	30
DIA NUBLADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LLUVIA	0	0	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0,4	0	0	0	7
TOTAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31
ESTADO DEL SUELO	S																															

Nota: Estado del Suelo Seco (S), Saturado (ST), Inundado (I)

OBSERVACIONES

ING. RESIDENTE

Elaboró SANDRA GUAUÑA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - TIRSO COSME

Aprobó

NOTAS

(1) INFORMACION RELACIONADA EN EL INFORME DIARIO DE INSPECCION INT-8:00

(2) CONTINÚE AL RESPALDO SI REQUIERE DE MAYOR ESPACIO

Anexo No. 12 Bitácora de Obra

Scanned by CamScanner

[redacted]

EL CONTRATISTA REITERA LA PRECEDENTE
PETICION. HACE VARIAS SEMANAS SE
RECIBIERON LA FACTA DE DEFINI-
CION RESPECTO A LOS DIAMETROS DE
LOS PASAMUROS PARA LAS TUBERIAS
DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE
AGUA. ESTO GENERA QUE POR LA
EXTENSION DE PLAZOS EL CONTRATO SE
VEA AFECTADO PARA REALIZAR
[redacted]

Scanned by CamScanner

TOS QUE PRESENTA LOS RESIDENTES DE OBRA [illegible].

FUE NECESARIO INICIAR EL RETIRO DE LA TORNAMESA QUE YA SE HABIA INSTALADO DE ACUERDO CON LA APROBACION DEL COMITE INTERNO DE OBRA Y QUE ESTABA POSICIONADA PARA INSTALAR LA CINTA A 15 MM DEL NIVEL DEL FONDO DEL TANQUE, DEBIDO A LA REFERENTE COMUNICACION RECIBIDA, SUMINISTRADA POR LA INTERVENTORIA.

+ SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE EN LOS DIFERENTES FRENTES DE EJECUCION DE OBRA, HIERROS, CONCRETOS, MAMPOSTERIAS, PAREDES, COLUMNETAS, VIGUETAS, ETC, ETC.









JUEVES 3 ENERO/2019

EL CONTRATISTA SOLICITA NUEVAMENTE A LA INTERVENTORIA POR FAVOR NOS DESCUENTEN EL JUNTERO DE LAS PARAVEDS DE LA PERICION FINAL DE LA CINTA PUES [illegible] DE AVANCE DE ALMACENAMIENTO [illegible] ESTA PARTE DE LA CIMENTACION


Scanned by CamScanner

TIENE RETRAZADA LA FUNDICION DE LA LOSA DE FONDO DEL TANQUE. EL CONTRATISTA ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DONDE SE OBSERVAN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE ESTAN EJECUTANDO.





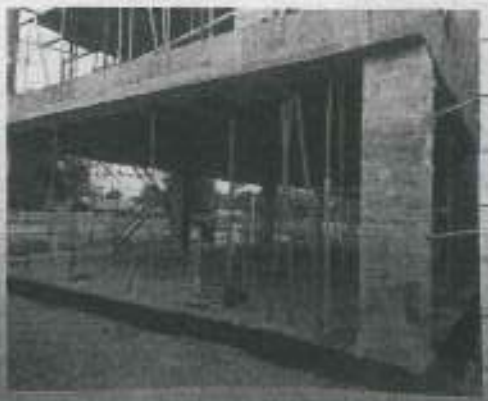

Scanned by CamScanner






- Personal de obra: Personal administrativo. Conserje BU: 6 técnicos (1 operador, 2 capataces, 1 almacenero, 2 ayudantes); Subcontratista Obras (2 operador); Conserje BU estructura (4 operador, 2 maquetistas); Subcontratista vidrio (2 operador + ayudante); Subcontratista Arquitectura (2 ayudante); Subcontratista Obra civil (2 ayudante)
- Personal de restaurante: Personal administrativo,
- Obra Mañana: Soldado Tarde: Soldado
- Equipo: —
- Elementos de seguridad industrial: Casco Botas, Guantes, Chalecos, Lentes, Tapabocas, Tapabocas
- Actividades Ejecutadas:
  - Mano Obra No 5 (Obra de petrolera y en Obra de casa)
  - Andaje en concreto con equipos de 1/2" y 3/4" (Salida en Obra de petrolera)
  - Cod de agregados en concreto (arcilla expansiva) (en salida en Obra de petrolera)
  - Pared bloque arcilla (incluye pega y dilataciones) (en Obra de casa) y Mano en tabique en abertura
- Observaciones:
  - Se quedo computador en Obra en almacen de petrolera y casa


Scanned by CamScanner

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

Ing Saul J. Leon P.
Fiscalizador

VIERNES 4 ENERO/2019

+ EL CONTRATISTA REITERA QUE AUN NO SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA PRESENTADA EN REFERENCIA A LOS PASAMUROS Y POSICION DE LA CINTA PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.
DE IGUAL MANERA SE REITERA LA SOLICITUD PARA QUE NOS SUMINISTREN LOS PLANOS CORREGIDOS DEL TANQUE ELI YA QUE LOS ESTRUCTURALES EXISTENTES NO TIENEN LOS DETALLES COMPLETOS DE CARGAMENTO FOSO PASAMUROS.
EL CONTRATISTA AVANZA EN ACTIVIDADES NO LAS OBSERVADAS EN ESTE REGISTRO FOTOGRAFICO.

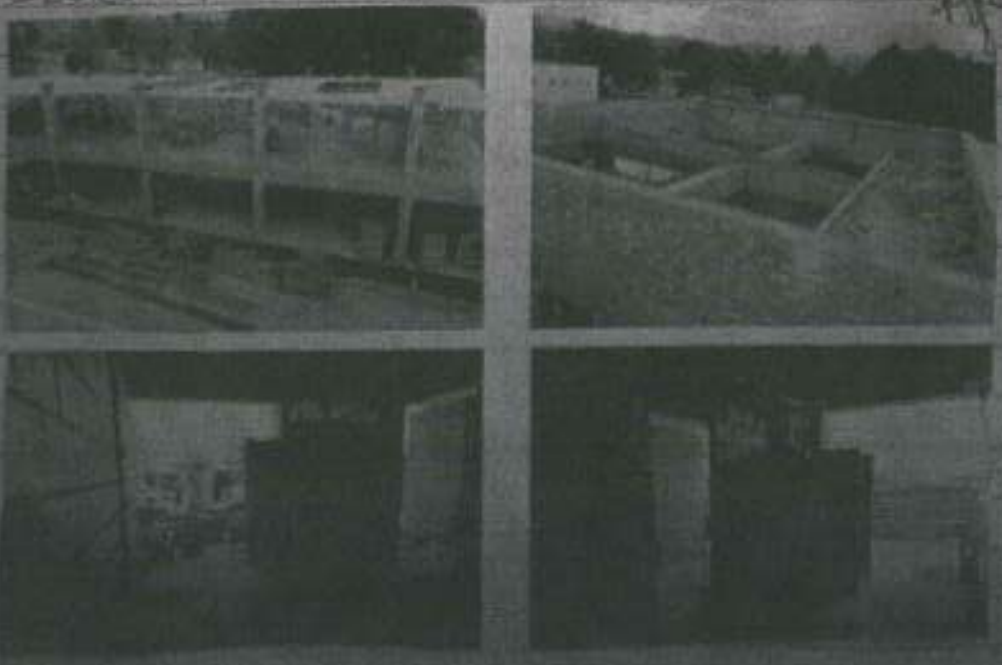

Scanned by CamScanner

[redacted]

Scanned by CamScanner

[illegible] a standard por la rejilla existente
[illegible] alcantarillado sobre la acera a la [illegible]
[illegible] por [illegible] se deja la solicitud que [illegible] (6)
[illegible] tiempo de [illegible] del tramo [illegible] de la
[illegible] que [illegible] la canalización,

Muy [illegible] y bien
[illegible]

SABADO 5 ENERO/2019 - DIA CIVICO.

EL CONTRATISTA ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE ALGUNOS DE LOS AVANCE QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LAMPISTERIA EN LOS DIFERENTES BLOQUES. HAC






EL CONTRATISTA CONTINUA A LA ESPERA LE DEFINAN EL DIAMETRO DE LOS PASOS EN LA ZONA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.

SOLICITAMOS POR FAVOR NOS DEFINAN LA POSICION DEL TANQUE ROI

Scanned by CamScanner

DOMINGO 6 ENERO/2019 -
EL PERSONAL DE OBRA SE PRESENTA HOY A LABORAR Y AVANZAN PRINCIPALMENTE EN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA MAMPOSTERIA DE LOS BLOQUES PATRULLEROS, CASINO Y SUBESTACION.












Scanned by CamScanner

LUNES FESTIVO 7 ENERO /2019

DURANTE LA JORNADA DE HOY EL PERSONAL REALIZA MAMPOSTERIA, COLUMNETAS, CINTAS ALFAJIA, CULATAS, HUECOS EN LADRILLO TOLETE HECHO.













Scanned by CamScanner

SE AVANZA EN PAÑETES DE MUROS INTERNOS Y CULATAS.
CONTINUA LA INSTALACION DE FORMALETA PARA VIGAS Y LOSA DE CUBIERTA DEL BLOQUE OFICIALES Y SUBOFICIALES.

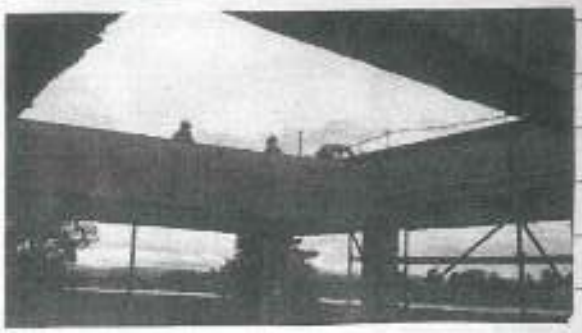

EL CONTRATISTA CONTINUA A LA ESPERA LE DEFINAN EL NIVEL DE INSTALACION DE LA CINTA PVC 0.20 EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y EL DIAMETRO PARA LOS PASAMUROS QUE VAN EN EL T.A. CONSORCIO BGS-GUTIERREZ.

MARTES 8 ENERO/2019.

SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES EN EJECUCION DURANTE EL DIA DE HOY.




Scanned by CamScanner










EL CONTRATISTA NUEVAMENTE REITERA QUE NO HA PODIDO FUNDIR LA LOSA DE FONDO DEL TANQUE PORQUE NECESITA QUE SE LE DEFINA EL DIAMETRO DE LOS PASAMUROS PARA HACERLOS FABRICAR. ESTO GENERA ATRAZO EN LA EJECUCION DE ESTA ACTIVIDAD EL CUAL NO ES IMPUTABLE A NOSOTROS. ACC.

SEGUIMOS ADEMAS EN ESPERA DE LOS PLANOS COMPLETOS DEL TANQUE REI- ACC.

CONSORCIO POS-CUTIMBO

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

entregar áreas terminadas para la ejecución de pruebas
- Se presentaron ahora al finalizar la tarde.
Inge Saul & Inge P
Estudiantes

Miercoles 9 de (07) Enero de 2019

- Personal de obra: Personal administrativo, Contratistas externos (2 conductores, 2 inspectores, 1 almacenista, 2 ayudantes, 1 operador (5 oficiales y 12 ayudantes respectivos); Subcontratista Pinino (4 oficiales, 4 ayudantes); Subcontratista Arcida (Subcontratista Ubral (4 ayudantes, 4 oficiales); 2 laboratorio concreto
- Personal de interventoría: Personal administrativo
- Clima: Mañana: Nublado Tarde Soleado
- Equipo: Volqueta (2), Minicargador (1), Retroexcavadora (1) Vibrocompactador (1)
- Elementos de seguridad industrial (casco, botas, Guantes, chaleco, Pantalón, Tapabocas, Uniforme.

- Actividades Ejecutadas:
  - Hierro de refuerzo figurado de 4000 psi (Llega de oficiales)
  - Muro Llega bajo Nivel (Llega de patrulleros)
  - Muro en ladrillo tolete 20x12x6 (muro retención)
  - Muro en ladrillo tolete 20x12x6 (relleno en Llega de patrulleros)
  - Anclaje en concreto con epoxico de 1/2", 3/4" (relleno en Llega de patrulleros)
  - Columneta de confinación en concreto (incluye apuntalamiento) (en Llega de camino)
  - Viga de confinación en concreto (incluye apuntalamiento) (relleno en Llega de patrulleros)
  - Alfajías concreto a la vista (sobre relleno en Llega de patrulleros)
  - Pañete bajo muro 1:4 (incluye filos y dilataciones) (Llega de camino)
  - Pañete bajo muros 1:4 (incluye filos y dilataciones (en relleno en Llega de patrulleros)
- Observaciones:
  - La grúa ingresa en Llega en el área de patrulleros


Scanned by CamScanner


211

- Se gira inspectora en lado este en Hoja de pendiente y en muro en edificación.
- Se gira columnetas, dinteles y alfajías en obra en Hoja de pendiente.
- Se (Gira) solicita al Contratista realizar curado en área donde ya se ejecutó actividad, como también asegurar las áreas antes que el personal inicie labores.
- Se realiza pruebas en muro de edificación
- Se realiza el armado de barras de viga de cubierta en Hoja de pendiente
- Se solicita al Contratista formaletas muro con sus columnetas y dinteles ya que se obtuvo el área de curado en proceso.
- Se solicita al Contratista nuevamente la fachada sacar los planos sobre la cara externa.
- Se entrega por parte de la constructora expediente de pruebas en tanque de almacenamiento, Inspección ya se remitió al Contratista

Ing Sol de Luna P.
Interventora

PLANO CON PASAMUROS POR DEFINIR ¿

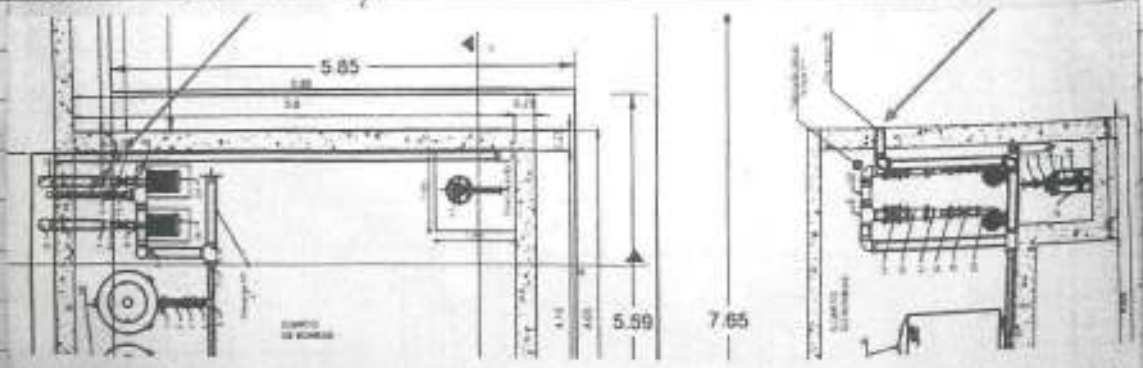

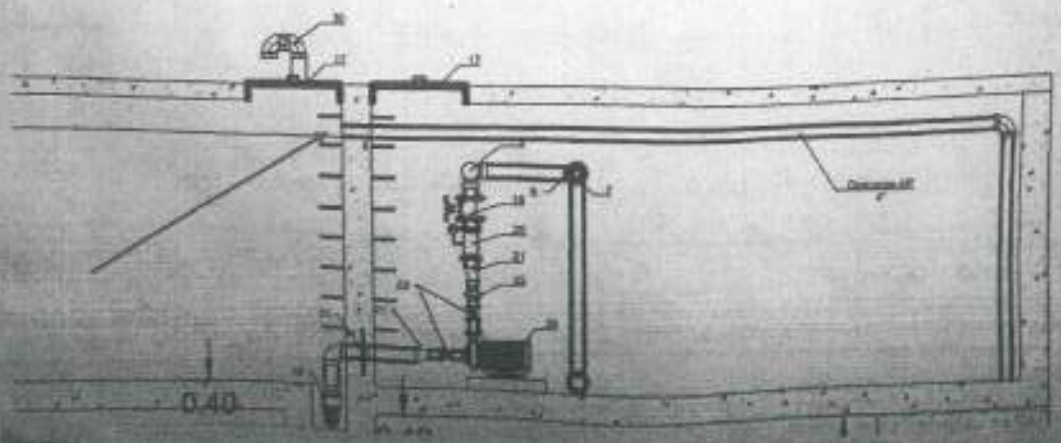


Scanned by CamScanner

EL CONTRATISTA HACE EVIDENCIA QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA POR LA CONSULTORIA CONTINUA SIENDO INCOMPLETA YA QUE SOLO SE HABLA DEL ELEMENTO MARCADO COMO #11, PERO COMO SE OBSERVA EN EL PLANO ADJUNTO EN EL FOLIO 86 HAY 3 PASAMUROS MAS EN EL TANQUE DE LOS CUALES SE REQUIERE LA ESPECIFICACION COMPLETA. SEGUIMOS A LA ESPERA QUE NOS SUMINISTREEN LOS DETALLES CLAROS Y COMPLETOS DE LA TOTALIDAD DE PASAMUROS QUE VAN EN EL TANQUE.

EN REFERENCIA A LA TUBERIA DE VENTILACION UBICADA EN LA TAPA DEL TANQUE, EN EL PLANO ESTRUCTURAL E-02. HAY UNA INCONSISTENCIA EN LA PLANTA DE LA CUBIERTA APARECE EN 6" (MIRAR CIRCULO ROJO) Y EN EL DETALLE APARECE EN 4", NO ACLARAN EL MATERIAL Y ADEMAS EN EL MISMO PLANO (MIRAR CIRCULO VERDE) INDICA " USAR DOS Ø #5 SOLDADOS AL TUBO L=60CM." PERO NO HAY UNA PLANTA QUE ACLARE ESTE DETALLE.

EN EL DETALLE DEL PASE TUBERIA Ø6" NO ACLARA LA DIMENSION DE LA BRIDA. (MIRAR CIRCULO AZUL)

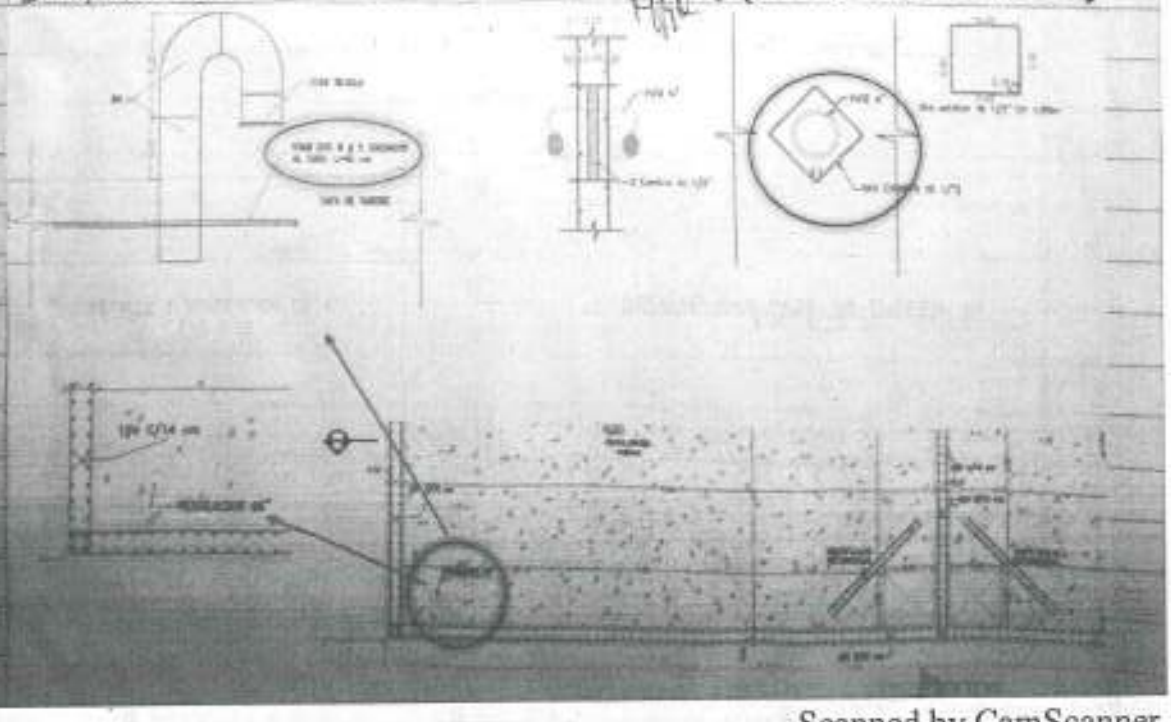

Scanned by CamScanner

EL CONTRATISTA ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DONDE SE OBSERVA AVANCE EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO. RELLENOS PERIMETRALES, ELABORACION CUNETAS, INSTALACION MALLA GALLINERO, MUROS EN LADRILLO TOLETE, FORMALETA VIGAS y LOSA CUBIERTA, PANETES, FORMALETA MUROS TIA,










Scanned by CamScanner

INSTALACION ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, APUNTALADO Y FUNDICION ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, BANCOS LATERALES, CANALES DES-GUTIERRES.







Jueves 10 de Enero de 2018

- Personal de obra: Personal administrativo, Cuerpo Des-Gutierrez (1 capataz, 2 carpinteros, 2 ayudantes), 5 oficiales carpintero, 12 ayudantes carpintero); Subcontrato Civil (1 capataz, 2 ayudantes); Subcontrato Madera (2 oficiales, 2 ayudantes); Subcontrato otros (Soldadores, Electricistas)
- Personal de intervención: Personal administrativo.
- Clima: Mañana: Soleado Tarde: (1-4:00) P.M. Soleado (4:00-5) P.M. Lluvia.
- Equipo: Soldadora (2), Miniesmeriladora (1), Retroexcavadora Montes (1), Vibrocompactador (1)
- Elementos de seguridad industrial: Casco, Botas, Guantes, Chaleco, Tapaoidos, Tapabocas, Gafas.
- Actividades Ejecutadas:
  - Relleno en recebo común compactado el 95% del protocolo del puente modificado de acuerdo con el estudio de suelos (subpresupuesto)
  - Armada de refuerzo figurado de caja #21 (subida en hoja de registro).
  - Mon. Hoja Loc. No. 5 (Hoja 1 protocolo)

Firma

Scanned by CamScanner

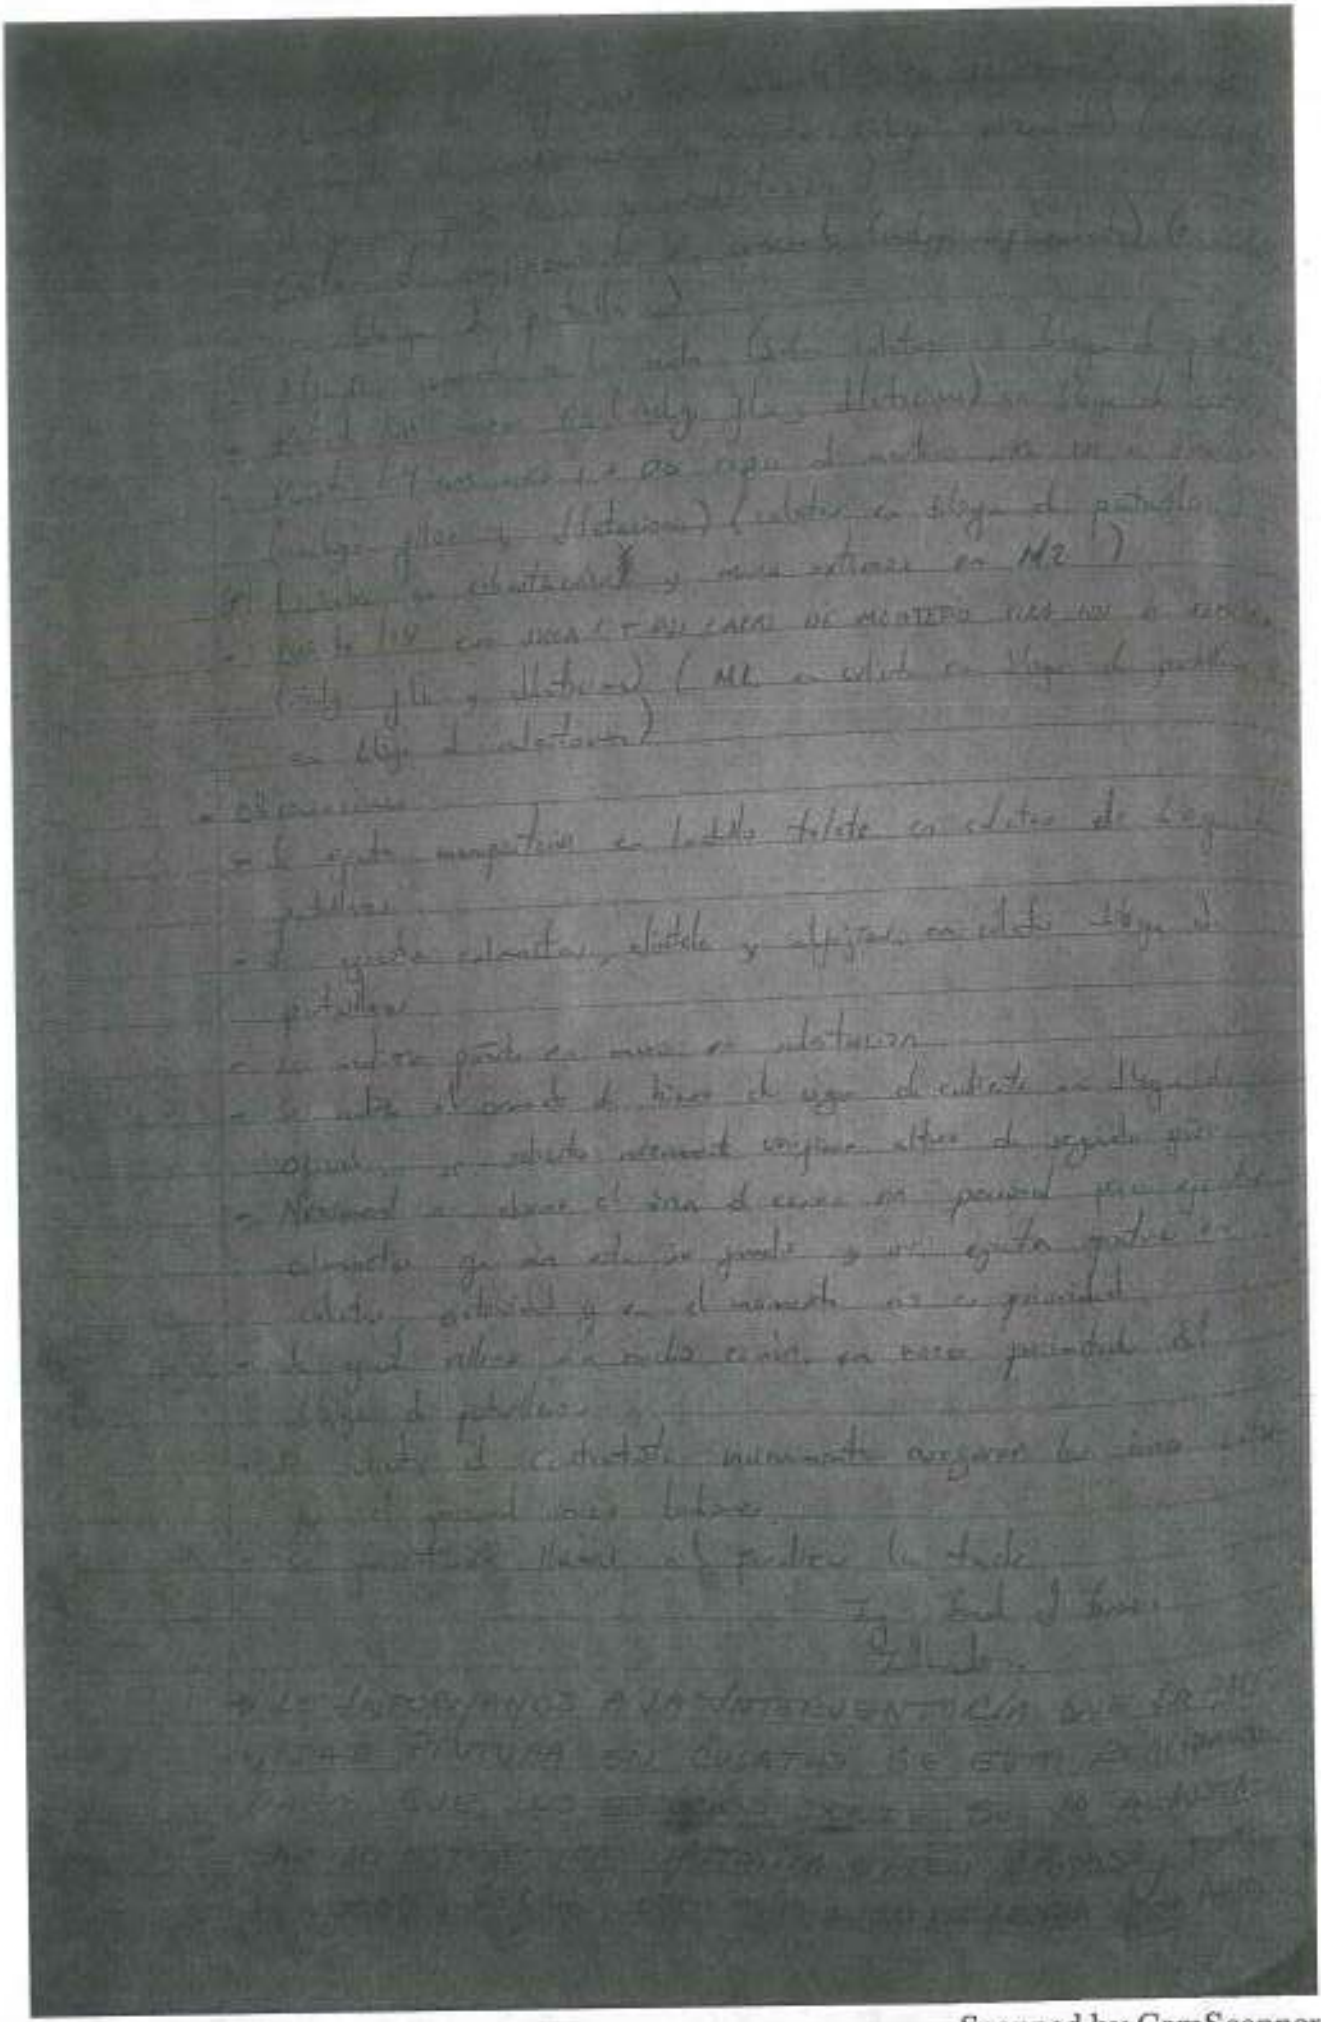

Scanned by CamScanner












Norma

Scanned by CamScanner

de cemento)
- (Columnata de confinamiento en concreto (incluye reforzamiento) (en dicho en bloque de patrullero) y en muro interno.
- (Columnata) Cinta de confinamiento en concreto (incluye reforzamiento) (en celdas, en bloque de patrulleros)
- Algunas cuerdas a la vista (todos dicho bloque de patrulleros)
- Pañete liso en VIGA LA REJA UNAS DE MORTERO 1:3 1:4 O SIMILAR (incluye pela y dilatación) (celdas en bloque de patrulleros (en M2 y ML) y en bloque de visitantes.

• Observaciones.
- Se ejecuta mampostería en ladrillo tolete en celdas bloque patrulleros
- Se ejecuta columnas, dinteles y dilación en celdas bloque patrulleros.
- Se realiza pañete en muro fachadas externa en visitación
- Se realiza el cambio de viga de dintel en bloque de oficinas, se retira nuevamente verificar altura de segundo piso.
- Se ejecuta relleno en recebo común en zonas primarias del bloque de patrulleros
- Se solicita al Contratista nuevamente asegurar las áreas antes que el personal inicie labores, se observa personal en las debidas seguridad para trabajar en alturas.
- Interventoría realiza la gestión logística y técnica de las celdas posibles en zonas verdes con material tierra amarilla, para minimizar costo, ya que esta interventoría no justifica técnicamente el uso relleno en recebo común, para ejecutar actividades de empradizado. El material a usar previene de canteras que a la fecha cumple con las permisos ambientales expedidas por la CRC.
- Interventoría solicita al Contratista el retiro de trabajos eléctricos ya que se esta realizando pañete, en la debida instalaciones eléctricas.

→ EL CONTRATISTA SE INFORMA A LA INTERVENTORIA QUE HOY HAY PERSONAL REALIZANDO TRABAJOS ELECTRICOS EN EL CAMINO Y BLOQUE #1.
HAY OTRAS PERSONAL INDEPENDIENTE REALIZANDO LA INSTALACION DE CARPINTERIA METALICA.

Scanned by CamScanner

INDEPENDIENTE A LOS SUBCONTRATISTA DE CADA BLOQUE HAY 2 CUADRILLAS DE CAMPO, TERIA Y PANETE.










TAMBIEN SE ESTA ADELANTANDO LA INSTALACION DE CARPINTERIA METALICA PARA LA CUBIERTA.

Scanned by CamScanner

DE AVANZA EN EJECUCION DE MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES ETC.







EL CONTRATISTA CONTINUA A LA ESPERA LE DEFINAN LAS INQUIETUDES EXPUESTAS EN LOS FOLIOS 86 y 87 DE ESTA BITACORA EN CUANTO A LOS PASAMUROS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. ESTA FALTA DE DEFINICION TIENE ATRASADA LA EJECUCION DE ESTA ACTIVIDAD HACE VARIAS SEMANAS ~~ATRAS~~ CONSECHO DOS GUTIERREZ.

- CONFORME A LO ACORDADO CON INTERVENTORIA EL CONTRATISTA HACE CONSTANCIA QUE SE EJECUTARON ALFAJIAS PERIMETRALES EN LA CUBIERTA DE SUBESTACION ETC.

12 de Enero de 2018 - Saludo

Scanned by CamScanner

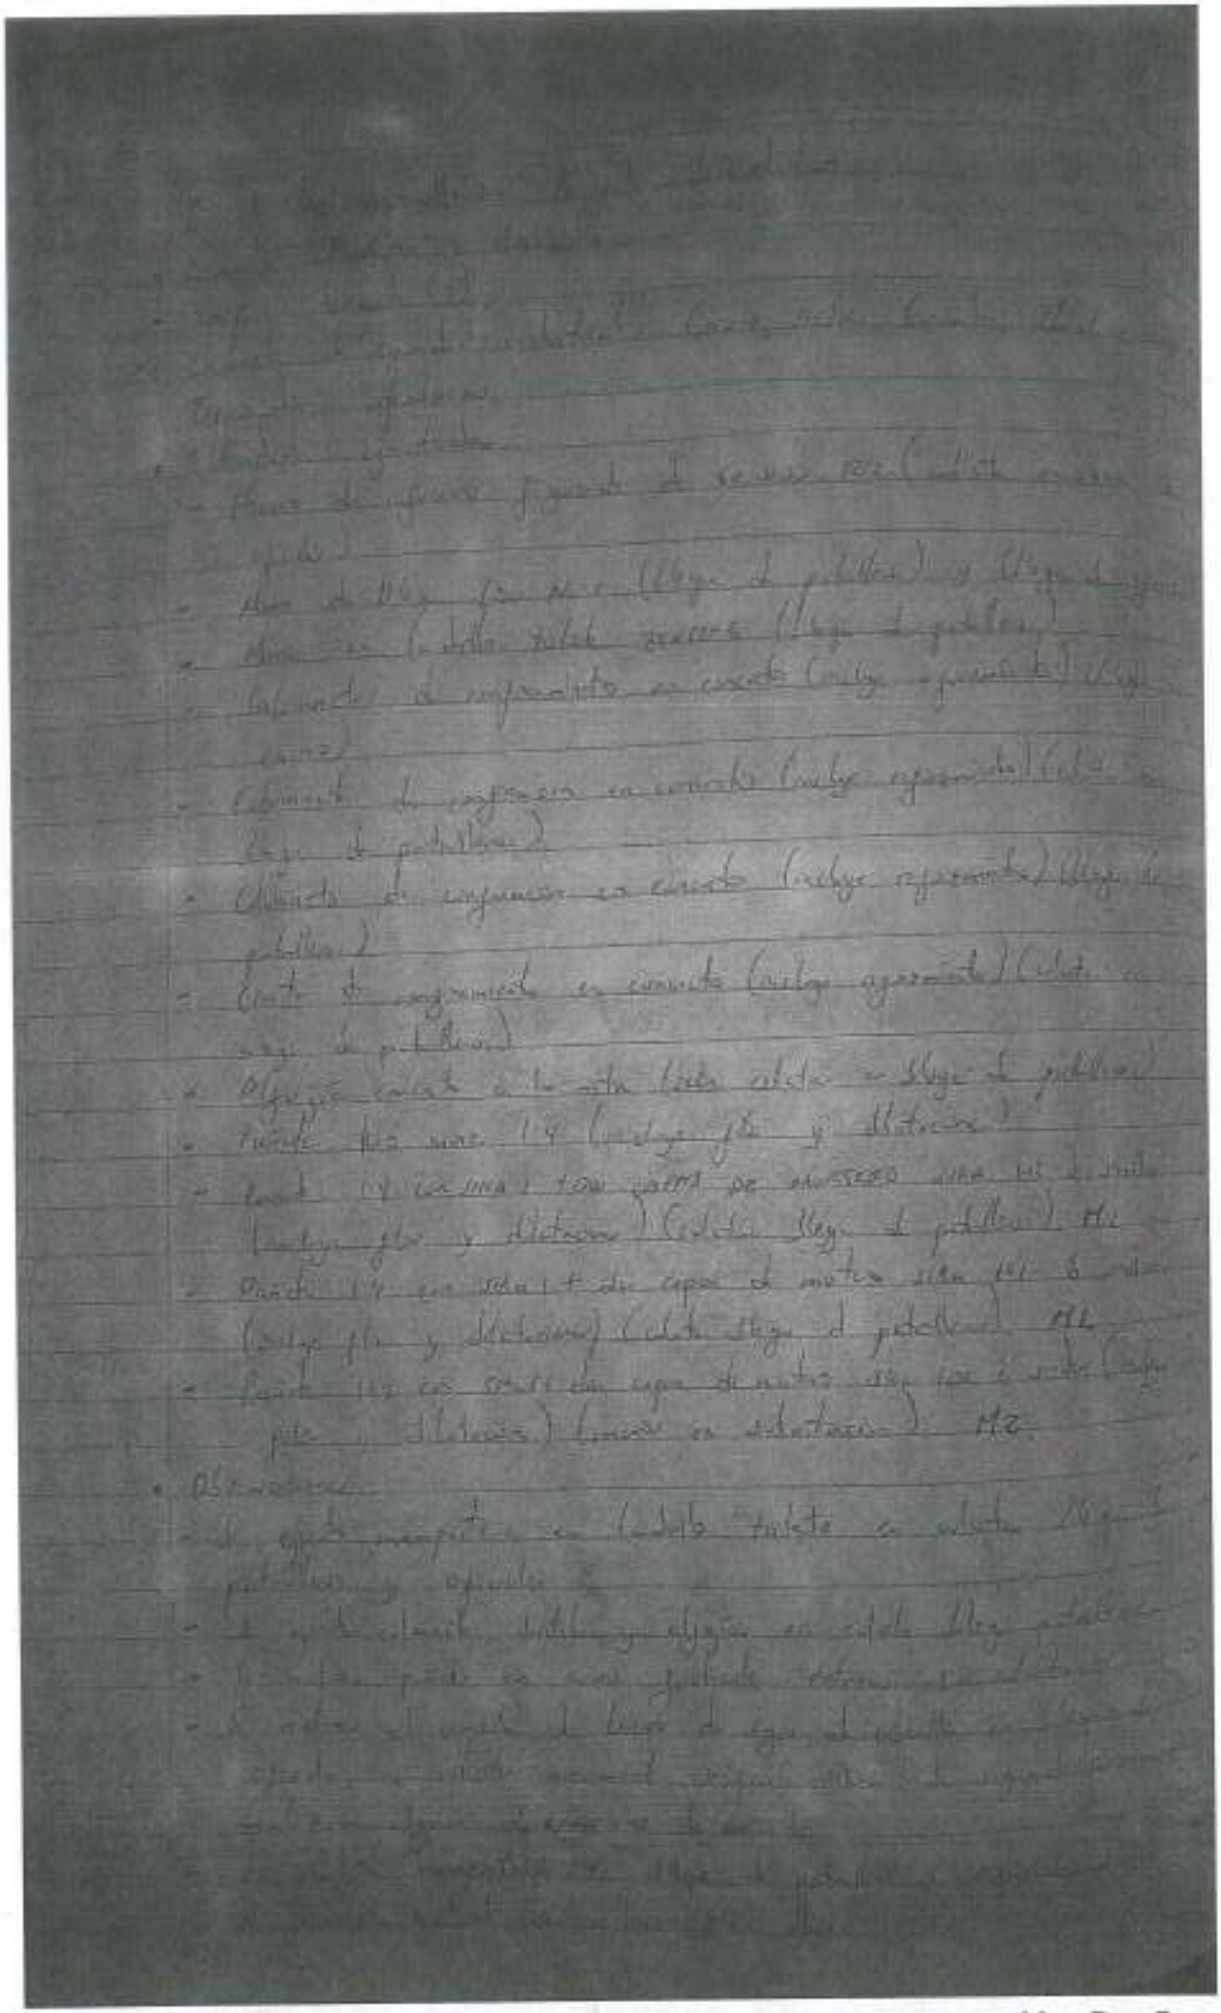

Scanned by CamScanner









Scanned by CamScanner

Lunes 11 de Enero de 2019



- Personal de obra: Personal administrativo, (consorcio UCU-6 técnicos (conductor y operador, 1 almacenista, 2 inspectores, 2 ayudantes, 5 oficial mampostero, 12 ayudante (mamposteros); subcontrato Bernal 3 oficiales, 3 ayudantes); subcontrato Arocha (2 oficiales, 9 ayudantes); 2 laboratoristas, 6 operadores, subcontrato Ana Pavo (2 ayudantes)
- Visita de entrevistas: Personal administrativo
- Clima: Mañana - soleado Tarde: soleado
- Equipo: Celular (2)
- Elementos de seguridad industrial: Casco, botas, guantes, chalecos, Uniforme, Tapabocas, Tapaoídos
- Actividades Ejecutadas:
  - Pisos de Xpress fueron el caso #1 (celdas en bloque de ayudas)
  - Muro bloque liso #3 (muros ayudas por bloque de patrulleros)
  - Muro bloque liso #5 (muros guías por bloque de ayudas)
  - Muro en ladrillo tolete 20x12x6 (muros ayudas por bloque de patrulleros)
  - Muro en ladrillo tolete 20x12x6 (celdas bloque de patrulleros)
  - Columneta de confinación en concreto (malla reforzada) en bloque de cuarto
  - Columneta de confinación en concreto (malla reforzada) en bloque de patrulleros
  - Pañete liso muros 1.4 (malla gris y blanca) M2-ML contadores
  - Pañete 1.4 con sika 1+1 de capas de mortero sika 101 & sellex (malla gris y blanca (en muros de celdas y en muros de bloque de ayudas).
  - Estructura metálica para cubierta (malla antiescombro, vinilo y doble acceso para el concreto fue reforzada (viga doble) en bloque patrulleros.
- observaciones:
  - Se quito mampostería en ladrillo tolete en celdas bloque de patrulleros
  - Se quito mampostería en bloque y en ladrillo tolete en el segundo piso del área de patrulleros.
  - Se realizo adhesivo de estructura metálica en deck en bloque de patrulleros
  - Se quito mampostería divisoria en el bloque de patrulla primer

Scanned by CamScanner


pico con pendiente de agua y filtros.
- Se realiza prueba de nivel de flotadores en cisternas
- Se realiza el armado de bisagras de tapas de cisterna en Obra de oficios, se retira remanente vertical de regado pvc, se realizan algunas observaciones de contado
- Se realiza inspección en Obra de oficios
- Se suministra material de relleno en obra.
- Se solicita al Contratista disponer de los equipos necesarios y seguros para que el personal acceda a las zonas de trabajo
- ~~(Se inicia la instalación de equipos eléctricos, como caja, en Obra de pvc)~~
- Mañana, se solicita al Contratista disponer de personal en cuanto ya que se dispone con ejecutar algunas.
- Se gestiona ácumo en relatividad
- El Contratista dispone por el retiro de cerdos y gatos bidireccionales

Ing. Saul J. Gómez P.
Interventor

→ SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DIFERENTE AVANCE QUE SE ESTA REALIZANDO EN CULATAS DE CUBIERTA.

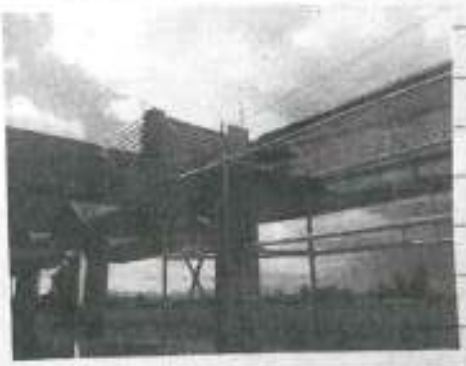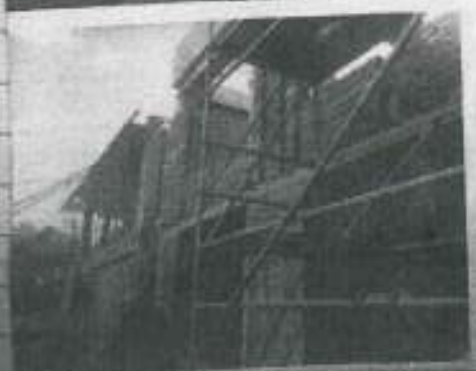
Scanned by CamScanner

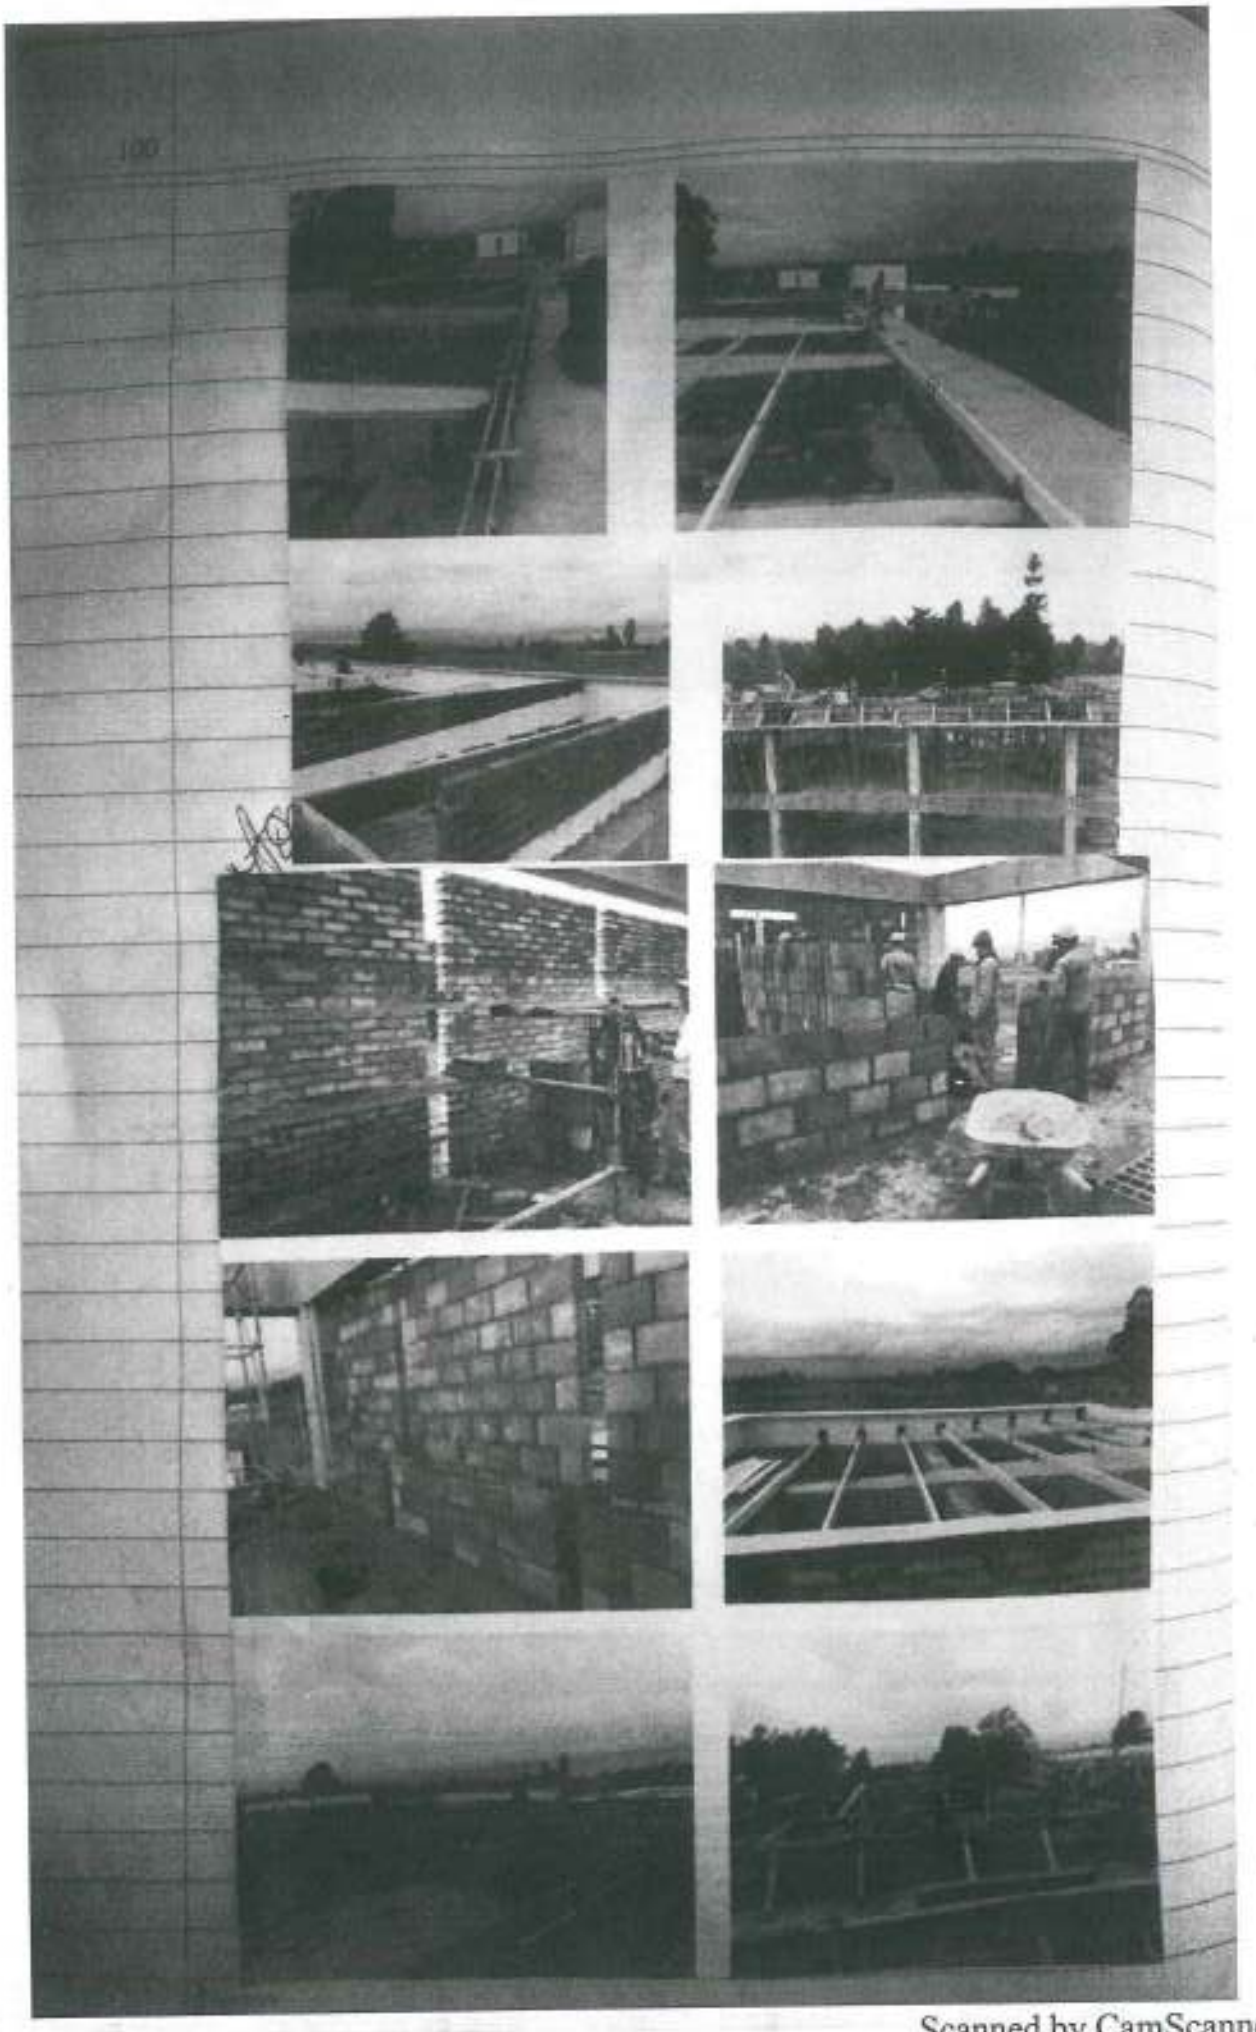

Scanned by CamScanner





SE AVANZA EN INSTALACION DE FRESCAZA, MALLAS DE GALLINERO, FUNDICION DE CARGADO DE LA SUBESTACION, INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, MUROS TOLETE Y BLOQUETAS, FUNDICION CINTAS, FORMALETA LOSA BTO, INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS ETC.

Mart 15 d Enero d 2019

- Personal en obra: Personal administrativo, (Ingeniero Residente, 1 operador, 2 conductores, 1 almacenista, 1 vigilante, 97 oficiales, 1 maniobrero, 12 ayudantes maniobrero), Subcontrata Bruno (3 oficiales, 4 ayudantes), Subcontrata Arnulfo (2 oficiales, 7 ayudantes)
- Personal de retroexcavadora: Personal administrativo
- Clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado
- Equipo Utilizado (2)
- Elementos de seguridad industrial: Casco, Botas, Guantes, Chaleco, Uniforme, Tapabocas, Tapabocas
- Actividades Ejecutadas:
  - Muro Bloque Liso No 5 (muro segundo piso bloque 2 patillas)
  - Muro Bloque Liso No 5 (muro primer piso bloque de oficinas)
  - Muro en bloque tolete 24x12x6 (colorado) en bloque de patinetas
  - Columneta de confinamiento en concreto (ambos extremos) bloque de casino y patinetas
  - Pañete 1:4 un solo lado (ambos lados de muros viga 101 y similares) (ambos ejes y alrededores) (muros en bloque de oficinas)
  - Estructura para aleros (ambos costados, concreto y demas accesorios para su correcto funcionamiento según diseño) (en bloque de patinetas)

Observaciones


Normal

Scanned by CamScanner

- Se ejecuta mampostería en ladrillo tolete en cubierta bloque de patinadores
- Se ejecuta mampostería en bloque en el segundo piso del área de patinadores
- Se realiza actividad de estructura metálica en cubierta del bloque de patinadores
- Se realizan actividades eléctricas en el bloque de patinadores primer piso como instalación de cajas y tubería PVC
- Se realiza pañete en muro fachada en oficinas
- Se realiza el armado de hierro de viguetas de cubierta en bloque de oficinas e instalación de cerramientos.
- Se realiza mampostería en bloque de oficinas.
- Se suministra material de relleno a obra
- Nuevamente se solicita al contratista dispone de la cuadrilla mencionada y según programación del personal acorde a la ruta de trabajo
- ~~Se continúa la instalación de aparatos eléctricos como vigas en~~
- Se observa la patinadera en condiciones adecuadas de almacenamiento con poco de cemento. Está interventoría siempre a recomendado diligenciar las matrices de ella.
- Se solicita al Contratista ingresar las cuadrillas que se ejecutan en mampostería para las instalaciones eléctricas
- Nuevamente, se solicita al Contratista disponer el personal en cuadrilla ya que se observa sin ejecución alguna.

Ing Sindy J Lara D
Interventora

→ SE INFORMA A LA INTERVENTORIA QUE SE ESTAN ADELANTANDO ASEO GENERAL y ORGANIZACION DE ACERO.
→ SE DISPONE PERSONAL PARA COMPLETAR TRABAJOS CASINO





Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

[redacted]

Scanned by CamScanner

dorso)

* Observaciones:
- Se ejecuta compactación en ladrillo tolete en cubeta Bloque patrulleros
- Se ejecuta compactación en Bloque en el segundo piso del área de patrulleros, se realizan algunas observaciones como plomos y aplomos de juntas
- Se realiza actividad de estructura metálica en cubierta del Bloque de patrulleros, se verifica el tipo de soldadura con
- Se recomienda al Contratista humedecer los pisos del ladrillo tolete antes de su instalación
- Se realiza actividad eléctrica en Bloque patrulleros primer piso con instalación de cajas y tuberías
- Se recibe la inspección de cubierta del ejercicio, antes de su fundida haciendo las recomendaciones de reparar hierro de pantaletería y asegurar gotas hidráulicas
- Se instala Bloque en el eje de ejercicio primer piso
- Se suministra material de arena en obra
- Nuevamente se solicita al Contratista dispone de los equipos necesarios y seguros para el personal acorde a la actividad de trabajo
- Nuevamente se solicita al Contratista dispone de personal en casino que sea se observe sin ejecución de obra real

Ing. Saul F. Cano
Interventor

→ EL CONTRATISTA DE FORMA PERMANENTE CON LOS INSPECTORES (2) Y LOS RESIDENTES (2), HACEN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LAS OBRAS DANDO PREVIAMENTE LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES A CADA ACTIVIDAD EN CASO DE UN ELEMENTO NO CONFORME, SE TOMAN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS NECESARIAS Y SE REALIZA EL LLAMADO DE ATENCION A LOS SUBCONTRATISTAS PARA MEJORAR LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS.
+ SE TRAEN EQUIPOS ADICIONALES CONFORME LA NECESIDAD EN OBRA.

Scanned by CamScanner

SE ADJUNTA REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES EN EJECUCION EN TODOS LOS BLOQUES DEL ALIMENTADOR CASING, SUBESTACION Y TENDIDO DE CONDUCTOR POS-CUTTER.












Scanned by CamScanner

Jueves 17 de enero 2019

- Personal en Obra: Personal Administrativo Consorcio BCS Gutierrez. (1 Operador, 2 Inspectores, 1 Almacenista, 2 Volqueteros, 11 Oficiales Mampostería, 12 Ayudantes Mamposteros, 2 Ayudantes Cuadrilla) Sub Contrato Bruno (3 Oficiales, 4 Ayudantes) Arrieta (2 Oficiales, 7 Ayudantes) Area Tanque (9 Ayudantes) Estructura Cubierta (2 Personas) Electricos (4 personas) Topografía (2 Personas)
- Personal Interventoría: Personal Administrativo
- Clima: Mañana Soleado
  Tarde Soleado
- Equipo: Volqueta 16 m3 (2)
- Elementos de Seguridad Industrial: Casco, Botas, Guantes, Uniforme, Chaleco, Tapaoidos, Tapabocas.
- Actividades Ejecutadas:
  - Muro Bloque liso No 5 (Muro Segundo Piso bloque Patrulleros) (Primer Piso Patrulleros remates Ejes D1 - D4) (Muros Primer Piso Sub Oficiales) (Muros 2do Piso Bloque Patrulleros)
  - Muro Ladrillo Tolete (Cubiertas bloque Patrulleros)

Scanned by CamScanner

- Columnetas y Viga corona ción para continuar de mampostería (1er Piso bloque Patrulleros)
- Pañetes 1:4 con Sika 1 + Dos (capas) de mortero Sika 107 (Muros bloque Oficinas)
- Instalaciones tubería PVC y EMT en Bloque Patrulleros 1er Piso ejes D1 - D4 Para
- Instalaciones Hidrosanitarias en 1er Piso Bloque Patrulleros ejes D1 - D4
- Instalacion Formaleta para Tanque Almacenamiento.
- Fundicion Vigas de cubierta Bloque 3 Oficinas, en el acompañamiento de la comisión topográfica.

- Observaciones


- Se recomienda al Contratista revisar detalles en Pañetes bloque 3 Primer Piso Oficinas Realizar primero Instalaciones Electricas, chidro sanitarias como en bloque 1, 1er Piso para luego proceder a realizar Pañetes

Arq. Monica
Interventoría


EL CONTRATISTA REITERA LA SOLICITUD PARA QUE SE LE DEFINAN DIAMETRO TIPO Y POSICION PARA - MUROS TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y PARA QUE LE SEA ENTREGADO EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEFINITIVO DEL TANQUE RAS.

LA FALTA DE DEFINICION DE ESTOS TEMAS ATRAZA LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LOS TANQUES.

→ SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS OBRAS EN EJECUCION. MAMPOSTERIA, FUNDICION LOSA, ELECTRICA.

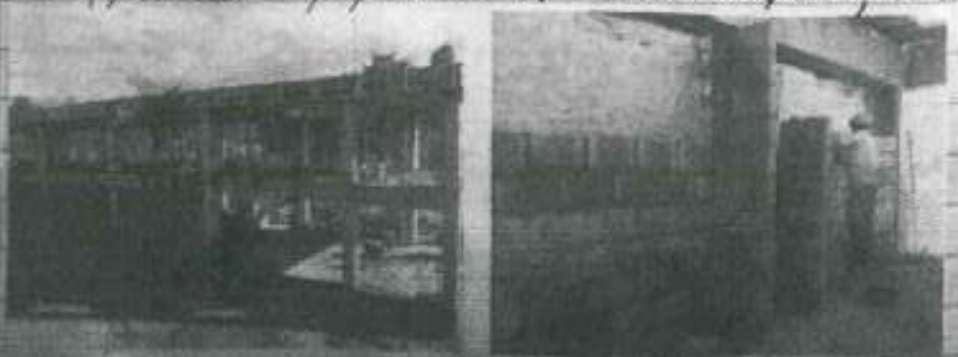

Scanned by CamScanner

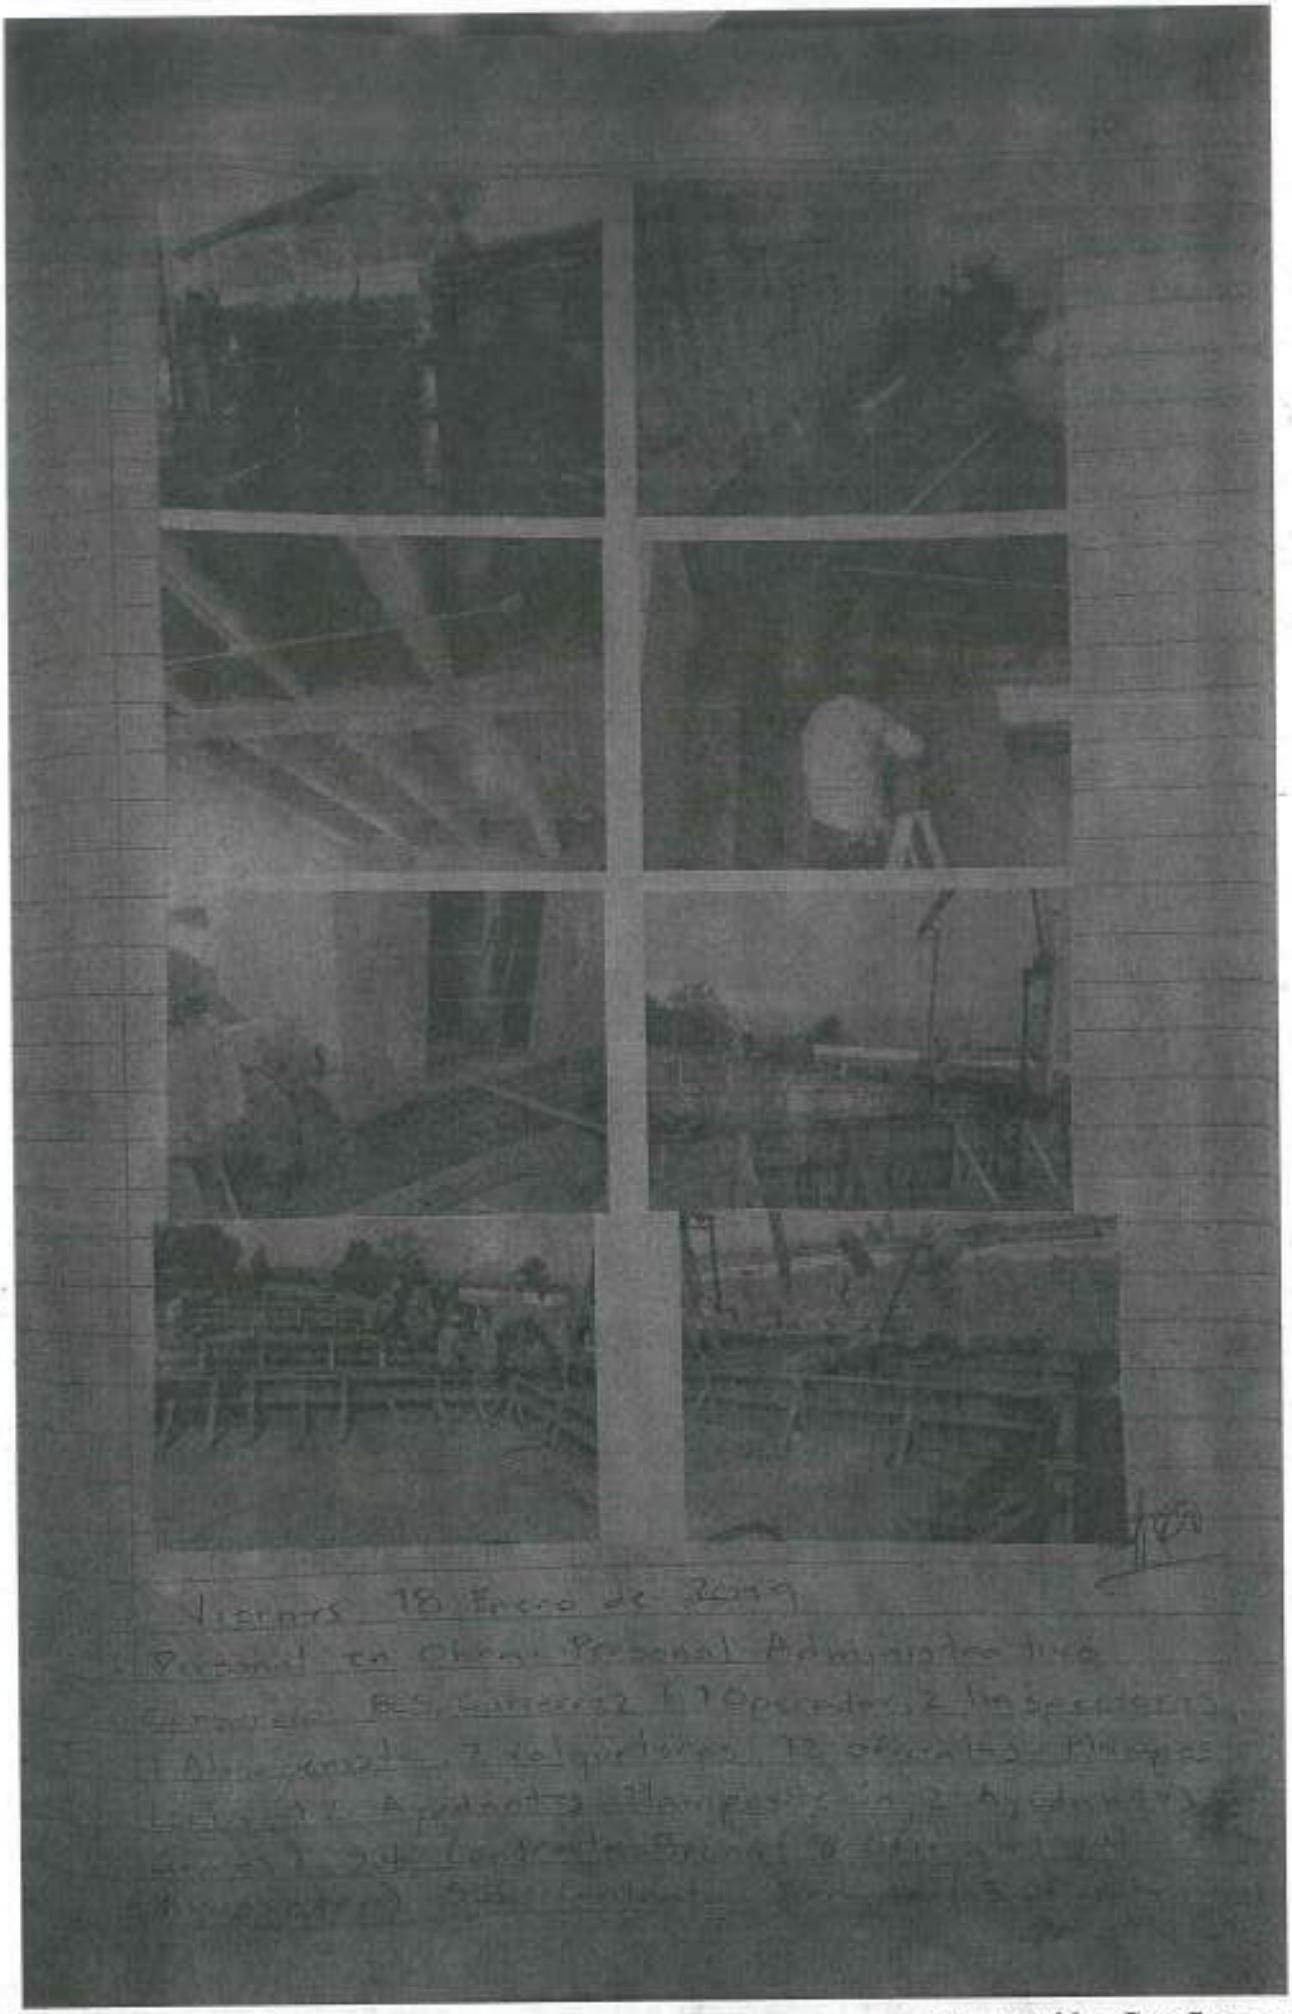

Viernes 18 Enero de 2019


Reunión en Obra: Personal Administrativo, Jefe de Obra, Capataz, 1 Operadores, 2 Inspectores, 1 Almacenero, 2 Ayudantes, 12 Oficiales, Peones

Scanned by CamScanner

9 Ayudantes) Area Tanque (9 Ayudantes) Estructura cubierta (2 Personas) Electricos (4 Personas) Topografia (2 Personas)

- Personal Interventoria: Administrativo
- Clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado
- Equipo: Volqueta 16 m3 (2)
- Elementos de Seguridad Industrial: Casco, Botas, Guantes, Uniforme, Chaleco, tapaboca, Tapaoidos.
- Actividades Ejecutadas
  - Muro Bloque liso H=5 (1er Piso eje D1 - D4 bloque Patrulleros) (2do Piso bloque Patrulleros) (1er Piso bloque 3 Oficinas)
  - Muro ladrillo Tolete (Culatas bloque 1 Patrulleros) (1er Piso bloque 3 Oficinas fachada/atras
  - Columnetas y Cinta de continamiento mamposteria 1er piso Bloque 1 Patrulleros
  - Pañete 1:4 para primer Piso bloque Oficinas
  - Instalacion Malla Gallinero en fachada Casino y 1er Piso bloque Oficinas
  - Instalaciones hidrosanitarias (1er Piso bloque Patrulleros)
  - Instalaciones electricas (1er Piso bloque Patrulleros)
  - Instalacion Cinta PVC tanque de Almacenamiento.
- Observaciones:
  - Se revisa Ubicacion de ~~Columnas~~ Cinta y se plantea con asesoria de instalar la cinta realizar unos cortes en varillas en las esquinas y agregar refuerzo de 1mt y soldadura de 10cm en cada lado
  - Nuevamente se solicita al Contratista dejar el pozo en condiciones y se deja pendiente de observar
  - Nuevamente se solicita al Contratista dejar de las condiciones y limpieza que se genera cada a las de trabajo

Scanned by CamScanner

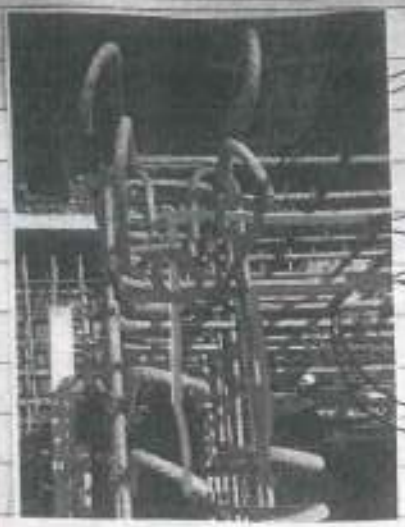

Corte Varilla

Cinta PVC

Soldadura.

Refuerzo

Arq. Manuel Benítez
Interventoria.


SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS OBRAS EJECUTADAS EL DIA DE HOY. LA CINTA SE UNIRA PARA EN LA POSICION SEGUN DISEÑO.









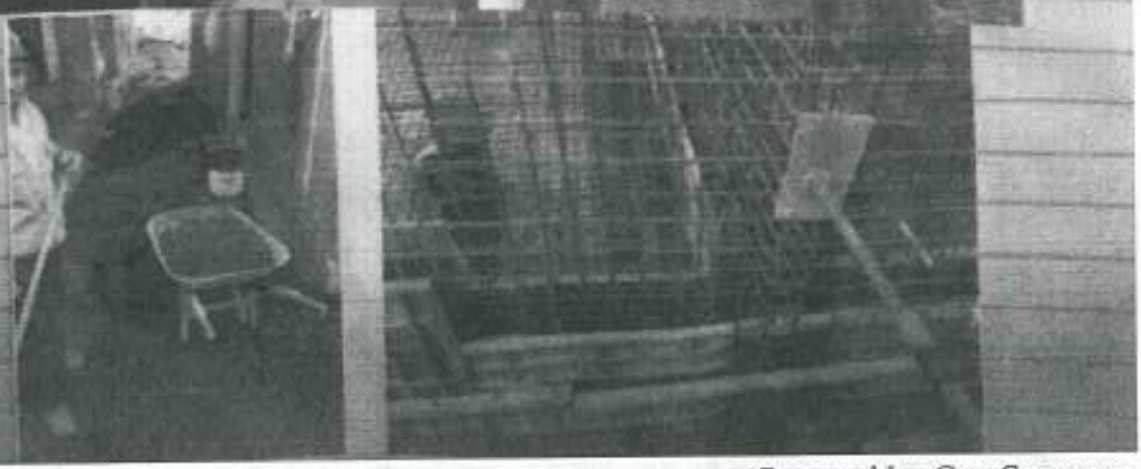


Scanned by CamScanner







Scanned by CamScanner

* SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN EN EJECUCION, INCLUIDA LA FUNDICION DEL MAN... Y LA INSTALACION DE LA CINTA PVC EN EL TANQUE, SEGUN INSTRUCCION DADA POR INTERVENTORIA EN FOLIO 111 DE ESTA BITACORA



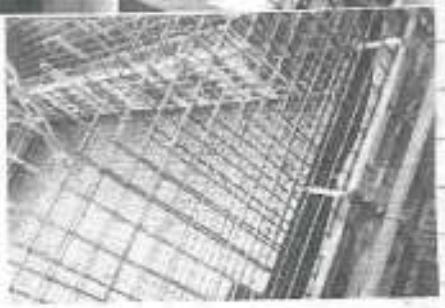DOMINGO 20 ENERO / 2019.

* SE REALIZA DILATACION Y CURADO ANDEN SUBESTACION.
SE REALIZA RETIRO DE BASURA Y ESCOMBROS

Scanned by CamScanner

DE LA ZONA ENTRE BLOQUES. M/A 02.

Zona de Entre de Lote

- Personal de obra: Personal administrativo. Camiones acc-betonera (2 maquinistas, 1 ayudante, 1 operador, 1 ayudante, maquinaria y apoyo maquinaria). Subcontrata Hierros (4 oficiales, 3 ayudantes) Subcontrata Aceite (2 oficiales, 6 ayudantes) Subcontrata Encofrados (8 oficiales, 8 ayudantes)
- Personal de intervención: Personal administrativo.
- Horario: Mañana: Soleado Tarde: Soleado
- Equipos: Vibrador 16 m³ (2), maniobrador (1), vibrador portátil
- Elementos de seguridad industrial: Casco, Botas, Guantes, Chalecos, Gafas, Tapones, Tapabocas.
- Actividades ejecutadas:
  - Muro Bloque Eje M.5 (muro ejecutado por Bloque de pabellón)
  - Muro Bloque Eje M.5 (muro ejecutado por Bloque de oficinas)
  - Muro en ladrillo tolete 24 cm (culata)
  - Colocación de refuerzo en concreto (muro reforzado) Bloque de cuna (En ejecución)
  - Pañete (4 cm de 1 a 1 de capa de mortero 1:4 con 10% de aditivo (muro glo y alrededores) (en muro en Bloque de oficinas)
  - Estructura metálica para cubierta (incluye anticorrosivo, esmalte y demás accesorios, para ser cortada posteriormente según diseño) en Bloque de pabellones).
- Observaciones:
  - El operario manipulador de ladrillo tolete en culata Bloque de pabellones
  - Se ejecuta manipulación en Bloque en el segundo piso del eje de pabellones
  - Se realiza actividad de soldadura metálica en cubierta del Bloque de pabellones, se solicita al contratista no ejecutar soldadura en altura
  - Se realiza actividad eléctrica en el Bloque de cuna
  - Se realiza (completa) el vaciado de concreto.
  - Necesario se retire el contratista después de las 4 pm para que el personal acceda a las vías de trabajo
  - Necesario, se retire el contratista después de personal en cuna ya que se realiza por ejemplo de vibrado (ruido) y evita el trabajo del mismo
  - Se retire el contratista después de un personal ya que se observa que en la puerta que es para pro Bloque de pabellones y cuna

Scanned by CamScanner

- S nuevo cant M 24 Sad se reinvierten tres años avance de obra, inicio de tanque RCL, falta reforzar el plano de ganancia y dirección del viento, retiro de suelo cuando dan exteriores.

Ing Sub / Gen P
Tributario.

- DEL CONTRATISTA DISPONE PERSONAL EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS A DIFERENTE NIVEL SEGUN LAS PRIORIDADES EN OBRA, LAS JORNADAS DE TRABAJO SE PROLONGAN EN LA NOCHE. MCC.











Scanned by CamScanner

SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DEL RECORRIDO REALIZADO EN OBRA CON EL MAYOR JOPER SUPERVISOR DE LA DIRAF. DONDE SE CONFIRMA LA UBICACION DEL CASINO Y SE IDENTIFICA LA POSICION PARA FUTURAS OBRAS FASE 4.
SE AVANZA EN LOS CONCRETOS CON SU CURADO Y EN FUNDICION DE ALFAJIAS EN CUBIERTA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, EN MAMPOSTERIA EN INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA.
SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO

ADJUNTO
BOS-GUTIERREZ










Mala 22 de mes de 2018

- Personal de obra: Personal administrativo, Carnicería OCI- Externos (2 conductores 1 operador, 1 almacenista, 2 inspectores, 13 ayudantes campamento, 11 ayudantes campamento), Laboratorio Bureo (3 oficiales, 4 ayudantes) Residente Obra (2 operarios, 5 ayudantes), 2 Topógrafos, 11 personal
- Personal de interventoría: Personal administrativo, Carnicería topografía
- Obra: Maquinaria: Volquetas Pluma: Vibrador
- Equipo menor: (2) Mezcladora (1) Vibrocompactador de rodillo (1)
- Herramienta menor: Carretillas, Pala, Barretas, Pisones, Llanas, Tapabarros, Topógrafos
- Actividades ejecutadas

Scanned by CamScanner

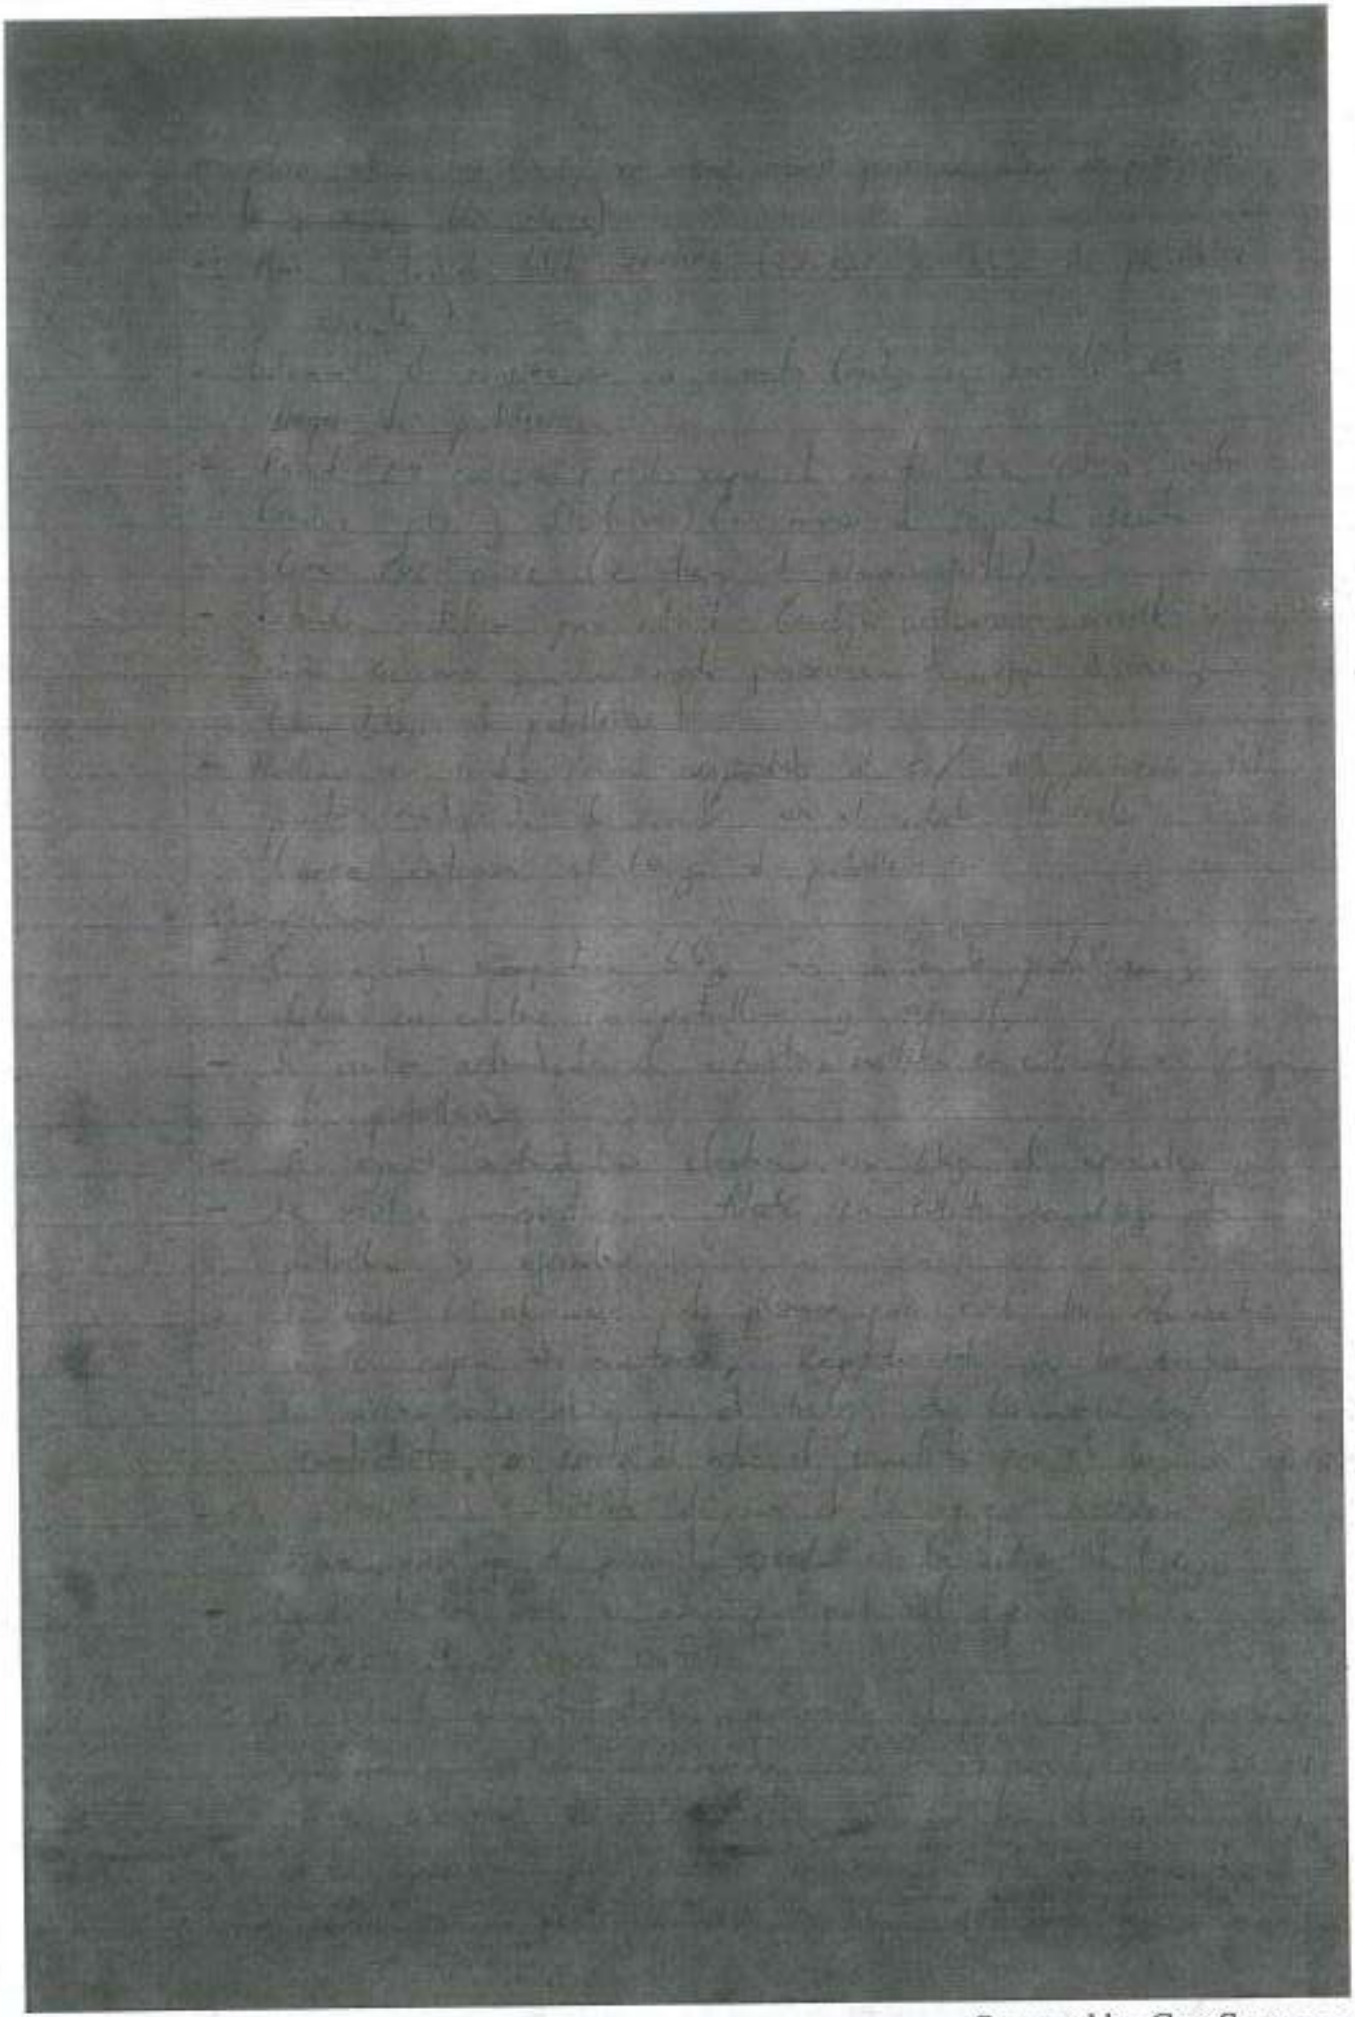

Scanned by CamScanner

- Se hace entrega de planos en mal de contratista adicional en lugar de patrulla y oficial ya que se observan deficiencias (Ganado). El resto el contratista tiene medido por su cuenta.

Ing Sid I Gm P.
Interventor

→ EL CONTRATISTA CONTINUA A LA ESPERA DE SEA ENTREGADO EL DISEÑO ESTRUCTURAL COMPLETO DEL TANQUE ROI YA QUE EN EL SUMINISTRADO NO APARECEN ELEMENTOS COMO EL FOSO.


→ EL CONTRATISTA VERIFICA EN CONJUNTO CON LA INTERVENTORIA LA MAMPOSTERIA DE CULATA EL AJUSTE A LA ZONA POR CORRECTA SE REALIZA DE FORMA INMEDIATA.








Scanned by CamScanner

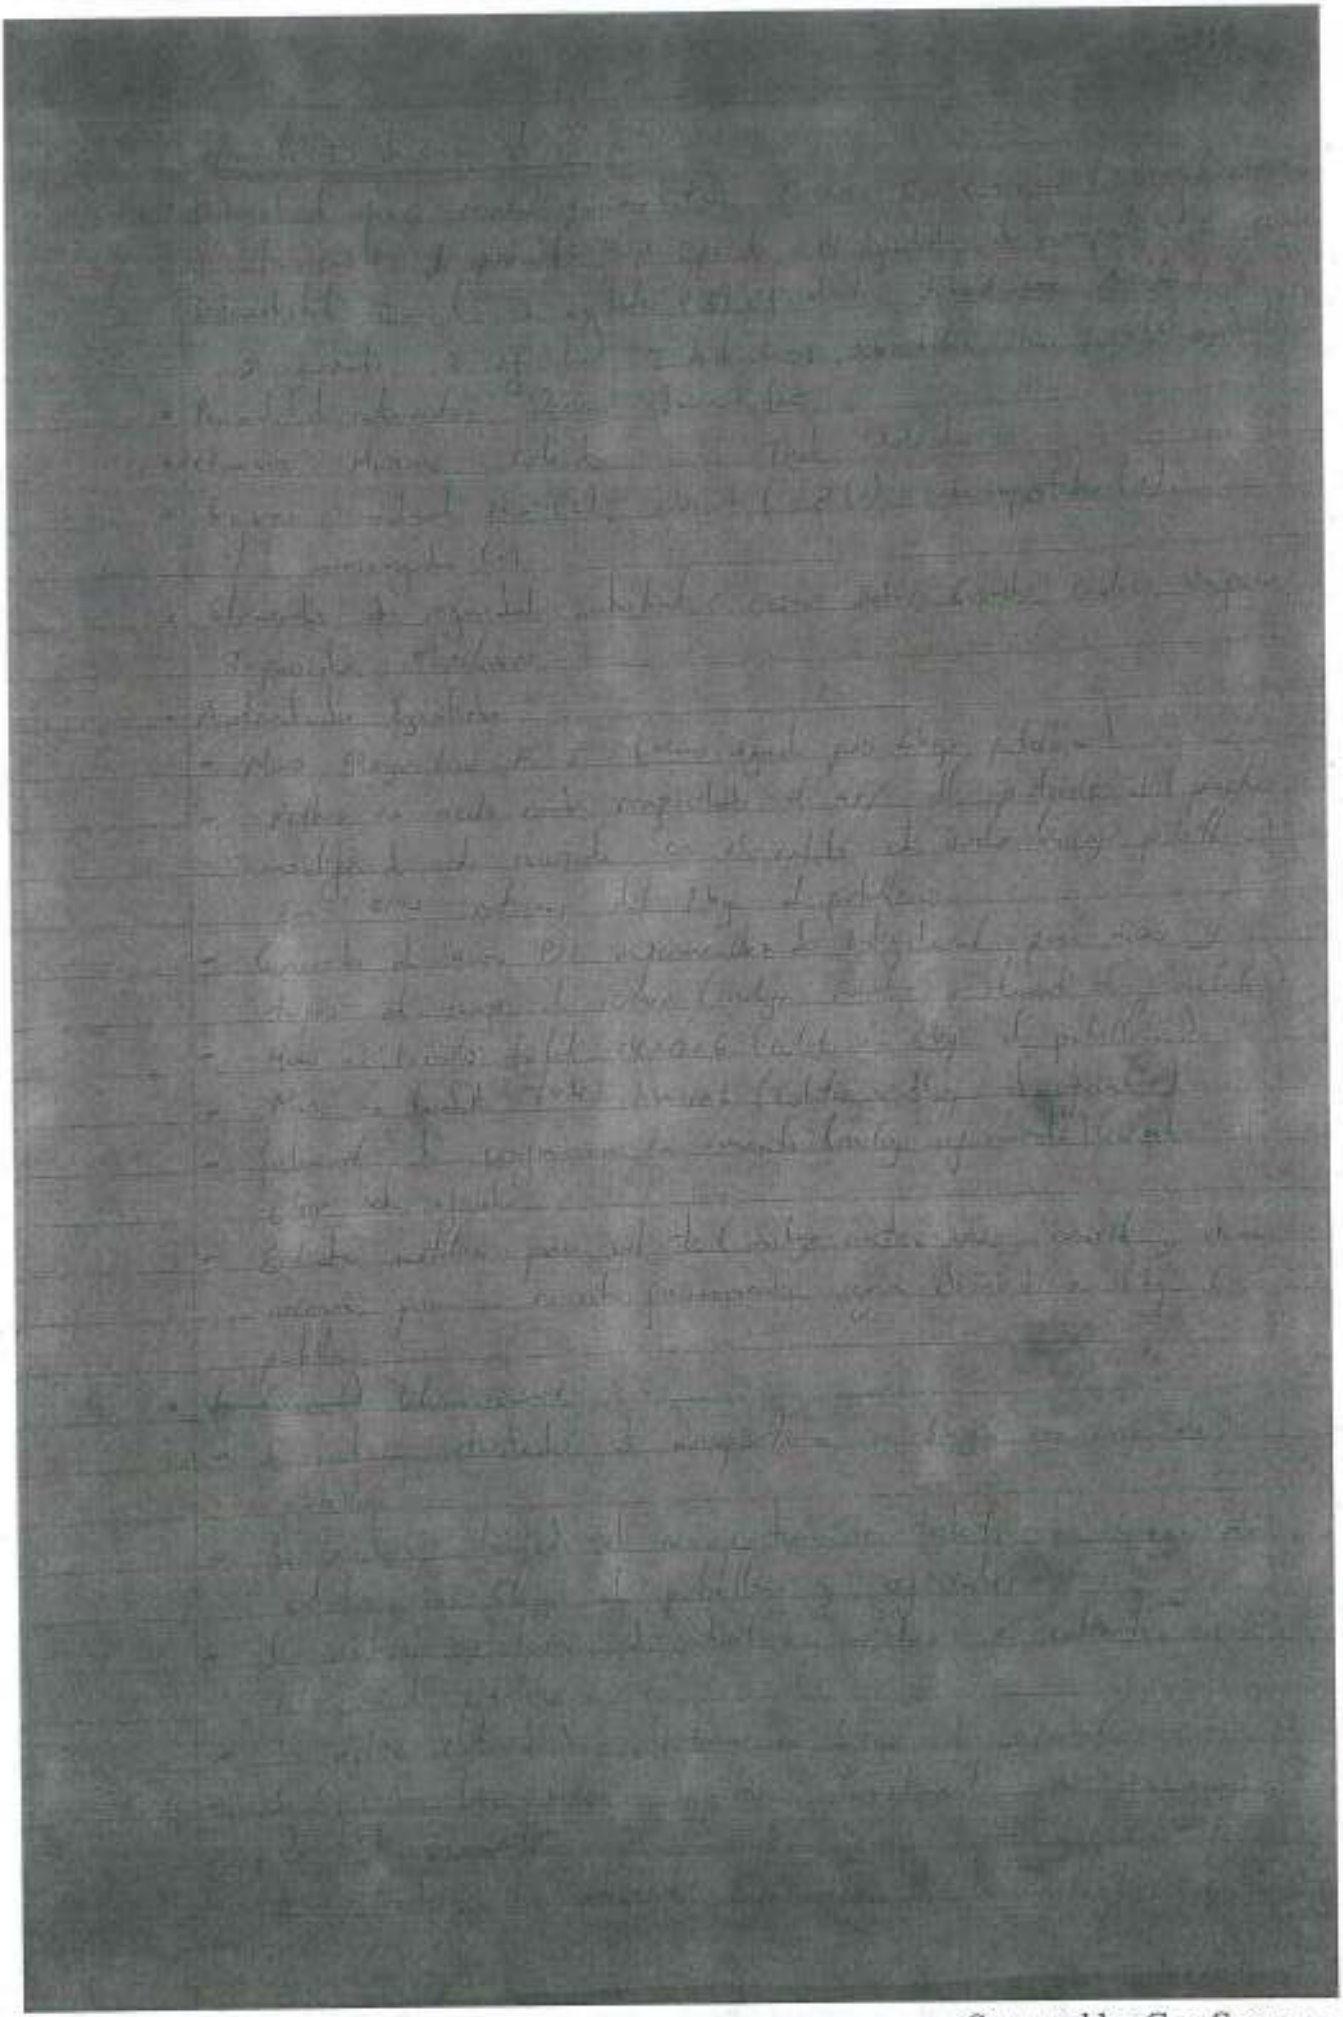

Scanned by CamScanner

completa en área donde se abrirá posteriormente el contratista después de la zanja
- Se retira el contratista hacia el dentro de la parcela donde por seguir planos de obras en Sitio de apoyo
- Se retira al contratista nuevamente después de una parcial y ya se contara alrededor área en parcial como en el caso además el subcontratista aún no hay disparto de más parcial para cubrir la zona donde se tiene tareas mencionadas anteriormente en las actividades de manipulación
- Se hace nuevamente la observación de plano en mano en sitio indicado en Sitio de patillero y ejecutar
- Se retira la tarea de alrededor para su respectivo cargo

Ing Sub J Gus
Inspectora

+ SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PROCESO DE FUNDICION DE LOSA DE FONDO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA







Scanned by CamScanner

PREVIAMENTE SE INSTALARON PASAMUROS DE BOMBAS.





→ SE SOLICITA A INTERVENTORIA EL CONCEPTO RESPECTO AL PLANO DE REDES HIDROSANITARIAS CON LOS AJUSTES DE PENDIENTES Y NIVELES DE CAJAS POR EL CAMBIO DE NIVEL DE LOS BLOQUES PARA PROCEDER A LA EJECUCION DE DICHAS REDES.

→ EN LA CARPINTERIA → ESTRUCTURA METALICA SE REALIZARAN LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE TINTAS.

→ EN REFERENCIA A LA NOTA RESPECTO A EQUIPO NECESARIO Y SEGURO, DANOS FE A LA INTERVENTORIA QUE TODAS LAS LABORES SE ESTAN ADELANTANDO CON LOS EQUIPOS ADECUADOS, NECESARIOS Y SEGUROS EN TAL SENTIDO ESTA AUTORIZADA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, SOLICITAMOS QUE DE EXISTIR ALGUNA ACTIVIDAD O EQUIPO INSEGURO SEA REPORTADO DE INMEDIATO AL PROFESIONAL SISO A/O A SUS AUXILIARES O ALGUNO DE LOS RESIDENTES DE OBRA Y DE FORMA INMEDIATA SE DARA SOLUCION A LA SITUACION.

→ EN EL MOMENTO SE CUENTA CON PERSONAL DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES FRENTES DE OBRA Y EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, DE NECESITARSE PERSONAL CONFORME A LAS NECESIDADES DE PROYECTO.

→ LOS CONTRATISTAS E INSPECTORES ESTAN PRESTOS A APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL QUE LA INTERVENTORIA DESEE REALIZAR.

Atentamente

Scanned by CamScanner

Jueves 21 de enero de 2019

- Jefe de obra: Personal administrativo (cuenta con 6 años de experiencia, 1 administrativo, 2 ayudantes), Subcontratista Arena (1 oficial, 2 ayudantes); Subcontratista Madera (2 oficiales, 1 ayudante y 1 Administrativo-portería, 2 horas, 8 horas).
- Puesto de Vigilancia: Personal administrativo
- Clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado
- Equipo: Utilizado 16 (m²) (2), Utilizado 2 m²(2), Mantenimiento (1), Utilizado de valla (1).
- Elementos de seguridad material: Casco, Botas, Guantes, Viseras, Chaleco, Tapones, Tapabocas.
- Actividades Ejecutadas
  - Fachada en muro completado al 95% del perímetro del proyecto, dependiendo de acuerdo con el estado de suelo (muro pantalla).
  - Muro 36cm 150 Ms (primer vaciado paso) en pantalla Ms
  - Muro 36cm 150 Ms (muro por paso) en oficinas y segundo paso de 36cm de pantallas MS y ML
  - Muro en bodega total 24×12×6 (en celdas 36cm de espesor)
  - Columnetas de confinación en concreto (incluye refuerzo y dilataciones) segundo paso 36cm de (segunda) pantalla y en celdas en 36cm de oficinas
  - Pañete 1:4 con sika 1% de capa de mortero rica 1:3 de muro (incluye filos y dilataciones) en celdas 36cm de oficinas
  - Estructura metálica para cubierta (incluye anticorrosivo, cumbrera y demás accesorios para su correcto funcionamiento según diseño)
- Observaciones:
  - Se ejecuta campaña en bodega total en celdas pantalla y en 36cm de oficinas
  - Se ejecuta campaña en 36cm en el segundo paso del muro de pantallas
  - Se retiran actividades de cubierta debido a celda de 36cm de pantallas
  - Se retira en actividad de dilatación en 36cm de oficinas (muro y filos).

Scanned by CamScanner

- EL CONTRATISTA DEBERÁ PROVEER PARA QUE LA INTERVENTORÍA PUEDA HACER LOS REGISTROS DE CONFORMIDAD CON LOS MEDIOS PARA EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN COMO LAS QUE SE OBSERVAN EN EL SIGUIENTE REGISTRO FOTOGRÁFICO.








Scanned by CamScanner











Scanned by CamScanner


- Cine Menor Soldado TVD: Soldado
- Equipo: vulgrat 16 → (2), Vulgrat 9 → 2 (3), Municionador (1), Ultracompatible (1)
- Elementos de seguridad industrial: Casco, botas, bastón, chaleco, Uniforme, Tapa oídos, tapabocas
- Actividades Ejecutadas
  - Pulido en vereda con compactador en el eje del pretil del puente modificando de acuerdo con el estado de vía (incluye pretiles)
  - Estructura metálica para cubierta (incluye anclajes, muelle y demás accesorios para su correcto funcionamiento según diseño)
  - Muro Eje 120 Nº 5 (muro segundo piso) en Eje de pantallas
  - y el en primer piso en Eje de oficinas
  - Muro en ladrillo tolete 7 x 12 x 24 (en cada Eje de oficinas)
  - Colocación de empaques en vereda (incluye impermeable) en cubierta en Eje de oficinas y en segundo piso en Eje de pantallas.
  - Pared 1:4 con silla 1 + dos capas de mortero con aditivo impermeabilizante (incluye filos y dilataciones) en cubierta en Eje de oficinas
- Observaciones:
  - La ejecución compartida en ladrillo tolete en cubierta en Eje de pantallas y en Eje de oficinas
  - Se ejecutó compartida en Eje en el segundo piso del área de pantallas
  - Se realizó actividades de estructura metálica en cubierta del Eje de pantallas
  - Se realizan actividades eléctricas en el Eje de oficinas instalando cajas y tubería
  - Aún el contratista no ha realizado el diseño de la formaleta de cubierta para verificar planos de cubierta, en Eje de oficinas
  - Se solicita al contratista nuevamente adquirir el mar principal ya que se encuentra obstruyendo área sin pretil como en el eje 5, además el subcontratista aún no ha adquirido dicho mar para cubrir las zonas donde se tiene tanques, particularmente en las actividades de soldadura en

Scanned by CamScanner

Algo de agregar
- Se solicita al contratista durante dos meses en ultimo en área de oficinas ya que el mismo actualmente presenta mucho polvo por lo cual se encuentra en mal estado arte de pintura, como también limpiar los vidrios de encuentra en mal estado arte de pintura, como también retirar los #pegues arte de pintura
- Se solicita al contratista retirar area de obra en área de cubierta.

Ing Luis J Gonzalez P
Fiscalizador

- EL CONTRATISTA DISPONE EL PERSONAL PARA LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS EN EJECUCION.

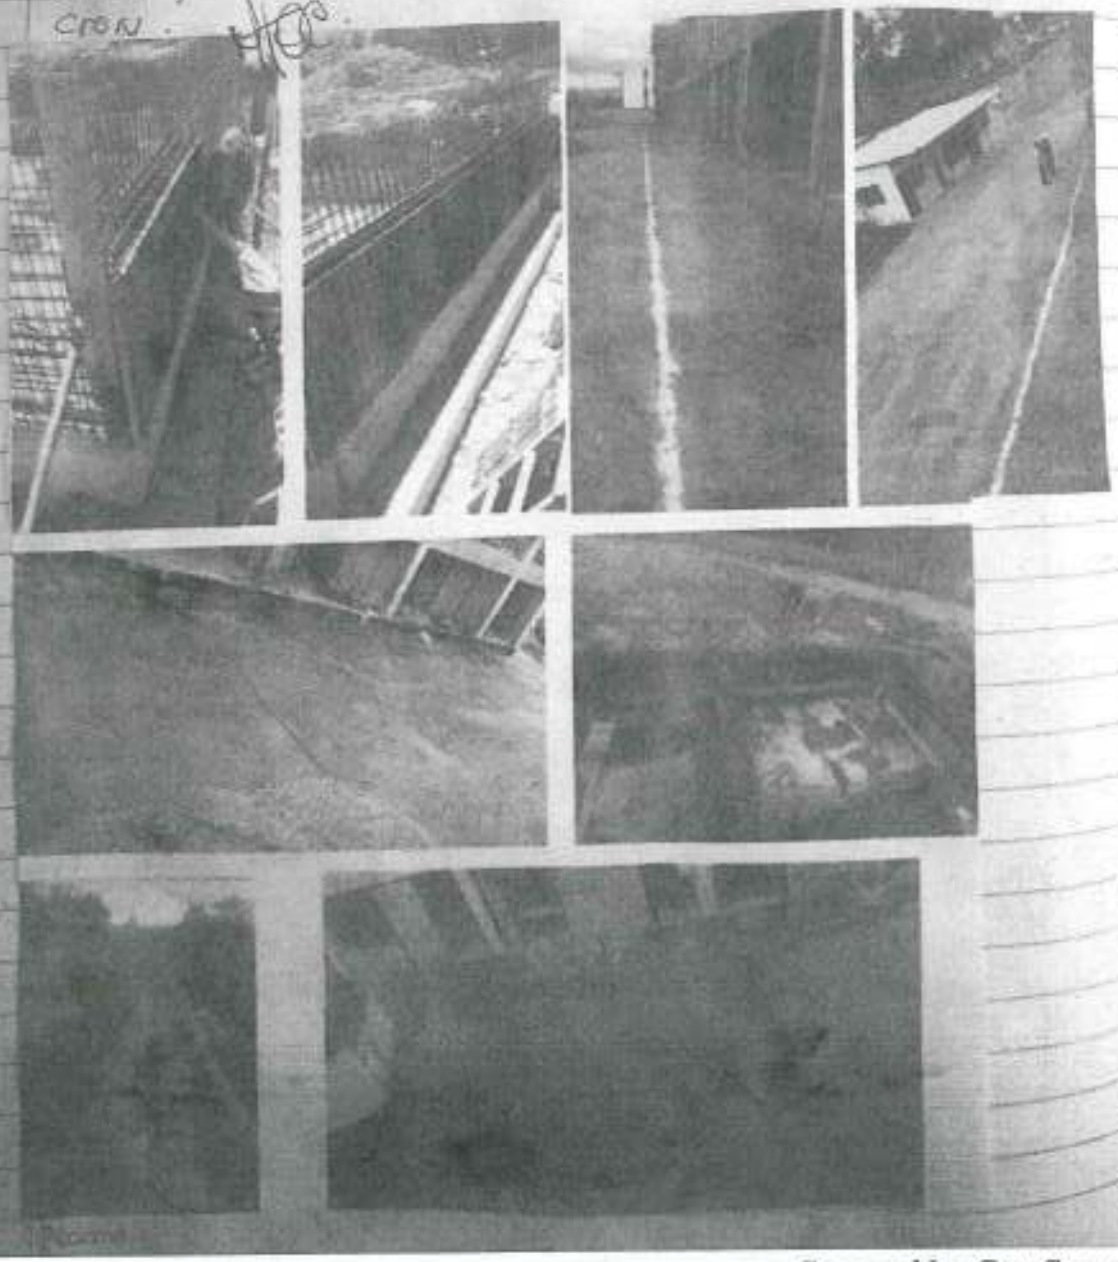

Scanned by CamScanner

SE RETIRA DIRECTAMENTE [illegible] DE ACUERDO CON EL PERITO DE LOS CONTRATISTAS Y LA INTERVENTORIA EN OBRA.

SE REALIZO EL AJUSTE A VEZ Y MEDIO DE CUOTA DE DEMOLICION A CUENTA DE REFERENCIA ENTRE EL NIVEL ANTERIOR DE LA INTERVENTORIA.

SE TRABAJA EN MEDIO DE FORMALETA DE MUROS TANQUE.

SE ENTREGO A INTERVENTORIA EL PUNTO DEL AJUSTE DE COTAS PARA DEJAR ALGUNOS MUROS EN PARCELA AL NIVEL A LA CUAL SE TRAZO EN SITIO DE ESPERA APROBACION PARA EJECUCION.

SE ALISTA EN REFUERZOS EN ZONA CONTIGUA A LA BLOQUE.

SE ACOPIA MATERIAL DE RELLENO.

SE TRABAJA EN EXCAVACION Y/O DESCAPOTE EN OTRA ZONA JUNTO A BLOQUES.

SE VERIFICA POR PARTE DE INTERVENTORIA CUOTAS Y PUNTOS EN CONCRETO EJECUTADOS EN CUBIERTA AYO.





Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

además el subcontrato, dar a los disputo de más personal para cubrir las zonas donde se tiene tareas mínimas, particularmente en las actividades de carpintería.
- Se hace necesario la elaboración de planos en base de cotas en bloque de ejes y alturas de muros en detalle.
- Se solicita la toma de ultimo de concreto para el siguiente corrida

Ing Saul J Gm P.
Interventor.

→ EL CONTRATISTA ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN TANQUE Y EXCAVACION PARA REDES CONFORME COTAS Y PENDIENTES APROBADAS POR INTERVENTORIA!

→ EL SUBCONTRATISTA SE COMPROMETIO A REDISTRIBUIR PERSONAL Y AUMENTAR EL GRUPO DE OBREROS

→ EL PERSONAL TRABAJA EL SABADO EN LA TARDE Y SE AVANZAN VARIOS FRENTE DE TRABAJO PRIORITARIOS.









DOMINGO 27 ENERO/2019.

→ SE TRABAJA EN TANQUE ALMACENAMIENTO, MAMPOSTERIA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, PAÑETES, ESTRUCT. METALICA

Scanned by CamScanner

Lunes 25 de enero de 2019

- Personal de obra: Personal administrativo, Concreto de 6 horas (2 maestros, 2 ayudantes, 2 operador, 1 ingeniero residente, 1 operador maquinaria) Subcontratista Bimbo (3 maestros, 4 ayudantes) Subcontratista Arista (2 operadores, 5 ayudantes) Subcontratista Jhon Jairo (2 operadores, 10 ayudantes); 2 operadores almacenistas y administrativo, 4 ayudantes
- Personal de interventoría: Personal administrativo.
- Clima Mañana: Soleado Tarde: (1-1:30) PM: soleado (1:30-5) PM: lluvia
- Equipo: Volqueta 16 m³ (2), Volqueta 7 m³ (7), Motoniveladora (1), retroexcavadora (1)
- Elementos de seguridad industrial: Casco, botas, guantes, chaleco, arnés, Tapa oídos, Tapabocas
- Actividades ejecutadas:
  - Pedido en mina cantera aprobado al 95% del pedido que fue modificado de acuerdo con el estudio de suelos (incluye adicional)
  - Cuanto de pozos para empradizado, instalación para mano, tapa de tanque de agua (incluye machaza y demolición de pavimento)
  - Estructuras metálicas para cubierta (incluye anticorrosivo, esmalte y demás materiales para su correcto funcionamiento según diseño)
  - Placa bloque 12 de 20 cm para bloque pantalla y muro para bloque de oficinas
  - Anclajes en concreto con broca de ½" y ¾" (muro pantalla para bloque de oficinas)
  - Cubierta de Cerramiento en acrylit (incluye aislamiento) en pantalla bloque de oficinas
- Observaciones:
  - El retiro del contratista no genera regalía sin antes de realizar los trabajos dichos en bloque de oficinas
  - Se retira la fundición de muro en tanque de almacenamiento después de realizado bisel y pase
  - Se genera manguetón en bloque en el segundo paso en el área de pantallas
  - A la fecha no se ha recibido la formaleta de cielo en bloque de oficinas ni el ref. VIII para el respectivo refuerzo en bloque, debido a que se han retirado con anticipación al

Scanned by CamScanner

contratista después de tener resultados de exploración
- Se realiza actividad de excavación manual en cabina del tablero de patrullaje sitio en Llegar a definir.
- Se realiza actividad eléctrica en el tablero de patrullaje retirando cajas y alambres
- Se realizan observaciones en área de celdas en Llegar de oficiales con funcionario de cada.
- Se realiza instalación de tubería sanitaria en área exterior del Llegar de patrullaje.
- Mensualmente se solicita al contratista disponer de personal en cuanto ya que se observa sin presencia de obra civil.
- Se presentaron lluvias en horas de la tarde, dificultando la jornada de trabajo con descarga eléctricas, se (illegible) hizo la observación al contratista donde prevale la vida humana,
- Se realizo la toma de registro de imagen


Ing. Jefe de Obra
Interventoría

→ SE SOLICITA A LA INTERVENTORÍA QUE REALICE EL CHEQUEO DE ROLLOS, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN EL PERSONAL PARA QUE LO REALICE AUN CON FORMALETA COLOCADA UTILIZANDO METODOS ALTERNOS PARA ESTOS CASOS.







Scanned by CamScanner

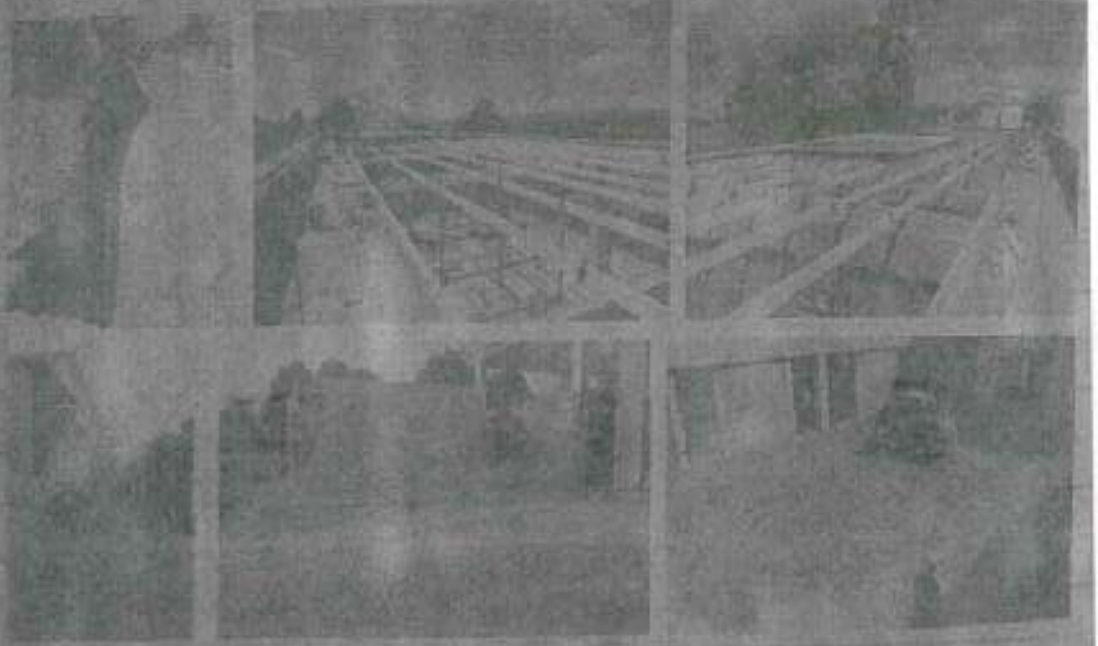

Scanned by CamScanner

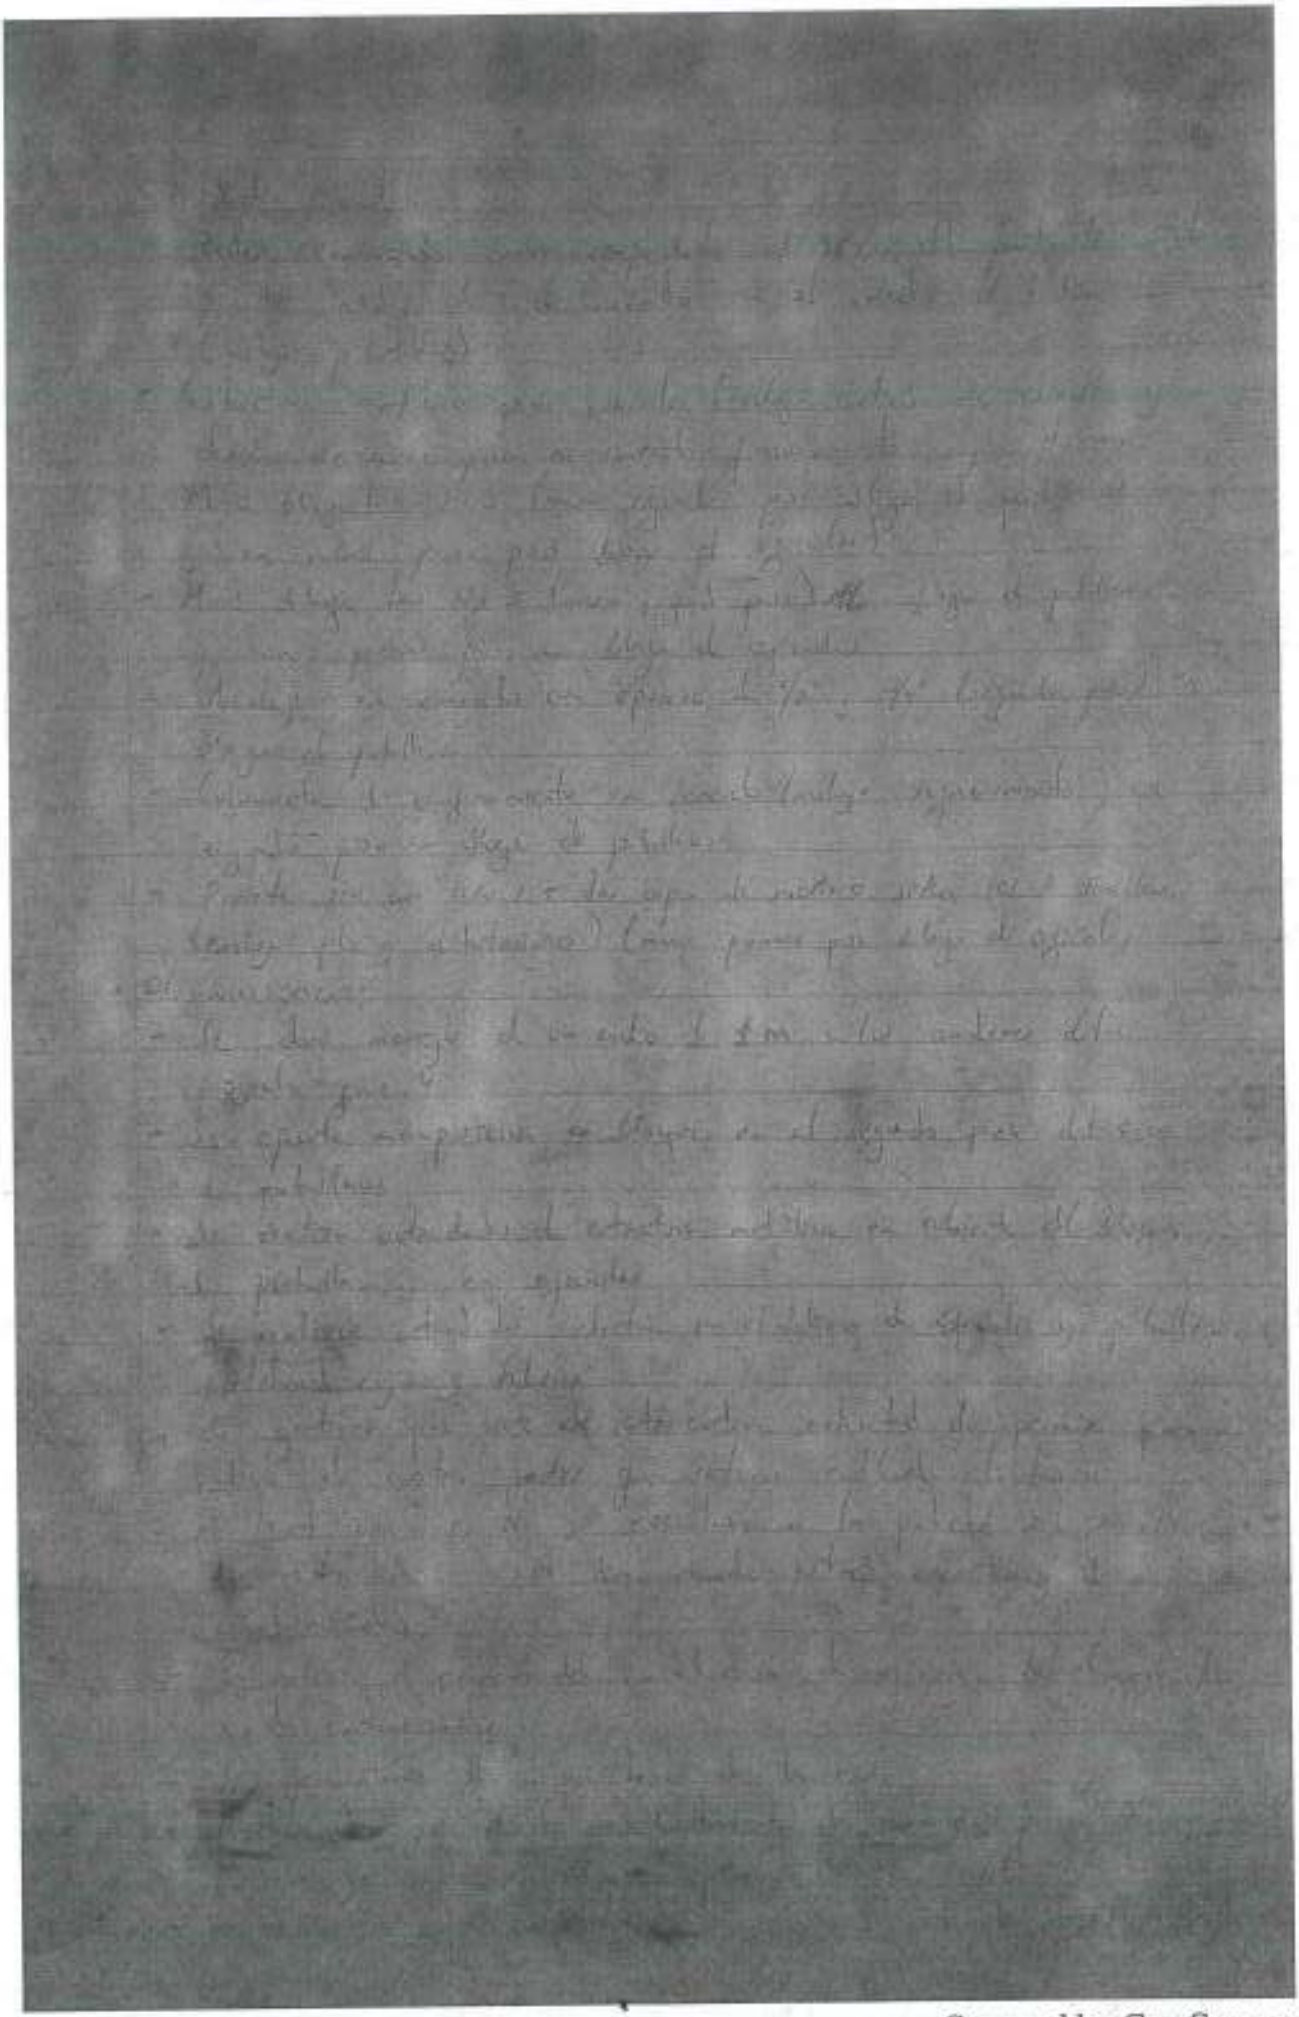

Scanned by CamScanner

Se adjunta registro fotográfico obra en ejecución:


















Scanned by CamScanner








SE ACATAN LAS INDICACIONES DE LA INTERVENTORIA EN CUANTO A LAS ALTURAS Y FLANCHES.
SE DISPONDRA PERSONAL ADICIONAL PARA FRENTES CASINO Y SUBESTACION.
SE AVANZA EN LA INSTALACION DE RELLENOS TANQUE, MAMPOSTERIA, CAJES DE INSPECCION, INSTALACION TUBERIA, ESTRUCTURA METALICA, PAÑETES, ETC.

GERENCIA BCS GUTIERREZ.

Miercoles 30 enero 2019

- Personal en Obra: Personal Administrativo, Obra, Consorcio BCS Gutierrez 57 Operador, 2 Conductores, 2 Inspectores 3 Ayudantes, 4 Ayudantes Mamposteria 1 hidraulico, 11 Mamposteros, 9 Oficiales Mamposteria 9 personas en tanque, 5 personas electricos Datales, 4 estructura metálica Metalbe SAS Operador Vibrocompactador, 2 personas comision topografia. 3 Oficiales y 5 Ayudantes Bruno, 5 Ayudantes y 4 Oficiales Arrieta
- Personal de Interventoria (Administrativo)
- Clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado

Scanned by CamScanner

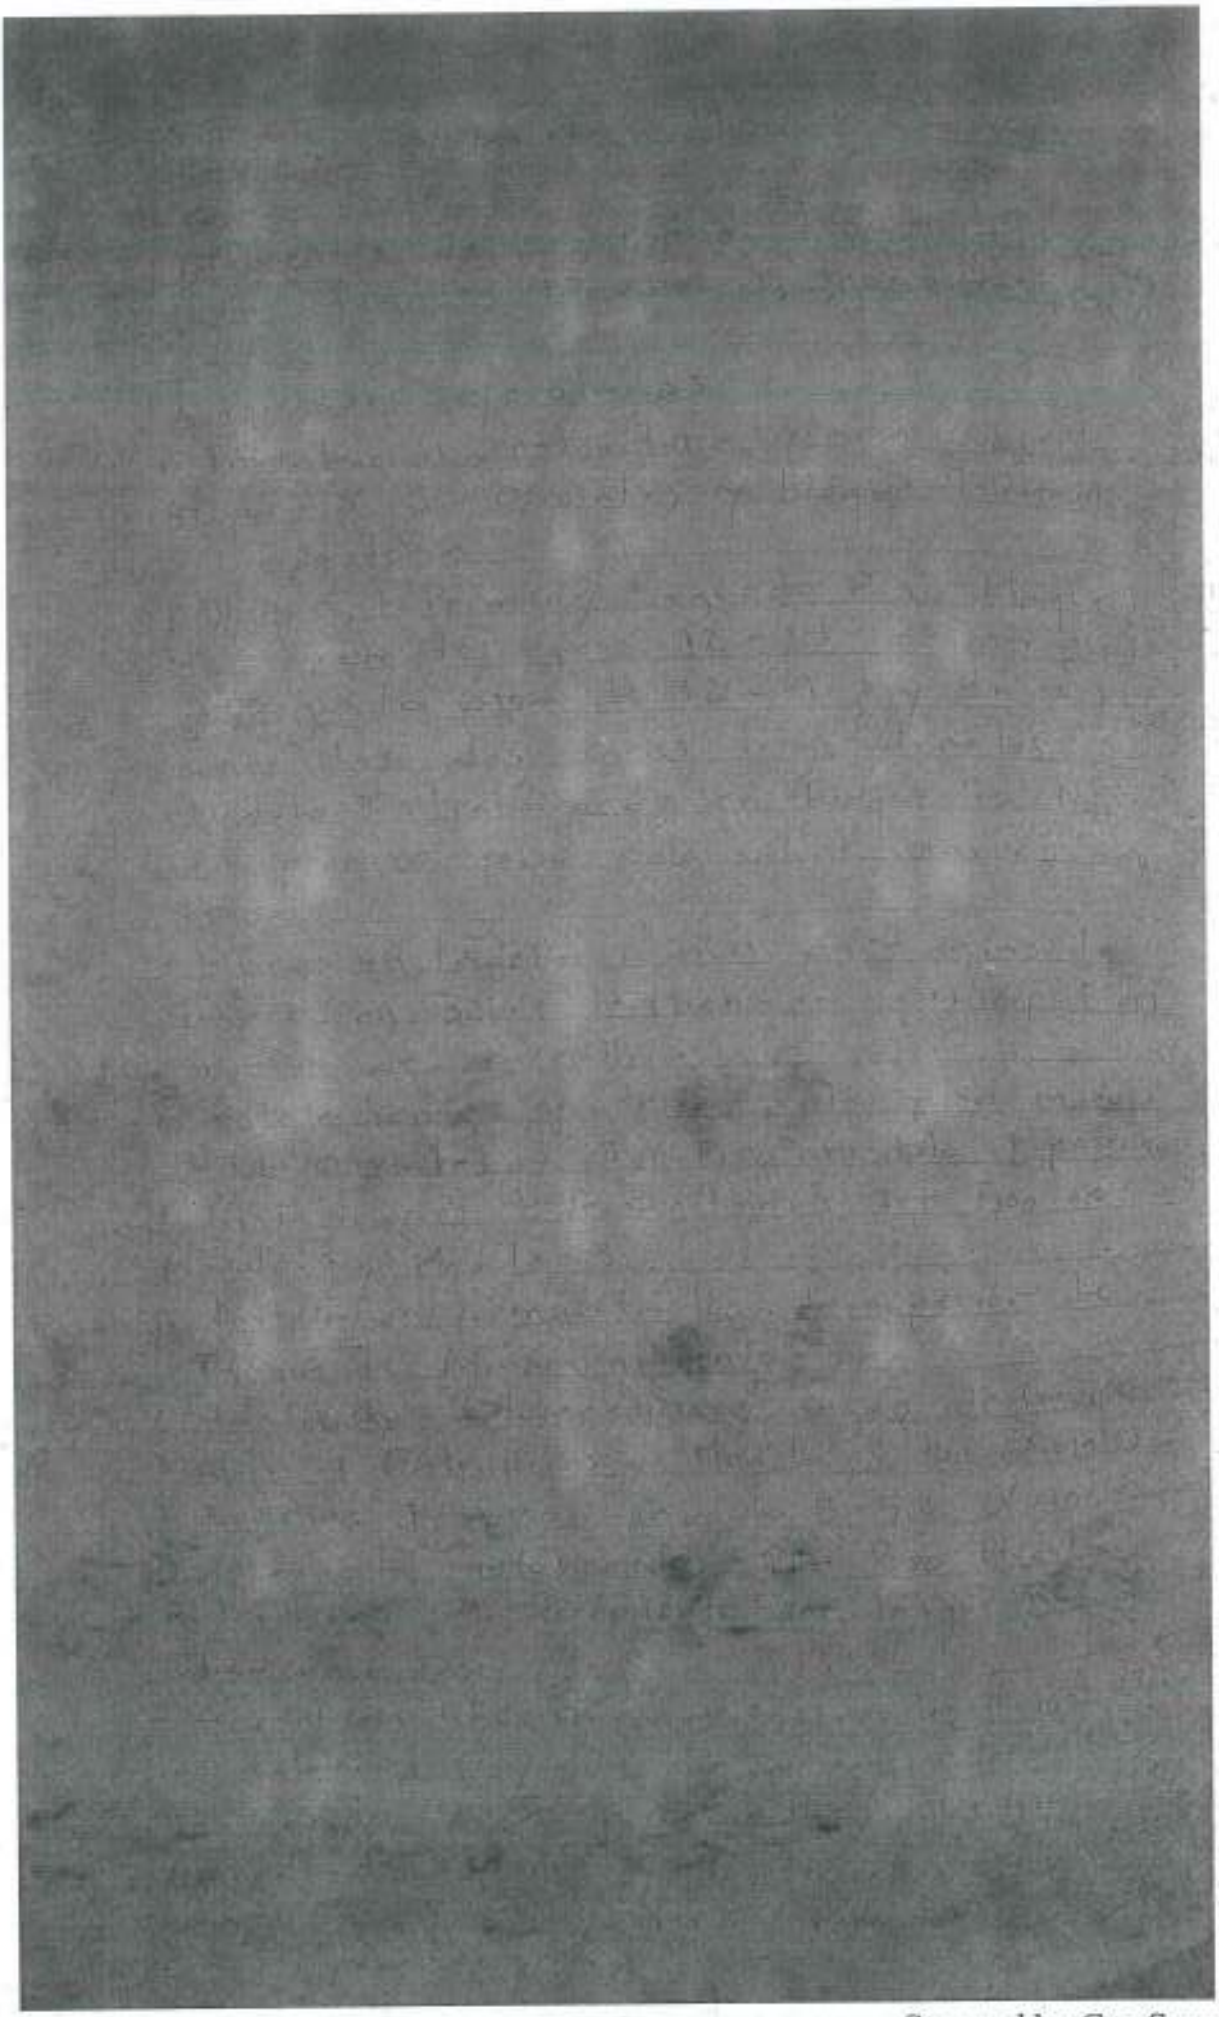

Scanned by CamScanner

EL CONTRATISTA AVANZA EN MAMPOSTERIA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, PAÑETES, TANQUE RCI, RETIRO FORMALETA BLOQUE OFICIALES, INSTALACION FORMALETA EN TANQUE ALMACENAMIENTO, RELLENOS, REDES AGUAS LLUVIAS, ESTRUCTURA METALICA.










EL CONTRATISTA CONTINUA A LA ESPERA DEL PAQUETE TOTAL DE PLANOS, SOLICITAMOS EN ESPECIAL LOS PLANOS DEL GIMNASIO PARA VERIFICAR TUBOS ELECTRICOS.

Scanned by CamScanner

Jueves 31 Enero 2019

- Personal en Obra:
- Personal Administrativo BCS Gutierrez
- Personal Operativo BCS Gutierrez (1 Operador Minicargador, 2 Conductor Volqueta, 2 Inspectores, 3 Ayudantes Generales Oficina, 4 Ayudantes Mampostería, 9 Oficiales Mampostería, 1 Hidraulica, 11 Mamposteres, 3 Ayudantes Bruno, 4 Oficiales Bruno, 8 Ayudantes Tanque, 2 Comisión Topografía)
- Arrieta (4 Oficiales, 4 Ayudantes)
- Datelec (5 Electricos)
- Metalbe SAS (4 Estructura Cubierta)
- Vibrocompactador 1 Operador.
- Juan Diego Gurrute (2 Personas levantando Prado)
- Personal Administrativo de Interventoría.
- Clima: Mañana: Soleado Tarde: (Soleado) Lluvia
- Equipos: Volquetes, Minicargador, Vibrocompactador
- Elementos de Seguridad Industrial: Casco, botas, guantes, tapabocas, Uniforme, tapaoidos, Chaleco
- Actividades Ejecutadas
- Instalacion tubería Sanitaria paralela fachada principal modulo 1 Patrulleros
- Construccion de Cajas en ladrillo tolete común sobre fachada principal modulo Patrulleros
- Mampostería:
  - Bloque liso #5 en muros transversales y longitudinales 2do Piso modulo 1 Patrulleros
  - Formaleta y fundicion Columnetas 1er piso modulo 1 Patrulleros y Segundo Piso
  - Instalacion formaleta 1er Piso y Vigas corona 1er piso modulo 3 Sub oficiales.
  - Repellos 1er Piso modulo 3 Sub oficiales.
  - Instalacion estructura de Cubierta en Modulo 1 y modulo 3
- Instalaciones eléctricas 2do Piso modulo 1 y 1er Piso modulo 3

Scanned by CamScanner

- Formaleteando losa de tanque almacenamiento (losa superior)
- Rellenos area interior entre modulo 1 y 3.

Observaciones:


- Se solicita al Contratista que portayer se terminen vigas de confinamiento y columnetas y repellos del modulo del Casino.
- Se da Inicio a descapote para el Area del Tanque RC1.

→ SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA EN EJECUCION.







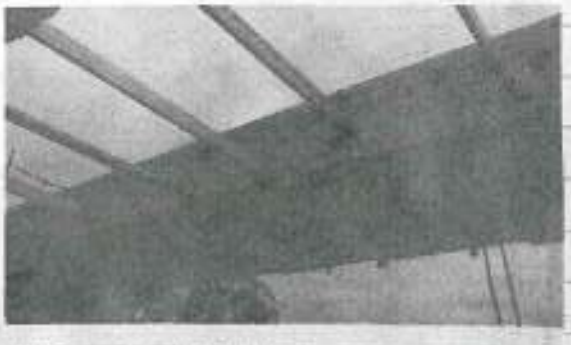



Scanned by CamScanner











-SE ACUERDA CON INTERVENTORIA EL MANEJO QUE SE DARA A LA VIGA DESCOLGADA EN CUBIERTA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA MINIMIZAR LA FILTRACION POR DICHA ZONA.

SE REALIZA EL ARMADO DEL RE FUERZO CORRESPONDIENTE

VIERNES 1 FEBRERO / 2013.

EL CONTRATISTA ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DONDE SE OBSERVA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ESTAN EN EJECUCION.

Scanned by CamScanner
