DAIMCO
NIT: 900021462 - 1

CPP-DIRAF-2018-113

Bogotá D.C. 13 de Marzo de 2019.

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión Informe Mensual No 09.

Respetados Señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir el informe mensual No. 09 de Interventoría, comprendido entre el primero (01) de febrero de 2019 al veintiocho (28) de febrero de 2019. La presente con el fin de informar a la entidad contratante el avance de ejecución del contrato.

Agradecemos de antemano su atención.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	*243 Folios*	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	*Archivo – Contrato de interventoría*	

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

POLICÍA NACIONAL

POLICIA NACIONAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN NO.4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.



DAIMCO

CONTRATO No. PN DIRAF NO. 06-3-10051-18

Informe Mensual No. **09**

INFORME DE INTERVENTORÍA
01 al 28 de Feb de 2019
VERSIÓN 0
VOLUMEN 1 DE 1
ORIGINAL

INFORME MENSUAL No 09 DE INTERVENTORIA

PROYECTO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN NO.4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

CONTRATO DE CONSULTORÍA PN DIRAF NO. 06-3-10051-18

TÍTULO:

INFORME MENSUAL No 09

01 DE FEBRERO DEL 2019 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Realizo: TIRSO COSME. Director de Interventoría

_____

Aprobó: Ing. José Vicente Bocanegra – Gerente Técnico de Interventoría

_____

Tabla de contenido

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

INDICE DE MODIFICACIONES

ESTADO DE REVISIÓ Y APROBACIÓN

1.INTRODUCCIÓN 6

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6

2.ESTADO Y AVANCE DEL PROYECTO 13

2.1 AVANCE DOCUMENTAL 13

2.2AVANCE DE ACUERDO A LA PORGRAMACIÓN 14

2.3CRONOGRAMA DE OBRA 15

3.ESTADO DEL CONTRATO 16

3.1 ÁMBITO FINANCIERO 16

3.2 ÁMBITO PRESUPUESTAL 16

3.3 ANTICIPO 17

3.3.1 Informe Plan Anticipo 18

3.4 FACTURACIÓN MENSUAL 19

4.ACTAS PARCIALES DE OBRA 20

5.ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORIA 21

6.TRABAJOS EJECUTADOS 21

6.1 DESCRIPCION GENERAL DE LAS TAREAS 21

6.2 MODIFICACIONES DEL PROYECTO 27

7.CUMPLIMIENTO PAGOS PARAFISCALES 27

8.PERMANENCIA Y ESTADO DE LOS EQUIPOS 27

8.1 CONTROL PERSONAL CONTRATISTA 27

8.2CONTROL PERSONAL INTERVENTORIA 27

8.3CONTROL DE EQUIPOS 27

9.ASPECTOS VARIOS 27

9.1REGISTRO FOTOGRAFICO 27

9.2ESTADO DEL TIEMPO 27

9.3POLIZAS 27

10.CONCLUSIONES 28

LISTA DE TABLAS

Tabla No. 1 Avance del proyecto 15

Tabla No. 2 Hitos 15

Tabla No. 3 Estado Financiero 16

Tabla No. 4 Avance Fisico 16

Tabla No. 5 Actas Parciales Contrato de Obra 20

Tabla No. 6 Actas Parciales Contrato de Interventoria 21

Tabla No. 7 Actas de Comité 21

Tabla No. 8 Equipos interventoria 22

Tabla No. 9 Polizas Contrato de Obra 28

Tabla No. 10 Polizas Contrato de Interventoría 28

RELACIÓN DE ANEXOS

INFORME EJECUTIVO No. 09

Anexo No.1. Informes semanales y diario

Anexo No.2. Relación de Correspondencia

Anexo No.3. Actas de comité del periodo

Anexo No.4. Plan de Anticipo

Anexo No.5. Seguridad Social

Anexo No.6. Control de personal del Contratista

Anexo No.7. Control de personal de la Interventoría

Anexo No 8 Informe SISO

Anexo No.9. Control de Equipos-Ensayos

Anexo No.10. Registro fotográfico

Anexo No.11. Control de clima

Anexo No.12. Bitácora

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Las copias de este documento han sido entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREA O DEPENDENCIA		No. DE COPIAS
Copia No. 1	**Policía Nacional**	**1 (original)**
Copia No. 2	**Archivo Contrato de Interventoría No. PN DIRAF 06-3-10051-18**	**1**

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

ÍNDICE VERSIÓN	CAPÍTULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
0		-	Versión original

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

TITULO DOCUMENTO:		INFORME MENSUAL		
DOCUMENTO No:		No. 09		
NUMERO DE REVISIÓN		0	1	2
RESPONSABLE POR ELABORACIÓN "Director de Interventoría"	Nombre:	**Ing. Tirso Cosme**		
	Firma:			
	Fecha:	**05-03-2019**		
RESPONSABLE APROBACIÓN "Gerente Técnico de Interventoría"	Nombre:	**Ing. José Vicente Bocanegra**		
	Firma:			
	Fecha:	**11-03-2019**		
RESPONSABLE APROBACIÓN "Supervisora del contrato"	Nombre:	**Mayor Ingeniero Civil Ángel Giovanni López Ostos**		
	Firma:			
	Fecha:	**12 -03-2019**		

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe Mensual No 09, correspondiente al Periodo del 01 de febrero del 2019 al 28 de febrero de 2019, presentado en cumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en el Contrato de Interventoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18 y los adicionales o prorrogas que se generen suscrito entre **DAIMCO S.A.S** y **POLICIA NACIONAL – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Se presenta acorde al manual de Interventoría y exigencias de la Policía Nacional – Dirección administrativa y financiera, el Control realizado por nuestra empresa al Contratista CONSORCIO CBS-GUTIERREZ, encargado de la ejecución del Contrato de Obra No. PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Localización del Proyecto: Popayán, departamento de Cauca.



El municipio de Popayán limita por el norte con los municipios de Cajibío y Piendamó, por el sur con los municipios de Sotará y Puracé, por el oriente con el municipio de Totoró, Puracé y el Departamento del Huila, por el occidente con el municipio de El Tambo y Timbio, el proyecto se desarrollara en la Región No 4 DECAU MEPOY Comando Departamento de

Policía Cauca en el predio con dirección Carrera 17 No 1 – 75 – Popayán - Cauca con matricula inmobiliaria 120-13255 con un área aproximada de 16 Hectáreas con 8.040 metros

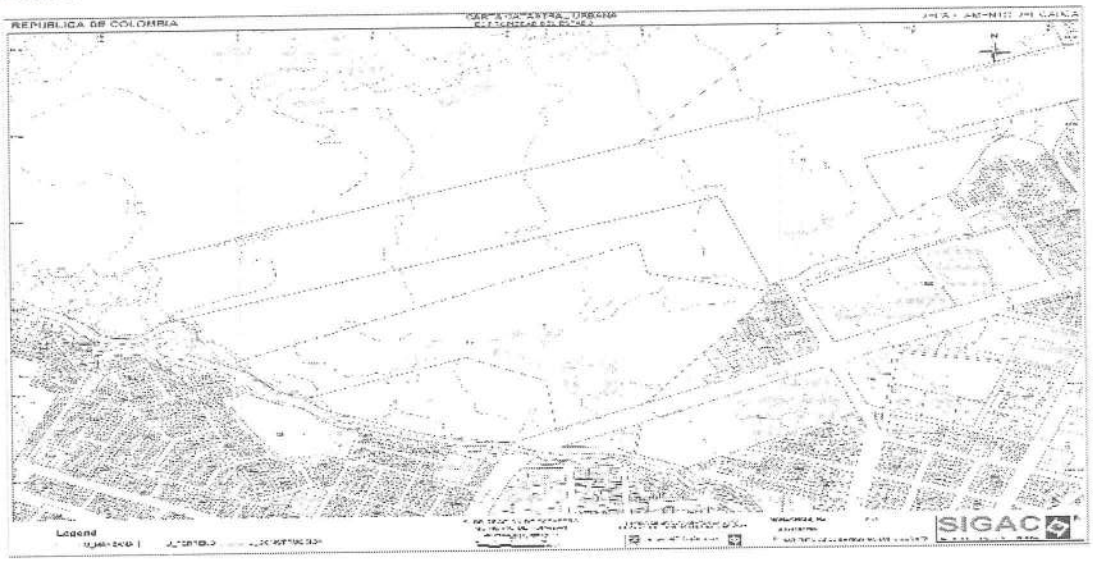


Ilustración 1. Localización general
Fuente. Equipo de Topografía

El proyecto se centra en la ejecución de las actividades para la **"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"**, de acuerdo a diseños de consultoría bajo el contrato No PN-DIRAF No 06-3-10041-15, el contrato de obra incluye la ejecución de actividades para el desarrollo de la Fase 4 – Edificio D de excavaciones, rellenos, estructura de concreto, mobiliario de oficinas, sistemas de detección de incendios, carpintería metálica y de madera, sistemas de ventilación mecánica y todas las adecuaciones urbanísticas eléctricas e hidráulicas internas y externas que permitan el correcto funcionamiento del edificio y el desarrollo de esta fase y de las fases futuras que comprenden el complejo de Policía del Cauca".

2. ESTADO Y AVANCE DEL PROYECTO

2.1 AVANCE DOCUMENTAL

Correspondencia Recibida

En el Anexo No. 2. Se relaciona y adjunta la correspondencia recibida del Contratista y de la Entidad contratante, durante el presente informe.

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento
PN-DIRAF-POPAYAN-136	Documentos corte # 07	1	N.A	06/02/2019 radicado el 07/02/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-137	Orden de pago #17 y #18	1	N.A	14/02/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-139	Cambio de residente # 4	1	N.A	19/02/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-140-1	Orden de pago #19 y #20	1	N.A	19/02/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-142-1	Remisión de APUS eléctricos NP105-NP118	1	N.A	21/02/2019
S-2019-004302-/DIRAF/GUMAI-43	Informando adición al contrato # PN-DIRAF-No 06-3-10051-18	1	N.A	14/02/2019

Correspondencia Enviada

En el Anexo No. 2. Se relaciona y adjunta la correspondencia enviada al Contratista y a la Entidad contratante.

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento
CPP-DIRAF-2019-095	Remisión orden de pago # 16	1	N.A	01/02/2019
CPP-DIRAF-2018-096	Remisión acta parcial # 07 –Contrato de obra	1	N.A	07/02/2019
CPP-DIRAF-2018-097	Remisión acta #07 de interventoría	1	N.A	07/02/2019
CPP-DIRAF-2018-098	Remisión informe mensual #08	1	N.A	14/02/2019

CPP-DIRAF-2018-099	Respuesta al documento S-2019-004302/DIRAF-GUMAI-43, con radicado DAIMCO D-2019-0324 del 14 de febrero de 2019-informando adicional al contrato PN-DIRAF-06-3-10051-18	1	N.A	14/02/2019
CPP-DIRAF-2018-100	Devolución de planos	1	N.A	14/02/2019
CPP-DIRAF-2018-101	Remisión orden de pago #17	1	N.A	18/02/2019
CPP-DIRAF-2018-102	Remisión orden de pago #18	1	N.A	18/02/2019
CPP-DIRAF-2018-103	Remisión orden de pago #19	1	N.A	20/02/2019
CPP-DIRAF-2018-104	Respuesta al documento PN-DIRAF-POPAYAN-0140 del 19 de febrero de 2019-Solicitud cambio de plan de inversión del anticipo	1	N.A.	20/02/2019
CPP-DIRAF-2018-105	Remisión orden de pago #20	1	N.A	21/02/2019
CPP-DIRAF-2018-106	Respuesta al documento PN-DIRAF-POPAYAN-139 del 19 de febrero de 2019-cambio residente #4	1	N.A.	25/02/2019

2.2 AVANCE DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN:

La nueva programación presentada por el contratista de acuerdo a la ampliación en plazo y adición presupuestal para la construcción del tanque de reserva de la Red Contra Incendios (RCI), por frente de trabajos, estos frentes son:

1. Edificio de Patrulleros en ejecución y activo
2. Edificio de oficiales en ejecución y activo
3. Casino en ejecución y baja actividad
4. Subestación y tanque de reserva, en ejecución
5. Tanque reserva de red contra incendios RCI, en ejecución.

El constructor viene avanzando en los diferentes frentes con mejores rendimientos en unos que en otros atribuible a ítems que en este mes se tenían programado iniciar como la colocación de pisos y el cielo falso.

Tabla 1. AVANCE DEL PROYECTO

INFORME	CORTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
No 09	DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.	50.01%	45.15%

En el mes de febrero se ejecutaron actividades como la construcción de la estructura de cubierta y la fabricación y montaje de la cubierta, se continuo con construcción de mampostería con bloque #5 en edificios de oficiales en segundo piso además se continua en la construcción de viguetas y columnetas de amarre a la mampostería, en área del tanque de reserva para la Red Contra Incendio RCI se realiza excavación en el cual se encuentra varios cruces de tuberías de redes hidrosanitarias, las cuales provienen del edificio antiguo que sirve de alojamiento, estas redes provocan actividades imprevistas como es el redireccionamiento de las mismas, se realiza relleno con material de subbase, y se evidencia en esta excavación del tanque RCI aguas subterráneas lo que implicara realizar filtros alrededor del tanque para controlar este flujo. Se continua en actividades como fundición de viguetas y columnetas de confinamiento de mampostería, se realiza instalación de tubería para redes eléctricas, se continuo con el relleno con material de recebo de acuerdo con las especificaciones.

Los informes semanales realizados en el periodo de 01 al 28 de febrero de 2019 se encuentran en el **anexo No. 1** del presente informe.

2.3 CRONOGRAMA DE OBRA

De acuerdo con la reprogramación presentada por el constructor el inicio de algunos hitos a esta fecha debería haberse comenzado, esto puede representar la diferencia entre lo programado y ejecutado.

Tabla 2. HITOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA
01	ACTIVIDADES PRELIMINARES	07 /JUNIO / 2018
02	DESMONTES Y DEMOLICIONES	07 /JUNIO/ 2018
04	EXCAVACIONES Y RELLENOS	19/JULIO / 2018

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA
04	CIMENTACIÓN	15/SEPTIEMBRE / 2018
05	PISOS - BASES	11/ FEBRERO / 2019
07	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	21 / SEPTIEMBRE / 2018
07	TANQUE DE RESERVA	17 / SEPTIEMBRE / 2018
09	ESTRUCTURA METALICA	14 /FEBRERO / 2019
09	MAMPOSTERÍA	30/ NOVIEMBRE / 2018
10	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	30/ NOVIEMBRE /2018
11	PAÑETES	27 / FEBRERO/ 2018
12	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS	04 / OCTUBRE / 2018
13	INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEMATICAS Y AUTOMATIZACIÓN	15 / ENRO / 2019
14	PISOS - ACABADOS	23/ FEBRERO / 2018
15	CARPINTERÍA MADERA	7/ MARZO / 2019
16	CARPINTERÍA METÁLICA	20 /MARZO / 2019
17	PINTURA	11 / FEBRERO / 2019
18	CUBIERTAS	21 / ENRERO / 2019

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA
19	CIELOS RASOS	29 / FEBRERO / 2019
22	MUEBLES FIJOS	29 / FEBRERO / 2019
23	ENCHAPES, ESPEJOS, MESONES Y DIVISIONES	29 / FEBRERO / 2019
24	APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS	14/ MARZO / 2019
26	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA	28 / FEBRERO / 2019
27	MOBILIARIO DE OFICINAS	8/ ABRIL / 2019
28	DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS	8/ ABRIL / 2019
30	ASEO DE OBRA	18/ ABRIL / 2019

3. ESTADO DEL CONTRATO

3.1 ÁMBITO FINANCIERO

A la fecha de corte del presente informe mensual No 09 (01 de febrero de 2019 al 28 de febrero de 2019), se tiene que el avance financiero es el siguiente:

Tabla 3. ESTADO FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	$ 9.250.463.250,09
ADICION	433.346.050.00
VALOR ACTUALIZADO	$ 9.683.809.300,31
VALOR PROGRAMADO	$ 4.842.873.031,09
VALOR EJECUTADO	$ 4.372.239.899,09

3.2 ÁMBITO PRESUPUESTAL


A la fecha de corte del presente informe mensual No 09 (01 de febrero de 2019 al 28 de febrero de 2019), se tiene que el avance físico es el siguiente:

Tabla 4. AVANCE FISICO

PORCENTAJE PROGRAMADO	**50.01 %**

PORCENTAJE EJECUTADO	45.15 %

En la gráfica apreciamos una curva descendente en la programación, que corresponde al adicional en tiempo que se le aprobó al contratista, por tal motivo Se presenta la Gráfica de Control Avance de obra (Programado Vs Ejecutado). se mantiene una pequeña diferencia para lo que se le ha solicitado al constructor ejecutar un plan de contingencia que permita reducir la diferencia entre el porcentaje de programación y ejecución.

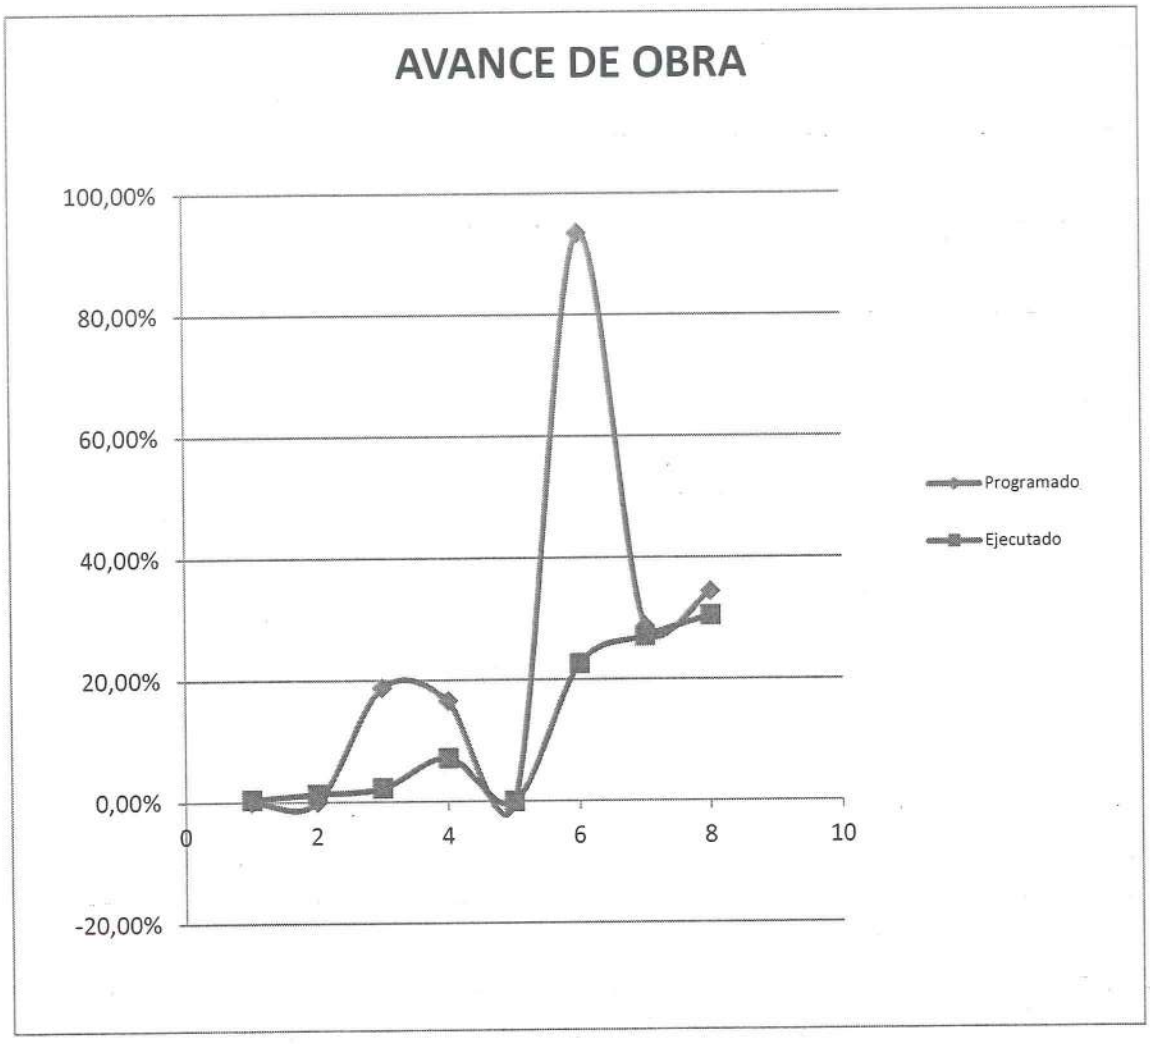

3.3 ANTICIPO

De acuerdo con Prorroga No 01 y Modificatorios # 1,2,3 y 4, generados, se aprueba al contratista una ampliación al Anticipo por un porcentaje total del 50% del contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, esto de acuerdo con las solicitudes presentadas por el contratista a esta interventoría.

PROYECCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO		Página 1de1
PROGRAMACIÓN	FECHA	
CONTRATO No.	PN DIRAF 06-6-10044-18	
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 9.250.463.250,08
CONTRATISTA	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ	
INTERVENTOR	DAIMCO SAS	
PLAZO	Hasta el 15 de Diciembre de 2018	
VALOR ANTICIPO	50%	$ 4.625.231.625,04

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 1.387.569.487,51	30,00%
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 2.913.895.923,78	63,00%
3	Transporte y retiro de escombros	$ 231.261.581,25	5,00%
4	Pólizas, impuestos, administración	$ 92.504.632,50	2,00%
TOTAL		$ 4.625.231.625,04	100,00%

3.3.1 Plan De Inversión Del Anticipo Aprobado:

A continuación, se presenta el plan de Inversión del Anticipo aprobado a la fecha para el contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18.

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO		Página 1de1
PROGRAMACIÓN	FECHA	19-feb-19
CONTRATO No.	PN DIRAF 06-6-10044-18	
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 9.250.463.250,08
CONTRATISTA	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ	
INTERVENTOR	DAIMCO SAS	
PLAZO	Hasta el 29 de abril de 2019	
VALOR ANTICIPO	50%	$ 4.625.231.625,04

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 1.626.671.348,00	35,17%
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 2.690.330.223,04	58,17%
3	Transporte y retiro de escombros	$ 259.106.455,00	5,60%
4	Descuentos y retenciones	$ 49.122.000,00	1,06%
TOTAL		$ 4.625.231.625,04	100,00%

Nota:

a) Plazo en días para la inversión del anticipo 150 días.

Para constancia de lo anterior, se firma y aprueba el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2019

MAYOR ANGEL GIOVANNY LÓPEZ CASTRO
Supervisor de Contrato
POLICIA NACIONAL-DIRAF

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

CAPITAN OLIVER ESPITIA PALOMINO
Representante Legal
DAIMCO SAS
INTERVENTORIA

3.4 FACTURACIÓN MENSUAL

CONTRATO DE OBRA

La Policía Nacional-Dirección Administrativa y Financiera cancelará el valor del contrato en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma:

UN ANTICIPO:

Disponible para el contratista desde el mes de diciembre de 2018, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato principal, lo anterior teniendo en cuenta la solicitud que realizo el contratista toda vez que contractualmente la entidad había quedado de otorgarle el 20% de anticipo 30 días después que se legalizara el contrato y en esto no fue posible cumplirle al contratista, por tal motivo la entidad, aprobó el incremento del porcentaje.

NOTA 1: El contratista deberá constituir un contrato de fiducia con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera de Colombia, para el manejo de los recursos provenientes del anticipo en los términos establecidos en los artículos 2.2.1.1.2.4.1 y 2.2.1.2.3.3.1 del Decreto 1092 de 2015, así mismo presentará a la interventoría la programación de inversión del anticipo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la aprobación de la garantía única, el cual debe estar aprobado por la interventoría y el supervisor de la interventoría, garantizando control permanente sobre el mismo.

NOTA 2: En los términos y condiciones del contrato de fiducia deberá quedar como obligación:

a) La entrega de un informe mensual por parte de la fiducia, donde se evidencien los pagos efectuados y los rendimientos mensuales a consignar en la cuenta que indique la entidad contratante.

b) Los desembolsos solicitados por el contratista de obra tomando como base el plan de manejo del anticipo, deberán ser autorizados por el representante legal de la interventoría.

El pago del anticipo se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la aprobación de la garantía única, una vez aprobados los documentos presentados y requerido 'por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y a la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

PAGOS PARCIALES:

Se realizarán. pagos parciales de acuerdo al porcentaje de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez, la Interventoría y Contratista hayan suscrito el acta parcial

correspondiente con sus respectivas memorias y que la Interventoría haya certificado la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinticinco (25) de cada mes.

Nota 1: En cada acta de corte parcial se amortizará proporcionalmente, el valor entregado al, contratista en calidad de anticipo, hasta amortizar el 100% de su valor.

Cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación.

Previo a la presentación de las actas parciales y a su ejecución, deberá estar aprobado por la DIRAF el balance de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos si los hay. Consolidado por el contratista de obra con los soportes documentales (y fotográficos de ser necesario), proyectado y avalado por la interventoría. igual condición para el acta final, si hay modificaciones al balance aprobado.

Para cada una de las actas parciales, el pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles, una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del plan anual de caja (PAC), así:

- Acta de recibo parcial. (suscrita entre los contratistas de obra e interventoría) Factura de venta
- Balance de cantidades ejecutadas.
- Certificación de pagos parafiscales y seguridad social.
- Certificación pagos FIC
- Memoria de cantidades ejecutadas.

Y los demás documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera,

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o. si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección Administrativa y Financiera, programará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

JUSTIFICACIÓN DEL PAGO DE ANTICIPO:

En el presente proceso de contratación el Grupo de Seguimiento a Proyectos del Área de Infraestructura de la Dirección Administrativa y Financiera justifica el pago de anticipo al futuro contratista, con el fin de que el proyecto constructivo tenga la financiación suficiente y el constructor tenga la posibilidad de adquirir los insumos y bienes a los precios establecidos en el presente contrato.

Es de anotar que el giro de los recursos a una fiducia independiente genera el respaldo del manejo de los dineros evitándose la desviación de los mismos, toda vez que los desembolsos deberán ser autorizados por la interventoría.

Es importante aclarar que el anticipo deberá estar amparado por la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, acorde al Decreto 1092 de 2015 'por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional" en su Artículo 2.2.1.1.2.4.1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La Policía Nacional-Dirección Administrativa y Financiera cancelará el valor del contrato en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma:

PAGOS PARCIALES:

Se realizarán pagos parciales hasta completar el 95% del valor del contrato, sujetas al porcentaje de avance del contrato de obra que corresponderá al valor ejecutado en el respectivo periodo, las que se tramitarán una vez el supervisor e Interventor hayan suscrito el acta parcial correspondiente y se certifique la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, de igual manera el supervisor de la interventoría deberá certificar el cumplimiento de las funciones y obligaciones contractuales; las actas deberán presentarse a más tardar el día veinticinco (25) de cada mes.

Para cada uno de los pagos parciales, se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a, turno y la disponibilidad del plan anual de caja (PAC), así:

- Factura de venta
- Certificación de pagos parafiscales y seguridad social

Y los demás documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección Administrativa y Financiera, programará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

ACTA DE RECIBO FINAL

Su valor será del cinco por ciento 5% del valor total del contrato, una vez se certifique por parte del supervisor del contrato de interventoría el recibo a satisfacción del cien (100%)

del valor del contrato. Se presentará una vez la interventoría certifique el recibo a satisfacción del cien por ciento (100%) del contrato de obra y se haya recibido a satisfacción el cien por ciento (100%) del valor del contrato de interventoría en el cual se certifique el seguimiento y control adelantado por la interventoría al contrato de obra.

El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de las facturas del acta respectiva, junto con el recibo a satisfacción suscrito por la interventoría del contrato, con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo con el derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección Administrativa y Financiera, programará el valor a, cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Nota: Es claro que el valor del contrato de interventoría y su pago, se realizará bajo objetivo ejecutado en el contrato de obra y no por la permanencia de los profesionales o el mayor tiempo de ejecución del contrato de obra en el desarrollo de los ítems con su valor contractual, por tal motivo la única forma de realizar una adición presupuestal al contrato de interventoría, 1 será siempre y cuando se realice alguna adición presupuestal al contrato de obra, el cual justifique la necesidad de tener mayor tiempo en su ejecución, para la realización de las actividades contempladas en la adición.

4. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha presentado cuatro actas parciales para aprobación de la interventoría:

Tabla 5. ACTAS PARCIALES CONTRATO DE OBRA No. 07-6-10044-18

No. Acta	Periodo	Valor Total del Acta	AMORTIZACIÓN
1	7 de junio hasta 7 de julio de 2018	$ 88.945.135.99	17.789.027,20
2	09 de Julio hasta 07 de agosto de 2018	$ 99.764.316,74	19.952.863,35
3	09 de agosto hasta 07 de septiembre de 2018	$ 271.551.766,01	54.31.353,20
4	09 de septiembre hasta 07 de octubre de 2018	$385.070.488,89	77.012.097,78

5	08 de octubre hasta 07 de noviembre de 2018	614.366.847,81	122.873.369,56
6	08 de noviembre hasta 20 de diciembre de 2018	1.047.183.680,70	209.436.736,14
7	21 de diciembre de 2018 hasta el 29 de enero de 2019	884.138.348,38	442.069.174,19
8	30 de enero de 2019 hasta el 28 de febrero de 2019	514.864.809,38	323.335.100,29
9	30 de enero de 2019 hasta el 28 de febrero de 2019	78.864.470,65	39.432.235,33

ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORÍA

Contrato de Interventoría

A la fecha la Interventoría ha radicado Actas Parcial a la Entidad Contratante:

Tabla 6. ACTAS PARCIALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 06-3-10051-18

No. Acta	Periodo	Valor Total del Acta
1	7 – Jun / 7 Jul 2018	4.445.827,38
2	8 jul / 7 ago. 2018	4.986.612,54
3	8 ago. / 7 Sep. 2018	13.573.224,24
4	8 sep. / 7 Oct 2018	19.246.836,21
5	8Oct / 7 Nov 2018	30.708.469,01
6	8 Nov / 20 Dic 2018	52.342.354,94
7	20 dic 2018/ 29 ene 2019	44.192.708,59
8	30 ene 2019 / 28 feb 2019	25.734.966,17
9	30 ene 2019 / 28 feb 2019	3.941.956,12

5. TRABAJOS EJECUTADOS

5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS TAREAS

- ACTAS DE COMITÉ

Dentro de las tareas desarrolladas durante el periodo en evaluación, se encuentran la suscripción de actas de comité, las cuales se han realizado para el seguimiento de la POLICIA NACIONAL hacia el contrato de Interventoría y de comité de Interventoría hacia el contrato de obra. Dichas actas se indican a continuación y se encuentran en medio físicos en el **anexo No. 3** del presente informe:

Tabla 7. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

FECHA	CONCLUSIONES
08 de febrero de 2019	Acta # 26 Revisión de planos red sanitaria de parte de interventoría, instalación de teja de cubierta, solicitud al Supervisor My Ángel López de los archivos planos de RCI.
21 de febrero de 2019	Acta # 27 Comité realizado en presencia del supervisor del proyecto el Mayor. Ángel Giovanny Lopez O., entrega de diseño de tanque RCI, se adelantará gestión para actualizar licencias ambientales y de construcción entre constructor e interventoría con apoyo de DIRAF.
28 de febrero 2019	Acta # 28 Contratista hace énfasis en que han realizado corrección de observaciones realizadas por interventoría, pero igualmente se recalca que aún siguen realizando mismos procedimientos que hay que corregir, verificación y solicitud de propuestas para evacuar aguas de filtro que se haría alrededor de tanque RCI

- **ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

Dentro de las actividades efectuadas por el Consorcio BCS- Gutiérrez y la interventoría Daimco, durante el periodo de 01 de febrero del 2019 al 28 de febrero del 2019, se encuentran las siguientes:

- **Cumplimiento de Especificaciones técnicas, diseños, normas técnicas, cantidades, según contrato.**

  La DIRAF en cabeza del Supervisor del proyecto el Mayor Ángel Giovanny López Ostos adelantaron las gestiones y documentos pertinentes para la aprobación de modificatorios y prorrogas al contrato.

ACTIVIDADES ADELANTADAS:

- Se realiza trabajo conjunto de presentación de Análisis de Precios Unitarios no previstos y precios adicionales para obras de urbanismo, paisajismo y gimnasio que soportaran la solicitud de adición al presupuesto contractual.

- En cuanto a los oficios dirigidos a la entidad para aclarar las inconsistencias o dudas encontradas el Supervisor DIRAF, estos con el fin de que se vea la trazabilidad.

EXTERIORES

- **Acciones adelantadas por la interventoría y supervisión actividades Eléctricas**
  En ejecución los planos aprobados y actividades definidas en el último balance que incluían los cambios y definiciones eléctricas realizadas por el intendente Adán Rubio de la Policía.

- **Acciones adelantadas por la interventoría y supervisión actividades chequeo topografía**

  Se envía datos de topografía sobre los rellenos a realizar para emparejar niveles de zonas aledañas a edificio, al Supervisor Mayor Giovanni López para la verificación del volumen a rellenar.
  Se realiza la verificación del proyecto en nivelación de cada uno de los niveles de losa de cimentación y verificación y corrección de la localización de columnas y demás elementos estructurales.

- **Acciones adelantadas por el contratista y supervisión ante el cumplimiento al Carácter Técnico.**

  Respecto de la fundición de tanque de reserva la interventoría realizo intentos variados y a pesar de haberse comunicado con la parte diseñadora, como no fue posible se resolvió en obra con la colaboración de los asesores de la interventoría y casi 20 días después de haber terminado obra de tanque de reserva se recibió oficio de parte de consultoría donde básicamente no aclaraba las dudas planteadas ..

- **Calidad de la Obra, Equipos, Bienes, Insumos, Ensayos o Pruebas.**
  El contratista en el mes de febrero tuvo en obra, una (1) máquina retroexcavadora sobre llantas, (2) volquetas de planta y (1) Mini cargador, equipos utilizados para trabajos de excavación y regado de material.

- **Novedades, observaciones y recomendaciones de carácter técnico.**
  La interventoría ha estado muy atenta en informar los posibles cambios del clima que podrían afectar los trabajos, para este periodo se presentaron tiempo lluvioso y algunas tormentas que afectarían el desarrollo de trabajos. En la segunda quincena de febrero se presentó un clima variado pero favorable en términos generales para la ejecución de obras.

6. CUMPLIMIENTO PAGOS PARAFISCALES

En lo correspondiente al presente periodo, la interventoría ha realizado el seguimiento y control bajo los lineamientos de la normatividad sobre la materia (aspectos básicos legales):

- Seguimiento a las afiliaciones al sistema de seguridad social de los trabajadores que laboran en la obra. (Contratista entregó copias de las afiliaciones).
- Inspección en el desarrollo de las actividades la entrega de los elementos de protección personal –EPP y supervisión en el uso de los mismos.
- Solicitud al constructor sobre la entrega de los exámenes médicos de ingreso de salud ocupacional del personal que labora en el proyecto.

En el anexo No. 5 se muestran las planillas de pagos parafiscales de los profesionales involucrados en el proyecto del Contratista y la interventoría.

7. PERMANENCIA Y ESTADO DE LOS EQUIPOS

8.1 CONTROL PERSONAL CONTRATISTA

En el Anexo No. 6. Se diligenció el Formato Control del Personal, acorde a lo requerido por el contrato de obra No DIRAF 07-6-10044-18, para la ejecución de las actividades correspondientes al presente periodo.

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	Director de ing. obra	Ing. Julián Mauricio Giraldo
2	Residente 2 de ing. obra	Ing. María Teresa Ojeda Cabrera
3	Residente de arquitectura	Arq., Edgar Enrique Calvete
4	Auxiliar administrativo	María Fernanda Benavidez
5	Residente ing. Ambiental y SISO	Yuli Gomez Urbano
7	Topógrafo 1	Margarita Eugenia Álvarez Fuentes
9	Auxiliar topografía	Alexandra Risueño
10	Maestro	Armando José Arrieta
11	Ayudantes	282

8.2 CONTROL PERSONAL INTERVENTORIA

En el Anexo No. 7. Se encuentra el Formato Control del Personal de la Interventoría, para la ejecución de las actividades durante el periodo del contrato de interventoría No DIRAF 07-3-10051-18

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1	ING. TIRSO MARINO COSME OROZCO
2	RESIDENTE ING. CIVIL	ING. SANDRA LUCIA GUAUÑA PISSO
3	RESIDENTE ARQUITECTURA	ARQ. MONICA LILIANA BENITEZ ANGEL
4	RESIDENTE AMBIENTAL ESP. SALUD OCUPACIONAL	ROSA DEL MAR RODRIGUEZ GALVIS
5	ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JAVIER JOSE CARRILLO O.
6	RESIDENTE ING. TOPOGRAFO	RIGOBERTO LOZADA DIAZ
7	RESIDENTE ELÉCTRICO	VICTOR MANUEL BOCANEGRA
8	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JOSE ARMANDO RUIZ ANGARITA
9	ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA	ALBERTO FEDERICO MOUTHON BELLO
10	ASESOR JURÍDICO	PABLO MANRIQUE CONVERS
11	ASESOR CONTABLE	PABLO EMILIO GUERRERO JIMENEZ

8.3 CONTROL DE EQUIPOS

En el Anexo No. 09 se presenta el formato Control de Equipos, en el cual se reportan los equipos usados por el Contratista en obra durante dicho periodo.

Cuadro 8. Relación de Equipos de Interventoría

EQUIPOS	CANTIDAD
COMPUTADORES	5

CAMARA DIGITAL	3
IMPRESORA	1
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	1
EQUIPO ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS	1

8. ASPECTOS VARIOS

8.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO

El registro fotográfico se presenta en el anexo No. 10 del presente informe.

9.2 ESTADO DEL TIEMPO

En el Anexo No. 11 se presenta el formato control del clima, en el cual se reporta el estado del tiempo en la obra durante dicho periodo

9.3 POLIZAS

Contrato de Obra

En el siguiente cuadro se relacionan las pólizas del contrato de obra No DIRAF 06-6-10044-18.

Tabla 9. POLIZAS CONTRATO DE OBRA

GARANTÍAS				
POLIZAS	COMPAÑÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
			Iniciación	Terminación
Anticipo	Seguros del Estado S.A.	4.841.904.651	18/05/2018	02/12/2019
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A.	1.936.761.861	18/05/2018	02/12/2019
Pago de salarios y prestaciones	Seguros del Estado S.A.	484.190.466.00	18/05/2018	02/10/2022

Estabilidad de la obra	Seguros del Estado S.A.	2.905.142.791	15/12/2018	15/12/2023
Calidad de los bienes	Seguros del Estado S.A.	329.371.500.00	18/05/2018	05/09/2020

Contrato de Interventoría

En el siguiente cuadro se relacionan las pólizas del contrato de Interventoría No. DIRAF 06 -3-10051-18

Tabla 10. POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

GARANTÍAS				
POLIZAS	COMPAÑÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
			Iniciación	Terminación
Cumplimiento	Seguros Mundial	$ 96.806.967,66	07/06/2018	29/10/2019
Calidad de Servicio	Seguros Mundial	$ 242.017.419,15	29/04/2019	29/04/2024
Pago de salarios y prestaciones	Seguros Mundial	$ 24.201.741,91	07/06/2018	29/08/2022

9. CONCLUSIONES

El edificio de Patrulleros se ha realizado la instalación de estructura metálica para cubierta como la fabricación y montaje de cubierta, se realizan últimos muros y se avanza en repello sobre muros, instalaciones eléctricas tubería, colocación de tubería hidráulica y sanitaria en niveles superiores.

En edificio de Casino se encuentra arreglo y repello de regatas eléctricas, en este edificio la actividad ha sido muy lenta en el mes.

Se adelantan redes exteriores de alcantarillados sanitarios y pluviales de los edificios de la fase 4.

El edificio de oficiales se realizó la fundición de losa de cubierta, se ha instalado estructura de cubierta y se está terminando la colocación de cubierta, en segundo piso terminando mampostería y avanzando en repello en segundo nivel.

Considerando el porcentaje de atraso a pesar que el contratista intento tener doble jornada para acortar tiempos, vale la pena anotar que por disposiciones de seguridad en el Comando de Policía Cauca los permisos de trabajo solo se pudieron lograr hasta las 10 pm lo que solo permitió alargar jornada, sin el rendimiento deseado, considero que aunque la diferencia porcentual se mantiene, el constructor se haya en toda la disponibilidad con recursos humanos y suministros que se encuentran en obra como baldosa para piso y gradería metálica a instalar y otros que se encuentran en fabrica como la carpintería en aluminio.

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

RESUMEN EJECUTIVO INT-11:09

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

PERIODO DEL INFORME

DEL			AL		
1	2	2019	28	2	2019

No. DE INFORME 9 DE 2019

PLAZO TRANSCURRIDO

FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION		
7	6	2018	28	2	2019

TIEMPO CONTRACTUAL TRANSCURRIDO EN DIAS 266 DE 2019

DATOS BASICOS

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
CONTRATO No.	06-6-10044-18
VALOR INICIAL	$ 9.250.463.250,08
VALOR ADICION NO 01	$ 433.346.050,23
VALOR ACTUALIZADO	$ 9.683.809.300,31
PLAZO INICIAL	191,00
PRORROGA	135,00
PLAZO ACTUALIZADO	326,00
FECHA DE INICIACIÓN	O7 DE JUNIO DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE ABRIL DE 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	DAIMCO S.A.S
CONTRATO No.	06-3-10051-18
VALOR INICIAL ESTUDIO Y DISEÑOS	
VALOR ACTUALIZADO ESTUDIO Y DISEÑOS	
VALOR INICIAL INTERVENTORIA	$ 462.374.500,00
VALOR ADICIONES	$ 21.660.338,29
VALOR ACTUALIZADO INTERVENTORIA	$ 484.034.838,29
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	191,00
PRORROGA	135,00
PLAZO ACTUALIZADO	326,00
FECHA DE INICIACIÓN INTERVENTORIA	O7 DE JUNIO DE 2018
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	29 DE ABRIL DE 2019

AVANCE DEL OBRA

		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
PROGRAMADO ACUMULADO	%	0,00%	0,00%	18,74%	16,52%	0,00%	93,38%	28,62%	34,37%
	Valor			##########	##########	$ -	$ 8.638.507.935,78	$ 2.771.506.221,75	$ 3.328.351.611,99
EJECUTADO ACUMULADO	%	0,417%	1,307%	2,256%	7,178%	0,00%	22,54%	25,85%	30,43%
	Valor	$ 38.582.253,33	$ 120.934.593,63	$ 208.656.853,11	$ 664.039.632,46	$ -	$ 2.085.259.493,39	$ 2.503.261.422,57	$ 2.946.784.044,44

		MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16
PROGRAMADO ACUMULADO	%	50,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Valor	$ 4.842.427.110,59							
EJECUTADO ACUMULADO	%	45,15%	0,000%	0,000%	0,000%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Valor	$ 4.372.239.899,09							

DAIMCO
NIT 800037482 - 1
Diseño, Asesorias, Interventorias, Montaje, Mantenimiento y Construcción

RESUMEN EJECUTIVO INT-11:09

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

PERIODO DEL INFORME

DEL			AL		
1	2	2019	28	2	2019

No. DE INFORME 9 DE 2019

PLAZO TRANSCURRIDO


FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION		
7	6	2018	28	2	2019

TIEMPO CONTRACTUAL TRANSCURRIDO EN DIAS 266 DE 2019

MANEJO DE ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

ENTIDAD BANCARIA		BANCO POPULAR	
CIUDAD		BOGOTÁ	
SUCURSAL		BOGOTÁ	
No. DE CUENTA		220-050-11979-1	
FECHA APERTURA		18 de mayo de 2108	
No. DE CHEQUES GIRADOS EN EL PERIODO		6	
No. DE CHEQUES PAGADOS			
SALDO ANTERIOR		$4.625.231.625,04	
VALOR DE ORDENES GIRADAS	1	$	469.621.215,00
	2	$	377.531.434,00
	3	$	153.288.214,00
	4	$	109.086.476,00
	5	$	104.245.831,00
	6	$	193.301.891,00
	7	$	156.386.540,00
	8	$	177.127.861,00
	9	$	31.081.982,00
	10	$	78.421.206,02
	11	$	516.185.811,00
	12	$	298.933.155,00
	13	$	130.006.602,00
	14	$	87.847.504,00
	15	$	640.620.608,00
	16	$	64.517.753,00
	17	$	227.093.583,00
	18	$	312.685.021,00
	19	$	31.702.300,00
	20	$	254.014.263,00
TOTAL		$	4.413.699.250,02
VALOR AMORTIZADO EN ACTA		$	1.266.778.721,71
SALDO ACTUAL		$	211.532.375,02
FECHA CIERRE DE CUENTA			

AVANCE DE OBRA

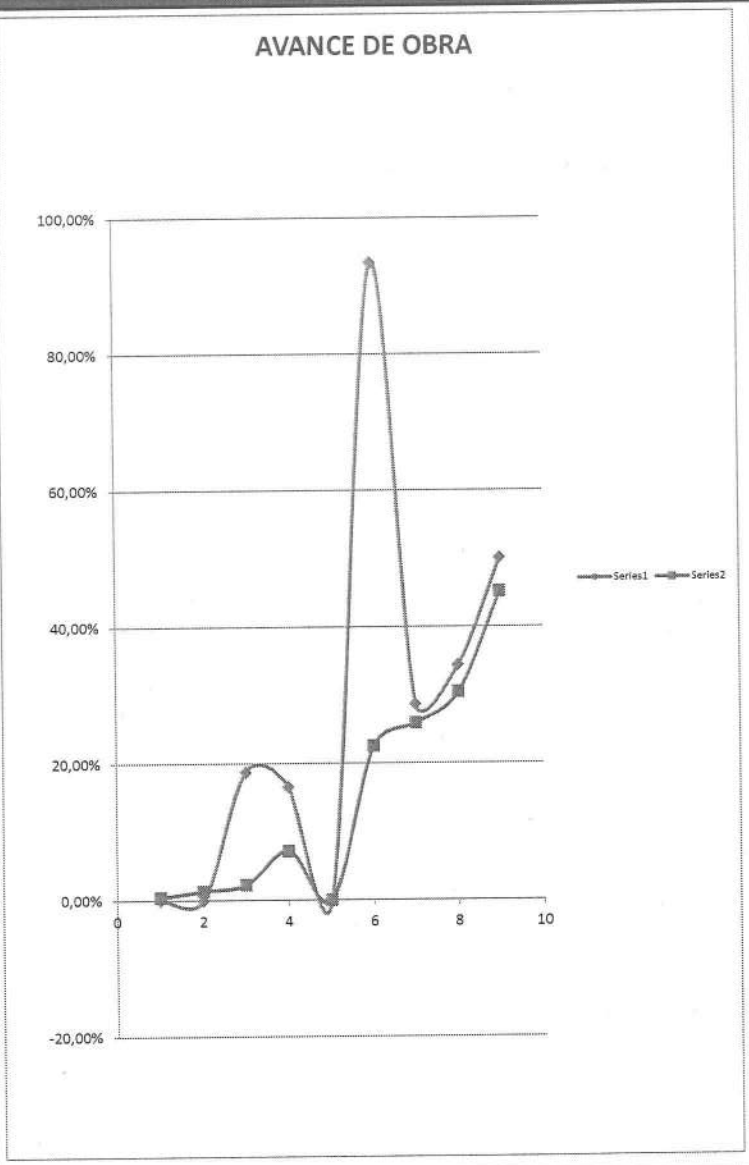

CONTROL DE POLIZAS

AMPAROS	VALOR		VIGENCIA SI	VIGENCIA NO
CUMPLIMIENTO	$	1.936.761.861,00	X	
ANTICIPO	$	4.841.904.651,00	X	
SALARIOS Y PRESTACIONES	$	484.190.466,00	X	
RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$	484.190.466,00	X	
ESTABILIDAD	$	2.905.142.791,00	X	

OBSERVACIONES:

RESUMEN GENERAL

En el presente periodo se tiene un avance ejecutado acumulado de 45.15% y un avance programado de 50.01%

En el presente periodo se ha presentado lluvias que han afectado las actividades de excavaciones hidrosanitarias

Se le solicita al constructor mejorar acabados en la mano de obra ya que son constantes los detalles por corregir como alineamientos, plomos, columnetas y cintas en concreto con poca tecnica de fundicion, resanes incorrectos en regatas reealizadas para instalaciones electricas e hidrosanitarias, carencia de dilataciones superiores de los muros, deficiencia en mortero de pega en la mamposteria, deficiencia en el armado de hierro de las columnetas y cintas en concreto, deficiencia en el piso de nivelacion ya que se observo falencias en el nivel de piso.

Se recomienda al Constructor realizar procesos constructivos adecuadamente (no ejecutar repellos sin antes de realizar los trabajos regatas, ni haber colocado la ducteria de hidrosanitaria en muros)

La interventoria solicito correcion de trabajo de soldadura en estrutura de cubierta

En el presente periodo se ha ejecutado mamposterias en bloque, fundicion de columnetas y cintas en concreto, instalaciones electricas e hidrosanitarias, repellos en muros internos, instalacion de cubierta en el bloque de patrulleros y oficiales

Sele ha solicitado reiteradamente avance en el edificio casino (sin ejecucion y terminacion de obra civil)

Se ejecuta actividades de relleno en areas externas de los bloques.

Se ejecuta actividades de excavaciones e instalacion de tuberias sanitarias y de lluvias, como sus respectivas cajas.

Se inicio actividades en el area de tanque de almacenamiento de la red contraincendio

29

DAIMCO
NIT 8300274-8
Diseño, Asesorias, Interventorias, Montaje, Mantenimiento y Construcción

RESUMEN EJECUTIVO INT-11:09

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

PERIODO DEL INFORME

DEL			AL		
1	2	2019	28	2	2019

No. DE INFORME 9 DE 2019

PLAZO TRANSCURRIDO

FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION		
7	6	2018	28	2	2019

TIEMPO CONTRACTUAL TRANSCURRIDO EN DIAS 266 DE 2019

Se realizo por parte de la interventoria la toma de pruebas de tintas y visual de la estructura metalica para cubierta. Posteriormente se solicito al constructor la correccion de detalles, los cuales fueron corregidos.

Se solicito al constructor proteger el poliuretano de las aguas lluvias.

Se realizo la toma de muestras de concreto en las diferentes fundiciones.

Esta pendiente por corregir lineamientos de muros, resane en culatas de cubierta donde se encuentran apoyadas las platinas de cubierta.

Se realizo visita de obra por parte del supervisor de la DIRAF, Mayor Lopez los dias 21 y 22 de febrero

Se realizo el suministro de material de rellenos en el presente periodo

Se realiza las respectivas observaciones del armado del hierro de la cubieta del bloque de oficiales antes de la fundicion

Interventoria realizó la gestion logistica y tecnica de los rellenos posibles en zonas verdes, para minimizar costos y ya que esta interventoria no justifica tecnicamente el usar rellenos en recebo común, para ejecutar actividades de empradizado. El material a usar proviene de cantera que a la fecha cumple con los permisos ambientales expedidos por la CRC.

ACTIVIDADES A REALIZAR EL PRÓXIMO MES POR EL CONTRATISTA

18.01.01 TEJA METALICA SIN TRANSLAPO TIPO SANDWICH CON AISLAMIENTO TERMOACUSTICO EN POLIURETANO INYECTADO
* ACABADO EN PINTURA ESMALTADA AL HORNO INSTALADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA SEGUN PLANOS

18.01.03 IMPERMEABILIZACION EN ELAS/FOAM ELASTOMETRO DE URETANO DE 2MM APLICADA A 3 MANOS CON MAQUINA DE ALTA
* PRESIÓN (1500LBS) SISTEMA SPRAY EN SITIO SOBRE MORTERO

11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)
11.01.02 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)
* 11.01.03 PAÑETE 1:4 CON SIKA 1 + DOS CAPAS DE MORTERO SIKA 101 Ó SIMILAR (incluye filos y dilataciones)
* 11.01.04 PAÑETE 1:4 CON SIKA 1 + DOS CAPAS DE MORTERO SIKA 101 Ó SIMILAR (incluye filos y dilataciones)
* 11.01.05 GOTERO DESCOLGADO
* 13.09.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL MONOFASICA F+N+T 110V
* 13.09.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFASICA F+N+T 110V
* 12.17 RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
* 14.01.21 ALISTADO DE PISOS IMPERMEABILIZADOS E= 5 CM
* 17.01 PINTURA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

28	2	2019
DD	MM	AAAA

Anexo No. 1 Informes Semanales

DAIMCO
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

INFORME SEMANAL INT-23:30

Semana Número: 35 Del: 01 de Febrero 2019 Al: 09 de Febrero de 2019
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 247
Nombre del Supervisor. POLICIA NACIONAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,13%	38,92%
Valor de la Obra programada:	$ 303.103.231,10	$ 3.768.938.579,68
Obra Física Ejecutada (%)	1,6000%	36,68%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 154.940.948,80	$3.552.021.251,35

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
Contrato No.	06-6-10044-18
Valor Inicial:	$9.250.463.250,08
Valor adicional:	$433.346.050,23
Valor Actualizado:	$9.683.809.300,31
Plazo Inicial:	192 dias
Plazo Actualizado:	327 dias
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Términación:	28 de Abril de 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	DAIMCO S.A.S
Contrato No.	06-3-10051-18
Valor Inicial:	$ 462.374.500,00
Valor Adicional:	$ 21.660.338,29
Valor Actualizado:	$ 484.034.838,29
Plazo Inicial:	192 dias
Plazo Actualizado:	327 dias
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Términación:	28 de Abril de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* 12.22.01 EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO
* 03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS
* 07.01.07 HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI (Tapa de Tanque)
* 09.01.01 MURO BLOQUE LISO No.5
* 10.01.03 COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
* 10.01.04 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
* 08.02.01 ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO)
* 12.21.04 CAJA INSPECCIÓN DE AGUA LLUVIAS 80x80
* 07.01.04 CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA MUROS Y TAPAS DE TANQUE DE RESERVA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)
* 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)
* 18.01.01 TEJA METALICA SIN TRANSLAPO TIPO SANDWICH CON AISLAMIENTO TERMOACUSTICO EN POLIURETANO INYECTADO ACABADO EN PINTURA ESMALTADA AL HORNO INSTALADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA SEGUN PLANOS

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* 12.22.01 EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO
* 03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS
* 09.01.01 MURO BLOQUE LISO No.5
* 10.01.03 COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
* 10.01.04 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
* 08.02.01 ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO)
* 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)
* 18.01.01 TEJA METALICA SIN TRANSLAPO TIPO SANDWICH CON AISLAMIENTO TERMOACUSTICO EN POLIURETANO INYECTADO ACABADO EN PINTURA ESMALTADA AL HORNO INSTALADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA SEGUN PLANOS

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

* Se realizan rellenos en todas las areas perimetrales a los diferentes bloques para ir conformando las zonas de circulacion y Urbanismo
  Se realizan trabajos en Tanques de Almacenamiento y Red conta Incendios
* Se ejecuta mamposteria en bloque en las areas de Patrulleros y Oficiales
* Se ejecuta pañetes en muros en bloque de Sub Oficiales
* Se ejecuta columnetas y Vigas de Confinamiento en Bloque de Patrulleros y Oficiales
* Se han realizado observaciones en mortero de pega, plomos en la actividad de mamposteria.
* Se inicia la realización de pruebas de Tintas a la estructura metalica de las Cubiertas

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TIRSO COSME OROZCO

Firma

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

INFORME SEMANAL INT-23:31

Semana Número: 36 Del: 10 de Febrero de 2019 Al: 16 de Febrero de 2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 254

Nombre del Supervisor. POLICIA NACIONAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,92%	41,84%
Valor de la Obra programada:	$ 282.767.231,57	$ 4.051.705.811,25

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,5000%	38,1200%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 145.257.139,50	$3.691.468.105,28

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
Contrato No.	06-6-10044-18
Valor Inicial:	$9.250.463.250,08
Valor adicional:	$433.346.050,23
Valor Actualizado:	$9.683.809.300,31
Plazo Inicial:	192 dias
Plazo Actualizado:	327 dias
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Términación:	28 de Abril de 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	DAIMCO S.A.S
Contrato No.	06-3-10051-18
Valor Inicial:	$ 462.374.500,00
Valor Adicional:	$ 21.660.338,29
Valor Actualizado:	$ 484.034.838,29
Plazo Inicial:	192 dias
Plazo Actualizado:	327 dias
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Términación:	28 de Abril de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* 12.22.01 EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO
* 12.22.02 EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO
* 03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS
* 12.22.03 RELLENO EN ARENA DE PEÑA
* 12.03.05 TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 2"
* 07.01.07 HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI (Tapa de Tanque)
* 09.01.01 MURO BLOQUE LISO No.5
* 10.01.03 COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
* 10.01.04 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
* 08.02.01 ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN
* 07.01.10 SELLADO EXTERIOR TANQUE CON IGOL DENSO
* 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)
* 18.01.01 TEJA METALICA SIN TRANSLAPO TIPO SANDWICH CON AISLAMIENTO TERMOACUSTICO EN POLIURETANO INYECTADO ACABADO EN PINTURA ESMALTADA AL

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* 12.22.02 EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO
* 03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS
* 07.01.07 HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI (Tapa de Tanque)
* 09.01.01 MURO BLOQUE LISO No.5
* 10.01.03 COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
* 10.01.04 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
* 08.02.01 ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO)
* 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)
* 18.01.01 TEJA METALICA SIN TRANSLAPO TIPO SANDWICH CON AISLAMIENTO TERMOACUSTICO EN POLIURETANO INYECTADO ACABADO EN PINTURA ESMALTADA AL HORNO INSTALADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA SEGUN PLANOS

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

* Se realizan rellenos en todas las areas perimetrales a los diferentes bloques para ir conformando las zonas de circulacion y Urbanismo
* Se realizan trabajos en Tanques de Almacenamiento y Red conta Incendios
* Se ejecuta mamposteria en bloque en las areas de Patrulleros y Oficiales
* Se ejecuta pañetes en muros en bloque de Sub Oficiales
* Se ejecuta columnetas y Vigas de Confinamiento en Bloque de Patrulleros y Oficiales
* Se recomienda mejorar los resanes que se realizan en las regatas de las instalaciones Eléctricas e Hidrosanitarias utilizar un mortero de reparación.
* Se informa sobre las observaciones que resultaron de la inspeccion visual del dia de ayer por parte de la persona de apoyo de la interventoria, para que se adelantaran esats correcciones en espera del informe definitivo.
* Se le solicita a obra entregar un cuadro con la relacion de los materiales a utilizar en enchapes y ceramicas para piso ya que en el presupuesto oficial dan la opcion de que sea similar al que aperece en el item.

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TIRSO COSME OROZCO

Firma

DAIMCO
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

INFORME SEMANAL INT-23:32

Semana Número: 37 — Del: 17 de Febrero 2019 — Al: 23 de Febrero 2019
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 261
Nombre del Supervisor. POLICIA NACIONAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,26%	45,09%
Valor de la Obra programada:	$ 318.964.836,42	$ 4.370.670.647,67
Obra Física Ejecutada (%)	1,53%	39,65%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 6.630.194,57	$3.839.630.387,57

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
Contrato No.	06-6-10044-18
Valor Inicial:	$9.250.463.250,08
Valor adicional:	$433.346.050,23
Valor Actualizado:	$9.683.809.300,31
Plazo Inicial:	192 dias
Plazo Actualizado:	327 dias
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Términación:	28 de Abril de 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	DAIMCO S.A.S
Contrato No.	06-3-10051-18
Valor Inicial:	$ 462.374.500,00
Valor Adicional:	$ 21.660.338,29
Valor Actualizado:	$ 484.034.838,29
Plazo Inicial:	192 dias
Plazo Actualizado:	327 dias
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Términación:	28 de Abril de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- 12.22.01 EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO
- 12.22.02 EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO
- 03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS
- 12.22.03 RELLENO EN ARENA DE PEÑA
- 12.03.05 TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 2"
- 09.01.01 MURO BLOQUE LISO No.5
- 10.01.03 COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 10.01.04 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 08.02.01 ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO)
- 07.01.10 SELLADO EXTERIOR TANQUE CON IGOL DENSO
- 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)
- 18.01.01 TEJA METALICA SIN TRANSLAPO TIPO SANDWICH CON AISLAMIENTO TERMOACUSTICO EN POLIURETANO INYECTADO ACABADO EN PINTURA ESMALTADA AL HORNO INSTALADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA SEGUN PLANOS
- 14.01.21 ALISTADO DE PISOS IMPERMEABILIZADOS E= 5 CM

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- 12.22.02 EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO
- 03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS
- 07.01.07 HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI Tanque RCI
- 09.01.01 MURO BLOQUE LISO No.5
- 10.01.03 COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 10.01.04 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 08.02.01 ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO)
- 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)
- 18.01.01 TEJA METALICA SIN TRANSLAPO TIPO SANDWICH CON AISLAMIENTO TERMOACUSTICO EN POLIURETANO INYECTADO ACABADO EN PINTURA ESMALTADA AL HORNO INSTALADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA SEGUN PLANOS

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

- Se realizan rellenos en todas las areas perimetrales a los diferentes bloques para ir conformando las zonas de circulacion y Urbanismo
- Se realizan trabajos en Tanques de Almacenamiento y Red conta Incendios
- Se ejecuta mamposteria en bloque en las areas de Patrulleros y Oficiales
- Se ejecuta pañetes en muros en bloque de Sub Oficiales
- Se ejecuta columnetas y Vigas de Confinamiento en Bloque de Patrulleros y Oficiales
- Se recomienda mejorar los resanes que se realizan en las regatas de las instalaciones Eléctricas e Hidrosanitarias utilizar un mortero de reparación.
- Se evidencia que las tuberia de desague de sanitarios en algunos casos estan fuera del eje constructivo entonces se le solicita a obra revisar estos detalles y corregirlos.
- Se recomienda que antes de cada fundicion de debe tener listas las areas a fundir y los elementos necesarios para esta actividad, ademas de tomar las medidas y plomos necesarios para su correcto acabado.
- Se solicita revisar la distancia de los estribos en las columnetas y cintas de confinamiento ya que en muchos casos no se esta respetando la medida del plano.
- Revisar limpieza en areas de circulacion yasegurar bien el mecanismo de ingreso al segundo piso.
- Visita del supervisor por parte de la DIRAF el mayor Ángel López Ostos
- El mayor ratifica orden de demolición de 4 columnas que se encuentran sobre el eje 4 en el bloque de oficiales ya que los ensayos que se realizaron a la mezcla con la que se construyeron estas columnetas están muy por debajo de las permitidas.
- Pendiente realizar dilataciones horizontales y verticales en repellos, acabado de resanes en regatas Eléctricas e Hidro sanitarias, detalles de repellos sin plomo y mal terminados.
- Se recomienda revisar muy bien el acabado del repello de las fachadas ya qye estas no tienen estuco, va solo pintura sobre repello.
- Visita del Coronel Marco Jair Ospina, jefe de la oficina de Infraestructura Nacional
- Se recomienda revisar muy bien el acabado del repello de las fachadas ya que estas no tienen estuco, va solo pintura sobre repello y también los detalles internos de mortero de nivelación.

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TIRSO COSME OROZCO

Firma

DAIMCO
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

INFORME SEMANAL INT-23:33

Semana Número: 38 Del: 24 de Febrero de 2019 Al: 28 de Febrero de 2019
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 266
Nombre del Supervisor. POLICIA NACIONAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	4,91%	50,01%
Valor de la Obra programada:	$ 475.475.036,65	$ 4.842.873.031,09
Obra Física Ejecutada (%)	1,59%	45,15%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 153.972.567,87	$4.372.239.899,09

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
Contrato No.	06-6-10044-18
Valor Inicial:	$9.250.463.250,08
Valor adicional:	$433.346.050,23
Valor Actualizado:	$9.683.809.300,31
Plazo Inicial:	192 dias
Plazo Actualizado:	327 dias
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Términación:	28 de Abril de 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	DAIMCO S.A.S
Contrato No.	06-3-10051-18
Valor Inicial:	$ 462.374.500,00
Valor Adicional:	$ 21.660.338,29
Valor Actualizado:	$ 484.034.838,29
Plazo Inicial:	192 dias
Plazo Actualizado:	327 dias
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Términación:	28 de Abril de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* 12.22.01 EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO
* 12.22.02 EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO
* 03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS
* 07.01.07 HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI Tanque RCI
* 09.01.01 MURO BLOQUE LISO No.5
* 10.01.03 COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
* 10.01.04 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
* 08.02.01 ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN
* 07.01.10 SELLADO EXTERIOR TANQUE CON IGOL DENSO
* 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)
* 18.01.01 TEJA METALICA SIN TRANSLAPO TIPO SANDWICH CON AISLAMIENTO TERMOACUSTICO EN POLIURETANO INYECTADO ACABADO EN PINTURA ESMALTADA AL HORNO INSTALADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA SEGUN PLANOS

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* 12.22.02 EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO
* 03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS
* 07.01.07 HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI Tanque RCI
* 09.01.01 MURO BLOQUE LISO No.5
* 10.01.03 COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
* 10.01.04 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
* 08.02.01 ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN
* 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)
* 18.01.01 TEJA METALICA SIN TRANSLAPO TIPO SANDWICH CON AISLAMIENTO TERMOACUSTICO EN POLIURETANO INYECTADO ACABADO EN PINTURA ESMALTADA AL

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

* Se realizan rellenos en todas las areas perimetrales a los diferentes bloques para ir conformando las zonas de circulacion y Urbanismo
* Se realizan trabajos en Tanques de Almacenamiento y Red conta Incendios
* Se ejecuta mamposteria en bloque en las areas de Patrulleros y Oficiales
* Se ejecuta pañetes en muros en bloque de Sub Oficiales
* Se ejecuta columnetas y Vigas de Confinamiento en Bloque de Patrulleros y Oficiales
* Se recomienda mejorar los resanes que se realizan en las regatas de las instalaciones Eléctricas e Hidrosanitarias utilizar un mortero de reparación.
* Se solicita nuevamente realizar dilataciones horizontales y verticales en repellos, acabado de resanes en regatas eléctricas e hidrosanitarias, detalles de repellos sin plomo y mal terminados.
* Corregir columnetas en eje 11 y 12 patrulleros.
* Se envia oficio al intendente molina del área de mantenimiento y servicios del DECAU para informar sobre trabajo de reposición de sistema de desagüe red sanitaria paralela área tanque RCI y por estos trabajos se suspenderá el servicio de redes hidrosanitarias en el módulo de alojamiento contiguo.
* Se iniciaron trabajos para el cambio de la red hidrosanitaria perimetral del tanque RCI.

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TIRSO COSME OROZCO

Firma

Anexo No. 2 Relación de Correspondencia

Enviada

POLICÍA NACIONAL

DAIMCO

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

CONTRATO No. :	Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18
OBJETO:	"Interventoria técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".
CONTRATISTA:	CONSORCIO BCS GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO S.A.S
SUPERVISOR:	Mayor Ingeniero Civil ángel Giovanni López Ostos

No.	Titulo del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
CPP-DIRAF-2018-095	Remisión orden de pago No. 16	1	N.A	01/02/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO AL CONTRATISTA CON COPIA A LA ENTIDAD CONTRATANTE POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-096	Remisión acta parcial No. 07 – Contrato de Obra.	1	N.A	07/02/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-097	Remisión Acta parcial de Interventoría No. 7.	1	N.A	07/02/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-098	Remisión Informe Mensual No 08.	1	N.A	14/02/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-099	Respuesta al documento S-2019-004302/DIRAF-GUMAI-43 con radicado Daimco D-2019-0324 del 14 de febrero de 2019 – Informando adición al contrato PN DIRAF No 06-3-10051-18.	1	N.A	14/02/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-100	Devolución de planos	1	N.A	14/02/2019	N.A	1	1	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-101	Remisión orden de pago No. 17	1	N.A	18/02/2019	N.A	1	1	0	OFICIO REMISORIO AL CONTRATISTA CON COPIA A LA ENTIDAD CONTRATANTE POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-102	Remisión orden de pago No. 18	1	N.A	19/02/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO AL CONTRATISTA CON COPIA A LA ENTIDAD CONTRATANTE POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-103	Remisión orden de pago No. 19.	1	N.A	20/02/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO AL CONTRATISTA CON COPIA A LA ENTIDAD CONTRATANTE POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-104	Respuesta al documento PN-DIRAF-POPAYAN-0140 del 19 de febrero de 2019 – Solicitud de cambio del plan de inversión del anticipo.	1	N.A	20/02/2019	N.A	1	1	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-105	Remisión orden de pago No. 20	1	N.A	21/02/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO AL CONTRATISTA CON COPIA A LA ENTIDAD CONTRATANTE POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-106	Respuesta al documento PN-DIRAF-POPAYAN-139 del 19 de febrero de 2019 – Cambio de residente No 4	1	N.A	25/02/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD CON COPIA AL CONTRATISTA POR PARTE DE DAIMCO

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C. a los 28 días del mes Febrero del 2019.

ENTREGA
NOMBRE: TIRSO COSME (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)
Fecha: 28 de Febrero de 2019

RECIBE
Firma
NOMBRE: Mayor Ingeniero Civil ángel Giovanni López Ostos
Fecha: 28 de Febrero de 2019

Original: POLICIA NACIONAL
Copias: Contratista, Interventoria

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa
RADICACION
Radicado 2019-012924-DIPON
Recibido el 140219
Hora 0917 Firma

CPP-DIRAF-2018-095

Bogotá D.C. 01 de febrero de 2019

Señores
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
~~Aurelio Gutiérrez Castillo~~
Representante Legal
Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Remisión orden de pago No. 16

Respetado Ingeniero:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir debidamente firmado y verificado la orden de pago No. 16, correspondiente al documento No PN-DIRAF-POPAYAN-0133 con radicado Daimco No D-2019-0194 del 30 de enero de 2019, para continuar con su trámite ante la fiduciaria POPULAR.

Cuentas por pagar a proveedores (Salarios, jornales y mano de obra – Compra de Materiales)

- Orden de giro No. 16 - Pago de aportes por compra de materiales dotación u alquiler de equipos s a CONSTRUCTORA SUMI AGUAS SAS, por un valor de $ 64.517.753.00

Agradecemos de antemano su atención y estaremos atentos a cualquier solicitud.

Cordialmente,

JOSE MIGUEL BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Orlando Roboyo
CC 80820 847
01-02-2019

Anexos	*25 folios*
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal
Elaboro	*Arq. Diego Lopez – Prof. Apoyo*
Copia 1.	*Archivo – Contrato de interventoría*
Copia 2.	POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Directora Administrativa y Financiera - Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 – CAN Mayor – Ángel Lopez Ostos – Supervisor

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co

Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-096

Bogotá D.C. 07 de febrero de 2019.

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión acta parcial No. 07 – Contrato de Obra.

Respetados señores.

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos informar que el documento citado en el asunto fue verificado y aprobado por parte de la interventoría.

Por lo anterior, se solicita a la Entidad proceder con el respectivo trámite de desembolso del Acta Parcial No.07, correspondiente al contrato de obra No PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Lo anterior para trámite y fines pertinentes

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

M.Y. Angel Giovanni López Ortiz 07/02/2019

Anexos	*98 folios*	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	*Archivo – Contrato de interventoría*	

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-097

Bogotá D.C. 07 de febrero de 2019

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico-administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión Acta parcial de Interventoría No. 7.

Respetados Señores.

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y según lo establecido en la ***CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO: LA POLICIA*** *pagara al* ***CONTRATISTA*** *el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el anexo No 1 "DATOS DEL CONTRATO"* El cual reza ***"(...) PAGOS PARCIALES – Se realizaran pagos parciales hasta completar el 95% del valor del contrato, sujetas al porcentaje de avance del contrato de obra que corresponderá al valor ejecutado en el respectivo periodo (...)"*** por lo anterior nos permitimos remitir el acta parcial No. 07 de interventoría correspondiente al periodo 21 de diciembre de 2018 al 29 de enero de 2019 del contrato de la referencia, con los soportes relacionados a continuación:

- Original Factura de Venta 1380
- Acta Recibo a satisfacción Obra
- Acta recibo a satisfacción Interventoría
- RUT Daimco S.A.S
- Resolución de facturación DAIMCO S.A.S
- Referencia Bancaria DAIMCO S.A.S
- Copia cédula de ciudadanía (Representante legal)
- Certificado de aportes parafiscales
- Soportes Revisor Fiscal

Lo anterior para trámite y fines pertinentes

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Recibí
My Angel. Giovanni López Ostos
07/02/2018

Anexos	*13 folios*	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	*Archivo – Contrato de interventoría*	

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

91

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-098

POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa
RADICACION
E-032926
14 FEB 2019
09:19 Firma

Bogotá D.C. 14 de febrero de 2019.

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión Informe Mensual No 08.

Respetados Señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir el informe mensual No. 08 de Interventoría, comprendido entre el primero (01) de enero de 2019 al treinta y uno (31) de enero de 2019. La presente con el fin de informar a la entidad contratante el avance de ejecución del contrato.

Agradecemos de antemano su atención.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	*265 Folios*	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	*Archivo – Contrato de interventoría*	

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-099

Bogotá D.C. 14 de febrero de 2019

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico-administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Respuesta al documento S-2019-004302/DIRAF-GUMAI-43 con radicado Daimco D-2019-0324 del 14 de febrero de 2019 – Informando adición al contrato PN DIRAF No 06-3-10051-18.

Respetados Señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, y en respuesta al comunicado del asunto, manifestamos que, para ejercer el control y verificación de las obras de paisajismo y urbanismo, el edificio del gimnasio y las obras complementarias contempladas dentro de la fase 4, la interventoría cuenta con la capacidad económica, financiera, técnica y de recurso humano, para ejercer el control de las actividades en comento.

Asimismo, y teniendo en cuenta que el contrato de interventoría No PN DIRAF No. 06-3-10051-18 vence a partir del 29 de abril de 2019, consideramos insuficiente el tiempo para la ejecución de las actividades precitadas, razón por la cual para llevar a un feliz término el objeto contractual y poder ejecutar la totalidad de las obras, será necesario que la entidad contratante conceda una prorroga al contrato de interventoría, en los términos en que se solicito en el documento CPP-DIRAF-2018-094 del 30 de enero de 2019 con radicado de la entidad No E-007576.

Agradecemos de antemano su atención.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S

Anexos	*Lo enunciado*	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	*Archivo – Contrato de interventoría*	

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-100

14 FEB

Bogotá D.C. 14 de febrero de 2019

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico-administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Devolución de planos

Respetados Señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, por medio de la presente nos permitimos realizar la devolución de la planimetría ORIGINAL correspondientes a la versión final del edificio de Gimnasio, asi:

No Plano	Contenido	No Plano
1	Especificaciones generales y corte general	E1
2	Planta de localización columnas	E2
3	Planta de cimentación, cuadro de zapatas y detalles bienestar y gimnasio	E3
4	Planta cubierta N+4,00 y detalles bienestar y gimnasio	E4
5	Planta cubierta N+6,50 y Detalles Gimnasio	E5
6	Despiece vigas cimentación, despiece vigas aéreas y columnas	E6
7	Especificaciones generales y cortes generales	E1
8	Fase 4 Edificios C-D-E	2 DE 22
9	Fase 4 - Edificio C - Gimnasio, Bienestar Plantas - Cotas	3 DE 22
10	Fase 4 - Edificio C - Gimnasio, Bienestar Plantas Referencias	4 DE 22
11	Fase 4 - Edificio C - Gimnasio, Bienestar Fachadas	5 DE 22
12	Fase 4 - Edificio C - Gimnasio, Bienestar Cortes	6 DE 22
13	Red de suministro agua potable / aguas grises primer piso Fase 4 Edificio C	5 de 37
14	Red de suministro agua potable / aguas grises primer piso Fase 4 Edificio C y E	6 de 37
15	Isométricos agua potable primer piso Fase 4 Edificios C y E	11 DE 37
16	Isométricos agua potable segundo piso Fase 4 Edificios C y E	13 DE 37
17	Red de desagües primer piso Fase 4 Edificios C y E	19 DE 37
18	Red de desagües cubierta Fase 4 Edificios C	22 DE 37
19	Red contra incendio primer piso Fase 4 Edificio C y E	27 DE 37
20	Red de desagües primer piso Fase 4 Edificios C y E	16 DE 37

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

21	Red de desagües primer piso Fase 4 Edificios C	18 de 37
22	Fase 4 Tomas normales Edificio 15 Gimnasio Primer Piso	E-TN-1/10
23	Fase 4 Tomas normales Edifico 16 Bienestar Primer Piso	E-TN-2/10
24	Fase 4 Iluminación Edificio 15 Gimnasio Primer Piso	E-ILUM-1/10
25	Fase 4 Iluminación Edificio 16 Bienestar Primer Piso	E-ILUM-2/10
26	Fase 4 Red de detección contra incendio ED 15 Gimnasio Primer piso	E-RDCI-1/4
27	Fase 4 Red de detección contra incendio ED 16 Bienestar Primer piso	E-RDCI-2/4
28	Fase 4 Cámaras, TV y Sonido Edificio 15 Gimnasio Primer Piso	E-DM-1/4
29	Fase 4 Cámaras, TV y Sonido Edificio 16 Bienestar Primer Piso	E-DM-2/4

Agradecemos de antemano su atención.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S

Anexos	*29 planos Originales*	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	*Archivo – Contrato de interventoria*	

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-101

Orlando 20407 0
c80820348
19- febrero. 2019

Bogotá D.C. 18 de febrero de 2019

Señores
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
Aurelio Gutiérrez Castillo
Representante Legal
Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Remisión orden de pago No. 17

Respetado Ingeniero:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir debidamente firmado y verificado la orden de pago No. 17, correspondiente al documento No PN-DIRAF-POPAYAN-0137 con radicado Daimco No D-2019-0327 del 14 de febrero de 2019, para continuar con su trámite ante la fiduciaria POPULAR.

- Orden de giro No. 17 - Devolución de aportes por pago de salarios, jornales y mano de obra, por un valor de $ 152.663.448.00
- Orden de giro No. 17 - Devolución de aportes por pago de materiales, dotación y alquiler de equipos, por un valor de $ 65.590.069.00
- Orden de giro No. 17 - Devolución de aportes por pago de transporte y retiro de escombros, por un valor de $ 8.840.066.00

Agradecemos de antemano su atención y estaremos atentos a cualquier solicitud.

POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa
RADICACION
Radicado Nº E-05593
Recibido 20 FEB 2019
Hora 15:36 Firma

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	*140 folios*
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal
Elaboro	*Arq. Diego Lopez – Prof. Apoyo*
Copia 1.	*Archivo – Contrato de interventoria*
Copia 2.	POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Directora Administrativa y Financiera - Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 – CAN Capitán – Ángel Lopez Ostos – Supervisor

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A – 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa
RADICACION
Radicado N° E-201397
Recibido el 20 FEB 2019
Hora 15:39 Firma

CPP-DIRAF-2018-102

Orlando Redondo
CC. 80.820.348
19- febrero-2019

Bogotá D.C. 19 de febrero de 2019

Señores
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
Aurelio Gutiérrez Castillo
Representante Legal
Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Remisión orden de pago No. 18

Respetado Ingeniero:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir debidamente firmado y verificado la orden de pago No. 18, correspondiente al documento No PN-DIRAF-POPAYAN-0137 con radicado Daimco No D-2019-0327 del 14 de febrero de 2019, para continuar con su trámite ante la fiduciaria POPULAR.

Cuentas por pagar a proveedores (Materiales)

- Orden de giro No. 18 - Pago de aportes por salarios, jornales y mano de obra a ORLANDO EDMUNDO REVELO, por un valor de $ 5.319.552.00
- Orden de giro No. 18 - Pago de aportes por salarios, jornales y mano de obra a BCS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS, por un valor de $ 16.751.784.00
- Orden de giro No. 18 - Pago de aportes por salarios, jornales y mano de obra a LUIS ALFREDO VARGAS BURGOS, por un valor de $ 50.000.000.00
- Orden de giro No. 18 - Pago de aportes por compra de materiales dotación u alquiler de equipos a CRISTINA ELIZABETH MUÑOZ ESCOBAR, por un valor de $ 5.510.361.00
- Orden de giro No. 18 - Pago de aportes por compra de materiales dotación u alquiler de equipos s a EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO S.A.S, por un valor de $ 3.823.065.00
- Orden de giro No. 18 - Pago de aportes por compra de materiales dotación u alquiler de equipos s a SODIMAC COLOMBIA SA, por un valor de $ 11.175.800.00
- Orden de giro No. 18 - Pago de aportes por compra de materiales dotación u alquiler de equipos s a CVS EQUIPAR & CIA S EN C, por un valor de $ 5.297.921.00
- Orden de giro No. 18 - Pago de aportes por transporte y retiro de escombros a ORLANDO EDMUNDO REVELO, por un valor de $ 4.079.475.00

47

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-102

- Orden de giro No. 18 - Pago de aportes por salarios, jornales y mano de obra a AG3 INGENIERIA SAS, por un valor de $ 210.385.919.00

Agradecemos de antemano su atención y estaremos atentos a cualquier solicitud.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	*58 folios*	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	*Arq. Diego Lopez – Prof. Apoyo*	
Copia 1.	*Archivo – Contrato de interventoría*	
Copia 2.	POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Directora Administrativa y Financiera - Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 – CAN Mayor – Angel Lopez Ostos – Supervisor	

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co

Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-103

Bogotá D.C. 20 de febrero de 2019

POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa
y Financiera
E-016229
22 FEB 2019
09:45

Señores
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
Aurelio Gutiérrez Castillo
Representante Legal
Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Remisión orden de pago No. 19.

Respetado Ingeniero:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir debidamente firmado y verificado la orden de pago No. 19, correspondiente al documento No PN-DIRAF-POPAYAN-0140 con radicado Daimco No D-2019-0371 del 19 de febrero de 2019, para continuar con su trámite ante la fiduciaria POPULAR.

- Orden de giro No. 19 - Devolución de aportes por pago de salarios, jornales y mano de obra, por un valor de $ 20.282.300.00
- Orden de giro No. 19 - Devolución de aportes por pago de descuentos y retenciones, por un valor de $ 11.420.000.00

Agradecemos de antemano su atención y estaremos atentos a cualquier solicitud.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Orlando Roberto
c80820 348
22-01-2019

Anexos	*16 folios*
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal
Elaboro	*Arq. Diego Lopez – Prof. Apoyo*
Copia 1.	*Archivo – Contrato de interventoría*
Copia 2.	POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Directora Administrativa y Financiera - Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 – CAN Mayor – Ángel Lopez Ostos – Supervisor

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co

Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-104

Bogotá D.C. 20 de febrero de 2019.

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico-administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Respuesta al documento PN-DIRAF-POPAYAN-0140 del 19 de febrero de 2019 – Solicitud de cambio del plan de inversión del anticipo.

Respetados Señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, y en respuesta al comunicado del asunto, donde el contratista de obra solicita a la interventoría la modificación del plan de inversión del anticipo del contrato de obra No 06-6-10044-18, esto teniendo en cuenta que en el desarrollo del proyecto se ha destinado gran porcentaje de los recursos al pago de salarios, jornales y mano de obra y la compra de materiales.

Por lo anterior, nos permitimos remitir debidamente avalado por esta Interventoría, la modificación realizada al plan de inversión del anticipo, aumentando así el ítem de pago de salarios y jornales, mano de obra y disminuyendo en porcentaje los ítems de compra de materiales, dotación y alquiler de equipos, Transporte y retiro de escombros, Descuentos y retenciones.

Se anexa relación de informe de inversión y buen manejo del anticipo detallada a la fecha.

Agradecemos de antemano su atención.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	*5 folios*	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	*Archivo – Contrato de interventoría*	

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-105

Bogotá D.C. 21 de febrero de 2019

POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa
y Financiera
DIRAF - GIDH
Radicado No E-216232
Fecha de 22 FEB 2019
Hora 09:11 Firma

Señores
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
Aurelio Gutiérrez Castillo
Representante Legal
Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Remisión orden de pago No. 20

Respetado Ingeniero:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir debidamente firmado y verificado la orden de pago No. 20, correspondiente al documento No PN-DIRAF-POPAYAN-0140 con radicado Daimco No D-2019-0371 del 19 de febrero de 2019, para continuar con su trámite ante la fiduciaria POPULAR.

Cuentas por pagar a proveedores (Salarios, Jornales y Mano de Obra y Compra de materiales dotación u alquiler de equipos)

- Orden de giro No. 20 - Pago de aportes por salarios, jornales y mano de obra a GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO, por un valor de $ 127.455.922.00

- Orden de giro No. 20 - Pago de aportes por compra de materiales dotación u alquiler de equipos a CRISTINA ELIZABETH MUÑOZ ESCOBAR, por un valor de $ 126.558.341.00

Agradecemos de antemano su atención y estaremos atentos a cualquier solicitud.

Cordialmente,

JOSÉ VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Orlando 1206070
1808263418
22.01.2019

Anexos	*18 folios*
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal
Elaboro	*Arq. Diego Lopez – Prof. Apoyo*
Copia 1.	*Archivo – Contrato de interventoría*
Copia 2.	POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Directora Administrativa y Financiera - Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 – CAN Mayor – Angel Lopez Ostos – Supervisor

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-106

POLICIA NACIONAL
Subdirección Administrativa y Financiera
Unidad Construcciones y Arquitectura
Radicado Bajo El No. _____
Recibido El 25/02/2019 M y Angel L 022
Hora 14:41 Firma

Bogotá D.C. 25 de febrero de 2019.

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico-administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Respuesta al documento PN-DIRAF-POPAYAN-139 del 19 de febrero de 2019 – Cambio de residente No 4

Respetados Señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir la hoja de vida de la Ing. Yuli Gomez Urbano, la cual consideramos viable para ejercer las funciones como Residente de Obra No 4 (Seguridad industrial y/o salud ocupacional) Ingeniera Ambiental, quien remplazará al Ing Federico Montealegre, lo anterior a solicitud del Contratista mediante comunicado relacionado en el asunto con radicado Daimco No. D-2019-0372 del 19 de febrero de 2019.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
26 FEB 2019
HORA: 10:30 FIRMA:
ESTE DOCUMENTO SE RECIBE PARA POSTERIOR VERIFICACION

Anexos	*10 folios*	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	*Archivo – Contrato de interventoría*	
Copia 2.	*CONSORCIO BCS-GUTIERREZ - Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402 - Aurelio Gutiérrez Castillo*	

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

Recibida

POLICÍA NACIONAL

DAIMCO

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

CONTRATO No. :	Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18
OBJETO:	"Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".
CONTRATISTA:	CONSORCIO BCS GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO S.A.S
SUPERVISOR:	Mayor Ingeniero Civil ángel Giovanni López Ostos

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
D-2019-0260	Documentos corte # 07	1	N.A	11/01/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2019-0324	Informando adición al contrato # PN-DIRAF-No 06-3-10051-18	1	N.A	29/01/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DE LA ENTIDAD
D-2019-0327	Orden de pago #17 y #18	1	N.A	17/01/2019	N.A	1	1	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2019-0371	Orden de pago #19 y #20	1	N.A	25/01/2019	N.A	1	1	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2019-0372	Cambio de residente # 4	1	N.A	17/01/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2019-0380	Remisión de APUS eléctricos NP105-NP118	1	N.A	29/01/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C. a los 28 días del mes Febrero del 2019.

ENTREGA
Firma
NOMBRE: TIRSO COSME (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)
Fecha: 28 de Febrero de 2019

RECIBE
Firma
NOMBRE: Mayor Ingeniero Civil ángel Giovanni López Ostos
Fecha: 28 de Febrero de 2019

Original: POLICIA NACIONAL
Copias: Contratista, Interventoría

SA

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

DAIMCO
Febrero 07- 2019 Hora: 14:13 p.m
Folios: 01 Anexos: 98
No.Radicado D-2019-0260
Radicado: Yesenia Homez 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Bogotá febrero 6 de 2019

PN-DIRAF-POPAYAN-136

Señores
DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-
Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Calle 44B No. 57A-52 Barrio La Esmeralda
Bogotá

Referencia: **CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: Documentos Corte #7

Enviamos documentos de factura, de acuerdo a clausula cuarta-forma de pago del contrato de la referencia:

- Constancia de recibo a satisfacción Acta Corte #7
- Factura de Venta #7,
- Resolución de facturación Consorcio BCS-GUTIERREZ
- Rut de CONSORCIO BCS-GUTIERREZ, y de consorciados
- Certificación de pagos parafiscales y seguridad social
- Soporte de pago parafiscales
- Certificación pagos FIC
- Soporte de pago FIC
- Acta y Memorias de cantidades ejecutados

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No. S-2019- 004302 / DIRAF – GUMAI – 43

Bogotá D.C., 14 de febrero de 2019

DAIMCO
Febrero 14- 2019 Hora: 09:35 a.m
Folios: 01 Anexos: 00
No.Radicado D-2019-0324
Radicado: Yesenia Homez 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Señor
CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO
Representante Legal DAINCO S.A.S
Carrera 43 No. 57A - 52
Bogotá D.C

Asunto: informando adición al contrato PN DIRAF No. 06-3-10051-18.

En atención a la comunicación CPP-DIRAF-2018-094 dentro de la cual se da viabilidad a la adición y prórroga del contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, por valor de TRES MIL MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON UN CENTAVO M/CTE (3.000.721.946.01), A.I.U incluido, que tiene por objeto "Construcción y Dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región no. 4 a precios unitarios fijos sin formula de reajuste", y de acuerdo con lo plasmado en el contrato de interventoría, informo que la Dirección Administrativa y Financiera, está estudiando la posibilidad de adicionar el acuerdo de voluntades en la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATROMIL DOCIENTOSOCHENTA Y SIETE MIL PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($149.994.287,80) IVA incluido, para el control de las obras de paisajismo y urbanismos, el edificio del gimnasio y las obras complementarias contempladas dentro de la fase cuatro del proyecto MEPOY-DECAU.

Por lo anterior, se solicita informar mediante comunicación escrita, si se cuenta con la capacidad económica, financiera y recurso humano necesario, para realizar la verificación y el control las obras de paisajismo y urbanismo, el edificio del gimnasio y las obras complementarias; así como las obligaciones generales y específicas indicadas en el contrato PN DIRAF No. 06-3-10051-18, lo anterior en un tiempo adicional de 60 días calendario a partir del 29 de abril de 2019, tiempo que cubrirá el contrato principal, sus adicciones y modificaciones.

Atentamente,

Mayor, Ingeniero Civil **ANGEL GIOVANNI LÓPEZ OSTOS**
Supervisor Contrato Interventoría PN DIRAF No.06-3-10051-18

Elaborado por: MT. Ángel Giovanni López Ostos
Revisado por: MY. Daniel Elías Silva Ibarra
Fecha elaboración: 23/01/2019
Archivo: Mis documentos\OFICIOS\SALIDOS-2\FUNCIONARIO\

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 315 9154 – 315 9863
dirafarmi@gusep.policia.gov.co
www.policia.gov.co

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

DAIMCO
Febrero 14- 2019 Hora: 15:33 p.m
Folios: 01 Anexos: 195
No.Radicado D-2019-0327 1087-2018
Radicado: Yesenia Homez
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Bogotá, febrero 14 de 2019

Señores

DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Calle 44B No. 57A-52 Barrio La Esmeralda
Bogotá

PN-DIRAF-POPAYAN-0137

Referencia: **CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: Orden de pago 17 y 18

Por medio de la presente se adjunta los siguientes documentos para su revisión y visto bueno.

- Orden de pago 17
- Orden de pago 18
- Relación de ordenes de pago a la 17
- Relación de ordenes de pago a la 18

Cordialmente,

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
fol. 195

57

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

Bogotá, febrero 19 de 2019

Señores

DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Calle 44B No. 57A-52 Barrio La Esmeralda
Bogotá

PN-DIRAF-POPAYAN-0140

DAIMCO
Febrero 19- 2019 Hora: 4:36 p.m
Folios: 01 Anexos:36
No.Radicado D-2019-0371
Radicado: Yesenia Homez I087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Referencia: **CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: Orden de pago 19 y 20

Por medio de la presente se adjunta los siguientes documentos para su revisión y visto bueno.

- Orden de pago 19
- Solicitud de cambio de Plan de Inversión de Anticipo del 50%, debido a que alcanzamos los topes de valor en los items aprobados a la fecha, y requerimos realizar pagos en los items de mano de obra y compra de materiales.
- Solicitud de cambio de Plan de Inversion de Adición #1, para que esté de acuerdo a los porcentajes sugeridos en el Plan de Anticipo arriba descrito.
- Orden de pago 20
- Relación de órdenes de pago a la 19
- Relación de órdenes de pago a la 20

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

CONSORCIO BCS GUTIERREZ

Bogotá, febrero 19 de 2019

DAIMCO
Febrero 19- 2019 Hora: 4:36 p.m
Folios: 01 Anexos:00
No.Radicado D-2019-0372
Radicado: Yesenia Homez I087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

PN-DIRAF-POPAYAN-139

Señores
DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Calle 44B No. 57A-52 Barrio La Esmeralda
Bogotá

Referencia: **CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: Cambio de Residente #4

Dando alcance a nuestro oficio 068 de septiembre 27 de 2018, solicitamos visto bueno para realizar cambio de profesional Nro 4, Ing. Federico Montealegre SSTMA, quien seguirá desarrollando actividades de asesoría SISOMA, y dejar en firme a la profesional a:

- ✓ Profesional SISOMA -Ing Ambiental. Yuly Gómez Urbano, que nos colabora en la obra desde el 12 de septiembre de 2018, quien cumple con la experiencia exigida en campo.

Cordial Saludo,

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

59

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

DAIMCO
Febrero 21- 2019 Hora: 08:51 a.m
Folios: 01 Anexos:46
No.Radicado D-2019-0380
Radicado: Yesenia Homez 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Bogotá, febrero 21 de 2019

PN-DIRAF-POPAYAN-0142

Señores

DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Calle 448 No. 57A-52 Barrio La Esmeralda
Bogotá

Referencia: **CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto:

Por medio de la presente remito a ustedes los APUS no previstos eléctricos de NP 105 al NP 118, cotizaciones y especificaciones de cada uno de ellos para su revisión y aprobación.

Cordial Saludo,

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

60

Anexo No. 3 Actas de comité

ACTA DE REUNIÓN N° 26

FECHA: 8 febrero/19

DAIMCO

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

Pag.

NOMBRE PARTICIPANTE	CARGO- EMPRESA	CELULAR	FIRMA ASISTENCIA
Oliver Giraldo	Dir. Obra.		
Hijodel Hoz Rodriguez	RESIDENTE SSTMA	3145725028	
Monica L. Benítez	Residente Interven.	3456625	
EDGAR CALUETE LOPEZ	RESIDENTE OBRA BCS	3173823629	

Scanned by CamScanner

Hora de Inicio. 3:30 p.m.

	ACTA DE REUNIÓN N° 26 FECHA: 8 feb/19	DAIMCO		Pag.

IV. TEMAS TRATADOS

- Lectura del Acta Anterior (#25) y Observaciones al respecto.
- Con base en Inspección Visual realizada por personal Contratada por Interventoría el Contratista realiza las correcciones pertinentes.
- El Contratista Inicia Instalacion de la Teja para Cubierta Modulo 1 Patrulleros y tendran el personal Suficiente para la actividad y continuar la estructura
- Se hace entrega a la Interventoria de plano de la red Sanitaria costado Sur Bloque Patrulleros y la Interventoria se compromete a revision con topografia para revisar detalles de las pendientes.
- El contratista manifiesta que conbase en conversación realizada con el Ing. Carrillo se ~~realizara~~ rellenara un perimetro en el tanque de Almacenamiento de 3mt.
- La Interventoría informa que ya se le hizo la solicitud al Mayor Angel Lopez de los archivos o planos del tanque de la RCI complementarios y con detalles pendientes.

Scanned by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN N° ___ FECHA:_____	DAIMCO		Pag.

B. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA
- Ejecutar Detalles de Soldadura y estructura Cubierta se terminaran en un bloque Inicial.	Contratista.	16/02/19.
- Revision de plano de la red Sanitaria costado Sur Bloque Patrulleros	Interventoría	12/02/19.

Scanned by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN N° 27

DAIMCO

21 - de febrero de 2019

NOMBRE PARTICIPANTE	CARGO- EMPRESA	CELULAR	FIRMA ASISTENCIA
Ing. Sandra Lucía Guzmán P.	Res. Interventoría. DAIMCO	3113920256	Sandra Guzmán P.
Brandol Hair Rodríguez.	RESIDENTE SST HA	3015725028	
Julio Cesar Urbano.	Residente SST HA contrata	3184752094	
Federico Montealegre	ESP. SST	3005666303	
Monica Benítez	Residente. Interventoría	3146156619	
My. Angel Giovanni López O.	Supervisor Interventoría	3123041116	
Julian M. Giraldo	Dir. Obra.	3153431046	
Maria Teresa Ojeda C.	RESIDENTE OBRA.	3218024442	
TIRSO CORTE	Dir. Interv.	3104167161	
Aurelio Gutiérrez C.	R.L. consorcio BCS Ltda.	3124559049	

Scanned by CamScanner

Acta 27 21-02-19

IV. TEMAS TRATADOS


Hora de inicio: 5:30 p.m.

- Revisar área a intervenir. de cuerdas para saber que árboles estarían comprometidos para futuro proyecto, para gestión de permiso ambiental.
Según constructor salen 43 especies.

- Se gestionará licencia de construcción y (ambiental) ambiental permiso.

- Será ventilación mecánica en llegada de aparcados, si hubiera evaluación de su sistema, si no se ingresaría sólo el ventilador o motor de el sistema con tubería

- Para la conexión de aguas residuales del gimnasio. se evaluará la red más conveniente. para su conexión final para la cual hay dos opciones
1. Derivarla hacia la vía existente. frente al gimnasio y
2. Conectarla. hacia dos pozos. existente. en cruce de vía.

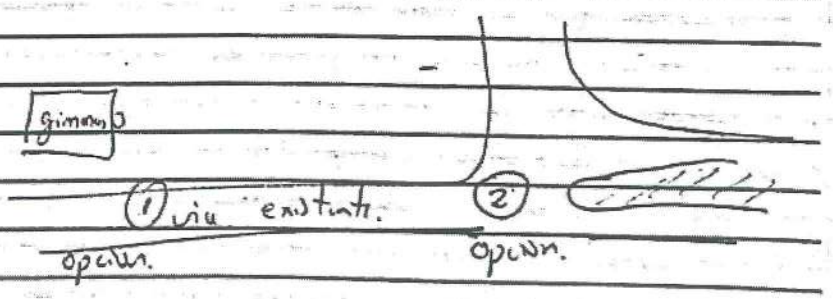

- Se revisará ventanería., para definir y unificar. ya que hay información distinta entre especificación y APUS.

Scanned by CamScanner

Acta 27

21-02-19.

B. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
- Entrega reporte de valor de acta No 8	Tesu en la tarde. 25 de febrero
- Informe interventoría	Interventoría
- Entrega de acta No 8 hora 10:00 a.m. el día 22 de febrero	7 de marzo, Interventoría.
-	contratista

Scanned by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN N° 28

DAIMCO

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

FECHA: 28 feb. /19.

Pag. 7.

NOMBRE PARTICIPANTE	CARGO- EMPRESA	CELULAR	FIRMA ASISTENCIA
Arq. Monica Benitez	Residente. Int.	3146156619	
Brian M. Giraldo.	Dir. Obra.		
Juan del rosario	RESIDENTE 3STHA	3015725028	
EDGAR CALVETE LOPEZ	RESIDENTE DE OBRA	3173873629	

Scanned by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN N° 28 FECHA: 28-02-2019	DAIMCO		Pag.

IV. TEMAS TRATADOS

LECTURA ACTA ANTERIOR:

* Revisión area de obras gimnasio y canchas
  -> Se expresa la necesidad de demolición de estructuras existentes para lo que se necesitaría: desalojo instalaciones
  -> Definición de niveles cancha y nuevas construcciones

* Seguimiento pendientes: Se adelantan gestiones conjuntas de constructor e interventoría respecto temas.

* Pendiente evaluación de cimentación según del futuro gimnasio

* Revisado tema de ventilación se ve necesidad de realizar AIP según necesidad para cada una de -

Scanned by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN N° 28 | DAIMCO | Pag.

FECHA: 28-feb/2019

TEMAS TRATADOS

* Construcción Filtros para evacuar aguas subterraneas o de N.F.T. en área tanque Z.C.I. verificar evacuación.

* Acabados en obra, manifiesta el constructor, que se han estado adelantando los arreglos solicitados por interventoría (por estar en ejecución aún) estarán completado lo pertinente en C/item.

* El avance en edificio de casino esta interventoría solicita, que se sigan adelantando obras en esta área.

* Siguen continuar con tramites de licencias ambientales

Scanned by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN N° ___ FECHA:_____	DAIMCO		Pag.

B. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA
* Presenta NP de ventana G0-A	Contratista	12 Marzo/14
* Presentar propuesta y verificar hora dejar aguas contratos con otro alrededor de tanque R.C.I	Interventoría y Constructora	15 Marzo/14
* Plan contingencia para mejorar rendimiento y por ende progresiva	Contratista	

Scanned by CamScanner

Anexo No. 4 Plan de Anticipo

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO		Página 1 de 1
PROGRAMACIÓN	FECHA	19-feb-19
CONTRATO No. Adición Nro 1	PN DIRAF 06-6-10044-18	
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	
VALOR TOTAL DE ADICION NRO 1	$ 433.346.050,23	
CONTRATISTA	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ	
INTERVENTOR	DAIMCO SAS	
PLAZO	Hasta el 29 de abril de 2019	
VALOR ANTICIPO	50%	$ 216.673.025,12

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 76.203.902,93	35,17%
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 126.038.698,71	58,17%
3	Transporte y retiro de escombros	$ 12.133.689,41	5,60%
4	Descuentos y retenciones	$ 2.296.734,07	1,06%
	TOTAL	$ 216.673.025,12	100,00%

Nota:

a) Plazo en dias para la inversión del anticipo 150 dias.

Para constancia de lo anterior, se firma y aprueba el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los diecinueve (19) dias del mes de febrero de 2019

MAYOR ANGEL GIOVANNY LOPEZ OSTOS
Supervisor de Contrato
POLICIA NACIONAL-DIRAF

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO
Representante Legal
DAIMCO SAS
INTERVENTORIA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO		Página 1 de 1
PROGRAMACIÓN	FECHA	19-feb-19
CONTRATO No.	PN DIRAF 06-G-10044-18	
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 9.250.463.250,08
CONTRATISTA	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ	
INTERVENTOR	DAIMCO SAS	
PLAZO	Hasta el 29 de abril de 2019	
VALOR ANTICIPO	50%	$ 4.625.231.625,04

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 1.626.671.948,00	35,17%
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 2.690.530.222,04	58,17%
3	Transporte y retiro de escombros	$ 259.106.455,00	5,60%
4	Descuentos y retenciones	$ 48.923.000,00	1,06%
TOTAL		$ 4.625.231.625,04	100,00%

Nota:

a) Plazo en dias para la inversión del anticipo 150 dias.

Para constancia de lo anterior, se firma y aprueba el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los diecinueve (19) dias del mes de febrero de 2019

MAYOR ANGEL GIOVANNY LOPEZ OSTOS
Supervisor de Contrato
POLICIA NACIONAL-DIRAF

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

CARLOS XAVIER PITTA PALOMINO
Representante Legal
DAIMCO SAS
INTERVENTORIA

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDEN DE PAGO 1

CONTRATO No. :	PN DIRAF 06-6-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.250.463.250,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	$1.850.092.650,02
VALOR ANTICIPO :	Hasta 15 de diciembre

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.877.002	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.837.846	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.645.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.261.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
			469.621.215,00		

RESUMEN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 555.027.795,01		$ 71.877.002,00	$ 71.877.002,00	$ 483.150.793,01
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 980.549.104,51		$ 376.837.846,00	$ 376.837.846,00	$ 603.711.258,51
3	Transporte y retiro de escombros	$ 185.009.765,00		$ 19.645.367,00	$ 19.645.367,00	$ 165.363.898,00
4	Descuentos y retenciones	$ 129.506.485,50		$ 1.261.000,00	$ 1.261.000,00	$ 128.245.485,50
	TOTALES	$ 1.850.092.650,02	$ -	$ 469.621.215,00	$ 469.621.215,00	$ 1.380.471.435,02

Firma
Nombre: AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: JOSE VICENTE BOLAÑOS GARCIA
DAIMCO S.A.S.
INTERVENTOR

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 1 al 2

CONTRATO No. :	PN DIRAF 06-6-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.250.463.250,08
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 15 de diciembre
VALOR ANTICIPO :	$1.850.092.650,02

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.877.002	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.837.846	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.645.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.261.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.501.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.942.563	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.313.950	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.773.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO			
			847.152.649,00		

RESUMEN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 555.027.795,01	$ 71.877.002,00	$ 40.501.921,00	$ 112.378.923,00	$ 442.648.872,01
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 980.549.104,51	$ 376.837.846,00	$ 331.942.563,00	$ 708.780.409,00	$ 271.768.695,51
3	Transporte y retiro de escombros	$ 185.009.265,00	$ 19.645.367,00	$ 2.313.950,00	$ 21.959.317,00	$ 163.049.948,00
4	Descuentos y retenciones	$ 129.506.485,50	$ 1.261.000,00	$ 2.773.000,00	$ 4.034.000,00	$ 125.472.485,50
	TOTALES	$ 1.850.092.650,02	$ 469.621.215,00	$ 377.531.434,00	$ 847.152.649,00	$ 1.002.940.001,02

Firma
Nombre: AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: JOSE VICENTE [illegible]
DAIMCO S.A.
INTERVENTOR

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 1 al 9

CONTRATO No. :	PN DIRAF 08-8-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 6 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$4.250.463.250 00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 15 de diciembre
VALOR ANTICIPO :	$1.850.092.650,02

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.677.002	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.837.849	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.645.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.161.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.501.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.942.585	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.313.950	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.778.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.626.319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.017.845	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44.644.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
			1.000.440.863,00		

RESUMEN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 555.027.795,01	$ 112.378.923,00	$ 67.626.319,00	$ 180.005.242,00	$ 375.022.553,0
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 980.549.104,51	$ 708.780.409,00	$ 41.017.845,00	$ 749.798.254,00	$ 230.750.850,5
3	Transporte y retiro de escombros	$ 185.009.265,00	$ 21.959.317,00	$ 44.644.050,00	$ 66.603.367,00	$ 118.405.898,00
4	Descuentos y retenciones	$ 129.506.485,50	$ 4.034.000,00	$	$ 4.034.000,00	$ 125.472.485,5
	TOTALES	$ 1.850.092.650,02	$ 847.152.649,00	$ 353.288.214,00	$ 1.000.440.863,00	$ 849.651.787,02

Firma
Nombre: AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: JOSE VILLA
DAIMCO S.A.S
INTERVENTOR

INFORME DE INVERSION Y/O DE MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 1 al 4

CONTRATO No.:	PN-DIRAF-25-6-10064-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 1 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$8,250,463,250,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO SCI-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO S.A.S
PLAZO:	$1,359,091,850,00
VALOR ANTICIPO :	Hasta 15 de diciembre

DATOS ESPECIFICOS					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71,377,382	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376,337,346	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19,945,367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1,261,300	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40,501,971	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331,342,563	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1,318,350	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1,773,000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67,926,319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41,217,349	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44,644,050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9,881,700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 95,765,176	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643,500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1,796,000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
			$ 1,109,517,339,00		

RESUMEN						
ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	170,014,530,00	150,005,242,00	9,881,700,00	159,886,942,00	180,131,588,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	1,332,164,708,02	749,794,154,00	95,765,176,00	845,561,330,00	486,503,378,02
3	Transporte y retiro de escombros	129,506,485,50	66,903,367,00	643,500,00	67,246,867,00	62,259,618,50
4	Descuentos y retenciones	18,500,926,50	4,034,000,00	1,796,000,00	6,830,000,00	11,670,926,50
	TOTALES	1,650,392,650,02	1,000,440,163,00	109,086,476,00	1,109,517,389,00	740,565,311,02

Firma:
Nombre: ING. AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO SCI-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: ING. JOSE MARIO SOLARTE
DAIMCO S.A.S
INTERVENTOR

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO 1 al 5

CONTRATO No.:	SN CRAF 084-1004-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA"
	COMANDO DE REGIÓN No. 4 3 ESPECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE" 38.258.483.150,08
VALOR:	
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCI-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	CAMICO SAS 11.150.292.330,02
PLAZO:	Hasta 15 de diciembre
VALOR ANTICIPO:	

DATOS ESPECIFICOS					ITEM	DESCRIPCION EGRESO
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR			
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	71.177.002	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	376.187.146	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	19.545.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	1.197.300	4	Reembolso Descuentosy retenciones
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	80.301.971	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	131.142.563	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	2.313.360	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	2.773.000	4	Reembolso Descuentosy retenciones
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	67.326.319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	41.717.349	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	44.644.350	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	9.581.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	86.765.276	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	1.796.300	4	Reembolso Descuentosy retenciones
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	33.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	71.245.831	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO				
				1.117.773.170,00		

RESUMEN						
ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	370.018.530,00	189.386.342,00	33.000.000,00	222.386.342,00	147.131.388,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	1.132.066.704,02	845.563.530,00	71.245.831,00	916.809.361,00	415.257.347,02
3	Transporte y retiro de escombros	129.506.485,50	97.246.367,00	0,00	97.246.367,00	52.259.118,50
4	Descuentosy retenciones	18.500.926,50	6.130.000,00	0,00	6.130.000,00	11.670.926,50
	TOTALES	1.350.092.650,02	1.108.527.339,00	104.245.831,00	1.213.779.170,90	636.319.480,02

Firma
Nombre: ING. AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCI-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: ING. [illegible]
Cargo:
INTERVENTOR

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 1 al 6

CONTRATO No.:	PN-DIRAF-06-6-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA"
	COMANDO DE REGION No. 4 X PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE" 19.150.463.750,00
VALOR:	
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO SCI-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	CAMACO SAS 12.150.092.259,02
PLAZO:	Hasta 15 de diciembre
VALOR ANTICIPO:	

DATOS ESPECIFICOS					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.377.002	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 175.137.346	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.545.267	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.361.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.301.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 181.342.563	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.313.350	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.773.300	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 57.626.119	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.017.345	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 64.644.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.181.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 85.765.276	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.796.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.145.831	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
5	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 20.912.701	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
5	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 19.357.057	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
5	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 100.066.386	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
5	9/11/18	FERRELECTRICOM J.P SAS	$ 1.909.260	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
5	9/11/18	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$ 35.660.235	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.467.980	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	AGB INGENIERIA SAS	$ 9.425.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.489.172	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18		$ 1.407.975.461,00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	370.018.530,00	222.886.942,00	0,00	222.886.942,00	147.131.588,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	1.332.966.704,02	916.809.361,00	186.276.791,00	1.103.086.152,00	228.880.552,02
3	Transporte y retiro de escombros	129.506.485,50	67.246.367,00	6.425.100,00	73.671.467,00	55.834.518,50
4	Descuentos y retenciones	18.500.326,50	6.830.900,00	0,00	6.830.900,00	11.670.326,50
	TOTALES	1.850.992.050,02	1.213.773.570,00	193.101.891,00	1.407.975.461,00	443.017.589,02

Firma
Nombre: ING AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO SCI-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: ING JOSE VICENTE [illegible]
INTERVENTOR

111

80

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 1 al 7

CONTRATO No.:	IPN GIRAF 08-2-12044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCION Y COTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 6 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE" $8.260.482.159,08
VALOR:	
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO SCC-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS $1.150.282.459,01
PLAZO:	Hasta 15 de diciembre
VALOR ANTICIPO:	

DATOS ESPECIFICOS						DESCRIPCION EGRESO
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR		ITEM	
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	71.177.001	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	376.137.346	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	13.645.267	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	1.261.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	40.501.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	131.342.543	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	1.313.950	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	2.773.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	67.626.319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	41.017.345	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	44.644.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	9.861.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	25.765.276	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	2.796.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	13.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	71.145.831	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
5	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$	10.313.701	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$	19.357.057	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$	100.069.366	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICOM IP SAS	$	3.909.260	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$	35.580.235	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$	5.467.340	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	AGS INGENIERIA SAS	$	5.425.200	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$	1.883.172	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$	8.441.962	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$	8.694.049	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	17/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$	5.867.794	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	18/11/18	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$	38.576.000	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	19/11/18	AGS INGENIERIA S.A.S	$	54.524.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	20/11/18	ARRIETA S.A.S	$	40.582.485	1	salarios y jornales, mano de obra
				1.363.461.801,00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	370.018.530,00	222.186.942,00	40.582.485,00	262.769.427,00	106.449.103,00
2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	1.382.068.706,02	1.103.686.157,00	61.179.805,00	1.164.865.957,00	167.200.751,02
3	Transporte y retiro de escombros	129.506.485,30	73.571.367,00	54.524.250,00	128.196.217,00	1.310.268,30
4	Descuentos y retenciones	18.500.326,30	6.130.000,00	0,00	6.130.000,00	12.370.326,30
	TOTALES	1.350.092.650,32	1.407.078.061,00	156.286.540,00	1.563.461.801,00	286.831.349,02

Firma
Nombre: JESUS AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO SCC-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre: JORGE [illegible]
DAIMCO S.A.S
INTERVENTOR

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO No 1 al 8

CONTRATO No.: FN-DIRAF-064-LIC44-15

OBJETO: "CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGIONAL # 3 PRECIOS UNITARIOS FIJOS (INFORMULA DE REAJUSTE" $8.350.493.150,00

VALOR: $8.350.493.150,00

CONTRATISTA: AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO SGI-GUTIERREZ

INTERVENTOR: DAIMCO SAS

PLAZO: Hasta 15 de diciembre $1.150.092.350,00

VALOR ANTICIPO: 25%

DATOS ESPECIFICOS						
ORDEN DE PAGO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION GASTO	
1	5/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.477.203	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra	
1	5/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 176.187.846	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	
1	5/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 15.645.167	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros	
1	5/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.251.200	[redacted]	Reembolso Descuentos y retenciones	
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.501.321	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra	
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.347.163	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.313.350	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros	
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.773.000	[redacted]	Reembolso Descuentos y retenciones	
3	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.628.319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra	
3	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.017.845	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	
3	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44.244.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros	
3	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3.861.700	[redacted]	Reembolso Descuentos y retenciones	
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 95.765.176	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra	
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 943.500	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.796.000	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros	
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 38.000.000	[redacted]	Reembolso Descuentos y retenciones	
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.245.831	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra	
6	9/11/18	ELIZABETH CASTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 28.312.701	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	
6	9/11/18	COVALCOMERCIAL S.A	$ 19.397.057	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 100.056.388	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	
6	9/11/18	FERRELECTRICOM JP SAS	$ 2.509.263	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	
6	9/11/18	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOCS.A.S	$ 35.680.235	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.487.580	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	
6	9/11/18	AGB INGENIERIA SAS	$ 6.425.100	3	Transporte y retiro de escombros	
8	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.443.171	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 6.441.962	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	
7	16/11/18	COVALCOMERCIAL S.A	$ 1.634.049	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	
7	16/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.067.754	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	
7	16/11/18	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$ 38.976.000	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	
7	16/11/18	AGB INGENIERIA S.A.S	$ 34.524.250	3	Transporte y retiro de escombros	
7	16/11/18	ARRIETA S.A.S	$ 40.582.485	1	Salarios y jornales, mano de obra	
8		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 98.136.124	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra	
8		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 83.348.137	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	
8		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros	
			1.740.589.462,00			

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	370.018.530,00	283.563.427,00	93.136.124,00	356.705.651,00	13.312.879,00
[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	1.332.068.708,02	1.164.865.357,00	83.348.137,00	1.248.214.094,00	83.854.614,02
3	Transporte y retiro de escombros	128.506.485,50	126.196.217,00	643.500,00	126.839.717,00	668.768,50
[redacted]	Descuentos y retenciones	18.508.926,50	6.430.000,00	0,00	6.430.000,00	11.870.926,50
	TOTALES	1.850.092.350,02	1.581.161.601,00	177.127.761,00	1.740.589.462,00	109.503.188,02

Firma
Nombre: ING AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO SGI-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre: ING. [redacted]
DAIMCO SAS
INTERVENTOR

165

113

82

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 1 al 9

CONTRATO No.: FNSTRAP-05-9-10044-18

OBJETO: "CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE" $8.150.483.000,00

VALOR:

CONTRATISTA: AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO SCC-GUTIERREZ

INTERVENTOR: DAIMCO SAS

PLAZO: Veinte (20) de diciembre $1.350.092.550,00

VALOR ANTICIPO :

DATOS ESPECIFICOS					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION GENERAL
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.177.072	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.037.346	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.545.167	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.271.000	[redacted]	Reembolso Descuentos y retenciones
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.101.575	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.342.267	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.153.150	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.773.000	[redacted]	Reembolso Descuentos y retenciones
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.016.119	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 47.917.145	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44.544.150	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3.381.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 95.763.276	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 540.300	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.736.000	[redacted]	Reembolso Descuentos y retenciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.249.831	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 10.912.701	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 19.257.257	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 100.096.186	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICOM JP SAS	$ 3.309.260	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/18	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOCS..A.S	$ 15.630.355	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.467.380	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/18	AGB INGENIERIA SAS	$ 8.425.100	2	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.483.171	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.441.967	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 6.894.049	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	16/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.467.794	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	16/11/18	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$ 38.376.000	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	16/11/18	AGB INGENIERIA S.A.S	$ 54.924.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	ARRIETA S.A.S	$ 40.642.483	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 93.136.224	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.148.137	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 543.500	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
9		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.081.382		
			$ 1.771.571.464,00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 198.705.451,00	356.705.451,00	0,00	356.705.451,00	0,00
[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	$ 1.157.717.381,07	1.348.314.084,00	31.081.382,00	1.379.396.076,00	78.421.206,72
3	Transporte y retiro de escombros	$ 128.859.717,00	128.859.717,00	0,00	128.859.717,00	0,00
4	Descuentos y retenciones	$ 5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	5.830.000,00	0,00
	TOTALES	1.350.092.550,07	1.740.549.482,00	31.081.382,00	1.771.571.444,72	78.421.206,72

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 13 días del mes de noviembre de 2018

Firma
Nombre: ING. AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO SCC-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre: ING. VICENTE TORO ORTIZ
DAIMCO S.A.S
INTERVENTOR

44

19

83

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 1 al 10

CONTRATO No.:	[illegible]
OBJETO:	"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER"
	COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE"
VALOR:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ECI-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	
PLAZO:	
VALOR ANTICIPO:	

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	DATOS ESPECIFICOS BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION ITEMS
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.877.003	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 174.487.349	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 18.645.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 5.251.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.901.721	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 128.142.503	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3.313.350	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.775.000	[redacted]	Reembolso Descuentos y retenciones
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 17.028.318	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.017.345	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 66.664.250	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.681.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 35.785.274	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 648.700	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.794.000	[redacted]	Reembolso Descuentos y retenciones
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 38.028.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.249.281	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 98.912.701	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
5	9/12/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 19.357.057	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
5	9/12/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 100.065.386	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/12/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 3.109.259	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/12/18	FONDELECTRICOM...P SAS	$ 35.680.235	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/12/18	SIDERMECA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOCS.A.S	$ 5.497.580	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/12/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 6.425.108	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/12/18	AGS INGENIERIA SAS	$ 1.489.172	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/12/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 8.441.342	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.694.048	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 5.457.794	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	16/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 98.978.000	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	16/11/18	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$ 54.574.259	2	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	AGS INGENIERIA S.A.S	$ 40.682.485	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
7	16/11/18	ARRETA S.A.S	$ 98.158.224	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 88.348.137	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 543.503	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 35.081.367	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
9		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.713.343	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
9		ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 1.302.377	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10		COVAL COMERCIAL S.A	$ 197.810	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10		JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 78.308.459,02	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10		CEMENTOS ARGOS S.A	$ 1.459.692.810,02		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1.	Pago de salarios y jornales...mano de obra	$ 356.705.651,00	356.705.651,00	0,00	356.705.651,00	0,00
[redacted]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos	$ 1.327.717.781,02	1.179.296.074,00	78.421.296,02	1.257.717.781,02	0,00
3	Transporte y retiro de escombros	$ 128.829.717,00	128.829.717,00	0,00	128.829.717,00	0,00
4.	Descuentos y retenciones	$ 6.830.000,00	5.330.000,00	0,00	5.330.000,00	0,00
	TOTALES	$ 1.459.082.849,02	$ 1.771.871.444,00	78.421.296,02	$ 1.459.082.849,02	0,00

Para constancia de lo anterior, el informe presente será bajo la responsabilidad técnica de las que intervinieron en ello, a los 19 días del mes de noviembre de 2018.

Firma
Nombre: ING. AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO ECI-GUTIERREZ
CONTRATISTA

[illegible]
GRUPO S.A.S
INTERVENTOR

115

84

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO ORDENES DE PAGO del 1 al 11	
CONTRATO No. :	PN-DIRAF-06-6-10044-18	
OBJETO:	"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	
VALOR:		$9.250.483.250,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO ECS-GUTIERREZ	
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS	
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019	
VALOR ANTICIPO :		$4.625.231.625,04

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.477.002	1	Reembolso Pago de salarios y jornales mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 176.837.346	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.645.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.261.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.301.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 131.342.563	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 7.313.350	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.773.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.626.319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.017.845	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 68.544.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3.881.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 95.765.276	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 543.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.795.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.245.331	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 20.912.701	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 19.357.057	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 100.066.388	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICOM LP SAS	$ 3.909.260	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$ 35.680.235	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 3.467.880	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	AG3 INGENIERIA SAS	$ 5.425.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.485.172	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.441.962	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 8.694.049	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.067.794	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$ 38.976.009	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	AG3 INGENIERIA S.A.S	$ 54.524.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	ARRIETA S.A.S	$ 40.682.485	1	salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 93.136.224	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.348.137	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 543.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
9	28/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.081.982	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2.313.969	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 1.302.977	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 997.810	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 73.806.450,02	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 126.850.268,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 359.194.946,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.674.597,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.666.000,00	4	Reembolso Descuentos y retenciones
			2.384.278.461,02		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 1.387.569.487,51	356.705.651,00	$ 126.850.268,00	495.555.919,00	892.213.568,51
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 2.913.895.923,78	1.357.717.782,02	$ 359.194.946,00	1.716.912.728,02	1.196.983.695,76
3	Transporte y retiro de escombros	$ 231.261.591,25	128.839.717,00	$ 11.674.597,00	140.514.314,00	90.747.267,25
4	Descuentos y retenciones	$ 92.504.632,50	6.830.000,00	$ 6.666.000,00	13.496.000,00	78.008.631,50
	TOTALES	4.625.231.625,04	1.850.092.650,02	513.385.811,00	2.364.278.461,02	2.258.353.164,02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 23 días del mes de enero de 2019

Firma
Nombre: ING.AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO ECS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre: ING. JOSE VICENTE BOCANEGRA
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO
	ORDENES DE PAGO del 1 al 12
CONTRATO No. :	PN DIRAF 06-6-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.250.463.250,08
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 28 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO :	$4.625.231.625,04

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.877.002	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.837.846	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.645.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.261.000	4	Reembolso Descuentosy retenciones
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.501.321	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.942.563	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.313.950	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.773.000	4	Reembolso Descuentosy retenciones
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.926.319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.017.345	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44.644.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3.881.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 95.765.276	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 543.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.796.000	4	Reembolso Descuentosy retenciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.245.831	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
5	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 20.912.701	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
6	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 19.357.057	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 100.066.386	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICOM JP SAS	$ 3.909.260	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
6	9/11/18	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$ 35.680.235	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.467.980	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
6	9/11/18	AG3 INGENIERIA SAS	$ 6.425.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.483.172	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.441.962	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 8.694.049	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
7	16/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.067.794	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
7	16/11/18	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$ 18.976.000	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
7	16/11/18	AG3 INGENIERIA S.A.S	$ 54.524.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	ARRIETA S.A.S	$ 40.682.485	1	salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 93.136.224	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 83.348.137	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
9	28/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.081.982	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2.313.969	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
10	28/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 1.302.977	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
10	28/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 997.810	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
10	28/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 73.806.450,02	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 138.650.268,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 359.194.946,00	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.674.597,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.666.000,00	4	Reembolso Descuentosy retenciones
12	23/01/19	METAL BSAS	$ 88.264.775,00	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
12	23/01/19	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS SA	$ 61.000.000,00	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
12	23/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 44.639.280,00	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
12	23/01/19	AG3 INGENIERIA SAS	$ 105.029.100,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
			2.665.211.616,02		

RESUMEN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
		1.357.000.000,00	495.355.919,00		495.355.919,00	861.644.081,00
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 2.913.895.923,78	1.716.912.278,02	$ 193.904.055,00	1.910.816.283,02	1.003.079.640,76
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	261.831.068,76	140.514.314,00	$ 105.029.100,00	245.543.414,00	16.287.654,76
3	Transporte y retiro de escombros	$ 92.504.832,50	13.496.000,00		13.496.000,00	79.008.832,50
4	Descuentosy retenciones					
	TOTALES	4.625.231.625,04	2.366.278.461,02	298.933.155,00	2.665.211.616,02	1.960.020.009,02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 23 días del mes de enero de 2019

Firma
Nombre: ING.AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS GUTIERREZ

Firma:
Nombre: [illegible] JOSE VICENTE [illegible]
DAIMCO S.A.S

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 13	
CONTRATO No. :	PN DIRAF 06-6-10044-18	
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	$9.250.463.250,08
VALOR:		
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIÉRREZ	
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS	
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019	$4.625.231.625,04
VALOR ANTICIPO :		

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.877.002	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.837.846	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.645.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.261.000	4	Reembolso Descuentosy retenciones
2	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.501.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.942.563	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.313.950	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.773.000	4	Reembolso Descuentosy retenciones
3	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 57.626.319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.017.845	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44.644.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	09/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3.881.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	09/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 95.765.276	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	09/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	09/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.796.000	4	Reembolso Descuentosy retenciones
5	09/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	09/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.245.831	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	09/11/2018	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 20.912.701	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
6	09/11/2018	COVAL COMERCIAL S.A	$ 19.357.057	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
6	09/11/2018	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 100.066.386	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
6	09/11/2018	FERRELECTRICOM JP SAS	$ 3.909.260	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
6	09/11/2018	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$ 35.680.235	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	09/11/2018	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.467.980	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
6	09/11/2018	AG3 INGENIERIA SAS	$ 6.425.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	09/11/2018	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.483.172	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
7	16/11/2018	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.441.962	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
7	16/11/2018	COVAL COMERCIAL S.A	$ 8.694.049	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
7	16/11/2018	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.067.794	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
7	16/11/2018	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$ 38.976.000	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
7	16/11/2018	AG3 INGENIERIA S.A.S	$ 54.524.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/2018	ARRIETA S.A.S	$ 40.582.485	1	salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 93.136.224	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 83.348.137	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
9	28/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.081.982	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/2018	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2.313.969	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
10	28/11/2018	COVAL COMERCIAL S.A	$ 1.302.977	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
10	28/11/2018	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 997.810	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
10	28/11/2018	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 73.806.450,02	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
11	23/01/2019	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 138.650.268,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	23/01/2019	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 359.194.946,00	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
11	23/01/2019	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.674.597,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	23/01/2019	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.666.000,00	4	Reembolso Descuentosy retenciones
12	23/01/2019	METAL B SAS	$ 88.264.775,00	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
12	23/01/2019	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETR	$ 61.000.000,00	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
12	23/01/2019	CEMENTOS ARGOS SA	$ 44.639.280,00	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
12	23/01/2019	AG3 INGENIERIA SAS	$ 105.029.100,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 1 al 13

CONTRATO No. :	PN DIRAF 06-6-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.250.463.250,08
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO 3CS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO :	$4.625.231.625,04

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
13		METAL 3 SAS	$ 10.200.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		SODIMAC COLOMBIA SA	$ 23.147.200,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		CEMENTOS ARGOS SA	$ 61.379.010,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 13.891.133,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7.242.536,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 14.146.713,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
			2.795.218.218,02		

RESUMEN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	1.357.000.000,00	495.355.919,00		495.355.919,00	861.644.081,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 2.913.895.923,78	1.910.816.283,02	$ 130.006.602,00	2.040.822.885,02	873.073.038,76
3	Transporte y retiro de escombros	261.831.068,76	245.543.414,00		245.543.414,00	16.287.654,76
4	Descuentosy retenciones	$ 92.504.632,50	13.496.000,00		13.496.000,00	79.008.632,50
	TOTALES	4.625.231.625,04	2.665.211.616,02	130.006.602,00	2.795.218.218,02	1.830.013.407,02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 28 días del mes de enero de 2019

Firma
Nombre: ING. AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO 3CS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: ING. JOSE VICENTE BOCANEGRA
DAIMCO S.A.S
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 14	

CONTRATO No. :	PN DIRAF 06-6-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.250.463.250,08
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO :	$4.625.231.625,04

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.877.002	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 176.837.846	[illegible]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.645.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.261.000	4	Reembolso Descuentosy retenciones
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.501.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.342.563	[illegible]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.313.950	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.773.000	4	Reembolso Descuentosy retenciones
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.626.319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.017.845	[illegible]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44.644.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.881.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 95.765.276	[illegible]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.796.000	4	Reembolso Descuentosy retenciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.245.831	[illegible]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 20.912.701	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 19.357.057	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 100.066.386	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICOM JP SAS	$ 3.909.260	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$ 35.680.235	[illegible]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.467.980	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	AG3 INGENIERIA SAS	$ 6.425.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.483.172	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.441.962	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 8.594.049	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.067.794	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$ 38.976.000	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	AG3 INGENIERIA S.A.S	$ 54.524.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	ARRIETA S.A.S	$ 40.682.485	1	salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 93.136.224	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 83.348.137	[illegible]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
9	28/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.081.982	[illegible]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2.313.969	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 1.302.977	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 997.810	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos

	INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO
	ORDENES DE PAGO del 1 al 14
CONTRATO No. :	PN DIRAF 06-6-10046-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	39.250.463.250,08
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO :	$4.625.231.625,04

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
10	28/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 73.806.450,02	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 138.650.268,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 359.194.946,00	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.574.597,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.666.000,00	4	Reembolso Descuentosy retenciones
12	23/01/18	METAL B SAS	$ 38.264.775,00	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/19	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS	$ 61.000.000,00	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 44.639.280,00	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/19	AG3 INGENIERIA SAS	$ 105.029.100,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
13		METAL B SAS	$ 10.200.000,00	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		SODIMAC COLOMBIA SA	$ 23.147.200,00	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		CEMENTOS ARGOS SA	$ 61.379.010,00	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 13.891.133,00	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7.242.536,00	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 14.146.723,00	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 26.452.900	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 36.744.104	[illegible]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 24.007.000	4	Reembolso Descuentosy retenciones
			2.883.065.722,02		

RESUMEN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	1.357.000.000,00	495.355.919,00	$ 26.452.900,00	521.808.819,00	835.191.181,00
[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 2.913.895.923,78	1.040.822.885,02	$ 36.744.104,00	2.077.566.989,02	836.328.934,76
3	Transporte y retiro de escombros	261.831.068,76	245.543.414,00	$ 643.500,00	246.186.914,00	15.644.154,76
4	Descuentosy retenciones	$ 92.504.632,50	13.496.000,00	$ 24.007.000,00	37.503.000,00	55.001.632,50
	TOTALES	4.625.231.625,04	1.795.218.218,02	87.847.504,00	2.883.065.722,02	1.742.165.903,02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 28 días del mes de enero de 2019

Firma
Nombre: ING.AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre: ING. JOSE [illegible] BOCANEGRA
DAIMCO S.A.S
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 15	
CONTRATO No. :	PN DIRAF 06-6-10044-18	
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	59.250.463.250,08
VALOR:		
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ	
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS	
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019	54.525.131.925,04
VALOR ANTICIPO :		

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO		VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	71.877.002	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	379.837.846	[illegible]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	19.645.357	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	1.261.000	4	Reembolso Descuentosy retenciones
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	40.501.931	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	331.342.563	[illegible]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	2.313.950	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	2.773.000	4	Reembolso Descuentosy retenciones
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	67.626.319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	41.017.845	[illegible]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	44.644.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	9.881.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	95.765.276	[illegible]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	2.796.000	4	Reembolso Descuentosy retenciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	33.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	71.245.831	[illegible]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$	20.912.701	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$	19.357.057	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$	100.066.386	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICOM JP SAS	$	3.909.260	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOCS.A.S	$	35.680.235	[illegible]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$	5.467.360	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	AG3 INGENIERIA SAS	$	6.425.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$	1.483.172	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$	8.441.962	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$	8.694.049	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$	5.067.794	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$	38.976.000	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	AG3 INGENIERIA S.A.S	$	54.524.150	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	ARRETA S.A.S	$	40.682.485	1	salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	93.136.124	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	83.348.137	[illegible]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO
	ORDENES DE PAGO del 1 al 15
CONTRATO No. :	PN DIRAF 06-6-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.250.463.250,08
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO :	$4.625.231.625,04

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
9	28/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.081.982	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2.313.969	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 1.302.977	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 997.810	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 73.806.450,02	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 138.650.268,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 359.184.946,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.674.597,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.666.000,00	[redacted]	Reembolso Descuentosy retenciones
12	23/01/18	METAL 8 SAS	$ 38.264.775,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/19	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS SA	$ 61.000.000,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 14.639.280,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/19	AG3 INGENIERIA SAS	$ 105.029.100,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
13		METAL 8 SAS	$ 10.200.000,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		SODIMAC COLOMBIA SA	$ 23.147.200,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		CEMENTOS ARGOS SA	$ 61.379.010,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 13.891.133,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7.242.536,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 14.146.713,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 26.452.900	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 36.744.104	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 14.007.000	[redacted]	Reembolso Descuentosy retenciones
15		ALFAGRES SA	$ 268.957.548,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
15		AG3 INGENIERIA SAS	$ 371.663.060	1	salarios y jornales, mano de obra
			3.523.686.330,02		

RESUMEN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	1.357.000.000,00	521.808.819,00	$ 371.663.060,00	893.471.879,00	463.528.121,00
[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 2.913.495.923,78	2.077.566.269,02	$ 268.957.548,00	2.346.524.537,02	567.371.386,76
3	Transporte y retiro de escombros	261.831.068,76	246.186.914,00		246.186.914,00	15.644.154,76
4	Descuentosy retenciones	$ 92.504.632,50	37.503.000,00		37.503.000,00	55.001.632,50
	TOTALES	4.625.231.625,04	2.883.065.722,02	640.620.608,00	3.523.686.330,02	1.101.545.295,02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 30 días del mes de enero de 2019

Firma
Nombre: ING.AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
DAIMCO S.A.S
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 17	
CONTRATO No. :	PN DIRAF 06-6-10044-18	
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	
VALOR:		$9.250.463.250,08
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ	
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS	
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019	
VALOR ANTICIPO :		$4.625.231.625,04

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.877.002	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.837.846	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.645.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.261.000	4	Reembolso Descuentosy retenciones
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.501.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.942.563	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.313.950	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.773.000	4	Reembolso Descuentosy retenciones
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.626.319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.017.845	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44.644.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.881.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 95.765.276	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.796.000	4	Reembolso Descuentosy retenciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.245.831	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 20.912.701	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 19.357.057	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 100.066.386	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICOM JP SAS	$ 3.909.260	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$ 35.680.235	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.467.980	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	AG3 INGENIERIA SAS	$ 6.425.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.483.172	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.441.962	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 8.694.049	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.067.794	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$ 38.976.000	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	AG3 INGENIERIA S.A.S	$ 54.524.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	ARRIETA S.A.S	$ 40.682.485	1	salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 93.136.224	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 83.348.137	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO ORDENES DE PAGO del 1 al 17	
CONTRATO No. :	PN DIRAF 06-6-10044-18	
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	
VALOR:		$9.250.463.250,08
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ	
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS	
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019	
VALOR ANTICIPO :		$4.625.231.625,04

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
9	28/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.081.982	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2.313.969	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 1.302.977	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 997.810	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 73.806.450,02	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 138.650.268,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 359.194.946,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.674.597,00	3	Reembolso Transporte y retir escombros
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.666.000,00	4	Reembolso Descuentosy retenciones
12	23/01/18	METAL B SAS	$ 88.264.775,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/19	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS SA	$ 61.000.000,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 44.639.280,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/19	AG3 INGENIERIA SAS	$ 105.029.100,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
13	31/01/19	METAL B SAS	$ 10.200.000,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	SODIMAC COLOMBIA SA	$ 23.147.200,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 61.379.010,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 13.891.133,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7.242.536,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 14.146.723,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 26.452.900	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 36.744.104	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 24.007.000	4	Reembolso Descuentosy retenc
15	5/02/19	ALFAGRES SA	$ 268.957.548,00	[redacted]	Compra de materiales, dotació alquiler de equipos
15	5/02/19	AG3 INGENIERIA SAS	$ 371.663.060	1	salarios y jornales, mano de obra
16	5/02/19	CONSTRUCTORA SUMI AGUAS SAS	64.517.753,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	152.663.448,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	65.590.069,00	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	8.840.066,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
			3.815.297.666,02		

RESUMEN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	1.357.000.000,00	893.471.879,00	$ 152.663.448,00	1.046.135.327,00	310.864.673,00
[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 2.913.895.923,78	2.411.042.290,02	$ 65.590.069,00	2.476.632.359,02	437.263.564,76
3	Transporte y retiro de escombros	261.831.068,76	246.186.914,00	$ 8.840.066,00	255.026.980,00	6.804.088,76
4	Descuentosy retenciones	$ 92.504.632,50	37.503.000,00		37.503.000,00	55.001.632,50
	TOTALES	4.625.231.625,04	3.588.204.083,02	227.093.583,00	3.815.297.666,02	809.933.959,02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 14 días del mes defebrero de 2019

94

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 17	
CONTRATO No. :	PN DIRAF 06-6-10044-18	
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	
VALOR:	$9.250.463.250,08	
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ	
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS	
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019	
VALOR ANTICIPO :	$4.625.231.625,04	

DATOS ESPECÍFICOS					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO

Firma
Nombre: ING.AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
DAIMCO S.A.S
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 18	
CONTRATO No. :	PN DIRAF 06-6-10044-18	
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	
VALOR:		$9.250.463.250,08
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ	
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS	
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019	
VALOR ANTICIPO :		$4.625.231.525,04

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.877.002	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.837.846	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.645.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.261.000	4	Reembolso Descuentosy retenciones
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.501.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.942.563	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.313.950	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.773.000	4	Reembolso Descuentosy retenciones
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.626.319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.017.845	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44.644.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.881.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 95.765.276	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.796.000	4	Reembolso Descuentosy retenciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.245.831	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 20.912.701	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 19.357.057	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 100.066.386	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICOM JP SAS	$ 3.909.260	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$ 35.680.235	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.467.980	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	AG3 INGENIERIA SAS	$ 6.425.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.483.172	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.441.962	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 8.694.049	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.067.794	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$ 38.976.000	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	AG3 INGENIERIA S.A.S	$ 54.524.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	ARRIETA S.A.S	$ 40.682.485	1	salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 93.136.224	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 83.348.137	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
9	28/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.081.982	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2.313.969	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 1.302.977	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 18	
CONTRATO No. :	PN DIRAF 06-6-10044-18	
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	
VALOR:		$9.250.463.250,08
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ	
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS	
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019	
VALOR ANTICIPO :		$4.625.231.625,04

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
10	28/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 997.810	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 73.806.450,02	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 138.650.268,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 359.194.946,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.674.597,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.666.000,00	4	Reembolso Descuentosy retenciones
12	23/01/18	METAL B SAS	$ 88.264.775,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/19	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS SA	$ 61.000.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 44.639.280,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/19	AG3 INGENIERIA SAS	$ 105.029.100,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
13		METAL B SAS	$ 10.200.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		SODIMAC COLOMBIA SA	$ 23.147.200,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		CEMENTOS ARGOS SA	$ 61.379.010,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 13.891.133,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7.242.536,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 14.146.723,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 26.452.900	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 36.744.104	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 24.007.000	4	Reembolso Descuentosy retenciones
15		ALFAGRES SA	$ 268.957.548,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
15		AG3 INGENIERIA SAS	$ 371.663.060	1	salarios y jornales, mano de obra
16		CONSTRUCTORA SUMI AGUAS SAS	64.517.753,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	152.663.448,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	65.590.069,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	8.840.066,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
18		ORLANDO EDMUNDO REVELO	5.319.552,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		BCS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	16.751.784,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		LUIS ALFREDO VARGAS BURGOS	50.000.000,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		CRISTINA ELIZABETH MUÑOZ ESCOBAR	5.510.361,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		EQUIPOS Y CONTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	3.823.065,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		SODIMAC COLOMBIA SA	11.175.800,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		CVS EQUIPAR & CIA S EN C	5.297.921,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		ORLANDO EDMUNDO REVELO	4.079.475,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
18		AG3 INGENIERIA SAS	210.727.063,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
			4.127.982.687,02		

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 18	
CONTRATO No. :	PN DIRAF 06-6-10044-18	
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	
VALOR:		$9.250.463.250,08
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ	
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS	
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019	
VALOR ANTICIPO :		$4.625.231.625,04

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO

RESUMEN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	1.357.000.000,00	1.046.135.327,00	$ 282.798.399,00	1.328.933.726,00	28.066.274,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 2.913.895.923,78	2.476.632.359,02	$ 25.807.147,00	2.502.439.506,02	411.456.417,76
3	Transporte y retiro de escombros	261.831.068,76	255.026.980,00	$ 4.079.475,00	259.106.455,00	2.724.613,76
4	Descuentosy retenciones	$ 92.504.632,50	37.503.000,00		37.503.000,00	55.001.632,50
	TOTALES	**4.625.231.625,04**	**3.815.297.666,02**	**312.685.021,00**	**4.127.982.687,02**	**497.248.938,02**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 14 días del mes defebrero de 2019

Nombre: ING.AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: ING. JOSE VICENTE [illegible] ANEGRA
DAIMCO S.A.S
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO
	ORDENES DE PAGO del 1 al 19
CONTRATO No. :	PN DIRAF 06-6-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.250.463.250,08
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO :	$4.625.231.625,04

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.877.002	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.837.846	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.645.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.261.000	4	Reembolso Descuentosy retenciones
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.501.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.942.563	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.313.950	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.773.000	4	Reembolso Descuentosy retenciones
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.626.319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.017.845	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44.644.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.881.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 95.765.276	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.796.000	4	Reembolso Descuentosy retenciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.245.831	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 20.912.701	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 19.357.057	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 100.066.386	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICOM JP SAS	$ 3.909.260	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$ 35.680.235	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.467.980	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	AG3 INGENIERIA SAS	$ 6.425.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.483.172	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.441.962	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 8.694.049	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.067.794	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$ 38.976.000	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	AG3 INGENIERIA S.A.S	$ 54.524.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	ARRIETA S.A.S	$ 40.682.485	1	salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 93.136.224	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 83.348.137	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
9	28/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.081.982	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2.313.969	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 1.302.977	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
ORDENES DE PAGO del 1 al 19	
CONTRATO No. :	PN DIRAF 06-6-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.250.463.250,08
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO :	$4.625.231.625,04

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
10	28/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 997.810	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 73.806.450,02	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 138.650.268,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 359.194.946,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.674.597,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.666.000,00	4	Reembolso Descuentosy retenciones
12	23/01/18	METAL 8 SAS	$ 88.264.775,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/19	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS SA	$ 61.000.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 44.639.280,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/19	AG3 INGENIERIA SAS	$ 105.029.100,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
13	31/01/19	METAL 8 SAS	$ 10.200.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	SODIMAC COLOMBIA SA	$ 23.147.200,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 61.379.010,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 13.891.133,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7.242.536,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 14.146.723,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 26.452.900	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 36.744.104	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 24.007.000	4	Reembolso Descuentosy retenciones
15	5/02/19	ALFAGRES SA	$ 268.957.548,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
15	5/02/19	AG3 INGENIERIA SAS	$ 371.663.060	1	salarios y jornales, mano de obra
16	5/02/19	CONSTRUCTORA SUMI AGUAS SAS	64.517.753,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	152.663.448,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	65.590.069,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	8.840.066,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
18		ORLANDO EDMUNDO REVELO	5.319.552,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		BCS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	16.751.784,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		LUIS ALFREDO VARGAS BURGOS	50.000.000,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		CRISTINA ELIZABETH MUÑOZ ESCOBAR	5.510.361,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		EQUIPOS Y CONTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	3.823.065,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		SODIMAC COLOMBIA SA	11.175.800,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		CVS EQUIPAR & CIA S EN C	5.297.921,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		ORLANDO EDMUNDO REVELO	4.079.475,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
18		AG3 INGENIERIA SAS	210.727.063,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 19	

CONTRATO No. :	PN DIRAF 06-6-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.250.463.250,08
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO :	$4.625.231.625,04

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
19		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	20.282.300,00	1	salarios y jornales, mano de obra
19		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	11.420.000,00	4	Reembolso Descuentosy retenciones
			4.159.684.987,02		

RESUMEN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	1.357.000.000,00	1.328.933.726,00	$ 20.282.300,00	1.349.216.026,00	7.783.974,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 2.913.895.923,78	2.502.439.506,02		2.502.439.506,02	411.456.417,76
3	Transporte y retiro de escombros	261.831.068,76	259.106.455,00		259.106.455,00	2.724.613,76
4	Descuentosy retenciones	$ 92.504.632,50	37.503.000,00	$ 11.420.000,00	48.923.000,00	43.581.632,50
	TOTALES	**4.625.231.625,04**	**4.127.982.687,02**	**31.702.300,00**	**4.159.684.987,02**	**465.546.638,02**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 19 días del mes defebrero de 2019

Firma
Nombre: ING.AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: ING. JOSE VICENTE BOCANEGRA
DAIMCO S.A.S
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO
	ORDENES DE PAGO del 1 al 20
CONTRATO No. :	PN DIRAF 06-6-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.250.463.250,08
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO :	$4.625.231.625,04

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.877.002	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.837.846	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.645.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.261.000	4	Reembolso Descuentosy retenciones
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.501.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.942.563	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.313.950	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.773.000	4	Reembolso Descuentosy retenciones
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.626.319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.017.845	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44.644.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.881.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 95.765.276	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.796.000	4	Reembolso Descuentosy retenciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.245.831	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 20.912.701	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 19.357.057	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 100.066.386	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICOM JP SAS	$ 3.909.260	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$ 35.680.235	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.467.980	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	AG3 INGENIERIA SAS	$ 6.425.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.483.172	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.441.962	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 8.694.049	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.067.794	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$ 38.976.000	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	AG3 INGENIERIA S.A.S	$ 54.524.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	ARRIETA S.A.S	$ 40.682.485	1	salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 93.136.224	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 83.348.137	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
9	28/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.081.982	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2.313.969	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 1.302.977	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 1 al 20

CONTRATO No. :	PN DIRAF 06-6-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POUCÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.250.463.250,08
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO :	$4.625.231.625,04

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
19		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	20.282.300,00	1	salarios y jornales, mano de obra
19		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	11.420.000,00	4	Reembolso Descuentosy retenciones
20		GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO	127.455.922,00	1	salarios y jornales, mano de obra
20		CENTIMETRO MOBILIARIO SAS	126.558.341,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
			4.413.699.250,02		

RESUMEN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	1.626.671.948,00	1.349.216.026,00	$ 127.455.922,00	1.476.671.948,00	150.000.000,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 2.690.530.222,04	2.502.439.506,02	$ 126.558.341,00	2.628.997.847,02	61.532.375,02
3	Transporte y retiro de escombros	259.106.455,00	259.106.455,00		259.106.455,00	0,00
4	Descuentosy retenciones	$ 48.923.000,00	48.923.000,00		48.923.000,00	0,00
	TOTALES	4.625.231.625,04	4.159.684.987,02	254.014.263,00	4.413.699.250,02	211.532.375,02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 19 días del mes defebrero de 2019

Firma
Nombre: ING.AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: ING. JOSE VICENTE BOCANEGRA
DAIMCO S.A.S
INTERVENTOR

Anexo No. 5 Seguridad Social

Contrato de Obra

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901177394-5	CONSORCIO BCS - GUTIERRÉZ		CARRERA 19 N 84-41 OFICINA 402	2570898	administrativa@aureliogutierrez.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
			2019-02-19		EMPLEADOS	UPC
					67	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-02	2019-01	E		33043794	$19.984.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	477.300	0		0		0	0	0	0	477.300	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	226.300	0		0		0	0	0	0	226.300	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	33.200	0		0		0	0	0	0	33.200	1
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	141.100	0		0		0	0	0	0	141.100	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	299.200	0		0		0	0	0	0	299.200	8
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	185.200	0		0		0	0	0	0	185.200	3
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	99.600	0		0		0	0	0	0	99.600	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	464.100	0		0		0	0	0	0	464.100	13
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	33.200	0		0		0	0	0	0	33.200	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	331.800	0		0		0	0	0	0	331.800	7
EPSC33	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	830074184-5	33.200	0		0		0	0	0	0	33.200	1
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	21.200	0		0		0	0	0	0	21.200	3
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	2.300	0		0		0	0	0	0	2.300	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	814000337-1	210.000	0		0		0	0	0	0	210.000	6
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	33.200	0		0		0	0	0	0	33.200	1
ESSC91	EPS ECOOPSOS S.A.S	901093846-0	33.200	0		0		0	0	0	0	33.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.792.600	0	0	17.500	17.500	0	0		2.827.600	17
230301	Porvenir	800224808-8	4.483.500	0	0	21.000	21.000	0	0		4.525.500	38
231001	Colfondos	800227940-6	649.300	0	0	0	0	0	0		649.300	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.157.500	0	0	27.500	27.500	0	0		2.212.500	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	4.536.800				4.536.800	0	0	4.536.800			45.368	4.536.800	67

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauca	891500182-0	2.608.800	0	0	2.608.800	67

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

166

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901177394-5	CONSORCIO BCS - GUTIERRÉZ	CARRERA 19 N 84-41 OFICINA 402	2570898	administrativa@aureliogutierrez.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					67	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-02	2019-01	E		33043794	$19.984.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	16	2.624.100	2.624.100
Pensión	4	10.214.900	10.214.900
Riesgos Laborales	1	4.536.800	4.536.800
CCF	1	2.608.800	2.608.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	22	19.984.600	19.984.600

PAGA 41588300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901177394-5	CONSORCIO BCS - GUTIERRÉZ	CARRERA 19 N 84-41 OFICINA 402	2570898	administrativa@aureliogutierrez.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					67	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-02	2019-01	E		33043794	$19.984.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Sueldo	Bonificación	Colilla sustitut	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TUP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	LNR	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002966865	MONTENEGRO MONTENEGRO ERMINSON ARLEY	1	0			S	X															230301	55.208	8.900	0	0	0	0	EPSIC5	55.208	2.300	14-11	55.208	5	3.900	CCF14	55.208	2.300	0	0	0	0	0
2	CC	1005855845	GARCIA GRAJALES RUSBEL WEIMAR	1	0			S	X															230301	552.078	88.400	0	0	0	0	EPS044	552.078	22.100	14-11	552.078	5	38.500	CCF14	552.078	22.100	0	0	0	0	0
3	CC	1005929429	OLIVEROS PENAGOS JORGE ANDRES	1	0			S							X									230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
4	CC	1005929932	ROMERO CARLOS ANDRES	1	0			S		X					X									230301	634.889	101.600	0	0	0	0	EPS005	634.889	25.400	14-11	634.889	5	44.200	CCF14	634.889	25.400	0	0	0	0	0
5	CC	1012363595	CARVAJAL AVIRAMA JESUS	1	0			S	X															230301	55.208	8.900	0	0	0	0	EPS005	55.208	2.300	14-11	55.208	5	3.900	CCF14	55.208	2.300	0	0	0	0	0
6	CC	1014210409	BAUTISTA GUERRERO JOAN SEBASTIAN	1	0			S	X															230301	579.682	92.800	0	0	0	0	EPS044	579.682	23.200	14-11	579.682	5	40.400	CCF14	579.682	23.200	0	0	0	0	0
7	CC	10290853	ATOY GUTIERREZ RAMON ORLANDO	1	0			S							X									230201	828.116	132.500	0	0	0	0	ESSC18	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
8	CC	1031140681	GARCIA PALACIO OSCAR HERNAN	1	0			S							X									230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
9	CC	10317382	GUACA WEIMAR HERNAN	1	0			S							X									230301	745.305	119.300	0	0	0	0	EPS037	745.305	29.900	14-11	745.305	5	51.900	CCF14	745.305	29.900	0	0	0	0	0
10	CC	10317382	GUACA WEIMAR HERNAN	1	0			S									X							230301	82.812	13.300	0	0	0	0	EPS037	82.812	3.400	14-11	82.812	5	0	CCF14	82.812	0	0	0	0	0	0
11	CC	1058787468	UNI CHILITO DANEYER	1	0			S							X									230301	579.682	92.800	0	0	0	0	EPS037	579.682	23.200	14-11	579.682	5	40.400	CCF14	579.682	23.200	0	0	0	0	0
12	CC	1058787468	UNI CHILITO DANEYER	1	0			S									X							230301	165.624	26.500	0	0	0	0	EPS037	165.624	6.700	14-11	165.624	5	0	CCF14	165.624	0	0	0	0	0	0
13	CC	1058787468	UNI CHILITO DANEYER	1	0			S									X							230301	82.812	13.300	0	0	0	0	EPS037	82.812	3.400	14-11	82.812	5	0	CCF14	82.812	0	0	0	0	0	0
14	CC	1058789787	CHILITO MUÑOZ ALFREDO	1	0			S	X															230301	220.831	35.400	0	0	0	0	EPS005	220.831	8.900	14-11	220.831	5	15.400	CCF14	220.831	8.900	0	0	0	0	0
15	CC	1061599883	GOMEZ FIGUEROA JOSE DIVIER	1	0			S							X									230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPSC33	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
16	CC	1061689198	FLOR ATOY JOSELITO	1	0			S							X									231001	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS044	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
17	CC	1061713631	CAMPO SANCHEZ EDGAR EUGENIO	1	0			S	X															230301	27.604	4.500	0	0	0	0	EPSIC3	27.604	1.200	14-11	27.604	5	2.000	CCF14	27.604	1.200	0	0	0	0	0
18	CC	1061716774	VELASCO CERON JULIAN DARIO	1	0			S																230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS016	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	5	83.600	CCF14	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
19	CC	1061725400	ANGUCHO CAMPO DIEGO HERNAN	1	0			S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS018	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF14	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
20	CC	1061780338	LOPEZ LAME IVAN JAVIER	1	0			S		X					X									230301	662.493	106.000	0	0	0	0	EPS044	662.493	26.500	14-11	662.493	5	46.200	CCF14	662.493	26.500	0	0	0	0	0
21	CC	1061793125	QUILINDO CHAGUENDO YILVER DUVAN	1	0			S																230301	1.100.000	176.000	0	0	0	0	ESSC18	1.100.000	44.000	14-11	1.100.000	5	76.600	CCF14	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
22	CC	1061797592	GONZALEZ COBO ANDRES	1	0			S							X									230301	828.116	132.500	0	0	0	0	ESSC62	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
23	CC	1061808030	SALAZAR SALAZAR WILSON ANDRES	1	0			S							X									230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
24	CC	1062324018	AGRONO CRUZ JHON FREDY	1	0			S							X									230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
25	CC	1062754412	RISUEÑO ZEMANATE ALEXANDRA	1	0			S							X									230301	828.116	132.500	0	0	0	0	ESSC18	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
26	CC	1062776138	QUILINDO ULCUE ARIS	1	0			S																230301	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS037	1.100.000	44.000	14-11	1.100.000	5	76.600	CCF14	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
27	CC	1063809683	MOSQUERA TINTINAGO RICHAR JOSE	1	0			S							X									230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS018	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
28	CC	1063813153	MOSQUERA ROBINSON DAMIAN	1	0			S							X									230201	828.116	132.500	0	0	0	0	ESSC18	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
29	CC	10661566	DE LA CRUZ LUIS ALBERTO	1	0			S	X															230301	193.228	31.000	0	0	0	0	EPS037	193.228	7.800	14-11	193.228	5	13.500	CCF14	193.228	7.800	0	0	0	0	0
30	CC	1070602598	SANCHEZ GARCIA CAMILO ANDRES	1	0			S	X															230201	524.474	84.000	0	0	0	0	EPS005	524.474	21.000	14-11	524.474	5	36.600	CCF14	524.474	21.000	0	0	0	0	0
31	CC	1070615598	BERMUDEZ ORTIZ DIEGO FERNANDO	1	0			S	X															230301	524.474	84.000	0	0	0	0	EPS002	524.474	21.000	14-11	524.474	5	36.600	CCF14	524.474	21.000	0	0	0	0	0
32	CC	1080900178	GOMEZ URBANO YULI	1	0			S																25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF14	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
33	CC	108383	DIAZ MORALES JOSE DARIO	1	0			S	X															230201	358.851	57.500	0	0	0	0	EPS017	358.851	14.400	14-11	358.851	5	25.000	CCF14	358.851	14.400	0	0	0	0	0
34	CC	1088352445	PINEDA GIRALDO NELSON DANIEL	1	0			S							X									230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS002	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
35	CC	1106308450	MENDEZ GARZON RAFAEL ANTONIO	1	0			S	X															231001	745.305	119.300	0	0	0	0	EPS002	745.305	29.900	14-11	745.305	5	51.900	CCF14	745.305	29.900	0	0	0	0	0
36	CC	1106893622	GOMEZ RAYO YEFERSON	1	0			S	X															230301	552.078	88.400	0	0	0	0	EPS037	552.078	22.100	14-11	552.078	5	38.500	CCF14	552.078	22.100	0	0	0	0	0
37	CC	1106896374	PALOMINO GOMEZ BRYAN JESUS	1	0			S							X									230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
38	CC	1110506178	RODRIGUEZ PATIÑO DANIEL ANDREY	1	0			S							X									230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS002	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
39	CC	1117486148	MUÑOZ VARGAS ROBINSON	1	0			S	X															230301	55.208	8.900	0	0	0	0	EPS005	55.208	2.300	14-11	55.208	5	3.900	CCF14	55.208	2.300	0	0	0	0	0
40	CC	11223201	GALINDO MARTINEZ JIMMY	1	0			S	X															230201	552.078	88.400	0	0	0	0	EPS017	552.078	22.100	14-11	552.078	5	38.500	CCF14	552.078	22.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901177394-5	CONSORCIO BCS - GUTIERRÉZ		CARRERA 19 N 84-41 OFICINA 402	2570898	administrativa@aureliogutierrez.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					67	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-02	2019-01	E		33043794	$19,984,600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	1123326770	CHAGOY ORTEGA OSCAR ORLANDO	1	0			S	X	X															230301	303.643	48.600	0	0	0	0	EPSIC3	303.643	12.200	14-11	303.643	5	21.200	CCF14	303.643	12.200	0	0	0	0	0
42	CC	1130584465	ERAZO JOSE HECTOR	1	0			S							X									230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS016	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
43	CC	14251298	RODRIGUEZ AYALA JOSE MANUEL	1	0			S		X					X									230301	690.097	110.500	0	0	0	0	EPS037	690.097	27.700	14-11	690.097	5	48.100	CCF14	690.097	27.700	0	0	0	0	0
44	CC	14253118	FERIA MONTEALEGRE ALVARO	1	0			S	X															230201	607.286	97.200	0	0	0	0	EPS017	607.286	24.300	14-11	607.286	5	42.300	CCF14	607.286	24.300	0	0	0	0	0
45	CC	14253561	LOZANO RICAURTE LUIS EDUARDO	1	0			S	X	X														230301	469.266	75.100	0	0	0	0	EPS017	469.266	18.800	14-11	469.266	5	32.700	CCF14	469.266	18.800	0	0	0	0	0
46	CC	15908656	GIRALDO LOPEZ JULIAN MAURICIO	1	0			S																25-14	5.500.000	880.000	0	0	27.500	27.500	EPS002	5.500.000	220.000	14-11	5.500.000	5	382.800	CCF14	5.500.000	220.000	0	0	0	0	0
47	CC	16400159	IDARRAGA HUGO ANTONIO	1	0			S							X									230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
48	CC	19423106	BAUTISTA BAUTISTA LUIS ALFREDO	1	0			S							X									25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS044	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
49	CC	3057064	LEON CARLOS EDUVER	1	0			S							X									230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
50	CC	34315134	BENAVIDES BELTRAN MARIA FERNANDA	1	0			S																230301	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS016	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	5	87.500	CCF14	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
51	CC	34315134	BENAVIDES BELTRAN MARIA FERNANDA	1	0			S										X						230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS016	43.334	1.800	14-11	43.334	5	0	CCF14	43.334	0	0	0	0	0	0
52	CC	34555320	OJEDA CABRERA MARIA TERESA	1	0			S																230301	4.200.000	672.000	0	0	21.000	21.000	EPS044	4.200.000	168.000	14-11	4.200.000	5	282.400	CCF14	4.200.000	168.000	0	0	0	0	0
53	CC	4634695	HOYOS EVER ANTONIO	1	0			S							X									231001	828.116	132.500	0	0	0	0	ESSC18	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
54	CC	4751640	HERNANDEZ OSORIO HUALTER ANTONIO	1	0			S							X									230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
55	CC	4979340	CALVETE LOPEZ EDGAR ENRIQUE	1	0			S																230201	3.500.000	560.000	0	0	17.500	17.500	EPS002	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	5	243.800	CCF14	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
56	CC	52242119	AGUDELO GALLO EVA ARFILENI	1	0			S							X									230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS041	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
57	CC	5879880	QUIMBAYO JOSE SANTOS	1	4			S		X																0	0	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF14	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
58	CC	7251758	GORDILLO LONDOÑO LUIS ALFONSO	1	0			S							X									25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	ESSC81	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
59	CC	75003219	CASTAÑEDA PIÑEROS AMALQUIO ALEJANDRO	1	0			S							X									231001	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS023	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
60	CC	75082427	PINEDA CARDENAS JHON JAIRO	1	0			S																230201	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS018	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	5	194.900	CCF14	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
61	CC	76025008	DOMINGUEZ JOSE ELIECER	1	0			S							X									25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
62	CC	76244421	VALENCIA VALLECILLA DIONISIO	1	0			S							X									230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
63	CC	76293311	PIPICANO INCHIMA MILTON HUMBERTO	1	0			S							X									230301	828.116	132.500	0	0	0	0	ESSC18	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
64	CC	76316674	OME HERNEY	1	0			S	X															230301	193.228	31.000	0	0	0	0	EPS3C3	193.228	7.800	14-11	193.228	5	13.500	CCF14	193.228	7.800	0	0	0	0	0
65	CC	80010363	AVILA GUERRA MARIO PAUL	1	0			S	X															230301	193.228	31.000	0	0	0	0	EPS016	193.228	7.800	14-11	193.228	5	13.500	CCF14	193.228	7.800	0	0	0	0	0
66	CC	80421341	PALOMINO ROJAS BRUNO TENORIO	1	0			S																25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF14	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
67	CC	85270098	CENTENO OROZCO LENIN EDUARDO	1	0			S							X									230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS023	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
68	CC	86046874	CASTAÑEDA PIÑEROS WILLIAM	1	0			S							X									230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS009	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
69	CC	86438331	LEON EDUAR FABIAN	1	0			S	X															230301	745.305	119.300	0	0	0	0	EPS037	745.305	29.900	14-11	745.305	5	51.900	CCF14	745.305	29.900	0	0	0	0	0
70	CC	94463640	SOLARTE GONZALEZ GERARDO	1	0			S							X									231001	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS023	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
71	CC	96366835	HOYOS VARGAS HENRY	1	0			S		X														230301	640.000	102.400	0	0	0	0	EPS044	640.000	25.600	14-11	640.000	5	44.900	CCF14	640.000	25.600	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

109

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

MiPlanilla.com

PAG 1 DE 2

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
NI	830059125-8	DATALEC INGENIEROS LTDA	U ☑ C ☐ S ☐ D ☐		

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO
2	2019	1	2019

NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
32826186	PUBLICA ☐ PRIVADA ☑ MIXTA ☐	PEQUEÑO ☐ GRANDE ☐ INDEPENDIENTE ☐	14-29	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
Cll. 74 a # 75 a 19 Santa Maria del lago	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ D. C.	11	4360861	4360861	datalecing@yahoo.com.ar	4542	4.838.616	9	2019/02/07	411783862

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS008	860066942-7	36.000	0		0		0	36.000	0	0	0	36.000	0		0	0	36.000	1
EPS017	830003564-7	42.700	0		0		0	42.700	0	0	0	42.700	0		0	0	42.700	2
EPS018	805001157-2	2.300	0		0		0	2.300	0	0	0	2.300	0		0	0	2.300	1
EPS037	900156264-2	24.300	0		0		0	24.300	0	0	0	24.300	0		0	0	24.300	1
EPS041	900156264-2	3.400	0		0		0	3.400	0	0	0	3.400	0		0	0	3.400	1
EPS044	901097473-5	68.700	0		0		0	68.700	0	0	0	68.700	0		0	0	68.700	2
EPSC34	900298372-9	33.200	0		0		0	33.200	0	0	0	33.200	0		0	0	33.200	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
230301	800224808-8	451.100	0	0	0	0	0	0	451.100	5
231001	800227940-6	144.000	0	0	0	0	0	0	144.000	1
25-14	900336004-7	179.300	0	0	0	0	0	0	179.300	3

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCF26	860045904-7	194.100	0	0	194.100	9

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	5.900	0	0	5.900	1
SENA					
1	3.900	0	0	3.900	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-29	830008886-1	279.200		0	0	279.200
DIAS MORA	**INTERES MORA COTI**	**SUBTOTAL APORT COTIZ**	**No. RADICAC SALDO A FAVOR**	**SALDO A FAVOR**	**FONDO SOLIDARIDAD**	**TOTAL A PAGAR**
0	0	279.200	0	0	2.792	279.200

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS	
PENSIONES	3
SALUD	7
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	2
TOTAL	14

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,LMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	774.400	774.400
SALUD	210.600	210.600
RIESGOS LABORALES	279.200	279.200
CCF	194.100	194.100
SENA	3.900	3.900
ICBF	5.900	5.900
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	1.468.100	1.468.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

MiPlanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																		VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUSPEN COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	1023874971	VARGAS VASQUEZ CRISTIAN ALFREDO	EPS044	230301	CCF26																			886.000	886.000	886.000	886.000	0			141.800	0	0	35.500	0
2	CC	1054091084	REYES CARDENAS OMAR ENRIQUE	EPS017	25-14	CCF26		X																	236.267	236.267	236.267	236.267	0			37.900	0	0	9.500	0
3	CC	1061695090	CHAMIZO CAMACHO JORGE ARMANDO	EPS018	25-14	CCF26	X																		55.334	55.334	55.334	55.334	0			8.900	0	0	2.300	0
4	CC	1061782586	PISAMINA PINZON YUSEP MICHEL	EPS037	230301	CCF26	X																		193.667	193.667	193.667	193.667	0			31.000	0	0	24.300	0
5	CC	1061782586	PISAMINA PINZON YUSEP MICHEL	EPS037	230301	CCF26	X																		193.667	193.667	193.667	193.667	0			31.000	0	0	24.300	0
6	CC	1082689443	QUIÑONES QUIÑONES ALBERT DAVID	EPSC34	230301	CCF26																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
7	CC	79208015	CARO BERNAL LUIS IGNACIO	EPS044	25-14	CCF26																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
8	CC	79451429	VARGAS BURGOS LUIS ALFREDO	EPS008	231001	CCF26																			900.000	900.000	900.000	900.000	0			144.000	0	0	36.000	0
9	CC	91288832	MENDOZA CARRILLO OMAR ALEX	EPS041	230301	CCF26	X																		83.000	83.000	83.000	83.000	0			13.300	0	0	3.400	0
10	CC	93345165	GUEPENDO VILLALOBOS JOSE VICENTE	EPS017	230301	CCF26																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900763851-1	METAL B SAS	CRA 5 9 24	8965955	bolivarale08@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Ley 1429	PLANILLA 1	0	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
			2019/02/14		16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-02	2019-01	E	14/02/2019	33041591	$3.976.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	132.800	0		0		0	1	100	0	132.900	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	166.000	0		0		0	1	200	0	166.200	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	66.400	0		0		0	1	100	0	66.500	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	66.400	0		0		0	1	100	0	66.500	2
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	33.200	0		0		0	1	100	0	33.300	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	66.400	0		0		0	1	100	0	66.500	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.060.000	0	0	0	0	1	800	0	1.060.800	8
230301	Porvenir	800224808-8	530.000	0	0	0	0	1	400	0	530.400	4
231001	Colfondos	800227940-6	265.000	0	0	0	0	1	200	0	265.200	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	132.500	0	0	0	0	1	100	0	132.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	923.200				923.200	1	700	923.900			9.232	923.900	16

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	531.200	1	400	531.600	16

PAGADA
33041591

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

212

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900763851-1	METAL B SAS		CRA 5 9 24	8965955	bolivarale08@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PLANILLA 1	0	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-02	2019-01	E	14/02/2019	33041591	$3.976.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	531.200	531.900
Pensión	4	1.987.500	1.989.000
Riesgos Laborales	1	923.200	923.900
CCF	1	531.200	531.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	3.973.100	3.976.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

113

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900763851-1	METAL B SAS		CRA 5 9 24	8965955	bolivarale08@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Lev 1429	PLANILLA 1	0	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 16 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-02	2019-01	E	14/02/2019	33041591	$3.976.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013671333	PEÑARETE CAMARGO JEISON ALEXANDER	1	0			S																	230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS044	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
2	CC	1019021014	DE LA HOZ HERNANDEZ MARCO FIDEL	1	0			S																	230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS023	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
3	CC	1032447911	PATIÑO PARUMA WILMER	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS044	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
4	CC	1032486787	BURBANO VERGARA WILLIAM ALFONSO	1	0			S																	230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS002	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
5	CC	1070917560	BOLIVAR ALVARADO CARLOS JULIO	1	0			S																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS010	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
6	CC	1070924595	SANCHEZ SIERRA ERIK JEFFERSON	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS002	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
7	CC	1070925572	DE LA HOZ HERNANDEZ OMAR DUVAN	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
8	CC	19314470	PEDROZA PAEZ CARLOS EDUARDO	1	0			S																	230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
9	CC	74339068	ALVARADO PINZON FERMIN	1	0			S																	231001	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
10	CC	79312889	BOLIVAR PEREZ RICARDO	1	0			S																	230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
11	CC	79867574	GONZALEZ SAAVEDRA MILLER HENRY	1	0			S																	230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
12	CC	79915357	GONZALEZ SAAVEDRA WILFREDO	1	0			S																	230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
13	CC	79915732	RODRIGUEZ GARZON CHRISTIAN ALBERTO	1	0			S																	230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS002	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
14	CC	80178671	BOLIVAR ARIAS JUAN CARLOS	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS010	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
15	CC	80803303	GARCIA BARRETO JHON ALEXANDER	1	0			S																	231001	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
16	PE	831357616111 979	BLANCO EOSTEICOCHEA JUAN CARLOS	1	0	X		S																			0	0	0	0	0	EPS002	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38362885		ALVAREZ FUENTES MARGARITA EUGENIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 6 # 22 - 29	POPAYAN-CAUCA	8345114	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-01	2019-01	414186398	8488790474	I	2019/02/20	2019/02/14	BANCOLOMBIA	0	$236,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	38362885	ALVAREZ MARGARITA	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0

PAGADO

2019/02/14 10:23 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38362885		ALVAREZ FUENTES MARGARITA EUGENIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 6 # 22 - 29	POPAYAN-CAUCA	8345114	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-01	2019-01	414186398	8488790474	I	2019/02/20	2019/02/14	BANCOLOMBIA	0	$236,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$132,500	$0	$0	$132,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$132,500	$0	$0	$132,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				1	$236,100	$0	$0	$236,100

PAGADO

2019/02/14 10:23 AM

Contrato de Interventoría

DAIMCO

NIT 900021482 - 1

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito Representante Legal y Revisor Fiscal de DAIMCO S.A.S., certifica que DAIMCO S.A.S. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar, así como por concepto de pago de parafiscales. De los últimos seis (6) meses.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1819 de 2016 cumpliendo con el artículo 114-1, deberá diligenciar la siguiente información:

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES		
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados (artículo 114-1)	Si (X)	No ()

Dado en Bogotá D.C., a los 04 días del mes de marzo de 2019.

Atentamente,

CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO
C.C. 78.027.760 de Cerete
Representante Legal

MARCIA CECILIA ATENCIALOZANO
Revisora Fiscal
TP 69499-T

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
comercial@daimco.com
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

Anexo No. 6 Control de Personal del Contratista

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, : Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-6-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitana De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERÍODO:DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICÍA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	AURELIO GUTIERREZ	REPRESENTANTE LEGAL					1	1	1	1	1													1	1							
2	FABIO ANDRES CLAROS BAUTISTA	RESIDENTE ELECTRICO	79.921.075																										1	1	1	
3	FEDERICO MONTEALEGRE	ING COORDINADOR SSTMA	76.318.096																		1	1	1	1	1							
4	JULIAN MAURICIO GIRALDO	DIRECTOR DE OBRA	15.908.656	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	
5	MARIA TERESA OJEDA CABRERA	RESIDENTE DE OBRA	34.555.320	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
6	MARIA FERNANDA BENAVIDES BELTRAN	AUXILAIR ADMINISTRATIVO/ SSTMA	34.315.134				1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
7	EDGAR ENRIQUE CALVETE LOPEZ	ARQUITECTO	4.979.340	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
8	YULI GOMEZ URBANO	RESIDENTE SSTMA	1.080.900.176	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
9	JULIAN VELASCO	AUXILIAR SSTMA	1.061.716.774	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
10	CLAUDIA ANDREA ANAYA PIAMBA	AUXILIAR SSTMA	34.324.707	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA											
11	CRISTIAN FERNANDO MUÑOZ CEDEÑO	AUXILIAR SSTMA	1.061.740.754																				NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	
12	MARGARITA EUGENIA ALVAREZ FUENTES	TOPOGRAFA	38.362.885	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	
13	ALEXANDRA RISUEÑO ZEMANATE	AUX. TOPOGRAFIA	1.062.754.412	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
14	MILTON GUSTAVO CASTILLO BOJACA	CONDUCTOR	80.374.061	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
15	RAUL ALEXANDER MORENO SUAREZ	CONDUCTOR	79.560.334	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	

021

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, : Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-6-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitana De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO:DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
16	YILVER DUVAN QUILINDO	OPERADOR	1.061.793.125	1	1		1	1	1	1	1	1																				
17	CARLOS URIEL CAMPO MOSQUERA	OPERADOR	1.061.711.030											1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
18	JHON JAIRO PINEDA	INSPECTOR	75.082.427	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19	DIEGO HERNAN ANGUCHO CAMPO	AUX. BODEGA	1.061.725.400	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20	HUALTER ANTONIO HERNANDEZ OSORIO	AYUDANTE	4.751.640	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1			1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
21	ARIS QUILINDO ULCUE	AYUDANTE	1.062.776.138	1	1		1	1		1	1	1		1	1		1	1	1		1							1	1	1	1	
22	EDGAR EUGENIO CAMPO SANCHEZ	AYUDANTE	1.061.713.631	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
23	AMALQUIO ALEJANDRO CASTAÑEDA	AYUDANTE	75.003.219	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
24	CARLOS EDUVER LEON	OFICIAL	3.087.064	1		1	1	1	1	1	1								1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
25	EVA ARFILENI AGUDELO GALLO	AYUDANTE	52.242.119	1			1	1	1	1	1								1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
26	HUGO ANTONIO IDARRAGA	AYUDANTE	18.400.159	1		1	1	1	1	1	1					1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
27	WILLIAN CASTAÑEDA PINEROS	AYUDANTE	86.048.874	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
28	GERARDO SOLARTE GONZALEZ	OFICIAL	94.463.640	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
29	LUIS ALFREDO BAUTISTA BAUTISTA	OFICIAL	19.423.106																												1	
30	EDUAR FABIAN LEON	AYUDANTE	93.438.331	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, : Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-6-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitana De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO:DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
31	RAFAEL ANTONIO MENDEZ GARZON	AYUDANTE	1.106.308.450	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
32	JOHAN SEBASTIAN BAUTISTA GUERRERO	AYUDANTE	101.420.409			1	1	1	1	1	1					1	1															
33	JOSE MARIO DIAZ MORALES	AYUDANTE	1.083.838.643	1	1	1	1	1	1	1	1																	1	1	1	1	
34	JORGE ANDRES OLIVEROS PENAGOS	AYUDANTE	1.005.929.429	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	
35	BRYAN JESUS PALOMINO GOMEZ	AYUDANTE	1.106.899.374	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
36	JOSE RAUL GONZALEZ	OFICIAL	94.254.061		1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
37	IVAN RICARDO JIMENEZ BERNAL	AYUDANTE	79.942.276													1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
38	GUSTAVO ROMERO	AYUDANTE	91.437.224																1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
39	DANIEL ANDREY RODRIGUEZ PATIÑO	OFICIAL	1.110.506.178	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
40	LUIS ALFONSO GORDILLO LONDOÑO	AYUDANTE	7.251.758	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
41	JOSE HECTOR ERAZO	AYUDANTE	113.058.446	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	
42	ALVARO MILENA FERIA MONTEALEGRE	HIDRAULICOS	14.253.118	1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
43	RUSSEL WEIMAR GARCIA GRAJALES	OFICIAL	1.005.855.845	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	
44	YEFERSON GOMEZ RAYO	OFICIAL	1.106.893.622	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
45	DIEGO FERNANDO BERMUDEZ ORTIZ	OFICIAL	1.070.615.596	1	1	1	1	1	1	1																						

122

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, : Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-6-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policia Metropolitana De Popayán, Departamento De Policia Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERÍODO:DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
46	CAMILO ANDRES SANCHEZ GARCIA	OFICIAL	1.070.602.996	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
47	JIMMY GALINDO MARTINEZ	OFICIAL	11.223.201	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
48	LUIS ALBERTO DE LA CRUZ	HIDRAULICOS	10.661.566	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
49	MARIO PAUL AVILA GUERRA	HIDRAULICOS	80.010.363	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
50	ALFREDO CHILITO MUÑOZ	AYUDANTE	1.058.789.787	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
51	HERNEY OIME	HIDRAULICOS	76.316.674	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
52	ERMINSON ARLEY MONTENEGRO MONTENEGRO	HIDRAULICOS	1.002.966.865	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
53	ARCENIO GUAMANGA ANACONA	OFICIAL	76.318.444																						1		1	1	1	1	
54	BRUNO TENORIO PALOMINO ROJAS	CONTRATISTA	80.421.341													1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
55	JHON FREDY AGRONO CRUZ	AYUDANTE	1.062.324.018	1	1		1	1	1	1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
56	JOSE DIVIER GOMEZ FIGUEROA	AYUDANTE	1.061.599.683	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1				1	1	
57	LENIN EDUARDO CENTENO OROZCO	OFICIAL	85.270.068	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
58	MILTON HUMBERTO PIPICANO INCHIMA	AYUDANTE	76.293.311	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
59	RICHAR JOSE MOSQUERA	OFICIAL	106.380.968	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
60	WEIMAR HERNAN GUACA	OFICIAL	10.317.382	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	

103

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, : Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-6-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policia Metropolitana De Popayán, Departamento De Policia Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO:DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
61	JESUS CARVAJAL AVIRAMA	AYUDANTE	1.012.363.595	1	1																											
62	ROBINSON MUÑOZ VARGAS	AYUDANTE	1.117.486.148	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
63	JOSE ALECIO MOSQUERA LOZANO	OFICIAL	4.832.722																		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
64	ESAU JIMENEZ JIMENEZ	OFICIAL	7.552.190																			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
65	ESAU JIMENEZ CUELLO	AYUDANTE	1.061.730.544																			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
66	CARLOS JAIR ZAMBRANO PILLIMUE	AYUDANTE	10.301.240																						1	1		1	1	1	1	
67	FERNEY ALEXANDER MONTENEGRO MONTENEGRO	AYUDANTE	1.002.966.866	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
68	JHON ALEXIS BENAVIDES VALVERDE	AYUDANTE	1.063.818.358	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
69	DIDIMO ANCISAR ACOSTA MACIAS	AYUDANTE	1.058.970.334	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
70	ALEXANDER HUBERT LUCUMI PINO	AYUDANTE	16.840.385	1			1	1	1	1	1	1				1	1															
71	CRISTIAN CAMILO MOPAN	AYUDANTE	1.061.804.916				1	1	1		1	1																				
72	JOHN EDINSON MARTINEZ PINO	OFICIAL	1.113.514.242	1			1	1	1	1	1	1																				
73	CESAR PEREZ RONDON	OFICIAL	74.795.219	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
74	JOSE OLIMPO VILLANUEVA VILLANUEVA	OFICIAL	10.009.619	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1																
75	BENITO ORTIZ CUASQUER	OFICIAL	1.102.841.897					1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	

124

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, : Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-6-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitana De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO:DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICÍA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
76	CARLOS ALIRIO LOPEZ LUNA	OFICIAL	76.150.050																				1	1	1	1		1	1	1	1	
77	ANDRES MEJIA MARTINEZ	AYUDANTE	1.135.014.020																						1	1		1	1	1	1	
78	MIGUEL ANGEL PAZU MESTIZO	OFICIAL	10.484.701																									1	1	1	1	
79	ANDRES GONZALEZ COBO	AYUDANTE	1.061.797.592	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	
80	JOSE ELIECER DOMINGUEZ	AYUDANTE	76.025.008	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
81	ROBINSON MOSQUERA	AYUDANTE	1.063.813.153		1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
82	OSCAR HERNAN GARCIA PALACIO	AYUDANTE	1.031.140.081	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1		1	1													
83	WILSON ANDRES SALAZAR SALAZAR	AYUDANTE	1.061.808.030	1	1			1	1	1	1	1		1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	
84	DANEYER UNI CHILITO	AYUDANTE	1.058.787.468	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
85	DIONICIO VALENCIA VALLECILLA	AYUDANTE	76.244.421	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
86	JOSELITO FLOR ATOY	AYUDANTE	1.061.689	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
87	RAMON ORLANDO ATOY GUTIERREZ	AYUDANTE	10.290.853	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
88	JAMES ALBERTO GOMEZ GRIJALBA	OFICIAL	10.696.850	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
89	MARIO ALEXANDER GOMEZ VARGAS	OFICIAL	75.085.575					1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
90	MILTON FAVIAN GOMEZ CAMPO	AYUDANTE	1.063.812.410																1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	

Anexo No. 7 Control Personal de Interventoría

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DE LA INTERVENTORIA INT-40:00

PROYECTO: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

EMPRESA: DAIMCO S.A.S

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

FRENTE DE OBRA: POPAYAN - CAUCA

No	Nombre	Cargo	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	TIRSO MARINO COSME OROZCO	DI	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	24
2	SANDRA LUCIA GUAUÑA PISSO	IR	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	24
3	ROSA DEL MAR RODRIGUEZ GALVIS	SO	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	24
4	MONICA LILIANA BENITEZ ANGEL	AR	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	24
5	JAVIER JOSE CARILLO ORTEGA	E	0	1	0	1	1	0	0	1	1,0	0	1	0	0	1	1	0,0	0	1	0	0	1	1	0,0	0	1	0	0	1	13
6	RIGOBERTO LOZADA DIAZ	TA	0	1	0	1	1	1	1	1	0,5	0	0	1	0	1	1	0,5	0	1	1	0	1	1	0,5	0	1	1	0	1	18
7	VÍCTOR MANUEL BOCANEGRA GARCÍA	E	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1,0	0	1	1	1	1	1	1,0	0	1	1	1	1	24
8	JOSE ARMANDO RUIZ ANGARITA	E	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	7
9	ALBERTO FEDERICO MOUTHON BELLO	E	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0,0	0	1	1	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	8
10	PABLO MANRIQUE CONVERS	E	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0,0	0	1	0	0	0	1	1,0	0	0	1	1	1	14
11	PABLO EMILIO GUERRERO JIMENEZ	E	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	24
	TOTAL PERSONAL POR DIA		8	10	0	9	10	7	8	9	9	0	9	9	7	11	10	8	0	10	8	6	8	9	8	0	8	8	7	9	204

OBSERVACIONES

ING. RESIDENTE

Elaboró SANDRA GUAUÑA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - TIRSO COSME

Aprobó

CONVENCIONES DE CARGO

DO	DIRECTOR DE OBRA	**O**	OFICIAL
IR	INGENIERO RESIDENTE	**A**	AYUDANTE
TA	TECNICA AMBIENTAL	**I**	INSPECTOR
TA	TOPOGRAFO	**OP**	OPERADOR
CI	CADENERO I	**PL**	PALETEROS
CII	CADENERO II	**LB**	LABORATORISTA
M	MAESTRO	**E**	ESPECIALISTA

Fecha de Aprobación de Formato INT-40:01, 30 de Abril de 2015

Anexo No. 8 Informe SISO

INTERVENTORÍA TÉCNICA EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DEL MANEJO AMBIENTAL AL CONTRATO, PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REALIZADA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ EN LA CIUDAD DE POPAYÁN CAUCA.





PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2019

ELABORÓ:

ROSA DEL MAR RODRIGUEZ G.

RESIDENTE SISOMA

INTERVENTORÍA DAIMCO S.A.S

1. INTRODUCCIÓN

A continuación se presenta la recopilación y el análisis de la información proveniente de las actividades del **SG-SST** ejecutadas por el contratista **CONSORCIO BCS-GUTIERREZ** durante la ejecución del proyecto **CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN** ubicada en la ciudad de Popayán , con el fin de analizar y evaluar la protección y promoción de la salud de los trabajadores, condiciones de trabajo, gestión social con la comunidad y protección al medio ambiente de posibles impactos durante la ejecución del contrato.

2. OBJETIVO GENERAL

El objetivo del presente informe es evidenciar el trabajo respecto a la gestión en seguridad y salud en el trabajo (SST) establecido y aplicado por el contratista Consorcio BCS- GUTIERREZ en la ejecución del proyecto Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitana De Popayán; durante el periodo del 26 de Enero al 25 de Febrero de 2019. Así mismo analizar el avance de la implementación para evaluar resultados de este y establecer medidas que nos conlleven al mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo y el control eficaz de los peligros y riesgos, en materia de seguridad y salud en el trabajo.

3. METODOLOGÍA ÁREA SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SISOMA) o SG-SST y MA(Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente:

La metodología a implementar para fundamentar el presente informe se basa en la recopilación y registros de la información de las actividades establecidas por los subprogramas de medicina preventiva de trabajo, seguridad industrial, gestión de saneamiento básico y protección ambiental realizada según la estructura del SG-SST determinado en la presente obra.

4. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

132

4.1 Seguimiento a los hallazgos , se realizan los siguientes requerimientos en Seguridad y Salud en el trabajo al contratista:

✓ Seguir Manteniendo las áreas de circulación y rutas de evacuación limpia y despejada.

Rta: Se ha continuado con el programa de Orden y Aseo, se designó provisionalmente por un periodo de 2 semanas, un área de acopio de escombros en el área del 1 piso de Bloque 1 (patrulleros), dado que esta área se prestaba para evacuarlos los escombros con el minicargador y disponerlos en el botadero autorizado.

✓ Completar las hojas de vida pendientes, como son las 2 del personal de cubierta, Metal B- S.A.S, personal de Eléctricos y demás personal que vaya ingresando.

Rta: El contratita realizo la entrega de las Hojas de Vida cubierta, Metal B- S.A.S, personal de Eléctricos.

4.2. Identificación de riesgos y peligros en áreas del proyecto:

✓ Realizada una inspección de campo en los diferentes frentes de trabajo que se encuentran en la obra Construcción y Dotación de la Cuarta Fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán.

✓ Aplicar medidas preventivas y correctivas identificadas en cada uno de los frentes de trabajo.

✓ Hacer seguimiento a la cronograma de capacitación anual y del charlas semanales.

✓ Realizar seguimiento a la ejecución de los procedimientos seguros correspondiente a cada actividad que ejecuta el contratista en obra.

✓ Verificar que se tomen las medidas preventivas y correctivas a que haya lugar.

✓ Verificar el cumplimiento de los programa que hacen parte de la Gestión en SST- MA, los cuales garantizan la Seguridad y Salud de los trabajadores en obra.

133

5. GESTIÓN HUMANA

5.1. INGRESOS - DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL

En el periodo comprendido entre el 26 de Enero y el 25 de Febrero de 2019 se realiza por parte de la interventoría al residente SISOMA de la Empresa Contratista Consorcio BCS- GUTIERREZ, la revisión de la carpeta de ingreso del personal contratistas y subcontratista, verificando que se cumpla con lo propuesto en el subprograma de medicina preventiva y del trabajo y el subprograma de higiene y seguridad industrial. Finalizada la verificación se evidencia que a la fecha se encuentran los siguientes documentos:

Se verifica los exámenes de ingreso, se realizaron 28 exámenes médicos de ingreso, al personal nuevo que ingreso para este periodo.

Para el presente periodo el contratista realizaron 8 solicitudes para que los trabajadores se realizaran los exámenes médicos de retiro, se hizo la socialización del derecho de examen de retiro a un total de 8 personas.

No se ejecutaron exámenes periódicos, dado que para el periodo no aplican.

Para el presente periodo no se realizaron recomendaciones médicas originadas de los exámenes médicos de ingreso.

El contratista informa que dentro de las inducciones realizadas de acuerdo al ingreso de personal se socializan las políticas del SG-SST (Política del SG-SST y Política de no al consumo de sustancias psicoactivas, tabaco y alcohol) y los temas generales del SG-SST, dentro de las inducciones se incluyó el tema de la Política de Medio Ambiente.

Para el periodo de 26 de Enero al 25 de Febrero de 2019, se realizaron 12 inducciones, con asistencia de 27 personas en total, las inducciones están soportadas con los registros y sus respectivas evaluaciones.

Los temas tratados en las inducciones son:

- Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
- Política de Tabaquismo, Alcoholismo
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Definición de AT y EL

134

- Uso de Elementos de protección personal
- Sistema General de Seguridad Social
- Notificación de Riesgos
- Plan de Emergencias
- Notificación al derecho de examen Médico ocupacional.

El contratista informa que dentro del SG-SST del consorcio, se implementa el manual de contratistas, el cual debe acogerse cada una de las organizaciones subcontratadas por el consorcio, con el fin de garantizar el cumplimiento a todo lo concerniente a la Seguridad y Salud en el Trabajo, es decir, que de acuerdo a la implementación del documento mencionado, se está cumpliendo con los procedimientos de inducción debidamente soportados y documentados.

Se verifica todas Hojas de vida de Consorcio BCS Gutiérrez, estas cumplen con los requerimientos establecidos.

Formato de hoja de vida con actualización de datos del trabajador.

Contratista:

AG3 INGENIERIA: Se cuenta con el 100% de las Hojas de Vida. Equivalente a Trabajadores

CONSORCIO BCS-GUTIERREZ: Cuenta con el 99% de las Hojas de Vida, equivalente de 7 Trabajadores operativos, 100% 9 H.V del área administrativa.

A la fecha está pendiente 1 H.V del Nuevo Auxiliar SSTSM.

Hojas de Vida faltantes de Subcontratistas:

BRUNO: 4
CARLOS LEON: 3
DANEL RODRIGUEZ: 1
DATALEC INGENIEROS: 2
JHON JAIRO PINEDA(TANQUE): 5
METAL B SAS: 2
ORLANDO EDMUNDO REVELO: 2
ESTRUCTURA METALICA: 2

Aparte de los documentos pendientes se realizó las siguientes verificaciones:

188

Se verifica que se realice a diario el registro del personal en el libro de obra (bitácora) y formato personal de contratista y formato de Interventoría (int-8 F. Informe diario de inspección v0 y int-40 f. personal del contratista v0) , en el cual se registra todo el personal de obra, tanto de contratista y de interventoría, Control de Dotación y EPP, Equipos, Maquinaria, Estado del tiempo, Control de Sumistro de Materiales, Registro de Control de Calidad de Materiales y Obras, Descripción General de las Principales Actividades Desarrolladas, dicho formato lo diligencia la Ing Residente, en donde se relaciona el personal administrativo y operativo como: director de obra, ingeniero residente, residente SISOMA, Contratita Topografía: Margarita Álvarez, Subcontratista AG3 Ingeniería, Arrieta SAS, Bruno Palomino, Contratista Mamposteria: Carlos Leon, Daniel Rodríguez, Contratista Tanque: Jhon Pineda, Contratista Eléctricos: DATALEC INGENIEROS, Contratista: Retroexcavadora: Orlando Edmundo Revelo, Contratista Cubierta: Metal B SAS.

Se evidencia la entrada del personal de lunes a viernes en la jornada de la mañana en el horario de 7:00 am y la salida en horario de la tarde 5:00 pm; con su respectiva horario de almuerzo de 12:00 M a 1:00 P.M. los días sábados de 7:00 am a 12:00 pm del medio día. Tanto contratista como subcontratista.

5.2. PERSONAL ACTUAL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

CONTRATISTA	ACTIVIDAD	# TRABAJADORES
CONSORCIO BCS- GUTIERREZ	ADMINISTRACIÓN	9
	OBRA	5
AG3 INGENIERIA	CONDUCTORES -2 DE VOLQUETAS), -1 PAGARITA	3
	TOTAL	17
SUB CONTRATISTA	**ACTIVIDAD**	**# TRABAJADORES**
MARGARITA ALVAREZ	Topografia	2
ARRIETA SAS	ESCAVACION (Movimientos de Tierra), Armado de Hierro, vaciado de concreto.	8
BRUNO	Armado de Hierro, vaciado de concreto	13

136

CARLOS LEON	Mamposteria	**14**
DANIEL RODRIGUEZ	Mamposteria	**13**
JHON JAIRO PINEDA	Armado de Hierro, vaciado de concreto	**13**
DATALEC INGENIEROS	Mamposteria	**5**
METAL B SAS	Estructura Metalica	**4**
ORLANDO EDMUNDO REVELO	Retroexcavadora	**3**
Subcontratistas TOTAL		**75**

A la fecha el personal ha tenido la siguiente rotación:

Nuevos = 21
Personal antiguo =61
Personal retirado = 8
Ingreso retiro = 7

6. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

6.1. Señalización y demarcación:

- Se verifica que los frentes de trabajo de la obra se encuentren demarcados y señalizados, dando cumplimento a la resolución 1016 de 1989. Artículo 11 (Numeral 17).

- Se inspecciona camilla, extintores y botiquines del campamento y los de los vehículos, se verifica que el extintor multipropósito (ABC) del contratista, (suministrado por el proveedor REPARAEQUIPOS MARTINEZ), esté cargado, presurizado, tenga el pasador de seguridad, tenga la fecha de recarga vigente, este rotulado, señalizado y se encuentre en un lugar visible, accesible y a disposición inmediata en caso de incendio.

- Se inspecciona que el botiquín de primeros auxilios que se encuentra en la obra, contenga los elementos establecidos por la RESOLUCIÓN 0705 DE 2007.

6.2. Vigilancia a las actividades propuestas para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

- Se verifica que el contratista realice actividades encaminadas a la prevención de accidentes y al mejoramiento de las condiciones laborales de acuerdo al cronograma de actividades de seguridad y salud en el trabajo (SST), que se

137

ejecutan por el Residente SISOMA del contratista. Dando cumplimiento a la resolución 1016/89 y al Decreto 1443 de 2012, Resolución 1111 de 2017

- Se inspecciona que en las inducciones a los trabajadores se traten los temas conforme a cumplimiento de la legislación vigente en seguridad y salud en el trabajo.

- Se verifica que en el proceso de inducción se incluya los temas ambientales socializar política de consumo de sustancia psicoactivas, política vial, plan emergencia, temas ambientales.

TABLA DE INDUCCIONES		
TEMAS	**PROGRAMADAS**	**REALIZADAS**
Marco legal en seguridad, salud en el Trabajo y Medio Ambiente.	De acuerdo al número de trabajadores que ingresen en el mes	5
Política del SG-SST y MA		

6.3. Capacitation y entrenamiento

Se revisa el cronograma de capacitación y entrenamiento teniendo en cuenta que estas se realicen de acuerdo a los procesos que se ejecutan en la obra, a la fecha la empresa contratista BCS GUTIERREZ, han realizado las capacitaciones de acuerdo al cronograma mensual y anual propuesto.

Dando cumplimiento al 100% de las capacitaciones programadas

Durante lo corrido del periodo que abarca este informe, se realizaron capacitaciones al personal de la obra, correspondiente a los siguientes temas:

TEMA	ORIENTADOR
Levantamiento de Cargas	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
Accidentes en la Construcción Orden y Aseo	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
Cultura del Autocuidado	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
Riesgo Eléctrico	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
Socialización Retiro de Puntillas	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS

138

6.3.1. Charlas de seguridad diaria y precalentamiento

TEMA	ORIENTADOR
Accidentes en la Construcción Orden y Aseo	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
Comunicación Asertiva	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
Levantamiento de Cargas	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
Seguridad para Trabajo en Alturas	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
Socialización de Retiro de Puntillas	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS

Se siguen realizando las charlas los Martes o Miércoles, por grupos guiadas al componente de SST y MA total 4 charlas programadas.

6.3.2 Actividades de prevención personal sintomática.

Durante del desarrollo de este periodo CONSORCIO BCS-GUTIERREZ no se realizaron actividades de prevención de la enfermedad, ni promoción de la salud.

Línea base de condiciones de salud.

CONSORCIO BCS-GUTIERREZ realiza el seguimiento a la línea base de condiciones de salud en las áreas que serán programadas

6.4 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

La empresa realiza la Entrega, reposición, inspección y mantenimiento de elementos de protección personal (EPP).

Para el Periodo del 26 Enero al 25 de Febrero de 2019 se realizó la entrega de los siguientes Elementos de Protección Personal.

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD
1	Casco de seguridad	22
2	Gafa lente oscuro	33
3	Gafa lente claro	10
4	Tapa boca	71

139

5	Guantes reforzados	100
6	Tapa oído inserción	20
9	Guantes caucho	66
11	Botas punteras en caucho	5
12	Barbuquejo	5
13	Guantes nitrilo	3

El contratista realiza las inspecciones planeadas de EPP de acuerdo al programa de inspecciones planeadas y se verifica el uso de EPP al personal en obra.

El contratista da cumplimiento constante en la obra a la inspección de utilización y estado de los EPP acordes a la tarea, se realiza cambio de EPP de acuerdo a la necesidad, sobre todo se realiza cambio de guantes de vaqueta, sencillos y reforzados, de caucho, hilaza y gafas y protección auditiva tipo inserción

Adicionalmente a la entrega de elementos de protección personal, el consorcio hace entrega de la siguiente relación de dotación:

ITEM	DOTACION	CANTIDAD
1	Bota punta de acero	32
2	Pantalón y camisa (logo consorcio)	23

Dicha dotación es entregada en su respectivo formato.

6.5 ACTIVIDADES DE SOPORTES DEL PLAN DE PREPARACIÓN Y ATENCIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA.

Se realizó inspección de extintor y botiquín de primeros auxilios ubicado en el campamento del contratista, almacén, volqueta Szp025, volqueta szp026 y minicargador.

7. DESCRIPCION GENERAL DE ACTIVIDADES.

Con el fin de dar a conocer las diferentes actividades que se desarrollan en el periodo se describe a continuación el avance de obra del área técnica, para tener un mejor

140

entendimiento que debe realizar el área SST-MA, a continuación se describe las actividades del área técnica así:

- Excavación mecánica, cargue y desalojo de material.
- Localización de ejes y niveles
- Fundida de placa en cubierta
- Levante de muros
- Relleno de subestación eléctrica y base de tanque de almacenamiento de agua
- Instalación de cinta PVC en tanque
- Realización de pañetes casino, subestación y oficiales.
- Relleno con material en área de patrulleros.

8. INFORME GESTION SOCIAL.

8.1 ACTIVIDADES PRINCIPALES

No se cuenta con guarda de seguridad, dado que la obra se encuentra ubicada dentro de las instalaciones de la Policía Metropolitana de Popayán y cuenta con cerramiento perimetral en malla verde.

El contratista instalo Cámaras de Seguridad, para brindar mejor soporte referente al tema de seguridad.

Hasta le fecha no se registró sugerencias, quejas o reclamos del área externa.

9. INSPECCIONES

Durante el presente periodo se desarrollaron las siguientes inspecciones por parte del área SISOMA del Contratista BCS Gutierrez:

TIPO DE INSPECCIÓN	FRECUENCIA
Inspecciones de botiquín de primeros Auxilios	Mensual
Inspección de extintores	Mensual
Inspección de camilla	Mensual
Inspección orden y aseo	Semanal
Inspecciones de Equipos y Herramientas	Mensual

141

Inspección pre operacional de Vehículos y Maquinaria	Diaria
Inspección de elementos de protección Personal	Cada quince días
Inspección para Permisos de Trabajo en Alturas	De acuerdo a los trabajos ejecutados en Alturas
Inspección ambiental	Semanal
Inspección de observación de Comportamiento	Semanal

Todas las inspecciones están soportadas en los formatos correspondientes.

10. AUSENTISMO LABORAL GLOBAL

A continuación, se hace la relación de ausentismo general global discriminado de la siguiente manera:

Nota. La NTC 3793 en el numeral 3.2.1. De ausentismo laboral, manifiesta lo siguiente, "El periodo se puede tomar en meses o años, se recomiendan cortes mensuales.

ALG = AUSENTISMO LABORAL GLOBAL
Días perdidos no relacionados con la salud: 96 días= 768 horas
Días perdidos por accidentes de trabajo: 7 días = 56 horas
Días perdidos relacionados con enfermedad general 39 días: 312 horas
Total, días perdidos: 142 días = 1.136 horas.
Tiempo programado en el periodo: 31 días
Total, personal del proyecto en el periodo: 82 personas

Tiempo de trabajo programado en el periodo (trabajador x horas día x días semana x número semana) = 22.140

$$ALG = \frac{\text{Tiempo de trabajo perdido en el periodo} * 100}{\text{Tiempo de trabajo programado en el mismo periodo}}$$

ALG = 1136/22140* 100 = 5,13%

Para un total de 82 personas del contratista, significa que de cada 100 horas trabajadas se presenta el 5,13 % de pérdida de tiempo para el periodo.

142

11. ACCIDENTALIDAD EN LA OBRA DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2019.

Durante este periodo se presentó 2 accidentes laborales a los siguientes trabajadores:

El 29 de Enero: AT - Por caída de volqueta
Nombre del Trabajador: María Fernanda Benavides Beltrán
Cargo: auxiliar administrativo/sstma.

El 11 de febrero: Por golpe con cuchara de retroexcavadora con pared
Nombre del Trabajador: Herney Oime
Cargo: ayudante de obra.

A continuación, se presenta el listado de personal con la estadística.

TABLA 2. ÍNDICES DE ACCIDENTALIDAD DEL MES DE 26 ENERO AL 25 FEBRERO 2019 **Periodo**	**Total, trabajadores**	**Total, accidentes de trabajo**	**Accidentes mortales**	**HHT**	**No. Días perdidos acumulados**	**IF**	**IS**	**ILI**	**LETALIDAD**
07 junio – 25 junio	12	0	0	1376	o	0.00	0.00	0.00	0.00
26 junio – 25 julio	22	0	0	4008	25,5	0.00	0.00	0.00	0.00
26 julio – 25 agosto	20	1	0	6884	47	1923,08	1923,08	3698,22	0.00
26	70	0	0	15120	3	0.00	0.00	0.00	0.00

con los soportes respectivos.		inducciones
La política SST, se socializa a todo el personal de la obra, firmada por el representante legal, se encuentra en lugar visible y se cuenta con los soportes respectivos	100%	El contratista realiza la socialización de la política de seguridad y salud en el trabajo en las inducciones
El COPASST o VIGIA, se reúne en forma mensual, cuenta con el cronograma de reuniones, Plan de Trabajo General de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión cumpliendo con la normatividad legal vigente	100%	Reunión con el COPASST
Se cumple el plan de Capacitación, Inducción y Entrenamiento.	100%	Se realizó inducción a todo el personal de la obra
Todos los trabajadores son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	100%	Se realizó la notificación de riesgos a todo el personal del proyecto.
Los contratistas cumplen con los compromisos adquiridos en los Comité SST-MA.	100%	Cumplimiento a las observaciones de la auditoria.
Se notifica a la Interventoría todas las novedades del personal (reingresos, cambios de cargo cambios de empleador y retiro) inmediatamente se presentan	100%	El contratista hace entrega vía correo electrónico por solicitud de interventoría, la documentación correspondiente a seguridad social de los trabajadores

Se efectúa examen médico de ingreso/periódico/egreso (este último el empleador entrega la orden al trabajador y la presenta a Interventoría), por cargo, se realiza por médico especialista en SST-MA. y con la información se	100%	Se presentaron exámenes médicos a todas las personas que permanecieron en la obra

mantiene actualizado el diagnostico de condiciones de salud del personal.		
Se cuenta con botiquín que contiene la dotación básica.	100%	El contratista cuenta en campamento con botiquín de primeros auxilios, con elementos necesarios para brindar el servicio ante cualquier eventualidad.
Se realizan actividades de promoción y prevención	N.A.	Para el periodo en mención no se realizaron actividades de promoción y prevención.
Las instalaciones provisionales cuentan con vistieres, donde los espacios son suficientes y adecuados para el manejo de ropas, implementos personales y EPP	100%	Se cuenta con tres vistieres, distribuidos uno para el personal de cada subcontratista.
Se posee 1 baño por cada 15 trabajadores y el baño recibe mantenimiento y limpieza periódica.	100%	Los baños se mantienen en buenas condiciones y estos se realizan los mantenimientos dos veces por semana, se cuenta con tramo 1=1, , tramo 2=2, , tramo 3= 1,tramo 4= 2; tramo 5=2, punto crea=2 baños fijos, total baños =10
Se entregan los EPP que cumplan con las normas de garantía de calidad, de acuerdo a la matriz aprobada y se lleva un registro formal de entrega	100%	El contratista tiene los formatos de entrega de elementos de protección personal y se entrega la dotación a todo el personal en total se hizo 26 entregas de EPP al personal de obra y se realiza reposición de acuerdo a la necesidad
Los trabajadores usan adecuadamente los EPP de acuerdo a la actividad y matriz aprobada.	100%	En los recorridos a diario que se realizan se verifica el uso de los elementos de protección personal, por tal motivo estos se encuentran en buen estado y lo usan

148

Las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con procedimientos de seguridad.	100%	Se cuenta con hojas de seguridad de las sustancias químicas utilizadas en el periodo se encuentra los siguientes: • • Cemento • • ACPM • • GASOLINA • • IMPERMEABILIZANTE SIKA1
Se implementan los permisos de trabajo para las labores de alto riesgo, y cumple los Procedimientos y/o estándares definidos.	100%	Se implementa permisos de trabajo en alturas
Se cuenta con procedimientos documentados y/o estándares de trabajo seguro por cada proceso constructivo u operación, los socializa, actualiza y se ejecutan según lo establecido.	100%	El contratista entrega todos procedimientos según los resultados de la matriz de peligros
Se tienen documentadas las estadísticas mensuales de ausentismo se presentan a interventoría con el análisis y acciones correctivas/preventivas correspondiente	100%	Para el presente periodo no se presentaron ausentismos relacionados con causas ATEP.
Se realizan las inspecciones establecidas en el programa	100%	Se realiza inspección a volquetas revisión, maquinaria, botiquín, extintor, uso de epp.
Se capacitan a todos los trabajadores en el plan de emergencia y tiene soportes.	100%	En las inducciones se realizó la socialización del plan de emergencias.
Se han conformado las Brigadas de emergencia, están activas, especializadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento mensual, se ejecuta y existen los soportes.	100%	Se encuentran identificadas

149

17. GESTIÓN DE MANEJO AMBIENTAL

MAQUINARIA EQUIPOS Y VEHICULOS.

Para el periodo del 26 de Enero al 25 de Febrero de 2019, se realizó trabajos con la Retro-Excavadora y el vibro compactador, del contratista Orlando Edmundo Revelo.

Para el presente periodo ingresaron al proyecto los siguientes equipos vehículos y maquinaria.

17.1 VEHICULOS

EHICULOS **TIPO DE VEHICULO**	**PLACA**	**NOMBRE DEL CONDUCTOR**	**FECHA DE INGRESO**
Volqueta	SZP 026	Milton Gustavo Castillo Bajaca	11/08/2018
Volqueta	SZP 025	Raúl Alexander Moreno Suarez	11/08/2018
Tractocamión	FLP894	Jairo Hernando Diaz	01/12/2018
Tractocamión	SWN046	William Cardono	07/12/2018
Camión	VAD086	Anderson López	15/12/2018
Volqueta	OYJ-223	Javier Oswaldo Bolaños	23/01/2019
Volqueta	CIZ-640	Nelson Olmedo Montilla	23/01/2019
Volqueta	GUE-408	Aurelio Oswaldo Bolaños	23/01/2019
Camión	NKN085	Juan Diego Gurrute	02/02/2019
Camión	SOQ149	Jhon Fredy Montilla	09/02/2019
Camión	SWN852	Olimpo Velasquez	11/02/2019
Camión	SXKS17	Arcesio Soto	11/02/2019
Tractocamioón	THY068	Tarcisio Pabon Campos	03/02/2019

17.2 MAQUINARIA

AQUINARIA **TIPO DE MAQUINARIA**	**REFERENCIA**	**NOMBRE OPERARIO**	**FECHA DE INGRESO**
Minicargador	218	CARLOS URIEL CAMPO	20/09/2018
Excavadora	420 E	Flavio Chañag	11/08/2018
Excavadora	PC200-5	Orlando Muñoz	14/11/2018
Excavadora	JCB214E	MILTON CESAR MACA	15/12/2018
Vibrocompactador	CA-15 DYNAPAC	MIGUEL MONTAÑO LAGO	18/12/2018
Excavadora	JCB214E	ORLANDO MUÑOZ	25/01/2019
Excavadora	KOMATSU	GERMAN CHALPARIZA	05/02/2019

Para el periodo objeto de este informe se tiene que se cuenta con los documentos de volquetas como:

Licencia de transito
*SOAT
*Tecno mecánica
*Licencia de conducción del señor

Adicionalmente a las volquetas se adjunta la documentación de la maquinaria (ver anexo 7. Documentación Vehículos y maquinaria).

$$\frac{\text{No. De vehículos con documentos requeridos vigentes}}{\text{No. De vehículos en obra}} * 100 = 13/13 = 100\%$$

$$\frac{\text{No. De acciones cumplidas}}{\text{No. De acciones propuestas aplicables en el periodo}} * 100 = 3/= 100\%$$

18. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Se dispone en campamento tres recipientes para disposición de residuos ordinarios

$$\frac{\text{Cantidad de residuos especiales, peligrosos, reciclables entregados en empresa autorizada}}{\text{Cantidad de residuos especiales, peligrosos, reciclables generados en periodo}} * 100$$

$$= \frac{\text{250 kg (reciclable entregado)}}{\text{250 kg (reciclable generado)}} * 100 = 100\%$$

La entrega de material reciclable se hace a través de la asociación de recolectores de materiales reciclables de Popayán "aremarpo", quien para este periodo certifica la recolección.

$$= \frac{\text{160 kg (ordinario entregado)}}{\text{160 kg (ordinario generado)}} * 100 = 100\%$$

La entrega de residuos ordinarios se hace a través de la ruta de recolección que realiza la empresa Serví Aseo; como evidencia se presente registro fotográfico en el punto de recolección ubicado en zona del comando.

La entrega de residuos peligrosos o especiales se hace a través de la empresa ASERHI, dando cumplimiento al indicador.

$$= \frac{\text{225 Kg (Residuos peligrosos en obra)}}{\text{225 kg (Residuos peligrosos en obra)}} * 100 = 100\%$$

La distribución de los recipientes corresponde a:

3 recipientes para recolección en oficina
4 recipientes para recolección de residuos en baños
5 recipientes del punto ecológico donde se hace la separación y clasificación de residuos según código de colores.

128

19. MANEJO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

Se realizan excavaciones movimiento de tierra en obra, el cual es dispuesto en la escombrera Revelo, quien cuenta con permiso, otorgado por la corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), (ver Anexo 4. Permiso escombrera y solicitud aprovechamiento)

Para el cual se tiene la siguiente relación:

CONTROL VIAJES DISPOSICION DE MATERIAL							
ITEM	FECHA	PLACA	CAPACIDAD	MATERIAL	No. RECIBO	L. DISPOSICION	TOTAL X DIA
1	25/01/2019	SZP026	15	TIERRA	267	REVELO	15
2	25/01/2019	SZP026	15	TIERRA	268	REVELO	15
3	25/01/2019	SZP026	15	TIERRA	269	REVELO	15
4	26/01/2019	SZP026	15	TIERRA	271	REVELO	15
5	31/01/2019	SZP025	15	ESCOMBROS	290	REVELO	15
6	4/02/2019	SZP026	15	ESTERILLA	291	REVELO	15
7	5/02/2019	SZP026	15	TIERRA	292	REVELO	15
8	5/02/2019	SZP025	15	TIERRA	293	REVELO	15
9	5/02/2019	SZP026	15	TIERRA	294	REVELO	15
10	5/02/2019	SZP025	15	TIERRA	295	REVELO	15
11	5/02/2019	SZP026	15	TIERRA	296	REVELO	15
12	6/02/2019	GUE408	7	TIERRA	297	REVELO	7
13	6/02/2019	OYJ223	7	TIERRA	300	REVELO	7
14	6/02/2019	GUE408	7	TIERRA	303	REVELO	7
15	6/02/2019	OYJ223	7	TIERRA	304	REVELO	7
16	5/02/2019	SZP025	15	TIERRA	305	REVELO	15
17	5/02/2019	SZP025	15	TIERRA	306	REVELO	15
18	6/02/2019	SZP025	15	TIERRA	307	REVELO	15
19	6/02/2019	SZP025	15	TIERRA	308	REVELO	15
20	6/02/2019	SZP025	15	TIERRA	309	REVELO	15
21	6/02/2019	GUE408	7	TIERRA	310	REVELO	7
22	6/02/2019	OYJ223	7	TIERRA	311	REVELO	7
23	7/02/2019	GUE408	7	TIERRA	312	REVELO	7
24	7/02/2019	CIZ640	7	TIERRA	313	REVELO	7
25	7/02/2019	OYJ223	7	TIERRA	314	REVELO	7
26	7/02/2019	GUE408	7	TIERRA	315	REVELO	7
27	7/02/2019	CIZ640	7	TIERRA	316	REVELO	7
28	7/02/2019	OYJ223	7	TIERRA	317	REVELO	7
29	7/02/2019	GUE408	7	TIERRA	318	REVELO	7
30	7/02/2019	CIZ640	7	TIERRA	319	REVELO	7
31	7/02/2019	OYJ223	7	TIERRA	320	REVELO	7

133

32	7/02/2019	GUE408	7	TIERRA	321	REVELO	7
33	7/02/2019	CIZ640	7	TIERRA	322	REVELO	7
34	7/02/2019	OYJ223	7	TIERRA	323	REVELO	7
35	7/02/2019	SZP025	15	TIERRA	324	REVELO	15
36	7/02/2019	GUE408	7	TIERRA	325	REVELO	7
37	7/02/2019	OYJ223	7	TIERRA	326	REVELO	7
38	7/02/2019	SZP025	15	TIERRA	327	REVELO	15
39	8/02/2019	SZP025	15	TIERRA	330	REVELO	15
40	20/02/2019	SZP026	15	TIERRA	338	REVELO	15
41	9/02/2019	SZP025	15	TIERRA	339	REVELO	15
42	9/02/2019	SZP026	15	TIERRA	340	REVELO	15
43	11/02/2019	SZP026	15	TIERRA	344	REVELO	15
44	11/02/2019	SZP025	15	TIERRA	345	REVELO	15
45	11/02/2019	SZP026	15	TIERRA	346	REVELO	15
46	12/02/2019	OYJ223	7	TIERRA	360	REVELO	7
47	13/02/2019	GUE408	7	TIERRA	361	REVELO	7
48	12/02/2019	CIZ640	7	TIERRA	362	REVELO	7
49	12/02/2019	SZP026	15	TIERRA	363	REVELO	15
50	12/02/2019	CIZ640	7	TIERRA	366	REVELO	7
51	12/02/2019	OYJ223	7	TIERRA	367	REVELO	7
52	12/02/2019	GUE408	7	TIERRA	368	REVELO	7
53	12/02/2019	SZP026	15	TIERRA	369	REVELO	15
54	12/02/2019	SZP026	15	TIERRA	370	REVELO	15
55	12/02/2019	CIZ640	7	TIERRA	371	REVELO	7
56	12/02/2019	OYJ223	7	TIERRA	372	REVELO	7
57	13/02/2019	GUE408	7	TIERRA	375	REVELO	7
58	13/02/2019	OYJ223	7	TIERRA	376	REVELO	7
59	13/02/2019	SZP026	15	TIERRA	379	REVELO	15
60	13/02/2019	SZP026	15	TIERRA	380	REVELO	15
61	13/02/2019	CIZ640	7	TIERRA	381	REVELO	7
62	13/02/2019	OYJ223	7	TIERRA	383	REVELO	7
63	13/02/2019	GUE408	7	TIERRA	384	REVELO	7
64	13/02/2019	OYJ223	7	TIERRA	385	REVELO	7
65	13/02/2019	GUE408	7	TIERRA	388	REVELO	7
66	13/02/2019	GUE408	7	TIERRA	389	REVELO	7
67	14/02/2019	SZP026	15	TIERRA	392	REVELO	15
68	14/02/2019	SZP026	15	TIERRA	393	REVELO	15
69	14/02/2019	OYJ223	7	TIERRA	394	REVELO	7
70	14/02/2019	OYJ223	7	TIERRA	398	REVELO	7
71	14/02/2019	GUE408	7	TIERRA	399	REVELO	7
72	14/02/2019	SZP025	15	TIERRA	400	REVELO	15
73	14/02/2019	SZP025	15	TIERRA	401	REVELO	15
74	14/02/2019	SZP025	15	TIERRA	402	REVELO	15
75	14/02/2019	SZP025	15	TIERRA	403	REVELO	15

154

76	14/02/2019	SZP025	15	TIERRA	404	REVELO	15
77	14/02/2019	SZP025	15	TIERRA	405	REVELO	15
78	14/02/2019	SZP025	15	TIERRA	406	REVELO	15
79	15/02/2019	GUE408	7	TIERRA	404	REVELO	7
80	15/02/2019	OYJ223	7	TIERRA	408	REVELO	7
81	15/02/2019	SZP025	15	TIERRA	409	REVELO	15
82	15/02/2019	SZP026	15	TIERRA	410	REVELO	15
83	15/02/2019	SZP026	15	TIERRA	411	REVELO	15
84	16/02/2019	SZP026	15	TIERRA	412	REVELO	15
85	16/02/2019	SZP026	15	TIERRA	413	REVELO	15
86	15/02/2019	SZP026	15	TIERRA	414	REVELO	15
87	18/02/2019	SZP026	15	TIERRA	428	REVELO	15
88	19/02/2019	SZP026	15	TIERRA	429	REVELO	15
89	19/02/2019	SZP025	15	TIERRA	430	REVELO	15
90	20/02/2019	SZP025	15	TIERRA	439	REVELO	15
91	22/02/2019	SZP026	15	TIERRA	446	REVELO	15
92	22/02/2019	SZP026	15	TIERRA	447	REVELO	15
93	21/02/2019	SZP026	15	TIERRA	448	REVELO	15
94	22/02/2019	SZP025	15	TIERRA	449	REVELO	15
95	8/02/2019	SZP026	75	TIERRA	349	INTERNO	15
96	8/02/2019	SZP026	75	TIERRA	349	INTERNO	15
97	8/02/2019	SZP026	75	TIERRA	349	INTERNO	15
98	8/02/2019	SZP026	75	TIERRA	349	INTERNO	15
99	8/02/2019	SZP026	75	TIERRA	349	INTERNO	15
100	9/02/2019	SZP026	75	TIERRA	350	INTERNO	15
101	9/02/2019	SZP026	75	TIERRA	350	INTERNO	15
102	9/02/2019	SZP026	75	TIERRA	350	INTERNO	15
103	9/02/2019	SZP026	75	TIERRA	350	INTERNO	15
104	9/02/2019	SZP026	75	TIERRA	350	INTERNO	15
105	8/02/2019	SZP025	45	TIERRA	364	INTERNO	15
106	8/02/2019	SZP025	45	TIERRA	364	INTERNO	15
107	8/02/2019	SZP025	45	TIERRA	364	INTERNO	15
108	9/02/2019	SZP025	75	TIERRA	365	INTERNO	15
109	9/02/2019	SZP025	75	TIERRA	365	INTERNO	15
110	9/02/2019	SZP025	75	TIERRA	365	INTERNO	15
111	9/02/2019	SZP025	75	TIERRA	365	INTERNO	15
112	9/02/2019	SZP025	75	TIERRA	365	INTERNO	15
TOTAL				**1352**			

154

VOLQUETA	N. DE VIAJES	CANTIDAD M3
SZP025	32	480M3
SZP026	39	585M3
CIZ640	8	56M3
GUE408	16	112M3
OYJ223	17	119M3
TOTAL	**1352M3**	

MANEJO	No. VIAJES	CANT.M3
DISPOSICION FINAL	94	1082
APROVECHAMIENTO	18	270
% APROVECHAMIENTO	112	19,97%

Cantidad de escombros y material de excavación dispuestos correctamente en m3
_____ * 100
Cantidad de escombros y material de excavación generados en el mes

= (1352/1352) *100= 100%

Cantidad de escombros aprovechados
_____ * 100 = (270/1352) *100= 19,97%
Cantidad de generados

Los valores acumulados respecto al mes anterior son los siguientes:

Los valores acumulados respecto al mes anterior son los siguientes:

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES				
PERIODO	DISPOSICION FINAL		APROVECHAMIENTO	
	No. VIAJES	CANT .M3	No. VIAJES	CANT.M3
7 junio al 25 de junio	0	0	0	0
26 junio al 25 julio	90	958	12	180
26 julio al 25 agosto	25	371,25	19	284,5
26 agosto al 25 septiembre	14	206,41	22	330
26 septiembre al 25 octubre	26	389,5	3	45
26 octubre al 25 noviembre	9	135	0	0
26 noviembre al 25 diciembre	17	255	0	0
26 diciembre al 25 enero	13	195	0	0

En este mes se hace disposición en la escombrera del señor Orlando Edmundo Revelo, de cual se anexa la documentación pertinente.

Dando cumplimiento a los lineamientos de la resolución 472 de 2017, el consorcio radicara ente la CRC el programa de manejo ambiental de RCD.

21. USO EFICIENTE DE AGUA

Se anexa lecturas del mes, que se han tomado conjuntamente con interventoría:

CONSUMO DE AGUA						
ITEM	FECHA LECTURA	No. INTERNO	MARCA	No. CONTADOR	LECTURA M3	CONSUMO MENSUAL (M3)
1	1/02/2019	# 1	COLTAVIRA S.A.	2942770	0 727,1	228,20

$$\frac{\text{Consumo de agua actual} - \text{consumo mes anterior}}{\text{Consumo de agua mes}} \times 100 = (228{,}20\text{-}119{,}50/228{,}20) * 100 = 47{,}63\%$$

154

Se evidencia que no se ha hecho una educación respecto al consumo de agua en el mes.

No. de eliminación de fugas
_____* 100 = 2/2* 100 = 100%
No. de fugas halladas

Se presenta daño en manguera ubicada en zona de obra, el cual es reparado de inmediato

22. MANEJO DE FAUNA

No. de Nidos reubicados
_____ * 100
No. de nidos hallados
= 9
_____ * 100= 100%
9
No. de especies entregadas a Bomberos Popayán
_____ * 100
No. de avistamiento de especies en obra sin manejo
= 600
_____ * 100= 100%
0

Para el presente periodo se realizó el desmonte de kiosco ubicado entre casino y piscina del Comando Policía Nacional, en donde se encontraron 600 abejas aproximadamente, por tal motivo se informó a los Bomberos de Popayán para atender la emergencia presentada, quienes realizaron el respectivo manejo para retirar las abejas de kiosco y realizaron el traslado a un área de conservación de fauna vía al Huila.

Por desmonte y retiro de kiosco, se realizó entrega de elementos retirados al Intendente José Giovanny Molina, el día 07 de febrero 2019. (Ver Anexo).

23. MANEJO DE FLORA

Para el siguiente periodo se radico oficio en la Corporación Regional del Cauca, para entrega de información por compensación forestal, según RESOLUCIÓN No. (01490) del 31 de Agosto de

2018 CRC, donde se está a la espera de visita por funcionario de CRC para dar cierre a lo mencionado.

A continuación, se relacionan las gestiones realizadas en el periodo correspondientes al procedimiento de compensación.

El 11 de Febrero de 2019, Se radico oficio a la Corporación Regional del Cauca, para información por compensación forestal realizada, dando cumplimiento a lo establecido en la RESOLUCIÓN No. (01490) del 31 de Agosto de 2018 CRC

24. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL EN OBRA COMPONENTE AMBIENTAL

$$\frac{\text{No. de charlas realizadas}}{\text{No. charlas programadas}} * 100 = (1/1) * 100 = 100\%$$

$$\frac{\text{No. de asistentes a las charlas de un promedio}}{\text{No. de asistentes a obra}} *100 = (25/25) *100= 100\%$$

Ver anexo . Capacitación componente ambiental

25. TRABAJO EN ALTURAS

- ✓ Uso adecuado de ESTINGA y ARNES por cada trabajador que realiza dicha actividad.
- ✓ Hojas de vida de ARNES y ESLINGA usados y firmados por el trabajador.
- ✓ Permiso en alturas y con las respectivas firmas de los trabajadores antes de realizar las actividades.
- ✓ Uso de escaleras, las cuales cuentan con las condiciones y materiales necesarios para labor a desempeñar.
- ✓ Uso de andamios certificados para la labor, armado de forma completa, las actividades realizadas permiten asegurar el andamio a la estructura.
- ✓ Se cuenta con uso de líneas de vida horizontal para los trabajos en altura.
- ✓ Se usan ganchos como puntos de anclaje resistentes a la actividad.
- ✓ Los trabajadores usan sus epp apropiados para cada actividad a realizar.
- ✓ Se adecuan las áreas de ingreso, como son escalera, puentes, para acceso y cada

una de las áreas, dando cumplimiento a PTSA.

✓ Actualmente se está utilizando una pluma, ubicado en el segundo piso del bloque de casino, para transporte de material, la cual esta operada por personal capacitado por parte del Consorcio para operarla, para lo cual el operador utiliza EPP para T.S.A.

26. OTROS

- Planilla por pago de Seguridad Social.
- Oficio radicado a Intendente José Giovanny Molina, el día 07 de febrero 2019, por entrega de elementos generados por desmonte y retiro de kiosco.
- Oficio radicado a CRC, por información de cumplimiento a compensación forestal.
- Documentación Retroexacavadora
- Requerimiento ingreso a obra de vehículos

27. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJOS

La interventoría le solicita al contratista a través del residente SSTMA, el procedimiento y formatos mensuales utilizados para el control de accidentes e incidentes de trabajo, con el fin de verificar el cumplimiento que determina la Resolución 1401 del 2007 la cual tiene como objeto establecer obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, con el fin de identificar las causas, hechos y situaciones que los han generado, e implementar las medidas correctivas encaminadas a eliminar o minimizar condiciones de riesgo y evitar su recurrencia. Y al decreto 1072 DE 2015 donde se establece como componente la investigación de accidentes e incidentes, no conformidad y acciones correctivas y preventivas**. Se verificaron los formatos del informe de investigación de accidentes e incidentes de trabajos y se evidencia el cumpliendo con lo establecido en la resolución 156 de 2005.**

28. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Par presente periodo, se presentó 2 A.T. para lo cual el contratista realizo la investigación del mismo, dando cumplimiento a la Resolución 1401 del 2007, se Realizó la respectiva socialización del evento, como proceso de retroalimentación al personal, todo con el propósito de que no se vuelvan a presentar este tipo de eventos.

- Se cumplió con la entrega y uso de elementos de protección personal, en lo referente a casco, gafas, guantes de vaqueta, caucho, tapabocas, botas de seguridad y de caucho con puntera y uniforme.

168

- El personal que realiza trabajo en alturas, se retroalimento frente al tema, para prevención de AT, por caída de alturas, se verifica que el personal utilice los EPP para TS.A. de forma adecuada, tales como Arnés, Eslinga, Cascos, andamios certificados.

- Se realiza disposición final 1082 M3 de tierra de excavación generada en obra, en escombrera Rebelo autorizada por la autoridad ambiental competente.

- Se realiza aprovechamiento de 270 M3 de tierra de excavación generada en obra, en parte interna de Comando de Policía de Popayán Cauca, para nivelación de terreno.

- Se realiza disposición final de 225 Kg de residuos peligrosos generados en obra tales como, guantes, tapabocas, botas, tapabocas, residuos de plástico contaminado en obra, polisombra contaminada, los cuales fueron recibidos por la empresa ASERHI.

- Se realizo entrega de 250 Kg de residuos reciclables generados en obra, a empresa AREMARPO autorizada por autoridad competente Popayán Cauca.

- Consorcio BCS- Gutiérrez Cumple con la correcta disposición de residuos generados en obra a través de los gestores autorizados.

- Diariamente se realiza jornada de aseo al finalizar las actividades en obra.

- Se realiza aseo a baños cada ocho días, baños permanecen limpios, lavado de llantas para que permanezca la vía limpia.

- Se realiza la respectiva señalización y cerramiento de la áreas intervenidad.

- Se da cumplimiento a inspecciones de vehículo/maquinaria, botiquín, extintor, uso de epp, orden y aseo, equipos y herramientas, permiso de trabajo para actividades en alturas diariamente.

- Se da cumplimiento a lo establecido en procedimiento de vehículos con la verificación documental de SOAT, Revisión técnico mecánica, Licencia de conducción, inspecciones al vehículo y mejora de los mismos

24. Se realizan los siguientes requerimientos en Seguridad y Salud en el trabajo al contratista:

✓ Seguir Manteniendo las áreas de circulación y rutas de evacuación limpias y despejadas.

161

✓ Completar las hojas de vida pendientes, de los subcontratistas:

- BRUNO: 4
- CARLOS LEON: 3
- DANEL RODRIGUEZ: 1
- DATALEC INGENIEROS: 2
- JHON JAIRO PINEDA(TANQUE): 5
- METAL B SAS: 2
- ORLANDO EDMUNDO REVELO: 2
- ESTRUCTURA METALICA: 2

LISTA DE ANEXOS ENVIADOS POR EL CONTRATISTAS

ANEXO 1. Capacitaciones
ANEXO 2. Charla semanal
ANEXO 3 Exámenes de ingreso
ANEXO 4. Exámenes de retiro
ANEXO 5. Inducciones
ANEXO 6. Inspecciones
ANEXO 7. Maquinaria Orlando Revelo
ANEXO 8. Planilla
ANEXO 9. Requerimiento Ingreso Vehículo

Se anexa informe mensual del contratista, con los soporte de indicadores mensuales, de SST y MA. Establecidos hasta el momento.

ELABORÓ:

ROSA DEL MAR RODRIGUEZ G.
RESIDENTE SISOMA

INTERVENTORÍA DAIMCO S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO

162

REGISTRO FOTOGRAFICO # 1 Verificación de uso de EPP





REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATISTA CONSORCIO BCS GUTIÉRREZ



Foto 1. Charla Comunicación asertiva



Foto 2. Charla Accidente en construcciones



Foto 3. Charla en Levantamiento de cargas



Foto 4. Charla Seguridad de trabajo en alturas

163

	
Foto 5. Socialización retiro de puntillas	Foto 6. Capacitación Accidente en construcciones, orden y aseo

Foto 14. Componentes de Elementos de Primeros Auxilios







184

Anexo No. 9 control de Equipos y Ensayos.

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

EQUIPO DEL CONTRATISTA INT-41:01

PROYECTO: CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

EQUIPO		(A)	(B)	(C) CLASE DE ACTIVIDAD EN CADA DIA																												
TIPO	MARCA -CAPACIDAD			VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES
		ORIGEN	ESTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	MINICARGADOR NEW HOLLAND	P	B	C1.	C1.		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5			C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5
2	VOLQUETA DAEWOO- SZP25	P	B	C1.	C1.		C1.	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C1.	C1.	C.1.5	C.1.5			C1.	C.1.5	C.1.5	C1.	C.1.5	C1.		C1.	C1.	C1.	C1.
3	VOLQUETA DAEWOO- SZP26	P	B	C1.	C1.		C.1.5	C.1.5	C1.	C1.	C1.	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C1.		C1.	C1.	C1.	C1.
4	VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO - CA-15 DYNAPAC	A	B	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5			C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5			C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5
5	RETROEXCAVADORA JCB214E	A	B					C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5													
6	RETROEXCAVADORA KOMATSU	A	B					C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5			C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5						
7	VOLQUETA SUBCONTRATISTA Javier Oswaldo Bolaños Placa: OYJ-223 8 Mtrs3	A	B						C.1.5	C.1.5					C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5													
8	VOLQUETA SUBCONTRATISTA Nelson Olmedo Montilla Placa: CIZ-640 8 Mtrs3	A	B							C.1.5					C.1.5	C.1.5															
9	VOLQUETA SUBCONTRATISTA Aurelio Oswaldo Bolaños Placa: GUE-408 8 Mtrs3	A	B						C.1.5	C.1.5					C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5													

(A) ORIGEN
P- Propio
A- Alquilado
S- Sub-contratado

(B) ESTADO
B-Bueno
R-Regular
M-Malo

(C) CLASE DE ACTIVIDAD
1. Movilización y Desmovilización
2. Localización, Replanteo y Control Topográfico
3. Demolición General
4. Excavaciones
5. Relleno Material Seleccionado
6. Hincado de Pilotes
7. Concreto _____ PSI
8. Acero de Refuerzo
9. Protección con Bolsacretos
10. Colchacretos

F.S. Fuera de Servicio
R. Reparación
D. Disponible

OBSERVACIONES

ING. RESIDENTE

Elaboró SANDRA GUAUÑA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - TIRSO COSME

Aprobó

Ensayos

Citec Ltda.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
Popayán - Cauca

DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO MÉTODO CONO Y ARENA	Código:	CT-DCA-CE01
	Versión:	1
	Páginas:	1de 1
NORMAS REFERENCIA: INVE-161	Fecha Format	21-mar-2012
	ODS:	973

FECHA: *21-feb-19*

OBRA: *CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN.*

SECTOR: *COMANDO REGIÓN N°4 POLICIA NACIONAL CAUCA, POPAYÁN.*

INTERVENTOR: *DAIMCO*

CONSTRUCTOR: *CONSORCIO BCS-GUTIERREZ*

SOLICITÓ: *DAIMCO*

MATERIAL: *BASE GRANULAR*

FUENTE: *CONEXPE*

DESCRIPCION: *MATERIAL GRANULAR TIPO SUB BASE COLOR GRIS CON PRESENCIA DE GRAVAS DE TRITURACIÓN DEL MISMO COLOR*

	1	2	3				
Localización	TANQUE RED CONTRA INCENDIO						
Margen							
Profundidad del ensayo en cm	300	300	300				
Peso frasco+cono+arena inicial	7530	7366	7232				
Peso frasco+cono+arena final	2856	2948	2678				
Constante del cono	1721	1721	1721				
Peso arena total usada	2953	2697	2833				
Densidad de la arena	1.586	1.586	1.586				
Peso material retenido 3/4"	1452	994	1216				
Gs material retenido 3/4"	2.577	2.577	2.577				
Volumen del hueco	1298	1315	1314				
Peso material extraido humedo	2908	3048	3044				
Humedad	6.45	5.99	6.77				
Peso material extraido seco	2732	2876	2851				
Densidad seca g/cm3	2.104	2.187	2.169				
Densidad máxima de laboratorio g/cm3	2.169	2.169	2.169				
% de compactación	97%	101%	100%				
Cumplimiento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				
	SUB BASE GRANULAR	SUB BASE GRANULAR	SUB BASE GRANULAR				

HUMEDAD

CAPSULA #	1	2	3				
Peso inicial	81.63	86.46	73.16				
Peso final	76.96	81.83	68.81				
Peso capsula	4.51	4.54	4.53				
Humedad	6.45	5.99	6.77				

OBSERVACIONES: Ensayos realizados por personal autorizado de CITEC Ltda

LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO APLICAN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA INGRESADA Y PROCESADA EN LABORATORIO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DE CALIDAD DE CITEC Ltda.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Geot. Luis Carlos Ponce	Ing. Hugo Daza Delgado	

vias95@hotmail.com www.citec.com.co Telefono: 8366256 Cel:310 8393670 - 301 3368684

Citec Ltda.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
Popayán - Cauca

REGISTRO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	Código:	CT-RCC-CE01
	Versión:	1
	Páginas:	1 de 1
NORMAS REFERENCIA: INV. E-401, E-402, E-403, E 404, E-410, E-412 NTC 673	Fecha Formato:	12-ene-2010

FECHA INFORME: *26-feb-19*

OBRA: *CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN.*

SECTOR: *COMANDO REGIÓN N°4 POLICIA NACIONAL CAUCA. POPAYÁN.*

INTERVENTOR: *DAIMCO*

CONSTRUCTOR: *CONSORCIO BCS-GUTIERREZ*

SOLICITÓ: *DAIMCO*

FECHA ENTRADA: *11-ene-19*

ODS: 894

RESISTENCIA DE DISEÑO: 3000 PSI

ESTRUCTURA: VARIAS

Ref. N°	Fecha Toma	Fecha Rotura	Edad días	Perimetro cm	Carga Lb	Resistencia KN	kg/cm²	MPa	PSI	Tipo Falla	% CUMPLIMIENTO RESISTENCIA	DETALLE OBRA
1	17-dic	14-ene	28	48.4	58077	228.2	125	12.2	1773	1	59%	SOLADO TANQUE
2	17-dic	14-ene	28	48.3	61971	243.5	134	13.1	1899	1	63%	
3	17-dic	11-feb	56	48.4	76070	298.9	164	16.0	2322	1	77%	
4	18-dic	15-ene	28	48.4	140891	553.6	303	29.7	4300	2	143%	VIGA CUBIERTA PATRULLEROS
5	18-dic	15-ene	28	48.4	140306	551.3	302	29.5	4282	2	143%	
6	18-dic	12-feb	56	48.4	142724	560.8	307	30.0	4356	2	145%	
7	20-dic	17-ene	28	48.4	114958	451.7	247	24.2	3509	1	117%	COLUMNA 2do PISO B3
8	20-dic	17-ene	28	48.4	119564	469.8	257	25.2	3649	1	122%	
9	20-dic	14-feb	56	48.4	127555	501.2	274	26.9	3893	2	130%	
10	21-dic	18-ene	28	48.4	141095	554.4	303	29.7	4306	2	144%	VIGAS COLUMNA PATRULLEROS
11	21-dic	18-ene	28	48.4	141477	555.9	304	29.8	4318	2	144%	
12	21-dic	15-feb	56	48.4	141833	557.3	305	29.9	4329	2	144%	
13	22-dic	19-ene	28	48.3	140688	552.8	304	29.7	4312	2	144%	COLUMNAS SUB OFICIALES
14	22-dic	19-ene	28	48.4	140077	550.4	301	29.5	4275	2	143%	
15	22-dic	16-feb	56	48.4	141706	556.8	305	29.8	4325	2	144%	
16	28-dic	25-ene	28	48.3	100069	393.2	216	21.2	3067	1	102%	PLACAS CONTRAPISO COLUMNAS SUB OAFICIALES
17	28-dic	25-ene	28	48.4	103073	405.0	222	21.7	3146	1	105%	
18	28-dic	22-feb	56	48.4	110657	434.8	238	23.3	3377	1	113%	

OBSERVACIONES: MUESTRAS INGRESADAS AL LABORATORIO POR EL INTERESADO

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: *F - 337* EXPEDIDO POR: *SIMIM METROLOGIA S.A.S*

FECHA DE EXPEDICIÓN: *21-ene-19* VIGENCIA: *21-ene-21*

LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO APLICAN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA INGRESADA Y PROCESADA EN LABORATORIO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DE CALIDAD DE CITEC Ltda.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Gebt. Luis Carlos Ponce	Ing. Hugo Daza Delgado	

vias95@hotmail.com www.citec.com.co Telefono: 8366256 Cel:310 8393670 - 301 3368684

Citec Ltda.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
Popayán - Cauca

REGISTRO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO					Código:	CT-RCC-CE01
					Versión:	1
					Páginas:	1 de 1
NORMAS REFERENCIA:	INV. E-401, E-402, E-403, E 404, E-410, E-412		NTC 673		Fecha Formato:	12-ene-2010

FECHA INFORME: *18-feb-19*

OBRA: *CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN.*

SECTOR: *COMANDO REGIÓN N°4 POLICIA NACIONAL CAUCA, POPAYÁN.*

INTERVENTOR: *DAIMCO*

CONSTRUCTOR: *CONSORCIO BCS-GUTIERREZ*

SOLICITÓ: *DAIMCO*

FECHA ENTRADA: *21-ene-19*

ODS: 911

RESISTENCIA DE DISEÑO: 3000 PSI

ESTRUCTURA: VARIAS

Ref. N°	Fecha Toma	Fecha Rotura	Edad días	Perímetro cm	Carga Lb	Resistencia KN	kg/cm²	MPa	PSI	Tipo Falla	% CUMPLIMIENTO RESISTENCIA	DETALLE OBRA
1	17-ene	21-ene	4	48.2	93732	368.3	203	19.9	2885	1	96%	CONCRETO ACELERADO
2	17-ene	14-feb	28	48.4	118546	465.8	255	25.0	3618	1	121%	
3	17-ene	14-feb	28	48.3	120124	472.0	259	25.4	3681	1	123%	

OBSERVACIONES: MUESTRAS INGRESADAS AL LABORATORIO POR EL INTERESADO

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: *F - 337* EXPEDIDO POR: *SIMIM METROLOGIA S.A.S*

FECHA DE EXPEDICIÓN: *21-ene-19* VIGENCIA: *21-ene-21*

LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO APLICAN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA INGRESADA Y PROCESADA EN LABORATORIO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DE CALIDAD DE CITEC Ltda.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Geot. Luis Carlos Ponce	Ing. Hugo Daza Delgado	

Citec Ltda.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
Popayán - Cauca

REGISTRO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO		Código:	CT-RCC-CE01
		Versión:	1
		Páginas:	1 de 1
NORMAS REFERENCIA:	INV. E-401, E-402, E-403, E 404, E-410, E-412 NTC 673	Fecha Formato:	12-ene-2010

FECHA INFORME: *01-mar-19*

OBRA: *CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN.*

SECTOR: *COMANDO REGIÓN N°4 POLICIA NACIONAL CAUCA, POPAYÁN.*

INTERVENTOR: *DAIMCO*

CONSTRUCTOR: *CONSORCIO BCS-GUTIERREZ*

SOLICITÓ: *DAIMCO*

FECHA ENTRADA: *05-feb-19*

ODS: 936

RESISTENCIA DE DISEÑO: 3000 PSI

ESTRUCTURA: VARIAS

Ref. N°	Fecha Toma	Fecha Rotura	Edad días	Perimetro cm	Carga Lb	Resistencia KN	Resistencia kg/cm²	Resistencia MPa	Resistencia PSI	Tipo Falla	% CUMPLIMIENTO RESISTENCIA	*Proyeccion a 28d	DETALLE OBRA
83	28-ene	04-feb	7	48.3	135496	532.4	292	28.6	4153	1	104%		TANQUE DE ALMACENAMIENTO
84	28-ene	25-feb	28	48.4	141833	557.3	305	29.9	4329	1	108%		
85	28-ene	25-feb	28	48.7	140713	552.9	299	29.3	4242	1	106%		
86	31-ene	05-feb	5	48.3	46497	182.7	100	9.8	1425	1	48%		COLUMNETAS PATRULLEROS 1er PISO
87	31-ene	28-feb	28	48.4	62327	244.9	134	13.1	1902	1	63%		
88	31-ene	05-feb	5	48.4	33823	132.9	73	7.1	1032	1	34%		COLUMNETAS OFICIALES 1er PISO
89	31-ene	07-feb	7	48.3	40058	157.4	86	8.5	1228	1	41%	1754	
90	02-feb	09-feb	7	48.2	95641	375.8	207	20.3	2943	1	74%	4205	TAPA TANQUE ALMACENAMIENTO
91	02-feb	02-mar	28								0%		
92	02-feb	02-mar	28								0%		

OBSERVACIONES: MUESTRAS INGRESADAS AL LABORATORIO POR EL INTERESADO

*Proyección aproximada solicitada por el cliente

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: *F-337* EXPEDIDO POR: *SIMIM METROLOGIA S.A.S*

FECHA DE EXPEDICIÓN: *21-ene-19* VIGENCIA: *21-ene-21*

LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO APLICAN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA INGRESADA Y PROCESADA EN LABORATORIO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DE CALIDAD DE CITEC Ltda.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Gebt. Luis Carlos Ponce	Ing. Hugo Daza Delgado	

Anexo No. 10 Registro Fotográfico

DAIMCO

NIT 900021482 - 1

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:09

POLICIA NACIONAL

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CÓDIGO: **PROYECTO:** 06-6-10044-18
Donde POPAYAN - CAUCA
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES: feb-19

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Foto No. 1 Fecha: 04-02-2019

DETALLE GENERAL DE OBRA



Foto No.2 Fecha: 04-02-2019

DETALLE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA EN BLOQUE DE PATRULLEROS



Foto No.3 Fecha: 04-02-2019

DETALLE GENERAL DE CASINO

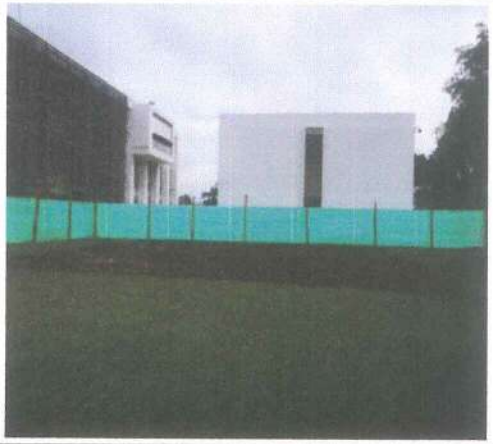


Foto No. 4 Fecha: 04-02-2019

DETALLE DE DESCAPOTE EN AREA PARA TANQUE RCI

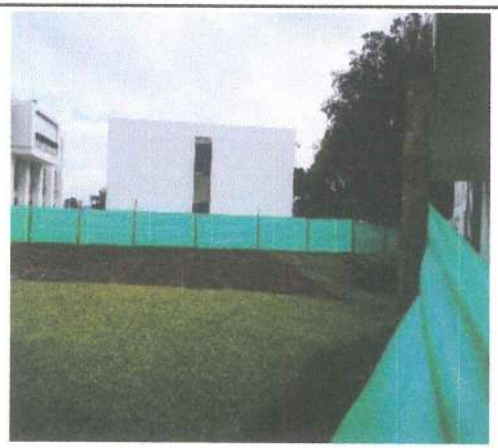


Foto No.5 Fecha: 04-02-2019

DETALLE DE CERRAMIENTO AREA PARA TANQUE RCI



Foto No.6 Fecha: 05-02-2019

DETALLE DE COLUMNETAS EN BLOQUE DE PATRULLEROS



Foto No.7 Fecha: 05-02-2019

DETALLE DE MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE PATRULLEROS



Foto No.8 Fecha: 05-02-2019

DETALLE DE GENRAL BLOQUE DE PATRULLEROS

176

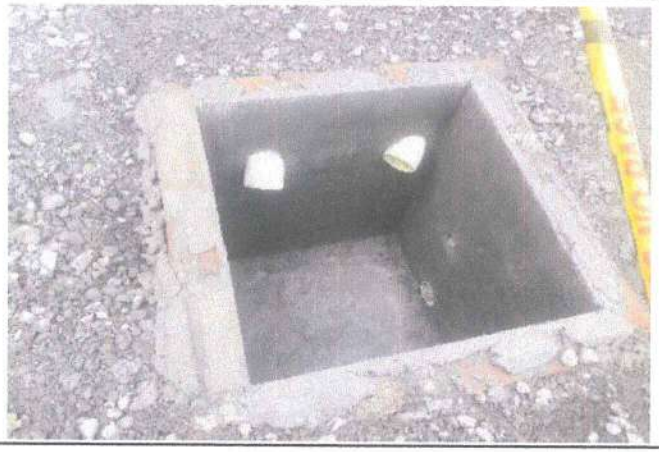


Foto No.9 Fecha: 05-02-2019

DETALLE DE CAJA PARA AGUAS LLUVIAS 80X80



Foto No.10 Fecha: 05-02-2019

DETALLE DE EXCAVACION



Foto No.11 Fecha: 06-02-2019

DETALLE DE MAMPOSTERIA EN BLOQUE EN AREA DE PATRULLEROS



Foto No.12 Fecha: 06-02-2019

DETALLE GENERAL DE OBRA



Foto No.13 Fecha: 11-02-2019

DETALLE DE BORDILLO EN LOSA DE CUBIERTA BLOQUE DE OFICIALES



Foto No.14 Fecha: 11-02-2019

DETALLE DE RELLENO EN RECEBO COMUN AREA EXTERIORES ENTRE BLOQUE PATRULLEROS Y CASINO



Foto No.15 Fecha: 11-02-2019

DETALLE DE EXCAVACIONES EN AREA TANQUE RCI



Foto No.16 Fecha: 11-02-2019

DETALLE DE INSTALACION DE TUBERIA 4"PVC PARA AGUAS LLUVIAS EN BLOQUE DE PATRULLEROS SEGUNDO PISO

176



Foto No.17 Fecha: 13-02-2019

DETALLE DE SUMINISTRO DE HIERRO PARA TANQUE DE RCI

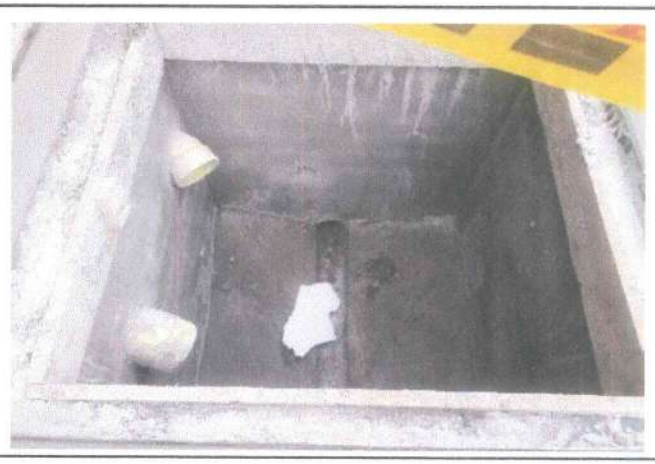


Foto No.18 Fecha: 22-01-2019

DETALLE DE MAMPOSTERIA EN BLOQUE Y TOLETE EN AREA DE OFICIALES PRIMER PISO



Foto No.19 Fecha: 14-02-2019

DETALLE GENERAL DE OBRA BLOQUE CASINO-SUBESTACION Y OFICIALES



Foto No.20 Fecha: 14-02-2019

DETALLE INTERNO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO



Foto No.21 Fecha: 14-02-2019

DETALLE DE INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA

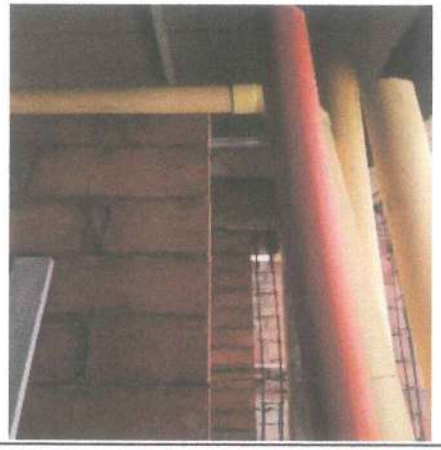


Foto No.22 Fecha: 14-02-2019

DETALLE DE TUBERIA DE VENTILACION, AGUAS LLUVIAS



Foto No.23 Fecha: 16-02-2019

DETALLE DE SELLADO EXTERIOR TANQUE CON IGOL DENSO



Foto No.24 Fecha: 18-02-2019

DETALLE GENERAL DE OBRA



Foto No.25 Fecha: 18-02-2019

DETALLE DE RELLENO PARA MEJORAMIENTO DE SUELO PARA LA CIMENTACION DEL TANQUE RCI



Foto No.26 Fecha: 18-02-2019

DETALLE DE INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA RED ELECTRICA



Foto No.27 Fecha: 18-02-2019

DETALLE DE CAJA ELECTRICA



Foto No.28 Fecha: 20-02-2019

DETALLE DE RELLENO BASE PARA CIMENTACION TANQUE RCI

124



Foto No.29 Fecha: 21-02-2019

DETALLE GENERAL DE PATRULLEROS



Foto No.30 Fecha: 21-02-2019

DETALLE GENERAL DE OFICIALES



Foto No.31 Fecha: 22-02-2019

DETALLE DE ALISTADO IMPERMEABILIZADO EN PISOS



Foto No.32 Fecha: 25-02-2019

DETALLE DE CUBIERTA BLOQUE DE PATRULLEROS



Foto No.33 Fecha: 25-02-2019

DETALLE GENERAL BLOQUE CASINO, OFICIAL Y SUBESTACION



Foto No.34 Fecha: 25-02-2019

DETALLE DE CUBIERTA EN BLOQUE DE OFICIALES



Foto No.35 Fecha: 25-02-2019

DETALLE DE REPELLOS EXTERNOS EN BLOQUE CASINO



Foto No.36 Fecha: 25-02-2019

DETALLE DE REPELLOS EN MUROS INTERNOS EN BLOQUE DE OFICIALES



Foto No.29 Fecha: 26-02-2019

DETALLE DE ARMADO DE HIERRO EN TANQUE RCI



Foto No.30 Fecha: 26-02-2019

DETALLE DE MORTERO IMPERMEABILIZADO EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO



Foto No.31 Fecha: 27-02-2019

DETALLE DE CAJAS PARA AGUAS SANITARIAS BLOQUE DE OFICIALES



Foto No.32 Fecha: 28-02-2019

DETALLE DE REGISTRO DE CIERRE BLOQUE DE PATRULLEROS

182

DAIMCO

NIT 800214482 - 4

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:09

POLICIA NACIONAL

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CÓDIGO: **PROYECTO:** 06-6-10044-18

Donde POPAYAN - CAUCA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES: feb-19

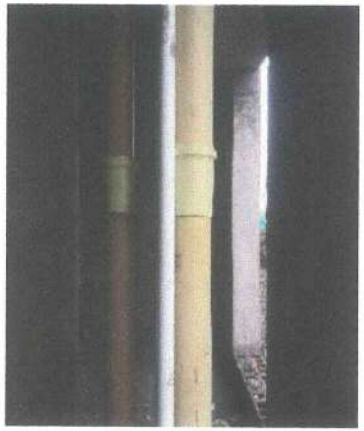


Foto No.33 Fecha: 28-02-2019

DETALLE DE JUNTA DE EPVCXPANSION EN TUBERIA



Foto No.34 Fecha: 28-02-2019

DETALLE DE SALIDA HIDRAULICA PARA ORINALES

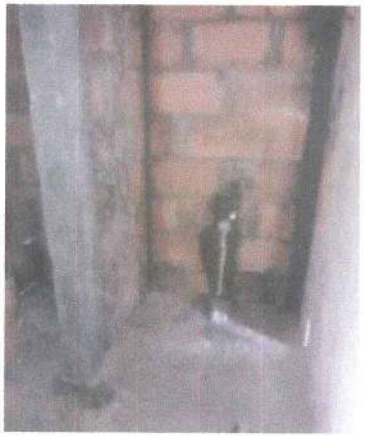


Foto No.35 Fecha: 28-02-2019

DETALLE DE SALIDA HIDRAULICA PARA LAVAMANOS



Foto No.36 Fecha: 28-02-2019

DETALLE DE MAMPOSTERIA PARA BUITRONES

183



Foto No.37 Fecha: 28-02-2019

CARPINTERIA EN ALUMINIO



Foto No.38 Fecha: 28-02-2019

PRODUCCION DE VENTANAS



Foto No.39 Fecha: 28-02-2019

VENTANERIA Y PUERTAS EN ALUMINIO SITIO DE FABRICA



Foto No.40 Fecha: 28-02-2019

VENTANERIA Y PUERTAS EN ALUMINIO SITIO DE FABRICA

187

Anexo No. 11 Control de Clima

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

CONTROL ATMOSFÉRICO INT-39:00

PROYECTO: CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

CONSOLIDADO DEL PERIODO

MES	feb-19																												TOTALES
ESTADO DEL TIEMPO	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
DIA SOLEADO	0,9	1	1	0,9	1	1	1	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,6	1	1	1	1	1	0,9	1	0,9	1	**26,89**
DIA NUBLADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00**
LLUVIA	0,1	0	0	0,1	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0,1	0	0,1	0	**1,11**
TOTAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**28,00**
ESTADO DEL SUELO																													

Nota: Estado del Suelo Seco (S), Saturado (ST), Inundado (I)

OBSERVACIONES








ING. RESIDENTE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA - TIRSO COSME
Elaboró SANDRA GUAUÑA	Aprobó

NOTAS

(1) INFORMACION RELACIONADA EN EL INFORME DIARIO DE INSPECCION **INT-8:00**

(2) CONTINÚE AL RESPALDO SI REQUIERE DE MAYOR ESPACIO

Anexo No. 12 Bitácora de Obra

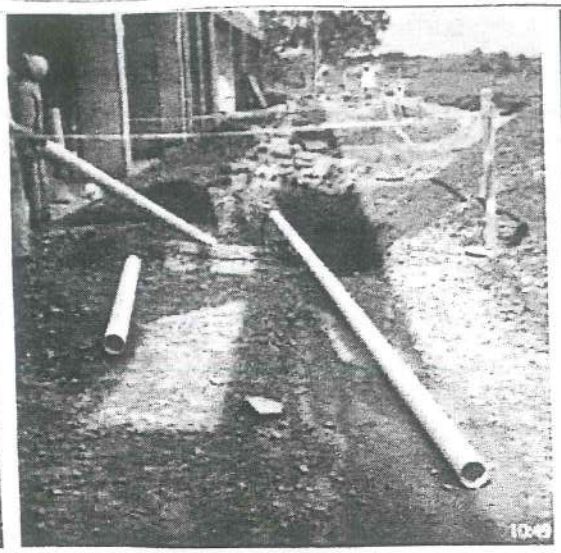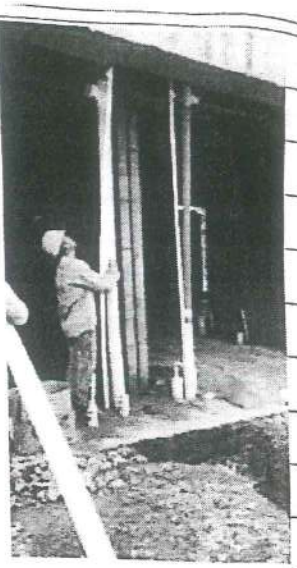



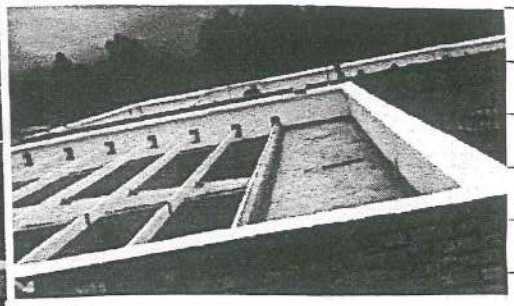
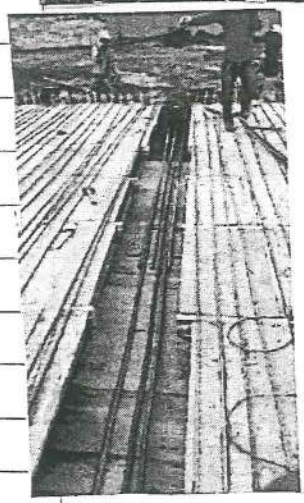









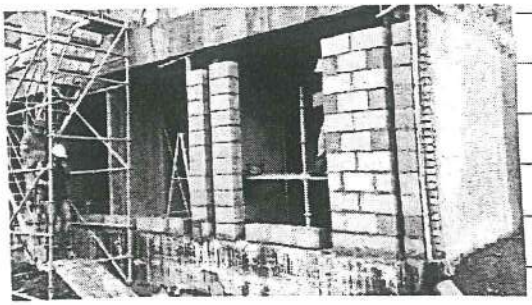

-SE ACUERDA CON INTERVENTORIA EL MANEJO QUE SE DARA A LA VIGA DESCOLOCADA EN CUBIERTA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA MINIMIZAR LA FILTRACION POR DICHA ZONA.

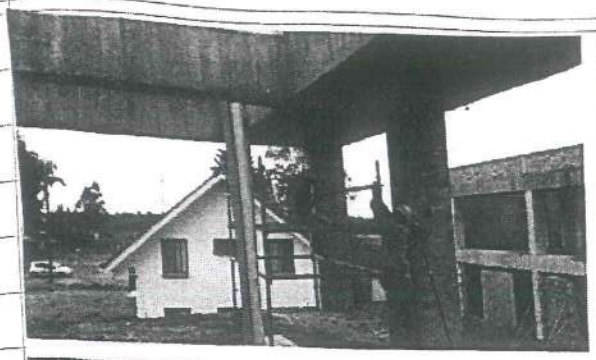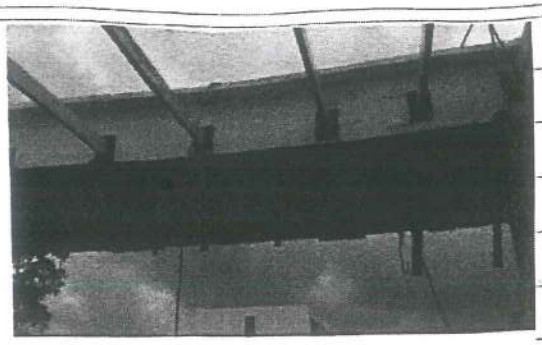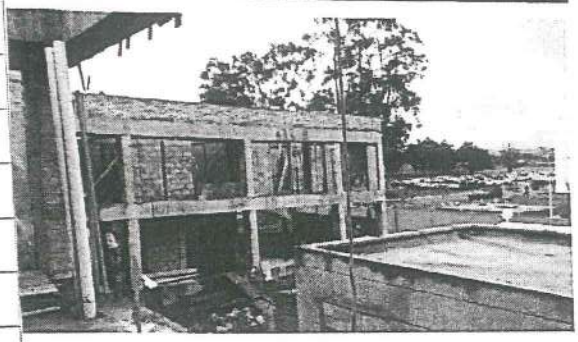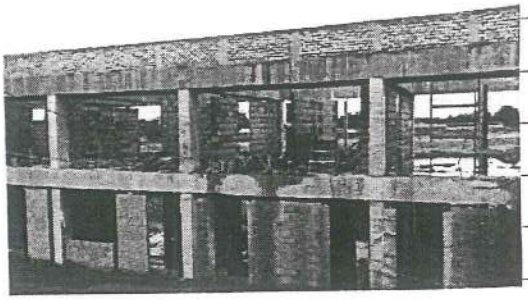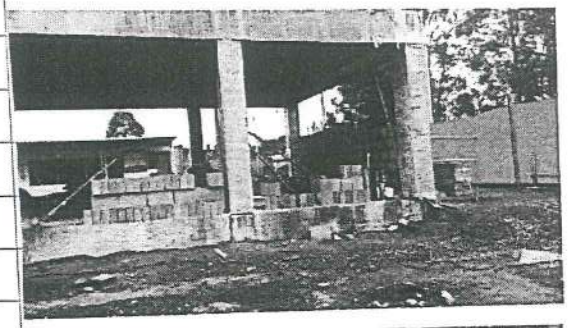
SE REALIZA EL ARMADO DEL REFUERZO CORRESPONDIENTE A VIERNES 2 FEBRERO / 2018.

EL CONTRATISTA ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DONDE SE OBSERVA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ESTAN EN EJECUCION.

Scanned by CamScanner



→ SE AVANZA EN EL TENDIDO DE ACERO PARA LOSA TANQUE, SE SOLICITA A INTERVENTORIA VERIFICAR PARA REALIZAR LA FUNDICION MAÑANA SABADO.

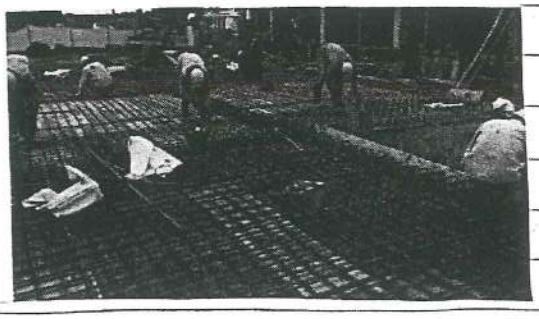SE SOLICITA SE DEFINA EL TIPO DE ACABADO PARA

Scanned by CamScanner

LA LOSA DE CUBIERTA.

- Observaciones:
- Se dará un manejo de un ancho de 1 m a los anderes del proyecto por 4, disposición que se retiro al contratista
- Se continua con los trabajos electricos en cada de casino
- El día 31 se presentaron lluvias durante la tarde
- Se solicita al contratista disponer de personal en caso ya que los días 30 y 31 no se observo personal ejecutando obra civil
- Se informo al día 30 de enero al contratista que para la construcción de la viga de cubierta allí tengan se deberá hacer la respectiva abscardamiento y anclajes y realizar debidamente el vaciado en la unión de los dos concretos
- Se informa al contratista que los muros que tienen las alturas debidas según planos arquitectonicos
- Se informa al contratista sobre la mezcla usada para las columnetas que se fundan en pabellones y oficinas para el confinamiento de los muros que deben ser para una resistencia de 3000 PSI, para verificación se tomaron cilindros de prueba, También se les hizo la observación del acabado de las columnetas ya que se observa mal proceso de fundición en agitamiento.
- Se informa al contratista que la cubierta no se deben instalar hasta no tener resultados de las pruebas de tintas, Igualmente el caso de no acatar la observación por el contratista, si los resultados no son favorables, asumirán los correctivos pertinentes.
- Personal en Obra:
- Personal Administrativo BCS Gutierrez.
- Personal Operativo BCS Gutierrez (1 Operador Minicargador, 2 Conductores Volquetas, 1 Inspector, 3 Ayudantes Generales Oficina, Ayudantes Mampostería, Oficiales Mampostería, personal en Oficios Varios de Obra (Repellos, Vigas, Columnetas) 1 Hidraulico, 5 Ayudantes Bruno, 4 Oficiales Bruno, Ayudantes tanque)
- Arrieta
- Dantelec

Scanned by CamScanner

- Metalbe SAS
- Vibrocompactador 1 Operador
- Personal Administrativo de Interventoría.

- Clima: Mañana: Tarde:
- Equipos: Minicargador, Volquetas, Vibrocompactador
- Elementos de Seguridad Industrial: Casco, Botas, Guantes, Uniforme, Tapabocas, Tapaoidos, Chaleco.
- Actividades Ejecutadas:

- Bloque liso #5 - 2do Piso modulo 1 y detalles de 1er Piso modulo 3 y modulo 1.
- Vigas y Columnas de Confinamiento en 1er y Segundo Piso bloque 1 Patrulleros. y 1er piso bloque
- 3 Sub Oficiales.
- Instalación Formaleta tanque de almacenamiento e Instalacion hierro.
- Instalación estructura metalica modulo 3 y detalles deremate modulo 1.
- Ladrillo tolete comun elaboracion capas inspeccion linea paralela modulo 1 fachada principal
- Nivelación area interna entre módulo 1 y modulo 3 relleno.

Observaciones:

- Se Informa a Obra que acabado del tanque se deje liso esmaltado y acolillado en los bordes


SABADO - 02 FEBRERO / 2018.





EL CONTRATISTA ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO EN FOLIO 144 DE ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN EN EJECUCION Hoy: COMO SON FUNDICION DE LOSA DE CUBIERTA DEL TANQUE UNA VEZ APROBADO POR INTERVENTORIA EL REFUERZO Y LOS NIVELES DE FUNDICION ASI COMO EL ACABADO DE ESTE CONCRETO.

DE FORMA SIMULTANEA SE TRABAJA EN ACTIVIDADES COMO DESCAPOTE EN ZONA ROI, LUENES,

Norma

Scanned by CamScanner

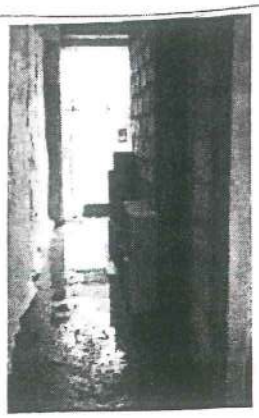MAMPOSTERIA, INSTALACION DE FRESCADA, ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, PAÑETES, ESTRUCTURA CUBIERTA.

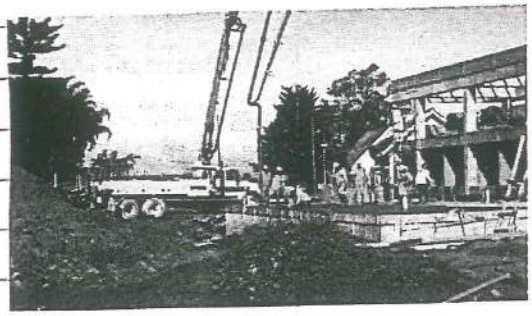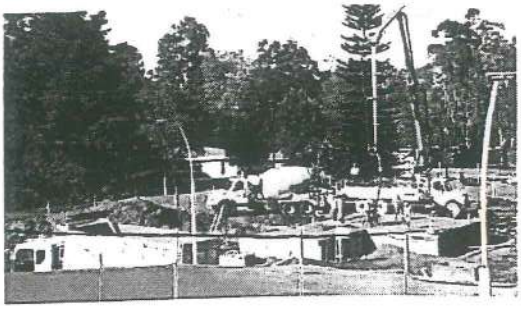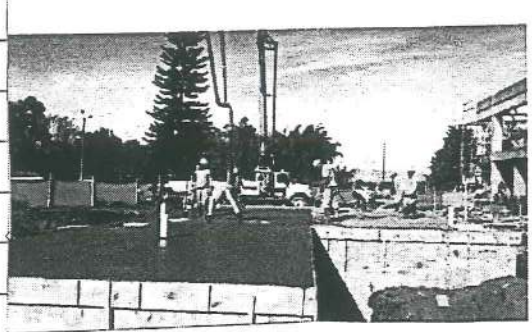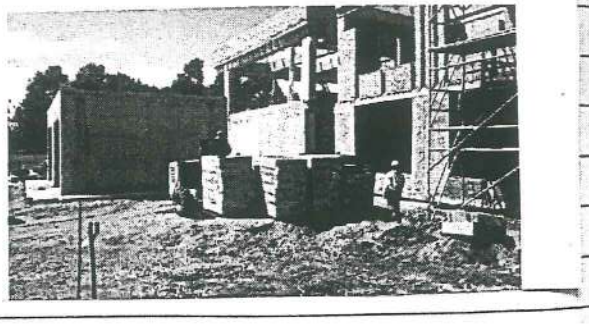ESTAMOS A LA ESPERA DE LOS PLANOS EN MEDIO MAGNETICO DEL LA ZONA DEL GIMNASIO PARA SACAR CANTIDADES DE OBRA.

- Personal en Obra:
  - Personal Administrativo de BCS Gutierrez.
  - Personal Operativo BCS Gutierrez (1 Operador mini cargador, 2 Conductores Volqueta, 1 Inspector, 3 Ayudantes Generales Oficina, Ayudantes mamposteria, Oficiales mamposteria personal en Mamposteria (vigas, columnetas, repellos), 1 hidraulico, Ayudantes Brno, Oficiales Bruno,


Scanned by CamScanner

Ayudantes tanque,
- 5 Arrieta, Datalec, Metalbe SAS, 1 Operador Vibrocompactador
- Personal Administrativo de Interventoría.


- Clima: Mañana
- Equipos: Minicargador, Volqueta, Vibrocompactador,
- Elementos de seguridad Industrial. Casco, Botas, Guantes, tapabocas, Uniforme, Chalecos.
- Actividades Ejecutadas:
- Fundicion Losa superior tapa de tanque almacenamiento.
- Bloque liso No 5 remate detalles 1er Piso bloque 3, 1er y Segundo piso modulo 1 Patrulleros,
- Columnetas y Vigas confinamiento en 1er y 2do piso modulo 1 Patrulleros, 1er piso modulo 5 Sub Oficiales.



DOMINGO 3 FEBRERO.


SE ~~ADJUNTA~~ REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD ADICIONAL REALIZADA, DURANTE LA CUAL SE REALIZO EL RETIRO DE POSTES Y CABLEADO EN UN SECTOR DE FASE 4.
EL TRABAJO FUE REALIZADO CON LAS MEDIDAS NECESARIAS DE SEGURIDAD.

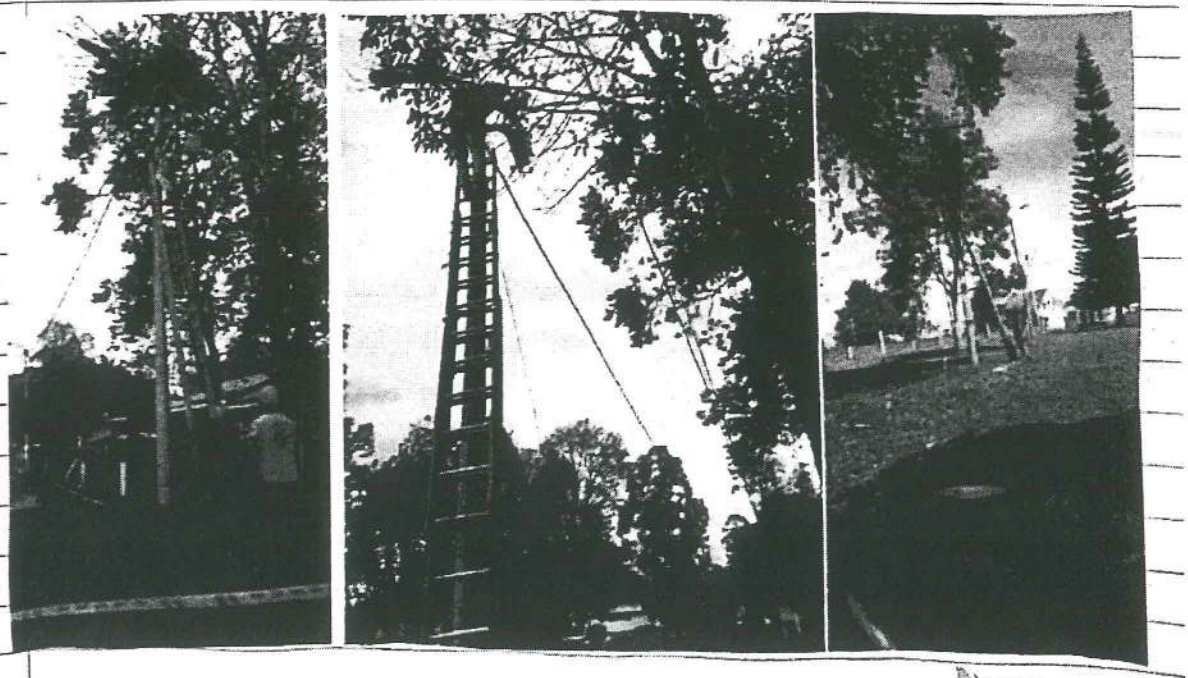

Scanned by CamScanner

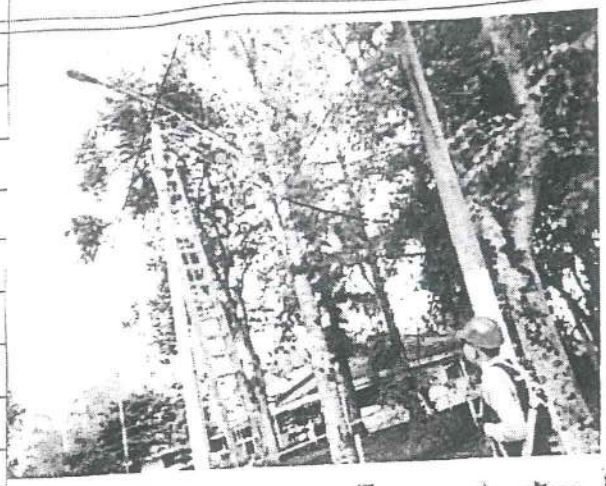

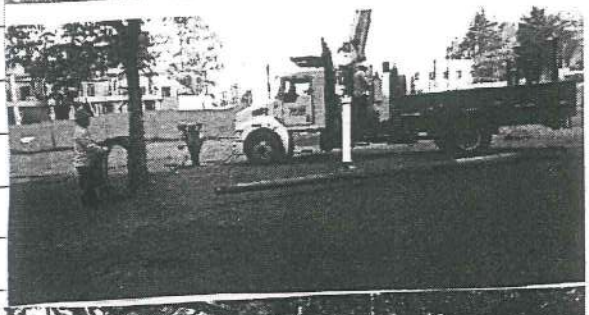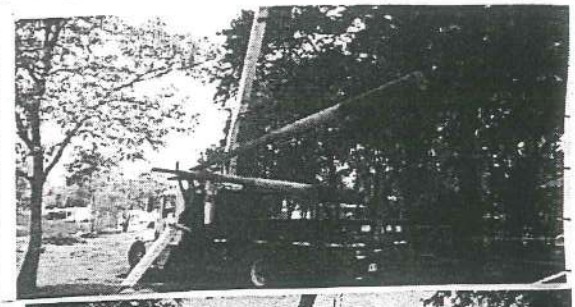

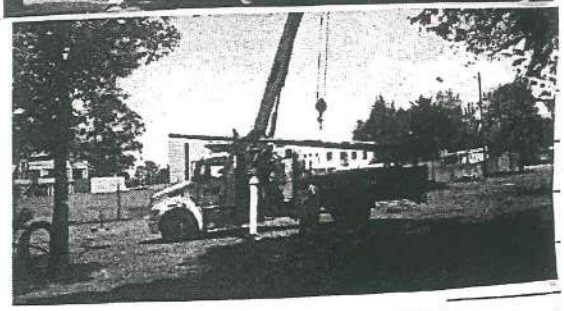

SE REALIZA INVENTARIO DEL MATERIAL DESMONTADO Y SE ENTREGARÁ MEDIANTE ACTA AL COMANDO. MMO.

Lunes 4 Febrero 2019

Personal en Obra:

. Personal Administrativo BCS Gutierrez

. Personal Operativo BCS Gutierrez (7 Operador Mini

Scanned by CamScanner

Cargador, 2 Conductores Valqueta, 1 Inspector, 3 Ayudantes Generales Oficina, 12 Oficiales area Mamposteria, 14 Mamposteros, 4 Ayudantes area Mamposteria, 4 Ayudantes Bruno, 3 Oficiales Bruno, 1 Hidraulico)


- Arrieta SAS : 5 Ayudantes, 4 Oficiales.
- 8 Ayudantes Area del tanque.
- Meta B SAS: 4 Personas estructura metalica y Cubierta
- Datalec Ing Elec: 4 Personal Electrico.
- Clima mañana:
- Equipos: 1 Minicargador, 2 Valquetas, 1 Vibro-Compactador, 1 Re
- Elementos de Seguridad Industrial: Casco, Botas, tapabocas, tapaoidos, Uniforme, Guantes, Chaleco.
- Actividades Ejecutadas:
- Se teja metalica en Obra (pasan lamina metálica por troqueladora y procederan en Obra al armado de la teja con el poliuretano al Interior)
- Continuan rellenos sobre Interior entre bloques 1 y 3 y sobre la fachada posterior edificio 1 Patrulleros.
- Inician pruebas de Soldaduras para estructura metalica en el area de la Soldadura (Cubierta)
- Bloque piso #5 (remates en 1er piso modulo 1 Patrulleros y modulo 3 Sub Oficiales, Mamposteria en 2do piso Inician en Sub-Oficiales y Terminando en 2do Piso Patrulleros)
- Ter Piso y 2do Piso bloque 1 Patrulleros rematando Vigas y Columnetas de Confinamiento.
- 1er Piso Sub Oficiales rematando Vigas y Columnetas Confinamientos.
- Repellos 1er Piso bloque 3 Sub Oficiales.
- Instalaciones electricas 2 Piso bloque 1 Patrulleros.


Norma


Scanned by CamScanner

- Quitando formaleta tanque.
- Observaciones:
- Se solicita al contratista revisar Plomos muros y alineacion en 2do piso blague 7 Patrulleros ya que se revisaron unos y se encontraron detalles de alineasión.
- Chequear el plantee de la Mampostería en 2do Piso Sub Oficiales para no cometer errores en el Arranque.


→ SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS OBRAS EN EJECUCION.

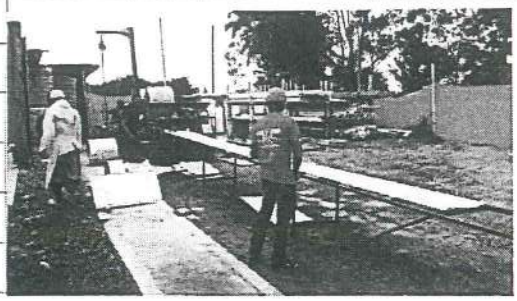


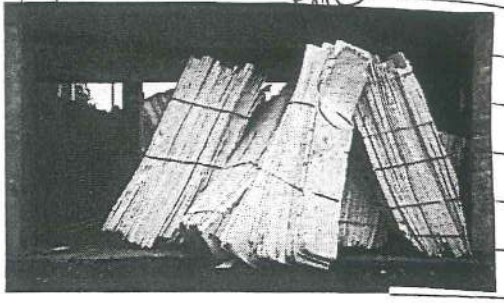


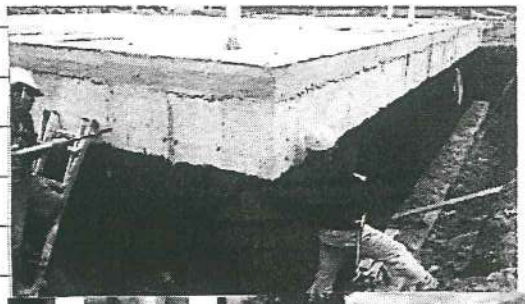










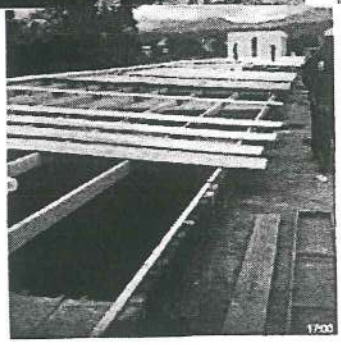

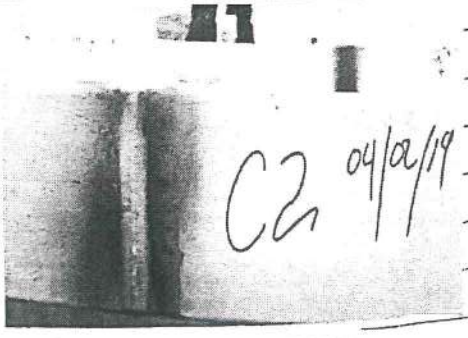

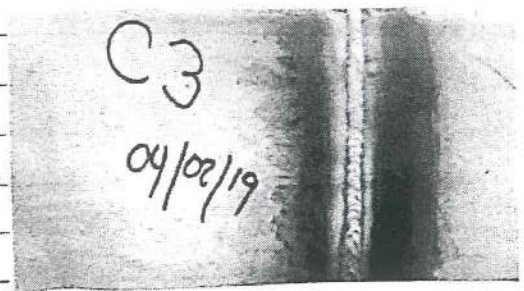

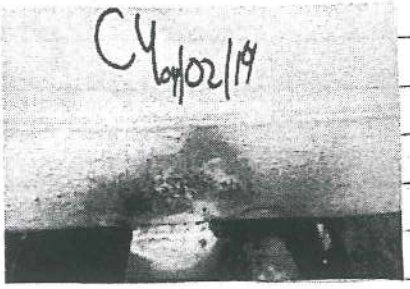

Norma

Scanned by CamScanner








DURANTE EL DÍA DE HOY SE AVANZA ADEMAS EN LA FABRICACION DE LA TEJA, SE ENCUENTRA EN OBRA LA MAQUINA LA LAMINA Y LANA PARA SU ELABORACION.
SE APLICA EL SELLO PERIMETRAL AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.
SE REALIZA PRUEBA DE TINTAS EN LA ESTRUCTURA METALICA EN LOS SITIOS DEFINIDOS POR LA INTERVENTORIA.

- Se chequeo un desplome de 15 cm en muro fachada lateral eje D46 del bloque de oficinas

Ing Sind J Gue P.
Interventor


MARTES 5 FEBRERO/2019.
SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN EN EJECUCION.

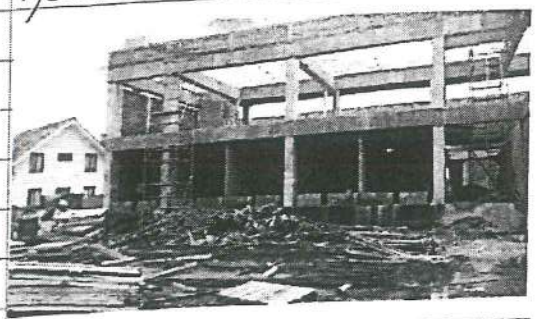







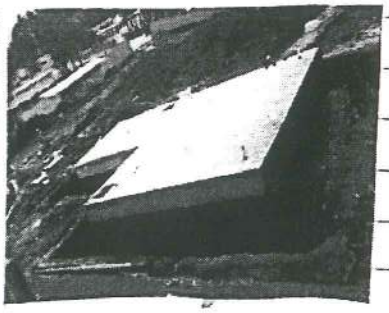

Scanned by CamScanner

SE AVANZA EN LAS EXCAVACIONES PERIMETRALES AL EDIFICIO BLOQUE OFICIALES PARA CONTINUAR LOS RELLENOS.
SE IDENTIFICAN LAS CAJAS EXISTENTES EN ZONA DE NUEVO TANQUE ROI.
-LOS DETALLES POR CORREGIR SE ESTAN REALIZANDO.

- Observaciones:
- Se recomienda al contratista realizar el tratamiento al hierro expuesto en columnas ya que se observó el retiro o del recubrimiento de la misma.
- Esta interventoría, en revisión del documento de calificación del soldador, no calificación para los trabajos de soldadura que se está realizando en obra. Se solicita al contratista hacer ella respectiva correctivo.
- Se recomienda al contratista tener en cuenta el almacenamiento del mismo desde su arranque ya que se observó juntas de la línea de planta.

Ing. Saul J. Cruz
Interventor

→ EL CONTRATISTA SOLICITA A LA INTERVENTORIA QUE POR FAVOR REALICEN LAS PRUEBAS QUE TIENEN PROGRAMADAS PARA LA ESTRUCTURA METALICA PARA LA VERIFICACION COMPLEMENTARIA DE LOS TRABAJOS DE SOLDADURA, A LAS CUALES EN CONTRATISTA YA REALIZO PRUEBAS COMO CONSTA EN 148 y 149 FOLIOS DE ESTA BITACORA.
EL PROCESO DE SOLDADURA SE ADELANTA HACE VARIOS DIAS DURANTE LOS CUALES LA INTERVENTORIA REALIZO SEGUIMIENTO PERMANENTE Y EL CONTRATISTA ATENDIO LAS RECOMENDACIONES QUE FUERON PRESENTADAS, ASI MISMO SE REALIZARON LAS PRUEBAS DE TINTA EN LOS SITIOS DETERMINADOS POR LA INTERVENTORIA.
→ EL CONTRATISTA REITERA LA SOLICITUD PARA QUE LE SEAN ENTREGADOS LOS PLANOS EN

Forma

Scanned by CamScanner

MEDIO MAGNETICO DE LAS NUEVAS ZONAS DE TRABAJO. Y OTROS DONDE SE ACLAREN POSICION Y CONFORMACION DE FILTROS DE T.A. SE SOLICITA A INTERVENTORIA POR FAVOR COORDINAR LA ENTREGA AL COMANDO DE POLICIA DE LOS ELEMENTOS ELECTRICOS DESMONTADOS EN EL FIN DE SEMANA.

→ EN REFERENCIA AL REFUERZO DE ELEMENTOS COMO COLUMNETAS LOS SUBCONTRATISTAS YA TIENEN LAS INSTRUCCION PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONFORME A LAS NORMAS TECNICAS CORRESPONDIENTE. Y ADEMAS CONTAMOS CON UN INSPECTOR DE OBRA QUE REALIZA CONTROL PERMANENTE DE LAS OBRAS EN EJECUCION.


EL TRAZADO DE MUROS SE REALIZA CON COMISION DE TOPOGRAFIA Y EL PLANTEO LO REALIZA EL INSPECTOR CON LOS MAESTROS ATENDIENDO LOS PARAMENTOS Y ACOTAMIENTOS QUE DETERMINA ARQUITECTURA DEL PROYECTO ~~ATC~~.


Miercoles 6 de Febrero de 2018


- Personal en Obra:
  - Personal Administrativa de BCS Gutierrez
  - Personal Operativo BCS Gutierrez (1 Operador mini cargador, 2 Operador Volqueta, 1 Inspector, 3 Ayudantes Generales Oficinas, Oficiales area Mamposteria, Mamposteria, Ayudantes Area mamposteria, Ayudantes Bruno, Oficiales Bruno, Hidraulico)
  - Arrieta SAS: Ayudantes, Oficiales.
  - Ayudantes Area tanque
  - Meta B SAS: Personales estructura metalica y Cubierta.
  - Datalec Ing. Elec: Personal Electrico.
- Clima: · Mañana
- Equipos: 1 Minicargador, 2 Volquetas, 1 Retro


Norma
Scanned by CamScanner

- Elementos de Seguridad: Casco, Botas, Guantes, tapabocas, tapaoidos, Uniforme, Chaleco.
- Actividades Ejecutadas:
- Rematando detalles de Vigas y Columnetas de Confinamientos en 1ro y 2do Piso Bloque 1 Patrulleros. y en 1er Piso bloque 3 Sub Oficiales.
- Mamposteria detalles 1ro y 2do Piso Patrulleros y 1er Piso Sub Oficiales.
- Continuan con Mamposteria en 2do Piso Sub Oficiales.
- Repello en 1er Piso bloque 3 Sub Oficiales, y Segunto Piso bloque 1 Patrulleros.
- Excavacion. en area tanque Red Contra Incendios.
- Continuan rellenos
- Inicia excavasión para instalacion tuberia agua potable sobre fachada externa edificio Patrulleros.
- Instalaciones eléctricas en el Segundo Piso del Modulo 1 Patrulleros (Tubería para Iluminación.

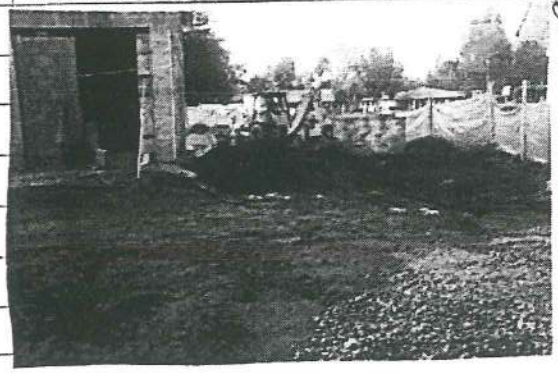

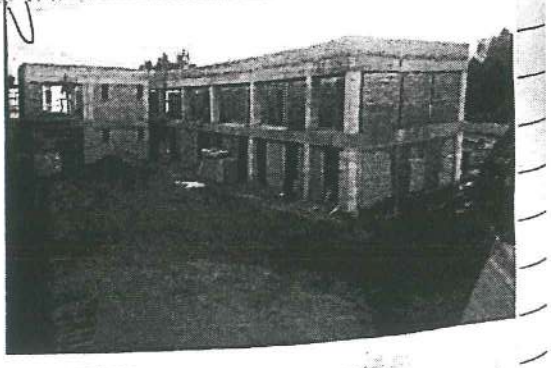

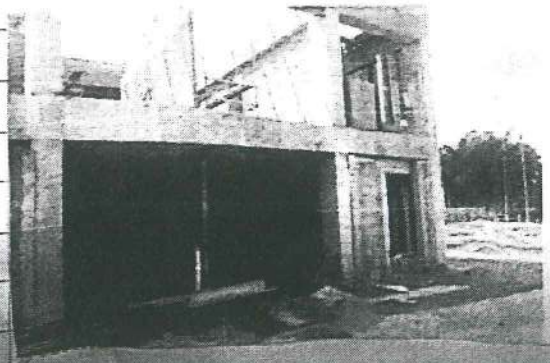

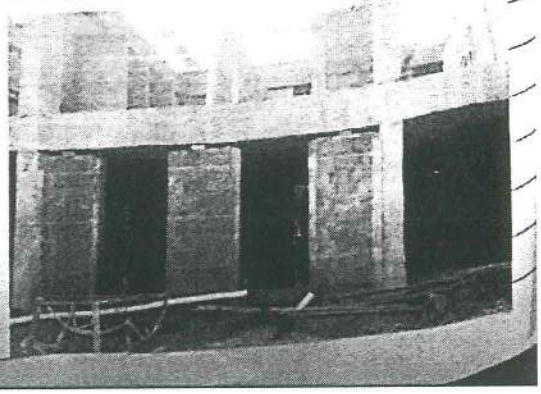

Scanned by CamScanner

- Observaciones:
- Se observa nuevamente montaje de pega insuficiente en la manposteria 3 hiladas de patillos en segundo piso.
- Se observa estructura metalica sin terminar en 3 hiladas de apoyo se recomienda al contratista realizar viga donde se tomillen y dentado en los apoyos de las platinas en 3 hiladas de ramas y apoyo y patillos.
- Se informa al contratista de las observaciones a subsanar en la instalacion de la estructura metalica como refuerzo en los cordones de soldadura ya que se observa algunas fisuras y concavos, reforzar en el ancho de la pestaña donde se observa agujeros sin explicacion alguna. Tambien subsanar detalles en la manposteria aún pendiente en el 3 hiladas de patillos.
- El no subsanar el incumplimiento de los puntos en 3 hiladas de apoyo se observa luz entre la platina y esta.

Ing Saul L Gom P.
Interventor

→ TAL COMO SE DEJO REGISTRADO EN FOLIOS ANTERIORES DE LA BITACORA EL CONTRATISTA CONFIRMA QUE AL PERSONAL EN OBRA SE LE DIO INSTRUCCION SOBRE LA FORMA TECNICA PARA REALIZAR LA PEGA DE MAMPOSTERIA, Y ADICIONAL SE HACE LLAMADO DE ATENCION AL PERSONAL QUE NO ESTE ACATANDO LAS INSTRUCCIONES TECNICAS, INCLUSO DE SER NECESARIO SE CORRIGE LA PIEZA SI HA ESTADO MAL INSTALADA.

→ LA ESTRUCTURA METALICA SE ENCUENTRA EN EJECUCION AL TERMINAR EL PROCESO SE HACEN LOS RESANES POR DESPORTILLE EN CULATAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR.

SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO DE SOLDADURA ACATANDO LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS Y REALIZANDO AJUSTES DE SER NECESARIOS

Norma

Scanned by CamScanner

CUANDO ESTEN TERMINADOS LOS PROCESOS SE HARA ENTREGA A INTERVENTORIA CON LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE TINTAS LOS AGUJEROS QUE PRESENTA LOS PERLINES ES POR EL TIPO DE PROCESO QUE SE REALIZA PARA PINTURA, DE ESTOS SITIOS SE CUELGAN LOS PERLINES PARA QUE LA PINTURA QUEDE TOTALMENTE UNIFORME






JUEVES 7 DE FEBRERO /2019.

-SE AVANZA EN LA EXCAVACION PARA LA RED TUBERIA A PRESION PARALELA AL COSTADO NORTE DEL BLOQUE PATRULLEROS, SE COMPLETO LA APLICACION DEL GEOCALRE DEDOR DEL TANQUE.

SE AVANZA CON MAMPOSTERIA, ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES Y PAÑETE.

SE REALIZA ENTREGA AL COMANDO DE LOS ELEMENTOS DESMONTADOS.

SE AVANZA EN EXCAVACION EN ZONA PARA TANQUE RCI, DESCUBRIENDO LAS DIFERENTES REDES EN ESA ZONA.

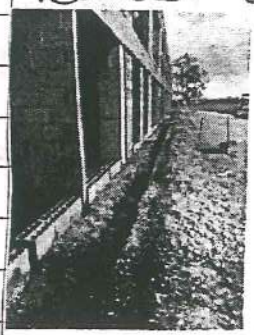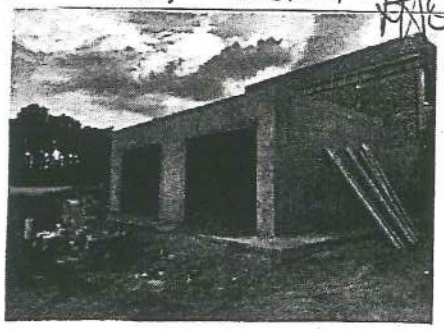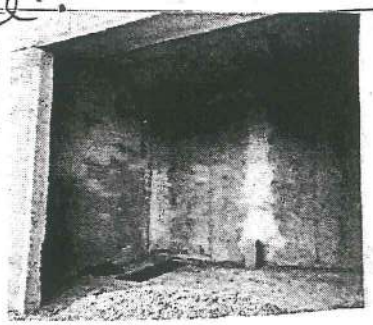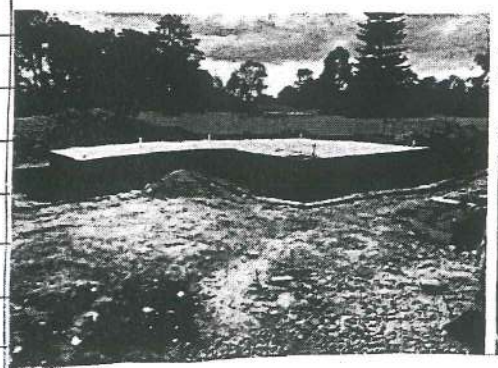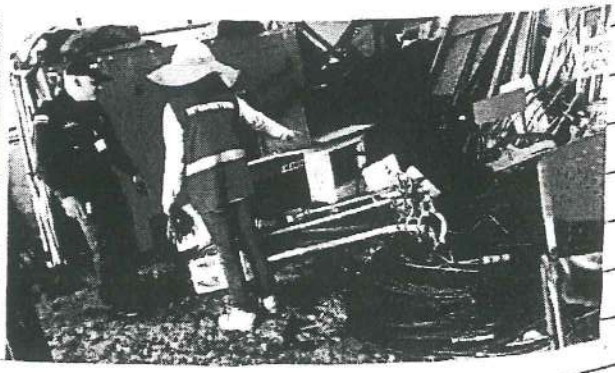Norma

Scanned by CamScanner

- Observaciones:
- Se da inicio a la instalación de la cubierta en patrulleras y aún el contratista no ha reportado los resultados de ensayos. se solicita se agilice dicho procedimiento.
- Se informa al contratista que la estructura metálica instalada en oficinas no corresponde al dimensionamiento que está registrado en planos, no se recibió por parte del contratista explicación técnica alguna. Se deja en manifiesto que toda actividad que se ejecute debe ser realizado por personal idóneo para garantizar la calidad de los mismos.

Ing Sant J Cruz D
Interventor

→ EL CONTRATISTA VERIFICARA LO REPORTADO POR LA INTERVENTORIA Y DE TENER IMPLICACIONES TECNICAS SE TOMARAN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.
→ LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SE SUMINISTRARAN TAN PRONTO SEAN ENTREGADOS POR EL PERSONAL ENCARGADO DE ELLAS.

*Personal en Obra:
- Personal Administrativo BCS Gutierrez.
- Personal Operativo BCS Gutierrez. (1 Operador Minicargador, Conductores Volqueta, Operador Retroexcavadora, 1 Inspector, 3 Ayudantes Generales Oficina, Oficiales area Mamposteria, Mamposteros, Ayudantes area Mamposteria, Ayudantes Bruno, Oficiales Bruno, Hidraulico)
- Arrieta SAS: Ayudantes, Oficiales
- Ayudantes Area tanque
- Meta B SAS: Personas en estructura Metálica y la Instalación de la Cubierta.
- Datalec Ingeniería Electrica: Personas realizando Instalaciones Eléctricas.
- Clima: Mañana:
- Equipos: Minicargador, Volquetas, Retro excavadora.

Scanned by CamScanner

- Elementos de Seguridad: Casco, botas, guantes, tapabocas, tapaoidos, Uniforme, Chaleco.
- Actividades Ejecutadas:
- Bloque liso # 5: 1er y Segundo Piso modulo 1 Patrulleros; 1er y Segundo Piso modulo 3 Sub Oficiales.
- Repellos: 1er Piso modulo 3 Sub Oficiales y Segundo Piso inician Repellos sobre muros circulación.
- Aplicacion Igol sobre muros tanque de Almacenamiento Agua Potable.
- Excavasión para redes agua potable modulo 1 Patrulleros sobre fachada posterior.
- Instalaciones electricas segundo Piso modulo 1 Patrulleros y 1er Piso modulo 3 Sub Oficiales
- Excavasiones para tanque de Almacenamiento contra Incendios.
- Nivelacion y rellenos sobre area Sub estación y Casino.
- Detalles Soldaduras en estructura de Cubierta.
- Se Inicia Instalación Cubierta Modulo 1 Patrulleros, Interventoría realizo Observasiones sobre detalles de soldaduras.

Observasiones:

- Revisar Plomos mamposterín, se deben plantear bien ejes en circulación para poder chequear hilos y Plomos en el momento de los repellos.
- Chequear calidad de los repellos 1er Piso modulo 3 Sub Oficiales




Interventoría.



VIERNES 8 DE FEBRERO /2019.

EL CONTRATISTA ADJUNTA A CONTINUACION REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION.

Norma

Scanned by CamScanner

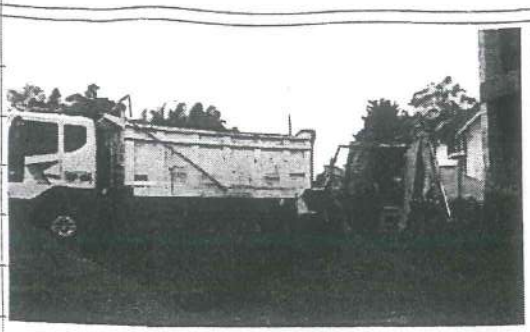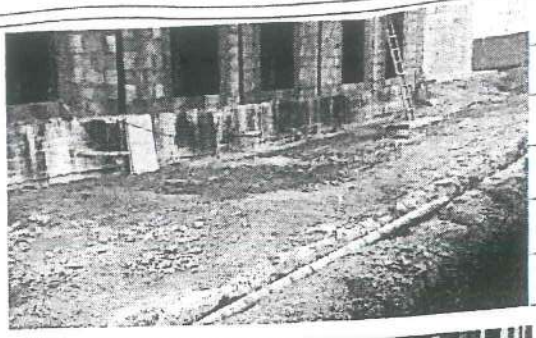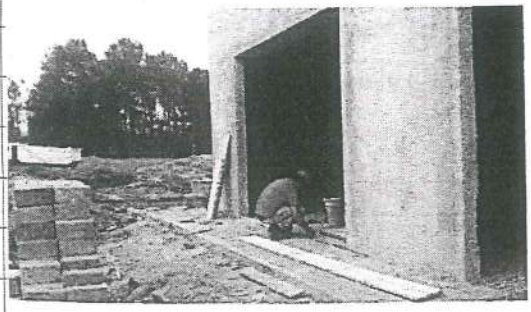SE AVANZA EN LAS EXCAVACION Y RELLENOS PERIMETRALES AL BLOQUE OFICIALES.
SE REALIZA ASEO PREVIO DE LA ZONA Y SE EXCAVA HASTA EL NIVEL APROBADO POR INTERVENTORIA.
SE REALIZA TRABAJOS DE PANETES EN ZONA SUBESTACION Y BLOQUES.
EN LOS BLOQUES SE AVANZA EN LA ELABORACION DE MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES. EN INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y TEJA.
SE CONTINUA EXCAVACION PARA RED HIDRÁULICA.
SE SOLICITA A LA INTERVENTORIA QUE POR-FAVOR NOS ENTREGUEN EL DISEÑO DEL FILTRO PERIMETRAL AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO. DE AGUA Y LA FORMA Y SITIO PARA RECOGER EL AGUA QUE DICHO FILTRO RECOJA.

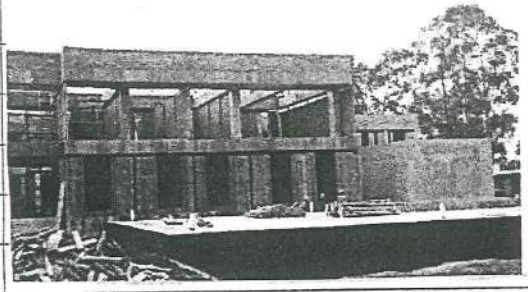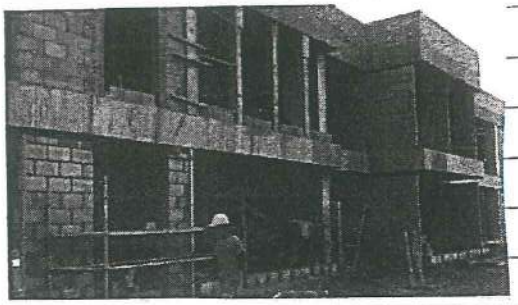Norma
Scanned by CamScanner

CONTINUAMOS A LA ESPERA DE LOS PLANOS MAGNETICOS DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO.
SOLICITAMOS A LA INTERVENTORIA REALICE POR FAVOR CON SU COMISION DE TOPOGRAFIA LOS CHEQUEOS DE PENDIENTES DE LAS REDES EN INSTALACION Y LOS NIVELES DE LAS EXCAVACIONES EN EJECUCION.
SE ENTREGA COPIA A LA INTERVENTORIA DE PLANO CON COTAS DE LA RED SANITARIA PARALELA AL COSTADO SUR DEL BLOQUE PATRULLEROS EN ESPERA DE SU AVAL PARA INICIAR EXCAVACIONES CONSORCIO BCS-GUTIERREZ.

- Personal en Obra:
  - Personal Administrativo Consorcio BCS Gutierrez
  - Personal Operativo Consorcio BCS Gutierrez (1 operador Minicargador, 2 conductores Volqueta, Operador Retroexcavadora, 1 Inspector, 3 Ayudantes Generales Obicina, Oficiales area Mamposteria, Mamposteros, Ayudantes area Mamposteria, Ayudantes Bruno, Oficiales Bruno, 1 Hidraulico)
  - Arrieta SAS: Oficiales, Ayudantes.
  - Ayudantes Area Tanque
  - Mela B SAS: Personal en estructura Metálica y Cubierta.
  - Datalec Ingenieria Electrica: Personas en Instalaciones electricas.
  - Personal Interventoría.
- Clima: Mañana.
- Equipos: Minicargador, Yolquetas, Retroexcavador
- Elementos de Seguridad: Casco, Botas, Guantes, Tapabocas, Tapacidos, Chaleco, Uniforme.

Norma

Scanned by CamScanner

*Actividades Ejecutadas:

- Bloque Uso # 5: 1er y Segundo Piso modulo 1 Patrulleros; 1er y Segundo Piso modulo 3 Sub oficiales
- Repellos en 1er Piso modulo 3 Sub Oficiales y pasillos 2do Piso bloque 1 Patrulleros (Inician con 1er mano de material champeo).
- Instalaciones electricas 2do Piso modulo 1 Patrulleros
- Instalaciones Hidrosanitarias 1er y 2do Piso Modulo 1 Patrulleros.
- Instalacion Cubierta modulo Patrulleros.


Interventoría


SABADO 9 FEBRERO /2019


→ EL CONTRATISTA SOLICITA A LA INTERVENTORIA LE INFORME SE ESTA APROBADO EL PLANO ENTREGADO AYER CON COTAS Y ALINEAMIENTOS DE LA RED SANITARIA DEL BLOQUE PATRULLEROS.

→ SE AVANZA EN ORDEN Y ASEO EN OBRA Y SE REUBICA BLOQUE PARA DESPEJAR ZONA DE TRABAJO PARA EXCAVACION DE REDES EN ZONA ENTRE BLOQUE PATRULLEROS Y BLOQUE CASINO.



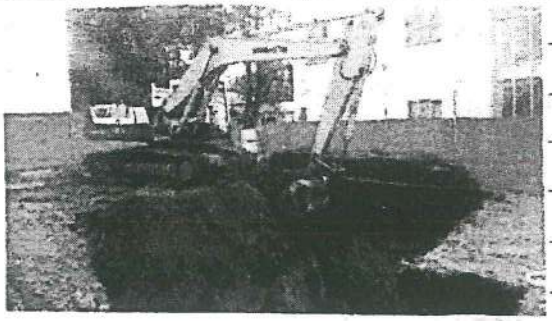

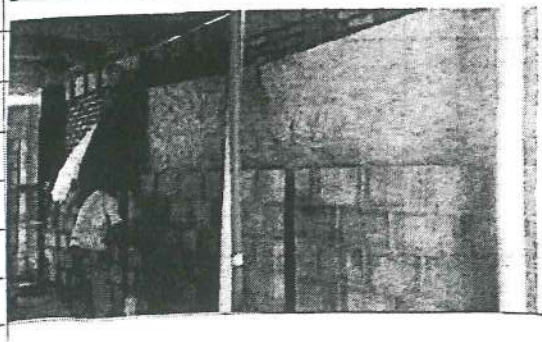

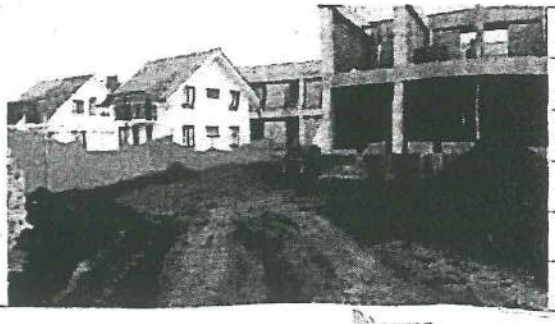

Norma

Scanned by CamScanner

SE INSTALA FRESCASA, SE CONTINUA CON LA EJECUCION DE MAMPOSTERIA, ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, PAÑETES, EXCAVACION EN ZONA TANQUE, RETIRO DE REDES EXISTENTES.
SE AVANZA EN RELLENO Y SU COMPACTACION ALREDEDOR DE BLOQUE OFICIALES
SE CONTINUA CON INSTALACION RED HIDRAULICA ZONA BLOQUE PATRULLEROS EN LOS DIFERENTES BLOQUES SE AVANZA EN LAS REDES ELECTRICAS Y LOS PUNTOS HIDROSANITARIOS.
SE AVANZA EN ESTRUCTURA METALICA Y ACABADOS EN ZONAS CUBIERTA.
SOLICITAMOS A LA INTERVENTORIA QUE SU COMISION VERIFIQUE SIMULTANEAMENTE LA INSTALACION DE REDES QUE SE REALIZARA LA PROXIMA SEMANA. CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

- Personal en Obra:
  - Personal Administrativo Consorcio BCS Gutierrez.
  - Personal Operativo Consorcio BCS Gutierrez. (1 Operador minicargador, Operadores Volqueta, 1 Inspector, 3 Ayudantes Generales Oficina, Operador Retroexcavadora, Oficiales area Mamposteria, Ayudantes area Mamposteria, Mamposteros, Ayudantes Bruno, Oficiales Bruno, Hidraulico)
  - Arrieta SAS: Ayudantes, Oficiales.
  - Ayudantes en el Area del Tanque.
  - Meta B SAS: Personas en estructura metalica y Cobierta.
  - Datalec Ingeniería Eléctrica: Personas en Instalaciones eléctricas.
  - Personal Administrativo Interventoría.
- Clima: Mañana:

Norma

Scanned by CamScanner

- Equipos: Minicargador, Volquetas, Retroexcavadora, Pajarita.
- Elementos de Seguridad Industrial: Casco, Botas, Guantes, tapabocas, tapaoidos, Chaleco, Uniforme.
- Actividades Ejecutadas:
  - Bloque Liso #5: 1er y Segundo Piso modulo 1 Patrulleros y 1er y Segundo Piso modulo 3 Sub Oficiales.
  - Repellos en 1er Piso modulo 3 Sub Oficiales y 2do Piso modulo 1 Patrulleros.
  - Instalaciones Hidrosanitarias 2do Piso y 1er Piso Patrulleros y 1er Piso Sub Oficiales
  - Instalaciones Electricas 2do Piso Patrulleros
  - Excavasion para Tanque de Red Contra Incendios.
- Observasiones:
  - Se solicita a Obra Terminar trabajos de elementos no estructurales y repellos en Area Casino, no se ve personal desde hace varios días.
  - Chequear el plantco de la Mamposteria 2do Piso Sub Oficiales y revisar bien alineación muros en 2do Piso modulo Patrulleros para ajustar bien los repellos.

Interventoría.


DOMINGO 10 FEBRERO /2019.
EL PERSONAL DE OBRA LABORA HOY EN ACTIVIDADES COMO ESTRUCTURA METALICA DE COBIERTA ADELANTANDO PROCESOS DE SOLDADURA MH@.



LUNES 11 FEBRERO /2019.
SE ADJUNTAN A CONTINUACION FOTOS DONDE SE OBSERVAN ALGUNOS DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN ADELANTANDO EN EXCAVACIONES EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, RIEGO Y COMPACTACION DE RELLENO.

Norma

Scanned by CamScanner

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN LA SOLDADURA EN CUBIERTA.
SE REALIZA EL RETIRO DE FORMALETA EN LA ZONA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.
AVANZAMOS EN MAMPOSTERIA, ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES COMO COLUMNETAS, CINTAS DE CONFINAMIENTO, PAÑETES DE MUROS.

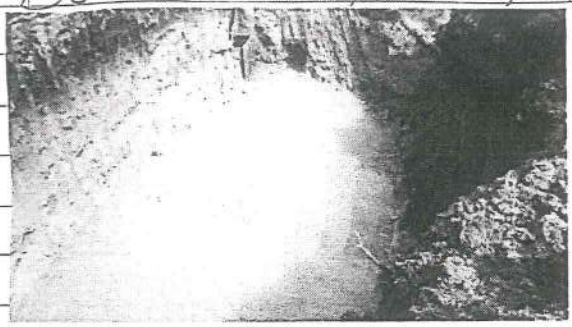

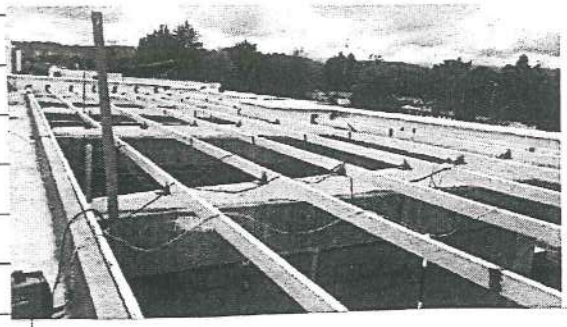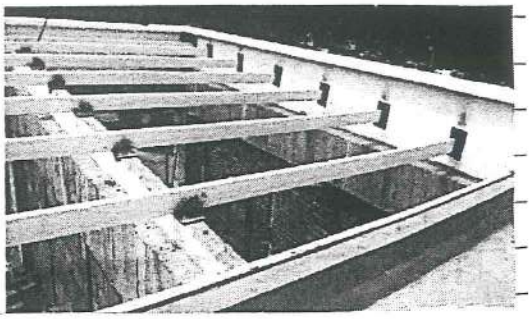EL CONTRATISTA INICIA LA INSTALACION DE RED DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A LA LOCALIZACION REALIZADA POR LA COMISION DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA CONFORME A PLANO DADO A LA INTERVENTORIA.
SE TRABAJA EN EL COSTADO OCCIDENTE DEL BLOQUE PATRULLEROS. SE ESPERA VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DE INTERVENTORIA. EL CONTRATISTA. DEJA CONSTANCIA QUE MEDIANTE OFICIO PN-DRAF-044 REALIZO ENTREGA A LA INTERVENTORIA RESULTADO DE LA PRUEBA DE TINTAS REALIZADO A LA ESTRUCTURA METALICA DEL BLOQUE #1. ALOJAMIENTO PATRULLEROS.
CONTINUAMOS A LA ESPERA DE LOS PLANOS

Norma

Scanned by CamScanner

EN MEDIO MAGNETICO PARA OBRA COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO.

- Personal en Obra:
  - Personal Administrativo Consorcio BCS Gutierrez
  - Personal Operativo Consorcio BCS Gutierrez (1 Operador minicargador, 2 Operadores Volqueta, 1 Operador Retroexcavadora, 1 Operador Pajarita, 1 Inspector, 3 Ayudantes Generales Oficina, Ayudantes Obras de Mamposteria, Oficiales Obras de Mamposteria, Mamposteros, Ayudantes Bruno, Oficiales Bruno, 1 Hidraulico)
  - Arrieta SAS: Ayudantes, Oficiales
  - Ayudantes en Area de tanque RCI
  - Meta D SAS: Personas en Estructura metalica y Cubierta.
  - Datalec Ingenieria Electrica: Personas en labores electricas Instalaciones
  - Personal Administrativo Interventoria
- Clima: Mañana: Nublado Tarde: Nublado.
- Equipos: Minicargador, Volquetas, Retroexcavadora, Pajarita
- Elementos de Seguridad: Casco, Botas, Guantes, tapabocas, tapaoidos, Chaleco, Uniforme.
- Actividades Ejecutadas:
  - Excavasion para redes hidroSanitarias Sobre la fachada posterior del edificio de Patrulleros.
  - Bloque liso #5: 1er Piso y Segundo en modulo 1 Patrulleros; 1er y 2do Piso en modulo 3 Sub Oficiales.
  - Columnetas y Vigas de Confinamiento en 1ro y 2do piso bloque 1 Patrulleros y Primer Piso bloque 3 Sub Oficiales.
  - Repello en 1er Piso bloque 3 y 2do Piso bloque 1. Patrulleros.
  - Detalles de Soldadura en area Cubierta Bloque 1 Patrulleros

Norma

Scanned by CamScanner

- Excavacion en Area Tanque RCI
- Rellenos areas perimetrales modulo 7 y casino
- Instalaciones Electricas e Hidrosanitarias en Bloque 7 y 3.

- Observaciones:

- Se solicita al contratista subsanar detalles como:
  - Rasuras de repellos que se han hecho con relleno de pega de bolsa de cemento, esto es en las actividades electricas.
  - Fundas de columnetas y vigas que se observan no como un elemento en concreto sino como un relleno con material de repello.
  - Traslapes no debidos en las vigas en concreto.
  - Fisuras en media caña.
  - Realizar las debidas dilataciones entre la pergolera metalica de cubierta y el bordillo de losa de cubierta en bloque de oficinas.
  - Realizar o verificar la correcta seguridad en escaleras de acceso bloque oficinas.
  - Area o retiro de escombros ubicados dentro de los bloques (oficinas).
  - Hacer uso de las curvas electricas ya que se observa el calentamiento del tubo electrico para darle la curva.
  - No instalar la tuberia electrica dentro de las columnetas para ello. se manga dentro de la mamposteria.
  - Nuevamente se solicita al contratista instruir al personal en obra del proceso tecnico que se debe llevar a cabo o el personal, retiro, no es idoneo ya que las anteriores observaciones han sido (reales) repetitivas.

Ing. Jesus J. Garcia
Inspector

- Se realizo por parte del evaluador de soldadura de inspectorio la ensayo de tinte y visual en estructura metalica de cubierta en bloque de oficinas y casino.
- Se realizo algunas observaciones al contratista sobre el

Norma

Scanned by CamScanner

informe el resultado de la evaluación de calidad realizada por el contratista correspondiente al 16 de febrero de 2016 y se solicita la corrección del mismo

Ing. [illegible] y Ing.
Interventoría.

- LAS OBSERVACIONES QUE REGISTRA LA INTERVENTORÍA EN EL FOLIO 164 YA HAN SIDO EXPRESADAS EN SITIO Y HAN SIDO ASIMISMO ATENDIDAS, SOLICITANDO A LOS CORRESPONDIENTES CONTRATISTAS PARA QUE ATIENDAN LAS CORRECCIONES SOLICITADAS Y DE LES HA REITERADO POR PARTE DE LOS RESIDENTES E INSPECTORES QUE LOS PROCESOS SE REALICEN CONFORME A LA ESPECIFICADO TECNICAMENTE, PARA LO CUAL SE HAN REALIZADO COMITES CON ELLOS Y EXPLICACIONES EN LAS ZONAS DE TRABAJO. COMO ES DE CONOCIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA.
EN REFERENCIA AL TEMA ELECTRICO YA EN CAMPO SE HA MOSTRADO A LA INTERVENTORÍA SITUACIONES PUNTUALES QUE HAN REQUERIDO UN MANEJO ESPECIAL.
RESPECTO AL ACOPIO DE ESCOMBROS ESTE SE REALIZA EN UN SITIO ESPECIFICO DE LA OBRA Y SE RETIRA AL MOMENTO DE COMPLETAR UN VIAJE.
EL TEMA DE LA ESCALERA TAL COMO LO REPORTA LA INTERVENTORÍA FUE SOLUCIONADO LA SEMANA ANTERIOR.
- NINGUNA COLUMNETA A SIDO FUNDIDA CON MORTERO, TODOS DE PREPARADO CONCRETO CONFORME A LA ESPECIFICACION, EL PROCESO DE FUNDICION DE ESTOS ELEMENTOS ES DIFERENTE AL DE COLUMNETAS POR SU UBICACION.

Norma

Scanned by CamScanner

- Excavacion tanque de RCI
- Excavacion para tuberias Hidrosanitarias y aguas lluvias.
- Construccion Cajas para redes sanitarias.

- Observaciones:
- Se le Informa a la Obra sobre detalles de repellos y plomos de mamposteria.
- Revisar alineacion mamposteria con un eje para rectificar repellos.

→ EL CONTRATISTA SOLICITA A LAS RESIDENTES DE INTERVENTORIA POR FAVOR ESPECIFICAR LOS SITIOS PUNTUALES REFERIDOS EN FOLIO 167 Y 168 PARA REALIZAR LOS CORRECTIVOS NECESARIOS.

→ EN ZONA DE TANQUE RCI SE AVANZA EN EXCAVACION Y SE IDENTIFICA VARIAS REDES QUE ATRAVIEZAN LA ZONA Y QUE DEBEREMOS REUBICAR, ASI MISMO HAY 3 CAJAS QUE DEBEN DEMOLERSE Y SE LOCALIZARAN 3 CAJAS NUEVA PARA DAR CONTINUIDAD AL FLUJO DE AGUAS

MIERCOLES 13. FEBRERO/20A.

- Observaciones:
- En relacion a los columnetas encontrados en el folio 167 correspond al bloque de petrolera entre ejes D6-D7.
- Se hace la observacion al contratista de hacer los cortes debidos en los excesos de vaciado para realizar el remate adecuado del repello.
- Nuevamente se hace la observacion al contratista de no realizar el paso de tuberia electrica por columnetas, para ello esta el bloque para hacer el debido paso de instalacion.
- Nuevamente se observa el inadecuado acabado de las vigas en concreto sobre los muros en bloque de petrolera.
- Se hace las correcciones pertinentes de la estructura metalica en los tres bloques.
- Se hace la observacion al contratista que nuevamente

Norma

Scanned by CamScanner

se ejecuta repelles en terminar estructura de amarramiento por ello el cubrido del repello técnicamente no es el mejor, preocupación que manifiesta esta interventoria por las actividades de estuco.

Ing Civil
Interventor

- Personal en Obra
- Personal Administrativo de Obra.
- Personal Operativo de Obra (2 Conductores Volqueta, 1 Operador Retroexcavadora, 1 Operador Pajarita, 3 Ayudantes Generales Oficina, Ayudantes Mamposteria, Oficiales Obras de Mampostería, Mamposteros, Hidraulicos, Ayodantes Bruno, Oficiales Bruno)
- Arrieta SAS: Oficiales, Ayudantes.
- Ayudantes en el area de los tanques.
- Metal B SAS: Personal en estructura metalica y Cubierta.
- Datatec Ing. Electrica: Personas realizando Instalaciones electricas.
- Personal Administrativo de Interventoría.
- Clima: mañana: Soleado Tarde: Soleado.
- Equipos de Seguridad Industrial. Casco, botas, Guantes, Tapatecas, Tapaoidos, Chaleco, Uniforme.
- Actividades Ejecutadas:
- Mampostería en Modulo 1 Patrulleros y modulo 3 Sub Oficiales en 1ro y 2do Piso.
- Vigas y Columnetas de Confinamientos en Modulo 1 y 3; 1ro y Segundo Piso Patrulleros y 1er Piso Sub Oficiales.
- Repelles en 1ro y 2do Piso Modulo 1 Patrulleros y 1er Piso Modulo 3 Sub Oficiales.
- Excavaciones area Tanque RC1
- Rellenos Area Perimetral bloque 1 y Casino.
- Instalaciones Hidro Sanitarias y excavaciones.
- Cajas de Inspección en ladrillo común.


Scanned by CamScanner


Observaciones:


- Se solicita a Clara suministrar cuadro con la relacion de acabados para pisos y enchapes, con base en lo contratado.


→ EL CONTRATISTA ~~ESTA~~ AJUSTANDO EL CUADRO A LOS MATERIALES ESPECIFICADOS.


+ SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE ACTIVIDADES:

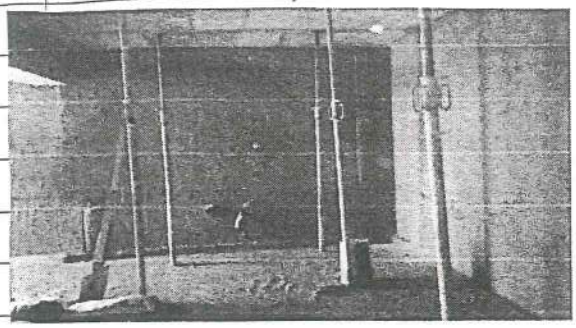


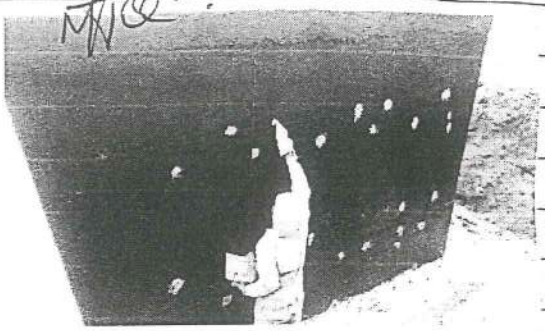

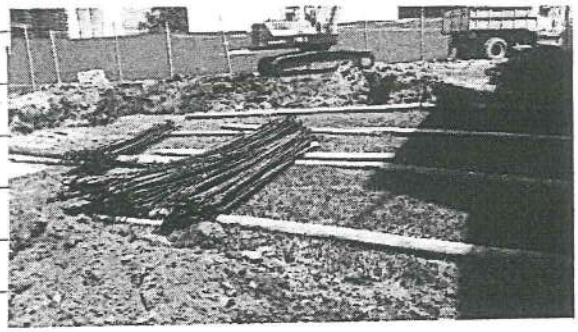

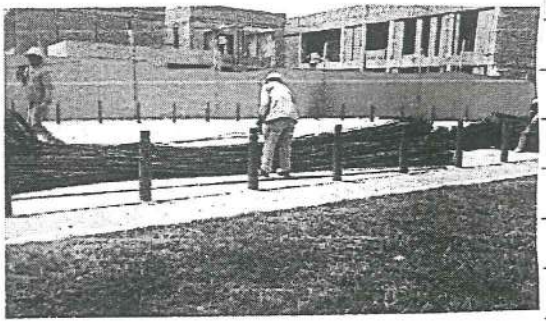


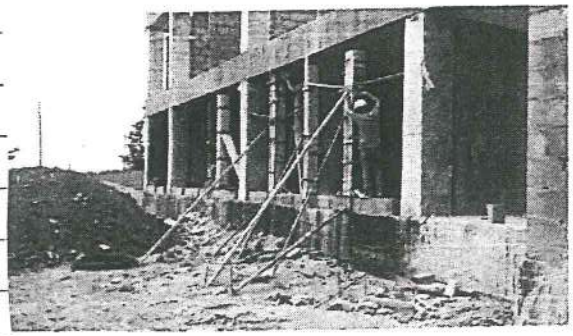

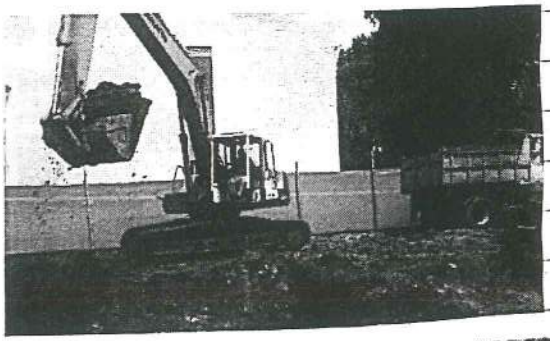













Scanned by CamScanner



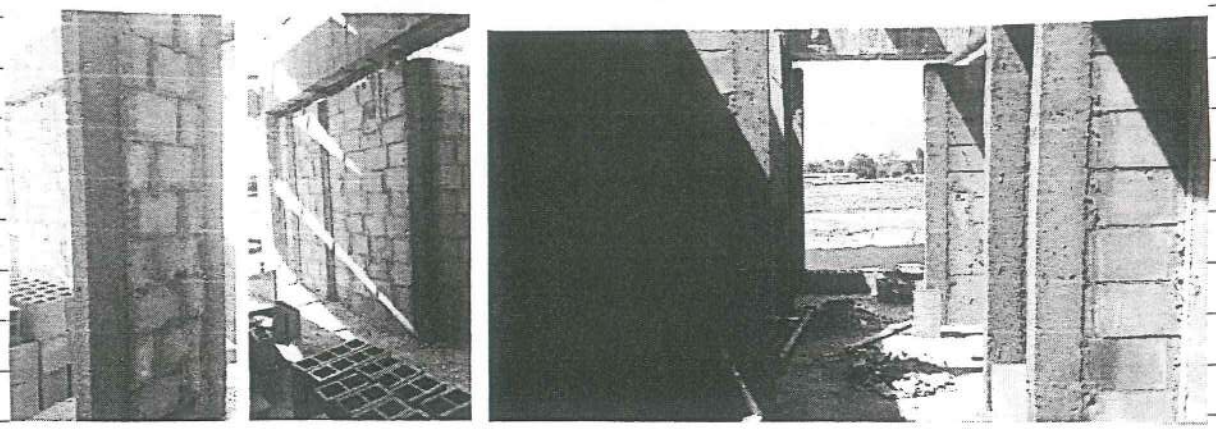



→ EL CONTRATISTA ACLARA A LA INTERVENTORIA EN REFERENCIA AL COMENTARIO DEL FOLIO 168 QUE EL MURO NO ESTA COLOCADO EN EXCESO ESTE SE CORTA DEL ANCHO DEL MURO. Y SE REALIZARA EL AJUSTE DE LOS QUE SE HAN DESPLAZADO AL MOMENTO DEL DIFICIL PROCESO DE LA FUNDICION DE LAS CINTAS DE CONFINAMIENTO CONTRA LAS VIGAS DE LOSA DE ENTREPISO, EL MISMO QUE GENERA QUE DICHAS VIGAS REQUIERAN UN PROCESO

Scanned by CamScanner

ADICIONAL EN SU ACABADO EL CUAL SE REALIZA ANTES DEL PAÑETE.

+ SE SOLICITA A LA INTERVENTORIA QUE VERIFIQUE EL ACABADO DEL REPELLO UNA VEZ LOS MUROS Y COLUMNUTAS ESTAN COMPLETAMENTE REPELLADOS Y PODRA COMPROBAR QUE CUMPLEN CON PLANOS Y ESCUADRAS Y LA CALIDAD DEL PRODUCTO ES UNA MEZCLA PREPARADA - MORTERO SECO AL CUAL UNICAMENTE SE ADICIONA AGUA. POR LO CUAL CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS.

EL DIA DE HOY LLEGA REFUERZO QUE SE USARA EN EL TANQUE RCI. DONDE SE ESTA AVANZANDO EN EXCAVACION.

Jueves 14 Febrero /19

- Personal el Cera:
- Personal Administrativo BCS Gutierrez.
- Personal Operativo BCS Gutierrez (2 Conductores Volqueta, 1 Operador Pajarita, 1 Operador Retroexcavadora, Oficial Ayudantes Generales Oficina, Ayudantes Mamposteria, Oficiales Mamposteria, Mamposteros, Hidraulicos, Ayudantes Bruno, Oficiales Bruno)
- Arrieta SAS: Ayudantes, Oficiales
- Ayudantes en el Area de los tanques.
- Metal B SAS: Trabajadores en estructura metalica y Cubierta.
- Datalec. Ing. Electrica: Personas en Instalaciones eléctricas.
- Personal Administrativo Interventoria.
- Clima: Mañana
- Equipos: Volquetas, Pajarita, Retroexcavadora
- Elementos de Seguridad Industrial: Casco, Botas, Guantes, tapabocas, tapaoidos, Chaleco, Uniforme.

Forma


Scanned by CamScanner

- Actividades Ejecutadas:
- Bloque liso #5: 1er y 2do Piso bloque 1 Patrulleros, Primer y Segundo Piso modulo 3 Sub Oficiales.
- Repellos en 1er Piso modulo 3 Sub Oficiales; 1er y 2do Piso modulo 1 Patrulleros.
- Instalaciones eléctricas 2do Piso bloque 1 Patrulleros.
- Instalaciones Hidrosanitarias 2do Piso bloque 1 Patrulleros.
- Excavasiones e Instalacion tuberias para redes Hidrosanitarias.
- Elaboracion de Cajas para redes Hidrosanitarias en ladrillo comun, e Instalacion de marcos y tapas.
- Excavasión para tanque RCI.
- relleno perimetral sobre tanque dealmacenamiento.

Observasiones:

- Revisar ejes de las tuberias sanitarias en baños 1er Piso bloque 1 y 3.
- Se recomientar proceso de resanes para areas donde se Instalan tuberias sanitarias en 2do Piso bloque 1 Patrulleros.


→ EL CONTRATISTA ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS OBRAS EN EJECUCION. EN LA FOTO CENTRAL SE OBSERVA EL TRAZADO DE CAJAS Y RED RESIDUAL DEL BLOQUE PATRULLEROS Y POSICION CAJA ELECTRICA.


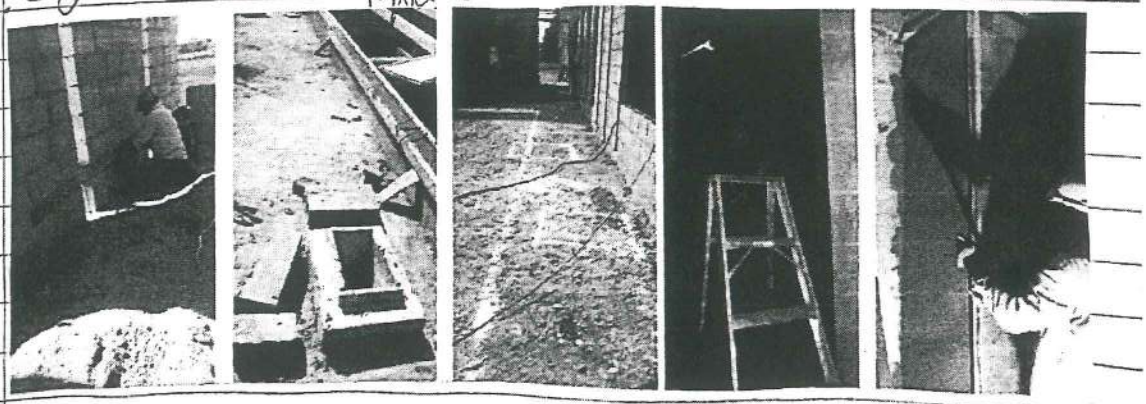



Norma

Scanned by CamScanner







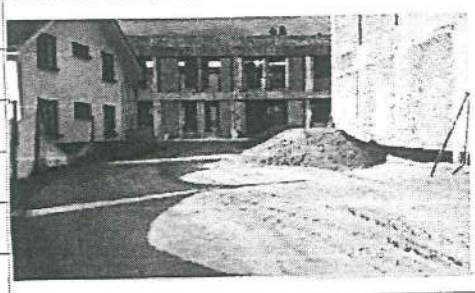

SE TOMARAN EN CUENTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA EN CUANTO A LOS PASES SANITARIOS EN LOSA, PROCESO QUE SE ESTA REALIZANDO.

RESIDENTE E INSPECTOR REALIZAN POR PARTE EN RECORRIDO EXHAUSTIVO EN OBRA Y LA RECOMIENDA PREVIA IDENTIFICACION CORRECCION QUE DEBE REALIZAR EL PERSONAL DONDE LA CALIDAD DE OBRA LO REQUIERA.

Viernes 15 Febrero / 99.

-Personal en Obra:

- Personal Administrativo BCS Gutierrez.
- Personal Operativo BCS Gutierrez (2 conductores Volqueta, 1 Operador Pajarita, 1 Operador

Norma

Scanned by CamScanner

Retroexcavadora, 3 Ayudantes Generales Oficina, Ayudantes Mampostería, Oficiales Mampostería, Mamposteros, Hidraulicos, Ayudantes Bruno, Oficiales Bruno, Personas en tanques RCI y de almacenamiento)
- Arrieta SAS: Oficiales, Ayudantes
- Metal BSAS: Personas en la Instalacion Teja para Cubierta
- Datalec. Ing. Electrica: Personas en Instalaciones Electricas
- Personal Administrativo Interventoría:
- Clima: Mañana
- Equipos: Volquetas, Retroexcavadora, Pajarita,
- Elementos de Seguridad Industrial: Casco, Botas, Guantes, Tapaoidos, Tapaboca, Uniforme, Chaleco,
- Actividades Ejecutadas
- Repellos 1er Piso modulo 3 Oficiales; 1er y 2do Piso modulo 1 Patrulleros
- Blague liso # 5: 1er y 2do Piso de modulo 1 Patrulleros y blague 3 Oficiales
- Vigas y Columnetas de Confinamiento en 1er Piso modulo 3 Oficiales y 1ro y 2do Piso modulo 1 Patrulleros
- Instalaciones Hidrosanitarias 2do Piso modulo 1 Patrulleros
- Excavacion e Instalacion Tuberías para redes Hidrosanitarias
- Elaboracion Cajas para redes Hidrosanitarias en ladrillo Común

Observaciones
- Revisar acabado de los muros (Plomos y Nivel) escuadra.

→ EL CONTRATISTA A LA INTERVENTORIA QUE POR FAVOR VERIFIQUEN LOS NIVELES DE EXCAVACION EN TANQUE PARA MAÑANA LA COLOCACION DE REJON.

Scanned by CamScanner

- Observaciones:
  - Se recomienda al contratista corregir el paso de tuberías eléctricas no por las vigas en concreto sino por el bloque o mampostería
  - Se recuerda al contratista la corrección de las alfajías en bloque patrulleros y oficiales.
  - Se recomienda al contratista la limpieza de la cubierta ya que se observó virutas de soldadura que ocasiona la oxidación en la lámina de cubierta.

Ing Sub de Gran Estructuras

Sábado 16 Febrero /19

- Personal el Obra:
  - Personal Administrativo BCS Gutierrez
  - Personal Operativo BCS Gutierrez (2 Conductores Volqueta, 1 Operador pajarita, 1 Operador retroexcavadora, 3 Ayudantes Generales Oficina, Ayudantes Mampostería, Oficiales Mampostería, Mamposteros, Hidraulicos, Ayudantes Bruno, Oficiales Bruno, Ayudantes area Tanques)
  - Arricta SAS: Ayudantes, Oficiales.
  - BMetalB SAS: Instalacion teja de Cubierta.
  - Datalec Ing. Electrica: Instalaciones Electricas
  - Personal Administrativo Interventoría
- Clima: Mañana
- Equipos: Volquetas, Retroexcavadora, Pajarita
- Elementes de Seguridad Industrial: Casco, Botas, Guantes, tapabocas, tapacidos, Uniforme, Chaleco
- Actividades Ejecutadas
  - Mampostería en Bloque 1 y 3 primer y segundo piso
  - Vigas y Columnetas de Confinamiento en bloque 1 primer y segundo Piso y bloque 3 1er Piso.
  - Repellos primer y Segundo piso modulo 1 Patrulleros y 1er Piso Sub oficiales
  - Instalaciones Hidrosanitarias en 2do Piso bloque 1 Patrulleros.
  - Instalaciones electricas 1ro y 2do Piso bloque 1.

Norma



Scanned by CamScanner


Patrulleros
- Se inicia relleno con piedra para base area tanque RCI.


- Observaciones:
- Por favor revisar la tuberia Sanitaria para ajustar medidas a ejes necesarias posterior Instalacion Sanitarios y lavamanos (Segun ejes y recomendaciones de los Aparatos Sanitarios que se vayan a Instalar.
- Se solicita a Obra el listado de los materiales que se van a Utilizar en pisos y enchapes ademas de los Aparatos Sanitarios.

→ YA SE DIO POR PARTE DE CONSTRUCTOR LA INSTRUCCION PARA REPOSICIONAR LA TUBERIA ELECTRICA QUE LO REQUIERA.

SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE ALGUNAS DE LAS OBRAS EN EJECUCION.

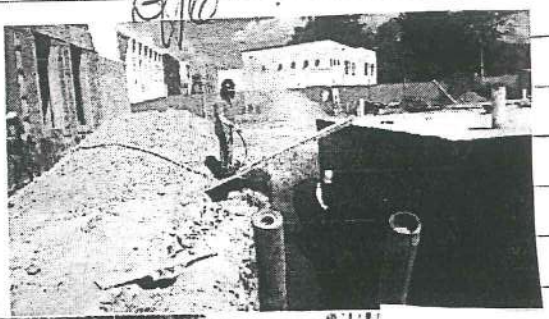


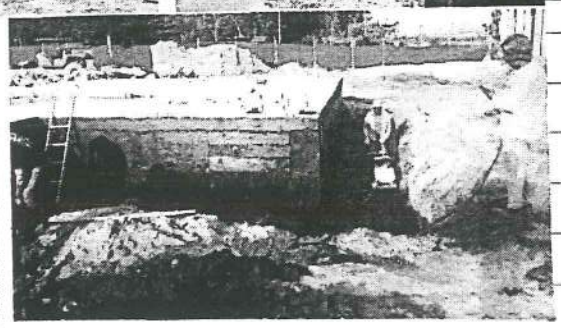


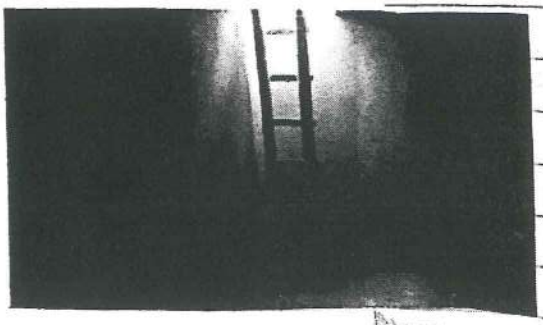
Norma



Scanned by CamScanner




→ SE INICIA EL MEJORAMIENTO DEL FONDO DEL TANQUE RLI.
→ SE REALIZO JORNADA DE ASEO EN LA OBRA Y QUEDAN LOS ESPACIOS COMO SE OBSERVA A CONTINUACION. HHP.

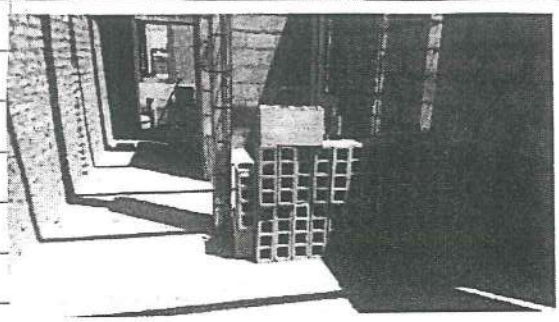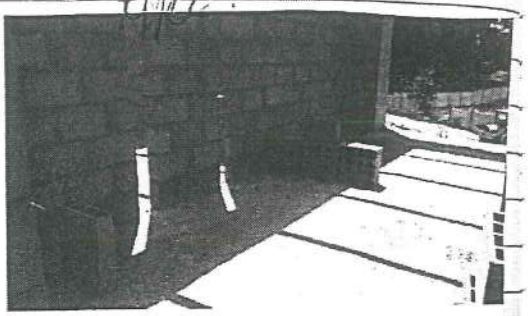


DOMINGO 17 FEBRERO / 2019.
DURANTE EL DIA ANTERIOR SE PROLONGA LA JORNADA DE TRABAJO EN LA TARDE Y HOY SE TRABAJA EN DETALLADO GENERAL, PLANETES, DINTELES, EN BLOQUE ALOJAMIENTO DE OFICIALES.
TRABAJOS EN REDES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS INTERNAS.
.TRABAJOS EN CUBIERTA DEL BLOQUE ALOJAMIENTO PATRULLEROS. HHP.

Norma

Scanned by CamScanner

LUNES 18 FEBRERO / 2019.

-Personal en Obra
- Personal Administrativo BCS Gutierrez.
- Personal Operativo BCS Gutierrez (2 Conductores Volqueta, 1 Operador Pajarita, 3 Ayudantes Generales Oficina, Oficiales Mamposteria, Ayudantes Mamposteria, Mamposteros Hidraulicos, Ayudantes Bruno, Oficiales Bruno, Ayudantes area de Tanques)
- Arrieta SAS: Ayudantes, Oficiales.
- Metal 8 SAS: Personas instalando Cubierta Primer entramado de base
- Datalec Ing. Electrical Personas en Instalaciones eléctricas
- Personal Administrativo Interventoría.


- Clima: Mañana
- Equipos: Volquetas, Pajarita, Retroexcavadora, Vibrocompactador.
- Elementos de Seguridad Industrial: Casco, Botas, Guantes, tapaoidos, tapabocas, Chaleco, Uniforme.
- Actividades Ejecutadas
- Bloque liso Ho5: Bloques 1 Patrulleros y 3 Sub Oficiales en 1er y Segundo Piso.
- Vigas y Columnetas de Confinamientos en 1 y 2do Piso bloque 1 Patrulleros y 1er Piso bloque 3 Sub oficiales
- Repellos en 1er y 2do Piso bloque 1 Patrulleras y 1er Piso bloque 3 Sub Oficiales.
- Instalaciones electricas bloque 1 y 3
- Instalaciones Hidrosanitarias bloque 1 y 3.
- Relleno con Piedra en el Area del tanque RCI

Observaciones:
- Revisar medidas de desagües sanitarios y sifones en 1er Piso del bloque 1 y 3.

Norma

Scanned by CamScanner

→ EL CONTRATISTA HARA LO SOLICITADO.
SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE ALGUNAS DE LAS OBRAS EN EJECUCION.

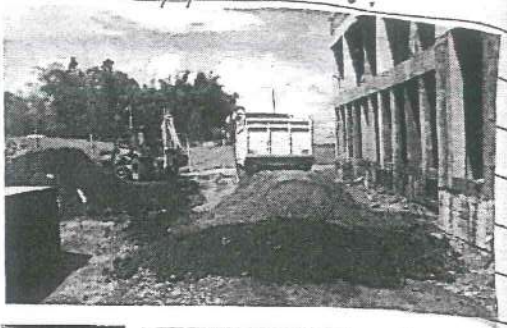



Martes 12 Febrero / 19

- Personal en Obra:
  - Personal Administrativo BCS Gutierrez
  - Personal Operativo BCS Gutierrez (2 Conductores Volqueta, 1 Operador Minicargado, 1 Operador Pajarita, 3 Ayudantes Generales Oficina, Ayudantes mamposteria Oficiales Mamposteria, Mamposterias, 7 Ayudantes area de tanque PQ Oficiales Bruno, Ayudantes Bruno, Hidraulicos
  - Arrieta SAS: Ayudantes, Oficiales.
  - Metal B SAS: Personas en la Instalacion de la teja de Cubierta.
  - Datalec Ing. Electrica: Personas en las Instalaciones electricas.
  - Personal Administrativo de Interventoria
- Clima: Mañana. Lluvioso Tarde Lluvioso
- Equipos: Volquetas, minicargador, Pajarita.
- Elementos de Seguridad Industrial: Casco, Botas,

Norma


Scanned by CamScanner

Guantes, Tapabocas, Tapaoidos, Uniforme, Chaleco.
- Actividades Ejecutadas
• Bloque Piso # 5: 1er y Segundo Piso modulo 1 Patrulleros y modulo 3 Sub Oficiales.
• Repellos en 1er Piso Sub Oficiales y 1er y 2do Piso modulo 1 Patrulleros.
• Vigas y columnetas de Confinamiento en 1er y 2do Piso modulo 1 Patrulleros y 1er Piso modulo 3 Sub Oficiales.
• Instalaciones Electricas e Hidrosanitarias en Bloque 1 y 3.
- Relleno Base Granular en area Tanque RCI.
• Conformando y limpieando area perimetral del bloque 3 Sub Oficiales para nivelar y rellenar.
• Instalacion Teja en Modulo 3 Sub Oficiales.

- Observaciones.
• En el dia de hoy se tiene las siguiente observaciones:
* de observa varios de madera en la dilatacion en muros eje 10-B8 en bloque de oficiales donde se evidencia realizados los repellos. Inmediatamente el constructor realiza o ubano, (sic) el detalle, esto así se destaca al constructor que el subcontratista debe proveer este tipo de detalles antes de ejecutar las demás actividades
* El constructor realiza la ejecucion de fundicion de columneta y nuevamente se evidencia una ejecucion mal ejecutada, varilla - junta horizontal, esto es en el eje (6-7) (A-B) bloque patrulleros.
* Se observa faltante varilla de pega en mamposteria en bloque patrulleros.
* Se recomienda nuevamente realizar el armado de hierro de las columnetas a la distancia segun diseño. (bloque) y realizar el corte del estribo a la altura correspondiente. ya que no se ve ni es correcto tecnicamente hacer el corte yafundado las las columnetas.

Norma

Scanned by CamScanner

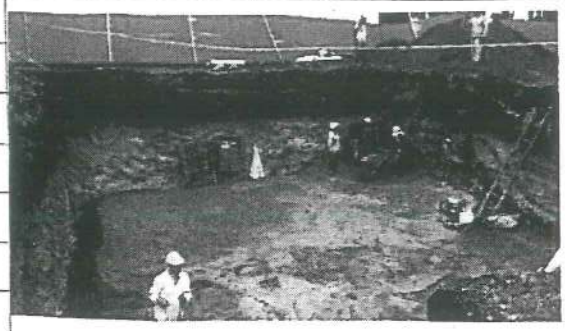



SE ADJUNTO REGISTRO FOTOGRAFICO DE ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES EN EJECUCION.

→ YA SE HA DADO LA INSTRUCCION AL PERSONAL ELECTRICA PARA QUE SE COLOQUE LA TUBERIA EN UNA POSICION ADECUADA AL BORDE DE VIGUETAS PARA NO CORTAR DE FORMA HORIZONTAL LA MAMPOSTERIA Y DEBILITARLA.

→ LA MAMPOSTERIA ESTA SIENDO LEVANTADA CONFORME FUE PLANTEADA CON TOPOGRAFIA Y SE ESTAN REALIZANDO AJUSTES A LAS COLUMNETAS PARA GENERAR ALINEAMIENTOS Y ESCUADRAS ADECUADAS.

→ EL ACERO DE REFUERZO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES SE ESTA COMPLETANDO CON LOS TRASLAPOS Y ESCUADRAS ADECUADOS.

→ SE REALIZARA LA DILATACION ADICIONAL SOLICITADA POR INTERVENTORIA.

Miercoles 20 Febrero / 19.

- Personal en Obra:
  - Personal Administrativo de BCS Gutierrez.
  - Personal Operativo BCS Gutierrez (1 operador minicargador, 2 Conductores Volqueta, 1 operador Papirita, 3 Ayudantes Generales Oficina, 1 Ayudantes Mamposteria, 3 Oficiales Mamposteria, ~~Mamposteros~~, 6 Oficiales Daniel, 5 Hidráulico, 3 Ayudantes Daniel, 6 Oficiales Bruno, 5 Ayudantes Bruno, 4 Ayudants Arrieta, Arrieta SAS: 4 Ayudantes, 3 Oficiales


Norma

Scanned by CamScanner

- 12 Ayudants Tangue - 1 Oficial Tangue.
- Operador Vibrocompactador
- Operador Retroexcavadora
- Metal BSAS: 4 personas Instalacion Cubierta (Teja)
- Datalec Ingenieros Electricos: 5 personas en Instalaciones eléctricas.
- Clima: Mañana:
- Equipos: Volquetas, Vibrocompactador, Retro excavadora, Pajarita, Minicargador
- Elementos de Seguridad Industrial: Casco, Botas, Guantes, Tapaoidos, Tapabocas, Chaleco, Uniforme.
- Actividades Ejecutadas.
- Bloque liso #5: modulo 1 y 3 Primer y Segundo Piso.
- Repellos en 1er y 2do Piso modulo 1 Patrulleros, 1er Piso modulo 3 Sub Oficiales.
- Instalaciones Hidrosanitarias en 1er y 2do Piso modulo 1 Patrulleros
- Instalaciones electricas 1er Piso y 2do en bloque 1 Patrulleros
- Instalacion Cubiertas bloque 3 Sub Oficiales.
- Nivelacion area Tangue RCI.

Intervventoria

→ SE REALIZA RECORRIDO EN OBRA Y SE HACEN AJUSTES A DETALLES BLOQUE #5 1er PISO CON RELACION, PERSONAL HACE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS, SE ADJUNTA FOTOS DE TRABAJOS

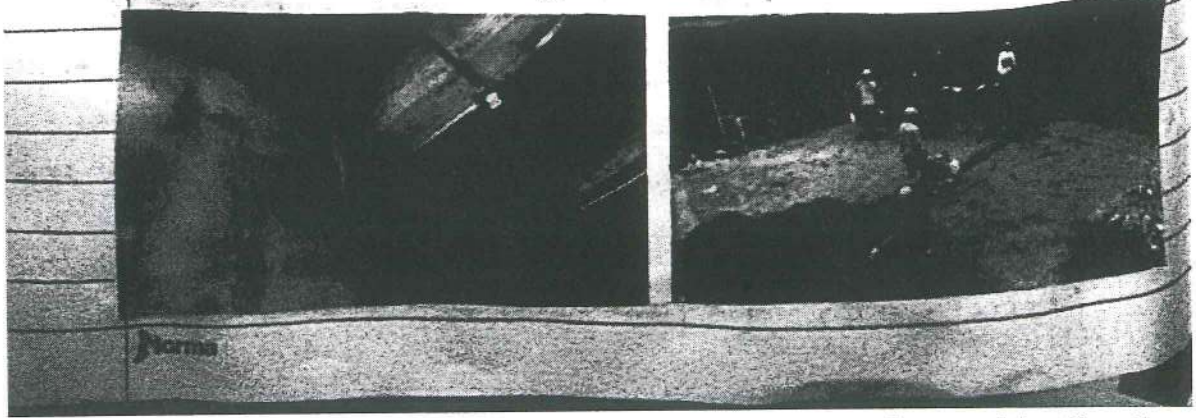

Scanned by CamScanner

EN REDES ELECTRICAS Y TANQUE RCI.
LAS REDES PERIMETRALES A LA ZONA DE TANQUE SE VAN A REOBICAR PARA LA CUAL SE HARA UN INVENTARIO Y SE SOLICITARA PARA PROXIMA SEMANA QUE NO SE USEN LOS BAÑOS QUE DESCARGAN A LAS CAJAS Y REDES EXISTENTE SE CANALIZA PROVISIONALMENTE PARÁ AVANZAR EN LOS TRABAJOS DE RELLENO EN TANQUE RCI. AHC

VIERNES 01 FEBRERO / 2019

SE APUNTA POR PARTE DEL CONTRATISTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRAS EN EJECUCION. AHC



Scanned by CamScanner

SE AVANZA EN PAÑETES INTERNOS Y EXTERNOS
SE PASAN NIVELES Y SE INICIA ALISTADO
DE PISOS.
- SE REALIZA RECORRIDO EN OBRA CON EL
SUPERVISOR MAYOR LOPEZ.
- SE TRABAJA EN LA NIVELACION DE TANQUE
RCI CON MATERIAL BASE, LA INTERVENTO-
RIA TOMA MUESTRAS.
- SE INSTALA MORTERO IMPERMEABILIZADO
EN MUROS Y PISO
- LLEGA LECHADOSA PARA PISOS.
- SE ESPERA EL AVAL POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA PARA FUNDIR SOCADO DE
TANQUE RCF.

- Observaciones del día 20 de febrero de 2019.
  - Se hace la observación de ejecutar adecuadamente repellos en cuarterías en columnas
  - Durante el recorrido con la Ing Maria Teresa se observa ~~inestable~~ detalles por subsanar por parte del subcontratista tales como:
    - Realizar dilataciones en muros tanto horizontales ~~como verticales~~
    - Rematar repello en muros vistos superiores justo a viga de empuje y pulir aristas del mismo
    - limpieza de cuartos de empuje
    - Adecuar ranuras en muros tanto realizadas para instalaciones eléctricas e hidráulicas
    - Realizar limpieza interna en cuarto de llaves de paso
    - El retiro de distanciadores que se observa en cuartos de empuje

En general los repellos se ven mal rematados, y se hace claridad al subcontratista, que ningun cuarto empuje es dado de trabajo debe ser con calidad. Los repellos se deben realizar en su área completa, que se proceda a ejecutarse después de realizados los columnetes y vigas y no después. los repellos después de fundidos.
Subsanar recordar de columnetes.

Norma

Scanned by CamScanner

- Se realizaron perforaciones en la losa ya el subcontratista dice no sabe el porque. Todo lo anterior en bloque ejes
- Nuevamente se le recuerda al subcontratista la importancia del lleno de los ejes de columnas en bloque pantallas
- Para zapatas exteriores realizar los rellenos en los siguientes días y vigas de estructura para ejecutar debidamente la actividad de zapata y así evitar posibles fisuras en concreto.
- En bloque de pantallas tener en cuenta la instalación de grapas en muros como también dilatar en la parte superior del muro
- Corregir columnas entre ejes 11-12 bloque de pantallas
- En losa de cubierta retirar alguna carga del ejecutor ubicada impermeabilizada y corregir el acabado del mismo en las áreas ya ejecutadas, en bloque de pantallas
- Fundiciones medianeras de columnas con fisuras horizontales en bloque de ejes 1 y 2D, como también corregir almacenamiento en relación al mismo.
- Se observa nuevamente nivel de zapata en bloque de ejes 1 y 2 en termino contra. Esta intervención ha sido reiterativa en esta observación.
- Nuevamente el subcontratista puede entrar sin realizar labores diarias.

Ing Sud J Cruz P
Interventoría

-Personal en Obra - Mayor Angel Lopez Ostos.
. Personal Administrativo Consorcio BCS Gutierrez.
. Personal Operativo Consorcio BCS Gutierrez (1 Operador Retroexcavadora, 1 Operador Vibrocompactador, 1 Operador Minicargador, 2 Conductores Volqueta, 3 Ayudantes Generales Oficina 11 Ayudantes Sub Carlos, 3 Oficiales Carlos, 6 Oficiales Daniel, 3 Ayudantes Daniel, 5 Hidraulicos, 5 Ayudantes Bruno, 6 Oficiales Bruno)
. Arrieta SAS: 4 Ayudantes, 3 Oficiales
. 12 Ayudantes tanque, 1 Oficial tanque.

Norma

Scanned by CamScanner


ATENCION AL SUBCONTRATISTA PORQUE EL ARREGLO PARCIAL, SE DA LA INSTRUCCION AL PERSONAL PARA REALIZAR DE FORMA INMEDIATA LOS ARREGLOS A DETALLES PENDIENTES Y SE LES SOLICITA APLICAR LAS MISMAS RECOMENDACIONES PARA EL RESTO DE OBRA.

LOS NIVELES DEL ALISTADO FUERON PASADOS POR CONTRATISTA CON SU COMISION DE TOPOGRAFIA, LA INTERVENTORIA PUEDE REALIZAR LAS VERIFICACIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS. MHC.


VIERNES. 22 FEBRERO / 2019.

EL CONTRATISTA DE OBRA: ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA TOMA DE DENSIDADES EN LA ZONA DE RELLENO CON BASE. EN TANQUE RCI.



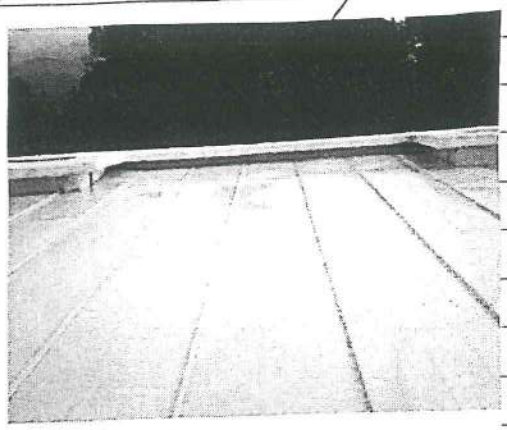

LOS RESULTADOS SUPERAN EL 95% ESPERADO.

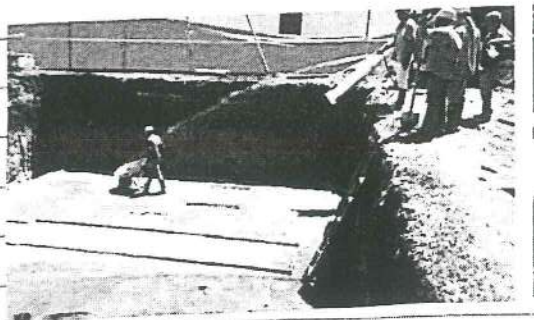



SE REALIZA LA FUNDICION DEL SOLADO CON AUTORIZACION DE INTERVENTORIA LUEGO DEL CHEQUEO DE LOCALIZACION Y NIVEL. SE MARCAN ZONAS PARA CARGAMOS Y FOO EYECTOR. MHC.

Norma

Scanned by CamScanner

Observaciones día 21 de Febrero de 2019

- Se evidencia la ejecución de apiqueo exterior sin atender la recomendación dada por esta interventoría de ejecutar los pilotes en la junta entre muro y viga sobre la fachada hacia el exterior.
- Se recomienda al constructor proteger el polivatmo de las lluvias.
- Se hace evidencia la corrección de los detalles vistos el día 20 de febrero en el libro de oficio para el inicio de pase de vibración.
- En conversa con ingeniero Mayor Lopez, con evidencia de resultados de resistencia del concreto ejecutado para los columnetas eje 4 del libro de oficios, cuyos resultados a los 7 días arrojaron un 41% de cumplimiento con 1228 PSI con una proyección a 28 días de 1754 PSI. El concreto que se vacío para columnetas es de 3.000 PSI. Por tanto en comité se decide la demolición de 4 columnetas ubicadas en dicho eje

Ing Saul J Cano
Interventor

- Personal en Obra: - Mayor Angel Lopez Ostos.
- Personal Administrativo Consorcio BCS Gutierrez
- Personal Operativo Consorcio BCS Gutierrez (1 Operador Vibro Compactador, 1 Operador Retroexcavadora, 1 Operador Minicargador, 2 Conductores Volqueta, 3 Ayudantes Generales Oficina, 11 Ayudantes Carbs, 3 Oficiales Carlos, 6 Oficiales Daniel, 3 Ayudantes Daniel, 5 Hidraulicos, 5 Ayudantes Bruno, 6 Oficiales Bruno, 12 Ayudantes Tanque, RCI y Oficial Tanque RCI)
- Arrieta SAS: 4 ayudantes, 3 Oficiales
- Metal B SAS: 4 personas en Instalación Cubierta
- Datalec Ing. Eléctrica: 5 Personas en Instalaciones Electricas.
- Personal Administrativo ~~Oficina~~ Interventoría.
- Clima: Mañana:

Norma

Scanned by CamScanner

- Equipos: Volquetas, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Pajarita, Minicargador,
- Elementos de Seguridad Industrial: Casco, Botas, Guantes, tapaoidos, tapabocas, Chaleco, Uniforme.
- Actividades Ejecutadas:
• Bloque liso # 5: 1er y Segundo Piso modulo 1 Sub Oficiales, 2do Piso modulo 3 Sub Oficiales.
- Repellos en 1er y 2do Piso modulo 1 Patrulleros y 1er Piso módulo 3 Sub Oficiales.
• Fundicion de Solado Limpieza tanque RCI
- Instalacion teja de Cubierta modulo 3 Sub Oficiales.
- Instalaciones electricas e hidrosanitarias.
• Mortero de alistado de piso 1er Piso bloque 3 Sub Oficiales.
• Columnetas y vigas Confinamiento en 1er Piso y 2do modulo 1 Patrulleros.
- Observaciones.
Se realiza Comite con el Mayor el dia de Ayer y se ~~definen~~ decide revisar detalle de ventaneria de Casino, color de la bocapuerta y huella de las gradas en Grano color Chocolate, retomar detalle de fachadas y cubierta areas libres, apoyo de la escalera metalica igual a los edificios de Oficinas, todas estas Observasiones consignadas en el Acta realizada.
- Visita en Horas de la tarde del Coronel Marco Jair Ospina Jefe Oficina Infraestructura en Bogota y el Teniente Diego Gonzales personal de esta Oficina.



Interventoría.


→ EL CONTRATISTA CONFIRMA QUE LOS AJUSTES A LA OBRAS EN EJECUCION SE HAN ATENDIDO Y REALIZADO DE FORMA PREVIA A LA EJECUCION DE LA SIGUIENTE ACTI-

forma

Scanned by CamScanner

VIDAD.
EL PAÑETE EN MUROS EXTERIORES CASINO SE REALIZA EL LLENO DE LAS ZONAS DE DILATACION ENTRE ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA DE FORMA PREVIA A LA EJECUCION DEL PAÑETE. COMO SE PUDO OBSERVAR EN SITIO Y EN EL REGISTRO FOTOGRAFICO ADJUNTO.
EL POLIURETANO QUE SE ESTA INSTALANDO ESTA PROTEGIDO PREVIO A SU INSTALACION COMO SE OBSERVA EN FOTOS ADJUNTAS.

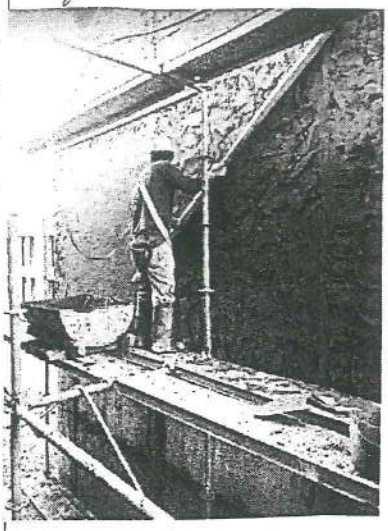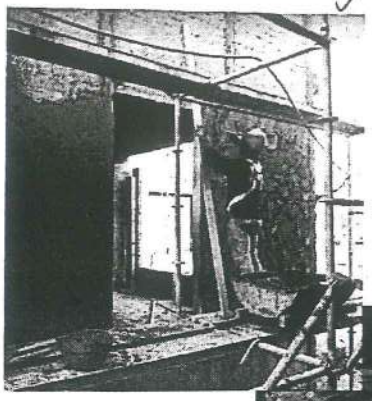

- Observaciones día 22 de Febrero de 2019
- Nuevamente se informa al constructor (y fiscal) contista el armado de hierro de las columnetas y de cintas según diseño estructural en bloque de pabellones
- Se observa despiece de columnetas en relación a muro por cargar en bloque de oficinas, además, se advierte segundo piso sin ejecutar aún.
Como también muros sin el debido motivo de pega.

Ing Sandra Cuevas
Interventora.

→ DEBIDO AL POCO ANCHO DE MOCHETAS LAS COLUMNETAS LEO GENERALMENTE DE GIRO QUE YA SE ESTA CORRIGIENDO.

Norma

Scanned by CamScanner

Sabado 23 de Febrero 2019

- Observaciones:
  - Se observó muro suelto [illegible] eje 6 y 7 en bloque 1 de pretiles.
  - Nuevamente se solicita realizar adecuadamente las pruebas de los trabajos electricos.
  - Se recomienda al contratista corregir muro antes de fundir columneta en bloque 1 oficinas.

Ing Sandra Gomez
Interventoria.

- Personal en Obra:
- Personal administrativo Interventoría
- Personal Administrativo BCS Gutierrez
- Personal Operativo BCS Gutierrez. (1 Operator Vibro Compactador, 1 Operador minicargador, 1 Operador Pajarita, 2 Conductores de volqueta, 9 Ayudantes Carlos, 3 Oficiales Carlos, 4 Hidraulicos, 6 Oficiales Daniel, 4 Ayudantes Daniel, 6 Oficiales Bruno, 6 Ayudantes Bruno, 12 Ayudantes tanque 1 Oficial tanquero,
- Arrieta SAS: 4 Ayudantes, 3 Oficiales
- Metal B SAS: 4 personas en Instalación Cubierta
- Datalec Ing. Elec: 4 personas en Instalaciones elec.
- Clima: Mañana: Soleado Tarde: +
- Equipos: Volquetas, Retroexcavadora, minicargador, Pajarita, Vibrocompactador,
- Elementos de Seguridad: Casco, botas, Guantes, Chaleco, Uniforme, Tapabocas, Tapaoidos, Gafas.
- Actividades ejecutadas.
  - Repello en 1er Piso bloque 3 y 1er y 2do piso bloque 1
  - Bloque Liso #5 en 1er y 2do Piso detalles en bloque 1 y 2do Piso modulo 3.
  - Columnetas y Vigas de Confinamiento en bloque 1 (1er y 2do Piso)
  - Instalaciones electricas e hidrosanitarias en bloque 1 y 3.


Norma
Scanned by CamScanner


- Redes Hidrosanitarias en areas de Circulacion y Urbanismo.
- Repellos Fachadas.
- Rellenos areas comunes.

→ EL CONTRATISTA ATIENDE LAS SOLICITUDES DE LA INTERVENTORIA.

SE REALIZA LA VERIFICACION DE MURO, RESANES y SE REALIZAN AJUSTES SI SON NECESARIOS PREVIOS A LA FUNDICION.


SE TRABAJA EN ARMADO DE ACERO PARA LOSA TANQUE y SE ARMAN y FUNDEN DINTELES. HAG.

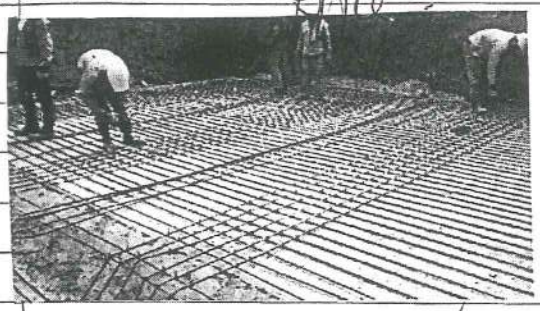

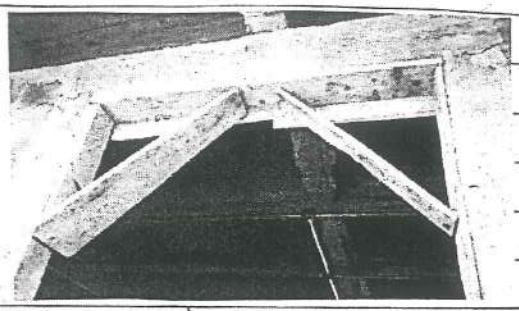

DONFINDO 24 de Febrero /2019.

DURANTE LA NOCHE y MADRUGADA DE HOY SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS, LAS CUALES GENERAN QUE SE LLENE EL TANQUE RCI, PARA SU EVACUACION SE DISPONEN MOTOBOMBAS ADICIONALES A LAS QUE MANTIENEN DE FORMA PERMANENTE INSTALADAS y SE RECUPERA LA ZONA. HAG.









EN BLOQUES DE ALOJAMIENTO TRABAJAN LOS SUBCONTRATISTA EN MAMPOSTERIA y PAÑETES HAG.

Norma

Scanned by CamScanner

Lunes 25 Febrero 2019.






- Personal en Obra: Ing. Victor y Jose Vicente Bocanegra.
- Personal Administrativo BCS Gutierrez.
- Personal Operativo BCS Gutierrez. (2 Conductores Volquetas, 1 Operador Vibro, 1 Operador Pajarita, 1 Operador Minicargador, 3 Ayudantes Generales Oficina, 10 ~~Oficiales~~ Ayudantes Carlos, 3 Oficiales Carlos, 5 Hidraulicos, 5 Oficiales Daniel, 3 Ayudantes Daniel, 11 Ayudantes tanque RCI, 1 Oficial RCI, Ayudantes Bruno, Oficiales Bruno)
- Arrieta SAS: Ayudantes, Oficiales.
- Metal B SAS: 3 Personas Instalación Cubierta.
- Datalec. Ing. Elec: 4 Personas Instalaciones Elec.
- Personal Administrativo Interventoría DAIMCO SAS.

- Clima: Mañana: ~~Nublado~~ Soleado Tarde: 1 hora lluvia.
- Equipos: Volquetas, Retroexcavadora, Pajarita, Minicargador,
- Elementos de Seguridad Industrial: Casco, Botas, Guantes, tapaoidos, tapabocas, Chaleco, Uniforme, Gafas
- Actividades Ejecutadas:
  - Repello 1er y 2do Piso modulo 1 Patrulleros.
  - Vigas y Columnetas de confinamiento en 1er y 2do Piso modulo 1 Patrulleros.
  - Mamposteria en 2do Piso de modulo 3 Sub Oficiales.
  - Instalaciones electricas e hidrosanitarias Generales
  - Redes Hidrosanitarias en areas de Circulacion y Urbanismo.
- Observaciones:
  - Se observa 6 columnetas por corregir ejes 8 y 9 del 16 de Patrulleros, se solicita al contratista realizar su respectiva reparacion.
  - Se solicita al contratista que aún no se ha realizado la correccion del mismo eje K y 12 del 16 de Patrulleros.
  - Se observa y se solicita al contratista nuevamente realizar las ratificaciones en la parte superior de las mismas en 16 de Patrulleros.

Ing. Sandra Milena Forma
Fiscalizadora

Scanned by CamScanner

EL CONTRATISTA ACATA LAS SOLICITUDES DE LA INTERVENTORIA, REALIZARA LAS VERIFICACIONES NECESARIAS Y ENTREGARA LA OBRA SEGUN ESPECIFICACIONES. LLEGA A LA OBRA LAS ESCALERAS PARA SER INSTALADAS Y LAS BOMBAS TANQUE.
SE AVANZA EN RETIRO DERRUMBE DEL TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA ESTA ACOPIADO EN OBRA MATERIAL COMO BALDOSA, BLOQUE, CERAMICA, DEGANTE CEMENTO, MORTERO, etc.

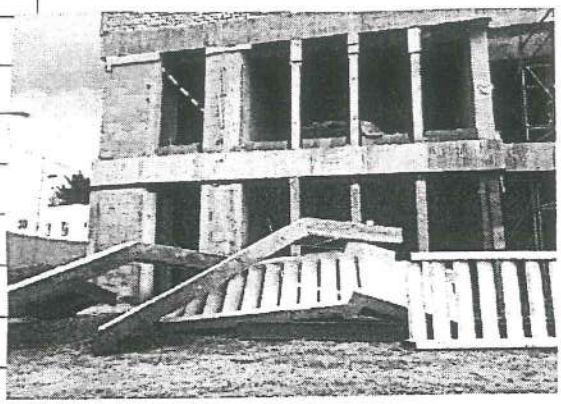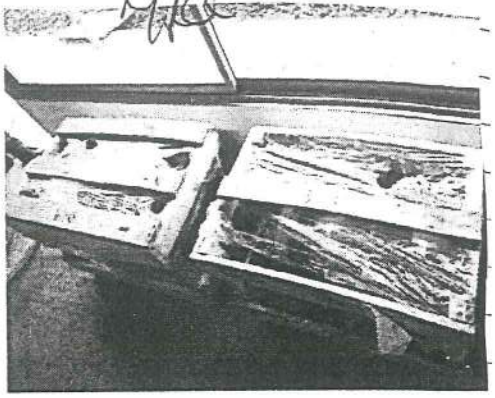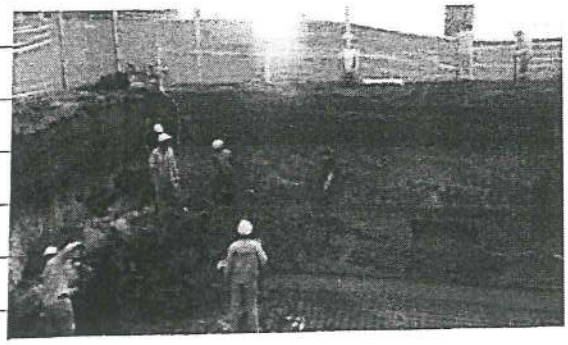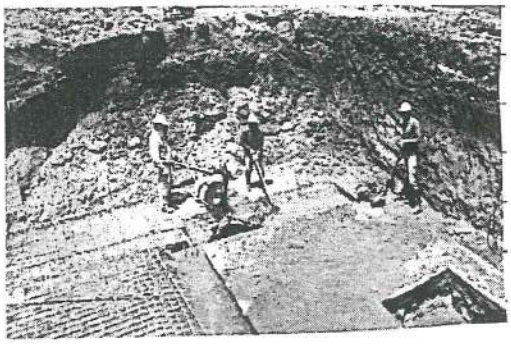

Norma

Scanned by CamScanner

Martes 27 de Febrero 2019

- Personal en Obra:
  - Personal Administrativo BCS Gutierrez
  - Personal Operativo BCS Gutierrez (2 Conductores Volqueta, 1 Operador minicargador, 1 operador Pajarita, 3 Ayudantes Generales Oficina, Ayudantes Carlos, Oficiales Carlos, Ayudantes Daniel, Oficiales Daniel, Hidraulicos, Ayudantes Tanque RCI, 1 Oficial tanque RCI, Ayudantes Bruno, Oficiales Bruno)
  - Arrieta SAS: Oficiales, Ayudantes.
  - Metal B SAS: Personal Instalacion Teja para Cubierta.
  - Datalec Ingenieria Elec: Personas en Instalaciones Electricas.
  - Personal Administrativo Interventoría DAIMCO SAS.
- Clima: Mañana: Soleado Tarde
- Equipos: Volquetas, Minicargador, Pajarita,
- Elementos de Seguridad Industrial: Casco, Botas, Guantes, Tapaoidos, Tapabocas, Chaleco, Uniforme.
- Actividades Ejecutadas:
  - Hierro para tanque de la Red Contra Incendios.
  - Repellos 1er y 2do Piso modulo 1 Patrulleros.
  - Mamposteria 2do Piso modulo 3 Sub Oficiales.
  - Instalaciones Electricas e Hidrosanitarias general.
  - ~~Se envia OFI~~ • Relleno en areas Perimetrales bloques 1, 2 y 3.
  - Columnetas y Cinta de confinamientos bloques 1 y 3.

Observaciones:

Se inician trabajos para reubicar redes Sanitarias sobre el area del tanque RCI; se socilita autorizacion para 3 dias de suspencion de Servicio en alojamientos ubicados al costado.

Interventoría Norma

Scanned by CamScanner


Miercoles 28 de Febrero 2019


-Personal en Obra:

- Personal Administrativo BCS Gutierrez
- Personal Operativo BCS Gutierrez (2 Conductores Volqueta, 1 Operador Minicargador, 1 Operador Pajarita, 3 Ayudantes Generales Oficina, Ayudantes Carlos, Oficiales Carlos, Ayudantes Daniel, Oficiales Daniel, Hidraulicos, Ayudantes tanque RCI, 1 Oficial Tanque RCI, Ayudantes Bruno, Oficiales Bruno)
- Arrieta SAS: Ayudantes, Oficiales.
- Datalec Ing. Electrica: Instalaciones electricas.
- Metal B SAS: Personas Instalacion teja Cubierta
- Personal Administrativo Interventoria DAIMCO SAS

- Clima: Mañana:
- Equipos: Volquetas, Pajarita, Minicargador.
- Elementos de Seguridad Industrial: Casco, Botas, Guantes.

→ EL CONTRATISTA ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS OBRAS EN EJECUCION: TANQUE RCI Y REDES NUEVAS ALCANTARILLADO VIEJO.

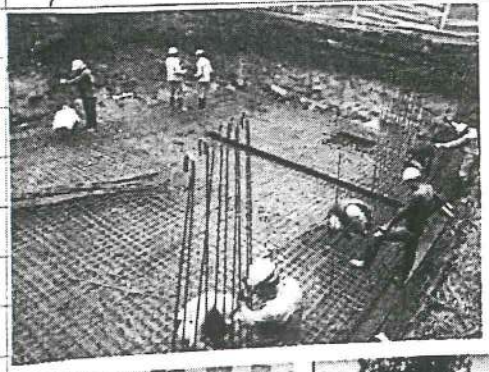

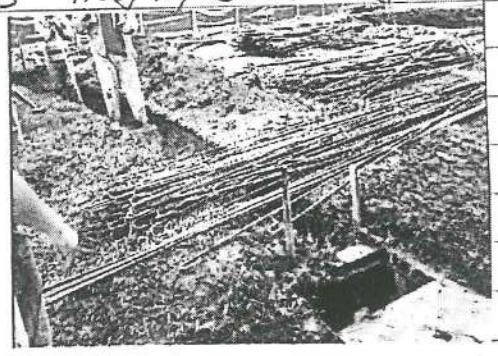













Norma

Scanned by CamScanner

- EL CONTRATISTA ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION.
- SE MANTIENE EN USO PERMANENTE LAS MOTOBOMBAS PARA EXTRACCION AGUA EN EL TANQUE.
- SE EVACUAN MATERIALES ESTANCADOS EN LAS REDES VIEJAS DEL ALOJAMIENTO VIEJO.
- SE AVANZA EN RELLENOS OBRE TUBERIA EN EXCAVACIONES y RELLENOS JUNTO AL TANQUE.
- AVANZA EL ARMADO ACERO TANQUE
- CONTINUAN PEGA MAMPOSTERIA. TOLETE EN CUCATA ORIENTE FACHADA BLOQUE #3.

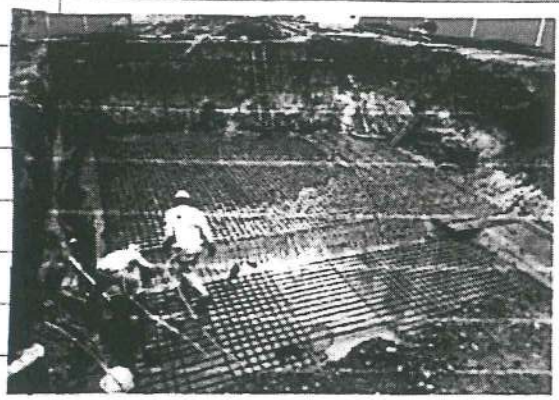

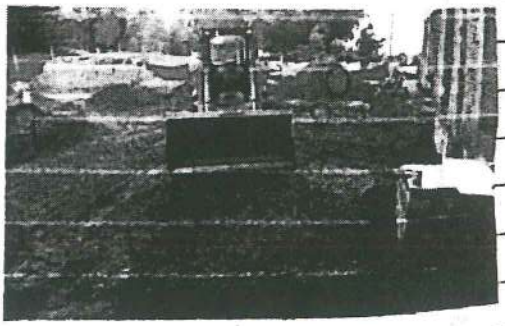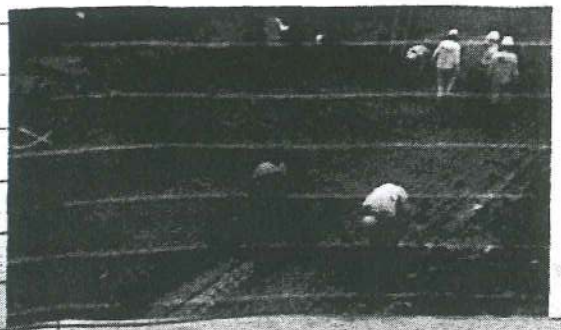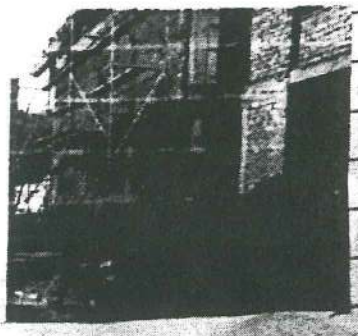

Norma

Scanned by CamScanner
