DAIMCO
NIT: 900021462 - 1

CPP-DIRAF-2018-132

Bogotá D.C. 10 de Abril de 2019.

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión Informe Mensual No 10.

Respetados Señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir el informe mensual No. 10 de Interventoría, comprendido entre el primero (01) de Marzo de 2019 al treinta y uno (31) de Marzo de 2019. La presente con el fin de informar a la entidad contratante el avance de ejecución del contrato.

Agradecemos de antemano su atención.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TÉCNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	312 Folios	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	Archivo – Contrato de interventoría	

Bogotá: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

POLICÍA NACIONAL

POLICIA NACIONAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN NO.4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.



DAIMCO

CONTRATO No. PN DIRAF NO. 06-3-10051-18

Informe Mensual No. **10**

INFORME DE INTERVENTORÍA
01 de marzo a 31 de marzo de 2019
VERSIÓN 0
VOLUMEN 1 DE 1
ORIGINAL

INFORME MENSUAL No 10 DE INTERVENTORIA

PROYECTO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN NO.4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

CONTRATO DE CONSULTORÍA PN DIRAF NO. 06-3-10051-18

TÍTULO:

INFORME MENSUAL No 10

01 DE MARZO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Realizo: TIRSO COSME. Director de Interventoría

_____

Aprobó: Ing. José Vicente Bocanegra – Gerente Técnico de Interventoría

_____

Tabla de contenido

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

INDICE DE MODIFICACIONES

ESTADO DE REVISIÓ Y APROBACIÓN

1.INTRODUCCIÓN **6**

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6

2.ESTADO Y AVANCE DEL PROYECTO **13**

2.1 AVANCE DOCUMENTAL 13

2.2AVANCE DE ACUERDO A LA PORGRAMACIÓN 14

2.3CRONOGRAMA DE OBRA 15

3.ESTADO DEL CONTRATO **16**

3.1 ÁMBITO FINANCIERO 16

3.2 ÁMBITO PRESUPUESTAL 16

3.3 ANTICIPO 17

3.3.1 Informe Plan Anticipo 18

3.4 FACTURACIÓN MENSUAL 19

4.ACTAS PARCIALES DE OBRA **20**

5.ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORIA **21**

6.TRABAJOS EJECUTADOS **21**

6.1 DESCRIPCION GENERAL DE LAS TAREAS 21

6.2 MODIFICACIONES DEL PROYECTO 27

7.CUMPLIMIENTO PAGOS PARAFISCALES **27**

8.PERMANENCIA Y ESTADO DE LOS EQUIPOS **27**

8.1 CONTROL PERSONAL CONTRATISTA 27

8.2CONTROL PERSONAL INTERVENTORIA 27

8.3CONTROL DE EQUIPOS 27

9.ASPECTOS VARIOS **27**

9.1REGISTRO FOTOGRAFICO 27

9.2ESTADO DEL TIEMPO 27

9.3POLIZAS 27

10.CONCLUSIONES **31**

LISTA DE TABLAS

Tabla No. 1 Avance del proyecto 15

Tabla No. 2 Hitos 15

Tabla No. 3 Estado Financiero 16

Tabla No. 4 Avance Fisico 16

Tabla No. 5 Actas Parciales Contrato de Obra 20

Tabla No. 6 Actas Parciales Contrato de Interventoria 21

Tabla No. 7 Actas de Comité 21

Tabla No. 8 Equipos interventoria 22

Tabla No. 9 Polizas Contrato de Obra 31

Tabla No. 10 Polizas Contrato de Interventoría 31

RELACIÓN DE ANEXOS

INFORME EJECUTIVO No. 10

Anexo No.1. Informes semanales y diario

Anexo No.2. Relación de Correspondencia

Anexo No.3. Actas de comité del periodo

Anexo No.4. Plan de Anticipo

Anexo No.5. Seguridad Social

Anexo No.6. Control de personal del Contratista

Anexo No.7. Control de personal de la Interventoría

Anexo No 8 Informe SISOMA y Certificaciones escombreras

Anexo No.9. Control de Equipos-Ensayos

Anexo No.10. Registro fotográfico

Anexo No.11. Control de clima

Anexo No.12. Bitácora

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Las copias de este documento han sido entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREA O DEPENDENCIA		No. DE COPIAS
Copia No. 1	**Policía Nacional**	**1 (original)**
Copia No. 2	**Archivo Contrato de Interventoria No. PN DIRAF 06-3-10051-18**	**1**

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

ÍNDICE VERSIÓN	CAPÍTULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
0		-	Versión original

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

TITULO DOCUMENTO:		INFORME MENSUAL		
DOCUMENTO No:		No. 10		
NUMERO DE REVISIÓN		0	1	2
RESPONSABLE POR ELABORACIÓN "Director de Interventoría"	Nombre:	Ing. Tirso Cosme		
	Firma:			
	Fecha:	04-04-2019		
RESPONSABLE APROBACIÓN "Gerente Técnico de Interventoría"	Nombre:	Ing. José Vicente Bocanegra		
	Firma:			
	Fecha:	05-04-2019		
RESPONSABLE APROBACIÓN "Supervisora del contrato"	Nombre:	Mayor Ingeniero Civil Ángel Giovanni López Ostos		
	Firma:			
	Fecha:	08 -04-2019		

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe Mensual No 10, correspondiente al Periodo del 01 de MARZO del 2019 al 31 de MARZO de 2019, presentado en cumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en el Contrato de Interventoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18 y los adicionales o prorrogas que se generen suscrito entre **DAIMCO S.A.S** y **POLICIA NACIONAL – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Se presenta acorde al manual de Interventoría y exigencias de la Policía Nacional – Dirección administrativa y financiera, el Control realizado por nuestra empresa al Contratista CONSORCIO CBS-GUTIERREZ, encargado de la ejecución del Contrato de Obra No. PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Localización del Proyecto: Popayán, departamento de Cauca.



El municipio de Popayán limita por el norte con los municipios de Cajibio y Piendamó, por el sur con los municipios de Sotará y Puracé, por el oriente con el municipio de Totoró, Puracé y el Departamento del Huila, por el occidente con el municipio de El Tambo y Timbio, el proyecto se desarrollara en la Región No 4 DECAU MEPOY Comando Departamento de

Policía Cauca en el predio con dirección Carrera 17 No 1 – 75 – Popayán - Cauca con matricula inmobiliaria 120-13255 con un área aproximada de 16 Hectáreas con 8.040 metros

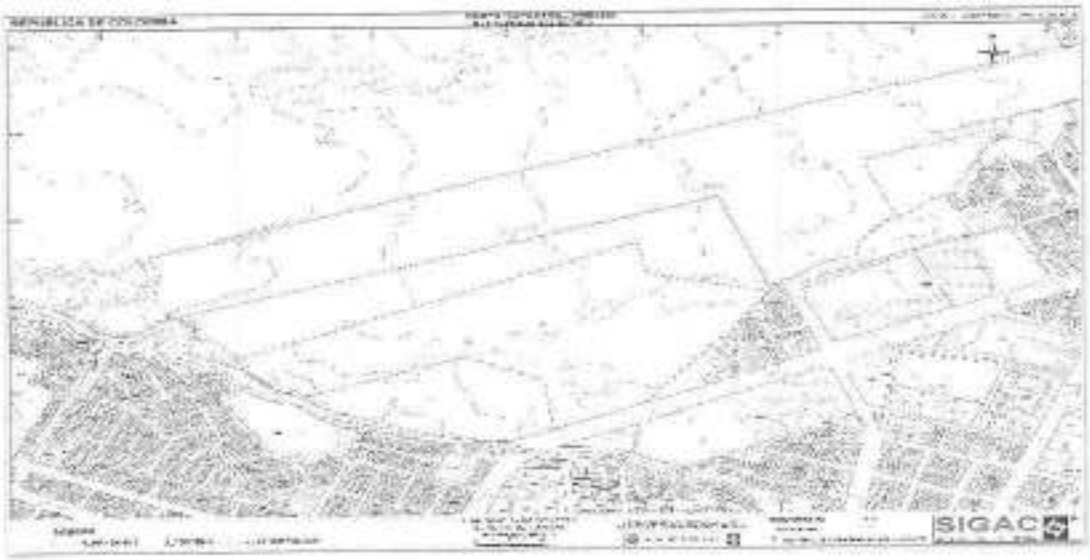


Ilustración 1. Localización general
Fuente. Equipo de Topografía

El proyecto se centra en la ejecución de las actividades para la **"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"**, de acuerdo a diseños de consultoría bajo el contrato No PN-DIRAF No 06-3-10041-15, el contrato de obra incluye la ejecución de actividades para el desarrollo de la Fase 4 – Edificio D de excavaciones, rellenos, estructura de concreto, mobiliario de oficinas, sistemas de detección de incendios, carpintería metálica y de madera, sistemas de ventilación mecánica y todas las adecuaciones urbanísticas eléctricas e hidráulicas internas y externas que permitan el correcto funcionamiento del edificio y el desarrollo de esta fase y de las fases futuras que comprenden el complejo de Policía del Cauca".

2. ESTADO Y AVANCE DEL PROYECTO

2.1 AVANCE DOCUMENTAL

Correspondencia Recibida

En el Anexo No. 2. Se relaciona y adjunta la correspondencia recibida del Contratista y de la Entidad contratante, durante el presente informe.

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento
PN-DIRAF-POPAYAN-148	Documentos corte # 08	1	N.A	04/03/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-149	Documentos corte # 08 adición 1	1	N.A	04/03/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-151	Respuesta a oficio CPP-DIRAF-2018-108	1	N.A	06/03/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-154	NP extracción y ventilación mecánica	1	N.A	13/03/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-156	Plan de inversión del anticipo	1	N.A	14/03/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-157	Orden de pago #21 y 22	1	N.A	19/03/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-159	Actividades bloqueados por situación de orden público y actividades en proceso constructivo	1	N.A.	18-03-2019 recibida 22/03/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-163	Afectación de obra por cierre de vías de acceso a la ciudad de Popayán, Cauca, Zona del Proyecto	1	N.A.	21/03/2019 recibida 22/03/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-164	Documentos corte #09	1	N.I.	29/03/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-165	Documentos corte #09 Adición 1	1	N.I.	29/03/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-166	Documentos corte #09 Adicion 2	1	N.I.	29/03/2019

Correspondencia Enviada

En el Anexo No. 2. Se relaciona y adjunta la correspondencia enviada al Contratista y a la Entidad contratante.

No.	Titulo del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento
CPP-DIRAF-2018-107	Observaciones tanque Red Contra Incendios	1	N.A	04/03/2019
CPP-DIRAF-2018-108	Observaciones calidad obra gris	1	N.A	06/03/2019
CPP-DIRAF-2018-109	Acta parcial de obra # 08	1	N.A	05/03/2019
CPP-DIRAF-2018-110	Remisión acta parcial de obra adición # 8A1	1	N.A	06/03/2019
CPP-DIRAF-2018-111	Remisión acta parcial de interventoría # 8	1	N.A	05/03/2019
CPP-DIRAF-2018-112	Remisión acta parcial de interventoría # 8"-adicion 1	1	N.A	05/03/2019
CPP-DIRAF-2018-113	Remisión informe mensual No 09	1	N.A	13/03/2019
CPP-DIRAF-2018-114	Respuesta al documento PN-DIRAF—OBRA-045, revisión items No 16.03.77 y 16.03.78 del 25 de febrero del 2019	1	N.A	15/03/2019
CPP-DIRAF-2018-115	Respuesta al documento PN-DIRAF-POPAYAN-154 NP ventilación mecánica del 13 de marzo de 2019 con radicado DAIMCO D-2019-0545	1	N.A	15/03/2019
CPP-DIRAF-2018-116	Observaciones ventilación mecánica	1	N.A	15/03/2019
CPP-DIRAF-2018-117	Remisión pólizas ajustadas a la adición No 2 y prorroga No 02 al Contrato de Interventoría No PN-DIRAF-06-3-10051-18	1	N.A	15/03/2019
CPP-DIRAF-2018-118	Respuesta al documento PN-DIRAF-POPAYAN-156 del 14 de marzo 2019 – Plan de inversión del anticipo	1	N.A	18 18/03/2019
CPP-DIRAF-2018-119	Remisión orden de pago No 21	1	N.A	21/03/2019 recibido 03/04/2019

CPP-DIRAF-2018-120	Remisión orden de pago No 22	1	N.A	21/03/2019 recibido 03/04/2019
CPP-DIRAF-2018-121	Remisión acta parcial de interventoría No 09	1	N.A	29/03/2019
CPP-DIRAF-2018-122	Remisión acta parcial de interventoría No 09 adición 01	1	N.A	29/03/2019
CPP-DIRAF-2018-123	Respuesta al documento PN-DIRAF-POPAYAN-0140 del 19 de MARZO de 2019-Solicitud cambio de plan de inversión del anticipo	1	N.A.	20/03/2019
CPP-DIRAF-2018-105	Remisión orden de pago #20	1	N.A	21/03/2019
CPP-DIRAF-2018-106	Respuesta al documento PN-DIRAF-POPAYAN-139 del 19 de MARZO de 2019-cambio residente #4	1	N.A.	25/03/2019

2.2 AVANCE DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN:

El día 14 de marzo de 2019, se oficializo y firmo el ADICIONAL #02 de obra, lo que de inmediato genera una nueva programación el contratista inicialmente presenta el flujo de inversión que de acuerdo a esta nueva adición también implica ampliación en plazo, la adición presupuestal para la construcción del gimnasio y áreas de urbanismo y paisajismo. Ente de trabajos, estos frentes son:

1. Edificio de Patrulleros en ejecución y activo
2. Edificio de oficiales en ejecución y activo
3. Casino en ejecución y baja actividad
4. Subestación y tanque de reserva, en ejecución
5. Tanque reserva de red contra incendios RCI, en ejecución.
6. Gimnasio
7. Áreas de urbanismo y paisajismo

El constructor viene avanzando en los diferentes frentes con mejores rendimientos en unos que en otros atribuible a items que en este mes se tenían programado iniciar como la colocación de pisos y el cielo falso.

Tabla 1. AVANCE DEL PROYECTO

INFORME	CORTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
No 10	DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2019.	44.3%	44.985%

En el mes de MARZO se vienen realizando actividades como la construcción del tanque de la red contra incendios RCI, Instalaciones eléctricas, últimos repellos de interiores, morteros de nivelación de piso, repello de fachadas, se está terminando con construcción de mampostería con bloque #5 en áreas de baños en edificios de patrulleros y oficiales, se inicia con la colocación de piso en primer piso de oficiales, igualmente se avanza en obra blanca con el estucado de muros en edifico de oficiales, y en la excavación para instalación de redes hacia el gimnasio, igualmente el contratista, comienza con la localización y descapote de terreno y fiejado de acero para el gimnasio.

Los informes diarios y semanales realizados en el periodo de 01 al 31 de MARZO de 2019 se encuentran en el **anexo No. 1** del presente informe.

2.3 CRONOGRAMA DE OBRA

De acuerdo con la reprogramación presentada por el constructor el inicio de algunos hitos a esta fecha debería haberse comenzado, esto puede representar la diferencia entre lo programado y ejecutado.

Tabla 2. HITOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA
01	ACTIVIDADES PRELIMINARES	07 /JUNIO / 2018
02	DESMONTES Y DEMOLICIONES	07 /JUNIO/ 2018
04	EXCAVACIONES Y RELLENOS	19/JULIO / 2018
04	CIMENTACIÓN	15/SEPTIEMBRE / 2018
05	PISOS - BASES	11/ MARZO / 2019
07	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	21 / SEPTIEMBRE / 2018

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA
07	TANQUE DE RESERVA	17 / SEPTIEMBRE / 2018
10	ESTRUCTURA METALICA	14 /MARZO / 2019
10	MAMPOSTERÍA	30/ NOVIEMBRE / 2018
10	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	30/ NOVIEMBRE /2018
11	PAÑETES	27 / MARZO/ 2018
12	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS	04 / OCTUBRE / 2018
13	INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEMATICAS Y AUTOMATIZACIÓN	15 / ENRO / 2019
14	PISOS - ACABADOS	23/ MARZO / 2018
15	CARPINTERÍA MADERA	7/ MARZO / 2019
16	CARPINTERÍA METÁLICA	20 /MARZO / 2019
17	PINTURA	11 / MARZO / 2019
18	CUBIERTAS	21 / ENRERO / 2019
19	CIELOS RASOS	29 / MARZO / 2019
22	MUEBLES FIJOS	29 / MARZO / 2019
23	ENCHAPES, ESPEJOS, MESONES Y DIVISIONES	29 / MARZO / 2019

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA
24	APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS	14/ MARZO / 2019
26	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA	31 / MARZO / 2019
27	MOBILIARIO DE OFICINAS	8/ ABRIL / 2019
31	DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS	8/ ABRIL / 2019
30	ASEO DE OBRA	18/ ABRIL / 2019

3. ESTADO DEL CONTRATO

3.1 ÁMBITO FINANCIERO

A la fecha de corte del presente informe mensual No 10 (01 de MARZO de 2019 al 31 de MARZO de 2019), se tiene que el avance financiero es el siguiente:

Tabla 3. ESTADO FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	$ 9.250.463.250,10
ADICION 01	$ 433.346.050.00
ADICION 02	$3.000.721.946.00
VALOR ACTUALIZADO	$12,684,531,246.31
VALOR PROGRAMADO	$5,623,324,361.69
VALOR EJECUTADO	$ 5.706.332.003.42

3.2 ÁMBITO PRESUPUESTAL


A la fecha de corte del presente informe mensual No 10 (01 de MARZO de 2019 al 31 de MARZO de 2019), se tiene que el avance físico es el siguiente:

Tabla 4. AVANCE FISICO

PORCENTAJE PROGRAMADO	**44.3 %**
PORCENTAJE EJECUTADO	**44-98 %**

En la gráfica apreciamos una curva descendente en la programación, que corresponde al adicional en tiempo que se le aprobó al contratista, por tal motivo Se presenta la Gráfica de Control Avance de obra (Programado Vs Ejecutado). se mantiene una pequeña diferencia

para lo que se le ha solicitado al constructor ejecutar un plan de contingencia que permita reducir la diferencia entre el porcentaje de programación y ejecución.

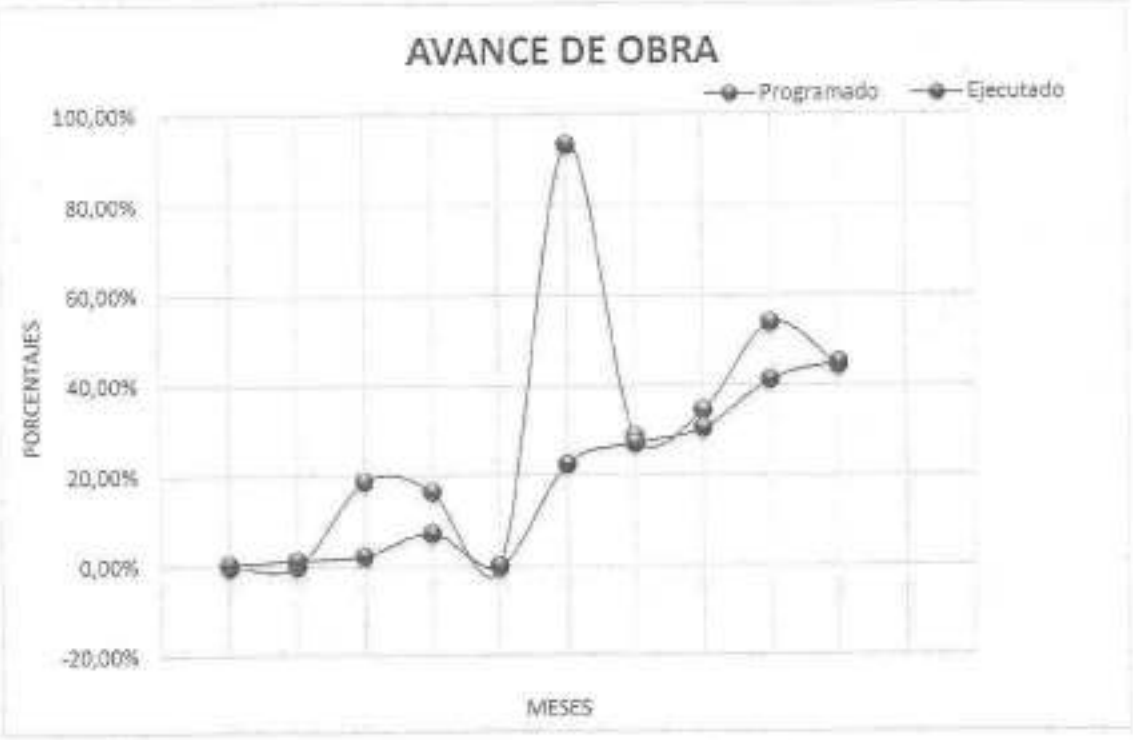

3.3 ANTICIPO

De acuerdo con Prorroga No 02 y Modificatorios # 1,2,3,4 y 5 generados, se aprobo al contratista una ampliación al Anticipo por un porcentaje total del 50% del contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, esto de acuerdo con las solicitudes presentadas por el contratista a esta interventoría.



3.3.1 Plan De Inversión Del Anticipo Aprobado:

A continuación, se presenta el plan de Inversión del Anticipo aprobado a la fecha para el contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18.



3.4 FACTURACIÓN MENSUAL

CONTRATO DE OBRA

La Policía Nacional-Dirección Administrativa y Financiera cancelará el valor del contrato en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma:

UN ANTICIPO:

Disponible para el contratista desde el mes de diciembre de 2018, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato principal, lo anterior teniendo en cuenta la solicitud que realizo el contratista toda vez que contractualmente la entidad habia quedado de otorgarle el 20% de anticipo 30 días después que se legalizara el contrato y en esto no fue posible cumplirle al contratista, por tal motivo la entidad, aprobó el incremento del porcentaje.

NOTA 1: El contratista deberá constituir un contrato de fiducia con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera de Colombia, para el manejo de los recursos provenientes del anticipo en los términos establecidos en los

artículos 2.2.1.1.2.4.1 y 2.2.1.2.3.3.1 del Decreto 1102 de 2015, así mismo presentará a la interventoría la programación de inversión del anticipo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la aprobación de la garantía única, el cual debe estar aprobado por la interventoría y el supervisor de la interventoría, garantizando control permanente sobre el mismo.

NOTA 2: En los términos y condiciones del contrato de fiducia deberá quedar como obligación:

a) La entrega de un informe mensual por parte de la fiducia, donde se evidencien los pagos efectuados y los rendimientos mensuales a consignar en la cuenta que indique la entidad contratante.

b) Los desembolsos solicitados por el contratista de obra tomando como base el plan de manejo del anticipo, deberán ser autorizados por el representante legal de la interventoría.

El pago del anticipo se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la aprobación de la garantía única, una vez aprobados los documentos presentados y requerido 'por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y a la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

PAGOS PARCIALES:

Se realizarán. pagos parciales de acuerdo al porcentaje de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez, la Interventoría y Contratista hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias y que la Interventoría haya certificado la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinticinco (25) de cada mes.

Nota 1: En cada acta de corte parcial se amortizará proporcionalmente, el valor entregado al, contratista en calidad de anticipo, hasta amortizar el 100% de su valor.

Cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación.

Previo a la presentación de las actas parciales y a su ejecución, deberá estar aprobado por la DIRAF el balance de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos si los hay. Consolidado por el contratista de obra con los soportes documentales (y fotográficos de ser necesario), proyectado y avalado por la interventoría. igual condición para el acta final, si hay modificaciones al balance aprobado.

Para cada una de las actas parciales, el pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles, una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del plan anual de caja (PAC), así:

- Acta de recibo parcial. (suscrita entre los contratistas de obra e interventoría) Factura de venta
- Balance de cantidades ejecutadas.
- Certificación de pagos parafiscales y seguridad social.
- Certificación pagos FIC
- Memoria de cantidades ejecutadas.

Y los demás documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera,

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o. si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección Administrativa y Financiera, programará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

JUSTIFICACIÓN DEL PAGO DE ANTICIPO:

En el presente proceso de contratación el Grupo de Seguimiento a Proyectos del Área de Infraestructura de la Dirección Administrativa y Financiera justifica el pago de anticipo al futuro contratista, con el fin de que el proyecto constructivo tenga la financiación suficiente y el constructor tenga la posibilidad de adquirir los insumos y bienes a los precios establecidos en el presente contrato.

Es de anotar que el giro de los recursos a una fiducia independiente genera el respaldo del manejo de los dineros evitándose la desviación de los mismos, toda vez que los desembolsos deberán ser autorizados por la interventoría.

Es importante aclarar que el anticipo deberá estar amparado por la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, acorde al Decreto 1102 de 2015 'por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional" en su Artículo 2.2.1.1.2.4.1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La Policía Nacional-Dirección Administrativa y Financiera cancelará el valor del contrato en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma:

PAGOS PARCIALES:

Se realizarán pagos parciales hasta completar el 95% del valor del contrato, sujetas al porcentaje de avance del contrato de obra que corresponderá al valor ejecutado en el respectivo periodo, las que se tramitarán una vez el supervisor e Interventor hayan suscrito el acta parcial correspondiente y se certifique la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, de igual manera el supervisor de la interventoría deberá certificar el cumplimiento de las funciones y obligaciones contractuales; las actas deberán presentarse a más tardar el día veinticinco (25) de cada mes.

Para cada uno de los pagos parciales, se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a, turno y la disponibilidad del plan anual de caja (PAC), así:

- Factura de venta
- Certificación de pagos parafiscales y seguridad social

Y los demás documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección Administrativa y Financiera, programará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

ACTA DE RECIBO FINAL

Su valor será del cinco por ciento 5% del valor total del contrato, una vez se certifique por parte del supervisor del contrato de interventoría el recibo a satisfacción del cien (100%) del valor del contrato. Se presentará una vez la interventoría certifique el recibo a satisfacción del cien por ciento (100%) del contrato de obra y se haya recibido a satisfacción el cien por ciento (100%) del valor del contrato de interventoría en el cual se certifique el seguimiento y control adelantado por la interventoría al contrato de obra.

El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de las facturas del acta respectiva, junto con el recibo a satisfacción suscrito por la interventoría del contrato, con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo con el derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección Administrativa y Financiera, programará el

valor a, cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Nota: Es claro que el valor del contrato de interventoria y su pago, se realizará bajo objetivo ejecutado en el contrato de obra y no por la permanencia de los profesionales o el mayor tiempo de ejecución del contrato de obra en el desarrollo de los items con su valor contractual, por tal motivo la única forma de realizar una adición presupuestal al contrato de interventoría, 1 será siempre y cuando se realice alguna adición presupuestal al contrato de obra, el cual justifique la necesidad de tener mayor tiempo en su ejecución, para la realización de las actividades contempladas en la adición.

4. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha presentado cuatro actas parciales para aprobación de la interventoria:

Tabla 5. ACTAS PARCIALES CONTRATO DE OBRA No. 07-6-10044-18

No. Acta	Periodo	Valor Total del Acta	AMORTIZACIÓN
1	7 de junio hasta 7 de julio de 2018	$ 88.945.135.99	17.789.027,20
2	08 de Julio hasta 07 de agosto de 2018	$ 99.764.316,74	19.952.863,35
3	08 de agosto hasta 07 de septiembre de 2018	$ 271.551.766,01	54.310.353,20
4	08 de septiembre hasta 07 de octubre de 2018	$385.060.488,89	77.012.097,78
5	08 de octubre hasta 07 de noviembre de 2018	$614.366.847,81	122.873.369,56
6	08 de noviembre hasta 20 de diciembre de 2018	$1.047.183.680,70	523.591.840,35
7	21 de diciembre de 2018 hasta el 29 de enero de 2019	$884.138.348,38	442.069.174,19
8	30 de enero de 2019 hasta el 28 de febrero de 2019	$514.864.809,38	323.335.100,29
8ª1	30 de enero de 2019 hasta el 28 de febrero de 2019	$78.864.470,65	39.432.235,33
9	01de marzo de 2019 hasta el 29de marzo de 2019	$ 1.292.653.567,28	811.786.440,25
9ª1	01de marzo de 2019 hasta el 29de marzo de 2019	$139.441.533,83	69.720.766,92
9ª2	01de marzo de 2019 hasta el 29de marzo de 2019	$289.698.277,99	144.849.139,00

ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORÍA

Contrato de Interventoría

A la fecha la Interventoría ha radicado Actas Parcial a la Entidad Contratante:

Tabla 6. ACTAS PARCIALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 06-3-10051-18

No. Acta	Periodo	Valor Total del Acta
1	7 – Jun / 7 Jul 2018	4.445.827,38
2	8 jul / 7 ago. 2018	4.986.612,54
3	8 ago. / 7 Sep. 2018	13.573.224,24
4	8 sep. / 7 Oct 2018	19.246.836,21
5	8Oct / 7 Nov 2018	30.708.469,01
6	8 Nov / 20 Dic 2018	52.342.354,94
7	20 dic 2018/ 29 ene 2019	44.192.708,59
8	30 ene 2019 / 28 feb 2019	25.734.966,17
8a1	30 ene 2019 / 28 feb 2019	3.941.956,12
9	01 mar 2019 / 31 mar 2019	64.611.904,36
9a1	01 mar 2019 / 31 mar 2019	6.969.835.75
9a2	01 mar 2019 / 31 mar 2019	14.480.877.49

5. TRABAJOS EJECUTADOS

5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS TAREAS

- ACTAS DE COMITÉ

Dentro de las tareas desarrolladas durante el periodo en evaluación, se encuentran la suscripción de actas de comité, las cuales se han realizado para el seguimiento de la POLICIA NACIONAL hacia el contrato de Interventoria y de comité de Interventoría hacia el contrato de obra. Dichas actas se indican a continuación y se encuentran en medio físicos en el **anexo No. 3** del presente informe:

Tabla 7. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

FECHA	CONCLUSIONES
08 de MARZO de 2019	Acta # 29 Interventoría solicita la realización de pruebas de estanqueidad en tanques de reserva, se realiza nuevamente observación sobre el rendimiento de obra, interventoria considera que en obra pueden atacar otros frentes de trabajo como son repellos exteriores en distintos edificios.
15 de MARZO de 2019	Acta # 30 Aprobado y firmado el adicional de obra número 2 con fecha del 14 de marzo de 2019, para realizar el gimnasio y obras de urbanismo, se definen incongruencia de planos del

FECHA	CONCLUSIONES
	gimnasio entre lo arquitectónico y estructural, que no presentan mayor afectación, obra hace referencia al paro indígena que puede afectar por que no entran suministros importantes.
22 de MARZO 2019	Acta # 31 El tema del paro comienza a preocupar por su continuidad hay afectación en distintas actividades.
29 de MARZO(2 ABRIL 2019)	Acta # 32 En presencia del supervisor de la DIRAF el My. Angel Giovanni Lopez Ostos, quien determina pautas para presentación de actas e informe, con tiempos y fechas preestablecidas a fin de superar inconvenientes presentados este mes.

- **ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

Dentro de las actividades efectuadas por el Consorcio BCS- Gutiérrez y la interventoría Daimco, durante el periodo de 01 de MARZO del 2019 al 31 de MARZO del 2019, se encuentran las siguientes:

- **Cumplimiento de Especificaciones técnicas, diseños, normas técnicas, cantidades, según contrato.**

  La DIRAF en cabeza del Supervisor del proyecto el Mayor Ángel Giovanny López Ostos adelantaron las gestiones y documentos pertinentes para la aprobación de modificatorios y prorrogas al contrato.

ACTIVIDADES ADELANTADAS:

- Se realiza trabajo conjunto de presentación de Análisis de Precios Unitarios no previstos y precios adicionales para obras de urbanismo, paisajismo y gimnasio que soportaran la solicitud de adición al presupuesto contractual.

- En cuanto a los oficios dirigidos a la entidad para aclarar las inconsistencias o dudas encontradas el Supervisor DIRAF, estos con el fin de que se vea la trazabilidad.

EXTERIORES

- **Acciones adelantadas por la interventoría y supervisión actividades Eléctricas**
  En chequeo y revisión en obra de actividades eléctricas, de las cuales se deja respectivas anotaciones en bitácora.

- **Acciones adelantadas por la interventoria y supervisión actividades chequeo topografía**

  Se realiza la verificación del proyecto en nivelación de cada uno de los niveles de losa de cimentación y verificación y corrección de la localización de columnas y demás elementos estructurales, y de redes, del gimnasio.

- **Acciones adelantadas por el contratista y supervisión ante el cumplimiento al Carácter Técnico.**

  Se le solicita a contratista adelantar pruebas de estanqueidad de tanques de reserva y tanque de red contra incendios, a fin de verificar posibles filtraciones.

- **Calidad de la Obra, Equipos, Bienes, Insumos, Ensayos o Pruebas.**
  El contratista en el mes de MARZO tuvo en obra, una (1) máquina retroexcavadora sobre llantas, (2) volquetas de planta y (1) Mini cargador, equipos utilizados para trabajos de excavación y regado de material.

- **Novedades, observaciones y recomendaciones.**
  Esta interventoría y el constructor obviamente, dejamos constancia de la afectación que para el normal desarrollo de obra puede implicar el paro indígena que ha bloqueado la via panamericana a la altura del municipio de Caldono y a lo largo de 50 km de esta via, lo que imposibilita la llegada de materiales que el contratista ha comprado fuera del departamento como son insumos eléctricos y la carpintería de aluminio.
  La interventoría ha estado muy atenta en informar los posibles cambios del clima que podrían afectar los trabajos, para este periodo se presentaron tiempo lluvioso y algunas tormentas que afectarían el desarrollo de trabajos. En la segunda quincena de MARZO se presentó un clima variado pero favorable en términos generales para la ejecución de obras.

6. CUMPLIMIENTO PAGOS PARAFISCALES

En lo correspondiente al presente periodo, la interventoría ha realizado el seguimiento y control bajo los lineamientos de la normatividad sobre la materia (aspectos básicos legales):

- Seguimiento a las afiliaciones al sistema de seguridad social de los trabajadores que laboran en la obra. (Contratista entregó copias de las afiliaciones).
- Inspección en el desarrollo de las actividades la entrega de los elementos de protección personal –EPP y supervisión en el uso de los mismos.
- Solicitud al constructor sobre la entrega de los exámenes médicos de ingreso de salud ocupacional del personal que labora en el proyecto.

En el anexo No. 5 se muestran las planillas de pagos parafiscales de los profesionales involucrados en el proyecto del Contratista y la interventoría.

7. PERMANENCIA Y ESTADO DE LOS EQUIPOS

7.1 CONTROL PERSONAL CONTRATISTA

En el Anexo No. 6. Se diligenció el Formato Control del Personal, acorde a lo requerido por el contrato de obra No DIRAF 07-6-10044-18, para la ejecución de las actividades correspondientes al presente periodo.

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	Director de ing. obra	Ing. Julián Mauricio Giraldo
2	Residente 2 de ing. obra	Ing. Maria Teresa Ojeda Cabrera
3	Residente de arquitectura	Arq., Edgar Enrique Calvete
4	Auxiliar administrativo	Maria Fernanda Benavidez
5	Residente ing. Ambiental y SISO	Yuli Gomez Urbano
7	Topógrafo 1	Margarita Eugenia Álvarez Fuentes
9	Auxiliar topografía	Alexandra Risueño
10	Maestro	Armando José Arrieta
11	Ayudantes	312

7.2 CONTROL PERSONAL INTERVENTORIA

En el Anexo No. 7. Se encuentra el Formato Control del Personal de la Interventoria, para la ejecución de las actividades durante el periodo del contrato de interventoría No DIRAF 07-3-10051-18

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1	ING. TIRSO MARINO COSME OROZCO
2	RESIDENTE ING. CIVIL	ING. SANDRA LUCIA GUAUÑA PISSO
3	RESIDENTE ARQUITECTURA	ARQ. MONICA LILIANA BENITEZ ANGEL
4	RESIDENTE AMBIENTAL ESP. SALUD OCUPACIONAL	ROSA DEL MAR RODRIGUEZ GALVIS
5	ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JAVIER JOSE CARRILLO O.
6	RESIDENTE ING. TOPOGRAFO	RIGOBERTO LOZADA DIAZ
7	RESIDENTE ELÉCTRICO	VICTOR MANUEL BOCANEGRA
8	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JOSE ARMANDO RUIZ ANGARITA
9	ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA	ALBERTO FEDERICO MOUTHON BELLO
10	ASESOR JURÍDICO	PABLO MANRIQUE CONVERS
11	ASESOR CONTABLE	PABLO EMILIO GUERRERO JIMENEZ

7.3 CONTROL DE EQUIPOS

En el Anexo No. 10 se presenta el formato Control de Equipos, en el cual se reportan los equipos usados por el Contratista en obra durante dicho periodo.

Cuadro 8. Relación de Equipos de Interventoría

EQUIPOS	CANTIDAD
COMPUTADORES	5

CAMARA DIGITAL	3
IMPRESORA	1
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	1
EQUIPO ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS	1

8 ASPECTOS VARIOS

8.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO

El registro fotográfico se presenta en el anexo No. 10 del presente informe.

8.2 ESTADO DEL TIEMPO

En el Anexo No. 11 se presenta el formato control del clima, en el cual se reporta el estado del tiempo en la obra durante dicho periodo

8.3 POLIZAS

Contrato de Obra

En el siguiente cuadro se relacionan las pólizas del contrato de obra No DIRAF 06-6-10044-18.

Tabla 9. POLIZAS CONTRATO DE OBRA

GARANTÍAS				
POLIZAS	COMPAÑÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
			Iniciación	Terminación
Anticipo	Seguros del Estado S.A.	6.342.265.624	18/05/2018	31/12/2019
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A.	2.536.906.250	18/05/2018	31/12/2019
Pago de salarios y prestaciones	Seguros del Estado S.A.	634.226.563	18/05/2018	31/10/2022

Estabilidad de la obra	Seguros del Estado S.A.	3.805.359.374	15/12/2018	15/12/2023
Calidad de los bienes	Seguros del Estado S.A.	329.371.500.00	18/05/2018	31/10/2020

Contrato de Interventoría

En el siguiente cuadro se relacionan las pólizas del contrato de Interventoría No. DIRAF 06 -3-10051-18

Tabla 10. POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

GARANTÍAS				
POLIZAS	COMPAÑÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
			Iniciación	Terminación
Cumplimiento	Seguros Mundial	$ 126.805.825.22	22/05/2018	28/12/2019
Calidad de Servicio	Seguros Mundial	$ 317.014.563.05	22/05/2019	28/06/2024
Pago de salarios y prestaciones	Seguros Mundial	$ 31.701.456.30	22/05/2018	28/10/2022

9. CONCLUSIONES

En los edificios de oficiales y patrulleros , este mes se adelantaron actividades correspondiente a obra gris, como repellos en interiores, se comenzaron repello de fachadas, mortero de nivelación de piso, igualmente se adelantaron actividades de estucado de muros, instalación de cerámica en baños, he instalación de baldosa de grano de mármol, son actividades que si bien se están realizando simultáneamente, esta interventoría considera que con un mayor esfuerzo de parte del contratista en cuanto aumento del personal se podrían realizar estas actividades mas rápidamente sobre todo en lo que compete a subsanar o arreglar actividades como reparación de columnetas y viguetas igualmente que repellos, además de las instalaciones hidrosanitarias.

En edificio de Casino se encuentra arreglo y repello de regatas eléctricas, en este edificio la actividad ha sido muy lenta en el mes.

Se adelantan redes exteriores de alcantarillados sanitarios y pluviales de los edificios de la fase 4. Además de excavaciones, suministro de redes contra incendios.

En oficiales como patrulleros se instalaron graderías metálicas, con pendientes de terminación de algunos detalles como pintura.

Con la aprobación del adicional, el constructor pudo cobrar actividades que estaban pendientes de pago y esto determino también un repunte en el porcentaje de ejecución, es conveniente resaltar que debido al adicional en obra y dinero del que fue objeto este contrato, los indicativos de porcentajes programados vs porcentaje ejecutado varia, consideramos en esta interventoría que el tiempo que se le adiciono está muy ajustado para la culminación, más aun teniendo en cuenta que el paro indígena que se presentó en el departamento del Cauca , afecta directamente los suministros en obra de algunas actividades que pueden determinar una ruta crítica.

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montajes, Mantenimientos y Construcción

RESUMEN EJECUTIVO INT-11:10

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

PERIODO DEL INFORME

DEL			AL		
1	3	2019	31	3	2019

No. DE INFORME: 10 DE: 2019

PLAZO TRANSCURRIDO

FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION		
7	6	2018	31	3	2019

TIEMPO CONTRACTUAL TRANSCURRIDO EN DIAS: 297 DE: 2019

DATOS BASICOS

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
CONTRATO No.	06-6-10044-18
VALOR INICIAL	$9.250.483.250,05
VALOR ADICION 1	$403.946.050,23
VALOR ACTUALIZADO 1	$9.683.809.300,31
VALOR ADICION 2	$3.000.721.946,00
VALOR ACTUALIZADO 2	$12.684.531.246,31
PLAZO INICIAL	191,00
PRORROGA ADICION 1	135,00
PRORROGA ADICION 2	60,00
PLAZO ACTUALIZADO	386,00
FECHA DE INICIACIÓN	07 DE JUNIO DE 2018
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	15 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACION 1	29 DE ABRIL DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	29 DE JUNIO DE 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	DAIMCO S.A.S
CONTRATO No.	06-3-10051-18
VALOR INICIAL ESTUDIO Y DISEÑOS	
VALOR ACTUALIZADO ESTUDIO Y DISEÑOS	
VALOR INICIAL INTERVENTORIA	$482.374.500,00
VALOR ADICION 1	$21.660.338,29
VALOR ADICION 2	$149.994.287,80
VALOR ACTUALIZADO INTERVENTORIA	$634.029.126,09
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	191,00
PRORROGA ADICION 1	135,00
PRORROGA ADICION 2	60,00
PLAZO ACTUALIZADO	386,00
FECHA DE INICIACIÓN INTERVENTORIA	07 DE JUNIO DE 2018
PLAZO INICIAL DE INTERVENTORIA	15 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACION INTERVENTORIA 1	29 DE ABRIL DE 2019
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	29 DE JUNIO DE 2019

AVANCE DEL OBRA

		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
PROGRAMADO ACUMULADO	%	0,00%	0,00%	18,74%	16,52%	0,00%	93,58%	28,82%	34,37%
	Valor			############	############	$ -	$ 8.628.937.936,78	$ 2.771.006.221,75	$ 3.309.351.511,99
EJECUTADO ACUMULADO	%	0,417%	1,307%	2,258%	7,176%	0,00%	22,54%	27,08%	30,40%
	Valor	$ 39.682.253,33	$ 123.934.553,83	$ 230.668.353,11	$ 684.836.038,46	$ -	$ 2.085.269.465,38	$ 2.503.051.422,57	$ 2.948.794.044,44

		MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16
PROGRAMADO ACUMULADO	%	53,78%	44,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Valor	$ 5.037.917.837,74	$ 4.823.324.381,69						
EJECUTADO ACUMULADO	%	41,146%	44,987%	0,000%	0,000%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Valor	$ 3.894.538.824,30	$ 5.706.259.933,42						

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Gerencia, Administración y Construcción

RESUMEN EJECUTIVO INT-11:10

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITROS FIJOS SIN REAJUSTE .

PERIODO DEL INFORME

DEL			AL		
1	3	2019	31	3	2019

No. DE INFORME: 10 DE 2019

PLAZO TRANSCURRIDO


FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION		
7	6	2018	31	3	2019

TIEMPO CONTRACTUAL TRANSCURRIDO EN DIAS: 297 DE 2019

MANEJO DE ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

ENTIDAD BANCARIA	BANCO POPULAR	
CIUDAD	BOGOTÁ	
SUCURSAL	BOGOTÁ	
No. DE CUENTA	220-050-11979-1	
FECHA APERTURA	18 de mayo de 2108	
No. DE CHEQUES GIRADOS EN EL PERIODO	2	
No. DE CHEQUES PAGADOS		
SALDO ANTERIOR	$6.340.388.623,10	
VALOR DE CHEQUES GIRADAS	1	$ 469.821.215,00
	2	$ 377.531.404,00
	3	$ 193.286.214,00
	4	$ 103.086.476,00
	5	$ 104.245.691,00
	6	$ 193.301.891,00
	7	$ 166.386.840,00
	8	$ 177.127.561,00
	9	$ 31.061.982,00
	10	$ 78.421.206,02
	11	$ 516.165.811,00
	12	$ 296.933.155,00
	13	$ 130.006.629,00
	14	$ 67.847.934,00
	15	$ 640.630.639,00
	16	$ 84.617.763,00
	17	$ 227.093.583,00
	18	$ 313.695.021,00
	19	$ 31.702.300,00
	20	$ 254.014.269,00
	21	$ 61.532.375,00
	22	$ 150.000.000,02
TOTAL	$	4.629.221.625,24
VALOR AMORTIZADO EN ACTA	$	2.332.567.302,90
SALDO ACTUAL	$	1.717.038.986,12
FECHA CIERRE DE CUENTA		

AVANCE DE OBRA

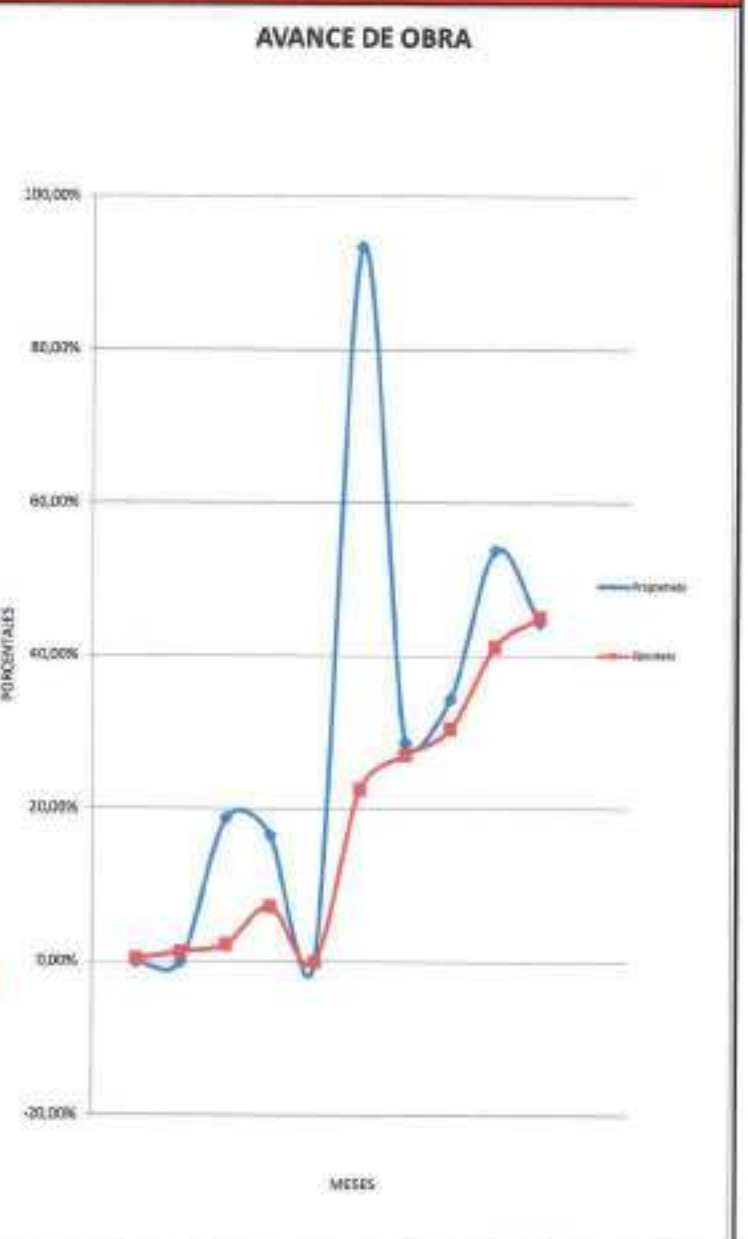

CONTROL DE POLIZAS

AMPAROS	VALOR	VIGENCIA	
		SI	NO
CUMPLIMIENTO			
ANTICIPO			
SALARIOS Y PRESTACIONES			
RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ESTABILIDAD			

OBSERVACIONES:

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

RESUMEN EJECUTIVO INT-11:10

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

PERIODO DEL INFORME

DEL			AL		
1	3	2019	31	3	2019

No. DEL INFORME: 10 DE 2019

PLAZO TRANSCURRIDO

FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION		
7	6	2018	31	3	2019

TIEMPO CONTRACTUAL TRANSCURRIDO EN DIAS: 297 DE: 2019

RESUMEN GENERAL

En el presente periodo se tiene un avance ejecutado acumulado de 44,987% y un avance programado de 44,33%

En el presente periodo se ha presentado lluvias que han afectado las actividades de repellos

Se sigue observando deficiencia en calidad en la mano de obra ya que se observa la correccion a los detalles que constantemente esta Interventoria a manifestado durante el proceso constructivo como alineamientos, plomos y resanes incorrectos en regatas realizadas para instalaciones electricas e hidrosanitarias, carencia de dilataciones superiores de los muros, deficiencia en mortero de repellos, deficiencia en el piso de nivelacion ya que se observo imperfecciones en su instalacion, al igual deficiencia en la instalacion de piso en baldosa en granito.

Se solicitó al Constructor referenciamente no ejecutar repellos sin antes de realizar los trabajos electricos y sanitarios en bloque de oficiales, patrulleros; al igual sin ejecutar columnetas y cintas en concreto, estas situaciones se sigue presentando en obra, situaciones que no favorecen en calidad a los procesos posteriores como enlucs y pinturas en fachadas exteriores

A la fecha el constructor no ha facilitado la calificacion del soldador.

En el presente periodo se ha ejecutado mamposterias en bloque, fundicion de columnetas y cintas en concreto, instalaciones electricas e hidrosanitarias, repellos en muros internos y externos, instalacion de cubierta en el bloque de patrulleros y oficiales, rellenos con recebo en areas exteriores de los bloques, estuco en bloque de oficiales, enchapes de baño en bloque de oficiales e instalacion de estructura para cielo raso e inicio de enchape de piso en baldosa en granito, trabajos electricos, construccion de tanque de RCI, estructura metalica de escaleras y pasillos entre bloques casino y oficiales

En el presente periodo se retomo actividades en el area de casino.

Se ve la necesidad de la construccion de filtros permeables a los tanques de almacenamiento y de red contraincendio por la presencia de aguas subterraneas, para evitar afectaciones futuras a dichas estructuras.

Esta Interventoria ha solicitado la certificacion de calidad de concretos aplicados para la fundicion de losas de entrepiso de los bloques, de estructura metalica de escaleras, de ceramicas y baldosa.

Aun el contratista no ha ejecutado la demolicion de columnetas del eje 4 del bloque de oficiales.

En el presente periodo se realizo la segunda adicion al proyecto de obra

Se realizo por parte de la interventoria la prueba visual de la estructura metalica para escaleras. Posteriormente se solicito al constructor la correccion de detalles, los cuales a la fecha parcialmente se han corregido.

Se realizo la toma de muestras de concreto en las diferentes fundiciones.

Se solicito al constructor la ejecucion de red contraincendios

Aun esta pendiente algunas correcciones de linealmientos y descuadres de muros, tesane en cubias de cubierta donde se encuentran apoyadas las platinas de cubierta.

Interventoria y Constructor realizan las pruebas hidraulicas en obra

En el presente periodo el avance de obra empieza a ser afectado por el paro indigena que a ocasionado desabastecimiento de materiales principalmente cemento y el no suministro de materiales provenientes de Bogota como carpinterias.

ACTIVIDADES A REALIZAR EL PROXIMO MES POR EL CONTRATISTA

16.01.03 IMPERMEABILIZACION EN ELAS/FOAM ELASTOMETRO DE URETANO DE 2MM APLICADA A 3 MANOS CON MAQUINA DE ALTA
* PRESIÓN (1500LBS) SISTEMA SPRAY EN SITIO SOBRE MORTERO
* 12.17 RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
* 13.01 ACOMETIDAS A TABLEROS NORMALES
* 13.04 ACOMETIDAS A TALEROS BOMBAS
* 13.09 SALIDAS ELECTRICAS
* 13.12 LUMINARIAS Y LÁMPARAS
* 13.13 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO
* 13.16 REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION
* 13.17 SUB ESTACION Y CELDAS DE MEDIA TENSION
* 13.18 TRANSFORMADOR DE POTENCIA
* 13.19 TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y SUS ACOMETIDAS
* 17.01 PINTURA
* 19.01 CIELO RASO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

31	3	2019
DD	MM	AAAA

Anexo No. 1 Informes Semanales

DAIMCO

Diseño, asesoría, interventoría, consulta, mantenimiento y construcción

INFORME SEMANAL INT-22.39

Semana Número: 39 Del: 01 de Marzo 2019 Al: 09 de Marzo de 2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 275

Nombre del Supervisor. POLICIA NACIONAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,16%	37,00%
Valor de la Obra programada:	$ 209.170.280,99	$ 3.583.009.441,11

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,2000%	39,2000%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 213.043.904,61	$3.505.538.966,71

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ

Contrato No.	06-6-10044-18
Valor Inicial:	$9.250.483.250,08
Valor adicional:	$433.346.050,23
Valor Actualizado:	$9.683.809.300,31
Plazo Inicial:	192 días
Plazo Actualizado:	327 días
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Terminación:	28 de Abril de 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: DAIMCO S.A.S

Contrato No.	06-3-10051-18
Valor Inicial:	$ 462.374.500,00
Valor Adicional:	$ 21.660.338,29
Valor Actualizado:	$ 484.034.838,29
Plazo Inicial:	192 días
Plazo Actualizado:	327 días
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Terminación:	28 de Abril de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- 12.22.01 EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO (Redes Hidrosanitarias paralelas Bloque 1 Patrulleros)
- 12.22.03 RELLENO EN ARENA DE PEÑA
- 12.06.01 TUBERIA PVC SANITARIA 6"
- 03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS
- 07.01.02. RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS
- AD-16 CINTA PVC 0-22
- 09.01.01 MURO BLOQUE LISO No.5
- 10.01.09 COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 10.01.04 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)
- 08.02.01 ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTE DE EDIFICIOS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO)
- 08.01.01 ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESCALERAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO)
- 12.21.03 CAJA INSPECCIÓN DE AGUA RESIDUAL 60x60
- 07.01.04 CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA MUROS Y TAPAS DE TANQUE DE RESERVA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)
- 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (incluye estuco, filos y dilataciones)
- 12.01.04 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO A PRESION AGUA POTABLE MOTOBOMBA CENTRIFUGA HM EUROLINA 10x10x20W o similar, 20HP (TITULAR + SUPLENCIA) Incluye 2 tanques hidro 500L, tablero control y accesorios especificados.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- 12.22.01 EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO (Redes Hidrosanitarias paralelas Bloque 1 Patrulleros)
- 03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS
- 09.01.01 MURO BLOQUE LISO No.5
- 10.01.03 COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 10.01.04 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)
- 07.01.07 HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI
- 07.01.04 CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA MUROS Y TAPAS DE TANQUE DE RESERVA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)
- 08.01.01 ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESCALERAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO)
- 13.09. SALIDAS ELECTRICAS
- 12.02.PUNTOS HIDRAULICOS
- 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (incluye estuco, filos y dilataciones)
- 12.01.04 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO A PRESION AGUA POTABLE MOTOBOMBA CENTRIFUGA HM EUROLINA 10x10x20W o similar, 20HP (TITULAR + SUPLENCIA) Incluye 2 tanques hidro 500L, tablero control y accesorios especificados.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

* Se realizan rellenos en todas las areas perimetrales a los diferentes bloques para ir conformando las zonas de circulacion y Urbanismo
  Se realizan trabajos en Tanques de Almacenamiento y Red contra Incendios
* Se estan rematando ya detalles en mamposteria en bloque en las areas de Patrulleros y Oficiales
* Se construyen cajas de apantallamiento.
* Se ejecuta pañetes en muros en bloque de Oficiales y Patrulleros
* Se ejecuta columnetes y Vigas de Confinamiento en Bloque de Patrulleros y Oficiales
* Se realiza limpieza de cajas de redes sanitarias sobre el área del tanque RCI y conexiones hacia los niveles de salida.
* Inician labores de estuco en el 1er piso de oficiales, se revisa con el contratista las escuadras de los muros antes de ir estucando estas áreas.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	TIRSO COSME OROZCO Firma

DAIMCO

Diseño, Asesoría, Interventoría, Gerencia Administrativa y Construcción

INFORME SEMANAL INT-23.01

Semana Número: 40 Del: 10 de Marzo de 2019 Al: 16 de Marzo de 2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 282

Nombre del Supervisor: POLICIA NACIONAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,95%	39,97%
Valor de la Obra programada:	$ 288.577.617,15	$ 3.870.618.577,33

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,9500%	39,1600%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 288.577.517,15	$3.794.116.493,86

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
Contrato No:	06-6-10044-18
Valor inicial:	$9.250.483.250,08
Valor adicional:	$433.346.050,23
Valor Actualizado:	$9.683.829.300,31
Plazo Inicial:	192 días
Plazo Actualizado:	327 días
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Terminación:	28 de Abril de 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Interventor:	DAIMCO S.A.S
Contrato No:	06-3-10051-18
Valor Inicial:	$ 462.374.500,00
Valor Adicional:	$ 31.660.338,29
Valor Actualizado:	$ 494.034.838,29
Plazo Inicial:	192 días
Plazo Actualizado:	327 días
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Terminación:	28 de Abril de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- 12.22.01 EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO (Redes Hidrosanitarias paralelas Bloque 1 Patrulleros)
- 03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS
- 09.01.01 MURO BLOQUE LISO No.5
- NP-030 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALLINERO EN MUROS DE MAMPOSTERIA, PARA POSTERIORMENTE PAÑETARLA
- 10.01.03 COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (Incluye reforzamiento)
- 10.01.04 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (Incluye reforzamiento)
- 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (Incluye filos y dilataciones)
- 07.01.07 HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI
- 07.01.04 CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA MUROS Y TAPAS DE TANQUE DE RESERVA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)
- 09.01.01 ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESCALERAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO)
- NP-012 BANDEJA TIPO MALLA 30 CM (ANCHO) X 6 CM (ANCHO) EN ACERO PARA INSTALACIÓN EN INTERIOR, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, SOPORTERIA.
- 12.02.PUNTOS HIDRAULICOS
- 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (Incluye estuco, filos y dilataciones)
- 17.01.02 PINTURA SOBRE MURO 100% AGUA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE RUSTICO ACABADO FINAL
- 12.01.04 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO A PRESION AGUA POTABLE MOTOBOMBA CENTRIFUGA I-M EUROLINA 10x16x20W o similar, 20HP (TITULAR + SUPLENCIA) Incluye 2 tanques rótio 500L, tablero control y accesorios especificados.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- 12.22.01 EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO (Redes Hidrosanitarias paralelas Bloque 1 Patrulleros)
- 03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS
- 09.01.01 MURO BLOQUE LISO No.5
- 10.01.03 COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (Incluye reforzamiento)
- 10.01.04 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (Incluye reforzamiento)
- 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (Incluye filos y dilataciones)
- NP-030 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALLINERO EN MUROS DE MAMPOSTERIA, PARA POSTERIORMENTE PAÑETARLA
- NP-012 BANDEJA TIPO MALLA 30 CM (ANCHO) X 6 CM (ANCHO) EN ACERO PARA INSTALACIÓN EN INTERIOR, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, SOPORTERIA.
- 07.01.07 HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI
- 07.01.04 CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA MUROS Y TAPAS DE TANQUE DE RESERVA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)
- 09.01.01 ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESCALERAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO)
- NP-030 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALLINERO EN MUROS DE MAMPOSTERIA, PARA POSTERIORMENTE PAÑETARLA
- 26.09.19 CABLE 7 hilos No 14
- 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (Incluye estuco, filos y dilataciones)
- 23.01.03 ENCHAPE DE MURO (PISO-TECHO) EN TABLETA CERAMICA, BLANCO JAYA, FORMATO DE 30 X 60 CM, BORDES RECTIFICADOS.
- 10.01.11 ALFAJÍAS CONCRETO A LA VISTA

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

* Se realizan rellenos en todas las areas perimetrales a los diferentes bloques para ir conformando las zonas de circulacion y Urbanismo
* Se realizan trabajos en Tanque Red Contra Incendios
* Se ejecuta mamposteria en bloque en las areas de Patrulleros y Oficiales
* Se ejecuta pañetes en muros en bloque de Sub Oficiales
* Se ejecuta columnatas y Vigas de Confinamiento en Bloque de Patrulleros y Oficiales
* Se recomienda mejorar los resanes que se realizan en las regatas de las instalaciones Eléctricas e Hidrosanitarias utilizar un mortero de reparación.
* Trabajan en la instalación de formaleta para losa de cubierta para tanque RCI.
* Pintura sobre muro 100% agua tipo Koraza o similar para exteriores color blanco aplicada a tres manos sobre pañete nuevo acabado final.
* Se realizan pruebas de presión tuberías bloque 1 Primer Piso.

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TIRSO COSME OROZCO

Firma

DAIMCO

Diseño, Asesoría, Interventoría, Gerencia, Administración y Construcción

INFORME SEMANAL INT-23.02

Semana Número: 41 Del: 17 de Marzo 2019 Al: 23 de Marzo 2019

Tiempo transcurrido desde la Iniciación del contrato: 289

Nombre del Supervisor: POLICIA NACIONAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,31%	41,30%	Obra Fisica Ejecutada (%)	2,53%	41,71%
Valor de la Obra programada:	$ 318.984.836,42	$ 4.189.583.413,75	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 10.983.655,07	$5.260.717.982,84

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
Contrato No.	06-6-10044-18
Valor Inicial:	$8.250.463.250,08
Valor adicional:	$433.346.050,23
Valor Adicional 2:	$3.000.721.946,00
Valor Actualizado:	$12.684.531.246,31
Plazo Inicial:	192 dias
Plazo Actualizado:	386 dias
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Terminación:	28 de Junio de 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Interventor:	DAIMCO S.A.S
Contrato No.	06-3-10051-18
Valor Inicial:	$ 462.374.500,00
Valor Adicional:	$ 21.660.338,29
Valor Adicion 2:	$149.994.287,80
Valor Actualizado:	$ 634.029.126,09
Plazo Inicial:	192 dias
Plazo Actualizado:	386 dias
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Terminación:	28 de Junio de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* 12.22.01 EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO (Redes Hidrosanitarias paralelas Bloque 1 Patrulleros)
* 03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS
* 09.01.01 MURO BLOQUE LISO No.5
* 10.01.03 COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (Incluye reforzamiento)
* 10.01.04 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (Incluye reforzamiento)
* 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (Incluye filos y dilataciones)
* NP-030 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALLINERO EN MUROS DE MAMPOSTERIA, PARA POSTERIORMENTE PAÑETARLA
* NP-012 BANDEJA TIPO MALLA 30 CM (ANCHO) X 8 CM (ANCHO) EN ACERO PARA INSTALACIÓN EN INTERIOR, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, SOPORTERIA.
* 07.01.07 HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI
* NP-030 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALLINERO EN MUROS DE MAMPOSTERIA, PARA POSTERIORMENTE PAÑETARLA
* 26.08.19 CABLE 7 hilos No 14
* 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (Incluye estuco, filos y dilataciones)
* 23.01.03 ENCHAPE DE MURO (PISO-TECHO) EN TABLETA CERAMICA, BLANCO JAYA, FORMATO DE 30 X 60 CM, BORDES RECTIFICADOS.
* 10.01.11 ALFAJÍAS CONCRETO A LA VISTA

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* 12.22.01 EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO (Redes Hidrosanitarias paralelas Bloque 1 Patrulleros)
* 03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS
* 09.01.01 MURO BLOQUE LISO No.5
* 10.01.03 COLUMNETA DE CONFINACION EN CONCRETO (Incluye reforzamiento)
* 10.01.04 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (Incluye reforzamiento)
* 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (Incluye filos y dilataciones)
* NP-030 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALLINERO EN MUROS DE MAMPOSTERIA, PARA POSTERIORMENTE PAÑETARLA
* 13.16.01 CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION SIMILAR A NORMA CODENSA CS274
* 07.01.07 HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI
* 07.01.04 CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA MUROS Y TAPAS DE TANQUE DE RESERVA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)
* NP-030 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALLINERO EN MUROS DE MAMPOSTERIA, PARA POSTERIORMENTE PAÑETARLA
* 14.01.21 ALISTADO DE PISOS IMPERMEABILIZADOS E= 5 CM
* 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (Incluye estuco, filos y dilataciones)
* 23.01.03 ENCHAPE DE MURO (PISO-TECHO) EN TABLETA CERAMICA, BLANCO JAYA, FORMATO DE 30 X 60 CM, BORDES RECTIFICADOS.
* NP-047 BALDOSA EN GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO 30X30CM FONDO BLANCO ESPESOR CARA ARISTA 15MM GRANO HOMOGENEO, INCLUYE: DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN
* 10.01.11 ALFAJÍAS CONCRETO A LA VISTA

36

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

* Se realizan rellenos en todas las areas perimetrales a los diferentes bloques para ir conformando las zonas de circulacion y Urbanismo
* Se realizan trabajos en Tanque de la Red contra Incendios
* Se estan rematando detalles de Vigas y columnetas de confinamiento y de la mamposteria en bloque en las areas de Patrulleros y Oficiales
* Se ejecuta pañetes en muros en bloque de Sub Oficiales
* Se solicita nuevamente arreglar las tuberia de desague de sanitarios estan fuera del eje constructivo en el 1er piso de bloque 1 y 3.
* Visita del supervisor por parte de la DIRAF el mayor Ángel López Ostos
* Se recomienda revisar muy bien el acabado del repello de las fachadas ya que estas no tienen estuco, va solo pintura sobre repello y también los detalles interiores de mortero de nivelación.

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TIRSO COSME OROZCO

Firma

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventoría, Montaje, Mantenimiento y Construcción

INFORME SEMANAL INT-23.23

Semana Número: 42 — Del: 24 de Marzo de 2019 — Al: 29 de Marzo de 2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 287

Nombre del Supervisor: POLICIA NACIONAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE ,

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,02%	44,30%
Valor de la Obra programada:	$ 383.072.843,64	$ 5.619.247.342,12

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	3,19%	44,0%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 404.636.546,76	$5.595.354.529,59

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
Contrato No.	08-6-10044-18
Valor Inicial:	$9.250.463.250,08
Valor adicional	$433.346.050,23
Valor Adicional 2:	$3.000.721.946,00
Valor Actualizado:	$12.684.531.246,31
Plazo Inicial:	192 días
Plazo Actualizado:	386 días
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Terminación:	28 de Junio de 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Interventor:	DAIMCO S.A.S
Contrato No.	08-3-10081-18
Valor Inicial:	$ 462.374.500,00
Valor Adicional:	$ 21.660.338,29
Valor Adicional 2:	$149.994.287,80
Valor Actualizado:	$ 634.029.126,09
Plazo Inicial:	192 días
Plazo Actualizado:	386 días
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Terminación:	28 de Junio de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- 12.22.01 EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO (Redes Hidrosanitarias paralelas Bloque 1 Patrulleros)
- 03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS
- 09.01.01 MURO BLOQUE LISO No.5
- 10.01.03 COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 10.01.04 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)
- NP-030 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALLINERO EN MUROS DE MAMPOSTERIA, PARA POSTERIORMENTE PAÑETARLA
- 13.16.01 CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION SIMILAR A NORMA CODENSA CS274
- 07.01.07 HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI
- 08.01.01 ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESCALERAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO)
- NP-030 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALLINERO EN MUROS DE MAMPOSTERIA, PARA POSTERIORMENTE PAÑETARLA
- 14.01.21 ALISTADO DE PISOS IMPERMEABILIZADOS E= 5 CM
- 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (incluye estuco, filos y dilataciones)
- 23.01.03 ENCHAPE DE MURO (PISO-TECHO) EN TABLETA CERAMICA. BLANCO JAYA, FORMATO DE 30 X 60 CM, BORDES RECTIFICADOS.
- NP-047 BALDOSA EN GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO 30X30CM FONDO BLANCO ESPESOR CARA ARISTA 15MM GRANO HOMOGENEO. INCLUYE: DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN
- 10.01.11 ALFAJÍAS CONCRETO A LA VISTA

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- 12.22.01 EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO (Redes Hidrosanitarias paralelas Bloque 1 Patrulleros)
- 03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS
- 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)
- NP-030 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALLINERO EN MUROS DE MAMPOSTERIA, PARA POSTERIORMENTE PAÑETARLA
- 07.01.07 HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI
- NP-047 BALDOSA EN GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO 30X30CM FONDO BLANCO ESPESOR CARA ARISTA 15MM GRANO HOMOGENEO. INCLUYE: DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN
- NP-030 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALLINERO EN MUROS DE MAMPOSTERIA, PARA POSTERIORMENTE PAÑETARLA
- 14.01.21 ALISTADO DE PISOS IMPERMEABILIZADOS E= 5 CM
- 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (incluye estuco, filos y dilataciones)
- 23.01.03 ENCHAPE DE MURO (PISO-TECHO) EN TABLETA CERAMICA. BLANCO JAYA, FORMATO DE 30 X 60 CM, BORDES RECTIFICADOS.
- 10.01.11 ALFAJÍAS CONCRETO A LA VISTA

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

* Se realizan rellenos en todas las areas perimetrales a los diferentes bloques para ir conformando las zonas de circulacion y Urbanismo
* Se realizan trabajos en Tanque de la Red contra incendios
* Se estan rematando detalles de Vigas y columnetas de confinamiento y de la mamposteria en bloque en las areas de Patrulleros y Oficiales
* Se ejecuta pañetes en muros en bloque de Sub Oficiales
* Se solicita nuevamente arreglar las tuberia de desagua de sanitarios estan fuera del eje constructivo en el 1er piso de bloque 1 y 3.
* Visita del supervisor por parte de la DIRAF el mayor Ángel López Ostos
* Se recomienda revisar muy bien el acabado del repello de las fachadas ya que estas no tienen estuco, va solo pintura sobre repello y también los detalles internos de mortero de nivelación.

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TIRSO COSME OROZCO

Firma

Anexo No. 2 Relación de Correspondencia

Enviada

POLICIA NACIONAL

DAIMCO

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

CONTRATO No. :	Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 08-3-10051-18
OBJETO:	"Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta base del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No 4 a través unitario fijo sin fórmula de reajuste".
CONTRATISTA:	CONSORCIO BCS GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO S.A.S
SUPERVISOR:	Mayor Ingeniero Civil Angel Giovanni Lopez Ortiz

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aportado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
CPP-DIRAF-2018-107	Observaciones tanque red contraincendios	1	N.A	04/03/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-108	Observaciones procesos de calidad de obra gris	1	N.A	05/03/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO AL CONTRATISTA CON COPIA A LA ENTIDAD CONTRATANTE POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-109	Remision acta parcial No 08 - Contrato de Obra	1	N.A	05/03/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD CON COPIA AL CONTRATISTA POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-110	Remision acta parcial No 08 A Adicion - Contrato de Obra	1	N.A	05/03/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD CON COPIA AL CONTRATISTA POR PARTE DE DAIMCO
-DIRAF-2018-111	Remision acta parcial de interventoria No 8	1	N.A	05/03/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-112	Remision acta parcial de interventoria No 8A Adicion 1	1	N.A	05/03/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-113	Remision informe mensual No 09	1	N.A	13/03/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-114	Respuesta al documento PN-DIRAF-OBRA-045 revisión ítems No. 16.03.77 y No. 16.03.78 del 25 de febrero de 2019	1	N.A	14/03/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO AL CONTRATISTA POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-115	Respuesta al documento PN-DIRAF-POPAYAN-154 Np Extracción ventilación mecánica del 13 de marzo de 2019 con radicado Daimco D-2019-0545.	1	N.A	14/03/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-116	Observaciones Ventilacion Mecanica	1	N.A	15/03/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-117	Remisión Pólizas ajustadas a la Adición No 2 y Prorroga No 02 al Contrato de Interventoría N° PN DIRAF No. 08-3-10051-18	1	N.A	15/03/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-118	Respuesta al documento PN-DIRAF-POPAYAN-0158 del 14 de marzo de 2019 –Plan de inversión del anticipo.	1	N.A	18/03/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
-DIRAF-2018-119	Remision orden de pago No 21	1	N.A	21/03/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO AL CONTRATISTA CON COPIA A LA ENTIDAD CONTRATANTE POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-120	Remision orden de pago No 22	1	N.A	21/03/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO AL CONTRATISTA CON COPIA A LA ENTIDAD CONTRATANTE POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-121	Remision acta parcial de interventoria No 9	1	N.A	29/03/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD CON COPIA AL CONTRATISTA POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-122	Remision acta parcial de interventoria No 9 Adicion 1	1	N.A	29/03/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD CON COPIA AL CONTRATISTA POR PARTE DE DAIMCO

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C. a los 31 días del mes Marzo del 2019.

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: TIRSO COSME (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)	Firma NOMBRE: Mayor Ingeniero Civil Ángel Giovanni López Ortiz
Fecha: 31 de Marzo de 2019	Fecha: 31 de Marzo de 2019

Original: POLICIA NACIONAL
Copias: Contratista, Interventoria

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-107

POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa
RADICACION
Radicado N° E-09652
Fecha 04 MAR 2019
Hora 10:55 Firma

Bogotá D.C. 04 de marzo de 2019.

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoria PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico-administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Observaciones Tanque red Contraincendios.

Respetados Señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, y una vez revisada la documentación aportada referente al Tanque de red contraincendios para alimentar las obras de la Fase 4, se identificaron observaciones según plano E-01 de "TANQUES DE RCI", para lo cual, se requiere ampliar la información suministrada por la consultoria para continuar con el proceso constructivo del tanque de RCI, a continuación, las relacionamos así:

- Se presentan pasamuros de ventilación de 4" y 6", por tanto, solicitamos aclarar el diámetro efectivo del pasamuros de ventilación y las especificaciones de los demás pasamuros.
- El despiece estructural en sentido longitudinal del cárcamo está incompleto, por tanto, se solicita complementar la información
- Se solicita se especifique al detalle el cuarto de bombas y toda la instalación hidráulica correspondiente al tanque de RCI.
- Se anexe el diseño estructural del foso eyector, ya que en el plano E-01no se presenta ninguna referencia.

Se anexa la siguiente documentación de soporte en obra:

- Plano en planta "TANQUE RCI E:01"

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos ampliar de manera detallada la información del tanque de la RCI, a fin de avanzar óptimamente en la ejecución de las actividades y no generar retrasos a la programación de las actividades.

Agradecemos de antemano su atención.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	1 Folio	
Vo. Bo.	Ing. Omar Perez Restrepo - Ing. Carlos Espita Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego Lopez – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	Archivo – Contrato de interventoria	

Bogota: 57 1 7030798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL
VENTANILLA ÚNICA
DE RADICACIÓN Y CORRESPONDENCIA
FECHA 06 MAR 2019
HORA: _____ GUIA SI ☐ NO ☐
No. RADICACIÓN: 02 0837

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
06 MAR 2019
HORA: 11:18 FIRMA:
ESTE DOCUMENTO SE ENTREGA PARA APOSTILLAR Y/O LEGALIZACIÓN

CPP-DIRAF-2018-108

Bogotá D.C. 05 de marzo de 2019

Señores
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
Aurelio Gutiérrez Castillo
Representante Legal
Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Observaciones procesos de calidad de obra gris.

Respetado Ingeniero:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos manifestar nuestra preocupación frente a los procesos de calidad de las actividades ejecutadas relacionadas con la construcción de columnetas y viguetas, mampostería y pañetes, es preciso anotar que esta Interventoría le ha manifestado de distintas formas la necesidad de mejorar la calidad de los procesos constructivos, sin que esto se haya podido superar, a pesar del acompañamiento que esta Interventoría les ha brindado para suplir las dificultades presentadas.


Consecuentemente con lo dicho, hacemos un resumen de las principales actividades que presentan observaciones y su incidencia en la obra, esto con el fin de buscar las salidas rápidas a los inconvenientes presentados con los profesionales de obra encargados de la calidad en los procesos constructivos y continuar de manera efectiva con la ejecución de las actividades del proyecto.

- ***Construcción de columnetas y viguetas:***

  Para la ejecución de esta actividad se ha evidenciado que el refuerzo en gran parte de las columnetas se ha instalado con estribos transversales en S con espaciamiento de más de 20 centímetros, cuando lo mínimo que se debe ejecutar según los diseños es a 15 centímetros, procedimientos que se han corregido en obra; sin embargo, generan reprocesos y consecuentemente atrasos a la programación de obra y sobrecostos administrativos al contratista.

  Estos elementos requieren una resistencia de 2500 PSI según especificaciones técnicas, pero en algunos casos se presentó que las resistencias no están alcanzando a dar la mínima requerida (anexo ensayo de nuestro laboratorio)

  La tubería eléctrica resalta en medio de las columnetas y viguetas como se aprecia en las fotos anexas al presente comunicado, el acabado a la vista no presenta una textura homogénea y se presenta hormigueo en alguno de los casos, situación que debe ser atendida en la ejecución de la obra.

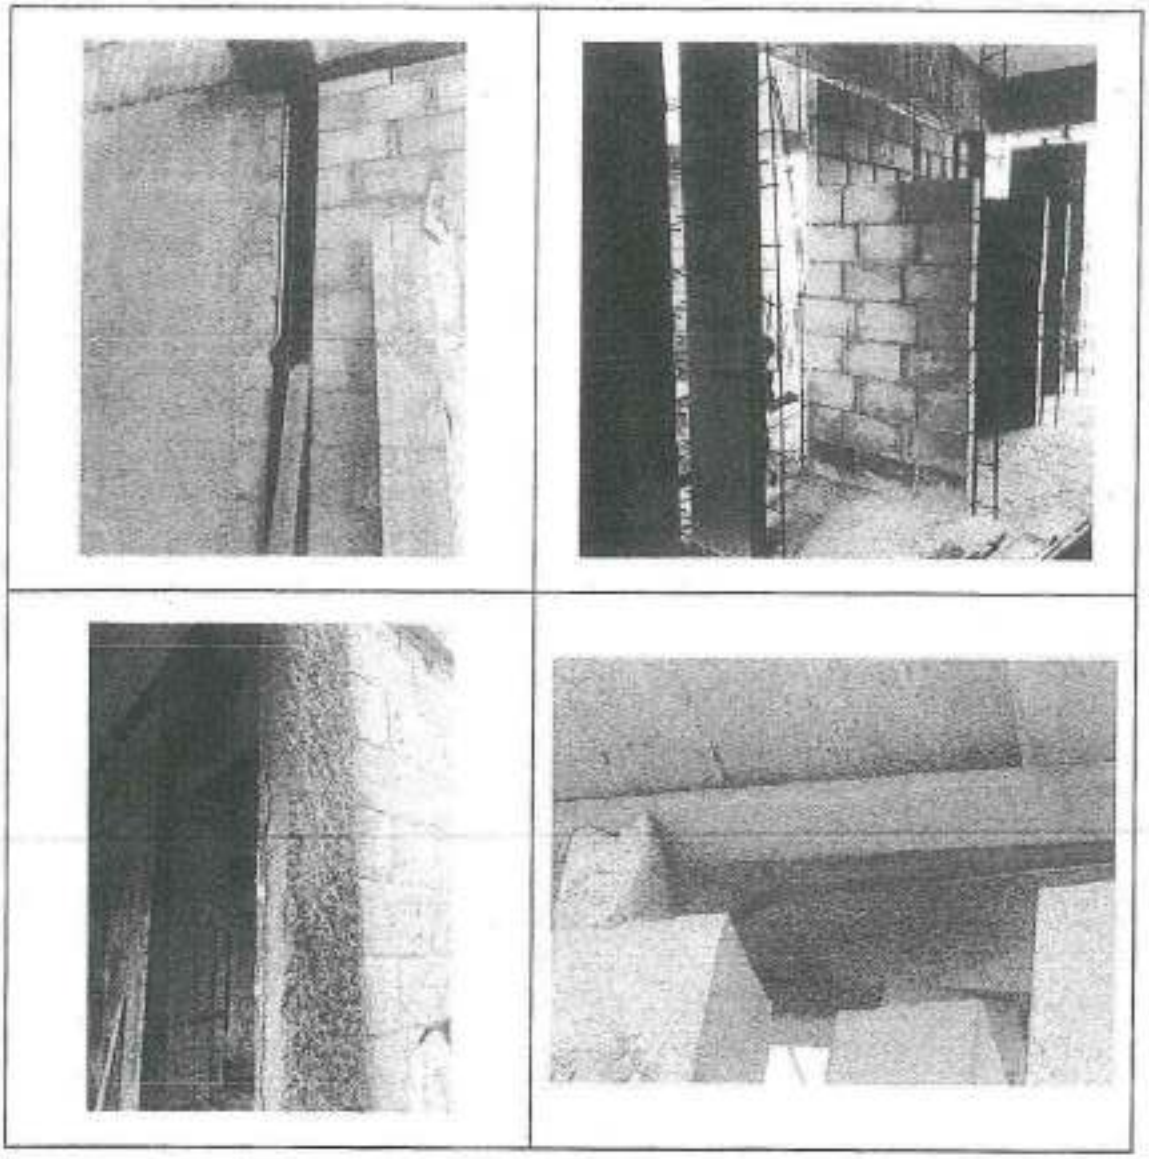


- ***Mampostería:***

La ejecución de esta actividad ha presentado varios detalles, los muros que presentan regatas eléctricas se rellenan con papel, otros muros se pañetan y posteriormente se ejecuta la regata generando reprocesos, adicionalmente se debe verificar y corregir la escuadra de los muros divisorios en el área de baños.


Respecto al alineamiento de muros, en el segundo piso del bloque de patrulleros el muro en el corredor presenta diferencias notorias en cada uno de sus tramos, situación que debe ser corregida y dar seguimiento estricto por parte de los profesionales en obra para su correcta ejecución.

Se deben realizar las dilataciones entre viguetas y vigas estructurales, esto con el propósito de evitar posibles fisuras al pañete.

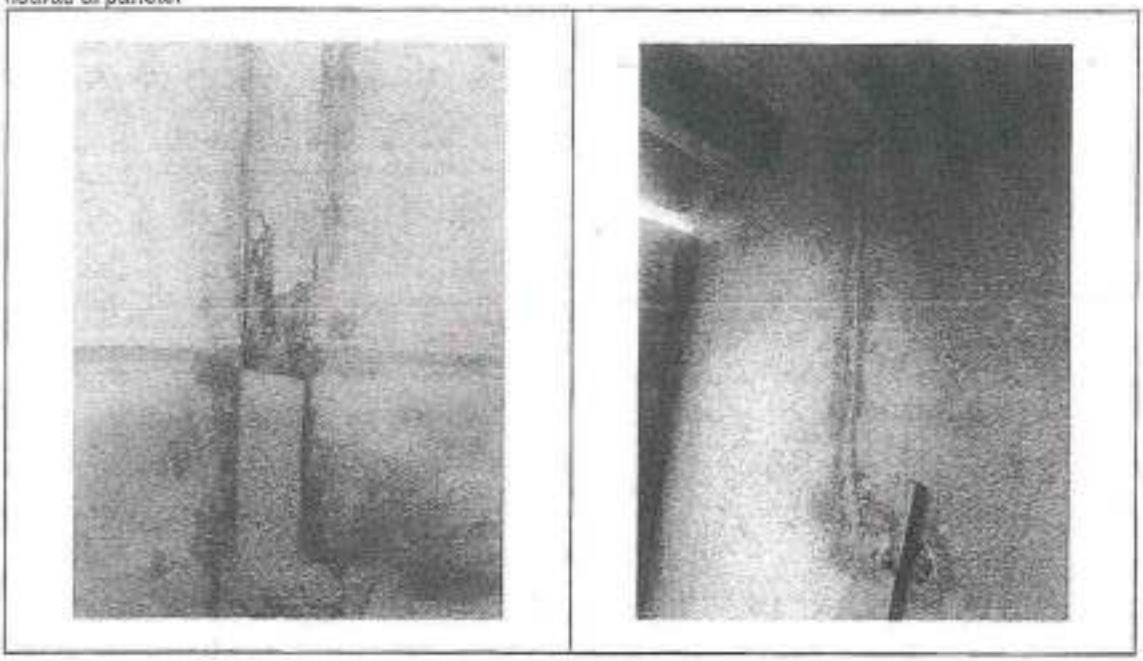

- ***Pañetes (Repellos):***

Esta actividad de importante desarrollo requiere de especial atención, teniendo en cuenta que hay acabados en fachadas y al interior del edificio, a continuación, se muestra registro fotográfico del pañete fisurado el cual no cumple con las condiciones de calidad requeridas.

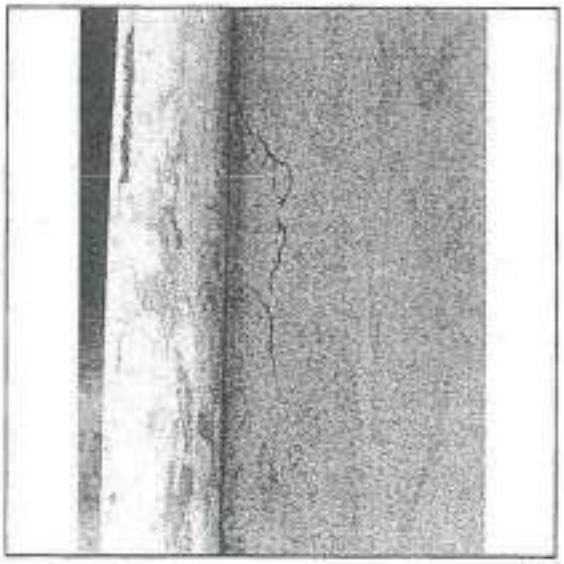

En virtud de lo anterior, esta Interventoría solicita al Contratista tomar las acciones pertinentes con el fin de continuar con la ejecución de las actividades de manera optima y no generar reprocesos, la interventoría reconoce y valora el compromiso y esfuerzo realizado por el contratista de obra activando planes de contingencia para cumplir con la programación de obra

Finalmente, solicitamos la entrega de los certificados de calidad de los materiales utilizados en la ejecución de las actividades del proyecto (cementos, mampostería, tubería eléctrica, pinturas, estucos, concretos, accesorios eléctricos e hidráulicos).

Agradecemos de antemano su atención y estaremos atentos a cualquier solicitud.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	*N/A*
Elaboro	*Ing Tiago Cosme – Director Interventoría*
Copia 1.	*Archivo – Contrato de interventoría*
Copia 2.	POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Directora Administrativa y Financiera - Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 – CAN Mayor – Angel Lopez Ostos – Supervisor

DAIMCO
NIT: 900021462 - 1

CPP-DIRAF-2018-109

Bogotá D.C. 05 de marzo de 2019.

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18 "Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión acta parcial No. 08 – Contrato de Obra.

Respetados señores.

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos informar que el documento citado en el asunto fue verificado y aprobado por parte de la interventoría.

Por lo anterior, se solicita a la Entidad proceder con el respectivo trámite de desembolso del Acta Parcial No.08, correspondiente al contrato de obra No PN DIRAF No 06-3-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Lo anterior para trámite y fines pertinentes.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
05 MAR 2019
HORA: 17:18

My angel Giuvenni López Costa
05/03/2019
16:50

Anexos	117 folios
Vo. Bo.	Ing. Omar Perez Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal
Elaboro	Arq. Diego Lopez – Prof. de Apoyo
Copia 1.	Archivo – Contrato de interventoría
Copia 2	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ - Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402 - Aurelio Gutiérrez Castillo

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co

Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021492 - 1

CPP-DIRAF-2018-110

Bogotá D.C. 05 de marzo de 2019.

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18 "Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión acta parcial No. 08 A - Adición – Contrato de Obra.

Respetados señores.

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos informar que el documento citado en el asunto fue verificado y aprobado por parte de la interventoría.

Por lo anterior, se solicita a la Entidad proceder con el respectivo trámite de desembolso del Acta Parcial No.08, correspondiente al contrato de obra No PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Lo anterior para trámite y fines pertinentes

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
06 MAR 2019
HORA: 11:18
ESTE DOCUMENTO SE RECIBE PARA POSTERIOR VERIFICACION

My angel Guevara, Cpt. O
05/03/2019
16:54

Anexos	27 folios	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego Lopez – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	Archivo – Contrato de interventoría	
Copia 2	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ - Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402 - Aurelio Gutiérrez Castillo	

Bogotá: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-111

Bogotá D.C. 05 de marzo de 2019

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoria PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico-administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión Acta parcial de Interventoría No. 8.

Respetados Señores.

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y según lo establecido en la ***CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO: LA POLICIA*** pagara al ***CONTRATISTA*** el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el anexo No 1 "DATOS DEL CONTRATO" El cual reza "*(...) **PAGOS PARCIALES – Se realizaran pagos parciales hasta completar el 95% del valor del contrato, sujetas al porcentaje de avance del contrato de obra que corresponderá al valor ejecutado en el respectivo periodo** (...)*" por lo anterior nos permitimos remitir el acta parcial No. 08 de interventoría correspondiente al periodo 30 de enero de 2019 al 28 de febrero de 2019 del contrato de la referencia, con los soportes relacionados a continuación:

- Original Factura de Venta 1387
- Acta Recibo a satisfacción Obra
- Acta recibo a satisfacción Interventoría
- RUT Daimco S.A.S
- Resolución de facturación DAIMCO S.A.S
- Referencia Bancaria DAIMCO S.A.S
- Copia cédula de ciudadanía (Representante legal)
- Certificado de aportes parafiscales
- Soportes Revisor Fiscal

Lo anterior para trámite y fines pertinentes

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Myangel Gloria Lopez O
05/03/2019
16:53

Anexos	17 folios
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo
Copia 1.	Archivo – Contrato de interventoría

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049279
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A – 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 800021462 - 1

CPP-DIRAF-2018-112

Bogotá D.C. 05 de marzo de 2019

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico-administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión Acta parcial de Interventoría No. 8 A – ADICION 1.

Respetados Señores.

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y según lo establecido en la ***CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO: LA POLICIA*** *pagara al* ***CONTRATISTA*** *el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el anexo No 1 "DATOS DEL CONTRATO"* El cual reza ***"(...) PAGOS PARCIALES – Se realizaran pagos parciales hasta completar el 95% del valor del contrato, sujetas al porcentaje de avance del contrato de obra que corresponderá al valor ejecutado en el respectivo periodo (...)"*** por lo anterior nos permitimos remitir el acta parcial No. 08 A – Adición 1 de interventoría correspondiente al periodo 30 de enero de 2019 al 28 de febrero de 2019 del contrato de la referencia, con los soportes relacionados a continuación:

- Original Factura de Venta 1386
- Acta Recibo a satisfacción Obra
- Acta recibo a satisfacción Interventoría
- RUT Daimco S.A.S
- Resolución de facturación DAIMCO S.A.S
- Referencia Bancaria DAIMCO S.A.S
- Copia cédula de ciudadanía (Representante legal)
- Certificado de aportes parafiscales
- Soportes Revisor Fiscal

Lo anterior para trámite y fines pertinentes

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	17 folios	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espita Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	Archivo – Contrato de interventoría	

Yly Angel Cuenca Lider
05/03/2019
16:59

Bogotá: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049178
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT. 900031455 - 1

CPP-DIRAF-2018-113

Bogotá D.C. 13 de Marzo de 2019.

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión Informe Mensual No 09.

Respetados Señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir el informe mensual No. 09 de Interventoría, comprendido entre el primero (01) de febrero de 2019 al veintiocho (28) de febrero de 2019. La presente con el fin de informar a la entidad contratante el avance de ejecución del contrato.

Agradecemos de antemano su atención.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa
RADICACION
Radicado E-023572
Fecha 13 MAR 2019
Hora 14:45 Firma

Anexos	243 Folios
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal
Elaboro	Arq. Diego Lobet – Prof. de Apoyo
Copia 1.	Archivo – Contrato de Interventoría

Bogotá: 57 1 7020798 / 7020797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 65 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT. 830027492 - 1

CPP-DIRAF-2018-114

Bogotá D.C. 14 de marzo de 2019

Señores
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
Aurelio Gutiérrez Castillo
Representante Legal
Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402
Bogotá D.C.

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
15 MAR 2019
HORA 10:01

Referencia: Contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Respuesta al documento PN-DIRAF-OBRA-045 revisión items No. 16.03.77 y No. 16.03.78 del 25 de febrero de 2019

Respetado Ingeniero:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, y en respuesta al comunicado relacionado en el asunto, nos permitimos manifestar lo siguiente:

1. El ítem No 16.03.77 V-62 relacionado en el comunicado del asunto; y teniendo en cuenta que la información suministrada por la entidad contratante presenta inconsistencias entre la descripción del ítem en el presupuesto, la Información de la consultoria y la especificación técnica. El Supervisor por parte de la DIRAF Mayor Ángel López Ostos en visita realizada el jueves 21 de Febrero solicito fuese presentada una cotización, en donde se pueda evidenciar la descripción del presupuesto contractual y en otra la descripción encontrada en la especificación para que la Interventoria pueda evaluar y presentar la mejor opción a la entidad Contratante con el fin de determinar el tipo de Ventana a utilizar.

2. El Ítem No 16.03.78 está relacionado dentro del proyecto general presentado por la Consultoría y además aparece como V-63 en los planos MEPOY-A-F4-ED-102 y MEPOY-A-F4-ED-104 los cuales corresponden a la Fase 4 objeto del contrato de la referencia y que corresponde a las ventanas de ventilación de baños en el Bloque 2 - Casino, se solicita al Contratista se realice y presente a la interventoría el APU correspondiente a esta especificación para su evaluación y aprobación.

Agradecemos de antemano su atención y estaremos atentos a cualquier solicitud.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	N/A
Elaboró	Ing Yaso Cosmo – Director Interventoría
Copia 1	Archivo – Contrato de interventoría

Bogotá: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 445 No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-115

POLICIA NACIONAL
Subdirector Administrativo
Unidad Coordinadora de Contratación
Radicado Bajo El No.
Recibido El: 15/03/2019
Hora 16:30 Firma

Bogotá D.C. 14 de Marzo de 2019.

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Respuesta al documento PN-DIRAF-POPAYAN-154 Np Extracción ventilación mecánica del 13 de marzo de 2019 con radicado Daimco D-2019-0545.

Respetados Señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, damos traslado de la propuesta realizada por parte del contratista relacionada con la inclusión del ítem no previsto del componente de ventilación mecánica, el cual cubre la necesidad requerida para la ventilación y extracción dirigida de los baños del bloque de suboficiales de alojamientos.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el equipo relacionado en el ítem 26.04.06 - MOTOR EXTRACCION TIPO HONGO CRHD18, es de gran capacidad y excede la necesidad requerida en el proyecto.

Finalmente, solicitamos evaluar la viabilidad de la propuesta realizada por el contratista a fin de implementar la solución técnica dentro de la fase 4.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos al pronunciamiento por parte de la entidad.

Cordialmente,

JOSÉ VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TÉCNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	14 Folios	
Vo. Bo.	Ing. Omar Perez Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	Archivo – Contrato de interventoría	

Bogotá: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co

Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900035483 - 1

CPP-DIRAF-2018-116

POLICIA NACIONAL
Subdirección Administrativa y Financiera
Oficina Gestión Documental y Archivo
Fecha: 15/03/2019
Hora: 16:30 Firma

Bogotá D.C. 15 de Marzo de 2019

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Observaciones Ventilación Mecánica.

Respetados Señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, y una vez revisada la documentación aportada referente al componente de ventilación mecánica de la Fase 4, se identificaron observaciones según planos y especificaciones técnicas, para lo cual, se requiere ampliar la información suministrada por la consultoria para continuar con el proceso constructivo.

Por lo anterior, solicitamos de manera atenta aclarar técnicamente las caracteristicas de los extractores para la ventilación mecánica, ya que la información en planos difiere de la consignada en el documento de especificaciones respecto al caudal de aire de cada equipo.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos al pronunciamiento.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TÉCNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	4 Folios	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboró	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	Archivo – Contrato de Interventoría	

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021492 - 1

CPP-DIRAF-2018-117

POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera
Unidad Administrativa y Financiera
Radicado Bajo El No.
Recibido El 15/03/2019
Hora 16:30 Firma

Bogotá D.C. 15 de marzo de 2019.

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión Pólizas ajustadas a la Adición No 2 y Prorroga No 02 al Contrato de Interventoría N° PN DIRAF No. 06-3-10051-18

Respetados Señores:

En cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales se remiten las pólizas ajustadas de acuerdo con la firma de la Adición No 2 y Prorroga No 02 al contrato de la referencia, para lo cual se remite:

- Póliza de seguro de cumplimiento No. CSC-100000413 Anexo 5

Quedamos atentos a la aprobación del documento en relación, agradecemos de antemano su atención.

Cordialmente,

JOSE LOGENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	3 folios	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Escrib Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	Archivo – Contrato de Interventoría	

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-118

Bogotá D.C. 18 de marzo de 2019.

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico-administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Respuesta al documento PN-DIRAF-POPAYAN-0156 del 14 de marzo de 2019 –Plan de inversión del anticipo.

Respetados Señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, y en respuesta al comunicado del asunto, nos permitimos remitir debidamente avalado por esta Interventoría, el plan de inversión del anticipo de acuerdo con la adición No 2.

Quedamos atentos a la suscripción del documento en relación por parte de la entidad, agradecemos de antemano su atención.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TÉCNICO
DAIMCO S.A.S.

MY ans-1-14-2-d
20/03/19
16:25

Anexos	2 folios
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espita Palomino Representante Legal
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo
Copia 1	Archivo – Contrato de interventoría

Bogotá: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co

Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 830021492 - 1

CPP-DIRAF-2018-119

Bogotá D.C. 21 de marzo de 2019

031164

Señores
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
Aurelio Gutiérrez Castillo
Representante Legal
Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Remisión orden de pago No. 21

Respetado Ingeniero:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir debidamente firmado y verificado la orden de pago No. 21, correspondiente al documento No PN-DIRAF-POPAYAN-0157 con radicado Daimco No D-2019-0598 del 19 de marzo de 2019, para continuar con su trámite ante la fiduciaria POPULAR.

- Orden de giro No. 21 - Devolución de aportes por pago de materiales, dotación y alquiler de equipos, por un valor de $ 61.532.375.00

Agradecemos de antemano su atención y estaremos atentos a cualquier solicitud.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

21-III-19

Anexos	21 folios	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego Lopez – Prof. Apoyo	
Copia 1	Archivo – Contrato de interventoria	
Copia 2.	POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Directora Administrativa y Financiera - Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 – CAN Mayor – Angel Lopez Ostos – Supervisor	

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co

Calle 44B No. 57A – 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 800021433 - 1

CPP-DIRAF-2018-120

Bogotá D.C. 21 de marzo de 2019

FECHA: 21 MAR 19
HORA: 03 1165

Señores
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
Aurelio Gutiérrez Castillo
Representante Legal
Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Remisión orden de pago No. 22

Respetado Ingeniero:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir debidamente firmado y verificado la orden de pago No. 22, correspondiente al documento No PN-DIRAF-POPAYAN-0157 con radicado Daimco No D-2019-0598 del 19 de marzo de 2019, para continuar con su trámite ante la fiduciaria POPULAR.

Cuentas por pagar a proveedores (Materiales)

- Orden de giro No. 22 - Pago de aportes por salarios, jornales y mano de obra a AG3 INGENIERIA SAS, por un valor de $ 150.000.000.00

Agradecemos de antemano su atención y estaremos atentos a cualquier solicitud.

Cordialmente,

21-III-19

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	14 folios	
Vo. Bo	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego Lopez – Prof. Apoyo	
Copia 1	Archivo – Contrato de interventoría	
Copia 2.	POLICIA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Directora Administrativa y Financiera - Carrera 59 No. 26-21 Piso 3 – CAN Mayor – Ángel Lopez Ostos – Supervisor	

Bogotá: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049178
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 65 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

59

DAIMCO
NIT: 900031482 - 1

CPP-DIRAF-2018-121

Bogotá D.C. 29 de marzo de 2019

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoria PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoria técnico-administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión Acta parcial de Interventoria No. 9.

Respetados Señores.

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y según lo establecido en la ***CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO: LA POLICIA*** *pagara al* ***CONTRATISTA*** *el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el anexo No 1 "DATOS DEL CONTRATO"* El cual reza ***"(...) PAGOS PARCIALES – Se realizaran pagos parciales hasta completar el 95% del valor del contrato, sujetas al porcentaje de avance del contrato de obra que corresponderá al valor ejecutado en el respectivo periodo (...)"*** por lo anterior nos permitimos remitir el acta parcial No. 09 de interventoria correspondiente al periodo 01 de marzo de 2019 al 29 de marzo de 2019 del contrato de la referencia, con los soportes relacionados a continuación:

- Original Factura de Venta 1391
- Acta recibo a satisfacción Interventoria
- RUT Daimco S.A.S
- Resolución de facturación DAIMCO S.A.S
- Referencia Bancaria DAIMCO S.A.S
- Copia cédula de ciudadanía (Representante legal)
- Certificado de aportes parafiscales
- Soportes Revisor Fiscal

Lo anterior para trámite y fines pertinentes

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

My Angel Giovanni López
29/03/2019
15:20

Anexos	11 folios	
Vo. Bo.	Ing. Omar Perluz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	Archivo – Contrato de interventoria	

Bogota: 57 1 7020798 / 7020797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-122

Bogotá D.C. 29 de marzo de 2019

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico-administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión Acta parcial de Interventoría No. 9 Adición 1.

Respetados Señores.

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y según lo establecido en la ***CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO: LA POLICIA*** *pagara al* ***CONTRATISTA*** *el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el anexo No 1 "DATOS DEL CONTRATO"* El cual reza ***"(...) PAGOS PARCIALES – Se realizaran pagos parciales hasta completar el 95% del valor del contrato, sujetas al porcentaje de avance del contrato de obra que corresponderá al valor ejecutado en el respectivo periodo (...)"*** por lo anterior nos permitimos remitir el acta parcial No. 09 de interventoría correspondiente al periodo 01 de marzo de 2019 al 29 de marzo de 2019 del contrato de la referencia, con los soportes relacionados a continuación:

- Original Factura de Venta 1392
- Acta recibo a satisfacción Interventoría
- RUT Daimco S.A.S
- Resolución de facturación DAIMCO S.A.S
- Referencia Bancaria DAIMCO S.A.S
- Copia cédula de ciudadanía (Representante legal)
- Certificado de aportes parafiscales
- Soportes Revisor Fiscal

Lo anterior para trámite y fines pertinentes

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	11 folios	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboró	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	Archivo – Contrato de interventoría	

18:20 29/03/2019

Bogotá: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049279
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

Recibida

POLICIA NACIONAL

DAIMCO

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

CONTRATO No. :	Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 80-8-10050-18
OBJETO:	"Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Region No 4 a precios unitarios Fijos (sin formula de reajuste)".
CONTRATISTA:	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO S.A.S
SUPERVISOR:	Mayor Ingeniero Civil Ángel Giovanni López Ostos

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
D-2019-0478	Documentos corte #8-Adicion Nro 1	1	N.A	04/03/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2019-0479	Documentos corte #8	1	N.A	04/03/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2019-0506	Respuesta oficio CPP-DIRAF-2019-108	1	N.A	07/03/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
I-2019-0533	Solicitud Informar	1	N.A	12/03/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DE LA ENTIDAD
D-2019-0545	Np Extraccion / Ventilacion Mecanica	1	N.A	13/03/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2019-0565	Plan de Inversion del Anticipo	1	N.A	14/03/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2019-0598	Orden de pago 21 y 22	1	N.A	18/03/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2019-0633	Afectacion obra por cierre de vias de acceso a la ciudad de Popayan, Cauca, zona proyecto del objeto contrato	1	N.A	22/03/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2019-0634	Actividades bloqueadas por situacion de orden publico y actividades en proceso constructivos.	1	N.A	22/03/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2019-0705	Documentos Corte # 9 - Adicion 2	1	N.A	29/03/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2019-0706	Documentos Corte # 9 - Adicion 1	1	N.A	29/03/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
I-2019-0707	Documentos Corte # 9	1	N.A	29/03/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C. a los 31 días del mes Marzo del 2019.

ENTREGA
Firma
NOMBRE: TIRSO COSME (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)
Fecha: 31 de Marzo de 2019

RECIBE
Firma
NOMBRE: Mayor Ingeniero Civil Ángel Giovanni López Ostos
Fecha: 31 de Marzo de 2019

Original: POLICIA NACIONAL
Copias: Contratista, Interventoría





Bogotá marzo 4 de 2019

PIN-DIRAF-POPAYAN-149

Señores
DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-
Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoria
Tel: 3176594536 7020798 7090797
Calle 448 No. 57A-52 Barrio La Esmeralda
Bogotá

Referencia: **CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: Documentos Corte #8-Adicion Nro 1

Enviamos documentos de factura, de acuerdo a clausula cuarta-forma de pago del contrato de la referencia:

- Constancia de recibo a satisfacción Acta Corte
- Factura de Venta 9
- Resolución de facturación Consorcio BCS-GUTIERREZ
- Rut de CONSORCIO BCS-GUTIERREZ, y de consorciados
- Certificación de pagos parafiscales y seguridad social
- Soporte de pago parafiscales
- Certificación pagos FIC
- Soporte de pago FIC
- Acta y Memorias de cantidades ejecutados

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

DAIMCO
Marzo 04- 2019 Hora: 12:48 p.m.
Folios: 00 Anexos: 116
No.Radicado D-2019-0479
Radicado: Yesenia Homes 1867-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Bogotá marzo 4 de 2019

PN-DIRAF-POPAYAN-148

Señores
DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-
Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Calle 448 No. 57A-52 Barrio La Esmeralda
Bogotá

Referencia: **CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: Documentos Corte #8

Enviamos documentos de factura, de acuerdo a clausula cuarta-forma de pago del contrato de la referencia:

- Constancia de recibo a satisfacción Acta Corte
- Factura de Venta .
- Resolución de facturación Consorcio BCS-GUTIERREZ
- Rut de CONSORCIO BCS-GUTIERREZ, y de consorciados
- Certificación de pagos parafiscales y seguridad social
- Soporte de pago parafiscales
- Certificación pagos FIC
- Soporte de pago FIC
- Acta y Memorias de cantidades ejecutadas

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

Bogotá, 06 de marzo de 2019

PN-DIRAF-POPAYAN-0151

Señores
DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-
Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
a/a Mayor Ángel G. Ostos
Supervisor de Contrato
DIRAF
Bogotá

DAIMCO
Marzo 07- 2019 Hora: 12:06 p.m
Folios: 01 Anexos: 00
No.Radicado D-2019-0506
Radicado: Yesenia Homes 1087-2018.
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Referencia: CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Respuesta Oficio CPP-DIRAF-2018-108

Ingeniero José Vicente, este oficio es una clara retaliación por el justo reclamo que se hizo a finales del mes de enero por unas medidas que no estaba de acuerdo como las querían pagar prueba de esto es que la Interventoría tomó unas muestras para resistencias de concreto de columnetas el 31 de Enero (2 días después del reclamo) sin contar con la presencia de ningún profesional de obra y al ensayarlos a los 5 días (según información recibida en este oficio a página 7), dan unos resultados que por supuesto no dan al 100% ya que se necesita 28 días y mínimo un testigo y dejan por escrito que debemos demoler en obra, cosa que en obra las estamos demoliendo para evitar futuras retaliaciones que siempre afectarán al contratista.

Lo mismo, el resto de las observaciones como lo es la foto de la tubería eléctrica que se hizo después de pañetado, me extraña que la Interventoría no sepa en obra que inicialmente se dijo que las luces de los baños se operaban con sensores y luego en reunión con los eléctricos Adán Rubio, Víctor Bocanegra y Fabio Claros decidieron colocar los interruptores cuando ya se había pañetado.

Las otras observaciones, da pena que las envíen por escrito, eso quiere decir que en obra Contratista e Interventoría no tenemos inspectores, residentes, directores ya que son obras que se están ejecutando y las falencias son del proceso constructivo el cual no está terminado, la columneta que presentan hormigoneada se nota que fue un sobreancho que se tuvo que retirar para no hacer sobrepañetes.

En todo caso todas las observaciones se tomarán como beneficio para entregar la obra en las mejores condiciones y agradezco esas observaciones se digan directamente en obra y en el momento.

Atentamente,

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No. S-2019 - 007159 DIRAF – GUMAI

DAIMCO
Marzo 13- 2019 Hora: 13:59 p.m
Folios: 02 Anexos: 00
No.Radicado D-2019-6533
Radicado: Yesenia Homez 1987-2019
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Bogotá D.C., 11 de marzo de 2019

Señor
CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO
Representante legal DAINCO S.A.S
Carrera 43 No. 57A-52
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud informar.

En virtud de mis funciones como supervisor del contrato de interventoría No. 06-3-10051-18 cuyo objeto es "Interventoría técnico-administrativa, financiera, legal y ambiental para la Construcción y Dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región no. 4 a precios unitarios fijos sin formula de reajuste", dentro del cual señalan en su cláusula número decima primera **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA,** y la comunicación CPP-DIRAF-2018-108 del 05 de marzo de 2019 emitida por ustedes, menciona lo siguiente:

> *"CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:*
> *OBLIGACIONES ESPECÍFICAS;*
> *DE CARÁCTER TÉCNICO: 3. Velar por el correcto desarrollo de los trabajos a ejecutar, de acuerdo a planos aprobados, especificaciones, cantidades de obra, precios establecidos en el contrato de obra, así como el cumplimiento de normas de calidad, seguridad, economía y aspectos ambientales, el estricto cumplimiento del programa de trabajo y someter a consideración del supervisor las modificaciones que por razones de orden técnico o por naturaleza de la obra fueran necesarias. 7. Inspeccionar de manera permanente las obras y dotación que ejecute el contratista durante la ejecución del contrato de obra. 8. Inspeccionar permanentemente los materiales que se utilicen en la obra y dotación rechazando los que no se ajusten a las especificaciones técnicas dadas. 11. Comprobar permanentemente que se hagan todos los ensayos de laboratorio necesarios para la correcta ejecución de la obra. 12. Exigir a la firma contratista que los laboratorios para los ensayos de materiales y calidad de los productos estén certificados.*

Solicito al señor contratista ejercer en debida forma sus obligaciones contractuales en especial en lo referente a las labores previas de diseño y dosificación de las mezclas en obra, así como el acompañamiento oportuno que permita optimizar los tiempos de ejecución y evitar reprocesos. Por lo anterior esta supervisión, espera el informe sobre lo reportado por ustedes y las acciones adelantadas con el fin de cerrar el incidente.

Atentamente,

Mayor ÁNGEL GIOVANNI LÓPEZ OSTOS
Supervisor Contrato de Interventoría PN-DIRAF 06-3-10051-18

Elaborado por: MY. Ángel Giovanni López Ostos
Revisado por: MY. Daniel Elías silva Ibarra
Fecha elaboración: 11/03/2019

Carrera 59 No. 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos: 3159000 IP. 9013
diraf.guged@policia.gov.co
www.policia.gov.co

67

Bogotá, marzo 13 de 2019

PN-DIRAF-POPAYAN-154

DAIMCO
Marzo 13- 2019 Hora: 14:23 p.m
Folios: 02 Anexos: 14
No.Radicado D-2019-0545
Radicado: Yesenia Homez 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Señores:
DAIMCO S.A.S
a/a: Ing. José Vicente Bocanegra
Gerente técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoria
Tel.: 317 659 4536 7020798 7030797
Calle 44B No. 57ª-52 Barrio La Esmeralda
Bogotá

Referencia: CONTRATO No 06-6-10044-18 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN NO 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

Asunto: Np Extracción / Ventilación Mecánica

Cordialmente remitimos la documentación asociada al asunto (formato APU-NP131, especificaciones y justificación técnica, tres cotizaciones, carta de certificación de solución Jellyfish Power), dando cubrimiento a la necesidad de instalar un sistema para la ventilación y extracción dirigida a los baños del bloque de suboficiales (edificio 3) de los alojamientos en proceso de construcción. Se pone en conocimiento la solución mediante extractores de baño con las siguientes características:

- Potencia 20W
- 190 caudal (m3/h)
- Nivel sonoro 34 dB (A)
- Extraplanos, ultra silenciosos, de alto rendimiento, de fácil y rápida instalación.
- Con compuerta antirretorno (damper) para evitar el ingreso o retorno de olores.
- Cumplimiento de estándar 62.11 de ASHRAE para ventilación en estos espacios

(13)

El precio de No previstos se muestra a continuación:

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP - 131	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR PUNTUAL PARA BAÑO.	UN	18	$ 631.312	$ 11.363.616

De antemano agradezco su atención,

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO

Representante legal

Consorcio BCS – Gutiérrez

Bogotá, marzo 14 de 2019

PN-DIRAF-POPAYAN-156

Señores
DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-
Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Bogotá

DAIMCO
Marzo 14- 2019 Hora: 13:58 p.m
Folios: 01 Anexos: 01
No.Radicado D-2019-0555
Radicado: Yesenia Hamaz 1087-2019
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Referencia: CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Plan de Inversión del Anticipo

Enviamos PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO de acuerdo a Adicion #2, para su revisión y visto bueno.

Atentamente,

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

Bogotá, marzo 19 de 2019

DAIMCO
Marzo 19- 2019 Hora: 11 :46 a.m
Folios: 01 Anexos: 37
No.Radicado D-2019-0598
Radicado: Yesenia Herrez 1067-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Señores

DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-
Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Bogotá

PN-DIRAF-POPAYAN-157

Referencia: CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Orden de pago 21 y 22

Por medio de la presente se adjunta los siguientes documentos para pago respectivo.

- Orden de pago 21
- Orden de pago 22
- Relación de ordenes de pago a la 21
- Relación de ordenes de pago a la 22

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

21

Bogotá, marzo 21 de 2019

PN-DIRAF-POPAYAN-163

Señores
DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-
Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Bogotá

DAIMCO
Marzo 22- 2019 Hora: 13:05 p.m
Folios:09 Anexos: 00
No.Radicado D-2019-0633
Radicado: Yesenia Homes 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Referencia: **CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: Afectación obra por cierre de vías de acceso a la ciudad de Popayán, Cauca, zona proyecto del objeto contrato

Respetado ingeniero,

Como es bien sabido, en el departamento del Cauca, el CRIC, Consejo Regional Indígena, desde el pasado 13 de marzo ha venido realizando actividades en pro de exigencias que viene solicitando al gobierno central. Hasta la actual fecha, al no ser atendidas dicha exigencia y desde ese pasado 13 de marzo de 2019, los grupos indígenas de la región tomaron vias de hecho, entre las cuales estuvo el cierre de la vía nacional que comunica a la ciudades de Cali y Popayán, al igual que de las vias que conducen al Huila y, de forma esporádica, la via a Pasto, lo que ha venido causando un progresivo desabastecimiento de productos a los departamentos del Cauca y Nariño, principalmente, ver anexos.

DIARIO DEL CAUCA
Jueves 14 de marzo de 2019
Pablo Lemos / pablolemos@gmail.com

Cierre en varios tramos de la Panamericana

Bloqueos y enfrentamientos no paran en minga indígena

En vista de que no hubo una fecha definida para la llegada del presidente Iván Duque, los dirigentes de la Minga por la Vida y el Territorio, bloquearon la vía Panamericana y las rutas alternas.

Mediante un comunicado oficial el Consejo Regional Indígena CRIC, ratificó que la Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz del Suroccidente colombiano, continúa hasta que el presidente Iván Duque llegue al Cauca con soluciones ante sus exigencias.

Entre tanto, afirman que continuarán con las vías de hecho e invitan a la comunidad a ser partícipes de su lucha. Se aclara que hasta el cierre de esta edición aún no se conocía de la llegada del presidente.



Aida Quilcué, Consejera CRIC.

Bloqueos

El CRIC afirmó que bloquearon la vía Panamericana, porque consideran respuestas escuetas las otorgadas por la Ministra del Interior, Nancy Gutiérrez y los delegados nacionales, puesto que no tenían una fecha definida para la llegada del primer mandatario.

La Ministra Gutiérrez manifestó que, "reiteramos la disponibilidad del presidente Iván Duque para dialogar y buscar soluciones a las condiciones de los pueblos indígenas".

El sector indígena aclaró que no solo el CRIC está en protesta, también participan delegados de campesinos del Cinu, Marcha Patriótica y organizaciones sociales e indígenas de Hidroituango en Antioquia, comunidades del Chocó, Valle del Cauca, Huila, Tolima, Nariño y Caquetá; quienes hacen presencia en las zonas de bloqueo.

Así mismo, el representante del CRIC Neis Larre, dio a conocer que necesitan de la presencia del Presidente Colombiano, porque es la responsabilidad que debe dar testigo de los acuerdos, puesto que ellos son los directamente afectados por los incumplimientos del ente nacional.

Los manifestantes afirman que cuentan con aproximadamente 17 mil autoridades que están distribuidas en los puntos estratégicos de la vía, de tal manera que desde la noche del pasado lunes está bloqueada la Panamericana en tres lugares: El Descanso, El Rosal y La Agustina, donde permanecen vehículos atravesados, palos, piedras y manifestantes. Los bloqueos se prolongan durante toda la noche y madrugada a pesar del anuncio en Consejo de Seguridad que afirmaba que la fuerza pública no permitiría afectaciones a la movilidad.

Finalmente, uno de los mingueros, que se encuentra en los puntos estratégicos de la vía, invitó a las personas que viven del trabajo diario, con ingresos de menos de un salario mínimo y a todos aquellos que se ven afectados por las políticas impuestas por el Gobierno, a que participen activamente de la minga de resistencia y añadió que, "hay que estar atentos a las orientaciones de las autoridades, ya que se pueden presentar situaciones en contra de la minga, que es posible que dure más de 15 días o hasta un mes".



Bloqueos en la Panamericana.

Jueves
DIARIO DEL CAUCA
$1.000
@diariodelcauca1 www.diariodelcauca.com.co 8 2001 Popayán, 14 de marzo de 2019

EDITORIAL

Autobús se precipitó a un abismo

Un grave accidente se presentó en el sector de Brisas del Río Villarrel, en la vía que de Bolaños va para Inzá. El saldo es de cuatro personas muertas y diez heridas. "El autobús salió de Bolaños en horas de la mañana, al parecer tuvo una falla mecánica que hizo perder el control al conductor." Entre tanto, hasta hoy se conocer el listado de los afectados. Luz Marina Tobar, María Jesús Muca, María Mendoza, Claudia Muñoz, Fabián Martínez, Rolando Narváez, Angel Quinayá y el A.A.F.

Diálogos infructuosos en Caldono

CRIC dice que la minga va para largo

En vista de que no hubo una fecha definida para la llegada del presidente Iván Duque, los dirigentes de la Minga por la Vida y el Territorio, bloquearon la vía Panamericana y las rutas aledañas.

Mediante un comunicado oficial el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, informó que la Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz del Suroccidente colombiano, continúa hasta que el Presidente Iván Duque llegue al Cauca a cumplir los acuerdos pactados. Entretanto, afirman que continuarán con las vías de hecho e invitan a la comunidad a ser partícipes de su lucha.



Arremeten contra campamentos en el Cairo

Choques entre manifestantes y ESMAD

Según el boletín de Derechos Humanos el pasado sábado, el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD atacó de manera indiscriminada los campamentos de los campesinos en los puntos del Cairo y el Túnel, ubicados en la panamericana en el marco de la 'Minga por la defensa de la vida y el Territorio'.

El comunicado informó que la arremetida se perpetró mientras los campesinos estaban realizando un proceso de pedagogía sobre el respeto a misión médica y humanitaria. El documento resalta que no había bloqueos ni barricadas por parte de los campesinos, sin embargo el ESMAD inició un proceso de represión en contra de los manifestantes.

De tal manera que agentes de este escuadrón llegaron al punto de concentración, lanzando gases lacrimógenos sin ninguna provocación y causaron la destrucción total del campamento, incinerando los implementos de los campesinos. Además, se informó un camión del ESMAD extrajo las pertenencias de los manifestantes ubicados en este punto entre ellos que se encontraban implementos plásticos, ollas, toldos, cicletas, alimentos, entre otras provisiones.

Se informa que pese a que los campesinos se habían replegando el ESMAD sigue lanzando gases lacrimógenos, generando varios heridos, entre los que se encuentra Nora Huirtado una campesina que participaba en el evento, cual fue trasladada a un centro hospitalario.



Comisión de Derechos Humanos y Cruz Roja, en reunión con la comunidad afectada

Finalmente, los participantes de las organizaciones movilizadas advierten que estos hechos se suman a los ocurridos durante el transcurso de estos días como intimidaciones, presencia policial y ESMAD cerca de puntos de concentración, hostigamientos, estigmatización y falsas noticias sobre la minga en medios de comunicación, detalmanera que queda en riesgo la integridad de las distintas delegaciones de los procesos sociales que participan de la minga.

La visita al Cauca no se concretó

Duque rechaza las acciones de los indígenas

En la realización del Taller Construyendo País, en Miná, Viagrés, el Presidente de Colombia, Iván Duque, envió un mensaje a los indígenas del departamento del Cauca, quienes desde el pasado martes 12 de marzo bloquean la vía Panamericana.

"Es un gobierno dispuesto al diálogo, pero lo que no podemos validar es ninguna vía de hecho", dijo el presidente. En el mismo envió, Duque fue claro en decir, que "no puede haber ninguna justificación para que los derechos fundamentales de los demás se vean violados".

Durante su intervención, se refirió a la visita de la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez a la zona de El Túnel, en el municipio de Caldono. "La Ministra del Interior mostró la clara voluntad del Gobierno Nacional en dialogar con los comunidades indígenas".

Así mismo, fue enfático en decir, que no se necesita ninguna vía de hecho, para dialogar con el ente Nacional. A su vez, Duque trajo a colación los acuerdos de sus antecesores, y dijo que, "muchas veces se han hecho acuerdos imposibles y multimillonarios que el Estado Firma sin la capacidad de cumplir, y eso no está bien", puntualizó el presidente.



DIARIO DEL CAUCA
Lunes 18 de marzo de 2019

Pablo Labarre / secciones@unial.com

Bloqueos inamovibles en la Panamericana

Balance tras una semana de minga indígena en el Cauca

Ocho días transcurren desde el inició de las manifestaciones por la defensa de las peticiones de distintas organizaciones sociales ante el gobierno, que tienen en vilo al departamento del Cauca.

Tras ocho días de haber empezado la minga indígena en el Cauca, las autoridades y medios de comunicación han logrado realizar un balance de la información más importante al respecto y la perspectiva a lo que pueda suceder durante los próximos días.

En el momento se presentan 2 puntos de bloqueo en Caldono, uno en El Descanso con participación de 280 indígenas y otro en El Rosal con participación de 260 indígenas). Estos han afectado la libre movilización en el Cauca, causado pérdidas económicas millonarias, desabastecimiento de víveres y daños en las vías y poblaciones donde se presentan.

Respecto a la concentración de manifestantes, hay seis puntos del departamento, donde además se realizan bloqueos intermitentes: en Caldono (Monterilla - 6.000 indígenas), Cajibío (El Cairo - 80 campesinos COCCAM y El Túnel - 70 campesinos COCCAM), Piendamó (La María – 80 indígenas Misak), Santander de Quilichao (Mondomo - 150 indígenas) y Toribío (Ruta Libertadores - 150 nativos).



Bloqueo en la vía Panamericana, al Norte del Cauca.

Encuentro los resultados encontrados en las últimas intervenciones del ESMAD, en la vereda El Cairo, se incautan 35 contenedores de vidrio, 47 artefactos explosivos por impacto (papas bomba), 4 kg de fragmentación y 4 kg de clorato de potasio. Por su parte en la vereda El Túnel, se incautan artefactos explosivos improvisados, 5 kg de grapas, 1000 canicas, 115 artefactos explosivos por impacto (voladores), 3 kg de clorato de potasio, 2 kg de polvo de aluminio y 2 kg de mezcla explosiva.

Desde que iniciaron los bloqueos se reporta que ha habido 20 intervenciones del Esmad, en las cuales se han realizado 9 notas criminales a los mismos sostenos por terrorismo, amenazas, violencia, porte de municiones o explosivos y obstrucción de vías públicas.

Por otro lado, ayer a las 11:00 am arribó a la comisión fiscal de la Fiscalía General de la Nación al corregimiento El Pital para tratar de aportar a los diálogos y



Jonathan Centeno, Marcha Patriótica.

procurar dar solución a las peticiones de los indígenas y acabar con las vías de hecho.

Los indígenas hacen un buen balance de la Minga y dicen mantenerse en pie de lucha esperando por más delegaciones que se sumen a su propósito. "Podemos prescindir del gobierno nacional, de lo contrario vamos a seguir resistiendo en esta movilización que es el único recurso que nos han dejado. Desde el 28 de febrero se le envió la carta de invitación al Presidente para dialogar en torno a estas temáticas que hemos hecho y [illegible]", Centeno, vocero de Marcha Patriótica.



Lunes

DIARIO DEL CAUCA

$1.000

f /DiarioDelCauca @diariodelcauca1 www.diariodelcauca.com.co #2005 Año IV - 16 páginas Popayán, 18 de marzo de 2019

Una semana de minga indígena

La minga indígena completó una semana, hasta ahora los pronunciamientos estatales han sido insuficientes para la comunidad nativa que sigue bloqueando la vía Panamericana. Los enfrentamientos con la fuerza pública se han presentado todos los días, las manifestaciones denuncian represión de las autoridades. Ver Pagina 5A

¿Hay un buen servicio de transporte en la ciudad?

ver 7A

EDITORIAL

DIARIO DEL CAUCA
Martes 19 de marzo de 2019

Claudia Otero | claudiaotero@elcaucano.com

Se desconocen los avances en negociaciones

Empieza segunda semana de paro indígena en Cauca

Crece la angustia en el departamento, ya que van dos semanas de bloqueos en la vía Panamericana y aún no se conocen negociaciones entre indígenas y el ente nacional.

Aumenta la incertidumbre en en el departamento del Cauca al iniciar la segunda semana del paro llevado a cabo por el sector indígena con el apoyo de otras organizaciones, las cuales tienen sembloqueado al departamento.



Nancy Patricia Gutiérrez, Andrés Valencia, Ministros del Interior y Agricultura, y Nels Lame, representante CRIC.

Bloqueo de rutas

Desde el inicio de la Minga, cada vez son más las rutas que se cierran en el departamento. Si bien la fuerza pública ha hecho su intervención para mantener abierta la ruta alterna Morales- Suárez, otros trayectos indispensables, como las vías que comunican con el Huila han sido bloqueadas. A pesar de estar habilitado el corredor humanitario, el combustible está siendo regulado en la ciudad, priorizando a los vehículos de uso público. Por su parte, los indígenas se pronunciaron este fin de semana y afirmaron que, "esto va para largo", por lo cual ratifican que están en disposición de permanecer en la vía al tiempo que sea necesario para lograr ser escuchados por el gobierno de Duque. Sin embargo, el máximo mandatario de Colombia mantiene una postura hasta ahora inamovible quien afirmó que con vías de hecho no hay negociación.

Presidencia

En este sentido el presidente de la República, aseguró que está abierto al diálogo con los indígenas que mantienen bloqueos en la vía Panamericana y señaló que están afectando los derechos fundamentales de los demás. Por otra parte, se sabe de algunas reacciones de la población que quedó en medio de las manifestaciones de tal manera que el fin el pasado fin de semana, habitantes de la Agustina, Santander de Quilichao Cauca, protestaron contra los bloqueos de la vía Panamericana por parte de los indígenas. Estas personas manifestaron que respetan las exigencias, pero piden libre movilidad por este corredor vial.

A su vez, los sucesos del Cairo Cajibío en donde agentes del ESMAD arremetieron en la concentración de Marcha Patriótica, generó varias denuncias de supuesto abuso de autoridad, en donde las autoridades reportaron el hallazgo de elementos explosivos no convencionales, motivo por el cual la Defensoría del Pueblo suspendió las acciones de verificación y acompañamiento de los derechos humanos en el marco de la movilización, por falta de garantías.



Jueves

DIARIO DEL CAUCA

$1.000

Popayán, 21 de marzo de 2019

Retomarán diálogos en medio de la tensión

Se agudiza la crisis en el Cauca

Medidas de emergencia

Habilitan entrada de combustible por Tumaco

¿Qué opina de las objeciones a la JEP?

EDITORIAL

Ministra del Interior

Además de lo mencionado anteriormente el Contratista, como se indicó en el oficio, radicado a la Interventoría, PN-DIRAF-POPAYAN-159, del 18 de marzo de 2019, ver anexo, también ha adquirido para la obra otros insumos para llevar a buen término las actividades, como son:

- Puertas Metálicas:
  Valor Costo Directo: $111.274.000
  Nota: Pago de Anticipo, lista para entrega

- Carpintería en Aluminio:
  Valor Costo Directo: $389.017.000
  Nota: Pago de Anticipo, lista para entrega

- Celdas y Transformador:
  Valor Costo Directo: $137.000.000
  Nota: Pago de Anticipo, lista para entrega

- Equipos de Red Contra Incendios:
  Valor Costo Directo: $118.320876
  Nota: Pago de anticipo, entrega en 3 semanas

- Carpintería en Madera:
  Valor Costo Directo: $523.712.000
  Nota: Pago de Anticipo, estos elementos están en proceso de construcción.

- Planta Eléctrica:
  Valor Costo Directo: $65.010.443
  Nota: Pago de Anticipo, lista para entrega

Los proveedores han informado al contratista que, debido al volumen de esto insumos y la imposibilidad de realizar la entrega de estos, han tomado la decisión de realizar cobro de bodegaje por estos elementos, costos que el contratista no tiene contemplados dentro de su presupuesto.

Por todo lo anterior el Contratista solicita, comedidamente, a la Interventoría, se haga un análisis detallado de la crisis anteriormente mencionada, y se tomen medidas de apoyo al ejecutor, en pro del bienestar y pronta terminación de las obras objeto del contrato de la referencia.

Cordialmente,

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

DAIMCO
Marzo 22- 2019 Hora: 13:05 p.m
Folios:04 Anexos: 00
No.Radicado D-2019-0634
Radicado: Yesenia Nunez 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Bogotá, marzo 18 de 2019

PN-DIRAF-POPAYAN-159

Señores
DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-
Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Bogotá

Referencia: **CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: Actividades bloqueados por situación de orden público y actividades en proceso constructivos

Cordialmente solicito informa el avance de obra informar al contratante, y para el corte de mes de marzo tener en cuenta la siguiente situación:

Debido a la situación de orden público que presenta la zona de la obra (bloqueo en la vía panamericana, principal zona de acceso a la ciudad de Popayán) , tenemos bloqueados en Bogotá los siguientes materiales los cuales ya están pagados sus respectivos anticipos y listos para su despacho a Popayán:
Todos los materiales de estas actividades se debieron entregar la semana pasada:

Puertas Metálicas:
Valor Costo Directo: $111.274.000
Nota : Pago de Anticipo, lista para entrega

Carpintería en Aluminio:
Valor Costo Directo: $389.017.000
Nota : Pago de Anticipo, lista para entrega





Celdas y Transformador:
Valor Costo Directo: $137.000.000
Nota : Pago de Anticipo, lista para entrega

Equipos de Red Contra Incendios:
Valor Costo Directo: $118.320876
Nota : Pago de anticipo, entrega en 3 semanas

Carpintería en Madera:
Valor Costo Directo: $523.712.000
Nota : Pago de Anticipo, estos elementos están en proceso de construcción.



Planta Eléctrica:
Valor Costo Directo: $65.010.443
Nota : Pago de Anticipo, lista para entrega





Atentamente,

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

Bogotá marzo 29 de 2019

DAIMCO
Marzo 29- 2019 Hora: 15 : 48 p.m
Folios: 01 Anexos: 15
No.Radicado D-2019-0705
Radicado: Yesenia Hornez 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

PN-DIRAF-POPAYAN-166

Señores
DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-
Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoria
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Calle 448 No. 57A-52 Barrio La Esmeralda
Bogotá

Referencia: **CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: Documentos Corte #9- Adición 2

Enviamos documentos de factura, de acuerdo a clausula cuarta-forma de pago del contrato de la referencia:

- Constancia de recibo a satisfacción Acta Corte
- Factura de Venta
- Resolución de facturación Consorcio BCS-GUTIERREZ
- Rut de CONSORCIO BCS-GUTIERREZ, y de consorciados
- Certificación de pagos parafiscales y seguridad social
- Soporte de pago parafiscales
- Certificación pagos FIC
- Soporte de pago FIC
- Acta y Memorias de cantidades ejecutados

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

Bogotá marzo 29 de 2019

DAIMCO
Marzo 29- 2019 Hora: 15 : 48 p.m
Folios: 01 Anexos: 15
No.Radicado D-2019-0706
Radicado: Yesenia Nemez 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

PN-DIRAF-POPAYAN-165

Señores
DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-
Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Calle 44B No. 57A-52 Barrio La Esmeralda
Bogotá

Referencia: **CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: Documentos Corte #9- Adición 1

Enviamos documentos de factura, de acuerdo a clausula cuarta-forma de pago del contrato de la referencia:

- Constancia de recibo a satisfacción Acta Corte
- Factura de Venta
- Resolución de facturación Consorcio BCS-GUTIERREZ
- Rut de CONSORCIO BCS-GUTIERREZ, y de consorciados
- Certificación de pagos parafiscales y seguridad social
- Soporte de pago parafiscales
- Certificación pagos FIC
- Soporte de pago FIC
- Acta y Memorias de cantidades ejecutados

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

Bogotá marzo 29 de 2019

DAIMCO
Marzo 29- 2019 Hora: 15 : 48 p.m
Folios: 01 Anexos: 15
No.Radicado D-2019-0707
Radicado: Yesenia Homes 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

PN-DIRAF-POPAYAN-164

Señores
DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-
Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Calle 44B No. 57A-52 Barrio La Esmeralda
Bogotá

Referencia: **CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: Documentos Corte #9-

Enviamos documentos de factura, de acuerdo a clausula cuarta-forma de pago del contrato de la referencia:

- Constancia de recibo a satisfacción Acta Corte
- Factura de Venta
- Resolución de facturación Consorcio BCS-GUTIERREZ
- Rut de CONSORCIO BCS-GUTIERREZ, y de consorciados
- Certificación de pagos parafiscales y seguridad social
- Soporte de pago parafiscales
- Certificación pagos FIC
- Soporte de pago FIC
- Acta y Memorias de cantidades ejecutados

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

Anexo No. 3 Actas de comité

ACTA DE REUNIÓN N° 29

DAIMCO

Marzo 08/2019

NOMBRE PARTICIPANTE	CARGO EMPRESA	CELULAR	FIRMA ASISTENCIA
Julian Giraldo	Dir. Obra.		
Arq. Monica Benítes	Res. Interventoría	3146156619	
Tirso Cosme	Dir. Interventoría	3101117761	
Victor Hugo Per	Ingeniero Eléctrico.	3137036978	
Juan del mar Rodriguez	Residente SST MA	3015725028	
MARIA TERESA OTERO C.	RESIDENTE OBRA CONSORCIO BOS-GUTIERREZ	3138027442	
	RESID. OBRA. MKO		

Scanned by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN N° 29 FECHA: 8-03-2019	DAIMCO		Pag.

- Lectura acta anterior (#28)
- Compromisos:

* Se presenta NP de ventana en el balance aprobarse en un adicional que se solicita DRAI

* Sobre los filtros alrededor tanque ECI ; contratista no presenta propuesta, e interventoría consultará con asesor estructural.

* El tema del plan de Contingencia mientras por la construcción de personal en la zona que cumpla con requisito de certificación en altura para trabajos exteriores techados y no es facil. pero algo se avanza y el contratista ha estado dispuesto.

* (Hoyuelo OK de. evacuación de aguas y redes Hidro sanitarias hacia y desde el cuarto a construir en ítems del adicional a aprobar.

Scanned by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN N° ___ FECHA: _____	DAIMCO	Pag.

A. DECISIONES TOMADAS

* Se le solicita al contratista la ejecución de prueba de estanqueidad en tanque R.C.I.

* Aun persisten algunas observaciones respecto de mejora o reparación de columnetas y vigetas. Corregir.

Scanned by CamScanner

IV. TEMAS TRATADOS

* El tema de licencia ambiental y ampliación licencia de construcción

→ Aún espera de poderes depute draft para radicación de respectivos tramites

* Respecto de las observaciones de interventoría el contratista señala: dejar constancia que se han venido realizando.

→ Esta interventoria efectivamente efectua sobre las correcciones en diferentes actividades que el contratista ha realizado

* La interventoría conceptua que hay diferentes frentes que el contratista puede atacar para reportar % ejecutado como

- Relleno en cachorros

Scanned by CamScanner

* Se comenta sobre posible pero investigar que de acuerdo a redes sociales se realizara después del 10 de Marzo con fines de que si esto sucede el constructor pueda tomar las medidas pertinentes para afrontar esta situación que podría afectar el rendimiento de obra.

Scanned by CamScanner

B. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
* Definición de replanteo, entre Plano estructura y Arquitectonico de la Columnata	Interventoria - Constructor
* Incrementar inicio de actividades como estuco pintura y Piso	Contratista

Scanned by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN N° 30

DAIMCO

15 - Marzo - 2019

NOMBRE PARTICIPANTE	CARGO EMPRESA	CELULAR	FIRMA ASISTENCIA
Julian Giraldo	Dir. Obra.		
Arq. Monica Benitez	Residente Interv	3146156671	
Yuri del mar Rodriguez	Residente SST MR	3=4372502	
Tirso Cosme	Dir. Interv	3104117761	
[illegible]	RESIDENTE OBRA CONSORCIO BOLIVAR	321 802 4412	
EDGAR CALUETE	RESID. OBRA 1PQ		

Scanned by CamScanner

IV. TEMAS TRATADOS

- lectura acta anterior. Ok.

- Temas relacionados con ítems no previstos quedan aprobados de acuerdo a presupuesto de UP y adicionales aprobado c/o firmado el día catorce (14) por el contratista y dicp.-

- El tema de redes para area. donde queda cimentación con propuesta de contratista se hasta revisión quedara aprobado por esta intervención.

- Propuesta de redes Ok.

* Continua espera de Poderes para adelantar gestión de actualización licencias Ambiental y construcción.

Scanned by CamScanner

* El contratista como fue su compromiso inicio labores de enlace y pintura en primer piso de oficinas.

* Interventoria definio las diferencias entre diseño estructural y arquitectonico que habian diseño ghinnasio.

*

Scanned by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN N° 32

FECHA: 15-05-19

DAIMCO

Pag

* Respecto del tema de pago, inquietud anunciado: es un hecho pero en la actualidad el contratista tiene en almacen suficiente material en obra para no presentar un atrazo evidente.

* El contratista advierte sobre equipo y material electrico, igualmente carpinteria metalica en camino desde Bogota a Popayan.

* El constructor comenta sobre el item de pedidos que a la fecha se venia realizando con repetitivo: en la actualidad no podran volver a suministrar para en esa eventualidad continuar con obra y cemento de la forma tradicional.

Scanned by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN N° ___ FECHA: _____	DAIMCO	


A. DECISIONES TOMADAS

* Contratista pone en conocimiento de hora entrega de analisis de precios no previstos de algunas actividades que no se tuvieron en cuenta en presupuesto de adicional.

* Esta interventoria recuerda al contratista sobre las observaciones en los terminados de las actividades como fundicion vigueta, zapatas, internos y de fachada al igual del rendimiento que el constructor se compromete a mejorar.

* Interventoria solicita nueva programación

Scanned by CamScanner

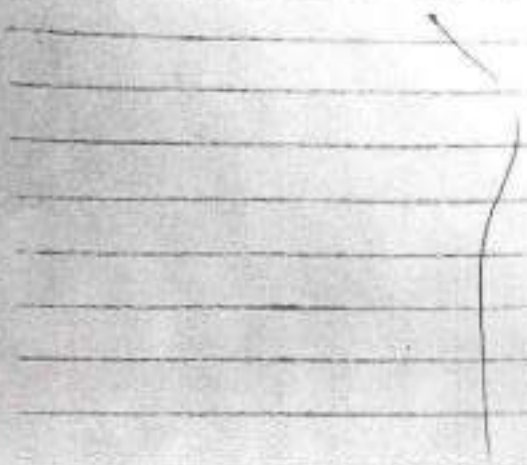

8. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
* Entrega Nueva programación con flujo inversión	Contratista
* Revisión y Aprobación de Nueva Programación	Interventoría
* —	—

Scanned by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN N°32

DAIMCO

FECHA: 02 Abril/19

Pag. 07

NOMBRE PARTICIPANTE	CARGO- EMPRESA	CELULAR	FIRMA ASISTENCIA
Ing Angel Gustavo Lozada	Supervisor Interventoría	79'369.394	
Adrian M. Giraldo	Dir. Obra - BGSA		
TIRSO GOMEZ	Dir Interventoría	3104199761	
Arq Monica Benitez	Res. Interventoría	3146156677	
Jhoan Alexander Zuluaga	Res. SST HA	3213725028	
EDGAR CALVETE	RESID. OBRA BOG	3173823629	
Sandra Lucia Gaviria P.	Res. Interventoría	3139702154	
MARIA TERESA UPEGUI	RESIDENTE OBRA CONSORCIO BOG-OUT	3218024442	
Juli Gómez Urbano	Residente SST HA Consorcio BOG-Guayabal	3184732094	

Scanned by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN N° 32

FECHA: 02 Abril/19

DAIMCO

Pag. 01

A-P1-F3

AREA O PROYECTO: FASE 4 - EDIFICIO D - ALOJAMIENTOS

SOCIOS ☐ CONSULTORIA ☐ OBRA ☐ OTROS _____ ☐

I. PARTICIPANTES	CARGO
Angel Giovanni Lopez D.	MAYOR - SUPERVISOR INTERVEN.
Julian H Giraldo	DIR - OBRA BCS-G
TIRSO COSME	DIR - INTERVENTORIA
Monica Benitez	ARQ - RES. INTERVENTORIA
Rosa del Mar Rodriguez	Residente SSTMA
Edgar Calvete	ARQ - RES - OBRA - BCS-G
MARIA TERESA OJEDA	RES. DCSTE - OBRA BCS - GOTE.
YUDI GOMEZ URBANO	RESIDENTE - SSTMA BCS GOTE
SANDRA LUCIA GUAUÑA	RESIDENTE - INTERVENTORIA

II. OBJETO

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN NRO. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Scanned by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN N° 32 FECHA: 2 Abril /19	DAIMCO		Pag 03

IV. TEMAS TRATADOS

- El Mayor Angel Lopez solicita que todos los 24 deben estar en Bogotá las Actas y asignar en Obra e Interventoría encargados para esta entrega.
- Ing. Tirso solicita que 3 Dias antes se entregan para su revision
- Arq. Edgar encargado por parte de Obra y la Ing. Sandra por parte de Interventoría ~~ena~~ Actas
- del 1ro al 5 informes mesuales de Interventoría y por favor entregar informe de

- Elaborar una Carpeta en medio Magnetico donde se puedan evidenciar Laboratorios, Carteras de topografía, perfiles y Planos record para revision final
- Jueves por favor entregar Registro fotográfico y la evaluación porcentaje de la Semana; desglosar Principal, Adicion 1 y Adición 2.
- Enfocar en pagos Principal y Adición 1 por urgencias
- Los Canales de Comunicación se deben respetar y se solicita que esten en Obra e Interventoría a Disposicion tecnica para rendimiento de Información.

Scanned by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN N° 32 FECHA: 2 Abril/19	DAIMCO		Pág. 4/4

- Bolicita el Mayor que la información que se maneja al interior de la Obra se debe manejar de manera confidencial y a través de los conductos regulares.
- Licencias: apenas se autorizan la tala de los otros arboles que afectan la otra parte de la fase 4 realizar la tala con base en la información de la CRC.
- Licencia de Construcción enviar la información para la revisión de los documentos y planos y tener listo para cuando se ~~vaya~~ vaya a terminar la vigencia de la actual
- Revisar la situación con respecto de la situación actual del paro en la ciudad y hacer un análisis de esta situación y como esta afectando el desarrollo
- La Documentación ya esta en solicitud y el poder ya se presentón en Curaduría y se inicia también trámite en CRC.
- Se le solicita al Contratista que pueda Iniciar el Gimnasio desde hace unos días por favor ingresar personal para poder atacar ese frente de trabajo y repuntar los otros frentes y mejorar el rendimiento.
- Se realizara visitas en Bogota para revisar materiales que se encuentran comprados y que no son han podido enviar.

Scanned by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN N° 32

FECHA: 02 Abril /19

DAIMCO

A. DECISIONES TOMADAS

- Revisar porcentajes de ejecución y rendimientos en Obra para no generar diferencias grandes. Revisar rutas criticas.
- Chequear bien vanos de Ventanería y detalles de acabados para rendimientos.
- Se le solicita al mayor revisión del sistema de ventilación mecánica y se toma que por la no respuesta de la consultoría se definir plantear una ventana de 60x30 en celosia la cual se definira en conjunto.
- El mayor solicita se estudie la construcción de refuerzo para el mantenimiento posterior de las fachadas.
- El mayor autoriza estuco para fachadas trasversales o culatas en los edificios para que acabado sea el adecuado.
- Arq. Edgar solicita se revise las especificaciones del mobiliario y el Mayor pide que se ~~revisen~~ estas especificaciones para que en Bogota se planten los mobiliarios.
- Hay que elaborar trampas de grasas por el area de las cocinas.
- Ha un muro para contenedor de rnizes ya que se van a cortar en este contrato y no van a afectar.
- Se debe estudiar la posibilidad de construir una media cana en toda la pata de los

Scanned by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN N° 32.

FECHA: 2 Abril/19

DAIMCO

- Elaborar puente para mantenimiento gemelo al otro ubicado entre el volumen del casino y bloque 3 Oficinas y dejarlo con retylo.

-

Scanned by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN N° 32 FECHA: 02 Abril /19	DAIMCO		Pag 97

B. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA
1- Entrega Actas 24 dec/mes	Obra: Arq Edgar	
	Inter. Ing Sandra	
2. Elaboracion Archivo Digital con Informacion Gral de Proyecto (Carteras, Planoteca, Laboratorios)	Obra. Ing. Ma Te	
	Int Arq Monica	
3. Iniciar tramites de Licencia Ambiental	Ing. Yuli	
Licencia Arqui. Prorroga	Ing. Ma Te	
4. Pendiente revisar en Bogota Propuesta para mobiliario por falta de Detalles en especificacion	Ing Angel Lopez	

Scanned by CamScanner

Anexo No. 4 Plan de Anticipo

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	Página 1 de 1

	FECHA	19-feb-19
PROGRAMACIÓN	PN DIRAF 19-4-10044-18	
CONTRATO No. Adición No. 1		
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE ESTACIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	
VALOR TOTAL DE ADICIÓN NRO 1		$ 423.844.050,23
CONTRATISTA	CONSORCIO MCH-GUTIERREZ	
INTERVENTOR	DAMACO SAS	
PLAZO	Hasta el 17 de abril de 2019	
VALOR ANTICIPO	50%	$ 226.679.025,12

DATOS ESPECIFICOS

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 78.220.340,00	35,17%
2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos	$ 126.038.898,71	56,17%
3	Transportes y retiro de escombros	$ 12.143.889,41	5,41%
4	Depreciación y retenciones	$ 2.296.734,07	1,05%
	TOTAL	$ 226.679.025,12	100,00%

Nota:

a) Plazo en días para la inversión del anticipo 150 días.

Para constancia dicho anterior, se firma e suscribe el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2019

MAYOR (RNCL) GIOVANNY LOPEZ SOTO
Supervisor de Contrato
POLICIA NACIONAL-DIRAF

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO MCH-GUTIERREZ
CONTRATISTA

CARLOS [illegible] PALOMINO
Representante Legal
DAMACO Ltd
INTERVENTORIA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO		Página 1 de 1
	FECHA	19-Feb-19
PROGRAMACIÓN	PN DIRAF 06-G-10044-18	
CONTRATO No.		
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 9.266.463.258,08
CONTRATISTA	CONSORCIO BICS-GUTIERREZ	
INTERVENTOR	DAIMCO SAS	
PLAZO	hasta el 19 de abril de 2019	
VALOR ANTICIPO	50%	$ 4.633.231.629,04

DATOS ESPECIFICOS

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 1.610.879.040,00	10,17%
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 1.696.218.222,04	58,17%
3	Transporte y retiro de escombros	$ 259.106.466,00	5,60%
4	Imprevistos y rendimiento	$ 48.023.000,00	1,04%
	TOTAL	$ 4.633.231.629,04	100,00%

Nota:

1) Plazo en días para la inversión del anticipo 120 días.


Para constancia de lo anterior, se firma y aprueba el presente documento bajo la responsabilidad expresa de las que intervienen, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2019


MAYOR ANGEL GIOVANNY LOPEZ ORTIZ
Supervisor de Contrato
POLICIA NACIONAL-DIRAF


AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BICS-GUTIERREZ
CONTRATISTA


CAPITAN [illegible] BOTIA PALOMINO
Representante Legal
DAIMCO SAS
INTERVENTORIA



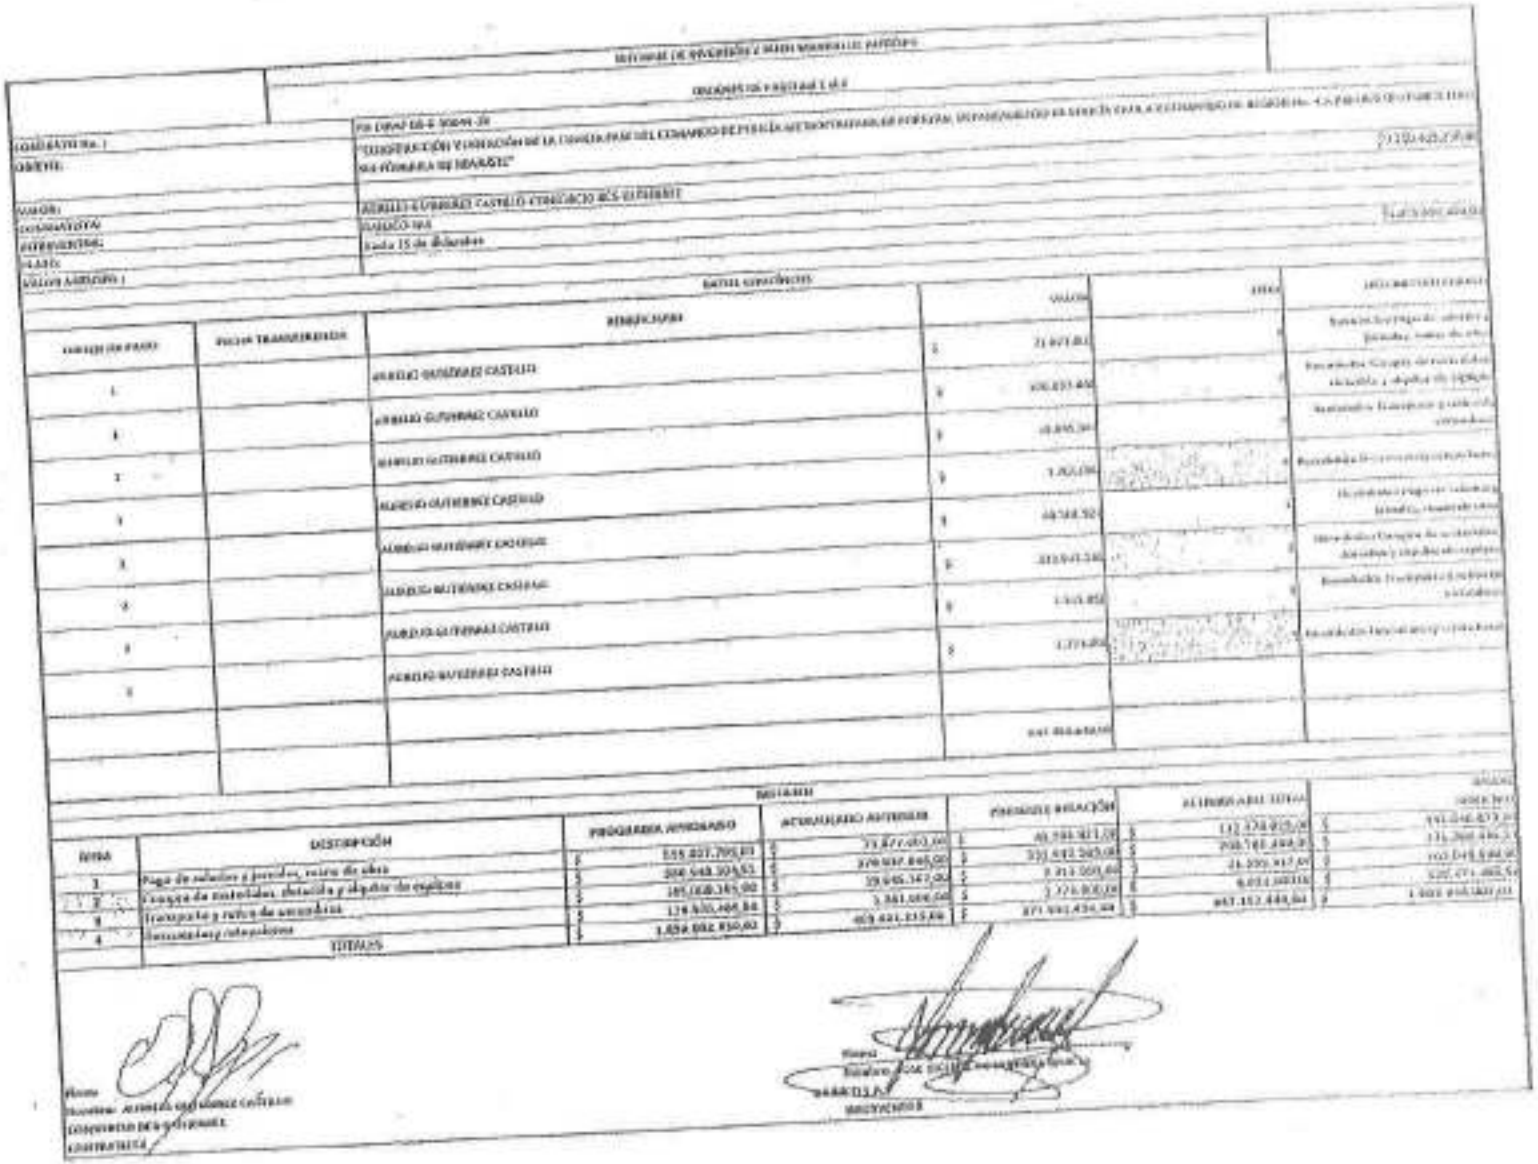

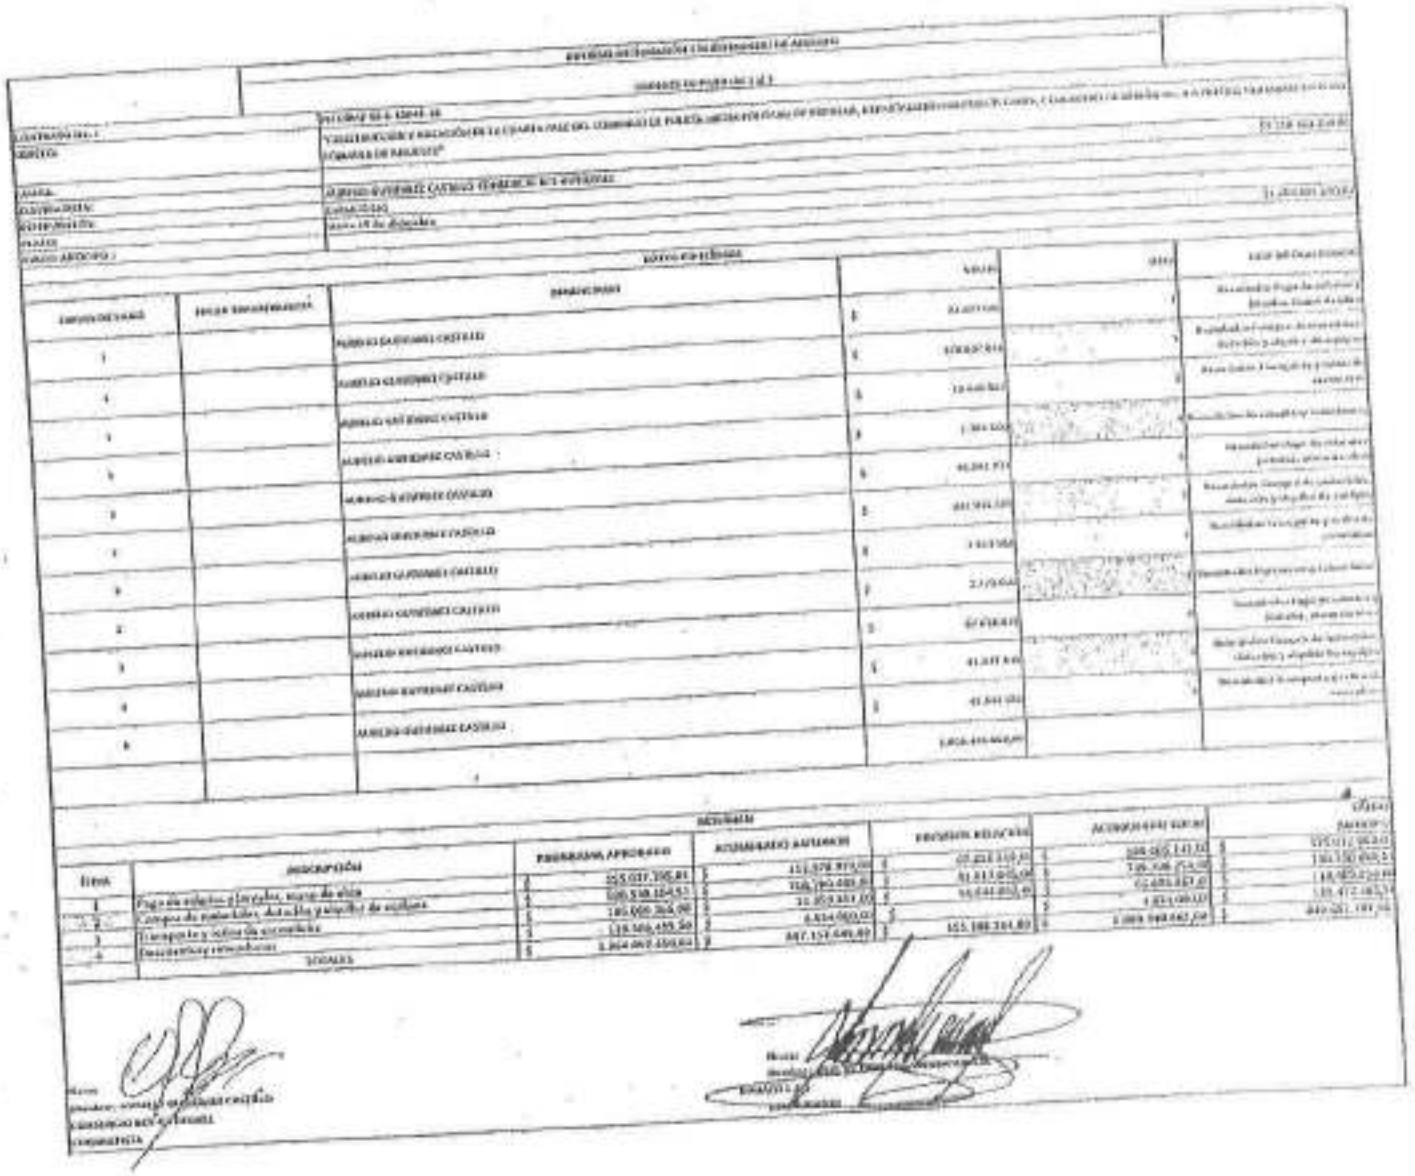


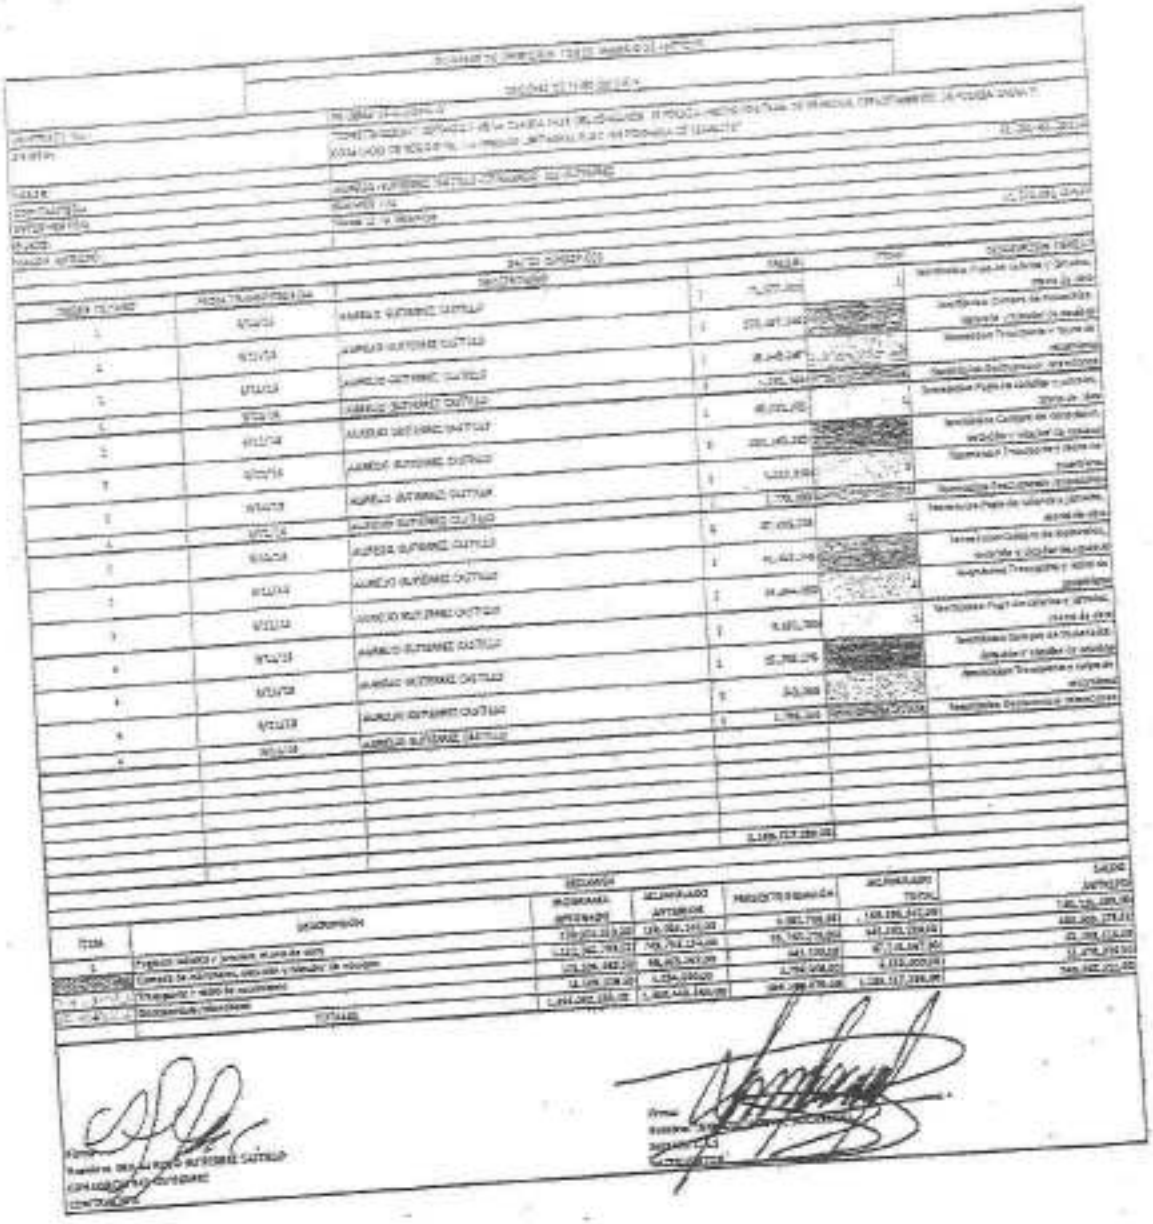


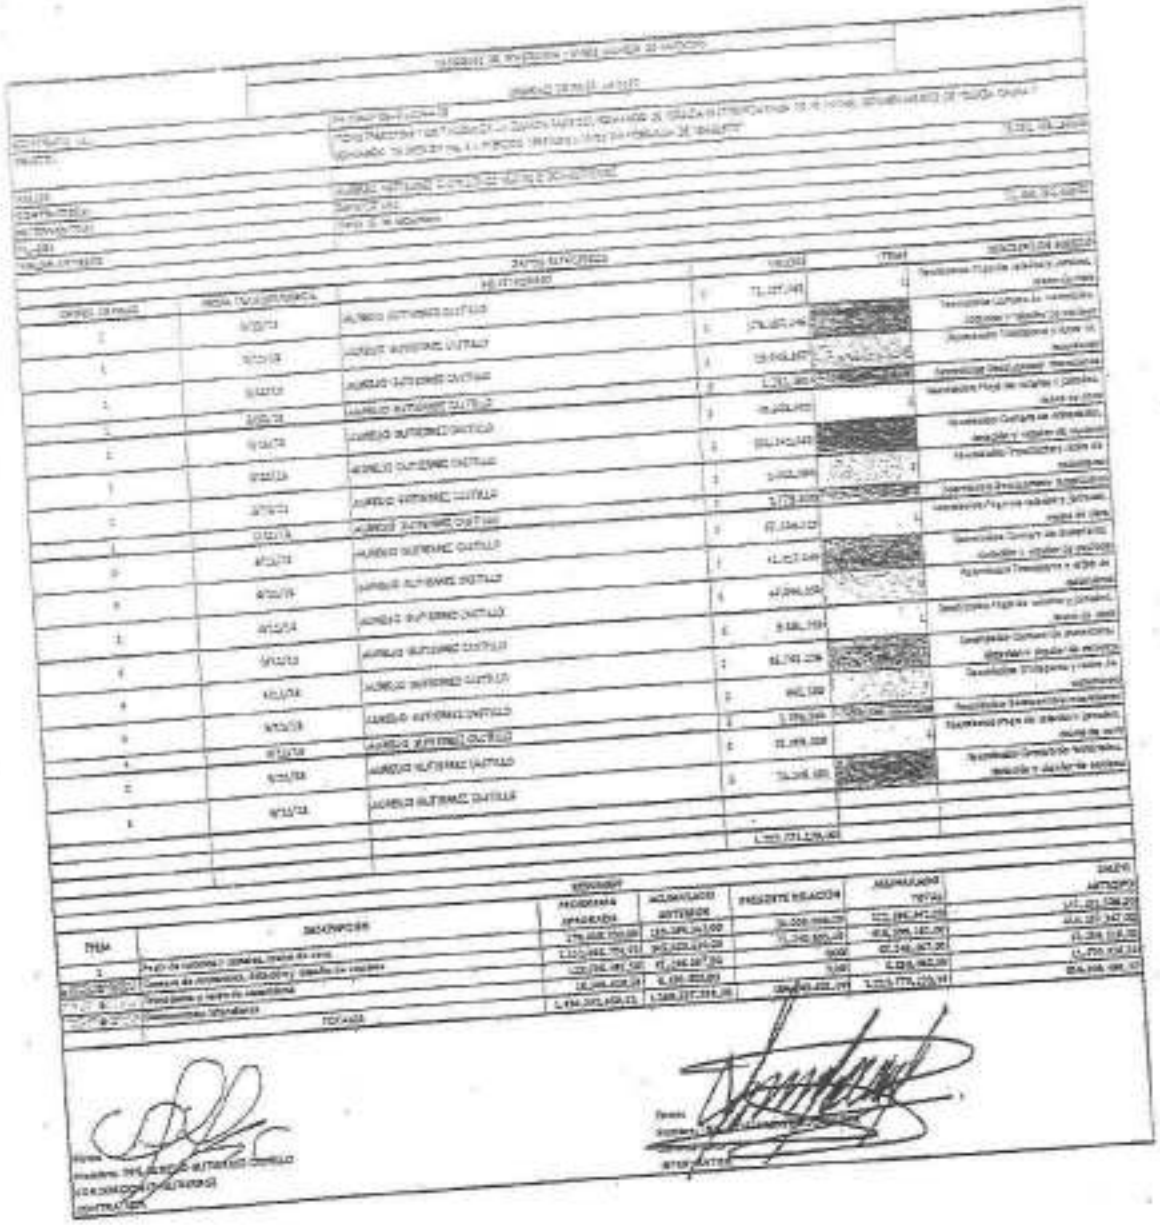

79

115

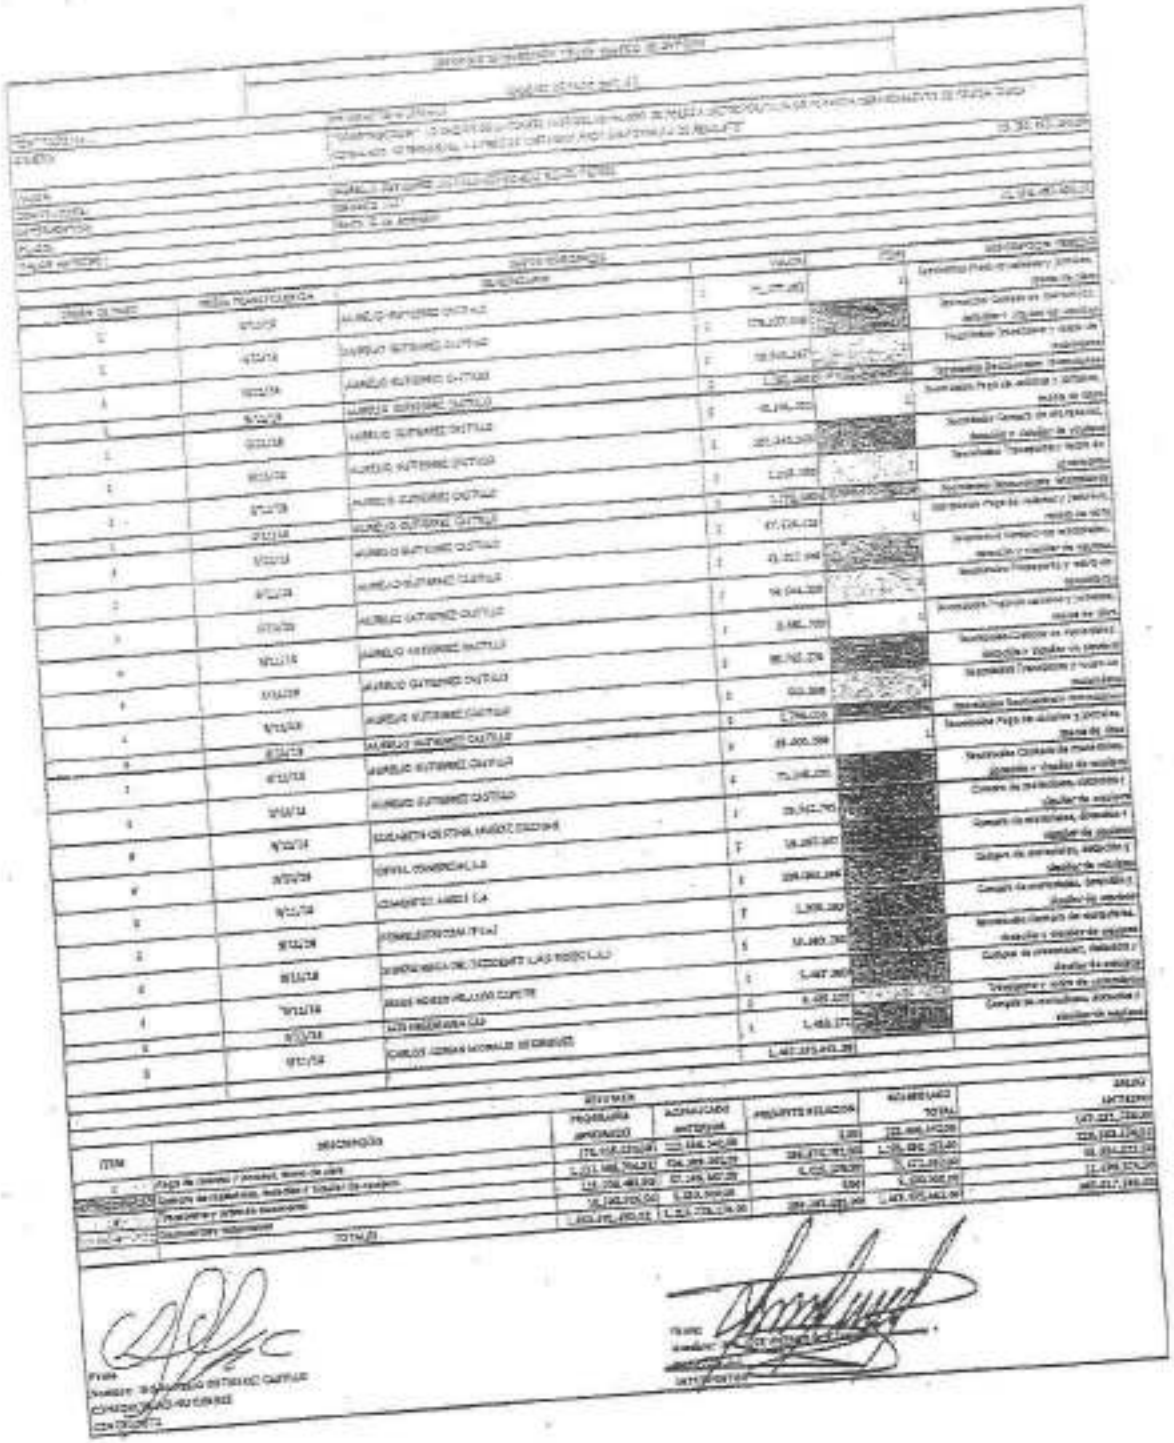

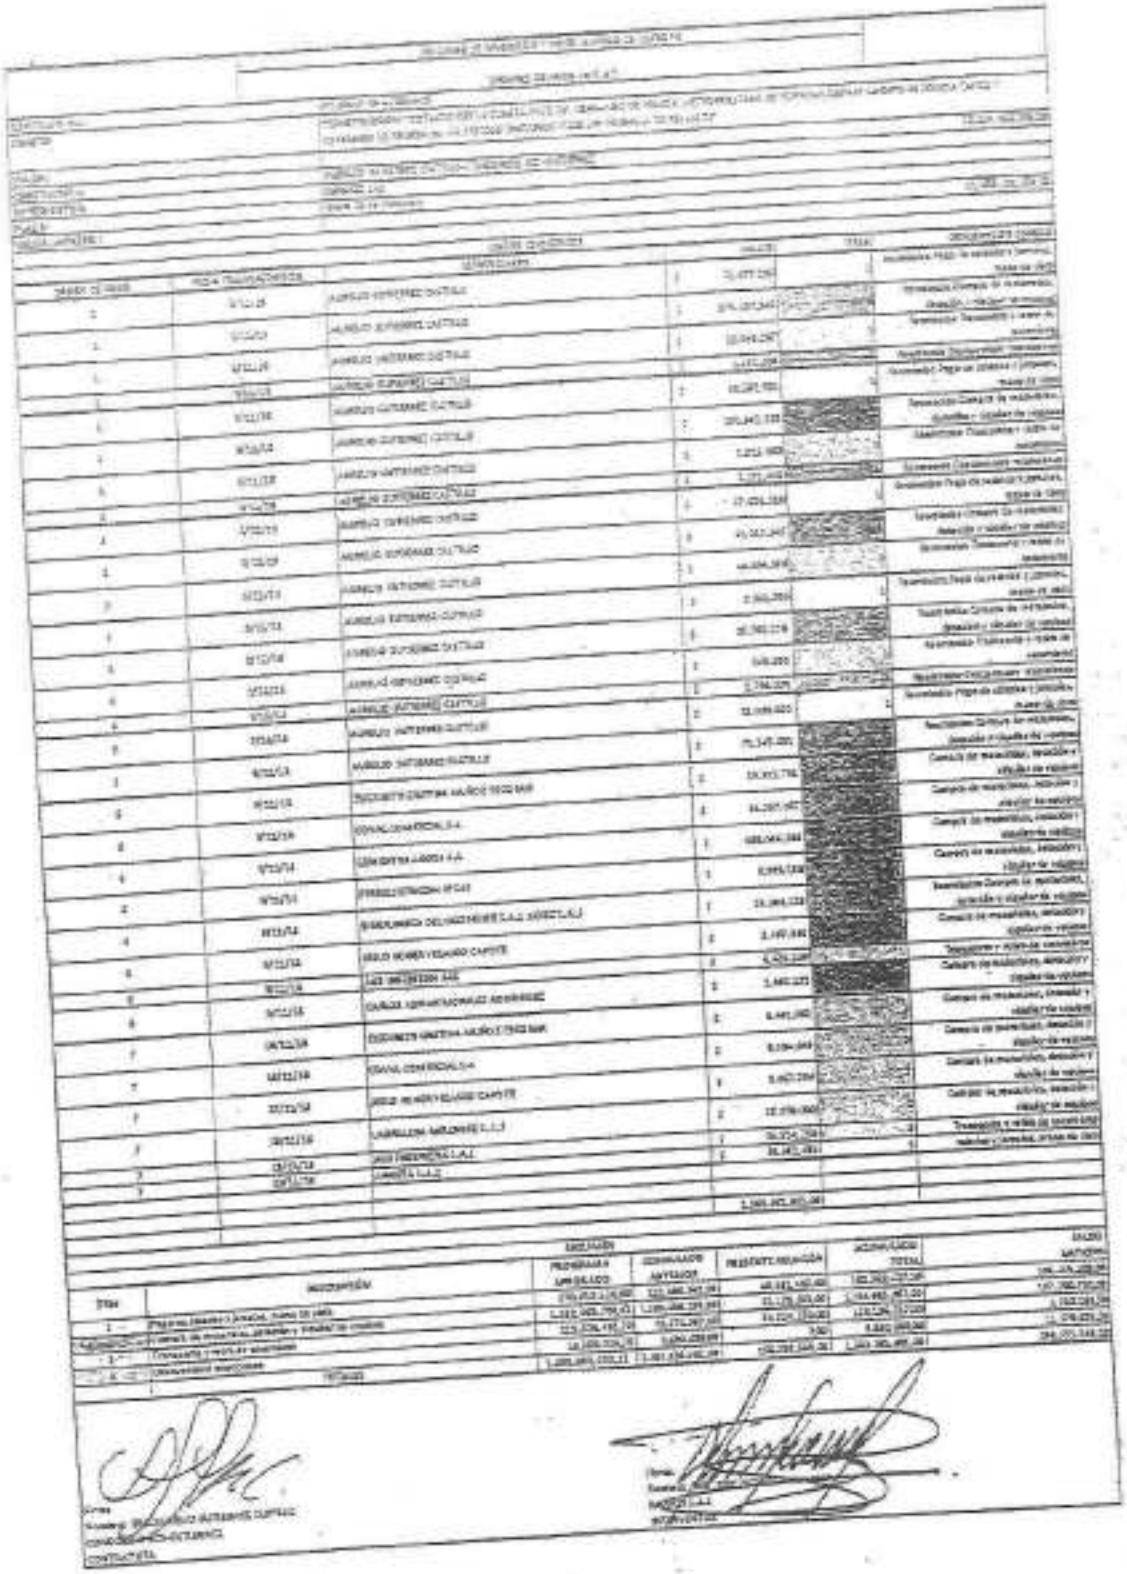

117



113

118







CONTRATO No.:	[illegible]
CONTRATISTA:	[illegible]
OBJETO:	[illegible]
VALOR:	[illegible]
FORMA DE PAGO:	[illegible]
PLAZO:	[illegible]
FECHA DE INICIO:	[illegible]

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71,247,100	1	[illegible]
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 179,157,[illegible]	2	[illegible]
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 12,313,247	3	[illegible]
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1,231,[illegible]	4	[illegible]
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 18,[illegible]	5	[illegible]
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 231,[illegible]	6	[illegible]
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1,231,[illegible]	7	[illegible]
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1,771,[illegible]	8	[illegible]
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 61,[illegible]	9	[illegible]
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11,[illegible]	10	[illegible]
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 16,[illegible]	11	[illegible]
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3,[illegible]	12	[illegible]
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 88,[illegible]	13	[illegible]
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 940,000	14	[illegible]
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1,784,[illegible]	15	[illegible]
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 10,000,000	16	[illegible]
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71,247,[illegible]	17	[illegible]
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 10,[illegible]	18	[illegible]
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ DE RIBAS	$ 18,[illegible]	19	[illegible]
6	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 100,[illegible]	20	[illegible]
6	9/11/18	CONINTOS LIMITADA	$ 1,[illegible]	21	[illegible]
6	9/11/18	ECOELECTRICOS SA (PUB	$ 10,[illegible]	22	[illegible]
6	9/11/18	DISEÑOS DEL OCCIDENTE S.A.S DISOCS.A.S	$ 5,167,[illegible]	23	[illegible]
6	9/11/18	JESUS NOLBERTO VELASCO CAPOTE	$ 6,[illegible]	24	[illegible]
6	9/11/18	ALEX HERRERA SAS	$ 1,[illegible]	25	[illegible]
7	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 6,[illegible]	26	[illegible]
7	10/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 6,[illegible]	27	[illegible]
7	10/11/18	COVAL COM MEDAL S.A	$ 1,[illegible]	28	[illegible]
7	12/11/18	JESUS NOLBERTO VELASCO CAPOTE	$ 18,[illegible]	29	[illegible]
7	12/11/18	LUBRILUNA MAYORISTA S.A.S	$ 14,[illegible]	30	[illegible]
7	12/11/18	ALEX INGENIERIA S.A.S	$ 40,[illegible]	31	[illegible]
7	12/11/18	AMRETTA S.A.S	$ 83,[illegible]	32	[illegible]
8	13/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 10,[illegible]	33	[illegible]
8	13/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 845,[illegible]	34	[illegible]
8	14/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 10,[illegible]	35	[illegible]
9	15/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3,[illegible]	36	[illegible]
10	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 1,[illegible]	37	[illegible]
20	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 907,[illegible]	38	[illegible]
30	20/11/18	JESUS NOLBERTO VELASCO CAPOTE	$ 75,[illegible]	39	[illegible]
10	20/11/18	CONINTOS LIMITADA	$ 136,[illegible]	40	[illegible]
11	23/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 158,[illegible]	41	[illegible]
11	23/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 73,[illegible]	42	[illegible]
11	23/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6,[illegible]	43	[illegible]
11	23/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 88,[illegible]	44	[illegible]
11	23/11/18	METALESAS	$ 63,[illegible]	45	[illegible]
12	23/11/18	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS SA	$ 66,[illegible]	46	[illegible]
13	23/11/18	CONINTOS LIMITADA	$ 106,[illegible]	47	[illegible]
33	26/11/18	ALEX INGENIERIA SAS	$ 1,[illegible]		

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO: PROGRAMADO ANTERIORMENTE	PRESUPUESTO: ACUMULADO ANTERIORMENTE	PRESUPUESTO: PROGRAMADO ESTE PERIODO	PRESUPUESTO: ACUMULADO TOTAL	SALDOS: POR EJECUTAR
1	Preparación inicial y servicios, mano de obra	$ 1,[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
2	Compra de materiales, elevación y colocación de postes	$ 1,[illegible]	$ 1,[illegible]	$ [illegible]	$ 1,[illegible]	$ [illegible]
3	Transporte y apoyo de materiales	$ 79,[illegible]	$ 79,[illegible]	$ [illegible]	$ 79,[illegible]	$ [illegible]
4	Construcción instalación	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
	TOTALES	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]

Para constancia de lo anterior se firma el presente acta hoja la misma a [illegible] de [illegible] a los 21 días del mes de [illegible]

Firma
Nombre: [illegible]
CONTRATISTA

Firma
Nombre: [illegible]
SAINGIT S.A.S

88

122

	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN INTEGRAL DE ANTIOQUIA	
	ORDENES DE PAGO DEL 1 AL 12	

CONTRATO No.	PRIMER OTRO SI
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL CEDAMUDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE MEDELLÍN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y CUARTEL DE ASCENSO No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$2.293.160.224
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO CONSTRUCTOR INTEGRALMENTE
INTERVENTOR:	CIANCO SAS
PLAZO:	Desde 28 de Mayo de 2018
VALOR VIGENTE:	$2.293.160.224

DATOS EMPRESTADOS						
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION CONCEPTO	
1	08/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.677.080	1	Suministro Pago de cuartos y	
1	08/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 878.837.848	2	Suministro Compra de materiales,	
1	08/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 15.698.842	3	Transporte Transporte y retiro de	
1	08/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.151.080	4	Suministro Descuentos	
1	08/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.551.911	1	Suministro Pago de cuartos y	
1	08/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 333.841.848	2	Suministro Compra de materiales,	
1	08/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.213.080	3	Suministro Transporte y retiro de	
1	08/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.779.080	4	Suministro Descuentos	
1	08/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 97.636.218	1	Suministro Pago de cuartos y	
1	08/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.007.348	2	Suministro Compra de materiales,	
1	08/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 14.848.000	3	Suministro Transporte y retiro de	
1	08/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 8.381.760	1	Suministro Pago de cuartos y	
1	08/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 85.766.376	2	Suministro Compra de materiales,	
1	08/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 443.000	3	Suministro Transporte y retiro de	
1	08/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.796.000	4	Suministro Descuentos	
1	08/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 88.080.080	1	Suministro Pago de cuartos y	
1	08/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.245.853	2	Suministro Compra de materiales,	
1	08/11/2018	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 33.913.706	1	Compra de materiales, entrega y	
1	09/11/2018	CONAL COMERCIAL S.A	$ 18.257.055	2	Compra de materiales, entrega y	
1	09/11/2018	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 285.666.346	1	Compra de materiales, entrega y	
1	09/11/2018	FERRALECTRODA IP SAS	$ 9.450.160	1	Compra de materiales, entrega y	
1	09/11/2018	SUBTERRANEA DEL OCCIDENTE S.A.S SUBOC S.A.S	$ 25.686.234	1	Suministro Compra de materiales,	
1	09/11/2018	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 9.167.860	1	Compra de materiales, entrega y	
1	09/11/2018	AGS INGENIERIA SAS	$ 8.425.180	1	Transporte y retiro de escombros	
1	09/11/2018	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.483.172	0	Compra de materiales, entrega y	
1	09/11/2018	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.441.840	1	Compra de materiales, entrega y	
1	10/11/2018	CONAL COMERCIAL S.A	$ 8.699.084	1	Compra de materiales, entrega y	
1	10/11/2018	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 9.207.794	1	Compra de materiales, entrega y	
1	10/11/2018	LABRILLERA ARLEQUINOS S.A.I	$ 28.976.000	1	Compra de materiales, entrega y	
1	10/11/2018	AGS INGENIERIA S.A.S	$ 54.514.250	0	Transporte y retiro de escombros	
1	10/11/2018	ARMATA S.A.S	$ 42.982.488	1	salados y jornales, mano de obra	
1	12/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 95.336.334	1	Suministro Pago de cuartos y	
1	12/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 88.648.227	2	Suministro Compra de materiales,	
1	13/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 843.000	3	Suministro Transporte y retiro de	
1	13/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.091.842	4	Suministro Compra de materiales,	
1	13/11/2018	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 3.343.560	2	Compra de materiales, entrega y	
1	13/11/2018	CONAL COMERCIAL S.A	$ 1.300.977	2	Compra de materiales, entrega y	
1	13/11/2018	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 997.810	2	Compra de materiales, entrega y	
1	13/11/2018	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 79.906.456,00	2	Compra de materiales, entrega y	
1	13/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 178.593.946,00	1	Suministro Pago de cuartos y	
1	14/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 358.284.944,00	2	Compra de materiales, entrega y	
1	14/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.674.297,00	3	Suministro Transporte y retiro de	
1	14/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.000.000,00	4	Suministro Descuentos	
1	15/11/2018	METAL 8 SAS	$ 98.264.775,00	2	Compra de materiales, entrega y	
1	15/11/2018	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETR	$ 91.200.000,00	2	Compra de materiales, entrega y	
1	15/11/2018	CEMENTOS ARGOS SA	$ 64.220.280,00	2	Compra de materiales, entrega a	
1	15/11/2018	AGS INGENIERIA SAS	$ 125.028.100,00	3	Suministro Transporte y retiro de	

INFORME DE ORDENES Y SALDO Y PAGO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO No. [illegible]

CONTRATO No. [illegible]

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL CRAMADO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE ESTACIÓN NO. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE"

VALOR: [illegible]

CONTRATISTA: [illegible]

INTERVENTOR: [illegible]

PLAZO: Hasta 30 de junio de 2015

VALOR ANTICIPO: [illegible]

DATOS GENERALES

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION GASTO
13		METAL 3 SAS	$ 18.200.909,00	2	Compra de materiales, suministro y alquiler de andamios
14		SODIMAC COLOMBIA SA	$ 28.147.285,00	1	Compra de materiales, suministro y alquiler de andamios
15		CEMENTOS ARGOS SA	$ 61.276.000,00	1	Compra de materiales, suministro y alquiler de andamios
16		ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 13.885.718,00	2	Compra de materiales, suministro y alquiler de andamios
17		EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7.242.614,00	1	Compra de materiales, suministro y alquiler de andamios
18		PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 14.146.703,00	1	Compra de materiales, suministro y alquiler de andamios
			$ 1.195.158.218,00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCION	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACION	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de cargues y cargues, mano de obra	1.337.000.000,00	400.700.000,00		400.700.000,00	936.300.000,00
2	Compra de materiales, suministro y alquiler de andamios	$ 1.913.000.314,78	1.070.826.783,00	$ 120.084.902,00	1.190.911.685,00	722.088.629,78
3	Transporte y cargue de materiales	284.241.000,00	209.241.414,00		209.241.414,00	74.999.586,00
4	Descargues materiales	$ 61.464.671,00	18.464.000,00		18.464.000,00	43.000.671,00
	TOTALES	4.469.391.985,78	1.699.232.197,00	120.084.902,00	1.819.317.099,00	2.650.074.886,78

Para constancia firma anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de las mismas mencionadas en ella, a los 18 días del mes de agosto de 2015

Firma:
Nombre: [illegible]
CONSORCIO [illegible]
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: [illegible]
CARGO: [illegible]
INTERVENTOR

124

CONTRATO Nº:	[illegible]
OBJETO:	"CO ALTIPLICIDAD Y ESTADO MORA LA CUARTA FASE DEL CO MARCO DE PROJETA MEJORAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEPARTAMENTO DE PERSONAL CARGO Y CONSUMO DE [illegible]
VALOR:	[illegible]
CONTRATISTA:	[illegible]
INTERVENTOR:	[illegible]
PLAZO:	[illegible]
VALOR ANTICIPO:	[illegible]

DATOS NUMERICOS						
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO		VALOR	ITEM	DESCRIPCION ITEMIZADO
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	71,377,002	1	Anticipo Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	376,217,048	[illegible]	Anticipo Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	18,810,287	3	Anticipo Transporte y retiro de escombros
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	3,761,000	4	Anticipo Desmovilización temporal
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	93,940,611	1	Anticipo Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	201,242,543	[illegible]	Anticipo Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	5,313,000	3	Anticipo Transporte y retiro de escombros
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	2,772,000	4	Anticipo Desmovilización temporal
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	67,604,319	1	Anticipo Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	41,217,945	[illegible]	Anticipo Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	46,244,054	3	Anticipo Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	3,081,750	1	Anticipo Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	55,765,374	[illegible]	Anticipo Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	845,500	3	Anticipo Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	1,786,500	4	Anticipo Desmovilización temporal
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	88,000,000	1	Anticipo Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	71,305,831	[illegible]	Anticipo Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA VALÑOZ ESCOBAR	$	20,211,750	[illegible]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	9/11/18	COFAL COMERCIAL S.A.	$	19,187,387	[illegible]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	9/11/18	CONCRETOS ARGOS S.A.	$	208,260,589	[illegible]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICOM (PTAR)	$	1,269,224	[illegible]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	9/11/18	DISCOBURGOS DEL OCCIDENTE S.A.S. (DISCOL A.J.	$	20,888,100	[illegible]	Asamblea Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAYOTE	$	5,167,380	[illegible]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	9/11/18	LAGO INGENIERIA SAS	$	3,425,208	4	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES ROMERO RC	$	1,488,171	[illegible]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
7	10/11/18	ELIZABETH CRISTINA VALÑOZ ESCOBAR	$	6,440,940	3	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
7	10/11/18	COFAL COMERCIAL S.A.	$	8,894,949	3	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
7	10/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAYOTE	$	5,897,794	3	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
7	10/11/18	LAGO INGENIERIA S.A.S.	$	39,976,000	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
7	10/11/18	LAGO INGENIERIA S.A.S.	$	54,526,280	3	Transporte y retiro de escombros
7	10/11/18	ARRIETA S.A.S.	$	48,680,480	5	Materiales y arriendos, mano de obra
8	10/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	38,126,224	1	Anticipo Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	10/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	80,348,187	[illegible]	Anticipo Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
8	10/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	448,500	3	Anticipo Transporte y retiro de escombros
9	10/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	11,181,972	[illegible]	Anticipo Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
20	10/11/18	ELIZABETH CRISTINA VALÑOZ ESCOBAR	$	1,113,000	[illegible]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
10	10/11/18	COFAL COMERCIAL S.A.	$	1,860,307	[illegible]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
10	10/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAYOTE	$	987,000	[illegible]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos

CONTRATO No.	[illegible]
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LA CAMPA Y ASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE ESTACIÓN No. 1 Y 4 PREDIOS UBICADOS AL SUR DEL PERIMETRO DE MUNICIPIO"
CONTRATISTA	[illegible]
CONTRATANTE	[illegible]
INTERVENTOR	[illegible]
VALOR	[illegible]
TIPO DE ANTICIPO	[illegible]

DATOS BENEFICIARIO

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION ITEM LIQ
10	04/11/19	CONCRETOS ARGOS S.A	[illegible]	[illegible]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipo
11	11/06/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	[illegible]	1	Anticipo Pago de salarios y jornales mano de obra
11	20/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	[illegible]	[illegible]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipo
11	28/05/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	[illegible]	1	Suministros Transporte y fletes de accesorios
11	31/05/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	[illegible]	[illegible]	Suministros Descuentos retenciones
11	03/06/19	METAL S SAS	[illegible]	[illegible]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipo
11	13/06/19	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS	[illegible]	[illegible]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipo
11	24/06/19	CONCRETOS ARGOS SA	[illegible]	[illegible]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipo
11	28/06/19	ACS INGENIERIA SAS	[illegible]	1	Suministros Transporte y fletes de accesorios
12		METAL S SAS	[illegible]	[illegible]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipo
13		CONCRETOS ARGOS SA	[illegible]	[illegible]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipo
14		CONCRETOS ARGOS SA	[illegible]	[illegible]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipo
15		ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	[illegible]	[illegible]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipo
15		EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	[illegible]	[illegible]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipo
16		PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	[illegible]	[illegible]	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipo
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	[illegible]	1	Anticipo Pago de salarios y jornales mano de obra
18		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	[illegible]	[illegible]	Suministros Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipo
19		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	[illegible]	1	Suministros Transporte y fletes de accesorios
20		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	[illegible]	[illegible]	Suministros Descuentos retenciones

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Transporte y fletes de accesorios	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Descuentos y retenciones	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 28 días del mes de enero de 2020

FIRMA
NOMBRE: AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO ACS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE:
CARGO:
ENTIDAD

CONTRATO No.	FR-DAG/ SBH-CONV-19
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA Y QUINTA DEL CENTRO DE POLICÍA JUDICIAL Y PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CIUDAD Y ZONA AMBO DE NEGRITA No. 1 A PRECIOS UNITARIOS NO FORMULA DE TIEMPO"
CONTRATISTA	
REPRESENTANTE	
ACTA No.	
PLAZO	
FECHA DE ACTA	

ORDEN DE PAGO	FECHA PRESENTACIÓN	BENEFICIARIO		VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL
9	09/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1	70.681.000	[redacted]	Anticipo Compra de maquinaria, instalación y alquiler de equipos
10	09/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	1	1.212.237	[redacted]	Cancelación de maquinaria, instalación y alquiler de equipos
11	09/11/18	SOFYAL ASOMERCIAL S.A	1	1.383.317	[redacted]	Cancelación de maquinaria, instalación y alquiler de equipos
12	09/11/18	DIEGO ROCHA VILLALBA CAMPOS	1	891.000	[redacted]	Compra de maquinaria, instalación y alquiler de equipos
13	09/11/18	CONSTRUCTORA LARGO S.A	1	76.206.402,42	[redacted]	Compra de maquinaria, instalación y alquiler de equipos
14	09/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1	225.652.000,00	1	Suministro Papelería Impresos y servicios, mayo de 2018
15	09/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1	180.264.346,00	[redacted]	Compra de materiales, instalación y alquiler de equipos
16	09/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1	11.274.087,00	1	Resolución Transporte y viajes de colombianos
17	09/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1	5.000.000,00	1	Inventarios Computadores relacionados
18	09/11/18	METAL R SAS	1	38.764.775,00	[redacted]	Compra de maquinaria, instalación y alquiler de equipos
19	09/11/18	CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MATERIALES FERRERO SA	1	11.000.000,00	[redacted]	Compra de maquinaria, instalación y alquiler de equipos
20	09/11/18	DIAMANTES JARDIN SA	1	44.334.240,00	[redacted]	Compra de maquinaria, instalación y alquiler de equipos
21	09/11/18	H&S INGENIERIA SAS	1	125.025.000,00	1	Suministro Transporte y viajes de colombianos
22		METAL R SAS	1	18.000.000,00	[redacted]	Compra de maquinaria, instalación y alquiler de equipos
23		MORAVIA CONSTRUCCIONES SA	1	33.147.000,00	[redacted]	Compra de maquinaria, instalación y alquiler de equipos
24		CONCRETOS JARDIN SA	1	45.274.000,00	[redacted]	Compra de maquinaria, instalación y alquiler de equipos
25		ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	1	12.000.000,00	[redacted]	Compra de maquinaria, instalación y alquiler de equipos
26		CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MATERIALES FERRERO SA	1	7.040.000,00	[redacted]	Compra de maquinaria, instalación y alquiler de equipos
27		PREFABRICADOS OBRA CIVIL DISEÑO SAS	1	24.040.720,00	[redacted]	Compra de maquinaria, instalación y alquiler de equipos
28		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1	28.150.000	1	Suministro Papelería Impresos y servicios, mayo de 2018
29		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1	38.766.208	[redacted]	Suministro Compra de maquinaria, instalación y alquiler de equipos
30		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1	942.000	1	Suministro Transporte y viajes de colombianos
31		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1	24.000.000	[redacted]	Suministro Compra de maquinaria, instalación y alquiler de equipos
32		LUNAGRES SA	1	248.907.118,00	[redacted]	Compra de maquinaria, instalación y alquiler de equipos
33		H&S INGENIERIA SAS	1	371.000.000	1	Instalación y pantalla, mayo de 2018
34				3.329.966.000,00		

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	ANTICIPO EQUIPOS	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios (Empleados de obra	1.287.000.000,00	921.000.000,00	171.000.000,00	921.171.675,00	465.728.325,00
2	Compra de materiales, alquileres y alquiler de equipos	3.213.675.113,79	2.077.594.000,00	220.227.114,00	2.140.021.227,00	1.073.653.886,79
3	Transporte y viajes de colombianos	81.351.063,79	146.251.114,00		146.251.114,00	81.351.063,79
4	Descuentos Impuestos	3.95.704.000,00	57.000.000,00		57.000.000,00	38.704.000,00
	TOTALES	4.695.380.439,58	3.201.845.114,00	440.024.999,00	3.264.444.966,00	1.431.435.286,58

Para constancia de la veracidad de firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de las que suscriben en ella, a los 09 días del mes de enero de 2019

Firma
Nombre: [redacted]
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
CONTRATISTA

Firma
Nombre: [redacted]
INTERVENTOR
CONTRATO

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 17	
CONTRATO No.:	APOYAF 88-8-30944-18	
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE ESTACIÓN, A LA PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	$8.250.489.150,00
VALOR:		
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO SOLUCIONES	
INTERVENTOR:	SAIMCO SAS	
PLAZO:	Hasta 19 de abril de 2019	$4.625.791.825,00
VALOR ANTICIPO:		

DATOS DESPACHO					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION REEMBOLSO
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.877.602	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 174.837.546	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 18.645.287	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.281.000	4	Reembolso Derramaderos, retenciones
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 68.501.922	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 131.901.341	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.125.980	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.710.300	4	Reembolso Derramaderos, retenciones
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 97.626.419	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.057.545	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 66.044.059	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 8.881.708	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 65.765.275	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 642.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.700.000	4	Reembolso Derramaderos, retenciones
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.080.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.244.881	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	8/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 18.572.795	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	8/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 18.497.803	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	8/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 100.066.385	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	8/11/18	FERRELECTRICOS M SAS	$ 5.909.268	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	8/11/18	MADERAS DEL OCCIDENTE S.A.S ESODES.A.S	$ 20.898.198	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
5	9/11/18	JESUS ROBIN VELASCO CAPOTE	$ 5.687.980	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	AMI INGENIERIA SAS	$ 6.436.300	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.481.171	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	10/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.443.582	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	10/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 8.884.343	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	10/11/18	JESUS ROBIN VELASCO CAPOTE	$ 5.867.794	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	10/11/18	LADRILLERA MEDELLIN S.A.S	$ 86.676.000	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	10/11/18	AGV INGENIERIA S.A.S	$ 14.534.259	3	Transporte y retiro de escombros
7	10/11/18	ARKITA S.A.S	$ 40.662.400	1	Jornales y jornales, mano de obra
8	12/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.154.224	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	12/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 80.348.127	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	12/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 498.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros

2
98
129

	INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO
	ORDENES DE PAGO del 1 al 17
CONTRATO No.:	FALGINAT 06-0-2018-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE TECNOS No. 1.A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$8.250.169.251,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO CONSORCIO BICI-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO:	$4.625.321.625,04

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION GASTO
9	28/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTRIAS	$ 91.081.881	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 1.113.369	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	28/11/18	COVAL COMERCIAL S.A.	$ 1.081.277	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	28/11/18	JESUS EDGAR VALANCO CUPOTE	$ 997.814	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	28/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A.	$ 72.808.458,81	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	28/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 138.050.268,80	3	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	28/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 159.134.345,09	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	25/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.474.197,08	2	Reembolso Transporte y retiro escombros
11	25/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 5.606.606,06	4	Reembolso Descuentos retenciones
11	23/01/19	METAL 9 SAS	$ 88.194.775,20	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/19	CONSTRUCCIONES Y DISPUTADOS DE MATERIALES PETREOS SA	$ 81.080.000,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 44.499.360,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/19	MGS INGENIERIA SAS	$ 105.920.106,00	2	Reembolso Transporte y retiro de escombros
13	21/01/19	METAL 9 SAS	$ 18.106.000,80	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	21/01/19	BOOMACO COLOMBIA SA	$ 23.147.199,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	21/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 41.379.313,05	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	21/01/19	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 18.895.116,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	21/01/19	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7.147.588,80	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	21/01/19	PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 14.145.729,09	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 18.402.900	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 58.744.104	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	2	Reembolso Transporte y retiro de escombros
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 24.907.000	4	Reembolso Descuentos y retenci
15	5/02/19	ALPADRAS SA	$ 288.907.548,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación, alquiler de equipos
15	5/02/19	MGS INGENIERIA SAS	$ 471.888.960	1	salarios y jornales, mano de obra
16	5/02/19	CONSTRUCTORA SUMI AGUAS SAS	$ 84.317.753,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 162.888.648,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 65.888.888,00	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 8.840.000,00	2	Reembolso Transporte y retiro de escombros
			$ 3.915.297.668,02		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales /mano de obra	$ 1.357.308.000,00	$ 866.471.875,00	$ 131.963.448,00	$ 998.135.137,00	$ 359.172.863,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 3.938.895.920,78	$ 3.413.842.290,80	$ 88.230.049,00	$ 3.502.072.339,80	$ 436.823.581,00
3	Transporte y retiro de escombros	$ 361.831.264,78	$ 248.186.954,80	$ 8.840.000,00	$ 255.026.980,80	$ 106.804.283,98
4	Descuentos/ retenciones	$ 92.504.950,50	$ 47.102.080,00		$ 47.102.900,00	$ 45.401.850,50
	TOTALES	$ 5.750.540.135,06	$ 4.575.603.200,60	$ 229.033.497,00	$ 4.804.637.357,60	$ 945.902.777,46

Para constancia de lo anterior, se firma la presente ante todo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 14 días del mes de febrero de 2019

130

	(I) FORMA DE INVERSIÓN Y PAGO ANTICIPO DE ANTICIPO
	ORDENES DE PAGO 001 A 07
CONTRATO No.:	PN-SNAF-SE-5-UEO44-18
OBJETO:	"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE BRIGADA No. 8 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$8.209.465.750,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO SCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DANVICI SAS
PLAZO:	Hasta 28 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO:	$4.729.191.525,00

DATOS ESPECIFICOS				
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO

Firma
Nombre: INGLAURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO SCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
Cargo:
INTERVENTOR

3

131

INFORME DE INVERSIÓN Y SUMINISTRO DE ANTICIPO

CUADRO DE PAGO del 1 al 12

CONTRATO No.	20150002 SECOP II
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE ROLDANILLO, DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS PARA CONFORMAR UN ESTATUTO DE ARANCEL"
VALOR:	$7.250.140.000
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO CONSORCIO MANTENIMIENTO
INTERVENTOR:	DAVINCI S.A.S
PLAZO:	Hasta 28 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO:	$4.429.312.615,04

DATOS ESPECIFICOS						
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO		VALOR	ITEM	DESCRIPCION GENERAL
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	71.877.000	1	Anticipo Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	176.927.036	2	Anticipo Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	29.649.097	3	Anticipo Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	1.361.000	4	Anticipo Descuentos retenciones
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	48.505.815	1	Anticipo Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	111.941.569	2	Anticipo Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	1.161.000	3	Anticipo Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	1.771.303	4	Anticipo Descuentos retenciones
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	67.515.319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	61.917.845	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	44.944.963	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
3	12/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	9.881.760	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	12/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	85.781.274	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	12/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	841.909	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
3	12/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	2.708.926	4	Reembolso Descuentos y retenciones
4	14/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	83.008.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	14/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	71.245.851	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
5	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$	30.913.791	1	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
5	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$	19.257.057	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	19/11/18	CONSTRUCTOR ARQUOS S.A	$	108.998.889	1	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	19/11/18	FERRELECTRICOMA LP SAS	$	3.999.280	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	19/11/18	MADERAS DEL OCCIDENTE S.A.S SIGLA C.I. A.S	$	65.980.235	3	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	19/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$	3.467.889	4	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	19/11/18	ABB INGENIERIA SAS	$	8.425.180	5	Transporte y retiro de escombros
8	21/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$	1.485.575	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	20/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$	8.965.862	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$	8.934.049	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$	5.087.799	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$	18.979.970	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ABB INGENIERIA S.A.S	$	54.524.200	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	AMBETA S.A.S	$	40.981.485	1	salarios y jornales, mano de obra
8	20/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	98.186.334	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	20/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	85.548.187	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	20/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	841.909	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
9	26/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	31.081.982	1	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	26/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$	2.319.999	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	26/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$	1.301.977	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos

3

9/6

12

	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ORDEN DE PAGO No [illegible]	

CONTRATO No.:	PC-CDMA-SIB-S-CDMA-19
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL CRAI DE LA METROPOLITANA DE POLICÍA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.758.452.216,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO RED-LUTIERMAT
DEPENDENCIA:	GRUPO SAC
PLAZO:	Hasta 23 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO:	$4.335.251.429,34

DATOS DEL PROVEEDOR

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO		VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
10	28/12/18	JESUS ROMER VELASCO CAPOTE	$	897.910	1	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/12/18	CEMENTOS ARGOS S.A.	$	73.896.450,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	31/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	128.556.259,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	31/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	304.181.360,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	31/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	11.474.387,00	3	Reembolso Transporte y pago de accesorios
11	31/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	6.666.000,00	4	Reembolso Descuentos y retenciones
12	28/02/19	METAL S SAS	$	88.244.775,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	28/02/19	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS SA	$	61.000.000,00	3	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	28/02/19	CEMENTOS ARGOS SA	$	44.109.280,00	4	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	28/02/19	AGS INGENIERIA SAS	$	185.039.100,00	5	Reembolso Transporte y pago de accesorios
13		METAL S SAS	$	10.260.905,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		SODIMAC COLOMBIA SA	$	10.147.300,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		CEMENTOS ARGOS SA	$	61.879.010,00	3	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$	11.691.181,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES SOL PACIFICO SAS	$	7.242.599,00	3	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$	14.146.723,00	3	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	25.452.300	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	86.744.104	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	858.300	3	Reembolso Transporte y pago de accesorios
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	24.007.800	4	Reembolso Descuentos y retenciones
15		AUTADRES SA	$	268.997.848,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
15		AGS INGENIERIA SAS	$	971.668.000	1	salarios y jornales, mano de obra
16		CONSTRUCTORA JUAN MEJIAS SAS		64.317.756,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO		132.665.406,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO		80.580.369,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO		8.865.369,00	3	Reembolso Transporte y pago de accesorios
18		ORLANDO EDWUNDO REVOLLO		9.919.553,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		BCI INGENIERIA Y PROYECTOS SAS		68.751.794,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		LUIS ALFREDO VARGAS BURGOS		90.080.000,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		CRISTINA ELIZABETH MUÑOZ ESCOBAR		5.516.905,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS		3.823.000,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		SODIMAC COLOMBIA SA		11.179.800,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		CVS SOLUCIONES & CIA S EN C		5.297.905,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		ORLANDO EDWUNDO REVOLLO		6.919.475,00	4	Reembolso Transporte y pago de accesorios
18		AGS INGENIERIA SAS		238.715.668,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
				$ 3.327.992.667,34		

4

133

	ESTADO DE INVERSIÓN Y AVANCE FINANCIERO DEL ANTICIPO
	ORDENES DE PAGO del 1 al 13
CONTRATO No.	[illegible]
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA TERCERA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANA Y COMANDO DE ESTACIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS A MES CALENDARIO"
VALOR:	$ 231.440.784,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO BG-GUTIERREZ CASTILLO INTEGRADO POR: GUTIERREZ
INTERVENTOR:	CONSORCIO CAS
PLAZO:	Hasta 28 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO:	$ 34.855.763.635,04

DATOS CONSIGNACIÓN					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN DOMINIO

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE EJECUCIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y prestaciones sociales de obra	$ 997.080.283,09	$ 848.159.337,00	$ 781.796.948,00	$ 1.629.956.285,00	$ 39.084.373,09
2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos	$ 11.312.499.921,73	$ 7.479.611.219,00	$ 35.907.147,00	$ 9.903.428.926,00	$ 431.954.457,73
3	Transporte y cargo de escombros	$ 281.031.068,79	$ 218.038.460,00	$ 4.020.479,00	$ 258.188.455,00	$ 2.774.613,79
4	Gastos varios y retenciones	$ 992.294.351,30	$ 37.439.000,00		$ 37.439.000,00	$ 55.855.443,30
	TOTALES	$ 13.582.905.624,91	$ 8.515.297.668,00	$ 816.996.861,00	$ 11.827.960.667,00	$ 487.109.998,91

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de las que intervinieron en ella, a los 14 días del mes diciembre de 2018

Nombre: ING. GUILLERMO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BG-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre
[illegible]
INTERVENTOR

	SUBSECRETARÍA DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE INMUEBLES
	ORDENES DE PAGO del 1 al 10
CONTRATO No.	SIN CLAVE SEA-CD-[illegible]-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. # # PREDIOS CHITARERO Y LOS OLIVOS UBICADOS EN LA CARRERA [illegible] DE POPAYÁN"
VALOR:	$ 2[illegible]
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEA-[illegible]
INTERVENTOR:	CONSORCIO SEA
PLAZO:	Hasta el 28 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO:	$ [illegible]

DATOS FINANCIEROS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.977.601	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 335.357.049	2	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 28.545.287	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.291.400	4	Reembolso Desperdicios y retenciones
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.901.321	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 181.940.243	2	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3.824.950	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.775.808	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.626.318	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.057.805	2	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44.044.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3.891.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 85.745.275	2	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 645.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.796.808	4	Reembolso Descuentos y retenciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 10.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.145.801	2	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 30.802.781	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
8	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 19.267.057	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
8	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A.	$ 106.868.368	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
8	9/11/18	FERRELECTRICOS M.P.SAS	$ 3.809.380	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
8	9/11/18	INGENIERIA DEL OCCIDENTE S.A.S SIGLA INGOC S.A.S	$ 31.683.193	2	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
8	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CARVOTE	$ 6.467.980	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
8	9/11/18	MDI INGENIERIA SAS	$ 6.425.108	2	Transporte y retiro de escombros
8	9/11/18	EMILCE ADRIANA MORALES RODRIGUEZ	$ 3.483.171	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	10/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.441.982	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	10/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 8.694.949	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	10/11/18	JESUS ROGER VELASCO CARVOTE	$ 5.367.794	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	10/11/18	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$ 88.676.080	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	10/11/18	MDI INGENIERIA S.A.S	$ 54.324.258	2	Transporte y retiro de escombros
7	10/11/18	ARRISTA S.A.S	$ 10.662.405	2	salarios y jornales, mano de obra
9	10/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 95.334.324	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
9	10/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 83.348.127	2	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
9	10/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
9	10/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.981.983	3	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	10/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2.112.049	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	10/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 3.902.977	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos

2
49
135

	INFORME DE LIQUIDACION Y PAGO AVANCE DE ANTICIPO
	ORDENES DE PAGO del 1 al 19
CONTRATO No. :	20-0-08-18-044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE ROLDANILLO, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y CONMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"
	$7.203.463.258,04
VALOR:	
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO RGC-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	CONMACO SAS
PLAZO:	PRAZO 28 DE JUNIO DE 2019
VALOR ANTICIPO :	$2.420.383.000,00

BANCO ESPECIFICO					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
10	06/11/18	JESUS RENDER VELASCO CHOTE	$ 697.330	3	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	08/11/18	ELEMENTOS AMEDS S.A	$ 73.306.150,82	3	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
11	05/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 198.653.209,08	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	05/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 659.194.406,08	3	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
11	05/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.974.597,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	05/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.664.000,00	4	Reembolso Descombros, retiramientos
12	15/01/19	METAL 9 SAS	$ 85.254.775,00	3	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
12	15/01/19	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS SA	$ 61.308.608,08	3	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
12	15/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 68.630.180,00	3	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
12	15/01/19	AGD INGENIERIA SAS	$ 185.059.100,00	4	Reembolso Transporte y retiro de escombros
13	21/01/19	METAL 9 SAS	$ 30.300.900,08	3	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13	31/01/19	SODIMAC COLOMBIA SA	$ 19.167.200,00	3	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13	31/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 81.379.050,00	3	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13	31/01/19	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 13.991.149,08	3	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13	31/01/19	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7.242.538,08	3	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13	31/01/19	RESTAURACIONES EDVITA CASTRO SAS	$ 14.146.732,00	3	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 28.452.209	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 98.746.184	3	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 868.000	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 16.807.000	4	Reembolso Descombros, retiramientos
15	9/02/19	ALFADRES SA	$ 368.807.548,08	3	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
15	9/02/19	AGD INGENIERIA SAS	$ 371.888.080	1	salarios y jornales, mano de obra
16	5/03/19	CONSTRUCTORA SUMI ASIAS SAS	$ 81.837.761,80	3	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 132.003.448,08	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 65.026.069,08	3	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 8.660.060,00	5	Reembolso Transporte y retiro de escombros
18		ORLANDO EDMUNDO REVELO	$ 5.519.392,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		RGS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	$ 16.751.784,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		LUIS ALFREDO VARGAS BURGOS	$ 10.000.000,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		CRISTINA ELIZABETH MUÑOZ ESCOBAR	$ 5.519.361,00	3	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
18		EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 8.823.963,00	3	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
18		SODIMAC COLOMBIA SA	$ 11.171.800,00	3	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
18		CVI COLOMBIA S.A.S.	$ 5.297.913,00	3	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
18		ORLANDO EDMUNDO REVELO	$ 4.919.475,00	4	Reembolso Transporte y retiro de escombros
19		AGD INGENIERIA SAS	$ 210.737.080,80	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra

136

	INFORME DE INTERVENTORIA Y PAGO UNICO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO Hoja 1 de 19	

CONTRATO No.:	MI-CMAP-06-5-0004-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL CUARTEL DE POLICIA METROPOLITANA DE SOACHA (DEPARTAMENTO DE POLICIA GALICIA Y COMANDO DE ESTACION No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$7.793.865.750.000
CONTRATISTA:	CONSORCIO ECI-SUTTARES CONFORMADO ECI-SUTTARES
INTERVENTOR:	DAINCO SAS
PLAZO:	hasta 15 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO:	$1.948.466.437,50

DATOS SOPORTE

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
18		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	20.240.000,00	1	salarios y prestac. mayo de 2018
18		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	11.420.000,00	4	Suministros Descuentos y retenciones
			4.128.094.997,00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCION	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE RELACION	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTERIOR
1	Pago de salarios / jornales, mano de obra	1.937.000.000,00	1.328.933.736,00	$	19.282.302,00	1.328.216.038,00	7.783.873,00
2	Compra de materiales, instalación y alquiler de equipos	$ 3.974.865.428,78	3.400.434.508,00			3.504.428.208,00	401.436.420,78
3	Transporte y acarreo de escombros	267.001.065,75	259.308.453,00			259.308.245,00	7.724.819,75
4	Descuentos y retenciones	592.504.937,500	57.509.809,00	$	11.420.000,00	68.329.809,00	43.961.693,50
	TOTALES	6.438.171.429,03	4.127.187.487,01		31.282.302,00	4.159.683.987,01	455.545.918,02

Para constancia de la entrega, se firma la presente acta mejor la responsabilidad/cumplimiento de las que haya incurrido en ella, a los 19 días del mes diciembre de 2018

Firma:
Nombre: INGE AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO ECI-SUTTARES
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: [illegible]
DAINCO S.A.S
INTERVENTOR

405

137

CONTRATO No. :	PROGRAM 06-0-1894-18
OBJETO:	"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$ 2.268.483.156,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO -CONSORCIO SCI -NIT 0
INTERVENTOR:	DANIELO TAO
PLAZO:	Hasta 20 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO:	$ 680.535.136,80

DATOS ESTIMACIÓN

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO		VALOR	ITEM	DESCRIPCION GENERAL
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	71.827.063	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	179.317.349	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	18.645.347	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	1.265.000	4	Reembolso Diseccionary retenciones
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	48.205.311	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	191.943.549	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	3.713.959	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	1.774.000	4	Reembolso Diseccionary retenciones
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	61.638.939	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	41.837.845	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	44.644.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	3.681.740	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	95.702.229	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	843.200	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	2.786.000	4	Reembolso Diseccionary retenciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	20.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	71.345.981	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$	20.833.183	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$	19.697.057	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$	180.080.280	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICOM JP SAS	$	3.809.360	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$	55.680.756	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROBER VELASCO CAPOTE	$	3.467.860	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	AGS INGENIERIA SAS	$	6.425.300	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$	1.481.171	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$	9.441.982	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$	8.894.040	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	JESUS ROBER VELASCO CAPOTE	$	3.047.784	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	CADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$	68.976.000	1	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	AGS INGENIERIA S.A.S	$	54.514.259	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	ARNETA S.A.S	$	68.662.665	1	salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	95.158.234	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	89.348.137	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	843.200	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
9	29/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	31.081.082	1	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	29/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$	1.333.969	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	29/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$	1.382.977	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos

138

	INFORME DE INTERVENTORÍA Y GUÍA NÚMERO DE ANTICIPO
	ORDENES DE PAGO del 1 al 19

CONTRATO No.	FR-SIRAT-SB-6-2019-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL CAI AVANZADO DE POLICÍA METROPOLITANA DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$8.774.644.220,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO GIO-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	CALMICO SAS
PLAZO:	Hasta 28 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO:	$2.632.393.266,00

DATOS ORDEN DE PAGO:

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN SOPORTE
28		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	89.052.909,69	1	salarios y jornales, mano de obra
29		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	12.429.600,00	6	Arrendamiento Camioneta doble cabina
27		ANABEL PASTOR AGUILAR SERVIEC	127.455.912,80	1	salarios y jornales, mano de obra
30		CONTRATRO MODELAMOS SAS	168.018.941,56	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
			4.413.089.269,03		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	1.630.071.944,00	1.148.206.029,00	117.455.912,00	1.475.671.940,00	155.206.029,00
2	Cancelar los materiales, contratos y alquiler de equipos	3.916.930.222,94	3.490.599.590,22	126.918.151,00	3.408.837.847,00	31.491.375,22
3	Transporte y retiro de escombros	259.206.431,06	155.185.183,00		155.206.029,00	0,00
4	Excavaciones manuales	1.45.371.883,00	48.413.308,00		48.413.308,00	0,00
	TOTALES	4.829.291.605,94	4.132.594.187,03	354.634.183,00	4.413.089.269,03	121.132.178,94

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, a los 13 días del mes diciembre de 2019

Firma:
Nombre: AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO GIO-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: [illegible]
CALMICO SAS
INTERVENTOR

4
403
139

	INFORME DE INVERSION Y MAL MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 22	

CONTRATO No.:	PN-DIRAF-SS-9-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA QUINTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.259.485.214,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO CONSORCIO ACS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	GAVICO SAS
PLAZO:	Hasta 28 de Junio de 2019
VALOR ANTICIPO:	$2.629.331.630,00

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.877.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.867.846	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 18.045.267	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.261.300	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.501.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.341.545	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.313.993	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.773.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.606.919	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 61.017.845	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44.044.858	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.881.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 96.360.276	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 642.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.795.808	4	Reembolso Descuentos y retenciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.000.800	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.245.851	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 20.913.701	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 33.357.057	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 109.866.386	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	TERMOELECTRICOAM JP SAS	$ 8.939.263	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S NIDOCA A.S	$ 16.480.215	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.487.960	1	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	9/11/18	AGS INGENIERIA SAS	$ 6.425.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.468.171	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.441.982	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 8.834.049	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 8.887.788	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$ 28.070.000	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	AGS INGENIERIA S.A.S	$ 54.324.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	ARECTA S.A.S	$ 40.982.485	1	Salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 83.138.124	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 83.348.157	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 845.900	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
9	26/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 21.081.982	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	26/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2.916.868	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	26/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 1.562.471	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos

190

	INFORME DE INVERSIÓN Y RELEVO ANTICIPO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 21	

CONTRATO No. :	PN DENAP 08-6-18869-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE ROLDANILLO, DEPARTAMENTO DE POLICIA GAVICA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$8.210.968.150,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	GAVICO SAS
PLAZO:	Hasta 28 de Junio de 2020
VALOR ANTICIPO :	$4.105.221.625,04

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION DEBELO
10	28/11/18	JESUS ROGER VILLALOBO CAPOTE	$ 947.810	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	CEMENTOS ARGOS S A	$ 73.886.458,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	19/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 138.650.298,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	19/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 355.196.804,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	19/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.474.547,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	19/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.686.810,00	4	Reembolso Descuentos financieros
12	23/01/19	METAL B SAS	$ 66.264.775,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/19	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETROS SA	$ 61.008.080,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 44.636.280,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/19	AGS INGENIERIA SAS	$ 185.829.108,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
13	31/01/19	METAL B SAS	$ 18.330.008,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	SODIMAC COLOMBIA SA	$ 23.147.208,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 61.379.810,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 13.685.185,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7.262.536,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	PREFABRICADOS KINTA CASTRO SAS	$ 10.146.710,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 28.452.900	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 86.768.100	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 642.588	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 28.007.008	4	Reembolso Descuentos financieros
15	6/02/19	ALFAGRES SA	$ 268.997.548,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
15	6/02/19	AGS INGENIERIA SAS	$ 371.662.008	1	salarios y jornales, mano de obra
16	8/02/19	CONSTRUCTORA SUMI AGUAS SAS	60.517.764,08	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	152.602.448,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	65.380.908,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	8.840.868,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
18		ORLANDO EDMUNDO REVELO	5.328.552,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		BCS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	16.751.784,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		LUIS ALFREDO VARGAS MARQUEZ	50.008.080,08	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		CRISTINA ELIZABETH MUÑOZ ESCOBAR	5.518.583,08	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	3.823.080,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		SODIMAC COLOMBIA SA	12.175.800,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		CVS EQUIPAR & CIA S EN C	5.297.921,80	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		ORLANDO EDMUNDO REVELO	4.079.479,80	3	Transporte y retiro de escombros
18		AGS INGENIERIA SAS	210.727.080,00	1	salarios y jornales, mano de obra

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 21	

CONTRATO No. :	PN DIRAF 06-6-18044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.253.485.704,96
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO RCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	CIVILMEC SAS
PLAZO:	Hasta 28 de junio de 2019
VALOR ANTICIPO :	$4.626.331.615,24

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
19		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	30.082.380,00	1	salarios y jornales, mano de obra
19		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	11.428.069,00	4	Rendimiento Oficiales,ayud y operadores
20		GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO	127.455.901,00	1	salarios y jornales, mano de obra
21		CENTIMETRO INMOBILIARIO SAS	126.558.341,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
21		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	81.532.375,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
			4.475.231.625,00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	1.928.671.948,00	1.478.671.948,00		1.478.671.948,00	150.000.000,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 2.680.660.322,04	2.518.197.847,00	$ 81.532.375,00	2.680.583.222,00	0,00
3	Transporte y retiro de escombros	259.100.455,00	259.100.455,00		259.100.455,00	0,00
4	Oficialesy y ayudantes	$ 88.920.000,00	88.920.000,00		88.920.000,00	0,00
	TOTALES	4.626.331.615,04	4.415.090.250,00	81.532.375,00	4.475.231.625,00	150.000.000,00

Para constancia de lo anterior, se firmaría presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 18 días del mes marzo de 2019

Firma:
Nombre: ING. AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO RCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: ING. JOSE VICENTE [illegible]
CIVILMEC S.A.S
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 22	

CONTRATO No.:	"IN DIBAT DE-8-10004-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$ 250.462.150,08
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 28 de junio de 2019
VALOR ANTICIPO:	$ 125.231.075,04

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION REEMBOLSO
1	5/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	71.877.062	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	5/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	126.837.846	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	5/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	39.645.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	5/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1.361.800	4	Reembolso Descuentos, retenciones
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	40.503.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	101.942.393	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	2.313.950	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	2.772.080	4	Reembolso Descuentos, retenciones
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	67.626.318	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	41.017.845	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	44.644.358	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	9.881.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	85.765.276	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	2.796.000	4	Reembolso Descuentos, retenciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	33.808.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	71.345.881	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	10.913.781	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	19.197.097	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	100.060.366	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICOVA JP SAS	2.909.360	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	SOLUCIONES DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	35.680.195	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	5.467.080	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	AGI INGENIERIA SAS	8.438.190	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	1.488.172	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	15/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	8.641.962	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	15/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	8.886.669	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	15/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	5.067.794	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	14/11/18	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	38.976.800	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	14/11/18	AGI INGENIERIA S.A.S	14.534.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	ARRIETA S.A.S	40.932.485	1	Salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	99.298.134	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	88.848.127	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	31.081.992	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	20/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	1.313.968	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	20/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	1.303.977	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 21	

CONTRATO No.:	PN-DIRAF-06-8-330M-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE PIENDAMO, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE BRIGADA No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$8.250.465.255,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DIMARCO SAS
PLAZO:	Hasta 25 de junio de 2019
VALOR ANTICIPO:	$4.625.232.625,00

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO		VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
10	28/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAMPOS	$	997.800	3	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$	75.006.450,62	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	128.556.288,80	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	355.194.540,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	11.874.597,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	5.898.080,00	4	Reembolso Descuentos retenciones
12	28/01/19	METAL B SAS	$	68.364.775,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	28/01/19	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETRICH SA	$	61.800.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	29/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$	44.339.208,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	29/01/19	AGS INGENIERIA SAS	$	105.019.308,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
13	31/01/19	METAL B SAS	$	10.268.800,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	SOCIMACCO COLOMBIA SA	$	23.147.200,80	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$	61.579.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$	15.891.135,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	31/01/19	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$	7.241.548,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$	14.196.733,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	28.452.500	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	18.744.104	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	441.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	14.007.408	4	Reembolso Descuentos retenciones
15	5/02/19	ALCAGRES SA	$	288.957.548,80	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
15	5/02/19	AGS INGENIERIA SAS	$	371.693.760	1	salarios y jornales, mano de obra
16	5/02/19	CONSTRUCTORA SUMI ARMAS SAS		84.917.753,08	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO		102.668.448,08	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO		66.880.068,08	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO		8.880.968,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
18		ORLANDO EDMUNDO REVELO		3.310.551,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		BCS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS		16.751.784,80	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		LUIS ALFREDO VARGAS BURGOS		50.000.800,80	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		CRISTINA ELIZABETH MUÑOZ ESCOBAR		5.518.381,80	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS		3.829.985,08	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		SOCIMACCO COLOMBIA SA		11.175.888,08	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		CIS EQUIPAR & CIA S EN C		5.297.911,08	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		ORLANDO EDMUNDO REVELO		4.079.479,00	3	Transporte y retiro de escombros
18		AGS INGENIERIA SAS		210.727.368,80	1	salarios y jornales, mano de obra

2

198

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO ORDENES DE PAGO del 1 al 22	
CONTRATO No.:	IN-DSNAF-06-0-0044-19	
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	
VALOR:		38.256.385.240,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO SICS-GUTIERREZ	
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS	
PLAZO:	Hasta 18 de junio de 2020	
VALOR ANTICIPO :		38.626.231.625,04

GASTOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	20.280.000	1	salarios y jornales, mano de obra
18		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	13.420.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
19		GABRIEL PASTOR AGUILAR SERRATO	117.650.922	1	salarios y jornales, mano de obra
20		CENTIMETRO MOBILIARIO SAS	126.158.340	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
21		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	61.532.375	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
22		AGI INGENIERIA SAS	150.000.000	1	salarios y jornales, mano de obra
			6.625.231.625		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	1.626.671.948,00	1.470.671.948,00	156.000.000,00	0,00	0,00
[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	2.890.590.233,04	2.890.590.233,04	-	0,00	0,00
3	Transporte y retiro de escombros	255.186.456,00	219.336.456,00	-	-	-
4	Descuentos y retenciones	48.923.000,00	48.923.000,00	-	-	-
	TOTALES	4.625.231.625,04	4.479.231.625,04	156.000.000,00	0,00	0,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 18 días del mes marzo de 2019

Firma
Nombre: ING. AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO SICS GUTIERREZ
CONTRATISTA

Nombre: ING. JOSE [illegible]
DAIMCO S.A.S
INTERVENTOR

145

fiduciaria popular

Bogotá D.C,

Doctor
AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS - GUTIERREZ
Carrera 19 No. 84 – 41 Oficina 402
Bogotá

Asunto: **P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ CTO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10044-18 POLICIA NACIONAL CODIGO 378244**
INFORME DE GESTION MES DE DICIEMBRE DE 2018

Respetado Doctor:

En cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos celebrado entre Consorcio BCS Gutierrez y Fiduciaria Popular S.A., suscrito el dia 26 de junio de 2018, nos permitimos presentar informe del mes de diciembre de 2018, con los aspectos administrativos, financieros y los hechos sucedidos durante el periodo asi:

1. Informe Económico del Fideicomiso
2. Informe de Fuentes y Usos
3. Detalle de las comisiones fiduciarias
4. Extracto Fondo de Inversión
5. Estados Financieros
6. Ejecución del plan de inversión del anticipo

ASPECTOS RELEVANTES:

En desarrollo del objeto contractual del citado Fideicomiso, Fiduciaria Popular S.A. como vocera y administradora del mismo se permite relacionar los siguientes hechos:

- **BIENES FIDEICOMITIDOS**

Los bienes Fideicomitidos que harán parte del Patrimonio Autónomo Consorcio BCS Gutierrez de conformidad con la cláusula tercera del contrato fiduciario son:

- ✓ La suma de Tres Millones Quinientos Mil Pesos m/cte. ($3.500.000,00) aportados por el fideicomitente para la constitución del Fideicomiso y del Fondo de Reserva.
- ✓ Frente al anticipo la suma que equivale al Veinte por ciento (20%) del valor de las obras financiadas, es decir un anticipo equivalente a Mil Ochocientos Cincuenta Millones Noventa y Dos Mil Seiscientos Cincuenta Pesos Con Cero Dos Centavos M/CTEM/CTE ($1.850.092.650,02).

Anticipo que otorgara la Policía Nacional	1.820.092.650,02
Recursos que entregara el Consorcio BCS Gutierrez	3.000.000,00

- **SALDOS**

A continuación se relacionan los saldos del mes de diciembre de 2018 en los encargos del fondo de inversión colectiva fiduliquidez adscritos al P.A. Consorcio Consorcio BCS Gutierrez así:

Fondo de Inversión No.	VALOR ($)
Fiduliquidez No. 7008362592 anticipo	2.776.993.820,77
Fiduliquidez No. 7008362605 reserva	1.669.796,84
TOTAL ($)	2.778.663.617,61

- **RENDIMIENTOS**

El fideicomiso en el mes de diciembre de 2018 registró ingresos por rendimientos por un valor de $738.903,69 como se detalla a continuación:

Fondo de Inversión No.	VALOR ($)
Fiduliquidez No. 7008362592 anticipo	736.106,27
Fiduliquidez No. 7008362605 reserva	2.797,42
TOTAL ($)	738.903,69

Los rendimientos generados en el fondo de inversión colectiva fiduliquidez N° 70083602592, serán girados a la liquidación del fideicomiso de conformidad a lo estipulado en la cláusula tercera, parágrafo primero – Rendimientos del contrato fiduciario. No obstante de lo anterior se informa que en los estados financieros del fideicomiso se registra en la cuenta por pagar un valor de $3.419.395,29 correspondiente a los rendimientos pendientes de giro a la entidad otorgante.

- **COMISIONES**

De acuerdo a lo establecido con el contrato fiduciario, Cláusula – Décima Quinta – Remuneración de la Fiduciaria - numeral 1, se estableció el cobro de las comisiones de acuerdo con lo relacionado a continuación:

"(...) No se cobra comisión por la administración del Patrimonio Autónomo, si el promedio de los recursos administrados en el mes, es superior a Un Mil Millones de Pesos ($1.000.000.000). Si el promedio de los recursos administrados en el mes, es inferior a Un Mil Millones de Pesos ($1.000.000.000) EL FIDEICOMITENTE pagará una comisión a la FIDUCIARIA de CERO PUNTO CINCO SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (0.5 S.M.L.M.V.) por mes o fracción de mes. (...)"

Conforme a lo anterior en el mes de diciembre de 2018 Fiduciaria Popular genero cobro de comisión fiduciaria de 1 SMMLV el cual contempla el concepto de la elaboración del Otrosi No. 1 al contrato fiduciario y el promedio del fondo del cual fue inferior a los Un Mil Millones de Pesos ($1.000.000.000). Es importante mencionar como hecho subsecuente que esta comisión fue descontada del fondo de reserva en el mes de enero de 2019 con el fin de estar a paz y salvo por este concepto.

fiduciaria popular

- PAGOS

Durante el mes de diciembre de 2018 no se realizaron operaciones de pago.

- SARLAFT

Nos permitimos informar que el Fideicomitente actualizó su información el pasado 07 de junio de 2018, por lo tanto al envio del presente informe se encuentra al día.

- OTROS HECHOS RELEVANTES

En el mes de diciembre de 2018 el Fideicomitente solicito a Fiduciaria Popular la elaboración de un Otrosí al contrato fiduciario en el cual se incrementa el porcentaje del anticipo a recibir pasando del 20% por valor de $1.850.092.650,02 al 50% por valor de $4.625.231.625,04 en razón al modificatorio No. 2 del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10044-18.

Con la entrega de este informe mensual, la Fiduciaria da cumplimiento a su deber de presentación del informe detallado y pormenorizado de la gestión de los bienes entregados en virtud del negocio fiduciario; agradecemos notificar a la Fiduciaria si existe alguna observación al mismo en el menor tiempo posible.

Finalmente, es importante mencionar que dentro de las obligaciones del Fideicomitente, se encuentran las de informar a la Fiduciaria cualquier cambio material o legal que se presente en el contrato de obra, así como las prórrogas, otrosíes o suspensiones que se generen a raíz del citado contrato.

Cordialmente,

WILSON BUITRAGO HORTA
Director de Negocios Fiduciarios

Elaboró: Daisy Bustos
Revisó: Mauricio Lugo

C.C. Brigadier General Yolanda Caceres Martinez – Directora Administrativa y Financiera POLICIA NACIONAL Carrera 59 No. 26 – 21 Bogotá

● Dirección General Bogotá: Carrera 13A N° 29 - 24 Pisos 20, 21 y 24 ● PBX 607 99 77 / 596 15 06
● servicioalcliente@fidupopular.com.co ● www.fidupopular.com.co
● Línea Nacional gratuita 018000-513962

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

INFORME DE ESTADO ECONOMICO
P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ
DICIEMBRE DE 2018

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS FONDO FIDULIQUIDEZ No 70003602592
FONDO ANTICIPO
P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ
DICIEMBRE DE 2018

FECHA	IDENTIFICACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FUENTES	USOS	SALDO
SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018				$ 6.590.219,82	$ 1.857.493.020,61	1.118.739,46
27/12/2018	800.141.397	POLICIA NACIONAL	APORTES ANTICIPO	$ 2.775.136.975,02		2.776.255.714,50
31/12/2018	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	RENDIMIENTOS	$ 738.106,27		2.776.993.820,77
SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018				$ 2.775.875.081,29	$ -	2.776.993.820,77

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS FONDO FIDULIQUIDEZ No 70003602605
FONDO RESERVA
P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ
DICIEMBRE DE 2018

FECHA	IDENTIFICACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FUENTES	USOS	SALDO
SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018				$ 6.002.820,47	$ 5.835.821,05	$ 1.666.999,42
31/12/2018	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	RENDIMIENTOS	$ 2.797,42		$ 1.669.796,84
SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018				$ 2.797,42	$ -	$ 1.669.796,84

ELABORÓ

DEISY PAOLA BOSTOS
ANALISTA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

APROBÓ

MAURICIO LUGO CARDENAS
COORDINADOR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

149

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ
INFORME DE FUENTES Y USOS

popular

DETALLE	dic-19			Total Acumulado		
	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL
CUENTA DE AHORROS No 630-971041-66 ANTICIPO	2.315.571.081,39	-	2.315.571.081,39	4.614.484.841,38	1.837.473.008,61	2.376.993.829,77
Saldo anterior bancos	2.315.571.081,39			4.614.484.841,38		
Aportes del Fideicomitente	1.799.134.375,00			3.599.268.750,00		
Rendimientos Netos	7.181.926,39			14.363.853,39		
Traslado a fiducia de fondo de reserva					1.350.342.652,00	
Pagos					487.130.356,61	
G.M.F. 4*1000					-	
Pago de Rendimientos a Inversionistas					-	
G.M.F. 4*1000 generados en el Patrimonio Autónomo					-	

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ
INFORME DE FUENTES Y USOS

DETALLE	dic-19			Total Acumulado		
	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL
FIDUCIARIA POPULAR FONDO DE RESERVA Nº 7060102351	2.797,42	-	1.660.706,64	7.585.617,85	5.815.921,00	1.669.696,64
Saldo anterior bancos	1.664.909,22			7.582.820,43		
Aportes Fideicomitente				2.797,42		
Rendimientos Netos	2.797,42					
G.M.F. 4*1000					5.815.921,00	
Traslado al Fondo de Anticipo					-	
Liquidación Fiduciaria					-	

ELABORÓ

DE LA PAVA AVENDAÑO
ANALISTA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

APROBÓ

MAURICIO LUGO CARDENAS
COORDINADOR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

86

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
P.A CONSORCIO BCS GUTIERREZ
DETALLE DE COMISIONES
dic-18

FECHA	NIT	CONCEPTO	FACTURA	CAUSADO	PAGADO	SALDO
26-dic-18	901.177.394	COMISION FIDUCIARIA DICIEMBRE DE 2018	110626	929.677,98	929.677,98	-
TOTAL COMISION				929.677,98	929.677,98	-

MAURICIO LUGO C
COORDINADOR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
APROBÓ

DEISY PAOLA BUSTOS
ANALISTA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
ELABORÓ

151

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit 800247235

Fiduciaria popular

NIT 800141235

PA CONSORCIO BCS-GUTIÉRREZ CONTRATO DE OBRA PN

PA CONSORCIO BCS GUTIÉRREZ-FONDO DE RESERVA

CR 13 A 29 24 P 20

BOGOTA D C / CUNDINAMARCA

Número de Identificación 378244

Fiduliquidez

Extracto de Cuenta Periodo del 01 Diciembre 2018 al 31 Diciembre 2018 Número de Encargo: XXXXXXX2605 2

BALANCE DE LA INVERSIÓN

Saldo Inicial a 01 Diciembre 2018		$ 1,668,999.42
Aportes	$ 0.00	
Retiros	$ 0.00	
Gravamen a los movimientos financieros	$ 0.00	
Rendimientos	$ 2,797.42	
Retención en la fuente	$ 0.00	
Saldo Final a 31 Diciembre 2018		$ 1,669,796.84

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN

Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial en $	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en $	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en $
01/12/2018 a 26/12/2018	F TIPO NEG	15 122 946609	110 220811	15 144 328418	110 220811	1 669 313 07
27/12/2018 a 31/12/2018	F TIPO NEG	15 127 468367	109 999234	15 161 490153	109 999234	1 669 796 84

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Valor en $	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en $

Valor Acumulado del Fondo en $ mes

$344 230 668 945 74

F TIPO NEG 2 10%

Valor Unidad Histórico por tipo de participación (%)

Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
F TIPO NEG	3 756	3 756	4 241	4 779	4 784	5 507	0 156	0 156	0 156	0 156	0 156	0 171
F TIPO NEG	3 358	3 410	3 851	3 755	4 150	5 502	0 156	0 156	0 157	0 157	0 156	0 210
F TIPO NEG	3 561	3 521	3 974	3 956	4 359	5 605	0 156	0 156	0 157	0 157	0 156	0 210
F TIPO NEG	3 764	3 763	4 097	4 158	4 569	5 708	0 156	0 156	0 157	0 157	0 156	0 210
F TIPO NEG	3 967	3 967	4 220	4 361	4 779	5 811	0 156	0 156	0 157	0 157	0 156	0 210
F TIPO NEG	4 170	4 170	4 343	4 564	4 989	5 914	0 156	0 156	0 157	0 157	0 156	0 210
F TIPO NEG	4 373	4 373	4 466	4 767	5 199	6 017	0 156	0 156	0 157	0 157	0 156	0 210
F TIPO NEG	4 576	4 576	4 589	4 970	5 409	6 120	0 156	0 156	0 157	0 157	0 156	0 210
F TIPO NEG	4 779	4 779	4 712	5 173	5 619	6 223	0 156	0 156	0 157	0 157	0 156	0 210
F TIPO NEG	4 982	4 982	4 835	5 376	5 829	6 326	0 156	0 156	0 157	0 157	0 156	0 210
F TIPO NEG	5 185	5 185	4 958	5 579	6 039	6 429	0 156	0 156	0 157	0 157	0 156	0 210
F TIPO NEG	5 388	5 388	5 081	5 782	6 249	6 532	0 156	0 156	0 157	0 157	0 156	0 210

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

152

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit 900247285

fiduciaria popular

NIT 800141235-5

PA CONSORCIO BCS-GUTIÉRREZ CONTRATO DE OBRA PN

PA CONSORCIO BCS GUTIÉRREZ-FONDO DE RESERVA

CR 13 A 29 24 P 20

BOGOTA D.C. / CUNDINAMARCA

Número de Identificación 376044

Fiduliquidez

Extracto de Cuenta - Periodo del 01 Diciembre 2018 al 31 Diciembre 2018

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los aportes entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni genéricos toda la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafin. El riesgo ninguno otro instrumento de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la fluctuación de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

Cualquier inquietud comuníquese con Servicio al Cliente al PBX 6076077, 6851600 Opción 3, a la línea nacional gratuita 018000513802, al correo servicioalcliente@fiducipopular.com.co o remítala a la Cra. 13 A N° 29 - 24 piso 2d, 3, y 24. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto remítala a las Revisores Fiscales KPMG al correo electrónico jmolina@kpmg.com.co al número telefónico 6076077 Ext 5062. El reglamento y la ficha técnica del producto consultada en la página web www.fiducipopular.com.co ingresando al link de cada Fondo de Inversión. Recuerde que cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero calle 70 A No 11 - 83 en Bogotá. Teléfonos: (1) 5439854 (1)2351604. Correo electrónico: reclamaciones@defensoria.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit 900247885

fiduciaria popular

Nit 8001412.45

PA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ CONTRATO DE OBRA PN
PA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ -FONDO DE ANTICIPO
CR 13 A 29 24 P 20
BOGOTA D C / CUNDINAMARCA

Número de Identificación 378244

Fiduliquidez

Extracto de cuenta - Periodo del 01 Diciembre 2018 al 31 Diciembre 2018 Número de Encargo: XXXXXX2892-5

BALANCE DE LA INVERSION

Saldo Inicial a 01 Diciembre 2018		$ 1,118,739.48
Aportes	$ 2,775,139,975.02	
Retiros	$ 0.00	
Gravamen a los movimientos financieros	$ 0.00	
Rendimientos	$ 736,105.27	
Retención en la fuente	$ 0.00	
Saldo Final a 31 Diciembre 2018		$ 2,776,993,820.77

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACION

Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial en $	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en $	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en $
01/12/2018 a 31/12/2018	F TIPOS NEG	15,122.945605	73,970296	15,144.388418	73,970296	1,120,325.79
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	182,921,774766	2,775,873,820.77

Detalle movimientos del mes de la inversión

[illegible]	Valor en Unidades	Valor $	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en $
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Valor promedio del Fondo en el mes

Tipo de Participación	
F TIPOS NEG	5344 230 958 945.74

Valor final histórico por tipo de participación (%)

Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
F TIPOS NEG	2.359	3.515	3.515	3.515	4.024	5.551	0.195	0.159	0.159	0.159	0.199	0.210
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit 900247285

fiduciaria popular

NIT 860141278

PA CONSORCIO BCS-GUTIÉRREZ CONTRATO DE OBRA PN

PA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ -FONDO DE ANTICIPO

CR 13 A 29 24 P 20

BOGOTA D.C / CUNDINAMARCA

Numero de Identificacion 378244

Fiduliquidez

Extracto de Cuenta - Periodo del 01 Diciembre 2018 al 31 Diciembre 2018 - Número de Encargo

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%) - Volatilidad Histórica por tipo de participación

Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
[illegible]	[illegible]	2.415	2.571	3.478	2.476	4.309	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversion colectiva relacionadas con la gestion del portafolio son de medio y no de resultado. Los aportes entregados por los inversionistas a los fondos de inversion colectiva no son depositos ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institucion de deposito y no estan amparados por el seguro de deposito del Fondo de Garantias de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de igual naturaleza. La inversion en el fondo de inversion colectiva esta sujeta a los riesgos de inversion derivados de la evolucion de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversion colectiva.

Cualquier inquietud comuniquese con Servicio al Cliente al PBX 6079977 5651566 Opción 3 a la línea nacional gratuita 018000512922 al correo serviciosalcliente@fiduciariapopular.com.co o acerquese a la Cra 13 A N° 29 24 piso 20, 21 y 24. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto remitida a los Inversores Locales KPMG al correo electrónico simcon@kpmg.com o al número telefónico 6079977 Ext 502. El reglamento y la ficha técnica podrá consultarla en la página web www.fiduciariapopular.com.co ingresando al link de cada Fondo de Inversión. Recuerde que cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero calle 70 A No 11 83 en Bogotá. Teléfonos (1) 5439850 (1)2351684 Correo electronico: reclamacsuno5@defensoriafc.com.co

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVO	NAPL	2,786,738.90	2,776,863,602.22	185,623.51	2,778,863,617.61
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	NAPL	2,786,738.90	2,776,863,602.22	185,623.51	2,778,863,617.61
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	NAPL	2,786,738.90	2,776,863,602.22	185,623.51	2,778,863,617.61
130205		EMISORES NACIONALES	NAPL	2,786,738.90	2,776,863,602.22	185,623.51	2,778,863,617.61
13020501		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	NAPL	2,786,738.90	2,776,863,602.22	185,623.51	2,778,863,617.61
1302050105		FONDOS DE INVERSION COLECTIVA FIDUPOPULAR	NAPL	1,118,739.48	2,776,060,170.63	185,089.34	2,776,993,820.77
	70083602592	ENCARGO FIDUCIARIO 70083602592	NAPL	1,666,999.42	3,331.59	534.17	1,669,796.84
	70083602605	ENCARGO FIDUCIARIO 70083602605	NAPL	-2,785,738.90	738,903.69	2,776,616,782.40	-2,778,863,617.61
3		PATRIMONIO	NAPL	-7,500,000.02	.00	2,775,138,975.02	-2,782,638,975.04
35		PATRIMONIO ESPECIALES	NAPL	-1,857,592,650.02	.00	2,775,138,975.02	-4,632,731,625.04
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-1,857,592,650.02	.00	2,775,138,975.02	-4,632,731,625.04
350505		APORTES EN DINERO	NAPL	-1,857,592,650.02	.00	2,775,138,975.02	-4,632,731,625.04
35050501		APORTES EN DINERO	NAPL	-1,857,592,650.02	.00	2,775,138,975.02	-4,632,731,625.04
3505050105		APORTES EN DINERO	NAPL	-1,857,592,650.02	.00	2,775,138,975.02	-4,632,731,625.04
	901177394	CONSORCIO BCS GUTIERREZ	NAPL	1,850,092,650.00	.00	.00	1,850,092,650.00
3510		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	1,850,092,650.00	.00	.00	1,850,092,650.00
351010		PAGOS A TERCEROS	NAPL	1,850,092,650.00	.00	.00	1,850,092,650.00
35101030		PAGOS A TERCEROS	NAPL	1,850,092,650.00	.00	.00	1,850,092,650.00
3510103095		OTROS	NAPL	11,533,584.00	.00	.00	11,533,584.00
	10296018	VELASCO CAPOTE JESUS ROGER	NAPL	31,668,632.00	.00	.00	31,668,632.00
	34535584	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	NAPL	1,483,172.00	.00	.00	1,483,172.00
	76326961	MORALES RODRIGUEZ CARLOS ADRIAN	NAPL	38,976,000.00	.00	.00	38,976,000.00
	817000019	LADRILLERA MELENDEZ S A	NAPL	29,354,083.00	.00	.00	29,354,083.00
	830363600	COVAL COMERCIAL S.A.	NAPL	173,872,836.00	.00	.00	173,872,836.00
	890100251	CEMENTOS ARGOS S A	NAPL	35,680,235.00	.00	.00	35,680,235.00
	890333023	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S A	NAPL	60,949,350.00	.00	.00	60,949,350.00
	901041132	AG3 INGENIERIA SAS	NAPL	3,909,260.00	.00	.00	3,909,260.00
	901067532	FERRELECTRICOM JP SAS	NAPL	1,421,983,013.00	.00	.00	1,421,983,013.00
	901177394	CONSORCIO BCS GUTIERREZ	NAPL	40,682,485.00	.00	.00	40,682,485.00
	901187788	ARRIETA S.A.S	NAPL	4,714,261.12	738,903.69	1,477,807.28	3,976,357.43
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	NAPL	.00	738,903.69	738,903.69	.00
3915		GANANCIAS DEL EJERCICIO	NAPL	.00	738,903.69	738,903.69	.00
391501		GANANCIAS DEL EJERCICIO	NAPL	.00	738,903.69	738,903.69	.00
39150101		GANANCIAS DEL EJECICIO	NAPL	.00	738,903.69	738,903.69	.00
3915010101		GANANCIAS DEL EJERCICIO	NAPL	.00	738,903.69	738,903.69	.00
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	4,714,261.12	.00	738,903.69	3,976,357.43
3920		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	4,714,261.12	.00	738,903.69	3,976,357.43
392001		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	4,714,261.12	.00	738,903.69	3,976,357.43
39200101		PÉRDIDA DEL EJECICIO	NAPL	4,714,261.12	.00	738,903.69	3,976,357.43
3920010101		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	4,714,261.12	.00	738,903.69	3,976,357.43
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	-3,696,987.36	95,186.65	1,019,713.86	-4,621,514.55
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL	-3,696,987.36	95,186.65	1,019,713.86	-4,621,514.55
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	NAPL	-3,696,987.36	95,186.65	1,019,713.86	-4,621,514.55
4108		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	NAPL	-3,696,987.36	95,186.65	1,019,713.86	-4,621,514.55
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO					

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
41060501		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR)	NAPL	-3,695,987.35	95,186.65	1,019,713.85	-4,621,514.55
4106050101		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR)	NAPL	-3,695,987.35	95,186.65	1,019,713.85	-4,621,514.55
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	.00	95,186.65	95,186.85	.00
	900247285	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ	NAPL	-3,695,987.35	.00	924,527.20	-4,621,514.55
5		GASTOS	NAPL	3,696,987.35	924,527.20	.00	4,621,514.55
51		GASTOS OPERACIONALES	NAPL	8,411,248.47	185,623.51	.00	8,596,871.98
5108		VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.	NAPL	1,010,877.86	185,623.51	.00	1,196,501.37
510805		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	1,010,877.86	185,623.51	.00	1,196,501.37
51080501		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (DB)	NAPL	1,010,877.86	185,623.51	.00	1,196,501.37
5108050101		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (DB)	NAPL	1,010,877.86	185,623.51	.00	1,196,501.37
	900247285	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ	NAPL	7,400,370.61	.00	.00	7,400,370.61
5140		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	7,400,370.61	.00	.00	7,400,370.61
514006		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	7,400,370.61	.00	.00	7,400,370.61
51400601		G.M.F.	NAPL	7,400,370.61	.00	.00	7,400,370.61
5140060102		G.M.F. OFERTAS FDOS COMUNES	NAPL	7,400,370.61	.00	.00	7,400,370.61
	900247285	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ	NAPL	-4,714,261.12	738,503.69	.00	-3,975,357.43
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	NAPL	-4,714,261.12	738,503.69	.00	-3,975,357.43
5906		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	-4,714,261.12	738,503.69	.00	-3,975,357.43
590601		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	-4,714,261.12	738,503.69	.00	-3,975,357.43
59060101		GANANCIAS	NAPL	-4,714,261.12	738,503.69	.00	-3,975,357.43
5906010101		GANANCIAS	NAPL	-4,714,261.12	738,503.69	.00	-3,975,357.43
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	.00	1,078,113.56	1,078,113.56	.00
8		CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL	NAPL	.00	.00	929,677.98	-929,677.98
82		ACREEDORAS	NAPL	.00	.00	929,677.98	-929,677.98
8295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	.00	.00	929,677.98	-929,677.98
829501		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	.00	.00	929,677.98	-929,677.98
82950101		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	.00	.00	929,677.98	-929,677.98
8295010101		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	.00	.00	929,677.98	-929,677.98
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	NAPL	.00	1,078,113.56	148,435.58	929,677.98
84		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	.00	1,078,113.56	148,435.58	929,677.98
8405		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	.00	1,078,113.56	148,435.58	929,677.98
840500		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	.00	1,078,113.56	148,435.58	929,677.98
84050000		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	.00	1,078,113.56	148,435.58	929,677.98
8405000000		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	.00	929,677.98	.00	929,677.98
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	.00	148,435.58	148,435.58	.00
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.					
			Total	.00	2,778,900,233.72	2,778,900,233.72	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL

DIRECTOR CONTABLE

REPRESENTANTE LEGAL

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO BCS GUTIERREZ - 378244

PLAN DE INVERSION ANTICIPO

ITEM	PLAN DE INVERSION	VALOR ANTICIPO POR RUBRO	ORDEN DE PAGO No. 1	ORDEN DE PAGO No. 2	ORDEN DE PAGO No. 3	ORDEN DE PAGO No. 4	ORDEN DE PAGO No. 5	ORDEN DE PAGO No. 6	ORDEN DE PAGO No. 7	ORDEN DE PAGO No. 8	ORDEN DE PAGO No. 9	ORDEN DE PAGO No. 10	SALDO ANTICIPO POR RUBRO
1	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ -
2	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
3	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ -
4	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ -
		$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]

[illegible]

MAURICIO UGO
Coordinador de Negocios Fiduciarios

ODISSEA PAOLA BOTERO
Analista de Negocios Fiduciarios

159

fiduciaria popular

Bogotá D.C,

Doctor
AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS - GUTIERREZ
Carrera 19 No. 84 – 41 Oficina 402
Bogotá

Asunto: **P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ CTO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10044-18 POLICIA NACIONAL CODIGO 378244 - INFORME DE GESTION MES DE ENERO DE 2019**

Respetado Doctor:

En cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos celebrado entre Consorcio BCS Gutierrez y Fiduciaria Popular S.A., suscrito el día 26 de junio de 2018, nos permitimos presentar informe del mes de enero de 2019, con los aspectos administrativos, financieros y los hechos sucedidos durante el periodo así:

1. Informe Económico del Fideicomiso
2. Informe de Fuentes y Usos
3. Detalle de las comisiones fiduciarias
4. Extracto Fondo de Inversión
5. Estados Financieros
6. Ejecución del plan de inversión del anticipo

ASPECTOS RELEVANTES:

En desarrollo del objeto contractual del citado Fideicomiso, Fiduciaria Popular S.A. como vocera y administradora del mismo se permite relacionar los siguientes hechos:

- **PÓLIZAS**

En atención a la obligación contractual entre el Fideicomitente y la Policía Nacional relacionamos la póliza de cumplimiento No. 96-44-101137868, expedida por Seguros del Estado S.A., a favor de las entidades estatales la cual se encuentra vigente de acuerdo al siguiente detalle:

COBERTURA	VALOR ASEGURADO($)	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	1.850.092.650,02	18/05/2018 a 15/06/2019
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	4.625.231.626,00	18/05/2018 a 15/06/2019
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	462.523.162,50	18/05/2018 a 15/04/2022
Estabilidad y calidad de la obra	2.775.138.975,02	15/12/2018 a 15/12/2023
Calidad y buen funcionamiento de los bienes	329.371.500,00	18/05/2018 a 15/04/2020

- **BIENES FIDEICOMITIDOS**

Los bienes Fideicomitidos que harán parte del Patrimonio Autónomo Consorcio BCS Gutierrez de conformidad con la cláusula tercera del contrato fiduciario son:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA

110

- ✓ La suma de Tres Millones Quinientos Mil Pesos m/cte. ($3.500.000,00) aportados por el fideicomitente para la constitución del Fideicomiso y del Fondo de Reserva.

- ✓ Frente al anticipo la suma que equivale al Veinte por ciento (20%) del valor de las obras financiadas, es decir un anticipo equivalente a Mil Ochocientos Cincuenta Millones Noventa y Dos Mil Seiscientos Cincuenta Pesos Con Cero Dos Centavos M/CTEM/CTE ($1.850.092.650,02).

Anticipo que otorgara la Policia Nacional	1.820.092.650,02
Recursos que entregara el Consorcio BCS Gutierrez	3.000.000,00

- **SALDOS**

A continuación se relacionan los saldos del mes de enero de 2019 en los encargos del fondo de inversión colectiva fiduliquidez adscritos al P.A. Consorcio Consorcio BCS Gutierrez así:

Fondo de Inversión No.	VALOR ($)
Fiduliquidez No. 7008362592 anticipo	1.837.305.627,25
Fiduliquidez No. 7008362605 reserva	11.097.842,87
TOTAL ($)	1.848.403.470,12

- **RENDIMIENTOS**

El fideicomiso en el mes de enero de 2019 registró ingresos por rendimientos por un valor de $5.591.319,46 como se detalla a continuación:

Fondo de Inversión No.	VALOR ($)
Fiduliquidez No. 7008362592 anticipo	5.573.205,63
Fiduliquidez No. 7008362605 reserva	18.113,83
TOTAL ($)	5.591.319,46

Los rendimientos generados en el fondo de inversión colectiva fiduliquidez N° 70083602592, serán girados a la liquidación del fideicomiso de conformidad a lo estipulado en la cláusula tercera, parágrafo primero – Rendimientos del contrato fiduciario. No obstante de lo anterior se informa que en los estados financieros del fideicomiso se registra en la cuenta por pagar un valor de $9.480.492,16 correspondiente a los rendimientos pendientes de giro a la entidad otorgante.

- **COMISIONES**

De acuerdo a lo establecido con el contrato fiduciario, Cláusula – Décima Quinta – Remuneración de la Fiduciaria - numeral 1, se estableció el cobro de las comisiones de acuerdo con lo relacionado a continuación:

"(...) No se cobra comisión por la administración del Patrimonio Autónomo, si el promedio de los recursos administrados en el mes, es superior a Un Mil Millones de Pesos ($1.000.000.000). Si el promedio de los recursos administrados en el mes, es inferior a Un Mil Millones de Pesos ($1.000.000.000) EL FIDEICOMITENTE pagará una comisión a la FIDUCIARIA de CERO PUNTO CINCO SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (0.5 S.M.L.M.V.) por mes o fracción de mes. (...)"

161

fiduciaria popular

Conforme a lo anterior en el mes de enero de 2019 Fiduciaria Popular genero cobro de comisión fiduciaria de 0.5 SMMLV que corresponde a la elaboración del Otrosi No. 2 al contrato fiduciario. Es importante mencionar como hecho subsecuente que esta comisión fue descontada del fondo de reserva en el mes de febrero de 2019 con el fin de estar a paz y salvo por este concepto.

- PAGOS

Durante el mes de enero de 2019 se realizaron quince (15) operaciones de pago por valor de $946.055.245,98 mediante trasferencia electrónica para el pago a proveedores y comisión fiduciaria.

- SARLAFT

Nos permitimos informar que el Fideicomitente actualizó su información el pasado 07 de junio de 2018, por lo tanto al envio del presente informe se encuentra al dia.

- OTROS HECHOS RELEVANTES

En el mes de enero de 2019 el Fideicomitente solicito a Fiduciaria Popular la elaboración del Otrosí No. 2al contrato fiduciario en el cual se adiciono recursos al contrato de obra en razón al modificatorio No. 3 del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10044-18, incrementando el valor del anticipo por la suma de $216.673.025,12.

Adicionalmente se informa que en fecha 21 de enero de 2019 se procedio a legalizar los recursos por valor de $2.988.000,00 correspondiente a la consignación errada que realizó por el Fideicomitente a la cuenta de la Sociedad Fiduciaria por valor de $3.000.000,00 para la constitución del fondo de reserva, por lo que se procedió a realizar el respectivo traslado y legalización al fondo de reserva adscrito al fideicomiso esto una vez descontando el GMF generado por esta operación.

Con la entrega de este informe mensual, la Fiduciaria da cumplimiento a su deber de presentación del informe detallado y pormenorizado de la gestión de los bienes entregados en virtud del negocio fiduciario; agradecemos notificar a la Fiduciaria si existe alguna observación al mismo en el menor tiempo posible.

Finalmente, es importante mencionar que dentro de las obligaciones del Fideicomitente, se encuentran las de informar a la Fiduciaria cualquier cambio material o legal que se presente en el contrato de obra, así como las prórrogas, otrosíes o suspensiones que se generen a raíz del citado contrato.

Cordialmente,

WILSON BUITRAGO HORTA
Director de Negocios Fiduciarios

Elaboró: Desy Bustos
Revisó: Mauricio Lugo

C.C. Bigadier General Yolanda Caceres Martinez – Directora Administrativa y Financiera POLICIA NACIONAL Carrera 59 No. 26 – 21 Bogotá

● Dirección General Bogotá: Carrera 13A N° 29 - 24 Pisos 20, 21 y 24 ● PBX 607 99 77 / 596 15 06
● servicioalcliente@fidupopular.com.co ● www.fidupopular.com.co
● Línea Nacional gratuita 018000-513962

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

162

INFORME DE ESTADO ECONOMICO
P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ
ENERO DE 2019

Fiduciaria popular

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS FONDO FIDULIQUIDEZ No 70003602592
FONDO ANTICIPO
P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ
ENERO DE 2019

FECHA	IDENTIFICACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FUENTES	USOS	SALDO
		SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		$ 2.775.875.081,29	$ -	2.776.980.820,77
23/01/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO FONDO DE RESERVA - GMF	$ 2.773.254,69		2.779.767.075,46
23/01/2019	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 01-REEMBOLSO DE GASTOS DE SALARIOS JORNALES Y MANO DE OBRA		$ 138.650.268,00	2.641.116.807,46
23/01/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 554.601,07	2.640.562.206,39
23/01/2019	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 02-REEMBOLSO GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 359.194.946,00	2.281.367.260,39
23/01/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 1.436.779,78	2.279.930.480,61
23/01/2019	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 03-REEMBOLSO GASTOS DE TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS		$ 11.674.597,00	2.268.255.883,61
23/01/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 46.698,39	2.268.209.185,22
23/01/2019	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 04-REEMBOLSO DESCUENTOS Y RETENCIONES		$ 6.666.000,00	2.261.543.185,22
23/01/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 26.664,00	2.261.516.521,22
23/01/2019	900.763.851	METAL B SAS	FACTURAS VARIAS RP 01-COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 88.284.775,00	2.173.231.746,22
23/01/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 353.059,10	2.172.898.687,12
23/01/2019	817.007.557	CONEXPE S A	FACTURAS VARIAS RP 02-COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 61.000.000,00	2.111.898.687,12
23/01/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 244.000,00	2.111.554.687,12
23/01/2019	890.100.251	CEMENTOS ARGOS S.A	FACTURAS VARIAS RP 03-COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 44.639.280,00	2.067.015.407,12
23/01/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 178.557,12	2.066.836.850,00
23/01/2019	901.041.132	AG3 INGENIERIA SAS	FACTURAS VARIAS RP 04-TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS		$ 105.029.100,00	1.961.807.750,00
23/01/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 420.116,40	1.961.387.633,60
31/01/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO FONDO DE RESERVA - GMF	$ 871.416,42		1.962.259.050,02
31/01/2019	900.763.851	METAL B SAS	FACTURAS VARIAS RP 01-COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 10.200.000,00	1.952.059.050,02
31/01/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 40.800,00	1.952.018.250,02
31/01/2019	800.242.106	SODIMAC COLOMBIA S.A	FACTURAS VARIAS RP 02-COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 23.147.200,00	1.928.871.050,02
31/01/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 92.588,80	1.928.778.461,22
31/01/2019	890.100.251	CEMENTOS ARGOS S.A	FACTURAS VARIAS RP 03-COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 61.379.010,00	1.867.399.451,22
31/01/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 245.516,04	1.867.153.935,18
31/01/2019	34.535.384	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	FACTURAS VARIAS RP 04-COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 13.891.133,00	1.853.262.802,18
31/01/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 55.564,53	1.853.207.237,65
31/01/2019	900.908.707	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	FACTURAS VARIAS RP 05-COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 7.242.536,00	1.845.964.701,65

31/01/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$	28.970,14	1.845.935.731,51
31/01/2019	900.150.515	PREFABRICADOS JOVITA CASTRO & CIA LTDA	FACTURAS VARIAS RP 06-COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$	14.146.723,00	1.831.789.008,51
31/01/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$	56.586,89	1.831.732.421,62
31/01/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	RENDIMIENTOS	$ 5.573.205,63			1.837.305.627,25
SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2019				$ 9.217.876,74	$	948.908.070,26	$ 1.837.305.627,25

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS FONDO FIDULIQUIDEZ No 70083502605
FONDO RESERVA
P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ
ENERO DE 2019

FECHA	IDENTIFICACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FUENTES	USOS	SALDO
SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018				$ 2.797,42	$ -	$ 1.669.796,84
16/01/2019	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A	PAGO COMISION MES DE DICIEMBRE 2018		$ 929.677,98	$ 740.118,86
16/01/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 3.718,71	$ 736.400,15
21/01/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	APORTE DEL FIDEICOMITENTE	$ 2.988.000,00		$ 3.724.400,15
23/01/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO AL FONDO ANTICIPO - GMF PAGOS		$ 2.773.254,69	$ 951.145,46
23/01/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	APORTE DEL FIDEICOMITENTE	$ 2.000.000,00		$ 2.951.145,46
30/01/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	APORTE DEL FIDEICOMITENTE	$ 4.000.000,00		$ 6.951.145,46
31/01/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO AL FONDO ANTICIPO - GMF PAGOS		$ 871.416,42	$ 6.079.729,04
31/01/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	APORTE DEL FIDEICOMITENTE	$ 5.000.000,00		$ 11.079.729,04
31/01/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	RENDIMIENTOS	$ 18.113,83		$ 11.097.842,87
SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2019				$ 14.008.113,83	$ 4.578.067,80	$ 11.097.842,87

ELABORÓ

DEISY PAOLA BUSTOS
ANALISTA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

APROBÓ

MAURICIO LUGO CARDENAS
COORDINADOR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

164

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ
INFORME DE FUENTES Y USOS

popular

DETALLE	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL
CUENTA DE AHORROS No 031 675567-96 ANTICIPO	9.217.616,74	948.906.078,26	1.837.305.627,25	4.643.704.718,62	2.806.399.090,87	1.837.305.627,25
Saldo periodo anterior	2.719.693.920,77			4.625.231.625,04		
Aportes entidad otorgante				8.982.600,95		
Rendimientos Netos	5.513.235,53			9.480.492,16		
Traslados desde el fondo de reserva	3.944.671,11					
Pagos		945.125.568,00			2.759.218.218,00	
GMF 4*1000		3.780.510,26			11.180.872,87	
Pago de Rendimientos a la entidad						
GMF 4*1000 generado por Gravamenes						

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ
INFORME DE FUENTES Y USOS

DETALLE	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL
FIDULIQUIDEZ FONDO DE RESERVA N° 7005302539	14.006.113,83	4.538.681,68	11.067.842,87	21.519.731,72	10.451.888,85	11.067.842,87
Saldo periodo inicial	12.938.780,84			21.488.000,00		
Aportes Fideicomiso	13.988.000,00			23.731,72		
Rendimientos Netos	16.113,83					
GMF 4*1000		2.718,71			3.718,71	
Traslado al Fondo de Anticipo		3.944.671,11			9.480.492,16	
Comision Fiduciaria		925.677,58			925.677,58	

ELABORÓ

DEBY PAOLA BUSTOS
ANALISTA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

APROBÓ

MAURICIO LUGO CARDENAS
COORDINADOR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

15

fiduciaria popular

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
P.A CONSORCIO BCS GUTIERREZ
DETALLE DE COMISIONES
ene-19

FECHA	NIT	CONCEPTO	FACTURA	CAUSADO	PAGADO	SALDO
26-dic-18	901.177.394	COMISION FIDUCIARIA DICIEMBRE DE 2018	110626	929.677,98	929.677,98	-
29-ene-19	901.177.394	COMISION FIDUCIARIA ENERO DE 2019	110936	492.729,02	492.729,02	-
TOTAL COMISION				1.422.407,00	1.422.407,00	-

MAURICIO LUGO C
COORDINADOR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
APROBÓ

DEISY PAOLA BUSTOS
ANALISTA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
ELABORÓ

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. [illegible]

fiduciaria popular

NIT 860543220

PA CONSORCIO BCS-GUTIÉRREZ CONTRATO DE OBRA PN
PA CONSORCIO BCS GUTIÉRREZ-FONDO DE RESERVA
CR 13 A 29 24 P 20
BOGOTA D.C. / CUNDINAMARCA

Número de Identificación 178344

Fiduliquidez

Extracto Cuenta Periodo del 01 Enero 2019 al 31 Enero 2019 Número de Encargo: XXXXXXX2605.2

BALANCE DE LA INVERSIÓN

Saldo Inicial a 01 Enero 2019		$ 1,669,796.84
Aportes	$ 10,981,000.00	
Retiros	$ -4,574,349.09	
Gravamen a los movimientos financieros	$ -3,718.71	
Rendimientos	$ 18,113.83	
Retención en la fuente	$ 0.00	
Saldo Final a 31 Enero 2019		$ 11,097,842.87

RENDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN

Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial $	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en $	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en $
01/01/2019 al 31/01/2019	F TIPO7 NEG	15.181.319033	109.960234	15.203.913024	246.976385	3.739.803.47
23/01/2019 al 31/01/2019	F TIPO7 NEG	15.107.536761	595.281481	15.203.913024	729.960259	11.097.842.87

Detalle movimientos del mes de la inversión

Concepto	Movimiento	Valor en $	Valor de Unidades	Saldo en Unidades	Saldo en $
[illegible]					

Tipo de Participación	Rentabilidad Efectiva Anual Fiduciaria sentido de Participación	Valor promedio del Fondo en el mes
F TIPO7 NEG	2.20%	$359,784,682,619.23

Rentabilidad Efectiva Anual por tipo de participación %

Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
[illegible]												

VIGILADO

11

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit 900247205

PA CONSORCIO BCS-GUTIÉRREZ CONTRATO DE OBRA PN

PA CONSORCIO BCS GUTIÉRREZ-FONDO DE RESERVA

CR 13 A 29 24 P 20

BOGOTA D C / CUNDINAMARCA

Numero de Identificacion 376244

Fiduliquidez

Extracto del Cliente - Periodo del 01 Enero 2018 al 31 Enero 2018 - Numero de Encargo 2000000000

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%) - Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)

Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversion colectiva relacionadas con la gestion del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversion colectiva no son depositos, no generan para la sociedad administradora [illegible] obligaciones propias de una institucion de deposito y no estan amparados por el seguro de deposito del Fondo de Garantias de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ninguna otra caucion de dicha naturaleza. La inversion en un fondo de inversion colectiva esta sujeta a los riesgos de inversion derivados de la evolucion de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversion colectiva.

Cualquier inquietud comuniquese con Servicio al Cliente al PBX 6079977, 5951505 Opcion 3, a la linea nacional gratuita 018000513992, al correo servicioalcliente@fiduciariapopular.com.co o acerquese a la Cra 13 A N° 29 - 24 piso 20, 21 y 24. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto debera ser informada a los Representantes Legales 6079977, al correo electronico: sumerce@fiduciariapopular.com.co o al numero telefonico 6079977 Ext 502. El reglamento y la hoja de vida podra ser consultada en la pagina web: www.fiduciariapopular.com.co ingresando al link de cada Fondo de Inversion. Recuerde que cuenta con la Defensoria del Consumidor Financiero, calle 7 G A No 11 - 83 de Bogota. Telefonos: +(1) 5600550 / (1) 2351904. Correo electronico: reclamaciones@defensoriafg.com.co

VIGILADO

12

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit 900967285

fiduciaria popular

NIT 860514235

PA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ CONTRATO DE OBRA PN

PA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ -FONDO DE ANTICIPO

CR 13 A 29 24 P 20

BOGOTA D.C. / CUNDINAMARCA

Número de Identificación 378244

Fiduliquidez

Extracto de cuenta - Periodo del 01 Enero 2019 al 31 Enero 2019 - Número de Encargo: XXXXXXX2592-6

BALANCE DE LA INVERSIÓN

Saldo Inicial a 01 Enero 2019		$ 2,776,993,820.77
Aportes	$ 3,641,671.11	
Retiros	$ -945,125,568.00	
Gravamen a los movimientos financieros	$ -3,780,502.26	
Rendimientos	$ 5,573,205.63	
Retencion en la fuente	$ 0.00	
Saldo Final a 31 Enero 2019		$ 1,837,305,627.25

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACION

Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial en $	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en $	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en $
01/01/2019 al 25/01/2019	F TIPO NEG	15,181.319033	182,921.774767	15,203.913024	182,921.774767	2,781,126,793.77
25/01/2019 al 31/01/2019	F TIPO NEG	15,192.956761	120,883.634941	15,202.964672	120,654.134997	1,837,305,627.25

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en $	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en $

VIGILADO

169

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit 900247385

fiduciaria popular

Nit 800141235

PA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ CONTRATO DE OBRA PN

PA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ -FONDO DE ANTICIPO

CR 13 A 29 24 P 20

BOGOTA D.C / CUNDINAMARCA

Número de Identificación 278244

Fiduliquidez

Extracto de cuenta Periodo del 01 Enero 2019 al 31 Enero 2019 Número de Encargo 300042

Fecha	Concepto	Movimiento en Unidades	Valor en $	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en $

Tipo de Participación	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación	Valor promedio de Encargo
F TP07 NEG	2.20%	$368 784 882 510,44

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%) Volatilidad Histórica por tipo de participación

Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los aportes realizados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, no generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN ni por ninguna otra cobertura de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectivo esta sujeta a los riesgos de mercado derivados de la variación de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

VIGILADO

170

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit [illegible]

fiduciaria popular

Ref: 00014239

Numero de Identificación 378144

PA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ CONTRATO DE OBRA PN

PA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ -FONDO DE ANTICIPO

CR 13 A 29 24 P 20

BOGOTA D.C. / CUNDINAMARCA

Fiduliquidez

[illegible] Número de Encargo: XXXXXXX2582-5

Cualquier inquietud comuníquese con Servicio al Cliente al PBX 6070077, 6561506 Opción 3 o la línea nacional gratuita 018000513962 al correo servicioalcliente@fiduciariapopular.com.co o dirigida a la Cra. 13 A N. 29 24 piso 20, 21 y 24. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto, remítala a la Defensoría Financiera (601) al correo electrónico defensoriafinanciera@defensoriafin.com.co o al mismo teléfono (+1) 6070077 ext 102. Oportunamente y de no ser así, el mismo podrá ser cobrado en la siguiente vista. Salvo las operaciones de carácter privado, el saldo de esta Fiducia de Inversión. Recuerde que puede consultar el Defensor del Cliente en la Calle 70 A No 11 - 23 en Bogotá. Teléfono (+1) 3429810 ext 2351000. Correo electrónico defensoriafinanciera@defensoriafin.com.co

171

Fiduciaria Popular S A

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

378244-PA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ CONT DE OBRA PN DIRAF N 061004418

Periodo: 201901

SIFI
CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVO	NAPL	2,778,663,617.61	23,853,211.10	954,113,358.59	1,848,403,470.12
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	NAPL	2,778,663,617.61	23,853,211.10	954,113,358.59	1,848,403,470.12
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	NAPL	2,778,663,617.61	23,853,211.10	954,113,358.59	1,848,403,470.12
130205		EMISORES NACIONALES	NAPL	2,778,663,617.61	23,853,211.10	954,113,358.59	1,848,403,470.12
13020501		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	NAPL	2,778,663,617.61	23,853,211.10	954,113,358.59	1,848,403,470.12
1302050105		FONDOS DE INVERSION COLECTIVA FIDUPOPULAR	NAPL	2,776,993,820.77	9,846,656.85	948,534,850.37	1,837,305,627.25
	70083602592	ENCARGO FIDUCIARIO 70083602592	NAPL	1,669,796.84	14,006,554.25	4,578,508.22	11,097,842.87
	70083602605	ENCARGO FIDUCIARIO 70083602605	NAPL	.00	946,055,245.98	951,628,451.61	-5,573,205.63
2		PASIVO	NAPL	.00	946,055,245.98	951,628,451.61	-5,573,205.63
25		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	946,055,245.98	951,628,451.61	-5,573,205.63
2590		DIVERSOS	NAPL	.00	946,055,245.98	951,628,451.61	-5,573,205.63
259095		OTROS	NAPL	.00	946,055,245.98	951,628,451.61	-5,573,205.63
25909501		DIVERSOS	NAPL	.00	946,055,245.98	951,628,451.61	-5,573,205.63
2590950101		CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR	NAPL	.00	13,891,133.00	13,891,133.00	.00
	34535384	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	NAPL	.00	929,677.98	929,677.98	.00
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	NAPL	.00	.00	5,573,205.63	-5,573,205.63
	800141397	POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NAPL	.00	23,147,200.00	23,147,200.00	.00
	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A	NAPL	.00	61,000,000.00	61,000,000.00	.00
	817007557	CONEXPE S.A	NAPL	.00	106,018,290.00	106,018,290.00	.00
	890100251	CEMENTOS ARGOS S.A	NAPL	.00	14,146,723.00	14,146,723.00	.00
	900150515	PREFABRICADOS JOVITA CASTRO & CIA LTDA	NAPL	.00	98,464,775.00	98,464,775.00	.00
	900743851	METAL 8 SAS	NAPL	.00	7,242,536.00	7,242,536.00	.00
	900906707	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	NAPL	.00	105,029,100.00	105,029,100.00	.00
	901041132	AG3 INGENIERIA SAS	NAPL	.00	516,185,811.00	516,185,811.00	.00
	901177394	CONSORCIO BCS GUTIERREZ	NAPL	-2,778,663,617.61	957,441,381.65	21,608,028.54	-1,842,830,264.49
3		PATRIMONIO	NAPL	-2,762,838,975.04	949,695,917.09	17,632,671.11	-1,830,671,729.06
35		PATRIMONIO ESPECIALES	NAPL	-4,632,731,625.04	3,644,671.11	17,632,671.11	-4,646,719,625.04
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-4,632,731,625.04	3,644,671.11	17,632,671.11	-4,646,719,625.04
350595		APORTES EN DINERO	NAPL	-4,632,731,625.04	3,644,671.11	17,632,671.11	-4,646,719,625.04
35059501		APORTES EN DINERO	NAPL	-4,632,731,625.04	3,644,671.11	17,632,671.11	-4,646,719,625.04
3505050105		APORTES EN DINERO	NAPL	-4,632,731,625.04	3,644,671.11	17,632,671.11	-4,646,719,625.04
	901177394	CONSORCIO BCS GUTIERREZ	NAPL	1,850,092,650.00	945,055,245.98	.00	2,795,147,895.98
3510		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	1,850,092,650.00	945,055,245.98	.00	2,795,147,895.98
351010		PAGOS A TERCEROS	NAPL	1,850,092,650.00	945,125,568.00	.00	2,795,218,218.00
35101000		PAGOS A TERCEROS	NAPL	1,850,092,650.00	945,125,568.00	.00	2,795,218,218.00
3510100095		OTROS	NAPL	11,533,584.00	00	.00	11,533,584.00
	10256018	VELASCO CAPOTE JESUS ROGER	NAPL	31,668,632.00	13,891,133.00	.00	45,559,765.00
	34535384	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	NAPL	1,483,172.00	.00	.00	1,483,172.00
	76326951	MORALES RODRIGUEZ CARLOS ADRIAN	NAPL	.00	23,147,200.00	.00	23,147,200.00
	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	NAPL	38,976,000.00	.00	.00	38,976,000.00
	817000019	LADRILLERA MELENDEZ S.A	NAPL	.00	61,000,000.00	.00	61,000,000.00
	817007557	CONEXPE S.A	NAPL	29,354,083.00	00	.00	29,354,083.00
	830053800	COVAL COMERCIAL S.A.	NAPL	173,872,836.00	106,018,290.00	.00	279,891,126.00
	890100251	CEMENTOS ARGOS S.A	NAPL	35,680,235.00	.00	.00	35,680,235.00
	890330023	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.	NAPL	.00	14,146,723.00	.00	14,146,723.00
	900150515	PREFABRICADOS JOVITA CASTRO & CIA LTDA					

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
3510100095	900783851	METAL B SAS	NAPL	.00	98,464,775.00	.00	98,464,775.00
	900906707	ECUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	NAPL	.00	7,242,536.00	.00	7,242,536.00
	901041132	ACG INGENIERIA SAS	NAPL	60,949,350.00	105,029,100.00	.00	165,978,450.00
	901067032	FERRELECTRICOM JP SAS	NAPL	3,909,260.00	.00	.00	3,909,260.00
	901177394	CONSORCIO BCS GUTIERREZ	NAPL	1,421,983,013.00	516,185,811.00	.00	1,938,168,824.00
	901187758	ARRIETA S.A.S	NAPL	40,682,485.00	.00	.00	40,682,485.00
35101007		COSTOS Y GASTOS	NAPL	.00	929,677.98	.00	929,677.98
3510100705		COMISIONES	NAPL	.00	929,677.98	.00	929,677.98
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	NAPL	.00	929,677.98	.00	929,677.98
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	NAPL	3,975,357.43	7,741,464.57	3,975,357.43	7,741,464.57
3910		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	.00	3,975,357.43	.00	3,975,357.43
391001		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	.00	3,975,357.43	.00	3,975,357.43
39100101		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	.00	3,975,357.43	.00	3,975,357.43
3910010101		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	.00	3,975,357.43	.00	3,975,357.43
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	.00	3,975,357.43	.00	3,975,357.43
3930		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	3,975,357.43	3,766,107.14	3,975,357.43	3,766,107.14
393001		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	3,975,357.43	3,766,107.14	3,975,357.43	3,766,107.14
39300101		PÉRDIDA DEL EJECICIO	NAPL	3,975,357.43	3,766,107.14	3,975,357.43	3,766,107.14
3930010101		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	3,975,357.43	3,766,107.14	3,975,357.43	3,766,107.14
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	3,975,357.43	3,766,107.14	3,975,357.43	3,766,107.14
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL	.00	43.68	6,220,583.67	-6,220,539.99
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	NAPL	.00	43.68	6,220,583.67	-6,220,539.99
4108		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	NAPL	.00	43.68	6,220,583.67	-6,220,539.99
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	NAPL	.00	43.68	6,220,583.67	-6,220,539.99
41080501		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR)	NAPL	.00	43.68	6,220,583.67	-6,220,539.99
4108050101		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR)	NAPL	.00	43.68	43.68	.00
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	.00	.00	6,220,539.99	-6,220,539.99
	900247285	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ	NAPL	.00	9,986,647.13	3,766,107.14	6,220,539.99
5		GASTOS	NAPL	.00	9,986,647.13	.00	9,986,647.13
51		GASTOS OPERACIONALES	NAPL	.00	629,220.53	.00	629,220.53
5108		VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.	NAPL	.00	629,220.53	.00	629,220.53
510805		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	.00	629,220.53	.00	629,220.53
51080501		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (DB)	NAPL	.00	629,220.53	.00	629,220.53
5108050101		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (DB)	NAPL	.00	629,220.53	.00	629,220.53
	900247285	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ	NAPL	.00	3,784,220.97	.00	3,784,220.97
5140		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	.00	3,784,220.97	.00	3,784,220.97
514005		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	.00	3,784,220.97	.00	3,784,220.97
51400501		G.M.F.	NAPL	.00	3,784,220.97	.00	3,784,220.97
5140050102		G.M.F. OFERTAS FDOS COMUNES	NAPL	.00	3,784,220.97	.00	3,784,220.97
	900247285	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ	NAPL	.00	5,573,205.63	.00	5,573,205.63
5167		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL				

Fiduciaria Popular S A

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

378244-PA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ CONT DE OBRA PN DIRAF N 061004418

Periodo: 201901

14/03/19 11:13 AM

Programa. SCMRSLNA

DEISY PAOLA BUSTOS VEGA

SIFI

CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
816701		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	.00	5,573,205.63	.00	5,573,205.63
81670101		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	.00	5,573,205.63	.00	5,573,205.63
8167010101		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	.00	5,573,205.63	.00	5,573,205.63
	800141397	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NAPL	.00	5,573,205.63	.00	5,573,205.63
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	NAPL	.00	.00	3,766,107.14	-3,766,107.14
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	.00	.00	3,766,107.14	-3,766,107.14
590501		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	.00	.00	3,766,107.14	-3,766,107.14
59050101		GANANCIAS	NAPL	.00	.00	3,766,107.14	-3,766,107.14
5905010101		GANANCIAS	NAPL	.00	.00	3,766,107.14	-3,766,107.14
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	.00	1,492,171.96	1,492,171.96	.00
8		CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL					
83		ACREEDORAS	NAPL	-929,677.98	929,677.98	492,729.02	-492,729.02
8295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-929,677.98	929,677.98	492,729.02	-492,729.02
829501		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-929,677.98	929,677.98	492,729.02	-492,729.02
82950101		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-929,677.98	929,677.98	492,729.02	-492,729.02
8295010101		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-929,677.98	929,677.98	492,729.02	-492,729.02
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S A	NAPL	-929,677.98	929,677.98	492,729.02	-492,729.02
84		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	929,677.98	562,493.98	999,442.94	492,729.02
8405		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	929,677.98	562,493.98	999,442.94	492,729.02
840500		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	929,677.98	562,493.98	999,442.94	492,729.02
84050000		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	929,677.98	562,493.98	999,442.94	492,729.02
8405000000		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	929,677.98	562,493.98	999,442.94	492,729.02
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	929,677.98	414,056.00	851,006.96	492,729.02
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S A	NAPL	.00	148,435.98	148,435.98	.00
			Total	.00	1,938,828,701.51	1,938,828,701.51	.00

DIRECTOR CONTABLE

REPRESENTANTE LEGAL

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO BCS GUTIERREZ - 330216





fiduciaria popular

Bogotá D.C,

Doctor
AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS - GUTIERREZ
Carrera 19 No. 84 – 41 Oficina 402
Bogotá

Asunto: P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ CTO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10044-18 POLICIA NACIONAL CODIGO 378244
INFORME DE GESTION MES DE FEBRERO DE 2019

Respetado Doctor:

En cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos celebrado entre Consorcio BCS Gutierrez y Fiduciaria Popular S.A., suscrito el día 26 de junio de 2018, nos permitimos presentar informe del mes de febrero de 2019, con los aspectos administrativos, financieros y los hechos sucedidos durante el periodo así:

1. Informe Económico del Fideicomiso
2. Informe de Fuentes y Usos
3. Detalle de las comisiones fiduciarias
4. Extracto Fondo de Inversión
5. Estados Financieros
6. Ejecución del plan de inversión del anticipo

ASPECTOS RELEVANTES:

En desarrollo del objeto contractual del citado Fideicomiso, Fiduciaria Popular S.A. como vocera y administradora del mismo se permite relacionar los siguientes hechos:

- **PÓLIZAS**

En atención a la obligación contractual entre el Fideicomitente y la Policía Nacional relacionamos la póliza de cumplimiento No. 96-44-101137868, expedida por Seguros del Estado S.A., a favor de las entidades estatales la cual se encuentra vigente de acuerdo al siguiente detalle:

COBERTURA	VALOR ASEGURADO($)	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	1.850.092.650,02	18/05/2018 a 15/06/2019
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	4.625.231.626,00	18/05/2018 a 15/06/2019
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	462.523.162,50	18/05/2018 a 15/04/2022
Estabilidad y calidad de la obra	2.775.138.975,02	15/12/2018 a 15/12/2023
Calidad y buen funcionamiento de los bienes	329.371.500,00	18/05/2018 a 15/04/2020

VIGILADA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- BIENES FIDEICOMITIDOS

Los bienes Fideicomitidos que harán parte del Patrimonio Autónomo Consorcio BCS Gutierrez de conformidad con la cláusula tercera del contrato fiduciario son:

- ✓ La suma de Tres Millones Quinientos Mil Pesos mcte. ($3.500.000,00) aportados por el fideicomitente para la constitución del Fideicomiso y del Fondo de Reserva.
- ✓ Frente al anticipo la suma que equivale al Veinte por ciento (20%) del valor de las obras financiadas, es decir un anticipo equivalente a Mil Ochocientos Cincuenta Millones Noventa y Dos Mil Seiscientos Cincuenta Pesos Con Cero Dos Centavos M/CTE/M/CTE ($1.850.092.650,02).

Anticipo que otorgara la Policia Nacional	1.820.092.650,02
Recursos que entregara el Consorcio BCS Gutierrez	3.000.000,00

- SALDOS

A continuación se relacionan los saldos del mes de febrero de 2019 en los encargos del fondo de inversión colectiva fiduliquidez adscritos al P.A. Consorcio Consorcio BCS Gutierrez así:

Fondo de Inversión No	VALOR ($)
Fiduliquidez No. 7008362592 anticipo	475.215.698,24
Fiduliquidez No. 7008362605 reserva	11.520.905,64
TOTAL ($)	486.736.603,88

- RENDIMIENTOS

El fideicomiso en el mes de febrero de 2019 registró ingresos por rendimientos por un valor de $2.752.469,77 como se detalla a continuación:

Fondo de Inversión No.	VALOR ($)
Fiduliquidez No. 7008362592 anticipo	2.728.230,00
Fiduliquidez No. 7008362605 reserva	24.239,77
TOTAL ($)	2.752.469,77

Los rendimientos generados en el fondo de inversión colectiva fiduliquidez N° 70083602592, serán girados a la liquidación del fideicomiso de conformidad a lo estipulado en la cláusula tercera, parágrafo primero – Rendimientos del contrato fiduciario. No obstante de lo anterior se informa que en los estados financieros del fideicomiso se registra en la cuenta por pagar un valor de $11.720.830,92 correspondiente a los rendimientos pendientes de giro a la entidad otorgante.

- COMISIONES

De acuerdo a lo establecido con el contrato fiduciario, Cláusula – Décima Quinta – Remuneración de la Fiduciaria - numeral 1, se estableció el cobro de las comisiones de acuerdo con lo relacionado a continuación:

177

fiduciaria popular

"(...) No se cobra comisión por la administración del Patrimonio Autónomo, si el promedio de los recursos administrados en el mes, es superior a Un Mil Millones de Pesos ($1.000.000.000). Si el promedio de los recursos administrados en el mes, es inferior a Un Mil Millones de Pesos ($1.000.000.000) EL FIDEICOMITENTE pagará una comisión a la FIDUCIARIA de CERO PUNTO CINCO SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (0.5 S.M.L.M.V.) por mes o fracción de mes. (...)"

Conforme a lo anterior en el mes de febrero de 2019 Fiduciaria Popular genero cobro de comisión fiduciaria de 0.5 SMMLV dado que el promedio de los recursos administrados fueron inferiores a los Mil Millones de Pesos. Es importante mencionar como hecho subsecuente que esta comisión será descontada del fondo de reserva en el mes de marzo de 2019 con el fin de estar a paz y salvo por este concepto.

- **PAGOS**

Durante el mes de febrero de 2019 se realizaron veintidós (22) operaciones de pago por valor de $1.364.959.498,02 mediante trasferencia electrónica para el pago a proveedores y comisión fiduciaria.

- **SARLAFT**

Nos permitimos informar que el Fideicomitente actualizó su información el pasado 07 de junio de 2018, por lo tanto al envío del presente informe se encuentra al día.

- **OTROS HECHOS RELEVANTES**

Con la entrega de este informe mensual, la Fiduciaria da cumplimiento a su deber de presentación del informe detallado y pormenorizado de la gestión de los bienes entregados en virtud del negocio fiduciario; agradecemos notificar a la Fiduciaria si existe alguna observación al mismo en el menor tiempo posible.

Finalmente, es importante mencionar que dentro de las obligaciones del Fideicomitente, se encuentran las de informar a la Fiduciaria cualquier cambio material o legal que se presente en el contrato de obra, así como las prórrogas, otrosíes o suspensiones que se generen a raíz del citado contrato.

Cordialmente,

WILSON BUITRAGO HORTA
Director de Negocios Fiduciarios

Elaboró: Deisy Bustos
Revisó: Mauricio Lugo

C.C. Brigadier General Yolanda Caceres Martinez – Directora Administrativa y Financiera POLICIA NACIONAL Carrera 59 No. 26 – 21 Bogotá

● Dirección General Bogotá: Carrera 13A N° 29 - 24 Pisos 20, 21 y 24 ● PBX 607 99 77 / 596 15 06
● servicioalcliente@fiducpopular.com.co ● www.fiducpopular.com.co
● Línea Nacional gratuita 01 8000-513962

178

INFORME DE ESTADO ECONOMICO
P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ
FEBRERO DE 2019

banco popular

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS FONDO FIDULIQUIDEZ No 70083682592
FONDO ANTICIPO
P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ
FEBRERO DE 2019

FECHA	IDENTIFICACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FUENTES	USOS	SALDO
SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2019				$ 9.217.876,74	$ 948.906.970,26	$ 1.837.305.627,25
01/02/2019	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 01-REEMBOLSO DE GASTOS DE SALARIOSJORNALES Y MANO DE OBRA		$ 26.452.900,00	1.810.852.727,25
01/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 105.811,60	1.810.746.915,65
01/02/2019	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 02-REEMBOLSO GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 36.744.104,00	1.774.002.811,65
01/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 146.976,42	1.773.855.835,23
01/02/2019	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 03-REEMBOLSO GASTOS DE TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS		$ 643.500,00	1.773.212.335,23
01/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 2.574,00	1.773.209.761,23
01/02/2019	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 04-REEMBOLSO DESCUENTOS Y RETENCIONES		$ 24.007.000,00	1.749.202.761,23
01/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 96.028,00	1.749.106.733,23
04/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO FONDO DE RESERVA - GMF	$ 2.820.553,44		1.751.927.286,67
05/02/2019	860.032.550	ALFAGRES S.A.	FACTURAS VARIAS RP 01-COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 268.957.548,00	1.482.969.738,67
05/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 1.075.830,19	1.481.893.908,48
05/02/2019	901.041.132	AG3 INGENIERIA SAS	FACTURAS VARIAS RP 02-SALARIOS JORNALES Y MANO DE OBRA		$ 371.663.060,00	1.110.230.848,48
05/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 1.486.652,24	1.108.744.196,24
05/02/2019	900.627.979	CONSTRUCTORA SUMI AGUAS SAS	FACTURAS VARIAS RP 01-COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 64.517.753,00	1.044.226.443,24
05/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 258.071,01	1.043.968.372,23
21/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO FONDO DE RESERVA - GMF	$ 2.159.114,42		1.046.127.486,65
22/02/2019	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 01-REEMBOLSO DE GASTOS DE SALARIOSJORNALES Y MANO DE OBRA		$ 152.663.448,00	893.464.038,65
22/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 610.653,79	892.853.384,86
22/02/2019	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 02-REEMBOLSO GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 65.590.069,00	827.263.315,86
22/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 262.360,28	827.000.955,58
22/02/2019	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 03-REEMBOLSO GASTOS DE TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS		$ 8.840.066,00	818.160.889,58
22/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 35.360,26	818.125.529,32
22/02/2019	12.976.085	REVELO ORLANDO EDMUNDO	FACTURAS VARIAS RP 01-SALARIOSJORNALES Y MANO DE OBRA		$ 5.319.552,00	812.805.977,32
22/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 21.278,21	812.784.699,11
22/02/2019	900.335.385	BCS INGENIERIA SAS	FACTURAS VARIAS RP 02-SALARIOSJORNALES Y MANO DE OBRA		$ 16.751.784,00	796.032.915,11
22/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 67.007,14	795.965.907,97

22/02/2019	79.451.429	LUIS ALFREDO VARGAS BURGOS	FACTURAS VARIAS RP 03-SALARIOSJORNALES Y MANO DE OBRA		$ 50.000.000,00	745.965.907,97
22/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 200.000,00	745.765.907,97
22/02/2019	34.535.384	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	FACTURAS VARIAS RP 04-MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 5.510.361,00	740.255.546,97
22/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 22.041,44	740.233.505,53
22/02/2019	900.906.707	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	FACTURAS VARIAS RP 05-MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 3.823.065,00	736.410.440,53
22/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 15.292,26	736.395.148,27
22/02/2019	800.242.106	SODIMAC COLOMBIA S.A	FACTURAS VARIAS RP 06-MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 11.175.800,00	725.219.348,27
22/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 44.703,20	725.174.645,07
22/02/2019	891.502.316	CVS EQUIPAR Y CIA SEN C	FACTURAS VARIAS RP 07-MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 5.297.921,00	719.876.724,07
22/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 21.191,68	719.855.532,39
22/02/2019	12.976.065	REVELO ORLANDO EDMUNDO	FACTURAS VARIAS RP 08-TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS		$ 4.079.476,00	715.776.057,39
22/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 16.317,90	715.759.739,49
22/02/2019	901.041.132	AG3 INGENIERIA SAS	FACTURAS VARIAS RP 09-SALARIOSJORNALES Y MANO DE OBRA		$ 210.727.063,00	505.032.676,49
22/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 842.908,25	504.189.768,24
26/02/2019	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 01-REEMBOLSO DE GASTOS DE SALARIOSJORNALES Y MANO DE OBRA		$ 20.282.300,00	483.907.468,24
26/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 81.129,20	483.826.339,04
26/02/2019	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 02-REEMBOLSO DE GASTOS DE DESCUENTOS Y RETENCIONES		$ 11.420.000,00	472.406.339,04
26/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 45.680,00	472.360.659,04
26/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO FONDO DE RESERVA - GMF	$ 126.809,20		472.487.468,24
28/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	RENDIMIENTOS	$ 2.728.230,00		475.215.698,24
SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2019				$ 7.834.707,06	$ 1.369.924.636,07	$ 475.215.698,24

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS FONDO FIDULIQUIDEZ No 70583602605
FONDO RESERVA
P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ
FEBRERO DE 2019

FECHA	IDENTIFICACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FUENTES	USOS	SALDO
SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2019				$ 14.006.113,83	$ 4.578.867,00	$ 11.037.842,87
04/02/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO AL FONDO ANTICIPO - GMF PAGOS		$ 2.820.553,44	$ 8.277.289,43
06/02/2019	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A	PAGO COMISION MES DE ENERO DE 2019		$ 492.729,02	$ 7.784.560,41
06/02/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 1.970,92	$ 7.782.589,49
20/02/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	APORTE DEL FIDEICOMITENTE	$ 6.000.000,00		$ 13.782.589,49
21/02/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO AL FONDO ANTICIPO - GMF PAGOS		$ 2.159.114,42	$ 11.623.475,07
26/02/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO AL FONDO ANTICIPO - GMF PAGOS		$ 126.809,20	$ 11.496.665,87
28/02/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	RENDIMIENTOS	$ 24.239,77		$ 11.520.905,64
SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2019				$ 6.024.239,77	$ 6.601.177,00	$ 11.520.905,64

ELABORÓ

DEISY PAOLA BUSTOS
ANALISTA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

APROBÓ

MAURICIO LUGO CARDENAS
COORDINADOR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ
INFORME DE FUENTES Y USOS

popular

DETALLE
CUENTA DE AHORROS No 634-975547 RETENCIÓN
Saldo periodo anterior
Aportes en efectivo
Rendimientos Netos
Traslados Recibidos Varias de cuentas
Pagos
G.M.F. 4*1000
Pago de Rendimientos Financieros
G.M.F. 4*1000 generado por Pago de Rendimientos

Feb-19			Total Acumulado		
FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL
7.854.707.06	1.369.924.105.07	875.245.636.74	4.851.109.425.98	4.178.321.726,64	475.215.184,24
1.367.069.627,25			4.476.331.525,04		
-			33.729.850,92		
2.774.237,03			18.996.962,32		
1.134.437,04					
	1.362.662.309,00			4.158.684.987,00	
	3.451.857,97			19.636.739,64	
	-			-	

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ
INFORME DE FUENTES Y USOS

DETALLE
FIDUOCUPADO FONDO DE RESERVA Nº 10436002108
Saldo periodo anterior
Aportes Empresarios
Rendimientos Netos
G.M.F. 4*1000
Traslados a Fondo de Ahorros
Comisión Fiduciaria

Feb-19			Total Acumulado		
FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL
4.624.339,77	2.681.137,03	11.520.926,64	37.535.971,48	19.015.965,85	11.520.926,64
11.057.562,87			-		
4.000.000,00			2*** ***,00		
23.639,77			47.177,48		
	1.170,97			5.581,93	
	5.196.237,06			19.550.965,92	
	482.729,00			1.465.397,00	

ELABORÓ

CARLOS PABLO BARROS
ANALISTA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

APROBÓ

MARIA [illegible] DE BRIÑAS
COORDINADORA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

fiduciaria popular

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
P.A CONSORCIO BCS GUTIERREZ
DETALLE DE COMISIONES
feb-19

FECHA	NIT	CONCEPTO	FACTURA	CAUSADO	PAGADO	SALDO
26-dic-18	901.177.394	COMISION FIDUCIARIA DICIEMBRE DE 2018	110525	929.677,98	929.677,98	-
29-ene-19	901.177.394	COMISION FIDUCIARIA ENERO DE 2019	110936	492.729,02	492.729,02	-
27-feb-19	901.177.394	COMISION FIDUCIARIA FEBRERO DE 2019	111188	492.729,02		492.729,02
TOTAL COMISION				1.915.136,02	1.422.407,00	492.729,02

MAURICIO LUGO C
COORDINADOR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
APROBÓ

DEISY PAOLA BUSTOS
ANALISTA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
ELABORÓ

182

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit 800194755

fiduciaria popular

Nit 800141235

Numero de Identificación 378244

PA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ CONTRATO DE OBRA PN

PA CONSORCIO BCS GUTIERREZ-FONDO DE RESERVA

CR 13 A 29 24 P 20

BOGOTA D.C. / CUNDINAMARCA

Fiduliquidez

Extracto de cuenta - Periodo del 01 Febrero 2019 al 28 Febrero 2019 — **Número de Encargo: XXXXXXX2605-2**

BALANCE DE LA INVERSION

Saldo Inicial a 01 Febrero 2019			$ 11,097,842.87
Aportes	$	6,000,000.00	
Retiros	$	-5,599,206.08	
Gravamen a los movimientos financieros	$	-1,970.92	
Rendimientos	$	24,239.77	
Retención en la fuente	$	0.00	
Saldo Final a 28 Febrero 2019			$ 11,520,905.64

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACION

Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial en $	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en $	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en $
01/02/2019 al 21/02/2019	F TIPO3 NEG	15,292.994472	725,993259	15,231.799696	764,231949	11,640,622.56
22/02/2019 al 28/02/2019	F TIPO3 NEG	15,235.742168	765,276629	15,214.626754	756,246432	11,520,905.64

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en $	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en $

Valor promedio del Fondo en el mes

F TIPO3 NEG — 2.40% — $360,379,259,577.92

Rentabilidad histórica del Portafolio - Tipo de participación (%)

Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
	4.266									0.154	0.193	0.210
											NA	NA
												0.218

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

183

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit 900247205

popular

Nit. 830054230

PA CONSORCIO BCS-GUTIÉRREZ CONTRATO DE OBRA PN

PA CONSORCIO BCS GUTIÉRREZ-FONDO DE RESERVA

CR 13 A 29 24 P 20

BOGOTA D.C. / CUNDINAMARCA

Numero de Identificación 378241

Fiduliquidez

Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, no generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de orden nacional. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión inherentes de la realización de las inversiones de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

Cualquier inquietud, observación con Servicio al Cliente al (PBX 6026677 - 5951500 Opción 3 o a la línea nacional gratuita 018000512442 o escribe también al buzón fiduprocesal@fiduprocesal.com.co o remítala a la Cra 13 A N. 29 24 piso 20 21 y 24. Cualquier inconformidad con la información mostrada en el extracto, remítala a los Revisores Fiscales KPMG al correo electrónico mincas@kpmg.com.co al número telefónico 6079477 Ext 502. El reglamento y la ficha técnica puede consultarla en la página web: www.fiduprocesal.com.co ingresando al link de cada Fondo de Inversión. Recuerde que cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero: calle 70 A No 11 -31 en Bogotá. Teléfonos: (1) 5439858 - (1)2151604. Correo electrónico: reclamaciones@defensordelcliente.com.co

184

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Fiduciaria popular

Nit: 800141235

Numero de Identificacion 378044

PA CONSORCIO BCS-GUTIÉRREZ CONTRATO DE OBRA PN
PA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ -FONDO DE ANTICIPO
CR 13 A 29 24 P 20
BOGOTA D.C. / CUNDINAMARCA

Fiduliquidez

Extracto de cuenta Periodo del 01 Febrero 2019 al 28 Febrero 2019 — Número de Encargo: XXXXXXX2592-5

BALANCE DE LA INVERSIÓN

Saldo Inicial a 01 Febrero 2019		$ 1.837.305.627,25
Aportes	$ 5.108.477,08	
Retiros	$ -1.364.466.769,00	
Gravamen a los movimientos financieros	$ -5.457.867,07	
Rendimientos	$ 2.726.230,00	
Retención en la fuente	$ 0,00	
Saldo Final a 28 Febrero 2019		$ 475.215.698,24

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN

Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial en $	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en $	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en $
01/02/2019 al 21/02/2019	[illegible]	15.202,004672	120.854,181937	[illegible]	[illegible]	1.840.527.170,11
22/02/2019 al 28/02/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.214,423194	31.234.744,214	475.215.698,24

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Aportes en Unidades	Valor en $	Valor en Unidades	Saldo en Unidades	Saldo en $
[illegible]						

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit 830267295

PA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ CONTRATO DE OBRA PN

PA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ -FONDO DE ANTICIPO

CR 13 A 29 24 P 20

BOGOTA D.C / CUNDINAMARCA

Numero de Identificacion 378241

Fiduliquidez

Concepto	Numero Encargos	Valor en $	Valor de Unidad	Saldo en Unidades

F TP06 NEG	3.401	$360.378.259.67

Tipo de Participacion	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

186

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit 800141235

Número de Identificación 378044

PA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ CONTRATO DE OBRA PN

PA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ -FONDO DE ANTICIPO

CR 13 A 29 24 P 20

BOGOTA D.C. / CUNDINAMARCA

Fecha de Entrega: XXXXXXXX25845

Rentabilidad Periodo 01 de Diciembre de 2021 al 28 de Febrero de 2022 Tipo de Participación (%)

Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva no garantizan con la gestión del portafolio con de medio y no de resultado. Los riesgos inherentes por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son asegurables, no genera para la sociedad administradora las obligaciones propias de una aceptación de depósito y no existe amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión derivados de la variación de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

Cualquier petición, queja, reclamo, felicitación, sugerencia, consulta o solicitud de información adicional, puede ser presentada a través de nuestra línea nacional gratuita 018000 513762, al correo electrónico fiduciaria@fiduciariapopular.com.co, en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional, en la página web www.fiduciariapopular.com.co, en el chat de nuestra página web, en el correo electrónico contactenos@defensoriaj.com.co, en la línea nacional gratuita 018000 513762, al correo electrónico fiduciaria@fiduciariapopular.com.co, en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional, en la Cra. 13 A N. 29 24 o en la Cra. 7 No. 71 - 21 Torre B Piso 12 Bogotá, en el horario establecido para la atención al público. Igualmente, puede acudir al Defensor del Consumidor Financiero, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en la Calle 72 No. 10 - 03 Oficina 701, teléfono 6108161 o 3138161, correo electrónico defensoriaj@defensoriaj.com.co, página web www.defensoriaj.com.co, o a la Superintendencia Financiera de Colombia, en la Calle 7 No. 4 - 49, teléfono 5940200, correo electrónico servicioalconsumidor@superfinanciera.gov.co, página web www.superfinanciera.gov.co.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

187

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVO	NAPL	1,848,403,470.12	13,858,946.83	1,375,525,813.07	486,736,603.88
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	NAPL	1,848,403,470.12	13,858,946.83	1,375,525,813.07	486,736,603.88
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	NAPL	1,848,403,470.12	13,858,946.83	1,375,525,813.07	486,736,603.88
130205		EMISORES NACIONALES	NAPL	1,848,403,470.12	13,858,946.83	1,375,525,813.07	486,736,603.88
13020601		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	NAPL	1,848,403,470.12	13,858,946.83	1,375,525,813.07	486,736,603.88
1302050105		FONDOS DE INVERSION COLECTIVA FIDUPOPULAR	NAPL	1,837,365,627.25	7,834,707.06	1,369,924,639.07	475,275,695.24
	70083602592	ENCARGO FIDUCIARIO 70083602592	NAPL	11,037,842.87	6,024,239.77	5,601,177.00	11,520,905.64
	70083602605	ENCARGO FIDUCIARIO 70083602605	NAPL	-6,573,205.63	1,364,959,498.02	1,367,687,728.02	-8,301,435.63
2		PASIVO	NAPL	-6,573,205.63	1,364,959,498.02	1,367,687,728.02	-8,301,435.63
25		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-6,573,205.63	1,364,959,498.02	1,367,687,728.02	-8,301,435.63
2590		DIVERSOS	NAPL	-6,573,205.63	1,364,959,498.02	1,367,687,728.02	-8,301,435.63
259095		OTROS	NAPL	-6,573,205.63	1,364,959,498.02	1,367,687,728.02	-8,301,435.63
25909501		DIVERSOS	NAPL	-6,573,205.63	1,364,959,498.02	1,367,687,728.02	-8,301,435.63
2590950101		CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR	NAPL	.00	9,399,027.00	9,399,027.00	.00
	12976085	REVELO ORLANDO EDMUNDO	NAPL	.00	5,510,361.00	5,510,361.00	.00
	34536384	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	NAPL	.00	492,729.02	492,729.02	.00
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S A	NAPL	-6,573,205.63	.00	2,728,230.00	-8,301,435.63
	800141397	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NAPL	.00	11,175,600.00	11,175,600.00	.00
	800242106	SODIMAC COLOMBIA S A	NAPL	.00	50,000,000.00	50,000,000.00	.00
	830055125	DATALEC INGENIEROS LTDA	NAPL	.00	268,957,548.00	268,957,548.00	.00
	860032550	ALFAGRES S A	NAPL	.00	5,297,921.00	5,297,921.00	.00
	891802318	CVS EQUIPAR Y CIA S EN C	NAPL	.00	16,751,784.00	16,751,784.00	.00
	900335385	BCS INGENIERIA SAS	NAPL	.00	64,517,753.00	64,517,753.00	.00
	900827979	CONSTRUCTORA SUMI AGUAS SAS	NAPL	.00	3,823,065.00	3,823,065.00	.00
	900936707	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	NAPL	.00	582,390,123.00	582,390,123.00	.00
	901041132	AG3 INGENIERIA SAS	NAPL	.00	346,643,387.00	346,643,387.00	.00
	901177394	CONSORCIO BCS GUTIERREZ	NAPL	-1,842,830,264.49	1,376,581,573.30	11,106,477.06	-478,435,168.25
3		PATRIMONIO	NAPL	-1,850,571,729.06	1,370,865,575.08	11,106,477.06	-491,812,231.84
36		PATRIMONIO ESPECIALES	NAPL	-4,646,719,625.04	5,106,477.06	11,106,477.06	-4,652,719,625.04
3605		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-4,646,719,625.04	5,106,477.06	11,106,477.06	-4,652,719,625.04
360505		APORTES EN DINERO	NAPL	-4,646,719,625.04	5,106,477.06	11,106,477.06	-4,652,719,625.04
36050501		APORTES EN DINERO	NAPL	-4,646,719,625.04	5,106,477.06	11,106,477.06	-4,652,719,625.04
3605050105		APORTES EN DINERO	NAPL	-4,646,719,625.04	5,106,477.06	11,106,477.06	-4,652,719,625.04
	901177394	CONSORCIO BCS GUTIERREZ	NAPL	2,796,147,895.98	1,364,959,498.02	.00	4,161,107,394.00
3610		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	2,796,147,895.98	1,364,959,498.02	.00	4,161,107,394.00
361010		PAGOS A TERCEROS	NAPL	2,795,218,218.00	1,364,466,769.00	.00	4,159,684,987.00
36101080		PAGOS A TERCEROS	NAPL	2,795,218,218.00	1,364,466,769.00	.00	4,159,684,987.00
3610100005		OTROS	NAPL	11,533,584.00	00	.00	11,533,584.00
	10296018	VELASCO CAPOTE JESUS ROGER	NAPL	.00	9,399,027.00	.00	9,399,027.00
	12976085	REVELO ORLANDO EDMUNDO	NAPL	45,559,765.00	5,510,361.00	.00	51,070,126.00
	34535384	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	NAPL	1,483,172.00	00	.00	1,483,172.00
	78328951	MORALES RODRIGUEZ CARLOS ADRIAN	NAPL	23,147,200.00	11,175,800.00	.00	34,323,000.00
	800242106	SODIMAC COLOMBIA S A	NAPL	38,976,000.00	00	.00	38,976,000.00
	817000019	LADRILLERA MELENDEZ S A	NAPL	61,000,000.00	00	.00	61,000,000.00
	817007557	CONEXPE S A	NAPL	.00	50,000,000.00	.00	50,000,000.00
	830055125	DATALEC INGENIEROS LTDA					

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
3510100305	830063800	COVAL COMERCIAL S A	NAPL	29,354,083.00	.00	.00	29,354,083.00
	860032550	ALFAGRES S A	NAPL	.00	268,957,548.00	.00	268,957,548.00
	890100251	CEMENTOS ARGOS S A	NAPL	279,891,126.00	.00	.00	279,891,126.00
	890333023	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S A	NAPL	35,680,235.00	.00	.00	35,680,235.00
	891502316	CVS EQUIPAR Y CIA SEN C	NAPL	.00	5,297,921.00	.00	5,297,921.00
	900160515	PREFABRICADOS JOVITA CASTRO & CIA LTDA	NAPL	14,146,723.00	.00	.00	14,146,723.00
	900335385	BCS INGENIERIA SAS	NAPL	.00	16,751,784.00	.00	16,751,784.00
	900763851	METAL B SAS	NAPL	98,464,775.00	.00	.00	98,464,775.00
	900827978	CONSTRUCTORA SUMI AGUAS SAS	NAPL	.00	64,517,753.00	.00	64,517,753.00
	900906707	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	NAPL	7,242,535.00	3,823,061.00	.00	11,065,601.00
	901041132	AG3 INGENIERIA SAS	NAPL	185,978,450.00	582,390,123.00	.00	749,368,573.00
	901067532	FERRELECTRICOM JP SAS	NAPL	3,909,260.00	.00	.00	3,909,260.00
	901177394	CONSORCIO BCS GUTIERREZ	NAPL	1,938,168,824.00	346,643,387.00	.00	2,284,812,211.00
	901187758	ARRIETA S A S	NAPL	40,682,485.00	.00	.00	40,682,485.00
35101007		COSTOS Y GASTOS	NAPL	929,677.98	492,729.02	.00	1,422,407.00
3510100705		COMISIONES	NAPL	929,677.98	492,729.02	.00	1,422,407.00
	860141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	NAPL	929,677.98	492,729.02	.00	1,422,407.00
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	NAPL	7,741,464.57	5,435,598.22	.00	13,177,062.79
3910		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	3,975,357.43	.00	.00	3,975,357.43
391001		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	3,975,357.43	.00	.00	3,975,357.43
39100101		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	3,975,357.43	.00	.00	3,975,357.43
3910010101		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	3,975,357.43	.00	.00	3,975,357.43
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	3,975,357.43	.00	.00	3,975,357.43
3920		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	3,766,107.14	5,435,598.22	.00	9,201,705.36
392001		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	3,766,107.14	5,435,598.22	.00	9,201,705.36
39200101		PÉRDIDA DEL EJECICIO	NAPL	3,766,107.14	5,435,598.22	.00	9,201,705.36
3920010101		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	3,766,107.14	5,435,598.22	.00	9,201,705.36
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	3,766,107.14	5,435,598.22	.00	9,201,705.36
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL	-6,220,539.99	.00	2,752,469.77	-8,973,009.76
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	NAPL	-6,220,539.99	.00	2,752,469.77	-8,973,009.76
4108		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	NAPL	-6,220,539.99	.00	2,752,469.77	-8,973,009.76
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	NAPL	-6,220,539.99	.00	2,752,469.77	-8,973,009.76
41080501		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR)	NAPL	-6,220,539.99	.00	2,752,469.77	-8,973,009.76
4108050101		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR)	NAPL	-6,220,539.99	.00	2,752,469.77	-8,973,009.76
	900247285	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ	NAPL	-6,220,539.99	.00	2,752,469.77	-8,973,009.76
5		GASTOS	NAPL	6,220,539.99	8,188,067.99	5,435,598.22	8,973,009.76
51		GASTOS OPERACIONALES	NAPL	5,366,647.13	8,188,067.99	.00	18,174,715.12
5108		VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.	NAPL	629,220.53	.00	.00	629,220.53
510805		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	629,220.53	.00	.00	629,220.53
51080501		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (DB)	NAPL	629,220.53	.00	.00	629,220.53
5108050101		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (DB)	NAPL	629,220.53	.00	.00	629,220.53
	900247285	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO	NAPL	629,220.53	.00	.00	629,220.53

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
5100050101		FIDULIQUIDEZ	NAPL	3,784,220.97	5,459,837.99	.00	9,244,058.96
5140		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	3,784,220.97	5,459,837.99	.00	9,244,058.96
514005		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	3,784,220.97	5,459,837.99	.00	9,244,058.96
51400501		G.M.F.	NAPL	3,784,220.97	5,459,837.99	.00	9,244,058.96
5140050102		G.M.F. OPERTAS FDOS COMUNES	NAPL	3,784,220.97	5,459,837.99	.00	9,244,058.96
	900247285	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ					
5167		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	5,573,205.63	2,728,230.00	.00	8,301,435.63
516701		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	5,573,205.63	2,728,230.00	.00	8,301,435.63
51670101		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	5,573,205.63	2,728,230.00	.00	8,301,435.63
5167010101		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	5,573,205.63	2,728,230.00	.00	8,301,435.63
	800141397	POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NAPL	5,573,205.63	2,728,230.00	.00	8,301,435.63
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	NAPL	-3,766,107.14	.00	5,435,598.22	-9,201,705.36
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	-3,766,107.14	.00	5,435,598.22	-9,201,705.36
590501		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	-3,766,107.14	.00	5,435,598.22	-9,201,705.36
59050101		GANANCIAS	NAPL	-3,766,107.14	.00	5,435,598.22	-9,201,705.36
5905010101		GANANCIAS	NAPL	-3,766,107.14	.00	5,435,598.22	-9,201,705.36
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	-3,766,107.14	.00	5,435,598.22	-9,201,705.36
8		CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL	NAPL	.00	985,468.04	985,468.04	.00
82		ACREEDORAS	NAPL	-492,729.02	492,729.02	492,729.02	-492,729.02
8295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-492,729.02	492,729.02	492,729.02	-492,729.02
829501		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-492,729.02	492,729.02	492,729.02	-492,729.02
82950101		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-492,729.02	492,729.02	492,729.02	-492,729.02
8295010101		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-492,729.02	492,729.02	492,729.02	-492,729.02
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A	NAPL	-492,729.02	492,729.02	492,729.02	492,729.02
84		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	492,729.02	492,729.02	492,729.02	492,729.02
8405		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	492,729.02	492,729.02	492,729.02	492,729.02
840500		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	492,729.02	492,729.02	492,729.02	492,729.02
84050000		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	492,729.02	492,729.02	492,729.02	492,729.02
8405000000		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	492,729.02	414,058.00	414,058.00	492,729.02
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	492,729.02	78,671.02	78,671.02	.00
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A					
			Total	.00	2,763,493,544.18	2,763,493,544.18	.00

DIRECTOR CONTABLE

REPRESENTANTE LEGAL

190

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO IBCE GUTIERREZ - 578144







Anexo No. 5 Seguridad Social

Contrato de Interventoría

DAIMCO

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito Representante Legal y Revisor Fiscal de DAIMCO S.A.S., certifica que DAIMCO S.A.S. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar, así como por concepto de pago de parafiscales. De los últimos seis (6) meses.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1819 de 2016 cumpliendo con el artículo 114-1, deberá diligenciar la siguiente información:

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES		
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados (artículo 114-1)	SI (x)	No 0

Dado en Bogotá D.C., a los 04 días del mes de abril de 2019.

Atentamente,

CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO
C.C. 78.027.760 de Cerete
Representante Legal

MARCIA CECILIA ATENCIALOZANO
Revisora Fiscal
TP 69499-T

194

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900831481	1	DABACO S A S	B - MENOS DE 300 COTIZANTES	COMPENSAR	CALLE 44 B No. 57A 53	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7455796	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
								Dias Mora	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		
2019-02	2019-03	41385904	849513267	E	2019/03/10	2019/04/08	BANCOLOMBIA	19	$11,674,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR (9 Afiliados)						$10,064,724	$1,156,400			$10,809,724	$867,400			$14,681,192	$646,400			$15,369,724	$1,107,900					$5,313,300
Centro de Trabajo: S.32 (3 Afiliados)						$908,804	$144,000			$1,065,624	$96,480			$980,000	$26,080			$1,065,624	$1,780					$242,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$908,804	$144,000			$1,065,624	$96,480			$980,000	$26,080			$1,065,624	$1,780					$242,300
1	CC	1019052684	HERNANDEZ GONZALEZ JEYSSON ALEXANDER		30	$0	$0	0007501	1	$27,404	$3,288		0	$0	$0	14-4	1	$27,404	$300	0	$0	$0	no	$1,780
2	CC	52868767	MOLANO MORENO SANDRA MILENA		0	$0	$0	0007508	0	$108,000	$17,300		0	$0	$0	14-4	0	$108,000	$300	0	$0	$0	no	$18,400
3	CC	1032411680	QUIROGA RODRIGUEZ ERIKA PAOLA	230301	30	$980,000	$144,000	CF5817	30	$980,000	$26,080	CCF24	30	$980,000	$26,080	14-4	30	$980,000	$6,780	30	$0	$0	SI	$202,900
Centro de Trabajo: 6.36 (6 Afiliados)						$10,764,150	$2,612,400			$15,764,150	$630,600			$15,764,150	$630,600			$15,764,150	$1,097,300					$4,970,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)						$10,764,150	$2,612,400			$15,764,150	$630,600			$15,764,150	$630,600			$15,764,150	$1,097,300					$4,970,800
4	CC	731.88668	BOCANEGRA GARCIA JOSE VICENTE	230301	30	$1,633,000	$261,300	EP5009	30	$1,633,000	$65,300	CCF24	30	$1,633,000	$65,300	14-4	30	$1,633,000	$113,400	30	$0	$0	SI	$505,300
5	CC	7593364	BOCANEGRA GARCIA VICTOR AMABEL	23-14	30	$4,500,000	$765,000	EP5002	30	$4,500,000	$180,000	CCF24	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0	SI	$1,438,200
6	CC	7498332	LOPEZ PALACIO MANUEL ANDRES	230301	30	$4,500,000	$765,000	EP5008	30	$4,500,000	$180,000	CCF24	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0	SI	$1,438,200
7	CC	7229187	MORALES RAMOS CARLOS ALBERTO	23-14	30	$1,600,000	$272,000	EP5010	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	$111,360	30	$0	$0	SI	$511,360
8	CC	1020487999	RIVEROS RODRIGUEZ JHAN ESNEIDER	230301	30	$1,500,000	$255,000	EP5003	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	SI	$479,400
9	CC	7180063	PEREZ RESTREPO OMAR RAFAEL	230301	30	$1,632,150	$277,500	EP5005	30	$1,632,150	$65,300	CCF24	30	$1,632,150	$65,300	14-4	30	$1,632,150	$113,600	30	$0	$0	SI	$521,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MONTERIA (2 Afiliados)						$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$8,900					$406,600
Centro de Trabajo: MONTERIA (2 Afiliados)						$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$8,900					$406,600
Ciudad: PONTEVEDRA Depto: CORDOBA (2 Afiliados)						$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$8,900					$406,600
10	CC	91284184	BALCELLS RIVERA JESSAR	23-14	30	$828,116	$132,500	EP5016	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	SI	$203,300
11	CC	6862368	DIAZ DE LA OSSA OSWALDO	23-14	30	$828,116	$132,500	EP5016	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	SI	$203,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MEDELLIN (1 Afiliados)						$3,357,600	$570,900			$3,357,600	$134,400			$3,357,600	$134,400			$3,357,600	$213,700					$1,073,400
Centro de Trabajo: COMFAMA (1 Afiliados)						$3,357,600	$570,900			$3,357,600	$134,400			$3,357,600	$134,400			$3,357,600	$213,700					$1,073,400
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$3,357,600	$570,900			$3,357,600	$134,400			$3,357,600	$134,400			$3,357,600	$213,700					$1,073,400
12	CC	1020501763	CARDENAS CARRANCO JORGE ANDRES	230301	30	$3,357,600	$570,900	EP5014	30	$3,357,600	$134,400	CCF24	30	$3,357,600	$134,400	14-4	30	$3,357,600	$213,700	30	$0	$0	SI	$1,073,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes

aportes en línea

Planilla Resumen

SUCURSAL: COMFAMILIAR ATLANTICO (1 Afiliados)

Centro de Trabajo: 6.96 (1 Afiliados)

Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO: Identificación	EMPLEADO: Nombre	NOVEDADES	PENSION: Codigo	PENSION: Dias	PENSION: IBC	PENSION: Aporte	SALUD: Codigo	SALUD: Dias	SALUD: IBC	SALUD: Aporte	CCF: Codigo	CCF: Dias	CCF: IBC	CCF: Aporte	RIESGOS: Codigo	RIESGOS: Dias	RIESGOS: IBC	RIESGOS: Aporte	PARAFISCALES: Dias	PARAFISCALES: IBC	PARAFISCALES: Aporte	PARAFISCALES: Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
13	CC 3802758	ESPITIA PALOMINO CARLOS MARIO		230301	30	$1,617,000	$161,100	EPS005	30	$1,617,000	$65,000	CCF07	30	$1,617,000	$65,000	14-4	30	$1,617,000	$113,600	30	$0	$0	$0	$565,400

SUCURSAL: CAJANG (1 Afiliados)

Centro de Trabajo: 6.96 (1 Afiliados)

Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO: Identificación	EMPLEADO: Nombre	NOVEDADES	PENSION: Codigo	PENSION: Dias	PENSION: IBC	PENSION: Aporte	SALUD: Codigo	SALUD: Dias	SALUD: IBC	SALUD: Aporte	CCF: Codigo	CCF: Dias	CCF: IBC	CCF: Aporte	RIESGOS: Codigo	RIESGOS: Dias	RIESGOS: IBC	RIESGOS: Aporte	PARAFISCALES: Dias	PARAFISCALES: IBC	PARAFISCALES: Aporte	PARAFISCALES: Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
14	CC 1088013177	SUAREZ RODRIGUEZ DARWIN MARCOS	X	29/14	9	$450,000	$73,000	EPS[illegible]	9	$450,000	$18,000	CCF33	9	$450,000	$18,000	14-4	9	$450,000	$31,400	9	$0	$0	$0	$139,400

SUCURSAL: COMFACAUCA (6 Afiliados)

Centro de Trabajo: 6.960 (6 Afiliados)

Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (6 Afiliados)

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO: Identificación	EMPLEADO: Nombre	NOVEDADES	PENSION: Codigo	PENSION: Dias	PENSION: IBC	PENSION: Aporte	SALUD: Codigo	SALUD: Dias	SALUD: IBC	SALUD: Aporte	CCF: Codigo	CCF: Dias	CCF: IBC	CCF: Aporte	RIESGOS: Codigo	RIESGOS: Dias	RIESGOS: IBC	RIESGOS: Aporte	PARAFISCALES: Dias	PARAFISCALES: IBC	PARAFISCALES: Aporte	PARAFISCALES: Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
15	CC 34566615	BRAVO DIAZ ANDREA LILIANA		230301	30	$2,000,000	$160,000	EPS016	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$40,000	14-4	30	$2,000,000	$159,200	30	$0	$0	$0	$279,200
16	CC 2713756	CUCUNAME PEREZ OSCAR ANDRES		230301	30	$1,800,000	$160,000	EPS005	30	$1,800,000	$48,000	CCF14	30	$1,800,000	$48,000	14-4	30	$1,800,000	$48,600	30	$0	$0	$0	$369,600
17	CC 5081609	CHACON ORDOÑEZ JORGE ANDRES		231001	30	$1,300,000	$240,000	EPS005	30	$1,300,000	$68,000	CCF14	30	$1,300,000	$68,000	14-4	30	$1,300,000	$104,000	30	$0	$0	$0	$864,000
18	CC 76307131	LOSADA OROZCO DIEGO MARINO		231001	30	$3,000,000	$460,000	EPS016	30	$3,000,000	$120,000	CCF14	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$108,000	30	$0	$0	$0	$918,000
19	CC 4860009	CAMAÑO PEREZ SANDRA LUCIA		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS016	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$40,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	$0	$619,200
20	CC 25251750	RODRIGUEZ CALVO NORA DEL AUX		13604	30	$2,000,000	$320,000	EPS016	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$40,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	$0	$619,200

SUCURSAL: COMFA (1 Afiliados)

Centro de Trabajo: 6.960 (1 Afiliados)

Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO: Identificación	EMPLEADO: Nombre	NOVEDADES	PENSION: Codigo	PENSION: Dias	PENSION: IBC	PENSION: Aporte	SALUD: Codigo	SALUD: Dias	SALUD: IBC	SALUD: Aporte	CCF: Codigo	CCF: Dias	CCF: IBC	CCF: Aporte	RIESGOS: Codigo	RIESGOS: Dias	RIESGOS: IBC	RIESGOS: Aporte	PARAFISCALES: Dias	PARAFISCALES: IBC	PARAFISCALES: Aporte	PARAFISCALES: Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
11	CC 24381484	RIOS CARDONA MARIA MONICA	X	230301	11	$366,667	$58,700	EPS005	11	$366,667	$14,700	CCF11	11	$366,667	$14,700	14-4	11	$366,667	$25,600	11	$0	$0	$0	$113,700

SUCURSAL: COMFASUCRE (1 Afiliados)

Centro de Trabajo: 6.096 (1 Afiliados)

Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (1 Afiliados)

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO: Identificación	EMPLEADO: Nombre	NOVEDADES	PENSION: Codigo	PENSION: Dias	PENSION: IBC	PENSION: Aporte	SALUD: Codigo	SALUD: Dias	SALUD: IBC	SALUD: Aporte	CCF: Codigo	CCF: Dias	CCF: IBC	CCF: Aporte	RIESGOS: Codigo	RIESGOS: Dias	RIESGOS: IBC	RIESGOS: Aporte	PARAFISCALES: Dias	PARAFISCALES: IBC	PARAFISCALES: Aporte	PARAFISCALES: Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
12	CC 1069765539	TORRES AMADOR MAURICIO ORLANDO		230301	30	$1,579,000	$253,500	EPS[illegible]	30	$1,579,000	$63,200	CCF41	30	$1,579,000	$63,200	14-4	30	$1,579,000	$109,900	30	$0	$0	$0	$489,600

SUCURSAL: COMFAMA (1 Afiliados)

Centro de Trabajo: 6.96 (1 Afiliados)

Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO: Identificación	EMPLEADO: Nombre	NOVEDADES	PENSION: Codigo	PENSION: Dias	PENSION: IBC	PENSION: Aporte	SALUD: Codigo	SALUD: Dias	SALUD: IBC	SALUD: Aporte	CCF: Codigo	CCF: Dias	CCF: IBC	CCF: Aporte	RIESGOS: Codigo	RIESGOS: Dias	RIESGOS: IBC	RIESGOS: Aporte	PARAFISCALES: Dias	PARAFISCALES: IBC	PARAFISCALES: Aporte	PARAFISCALES: Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
21	CC 1090086	PALACIOS CORDOBA EDILMS	X X	230301	1	$33,334	$5,400	EPS016	1	$33,334	$1,400	CCF94	1	$33,334	$1,400	14-4	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0	$0	$10,600

aportes en línea

Planilla Resumen

| Total | Afiliados(23) | | |

Contrato de Obra

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	ESDOMERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830099125-8	DATALEC INGENIEROS LTDA		CL 74 a # 75 a 79 Santa Maria del Lago	4393861	datalecing@yahoo.com.ar	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	N – casos de 200 s			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		N

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DD/MM/AAAA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DD/MM/AAAA)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
					0	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-02	2019-02	E		35498831	$1.835.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	860130807-4	33.200	0		0		0	0	0	0	33.200	1
EPS008	Compartar EPS	800088842-7	14.900	0		0		0	0	0	0	14.900	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	33.200	0		0		0	0	0	0	33.200	1
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	800251137-2	33.200	0		0		0	0	0	0	33.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	16.600	0		0		0	0	0	0	16.600	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	33.200	0		0		0	0	0	0	33.200	1
EPSC34	Red de EPS Capital Salud	900156264-2	33.200	0		0		0	0	0	0	33.200	1

TOTALES PENSION											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	819.400	0	0	0	0	0	0		819.400	6
231001	Colfondos	800227940-4	144.000	0	0	0	0	0	0		144.000	1
25-14	Colpensiones	800138188-7	265.300	0	0	0	0	0	0		265.300	2

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Equidad Vida	830088069-1	308.500				308.500	0	0	308.500			3.008	308.508	6

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF29	Cordicaribe	890405884-7	257.500	0	0	257.500	1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830059125-8	DATALEC INGENIEROS LTDA		Cll. 14 a # 73 a 19 Santa Maria del lago	[illegible]	[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B -- Menos de 200			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-03	2019-02	E		31466537	$1.933.600	

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LNA, RP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	257.500	257.500
Pensión	3	1.035.700	1.035.700
Riesgos Laborales	1	389.900	389.900
CCF	1	257.500	257.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	1.933.600	1.933.600

PAGA 2034535

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830059125-0	DATALEC INGENIEROS LTDA		Cl. 74 a # 75 a 19 Santa María del lago	4360081	[illegible]@yahoo.com.ar	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
(PUBLICA	B – (menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTA, D.C.		N

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					APORTANTES	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-03	2019-03	E		33486537	$1.935.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Tarifa	Aportes	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC-LR	AVP	VCT	IRP	SUS	EDU	CUOTA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Obligatorio	Voluntario a Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016080381	VARGAS VEGA SEBASTIAN	1	X			X	X																			230301	33.400	13.400	0	0	0	0	EPS005	83.400	5.600	14-01	83.400	3	5.660	CCF08	83.400	3.003	0	0	0	0	0
2	CC	1020814371	VARGAS VASQUEZ CRISTIAN ALFREDO	1	X			X																				230301	868.000	141.600	0	0	0	0	EPS008	868.000	33.040	14-01	868.000	1	41.004	CCF08	868.000	31.248	0	0	0	0	0
3	CC	1053800886	CORREDOR CAMACHO JORGE ARMANDO	1	X			X																				05-14	630.000	132.600	0	0	0	0	EPS016	630.000	33.280	14-28	630.000	1	37.800	CCF20	630.000	22.680	0	0	0	0	0
4	CC	1001152568	PEDREIRA PINZON YUSEF MICHEL	1	X			X																				230301	630.000	132.600	0	0	0	0	EPS002	630.000	33.280	14-28	630.000	1	37.800	CCF20	630.000	22.680	0	0	0	0	0
5	CC	1052685441	GIRALDO CORTES ALBERT DAVID	1	X			X																				230301	630.110	132.300	0	0	0	0	EPS041	630.110	33.280	14-28	630.110	1	37.806	CCF26	630.110	22.680	0	0	0	0	0
6	CC	79278510	CANO GUEVARA LUIS IGNACIO	1	X			X																				05-14	630.110	132.300	0	0	0	0	EPS010	630.110	33.280	14-28	630.110	1	37.806	CCF26	630.110	22.680	0	0	0	0	0
7	CC	7545433	VARGAS MURCIA LUIS ALFREDO	1	X			X																				230301	900.000	189.000	0	0	0	0	EPS010	900.000	38.000	14-28	900.000	1	4.700	CCF26	900.000	38.000	0	0	0	0	0
8	CC	91189910	MEDRADO CARRILLO OMAR ALEX	1	X			X	X																			230301	415.000	86.400	0	0	0	0	EPS037	415.000	18.600	14-28	415.000	1	58.000	CCF26	415.000	17.400	0	0	0	0	0
9	CC	93240155	GUEVARA VILLAMIZAR JOSE VICENTE	1	X			X																				230301	630.110	132.300	0	0	0	0	CF0017	630.110	33.200	14-28	630.110	1	37.700	CCF26	630.110	22.680	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PA 2034-3

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10547229	6	GABRIEL PASTOR ARAVLAR BERMEO	B - MENOS DE 500 COTIZANTES	OBRA POLICIA	carrera 17 calle 1 c	POPAYAN-CAUCA	8371346	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	2019-03	4284479326	0489556820	E	2019/03/08	2019/03/04	ITAU	0	$519,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	irl	avp	vct	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1061703015	CASTILLO DE BEDOYA	X																	230301	6	$158,000	$31,160	6M4818	5	$158,000	$9,480	CCF14	5	$158,000	$5,400	14-15	5	$158,000	$9,700	5	$0	$0	N	$43,000
2	CC	1484613	OKEA ALEMAN DE	X																	25-14	5	$158,000	$12,160	D3C32	5	$158,000	$5,600	CCF14	5	$158,000	$5,600	14-15	5	$158,000	$9,700	5	$0	$0	N	$43,000
3	CC	1061699527	MESA CARLOS	X																	230301	5	$158,000	$25,300	D3C218	5	$158,000	$5,600	CCF14	5	$158,000	$5,600	14-15	5	$158,000	$9,700	5	$0	$0	N	$43,000
Total		Affiliados(3)																					$474,000	$69,000			$474,000	$20,680			$474,000	$16,800			$474,000	$29,100		$0	$0		$129,000

2019/03/04 02:46 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10547225	6	GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA POLICIA	carrera 17 calle 5 c	POPAYAN-CAUCA	8375346	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	2019-03	48491338	848455820	E	2019/03/08	2019/03/04	ITAU	0	$129,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$66,300	$0	$0	$66,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$22,100	$0	$0	$22,100
PORVENIR	230501	800,224,808	8	1	$22,100	$0	$0	$22,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$22,100	$0	$0	$22,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,100	$0	$0	$29,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$29,100	$0	$0	$29,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,800	$0	$0	$16,800
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$16,800	$0	$0	$16,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				1	$16,800	$0	$0	$16,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$5,600	$0	$0	$5,600
EMSSANAR	ESSC18	814,000,337	1	1	$5,600	$0	$0	$5,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$5,600	$0	$0	$5,600
TOTAL				3	$129,000	$0	$0	$129,000

2019/03/04 02:46 PM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION . . APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900103801-1	METAL B SAS		CRA 5 9-24	[illegible]	[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PLANILLA 1	8	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				11	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-01	2019-02	E	14/03/2019	3365032	$2.092.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	98.000	0		0		0	1	100	0	98.700	1
EPS008	Compensar EPS	800088702-7	98.000	0		0		0	1	100	0	98.500	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	98.400	0		0		0	1	100	0	98.500	1
EPS041	Famisanar EPS	830003564-7	98.400	0		0		0	1	100	0	98.500	1
EPS044	MEDIMAS EPS S.A.S.	901097473-5	98.400	0		0		0	1	100	0	98.500	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subcuenta	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Protección (RAIS + Protecover)	800227939-9	397.000	0	0	0	0	1	300	0	397.000	1
230501	Porvenir	800144331-3	530.000	0	0	0	0	1	400	0	530.400	1
230901	Colfondos	800227940-4	265.000	0	0	0	0	1	200	0	265.200	1
25-14	Colpensiones	830009783-7	132.500	0	0	0	0	1	100	0	132.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	830031750-0	830.700				104.700	1	200	830.280			6.347	830.300	11

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Compensar Caja	860066942-7	365.200	1	300	365.500	11

PAGADA
3365032

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

204

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	0837630571 1	METAL 8 SAS		CRA 5 0 24	6840655	[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PLANILLA 1	0	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		S

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DD/MM/AAAA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DD/MM/AAAA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	VPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-09	2019-09	E	14/10/2019	3383338 02	$2.802.480	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IBP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	385.200	385.200
Pensión	4	1.320.680	1.320.680
Riesgos Laborales	1	634.780	635.208
CCF	1	365.280	365.908
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	2.006.160	2.802.480

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900763851-1	METAL B SAS		CRA 9 9 24	8905855	[illegible]@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	O – Ley 1429	PLANILLA 1	0	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DDAAMMSSAA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DDAAMMSSAA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	APC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-03	2019-02	E	19/03/2019	33953002	$2.900.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE								INFORMACION NOVEDADES																		PENSION						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Estrato	Ludico	Sanción	Extranjero no obligado a cotizar pensión	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	[illegible]	[illegible]	COD. AFP	SEC AFP	Días cotizados	Salario básico	Variación Transitoria Salario	Variación Permanente Salario	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	SEC EPS	Días cotizados / Valor UPC	Cod. ARL	SEC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	SEC CCF	Aporte CCF	SEC aportes parafiscales	Aporte ESAL	Aporte ICBF	Aporte SENA	Aporte SLI
1	CC	1018457103	RIVAMBETE CAMPUSCO JOSUN ALEXANDER	1	O																				230301	628118	132.540	0	0	0	0	EPS034	628.118	33.200	14-11	628.118	3	87.700	CCF24	628.118	33.200	0	0	0	0	0
2	CC	1033441611	PATIÑO ENRIQUE VALMIR	1	O																				240301	628.118	132.540	0	0	0	0	EPS034	628.118	33.200	14-11	628.118	3	87.700	CCF24	628.118	33.200	0	0	0	0	0
3	CC	1018457080	BOLIVAR ALVARADO CARLOS JULIO	1	O																				26-14	628.118	132.540	0	0	0	0	EPS040	628.118	33.200	14-11	628.118	3	87.700	CCF24	628.118	33.200	0	0	0	0	0
4	CC	1010454465	SANCHEZ SIERRA ERIK JEFFERSON	1	O																				230301	628.118	132.540	0	0	0	0	EPS042	628.118	33.200	14-11	628.118	3	87.700	CCF24	628.118	33.200	0	0	0	0	0
5	CC	1088000196	LIEVAS DANIEL RAFAEL MANUEL	1	O																				230301	628.118	132.540	0	0	0	0	EPS002	628.118	33.200	14-11	628.118	3	87.700	CCF24	628.118	33.200	0	0	0	0	0
6	CC	1033441701	PROPISA PAEZ CARLOS EDUARDO	1	O																				230301	628.118	132.540	0	0	0	0	EPS017	628.118	33.200	14-11	628.118	3	87.700	CCF24	628.118	33.200	0	0	0	0	0
7	CC	1033458564	ALVARADO PINZON FERMIN	1	O																				230301	628.118	132.540	0	0	0	0	EPS038	628.118	33.200	14-11	628.118	3	87.700	CCF24	628.118	33.200	0	0	0	0	0
8	CC	79130549	BOLIVAR PEREZ RICARDO	1	O																				230301	628.118	132.540	0	0	0	0	EPS038	628.118	33.200	14-11	628.118	3	87.700	CCF24	628.118	33.200	0	0	0	0	0
9	CC	80104271	JIMENEZ MORA JUAN CARLOS	1	O																				230301	628.118	132.540	0	0	0	0	EPS017	628.118	33.200	14-11	628.118	3	87.700	CCF24	628.118	33.200	0	0	0	0	0
10	CC	80861500	GARCIA BARRETO JHON ALEXANDER	1	O																				230301	628.118	132.540	0	0	0	0	EPS017	628.118	33.200	14-11	628.118	3	87.700	CCF24	628.118	33.200	0	0	0	0	0
11	PE	1010454111 970	OLIVACO CORTES GIOVANNA JUNO CARLOS	1	O																						0	0	0	0	0	EPS017	628.118	33.200	14-11	628.118	3	87.700	CCF24	628.118	33.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

206

compensar | mipianilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901177094-5	CONSORCIO ECO - GUTIERREZ		CARRERA 15 #104-41 OFICINA 402	3007898	administrativo@consorcioguterrez.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
USUEA	C - [illegible]			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					DEPENDIENTES	ERC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				0	0
2019-03	2019-03	V		3380178	TOTAL A PAGAR	
					$336.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otras Empresas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Resolución Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-17	ARL SURA	800656750-5	336.000				336.000	9	0	336.000			3.360	339.360	3

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, ERP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	336.000	336.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	336.000	336.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	ENDOSADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901177084-5	CONSORCIO BCS - GUTIERREZ		CARRERA 19 93 B 61 I OFICINA 402	2570808	administracion@consorciobcsgutierrez.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		01

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	SFD PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
202605	202605	1		93611720	$306.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES					SCP			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Estudio	Exterior	Colombiano en el exterior	Salario integral	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC-LR	AVP	VCT	IRP	SLE		CAI AFP	IBC AFP	Cotización	Solidaridad y subsistencia	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	CAI EPS	IBC APS	Cotización Valor UPC	CAI ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código SCP	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte ICBF	Aporte SENA	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001747914	MARCO EUSEBIO CASTAÑO FERNANDEZ	01	X																					0	0	0	0	0	0		0	0	14-01	261.000	1	21.200		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1023915101	ANGIE PAMELA CARDONA MARQUEZ	00	X			X																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-01	625.000	0	30.000		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1000000000	ALVARO HUMBERTO MANCILLA FERREIRA	00	X																					0	0	0	0	0	0		0	0	14-01	4.000.000	4	255.000		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGADO 4260534

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	ESTABLECIDO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901177394-5	CONSORCIO BCB - GUTIERREZ		CARRERA 19 N 84-41 OFICINA 403	2570886	asistentecalidad.autoliquidacion@compensar.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	C – MIPYMI			BOGOTA D. C.	BOGOTA, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPO
					78	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-03	2019-02	N		2855570	$22 168.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	934.980	0		0		0	0	0	0	934.980	9
EPS005	Sanitas EPS	830251443-6	303.750	0		0		0	0	0	0	303.750	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	81.900	0		0		0	0	0	0	81.900	3
EPS010	Coomeva EPS	805000427-1	140.900	0		0		0	0	0	0	109.990	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	358.200	0		0		0	0	0	0	358.200	11
EPS018	Serv. Occ. Salud - SOS	805001157-2	140.900	0		0		0	0	0	0	108.900	4
EPS023	Cruz Blanca - CRS	830037850-0	90.900	0		0		0	0	0	0	90.900	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	385.980	0		0		0	0	0	0	385.900	13
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	93.600	0		0		0	0	0	0	93.600	1
EPS046	MEDIMAS EPS SAS	900156264-2	234.480	0		0		0	0	0	0	234.400	3
EPS048	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	800251164-5	93.600	0		0		0	0	0	0	93.600	1
EPS053	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C."	817001773-9	78.000	0		0		0	0	0	0	70.900	3
EPS055	Fondo Promotor de Salud Mallamas	837000084-5	33.280	0		0		0	0	0	0	33.280	1
EPS056	EPS-S Emssanar	814000307-1	198.900	0		0		0	0	0	0	198.900	8
EPS058	ANIDET SALUD EPS SAS	900935126-7	46.800	0		0		0	0	0	0	49.080	2
EPS061	CPS ECOOPSOS S.A.S.	901028648-0	93.600	0		0		0	0	0	0	93.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Protección (PAS - Protección)	800227339-0	3.247.500	0	0	17.500	17.500	0	0		3.282.500	33
230301	Porvenir	800224808-0	5.068.900	0	0	31.600	31.600	0	0		5.097.500	39
231601	Colfondos	800227940-4	600.400	0	0	0	0	0	0		600.400	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.312.400	0	0	27.500	27.500	0	0		2.367.400	19

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Nuevo Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860070790-5	4.682.200				4.682.200	0	0	4.682.200			45.020	4.682.200	78

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
333719	Compensar	860013816-0	3.883.400	0	0	3.883.400	78

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	ID GENERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901177284-5	CONSORCIO BCS - SUTIBIENES2	CARRERA 19 A BIS 41 OFICINA 402	2570999	administrativo@sutibienes.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	91

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
					70	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-03	2019-04	E		33981858	$22.108.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LRA, INT y Mora	Total a Pagar
Salud	1	2.960.400	2.960.400
Pensión	4	11.580.300	11.580.300
Riesgos Laborales	1	4.062.200	4.062.200
CCF	1	3.960.400	3.960.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	22.108.300	22.108.300

PAGA 42605173

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

912

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901177304-5	CONSORCIO BCB - GATEPREZ		CARRERA 19 # 94-41 OFICINA 402	2972886	[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	C – MIPYME			BOGOTA D.C.	BOGOTA, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DAMESIANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DAMESIANO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					IMPLEADOS	VRO
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-03	2019-03	E		20551559	$22,168,300	

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | |

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901177364-5	CONSORCIO BCS - GUTIERREZ		CARRETA 15 11 64 41 OFICINA 402	2570808	administrativo@consorciobcs.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
LINEA	C - MIPYME			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PARAFISCALES				TOTAL A PAGAR	
202104	202104	E		8365 9280	$22.168.300	

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACION COTIZANTE | | | | | | |

Anexo No. 6 Control de Personal del Contratista

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-6-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitana De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	AURELIO GUTIERREZ	REPRESENTANTE LEGAL																												1	1	1	1		
2	FABIO ANDRES CLAROS BAUTISTA	RESIDENTE ELECTRICO	79.921.075	1	1																														
3	FEDERICO MONTEALEGRE	INS COORDINADOR SSTMA	76.318.086																										1	1	1	1	1		
4	JULIAN MAURICIO GIRALDO	DIRECTOR DE OBRA	15.908.656	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		
5	MARIA TERESA OJEDA CABRERA	RESIDENTE DE OBRA	34.555.320	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
6	MARIA FERNANDA BENAVIDES BELTRAN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ SSTMA	34.315.134	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
7	EDGAR ENRIQUE CALVETE LOPEZ	ARQUITECTO	4.979.340	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
8	YULI GOMEZ URBANO	RESIDENTE SSTMA	1.080.900.176	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1			1	1	1					1	1	1		
9	JULIAN VELASCO	AUXILIAR SSTMA	1.061.716.774	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1			1	1	1	1	1		
10	CRISTIAN FERNANDO MUÑOZ CEDEÑO	AUXILIAR SSTMA	1.061.740.754	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	1	NA	NA	NA			NA	1	NA	NA	NA		
11	MARGARITA EUGENIA ALVAREZ FUENTES	TOPOGRAFA	38.362.685	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
12	ALEXANDRA ROJEÑO ZEMANATE	AUX. TOPOGRAFIA	1.062.754.412	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1			1			1	1	1	1	1		

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-6-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitana De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
13	RAUL ALEXANDER MORENO SUAREZ	CONDUCTOR	79.592.534	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
14	JOHN EDUIN BOLAÑOS FLOREZ	CONDUCTOR	10.292.092						1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
15	CARLOS URIEL CAMPO MOSQUERA	OPERADOR	1.061.711.030	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
16	JHON JAIRO PINEDA	CONTRATISTA	75.052.427	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1																	
17	YESID ALEXIS PANTOJA TREJO	INSPECTOR	1.087.408.073				1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1			1	1	1					1	1	1		
18	DIEGO HERNAN ANGUCHO CAMPO	AUX. BODEGA	1.061.725.400	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
19	HUALTER ANTONIO HERNANDEZ OSORIO	AYUDANTE	4.751.640	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					1	1	1			1	1	1	1	1		
20	ARIS QUILINDO ULCUE	AYUDANTE	1.062.776.138	1	1		1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1				
21	EDGAR EUGENIO CAMPO SANCHEZ	AYUDANTE	1.061.713.831	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
22	AMALQUIO ALEJANDRO CASTAÑEDA	AYUDANTE	75.033.219	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
23	CARLOS EDUVER LEON	OFICIAL	3.087.064	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	1		
24	EVA ARRIENI AGUDELO GALLO	AYUDANTE	52.242.119	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1	1	1		

DAIMCO

Diseño, Asesoría, Interventoría, Montaje, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40.05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-6-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitana De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
25	HUGO ANTONIO IDARRAGA	AYUDANTE	16.400.159	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
26	WILLIAN CASTAÑEDA PINEROS	AYUDANTE	86.048.874	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
27	GERARDO SOLARTE GONZALEZ	OFICIAL	94.463.640	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
28	LUIS ALFREDO BAUTISTA BAUTISTA	OFICIAL	19.423.106	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
29	EDUAR FABIAN LEON	AYUDANTE	93.438.331	1	1																1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
30	RAFAEL ANTONIO MENDEZ GARZON	AYUDANTE	1.106.308.450	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1			1									
31	JOSE MARIO DIAZ MORALES	AYUDANTE	1.083.838.643	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1			1	1	1	1	1		
32	JORGE ANDRES OLIVEROS PENAGOS	AYUDANTE	1.006.929.420	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
33	BRYAN JESUS PALOMINO GOMEZ	AYUDANTE	1.106.899.374	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
34	JOSE RAUL GONZALEZ	OFICIAL	94.254.051				1	1	1			1	1	1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
35	IVAN RICARDO JIMENEZ BERNAL	AYUDANTE	79.942.276	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
36	GUSTAVO ROMERO	AYUDANTE	91.437.224	1	1		1	1	1	1																									

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-6-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitana De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
37	ANDERSON YAMIT BAUTISTA GUERRERO	AYUDANTE	101.428.230				1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
38	DANIEL ANDREY RODRIGUEZ PATIÑO	OFICIAL	1.110.506.178	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
39	LUIS ALFONSO GORDILLO LONDOÑO	AYUDANTE	7.251.758	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
40	JOSE HECTOR ERAZO	AYUDANTE	113.068.448		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
41	ALVARO MILENA FERIA MONTEALEGRE	HIDRAULICOS	14.269.118				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1			1	1	1	1	1		
42	RUSSEL WEIMAR GARCIA GRAJALES	OFICIAL	1.005.856.846	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
43	YEFERSON GOMEZ RAYO	OFICIAL	1.106.893.622		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
44	CAMILO ANDRES SANCHEZ GARCIA	OFICIAL	1.070.602.996		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
45	JIMMY GALINDO MARTINEZ	OFICIAL	11.223.201		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
46	LUIS ALBERTO DE LA CRUZ	HIDRAULICOS	10.661.566	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
47	MARIO PAUL AVILA GUERRA	HIDRAULICOS	80.010.363	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
48	ALFREDO CHILITO MUÑOZ	AYUDANTE	1.058.789.787		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1																		

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 08-6-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitano De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios F(os Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO:DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
49	HERNEY CIMA	HIDRAULICOS	76.316.674	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
50	ERWINSON ARLEY MONTENEGRO MONTENEGRO	HIDRAULICOS	1.002.986.868	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
51	ARCENIO GUAMANGA ANACONA	OFICIAL	76.318.444	1	1																														
52	ENJAR YESID COMETA MOSQUERA	AYUDANTE	4.788.930						1	1	1																								
53	JOSE REINEL CAICEDO	AYUDANTE	76.030.076						1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1					1			1	1	1	1	1		
54	ROLANDO BURBANO CALBIO	AYUDANTE	15.671.990							1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
55	SANDRO IVAN ORTEGA BENAVIDES	AYUDANTE	1.061.770.857							1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
56	IVAN DARIO ALCUE SANTIAGO	AYUDANTE	1.061.803.703								1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
57	GIOVANNY ULCHUR LIZ	AYUDANTE	10.754.770								1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
58	YERQUI ANIBAL CASTILLO SANTIAGO	AYUDANTE	10.305.866								1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
59	DIEGO FERNANDO ULCHUR SANTIAGO	AYUDANTE	1.061.791.567															1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
60	USANEL ULCHUR LIZ	AYUDANTE	10.758.151															1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40-05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN OIRAF No 06-6-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitana De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO:DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
61	BRUNO TESORO PALOMINO BOLAS	CONTRATISTA	80.421.341	1	1		1	1	1	1	1	1																							
62	JHON FREDY AGRONO GRUZ	AYUDANTE	1.082.324.018	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
63	JOSE DIVIER GOMEZ FIGUEROA	AYUDANTE	1.061.598.680	1	1		1		1			1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
64	LENIN EDUARDO CENTENO ORDOZCO	OFICIAL	85.270.068	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
65	MILTON HUMBERTO PIPICANO INCHIMA	AYUDANTE	76.293.311	1	1			1	1					1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
66	RICHAR JOSE MOSQUERA	OFICIAL	106.380.968	1	1		1		1			1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
67	WEIMAR HERNAN GUACA	OFICIAL	10.317.382	1	1		1		1			1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
68	ROBINSON MUÑOZ VARGAS	AYUDANTE	1.117.406.148	1	1		1		1			1		1	1	1	1	1	1		1			1	1	1					1	1	1		
69	JOSE ALEXIS MOSQUERA LOZANO	OFICIAL	4.832.722	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1			1	1	1					1	1	1		
70	ESAU JIMENEZ JIMENEZ	OFICIAL	7.552.190	1	1		1	1	1	1	1	1																							
71	ESAU JIMENEZ CUELLO	AYUDANTE	1.061.730.544	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
72	CARLOS IAIR ZAMBRANO PELEMUE	AYUDANTE	10.301.240	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN ORAF No 06-6-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitana De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO:DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
73	FERNEY ALEXANDER MONTENEGRO MONTENEGRO	AYUDANTE	1.002.966.866	1				1	1	1	1			1	1	1	1	1	1																
74	JHON ALEXIS BENAVIDES VALVERDE	AYUDANTE	1.063.618.358	1	1																														
75	DIDIMO ANCISAR ACOSTA MACIAS	AYUDANTE	1.058.970.334	1	1		1	1	1	1	1																								
76	CESAR PEREZ BONDON	OFICIAL	74.795.219																																
77	BENITO ORTIZ CUASQUER	OFICIAL	1.102.841.897	1	1			1	1	1	1	1																							
78	CARLOS ALIRIO LOPEZ LUNA	OFICIAL	76.150.060																																
79	ANDRES MEJIA MARTINEZ	AYUDANTE	1.135.014.020	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1																
80	MIGUEL ANGEL PAZU MESTIZO	OFICIAL	10.484.701	1	1		1	1	1	1	1	1																							
81	JHON JAIRO PINEDA	CONTRATISTA	75.082.427																		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
82	ANDRES GONZALEZ COBO	AYUDANTE	1.061.797.592	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
83	JOSE EUECER DOMINGUEZ	AYUDANTE	76.025.008	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1			1			1	1	1	1	1		
84	ROBINSON MOSQUERA	AYUDANTE	1.063.813.153	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-6-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitano De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
85	WILSON ANDRES SALAZAR SALAZAR	AYUDANTE	1.061.808.030	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																						
86	DANEYER LINI CHILITO	AYUDANTE	1.058.787.468	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	1									
87	DIONICIO VALENCIA VALLECILLA	AYUDANTE	76.244.421	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1									
88	JOSELITO FLOR ATOY	AYUDANTE	1.061.689	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1									
89	RAMON ORLANDO ATOY GUTIERREZ	AYUDANTE	10.200.653	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1									
90	JAMES ALBERTO GOMEZ GRIJALBA	OFICIAL	10.696.850	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1									
91	MARIO ALEXANDER GOMEZ VARGAS	OFICIAL	75.085.575	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1									
92	MILTON FAVIAN GOMEZ CAMPO	AYUDANTE	1.063.812.410	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1									
93	MARTIN ANCHICO MORENO	AYUDANTE	103.888.606	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1									
94	JORGE ENRIQUE MARTINEZ BASTIDAS	AYUDANTE	10.291.279	1	1																																				
95	CESAR PEREZ RONDON	AYUDATE	74.756.219				1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1									
96	JOSE FERNANDO LOPEZ IMBACHI	AYUDANTE	1.058.876.030				1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1									

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-6-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitana De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO:DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
97	LUIS ALBERTO BARQUEÑO CHIRIPUA	AYUDANTE	1.059.042.097					1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1												
98	JHON ALEXIS BENAVIDES VALVERDE	AYUDANTE	1.063.818.358					1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
99	OSCAR GARCIA	AYUDANTE	1.031.140.081							1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
100	JOSE OLIMPO VILLANUEVA VILLANUEVA	AYUDANTW	10.009.619																													1		
101	MIGUEL MONTAÑO LARGO	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	10.547.336	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
102	MILTON CESAR MACA	OPERADOR RETROEXCAVADORA	76.328.537	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1			
103	GERMAN RAUL PASTAS CHALPARTAN	OPERADOR RETROEXCAVADORA	1.088.649.038																															
104	WEIMAR CAICEDO CARABALI	OPERADOR RETROEXCAVADORA	10.310.181																															
105	JHON ALEXANDER GARCIA BARRETO	ESTRUCTURA METALICA	80.803.303	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1					
106	WILMER PATIÑO	ESTRUCTURA METALICA	103.244.791	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1			1	1					
107	RAFAEL MANUEL LUCAS SUAREZ	ESTRUCTURA METALICA	10.685.046	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1					
108	RAMON ORDOÑEZ ALVARADO	ESTRUCTURA METALICA	74.338.568	1	1	1	1	1																											

DAIMCO

Diseño, Asesoría, Interventoría, Montaje, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 08-6-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitana De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
109	CRISTIAN ALFREDO VARGAS VASQUEZ	ELECTRICOS	1.023.874.971	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1								
110	LUIS ALFREDO VARGAS BURGOS	ELECTRICOS	76.451.429							1	1	1		1																											
111	JOSE VICENTE GUEPENDO VILLALOBOS	ELECTRICOS	93.345.165	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1								
112	YUSEP MICHEL PISAMINA PINZON	ELECTRICOS	1.061.782.586	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1								
113	JORGE ARMANDO CHAVEZ CAMACHO	ELECTRICOS	1.061.035.050	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1										
114	VICTOR MANUEL VARGAS BURGOS	ELECTRICOS	19.339.620								1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1								
115	YONI EBOMAR INCHIMA TALAGA	ELECTRICOS	1.063.811.930								1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1										
116	ALEXANDER DAZA SEVILLA	ESTUCO Y PINTURA	10.836.633					1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1								
117	CARLOS MESA SOLARTE	ESTUCO Y PINTURA	1.061.699.577					1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1								
118	RODRIGO CERTUCHE VILLAQUIRAN	ESTUCO Y PINTURA	1.061.703.015					1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1								
119	RORY MENESES	ESTUCO Y PINTURA	4.739.598																1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1								
120	CARLOS ALBERTO ORTEGA	PISOS	10.543.944																										1	1	1										

DAIMCO

Diseño, Asesoría, Interventoría, Montaje, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-6-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitana De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
121	AICARIO CORTES	PISOS	76.305.722																										1	1	1	1	1		
122	JORGE HURTADO VERGARA	PISOS	76.317.916																										1	1	1	1	1		
123	OSCAR MUÑOZ	PISOS	10.539.576																										1	1	1	1	1		
124	MAURICIO CALAMBAS	PISOS	10.541.775																											1	1	1	1		
			TOTAL PERSONAL POR DIA	78	78	4	81	85	91	90	93	88	17	92	92	83	90	83	83	0	82	81	86	83	83	86	0	0	90	92	92	88	88	0	0

OBSERVACIONES

ING. RESIDENTE

Elaboró SANDRA GUAUÑA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - TIRSO COSME

Aprobó

CONVENCIONES DE CARGO

DO	DIRECTOR DE OBRA	O	OFICIAL
IR	INGENIERO RESIDENTE	A	AYUDANTE
TA	TECNICA AMBIENTAL	I	INSPECTOR
TA	TOPOGRAFO	OP	OPERADOR
CI	CADENERO I	PL	PALETEROS
CII	CADENERO II	LB	LABORATORISTA
M	MAESTRO		

Anexo No. 7 Control Personal de Interventoría

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Gerencia, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DE LA INTERVENTORIA INT-40:00

PROYECTO: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

EMPRESA: DAIMCO S.A.S

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

FRENTE DE OBRA: POPAYAN - CAUCA

No	Nombre	Cargo	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	TIRSO MARINO COSME OROZCO	DI	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	26
2	SANDRA LUCIA GUAUÑA PISSO	IR	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	26
3	ROSA DEL MAR RODRIGUEZ GALVIS	SO	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	26
4	MONICA LILIANA BENITEZ ANGEL	AR	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	26
5	JAVIER JOSE CARILLO ORTEGA	E	0	1	0	1	1	0	0	1	1,0	0	1	0	0	1	1	0,0	0	0	0	0	1	1	0,0	0	1	0	0	1	0	0	1	13
6	RIGOBERTO LOZADA DIAZ	TA	0	1	0	1	1	1	1	1	0,5	0	0	1	0	1	1	0,5	0	0	1	0	1	1	0,5	0	1	1	0	1	1	0	1	19
7	VÍCTOR MANUEL BOCANEGRA GARCÍA	E	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1,0	0	0	1	1	1	1	1,0	0	1	1	1	1	1	1	1	26
8	JOSE ARMANDO RUIZ ANGARITA	E	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
9	ALBERTO FEDERICO MOUTHON BELLO	E	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0,0	0	0	1	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
10	PABLO MANRIQUE CONVERS	E	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0,0	0	0	0	0	0	1	1,0	0	0	1	1	1	1	1	1	16
11	PABLO EMILIO GUERRERO JIMENEZ	E	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	26
	TOTAL PERSONAL POR DIA		8	10	0	9	10	7	8	9	9	0	9	9	7	11	10	8	0	0	8	6	8	9	8	0	8	8	7	9	8	7	5	218

OBSERVACIONES

ING. RESIDENTE

Elaboró SANDRA GUAUÑA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - TIRSO COSME

Aprobó

CONVENCIONES DE CARGO

DO	DIRECTOR DE OBRA	**O**	OFICIAL
IR	INGENIERO RESIDENTE	**A**	AYUDANTE
TA	TECNICA AMBIENTAL	**I**	INSPECTOR
TA	TOPOGRAFO	**OP**	OPERADOR
CI	CADENERO I	**PL**	PALETEROS
CII	CADENERO II	**LB**	LABORATORISTA
M	MAESTRO	**E**	ESPECIALISTA

22

Anexo No. 8 Informe SISO

INTERVENTORÍA TÉCNICA EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DEL MANEJO AMBIENTAL AL CONTRATO, PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REALIZADA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ EN LA CIUDAD DE POPAYÁN CAUCA.





PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2019

ELABORÓ:

ROSA DEL MAR RODRIGUEZ G.

RESIDENTE SISOMA

INTERVENTORÍA DAIMCO S.A.S

208

1. INTRODUCCIÓN

A continuación se presenta la recopilación y el análisis de la información proveniente de las actividades del **SG-SST** ejecutadas por el contratista **CONSORCIO BCS-GUTIERREZ** durante la ejecución del proyecto **CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN** ubicada en la ciudad de Popayán , con el fin de analizar y evaluar la protección y promoción de la salud de los trabajadores, condiciones de trabajo, gestión social con la comunidad y protección al medio ambiente de posibles impactos durante la ejecución del contrato.

2. OBJETIVO GENERAL

El objetivo del presente informe es evidenciar el trabajo respecto a la gestión en seguridad y salud en el trabajo (SST) establecido y aplicado por el contratista Consorcio BCS- GUTIERREZ en la ejecución del proyecto Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policia Metropolitana De Popayán; durante el periodo del 26 de Febrero al 25 de Marzo de 2019. Así mismo analizar el avance de la implementación para evaluar resultados de este y establecer medidas que nos conlleven al mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo y el control eficaz de los peligros y riesgos, en materia de seguridad y salud en el trabajo.

3. METODOLOGÍA ÁREA SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SISOMA) o SG-SST y MA(Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente:

La metodología a implementar para fundamentar el presente informe se basa en la recopilación y registros de la información de las actividades establecidas por los subprogramas de medicina preventiva de trabajo, seguridad industrial, gestión de saneamiento básico y protección ambiental realizada según la estructura del SG-SST determinado en la presente obra.

4. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

224

4.1 Seguimiento a los hallazgos , se realizan los siguientes requerimientos en Seguridad y Salud en el trabajo al contratista:

✓ Seguir Manteniendo las áreas de circulación y rutas de evacuación limpia y despejada.

Rta: Se ha continuado con el programa de Orden y Aseo, se ha estado designan do áreas de acopio de escombros en cada uno de los bloque de trabajo, Bloque 1 (Patrulleros) piso 1 y 2, bloque 2 (Casino) Piso 1 y 2, Bloque 3 (Suboficiales) piso 1 y 2, los escombros se han estado evacuando con el minicargador y disponiendo en el botadero autorizado.

✓ Completar las hojas de vida pendientes, como son las 2 del personal de cubierta, Metal B- S.A.S, personal de Eléctricos y demás personal que vaya ingresando.

- **Rta:** El contratita realizo la entrega de las Hojas de Vida los subcontratistas:

- BRUNO: 4
- CARLOS LEON: 3
- DANEL RODRIGUEZ: 1
- DATALEC INGENIEROS: 2
- JHON JAIRO PINEDA(TANQUE): 5
- METAL B SAS: 2
- ORLANDO EDMUNDO REVELO: 2
- ESTRUCTURA METALICA: 2

4.2. Identificación de riesgos y peligros en áreas del proyecto:

✓ Realizada una inspección de campo en los diferentes frentes de trabajo que se encuentran en la obra Construcción y Dotación de la Cuarta Fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán.

✓ Aplicar medidas preventivas y correctivas identificadas en cada uno de los frentes de trabajo.

✓ Hacer seguimiento a la cronograma de capacitación anual y del charlas semanales.

✓ Realizar seguimiento a la ejecución de los procedimientos seguros

736

correspondiente a cada actividad que ejecuta el contratista en obra.

- ✓ Verificar que se tomen las medidas preventivas y correctivas a que haya lugar.

- ✓ Verificar el cumplimiento de los programa que hacen parte de la Gestión en SST- MA, los cuales garantizan la Seguridad y Salud de los trabajadores en obra.

5. GESTIÓN HUMANA

5.1. INGRESOS - DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL

En el periodo comprendido entre el 26 de Febrero y el 25 de Marzo de 2019 se realiza por parte de la interventoría al residente SISOMA de la Empresa Contratista Consorcio BCS- GUTIERREZ, la revisión de la carpeta de ingreso del personal contratistas y subcontratista, verificando que se cumpla con lo propuesto en el subprograma de medicina preventiva y del trabajo y el subprograma de higiene y seguridad industrial. Finalizada la verificación se evidencia que a la fecha se encuentran los siguientes documentos:

Se verifica los exámenes de ingreso, se realizaron 21 exámenes médicos de ingreso, al personal nuevo que ingreso para este periodo.

Para el presente periodo el contratista realizaron 18 solicitudes para que los trabajadores se realizaran los exámenes médicos de retiro, se hizo la socialización del derecho de examen de retiro a un total de 15 personas.

No se ejecutaron exámenes periódicos, dado que para el periodo no aplican.

Para el presente periodo se realizaron 2 recomendaciones médicas originadas de los exámenes médicos de ingreso.

El contratista informa que dentro de las inducciones realizadas de acuerdo al ingreso de personal se socializan las políticas del SG-SST (Política del SG-SST y Política de no al consumo de sustancias psicoactivas, tabaco y alcohol) y los temas generales del SG-SST, dentro de las inducciones se incluyó el tema de la Política de Medio Ambiente.

Para el periodo de 26 de Febrero al 25 de Marzo de 2019, se realizaron 12 inducciones, con asistencia de 27 personas en total, las inducciones están soportadas con los registros y sus respectivas evaluaciones.

23

Los temas tratados en las inducciones son:

- Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
- Política de Tabaquismo, Alcoholismo
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Definición de AT y EL
- Uso de Elementos de protección personal
- Sistema General de Seguridad Social
- Notificación de Riesgos
- Plan de Emergencias
- Notificación al derecho de examen Médico ocupacional.

El contratista informa que dentro del SG-SST del consorcio, se implementa el manual de contratistas, el cual debe acogerse cada una de las organizaciones subcontratadas por el consorcio, con el fin de garantizar el cumplimiento a todo lo concerniente a la Seguridad y Salud en el Trabajo, es decir, que de acuerdo a la implementación del documento mencionado, se está cumpliendo con los procedimientos de inducción debidamente soportados y documentados.

Se verifica todas Hojas de vida de Consorcio BCS Gutiérrez, estas cumplen con los requerimientos establecidos.

Formato de hoja de vida con actualización de datos del trabajador.

Contratista:

AG3 INGENIERIA: Se cuenta con el 100% de las Hojas de Vida. Equivalente a Trabajadores

CONSORCIO BCS-GUTIERREZ: Cuenta con el 100% de las Hojas de Vida, equivalente de 8 Trabajadores operativos, 100% 9 H.V del área administrativa.

Hojas de Vida de Subcontratistas:

BRUNO, CARLOS LEON, DANEL RODRIGUEZ, DATALEC INGENIEROS: JHON JAIRO PINEDA, METAL B SAS, ORLANDO EDMUNDO REVELO: 2 ESTRUCTURA METALICA, GRABRIEL PASTOR AGUILAR.

232

Aparte de los documentos pendientes se realizó las siguientes verificaciones:

- Se verifica que se realice a diario el registro del personal en el libro de obra (bitácora) y formato personal de contratista y formato de Interventoría (int-8 F. Informe diario de inspección v0 y int-40 f. personal del contratista v0) , en el cual se registra todo el personal de obra, tanto de contratista y de interventoría, Control de Dotación y EPP, Equipos, Maquinaria, Estado del tiempo, Control de Sumistro de Materiales, Registro de Control de Calidad de Materiales y Obras, Descripción General de las Principales Actividades Desarrolladas, dicho formato lo diligencia la Ing Residente, en donde se relaciona el personal administrativo y operativo como: director de obra, ingeniero residente, residente SISOMA, Contratita Topografía: Margarita Álvarez, Subcontratista AG3 Ingeniería, Arrieta SAS, Bruno Palomino, Contratista Mamposteria: Carlos Leon, Daniel Rodriguez, Contratista Tanque: Jhon Pineda, Contratista Eléctricos: DATALEC INGENIEROS, Contratista: Retroexcavadora: Orlando Edmundo Revelo, Contratista Cubierta: Metal B SAS.
- Se evidencia la entrada del personal de lunes a viernes en la jornada de la mañana en el horario de 7:00 am y la salida en horario de la tarde 5:00 pm; con su respectiva horario de almuerzo de 12:00 M a 1:00 P.M. los días sábados de 7:00 am a 12:00 pm del medio día. Tanto contratista como subcontratista.

5.2. PERSONAL ACTUAL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

CONTRATISTA	ACTIVIDAD	# TRABAJADORES
CONSORCIO BCS- GUTIERREZ	ADMINISTRACIÓN	9
	OBRA	5
AG3 INGENIERIA	CONDUCTORES -2 DE VOLQUETAS), -1 PAGARITA	3
	TOTAL	17
SUB CONTRATISTA	**ACTIVIDAD**	**# TRABAJADORES**
MARGARITA ALVAREZ	Topografia	2
ARRIETA SAS	Mamposteria,	6
BRUNO	Armado de Hierro, vaciado de concreto,	12
	Mamposteria	14

234

CARLOS LEON		
DANIEL RODRIGUEZ	Mamposteria	**25**
JHON JAIRO PINEDA	Armado de Hierro, vaciado de concreto,	**20**
DATALEC INGENIEROS	Instalación de sistema eléctricos	**7**
METAL B SAS	Estructura Metalica, Instalación de cubierta y escaleras	**4**
ORLANDO EDMUNDO REVELO	Retroexcavadora	**2**
GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO	Estuco, Pintura e Instalación de pisos	**9**
Subcontratistas TOTAL		**135**

A la fecha el personal ha tenido la siguiente rotación:

Nuevos = 19
Personal antiguo =66
Personal retirado = 16
Ingreso retiro = 2

6. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

6.1. Señalización y demarcación:

- Se verifica que los frentes de trabajo de la obra se encuentren demarcados y señalizados, dando cumplimento a la resolución 1016 de 1989. Artículo 11 (Numeral 17).

- Se inspecciona camilla, extintores y botiquines del campamento y los de los vehículos, se verifica que el extintor multipropósito (ABC) del contratista, (suministrado por el proveedor REPARAEQUIPOS MARTINEZ), esté cargado, presurizado, tenga el pasador de seguridad, tenga la fecha de recarga vigente, este rotulado, señalizado y se encuentre en un lugar visible, accesible y a disposición inmediata en caso de incendio.

- Se inspecciona que el botiquín de primeros auxilios que se encuentra en la obra, contenga los elementos establecidos por la RESOLUCIÓN 0705 DE 2007.

6.2. Vigilancia a las actividades propuestas para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

235

- Se verifica que el contratista realice actividades encaminadas a la prevención de accidentes y al mejoramiento de las condiciones laborales de acuerdo al cronograma de actividades de seguridad y salud en el trabajo (SST), que se ejecutan por el Residente SISOMA del contratista. Dando cumplimiento a la resolución 1016/89 y al Decreto 1443 de 2012, Resolución 1111 de 2017

- Se inspecciona que en las inducciones a los trabajadores se traten los temas conforme a cumplimiento de la legislación vigente en seguridad y salud en el trabajo.

- Se verifica que en el proceso de inducción se incluya los temas ambientales socializar política de consumo de sustancia psicoactivas, política vial, plan emergencia, temas ambientales.

TABLA DE INDUCCIONES		
TEMAS	**PROGRAMADAS**	**REALIZADAS**
Marco legal en seguridad, salud en el Trabajo y Medio Ambiente.	De acuerdo al número de trabajadores que ingresen en el mes	5
Política del SG-SST y MA		

6.3. Capacitation y entrenamiento

Se revisa el cronograma de capacitación y entrenamiento teniendo en cuenta que estas se realicen de acuerdo a los procesos que se ejecutan en la obra, a la fecha la empresa contratista BCS GUTIERREZ, han realizado las capacitaciones de acuerdo al cronograma mensual y anual propuesto.

Dando cumplimiento al 100% de las capacitaciones programadas

Durante lo corrido del periodo que abarca este informe, se realizaron capacitaciones al personal de la obra, correspondiente a los siguientes temas:

TEMA	ORIENTADOR
Seguridad de trabajo en alturas	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
*Higiene postural	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
*Riesgo eléctrico	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
*Prevención por trabajo en alturas	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS

136

*Condición de actos inseguros	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
Protección Auditiva	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
*Investigación de accidentes	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS

6.3.1. Charlas de seguridad diaria y precalentamiento

Se siguen realizando las charlas los Martes o Miércoles, por grupos guiadas al componente de SST y MA total 5 charlas programadas.

6.3.2 Actividades de prevención personal sintomática.

Durante del desarrollo de este periodo CONSORCIO BCS-GUTIERREZ no se realizaron actividades de prevención de la enfermedad, ni promoción de la salud.

Línea base de condiciones de salud.

CONSORCIO BCS-GUTIERREZ realiza el seguimiento a la línea base de condiciones de salud en las áreas que serán programadas

6.4 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

La empresa realiza la Entrega, reposición, inspección y mantenimiento de elementos de protección personal (EPP).

Para el Periodo del 26 Febrero al 25 de Marzo de 2019 se realizó la entrega de los siguientes Elementos de Protección Personal.

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD
1	Casco de seguridad	13
2	Gafa lente oscuro	20
3	Gafa lente claro	18
4	Tapa boca	70
5	Guantes reforzados	84
6	Tapa oído	21
7	Guantes caucho	36
8	Botas punteras en caucho	2
9	Barbuquejo	10

23)

10	Guantes nitrilo	3

El contratista realiza las inspecciones planeadas de EPP de acuerdo al programa de inspecciones planeadas y se verifica el uso de EPP al personal en obra.

El contratista da cumplimiento constante en la obra a la inspección de utilización y estado de los EPP acordes a la tarea, se realiza cambio de EPP de acuerdo a la necesidad, sobre todo se realiza cambio de guantes de vaqueta, sencillos y reforzados, de caucho, hilaza y gafas y protección auditiva tipo inserción

Adicionalmente a la entrega de elementos de protección personal, el consorcio hace entrega de la siguiente relación de dotación:

ITEM	DOTACION	CANTIDAD
1	Bota punta de acero	21
2	Pantalón (logo consorcio)	12
3	Camisa (logo consorcio)	12

Dicha dotación es entregada en su respectivo formato.

6.5 ACTIVIDADES DE SOPORTES DEL PLAN DE PREPARACIÓN Y ATENCIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA.

Se realizó inspección de extintor y botiquín de primeros auxilios ubicado en el campamento del contratista, almacén, volqueta Szp025, volqueta szp026 y minicargador.

7. DESCRIPCION GENERAL DE ACTIVIDADES.

Con el fin de dar a conocer las diferentes actividades que se desarrollan en el periodo se describe a continuación el avance de obra del área técnica, para tener un mejor entendimiento que debe realizar el área SST-MA, a continuación se describe las actividades del área técnica así:

- Excavación mecánica, cargue y desalojo de material.
- Localización de ejes y niveles.
- Levante de muros.
- Relleno subestación eléctrica y alrededor del tanque RCI.
- Realización de pañetes casino, subestación y oficiales.
- Relleno con material alrededor del área de patrulleros.
- Instalación de tubería hidrosanitaria e hidráulica.
- Instalación de tubería eléctrica.
- Instalación de cableado para la red eléctrica en el bloque 3, nivel 1
- Fundida de solado de tanque de RCI.
- Colocación de cubierta.
- Cerramiento en polisombra.
- Construcción de cajas sanitarias.
- Fundida de columnetas, vigacinta, dinteles.
- Pañete dentro del tanque RCI.
- Aplicación de IGOOL alrededor del tanque RCI.
- Replanteo para iniciar actividades de construcción en Gimnasio
- Refuerzo de acero para Gimnasio.
- Enchape de pared de baños primer piso bloque 3.
- Estuco de paredes internes, bloque 3, primer piso.
- Pintura de paredes internas, bloque 3 primer piso.
- Estuco acrílico en paredes de escaleras de acceso al segundo nivel.
- Conformación de escaleras metálicas en los tres bloques (pasamanos).
- Repello en fachadas laterales bloque 1.
- Repello de fachada principal y trasera bloque 3.
- Terminación de muros de baños en el bloque 1 primer piso.
- Repello de filos (carteras), bloque 1 y 3, segundo nivel.
- Reubicación de campamentos de almacenes de subcontratistas.

8. INFORME GESTION SOCIAL.

8.1 ACTIVIDADES PRINCIPALES

No se cuenta con guarda de seguridad, dado que la obra se encuentra ubicada dentro de las instalaciones de la Policía Metropolitana de Popayán y cuenta con cerramiento perimetral en malla verde.

El contratista instalo Cámaras de Seguridad, para brindar mejor soporte referente al tema de seguridad.

Hasta le fecha no se registró sugerencias, quejas o reclamos del área externa.

9. INSPECCIONES

Durante el presente periodo se desarrollaron las siguientes inspecciones por parte del área SISOMA del Contratista BCS Gutierrez:

TIPO DE INSPECCIÓN	FRECUENCIA
Inspecciones de botiquín de primeros Auxilios	Mensual
Inspección de extintores	Mensual
Inspección de camilla	Mensual
Inspección orden y aseo	Semanal
Inspecciones de Equipos y Herramientas	Mensual
Inspección pre operacional de Vehículos y Maquinaria	Diaria
Inspección de elementos de protección Personal	Cada quince días
Inspección para Permisos de Trabajo en Alturas	De acuerdo a los trabajos ejecutados en Alturas
Inspección ambiental	Semanal
Inspección de observación de Comportamiento	Semanal

Todas las inspecciones están soportadas en los formatos correspondientes.

10. AUSENTISMO LABORAL GLOBAL

A continuación, se hace la relación de ausentismo general global discriminado de la siguiente manera:

Nota. La NTC 3793 en el numeral 3.2.1. De ausentismo laboral, manifiesta lo siguiente, "El periodo se puede tomar en meses o años, se recomiendan cortes mensuales.

240

ALG = AUSENTISMO LABORAL GLOBAL

Días perdidos no relacionados con la salud: 112 días= 896 horas

Días perdidos por accidentes de trabajo: 4 días = 32 horas

Días perdidos relacionados con enfermedad general 12 días: 96 horas

Total, días perdidos: 128 días = 1.024 horas

Tiempo programado en el periodo: 28 días

Total, personal del proyecto en el periodo: 85 personas

Tiempo de trabajo programado en el periodo (trabajador x horas día x días semana x número semana) = 22.950

$$ALG = \frac{\text{Tiempo de trabajo perdido en el periodo} * 100}{\text{Tiempo de trabajo programado en el mismo periodo}}$$

ALG = 1024/22950* 100 = 4,46%

Para un total de 85 personas del contratista, significa que de cada 100 horas trabajadas se presenta el 4,46 % de pérdida de tiempo para el periodo.

11. ACCIDENTALIDAD EN LA OBRA DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2019.

Durante este periodo se presentó 1 accidente laboral al siguiente trabajador:

El 05 de marzo se presentó un accidente por golpe en pierna izquierda, por escalera metálica al señor Milton Humberto Pipicano ayudante de obra, el cual fue atendido, no genero mayor significancia para incluir en los indicadores.

A continuación, se presenta el listado de personal con la estadística.

291

TABLA 2. ÍNDICES DE ACCIDENTALIDAD DEL MES DE 26 ENERO AL 25 FEBRERO 2019 **Periodo**	**Total, trabajadores**	**Total, accidentes de trabajo**	**Accidentes mortales**	**HHT**	**No. Días perdidos acumulados**	**IF**	**IS**	**ILI**	**LETALIDAD**
07 junio – 25 junio	12	0	0	1376	o	0.00	0.00	0.00	0.00
26 junio – 25 julio	22	0	0	4008	25,5	0.00	0.00	0.00	0.00
26 julio – 25 agosto	20	1	0	6884	47	1923,08	1923,08	3698,22	0.00
26 agosto – 25 septiembre 2018	70	0	0	15120	3	0.00	0.00	0.00	0.00
26 septiembre – 25 octubre 2018	75	1	0	10125	12	19,75	237	4,68	0.00
26 octubre – 25 noviembre 2018	72	0	0	9720	20	0	412	0	0.00
26 noviembre -25 diciembre 2018	74	2	0	9.990	54	40.04	1.081	43,29	0.00
26 diciembre – 25 enero 2019	71	1	0	9585	67	20.87	1.398	29,17	0.00
26 enero -25 febrero 2019	82	2	0	22140	142	18.07	1.283	23.18	0.00
26 febrero – 25 marzo 2019	85	1	0	22950	125	8,71	1,089	9,49	0.00

I.F.: Indice de frecuencia: No. de accidentes/HHT*K
I.S.: Indice de severidad: No. días de perdidos ó Días cargados/HHT*K
I.L.I: Indice de lesiones incapacitantes: IF*IS/1000
K: 200000

12. BRIGADAS DE EMERGENCIA

Para este periodo no se realizó capacitación a la Brigada de Emergencia.

El Contratista cuenta con un Kit de Emergencia:

Campamento: 1 Botiquín, camilla inmovilizadora y extintor de 20 lb

Además cada vehículo cuenta con su respectivo extintor y botiquín.

La camilla de emergencia y el extintor se encuentran ubicados en el campamento a la entrada de fácil acceso, debidamente identificados y señalizados

13. SANEAMIENTO BÁSICO

Se da cumplimiento a los aspectos básicos de servicios sanitarios, para ello se cuenta con los siguientes servicios:

4 baterías sanitarias con la siguiente distribución:

1 batería sanitaria con lava manos destinada para el servicio de mujeres

1 batería sanitaria con lavamanos destinada a los ingenieros hombres de la obra

2 baterías sanitarias destinadas para el servicio de trabajadores en general

Un orinal en la parte de atrás de los baños.

Se hace aseo de acuerdo al procedimiento de orden y aseo cada 3 días o dependiendo de la necesidad.

14. COPASST DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Para lo corrido del presente periodo, el día el 26 de Febrero al 25 de Marzo de 2019 no se realizó reunión del COPASST.

Para lo corrido del presente periodo, el día 11 de marzo se realizó reunión con la participación de los integrantes que conforman el COPASST, donde se trataron los siguientes temas: Manejo de agua por manguera dañada, solicitud de otra dotación de pantalón y camisa para el personal de obra, despejar y mantener limpias áreas de trabajo en obra, socialización del retiro de puntillas, orden y aseo, supervisar a que el personal que realiza trabajo en alturas use adecuadamente los equipos de seguridad. El personal fue atento y se comprometieron hacer seguimiento a cada uno de los temas tratados.

15. COMITÉ DE CONVIVENCIA

No se realizó actividades relacionadas con el comité de convivencia laboral

43

16. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

A continuación, se presenta el seguimiento a las actividades desarrolladas por el contratista

PARAMETRO A EVALUAR	CALIFICACION MENSUAL	ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO
Todo el personal directo e indirecto que labora en la obra se encuentra afiliado a una ARL, EPS Y AFP, el ingreso a la obra, se encuentra al día en el pago, se lleva registro semanal en el formato correspondiente. Y se tiene el procedimiento para verificar la afiliación al sistema y este contiene las medidas a aplicar por el contratista en caso de incumplimiento en la obligación y se ejecuta según lo estipulado	100%	El 100% de los trabajadores cuentan con la seguridad social vigente
El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial se encuentra publicado en un lugar visible del campamento, está socializado y se cuenta con los soportes respectivos.	100%	El reglamento se encuentra publicado en la cartelera informativa del consorcio desde, de igual forma se hace la socialización en las inducciones
La política SST, se socializa a todo el personal de la obra, firmada por el representante legal, se encuentra en lugar visible y se cuenta con los soportes respectivos	100%	El contratista realiza la socialización de la política de seguridad y salud en el trabajo en las inducciones
El COPASST o VIGIA, se reúne en forma mensual, cuenta con el cronograma de reuniones, Plan de Trabajo General de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión cumpliendo con la normatividad legal vigente	100%	Reunión con el COPASST
Se cumple el plan de	100%	Se realizó inducción a todo el

244

Capacitación, Inducción y Entrenamiento.		personal de la obra
Todos los trabajadores son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	100%	Se realizó la notificación de riesgos a todo el personal del proyecto.
Los contratistas cumplen con los compromisos adquiridos en los Comité SST-MA.	100%	Cumplimiento a las observaciones de la auditoria.
Se notifica a la Interventoría todas las novedades del personal (reingresos, cambios de cargo cambios de empleador y retiro) inmediatamente se presentan	100%	El contratista hace entrega vía correo electrónico por solicitud de Interventoría, la documentación correspondiente a seguridad social de los trabajadores
Se efectúa examen médico de ingreso/periódico/egreso (este último el empleador entrega la orden al trabajador y la presenta a Interventoría), por cargo, se realiza por médico especialista en SST-MA. y con la información se mantiene actualizado el diagnostico de condiciones de salud del personal.	100%	Se presentaron exámenes médicos a todas las personas que permanecieron en la obra
Se cuenta con botiquín que contiene la dotación básica.	100%	El contratista cuenta en campamento con botiquin de primeros auxilios, con elementos necesarios para brindar el servicio ante cualquier eventualidad.
Se realizan actividades de promoción y prevención	N.A.	Para el periodo en mención no se realizaron actividades de promoción y prevención.
Las instalaciones provisionales cuentan con vistieres, donde los espacios son suficientes y adecuados para el manejo de ropas, implementos personales y EPP	100%	Se cuenta con tres vistieres, distribuidos uno para el personal de cada subcontratista.

Se posee 1 baño por cada 15 trabajadores y el baño recibe mantenimiento y limpieza periódica.	100%	Los baños se mantienen en buenas condiciones y estos se realizan los mantenimientos dos veces por semana, se cuenta con tramo 1=1, , tramo 2=2, , tramo 3= 1,tramo 4= 2; tramo 5=2, punto crea=2 baños fijos, total baños =10
Se entregan los EPP que cumplan con las normas de garantía de calidad, de acuerdo a la matriz aprobada y se lleva un registro formal de entrega	100%	El contratista tiene los formatos de entrega de elementos de protección personal y se entrega la dotación a todo el personal en total se hizo 26 entregas de EPP al personal de obra y se realiza reposición de acuerdo a la necesidad
Los trabajadores usan adecuadamente los EPP de acuerdo a la actividad y matriz aprobada.	100%	En los recorridos a diario que se realizan se verifica el uso de los elementos de protección personal, por tal motivo estos se encuentran en buen estado y lo usan
Las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con procedimientos de seguridad.	100%	Se cuenta con hojas de seguridad de las sustancias químicas utilizadas en el periodo se encuentra los siguientes: • • Cemento • • ACPM • • GASOLINA • • IMPERMEABILIZANTE SIKA1
Se implementan los permisos de trabajo para las labores de alto riesgo, y cumple los Procedimientos y/o estándares definidos.	100%	Se implementa permisos de trabajo en alturas
Se cuenta con procedimientos documentados y/o estándares de trabajo seguro por cada proceso constructivo u operación, los socializa, actualiza y se ejecutan según	100%	El contratista entrega todos procedimientos según los resultados de la matriz de peligros

246

lo establecido.		
Se tienen documentadas las estadísticas mensuales de ausentismo se presentan a interventoría con el análisis y acciones correctivas/preventivas correspondiente	100%	Para el presente periodo no se presentaron ausentismos relacionados con causas ATEP.
Se realizan las inspecciones establecidas en el programa	100%	Se realiza inspección a volquetas revisión, maquinaria, botiquín, extintor, uso de epp.
Se capacitan a todos los trabajadores en el plan de emergencia y tiene soportes.	100%	En las inducciones se realizó la socialización del plan de emergencias.
Se han conformado las Brigadas de emergencia, están activas, especializadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento mensual, se ejecuta y existen los soportes.	100%	Se encuentran identificadas

17. GESTIÓN DE MANEJO AMBIENTAL

MAQUINARIA EQUIPOS Y VEHICULOS.

Para el periodo del 26 de Febrero al 25 de Marzo de 2019, se realizó trabajos con la Retro-Excavadora y el vibro compactador, del contratista Orlando Edmundo Revelo.

Para el presente periodo ingresaron al proyecto los siguientes equipos vehículos y maquinaria.

17.1 VEHICULOS

EHICULOS **TIPO DE VEHICULO**	**PLACA**	**NOMBRE DEL CONDUCTOR**	**FECHA DE INGRESO**
Volqueta	SZP 026	Milton Gustavo	11/08/2018

		Castillo Bajaca	
Volqueta	SZP 025	Raúl Alexander Moreno Suarez	11/08/2018
Tractocamión	FLP894	Jairo Hernando Diaz	01/12/2018
Tractocamión	SWN046	William Cardono	07/12/2018
Camión	VAD086	Anderson López	15/12/2018
Volqueta	OYJ-223	Javier Oswaldo Bolaños	23/01/2019
Volqueta	CIZ-640	Nelson Olmedo Montilla	23/01/2019
Volqueta	GUE-406	Aurelio Oswaldo Bolaños	23/01/2019
Camión	NKN085	Juan Diego Gurrute	02/02/2019
Camión	SOQ149	Jhon Fredy Montilla	09/02/2019
Camión	SWN852	Olimpo Velasquez	11/02/2019
Camión	SXKS17	Arcesio Soto	11/02/2019
Tractocamioón	THY068	Tarcisio Pabon Campos	03/02/2019

17.2 MAQUINARIA

AQUINARIA **TIPO DE MAQUINARIA**	**REFERENCIA**	**NOMBRE OPERARIO**	**FECHA DE INGRESO**
Minicargador	218	CARLOS URIEL CAMPO	20/09/2018
Excavadora	420 E	Flavio Chañag	11/08/2018
Excavadora	PC200-5	Orlando Muñoz	14/11/2018
Excavadora	JCB214E	MILTON CESAR MACA	15/12/2018
Vibrocompactador	CA-15 DYNAPAC	MIGUEL MONTAÑO LAGO	18/12/2018
Excavadora	JCB214E	ORLANDO MUÑOZ	25/01/2019
Excavadora	KOMATSU	GERMAN CHALPARIZA	05/02/2019

Para el periodo objeto de este informe se tiene que se cuenta con los documentos de volquetas como:

Licencia de transito
*SOAT
*Tecno mecánica

*Licencia de conducción del señor

Adicionalmente a las volquetas se adjunta la documentación de la maquinaria (ver anexo 7. Documentación Vehículos y maquinaria).

No. De vehículos con documentos requeridos vigentes
_____ * 100= 13/13= 100%
No. De vehículos en obra

No. De acciones cumplidas
_____ * 100
No. De acciones propuestas aplicables en el periodo

Para este mes no se realizaron acciones que requirieran de cumplimiento, es por esta razón que el segundo indicador del programa no aplica

18. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Se dispone en campamento tres recipientes para disposición de residuos ordinarios

Cantidad de residuos especiales, peligrosos, reciclables entregados en empresa autorizada
_____ * 100
Cantidad de residuos especiales, peligrosos, reciclables generados en periodo

330 kg (reciclable entregado)
= _____ * 100= 100%
330 kg (reciclable generado)

La entrega de material reciclable se hace a través de la asociación de recolectores de materiales reciclables de Popayán "aremarpo", quien para este periodo certifica la recolección.

150 kg (ordinario entregado)
= _____ * 100 = 100%
150 kg (ordinario generado)

La entrega de residuos ordinarios se hace a través de la ruta de recolección que realiza la empresa Serví Aseo; como evidencia se presente registro fotográfico en el punto de recolección ubicado en zona del comando.

249

La entrega de residuos peligrosos o especiales se hace a través de la empresa ASERHI, dando cumplimiento al indicador.

$$= \frac{\text{21 Kg (Residuos peligrosos en obra)}}{\text{21 kg (Residuos peligrosos en obra)}} * 100 = 100\%$$

La distribución de los recipientes corresponde a:

3 recipientes para recolección en oficina
4 recipientes para recolección de residuos en baños
5 recipientes del punto ecológico donde se hace la separación y clasificación de residuos según código de colores.

19. MANEJO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

Se realizan excavaciones movimiento de tierra en obra, el cual es dispuesto en la escombrera Revelo, quien cuenta con permiso, otorgado por la corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), (ver Anexo 4. Permiso escombrera y solicitud aprovechamiento)

Para el cual se tiene la siguiente relación:

20. CONTROL VIAJES DISPOSICION DE MATERIAL

ITEM	FECHA	PLACA	CAPACIDAD	MATERIAL	No. RECIBO	L. DISPOSICION	TOTAL X DIA
1	26/02/2019	SZP026	15	ESCOMBROS	451	REVELO	15
2	26/02/2019	SZP025	15	TIERRA	452	REVELO	15
3	26/02/2019	SZP025	15	TIERRA	454	REVELO	15
4	26/02/2019	SZP025	15	TIERRA	455	REVELO	15
5	26/02/2019	SZP026	15	TIERRA	456	REVELO	15
6	26/02/2019	SZP026	15	TIERRA	457	REVELO	15
7	27/02/2019	SZP026	15	TIERRA	458	REVELO	15
8	26/02/2019	SZP026	15	TIERRA	459	REVELO	15
9	5/03/2019	OYJ223	7	TIERRA	467	REVELO	7
10	5/03/2019	OYJ223	7	TIERRA	468	REVELO	7

11	5/03/2019	OYJ223	7	TIERRA	469	REVELO	7
12	6/03/2019	OYJ223	7	TIERRA	472	REVELO	7
13	6/03/2019	GUE408	7	TIERRA	473	REVELO	7
14	6/03/2019	GUE408	7	TIERRA	474	REVELO	7
15	7/03/2019	SZP026	15	TIERRA	475	REVELO	15
16	8/03/2019	OYJ223	7	TIERRA	476	REVELO	7
17	8/03/2019	GUE408	7	TIERRA	477	REVELO	7
18	8/03/2019	GUE408	7	TIERRA	481	REVELO	7
19	8/03/2019	OYJ223	7	TIERRA	482	REVELO	7
20	8/03/2019	GUE408	7	TIERRA	483	REVELO	7
21	8/03/2019	GUE408	7	TIERRA	484	REVELO	7
22	9/03/2019	GUE408	7	TIERRA	486	REVELO	7
23	9/03/2019	GUE408	7	TIERRA	487	REVELO	7
24	9/03/2019	OYJ223	7	TIERRA	488	REVELO	7
25	9/03/2019	GUE408	7	TIERRA	489	REVELO	7
26	11/03/2019	GUE408	7	TIERRA	496	REVELO	7
27	12/03/2019	OYJ223	7	TIERRA	500	REVELO	7
28	12/03/2019	GUE408	7	TIERRA	501	REVELO	7
29	12/03/2019	GUE408	7	TIERRA	502	REVELO	7
30	12/03/2019	OYJ223	7	TIERRA	503	REVELO	7
31	12/03/2019	SZP026	15	TIERRA	504	REVELO	15
32	12/03/2019	SZP026	15	TIERRA	505	REVELO	15
33	12/03/2019	SZP026	15	TIERRA	506	REVELO	15
34	12/03/2019	SZP026	15	TIERRA	507	REVELO	15
35	12/03/2019	SZP025	15	TIERRA	508	REVELO	15
36	12/03/2019	SZP025	15	TIERRA	509	REVELO	15
37	12/03/2019	SZP025	15	TIERRA	510	REVELO	15
38	12/03/2019	SZP025	15	TIERRA	511	REVELO	15
39	13/03/2019	SZP025	15	TIERRA	512	REVELO	15
40	13/03/2019	SZP025	15	TIERRA	513	REVELO	15
41	13/03/2019	SZP025	15	TIERRA	514	REVELO	15
42	13/03/2019	SZP026	15	TIERRA	506	REVELO	15
43	13/03/2019	SZP026	15	TIERRA	515	REVELO	15
44	13/03/2019	SZP026	15	TIERRA	516	REVELO	15
45	13/03/2019	SZP026	15	TIERRA	517	REVELO	15
46	14/03/2019	OYJ223	7	TIERRA	519	REVELO	7
47	14/03/2019	OYJ223	7	TIERRA	521	REVELO	7
48	15/03/2019	OYJ223	7	TIERRA	523	REVELO	7
49	15/03/2019	SZP026	15	TIERRA	525	REVELO	15
50	15/03/2019	SZP026	15	TIERRA	526	REVELO	15
51	15/03/2019	SZP025	15	TIERRA	527	REVELO	15
52	15/03/2019	SZP026	15	TIERRA	528	REVELO	15
53	15/03/2019	SZP026	15	TIERRA	529	REVELO	15
54	15/03/2019	SZP026	15	TIERRA	532	REVELO	15

55	15/03/2019	OYJ223	7	TIERRA	531	REVELO	7
56	16/03/2019	SZP026	15	TIERRA	533	REVELO	15
57	18/03/2019	SZP026	15	TIERRA	534	REVELO	15
58	18/03/2019	SZP026	15	TIERRA	535	REVELO	15
59	23/03/2019	SZP025	14	ESCOMBROS	536	REVELO	14
TOTAL							**684**

VOLQUETA	N. DE VIAJES	CANTIDAD M3
SZP025	12	179M3
SZP026	22	330M3
GUE408	12	84M3
OYJ223	13	91M3
TOTAL	**684M3**	

PORCENTAJE APROVECHAMIENTO MATERIAL		
MANEJO	**No. VIAJES**	**CANT.M3**
DISPOSICION FINAL	59	684
APROVECHAMIENTO	0	0
% DISPOSICIÓN FINAL	59	100%
GENERACIÓN DE MATERIAL		

$$\frac{\text{Cantidad de escombros y material de excavación dispuestos correctamente en m3}}{\text{Cantidad de escombros y material de excavación generados en el mes}} * 100$$

= (684/684) *100= 100%

Los valores acumulados respecto al mes anterior son los siguientes:

Los valores acumulados respecto al mes anterior son los siguientes:

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES				
PERIODO	DISPOSICION FINAL		APROVECHAMIENTO	
	No. VIAJES	CANT .M3	No. VIAJES	CANT.M3
7 junio al 25 de junio	0	0	0	0
26 junio al 25 julio	90	958	12	180
26 julio al 25 agosto	25	371,25	19	284,5
26 agosto al 25 septiembre	14	206,41	22	330
26 septiembre al 25 octubre	26	389,5	3	45
26 octubre al 25 noviembre	9	135	0	0
26 noviembre al 25 diciembre	17	255	0	0
26 diciembre al 25 enero	13	195	0	0
26 enero al 25 de febrero	94	1082	18	270
26 de febrero al 25 de marzo	59	684	0	0

En este mes se hace disposición en la escombrera del señor Orlando Edmundo Revelo, de cual se anexa la documentación pertinente.

Dando cumplimiento a los lineamientos de la resolución 472 de 2017, el consorcio radicara ente la CRC el programa de manejo ambiental de RCD.

21. USO EFICIENTE DE AGUA

Se anexa lecturas del mes, que se han tomado conjuntamente con interventoría:

CONSUMO DE AGUA						
ITEM	FECHA LECTURA	No. INTERNO	MARCA	No. CONTADOR	LECTURA M3	CONSUMO MENSUAL (M3)
1	03/03/2019	# 1	COLTAVIRA S.A.	2942770	0809,9	82,80

Consumo de agua actual –consumo mes anterior

Consumo de agua mes _____ x 100 = (82,80 - 228,20/82,80) * 100 = 255,32%

El consumo de agua por parte del proyecto es de 255,32%

Se evidencia que no se ha hecho una educación respecto al consumo de agua en el mes.

No. de eliminación de fugas
_____* 100 = 3/3* 100 = 100%
No. de fugas halladas

Se presenta daño en manguera ubicada en zona de obra, el cual es reparado de inmediato

22. MANEJO DE FAUNA

No. de Nidos reubicados
_____ * 100
No. de nidos hallados

No. de especies entregadas a la CRC o PCA
_____ * 100
No. de avistamiento de especies en obra sin manejo

Para el presente periodo no se realizó tala de árboles, por tanto, tampoco identificación de posibles aves.

Para el siguiente periodo la Corporación Regional del Cauca dio cumplimiento con la visita el día 8 de marzo, realizado por funcionaria Leidy Joana Gómez Astudillo, según RESOLUCIÓN No. (01490) del 31 de Agosto de 2018 CRC, donde informa que se da cumplimiento con el 100 % de las obligaciones establecidas en la anterior Resolución. (Ver ANEXO 7. Documento por verificación de cumplimiento por CRC, Acta de visita)

23. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL EN OBRA COMPONENTE AMBIENTAL

Se realiza charla por grupos guiados al componente ambiental correspondiente al tema de manejo de residuos generados en obra.
No. de charlas realizadas
_____* 100 = (2/2) * 100 = 100%
No. charlas programadas
No. de asistentes a las charlas de un promedio
_____*100 = (20/20) *100= 100%

254

No. de asistentes a obra

Ver anexo . Capacitación componente ambiental

24. TRABAJO EN ALTURAS

- ✓ Uso adecuado de ESTINGA y ARNES por cada trabajador que realiza dicha actividad.
- ✓ Hojas de vida de ARNES y ESLINGA usados y firmados por el trabajador.
- ✓ Permiso en alturas y con las respectivas firmas de los trabajadores antes de realizar las actividades.
- ✓ Uso de escaleras, las cuales cuentan con las condiciones y materiales necesarios para labor a desempeñar.
- ✓ Uso de andamios certificados para la labor, armado de forma completa, las actividades realizadas permiten asegurar el andamio a la estructura.
- ✓ Se cuenta con uso de líneas de vida horizontal para los trabajos en altura.
- ✓ Se usan ganchos como puntos de anclaje resistentes a la actividad.
- ✓ Los trabajadores usan sus epp apropiados para cada actividad a realizar.
- ✓ Se adecuan las áreas de ingreso, como son escalera, puentes, para acceso y cada una de las áreas, dando cumplimiento a PTSA.
- ✓ Actualmente se está utilizando una pluma, ubicado en el segundo piso del bloque de casino, para transporte de material, la cual esta operada por personal capacitado por parte del Consorcio para operarla, para lo cual el operador utiliza EPP para T.S.A.
- ✓ Realización de curso en alturas avanzado y reentrenamiento de personal obra, en SENA Cauca.
- ✓ Personal de obra realizo curso de alturas en SENA Popayán Cauca

25. OTROS

- ✓ Planilla por pago de Seguridad Social.
- ✓ Oficio radicado a CRC, por información de cumplimiento a compensación forestal.
- ✓ Documento visita de CRC, para verificación de cumplimiento a obligaciones establecidas en Resolución 1490 de 31 de agosto de 2018.

26. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJOS

La interventoría le solicita al contratista a través del residente SSTMA, el procedimiento y formatos mensuales utilizados para el control de accidentes e incidentes de trabajo, con el fin de verificar el cumplimiento que determina la Resolución 1401 del 2007 la cual tiene como objeto establecer obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, con el fin de identificar las causas, hechos y situaciones que los han generado, e implementar las medidas correctivas encaminadas a eliminar o minimizar condiciones de riesgo y evitar su recurrencia. Y al decreto 1072 DE 2015 donde se establece como componente la investigación de accidentes e incidentes,

259

no conformidad y acciones correctivas y preventivas. **Se verificaron los formatos del informe de investigación de accidentes e incidentes de trabajos y se evidencia el cumpliendo con lo establecido en la resolución 156 de 2005.**

Se realizó la investigación de Accidente de trabajo y su respectiva socialización del plan de acción.

27. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Par presente periodo, se presentó 1 A.T. para lo cual el contratista realizo la investigación del mismo, dando cumplimiento a la Resolución 1401 del 2007, se Realizó la respectiva socialización del evento, como proceso de retroalimentación al personal, todo con el propósito de que no se vuelvan a presentar este tipo de eventos.
- Se dio cumplimiento con la realización de curso avanzado en alturas y reentrenamiento de personal de obra, en SENA Popayán Cauca.
- Se cumplió con la entrega y uso de elementos de protección personal, en lo referente a casco, gafas, guantes de vaqueta, caucho, tapabocas, botas de seguridad y de caucho con puntera y uniforme.
- El personal que realiza trabajo en alturas, se retroalimento frente al tema, para prevención de AT, por caída de alturas, se verifica que el personal utilice los EPP para TS.A. de forma adecuada, tales como Arnés, Eslinga, Cascos, andamios certificados.
- Se realiza disposición final de 684 M3 de tierra de excavación generada en obra, en escombrera Rebelo autorizada por la autoridad ambiental competente.
- Se realiza disposición final de 21 Kg de residuos peligrosos generados en obra tales como, guantes, tapabocas, botas, tapabocas, residuos de plástico contaminado en obra, polisombra contaminada, los cuales fueron recibidos por la empresa ASERHI.
- Se realizo entrega de 330 Kg de residuos reciclables generados en obra, a empresa AREMARPO autorizada por autoridad competente Popayán Cauca.
- Consorcio BCS- Gutiérrez Cumple con la correcta disposición de residuos generados en obra a través de los gestores autorizados.

256

- Consorcio BCS- Gutiérrez Cumple con la correcta disposición de residuos generados en obra a través de los gestores autorizados.
- Diariamente se realiza jornada de aseo al finalizar las actividades en obra.
- Se realiza aseo a baños cada ocho días, baños permanecen limpios, lavado de llantas para que permanezca la vía limpia.
- Se realiza la respectiva señalización y cerramiento de la áreas intervenidad.
- Se da cumplimiento a inspecciones de vehículo/maquinaria, botiquín, extintor, uso de epp, orden y aseo, equipos y herramientas, permiso de trabajo para actividades en alturas diariamente.
- Se da cumplimiento a lo establecido en procedimiento de vehículos con la verificación documental de SOAT, Revisión técnico mecánica, Licencia de conducción, inspecciones al vehículo y mejora de los mismos

28. Se realizan los siguientes requerimientos en Seguridad y Salud en el trabajo al contratista:

✓ Seguir Manteniendo las áreas de circulación y rutas de evacuación limpias y despejadas.

✓ Completar las hojas de vida pendientes, de los subcontratistas:

- BRUNO: 1
- METAL B SAS: 2
- ORLANDO EDMUNDO REVELO: 2

29

28. LISTA DE ANEXOS ENVIADOS POR EL CONTRATISTAS

ANEXO 1. Capacitaciones
ANEXO 2. Certificado Escombrera Orlando Revelo
ANEXO 3. Charlas
ANEXO 4. Documentos Verificación CRC Compensación Arboles
ANEXO 5. Examen de Ingreso
ANEXO 6. Hojas de Vida
ANEXO 7. Inducciones
ANEXO 8. Inspecciones
ANEXO 9. Permisos Trabajo en Alturas
ANEXO 10. Planilla Pago de Seguridad Social
ANEXO 11. Recomendaciones

Se anexa informe mensual del contratista, con los soporte de indicadores mensuales, de SST y MA. Establecidos hasta el momento.

ELABORÓ:

ROSA DEL MAR RODRIGUEZ G.
RESIDENTE SISOMA
INTERVENTORÍA DAIMCO S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO # 1 Verificación de uso de EPP










REGISTRO FOTOGRAFICO # 2 Verificación de acceso cumplimiento de procedimientos T.S.A







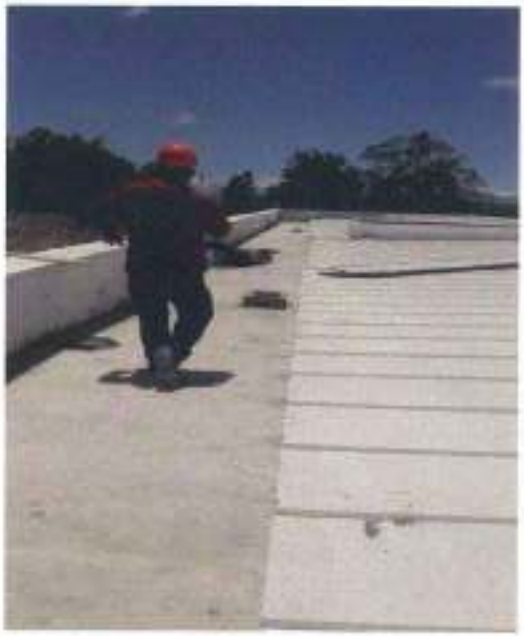

280

REGISTRO FOTOGRAFICO # 3 Verificación de Áreas de Trabajo, Orden y Aseo










261

REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATISTA CONSORCIO BCS GUTIÉRREZ

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
Foto 1. Charla de Seguridad de trabajo en Alturas	Foto 2. Charla en Prevención de accidentes para trabajo en alturas
	
Foto 3. Charla en Condiciones y aptos inseguros	Foto 4. Charla en Protección Auditiva
	
Foto 5. Capacitación en Higiene Postural	Foto 6. Capacitación Investigación de Accidentes.

262

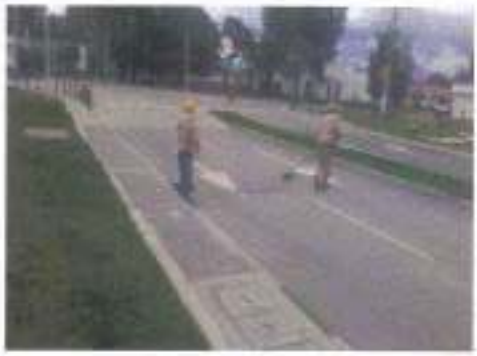	
Foto 7. Capacitación Riesgo Electrico	Foto 8. Capacitación reunión con el COPASST
	
Foto 9. Jornada de Orden y Aseo	Foto 10. Trabajo en alturas usando equipos de seguridad
	
Foto 11. Limpieza vía	Foto 12. Áreas despejadas

203



Foto 13. Perosnal en obra usando EPP



Foto 14. Avisos colocados en obra



Foto 15. Avisos colocados en obra



Foto 16. Equipo de primeros auxilios en obra



Foto 17. Escalera instalada en obra



Foto 18. Cargue de escombros

264



Foto 19. Recolección de residuos peligrosos



Foto 20. Recolección de residuos reciclebles



Foto 21. Residuos de desperdicios de alambre generados en obra



Foto 22. Acopio de Madera

265

Foto 14. Componentes de Elementos de Primeros Auxilios







266

ORLANDO EDMUNDO REVELO INGENIERO CIVIL
CONTRATISTA NIT. 12.976.085 -8

CALLE 18 N No 16-15 TEL: 8366180 Popayán

Popayán, octubre 27 de 2018

Señores
CONSORCIO BCS - GUTIERREZ
La ciudad.

REF. CERTIFICACION SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RCD "LA LAJITA"

Yo, **ORLANDO EDMUNDO REVELO**, identificado con cedula de ciudadanía No 12.976.085 de Pasto (N), en mi calidad de propietario del sitio de disposición final de **RCD** denominado **"La lajita"** ubicada a dos kilómetros de Popayán en la vía al Tambo, CERTIFICO que estuvo a disposición de **CONSORCIO BCS-GUTIERREZ** identificado con nit. **901.177.394-5.** para recibir escombros y materiales sobrantes de la obra cuyo objeto es: **CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN NRO 4.**

FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	CANTIDAD DEPOSITADA EN M3
13-08-2018	23-08-2018	356.25
06-09-2018	28-09-2018	551.66
01-10-2018	19-10-2018	360

Para constancia se expide a los (27) días del mes de octubre de 2018

ORLANDO EDMUNDO REVELO
C.C. No. 12.976.085

ORLANDO EDMUNDO REVELO INGENIERO CIVIL
CONTRATISTA NIT. 12.976.085 -8

CALLE 18 N No 16-15 TEL: 8366180 Popayán

Popayán, Marzo 15 de 2019

Señores
CONSORCIO BCS - GUTIERREZ
La ciudad.

REF. CERTIFICACION SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RCD "LA LAJITA"

Yo, **ORLANDO EDMUNDO REVELO**, identificado con cedula de ciudadanía No 12.976.085 de Pasto (N), en mi calidad de propietario del sitio de disposición final de **RCD** denominado **"La lajita"** ubicada a dos kilómetros de Popayán en la vía al Tambo, CERTIFICO que estuvo a disposición de **CONSORCIO BCS-GUTIERREZ** identificado con nit. **901.177.394-5.** para recibir escombros y materiales sobrantes de la obra cuyo objeto es: **CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN NRO 4.**

FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	CANTIDAD DEPOSITADA EN M3
19-10-2018	30-10-2018	15
16-11-2018	20-11-2018	75
4-12-2018	21-12-2018	270
25-01-2019	31-01-2019	75
4-02-2019	26-02-2019	1127

Para constancia se expide a los (15) días del mes de marzo de 2019

ORLANDO EDMUNDO REVELO
C.C. No. 12.976.085

268

ORLANDO EDMUNDO REVELO INGENIERO CIVIL
CONTRATISTA NIT. 12.976.085 -8

CALLE 18 N No 16-15 TEL: 8366180 Popayán

Popayán, marzo 27 de 2019

Señores
CONSORCIO BCS - GUTIERREZ
La ciudad.

REF. CERTIFICACION SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RCD "LA LAJITA"

Yo, **ORLANDO EDMUNDO REVELO**, identificado con cedula de ciudadanía No 12.976.085 de Pasto (N), en mi calidad de propietario del sitio de disposición final de **RCD** denominado **"La lajita"** ubicada a dos kilómetros de Popayán en la via al Tambo, CERTIFICO que estuvo a disposición de **CONSORCIO BCS-GUTIERREZ** identificado con nit. **901.177.394-5.** para recibir escombros y materiales sobrantes de la obra cuyo objeto es: **CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN NRO 4.**

FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	CANTIDAD DEPOSITADA EN M3
05/03/2019	23/03/2019	519

Para constancia se expide a los (27) días del mes de marzo de 2019

ORLANDO EDMUNDO REVELO
C.C. No. 12.976.085

Anexo No. 9 control de Equipos y Ensayos.

DAIMCO

Diseño, Asesoría, Interventoría, Montaje, Mantenimiento y Construcción

EQUIPO DEL CONTRATISTA INT-41:01

PROYECTO: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

EQUIPO		(A)	(B)	(C) CLASE DE ACTIVIDAD EN CADA DIA																																
TIPO	MARCA -CAPACIDAD			VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
		ORIGEN	ESTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	MINICARGADOR NEW HOLLAND	P	B	C1.	C1.		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5			C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5			
2	VOLQUETA DAEWOO- SZP25	P	B	C1.	C1.		C1.	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C1.	C1.	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5			C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5			
3	VOLQUETA DAEWOO- SZP26	P	B	C1.	C1.		C.1.5	C.1.5	C1.	C1.	C1.	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5			C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5			
4	VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO - CA-15 DYNAPAC	A	B	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5			C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5			
5	RETROEXCAVADORA JCB214E	A	B	C1.	C1.		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5			C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5				
6	Aurelio Oswaldo Bolaños Placa: GYJ223 8 Mts3	A	B					C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5			C.1.5		C.1.5	C.1.5																		
9	VOLQUETA SUBCONTRATISTA Aurelio Oswaldo Bolaños Placa: GUE-408 8 Mts3	A	B						C.1.5		C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5																				

(A) ORIGEN
P- Propio
A- Alquilado
S- Sub-contratado

(B) ESTADO
B-Bueno
R-Regular
M-Malo

(C) CLASE DE ACTIVIDAD
1. Movilización y Desmovilización
2. Localización, Replanteo y Control Topográfico
3. Demolición General
4. Excavaciones
5. Relleno Material Seleccionado
6. Hincado de Pilotes
7. Concreto _____ PSI
8.Acero de Refuerzo
9. Protección con Bolsacretos
10. Coldfacretos

F.S. Fuera de Servicio
R. Reparación
D. Disponible

OBSERVACIONES

ING. RESIDENTE

Elaboró: SANDRA GUAUÑA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - TIRSO COSME

Aprobó

Fecha de Aprobación de Formato INT-41:00, 30 de Abril de 2018

Ensayos

Citec Ltda.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
Popayán - Cauca

REGISTRO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO			Código:	CT-RCC-0801
			Versión:	1
			Páginas:	1 de 1
NORMAS REFERENCIA:	INV. E-401, E-402, E-403, E-404, E-410, E-412	NTC 673	Fecha Formato:	12-ene-2015

FECHA INFORME: 25-feb-19

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN.

SECTOR: COMANDO REGIÓN N°4 POLICIA NACIONAL CAUCA, POPAYÁN.

INTERVENTOR: DAIMCO

CONSTRUCTOR: CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

SOLICITÓ: DAIMCO

FECHA ENTRADA: 11-ene-19

ODS: 894

RESISTENCIA DE DISEÑO: 3000 Psi

ESTRUCTURA: VARIAS

Ref. N°	Fecha Toma	Fecha Rotura	Edad días	Perímetro cm	Carga Lb	Resistencia KN	kg/cm²	MPa	PSI	Tipo Falla	% CUMPLIMIENTO RESISTENCIA	DETALLE OBRA
1	17-dic	14-ene	28	48.4	58077	228.2	125	12.2	1773	1	59%	SOLADO TANQUE
2	17-dic	14-ene	28	48.3	61971	243.5	134	13.1	1899	1	63%	
3	17-dic	11-feb	56	48.4	76070	298.9	164	16.0	2322	1	77%	
4	18-dic	15-ene	28	48.4	140801	553.6	303	29.7	4300	2	143%	VIGA CUBIERTA PATRULLEROS
5	18-dic	15-ene	28	48.4	140308	551.3	302	29.6	4282	2	143%	
6	18-dic	12-feb	56	48.4	142724	560.8	307	30.0	4356	2	145%	
7	20-dic	17-ene	28	48.4	114058	451.7	247	24.2	3509	1	117%	COLUMNA 2do PISO E3
8	20-dic	17-ene	28	48.4	115664	469.8	257	25.2	3649	1	122%	
9	20-dic	14-feb	56	48.4	127555	501.2	274	26.9	3893	2	130%	
10	21-dic	18-ene	28	48.4	141095	554.4	303	29.7	4306	2	144%	VIGAS COLUMNA PATRULLEROS
11	21-dic	18-ene	28	48.4	141477	555.9	304	29.8	4318	2	144%	
12	21-dic	15-feb	56	48.4	141833	557.3	305	29.9	4329	2	144%	
13	22-dic	19-ene	28	48.3	140668	552.8	304	29.7	4312	2	144%	COLUMNAS SUB OFICIALES
14	22-dic	19-ene	28	48.4	140077	550.4	301	29.5	4275	2	143%	
15	22-dic	16-feb	56	48.4	141706	556.8	305	29.8	4325	2	144%	
16	28-dic	25-ene	28	48.3	100369	393.2	216	21.2	3057	1	102%	PLACAS CONTRAPISO COLUMNAS SUB OFICIALES
17	28-dic	25-ene	28	48.4	103073	405.0	222	21.7	3146	1	105%	
18	28-dic	22-feb	56	48.4	110657	434.8	238	23.3	3377	1	113%	

OBSERVACIONES: MUESTRAS INGRESADAS AL LABORATORIO POR EL INTERESADO

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: F-337 — EXPEDIDO POR: SIMM METROLOGIA S.A.S

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21-ene-19 — VIGENCIA: 21-ene-21

LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO APLICAN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA INGRESADA Y PROCESADA EN LABORATORIO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACION DEL INGENIERO DE CALIDAD DE CITEC Ltda.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Gebt. Juan Carlos Ponce	Ing. Hugo Daza Delgado	

Citec Ltda.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
Popayán - Cauca

REGISTRO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO		Código:	CT-RGO-0001
		Versión:	1
		Página:	1 de 1
NORMAS DE REFERENCIA: INV. E-401, E-402, E-403, E-404, E-410, E-413 NTC 673		Fecha Formato:	12-ene-2010

FECHA INFORME: 18-feb-19
OBRA: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN.
SECTOR: COMANDO REGIÓN N°4 POLICIA NACIONAL CAUCA, POPAYÁN.
INTERVENTOR: DAIMCO
CONSTRUCTOR: CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
SOLICITÓ: DAIMCO
FECHA ENTRADA: 21-ene-19
ODS: 211

RESISTENCIA DE DISEÑO: 3000 PSI
ESTRUCTURA: VARIAS

Ref. N°	Fecha Toma	Fecha Rotura	Edad días	Perímetro cm	Carga Lb	Resistencia kN	kg/cm²	MPa	PSI	Tipo Falla	% CUMPLIMIENTO RESISTENCIA	DETALLE OBRA
1	17-ene	21-ene	4	48.2	83732	368.3	203	19.9	2885	1	96%	CONCRETO ACELERADO
2	17-ene	14-feb	28	48.4	118546	468.8	255	25.0	3618	1	121%	
3	17-ene	14-feb	28	48.3	120124	472.0	259	25.4	3681	1	123%	

OBSERVACIONES: MUESTRAS INGRESADAS AL LABORATORIO POR EL INTERESADO

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: F - 337 EXPEDIDO POR: SIMM METROLOGIA S.A.S.
FECHA DE EXPEDICIÓN: 21-ene-19 VIGENCIA: 21-ene-21

LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO APLICAN UNICAMENTE A LA MUESTRA INGRESADA Y PROCESADA EN LA BORATORIO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DE CALIDAD DE CITEC Ltda.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Gabriel Elías Carrera Ponce	Ing. Hugo Daza Delgado	

Citec Ltda.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
Popayán - Cauca

REGISTRO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO		Código:	CT-REG-0501
		Versión:	1
		Página:	1 de 1
NORMA DE REFERENCIA:	NTC 673	Fecha Formato:	12-ene-2018

FECHA INFORME: 07-mar-19
OBRA: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
SECTOR: COMANDO REGIÓN N°4 POLICIA NACIONAL CAUCA, POPAYAN.
INTERVENTOR: DAIMCO
CONSTRUCTOR: CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
SOLICITÓ: DAIMCO
FECHA ENTRADA: 05-feb-19 ODS: 936

RESISTENCIA DE DISEÑO: 3000 Psi
ESTRUCTURA: VARIAS

Rel. N°	Fecha Toma	Fecha Rotura	Edad días	Perímetro cm	Carga Resistencia La	kN	kg/cm²	MPa	Psi	Tipo Falla	% CUMPLIMIENTO RESISTENCIA	*Proyección a 28d	DETALLE OBRA
83	28-ene	04-feb	7	48.3	135496	532.4	292	28.6	4153	1	104%		TANQUE DE ALMACENAMIENTO
84	28-ene	25-feb	28	48.4	141633	557.3	305	29.9	4329	1	108%		
85	28-ene	25-feb	28	48.7	140713	553.9	299	29.3	4242	1	106%		
86	31-ene	05-feb	5	48.5	46497	182.7	100	9.8	1425	1	48%		COLUMNETAS PATRULLEROS 1er PISO
87	31-ene	28-feb	28	48.4	62327	244.9	134	13.1	1902	1	63%		
88	31-ene	05-feb	5	48.4	33823	132.9	73	7.1	1032	1	34%		COLUMNETAS OFICIALES 1er PISO
89	31-ene	07-feb	7	48.3	40058	157.4	86	8.5	1228	1	41%	1754	
90	02-feb	09-feb	7	48.2	95641	375.8	207	20.3	2943	1	74%	4205	TORR TANQUE ALMACENAMIENTO
91	02-feb	02-mar	28								0%		
92	02-feb	02-mar	28								0%		

OBSERVACIONES: MUESTRAS INGRESADAS AL LABORATORIO POR EL INTERESADO
*Proyección aproximada solicitada por el cliente

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: F - 337 EXPEDIDO POR: SIMM METROLOGIA S.A.S
FECHA DE EXPEDICION: 21-ene-18 VIGENCIA: 21-ene-21

LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO APLICAN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA INGRESADA Y PROCESADA EN LABORATORIO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DE CALIDAD DE CITEC Ltda.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Gept. Luis Carlos Ponce	Ing. Hugo Cuaa Delgado	

vias95@hotmail.com www.citec.com.co Teléfono: 8386256 Cel:310 8393670 - 301 3368684

Anexo No. 10 Registro Fotográfico

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:10

POLICIA NACIONAL

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CÓDIGO: **PROYECTO:** 05-6-10044-18
Donde POPAYAN - CAUCA
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES: mar-19

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Foto No. 1 Fecha: 03-03-2019

DETALLE TANQUE RED CONTRAINCENDIO



Foto No.2 Fecha: 03-03-2019

FUNDICION TANQUE RED CONTRAINCENDIO



Foto No.3 Fecha: 04-03-2019

DETALLE GENERAL INTERNO BLOQUE PATRULLEROS



Foto No. 4 Fecha: 04-03-2019

DETALLE REPELLOS BLOQUE DE PATRULLEROS

24

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:10

POLICIA NACIONAL

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CÓDIGO: **PROYECTO:** 08-8-10044-18
Donde POPAYAN - CAUCA
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES: mar-19

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Foto No.5 Fecha: 05-03-2019

DETALLE DE ESTRUCTURA METALICA -PUENTE ENTRE BLOQUE OFICIALES Y CASINO



Foto No.6 Fecha: 06-03-2019

DETALLE DE ESTUCOS BLOQUE OFICIALES



Foto No.7 Fecha: 08-03-2019

DETALLE DE TANQUE DE RED CONTRAINCENDIO DESPUES DE LA FUNDICION



Foto No.8 Fecha: 08-03-2019

DETALLE DE PRESENCIA DE AGUAS SUBTERRANEAS EN AREA DE TANQUE DE RED CONTRAINCENDIO

8x2

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventoría, Montaje, Mantenimiento y Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:10

POLICIA NACIONAL

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CÓDIGO: **PROYECTO:** 06-6-10044-18
Donde POPAYAN - CAUCA
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES: mar-19

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Foto No.9 Fecha: 08-03-2019

DETALLE DE CAJA PARA AGUAS SANITARIAS 80X80



Foto No.10 Fecha: 08-03-2019

DETALLE DE EXCAVACION



Foto No.11 Fecha: 08-03-2019

DETALLE DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO TANQUE DE ALAMCENAMIENTO



Foto No.12 Fecha: 08-03-2019

DETALLE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TANQUE DE ALMACENAMIENTO

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:10

POLICIA NACIONAL

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CÓDIGO: **PROYECTO:** 06-6-10044-18
Donde POPAYAN - CAUCA
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES: mar-19

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Foto No.13 Fecha: 11-03-2019

DETALLE DE FUNDICION MUROS TANQUE DE REDCONTRAINCENDIO

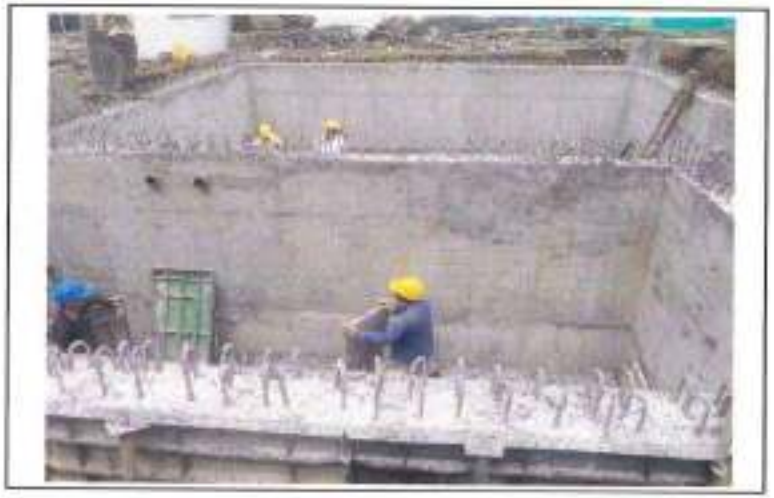


Foto No.14 Fecha: 11-03-2019

DETALLE DESPUES DE FUNDICION TANQUE RED CONTRAINCENDIO



Foto No.15 Fecha: 12-03-2019

DETALLE GENERAL DE OBRA



Foto No.16 Fecha: 12-03-2019

DETALLE PASILLO BLOQUE PATRULLEROS



Foto No.17 Fecha: 12-03-2019

DETALLE ESCALERAS METALICAS



Foto No.18 Fecha: 12-03-2019

DETALLE GENERAL DE OBRA BLOQUE CASINO, SUBESTACION Y OFICIALES



Foto No.19 Fecha: 12-03-2019

DETALLE GENERAL DE OBRA BLOQUE SUBESTACION Y AREAS EXTERNAS

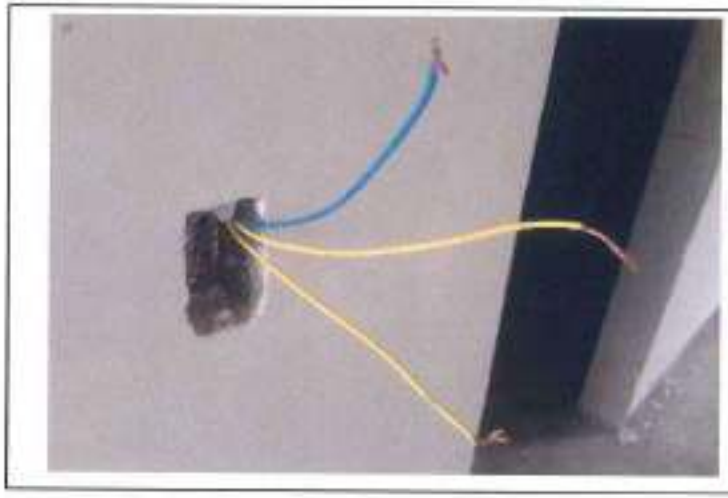


Foto No.20 Fecha: 12-03-2019

SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN CABLE 12 AWG

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:10

POLICIA NACIONAL

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITROS FIJOS SIN REAJUSTE

CÓDIGO: **PROYECTO:** 06-6-10044-18
Donde POPAYAN - CAUCA
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES: mar-19

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Foto No.21 Fecha: 13-03-2019

DETALLE FORMALETA TAPA TANQUE DE RED CONTRAINCENDIO



Foto No.22 Fecha: 13-03-2019

DETALLE DE PRUEBAS HIDROSTATICAS A LA RED HIDRAULICA



Foto No.23 Fecha: 13-03-2019

DETALLE GENERAL DE OBRA



Foto No.24 Fecha: 14-03-2019

DETALLE DE ARMADO DE HIERRO PARA TAPA DE TANQUE RED CONTRAINCENDIO

282

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventoría, Montaje, Mantenimiento y Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:10

POLICIA NACIONAL

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CÓDIGO: **PROYECTO:** 06-6-10044-18
Donde POPAYAN - CAUCA
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES: mar-19

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Foto No.25 Fecha: 14-03-2019

DETALLE GENERAL DE OBRA-AREA TANQUE DE ALAMACENAMEINTO



Foto No.26 Fecha: 14-03-2019

DETALLE GENERAL CUBIERTA BLOQUE DE PATRULLEROS



Foto No.27 Fecha: 14-03-2019

DETALLE GENRAL DE OBRA, BLOQUE PATRULLEROS Y CASINO



Foto No.28 Fecha: 14-03-2019

DETALLE GENRAL DE AREA TANQUE RED CONTRAINCENDIO

785

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:10

POLICIA NACIONAL

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CÓDIGO: **PROYECTO:** 06-6-10044-18
Donde POPAYAN - CAUCA
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES: mar-19

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Foto No.29 Fecha: 15-03-2019

DETALLE GENRAL DE FUNDICION TAPA RED CONTRAINCENDIO



Foto No.30 Fecha: 18-03-2019

APLICACION IGOL TANQUE RED CONTRAINCENDIO



Foto No.31 Fecha: 18-03-2019

DETALLE AGUAS SUBTERRANEAS EN AREA DE TANQUE REDCONTRAINCENDIO



Foto No.32 Fecha: 18-03-2019

DETALLE DE PAÑETES EN AREAS EXTERNAS BLOQUE DE OFICIALES

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:10

POLICIA NACIONAL

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CÓDIGO: **PROYECTO:** 06-6-10044-18
Donde POPAYAN - CAUCA
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES: mar-19

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Foto No.33 Fecha: 21-03-2019

DETALLE AGUAS SUBTERRANEAS EN AREA DE TANQUE REDCONTRAINCENDIO



Foto No.34 Fecha: 21-03-2019

DETALLE DE CONSTRUCCION DE ALFAGIAS BLOQUE DE OFICIALES



Foto No.35 Fecha: 21-03-2019

DETALLE DE ALFAGIAS



Foto No.36 Fecha: 21-03-2019

DETALLE DE INSTALACION DE SALIDAS DE ILUMINACION

282

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:10

POLICIA NACIONAL

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CÓDIGO: **PROYECTO:** 06-6-10044-18
Donde POPAYAN - CAUCA
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES: mar-19

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Foto No.29 Fecha: 28-03-2019

DETALLE DE REPELLOS EXTERNOS EN BLOQUE DE OFICIALES



Foto No.30 Fecha: 28-03-2019

DETALLE DE INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA



Foto No.31 Fecha: 28-3-2019

DETALLE DE REPELLOS INTRNOS BLOQUE PATRULLEROS



Foto No.32 Fecha: 28-03-2019

DETALLE DE ALISTADO DE PISOS SEGUNDO PISO BLOQUE DE OFICIALES

926

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56.10

POLICIA NACIONAL

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CÓDIGO: **PROYECTO:** 06-6-10044-18
Donde POPAYAN - CAUCA
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES: - mar-19

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Foto No.33 Fecha: 28-03-2019

DETALLE DE ALFAGIAS



Foto No.34 Fecha: 28-03-2019

DETALLE GENERAL DE OBRA, BLOQUE PATRULLEROS Y CASINO



Foto No.35 Fecha: 28-03-2019

DETALLE GENERAL DE OBRA, BLOQUE PATRULLEROS Y CASINO



Foto No.36 Fecha: 28-03-2019

DETALLE DE PRUEBA HIDRAULICA

Anexo No. 11 Control de Clima

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

CONTROL ATMOSFÉRICO INT-39:00

PROYECTO: CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL	CONTRATISTA: CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

CONSOLIDADO DEL PERIODO

MES	mar-19																														
ESTADO DEL TIEMPO	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
DIA SOLEADO	0,9	1	1	0,9	1	1	1	1	1	1	0,8	1	1	1	1	1	1	1	0,8	0,8	0,6	0,8	1	1	1	1	1	1	0,8	1	1	**29,22**
DIA NUBLADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00**
LLUVIA	0,1	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,4	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	**1,78**
TOTAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**31,00**
ESTADO DEL SUELO	S																															

Nota: Estado del Suelo Seco (S), Saturado (ST), Inundado (I)

OBSERVACIONES

ING. RESIDENTE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA - TIRSO COSME
Elaboró SANDRA GUAUÑA	Aprobó

NOTAS

(1) INFORMACION RELACIONADA EN EL INFORME DIARIO DE INSPECCION **INT-8:00**

(2) CONTINÚE AL RESPALDO SI REQUIERE DE MAYOR ESPACIO

Anexo No. 12 Bitácora de Obra

Viernes 01 Marzo 2019

- Personal en Obra
  - Personal Administrativa BCS Gutierrez
  - Personal Operativa BCS Gutierrez (Conductores Volqueta, Operador minicargador, Operador Retroexcavadora, Operador Vibrocompactador, Ayudantes Carlos, Oficiales Carlos, Ayudantes Daniel, Oficiales Daniel, Hidraulicas, 3 Ayudantes Generales Oficina, Ayudantes Bruno, Oficiales Bruno, Ayudantes tanques, Oficial tanque)
  - Arrieta SAS: Oficiales, Ayudantes.
  - Metal B SAS: Personas en Cubierta.
  - Datelec Ing. Elec: Personas en Instalaciones Eléctricas.
- Clima: Mañana: Nublado tarde lluvias
- Equipos: Volquetas, Minicargador, Vibrocompactador, Retroexcavadora.
- Elementos de Seguridad Industrial: Casco, Botas, Gafas, Guantes, tapaoidos, tapabocas, Uniforme, Chaleco,
- Actividades ejecutadas:
  - Columnetas y Vigas en 1er y 2do Piso Patrulleros y 2do Piso Oficiales.
  - Mamposteria bloque liso #5 en 1er y 2do Piso Patrulleros y 2do Piso Oficiales.
  - Repellos en 1er y 2do Piso en bloque Patrulleros y Segundo Piso Oficiales.
  - Acero de refuerzo en Tanque RCI
  - Excavacion para retrazado de tuberias de desagüe paralelo tanque RCI
  - Instalacion estructura metálica para puentes en Casino a oficiales y cubierta a Patrulleros.

Residente Interventoria.

→ EL CONTRATISTA NO ANEXA REGISTRO FOTOGRA—

Scanned by CamScanner

LECCION DE AGUAS EN ZONAS DE TANQUES
SE MANTIENEN EN USO LAS MOTOBOMBAS. MAC.
SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DEL CAMBIO DE TUBERIA SOLICITADO POR LA INTERVENTORIA.
COMO SE OBSERVA DESDE LAS REDES VIEJAS DEL ALCANTARILLADO BLANCO SIGUE BROTANDO AGUA PORQUE HAN SEGUIDO HACIENDO USO DE EL, AÚN ASI SE ADELANTA CAMBIO DE REDES MAC.











Scanned by CamScanner

EN ZONA TANQUE DE REALZA INSTALACION CINTA PVC. Y SE AVANZA CON FORMALETA. TANQUE RCI. SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PUENTE Y CUBIERTAS INSTALADAS N/A/C.

*DOMINGO 3 MARZO - HAY JORNADA LABORAL HOY. N/A/C.

Lunes 4 de Marzo 2019

- Personal en Obra.
- Personal Administrativo BCS Gutierrez
- Personal Operativo BCS Gutierrez. (1 Operador minicargador, 2 Conductores Volqueta, 1 Operador Vibrocompactador, 1 Operador Retroexcavadora, 3 Ayudantes Generales Oficina, Ayudantes Carlos, Oficiales Carlos, Ayudantes Daniel, Oficiales Daniel, Hidraulicos, Ayudantes Bruno, Oficiales Bruno, Ayudantes Tanque, Oficial tanque)
- Arrieta SAS:
- Metal B SAS: 4 Personas Instalacion estructura Graderia
- Datalec Ing. Elec: 4 Personas Instalaciones Electricas.
- Clima: Mañana
- Equipos: Volquetas, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Minicargador.
- Elementos de Seguridad Industrial: Casco, Botas, Gafas, Guantes, tapabocas, tapaoidos, Chaleco, Uniforme.
- Actividades ejecutadas:
- Mamposteria en 1er y 2do Piso bloque 1 Patrulleros, 2do Piso bloque 3 Oficiales.
- Vigas y Columnetas de Confinamiento en 1er y 2do Piso bloque 1 Patrulleros y 2do Piso modulo 3 Oficiales.
- Repellos en 1er y 2do Modulo bloque 1 Patrulleros y 2do Piso bloque 3 Sin Oficiales.
- Instalacion de Puentes Metalicos para circulación Casino.

Scanned by CamScanner

EN ZONA TANQUE DE REALIZA INSTALACION CINTA PVC. Y SE AVANZA CON FORMALETA. TANQUE RCT. SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PUENTE Y CUBIERTAS INSTALADAS N/A.

DOMINGO 3 MARZO - HAY JORNADA LABORAL HOY. N/A.

Lunes 4 de Marzo 2019

- Personal en Obra.
- Personal Administrativo BCS Gutierrez
- Personal Operativo BCS Gutierrez. (1 Operador minicargador, 2 Conductores Volqueta, 1 Operador Vibrocompactador, 1 Operador Retroexcavadora, 3 Ayudantes Generales Oficina, Ayudantes Carlos, Oficiales Carlos, Ayudantes Daniel, Oficiales Daniel, Hidraulicos, Ayudantes Bruno, Oficiales Bruno, Ayudantes Tanque, Oficial tanque)
- Arrieta SAS:
- Metal B SAS: 4 Personas Instalacion estructura Graderia
- Datalec Ing. Elec: 4 Personas Instalaciones Electricas.
- Clima: Mañana
- Equipos: Volquetas, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Minicargador.
- Elementos de Seguridad Industrial: Casco, Botas, Gafas, Guantes, tapaoidos, tapaoidos, Chaleco, Uniforme.
- Actividades ejecutadas:
- Mamposteria en 1er y 2do Piso bloque 1 Patrulleros, 2do Piso bloque 3 Oficinas.
- Vigas y Columnetas de Confinamiento en 1er y 2do Piso bloque 1 Patrulleros y 2do Piso modulo 3 Oficinas.
- Repellos en 1er y 2do Modulo bloque 1 Patrulleros y 2do Piso bloque 3 Stk Oficiales.
- Instalacion de Puentes Metalicos para circulación Casino.

Scanned by CamScanner

- Instalaciones tuberia y Construccion de Caja para traslado de Red paralela tanque RC1
- Hierro tanque RC1
- Observaciones:

Revisar detalles de repellos en plomos y acabado y los resanes en Instalaciones hidrosanitarias y electricos.

- EL CONTRATISTA REALIZA INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS PARA DAR AL SERVICIO HOY LAS NUEVAS REDES SANITARIAS DEL ALMACENAMIENTO VIEJO.






SE AVANZA EN ARMADO DE REFUERZO TANQUERIA EN RELLENOS JUNTO A TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA.

Martes 5 Marzo 2019.

- Personal en Obra
  - Personal Administrativo BCS Gutierrez.
  - Personal Operativo BCS Gutierrez (1Operador Minicargador, 2 Conductores Volqueta, 1Operador Retroexcavadora, 1 Operador Vibrocompactador, 3 Ayudantes Grales Oficinas, Ayudantes Carlos, Oficiales Carlos, Ayudantes Daniel, Oficiales Daniel, Hidraulicos, Ayudantes Bruno, Oficiales Bruno, Ayudantes tanque, Oficiales tanque)
  - Arrieta SAS.
  - Metal B SAS: 4 personas Instalación Estructura.

Scanned by CamScanner

metalica Curadas
- Datalec Ing. Eléctrica: 4 Personas en Instalaciones Electricas
- Personal Administrativo Daimco SAS.
- Clima: mañana Soleada tarde.
- Equipos: Valquetas, Retroexcavadora, Vibrocompactador, Minicargador
- Elementos de Seguridad Industrial: Casco, Botas, Guantes, Gafas, tapaoidos, tapabocas, Uniforme, Chaleco.
- Actividades Ejecutadas:
- Mampos feria 1er y 2do Piso modulo 7 Patrulleros 2do Piso modulo 3 Oficiales
- Repelles en 1er y 2do Piso modulo 7 Patrulleros y 2do piso modulo 3 Oficiales
- Vigas y Columnetas de confinamiento en bloque 1 y bloque 3.

Res. Interventoría.

- AYER INGRESA ING. CIVIL JESID PANTOJA COMO AUXILIAR INSPECTOR CONSORCIO
- Observaciones día 04 de marzo de 2019
- Durante la fundida, se evidencio aguas subterraneas, se solicita al contratista darle manejo con la implementación de más motobombas y/o cunetas con desviacion ya que no eran suficiente una sola motobomba y un tubo de desviación.
Durante el proceso de fundida, se solicita la suspension de la fundida, ya que concreto y aguas subterraneas se empezaron a mezclar corriendo el riesgo de alterar las caracteristicas del concreto de 4000 PSI
- El dia 02 de marzo Hd. el contratista realizo la debida corrección de empalme instalación en tubería de aguas lluvias donde se encontraba tubería lisa y tubería corrugada, haciendo el cambio del trayecto entre cajas 13 y 13' a tubería corrugada realizando el empalme tecnicamente correcto.

Ing Sandra C. Ruiz P.
Interventora.

⇒ EL CONTRATISTA REALICE MANEJO DE AGUAS DURANTE LA.

Scanned by CamScanner

FUNDICION DEL TANQUE, BAJO SUPERVISION PERMANENTE DE LA INTERVENTORIA

Miercoles 6 Marzo 2019

- Personal en Obra
- Personal Administrativo BCS Gutierrez
- Personal Operativo BCS Gutierrez (1 Operador minicargador, Conductor Volqueta, Operador Vibrocompactador, Operador Retroexcavadora, Ayudantes Generales Oficina, Ayudantes Carlos, Oficiales Carlos, Ayudantes Daniel, Oficiales Daniel, Hidraulicos, Ayudantes tanque, Oficiales tanque, Ayudantes Bruno, Oficiales Bruno)
- Arrieta SAS: Ayudantes
- Metal B SAS: 3 Personas en Instalacion de la estructura de la Grada.
- Datalec Ing. Elec: 4 Personas en instalaciones electricas.
- Gabriel Aguilar: 3 Personas en Acabados (Estuco
- Personal Administrativo de DAIMCO SAS Interventoria
- Clima: Mañana
- Equipos: Volquetas, Vibrocompactador, Minicargador Retroexcavadora.
- Elementos de Seguridad Industrial: Casco, Botas, Guantes, Gafas, Chaleco, Uniforme, Tapaoidos, tapabocas.
- Actividades ejecutadas:
- Repellos en 1er y 2do Piso Bloque 1 Patrulleros y 2do Piso bloque 3 Oficiales.
- Columnetas y Cintas confinamiento en 1er y 2do piso bloque 1 Patrulleros y 2do Piso bloque 3 Oficiales.
- Instalacion Malla de Gallinero enFachada para Repellos.

Scanned by CamScanner

- Rellenos y excavaciones en áreas perimetrales.
- Observación día 07 de marzo de 2019
  - Se realiza seguimiento de parte de interventoría al estado del tanque RCI, observando presencia en muros, centro y parte de muro, con exposición de hierro especificamente en el área del paso de tanque de llenado, allí también en el área de pegunes a abscisa una capa blanquezca y alta el concreto blando.
  - Se observa en bloque de oficinas, (columnetas) curas realizadas en columnetas con exposición del hierro
  - A la fecha no se han realizado la demolición de las columnetas de bloque oficinas.
  - Se solicita al contratista certificados del concreto usado para la fundición del tanque RCI
  - Se da inicio de pegados desde el día 22 de marzo sin cambios estructurales en concreto en bloque de oficinas
  - Se solicita al contratista tomar las medidas necesarias de las observaciones anteriormente escritas.

Ing. Sindy [illegible]
Interventoría.

→ EL CONTRATISTA REALIZA DETALLADO DEL TANQUE CONFORME LO ACORDADO CON LA INTERVENTORÍA SE LES SUMINISTRA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO UTILIZADO. DE IGUAL MANERA SE REALIZA EL DETALLADO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN LOS BLOQUES.

→ EL CONCRETO COLOCADO EN TANQUE RCI LO SUMINISTRO TAMBIEN LA EMPRESA ARECO, ES UN CONCRETO PREFABRICADO DE 4000 PSI CON BAJA PERMEABILIDAD.

→ LOS PAÑETES EN LOS BLOQUES SE ADELANTAN EN ALGUNOS SECTORES Y SIMULTANEAMENTE EN OTROS SECTORES SE AVANZA CON ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.

Scanned by CamScanner

Jueves 7 marzo 2019

- Personal en Obra:
  - Personal Administrativo BCS Gutierrez
  - Personal Operativo BCS Gutierrez (1 Operador mini cargador, 2 Operadores Volqueta, 1 Operador Retro excavadora, 1 Operador Vibrocompactador, 3 Ayudantes Generales Oficina, Ayudantes Carlos, Oficiales Carlos, Ayudantes Daniel, Oficiales Daniel, 3 Hidraulicos, Ayudantes Bruno, Oficiales Bruno, Ayudantes Grales, Oficiales Generales)
  - Arrieta SAS: 5 Persona en Obra
  - Gabriel Aguilar: 3 oficiales
  - Metal B SAS: 3 personas en estructura escaleras
  - Datalec Ing. Elec: 4 personas en (instalaciones electricas)
  - Personal Administrativo de DAIMCO SAS
- Clima. Mañana: Soleado
- Equipos: Volquetas, Retroexcavadora, Vibrocompactador, Minicargador.
- Elementos de Seguridad Industrial: Casco, Botas, Guantes, Tapabocas, tapaoidos, Chaleco, Uniforme.
- Actividades ejecutadas:
  - Cajas inspeccion para instalaciones Electricas,
  - Estuco Primer Piso blogue 3 Oficinales.
  - Instalacion estructura para Cielo Raso 1er Piso blogue 3 Oficinales
  - Rellenos Perimetrales bloques 1 y 3
  - Instalacion estructura para puente blogue 3 a Casino
  - Instalación equipos de Bombeo tanque de almacenamiento
  - Repellos 1er y 2do Piso blogue 1 Patrulleros

Scanned by CamScanner

→ SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA PARA RECIBO DE PAÑETES Y APROBACION DE ZONAS PARA ADELANTAR ESTUCO.
→ SE AVANZA EN INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CIELOS EN LAS ZONAS APROBADAS POR INTERVENTORIA.
→ EL CONTRATISTA CONSULTA SI TANTO PUENTES COMO CUBIERTAS DEBEN LLEVAR ROTULAS EN TODOS LOS EXTREMOS.
→ SE TRABAJA EN DIFERENTES FRENTES y DE ADELANTA DETALLADO GENERAL

Viernes 8 de Marzo 2019

- Personal en Obra
- Personal Administrativo BCS Gutierrez
- Personal Operativo BCS Gutierrez (1 Operador Minicargador, 2 Conductores Volqueta, 1 Operador Retroexcavadora, 1 Vibrocompactador, 2 Inspectores, 3 Ayudantes Generales Oficina, 4 Ayudantes Carlos, 1 Oficial Carlos, 11 Ayudantes Daniel, 5 Oficiales Daniel, 5 Hidraulicos 5 Ayudantes Bruno, 5 Oficiales Bruno, 16 Ayudantes Jhon Jaire, 2 Oficiales Jhon Jaire)
- Arrieta SAS: 2 Oficiales, 1 Ayudante.
- Metal B SAS: 1 persona en estructura Metalica.
- Datalec Ing. Elec: 5 Personas en Instalaciones Electricas • Gabriel Aguilar 3 Personas Estuco,
- Personal Administrativo Interventoria DAIMCO SA
- Clima: Mañana: Soleado.
- Equipos: 2 Volquetas, 1 Minicargador, 1 Retroexcavadora, 1 Vibrocompactador.
- Elementos de Seguridad: Casco, Botas, Guantes, Tapabocas, Tapaoidos, Gafas, Chaleco, Uniforme
- Actividades Ejecutadas:
- Instalacion Estructura metalica Gradas Bloque 3 Oficinas.

Scanned by CamScanner

- Rellenos áreas Perimetrales Bloques 1 y 3.
- Repellos 1er y 2do Piso Bloque 1 Patrulleros y 2do Piso bloque 3 Oficiales.
- Columnetas 1er Piso y 2do bloque 1 Patrulleros
- Estuco 1er Piso bloque 3 Oficiales.
- Remate Mamposteria 2do Piso bloque 1 Patrulleros. Interventoría

→ CON COMPAÑIA DE LA INTERVENTORIA SE CONFIRMA LA UBICACION DE ESCALERA EN BLOQUE 3 Ofic.









SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES

Sabado 9 Marzo a 29 de Marzo / 2019

- Personal en Obra:
- Personal Administrativo BCS Gutierrez
- Personal Operativo BCS Gutierrez (1 Operador Minicargador, 2 conductores Volqueta, 1 Operador

Scanned by CamScanner

Vibrocompactador, 1 Operador Retroexcavadora, 2 Inspectores, 3 Ayudantes Generales, 1 Auxiliar Bodega, 6 Ayudantes Carlos, 1 Oficial Carlos, 11 Ayudantes Daniel, 5 Oficiales Daniel, 5 Hidraulicos, 5 Ayudantes Bruno, 5 Oficiales Bruno, 16 Ayudantes Jhon Jairo, 2 Oficiales Jhon Jairo)
- Arrieta SAS: 2 Oficiales 1 Ayudante
- Metal B SAS: 1 Persona estructuras galeria
- Datalec Ing. Elec: 5 Personas en Instalaciones Electricas.
- Gabriel Aguilar: 3 Personas en Educo.
- Personal Administrativo Interventoria DAIMCO.
- Clima: Mañanas):

- Equipos: 2 Volquetas, 1 Minicargador, 1 Vibro-Compactador, 1 Retroexcavadora
- Elementos de Seguridad Industrial: Casco, Botas, Guantes, tapabocas, tapaoidos, Gafas, Uniforme, Chaleco.
- Actividades Ejecutadas:
- Repellos en 1er y 2do Piso bloque 3 Patrulleros
- Vigas de coronacion y Columnetas en 1er y 2do Piso bloque 1 Patrulleros
- Instalaciones electricas en 1er Piso de bloque 1 y 3 Patrulleros y Oficiales.
- Instalaciones Hidrosanitarias en 2do piso de bloque 1 Patrulleros y bloque 3 Oficiales.
- Instalacion malla y Repellos en Fachadas en Bloque Oficiales y Patrulleros.
- Remates de Mamposteria en Casino y 2do Piso bloque 1 Patrulleros.
- Instalacion estructura para escaleras en bloque 1 Patrulleros y bloque 3 oficiales.
- Fundicion de Altagia en 2do Piso Bloque 3 Oficiales.
- Mortero de Nivelacion en 2do Piso bloque

Scanned by CamScanner

3 Oficiales.
- Rellenos perimetrales en bloque 3 y Area Casino.
- Fijas para tuberias e instalaciones electricas (Redes y apantallamiento)
- Estuco en 1er Piso bloque 3 Oficiales
- Estructura para Cielo Raso Panel Yeso y Superboard 1er Piso bloque 3 Oficiales.
- Pintura Sub Estacion.
- Aplicacion Relleno Acrilico puntos fijos bloque 1 y 3 Patrulleros y Oficiales.
- Excavasiones area Gimnasio.

-Observaciones:
- El supervisor de Interventoria Electrico le solicita al personal electrico de Obra verificar los colores del cableado ya que no coinciden con lo consignado en el codigo de Colores en los planos. ademas informa que en el apantallamiento no se pueden realizar los empalmes de la manera que se estan efectuando.


Revisar los remates de las instalaciones electricas que llegan a la bandeja las cuales deben utilizar los accesorios indicados.

→ EL CONTRATISTA ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES EN EJECUCION.






Scanned by CamScanner

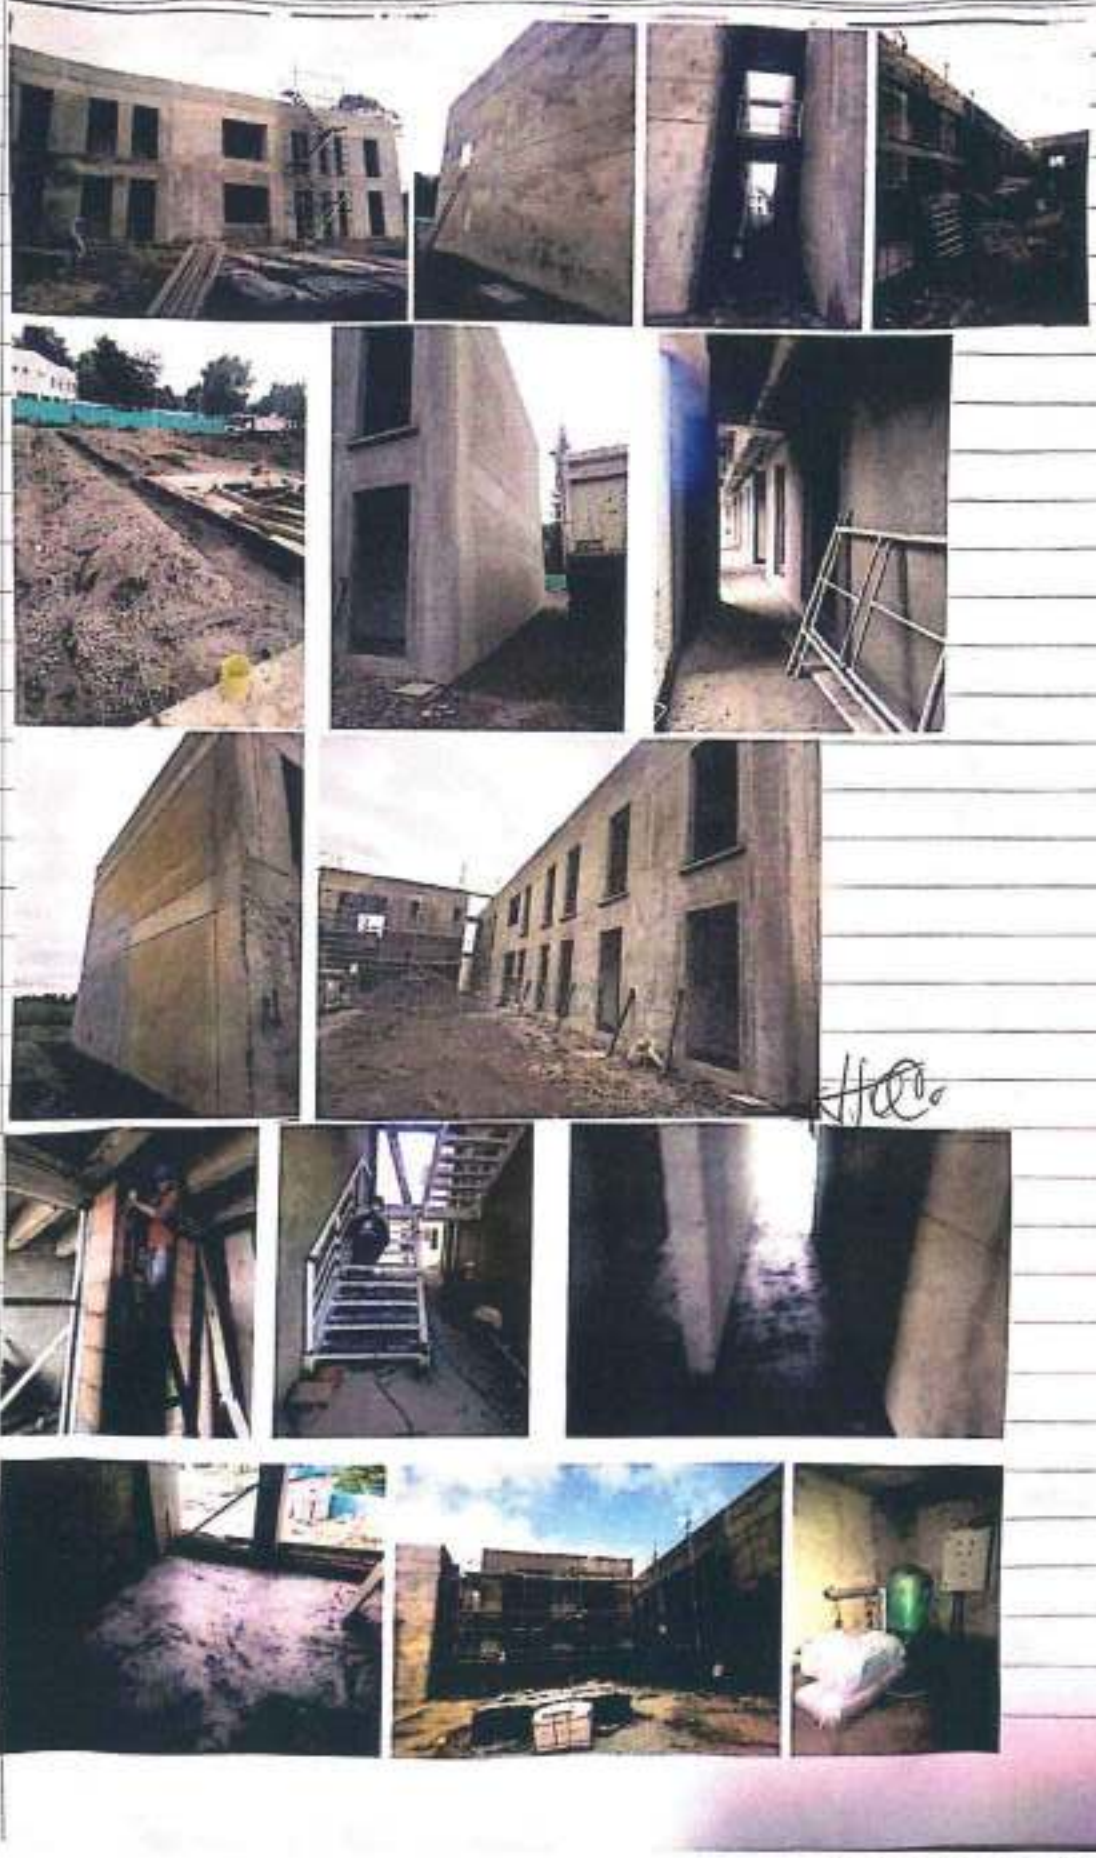

Scanned by CamScanner


















Scanned by CamScanner















→ LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INTERVENTORIA FUERON ACATADAS Y CORREGIDAS NHC.
A LA FECHA Y DESDE EL 13 DE MARZO CONTINUA EL BLOQUE EN LA VIA PANAMERICANA, LO CUAL SIGUE PERJUDICANDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES COMO:

Scanned by CamScanner

ARENA, MORTERO, CARPINTERIA METALICA, TUBERIAS HIDRAULICA, SANITARIA, ELECTRICA, RED CONTRA INCENDIA, MATERIALES PARA CUBIERTA, PARA IMPERMEABILIZACION, EQUIPOS ELECTRICOS, TODOS ESTOS COMPRADOS Y SIN PODER TRAERLOS EN SU TOTALIDAD A LA OBRA. HC.

SE ADJUNTA IMAGENES DE LAS NOTICIAS A LA FECHA EN TELEVISION Y PERIODICOS. HC.

Emisión 11:30 p.m. / 29 marzo de 2019



La vía Panamericana continúa afectada por el paro indígena. Gobierno y líderes dialogan en Buenaventura.

Pese a posición de Duque, minga indígena mantendrá vías cerradas en Cauca



Pese a los reclamos anunciados del Presidente de la República, Iván Duque, hechos desde la Casa de Nariño, en donde manifestó su postura en torno a los bloqueos en el Cauca diciendo que, "las vías de hecho no son la forma para que nos expresemos [...] estoy dispuesto a ir Cauca y Nariño cuando haya una hoja de ruta concertada, pero por las vías de hecho no haré presencia", en Cali vocero del CRIC aseguraron que los cierres en la vía panamericana se mantendrán.

Scanned by CamScanner

- Observaciones

• Día 11 de marzo de 2019

- Se chequea repello en bloque de petrileros con detalle en escuadras, terminaciones en punta de muro y esquinas, como también distancia entre muros y dilataciones que no se han ejecutado.
- Se sigue observando instalaciones de hidrosanitarias en muros repellados
- Se hace la observación de ubicar cenizo en otro lugar de concreto y manipulación antes de realizar los repellos externos

• Día 12 de marzo de 2019.

- Se observa nuevamente ejecución de repello sin ejecutar curtes en concreto
- Se solicita nuevamente la limpieza de cuetones antes de la instalación de bandaja pvc/cpvc las instalaciones eléctricas, solicitud que esta intervención realice con anterioridad
- Se recomienda al constructor revisar acabados de los ~~Cielos~~ otros

• Día 15 de marzo de 2019

- Nuevamente se observa la falta de atención a la observación técnica de parte del subcontratista por ejecutar debidamente el repello.
- Aún se observan fugas activas alrededores en el área de tanque de red contra incendio y tanque de almacenamiento, esta interventoría a solicitado el seguimiento de estas fugas, manifestadas en los pozos.
- Se recomienda al contratista llevar el control de cuadros en los repellos.

• Día 18 de marzo de 2019

- Se recuerda al contratista que no debe manejar calamicto y más donde ya que el bloque no es estructural.
- Se recuerda al contratista realizar la reparación del concreto de vigas, antes de la instalación del cielorraso
- Se sigue observando entre en muros repellados por trabajos eléctricos

Scanned by CamScanner

- Se solicita al contratista disponer personal para finiquitar o depurar detalles de repello y terminar enfoscados para poder continuar con actividades posteriores.

• Día 21 de marzo de 2019

- Aún no se ha ejecutado la demolición de columneta eje 4 del Bloque de oficinas.
- Se recomienda al contratista agilizar las pruebas hacer con el contacto de más manzanillos ya que se tiene hasta cada botón para dicha prueba y así poder iniciar con otras actividades, a la fecha no se ha terminado las pruebas en el primer piso del Bloque de oficinas.
- Se recomienda al contratista no hacer uso de las escaleras metálicas como acceso, porque no tiene aún las condiciones adecuadas constructivo ni de seguridad para tal fin, por tanto adecuar los accesos para obra.
- Se recomienda realizar las despiezadas indicadas por cintas en concreto.

• Día 22 de marzo de 2019

- Se revisa al contratista que para dar inicio a actividades de piso a Ube entregar mismo alineado repellado, con curvas y planos corregidos, columnetas totalmente terminadas y debidamente
- Se recomienda al contratista que para los trabajos de repellos exteriores, en tiempos de invierno, se debe prever protección para que no se dañen y el personal pueda trabajar de manera continua
- Se realiza observaciones en la instalación de enchape como corte disparejos, durante o quedo esta pieza de cerámica en área de baños Bloque oficinas primer piso.

• Día 28 de marzo de 2019

- Se observa y se recomienda al contratista arreglar detalle en la instalación de cerámica en piso como quedan piezas despostilladas, juntas sin alineamiento, esto en primer piso Bloque de oficinas.
También se hace la observación de poca calidad en la instalación de piso de nivelación en segundo piso Bloque de

Scanned by CamScanner

ejecutado por parte del subcontratista.

Ing. Saul J. Guerra
Interventoría

Sabado 30 Marzo 2019

- Personal en Obra: Ing. Aurelio Gutierrez.
- Personal Administrativo BCS Gutierrez
- Personal Operativo BCS Gutierrez (1 Operador minicargador, 2 Conductores Volqueta, 1 Operador Retroexcavadora, 1 Operador Vibrocompactador, 2 Inspectores, 3 Ayudantes Generales Oficina, 1 Auxiliar Bodega, 10 Ayudantes Carlos, 3 Oficiales Carlos, 12 Ayudantes Daniel, 3 Oficiales Daniel, 5 Hidraulicos, 15 Ayudantes Jhon Jairo, 2 Oficiales ~~Ayudantes~~, Jhon Jairo, 6 Ayudantes Bruno, 4 Oficiales Bruno)
- Datalec Ing. Elec. 4 Personas en Instalaciones electricas.
- Gabriel Aguilar: 4 Personas en Estuco, 4 personas en Piso en Grano.
- Personal Administrativo Interventoría.
- Clima: Mañana: Soleado.
- Equipos: Volquetas, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Minicargador.
- Elementos de Seguridad: Casco, Botas, Guantes, Gafas, Uniforme, Chaleco, Tapaoidos, Tapabocas.
- Actividades Ejecutadas.
- Repelles Fachadas en bloque 1 y 3 Patrulleros y Oficiales
- Rellenos Areas Perimetrales bloque 3 Oficiales.
- Remates mampostería, vigas y columnetas en 1er y 2do Piso en bloque 1 Patrulleros.
- Estuco 1er Piso bloque 3 Oficiales
- Piso en Grano 1er piso bloque 3 Oficiales
- Estructura Cielorraso 1er piso bloque 3 Oficiales

Residente Interv.

Scanned by CamScanner

EN REFERENCIA AL RESUMEN DE OBSERVACIONES LISTADO POR LA INTERVENTORIA EN LOS FOLIOS #25 y #26 DE ESTA BITACORA, NOS PERMITIMOS ACLARAR QUE ESTOS YA HABIAN SIDO EXPUESTOS EN EL CAMPO Y ASI MISMO HAN SIDO ATENDIDAS Y SE FUERON SOLUCIONANDO CONFORME LA EJECUCION DE LA OBRA. REITERAMOS QUE EL INICIO DE TODA NUEVA ACTIVIDAD SE REALIZA CON LA AUTORIZACION DE LA INTERVENTORA.

SE SOLICITA APENAS UN ACOMPAÑAMIENTO CONSTANTE DE INTERVENTORIA PARA QUE NO SE ESPERE A QUE ALGUNA ACTIVIDAD NO CUMPLA PARA SOLICITAR SU ARREGLO, LA IDEA ES QUE ACOMPAÑEMOS LOS PROCESOS Y SE CORRIJAN SOBRE LA EJECUCION. Y NO DE FORMA POSTERIOR.

→ EL CONTRATISTA REPORTA QUE PERSISTEN LOS BLOQUEOS.





Reportan pérdidas de $22 mil millones por bloqueo de la Panamericana

Scanned by CamScanner

DE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE ESTUCOS Y BACHOSA EN BLOQUE #3.






- DOMINGO 31 MARZO /2019 - SE LABORA EN PAÑETES AFECTADOS.
- Lunes 01 de Abril /19
- Personal en Obra:
- Personal Administrativo BCS Gutierrez.
- Mayor Angel Lopez Ostos Supervisor por parte DIRAF
- Personal Operativo BCS Gutierrez (1 Operador minicargador, 2 conductores Volqueta, 1 Operador Vibrocompactador, 1 Operador Retroexcavadora, 1 Auxiliar bodega, 3 Ayudantes Generales Oficina, 6 trabajadores Bruno, 16 Jhon Jairo, 10 trabajadores Daniel, 2 Hidraulicos, 11 trabajadores Carlos) 46
- Datalec Ing Elec: 3 personas instalaciones Elec.
- Gabriel Aguilar: 6 personas Acabados.
- Personal Administrativo Interventoria DAIMCO SAS.
- Clima: Mañana Soleado Tarde
- Equipos: Volquetas, Minicargador, Retroexcavadora, Vibrocompactador.
- Elementos de Seguridad Industrial: Casco, Botas, Guantes, tapabocas, tapaoidos, Gafas, Uniforme, chaleco
- Actividades ejecutadas:
- Relleno y ~~retiro~~ arena perimetrales bloque 1 y 3.
- Excavaciones para Instalacion tuberias
- Rellenos arena tanque RCI

Scanned by CamScanner
