DAIMCO
NIT: 900021492 - 1

CPP-DIRAF-2018-142

Bogotá D.C. 13 de Abril de 2019.

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DIRAF).
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión Informe Mensual No 11.

Respetados Señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir el informe mensual No. 11 de Interventoría, comprendido entre el primero (01) de Abril de 2019 al treinta (30) de Abril de 2019. La presente con el fin de informar a la entidad contratante el avance de ejecución del contrato.

Agradecemos de antemano su atención.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	*268 Folios*
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo
Copia 1.	*Archivo – Contrato de interventoría*

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

POLICÍA NACIONAL

POLICIA NACIONAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN NO.4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.



DAIMCO

CONTRATO No. PN DIRAF NO. 06-3-10051-18

Informe Mensual No. **11**

INFORME DE INTERVENTORÍA
01 de abril a 30 de abril de 2019
VERSIÓN 0
VOLUMEN 1 DE 1
ORIGINAL

INFORME MENSUAL No 11 DE INTERVENTORIA

PROYECTO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN NO.4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

CONTRATO DE CONSULTORÍA PN DIRAF NO. 06-3-10051-18

TÍTULO:

INFORME MENSUAL No 11

01 DE ABRIL DEL 2019 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

Realizo: TIRSO COSME. Director de Interventoría

_____

Aprobó: Ing. José Vicente Bocanegra – Gerente Técnico de Interventoría

_____

Tabla de contenido

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

INDICE DE MODIFICACIONES

ESTADO DE REVISIÓ Y APROBACIÓN

1.INTRODUCCIÓN **6**

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6

2.ESTADO Y AVANCE DEL PROYECTO **13**

2.1 AVANCE DOCUMENTAL 13

2.2AVANCE DE ACUERDO A LA PORGRAMACIÓN 14

2.3CRONOGRAMA DE OBRA 15

3.ESTADO DEL CONTRATO **16**

3.1 ÁMBITO FINANCIERO 16

3.2 ÁMBITO PRESUPUESTAL 16

3.3 ANTICIPO 17

3.3.1 Informe Plan Anticipo 18

3.4 FACTURACIÓN MENSUAL 19

4.ACTAS PARCIALES DE OBRA **20**

5.ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORIA **21**

6.TRABAJOS EJECUTADOS **21**

6.1 DESCRIPCION GENERAL DE LAS TAREAS 21

6.2 MODIFICACIONES DEL PROYECTO 27

7.CUMPLIMIENTO PAGOS PARAFISCALES **27**

8.PERMANENCIA Y ESTADO DE LOS EQUIPOS **27**

8.1 CONTROL PERSONAL CONTRATISTA 27

8.2CONTROL PERSONAL INTERVENTORIA 27

8.3CONTROL DE EQUIPOS 27

9.ASPECTOS VARIOS **27**

9.1REGISTRO FOTOGRAFICO 27

9.2ESTADO DEL TIEMPO 27

9.3POLIZAS 27

10.CONCLUSIONES **31**

LISTA DE TABLAS

Tabla No. 1 Avance del proyecto 15

Tabla No. 2 Hitos 15

Tabla No. 3 Estado Financiero 16

Tabla No. 4 Avance Fisico 16

Tabla No. 5 Actas Parciales Contrato de Obra 20

Tabla No. 6 Actas Parciales Contrato de Interventoria 21

Tabla No. 7 Actas de Comité 21

Tabla No. 8 Equipos interventoria 22

Tabla No. 9 Polizas Contrato de Obra 31

Tabla No. 10 Polizas Contrato de Interventoria 31

RELACIÓN DE ANEXOS

INFORME EJECUTIVO No. 11

Anexo No.1. Informes semanales y diario

Anexo No.2. Relación de Correspondencia

Anexo No.3. Actas de comité del periodo

Anexo No.4. Plan de Anticipo

Anexo No.5. Seguridad Social

Anexo No.6. Control de personal del Contratista

Anexo No.7. Control de personal de la Interventoria

Anexo No 8 Informe SISOMA y Certificaciones escombreras

Anexo No.9. Control de Equipos-Ensayos

Anexo No.10. Registro fotográfico

Anexo No.11. Control de clima

Anexo No.12. Bitácora

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Las copias de este documento han sido entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREA O DEPENDENCIA		No. DE COPIAS
Copia No. 1	**Policía Nacional**	**1 (original)**
Copia No. 2	**Archivo Contrato de Interventoría No. PN DIRAF 06-3-10051-18**	**1**

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

ÍNDICE VERSIÓN	CAPÍTULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
0		-	Versión original

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

TITULO DOCUMENTO:		INFORME MENSUAL		
DOCUMENTO No:		No. 11		
NUMERO DE REVISIÓN		0	1	2
RESPONSABLE POR ELABORACIÓN "Director de Interventoría"	Nombre:	**Ing. Tirso Cosme**		
	Firma:			
	Fecha:	**30-04-2019**		
RESPONSABLE APROBACIÓN "Gerente Técnico de Interventoría"	Nombre:	**Ing. José Vicente Bocanegra**		
	Firma:			
	Fecha:	**04-05-2019**		
RESPONSABLE APROBACIÓN "Supervisora del contrato"	Nombre:	**Mayor Ingeniero Civil Ángel Giovanni López Ostos**		
	Firma:			
	Fecha:	**06 -05-2019**		

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe Mensual No 11, correspondiente al Periodo del 01 de ABRIL del 2019 al 30 de ABRIL de 2019, presentado en cumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en el Contrato de Interventoria PN DIRAF No. 06-3-10051-18 y los adicionales o prorrogas que se generen suscrito entre **DAIMCO S.A.S** y **POLICIA NACIONAL – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Se presenta acorde al manual de Interventoría y exigencias de la Policía Nacional – Dirección administrativa y financiera, el Control realizado por nuestra empresa al Contratista CONSORCIO CBS-GUTIERREZ, encargado de la ejecución del Contrato de Obra No. PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Localización del Proyecto: Popayán, departamento de Cauca.



El municipio de Popayán limita por el norte con los municipios de Cajibío y Piendamó, por el sur con los municipios de Sotará y Puracé, por el oriente con el municipio de Totoró, Puracé y el Departamento del Huila, por el occidente con el municipio de El Tambo y Timbio, el proyecto se desarrollara en la Región No 4 DECAU MEPOY Comando Departamento de

Policía Cauca en el predio con dirección Carrera 17 No 1 – 75 – Popayán - Cauca con matricula inmobiliaria 120-13255 con un área aproximada de 16 Hectáreas con 8.040 metros

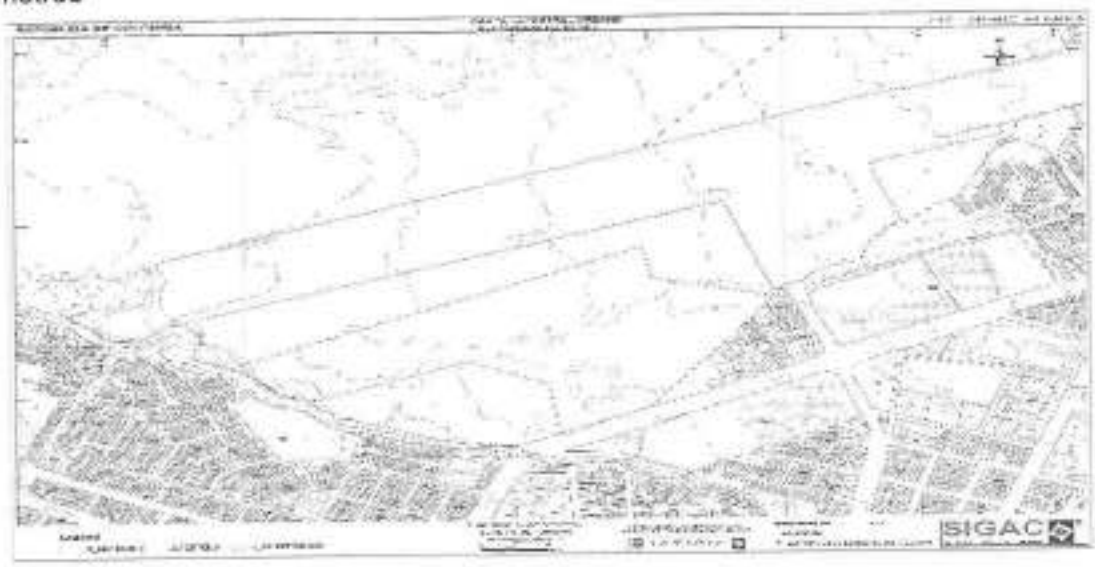


Ilustración 1. Localización general
Fuente. Equipo de Topografía

El proyecto se centra en la ejecución de las actividades para la **"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"**, de acuerdo a diseños de consultoría bajo el contrato No PN-DIRAF No 06-3-10041-15, el contrato de obra incluye la ejecución de actividades para el desarrollo de la Fase 4 – Edificio D de excavaciones, rellenos, estructura de concreto, mobiliario de oficinas, sistemas de detección de incendios, carpintería metálica y de madera, sistemas de ventilación mecánica y todas las adecuaciones urbanísticas eléctricas e hidráulicas internas y externas que permitan el correcto funcionamiento del edificio y el desarrollo de esta fase y de las fases futuras que comprenden el complejo de Policía del Cauca".

2. ESTADO Y AVANCE DEL PROYECTO

2.1 AVANCE DOCUMENTAL

Correspondencia Recibida

En el Anexo No. 2. Se relaciona y adjunta la correspondencia recibida del Contratista y de la Entidad contratante, durante el presente informe.

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento

PN-DIRAF-POPAYAN-167	Órdenes de pago # 23 y 24	1	N.A	02/04/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-168	Suspensión del contrato	1	N.A	05/04/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-173	Envían flujograma y programación en dos copias	1	N.A	11/04/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-174	Apus NP Eléctricos	1	N.A	11/04/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-178	Documentos corte #10	1	N.A	25/04/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-179	Documentos corte #10, Adición 1	1	N.A	25/04/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-180	Documentos corte #10, Adición 2	1	N.A.	25/04/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-181	Dotación y equipos de gimnasio	1	N.A.	25/04/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-182	Maniobra eléctrica MT e Instalación eléctrica GYM	1	N.A.	25/04/2019

Correspondencia Enviada

En el Anexo No. 2. Se relaciona y adjunta la correspondencia enviada al Contratista y a la Entidad contratante.

No.	Titulo del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento
CPP-DIRAF-2018-124	Remisión de acta parcial de obra # 09	1	N.A	29/03/2019
CPP-DIRAF-2018-125	Remisión de acta parcial de obra # 09 adición 01	1	N.A	29/03/2019
CPP-DIRAF-2018-126	Remisión de acta parcial de obra # 09 adición 02	1	N.A	29/03/2019

CPP-DIRAF-2018-127	Remisión de documentos PN-DIRAF-POPAYAN 159-163, afectación de obra por cierre de vías	1	N.A	03/04/2019
CPP-DIRAF-2018-128	Remisión ordon de pago #23	1	N.A	04/04/2019
CPP-DIRAF-2018-129	Remisión orden de pago #24	1	N.A	04/04/2019
CPP-DIRAF-2018-130	Respuesta al documento S 2019 007159 DIRAF GUMAI No 09	1	N.A	09/04/2019
CPP-DIRAF-2018-131	Respuesta al documento S 2019 010412 DIRAF GUMAI No 09- conceptos oficios PN – DIRAF POPAYAN 159-163	1	N.A	10/04/2019
CPP-DIRAF-2018-132	Remisión informe mensual # 10	1	N.A	10/04/2019
CPP-DIRAF-2018-133	Remisión programación de obra actualizada	1	N.A	12/04/2019
CPP-DIRAF-2018-134	Remisión acta parcial de interventoria # 10	1	N.A	25/04/2019
CPP-DIRAF-2018-135	Remisión acta parcial de interventoría # 10 Adición 1	1	N.A	25/04/2019
CPP-DIRAF-2018-136	Remisión acta parcial de interventoría # 10 adición 2	1	N.A	25/04/2019
CPP-DIRAF-2018-137	Remisión acta parcial de obra # 10 v2	1	N.A	25/04/2019
CPP-DIRAF-2018-138	Remisión acta parcial de obra # 10 adición 1 v2	1	N.A	25/04/2019
CPP-DIRAF-2018-139	Remisión acta parcial de obra # 10 adición 2 v2	1	N.A	25/04/2019

2.2 AVANCE DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN:

El día 14 de marzo de 2019, se firmó el adicional de obra #02, el constructor entrega programación ultima y corregida de acuerdo a observaciones de interventoría el 10 de abril,

en ella según solicitud del supervisor de la DIRAF, entrega flujo de inversión por cada uno de los frentes y por obras aprobadas según los adicionales 1 y 2, estas reprogramaciones determinan como fecha de terminación de obra el día 28 de junio de 2019, los trabajos, por frentes son:

1. Edificio de Patrulleros en ejecución y activo
2. Edificio de oficiales en ejecución y activo
3. Casino en ejecución y activo
4. Subestación y tanque de reserva, en montaje de equipos
5. Tanque reserva de red contra incendios RCI, finalización.
6. Gimnasio en ejecución
7. Áreas de urbanismo y paisajismo sin intervención

El constructor viene avanzando en los diferentes frentes con mejores rendimientos en unos que en otros atribuible a ítems que en este mes se tenían programado iniciar como la colocación de pisos y el cielo falso.

Tabla 1. AVANCE DEL PROYECTO

INFORME	CORTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
No 11	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	60.93%	58.97%

En el mes de abril se ejecutó la instalación de la red contra incendio quedando pendiente solo la instalación de las bombas que se encuentran en obra.

a ejecutando la termina la construcción del tanque de la red contra incendios RCI y se realizan la instalación de la tubería de red contra incendios tanto la sub como la aérea, se continua en trabajo de instalaciones eléctricas, quedan pendiente arreglos de repellos de interiores, y terminación de repellos de fachadas, se terminan morteros de nivelación de piso, se termina la construcción de mampostería con bloque, se continua con la colocación de piso en piso de oficiales, igualmente se avanza en obra blanca con el estucado de muros en edifico de oficiales y patrulleros, además de la estructuración de cielo falso, es está realizando el relleno con material de sub base y material de base en el área de gimnasio, se continua con el flejado de acero para el gimnasio.

Los informes semanales realizados en el periodo de 01 al 30 de ABRIL de 2019 se encuentran en el **anexo No. 1** del presente informe.

2.3 CRONOGRAMA DE OBRA

De acuerdo con la reprogramación presentada por el constructor el inicio de algunos hitos a esta fecha deberia haberse comenzado, esto puede representar la diferencia entre lo programado y ejecutado.

Tabla 2. HITOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA
01	ACTIVIDADES PRELIMINARES	07 /JUNIO / 2018
02	DESMONTES Y DEMOLICIONES	07 /JUNIO/ 2018
04	EXCAVACIONES Y RELLENOS	19/JULIO / 2018
04	CIMENTACIÓN	15/SEPTIEMBRE / 2018
05	PISOS - BASES	11/ ABRIL / 2019
07	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	21 / SEPTIEMBRE / 2018
07	TANQUE DE RESERVA	17 / SEPTIEMBRE / 2018
10	ESTRUCTURA METALICA	14 /ABRIL / 2019
10	MAMPOSTERÍA	30/ NOVIEMBRE / 2018
10	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	30/ NOVIEMBRE /2018
11	PAÑETES	27 / ABRIL/ 2018
12	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS	04 / OCTUBRE / 2018
13	INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEMATICAS Y AUTOMATIZACIÓN	15 / ENRO / 2019

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA
14	PISOS - ACABADOS	23/ ABRIL / 2018
15	CARPINTERÍA MADERA	7/ ABRIL / 2019
16	CARPINTERÍA METÁLICA	20 /ABRIL / 2019
17	PINTURA	11 / ABRIL / 2019
18	CUBIERTAS	21 / ENRERO / 2019
19	CIELOS RASOS	29 / ABRIL / 2019
22	MUEBLES FIJOS	29 / ABRIL / 2019
23	ENCHAPES, ESPEJOS, MESONES Y DIVISIONES	29 / ABRIL / 2019
24	APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS	14/ ABRIL / 2019
26	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA	31 / ABRIL / 2019
27	MOBILIARIO DE OFICINAS	8/ ABRIL / 2019
31	DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS	8/ ABRIL / 2019
30	ASEO DE OBRA	18/ ABRIL / 2019

3. ESTADO DEL CONTRATO

3.1 ÁMBITO FINANCIERO

A la fecha de corte del presente informe mensual No 10 (01 de ABRIL de 2019 al 30 de ABRIL de 2019), se tiene que el avance financiero es el siguiente:

Tabla 3. ESTADO FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	$ 9.250.463.250,10
ADICION 01	$ 433.346.050.00
ADICION 02	$3.000.721.946.00
VALOR ACTUALIZADO	$12,684,531,246.31
VALOR PROGRAMADO	$7.728.845.433.85
VALOR EJECUTADO	$ 7.480.068.075.95

3.2 ÁMBITO PRESUPUESTAL

A la fecha de corte del presente informe mensual No 11 (01 de ABRIL de 2019 al 30 de ABRIL de 2019), se tiene que el avance físico es el siguiente:

Tabla 4. AVANCE FISICO

PORCENTAJE PROGRAMADO	60.93 %
PORCENTAJE EJECUTADO	58.97 %

En la gráfica apreciamos una curva descendente en la programación, que corresponde al adicional en tiempo que se le aprobó al contratista, por tal motivo Se presenta la Gráfica de Control Avance de obra (Programado Vs Ejecutado). El rendimiento, aunque afectado por paro indígena, presenta unos repuntes gracias a la ejecución de los adicionales 1 y 2.



3.3 ANTICIPO

De acuerdo con Prorroga No 01 y Modificatorios # 1,2,3 y 4, generados, se aprueba al contratista una ampliación al Anticipo por un porcentaje total del 50% del contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, esto de acuerdo con las solicitudes presentadas por el contratista a esta interventoría.



3.3.1 Plan De Inversión Del Anticipo Aprobado:

A continuación, se presenta el plan de Inversión del Anticipo aprobado a la fecha para el contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18.



3.4 FACTURACIÓN MENSUAL

CONTRATO DE OBRA

La Policía Nacional-Dirección Administrativa y Financiera cancelará el valor del contrato en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma:

UN ANTICIPO:

Disponible para el contratista desde el mes de diciembre de 2018, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato principal, lo anterior teniendo en cuenta la solicitud que realizo el contratista toda vez que contractualmente la entidad había quedado de otorgarle el 20% de anticipo 30 días después que se legalizara el contrato y en esto no fue posible cumplirle al contratista, por tal motivo la entidad, aprobó el incremento del porcentaje.

NOTA 1: El contratista deberá constituir un contrato de fiducia con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera de Colombia, para el manejo de los recursos provenientes del anticipo en los términos establecidos en los artículos 2.2.1.1.2.4.1 y 2.2.1.2.3.3.1 del Decreto 1102 de 2015, así mismo presentará a la interventoría la programación de inversión del anticipo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la aprobación de la garantía única, el cual debe estar aprobado por la interventoría y el supervisor de la interventoría, garantizando control permanente sobre el mismo.

NOTA 2: En los términos y condiciones del contrato de fiducia deberá quedar como obligación:

a) La entrega de un informe mensual por parte de la fiducia, donde se evidencien los pagos efectuados y los rendimientos mensuales a consignar en la cuenta que indique la entidad contratante.

b) Los desembolsos solicitados por el contratista de obra tomando como base el plan de manejo del anticipo, deberán ser autorizados por el representante legal de la interventoría.

El pago del anticipo se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la aprobación de la garantía única, una vez aprobados los documentos presentados y requerido 'por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y a la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

PAGOS PARCIALES:

Se realizarán. pagos parciales de acuerdo al porcentaje de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez, la Interventoría y Contratista hayan suscrito el acta parcial

correspondiente con sus respectivas memorias y que la Interventoría haya certificado la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinticinco (25) de cada mes.

Nota 1: En cada acta de corte parcial se amortizará proporcionalmente, el valor entregado al, contratista en calidad de anticipo, hasta amortizar el 100% de su valor.

Cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación.

Previo a la presentación de las actas parciales y a su ejecución, deberá estar aprobado por la DIRAF el balance de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos si los hay. Consolidado por el contratista de obra con los soportes documentales (y fotográficos de ser necesario), proyectado y avalado por la interventoría. igual condición para el acta final, si hay modificaciones al balance aprobado.

Para cada una de las actas parciales, el pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles, una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del plan anual de caja (PAC), así:

- Acta de recibo parcial. (suscrita entre los contratistas de obra e interventoría) Factura de venta
- Balance de cantidades ejecutadas.
- Certificación de pagos parafiscales y seguridad social.
- Certificación pagos FIC
- Memoria de cantidades ejecutadas.

Y los demás documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera,

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o. si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección Administrativa y Financiera, programará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

JUSTIFICACIÓN DEL PAGO DE ANTICIPO:

En el presente proceso de contratación el Grupo de Seguimiento a Proyectos del Área de Infraestructura de la Dirección Administrativa y Financiera justifica el pago de anticipo al futuro contratista, con el fin de que el proyecto constructivo tenga la financiación suficiente y el constructor tenga la posibilidad de adquirir los insumos y bienes a los precios establecidos en el presente contrato.

Es de anotar que el giro de los recursos a una fiducia independiente genera el respaldo del manejo de los dineros evitándose la desviación de los mismos, toda vez que los desembolsos deberán ser autorizados por la interventoría.

Es importante aclarar que el anticipo deberá estar amparado por la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, acorde al Decreto 1102 de 2015 'por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional" en su Artículo 2.2.1.1.2.4.1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La Policía Nacional-Dirección Administrativa y Financiera cancelará el valor del contrato en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma:

PAGOS PARCIALES:

Se realizarán pagos parciales hasta completar el 95% del valor del contrato, sujetas al porcentaje de avance del contrato de obra que corresponderá al valor ejecutado en el respectivo periodo, las que se tramitarán una vez el supervisor e Interventor hayan suscrito el acta parcial correspondiente y se certifique la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, de igual manera el supervisor de la interventoría deberá certificar el cumplimiento de las funciones y obligaciones contractuales; las actas deberán presentarse a más tardar el día veinticinco (25) de cada mes.

Para cada uno de los pagos parciales, se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a, turno y la disponibilidad del plan anual de caja (PAC), así:

- Factura de venta
- Certificación de pagos parafiscales y seguridad social

Y los demás documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección Administrativa y Financiera, programará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

ACTA DE RECIBO FINAL

Su valor será del cinco por ciento 5% del valor total del contrato, una vez se certifique por parte del supervisor del contrato de interventoría el recibo a satisfacción del cien (100%) del valor del contrato. Se presentará una vez la interventoría certifique el recibo a

satisfacción del cien por ciento (100%) del contrato de obra y se haya recibido a satisfacción el cien por ciento (100%) del valor del contrato de interventoría en el cual se certifique el seguimiento y control adelantado por la Interventoría al contrato de obra.

El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de las facturas del acta respectiva, junto con el recibo a satisfacción suscrito por la interventoría del contrato, con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo con el derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección Administrativa y Financiera, programará el valor a, cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Nota: Es claro que el valor del contrato de interventoría y su pago, se realizará bajo objetivo ejecutado en el contrato de obra y no por la permanencia de los profesionales o el mayor tiempo de ejecución del contrato de obra en el desarrollo de los ítems con su valor contractual, por tal motivo la única forma de realizar una adición presupuestal al contrato de interventoría, 1 será siempre y cuando se realice alguna adición presupuestal al contrato de obra, el cual justifique la necesidad de tener mayor tiempo en su ejecución, para la realización de las actividades contempladas en la adición.

4. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Contrato de Obra : A la fecha el Contratista ha presentado cuatro actas parciales para aprobación de la interventoría:

Tabla 5. ACTAS PARCIALES CONTRATO DE OBRA No. 07-6-10044-18

No. Acta	Periodo	Valor Total del Acta	AMORTIZACIÓN
1	7 de junio hasta 7 de julio de 2018	$ 88.945.135.99	17.789.027,20
2	08 de Julio hasta 07 de agosto de 2018	$ 99.764.316,74	19.952.863,35
3	08 de agosto hasta 07 de septiembre de 2018	$ 271.551.766,01	54.310.353,20
4	08 de septiembre hasta 07 de octubre de 2018	$385.060.488,89	77.012.097,78
5	08 de octubre hasta 07 de noviembre de 2018	$614.366.847,81	122.873.369,56
6	08 de noviembre hasta 20 de diciembre de 2018	$1.047.183.680,70	523.591.840.35

7	21 de diciembre de 2018 hasta el 29 de enero de 2019	$884.138.348,38	442.069.174,19
8	30 de enero de 2019 hasta el 28 de febrero de 2019	$514.864.809,38	323.335.100,29
8a1	30 de enero de 2019 hasta el 28 de febrero de 2019	$78.864.470,65	39.432.235,33
9	01de marzo de 2019 hasta el 29de ABRIL de 2019	$ 1.292.653.567.28	811.786.440,25
9a1	01de marzo de 2019 hasta el 29de marzo de 2019	$139.441.533,83	69.720.766,92
9a2	01de marzo de 2019 hasta el 29de marzo de 2019	$289.698.277,99	144.849.139.00
10	30 de marzo de 2019 al 25 de abril de 2019	$249.185.601,12	$ 156.488.557,50
10a 1	30 de marzo de 2019 al 25 de abril de 2019	$111.891.948.98	$ 55.945.974,49
10a 2	30 de marzo de 2019 al 25 de abril de 2019	$194.996.827,84	$ 97.498.413,92

ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORÍA

Contrato de Interventoria

A la fecha la Interventoria ha radicado Actas Parcial a la Entidad Contratante:

Tabla 6. ACTAS PARCIALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 06-3-10051-18

No. Acta	Periodo	Valor Total del Acta
1	7 – Jun / 7 Jul 2018	4.445.827,38
2	8 jul / 7 ago. 2018	4.986.612,54
3	8 ago. / 7 Sep. 2018	13.573.224,24
4	8 sep. / 7 Oct 2018	19.246.836,21
5	8Oct / 7 Nov 2018	30.708.469,01
6	8 Nov / 20 Dic 2018	52.342.354,94
7	20 dic 2018/ 29 ene 2019	44.192.708,59
8	30 ene 2019 / 28 feb 2019	25.734.966,17
8a1	30 ene 2019 / 28 feb 2019	3.941.956,12
9	01 mar 2019 / 31 mar 2019	64.611.904.
9a1	01 mar 2019 / 31 mar 2019	6.969.835.76
9a2	01 mar 2019 / 31 mar 2019	14.480.258.23
10	01 abril 2019/ 30 abril 2019	$12.455.275,44
10a 1	01 abril 2019/ 30 abril 2019	$5.592.799,25
10a 2	01 abril 2019/ 30 abril 2019	$9.747.124,47

5. TRABAJOS EJECUTADOS

5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS TAREAS

- ACTAS DE COMITÉ

Dentro de las tareas desarrolladas durante el periodo en evaluación, se encuentran la suscripción de actas de comité, las cuales se han realizado para el seguimiento de la POLICIA NACIONAL hacia el contrato de Interventoría y de comité de Interventoría hacia el contrato de obra. Dichas actas se indican a continuación y se encuentran en medio físicos en el **anexo No. 3** del presente informe:

Tabla 7. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

FECHA	CONCLUSIONES
12 de ABRIL de 2019	Acta # 33; seguimiento a compromisos del comité #32 realizado en presencia del My Angel Lopez, aún pendientes por realizar como son presentación en fechas para actas de pago e informes, análisis de paro indígena y la incidencia sobre el avance en la obra.
22 de ABRIL de 2019	Acta # 34 Aprobación de propuesta varias presentadas por el constructor, además explican retraso de algunas actividades sobre todo lo concerniente al gimnasio,
30 de ABRIL 2019	Acta # 35 Seguimiento a la ejecución que ha presentado contratista vs la programación, aprobación de ítems NP, solicitud de presentación de Balance para modificatorio, solicitud de plan de contingencia para obras de gimnasio y urbanismo..

- **ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

Dentro de las actividades efectuadas por el Consorcio BCS- Gutiérrez y la interventoría Daimco, durante el periodo de 01 de ABRIL del 2019 al 30 de ABRIL del 2019, se encuentran las siguientes: Realización, presentación y aprobación de análisis de precios no previstos para balance final.

- **Cumplimiento de Especificaciones técnicas, diseños, normas técnicas, cantidades, según contrato.**

  La DIRAF en cabeza del Supervisor del proyecto el Mayor Ángel Giovanny López Ostos adelantaron las gestiones para la actualización de las licencias de construcción del proyecto macro y licencia ambiental por sustitución de arboles que deben ser removidos o talados por el bien del proyecto

ACTIVIDADES ADELANTADAS:

- En cuanto a los oficios dirigidos a la entidad para aclarar las inconsistencias o dudas encontradas el Supervisor DIRAF, estos con el fin de que se vea la trazabilidad.

EXTERIORES

- **Acciones adelantadas por la interventoria y supervisión actividades Eléctricas**
  En chequeo y revisión en obra de actividades eléctricas, de las cuales se deja respectivas anotaciones en bitácora..

- **Acciones adelantadas por la interventoria y supervisión actividades chequeo topografia**

  Se realiza la verificación del proyecto en nivelación de cada uno de los niveles de losa de cimentación y verificación y corrección de la localización de columnas y demás elementos estructurales, y de redes, del gimnasio.

- **Acciones adelantadas por el contratista y supervisión ante el cumplimiento al Carácter Técnico.**

  El contratista realiza pruebas de presión de tubería de red hidráulica y de la red contra incendio, se le solicita a contratista adelantar pruebas de estanqueidad de tanques de reserva y tanque de red contra incendios, a fin de verificar posibles filtraciones.

- **Calidad de la Obra, Equipos, Bienes, Insumos, Ensayos o Pruebas.**
  El contratista en el mes de ABRIL tuvo en obra, una (1) máquina retroexcavadora sobre llantas, (2) volquetas de planta y (1) Mini cargador, equipos utilizados para trabajos de excavación y regado de material.

- **Novedades, observaciones y recomendaciones.**
  Esta interventoria y el constructor obviamente, sirve dejar testimonio de la afectación que para la obra implico el paro indígena que bloqueo la via panamericana a lo largo de 25 días desde el 11 de marzo de 2019 hasta el 06 de abril, lo que en definitiva afecto el suministro de las compras de insumo de materiales que el constructor realizo por fuera del departamento y que por tal no pudieron llegar a tiempo, con la consecuencia de generar retrasos en las actividades que estos suministros incidian.

  La interventoria ha estado muy atenta en informar los posibles cambios del clima que podrían afectar los trabajos, para este periodo se presentaron tiempo lluvioso y algunas tormentas que afectarían el desarrollo de trabajos. En la segunda quincena de ABRIL se presentó un clima variado pero favorable en términos generales para la ejecución de obras.

6. CUMPLIMIENTO PAGOS PARAFISCALES

En lo correspondiente al presente periodo, la interventoría ha realizado el seguimiento y control bajo los lineamientos de la normatividad sobre la materia (aspectos básicos legales):

- Seguimiento a las afiliaciones al sistema de seguridad social de los trabajadores que laboran en la obra. (Contratista entregó copias de las afiliaciones).
- Inspección en el desarrollo de las actividades la entrega de los elementos de protección personal –EPP y supervisión en el uso de los mismos.
- Solicitud al constructor sobre la entrega de los exámenes médicos de ingreso de salud ocupacional del personal que labora en el proyecto.

En el anexo No. 5 se muestran las planillas de pagos parafiscales de los profesionales involucrados en el proyecto del Contratista y la interventoría.

7. PERMANENCIA Y ESTADO DE LOS EQUIPOS

7.1 CONTROL PERSONAL CONTRATISTA

En el Anexo No. 6. Se diligenció el Formato Control del Personal, acorde a lo requerido por el contrato de obra No DIRAF 07-6-10044-18, para la ejecución de las actividades correspondientes al presente periodo.

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	Director de ing. obra	Ing. Julián Mauricio Giraldo
2	Residente 2 de ing. obra	Ing. Maria Teresa Ojeda Cabrera
3	Residente de arquitectura	Arq., Edgar Enrique Calvete
4	Auxiliar administrativo	María Fernanda Benavidez
5	Residente ing. Ambiental y SISO	Yuli Gomez Urbano
7	Topógrafo 1	Margarita Eugenia Álvarez Fuentes

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
9	Auxiliar topografía	Alexandra Risueño
10	Maestro	Armando José Arrieta
11	Ayudantes	3

7.2 CONTROL PERSONAL INTERVENTORIA

En el Anexo No. 7. Se encuentra el Formato Control del Personal de la Interventoría, para la ejecución de las actividades durante el periodo del contrato de interventoria No DIRAF 07-3-10051-18

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1	ING. TIRSO MARINO COSME OROZCO
2	RESIDENTE ING. CIVIL	ING. SANDRA LUCIA GUAUÑA PISSO
3	RESIDENTE ARQUITECTURA	ARQ. MONICA LILIANA BENITEZ ANGEL
4	RESIDENTE AMBIENTAL ESP. SALUD OCUPACIONAL	ROSA DEL MAR RODRIGUEZ GALVIS
5	ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JAVIER JOSE CARRILLO O.
6	RESIDENTE ING. TOPOGRAFO	RIGOBERTO LOZADA DIAZ
7	RESIDENTE ELÉCTRICO	VICTOR MANUEL BOCANEGRA
8	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JOSE ARMANDO RUIZ ANGARITA

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE
9	ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA	ALBERTO FEDERICO MOUTHON BELLO
10	ASESOR JURÍDICO	PABLO MANRIQUE CONVERS
11	ASESOR CONTABLE	PABLO EMILIO GUERRERO JIMENEZ

7.3 CONTROL DE EQUIPOS

En el Anexo No. 10 se presenta el formato Control de Equipos, en el cual se reportan los equipos usados por el Contratista en obra durante dicho periodo.

Cuadro 8. Relación de Equipos de Interventoria

EQUIPOS	CANTIDAD
COMPUTADORES	4
CAMARA DIGITAL	4
IMPRESORA	1
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	1
EQUIPO ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS	1

8 ASPECTOS VARIOS

8.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO

El registro fotográfico se presenta en el anexo No. 11 del presente informe.

8.2 ESTADO DEL TIEMPO

En el Anexo No. 11 se presenta el formato control del clima, en el cual se reporta el estado del tiempo en la obra durante dicho periodo

8.3 POLIZAS

Contrato de Obra

En el siguiente cuadro se relacionan las pólizas del contrato de obra No DIRAF 06-6-10044-18.

Tabla 9. POLIZAS CONTRATO DE OBRA

GARANTÍAS				
POLIZAS	COMPAÑÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
			Iniciación	Terminación
Anticipo	Seguros del Estado S.A.	6.342.265.624	18/05/2018	31/12/2019
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A.	2.536.906.250	18/05/2018	31/12/2019
Pago de salarios y prestaciones	Seguros del Estado S.A.	634.226.563	18/05/2018	31/10/2022
Estabilidad de la obra	Seguros del Estado S.A.	3.805.359.374	15/12/2018	15/12/2023
Calidad de los bienes	Seguros del Estado S.A.	329.371.500.00	18/05/2018	31/10/2020

Contrato de Interventoria

En el siguiente cuadro se relacionan las pólizas del contrato de Interventoria No. DIRAF 06 -3-10051-18

Tabla 10. POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

GARANTÍAS				
POLIZAS	COMPAÑÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
			Iniciación	Terminación
Cumplimiento	Seguros Mundial	$ 126.605.825.22	22/05/2018	28/12/2019

Calidad de Servicio	Seguros Mundial	$ 317.014.563.05	22/05/2019	28/06/2024
Pago de salarios y prestaciones	Seguros Mundial	$ 31.701.456.30	22/05/2019	28/10/2022

8. CONCLUSIONES

En los edificios de oficiales y patrulleros, se van terminando actividades faltantes de obra gris, como repellos en interiores, se da finalización al repello de fachadas, se continua avanzando en ítems como piso en grano de mármol, igualmente se adelantaron actividades de estucado y pintura de muros, instalación de cerámica en baños, son actividades que si bien se están realizando simultáneamente, esta interventoría solicita que un incremento de personal para poder dar cumplimiento al avance programado de parte del constructor.

Además, se debe ir realizando actividades de mejora de detalles de pegado piso, arreglo de las instalaciones hidrosanitarias.

En edificio de Casino ha avanzado en los últimos quince días del mes de abril, pero aún falta detalles de instalación de áreas de cocina y baños.

Se adelantan redes exteriores de alcantarillados sanitarios y pluviales de los edificios de la fase 4.

El tanque y red contra incendios es el adicional próximo a terminar solo faltando algunos aditamentos como la bomba que se encuentra en obra, y los gabinetes.

El tema Eléctrico viene ejecutándose a pesar del imprevisto con las dimensiones de la planta que se recibió que a pesar de cumplir con las especificaciones técnicas eléctricas el dimensionamiento para su acople en el espacio asignado requirió un acondicionamiento extra.

El constructor repunto en la de ejecución, es conveniente resaltar que debido al adicional dos en obra y dinero del que fue objeto este contrato, los indicativos de porcentajes programados vs porcentaje ejecutado varían, esta interventoría nuevamente recalca que el tiempo adicionado es muy ajustado, además teniendo en cuenta el traumatismo regional que hubo en transporte por lo del paro indígena que se presentó en el departamento.

La programación presentada por el constructor para plasmar el adicional dos, nos da que en los dos últimos meses: mayo y junio, el constructor deberá realizar un gran esfuerzo en la ejecución para terminar a tiempo, debido que deja acumular en estos últimos meses un gran porcentaje de actividades que dependen directamente entre ellas, lo que cualquier imprevisto puede determinar un atraso significativo.

DAIMCO

RESUMEN EJECUTIVO INT-11:11

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

PERIODO DEL INFORME

DEL			AL		
1	4	2019	30	4	2019

No. DE INFORME: 11 DE 2019

PLAZO TRANSCURRIDO

FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION		
7	6	2018	30	4	2019

TIEMPO CONTRACTUAL TRANSCURRIDO EN DIAS: 327 DE 2019

DATOS BASICOS

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
CONTRATO No.	06-6-10044-18
VALOR INICIAL	$9.250.463.250,08
VALOR ADICION 1	$433.346.000,23
VALOR ACTUALIZADO 1	$9.683.809.300,31
VALOR ADICION 2	$3.000.721.946,00
VALOR ACTUALIZADO 2	$12.684.531.246,31
PLAZO INICIAL	191,00
PRORROGA ADICION 1	135,00
PRORROGA ADICION 2	60,00
PLAZO ACTUALIZADO	386,00
FECHA DE INICIACIÓN	07 DE JUNIO DE 2018
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	15 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACION 1	29 DE ABRIL DE 2019
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	28 DE JUNIO DE 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	DAIMCO S.A.S
CONTRATO No.	06-3-10051-18
VALOR INICIAL ESTUDIO Y DISEÑOS	
VALOR ACTUALIZADO ESTUDIO Y DISEÑOS	
VALOR INICIAL INTERVENTORIA	$462.374.500,00
VALOR ADICION 1	$21.690.338,20
VALOR ADICION 2	$149.964.287,89
VALOR ACTUALIZADO INTERVENTORIA	$634.029.126,09
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	191,00
PRORROGA ADICION 1	135,00
PRORROGA ADICION 2	60,00
PLAZO ACTUALIZADO	386,00
FECHA DE INICIACIÓN INTERVENTORIA	07 DE JUNIO DE 2018
PLAZO INICIAL DE INTERVENTORIA	15 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACION INTERVENTORIA 1	29 DE ABRIL DE 2019
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	28 DE JUNIO DE 2019

AVANCE DEL OBRA

		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
PROGRAMADO ACUMULADO	%	0,00%	0,00%	18,74%	16,52%	39,27%	93,36%	28,62%	34,37%
	Valor			$ 1.738.111.769,69	[redacted]	$ 3.632.367.411,01	$ 8.638.687.036,79	$ 2.771.556.221,75	$ 3.328.391.911,69
EJECUTADO ACUMULADO	%	0,417%	1,307%	2,256%	7,176%	15,15%	22,54%	27,08%	30,43%
	Valor	$ 38.582.253,33	$ 120.934.593,83	$ 205.059.803,11	$ 664.029.832,46	$ 1.401.421.534,57	$ 2.085.259.403,39	$ 2.503.201.422,57	$ 2.946.784.044,44

		MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16
PROGRAMADO ACUMULADO	%	53,78%	44,30%	60,931%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Valor	$ 5.297.417.837,74	$ 5.623.324.381,69	7.728.845.403,85					
EJECUTADO ACUMULADO	%	41,146%	44,387%	58,970%	0,000%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Valor	$ 3.806.638.624,32	$ 5.706.352.583,42	7.480.065.975,99					

DAIMCO

Diseño, Asesoría, Interventoría, Gerencia, Administración y Construcción

RESUMEN EJECUTIVO INT-11:11

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRYOS FIJOS SIN REAJUSTE.

PERIODO DEL INFORME

DEL			AL		
1	4	2019	30	4	2019

No. DE INFORME: 11 DE 2019

PLAZO TRANSCURRIDO


FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION		
7	6	2018	30	4	2019

TIEMPO CONTRACTUAL TRANSCURRIDO EN DIAS: 327 DE 2019

MANEJO DE ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

ENTIDAD BANCARIA	BANCO POPULAR		
CIUDAD	BOGOTÁ		
SUCURSAL	BOGOTÁ		
No. DE CUENTA	220-050-11979-1		
FECHA APERTURA	18 de mayo de 2108		
No. DE CHEQUES GIRADOS EN EL PERIODO	2		
No. DE CHEQUES PAGADOS			
TOTAL ANTICIPO	$6.342.255.823,15		
VALOR DE ORDENES GIRADAS	1	$	469.621.215,00
	2	$	377.631.434,00
	3	$	153.288.214,00
	4	$	109.088.479,00
	5	$	104.245.831,00
	6	$	193.301.891,00
	7	$	156.386.540,00
	8	$	177.127.861,00
	9	$	31.081.982,00
	10	$	78.421.209,02
	11	$	516.185.811,00
	12	$	294.933.155,00
	13	$	130.006.602,00
	14	$	87.847.504,00
	15	$	640.820.608,00
	16	$	64.517.753,00
	17	$	227.063.583,00
	18	$	312.886.021,00
	19	$	31.702.500,00
	20	$	254.014.263,00
	21	$	61.532.375,00
	22	$	150.000.000,02
	23	$	40.571.444,09
	24	$	176.101.581,12
TOTAL	$		4.941.904.550,16
VALOR AMORTIZADO EN ACTA	$		2.542.500.249,11
SALDO ACTUAL	$		1.500.369.972,99
FECHA CIERRE DE CUENTA			

AVANCE DE OBRA

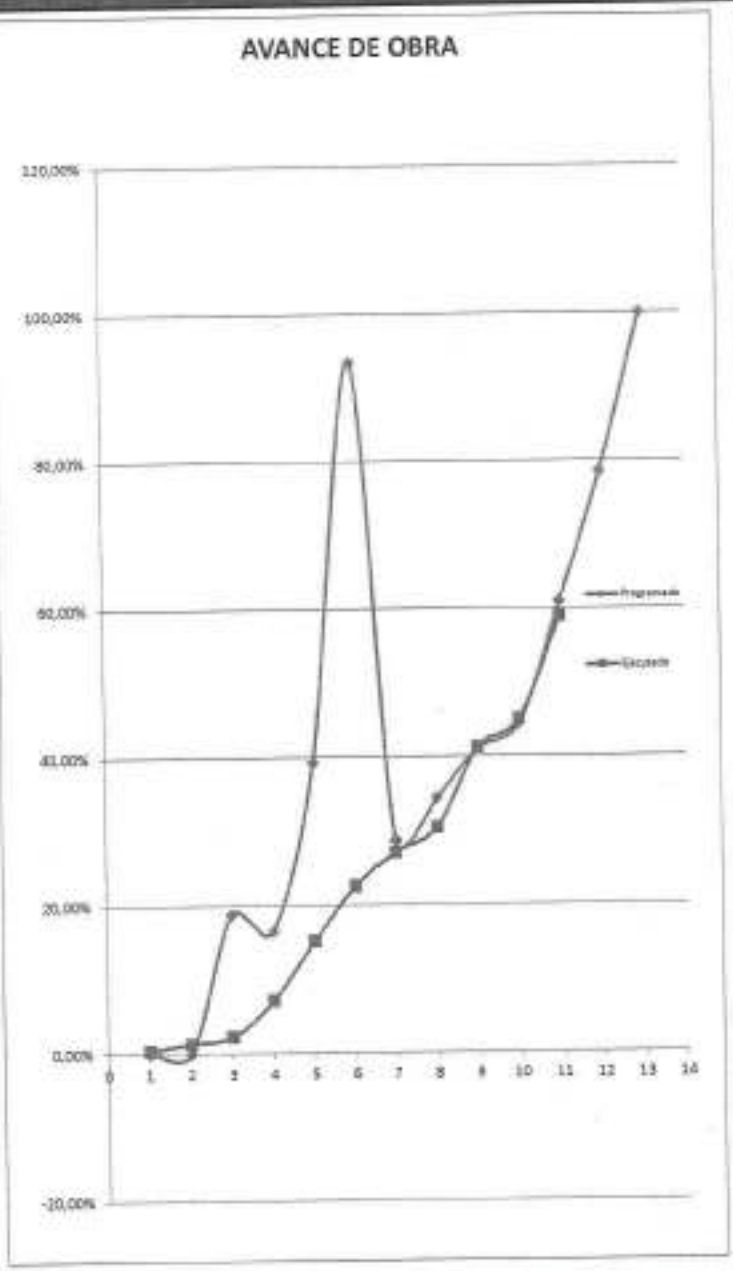

CONTROL DE POLIZAS

AMPAROS	VALOR	VIGENCIA SI	VIGENCIA NO
CUMPLIMIENTO	$ 1.936.751.881,00	X	
ANTICIPO	$ 4.941.904.651,00	X	
SALARIOS Y PRESTACIONES	$ 484.100.488,00	X	
RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 484.100.488,00	X	
ESTABILIDAD	$ 2.906.142.791,08	X	

OBSERVACIONES:

RESUMEN GENERAL

En el presente periodo con el valor presupuestal de $12.984.531.246,31 se tiene un avance ejecutado acumulado de 58,97% y un avance programado de 60,93%.
Desglosado con los siguientes valores presupuestales se tiene los siguientes porcentajes: Contractual $9.290.463.250,08 un ejecutado de 58,97% ;
adicional 1:$433.349.050,23 un ejecutado de 76,20%;
adicional 2:$3.000.721.946,00 ejecutado de 16,15%

En el presente periodo se ha presentado lluvias que han afectado las actividades de rellenos en el area de gimnasio

Se ha realizado las siguientes observaciones al constructor como el adecuado corte de las piezas de ceramica que se instala en los baños, conservar el alineamiento de las juntas, terminar repellos en areas que aun estan pendientes por ejecutar, corregir detalles de acabado en estucos, corregir lineamiento en la instalacion de guardaescobas, terminar completamente la instalacion de cubierta ya que falta el corte de hojas de cubierta, terminar estructura metalica en escaleras

DAIMCO

RESUMEN EJECUTIVO INT-11:11

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FUOS SIN REAJUSTE .

PERIODO DEL INFORME

DEL			AL		
1	4	2019	30	4	2019

No. DE INFORME: 11 DE 2019

PLAZO TRANSCURRIDO

FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION		
7	6	2018	30	4	2019

TIEMPO CONTRACTUAL TRANSCURRIDO EN DIAS: 327 DE 2019

Las fachadas de los bloques, que reiteradamente esta Interventoria ha realizado la observacion al constructor sobre el acabado de los repellos exteriores, no tiene la superficie de acabado adecuado para la aplicacion de pinturas. Se solicito al Constructor realizar la correcciones pertinentes.

A la fecha el constructor no ha facilitado la calificacion del soldador.

En el presente periodo se ha ejecutado mamposterias en bloque, instalaciones electricas e hidrosanitarias, repellos en muros internos y externos, instalacion de cubierta en el bloque de patrulleros y oficiales, relleno con recebo en areas exteriores de los bloques, estucos en bloque de oficiales y patrulleros, enchapes de baño en bloque de oficiales y patrulleros, instalacion de estructura para cielo raso, enchape de piso en baldosa en granito en casino y oficiales, trabajos electricos, actividades de relleno, repello impermeabilizado, instalacion de tapas metalicas en tanque de RCI, estructura metalica de escaleras y puentes entre bloques casino y oficiales, actividades preliminares en el area de gimnasio, se inicio la instalacion de red contraincendio

Se ve la necesidad de la construccion de filtros perimetrales a los tanques de almacenamiento y de red contraincendio por la presencia de aguas subterraneas, al igual en el area de gimnasio, para evitar afectaciones futuras a dichas estructuras. Esta interventoria ha realizado el seguimiento fotografico de tal situacion.

Esta interventoria ha solicitado la certificacion de calidad de estructura metalica de escaleras, de ceramicas y baldosa. A la fecha sin cumplimiento por parte del constructor.

A la fecha el contructor no ha ejecutado la demolicion de columnetas del eje 4 del bloque de oficiales.

A la fecha parcialmente se ha corregido algunos detalles de soldadura en la instalacion de escaleras

Se realizo la toma de muestras de concreto en las diferentes fundiciones.

Aun esta pendiente resanes en cubetas de cubierta donde se encuentran apoyadas las platinas de cubierta.

Interventoria y Constructor realizan las pruebas hidraulicas en obra

ACTIVIDADES A REALIZAR EL PRÓXIMO MES POR EL CONTRATISTA

18.01.03 IMPERMEABILIZACION EN ELASTOFOAM ELASTOMETRO DE URETANO DE 2MM APLICADA A 3 MANOS CON MAQUINA DE ALTA PRESIÓN (1500LBS) SISTEMA SPRAY EN SITIO SOBRE MORTERO

- 12.17 RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
- 13.01 ACOMETIDAS A TABLEROS NORMALES
- 13.04 ACOMETIDAS A TALEROS BOMBAS
- 13.09 SALIDAS ELECTRICAS
- 13.12 LUMINARIAS Y LÁMPARAS
- 13.13 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO
- 13.16 REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION
- 13.17 SUB ESTACION Y CELDAS DE MEDIA TENSION
- 13.18 TRANSFORMADOR DE POTENCIA
- 13.19 TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y SUS ACOMETIDAS
- 17.01 PINTURA
- 19.01 CIELO RASO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

30	4	2019
DD	MM	AAAA

Anexo No. 1 Informes Semanales

DAIMCO

INFORME SEMANAL INT-23.30

Semana Número: 46 — Del: 01 de Abril 2019 — Al: 06 de Abril de 2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 303

Nombre del Supervisor: POLICIA NACIONAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA PASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,55%	48,24%
Valor de la Obra programada:	$ 501.612.916,21	$ 6.119.017.873,22

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		56,6000%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ -	$7.179.444.885,41

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
Contrato No.	06-6-10044-18
Valor Inicial:	$6.250.463.250,00
Valor adicional 1	$433.346.050,23
Valor adicional 2	$3.000.721.946,00
Valor Actualizado:	$12.684.531.246,31
Plazo Inicial:	192 días
Plazo Actualizado:	396 días
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Terminación:	28 de Junio de 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	DAIMCO S.A.S
Contrato No.	06-3-10051-18
Valor Inicial:	$ 462.374.500,00
Valor adicional 1	$ 21.660.338,29
Valor adicional 2	$ 149.994.287,80
Valor Actualizado:	$ 634.029.126,09
Plazo Inicial:	192 días
Plazo Actualizado:	396 días
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Terminación:	28 de junio de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- 03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS
- 12.22.02 EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO
- 09.01.01 MURO BLOQUE LISO No.5
- 10.01.03 COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 10.01.04 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)
- 10.01.11 ALFAJÍAS CONCRETO A LA VISTA
- NP-030 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALLINERO EN MUROS DE MAMPOSTERIA, PARA POSTERIORMENTE PAÑETARLA
- 23.01.03 ENCHAPE DE MURO (PISO-TECHO) EN TABLETA CERAMICA, BLANCO JAYA, FORMATO DE 30 X 60 CM, BORDES RECTIFICADOS.
- 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (incluye estuco, filos y dilataciones)
- NP-047 BALDOSA EN GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO 30X30CM FONDO BLANCO ESPESOR CARA ARISTA 15MM GRANO HOMOGENEO. INCLUYE: DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN
- NP-048 GUARDA ESCOBA RECTO EN GRANO DE MARMOL PULIDO 30X7.2-1 CM FONDO BLANCO

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- NP-042 LOSA EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, ACABADO ANTIDESLIZANTE Y A LA VISTA COLOR GRIS ESPESOR 10 CM, PARA ANDENES EXTERIORES
- 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)
- 23.01.03 ENCHAPE DE MURO (PISO-TECHO) EN TABLETA CERAMICA, BLANCO JAYA, FORMATO DE 30 X 60 CM, BORDES RECTIFICADOS.
- 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (incluye estuco, filos y dilataciones)
- NP-048 GUARDA ESCOBA RECTO EN GRANO DE MARMOL PULIDO 30X7.2-1 CM FONDO BLANCO
- 03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS
- 10.01.03 COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 10.01.04 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)
- 12.17.01 TUBERIA 150mm PE RC TIPO FIRE SLIDE O SIMILAR LISTADO Y CERTIFICADO
- NP-047 BALDOSA EN GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO 30X30CM FONDO BLANCO ESPESOR CARA ARISTA 15MM GRANO HOMOGENEO. INCLUYE: DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

- Instalación estructura para cielo raso en panel yeso y Super board
- Formaleta para anderes perimetrales bloque 1 paruleros
- Por la situación de la ciudad con relación al bloqueo de la vía, el personal en obra disminuye en un 30% ya que no se tiene disponibilidad de algunos materiales para poder trabajar principalmente al cemento y el combustible para los equipos.
- Llega personal para revisar los materiales en obra de la red contra incendios.
- Se trabaja a media marcha por el problema en la vía, no ha llegado materiales ni combustible
- Después de casi un mes de cierre de la vía panamericana el Sábado 6 de Abril se dio paso nuevamente.

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TIRSO COSME OROZCO

Firma

Fecha de Aprobación de Formato INT-23.02: 30 de Abril de 2018

DAIMCO

Gestión, Asesoría, Interventoría, Ambiental, Diseño, Gerenciamiento y Construcción

INFORME SEMANAL INT-23.01

Semana Número: 47 — Del: 07 de Abril de 2019 — Al: 14 de Abril de 2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 310

Nombre del Supervisor: POLICIA NACIONAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,50%	91,79%
Valor de la Obra programada:	$ 484.255.005,04	$ 6.563.272.678,26

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,1600%	56,75%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 19.026.796,87	$7.198.471.462,26

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
Contrato No.	06-6-10044-18
Valor inicial:	$9.250.463.250,08
Valor adicional 1	$433.346.050,23
Valor adicional 2	$3.000.721.549,00
Valor Actualizado:	$12.684.531.248,31
Plazo Inicial:	192 días
Plazo Actualizado:	386 días
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Terminación:	28 de Junio de 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	DAIMCO S.A.S
Contrato No:	06-3-10051-18
Valor Inicial:	$ 462.374.500,00
Valor adicional 1	$ 21.660.336,29
Valor adicional 2	$ 149.994.287,80
Valor Actualizado:	$ 634.029.126,09
Plazo Inicial:	192 días
Plazo Actualizado:	386 días
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Terminación:	28 de junio de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- NP-042 LOSA EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, ACABADO ANTIDESLIZANTE Y A LA VISTA COLOR GRIS ESPESOR 10 CM, PARA ANDENES EXTERIORES
- 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)
- 23.01.03 ENCHAPE DE MURO (PISO-TECHO) EN TABLETA CERAMICA, BLANCO JAYA, FORMATO DE 30 X 60 CM, BORDES RECTIFICADOS.
- 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (incluye estuco, filos y dilataciones)
- NP-048 GUARDA ESCOBA RECTO EN GRANO DE MARMOL PULIDO 30X7.2-1 CM FONDO BLANCO
- 03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS
- 10.01.03 COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 10.01.04 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)
- 12.17.01 TUBERIA 160mm PE RC TIPO FIRE SLIDE O SIMILAR LISTADO Y CERTIFICADO
- NP-047 BALDOSA EN GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO 30X30CM FONDO BLANCO ESPESOR CARA ARISTA 15MM GRANO HOMOGENEO. INCLUYE: DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- NP-042 LOSA EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, ACABADO ANTIDESLIZANTE Y A LA VISTA COLOR GRIS ESPESOR 10 CM, PARA ANDENES EXTERIORES
- 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)
- 23.01.03 ENCHAPE DE MURO (PISO-TECHO) EN TABLETA CERAMICA, BLANCO JAYA, FORMATO DE 30 X 60 CM, BORDES RECTIFICADOS.
- 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (incluye estuco, filos y dilataciones)
- NP-048 GUARDA ESCOBA RECTO EN GRANO DE MARMOL PULIDO 30X7.2-1 CM FONDO BLANCO
- 03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS
- 10.01.03 COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 10.01.04 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 12.17.01 TUBERIA 160mm PE RC TIPO FIRE SLIDE O SIMILAR LISTADO Y CERTIFICADO
- NP-047 BALDOSA EN GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO 30X30CM FONDO BLANCO ESPESOR CARA ARISTA 15MM GRANO HOMOGENEO. INCLUYE: DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

- Armando hierro para sobre marco fachada lateral bloque 3 oficiales
- Ingresa mini retro para excavación red contra incendios
- Llega la planta para la sub estación
- Llega carpintería metálica y en aluminio
- Vestalando formaleta para sobre marco fachada bloque 3 oficiales
- Cartaras estuco Acrilico marcos ventanas bloque 3 oficiales
- Instalación estructura para cielo raso 1er piso bloque 3 oficiales

OBSERVACIONES:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TIRSO COSME OROZCO

Firma

DAIMCO

INFORME SEMANAL INT-23.02

Semana Número: 46 — Del: 14 de Abril de 2019 — Al: 20 de Abril 2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 317

Nombre del Supervisor: POLICIA NACIONAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	4,01%	55,75%	Obra Física Ejecutada (%)	2,14%	56,89%
Valor de la Obra programada:	$ 308.063.912,49	$ 7.071.336.790,75	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 64.215.449,64	#¡VALOR!

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
Contrato No:	09-9-10044-18
Valor Inicial:	$9.200.463.250,06
Valor adicional 1	$433.346.060,23
Valor adicional 2	$3.000.721.946,00
Valor Actualizado:	$12.634.531.246,31
Plazo Inicial:	192 días
Plazo Actualizado:	386 días
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Terminación:	28 de Junio de 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	DAIMCO S.A.S
Contrato No:	08-3-10051-18
Valor Inicial:	$ 462.374.500,00
Valor adicional 1	$ 21.680.339,25
Valor adicional 2	$ 149.964.287,80
Valor Actualizado:	$ 634.029.126,05
Plazo Inicial:	192 días
Plazo Actualizado:	386 días
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Terminación:	28 de junio de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- NP-042 LOSA EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, ACABADO ANTIDESLIZANTE Y A LA VISTA COLOR GRIS ESPESOR 10 CM, PARA ANDENES EXTERIORES
- 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)
- 23.01.03 ENCHAPE DE MURO (PISO-TECHO) EN TABLETA CERAMICA, BLANCO JAYA, FORMATO DE 30 X 60 CM, BORDES RECTIFICADOS.
- 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (incluye estuco, filos y dilataciones)
- NP-048 GUARDA ESCOBA RECTO EN GRANO DE MARMOL PULIDO 30X7.2/-1 CM FONDO BLANCO
- 03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS
- 10.01.03 COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 10.01.04 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 12.17.01 TUBERIA 160mm PE RC TIPO FIRE SLIDE O SIMILAR LISTADO Y CERTIFICADO
- NP-047 BALDOSA EN GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO 30X30CM FONDO BLANCO ESPESOR CARA ARISTA 15MM GRANO HOMOGENEO. INCLUYE: DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (incluye estuco, filos y dilataciones)
- 10.01.03 COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 10.01.04 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)
- 23.01.03 ENCHAPE DE MURO (PISO-TECHO) EN TABLETA CERAMICA, BLANCO JAYA, FORMATO DE 30 X 60 CM, BORDES RECTIFICADOS.
- 12.17.01 TUBERIA 160mm PE RC TIPO FIRE SLIDE O SIMILAR LISTADO Y CERTIFICADO
- 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (incluye estuco, filos y dilataciones)
- NP-047 BALDOSA EN GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO 30X30CM FONDO BLANCO ESPESOR CARA ARISTA 15MM GRANO HOMOGENEO. INCLUYE: DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN
- 03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS
- 10.01.11 ALFAJÍAS CONCRETO A LA VISTA
- 23.01.04 ENCHAPE DE MURO (PISO-TECHO) EN TABLETA CERAMICA, REF. PLANA BLANCA, FORMATO DE 30 X 45 CM, BORDES RECTIFICADOS.
- NP-048 GUARDA ESCOBA RECTO EN GRANO DE MARMOL PULIDO 30X7.2/-1 CM FONDO BLANCO

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

- El ingeniero Claros y el supervisor de la parte eléctrica de interventoria el señor Victor Paz revisaron detalles relacionados con el área de la sub estacion y con base en lo encontrado en obra se va a definir las conexiones a realizar en obra.
- Corte y demolición para ventana baños 1er piso bloque 3 oficinas para ventilación natural y no la mecánica planteada en el contrato.
- Se desmonta piso en grano 1er piso bloque 3 oficinas
- Llueve mucho en el transcurso de la semana y el suelo esta totalmente Saturado demoreando procesos de relleno y el retraso de secado de repellos, estucos y rellenos.
- Continua estructuracion de Cielo Raso en espera de tapar hasta que no se rompa nuevamente fugas en tubería hidraulica
- Se aplica Relleno Acrilico sobre Fachadas por recomendación en Comité del Mayor Angel Lopez, ya que en el cambio de tipo de Repello por la falta de material en el transcurso del cierre de la vía; Se generaron dos tonos en dicho repello de la Fachada.
- Excavación sobre Via perimetral fase 4 para limpieza cunetas e iniciar proceso constructivo para recarpeo.

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TIRSO COSME OROZCO

Firma

DAIMCO

INFORME SEMANAL INT-23:33

Semana Número: 49 — Del: 21 de Abril de 2019 — Al: 30 de Abril de 2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 327

Nombre del Supervisor: POLICIA NACIONAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,19%	60,94%
Valor de la Obra programada:	$ 658.075.853,32	$ 7.729.415.644,07
Obra Física Ejecutada (%)	0,08%	58,97%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 10.147.625,00	$7.480.068.075,95

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
Contrato No.	06-6-10044-18
Valor Inicial:	$9.250.463.250,08
Valor adicional 1	$433.346.050,23
Valor adicional 2	$3.000.721.946,00
Valor Actualizado:	$12.684.531.246,31
Plazo Inicial:	192 días
Plazo Actualizado:	366 días
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Terminación:	28 de Junio de 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Interventor:	DAIMCO S.A.S
Contrato No:	06-3-10051-18
Valor Inicial:	$ 462.374.800,00
Valor adicional 1	$ 21.650.338,29
Valor adicional 2	$ 149.994.287,80
Valor Actualizado:	$ 634.029.126,09
Plazo Inicial:	192 días
Plazo Actualizado:	366 días
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Terminación:	28 de junio de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (incluye estuco, filos y dilataciones)
- 10.01.03 COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 10.01.04 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento)
- 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)
- 23.01.03 ENCHAPE DE MURO (PISO-TECHO) EN TABLETA CERAMICA, BLANCO JAYA, FORMATO DE 30 X 60 CM, BORDES RECTIFICADOS.
- 12.17.01 TUBERIA 160mm PE RC TIPO FIRE SLIDE O SIMILAR LISTADO Y CERTIFICADO
- 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (incluye estuco, filos y dilataciones)
- NP-047 BALDOSA EN GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO 30X30CM FONDO BLANCO ESPESOR CARA ARISTA 15MM GRANO HOMOGENEO, INCLUYE: DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACION Y DILATACIÓN
- 03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS
- 10.01.11 ALFAJÍAS CONCRETO A LA VISTA
- 23.01.04 ENCHAPE DE MURO (PISO-TECHO) EN TABLETA CERAMICA, REF. PLANA BLANCA, FORMATO DE 30 X 45 CM, BORDES RECTIFICADOS.
- NP-048 GUARDA ESCOBA RECTO EN GRANO DE MARMOL PULIDO 30X7.2-1 CM FONDO BLANCO

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- 11.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)
- 23.01.04 ENCHAPE DE MURO (PISO-TECHO) EN TABLETA CERAMICA, REF. PLANA BLANCA, FORMATO DE 30 X 45 CM, BORDES RECTIFICADOS.
- 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (incluye estuco, filos y dilataciones)
- NP-047 BALDOSA EN GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO 30X30CM FONDO BLANCO ESPESOR CARA ARISTA 15MM GRANO HOMOGENEO, INCLUYE: DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN
- 17.01.04 PINTURA SOBRE MURO 100% AGUA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE RUSTICO ACABADO FINAL
- 12.17.01 TUBERIA 160mm PE RC TIPO FIRE SLIDE O SIMILAR LISTADO Y CERTIFICADO
- NP-048 GUARDA ESCOBA RECTO EN GRANO DE MARMOL PULIDO 30X7.2-1 CM FONDO BLANCO

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

- Instalación tubería de desagües área gimnasio
- Obra entrega resultados de las densidades tomadas por su laboratorio para el Área de gimnasio. 98 - 100
- Terminan instalación de tubería y empalmes del cárcamo con la cámara de inspección

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TIRSO COSME OROZCO

Firma

Anexo No. 2 Relación de Correspondencia

Enviada

POLICIA NACIONAL

DAIMCO

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

CONTRATO No. :	Consultoría de Consultoría PN-DIRAF No. 06-3-10051-18
OBJETO:	"Interventoría técnica administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No. 4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".
CONTRATISTA:	CONSORCIO RCI SUPERVISEZ
INTERVENTOR:	DAIMCO S.A.S
SUPERVISOR:	Mayor Ingeniero Civil Angel Giovanni López Ostos

No.	Titulo del Documento	Revisión #	Tomo No.	Fecha documento	Remitido por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
CPP-DIRAF-2018-124	Remision acta parcial No 09 - Contrato de obra	1	N.A	04/04/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD CON COPIA AL CONTRATISTA POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-125	Remision acta parcial No 09 Adicion 1 - Contrato de Obra	1	N.A	04/04/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD CON COPIA AL CONTRATISTA POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-126	Remision acta parcial No 09 Adicion 2 - Contrato de Obra	1	N.A	04/04/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD CON COPIA AL CONTRATISTA POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-127	Remision documentos PN-DIRAF-POPAYAN-159 y PN-DIRAF-POPAYAN-163 - Afectacion obra por cierres de vias	1	N.A	03/04/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-128	Remision orden de pago No 23	1	N.A	08/04/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO AL CONTRATISTA CON COPIA A LA ENTIDAD CONTRATANTE POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-129	Remision orden de pago No 24	1	N.A	08/04/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO AL CONTRATISTA CON COPIA A LA ENTIDAD CONTRATANTE POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-130	Respuesta al documento S-2019-007159/DIRAF-GUMAI con radicado Daimco D-2019-0533 del 12 de marzo de 2019 - Solicitud informar	1	N.A	08/04/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-131	Respuesta al documento S-2019-010412/DIRAF-GUMAI-29 con radicado Daimco D-2019-0796 del 09 de abril de 2019 - Solicitud concepto oficios PN-DIRAF-POPAYAN-159 Y 163	1	N.A	10/04/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-132	Remision informe mensual No 10	1	N.A	10/04/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-133	Remision programacion del contrato de obra No PN-DIRAF No 06-6-10044-18	1	N.A	23/03/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-134	Remision acta parcial de interventoria No 10	1	N.A	25/04/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-135	Remision acta parcial de interventoria No 10 Adicion 1	1	N.A	25/04/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-136	Remision acta parcial de interventoria No 10 Adicion 2	1	N.A	25/04/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-137	Remision acta parcial No 10 - Contrato de Obra	1	N.A	25/04/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD CON COPIA AL CONTRATISTA POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-138	Remision acta parcial No 10 Adicion 01 - Contrato de Obra	1	N.A	25/04/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD CON COPIA AL CONTRATISTA POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-139	Remision acta parcial No 10 Adicion 02 - Contrato de Obra	1	N.A	25/04/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD CON COPIA AL CONTRATISTA POR PARTE DE DAIMCO

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C. a los 30 días del mes Abril del 2019.

ENTREGA
NOMBRE: TIRSO CÓSME (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)
Fecha: 30 de Abril de 2019

RECIBE
Firma
NOMBRE: Mayor Ingeniero Civil Angel Giovanni López Ostos
Fecha: 30 de Abril de 2019

Original: POLICIA NACIONAL
Copias: Contratista, Interventoría

DAIMCO
NIT. 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-124

Bogotá D.C. 29 de marzo de 2019.

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión acta parcial No. 09 – Contrato de Obra.

Respetados señores.

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos informar que el documento citado en el asunto fue verificado y aprobado por parte de la interventoría.

Por lo anterior, se solicita a la Entidad proceder con el respectivo trámite de desembolso del Acta Parcial No.09, correspondiente al contrato de obra No PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Lo anterior para trámite y fines pertinentes

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
04 ABR 2019
HORA: 3:25
ESTE DOCUMENTO SE RECIBE PARA POSTERIOR VERIFICACIÓN

My Angel G. Lopez A
29/03/2019
18:20

Anexos	1 Tomo
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Escilla Palomino Representante Legal
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo
Copia 1.	Archivo – Contrato de interventoría
Copia 2	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ - Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402 - Aurelio Gutiérrez Castillo

Bogotá: 57 1 7020796 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 65 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021882 - 1

CPP-DIRAF-2018-125

Bogotá D.C. 29 de marzo de 2019.

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión acta parcial No. 09 Adición 1 – Contrato de Obra.

Respetados señores.

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos informar que el documento citado en el asunto fue verificado y aprobado por parte de la interventoría.

Por lo anterior, se solicita a la Entidad proceder con el respectivo trámite de desembolso del Acta Parcial No.09, correspondiente al contrato de obra No PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Lo anterior para trámite y fines pertinentes

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
04 ABR 2019
HORA: 07:25
ESTE DOCUMENTE ES PARTE
PARA FOLIO

My. Angel Giovanni López O
29/03/2019
18:20

Anexos	1 Tomo
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espita Palomino Representante Legal
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo
Copia 1.	Archivo – Contrato de interventoría
Copia 2	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ - Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402 - Aurelio Gutiérrez Castillo

Bogota: 57 1 7020795 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43S No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-126

Bogotà D.C. 29 de marzo de 2019.

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoria técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión acta parcial No. 09 Adición 2 – Contrato de Obra.

Respetados señores.

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos informar que el documento citado en el asunto fue verificado y aprobado por parte de la interventoría.

Por lo anterior, se solicita a la Entidad proceder con el respectivo trámite de desembolso del Acta Parcial No.09, correspondiente al contrato de obra No PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Lo anterior para trámite y fines pertinentes

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
04 ABR 2019
HORA 3:25
ESTE DOCUMENTO DEBE SER REVISADO PARA POSTERIOR VERIFICACION

MY Angel Lopez Ortiz 04/04/19

Anexos	1 Tomo	
Vo. Bo.	Ing. Omar Perez Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	Archivo – Contrato de interventoria	
Copia 2	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ - Carrera 19 No 64-41 – Oficina 402 - Aurelio Gutiérrez Castillo	

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049078
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT 900901482 - 1

CPP-DIRAF-2018-127

Bogotá D.C. 03 de abril de 2019.

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

FECHA: 03 ABR 2019
HORA: 15:16:16
NO. RADICACIÓN: 031166

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico-administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión documentos PN-DIRAF-POPAYAN-159 y PN-DIRAF-POPAYAN-163 – Afectación obra por cierres de vías.

Respetados señores,

El contratista mediante los comunicados relacionados en el asunto (se adjuntan documentos), informo la afectación al avance del proyecto a razón del paro indígena que actualmente se encuentra en la zona de influencia de la ciudad de Popayan, Departamento del Cauca, desde el pasado 10 de marzo de 2019 (se adjuntan soportes de prensa).

Lo anterior para su conocimiento.

Cordialmente,

JOSÉ VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	13 Folios	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pantz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	Archivo – Contrato de Interventoria	

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co

Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021492 - 1

CPP-DIRAF-2018-128

DIRAF
FECHA 08 ABR 2019
HORA:
No. RADICACIÓN 032625

Bogotá D.C. 04 de abril de 2019

Señores
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
Aurelio Gutiérrez Castillo
Representante Legal
Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Remisión orden de pago No. 23.

Respetado Ingeniero:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir debidamente firmado y verificado la orden de pago No. 23, correspondiente al documento No PN-DIRAF-POPAYAN-0167 con radicado Daimco No D-2019-0747 del 03 de abril de 2019, para continuar con su trámite ante la fiduciaria POPULAR.

Cuentas por pagar a proveedores (Materiales)

- Orden de giro No. 23 - Pago de aportes por compra de materiales dotación u alquiler de equipos a PRIXMA LTDA, por un valor de $ 28.416.764.00.
- Orden de giro No. 23 - Pago de aportes por compra de materiales dotación u alquiler de equipos a INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS MAGNETRON S.A.S, por un valor de $ 12.154.680.00.

Agradecemos de antemano su atención y estaremos atentos a cualquier solicitud.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Orlando Rodado
C80820748
08-04-2019

Anexos	16 folios	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pantuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego Lopez – Prof. Apoyo	
Copia 1.	Archivo – Contrato de Interventoría	
Copia 2.	POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Directora Administrativa y Financiera - Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 – CAN Mayor – Angel Lopez Ostos – Supervisor	

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegre@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogota D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 95 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-129

FOLIO
ARCHIVO GENERAL
CORRESPONDENCIA
FECHA 04 ABR 2019
HORA
GUIA SI NO
032627

Bogotá D.C. 04 de abril de 2019

Señores
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
Aurelio Gutiérrez Castillo
Representante Legal
Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Remisión orden de pago No. 24.

Respetado Ingeniero:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir debidamente firmado y verificado la orden de pago No. 24, correspondiente al documento No PN-DIRAF-POPAYAN-0167 con radicado Daimco No D-2019-0747 del 03 de abril de 2019, para continuar con su trámite ante la fiduciaria POPULAR.

- Orden de giro No. 24 - Devolución de aportes por pago de salarios, jornales y mano de obra, por un valor de $ 76.203.902.93.
- Orden de giro No. 24 - Devolución de aportes por pago de materiales, dotación y alquiler de equipos, por un valor de $ 85.467.254.71
- Orden de giro No. 24 - Devolución de aportes por pago de transporte y retiro de escombros, por un valor de $ 12.133.689.41
- Orden de giro No. 24 - Devolución de aportes por pago de descuentos y retenciones, por un valor de $ 2.296.734.07

Agradecemos de antemano su atención y estaremos atentos a cualquier solicitud.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Orlando Robayo
C80820 541
08-04-2019

Anexos	130 folios
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal
Elaboro	Arq. Diego Lopez – Prof. Apoyo
Copia 1.	Archivo – Contrato de Interventoría
Copia 2.	POLICIA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Directora Administrativa y Financiera - Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 – CAN Capitán. – Angel Lopez Ostos – Supervisor

Bogotá: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-130

15-26
10 ABR 2019
Recibida
Pt. Astrid Gallo
DIRAF - GUMAI

Bogotá D.C. 09 de abril de 2019.

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Mayor ANGEL GIOVANNI LOPEZ OSTOS
Supervisor de contrato.
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoria técnico-administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Respuesta al documento S-2019-007159/DIRAF-GUMAI con radicado Daimco D-2019-0533 del 12 de marzo de 2019 – Solicitud informar

Respetados Señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, y en respuesta al comunicado del asunto, nos permitimos manifestar que la Interventoria objeto de este contrato ha sido ejercida por nuestra empresa como estipula el contrato en sus distintas clausulas, y es así como nuestros profesionales en obra han velado siempre por el correcto desarrollo de los trabajos, y de forma oportuna han realizado las tomas de ensayos en concretos y soldaduras de estructuras metálicas , y oportunamente han solicitado al contratista de obra realizar las correcciones atendiendo los diseños y normas, y en contadas ocasiones por falta de información exacta y clara de los diseño, se ha tenido que tomar decisiones, no sin antes haber agotado las distintas etapas administrativas para tratar de resolver las dudas, también se ha velado por un oportuno seguimiento al tema ambiental y de seguridad industrial, prueba de todo este trabajo antes mencionado son las anotaciones en bitácora y llamados de atención en comités de obra que sirven como testimonio del trabajo oportuno como corresponde a la interventoria, si bien el contratista de obra ha sido diligente y atento de la gran mayoría de las observaciones, en ocasiones es necesario informar de manera formal situaciones de obra que por el respectivo alcance que tiene cada una de las partes, se nos escapa al deseo correcciones de forma inmediata en obra, esto fue lo que motivo la comunicación CPP-DIRAF-2018-108.

Esta interventoria tiene los mejores propósitos con el proyecto y con el fin de canalizar esfuerzo para la culminación de obra continuaremos esforzando cada dia para contribuir con el fin de obra a tiempo.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	N/a
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal
Elaboro	Ing Tirso Cosme – Director de Interventoria
Copia 1.	Archivo – Contrato de interventoria

Bogota: 57 1 7020799 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co

Calle 446 No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021483 - 1

CPP-DIRAF-2018-131

Bogotá D.C. 10 de abril de 2019.

10 ABR 2019 15:26
Recibido
PT: Astrid Gallo
DIRAF - GUMAI

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Mayor ANGEL GIOVANNI LOPEZ OSTOS
Supervisor de contrato.
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "interventoría técnico-administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Respuesta al documento S-2019-010412/DIRAF-GUMAI-29 con radicado Daimco D-2019-0796 del 09 de abril de 2019 – Solicitud concepto oficios PN DIRAF POPAYAN 159 y 163.

Respetados Señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, y en respuesta al comunicado del asunto, nos permitimos manifestar que, en relación a los comunicados enviados por el contratista, la interventoría considera que efectivamente el cierre de la vía panamericana por espacio de 27 días tuvo implicaciones directas sobre la ejecución de la obra, a pesar que durante este tiempo, el contratista estuvo ejecutando las actividades del contrato y de manera precavida almaceno materiales para la ejecución de las obras.

Sin embargo, los suministros de insumos eléctricos y de carpintería metálica (Ventanería y Puertas) no se lograron realizar, pese a que el contratista cuenta con estos materiales en talleres en la ciudad de Bogotá, listos para él envió.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que estas actividades cuentan con un tiempo considerable previsto en la programación, y la no ejecución de las mismas a tiempo generan un retraso considerable, por las circunstancias citadas en los comunicados enviados por el contratista, y al presentarse una situación de fuerza mayor, la interventoría considera que el contratista de obra podría solicitar tiempo adicional y en caso de que persista el bloqueo de parte de las comunidades indígenas habría que considerar una suspensión.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	N/a
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal
Elaboro	Ing Tirso Cosme – Director de Interventoría
Copia 1.	Archivo – Contrato de interventoría

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900031482 - 1

CPP-DIRAF-2018-132

POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa
RADICACION
Radicado N° E-035833
Fecha: 2 ABR 2019
Hora: 15:28 Folios: 312

Bogotá D.C. 10 de Abril de 2019.

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoria técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión Informe Mensual No 10.

Respetados Señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir el informe mensual No. 10 de Interventoría, comprendido entre el primero (01) de Marzo de 2019 al treinta y uno (31) de Marzo de 2019. La presente con el fin de informar a la entidad contratante el avance de ejecución del contrato.

Agradecemos de antemano su atención.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	312 Folios	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	Archivo – Contrato de interventoría	

Bogotá: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049279
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 95 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900031482 - 1

CPP-DIRAF-2018-133

Bogotá D.C. 12 de Abril de 2019.

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico-administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión Programación del Contrato de Obra No. PN DIRAF No 06-6-10044-18

Respetados Señores.

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, se remite para su conocimiento y fines pertinentes la programación ajustada a la prorroga y adición No 2 suscrita mediante el modificatorio No 05 del Contrato de Obra No. PN DIRAF No 06-6-10044-18, la cual se encuentra revisada y avalada por parte de la Interventoría.

Se adjunta el documento impreso.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

My angel lopez C.
23/03/2019
18:00 horas

Anexos	27 folios
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal
Elaboro	Arq. Diego Lopez – Prof. de Apoyo
Copia 1.	Archivo – Contrato de Interventoría
Copia 2.	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ - Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402 - Aurelio Gutiérrez Castillo

Bogotá: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO

NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-134

Bogotá D.C. 25 de Abril de 2019

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18 "Interventoría técnico-administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión Acta parcial de Interventoría No. 10.

Respetados Señores.

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y según lo establecido en la ***CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO: LA POLICIA*** *pagara al* ***CONTRATISTA*** *el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el anexo No 1 "DATOS DEL CONTRATO"* El cual reza ***"(...) PAGOS PARCIALES – Se realizaran pagos parciales hasta completar el 95% del valor del contrato, sujetas al porcentaje de avance del contrato de obra que corresponderá al valor ejecutado en el respectivo periodo (...)"*** por lo anterior nos permitimos remitir el acta parcial No. 10 de interventoría correspondiente al periodo 30 de marzo de 2019 al 24 de abril de 2019 del contrato de la referencia, con los soportes relacionados a continuación:

- Original Factura de Venta 1399
- Acta recibo a satisfacción Interventoría
- RUT Daimco S.A.S
- Resolución de facturación DAIMCO S.A.S
- Referencia Bancaria DAIMCO S.A.S
- Copia cédula de ciudadanía (Representante legal)
- Certificado de aportes parafiscales
- Soportes Revisor Fiscal

Lo anterior para trámite y fines pertinentes

Cordialmente,

JOSE [illegible] BOCANEGRA
GERENTE TÉCNICO
DAIMCO S.A.S.

NY Angel Giovanni López
25/04/2019
15:49

Anexos	11 folios	
Vo. Bo.	Ing. Omar Perruz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	Archivo – Contrato de interventoría	

Bogota: 57 1 7020799 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049279
jbocanegra@daimco.com.co

Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900CCIMCO - 1 -

CPP-DIRAF-2018-135

Bogotá D.C. 25 de Abril de 2019

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoria PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoria técnico-administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión Acta parcial de Interventoria No. 10 Adición 1.

Respetados Señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y según lo establecido en la ***CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO: LA POLICIA*** *pagara al* ***CONTRATISTA*** *el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el anexo No 1 "DATOS DEL CONTRATO"* El cual reza ***"(...) PAGOS PARCIALES – Se realizaran pagos parciales hasta completar el 95% del valor del contrato, sujetas al porcentaje de avance del contrato de obra que corresponderá al valor ejecutado en el respectivo periodo (...)"*** por lo anterior nos permitimos remitir el acta parcial No. 10 de interventoria correspondiente al periodo 30 de marzo de 2019 al 24 de abril de 2019 del contrato de la referencia, con los soportes relacionados a continuación:

- Original Factura de Venta 1400.
- Acta recibo a satisfacción Interventoria
- RUT Daimco S.A.S
- Resolución de facturación DAIMCO S.A.S
- Referencia Bancaria DAIMCO S.A.S
- Copia cédula de ciudadania (Representante legal)
- Certificado de aportes parafiscales
- Soportes Revisor Fiscal

Lo anterior para trámite y fines pertinentes

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

My. Angel Giovanni Lopez
15:54 horas
25/04/2019

Anexos	11 folios	
Vo. Bo.	Ing. Omar Peñuz Restrepo - Ing. Carlos Escilla Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	Archivo – Contrato de interventoria	

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A – 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT. 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-136

Bogotá D.C. 25 de abril de 2019

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18 "Interventoría técnico-administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión Acta parcial de Interventoría No. 10 Adición 2.

Respetados Señores.

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y según lo establecido en la ***CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO: LA POLICIA*** *pagara al* ***CONTRATISTA*** *el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el anexo No 1* "DATOS DEL CONTRATO" El cual reza ***"(...) PAGOS PARCIALES – Se realizaran pagos parciales hasta completar el 95% del valor del contrato, sujetas al porcentaje de avance del contrato de obra que corresponderá al valor ejecutado en el respectivo periodo (...)"*** por lo anterior nos permitimos remitir el acta parcial No. 10 de interventoría correspondiente al periodo 30 de marzo de 2019 al 24 de abril de 2019 del contrato de la referencia, con los soportes relacionados a continuación:

- Original Factura de Venta 1401.
- Acta recibo a satisfacción Interventoría
- RUT Daimco S.A.S
- Resolución de facturación DAIMCO S.A.S
- Referencia Bancaria DAIMCO S.A.S
- Copia cédula de ciudadanía (Representante legal)
- Certificado de aportes parafiscales
- Soportes Revisor Fiscal

Lo anterior para trámite y fines pertinentes

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

MY Angel Gricelda Lopez Cuka
25/04/2019
15:58 horas

Anexos	11 folios	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	Archivo – Contrato de interventoría	

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 65 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT. 900021483 - 1

CPP-DIRAF-2018-137
Daimco.

Bogotá D.C. 25 de abril de 2019.

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18 "Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión acta parcial No. 10 – Contrato de Obra.

Respetados señores.

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos informar que el documento citado en el asunto fue verificado y aprobado por parte de la interventoría.

Por lo anterior, se solicita a la Entidad proceder con el respectivo trámite de desembolso del Acta Parcial No.10, correspondiente al contrato de obra No PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Lo anterior para trámite y fines pertinentes

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TÉCNICO
DAIMCO S.A.S.

GUTIERREZ CASTILLO
25 ABR 2019
Hora 11:00 Folios 5 Anexos
FIRMA QUIEN SE RECIBE
ELIMINAR RADICACIÓN

My Angel Gerardo López
25/04/2019
15:48 horas.

Anexos	80 Folios
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo
Copia 1.	Archivo – Contrato de interventoría
Copia 2.	CONSORCIO RCS-GUTIERREZ - Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402 - Aurelio Gutiérrez Castillo

Bogota: 57 1 7020796 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A – 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 95 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900921492 - 1

CPP-DIRAF-2018-138
DAIMCO

Bogotá D.C. 25 de abril de 2019.

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18 "Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión acta parcial No. 10 Adición 1 – Contrato de Obra.

Respetados señores.

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos informar que el documento citado en el asunto fue verificado y aprobado por parte de la interventoría.

Por lo anterior, se solicita a la Entidad proceder con el respectivo trámite de desembolso del Acta Parcial No.10 Adición 01, correspondiente al contrato de obra No PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Lo anterior para trámite y fines pertinentes

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
25 ABR 2019
HORA: 11 am FOLIOS: Suscr
ESTE DOCUMENTO SE RECIBE PARA POSTERIOR VERIFICACIÓN

My angel Giraldo Lopez
25/04/2019
15:53 horas

Anexos	36 Folios	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	Archivo – Contrato de interventoría	
Copia 2	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ - Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402 - Aurelio Gutierrez Castillo	

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co

Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO

NIT: 830021492 - 1

CPP-DIRAF-2018-139

DAIMC

Bogotá D.C. 25 de abril de 2019.

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18 "Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión acta parcial No. 10 Adición 2 – Contrato de Obra.

Respetados señores.

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos informar que el documento citado en el asunto fue verificado y aprobado por parte de la interventoría.

Por lo anterior, se solicita a la Entidad proceder con el respectivo trámite de desembolso del Acta Parcial No.10 Adición No 2, correspondiente al contrato de obra No PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Lo anterior para trámite y fines pertinentes

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

GUTIERREZ CASTILLO
29 ABR 2019
HORA 11. am
Este documento se recibe para posterior verificación

My Angel Giovanni López
25/04/2019
15:59 hora

Anexos	48 Folios
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Escilla Palomino Representante Legal
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo
Copia 1.	Archivo – Contrato de interventoría
Copia 2	CONSORCIO SCS-GUTIERREZ - Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402 - Aurelio Gutiérrez Castillo

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co

Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

Recibida

POLICÍA NACIONAL

DAIMCO

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

CONTRATO No. :	Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18
OBJETO:	"...levantamiento técnico administrativo, financiero, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento del Cauca y Comunidad de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".
CONTRATISTA:	CONSORCIO GCC GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO S.A.S
SUPERVISOR:	Mayor Ingeniero Civil Ángel Giovanni López Ostos

No.	Titulo del Documento	Version #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
D-2019-0747	Orden de pago 23 y 24	1	N.A	03/04/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2019-0782	Solicitud de suspension del plazo de ejecucion contrato	1	N.A	08/04/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2019-0796	Solicitud concepto oficios PN-DIRAF-POPAYAN 159 Y 163	1	N.A	09/04/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DE LA ENTIDAD
D -3-0820	Envio flujograma en dos copias	1	N.A	11/04/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2019-0821	Apus No Previstos Electricos	1	N.A	11/04/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2019-0917	Documentos Corte #10 - Adicion 1	1	N.A	25/04/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2019-0918	Dotacion y Equipos de gimnasio	1	N.A	25/04/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2019-0919	Documentos Corte # 10	1	N.A	25/04/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2019-0920	Documentos Corte #10 - Adicion 2	1	N.A	25/04/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2019-0924	Maniobra electrica media tension e instalacion electrica gim	1	N.A	25/04/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C. a los 30 días del mes Abril del 2019.

ENTREGA
NOMBRE: TIRSO COSME (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)
Fecha: 30 de Abril de 2019

RECIBE
Firma
NOMBRE: Mayor Ingeniero Civil Ángel Giovanni López Ostos
Fecha: 30 de Abril de 2019

Original: POLICÍA NACIONAL
Copias: Contratista, Interventoría

DAIMCO
Abril 03- 2019 Hora: 13 :31 p.m
Folios: 01 Anexos: 147
No Radicado D-2019-0747
Radicado: Yesenia Gomez /087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Bogotá, abril 2 de 2019

PN-DIRAF-POPAYAN-167

Señores

DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-
Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7020797
Bogotá

Referencia: CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Orden de pago 23 y 24

Por medio de la presente se adjunta los siguientes documentos para pago respectivo.

- Orden de pago 23
- Orden de pago 24
- Relación de ordenes de pago a la 23
- Relación de ordenes de pago a la 24

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

Bogotá, abril 5 de 2019

PN-DIRAF-POPAYAN-168

Señores
DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-
Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Bogotá

DAIMCO
Abril 08- 2019 Hora: 10 : 58 a.m
Folios: 05 Anexos: 00
No.Radicado D-2019-0782
Radicado: Yesenia Hamaz 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Referencia: **CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: Solicitud de suspensión del plazo de ejecución contrato

Respetado ingeniero,

Como el Contratista ha venido informando en los últimos días, en oficios PN-DIRAF-POPAYAN-159 y PN-DIRAF-POPAYAN-163, y en bitácora de obra, desde el pasado 13 de marzo de 2019, se ha venido presentando una tensa situación en el departamento del Cauca, debido a las reclamaciones del CRIC, Consejo Regional Indígena, al gobierno central. El mencionado consejo como forma de presión al gobierno ha venido realizando cierres en las vías principales de acceso al departamento del Cauca, lo que ha ocasionado, a la fecha, desabastecimiento de algunos productos de primera necesidad, combustibles e insumos de toda índole, dentro de los cuales se encuentran los materiales propios para la construcción que vienen de otras regiones del país, ya que el departamento es, netamente, productor agrícola.

Integrantes del CRIC y sus exigencias de tierras

Los indígenas justificaron sus peticiones

Los dirigentes del CRIC se mantienen firmes en sus peticiones de tierras hacia el Gobierno Nacional.

Esta vez, reiteraron su petición por medio de Giovanni Yule, dinamizador político de este consejo; quien explicó algunas de las razones de sus exigencias de tierras.

Yule afirmó que la petición de más de 49 mil hectáreas que le solicitan al Gobierno, van con el fin de "fortalecer la agricultura en sus territorios", debido a que la mayoría de las tierras que poseen en la actualidad no son permitidas para trabajar en la producción de alimentos. "Nosotros tenemos más de 546 mil hectáreas, pero el 80% están en zonas de protección, como páramos, nacimientos, ríos y demás, que no pueden ser intervenidas", indicó el vocero del CRIC.

A lado, que en cuanto al restante equivalente a más de 140 mil hectáreas, la mayor parte de ellas se encuentran en zonas de laderas, donde realizar agricultura es mucho más costoso.



Giovanni Yule, dinamizador político del CRIC.

Así mismo, expresó que esta petición de más de 49 mil hectáreas, es por incumplimientos de gobiernos anteriores, es decir que no hay una modificación en las solicitudes.

Sin embargo, a pesar de su petición, los directivos son conscientes que ésta no será cumplida en su totalidad y que deberán negociar esa cantidad hasta llegar a un acuerdo. Por su parte la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ha sido enfática en que solo podrían cumplir con 1.500 hectáreas de tierra y que no negociarán algo que el Gobierno no pueda cumplir. Hasta el momento, no ha habido un rechazo oficial a dicha propuesta por el CRIC.

DIARIO DEL CAUCA
Lunes 1° de abril de 2019

GENERAL

Luego de 22 días de protestas, indígenas exigen al Presidente Iván Duque buscar soluciones en defensa de la vida y el territorio.

Rechazan las vías de hecho

Indígenas reiteran su voluntad para dialogar

En su ejercicio de réplica, la bancada de la oposición y la minga indígena respondieron a las declaraciones hechas por el presidente Iván Duque a lo largo de la semana sobre las peticiones de las comunidades indígenas exigiendo mayores recursos para la población.

El senador Feliciano Valencia fue el vocero de la respuesta a Duque. En el video, Valencia reitera la voluntad de diálogo por parte de la minga e invitó una vez más al presidente Duque para que visite el Cauca reiterando "venga señor presidente, aquí no hay gente violenta".

En la réplica se recalca que si bien se anunciaron 10 billones de pesos como base presupuestal para cubrir las necesidades de los 102 pueblos indígenas, la Minga ratifica que esos recursos no pueden ser transversales ni regados en los diferentes pactos del Plan Nacional de Desarrollo para no repetir incumplimientos de años anteriores en los que el dinero se destinó a diferentes artículos del PND.



El senador Feliciano Valencia grabó un video, acompañado de miembros de la minga, en donde le reclama al Presidente Iván Duque la voluntad de diálogo.

El senador del Mais y líder de la Cric se refirió al llamado por la defensa de la vida de líderes indígenas y sociales pidiendo al presidente Duque hacer parte del diálogo para solucionar las exigencias de los sectores concentrados en la Minga.

"Somos pueblos que hemos sufrido la rigurosidad del abandono, no obstante nos negamos a desaparecer" añadió Valencia quien añadió que las manifestaciones ya se están trasformando en una Minga Nacional a la que se han unido más comunidades.

La respuesta de la gran minga nacional se debe al último pronunciamiento del Presidente en el cual afirmó que "Por las vías de hecho no haría presencia".

Esto se dio luego de que un grupo de congresistas se plantara a las afueras de la Casa de Nariño pidiendo hablar con él, para solicitarle que cumpliera con esta petición que desde hace varios días le viene haciendo la minga indígena del Cauca para llegar a un acuerdo y proceder a levantar el bloqueo de la vía Panamericana, que está a punto de cumplir 22 días.

Sigue la presión sobre Iván Duque

Liberales e izquierda pujan por llegada del ejecutivo al Cauca

En medio de las dificultades que afronta el departamento para suplirse por el corte de su vía principal, la bancada parlamentaria se mueve acuciosa en pos de conseguir que finalmente el presidente Iván Duque decida venir a conversar con La Minga.

Así se ha conocido por parte de los congresistas de la región liderados especialmente por los liberales y por movimientos de izquierda. Voces como la del senador Feliciano Valencia, del Consejo regional indígena del Cauca, han decidido estar al frente de la solicitud pese a la posición unilateral que pretende fijar el mandatario nacional. Creen firmemente en que la petición debe ser insistente hasta lograr resultados.

Acercar, la clave

De acuerdo con medios de corte nacional, los senadores Alexander López y Feliciano Valencia, por el ala izquierda, y Luis Fernando Velasco por el partido liberal, estarían efectuando acercamientos de todo tipo entre las partes buscando que ambas se encuentren. Saben que lo primero es lograr el acercamiento para luego pasar a un segundo momento.

Dicho momento estaría representado en el diálogo alrededor del pliego que maneja La Minga y cuyos alcances incluso rebasan los intereses propios del CRIC. Al tocar temas como el desarrollo del primer punto de los acuerdos en La Habana, rechazo al fracking y al uso del glifosato, la Minga tocará aspectos "espinosos" dentro de la política nacional.



Alexander López, senador.



Feliciano Valencia, congresista.

Movimiento influencias

Por su parte, al senador liberal de origen payanés, Luis Velasco, se le ha reconocido el mover sus influencias políticas y cierto de grado de aceptación que tiene entre las partes para construir una especie de puente. Sabe el senador de las exigencias que tiene en la región respecto a un problema cuya dimensión es de su resorte.

Misma posición a la asumida por Crisanto Pisso quien fue hasta estar en el Concejo municipal payanés ungido por la presidente del liberalismo en el Cauca, la concejal Argeny Gómez.

DIARIO DEL CAUCA

POLÍTICA

Piden a Duque que venga hasta la Ciudad Blanca

Acusan a concejales de hacer juego a la minga caucana

Pronunciamiento del concejal Almario causó controversia entre algunos de sus colegas. El cabildante propone a Popayán como sitio de reunión para que el Presidente de la República dialogue con los líderes de la minga indígena.

El concejal conservador Franky Darío Almario dijo en la sesión extraordinaria sobre el problema de la Minga en el Cauca, que hay concejales cuya conducta le hacen el juego al bloqueo vial y se ellos parte de las comunidades que protestan.

Su declaración generó alguna controversia al quedar la sensación de que dicha acusación podría recaer sobre algún homólogo del cabildo payanés. Luego de lo cual Almario reiteró en la necesidad de redactar una invitación al presidente Iván Duque con el objeto de poder ofrecer a la capital caucana como lugar idóneo para llevar a cabo las negociaciones.



Franky Almario, concejal de Popayán.



Juan Duque, Presidente de la República.

Cree que es riesgoso

Para Almario, la llegada del presidente Iván Duque al Pital, en Caldono, núcleo de la minga, conllava un cierto riesgo por la presencia de elementos infiltrados tal como lo señaló en su intervención. Y agregó que por dicho motivo es necesario considerar a la capital como el lugar idóneo en donde llevar a cabo ese encuentro en los líderes indígenas y el gobierno central.

"Para nadie es un secreto que en medio de la Minga hay infiltrados de las Farc, del ELN. Incluso hay personas que son concejales y se creen indígenas y van a apoyar este tema", anotó el concejal del partido conservador.

Con todos los actores

Expresó el corporado que la oferta y selección de Popayán como el punto de encuentro para los mingueros y el alto gobierno es la mejor por la logística que posee la capital caucana y la posibilidad de reunir de una vez a todos los actores importantes del departamento. Sería una posibilidad real para llegar a la solución definitiva.

"Aquí estarían los representados los voceros de la Minga, el presidente Duque y sus ministros, los gremios de nuestra región, los asambleístas, los concejales, los funcionarios de la administración payanesa, los alcaldes y concejales de los municipios nuestros. Todos quienes hacen la vida económica y política de esta parte del país para continuar el acuerdo de mayo y abrirla para nuestra casa", sostuvo el concejal Almario.

Propuesta en el aire

Manifestó el corporado, al concluir su intervención que es necesario plantear en el acta una proposición a fin de cristalizar la Observación que recogió la presidencia de la corporación en cabeza del concejal de la ASI, Carlos Enrique Guerrero Vela.

Esta petición fue puesta en manos de la Comisión accidental que se encargará en el Concejo para estudiar el desarrollo de la Minga y actuar para colaborar en la solución. Dicha comisión está compuesta por los corporados Argemis Gómez, Luis Bravo y Wilson Valencia.

La idea ya había sido puesta en consideración en otra ocasión al interior del Concejo por la que fue suspendida la sesión y se coordinaría una visita a la zona para que el mandatario nacional llegue al Cauca a conjurar en parte el impasse invernal.

Piden solución antes de la Semana Santa

Bloqueo de la Panamericana deja en crisis al sector hotelero

Los hoteles de Popayán reportan significativas pérdidas económicas a causa de los días de hecho de la minga indígena. Varios establecimientos han cerrado sus puertas

Varios hoteles de Popayán han tenido que cerrar sus puertas a causa de las afectaciones generadas por los bloqueos en la vía Panamericana. Voceros de este sector hacen el llamado antes de la llegada de la Semana Santa para evitar mayores afectaciones.



José Manuel Vargas, presidente Cotelco.

Diana

José Manuel Vargas, presidente de Cotelco Cauca, dijo a este medio que se encuentran en una crisis económica que se agrava cada día, puesto que se acerca la Semana Mayor, la mejor temporada que tiene este sector en el año, y aun no se conoce de soluciones.

El vocero indicó que la crisis ha generado la cancelación de reservas y de desayunos en las cadenas, "los pocos que habían reservado se cayeron al hotel para no perder sus celebraciones religiosas, han llamado a cancelar debido a que no cuentan las garantías de seguridad, la calidad baja mucho y la gente opta por irse para el lado de devolución de dinero".

Los perjudicados

"El hotelero sabe que los turistas no quieren llegar a la ciudad para estar dos días, los días reconocidos los hemos visto caer por la ausencia de la planta de personal y los elevados costos que requiere mantener las instalaciones de los hoteles", dijo el presidente de Cotelco, quien resaltó que las afectaciones en la vía del no cesan, solo el cambio de ruta comercial con el aeropuerto, puesto que los precios siguen siendo cuatro veces más elevados que los costos para llegar a los turistas.

Así las cosas, este empresario añadió que el Viacrucis de los colegas no han visto la obligación de cerrar, pues todos los días pagan y no cuentan con ningún apoyo económico para el sostenimiento, de tal manera que varios se quedan sin ningún cliente disponible.

Llamado

"Le hacemos un llamado a los turistas no quieran llegar a la ciudad para estar dos días, los días reconocidos los hemos visto caer por la ausencia de la planta de personal y los elevados costos que requiere mantener las instalaciones de los hoteles", dijo el presidente de Cotelco, quien resaltó que las afectaciones en la vía del no cesan, solo el cambio de ruta comercial con el aeropuerto, puesto que los precios siguen siendo cuatro veces más elevados que los costos para llegar a los turistas.

Así las cosas, este empresario añadió que el Viacrucis de los colegas no han visto la obligación de cerrar, pues todos los días pagan y no cuentan con ningún apoyo económico para el sostenimiento, de tal manera que varios se quedan sin ningún cliente disponible.

Llamado

"Le hacemos un llamado a los turistas no quieran llegar a la ciudad para estar dos días, los días reconocidos los hemos visto caer por la ausencia de la planta de personal y los elevados costos que requiere mantener las instalaciones de los hoteles", dijo el presidente de Cotelco, quien resaltó que las afectaciones en la vía del no cesan, solo el cambio de ruta comercial con el aeropuerto, puesto que los precios siguen siendo cuatro veces más elevados que los costos para llegar a los turistas.

Así las cosas, este empresario añadió que el Viacrucis de los colegas no han visto la obligación de cerrar, pues todos los días pagan y no cuentan con ningún apoyo económico para el sostenimiento, de tal manera que varios se quedan sin ningún cliente disponible.

Llamado

"Le hacemos un llamado a los turistas no quieran llegar a la ciudad para estar dos días, los días reconocidos los hemos visto caer por la ausencia de la planta de personal y los elevados costos que requiere mantener las instalaciones de los hoteles", dijo el presidente de Cotelco, quien resaltó que las afectaciones en la vía del no cesan, solo el cambio de ruta comercial con el aeropuerto, puesto que los precios siguen siendo cuatro veces más elevados que los costos para llegar a los turistas.

Así las cosas, este empresario añadió que el Viacrucis de los colegas no han visto la obligación de cerrar, pues todos los días pagan y no cuentan con ningún apoyo económico para el sostenimiento, de tal manera que varios se quedan sin ningún cliente disponible.

Llamado

"Le hacemos un llamado a los turistas no quieran llegar a la ciudad para estar dos días, los días reconocidos los hemos visto caer por la ausencia de la planta de personal y los elevados costos que requiere mantener las instalaciones de los hoteles", dijo el presidente de Cotelco, quien resaltó que las afectaciones en la vía del no cesan, solo el cambio de ruta comercial con el aeropuerto, puesto que los precios siguen siendo cuatro veces más elevados que los costos para llegar a los turistas.

Así las cosas, este empresario añadió que el Viacrucis de los colegas no han visto la obligación de cerrar, pues todos los días pagan y no cuentan con ningún apoyo económico para el sostenimiento, de tal manera que varios se quedan sin ningún cliente disponible.

Llamado

"Le hacemos un llamado a los turistas no quieran llegar a la ciudad para estar dos días, los días reconocidos los hemos visto caer por la ausencia de la planta de personal y los elevados costos que requiere mantener las instalaciones de los hoteles", dijo el presidente de Cotelco, quien resaltó que las afectaciones en la vía del no cesan, solo el cambio de ruta comercial con el aeropuerto, puesto que los precios siguen siendo cuatro veces más elevados que los costos para llegar a los turistas.

Así las cosas, este empresario añadió que el Viacrucis de los colegas no han visto la obligación de cerrar, pues todos los días pagan y no cuentan con ningún apoyo económico para el sostenimiento, de tal manera que varios se quedan sin ningún cliente disponible.

Exigen representación

Ciudadanos cuestionan gestión del gobernador del Cauca



Manuel Barbosa, analista.

A partir de las tres de la tarde de la minga indígena en el Cauca, Manuel Barbosa, un trabajador independiente, hizo un llamado a los gobernantes del municipio y el departamento para que se empoderen de su papel como representantes de la ciudadanía, puesto que son ellos para gestionar para nosotros una medida ante los puntos de los actuales líderes políticos.

"Me parece contradictorio que gobernantes de estos departamentos se pueden acudir a los sitios de concentración de los indígenas y se pronuncien ante el presidente Duque para que venga al Cauca y se reúna más directamente en esta barriada", dijo Barbosa.

El ciudadano indicó que se pronuncia contra el alcalde por ser gobernados del departamento del Cauca puesto que no ha visto una verdadera vocería en defensa de los derechos del pueblo.

"Al Gobernador del Cauca le hace falta existencia y gestión para defender los intereses del pueblo, porque no sabía acompañar que somos una gran región departamentales para exigir promover soluciones ante el Gobierno Nacional, pero hasta el momento no he visto esa tipo de acciones de su parte", puntualizó.

Recorrido por Popayán

Agricultores en declive



Marcelo García, Adobe agricultor

Frente a la actual situación de Popayán y la región a causa de los bloqueos en la vía Panamericana, Marcelo García Adobe, agricultor payanés, indicó a este medio que el cierre total del desabastecimiento de algunos productos en la ciudad, por lo tanto indicó que es necesario que el sector indígena luche por sus derechos y que el Gobierno Nacional tome

[illegible]

"Basados en estas actividades económicas que hoy son verdaderas preocupación por parte del Gobierno, tanto en el sector indígena, como los pequeños agricultores, puesto que los altos costos de los productos y los bajos precios de los productos en el mercado hacen que nuestros ecosistemas se vean afectados por lo tanto presentamos una pronta intervención", puntualizó.

En riesgo el paso de los peatones

Golpe a la economía local

Balance oficial de pérdidas en el comercio

Tras 22 días de bloqueos en la vía Panamericana, el sector hotelero de Popayán se declaró en crisis a partir de las millonarias pérdidas que pueden llegar a registrar si no hay una solución pronta.

La presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca, Ana Fernanda Bravo, dijo a este medio que se eleva la cantidad de la económica regional hay pérdidas por cada día 43 millones de pesos dentro de los que se encuentra el sector hotelero el cual podría tener pérdidas por $300 millones, pero, de no lograrse una solución se entra de la temporada de Semana Santa.

Esta información se presentó de manera oficial en el encuentro entre líderes de diferentes gremios de la ciudad, liderado por la Administración Municipal en donde se analizaron cuantificaron las



Ana Fernanda Bravo, presidenta de la Cámara de Comercio.

pérdidas que se han adquirido frente a las afectaciones de la minga indígena.

En este encuentro asistieron representantes de la Cámara de Comercio del Cauca, Parque Nacional Natural Puracé, Clínica, Hospital, Terminal, Aeropuerto, Recreativa de algunos hoteles, gremios, Fenalco, ACOPI, Policía Metropolitana y Secretaría de Tránsito, quienes dieron a conocer las pérdidas para cada sector.

DIARIO DEL CAUCA
Martes 2 de abril de 2019
Redacción / diariodelcauca@gmail.com

QUÉ OPINA

Diálogos entre el Gobierno y los indígenas

Se cumplen 22 días del cierre en la vía Panamericana, la incertidumbre de la población es muy grande, puesto que no existe un acercamiento efectivo entre el Gobierno y los indígenas que permita abrir la vía internacional. Mientras tanto, vallunos, caucanos, huilenses y nariñenses viven los efectos y tratan de hacerle frente al desabastecimiento de combustible y de algunos víveres.

Notivision Cauca
hace 2 días ·

En horas de la madrugada de hoy 03 de abril, vándalos realizaron una afectación para impedir el paso sobre la vía alterna que comunica a Morales con Suárez en el Departamento del Cauca.

Tropas del Batallón de infantería N7 General José Hilario López adscrito a la Brigada 29 en Coordinación con la Policía Nacional y la población civil habilitan el paso en éstos momentos.



CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

NOTIVISION

VIERNES, 5 DE ABRIL DE 2019

Payaneses salen a las calles y protestan frente al CRIC por bloqueo de la vía Panamericana



Habitantes de Popayán marcharon por los bloqueos de la vía Panamericana.

En la actualidad el cierre de vía ha tenido como consecuencias para el contratista, a pesar de sus ingentes esfuerzos para conseguir materiales, así:

- Escasez de combustible, para la maquinaria usada en obra, para las volquetas que transportan materiales de excavación, relleno e insumos como arena, arena, gravilla, bases, subbases y afirmado.
- Cemento, el contratista, antes que se iniciara el taponamiento de las vías, se aprovisionó de una buena cantidad de este insumo para poder continuar con las labores del contrato. Debido a que el tiempo que ha tomado este taponamiento, 24 días, a la fecha, superó el pronóstico, este material se usó en su totalidad. En la actualidad el contratista ha logrado conseguir cemento en la ciudad de Cali, transporte que, desde el pasado miércoles 03 de abril de 2019, se encuentra retenido en la vía, con la intención de unirse a la caravana de transportes que viene realizando la policía nacional, por vías alternas. Solo se pueden transportar 200 sacos por viaje, ya que la vía no está diseñada para vehículos de carga pesada.
- Puertas Metálicas

- Carpintería en Aluminio
- Celdas y Transformador
- Equipos de Red Contra Incendios
- Carpintería en Madera
- Planta Eléctrica
- Materiales de cieloraso
- Así con todos los materiales, equipos y mano de obra.

Nuevamente, el Contratista, le manifiesta a al Interventoría que los proveedores que elaboraron la mayoría de los elementos anteriormente mencionados, han manifestado que, debido al volumen de estos, hará cobro de bodegaje, lo que implicaría un sobre costo para el contratista.

Debido a todo lo anterior el contratista, plantea una suspensión del contrato, mientras las condiciones de seguridad y transporte se reestablezcan.

Es de recalcar que estos 24 dias con todo lo anterior mencionado representa un rendimiento bajo y se están haciendo esfuerzo económicos que incurrimos en sobrecostos por los precios elevados por lo que se con siguen los materiales ante la escazez, además la mano de obra la debemos pagar mas costosa por no tener los materiales solicitados para su correcta ejeculón sumandose a esto el stand by de los equipos por no tener combustible.

Estos 24 dias hasta hoy 5 de Abril se debe tener como justificación para la entrega final

Cordialmente,

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante legal
CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICIA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: ____ ____ Hora: _____

No. S-2019- 10412 / DIRAF- GUMAI- 29

Bogotá D.C., 08 de Abril de 2019

DAIMCO
Abril 09- 2019 Hora: 08 : 41 a.m
Folios: 01 Anexos: 00
No.Radicado D-2019-0796
Radicado: Yesenia Hamez 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Señor
CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO
Representante legal DAINCO S.A.S
Carrera 44B No. 57A-52 Barrio La Esmeralda.
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud concepto oficios PN DIRAF POPAYAN 159 Y 163

En atención al oficio CPP-DIRAF-2018-127 del 03 de abril de 2019, suscrito por ustedes dentro del cual muestran imágenes y noticias del paro indígena sobre la vía panamericana, que afectaron la ciudad de Popayán, por ende el normar desarrollo del proyecto y su programación, razón por la cual solicito a ustedes conceptuar sobre cada uno de los aspectos que fueron o siguen siendo perturbados dentro del proyecto (para cada actividad), determinando si se afectó la ruta crítica del proyecto, la magnitud de dicha afectación y las consecuencia del mismo.

Lo anterior se requiere antes del miércoles 10 de abril a las 10am, con el fin de poder informar de manera oportuna a la ordenadora del gasto.

Mayor ÁNGEL GIOVANNI LOPEZ OSTOS
Supervisor Contrato de Interventoría PN-DIRAF 06-3-10051-18

Elaborado por: Mayor ÁNGEL GIOVANNI LOPEZ OSTOS
Revisado por: Mayor Daniel Elias Silva Ibarra

Fecha elaboración: 08/04/2019
Archivo: Mis documentos\OFICIOS\SALIDOS\FUNCIONARIOS

Carrera 59 No. 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos: 3159000 IP. 9013

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

Bogotá abril 11 de 2019

DAIMCO
Abril 11- 2019 Hora: 10 :50 a.m
Folios: 01 Anexos: 32 PLANOS
No.Radicado D-2019-0620
Radicado: Yesenia Homez 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

PN-DIRAF-POPAYAN-173

Señores
DAIMCO SAS
a/a Ing. José Vicente Bocanegra-
Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Calle 448 No. 57A-52 Barrio La Esmeralda
Bogotá

Referencia: **CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: Envió flujogramas y programación en dos copias.

Enviamos los siguientes flujogramas y programación

- Flujograma Tanque RCI
- Flujograma Subestación Y Tanque De Reserva
- Flujograma Bloque Casino
- Flujograma Bloque Oficiales Y Suboficiales
- Flujograma Bloque Patrulleros
- Flujo De Caja Total
- Programación

Cordialmente,

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

Bogotá, abril 10 de 2019

DAIMCO
Abril 11- 2019 Hora: 10 :50 a.m
Folios: 01 Anexos: 42
No.Radicado D-2019-0821
Radicado: Yesenia Hornez 1087-2016
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

PN-DIRAF-POPAYAN-174

Señores:
DAIMCO S.A.S
a/a: Ing. Victor Bocanegra
vbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel.: 317 659 4536 7020798 7030797
Calle 44B No. 57I-52 Barrio La Esmeralda
Bogotá

Referencia: CONTRATO No 06-6-10044-18 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN NO 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

Asunto: APUS NO PREVISTOS ELECTRICOS

Cordialmente remitimos la documentación asociada al asunto:

- Formato NP APU-NP144-149.
- Especificaciones, justificación técnica.
- Cotizaciones

Estos se emiten con el propósito de dar cubrimiento a las necesidades reales del proyecto.

13	INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEMATICAS Y AUTOMATIZACIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP 144	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 4 CIRCUITOS	UN	1	$ 352.456,00	$ 352.456,00
NP 145	TUBO DE ESCAPE PARA PLANTA ELECTRICA	ML	10	$ 888.675,00	$ 8.886.750,00
NP 146	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA LED 2 *18 T8	UN	7	$ 165.337,00	$ 1.157.359,00
NP 147	PRUEBAS A BAJA FRECUENCIA CABLE XLPE	UN	1	$ 3.884.483,00	$ 3.884.483,00
NP 148	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR COMPACTA 17,5 W	UN	19	$ 2.083.127,00	$ 39.579.413,00
NP 149	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO DE 4 M BRAZO SENCILLO	UN	19	$ 1.046.535,00	$ 19.884.165,00
			SUBTOTAL COSTO DIRECTO		$ 73.844.626,00

De antemano agradezco la atención.

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante legal
Consorcio BCS – Gutiérrez

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

Bogotá, abril 25 de 2019

DAIMCO
Abril 25- 2019 Hora: 09 : 54 p.m.
Folios: 01 Anexos: 35
No.Radicado D-2019-0917
Radicado: Yesenia Gomez 0087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

PN-DIRAF-POPAYAN-179

Señores
DAIMCO SAS
n/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-
Gerente Técnico
Jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Calle 448 No. 57A-52 Barrio La Esmeralda
Bogotá

Referencia: **CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: Documentos Corte #10- Adición 1

Enviamos documentos de factura, de acuerdo con clausula cuarta-forma de pago del contrato de la referencia:

- Constancia de recibo a satisfacción Acta Corte
- Factura de Venta
- Resolución de facturación Consorcio BCS-GUTIERREZ
- Rut de CONSORCIO BCS-GUTIERREZ, y de consorciados
- Certificación de pagos parafiscales y seguridad social
- Soporte de pago parafiscales
- Certificación pagos FIC
- Soporte de pago FIC
- Acta y Memorias de cantidades ejecutados

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

DAIMCO
Abril 25- 2019 Hora: 09 : 54 p.m
Folios: 01 Anexos: 35
No.Radicado 0-2019-0918
Radicado: Yesenia Hernes 1087-2019
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

PN-DIRAF-POPAYAN-181

Bogotá, abril 24 de 2019

Señores
DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-
Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoria
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Calle 448 No. 57A-52 Barrio La Esmeralda
Bogotá

Referencia: CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Dotación Y Equipos De Gimnasio

De acuerdo al contrato de la referencia adjuntamos la siguiente documentación para revisión y visto bueno de parte de la Interventoría correspondiente a la dotación requerida contractualmente para el edificio del gimnasio:

1. Presentación de solución de dotación.
2. Fichas técnicas.
3. Cotizaciones de elementos NP requeridos adicionales y sus respectivos APUs.

Estaremos atentos a su revisión y visto buena.

Nota: Tener en cuenta que los equipos a requerir son de importación y el tiempo estimado para ello es de 45 a 60 días.

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

Bogotá, abril 25 de 2019

DAIMCO
Abril 25- 2019 Hora: 09 : 54 p.m
Folios: 01 Anexos: 79
No Radicado D-2019-0919
Radicado: Yesenia Homes 1087-2019
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

PN-DIRAF-POPAYAN-178

Señores
DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-
Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Calle 44B No. 57A-52 Barrio La Esmeralda
Bogotá

Referencia: **CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: Documentos Corte #10-

Enviamos documentos de factura, de acuerdo con clausula cuarta-forma de pago del contrato de la referencia:

- Constancia de recibo a satisfacción Acta Corte
- Factura de Venta
- Resolución de facturación Consorcio BCS-GUTIERREZ
- Rut de CONSORCIO BCS-GUTIERREZ, y de consorciados
- Certificación de pagos parafiscales y seguridad social
- Soporte de pago parafiscales
- Certificación pagos FIC
- Soporte de pago FIC
- Acta y Memorias de cantidades ejecutados

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

DAIMCO
Abril 25- 2019 Hora: 09 : 54 p.m
Folios: 01 Anexos: 47
No.Radicado D-2019-0920
Radicado: Yesenia Homez 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Bogotá, abril 25 de 2019

PN-DIRAF-POPAYAN-180

Señores
DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-
Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Calle 44B No. 57A-52 Barrio La Esmeralda
Bogotá

Referencia: **CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: Documentos Corte #10- Adición 2

Enviamos documentos de factura, de acuerdo con clausula cuarta-forma de pago del contrato de la referencia:

- Constancia de recibo a satisfacción Acta Corte
- Factura de Venta
- Resolución de facturación Consorcio BCS-GUTIERREZ
- Rut de CONSORCIO BCS-GUTIERREZ, y de consorciados
- Certificación de pagos parafiscales y seguridad social
- Soporte de pago parafiscales
- Certificación pagos FIC
- Soporte de pago FIC
- Acta y Memorias de cantidades ejecutados

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

Bogotá, abril 24 de 2019

DAIMCO
Abril 25- 2019 Hora: 15 : 07 p.m
Folios: 02 Anexos: 00
No.Radicado D-2019-0924
Radicado: Yesenia Hamez (087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

PN-DIRAF-POPAYAN-182

Señores
DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-
Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594586 7020798 7030797
Calle 44B No. 57A-52 Barrio La Esmeralda
Bogotá

Referencia: **CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: **MANIOBRA ELÉCTRICA MEDIA TENSIÓN e INSTALACIÓN ELÉCTRICA GIM**

Cordialmente solicito realizar las aclaraciones respectivas a los temas del asunto:


1. Maniobra eléctrica de Media Tensión.


Para la conexión de la nueva subestación a la red de media tensión, se requiere realizar maniobra de corte para desenergizar la subestación del edificio # 6, punto del cual se pretende realizar la conexión respectiva.



SUBESTACIÓN EDIFICIO # 6 CELDA ENTRADA SALIDA

Se solicita confirmar el punto de corte, el cual por información recogida en campo se presume que está en el poste ubicado en la zona de ingreso a la base, poste número 100483-9328-6322.

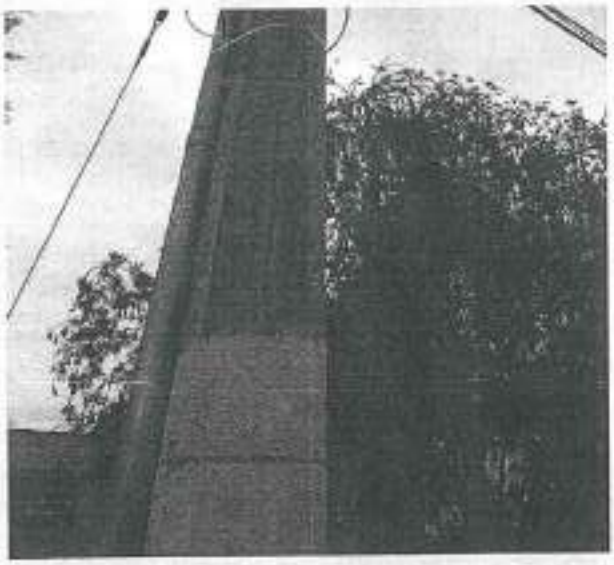

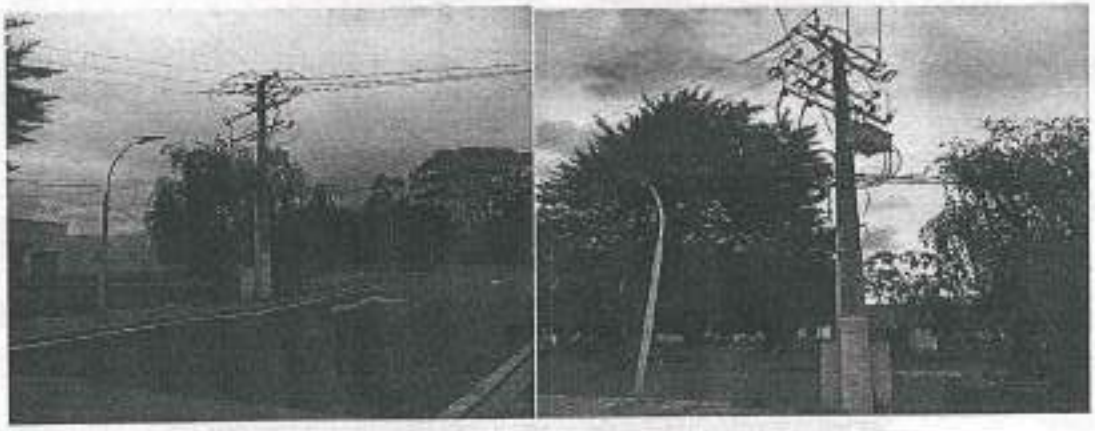

POSTE ZONA INGRESO COMANDO POLICIA CAUCA

Igualmente se solicita la colaboración para la coordinación de dicho corte de energía, indicar si existe algún requerimiento especial previo.

La maniobra será desarrollada por el contratista y se especificaran los costos de la misma mediante el NP-APU respectivo, ya que este ítem no está presupuestado.

DATOS ESPECÍFICOS MANIOBRA.

Duración estimada: 12 horas. Se propone iniciar a las 06:00 y normalizar servicio a las 18:00.
Fecha: en proceso de evaluación de acuerdo a los avances de obra. La fecha se acordará según los requisitos que establezca la entidad, dada la duración del corte de energía.
Trabajos a ejecutar: finalización de tendido de cable hasta la celda de entrada salida edificio 6, instalación de conos premoldeados respectivos, prueba de baja frecuencia a cable XLPE, conexión final y energización de subestación nueva edificio D.

Bogotá, abril 24 de 2019

DAIMCO
Abril 25- 2019 Hora: 15 : 07 p.m
Folios: 02 Anexos: 00
No.Radicado 0-2019-0924
Radicado: Yesenia Gomez 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

PN-DIRAF-POPAYAN-182

Señores
DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-
Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Calle 44B No. 57A-52 Barrio La Esmeralda
Bogotá

Referencia: **CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: **MANIOBRA ELÉCTRICA MEDIA TENSIÓN e INSTALACIÓN ELÉCTRICA GIM**

Cordialmente solicito realizar las aclaraciones respectivas a los temas del asunto:


1. Maniobra eléctrica de Media Tensión.


Para la conexión de la nueva subestación a la red de media tensión, se requiere realizar maniobra de corte para desenergizar la subestación del edificio # 6, punto del cual se pretende realizar la conexión respectiva.



SUBESTACIÓN EDIFICIO # 6 CELDA ENTRADA SALIDA

Se solicita confirmar el punto de corte, el cual por información recogida en campo se presume que está en el poste ubicado en la zona de ingreso a la base, poste número 100483-9328-6322.

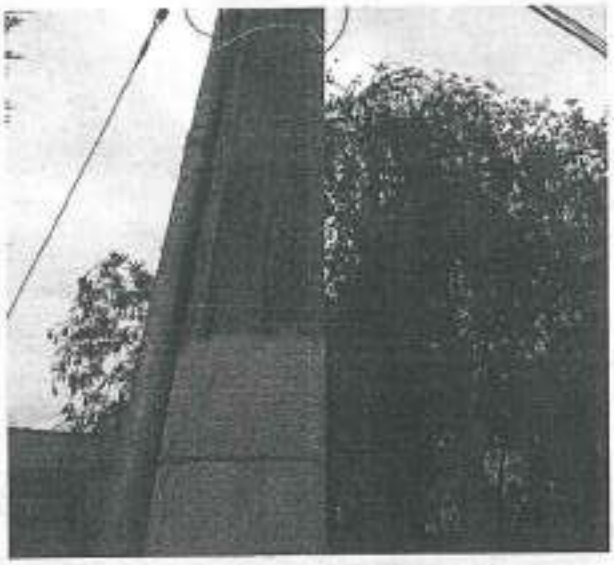

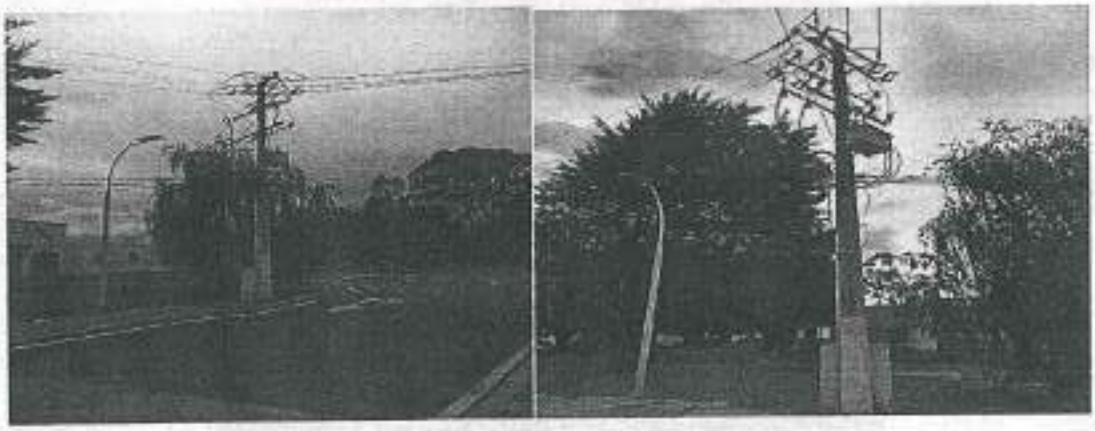

POSTE ZONA INGRESO COMANDO POLICIA CAUCA

Igualmente se solicita la colaboración para la coordinación de dicho corte de energía, indicar si existe algún requerimiento especial previo.

La maniobra será desarrollada por el contratista y se especificaran los costos de la misma mediante el NP-APU respectivo, ya que este ítem no está presupuestado.

DATOS ESPECÍFICOS MANIOBRA.

Duración estimada: 12 horas. Se propone iniciar a las 06:00 y normalizar servicio a las 18:00.
Fecha: en proceso de evaluación de acuerdo a los avances de obra. La fecha se acordará según los requisitos que establezca la entidad, dada la duración del corte de energía.
Trabajos a ejecutar: finalización de tendido de cable hasta la celda de entrada salida edificio 6, instalación de conos premoldeados respectivos, prueba de baja frecuencia a cable XLPE, conexión final y energización de subestación nueva edificio D.

2. Instalación eléctrica Gimnasio

Se solicita realizar las aclaraciones a la instalación eléctrica para el Gimnasio, específicamente calibre de la acometida y cuadro de cargas respectivo. La acometida inicialmente presupuestada esta en calibre 8 awg, pero se necesita de un calibre mayor para cumplir con la regulación de tensión respectiva.

Igualmente, el cuadro de cargas debe ser aclarado, o confirmar si se va a usar el que se envió en correo del día 3 de abril de 2019, información que hace parte de los diseños originales recibidos.

Quedo atento a su amable respuesta.

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

Anexo No. 3 Actas de comité

ACTA DE REUNIÓN N° 33

DAIMCO

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

FECHA: Abril 12 /2019

NOMBRE PARTICIPANTE	CARGO- EMPRESA	CELULAR	FIRMA ASISTENCIA
Monica Benítez	Residente Interventoría	3146156619	
Adrián M. Giraldo	Dir. Obra.		
Yiosd M. Cosme	Dir. Interventoría	3101117961	
Ruth del mar Rodriguez	Residente SST HA	3013725028	
MARIA TERESA OJEDA	RESIDENTE OBRA	3218026440	
EDGAR E. CALVETE LL.	RESIDENT. OBRA.	3173823629	

ACTA DE REUNIÓN N° 33

FECHA: 12/04/19

DAIMCO

Pag. 2

A-P1-F3

AREA O PROYECTO: FASE 4 - EDIFICIO D - ALOJAMIENTOS

SOCIOS ☐ CONSULTORIA ☐ OBRA ☐ OTROS _____ ☐

I. PARTICIPANTES

CARGO

II. OBJETO

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN NRO. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

- De acuerdo solicitud del My Angel Lopez en anterior comite del 02 abril se recuerda a obra y Dpal de interventoria de tomar medidas de forma conjunta de tal manera que se cumpla con los plazos y fechas determinados por el supervisor

* El constructor resalta que ha comenzado y está ejecutando actividades nuevas como la instalación de la RCI que ha pesar del paro logrión hacer llegar materiales como tuberías para este tema.

* El tema del gimnasio en lo que respecta al retraso, se ejecuta pero el inconveniente del suministro de combustible para vehículo por consecuencia del paro hace que el suministro de material sea escaso y previendo la proximidad cercana de la semana santa / por ser temporada de votaciones en la ciudad se vera afectado - hace resaltar constructor (D.O)+

ACTA DE REUNIÓN N° 33

FECHA: 12/04/19

DAIMCO

Pag. 4

IV. TEMAS TRATADOS

* El paro que afectaba a la región y la movilidad finalmente terminó. Ocasionando el inconveniente en el suministro de insumos para la obra sobre todo lo relacionado con materiales del tema eléctrico. Y suministro de carpintería de aluminio para ventanas y puertas y arena para topellos

* A cost un mes de haberse legalizado adicional de obra y a pesar de la afectación del paro indígena se solicita al contratista una mejor disposición para el avance en el área del gimnasio toda vez que el avance en esta área ha sido muy poco.

* Definición de temas de concordancia de planos del gimnasio entre Arquitectonico y Estructural.

* Definición sobre detalle de rejillas de ventanería.

ACTA DE REUNIÓN N° 33

FECHA: 12/04/2009

DAIMCO

B. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA
* Pendientes compromisos Pactados en Acta de Comité #32 Con el supervisor Ing Angel Lopez.	Constructor & Interventoria	21-Abril/2009

ACTA DE REUNIÓN N°34

FECHA: abril 22 de 2019

DAIMCO

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

NOMBRE PARTICIPANTE	CARGO- EMPRESA	CELULAR	FIRMA ASISTENCIA
Tirso M. Cossio O.	D. interventoría	3104117761	
Julián M. Giraldo	Dir. Obra.		
Juan M. Rodríguez	Residente SSTA	3015725128	
Monica L. Benítez	Residente Interv.	3446156619	
MARIA TERESA OJEDA C	RESIDENTE OBRA	321 8024492	
EDGAR E. CALVETE LOPEZ.	RESIDENTE OBRA	3173823629	

	ACTA DE REUNIÓN N° 34 FECHA: 22/01/19	DAIMCO		Pag. 02

IV. TEMAS TRATADOS

1- El contratista informa que en las últimas de semana santa se realizaron labores de regates, instalac. eléctricas en bandejas en bloque ejes, repelos estucos en bloque patrulleros.

2- El contratista manifiesta que en el período continuan lluvias fuertes en el área de trabajo lo que ha perjudicado las actividades de relleno en los zocalos de gimnasio manifiesta tambien que continua con la figuración de acero para esta estructura, sumado a esto afectación para.

3- Con anterioridad se definió instalación de rejillas en aluminio en los barros que no estan orientados o localizados sin salida de aire al exterior, esto en B3 ejidales, y en los barros de patrulleras en el B1, patrulleros.

4- La rejilla anteriormente explicó el contratista, es un sistema que tiene como intención evitar el paso de la mayor parte del agua de las lluvias y que a la vez, permita el flujo de aire para lo cual el contratista realizará muestra para aprobación de la Interventoría.

5- Se realizará AIU para adición de mayor ta monto que los existentes para aprobación de Interventoría.

6- Se está en revisión por parte del Contratista y la Interventoría, de forma independiente, de los posibles atrasos causados por el paro nacional de 24 días en la región.

7- El contratista, respondió a la interventoría que en las actividades se tienen ejecutadas actividades con el personal suficiente, en cada actividad, a lo que la interventoría responde que se debe realizar un análisis para optimizarlos y ver si existe la necesidad.

8- El contratista manifiesta que en la zona donde se realizan excavaciones para las cámaras de inspección de desagües del gimnasio existe un cárcamo colector de las aguas que se recogen en esta área y que se debería colectar a la nueva red ya que se están construyendo estas cámaras, para evitar deterioro de estas estructuras posteriormente. este empalme sería de 20m. aprox. en tubería sanit. de 8", a lo cual la interventoría avala esta solicitud.

9- Se realiza revisión y aprobación APUs NP por parte de la interventoría.

ACTA DE REUNIÓN N° 34

FECHA: 22/04/2014

DAIMCO

Pag. 04

B. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA
- Presentar muestra rejilla para ventanas exter.	Contrat.	30/04/14
-		

ACTA DE REUNIÓN N° 35

FECHA: 30/04/2019

DAIMCO

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

NOMBRE PARTICIPANTE	CARGO- EMPRESA	CELULAR	FIRMA ASISTENCIA
Monica L. Benítez	Res. Interventoría	3146156617	
Yoya del Mar Rodriguez G.	Res SSTMA	3015725028	
KARLA TERESA OJEDA P	RES OBRA	3218024442	
Jesus Cosme Ochoa	Dire. Interventoria	3104117461	
Jonathan Giraldo	Dir. Obra.		
EDGAR CALVETE.	RESID. OBRA.	317 3823629	

IV. TEMAS TRATADOS

1. Avance de adicionales 2

* Construcción Gimnasio: área en proceso de excavación y relleno en capas de recebo, Subbase y base, actividad que manifiesta el constructor se ha afectado por el clima que desde días de semana santa se ha incrementado las lluvias
- la interventoría invita a optimizar las labores de esta actividad con el propósito de dar rendimiento

* Áreas de urbanismo: esta actividad debe el constructor colocar frentes de trabajo en disposición de adelantar estos trabajo (más personal)

* Decisión de aprobar propuesta para evaluación de ayus lluvias realizada por constructor lo que implica realizar reformula de alcantarillado en vía principal de no ha sido intervenida esto genera nuevo NP que se deben adicionar para ajuste definitivo.

	ACTA DE REUNIÓN N° 35 FECHA: 30/04/2019	DAIMCO		Pag. 4

B. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA
* Se recuerda compromiso de Acta #32 con el Mayor Angel L. para cumplir con fechas entrega de Mayores Pedir Acta de Cobro	Constructor e Interventoria	Fechas Indicadas 28-Mayo-2019
* La interventoria solicita incrementar frentes de Trabajo en Pilas, Area de gimnasio y camerinos. Urbanismo	Constructor	Antes Posible.

Anexo No. 4 Plan de Anticipo

fiduciaria popular

Bogotá D.C. 29 ABR 2019

484293

Doctor
AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS - GUTIERREZ
Carrera 19 No. 84 – 41 Oficina 402
Bogotá

Asunto: **P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ CTO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10044-18 POLICIA NACIONAL CODIGO 378244**
INFORME DE GESTION MES DE MARZO DE 2019

Respetado Doctor:

En cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos celebrado entre Consorcio BCS Gutierrez y Fiduciaria Popular S.A., suscrito el día 26 de junio de 2018, nos permitimos presentar informe del mes de marzo de 2019, con los aspectos administrativos, financieros y los hechos sucedidos durante el periodo así:

1. Informe Económico del Fideicomiso
2. Informe de Fuentes y Usos
3. Detalle de las comisiones fiduciarias
4. Extracto Fondo de Inversión
5. Estados Financieros
6. Ejecución del plan de inversión del anticipo

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
03 MAY 2019

ASPECTOS RELEVANTES:

En desarrollo del objeto contractual del citado Fideicomiso, Fiduciaria Popular S.A. como vocera y administradora del mismo se permite relacionar los siguientes hechos:

- **PÓLIZAS**

En atención a la obligación contractual entre el Fideicomitente y la Policía Nacional relacionamos la póliza de cumplimiento No. 96-44-101137868, expedida por Seguros del Estado S.A., a favor de las entidades estatales la cual se encuentra vigente de acuerdo al siguiente detalle:

COBERTURA	VALOR ASEGURADO($)	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	1.850.092.650,02	18/05/2018 a 15/06/2019
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	4.625.231.625,00	18/05/2018 a 15/06/2019
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	462.523.162,50	18/05/2018 a 15/04/2022
Estabilidad y calidad de la obra	2.775.138.975,02	15/12/2018 a 15/12/2023
Calidad y buen funcionamiento de los bienes	329.371.500,00	18/05/2018 a 15/04/2020

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- **BIENES FIDEICOMITIDOS**

Los bienes Fideicomitidos que harán parte del Patrimonio Autónomo Consorcio BCS Gutierrez de conformidad con la cláusula tercera del contrato fiduciario son:

- ✓ La suma de Tres Millones Quinientos Mil Pesos m/cte. ($3.500.000,00) aportados por el fideicomitente para la constitución del Fideicomiso y del Fondo de Reserva.
- ✓ Frente al anticipo la suma que equivale al Veinte por ciento (20%) del valor de las obras financiadas, es decir un anticipo equivalente a Mil Ochocientos Cincuenta Millones Noventa y Dos Mil Seiscientos Cincuenta Pesos Con Cero Dos Centavos M/CTEM/CTE ($1.850.092.650,02).

Anticipo que otorgara la Policía Nacional	1.820.092.650,02
Recursos que entregara el Consorcio BCS Gutierrez	3.000.000,00

- **SALDOS**

A continuación se relacionan los saldos del mes de marzo de 2019 en los encargos del fondo de inversión colectiva fiduliquidez adscritos al P.A. Consorcio Consorcio BCS Gutierrez así:

Fiduliquidez No. 7008362592 anticipo	12.312.125,96
Fiduliquidez No. 7008362605 reserva	12.141.379,61

- **RENDIMIENTOS**

El fideicomiso en el mes de marzo de 2019 registró ingresos por rendimientos por un valor de $620.426,18 como se detalla a continuación:

Fiduliquidez No. 7008362592 anticipo	591.295,00
Fiduliquidez No. 7008362605 reserva	29.131,18

Los rendimientos generados en el fondo de inversión colectiva fiduliquidez N° 70083602592, serán girados a la liquidación del fideicomiso de conformidad a lo estipulado en la cláusula tercera, parágrafo primero – Rendimientos del contrato fiduciario. No obstante de lo anterior se informa que en los estados financieros del fideicomiso se registra en la cuenta por pagar un valor de $8.892.730,63 correspondiente a los rendimientos pendientes de giro a la entidad otorgante.

- **COMISIONES**

De acuerdo a lo establecido con el contrato fiduciario, Cláusula – Décima Quinta – Remuneración de la Fiduciaria - numeral 1, se estableció el cobro de las comisiones de acuerdo con lo relacionado a continuación:

"(...) No se cobra comisión por la administración del Patrimonio Autónomo, si el promedio de los recursos administrados en el mes, es superior a Un Mil Millones de Pesos ($1.000.000.000). Si el promedio de los recursos administrados en el mes, es inferior a Un Mil Millones de Pesos ($1.000.000.000) EL FIDEICOMITENTE pagará una comisión a la FIDUCIARIA de CERO PUNTO CINCO SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (0.5 S.M.L.M.V.) por mes o fracción de mes. (...)"

Conforme a lo anterior en el mes de marzo de 2019 Fiduciaria Popular genero cobro de comisión fiduciaria de 0.5 SMMLV dado que el promedio de los recursos administrados fueron inferiores a los Mil Millones de Pesos. Es importante mencionar como hecho subsecuente que esta comisión será descontada del fondo de reserva en el mes de abril de 2019 con el fin de quedar a paz y salvo por este concepto.

- **PAGOS**

Durante el mes de marzo de 2019, se realizaron seis (6) operaciones de pago por valor de $466.039.367,02 mediante trasferencia electrónica para el pago a proveedores y comisión fiduciaria.

- **SARLAFT**

Informamos que el Fideicomitente actualizó su información el pasado 07 de junio de 2018, por lo tanto al envío del presente informe se encuentra al día.

- **OTROS HECHOS RELEVANTES**

Con la entrega de este informe mensual, la Fiduciaria da cumplimiento a su deber de presentación del informe detallado y pormenorizado de la gestión de los bienes entregados en virtud del negocio fiduciario; agradecemos notificar a la Fiduciaria si existe alguna observación al mismo en el menor tiempo posible.

Finalmente, es importante mencionar que dentro de las obligaciones del Fideicomitente, se encuentran las de informar a la Fiduciaria cualquier cambio material o legal que se presente en el contrato de obra, así como las prórrogas, otrosíes o suspensiones que se generen a raíz del citado contrato.

Cordialmente,

INGRID ASTRID DUARTE
Directora de Negocios Fiduciarios

Elaboró: Johan Barragán
Revisó: Mauricio Lugo

C.C. Brigadier General Yolanda Caceres Martinez – Directora Administrativa y Financiera POLICIA NACIONAL Carrera 59 No. 26 – 21 Bogotá

INFORME DE ESTADO ECONOMICO
P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ
MARZO DE 2019

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS FONDO FIDULIQUIDEZ No 70083602592
FONDO ANTICIPO
P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ
MARZO DE 2019

FECHA	IDENTIFICACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FUENTES	USOS	SALDO
SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2019				$ 7.834.797,06	$ 1.369.924.636,67	$ 475.215.688,24
04/03/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO FONDO DE RESERVA - GMF	$ 1.016.057,05		476.231.755,29
05/03/2019	10547229	AGUILAR BERMEO GABRIEL PASTOR	FACTURAS VARIAS RP 01-SALARIOSJORNALES Y MANO DE OBRA		$ 127.456.922,00	348.775.833,29
05/03/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 509.623,69	348.266.009,60
06/03/2019	900374726	CENTIMETRO MOBILIARIO SAS	FACTURAS VARIAS RP 02-COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 126.558.341,00	221.707.668,60
06/03/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 506.233,36	221.201.435,24
15/03/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO FONDO DE RESERVA - GMF	$ 2.051.770,72		223.253.205,96
20/03/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO FONDO DE RESERVA - GMF	$ 846.129,50		224.099.335,46
26/03/2019	901041132	AGS INGENIERIA SAS	SALARIO JORNALES Y MANO DE OBRA		$ 150.000.000,00	74.099.335,46
26/03/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 600.000,00	73.499.335,46
26/03/2019	19206114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	REEMBOLSO DE GASTOS DE MATERIALES, DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 22.895.028,00	- 50.604.307,46
26/03/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 91.580,11	50.512.727,35
26/03/2019	19206114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	REEMBOLSO DE GASTOS DE MATERIALES, DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 38.637.347,00	11.875.380,35
28/03/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 154.549,39	11.720.830,96
31/03/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	RENDIMIENTOS	$ 591.295,00		12.312.125,96
SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2019				$ 4.965.252,27	$ 467.468.834,55	$ 12.312.125,96

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS FONDO FIDULIQUIDEZ No 70083602605
FONDO RESERVA
P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ
MARZO DE 2019

FECHA	IDENTIFICACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FUENTES	USOS	SALDO
SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2019				$ 6.024.239,77	$ 3.891.177,00	$ 11.520.965,64
04/03/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO AL FONDO ANTICIPO - GMF PAGOS		$ 1.016.057,05	$ 10.504.848,59
15/03/2019	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A	PAGO DE COMISION MES DE FEBRERO 2019		$ 492.729,02	$ 10.012.119,57
15/03/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 1.970,92	$ 10.010.148,65
15/03/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO AL FONDO ANTICIPO - GMF PAGOS		$ 2.051.770,72	$ 7.958.377,93
21/03/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	APORTE DEL FIDEICOMITENTE	$ 5.000.000,00		$ 12.958.377,93
26/03/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO AL FONDO ANTICIPO - GMF PAGOS		$ 846.129,50	$ 12.112.248,43
31/03/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	RENDIMIENTOS	$ 29.131,18		$ 12.141.379,61
SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2019				$ 5.029.131,18	$ 4.408.857,21	$ 12.141.379,61

ELABORÓ

JORDAN BARRAGÁN
ANALISTA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

APROBÓ

MAURICIO LUGO CARDENAS
COORDINADOR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ
INFORME DE FUENTES Y USOS

DETALLE	mar-19			Total Acumulado		
	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL
FIDULIQUIDEZ FONDO DE ANTICIPO No 70083602562	4.505.252,27	467.408.824,55	12.312.125,96	4.656.944.677,45	4.643.732.551,49	12.312.125,96
Saldo periodo anterior	475.215.698,24			-		
Aportes entidad otorgante				4.625.231.625,04		
Rendimientos Netos	581.295,00			12.312.125,92		
Traslados desde el fondo de reserva	3.913.957,27			18.500.926,49		
Pagos		465.546.636,00			4.625.231.625,00	
G.M.F. 4*1000		1.862.186,55			18.500.926,49	
Pago de Rendimientos a la entidad					-	
G.M.F. 4*1000 generado por Gto de Rendimientos						

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ
INFORME DE FUENTES Y USOS

DETALLE	mar-19			Total Acumulado		
	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL
FIDULIQUIDEZ FONDO DE RESERVA N° 70083602559	5.029.131,18	4.488.857,21	12.141.379,61	32.565.102,67	20.423.723,06	12.141.379,61
Saldo periodo Inicial	11.520.905,64			-		
Aportes Fideicomitente	5.000.000,00			32.488.000,00		
Rendimientos Netos	29.131,18			77.102,67		
G.M.F. 4*1000		1.970,92			7.650,55	
Traslado al Fondo de Anticipo		3.913.957,27			18.500.926,49	
Comisión Fiduciaria		492.729,02			1.915.136,02	

ELABORO

JOHAN BARRAGÁN
ANALISTA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

APROBÓ

MAURICIO LUGO CARDENAS
COORDINADOR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

fiduciaria popular

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
P.A CONSORCIO BCS GUTIERREZ
DETALLE DE COMISIONES
mar-19

FECHA	NIT	CONCEPTO	FACTURA	CAUSADO	PAGADO	SALDO
26-dic-18	901.177.394	COMISION FIDUCIARIA DICIEMBRE DE 2018	110626	929.677,98	929.677,98	-
29-ene-19	901.177.394	COMISION FIDUCIARIA ENERO DE 2019	110936	492.729,02	492.729,02	-
27-feb-19	901.177.394	COMISION FIDUCIARIA FEBRERO DE 2019	111188	492.729,02	492.729,02	-
27-mar-19	901.177.394	COMISION FIDUCIARIA MARZO DE 2019	111434	492.729,02		492.729,02
TOTAL COMISIÓN				**2.407.865,04**	**1.915.136,02**	**492.729,02**

MAURICIO LOPEZ C
COORDINADOR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
APROBÓ

JOHAN BARRAGÁN
ANALISTA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
ELABORÓ

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit 900247285

fiduciaria popular

NIT 800141235

PA CONSORCIO BCS-GUTIÉRREZ CONTRATO DE OBRA PN
PA CONSORCIO BCS GUTIÉRREZ FONDO DE RESERVA
CR 13 A 29 24 P 20
BOGOTA D.C. / CUNDINAMARCA

Número de Identificación 378244

Fiduliquidez

Extracto de cuenta Periodo del 01 Marzo 2019 al 31 Marzo 2019 **Número de Encargo: XXXXXXX2635-2**

BALANCE DE LA INVERSIÓN

Saldo Inicial a 01 Marzo 2019		$ 11,520,905.64
Aportes	$ 5,000,000.00	
Retiros	$ -4,406,686.29	
Gravamen a los movimientos financieros	$ -1,970.92	
Rendimientos	$ 29,131.18	
Retención en la fuente	$ 0.00	
Saldo Final a 31 Marzo 2019		$ 12,141,379.61

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN

Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial en $	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en $	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en $
01/03/2019 al 31/03/2019	F TP06 NEG	15,214.329754	757,240432	15,255.470029	795,870569	12,141,379.61

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en $	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en $
[illegible]	SALDO ANTERIOR		11,520,905.64	15,214.329754	757,240432	11,520,905.64
[illegible]	[illegible]	65,765675	-1,016,997.65	15,255.254734	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RETIRO FIDEICOMISO CC 0[illegible]	32,334164	492,729.02	15,239.961410	[illegible]	[illegible]
[illegible]	GMF 3x1000	0.129359	-1,970.92	15,238.903350	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RETIROS	-784.643939	12,091,770.72	15,255.909350	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES	327,997.135	5,000,000.00	15,244.035584	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RETIROS	-65,494.059	-946,129.90	15,247.143510	[illegible]	[illegible]

Tipo de Participación	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación	Valor promedio del Fondo en el mes
F TP06 NEG	2.40%	$364,887,134,780.09

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
F TP01 INV	4.043	3.184	3.723	3.931	4.324	5.340	0.147	0.150	0.122	0.157	0.187	0.211
F TP02 INV	4.186	3.285	3.829	3.632	4.379	5.375	0.147	0.150	0.122	0.157	0.187	0.210
F TP03 INV	4.288	3.389	3.929	3.736	4.427	5.410	0.147	0.150	0.122	0.157	0.186	0.210
F TP04 INV	4.454	3.590	4.133	3.939	4.529	5.479	0.147	0.150	0.122	0.157	0.185	0.208
F TP05 INV	2.571	1.809	1.829	NA	NA	NA	0.150	0.128	0.133	NA	NA	NA
F TP06 NEG	3.231	2.377	2.913	2.722	3.915	5.065	0.147	0.150	0.122	0.157	0.190	0.218

VIGILADO

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285

fiduciaria popular

NIT 800141235

PA CONSORCIO BCS-GUTIÉRREZ CONTRATO DE OBRA PN

PA CONSORCIO BCS GUTIERREZ-FONDO DE RESERVA

CR 13 A 29 24 P 20

BOGOTA D.C / CUNDINAMARCA

Número de Identificacion: 378244

Fiduliquidez

Extracto de cuenta Periodo del 01 Marzo 2019 al 31 Marzo 2019 **Número de Encargo: XXXXXX2605.2**

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
F TPU7 NEG	3.432	2.578	3.114	2.923	4.017	5.134	0.147	0.150	0.122	0.157	0.191	0.216
F TPU8 NEG	3.634	2.678	3.315	3.023	4.068	5.168	0.147	0.150	0.122	0.157	0.191	0.215
F TP09 NEG	4.146	3.286	3.826	3.633	4.379	5.375	0.147	0.150	0.122	0.157	0.187	0.210
F TP10 NEG	4.661	3.797	4.339	4.149	4.833	5.548	0.147	0.150	0.122	0.157	0.185	0.207
F TP11 INMGB	3.629	2.779	3.317	3.124	4.119	5.202	0.147	0.150	0.122	0.157	0.190	0.214

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva esta sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

Cualquier inquietud comuníquese con Servicio al Cliente al PBX 6079977, 5951506 Opcion 3, a la linea nacional gratuita 018000513962, al correo servicioalcliente@fidupopular.com.co o remitala a la Cra. 13 A N° 29 24 piso 20, 21 y 24. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto, remítala a los Revisores Fiscales KPMG al correo electrónico srincon@kpmg.com o al numero telefónico 6079977 Ext 502. El reglamento y la hoja técnica podrá consultarla en la página web: www.fidupopular.com.co ingresando al link de cada Fondo de Inversión. Recuerde que cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero: calle 70 A No 11 83 en Bogotá, Teléfonos: (1) 5439850 (1)2351604. Correo electrónico: reclamaciones@defensorialg.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit 900247285

fiduciaria popular

NIT 800141235

PA CONSORCIO BCS-GUTIÉRREZ CONTRATO DE OBRA PN
PA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ -FONDO DE ANTICIPO -
CR 13 A 29 24 P 20
BOGOTA D.C. / CUNDINAMARCA

Número de Identificación 378244

Fiduliquidez

Extracto de cuenta **Periodo del** 01 Marzo 2019 al 31 Marzo 2019 **Número de Encargo: XXXXXXX2562-5**

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Marzo 2019		$ 475,215,698.24
Aportes	$ 3,913,957.27	
Retiros	$ -465,546,638.00	
Gravamen a los movimientos financieros	$ -1,862,186.55	
Rendimientos	$ 591,295.00	
Retención en la fuente	$ 0.00	
Saldo Final a 31 Marzo 2019		$ 12,312,125.96

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN

Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial en $	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en $	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en $
01/03/2019 al 31/03/2019	F TP06 NEG	15,214.329754	31,234.744214	15,255.470029	807.063036	12,312,125.96

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en $	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en $
01/03/2019	SALDO ANTERIOR		475,215,698.24	15,214.329754	31,234.744214	475,215,698.24
04/03/2019	APORTES	66.769975	1,016,057.05	15,218.254134	31,301.452930	476,231,755.29
07/03/2019	RETIRO FIDEICOMISO CC 0054 GMF	-8,373.998114	-127,408,982.01	15,218.678079	22,974.102490	349,775,851.24
07/03/2019	GMF 4x1000	-72.425476	-909,820.64	15,218.678079	22,901.720425	348,865,530.60
07/03/2019	RETIRO FIDEICOMISO CC 0054 GMF	-8,314.864809	-126,564,347.00	15,218.678079	14,586.234748	222,001,183.60
07/03/2019	GMF 4x1000	-53.259840	-505,233.36	15,218.678079	14,533.043196	221,301,478.24
08/03/2019	APORTES	134,643.558	2,051,770.74	15,238.696500	14,667.764440	223,210,307.30
08/03/2019	APORTES	65,496.290	846,129.50	15,247.143516	14,667.764440	224,056,436.80
08/03/2019	RETIRO FIDEICOMISO CC 0054 GMF	-8,801,594.535	-82,699,026.00	15,247.143516	13,196.148894	201,234,957.91
08/03/2019	GMF 4x1000	-6,056.578	-91,980.11	15,247.143516	13,190.092316	201,142,977.80
26/03/2019	RETIRO FIDEICOMISO CC 0054 GMF	-2,534,071.182	-38,637,347.00	15,247.143516	10,655.921134	162,475,390.75
26/03/2019	GMF 4x1000	-10,135.245	-154,549.93	15,247.143516	10,645.785889	162,320,830.90
26/03/2019	RETIRO FIDEICOMISO CC 0054 GMF	-9,837,908.016	-150,000,000.00	15,247.143516	807.877873	12,320,830.90
26/03/2019	GMF 4x1000	-39,351.633	-600,000.00	15,247.143516	768.226240	11,720,830.90

Tipo de Participación	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación	Valor promedio del Fondo en el mes
F TP06 NEG	2.40%	$354,887,134,780.09

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
F TP01 Ntv	4.043	3.184	3.723	3.631	4.324	5.340	0.147	0.150	0.122	0.117	0.187	0.211

VIGILADO

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285

fiduciaria popular

NIT. 800141235

PA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ CONTRATO DE OBRA PN

PA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ -FONDO DE ANTICIPO

CR 13 A 29 24 P 20

BOGOTA D.C / CUNDINAMARCA

Número de Identificación 378244

Fiduliquidez

Extracto de cuenta Periodo del 01 Marzo 2019 al 31 Marzo 2019 **Número de Encargo: XXXXXXX2592-5**

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
F TP02 INV	4.146	3.284	3.828	3.632	4.375	5.376	0.147	0.150	0.122	0.157	0.181	0.210
F TP03 INV	4.246	3.388	3.928	3.738	4.427	5.410	0.147	0.150	0.122	0.157	0.186	0.215
F TP04 INV	4.454	3.590	4.110	3.939	4.529	5.479	0.147	0.150	0.122	0.157	0.189	0.218
F TP05 INV	2.571	1.500	1.829	NA	NA	NA	0.150	0.128	0.137	NA	NA	NA
F TP06 NEG	1.251	2.377	2.913	2.722	3.915	5.065	0.147	0.150	0.122	0.157	0.183	0.210
F TP07 NEG	3.452	2.578	3.114	2.923	4.017	5.134	0.147	0.150	0.122	0.157	0.191	0.219
F TP08 NEG	3.574	2.678	3.215	3.023	4.088	5.166	0.147	0.150	0.122	0.157	0.191	0.219
F TP09 NEG	4.146	3.286	3.828	3.633	4.375	5.375	0.147	0.150	0.122	0.157	0.187	0.216
F TP10 NEG	4.681	3.797	4.339	4.145	4.833	5.548	0.147	0.150	0.122	0.157	0.185	0.207
F TP11 BMOR	3.635	2.779	3.317	3.124	4.119	5.202	0.147	0.150	0.122	0.157	0.190	0.214

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversion colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de deposito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversion colectiva esta sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversion colectiva.

Cualquier inquietud comuníquese con Servicio al Cliente al PBX 6079977, 5951506 Opción 3, a la línea nacional gratuita 018000513962, al correo servicioalcliente@fidupopular.com.co o remítala a la Cra. 13 A N° 29 24 piso 20, 21 y 24. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto, remítela a los Revisores Fiscales KPMG al correo electrónico srincon@kpmg.com o al número telefónico 6079977 Ext 502. El reglamento y la ficha técnica podrá consultarla en la página web: www.fidupopular.com.co ingresando al link de cada Fondo de Inversión. Recuerde que cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero: calle 70 A No 11 83 en Bogotá, Teléfonos: (1) 5439850 (1)2351604. Correo electrónico: reclamaciones@defensorialg.com.co

VIGILADO superintendencia financiera de colombia

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVO	NAPL	486,736,603.88	9,553,646.40	471,836,744.71	24,453,505.57
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	NAPL	486,736,603.88	9,553,646.40	471,836,744.71	24,453,505.57
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	NAPL	486,736,603.88	9,553,646.40	471,836,744.71	24,453,505.57
130205		EMISORES NACIONALES	NAPL	486,736,603.88	9,553,646.40	471,836,744.71	24,453,505.57
13020501		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	NAPL	486,736,603.88	9,553,646.40	471,836,744.71	24,453,505.57
1302050105		FONDOS DE INVERSION COLECTIVA FIDUPOPULAR	NAPL	486,736,603.88	9,553,646.40	471,836,744.71	24,453,505.57
	70083602592	ENCARGO FIDUCIARIO 70083602592	NAPL	475,215,698.24	4,523,650.81	467,427,223.06	12,312,125.96
	70083602605	ENCARGO FIDUCIARIO 70083602605	NAPL	11,520,905.64	5,029,995.59	4,409,521.62	12,141,379.61
2		PASIVO	NAPL	-8,301,435.63	466,039,367.02	466,630,662.02	-8,892,730.63
25		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-8,301,435.63	466,039,367.02	466,630,662.02	-8,892,730.63
2580		DIVERSOS	NAPL	-8,301,435.63	466,039,367.02	466,630,662.02	-8,892,730.63
258095		OTROS	NAPL	-8,301,435.63	466,039,367.02	466,630,662.02	-8,892,730.63
25809501		DIVERSOS	NAPL	-8,301,435.63	466,039,367.02	466,630,662.02	-8,892,730.63
2580950101		CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR	NAPL	-8,301,435.63	466,039,367.02	466,630,662.02	-8,892,730.63
	901041132	AG3 INGENIERIA SAS	NAPL	.00	150,000,000.00	150,000,000.00	.00
	900374726	CENTIMETRO MOBILIARIO SAS	NAPL	.00	126,558,341.00	126,558,341.00	.00
	10547229	AGUILAR BERMEO GABRIEL PASTOR	NAPL	.00	127,455,922.00	127,455,922.00	.00
	901177394	CONSORCIO BCS GUTIERREZ	NAPL	.00	61,532,375.00	61,532,375.00	.00
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A	NAPL	.00	492,729.02	492,729.02	.00
	800141397	POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NAPL	-8,301,435.63	.00	591,295.00	-8,892,730.63
3		PATRIMONIO	NAPL	-478,435,168.25	471,788,360.58	8,913,957.27	-15,560,774.94
35		PATRIMONIO ESPECIALES	NAPL	-491,612,231.04	469,953,324.29	8,913,957.27	-30,572,864.02
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-4,652,719,625.04	3,913,957.27	8,913,957.27	-4,657,719,625.04
350505		APORTES EN DINERO	NAPL	-4,652,719,625.04	3,913,957.27	8,913,957.27	-4,657,719,625.04
35050501		APORTES EN DINERO	NAPL	-4,652,719,625.04	3,913,957.27	8,913,957.27	-4,657,719,625.04
3505050105		APORTES EN DINERO	NAPL	-4,652,719,625.04	3,913,957.27	8,913,957.27	-4,657,719,625.04
	901177394	CONSORCIO BCS GUTIERREZ	NAPL	-4,652,719,625.04	3,913,957.27	8,913,957.27	-4,657,719,625.04
3510		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	4,161,107,394.00	466,039,367.02	.00	4,627,146,761.02
351010		PAGOS A TERCEROS	NAPL	4,161,107,394.00	466,039,367.02	.00	4,627,146,761.02
35101000		PAGOS A TERCEROS	NAPL	4,159,684,987.00	466,546,638.00	.00	4,626,231,625.00
3510100095		OTROS	NAPL	4,159,684,987.00	466,546,638.00	.00	4,626,231,625.00
	901041132	AG3 INGENIERIA SAS	NAPL	748,368,573.00	150,000,000.00	.00	898,368,573.00
	901187768	ARRIETA S.A.S	NAPL	40,682,485.00	.00	.00	40,682,485.00
	900374726	CENTIMETRO MOBILIARIO SAS	NAPL	.00	126,558,341.00	.00	126,558,341.00
	900827979	CONSTRUCTORA SUMI AGUAS SAS	NAPL	84,517,753.00	.00	.00	84,517,753.00
	900906707	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	NAPL	11,065,601.00	.00	.00	11,065,601.00
	901057532	FERRELECTRICOM JP SAS	NAPL	3,909,260.00	.00	.00	3,909,260.00
	900763911	METAL B SAS	NAPL	98,464,775.00	.00	.00	98,464,775.00
	10547229	AGUILAR BERMEO GABRIEL PASTOR	NAPL	.00	127,455,922.00	.00	127,455,922.00
	890032550	ALFAGRES S.A.	NAPL	268,957,548.00	.00	.00	268,957,548.00
	900335365	BCS INGENIERIA SAS	NAPL	16,751,784.00	.00	.00	16,751,784.00
	890100251	CEMENTOS ARGOS S.A	NAPL	279,891,126.00	.00	.00	279,891,126.00
	817007557	CONEXPE S.A	NAPL	61,000,000.00	.00	.00	61,000,000.00
	901177394	CONSORCIO BCS GUTIERREZ	NAPL	2,284,812,211.00	61,532,375.00	.00	2,346,344,586.00
	830063800	COVAL COMERCIAL S.A.	NAPL	29,354,083.00	.00	.00	29,354,083.00
	891502316	CVS EQUIPAR Y CIA SEN C	NAPL	5,297,921.00	.00	.00	5,297,921.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
3510100095	830059125	DATALEC INGENIEROS LTDA	NAPL	50,000,000.00	.00	.00	50,000,000.00
	817000019	LADRILLERA MELENDEZ S.A.	NAPL	38,976,000.00	.00	.00	38,976,000.00
	76326951	MORALES RODRIGUEZ CARLOS ADRIAN	NAPL	1,483,172.00	.00	.00	1,483,172.00
	34535384	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	NAPL	51,070,126.00	.00	.00	51,070,126.00
	900150515	PREFABRICADOS JOVITA CASTRO & CIA LTDA	NAPL	14,146,723.00	.00	.00	14,146,723.00
	12976085	REVELO ORLANDO EDMUNDO	NAPL	9,399,027.00	.00	.00	9,399,027.00
	890333023	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.	NAPL	35,680,235.00	.00	.00	35,680,235.00
	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	NAPL	34,323,000.00	.00	.00	34,323,000.00
	10296018	VELASCO CAPOTE JESUS ROGER	NAPL	11,533,584.00	.00	.00	11,533,584.00
35101007		**COSTOS Y GASTOS**	**NAPL**	**1,422,407.00**	**492,729.02**	**.00**	**1,915,136.02**
3510100705		COMISIONES	NAPL	1,422,407.00	492,729.02	.00	1,915,136.02
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	NAPL	1,422,407.00	492,729.02	.00	1,915,136.02
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**13,177,062.79**	**1,835,026.29**	**.00**	**15,012,089.08**
3910		**PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**3,975,357.43**	**.00**	**.00**	**3,975,357.43**
391001		**PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**3,975,357.43**	**.00**	**.00**	**3,975,357.43**
39100101		**PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**3,975,357.43**	**.00**	**.00**	**3,975,357.43**
3910010101		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	3,975,357.43	.00	.00	3,975,357.43
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	3,975,357.43	.00	.00	3,975,357.43
3920		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**9,201,705.36**	**1,835,026.29**	**.00**	**11,036,731.65**
392001		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**9,201,705.36**	**1,835,026.29**	**.00**	**11,036,731.65**
39200101		**PÉRDIDA DEL EJECICIO**	**NAPL**	**9,201,705.36**	**1,835,026.29**	**.00**	**11,036,731.65**
3920010101		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	9,201,705.36	1,835,026.29	.00	11,036,731.65
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	9,201,705.36	1,835,026.29	.00	11,036,731.65
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**-8,973,009.76**	**.00**	**639,689.13**	**-9,612,698.89**
41		**INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES**	**NAPL**	**-8,973,009.76**	**.00**	**639,689.13**	**-9,612,698.89**
4108		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**	**NAPL**	**-8,973,009.76**	**.00**	**639,689.13**	**-9,612,698.89**
410805		**POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO**	**NAPL**	**-8,973,009.76**	**.00**	**639,689.13**	**-9,612,698.89**
41080501		**PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR)**	**NAPL**	**-8,973,009.76**	**.00**	**639,689.13**	**-9,612,698.89**
4108050101		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR)	NAPL	-8,973,009.76	.00	639,689.13	-9,612,698.89
	900247285	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ	NAPL	-8,973,009.76	.00	639,689.13	-9,612,698.89
5		**GASTOS**	**NAPL**	**8,973,009.76**	**2,474,715.42**	**1,835,026.29**	**9,612,698.89**
51		**GASTOS OPERACIONALES**	**NAPL**	**18,174,715.12**	**2,474,715.42**	**.00**	**20,649,430.54**
5108		**VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.**	**NAPL**	**629,220.53**	**19,262.95**	**.00**	**648,483.48**
510805		**POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**629,220.53**	**19,262.95**	**.00**	**648,483.48**
51080501		**PARTICIPACIÓN EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (DB)**	**NAPL**	**629,220.53**	**19,262.95**	**.00**	**648,483.48**
5108050101		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (DB)	NAPL	629,220.53	19,262.95	.00	648,483.48
	900247285	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ	NAPL	629,220.53	19,262.95	.00	648,483.48
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**9,244,058.96**	**1,864,157.47**	**.00**	**11,108,216.43**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**9,244,058.96**	**1,864,157.47**	**.00**	**11,108,216.43**
51400501		**G.M.F.**	**NAPL**	**9,244,058.96**	**1,864,157.47**	**.00**	**11,108,216.43**
5140050102		G.M.F. OFERTAS FDOS COMUNES	NAPL	9,244,058.96	1,864,157.47	.00	11,108,216.43

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
5140050102	900247285	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ	NAPL	9,244,058.98	1,864,157.47	.00	11,108,216.43
5167		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**8,301,435.63**	**591,295.00**	**.00**	**8,892,730.63**
516701		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**8,301,435.63**	**591,295.00**	**.00**	**8,892,730.63**
51670101		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**8,301,435.63**	**591,295.00**	**.00**	**8,892,730.63**
5167010101		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	8,301,435.63	591,295.00	.00	8,892,730.63
	800141397	POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NAPL	8,301,435.63	591,295.00	.00	8,892,730.63
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-9,201,705.36**	**.00**	**1,835,026.29**	**-11,036,731.65**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-9,201,705.36**	**.00**	**1,835,026.29**	**-11,036,731.65**
590501		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-9,201,705.36**	**.00**	**1,835,026.29**	**-11,036,731.65**
59050101		**GANANCIAS**	**NAPL**	**-9,201,705.36**	**.00**	**1,835,026.29**	**-11,036,731.65**
5905010101		GANANCIAS	NAPL	-9,201,705.36	.00	1,835,026.29	-11,036,731.65
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	-9,201,705.36	.00	1,835,026.29	-11,036,731.65
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL**	**NAPL**	**.00**	**985,458.04**	**985,458.04**	**.00**
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**-492,729.02**	**492,729.02**	**492,729.02**	**-492,729.02**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-492,729.02**	**492,729.02**	**492,729.02**	**-492,729.02**
829501		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-492,729.02**	**492,729.02**	**492,729.02**	**-492,729.02**
82950101		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-492,729.02**	**492,729.02**	**492,729.02**	**-492,729.02**
8295010101		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-492,729.02	492,729.02	492,729.02	-492,729.02
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	NAPL	-492,729.02	492,729.02	492,729.02	-492,729.02
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**492,729.02**	**492,729.02**	**492,729.02**	**492,729.02**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**492,729.02**	**492,729.02**	**492,729.02**	**492,729.02**
840500		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**492,729.02**	**492,729.02**	**492,729.02**	**492,729.02**
84050000		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**492,729.02**	**492,729.02**	**492,729.02**	**492,729.02**
8405000000		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	492,729.02	492,729.02	492,729.02	492,729.02
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	492,729.02	414,058.00	414,058.00	492,729.02
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	NAPL	.00	78,671.02	78,671.02	.00
			Total	.00	950,841,537.46	950,841,537.46	.00

DIRECTOR CONTABLE

REPRESENTANTE LEGAL

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO BCS GUTIERREZ - 378244

PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO

1	Pago de Salarios y Jornales, Mano de Obra	$ 65.001.907,53		$ 65.001.907,53
2	Compra de Materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 136.504.005,82		$ 136.504.005,82
3	Transporte y retiro de escombros	$ 10.833.651,26		$ 10.833.651,26
4	Descuentos y retenciones	$ 4.333.460,50		$ 4.333.460,50

MAURICIO LUGO
Coordinador de Negocios Fiduciarios

JOHAN BARRAGÁN
Analista de Negocios Fiduciarios

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	Página 1 de 1

PROGRAMA/ADIÓN	FECHA: 17-feb-15 FPI-TRIAP-06-0-LICITA-14
CONTRATO (No. adición Vter.)	
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE POLICIA CRUCE Y COMANDO DE ESTACIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"
VALOR TOTAL DE ADICIÓN (IVA)	$ 483.144.050,00
CONTRATISTA	CONSORCIO BCI-GUTIERREZ
INTERVENTOR	Ejército SAS
PLAZO	Hasta el 29 de abril de 2015
VALOR ANTICIPO	50% $ 116.875.000,00

DATOS ESPECIFICOS

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Pago de salarios y prestac. sociales de obra	$ 76.193.001,89	16,17%
2	Compra de materiales, alquileres y alquiler de equipos	$ 174.038.998,71	36,27%
3	Transportes y pagos de accesorios	$ 12.232.999,41	5,44%
4	Gastos varios y relacionados	$ 3.296.734,07	1,38%
	TOTAL	$ 116.875.000,00	100,00%

Notas:

a) Plazo en días para la inversión del anticipo 135 días.

Para constancia de lo anterior, se firma y suscribe el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los aquí intervinientes, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2015

MAYOR CRISTIAN EDUARDO LOPEZ REYES
Supervisor de Contratos
POLICIA NACIONAL-DOSAF

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCI-GUTIERREZ
CONTRATISTA

CARLOS ALFONSO PARRA PALOMINO
Representante Legal
BANCO SAS
INTERVENTORIA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO		Página
		Uno

	FECHA	12 de [illegible]
PROGRAMACIÓN		
CONTRATO No.		
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE"	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 1.252.449.334,08
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA	
INTERVENTOR	DAIMCO SAS	
PLAZO	Hasta el 19 de abril de 2013	
VALOR ANTICIPO	50%	$ 4.019.245.405,04

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 1.616.677.042,00	30,17%
2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos	$ 2.891.330.222,04	54,17%
3	Transporte y retiro de escombros	$ 198.188.455,04	3,46%
4	Seguridad y señalización	$ 18.973.000,00	1,06%
	TOTAL	$ 4.819.291.679,04	108,86%

Nota:


1) Plazo en días para la inversión del anticipo 150 días.


Para constancia de lo anterior, se firma y aprueba el presente documento hoy [illegible] a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2013


MAYOR JAIRO ALEXANDER LOPEZ ORTIZ
Supervisor de Contrato
POLICIA NACIONAL-DIRAF


ALFREDO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO ACS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

[illegible] PALOMINO
Representante Legal
DAIMCO SAS
INTERVENTORIA

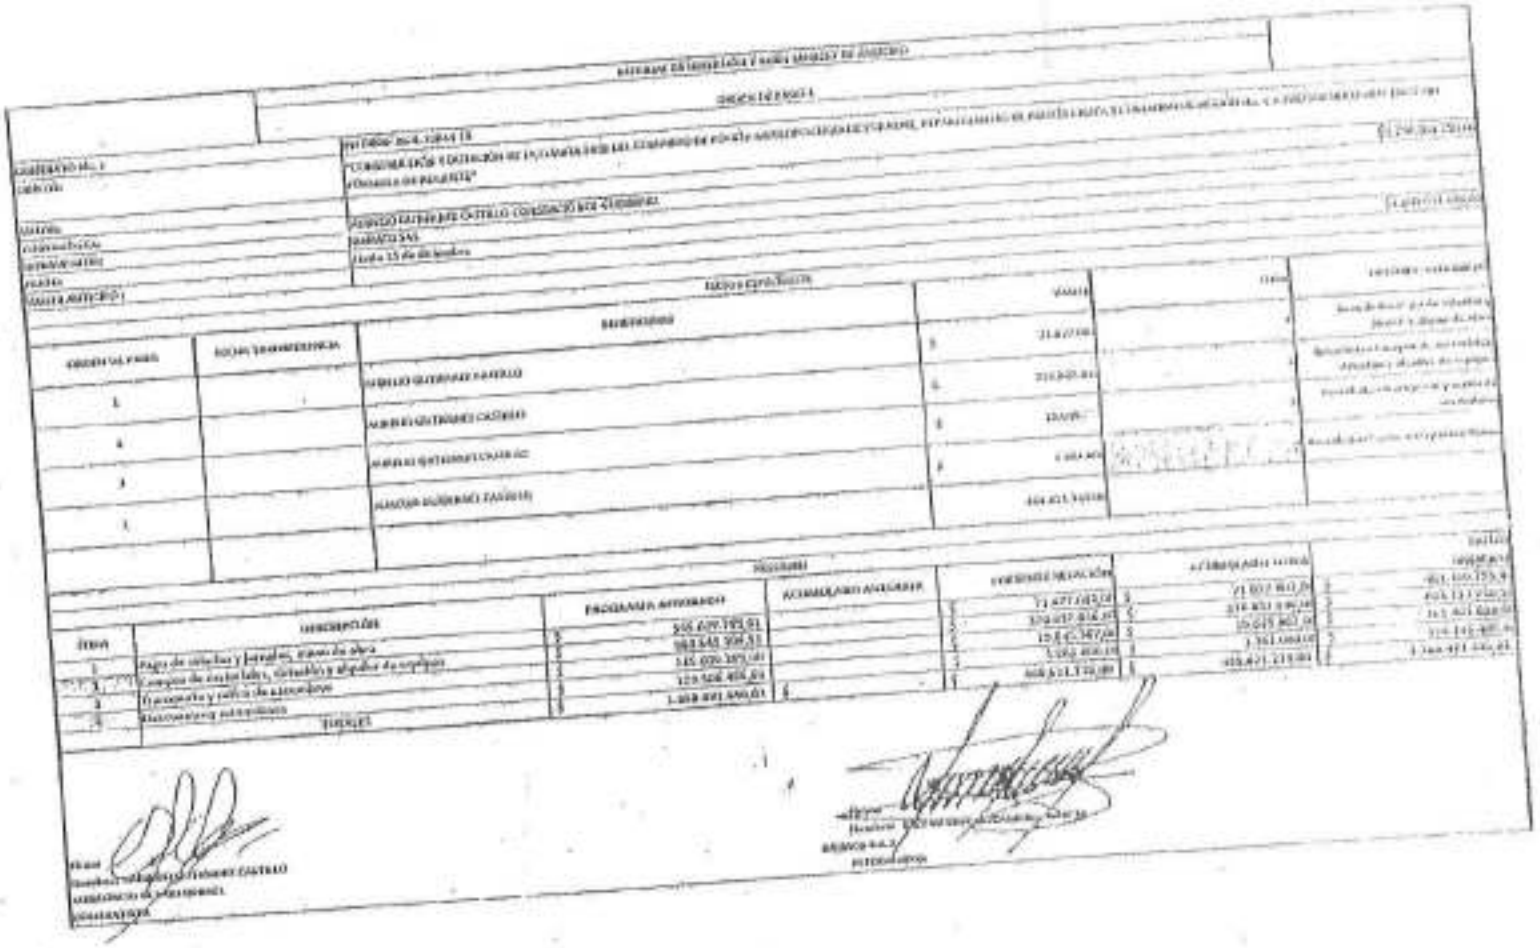

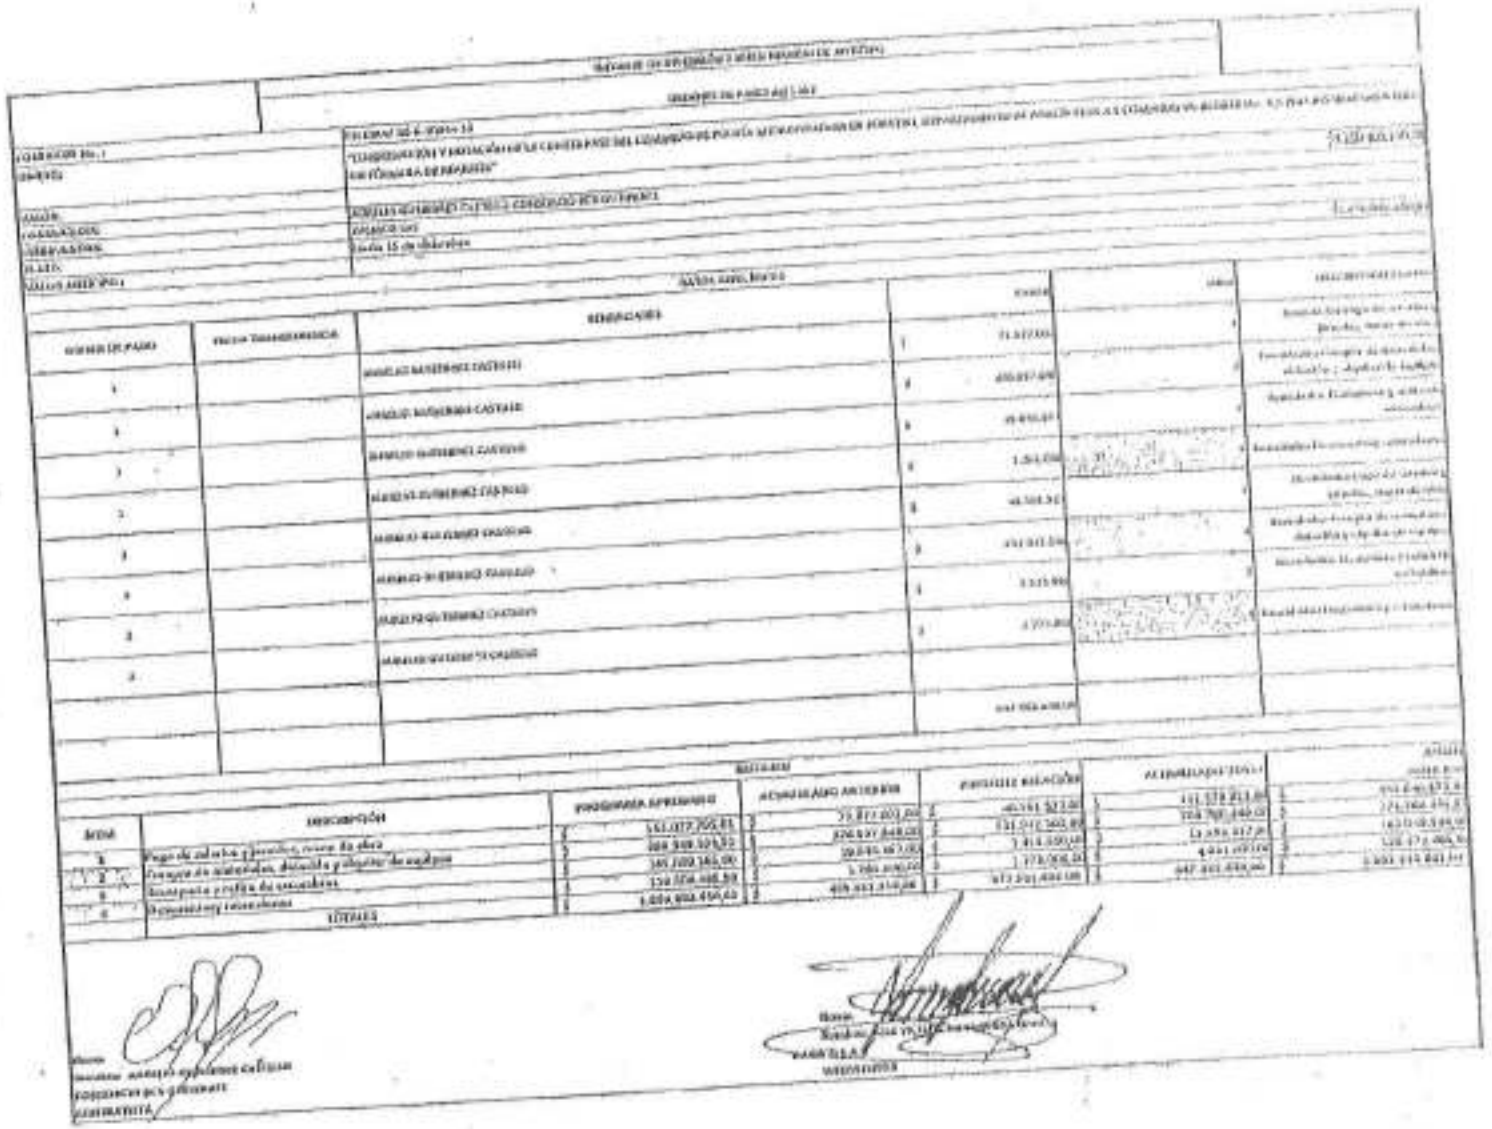

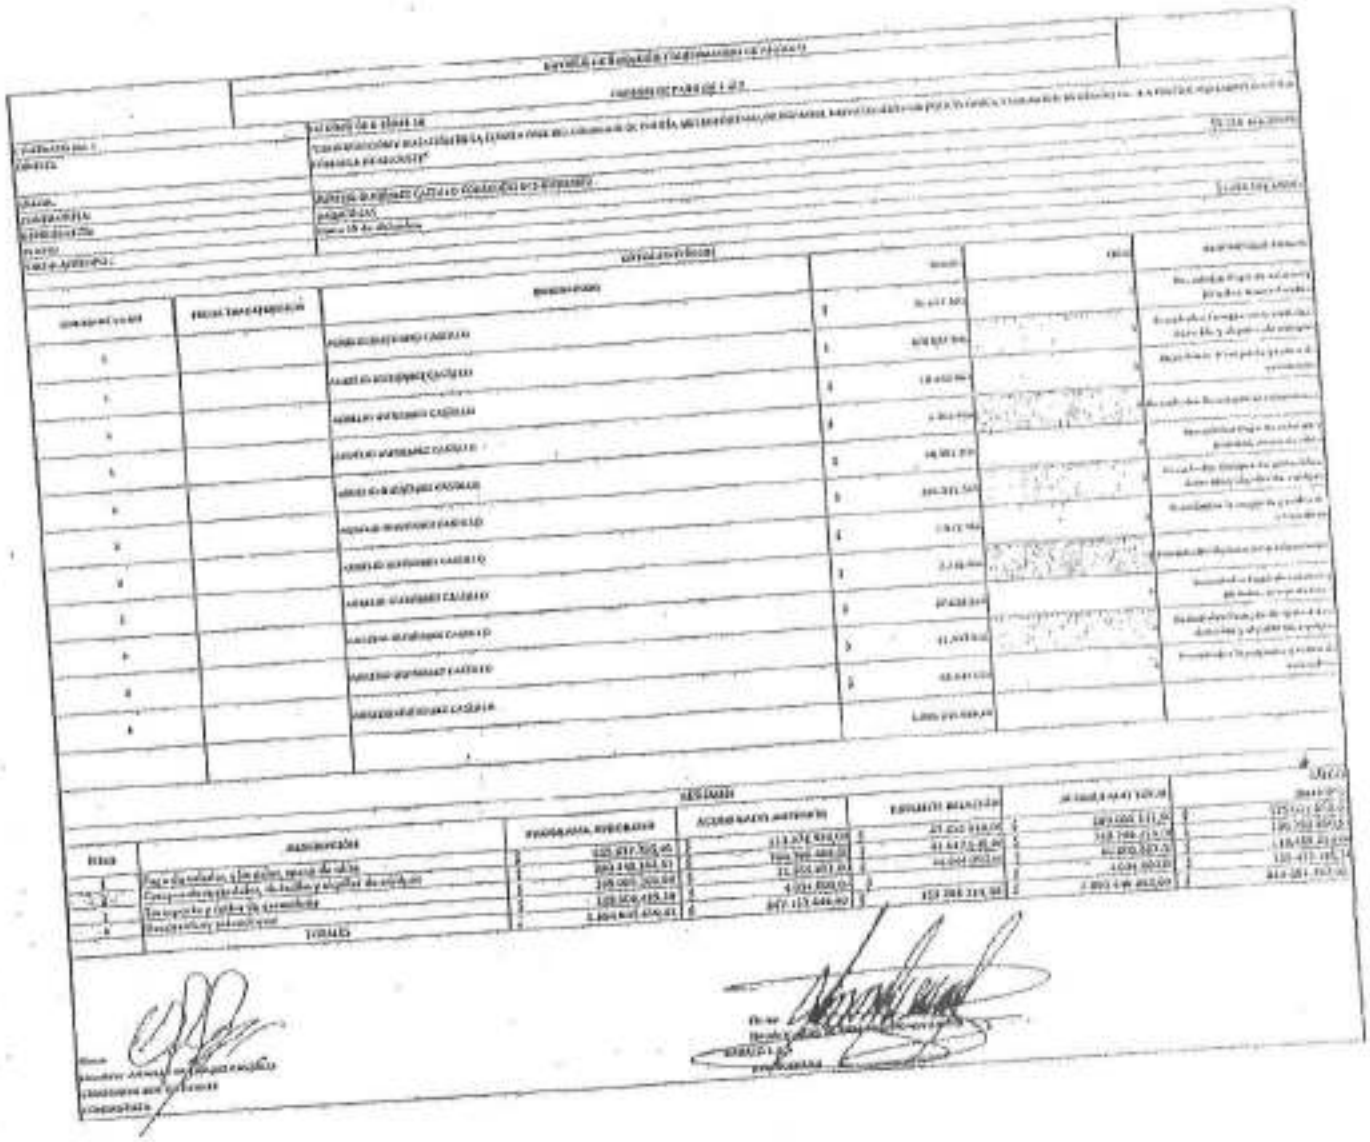

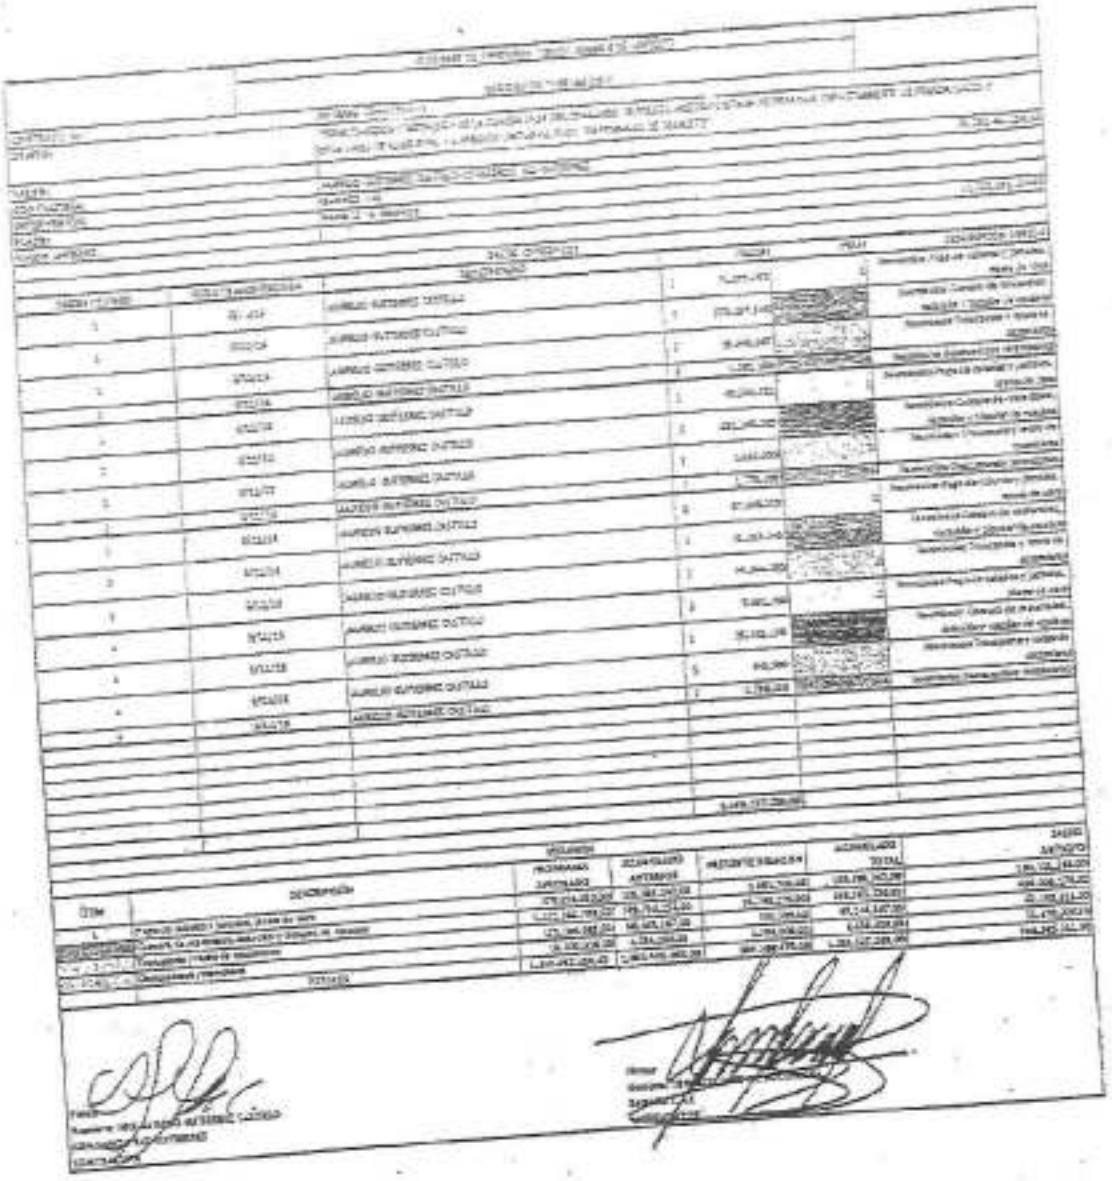





116



117









	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN GOBIERNO DE ANTICIPO
	INFORME DE PAGO (el 1 al 3)
CONTRATISTA:	CONSORCIO SCI-GUTIERREZ
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA ESTACIÓN, CAI MOVIL DE POLICÍA METROPOLITANA DE ROLDANILLO, CAI HISTÓRICO DE POLICÍA CALI Y COMANDO DE ESTACIÓN NO. 4 A POLICÍA METROPOLITANA TIPO CAI TERRAZUL DE TULUÁ VALLE"
VALOR:	$5,250,464,000.00
CONTRATO:	NÚMERO GUTIERREZ CONTRATO CONSORCIO SCI-GUTIERREZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SCI
VIGENCIA:	3 meses 15 días contados a partir de la suscripción del acta de inicio
PLAZO:	
VALOR ANTICIPO:	$1,575,139,200.00

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN CONCEPTO
01		METAL 8 SAS	$ 12,000,000.00	1	Compra de materiales, dotación y pruebas de soldeo
02		ECOSMAC COLOMBIA SA	$ 33,437,500.00	1	Compra de materiales, dotación y pruebas de soldeo
03		CEMENTOS ARGOS SA	$ 5,778,951.00	1	Compra de materiales, dotación y pruebas de soldeo
04		ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 13,987,134.00	1	Compra de materiales, dotación y pruebas de soldeo
05		EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 1,241,014.00	1	Compra de materiales, dotación y pruebas de soldeo
06		PREFABRICADOS JOVICA CUATRO SAS	$ 11,145,772.00	1	Compra de materiales, dotación y pruebas de soldeo
			$ 1,798,914,515.00		

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALORES PROGRAMADO ANTICIPO	ACUMULADO ANTICIPO	PRESENTE ANTICIPO	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de personal y honorarios, mano de obra	$ 1,575,139,200.00	$ 481,000,212.00		$ 481,000,212.00	$ 881,044,282.00
2	Compra de equipos, dotación y alquiler de vehículo	$ 1,575,139,200.00	$ 413,004,282.00	$ 126,304,900.00	$ 539,309,182.00	$ 1,035,830,018.00
3	Compra de materiales y mano de obra	$ 787,569,600.00	$ 545,243,414.00		$ 545,243,414.00	$ 242,326,186.00
4	Transporte y mano de obra	$ 787,569,600.00	$ 28,000,000.00		$ 28,000,000.00	$ 759,569,600.00
5	Consultorías terceradas	$ 349,791,900.00	$ 287,777,314.00	$ 126,304,900.00	$ 413,782,214.00	$ 936,009,686.00
	TOTALES	$ 5,075,169,500.00	$ 1,755,025,222.00	$ 252,609,800.00	$ 2,007,634,822.00	$ 3,854,779,772.00

Para constancia del/lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad moral de las mismas empresas en ella, a los 18 días del mes de enero de 2019

Firma:
Nombre: WILMER ELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO SCI-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
CARGO:
INTERVENTOR

	SISTEMA DE INVENTARIO Y CONTROL PATRIMONIAL
	INVENTARIO DE BIENES AL 31/12/2018
DEPARTAMENTO:	INVERSIONES
OBJETO:	"CONSTRUCCION Y OTORGAMIENTO DE LA CUARTA FASE DEL CUARTEL DE POLICIA METROPOLITANA DE HONDURAS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN"
	BODEGA No. 1 UBICADO EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE VILLANUEVA
VALOR:	VALOR DE CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCION
CENTRO DE COSTO:	BIENES DE USO
FECHA DE ADQUISICION:	FECHA DE INICIO DE OBRA
PLAZO:	
VALOR ACTUALIZADO:	

DATOS ALMACENADOS					
CODIGO DE BIEN	FECHA DE ADQUISICION	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	ESTADO	DESCRIPCION DETALLE
1	2/1/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1	[illegible]	1	Asentamiento Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	2/1/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1	[illegible]	[illegible]	Asentamiento Compra de materiales, donación y alquiler de equipo
1	2/1/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1	[illegible]	2	Asentamiento Transporte y retiro de escombros
1	2/1/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1	[illegible]	4	Asentamiento Documentación satisfactoria
1	2/1/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1	[illegible]	1	Asentamiento Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	2/1/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1	[illegible]	[illegible]	Asentamiento Compra de materiales, donación y alquiler de equipo
1	2/1/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1	[illegible]	2	Asentamiento Transporte y retiro de escombros
1	2/1/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1	[illegible]	4	Asentamiento Documentación satisfactoria
2	2/1/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1	[illegible]	1	Asentamiento Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	2/1/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1	[illegible]	[illegible]	Asentamiento Compra de materiales, donación y alquiler de equipo
2	2/1/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1	[illegible]	2	Asentamiento Transporte y retiro de escombros
2	2/1/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1	[illegible]	1	Asentamiento Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	2/1/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1	[illegible]	[illegible]	Asentamiento Compra de materiales, donación y alquiler de equipo
4	2/1/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1	[illegible]	2	Asentamiento Transporte y retiro de escombros
4	2/1/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1	[illegible]	4	Asentamiento Documentación satisfactoria
4	2/1/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1	[illegible]	1	Asentamiento Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	2/1/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1	[illegible]	[illegible]	Asentamiento Compra de materiales, donación y alquiler de equipo
4	2/1/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ CISTERNA	1	[illegible]	[illegible]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipo
4	2/1/18	COVALCO MINERAL S.A	1	[illegible]	[illegible]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipo
4	2/1/18	CONCRETOS JARDIN S.A	1	[illegible]	[illegible]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipo
4	2/1/18	REMOLQUITRUCKS P SAS	1	[illegible]	[illegible]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipo
4	2/1/18	SEGURIDAD MS OCCIDENTE S.A.S. SEGOCI S.A.S	1	[illegible]	[illegible]	Supervisión Compra de materiales, donación y alquiler de equipo
4	2/1/18	JESUS SOLMAN VELASCO CANTE	1	[illegible]	[illegible]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipo
4	2/1/18	AGD INGENIERIA SAS	1	[illegible]	4	Transporte y retiro de escombros
4	2/1/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	1	[illegible]	[illegible]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipo
7	10/1/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ CISTERNA	1	[illegible]	1	Compra de materiales, donación y alquiler de equipo
7	10/1/18	COVALCO MINERAL S.A	1	[illegible]	1	Compra de materiales, donación y alquiler de equipo
7	10/1/18	JESUS SOLMAN VELASCO CANTE	1	[illegible]	1	Compra de materiales, donación y alquiler de equipo
7	10/1/18	CONCRETOS JARDIN S.A	1	[illegible]	1	Compra de materiales, donación y alquiler de equipo
7	10/1/18	AGD INGENIERIA S.A.S	1	[illegible]	4	Transporte y retiro de escombros
7	10/1/18	AGD INGENIERIA S.A.S	1	[illegible]	1	Asentamiento Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	10/1/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1	[illegible]	[illegible]	Asentamiento Compra de materiales, donación y alquiler de equipo
8	10/1/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1	[illegible]	2	Asentamiento Transporte y retiro de escombros
8	10/1/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1	[illegible]	4	Asentamiento Documentación satisfactoria
8	10/1/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1	[illegible]	1	Asentamiento Pago de salarios y jornales, mano de obra
10	10/1/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ CISTERNA	1	[illegible]	[illegible]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipo
10	10/1/18	COVALCO MINERAL S.A	1	[illegible]	[illegible]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipo
10	10/1/18	JESUS SOLMAN VELASCO CANTE	1	[illegible]	[illegible]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipo

CONTRATO No.	
OBJETO	
VALOR	
PLAZO DE EJECUCIÓN	
ACTA DE INICIO	
PLAZO	
FECHA DE TERMINACIÓN	

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSACCIÓN	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO
29	28/12/18	CONSTRUCTORA AMBOS S.A.	[redacted]	[redacted]	Compra de materiales, alquileres y pagos de nómina
30	28/12/18	ALBERTO GUTIERREZ CASTILLO	[redacted]	1	Recolección Pago de peones y ayudantes, mano de obra
31	28/12/18	ALBERTO GUTIERREZ CASTILLO	[redacted]	[redacted]	Compra de materiales, alquileres y pagos de nómina
32	28/12/18	ALBERTO GUTIERREZ CASTILLO	[redacted]	4	Reembolso Transporte y venta de materiales
33	28/12/18	ALBERTO GUTIERREZ CASTILLO	[redacted]	[redacted]	Anticipado Descontado Liquidación
34	28/12/18	METAL 8 SAS	[redacted]	[redacted]	Compra de materiales, alquileres y pagos de nómina
35	28/12/18	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS	[redacted]	[redacted]	Compra de materiales, alquileres y pagos de nómina
36	28/12/18	CEMENTOS ARGOS SA	[redacted]	[redacted]	Compra de materiales, alquileres y pagos de nómina
37	28/12/18	ACD INGENIERIA SAS	[redacted]	3	Reembolso Transporte y venta de materiales
38		METAL 8 SAS	[redacted]	[redacted]	Compra de materiales, alquileres y pagos de nómina
39		ECOSMAC COLOMBIA SA	[redacted]	[redacted]	Compra de materiales, alquileres y pagos de nómina
40		CEMENTOS ARGOS SA	[redacted]	[redacted]	Compra de materiales, alquileres y pagos de nómina
41		ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	[redacted]	[redacted]	Compra de materiales, alquileres y pagos de nómina
42		SUMINTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	[redacted]	[redacted]	Compra de materiales, alquileres y pagos de nómina
43		PRETENSADOS JOYITA CASTRO SAS	[redacted]	[redacted]	Compra de materiales, alquileres y pagos de nómina
44		JUANCHO GUTIERREZ CASTILLO	[redacted]	1	Recolección Pago de peones y ayudantes, mano de obra
45		ALBERTO GUTIERREZ CASTILLO	[redacted]	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, alquileres y pagos de nómina
46		ALBERTO GUTIERREZ CASTILLO	[redacted]	4	Reembolso Transporte y venta de materiales
47		ALBERTO GUTIERREZ CASTILLO	[redacted]	[redacted]	Anticipado Descontado Liquidación
			3.885.966.711,93		


ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR
1	Pago de peones y ayudas mano de obra	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2	Compra de materiales, alquileres y pagos de nómina	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3	Transporte y venta de materiales	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4	Descripción restricciones	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	TOTALES	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Para constancia de lo anterior se firma el [redacted] hasta la terminación total del contrato que corresponde en este, a los [redacted] días del mes de [redacted]

Firma
Nombre: [redacted]
CONTRATISTA

INTERVENTOR

9/5
126

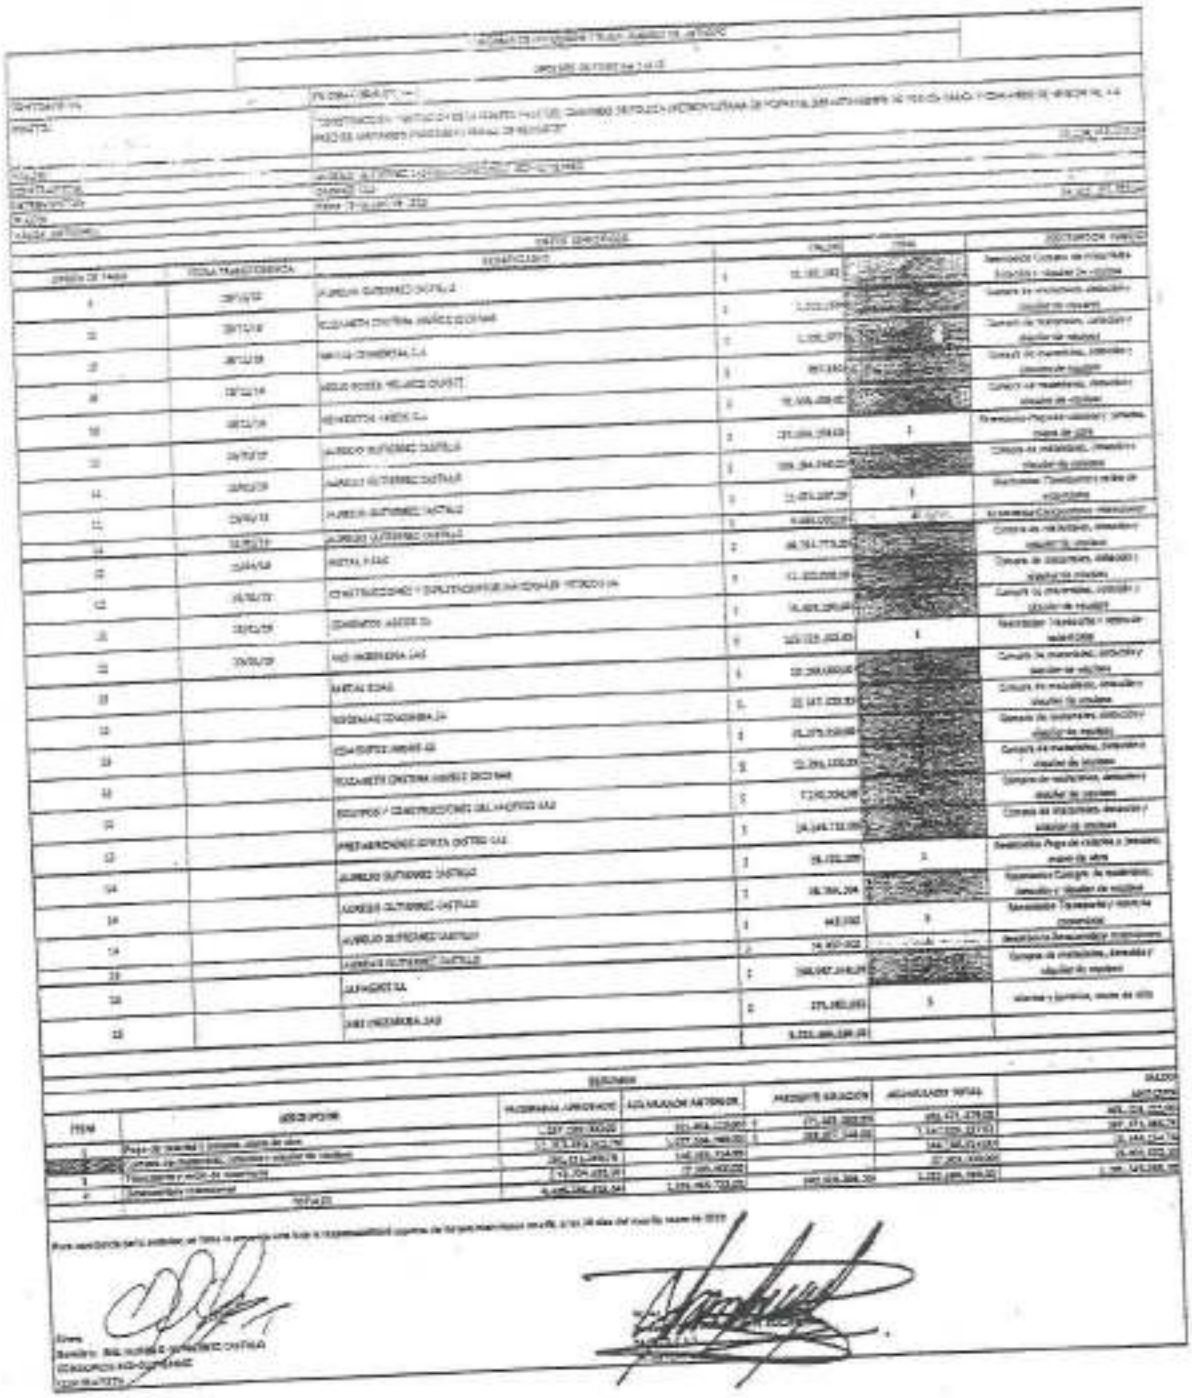

	INFORME DE TRANSFERENCIA Y SUSTENTO MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 17	
CONTRATO No. :	MO SUMA 004-2018-18	
OBJETO:	"SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE POLICIA SALUD Y COMANDO DE AVIACION Nro. 4-3 PRECIOS UNITARIOS TODO EN FORMULA DE REAJUSTE"	
VIAJE:		
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO - CONSORCIO MO-GUTIERREZ	
ENTIDAD EJECUTORA:	DIRINCRI 5-45	
PLAZO:	Hasta 28 de abril de 2019	
MONTO ANTICIPO :		

DATOS ESPECIFICOS						
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO		VALOR	ITEM	DESCRIPCION GENERAL
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	S/	71,817,083	1	Asambleas Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	S/	979,207,348	[redacted]	Asambleas Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	S/	18,836,347	3	Asambleas Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	S/	1,781,200	4	Asambleas Servicios/otros relacionados
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	S/	48,021,912	1	Asambleas Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	S/	110,342,743	[redacted]	Asambleas Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	S/	5,143,350	3	Asambleas Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	S/	1,776,500	4	Asambleas Servicios/otros relacionados
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	S/	97,525,329	1	Asambleas Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	S/	42,117,843	[redacted]	Asambleas Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	S/	44,844,000	3	Asambleas Transporte y retiro de escombros
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	S/	9,881,700	4	Asambleas Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	S/	91,369,236	[redacted]	Asambleas Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	S/	842,500	3	Asambleas Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	S/	1,766,000	4	Asambleas Servicios/otros relacionados
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	S/	23,000,000	1	Asambleas Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	S/	71,345,000	[redacted]	Asambleas Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ROCHA	S/	28,012,700	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ODVAL COMERCIAL S.A	S/	15,557,057	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CONVENTOS ARGOS S.A	S/	120,166,336	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ARANDI ELECTRICOM JP SAS	S/	1,908,160	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	9/11/18	SKANSKA/OBRAS DEL OCCIDENTE S.A.S Y OBRAS S.A.S	S/	35,980,339	[redacted]	Servicios Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	9/11/18	LICEUS RONNER VELASCO CARPOTE	S/	5,467,500	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
8	9/11/18	AAS INGENIERIA SAS	S/	9,425,184	3	Transporte y retiro de escombros
8	9/11/18	DARLOK ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	S/	1,458,171	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	14/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ROCHA	S/	8,441,902	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	14/11/18	ODVAL COMERCIAL S.A	S/	8,699,040	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	14/11/18	JESUS RONNER VELASCO CARPOTE	S/	2,067,784	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	14/11/18	SKANSKA/OBRAS DEL OCCIDENTE S.A.S	S/	38,376,000	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	14/11/18	AAS INGENIERIA S.A.S	S/	54,324,250	3	Transporte y retiro de escombros
7	14/11/18	ARANDI S.A.S	S/	10,681,455	1	Asambleas Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	S/	91,228,224	1	Asambleas Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	S/	88,348,137	[redacted]	Asambleas Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	S/	649,300	3	Asambleas Transporte y retiro de escombros

2
98
129

CONTRATO No.	PC-SUMI-26-9-10844-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL CENTRO DE POLICÍA METROPOLITANA DE FONTIBÓN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y CENTRO DE REGIÓN No. 1 A CARGO DE LA POLICÍA NACIONAL"
VALOR:	
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO ASP-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	CONSORCIO SAS
ANEXO:	HASTA EL 30 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO:	

DATOS GENERALES

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM
9	28/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11,281,940	[redacted]	Suministros Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	28/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 3,718,999	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	28/11/18	GOMAL COMERCIAL S.A	$ 1,802,917	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	28/11/18	ISRAEL ADALBERTO VELASCO CHIVITE	$ 697,318	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	28/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 75,805,450.91	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
11	29/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 386,604,268.99	3	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	29/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 328,134,946.58	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
11	29/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11,674,387.80	3	Suministros Transporte y retiro de escombros
11	29/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 5,688,958.59	4	Reembolso Descuentos y retenciones
12	30/11/18	METAL R SAS	$ 88,294,775.08	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
12	30/11/18	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE MATERIALES PETREOS SA	$ 92,900,580.00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
12	30/11/18	CEMENTOS ARGOS SA	$ 44,028,398.00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
12	30/11/18	ARS INGENIERIA SAS	$ 225,329,326.00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
13	30/11/18	METAL R SAS	$ 18,209,080.80	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13	30/11/18	SIGMA ACCOLOMBIA SA	$ 35,167,209.09	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13	30/11/18	CEMENTOS ARGOS SA	$ 85,379,010.87	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13	30/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 12,891,388.00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13	01/01/19	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7,241,908.08	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13	01/01/19	PREFABRICADOS OVITA CASTRO SAS	$ 14,248,733.00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
14	3/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 38,452,909	3	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14	3/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 38,744,164	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
14	3/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643,508	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
14	3/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 24,987,000	[redacted]	Reembolso Descuentos y retenciones
15	3/01/19	ALFAGRES SA	$ 368,937,348.06	[redacted]	Compra de materiales, donación, alquiler de equipos
15	3/01/19	ARS INGENIERIA SAS	$ 373,681,900	3	salarios y jornales, mano de obra
16	3/01/19	CONSTRUCTORA JUAN JARAMILLO SAS	$ 64,657,764.00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 282,968,448.00	3	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 82,598,988.00	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 8,940,996.00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
			$ 8,913,297,948.92		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
3	Pago de salarios y jornales mano de obra	$ 1,327,000,000.00	$ 885,471,279.00	$ 170,983,448.00	$ 1,056,454,727.00	$ 270,545,273.00
2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	$ 2,753,895,570.78	$ 1,411,947,280.00	$ 82,598,988.00	$ 1,494,546,268.00	$ 1,259,349,302.78
3	Transporte y retiro de escombros	$ 363,481,268.78	$ 368,086,604.00	$ 8,940,996.00	$ 377,027,600.00	$ (13,546,331.22)
4	Descuentos y retenciones	$ 67,104,453.22	$ 37,909,180.00		$ 37,909,180.00	$ 29,195,273.22
	TOTALES	$ 4,511,481,292.78	$ 2,703,414,343.00	$ 262,523,432.00	$ 2,965,937,775.00	$ 1,545,543,517.78

Para constancia de la anterior, se firma la presente acta hoy [illegible] en [illegible] a los [illegible] días del mes de [illegible] de 2019

130

	INFORME DE AVANCE Y ANEXO SOPORTE
	ORDEN DE PAGO No 5 A 12
CONTRATO No.	PN-DIMAT-064-2020-19
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DE CIEN NODOS DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE ESTACIÓN No. 1 A PRECIOS UNITARIOS Y TASA DE UTILIDAD DE REMATE"
VALOR	
CONTRATISTA	
INTERVENTOR	
PLAZO	
VALOR ANTICIPO	

DATOS DESPACHO		VALOR	ITEM	DESCRIPCION ITEM(S)
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO		

Firma
Nombre:
CONSORCIO SCI-SUPERVISE
CONTRATISTA

INTERVENTOR

3

131

INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE INTERÉS

CONSORCIO DE PAZ 001 - 2.18

CONTRATANTE:	FIDUCIAR [illegible]
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL CRAMED DE POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE [illegible] S.A. PROCESO LICITATORIO PAZ 001 DE 2018 FIDUCIARIA"
VALOR:	
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLA-CONSORCIO 001-GUTIERREZ
CONTRATANTE:	CONSORCIO PAZ
PLAZO:	Hasta 28 de abril de 2019
VALOR APROBADO:	

DATOS GENERALES					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 73,477,000	1	Anticipado Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 109,607,340	2	Anticipado Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 18,545,280	3	Anticipado Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1,760,000	4	Anticipado Disco duros externos
2	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40,230,323	1	Anticipado Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 120,342,940	2	Anticipado Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 7,313,600	4	Anticipado Transporte y retiro de escombros
2	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1,777,600	4	Anticipado Disco duros externos
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67,635,323	1	Anticipado Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 18,017,340	2	Anticipado Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44,344,000	3	Anticipado Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 8,881,780	1	Anticipado Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 91,765,200	2	Anticipado Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 880,000	3	Anticipado Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1,786,000	4	Anticipado Disco duros externos
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 83,000,000	1	Anticipado Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 75,190,000	2	Anticipado Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 10,013,700	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A.	$ 58,257,057	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 220,000,364	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICOM JP SAS	$ 1,969,280	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	SUMINISTROS DEL OCCIDENTE S.A.S	$ 35,686,315	2	Arrendamiento Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROMERO VELASCO CAPOTE	$ 5,687,980	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ASI INGENIERIA SAS	$ 5,629,320	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1,481,171	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	28/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 6,441,960	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	04/11/18	COVAL COMERCIAL S.A.	$ 8,284,048	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	28/11/18	JESUS ROMERO VELASCO CAPOTE	$ 5,687,980	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	LAURA LLENA MELENDEZ S.A.S	$ 16,379,000	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ASI INGENIERIA S.A.S	$ 54,514,200	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	ARBETA S.A.S	$ 40,681,485	1	salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 88,184,334	1	Anticipado Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	04/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 87,548,187	2	Anticipado Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	28/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 600,000	4	Anticipado Transporte y retiro de escombros
9	28/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31,901,940	2	Anticipado Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2,112,000	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	COVAL COMERCIAL S.A.	$ 5,342,277	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos

3

98

132

CONTRATO No.:	PYDABLE-SEG-CUMPLO
OBJETO:	"CONVENIO DE CESIÓN DE LA CUARTA FASE DEL CONVENIO DE OBRA PÚBLICA BICENTENARIO "LAS DE PONIENTE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CELDA Y CONVENIO DE CESIÓN No. 1-1 MICRO LIMITADO PARA COMPAÑÍA DE SEGUROS"
VIGENCIA:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SUR
VALOR CONTRATO:	
PLAZO:	
FECHA ANTICIPO:	

DATOS DEPOSITARIO

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION PAGO
10	09/11/18	JESUS ADRIAN VILLALBA CORTES	$ 867.320	1	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
11	09/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 72.986.458,00	1	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
12	09/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 108.000.000,00	1	Suministro e Pago de salarios y jornales, apoyo de obra
13	09/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 378.234.949,00	1	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
14	09/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.874.997,00	1	Suministro Transporte y retiro de escombros
15	09/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 5.000.000,00	4	Suministro e Desplazamiento y alimentación
16	09/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 68.180.778,00	1	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
17	09/11/18	SIETAL S.A.S	$ 61.000.000,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
18	09/11/18	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACIONES DE MATERIALES PETREOS SA	$ 44.728.000,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
19	13/11/18	CONCRETOS ARGOS SA	$ 105.109.200,00	2	Suministro Transporte y retiro de escombros
20	13/11/18	ACE INGENIERIA SAS	$ 18.200.000,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
21		SIETAL S.A.S	$ 31.147.200,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
22		SOCIEDAD CONCAVIA SA	$ 41.879.213,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
23		CEMENTOS ARGOS SA	$ 13.981.139,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
24		ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ CIDO BAR	$ 1.200.200,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
25		EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 14.196.733,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
26		PREFABRICADOS JOYITA CASTRO SAS	$ 16.653.000	1	Suministro Pago de salarios y jornales, mano de obra
27		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 66.744.104	2	Suministro Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
28		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.000	3	Suministro Transporte y retiro de escombros
29		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 24.907.000	4	Suministro e Desplazamiento y alimentación
30		ACTIVERS SA	$ 386.897.340,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
31		ACE INGENIERIA SAS	$ 171.660.000	1	salarios y jornales, mano de obra
32		CONSTRUCTORA JUAN AGUAS SAS	$ 64.307.700,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
33		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 253.465.495,00	1	Suministro Pago de salarios y jornales, mano de obra
34		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 68.338.869,00	2	Suministro Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
35		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 5.940.288,00	3	Suministro Transporte y retiro de escombros
36		ORLANDO DOMINGO REYES	$ 1.008.653,00	1	Suministro Pago de salarios y jornales, mano de obra
37		ACE INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	$ 38.761.784,00	1	Suministro Pago de salarios y jornales, mano de obra
38		LUIS ALFREDO VARGAS BURGOS	$ 50.000.000,00	1	Suministro Pago de salarios y jornales, mano de obra
39		CRISTINA ELIZABETH MUÑOZ CIDO BAR	$ 1.200.000,00	2	Suministro Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
40		EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 8.823.000,00	2	Suministro Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
41		SOCIEDAD CONCAVIA SA	$ 11.178.800,00	2	Suministro Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
42		DISTRIQUIMICA LTDA S.EN C	$ 1.167.000,00	2	Suministro Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
43		ORLANDO DOMINGO REYES	$ 4.473.475,00	3	Suministro Transporte y retiro de escombros
44		ACE INGENIERIA SAS	$ 139.727.000,00	1	Suministro Pago de salarios y jornales, mano de obra
			$ 2.127.692.987,00		

133

CONTRATO No.	
OBJETO:	
VALOR:	
CONTRATISTA:	
INTERVENTOR:	
PLAZO:	
VALOR AMPLIADO:	

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	RENDIMIENTOS	VALOR	ITEM	DESCRIPCION ITEM

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE EJECUCIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO APROBADO
1						
2						
3						
4						
TOTALES						

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta hoy [illegible] de [illegible] que intervienen en ella, a los [illegible] días del mes de [illegible] de 2019

NOMBRE INTERVENTOR CONTRATO
CONSORCIO [illegible]
INTERVENTOR

Firma
Representante [illegible]
[illegible]
INTERVENTOR

INFORME DE INVERSIÓN Y AUTENTAMIENTO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO (OP) - N.OP

CONTRATO No.:	24-SUBASTA-4-LICI041-18
OBJETO:	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CAMETA PARA DEL CUARTELO DE POLICIA VENTIQUE, TUMBA DE ANTIOQUIA, DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO Y CUARTELO DE NEGRITO No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
VALOR:	
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO - CONSORCIO VIAS GUTIERREZ
INTERVENTORIA:	CONSULTANTE S.A.S.
PLAZO:	Inicio: 29 de junio de 2018
VALOR ANTICIPO:	

DATOS GENERALES

ORDEN DE PAGO	FECHA DE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71,377,000	1	Anticipo Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 226,007,000	1	Anticipo Compra de materiales, adquisición y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 18,000,000	1	Anticipo Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1,000,000	1	Anticipo Seguridad industrial
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 83,000,000	1	Anticipo Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 101,000,000	2	Anticipo Compra de materiales, adquisición y alquiler de equipos
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1,000,000	3	Anticipo Transporte y retiro de escombros
4	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1,000,000	4	Anticipo Seguridad industrial
5	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 97,000,000	5	Anticipo Pago de salarios y jornales, mano de obra
6	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40,000,000	6	Anticipo Compra de materiales, adquisición y alquiler de equipos
7	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 10,000,000	7	Anticipo Transporte y retiro de escombros
8	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 8,000,000	8	Anticipo Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 95,000,000	9	Anticipo Compra de materiales, adquisición y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 800,000	10	Anticipo Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2,000,000	11	Anticipo Seguridad industrial
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 35,000,000	12	Anticipo Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 75,000,000	13	Anticipo Compra de materiales, adquisición y alquiler de equipos
8	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 19,000,000	14	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
8	9/11/18	CONALCOMERCIAL S.A	$ 19,000,000	15	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
8	9/11/18	FERRETERIA JARDIS S.A	$ 100,000,000	16	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRETERIA JARDIS S.A	$ 3,000,000	17	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
8	9/11/18	DISTRIBUIDORA DEL OCCIDENTE S.A.S NIVOCS.A.S	$ 10,000,000	18	Suministro Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
8	9/15/18	JESUS ROMAN VELASCO CHOCO	$ 3,000,000	19	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
4	9/11/18	JMR INGENIERIA SAS	$ 2,000,000	20	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 3,000,000	21	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	10/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8,000,000	22	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	10/11/18	CONALCOMERCIAL S.A	$ 8,000,000	23	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	10/11/18	JESUS ROMAN VELASCO CHOCO	$ 5,000,000	24	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	10/11/18	LACMELENA MELENDEZ S.A.S	$ 10,000,000	25	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	10/11/18	JMR INGENIERIA S.A.S	$ 16,000,000	26	Transporte y retiro de escombros
7	10/11/18	ARBUTA S.A.S	$ 40,000,000	27	Compra y cemento, mano de obra
3	10/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 60,000,000	28	Anticipo Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	10/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 10,000,000	29	Anticipo Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
8	10/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 800,000	30	Anticipo Transporte y retiro de escombros
3	10/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 10,000,000	31	Anticipo Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	10/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2,000,000	32	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	10/11/18	CONALCOMERCIAL S.A	$ 1,000,000	33	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos

2
95
85

CONTRATO No.	
OBJETO:	
VALOR:	
CONTRATISTA:	
INTERVENTOR:	
PLAZO:	
FECHA DE INICIO:	

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSPORTADORA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION ITEMS
10					
10					
11					
11					
11					
11					
12					
12					
12					
12					
12					
13					
13					
13					
13					
13					
14					
14					
14					
14					
15					
15					
15					
17					
17					
17					
18					
18					
18					
18					
18					
18					
18					
18					
18					
18					

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

ORDENES DE PAGO EN LIQUIDACIÓN

CONTRATO No.	PN-DIMAT-05-11-2020-LIQ
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LA CUARTA FASE DEL TERMINADO DE POLICÍA METROPOLITANA DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE / TERMINADO DE MEDICINA No. 1-4 PRIMERA UBICACIÓN FASE DE FORMULA DE REDUCCIÓN"
VALOR	$1.251.485.283.000
CONTRATISTA	ALVARO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO M.G. GUTIERREZ
INTERVENTORIA	DAVINCI S.A.S
PLAZO	HASTA EL 30 abril de 2019
VALOR AMPLIACIÓN	$4.875.000.000

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	OBSERVACIONES
13		ALVARO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3.847.000,00	1	Anticipo 1 Contratista - Factura No. 0048
14		ALVARO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.028.000,00	4	Reajuste Interventoria Diferencia Factura No. 0048
			$ 4.875.000.000,00		

RESUMEN

ITEM	OBJETO PAGO	PROGRAMADO APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO APROBADO
1	Pago de salarios y prestaciones sociales	$ 1.017.004.318,00	$ 1.009.868.758,00	$ 91.787.189,00	$ 1.109.736.836,00	$ 7.765.374,00
2	Compra de materiales, consumos y equipos de cómputo	$ 1.078.866.000,707	$ 1.067.439.904,00		$ 1.067.439.904,00	$ 11.426.796,00
3	Transporte y pago de aportes	$ 81.581.088,79	$ 60.106.455,00		$ 60.106.455,00	$ 21.474.633,79
4	Dotaciones, suministros	$ 65.304.572,00	$ 37.000.000,00	$ 11.120.000,00	$ 48.120.000,00	$ 17.184.572,00
	TOTALES	$ 4.875.775.428,00	$ 4.127.982.887,00	$ 102.787.189,00	$ 4.230.401.987,00	$ 644.374.439,79

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta objeto representabilidad suscrito, en los que intervinieron en ella, a los 19 días del mes Septiembre de 2019

Firma
Nombre: ING. ALVARO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO M.G. GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre:
DAVINCI S.A.S
INTERVENTOR

CONTRATO No.	
OBJETO:	
VALOR:	
CONTRATISTA:	
INTERVENTOR:	
PLAZO:	
FECHA DE INICIO:	

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION ITEM
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.377.923	1	Asamblea Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 179.637.446	2	Asamblea Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 18.345.267	3	Asamblea Transporte y retiro de escombros
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.391.000	4	Asamblea Diseñamiento ingenieril
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 96.301.425	1	Asamblea Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 181.643.140	2	Asamblea Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.713.999	3	Asamblea Transporte y retiro de escombros
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.773.900	4	Asamblea Diseñamiento ingenieril
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.536.818	1	Asamblea Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.817.585	2	Asamblea Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 8.604.000	3	Asamblea Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.881.700	1	Asamblea Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 45.765.278	2	Asamblea Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 868.000	3	Asamblea Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.790.000	4	Asamblea Diseñamiento ingenieril
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 18.000.000	1	Asamblea Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.349.881	2	Asamblea Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 18.912.700	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 18.010.857	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 120.084.288	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRETERIA CENTRAL DE PIPAS	$ 3.903.189	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/18	HIDROMECANICA DEL OCCIDENTE S.A.S Y CIA DOC S.A.S	$ 10.885.298	2	Asamblea Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.481.840	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ACD INGENIERIA SAS	$ 5.423.339	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.481.172	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.441.982	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 8.634.040	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	16/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.047.784	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	16/11/18	CACRILLERA MELENDEZ S.A.S	$ 88.978.000	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ACD INGENIERIA S.A.S	$ 6.324.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	CARISTA S.A.S	$ 10.681.495	1	Asamblea Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 96.126.214	1	Asamblea Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 83.348.287	2	Asamblea Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 988.000	3	Asamblea Transporte y retiro de escombros
9	26/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 21.081.382	2	Asamblea Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	28/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 5.211.340	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	28/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 5.362.977	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos

138

CONTRATO NO.	
OBJETO	
VALOR	
CONTRATISTA	
FECHA DE INICIO	
PLAZO	
VALOR ANTICIPO	

DATOS ESPECIFICOS					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION AMORTIZA
19					
22					
24					
29					

ITEM	DESCRIPCION	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE FACTURACION	ACUMULADO TOTAL	SALDO
	Pago de nomina / honorarios, aseo de obra					
1	Compra de materiales, alquiler / compra de equipos					
2	Transporte / viaje de personal					
4	Prestaciones / reservas					
	TOTALES					

Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta con la responsabilidad expresa de las que intervienen en ella, a los 13 días del mes de febrero de 2019

Firma
Nombre: [illegible]
CONSORCIO SICI-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre: ING. [illegible]
SALMED SAS
INTERVENTOR

4
403
1391

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO
	ORDENES DE PAGO (ref. 0-2)
CONTRATO No.:	PN DIGAF 08-6-12000-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL SEGMENTO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE" $9.050.980.250,00
VALOR:	
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCI GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAVINCI SAS
PLAZO:	Hasta el 28 de junio de 2019 $4.525.331.625,00
VALOR ANTICIPO:	

DATOS GENERALES

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION ITEM(S)
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.377.902	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 676.837.340	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.645.167	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.281.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 48.305.892	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.945.848	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3.153.350	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.775.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 37.626.329	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.817.845	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44.441.258	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.881.780	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 99.766.176	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 600.600	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.700.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 58.800.960	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.148.873	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 38.913.700	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
9	9/11/18	CONVAL COMERCIAL S.A	$ 20.357.057	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A.	$ 100.080.288	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICOM JP SAS	$ 5.959.260	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	9/11/18	ALCOBURGO DEL OCCIDENTE S.A.S Y OTROS S.A.S	$ 22.888.255	2	Reembolso compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	9/11/18	JESUS ROGER VILLASCO CAPOTE	$ 5.487.980	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	AGS INGENIERIA SAS	$ 8.426.100	2	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.488.472	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.461.962	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	CONVAL COMERCIAL S.A	$ 8.484.040	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	JESUS ROGER VILLASCO CAPOTE	$ 5.087.784	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	LADRILLERA ANTIOQUIA S.A.S	$ 38.976.000	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	AGS INGENIERIA S.A.S	$ 14.324.258	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	ARMASTA S.A.S	$ 40.682.488	1	Salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 68.126.224	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 82.888.127	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 945.000	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
9	28/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.081.962	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2.111.963	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	CONVAL COMERCIAL S.A	$ 1.301.977	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos

190

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 20	
CONTRATO No.:	PNO RAP 06-5-0099-18	
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CASES Y COMANDO DE BOSQUE No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	$9.250.189.750,04
VALOR:		
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO SOLUCIONES	
INTERVENTOR:	CONMECO SAS	
PLAZO:	hasta 28 de junio de 2019	$6.500.331.625,04
VALOR ANTICIPO:		

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
10	26/11/18	HEBER ROGER VELASCO CAPOTE	$ 687.830	3	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	26/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 72.586.450,62	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	29/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 139.650.268,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	29/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 859.194.848,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	29/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.674.897,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	29/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.348.000,00	4	Reembolso Desmontaje y reinstalacion
12	30/11/18	METAL B SAS	$ 88.184.779,80	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	30/11/18	CONSTRUCCIONES Y CONSTRUCCION DE MATERIALES PREMEZCLADOS SA	$ 81.580.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	30/11/18	CEMENTOS ARGOS SA	$ 68.639.288,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	30/11/18	ASB INGENIERIA SAS	$ 206.819.268,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
13	31/11/18	METAL B SAS	$ 10.206.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	SODIMAC COLOMBIA SA	$ 25.167.280,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 81.379.019,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 13.806.103,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	ACEROS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7.240.536,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 14.198.725,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14	1/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 26.451.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14	1/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 18.766.184	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14	1/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 945.000	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
14	1/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 16.007.000	4	Reembolso Desmontaje y reinstalacion
15	6/02/19	ALPADRES SA	$ 268.957.348,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
15	6/02/19	ASB INGENIERIA SAS	$ 171.985.969	1	salarios y jornales, mano de obra
16	5/02/19	CONSTRUCTORA JUAN MARIAS SAS	$4.517.755,08	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$22.903.448,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$6.680.000,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 680.000,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
18		ORLANDO EDMUNDO REVELO	$ 2.259.582,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		BCS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	$6.761.784,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		LUIS ALFREDO VARGAS BURGOS	$8.000.000,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		CRISTINA ELIZABETH MUÑOZ ESCOBAR	$ 2.510.361,00	1	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		ACEROS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 4.620.065,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
19		SODIMAC COLOMBIA SA	$ 11.179.808,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		LUIS ALFREDO VARGAS BURGOS	$ 2.297.301,00	1	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		ORLANDO EDMUNDO REVELO	$ 1.076.676,00	3	Transporte y retiro de escombros
18		ASB INGENIERIA SAS	$ 220.727.269,00	1	salarios y jornales, mano de obra

	INFORME DE INVERSIÓN Y FLUJO MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 23	

CONTRATO No.:	1-DISAC-05-G-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE ESTACIÓN No. 4 Y ANEXOS E INSTALACIÓN PUNTOS CON FORMULA DE REALISTE"
VALOR:	$6.478.591.835,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO SCI-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DISMICO SAS
PLAZO:	Hasta 18 de Junio de 2019
VALOR ANTICIPO:	$4.615.197.426,00

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION PAGO
19		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$6.982.306,00	1	salarios y jornales, mano de obra
22		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$1.426.000,00	4	Suministros Desplazamiento combustible
20		GABRIEL PASTOR AMEZQUITA BERMEO	$21.455.871,00	1	salarios y jornales, mano de obra
23		CONTAINETRO MOBILIARIO SAS	$26.238.241,00	2	Compra de materiales, adquisición y alquiler de equipos
21		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$1.332.475,00	3	Compra de materiales, adquisición y alquiler de equipos
			$ 6.478.591.835,00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACION	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 1.936.471.348,00	$ 1.936.471.348,00		$ 1.430.471.348,00	$ 505.999.999,00
2	Compra de materiales, adquisición y alquiler de equipos	$ 2.589.514.122,04	$ 2.026.297.847,63	$ 45.513.275,00	$ 2.071.811.122,63	$ 517.703.000,00
3	Transporte y retiro de escombros	$ 159.106.455,00	$ 159.106.455,00		$ 159.106.455,00	$ 0,00
4	Desplazamiento/ Refrigerios	$ 48.913.080,00	$ 48.913.080,00		$ 48.913.080,00	$ 0,00
	TOTALES	$ 4.732.731.424,04	$ 4.418.698.250,63	$ 45.513.275,00	$ 4.464.211.525,63	$ 1.023.702.999,00

Para constancia de lo anterior se firma a nombre suyo bajo la responsabilidad expresa de las que intervienen en ella, a los 18 días del mes marzo de 2019

Firma
Nombre: ING. JOSE VICENTE SARMIENTO
CARGO: [illegible]
INTERVENTOR

Firma
Nombre: CAP.AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO SCI-GUTIERREZ
CONTRATISTA

142

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 23	

CONTRATO No.:	PN DIRAF 08-8-2018-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE PONTAL, DEPARTAMENTO DE POLICÍA LANCA Y COMANDO DE ESTACIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
	$9.293.988.330,00
VIAJES:	
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO MCI-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAURACO SAS
PLAZO:	Hasta 28 de junio de 2019
VALOR ANTICIPO:	$4.646.994.165,00

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	71.877.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	378.937.000	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	18.845.587	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1.291.000	4	Reembolso Descuentos retenciones
2	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	40.970.513	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	181.941.363	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	3.111.350	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1.771.000	4	Reembolso Descuentos retenciones
3	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	47.616.210	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	81.017.945	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	44.594.850	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	9.881.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	35.785.174	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	843.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1.788.200	4	Reembolso Descuentos retenciones
5	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	33.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	71.245.851	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	8/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	38.612.781	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	18.257.957	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	120.048.388	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICIDAD P SAS	3.989.269	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRETERIA DEL OCCIDENTE S.A.S SIGLO S.A.S	15.680.225	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CARPIO	5.467.980	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ABB INGENIERIA SAS	6.425.208	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	1.081.175	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	10/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	8.081.963	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	10/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	8.896.988	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	10/11/18	JESUS ROGER VELASCO CARPIO	3.867.794	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	10/11/18	LADRILLERA MEJICANOS S.A.S	58.979.000	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	10/11/18	ACE INGENIERIA S.A.S	14.524.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	10/11/18	JAIMETA S.A.S	48.982.485	1	salarios y jornales, mano de obra
8	12/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	88.280.224	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	12/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	82.348.387	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	12/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	648.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
9	13/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	31.081.963	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	13/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	3.935.963	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	13/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	1.302.377	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 22	

CONTRATO No. :	[illegible]
OBJETO:	"CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$4.730.489.710,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO -CONSORCIO MG-GUTIGAMET
INTERVENTOR:	CIMENGO SAS
PLAZO:	Hasta 28 de junio de 2019
VALOR ANTICIPO:	$1.420.221.570,00

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
10	29/11/18	HOLVIS ROMERO VILLANUEVA CAPOTE	$ 897.820	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	29/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 76.666.450,62	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	30/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 138.000.268,00	3	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	30/01/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 358.194.948,00	3	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	30/01/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.874.997,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	25/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.666.000,00	4	Reembolso Descuentos y retenciones
12	01/11/18	METAL 8 SAS	$ 80.394.779,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	28/01/19	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS SA	$ 61.000.000,00	3	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	28/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 66.829.160,00	3	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	28/01/19	ASESINGENIERIA SAS	$ 106.819.308,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
13	31/01/19	METAL 8 SAS	$ 18.308.906,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14	01/01/19	SODIMAC COLOMBIA SA	$ 29.167.280,82	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
15	01/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 61.079.010,60	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
15	01/02/19	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 15.881.135,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	31/01/19	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7.342.536,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
22	31/01/19	PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 14.348.720,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 26.452.260	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 98.268.304	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 666.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 34.037.060	4	Reembolso Descuentos y retenciones
15	5/02/19	ALFADIBES SA	$ 268.257.348,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
15	5/02/19	AIDI INGENIERIA SAS	$ 371.581.080	1	salarios y jornales, mano de obra
16	5/02/19	CONSTRUCTORA SUME ASMAS SAS	66.917.754,80	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	152.662.448,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	68.209.803,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	8.865.666,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
18		ORLANDO EDMUNDO REVELO	5.328.582,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
19		BCS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	26.751.784,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
19		LUIS ALFREDO VARGAS BURGOS	60.000.000,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
19		CRISTINA ELIZABETH MUÑOZ ESCOBAR	5.518.365,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
19		EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	3.822.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
19		SODIMAC COLOMBIA SA	11.175.480,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
19		CAS EQUIPAR & CIA S EN C	5.257.971,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
19		ORLANDO EDMUNDO REVELO	4.878.475,00	1	Transporte y retiro de escombros
20		JAIDI INGENIERIA SAS	214.737.988,00	1	salarios y jornales, mano de obra

2
142

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 13	

CONTRATO No.:	PA DEMAF 36-5-DEMA-08
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 2. PREDIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VLR. CTR:	$8.758.384.310,00
CON TRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO SOLUCIONES
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 15 de junio de 2019
VALOR ANTICIPO:	$4.429.191.615,00

DATOS ESPECIFICOS					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
12		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	30.182.180	1	salarios y jornales, mano de obra
13		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	71.630.000	4	Reembolso Descuentos retenciones
28		GABRIEL ANTONIO AGUILAR BERMEO	127.455.912	1	salarios y jornales, mano de obra
30		CONCRETO MOBILIARIO SAS	116.018.341	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de vestier
31		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	91.661.475	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de vestier
32		[illegible] SAS	150.000.000	1	salarios y jornales, mano de obra
			4.429.191.615		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACION	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	1.628.871.898,00	1.470.671.788,00	150.080.080,00	0,01	- 0,01
[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de vestier	1.680.500.222,04	1.680.500.222,04	-	0,01	0,01
3	Transporte y viajes de escoltantes	739.180.454,00	458.105.455,00	-	-	-
4	Descuentos/ retenciones	400.920.000,00	400.920.000,00	-	-	-
	TOTALES	4.429.191.624,04	4.010.181.665,04	150.080.080,00	0,00	-

Para constancia de lo anteriormente firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de las mismas en ella, a los 18 días del mes marzo de 2019

Firma
Nombre: [illegible] AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO SOLUCIONES GUTIERREZ
CONTRATISTA

Nombre: [illegible]
DAIMCO S.A.S
INTERVENTOR

183

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 23	

CONTRATO No., ADICIÓN NRO 1:	PMEBAT 06-G-1004-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$432.346.501,12
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMED SAS
PLAZO:	Hasta 28 de junio de 2019
VALOR ANTICIPO :	$106.870.425,13

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION BIENES
22		PRISMA LTDA	28.416.764	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
23		MAGNETRON SAS	12.154.680	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
			40.571.444		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	76.203.901,89			76.203.901,89	76.203.901,89
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	126.948.648,71		40.571.444,00	85.467.254,71	85.467.254,71
3	Transporte y retiro de escombros	12.133.680,41			12.133.680,41	12.133.680,41
4	Descuentos y retenciones	2.296.794,07			2.296.794,07	2.296.794,07
	TOTALES	**216.675.025,12**	-	40.571.444,00	**176.101.581,12**	176.101.581,12

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, a los 3 días del mes abril de 2019

FIRMA
Nombre: ING.AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

FIRMA
Nombre:
DAIMED S.A.S
INTERVENTOR

5

	INFORME DE INVERSIÓN Y MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 24	

CONTRATO No., ADICIÓN NRO 1:	PN DIRAF 05-6-10044-19
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$431.948.080,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO -CONSORCIO SCI-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	SAINCO SAS
PLAZO:	Hasta 28 de Junio de 2020
VALOR ANTICIPO:	$129.974.025,12

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
38		PEDANA LTDA	28.426.764	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
29		MAGNETRON SAS	11.154.680	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
33		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	76.069.903	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
39		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	86.477.264	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
34		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	12.133.680	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
34		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	2.266.744	4	Reembolso Descuentos retenciones
			317.183.034		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	76.300.062,59		76.300.062,59	76.300.062,59	0,00
2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	130.038.698,71	40.571.444,80	85.467.254,71	126.038.699,51	- 0,00
3	Transporte y retiro de escombros	12.133.680,41		12.133.680,41	12.133.680,41	- 0,00
4	Descuentos retenciones	2.266.744,07		2.266.744,07	2.266.744,07	- 0,00
	TOTALES	216.675.625,12	40.571.444,80	176.181.581,12	216.676.025,12	- 0,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente cuña bajo la responsabilidad exclusiva de los que intervienen en ella, a los 8 días del mes abril de 2019

Firma
Nombre: ING. AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO SCI-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre: [illegible]
SAINCO S.A.S
INTERVENTOR

3

Anexo No. 5 Seguridad Social

Contrato de Obra

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	SEDE/RED PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901177394-5	CONSORCIO BCS - GUTIERREZ		CARRERA 19 # 84-14 OFICINA 402	2570806	administrativa@sanitlog.[illegible].com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	C – MIPYME			BOGOTA D.C.	BOGOTA, D.C.		91

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD APO
					93	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-04	2019-03	E		34181408	105.255.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Salud Total EPS	800130907-4	406.200	0		0		0	0	0	0	406.200	8
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	368.800	0		0		0	0	0	0	368.800	11
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	84.400	0		0		0	0	0	0	84.400	2
EPS010	Coomeva EPS	805000427-1	217.380	0		0		0	0	0	0	217.380	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	376.780	0		0		0	0	0	0	376.780	9
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	176.080	0		0		0	0	0	0	176.080	4
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	88.800	0		0		0	0	0	0	88.800	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	432.580	0		0		0	0	0	0	432.580	15
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	333.400	0		0		0	0	0	0	333.400	7
EPS046	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	830074184-5	83.180	0		0		0	0	0	0	83.180	2
EPSI03	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	139.600	0		0		0	0	0	0	139.600	4
EPSI05	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	90.060	0		0		0	0	0	0	90.060	3
ESSC18	EPS S Convivir	830009031-3	315.700	0		0		0	0	0	0	315.700	10
ESSC80	ASMET SALUD EPS SAS	900605126-7	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	3
ESSC81	EPS COOPSOS S.A.S	901036946-6	33.000	0		0		0	0	0	0	33.000	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsistencia	Aporte FSP - Solidaridad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora CGP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Protección (RD + Protección)	800224739-0	3.890.089	0	0	17.500	17.500	0	0		3.405.800	22
230301	Porvenir	800231669-8	6.057.100	0	0	21.000	21.000	0	0		6.098.100	46
230301	Colfondos	800227940-4	773.000	0	0	0	0	0	0		773.800	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.821.300	0	0	27.500	27.500	0	0		2.876.300	14

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	830603790-5	5.652.900				5.652.100	0	0	5.652.900			68.571	5.652.100	80

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfenalco	8915001824	3.265.400	0	0	3.265.400	80

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901177304-5	CONSORCIO BCS - GUTIERREZ		CARRERA 15 N 84-41 OFICINA 402	2570099	administrativo@eurobiogoliemx.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		N

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	APE
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				60	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-04	2019-03	E		34181406	$25.356.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	3.255.[illegible]10	4.[illegible]6.400
Pensión	4	13.[illegible]73.408	13.[illegible]73.408
Riesgos Laborales	1	5.[illegible]2.100	5.[illegible]2.100
CCF	1	3.[illegible]5.400	3.[illegible]5.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	31	25.356.300	25.356.300

PAGA 4365024

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PAG 5 de 5

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	ESDENERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901173866-5	CONSORCIO BCS - GUTIERREZ		CARRETERA 19 #184-41 OFICINA 402	2570808	administrativa@sanellogullerrez.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTA, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DD/MM/AAAA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DD/MM/AAAA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPO
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				89	0
2019-04	2019-03	E		34161408	TOTAL A PAGAR	
					$25.356.000	

LLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo cotizante	Subtipo	Extranjero sin cédula	Colombiano en el exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Correcciones	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Solidaridad y Subsistencia	Solidaridad y Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte ICBF	Aporte SENA	Aporte ESAP	Aporte MEN
1000061	TELLEZ VILLALOBOS JOSE CAMPO	1	0				X																230001	27.804	6.950	0	0	0	0	EPS044	27.804	1.390	14-11	27.804	0	1.390	0CF14	27.804	1.668	0	0	0	0	0
1000061	ADAM EMILIANO MONTENEGRO ESPARRAGA ARLEY	1	0				X																230001	605.118	151.279	0	0	0	0	CF047	605.118	30.256	14-11	605.118	0	30.256	0CF14	605.118	36.307	0	0	0	0	0
1000061	GARCIA CABALLERO RUBIEL MOMAR	1	0				X																230001	743.280	185.820	0	0	0	0	EPS041	743.280	37.164	14-11	743.280	0	37.164	0CF14	743.280	44.597	0	0	0	0	0
1000061	GARCIA CABALLERO RUBIEL MOMAR	1	0				X																230001	86.812	10.842	0	0	0	0	EPS041	86.812	4.340	14-11	86.812	0	4.340	0CF14	86.812	5.209	0	0	0	0	0
1000061	OLIVEROS PERALTA JORGE ANDRES	1	0				X																230001	605.118	151.279	0	0	0	0	EPS041	605.118	30.256	14-11	605.118	0	30.256	0CF14	605.118	36.307	0	0	0	0	0
1000061	BAUTISTA HERNANDEZ ANGELICA YANET	1	A				X	X															230001	743.280	185.820	0	0	0	0	CF047	743.280	37.164	14-11	743.280	0	37.164	0CF14	743.280	44.597	0	0	0	0	0
1000061	AYOY GUTIERREZ HAMON ORLANDO	1	0				X																230001	605.118	151.279	0	0	0	0	CB0018	605.118	30.256	14-11	605.118	0	30.256	0CF14	605.118	36.307	0	0	0	0	0
1000061	MARTINEZ BASTIDAS JOHER ENRIQUE	1	0				X		X														230001	55.200	13.800	0	0	0	0	EPS018	55.200	2.760	14-11	55.200	0	2.760	0CF14	55.200	3.312	0	0	0	0	0
1000061	BOLAÑOS FLOREZ JOHN EDURY	1	0				X	X															230001	1.600.000	400.000	0	0	0	0	EPS046	1.600.000	80.000	14-11	1.600.000	0	80.000	0CF11	1.600.000	96.000	0	0	0	0	0
1000061	ZAMBRANO PELAEZ CARLOS JAIR	1	0				X	X															230001	605.118	151.279	0	0	0	0	EPS002	605.118	30.256	14-11	605.118	0	30.256	0CF11	605.118	36.307	0	0	0	0	0
1000061	CARVAJAL SANTIAGO WILSON ANDRES	1	0				X	X															230001	834.880	167.000	0	0	0	0	CB0018	834.880	41.744	14-11	834.880	0	41.744	0CF11	834.880	50.093	0	0	0	0	0
1000061	MORAL PALACIO OSCAR HERNAN	1	0				X	X															230001	822.429	205.000	0	0	0	0	EPS037	822.429	41.121	14-11	822.429	0	41.121	0CF14	822.429	49.346	0	0	0	0	0
1000061	GUACA MOMAR PEDRO	1	0				X																230001	605.118	151.279	0	0	0	0	EPS037	605.118	30.256	14-11	605.118	0	30.256	0CF14	605.118	36.307	0	0	0	0	0
1000061	ARCINIEGO MURCIANO MARTIN	1	0				X																230001	605.118	151.279	0	0	0	0	EPS018	605.118	30.256	14-11	605.118	0	30.256	0CF14	605.118	36.307	0	0	0	0	0
1000061	LOPEZ AMAYA DIOSE FERNANDO	1	0				X	X															230001	743.280	185.820	0	0	0	0	EPS041	743.280	37.164	14-11	743.280	0	37.164	0CF14	743.280	44.597	0	0	0	0	0
1000061	DIB CHEUTO DANEYER	1	0				X																230001	605.118	151.279	0	0	0	0	EPS002	605.118	30.256	14-11	605.118	0	30.256	0CF14	605.118	36.307	0	0	0	0	0
1000061	CALLEJO MURILLO ALFREDO	1	0				X	X															230001	414.000	82.800	0	0	0	0	EPS002	414.000	18.630	14-11	414.000	0	18.630	0CF14	414.000	24.840	0	0	0	0	0
1000061	MANCILLO CHARRUPA LUIS ALBERTO	1	0				X	X															230001	743.280	185.820	0	0	0	0	EPS018	743.280	33.476	14-11	743.280	0	33.476	0CF14	743.280	44.597	0	0	0	0	0
1000061	GOMEZ FIGUEROA JUAN DAVID	1	0				X																230001	605.118	151.279	0	0	0	0	EPS018	605.118	30.256	14-11	605.118	0	30.256	0CF14	605.118	36.307	0	0	0	0	0
1000061	FLOR ATOY JOSELITO	1	0				X																230001	605.118	151.279	0	0	0	0	EPS044	605.118	30.256	14-11	605.118	0	30.256	0CF14	605.118	36.307	0	0	0	0	0
1000061	CAMPO ARDILA CARLOS URIEL	1	0				X																230001	605.118	151.279	0	0	0	0	EPS041	605.118	30.256	14-11	605.118	0	30.256	0CF14	605.118	36.307	0	0	0	0	0
1000061	CAMPO SANCHEZ EDGAR EVARISTO	1	0				X																230001	605.118	151.279	0	0	0	0	EPS018	605.118	30.256	14-11	605.118	0	30.256	0CF14	605.118	36.307	0	0	0	0	0
1000061	DELGADO OCHOA JAIRO DAÑO	1	0				X																230001	1.200.000	48.000	0	0	0	0	EPS018	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	0	48.000	0CF11	1.200.000	96.000	0	0	0	0	0
1000061	ARQUICHO CHANTO DIEGO HERNAN	1	0				X																230001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS018	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	0	40.000	0CF11	1.000.000	80.000	0	0	0	0	0
1000061	JIMENEZ OSILLO ESAU	1	0				X																230001	605.118	151.279	0	0	0	0	EPS017	605.118	30.256	14-11	625.118	5	37.500	0CF14	605.118	36.307	0	0	0	0	0
1000061	OROZCO PEREZ DANIEL ALEJANDRO	1	0				X	X															230001	882.900	196.200	0	0	0	0	EPS035	882.900	39.258	14-11	882.900	0	49.000	0CF14	882.900	58.974	0	0	0	0	0
1000061	ULCHUR SANTIAGO DIEGO FERNANDO	1	0				X	X															230001	441.882	78.750	0	0	0	0	EPS016	441.882	17.715	14-11	441.882	0	17.715	0CF14	441.882	26.513	0	0	0	0	0
1000061	OCAMPO GONZALEZ CARLOS ANDRES	1	0				X																230001	605.118	151.279	0	0	0	0	EPS018	605.118	30.256	14-11	605.118	0	30.256	0CF14	605.118	36.307	0	0	0	0	0
1000061	ALGAR SANTIAGO OSPINO CAMPO	1	0				X	X															230001	834.880	167.000	0	0	0	0	EPS037	834.880	33.395	14-11	834.880	0	44.000	0CF14	834.880	50.093	0	0	0	0	0
1000061	SALAZAR SALAZAR NELSON ANDRES	1	0				X		X														230001	486.000	76.100	0	0	0	0	EPS041	486.000	19.440	14-11	486.000	0	25.700	0CF14	486.000	29.160	0	0	0	0	0
1000061	ROMERO CRUZ JHON FREDY	1	0				X																230001	605.118	151.500	0	0	0	0	EPS005	605.118	30.256	14-11	605.118	0	37.700	0CF14	605.118	36.307	0	0	0	0	0
1000061	BRICEÑO ZEHANTE ALEXANDRA	1	0				X																230001	605.118	151.500	0	0	0	0	CB0018	605.118	30.256	14-11	605.118	0	37.700	0CF14	605.118	36.307	0	0	0	0	0
1000061	GUEVARA CRUZ ANA	1	0				X																230001	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS037	1.100.000	44.000	14-11	1.100.000	0	76.000	0CF14	1.100.000	66.000	0	0	0	0	0
1000061	ACOSTA RIVERA TRIFINIO RICARDO JOSE	1	0				X																230001	605.118	151.500	0	0	0	0	EPS018	605.118	30.256	14-11	605.118	0	37.700	0CF14	605.118	36.307	0	0	0	0	0
1000061	GOMEZ CAMPO MILCIADES ALVARO	1	0				X																230001	605.118	151.500	0	0	0	0	EPS018	605.118	30.256	14-11	605.118	0	37.700	0CF14	605.118	36.307	0	0	0	0	0
1000061	MORALES PALOMINO EDWIN	1	0				X																230001	605.118	151.500	0	0	0	0	EPS018	605.118	30.256	14-11	605.118	0	37.700	0CF14	605.118	36.307	0	0	0	0	0
1000061	BENAVIDES NAVARRETE JHON ALEXIS	1	0				X	X															230001	717.701	179.400	0	0	0	0	CF047	717.701	28.800	14-11	717.701	0	33.800	0CF14	717.701	43.062	0	0	0	0	0
1000061	DE LA CRUZ LUIS ALBERTO	1	0				X																230001	605.118	151.500	0	0	0	0	CF047	605.118	30.256	14-11	605.118	0	37.700	0CF14	605.118	36.307	0	0	0	0	0
1000061	GOMEZ OREJUELA MARIO ALBERTO	1	0				X																230001	605.118	151.500	0	0	0	0	CF047	605.118	30.256	14-11	605.118	0	37.700	0CF14	605.118	36.307	0	0	0	0	0
1000061	RAMIREZ GARCIA CAMILO ANDRES	1	0				X	X															230001	667.260	87.000	0	0	0	0	CF047	667.260	24.900	14-11	667.260	0	62.360	0CF14	667.260	40.035	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901177304-5	CONSORCIO BCS - GUTIERREZ		CARRERA 19 N 84-41 OFICINA 402	6370888	administrativo@bcsasesoriaslegales.co, cliff	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	C – MIPYME			BOGOTA, D.C.	BOGOTA, D.C.		

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO A BOGOTA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	APO
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				66	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-04	2019-03	E		34181406	$20.356.300	

LLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
Tipo de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Tipo cot	Extranjero	Colombiano en el exterior	Residente	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	DIA	SUS	COMENTARIOS	Salario básico	IBC APF	Cotización	Tarifa cot. a Pensión	Valor cot. Afiliado	Valor cot. Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
80154078	LEONARD LEONARDO	1	0			X	X																		2.000.000	654.000	93.000	9	0	0	0	6	EPS041	654.000	25.452	14-11	654.000	0	4.620%	33-214	654.000	33.000	0	0	0	0	0
80156011	GUSMAN LEO ABRIEL	1	0			X	X																		2.000.000	441.000	62.700	9	0	0	0	6	EPS041	441.000	17.700	14-11	441.000	1	20.000	33-214	441.000	17.700	0	0	0	0	0
1000000	GOMEZ SIMANO TUSI	1	0			X																			25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	0	EPS045	2.500.000	168.000	14-11	2.500.000	1	113.000	33-214	2.500.000	168.000	0	0	0	0	0
1000000	DIAZ MENDEZ JOSE DARIO	1	0			X																			2500001	800.000	100.500	9	0	0	0	0	EPS017	828.116	33.000	14-11	828.116	1	37.700	33-214	828.116	33.000	0	0	0	0	0
1000	PARTIDA TRUJO YEIMI ALEXIS	1	0			X	X																		2500001	3.000.000	400.000	9	0	0	0	0	EPS019	3.529.000	169.000	14-11	3.529.000	1	170.400	33-214	3.000.000	169.000	0	0	0	0	0
1000	PINEDA GIRALDO NELSON DANIEL	1	0			X		X																	2500001	37.804	4.500	9	0	0	0	0	EPS005	37.804	1.800	14-11	37.804	0	2.000	33-214	37.804	1.800	0	0	0	0	0
1000	MENDEZ SANTANA RAFAEL ANTONIO	1	0			X		X																	2500001	600.000	100.000	9	0	0	0	0	EPS037	600.000	25.000	14-11	600.000	0	45.200	33-214	600.000	25.000	0	0	0	0	0
1000	GOMEZ DAVID YEFERSON	1	0																						2500001	828.116	120.000	9	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.000	14-11	828.116	1	37.700	33-214	828.116	33.000	0	0	0	0	0
1000	PRADANO GOMEZ BRYAN JESUS	1	0																						2500001	828.116	120.000	9	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.000	14-11	828.116	1	37.700	33-214	828.116	33.000	0	0	0	0	0
1000	RODRIGUEZ PATIÑO DANIEL ANDRES	1	0																						2500001	828.116	120.000	9	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.000	14-11	828.116	1	37.700	33-214	828.116	33.000	0	0	0	0	0
1000	MUÑOZ VARGAS ROBINSON	1	0			X	X																		2500001	828.116	120.000	9	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.000	14-11	828.116	1	37.700	33-214	828.116	33.000	0	0	0	0	0
1000	SALAMO MARTINEZ JIMMY	1	0			X	X																		2500001	667.000	87.000	9	0	0	0	0	EPS037	667.000	26.000	14-11	667.000	1	30.400	33-214	667.000	26.000	0	0	0	0	0
1000	BRAGO JOSE HECTOR	1	0			X																			2500001	828.116	120.000	9	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.000	14-11	828.116	1	37.700	33-214	828.116	33.000	0	0	0	0	0
1000	PEÑA MONTENEGRO ALVARO	1	0			X																			2500001	828.116	120.000	9	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.000	14-11	828.116	1	37.700	33-214	828.116	33.000	0	0	0	0	0
1000	DURANGO CALDERON ANGEL	1	0			X	X																		2500001	660.000	95.000	9	0	0	0	0	EPS005	660.000	25.000	14-11	660.000	1	30.000	33-214	660.000	25.000	0	0	0	0	0
1000	GERALDO LOPEZ HUMBERTO MAURICIO	1	0			X																			25-14	2.000.000	800.000	0	0	0	0	0	EPS042	3.000.000	225.000	14-11	3.000.000	1	226.000	33-214	3.000.000	226.000	0	0	0	0	0
1000	GUERRERO HUGO ANTONIO	1	0			X																			2500001	828.116	120.000	9	0	0	0	0	EPS041	828.116	33.000	14-11	828.116	1	37.700	33-214	828.116	33.000	0	0	0	0	0
1000	BALDERA BALDERA LUIS ALFREDO	1	0			X																			25-14	828.116	120.000	0	0	0	0	0	EPS046	828.116	33.000	14-11	828.116	1	37.700	33-214	828.116	33.000	0	0	0	0	0
1000	LEON CARLOS LEONCIO	1	0			X																			2500001	825.116	120.000	0	0	0	0	0	EPS041	828.116	33.000	14-11	828.116	1	37.700	33-214	828.116	33.000	0	0	0	0	0
1000	GERMAGER BEDOYA MARIA FERNANDA	1	0			X																			2500001	1.000.000	200.000	0	0	0	0	0	EPS018	1.000.000	33.000	14-11	1.000.000	1	56.000	33-214	1.000.000	56.000	0	0	0	0	0
1000	GARZA GARCIA SARA TERESA	1	0			X																			2500001	4.000.000	577.000	0	0	0	0	0	EPS041	4.000.000	168.000	14-11	4.000.000	1	392.400	33-214	4.000.000	168.000	0	0	0	0	0
1000	SOLANO CASTELLO JULIO CESAR	1	0			X	X	X																	25-14	37.804	4.500	0	0	0	0	0	EPS037	37.804	1.500	14-11	37.804	1	2.500	33-214	37.804	1.500	0	0	0	0	0
1000	HOYOS CUEVI ANTONIO	1	0			X		X																	2500001	37.804	4.500	0	0	0	0	0	EPS018	37.804	1.500	14-11	37.804	1	2.500	33-214	37.804	1.500	0	0	0	0	0
1000	HERNANDEZ OSORIO WALTER ANTONIO	1	0			X																			2500001	828.116	120.000	0	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.000	14-11	828.116	1	37.700	33-214	828.116	33.000	0	0	0	0	0
1000	CORREA MOSQUERA DANNY YESID	1	0			X	X	X																	2500001	110.000	17.700	0	0	0	0	0	EPS037	110.000	4.000	14-11	110.000	1	4.500	33-214	110.000	4.500	0	0	0	0	0
1000	MOSQUERA LOZANO JOSE ALEXIS	1	0			X	X																		2500001	828.116	120.000	0	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.000	14-11	828.116	1	37.700	33-214	828.116	33.000	0	0	0	0	0
1000	CALVETE SOPEZ ESQUIVEL ENRIQUE	0	0			X																			2500001	5.500.000	660.000	0	0	0	17.000	10.000	EPS005	5.000.000	140.000	14-11	5.000.000	1	340.000	33-214	5.000.000	140.000	0	0	0	0	0
1000	ARZUELO GALLO EVA ARTEMIS	1	0			X																			2500001	828.116	120.000	0	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.000	14-11	828.116	1	37.700	33-214	828.116	33.000	0	0	0	0	0
1000	GORRILLO ACHECETO LUIS ALFONSO	4	0			X																			25-14	828.116	120.000	0	0	0	0	0	EPS041	828.116	33.000	14-11	828.116	1	37.700	33-214	828.116	33.000	0	0	0	0	0
1000	PEREZ ROMERO CESAR	1	0			X	X																		2500001	740.000	110.000	0	0	0	0	0	EPS041	740.000	33.000	14-11	740.000	1	33.000	33-214	740.000	33.000	0	0	0	0	0
1000	GUEVARA PIÑEROS SAMUEL ALEJANDRO	1	0			X																			23300	828.116	120.000	0	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.000	14-11	828.116	1	37.700	33-214	828.116	33.000	0	0	0	0	0
1000	PINEDA CARDENAS JHOALIMBO	1	0			X																			2500001	1.814.000	260.000	0	0	0	0	0	EPS018	1.814.000	72.000	14-11	1.814.000	1	72.000	33-214	1.814.000	72.000	0	0	0	0	0
1000	GOMEZ VARGAS MAGNOLIA EVANDER	1	0			X																			2500001	828.116	120.000	0	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.000	14-11	828.116	1	37.700	33-214	828.116	33.000	0	0	0	0	0
1000	JIMENEZ JIMENEZ ESAU	1	0			X	X																		2500001	845.405	90.000	0	0	0	0	0	EPS018	348.400	13.000	14-11	348.400	1	17.200	33-214	348.400	13.900	0	0	0	0	0
1000	CONCHO JOSE FRANCL	1	0			X	X																		2500001	690.597	110.500	0	0	0	0	0	EPS018	690.597	27.500	14-11	690.597	1	30.100	33-214	690.597	27.500	0	0	0	0	0
1000	ECHAVARRIA JOSE ALBERTO	1	0			X																			25-14	828.116	120.000	0	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.000	14-11	828.116	1	37.700	33-214	828.116	33.000	0	0	0	0	0
1000	WILENCIO MOLLEDA LEONARDO	1	0			X																			2500001	825.116	120.000	0	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.000	14-11	828.116	1	37.700	33-214	828.116	33.000	0	0	0	0	0
1000	PERLANO MACHIN MILTON HUMBERTO	1	0			X																			2500001	717.701	110.000	0	0	0	0	0	EPS018	717.701	28.800	14-11	717.701	1	30.000	33-214	717.701	28.800	0	0	0	0	0
1000	PERLANO MACHIN MILTON HUMBERTO	1	0			X																			2500001	110.000	17.700	0	0	0	0	0	EPS018	110.000	4.000	14-11	110.000	1	0	33-214	110.000	4.500	0	0	0	0	0
1000	ORIC HENRY	1	0			X	X																		2500001	828.116	120.000	0	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.000	14-11	828.116	1	37.700	33-214	828.116	33.000	0	0	0	0	0
1000	GUAMANGA MACONI ARMENIO	1	0			X	X																		25-14	828.000	33.100	0	0	0	0	0	EPS042	828.000	33.000	14-11	828.000	1	37.700	33-214	828.000	33.000	0	0	0	0	0
1000	JIMENEZ BERNAL JUAN RICARDO	1	0			X																			2500001	828.116	120.000	0	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.000	14-11	828.116	1	37.700	33-214	828.116	33.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	9011773845	CONSORCIO BCS - GUTIERREZ		CARRERA 19 N 83-41 OFICINA 402	2570890	administrativa@autoliquidaciones.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					69	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-04	2019-03	E		34901406	$25.356.300	

LLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo	Extranjero no obligado a cotizar pensión	Colombiano en el exterior	Actividad Alto Riesgo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP			Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1020818555	ANILA QUEVEDA MARQUEPAUL	1	0			0																			230301	608.196	122.000	0	0	0	0	EPS010	608.196	85.204	14-01	608.196	II	37.700	CCF14	608.196	85.204	0	0	0	0	0
1032721411	FALCONES OCAMPO BRIAN STEVENS	1	0			0																			230101	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	150.000	14-01	3.000.000	II	185.800	CCF14	3.000.000	420.000	0	0	0	0	0
1022703068	CENTENO OROZCO LEONARDO ENRICO	1	0			0																			230201	608.196	122.000	0	0	0	0	EPS002	608.196	85.204	14-01	608.196	II	37.700	CCF14	608.196	85.204	0	0	0	0	0
1000000019	CRUTAREDA PARDO WILLIAM	0	0			0																			230301	608.196	122.000	0	0	0	0	EPS008	608.196	85.204	14-01	608.196	II	37.700	CCF14	608.196	85.204	0	0	0	0	0
1014872214	ROMERO GUSTAVO	0	0			0	0																		230301	208.831	30.400	0	0	0	0	EPS002	208.831	4.999	14-01	208.831	II	10.000	CCF14	208.831	4.999	0	0	0	0	0
1014888101	DIOR FERNANDO	1	0			0	0																		230301	116.466	17.700	0	0	0	0	EPS037	116.466	4.999	14-01	116.466	II	2.700	CCF14	116.466	4.999	0	0	0	0	0
1014888101	DIOR FERNANDO	1	0			0	0																		230301	351.047	63.000	0	0	0	0	EPS037	351.047	13.298	14-01	351.047	II	33.100	CCF14	351.047	13.298	0	0	0	0	0
94021403	GONZALEZ JOSE RAUL	1	0			0																			230101	882.400	158.000	0	0	0	0	EPS017	882.400	35.000	14-01	882.400	II	44.000	CCF14	882.400	33.880	0	0	0	0	0
94021403	GONZALES JOSE RAUL	1	0			0																			230301	185.004	33.300	0	0	0	0	EPS017	185.004	6.700	14-01	185.004	II	0	CCF14	185.004	6.700	0	0	0	0	0
94021840	SOLARTE GONZALEZ ANTARES	1	0			0																			230301	608.116	100.000	0	0	0	0	EPS005	608.116	33.000	14-01	608.116	II	37.700	CCF14	608.116	33.000	0	0	0	0	0
80000000	OLIVOS VARGAS HENRY	1	0			0	0																		230301	665.304	111.000	0	0	0	0	EPS044	665.304	27.000	14-01	665.304	II	46.200	CCF14	665.304	27.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	8[illegible]5-6	DATALEC BOMBEROS LTDA		CL 74 g # 7b a 18 Santa María del lago	4360861	[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	D – Inferior de 200 s			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-04	2019-03	E	12/04/2019	[illegible]	$2.300.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	38.600	0		0		0	7	200	0	38.800	3
EPS008	Compensar EPS	800088482-7	155.306	0		0		0	7	800	0	155.000	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	10.190	0		0		0	7	100	0	10.290	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	33.280	0		0		0	7	200	0	33.480	1
EPS018	Serv. Occ. Salud - SOS	805001157-2	33.280	0		0		0	7	200	0	33.480	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	7.680	0		0		0	7	100	0	7.900	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-2	33.200	0		0		0	7	200	0	33.400	1
EPSC34	Redsalud SGP Capital Salud	900298372-3	33.200	0		0		0	7	200	0	33.400	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	7.680	0		0		0	7	100	0	7.880	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
23-301	Porvenir	800224808-8	394.300	0	0	0	0	7	3.700	0	798.800	6
22-501	Colfondos	800227040-4	184.100	0	0	0	0	7	1.800	0	185.100	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	322.300	0	0	0	0	7	1.700	0	324.000	5

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Nota Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-28	Equidad Vida	830008080-1	468.700				469.780	7	2.508	472.300			4.667	472.300	13

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF26	Comfacundi	800018424-2	303.400	7	1.600	305.000	13

PAGADA
5427166

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830058125-6	DATALEC INGENIEROS LTDA		Cll. 74 a # 75 a 19 Santa Maria del lago	4360961	datalecing@yahoo.com.ar	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – exepto de 200 a			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTA, D.C.		N

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-04	2019-03	E	12/04/2019	34272169	$2.380.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor Aportes de IDE, LRA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	303.400	305.089
Pensión	5	1.211.780	1.216.169
Riesgos Laborales	1	468.720	472.209
CCF	1	303.400	305.008
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	2.380.900	2.380.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830059135-8	DATALEC INGENIEROS LTDA		CL 74 a # 7A a 19 Santa Maria del Inga	4330801	datalecing@yahoo.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	E – menos de 200 c			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	8
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-04	2019-03	E	13/04/2019	34272106	$2.309.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Extranjero	Colombiano Residente Exterior	Tipo cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días cotizados	Días AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional Solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Días EPS	IBC EPS	Cotización UPC	Días ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC para parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1044280581	VARGAS VEGA SEBASTIAN	1	0		0																30	30	828.000	100.000	0	0	0	0	EPS008	828.000	33.000	14-23	828.000	1	98.300	CCF30	828.000	33.000	0	0	0	0	0
2	CC	1020874271	VARGAS VASQUEZ CRISTIAN ALFREDO	1	0		0																30	30	888.000	141.800	0	0	0	0	EPS008	888.000	33.000	14-23	888.000	1	61.300	CCF30	888.000	33.000	0	0	0	0	0
3	CC	1018955389	CHAMIZO CAMACHO JORGE ARMANDO	1	0		0																30	30	828.000	132.500	0	0	0	0	EPS018	828.000	33.000	14-24	828.000	1	57.800	CCF30	828.000	33.000	0	0	0	0	0
4	CC	1001702388	PEÑARANDA PINZON YULIER MICHEL	1	0		0																30	30	828.000	132.500	0	0	0	0	EPS040	828.000	33.000	14-24	828.000	1	57.800	CCF30	828.000	33.000	0	0	0	0	0
5	CC	1003811888	RICHMAN TAUMA YENI CRISTINA	1	0		0	X															30	30	828.000	31.300	0	0	0	0	EPS030	828.000	7.900	14-24	828.000	1	13.800	CCF30	828.000	7.900	0	0	0	0	0
6	CC	1002468445	QUIÑONES QUIÑONES ALBERT DAVID	1	0		0																30	30	828.116	132.816	0	0	0	0	EPS034	828.116	33.000	14-24	828.116	1	57.798	CCF30	828.116	33.000	0	0	0	0	0
7	CC	1039660021	VARGAS BARRIOS VICTOR MANUEL	1	0		0	X															25-14	25-14	644.500	31.200	0	0	0	0	EPS037	644.500	7.900	14-24	644.500	1	13.800	CCF24	644.500	7.900	0	0	0	0	0
8	CC	7512587	LAZA PORTILLA CARLOS JULIO	1	0		0	X															25-14	25-14	83.400	13.400	0	0	0	0	EPS042	83.400	3.900	14-24	83.400	1	5.800	CCF24	83.400	3.900	0	0	0	0	0
9	CC	7522911	CAÑIZARES MEJIA LUIS IGNACIO	1	0		0																25-14	25-14	635.116	102.040	0	0	0	0	EPS034	828.116	33.000	14-24	828.116	1	57.798	CCF30	828.116	33.000	0	0	0	0	0
10	CC	7540488	VARGAS DUMASS LUIS ALFREDO	1	0		0																30	30	800.000	128.500	0	0	0	0	EPS018	800.000	33.000	14-24	800.000	1	55.800	CCF30	800.000	33.000	0	0	0	0	0
11	CC	7697497	MARTINEZ OLIVEROS FREDY GILBARDO	1	0		0	X															30	30	1.300.000	208.800	0	0	0	0	EPS018	1.300.000	53.600	14-24	1.300.000	1	90.700	CCF30	1.300.000	53.600	0	0	0	0	0
12	CC	91139833	ALZA GALEANO GIL SAMIR	1	0		0	X															26-14	26-14	432.384	13.400	0	0	0	0	EPS037	83.334	3.400	14-24	83.334	1	5.800	CCF24	83.334	3.400	0	0	0	0	0
13	CC	91240466	RODRIGUEZ VILLAMIZAR JOSE VICENTE	1	0		0																30	30	828.116	132.900	0	0	0	0	EPS017	828.116	33.000	14-24	828.116	1	57.700	CCF30	828.116	33.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10547329	4	GABRIEL FAJARDO AGUILAR SERANO	B - AIENOS DE 180 COTIZANTES	OBRA POLICIA	carrera 17 calle 1 c	POPAYAN-CAUCA	8370345	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	2019-04	43229341	8499050879	E	2019/04/08	2019/04/08	ITAU	0	$1,531,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Cue	Fip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Tarifa	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	10541775	CALAMBAS MAURICIO	X																	25-14	26	$717,701	$114,808	ESSC18	26	$717,701	$28,800	CCF14	26	$717,701	$28,800	14-03	26	$717,701	$50,000	26	$0	$0	N	$102,900
2	CC	10670301	CERTUCHE RODRIGO																		230101	30	$828,116	$132,500	EPS018	30	$828,116	$33,200	CCF14	30	$828,116	$33,200	14-03	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	N	$256,600
3	CC	76305723	CORTES ALEJANDRO	X																	25-14	18	$496,870	$79,500	EPS005	18	$496,870	$19,900	CCF14	18	$496,870	$34,600	14-03	18	$496,870	$34,600	18	$0	$0	N	$153,900
4	CC	8618461	CUARTERAL JAIRO	X	X																230101	1	$27,604	$4,500	EPS037	1	$27,604	$1,100	CCF14	1	$27,604	$1,100	14-03	1	$27,604	$2,000	1	$0	$0	N	$8,900
5	CC	94836633	DAZA ALEXANDER																		25-14	30	$828,116	$132,500	ESSC62	30	$828,116	$33,200	CCF14	30	$828,116	$33,200	14-03	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	N	$256,600
6	CC	1061719902	GALEANO CRISTIAN	X	X																230101	1	$27,604	$4,500	EPS018	1	$27,604	$1,100	CCF14	1	$27,604	$1,100	14-03	1	$27,604	$2,000	1	$0	$0	N	$8,900
7	CC	76317910	HURTADO JORGE	X																	25-14	25	$690,097	$110,500	ESSC18	25	$690,097	$27,700	CCF14	25	$690,097	$27,700	14-03	25	$690,097	$48,100	25	$0	$0	N	$214,000
8	CC	1061731071	LOPEZ JHON	X	X																25-14	1	$27,604	$4,500	EPS018	1	$27,604	$1,100	CCF14	1	$27,604	$1,100	14-03	1	$27,604	$2,000	1	$0	$0	N	$8,900
9	CC	4759959	MENESES ROBY	X																	230101	15	$414,058	$66,300	EPS037	15	$414,058	$16,600	CCF14	15	$414,058	$28,900	14-03	15	$414,058	$28,900	15	$0	$0	N	$128,400
10	CC	1061699577	MESA CARLOS																		230101	30	$828,116	$132,500	ESSC18	30	$828,116	$33,200	CCF14	30	$828,116	$33,200	14-03	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	N	$256,600
11	CC	1061699576	MUÑOZ OSCAR	X	X																230101	1	$27,604	$4,500	EPS005	1	$27,604	$1,100	CCF14	1	$27,604	$1,100	14-03	1	$27,604	$2,000	1	$0	$0	N	$8,900
12	CC	10543944	ORTEGA CARLOS	X	X																25-14	1	$27,604	$4,500	ESSC18	1	$27,604	$1,100	CCF14	1	$27,604	$1,100	14-03	1	$27,604	$2,000	1	$0	$0	N	$8,900
Total	Afiliados(12)																						$4,941,094	$791,108			$4,941,094	$198,600			$4,941,094	$198,600			$4,941,094	$344,700			$0		$1,531,100

2019/04/06 11:52 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10547329	4	GABRIEL PASTOR AGUILAR GERARDO	B - ADMOS DE 200 COTIZANTES	OBRA POLICIA	carrera 17 calle 1 c	POPAYAN-CAUCA	8171366	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	2019-04	403259141	849850879	E	2019/04/08	2019/04/08	ITAU	0	$1,533,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$791,200	$0	$0	$791,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$446,400	$0	$0	$446,400
PORVENIR	230101	800,224,808	8	5	$212,300	$0	$0	$212,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$132,500	$0	$0	$132,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$344,700	$0	$0	$344,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	$344,700	$0	$0	$344,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$198,600	$0	$0	$198,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	12	$198,600	$0	$0	$198,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				12	$198,600	$0	$0	$198,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$33,200	$0	$0	$33,200
EMSSANAR	ESSC18	814,000,337	1	4	$90,900	$0	$0	$90,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$17,800	$0	$0	$17,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$34,400	$0	$0	$34,400
SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD	EPSC33	830,074,184	1	1	$1,200	$0	$0	$1,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$21,100	$0	$0	$21,100
TOTAL				12	$1,533,100	$0	$0	$1,533,100

2019/04/06 11:52 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900827979	1	CONSTRUCTORA SUMAGUAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUMAGUAS	K 23 B # 5-53	CALI-VALLE	8863951	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	2019-04	419680991	849506038	E	2019/04/17	2019/04/26	BanCOLOMBIA	3	$900,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SUMAGUAS (2 Afiliados)					$938,532	$150,300			$938,532	$37,700			$938,532	$37,700			$938,532	$65,900		$0	$0
Centro de Trabajo: OBRA (2 Afiliados)					$938,532	$150,300			$938,532	$37,700			$938,532	$37,700			$938,532	$65,900		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)					$938,532	$150,300			$938,532	$37,700			$938,532	$37,700			$938,532	$65,900		$0	$0
1	CC	[illegible]	[illegible]	30	$808,116	$121,900	[illegible]	30	$808,116	$32,300	[illegible]	30	$808,116	$32,300	[illegible]	30	$808,116	$57,700	30	$0	$0
3	CC	[illegible]	[illegible]	4	$130,416	$17,700	[illegible]	4	$130,416	$5,300	[illegible]	4	$130,416	$5,300	[illegible]	4	$130,416	$7,700	4	$0	$0

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: POPAYAN (2 Afiliados)					$938,532	$150,300			$938,532	$37,700			$793,628	$31,800			$938,532	$65,900		$0	$0
Centro de Trabajo: POPAYAN (3 Afiliados)					$938,532	$150,300			$938,532	$37,700			$793,628	$31,800			$938,532	$65,900		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)					$938,532	$150,300			$938,532	$37,700			$793,628	$31,800			$938,532	$65,900		$0	$0
3	CC	[illegible]	[illegible]	4	$130,416	$17,700	[illegible]	4	$130,416	$5,300	[illegible]	4	$104,784	$4,200	[illegible]	4	$130,416	$7,700	4	$0	$0
4	CC	[illegible]	[illegible]	30	$808,116	$132,600	[illegible]	30	$808,116	$32,300	[illegible]	30	$688,404	$27,600	[illegible]	30	$808,116	$57,700	30	$0	$0
Total	Afiliados(4)				$1,877,064	$300,400			$1,877,064	$75,400			$1,587,256	$63,600			$1,877,064	$131,800		$0	$0

2019/04/26 03:01 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA o ICBF
NIT 900827979	1	CONSTRUCTORA SUMAQUMS SAS	5 - MENOS DE 300 COTIZANTES	SUMAQUMS	K 33 6 # 5-53	CALI VALLE	3063651	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	2019-04	459600991	8491156503	E	2019/04/17	2019/04/26	BANCOLOMBIA	9	$580,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$300,400	$2,100	$0	$302,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	4	1	$132,500	$900	$0	$133,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$35,400	$300	$0	$35,700
PROTECCION	230201	800,225,739	0	1	$132,500	$900	$0	$133,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$130,800	$900	$0	$131,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$130,800	$900	$0	$131,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$69,500	$600	$0	$70,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$31,800	$300	$0	$32,100
COMFAMDI	CCF57	890,303,208	5	2	$37,700	$300	$0	$38,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$75,400	$700	$0	$76,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$66,400	$500	$0	$66,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$4,500	$100	$0	$4,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$4,500	$100	$0	$4,600
TOTAL				4	$576,100	$4,100	$0	$580,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38362885		ALVAREZ FUENTES MARGARITA EUGENIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 9 # 22 - 29	POPAYAN-CAUCA	8345114	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	2019-03	43700657	84099944823	I	2019/04/22	2019/04/17	BANCOLOMBIA	0	$216,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	38362885	ALVAREZ MARGARITA	25-04	30	$828,116	$132,500	EPS040	30	$828,116	$103,600	0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$828,116	$132,500			$828,116	$103,600		$0	$0			$0	$0		$0	$0

2019/04/17 10:07 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38561889		ALVAREZ FUENTES MARGARITA EUGENIA	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 6 # 22 - 29	POPAYAN-CAUCA	8345114	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	2019-03	43706571	8489994825	I	2019/04/22	2019/04/17	BANCOLOMBIA	0	$236,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$132,500	$0	$0	$132,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$132,500	$0	$0	$132,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				1	$236,100	$0	$0	$236,100

Contrato de Interventoría

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito Representante Legal y Revisor Fiscal de DAIMCO S.A.S., certifica que DAIMCO S.A.S. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar, así como por concepto de pago de parafiscales. De los últimos seis (6) meses. Del periodo del 06 de marzo de 2019 al 5 de abril de 2019.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1819 de 2016 cumpliendo con el artículo 114-1, deberá diligenciar la siguiente información:

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados (artículo 114-1)	SI (X)	No 0

Dado en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de mayo de 2019.

Atentamente,

CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO
C.C. 78.027.760 de Cerete
Representante Legal

MARCIA CECILIA ATENCIALOZANO
Revisora Fiscal
TP 69499-T

Anexo No. 6 Control de Personal del Contratista

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-6-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitana De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Lunes 1	Martes 2	Miércoles 3	Jueves 4	Viernes 5	Sábado 6	Domingo 7	Lunes 8	Martes 9	Miércoles 10	Jueves 11	Viernes 12	Sábado 13	Domingo 14	Lunes 15	Martes 16	Miércoles 17	Jueves 18	Viernes 19	Sábado 20	Domingo 21	Lunes 22	Martes 23	Miércoles 24	Jueves 25	Viernes 26	Sábado 27	Domingo 28	Lunes 29	Martes 30	TOTAL
1	AURELIO GUTIERREZ	REPRESENTANTE LEGAL																															
2	FABIO ANDRES CLAROS BAUTISTA	RESIDENTE ELECTRICO	79.921.075																					1	1	1							
3	FEDERICO MONTEALEGRE	ING COORDINADOR SSTMA	76.318.096	1																				1	1	1	1						
4	JULIAN MAURICIO GIRALDO	DIRECTOR DE OBRA	15.908.656	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1						1	1	1	1			1	1	
5	MARIA TERESA OJEDA CABRERA	RESIDENTE DE OBRA	34.565.320	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	
6	MARIA FERNANDA BENAVIDES BELTRAN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ SSTMA	34.315.134	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	
7	EDGAR ENRIQUE CALVETE LOPEZ	ARQUITECTO	4.979.340	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	
8	YULI GOMEZ URBANO	RESIDENTE SSTMA	1.080.900.175	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	
9	JULIAN VELASCO	AUXILIAR SSTMA	1.061.716.774	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1													
10	CRISTIAN FERNANDO MUÑOZ CEDEÑO	AUXILIAR SSTMA	1.061.740.754																		1				1	1	1	1	1	1		1	1	
11	MARGARITA EUGENIA ALVAREZ FUENTES	TOPOGRAFA	38.362.835	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	
12	ALEXANDRA RISUEÑO ZEMANATE	AUX. TOPOGRAFIA	1.062.764.412	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	
13	RAUL ALEXANDER MORENO SUAREZ	CONDUCTOR	79.560.334	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	
14	JOHN EDWIN BOLAÑOS FLOREZ	CONDUCTOR	10.292.092	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-6-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitana De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
15	CARLOS URIEL CAMPO MOSQUERA	OPERADOR	1.061.711.030	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	
16	YESID ALEXIS PANTOJA TREJO	INSPECTOR	1.067.408.073	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1							1	1	1	1	1		1	1	
17	DIEGO HERNAN AMSUCHO CAMPO	AUX. BODEGA	1.061.725.400	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	
18	HUALTER ANTONIO HERNANDEZ OSORIO	AYUDANTE	4.751.640	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	
19	ARIS QUIBINDO ULCUE	AYUDANTE	1.062.776.138								1	1	1												1	1	1	1	1	1		1	1	
20	EDGAR EUGENIO CAMPO SANCHEZ	AYUDANTE	1.061.713.631	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	
21	AMALQUIO ALEJANDRO CASTAÑEDA	AYUDANTE	75.003.219	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1		1	1	
22	CARLOS EDUVER LEON	OFICIAL	3.067.064	1	1	1	1	1																		1	1	1	1	1		1	1	
23	EVA ARRIENI AGUDELO GALLO	AYUDANTE	52.242.119	1	1	1	1																			1	1							
24	HUGO ANTONIO IDARRAGA	AYUDANTE	18.400.159	1	1	1	1	1	1					1	1	1										1	1	1	1	1		1	1	
25	WILLIAM CASTAÑEDA PINEROS	AYUDANTE	86.048.874	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1		1	1	
26	GERARDO SOLARTE GONZALEZ	OFICIAL	94.465.640	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1		1	1	
27	LUIS ALFREDO BAUTISTA BAUTISTA	OFICIAL	19.423.106	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1																	
28	EDUAR FABIAN LEON	AYUDANTE	93.438.331	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Alistamiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-6-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitana De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO:DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
29	JOSE MARIO DIAZ MORALES	AYUDANTE	1.065.658.643	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	
30	JORGE ANDRES OLIVEROS PENAGOS	AYUDANTE	1.005.929.429		1	1																												
31	BRYAN JESUS PALOMINO GOMEZ	AYUDANTE	1.108.899.374		1	1	1	1																										
32	JOSE RAUL GONZALEZ	OFICIAL	94.254.061	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1		1	1	
33	IVAN RICARDO JIMENEZ BERNAL	AYUDANTE	76.942.276	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1		1	1	
34	ANDERSON YAMIT BAUTISTA GUERRERO	AYUDANTE	101.428.233	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	
35	DANIEL ANDREY RODRIGUEZ PATIÑO	OFICIAL	1.110.505.178	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	
36	LUIS ALFONSO GORDILLO LONDOÑO	AYUDANTE	7.251.758		1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	
37	JOSE HECTOR ERAZO	AYUDANTE	113.068.446			1																												
38	ALVARO MILENA FERIA MONTEALEGRE	HIDRAULICOS	14.253.118		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	1		1	1	
39	RUSSEL WEINAR GARCIA GRAJALES	OFICIAL	1.005.855.045	1		1	1	1																										
40	FEFERSON GOMEZ RAYO	OFICIAL	1.105.893.622			1																												
41	LUIS ALBERTO DE LA CRUZ	HIDRAULICOS	10.661.566	1	1	1	1	1	1																									
42	MARIO PAUL AVILA GUERRA	HIDRAULICOS	80.010.363	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-8-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitano De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO:DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Lunes 1	Martes 2	Miércoles 3	Jueves 4	Viernes 5	Sábado 6	Domingo 7	Lunes 8	Martes 9	Miércoles 10	Jueves 11	Viernes 12	Sábado 13	Domingo 14	Lunes 15	Martes 16	Miércoles 17	Jueves 18	Viernes 19	Sábado 20	Domingo 21	Lunes 22	Martes 23	Miércoles 24	Jueves 25	Viernes 26	Sábado 27	Domingo 28	Lunes 29	Martes 30	TOTAL
43	ERMINSON ARLEY MONTENEGRO MONTENEGRO	HIDRAULICOS	1.002.966.865	1	1	1					1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	1					
44	JOSE REINEL CAICEDO	AYUDANTE	76.000.076	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1			
45	ROLANDO BURBANO CALBIO	AYUDANTE	16.571.993	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1	1				
46	SANDRO IVAN ORTEGA BENAVIDES	AYUDANTE	1.061.770.857			1	1	1	1		1	1			1	1			1	1			1		1	1		1	1			1	1	
47	IVAN DARIO ALCUE SANTIAGO	AYUDANTE	1.061.803.708	1	1	1					1	1	1	1	1	1			1	1					1			1	1	1			
48	GIOVANNY ULCHUR LIZ	AYUDANTE	10.754.770	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	1		1	1	
49	YERQUI ANIBAL CASTILLO SANTIAGO	AYUDANTE	10.305.866	1	1	1					1	1	1	1	1	1			1	1					1	1		1	1	1			
50	DIEGO FERNANDO ULCHUR SANTIAGO	AYUDANTE	1.061.791.567	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	1		1	1	
51	URIANEL ULCHUR LIZ	AYUDANTE	10.755.151	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	1		1	1	
52	LORENZO SANTIAGO AVILA	AYUDANTE	10.285.648									1	1	1	1	1			1	1			1		1	1	1	1	1	1		1	1	
53	LEON BOLIVAR BURBANO BUESAQUILLO	AYUDANTE	10.548.295												1	1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	1		1	1	
54	CAMILO AMORES SANCHEZ GARCIA	AYUDANTE	1.070.602.996																1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	
55	NESTOR ELDERIN PIZO MAMIAN	AYUDANTE	76.316.910																		1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	
56	BRUNO TENORIO PALOMINO ROJAS	CONTRATISTA	80.421.341																															

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA FN DIRAF No 06-6-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitana De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
57	JHON FREDY AGRONO GRUZ	AYUDANTE	1.062.324.018	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1			1	
58	JOSE DIVIER GOMEZ FIGUEROA	AYUDANTE	1.061.599.683	1	1	1	1					1		1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	
59	LENIN EDUARDO CENTENO OROZCO	OFICIAL	85.270.068	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	
60	MILTON HUMBERTO PIPICANO INCHIMA	AYUDANTE	76.293.311			1					1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1		1	1	
61	RICHAR JOSE MOSQUERA	OFICIAL	106.380.968	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1			1	
62	WEIMAR HERNAN GUACA	OFICIAL	10.317.382	1	1		1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1			1	
63	ESAU JIMENEZ CUELLO	AYUDANTE	1.061.730.544	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	
64	JHON JAIRO PINEDA	CONTRATISTA	75.082.427	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1		1	1	
65	JHON ALEXIS BENAVIDES VALVERDE	AYUDANTE	1.063.818.358	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	
66	CESAR PEREZ RONDON	OFICIAL	74.795.219	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1			1	1	
67	ANDRES GONZALEZ COBO	AYUDANTE	1.061.797.592	1	1	1	1	1					1	1	1	1									1	1	1	1	1	1		1	1	
68	JOSE FLECER DOMINGUEZ	AYUDANTE	76.025.008	1	1	1	1	1						1	1	1			1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	
69	ROBINSON MOSQUERA	AYUDANTE	1.063.813.153	1	1	1	1	1	1			1	1		1	1		1	1	1						1	1	1	1				1	
70	DAMEYER URI CHILITO	AYUDANTE	1.058.787.468	1	1	1	1	1					1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-6-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitana De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
71	DIONICIO VALENCIA VALLECILLA	AYUDANTE	76.244.421	1	1	1	1	1					1	1	1	1		1	1															
72	JOSELITO FLOR ATOY	AYUDANTE	1.061.689	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1		1	1	
73	RAMON ORLANDO ATOY GUTIERREZ	AYUDANTE	10.290.853	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	
74	JAMES ALBERTO GOMEZ GRIALBA	OFICIAL	10.696.850	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	
75	MARIO ALEXANDER GOMEZ VARGAS	OFICIAL	76.085.575	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	
76	WILTON FAVIAN GOMEZ CAMPO	AYUDANTE	1.063.812.410	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	
77	MARTIN ANCHICO MORENO	AYUDANTE	103.888.606	1	1	1	1	1					1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	
78	JOSE FERNANDO LOPEZ IMBACHI	AYUDANTE	1.058.876.030	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	
79	LUIS ALBERTO BARQUEÑO CHIRIPUA	AYUDANTE	1.059.042.097																															
80	OSCAR GARCIA	AYUDANTE	1.061.140.081	1	1	1	1	1	1																									
81	JOSE OLIMPO VILLANUEVA VILLANUEVA	AYUDANTE	10.009.619	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	
82	HEIDER ORTIZ	AYUDANTE	83.088.788												1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	
83	MIGUEL MONTAÑO LARGO	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	10.547.336	1	1							1	1	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	
84	WEIMAR CAICEDO CARABALI	OPERADOR RETROEXCAVADORA	10.316.181	1	1	1	1	1	1		1																							

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Mantenimiento, Montaje, Administración y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40.05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-6-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitana De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO:DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
85	FLAVIO ORLANDO CHAÑAG NICHOY	OPERADOR RETRODEXCAVADORA	12.936.033										1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	
86	RAFAEL MANUEL LUCAS SUAREZ	ESTRUCTURA METALICA	10.885.046											1	1	1	1	1	1	1														
87	RAMON ORDOÑEZ ALVARADO	ESTRUCTURA METALICA	74.330.568											1	1	1	1	1	1	1														
88	CRISTHIAN ALBERTO RODRIGUEZ GARZON	ESTRUCTURA METALICA	79.915.732											1	1	1	1	1	1	1														
89	WILFREDO GONZALEZ SAAVEDRA	ESTRUCTURA METALICA	79.915.357											1	1	1	1	1	1	1														
90	CRISTIAN ALFREDO VARGAS VASQUEZ	ELECTRICOS	1.023.874.971	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	1		1	1	
91	LUIS ALFREDO VARGAS BURGOS	ELECTRICOS	79.451.429															1	1	1			1											
92	JOSE VICENTE GUEPENDO VILLALOBOS	ELECTRICOS	93.385.385	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1		1	1	1	1	1	1		1	1	
93	YUSEP MICHEL PISAMBIA PINZON	ELECTRICOS	1.061.782.586												1	1	1	1	1	1			1		1	1	1	1	1	1		1	1	
94	JORGE ARMANDO CHAMIZO CAMACHO	ELECTRICOS	1.061.555.093												1	1	1	1	1	1			1		1	1	1	1	1	1		1	1	
95	VICTOR MANUEL VARGAS BURGOS	ELECTRICOS	19.339.630	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1			1		1	1	1	1	1	1		1	1	
96	LUIS IGNACIO CARO BERNAL	OFICIAL ELECTRICO	79.208.015														1	1	1	1			1											
97	ALBERT DAVID QUIÑONES QUIÑONES	AYUDANTE ELECTRICO	1.082.689.443														1	1	1	1			1											
98	ALEXANDER DAZA SEVILLA	ESTUCO Y PINTURA	16.836.633	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	1		1	1	

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-6-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitano De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Lunes 1	Martes 2	Miércoles 3	Jueves 4	Viernes 5	Sábado 6	Domingo 7	Lunes 8	Martes 9	Miércoles 10	Jueves 11	Viernes 12	Sábado 13	Domingo 14	Lunes 15	Martes 16	Miércoles 17	Jueves 18	Viernes 19	Sábado 20	Domingo 21	Lunes 22	Martes 23	Miércoles 24	Jueves 25	Viernes 26	Sábado 27	Domingo 28	Lunes 29	Martes 30	TOTAL
99	CARLOS MESA SOLARTE	MAESTRO	1.061.699.577	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	1		1	1	
100	RODRIGO CERTUCHE VILLAQUIRAN	ESTUCO Y PINTURA	1.061.703.015		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	
101	RORY MENESES	ESTUCO Y PINTURA	4.719.559	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1			1		1	1	
102	CARLOS ALBERTO ORTEGA	PISOS	10.541.944																														
103	AICARIO CORTES	PISOS	76.305.722	1	1			1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	1		1	1	
104	JORGE HURTADO VERGARA	PISOS	76.317.916	1	1						1	1	1	1	1	1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	1		1	1	
105	OSCAR MUÑOZ	PISOS	10.539.976																														
106	MAURICIO CALAMBAS	PISOS	10.541.775		1									1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	
107	VICTOR ALFONSO JIMENEZ PALECHOR	PISOS	1.061.718.653										1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	
108	BRAYAN CERTUCHE VILLAQUIRAN	PISOS	1.061.752.715										1	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	
109	JOSE JAIR LEITON MALES	PISOS	76.247.601										1	1	1	1		1	1	1			1		1								
110	BENJAMIN CRUZ SANCHEZ	OFICIAL	1.061.734.354															1	1	1					1								
111	MANUEL IGNACIO TEJADA MACHADO	AYUDANTE	10.296.514												1	1		1	1	1			1		1	1	1	1	1				
112	MANUEL JOSE TEJADA VALBUENA	AYUDANTE	10.539.465												1	1		1	1	1			1		1	1	1	1					
113	FANDER JAVIER PISSO CERTUCHE	AYUDANTE	1.061.801.290																								1	1	1	1		1	1	

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA. FN DIRAF No 06-6-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitana De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO SCS GUTIERREZ

PERIODO:DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Lunes 1	Martes 2	Miércoles 3	Jueves 4	Viernes 5	Sábado 6	Domingo 7	Lunes 8	Martes 9	Miércoles 10	Jueves 11	Viernes 12	Sábado 13	Domingo 14	Lunes 15	Martes 16	Miércoles 17	Jueves 18	Viernes 19	Sábado 20	Domingo 21	Lunes 22	Martes 23	Miércoles 24	Jueves 25	Viernes 26	Sábado 27	Domingo 28	Lunes 29	Martes 30	TOTAL
114	HAROLD MOSQUERA	AYUDANTE	76.332.935																							1	1	1		1	1	
115	DIEGO VELASCO GOMEZ	AYUDANTE	1.002.371.512																												1	1	
116	CARLOS FERNANDO LANDAZABAL CABALLERO	RED CONTRA INCEDIOS	94.537.320				1	1	1		1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1				
117	LUIS CERQUERA VERGARA	RED CONTRA INCEDIOS	16.845.867				1	1	1		1	1	1	1	1	1					1				1	1	1	1	1			1	1	
118	DRJHONER VIDAL GRUESO	RED CONTRA INCEDIOS	1.003.152.237										1	1	1	1		1	1	1	1				1	1	1	1	1	1		1	1	
119	GUSTAVO GUZMAN DAZA	RED CONTRA INCEDIOS	1.107.048.709										1	1	1	1					1												
120	GUSTAVO LANDAZABAL	RED CONTRA INCEDIOS											1	1	1	1			1	1	1				1	1	1		1					
121	GUSTAVO LANDAZABAL	OPERADOR MINIEXCAVADORA RED CONTRA INCEDIOS	76.328.148																1	1	1													
			TOTAL PERSONAL POR DIA	73	76	77	73	72	66	8	59	66	76	83	90	87	19	73	82	90	10	0	25	0	72	84	83	84	86	78	0	75	79	0

OBSERVACIONES

ING. RESIDENTE

Elaboró SANDRA GUAUÑA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - TIRSO COSME

Aprobó

CONVENCIONES DE CARGO

DD	DIRECTOR DE OBRA	O	OFICIAL
IR	INGENIERO RESIDENTE	A	AYUDANTE
TA	TECNICA AMBIENTAL	I	INSPECTOR
TA	TOPOGRAFO	OP	OPERADOR
CI	CADENERO I	PL	PALETEROS
CII	CADENERO II	LB	LABORATORISTA
M	MAESTRO		

Anexo No. 7 Control Personal de Interventoría

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DE LA INTERVENTORIA INT-40:00

PROYECTO: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

EMPRESA: DAIMCO S.A.S

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

FRENTE DE OBRA: POPAYAN - CAUCA

No	Nombre	Cargo	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	TIRSO MARINO COSME OROZCO	DI	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	26
2	SANDRA LUCIA GUAUÑA PISSO	IR	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	26
3	ROSA DEL MAR RODRIGUEZ GALVIS	SO	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	26
4	MONICA LILIANA BENITEZ ANGEL	AR	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	26
5	JAVIER JOSE CARILLO ORTEGA	E	0	1	0	1	1	0	0	1	1,0	0	1	0	0	0	1	0,0	0	0	0	0	0	1	1,0	0	1	0	0	0	0	0	10
6	RIGOBERTO LOZADA DIAZ	TA	0	1	0	1	1	1	0	1	0,5	0	0	1	0	0	1	0,5	0	0	1	0	0	1	0,5	0	1	1	0	0	1	0	14
7	VÍCTOR MANUEL BOCANEGRA GARCÍA	E	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1,0	1	1	1	1	0	1	1,0	1	1	1	1	0	1	1	26
8	JOSE ARMANDO RUIZ ANGARITA	E	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	6
9	ALBERTO FEDERICO MOUTHON BELLO	E	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0,0	0	0	1	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	6
10	PABLO MANRIQUE CONVERS	E	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	1,0	0	0	1	1	0	0	0	9
11	PABLO EMILIO GUERRERO JIMENEZ	E	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	26
	TOTAL PERSONAL POR DIA		8	10	6	9	10	7	0	9	8	6	9	9	7	0	10	8	6	6	8	6	0	9	9	6	8	8	7	0	7	6	201


OBSERVACIONES

ING. RESIDENTE

Elaboró SANDRA GUAUÑA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - TIRSO COSME

Aprobó



CONVENCIONES DE CARGO

DO	DIRECTOR DE OBRA	O	OFICIAL
IR	INGENIERO RESIDENTE	A	AYUDANTE
TA	TECNICA AMBIENTAL	I	INSPECTOR
TA	TOPOGRAFO	OP	OPERADOR
CI	CADENERO I	PL	PALETEROS
CII	CADENERO II	LB	LABORATORISTA
M	MAESTRO	E	ESPECIALISTA

Fecha de Aprobación de Formato INT-40:01, 30 de Abril de 2015

Anexo No. 8 Informe SISO

INTERVENTORÍA TÉCNICA EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DEL MANEJO AMBIENTAL AL CONTRATO, PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REALIZADA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ EN LA CIUDAD DE POPAYÁN CAUCA.





PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2019

ELABORÓ:

ROSA DEL MAR RODRIGUEZ G.

RESIDENTE SISOMA

INTERVENTORÍA DAIMCO S.A.S

1. INTRODUCCIÓN

A continuación se presenta la recopilación y el análisis de la información proveniente de las actividades del **SG-SST** ejecutadas por el contratista **CONSORCIO BCS-GUTIERREZ** durante la ejecución del proyecto **CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN** ubicada en la ciudad de Popayán , con el fin de analizar y evaluar la protección y promoción de la salud de los trabajadores, condiciones de trabajo, gestión social con la comunidad y protección al medio ambiente de posibles impactos durante la ejecución del contrato.

2. OBJETIVO GENERAL

El objetivo del presente informe es evidenciar el trabajo respecto a la gestión en seguridad y salud en el trabajo (SST) establecido y aplicado por el contratista Consorcio BCS- GUTIERREZ en la ejecución del proyecto Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitana De Popayán; durante el periodo del 26 de Marzo al 25 de Abril de 2019. Así mismo analizar el avance de la implementación para evaluar resultados de este y establecer medidas que nos conlleven al mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo y el control eficaz de los peligros y riesgos, en materia de seguridad y salud en el trabajo.

3. **METODOLOGÍA ÁREA SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SISOMA) o SG-SST y MA(Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente:** La metodología a implementar para fundamentar el presente informe se basa en la recopilación y registros de la información de las actividades establecidas por los subprogramas de medicina preventiva de trabajo, seguridad industrial, gestión de saneamiento básico y protección ambiental realizada según la estructura del SG-SST determinado en la presente obra.

4. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1 Seguimiento a los hallazgos , se realizan los siguientes requerimientos en Seguridad y Salud en el trabajo al contratista:

- ✓ Seguir Manteniendo las áreas de circulación y rutas de evacuación limpia y despejada.

Rta: Se ha continuado con el programa de Orden y Aseo, se ha estado designan do áreas de acopio de escombros en cada uno de los bloque de trabajo, Bloque 1 (Patrulleros) piso 1 y 2, bloque 2 (Casino) Piso 1 y 2, Bloque 3 (Suboficiales) piso 1 y 2, áreas de cubiertas de cada uno de los bloques, los escombros se han estado evacuando con el minicargador y disponiendo en el botadero autorizado.

✓ Completar las hojas de vida pendientes, de los subcontratistas:

- BRUNO: 1
- METAL B SAS: 2
- ORLANDO EDMUNDO REVELO: 2

Rta: se completó las hojas de vida de los subcontratistas, Bruno: 1, Metal B SAS: 2; ORLANDO EDMUNDO REVELO: 2.

4.2. Identificación de riesgos y peligros en áreas del proyecto:

✓ Realizada una inspección de campo en los diferentes frentes de trabajo que se encuentran en la obra Construcción y Dotación de la Cuarta Fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán.

✓ Aplicar medidas preventivas y correctivas identificadas en cada uno de los frentes de trabajo.

✓ Hacer seguimiento a la cronograma de capacitación anual y de charlas semanales.

✓ Realizar seguimiento a la ejecución de los procedimientos seguros correspondiente a cada actividad que ejecuta el contratista en obra.

✓ Verificar que se tomen las medidas preventivas y correctivas a que haya lugar.

✓ Verificar el cumplimiento de los programa que hacen parte de la Gestión en SST- MA, los cuales garantizan la Seguridad y Salud de los trabajadores en obra.

5. GESTIÓN HUMANA

5.1. INGRESOS - DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL

En el periodo comprendido entre el 26 de Marzo y el 25 de Abril de 2019 se realiza por parte de la interventoría al residente SISOMA de la Empresa Contratista Consorcio BCS- GUTIERREZ, la revisión de la carpeta de ingreso del personal contratistas y subcontratista, verificando que se cumpla con lo propuesto en el subprograma de medicina preventiva y del trabajo y el subprograma de higiene y seguridad industrial. Finalizada la verificación se evidencia que a la fecha se encuentran los siguientes documentos:

Se verifica los exámenes de ingreso, se realizaron 25 exámenes médicos de ingreso, al personal nuevo que ingreso para este periodo.

Para el presente periodo el contratista realizaron 23 solicitudes para que los trabajadores se realizaran los exámenes médicos de retiro, se hizo la socialización del derecho de examen de retiro a un total de 18 personas.

No se ejecutaron exámenes periódicos, dado que para el periodo no aplican.

Para el presente periodo no se realizaron recomendaciones médicas originadas de los exámenes médicos de ingreso.

El contratista informa que dentro de las inducciones realizadas de acuerdo al ingreso de personal se socializan las políticas del SG-SST (Política del SG-SST y Política de no al consumo de sustancias psicoactivas, tabaco y alcohol) y los temas generales del SG-SST, dentro de las inducciones se incluyó el tema de la Política de Medio Ambiente.

Para el periodo de 26 de Marzo al 25 de Abril de 2019, se realizaron 09 inducciones, con asistencia de 24 personas en total, las inducciones están soportadas con los registros y sus respectivas evaluaciones.

Los temas tratados en las inducciones son:

- Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
- Política de Tabaquismo, Alcoholismo
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Definición de AT y EL
- Uso de Elementos de protección personal

- Sistema General de Seguridad Social
- Notificación de Riesgos
- Plan de Emergencias
- Notificación al derecho de examen Médico ocupacional.

El contratista informa que dentro del SG-SST del consorcio, se implementa el manual de contratistas, el cual debe acogerse cada una de las organizaciones subcontratadas por el consorcio, con el fin de garantizar el cumplimiento a todo lo concerniente a la Seguridad y Salud en el Trabajo, es decir, que de acuerdo a la implementación del documento mencionado, se está cumpliendo con los procedimientos de inducción debidamente soportados y documentados.

Se verifica todas Hojas de vida de Consorcio BCS Gutiérrez, estas cumplen con los requerimientos establecidos.

Formato de hoja de vida con actualización de datos del trabajador.

Contratista:

AG3 INGENIERIA: Se cuenta con el 100% de las Hojas de Vida. Equivalente a Trabajadores

CONSORCIO BCS-GUTIERREZ: Cuenta con el 100% de las Hojas de Vida, equivalente de 8 Trabajadores operativos, 100% 9 H.V del área administrativa.

Hojas de Vida de Subcontratistas:

BRUNO:8.H.V=100%; CARLOS LEON:12.H.V=100%; DANEL RODRIGUEZ:19.H.V=83%; METAL-B:2.H.V=50%; DATALEC INGENIEROS: 7 H.V: 78%; JHON JAIRO PINEDA: 16 H.V 96%; ORLANDO EDMUNDO REVELO: 2 H.V 100%; GRABRIEL PASTOR AGUILAR: 8 HV 47%.

Aparte de los documentos pendientes se realizó las siguientes verificaciones:

Se verifica que se realice a diario el registro del personal en el libro de obra (bitácora) y formato personal de contratista y formato de Interventoría (int-8 F. Informe diario de inspección v0 y int-40 f. personal del contratista v0) , en el cual se registra todo el personal de obra, tanto de contratista y de interventoría, Control de Dotación y EPP, Equipos, Maquinaria, Estado del tiempo, Control de Sumistro de Materiales, Registro de Control de Calidad

de Materiales y Obras, Descripción General de las Principales Actividades Desarrolladas, dicho formato lo diligencia la Ing Residente, en donde se relaciona el personal administrativo y operativo como: director de obra, Ingeniero Residente, Residente SISOMA, Contratita Topografía: Margarita Álvarez, Subcontratista AG3 Ingeniería, Bruno Palomino, Contratista Mamposteria, , Pañetes,: Carlos Leon, Daniel Rodríguez, Jhon Pineda; Contratista Tanque de Almacenamiento de Agua y RCI: SIMI AGUAS : Contratista Eléctricos: DATALEC INGENIEROS, Contratista: Retroexcavadora: Orlando Edmundo Revelo, Mini Excavadora: Daniel Andres Achinte Gaona; Contratista Cubierta: Metal B SAS. Estuco, Pintura, y Pisos.: Gabriel Aguilar Bermeo.

Se evidencia la entrada del personal de lunes a viernes en la jornada de la mañana en el horario de 7:00 am y la salida en horario de la tarde 5:00 pm; con su respectiva horario de almuerzo de 12:00 M a 1:00 P.M. los días sábados de 7:00 am a 12:00 pm del medio día. Tanto contratista como subcontratista.

5.2. PERSONAL ACTUAL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

CONTRATISTA	ACTIVIDAD	# TRABAJADORES
CONSORCIO BCS- GUTIERREZ	ADMINISTRACIÓN	9
	OBRA	5
AG3 INGENIERIA	CONDUCTORES -2 DE VOLQUETAS), -1 PAGARITA	3
	TOTAL	17
SUB CONTRATISTA	**ACTIVIDAD**	**# TRABAJADORES**
MARGARITA ALVAREZ	Topografia	2
BRUNO	Armado de Hierro, vaciado de concreto,	08
CARLOS LEON	Mamposteria	12
DANIEL RODRIGUEZ	Mamposteria	23
JHON JAIRO PINEDA	Armado de Hierro, vaciado de concreto,	18
DATALEC INGENIEROS	Instalación de sistema eléctricos	8
METAL B SAS	Estructura Metalica, Instalación de cubierta y escaleras	4
ORLANDO EDMUNDO REVELO	Retroexcavadora	2

GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO	Estuco, Pintura e Instalación de pisos	**15**
SUBCONTRATISTAS TOTAL		**92**

A la fecha el personal ha tenido la siguiente rotación:

Nuevos = 20
Personal antiguo =65
Personal retirado = 18
Ingreso retiro = 5

6. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

6.1. Señalización y demarcación:

- Se verifica que los frentes de trabajo de la obra se encuentren demarcados y señalizados, dando cumplimento a la resolución 1016 de 1989. Artículo 11 (Numeral 17).

- Se inspecciona camilla, extintores y botiquines del campamento y los de los vehículos, se verifica que el extintor multipropósito (ABC) del contratista, (suministrado por el proveedor REPARAEQUIPOS MARTINEZ), esté cargado, presurizado, tenga el pasador de seguridad, tenga la fecha de recarga vigente, este rotulado, señalizado y se encuentre en un lugar visible, accesible y a disposición inmediata en caso de incendio.

- Se inspecciona que el botiquín de primeros auxilios que se encuentra en la obra, contenga los elementos establecidos por la RESOLUCIÓN 0705 DE 2007.

6.2. Vigilancia a las actividades propuestas para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

- Se verifica que el contratista realice actividades encaminadas a la prevención de accidentes y al mejoramiento de las condiciones laborales de acuerdo al cronograma de actividades de seguridad y salud en el trabajo (SST), que se ejecutan por el Residente SISOMA del contratista. Dando cumplimiento a la resolución 1016/89 y al Decreto 1443 de 2012, Resolución 1111 de 2017

- Se inspecciona que en las inducciones a los trabajadores se traten los temas conforme a cumplimiento de la legislación vigente en seguridad y salud en el trabajo.

- Se verifica que en el proceso de inducción se incluya los temas ambientales socializar política de consumo de sustancia psicoactivas, política vial, plan emergencia, temas ambientales.

TABLA DE INDUCCIONES		
TEMAS	**PROGRAMADAS**	**REALIZADAS**
Marco legal en seguridad, salud en el Trabajo y Medio Ambiente.	De acuerdo al número de trabajadores que ingresen en el mes	5
Política del SG-SST y MA		

6.3. Capacitation y entrenamiento

Se revisa el cronograma de capacitación y entrenamiento teniendo en cuenta que estas se realicen de acuerdo a los procesos que se ejecutan en la obra, a la fecha la empresa contratista BCS GUTIERREZ, han realizado las capacitaciones de acuerdo al cronograma mensual y anual propuesto.

Dando cumplimiento al 100% de las capacitaciones programadas

Durante lo corrido del periodo que abarca este informe, se realizaron capacitaciones al personal de la obra, correspondiente a los siguientes temas:

TEMA	ORIENTADOR
Inspeccion peldaños volquetas	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
Habitos de vida saludable	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
Socialización objetivos, politicas	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
Consumo Sustancias Psicoactivas	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
Campaña uso de bicicleta	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS

6.3.1. Charlas de seguridad diaria y precalentamiento

Se siguen realizando las charlas los Martes o Miércoles, por grupos guiadas al componente de SST y MA total 5 charlas programadas.

Temas tratados en las Charlas, para este periodo:

TEMA	ORIENTADOR
Protección contra caídas	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
Accidente en construcciones	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
Higiene Industrial	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
Resbalos, tropezones, caidas	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
Protección de la piel	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS

6.3.2 Actividades de prevención personal sintomática.

Durante del desarrollo de este periodo CONSORCIO BCS-GUTIERREZ no se realizaron actividades de prevención de la enfermedad, ni promoción de la salud.

Línea base de condiciones de salud.

CONSORCIO BCS-GUTIERREZ realiza el seguimiento a la línea base de condiciones de salud en las áreas que serán programadas

6.4 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

La empresa realiza la Entrega, reposición, inspección y mantenimiento de elementos de protección personal (EPP).

Para el Periodo del 26 Marzo al 25 de Abril de 2019 se realizó la entrega de los siguientes Elementos de Protección Personal.

ITEM	ELEMENT O	CANTIDAD
1	Casco de seguridad	8
2	Gafa lente oscuro	12
3	Gafa lente claro	12
4	Tapa boca	62
5	Guantes reforzados	35
6	Tapa oído	11
9	Guantes caucho	60
11	Botas punteras en caucho	4
12	Barbuquejo	1
13	Guantes nitrilo	2

El contratista realiza las inspecciones planeadas de EPP de acuerdo al programa de inspecciones planeadas y se verifica el uso de EPP al personal en obra.

El contratista da cumplimiento constante en la obra a la inspección de utilización y estado de los EPP acordes a la tarea, se realiza cambio de EPP de acuerdo a la necesidad, sobre todo se realiza cambio de guantes de vaqueta, sencillos y reforzados, de caucho, hilaza y gafas y protección auditiva tipo inserción.

Adicionalmente a la entrega de elementos de protección personal, el consorcio hace entrega de la siguiente relación de dotación:

ITEM	DOTACION	CANTIDAD
1	Bota punta de acero	11
2	Pantalón (logo consorcio)	6
3	Camisa (logo consorcio)	6

Dicha dotación es entregada en su respectivo formato.

6.5 ACTIVIDADES DE SOPORTES DEL PLAN DE PREPARACIÓN Y ATENCIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA.

Se realizó inspección de extintor y botiquín de primeros auxilios ubicado en el campamento del contratista, almacén, volqueta Szp025, volqueta szp026 y minicargador.

7. DESCRIPCION GENERAL DE ACTIVIDADES.

Con el fin de dar a conocer las diferentes actividades que se desarrollan en el periodo se describe a continuación el avance de obra del área técnica, para tener un mejor entendimiento que debe realizar el área SST-MA, a continuación se describe las actividades del área técnica así:

- Excavación mecánica, cargue y desalojo de material.
- Localización de ejes y niveles.
- Levante de muros.
- Relleno subestación eléctrica y alrededor del tanque RCI.
- Realización de pañetes casino, subestación y oficiales.
- Relleno con material alrededor del área de patrulleros.

- Instalación de tubería hidrosanitaria e hidráulica.
- Instalación de tubería eléctrica.
- Instalación de cableado para la red eléctrica en el bloque 3, nivel 1
- Colocación de cubierta.
- Cerramiento en polisombra.
- Construcción de cajas sanitarias.
- Fundida de columnetas, vigacinta, dinteles.
- Pañete dentro del tanque RCI.
- Aplicación de IGOOL alrededor del tanque RCI.
- Replanteo para iniciar actividades de construcción en Gimnasio
- Refuerzo de acero para Gimnasio.
- Enchape de pared de baños primer piso bloque 3, bloque 1.
- Estuco de paredes internas, bloque 3, bloque 2 y bloque 1.
- Pintura de paredes internas, bloque 3 primer piso y segundo piso.
- Estuco acrílico en paredes de escaleras de acceso al segundo nivel.
- Conformación de escaleras metálicas en los tres bloques (pasamanos).
- Repello de fachada principal y trasera bloque 3.
- Terminación de muros de baños en el bloque 1 primer piso, segundo piso.
- Repello de filos (carteras), bloque 1, 2 y 3, segundo nivel.
- Reubicación de campamentos de almacenes de subcontratistas.
- Colocación de PUSH en baños bloque 1, para orinales y sanitarios.
- Instalación de cielo raso en bloque 3.
- Instalación de piso en bloque 3 y 2.
- Fundida de alistado de pisos bloque 1 y 2.
- Tendido de acometidas eléctricas principales.
- Instalación de red contra incendios.
- Fundida de andenes en bloque 1, 2 y 3.

8. INFORME GESTION SOCIAL.

8.1 ACTIVIDADES PRINCIPALES

No se cuenta con guarda de seguridad, dado que la obra se encuentra ubicada dentro de las instalaciones de la Policía Metropolitana de Popayán y cuenta con cerramiento perimetral en malla verde.

El contratista instalo Cámaras de Seguridad, para brindar mejor soporte referente al tema de seguridad.

Hasta le fecha no se registró sugerencias, quejas o reclamos del área externa.

9. INSPECCIONES

Durante el presente periodo se desarrollaron las siguientes inspecciones por parte del área SISOMA del Contratista BCS Gutierrez:

TIPO DE INSPECCIÓN	FRECUENCIA
Inspecciones de botiquín de primeros Auxilios	Mensual
Inspección de extintores	Mensual
Inspección de camilla	Mensual
Inspección orden y aseo	Semanal
Inspecciones de Equipos y Herramientas	Mensual
Inspección pre operacional de Vehículos y Maquinaria	Diaria
Inspección de elementos de protección Personal	Cada quince días
Inspección para Permisos de Trabajo en Alturas	De acuerdo a los trabajos ejecutados en Alturas
Inspección ambiental	Semanal
Inspección de observación de Comportamiento	Semanal

Todas las inspecciones están soportadas en los formatos correspondientes.

10. AUSENTISMO LABORAL GLOBAL

A continuación, se hace la relación de ausentismo general global discriminado de la siguiente manera:

Nota. La NTC 3793 en el numeral 3.2.1. De ausentismo laboral, manifiesta lo siguiente, "El periodo se puede tomar en meses o años, se recomiendan cortes mensuales.

ALG = AUSENTISMO LABORAL GLOBAL

Días perdidos no relacionados con la salud: 164 días= 1312 horas.

Días perdidos por accidentes de trabajo: 0 días = 0 horas.

Días perdidos relacionados con enfermedad general 19 días: 152 horas.

Total, días perdidos: 183 días = 1464 horas.

Tiempo programado en el periodo: 31 días

Total, personal del proyecto en el periodo: 85 personas.

Tiempo de trabajo programado en el periodo (trabajador x horas día x días semana x número semana) = 22950.

Tiempo de trabajo perdido en el periodo * 100
ALG = _____
Tiempo de trabajo programado en el mismo periodo
ALG = 1464/22950* 100 = 6,37%

Para un total de 85 personas del contratista, significa que de cada 100 horas trabajadas se presenta el 6,37% de pérdida de tiempo para el periodo.

11. ACCIDENTALIDAD EN LA OBRA DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2019.

Durante este periodo no se presentó accidente laboral:

A continuación, se presenta el listado de personal con la estadística.

TABLA 1. ÍNDICES DE ACCIDENTALIDAD DEL MES DE 26 MARZO AL 25 ABRIL 2019

Periodo	Total, trabajadores	Total, accidentes de trabajo	Accidentes mortales	HHT	No. Días perdidos acumulados	IF	IS	ILI	LETALIDAD
07 junio – 25 junio	12	0	0	1376	o	0.00	0.00	0.00	0.00
26 junio – 25 julio	22	0	0	4008	25,5	0.00	0.00	0.00	0.00
26 julio – 25 agosto	20	1	0	6884	47	1923,08	1923,08	3698,22	0.00
26 agosto – 25	70	0	0	15120	3	0.00	0.00	0.00	0.00

septiembre 2018									
26 septiembre – 25 octubre 2018	75	1	0	10125	12	19,75	237	4,68	0.00
26 octubre – 25 noviembre 2018	72	0	0	9720	20	0	412	0	0.00
26 noviembre -25 diciembre 2018	74	2	0	9.990	54	40.04	1.081	43,29	0.00
26 diciembre – 25 enero 2019	71	1	0	9585	67	20.87	1.398	29,17	0.00
26 enero -25 febrero 2019	82	2	0	22140	142	18.07	1.283	23.18	0.00
26 febrero – 25 marzo 2019	85	1	0	22950	125	8,71	1,089	9,49	0.00
26 marzo al 25 de abril 2019	85	0	0	22950	183	0.00	1.595	0.00	0.00

I.F.: Índice de frecuencia: No. de accidentes/HHT*K
I.S.: Indice de severidad: No. días de perdidos ó Días cargados/HHT*K
I.L.I: Indice de lesiones incapacitantes: IF*IS/1000
K: 200000

12. BRIGADAS DE EMERGENCIA

Para este periodo no se realizó capacitación a la Brigada de Emergencia.

El Contratista cuenta con un Kit de Emergencia:

Campamento: 1 Botiquín, camilla inmovilizadora y extintor de 20 lb

Además cada vehículo cuenta con su respectivo extintor y botiquín.

La camilla de emergencia y el extintor se encuentran ubicados en el campamento a la entrada de fácil acceso, debidamente identificados y señalizados

13. SANEAMIENTO BÁSICO

Se da cumplimiento a los aspectos básicos de servicios sanitarios, para ello se cuenta con los siguientes servicios:

4 baterías sanitarias con la siguiente distribución:

1 batería sanitaria con lava manos destinada para el servicio de mujeres

1 batería sanitaria con lavamanos destinada a los ingenieros hombres de la obra

2 baterías sanitarias destinadas para el servicio de trabajadores en general

Un orinal en la parte de atrás de los baños.

Se hace aseo de acuerdo al procedimiento de orden y aseo cada 3 días o dependiendo de la necesidad.

14. COPASST DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Para lo corrido del presente periodo, el día el 26 de Marzo al 25 de Abril de 2019 se realizó reunión del COPASST.

Para lo corrido del presente periodo, el día 13 de Abroñ se realizó reunión con la participación de los integrantes que conforman el COPASST, donde se trataron los siguientes temas: Vinculación al señor Raúl Alexander Moreno, accidentalidad, exámenes de ingreso, incapacidades, solicitud de carnet a personal retirado de obra, solicitud de copia de cedula de ciudadanía con 3 días de anterioridad a personal que va a ingresar a obra para el estudio de seguridad, solicitar al personal de la guardia que realice una requisa al personal que sale de la obra. El personal fue atento y se comprometieron hacer seguimiento a cada uno de los temas tratados.

15. COMITÉ DE CONVIVENCIA

No se realizó actividades relacionadas con el comité de convivencia laboral

16. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

A continuación, se presenta el seguimiento a las actividades desarrolladas por el contratista

PARAMETRO A EVALUAR	CALIFICACION MENSUAL	ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO

Todo el personal directo e indirecto que labora en la obra se encuentra afiliado a una ARL, EPS Y AFP, el ingreso a la obra, se encuentra al día en el pago, se lleva registro semanal en el formato correspondiente. Y se tiene el procedimiento para verificar la afiliación al sistema y este contiene las medidas a aplicar por el contratista en caso de incumplimiento en la obligación y se ejecuta según lo estipulado	100%	El 100% de los trabajadores cuentan con la seguridad social vigente
El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial se encuentra publicado en un lugar visible del campamento, está socializado y se cuenta con los soportes respectivos.	100%	El reglamento se encuentra publicado en la cartelera informativa del consorcio desde, de igual forma se hace la socialización en las inducciones
La política SST, se socializa a todo el personal de la obra, firmada por el representante legal, se encuentra en lugar visible y se cuenta con los soportes respectivos	100%	El contratista realiza la socialización de la política de seguridad y salud en el trabajo en las inducciones
El COPASST o VIGIA, se reúne en forma mensual, cuenta con el cronograma de reuniones, Plan de Trabajo General de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión cumpliendo con la normatividad legal vigente	100%	Reunión con el COPASST
Se cumple el plan de Capacitación, Inducción y Entrenamiento.	100%	Se realizó inducción a todo el personal de la obra
Todos los trabajadores son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	100%	Se realizó la notificación de riesgos a todo el personal del proyecto.
Los contratistas cumplen con los compromisos adquiridos	100%	Cumplimiento a las observaciones de la auditoria.

en los Comité SST-MA.		
Se notifica a la Interventoría todas las novedades del personal (reingresos, cambios de cargo cambios de empleador y retiro) inmediatamente se presentan	100%	El contratista hace entrega vía correo electrónico por solicitud de interventoría, la documentación correspondiente a seguridad social de los trabajadores
Se efectúa examen médico de ingreso/periódico/egreso (este último el empleador entrega la orden al trabajador y la presenta a Interventoría), por cargo, se realiza por médico especialista en SST-MA. y con la información se mantiene actualizado el diagnostico de condiciones de salud del personal.	100%	Se presentaron exámenes médicos a todas las personas que permanecieron en la obra
Se cuenta con botiquín que contiene la dotación básica.	100%	El contratista cuenta en campamento con botiquín de primeros auxilios, con elementos necesarios para brindar el servicio ante cualquier eventualidad.
Se realizan actividades de promoción y prevención	N.A.	Para el periodo en mención no se realizaron actividades de promoción y prevención.
Las instalaciones provisionales cuentan con vistieres, donde los espacios son suficientes y adecuados para el manejo de ropas, implementos personales y EPP	100%	Se cuenta con tres vistieres, distribuidos uno para el personal de cada subcontratista.
Se posee 1 baño por cada 15 trabajadores y el baño recibe mantenimiento y limpieza periódica.	100%	Los baños se mantienen en buenas condiciones y estos se realizan los mantenimientos dos veces por semana, se cuenta con tramo 1=1, , tramo 2=2, , tramo 3= 1,tramo 4= 2; tramo 5=2, punto crea=2 baños fijos, total baños =10
Se entregan los EPP que cumplan con las normas de garantía de calidad, de acuerdo a la matriz aprobada	100%	El contratista tiene los formatos de entrega de elementos de protección personal y se entrega la

y se lleva un registro formal de entrega		dotación a todo el personal en total se hizo 26 entregas de EPP al personal de obra y se realiza reposición de acuerdo a la necesidad
Los trabajadores usan adecuadamente los EPP de acuerdo a la actividad y matriz aprobada.	100%	En los recorridos a diario que se realizan se verifica el uso de los elementos de protección personal, por tal motivo estos se encuentran en buen estado y lo usan
Las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con procedimientos de seguridad.	100%	Se cuenta con hojas de seguridad de las sustancias quimicas utilizadas en el periodo se encuentra los siguientes: • Cemento • ACPM • GASOLINA • IMPERMEABILIZANTE SIKA1
Se implementan los permisos de trabajo para las labores de alto riesgo, y cumple los Procedimientos y/o estándares definidos.	100%	Se implementa permisos de trabajo en alturas
Se cuenta con procedimientos documentados y/o estándares de trabajo seguro por cada proceso constructivo u operación, los socializa, actualiza y se ejecutan según lo establecido.	100%	El contratista entrega todos procedimientos según los resultados de la matriz de peligros
Se tienen documentadas las estadísticas mensuales de ausentismo se presentan a interventoría con el análisis y acciones correctivas/preventivas correspondiente	100%	Para el presente periodo no se presentaron ausentismos relacionados con causas ATEP.
Se realizan las inspecciones establecidas en el programa	100%	Se realiza inspección a volquetas revisión, maquinaria, botiquín, extintor, uso de epp.
Se capacitan a todos los	100%	En las inducciones se realizó la

trabajadores en el plan de emergencia y tiene soportes.		socialización del plan de emergencias.
Se han conformado las Brigadas de emergencia, están activas, especializadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento mensual, se ejecuta y existen los soportes.	100%	Se encuentran identificadas

17. GESTIÓN DE MANEJO AMBIENTAL

MAQUINARIA EQUIPOS Y VEHICULOS.

Para el periodo del 26 de Marzo al 25 de Abril de 2019, se realizó trabajos con la Retro-Excavadora y el vibro compactador, del contratista Orlando Edmundo Revelo.

Para el presente periodo ingresaron al proyecto los siguientes equipos vehículos y maquinaria.

17.1 VEHICULOS

TIPO DE VEHICULO	PLACA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	FECHA DE INGRESO
Volqueta	SZP 026	Milton Gustavo Castillo Bajaca	11/08/2018
Volqueta	SZP 025	Raúl Alexander Moreno Suarez	11/08/2018
Tractocamión	FLP894	Jairo Hernando Diaz	01/12/2018
Tractocamión	SWN046	William Cardono	07/12/2018
Camión	VAD086	Anderson López	15/12/2018
Volqueta	OYJ-223	Javier Oswaldo Bolaños	23/01/2019
Volqueta	CIZ-640	Nelson Olmedo Montilla	23/01/2019
Volqueta	GUE-408	Aurelio Oswaldo Bolaños	23/01/2019
Camión	NKN085	Juan Diego Gurrute	02/02/2019
Camión	SOQ149	Jhon Fredy Montilla	09/02/2019
Camión	SWN852	Olimpo Velasquez	11/02/2019
Camión	SXKS17	Arcesio Soto	11/02/2019
Tractocamión	THY068	Tarcisio Pabon	03/02/2019

		Campos	
Camión	KUK899	Eribeto Moreno Pinzon	11/04/2019

17.2 MAQUINARIA

AQUINARIA **TIPO DE MAQUINARIA**	**REFERENCIA**	**NOMBRE OPERARIO**	**FECHA DE INGRESO**
Minicargador	218	CARLOS URIEL CAMPO	20/09/2018
Excavadora	420 E	Flavio Chañag	11/08/2018
Excavadora	PC200-5	Orlando Muñoz	14/11/2018
Excavadora	JCB214E	MILTON CESAR MACA	15/12/2018
Vibrocompactador	CA-15 DYNAPAC	MIGUEL MONTAÑO LAGO	18/12/2018
Excavadora	JCB214E	ORLANDO MUÑOZ	25/01/2019
Excavadora	KOMATSU	GERMAN CHALPARIZA	05/02/2019
Mini Excavadora	BOBCAT	DANIEL ANDRES ACHINTE GAONA	09/04/2019

Para el periodo objeto de este informe se tiene que se cuenta con los documentos de volquetas como:

Licencia de transito
*SOAT
*Tecno mecánica
*Licencia de conducción del señor

Adicionalmente a las volquetas se adjunta la documentación de la maquinaria (ver anexo 7. Documentación Vehiculos y maquinaria).

$$\frac{\text{No. De vehiculos con documentos requeridos vigentes}}{\text{No. De vehiculos en obra}} * 100 = 14/14 = 100\%$$

$$\frac{\text{No. De acciones cumplidas}}{\text{No. De acciones propuestas aplicables en el periodo}} * 100$$

Para este mes no se realizaron acciones que requirieran de cumplimiento, es por esta razón que el segundo indicador del programa no aplica

18. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Se dispone en campamento tres recipientes para disposición de residuos ordinarios

$$\frac{\text{Cantidad de residuos especiales, peligrosos, reciclables entregados en empresa autorizada}}{\text{Cantidad de residuos especiales, peligrosos, reciclables generados en periodo}} * 100$$

$$= \frac{\text{250 kg (reciclable entregado)}}{\text{250 kg (reciclable generado)}} * 100 = 100\%$$

$$= \frac{\text{280 kg (Desperdicios de alambre)}}{\text{280 kg (Desperdicios de alambre)}} * 100 = 100\%$$

La entrega de material reciclable se hace a través de la asociación de recolectores de materiales reciclables de Popayán "aremarpo", quien para este periodo certifica la recolección.

$$= \frac{\text{180 kg (ordinario entregado)}}{\text{180 kg (ordinario generado)}} * 100 = 100\%$$

La entrega de residuos ordinarios se hace a través de la ruta de recolección que realiza la empresa Servi Aseo; como evidencia se presente registro fotográfico en el punto de recolección ubicado en zona del comando.

La entrega de residuos peligrosos o especiales se hace a través de la empresa ASERHI, dando cumplimiento al indicador.

$$= \frac{\text{20 Kg (Residuos peligrosos en obra)}}{\text{20 kg (Residuos peligrosos en obra)}} * 100 = 100\%$$

La distribución de los recipientes corresponde a:

3 recipientes para recolección en oficina
4 recipientes para recolección de residuos en baños
5 recipientes del punto ecológico donde se hace la separación y clasificación de residuos según código de colores.

19. MANEJO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

Se realizan excavaciones movimiento de tierra en obra, el cual es dispuesto en la escombrera Revelo, quien cuenta con permiso, otorgado por la corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), (ver Anexo 4. Permiso escombrera y solicitud aprovechamiento)

Para el cual se tiene la siguiente relación:

20. CONTROL VIAJES DISPOSICION DE MATERIAL

CONTROL VIAJES DISPOSICION DE MATERIAL							
ITEM	FECHA	PLACA	CAPACIDAD	MATERIAL	No. RECIBO	L. DISPOSICION	TOTAL, X DIA
1	26/03/2019	GUE408	7	TIERRA	537	REVELO	7
2	26/03/2019	OYJ223	7	TIERRA	539	REVELO	7

VOLQUETA	N. DE VIAJES	CANTIDAD M3
SZP025	12	180M3
SZP026	5	75M3
GUE408	2	14M3
OYJ223	2	14M3
CIZ640	1	7M3
TOTAL	290M3	

PORCENTAJE APROVECHAMIENTO MATERIAL		
MANEJO	No. VIAJES	CANT.M3
DISPOSICION FINAL	22	290
APROVECHAMIENTO	0	0
% DISPOSICIÓN FINAL	22	100%
GENERACIÓN DE MATERIA		

Cantidad de escombros y material de excavación dispuestos correctamente en m3
_____ * 100
Cantidad de escombros y material de excavación generados en el mes

= (290/290) *100= 100%

Los valores acumulados respecto al mes anterior son los siguientes:

Los valores acumulados respecto al mes anterior son los siguientes:

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES				
PERIODO	DISPOSICION FINAL		APROVECHAMIENTO	
	No. VIAJES	CANT .M3	No. VIAJES	CANT.M3
7 junio al 25 de junio	0	0	0	0
26 junio al 25 julio	90	958	12	180
26 julio al 25 agosto	25	371,25	19	284,5
26 agosto al 25 septiembre	14	206,41	22	330
26 septiembre al 25 octubre	26	389,5	3	45
26 octubre al 25 noviembre	9	135	0	0
26 noviembre al 25 diciembre	17	255	0	0
26 diciembre al 25 enero	13	195	0	0
26 enero al 25 de febrero	94	1082	18	270
26 de febrero al 25 de marzo	59	684	0	0
marzo 59 26 de marzo al 25 de abril	284	290	0 0	0

En este mes se hace disposición en la escombrera del señor Orlando Edmundo Revelo, de cual se anexa la documentación pertinente.

Dando cumplimiento a los lineamientos de la resolución 472 de 2017, el consorcio radicara ente la CRC el programa de manejo ambiental de RCD.

21. USO EFICIENTE DE AGUA

Se anexa lecturas del mes, que se han tomado conjuntamente con interventoría:

CONSUMO DE AGUA						
ITEM	FECHA LECTURA	No. INTERNO	MARCA	No. CONTADOR	LECTURA M3	CONSUMO MENSUAL (M3)
1	03/04/2019	# 1	COLTAVIRA S.A.	2942770	0809,9	82,80

$$\frac{\text{Consumo de agua actual – consumo mes anterior}}{\text{Consumo de agua mes}} \times 100 = (165{,}6 - 82{,}80/165{,}6) * 100 = 50\%$$

El consumo de agua por parte del proyecto es de 50%

Se evidencia que no se ha hecho una educación respecto al consumo de agua en el mes.

$$\frac{\text{No. de eliminación de fugas}}{\text{No. de fugas halladas}} * 100 = 3/3 * 100 = 100\%$$

Se presenta daño en manguera ubicada en zona de obra, el cual es reparado de inmediato

22. MANEJO DE FAUNA

$$\frac{\text{No. de Nidos reubicados}}{\text{No. de nidos hallados}} * 100$$

$$\frac{\text{No. de especies entregadas a la CRC o PCA}}{\text{No. de avistamiento de especies en obra sin manejo}} * 100$$

Para el presente periodo no se realizó tala de árboles, por tanto, tampoco identificación de posibles aves.

Para el siguiente periodo el contratista radico en la Corporación Regional del Cauca, documentos relacionados para el trámite del aprovechamiento forestal. Fecha de radicación 02 de Abril del presente. Ver ANEXO . Documentos radicados).

23. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL EN OBRA COMPONENTE AMBIENTAL

Se realiza charla por grupos guiados al componente ambiental correspondiente al tema de manejo de residuos generados en obra.

$$\frac{\text{No. de charlas realizadas}}{\text{No. charlas programadas}} * 100 = (2/2) * 100 = 100\%$$

$$\frac{\text{No. de asistentes a las charlas de un promedio}}{\text{No. de asistentes a obra}} *100 = (18/18) *100= 100\%$$

Ver anexo .Capacitación componente ambiental

24. TRABAJO EN ALTURAS

*Se realiza trabajo en alturas, para ello se da cumplimiento a:
*Uso adecuado de ESTINGA y ARNES por cada trabajador que realiza dicha actividad.
*Hojas de vida de ARNES y ESLINGA usados y firmados por el trabajador.
*Permiso en alturas y con las respectivas firmas de los trabajadores antes de realizar las actividades.
*Uso de escaleras, las cuales cuentan con las condiciones y materiales necesarios para labor a desempeñar.
*Uso de andamios certificados para la labor, armado de forma completa, las actividades realizadas permiten asegurar el andamio a la estructura.
* Se cuenta con uso de líneas de vida horizontal para los trabajos en altura.
* Se usan ganchos como puntos de anclaje resistentes a la actividad.
*Los trabajadores usan sus epp apropiados para cada actividad a realizar.
*Realización de curso en alturas avanzado y reentrenamiento de personal obra, en SENA Cauca.
*Personal de obra realizo curso de alturas en SENA Popayán Cauca.

25. OTROS

- Planilla por pago de Seguridad Social.
- Radicación de documentación a CRC, para trámite de aprovechamiento forestal.
- Documentos de maquinaria mini excavadora.

26. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJOS

La interventoría le solicita al contratista a través del residente SSTMA, el procedimiento y formatos mensuales utilizados para el control de accidentes e incidentes de trabajo, con el fin de verificar el cumplimiento que determina la Resolución 1401 del 2007 la cual tiene como objeto establecer obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, con el fin de identificar las causas, hechos y situaciones que los han generado, e implementar las medidas correctivas encaminadas a eliminar o minimizar condiciones de riesgo y evitar su recurrencia. Y al decreto 1072 DE 2015 donde se establece como componente la investigación de accidentes e incidentes, no conformidad y acciones correctivas y preventivas. **Se verificaron los formatos del informe de investigación de accidentes e incidentes de trabajos y se evidencia el cumpliendo con lo establecido en la resolución 156 de 2005.**

Para este periodo no se presentó Accidente de Trabajo.

27. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se cumplió con la entrega y uso de elementos de protección personal, en lo referente a casco, gafas, guantes de vaqueta, caucho, tapabocas, botas de seguridad y de caucho con puntera y uniforme.

- Se verifica que el personal utilice los EPP para TS.A. de forma adecuada, tales como Arnés, Eslinga, Cascos, andamios certificados.
- Se Cumple con las inspecciones planeadas de acuerdo al cronograma de Inspecciones.
- Se da Cumplimiento al Cronograma de Capacitación Mensual y de Charlas Semanales.
- Durante el periodo se presentaron dos incapacidades por enfermedad común.
- Durante el periodo se presento una incapacidad por licencia de paternidad, Ley María.
- En este periodo no se presentaron accidentes de trabajo.
- Se realiza disposición final de 290 M3 de tierra de excavación generada en obra, en escombrera Rebelo autorizada por la autoridad ambiental competente.

- Se realiza disposición final de 20 Kg de residuos peligrosos generados en obra tales como, guantes, tapabocas, botas, tapabocas, residuos de plástico contaminado en obra, polisombra contaminada, los cuales fueron recibidos por la empresa ASERHI.

- Se realizo entrega de 250 Kg de residuos reciclables generados en obra, a empresa AREMARPO autorizada por autoridad competente Popayán Cauca.

- Se realiza recolección de 280 desperdicios de alambre generados en obra, los cuales se vendieron a la empresa AREMARPO.

- Consorcio BCS- Gutiérrez Cumple con la correcta disposición de residuos generados en obra a través de los gestores autorizados.

- Diariamente se realiza jornada de aseo al finalizar las actividades en obra.

- Se realiza aseo a baños cada ocho días, baños permanecen limpios, lavado de llantas para que permanezca la vía limpia.

- Se realiza la respectiva señalización y cerramiento de la áreas intervenidas.

- Se da cumplimiento a inspecciones de vehículo/maquinaria, botiquín, extintor, uso de epp, orden y aseo, equipos y herramientas, permiso de trabajo para actividades en alturas diariamente.

- Se da cumplimiento a lo establecido en procedimiento de vehículos con la verificación documental de SOAT, Revisión técnico mecánica, Licencia de conducción, inspecciones al vehículo y mejora de los mismos

28. Se realizan los siguientes requerimientos en Seguridad y Salud en el trabajo al contratista:

- ✓ Seguir Manteniendo las áreas de circulación y rutas de evacuación limpias y despejadas.

- ✓ Completar las hojas de vida pendientes, de los subcontratistas:

DANEL RODRIGUEZ: 4 H.V
METAL-B: 2.H.V=
DATALEC INGENIEROS: 2 H.V
JHON JAIRO PINEDA: 1 H.V
GRABRIEL PASTOR AGUILAR: 17 HV

29. LISTA DE ANEXOS ENVIADOS POR EL CONTRATISTAS

ANEXO 1. Capacitaciones
ANEXO 2. Charlas
ANEXO 3. Documentos Radicados CRC Aprovechamiento Arboles
ANEXO 4. Documentos Vehículos y Equipos.
ANEXO 5. Exámenes de ingreso
ANEXO 6. Inducciones
ANEXO 7. Inspecciones
ANEXO 8. Permisos de Alturas
ANEXO 9. Planilla Pago de Seguridad Social
ANEXO 10. Certificados Escombrera

Se anexa informe mensual del contratista, con los soporte de indicadores mensuales, de SST y MA. Establecidos hasta el momento.

ELABORÓ:


ROSA DEL MAR RODRIGUEZ G.
RESIDENTE SISOMA
INTERVENTORÍA DAIMCO S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO # 1 Verificación de uso de EPP



EPP TSA

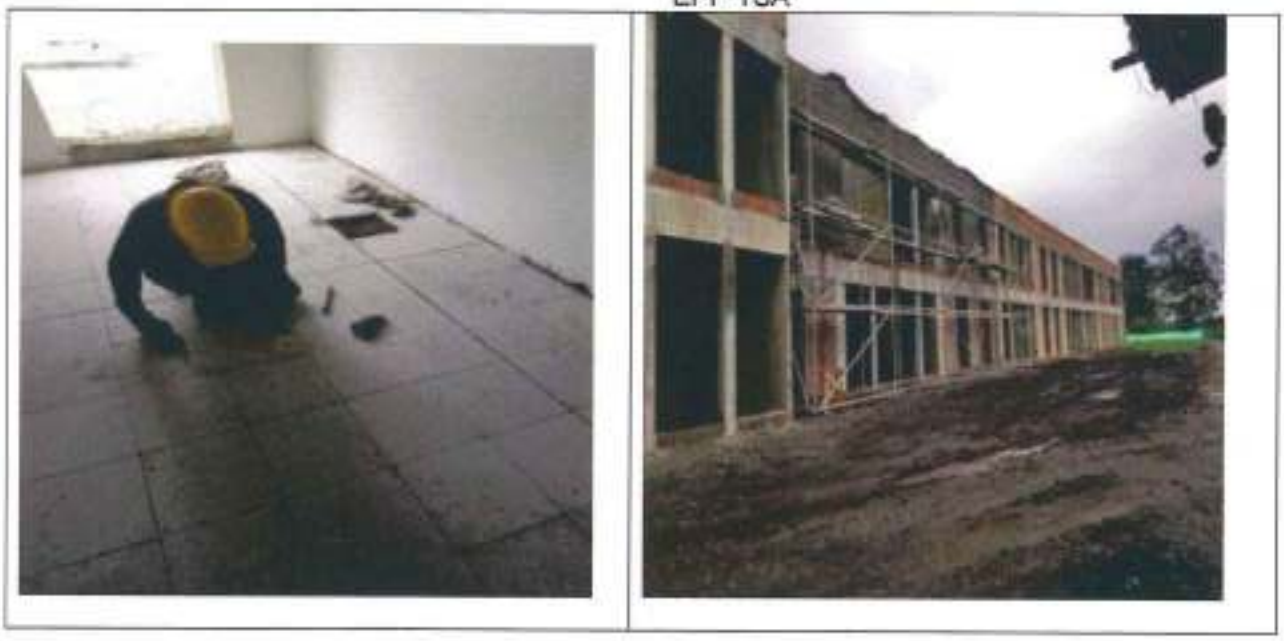

REGISTRO FOTOGRAFICO # 2 Verificación de Áreas de Trabajo, Orden y Aseo

Recolección de Puntillas



Orden y Aseo de Areas













REGISTRO FOTOGRAFICO # 3 ACOPIO DE MATERIAL RECICLABE

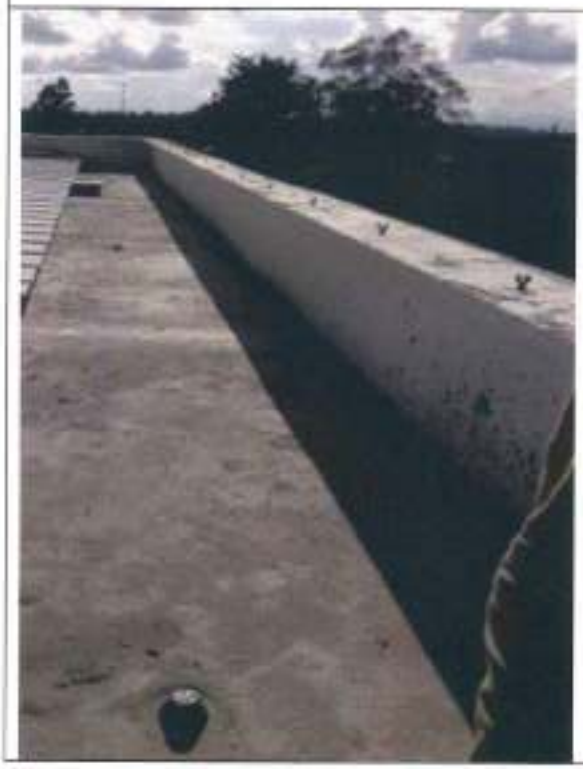



REGISTRO FOTOGRAFICO # 4 Verificación de Cumplimiento de Procedimientos de Seguridad



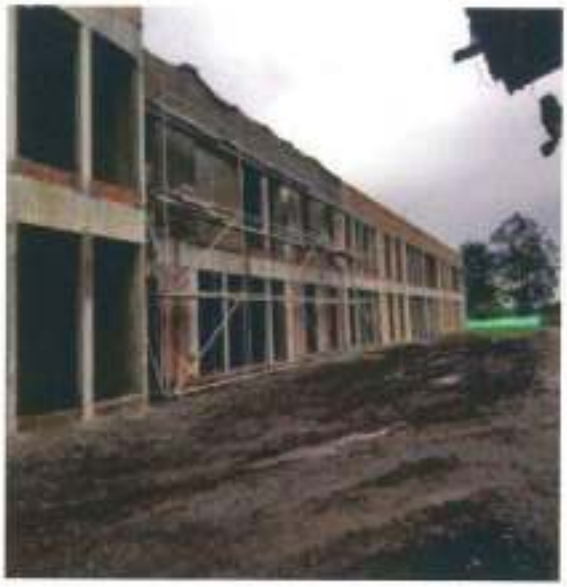

REGISTRO FOTOGRAFICO # 5 Delimitaciones de áreas de trabajo





REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATISTA
CONSORCIO BCS GUTIÉRREZ

	
Foto 1. Charla en accidente en construcciones	Foto 2. Charla en higiene industrial
	
Foto 3. Charla en resbalos, tropezones y caídas	Foto 4. Charla en protección con la piel
	
Foto 5. Capacitación en uso adecuado de EPP	Foto 6. Capacitación inspección peldaños de Volquetas

	
Foto 7. Capacitación hábitos de vida saludable	Foto 8. Capacitación consumo sustancias Psicoactivas
	
Foto 9. Campaña uso bicicleta	Foto 10. Capacitación reunión con el COPASST
	
Foto 11. Jornada de Orden y Aseo	Foto 12. Reinstalación de campamento subcontratista en obra



Foto 13. Limpieza vía



Foto 14. Limpieza de baños



Foto 15. Usando equipos de seguridad



Foto 16. Avisos colocados en obra



Foto 17. Señalización en obra



Foto 18. Equipo de primeros auxilios en obra

	
Foto 19. Uso de escalera	Foto 20. cerramiento en polisombra
	
Foto 21. Recolección de residuos peligrosos	Foto 22. Recolección de residuos reciclables
	
Foto 23. Residuos de desperdicios de alambre generados en obra	Foto 24. Areas despejadas

Anexo No. 9 control de Equipos y Ensayos.

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

EQUIPO DEL CONTRATISTA INT-41:01

PROYECTO: CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

EQUIPO		(A)	(B)	(C) CLASE DE ACTIVIDAD EN CADA DIA																												
TIPO	MARCA -CAPACIDAD			LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES
		ORIGEN	ESTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	MINICARGADOR NEW HOLLAND	P	B	C1.	C1.	C1.	C.1.5	C.1.5	C1.		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5					C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5
2	VOLQUETA DAEWOO- SZP20	P	B	C1.	C1.	C1.	C1.	C.1.5	C1.		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C1.	C1.		C.1.5	C.1.5	C.1.5					C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C1.		C.1.5	C.1.5
3	VOLQUETA DAEWOO- SZP20	P	B	C1.	C1.	C1.	C.1.5	C.1.5	C1.		C1.	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5					C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5
4	VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO - CA-15 DYNAPAC	A	B	C.1.5	C.1.5	C1.	C.1.5	C.1.5	C1.		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5			C.1.5	C.1.5	C.1.5					C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5			C.1.5	C.1.5
6	RETROEXCAVADORA KOMATSU	A	B	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5			C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5					C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5
7	RETROEXCAVADORA CASE 580N	A	B	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5			C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5					C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5
8	MINI EXCAVADORA BOBCAT	A	B																C.1.5	C.1.5	C.1.5												
	VOLQUETA SUBCONTRATISTA EDMUNDO REVELO Conductor: Nelson Olmedo Montilla CI2040	A	B																										C.1.5				
	VOLQUETA SUBCONTRATISTA EDMUNDO REVELO Conductor: Javier Oswaldo Bolaños Placa: OYJ-223 8 Mts3	A	B																										C.1.5				
9	VOLQUETA SUBCONTRATISTA EDMUNDO REVELO Conductor:Aurelio Oswaldo Bolaños Placa: GUE-408 8 Mts3	A	B																		F.S.								C.1.5				

(A) ORIGEN
P- Propio
A- Alquilado
S- Sub-contratado

(B) ESTADO
B-Bueno
R-Regular
M-Malo

(C) CLASE DE ACTIVIDAD
1. Movilización y Desmovilización
2. Localización, Replanteo y Control Topográfico
3. Demolición General
4. Excavaciones
5. Relleno Material Seleccionado
6. Hincado de Pilotes
7. Concreto PSI
8. Acero de Refuerzo
9. Protección con Bolsacretos
10. Colchacretos

F.S. Fuera de Servicio
R. Reparación
D. Disponible

OBSERVACIONES

ING. RESIDENTE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA - TIRSO COSME
Elaboró: SANDRA GUAUÑA	Aprobó

Fecha de Aprobación de Formato INT-41:00: 26 de Abril de 2013

Ensayos

Citec Ltda.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
Popayán - Cauca

REGISTRO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	Código:	CT-RCC-0521
	Versión:	1
	Página:	1 de 1
NORMA REFERENCIA: INV. E-401, E-402, E-403, E-404, E-410, E-412 NTC 673	Fecha Formato:	12-ene-2010

FECHA INFORME: 26-feb-19

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN.

SECTOR: COMANDO REGIÓN N°4 POLICÍA NACIONAL CAUCA. POPAYÁN.

INTERVENTOR: DAIMCO

CONSTRUCTOR: CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

SOLICITÓ: DAIMCO

FECHA ENTRADA: 11-ene-19

ODS: 894

RESISTENCIA DE DISEÑO: 3000 PSI

ESTRUCTURA: VARIAS

Ref. N°	Fecha Toma	Fecha Rotura	Edad días	Perímetro cm	Carga	Resistencia				Tipo Falla	% CUMPLIMIENTO RESISTENCIA	DETALLE OBRA
					Lb	MV	kg/cm²	MPa	PSI			
1	17-dic	14-ene	28	48.4	58077	228.2	125	12.2	1773	1	59%	SOLADO TANQUE
2	17-dic	14-ene	28	48.3	61971	243.5	134	13.1	1899	1	63%	
3	17-dic	11-feb	56	48.4	76070	298.9	164	16.0	2322	1	77%	
4	18-dic	15-ene	28	48.4	140891	553.6	303	29.7	4300	2	143%	VIGA CUBIERTA PATRULLEROS
5	18-dic	15-ene	28	48.4	140306	551.3	302	29.5	4282	2	143%	
6	18-dic	12-feb	56	48.4	142724	560.8	307	30.0	4356	2	145%	
7	20-dic	17-ene	28	48.4	114958	451.7	247	24.2	3509	1	117%	COLUMNA 2do PISO 53
8	20-dic	17-ene	28	48.4	119564	469.8	257	25.2	3649	1	122%	
9	20-dic	14-feb	56	48.4	127553	501.2	274	26.9	3893	2	130%	
10	21-dic	18-ene	28	48.4	141095	554.4	303	29.7	4306	2	144%	VIGAS COLUMNA PATRULLEROS
11	21-dic	18-ene	28	48.4	141477	555.9	304	29.9	4318	2	144%	
12	21-dic	15-feb	56	48.4	141833	557.3	305	29.9	4329	2	144%	
13	22-dic	19-ene	28	48.3	140688	552.8	304	29.7	4312	2	144%	COLUMNAS SUB OFICIALES
14	22-dic	19-ene	28	48.4	140077	550.4	301	29.5	4275	2	143%	
15	22-dic	16-feb	56	48.4	141706	556.8	305	29.8	4325	2	144%	
16	28-dic	25-ene	28	48.3	100069	393.2	216	21.2	3067	1	102%	PLACAS CONTRAPISO COLUMNAS SUB OFICIALES
17	28-dic	25-ene	28	48.4	103073	405.0	222	21.7	3146	1	105%	
18	28-dic	22-feb	56	48.4	110557	434.8	238	23.3	3377	1	113%	

OBSERVACIONES: MUESTRAS INGRESADAS AL LABORATORIO POR EL INTERESADO

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°: F-337 EXPEDIDO POR: SIMM METROLOGIA S.A.S

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21-ene-19 VIGENCIA: 21-ene-21

LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO APLICAN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA INGRESADA Y PROCESADA EN LABORATORIO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACION DEL INGENIERO DE CALIDAD DE CITEC Ltda.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Dept. Luis Carlos Ponce	Ing. Hugo Daza Delgado	

Citec Ltda.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
Popayán - Cauca

REGISTRO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	Código:	CT-RCC-0551
	Versión:	1
	Páginas:	1 de 1
NORMA REFERENCIA: INV. E-401, E-402, E-403, E-404, E-410, E-412 NTC 673	Fecha Formato:	12-ene-2010

FECHA INFORME: 18-feb-19
OBRA: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN
SECTOR: COMANDO REGIÓN N°4 POLICIA NACIONAL CAUCA, POPAYÁN
INTERVENTOR: DAIMCO
CONSTRUCTOR: CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
SOLICITÓ: DAIMCO
FECHA ENTRADA: 21-ene-19
OCS: 911

RESISTENCIA DE DISEÑO: 3000 PSI
ESTRUCTURA: VARIAS

Ref. N°	Fecha Toma	Fecha Rotura	Edad días	Perímetro cm	Carga	Resistencia				Tipo Falla	% CUMPLIMIENTO RESISTENCIA	DETALLE OBRA
					Lb	kN	kg/cm²	MPa	PSI			
1	17-ene	21-ene	4	46.2	80732	359.3	203	19.9	2885	1	96%	CONCRETO ACELERADO
2	17-ene	14-feb	28	46.4	119546	465.8	255	25.0	3618	1	121%	
3	17-ene	14-feb	28	46.3	120124	472.0	259	25.4	3681	1	123%	

OBSERVACIONES: MUESTRAS INGRESADAS AL LABORATORIO POR EL INTERESADO

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: F - 337 EXPEDIDO POR: SIMM METROLOGIA S.A.S
FECHA DE EXPEDICIÓN: 21-ene-19 VIGENCIA: 21-ene-21

LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO APLICAN UNICAMENTE A LA MUESTRA INGRESADA Y PROCESADA EN LABORATORIO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DE CALIDAD DE CITEC Ltda

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Geptsias Carlos Ponce	Ing. Hugo Daza Delgado	

vias95@hotmail.com www.citec.com.co Telefono: 8366256 Cel:310 8393670 - 301 3368684

Citec Ltda.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
Popayán - Cauca

REGISTRO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	Codigo:	CT-RCC-001
	Versión:	1
	Página:	1 de 1
NORMA DE REFERENCIA: INV. E-401, E-402, E-403, E-404, E-410, E-412 NTC 673	Fecha Formato:	12-ene-2016

FECHA INFORME: 01-mar-19

OBRA: CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN.

SECTOR: COMANDO REGIÓN N°4 POLICIA NACIONAL CAUCA, POPAYÁN.

INTERVENTOR: DAIMCO

CONSTRUCTOR: CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

SOLICITÓ: DAIMCO

FECHA ENTRADA: 05-feb-19 ODS: 939

RESISTENCIA DE DISEÑO: 3000 Psi

ESTRUCTURA: VARIAS

Ref. N°	Fecha Toma	Fecha Rotura	Edad días	Perímetro cm	Carga Resistencia Lb	kN	kg/cm²	MPa	PSI	Tipo Falla	% CUMPLIMIENTO RESISTENCIA	*Proyección a 28d	DETALLE OBRA
83	28-ene	04-feb	7	46.3	135496	602.4	292	28.6	4153	1	104%		TANQUE DE ALMACENAMIENTO
84	28-ene	25-feb	28	46.4	141853	557.3	305	29.9	4329	1	108%		
85	28-ene	25-feb	28	46.7	140713	552.9	299	29.3	4242	1	106%		
86	31-ene	05-feb	5	46.3	46497	182.7	100	9.8	1425	1	48%		COLUMNETAS PATRULLEROS 1er PISO
87	31-ene	28-feb	28	46.4	62327	244.9	134	13.1	1902	1	63%		
88	31-ene	05-feb	5	46.4	33823	132.9	73	7.1	1032	1	34%		COLUMNETAS OFICIALES 1er PISO
89	31-ene	07-feb	7	46.3	40358	157.4	85	8.3	1228	1	41%	1754	
90	02-feb	09-feb	7	46.2	95841	375.8	207	20.3	2943	1	74%	4205	TAPA TANQUE ALMACENAMIENTO
91	02-feb	02-mar	28								0%		
92	02-feb	02-mar	28								0%		

OBSERVACIONES: MUESTRAS INGRESADAS AL LABORATORIO POR EL INTERESADO

*Proyección aproximada solicitada por el cliente

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: F-337 EXPEDIDO POR: SIMM METROLOGIA S.A.S

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21-ene-19 VIGENCIA: 21-ene-21

LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO APLICAN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA INGRESADA Y PROCESADA EN LABORATORIO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DE CALIDAD DE CITEC Ltda.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Gebt. Luis Carlos Ponce	Ing. Hugo Daza Delgado	

vlas95@hotmail.com www.citec.com.co Telefono: 8366256 Cel:310 8393670 - 301 3368684

ORLANDO EDMUNDO REVELO INGENIERO CIVIL
CONTRATISTA NIT. 12.976.085 -8

CALLE 18 N No 16-15 TEL: 8366180 Popayán

Popayán, abril 27 de 2019

Señores
CONSORCIO BCS - GUTIERREZ
La ciudad.

REF. CERTIFICACION SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RCD "LA LAJITA"

Yo, **ORLANDO EDMUNDO REVELO**, identificado con cedula de ciudadanía No 12.976.085 de Pasto (N), en mi calidad de propietario del sitio de disposición final de **RCD** denominado **"La lajita"** ubicada a dos kilómetros de Popayán en la vía al Tambo, CERTIFICO que estuvo a disposición de **CONSORCIO BCS-GUTIERREZ** identificado con nit. **901.177.394-5.** para recibir escombros y materiales sobrantes de la obra cuyo objeto es: **CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN NRO 4.**

FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	CANTIDAD DEPOSITADA EN M3
24/03/2019	24/04/2019	290

Para constancia se expide a los (27) días del mes de abril de 2019

ORLANDO EDMUNDO REVELO
C.C. No. 12.976.085

Anexo No. 10 Registro Fotográfico

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:11

POLICIA NACIONAL

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CÓDIGO: **PROYECTO:** 06-6-10044-18
Donde POPAYAN - CAUCA
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES: abr-19

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Foto No. 1 Fecha: 01-04-2019

DETALLE DE AGUAS SUBTERRANEAS EN AREA DE GIMNASIO



Foto No.2 Fecha: 01-04-2019

DETALLE DE PRUEBA HIDRAULICA



Foto No. 3 Fecha: 02-04-2019

DETALLE DE INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA CON SU CINTA DE IDENTIFICACION



Foto No. 4 Fecha: 03-04-2019

DETALLE GENERAL DE CASINO, SIN INTERVENCION CIVIL



Foto No.5 Fecha: 03-04-2019

DETALLE DE PUNTOS SANITARIOS E HIDRAULICOS - AREA DE LAVANDERIA



Foto No.6 Fecha: 03-04-2019

DETALLE DE REPELLOS - BAÑO PATRULLEROS



Foto No.7 Fecha: 04-04-2019

DETALLE DE ALISTADO IMPERMEABILIZADO - BLOQUE PATRULLEROS. PRIMER PISO

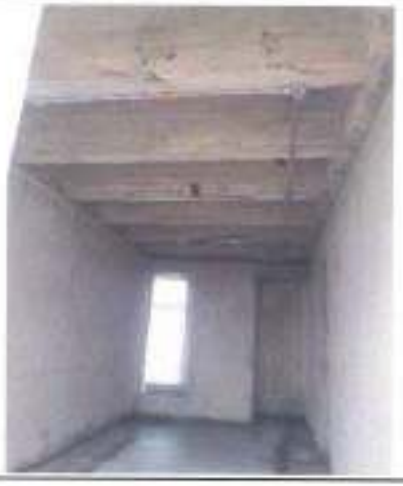


Foto No.8 Fecha: 04-04-2019

DETALLE DE INSTALACION DE TUBERIA EMT - BLOQUE DE PATRULLEROS



Foto No.9 Fecha: 05-04-2019

DETALLE DE ALISTADO DE PISO EN BLOQUE DE CASINO - SEGUNDO PISO



Foto No.11 Fecha: 05-04-2019

DETALLE GENERAL DE REPELLOS FACHADA - BLOQUE PATRULLEROS



Foto No.10 Fecha: 05-04-2019

DEATLLE DE INSTALACION DE TUBERIA DE RED CONTRAINCENDIO



Foto No.12 Fecha: 05-04-2019

DETALLE GENERAL DE REPELLOS FACHADA - BLOQUE PATRULLEROS



Foto No.13 Fecha: 05-04-2019

DETALLE GENERAL - AREA DE TANQUE RED CONTRAINCENDIO



Foto No.14 Fecha: 09-04-2019

DETALLE DE PUESTA A TIERRA



Foto No.15 Fecha: 09-04-2019

DETALLE GENERAL DE OBRA



Foto No.16 Fecha: 09-04-2019

DETALLE GENERAL BLOQUE PATRULLEROS



Foto No.17 Fecha: 08-04-2019

DETALLE DE AGUA SUBTERRANEA - AREA DE GIMNASIO



Foto No.18 Fecha: 08-04-2019

DETALLE GENERAL AREA DE GIMNASIO



Foto No.19 Fecha: 08-04-2019

DETALLE DE FUNDICION DE ANDENES



Foto No.20 Fecha: 08-04-2019

DETALLE DE RELLENOS - AREAS PERIMETRALES AL BLOQUE DE PATRULLEROS

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:11

POLICIA NACIONAL

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CÓDIGO: **PROYECTO:** 06-6-10044-18
Donde POPAYAN - CAUCA
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES: abr-19

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Foto No.21 Fecha: 09-04-2019

DETALLE DE ENCHAPE DE BAÑO - BLOQUE DE OFICIALES



Foto No.22 Fecha: 09-04-2019

DETALLE DE ARMADO DE HIERRO PARA REMARCOS DE VENTANA - BLOQUE DE OFICIALES



Foto No.23 Fecha: 09-04-2019

DETALLE DE ESTUCO - BLOQUE DE OFICIALES SEGUNDO PISO



Foto No.24 Fecha: 11-04-2019

DETALLE DE AREA DE MAQUINAS TANQUE DE RED CONTRAINCENDIO INUNDADA

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:11

POLICIA NACIONAL

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CÓDIGO: **PROYECTO:** 06-6-10044-18
Donde POPAYAN - CAUCA
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES: abr-19

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Foto No.25 Fecha: 11-04-2019

DETALLE DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO TANQUE RED CONTRAINCENDIO



Foto No.26 Fecha: 11-04-2019

DETALLE GENERAL CUBIERTA BLOQUE DE PATRULLEROS



Foto No.27 Fecha: 12-04-2019

DETALLE GENERAL DE OBRA, BLOQUE PATRULLEROS



Foto No.28 Fecha: 12-04-2019

DETALLE DE PISO EN BALDOSA DE GRANITO - BLOQUE DE OFICIALES PRIMER PISO

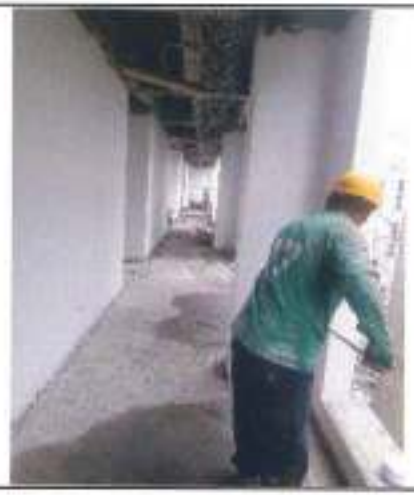


Foto No.29 Fecha: 15-04-2019

DETALLE DE ESTUCO -BLOQUE DE OFICIALES PASILLO SEGUNDO PISO



Foto No.30 Fecha: 15-04-2019

DETALLE DE CABLE 12 AWG PARA SALIDAS DE ILUMINACION



Foto No.31 Fecha: 16-04-2019

DETALLE DE INSTALACION DE BLADOSA EN GRANITO PRIMER PISO BLOQUE CASINO



Foto No.32 Fecha: 17-04-2019

DETALLE DE INSTALACION TUBERIA PVC 6" RED CONTRAINCEDIO EN AREA DE TANQUE RCI



Foto No.33 Fecha: 17-04-2019

DETALLE CODO 90 EN INSTALACION RED CONTRAINCENDIO



Foto No.39 Fecha: 22-04-2019

DETALLE GENERAL DE OBRA



Foto No.35 Fecha: 23-04-2019

DETALLE DE CERAMICA BAÑOS DE PATRULLEROS SEGUNDO PISO



Foto No.36 Fecha: 23-04-2019

DETALLE DE CUBIERTA BLOQUE DE PATRULLEROS

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:11

POLICIA NACIONAL

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CÓDIGO: **PROYECTO:** 06-6-10044-18
Donde POPAYAN - CAUCA
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES: abr-19

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Foto No.29 Fecha: 23-04-2019

DETALLE GENERAL DE OBRA



Foto No.30 Fecha: 23-04-2019

DETALLE GENERAL DE AREA DE GIMNASIO



Foto No.31 Fecha: 23-04-2019

DETALLE DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS



Foto No.32 Fecha: 24-04-2019

DETALLE DE ACOMETIDA PRINCIPAL DE CUARTO ELECTRICO GENERAL UBICADO EN BLOQUE No. 6 FASE 1 A SUBESTACION DE LA FASE 4



Foto No.33 Fecha: 25-04-2019

DETALLE DE AGUAS SUBTERRANEAS A 3,20 MTS DESDE LA SUPERFICIE DE VIA



Foto No.34 Fecha: 25-04-2019

DETALLE DE DESTRONCADO DE PISOS - BLOQUE DE OFICIALES PRIMER PISO



Foto No.35 Fecha: 25-04-2019

INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN GRANITO - BLOQUE DE OFICIALES PRIMER PISO



Foto No.36 Fecha: 25-04-2019

INSTALACION DE PISO EN CERAMICA DE GRANITO - BLOQUE DE CASINO SEGUNDO PISO

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:11

POLICIA NACIONAL

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CÓDIGO: **PROYECTO:** 06-6-10044-18
Donde POPAYAN - CAUCA
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES: abr-19

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Foto No.32 Fecha: 26-04-2019

DETALLE DE CUBIERTA - BLOQUE DE OFICIALES



Foto No.34 Fecha: 26-04-2019

DETALLE DE CUBIERTA - BLOQUE DE PATRULLEROS



Foto No.35 Fecha: 26-04-2019

DETALLE GENERAL DE OBRA



Foto No.36 Fecha: 26-04-2019

DETALLE GENERAL DE OBRA

Anexo No. 11 Control de Clima

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

CONTROL ATMOSFÉRICO INT-39:00

PROYECTO: CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL	CONTRATISTA: CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

CONSOLIDADO DEL PERIODO

MES	abr-19																														
ESTADO DEL TIEMPO	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	TOTALES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
DIA SOLEADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,7	1	0,7	1	1	1	1	0,8	0,9	0,9	0,8	1	1	1	1	1	28,67
DIA NUBLADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
LLUVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0	0,3	0	0	0	0	0,2	0,1	0,1	0,2	0	0	0	0	0	1,33
TOTAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30,00
ESTADO DEL SUELO	S																														

Nota: Estado del Suelo Seco (S), Saturado (ST), Inundado (I)

OBSERVACIONES

ING. RESIDENTE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA - TIRSO COSME
Elaboró SANDRA GUAUÑA	Aprobó

NOTAS

(1) INFORMACION RELACIONADA EN EL INFORME DIARIO DE INSPECCION **INT-8:00**

(2) CONTINÚE AL RESPALDO SI REQUIERE DE MAYOR ESPACIO

Anexo No. 12 Bitácora de Obra

SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE ESTUCOS Y BALDOSA EN BLOQUE #3.






- DOMINGO 31 MARZO /2019 → SE LABORA EN PAÑETES Y ESTUCO.
- Lunes 01 de Abril /19
- Personal en Obra:
- Personal Administrativo BCS Gutierrez
- Mayor Angel Lopez Ostos Supervisor por parte DIRAF
- Personal Operativo BCS Gutierrez (1 Operador minicargador, 2 conductores Volqueta, 1 Operador Vibrocompactador, 1 Operador Retroexcavadora, 1 Auxiliar bodega, 3 Ayudantes Generales Oficina, 6 trabajadores Bruno, 16 Shonjairo, 10 trabajadores Daniel, 2 Hidraulicos, 11 trabajadores Carlos) 16
- Datalec Ing Elec: 3 personas instalaciones Elec
- Gabriel Aguilar: 6 personas Acabados
- Personal Administrativo Interventoria DAIMCO SAS
- Clima: Mañana Soleado Tarde
- Equipos: Volquetas, Minicargador, Retroexcavadora, Vibrocompactador.
- Elementos de Seguridad Industrial: Casco, Botas, Guantes, tapaoreas, tapaoidos, Gafas, Uniforme, Chaleco
- Actividades ejecutadas:
- Relleno y retiro arenas perimetrales bloque 1 y 3.
- Excavaciones para instalación tuberias
- Rellenos alrededor RCI

- Alfagias Blogue 3 Oficinales
- Repellos 1er y 2do Piso Patrulleros
- Remate de mampostería, Vigas y Columnetas Confinamiento en 1er y 2do Piso blogue 1 Patrulleros
- Repellos fachadas Blogue 1 Patrulleros.
- Estuco y Pintura blogue 3 Oficinales 1er Piso.
- Instalacion estructura para cielo raso en Panel blogue 3 Oficinales.
- Instalacion Piso en Grano Alta 1er Piso blogue 3 Oficinales.
- Instalaciones electricas blogue 1 y 3.

- Observaciones:
- Revisar con el Contratista de Piso los niveles y dilatacion de la baldosa.
- Se ~~cambiaron~~ revisan detalles en enchape e muros baños 1er Piso blogue 3 para realizar cambios de algunas fichas

Interventoria

→ EL CONTRATISTA REPORTA QUE EL PARO Y BLOQUEO DE LAS VIAS PERSISTE Y PERJUDICA EL NORMAL AVANCE DE OBRA.

Afros se suman a la Minga Indígena y anuncian bloqueos del corredor humanitario

1 abril 2019 /

Por:

Se parte de nuestra comunidad, recibe y anvianos las noticias más importantes del día en tu celular via WhatsApp



La Asociación De Consejos Comunitarios del Norte Del Cauca (ACONC), La Asociación de Consejos Comunitarios de Suárez y el Proceso Nacional de Comunidades Negras en Colombia (PCN), Como Organizaciones que luchan por la reivindicación de los derechos del pueblo afrodescendiente, reiteramos nuestro reconocimiento y apoyamos a la Minga como una expresión válida del reclamo de nuestros pueblos al abandono histórico, a las profundas afectaciones del racismo estructural y el incumplimiento del Estado colombiano a sus obligaciones y a los acuerdos surgidos de los distintos diálogos y movilizaciones a las que como pueblos nos hemos visto obligados a realizar.

Ante un Gobierno que se niega a asumir plenamente los compromisos firmados con el pueblo afrodescendientes de esta región así como por los incumplimientos al acuerdo de paz, entre otros, la única posibilidad que tenemos como pueblos es fortalecer la unidad y la movilización como garantía de defensa de nuestros legítimos y fundamentales derechos a la vida con dignidad y a la paz.

Por lo anterior las comunidades del pueblo negro y afrodescendiente del norte del Cauca nos sumamos a la minga social por la defensa de la vida el territorio la democracia, la justicia y la paz.

→ SE REALIZAN LAS REVISIONES SOLICITADAS POR INTERVENTORIA EN INSTALACION BALDOSA Y ENCHAPE CON LA ARQUITECTA DE INTERVENTORIA Y SE REALIZAN LOS AJUSTES NECESARIOS.

→ EL CONTRATISTA REFIERE QUE EN LA ZONA DE GIMNASIO EN ACUERDO CON INTERVENTORIA FUE NECESARIO REALIZAR UNOS AJUSTES A UNOS PLANOS YA QUE SE OBSERVARON DIFERENCIAS COMO LA POSICION DEL EJE C-1a QUE EN EL PLANO ESTRUCTURAL ESTA DESPLAZADO HACIA LA IZQUIERDA 50CM. Y EL APOYO PARA EL MURO LATERAL ZONA DE BAÑOS QUE NO APARECE SOPORTADO SOBRE LA VIGA DE CIMENTACION, PARA ESTA ZONA SE ACORDO REUBICAR EN EL PLANO ESTRUCTURAL EN SU POSICION CONFORME AL ARQUITECTONICO, EL EJE DESPLAZADO, TAMBIEN DE ACUERDO UTILIZAR DETALLE QUE EXTIENDE LATERALMENTE LA VIGA DE CIMENTACION Y PERMITE UN APOYO A LA MAMPOSTERIA.

Martes 5 [illegible] 117


- Personal Obra
- Personal Administrativo BCS Gutierrez
- Visita Supervisor DIRAF Mayor Angel Lopez Ochoa
- Personal Operativo de BCS Gutierrez (1 operador Minicargador, 2 Conductores Volqueta, 1 Operador


Vibrocompactador, 1 Operador Retroexcavadora, 6 Trabajadores Bruno, 16 Trabajadores Juan Jairo Pineda, 14 trabajadores Daniel, 5 Hidraulicos, 12 trabajadores Carlos) &
• Datalec Ing. Elec: 3 Personas
• Gabriel Aguilar: 5 Personas Acabados
• Personal Administrativo Interventoria SAIMCO SAS
- Clima: Mañana
- Equipos: Volquetas, Minicargador, Retroexcavadora, Vibrocompactador.
- Elementos de Seguridad Industrial: Casco, Botas, Guantes, Gafas, Tapaoidos, Tapabocas, Uniforme
- Actividades en Obra:
• Rematando detalles de Mamposteria, Vigas, Columnas en primer y Segundo Piso bloque 1 Patrulleros,
• Repellos en 1er y 2do Piso bloque 1 Patrulleros
• ~~Resanes~~ Instalaciones electricas e Hidrosanitarias en bloque 1 Patrulleros
• Repello Fachadas en bloque 1 Patrulleros
• Limpieza 1er Piso bloque Patrulleros para realizar alistado de Piso en Pasillo y Habitaciones.
• Estuco 2do Piso bloque 3 Oficiales
• Pintura 1ra Mano 1er Piso bloque 3 Oficiales
• Estructurando 1er Piso bloque 3 Cielo raso y Panel y SuberBoard
• Fraguia en Piso en grano de Marmol 1er Piso Bloque 3 Oficiales
• Retiro y Nivelación Aceras Perimetrales Bloque 1 y 3
• Excavación area del Gimnasio
- Observaciones:
• En la visita del Supervisor Hayer Angel Lopez no realizo comite y en el Retroexcavadora

Consignadas varias observaciones con respecto al desarrollo de la Obra y compromisos adquiridos por ambas Partes (Obra e Interventoría)

- Con respecto a las determinaciones para Obra en el Comité se encuentra Ventana para ventilacion baños blaque 3 Bfrente y en Blaque uno baños patrulleras.

Medida 60 x 30

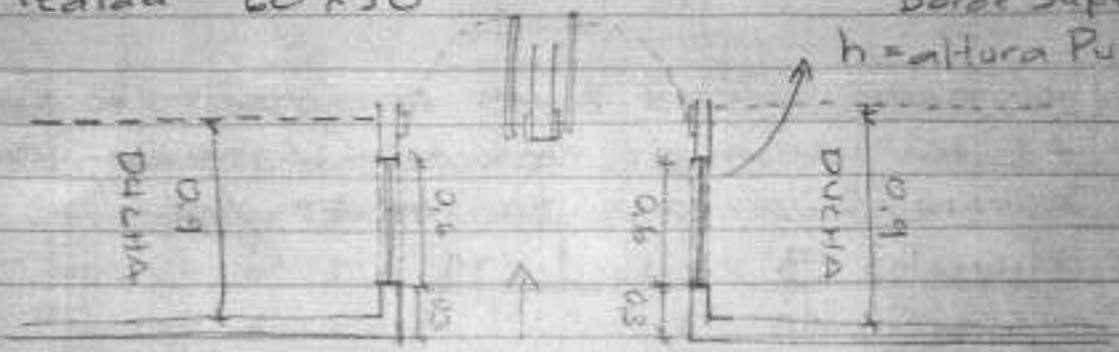

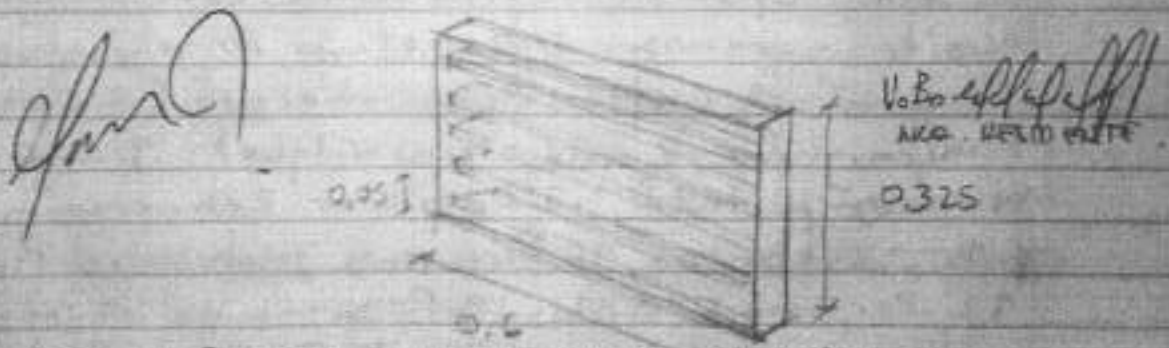

V.Bo
INGA. HELEN PATTE

DE ACUERDO REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA EJECUCION DE ALISTADO PISOS EN BLOQUE 1 3er PISO Y RELLENOS JUNTO REJ. SOBRE LAS REDES INSTALADAS.








SE TIENEN VISTAS ZONAS PERIMETRALES AL BLOQUE #3 CON MALLA ELECTROSOLDADA INSTALADA, PARA FUNDIR ANDENES EL DIA VIERNES 4/Abril.

Miercoles 3 de Abril /19

- Personal en Obra
- Personal Oper. Administrativo BCS Gutierrez
- Visita supervisar DIRAF Mayor Angel Lopez Ortos
- Personal Operativo BCS Gutierrez (1 Operador Minicargador, 2 conductores Volqueta, 1 Operador Vibrocompactador, 1 Operador Retroexcavadora, 6 Personas Bodino, 16 Personas Jhon Jairo Pineda, 12 Personas Carlos) 3 Personas para Oficina apoyo, 1 Auxiliar Bodega, 4 Personas Daniel, S. Hida, Gabriel Aguilar. 5 Personas en Acabados
- Datalec Ing. Electrica: 3 Personas en las Electricas
- Personal Administrativo Interventoria DAMCO SAS
- Clima: Mañana: Soleado, Tarde:
- Equipos: Volquetas, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Minicargador
- Elementos de Seguridad Industrial: Casco, Botas, Guantes, Gafas, Tapaoidos, tapabocas, Uniforme, Chaleco.
- Actividades en Obra
- Fraguado piso en Grano de Alfa, Terraza Oficinas
- Instalacion estructura para cielo raso panel yeso y Superboard 1er Piso Oficinas

- Nivelacion terreno para alistar formaleta y el hierro para anclajes perimetrales bloque 3 Oficinales.
- Limpieza de sobrantes en losa de cimentacion y entrepiso bloque 1 Patrulleros para aplicacion mortero nivelación a alistado de Piso.
- Rectificando niveles para proceso de nivelacion con comision de topografia.
- Instalaciones relacionadas con apantallamiento.
- Rematando Instalaciones Hidrosanitarias.
- Excavacion area Gimnasio.

- Observaciones:
- Proceso en Obra lento por la falta de materiales a raiz del bloqueo en la vía.
- Se le solicita al Contratista revisar los ejes de los desagües de Sanitarios en 1er Piso bloque 1.

Res Interventoría.

→ SE ADJUNTA POR PARTE DEL CONTRATISTA REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE EN LA COLOCACION DEL ALISTADO DE PISO EN BLOQUE 1







COMO SE OBSERVA EN EL RECORTE DE LAS NOTICIAS DE ABAJO LA SITUACION DEL BLOQUE PUEDE DEMORAR LA ENTREGA

Jueves 4 de Abril 2019

- Personal en Obra:
  - Personal Administrativo BCS Gutierrez
  - Personal Operativo BCS Gutierrez (1 Operador minicargador, 2 Conductores Volqueta, 3 Ayudantes Generales Obra, 1 Auxiliar Bodega, 5 Personas Bruno, 16 Trabajadores Jhon Jairo, 9 Trabajadores Daniel, 4 Hidraulicos, 12 trabajadores Carlos)
  - Datatec Ing. Electrica: 3 personas
  - Gabriel Aguilar: 4 Personas.
  - Personal Administrativo Interventoria DAIMCOA
- Clima: Mañana: Tarde:
- Equipos: Volquetas, Retroexcavadora, Vibrocompactador, Minicargador.
- Elementos (EPP): Casco, Botas, Guantes, Gafas, tapaoidos, tapatocas, Uniforme, Chaleco.
- Actividades en Obra
  - Mortero de nivelacion o Afinado de Piso en Bloque 1 primer y segundo Piso y Cocina 1er y 2do Piso
  - Estuco en 2do Piso bloque 3 Oficinas
  - Guardaescoba en 1er Piso bloque 3
  - Enchapes baños 1er Piso bloque 3
  - Nivelacion y alistado de rellenos para andenes Perimetrales bloque 3
  - Apuntalamientos bloque 1 y 3

EL CONTRATISTA ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS






ALISTADOS DE DIOS REALIZADO HOY EN BLOQUEO
LAS ACTIVIDADES HAN REDUCIDO SU RITMO DEBIDO A
QUE POR EL BLOQUEO NO SE HAN PODIDO TRAER INSUMOS
Y EQUIPOS YA PAGOS Y ELABORADOS QUE SE
ENCUENTRAN ALMACENADOS EN OTRAS CIUDADES.

NACIÓN (/SECCION/NACION/3) | 4/5/2019 6:12:00 AM

Por tutela, juez ordena a los indígenas desbloquear vía alternas a la carretera panamericana

Una medida cautelar de un juez de Popayán obliga a las organizaciones indígenas del Cauca a permitir el paso en la vía Panamericana, pues el bloqueo afecta hace más de 25 días a Popayán, Piendamo, Morales, Suarez y Santander de Quilichao.



Los demandantes piden que se defienda el derecho fundamental a la libre circulación o movilidad. Foto: Tatiana Ramírez

PERSISTEN LOS BLOQUEOS Y POR LO TANTO LOS INCONVE-
NIENTES PARA EL INGRESO DE MATERIAS A LA ORGANIZACIÓN.

Viernes, 5 Abril 2019

- Personal en Obra:
- Personal Operativo BCS Gutierrez (1 Operador minicargador, 2 Conductores Volqueta, 1 Auxiliar Bodega, 3 Ayudantes Generales Administración, 6 Trabajadores Bruno, 16 trabajadores Jhon Jairo Pineda, 9 trabajadores Daniel, 4 Hidraulicos, 11 trabajadores Carlos)
- Datatec Ing. elec. 3 personas Inst. Electricas.
- Gabriel Aguilar 5 personas acabados.
- Personal Administrativo BCS Gutierrez.
- Personal Administrativo Interventoría DAIMCO SAS
- Clima: Mañana:
- Equipos: Volquetas, Minicargador, Retroexcavadora, Vibrocompactador.
- Elementos (EPP): Casco, Botas, Guantes, Gafas, Chaleco, tapaoidos, tapabocas, Uniforme.
- Actividades en Obra:
- Fundición anden fachada posterior bloque 3 Oficiales.
- Conformando perímetro de los bloques 1 y 3 para fundición Andenes.
- Rematando detalles de repello y mampostería en bloque 1 Patrulleros 1er y 2do Piso.
- Se replantean las colas del apantallamiento por recomendaciones según la norma de supervisor de la Interventoria (Electrica)
- Instalacion de guardaescoba en grano 1er piso bloque 3 Oficiales
- Estuco en 2do Piso bloque Oficiales.
- Alfa
- Observaciones:
- Se Lato coordina con Obra Acabado andenes perimetrales y el ancho de ellos sobre las fachadas principales de los bloques

- Avance lento en obra por la falta de materiales a raiz del cierre de lavia

EL CONTRATISTA ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PROCESO DE FUNDICION DE ANDENES EN BT3 Y DE ALISTADO EN BT1. [illegible]








- A la fecha según resultados de concreto de fundición de columnas en el bloque de ejes 4, no se ha tomado medida alguna al respecto, según obra dada por la supervisión quien solicito la demolición de los elementos involucrados.
- En esta bitacora se hace la constancia que aún se sigue observando niveles de agua subterraneos en los tanques de almacenamiento y red entramada dentro de los ejes y en el area del gimnasio.
- De ahora y se solicita tener mucho para su corrección de los aspectos en vigas de cubierta entre ejes 8 y 9 que no se encuentran a plomo.

Ing. [illegible]
Interventor

Sábado 6 Abril / 19


- Personal en Obra.
  - Personal Administrativo BCS Gutierrez.
  - Personal Operativo BCS Gutierrez (1 Operador Minicargador, 2 Conductores Volqueta, 5 trabajadores Bruno, 8 trabajadores Jhon Jairo, 3 trabajadores Daniel, 4 Hidraulicos, 11 trabajadores Carlos)
  - Gabriel Aguilar: 5 personas Acabados
  - SumiAguas: 2 Personas RCI
  - Datatec Ing. Elec: 3 Personas Ins. Electricas.
  - Personal Administrativo Interventoría DAIMOS SAS
- Clima. Mañana: Soleado.
- Equipos: Volquetas, Minicargador.
- EPP: Casco, Botas, Guantes, Gafas, Chaleco, Uniforme, tapabocas, tapaoidos.
- Actividades en Obra.
  - Nivelacion perimetro Bloque 1 Patrulleros para construcción Andenes.
  - Se estan elaborando remates de Apantillamiento segun la Recomendacion del Supervisor Interventoría Victor Paz.
  - Rematando Repellos, Vigas y Columnetas de cantilevramiento y Mamposteria, en 1er y 2do Piso bloque 1 Patrulleros)
  - Realizando Dilataciones sobre Fachada Principal Bloque 1 Patrulleros.
  - Instalando Tuberias Internas RCI Edificio Oficinas (bloque 3)
  - Enchapes en 2do Piso bloque 3 Oficinas
  - Estuco en 2do Piso bloque 3 Oficinas y Pintura 1er Piso
  - Instalando Granitexcon 1er Piso Bloque 3 Oficinas.
  - Terminando Juntas (Remate Principal bloque 3

Oficiales

- Observaciones
- Se despeja vía Panamericana, se normalicen al final del día tránsito Vehicular.
- Se hacen algunas Observaciones sobre el proceso de pega enchape, resane los cortes y remates sobre muros.
- Mejorar las esquinas el corte de guarda escoba piso en Grano.

Residente Interv.

→ SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE EN ENCHAPE, PAÑETES Y LLEGADA CEMENTO, HOC.

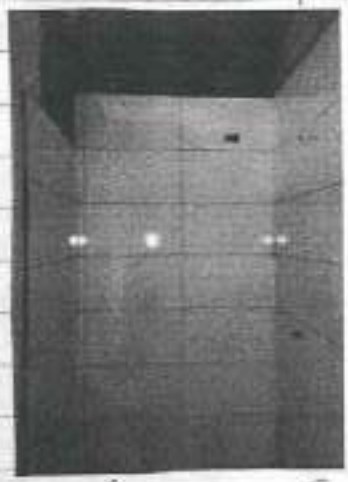





→ EL MATERIAL QUE INGRESO HOY LLEGO TRAS UNA TRAVESIA DE VARIOS DIAS POR LA VIA ALTERNA. HOC.

DOMINGO 7 ABRIL/19 - PERSONAL TRABAJA EN FACHADAS HOC.

Lunes 8 de Abril / 19

- Personal en Obra:
- Personal Administrativo BCS Gutierrez
- Personal Operativo BCS Gutierrez (1 Operador Minicargador, 2 Conductores Volqueta, 5 trabajadores Bruno, 6 trabajadores Jhon Jairo Pineda, 7 trabajadores Daniel, 4 Hidraulicos, 8 trabajadores Carlos)
- (6) Gabriel Aguilar en Arabantos
- (3) Datalec Ing. Electrica.
- (2) Sumiagua.

- Personal Administrativo Interventoría DAIMCO SAS
- Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado.
- Equipos: Minicargador, Volquetas, Retroexcavadora, Vibrocompactador.
- EPP: Casco, Botas, Guantes, Gafas, Uniforme, Chaleco, tapaoidos, tapabocas.
- Actividades en Obra.
  - Rematando Mampostería, repellos, y dinteles en 2do Piso bloque 1 Patrulleros
  - Rematando Repellos bloque 1 Primer Piso.
  - Repelle fachada posterior bloque 1 Patrulleros.
  - Se funde anden fachada posterior bloque 1 Patrulleros.
  - Se esta conformando terreno para andenes perimetrales bloque 1 y 3.
  - Estuco en 2do Piso: bloque 3 Oficiales
  - Piso en Granodr Alfa 1er Piso Bloque 3 Oficiales.
  - Instalaciones Red Contra Incendios al Interior bloque 3 Oficiales.
  - Detalles alfagías y cortezas bloque 3Oficiales.
- Observaciones:
  - Revisar detalles de Enchapes en baños; ~~vea~~ mejorar el corte de las fichas y la alineación
  - Igualmente detalles en guardaescoba remates en corte y esquinas.
  - Acabado en Andenes se coordina Obra e Interventoría.

Arq. Interventor.

→ EL DIA DE HOY SE RETOMAN ALGUNAS ACTIVIDADES QUE ESTABAN SUSPENDIDAS O CUYO RITMO DE TRABAJO SE HABIA REDUCIDO DEBIDO A LA FALTA DE MATERIAL POR EL PARO.

DE ACUERDO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE ALGUNAS ACTIVIDADES.





- Se solicita al contratista reforzar nivel de piso en soldadura grueso ~~de~~ eje a y 10 bloque ejes, ya que esta elevación esta lista, (que hacer) con autoridad.
- Se recomienda al contratista marcar el area en donde se cubierta de los tres bloques.

Ing. Jhon Jairo Gutierrez
Interventoria.

Martes 9 de Abril 2019

- Personal en Obra.
  - Personal Administrativo BCS Gutierrez
  - Personal Operativo BCS Gutierrez (1 Operador minicargador, 2 Conductores Volqueta, ~~Conductor~~ Operador Retroexcavadora, Operador Vibrocompactador, 6 trabajadores Bruno, 10 trabajadores JhonJairo, 10 trabajadores Daniel, 4 Hidraulicos, 9 trabajadores Carlos) ~~6 trabajadores Gato~~
  - Gabriel Aguilar. 6 trabajadores Acabados.
  - Datalec Ing. Elec. 3 trabajadores Ins. Elec.
  - Sumiaguas: 2 Personas RCI
  - Personal Administrativo Interventoria DAIMCO SAS
- Clima: Mañana: Soleado, Tarde: Soleado.
- Equipos: Minicargador, 2 volquetas, 1 Retroexcavadora, 1 Vibrocompactador.
- EPP: Casco, Botas, Guantes, Gafas, tapaoidos, tapabocas, Uniforme, Chaleco.
- Actividades en Obra:
  - Se fundes Andenes perimetrales bloque 1 y 3.

- Se realizan rellenos en el Area del Gimnasio
- Rematando detalles de ~~Est~~ Columnetas, Vigas, Mamposteria y Repellos en 1er y 2do Piso bloque 1 Patrulleros.
- Instalaciones RCI en Bloque 3 Oficiales.
- Estuco en 2do Piso bloque 3 Oficiales y Carteras en estuco Acrilico Pañetes Ventanas Fachada.
- Instalacion Piso baldosa en Granito 2do Piso bloque 3 Patrulleros.

→ Observaciones:

- Llega la Planta de la Subestación.
- Arq Interventoría

→ EL CONTRATISTA ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO COMO INSTALACION DE TUBERIA PARA RCI AL INTERIOR DE LOS BLOQUES #1, 2 y 3. SE ABREN REJILLAS EN ZONAS BAÑO B#3.








SE ADECUAN A NIVEL TAPAS PARA FUNDIR ANDENES.
SE ADJUNTA REMISION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI
UTILIZADO PARA FUNDIR ANDENES EL 5,8 Y HOY 9/04/2019 #1

REMISION No. 75021918

ARGOS

Fecha: 05/04/2019 No. Pedido 852386 Nit

Cliente: CONSORCIO BCS GUTIERREZ Proyecto: ALOJAMIENTOS DECAU FASE 4

Direccion: CR 17 1 ENE 75 POPAYAN CAUCA Cantidad (m3) 4.5

Cod Producto: C210400000 Descripcion Producto: C. PLASTICO 3000PSI TMN

Servicio Entrega: Asentamiento: 152.00 Resistencia:

Planta: 741 Conductor: MENDEZ SANCHEZ YAMITH Mixer: 376

Hora impreso: 12:14 Hora Cargue: 12:14 Hora Salida planta: 12:54pm

Hora llegada obra: 1:15pm Hora inicio descargue: 1:25pm. Hora salida obra:

Hora llegada planta: Despachador:

Observaciones

Recibi a mi entera satisfaccion la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

Maria Teresa Ojeda

Firma y sello

www.argos.com.co
Celular #250
01 8000 5 ARGOS

#2

REMISION No. 75021919

ARGOS

Fecha: 08/04/2019 No. Pedido 812206 Nit

Cliente: CONSORCIO BCS GUTIERREZ Proyecto: ALOJAMIENTOS DECAU FASE 4

Direccion: CR 17 1 ENE 75 POPAYAN CAUCA Cantidad (m3) 6.25

Cod Producto: C210400000 Descripcion Producto: C. PLASTICO 3000PSI TMN

Servicio Entrega: Asentamiento: 152.00 Resistencia

Planta: 741 Conductor: ARBELAEZ HOYOS NIXON Mixer: 255

Hora impreso: 11:05 Hora Cargue: 11:06 Hora Salida planta: 11:25

Hora llegada obra: 11:18 Hora inicio descargue: 11:25 Hora salida obra: 1:22

Hora llegada planta: Despachador:

Observaciones

Recibi a mi entera satisfaccion la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

Maria Teresa Ojeda

Firma y sello

www.argos.com.co
Celular #250
01 8000 5 ARGOS

#3

ARGOS

REMISION No. 75021920

Fecha 09/04/2019 No. Pedido 740001 Nit

Cliente CONSORCIO BCS GUTIERREZ Proyecto ALOJAMIENTOS DECAU FASE 4

Direccion CR 17 1 ENE 75 POPAYAN CAUCA Cantidad (m3) 7.25

Cod Producto C210400000 Descripcion Producto C. PLASTICO 3000PSI TMN

Servicio Entrega Asentamiento 152.00 Resistencia

Planta 741 Conductor ARBELAEZ HOYOS NIXON Mixer 255

Hora impreso 10:02 Hora Cargue 10:02 Hora Salida planta 10:25

Hora llegada obra 11.05 Hora inicio descargue 11:16 Hora salida obra 12:

Hora llegada planta Despachador

Observaciones

Recibi a mi entera satisfaccion la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

Maria Teresa Ojeda C.

Firma y sello

www.argos.com.co
Celular #250
01 8000 5 ARGOS

Miercoles 10 Abril /19

- Personal en Obra:
  - Personal Administrativo Bcs Gutierrez.
  - Personal Operativo BCS Gutierrez (1 Operador minicargador, 2 conductores Volquetas, 1 Operador Vibrocompactador, 1 Operador Retroexcavadora, 6 Trabajadores Bruno, 15 trabajadores Jhon Jairo, 9 trabajadores Daniel, 3 Hidraulicos, 9 trabajadores Carlos)
  - Gabriel Aguilar: 8 Personas.
  - Datalec Ing. Electrica: 3 Personas.
  - SumiAguas: 4 Personas
- Personal Interventoría DAIMCO SAS.
- Clima: Mañana: Soleado; Tarde: lluvia de 4 a 5 PM.
- Equipos: Volquetas, Retroexcavadora, Vibrocompactador, Minicargador.
- EPP: Casco, Botas, Guantes, Gafas, Tapaoidos, Tapabocas, Uniforme, Chaleco.

-Actividades en Obra:
- Rellenos en Area Gimnasio
- Instalacion tuberia en blogue 3 para RCI
- Rematando Detalles de Mamposteria, Repellos, Vigas y Columnetas de Confinamiento en 1er y 2do Piso del blogue 1 Patrulleros
- Aplicando estuco en 2do Piso de Blogue 3 Oficiales.
- Instalación piso baldosa en Grano en 1er y 2do Piso blogue 3 Oficiales.
- Repello Fachada Blogue 1 Patrulleros
- Formaleta para Andenes perimetrales.
- Formaleta para remarcos Ventaneria y Balcones sobre Fachadas.

Arq. Interventoría.

→ SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE TRABAJOS EN ZONA DE GIMNASIO.





Jueves 11 Abril /19

- Personal en Obra:
- Personal Administrativo BCS Gutierrez.
- Personal Operativo BCS Gutierrez (1 Operador Minicargador, 2 Conductores Volqueta, 1 Operador Vibrocompactador, 1 Operador Retroexcavadora, 1 trabajadores Bruto, 1 Strabajadores Jhon Jairo, 9 trabajadores Daniel, 4 Hidraulicos, 10 Trabajadores Carlos)
- Adecial Aguilar 10 trabajadores.

- Datalec Ing. Elec: 3 trabajadores.
- SumiAguas: 4 trabajadores
- Persona Interventoría PAIMO SAS.
- Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Nublado Lluvia 4.5 PM
- Equipos: Volquetas, Minicargador, Retroexcavadora, Vibrocompactador.
- EPP: Casco, Botas, Guantes, Gafas, Tapaoidos, Tapabocas, Uniforme, Chaleco.
- Actividades en Obra
- Llega Carpintería Metálica (Ventanería y Puertas) Fachada y Accesos Habitaciones.
- Rematando Detalles de Reptiles, columnetas, Vigas, Mampostería en 1er y 2do Piso bloque 1 Patrulleros.
- Fundición Andén Perimetral bloque 1 Patrulleros.
- Relleno Área Gimnasio.
- Estuco 1er y 2do Piso bloque 3 Oficiales
- Formaleta para Sobre marco Fachada Posterior bloque 3 Oficiales.
- Instalaciones Eléctricas 1er y 2do Piso bloque 3 Oficiales.
- Instalación tubería y Accesorios RCI.
- Instalaciones Hidráulicas 2do y 1er Piso bloque 1 Patrulleros.

→ CONTRATISTA ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICA ARFAJIAD





Y LA INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA LOS ANDENES QUE SE FUNDEN HOY. SE ADJUNTA A SOLICITUD DE LA INTERVENTORIA LOS SOPORTES DE LAS REMISIONES DEL CONCRETO PREMEZCLADO QUE SUMINISTRA ARGOS PARA LOS CONCRETOS DE ANDENES.

REMISION No. 75021925

Fecha: 11/04/2019 No. Pedido: 842008 Nit:

Cliente: CONSORCIO BCS GUTIERREZ Proyecto: ALOJAMIENTOS DECAU FASE 4

Direccion: CR 17 1 ENE 75 POPAYAN CAUCA Cantidad (m3): 5

Cod Producto: C210400000 Descripcion Producto: C. PLASTICO 3000PSI TMN

Servicio Entrega: Asentamiento: 152.00 Resistencia:

Planta: 741 Conductor: MENDEZ SANCHEZ YAMITH Mixer: 376

Hora impreso: 9:12 Hora Cargue: 9:12 Hora Salida planta: 9:37 am

Hora llegada obra: 10:07 am Hora inicio descargue: 10:22 Hora salida obra:

Hora llegada planta: Despachador:

Observaciones: Tenemos disponibilidad de recibir material desde las 8 am

Recibi a mi entera satisfaccion la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

Maria Teresa Ojeda C.

Firma y sello

[illegible]
Celular #250
01 8000 5 ARGOS

#5

ARGOS

REMISION No. 75021927

Fecha: 11/04/2019 No. Pedido 842014 Nit:

Cliente: CONSORCIO BCS GUTIERREZ Proyecto: ALOJAMIENTOS DECAU FASE 4

Direccion: CR 17 1 ENE 75 POPAYAN CAUCA Cantidad (m3): 5.7

Cod Producto: C210400000 Descripcion Producto: C. PLASTICO 3000PSI TMN

Servicio Entrega: Asentamiento: 152.00 Resistencia:

Planta: 741 Conductor: ARBELAEZ HOYOS NIXON Mixer: 255

Hora impreso: 12:53 Hora Cargue: 12:53 Hora Salida planta: 13:15

Hora llegada obra: 13:50 Hora inicio descargue: 14:05 Hora salida obra: 15:15

Hora llegada planta: Despachador:

Observaciones:

Recibi a mi entera satisfaccion la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

Maria Teresa Ojeda C.

Firma y sello

www.argos.com.co
Celular #250
01 8000 5 ARGOS

Viernes 12 Abril /19

- Personal en Obra.
- Personal Administrativo BCS Gutierrez
- Personal Operativo BCS Gutierrez (1 operador Minicargador, 1 Operador Retroexcavadora, 1 Operador Vibrocompactador, 7 trabajadores Bruno, 17 trabajadores Jhon Jairo Pineda, 11 trabajadores Daniel, 4 Hidraulicos, 10 trabajadores Carlos)
- Gabriel Aguilar: 11 trabajadores acabados.
- MetaB SAS: 4 personas en Cubierta
- SumiAguas: 4 personas RCI
- Datalec Ing: 4 Personas Inst. Electricas.
- Personal Administrativo Interventoria.
- Clima: Mañana: nublado;
- Equipos: Volquetas, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Minicargador.
- EPP: Casco, Botas, Guantes, Gafas, Tapaoidos, tapabocas, Uniforme, Chaleco.
- Actividades en Obra:
  - Relleno areas Perimetrales bloque 3 Oficiales.
  - Rematando detalles de Mamposteria, repellos, Vigas y Columnetas en 1er y 2do Piso bloque 1 Patrulleros
  - Instalación tubería RCI en bloque 1 y 3 1er Piso.
  - Estuco en 1er y 2do Piso bloque 3 Oficiales
  - Instalacion baldosa en Grano 1er y 2do piso bloque 3 Oficiales.
  - Rematando detalles Suit 2do Piso blq 3 Oficiales.
  - Reptilo Fachada bloque 1 Patrulleros.
  - Instalaciones electricas bloque 1 y 3
  - Apantallamiento.

Observaciones:

- Se revisa en Obra el detalle para ventana en baños 1er Piso bloque 3 Oficinas (Cambio de Ventilación Mecánica x Natural).
- En la ventanería que llegó a la Obra se evidencia que la rejilla de ventilación tiene un sistema diferente al que solicito la Consultoría. (Antitermenta) Revisar detalle.

Ing. Amy Interve.

EL CONTRATISTA ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN RELLENOS GIMNASIO Y AJUSTADOS PISOS EN BLOQUE.







Jornada 13 Abril /19.

- Personal en Obra.
- Personal Administrativo BCS Gutierrez
- Personal Operativo BCS Gutierrez (1 Operador Minicargador, 1 Operador Bibro Compactador, 1 Operador Retroexcavadora, 7 trabajadores Bruno, 17 trabajadores Jhon Jairo Pineda, 11 trabajadores Daniel, 4 Hidraulicos, 10 trabajadores Carlos)
- Gabriel Aguilar: 11 trabajadores.
- Datalec Ing. Elec: 5 trabajadores.
- SumiAguas: 4 trabajadores.
- Metal BSAS: 4 trabajadores.
- Personal Interventoría DAIMCO SAS.
- Clima: Mañana: Nublado.
- Equipos: Volquetas, Retroexcavadora, Vibrocompactador, Minicargador.

- EPP: Casco, botas, Guantes, Gafas, tapaoidos, tapabocas, Uniforme, Chaleco.
- Actividades en Obra:
  - Relleno area perimetral bloque 3 Oficiales y Area Gimnasio.
  - Rematando Detalles de Repello, Mampostería, Vegas y Columnetas en 1er y 2do Piso bloque 1 Patrulleros
  - Estuco 2do Piso bloque 3 Oficiales y 1er Piso bloque 1 Patrulleros
  - Pintura 1 mano bloque 3 Oficiales 1er y 2do Piso.
  - Piso en Grano de Marmol 2do Piso bloque 3 Oficiales.
  - Enchapes 2do Piso bloque 1 Patrulleros.
  - Instalaciones HidroSanitarias en bloque 1 Patrulleros.
  - Formaleta para alfagias 1er y 2do Piso bloque 3 oficiales.
  - Cableado acometidas bloque 3 Oficiales.
- Observaciones:
  - Revisar detalles de enchapes para acabado en bordes de remate muros sobre la pared del fondo.



√ X Arq. Interventor.

→ EL CONTRATISTA TENDRA EN CUENTA LA RECOMENDACION DE LA INTERVENTORIA Y REALIZARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE INSTALACION DE ENCHAPE QUE SEA EL ADECUADO PARA LOS PROCESOS EN OBRA, GARANTIZANDO QUE LA EJECUCION SE REALICE CON CALIDAD CONFORME A LO ESPECIFICADO (ABC).

DOMINGO 14 ABRIL /2019.
EN LA JORNADA DE HOY TRABAJA EL PERSONAL ELECTRICO Y EL DE CARPINTERIA METALICA EN EL AVANCE DE SUS ACTIVIDADES.


Lunes 15 Abril /2019
- Personal en Obra:
- Personal Administrativo BCS Gutierrez.
- Personal Operativo BCS Gutierrez (1 Operador Minicargador, 2 Conductores Volquetas, 1 Operador Retro excavadora, 1 Operador Vibrocompactador, 6 trabajadores Bruno, 15 trabajadores Jhon Jairo Pineda, 7 trabajadores Daniel, 1 Hidraulico)
- Gabriel Aguilar: 13 personas.
- Datalec Ing. Elec 7 Personas)
- SumiAguas: 2 Personas)
- Metals SAS: 4 Personas)
- Personal Interventoria DAIMCO SAS.
- Clima: Mañana lluvia de 7-9 AM
  Tarde: Nublado (Suelo Saturado)
- Equipos: Minicargador, Volquetas, Vibro Compactador, Retroexcavadora
- EPP: Cascos, Botas, Guantes, tapabocas, tapaoidas, Uniforme, Chaleco, Gafas
- Actividades en Obra:
- Rematando todavia detalles 1er y 2do Piso bloque 1 Patrulleros.
- Instalaciones Electricas para bloque 3 Oficinas
- Corte y Demolicion de varo para Ventana ventilacion baño Oficinas en 1er Piso.
- Estuco en 2do Piso bloque 3 Oficinas
- Instalacion Piso en Granito bloque 3 Oficinas
- ~~Arc~~ Instalacion Solapas en Cubierta bloque 1 y 3.
- Excavacion Para área de Gimnasio

- Excavación para tubería RCI.
- Estuco Relleno Acrílico para Fachadas Laterales bloque 3 Oficinas.

Arq. Interventoría.

- SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS FUERTES LLUVIAS QUE SE PRESENTAN EL DIA DE HOY Y QUE AFECTAN LOS TRABAJOS DE RELLENOS EN ZONA GIMNASIO.




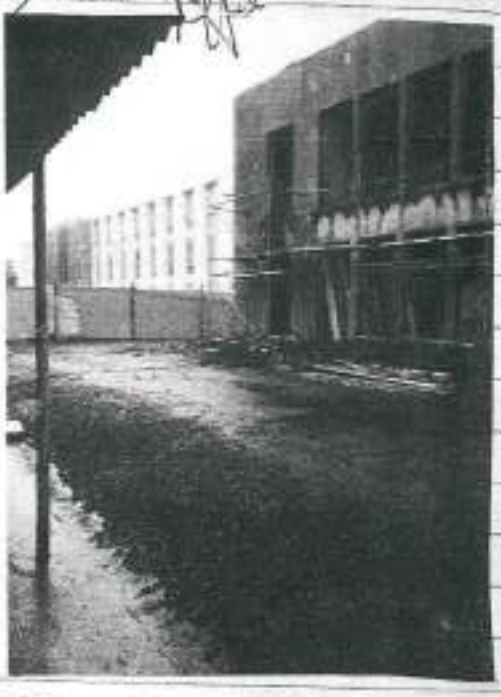

Martes 16 Abril 2019

- Personal en Obra
- Personal Administrativo BCS Gutierrez
- Personal Operativo BCS Gutierrez (1 Operador Minicargador, 1 Operador Retroexcavadora, 1 Operador Vibrocompactador, 2 conductores Volqueta, 6 trabajadores Bruno, 16 trabajadores Jhon Jairo Pineda, 12 trabajadores Daniel, 4 Hidraulicos)
- Gabriel Aguilar: 13 Personas.
- Datalec Ing. Elec: 7 Personas.
- Sumiengus: 2 Personas.
- Metal B SAS: 4 Personas.
- Personal Interventoría DAIMCO SAS.

- Clima: Mañana Soleado, Tarde: Nublado
- Equipos: Volquetas, Minicargador, Retroexcavadora, Vibrocompactador, Miniretro.
- EPP: Casco, Botas, Guantes, Gafas, Uniforme, Chaleco
- Actividades Ejecutadas:
  - Rematando Detalles en 1er y 2do Piso bloque 1 Patrulleros y en Suit area Oficiales
  - Instalacion de acometidas principales electricas.
  - Demolición para ventana baños 1er Piso oficiales.
  - Estuco 2do Piso bloque oficiales y 1er Piso bloque Patrulleros.
  - Relleno Acrílico en Fachada lateral bloque 3 Oficiales.
  - Instalación Piso en Grano bloque 3 Oficiales.
  - Instalacion Solapas en Cubierta.
  - Excavación y relleno Area Gimnasio.
  - Excavacion Para tuberia RCI en area tanque
  - Enchape en 2do Piso bloque 1 Patrulleros.
  - Res. Interbancaria.
- → EL CONTRATISTA ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS OBRAS EN EJECUCION EN GIMNASIO Y REDES RCI.

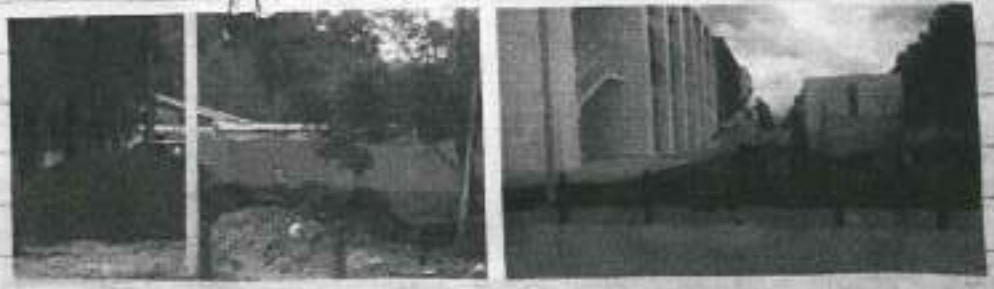

Miercoles 17 Abril 2019


- Personal en Obra.
  - Personal Administrativo BCS Gutierrez
  - Personal Operativo BCS Gutierrez (1 Operador minicargador, 2 Conductores Volqueta, 1 Operador Retroexcavadora, 1 Operador Vibrocompactador, 6

trabajadores Bruno, 16 trabajadores Jho Jairo)
12 trabajadores Daniel, 4 Hidraulicos)
Gabriel Aguilar; 13 trabajadores
Metal B SAS: 4 trabajadores
Sumi Aguas: 2 trabajadores
Datelec Ing. Elec: 7 trabajadores.

→ Personal Interventoria DAIRCO SAS.
- Clima: Mañana: Soleado Tarde: Lluvia.
- Equipos: Volquetas, Minicargador, Retroexcavadora, Vibrocompactador, mini Retro.
- EPP: Casco, Botas, Guantes, Gafas, Tapabocas, tapaoidos, Uniforme, Chaleco.
- Actividades Ejecutadas.
• Resane marcos para ventanas todos bloque 3 oficiales.
• Excavacion y relleno Gimnasio.
• Rematando detalles 1er y 2do Piso bloque 1 Patrulleros (Marcos ventanas y Puertas, repello en antepechos ventanas fachada, remates de muros bajos.
• Enchape 2do Piso bloque 1 Patrulleros.
• Estuco 1er Piso bloque 1 Patrulleros.
• Piso en Grano 2do Piso bloque 3 oficiales.
• Detalles en Cubierta.
• Instalaciones Electricas obras exteriores.

Arq. Interventoria

→ EL CONTRATISTA ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA EN EJECUCION COMO ANDENES, PAÑETES, ESTUCOS, PRUEBAS DE PRESION.

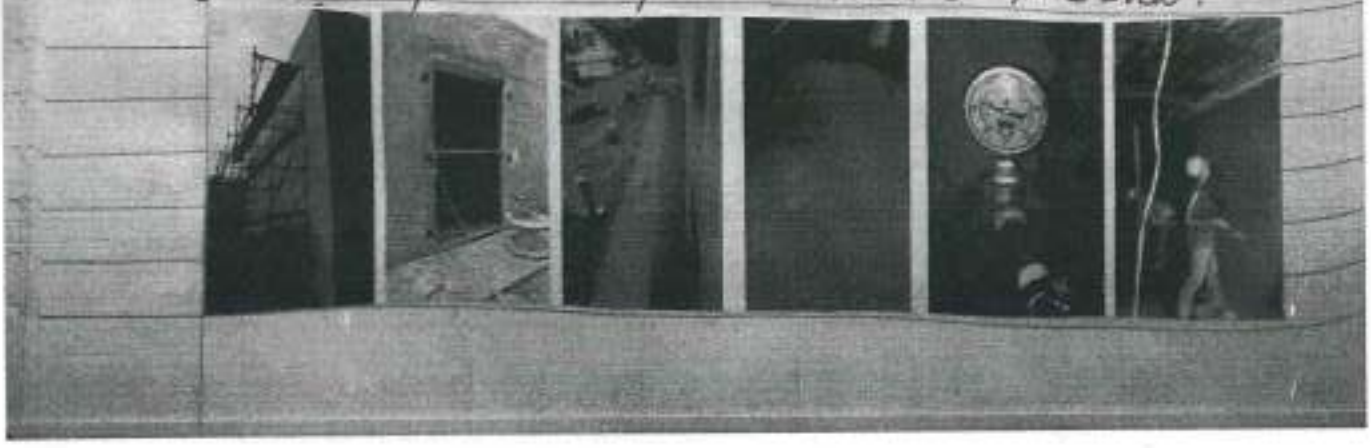





SE PRESENTAN LLUVIAS FUERTES EN DIA DE HOY.

SE AVANZA EN PANETES y ENCHAPES.

Jueves 18 Abril al Domingo 21 de Abril nose suspenden Labores por tempora Semana Santa, se trabaja en mamposteria, trabajador y electrica

Lunes 22 de Abril 2019

- Personal en Obra
- Personal Administrativo BCS Gutierrez
- Personal Operativo BCS Gutierrez (1 Operador Minicargador, 2 Conductores Valgueta, 1 Operador Retroexcavadora, 1 Operador VibroCompactador, 5 trabajadores Bruno, 13 trabajadores Jhon Jairo Pineda, 13 trabajadores Daniel, 3 Hidraulicos)
- Gabriel Aguilar; 13 trabajadores
- Datatec Ing Elec 3 Personas
- Sumiagua 4 Personas
- Personal Interventoria DAIMCO SAS
- Clima: Mañana:
- Equipos: Valguetas, Minicargador, Retroexcavadora, Vibro compactador.
- EPP: Casco, Botas, Guantes, Gafas, tapabocas, tapaoidos, Chaleco, Uniforme
- Actividades Ejecutadas
- Se retoman labores despues del receso
- Relleno areas perimetrales bloq 3 Oficinales.

- Excavacion Area Gimnasio.
- Instalación tubería RCI area tanque
- Estuco y Pintura 1er y 2do Piso bloque 1 Patrulleros.
- Relleno Acrilico Fachada Bloque 3 Oficiales
- Enchapes en 2do Piso bloque 1 Patrulleros.
- Resanes en repellos y columnetas 1er y 2do piso bloque 1 Patrulleros.

Residente. (Interv.

- Observacion:

Los dias de Semna Santa Se trabajo en Resanes 1er y 2do Piso Bloque 1 Patrulleros, Instalaciones eléctricas sobre bandejas en bloque 3 Oficiales y Detalles de Fachadas bloque 3 Estuco Relleno y repello en bloque 1 Patrulleros.

Semana Martes 23 Abril al 30 Abril Martes.

- Personal en Obra.
- Personal ~~Operativo~~ Administrativo BSS Gutierrez
- Personal Operativo BCS Gutierrez (1 Operador Minicargador, 1 Operador Retroexcavadora, 1 Operador Vibrocompactador, 2 Conductores Volqueta, 7 trabajadores Bruno, 16 trabajadores Jhon Jairo Pineda, 13 trabajadores Daniel, 4 Hidraulicos, 7 trabajadores Carlos)
- Gabriel Aguilar: 12 trabajadores.
- Datalec. Ing. Elec: 5 Personas.
- Sumi Aguas: 2 trabajadores.
- Personal Interventoría DAIMCO SAS.
- Clima: Mañanas: Nublado.
  Tardes: Lluviosa. Suelo Saturado.
- Equipos: Volquetas, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Minicargador.

- EPP. Casco, Botas, Guantes, Gafas, tapaboreas, lentes, Chaleco, Uniforme
- Actividades ejecutadas:
- Se realizan excavaciones y rellenos en Area del Gimnasio para mejorar el suelo, la lluvia tiene atrazado el proceso.
- Destroncando pisos en granito de Marmol 1er piso bloque 3 oficinas.
- Estuco y pintura 1er Piso bloque 1 Patrulleros, y 2do Piso.
- Resane marco para ventana en baños 1er y 2do Piso bloque 3 Oficinas
- Relleno Acrílico Fachadas en bloque 3 Oficinas.
- Instalaciones Red contra incendios bloques 1 y 3 y salida en tanque RCI.
- Repello Fachada bloque 1 Patrulleros.
- Estructura Cielo raso 1er y 2do Piso detalles en bloque 3 Oficinas.
- Enchapes 2do Piso bloque 1 Patrulleros.
- Bancas en concreto para baños en 1er y 2do Piso bloque 1 Patrulleros
- Formaleta para remarco Fachada en bloque 3 oficinas
- Instalaciones electricas en bloque 1 y 3 y Acometidas sobre Zonas comunes.
- Excavación y Conformación de terreno para Cajas de Inspeccion a recubrir sobre viga remate Tras 4.

Arq. Interventoria



(Estuco 1er Piso Bloque 1)



(Enchapes baños 1er Piso Bloque 1



(Vano ventana 1er Piso Bloque 3)
Baños



(Relleno Area Gimnasio)



(Relleno Acrilico Fachadas)



(RCI)
