FOTOGRAFÍA (4)



Texto explicativo de la fotografía.

FOTOGRAFÍA (5)



Texto explicativo de la fotografía. Entrega de unidas sanitaria

FOTOGRAFÍA (6)



Texto explicativo de la fotografía. Entrega de unidad sanitaria

FOTOGRAFÍA (7)



Texto explicativo de la fotografía. Recibida a satisfacción

FOTOGRAFÍA (8)



Texto explicativo de la fotografía. Suministro de material

FOTOGRAFÍA (9)



Texto explicativo de la fotografía: recorrido visitas con la entidad

FOTOGRAFÍA (10)



Texto explicativo de la fotografía: entrega de unidad sanitaria.

FOTOGRAFÍA (11)



Texto explicativo de la fotografía: recorrido encuestas

NOMBRE DEL PROYECTO:	Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Barrio El Poblado de Sincelejo (Sucre)
CONTRATISTA:	Consorcio Turquía
CONTRATO DE OBRA No.:	2220577
INTERVENTOR:	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	2220585
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**31 de Enero de 2023**

FOTOGRAFÍA (1)



(1) Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x 10 u 6 X 8 para Fotografías que muestren detalles.

Texto explicativo de la fotografía. Reunión de cierre con la entidad contratante, después de la visita de la ministra de vivienda Dra. Catalina Velazco Campuzano.

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía. Visita de la ministra de vivienda la Dra. Catalina Velazco Campuzano.

FOTOGRAFÍA (3)



Texto explicativo de la fotografía. Capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico.

FOTOGRAFÍA (4)



Texto explicativo de la fotografía. Verificación de medidas de las placas aéreas de los tanques elevados.

FOTOGRAFÍA (5)



Texto explicativo de la fotografía. Unidad sanitaria tipo 3. Terminada

FOTOGRAFÍA (6)



Texto explicativo de la fotografía. Aperturas de viviendas en compañía del equipo técnico y social del contratista e interventoría.

FOTOGRAFÍA (7)



Texto explicativo de la fotografía. Recorrido de obra en compañía del supervisor de la entidad contratante, Director de interventoría, equipo social y técnico del contratista.

FOTOGRAFÍA (8)



Texto explicativo de la fotografía. Levante de muros de unidad sanitaria tipo 3.

Anexo 9. Bitácora de Obra

de albañilería

Actividades en Obra: Suministro de material, excavaciones, levante de muro, Pañete, instalacion de cubierta instalacion de puerta, instalación de tubería Sanitaria y hidraulica, Subsanación de detalles.

* Equipo y herramienta: Cerchas, Gatos mecánicos, Andamios, Formaletas de madera moto carro, camioneta, boggy, Pulidora; taladros, Cortadora de enchape.

Residente interventoría — Residente de Obra.

Fecha: 31 Diembe, 01 Enero, 02 Enero, 03 Enero del 2023. El Contratista No laboró por ser estos dias festival de año, y la mano de obra dispuesta a laborar en estos dos fué escasa. Se retomaron las actividades el 04 Enero de 2023.

Fecha: 4 de Enero 2023

Proyecto: Conexiones intradomiciliaria de Saneamiento basico y Agua Potable en Sincelejo (Sucre)

Contratista: Consorcio Turquia

Interventoria: Gaviuco ingenieros Consultores S.A.S

Personal en Obra: Residente de Obra del contratista, interventoria e inspectores de Obra, SISO y Auxiliares Ambientales, Personal Social, Profesional de Subcontratista.

Actividad en Obra: Suministro de materia a viviendas en intervenciones, Excavaciones

levante de muro con ladrillo, Pañete, Formuletas de machones y columnas, Fundiciones de losa para tanque, Pintura, Subsanacion de detalle instalación de Cubierta, instalacion de tuberia Hidraulica, Sanitaria, instalacion de Combo Sanitaria, puerta e instalaciones.
Equipo y Herramienta: Cerchas, gatos metalicos Formuletas de madera, Andamios, moto carro, Camioneta, boggy, Pulidora, taludro, Cortadora de baldosa y herramientas menores.

Residente de interventoria Residente de Obra.

Fecha: 5 de enero 2023
Proyecto: Conexiones intradomiciliaria de Agua potable y Saneamiento basico en Sincelejo (Sucre).
Contratista: Consorcio turquia
Interventoria: Gavinco ingenieros Consultores S.A.S.
Personal en obra: Residentes de Obra del Contratista e inspectores, interventoria e inspectores Auxiliares ambiental, Personal Social, Profesional de Subcontratista, 32 oficiales de Albanileria 17 Ayudantes.
Actividades en obra: Suministro de materiales a Sitio y viviendas en intervenciones, excavaciones, levante de muro con ladrillo, Pañete, Formuleteo de madera para machones y Columnas, Fundicion de losa en concreto para tanque, Pintura, instalacion de Cubierta, Resane instalación de combo Sanitario, Enchape, instalacion de Puerta.
Equipo y Herramientas: Andamios, Cerchas, gatos

formaletas en madera. Pulidora, boggy, Cortadora de cachupe, taladro y Herramientas menores

Residente de interventoria Residente de Obra.

Fecha: 6 de enero 2023
Proyecto: Conexiones intradomiciliaria de Saneamiento basico y Agua potables en Sincelejo
Contratista: Consorcio Aurquia
interventoria: Covinoc ingenieros Consultores S.A.S
Personal en Obra: Residentes de Obra del Contratista, inspectores, interventoria, SISO, Auxiliar Ambientales, Personal Social, 30 oficiales de albañileria, 16 ayudantes.
Actividades en Obra: Suministro de materiales a viviendas. en intervenciones, Excavaciones, Pañetes Pintura, levante de muro en ladrillo, instalaciones de tuberia Hidraulica y Sanitaria Sustitucion de detalles, instalacion de Cubierta
Equipo y Herramientas: Cerchas, gatos metalicos Andamios, Formaletas de madera, Pulidora, taladro, Cortadora de baldosa, cumionetas, motocarro, boggy y herramientas menores

Residente de Interventoria Residente de Obra

Fecha: 7 de enero 2023
Proyecto: Conexiones intradomiciliarias de Agua potable y Saneamiento basico en Sincelejo

Powered by CamScanner

Contratista: Consorcio Turquia

Interventoria: Gavinco ingenieros Consultors S.A.S

Personal en Obra: Residente de Obra de Contratista, Personal profesional del Subcontratista, interventoria e inspectores, Siso, Personal Social, Auxiliares Ambientales, 28 Oficiales de albañileria, 16 Ayudantes

Residente interventoria

Residente de Obra

Contratista: Consorcio Turquia
Interventoria: Gavinco ingenieros Consultors S.A.S
Personal en Obra: Residente de Obra de Contratista Personal profesional del Subcontratista, interventoria e inspectores, Siso, Personal Social, Auxiliares Ambientales, 28 oficiales de albañileria, 16 Ayudantes.

Residente interventoria

Residente de Obra

Fecha: 9 de enero 2023
Proyecto: Conexiones intradomiciliarias de agua Potable y Saneamiento Basico en Sincelejo (Sucre).
Contratista: Consorcio Turquia
Interventoria: Gavinco ingenieros Consultors S.A.S
Personal en Obra: Residentes de Obra del Contratista Residente de interventoria y Sus inspectores Personal Social, Siso, Auxiliares ambientales, inspectores de obra contratista, Personal Profesional Subcontratista. 26 oficiales de albañileria y 15 ayudantes.
Actividad en obra: Suministro de material a viviendas a intervenir, Suministro de material en Sitio, trazados, excavaciones, cimentacion fundida de concreto para viga de cimentacion levante, Formaleteo de vigas y Columnas instalacion de Formaleta para Placa tanque Pintura de muro, instalacion de enchape, Pañete instalacion de puerta metalica, instalacion de Comb. Sanitaria, instalacion de Cubierta e instalacion de tuberia Hidraulica y Sanitaria, Subsanacion de detalles, demolicion de muros.
Equipos y Herramienta: cerchas metalicas,

Andamios, formaletas de madera, gato metalico moto carro, camioneta tipo estaca, Polidora. Cortadora de enchape, taladro, boggy y herramientas menores.

Residente de interventoria

Residente de Obra

Fecha: 10 de enero 2023
Proyecto: conexiones intradomiciliaria de agua potable y Saneamiento basico en Sincelejo (Sucre)
Contratista: Consorcio turquia
Interventoria: Gaviuco ingenieros Consultors S.A.S
Personal en Obra: Residentes de Obra Consorcio, interventoria e inspectores, personal del Sub contratista, SISO, Auxiliares, Personal Social coteros, 26 oficiales de albañileria y 15 Ayudantes.
Actividad en obra: Suministro de materiales, en Sitio, levante de muro en ladrillos, Pañete, instalacion de Cubierta, instalacion de tuberia Sanitaria, y Hidraulica, instalacion de puertas metalica, instalacion de Combo Sanitarios, Pintura, Subsanacion de detalles pendientes, excavacions de Cimentacion y Zapatas entregas de Viviendas con unidades Sanitarias en ejecucion.
Observaciones: Subsanar detalles de pintura, de enchape, fugas, Revisar trazadas de bacios, demoliciones de muros y pañete.
Equipos y Herramientas: Camionetas tipo estaca, moto carro, Camiones pequeños, Formaletas con maderas, gatos, Cerchas Andamios, tulubros, Polidoras, buggy, Cortadora de baldosa, y Herramientas menores,

Residente interventoria — Residente de Obra.

Fecha 11 de enero 2023

Proyecto: Conexiones intradomiciliarias de Agua potable y Saneamiento basico en Simacota (Santander)

Contratista: Consorcio Durguin.

Interventoria: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S

Personal en Obra: Residente de Obra. del contratista e inspectores, interventoria e inspectores, Personal Social, SISO, Auxiliares, Personal Subcontratista. 26 oficiales de albañileria, 18 Ayudantes

Actividad en Obra: Suministro de materiales en Sitio a viviendas en ejecucion, Excavaciones levantes de muro con ladrillos, Puente, instalacion de Formaleta para Fundir machones, vigas y Columnas, Pintura, instalacion de Cubiertas en tejas de Asbesto cemento, instalacion de Sanitario, instalacion de enchape, Sub Sanacion de detalles de pintura, Nivelacion de muros y machones.

Equipo y Herramienta: Guias metalicos, Cerchas tableros, tablones, Formaleta, taladros, pulidora moto carro, camionetas, camiones pequeños boggy, Cortadora de enchape.

Residente interventoria — Residente de Obra

Fecha
12 de enero 2023

Proyecto: Conexiones intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento basico.
Contratista: Consorcio furgvia
Interventoria: Gamineo ingenieros Consultors S.A.S

* Personal en Obra: Representantes de enterritorio, interventoria, Residente de Obra, profesionales Sociales, inspectors de Obra, Siso, Auxiliars Sociales, 24 oficiales y 15 Ayudantes.
* Observaciones: a la hora de levante de muros no realizar huecos en los "muros" o ladrillos, Detallar los filos de las casetas, limpieza de tejas y Cubudos, Reducir el tema de las fisuras presentadas en los pañete, tener encuenta el trazado y plomada de los muros a la hora de inicio de la Construcción del baño, mejorar los procesos Constructivo con las cuadrillas nuevas.
* Equipo y herramientas: Camiones pequeños camionetas, moto carros, boggy, taladro, pulidora, Cortadora de enchape, Cinchu, Gatos metalicos, Formaletas de madera.
* Actividad en Obra: Suministro de material a viviendas intervenidas, Excavacions y Fundida de Concreto, levante, Pañete, Pintura instalacion de Puerta, Cubierta y tuberias Hidraulicas, Sanitarias instalacion de enchape y Combo Sanitario instalacion de puertas metalicas, Resane, instalacion de tanque.

Residente interventoria

Residente de Obra

Fecha: 13 de enero 2023
Proyecto: Conexiones intradomiciliarias de Agua potable y Saneamiento básico
Contratista: Consorcio Turquia
Interventoria: Cavinco Ingeniero Consultores S.A.S.
Personal en Obra: Representante de ente territorial, interventoria, Residente del Consorcio, inspectores, y personal Social Siso, Auxiliares Ambiental, 25 Oficiales de albañilería 14 Ayudantes.
Actividad en Obra: Suministro de material a vivienda en ejecución, excavaciones levante, fundida de concreto en columnas, Pañete, pintura, instalacion de puerta, Combo Sanitaria, enchape, lumina, ducha. tanque y Resane de observaciones.
Observaciones: demolición de pañete, Replanteo de nuevo pañete y Subsanar dimensiones de baño

Residente de Interventoria Residente de Obra

Fecha: 14 de enero 2023
Proyecto: Conexiones intradomiciliarias de Agua potable y Saneamiento básico
Contratista: Consorcio Turquia
Interventoria: Cavinco Ingeniero Consultores S.A.S
Personal en Obra: Residente de Obra Contratista, Interventoria, Inspectores de obra, Siso, Auxiliares, Personal Social

Personal Profesional Subcontratista. 26 Oficiales de albañilería, 16 Ayudantes.
Actividad en Obra. Suministro de material a vivienda en ejecución excavaciones, levante, Pañeta, Pintura instalación de cubierta, instalación de puerta, instalación. de combo Sanitario instalación de enchape.
Equipos y herramienta. Cerchas metálicas, gatos, Formaletas en madera, - tableros, tablones, carros tipo camioneta motocarro, camiones pequeños, Doggy Pulidor, taludros, Cortadores de enchape.

Residente de interventoría, Residente de Obra

Fecha: 16 de enero 2023
Proyecto: Conexiones intradomiciliarias de agua potable y Saneamiento básico Sincelejo, (Sucre)
Contratista: Consorcio Aurquia
Interventoría: Gavinco ingeniero Consulta S.A.S.
Personal en Obra: Residente de Obra Consorcio y Contratista, Interventoría e inspectores de Obra, Personal Profesional de Subcontratista, Siso, Personal Social Auxiliares ambientales, 30 Oficiales de albañilería y 16 ayudantes
Actividad en Obra: Suministro de material a vivienda en ejecución excavacion para cimentaciones, levante, Pañete, pintura, instalación de tubería

Personal Profesional Subcontratista. 26 Oficiales de albañilería, 16 Ayudantes.

Actividad en Obra Suministro de material a vivienda en ejecución excavaciones, levante, Pañete, Pintura instalacion de cubierta, instalacion de Puerta, instalacion, de Combo Sanitario, instalacion de enchape.

Equipos y Herramienta. Cerchas metalicas, gatos, Formaletas en madera, tableros, tablons, carros tipo camionetas motocarro, camiones pequeños, Bogy, Pulidora, taladros, Cortadora de enchape.

Residente de interventoria, Residente de Obra.

Fecha: 16 de enero 2023

Proyecto: Conexiones intradomiciliarias de agua potable y Saneamiento basico Sincelejo, (Sucre)

Contratista: Consorcio Turquia

Interventoria: Gavinco ingeniero Consultores S.A.S.

Personal en Obra: Residente de Obra Consorcio y Contratista, Interventoría e inspectores de Obra, Personal profesional de Subcontratista, Siso, Personal Social Auxiliares ambientales, 30 Oficiales de albañilería y 16 ayudantes

Actividad en Obra: Suministro de material a vivienda en ejecución excavacion para cimentaciones, levante, pañete, pintura, instalación de tuberia

Hidraulica y Sanitaria, instalacion de puerta, bongue, cubierta, Subsanacion de detalles apertura, entregas, instalacion de enchape combo Sanitario.

Equipos y Herramienta: cerchas, gato metalico, formaletas de madera, tablero tablons, Carro tipo camioneta, motocarro Pulidora, taladro, Cortadora de enchape.

Residente interventoria, Residente de Obra.

- **Fecha:** 17 de enero 2023
- **Proyecto:** Conexiones intradomiciliarias de agua potable y Saneamiento basico
- **Contratista:** Consorcio Turquia
- **Interventoria:** Gavinco Ingeniero Consultores S.A.S.
- **Personal en Obra:** Residentes de Obra, equipo de interventoria, inspectores de Obra, equipo de Subcontratista, Siso, Auxiliares Sociales y 16 Ayudantes de Albañileria, 30 Oficiales
- **Actividades en Obra:** trazado y Replanteo Suministro de materiales a viviendas en ejecución, excavaciones para cimentación, tuberia Sanitaria, Hidraulica, Zapata, levante de muros en ladrillos, Fundida de Concreto, Pañete, instalacion de formaleta, pintura de muros, instalacion de puertas, Combo Sanitario y enchape.
- **Equipos y Herramienta:** Cerchas, gatos metalico formaletas de maderas, tablero, tablons, moto Carro, tipo camioneta, Camiones pequeños Pulidora, taladros, Cortadora de enchape

Powered by CamScanner

boggy, herramienta menores.

Residente de interventoria Residente de Obra

Fecha: 18 de enero 2022
Proyecto: conexiones intradomiciliarias de Agua potable y Saneamiento básico.
Contratista: Consorcio turquia
interventoria: Gavinco ingenieros Consultores S.A.S
* **Personal en Obra:** Residentes de Obra, inspectores, interventoria e inspectores, Personal Profesional. Subcontratista, Siso, Personal Social, 32 dos oficiales de Albanileria 19 Ayudantes o
* **Actividad en Obra:** Subsanacion de detalles, pintura, Suministro de material, demolicio de puñete, levante de muro, Excavaciones, instalacion de Aparatos Sanitarios, puesta, tejas en asbesto cemento Fundicion de Concreto para Vigas y Columnas, Aperturas de viviendas para anclaje de intervenciones. instalaciones de tuberia, fundida de losa, pisos, muchons
* **Equipos y herramienta:** boggy, moto carro Camiones pequeños, camioneta tipo estacas Cerchas, tubleros, tablons, gatos metalicos Pulidoras, taladros, Cortadoras de enchapes y Herramientas menores.

Residente de interventoria Residente de Obra

* **Fecha:** 19 de enero 2023
* **Proyecto:** Conexiones intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento basico
* **Contratista:** Consorcio turquia
* **interventoria:** Gavinco ingeniero consultores S.A.S
* **Personal en Obra:** Residentes de Obra, inspectores interventoria e inspectores, Personal Social, Personal Subcontratista, Siso, 33 Oficiales de albanileria 33 ayudantes.
* **Actividad en Obra:** Suministro de material a vivienda en ejecucion, trazado y Replanteo Excavaciones, levante de ladrillos, Puñete instalacion de formaleta para muchons Vigas y Columnas, Preparacion de Concreto para fundir Columnas, instalación de Puerta, instalacion de tuberia, Combo Sanitario, Pintura de muro, Subsanacion de detalles
* **Equipo y herramienta.** cerchas, gatos metalicos formaletas en madera, tablones, tableros, ligeras, moto Carro, camioneta tipo estacas, Camion Pequeño, taladro, pulidora. Cortadora de enchape

Residente de interventoria Residente de Obra

Fecha: 20 de enero 2023
Proyecto: Conexiones intradomiciliarias de Agua potable y Saneamiento basico
Contratista: Consorcio turquia
interventoria: Gavinco ingeniero Consultores S.A.S
Personal en obra: Residente de Obra, inspector de Obra, interventoria e inspectores, Personal Social, Personal Subcontratista, Siso, 38 oficiales

de albañilería, 24 Ayudantes.
Equipo y herramienta: Cercha, Gatos, tigera, Formaleta con madera, Tablones, Tablero Pulidora, Taladro, Cortadora de cuchuge, moto Carro, camioneta tipo estaca, Camiones Pequ y herramientas menores

Residente de interventoría

Residente de Obra

Fecha: 21 de enero 2023
Proyecto: Conexiones intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento básico
Contratista: Consorcio Turquia
Interventoria: Gavinco ingeniero Consultores S.A.S

* Personal en Obra: Residentes de Obra, Residentes de interventoria e inspectores. Personal Social, Subcontratistas, SISO, 35 Oficiales 24 Ayudantes
* Actividad en Obra: Suministro de materiales en Sitio, Excavaciones, levante de muros en ladrillo, pañete, Pintura, instalación de puerta, instalación de cubierta con teja de Asbesto cemento, instalacion de tuberia y Combo Sanitaria.
* Equipo y Herramienta: Cercha, Gato, tigeras Tablones, Tablero, Formaleta, moto carro, Camiones tipo estaca, Camiones Pequeño, boggy, Pulidora, Taladro, Cortadora de cuchuge, y herramientas menores,

Residente interventoría

Residente de Obra

Fecha: 23 Enero de 2023
proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de Agua potable y Saneamiento basico
Contratista: Consorcio Turquia
Interventoria: Gaunco Ingenieros Consultores S.A.S
* Personal en obra: Residentes de obra, Residente Interventoria e Inspectores, Personal Social, Subcontratistas, SSO, 36 oficiales y 24 ayudantes.
* Actividad en obra: Suministro de materiales en sitio, levante de muros en ladrillo, Pañete, pintura, Instalacion de puertas, Instalación de cubierta, Instalación de tubería y combos sanitarios. —— " —— " ——
* Equipos y herramientas: Cerchas, gatos, tablones, tablero, Famaletas, moto canos, camiones, bagey, Pulidoras, talado, cortadora y herramientas menores.

Residente Interventoria — Residente de obra

Fecha: 24 de Enero de 2023
Proyecto: Conexiones Intradaiciliarias de Agua Potable y Saneamiento basico
Contratista: Consorcio turquia
Interventoria: Gaunco Ingenieros Consultores S.A.S
* Personal en obra: Residentes de obra, Residente Interventoria e Inspectores, Personal Social, Subcontratistas, Siso, 36 oficiales y 24 ayudantes. —— " —— " ——
* Actividad en obra: Suministro de materiales a las viviendas próximas aperturar, levante de muros en ladrillo, pañete, pintura, Instalación de cubierta, Instalacion de tubería hidraulica y sanitaria, Instalacion de tanque elevado, construcción de Registros sanitarios, Excavaciones, Instalación de combos sanitarios. En el dia de hoy en horas de la tarde se Recibe la visita de la Supervisora del ministerio de vivienda, con el Fin de verificar las unidades sanitarias

que visitará la ministra de Vivienda el día 26 de Enero de 2023.

* Equipos y Herramientas: formaletas, cerchas, gatos, pistones, moto camos, camiones, buggy, pulidoras, cortadoras herramientas menores.

Residente Interventoría — Residente Obra

Fecha: 25 de Enero de 2023
Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de Agua potable y Saneamiento básico
Contratista: Consorcio Turquía
Interventoría: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S.

* Personal en obra: Residentes de obra, Residentes de Interventoría e Inspectores, personal social, subcontratistas, SISO, 36 oficiales y 24 Ayudantes.
* Actividad en obra: Entrega de materiales a los viviendas proximas Aperturar, excavaciones, Instalación de tubería hidraulica y sanitaria, Instalación de combos sanitarios, Instalación de cubiertas y tanque elevado, Construcción de Registros Sanitarios, levante de muro, Pañete. En el día de hoy se realizan 10 Aperturas y en horas de la mañana se realiza recorrido con el director de Interventoría y con la supervisora del ministerio de vivienda.
* Equipos y Herramientas: formaletas, cerchas, gatos, pistones, moto camos, Camiones, buggy pulidoras, cortadoras herramientas menores.

Residente de Interventoría — Residente obra

Fecha: 26 de Enero de 2023
proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de Agua potable y Saneamiento basico.
contratista: Consorcio turquira
Interventoria: Gaunco Ingenieros consultores S.A.S
* Personal en obra: Residentes de obra, Residentes de Interventoria, Inspectores, Personal Social, Subcontratistas, SISO, 36 oficiales y 24 Ayudantes.
* Actividad en obra: Entrega de materiales a los viviendas proximas a aperturar, excavaciones, Instalación de tubería hidraulica y sanitaria, Instalación de combos Sanitarios, Instalación de cubierta y tanque elevado, construcción de Registros sanitarios, levante de muro, pañetes, Pintura. en el dia de hoy se realizan 2 Aperturas. En horas de la mañana se recibe la visita de la ministra de Vivienda, la Alcaldia municipal de Sincelejo, Gobernación de Sucre, en el baño el poblado, estos visitaron 2 viviendas, en donde escucharon el proceso de como se hizo para la ejecución del baño. Después de terminada esta visita, los Asistentes de enteritorio cha reunión de cierre en las Instalaciones del Consorcio turquira, esto con el fin de hablar sobre el avance del proyecto, y mirar si se peden adicionar otras viviendas.
* Equipos y Herramientas: formatos, cerchas, gatos, listones, moto cams, camiones, buggys, pulidoras, cortadoras, Formaletas, herramientas menores.

Residente de Interventoria

Residente de obra

Fecha: 27 de enero de 2023
proyecto: conexiones Intradomiciliarias de Agua potable y Saneamiento basico.
Contratista: Consorcio Turquira
Interventoria: Gaunco Ingenieros consultores S.A.S
* Personal en obra: Residentes de obra, Residentes de Interven-

toria, Inspectores, personal social, SISO, 36 oficiales y 24 Ayudantes. ——— " ——— " ———

* Actividad en obra: Entrega de materiales a cada Vivienda proxima aperturar, Excavaciones, Instalación de Tubería hidraulica y Sanitaria, Instalación de tanque elevado, levante de muros, pañete pintura, construcción de Registros Sanitarios, esta Interventoría le hace la observación al contratista de que no se recibiran unidades sanitarias que no se les realice el anclaje de la viga canoa a los columnas y machones, por otra parte detalles como fisuras de los pañetes, baldosas huecas, Aceros de placas expestos, Tejas sucios, Dilataciones en los pañetes, pintura no homogenea, cabe resaltar que todos estos detalles hacen parte de los Acabados y calidad de la ejecución de los casetas. ——— " ———

* Equipos y Herramientas: formaletas, cerchas, gatos, listones, puliduras, cortaderas, motocanos, camiones, buggys, y herramientas menores. ——— " ———

Residente de Interventoría — Residente de obra

Fecha: 28 de Enero de 2023
Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de Agua potable y Saneamiento basico
Contratista: Consorcio Turquia
Interventoría: Gaunco Ingenieros Consultores S.A.S

* Personal en obra: Residentes de obra, Residentes de Interventoría, Inspectores, personal social, SISO, 36 oficiales y 24 Ayudantes. ——— " ——— " ———

* Actividad en obra: Entrega de materiales a cada vivienda aperturar, excavaciones, Instalación de tubería Hidraulica y Sanitaria, construcción de Registros Sanitarios, Instalación de tanque elevado, levante de muros, Pañete, pintura. Para el dra de hoy se tienen programados por parte del contratista varias entregas de unidades Sanitarias, pero esta Interventoría

no recibió ninguna de las unidades sanitarias ya que todas se encontraban con detalles, el contratista se compromete a subsanar y entregar el día 30/01/2023 ——"——

* Equipos y Herramientas: formaletas, cerchas, gatos, listones, pulidoras, cortadoras, motocomos, camiones, buggys, y herramientas menores. ——"——

Residente Interventoría

Residente de obra

no recibió ninguna de las unidades sanitarias ya que todas se encontraban con detalles, el contratista se compromete a subsanar y entregar el día 30/01/2023 ——"——

* Equipos y Herramientas: formaletas, cerchas, gatos, listones, pulidoras, cortadoras, motocarros, camiones, buggys, y herramientas menores. ——"——

Residente Interventoría — Residente de obra

Fecha: 30 de Enero de 2023.
Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de Agua potable y Saneamiento básico.
Contratista: Consorcio Turquía
Interventoría: Gaviuco Ingenieros Consultores S.A.S.
* Personal en obra: Residentes de obra, residentes de interventoría, Inspectores, personal social, SISO, 36 oficiales y 24 ayudantes.
* Actividad en obra: Entrega de materiales a cada vivienda aperturar, excavaciones, instalación de tubería, hidráulica y sanitaria. construcción de registros sanitarios, instalación de tanque elevado, levante de muros, pañete, pintura.
* Equipos y Herramientas: formaletas, cerchas, gatos, cutores, pulidoras, cortadoras, motocarros, camiones, buggys y herramientas menores.

Residente Interventoría — Residente de obra.

Fecha: 31 de Enero de 2023.
Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico.
Contratista: Consorcio Turquía
Interventoría: Gaviuco Ingenieros Consultores S.A.S.
* Personal en obra: Residentes de obra, Residentes de Interventoría,

Inspectores, personal social, SISO, 36 oficiales y 24 ayudantes.
* Actividad en obra: Entrega de materiales a cada vivienda, aperturas, excavaciones, instalacion de tuberias hidraulicas y sanitarias. construccion de registros sanitarios, instalacion de tanque elevado, levante de muros, pañete, pintura.
* equipos y Herramientas: formaletas, cerchas, gatos, listones, pulidoras, cortadoras, motocarros, camiones, buggys y herramientas menores.

Residente Interventoria — Residente de obra.

Fecha: 01 de febrero de 2023
Proyecto: Conexiones Intradomicilianas de Agua Potable y Saneamiento basico.
Contratista: Consorcio Torquia.
Interventoria: Covinco Ingenieros Consultores S.A.S.
* Personal en obra: Residentes de obra, Residente de interventoria, inspectores, personal social, SISO, 36 oficiales y 24 ayudantes.
* Actividad en obra: Entrega de materiales a cada vivienda, aperturas, excavaciones, instalacion de tuberias hidraulicas y sanitarias. Construccion de registros sanitarios, instalacion de tanque elevado, levante de muros, pañete, pintura.
* Equipos y Herramientas: Formaletas, cerchas, gatos, listones, pulidoras, cortadoras, motocarros, camiones, buggys y herramientas menores.

Residente Interventoria — Residente de obra

Fecha: 02 de febrero de 2023
Proyecto: Conexiones Intradomicilianas de Agua Potable y Saneamiento Basico.

Powered by CamScanner

Anexo 10. Relación de correspondencia

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	CÓDIGO:	F-GG-11
enterritorio		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

Informe No. **10** **Fecha Informe** **2/02/2023** **Periodo comprendido entre** **1/01/2023** **y** **31/01/2023**

TIPO DE CONTRATO:	Interventoría
NÚMERO DE CONTRATO:	2220585
OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.
CONTRATISTA:	Consorcio Turquía
INTERVENTOR:	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
SUPERVISOR:	Juan David Amon

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
29/03/2022	GA-DOMI-001-22	Solicitud documentacion inicial de obra	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
5/04/2022	GA-DOMI-002-22	Solicitud cumplimiento compromisos de entrega de la documentación inicial contrato	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
5/04/2022	GA-DOMI-003-22	Traslado correo electrónico, valla institucional para el proyecto de conexiones	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
6/04/2022	GA-DOMI-004-22	Remisión documentos previos a la firma del Acta de Inicio - Grupo 1: Sincelejo,	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
6/04/2022	GA-DOMI-005-22	Remisión póliza de garantía única de Cumplimiento y de RCE del contrato de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
11/04/2022	GA-DOMI-006-22	Remisión hoja de vida del contrato de Interventoría 2220585	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
11/04/2022	GA-DOMI-007-22	Remisión requisitos para suscripción de acta de inicio del contrato de Interventoría	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
11/04/2022	GA-DOMI-008-22	Remisión requisitos para suscripción de acta de inicio del contrato de obra N°.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
18/04/2022	GA-DOMI-009-22	Actividad 1. Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según la	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
19/04/2022	GA-DOMI-010-22	Cambio hojas de vida Inspector 1, Inspector 3 y Auxiliar Social del Contrato de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
19/04/2022	GA-DOMI-011-22	Remisión plan de inversión de anticipo del contrato de obra firmado.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
20/04/2022	GA-DOMI-012-22	Remisión actualización pólizas del contrato de interventoría respecto al Acta de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
25/04/2022	GA-DOMI-013-22	Remisión Informe Semanal No. 01 periodo del 13 al 24 de abril de 2022	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
25/04/2022	GA-DOMI-014-22	Codificación viviendas para diagnósticos del barrio El Poblado	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
27/04/2022	GA-DOMI-016-22	Solicitud entrega productos Actividad 1. Chequeo y validación de diseño de los	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
4/04/2022	20222200064831	Socialización de los actores vinculados en la ejecución del Programa de Co-	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
13/04/2022	20222200071361	Aprobación del personal mínimo requerido para ejecución del contrato de	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
13/04/2022	20222200071371	Entrega documentación para la ejecución del contrato de interventoría No.	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
5/04/2022	CONS-TUR-SINC-008	Remisión de soportes preliminares para acta de inicio.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
21/04/2022	CONS-TUR-SINC-011	MINUTA DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA	CONSORICO TURQUIA	Enterritorio
29/04/2022	CONS-TUR-SINC-013	Entrega de Productos ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACION DE DISEÑO	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
27/04/2022	GA-DOMI-016-22	Solicitud entrega productos Actividad 1. Chequeo y validación de diseño de los	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
2/05/2022	GA-DOMI-017-22	Remisión Informe Semanal No. 02 periodo del 25 de abril de 2022 al 01 de mayo de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
3/05/2022	GA-DOMI-018-22	Solicitud disponibilidad de materiales de construcción – Actividad 3. Ejecución de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
4/05/2022	GA-DOMI-019-22	Remisión Informe Mensual Técnico de Interventoría No. 01 periodo del 13 de abril	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
5/05/2022	GA-DOMI-020-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-013, Entrega de Productos Actividad 1:	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
5/05/2022	GA-DOMI-021-22	Solicitud remisión soportes de implementación de protocolo de bioseguridad	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
5/05/2022	GA-DOMI-022-22	Remisión actualización póliza RCE del contrato de interventoría.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
5/05/2022	GA-DOMI-023-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-017.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
9/05/2022	GA-DOMI-024-22	Solicitud Ajustes productos Actividad 1: chequeo y validación de diseño de los	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
9/05/2022	GA-DOMI-025-22	Remisión Informe Semanal No. 03 periodo del 02 de mayo de 2022 al 08 de mayo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
11/05/2022	GA-DOMI-026-22	Cambio hoja de vida personal del Contrato de Interventoría - Profesional HSEQ.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
11/05/2022	GA-DOMI-027-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-018.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
13/05/2022	GA-DOMI-028-22	Resp comunicación CONS-TUR-SINC-020	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
13/05/2022	GA-DOMI-029-22	Solicitud diagnosticos	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
16/05/2022	GA-DOMI-030-22	Aprobación diseño estructural con observaciones - Actividad 1. Chequeo y	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
17/08/2022	GA-DOMI-031-22	Remisión Informe Semanal No. 04 periodo del 09 de mayo de 2022 al 15 de mayo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
18/05/2022	GA-DOMI-032-22	Solicitud cumplimiento de los compromisos adquiridos en comité de seguimiento	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
24/05/2022	GA-DOMI-033-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 1. De Interventoría. Periodo facturado del 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
20/05/2022	GA-DOMI-034-22	Segunda solicitud cumplimiento compromisos comité de seguimiento N°. 5.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
24/05/2022	GA-DOMI-035-22	Remisión Informe Semanal No. 05 periodo del 16 de mayo de 2022 al 22 de mayo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
24/05/2022	GA-DOMI-036-22	Remision solicitud desembolso anticipo contrato de obra	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
25/05/2022	GA-DOMI-037-22	Solicitud inclusión para nuevos posible beneficiario del Programa de Conexiones	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Alcaldia Sincelejo
26/05/2022	GA-DOMI-038-22	Respuesta comunicaciones CONS-TUR-SINC-029 y CONS-TUR-SINC-028	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
26/05/2022	GA-DOMI-039-22	Obligaciones actividad 3 ejecución de obra y forma de pago.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
9/05/2022	CONS-TUR-SINC-018	CAMBIOS EN EL DOCUMENTO INICIAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
10/05/2022	CONS-TUR-SINC-019	Entrega de planos y memorias de casetas tipo.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
12/05/2022	CONS-TUR-SINC-020	CANTIDADES DE OBRA – ELEMENTOS ESTRUCTURALES	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
11/05/2022	CONS-TUR-SINC-020	Entrega de diagnósticos Paquete 01.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
12/05/2022	CONS-TUR-SINC-021	Entrega de diagnósticos Paquete 02.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
17/05/2022	CONS-TUR-SINC-022	Entrega de diagnósticos Paquete 03.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
18/05/2022	CONS-TUR-SINC-023	Entrega de diagnósticos Paquete 04.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
19/05/2022	CONS-TUR-SINC-024	Entrega de diagnósticos Paquete 05	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
23/05/2022	CONS-TUR-SINC-025	Entrega de diagnósticos Paquete 06	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
23/05/2022	CONS-TUR-SINC-026	Robo de micromedidores Barrio El Poblado, Sincelejo –Sucre.	CONSORICO TURQUIA	VEOLIA
24/05/2022	CONS-TUR-SINC-027	Entrega de diagnósticos Paquete 07.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
24/05/2022	CONS-TUR-SINC-028	Escasez de cerámica a nivel nacional	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
24/05/2022	CONS-TUR-SINC-029	Cambio especificaciones técnicas cerámica.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
26/05/2022	CONS-TUR-SINC-030	Entrega de diagnósticos Paquete 08	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
27/05/2022	CONS-TUR-SINC-031	Cambio de especificación técnica ítems 3.27 y 3.28	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Informe No. **10** **Fecha Informe** **2/02/2023** **Periodo comprendido entre** **1/01/2023** **y** **31/01/2023**

27/05/2022	CONS-TUR-SINC-032	Cambio en planimetría enviada de Casetas 1, 2, 3 y 4.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
18/05/2022	20222200093481	Aprobación Informe mensual de Interventoría No. 1, correspondiente al mes	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
26/05/2022	GA-DOMI-039-22	Obligaciones actividad 3 ejecución de obra y forma de pago.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
31/05/2022	GA-DOMI-040-22	Complemento y aprobación actividad 1. Chequeo y Validación prototipos	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
31/05/2022	GA-DOMI-041-22	Solicitud inclusión para nuevos posible beneficiario del Programa de Conexiones	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
31/05/2022	GA-DOMI-042-22	Comunicaciones CONS-TUR-SINC-028, CONS-TUR-SINC-029 y CONS-TUR-SINC-	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
1/06/2022	GA-DOMI-043-22	Remisión Informe Semanal No. 06 periodo del 23 de mayo de 2022 al 29 de mayo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
3/06/2022	GA-DOMI-044-22	Almacenamiento inadecuado de materiales de construcción en viviendas	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
3/06/2022	GA-DOMI-045-22	Solicitud mayor disponibilidad de materiales de construcción – Actividad 3.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
3/06/2022	GA-DOMI-046-22	Atraso cronograma de obra.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
3/06/2022	GA-DOMI-047-22	Recomendaciones para la ejecución de las obras	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
6/06/2022	GA-DOMI-048-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 02 periodo del 01 de mayo de 2022	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
6/06/2022	GA-DOMI-049-22	Comunicaciones CONS-TUR-SINC-034.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
8/06/2022	GA-DOMI-050-22	Remisión Informe Semanal No. 07 periodo del 30 de mayo de 2022 al 05 de junio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
8/06/2022	GA-DOMI-051-22	Solicitud verificación predio en zona de riesgo – manzana 60 lote 8.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
8/06/2022	GA-DOMI-052-22	Solicitud cumplimiento compromisos comité de seguimiento N°. 8.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
9/06/2022	GA-DOMI-053-22	Solicitud inclusión para nuevos posible beneficiario del Programa de Conexiones	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
10/06/2022	GA-DOMI-054-22	Observaciones ejecución de la obra.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
10/06/2022	GA-DOMI-055-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-035	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
10/06/2022	GA-DOMI-056-22	Solicitud verificación de predio en zona de riesgo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
15/06/2022	GA-DOMI-057-22	Remisión Informe Semanal No. 08 periodo del 06 de junio de 2022 al 12 de junio de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
15/06/2022	GA-DOMI-058-22	Solicitud inclusión para nuevos posibles beneficiarios del Programa de Conexiones	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
15/06/2022	GA-DOMI-059-22	Solicitud verificación de predio en zona de riesgo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
15/06/2022	GA-DOMI-060-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-040 del 13 de junio de 2022.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
15/06/2022	GA-DOMI-061-22	Compromiso de entrega de las 13 viviendas inicialmente intervenidas.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
22/06/2022	GA-DOMI-062-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-045 del 17 de junio de 2022	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
22/06/2022	GA-DOMI-063-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 2. De Interventoría. Periodo facturado del 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
23/06/2022	GA-DOMI-064-22	Remisión Informe Semanal No. 09 periodo del 13 de junio de 2022 al 19 de junio de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
24/06/2022	GA-DOMI-065-22	Aprobación cambio de especificaciones tecnicas	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
24/06/2022	GA-DOMI-066-22	Solicitud inclusión para nuevos posibles beneficiarios del Programa de Conexiones	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
24/06/2022	GA-DOMI-067-22	Solicitud inclusión para nuevos posibles beneficiarios del Programa de Conexiones	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
28/06/2022	GA-DOMI-068-22	Solicitud verificación de predio en zona de riesgo No. 04	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
28/06/2022	GA-DOMI-069-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-049	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
29/06/2022	GA-DOMI-070-22	Solicitud cumplimiento de dimensiones de las placas aéreas de soporte del tanque	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
30/06/2022	GA-DOMI-071-22	Seguimiento Plan de Contingencia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
1/07/2022	GA-DOMI-072-22	Solicitud inclusión N°. 7 para nuevos posible beneficiario del Programa de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
1/07/2022	GA-DOMI-073-22	Solicitud verificación de predio en zona de riesgo No. 6	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
1/07/2022	GA-DOMI-074-22	CONS-TUR-SINC-053	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
1/07/2022	GA-DOMI-075-22	Cambio hojas de vida personal del Contrato de Interventoría.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
5/07/2022	GA-DOMI-076-22	Respuesta oficio 20222200120441 plan de contingencia	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
5/07/2022	GA-DOMI-077-22	Observaciones unidades de viviendas en ejecución para entrega.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
6/07/2022	GA-DOMI-078-22	Remisión Informe Semanal No. 11 periodo del 27 de junio de 2022 al 03 de julio de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
7/07/2022	GA-DOMI-079-22	Resp oficio 20222200118481	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
3/06/2022	CONS-TUR-SINC-033	Envio Paquete 10 - Diagnosticos	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
6/06/2022	CONS-TUR-SINC-034	Cambio especificaciones técnicas cerámica.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
6/06/2022	CONS-TUR-SINC-035	Envío de documentación para aprobación de desembolso de anticipo	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
7/06/2022	CONS-TUR-SINC-036	Respuesta oficio GA-DOMI-044-22.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
9/06/2022	CONS-TUR-SINC-038	Entrega de diagnósticos Paquete 11.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
10/06/2022	CONS-TUR-SINC-039	Respuesta oficio GA-DOMI-046-22.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
13/06/2022	CONS-TUR-SINC-040	Solicitud de aprobación de hoja de vida de residente de obra Actividad 3.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
16/06/2022	CONS-TUR-SINC-041	Envío diagnósticos Paquete 12	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
15/06/2022	CONS-TUR-SINC-042	Respuesta oficio GA-DOMI-047-22 - Recomendaciones para la ejecución de las	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
16/06/2022	CONS-TUR-SINC-044	Entrega de diagnósticos Paquete 13.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
17/06/2022	CONS-TUR-SINC-045	Respuesta oficio GA-DOMI-054-22 Observaciones ejecución de la obra.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
18/06/2022	CONS-TUR-SINC-046	Carta relación de beneficiarios que no cuentan con documento FOVIS	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
19/06/2022	CONS-TUR-SINC-047	Entrega de diagnósticos Paquete 14a	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
20/06/2022	CONS-TUR-SINC-048	Entrega de diagnósticos Paquete 14b	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
21/06/2022	CONS-TUR-SINC-049	Cambio de Profesional Social Proyecto Conexiones Intradomiciliarias	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
22/06/2022	CONS-TUR-SINC-050	Entrega de diagnósticos Paquete 15	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
23/06/2022	CONS-TUR-SINC-051	Entrega de diagnósticos Paquete 15a	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
24/06/2022	CONS-TUR-SINC-052	Información Contrato de Alcantarillado barrio Puerto Arturo	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
25/06/2022	CONS-TUR-SINC-053	Entrega de diagnósticos Paquete 15c	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
22/06/2022	20222200117251	Aprobación Informe mensual de Interventoría No. 2, correspondiente al mes de	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
11/07/2022	GA-DOMI-080-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 03 periodo del 01 de junio de 2022	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
12/07/2022	GA-DOMI-081-22	Solicitud No. 7 de verificación de predio en zona de riesgo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
12/07/2022	GA-DOMI-082-22	Solicitud inclusión para nuevos posible beneficiario del Programa de Conexiones	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
12/07/2022	GA-DOMI-083-22	Seguimiento ejecucion del contrato y plan de contingencia	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
12/07/2022	GA-DOMI-084-22	Remisión Informe Semanal No. 12 periodo del 04 de julio de 2022 al 10 de julio de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
18/07/2022	GA-DOMI-085-22	Respuesta CONS-TUR-SINC-061	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/07/2022	GA-DOMI-086-22	Respuesta CONS-TUR-SINC-061	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	CÓDIGO:	F-GG-11
enterritorio		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

Informe No. **10** **Fecha Informe** **2/02/2023** **Periodo comprendido entre** **1/01/2023** **y** **31/01/2023**

18/07/2022	GA-DOMI-087-22	Respuesta CONS-TUR-SINC-053	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/07/2022	GA-DOMI-088-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-062	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
21/07/2022	GA-DOMI-089-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 3. De Interventoría. Periodo facturado del 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/07/2022	GA-DOMI-090-22	Solicitud inclusión para nuevos posible beneficiario del Programa de Conexiones	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
21/07/2022	GA-DOMI-091-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-062	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
21/07/2022	GA-DOMI-092-22	Remisión Informe Semanal No. 13 periodo del 11 de julio de 2022 al 17 de julio de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
22/07/2022	GA-DOMI-093-22	Trabajadores laborando sin Elementos de Protección Personal, EPP requeridos. –	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
22/07/2022	GA-DOMI-094-22	Seguimiento ejecucion del contrato y plan de contingencia	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
25/07/2022	GA-DOMI-095-22	Solicitud materiales suficientes para terminación de viviendas	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
25/07/2022	GA-DOMI-096-22	Remisión Informe Semanal No. 14 periodo del 18 de julio de 2022 al 24 de julio de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
27/07/2022	GA-DOMI-097-22	Aprobación ordenes de giro No. 01 y 02	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
27/07/2022	GA-DOMI-098-22	Solicitud de entrega del estado de los 192 diagnósticos faltantes.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
27/07/2022	GA-DOMI-099-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-064	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
28/07/2022	GA-DOMI-100-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-066 y CONS-TUR-SINC-067 del 27 de julio de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
28/07/2022	GA-DOMI-101-22	Respuesta CONS-TUR-SINC-065	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
1/07/2022	CONS-TUR-SINC-053	Información Contrato de Alcantarillado barrio Puerto Arturo.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
6/07/2022	CONS-TUR-SINC-056	Entrega de diagnósticos Paquete 16	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
2/07/2022	CONS-TUR-SINC-054	Oficio 053 - Respuesta comunicación GA-DOMI-071-22	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
6/07/2022	CONS-TUR-SINC-057	Información aprobación de micromedidores de ½"	CONSORICO TURQUIA	VEOLIA ESP
11/07/2022	CONS-TUR-SINC-059	Acompañamiento pruebas técnicas.	CONSORICO TURQUIA	VEOLIA ESP
11/07/2022	CONS-TUR-SINC-060	Entrega de diagnósticos Paquete 17	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
16/07/2022	CONS-TUR-SINC-061	Entrega de informes mensuales 01 y 02.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
21/07/2022	CONS-TUR-SINC-063	Entrega de diagnósticos Paquete 18	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
24/06/2022	20222200118481	Solicitud información sobre el cumplimiento del cronograma para el contrato de obra	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
29/06/2022	20222200120441	Solicitud información de acuerdo al plan de contingencia remitido mediante radi-	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
22/07/2022	20222200133451	Devolución Factura Electrónica de venta No. FV-2-1 del 21/07/2022	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
7/07/2022	20222200124601	Aprobación cambio de personal mínimo requerido para ejecución del contrato de	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
2/08/2022	GA-DOMI-102-22	Remisión Informe Semanal No. 15 periodo del 25 de julio de 2022 al 31 de julio de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
3/08/2022	GA-DOMI-103-22	Solicitud materiales de obra.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
3/08/2022	GA-DOMI-104-22	Seguimiento Plan de Contingencia semana 15	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
4/08/2022	GA-DOMI-105-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-062 y CONS-TUR-SINC-068	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
5/08/2022	GA-DOMI-106-22	Recomendación aplicación clausula 16 apremio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
5/08/2022	GA-DOMI-107-22	Remision oficio 20222200141481	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
8/08/2022	GA-DOMI-108-22	Solicitud diagnosticos pendientes	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
9/08/2022	GA-DOMI-109-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 04 periodo del 01 de julio de 2022 al	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
11/08/2022	GA-DOMI-110-22	Solicitud de inclusion pendientes de respuesta	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
11/08/2022	GA-DOMI-111-22	Remisión Informe Semanal No. 16 periodo del 01 de agosto de 2022 al 07 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
12/08/2022	GA-DOMI-112-22	Solicitud acompañamiento para verificación de predios.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
16/08/2022	GA-DOMI-113-22	Solicitud información contraloría general de la republica	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
17/08/2022	GA-DOMI-114-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 4. De Interventoría. Periodo facturado del 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
17/08/2022	GA-DOMI-115-22	Remision actas de reunion Contraloria, Ministerio y enterritorio.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/08/2022	GA-DOMI-116-22	Remisión Informe Semanal No. 17 periodo del 08 de agosto de 2022 al 14 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
18/08/2022	GA-DOMI-117-22	Seguimiento Plan de Contingencia semana 17.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
19/08/2022	GA-DOMI-118-22	Observaciones en la ejecución de las unidades sanitarias próximas	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
19/08/2022	GA-DOMI-119-22	Aprobación informe mensual 3 (1.Jul.22 al 31.Jul.22)	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
22/08/2022	GA-DOMI-120-22	Resp comunicacion CONS-TUR-SINC-077	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
22/08/2022	GA-DOMI-121-22	Acta de recibo parcial de obra No. 02.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
23/08/2022	GA-DOMI-122-22	PQR 192, 196 y 194 de solicitud de inclusión.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
24/08/2022	GA-DOMI-123-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-073	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
24/08/2022	GA-DOMI-124-22	Remisión Informe Semanal No. 18 periodo del 15 de agosto de 2022 al 21 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
24/08/2022	GA-DOMI-125-22	Seguimiento Plan de Contingencia	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
24/08/2022	GA-DOMI-126-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-076	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
29/08/2022	GA-DOMI-127-22	Solicitud exámenes de Egreso y certificados de paz y salvo con trabajadores.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
29/08/2022	GA-DOMI-128-22	Solicitud remisión Informe de accidente y reporte a la ARL	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
29/08/2022	GA-DOMI-129-22	Traslado petición del Sr. José Alfredo Pen Ayala	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
30/08/2022	GA-DOMI-130-22	Remisión Informe Semanal No. 19 periodo del 22 de agosto de 2022 al 28 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
31/08/2022	GA-DOMI-131-22	Viviendas priorizadas pendienes de entrega	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
16/08/2022	CONS-TUR-SINC-077	RUTA DE TRABAJO PARA ENTREGA DE MATERIALES E INICIO DE	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
29/08/2022	CONS-TUR-SINC-089	Entrega de diagnósticos Paquete 19B	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
20/07/2022	20222200131921	Aprobación Informe mensual de Interventoría No. 3, correspondiente al mes de	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
4/08/2022	20222200141471	Visita técnica solicitada por parte de la Contraloría General de la Nación	Enterritorio	CONSORICO TURQUIA
24/08/2022	20222200156751	Aprobación Informe mensual de Interventoría No. 4, correspondiente al mes de julio	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
1/09/2022	GA-DOMI-132-22	Personal en obra laborando sin Elementos de Protección Personal (EPP)	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
2/09/2022	GA-DOMI-133-22	Seguimiento Plan de Contingencia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
2/09/2022	GA-DOMI-134-22	Solicitud cumplimiento compromisos del acta de seguimiento No. 24	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
2/09/2022	GA-DOMI-135-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-093	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Veolia
7/09/2022	GA-DOMI-136-22	Remisión Informe Semanal No. 20 periodo del 29 de agosto de 2022 al 04 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
9/09/2022	GA-DOMI-137-22	Seguimiento Plan de Contingencia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
9/09/2022	GA-DOMI-138-22	Fecha de radicación facturación - Septiembre 2022	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
9/09/2022	GA-DOMI-139-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 05 periodo del 01 de agosto de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio

Informe No. **10** **Fecha Informe** **2/02/2023** **Periodo comprendido entre** **1/01/2023** **y** **31/01/2023**

12/09/2022	GA-DOMI-140-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 5. De Interventoría. Periodo facturado del 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
12/09/2022	GA-DOMI-141-22	Situaciones evidenciadas en obra	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
14/09/2022	GA-DOMI-142-22	Solicitud de pago a SSI y parafiscales	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
14/09/2022	GA-DOMI-143-22	Actualización Plan de contingencia ejecución actividad 3	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
15/09/2022	GA-DOMI-144-22	Remisión Informe Semanal No. 21 periodo del 05 de septiembre de 2022 al 11 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
16/09/2022	GA-DOMI-145-22	Seguimiento Plan de Contingencia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
16/09/2022	GA-DOMI-146-22	Respuesta oficio SPM-1300.10.02.1414	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
20/09/2022	GA-DOMI-147-22	Solicitud de respuestas PQR 192, 193, 194.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
21/09/2022	GA-DOMI-148-22	Remisión Informe Semanal No. 22 periodo del 12 de septiembre de 2022 al 18 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
20/09/2022	GA-DOMI-149-22	Acta de recibo parcial de obra No. 03.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/09/2022	GA-DOMI-150-22	Seguimiento compromisos comité de seguimiento No. 28	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
21/09/2022	GA-DOMI-151-22	Aprobación informe mensual 4 (1.Ago.22 al 31.Ago.22)	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
21/09/2022	GA-DOMI-152-22	Resp oficio 20222200162301	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/09/2022	GA-DOMI-153-22	Seguimiento Plan de Contingencia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
22/09/2022	GA-DOMI-154-22	Aclaración de solicitud de inclusión emitido en el informe de visita técnica N°2.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
23/09/2022	GA-DOMI-155-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-105	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
26/09/2022	GA-DOMI-156-22	Solicitud de visita y concepto de linderos.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
27/09/2022	GA-DOMI-157-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-111	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
28/09/2022	GA-DOMI-158-22	Remisión Informe Semanal No. 23 periodo del 19 de septiembre de 2022 al 25 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
28/09/2022	GA-DOMI-159-22	Seguimiento compromisos comité de seguimiento No. 29	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
28/09/2022	GA-DOMI-160-22	Seguimiento Plan de Contingencia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
30/09/2022	GA-DOMI-161-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-119 del 29 de septiembre de 2022.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
30/09/2022	GA-DOMI-162-22	Solicitud acta de recibo parcial de obra No. 04 e informe mensual de septiembre de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
1/09/2022	CONS-TUR-SINC-093	viviendas para instalación de micromedidores.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
13/09/2022	CONS-TUR-SINC-105	Entrega de diagnósticos Paquete 20	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
26/09/2022	CONS-TUR-SINC-114	Relación de códigos para apertura para la semana 26/09/2022 al 2/10/2022.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
2/09/2022	20222200162301	Observaciones visita de seguimiento del 09 al 12 de agosto de 2022.	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
3/10/2022	GA-DOMI-163-22	Seguimiento compromisos comité de seguimiento No. 30	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
3/10/2022	GA-DOMI-164-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-121 del 03 de octubre de 2022.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
4/10/2022	GA-DOMI-165-22	Remisión Informe Semanal No. 24 periodo del 26 de septiembre de 2022 al 02 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
4/10/2022	GA-DOMI-166-22	Solicitud liquidacion Contrato de Fiducia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
5/10/2022	GA-DOMI-167-22	Remisión segundas observaciones paquete 20	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
5/10/2022	GA-DOMI-168-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-122	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
6/10/2022	GA-DOMI-169-22	Solicitud acompañamiento para verificación de predios.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
7/10/2022	GA-DOMI-170-22	Solicitud de visita y concepto a la vivienda ubicada en Mz 41 – Lote 1	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
10/10/2022	GA-DOMI-171-22	Llamado de atención por no terminación de viviendas priorizadas.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
13/10/2022	GA-DOMI-172-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 06 periodo del 01 de septiembre de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/10/2022	GA-DOMI-173-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 6. De Interventoría. Periodo facturado del 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
12/10/2022	GA-DOMI-174-22	Solicitud planillas de seguridad social y parafiscales del mes de septiembre de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
12/10/2022	GA-DOMI-175-22	Resp oficio CONS-TUR-SINC-127	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
12/10/2022	GA-DOMI-176-22	Remisión Informe Semanal No. 25 periodo del 03 de octubre de 2022 al 09 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
13/10/2022	GA-DOMI-177-22	Traslado comunicación CONS-TUR-SINC-134	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	VEOLIA
14/10/2022	GA-DOMI-178-22	Remisión observaciones paquete 20 y paquete 20B	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
20/10/2022	GA-DOMI-179-22	Remisión Informe Semanal No. 26 periodo del 10 de octubre de 2022 al 16 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
20/10/2022	GA-DOMI-180-22	Solicitud ensayos de granulometría de materiales pétreos	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
20/10/2022	GA-DOMI-181-22	Solicitud certificados de nomenclatura	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
20/10/2022	GA-DOMI-182-22	Reconocimiento de la junta de Acción Comunal N°. 2 del barrio el Poblado del	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	GOBERNACION SUCRE
21/10/2022	GA-DOMI-183-22	Respuesta aprobación informe mensual 5	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
21/10/2022	GA-DOMI-184-22	Solicitud de concertación y aprobación de vivienda con domiciliaria.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	VEOLIA
21/10/2022	GA-DOMI-185-22	Situaciones evidenciadas en obra, octubre de 2022	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/10/2022	GA-DOMI-186-22	Acta de recibo parcial de obra No. 04.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/10/2022	GA-DOMI-187-22	Recomendación aplicación clausula 16 apremio Informe presunto incumplimiento	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
26/10/2022	GA-DOMI-188-22	Remisión Informe Semanal No. 27 periodo del 17 de octubre de 2022 al 23 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
26/10/2022	GA-DOMI-189-22	Solicitud remisión paquetes de viviendas ejecutadas Actas de Recibo Parcial 3 y 4.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
28/10/2022	GA-DOMI-190-22	Alcance radicado 2022CO5829 del 20 de octubre de 2022 comunicación GA-DOMI-	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
28/10/2022	GA-DOMI-191-22	Solicitud exámenes de egreso, certificados de paz y salvo del personal.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
28/10/2022	GA-DOMI-192-22	Personal laborando sin EPP	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
31/10/2022	GA-DOMI-193-22	Carta CONS-TUR-SINC-144	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
12/10/2022	CONS-TUR-SINC-132	Entrega de diagnósticos subsanados del Paquete 20	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
7/10/2022	CONS-TUR-SINC-126	Entrega del paquete 20B de diagnósticos para aprobación	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
8/11/2022	GA-DOMI-194-22	Respuesta oficio 20222200200761	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
2/11/2022	GA-DOMI-195-22	Remisión Informe Semanal No. 28 periodo del 24 de octubre de 2022 al 30 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
3/11/2022	GA-DOMI-196-22	Remisión observaciones paquete 21.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
4/11/2022	GA-DOMI-197-22	Seguimiento compromisos comité de seguimiento No. 34	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
5/11/2022	GA-DOMI-198-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 7. De Interventoría. Periodo facturado del 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
4/11/2022	GA-DOMI-199-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-145	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
8/11/2022	GA-DOMI-200-22	Solicitud liquidacion Contrato de Fiducia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
8/11/2022	GA-DOMI-201-22	Solicitud informe mensual de obra - octubre	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
9/11/2022	GA-DOMI-202-22	Solicitud entrega paquetes actas 3 y 4	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
10/11/2022	GA-DOMI-203-22	Remisión Informe Semanal No. 29 periodo del 31 de octubre de 2022 al 06 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio

enterritorio	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	CÓDIGO:	F-GG-11
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

Informe No. **10** **Fecha Informe** **2/02/2023** **Periodo comprendido entre** **1/01/2023** **y** **31/01/2023**

10/11/2022	GA-DOMI-204-22	Personal laborando sin afiliación a seguridad social integral.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
11/11/2022	GA-DOMI-205-22	Solicitud de prorroga Contrato de obra	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
11/11/2022	GA-DOMI-206-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 07 periodo del 01 de octubre de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
15/11/2022	GA-DOMI-207-22	Remisión observaciones paquete 20, 20B y 21.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
15/11/2022	GA-DOMI-208-22	Observaciones en la ejecución de las unidades sanitarias próximas a entregar	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
15/11/2022	GA-DOMI-209-22	Solicitud de paz y salvo y comprobantes de pago	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
16/11/2022	GA-DOMI-210-22	Observaciones SST	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
16/11/2022	GA-DOMI-211-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-122 problemática de tipo social y de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
16/11/2022	GA-DOMI-212-22	Remisión Informe Semanal No. 30 periodo del 07 de noviembre de 2022 al 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
16/11/2022	GA-DOMI-213-22	Personal laborando sin afiliación a seguridad social integral.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
17/11/2022	GA-DOMI-214-22	Seguimiento compromisos comité de seguimiento No. 37	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
21/11/2022	GA-DOMI-215-22	Observaciones emitidas por la entidad contratante ENTerritorio en el recorrido de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
21/11/2022	GA-DOMI-216-22	Remisión observaciones paquete 18B y 19B	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
22/11/2022	GA-DOMI-217-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-163	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
22/11/2022	GA-DOMI-218-22	Remisión Informe Semanal No. 31 periodo del 14 de noviembre de 2022 al 20 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/11/2022	GA-DOMI-219-22	Aprobación informe mensual 7 (01 de octubre de 22 al 31 de octubre de 22)	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
23/11/2022	GA-DOMI-220-22	Acta de recibo parcial de obra No. 05.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
23/11/2022	GA-DOMI-221-22	Llamado de atención por personal laborando sin afiliación a seguridad social	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
24/11/2022	GA-DOMI-222-22	Solicitud certificados de paz y salvo y comprobantes de pago de trabajadores	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
28/11/2022	GA-DOMI-223-22	Remisión observaciones diagnóstico comunicacion CONS-TUR-SINC-164	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
29/11/2022	GA-DOMI-224-22	Observaciones en la ejecución de unidades sanitarias por entregar y viviendas sin	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
29/11/2022	GA-DOMI-225-22	Remisión Informe Semanal No. 32 periodo del 21 de noviembre de 2022 al 27 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
29/11/2022	GA-DOMI-226-22	Alcance solicitud porroga y adicion interventoria	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
30/11/2022	GA-DOMI-227-22	Observaciones ejecución de unidades sanitarias	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
30/11/2022	GA-DOMI-228-22	Personal laborando sin afiliación a seguridad social integral.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
2/12/2022	GA-DOMI-229-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 8. De Interventoría. Periodo facturado del 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
9/12/2022	GA-DOMI-230-22	Acta de recibo parcial de obra No. 06.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
6/12/2022	GA-DOMI-231-22	Aprobación informe mensual 8 (01 de noviembre de 22 al 30 de noviembre de 22)	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
6/12/2022	GA-DOMI-232-22	Remisión Informe Semanal No. 33 periodo del 28 de noviembre de 2022 al 04 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
7/12/2022	GA-DOMI-233-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 08 periodo del 01 de noviembre de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
13/12/2022	GA-DOMI-234-22	Observaciones vivienda	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
14/12/2022	GA-DOMI-235-22	Solicitud planillas de seguridad social y parafiscales del mes de noviembre de 2022.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
15/12/2022	GA-DOMI-236-22	Remisión Informe Semanal No. 34 periodo del 05 de diciembre de 2022 al 11 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
19/12/2022	GA-DOMI-237-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-156	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
19/12/2022	GA-DOMI-238-22	Solicitud respuesta requerimientos en buzón de sugerencias por no pago de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
19/12/2022	GA-DOMI-239-22	Solicitud respuesta Derecho de Petición Veeduría barrio El Poblado.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
19/12/2022	GA-DOMI-240-22	Solicitud actualización link informativo Alcaldía de Sincelejo (Sucre).	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
20/12/2022	GA-DOMI-241-22	Remisión Informe Semanal No. 35 periodo del 12 de diciembre de 2022 al 18 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/12/2022	GA-DOMI-242-22	Respuesta oficio 202222003741	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/12/2022	GA-DOMI-243-22	Observaciones en la ejecución de las unidades de sanitarias en las viviendas del	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
27/12/2022	GA-DOMI-244-22	Remisión póliza de garantía única de Cumplimiento y de RCE del contrato de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
29/12/2022	GA-DOMI-245-22	Remisión Informe Semanal No. 36 periodo del 19 de diciembre de 2022 al 25 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
29/12/2022	GA-DOMI-246-22	Solicitud planillas de seguridad social y parafiscales del mes de noviembre de 2022.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
30/12/2022	GA-DOMI-247-22	Seguimiento compromisos comité de seguimiento No. 43	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
4/01/2023	GA-DOMI-248-23	Remisión Informe Semanal No. 37 periodo del 26 de diciembre de 2022 al 01 de enero de 2023	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
5/01/2023	GA-DOMI-249-23	Solicitud liquidación del anticipo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
10/01/2023	GA-DOMI-250-23	Solicitud actualización de la poliza de obra	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
12/01/2023	GA-DOMI-252-23	Remisión Informe Semanal No. 38 periodo del 02 de Enero de 2023 al 08 de enero	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
12/01/2023	GA-DOMI-253-23	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 09 periodo del 01 de diciembre de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
13/01/2023	GA-DOMI-254-23	Solicitud planillas de seguridad social y parafiscales del mes de diciembre de 2022.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
17/01/2023	GA-DOMI-255-23	Segunda solicitud planillas de seguridad social y parafiscales del mes de diciembre	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/01/2023	GA-DOMI-256-23	Remisión Informe Semanal No. 39 periodo del 02 de Enero de 2023 al 08 de enero	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
18/01/2023	GA-DOMI-257-23	Solicitud remisión programada de capacitaciones y soportes	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/01/2023	GA-DOMI-258-23	Solicitud remisión vales y certificados de materiales.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/01/2023	GA-DOMI-259-23	Seguimiento reprogramación de obra	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/01/2023	GA-DOMI-260-23	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-180	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/01/2023	GA-DOMI-261-23	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-176	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/01/2023	GA-DOMI-262-23	Solicitud liquidación del anticipo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/01/2023	GA-DOMI-263-23	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 9. De Interventoría. Periodo facturado del 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
20/01/2023	GA-DOMI-264-23	Alcance comunicaciones GA-DOMI-184-22 y GA-DOMI-177-22 Solicitud de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	VEOLIA
23/01/2023	GA-DOMI-265-23	Observaciones paquetes de vivienda terminadas de la 1 a la 4 y remisión paquetes	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
23/01/2023	GA-DOMI-266-23	Aprobación de diagnosticas S-SC-EP-M01-693, S-SC-EP-M07-113, S-SC-EP-M71-	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
24/01/2023	GA-DOMI-267-23	Remisión Informe Semanal No. 40 periodo del 16 de Enero de 2023 al 22 de enero	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
25/01/2023	GA-DOMI-268-23	Observaciones de obra enero	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
25/01/2023	GA-DOMI-269-23	Solicitud de entrega de las unidades sanitarias con observaciones del acta 5 y 6.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
26/01/20223	GA-DOMI-270-23	Solicitud plan de contingencia	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
27/01/2023	GA-DOMI-271-23	Observaciones detalles actividades de obra manzanas 54, 58 y 62	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
30/01/2023	GA-DOMI-272-23	Tercera solicitud de atención de observaciones paquetes de vivienda terminadas de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
30/01/2023	GA-DOMI-273-23	Solicitud respuesta comunicación GA-DOMI-260-23	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
30/01/2023	GA-DOMI-274-23	Solicitud respuesta comunicación GA-DOMI-261-23	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
31/01/2023	GA-DOMI-275-23	Remisión Informe Semanal No. 41 periodo del 23 de Enero de 2023 al 29 de enero	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	CÓDIGO:	F-GG-11
enterritorio		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

Informe No. **10** **Fecha Informe** **2/02/2023** **Periodo comprendido entre** **1/01/2023** **y** **31/01/2023**

31/01/2023	GA-DOMI-276-23	Atraso en las actividad No. 3	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
3/02/2023	GA-DOMI-277-23	Formato de evaluación Consorcio Turquía.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
6/02/2023	GA-DOMI-278-23	Comunicación CONS-TUR-SINC-182	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
8/02/2023	GA-DOMI-279-23	Remisión Informe Semanal No. 42 periodo del 30 de Enero de 2023 al 05 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
9/02/2023	GA-DOMI-280-23	Solicitud de certificados de paz y salvo y comprobantes de pago de trabajadores.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
10/02/2023	GA-DOMI-281-23	Atraso en la actividad No. 3	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA

Firma:

Nombre: Edgar Aragon Otero
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo 11. Relación de documentos

Contratista

enterritorio	**RELACIÓN DE DOCUMENTOS**	CÓDIGO:	**F-GG-19**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2010-10-12**

CONTRATO No. :	2220577
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
1	HOJAS DE VIDA PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO	1	1		Interventoria		X	X	
2	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN PROJECT CON SU FLUJO DE INVERSIÓN EN EXCEL.	1	1		Interventoria		X	X	
3	PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	1	1		Interventoria		X	X	
4	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	1	1		Interventoria		X	X	
5	PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL.	1	1		Interventoria		X	X	
6	PLAN DE CALIDAD	1	1		Interventoria		X	X	
7	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD APROBADO POR LA ARL Y RADICADO EN EL ENTE TERRITORIAL.	1	1		Interventoria		X	X	
8	ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO	1	1		Interventoria		X	X	
9	METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO	1	1		Interventoria		X	X	
10	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y LISTADO DE PRECIOS DE LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS PRESENTADOS EN LA OFERTA ECONOMÍA PARA LA ACTIVIDAD 3	1	1		Interventoria		X	X	
11	PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	1	1		Interventoria		X	X	
12	FLUJO DE INVERSIÓN DEL CONTRATO	1	1		Interventoria		X	X	

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	**RECIBE**
NOMBRE: JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES (R/L)	**NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO (R/L)**
Fecha: 12 de abril de 2022	Fecha: 12 de abril de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Interventoría

enterritorio	RELACIÓN DE DOCUMENTOS	CÓDIGO:	F-GG-19
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-10-12

CONTRATO No. :	2220585
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Titulo del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
1	MATRIZ DE EVALUACION DE ENCUETAS PCI, SINCELEJO, SUCRE.	1	1		Juan David Amon R			x	
2	CARTA DE PRESENTACION PCI, MUNICIPIO DE SINCELEJO, SUCRE.	1	1		Juan David Amon R		x	x	
3	RESUMEN PROYECTO INTRADOMICILIARIAS.	1	1		Juan David Amon R		x	x	
4	CERTIFICACION ESTADO DE LEGALIDAD DE LOS BARRIOS.	1	1		Juan David Amon R		x	x	
5	CERTIFICADO NO ZONA DE RIESGO BARRIO EL POBLADO	1	1		Juan David Amon R		x	x	
6	CERTIFICADO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BARRIO EL POBLADO	1	1		Juan David Amon R		x	x	
7	PLAN DE GESTION SOCIAL	1	1		Juan David Amon R	x		x	
8	ESPECIFICACIONES TECNICAS	1	1		Juan David Amon R	x		x	Especificaciones técnicas generales, Capitulo I, Capitulo II, Capitulo III, Capitulo IV,
9	FORMATOS PCI								PCI-001_Lista de chequeo para aprobación Diagnóstico
									PCI-002_Lista de chequeo para Aprobación Intervención
									PCI-003 Encuesta portanciales beneficiarios
									PCI-004_Carta de Compromiso Prop
									PCI-004a_Acta de rechazo
									PCI-005_Carta de Concertación propiet o poseedor
									PCI-006_Matriz_Suministrada por Municipio
									PCI-007_Plan de Intervención Beneficiario. Presupuesto
									PCI-008_Plan de intervención. Presupuesto
									PCI-009_Acta de concertacion para fa intervención
									PCI-010_Autorizacion inicio de obra
									PCI-011_Ajustes al Diagnóstico Inicial
									PCI-012 Cambio Plan de Intervención
									PCI-013_Acta de pruebas Técnicas
									PCI-014_Acta Recibo beneficiario6
									PCI-015_Acta de cierre e historico vivienda
									PCI-016_Verificación de viviendas visitadas
									PCI-017_Cronograma general de ejecución
									PCI-018_Cronograma especifico de ejecución
									PCI-019 Lineamientos para la inclusión de potenciales beneficiarios
									PCI-020 Plantilla Informe Quincenal
									PCI-021_Informe Mensual
									PCI-022_Lista de asistencia beneficiarios
									PCI-023_Lista de Convocatoria a beneficiarios
									PCI-024_ Solicitud del Ciudadano PQR
									PCI-025_Registro y Seguimiento PQR
									PCI-026_Criterios de planeación, Ej y Ev Reuniones con la comunidad
									PCI-027_Plantilla Agenda de Capacitación Educación Sanitaria
									PCI-028_Orientaciones y formatos MEMORIAS PCI
									PCI-029_Indicador de Empleo Mensual

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ	**NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO (R/L)**
Fecha: 06 de abril de 2022	Fecha: 05 de abril de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Entrega Informe Mensual de Interventoría

enterritorio	**RELACIÓN DE DOCUMENTOS**	CÓDIGO:	**F-GG-19**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2010-10-12**

CONTRATO No. :	2220585
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
1	**INFORME MENSUAL N°. 10 V-0**	1	1		Juan David Amon R			X	
CONTENIDO INFORME MENSUAL N°. 10 V-0	1. RESUMEN EJECUTIVO	N/A						X	
	F-GG-08 - Informe Ejecutivo Mensual de Interventoría	N/A						X	
	2. INFORME BÁSICO	N/A						X	
	2.1 ANEXO ADMINISTRATIVO	N/A						X	
	F-GG-04 - Acta de Vecindad	N/A						X	
	F-GG-09 - Acta de seguimiento de contrato	N/A						X	
	F-GG-09 - Acta de seguimiento de contrato - Actas de aprobación.	N/A						X	
	F-GG-10 - Control de personal	N/A						X	
	F-GG-11 - Relación de correspondencia	N/A						X	
	PCI-009 - Actas de concertación	N/A						X	
	2.2. ANEXO TECNICO	N/A						X	
	F-GG-19 - Relación de documentos	N/A						X	
	F-GG-20 - Relación de planos	N/A						X	
	F-GG-24 - Control de seguridad industrial	N/A						X	
	F-GG-25 - Formato de registro fotográfico	N/A						X	
	F-GG-21 - Análisis de Precios Unitarios	N/A						X	
	Cumplimiento normatividad ambiental	N/A						X	
	2.3. ANEXO PRESUPUESTAL	N/A						X	
	F-GG-32 - Acta de recibo parcial y balance presupuestal	N/A						X	
	F-GG-33 - Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos	N/A						X	
	Fotocopia de la bitácora o libro de obra de toda la ejecución del proyecto.	N/A						X	
	Informe de gestión social del proyecto.	N/A						X	
	Planillas de Seguridad Social	N/A						X	
ANEXOS INFORME MENSUAL N°. 10 V-0	Anexo 0. Aplicación y cumplimiento de requisitos del informe mensual de interventoría	N/A						X	
	Anexo 1. Informe Ejecutivo Mensual de Interventoría (Formato F-GG-08)	N/A						X	
	Anexo 2. Contrato de Interventoría y Contratista	N/A						X	
	Anexo 3. Pólizas contrato de Obra e Interventoría	N/A						X	
	Anexo 4. Acta de inicio contratos de Obra e Interventoría	N/A						X	
	Anexo 5. Análisis de Precios Unitarios	N/A						X	
	Anexo 6. Plan de inversión del anticipo	N/A						X	
	Anexo 7. Acta de seguimiento de contrato	N/A						X	
	Anexo 8. Formato de registro fotográfico	N/A						X	
	Anexo 9. Bitácora de Obra	N/A						X	
	Anexo 10. Relación de correspondencia	N/A						X	
	Anexo 11. Relación de documentos	N/A						X	
	Anexo 12. Relación de planos	N/A						X	
	Anexo 13. Acreditación pagos al sistema de seguridad social	N/A						X	
	Anexo 14. Control de personal	N/A						X	
	Anexo 15. Control de seguridad industrial	N/A						X	
	Anexo 16. Cumplimiento ambiental	N/A						X	
	Anexo 17. Informes semanales	N/A						X	
	Anexo 18. Informe de gestión social	N/A						X	
	Anexo 19. Diagnósticos aprobados.	N/A						X	
	Anexo 20. Certificaciones de materiales.	N/A						X	
	Anexo 21. Acta de Vecindad	N/A						X	
	Anexo 22. Actas de concertación	N/A						X	
	Anexo 23. Acta de recibo parcial y balance presupuestal de interventoría	N/A						X	
	Anexo 24. Control de equipos	N/A						X	
	Anexo 25. Control de inspección y ensayos	N/A						X	
	Anexo 26. Cambio especificación	N/A						X	
	Anexo 27. Acta de Recibo parcial y cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados (Matriz Tres Momentos Ejecución)	N/A						X	

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 02 días del el mes de febrero del 2023.

ENTREGA	**RECIBE**
NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO (R/L)	**NOMBRE: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ**
Fecha: 02 de febrero de 2023	Fecha: 02 de febrero de 2023

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Anexo 12. Relación de planos

Contratista

	RELACIÓN DE PLANOS	CÓDIGO	F-GG-20
eterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-12

CONTRATO No. :	2220577
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Plano #	Versión	Fecha	Contenido	Remplaza Plano #	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	PLANO 1-2	1	abr-22	PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTA DE VIGAS DE CUBIERTA, DETALLES DE VIGAS CIMIENTO Y DE CUBIERTA, CORTE ESTRUCTURAL, PLANTILLA, LOSA MACIZA Y MACHONES. DE CASETAS T1 Y T2. Y DETALLES DE COLUMNA DE TANQUE.	N/A	N/A	Interventoría	Producto Actividad 1. Chequeo y validación de prototipos.
2	PLANO 2-2	1	abr-22	PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTA DE VIGAS DE CUBIERTA, DETALLES DE VIGAS CIMIENTO Y DE CUBIERTA, CORTE ESTRUCTURAL, PLANTILLA, LOSA MACIZA Y MACHONES. DE CASETAS T1 Y T2	N/A	N/A	Interventoría	Planos proceso INA 032 2021

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES (R/L)	**NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO**
Fecha: 31 de mayo de 2022	Fecha: 31 de mayo de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

	RELACIÓN DE PLANOS	CÓDIGO	F-GG-20
enterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-12

CONTRATO No. :	2220577
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Plano #	Versión	Fecha	Contenido	Remplaza Plano #	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo I	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
2	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo II	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
3	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo III	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
4	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo IV	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO	**NOMBRE: JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES (R/L)**
Fecha: 05 de abril de 2022	Fecha: 05 de abril de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría


Interventoría

eterritorio	RELACIÓN DE PLANOS	CÓDIGO	F-GG-20
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-12

CONTRATO No. :	2220585
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Plano #	Versión	Fecha	Contenido	Remplaza Plano #	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	CASETA	1		Tipología caseta Tipo I	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
2	CASETA	1		Tipología caseta Tipo II	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
3	CASETA	1		Tipología caseta Tipo III	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
4	CASETA	1		Tipología caseta Tipo IV	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
	
NOMBRE: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ	**NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO (R/L)**
Fecha: 05 de abril de 2022	Fecha: 05 de abril de 2022



Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

	RELACIÓN DE PLANOS	CÓDIGO	F-GG-20
eterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-12

CONTRATO No. :	2220577
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Plano #	Versión	Fecha	Contenido	Remplaza Plano #	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	PLANO 1-2	1	abr-22	PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTA DE VIGAS DE CUBIERTA, DETALLES DE VIGAS CIMIENTO Y DE CUBIERTA, CORTE ESTRUCTURAL, PLANTILLA, LOSA MACIZA Y MACHONES. DE CASETAS T1 Y T2. Y DETALLES DE COLUMNA DE TANQUE.	N/A	N/A	Interventoría	Producto Actividad 1. Chequeo y validación de prototipos.
2	PLANO 2-2	1	abr-22	PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTA DE VIGAS DE CUBIERTA, DETALLES DE VIGAS CIMIENTO Y DE CUBIERTA, CORTE ESTRUCTURAL, PLANTILLA, LOSA MACIZA Y MACHONES. DE CASETAS T1 Y T2	N/A	N/A	Interventoría	Planos proceso INA 032 2021

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
	
NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO	**NOMBRE: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ**
Fecha: 31 de mayo de 2022	Fecha: 31 de mayo de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Anexo 13. Acreditación pagos al sistema de seguridad social

Contratista

CONSORCIO TURQUIA
NIT 901 570934-7

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE

SEGURIDAD SOCIAL Y DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA

CERTIFICACIÓN

Certifico que la persona jurídica **CONSORCIO TURQUIA** con **NIT No. 901.570.934 - 7,** ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los últimos (6) meses.

Expedida el trece (13) del mes de febrero 2023

JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES
C.C No 1.117.491.406 DE FLORENCIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TURQUIA

JAIME RICARDO MARQUEZ CONTRERAS
T.P No. 111052-T
C.C. No. 72.246.947 DE BARRANQUILLA
CONTADOR PÚBLICO

Calle 16 No 14 – 71 loca 2 Sincelejo Sucre
Teléfono: 6052791552- 3205287023
coordinadorturquiapci@gmail.com, consorcioturquia@gmail.com

CEDULA DE CIUDADANIA



COPIA VALIDAD PARA: _____

Powered by CamScanner

TARJETA PROFESIONAL





COPIA VALIDA PARA: _____

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7AA47C851AE326F4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIME RICARDO MARQUEZ CONTRERAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72246947 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 111052-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo **ISAIAS VARGAS GONZALEZ** Actuando en nombre propio, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.710.012, me permito certificar que he efectuado el pago y me encuentro a paz y salvo por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos Laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 797 y 828 de 2003 y Decreto 510 de 2003.

Dada en Sincelejo a los trece (13) días del mes de febrero de 2023

Atentamente,



ISAIAS VARGAS GONZALEZ.
CC. 7.710.012 de Neiva Huila
Representante Legal



MARIA BERNARDA RAMOS JARABA
CC. 1102840197 de Sincelejo
CONTADOR PUBLICO
TP. 244730-T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

El suscrito Representante legal de **V&M INGENIERIA S.A.S**, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.713.933, se permite certificar que la compañía ha efectuado el pago y se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos Laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 797 y 828 de 2003 y Decreto 510 de 2003.

Dada en Sincelejo a los trece (13) días del mes de febrero de 2023


Atentamente,

YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
CC. 7.713.933 de Neiva Huila
Representante Legal

MARIA BERNARDA RAMOS JARABA
CC. 1102840197 de Sincelejo
CONTADOR PUBLICO
TP. 244730-T

TARJETA PROFESIONAL



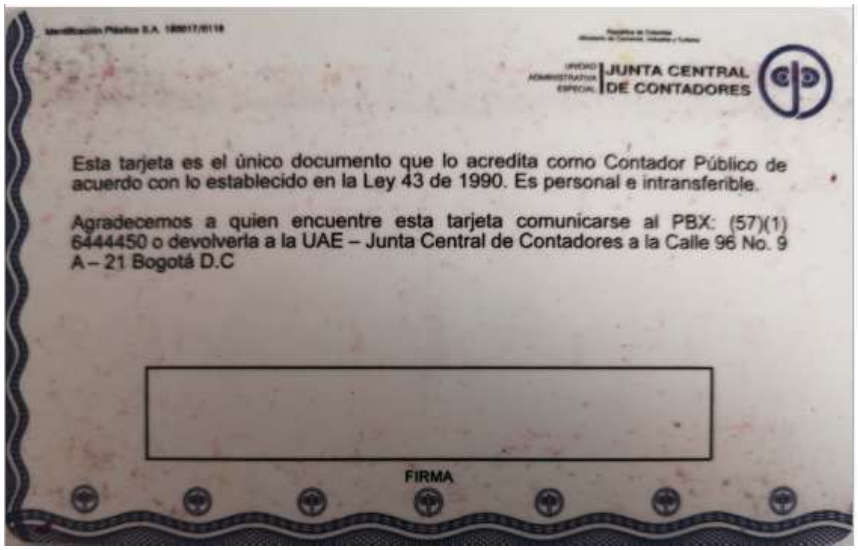

DOCUMENTO DE IDENTIDAD





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6AA777 3854AEC2FF41

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA BERNARDA RAMOS JARABA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102840197 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 244730-TSI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Interventoría

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NIT 900.916.608-4

CERTIFICAN QUE:

A la fecha, la firma **GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**, Se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar de sus empleados, durante los últimos doce (12) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide a solicitud de la compañía a los 07 días del mes de febrero del 2023.

Atentamente,

LUZ ANDREA FAJARDO C.
Representante Legal
GAVINCO S.A.S.

MARIA ALEJANDRA GARZON RUBIO
Revisor Fiscal
T.P 260106-T



FECHA DE NACIMIENTO 15-JUL-1995

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

19-JUL-2013 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1500150-00461133-F-1018477519-20130827 0034579202A 1 40169267

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.477.519

GARZON RUBIO

APELLIDOS

MARIA ALEJANDRA

NOMBRES

FIRMA

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



260106-T

MARIA ALEJANDRA
GARZÓN RUBIO
C.C. 1018477519
RES. INSCRIPCION 385 DEL 08/07/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

271024 **290395**

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0D9426F95740220

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA ALEJANDRA GARZÓN RUBIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018477519 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 260106-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Anexo 14. Control de personal

Interventoría

	CONTROL DE PERSONAL	CÓDIGO:	F-GG-10
enterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/01/2023 Y EL 31/01/2023 PLAZO: 11 meses

INTERVENTOR: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS CONTRATO No. 2220577

SUPERVISOR JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ CONTRATO No. 2220585

PERSONAL DEL CONTRATISTA (INTERVENTORIA)

FECHA	MES 10																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CARGO																																
Director de Interventoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Residente de Interventoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Especialista en Estructuras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Profesional Social	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Profesional HSEQ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Especialista Hidrosanitario	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Profesional Costos y Presupuesto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Auxiliar social	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Inspector de Interventoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Inspector de Interventoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Inspector de Interventoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
PERSONAL CONTRATISTA	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**TOTAL PERIODO** 341

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*																													SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA																														**0**	**0,00%**	
De la región																														0	0,00%	
De fuera de la región																														0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA																														**0**	**0,00%**	
De la región																														0	0,00%	
De fuera de la región																														0	0,00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS																														**0**	**0,00%**	
De la región	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	155	45,45%	**S**
De fuera de la región	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	186	54,55%	**S**
POBLACIÓN VULNERABLE																														**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social																														0	0,00%	
En condición de desplazamiento																														0	0,00%	
MUJERES																														**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada																														0	0,00%	
Mano de Obra Calificada																														0	0,00%	
Profesionales - Técnicos	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		150	43,99%	**S**
PROVEEDORES																																
Local																																
Nacional																																
Internacional																																

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: Edgar Aragon Otero

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAIRO ANDRES MEZA ROSAS identificado(a) con CC 13874430

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30

Este certificado se expide el día 2023-02-03 a las 04:29.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAIRO ALONSO ZORRO ROA identificado(a) con CC 1031120730

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30

Este certificado se expide el día 2023-02-03 a las 04:30.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ISAAC MANUEL MARTINEZ MARTINEZ identificado(a) con CC 92530837

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30

Este certificado se expide el día 2023-02-03 a las 04:33.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES identificado(a) con CC 1049796249

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30

Este certificado se expide el día 2023-02-03 a las 04:31.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO identificado(a) con CC 1022363189

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	29
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	1
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	29
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	1
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	29
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	1
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	29
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	1
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	29
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	1
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	29
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	1
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	29
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	1
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	29
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	1

Este certificado se expide el día 2023-02-03 a las 04:28.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SANDRA PATRICIA CONTRERAS NAVARRO identificado(a) con CC 1102854339

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30

Este certificado se expide el día 2023-02-03 a las 04:28.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA identificado(a) con CC 11052258

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	27
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	3
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	27
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	3
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	27
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	3
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	27
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	3
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	27
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	3
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	27
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	3
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	27
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	3
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	27
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	3

Este certificado se expide el día 2023-02-03 a las 04:30.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RAFAEL ANTONIO LOPEZ MOLINA identificado(a) con CC 1102874551

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	EPS	CCFC33	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30

Este certificado se expide el día 2023-02-03 a las 04:33.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LEIDER DE JESUS SUAREZ OZUNA identificado(a) con CC 1103109623

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	EPS	CCFC33	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30

Este certificado se expide el día 2023-02-03 a las 04:32.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LEANDRA MARIA OROZCO TOUS identificado(a) con CC 1026565862

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30

Este certificado se expide el día 2023-02-03 a las 04:32.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JULY PAULIN RIOS ANAYA identificado(a) con CC 1102813002

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446547340	1899185246	E	2023-02-03	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30

Este certificado se expide el día 2023-02-03 a las 04:29.

Contratista

enterritorio	CONTROL DE PERSONAL	CÓDIGO:	F-GG-10
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/01/2023 Y EL 31/01/2023 PLAZO: 11 meses

CONTRATISTA: Consorcio Turquia — CONTRATO No. 2220577

INTERVENTOR: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS — CONTRATO No. 2220585

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES 10																														OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CARGO																																
Especialista estructural	NA	NA	NA	1	1	1	1	NA	NA	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	Actividad 1, 2 y 3
Especialista Hidrosanitario	NA	NA	NA	1	1	1	1	NA	NA	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	Actividad 2 y 3
Profesional costos y presupuesto	NA	NA	NA	1	1	1	1	NA	NA	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	Actividad 1, 2 y 3
Profesional Social	NA	NA	NA	3	3	3	3	NA	NA	3	3	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	3	NA	3	3	Actividad 1, 2 y 3
Director de obra	NA	NA	NA	1	1	1	1	NA	NA	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	Actividad 1, 2 y 3
Residente de obra	NA	NA	NA	3	3	3	3	NA	NA	3	3	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	3	NA	3	3	Actividad 2y 3
Profesional de calidad	NA	NA	NA	1	1	1	1	NA	NA	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	Actividad 2 y 3
Tecnico PGIO	NA	NA	NA	1	1	1	1	NA	NA	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	Actividad 2 y 3
oficiales	NA	NA	NA	25	32	30	28	NA	NA	26	26	25	27	31	NA	30	30	32	33	35	34	NA	36	38	34	42	40	41	NA	34	41	Actividad 3
ayudantes	NA	NA	NA	12	17	16	16	NA	NA	15	18	17	14	11	NA	14	16	14	25	24	18	NA	18	20	17	19	18	16	NA	21	24	Actividad 3
almacenista	NA	NA	NA	1	1	1	1	NA	NA	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	Actividad 3
herrero	NA	NA	NA	6	6	6	6	NA	NA	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	NA	6	6	Actividad 3
Auxiliar de bodega	NA	NA	NA	6	6	6	6	NA	NA	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	NA	6	6	Actividad 3
																																Actividad 3
PERSONAL CONTRATISTA	**NA**	**NA**	**NA**	**62**	**74**	**71**	**69**	**NA**	**NA**	**66**	**69**	**67**	**66**	**67**	**NA**	**69**	**71**	**71**	**83**	**84**	**77**	**NA**	**79**	**83**	**76**	**86**	**83**	**82**	**NA**	**80**	**90**	**TOTAL PERIODO**	**1725**

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*																															SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA																																**0**	**0,00%**	
De la región	NA	NA	NA	49	61	58	56	NA	NA	53	56	54	53	54	NA	56	58	58	70	71	64	NA	66	70	63	73	70	69	NA	67	77	1426	82,67%	
De fuera de la región	NA	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA																																**0**	**0,00%**	
De la región	NA	NA	NA	13	13	13	13	NA	NA	13	13	13	13	13	NA	13	13	13	13	13	13	NA	13	13	13	13	13	13	NA	0	13	286	16,58%	
De fuera de la región	NA	NA	NA	1	1	1	1	NA	NA	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	23	1,33%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS																														0		**0**	**0,00%**	
De la región	NA	NA	NA	13	13	13	13	NA	NA	13	13	13	13	13	NA	13	13	13	13	13	13	NA	13	13	13	13	13	13	NA	0	13	286	16,58%	
De fuera de la región	NA	NA	NA	1	1	1	1	NA	NA	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	23	1,33%	
POBLACIÓN VULNERABLE																																**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social																																0	0,00%	
En condición de desplazamiento																																0	0,00%	
MUJERES																																**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada																																0	0,00%	
Mano de Obra Calificada	NA	NA	NA	6	6	6	6	NA	NA	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	NA	6	6	138	8,00%	
Profesionales - Técnicos	NA	NA	NA	6	6	6	6	NA	NA	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	NA	6	6	138	8,00%	
PROVEEDORES																																		
Local																																		
Nacional																																		
Internacional																																		

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: Edgar Aragon Otero

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901570934	7	CONSORCIO TURQUIA	B	2	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CARRERA 4 2 85 KM 3-2	2365738	COORDINADORTURQUIAPCI@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-12	2023-01	25537567	E	2023-02-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.195.400	99.400	Bancolombia

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
11	25537567	2023-01-10	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 26883989	GONZALEZ MEDINA CANDELARIA	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	5345433
2	CC 64699488	BENITEZ DIAZ ANDRY MARY	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.000.000	40.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	4534532
3	CC 64700723	CABALLERO GUERRERO HELENA	1.000.000	F	X	X														0			15	15	15	15	COLPENSION ES-25-14	500.000	80.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	500.000	20.000	CCF DE SUCRE-CCF41	500.000	20.000	500.000	34.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	154.800	S	5345642
4	CC 79534510	DEMERA GACHARNA CARLOS AUGUSTO	1.000.000	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	1234567
5	CC 92548981	ARRIETA GUTIERREZ JOSE LUIS	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.000.000	40.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	1234567
6	CC 1102829998	GONGORA TOVAR HENRY ANDRES	1.000.000	F	X	X														0			15	15	15	15	PROTECCION -230201	500.000	80.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	500.000	20.000	CCF DE SUCRE-CCF41	500.000	20.000	500.000	34.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	154.800	S	1234567
7	CC 1102850002	PATERNINA VITOLA ESTEFANY	1.000.000	F	X															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	5234567
8	CC 1102863131	SUAREZ MARTINEZ JESUS DAVID	1.000.000	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.000.000	40.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	5123456
9	CC 1102863514	MANJARREZ CALDERA SUANY DEL CARMEN	1.000.000	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.000.000	40.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	5234567
10	CC 1115690243	RODRIGUEZ MACANA MARLY DAYANA	1.000.000	F	X															0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	1234567
11	CC 1117491406	CARDENAS MENESES JOSE IGNACIO	1.000.000	F	X															0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.000.000	160.000	0	0	MIN001 - ADRES-MIN001	1.000.000	40.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	1234567

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901570934	7	CONSORCIO TURQUIA	B	2	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4220	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CARRERA 4 2 85 KM 3-2	2365738	COORDINADORTURQUIAPCI@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-12	2023-01	25537567	E	2023-02-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.195.400	99.400	Bancolombia

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
11	25537567		Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				11	1.600.000	0	51.300	0	1.651.300
PROTECCION	230201	800229739	0	2	240.000	0	7.700	0	247.700
PORVENIR	230301	800224808	8	4	640.000	0	20.500	0	660.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	160.000	0	5.200	0	165.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	560.000	0	17.900	0	577.900
EPS(Administradoras: 5)				11	400.000	0	13.000	0	413.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	40.000	0	1.300	0	41.300
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	5	160.000	0	5.200	0	165.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	40.000	0	1.300	0	41.300
MIN001 - ADRES	MIN001	901037916	1	1	40.000	0	1.300	0	41.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	120.000	0	3.900	0	123.900
ARP(Administradoras: 1)				11	696.000	0	22.300	0	718.300
ARL SURA	14-11	890903790	5	11	696.000	0	22.300	0	718.300
CCF(Administradoras: 1)				11	400.000	0	12.800	0	412.800
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	11	400.000	0	12.800	0	412.800
Gran Total					3.096.000	0	99.400	0	3.195.400

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 6889769	0	WILBERTO ECHAVARRIA REYES	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4390	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CARRERA 16 J 43H 12		3135840905			WILBERTOECHAVARRIA539@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-12	2022-12	25536534	Y	2023-02-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.160.200	51.800	Bancolombia
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
30	25536534	2023-01-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 8827655	BADILLO HERAZO JORGE	1.000.000		X	X														0			5	5	0	5	PORVENIR-230301	166.667	26.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	166.667	20.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	166.667	11.700	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	59.300	N	1234567
2	CC 10966190	AGAMEZ ARCIRIA SOVEID LUIS	1.000.000		X	X														0			6	6	0	6	PORVENIR-230301	200.000	32.000	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	200.000	25.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	200.000	14.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	71.000	N	5234567
3	CC 23179538	MEDINA FLOREZ CAROLINA	1.000.000		X	X														0			7	7	0	7	PORVENIR-230301	233.334	37.400	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	233.334	29.200	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	82.900	N	5234567
4	CC 92276415	TORRES PITALUA EVER ENRIQUE	1.000.000		X	X														0			5	5	0	5	COLPENSION ES-25-14	166.667	26.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	166.667	20.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	166.667	11.700	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	59.300	N	5123456
5	CC 92508067	PINEDA RODRIGUEZ JUAN JOSE	1.000.000		X	X														0			6	6	0	6	PORVENIR-230301	200.000	32.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	200.000	25.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	200.000	14.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	71.000	N	5123456
6	CC 92534051	MARTINEZ BELEÑO JORGE LUIS	1.000.000		X	X														0			6	6	0	6	COLPENSION ES-25-14	200.000	32.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	200.000	25.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	200.000	14.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	71.000	N	5123456
7	CC 92538620	ROMERO BETIN MANUEL ANTONIO	1.000.000		X	X														0			7	7	0	7	PORVENIR-230301	233.334	37.400	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	233.334	29.200	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	82.900	N	5123456
8	CC 92559348	PATERNINA CONTRERAS JADER DEL CRISTO	1.000.000		X	X														0			6	6	0	6	PORVENIR-230301	200.000	32.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	200.000	25.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	200.000	14.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	71.000	N	5123456
9	CC 92641557	VERGARA MONTALVO YAN CARLOS	1.000.000		X	X														0			7	7	0	7	PROTECCION-230201	233.334	37.400	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	233.334	29.200	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	82.900	N	5123456
10	CC 1005661546	HERNANDEZ SEPULVEDA VICTOR JOSE	1.000.000		X	X														0			5	5	0	5	COLFONDOS-231001	166.667	26.700	0	0	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	166.667	20.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	166.667	11.700	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	59.300	N	5123456
11	CC 1005664797	VERTEL REYES JORMAN JOSE	1.000.000		X	X														0			6	6	0	6	PORVENIR-230301	200.000	32.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	200.000	25.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	200.000	14.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	71.000	N	5123456
12	CC 1062963206	CUADRADO PEREZ ALEX	1.000.000		X	X														0			5	5	0	5	COLFONDOS-231001	166.667	26.700	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	166.667	20.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	166.667	11.700	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	59.300	N	5123456
13	CC 1101440773	SANCHEZ MERCADO PEDRO MANUEL	1.000.000		X	X														0			5	5	0	5	PORVENIR-230301	166.667	26.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	166.667	20.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	166.667	11.700	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	59.300	N	5123456
14	CC 1102583890	CHARRY TOVAR EDUARDO	1.000.000		X	X														0			7	7	0	7	COLPENSION ES-25-14	233.334	37.400	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	233.334	29.200	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	82.900	N	5123456
15	CC 1102795970	SIMANCA ESCORCIA LEDER FRANCISCO	1.000.000		X	X														0			5	5	0	5	PORVENIR-230301	166.667	26.700	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	166.667	20.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	166.667	11.700	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	59.300	N	5123456
16	CC 1102830896	MARTINEZ MORALES JORGE LUIS	1.000.000		X	X														0			6	6	0	6	COLFONDOS-231001	200.000	32.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	200.000	25.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	200.000	14.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	71.000	N	5123456
17	CC 1102838410	ALVAREZ LUNA OSCAR MANUEL	1.000.000		X	X														0			7	7	0	7	PORVENIR-230301	233.334	37.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	233.334	29.200	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	82.900	N	5123456
18	CC 1102867851	HERNANDEZ SEPULVEDA JOSE ALFREDO	1.000.000		X	X														0			5	5	0	5	PORVENIR-230301	166.667	26.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	166.667	20.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	166.667	11.700	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	59.300	N	5123456
19	CC 1102870774	MEJIA JARABA CHAINY	1.000.000		X	X														0			7	7	0	7	PORVENIR-230301	233.334	37.400	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	233.334	29.200	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	82.900	N	5123456
20	CC 1102873396	GENES CELIS JESUS YEISON	1.000.000		X	X														0			5	5	0	5	PROTECCION-230201	166.667	26.700	0	0	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	166.667	20.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	166.667	11.700	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	59.300	N	5123456
21	CC 1102880282	RUIZ SOLAR RONALD DAVID	1.000.000		X	X														0			6	6	0	6	PROTECCION-230201	200.000	32.000	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33	200.000	25.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	200.000	14.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	71.000	N	5123456
22	CC 1102881938	ARIAS PEREZ ANDERSON	1.000.000		X	X														0			7	7	0	7	PORVENIR-230301	233.334	37.400	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	233.334	29.200	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	82.900	N	5123456
23	CC 1104257364	ROMERO RODRIGUEZ LUIS MANUEL	1.000.000		X	X														0			5	5	0	5	PORVENIR-230301	166.667	26.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	166.667	20.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	166.667	11.700	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	59.300	N	5123456

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF		RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
24	CC 1148946197	DELGADO RUIZ LUIS ALBERTO	1.000.000		X	X														0			6	6	0	6	COLFONDOS-231001	200.000	32.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	200.000	25.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	200.000	14.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	71.000	N	5123456
25	CC 1193280561	DELGADO RUIZ LUIS ANDRES	1.000.000		X	X														0			7	7	0	7	PORVENIR-230301	233.334	37.400	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	233.334	29.200	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	82.900	N	5123456
26	CC 1193393466	ATENCIA RIOS ELIUT DAVID	1.000.000		X	X														0			5	5	0	5	PROTECCION-230201	166.667	26.700	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33	166.667	20.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	166.667	11.700	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	59.300	N	5123456
27	CC 1193559075	ACOSTA CANOLES JESUS DAVID	1.000.000		X	X														0			6	6	0	6	PORVENIR-230301	200.000	32.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	200.000	25.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	200.000	14.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	71.000	N	5123456
28	PT 5204587	JOSEPH PABON JIMMY RICHARDSON	1.000.000		X	X														0			7	7	0	7	PORVENIR-230301	233.334	37.400	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	233.334	29.200	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	82.900	N	5123456
29	PT 5366516	PADRON LINARES JOSE PASCUAL	1.000.000		X	X														0			5	5	0	5	PORVENIR-230301	166.667	26.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	166.667	20.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	166.667	11.700	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	59.300	N	5123456
30	PT 6062156	DIAZ GLECIANO JAMPIER JOSE	1.000.000		X	X														0			6	6	0	6	PROTECCION-230201	200.000	32.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	200.000	25.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	200.000	14.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	71.000	N	5123456

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 6889769	0	WILBERTO ECHAVARRIA REYES	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4390	Natural
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
70-1	CARRERA 16 J 43H 12		3135840905			WILBERTOECHAVARRIA539@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-12	2022-12	25536534	Y	2023-02-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.160.200	51.800	Bancolombia
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LIMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
30	25536534		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.933.343	5.933.343	5.933.343	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				30	950.300	0	23.200	0	973.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	4	117.400	0	2.900	0	120.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	96.100	0	2.400	0	98.500
PROTECCION	230201	800229739	0	5	154.800	0	3.800	0	158.600
PORVENIR	230301	800224808	8	18	582.000	0	14.100	0	596.100
EPS(Administradoras: 8)				30	742.700	0	18.600	0	761.300
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	4	91.900	0	2.300	0	94.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	45.900	0	1.200	0	47.100
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	8	212.700	0	5.200	0	217.900
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	2	45.900	0	1.200	0	47.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	4	91.800	0	2.300	0	94.100
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	3	75.100	0	1.900	0	77.000
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	2	41.800	0	1.100	0	42.900
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	5	137.600	0	3.400	0	141.000
ARP(Administradoras: 1)				30	415.400	0	10.000	0	425.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	30	415.400	0	10.000	0	425.400
Gran Total					2.108.400	0	51.800	0	2.160.200

EMPLEADO					NOVEDADES																						DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 8827655	BADILLO HERAZO JORGE	1.000.000		X	X														0			5	5	0	5	PORVENIR-230301	166.667	26.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	166.667	20.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	166.667	11.700	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	59.300	N	1234567
2	CC 10966190	AGAMEZ ARCIRIA SOVEID LUIS	1.000.000		X	X														0			6	6	0	6	PORVENIR-230301	200.000	32.000	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	200.000	25.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	200.000	14.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	71.000	N	5234567
3	CC 23179538	MEDINA FLOREZ CAROLINA	1.000.000		X	X														0			7	7	0	7	PORVENIR-230301	233.334	37.400	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	233.334	29.200	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	82.900	N	5234567
4	CC 92276415	TORRES PITALUA EVER ENRIQUE	1.000.000		X	X														0			5	5	0	5	COLPENSION ES-25-14	166.667	26.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	166.667	20.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	166.667	11.700	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	59.300	N	5123456
5	CC 92508067	PINEDA RODRIGUEZ JUAN JOSE	1.000.000		X	X														0			6	6	0	6	PORVENIR-230301	200.000	32.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	200.000	25.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	200.000	14.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	71.000	N	5123456
6	CC 92534051	MARTINEZ BELEÑO JORGE LUIS	1.000.000		X	X														0			6	6	0	6	COLPENSION ES-25-14	200.000	32.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	200.000	25.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	200.000	14.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	71.000	N	5123456
7	CC 92538620	ROMERO BETIN MANUEL ANTONIO	1.000.000		X	X														0			7	7	0	7	PORVENIR-230301	233.334	37.400	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	233.334	29.200	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	82.900	N	5123456
8	CC 92559348	PATERNINA CONTRERAS JADER DEL CRISTO	1.000.000		X	X														0			6	6	0	6	PORVENIR-230301	200.000	32.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	200.000	25.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	200.000	14.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	71.000	N	5123456
9	CC 92641557	VERGARA MONTALVO YAN CARLOS	1.000.000		X	X														0			7	7	0	7	PROTECCION-230201	233.334	37.400	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	233.334	29.200	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	82.900	N	5123456
10	CC 1005661546	HERNANDEZ SEPULVEDA VICTOR JOSE	1.000.000		X	X														0			5	5	0	5	COLFONDOS-231001	166.667	26.700	0	0	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	166.667	20.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	166.667	11.700	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	59.300	N	5123456
11	CC 1005664797	VERTEL REYES JORMAN JOSE	1.000.000		X	X														0			6	6	0	6	PORVENIR-230301	200.000	32.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	200.000	25.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	200.000	14.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	71.000	N	5123456
12	CC 1062963206	CUADRADO PEREZ ALEX	1.000.000		X	X														0			5	5	0	5	COLFONDOS-231001	166.667	26.700	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	166.667	20.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	166.667	11.700	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	59.300	N	5123456
13	CC 1101440773	SANCHEZ MERCADO PEDRO MANUEL	1.000.000		X	X														0			5	5	0	5	PORVENIR-230301	166.667	26.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	166.667	20.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	166.667	11.700	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	59.300	N	5123456
14	CC 1102583890	CHARRY TOVAR EDUARDO	1.000.000		X	X														0			7	7	0	7	COLPENSION ES-25-14	233.334	37.400	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	233.334	29.200	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	82.900	N	5123456
15	CC 1102795970	SIMANCA ESCORCIA LEDER FRANCISCO	1.000.000		X	X														0			5	5	0	5	PORVENIR-230301	166.667	26.700	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	166.667	20.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	166.667	11.700	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	59.300	N	5123456
16	CC 1102830896	MARTINEZ MORALES JORGE LUIS	1.000.000		X	X														0			6	6	0	6	COLFONDOS-231001	200.000	32.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	200.000	25.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	200.000	14.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	71.000	N	5123456
17	CC 1102838410	ALVAREZ LUNA OSCAR MANUEL	1.000.000		X	X														0			7	7	0	7	PORVENIR-230301	233.334	37.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	233.334	29.200	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	82.900	N	5123456
18	CC 1102867851	HERNANDEZ SEPULVEDA JOSE ALFREDO	1.000.000		X	X														0			5	5	0	5	PORVENIR-230301	166.667	26.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	166.667	20.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	166.667	11.700	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	59.300	N	5123456
19	CC 1102870774	MEJIA JARABA CHAINY	1.000.000		X	X														0			7	7	0	7	PORVENIR-230301	233.334	37.400	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	233.334	29.200	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	82.900	N	5123456
20	CC 1102873396	GENES CELIS JESUS YEISON	1.000.000		X	X														0			5	5	0	5	PROTECCION-230201	166.667	26.700	0	0	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	166.667	20.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	166.667	11.700	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	59.300	N	5123456
21	CC 1102880282	RUIZ SOLAR RONALD DAVID	1.000.000		X	X														0			6	6	0	6	PROTECCION-230201	200.000	32.000	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33	200.000	25.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	200.000	14.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	71.000	N	5123456
22	CC 1102881938	ARIAS PEREZ ANDERSON	1.000.000		X	X														0			7	7	0	7	PORVENIR-230301	233.334	37.400	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	233.334	29.200	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	82.900	N	5123456
23	CC 1104257364	ROMERO RODRIGUEZ LUIS MANUEL	1.000.000		X	X														0			5	5	0	5	PORVENIR-230301	166.667	26.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	166.667	20.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	166.667	11.700	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	59.300	N	5123456
24	CC 1148946197	DELGADO RUIZ LUIS ALBERTO	1.000.000		X	X														0			6	6	0	6	COLFONDOS-231001	200.000	32.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	200.000	25.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	200.000	14.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	71.000	N	5123456
25	CC 1193280561	DELGADO RUIZ LUIS ANDRES	1.000.000		X	X														0			7	7	0	7	PORVENIR-230301	233.334	37.400	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	233.334	29.200	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	82.900	N	5123456
26	CC 1193393466	ATENCIA RIOS ELIUT DAVID	1.000.000		X	X														0			5	5	0	5	PROTECCION-230201	166.667	26.700	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33	166.667	20.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	166.667	11.700	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	59.300	N	5123456
27	CC 1193559075	ACOSTA CANOLES JESUS DAVID	1.000.000		X	X														0			6	6	0	6	PORVENIR-230301	200.000	32.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	200.000	25.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	200.000	14.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	71.000	N	5123456
28	PT 5204587	JOSEPH PABON JIMMY RICHARDSON	1.000.000		X	X														0			7	7	0	7	PORVENIR-230301	233.334	37.400	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	233.334	29.200	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	82.900	N	5123456
29	PT 5366516	PADRON LINARES JOSE PASCUAL	1.000.000		X	X														0			5	5	0	5	PORVENIR-230301	166.667	26.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	166.667	20.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	166.667	11.700	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	59.300	N	5123456
30	PT 6062156	DIAZ GLECIANO JAMPIER JOSE	1.000.000		X	X														0			6	6	0	6	PROTECCION-230201	200.000	32.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	200.000	25.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	200.000	14.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	71.000	N	5123456

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 6889769	0	WILBERTO ECHAVARRIA REYES	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4390	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CARRERA 16 J 43H 12	3135840905	WILBERTOECHAVARRIA539@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-12	2022-12	25536534	Y	2023-02-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.160.200	51.800	Bancolombia

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
30	25536534		Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.933.343	5.933.343	5.933.343	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				30	950.300	0	23.200	0	973.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	4	117.400	0	2.900	0	120.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	96.100	0	2.400	0	98.500
PROTECCION	230201	800229739	0	5	154.800	0	3.800	0	158.600
PORVENIR	230301	800224808	8	18	582.000	0	14.100	0	596.100
EPS(Administradoras: 8)				30	742.700	0	18.600	0	761.300
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	4	91.900	0	2.300	0	94.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	45.900	0	1.200	0	47.100
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	8	212.700	0	5.200	0	217.900
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	2	45.900	0	1.200	0	47.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	4	91.800	0	2.300	0	94.100
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	3	75.100	0	1.900	0	77.000
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	2	41.800	0	1.100	0	42.900
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	5	137.600	0	3.400	0	141.000
ARP(Administradoras: 1)				30	415.400	0	10.000	0	425.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	30	415.400	0	10.000	0	425.400
Gran Total					2.108.400	0	51.800	0	2.160.200

Anexo 15. Control de seguridad industrial

	CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	CÓDIGO:	F-GG-24
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-19

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA					
NÚMERO DE CONTRATO:	2220585	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	1/01/2023	**Y EL**	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA					
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES					

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	x		El Contratista dispuso de tres camiones y dos camionetas que distribuyen los materiales desde la bodega principal hacia puntos de acopio localizados directamente en el barrio El Poblado o a las viviendas intervenidas. También se cuenta con dos motocarros en obra, los cuales distribuyen los materiales desde los diferentes puntos de acopios temporales hacia las viviendas intervenidas. En el periodo utilizó cortadoras y pulidoras para el corte de ladrillos, acero, ceramica, estos se encontraban en buen estado.
- Regularidad del mantenimiento	x		
- Vibraciones /Ruidos	x		En la ejecucion de las actividades que se realizan en el proyecto no se generan riesgos asociados a vibraciones de gran magnitud. Para el controlde ruido Los trabajadores utilizan proteccion auditiva en el uso de cortadoras y pulidoras.
- Protecciones / Guardas / Frenos	x		Se realizan los preoperacionales a vehiculos y maquinaria en obra
- Idoneidad operarios	x		Los conductores de vehiculos cuentan con la licencia de conduccion respectiva
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	X		El campamento cuenta con puntos de atención de emergencias y primeros auxilios, conformados por camillas, botiquín, extintores, kid antiderrames.
- Buen estado	X		Durante el periodoel campamento se mantuvo ordenado y se evidenció un correcto almacenamiento de los materiales.
- Fácil acceso y operación	X		El campamento principal cuenta con facil acceso
DOTACIÓN DEL PERSONAL			

	CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	CÓDIGO:	F-GG-24
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-19

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA					
NÚMERO DE CONTRATO:	2220585	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	1/01/2023	**Y EL**	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA					
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES					

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
- Dotación completa	X		Parcialmente. El Contratista realizó entrega de dotación y Elementos de Protección al personal que se vinculó al proyecto y aquellos trabajadores que no contaban con EPP requeridos, pese a lo anterior se observó en recorridos de obra realizados por interventoría que, en algunas viviendas en intervención, el personal no contaba con los EPP requeridos para la ejecución de actividades constructivas, razón por la cual la Interventoría mediante correo electrónico de fecha 16 y 18 de enero 2023 respectivamente, solicitó al Contratista retirar de la obra a estos trabajadores hasta tanto no se les suministrara los EPP necesarios para el desarrollo de sus actividades y dar cumplimiento al SGSST con el fin de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
- Buen estado	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		Parcialmene. En las actividades donde se realizan excavaciones se requere mejorar la delimitacion y demarcacion de areas y dar cumplimiento total al procedimiento de manejo de excavaciones establecido en el SGSST
- Uso según zona de trabajo	X		
VIGILANCIA			
- Personal suficiente	X		Se mantuvo personal suficiente para la vigilancia en el area administrativa y en el campamento principal.
- Diurna	X		
- Nocturna	X		
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia	X		
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		El personal que ingresó a trabajar en el mes de enero de 2023 en el proyecto fue afiliado a seguridad social integral

Firma: _____

Nombre: Edgar Aragon Otero

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo 16. Cumplimiento ambiental

CONTROL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA				
NÚMERO DE CONTRATO:	2220585	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	1/01/2023	**Y EL**	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA				
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES				

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
PERMISOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES			
Se cuenta con licencia ambiental y registro minero de las canteras donde se extare el material petereo	x		Teniendo en cuenta que se mantuvieron los proveedores que suministran los materiales pétreos utilizados en el proyecto, se mantienen vigentes los permisos, autorizaciones, licencias ambientales vigentes, de las canteras donde se extraen estos materiales.
Cuenta con autorizacion para la disposicion de RCD	x		Los escombros son donados a la comundad para el areglo de vias o para rellenos de patios, lo anterior con previa solicitud del propietario.
MAJEJO DE SEÑALIZACION			
Los frentes de trabajo se encuentran señalizados y demarcados	X		Parcialmente, Se debe mejorar y reforzar la señalizacion de las areas donde se realizan excavaciones.
Los materiales almacenados en los frentes de obra están ubicados y acordonados dentro de la señalización del frente de obra y no deberán obstaculizar el tránsito vehicular y peatonal.	X		Durante el periodo se obsevó mejoria en el almacenamiento de materiales en las viviendas intervenidas o que se van realizar su apertura.
Los materiales de obra y los escombros, se ubicarán en sitios que no interfieran con el tránsito peatonal.	X		Los escombros son donados a la comundad para el areglo de vias o para rellenos de patios, lo anterior con previa solicitud del propietario.
MANEJO DE MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS			
Los vehículos que se encuentran operando actualmente en el proyecto cuentan con las revisiones técnico-mecánicas, vigentes y expedidas en un sitio autorizado por la autoridad competente.	X		Los vehiculos cuentan co revision tecnomecanica vigente.
Las volquetas utilizan carpas para cubrir los materiales para la construccion el transporte de los mismos.	X		Las volquetas que realizaron el transporte de materiales hasta la bodega principal y hacia los puntos de acopio localizados en el Barrio el Poblado, utilizaron carpas, cumpliendo con todas las normas y disposiciones de la Secretaría tránsito Municipal y de la Resolución N° 0472 de 2017 y Resolución N° 1257 de 2021 de Minambiente, para la realización de esta actividad.
Las operaciones de mantenimiento de la maquinaria se adelantan únicamente en sitios autorizados	X		
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS			
Se cuenta con recipientes adecuados para el almcacenamiento y separacion de los residuos solidos que se generen en el proyecto.	X		El Contratista cuenta con puntos ecologicos para el almacenamiento y separacion de residuos en obra
se realiza disposicion final adecuada de los residuos generados en el proyecto	X		
CONTROL DE AGREGADOS PETREOS			

CONTROL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA				
NÚMERO DE CONTRATO:	2220585	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	1/01/2023	**Y EL**	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA				
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES				

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Se realiza un correcto almacenamiento de los materiales petreos que se utilizan en la ejecucion de actividades constructivas.	X		El contratista realizó acopio temporal de materiales pétreos en el campamento principal, estos materiales permanecen cubiertos con plástico para evitar la emisión de polvo, material particulado y el arrastre del material por efecto de las aguas lluvias mientras son trasladados al barrio el Poblado para la distribución a las viviendas intervenidas. También se establecieron puntos de acopio en el Barrio El Poblado, donde posteriormente estos materiales son trasladados en motocarro o en los camiones y vehículos disponibles por el Contratista hacia las viviendas intervenidas o que se van aperturar.
Los materiales dispuestos temporalmente serán cubiertos para evitar emisiones a la atmosfera y arrastre por efectos de la lluvia	X		Parcialmente. Se requiere el cubrimiento del material acopiado en los puntos dispuestos en el Barrio El Poblado, cuando estos no son distribuidos en su totalidad hacia las viviendas intervenidas.
Los sitios de acopio de materiales granulares se encuentran retirados de cuerpos de agua o zonas de vegetación.	X		
El cemento es acopiado en un lugar seco y aislados del suelo.	X		Se cumple con este aspecto.
CAMPAMENTOS Y AREA DE ALMACENES			
El campamento o almcenes se encuentran ordenados, aseados y señalizados de forma correcta	X		Durante el periodo se observó el campamento principal y las areas para el almacenamiento de materiales ordenas y aseadas.
El campamento cuenta con equipos para control de incendios –extintores	X		Los campamentos principales cuentan con equipos de control de incendios.
El campamento cuenta con punto de atencion de primeros auxilios	X		Se cuenta con punto de primeros auxilios
MANEJO DE ESCOMBROS			
Ese realiza un manejo adecuado de los escombros que se generan en el proyecto	X		Los escombros son reutilizados para el relleno de patios o lotes. Se generan pcos escombros en el proyecto.
CAPACITACIONES			
Se realiza capacitación permanente, para sensibilizar y evitar acciones que atenten contra el equilibrio ambiental de la zona donde se desarrolla el proyecto.	X		Se realizan charlas permanentes a los trabajadores



Firma: _____

Nombre: Edgar Aragon Otero

Director de Interventoria

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-01 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION

FECHA: 3/02/2022
CIUDAD: Sincelejo

Yo Enelvis Ruiz estrada, identificado con CC 1102829594 de Sincelejo solicito formalmente al **CONSORCIO TURQUIA**, contratista de las obras **"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005" GRUPO 1: SINCELEJO (SUCRE)"**, que los residuos de escombros y/o excavación generados por las actividades de construcción sean donados y dispuestos en la siguiente dirección: Manza 72 Vivienda 549 y los cuales serán utilizados para:

estabilizacion y relleno del terreno

Agradezco la atencion Prestada

Enelvis Ruiz

FIRMA

CC: 1102829594

Powered by CamScanner

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-02 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DONACION DE MATERIAL

Se reunieron el Señor (a) Enelvis Ruiz estrada Identificado con Cedula de Ciudadanía N° 1102829594 de Sincelejo y Andry Mary Benítez en calidad de Técnico PGIO en nombre de CONSORCIO TURQUÍA, con el fin de entregar por parte del Consorcio material de Escombro. Este material es solicitado por el Señor (a) en mención, así mismo el propietario del predio donde se dispondrá este material deberá cumplir con los siguientes compromisos:

1. La conformación del material donado estará a cargo del propietario del predio.
2. El beneficiario no podrá acopiar el material en lugares donde pueda afectar a fuentes hídricas o causar daños al medio ambiente.
3. Los materiales no pueden ser negociados o vendidos a terceros.
4. El propietario será el único responsable de afectación o daños a terceros ya sea económica y/o ambientalmente.
5. Teniendo en cuenta que el material no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para la construcción de obras de infraestructura como viviendas, locales comerciales entre otros, no se podrá utilizar para tal fin.

Quien recibe el material se compromete a darle un manejo adecuado al mismo, en su predio sin responsabilidad alguna del CONSORCIO TURQUÍA. El volumen dispuesto es 9,8m3

Se entrega a satisfacción del propietario sin reclamo alguno en tiempos posteriores.

Se firma a los 2 días del mes Dic de 2022

Enelvis Ruiz

Nombre y firma de quien recibe.

1102829594

Nombre y firma de quien entrega

Cargo: Técnico PGIO

Powered by CamScanner

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-01 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION

FECHA: 27/12/22
CIUDAD: Sincelejo

Yo Jose de Jesus Perez Rivero identificado con CC 92.546.692 de Sincelejo solicito formalmente al **CONSORCIO TURQUIA**, contratista de las obras **"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005" GRUPO 1: SINCELEJO (SUCRE)"**, que los resíduos de escombros y/o excavación generados por las actividades de construcción sean donados y dispuestos en la siguiente dirección: Manzana 50 Casa 606 y los cuales serán utilizados para:

Rellenos y estabilizacion del terreno

Agradezco la atencion Prestada

.JOSE

FIRMA

CC: .92546692

Powered by CamScanner

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-02 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DONACION DE MATERIAL

Se reunieron el Señor (a) Jose de jesus Toro Pivon Identificado con Cedula de Ciudadanía N° 92546692 de Sincelejo y Andry Mary Benitez en calidad de Técnico PGIO en nombre de CONSORCIO TURQUÍA, con el fin de entregar por parte del Consorcio material de Escombro. Este material es solicitado por el Señor (a) en mención, así mismo el propietario del predio donde se dispondrá este material deberá cumplir con los siguientes compromisos:

1. La conformación del material donado estará a cargo del propietario del predio.
2. El beneficiario no podrá acopiar el material en lugares donde pueda afectar a fuentes hídricas o causar daños al medio ambiente.
3. Los materiales no pueden ser negociados o vendidos a terceros.
4. El propietario será el único responsable de afectación o daños a terceros ya sea económica y/o ambientalmente.
5. Teniendo en cuenta que el material no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para la construcción de obras de infraestructura como viviendas, locales comerciales entre otros, no se podrá utilizar para tal fin.

Quien recibe el material se compromete a darle un manejo adecuado al mismo, en su predio sin responsabilidad alguna del CONSORCIO TURQUÍA. El volumen dispuesto es 9,7m3

Se entrega a satisfacción del propietario sin reclamo alguno en tiempos posteriores.

Se firma a los 27 días del mes Dic de 2022

JOSE

Nombre y firma de quien recibe.
92546692

Nombre y firma de quien entrega

Cargo: Técnico PGIO

Powered by CamScanner

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-01 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION

FECHA: 25/12/2022

CIUDAD: Sincelejo

Yo María Arroyo Arrieta, identificado con CC 1005441167 de Sincelejo solicito formalmente al **CONSORCIO TURQUIA**, contratista de las obras **"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005" GRUPO 1: SINCELEJO (SUCRE)"**, que los residuos de escombros y/o excavación generados por las actividades de construcción sean donados y dispuestos en la siguiente dirección: Manzana 62 casa 495 y los cuales serán utilizados para:

Relleno y estabilización del terreno.

Agradezco la atencion Prestada

María Arroyo.

FIRMA

CC: 1005441167.

Powered by CamScanner

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-02 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DONACION DE MATERIAL

Se reunieron el Señor (a) María Amaya Arrieta Identificado con Cedula de Ciudadanía N° 1005441167 de Sincelejo y Andry Mary Benitez en calidad de Técnico PGIO en nombre de CONSORCIO TURQUÍA, con el fin de entregar por parte del Consorcio material de Escombro. Este material es solicitado por el Señor (a) en mención, así mismo el propietario del predio donde se dispondrá este material deberá cumplir con los siguientes compromisos:

1. La conformación del material donado estará a cargo del propietario del predio.
2. El beneficiario no podrá acopiar el material en lugares donde pueda afectar a fuentes hídricas o causar daños al medio ambiente.
3. Los materiales no pueden ser negociados o vendidos a terceros.
4. El propietario será el único responsable de afectación o daños a terceros ya sea económica y/o ambientalmente.
5. Teniendo en cuenta que el material no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para la construcción de obras de infraestructura como viviendas, locales comerciales entre otros, no se podrá utilizar para tal fin.

Quien recibe el material se compromete a darle un manejo adecuado al mismo, en su predio sin responsabilidad alguna del CONSORCIO TURQUÍA. El volumen dispuesto es 94m3

Se entrega a satisfacción del propietario sin reclamo alguno en tiempos posteriores.

Se firma a los 26 días del mes Dic de 2022

María Arroyo

Nombre y firma de quien recibe.

1005441167

Nombre y firma de quien entrega

Cargo: Técnico PGIO

Powered by CamScanner

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-01 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION

FECHA: 26/12/2022
CIUDAD: Sincelejo

Yo Sixto Manuel Fuente Sneider identificado con CC 4.835.943 de Tierra Alta solicito formalmente al **CONSORCIO TURQUIA,** contratista de las obras **"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005" GRUPO 1: SINCELEJO (SUCRE)",** que los residuos de escombros y/o excavación generados por las actividades de construcción sean donados y dispuestos en la siguiente dirección: Manzana 66 Casa 564 y los cuales serán utilizados para:

Relleno y estabilización del terreno

Agradezco la atencion Prestada

Sixto

FIRMA

CC: 4.835.943

Powered by CamScanner

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-02 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DONACION DE MATERIAL

Se reunieron el Señor (a) Sixto Ramon Benitez Fuentes identificado con Cedula de Ciudadanía N° 4.835.913 de Tierra alta y Endry Mary Benitez en calidad de Técnico PGIO en nombre de CONSORCIO TURQUÍA, con el fin de entregar por parte del Consorcio material de Escombro. Este material es solicitado por el Señor (a) en mención, así mismo el propietario del predio donde se dispondrá este material deberá cumplir con los siguientes compromisos:

1. La conformación del material donado estará a cargo del propietario del predio.
2. El beneficiario no podrá acopiar el material en lugares donde pueda afectar a fuentes hídricas o causar daños al medio ambiente.
3. Los materiales no pueden ser negociados o vendidos a terceros.
4. El propietario será el único responsable de afectación o daños a terceros ya sea económica y/o ambientalmente.
5. Teniendo en cuenta que el material no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para la construcción de obras de infraestructura como viviendas, locales comerciales entre otros, no se podrá utilizar para tal fin.

Quien recibe el material se compromete a darle un manejo adecuado al mismo, en su predio sin responsabilidad alguna del CONSORCIO TURQUÍA. El volumen dispuesto es 0,7 m³

Se entrega a satisfacción del propietario sin reclamo alguno en tiempos posteriores.

Se firma a los 26 días del mes Dic de 2022.

SIXTO RAMON BENITEZ FUENTES

Nombre y firma de quien recibe.

4.835913

Nombre y firma de quien entrega

Cargo: Técnico PGIO

Powered by CamScanner

Anexo 17. Informes semanales

enterritorio	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 38

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **2/01/2023** al **8/01/2022** | Fecha **9/01/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

código PROYECTO	2220577				
OBJETO DEL PROYECTO	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO**	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	
GERENCIA A CARGO	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1				
SUPERVISOR	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ				
ESTADO DEL PROYECTO	En ejecución.				

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220577		
Contratista	CONSORCIO TURQUIA		
Valor inicial	$ 5.034.941.972,00		
Adición No. 1	N/A		
Valor actual	$ 5.034.941.972,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial (Días)	244 Días		
Prorroga No. 1	90 Días		
Plazo actual (Días)	334 Días	100,00%	
Variación en plazo	90 Días		
Fecha Contractual de terminación	13/03/2023		
Tiempo Transcurrido (días)	-94	-28,14%	
Días remanentes del Contrato	428	128,14%	
Acumulado a última acta pagada	$ 2.820.263.489,10		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

2.2 CONTRATO DE Interventoría

Contrato No.	2220585		
Interventor	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.		
Valor inicial	$ 542.723.071,00		
Adición No. 1	$ 150.072.084,00		
Valor actual	$ 692.795.155,00		
Variación del valor	$ 150.072.084,00		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial	244 Días		
Prorroga No. 1	90 Días		
Plazo actual	334 Días	100,00%	
Variación en plazo	90 Días		
Fecha Contractual de terminación	13/03/2023		
Ejecución del Contrato	-94	-28,14%	
Días remanentes del Contrato	428	128,14%	
Acumulado a última acta pagada	$ 339.826.050,90		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPENO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 5.034.941.972,00

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 3.137.981.104,82	62,32%	$ 3.174.027.419,15	63,04%	$ 36.046.314,33	0,72%
Durante el Periodo	$ 111.585.933,36	2,22%	$ 30.394.744,28	0,60%	$ -81.191.189,08	-1,61%
Acumulado a la Fecha	$ 3.249.567.038,18	**64,54%**	$ 3.204.422.163,43	**63,64%**	$ -45.144.874,75	**-0,90%**

Semáforo

Desviación en días: -2 Días

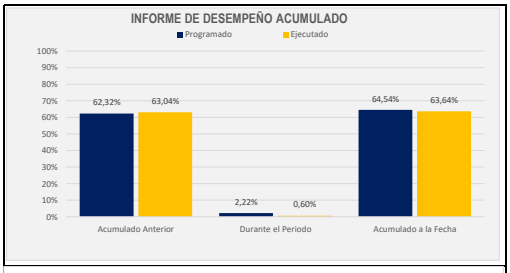

Observaciones al desempeño del proyecto


Actividad 1. *Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquia. Aprobado por interventoria con cartas GA-DOMI-040-22 del dia 31 de mayo de 2022 y radicado en ENTERRITORIO bajo el N°. 20224300206752 y GA-DOMI-030-22 radicado N°. 20224300189742.*


Actividad 2. *Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoria, por el Contratista de obra, un total de 64 4 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 640 diagnósticos acumulados. Hay 46 diagnósticos no efectivos y Tres (3) renuncias.*

Actividad 3. *A corte de este informe el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 429 viviendas, de las cuales 417 están terminadas, 12 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 211 para inicio de actividades.*

Actividad 4. *Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas, y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.*

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

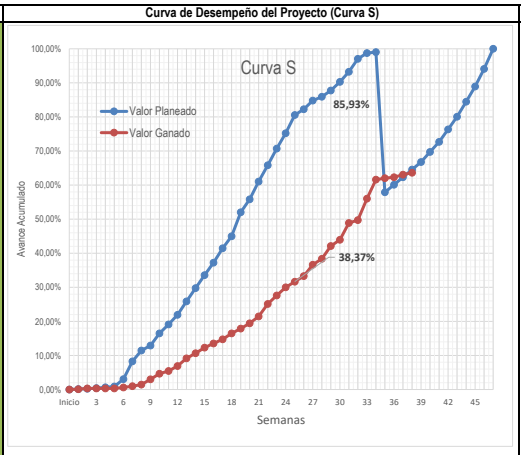

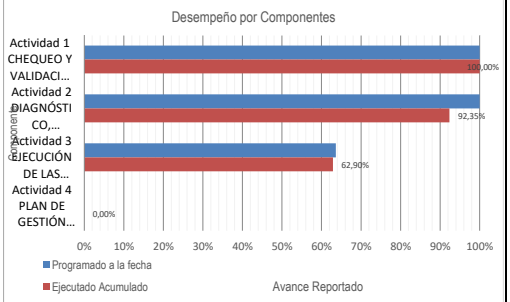

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE


DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

* Se ajusta la curva S del proyecto conforme a la capacitación dada el 28 de abril de 2022 por parte del supervisor de ENTERRITORIO.
* La Entidad mediante la suscripción del Modificatorio No. 1 del 13 de diciembre de 2022 se da aval a ampliar el plazo de la ejecución de las obras hasta el día 13 de marzo de 2023, tiempo que no generará costos adicionales a la Entidad y el contratista de obra asume el costo de mayor permanencia de Interventoría. Por consiguiente se realiza el ajuste de la curva S de las actividades de obra conforme a la reprogramacion realizada por el Consorcio Turquía con carta CONS-TUR-SINC-163 del 21 de noviembre de 2022, la cual fue revisada por Interventoría y avalada con la comunicación GA-DOMI-217-22 del día 25 de noviembre de 2022 radicado No. 20224300453802.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	62,32%	63,04%	0,72%	
Durante el Periodo	2,22%	0,60%	-1,61%	
Acumulado a la Fecha	**64,54%**	**63,64%**	**-0,90%**	

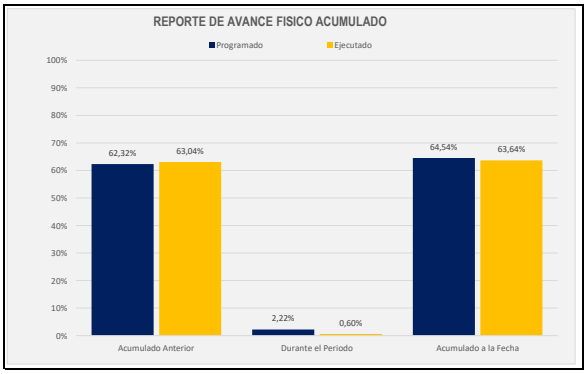

AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 5.034.941.972,00	$ 5.034.941.972,00	$ -	$ 981.956.213,60	$ 841.887.956,54	$ 140.068.257,06

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
6	$ 2.820.263.489,10	56,01%	6	$ 2.820.263.489,10	56,01%	9/12/2022	$ 769.913.798,72








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 542.723.071,00	$ 692.795.155,00	$ 150.072.084,00	N/A	N/A	N/A

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
8	$ 339.826.050,90	49,05%	8	$ 339.826.050,90	49,05%	12/12/2022	$ 54.489.396,32







INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 38

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **2/01/2023** al **8/01/2022** Fecha **9/01/2022**

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA APROBADO.

* Actividad 1. Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, se presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía.

* Actividad 2. Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoría, por el Contratista de obra, un total de 644 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 640 diagnósticos acumulados. Está pendiente de atención de observaciones de 3 diagnóstico y uno (1) por realizar la visita para diagnosticar la vivienda. De acuerdo al informe técnico entregado por el FOVIS de las manzanas 40A, 38A Y 38, hay once (11) diagnósticos que pasarían a ser no efectivos ya que las viviendas se encuentran en zona de riesgo, por lo tanto, el total de diagnósticos no efectivos se eleva a 46 y tres (3) renuncias.

* Actividad 3. A corte de este informe, el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 429 viviendas, de las cuales 417 están terminadas, 12 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 211 para inicio de actividades.

* Actividad 4. Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.

Actividad 2.

Diagnósticos programación inicial: 693
Diagnósticos reprogramación: 693
Diagnósticos Aprobados acumulados: 640
Viviendas con observaciones de diagnóstico: 3
Viviendas efectivas: 644
Viviendas no efectivas: 46
Renuncias: 3

Actividad 3.

Viviendas programación inicial: 693
Viviendas reprogramación: 420
Viviendas terminadas: 417
Viviendas en ejecución: 12
Viviendas totales iniciadas: 429

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

• Con carta GA-DOMI-248-22 del día 04 de enero de 2022, esta interventoría procedió a enviar el informe semanal # 37.

ACTIVIDADES EN CAMPO

* El día 02 de enero de 2023 el Consorcio Turquía no laboro en el dia de hoy.

* El día 03 de enero de 2023 el Consorcio Turquía no laboro en el dia de hoy.

* El día 04 de enero de 2023, el contratista continuó con las actividades de instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención, instalación de enchape, pintura y atendiendo detalles de la casetas terminadas. El 04 de enero de 2023 no se realizaron aperturas .

* El día 05 de enero de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. El dia 05 de enero de 2023 se realizaron dos (2) aperturas bajo los codigos N°. S-SC-EP-M05-VE-047 y S-SC-EP-M41-VE-285.

* El día 06 de enero de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. El dia 06 de enero de 2023 se realizaron dos (2) aperturas bajo los codigos N°. S-SC-EP-M01-VE-092, S-SC-EP-M6-VE-656

* El día 07 de enero de 2023, el contratista continuó con las actividades de instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención, instalación de enchape, pintura y atendiendo detalles de la casetas terminadas. El 07 de enero de 2023 se realizo una (1) apertura bajo el código N°. S-SC-EP-M25-VE-664.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

* Se continuará con la intervención de las viviendas en el barrio El Poblado en Sincelejo Sucre.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	149	0	149	71,6%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	35	0	35	16,8%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	8	0	8	3,8%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál? Orden público	16	0	16	7,7%
	Total	208	0	208	100,00%



En la semana no se presentaron lluvias.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
Tipología PQR	Radicado por		Fecha	Asunto	Dirigido a	Respuesta Alcaldía / FOVIS
Inclusión	No. de PQR 1 Yessica Cantello		20 mayo del 2022	El/La señor(a) Yessica Cantello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 2 Betilda Gonzales		25 mayo del 2022	El/La señor(a) Betilda Gonzales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 40 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 3 Luz Dary Ruiz		25 mayo del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 4 Jorge Guerra Arrieta		25 mayo del 2022	El/La señor(a) Jorge Guerra Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45a 16i - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 5 Emir Elias Pren M		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Emir Elias Pren M solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 15 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 6 Andrea Beltran Vides		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Andrea Beltran Vides solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 4 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 7 Jader Perez Molina		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Jader Perez Molina solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17e 45 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 8 Oscar Gamarro		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Oscar Gamarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 50 - lote 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 9 Manuel Mercado A		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Manuel Mercado A solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17d 45 -06.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 10 Humberto Atencia Sierra		27 mayo del 2022	El/La señor(a) Humberto Atencia Sierra solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 62 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 11 Erika Blanco		27 mayo del 2022	El/La señor(a) Erika Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	El contratista reliza el cierre d ela solicitud teniendo en cuenta el concepto del FOVIS.
Inclusión	No. de PQR 12 Yuris Paola Suarez		31 mayo del 2022	El/La señor(a) Yuris Paola Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 38 lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	zona de riesgo.El predio tiene un area dentro de la vivienda que presenta
Inclusión	No. de PQR 13 Katerine Benitez Villalba		31 mayo del 2022	El/La señor(a) Katerine Benitez Villalba solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 50 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 14 Jose Joaquin Florez		31 mayo del 2022	El/La señor(a) Jose Joaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 15 Ana Isabel Florez		31 mayo del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 16 Marileys Molina Alvarado		01 junio del 2022	El/La señor(a) Marileys Molina Alvarado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 17 Jeraldine Yepe Lasmar		01 junio del 2022	El/La señor(a) Jeraldine Yepe Lasmar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 18 Enna Maria Lamar		01 junio del 2022	El/La señor(a) Enna Maria Lamar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 19 Nauded Alvarez Maurez		02 junio del 2022	El/La señor(a) Nauded Alvarez Maurez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 38

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **2/01/2023** al **8/01/2022** | Fecha **9/01/2022**

Inclusión	No. de PQR 20 Henoc Jose Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Henoc Jose Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 F 45- 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 21 Brenda Galvan Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Brenda Galvan Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 61 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 22 Sindy Rodriguez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Sindy Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 23 Luz Dary Martinez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 24 Jose Juaquin Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Juaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 25 Ana Milena Vergara	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Milena Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 20 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 26 Maria Alejandra Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Alejandra Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 27 Oswaldo jimenez Ramirez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Oswaldo jimenez Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 28 Hernan Jimenez Marin	06 junio del 2022	El/La señor(a) Hernan Jimenez Marin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 14 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 29 Carmen Carpintero	06 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 30 Ana Isabel Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	Cabe aclarar que la PQR # 30 se recepcionó dos veces, a nombre de la
Inclusión	No. de PQR 31 Edilma Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 45 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 32 Silvio David Morelo	06 junio del 2022	El/La señor(a) Silvio David Morelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 57 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 33 Norelis Zabaleta	06 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Zabaleta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 59 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 34 Darin Blanco Fuentes	6 junio del 2022	El/La señor(a) Darin Blanco Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	definir con planeacion si esta en zona de riesgo.
Inclusión	No. de PQR 35 Deivi Jose Miranda	8 junio del 2022	El/La señor(a) Deivi Jose Miranda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 36 Gertrudis Lopez Herazo	8 junio del 2022	El/La señor(a) Gertrudis Lopez Herazo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 37 Sandra Cruz Peña	10 junio del 2022	El/La señor(a) Sandra Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 73.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 38 Gina Salcedo Ruiz	10 junio del 2022	El/La señor(a) Gina Salcedo Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 39 Yesica Cabrera Lora	10 junio del 2022	El/La señor(a) Yesica Cabrera Lora solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 40 Walter Arrieta	10 junio del 2022	El/La señor(a) Walter Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 41 Ana Luisa Contreras	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Luisa Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 32.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 42 Andres Bruno Benavidez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Bruno Benavidez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 43 Bertina Montes	15 junio del 2022	El/La señor(a) Bertina Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 39 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 44 Emistocle Bertel Avila	15 junio del 2022	El/La señor(a) Emistocle Bertel Avila solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 14.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 45 Griseida Arrieta Betin	15 junio del 2022	El/La señor(a) Griseida Arrieta Betin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 53 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 46 Nadin Carvajal	15 junio del 2022	El/La señor(a) Nadin Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 47 Carmen Carpintero	15 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 48 Martha Regino Herrera	15 junio del 2022	El/La señor(a) Martha Regino Herrera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 2 - lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 49 Blanca Avilez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Blanca Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 50 Luz Marina Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Marina Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 51 Gabriel Julio Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Julio Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 43 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 52 Luis rodriguez Rivero	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luis rodriguez Rivero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 53 Maria Monroy	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Monroy solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 54 Dani Velazquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Dani Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 55 Edith Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 9.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 56 Maryiris Navarro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maryiris Navarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 57 Santiago Troncoso Reyes	16 junio del 2022	El/La señor(a) Santiago Troncoso Reyes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45A - 157.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 58 Milagro Niebles Castro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Milagro Niebles Castro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 28 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 59 Elena Peña Pineda	16 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Peña Pineda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 60 Ever Luis Marquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ever Luis Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 121.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 61 Ramona Rosa Diaz	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ramona Rosa Diaz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 42 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 62 Andres Murillo Perez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 54 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 63 Heriberto Fernandez Lopez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Heriberto Fernandez Lopez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 17A 45B 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 64 Gabriel Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16I 45C 74.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 65 Denys Herrera Alvarez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Denys Herrera Alvarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 66 Alicia Conde Morales	16 junio del 2022	El/La señor(a) Alicia Conde Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45 A 65.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 67 Gregoria Marzan Solar	17 junio del 2022	El/La señor(a) Gregoria Marzan Solar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 01.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 68 Lina Martinez Zuñiga	17 junio del 2022	El/La señor(a) Lina Martinez Zuñiga solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 69 Carmerlo Castro Novoa	17 junio del 2022	El/La señor(a) Carmerlo Castro Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 48 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 70 Nicolasa Padilla	17 junio del 2022	El/La señor(a) Nicolasa Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 20A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 71 Jose Miguel Lopez Bravo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Miguel Lopez Bravo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 20.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 72 Vicente Villamizar Campo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Vicente Villamizar Campo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 73 Ely Causil Martinez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Ely Causil Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 74 Padro Ramos	17 junio del 2022	El/La señor(a) Padro Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 75 Dagoberto Mendoza Mercado	17 junio del 2022	El/La señor(a) Dagoberto Mendoza Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	PRESENTA RIESGO POR DESLIZAMIENTO NO CUMPLE CON
Inclusión	No. de PQR 76 Iris Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 77 Maria Carlota Menco	17 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Carlota Menco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 78 Iris Murillo Perez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 38

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **2/01/2023** al **8/01/2022** Fecha **9/01/2022**

Inclusión	No. de PQR 79 Edilsa Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Edilsa Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 80 Alejandra Loaiza Corrales	17 junio del 2022	El/La señor(a) Alejandra Loaiza Corrales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 29 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 81 Grey Montes Rodriguez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Grey Montes Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 82 Marlenys arroyo Quintero	21 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenys arroyo Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 83 Rodolfo Gonzalez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Rodolfo Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 41 - lote 38.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 84 Elida Pinto Morales	21 junio del 2022	El/La señor(a) Elida Pinto Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 85 Nelfi Calle Mejia	21 junio del 2022	El/La señor(a) Nelfi Calle Mejia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 86 Jorge Ramos Osorio	21 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Ramos Osorio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 87 Manuel Solano Almario	21 junio del 2022	El/La señor(a) Manuel Solano Almario solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 88 Carmen Perez Contreras	21 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Perez Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 89 Estefany Buelvas	21 junio del 2022	El/La señor(a) Estefany Buelvas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 22 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 90 Omaida Villadiego	22 junio de(2022	El/La señor(a) Omaida Villadiego solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 41.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 91 Rosa Isabel Alba Llanares	22 junio de(2022	El/La señor(a) Rosa Isabel Alba Llanares solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 92 Carmen Arroyo Ramos	22 junio de(2022	El/La señor(a) Carmen Arroyo Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 28.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 93 Alvaro Macea Rivera	22 junio de(2022	El/La señor(a) Alvaro Macea Rivera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 12 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 94 Maria Quiroz Goez	23 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Quiroz Goez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrea 17f 45B - 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 95 Luis Alberto Quiroz	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Alberto Quiroz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 64 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 96 Aracelis Zuñiga Salcedo	23 junio del 2022	El/La señor(a) Aracelis Zuñiga Salcedo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 59.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 97 Luz Velazquez Villareal	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Velazquez Villareal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 98 Luis Felipe Galeano	24 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Felipe Galeano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 99 Rosalba Barragan Barbosa	24 junio del 2022	El/La señor(a) Rosalba Barragan Barbosa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 100 Teresa Santana Peralta	24 junio del 2022	El/La señor(a) Teresa Santana Peralta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A - 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 101 Etelvina Lobo Cuello	24 junio del 2022	El/La señor(a) Etelvina Lobo Cuello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 102 Maria Gonzalez	24 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 16 - lote	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 103 Elena Perez Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 104 Edith Quintero	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 31 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 105 Edilma Gonzalez	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C 53.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 106 Karen Campo Cruz	27 junio del 2022	El/La señor(a) Karen Campo Cruz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16c 46B - 69.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 107 Libia Solar Orozco	27 junio del 2022	El/La señor(a) Libia Solar Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 108 Irma Baquero Fuentes	27 junio del 2022	El/La señor(a) Irma Baquero Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 -19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 109 Yuliet Perez Mendoza	27 junio del 2022	El/La señor(a) Yuliet Perez Mendoza solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 - 16C - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 110 Ibeth Vergara	29 junio del 2022	El/La señor(a) Ibeth Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 19A - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 111 Josefa Lazo Solano	29 junio del 2022	El/La señor(a) Josefa Lazo Solano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 112 Grisela Videz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Grisela Videz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 113 Juan Velazquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 60.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 114 Inogenes Carmona	29 junio del 2022	El/La señor(a) Inogenes Carmona solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46C - 52.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 115 Jesus Beltran Franco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jesus Beltran Franco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16B 46A - 51.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 116 Marina Benitez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marina Benitez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 117 Jorge Hoyos Otero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Hoyos Otero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 118 Yasmira Tovar Aguas	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yasmira Tovar Aguas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 119 Yerlis Salas Tovar	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Salas Tovar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 120 Jose Peñate Orozco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Peñate Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 121 Jorge Petro	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Petro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C 66.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 122 Francisco Romero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Francisco Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46 - 37.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 123 Luz Pajaro Garcia	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pajaro Garcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 55.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 124 Marlenis Delgado	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenis Delgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 125 Miguel Galindo	28 junio del 2022	El/La señor(a) Miguel Galindo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 126 Rubiela Gonzalez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Rubiela Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 48 B - 81.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 127 Norelis Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 55 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 128 Nohelia Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Nohelia Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 6 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 129 Esmeralda Marquez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Esmeralda Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 130 Gil Blanco Yubis	28 junio del 2022	El/La señor(a) Gil Blanco Yubis solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 23.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 131 Adis Arias Carvajal	29 junio del 2022	El/La señor(a) Adis Arias Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 76.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 132 Jaime Galindo Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime Galindo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 54.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 133 Luisa Noriega Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luisa Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 134 Silvia Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Silvia Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 135 Vianey Pelaez Vasquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Vianey Pelaez Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 145C - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 136 Yalitza Meza Montes	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yalitza Meza Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 137 Fredy Florian Pornnefz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Fredy Florian Pornnefz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 38

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **2/01/2023** al **8/01/2022** Fecha **9/01/2022**

Inclusión	No. de PQR 138 Segundo Novoa	29 junio del 2022	El/La señor(a) Segundo Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 35 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 139 Eduardo de Hoyo	29 junio del 2022	El/La señor(a) Eduardo de Hoyo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 140 Nohemi Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Nohemi Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 49.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 141 Yeline Molina Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeline Molina Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 45 - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 142 Yeison Ozuna Jimenez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeison Ozuna Jimenez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 11 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 143 Henry Contrera Rios	30 junio del 2022	El/La señor(a) Henry Contrera Rios solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 04.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 144 Dorys Yepez Suarez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dorys Yepez Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17D 45 - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 145 Jaime de Avila Syago	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime de Avila Syago solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 146 Hernando Trujillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Hernando Trujillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 147 Karina Marrugo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karina Marrugo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 148 Elisena Solar Orrozco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elisena Solar Orrozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 149 Bilma Salgado	30 junio del 2022	El/La señor(a) Bilma Salgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45B - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 150 Luz Fernandez Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Fernandez Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 151 Keider Avilez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keider Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 152 Rafael Bertel Bertel	30 junio del 2022	El/La señor(a) Rafael Bertel Bertel solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 153 Luz Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 43 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 154 Karol Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karol Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B - 136.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 155 Pabla Teran Romerin	30 junio del 2022	El/La señor(a) Pabla Teran Romerin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16H 45 - 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 156 Yadira Basilio Castillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yadira Basilio Castillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46a - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 157 Marqueza Padilla	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marqueza Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 36 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 158 Ruth Perez Perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ruth Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 159 Jose Carey Julio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Carey Julio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 160 Maria Manjarrez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Manjarrez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 161 Marleidis Bolaño	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marleidis Bolaño solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 162 Luis Manuel Murillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Manuel Murillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 163 Juan Perez Muslaco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Perez Muslaco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46A - 99.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 164 Keila Marquez Acosta	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keila Marquez Acosta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 33 - Lote 3A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 165 Nalfis Marquez David	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nalfis Marquez David solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 166 Yorlenis Tapia Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yorlenis Tapia Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 167 Ana Maria Tamara Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Maria Tamara Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 168 Elkin Zabala Vasquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elkin Zabala Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 169 Eder Hurtado Carpio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Eder Hurtado Carpio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 170 Dionicio Nieto	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dionicio Nieto solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 8 - Lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 171 Nerys Cruz Peña	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nerys Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 172 Consuelo Florez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Consuelo Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 173 Yonadis Tapias	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yonadis Tapias solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 16 - Lote 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 174 Jose Banquet perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Banquet perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 34 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 175 Alma Almentero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alma Almentero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 176 Luz Estela Escorcia	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Estela Escorcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 A 45A - 58.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 177 Celia Vega Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Celia Vega Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 136 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 178 Norelis Ortiz Rodelo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Ortiz Rodelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 179 Luis Julio Romero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Julio Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 48 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 180 Carmelina Gomez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Carmelina Gomez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 64 - Lote 29A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 181 Yerlis Muñoz	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Muñoz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17H 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 182 Andry Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Andry Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16E 46 - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 183 Emid Vega Bula	30 junio del 2022	El/La señor(a) Emid Vega Bula solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 184 Jhon Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jhon Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45C - 07.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 185 Alfonso Dieteben Ortega	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alfonso Dieteben Ortega solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 114.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 186 Luis Rosario Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Rosario Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 47 - 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 187 Frank Martinez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Frank Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16G 48A - 111.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 188 Ana Delgado Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Delgado Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 189 Ana Sofia Beltran	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Sofia Beltran solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45A 16G - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 190 Etilsa Suarez Ciprian	30 junio del 2022	El/La señor(a) Etilsa Suarez Ciprian solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45C - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 38

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **2/01/2023** al **8/01/2022** Fecha **9/01/2022**

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
Atraso en las actividades de ejecución de obra	Plan de contingencia	Teniendo en cuenta los atrasos que se presentaban en obra, se dio inicio al proceso de incumplimiento al Consorcio Turquía mediante mesa de trabajo del 21 de noviembre de 2022.	Consorcio Turquía	Plan de contingencia carta CONS-TUR-SINC-045 Actualización Plan de Contingencia GA-DOMI-071-22 Mesa de trabajo con aseguradora y aprobacion de modificatorio No. 01 del contrato de obra, mediante el cuals e prorroga por tres (3) meses más, es decir hasta el 13/03/2023.	13/12/2022
Mal estado de vías de acceso.	Solicitud adecuación de vías por parte de Alcaldía.	* Teniendo en cuenta la reunión realizada el día 31 de mayo de 2022 se concertó con la Alcaldía, a través del Ministerio de Vivienda, la disponibilidad de la maquinaria para llevar a cabo las adecuaciones de las vías de acceso al barrio El Poblado.	Alcaldía Sincelejo	El 22 de junio 2022 hizo presencia la maquinaria de la Alcaldía de Sincelejo para el inicio de las adecuaciones en la carrera 16 I con	22/06/2022
Contrato de acueducto	Coordinación entre contratos	El Contratista realizó los acercamientos pertinentes, no obstante a la fecha no se ha definido el fecha de inicio y fin de intervención de la vía 16 J	Alcaldía Sincelejo	N/A	N/A

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA










9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

* El Consorcio Turquía continuó con la Actividad 2 en las visitas de los diagnósticos de las viviendas objeto del programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en el barrio El Poblado, por lo tanto, a la fecha de corte del presente informe semanal se tiene aprobado seiscientos cuarenta (640) diagnósticos acumulados.

* De acuerdo con las diferentes reuniones sostenidas con el Contratista e Interventoría para la revisión de la Matriz Inicial, se realizó el balance de los posibles beneficiarios del programa de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Sincelejo - Sucre, en contraste con los recorridos de verificación en campo, plano del barrio El Poblado de caracterización de zonas de riesgo y los diferentes informes emitidos por el FOVIS, se obtuvo un potencial neto de 644 viviendas efectivas, 46 no efectivas y 3 renuncias, tal y como se muestra a continuación:

Viviendas efectivas: 644
Viviendas diagnóstico aprobado: 640
Viviendas con observaciones de diagnóstico: 3
Viviendas no efectivas: 46
Renuncias: 3
Viviendas Pendientes por diagnosticar: 1
Viviendas terminadas: 417
Viviendas en ejecución: 12
Viviendas iniciadas: 429

* Para la Actividad 3 se han iniciado un total de cuatrocientos veinte y nueve (429) viviendas, de las cuatrocientos diecisiete (417) están terminadas, doce (12) en ejecución. En la semana se realizaron 5 aperturas.

* Con respecto a la Actividad 4, se han recibido ciento noventa (190) solicitudes de inclusiones, de las cuales ciento cinco (105) han sido avaladas por la Alcaldía de Sincelejo, ochenta y cuatro (84) no fueron aprobadas y una (01) en la cual el FOVIS no dio una respuesta clara de aprobación. Se continuará con las visitas vivienda a vivienda así como reuniones sectorizadas para dar a conocer a los potenciales beneficiarios toda la información referente a este proyecto.

A corte del presente informe semanal se tiene un porcentaje ejecutado acumulado de 63,64% y un porcentaje programado acumulado de 64,54%, lo que incide en un retraso del 0,90%. producto del tiempo adicional de los tres (3) meses para la culminación de las obras. Teniendo en cuenta la modificación contractual se realizó el trámite de actualización de las pólizas del contrato de Interventoría remitidas a la Entidad mediante la comunicación GA-DOMI-244-22 del día 27 de diciembre de 2022 radicado No. 20224300503732, así mismo se realizó el cargue correspondiente en la plataforma del SECOP II.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 38

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **2/01/2023** al **8/01/2022** Fecha **9/01/2022**

		
Firma	**Firma**	**Firma**
Nombre EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Nombre HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Nombre
Director de Interventoría o Representante legal	Profesional Costos y Presupuesto	Supervisor
<NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	<NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, interventoria

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 39

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **09/01/2023** al **15/01/2022** | Fecha **16/01/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

código PROYECTO	2220577
OBJETO DEL PROYECTO	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** SUCRE **MUNICIPIO** SINCELEJO
GERENCIA A CARGO	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS T
SUPERVISOR	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
ESTADO DEL PROYECTO	En ejecución.

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220577		
Contratista	CONSORCIO TURQUIA		
Valor inicial	$ 5.034.941.972,00		
Adición No. 1	N/A		
Valor actual	$ 5.034.941.972,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial (Días)	244 Días		
Prorroga No. 1	90 Días		
Plazo actual (Días)	334 Días		100,00%
Variación en plazo	90 Días		
Fecha Contractual de terminación	13/03/2023		
Tiempo Transcurrido (días)	-87		-26,05%
Días remanentes del Contrato	421		126,05%
Acumulado a última acta pagada	$ 2.820.263.489,10		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

2.2 CONTRATO DE Interventoría

Contrato No.	2220585		
Interventor	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.		
Valor inicial	$ 542.723.071,00		
Adición No. 1	$ 150.072.084,00		
Valor actual	$ 692.795.155,00		
Variación del valor	$ 150.072.084,00		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial	244 Días		
Prorroga No. 1	90 Días		
Plazo actual	334 Días		100,00%
Variación en plazo	90 Días		
Fecha Contractual de terminación	13/03/2023		
Ejecución del Contrato	-87		-26,05%
Días remanentes del Contrato	421		126,05%
Acumulado a última acta pagada	$ 339.826.050,90		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 5.034.941.972,00

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 3.249.567.038,18	64,54%	$ 3.204.237.070,98	63,64%	-$ 45.329.967,20	-0,90%
Durante el Periodo	$ 111.585.933,36	2,22%	$ 28.311.130,35	0,56%	-$ 83.274.803,01	-1,65%
Acumulado a la Fecha	**$ 3.361.152.971,55**	**66,76%**	**$ 3.232.548.201,33**	**64,20%**	**-$ 128.604.770,21**	**-2,55%**

Desviación en días: -6 Días

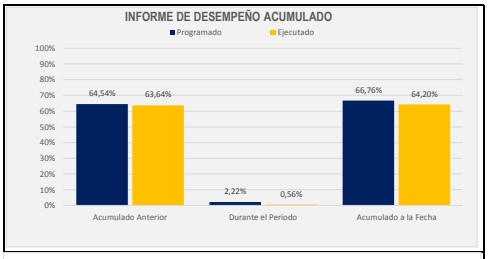

Observaciones al desempeño del proyecto


** **Actividad 1.** Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía. Aprobado por interventoría con cartas GA-DOMI-040-22 del día 31 de mayo de 2022 y radicado en ENTERRITORIO bajo el N°. 20224300206752 y GA-DOMI-030-22 radicado N°. 20224300189742.*


** **Actividad 2.** Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoria, por el Contratista de obra, un total de 644 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 640 diagnósticos acumulados. Hay 46 diagnósticos no efectivos y Tres (3) renuncias.*

** **Actividad 3.** A corte de este informe el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 433 viviendas, de las cuales 417 están terminadas, 16 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 207 para inicio de actividades.*

** **Actividad 4.** Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas, y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.*

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

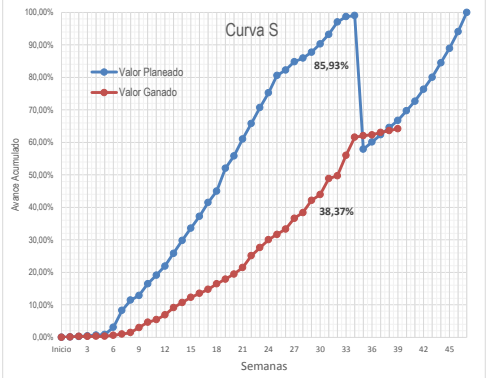

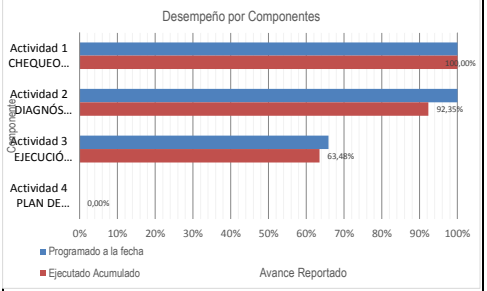

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE


DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

* Se ajusta la curva S del proyecto conforme a la capacitación dada el 28 de abril de 2022 por parte del supervisor de ENTERRITORIO.
* La Entidad mediante la suscripción del Modificatorio No. 1 del 13 de diciembre de 2022 se da aval a ampliar el plazo de la ejecución de las obras hasta el día 13 de marzo de 2023, tiempo que no generará costos adicionales a la Entidad y el contratista de obra asume el costo de mayor permanencia de Interventoría. Por consiguiente se realiza el ajuste de la curva S de las actividades de obra conforme a la reprogramacion realizada por el Consorcio Turquía con carta CONS-TUR-SINC-163 del 21 de noviembre de 2022, la cual fue revisada por Interventoría y avalada con la comunicación GA-DOMI-217-22 del día 25 de noviembre de 2022 radicado No. 20224300453802.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado %	Ejecutado %	Desviación %	Semáforo
Acumulado Anterior	64,54%	63,64%	-0,90%	
Durante el Periodo	2,22%	0,56%	-1,65%	
Acumulado a la Fecha	**66,76%**	**64,20%**	**-2,55%**	

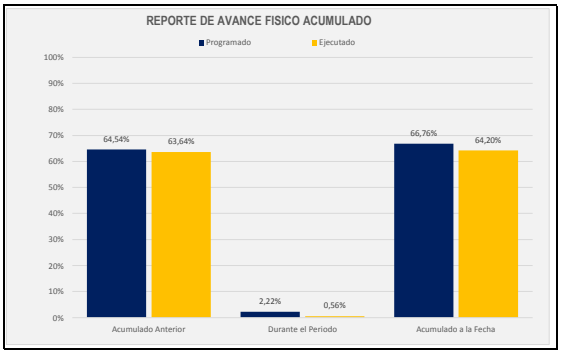


AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 5.034.941.972,00	$ 5.034.941.972,00	$ -	$ 981.956.213,60	$ 841.887.956,54	$ 140.068.257,06

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
6	$ 2.820.263.489,10	56,01%	6	$ 2.820.263.489,10	56,01%	09/12/2022	$ 769.913.798,72







AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 542.723.071,00	$ 692.795.155,00	$ 150.072.084,00	N/A	N/A	N/A

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
8	$ 339.826.050,90	49,05%	8	$ 339.826.050,90	49,05%	12/12/2022	$ 54.489.396,32







enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 39

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **09/01/2023** al **15/01/2022** Fecha **16/01/2022**

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA APROBADO.

* Actividad 1. Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos segun norma NSR-10, se presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validacion de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía.

* Actividad 2. Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoría, por el Contratista de obra, un total de 644 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 640 diagnósticos acumulados. Está pendiente de atención de observaciones de 3 diagnóstico y uno (1) por realizar la visita para diagnosticar la vivienda. De acuerdo al informe técnico entregado por el FOVIS de las manzanas 40A, 38A Y 38, hay once (11) diagnósticos que pasarían a ser no efectivos ya que las viviendas se encuentran en zona de riesgo, por lo tanto, el total de diagnósticos no efectivos se eleva a 46 y tres (3) renuncias.

* Actividad 3. A corte de este informe, el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 433 viviendas, de las cuales 417 están terminadas, 16 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 207 para inicio de actividades.

* Actividad 4. Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.

Actividad 2.

Diagnósticos programación inicial: 693
Diagnósticos reprogramación: 693
Diagnósticos Aprobados acumulados: 640
Viviendas con observaciones de diagnóstico: 3
Viviendas efectivas: 644
Viviendas no efectivas: 46
Renuncias: 3

Actividad 3.

Viviendas programación inicial: 693
Viviendas reprogramación: 435
Viviendas terminadas: 417
Viviendas en ejecución: 16
Viviendas totales iniciadas: 433

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

• Con carta GA-DOMI-252-22 del día 11 de enero de 2022, esta interventoría procedió a enviar el informe semanal # 38

ACTIVIDADES EN CAMPO

* El día 09 de enero de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. El dia 09 de enero de 2023 no se realizaron aperturas.

* El día 10 de enero de 2023, el contratista continuó con las actividades de instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención, instalación de enchape, pintura y atendiendo detalles de la casetas terminadas. El 10 de enero de 2023 no se realizaron aperturas .

* El día 11 de enero de 2023, el contratista continuó con las actividades de instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención, instalación de enchape, pintura y atendiendo detalles de la casetas terminadas. El 11 de enero de 2023 no se realizaron aperturas .

* El día 12 de enero de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. El dia 12 de enero de 2023 no se realizaron aperturas. para el dia de hoy se recibe la visita de la entidad contratante enterritorio , se realiza recorrido de obra con la presencia del contratista, interventoria y veedores ,se verifican las unidades sanitarias en ejecucion y la entidad presenta las observaciones pertinentes.

* El día 13 de enero de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. el dia de hoy se continua con el recorrido de obra en conjunto con los supervisores de la entidad contratante, contratista e interventoria. El dia 13 de enero de 2023 se realizaron cuatro (4) aperturas bajo los codigos N°. S-SC-EP-M55-VE-411, S-SC-EP-M62-VE-501, S-SC-EP-M61-VE-510, S-SC-EP-M61-VE-518.

* El día 14 de enero de 2023, el contratista continuó con las actividades de instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención, instalación de enchape, pintura y atendiendo detalles de la casetas terminadas.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

* Se continuará con la intervención de las viviendas en el barrio El Poblado en Sincelejo Sucre.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD PERIODO	CANTIDAD ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana: Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	149	6	155	72,4%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	35	0	35	16,4%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	8	0	8	3,7%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál? Orden público	16	0	16	7,5%
	Total	**208**	**6**	**214**	**100,00%**



los dias 09 y 11 de enero de 2023 se presentaron lluvias en horas de la tarde, para un total de 6 horas de lluvia.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No. / Tipología PQR	Fecha de realización / Radicado por	Lugar de realización	Cant. Asistentes / Fecha	Compromisos / Asunto	Responsable / Dirigido a	Fecha / Respuesta Alcaldía / FOVIS
Inclusión	No. de PQR 1 Yessica Cantello		20 mayo del 2022	El/La señor(a) Yessica Cantello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 2 Betilda Gonzales		25 mayo del 2022	El/La señor(a) Betilda Gonzales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 40 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 3 Luz Dary Ruiz		25 mayo del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 4 Jorge Guerra Arrieta		25 mayo del 2022	El/La señor(a) Jorge Guerra Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45a 16i - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 5 Emir Elias Pren M		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Emir Elias Pren M solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 15 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 6 Andrea Beltran Vides		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Andrea Beltran Vides solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 4 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 7 Jader Perez Molina		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Jader Perez Molina solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17e 45 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 8 Oscar Gamarro		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Oscar Gamarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 50 - lote 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 9 Manuel Mercado A		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Manuel Mercado A solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17d 45 -06.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 10 Humberto Atencia Sierra		27 mayo del 2022	El/La señor(a) Humberto Atencia Sierra solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 62 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 11 Erika Blanco		27 mayo del 2022	El/La señor(a) Erika Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	El contratista reliza el cierre d ela solicitud teniendo en cuenta el concepto del FOVIS.
Inclusión	No. de PQR 12 Yuris Paola Suarez		31 mayo del 2022	El/La señor(a) Yuris Paola Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 38 lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	zona de riesgo.El predio tiene un area dentro de la vivienda que presenta
Inclusión	No. de PQR 13 Katerine Benitez Villalba		31 mayo del 2022	El/La señor(a) Katerine Benitez Villalba solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 50 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 14 Jose Joaquin Florez		31 mayo del 2022	El/La señor(a) Jose Joaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 15 Ana Isabel Florez		31 mayo del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 16 Marileys Molina Alvarado		01 junio del 2022	El/La señor(a) Marileys Molina Alvarado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 17 Jeraldine Yepe Lasmar		01 junio del 2022	El/La señor(a) Jeraldine Yepe Lasmar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 18 Enna Maria Lamar		01 junio del 2022	El/La señor(a) Enna Maria Lamar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 19 Nauded Alvarez Maurez		02 junio del 2022	El/La señor(a) Nauded Alvarez Maurez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 39

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **09/01/2023** al **15/01/2022** Fecha **16/01/2022**

Inclusión	No. de PQR 20 Henoc Jose Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Henoc Jose Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 F 45- 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 21 Brenda Galvan Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Brenda Galvan Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 61 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 22 Sindy Rodriguez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Sindy Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 23 Luz Dary Martinez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 24 Jose Juaquin Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Juaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 25 Ana Milena Vergara	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Milena Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 20 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 26 Maria Alejandra Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Alejandra Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 27 Oswaldo jimenez Ramirez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Oswaldo jimenez Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 28 Hernan Jimenez Marin	06 junio del 2022	El/La señor(a) Hernan Jimenez Marin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 14 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 29 Carmen Carpintero	06 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 30 Ana Isabel Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	Cabe aclarar que la PQR # 30 se recepcionó dos veces, a nombre de la
Inclusión	No. de PQR 31 Edilma Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 45 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 32 Silvio David Morelo	06 junio del 2022	El/La señor(a) Silvio David Morelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 57 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 33 Norelis Zabaleta	06 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Zabaleta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 59 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 34 Darin Blanco Fuentes	6 junio del 2022	El/La señor(a) Darin Blanco Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	definir con planeacion si esta en zona de riesgo
Inclusión	No. de PQR 35 Deivi Jose Miranda	8 junio del 2022	El/La señor(a) Deivi Jose Miranda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 36 Gertrudis Lopez Herazo	8 junio del 2022	El/La señor(a) Gertrudis Lopez Herazo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 37 Sandra Cruz Peña	10 junio del 2022	El/La señor(a) Sandra Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 73.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 38 Gina Salcedo Ruiz	10 junio del 2022	El/La señor(a) Gina Salcedo Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 39 Yesica Cabrera Lora	10 junio del 2022	El/La señor(a) Yesica Cabrera Lora solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 40 Walter Arrieta	10 junio del 2022	El/La señor(a) Walter Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 41 Ana Luisa Contreras	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Luisa Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 32.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 42 Andres Bruno Benavidez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Bruno Benavidez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 43 Bertina Montes	15 junio del 2022	El/La señor(a) Bertina Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 39 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 44 Emistocle Bertel Avila	15 junio del 2022	El/La señor(a) Emistocle Bertel Avila solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 14.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 45 Griseida Arrieta Betin	15 junio del 2022	El/La señor(a) Griseida Arrieta Betin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 53 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 46 Nadin Carvajal	15 junio del 2022	El/La señor(a) Nadin Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 47 Carmen Carpintero	15 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 48 Martha Regino Herrera	15 junio del 2022	El/La señor(a) Martha Regino Herrera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 2 - lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 49 Blanca Avilez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Blanca Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 50 Luz Marina Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Marina Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 51 Gabriel Julio Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Julio Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 43 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 52 Luis rodriguez Rivero	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luis rodriguez Rivero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 53 Maria Monroy	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Monroy solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 54 Dani Velazquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Dani Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 55 Edith Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 9.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 56 Maryiris Navarro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maryiris Navarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 57 Santiago Troncoso Reyes	16 junio del 2022	El/La señor(a) Santiago Troncoso Reyes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45A - 157.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 58 Milagro Niebles Castro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Milagro Niebles Castro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 28 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 59 Elena Peña Pineda	16 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Peña Pineda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 60 Ever Luis Marquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ever Luis Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 121.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 61 Ramona Rosa Diaz	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ramona Rosa Diaz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 42 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 62 Andres Murillo Perez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 54 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 63 Heriberto Fernandez Lopez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Heriberto Fernandez Lopez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 17A 45B 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 64 Gabriel Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16I 45C 74.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 65 Denys Herrera Alvarez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Denys Herrera Alvarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 66 Alicia Conde Morales	16 junio del 2022	El/La señor(a) Alicia Conde Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45 A 65.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 67 Gregoria Marzan Solar	17 junio del 2022	El/La señor(a) Gregoria Marzan Solar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 01.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 68 Lina Martinez Zuñiga	17 junio del 2022	El/La señor(a) Lina Martinez Zuñiga solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 69 Carmerlo Castro Novoa	17 junio del 2022	El/La señor(a) Carmerlo Castro Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 48 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 70 Nicolasa Padilla	17 junio del 2022	El/La señor(a) Nicolasa Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 20A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 71 Jose Miguel Lopez Bravo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Miguel Lopez Bravo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 20.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 72 Vicente Villamizar Campo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Vicente Villamizar Campo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 73 Ely Causil Martinez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Ely Causil Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 74 Padro Ramos	17 junio del 2022	El/La señor(a) Padro Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 75 Dagoberto Mendoza Mercado	17 junio del 2022	El/La señor(a) Dagoberto Mendoza Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	PRESENTA RIESGO POR DESLIZAMIENTO, NO CUMPLE CON
Inclusión	No. de PQR 76 Iris Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 77 Maria Carlota Menco	17 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Carlota Menco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 78 Iris Murillo Perez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 39

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **09/01/2023** al **15/01/2022** Fecha **16/01/2022**

Inclusión	No. de PQR 79 Edilsa Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Edilsa Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 80 Alejandra Loaiza Corrales	17 junio del 2022	El/La señor(a) Alejandra Loaiza Corrales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 29 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 81 Grey Montes Rodriguez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Grey Montes Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 82 Marlenys arroyo Quintero	21 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenys arroyo Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 83 Rodolfo Gonzalez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Rodolfo Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 41 - lote 38.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 84 Elida Pinto Morales	21 junio del 2022	El/La señor(a) Elida Pinto Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 85 Nelfi Calle Mejia	21 junio del 2022	El/La señor(a) Nelfi Calle Mejia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 86 Jorge Ramos Osorio	21 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Ramos Osorio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 87 Manuel Solano Almario	21 junio del 2022	El/La señor(a) Manuel Solano Almario solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 88 Carmen Perez Contreras	21 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Perez Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 89 Estefany Buelvas	21 junio del 2022	El/La señor(a) Estefany Buelvas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 22 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 90 Omaida Villadiego	22 junio de(2022	El/La señor(a) Omaida Villadiego solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 41.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 91 Rosa Isabel Alba Llanares	22 junio de(2022	El/La señor(a) Rosa Isabel Alba Llanares solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 92 Carmen Arroyo Ramos	22 junio de(2022	El/La señor(a) Carmen Arroyo Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 28.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 93 Alvaro Macea Rivera	22 junio de(2022	El/La señor(a) Alvaro Macea Rivera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 12 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 94 Maria Quiroz Goez	23 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Quiroz Goez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrea 17f 45B - 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 95 Luis Alberto Quiroz	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Alberto Quiroz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 64 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 96 Aracelis Zuñiga Salcedo	23 junio del 2022	El/La señor(a) Aracelis Zuñiga Salcedo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 59.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 97 Luz Velazquez Villareal	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Velazquez Villareal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 98 Luis Felipe Galeano	24 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Felipe Galeano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 99 Rosalba Barragan Barbosa	24 junio del 2022	El/La señor(a) Rosalba Barragan Barbosa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 100 Teresa Santana Peralta	24 junio del 2022	El/La señor(a) Teresa Santana Peralta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A - 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 101 Etelvina Lobo Cuello	24 junio del 2022	El/La señor(a) Etelvina Lobo Cuello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 102 Maria Gonzalez	24 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 16 - lote .	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 103 Elena Perez Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 104 Edith Quintero	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 31 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 105 Edilma Gonzalez	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C 53.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 106 Karen Campo Cruz	27 junio del 2022	El/La señor(a) Karen Campo Cruz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16c 46B - 69.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 107 Libia Solar Orozco	27 junio del 2022	El/La señor(a) Libia Solar Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 108 Irma Baquero Fuentes	27 junio del 2022	El/La señor(a) Irma Baquero Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 -19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 109 Yuliet Perez Mendoza	27 junio del 2022	El/La señor(a) Yuliet Perez Mendoza solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 - 16C - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 110 Ibeth Vergara	29 junio del 2022	El/La señor(a) Ibeth Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 19A - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 111 Josefa Lazo Solano	29 junio del 2022	El/La señor(a) Josefa Lazo Solano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 112 Grisela Videz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Grisela Videz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 113 Juan Velazquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 60.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 114 Inogenes Carmona	29 junio del 2022	El/La señor(a) Inogenes Carmona solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46C - 52.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 115 Jesus Beltran Franco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jesus Beltran Franco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16B 46A - 51.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 116 Marina Benitez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marina Benitez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 117 Jorge Hoyos Otero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Hoyos Otero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 118 Yasmira Tovar Aguas	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yasmira Tovar Aguas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 119 Yerlis Salas Tovar	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Salas Tovar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 120 Jose Peñate Orozco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Peñate Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 121 Jorge Petro	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Petro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C 66.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 122 Francisco Romero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Francisco Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46 - 37.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 123 Luz Pajaro Garcia	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pajaro Garcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 55.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 124 Marlenis Delgado	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenis Delgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 125 Miguel Galindo	28 junio del 2022	El/La señor(a) Miguel Galindo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 126 Rubiela Gonzalez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Rubiela Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 48 B - 81.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 127 Norelis Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 55 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 128 Nohelia Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Nohelia Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 6 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 129 Esmeralda Marquez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Esmeralda Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 130 Gil Blanco Yubis	28 junio del 2022	El/La señor(a) Gil Blanco Yubis solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 23.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 131 Adis Arias Carvajal	29 junio del 2022	El/La señor(a) Adis Arias Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 76.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 132 Jaime Galindo Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime Galindo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 54.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 133 Luisa Noriega Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luisa Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 134 Silvia Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Silvia Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 135 Vianey Pelaez Vasquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Vianey Pelaez Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 145C - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 136 Yalitza Meza Montes	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yalitza Meza Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 137 Fredy Florian Pornnefz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Fredy Florian Pornnefz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 39

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **09/01/2023** al **15/01/2022** Fecha **16/01/2022**

Inclusión	No. de PQR 138 Segundo Novoa	29 junio del 2022	El/La señor(a) Segundo Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 35 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 139 Eduardo de Hoyo	29 junio del 2022	El/La señor(a) Eduardo de Hoyo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 140 Nohemi Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Nohemi Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 49.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 141 Yeline Molina Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeline Molina Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 45 - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 142 Yeison Ozuna Jimenez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeison Ozuna Jimenez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 11 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 143 Henry Contrera Rios	30 junio del 2022	El/La señor(a) Henry Contrera Rios solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 04.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 144 Dorys Yepez Suarez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dorys Yepez Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17D 45 - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 145 Jaime de Avila Syago	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime de Avila Syago solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 146 Hernando Trujillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Hernando Trujillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 147 Karina Marrugo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karina Marrugo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 148 Elisena Solar Orrozco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elisena Solar Orrozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 149 Bilma Salgado	30 junio del 2022	El/La señor(a) Bilma Salgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45B - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 150 Luz Fernandez Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Fernandez Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 151 Keider Avilez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keider Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 152 Rafael Bertel Bertel	30 junio del 2022	El/La señor(a) Rafael Bertel Bertel solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 153 Luz Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 43 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 154 Karol Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karol Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B - 136.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 155 Pabla Teran Romerin	30 junio del 2022	El/La señor(a) Pabla Teran Romerin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16H 45 - 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 156 Yadira Basilio Castillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yadira Basilio Castillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46a - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 157 Marqueza Padilla	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marqueza Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 36 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 158 Ruth Perez Perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ruth Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 159 Jose Carey Julio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Carey Julio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 160 Maria Manjarrez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Manjarrez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 161 Marleidis Bolaño	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marleidis Bolaño solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 162 Luis Manuel Murillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Manuel Murillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 163 Juan Perez Muslaco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Perez Muslaco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46A - 99.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 164 Keila Marquez Acosta	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keila Marquez Acosta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 33 - Lote 3A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 165 Nalfis Marquez David	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nalfis Marquez David solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 166 Yorlenis Tapia Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yorlenis Tapia Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 167 Ana Maria Tamara Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Maria Tamara Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 168 Elkin Zabala Vasquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elkin Zabala Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 169 Eder Hurtado Carpio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Eder Hurtado Carpio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 170 Dionicio Nieto	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dionicio Nieto solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 8 - Lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 171 Nerys Cruz Peña	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nerys Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 172 Consuelo Florez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Consuelo Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 173 Yonadis Tapias	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yonadis Tapias solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 16 - Lote 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 174 Jose Banquet perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Banquet perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 34 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 175 Alma Almentero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alma Almentero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 176 Luz Estela Escorcia	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Estela Escorcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 A 45A - 58.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 177 Celia Vega Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Celia Vega Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 136 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 178 Norelis Ortiz Rodelo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Ortiz Rodelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 179 Luis Julio Romero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Julio Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 48 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 180 Carmelina Gomez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Carmelina Gomez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 64 - Lote 29A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 181 Yerlis Muñoz	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Muñoz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17H 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 182 Andry Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Andry Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16E 46 - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 183 Emid Vega Bula	30 junio del 2022	El/La señor(a) Emid Vega Bula solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 184 Jhon Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jhon Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45C - 07.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 185 Alfonso Dieteben Ortega	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alfonso Dieteben Ortega solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 114.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 186 Luis Rosario Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Rosario Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 47 - 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 187 Frank Martinez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Frank Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16G 48A - 111.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 188 Ana Delgado Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Delgado Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 189 Ana Sofia Beltran	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Sofia Beltran solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45A 16G - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 190 Etilsa Suarez Ciprian	30 junio del 2022	El/La señor(a) Etilsa Suarez Ciprian solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45C - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 39

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **09/01/2023** al **15/01/2022** Fecha **16/01/2022**

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
Atraso en las actividades de ejecución de obra	Plan de contingencia	Teniendo en cuenta los atrasos que se presentaban en obra, se dio inicio al proceso de incumplimiento al Consorcio Turquía mediante mesa de trabajo del 21 de noviembre de 2022.	Consorcio Turquía	Plan de contingencia carta CONS-TUR-SINC-045 Actualización Plan de Contingencia GA-DOMI-071-22 Mesa de trabajo con aseguradora y aprobacion de modificatorio No. 01 del contrato de obra, mediante el cuals e prorroga por tres (3) meses más, es decir hasta el 13/03/2023.	13/12/2022
Mal estado de vías de acceso.	Solicitud adecuación de vías por parte de Alcaldía.	Teniendo en cuenta la reunión realizada el dia 31 de mayo de 2022 se concertó con la Alcaldía, a través del Ministerio de Vivienda, la disponibilidad de la maquinaria para llevar a cabo las adecuaciones de las vías de acceso al barrio El Poblado.	Alcaldía Sincelejo	El 22 de junio 2022 hizo presencia la maquinaria de la Alcaldía de Sincelejo para el inicio de las adecuaciones en la carrera 16 I con	22/06/2022
Contrato de acueducto	Coordinación entre contratos	El Contratista realizó los acercamientos pertinentes, no obstante a la fecha no se ha definido el fecha de inicio y fin de intervención de la vía 16 J	Alcaldía Sincelejo	N/A	N/A

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA










9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

* El Consorcio Turquía continuó con la Actividad 2 en las visitas de los diagnósticos de las viviendas objeto del programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en el barrio El Poblado, por lo tanto, a la fecha de corte del presente informe semanal se tiene aprobado seiscientos cuarenta (640) diagnósticos acumulados.

* De acuerdo con las diferentes reuniones sostenidas con el Contratista e Interventoría para la revisión de la Matriz Inicial, se realizó el balance de los posibles beneficiarios del programa de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Sincelejo - Sucre, en contraste con los recorridos de verificación en campo, plano del barrio El Poblado de caracterización de zonas de riesgo y los diferentes informes emitidos por el FOVIS, se obtuvo un potencial neto de 644 viviendas efectivas, 46 no efectivas y 3 renuncias, tal y como se muestra a continuación:

Viviendas efectivas: 644
Viviendas diagnóstico aprobado: 640
Viviendas con observaciones de diagnóstico: 3
Viviendas no efectivas: 46
Renuncias: 3
Viviendas Pendientes por diagnosticar: 1
Viviendas terminadas: 417
Viviendas en ejecución: 16
Viviendas iniciadas: 433

* Para la Actividad 3 se han iniciado un total de cuatrocientos treinta y tres (433) viviendas, de las cuatrocientos diecisiete (417) están terminadas, dieciseis (16) en ejecución. En la semana se realizaron 4 aperturas.

* Con respecto a la Actividad 4, se han recibido ciento noventa (190) solicitudes de inclusiones, de las cuales ciento cinco (105) han sido avaladas por la Alcaldía de Sincelejo, ochenta y cuatro (84) no fueron aprobadas y una (01) en la cual el FOVIS no dio una respuesta clara de aprobación. Se continuará con las visitas vivienda a vivienda así como reuniones sectorizadas para dar a conocer a los potenciales beneficiarios toda la información referente a este proyecto.

A corte del presente informe semanal se tiene un porcentaje ejecutado acumulado de 64,20% y un porcentaje programado acumulado de 66,76%, lo que incide en un retraso del 2,55%. producto del tiempo adicional de los tres (3) meses para la culminación de las obras. Teniendo en cuenta la modificación contractual se realizó el trámite de actualización de las pólizas del contrato de Interventoría remitidas a la Entidad mediante la comunicación GA-DOMI-244-22 del día 27 de diciembre de 2022 radicado No. 20224300503732, así mismo se realizó el cargue correspondiente en la plataforma del SECOP II.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 39

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **09/01/2023** al **15/01/2022** Fecha **16/01/2022**

		
Firma	**Firma**	**Firma**
Nombre EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Nombre HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Nombre
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Profesional Costos y Presupuesto <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 40

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **16/01/2023** al **22/01/2022** | Fecha **23/01/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

código PROYECTO	2220577			
OBJETO DEL PROYECTO	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO**	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO
GERENCIA A CARGO	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1			
SUPERVISOR	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ			
ESTADO DEL PROYECTO	En ejecución.			

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220577		
Contratista	CONSORCIO TURQUIA		
Valor inicial	$ 5.034.941.972,00		
Adición No. 1	N/A		
Valor actual	$ 5.034.941.972,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial (Días)	244 Días		
Prorroga No. 1	90 Días		
Plazo actual (Días)	334 Días		100,00%
Variación en plazo	90 Días		
Fecha Contractual de terminación	13/03/2023		
Tiempo Transcurrido (días)	-80		-23,95%
Días remanentes del Contrato	414		123,95%
Acumulado a última acta pagada	$ 2.820.263.489,10		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

2.2 CONTRATO DE Interventoría

Contrato No.	2220585		
Interventor	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.		
Valor inicial	$ 542.723.071,00		
Adición No. 1	$ 150.072.084,00		
Valor actual	$ 692.795.155,00		
Variación del valor	$ 150.072.084,00		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial	244 Días		
Prorroga No. 1	90 Días		
Plazo actual	334 Días		100,00%
Variación en plazo	90 Días		
Fecha Contractual de terminación	13/03/2023		
Ejecución del Contrato	-80		-23,95%
Días remanentes del Contrato	414		123,95%
Acumulado a última acta pagada	$ 442.373.612,60		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPENO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 5.034.941.972,00

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 3.361.152.971,55	66,76%	$ 3.232.432.746,02	64,20%	-$ 128.720.225,52	-2,56%
Durante el Periodo	$ 148.781.244,48	2,95%	$ 38.724.854,02	0,77%	-$ 110.056.390,46	-2,19%
Acumulado a la Fecha	$ 3.509.934.216,03	69,71%	$ 3.271.157.600,05	64,97%	-$ 238.776.615,98	-4,74%

Semáforo

Desviación en días: -12 Días

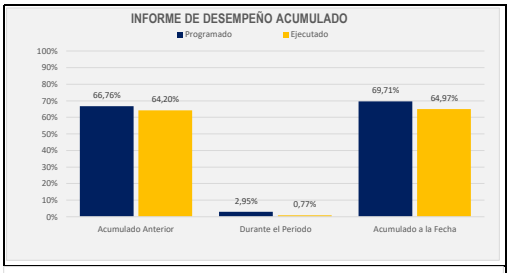

Observaciones al desempeño del proyecto


Actividad 1. *Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquia. Aprobado por interventoria con cartas GA-DOMI-040-22 del dia 31 de mayo de 2022 y radicado en ENTERRITORIO bajo el N°. 20224300206752 y GA-DOMI-030-22 radicado N°. 20224300189742.*


Actividad 2. *Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoria, por el Contratista de obra, un total de 64 4 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 640 diagnósticos acumulados. Hay 46 diagnósticos no efectivos y Tres (3) renuncias.*

Actividad 3. *A corte de este informe el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 445 viviendas, de las cuales 418 están terminadas, 16 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 195 para inicio de actividades.*

Actividad 4. *Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas, y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.*

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

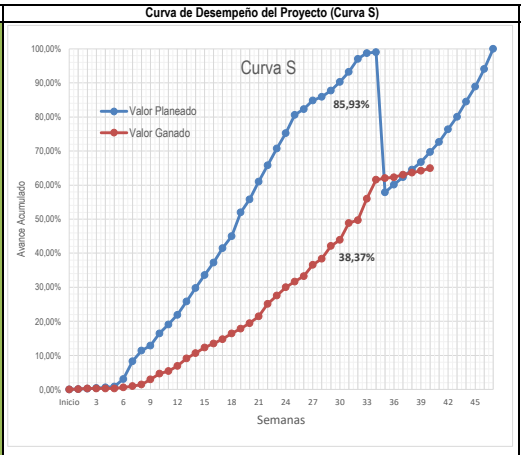

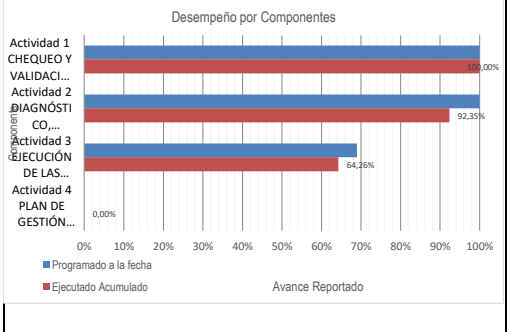

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE


DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

* Se ajusta la curva S del proyecto conforme a la capacitación dada el 28 de abril de 2022 por parte del supervisor de ENTERRITORIO.
* La Entidad mediante la suscripción del Modificatorio No. 1 del 13 de diciembre de 2022 se da aval a ampliar el plazo de la ejecución de las obras hasta el día 13 de marzo de 2023, tiempo que no generará costos adicionales a la Entidad y el contratista de obra asume el costo de mayor permanencia de Interventoría. Por consiguiente se realiza el ajuste de la curva S de las actividades de obra conforme a la reprogramacion realizada por el Consorcio Turquia con carta CONS-TUR-SINC-163 del 21 de noviembre de 2022, la cual fue revisada por Interventoría y avalada con la comunicación GA-DOMI-217-22 del día 25 de noviembre de 2022 radicado No. 20224300453802.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	66,76%	64,20%	-2,56%	
Durante el Periodo	2,95%	0,77%	-2,19%	
Acumulado a la Fecha	**69,71%**	**64,97%**	**-4,74%**	

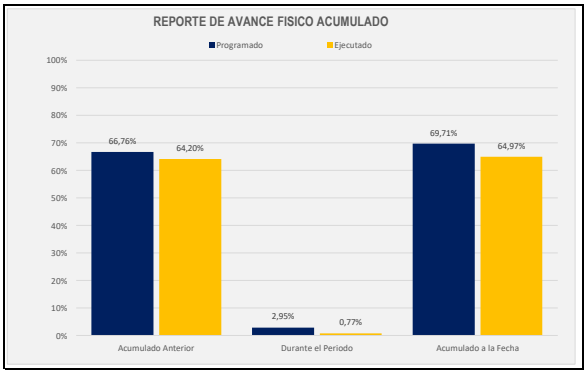


AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 5.034.941.972,00	$ 5.034.941.972,00	$ -	$ 981.956.213,60	$ 841.887.956,54	$ 140.068.257,06

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
6	$ 2.820.263.489,10	56,01%	6	$ 2.820.263.489,10	56,01%	9/12/2022	$ 769.913.798,72








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 542.723.071,00	$ 692.795.155,00	$ 150.072.084,00	N/A	N/A	N/A

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
9	$ 442.373.612,60	63,85%	8	$ 339.826.050,90	49,05%	12/12/2022	$ 54.489.396,32







INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 40

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **16/01/2023** al **22/01/2022** Fecha **23/01/2022**

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA APROBADO.

* Actividad 1. Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, se presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía.

* Actividad 2. Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoría, por el Contratista de obra, un total de 644 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 640 diagnósticos acumulados. Está pendiente de atención de observaciones de 3 diagnóstico y uno (1) por realizar la visita para diagnosticar la vivienda. De acuerdo al informe técnico entregado por el FOVIS de las manzanas 40A, 38A Y 38, hay once (11) diagnósticos que pasarían a ser no efectivos ya que las viviendas se encuentran en zona de riesgo, por lo tanto, el total de diagnósticos no efectivos se eleva a 46 y tres (3) renuncias.

* Actividad 3. A corte de este informe, el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 445 viviendas, de las cuales 418 están terminadas, 27 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 195 para inicio de actividades.

* Actividad 4. Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.

Actividad 2.

Diagnósticos programación inicial: 693
Diagnósticos reprogramación: 693
Diagnósticos Aprobados acumulados: 640
Viviendas con observaciones de diagnóstico: 3
Viviendas efectivas: 644
Viviendas no efectivas: 46
Renuncias: 3

Actividad 3.

Viviendas programación inicial: 693
Viviendas reprogramación: 455
Viviendas terminadas: 418
Viviendas en ejecución: 27
Viviendas totales iniciadas: 445

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

• Con carta GA-DOMI-256-23 del día 18 de enero de 2023, esta interventoría procedió a enviar el informe semanal # 39

* El día 13 de enero de 2023 con carta GA-DOMI-255-23 se solicitó al Consorcio Turquía la remisión del soporte de pago de parafiscales del mes de diciembre de 2022.

* Con carta GA-DOMI-262-22 del día 18 de enero de 2023 se reiteró la solicitud de liquidación del contrato de fiducia donde se giraron los recursos por concepto de anticipo.

* Mediante la comunicación GA-DOMI-258-23 del día 18 de enero de 2023 se procedió a solicitar al Consocio Turquía la remisión de los vales y certificados de ingreso de materiales pétreos entregados en obra de manera organizada mes a mes.

* El día 18 de enero de 2023 con carta GA-DOMI-259-23 se realizó análisis del seguimiento del avance en la reprogramación de obra en los porcentajes de ejecución y de las viviendas terminadas semana a semana, evidenciando bajos rendimientos y en las metas fijadas por el Consorcio Turquía en la modificación contractual del contrato de obra. Por lo tanto, se solicitó dar cumplimiento con la reprogramación aumentando la mano de obra, disponibilidad de materiales y apertura de intervenciones, con el fin de garantizar la terminación de las actividades dentro del plazo contractual.

* Con carta GA-DOMI-257-23 del día 18 de enero de 2023 se solicitó al Consocio Turquía la entrega del programa de capacitaciones de la mano de obra y soportes de las realizadas en los meses anteriores.

* El día 18 de enero de 2023 con carta GA-DOMI-261-23 se reiteró dar respuesta con el envío de los certificados de paz y salvo por todo concepto firmado por los peticionarios, con el fin de dar cierre a las PQR's presentadas por los trabajadores del contratista de obra.

* Con carta GA-DOMI-260-23 del día 18 de enero de 2023 se dio respuesta con observaciones al informe mensual de obra No. 9 del periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2022 entregado por el Consorcio Turquía.

ACTIVIDADES EN CAMPO

* El día 16 de enero de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. El día 16 de enero de 2023 no se realizaron aperturas. Para el día de hoy se realizó el comité de seguimiento de obra, en donde se contó con la presencia de la entidad contratante, contratista e interventoría.

* El día 17 de enero de 2023, el contratista continuó con las actividades de instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención, instalación de enchape, pintura y atendiendo detalles de la casetas terminadas. El 17 de enero de 2023 no se realizaron aperturas.

* El día 18 de enero de 2023, el contratista continuó con las actividades de instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención, instalación de enchape, pintura y atendiendo detalles de la casetas terminadas. El 18 de enero de 2023 no se realizaron aperturas.

* El día 19 de enero de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. El día 19 de enero de 2023 se realizaron trece (13)aperturas bajo los códigos: S-SC-EP-M22-VE-110, S-SC-EP-M71-VE-159, S-SC-EP-M002-VE-205, S-SC-EP-M56-VE-390, S-SC-EP-M44-VE-448, S-SC-EP-M60-VE-491, S-SC-EP-M60-VE-493, S-SC-EP-M8-VE-503, S-SC-EP-M71-VE-618, S-SC-EP-M67-VE-633, S-SC-EP-M56-VE-660, S-SC-EP-M23-VE-667, S-SC-EP-M44-VE-689.

* El día 20 de enero de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado.

* El día 21 de enero de 2023, el contratista continuó con las actividades de instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención, instalación de enchape, pintura y atendiendo detalles de la casetas terminadas.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

* Se continuará con la intervención de las viviendas en el barrio El Poblado en Sincelejo Sucre.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	155	0	155	72,4%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	35	0	35	16,4%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	8	0	8	3,7%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál? Orden público	16	0	16	7,5%
	Total	214	0	214	100,00%



En la semana no se presentaron lluvias.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
Tipología PQR	Radicado por		Fecha	Asunto	Dirigido a	Respuesta Alcaldía / FOVIS
Inclusión	No. de PQR 1 Yessica Cantello		20 mayo del 2022	El/La señor(a) Yessica Cantello solicitó la inclusión al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 2 Betilda Gonzales		25 mayo del 2022	El/La señor(a) Betilda Gonzales solicitó la inclusión al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 40 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 3 Luz Dary Ruiz		25 mayo del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 4 Jorge Guerra Arrieta		25 mayo del 2022	El/La señor(a) Jorge Guerra Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45a 16j - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 5 Emir Elias Pren M		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Emir Elias Pren M solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 15 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 6 Andrea Beltran Vides		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Andrea Beltran Vides solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 4 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 7 Jader Perez Molina		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Jader Perez Molina solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17e 45 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 8 Oscar Gamarro		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Oscar Gamarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 50 - lote 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 9 Manuel Mercado A		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Manuel Mercado A solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17d 45 -06.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 10 Humberto Atencia Sierra		27 mayo del 2022	El/La señor(a) Humberto Atencia Sierra solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 62 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 40

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **16/01/2023** al **22/01/2022** Fecha **23/01/2022**

Inclusión	No. de PQR 11 Erika Blanco	27 mayo del 2022	El/La señor(a) Erika Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	El contratista reliza el cierre d ela solicitud teniendo en cuenta el concepto del FOVIS,
Inclusión	No. de PQR 12 Yuris Paola Suarez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Yuris Paola Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 38 lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	zona de riesgo.El predio tiene un area dentro de la vivienda que presenta
Inclusión	No. de PQR 13 Katerine Benitez Villalba	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Katerine Benitez Villalba solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 50 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 14 Jose Joaquin Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Jose Joaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 15 Ana Isabel Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 16 Marileys Molina Alvarado	01 junio del 2022	El/La señor(a) Marileys Molina Alvarado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 17 Jeraldine Yepe Lasmar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Jeraldine Yepe Lasmar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 18 Enna Maria Lamar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Enna Maria Lamar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 19 Nauded Alvarez Maurez	02 junio del 2022	El/La señor(a) Nauded Alvarez Maurez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 20 Henoc Jose Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Henoc Jose Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 F 45- 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 21 Brenda Galvan Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Brenda Galvan Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 61 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 22 Sindy Rodriguez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Sindy Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 23 Luz Dary Martinez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 24 Jose Juaquin Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Juaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 25 Ana Milena Vergara	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Milena Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 20 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 26 Maria Alejandra Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Alejandra Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 27 Oswaldo jimenez Ramirez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Oswaldo jimenez Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 28 Hernan Jimenez Marin	06 junio del 2022	El/La señor(a) Hernan Jimenez Marin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 14 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 29 Carmen Carpintero	06 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 30 Ana Isabel Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	Cabe aclarar que la PQR # 30 se recepciono dos veces, a nombre de la
Inclusión	No. de PQR 31 Edilma Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 45 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 32 Silvio David Morelo	06 junio del 2022	El/La señor(a) Silvio David Morelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 57 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 33 Norelis Zabaleta	06 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Zabaleta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 59 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 34 Darin Blanco Fuentes	6 junio del 2022	El/La señor(a) Darin Blanco Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	definir con planeacion si esta en zona de riesgo.
Inclusión	No. de PQR 35 Deivi Jose Miranda	8 junio del 2022	El/La señor(a) Deivi Jose Miranda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 36 Gertrudis Lopez Herazo	8 junio del 2022	El/La señor(a) Gertrudis Lopez Herazo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 37 Sandra Cruz Peña	10 junio del 2022	El/La señor(a) Sandra Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 73.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 38 Gina Salcedo Ruiz	10 junio del 2022	El/La señor(a) Gina Salcedo Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 39 Yesica Cabrera Lora	10 junio del 2022	El/La señor(a) Yesica Cabrera Lora solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 40 Walter Arrieta	10 junio del 2022	El/La señor(a) Walter Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 41 Ana Luisa Contreras	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Luisa Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 32.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 42 Andres Bruno Benavidez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Bruno Benavidez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 43 Bertina Montes	15 junio del 2022	El/La señor(a) Bertina Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 39 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 44 Emistocle Bertel Avila	15 junio del 2022	El/La señor(a) Emistocle Bertel Avila solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 14.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 45 Griseida Arrieta Betin	15 junio del 2022	El/La señor(a) Griseida Arrieta Betin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 53 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 46 Nadin Carvajal	15 junio del 2022	El/La señor(a) Nadin Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 47 Carmen Carpintero	15 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 48 Martha Regino Herrera	15 junio del 2022	El/La señor(a) Martha Regino Herrera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 2 - lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 49 Blanca Avilez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Blanca Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 50 Luz Marina Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Manna Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 51 Gabriel Julio Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Julio Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 43 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 52 Luis rodriguez Rivero	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luis rodriguez Rivero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 53 Maria Monroy	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Monroy solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 54 Dani Velazquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Dani Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 55 Edith Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 9.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 56 Maryiris Navarro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maryiris Navarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 57 Santiago Troncoso Reyes	16 junio del 2022	El/La señor(a) Santiago Troncoso Reyes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45A - 157.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 58 Milagro Niebles Castro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Milagro Niebles Castro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 28 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 59 Elena Peña Pineda	16 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Peña Pineda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 60 Ever Luis Marquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ever Luis Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 121.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 61 Ramona Rosa Diaz	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ramona Rosa Diaz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 42 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 62 Andres Murillo Perez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 54 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 63 Heriberto Fernandez Lopez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Heriberto Fernandez Lopez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 17A 45B 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 64 Gabriel Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16I 45C 74.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 65 Denys Herrera Alvarez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Denys Herrera Alvarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 66 Alicia Conde Morales	16 junio del 2022	El/La señor(a) Alicia Conde Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45 A 65.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 67 Gregoria Marzan Solar	17 junio del 2022	El/La señor(a) Gregoria Marzan Solar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 01.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 68 Lina Martinez Zuñiga	17 junio del 2022	El/La señor(a) Lina Martinez Zuñiga solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 69 Carmerlo Castro Novoa	17 junio del 2022	El/La señor(a) Carmerlo Castro Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 48 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 40

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **16/01/2023** al **22/01/2022** Fecha **23/01/2022**

Inclusión	No. de PQR 70 Nicolasa Padilla	17 junio del 2022	El/La señor(a) Nicolasa Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 20A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 71 Jose Miguel Lopez Bravo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Miguel Lopez Bravo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 20.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 72 Vicente Villamizar Campo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Vicente Villamizar Campo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 73 Ely Causil Martinez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Ely Causil Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 74 Padro Ramos	17 junio del 2022	El/La señor(a) Padro Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 75 Dagoberto Mendoza Mercado	17 junio del 2022	El/La señor(a) Dagoberto Mendoza Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	PRESENTA RIESGO POR DESLIZAMIENTO , NO CUMPLE CON
Inclusión	No. de PQR 76 Iris Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 77 Maria Carlota Menco	17 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Carlota Menco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 78 Iris Murillo Perez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 79 Edilsa Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Edilsa Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 80 Alejandra Loaiza Corrales	17 junio del 2022	El/La señor(a) Alejandra Loaiza Corrales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 29 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 81 Grey Montes Rodriguez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Grey Montes Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 82 Marlenys arroyo Quintero	21 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenys arroyo Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 83 Rodolfo Gonzalez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Rodolfo Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 41 - lote 38.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 84 Elida Pinto Morales	21 junio del 2022	El/La señor(a) Elida Pinto Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 85 Nelfi Calle Mejia	21 junio del 2022	El/La señor(a) Nelfi Calle Mejia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 86 Jorge Ramos Osorio	21 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Ramos Osorio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 87 Manuel Solano Almario	21 junio del 2022	El/La señor(a) Manuel Solano Almario solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 88 Carmen Perez Contreras	21 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Perez Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 89 Estefany Buelvas	21 junio del 2022	El/La señor(a) Estefany Buelvas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 22 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 90 Omaida Villadiego	22 junio de(2022	El/La señor(a) Omaida Villadiego solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 41.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 91 Rosa Isabel Alba Llanares	22 junio de(2022	El/La señor(a) Rosa Isabel Alba Llanares solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 92 Carmen Arroyo Ramos	22 junio de(2022	El/La señor(a) Carmen Arroyo Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 28.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 93 Alvaro Macea Rivera	22 junio de(2022	El/La señor(a) Alvaro Macea Rivera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 12 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 94 Maria Quiroz Goez	23 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Quiroz Goez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrea 17f 45B - 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 95 Luis Alberto Quiroz	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Alberto Quiroz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 64 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 96 Aracelis Zuñiga Salcedo	23 junio del 2022	El/La señor(a) Aracelis Zuñiga Salcedo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 59.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 97 Luz Velazquez Villareal	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Velazquez Villareal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 98 Luis Felipe Galeano	24 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Felipe Galeano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 99 Rosalba Barragan Barbosa	24 junio del 2022	El/La señor(a) Rosalba Barragan Barbosa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 100 Teresa Santana Peralta	24 junio del 2022	El/La señor(a) Teresa Santana Peralta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A - 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 101 Etelvina Lobo Cuello	24 junio del 2022	El/La señor(a) Etelvina Lobo Cuello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 102 Maria Gonzalez	24 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 16 - lote .	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 103 Elena Perez Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 104 Edith Quintero	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 31 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 105 Edilma Gonzalez	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C 53.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 106 Karen Campo Cruz	27 junio del 2022	El/La señor(a) Karen Campo Cruz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16c 46B - 69.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 107 Libia Solar Orozco	27 junio del 2022	El/La señor(a) Libia Solar Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 108 Irma Baquero Fuentes	27 junio del 2022	El/La señor(a) Irma Baquero Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 -19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 109 Yuliet Perez Mendoza	27 junio del 2022	El/La señor(a) Yuliet Perez Mendoza solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 - 16C - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 110 Ibeth Vergara	29 junio del 2022	El/La señor(a) Ibeth Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 19A - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 111 Josefa Lazo Solano	29 junio del 2022	El/La señor(a) Josefa Lazo Solano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 112 Grisela Videz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Grisela Videz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 113 Juan Velazquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 60.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 114 Inogenes Carmona	29 junio del 2022	El/La señor(a) Inogenes Carmona solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46C - 52.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 115 Jesus Beltran Franco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jesus Beltran Franco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16B 46A - 51.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 116 Marina Benitez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marina Benitez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 117 Jorge Hoyos Otero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Hoyos Otero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 118 Yasmira Tovar Aguas	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yasmira Tovar Aguas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 119 Yerlis Salas Tovar	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Salas Tovar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 120 Jose Peñate Orozco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Peñate Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 121 Jorge Petro	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Petro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C 66.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 122 Francisco Romero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Francisco Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46 - 37.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 123 Luz Pajaro Garcia	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pajaro Garcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 55.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 124 Marlenis Delgado	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenis Delgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 125 Miguel Galindo	28 junio del 2022	El/La señor(a) Miguel Galindo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 126 Rubiela Gonzalez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Rubiela Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 48 B - 81.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 127 Norelis Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 55 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 128 Nohelia Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Nohelia Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 6 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 40

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **16/01/2023** al **22/01/2022** Fecha **23/01/2022**

Inclusión	No. de PQR 129 Esmeralda Marquez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Esmeralda Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 130 Gil Blanco Yubis	28 junio del 2022	El/La señor(a) Gil Blanco Yubis solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 23.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 131 Adis Arias Carvajal	29 junio del 2022	El/La señor(a) Adis Arias Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 76.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 132 Jaime Galindo Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime Galindo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 54.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 133 Luisa Noriega Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luisa Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 134 Silvia Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Silvia Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 135 Vianey Pelaez Vasquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Vianey Pelaez Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 145C - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 136 Yalitza Meza Montes	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yalitza Meza Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 137 Fredy Florian Pornnefz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Fredy Florian Pornnefz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 138 Segundo Novoa	29 junio del 2022	El/La señor(a) Segundo Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 35 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 139 Eduardo de Hoyo	29 junio del 2022	El/La señor(a) Eduardo de Hoyo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 140 Nohemi Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Nohemi Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 49.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 141 Yeline Molina Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeline Molina Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 45 - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 142 Yeison Ozuna Jimenez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeison Ozuna Jimenez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 11 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 143 Henry Contrera Rios	30 junio del 2022	El/La señor(a) Henry Contrera Rios solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 04.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 144 Dorys Yepez Suarez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dorys Yepez Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17D 45 - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 145 Jaime de Avila Syago	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime de Avila Syago solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 146 Hernando Trujillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Hernando Trujillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 147 Karina Marrugo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karina Marrugo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 148 Elisena Solar Orrozco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elisena Solar Orrozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 149 Bilma Salgado	30 junio del 2022	El/La señor(a) Bilma Salgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45B - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 150 Luz Fernandez Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Fernandez Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 151 Keider Avilez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keider Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 152 Rafael Bertel Bertel	30 junio del 2022	El/La señor(a) Rafael Bertel Bertel solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 153 Luz Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 43 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 154 Karol Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karol Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B - 136.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 155 Pabla Teran Romerin	30 junio del 2022	El/La señor(a) Pabla Teran Romerin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16H 45 - 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 156 Yadira Basilio Castillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yadira Basilio Castillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46a - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 157 Marqueza Padilla	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marqueza Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 36 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 158 Ruth Perez Perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ruth Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 159 Jose Carey Julio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Carey Julio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 160 Maria Manjarrez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Manjarrez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 161 Marleidis Bolaño	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marleidis Bolaño solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 162 Luis Manuel Murillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Manuel Murillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 163 Juan Perez Muslaco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Perez Muslaco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46A - 99.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 164 Keila Marquez Acosta	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keila Marquez Acosta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 33 - Lote 3A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 165 Nalfis Marquez David	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nalfis Marquez David solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 166 Yorlenis Tapia Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yorlenis Tapia Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 167 Ana Maria Tamara Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Maria Tamara Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 168 Elkin Zabala Vasquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elkin Zabala Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 169 Eder Hurtado Carpio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Eder Hurtado Carpio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 170 Dionicio Nieto	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dionicio Nieto solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 8 - Lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 171 Nerys Cruz Peña	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nerys Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 172 Consuelo Florez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Consuelo Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 173 Yonadis Tapias	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yonadis Tapias solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 16 - Lote 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 174 Jose Banquet perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Banquet perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 34 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 175 Alma Almentero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alma Almentero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 176 Luz Estela Escorcia	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Estela Escorcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 A 45A - 58.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 177 Celia Vega Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Celia Vega Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 136 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 178 Norelis Ortiz Rodelo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Ortiz Rodelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 179 Luis Julio Romero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Julio Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 48 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 180 Carmelina Gomez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Carmelina Gomez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 64 - Lote 29A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 181 Yerlis Muñoz	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Muñoz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17H 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 182 Andry Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Andry Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16E 46 - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 183 Emid Vega Bula	30 junio del 2022	El/La señor(a) Emid Vega Bula solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 184 Jhon Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jhon Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45C - 07.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 185 Alfonso Dieteben Ortega	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alfonso Dieteben Ortega solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 114.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 186 Luis Rosario Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Rosario Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 47 - 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 187 Frank Martinez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Frank Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16G 48A - 111.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 40

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **16/01/2023** al **22/01/2022** Fecha **23/01/2022**

Inclusión	No. de PQR 188 Ana Delgado Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Delgado Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSIÓN AL PCI
Inclusión	No. de PQR 189 Ana Sofia Beltran	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Sofia Beltran solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45A 16G - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSIÓN AL PCI
Inclusión	No. de PQR 190 Etilsa Suarez Ciprian	30 junio del 2022	El/La señor(a) Etilsa Suarez Ciprian solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45C - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSIÓN AL PCI

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
Atraso en las actividades de ejecución de obra	Plan de contingencia	Teniendo en cuenta los atrasos que se presentaban en obra, se dio inicio al proceso de incumplimiento al Consorcio Turquía mediante mesa de trabajo del 21 de noviembre de 2022.	Consorcio Turquía	Plan de contingencia carta CONS-TUR SINC-045 Actualización Plan de Contingencia GA-DOMI-071-22 Mesa de trabajo con aseguradora y aprobacion de modificatorio No. 01 del contrato de obra, mediante el cuals e prorroga por tres (3) meses más, es decir hasta el 13/03/2023.	13/12/2022
Mal estado de vías de acceso.	Solicitud adecuación de vías por parte de Alcaldía.	* Teniendo en cuenta la reunión realizada el dia 31 de mayo de 2022 se concertó con la Alcaldía, a través del Ministerio de Vivienda, la disponibilidad de la maquinaria para llevar a cabo las adecuaciones de las vías de acceso al barrio El Poblado.	Alcaldía Sincelejo	El 22 de junio 2022 hizo presencia la maquinaria de la Alcaldía de Sincelejo para el inicio de las adecuaciones en la carrera 16 I con	22/06/2022
Contrato de acueducto	Coordinación entre contratos	El Contratista realizó los acercamientos pertinentes, no obstante a la fecha no se ha definido el fecha de inicio y fin de intervención de la vía 16 J	Alcaldía Sincelejo	N/A	N/A

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

* El Consorcio Turquía continuó con la Actividad 2 en las visitas de los diagnósticos de las viviendas objeto del programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en el barrio El Poblado, por lo tanto, a la fecha de corte del presente informe semanal se tiene aprobado seiscientos cuarenta (640) diagnósticos acumulados.

* De acuerdo con las diferentes reuniones sostenidas con el Contratista e Interventoría para la revisión de la Matriz Inicial, se realizó el balance de los posibles beneficiarios del programa de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Sincelejo - Sucre, en contraste con los recorridos de verificación en campo, plano del barrio El Poblado de caracterización de zonas de riesgo y los diferentes informes emitidos por el FOVIS, se obtuvo un potencial neto de 644 viviendas efectivas, 46 no efectivas y 3 renuncias, tal y como se muestra a continuación:

Viviendas efectivas: 644
Viviendas diagnóstico aprobado: 640
Viviendas con observaciones de diagnóstico: 3
Viviendas no efectivas: 46
Renuncias: 3
Viviendas Pendientes por diagnosticar: 1
Viviendas terminadas: 418
Viviendas en ejecución: 27
Viviendas iniciadas: 445

* Para la Actividad 3 se han iniciado un total de cuatrocientos cuarenta y cinco (445) viviendas, de las cuatrocientos dieciocho (418) están terminadas, veintisiete (27) en ejecución. En la semana se realizaron 13 aperturas.

* Con respecto a la Actividad 4, se han recibido ciento noventa (190) solicitudes de inclusiones, de las cuales ciento cinco (105) han sido avaladas por la Alcaldía de Sincelejo, ochenta y cuatro (84) no fueron aprobadas y una (01) en la cual el FOVIS no dio una respuesta clara de aprobación. Se continuará con las visitas vivienda a vivienda así como reuniones sectorizadas para dar a conocer a los potenciales beneficiarios toda la información referente a este proyecto.

A corte del presente informe semanal se tiene un porcentaje ejecutado acumulado de 64,97% y un porcentaje programado acumulado de 69,71%, lo que incide en un retraso del 4,74%. Es importante mencionar que esta Interventoría el día 18 de enero de 2023 con carta GA-DOMI-259-23 se realizó análisis del seguimiento del avance en la reprogramación de obra en los porcentajes de ejecución y de las viviendas terminadas semana a semana, evidenciando bajos rendimientos y en las metas fijadas por el Consorcio

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 40

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **16/01/2023** al **22/01/2022** Fecha **23/01/2022**

con carta CA-DOM-235-20 se realizo analisis del seguimiento del avance en la reprogramación de obra en los porcentajes de ejecución y de las viviendas terminadas semana a semana, evidenciando bajos rendimientos y en las metas ligadas por el consorcio Turquía en la modificación contractual del contrato de obra. Por lo tanto, se solicitó dar cumplimiento con la reprogramación aumentando la mano de obra, disponibilidad de materiales y apertura de intervenciones, con el fin de garantizar la terminación de las actividades dentro del plazo contractual.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	**Firma**	**Firma**
Nombre EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Nombre HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Nombre
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Profesional Costos y Presupuesto <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría



Bogotá D.C, 31 de enero de 2023

Señor
JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
Supervisor
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio
Calle 26 N°. 13-19
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría N°. 2220585 "Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre"**

Asunto: **Remisión Informe Semanal No. 41 periodo del 23 de Enero de 2023 al 29 de enero de 2023**

Apreciado señor,

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, anexo, se remite el informe semanal de Interventoría No. 41 del contrato de la referencia para el período comprendido entre el 23 de enero de 2023 al 29 de enero de 2023.

Anexo se remite como soporte al Informe Semanal N°. 41; bitácora de obra, Lista de chequeo seguimiento estado de salud de Interventoría y Obra, Informe social, Resumen de avance y Matriz Tres Momentos.

Cordialmente,

EDGAR ALFONSO ARAGÓN OTERO
Director de Interventoría
Anexos: Lo enunciado en treinta y ocho (38) folios y archivos en magnético.
C.C.: Ing. Juan David Amón – Supervisor del contrato Convenio Inter administrativo 221005; Enterritorio.
Archivo.
Elaboró: A.P.
Revisó: EAO.

INFORME SEMANAL

Cra. 48 No. 101A – 29 Bogotá, Colombia Tel: (57 1) 236 7974 – 621 5383
E-mail: info@gavinco.com www.gavinco.com

enterritorio	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 40

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **23/01/2023** al **29/01/2023** | Fecha **30/01/2023**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

código PROYECTO	2220577			
OBJETO DEL PROYECTO	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO**	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO
GERENCIA A CARGO	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1			
SUPERVISOR	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ			
ESTADO DEL PROYECTO	En ejecución.			

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220577	
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	
Valor inicial	$ 5.034.941.972,00	
Adición No. 1	N/A	
Valor actual	$ 5.034.941.972,00	
Variación del valor	$ -	
Fecha de Inicio	13/04/2022	
Plazo inicial (Días)	244 Días	
Prorroga No. 1	90 Días	
Plazo actual (Días)	334 Días	100,00%
Variación en plazo	90 Días	
Fecha Contractual de terminación	13/03/2023	
Tiempo Transcurrido (días)	287	85,93%
Días remanentes del Contrato	42	12,57%
Acumulado a última acta pagada	$ 2.820.263.489,10	
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -	

2.2 CONTRATO DE Interventoría

Contrato No.	2220585	
Interventor	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.	
Valor inicial	$ 542.723.071,00	
Adición No. 1	$ 150.072.084,00	
Valor actual	$ 692.795.155,00	
Variación del valor	$ 150.072.084,00	
Fecha de Inicio	13/04/2022	
Plazo inicial	244 Días	
Prorroga No. 1	90 Días	
Plazo actual	334 Días	100,00%
Variación en plazo	90 Días	
Fecha Contractual de terminación	13/03/2023	
Ejecución del Contrato	287	85,93%
Días remanentes del Contrato	42	12,57%
Acumulado a última acta pagada	$ 442.373.612,60	
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -	

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPENO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 5.034.941.972,00

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 3.509.934.216,03	69,71%	$ 3.271.201.799,21	64,97%	-$ 238.732.416,82	-4,74%
Durante el Periodo	$ 148.781.244,48	2,95%	$ 45.170.548,66	0,90%	-$ 103.610.695,83	-2,06%
Acumulado a la Fecha	$ 3.658.715.460,52	**72,67%**	$ 3.316.372.347,86	**65,87%**	-$ 342.343.112,65	**-6,80%**

Semáforo

Desviación en días: -17 Días

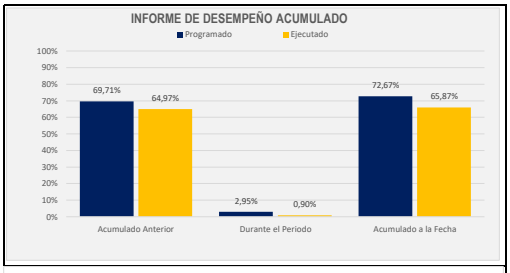

Observaciones al desempeño del proyecto


Actividad 1. *Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquia. Aprobado por interventoria con cartas GA-DOMI-040-22 del dia 31 de mayo de 2022 y radicado en ENTERRITORIO bajo el N°. 20224300206752 y GA-DOMI-030-22 radicado N°. 20224300189742.*


Actividad 2. *Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoria, por el Contratista de obra, un total de 64 4 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 640 diagnósticos acumulados. Hay 46 diagnósticos no efectivos y Tres (3) renuncias.*

Actividad 3. *A corte de este informe el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 457 viviendas, de las cuales 418 están terminadas, 39 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 187 para inicio de actividades.*

Actividad 4. *Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas, y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.*

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

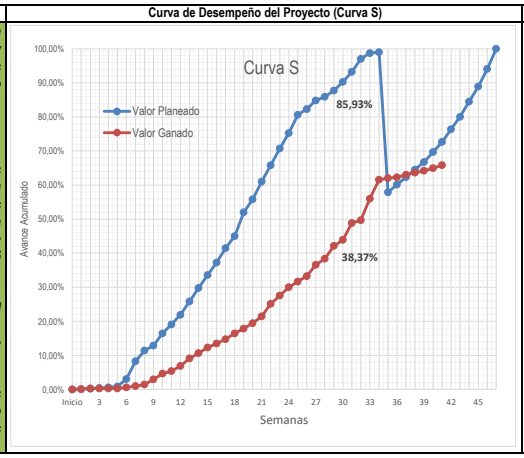

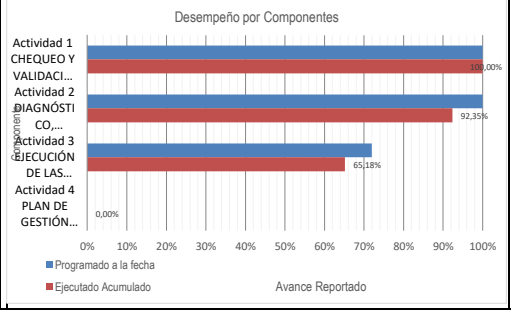

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE


DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

* Se ajusta la curva S del proyecto conforme a la capacitación dada el 28 de abril de 2022 por parte del supervisor de ENTERRITORIO.
* La Entidad mediante la suscripción del Modificatorio No. 1 del 13 de diciembre de 2022 se da aval a ampliar el plazo de la ejecución de las obras hasta el día 13 de marzo de 2023, tiempo que no generará costos adicionales a la Entidad y el contratista de obra asume el costo de mayor permanencia de Interventoría. Por consiguiente se realiza el ajuste de la curva S de las actividades de obra conforme a la reprogramacion realizada por el Consorcio Turquía con carta CONS-TUR-SINC-163 del 21 de noviembre de 2022, la cual fue revisada por Interventoría y avalada con la comunicación GA-DOMI-217-22 del día 25 de noviembre de 2022 radicado No. 20224300453802.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	69,71%	64,97%	-4,74%	
Durante el Periodo	2,95%	0,90%	-2,06%	
Acumulado a la Fecha	**72,67%**	**65,87%**	**-6,80%**	

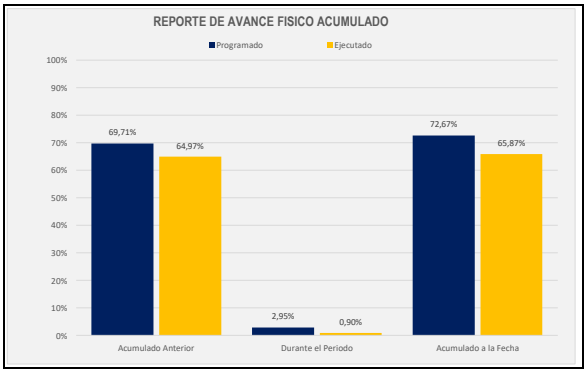

AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 5.034.941.972,00	$ 5.034.941.972,00	$ -	$ 981.956.213,60	$ 841.887.956,54	$ 140.068.257,06

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
6	$ 2.820.263.489,10	56,01%	6	$ 2.820.263.489,10	56,01%	9/12/2022	$ 769.913.798,72








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 542.723.071,00	$ 692.795.155,00	$ 150.072.084,00	N/A	N/A	N/A

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
9	$ 442.373.612,60	63,85%	8	$ 339.826.050,90	49,05%	12/12/2022	$ 54.489.396,32







INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 40

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **23/01/2023** al **29/01/2023** Fecha **30/01/2023**

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA APROBADO.

* Actividad 1. Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, se presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía.

* Actividad 2. Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoría, por el Contratista de obra, un total de 644 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 640 diagnósticos acumulados. Está pendiente de atención de observaciones de 3 diagnóstico y uno (1) por realizar la visita para diagnosticar la vivienda. De acuerdo al informe técnico entregado por el FOVIS de las manzanas 40A, 38A Y 38, hay once (11) diagnósticos que pasarían a ser no efectivos ya que las viviendas se encuentran en zona de riesgo, por lo tanto, el total de diagnósticos no efectivos se eleva a 46 y tres (3) renuncias.

* Actividad 3. A corte de este informe, el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 457 viviendas, de las cuales 418 están terminadas, 39 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 187 para inicio de actividades.

* Actividad 4. Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.

Actividad 2.

Diagnósticos programación inicial: 693
Diagnósticos reprogramación: 693
Diagnósticos Aprobados acumulados: 640
Viviendas con observaciones de diagnóstico: 3
Viviendas efectivas: 644
Viviendas no efectivas: 46
Renuncias: 3

Actividad 3.

Viviendas programación inicial: 693
Viviendas reprogramación: 475
Viviendas terminadas: 418
Viviendas en ejecución: 39
Viviendas totales iniciadas: 457

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

* El día 26 de enero de 2023 mediante la comunicación GA-DOMI-268-23 y de acuerdo con el seguimiento realizado por Interventoría a las actividades de ejecución de las obras, se procedió a emitir observaciones al Consorcio Turquía sobre las diferentes unidades sanitarias que se encuentran en ejecución por malas prácticas en las actividades de construcción que no cumplen con las especificaciones técnicas, enchapes con falencias en el mortero de pega de pega, deficiencias en los acabados, entre otros. Esto con el fin de que el contratista de obra realice los ajustes necesarios para garantizar la calidad de las obras.
* Con carta GA-DOMI-270-23 del día 26 de enero de 2023 y de acuerdo con el seguimiento semanal de avance de las actividades de obra, se ha evidenciado aumento en el atraso del contrato respecto a la programación; por tal motivo, se solicitó aumentar la mano de obra, disponibilidad de materiales, incrementar apertura de intervenciones y presentar un plan de contingencia que describa las acciones correctivas para dar cumplimiento con los compromisos y metas fijadas en la solicitud de modificación contractual No. 1 de prórroga del contrato de obra.

* Mediante la carta GA-DOMI-271-23 del día 27 de enero de 2023, se requirió al contratista de obra, teniendo en cuenta los recorridos de obra realizados a las manzanas 54, 58 y 62 del Barrio el Poblado los días 02, 11 de diciembre de 2022 y 12, 25 de enero de 2023, con el fin de que se atiendan las observaciones de detalles realizados por la interventoría y los cuales a la fecha no han sido atendidas por parte del Consorcio Turquía.

ACTIVIDADES EN CAMPO

* El día 23 de enero de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. El día 23 de enero de 2023 no se realizaron aperturas.
* El día 24 de enero de 2023, el contratista continuó con las actividades de instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención, instalación de enchape, pintura y atendiendo detalles de la casetas terminadas. El 24 de enero de 2023 no se realizaron aperturas. Para el día de hoy en horas de la tarde se recibe la visita de la supervisora por parte del ministerio de vivienda, para verificar las viviendas que visitara la ministra de vivienda el día 26 de enero de 2023.
* El día 25 de enero de 2023, el contratista continuó con las actividades de instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención, instalación de enchape, pintura y atendiendo detalles de la casetas terminadas. El 25 de enero de 2023 se realizaron aperturas diez (10) aperturas bajo los códigos: S-SC-EP-M71-VE-688, S-SC-EP-M67-VE-626,S-SC-EP-M67-VE-625,S-SC-EP-M67-VE-624 , S-SC-EP-M09-VE-440, S-SC-EP-M56-VE-398, S-SC-EP-M56-VE-399,S-SC-EP-M56-VE-400, S-SC-EP-M56-VE-401,S-SC-EP-M56-VE-406. Para el día hoy se realizó recorrido de obra con la supervisora del ministerio de vivienda, interventoría y contratista, con el fin de verificar las viviendas en ejecución y las pertinentes a la visita de la ministra de vivienda.

* El día 26 de enero de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. El día 26 de enero de 2023 se realizaron dos (2) aperturas bajo los códigos: S-SC-EP-M67-VE-630, S-SC-EP-M67-VE-632.

Se realizó recorrido de las viviendas del programa de conexiones intradomiciliarias con la Dra. Catalina Velasco Ministra de Vivienda, Alcalde de Sincelejo, Representante de la Gobernación de Sucre, Aguas de Sucre, ENTerritorio, FOVIS y todo el equipo de reportaje de las distintas entidades, la cual tuvo el objeto de realizar el seguimiento y avances de las obras, así como también constatar el impacto social en beneficio de la población del barrio El Poblado del municipio de Sincelejo (Sucre).
* El día 27 de enero de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado.
* El día 28 de enero de 2023, el contratista continuó con las actividades de instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención, instalación de enchape, pintura y atendiendo detalles de la casetas terminadas.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

* Se continuará con la intervención de las viviendas en el barrio El Poblado en Sincelejo Sucre.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	155	0	155	72,4%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	35	0	35	16,4%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	8	0	8	3,7%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál? Orden público	16	0	16	7,5%
	Total	**214**	**0**	**214**	**100,00%**



En la semana no se presentaron lluvias.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
Tipología PQR	Radicado por		Fecha	Asunto	Dirigido a	Respuesta Alcaldía / FOVIS
Inclusión	No. de PQR 1 Yessica Cantello		20 mayo del 2022	El/La señor(a) Yessica Cantello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 2 Betilda Gonzales		25 mayo del 2022	El/La señor(a) Betilda Gonzales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 40 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 3 Luz Dary Ruiz		25 mayo del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 4 Jorge Guerra Arrieta		25 mayo del 2022	El/La señor(a) Jorge Guerra Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45a 16i - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 5 Emir Elias Pren M		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Emir Elias Pren M solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 15 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 6 Andrea Beltran Vides		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Andrea Beltran Vides solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 4 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 7 Jader Perez Molina		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Jader Perez Molina solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17e 45 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 8 Oscar Gamarro		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Oscar Gamarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 50 - lote 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 9 Manuel Mercado A		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Manuel Mercado A solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17d 45 -06.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 10 Humberto Atencia Sierra		27 mayo del 2022	El/La señor(a) Humberto Atencia Sierra solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 62 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 11 Erika Blanco		27 mayo del 2022	El/La señor(a) Erika Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	El contratista reliza el cierre d ela solicitud teniendo en cuenta el concepto del FOVIS.
Inclusión	No. de PQR 12 Yuris Paola Suarez		31 mayo del 2022	El/La señor(a) Yuris Paola Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 38 lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	zona de riesgo.El predio tiene un area dentro de la vivienda que presenta

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 40

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **23/01/2023** al **29/01/2023** | Fecha **30/01/2023**

Inclusión	No. de PQR 13 Katerine Benitez Villalba	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Katerine Benitez Villalba solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 50 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 14 Jose Joaquin Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Jose Joaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 15 Ana Isabel Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 16 Marileys Molina Alvarado	01 junio del 2022	El/La señor(a) Marileys Molina Alvarado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 17 Jeraldine Yepe Lasmar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Jeraldine Yepe Lasmar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 18 Enna Maria Lamar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Enna Maria Lamar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 19 Nauded Alvarez Maurez	02 junio del 2022	El/La señor(a) Nauded Alvarez Maurez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 20 Henoc Jose Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Henoc Jose Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 F 45- 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 21 Brenda Galvan Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Brenda Galvan Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 61 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 22 Sindy Rodriguez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Sindy Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 23 Luz Dary Martinez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 24 Jose Juaquin Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Juaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 25 Ana Milena Vergara	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Milena Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 20 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 26 Maria Alejandra Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Alejandra Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 27 Oswaldo jimenez Ramirez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Oswaldo jimenez Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 28 Hernan Jimenez Marin	06 junio del 2022	El/La señor(a) Hernan Jimenez Marin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 14 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 29 Carmen Carpintero	06 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 30 Ana Isabel Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	Cabe aclarar que la PQR # 30 se recepciono dos veces, a nombre de la
Inclusión	No. de PQR 31 Edilma Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 45 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 32 Silvio David Morelo	06 junio del 2022	El/La señor(a) Silvio David Morelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 57 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 33 Norelis Zabaleta	06 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Zabaleta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 59 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 34 Darin Blanco Fuentes	6 junio del 2022	El/La señor(a) Darin Blanco Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	definir con planeacion si esta en zona de riesgo
Inclusión	No. de PQR 35 Deivi Jose Miranda	8 junio del 2022	El/La señor(a) Deivi Jose Miranda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 36 Gertrudis Lopez Herazo	8 junio del 2022	El/La señor(a) Gertrudis Lopez Herazo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 37 Sandra Cruz Peña	10 junio del 2022	El/La señor(a) Sandra Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 73.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 38 Gina Salcedo Ruiz	10 junio del 2022	El/La señor(a) Gina Salcedo Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 39 Yesica Cabrera Lora	10 junio del 2022	El/La señor(a) Yesica Cabrera Lora solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 40 Walter Arrieta	10 junio del 2022	El/La señor(a) Walter Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 41 Ana Luisa Contreras	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Luisa Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 32.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 42 Andres Bruno Benavidez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Bruno Benavidez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 43 Bertina Montes	15 junio del 2022	El/La señor(a) Bertina Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 39 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 44 Emistocle Bertel Avila	15 junio del 2022	El/La señor(a) Emistocle Bertel Avila solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 14.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 45 Griseida Arrieta Betin	15 junio del 2022	El/La señor(a) Griseida Arrieta Betin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 53 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 46 Nadin Carvajal	15 junio del 2022	El/La señor(a) Nadin Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 47 Carmen Carpintero	15 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 48 Martha Regino Herrera	15 junio del 2022	El/La señor(a) Martha Regino Herrera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 2 - lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 49 Blanca Avilez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Blanca Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 50 Luz Marina Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Marina Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 51 Gabriel Julio Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Julio Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 43 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 52 Luis rodriguez Rivero	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luis rodriguez Rivero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 53 Maria Monroy	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Monroy solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 54 Dani Velazquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Dani Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 55 Edith Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 9.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 56 Maryiris Navarro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maryiris Navarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 57 Santiago Troncoso Reyes	16 junio del 2022	El/La señor(a) Santiago Troncoso Reyes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45A - 157.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 58 Milagro Niebles Castro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Milagro Niebles Castro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 28 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 59 Elena Peña Pineda	16 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Peña Pineda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 60 Ever Luis Marquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ever Luis Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 121.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 61 Ramona Rosa Diaz	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ramona Rosa Diaz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 42 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 62 Andres Murillo Perez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 54 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 63 Heriberto Fernandez Lopez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Heriberto Fernandez Lopez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 17A 45B 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 64 Gabriel Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16I 45C 74.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 65 Denys Herrera Alvarez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Denys Herrera Alvarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 66 Alicia Conde Morales	16 junio del 2022	El/La señor(a) Alicia Conde Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45 A 65.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 67 Gregoria Marzan Solar	17 junio del 2022	El/La señor(a) Gregoria Marzan Solar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 01.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 68 Lina Martinez Zuñiga	17 junio del 2022	El/La señor(a) Lina Martinez Zuñiga solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 69 Carmerlo Castro Novoa	17 junio del 2022	El/La señor(a) Carmerlo Castro Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 48 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 70 Nicolasa Padilla	17 junio del 2022	El/La señor(a) Nicolasa Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 20A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 71 Jose Miguel Lopez Bravo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Miguel Lopez Bravo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 20.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 40

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **23/01/2023** al **29/01/2023** Fecha **30/01/2023**

Inclusión	No. de PQR 72 Vicente Villamizar Campo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Vicente Villamizar Campo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 73 Ely Causil Martinez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Ely Causil Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 74 Padro Ramos	17 junio del 2022	El/La señor(a) Padro Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 75 Dagoberto Mendoza Mercado	17 junio del 2022	El/La señor(a) Dagoberto Mendoza Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	PRESENTA RIESGO POR DESLIZAMIENTO , NO CUMPLE CON
Inclusión	No. de PQR 76 Iris Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 77 Maria Carlota Menco	17 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Carlota Menco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 78 Iris Murillo Perez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 79 Edilsa Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Edilsa Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 80 Alejandra Loaiza Corrales	17 junio del 2022	El/La señor(a) Alejandra Loaiza Corrales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 29 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 81 Grey Montes Rodriguez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Grey Montes Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 82 Marlenys arroyo Quintero	21 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenys arroyo Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 83 Rodolfo Gonzalez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Rodolfo Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 41 - lote 38.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 84 Elida Pinto Morales	21 junio del 2022	El/La señor(a) Elida Pinto Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 85 Nelfi Calle Mejia	21 junio del 2022	El/La señor(a) Nelfi Calle Mejia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 86 Jorge Ramos Osorio	21 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Ramos Osorio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 87 Manuel Solano Almario	21 junio del 2022	El/La señor(a) Manuel Solano Almario solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 88 Carmen Perez Contreras	21 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Perez Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 89 Estefany Buelvas	21 junio del 2022	El/La señor(a) Estefany Buelvas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 22 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 90 Omaida Villadiego	22 junio de(2022	El/La señor(a) Omaida Villadiego solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 41.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 91 Rosa Isabel Alba Llanares	22 junio de(2022	El/La señor(a) Rosa Isabel Alba Llanares solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 92 Carmen Arroyo Ramos	22 junio de(2022	El/La señor(a) Carmen Arroyo Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 28.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 93 Alvaro Macea Rivera	22 junio de(2022	El/La señor(a) Alvaro Macea Rivera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 12 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 94 Maria Quiroz Goez	23 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Quiroz Goez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrea 17f 45B - 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 95 Luis Alberto Quiroz	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Alberto Quiroz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 64 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 96 Aracelis Zuñiga Salcedo	23 junio del 2022	El/La señor(a) Aracelis Zuñiga Salcedo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 59.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 97 Luz Velazquez Villareal	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Velazquez Villareal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 98 Luis Felipe Galeano	24 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Felipe Galeano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 36	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 99 Rosalba Barragan Barbosa	24 junio del 2022	El/La señor(a) Rosalba Barragan Barbosa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 100 Teresa Santana Peralta	24 junio del 2022	El/La señor(a) Teresa Santana Peralta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A - 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 101 Etelvina Lobo Cuello	24 junio del 2022	El/La señor(a) Etelvina Lobo Cuello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 102 Maria Gonzalez	24 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 16 - lote .	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 103 Elena Perez Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 104 Edith Quintero	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 31 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 105 Edilma Gonzalez	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C 53.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 106 Karen Campo Cruz	27 junio del 2022	El/La señor(a) Karen Campo Cruz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16c 46B - 69.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 107 Libia Solar Orozco	27 junio del 2022	El/La señor(a) Libia Solar Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 108 Irma Baquero Fuentes	27 junio del 2022	El/La señor(a) Irma Baquero Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 -19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 109 Yuliet Perez Mendoza	27 junio del 2022	El/La señor(a) Yuliet Perez Mendoza solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 - 16C - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 110 Ibeth Vergara	29 junio del 2022	El/La señor(a) Ibeth Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 19A - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 111 Josefa Lazo Solano	29 junio del 2022	El/La señor(a) Josefa Lazo Solano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 112 Grisela Videz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Grisela Videz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 113 Juan Velazquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 60.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 114 Inogenes Carmona	29 junio del 2022	El/La señor(a) Inogenes Carmona solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46C - 52.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 115 Jesus Beltran Franco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jesus Beltran Franco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16B 46A - 51.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 116 Marina Benitez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marina Benitez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 117 Jorge Hoyos Otero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Hoyos Otero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 118 Yasmira Tovar Aguas	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yasmira Tovar Aguas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 119 Yerlis Salas Tovar	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Salas Tovar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 120 Jose Peñate Orozco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Peñate Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 121 Jorge Petro	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Petro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C 66.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 122 Francisco Romero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Francisco Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46 - 37.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 123 Luz Pajaro Garcia	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pajaro Garcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 55.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 124 Marlenis Delgado	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenis Delgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 125 Miguel Galindo	28 junio del 2022	El/La señor(a) Miguel Galindo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 126 Rubiela Gonzalez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Rubiela Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 48 B - 81.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 127 Norelis Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 55 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 128 Nohelia Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Nohelia Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 6 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 129 Esmeralda Marquez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Esmeralda Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 130 Gil Blanco Yubis	28 junio del 2022	El/La señor(a) Gil Blanco Yubis solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 23.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 40

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **23/01/2023** al **29/01/2023** Fecha **30/01/2023**

Inclusión	No. de PQR 131 Adis Arias Carvajal	29 junio del 2022	El/La señor(a) Adis Arias Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 76.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 132 Jaime Galindo Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime Galindo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 54.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 133 Luisa Noriega Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luisa Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 134 Silvia Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Silvia Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 135 Vianey Pelaez Vasquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Vianey Pelaez Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 145C - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 136 Yalitza Meza Montes	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yalitza Meza Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 137 Fredy Florian Pornnefz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Fredy Florian Pornnefz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 138 Segundo Novoa	29 junio del 2022	El/La señor(a) Segundo Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 35 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 139 Eduardo de Hoyo	29 junio del 2022	El/La señor(a) Eduardo de Hoyo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 140 Nohemi Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Nohemi Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 49.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 141 Yeline Molina Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeline Molina Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 45 - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 142 Yeison Ozuna Jimenez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeison Ozuna Jimenez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 11 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 143 Henry Contrera Rios	30 junio del 2022	El/La señor(a) Henry Contrera Rios solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 04.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 144 Dorys Yepez Suarez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dorys Yepez Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17D 45 - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 145 Jaime de Avila Syago	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime de Avila Syago solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 146 Hernando Trujillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Hernando Trujillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 147 Karina Marrugo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karina Marrugo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 148 Elisena Solar Orrozco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elisena Solar Orrozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 149 Bilma Salgado	30 junio del 2022	El/La señor(a) Bilma Salgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45B - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 150 Luz Fernandez Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Fernandez Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 151 Keider Avilez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keider Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 152 Rafael Bertel Bertel	30 junio del 2022	El/La señor(a) Rafael Bertel Bertel solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 153 Luz Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 43 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 154 Karol Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karol Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B - 136.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 155 Pabla Teran Romerin	30 junio del 2022	El/La señor(a) Pabla Teran Romerin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16H 45 - 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 156 Yadira Basilio Castillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yadira Basilio Castillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46a - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 157 Marqueza Padilla	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marqueza Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 36 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 158 Ruth Perez Perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ruth Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 159 Jose Carey Julio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Carey Julio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 160 Maria Manjarrez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Manjarrez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 161 Marleidis Bolaño	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marleidis Bolaño solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 162 Luis Manuel Murillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Manuel Murillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 163 Juan Perez Muslaco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Perez Muslaco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46A - 99.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 164 Keila Marquez Acosta	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keila Marquez Acosta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 33 - Lote 3A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 165 Nalfis Marquez David	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nalfis Marquez David solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 166 Yorlenis Tapia Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yorlenis Tapia Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 167 Ana Maria Tamara Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Maria Tamara Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 168 Elkin Zabala Vasquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elkin Zabala Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 169 Eder Hurtado Carpio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Eder Hurtado Carpio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 170 Dionicio Nieto	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dionicio Nieto solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 8 - Lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 171 Nerys Cruz Peña	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nerys Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 172 Consuelo Florez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Consuelo Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 173 Yonadis Tapias	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yonadis Tapias solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 16 - Lote 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 174 Jose Banquet perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Banquet perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 34 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 175 Alma Almentero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alma Almentero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 176 Luz Estela Escorcia	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Estela Escorcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 A 45A - 58.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 177 Celia Vega Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Celia Vega Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 136 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 178 Norelis Ortiz Rodelo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Ortiz Rodelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 179 Luis Julio Romero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Julio Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 48 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 180 Carmelina Gomez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Carmelina Gomez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 64 - Lote 29A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 181 Yerlis Muñoz	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Muñoz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17H 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 182 Andry Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Andry Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16E 46 - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 183 Emid Vega Bula	30 junio del 2022	El/La señor(a) Emid Vega Bula solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 184 Jhon Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jhon Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45C - 07.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 185 Alfonso Dieteben Ortega	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alfonso Dieteben Ortega solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 114.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 186 Luis Rosario Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Rosario Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 47 - 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 187 Frank Martinez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Frank Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16G 48A - 111.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 188 Ana Delgado Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Delgado Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 189 Ana Sofia Beltran	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Sofia Beltran solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45A 16G - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

enterritorio	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**1**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 40

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **23/01/2023** al **29/01/2023** Fecha **30/01/2023**

Inclusión	No. de PQR 190 Etilsa Suarez Ciprian	30 junio del 2022	El/La señor(a) Etilsa Suarez Ciprian solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45C - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSIÓN AL PCI

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
Atraso en las actividades de ejecución de obra	Plan de contingencia	Teniendo en cuenta los atrasos que se presentaban en obra, se dio inicio al proceso de incumplimiento al Consorcio Turquía mediante mesa de trabajo del 21 de noviembre de 2022.	Consorcio Turquía	Plan de contingencia carta CONS-TUR-SINC-045 Actualización Plan de Contingencia GA-DOMI-071-22 Mesa de trabajo con aseguradora y aprobacion de modificatorio No. 01 del contrato de obra, mediante el cuals e prorroga por tres (3) meses más, es decir hasta el 13/03/2023.	13/12/2022
Mal estado de vías de acceso.	Solicitud adecuación de vías por parte de Alcaldía.	* Teniendo en cuenta la reunión realizada el dia 31 de mayo de 2022 se concertó con la Alcaldía, a través del Ministerio de Vivienda, la disponibilidad de la maquinaria para llevar a cabo las adecuaciones de las vías de acceso al barrio El Poblado.	Alcaldía Sincelejo	El 22 de junio 2022 hizo presencia la maquinaria de la Alcaldía de Sincelejo para el inicio de las adecuaciones en la carrera 16 I con	22/06/2022
Contrato de acueducto	Coordinación entre contratos	El Contratista realizó los acercamientos pertinentes, no obstante a la fecha no se ha definido el fecha de inicio y fin de intervención de la vía 16 J	Alcaldía Sincelejo	N/A	N/A

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA












9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

* El Consorcio Turquía continuó con la Actividad 2 en las visitas de los diagnósticos de las viviendas objeto del programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en el barrio El Poblado, por lo tanto, a la fecha de corte del presente informe semanal se tiene aprobado seiscientos cuarenta (640) diagnósticos acumulados.

* De acuerdo con las diferentes reuniones sostenidas con el Contratista e Interventoría para la revisión de la Matriz Inicial, se realizó el balance de los posibles beneficiarios del programa de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Sincelejo - Sucre, en contraste con los recorridos de verificación en campo, plano del barrio El Poblado de caracterización de zonas de riesgo y los diferentes informes emitidos por el FOVIS, se obtuvo un potencial neto de 644 viviendas efectivas, 46 no efectivas y 3 renuncias, tal y como se muestra a continuación:

Viviendas efectivas: 644
Viviendas diagnóstico aprobado: 640
Viviendas con observaciones de diagnóstico: 3
Viviendas no efectivas: 46
Renuncias: 3

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 40

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **23/01/2023** al **29/01/2023** Fecha **30/01/2023**

Viviendas Pendientes por diagnosticar: 1
Viviendas terminadas: 418
Viviendas en ejecución: 39
Viviendas iniciadas: 457

* Para la Actividad 3 se han iniciado un total de cuatrocientos cincuenta y siete (457) viviendas, de las cuales cuatrocientos dieciocho (418) están terminadas y treinta y nueve (39) en ejecución. En la semana se realizaron 12 aperturas.

* Con respecto a la Actividad 4, se han recibido ciento noventa (190) solicitudes de inclusiones, de las cuales ciento cinco (105) han sido avaladas por la Alcaldía de Sincelejo, ochenta y cuatro (84) no fueron aprobadas y una (01) en la cual el FOVIS no dio una respuesta clara de aprobación. Se continuará con las visitas vivienda a vivienda así como reuniones sectorizadas para dar a conocer a los potenciales beneficiarios toda la información referente a este proyecto.

A corte del presente informe semanal se tiene un porcentaje ejecutado acumulado de 65,87% y un porcentaje programado acumulado de 72,67%, lo que incide en un retraso del 6,80%. Es importante mencionar que esta Interventoría el día 18 de enero de 2023 con carta GA-DOMI-259-23 y GA-DOMI-270-23 del día 26 de enero de 2023 se realizó análisis del seguimiento del avance en la reprogramación de obra en los porcentajes de ejecución y de las viviendas terminadas semana a semana, evidenciando bajos rendimientos y en las metas fijadas por el Consorcio Turquía en la modificación contractual del contrato de obra. Por lo tanto, se solicitó dar cumplimiento con la reprogramación aumentando la mano de obra, disponibilidad de materiales y apertura de intervenciones, con el fin de garantizar la terminación de las actividades dentro del plazo contractual y la presentación de un nuevo plan de contingencia para subsanar el atraso.

Es importante mencionar que el día 26 de enero de 2023 se tuvo la visita de la Dra. Catalina Velasco Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Alcalde de Sincelejo, Representante de la Gobernación de Sucre, Aguas de Sucre, ENTerritorio, FOVIS y todo el equipo de reportaje de las distintas entidades, la cual tuvo el objeto de realizar el seguimiento y avances de las obras, así como también constatar el impacto social en beneficio de la población del barrio El Poblado del municipio de Sincelejo (Sucre).

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	Firma	Firma
Nombre EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Nombre HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Nombre
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Profesional Costos y Presupuesto <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Anexo 18. Informe de gestión social

Municipio	Sincelejo	**Contrato:**		2220577
Contratista de obra	Consorcio Turquía	**Contratista de interventoría**		GAVINCO ingenieros consultores
Fecha:	30 enero 2023	**Elaboró**	Candelaria Gózales Medina	**Revisó:** July Paulin Rios Anaya

1. LÍNEA DE COMUNICACIÓN

Acompañamiento a Visitas de obra:

Durante el periodo del mes de enero del año en curso, se realizaron visitas de socialización casa a casa en las aperturas de viviendas, hasta la fecha de cierre de este informe se tiene un total de 80 viviendas visitadas en el barrio el Poblado para el mes de enero, en la actividad de socialización casa a casa en las aperturas. Esta actividad se realizó con el acompañamiento del área técnica y social de la interventoría y de la veeduría

Cabe resaltar que los beneficiarios se encuentran muy interesados y felices con la llegada del Programa a sus viviendas, los profesionales técnicos y sociales de obra e interventoría realizan explicación clara y veraz del alcance del Programa a los beneficiarios. Asimismo, se concertó el lugar de intervención en cada vivienda.

Fecha	Barrios	Asistentes	Lugar	Acciones y Principalesresultados	Responsable	Evidencias
Del 1 al 31 de enero	El Poblado	Contratistas de obra e interventoría Veedores	El Poblado	Socialización del PCI, se despejaron dudas e inquietudes	Contratistas Interventoría	asistencia y registro fotográficos

Diseñar, publicar y distribuir material publicitario:

Durante este periodo se llevó a cabo entregas, folletos informativos y volantes de invitación, con el fin de invitar a la comunidad a la capacitación sectorizada en educación sanitaria, se realizó convocatoria casa a casa, con entregas de volantes de invitación, oficios de invitación para las reuniones con líderes de la JAC.
Por otra parte, se continuó con la entrega de folletos informativos en las diferentes actividades realizada, como son las socializaciones y capacitaciones sectorizadas.

Material Utilizado	Descripción medio de divulgación implementado	Relación de las Evidencias
Material para las socializaciones	----------	---------
Material para las Capacitaciones	Folletos y volantes	Folletos escáner del volante
Material Informativo y/o de convocatoria	Oficios de invitación	Escáner de los oficios
Otras actividades de divulgación: Cuñas radiales, prensa local, perifoneo, entre otras)	N/A	----------

LÍNEA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Punto de Atención: El punto de atención la profesional social brinda atención personalizada, a 2 personas que se acercaron porque tenían dudas e inquietudes por la fecha de entrega de materiales e intervención de sus viviendas, a lo cual el área social suministra toda la información solicitada, dejando claridad sobre las dudas presentadas, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad. Cabe informar que durante este periodo se realizó la atención casa a casa con el fin de poder validar la percepción de los beneficiarios y cubrir la totalidad de las manzanas del barrio.

Los puntos de atención se encuentran ubicados en la calle 9 manzana 32- lote 38, casa del beneficiario José tiran y el segundo punto de atención se encuentra ubicado en la dirección Carrera 17 D# 45 A 05, en la casa de la beneficiaria Luz Mery Rivera. las atenciones a la comunidad se están brindando los días lunes, martes y jueves de 8:00am a 12:00pm y de 2:00 a 4:00 pm. De igual forma se cuenta con un número de contacto para que la comunidad pueda comunicarse a la línea 3015973080 con el fin de evitar aglomeraciones y minimizar el riesgo de contagio.

Adicionalmente, es de señalar que los Puntos de Atención a la Comunidad dispone de un cartel Informativo para que la comunidad tenga orientación donde están ubicadas las instalaciones del Programa, en el mismo se encuentran plasmados los días y horario de atención. (Debidamente validado por ENTerritorio).

Barrios	Punto de información	PQRS recibidas	PQRS atendidas	PQRS pendientes oen trámite	Producto	Observaciones
El Poblado	Calle 9 MZ 32-lote 38 Carrea 17D # 45ª -05	195	195	0	Formato PCI 024 .	Por solicitud de inclusión hay 3 en traite y por quejas 3 abiertas, las cuales deben ser atendidas por el Fovis, para poder cerrarlas a satisfacción

BUZÓN DE PQRS:

Para este periodo no se encontró ninguna PQR en el buzón de sugerencias, cabe resaltar que el mismo se revisa semanalmente con el acompañamiento de la veeduría
Relación de evidencias: registro fotográfico

Recepción y trámite de las PQRS: En el mes de diciembre del año en curso, no se realizó recepción de PQRS.

A la fecha de cierre de este informe se cuenta con un consolidado de la relación de las PQR recepcionadas durante el tiempo de ejecución del Programa, Total de PQR, recepcionadas en el barrio el Poblado, (195) de las cuales (190) correspondientes a solicitudes de inclusión y (5) por quejas de aspectos técnicos, donde la comunidad las ha interpuesto por inconformidad antes mencionada. De las (190) solicitudes para inclusión. Cabe, informar que la Alcaldía Municipal, emitió respuesta de cierre a las PQR pendientes por cerrar, las cuales fueron atendidas por el equipo social de obra.

Periodo Registrado	N° PQR recepcionadas		N° PQR cerradas	N° PQR en tramite	Reporte PQR en trámite del periodo anterior		Observación general / motivo
3er. Informe	9		0	9	N° de PQR	Estado	
4° Informe	24		0	24	9	Abiertas	Solicitud de inclusión
5° informe	54		7	54	24	Abiertas	Solicitud de inclusión
6° informe	0		41	0	54	cerrada	Solicitudes de inclusión
7° informe	0		41	0	0	Cerradas	Solicitud de inclusión
8° informe	0		41	149	149	Abiertas	Solicitud de inclusión
9° informe	5		85	6	149	Cerradas	Solicitud de inclusión y quejas
TOTAL	195		195	0	195	Cerradas	Solicitud y quejas

Cuadro acumulativo de PQRS:

Reunión con veeduría:

El 10 de enero del año en curso, se realizó una reunión con miembros de la veeduría, se contó con la participación de cuatro miembros de la veeduría, subcontratistas, profesionales técnicos y sociales de obra e interventoria, a las 3 de la tarde en las instalaciones del consorcio Turquía, en donde se abordaron cada uno de los temas relacionados en la agenda del orden del día como fueron: mantener la calidad constructiva, garantizar el número de personal necesario en las viviendas, cierre de manzanas y avance de obra; de igual forma, el equipo social de obra fue el moderador de la reunión, con el fin de mantener un tiempo y orden en cada tema abordado. Cabe resaltar la satisfacción de la veeduría con la respuestas y retroalimentación de las actividades realizadas en cada uno de los componentes del Proyecto. Finalmente se recibieron recomendaciones de los líderes y manifestación de apoyo en cada una de las actividades.

Relación de evidencias: Acta, asistencia y registro fotográfico.

Acercamiento con la JAC

El 17 de enero del año en curso, se realizó una reunión con los miembros de la JAC, se contó con la participación de los profesionales sociales y técnicos de obra e interventoría, en donde se logró socializar el avance y alcance del Programa y de la obra, barrido de la matriz inicial, plan de contingencia, para el avance de la obra, acompañamiento de los líderes en alguna vivienda en donde, el beneficiario tenga dudas o inquietudes. Asimismo, se atendieron las recomendaciones y sugerencias
Relación de evidencias: Acta, asistencia y registro fotográfico

Recorrido de Obra:

El 12 y 13 de enero del año 2023, se realizó un recorrido de obra liderado por la Entidad contratante, se contó con la participación de los profesionales técnicos y sociales de obra e interventoría, miembros del comité veedor, se logró visitar 42 viviendas en diferentes etapas de intervención, de igual forma, se evidencio la satisfacción del beneficiario
Relación de evidencia: Acta, asistencia y registro fotográfico.

El 25 de enero del año en curso, se realizó un recorrido de obra con la participación, del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, miembros de la veeduría profesionales técnicos y sociales de obra e interventoria, durante esta actividad se visitaron cinco viviendas, para la visita de la Ministra, se evidencio la satisfacción y felicidad de los beneficiarios con el anuncio de la vivista de la Ministra de vivienda.
Relación de evidencias: registro fotográfico.

Capacitación sectorizada y casa a casa en Educación Sanitaria e instalación de Acrílico

Se realizó una capacitación sectorizadas el 19 de enero, en donde se socializaron a los beneficiarios las líneas de intervención que conforma el Plan de Gestión Social y los conceptos claves en Educación Sanitaria como lo son la salud, la higiene, con una ayuda didáctica como fueron los folletos informativos, donde se les explicó las diferentes intervenciones y los concejos e iniciativas de mejoramiento. Seguidamente las profesionales sociales de obra continuaron, con las capacitación realizando recomendaciones para el cuidado de los equipos que contienen agua como son, no usar productos ácidos o detergentes agresivos para la limpieza, no golpear los equipos, también se habló del manejo adecuado de las casetas, como lo es limpiar el baño regularmente, cerrar la tapa del inodoro, no usar el inodoro como caneca de basura, de igual forma también es importante el mantenimiento básico de los equipos sanitarios de agua como lo es la revisión de la instalación, las reparaciones e implementar métodos sencillos que puedan establecer si existe algún escape de agua. Otro tema a tratar fue el almacenamiento, manipulación y uso adecuado del agua potable.
se realizaron (20) capacitaciones casa a casa e instalación de acrílicos.
Relación de evidencias: Acta, asistencias y registro fotográfico

Capacitación Masiva/ Sectorizada /Casa a Casa	Fecha	Barrio	N° de Asistentes	Entidades de Apoyo	Relación Evidencias
Capacitaciones sectorizadas	19 de enero del 2023	El Poblado	15	Contratista e Interventoría. Veeduría	Acta, Asistencia, Registro Fotográfico.
Capacitación Casa a Casa	15-31 de enero del 2023	El Poblado	27	Contratista e Interventoría.	Asistencia, Registro Fotográfico.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

El 26 de enero del presente año, se recibió la visita de la Ministra de Vivienda, Gobernación de sucre, Alcaldía, súper visión técnica de ENterritorio y del MVCT. La profesional social de obra, realizo una pequeña presentación a la Ministra sobra la persecución social del Proyecto en el barrio. Se logró visitar dos viviendas en donde la Ministra y demás actores del Programa, pudieron evidenciar la calidad de las obras, felicidad de las beneficiarias al momento de contar sus historias de vida y al expresar palabras las de agradecimiento por las intervenciones en sus viviendas, del mismo modo, la Entidad contratante realizo una retroalimentación de todo el avance del Proyecto.

Relación de evidencias: registro fotográfico

Generación de Empleo

Durante este periodo el Contratista de obra viene vinculando personal de mano de obra no calificada al Proyecto aportando al desarrollo económico del municipio y minimizando la tasa de desempleo en la región, generado satisfacción ante la comunidad beneficiada.

Cuadro 8. Empleo.

Barrios	No. de trabajadores	No. de empleos generados	No. empleos indirectos generados
El Poblado	80	80	80

Mes	No. de MONC del municipio	No. de MONC femenino	No. MONC en condición de desplazamiento
10	75	1	5

.

RECOMENDACIONES GENERALES:

Se recomienda la articulación permanente con Entes Territoriales con el fin de lograr los objetivos propuestos en la ejecución del PCI
Es importante mencionar que se necesita más acto de presencia y apoyo por parte de los Entes Territoriales frente a la problemática que se está presentando con los directivos de la JAC y la señora Doris Upegui.

CONCLUSIONES:

Se concluye que para este periodo se ha dado continuidad a las actividades programadas en cada una de las líneas de intervención, para la implementación del PGS, lo cual ha permitido la articulación entre la comunidad, veedores, líderes de JAC y el contratista de obra e Interventoría.

Se contó con el apoyo de la veeduría en todas las actividades realizadas y/o acompañamiento a los equipos técnicos y sociales de obra.

En este periodo, se dio continuidad a las estrategias del cronograma de actividades del PGS, entre ellas el acercamiento con los líderes de la JAC. Cabe informar que muy a pesar de todos los esfuerzos del equipo social y técnico por avanzar en el buen desarrollo del Proyecto, el mismo se ve entorpecido por el vicepresidente de la JAC, quien, con su comportamiento inadecuado con todos los profesionales, veedores y beneficiarios, no permite avanzar con seguridad y tranquilidad con las actividades en la obra.

July Rios Anaya

Candelaria

González Medina — **Profesional social de obra**

July Paulin Rios Anaya — **Profesional social Interventoría**

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO EL POBLADO DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO- SUCRE.

Contrato: 2220585_2022
July Paulin Rios Anaya
Profesional Social Interventoría
Semana del 2 al 8 de enero del 2023.
Barrio: El Poblado.

En el Programa de Conexiones Intradomiciliarias se llevan a cabo una serie de actividades que se encuentran estipuladas en el Plan de gestión social, las cuales son de gran apoyo para el desarrollo de las intervenciones en cada una de las viviendas beneficiadas.

Enero 4: el punto de atención en la manzana 55 estuvo funcionando en el horario estipulado, durante la jornada de atención no se acerco beneficiarios ni otros miembros de la comunidad



Punto de atención

Enero 5: se hizo acompañamiento en las apertura de viviendas beneficiadas en el Programa.




Apertura de viviendas

se realizó capacitación casa a casa en educación sanitaria en viviendas que fueron recibidas a satisfacción por el beneficiario, donde se evidencio que las personas se encuentran contentas y satisfechas con el Programa.




Capacitacion casa a casa

Enero 6: se hizo atencion en el punto de la manzana 32 en el cual no se acerco ninguna persona, asi mismo se hizo la pertura del buzon de sugerencia, donde tampoco se encontro solicitud o PQR.





punto de atencion y buzon de sugerencia

se hizo acompañamiento al area tecnica, con el fin de realizar concertaciones en viviendas donde se iniciaran las intervenciones de la unidad sanitaria.





Concertacion

Enero 7: se hizo acompañamiento en viviendas que cuentan con materiales para la apertura de la misma y poder iniciar las intervenciones.



Apertura de vivienda

CONSORCIO TURQUIA

PCI TURQUIA

GAVINCO

INGENIEROS CONSULTORES

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO EL POBLADO DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO- SUCRE.

Contrato: 2220585_2022
July Paulin Rios Anaya
Profesional Social Interventoría
Semana del 10 al 14 de enero del 2023.
Barrio: El Poblado.

En el Programa de Conexiones Intradomiciliarias se llevan a cabo una serie de actividades que se encuentran estipuladas en el Plan de gestión social, las cuales son de gran apoyo para el desarrollo de las intervenciones en cada una de las viviendas beneficiadas.

Enero 10: se realizó apoyo y acompañamiento a la veeduría, en el diligenciamiento de una encuesta enviada por el Ministerio de Vivienda, en cuanto a la percepción de ellos como veedores ante los Programas que el Ministerio Presenta.




Acompañamiento a veeduría

Se realizó capacitacion en educacion sanitaria en 2 viviendas que fueron recibidas a satifaccion por el beneficiario.




Capacitacion casa a casa

Se realizó reunion con el comité veedor, con el fin de socializar la respuesta del contratista al derecho de petición que interpuso los miembros de la veeduria.




Reunion comité veedor

Enero 11: la Interventoría realizó recorrido de se guimiento en diferentes viviendas que se encuentran en proceso de ejecucion, en las cuales se encuentra la vivienda del señor Alvaro Montesino, miebro de la JAC.




Recorrido



Visita de seguimiento

Capacitación en educacion sanitaria casa a casa a beneficiarios que recibieron a satisfaccion las viviendas con la construcion de la unidad sanitaria.




Capacitacion en educacion sanitaria casa a casa

Enero 12: se realizo recorrido de obra con la entidad contratante Enterritorio en 32 viviendas, las cuales se encuentran en ejecucion y termiandas, con el fin de realizar seguimiento y ver el estado de las mismas.




Recorrido de obra

Se hizo la atencion en el punto para el ciudadano, en el cual no se acerco beneficiario.



Punto de atencion

Enero 13: El area social del contratista, interventoría y entidad contratante Enterritorio, en compañía de la veeduria, realizó visita en 3 viviendas que se encuentran terminadas y entregadas a satifaccion al beneficiario, se les hizo video y fotos a cada una de ellas en compañía de los miembros de la familia, para asi conocer la percepcion de cada uno de ellos. Durante estas visitas pudimos ver lo contentos que se encuentran estas personas y como han cambiado sus vidas con la llegada del Programa de Conexiones Intradomiciliarias al barrio el Poblado de Sincelejo.

Se realizo acompañamiento en el recorrido tecnico con la entidad contratante Enterritorio en 8 viviendas, que se encuentran en ejecucion y/o terminadas.




Visita social



Recorrido de obra

Enero 14: se hizo acompañamiento en la realización de diagnostico en viviendas que se encontraba deshabitada, y que actualmente el propietario ya se encuentra habitando, por lo cual se acerco al area social para ver el estado en que se encontraba su vivienda, y junto con el area tecnica se acordo realizar el diagnostico ya que se encontraba en la matriz inicial.




Acompañamiento realizacion de diagnostico

Se hizo acompañamiento en las aperturas de las viviendas que estan listas con materiales para ser intervenidas.



Apertura de vivienda

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO EL POBLADO DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO- SUCRE.

Contrato: 2220585_2022
July Paulin Rios Anaya
Profesional Social Interventoría
Semana del 16 al 21 de enero del 2023.
Barrio: El Poblado.

En el Programa de Conexiones Intradomiciliarias se llevan a cabo una serie de actividades que se encuentran estipuladas en el Plan de gestión social, las cuales son de gran apoyo para el desarrollo de las intervenciones en cada una de las viviendas beneficiadas.

Enero 16*:* Se realizó acompañamiento en apertusas a viviendas que cuentan materiales, para iniciar las actividades de ejecucion del Programa de Conexiones Intradomiciliarias.





Aperturas de viviendas

Se abrio el punto de atencion ubicado en la manzana 55, en el cual no se acerco beneficiairos a solicitar informacion o interponer alguna PQR; así mismo se realizo acercamiento en la viviendas 101, ya que esta se encuentra para entrega, pero el beneficiario no ha firmado el recibido a satufaccion, hasta que no pruebe los aparatos sanitarios en un tiempo estipulado.



Punto de atencion



acercamiento en viviendas

Enero 17: se realizó comité social con las entidades que hacen parte del PCI, veolia, ADS, contratista de obra, Interventoría y Alcaldia Municipal, se socializo los avances que lleva la obra y las actividades que se han llevado a cabo desde el componente social, asi como las dificultades que se han tenido alguno de los lideres del barrio el Poblado.





Comite socia

Se relaizo reunion con la junta de accion comunal del barrio el Poblado, se tocaron temas como: avances de la obra, prorroga del contrato solicitado por la JAC y plan de accion para la entrega de los materiales.




Reunión JAC

Enero 18: se realizo visita con el FOVIS y Planeacion, en 4 viviendas que estan pendientes por respuestas de PQR




Recorrido de obra FOVIS y planeación

Se realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria a viviendas recibidas a satifacción por el beneficiario, se les explica el cuidado que deben tener con los aparatos sanitarios y como deben ser aseados las unidades sanitarias, para una mejor uso y durabilidad de la construccion.





Capacitacion casa a casa

Enero 19: se realizó capacitación sectorizada en las manzana 50, 53 y 55. Se les recuerda a los beneficiarios el uso adecuado de los apartos sanitarios y el cuidado que deben tener con la unidad sanitaria para mejor funcionamiento y durabilidad.




Capacitación sectorizada

Enero 20: se realizo acompañamiento al area tecnica en las aperturas de viviendas que cuentan con materiales, se les recuerda la responsabilidad y el cuidado que el beneficiario tiene una vez los materiales estan en la vivienda.

Enero 21: se abrio el punto de atencion en la manzana 32 y el buzon de sugernecia en el cual no se encontro PQR



Buzon de sugerencia

Anexo 19. Diagnósticos aprobados.

NO SE APROBARON DIAGNÓSTICOS EN EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL

Anexo 20. Certificaciones de materiales.

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO
ULTRACEM S.A.S

CEMENTO GRIS TIPO UG DE USO GENERAL

F.V: 01-03-2017

VERSIÓN 3.

Código 205

PLANTA:	ULTRACEM S.A.S
DIRECCIÓN:	Km 2.5 VIA CORDIALIDAD,GALAPA
FECHA DE PRODUCCIÓN:	1/05/2022 — 15/05/2022
PRESENTACIÓN:	GRANEL/ENSACADO
CLIENTE:	

ENSAYOS FÍSICOS	METODO DE ENSAYO	RESULTADO	NTC 121	ASTM C 1157	ULTRACEM
Contenido de Aire en volumen, %	NTC 224	8,55	Max. 12,0	Max. 12,0	Max. 12,0
Finura (permeabilidad al aire), cm^2/g	NTC 33	5248	—	—	—
Finura en tamiz N° 325 (45µm), %	NTC 294	92,60	—	—	—
Expansión en autoclave, %	NTC 107	0,01	Max. 0,80	Max. 0,80	Max. 0,80
Expansión barras de Mortero (14 dias), %	NTC 4927	0,006	Max. 0,020	Max. 0,020	Max. 0,020
Resistencia a la Compresión					
1 Dia, MPa (psi)	NTC 220	6,1 (880)	—	—	—
3 Dias, MPa (psi)	NTC 220	12,9 (1870)	Min. 8,0 (1160)	Min. 13,0 (1890)	Min. 8,0 (1160)
7 Dias, MPa (psi)	NTC 220	18,3 (2660)	Min. 15,0 (2176)	Min. 20,0 (2900)	Min. 15,0 (2176)
28 Dias, MPa (psi)	NTC 220	0 ()	Min. 24,0 (3481)	Min. 28,0 (4060)	Min. 24,0 (3481)
Tiempo de Fraguado (Vicat) METODO A					
Tiempo inicial de fraguado, min	NTC 118	235	Min. 45; Max. 420	Min. 45; Max. 420	Min. 45; Max. 420
Tiempo final de fraguado, min	NTC 118	320	—	—	—

Se certifica que el CEMENTO ULTRACEM GRIS TIPO USO GENERAL cumple con la norma Técnica Colombiana NTC 121 para Cemento tipo UG.

Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los métodos de muestreo y ensayos de acuerdo con las frecuencias e instructivos establecidos en el PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PARA LA GESTIÓN DE PRODUCCIÓN DE CEMENTO de Ultracem S.A.S. Aplica para las producciones realizadas durante el periodo comprendido en "Fecha de Producción".

FIRMA: ***Cargo: Gerente de Calidad Cementos***

Escaneado con CamScanner

FICHA TÉCNICA / VERSIÓN 9

CEMENTO GRIS DE USO GENERAL



Imagina todo lo que podemos
CONSTRUIR JUNTOS

ARGOS

CEMENTO GRIS DE USO GENERAL

Es un cemento que se puede usar para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados para la construcción en general.

Las especificaciones del Cemento Gris de Uso General cumplen con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo UG).

USOS:

- Morteros para pisos, nivelaciones, lechadas y emboquillados.
- Reparaciones, remodelaciones, pequeñas obras y diversas aplicaciones domésticas.
- Producción de elementos prefabricados de pequeño y mediano formato.
- Morteros para mampostería, pega de cerámicos, enchapes, acabados, recubrimientos interiores y para fachadas.
- Todo tipo de elementos de concreto que no requieran características especiales.

BENEFICIOS:

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS

- Es un producto versátil, con muchas posibilidades de aplicación.

VENTAJAS EN SOSTENIBILIDAD

Al utilizar el "Cemento Gris de Uso General" de Argos, se garantiza el uso de un producto suministrado por una empresa responsable en materia ambiental, social y económica, y transparente con sus grupos de interés, tal y como se evidencia en el reporte de sostenibilidad corporativo "Reporte Integrado" que Argos realiza anualmente con base en el Global Reporting Initiative (GRI), en el cual presenta los resultados de su desempeño y sus planes de acción, en relación a cada uno de los aspectos más relevantes para la sostenibilidad del negocio y sus grupos de interés. Este reporte se puede encontrar en la página web de la compañía (https://argos.co/), en la sección "Sostenibilidad".

Dentro de las características de sostenibilidad generales del "Cemento Gris de Uso General", se destacan:

Material con contenido reciclado, disminuyendo de esta manera el consumo de recursos naturales no renovables en su fabricación.
Nota: Los porcentajes de contenido reciclado pre-consumo pueden variar de acuerdo al tipo de producto y la disponibilidad del material. Algunos productos o plantas pueden no tener dicha adición.

Producto fabricado en la región: a 160 km o menos de distancia del punto de venta o de la obra.
Nota: Esta distancia puede variar dependiendo de la ubicación geográfica de la obra.

Se cuenta con diferentes alternativas amigables con el ambiente para el transporte de este producto, incluyendo vehículos eléctricos y vehículos a gas.

Producto de bajas emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles, lo que contribuye a una mejor calidad ambiental de los interiores.

El empaque de este producto podrá ser devuelto a la compañía para aprovechamiento del material, de acuerdo a las condiciones específicas del programa Sacos Verdes y la ubicación de la obra.

Material con Análisis de Ciclo de Vida (LCA, por sus siglas en inglés) y Auto-Declaración Ambiental de Producto (EPD, por sus siglas en inglés).
Nota: Aplica para "Cemento Gris de Uso General" producido en Plantas Rioclaro y Sogamoso.

Teniendo en cuenta lo anterior, este producto, combinado con las estrategias de diseño y construcción de la edificación, puede contribuir a obtener puntos en las siguientes certificaciones de construcción sostenible:

CERTIFICACIÓN	LEED® V4.1	CASA COLOMBIA V2.1
CRITERIO	**Materiales y Recursos:** · Transparencia y optimización de productos de construcción fuentes de materias primas. · Transparencia y optimización de productos de construcción - EPD. · Reducción del impacto en el ciclo de vida de la edificación - LCA de la edificación. **Calidad Ambiental Interiores:** · Materiales de baja emisión. (Hasta 7 puntos)	**Sostenibilidad en obra:** · Manejo de residuos de construcción. **Eficiencia en materiales:** · Origen de los materiales y productos. · Productos y materiales de bajo impacto ambiental. · Productos con atributos múltiples de sostenibilidad. · Productos y materiales con LCA. (Hasta 7 puntos)

Para conocer las características de sostenibilidad específicas del cemento suministrado a tu proyecto y los detalles de la contribución a la obtención de las certificaciones mencionadas anteriormente, puedes solicitar el certificado correspondiente a través de nuestros canales de atención.

PRESENTACIÓN:

- Sacos de: 1 kg - 5 kg - 25 kg - 50 kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PARÁMETROS FÍSICOS		NORMA DE ENSAYO	NTC 121 TIPO UG
Finura	Blaine, min. (cm^2/gr)	NTC 33	A
	Retenido Tamiz 45 µm (%)	NTC 294	A
Cambio de longitud por autoclave, expansión, máx. (%)		NTC 107	0.80
Tiempo de fraguado, Ensayo de Vicat[B]	No menos de, minutos	NTC 118	45
	No mas de, minutos	NTC 118	420
Contenido de Aire en Volumen de mortero, máx. (%)		NTC 224	12
Expansión de barras de mortero a 14 días, máx.		NTC 4927	0.020
RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN (MPa)			
3 días		NTC 220	8.0
7 días		NTC 220	15.0
28 días		NTC 220	24.0

A: Los resultados de estos ensayos deben ser informados en todos los reportes que sean solicitados.
B: El tiempo de fraguado se refiere al tiempo de fraguado inicial en la NTC 118.

RECOMENDACIONES:

- En la elaboración de concretos se recomienda la revisión y aplicación de la NTC 3318 y Norma Sismo Resistente Colombiana vigente; requisitos de producción, calidad y durabilidad.
- Almacenar el cemento en un lugar seco, cubierto y alejado de zonas húmedas.
- Conservar el cemento sobre estibas y no sobre el suelo.
- Una vez abierto el saco se debe consumir de manera inmediata.

ESTAMOS PARA AYUDAR

En ARGOS estamos comprometidos a ayudarte a construir grandes obras y sacar el mejor provecho de nuestros productos. Si tienes preguntas o reclamos sobre este producto comunícate con nuestros canales de atención:

DESDE TELÉFONO FIJO: **018000527467**

DESDE CELULAR: **#250**

Asesoría técnica:
ASESORVIRTUAL@ARGOS.COM.CO

Para aprender sobre la tecnología y aplicaciones de este producto, ingresa a:
WWW.360ENCONCRETO.COM

Para mayor información acerca de nuestros productos y servicios, consulta nuestra página web: **COLOMBIA.ARGOS.CO**



ARGOS

Empresa de cemento del GRUPO ARGOS

icontec

Sello con Reglamento Técnico

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

BARRAS CORRUGADAS DE ACERO DE BAJA ALEACIÓN PARA REFUERZO DE CONCRETO

Fabricado por **DIACO S.A.**, en la **Planta Muña:** Autopista Sur Kilometro 25 Vía Bogotá, Sibate; **Planta Tuta:** Carretera Central del Norte, Kilómetro 27 Vía Tunja, Paipa, Boyaca **Planta Tocancipá:** Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá-Zipaquirá Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia

Manufactured by **DIACO S.A.**, in the **Planta Muña:** Autopista Sur Kilometro 25 Vía Bogotá, Sibate; **Planta Tuta:** Carretera Central del Norte, Kilómetro 27 Vía Tunja, Paipa, Boyaca **Planta Tocancipá:** Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá-Zipaquirá Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución 1856 del 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Reglamento aplicable a barras corrugadas de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia
Regulation applicable to low alloy corrugated bars for concrete reinforcement in seismic resistant constructions that are manufactured, imported or commercialized in Colombia

SECTOR ICS 77.140.60

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSR-CER710306
Certificate

Fecha de Aprobación: 2019-09-03
Approval Date:
Fecha de Renovación:
Renewal Date:
Fecha Última Modificación: 2020-03-13
Last Modification Date:
Fecha de Vencimiento: 2025-09-02
Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

icontec

ANSI ACCREDITED
ID #0677
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

DIACO S.A.

Resolución 1856 del 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Anexo Certificado **CSR-CER710306**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2019-09-03**
Approval Date:

Fecha Última Modificación: **2020-03-13**
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: **2025-09-02**
Expiration Date:

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 de la Resolución 1856 de 04 de octubre de 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	5/8 Pulgada	5/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	9.0 mm	9.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	11.0 mm	11.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	12.0 mm	12.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	1/4 Pulgada	1/4 Pulgada	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia

DIACO S.A.

Resolución 1856 del 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Anexo Certificado **CSR-CER710306**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2019-09-03**
Approval Date:

Fecha Última Modificación: **2020-03-13**
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: **2025-09-02**
Expiration Date:

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 de la Resolución 1856 de 04 de octubre de 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	8.5 mm	8.5 mm	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	9.0 mm	9.0 mm	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/4 Pulgadas	1/4 Pulgadas	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	8.5 mm	8.5 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	9.0 mm	9.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia

DIACO S.A.

Resolución 1856 del 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Anexo Certificado **CSR-CER710306**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2019-09-03**
Approval Date:

Fecha Última Modificación: **2020-03-13**
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: **2025-09-02**
Expiration Date:

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 de la Resolución 1856 de 04 de octubre de 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	5/8 Pulgada	5/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/4 Pulgada	3/4 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	7/8 Pulgada	7/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1 Pulgada	1 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	12 mm	12 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADOS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1 ¼ Pulgada	1 ¼ Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia

DIACO S.A.

Resolución 1856 del 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Anexo Certificado **CSR-CER710306**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2019-09-03**
Approval Date:

Fecha Última Modificación: **2020-03-13**
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: **2025-09-02**
Expiration Date:

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 de la Resolución 1856 de 04 de octubre de 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/4 Pulgada	3/4 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	7/8 Pulgada	7/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1 Pulgada	1 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1 ¼ Pulgada	1 ¼ Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	8.5 mm	8.5 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: CONCREACEROS SAS
Dirección: CL 38 4A150 PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 2743303

Fecha Impresión 22/03/06
No. Remisión: 82441679
Página: 1 de 7

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5379572	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.12	0.19	0.018	0.020	0.001	0.46	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5379573	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.12	0.19	0.018	0.020	0.001	0.46	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5385527	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.16	0.21	0.013	0.019	0.003	0.50	0.03	0.02	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5385555	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.16	0.21	0.013	0.019	0.003	0.50	0.03	0.02	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5385559	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.16	0.21	0.013	0.019	0.003	0.50	0.03	0.02	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391113	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391117	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391118	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391145	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391146	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391154	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433256	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433257	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433262	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433263	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433264	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433383	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.21	0.009	0.019	0.002	0.48	0.03	0.02	0.05

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Jefe Sector Verificaciones y Laboratorios

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Escaneado con CamScanner

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: CONCREACEROS SAS
Dirección: CL 38 4A150 PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 2743303

Fecha Impresión 22/03/06
No. Remisión: 82441679
Página: 1 de 7

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5379572	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.12	0.19	0.018	0.020	0.001	0.46	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5379573	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.12	0.19	0.018	0.020	0.001	0.46	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5385527	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.16	0.21	0.013	0.019	0.003	0.50	0.03	0.02	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5385555	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.16	0.21	0.013	0.019	0.003	0.50	0.03	0.02	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5385559	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.16	0.21	0.013	0.019	0.003	0.50	0.03	0.02	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391113	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391117	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391118	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391145	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391146	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5391154	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.14	0.21	0.011	0.022	0.002	0.47	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433256	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433257	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433262	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433263	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433264	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433383	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.21	0.009	0.019	0.002	0.48	0.03	0.02	0.05

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Jefe Sector Verificaciones y Laboratorios

Escaneado con CamScanner

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: CONCREACEROS SAS
Dirección: CL 38 4A150 PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 2743303

Fecha Impresión 22/03/05
No. Remisión: 82441330
Página: 1 de 7

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5387964	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.20	0.006	0.020	0.002	0.48	0.03	0.02	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5387965	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.20	0.006	0.020	0.002	0.48	0.03	0.02	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5387966	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.20	0.006	0.020	0.002	0.48	0.03	0.02	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5387976	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.20	0.006	0.020	0.002	0.48	0.03	0.02	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5388216	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.14	0.19	0.009	0.016	0.002	0.48	0.03	0.02	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5388239	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.14	0.19	0.009	0.016	0.002	0.48	0.03	0.02	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5388245	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.14	0.19	0.009	0.016	0.002	0.48	0.03	0.02	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5388259	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.14	0.19	0.009	0.016	0.002	0.48	0.03	0.02	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5388267	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.14	0.19	0.009	0.016	0.002	0.48	0.03	0.02	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5392654	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.21	0.011	0.019	0.002	0.48	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5392655	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.21	0.011	0.019	0.002	0.48	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5392674	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.21	0.011	0.019	0.002	0.48	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5392675	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.21	0.011	0.019	0.002	0.48	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU5392676	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.13	0.21	0.011	0.019	0.002	0.48	0.03	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433242	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433268	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BMU6433269	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.11	0.20	0.011	0.018	0.001	0.47	0.02	0.02	0.04

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Jefe Sector Verificaciones y Laboratorios

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Escaneado con CamScanner

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: CONCREACEROS SAS
Dirección: CL 38 4A150 PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 2743303

Fecha Impresión 22/04/19
No. Remisión: 82458852
Página: 1 de 6

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2400991	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.09	0.26	0.007	0.021	0.001	0.47	0.05	0.02	0.02
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448117	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448119	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448120	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448124	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448125	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448129	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448131	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448132	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448134	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448138	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448140	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448142	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448143	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448145	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448147	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BDK2448150	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.26	0.011	0.021	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Jefe Sector Verificaciones y Laboratorios

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Escaneado con CamScanner

PazdelRío

Votorantim

REPORTE DE CALIDAD

FECHA: Belencito, 10.02.2022
HORA: 22:52:22
PÁGINA: 1 / 1

ISO 9001 icontec · I Net · Sello de Calidad icontec · Sello de Calidad icontec · Sello de Calidad icontec · Sello con Reglamento Técnico icontec

PRODUCTO: 6110776 - BARRA CORRU ENDE (M) N.2X6M
CLIENTE: 5083437 / CONCREACEROS S.A.S.
DIRECCIÓN: CL 38 4A 150

REPORTE: 30.297
ORDEN DE ENTREGA: 8086690523
PLACA: TJZ925

Análisis Químico y Propiedades Físicas Garantizadas

Propiedad:	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%Nb	% V	%Ceq	Rs(MPa)	FI (MPa)	AL(%)	DOBLADO	D/metro	Empa.Res.	Altura Re.
												%	MPa	MPa	%		#	mm	mm
Mínimo:	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00								550.00	420.00	14.00		294		0.25
Máximo:	0.30	1.50	0.035	0.045	0.50							0.550		540.00				6.45	

Lote/Colada	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%Nb	% V	%Ceq	Rs(MPa)	FI (MPa)	AL(%)	DOBLADO	D/metro	Empa.Res.	Altura Re
												%	MPa	MPa	%		#	mm	mm
B51965-21	0,27	0,97	0,020	0,015	0,15	0,023	0,016	0,014	0,002	0,000	0,018	0,428	605,69	437,33	14,74	B	249	6,20	0,33
C48598-21	0,29	0,91	0,015	0,027	0,13	0,028	0,020	0,020	0,003	0,000	0,018	0,443	630,87	460,73	15,04	B	295	6,28	0,43
E20051-21	0,27	0,92	0,017	0,033	0,16	0,272	0,150	0,135	0,014	0,003	0,020	0,446	636,92	471,69	14,83	B	243	6,11	0,32
E20551-21	0,28	0,90	0,010	0,027	0,18	0,344	0,084	0,075	0,010	0,000	0,019	0,443	634,98	450,07	15,35	B	249	6,20	0,38
B51495-21	0,29	0,89	0,016	0,022	0,16	0,029	0,022	0,014	0,002	0,002	0,021	0,451	648,79	472,11	14,93	B	250	6,18	0,41

Caracteristicas: Rs(MPa) - RESISTENCIA FI (MPa) - FLUENCIA AL(%) - ELONGACION (%) DOBLADO - B: BUENO

Método Determinación composición química: Espectrómetro de Emisión NTC 5192
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo y barra corrugada: Tracción NTC-3353,Doblado, Peso Masa NTC - 2289.
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo liso: Tracción NTC - 2, Doblado NTC - 1
Método Medición dimensional: Alambrón NTC - 330
Muestreo: Manual por Colada en Rollo y barra corrugada NTC 2289.
Muestreo: Manual por Colada en Alambrón.
Muestreo: Manual por Colada en Rollo Liso NTC 161.

Declaramos que los productos descritos, fueron inspeccionados y analizados conforme a lo especificado y los resultados cumplen con la norma citada. Los análisis aquí reportados corresponden a la muestra del lote Reportado.

Firma Autorizada: ING WILLIAM HURTADO SIABATO
Coordinador Calidad Productos

Km 6 Via Nobsa - Belencito
Planta Industrial.

Escaneado con CamScanner

aceros turia Colombia	INFORME DE ENSAYOS SEGÚN NTC 115 VERSION 2019-19-11	CODIGO: PE-CAL-R-5
		VERSION: 2
		VIGENTE DESDE: 24/09/2020
		PAGINA 1 DE 1

TEMPERATURA AMBIENTAL EN GRADOS CENTIGRADOS			21	HUMEDAD AMBIENTAL EN %			76	
FECHA DE REALIZACION DEL ENSAYO			jueves, 21 de abril de 2022	COLADA MUESTREADA		H-81	TIPO DE ACERO USADO	AISI 1566
DESIGNACION			ALAMBRE TREFILADO; NEGRO; 1,47mm (17 BWG)				"CONFORME";"NO CONFORME"	
DIAMETRO MAYOR mm 1,47+-0,03	Maximo	1,50	Medicion 1	Medicion 2	Medicion 3	Promedio	CONFORME	
	Minimo	1,44	1,49	1,49	1,48	1,487		
			Desviacion estandar			0,005		
DIAMETRO MENOR mm 1,47+-0,03	Maximo	1,50	Medicion 1	Medicion 2	Medicion 3	Promedio	CONFORME	
	Minimo	1,44	1,46	1,47	1,49	1,473		
			Desviacion estandar			0,012		
TOLERANCIA EN EL OVALAMIENTO (+-0,03) mm							CONFORME	
MAXIMA RESISTENCIA A LA TRACCION (Mpa)	415		400,84				CONFORME	
ASPECTO SUPERFICIAL	LIBRE DE DEFECTOS SUPERFICIALES OXIDACION						CUMPLE	
	LIBRE DE DEFECTOS SUPERFICIALES RAYADURAS						CUMPLE	
	LIBRE DE DEFECTOS SUPERFICIALES AGRETAMIENTO						CUMPLE	
	LIBRE DE DEFECTOS SUPERFICIALES EXFOLIACIONES						CUMPLE	
VERIFICACION ETIQUETADO	SE VERIFICO QUE LA ETIQUETA CUMPLIESE LO RESPECTIVO A ROTULADO SEGÚN NUMERAL 16 NTC 115						CUMPLE	

ELABORÓ	INGENIERO DE LABORATORIO	JULIETH RADA	APROBÓ	GUILLERMO BONETT-JEFE PLANTA

ACEROS TURIA
DIRECCION:KM 5 VIA MALAMBO-CARACOLI-BARRANQUILLA
TELEFONO: 3118572
EMAIL: ADMINTCO2@GRUPOTURIACO.COM

EL CERTIFICADO PERTENECE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS
Procedimiento de muestreo segun numeral 12,1 NTC 115
Ensayo mecanico: Metodo NTC 3353
CERTIFICADO MAQUINA TRACCION NUM 44071 EMITIDO POR LABQUIMEC

FIN DEL CERTIFICADO


Escaneado con CamScanner

aceros turia Colombia	INFORME DE ENSAYOS MALLA ELECTROSOLDADA NTC 5806 VERSION 2019	CODIGO: PE-CAL-R-1.1 VERSION 7 VIGENTE DESDE:01/09/2019 EL CERTIFICADO CONSTA DE 2 PAGINAS

INFORME NUMERO M470

TEMPERATURA AMBIENTAL DENTRO DEL LABORATORIO >= 16°C			20	HUMEDAD RELATIVA DENTRO DEL LABORATORIO >20%<=80%		79	INFORME PARA LA PLANTA: ACEROS TURIA BARRANQUILLA
ORDEN PRODUCCION	M-20	Turno	2	Fecha de realizacion del ensayo			16-abr-22
DESIGNACION: MALLA ESTANDAR	XX-084		Coladas Utilizadas	TZF-00110			

DESCRIPCION DE ATRIBUTOS	REQUISITO SEGÚN NTC 5806	OBTENIDO	OBSERVACIONES
Resistencia a la tracción Mpa Metodo de ensayo NTC 3353	550	759,9	CUMPLE
Resistencia a la fluencia Mpa Metodo de ensayo NTC 3353	485	668,7	CUMPLE
ESFUERZO CORTANTE EN NEWTON Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 8.3.2	1528	Probeta 1: 7342 | Probeta 2: 5925 | Probeta 3: 6190 | Probeta 4: 6689 | Promedio: 6536 Desviacion estandar: 623,671	CUMPLE

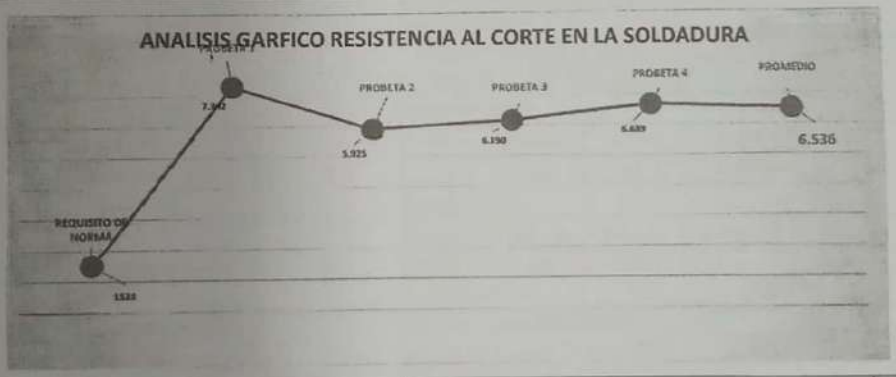

Promedio de Velocidad del ensayo maximo en minutos NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 9.3	609	519					CUMPLE
Ensayo de doblado Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 6.3	No presenta Grietas	No presenta Grietas					CUMPLE
Peso del grafil en gramos /metro Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 10.5	93,06	Pesaje 1	Pesaje 2	Pesaje 3	Pesaje 4	Promedio	CUMPLE
		96,20	96,20	96,20	96,20	96,2	
		Desviacion estandar: 0,00					
Soldaduras rotas "Unidades" Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 13.3	6	0					CUMPLE
Oxido Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 13.6	No presenta	No Presenta					CUMPLE

Escaneado con CamScanner

Ancho 235 cm **Maximo 237,5** **Minimo 232,5** Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 10.1		235	Medicion 1	Medicion 2	Medicion 3	Medicion 4	Promedio	CUMPLE
			233,4	234,0	233,6	234,0	233,8	
			Desviacion estandar			0,30		
Longitud 600 cm **Maximo 606** **Minimo 594** Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 10.2		600	Medicion 1	Medicion 2	Medicion 3	Medicion 4	Promedio	CUMPLE
			603,0	602,0	603,0	602,0	602,5	
			Desviacion estandar			0,58		
Numero de barras exacto en unidades Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 10.7	LONGITUDINAL	16	16					CUMPLE
	TRANSVERSAL	40	40					CUMPLE
Diametro del alambre de grafil en mm Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 10.7 tabla 11	LONGITUDINAL	4	4					CUMPLE
	TRANSVERSAL	4	4					CUMPLE
Separacion en cm Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 10.7 tabla 11	MIN	14,4	Medicion 1	Medicion 2	Medicion 3	Medicion 4	Promedio	CUMPLE
	LONGITUDINAL		15,0	15,0	15,5	15,0	15,1	
	MAX	15,6	Desviacion estandar			0,00		
	MIN	14,4	Medicion 1	Medicion 2	Medicion 3	Medicion 4	Promedio	CUMPLE
	TRANSVERSAL		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
	MAX	15,6	Desviacion estandar			0,00		
Longitud pelos en cm Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 10.7 tabla 11	LONGITUDINAL maximo	8	Medicion 1	Medicion 2	Medicion 3	Medicion 4	Promedio	CUMPLE
			7,8	8,0	8,0	7,0	7,7	
			Desviacion estandar			0,48		
	TRANSVERSAL maximo	5,0	Medicion 1	Medicion 2	Medicion 3	Medicion 4	Promedio	CUMPLE
			4,0	4,5	4,0	4,3	4,2	
			Desviacion estandar			0,24		
ETIQUETADO NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 15.4 RESOLUCION 0277 NUMERAL 6.1	**LA ETIQUETA DEBE CONTENER** NOMBRE DEL FABRICANTE PAIS DE ORIGEN DESCRIPCION DEL MATERIAL LOTE DE FABRICACION DESIGNACION DE LA NORMA DE FABRICACION OTRA INFORMACION		**LA ETIQUETA VERIFICADA CONTENIA** NOMBRE DEL FABRICANTE PAIS DE ORIGEN DESCRIPCION DEL MATERIAL LOTE DE FABRICACION DESIGNACION DE LA NORMA DE FABRICACION OTRA INFORMACION					CUMPLE

ELABORO	ING. DE CALIDAD	JULIETH RADA	APROBO	JEFE . PLANTA CRISTIAN HENAO

ACEROS TURIA DE COLOMBIA SAS
DIRECCION: CALLE 3 SUR NUM 36-10
MEDELLIN-ANTIOQUIA
TELEFONO: 3118572
EMAIL: ADMINTCO@GRUPOTURIACO.COM

EL CERTIFICADO PERTENECE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS
PROCEDIMIENTO DE MUESTREO SEGÚN NTC 5806

FIN DEL CERTIFICADO

Escaneado con CamScanner

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD
BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

icontec Sello de Calidad — NTC 2289:2020 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reglamento Técnico — Res 1856:2017 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

No. MAL-38045

FECHA: DD/MM/AA
15/07/2022

CLIENTE	**FERROMATERIALES SAN CARLOS S.A.S**	**DESTINO**	SINCELEJO
		VEHÍCULO No.	SUB 789

PEDIDO No.	17095
REMISIÓN No.	17089
FACTURA No.	0

						ENSAYOS FÍSICOS				COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.													DIMENSIONES DE PROCESO			
							ENSAYOS DE TRACCIÓN																				
PRODUCTO	**LONGITUD (metros)**	**COLADA**	**PAQUETES**	**UNIDADES**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO METRO (kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO (mm)**	**ANCHO DE VENAS (mm)**
R - No. 4	6	20221616	2	3024	✓	463.8	605.4	17.2	1.31	0.26	1.24	0.0095	0.036	0.19	0.14	0.06	0.06	0.015	0.00020	0.0022	0.48	0.957	1.060	8.380	1.620
		20221624	3		✓	480.2	622.0	17.7	1.30	0.27	1.20	0.0086	0.035	0.20	0.16	0.06	0.05	0.013	0.00020	0.0022	0.48	0.975	0.850	8.350	1.600
		20221251	4		✓	497.2	637.8	15.5	1.28	0.25	1.19	0.0117	0.033	0.19	0.18	0.08	0.06	0.017	0.00031	0.0022	0.46	0.980	0.740	8.440	1.700
R - 12M	6	20221525	2	2256	✓	495.2	639.2	16.9	1.29	0.25	1.20	0.0079	0.036	0.20	0.16	0.07	0.08	0.012	0.00091	0.0020	0.46	0.871	0.870	7.970	2.010
		20221522	4		✓	487.6	629.6	16.9	1.29	0.25	1.19	0.0127	0.032	0.19	0.16	0.07	0.08	0.013	0.00020	0.0020	0.46	0.879	0.940	8.060	2.420
R - No. 5	6	20221256	2	432	✓	491.0	628.3	15.9	1.28	0.24	1.21	0.0136	0.034	0.19	0.20	0.07	0.07	0.017	0.00020	0.0021	0.46	1.518	1.010	10.380	2.160
ESPECIFICACIONES DE NORMA																									
R - No. 4						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50								Max: 0.55	(0.934 - 0.994)	Min: 0.51	Max: 8.9	Max: 4.9
R - 12M						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50								Max: 0.55	(0.835 - 0.888)	Min: 0.48	Max: 8.4	Max: 4.71
R - No. 5						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50								Max: 0.55	(1.459 - 1.552)	Min: 0.71	Max: 11.1	Max: 6.1

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

Enviado: ferromaterialessancarlos@gmail.com

Durman by aliaxis
Km 27 Vía Fontibón – Facatativá -
Los Alpes + 400 m. Vía Barley – El Colegio
Lote 3
Madrid, Cundinamarca
Colombia

+57 1 8 200 200
laboratorioco@aliaxis-la.com
durman.com.co

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO : TUBOS PRESION
NTC- APLICABLE : NTC- 382
REFERENCIA : 1/2" RDE 13.5
LOTE : 10393T
FECHA : 20 de agosto de 2021

REQUISITOS	ESPECIFICACIONES			PROMEDIO OBTENIDO
	Mínimo	Máximo	Unidad	
Longitud del tubo	6000	-	mm	6010
Diámetro Exterior	21.24	21.44	mm	21.32
Ovalamiento	-	0.41	mm	0.47
Espesor de pared	1.57	2.08	mm	1.79
Variación espesor de pared	0	12	%	1.87
Presión Sostenida	970	-	psi	CUMPLE
Presión de Rotura	1000		psi	1100
Resistencia al Aplastamiento	40	-	%	CUMPLE
Impacto	13.6	-	Julios	CUMPLE
Calidad de Extrusión (ACETONA)	20	-	minutos	CUMPLE

Realizado por



GUSTAVO MATEUS
Inspector de Calidad
Telefono+571.8200200 Ext-3112
gmateus@aliaxis-la.com

Revisado por




LUIS FERNANDO GONZALEZ PINZON
Jefe de Calidad
Telefono+571.8200200 Ext-3116
lgonzalez@aliaxis-la.com

GEOTECNIA-CONCRETOS - CONSTRUCCION

GEOCRON SAS

UNIDADES DE MAMPOSTERÍA DE ARCILLA COCIDA, LADRILLOS Y BLOQUES CERÁMICOS. NTC 4205



I. DATOS INICIALES

Proyecto	Ensayo de carcaterización mecánica en unidades de arcilla	**Elemento**	1
Localización	Municipio de Sincelejo, Departamento Sucre.	**Muestra**	5
Peticionario	Ladrillos y arcillas San José Zomac SAS		
Direccion de Peticionario	Corregimiento La Palmira. Municipio de Toluviejo		

II. REFERENCIA DE CILINDROS

FECHA DE RECIBO		30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022
FECHA DE FABRICACION				
FECHA DE PRUEBA		1/07/2022	1/07/2022	1/07/2022
EDAD (Dias)		Sin referencia	Sin referencia	Sin referencia

III. NUMERACION DE BLOQUES.

PARAMETRO	UND	1	2	3.00	4.00	5.00
Largo L	cm	39.90	40.30	40.50	40.00	40.10
Ancho B	cm	9.74	9.74	9.80	9.81	9.70
Altura	cm	20.60	20.70	20.60	20.60	20.70
Seción 1	cm	5.51	5.44	5.58	5.34	5.57
Seción 2	cm	7.63	7.92	7.77	7.75	7.70
Espesor medio	cm	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07
Masa	Kg	4.982	5.070	5.11	5.11	4.95
Densidad	gr/cm3	1.89	1.89	1.91	1.93	1.87
Area bruta en planta	cm2	388.63	392.52	396.90	392.40	388.97
Area de cavidades	cm2	304.44	319.18	314.69	310.00	308.77
Area neta	cm2	84.19	73.35	82.22	82.40	80.20

IV. NIVELES DE CARGA Y RESULTADOS DE ESFUERZOS

		1	2	3	4	5
Velocidad de carga	Mpa/s	0.02	0.02	0.03	0.2	0.04
Carga de falla	KN	20.04	24.5	23.8	20.63	22.61
Esfuerzo de rotura	Kg-f/cm2	23.804	33.403	28.948	25.036	28.192
	PSI	340.051	477.190	413.550	357.663	402.743
Resultados individuales	**Kg-f/cm2**	**23.80**	**33.40**	**28.95**	**25.04**	**28.19**
	MPa	**2.38**	**3.34**	**2.89**	**2.50**	**2.82**
Resistencia promedio	**MPa**	**2.87**				

V. VALORES DE REFERENCIA DE ACUERDO A LA NTC 4025 PARA MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL. Tabla 2

Condición a valorar		Resistencia a compresión
Resistencia individual mínima requerida	kg-f/cm2	2.0
resistencia promedio minima requerida	kg-f/cm2	3.0

Alex Jose Bracamonte Miranda
Ingeniero Civil Esp. MSc
Director

Calle 36 # 16D - 60, Barrio Las Mercedes. Sincelejo_Sucre_Colombia.
Fijo (57+5) 2808911, Movil (+57) 3002333852, secretaria@geocron.com.co director@geocron.com.co


Prohibida la reproduccion total o parcial de este informe, sin la aprobacion por escrito del laboratorio Geocron SAS, según Ley 23 de 1982, Ley 1403 de 2010 y Articulo 61 de la Constitucion Politica de Colombia de 1991.

Cerámicas El Cinco®
Ladrillos bien hechos

FICHA TÉCNICA
PRODUCTOS FABRICADOS

NOMBRE DEL PRODUCTO:
BLOQUE No. 4

DIMENSIONES	
Largo	40 cm
Ancho	9 cm
Alto	20 cm
TOLERANCIA DIMENSIONAL	
Largo	± 8 mm
Ancho	± 2 mm
Alto	± 4 mm

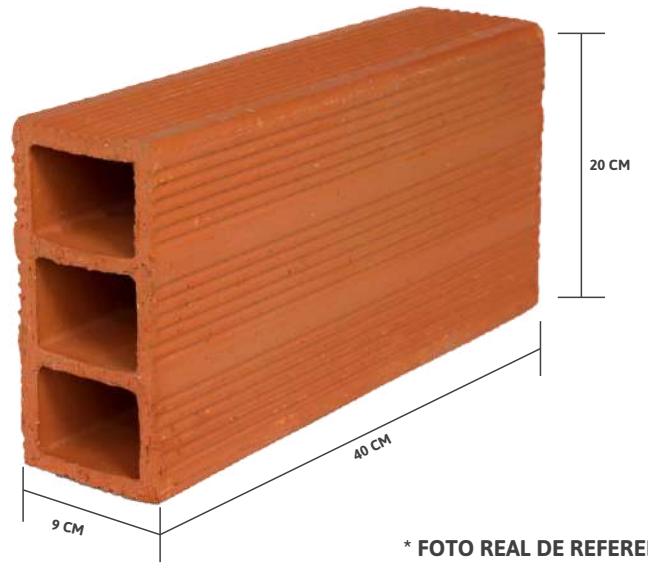

* FOTO REAL DE REFERENCIA.

Color	Terracota
Textura	Rayado
Paredes	10 mm
Tabiques	8 mm
Peso/unidad	4.75 kg Aprox.
Rendimiento	12 Unidades/m²
Aplicación	Mampostería Confinada
Clasificación	PH (Perforación Horizontal), NE (No Estructural)
Resistencia a la compresión	4.57 Mpa
Absorción de agua	11.5 %
Normas aplicadas	ICONTEC NTC 4205 - 4017

WWW.CERAMICASELCINCO.COM
SECTOR EL CINCO KM 1 VARIANTE LA GALLERA - BREMEN (SINCELEJO)
CONMUTADOR: 323 563 9125 321 563 0105
VENTAS@CERAMICASELCINCO.COM CERAMICASELCINCO

Sello con Reglamento Técnico

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBO CONDUIT TIPO LIVIANO, CURVAS CONDUIT, TUBO DUCTO CORRUGADO ELÉCTRICO Y TELEFÓNICO, ACCESORIOS CONDUIT, TUBO DUCTO TELEFÓNICO Y ELÉCTRICO (DB Y EB), CURVAS DUCTO TELEFÓNICO Y ELÉCTRICO, ACCESORIOS DUCTO TELEFÓNICO Y ELÉCTRICO

Fabricado por **P.V.C. GERFOR S.A.**, en la **Autopista Medellín 22-21 Autopista Medellín, Kilometro 2, 600 metros Entrada Parcelas Cota, Cota, Cundinamarca, Colombia,** identificada con **número de NIT 860.502.509-1**

Manufactured by **P.V.C. GERFOR S.A.**, in the **Autopista Medellín 22-21 Autopista Medellín, Kilometro 2, 600 metros Entrada Parcelas Cota, Cota, Cundinamarca, Colombia**, identified with **NIT number 860.502.509-1**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.6 y 20.6.1.1

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.6 y 20.6.1.1

Technical Regulations for Electrical Installations RETIE 2013 - Chapter 3, Sections 20.6 y 20.6.1.1

SECTOR ICS 23,040,20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado y se deben presentar como un solo documento.

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certified

Certificado CSR-CER317106
Certificate

Fecha de Aprobación: 2014-06-18
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Renovación: 2020-08-14
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2023-08-16
Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

icontec

ANSI ACCREDITED
ID #0677
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO

Expediente: FFU-142

RMN: FFU-142

MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Vigencia Desde: 16/02/2010 Hasta: 16/02/2040

Fecha y Hora de Registro: 16/02/2010 00:00:00

TITULARES: IDENTIFICACIÓN

GRANITOS Y CALIZAS DE COLOMBIA S.A.S. N 9004686153

AREA TOTAL: 109 Hectárea(s) y 7134 mt(s)2 MUNICIPIOS: TOLUVIEJO-SUCRE

MINERALES: DOLOMITA\ ARCILLA\ CALIZA\ GRAVA\ ARENA

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

AREA: 1

PUNTO ARCIFINIO: INTERSECCISN DEL ARROYO GRANDE CON LA VMA QUE VA DE TOLUVIEJO A MACAJANA

NORTE: 1542415,0000

ESTE: 852090,0000

PLANCHA IGAC: 44

ALINDERACIÓN

Coordenada Norte	Coordenada Este
1541529,6330	853373,9360
1539683,9580	853373,9360
1539523,9980	853127,0000
1539457,9990	852709,9990
1539457,6310	852707,0480
1539457,6310	852701,9990
1539459,9980	852701,9990
1539459,9980	852700,0000
1539724,0020	852683,0020
1540060,0010	852662,0020
1540055,9990	852659,9990
1540153,0000	852680,9990
1540965,0000	852852,9980
1541143,9990	852991,0010
1541529,6330	853286,7850

ANOTACIONES

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO	Expediente: FFU-142 RMN: FFU-142
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)	
Vigencia Desde: 16/02/2010 Hasta: 16/02/2040	Fecha y Hora de Registro: 16/02/2010 00:00:00

16/02/2010

TIPO ANOTACIÓN:	CONTRATO UNICO DE CONCESION	FECHA EJECUTORIA:	22/01/2010
DOCUMENTO	CONTRATO	NÚMERO:	1113255
EXPEDIDO POR:	REGIONAL BOGOTA	FECHA DOCUMENTO:	22/01/2010
LUGAR:	BOGOTÁ, D.C.		

ESPECIFICACIÓN: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MINERO NACIONAL DEL CONTRATO ÚNICO DE CONCESIÓN No.FFU-142 (EL CONTRATO DE CONCESION MINERA SE SUSCRIBE PARA LOS MINERALES DE CALIZA, DOLOMITA ARCILLA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN CONTRATO FFU-142).

ANOTACIÓN:	2	FECHA ANOTACIÓN:	04/08/2015
TIPO ANOTACIÓN:	MODIFICA ETAPAS CONTRATO /RENUNCIA A ETAPA /EXPT. ANTICIPADA	FECHA EJECUTORIA:	14/09/2012
DOCUMENTO	RESOLUCION	NÚMERO:	GTRM-351
EXPEDIDO POR:	PAR MEDELLIN	FECHA DOCUMENTO:	14/05/2012
LUGAR:	MEDELLÍN		

ESPECIFICACIÓN: ACEPTAR LA RENUNCIA A LAS ETAPAS DE EXPLORACION(PRIMERO Y SEGUNDO AÑO) Y A LA TOTALIDAD DE CONSTRUCCION Y MONTAJE, POR LO CUAL EL PRESENTE TITULO MINERO EN LA ETAPA DE EXPLOTACION DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012, FECHA EN LA CUAL SE CONCEDIO LA LICENCIA AMBIENTAL.

ANOTACIÓN:	3	FECHA ANOTACIÓN:	28/01/2016
TIPO ANOTACIÓN:	CESION TOTAL DE DERECHOS	FECHA EJECUTORIA:	09/12/2015
DOCUMENTO	RESOLUCION	NÚMERO:	002423
EXPEDIDO POR:	PAR CENTRO	FECHA DOCUMENTO:	06/10/2015
LUGAR:	BOGOTÁ, D.C.		

ESPECIFICACIÓN: ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR PERFECCIONADA LA CESIÓN TOTAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES emanadas del Contrato de Concesión No. FFU-142, que le corresponden a MARIA DEL CARMEN FADUL CHADID a favor de la sociedad GRANITOS Y CALIZAS DE COLOMBIA S.A.S., con Nit. 900.468.615-3.

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez inscrita en el Registro Minero Nacional la presente Resolución téngase a la sociedad GRANITOS Y CALIZAS DE COLOMBIA S.A.S., como ÚNICA TITULAR del Contrato de Concesión No. FFU-142, y responsable ante la Agencia Nacional de Minería, de todas las obligaciones que se deriven del mismo.

De conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la Resolución No. 002423 de fecha 06 de Octubre de 2015.

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO	Expediente: FFU-142 RMN: FFU-142
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)	
Vigencia Desde: 16/02/2010 Hasta: 16/02/2040	Fecha y Hora de Registro: 16/02/2010 00:00:00

NOTA ACLARATORIA

De acuerdo con la circular Número 0010 del 18 de junio de 2015 expedida por la Agencia Nacional de Minería ANM -, se fija la directriz relacionada con la inscripción de prendas mineras, donde se determina que "Por disposición de la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 400 de 2014 las garantías mineras o cualquier gravamen que recaiga sobre el derecho a explorar y explotar en los términos de la señalada norma, deben ser consultadas en el registro de Garantías Mobiliarias, el cual se desarrollará por parte de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecamaras)".

********** FIN DE ESTE DOCUMENTO **********

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Ana María González Borrero
Coordinadora de Catastro y Registro Minero

ICONTEC

MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL - ISO
MEMBER OF THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION - ISO

Member of IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

ICONTEC

CERTIFICADO
DE GESTION
DE LA CALIDAD

CERTIFICADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
CERTIFICATE OF QUALITY MANAGEMENT

ICONTEC certifica que el sistema de calidad de:
ICONTEC certifies that the quality system of:

ETERNIT COLOMBIANA S.A.

Planta El Muña Km 1. Vía Silvana, Bogota D.C. - Colombia

ha sido evaluado y aprobado con respecto a la norma internacional:
has been assessed and approved based on the international quality standard:

ISO 9001:2000 - NTC-ISO 9001:2000

Este Certificado es aplicable a las siguientes actividades:
This certificate is applicable to the following activities:

Fabricación de cubiertas y tubos de fibrocemento, tanques para almacenamiento de agua y tanques sépticos de polietileno fabricados por proceso de rotomoldeo

Manufacturing of roof tiles and fiber cement tubes, water storage tanks and septic tanks of polyethylene manufactured by rotomolding process

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de calidad se mantenga de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma, lo cual será verificado por el ICONTEC
This approval is subject to the maintenance of the quality system according to the requirements established in the above mentioned standard, which will be verified by ICONTEC.

Certificado N° 023-1
Certificate N°

Fecha de Aprobación: Approval date:	1994 09 19	**Fecha Última Modificación:** Last modification date	
Fecha de Renovación: Renewal date:	2004 12 16	**Fecha de Vencimiento:** Expiration date	2007 12 16

Director Ejecutivo
Executive Director

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accredited by:

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
RES. 36966 NOV. 09 DE 2001

Deutscher Akkreditierungs Rat
DAR
TGA - ZM - 34 - 96 - 00

INN - CHILE
SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION
ACREDITACIÓN SC 003 R

indecopi
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
Res. 0045-2002

CERTIFICADOS DE CALIDAD

Los productos Eternit cumplen con las normas nacionales e internacionales de calidad y protección al medio ambiente.

Eternit Colombiana S.A.







Eternit Pacífico S.A.







Eternit Atlántico S.A.











ROMA

DECLARACION DE CONFORMIDAD	AÑO:2022

A QUIEN PUEDA INTERESAR

CORDIAL SALUDO

SENCO COLOMBIANA S.A.S es una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos de porcelana sanitaria, bajo la marca **ROMA** nuestro propósito es tener relaciones estrechas con nuestros aliados estratégicos y clientes finales, con productos que satisfagan sus necesidades, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos de la norma ICONTEC NTC 920 “APARATOS SANITARIOS DE CERAMICA”

Todos los productos de porcelana sanitaria marca **ROMA.** En caso de presentarse un defecto de fabricación o mal desempeño del Producto estará amparado por su respectiva garantía siempre se cumplan todas las condiciones previstas, se reparará o remplazará a su discreción y criterio técnico, el respectivo Producto y/o pieza objeto de la reclamación una vez esta le sea notificada

En el cuadro anexo se encuentran descritos los porcentajes permitidos por la norma NTC 920 “APARATOS SANITARIOS DE CERAMICA”

y la conformidad de los productos ROMA respecto a la norma

Senco Colombiana S.A.S
NIT: 890.926.628-9
PBX: + 60 4 475 45 60
sencolombiana@sencolombiana.com
KM 25 Autopista Medellín – Bogotá, Guarne - Antioquia

ROMA

FICHA APARATOS SANITARIOS DE CERAMICA NTC-920

CARACTERISTICAS	NORMA NTC 920	SENCO COLOMBIANA
ABSORCION	MENOR O IGULA A 0.5%	0.3% - 0.5%
CUARTEADO	NO SE PERMITE	NO PRESENTA
ESPESOR	MAYOR O IGUAL A 6mm	TAZA MIXTA 12 – 13 mm LAVAMANOS 8.5-9mm TANQUES 12 – 13 mm PEDESTAL 8.5-9.5mm
AGUJEROS, AMPOLLAS Y PUSADURAS BURBUJAS, MANCHAS Y PECAS	NO MAS DE 5 TOTAL NO MAS DE 5 EN CUADRADO DE ALFARERIA, TOTAL 10	CUMPLE POR INSPECCION VISUAL SEGÚN NORMA DISTANCIA 24 PULG.
CARGA (MOR)	2.2KN	CUMPLE
ESPEJO DE AGUA	125mm x 100mm	CUMPLE
DIAMETRO DE PASO DE BOLA POR SIFON	BOLA DE 38mm DE DIAMETRO	CUMPLE
ALTURA TAZA	343mm	CUMPLE (390.5mm)
TAMAÑO DE ACOPLE	TAZA OPERADAS POR VALVULA FLUXOMETRO 38 mm o 32 mm ORIFICIOS PARA CUBIERTAS 14mm	CUMPLE (63.4mm) 13.8mm
HUECOS LAVAMANO	PERFORACIONES PARA GRIFERIA DE LLAVES Min 25 mm - Max 38. mm	LAV. OCEANO 30 mm LAV. Gaira 36 mm LAV. Vessel 37 mm
HUECOS TANQUES	TANQUES POR GRAVE- DAD ACOPLADOS: VAL- VULA DE DESCARGA 60 – 70 mm	TANQ. OCEANO 63 mm TANQ. AWA 63 mm
CONSUMO DE AGUA	ALTA EFICIENCIA 4.5 LTS	4.5 LTS / DESCARGA
DESACARGA MISO		Min 350 Gr – Max 700 Gr Dependiendo de la referencia.

Especificaciones Técnicas:

Senco Colombiana S.A.S
NIT: 890.926.628-9
PBX: + 60 4 475 45 60
sencolombiana@sencolombiana.com
KM 25 Autopista Medellín – Bogotá, Guarne - Antioquia

Material	Porcelana Sanitaria
Rango de presión de agua	20 PSI – 100 PSI
Sistema descarga	Descarga por Gravedad
Consumo de Agua	4.5 Lpf – 4.8 Lpf
Espejo de Agua	190 mm x 200 mm
Altura de Sello	60 mm
Medida Instalación	30,5 cm (Pared Terminada)
Dimensión Producto Empacado	0.080 M 3
Peso Empacado	19 Kg +/- 1 Kg

Requisitos Técnicos Cerámicos

a. Porcelana:

- Absorción de Agua: el valor obtenido es inferior al 0.5 %.
- Núcleo Negro: La producción debe estar libre de este defecto de cocción

b. Esmalte:

- Resistencia al Ataque Químico: Determinación de la Resistencia a Sustancias Químicas ASTM C650-04
- Acople pasta / esmalte: compresión, por lo cual debe pasar la Prueba de Craquelado

Grifería Tanque

- GARANTIA: 18 meses por defectos de fabricación o defecto significativo. No cubre daños físicos o mecánicos generados por errores en instalación del producto o daños por instalar con herramientas. No aplica garantía, a los componentes que sufren desgaste por el funcionamiento normal del producto como son empaques y partes que sufren manipulación

- Los repuestos de la Grifería, Válvula de entrada, Agua stop entre otros son homologados con otras marcas, así mismo a nuestros sanitarios le sirve griferías nacionales como ; Gerfor, Grival, Gricol

Senco Colombiana S.A.S
NIT: 890.926.628-9
PBX: + 60 4 475 45 60
sencolombiana@sencolombiana.com
KM 25 Autopista Medellín – Bogotá, Guarne - Antioquia

Senco Colombiana S.A.S
NIT: 890.926.628-9
PBX: + 60 4 475 45 60
sencolombiana@sencolombiana.com
KM 25 Autopista Medellín – Bogotá, Guarne - Antioquia

ROMA

GARANTIA PORCELANA SANITARIA

¡Felicitaciones! Usted acaba de adquirir un Producto ROMA 100 % colombiano diseñado y fabricado por SENCO COLOMBIANA S.A.S el Producto objeto de la garantía está libre de defectos de fabricación y su desempeño cumple las normas de calidad colombiana NTC -920 SANITARIOS DE CERAMICA y la Norma Internacional ASME A 112.19.2 - 2008

Con el propósito de dar validez a su garantía le solicitamos tenga en cuenta las siguientes apreciaciones:

Instrucciones de instalación y mantenimiento

- **El sanitario deberá ser instalado con brida o anillo de cera y en la unión entre la taza y el piso deberá utilizar selladores a base de Silicón.**
- **Por ningún motivo utilice cemento para la instalación y cemento y/o yeso para sellar la unión, ya que existe el riesgo de romper la taza ó que esta misma presente fisura por la contracción del cemento sobre la porcelana.**
- **En caso de requerir levantar la taza ó sanitario para hacer reparaciones por taponamiento ocasionados por agentes externos ó pruebas de funcionalidad se corre el riesgo de quebrar la taza al ser instalada con cemento, El no seguir esta instrucción de instalación anula por completo la garantía del producto.**
- **Siga las instrucciones de instalación expresadas en los documentos entregados con los productos correspondientes.**
- **Para el mantenimiento, limpie las superficies externas con una solución de agua jabonosa y el área interna de la taza ó pozo con un limpiador no abrasivo, Las áreas de acabados cromados deben limpiarse con jabón suave y el secado y brillo con un paño de algodón limpio y no deben estar expuestos a la intemperie.**

Cobertura de la Garantía.

La GARANTIA cubre todos los productos de marca ROMA en porcelana sanitaria, sobre cualquier defecto relacionado con la calidad intrínseca e idoneidad del producto, es decir por la calidad ofrecida y por su capacidad de funcionamiento y los acabados de los componentes cerámicos siempre y cuando se cumplan las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento.

Obligación de SENCO COLOMBIANA S.A.S

En caso de presentarse un defecto de fabricación o mal desempeño del Producto amparado por la presente garantía y de cumplirse todas las condiciones previstas, SENCO COLOMBIANA S.A.S reparará o remplazará a su discreción y criterio técnico, el respectivo Producto y/o pieza objeto de la reclamación una vez esta le sea notificada, con productos y/o piezas iguales o similares, de acuerdo a la disponibilidad en su inventario.

Tiempo de la Garantía.

Todos los productos de porcelana sanitaria ROMA están garantizados de por vida en su funcionamiento, siempre y cuando sean instalados de acuerdo con los procedimientos y normas especificados en los manuales de instalación adjuntos y sean utilizados dentro de las condiciones para las cuales fueron diseñados.

A los componentes producidos por otros fabricantes y representados ó distribuidos por SENCO COLOMBIANA S.A.S tales como: Porcelana sanitaria importada (de por vidad), asientos sanitarios (1 año), griferías y/o herrajes de tanque y griferías para lavamanos (1 año) y accesorios plásticos (1 año) les aplicará el tiempo de la garantía ofrecida por el respectivo fabricante siempre y cuando se sigan las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento de cada uno de ellos.

Exoneraciones.

ROMA, no asumirá daños indirectos, incidentales o que sean consecuencia de algún imperfecto que se genere como consecuencia de:

- **Culpa exclusiva del cliente y/o de terceros.**
- **Hechos ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor, es decir cualquier hecho u concurrencia imprevisible no imputable a SENCO COLOMBINA S.A.S y que no sea consecuencia de culpa suya ni concurra con ella, y que coloque a SENCO COLOMBIANA S.A.S en la imposibilidad absoluta de cumplir la garantía.**
- **No aplicara la garantía por Mal funcionamiento en los herrajes del tanque u otros componentes del Producto cuando sean causados ya sea por sedimentos generados por la falta de purga inicial de las tuberías, uso de cloraminas, sedimentos u otros minerales no retirados en el tratamiento de los abastecimientos de agua pública o por limpiadores de taza tipo tanque que contengan hipoclorito cálcico (cloro), acido fluorhídrico y/u otros productos químicos, utilización de pegantes o siliconas en la instalación de los herrajes que deterioran los sellos de caucho o por un mal funcionamiento de los mismos al no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento.**
- **Accesorios de grifería cromados como, Push del tanque , llave de lavamanos, no podrán ser limpiados con hipoclorito de cálcico (cloro), acido fluorhídrico y/u otros productos químicos tipo abrasivo ; puestos afectan la apariencia final de la pieza**
- **Daños que ocurran al Producto durante su transporte o instalación y que no hayan estado a cargo de SENCO COLOMBIANA S.A.S**
- **Los reclamos relativos a la apariencia, forma y color deben ser previos a la instalación.**

COMO HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para hacer efectiva la Garantía es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

- **El Producto se debe haber instalado conforme a las instrucciones indicadas por ROMA**
- **El mantenimiento y limpieza del Producto debe haberse hecho evitando elementos abrasivos o químicos fuertes (ácidos y/o cloro y/o derivados del cloro y/o amoniacos usados en el tratamiento de abastecimiento de agua o para limpieza de tanques sanitarios, bases o disolventes).**
- **Comunicarse con la línea de servicio al cliente: (57) (4) 4754560 , CEL : 315.300.51.67**
- **Presentar la factura de compra o comprobante de compra de los productos para verificar la fecha de adquisición.**

La responsabilidad que vincula a SENCO COLOMBIANA S.A.S con cada uno de sus DISTRIBUIDORES es de naturaleza contractual con base en el acto de ejecución que le dio origen; en tanto que con cualquier tercero que llegare a reclamar será de naturaleza extracontractual, surgida exclusivamente por ser el fabricante o productor del bien en cuestión, sin perjuicio, adicionalmente, de la responsabilidad contractual que llegare a existir entre ese tercero y el DISTRIBUIDOR de quien adquirió el producto…

QUES PLÁSTICOS
COPLAST

FDA

Tanques plásticos fabricados con polietileno de la mejor calidad, para garantizar productos livianos, resistentes y libres de elementos contaminantes, usando materias primas grado FDA


Higiénicos
No se corroen, no sueltan partículas, tienen superficies lisas y fáciles de limpiar

Resistentes
El material de los tanques plásticos está especificado para estar expuesto a la intemperie



Los Tanques Plásticos Ecoplast son fabricados en dos capas de color negro que impiden el paso de rayos solares inhibiendo el proceso de fotosíntesis necesario para el crecimiento de algas.

Cumplen con la norma técnica colombiana NTC 4384 de Tanques de Polietileno para Almacenamiento Fabricados por el Proceso de Rotomoldeo.

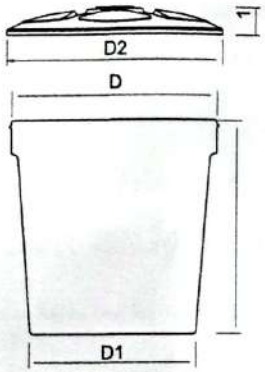

Volumen Bruto Litros	Dimensiones del tanque mm			Dimensiones de la tapa mm	
	D	D1	H	D2	H1
500	931	758	934	975	170
1000	1.232	1.031	1.030	1.275	236
2000	1.520	1.220	1.550	1.585	280

Transporte, almacenamiento y manipulación.

Cantidad máxima por arrume	
Litros	Tanques
2000	5
1000	8
500	12

- Los tanques se pueden transportar en arrumes verticales, en las cantidades indicadas en el cuadro.
- Los arrumes pueden colocarse sobre la plataforma del camión o sobre otros productos teniendo la precaución de hacerlo sobre cartón para evitar daños por rozamiento y vibración durante el viaje.
- Cuando el espacio en la altura no es suficiente, los tanques se pueden cargar acostados y encajados uno entre otro, siempre colocando cartones para evitar daños.


NOTA: En el descargue de los tanques Ecoplast se debe evitar cualquier tipo de golpe, caída o arrastrarlos ya que esto pueden ocasionar fisuras en el producto afectando su desempeño.

Cumplimos con los requisitos exigidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4384

Garantía
Eternit
CONSTRUCCIÓN EN EVOLUCIÓN

Escaneado con CamScanner

idráulica
instalación hidráulica

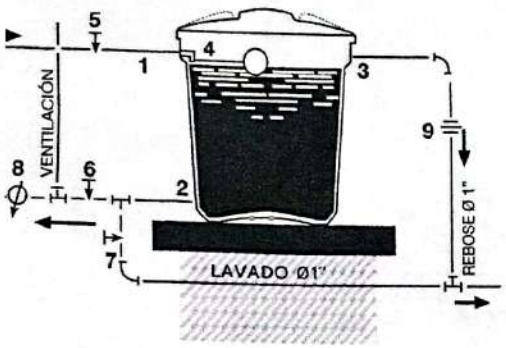

ecesarios:

entrada ø 1/2".

salida ø 1".

rebose ø 1".

ntrada ø 1/2 " y flotador.

paso directo para interrumpir la entrada del agua en caso de lavado de tanque.

aso para interrumpir la salida al servicio en caso de reparación o de tanque.

aso, se abre solamente para lavar el tanque.

paso directo o bypass (8A), para aprovechar la presión del acue-ed interna de servicio.

rsal.

-V1 / NOV2021

Instrucciones para la instalación

- Antes de instalar el tanque se recomienda lavar el interior con un desinfectante y enjuagar.
- La superficie que va a soportar el tanque debe ser totalmente horizontal, limpia y sin irregularidades que generen apoyos puntuales que lo deterioren o deformen.
- El área de la plataforma de apoyo debe ser mayor al diámetro de la tapa del tanque para que no queden partes por fuera.
- La estructura de apoyo debe soportar un peso mayor al peso del tanque lleno. (Tener en cuenta la densidad del líquido).
- No almacene líquidos derivados del petróleo o solventes ya que pueden deteriorar el tanque.
- Las tuberías o mangueras empleadas para las instalaciones hidráulicas no deben estar torcidas, ni deben generar fuerzas o tensiones sobre el tanque.
- Siempre utilice las conexiones y accesorios suministrados.
- No hacer conexiones con tuberías torcidas o mangueras que halen el tanque.
- No enterrar el tanque bajo tierra.


NOTA:

- La instalación debe ser realizada por personal calificado y certificado para trabajo en alturas.
- El tanque debe permancer bien tapado y con los conductos de ventilación sin obstrucciones.
- Realice inspecciones al menos una vez al año para verificar el correcto funcionamiento y limpieza.
- No instale los tanques cerca de fuentes de calor.


Para mayor información comuníquese
a nuestra Línea de Servicio al Cliente
018000 1156 60 o visite www.eternit.com.co

Fabricado por:
Eternit
CONSTRUCCIÓN EN EVOLUCIÓN


Conexiones para tanques plásticos
Localización de las conexiones

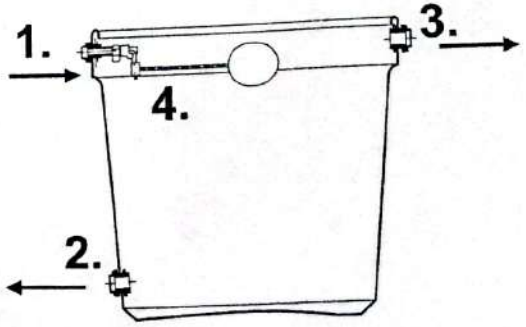

Conexión de entrada Ø 1/2"




2. Conexión de salida al servicio Ø 1"




A. Empaque de caucho
B. Flanche
C. Arandela y empaque
D. Tuerca espigo

Conexión de rebose Ø 1"



4. Válvula con varilla



Escaneado con CamScanner

Certificado

Registro Único de Comercializadores de Minerales
RUCOM

Registro **RUCOM-201607077329**

En cumplimiento del Capítulo 6º del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que AGREGADOS Y CANTERAS DEL NORTE S.A.S. con NIT número 900473048 acredita la calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales.

La presente certificación permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos y tiene una vigencia del 21-05-2021 hasta el 31-07-2022. Durante el mes de mayo de 2022 el interesado debe realizar los trámites de renovación indicada en el Decreto 1073 de 2015.

Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y consultar en la Base de datos de Confecámaras.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUTORIZA AL COMERCIALIZADOR A REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

Dado en Bogotá D.C., a los 21 dias del mes de mayo del año 2021.

PABLO ROBERTO BERNAL LOPEZ
Gerente de Proyecto - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

EDWIN ALFONSO COY GONZALEZ
21-05-2021 10:42

Este documento ha sido firmado digitalmente con un certificado provisto por una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999, y 15 del Decreto 1747 de 2000. La firma digital aquí impuesta es el equivalente electrónico de la firma manuscrita.
La autenticidad del presente certificado podrá ser validada ingresando a www.anm.gov.co, con el número Registro RUCOM disponible en este certificado.

Durman by aliaxis
Km 27 Vía Fontibón – Facatativá -
Los Alpes + 400 m. Vía Barley – El Colegio
Lote 3
Madrid, Cundinamarca
Colombia

+57 1 8 200 200
laboratorioco@aliaxis-la.com
durman.com.co

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO : TUBOS SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS
NTC – APLICABLE : NTC - 1087
REFERENCIA : 2" 60 mm
LOTE : 10618T
FECHA : 07 de Mayo de 2022

REQUISITOS	ESPECIFICACIONES			PROMEDIO OBTENIDO
	Mínimo	Máximo	Unidad	
Longitud del tubo	6000	-	mm	6010
Diámetro Exterior	60.17	60.47	mm	60.39
Ovalamiento	-	1.60	mm	0.41
Espesor de pared	2.92	3.43	mm	3.38
Variación espesor de pared	-	12	%	1.14
Impacto	81	-	Julios	CUMPLE
Calidad de Extrusión (ACETONA)	20	-	minutos	CUMPLE
Presión de Rotura	500	-	Psi	584
Resistencia Química	-	0.5	%	CUMPLE
Resistencia al Aplastamiento	40	-	%	CUMPLE
Absorción de Agua	-	0.3	%	CUMPLE

Realizado por

GUSTAVO MATEUS.
TECNICO DE ENSAYOS.

Revisado por

ING. LUIS FERNANDO G.
DIRECTOR TECNICO.

Durman by aliaxis
Km 27 Vía Fontibón – Facatativá -
Los Alpes + 400 m. Vía Barley – El Colegio
Vereda El Corzo Lote 3
Madrid, Cundinamarca
Colombia

+57 1 8 200 200
laboratorioco@aliaxis-la.com
www.durman.com.co

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO : **TUBOS SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS**
NTC – APLICABLE : **NTC - 1087**
REFERENCIA : **4”**
LOTE : **10625T**
FECHA : **15 de mayo de 2022**

REQUISITOS	ESPECIFICACIONES			PROMEDIO OBTENIDO
	Mínimo	Máximo	Unidad	
Longitud del tubo	6000	-	mm	6010
Diámetro Exterior	114.07	114.53	mm	114.30
Ovalamiento	-	2.40	mm	0.62
Espesor de pared	3.30	3.81	mm	3.66
Variación espesor de pared	-	12	%	9.82
Impacto	81	-	Julios	CUMPLE
Calidad de Extrusión (ACETONA)	20	-	minutos	CUMPLE
Presión de Rotura	360	-	Psi	430
Resistencia Química	0	0.5	%	CUMPLE
Resistencia al Aplastamiento	40	-	%	CUMPLE
Absorción de Agua	0	0.3	%	CUMPLE

REALIZADO POR:



AlVARO ENRIQUE PAVA
TECNICO DE ENSAYOS

REVISADO POR:



ING. LUIS FERNANDO G
JEFE DE CALIDAD

Anexo 21. Acta de Vecindad

NO SE APROBARON DIAGNÓSTICOS EN EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL

Anexo 22. Actas de concertación

NO SE APROBARON DIAGNÓSTICOS EN EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL

Anexo 23. Acta de recibo parcial y balance presupuestal de interventoría

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	F-GG-32
eterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

ACTA No. 9

TIPO DE CONTRATO: Interventoria **CONTRATO No.** 2220585

OBJETO: Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre

CONTRATISTA : Gavinco Ingenieros Consultores

SUPERVISOR: Nicolas Rincon Vega

PERÍODO A PAGAR: **DEL 13/12/2022 AL 13/01/2023**

En Bogotá D.C. , a los trece (13) días del mes de enero del año 2023 se reunieron Luz Andrea Fajardo Corredor Representante legal de Interventoría y Nicolas Rincon Vega Supervisor del Contrato , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	PAGOS MENSUALES IGUALES (40% DEL VALOR DEL CONTRATO)	MESES	11	$ 21.170.211,00	$ 232.872.321,01	8,62	0,38	9,00	$ 182.427.923,02	$ 8.103.975,98	$ 190.531.899,00	2,00	$ 42.340.422,01
2	PAGOS POR AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA (50% DEL VALOR DEL CONTRATO)	GLB	1	$ 291.090.401,26	$ 291.090.401,26	0,3543	0,2682	0,6225	$ 103.140.186,98	$ 78.070.445,62	$ 181.210.632,60	0,38	$ 109.879.768,66
3	PAGO POR LIQUIDACION (10% DEL VALOR DEL CONTRATO)	GLB	1	$ 58.218.080,25	$ 58.218.080,25	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 58.218.080,25
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 582.180.802,52**				**$ 285.568.110,00**	**$ 86.174.421,60**	**$ 371.742.531,60**		**$ 210.438.270,92**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 110.614.352,48**				**$ 54.257.940,90**	**$ 16.373.140,10**	**$ 70.631.081,00**		**$ 39.983.271,48**
	ADMINISTRACIÓN				N/A				N/A	N/A	N/A		N/A
	IMPREVISTOS				N/A				N/A	N/A	N/A		N/A
	UTILIDAD				N/A				N/A	N/A	N/A		N/A
	IVA 19	**19%**			$ 110.614.352,48				$ 54.257.940,90	$ 16.373.140,10	$ 70.631.081,00		$ 39.983.271,48
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**$ 692.795.155,00**				**$ 339.826.050,90**	**$ 102.547.561,70**	**$ 442.373.612,60**		**$ 250.421.542,40**

Nota 1: A partir de la presente acta se ajustan los valores de los ítems de interventoría en vitud del Otrosí No.1 suscrito el 13 de diciembre de 2022

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRA	**$ 542.723.071,00**	**V/R ANTICIPO:**	**N/A**
V/R ADICIONES:	$ 150.072.084,00	**% ANTICIPO :**	**N/A**
V/R ACTUAL CONTR	$ 692.795.155,00	**% RETEGARANTIA :**	**N/A**

Valor Actividad No.3 del Clo de Obra	**$ 4.909.781.068,00**
Valor Acumulado Actividad No. 3 ejecutado según Acta Parcial No. 6 del Clo de Obra	**$ 3.056.574.287,03**
Porcentaje de Avance Actividad No. 3	**62,25%**

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta No. 01 de pago del 40% del Mes 1 de Interventoría comprendido al periodo del 13 de abril de 2022 al 13 de mayo de 2022	3-may.-22	$ 27.136.153,55	3,9169%	N/A	N/A	N/A	$ 27.136.153,55	$ 515.586.917,45	3,9169%
2	Acta No. 02 de pago del 40% del Mes 2 de Interventoría comprendido al periodo del 13 de mayo de 2022 al 13 de junio de 2022	6-jul.-22	$ 27.136.153,55	3,9169%	N/A	N/A	N/A	$ 27.136.153,55	$ 488.450.763,90	7,8338%
3	Acta No. 03 de pago del 40% del Mes 3 de Interventoría comprendido al periodo del 13 de junio de 2022 al 12 de julio de 2022	3-ago.-22	$ 27.136.153,55	3,9169%	N/A	N/A	N/A	$ 27.136.153,55	$ 461.314.610,35	11,7507%
4	Acta No. 04 de pago del 40% del Mes 4 de Interventoría comprendido al periodo del 13 de julio de 2022 al 12 de agosto de 2022 y 50% de avance de obra del periodo del 13 de abril de 2022 al 01 de agosto de 2022	5-sep.-22	$ 36.878.032,68	5,3231%	N/A	N/A	N/A	$ 36.878.032,68	$ 424.436.577,67	17,0738%
5	Acta No. 05 de pago del 40% del Mes 5 de Interventoría comprendido al periodo del 13 de agosto de 2022 al 12 de septiembre de 2022 y 50% de avance de obra del periodo del 02 de agosto de 2022 al 21 de agosto de 2022	3-oct.-22	$ 48.329.489,48	6,9760%	N/A	N/A	N/A	$ 48.329.489,48	$ 376.107.088,20	24,0498%
6	Acta No. 06 de pago del 40% del Mes 6 de Interventoría comprendido al periodo del 13 de septiembre de 2022 al 12 de octubre de 2022 y 50% de avance de obra del periodo del 21 de agosto de 2022 al 19 de septiembre de 2022	28-oct.-22	$ 49.224.982,54	7,1053%	N/A	N/A	N/A	$ 49.224.982,54	$ 326.882.105,66	31,1551%
7	Acta No. 07 de pago del 40% del Mes 7 de Interventoría comprendido al periodo del 13 de octubre de 2022 al 12 de noviembre de 2022 y 50% de avance de obra del periodo del 20 de septiembre de 2022 al 19 de octubre de 2022	28-nov.-22	$ 69.495.689,24	10,0312%	N/A	N/A	N/A	$ 69.495.689,24	$ 257.386.416,42	41,1863%
8	Acta No. 08 de pago del 40% del Mes 8 de Interventoría comprendido al periodo del 13 de noviembre de 2022 al 13 de diciembre de 2022 y 50% de avance de obra del periodo del 20 de octubre de 2022 al 21 de noviembre de 2022	15-dic.-22	$ 54.489.396,32	7,8652%	N/A	N/A	N/A	$ 54.489.396,32	$ 202.897.020,10	49,0514%
9	Acta No. 09 de pago del 40% del Mes 9 de Interventoría comprendido al periodo del 13 de diciembre de 2022 al 13 de enero de 2023 y 50% de avance de obra del periodo del 22 de noviembre de 2022 al 09 de diciembre de 2022.		$ 102.547.561,70	14,8020%				$ 102.547.561,70	$ 250.421.542,40	63,8535%
	TOTAL		**$ 442.373.612,60**	**63,8535%**	-	-	-	**$ 442.373.612,60**	**$ 202.897.020,10**	**63,8535%**

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 de enero de 2023

Elaboró
INTERVENTOR:
Firma:
Nombre: LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
REP. LEGAL DE INTERVENTORIA - GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

Aprobó
Firma:
Nombre: NICOLAS RINCON VEGA
SUPERVISOR

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:
Firma:
Nombre: NO APLICA

Nota 1:
a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

Anexo 24. Control de equipos

enterritorio	**CONTROL DE EQUIPOS**	CÓDIGO	**F-GG-22**
		VERSIÓN	**01**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA	**2020-10-19**


INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/01/2023 **Y EL** 31/01/2023 **FECHA INICIO** 13/04/2022

CONTRATISTA: CONSORCIO TURQUIA **CONTRATO No.** 2220577

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS **CONTRATO No.** 2220585

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
CORTADORA MARCA MAKITA M 2401 120V-15A (50 -60 Hz)	X	X	X		Bodega principal	Corte de acero, alambres, ladrillos, ceramimica	
PULIDORA 1 MARCA INCCO 8600 RPM	X	X	X		Bodega ubicada en el Barrio El Poblado.	Corte de acero, alambres, ladrillos, ceramimica	Este equipo tambien se traslada a las viviendas intervenidas donde se requiera su uso para la actividad descrita.
PULIDORA 2 MARCA INCCO 8600 RPM	X	X	X		Bodega ubicada en el Barrio El Poblado.	Corte de acero, alambres, ladrillos, ceramimica	Este equipo tambien se traslada a las viviendas intervenidas donde se requiera su uso para la actividad descrita.



Firma:

Nombre: Edgar Aragon Otero

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

M2401B *Tronzadora*



203 191953-5

Potencia de entrada	2.000 W
Diámetro del disco	355 mm (14")
Velocidad sin carga (rpm)	3,8
Dimensiones (L x A x A)	500 x 280 x 620 mm
Peso	1.2 kg
Cable de conexión	2.5 m

Disco de corte, llave.

PULIDORA 9" INDUSTRIAL

DWE490

Potencia	2200W
Voltaje	120V
Velocidad (RPM)	6.500
Tamaño Disco	9" (230 mm)
Velocidad Variable	No
Peso	5,2 Kg



INCLUYE: Guarda Protectora, Flanges y Mango Lateral.

GARANTÍA HERRAMIENTA

3 AÑOS Garantía Limitada

1 AÑO Mantenimiento Gratis

90 DÍAS Satisfacción Garantizada

DEWALT

Anexo 25. Control de inspección y ensayos

	CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS	CÓDIGO:	F-GG-23
enterritorio		VERSIÓN:	1
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-19

FECHA DE PRESENTACIÓN:		**INFORME MENSUAL DEL**	**1-ene**	**AL**	**31-ene**	
CONTRATO No. :	INA-032-2021					
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre					
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA					
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.					
SUPERVISOR:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERROTORIO					

MEDIANTE EL PRESENTE FORMATO, EL INTERVENTOR CERTIFICA QUE LOS ÍTEMS DE PROYECTO QUE SE PAGARÁN, CUMPLEN EN TODOS LOS CASOS CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS APLICABLES Y CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1595 DE 2015 LOS QUE LE MODIFIQUEN O SUSTITUYAN

1. Si para el producto (bien o servicio), proceso o procedimiento se exigen requisitos por un Reglamento Técnico, decreto o ley (página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), obligatoriamente se declarará la conformidad y será entregable verificado previa presentación del certificado de conformidad de producto, sello de calidad o ensayos en laboratorio acreditado.

2. Si el producto (bien o servicios) proceso o procedimiento no está regido por un Reglamento técnico obligatorio, decreto o ley pero el contrato en su texto, en una especificación, el diseño, los planos u otro documento o requisito contractual cualquiera que sea se indica el cumplimiento de una norma (NTC, internacional, nacional o sectorial) o requisito particular o general, para declarar conforme ese bien o servicio y declararse entregable verificado, debe contar obligatoriamente con ensayo o cumplimiento de protocolo donde conste la conformidad con el requisito exigido.

1. LABORATORIOS ACREDITADOS Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

La Interventoría de Contrato CERTIFICA que la totalidad de los resultados de conformidad que se relacionan en este informe y anexan (anexo digital), se obtuvieron: en laboratorios acreditados cuando el bien o servicio está especificado y/o normado por un Reglamento Técnico Obligatorio, ley o decreto; cuando el proceso, procedimiento, bien o servicio no esta regido por un Reglamento técnico obligatorio, ley o decreto pero el Contrato lo exige, la conformidad de calidad se declaró mediante ensayo realizado con equipos de medición calibrados o verificación de cumplimiento de protocolo, bajo el control y seguimiento de un profesional capacitado e idóneo quien suscribe el registro del ensayo o protocolo en particular (anexo digital); en este último caso, se incluye en este formato la acreditación del laboratorio (anexo digital) si así lo exige el Contrato o acuerdo entre las partes. A continuación se relacionan los laboratorios acreditados y no acreditados donde se realizaron los ensayos y certificados de calibración de equipos utilizados (anexo digital).

1. 1. LABORATORIOS ACREDITADOS -EXIGIDO CUANDO EL BIEN O SERVICIO SE RIGE POR REGLAMENTO TÉCNICO OBLIGATORIO, LEY O DECRETO

Laboratorio		Certificado de Acreditación	Vigencia de la acreditación		Ensayos realizados en este laboratorio
Código (1)	Nombre		Desde	Hasta	
N/A	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	NO APLICA	N/A	N/A	COMPRESION DE CILINDROS
	Adicione las filas necesarias				

(1) Para efectos de trazabilidad y control, asignar a cada laboratorio un código LAC (Laboratorio Acreditado) seguido de un número consecutivo, sin repetir y sin anular desde el inicio del proyecto hasta el final.

1.1.1. EQUIPOS - Certificados de calibración

Laboratorio (3)	Serial equipo (2)	Descripción del equipo	Número de Certificado de Calibración	Vigencia certificado de calibración	
				Desde	Hasta
N/A	1-052-9-2-029	TRANSDUCTOR DE FUERZA	No. CNM-6917-85/19	26/01/2022	26/01/2022

(2) Para efectos de trazabilidad y control, relacionar el serial del equipo calibrado, sin repetir desde el inicio del proyecto hasta el final.
(3) Indique en esta casilla, el código del laboratorio donde se encuentra el equipo cuyo certificado de calibración se está informando.

2. ENSAYOS, SELLOS DE CALIDAD, CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD O REGISTRO DE ENSAYO EN LABORATORIO Y/O PROTOCOLOS APLICADOS

Los resultados de ensayos realizados y que se pagan parcial o totalmente en este periodo o períodos posteriores, son los que a continuación se relacionan.

Con el fin de tener trazabilidad de los ensayos, estos se numeran con dos dígitos XX-YY donde XX es el número del periodo del mes de ejecución del Proyecto y YY es el número en estricto orden cronológico del ensayo o certificado; para el primer informe el número de orden XX será 01, para el segundo informe 02 y así sucesivamente.

2.1. ENSAYOS REALIZADOS y/o PROTOCOLOS APLICADOS EN ESTE PERÍODO

No. de Orden			Ensayo			Resultado del Ensayo
XX	YY	Fecha ensayo o aplicac. protocolo	Norma, protocolo o requisito técnico aplicable (exigido)	Nombre de la norma, protocolo o requisito	Código de Laboratorio donde se realizó el ensayo	Observaciones (la observación no pude condicionar la conformidad)
01	4	27/12/2022	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**MACHON 103,41% DE LA RESISTENCIA**
02	4	27/12/2022	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**MACHON 107,06% DE LA RESISTENCIA**
03	4	27/12/2022	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**MACHON 103,46% DE LA RESISTENCIA**
04	4	27/12/2022	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**VIGA CORONA 106,81% DE LA RESISTENCIA**
05	4	3/01/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-14	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**VIGA CORONA 103,55% DE LA RESISTENCIA**
06	4	3/01/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-15	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**VIGA CORONA 104,84% DE LA RESISTENCIA**

07	4	3/01/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-15	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**VIGA CORONA** **105,78% DE LA RESISTENCIA**
08	4	3/01/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-15	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**VIGA CORONA** **105,81% DE LA RESISTENCIA**
09	4	5/01/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-15	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**MACHON** **105,64% DE LA RESISTENCIA**
10	4	10/01/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-16	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**VIGA CORONA** **103,37% DE LA RESISTENCIA**

2.2. CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO Y SELLOS DE CALIDAD RECIBIDOS EN ESTE PERIODO

No. de orden		No. Certificado o sello de calidad	Vigencia del Certificado o del sello de calidad		Certificador (entidad acreditada para expedir certificado)	Este sello de calidad o certificado de conformidad ampara los siguientes
XX	YY		Desde	Hasta		
		Certificado 82441679 Acero de refuerzo de 3/8" y 1/2"	3/06/2022	N/A	Ternium	NTC 2289 GR60
		Tanque Plastico Ecoplast	N/A	N/A	ECOPLAST	Norma Tecnica Colombiana NTC 4384
		205 Certificado de calidad cemento gris tipo UG de uso general	N/A	N/A	ULTRACEM	Norma Tecnica Colombiana NTC 121
		Ficha tecnica Bloque No. 04	N/A	N/A	Ceramicas el Cinco	ICONTEC NTC 4205-4017
		Certificado MAL-38045 Acero No. 04	N/A	N/A	Grupo Siderurgico Reyna	NTC 2289
		Tubos de Presion 1/2" RDE 13,5	20 de agosto de 2021	N/A	DURMAN	NTC- 382
		TUBOS SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS 2"	7/05/2022	N/A	DURMAN	NTC- 1087
		TUBOS SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS 4"	15/05/2022	N/A	DURMAN	NTC- 1087

CONTROL DE CONFORMIDAD DE CALIDAD POR ÍTEMS DE CONTRATO OBJETO DE PAGO

A continuación se relacionan los ítems de contrato que el Interventor avala para pago en este período, para lo cual se requiere como condición previa que la Interventoría los haya declarado entregables verificados mediante certificados de conformidad de producto y/o sellos de calidad recibidos y/o los ensayos que recibió de un laboratorio acreditatado.

A continuación se resumen los requisitos y trazabilidad de conformidad de los ítems que cumplen calidad para pago en el presente período

Ítems de contrato que se incluirán en el acta y/o factura y/o cuenta del presente período		Normas técnicas (ley, decreto, resolución, reglamento) exigidas a cada ítem en particular		La conformidad con la norma se demuestra mediante	Número de orden del documento (certificado, ensayo, sello) que evidencia objetivamente
# del ítem según contrato	Descripción del ítem	Numero de norma (4)	Descripción de la norma, reglamento, ley, decreto, resolución u otro exigible		

(4) Si un ítem está sujeto a mas de una norma o protocolo, utilice tantas filas como sean necesarias e indique una sola norma o protocolo por fila.
(5) El número de orden puede ser de ensayo, protocolo o certificado obtenido en este período o periodos anteriores.
(6) El Interventor llevará control de las cantidades, baches o volúmenes de productos, procesos o procedimientos que certifica que cumplen calidad, de manera que garantice la trazabilidad de calidad para cada entregable evitando que se aplique un certificado vencido, o se aplique un ensayo excediendo su alcance en frecuencia, cantidad o tiempo. El Supervisor ENTerritorio exigirá esta trazabilidad en cualquier momento.

TRAZABILIDAD: Para efectos de trazabilidad, el Interventor anexa a este formato un archivo digital que contiene una carpeta denominada "Control inspección y ensayo Periodo XXX) con la información del período. Esta carpeta contiene tantas subcarpetas como subcapítulos contiene este formato y en cada una de esas subcarpetas se están incluyendo la totalidad de documentos que soportan lo certificado. El Interventor declara que no ha aceptado ningún laboratorio acreditado, calibración de equipo o ensayo del cual no dispone de trazabilidad que anexa a este informe. No se aceptan excepciones ni entregas de trazabilidad posteriores a la radicación de este formato. Este formato incluye como ítems verificados para pago únicamente aquellos que cumplen todos los requisitos establecidos.

Firma	**Firma**
NOMBRE	NOMBRE: CARLOS AUGUSTO DEMERA GACHARNÁ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (no se acepta firma "por" o "en nombre de")	DIRECTOR DE OBRA (no se acepta firma "por" o "en nombre de")

GEOTECNIA Y PAVIMENTOS

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS
NTC - 673 2010

CODIGO: FT - LAB - 043

VERSION: 00

APROBADO: 2018-01-05

CLIENTE: CONSORCIO TURQUÍA


FECHA DE INFORME: 10/02/2023

PROYECTO: PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO EL POBLADO

LOCALIZACIÓN: BARRIO EL POBLADO

Nro.	ELEMENTO	FECHA FUNDICIÓN	DIAMETRO PROMEDIO CILINDRO 6"	FECHA ENSAYO A LOS 7 DIAS	FECHA ENSAYO A LOS 14 DIAS	FECHA ENSAYO A LOS 28 DIAS	ESPECIFICACION DEL CONCRETO	TIPO DE CONCRETO	CARGA (KN) PARA 7 DIAS	CARGA (KN) PARA 14 DIAS	CARGA (KN) PARA 28 DIAS	ESFUERZO A LA COMPRESION (PSI) EDAD DEL CILINDRO		
												7	14	28
1	MACHÓN S-SC-EP-M66-VE-554	27/12/2022	15,24	3/01/2023	10/01/2023	24/01/2023	3000	NORMAL	246,45	247,78	352,53	1996,2	2676,0	3102,3
												66,54%	89,20%	103,41%
2	MACHÓN S-SC-EP-M66-VE-555	27/12/2022	15,24	3/01/2023	10/01/2023	24/01/2023	3000	NORMAL	250,14	247,58	364,97	2026,1	2673,9	3211,7
												67,54%	89,13%	107,06%
3	MACHÓN S-SC-EP-M66-VE-559	27/12/2022	15,24	3/01/2023	10/01/2023	24/01/2023	3000	NORMAL	246,01	247,91	352,70	1992,7	2677,4	3103,7
												66,42%	89,25%	103,46%
4	MACHÓN S-SC-EP-M66-VE-560	27/12/2022	15,24	3/01/2023	10/01/2023	24/01/2023	3001	NORMAL	254,04	240,55	353,90	2057,8	2598,0	3114,3
												68,59%	86,60%	103,81%
5	VIGA CORONA S-SC-EP-M66-VE-554	3/01/2023	15,24	11/01/2023	18/01/2023	1/02/2023	3002	NORMAL	247,85	246,48	353,01	2007,6	2662,0	3106,5
												66,92%	88,73%	103,55%
6	VIGA CORONA S-SC-EP-M66-VE-555	3/01/2023	15,24	11/01/2023	18/01/2023	1/02/2023	3003	NORMAL	249,71	247,95	357,42	2022,7	2677,8	3145,3
												67,42%	89,26%	104,84%
7	VIGA CORONA S-SC-EP-M66-VE-559	3/01/2023	15,24	11/01/2023	18/01/2023	1/02/2023	3004	NORMAL	250,46	243,27	360,63	2028,7	2627,3	3173,5
												67,62%	87,58%	105,78%
8	VIGA CORONA S-SC-EP-M66-VE-560	3/01/2023	15,24	11/01/2023	18/01/2023	1/02/2023	3000	NORMAL	240,33	246,70	360,71	1946,7	2664,3	3174,3
												64,89%	88,81%	105,81%
9	MACHÓN S-SC-EP-M71-VE-587	5/01/2023	15,24	12/01/2023	19/01/2023	2/02/2023	3000	NORMAL	244,78	245,02	360,15	1982,7	2646,2	3169,3
												66,09%	88,21%	105,64%
10	VIGA CORONA S-SC-EP-M71-VE-587	10/01/2023	15,24	17/01/2023	24/01/2023	7/02/2023	3000	NORMAL	251,72	249,12	352,39	2038,9	2690,5	3101,0
												67,96%	89,68%	103,37%

TIPOS DE FALLA:



GEOTECNIA Y PAVIMENTO S.A.S. NIT 900.862.824-5

I.C JEISSON ESPAÑA DIAZ DIR. TÉCNICO

DIR TECNICO

COLTEST INGENIERIA S.A.S
EL PRINCIPIO DE LA CALIDAD

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Calibration Certificate

NÚMERO: *Number* NC 2565

MAGNITUD: FUERZA *Magnitude*

FECHA DE CALIBRACIÓN: *Date of Calibration*	26 de enero de 2022
SOLICITANTE: *Customer*	INGENIERÍA GEOTECNIA Y SUELOS S.A.S.
DIRECCIÓN: *Address*	CR 27 # 11-24
CIUDAD: *City*	Sincelejo, Sucre
INSTRUMENTO: *Instrument*	Máquina De Ensayo a Compresión
MARCA: *Brand*	Coltest
MODELO: *Model*	C-256
SERIE: *Serial*	524
TIPO: *Type*	Digital
CAPACIDAD: *Capacity*	100,0 - 1000,0 kN
NÚMERO DE PAGINAS: *Number of Pages*	TRES (3)
PATRÓN DE REFERENCIA: *Reference Standard*	TRANSDUCTOR DE FUERZA FABRICANTE: ELE MODELO: HP2 7HB SERIE: 1-052-9-2 029 CERTIFICADO No.CNM-6917-85/19

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente
This certificate is an accurate record of the perfomed measurements results. This certificate may not be partially or totaly reproduced,
El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
The user is responsable for having his instruments calibrated at appropiate intervals.
Los patrones de de calibración son trazados por la empresa Meister Ingeniería SAS

Calle 24F No. 100B-08 Bogotá -TEL 287 86 47 - 315 6089819
Email: coltestingenieria@homtail.com / coltestingenieria@gmail.com

COLTEST INGENIERIA S.A.S
EL PRINCIPIO DE LA CALIDAD

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Calibration Certificate

NÚMERO: NC 2565
Number

MAGNITUD: FUERZA
Magnitude

MÉTODO: COMPARACIÓN
División de Escala: 0,1 kN

TEMPERATURA: 20°C
HUMEDAD RELATIVA: 72%

RESULTADO DE LA CALIBRACIÓN

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO BAJO PRUEBA (1000,0kN)				
INSTRUMENTO		PATRÓN		
(%)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
10	100,0	99,0	99,2	99,3
20	200,0	200,3	199,	201,6
30	300,0	300,1	298,4	302,0
40	400,0	402,8	40,5	401,1
50	500,0	503,2	506,2	501,7
60	600,0	604.1	603,1	604,0
70	700,0	704,9	701,7	704,7
80	800,0	807.6	803,1	805,0
90	900,0	904,9	903,2	905,2
	CERO	0,0	0,0	0,0

Promedio	Exactitud	Repetibilidad	Resolución	Reversibilidad	Incertidumbre
(kN)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
99,20	0,81	0,40	0,10	-	0,44
200,55	-0,27	0,75	0,05	-	0,53
300,10	-0,03	0,47	0,03	-	0,64
401,40	-0,35	0,25	0,02	-	0,53
501,80	-0,36	0,68	0,02	-	0,61
604,05	-0,67	0,12	0,02	-	0,45
705,75	-0,81	0,01	0,01	-	0,57
805,95	-0,74	0,41	0,01	-	0,68
906,25	-0,69	0,10	0,01	-	0,57

Según los errores anteriores, y de acuerdo con la NTC 7500-1:2007, la maquina se encuentra en **CLASE 1**, desde el 10% hasta el 90% de su capacidad total

Calle 24F No. 100B-08 Bogotá -TEL 287 86 47 - 315 6089819
Email: coltestingenieria@homtail.com / coltestingenieria@gmail.com

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Calibration Certificate

NÚMERO: NC 2565
Number

MAGNITUD: FUERZA
Magnitude

La incertidumbre reportada se ha determinado multiplicando la incertidumbre estándar combinada, por el factor de cubrimiento k = 2, con el cual se logra un nivel de confianza del 95,45 %, aproximadamente.

TRAZABILIDAD

COLTEST INGENIERÍA, asegura el mantenimiento de la trazabilidad de los patrones de trabajo, utilizados en las mediciones, los cuales han sido certificados por el CENAM.

OBSERVACIONES

Una nueva calibración se deberá llevar a cabo cuando el instrumento sea sometido a reparaciones, ajustes ó uso inapropiado; independientemente del tiempo transcurrido desde la presente calibración.

Calibró:

HUGO ERNESTO FERNANDEZ TORRES
Metrólogo

Aprobó:

NICOLAS HERNANDEZ
Director de Gestión y Calidad

FIN DE CERTIFICADO

Calle 24F No. 100B-08 Bogotá -TEL 287 86 47 - 315 6089819
Email: coltestingenieria@homtail.com / coltestingenieria@gmail.com

Anexo 26. Cambio especificación

enterritorio	**ACTA DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES**	CÓDIGO:	**F-GG-29**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-20**

Nota: este formato aplicará cuando el cambio de especificacion no implique ajuste al precio. El insumo a modificar debe ser de calidad equivalente al inicialmente propuesto.

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220577 **DE** **OBRA** **FECHA INICIO** **11/04/2022** **FECHA TERMINACIÓ** **11/11/2022**

OBJETO DEL CONTRATO: Chequeo, validación de prototipos y diagnostico, concertación, intervención y gestion social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre

CONTRATISTA: CONSORCIO TURQUIA

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

SUPERVISOR: Ing. Juan David Amón

Me permito solicitar cambio de especificaciones al contrato en referencia de acuerdo con las siguientes consideraciones:

B. ESPECIFICACIÓN INICIAL VS. CAMBIO PROPUESTO

ESPECIFICACIÓN INICIAL					CAMBIO PROPUESTO				
Ítem	Unidad	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Ítem	Unidad	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario
3,1	un	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lava- manos)	1	$ 4.225.606,11	3,1	un	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lava- manos)	1	$ 4.225.606,11
3,2	un	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	1	$ 3.761.340,61	3,2	un	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	1	$ 3.761.340,61
3,3	un	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	1	$ 4.767.497,39	3,3	un	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	1	$ 4.767.497,39
3,4	un	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta	1	$ 4.898.390,93	3,4	un	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta	1	$ 4.898.390,93
3,27	m2	ENCHAPE PARED BLANCO FOR. 20*20	1,05	$ 51.443,02	3,27	m2	ENCHAPE PARED BLANCO ACUARELA BLANCO 40X40	1,05	$ 51.443,02
3,28	m2	ENCHAPE DE PISO - ANTIDESLIZANTE FOR. 20*20	1,05	$ 62.169,00	3,28	m2	ENCHAPE DE PISO - ANTIDESLIZANTE ACUARELA BLANCO 40X40	1,05	$ 62.169,00

C. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS

La instalación de este producto se realizará en la pared de la zona de ducha con 4 hiladas completas desde el piso hacia arriba. (1.60m). En el piso se iniciara desde el piso de la ducha en la pared posterior a la ubicación de los puntos hidraulicos hacia el acceso del baño para garantizar la linea de juntas.

D. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN EL CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN PROPUESTO

Debido a la pandemia que azotó en el año 2020 y 2021 a nivel mundial se presentaron diferentes factores a nivel de producción que afectaron de manera considerable la fabricación de diferentes elementos a sectores productivos. Este fenomeno ha causado inconveniente en la producción en masas de materiales para la construcción, mas especificamente la ceramica y que por demanda el formato con referencia 20,5cm x 20,5cm ha presentado escases en su producción, lo que dificulta el desarrollo y terminación del proyecto que se ejecuta.

E. REGISTROS DE SOLICITUD DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES

Solicitante	No. Oficio	Fecha
CONSORCIO TURQUIA	CONS-TUR-SINC-031	27/05/2022
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA

F. AVAL Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, a los seis ( ) días, del mes junio del año 2022.

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventor

Anexo 27. Acta de Recibo parcial y cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados (Matriz Tres Momentos Ejecución)

eterritorio	**ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL**	CODIGO:	**F-GG-32**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-20**

ACTA No. 6 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA - SINCELEJO, SUCRE

TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No.** 2220577

OBJETO: "Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el Municipio de Sincelejo, Departamento de Sucre"

CONTRATISTA : CONSORCIO TURQUÍA (NIT: 901.390.795 - 7)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. (NIT: 901.390.795 - 7)

PERÍODO A PAGAR: **DEL 22 de noviembre de 2022 al 9 de diciembre de 2022**

En Sincelejo, Sucre, a los nueve (09) días del mes de diciembre del año 2022 se reunieron José Ignacio Cárdenas Meneses Representante Legal del Contratist a y Luz Andrea Fajardo Corredor Representante Legal de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

Nota 1: El valor unitario de la Actividad No.2 corresponde a: $ 144.902,5392

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	ACTIVIDAD 1												
1.1	CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR-10	UN	1,00	$ 4.759.770,59	$ 4.759.770,59	1,00	-	1,00	$ 4.759.770,59	$ -	$ 4.759.770,59	-	$ -
	IVA 19% SOBRE ACTIVIDAD No.1				$ 904.356,41				$ 904.356,41	$ -	$ 904.356,41		$ -
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD No.1 + IVA (19%)				**$ 5.664.127,00**				**$ 5.664.127,00**	**$ -**	**$ 5.664.127,00**	-	$ -
	ACTIVIDAD 2												
1.2	DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.	UN	693	$ 144.902,5392	$ 100.417.459,66	301,00	113,00	414,00	$ 43.615.664,30	$ 16.373.986,93	$ 59.989.651,23	279	$ 40.427.808,44
	IVA 19% SOBRE ACTIVIDAD No. 2				$ 19.079.317,34			-	$ 8.286.976,22	$ 3.111.057,52	$ 11.398.033,73	-	$ 7.681.283,60
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD No.2 + IVA (19%)				**$ 119.496.777,00**				**$ 51.902.640,52**	**$ 19.485.044,45**	**$ 71.387.684,96**	-	$ 48.109.092,04
	ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE OBRA												
	REDES HIDROSANITARIAS												
2.1	Red intradomiciliaria de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	M	1,00	$ 14.370,00	$ 14.370,00	5.326,71	2.155,56	7.482,27	$ 76.544.822,70	$ 30.975.397,20	$ 107.520.219,90	-	-
2.2	Red intradomiciliaria de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	M	1,00	$ 57.385,00	$ 57.385,00	2.839,62	1.179,00	4.018,62	$ 162.951.593,70	$ 67.656.915,00	$ 230.608.508,70	-	-
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	M	1,00	$ 29.682,00	$ 29.682,00	386,23	210,80	597,030	$ 11.464.078,86	$ 6.256.965,60	$ 17.721.044,46	-	-
	PUNTOS HIDROSANITARIOS			-									
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	UN	1,00	$ 123.661,00	$ 123.661,00	298,00	113,00	411,00	$ 36.850.978,00	$ 13.973.693,00	$ 50.824.671,00	-	-
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	UN	1,00	$ 150.802,00	$ 150.802,00	299,00	113,00	412,00	$ 45.089.798,00	$ 17.040.626,00	$ 62.130.424,00	-	-
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UN	1,00	$ 110.519,00	$ 110.519,00	298,00	113,00	411,00	$ 32.934.662,00	$ 12.488.647,00	$ 45.423.309,00	-	-
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UN	1,00	$ 116.841,00	$ 116.841,00	33,00	20,00	53,00	$ 3.855.753,00	$ 2.336.820,00	$ 6.192.573,00	-	-
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UN	1,00	$ 185.833,00	$ 185.833,00	34,00	10,00	44,00	$ 6.318.322,00	$ 1.858.330,00	$ 8.176.652,00	-	-
	APARATOS			-									
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	UN	1,00	$ 192.852,00	$ 192.852,00	299,00	113,00	412,00	$ 57.662.748,00	$ 21.792.276,00	$ 79.455.024,00	-	-
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	UN	1,00	$ 148.176,00	$ 148.176,00	299,00	113,00	412,00	$ 44.304.624,00	$ 16.743.888,00	$ 61.048.512,00	-	-
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	UN	1,00	$ 239.081,00	$ 239.081,00	33,00	20,00	53,00	$ 7.889.673,00	$ 4.781.620,00	$ 12.671.293,00	-	-
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	UN	1,00	$ 228.983,00	$ 228.983,00	34,00	10,00	44,00	$ 7.785.422,00	$ 2.289.830,00	$ 10.075.252,00	-	-
	CAJAS DE INSPECCIÓN			-									
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	M	1,00	$ 226.866,00	$ 226.866,00	263,40	99,30	362,70	$ 59.756.504,40	$ 22.527.793,80	$ 82.284.298,20	-	-
	UNIDADES SANITARIAS			-									
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UN	1,00	$ 3.325.416,00	$ 3.325.416,00	2,00	-	2,00	$ 6.650.832,00	$ -	$ 6.650.832,00	-	-
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UN	1,00	$ 2.960.054,00	$ 2.960.054,00	82,00	21,00	103,00	$ 242.724.428,00	$ 62.161.134,00	$ 304.885.562,00	-	-
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UN	1,00	$ 3.751.867,00	$ 3.751.867,00	176,00	72,00	248,00	$ 660.328.592,00	$ 270.134.424,00	$ 930.463.016,00	-	-
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UN	1,00	$ 3.854.876,00	$ 3.854.876,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	-
	CIMENTACIÓN			-									
3.5	Relleno compactado con material de sitio	M3	1,00	$ 16.092,00	$ 16.092,00	5,46	-	5,46	$ 87.862,32	$ -	$ 87.862,32	-	-
3.6	Relleno con material seleccionado (recebo)	M3	1,00	$ 49.479,00	$ 49.479,00	98,04	63,24	161,28	$ 4.850.921,16	$ 3.129.051,96	$ 7.979.973,12	-	-
	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS			-									
3.7	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	M3	1,00	$ 704.327,00	$ 704.327,00	73,876	25,99	99,867	$ 52.032.861,45	$ 18.306.163,06	$ 70.339.024,51	-	-
3.8	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	KG	1,00	$ 6.655,00	$ 6.655,00	8.524,80	3.161,74	11.686,54	$ 56.732.544,00	$ 21.041.379,70	$ 77.773.923,70	-	-
3.9	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	M2	1,00	$ 68.432,00	$ 68.432,00	54,92	75,81	130,73	$ 3.758.148,58	$ 5.187.829,92	$ 8.945.978,50	-	-
3.10	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	M2	1,00	$ 71.036,00	$ 71.036,00	195,20	65,60	260,80	$ 13.866.227,20	$ 4.659.961,60	$ 18.526.188,80	-	-
3.11	Concreto ciclópeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	M3	1,00	$ 235.590,00	$ 235.590,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	-
	MAMPOSTERIA			-									
3.12	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	M2	1,00	$ 35.344,00	$ 35.344,00	185,28	169,08	354,36	$ 6.548.536,32	$ 5.975.963,52	$ 12.524.499,84	-	-
3.13	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	UN	1,00	$ 8.032,00	$ 8.032,00	7,00	-	7,00	$ 56.224,00	$ -	$ 56.224,00	-	-
	MORTEROS			-									
3.14	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	M2	1,00	$ 16.234,00	$ 16.234,00	463,46	218,29	681,75	$ 7.523.809,64	$ 3.543.719,86	$ 11.067.529,50	-	-
3.15	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	M2	1,00	$ 17.058,00	$ 17.058,00	338,56	176,28	514,84	$ 5.775.156,48	$ 3.006.984,24	$ 8.782.140,72	-	-
3.16	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	M2	1,00	$ 20.301,00	$ 20.301,00	41,94	-	41,94	$ 851.423,94	$ -	$ 851.423,94	-	-
	ELEMENTOS												
3.17	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo y Pintura en Esmalte Sintético	UN	1,00	$ 383.416,00	$ 383.416,00	39,00	20,00	59,00	$ 14.953.224,00	$ 7.668.320,00	$ 22.621.544,00	-	-
3.18	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	UN	1,00	$ 59.183,00	$ 59.183,00	39,00	20,00	59,00	$ 2.308.137,00	$ 1.183.660,00	$ 3.491.797,00	-	-
3.19	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UN	1,00	$ 246.067,00	$ 246.067,00	122,00	41,00	163,00	$ 30.020.174,00	$ 10.088.747,00	$ 40.108.921,00	-	-
3.20	Suministro e instalación de registro de cierre metálico	UN	1,00	$ 24.525,00	$ 24.525,00	90,00	20,00	110,00	$ 2.207.250,00	$ 490.500,00	$ 2.697.750,00	-	-
3.21	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm	M2	1,00	$ 65.320,00	$ 65.320,00	16,45	-	16,45	$ 1.074.514,00	$ -	$ 1.074.514,00	-	-
3.22	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	M	1,00	$ 25.877,00	$ 25.877,00	4,00	-	4,00	$ 103.508,00	$ -	$ 103.508,00	-	-
3.23	Rotura y adecuación de caja de inpección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	UN	1,00	$ 40.300,00	$ 40.300,00	274,00	99,00	373,00	$ 11.042.200,00	$ 3.989.700,00	$ 15.031.900,00	-	-
	ACABADOS			-									
3.24	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	M2	1,00	$ 41.074,00	$ 41.074,00	5,53	-	5,53	$ 227.139,22	$ -	$ 227.139,22	-	-

3.25	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	M2	1,00	$ 26.000,00	$ 26.000,00	262,32	99,49	361,81	$ 6.820.320,00	$ 2.586.740,00	$ 9.407.060,00	-	-
3.26	Recuperación de piso esmaltado	M2	1,00	$ 20.215,00	$ 20.215,00	119,27	52,14	171,41	$ 2.411.043,05	$ 1.054.010,10	$ 3.465.053,15	-	-
3.27	Enchape pared blanco (0.20 X 0.20) metros	M2	1,00	$ 40.484,00	$ 40.484,00	170,53	79,63	250,16	$ 6.903.736,52	$ 3.223.740,92	$ 10.127.477,44	-	-
3.28	Enchape piso antideslizante blanco (0,20 x 0,20) metros	M2	1,00	$ 48.925,00	$ 48.925,00	113,80	52,51	166,31	$ 5.567.713,93	$ 2.569.051,75	$ 8.136.765,68	-	-
3.29	Carburo blanco para muro exterior (3 manos)	M2	1,00	$ 6.616,00	$ 6.616,00	664,11	344,52	1.008,63	$ 4.393.751,76	$ 2.279.344,32	$ 6.673.096,08	-	-
	CONEXIONES												
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	UN	1,00	$ 155.488,00	$ 155.488,00	24,00	-	24,00	$ 3.731.712,00	$ -	$ 3.731.712,00	-	-
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	UN	1,00	$ 171.923,00	$ 171.923,00	1,00	-	1,00	$ 171.923,00	$ -	$ 171.923,00	-	-
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	UN	1,00	$ 36.602,00	$ 36.602,00	4,00	-	4,00	$ 146.408,00	$ -	$ 146.408,00	-	-
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	UN	1,00	$ 35.954,00	$ 35.954,00	2,00	-	2,00	$ 71.908,00	$ -	$ 71.908,00	-	-
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	M	1,00	$ 101.003,00	$ 101.003,00	146,10	-	146,10	$ 14.756.538,30	$ -	$ 14.756.538,30	-	-
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13,5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	M	1,00	$ 17.875,00	$ 17.875,00	28,50	-	28,50	$ 509.437,50	$ -	$ 509.437,50	-	-
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro	UN	1,00	$ 209.226,00	$ 209.226,00	14,00	-	14,00	$ 2.929.164,00	$ -	$ 2.929.164,00	-	-
	INTERVENCIONES VARIAS				-								
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	M2	1,00	$ 91.825,00	$ 91.825,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	-
	CAJAS DE INSPECCIÓN				-								
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA. (incluye acero de refuerzo)	M	1,00	$ 305.967,00	$ 305.967,00	29,50	-	29,50	$ 9.026.026,50	$ -	$ 9.026.026,50	-	-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 3.835.167.214,50**				**$ 1.734.572.375,53**	**$ 653.003.227,55**	**$ 2.387.575.603,08**		**$ 1.447.591.611,42**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 1.074.613.853,50**				**$ 486.027.179,59**	**$ 182.971.504,36**	**$ 668.998.683,95**		**$ 405.615.169,55**
	ADMINISTRACIÓN	**21,07%**			$ 808.069.732,10				$ 365.474.399,52	$ 137.587.780,04	$ 503.062.179,56		$ 305.007.552,54
	IMPREVISTOS	**1,0%**			$ 38.351.672,14				$ 17.345.723,75	$ 6.530.032,28	$ 23.875.756,03		$ 14.475.916,11
	UTILIDAD	**5%**			$ 191.758.360,72				$ 86.728.618,76	$ 32.650.161,38	$ 119.378.780,14		$ 72.379.580,58
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD	**19%**			$ 36.434.088,54				$ 16.478.437,56	$ 6.203.530,66	$ 22.681.968,22		$ 13.752.120,32
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (ACTIVIDAD 3)					**$ 4.909.781.068,00**				**$ 2.220.599.555,12**	**$ 835.974.731,91**	**$ 3.056.574.287,03**		**$ 1.853.206.780,97**
VALOR TOTAL ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3					**$ 5.034.941.972,00**				**$ 2.278.166.322,63**	**$ 855.459.776,36**	**$ 3.133.626.098,99**		**$ 1.901.315.873,00**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**$ 5.034.941.972,00**	**V/R ANTICIPO:**	**$ 981.956.213,60**
V/R ADICIONES:		**% ANTICIPO :**	**20%**
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 5.034.941.972,00	**% RETEGARANTIA :**	

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 1 - SINCELEJO	9-sep.-22	$ 167.258.412,19	3,3220%	-	$ 35.208.027,34	$ 946.748.186,26	$ 132.050.384,85	$ 4.867.683.559,81	3,3220%
2	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 2 - SINCELEJO	9-sep.-22	$ 353.326.921,98	7,0175%	-	$ 134.266.614,91	$ 812.481.571,35	$ 219.060.307,07	$ 4.514.356.637,83	10,3395%
3	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 3 - SINCELEJO	5-oct.-22	$ 368.027.756,01	7,3095%	-	$ 119.882.487,52	$ 692.599.083,83	$ 248.145.268,49	$ 4.146.328.881,82	17,6489%
4	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 4 - SINCELEJO	4-nov.-22	$ 706.246.363,04	14,0269%		$ 153.322.521,78	$ 539.276.562,05	$ 552.923.841,26	$ 3.440.082.518,78	31,6758%
5	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 5 - SINCELEJO	Tramite	$ 455.490.237,16	9,0466%		$ 148.415.885,42	$ 390.860.676,63	$ 307.074.351,74	$ 2.984.592.281,62	40,7224%
6	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 6 - SINCELEJO		$ 769.913.798,72	15,2914%		$ 250.792.419,57	$ 140.068.257,06	$ 519.121.379,15	$ 2.214.678.482,90	56,0138%
					-					
	TOTAL		**$ 2.820.263.489,10**	**56,0138%**	**-**	**$ 841.887.956,54**	**$ 140.068.257,06**	**$ 519.121.379,15**	**$ 2.214.678.482,90**	**56,0138%**

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACIÓN: 9 DE DICIEMBRE DE 2022

Elaboró
CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: JOSE IGNACIO CÁRDENAS MENESES
REP. LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO TURQUIA

Aprobó
INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
REPRESENTANTE LEGAL
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:

Nombre: No Aplica

Anexo 28. Formatos diarios de inspeccion

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	04-01-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-71	VE	586	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		✓	//
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		✓	//
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	0		✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	0		✓	//
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	0		✓	//
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	//
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	//
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)	0		✓	//
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	0		✓	//
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	//
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	//
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	//
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Sin ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Sin ejecutar
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		✓	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	//
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	//
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	//
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	//
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	//
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	//
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	//

Nombre: Sandra Cortes
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez.
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
PROFESIONALES CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	04-01-23	Codigo vivienda	B-SC-EP-M-55	VE	414	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitario de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	sin ejecutar
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	sin ejecutar
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	sin ejecutar
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0	✓	✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre: Cristian Cardona
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leidy Franco A.
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre:
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	04-01-23	Codigo vivienda		S-SC-EP-M-45	VE	334	Tipologia T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			✓	//
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			✓	
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)		✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)		✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)		✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)			✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)			✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	//
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	//
3,4	Instalacion de lavadero estandar			✓	//
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer			✓	//
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	//
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion		✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo		✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4		✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas			✓	Sin ejecutar
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor		✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	Sin ejecutar
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado		✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque		✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño		✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			✓	Sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibro cemento		✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye anl. y pintura			✓	//
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto			✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	//
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria			✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria			✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tubena sanitaria PVC de 6"			✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"			✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"			✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0.60 m			✓	//

* Paralizada sin material/es.

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre:
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	04-01-23	Codigo vivienda	B-SC-EP-M-62	VE	495	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chaqueo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	50	✓		Sin instalar
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluyo ant, y pintura	50	✓		Sin instalar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	"
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	100	✓		
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 6" para domiciliaria	100	✓		
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	100	✓		
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	N/A
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0	✓		Sin ejecutar
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,80 m	100	✓		

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	05-01-23	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-	66	VE	355	Tipologia	T7
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion						
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre							

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		✓	//
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		✓	//
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	0		✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	0		✓	//
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	0		✓	//
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	//
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	//
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)	0		✓	//
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	0		✓	//
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	//
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	//
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	//
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		Falta cuchillas y Viga amarre.
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Sin ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	//
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		✓	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	//
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	//
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	//
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	//
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	//
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	Sin ejecutar
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	//
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	//

Intervenciones sin trabajadores.

Nombre: Sandra Contreras	Nombre Leider Suárez	Nombre
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Inspector de interventoria	Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	05-01-23	Codigo vivienda		S-SC-EP-M-66	VE	554	Tipologia	T3	
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion							
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion							
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre								

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		Si
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		"
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		"
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)	0		✓	"
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	0		✓	"
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	Sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	100	✓		Falta pintura
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	"
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	50	✓		En ejecucion
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	50	✓		"
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	Sin ejecutar,
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tubena sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de ,60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre: Sandra Cortes
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez.
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	23-01-23	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-71	VE	586	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1'2"			✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			✓	〃
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			✓	
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)			✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)			✓	〃
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)			✓	〃
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)			✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)			✓	N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	〃
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	〃
3,4	Instalacion de lavadero estandar			✓	N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer			✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin ejecutar
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion		✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo		✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4		✓		Desalineación de muros
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas		✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	Sin ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	〃
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado			✓	〃
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			✓	〃
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			✓	〃
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			✓	〃
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			✓	〃
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	〃
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	〃
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto			✓	〃
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			✓	〃
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	〃
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	〃
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	〃
6,3	Suministro e instalacion de Tubena sanitaria PVC de 6"	0		✓	〃
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1'2"	0		✓	〃
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1'2"	0		✓	〃
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	〃

Nombre: [illegible]
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre [illegible] Leider Suarez.
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre [illegible]
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	05-01-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-62	VE	449	Tipologia	T7
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)	0		✓	"
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	0		✓	"
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	Sin ejecutar
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	En ejecucion
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	En ejecucion
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	Sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	0		✓	"
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			✓	N/A
5,2	Recuporacion de piso en concreto			✓	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			✓	"
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	"
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	"
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	"
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	"
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	"
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	"
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .80 m x 0,80 m	0		✓	"

Nombre:	Nombre Leider Suárez	Nombre
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Inspector de Interventoria	Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	05-Enero-2023	Codigo vivienda		S-SC-EP-M-71	VE	609	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion						
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre							

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	0		✓	Inst. sin terminar - sin pintar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	100	✓	✓	Ejecutado
5,2	Recuperacion de piso en concreto	100	✓	✓	Ejecutado
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	100	✓	✓	Ejecutado
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		ejecutados
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		2 pegas fuecas.
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		Ejecutado
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria		✓		En ejecucion
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria		✓		"
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"		✓		"
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"			✓	N/A
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"			✓	N/A
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m			✓	sin ejecutar

Nombre:	Nombre Leider Suarez	Nombre
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Inspector de Interventoria	Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Recibida a satisfacción.

Fecha de inspeccion	05-Dic-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-66	VE	564	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	100	✓	✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	100	✓	✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar	100	✓		
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	100	✓		
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	100	✓		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	"
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	"
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	"
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	"
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	"
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	"

Nombre:	Nombre Leider Suarez	Nombre
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Inspector de interventoria	Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

	Codigo vivienda	R-SC-FP-M- 24 VF 393 Tipologia 1-2	
Fecha de inspeccion	6-01-2023	fecha de inicio de la intervencion	
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha final de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES		
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, Intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	50	V		En ejecucion
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de ½"	50	V		En ejecucion
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"				
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"				
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS	100	V		
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	V		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	V		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)				N/A
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				
3	APARATOS	100	V		
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)	100	V		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	V		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal				N/A
3,4	Instalacion de lavadero estandar				N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer			V	Sin ejecutar
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto				
4	UNIDAD SANITARIA	100	V		
4,1	Excavacion para cimentacion	100	V		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	V		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	V		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	V		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	V		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	V		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	V		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	V		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	V		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	V		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	V		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	V		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	50	V		Falta ultima mano
5	ACABADOS Y PINTURA				N/A
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso estrallado				
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100			
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100			
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			V	Sin ejecutar
6	CONEXIONES DOMICILIARIA	100	V		
6,1	Excavacion para domiciliaria			V	Sin ejecutar
6,2	Suministro e instalacion de kit silla yo de 6" a 8" para domiciliaria			V	Sin ejecutar
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"			V	Sin ejecutar
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x ½"				
6,5	Suministro e instalacion de mirato medidor de ½"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Jaime Martinez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre:
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de Inspeccion	7-01-2023	Codigo Vivienda	5 SC EP M 05 VT 120 Tipologia T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	Fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	Fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de prelimitares y diagnostico, caracterización, intervención y garantía para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado en el municipio de Sincelejo. Departamento de Sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red Intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	50	✓		en ejecucion
1,2	Red Intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	50	✓		en ejecucion
1,3	Red Intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"				
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100			
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100			
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100			
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100			
3,2	Instalacion de (**ducha**)	102			
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100			
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin ejecutar
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100			
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100			
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100			
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100			
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0.02mt espesor	100			
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100			
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100			
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100			
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100			
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100			
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100			
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100			
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	101			
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100			
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100			
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100			
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0.60 m				N/A

Nombre Sandra Cantero
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Isaac Martinez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	6-01-2023	Codigo vivienda	6-SC-EP-M-[illegible] VE 594 Tipologia ADC
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			V	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	20	V		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"				
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)			V	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)			V	Sin ejecutar
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)			V	Sin ejecutar
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			V	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)			V	〃 〃 〃
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			V	
3,4	Instalacion de lavadero estandar				
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto				N/A
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion				N/A
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo				N/A
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4				N/A
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas				N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor				N/A
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			V	Sin ejecutar
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado			V	Sin ejecutar
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			V	
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			V	
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño				N/A
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			V	Sin ejecutar
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			V	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura				
5	ACABADOS Y PINTURA				N/A
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			V	Sin ejecutar
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			V	〃 〃 〃
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			V	
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior				
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				N/A
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla yo de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: [illegible] Nombre Isaac Martinez Nombre
Cargo: Residente de Interventoria Cargo: Inspector de interventoria Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	6-01-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-	21	VE	596	Tipologia	+3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion						
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre							

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	50	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	50	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"				N/A
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	100	✓		
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar				N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100			
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100			
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100			
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100			
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100			
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100			
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100			
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100			
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100			
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			✓	Sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100			
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	Sin ejecutar
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100			
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100			
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	Sin suministrar
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 6" para domiciliaria				N/A
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				N/A
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				N/A
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				N/A
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				N/A

Nombre: Sandra Cordero
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Isaac Martinez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de Inspeccion	6-01-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M- 77 VE 598 Tipologia T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red Intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			V	Sin ejecutar
1,2	Red Intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			V	Sin ejecutar
1,3	Red Intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"				N/A
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	V		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	V		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	V		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)			V	
3,2	Instalacion de (**ducha**)			V	
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**			V	
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				N/A
3,6	Construccion de caja de Inspeccion en concreto			V	
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100			
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100			
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100			
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100			
4,5	Pañete Interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100			
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100			
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100			
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100			
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100			
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			V	Sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100			
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			V	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			V	Sin ejecutar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	50	V		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	V		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			V	Sin ejecutar
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla yo de 6" a 6" para domiciliaria				N/A
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				N/A
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				N/A
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				N/A
6,6	Construccion de caja de Inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				N/A

Nombre: Sandra Carlon
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Isaac Martinez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	6-01-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-71	VE	599	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			V	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			V	" " "
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"				
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)			V	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)			V	" " "
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)			V	" " "
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			V	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)			V	Sin ejecutar
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			V	" " "
3,4	Instalacion de lavadero estandar				N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			V	Sin ejecutar
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	V		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	V		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4			V	Sin ejecutar
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas			V	" " "
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			V	" " "
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			V	" " "
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	V		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			V	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			V	
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			V	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			V	
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			V	
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			V	Sin ejecutar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			V	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			V	~ ~
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			V	~ ~
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				N/A
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				N/A
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				N/A
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				N/A
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				N/A

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Isaac Murgas
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector d

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	6-01-2023	Codigo vivienda	8-SC-EP-M-41 VE 089 Tipologia 3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			V	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			V	"
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			V	"
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)			V	
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)			V	
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)			V	
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			V	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)			V	"
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			V	"
3,4	Instalacion de lavadero estandar				N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			V	Sin ejecutar
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	V		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	V		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	V		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo reglilas	100	V		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			V	Sin ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			V	Sin ejecutar
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	V		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	V		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			V	Sin ejecutar
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			V	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	V		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			V	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			V	Sin suministro
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			V	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			V	"
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			V	"
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 6" para domiciliaria				N/A
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				N/A
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				N/A
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				N/A
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				N/A

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Esmeralda Martinez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	7-01-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-01 VE 167 Tipologia T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	07-01-2023
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"				
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar				N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	100	✓		
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020				N/A
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	CONEXIONES DOMICILIARIA	100	✓		
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				N/A

Nombre: Sandra Cantor
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Isaac Martinez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	7-01-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M- 01 VE 662 Tipologia 3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de ½"			✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			✓	
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			✓	
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)			✓	
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)			✓	
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)			✓	
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)			✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)			✓	Sin ejecutar
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**			✓	Sin ejecutar
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin ejecutar
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	30	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regilas			✓	Sin ejecutar
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	Sin ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	Sin ejecutar
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100			
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			✓	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100			
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			✓	Sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			✓	
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			1	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x ½"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de ½"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				N/A

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Isaac Martinez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	07-01-2023	Codigo vivienda		S-SC-EP-M-01	VE	244	Tipologia T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	50	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	50	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"				
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario **(Inodoro)**	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario **(ducha)**	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de **(lavamanos con pedestal)**	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de **(lavadero estandar)**				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de **(Lavaplatos)**				N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario **(inodoro)**			✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de **(ducha)**			✓	Sin ejecutar
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**			✓	Sin ejecutar
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin ejecutar
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mampostena en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			✓	Sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	Sin Suministrar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	Sin ejecutar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	Sin ejecutar
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	Sin ejecutar
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla yo de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				N/A

Nombre: Sandra Cortes
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	7-01-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-01	VE	B2	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"				
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100			
3,2	Instalacion de (ducha)	100			
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100			
3,4	Instalacion de lavadero estandar				N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin Ejecutar
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	Sin Suministro
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	50	✓		Falta ultima mano
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				N/A

Nombre: Sindel Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Isaac Montero
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	17-ener 2017	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-50	VE	212	Tipologia	T7
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	sin aplicar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibro cemento	0		✓	//
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	//
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	50	✓		sin pintar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	50	✓		Ejecutando
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	50	✓		Ejecutando
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	sin ejecutar
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	//

Nombre: Sandra Cantron
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez.
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	12-enero-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-40	VE	548	Tipologia	T1
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	50	✓		Falta pintar
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		Ejecutando
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	sin ejecutar
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0			

Nombre: Sandra Cantero
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez.
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	12-ene-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-50	VE	753	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	50		✓	Sin instalar
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		Piezas huecas en torno ducha
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		Falta retoque
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suárez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	17-ENE-2017	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-50	VE	085	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, Intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓	✓	
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓	✓	
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓	✓	
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	Sin instalar
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre: Sanchez Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
CONSULTORES CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	12 - enero - 2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-50	VE	356	Tipologia	
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1"2"	0		✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		✓	//
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		✓	
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	0		✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	0		✓	//
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	0		✓	//
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	//
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	//
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)	0		✓	//
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	0		✓	//
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	//
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	//
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	//
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		Ejecutando
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Sin ejecutar.
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Sin ejecutar
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	Sin ejecutar
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	//
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	//
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	//
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	//
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	//
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1"2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1"2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	//

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Laura Sierra
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obr

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	12-Enero-2021	Codigo vivienda	S-SC-EP-M- 30	VE	353	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		✓	//
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		✓	//
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	0		✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	0		✓	//
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	0		✓	//
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	//
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	//
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)	0		✓	//
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	0		✓	//
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	//
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	//
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	//
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		En ejecución
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Sin ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Sin ejecutar
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	Sin ejecutar
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	//
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	//
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	//
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	//
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	//
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	//

Nombre Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Leidy Suarez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	13 Enero 2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-64	VE	448	Tipologia	T1
Contratista	CONSORCIO TUROLA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validacion de prototipos y diagnostico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		//
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		//
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)	0		✓	//
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	0		✓	//
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	//
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	//
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	//
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	Sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	0		✓	Sin ejecutar
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	Sin ejecutar
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	//
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	//

Nombre: Sebastian Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	13-ene-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-62	VE	722	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de protocipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100		✓	N/A
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		✓	//
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		✓	
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	0		✓	
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	0		✓	
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	0		✓	
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)	0		✓	//
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	0		✓	
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	Sin ejecutar
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Sin ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Sin ejecutar
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		✓	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	Sin ejecutar
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100		✓	
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100		✓	
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100		✓	
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre: Sandra Cortes
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	13-Feb-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-71	VE	586	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		✓	"
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		✓	
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	0		✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	0		✓	"
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	0		✓	"
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	"
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	"
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)	0		✓	"
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	0		✓	"
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	"
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	"
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	"
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		Correccion de medidas y ejecutar
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Sin ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	"
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		✓	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	"
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	"
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	"
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	"
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	"
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto			✓	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			✓	"
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin ejecutar
5,5	Enchepe piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	"
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	"
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria			✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria			✓	"
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"			✓	"
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"			✓	"
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"			✓	"
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m			✓	"

Nombre: Cardin Cortes
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez.
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	17-Enero-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-50	VR	352	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		✓	
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		✓	En excavacion
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		✓	11
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	0		✓	
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	0		✓	
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	0		✓	
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	NIA
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	NIA
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)	0		✓	//
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	0		✓	
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Sin ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	//
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		✓	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	//
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	NIA
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	NIA
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre: Santana Ortega	Nombre Leider Suarez	Nombre
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Inspector de interventoria	Cargo: residente / Inspector d

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	14-dic-2023	Codigo vivienda		B-SC-EP-M-67	VE	547	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion						
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre							

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	0		✓	Desmontado
3,2	Instalacion de (ducha)	0		✓	"
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	0		✓	
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		Demolicion parcial
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Demolicion
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	50	✓		Demolicion parcial
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	Desmontado
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	"
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	0		✓	
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	Desmontado
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	"
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	"
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	"
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	"
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	"
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de ,60 m x 0,60 m	0		✓	"

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
Ingenieros consultores

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	10 - ene - 2023	Codigo vivienda	8-SC-EP-M-55	VR	41%	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		✓	〃
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		✓	〃
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	0		✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	0		✓	〃
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	0		✓	〃
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)	0		✓	〃
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	0		✓	〃
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	Sin ejecutar
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regilas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Sin ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Sin ejecutar
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		✓	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	〃
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	〃
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	〃
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	〃
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	0		✓	〃
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	〃
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	〃
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	〃
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	〃
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 6" para domiciliaria	0		✓	〃
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	〃
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	〃
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	〃
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	〃

Nombre: Sandra Contreras	Nombre: Leider Suarez	Nombre
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Inspector de Interventoria	Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	13 - Ene - 2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M- 70	VE	529	Tipologia	F3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)	0		✓	//
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	0		✓	//
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	//
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	//
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	//
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo reglilas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	Sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	Sin ejecutar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	//
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de ,60 m x 0,60 m	0		✓	//

Nombre: Sandra Contreras	Nombre	Nombre
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Inspector de Interventoria	Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	18-ene-2023	Codigo vivienda	8-SC-EP-M-70	VE	521	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

USTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		✓	//
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		✓	
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	0		✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	0		✓	
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	0		✓	
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)	0		✓	
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	0		✓	
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Sin ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Sin ejecutar
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	Sin ejecutar
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	Sin ejecutar
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 6" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre: Sandra Contreras	Nombre	Nombre
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Inspector de Interventoria	Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	19-ENE-2017	Codigo vivienda	B-SC-EP-M-70	VE	592	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	100	✓		
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	100	✓		Falta pintura
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	Sin instalar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0			
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	50	✓		Falta retoque
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 6" para domiciliaria	0		✓	"
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	"
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	"
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	"
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .80 m x 0,80 m	0		✓	"

Nombre: Sandra Contreras	Nombre: Leidis Suarez	Nombre
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Inspector de Interventoria	Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	14-01-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-171	VIS	444	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer	0		✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		falta instalar y pintar
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	50	✓		falta retoques
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	Sin ejecutar
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de ,60 m x 0,60 m	0		✓	//

Nombre: Sandra contreras	Nombre Leider Suarez	Nombre
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Inspector de Interventoria	Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

		Codigo vivienda	S-SC-EP-M- 71	VE	544	Tipologia	T2	
Fecha de inspeccion	18-01-2023	fecha de inicio de la intervencion						
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha final de la intervencion						
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES							
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre							

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		✓	//
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		✓	
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario **(Inodoro)**	0		✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario **(ducha)**	0		✓	//
2,6	Punto Hidrosanitario de **(lavamanos con pedestal)**	0		✓	//
2,7	Punto Hidrosanitario de **(lavadero estandar)**	0		✓	//
2,8	Punto Hidrosanitario de **(Lavaplatos)**	0		✓	//
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario **(inodoro)**	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de **(ducha)**	0		✓	//
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		✓	//
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	//
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	//
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	//
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	80	✓		En ejecucion
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Sin ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	//
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	0		✓	//
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		✓	//
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	//
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	//
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	//
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	N/A
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	Sin ejecutar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				Sin ejecutar
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	//
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	//
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	//

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez.
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre

Powered by CamScanner

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	18-01-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-71	VE	598	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		✓	Sin ejecutar
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	Sin ejecutar
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	Sin ejecutar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	100	✓		
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		Falta Mano pintura
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	100	✓		
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	100	✓		
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	100	✓		
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	N/A
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	N/A
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	100	✓		

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leidis Suarez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obr

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIERIA CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	18-01-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-71	VE	618	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1'2"	0		✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		✓	//
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		✓	
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	0		✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	0		✓	//
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	0		✓	
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	0		✓	Sin ejecutar.
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0		✓	//
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		✓	
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	50	✓		en ejecucion.
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Sin ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	//
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	0		✓	
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		✓	
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque sereo plastico de 500lt	0		✓	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	//
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collorin de derivacion de 4" x 1'2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1'2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0.60 m	0		✓	

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Yander S. Yander Suarez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

		Codigo vivienda	S-SC-EP-M- 71	VE	617	Tipologia	T2
Fecha de inspeccion	12-01-2023	fecha de inicio de la intervencion					
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha final de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		✓	//
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		✓	
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	0		✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	0		✓	//
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	0		✓	N/A
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion dc (**ducha**)	0		✓	//
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		✓	
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	50	✓		2 Hiladas
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Sin ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	//
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	0		✓	
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		✓	
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	0		✓	
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion dc collorin dc derivacion dc 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0.60 m	0		✓	

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre:
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	19-01-2023	Codigo vivienda	8-SC-EP-M- 71	VE	089	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0		✓	//
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		✓	//
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	//
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	//
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	//
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	80	✓		En ejecucion
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	70	✓		En ejecucion
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	Sin ejecutar
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	Sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	Sin ejecutar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	//
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	//

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider S. Leider Suárez.
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de ob...

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	19-01-23	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-74 VE 691 Tipologia T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1'2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		Falta homogenizar
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1'2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1'2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre: Sandra contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez.
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	19-01-23	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-04	VE	243	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0		✓	//
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		✓	//
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	//
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	//
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	//
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		en ejecucion
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	0		✓	//
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	//
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	//

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	19-01-23	**Codigo vivienda**	S-SC-EP-M- 23	VE	667	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		✓	//
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		✓	//
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	0		✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	0		✓	//
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	0		✓	//
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0		✓	//
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		✓	//
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	Sin ejecutar
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		pendida viga amarre.
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Sin ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	//
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	0		✓	//
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		✓	//
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	//
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	//
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	0		✓	//
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	//
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0.60 m	0		✓	//

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suárez.
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

Nota: en el recorrido de 413-Mz 55 evidencio que la viga de confinamiento no tiene Anclaje a Columna Existente

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	20-01-2023	**Codigo vivienda**	S-SC-EP-M-55	VE	413	Tipologia	T1
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetive	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			V	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			V	
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			V	
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)			V	
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)			V	
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)			V	
2,7	Punto Hidrosanitario dé (**lavadero estandar**)			V	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)			V	
3,2	Instalacion de (**ducha**)			V	
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**			V	
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**			V	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			V	Sin ejecutar
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	80	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	40	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	40	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado				N/A
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque				N/A
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			V	Sin ejecutar
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			V	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			V	
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			V	
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura			V	
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			V	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			V	Sin ejecutar
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			V	
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0.60 m				N/A

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Isaac Montes
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

418

Fecha de inspeccion	20-01-2023	**Codigo vivienda**		S-SC-EP-M55	VE 418	**Tipologia**	13
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			✓	Sin ejecutar
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"				
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)			✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)			✓	〃 〃 〃
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)			✓	
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)			✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)			✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)			✓	〃 〃 〃
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**			✓	
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin ejecutar
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100			
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100			
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100			
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100			
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	50	✓		En ejecucion
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	Sin ejecutar
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100			
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100			
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			✓	Sin ejecutar
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			✓	Sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100			
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	〃 〃 〃
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	〃 〃 〃
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	Sin ejecutar
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				〃
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				〃
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"				〃
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				〃
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				N/A

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Jesus Montoya
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	20-01-2023	**Codigo vivienda**	S-SC-EP-M-55 VE 409 **Tipologia** T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			✓	sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			✓	sin ejecutar
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"				
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)			✓	sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)			✓	〃 〃 〃
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)			✓	〃 〃 〃
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)			✓	sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)			✓	〃 〃 〃
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**			✓	
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	sin ejecutar
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100			
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100			
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4			✓	sin ejecutar
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas			✓	
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	〃 〃 〃
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100		✓	en ejecucion
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			✓	sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			✓	
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			✓	〃 〃 〃
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			✓	〃 〃 〃
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	〃 〃 〃
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura			✓	
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	〃 〃 〃
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0.60 m				

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Ismael Martinez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	20-01-2023	**Codigo vivienda**	S-SC-EP-M-50	VE	354	Tipologia	A/C
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100			
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100			
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100			
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100			
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100			
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100			
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	100			
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)			V	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)			V	Sin ejecutar
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**			V	Sin ejecutar
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**			V	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto				
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion				N/A
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo				N/A
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4				N/A
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas				
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	50			
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	50			
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100			
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			V	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100			
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			V	Sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento				N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			V	Sin suministro
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			V	Sin ejecutar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			V	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100			
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100			
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			V	Sin ejecutar
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				N/A

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Isune Martina
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	20-01-2023	**Codigo vivienda**	S-SC-EP-M 51 VE 360 **Tipologia** Adc
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"				
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"				
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"				
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**inodoro**)	100			
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100			
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100			
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)			V	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)			V	Sin ejecutar
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**			V	Sin ejecutar
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	50	V		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion				N/A
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo				
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4				levante del muro frontal
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas				N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor				
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			V	Solo muro frontal
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	V		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			V	
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	V		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			V	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibro cemento				N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque sereo plastico de 500lt				Sin suministrar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura				Sin suministrar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			V	Sin ejecutar
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			V	
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			V	
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			V	Sin ejecutar
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tubería sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				N/A

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Isune Martinez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	20-01-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-50	VE	855	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de ½"	100			
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100			
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"				N/A
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)			✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)			✓	Sin ejecutar
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)			✓	Sin ejecutar
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)			✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion dc (**ducha**)			✓	〃 〃 〃
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**			✓	Sin ejecutar
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin ejecutar
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100			
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100			
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	80			
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas			✓	Sin ejecutar
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	〃 〃 〃
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	〃 〃 〃
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100			
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100			
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			✓	Sin ejecutar
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			✓	〃 〃 〃
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			✓	〃 〃 〃
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	〃 〃 〃
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	Sin ejecutar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	〃 〃 〃
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	〃 〃 〃
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				〃
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				〃
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x ½"				〃
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de ½"				〃
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				N/A

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Isaac Martinez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	20-01-2023	**Codigo vivienda**	S-SC-EP-M-501 VE 1606 **Tipologia** T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	50	✓		Sin pintar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	50	✓		Falta detallar pintura
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0.60 m				N/A

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Ysnne Martinez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
ingeniería consultores

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	20-01-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-55 VE 140 Tipologia 3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			✓	〃 〃 〃
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			✓	
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)			✓	Sin Ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)			✓	〃 〃 〃
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)			✓	
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)			✓	Sin Ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)			✓	〃 〃 〃
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**			✓	
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**			·	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin Ejecutar
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100			
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100			
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	60			
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas			✓	Sin Ejecutar
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	〃 〃 〃
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100		·	
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			✓	Sin Ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			✓	
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			✓	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			✓	
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin Ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	Sin Ejecutar
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior				
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collorin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Jsaac Montes
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	23-01-2023	Codigo vivienda	S-SC-SP-M-71	VIS	1620	Tipologia	73
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estander**)	0		✓	NA
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	NA
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	NA
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	NA
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		En ejecucion.
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de celados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Sin ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Sin ejecutar
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	Sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	Sin ejecutar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	Sin ejecutar
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	
5,6	Pintura con cerburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	50		✓	En ejecucion
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 6" para domiciliaria	50		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	50		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0,60 m	50		✓	

Nombre: Sandra Cardona
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leidy Flores.
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	27-01-2023	Codigo vivienda	S-SC-SP-M-64	VE	543	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	NIA
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	NIA
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	0		✓	sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0		✓	//
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		✓	//
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	NIA
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	NIA
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	50	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	50	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	50	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	//
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	//
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	//
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	NIA
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	//
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliario	0		✓	NIA
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0,60 m	0		✓	//

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez.
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	23-01-2023	**Codigo vivienda**	S-SC-EP-III-71	**VE**	618	**Tipologia**	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			✓	//
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"			✓	
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)			✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)			✓	//
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)			✓	//
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)			✓	//
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)			✓	//
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)			✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)			✓	//
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**			✓	//
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**			✓	//
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**			✓	//
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	//
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		Demolicion para T3.
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	50	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	50	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas			✓	Sin ejecutar
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	//
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	//
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado			✓	//
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			✓	//
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			✓	//
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			✓	//
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibro-cemento			✓	//
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	//
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura			✓	//
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			✓	Sin ejecutar
5,2	Recuperacion de piso en concreto			✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			✓	//
5,4	Enchape para parad blanco 0,20*,020			✓	//
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	//
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria			✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria			✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"			✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"			✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"			✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0,60 m			✓	//

* Cambio T2 a T3.

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leader Suarez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / inspector de obra

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	23-01-2023	Codigo vivienda	S-SC-2P-M-71	VE	6	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		✓	//
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		✓	//
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	0		✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	0		✓	//
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	0		✓	//
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	//
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	//
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0		✓	//
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		✓	//
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	//
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	//
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	//
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		2 hiladas fabricadas · N/A
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	Sin ejecutar
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	//
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	//
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	0		✓	//
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		✓	//
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	//
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	//
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	//
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	//
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	//
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	Sin ejecutar
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	//
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collorin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0,60 m	0		✓	//

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Recibida.

Fecha de inspeccion	24-01-23	Codigo vivienda	B-SC-EF-M-67	VIS	027	Tipologia	77
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1'2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	100	✓		Falta click
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1'2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1'2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Fuentes.
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	24-01-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-45	VE	334	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1'2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0		✓	//
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		✓	//
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	//
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	//
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	//
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓	✗	
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Sin ejecutar
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	Sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	0		✓	
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	//
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1'2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1'2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0,60 m	0		✓	//

Nombre: Sandra Cantillo
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez.
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	24-01-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-41	VIS	676	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		Expuesta en el A.S.
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	100	✓		Fuga en el sapo
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		Dilatacion entre muro y columna
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		Fuga por la boya.
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	100	✓		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	"
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		Dilatacion en las esquinas
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	"
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	"
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	"
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	"
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0,60 m	0		✓	"

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leidy Suarez.
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONTRATISTAS

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	24-01-2023	Codigo vivienda	S-SC-SP-M-06	VR	641	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		✓	"
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		✓	"
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	0		✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	0		✓	"
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	0		✓	N/A
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0		✓	"
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		✓	N/A
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	Sin ejecutar
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regilas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Sin ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Sin ejecutar
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		✓	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	"
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	"
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	"
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	"
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	0		✓	"
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	"
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	"
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	"
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" y 8" para domiciliaria	0		✓	"
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	"
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	"
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	"
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	"

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	25 - 01 - 2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-71	VII	617	Tipologia	T2	
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion						
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre							

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		✓	
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		✓	
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		✓	
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	0		✓	
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	0		✓	
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	0		✓	
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	0		✓	
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0		✓	
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		✓	
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	N/A
4,5	Peñete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Sin ejecutar
4,6	Peñete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Sin ejecutar
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		✓	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	"
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliario	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider S.
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre:
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspección	4 / 12 / 2021	Código vivienda	a SG RP M 77 VR 168 Vivienda 72
Contratista	CONSORCIO TUNQUIA	Fecha de inicio de la intervención	
Interventoría	GAVINCO INGENIERIA CONSULTORIA	Fecha final de la intervención	
Objetivo	Ubicación, validación de prototipos y diagnósticos, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de soluciones individuales de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1.1	Red hidrosanitaria de agua fría de 1/2"			✓	Sin ejecutar
1.2	Red hidrosanitaria de alcantarillado de 4"			✓	//
1.3	Red hidrosanitaria ventilación sanitaria de 2"			✓	
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2.1	Punto Hidrosanitario (**inodoro**)			✓	Sin ejecutar
2.2	Punto Hidrosanitario (**ducha**)			✓	//
2.3	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)			✓	
2.4	Punto Hidrosanitario de (**lavadero extender**)			✓	
2.5	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)			✓	
3	**APARATOS**				
3.1	Instalación de sanitario (**inodoro**)			✓	Sin ejecutar
3.2	Instalación de (**ducha**)			✓	//
3.3	Instalación de **lavamanos con pedestal**			✓	
3.4	Instalación de **lavadero extender**			✓	
3.5	Instalación de **lavaplatos de sobreponer**			✓	
3.6	Construcción de caja de inspección en concreto			✓	
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4.1	Excavación para cimentación	100	✓		Demolición de 12.9.22.
4.2	Cimentación en concreto, incluye colocación de acero de refuerzo	100	✓		
4.3	Mampostería en ladrillo n°4	100	✓		
4.4	Suministro e instalación de cerdos tipo tejillas			✓	Sin ejecutar
4.5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0.02ml espesor			✓	
4.6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0.02ml espesor			✓	
4.7	Excavación y zapata en concreto reforzado			✓	
4.8	Viga en concreto reforzada para apoyo de tanque			✓	
4.9	Concreto para plantilla de piso 3000			✓	
4.10	Suministro e instalación de juego de conexiones para baño			✓	
4.11	Suministro e instalación de cubierta en teja ondulada fibrocemento			✓	
4.12	Suministro e instalación de tanque acero plástico de 500lt			✓	
4.13	Suministro e instalación de puerta metálica incluye anti, y pintura			✓	
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5.1	Pañoperación de piso en cerámica			✓	N/A
5.2	Pañoperación de piso en concreto			✓	//
5.3	Pañoperación de piso esmaltado			✓	
5.4	Enchape para pared blanco 0.30*.60			✓	Sin ejecutar
5.5	Enchape piso antideslizante blanco 0.30*.60			✓	//
5.6	Pintura con caucho blanco para muro exterior y interior			✓	
6	**CONDICIONES DOMICILIARIA**				
6.1	Excavación para domiciliaria			✓	N/A
6.2	Suministro e instalación de la silla de 6" x 6" para domiciliaria			✓	//
6.3	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6"			✓	
6.4	Suministro e instalación de collarín de derivación de 4" x 12"			✓	
6.5	Suministro e instalación de interceptor de 12"			✓	
6.6	Construcción de caja de inspección en concreto de 60 cm x 60 cm			✓	

Nombre: Sandra Cardona
Cargo: Residente de interventoría

Nombre: Leider Suarez
Cargo: Inspector de interventoría

Nombre
Cargo: residente / inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	26-01-2023	**Codigo vivienda**	S-SC-EP-M- 71	VIS	596	**Tipologia**	73
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	NIA
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	NIA
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓	✗	
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓	✗	
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓	✗	
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	NIA
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	NIA
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		se vacea. revisar cheque.
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	NIA
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	//

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Lader Figueroa
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	26-01-2022	**Codigo vivienda**	S-SC-SP-M-44 VS F44 **Tipologia** Ade.
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	Sin ejecutar
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	11
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	Sin ejecutar
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	11
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	0		✓	NCA
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	0		✓	//
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	0		✓	//
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regilla	0		✓	//
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	0		✓	Sin ejecutar
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		✓	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	NIA
4,13	Suministro e instalacion de tanque acero plastico de 500lt	0		✓	NIA
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	Sin ejecutar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	NCA
5,2	Recuperacion de piso en concreto	100	✓		
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	NIA
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con certuro blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	100	✓		
6,2	Suministro e instalacion de kit silla yee de 6" a 8" para domiciliaria	100	✓		
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	100	✓		
6,4	Suministro e instalacion de collorin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	NIA
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	NIA
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x0,60 m	100	✓		

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	9-01-2023	Codigo vivienda		S-SC-EP-M- 07	VE	744	Tipologia	77
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion						
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre							

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estander**)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		FISURA entre muro y columna c.
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		Filtracion de agua lluvia.
4,13	Suministro e instalacion de tanque agreo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Leidis Suarez.
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	27-01-2023	Codigo vivienda	S-SC-SP-M-21	VE	277	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n° 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0			
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0	✗	✓	Sin ejecutar
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Leider Suarez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	23-01-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-07	VE	068	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		Sin proteccion.
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		Pañete parcial.
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	100	✓		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0.60 m	0		✓	

Nombre Sandra Cantero
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Leider Suarez.
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	27 - 01 - 2023	Codigo vivienda	S-SC-SP-M-08	VR	128	Tipologia	A de
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	100	✓		
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	100	✓		
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	100	✓		
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	100	✓		
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	0		✓	
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	0		✓	
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	0		✓	
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		Falta pintar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0			N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0			//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0			
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre Sandra cartagena
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Leider Suarez.
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	28-01-2023	**Codigo vivienda**		S-SC-EP-M-08	VE	128	**Tipologia**	ADC
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion						
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre							

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1"2"	100			
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100			
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100			
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100			
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100			
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100			
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	100			
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	100			
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	100			
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100			
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100			
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	100			
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	100			
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100			
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100			
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100			
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4				N/A
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas				N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100			
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100			
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100			
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100			
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100			
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100			
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento				N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100			
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	50			Sin Pintura.
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100			
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100			
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100			
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				N/A
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				N/A
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1"2"				N/A
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1"2"				N/A
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0,60 m				N/A

Nombre: Sinuhe Cortes
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Isaac Montes
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	28-01-2023	**Codigo vivienda**		**S-SC-EP-M**	06	**VE**	067	**Tipologia** 3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion						
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre							

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100			
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100			
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"				N/A
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100			
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100			
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100			
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	100			
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100			
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100			
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100			
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100			
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100			
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100			
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100			
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100			
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100			
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100			
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100			
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100			
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100			
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100			
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100			
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	50			Detalles de pintura
5	**ACABADOS Y PINTURA**				N/A
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				
5,4	Enchape para parad blanco 0,20*,020	100			
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100			
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	70			detalles de pintura
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				N/A
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				N/A
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0.60 m				

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Ismac Martinez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	28-01-2023	**Codigo vivienda**	S-SC-EP-M 10 VE 581 Tipologia T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	50	✓		En ejecucion
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	50	✓		En ejecucion
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	50	✓		En ejecucion
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)			✓	
3,2	Instalacion dc (**ducha**)			✓	
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**			✓	
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100			
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100			
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100			
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100			
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100			
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100			
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100			
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100			
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100			
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100			
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100			
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100			
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	〃 〃 〃
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria			✓	Sin ejecutar
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria			✓	Sin ejecutar
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"			✓	Sin ejecutar
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"				N/A
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				N/A
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0,60 m	100	✓		

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Isaac Martinez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion		Codigo vivienda	S-SC-EP-M-	VE		Tipologia	
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"				
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"				
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"				
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)				
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)				
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)				
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)				
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)				
3,2	Instalacion de (**ducha**)				
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**				
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto				
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion				
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo				
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4				
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas				
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor				
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor				
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado				
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque				
4,9	Concreto para plantilla de piso baño				
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño				
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento				
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt				
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura				
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				
5,2	Recuperacion de piso en concreto				
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020				
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020				
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior				
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	28-01-2023	Codigo vivienda		S-SC-EP-M	62	VE 657	Tipologia 1/3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100			
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100			
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100			
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100			
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100			
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100			
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)			V	Sin instalar
3,2	Instalacion de (**ducha**)			V	Sin instalar
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**			V	Sin instalar
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100			
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100			
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100			
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100			
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100			
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100			
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100			
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100			
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100			
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100			
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			V	Sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			V	Sin ejecutar
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			V	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			V	Sin ejecutar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			V	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			V	Sin ejecutar
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			V	Sin ejecutar
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0,60 m				N/A

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Isaac Martinez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	29-01-2023	Codigo vivienda		S-SC-EP-M-90	VE	582	Tipologia	3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion						
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre							

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	SIN INSTALAR
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	50	✓		FALTA ULTIMA MANO
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				N/A

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre ISAAC MARTINEZ
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIERIA CONSULTORIA

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	28-01-2023	**Codigo vivienda**	S-SC-EP-M-62 VE 499 **Tipologia** 3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100			
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100			
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100			
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100			
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100			
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100			
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	100			
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100			
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100			
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100			
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100			
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100			
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100			
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100			
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100			
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100			
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100			
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100			
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100			
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100			
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100			
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100			
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	50			puerta mal instalada
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100			
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100			
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	50			con detalles
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0.60 m				N/A

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Isaac Martinez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	28-01-2023	**Codigo vivienda**		B-SC-SP-M-01	VE	444	**Tipologia**	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion						
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre							

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		Nave de poso averiada.
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque nergo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		No cierra adecuadamente.
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	"
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		Pieza buena
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliario	0		✓	"
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	"
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	"
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	"
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0,60 m	0		✓	"

Nombre: Sandra Cantero
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	28-07-2021	**Codigo vivienda**	S-SC-SP-M-24	VIS	682	**Tipologia**	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		Tub. exp. en mal estado
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		conf. fuga on. - falta grupos
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	100	✓		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	"
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	"
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	"
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	"
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	"

Nombre: Sandra Cardenas
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	23-09-2023	**Codigo vivienda**		S-SC-EP-M-50	VE	212	**Tipologia**	T1
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion						
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre							

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		Tub. expuesta.
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	100	✓		Mancha de pintura
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		Mancha de pintura
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		Papelera caida.
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque agua plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		Resane de boquilla.
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0			

Nombre: Sandra cantero
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez.
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	23-01-2023	Codigo vivienda	5-SC-SF-M-54	VIS	736	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	Fecha de inicio de la intervención					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	Fecha final de la intervención					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Barcelona, departamento de suarez						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red Intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red Intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red Intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		Remate pilos.
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		Acero expuesto.
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		Tejas con goteros.
4,13	Suministro e instalacion de tanque apoyo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	100	✓		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	
5,2	Recuperacion de piso en concreto	100	✓		
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	100	✓		
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		Pieza buecas
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		Falta boquilla y piezas buecas
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		Falta Humogabilizar
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" x 6" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0,60 m	0		✓	//

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	27-01-2023	Codigo vivienda	B-SC-EP-M-61	VR	512	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

USTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Sin ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	90	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		Medidas no cumplen
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	Sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓	✓	
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	Sin ejecutar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	//
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" x 6" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0.60 m	0		✓	//

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leader Suarez.
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	31-01-2023	**Codigo vivienda**	S-SC-BP-M-69	VE	547	**Tipologia**	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	sin ejecutar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		se encharco area ducha
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 0,60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre: Sandra Cortes
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra
