EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

CONTRATO DE OBRA No. 2220569

CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2220586

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

CONTRATO No. 2220586

DOCUMENTO No. I 130
Informe Mensual - No. 09

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
Del 01 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023

VERSIÓN 01
VOLUMEN 1 DE 1
ORIGINAL

LISTA DE DISTRIBUCIÓN



Copias de este documento han sido entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREA O DEPENDENCIA		No. DE COPIAS
Copia No. 1	ENTERRITORIO	1
Copia No. 2	Biblioteca del proyecto	1

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

ÍNDICE VERSIÓN	CAPÍTULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
0		-	Versión original

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

TITULO DOCUMENTO:			INFORME MENSUAL No. 09 – enero de 2023		
DOCUMENTO No:			I 130		
APROBACIÓN	NUMERO DE REVISIÓN		0	1	2
	RESPONSABLE POR ELABORACIÓN “Ingeniero Residente”	Nombre:	Jaime Barrios Contreras		
		Firma:			
		Fecha:	01/02/2023		
	RESPONSABLE REVISIÓN “Coordinador Proyecto”	Nombre:	Juan Camilo Pertuz		
		Firma:			
		Fecha:	02/02/2023		
	RESPONSABLE APROBACIÓN	Nombre:	William Jiménez Martínez		
		Firma:			
		Fecha:	03/01/2023		

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE

CLIENTE:		EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio
RESPONSABLE APROBACIÓN	Nombre:	Nicolás Rincón Vega
	Cargo:	Supervisor Contrato de Interventoría.
	Firma:	
	Fecha:	

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 6
1. INFORME EJECUTIVO 7
2. INFORMACIÒN GENERAL DEL PROYECTO 7
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
2.2. LOCALIZACIÓN 7
2.3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 9
3. GENERALIDADES DEL CONTRATO 12
3.1. CONTRATOS SUSCRITOS 12
3.1.1. Contrato de Obra 12
3.1.2. Contrato de Interventoría. 12
3.2. CONTROL DE PÓLIZAS 13
3.2.1. Pólizas contrato de Obra 13
3.2.2. Pólizas contrato de Interventoría 13
3.3. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO 14
3.3.1. Información de índole presupuestal. 14
3.3.2. Manejo de anticipo 14
3.3.3. Actas parciales. 15
3.4. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 16
3.4.1. Personal Autorizado por el Cliente 16
3.4.2. Personal de la Interventoría 16
3.4.3. Personal del Contratista 16
3.5. CONTROL DE RECURSOS Y PERSONAL 17
3.5.1. Control de equipos 17
3.5.2. Control de personal 18
3.6. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO 18
3.6.1. Comités de Seguimiento. 18
3.6.2. Comités de Aprobación. 18
3.6.3. Correspondencia 19
4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA 20

4.1. ACTIVIDADES DE ORDEN TÉCNICO 20
4.1.1. Actividad 1. 20
4.1.2. Actividad 2. 20
4.1.3. Actividad 3. 21
4.1.4. Avance general del proyecto. 48
4.2. SITUACIONES ESPECIALES OCURRIDAS DURANTE EL PERIODO 50
4.3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 50
4.4. PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO – SST 50
4.5. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL. 52
4.6. BITÁCORA 52
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 53
5.1. CONCLUSIONES. 53
5.2. RECOMENDACIONES. 53
ANEXOS 54

RELACIÓN DE TABLAS.

TABLA 1. LUGAR DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES..... 7
TABLA 2. CAPÍTULOS E ÍTEMS A EJECUTAR EN OBRA. 9
TABLA 3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA. 12
TABLA 4. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 12
TABLA 5. PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA 13
TABLA 6. PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 13
TABLA 7. CDP – CRP SALDO PRESUPUESTAL..... 14
TABLA 8. SEGUIMIENTO ANTICIPO 14
TABLA 9. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 15
TABLA 10. ACTAS PARCIALES..... 15
TABLA 11. PERSONAL ENTERRITORIO. 16
TABLA 12. PERSONAL INTERVENTORÍA. 16
TABLA 13. PERSONAL CONTRATISTA. 16
TABLA 14. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y OFIMÁTICOS. 17
TABLA 15. CONTROL DE EQUIPOS. 17
TABLA 16. RELACIÓN DE COMITES DE SEGUIMIENTO 18
TABLA 17. RELACIÓN DE COMITES DE APROBACIÒN 18
TABLA 18. RELACIÓN DE APROBACIÒN DE DIAGNÓSTICOS 19
TABLA 19. SEGUIMIENTO DE INTERVENCIÓN DE VIVIENDAS..... 22
TABLA 20. RELACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS. 48
TABLA 21. AVANCE DEL PROYECTO – INFORMES SEMANALES. 49
TABLA 22. GRÁFICA AVANCE ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 49
TABLA 23. CONTROL DE PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA..... 51
TABLA 24. CONTROL DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA..... 51
TABLA 25. CONTROL DE PERSONAL DEL PROYECTO..... 51

INTRODUCCIÓN

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

El proyecto nace de la necesidad de acceso a Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que se presenta en algunas comunidades que conforman el casco urbano del Municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar). Estas viviendas carecen de las instalaciones Hidrosanitarias internas impidiendo conectarse de manera efectiva a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado existentes en las vías de los barrios priorizados. Es por ello por lo que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio decidió implementar un Programa de Conexiones Intradomiciliarias que permita cubrir en un porcentaje mayor al actual, las deficiencias al acceso de agua potable y disminuir la posibilidad de adquirir enfermedades de tipo gastrointestinal.

En el alcance del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 934 de 2021 suscrito entre ENTerritorio y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el 07 de julio de 2021, se proyectan el CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR – 10, para proceder con el DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN, y con ellos la EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS. Durante todo este proceso debe llevarse a cabo PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 1,2 y 3.

1. INFORME EJECUTIVO

En el **Anexo 1,** se presenta el informe ejecutivo correspondiente al presente mes.

2. INFORMACIÒN GENERAL DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto busca “Fomentar el acceso a los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado mediante la construcción o mejoramiento de las conexiones Intradomiciliarias y domiciliarias de estos servicios cuando técnicamente se requieran, por medio de aportes presupuestales de la Nación y/o de las entidades territoriales en calidad de contrapartida que cubran sus costos, en los inmuebles objeto del programa.”

El beneficio principal del PCI es impactar de manera positiva en la calidad de vida y en la salud de los beneficiados, desarrollando hábitos saludables de higiene y disminuyendo el riesgo de adquirir enfermedades gastrointestinales, catalogadas como las principales causas de muerte a nivel mundial, adicionalmente, en la actualidad, impactará positivamente en la reducción del riesgo de contraer COVID 19.

El Proyecto pretende implementar las Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico, dirigido a atender las necesidades de instalación de equipos Hidrosanitarios en viviendas de la población de El Carmen de Bolívar, el cual fue priorizado por el ministerio de vivienda, ciudad y territorio, por lo anterior y de acuerdo con las obligaciones de ENTerritorio en el Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 934 de 2021 (Numeración ENTerritorio 221005).

2.2. LOCALIZACIÓN

El Carmen de Bolívar es un municipio del departamento de Bolívar, Colombia. Se ubica a 114 km al sudeste de Cartagena de Indias, capital departamental, en el sistema orográfico de los montes de María, muy cerca del litoral Caribe colombiano. Limita al norte con San Jacinto, al Este con Zambrano, Sureste con Córdoba Tetón, al Sur con Ovejas (sucre), al Suroeste con Chalán y Colosó (sucre) y al Oeste con San Onofre (Sucre).

TABLA 1. LUGAR DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES.

PROYECTO	DEPARTAMENTO	SUB-REGIÓN	DISTRITO/MUNICIPIO
PCI – EL CARMEN DE BOLÍVAR	**BOLÍVAR**	**MONTES DE MARÍA**	**EL CARMEN DE BOLÍVAR**

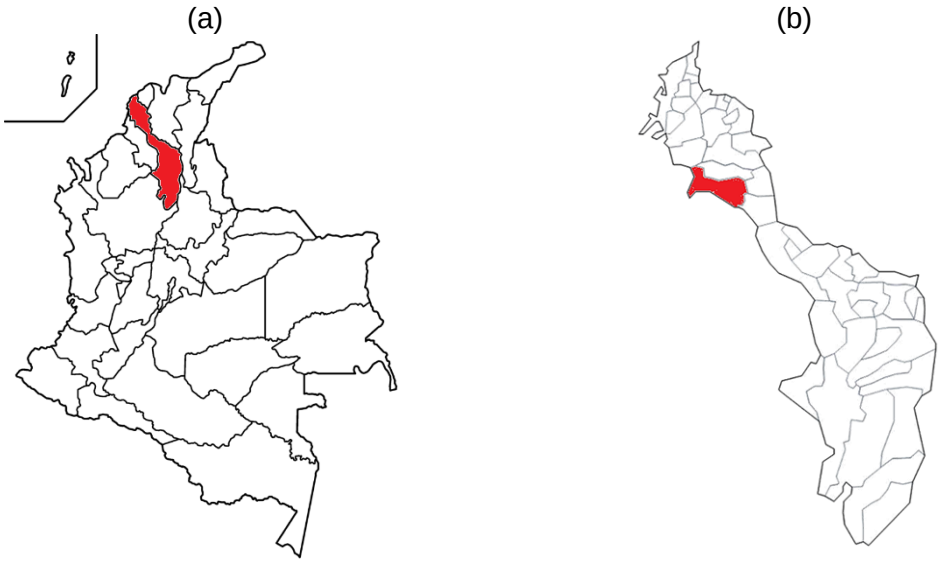


Ilustración 1 Localización del proyecto: (a) Departamento de Bolívar (b) Municipio de El Carmen de Bolívar.
Fuente: *Elaboración Propia - Google Earth.*

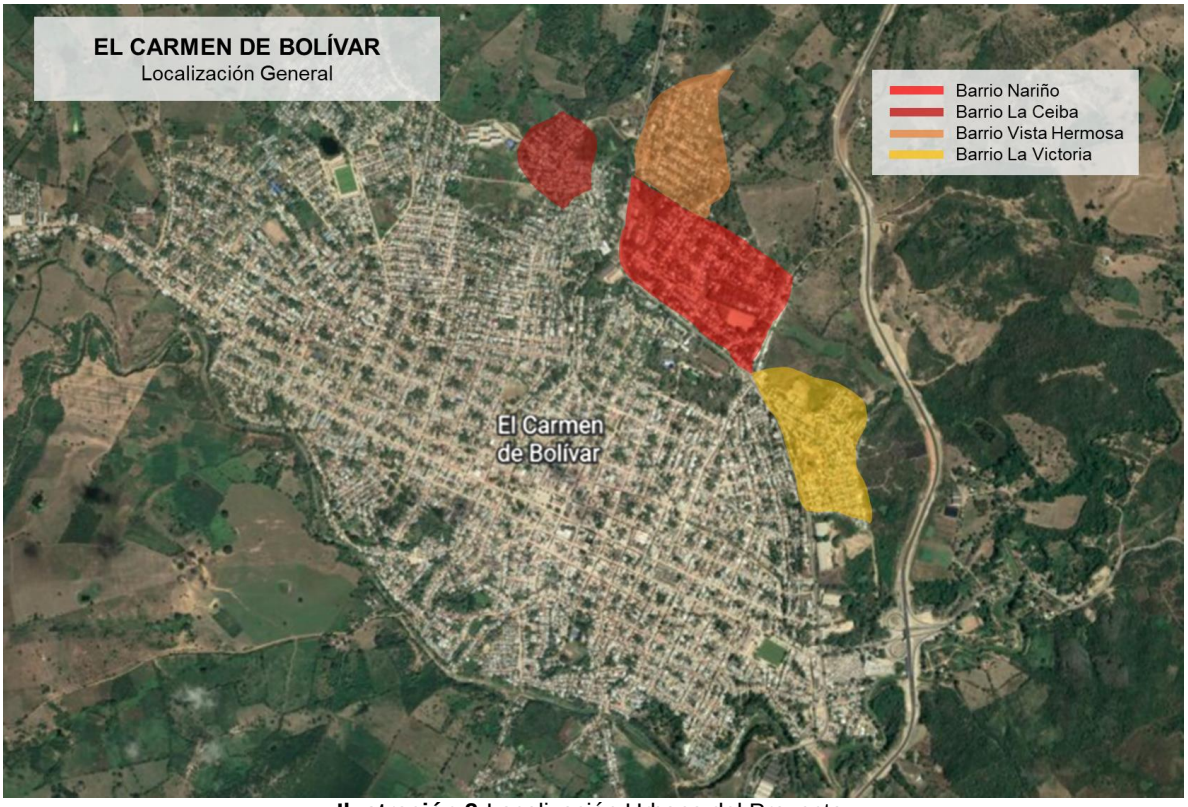


Ilustración 2 Localización Urbana del Proyecto.
Fuente: *Elaboración Propia - Google Earth.*

2.3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

De acuerdo con el Programa de Conexiones Intradomiciliarias se aprobaron los capítulos e ítems a ejecutar en obra descritos a continuación:

TABLA 2. CAPÍTULOS E ÍTEMS A EJECUTAR EN OBRA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
1	**PRELIMINAR**	
1.1	CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR – 10.	Und
1.2	DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.	Und
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	
	REDES HIDROSANITARIAS	
2.1	Redes intradomiciliarias de acueducto de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	ML
2.2	Redes intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	ML
2.3	Red Intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	ML
	PUNTOS HIDROSANITARIOS	
2.4	Punto HIDROSANITARIO **(INODORO).** Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und
2.5	Punto HIDROSANITARIO de **DUCHA.** Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und
2.6	Punto HIDROSANITARIO de **LAVAMANOS CON PEDESTAL.** Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und
2.7	Punto HIDROSANITARIO de **LAVADERO ESTANDAR** Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und
2.8	Punto HIDROSANITARIO de **LAVAPLATOS** Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und
	APARATOS	
2.9	Suministro e instalación de **SANITARIO (INODORO)**, incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und
2.10	Suministro e instalación de **LAVAMANOS CON PEDESTAL,** incluye grifería	Und
2.11	Suministro e instalación de **LAVADERO ESTANDAR** incluye llave de chorro macho para lavadero	Und
2.12	Suministro e instalación de **LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA** (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und
	CAJAS DE INSPECCIÓN	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para **INTRADOMICILIARIAS** (incluye acero de refuerzo)	m
	UNIDADES SANITARIAS	
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (**No incluye:** Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (**No incluye**: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (**No incluye:** Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre. (**No incluye**: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und
	CIMENTACIÓN	
3.5	Relleno compactado con material de sitio	m3
3.6	Relleno con material seleccionado (recebo)	m3
	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS	
3.7	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	m3
3.8	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	Kg
3.9	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2
3.10	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	m2
3.11	Concreto ciclópeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	m3
	MAMPOSTERIA	
3.12	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	m2
3.13	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und
	MORTEROS	
3.14	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	m2
3.15	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	m2
3.16	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso ducha de 1:4 y 0,03 metros de espesor	m2
	ELEMENTOS	
3.17	Suministro e instalación de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo y Pintura en Esmalte Sintético	Und
3.18	Suministro e instalación de juego de incrustaciones para baño	Und
3.19	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und
3.20	Suministro e instalación de registro de cierre metálico	Und

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
3.21	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metálico C120x60x1.2mm	m2
3.22	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	m
3.23	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red Intradomiciliaria.	Und
	ACABADOS	
3.24	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	m2
3.25	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2
3.26	Recuperación de piso esmaltado, incluye antisol y endurecedor.	m2
3.27	Enchape pared blanco (0.20 X 0.20) metros	m2
3.28	Enchape piso antideslizante blanco (0,20 x 0,20) metros	m2
3.29	Carburo blanco para muro exterior (3 manos)	m2
	CONEXIONES	
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und
	INTERVENCIONES VARIAS	
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	m2
	CAJAS DE INSPECCION	
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para **DOMICILIARIA**, (incluye acero de refuerzo)	m

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO

3.1. CONTRATOS SUSCRITOS

3.1.1. Contrato de Obra

TABLA 3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

CONTRATISTA:	HMM S.A.S.
NIT.	892.201.182-1
CONTRATO No.	2220569 de 2022
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIO ENRIQUE GARCIA DURAN
CONTACTO:	(5) 282 4223
FECHA DE INICIO	18 DE ABRIL DE 2022
SUSPENSIÓN N° 01:	N.A.
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 01	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	18 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No. 01 DEL CONTRATO:	N.A.
FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN No 01:	N.A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 6.120.295.592,00
ADICIÓN No. 01:	$ 1.828.773.582,67
VALOR FINAL DEL CONTRATO SEGÚN ADICIÓN No. 01:	$ 7.949.069.174,67
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES
PRÓRROGA No. 01:	TRES (3) MESES
PLAZO FINAL DEL CONTRATO SEGÚN PRÓRROGA No. 01:	ONCE (11) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	18 DE MARZO DE 2023

3.1.2. Contrato de Interventoría.

TABLA 4. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

CONTRATISTA:	DAIMCO S.A.S.
NIT.	900.021.482-1
CONTRATO No.	2220586 de 2022
REPRESENTANTE LEGAL:	SHEIRY CHARIN DAHJER HERRERA
CONTACTO:	BOGOTÁ 57 1 – 7020798
FECHA DE INICIO	18 DE ABRIL DE 2022
SUSPENSIÓN N° 01:	N.A.
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 01	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	18 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No. 01 DEL CONTRATO:	N.A.
FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN No 01:	N.A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 590.289.763,29
ADICIÓN No. 01:	$ 221.358.661,23
VALOR FINAL DEL CONTRATO SEGÚN ADICIÓN No. 01:	$ 811.648.424,52
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES
PRÓRROGA No. 01:	TRES (3) MESES
PLAZO FINAL DEL CONTRATO SEGÚN PRÓRROGA No. 01:	ONCE (11) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	18 DE MARZO DE 2023

En el **Anexo 4,** se presentan las actas de inicio suscritas

3.2. CONTROL DE PÓLIZAS

3.2.1. Pólizas contrato de Obra

TABLA 5. PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	65-45-10107448		
FECHA DE EXPEDICIÓN	27/04/2022		
TOMADOR	HMM S.A.S		
	VR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 1.836.088.677,60	2022/04/18	2023/08/18
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	$ 1.196.023.495,00	2022/04/18	2023/08/18
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 612.029.559,20	2022/04/18	2025/12/19
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	$ 612.029.559,20	SI AMPARA, 1 AÑO	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 1.836.088.677,60	SI AMAPA, 3 AÑOS	
RCE	$ 612.029.559,20	2022/04/18	2022/12/19
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 612.029.559,20	2022/04/18	2022/12/19
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 306.014.779,00	2022/04/18	2022/12/19
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 306.014.779,00	2022/04/18	2022/12/19
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	$ 306.014.779,00	2022/04/18	2022/12/19
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	$ 306.014.779,00	2022/04/18	2022/12/19
GASTOS MÉDICOS	$ 200.000.000,00	2022/04/18	2022/12/19
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	$ 612.029.559,20	2022/04/18	2022/12/19
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$ 612.029.559,20	2022/04/18	2022/12/19

3.2.2. Pólizas contrato de Interventoría

TABLA 6. PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	21-45-101366162		
FECHA DE EXPEDICIÓN	04/04/2022		
TOMADOR	DAIMCO S.A.S		
	VR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 177.086.928,99	2022/04/01	2023/08/01
CALIDAD DE LOS SERVICIOS	$ 118.057.952,66	2022/12/01	2027/12/01
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 29.514.488,16	2022/04/01	2025/12/01
RCE	$ 250.000.000,00	2022/04/18	2022/12/18
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 250.000.000,00	2022/04/18	2022/12/18
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 125.000.000,00	2022/04/18	2022/12/18
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	$ 125.000.000,00	2022/04/18	2022/12/18
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 125.000.000,00	2022/04/18	2022/12/18
GASTOS MÉDICOS	$ 200.000.000,00	2022/04/18	2022/12/18
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	$ 125.000.000,00	2022/04/18	2022/12/18

3.3. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO

3.3.1. Información de índole presupuestal.

El contrato de interventoría No. 2220586 tiene un valor total de $ 811.648.424,52 el cual hace parte del contrato suscrito entre el DAIMCO S.A.S. y ENTerritorio. Así mismo el contrato de Obra No. 2220569 tiene un valor total de $ 7.949.069.174,67 el cual hace parte del contrato suscrito entre el HMM S.A.S. y ENTerritorio.

TABLA 7. CDP – CRP SALDO PRESUPUESTAL

CONTRATO	CDP	CRP	SALDO PRESUPUESTAL
INTERVENTORIA	$ 622.133.098,00	$ 590.289.763,29	$ 31.843.334,71
OBRA	$ 6.127.518.229,01	$ 6.120.295.592,00	$ 7.222.637,01

3.3.2. Manejo de anticipo

El contrato de interventoría No. 2220586 no cuenta con anticipo, mientras que el contrato No. 2220569 cuenta con un anticipo de $1.196.023.494,20, el cual se encuentra consignado en la fiducia.

TABLA 8. SEGUIMIENTO ANTICIPO

CONTRATO	CUENTA	ENTIDAD	SALDO PRESUPUESTAL
INTERVENTORIA	N/A	N/A	N/A
OBRA	040-71942371	Bancolombia	$ 1.196.023.494,20

En el **Anexo 25,** se presenta el formato correspondiente al Plan de Inversión del Anticipo.

TABLA 9. DESEMBOLSOS DE ANTICIPO

CONTRATO	No.	FECHA	V. TOTAL
CTA OBRA	01	18/07/2022	$ 200.420.673,00
	02	26/07/2022	$ 210.338.003,00
	03	29/08/2022	$ 114.491.959,00
	04	20/09/2022	$ 310.270.980,70
	05	07/10/2022	$ 262.532.955,70
	06	08/11/2022	$ 80.724.134.79
	TOTAL		**$ 1.196.023.494,20**

TABLA 10. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

CONTRATO	AMORTIZADO			PENDIENTE POR AMORTIZAR
	Acta No.	Fecha	Valor	
INTERVENTORIA	N/A	N/A	N/A	N/A
OBRA	01	25/08/2022	$ 79.684.615,81	$ 1.116.338.878,39
	02	22/09/2022	$ 98.495.814,77	$ 1.017.843.063,62
	03	24/10/2022	$ 253.828.253,10	$ 764.014.810,52
	04	18/11/2022	$ 190.817.225,10	$ 573.197.585,42
	05	03/12/2022	$ 72.931.597,48	$ 500.265.987,94
	06	12/01/2023	$ 172.721.824,03	$ 327.544.163,91

3.3.3. Actas parciales.

A la fecha de corte del presente la interventoría y contratista presentan las siguientes actas.

TABLA 11. ACTAS PARCIALES

CONTRATO	No.	V. TOTAL	V. NETO
INTERVENTORIA	01	$ 59.028.976,33	$ 59.028.976,33
	02	$ 49.171.137,28	$ 49.171.137,28
	03	$ 29.514.488,16	$ 29.514.488,16
	04	$ 53.834.426,41	$ 53.834.426,41
	05	$ 92.144.232,05	$ 92.144.232,05
	06	$ 76.590.096,79	$ 76.590.096,79
	07	$ 47.518.325,94	$ 47.518.325,94
CTA OBRA	01	$ 372.277.394,00	$ 372.277.394,00
	02	$ 456.671.194,87	$ 456.671.194,87
	03	$ 1.169.261.678,84	$ 1.169.261.678,84
	04	$ 879.687.212,56	$ 879.687.212,56
	05	$ 334.834.961,32	$ 334.834.961,32
	06	$ 800.111.704,73	$ 800.111.704,73

En el **Anexo 3,** se presentan las actas parciales suscritas en este contrato.

3.4. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

3.4.1. Personal Autorizado por el Cliente

TABLA 12. PERSONAL ENTERRITORIO**.**

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE DEL PROFESIONAL
Gerente de Convenio	Carlos Andrés Bravo
Coordinadora	Karol Javela Pérez
Supervisor	Nicolás Rincón Vega
Supervisor Social.	Lina Otálvaro López

3.4.2. Personal de la Interventoría

TABLA 13. PERSONAL INTERVENTORÍA.

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE DEL PROFESIONAL
Director de Interventoría	William Jiménez Martínez
Residente de Interventoría	Jaime Alfonso Barrios Contreras
Profesional HSEQ	Carlos Alberto Morales Samper
Especialista Estructural	Robespierre Sánchez Manjarrés
Especialista Hidrosanitario	Alberto Federico Mouthon Bello
Profesional Social	Eliana Correa Marimón
Auxiliar Social	Lina Del Rosario Gamarra Moreno.
Profesional Costos Y Presupuestos	Juan Camilo Eduardo Pertuz Rodas
Inspector De Interventoría	Jesús José Pertuz Ortiz
Inspector De Interventoría	Luis Ángel Díaz Mendoza
Inspector De Interventoría	María Camila Orozco Camargo
Inspector De Interventoría	Jairo Leonel Gómez Anchundia

3.4.3. Personal del Contratista

TABLA 14. PERSONAL CONTRATISTA.

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE DEL PROFESIONAL
Director de Obra	Frank David Mancilla González
Residente de Obra	Manuel Garrido Severiche
Profesional PGIO	José Antonio Puentes Díaz
Profesional Técnico de Diagnósticos	Oscar Narváez Moguea
Especialista Estructural	José Guillermo Assia De La Rosa
Especialista Hidrosanitario	Irina Alejandra Támara
Profesional Social	Isabel Garces Puello
Profesional Social	Leidys Pérez Díaz
Profesional Calidad	Jesús Hernández Paternina
Profesional Costos y Presupuestos	Cristian Alberto Pérez Espitia
Maestro de Obra	Yhon Jairo Arrieta Paternina

3.5. CONTROL DE RECURSOS Y PERSONAL

3.5.1. Control de equipos

TABLA 15. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y OFIMÁTICOS.

EQUIPO REQUERIDO	EQUIPO APROBADO PARA EL PERIODO	EQUIPO UTILIZADO EN EL PERIODO
Equipos de Medición	Flexómetros y cinta métrica	Se cuenta con flexómetros y cintas métricas para la medición de las viviendas
Equipo Fotográfico	Teléfonos con cámara	Para obtener el Registro Fotográficos del estado actual de las viviendas.
Equipo de teléfono GPS	Teléfono GPS	Teniendo en cuenta que se debe tener la georreferenciación de las viviendas a intervenir se cuenta con teléfono con GPS.
Equipo de Computo	Computadores Portátiles	Para recolección y almacenamiento de la información, comunicación y entrega de los Diagnósticos.
Equipo de Impresión	Impresoras	Suministra la información recolectada, para entregas y comités.
Equipo de Red	Internet	Ayuda a la comunicación continua entre entidad contratante contratista e Interventoría, envío de información.
Plataformas Virtuales	Aplicaciones	Conexiones entre entidad contratante, contratista e interventoría para facilitar seguimiento de actividades
Equipos de Comunicación	Celulares	Para comunicación continua entre contratista, entidad contratante, interventoría y personal administrativo y en campo.
Consola de sonido	Equipo de perifoneo	Para la divulgación de información relacionada con programa a la comunidad

Durante este periodo no se realizó actividad con maquinaria pesada, debido a que las obras son actividades constructivas menores e internas en las viviendas. Se empleó el equipo relacionado a continuación:

TABLA 16. CONTROL DE EQUIPOS.

CANT	EQUIPO	OBSERVACIONES
1	Camioneta Chevrolet	Transporte de materiales a las viviendas. Vehículo con placa: STV 065
1	Camioneta Ford	Transporte de materiales a las viviendas. Vehículo con placa: CRS 560
5	Motocarro VAISAND DB300ZH	Transporte de materiales a las viviendas. Vehículos con placas: 941 AEO - 942 AEO - 265 AAR - 267 AAR - 290 AAR
1	Camión Chevrolet	Transporte de materiales a las viviendas. Vehículo con placa: LCL 482

En el **Anexo 14,** se presenta el formato correspondiente al control de relación y equipos utilizados en obra

3.5.2. Control de personal

En el **Anexo 16,** se presenta el formato correspondiente al control de personal del contratista e interventoría.

3.6. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO

3.6.1. Comités de Seguimiento.

Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023 se realizaron los comités de seguimiento relacionados en la siguiente tabla.

TABLA 17. RELACIÓN DE COMITES DE SEGUIMIENTO

ACTA No.	FECHA	TEMA	ASISTENTES
035	12/01/2023 - 13/01/2023	Visita de ENTerritorio. .	- Erika Gutiérrez Gaitán – ENTerritorio. Supervisora. - Maykoll Quevedo - ENTerritorio. Supervisor - William Jiménez M. – DAIMCO S.A.S. Director de Interventoría. - Jaime Barrios C. – DAIMCO S.A.S. Residente de Interventoría. - Eliana Correa M – DAIMCO S.A.S. Prof. social de Interventoría. - Frank Mancilla – HMM S.A.S. Director de Obra - Manuel Garrido – HMM S.A.S. Residente de Obra - Isabel Garces Puello – HMM S.A.S. Prof. Social de Obra
036	27/01/2023	Aspectos Técnicos y Sociales del contrato. Seguimiento Actividad 2, 3, 4 y Compromisos del proyecto. Semana 40 y Semana 41.	- Karol Javela Pérez – ENTerritorio. Coordinador - Nicolás Rincón Vega – ENTerritorio. Supervisor - Lina Otálvaro López. – ENTerritorio. Supervisora Social. - William Jiménez M. – DAIMCO S.A.S. Director de Interventoría. - Jaime Barrios C. – DAIMCO S.A.S. Residente de Interventoría. - Eliana Correa M – DAIMCO S.A.S. Prof. social de Interventoría. - Frank Mancilla – HMM S.A.S. Director de Obra - Manuel Garrido – HMM S.A.S. Residente de Obra - Isabel Garces Puello – HMM S.A.S. Prof. Social de Obra

***En el* Anexo 23,** se presentan las copias de las actas relacionadas

3.6.2. Comités de Aprobación.

Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023 se realizaron los comités de aprobación relacionados en la siguiente tabla.

TABLA 18. RELACIÓN DE COMITES DE APROBACIÒN

ACTA No.	FECHA	TEMA	ASISTENTES
048	11/01/2023	Comité de aprobación de diagnósticos	- William Jiménez Martínez – DAIMCO S.A.S. Director de Interventoría - Jaime Barrios Contreras. – DAIMCO S.A.S. Residente de Interventoría - María Camila Orozco C. – DAIMCO S.A.S. Inspector de Interventoría - Frank Mancilla G. – HMM S.A.S. Director de Obra - Manuel Garrido S. – HMM S.A.S. Residente de Obra - Oscar Narváez M. – HMM S.A.S. Profesional Técnico de Diagnósticos
049	13/01/2023	Comité de aprobación de diagnósticos	- William Jiménez Martínez – DAIMCO S.A.S. Director de Interventoría - Jaime Barrios Contreras. – DAIMCO S.A.S. Residente de Interventoría - María Camila Orozco C. – DAIMCO S.A.S. Inspector de Interventoría - Frank Mancilla G. – HMM S.A.S. Director de Obra - Manuel Garrido S. – HMM S.A.S. Residente de Obra - Oscar Narváez M. – HMM S.A.S. Profesional Técnico de Diagnósticos

ACTA No.	FECHA	TEMA	ASISTENTES
050	16/01/2023	Comité de aprobación de diagnósticos	- William Jiménez Martínez – DAIMCO S.A.S. Director de Interventoría - Jaime Barrios Contreras. – DAIMCO S.A.S. Residente de Interventoría - María Camila Orozco C. – DAIMCO S.A.S. Inspector de Interventoría - Frank Mancilla G. – HMM S.A.S. Director de Obra - Manuel Garrido S. – HMM S.A.S. Residente de Obra - Oscar Narváez M. – HMM S.A.S. Profesional Técnico de Diagnósticos

***En el* Anexo 23,** se presentan las copias de las actas relacionadas

TABLA 19. RELACIÓN DE APROBACIÒN DE DIAGNÓSTICOS

FECHA	VALOR TOTAL, DIAGNOSTICOS ($)	VALOR TOTAL OBRA ($)	NÚMERO DE DIAGNOSTICOS APROBADOS	VALOR TOTAL APROBADOS ($)	VALOR COMPROMETIDO ($)	SALDO POR COMPROMETER ($)
11/01/2023	$ 4.648.764,12	$ 170.462.299,85	26	$ 175.111.063,97	$ 6.104.631.249,30	$ 1.844.437.925,37
13/01/2023	$ 2.503.180,68	$ 86.704.473,15	14	$ 89.207.653,83	$ 6.193.838.903,13	$ 1.755.230.271,54
16/01/2023	$ 1.251.590,34	$ 50.552.106,35	7	$ 51.803.696,69	**$ 6.245.642.599,82**	**$ 1.703.426.574,85**
	$ 8.403.535,14	**$ 307.718.879,35**	**47**	**$ 316.122.414,49**		

3.6.3. Correspondencia

En el **Anexo 22,** se presentan la relación de correspondencia enviada y recibida.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

4.1. ACTIVIDADES DE ORDEN TÉCNICO

4.1.1. Actividad 1.

Actividad 1: Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el reglamento Colombiano de construcción sismo resistente NSR – 10.

La actividad No. 1 ha culminado, la interventoría dio aval a la actividad mediante los comunicados ICB-ENTERRITORIO-2022-019 con radicado No. 20224300185852 del 16 de mayo de 2022 e ICB-ENTERRITORIO-2022-022 con radicado No. 20224300191472 del 19 de mayo de 2022.

4.1.2. Actividad 2.

Actividad 2: Diagnóstico, Validación Preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención.

Esta actividad se inicia con el Plan de Gestión Social y sus líneas de intervención, para ello se realizaron socializaciones casa a casa, entrega de volantes con los requisitos documentales del Programa, perifoneo y demás estrategias de divulgación del Programa.

La elaboración de los diagnósticos en el Municipio de El Carmen de Bolívar se viene realizando por calles y carreras, que consiste en realizar barridos por calles y carreras mientras se visitan las viviendas. A la fecha se han realizado 414 visitas, en el barrio Nariño de las cuales se han aprobado 385, se recibió 1 renuncia al beneficio y se han clasificado 27 viviendas como no efectivas; en el barrio La Ceiba donde se han realizado 223 visitas, de las cuales se han aprobado 207 y se han clasificado 16 viviendas como no efectivas; en el barrio Vista Hermosa donde se han realizado 242 visitas, de las cuales se han aprobado 186 y se han clasificado 56 viviendas como no efectivas; y en el barrio La Victoria donde se han realizado 171 visitas, de las cuales se han aprobado 162, se recibieron 2 renuncias al beneficio y se han clasificado 4 viviendas como no efectivas

La actividad se desarrolla de la siguiente manera:

- ✓ Revisar la matriz principal, para la verificar que la vivienda se encuentre beneficiada por el PCI.
- ✓ Desinfección del personal, consiste en aplicarse alcohol en gel en las manos, alcohol liquido en la ropa
- ✓ Diligenciar el Formato PCI – 003, encuesta Potenciales Beneficiarios a cada una de las viviendas intervenidas, con el fin de categorizar las viviendas como unidades efectivas o no efectivas.
- ✓ Determinar las cantidades de puntos requeridos por la vivienda y tipo de intervención de acuerdo con los establecidos en el presente proceso.
- ✓ Realizar el registro fotográfico del antes de las viviendas, evidenciando las condiciones vulnerables de todos los aparatos existentes a intervenir, especialmente cuando se propone reposición por mal estado.

- ✓ Realizar el plan de intervención, con esquemas en los cuales se definieron la necesidad y obra a realizarse en cada vivienda.
- ✓ Definir el presupuesto de cada vivienda cumpliendo con las estructuras presupuestales.
- ✓ Obtener por parte del ocupante, propietario o poseedor de los inmuebles, la Firma del Anexo 2 de la Resolución 494 (Acta de concertación) plasmado en el formato PCI 009.
- ✓ Instalar los adhesivos en las puertas de cada vivienda visitada con la respectiva codificación.

Resumen de diagnósticos radicados entre el 01 de enero de 2023 y el 31 de enero de 2023:

- ✓ Se recibió por parte del contratista oficio sin consecutivo con fecha del 10 de enero de 2023, en el cual se relacionan 26 diagnósticos los cuales cumplen en su totalidad con los requisitos exigidos, por lo cual se les da aprobación a través de comité de aprobación el día 11 de enero de 2023.
- ✓ Se recibió por parte del contratista oficio sin consecutivo con fecha del 12 de enero de 2023, en el cual se relacionan 14 diagnósticos los cuales cumplen en su totalidad con los requisitos exigidos, por lo cual se les da aprobación a través de comité de aprobación el día 13 de enero de 2023.
- ✓ Se recibió por parte del contratista oficio sin consecutivo con fecha del 13 de enero de 2023, en el cual se relacionan 7 diagnósticos los cuales cumplen en su totalidad con los requisitos exigidos, por lo cual se les da aprobación a través de comité de aprobación el día 14 de enero de 2023.

En el **Anexo 5,** se presentan las actas de concertación aprobadas.
En el **Anexo 6,** se presentan las actas de vecindad levantadas.
En el **Anexo 11,** se presenta el registro fotográfico de las viviendas visitadas.

4.1.3. Actividad 3.

Actividad 3: Ejecución de las obras de las Conexiones Intradomiciliarias y Domiciliarias Acta de Entrega y Recibo de las obras.

A la fecha de corte de este informe el contratista de obra cuenta con 940 diagnósticos aprobados por la interventoría, 819 viviendas iniciadas, de las cuales 661 se encuentran terminadas, 55 listas sin enchape y 103 en ejecución. La interventoría realiza a diario verificación de las actividades contractuales y que se cumplan de acuerdo con las especificaciones Técnicas entregadas por ENTerritorio.

Se relaciona cuadro de ejecución y avance de obras hasta la fecha:

TABLA 20. SEGUIMIENTO DE INTERVENCIÓN DE VIVIENDAS.

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
1	B-CB-N-M20-VE-001	100%	Adecuación	$3.969.702,73	$3.969.702,73	7/08/2022	**TERMINADO**	**10/08/2022**	14/08/2022
2	B-CB-N-M18-VE-002	100%	Caseta T1	$7.481.934,04	$7.481.934,04	6/07/2022	**TERMINADO**	**11/07/2022**	17/07/2022
3	B-CB-N-M18-VE-003	100%	Adecuación	$1.941.065,78	$1.941.065,78	7/08/2022	**TERMINADO**	**10/08/2022**	14/08/2022
4	B-CB-N-M16-VE-004	260%	Adecuación	$1.447.511,07	$3.770.302,87	1/09/2022	**TERMINADO**	**4/09/2022**	25/09/2022
5	B-CB-N-M16-VE-005	100%	Caseta T1	$8.063.104,79	$8.063.104,79	7/06/2022	**TERMINADO**	**12/06/2022**	4/07/2022
6	B-CB-N-M16-VE-006	100%	Caseta T1	$6.953.020,57	$6.953.020,57	9/06/2022	**TERMINADO**	**14/06/2022**	4/07/2022
7	B-CB-N-M17-VE-007	100%	Adecuación	$3.943.068,88	$3.943.068,88	26/06/2022	**TERMINADO**	**29/06/2022**	17/07/2022
8	B-CB-N-M17-VE-008	100%	Adecuación	$1.273.147,99	$1.273.147,99	7/08/2022	**TERMINADO**	**10/08/2022**	17/08/2022
9	B-CB-N-M17-VE-009	100%	Caseta T1	$7.932.534,21	$7.932.534,21	10/06/2022	**TERMINADO**	**15/06/2022**	4/07/2022
10	B-CB-N-M17-VE-010	100%	Caseta T1	$8.213.565,95	$8.213.565,95	15/06/2022	**TERMINADO**	**20/06/2022**	4/07/2022
11	B-CB-N-M18-VE-011	122%	Adecuación	$3.280.683,37	$3.997.656,66	5/09/2022	**TERMINADO**	**8/09/2022**	25/09/2022
12	B-CB-N-M18-VE-012	100%	Caseta T1	$7.713.713,37	$7.713.713,37	14/06/2022	**TERMINADO**	**19/06/2022**	4/07/2022
13	B-CB-N-M19-VE-013	100%	Caseta T1	$7.656.760,90	$7.656.760,90	16/06/2022	**TERMINADO**	**21/06/2022**	4/07/2022
14	B-CB-N-M19-VE-014	171%	Adecuación	$2.281.138,76	$3.901.438,74	7/08/2022	**TERMINADO**	**10/08/2022**	25/09/2022
15	B-CB-N-M19-VE-015	128%	Adecuación	$2.994.464,57	$3.822.380,47	16/08/2022	**TERMINADO**	**19/08/2022**	30/08/2022
16	B-CB-N-M21-VE-016	100%	Caseta T1	$7.041.382,22	$7.041.382,22	14/06/2022	**TERMINADO**	**19/06/2022**	4/07/2022
17	B-CB-N-M21-VE-017	100%	Caseta T2	$5.725.640,17	$5.725.640,17	21/06/2022	**TERMINADO**	**26/06/2022**	4/07/2022
18	B-CB-N-M21-VE-018	100%	Caseta T2	$7.649.315,97	$7.649.315,97	21/06/2022	**TERMINADO**	**26/06/2022**	4/07/2022
19	B-CB-N-M21-VE-019	142%	Adecuación	$2.589.009,71	$3.664.107,35	16/08/2022	**TERMINADO**	**19/08/2022**	30/08/2022
20	B-CB-N-M21-VE-020	107%	Adecuación	$2.912.296,98	$3.112.829,14	23/07/2022	**TERMINADO**	**26/07/2022**	24/07/2022
21	B-CB-N-M02-VE-021	102%	Caseta T1	$3.289.899,35	$3.357.780,70	18/10/2022	**TERMINADO**	**23/10/2022**	30/10/2022
22	B-CB-N-M02-VE-022	100%	Caseta T1	$7.554.300,00	$7.554.300,00	16/06/2022	**TERMINADO**	**21/06/2022**	4/07/2022
23	B-CB-N-M02-VE-023	86%	Adecuación	$2.492.571,86	$2.150.533,18	7/08/2022	**TERMINADO**	**10/08/2022**	25/09/2022
24	B-CB-N-M02-VE-024	100%	Caseta T1	$6.890.204,61	$6.890.204,61	16/06/2022	**TERMINADO**	**21/06/2022**	4/07/2022
25	B-CB-N-M02-VE-025	119%	Adecuación	$3.175.408,65	$3.780.064,63	18/10/2022	**TERMINADO**	**21/10/2022**	30/10/2022
26	B-CB-N-M02-VE-026	100%	Caseta T1	$7.399.588,59	$7.399.588,59	18/06/2022	**TERMINADO**	**23/06/2022**	4/07/2022
27	B-CB-N-M02-VE-027	100%	Adecuación	$3.145.359,62	$3.145.359,62	7/08/2022	**TERMINADO**	**10/08/2022**	30/08/2022
28	B-CB-N-M04-VE-028	129%	Adecuación	$2.926.399,11	$3.773.839,42	16/08/2022	**TERMINADO**	**19/08/2022**	30/08/2022
29	B-CB-N-M04-VE-030	57%	Adecuación	$1.749.493,32	$1.003.071,35	8/10/2022	**TERMINADO**	**11/10/2022**	30/10/2022
30	B-CB-N-M04-VE-031	114%	Adecuación	$4.163.124,02	$4.743.713,45	8/09/2022	**TERMINADO**	**11/09/2022**	18/12/2022
31	B-CB-N-M04-VE-032	100%	Caseta T2	$6.890.540,49	$6.890.540,49	27/06/2022	**TERMINADO**	**2/07/2022**	9/07/2022

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
32	B-CB-N-M06-VE-033	100%	Caseta T1	$7.445.738,25	$7.445.738,25	15/07/2022	**TERMINADO**	**20/07/2022**	25/07/2022
33	B-CB-N-M04-VE-034	101%	Caseta T1	$7.557.058,79	$7.607.947,90	21/06/2022	**TERMINADO**	**26/06/2022**	4/07/2022
34	B-CB-N-M05-VE-035	100%	Caseta T1	$7.725.921,38	$7.725.921,38	23/06/2022	**TERMINADO**	**28/06/2022**	9/07/2022
35	B-CB-N-M05-VE-036	100%	Caseta T1	$7.159.051,42	$7.159.051,42	21/06/2022	**TERMINADO**	**26/06/2022**	4/07/2022
36	B-CB-N-M07-VE-037	184%	Adecuación	$2.530.285,02	$4.655.895,64	2/12/2022	**NO TERMINADO**	**5/12/2022**	
37	B-CB-N-M07-VE-038	100%	Caseta T1	$7.291.584,15	$7.291.584,15	1/07/2022	**TERMINADO**	**6/07/2022**	9/07/2022
38	B-CB-N-M04-VE-039	100%	Caseta T1	$7.892.847,86	$7.892.847,86	4/07/2022	**TERMINADO**	**9/07/2022**	19/07/2022
39	B-CB-N-M05-VE-040	82%	Caseta T1	$7.216.166,60	$5.943.482,59	1/09/2022	**TERMINADO**	**6/09/2022**	25/09/2022
40	B-CB-N-M04-VE-041	100%	Caseta T2	$5.382.242,21	$5.382.242,21	5/07/2022	**TERMINADO**	**10/07/2022**	17/07/2022
41	B-CB-N-M05-VE-042	170%	Caseta T1	$3.810.454,96	$6.491.970,51	14/09/2022	**TERMINADO**	**19/09/2022**	30/10/2022
42	B-CB-N-M04-VE-043	109%	Caseta T2	$5.268.643,62	$5.768.034,69	6/01/2023	**NO TERMINADO**	**11/01/2023**	
43	B-CB-N-M05-VE-044	100%	Caseta T1	$7.534.259,23	$7.534.259,23	26/06/2022	**TERMINADO**	**1/07/2022**	9/07/2022
44	B-CB-N-M05-VE-045	100%	Caseta T1	$6.506.628,47	$6.506.628,47	26/06/2022	**TERMINADO**	**1/07/2022**	9/07/2022
45	B-CB-N-M04-VE-046	100%	Caseta T2	$6.483.569,95	$6.483.569,95	24/06/2022	**TERMINADO**	**29/06/2022**	4/07/2022
46	B-CB-N-M04-VE-047	100%	Caseta T2	$6.292.406,50	$6.292.406,50	24/06/2022	**TERMINADO**	**29/06/2022**	4/07/2022
47	B-CB-N-M06-VE-048	25%	Adecuación	$4.050.702,70	$1.012.675,68	16/12/2022	**TERMINADO**	**19/12/2022**	15/01/2023
48	B-CB-N-M05-VE-049	106%	Adecuación	$3.086.791,66	$3.284.060,64	5/09/2022	**TERMINADO**	**8/09/2022**	9/10/2022
49	B-CB-N-M06-VE-050	110%	Caseta T1	$7.096.208,83	$7.791.328,84	7/08/2022	**TERMINADO**	**12/08/2022**	30/10/2022
50	B-CB-N-M07-VE-051	94%	Adecuación	$2.726.143,92	$2.569.006,50	10/01/2022	**NO TERMINADO**	**13/01/2022**	
51	B-CB-N-M08-VE-052	100%	Caseta T1	$8.047.309,12	$8.047.309,12	28/06/2022	**TERMINADO**	**3/07/2022**	4/07/2022
52	B-CB-N-M06-VE-053	100%	Caseta T1	$6.760.973,95	$6.760.973,95	1/07/2022	**TERMINADO**	**6/07/2022**	17/07/2022
53	B-CB-N-M08-VE-054	100%	Caseta T1	$6.857.811,82	$6.857.811,82	1/07/2022	**TERMINADO**	**6/07/2022**	9/07/2022
54	B-CB-N-M08-VE-055	100%	Caseta T1	$7.671.554,25	$7.671.554,25	1/07/2022	**TERMINADO**	**6/07/2022**	17/07/2022
55	B-CB-N-M08-VE-056	105%	Caseta T1	$7.769.282,32	$8.177.937,17	1/09/2022	**TERMINADO**	**6/09/2022**	30/10/2022
56	B-CB-N-M07-VE-057	101%	Caseta T1	$7.732.943,95	$7.783.687,95	1/10/2022	**TERMINADO**	**6/10/2022**	9/10/2022
57	B-CB-N-M06-VE-058	100%	Caseta T2	$6.697.105,43	$6.697.105,43	1/07/2022	**TERMINADO**	**6/07/2022**	17/07/2022
58	B-CB-N-M09-VE-059	95%	Caseta T1	$7.511.544,56	$7.135.967,33	30/08/2022	**TERMINADO**	**4/09/2022**	23/10/2022
59	B-CB-N-M10-VE-060	100%	Caseta T1	$7.561.885,91	$7.561.885,91	1/07/2022	**TERMINADO**	**6/07/2022**	9/07/2022
60	B-CB-N-M09-VE-061	100%	Caseta T1	$6.772.308,85	$6.772.308,85	7/07/2022	**TERMINADO**	**12/07/2022**	18/07/2022
61	B-CB-N-M10-VE-062	100%	Caseta T1	$6.118.878,54	$6.118.878,54	9/07/2022	**TERMINADO**	**14/07/2022**	19/07/2022
62	B-CB-N-M09-VE-063	92%	Adecuación	$5.152.296,93	$4.765.360,63	30/11/2022	**TERMINADO**	**3/12/2022**	15/01/2023

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
63	B-CB-N-M10-VE-064	216%	Adecuación	$3.482.814,44	$7.529.670,17	20/11/2022	**TERMINADO**	**23/11/2022**	4/12/2022
64	B-CB-N-M10-VE-065	100%	Caseta T1	$7.539.908,21	$7.539.908,21	13/07/2022	**TERMINADO**	**18/07/2022**	19/07/2022
65	B-CB-N-M11-VE-066	91%	Caseta T1	$7.673.904,85	$6.967.787,81	9/11/2022	**TERMINADO**	**14/11/2022**	15/01/2023
66	B-CB-N-M11-VE-067	134%	Caseta T1	$5.590.948,09	$7.501.404,72	1/11/2022	**TERMINADO**	**6/11/2022**	11/12/2022
67	B-CB-N-M41-VE-068	100%	Caseta T1	$7.267.983,56	$7.267.983,56	11/07/2022	**TERMINADO**	**16/07/2022**	19/07/2022
68	B-CB-N-M11-VE-069	100%	Caseta T2	$5.866.572,38	$5.866.572,38	11/07/2022	**TERMINADO**	**16/07/2022**	20/07/2022
69	B-CB-N-M06-VE-070	119%	Adecuación	$4.190.018,15	$4.994.426,06	4/12/2022	**NO TERMINADO**	**7/12/2022**	
70	B-CB-N-M09-VE-071	151%	Caseta T1	$4.997.176,61	$7.557.820,70	6/11/2022	**TERMINADO**	**11/11/2022**	4/12/2022
71	B-CB-N-M09-VE-072	100%	Caseta T1	$7.665.439,25	$7.665.439,25	15/08/2022	**TERMINADO**	**20/08/2022**	25/09/2022
72	B-CB-N-M18-VE-074	100%	Caseta T1	$7.221.567,66	$7.221.567,66	2/07/2022	**TERMINADO**	**7/07/2022**	17/07/2022
73	B-CB-N-M18-VE-075	100%	Caseta T1	$7.972.543,09	$7.972.543,09	26/06/2022	**TERMINADO**	**1/07/2022**	4/07/2022
74	B-CB-N-M16-VE-076	100%	Caseta T1	$7.608.540,16	$7.608.540,16	2/07/2022	**TERMINADO**	**7/07/2022**	17/07/2022
75	B-CB-N-M19-VE-077	100%	Caseta T1	$7.734.155,16	$7.734.155,16	9/07/2022	**TERMINADO**	**14/07/2022**	19/07/2022
76	B-CB-N-M18-VE-078	100%	Caseta T1	$6.774.174,14	$6.774.174,14	2/07/2022	**TERMINADO**	**7/07/2022**	17/07/2022
77	B-CB-N-M18-VE-079	100%	Caseta T1	$8.053.224,81	$8.053.224,81	4/07/2022	**TERMINADO**	**9/07/2022**	9/07/2022
78	B-CB-N-M20-VE-080	100%	Caseta T1	$7.022.267,26	$7.022.267,26	11/07/2022	**TERMINADO**	**16/07/2022**	31/07/2022
79	B-CB-N-M19-VE-081	100%	Caseta T1	$7.895.993,82	$7.895.993,82	5/07/2022	**TERMINADO**	**10/07/2022**	17/07/2022
80	B-CB-N-M22-VE-082	100%	Caseta T1	$6.614.437,32	$6.614.437,32	22/07/2022	**TERMINADO**	**27/07/2022**	16/08/2022
81	B-CB-N-M19-VE-083	100%	Caseta T1	$7.477.550,94	$7.477.550,94	6/07/2022	**TERMINADO**	**11/07/2022**	17/07/2022
82	B-CB-N-M22-VE-084	95%	Caseta T1	$7.679.083,58	$7.295.129,40	3/11/2022	**NO TERMINADO**	**8/11/2022**	
83	B-CB-N-M20-VE-085	102%	Caseta T1	$7.872.964,29	$8.014.752,04	15/07/2022	**TERMINADO**	**20/07/2022**	30/07/2022
84	B-CB-N-M19-VE-087	100%	Caseta T1	$7.953.298,01	$7.953.298,01	14/07/2022	**TERMINADO**	**19/07/2022**	3/08/2022
85	B-CB-N-M30-VE-088	100%	Caseta T1	$7.454.929,22	$7.454.929,22	15/07/2022	**TERMINADO**	**20/07/2022**	2/08/2022
86	B-CB-N-M16-VE-089	100%	Caseta T1	$7.510.305,06	$7.510.305,06	30/06/2022	**TERMINADO**	**5/07/2022**	9/07/2022
87	B-CB-N-M30-VE-090	100%	Caseta T1	$7.690.908,30	$7.690.908,30	19/07/2022	**TERMINADO**	**24/07/2022**	31/07/2022
88	B-CB-N-M16-VE-091	108%	Adecuación	$2.681.287,31	$2.886.136,58	7/12/2022	**TERMINADO**	**10/12/2022**	15/01/2023
89	B-CB-N-M30-VE-092	100%	Caseta T1	$7.704.038,45	$7.704.038,45	20/07/2022	**TERMINADO**	**25/07/2022**	1/08/2022
90	B-CB-N-M23-VE-093	100%	Caseta T1	$7.900.993,68	$7.900.993,68	1/07/2022	**TERMINADO**	**6/07/2022**	9/07/2022
91	B-CB-N-M30-VE-094	100%	Caseta T2	$5.945.233,74	$5.945.233,74	11/07/2022	**TERMINADO**	**16/07/2022**	31/07/2022
92	B-CB-N-M23-VE-095	100%	Caseta T1	$7.605.104,53	$7.605.104,53	2/07/2022	**TERMINADO**	**7/07/2022**	9/07/2022
93	B-CB-N-M30-VE-096	100%	Caseta T1	$7.126.858,52	$7.126.858,52	22/07/2022	**TERMINADO**	**27/07/2022**	21/08/2022

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
94	B-CB-N-M23-VE-097	65%	Adecuación	$6.210.273,49	$4.040.743,87	16/11/2022	**TERMINADO**	**19/11/2022**	15/01/2023
95	B-CB-N-M30-VE-098	100%	Caseta T1	$7.396.524,24	$7.396.524,24	11/07/2022	**TERMINADO**	**16/07/2022**	20/07/2022
96	B-CB-N-M30-VE-100	100%	Adecuación	$3.499.532,79	$3.486.381,98	4/12/2022	**TERMINADO**	**7/12/2022**	15/01/2023
97	B-CB-N-M22-VE-101	103%	Caseta T1	$6.645.995,09	$6.829.830,21	14/07/2022	**TERMINADO**	**19/07/2022**	31/07/2022
98	B-CB-N-M30-VE-102	100%	Caseta T1	$6.995.767,14	$6.995.767,14	15/07/2022	**TERMINADO**	**20/07/2022**	24/07/2022
99	B-CB-N-M29-VE-103	95%	Adecuación	$6.995.767,14	$6.645.978,78	19/09/2022	**TERMINADO**	**22/09/2022**	9/10/2022
100	B-CB-N-M29-VE-104	95%	Caseta T1	$6.995.767,14	$6.645.978,78	2/08/2022	**TERMINADO**	**7/08/2022**	9/10/2022
101	B-CB-N-M30-VE-105	100%	Caseta T1	$6.752.771,85	$6.752.771,85	16/07/2022	**TERMINADO**	**21/07/2022**	31/07/2022
102	B-CB-N-M20-VE-107	100%	Caseta T1	$7.619.764,75	$7.636.577,83	23/07/2022	**TERMINADO**	**28/07/2022**	2/08/2022
103	B-CB-N-M29-VE-106	100%	Caseta T1	$6.727.393,17	$6.727.393,17	21/07/2022	**TERMINADO**	**26/07/2022**	31/07/2022
104	B-CB-N-M29-VE-108	103%	Caseta T1	$6.509.525,31	$6.690.742,50	21/07/2022	**TERMINADO**	**26/07/2022**	5/09/2022
105	B-CB-N-M04-VE-109	109%	Adecuación	$3.769.811,09	$4.117.182,92	21/10/2022	**TERMINADO**	**24/10/2022**	20/11/2022
106	B-CB-N-M19-VE-110	196%	Caseta T1	$3.782.163,82	$7.412.993,29		**TERMINADO**	**5/01/1900**	30/10/2022
107	B-CB-N-M20-VE-111	100%	Caseta T1	$7.574.979,38	$7.574.979,38	12/07/2022	**TERMINADO**	**17/07/2022**	20/07/2022
108	B-CB-N-M19-VE-112	100%	Caseta T1	$7.080.057,71	$7.080.057,71	13/07/2022	**TERMINADO**	**18/07/2022**	21/07/2022
109	B-CB-N-M29-VE-113	100%	Caseta T1	$7.110.972,36	$7.110.972,36	16/07/2022	**TERMINADO**	**21/07/2022**	1/08/2022
110	B-CB-N-M20-VE-114	100%	Caseta T1	$7.067.384,78	$7.067.384,78	11/07/2022	**TERMINADO**	**16/07/2022**	19/07/2022
111	B-CB-N-M29-VE-115	100%	Caseta T1	$7.398.324,37	$7.398.324,37	21/07/2022	**TERMINADO**	**26/07/2022**	2/10/2022
112	B-CB-N-M19-VE-116	100%	Caseta T1	$7.395.074,12	$7.395.074,12	13/07/2022	**TERMINADO**	**18/07/2022**	31/07/2022
113	B-CB-N-M29-VE-117	110%	Adecuación	$3.244.599,69	$3.579.064,89	8/09/2022	**TERMINADO**	**11/09/2022**	19/09/2022
114	B-CB-N-M29-VE-118	100%	Caseta T1	$7.515.706,29	$7.515.706,29	12/07/2022	**TERMINADO**	**17/07/2022**	31/07/2022
115	B-CB-N-M22-VE-119	100%	Caseta T1	$7.449.555,42	$7.449.555,42	8/09/2022	**TERMINADO**	**13/09/2022**	9/10/2022
116	B-CB-N-M22-VE-120	100%	Caseta T2	$6.908.023,67	$6.908.023,67	15/07/2022	**TERMINADO**	**20/07/2022**	31/07/2022
117	B-CB-N-M22-VE-121	96%	Caseta T1	$7.726.065,21	$7.405.644,04	31/07/2022	**TERMINADO**	**5/08/2022**	25/09/2022
118	B-CB-N-M22-VE-122	97%	Caseta T1	$7.603.368,74	$7.344.014,61	2/08/2022	**TERMINADO**	**7/08/2022**	9/10/2022
119	B-CB-N-M17-VE-123	77%	Adecuación	$3.499.958,60	$2.689.912,21	18/09/2022	**TERMINADO**	**21/09/2022**	25/09/2022
120	B-CB-N-M23-VE-124	95%	Caseta T2	$7.603.739,30	$7.223.552,34	21/07/2022	**TERMINADO**	**26/07/2022**	9/10/2022
121	B-CB-N-M23-VE-125	113%	Caseta T2	$5.971.711,82	$6.768.512,07	21/07/2022	**TERMINADO**	**26/07/2022**	14/08/2022
122	B-CB-N-M23-VE-126	101%	Caseta T1	$7.274.897,66	$7.370.077,61	21/07/2022	**TERMINADO**	**26/07/2022**	14/08/2022
123	B-CB-N-M23-VE-127	101%	Caseta T2	$6.279.806,34	$6.324.767,59	21/07/2022	**TERMINADO**	**26/07/2022**	14/08/2022
124	B-CB-N-M23-VE-128	101%	Caseta T1	$7.499.824,24	$7.604.934,85	21/07/2022	**TERMINADO**	**26/07/2022**	14/08/2022

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
125	B-CB-N-M23-VE-129	95%	Adecuación	$3.445.220,00	$3.278.303,85	1/08/2022	**TERMINADO**	**4/08/2022**	10/08/2022
126	B-CB-N-M16-VE-130	100%	Caseta T1	$7.603.151,01	$7.625.369,65	22/07/2022	**TERMINADO**	**27/07/2022**	14/08/2022
127	B-CB-N-M16-VE-131	100%	Caseta T1	$7.513.645,49	$7.513.645,49	21/07/2022	**TERMINADO**	**26/07/2022**	14/08/2022
128	B-CB-N-M16-VE-132	94%	Caseta T1	$8.496.612,33	$7.984.826,62	21/07/2022	**TERMINADO**	**26/07/2022**	14/08/2022
129	B-CB-N-M16-VE-133	67%	Adecuación	$3.790.644,00	$2.542.057,78	14/10/2022	**TERMINADO**	**17/10/2022**	20/11/2022
130	B-CB-N-M24-VE-134	100%	Caseta T1	$6.786.534,02	$6.786.534,02	21/07/2022	**TERMINADO**	**26/07/2022**	31/07/2022
131	B-CB-N-M28-VE-135	100%	Caseta T1	$8.037.559,01	$8.037.559,01	21/07/2022	**TERMINADO**	**26/07/2022**	14/08/2022
132	B-CB-N-M24-VE-136	102%	Caseta T1	$7.759.234,12	$7.888.383,80	21/07/2022	**TERMINADO**	**26/07/2022**	1/08/2022
133	B-CB-N-M24-VE-137	100%	Caseta T1	$7.392.203,11	$7.392.203,11	21/07/2022	**TERMINADO**	**26/07/2022**	4/08/2022
134	B-CB-N-M24-VE-138	100%	Caseta T1	$7.192.735,86	$7.192.735,86	21/07/2022	**TERMINADO**	**26/07/2022**	9/08/2022
135	B-CB-N-M24-VE-139	93%	Adecuación	$2.804.079,17	$2.602.584,80	2/12/2022	**TERMINADO**	**5/12/2022**	15/01/2023
136	B-CB-N-M24-VE-140	239%	Caseta T1	$2.732.060,54	$6.540.043,92	2/12/2022	**TERMINADO**	**7/12/2022**	29/01/2023
137	B-CB-N-M28-VE-141	107%	Caseta T1	$7.531.022,33	$8.090.860,79	21/07/2022	**TERMINADO**	**26/07/2022**	9/10/2022
138	B-CB-N-M28-VE-142	235%	Caseta T1	$3.233.538,95	$7.606.388,37	26/10/2022	**TERMINADO**	**31/10/2022**	15/01/2023
139	B-CB-N-M28-VE-143	100%	Caseta T1	$7.525.776,94	$7.525.776,94	27/07/2022	**TERMINADO**	**1/08/2022**	14/08/2022
140	B-CB-N-M28-VE-144	99%	Caseta T1	$7.260.716,80	$7.196.151,18	14/10/2022	**TERMINADO**	**19/10/2022**	13/11/2022
141	B-CB-N-M28-VE-145	96%	Caseta T1	$7.795.034,08	$7.449.018,44		**TERMINADO**		13/11/2022
142	B-CB-N-M28-VE-146	93%	Caseta T1	$8.299.177,80	$7.759.385,29	14/08/2022	**TERMINADO**	**19/08/2022**	30/08/2022
143	B-CB-N-M35-VE-147	100%	Caseta T1	$7.227.026,84	$7.227.026,84	27/07/2022	**TERMINADO**	**1/08/2022**	9/08/2022
144	B-CB-N-M35-VE-148	106%	Caseta T4	$8.296.700,34	$8.792.124,08	28/07/2022	**TERMINADO**	**2/08/2022**	2/08/2022
145	B-CB-N-M35-VE-149	97%	Caseta T1	$7.679.864,56	$7.480.545,49	20/09/2022	**TERMINADO**	**25/09/2022**	9/10/2022
146	B-CB-N-M35-VE-150	102%	Caseta T1	$7.785.418,13	$7.904.685,97	28/07/2022	**TERMINADO**	**2/08/2022**	27/11/2022
147	B-CB-N-M35-VE-151	100%	Caseta T1	$6.765.763,36	$6.765.763,36	30/07/2022	**TERMINADO**	**4/08/2022**	5/09/2022
148	B-CB-N-M35-VE-152	97%	Caseta T1	$7.762.557,69	$7.505.122,25	30/07/2022	**TERMINADO**	**4/08/2022**	9/10/2022
149	B-CB-N-M34-VE-153	107%	Caseta T1	$7.454.780,26	$8.013.461,83		**TERMINADO**		23/10/2022
150	B-CB-N-M35-VE-154	95%	Caseta T1	$9.355.773,26	$8.887.984,60	28/07/2022	**TERMINADO**	**2/08/2022**	25/09/2022
151	B-CB-N-M35-VE-155	97%	Caseta T1	$7.491.011,70	$7.284.332,43	10/08/2022	**TERMINADO**	**15/08/2022**	9/10/2022
152	B-CB-N-M35-VE-156	100%	Caseta T1	$6.577.720,90	$6.577.720,90	28/07/2022	**TERMINADO**	**2/08/2022**	14/08/2022
153	B-CB-N-M36-VE-157	100%	Caseta T1	$7.264.669,67	$7.264.669,67	28/07/2022	**TERMINADO**	**2/08/2022**	2/08/2022
154	B-CB-N-M36-VE-158	100%	Caseta T1	$6.914.609,55	$6.914.609,55	30/07/2022	**TERMINADO**	**4/08/2022**	14/08/2022
155	B-CB-N-M37-VE-159	101%	Caseta T1	$7.541.795,32	$7.604.070,24	6/10/2022	**TERMINADO**	**11/10/2022**	15/01/2023

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
156	B-CB-N-M36-VE-160	100%	Caseta T1	$8.002.298,58	$8.002.298,58	31/07/2022	**TERMINADO**	**5/08/2022**	9/08/2022
157	B-CB-N-M38-VE-161	101%	Caseta T1	$7.818.320,74	$7.908.666,91	8/08/2022	**TERMINADO**	**13/08/2022**	2/10/2022
158	B-CB-N-M37-VE-162	100%	Caseta T1	$7.424.030,72	$7.424.030,72	31/07/2022	**TERMINADO**	**5/08/2022**	25/09/2022
159	B-CB-N-M37-VE-163	95%	Caseta T1	$7.597.016,14	$7.217.165,33	3/08/2022	**TERMINADO**	**8/08/2022**	27/11/2022
160	B-CB-N-M37-VE-164	115%	Caseta T1	$6.894.085,75	$7.920.886,00	31/07/2022	**TERMINADO**	**5/08/2022**	2/10/2022
161	B-CB-N-M38-VE-165	95%	Caseta T1	$8.429.655,54	$8.008.172,76		**TERMINADO**		15/01/2023
162	B-CB-N-M13-VE-166	100%	Caseta T1	$7.171.469,17	$7.171.469,17	16/08/2022	**TERMINADO**	**21/08/2022**	30/08/2022
163	B-CB-N-M27-VE-167	95%	Caseta T1	$8.080.596,20	$7.676.566,39		**TERMINADO**		23/10/2022
164	B-CB-N-M38-VE-168	99%	Caseta T1	$7.320.986,92	$7.256.307,19	3/09/2022	**TERMINADO**	**8/09/2022**	2/10/2022
165	B-CB-N-M13-VE-169	100%	Caseta T1	$7.458.314,55	$7.458.314,55	3/08/2022	**TERMINADO**	**8/08/2022**	21/08/2022
166	B-CB-N-M13-VE-170	90%	Caseta T2	$8.229.125,93	$7.406.213,34	5/10/2022	**TERMINADO**	**10/10/2022**	20/11/2022
167	B-CB-N-M13-VE-171	114%	Adecuación	$2.886.249,42	$3.300.006,73	4/12/2022	**NO TERMINADO**	**7/12/2022**	
168	B-CB-N-M13-VE-172	99%	Caseta T1	$7.270.587,03	$7.224.770,69	27/09/2022	**TERMINADO**	**2/10/2022**	20/11/2022
169	B-CB-N-M13-VE-173	197%	Caseta T1	$3.932.858,21	$7.763.734,57	14/11/2022	**TERMINADO**	**19/11/2022**	15/01/2023
170	B-CB-N-M06-VE-174	102%	Adecuación	$4.884.354,45	$4.963.132,21	12/12/2022	**TERMINADO**	**15/12/2022**	15/01/2023
171	B-CB-N-M13-VE-175	90%	Caseta T1	$9.012.007,19	$8.110.806,47	27/09/2022	**TERMINADO**	**2/10/2022**	15/01/2023
172	B-CB-N-M27-VE-176	100%	Caseta T1	$7.720.615,77	$7.686.009,90	18/10/2022	**TERMINADO**	**23/10/2022**	15/01/2023
173	B-CB-N-M27-VE-177	87%	Caseta T1	$7.314.946,45	$6.370.708,86	6/10/2022	**TERMINADO**	**11/10/2022**	15/01/2023
174	B-CB-N-M27-VE-178	100%	Caseta T1	$7.935.982,03	$7.971.053,20	6/10/2022	**TERMINADO**	**11/10/2022**	15/01/2023
175	B-CB-N-M13-VE-179	109%	Caseta T1	$7.325.841,56	$8.013.231,54	28/10/2022	**TERMINADO**	**2/11/2022**	18/12/2022
176	B-CB-N-M27-VE-180	102%	Caseta T1	$7.895.371,03	$8.067.169,69	11/10/2022	**TERMINADO**	**16/10/2022**	15/01/2023
177	B-CB-N-M13-VE-181	98%	Caseta T1	$7.612.716,77	$7.495.452,84	6/10/2022	**TERMINADO**	**11/10/2022**	15/01/2023
178	B-CB-N-M38-VE-182	104%	Caseta T1	$7.180.420,36	$7.488.348,86	11/10/2022	**TERMINADO**	**16/10/2022**	15/01/2023
179	B-CB-N-M13-VE-183	90%	Caseta T1	$7.784.688,23	$7.006.219,41	28/09/2022	**TERMINADO**	**3/10/2022**	15/01/2023
180	B-CB-N-M27-VE-184	108%	Caseta T1	$7.542.683,94	$8.115.011,68	3/11/2022	**TERMINADO**	**8/11/2022**	15/01/2023
181	B-CB-N-M35-VE-185	95%	Caseta T1	$8.427.309,71	$8.005.944,22		**TERMINADO**		9/10/2022
182	B-CB-N-M13-VE-186	99%	Caseta T1	$8.168.190,01	$8.124.707,89	6/10/2022	**TERMINADO**	**11/10/2022**	15/01/2023
183	B-CB-N-M36-VE-187	103%	Caseta T1	$7.404.436,21	$7.648.549,22	7/12/2022	**TERMINADO**	**12/12/2022**	15/01/2023
184	B-CB-N-M36-VE-188	96%	Caseta T1	$8.112.332,81	$7.776.043,74	7/12/2022	**TERMINADO**	**12/12/2022**	15/01/2023
185	B-CB-N-M28-VE-189	90%	Caseta T1	$7.764.697,67	$6.993.823,27	24/10/2022	**TERMINADO**	**29/10/2022**	22/01/2023
186	B-CB-N-M25-VE-190	98%	Caseta T1	$7.542.159,42	$7.373.776,73	22/09/2022	**TERMINADO**	**27/09/2022**	20/11/2022

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
187	B-CB-N-M27-VE-191	111%	Caseta T1	$6.727.993,31	$7.440.443,08	21/10/2022	**TERMINADO**	**26/10/2022**	18/12/2022
188	B-CB-N-M37-VE-192	103%	Caseta T1	$7.678.430,98	$7.903.849,94	11/10/2022	**TERMINADO**	**16/10/2022**	15/01/2023
189	B-CB-N-M38-VE-193	118%	Caseta T1	$6.711.195,46	$7.886.909,00	21/10/2022	**TERMINADO**	**26/10/2022**	20/11/2022
190	B-CB-N-M25-VE-194	95%	Caseta T1	$9.326.944,17	$8.860.596,96	21/09/2022	**TERMINADO**	**26/09/2022**	15/01/2023
191	B-CB-N-M25-VE-195	101%	Caseta T1	$7.276.590,31	$7.344.831,76	21/09/2022	**TERMINADO**	**26/09/2022**	20/11/2022
192	B-CB-N-M26-VE-196	161%	Adecuación	$2.949.510,67	$4.749.730,81	10/12/2022	**TERMINADO**	**13/12/2022**	15/01/2023
193	B-CB-N-M27-VE-197	96%	Caseta T1	$7.868.312,33	$7.536.226,00	21/09/2022	**TERMINADO**	**26/09/2022**	20/11/2022
194	B-CB-N-M26-VE-198	103%	Adecuación	$7.105.142,43	$7.309.418,60	13/09/2022	**TERMINADO**	**16/09/2022**	15/01/2023
195	B-CB-N-M40-VE-199	104%	Caseta T1	$7.783.435,41	$8.125.444,25	13/09/2022	**TERMINADO**	**18/09/2022**	23/10/2022
196	B-CB-N-M26-VE-201	93%	Caseta T1	$8.043.429,93	$7.507.910,00	19/08/2022	**TERMINADO**	**24/08/2022**	30/10/2022
197	B-CB-N-M26-VE-202	95%	Caseta T1	$8.666.869,36	$8.233.525,89	27/09/2022	**TERMINADO**	**2/10/2022**	30/10/2022
198	B-CB-N-M39-VE-203	94%	Caseta T1	$7.992.296,31	$7.510.901,88	21/09/2022	**TERMINADO**	**26/09/2022**	15/01/2023
199	B-CB-N-M40-VE-204	97%	Caseta T1	$7.853.612,54	$7.616.404,23		**TERMINADO**		30/10/2022
200	B-CB-N-M40-VE-205	94%	Caseta T1	$7.808.346,79	$7.340.783,52	21/09/2022	**TERMINADO**	**26/09/2022**	30/10/2022
201	B-CB-N-M40-VE-206	90%	Caseta T1	$7.659.470,07	$6.893.523,06	30/09/2022	**TERMINADO**	**5/10/2022**	30/10/2022
202	B-CB-N-M40-VE-207	90%	Caseta T1	$7.930.395,18	$7.137.355,66	14/09/2022	**TERMINADO**	**19/09/2022**	30/10/2022
203	B-CB-N-M26-VE-209	90%	Caseta T1	$8.486.474,81	$7.604.544,07	22/09/2022	**TERMINADO**	**27/09/2022**	23/10/2022
204	B-CB-N-M40-VE-210	94%	Caseta T1	$7.677.243,56	$7.182.420,51	13/09/2022	**TERMINADO**	**18/09/2022**	30/10/2022
205	B-CB-N-M14-VE-211	95%	Caseta T1	$7.552.754,06	$7.152.605,06	13/09/2022	**TERMINADO**	**18/09/2022**	20/11/2022
206	B-CB-N-M14-VE-212	100%	Caseta T1	$7.714.264,62	$7.746.407,10	13/09/2022	**TERMINADO**	**18/09/2022**	20/11/2022
207	B-CB-N-M26-VE-213	109%	Caseta T1	$7.421.509,46	$8.076.083,49	16/09/2022	**TERMINADO**	**21/09/2022**	15/01/2023
208	B-CB-N-M14-VE-214	94%	Caseta T1	$7.871.007,20	$7.367.864,93	16/09/2022	**TERMINADO**	**21/09/2022**	20/11/2022
209	B-CB-N-M14-VE-215	95%	Caseta T1	$8.053.543,96	$7.650.866,76	15/09/2022	**TERMINADO**	**20/09/2022**	2/10/2022
210	B-CB-N-M14-VE-216	102%	Caseta T1	$7.435.343,20	$7.548.734,84	16/09/2022	**TERMINADO**	**21/09/2022**	23/10/2022
211	B-CB-N-M14-VE-217	104%	Caseta T1	$6.936.906,58	$7.188.001,75	3/10/2022	**TERMINADO**	**8/10/2022**	30/10/2022
212	B-CB-N-M14-VE-218	95%	Adecuación	$3.156.776,05	$2.995.414,76	3/10/2022	**TERMINADO**	**6/10/2022**	13/11/2022
213	B-CB-N-M40-VE-219	93%	Caseta T1	$7.878.058,82	$7.346.651,11		**TERMINADO**		23/10/2022
214	B-CB-N-M40-VE-220	114%	Adecuación	$2.445.719,53	$2.780.636,21	10/12/2022	**TERMINADO**	**13/12/2022**	15/01/2023
215	B-CB-N-M40-VE-221	127%	Caseta T1	$6.294.804,86	$8.006.804,70		**TERMINADO**		23/10/2022
216	B-CB-N-M40-VE-222	70%	Caseta T1	$3.971.613,32	$2.765.109,02	7/10/2022	**TERMINADO**	**12/10/2022**	30/10/2022
217	B-CB-N-M40-VE-223	110%	Caseta T1	$7.498.041,95	$8.212.338,69		**TERMINADO**		23/10/2022

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
218	B-CB-N-M40-VE-224	90%	Caseta T1	$9.102.909,73	$8.192.618,76	11/09/2022	**TERMINADO**	**16/09/2022**	23/10/2022
219	B-CB-N-M40-VE-225	93%	Caseta T1	$8.247.151,14	$7.649.978,11	23/10/2022	**TERMINADO**	**28/10/2022**	30/10/2022
220	B-CB-N-M40-VE-226	102%	Caseta T1	$7.691.185,50	$7.810.730,32		**TERMINADO**		23/10/2022
221	B-CB-N-M40-VE-227	125%	Caseta T1	$6.452.183,34	$8.075.944,27		**TERMINADO**		23/10/2022
222	B-CB-N-M40-VE-228	90%	Caseta T1	$9.599.375,32	$8.639.437,79		**TERMINADO**		23/10/2022
223	B-CB-N-M41-VE-229	102%	Caseta T1	$7.979.476,74	$8.132.227,96		**TERMINADO**		30/10/2022
224	B-CB-N-M41-VE-230	90%	Caseta T1	$8.326.670,16	$7.494.003,14		**TERMINADO**		30/10/2022
225	B-CB-N-M41-VE-231	96%	Caseta T1	$7.973.566,99	$7.684.344,47		**TERMINADO**		30/10/2022
226	B-CB-N-M41-VE-232	103%	Caseta T1	$7.997.329,65	$8.198.153,78		**TERMINADO**		30/10/2022
227	B-CB-N-M41-VE-233	90%	Caseta T1	$7.922.806,99	$7.130.526,29	11/10/2022	**TERMINADO**	**16/10/2022**	30/10/2022
228	B-CB-N-M41-VE-234	92%	Caseta T1	$7.673.435,92	$7.076.935,70		**TERMINADO**		30/10/2022
229	B-CB-N-M41-VE-235	90%	Caseta T1	$8.645.800,54	$7.781.220,49		**TERMINADO**		23/10/2022
230	B-CB-N-M41-VE-236	110%	Caseta T1	$6.650.580,56	$7.328.120,69		**TERMINADO**		23/10/2022
231	B-CB-N-M14-VE-237	90%	Caseta T1	$7.370.722,69	$6.633.650,42		**NO TERMINADO**		
232	B-CB-N-M10-VE-238	94%	Adecuación	$4.243.117,36	$3.988.770,33	4/12/2022	**TERMINADO**	**7/12/2022**	29/01/2023
233	B-CB-N-M41-VE-239	102%	Adecuación	$3.145.882,21	$3.199.684,84	4/12/2022	**NO TERMINADO**	**7/12/2022**	
234	B-CB-N-M41-VE-240	95%	Caseta T1	$7.690.399,70	$7.305.879,72		**TERMINADO**		23/10/2022
235	B-CB-N-M34-VE-241	121%	Adecuación	$3.906.398,68	$4.735.737,19	13/12/2022	**TERMINADO**	**16/12/2022**	29/01/2023
236	B-CB-N-M41-VE-242	110%	Caseta T1	$7.230.970,87	$7.921.824,81		**TERMINADO**		30/10/2022
237	B-CB-N-M34-VE-243	101%	Caseta T1	$7.330.636,77	$7.403.081,09	17/08/2022	**TERMINADO**	**22/08/2022**	30/10/2022
238	B-CB-N-M34-VE-244	98%	Caseta T1	$7.823.674,14	$7.690.349,66	17/08/2022	**TERMINADO**	**22/08/2022**	30/10/2022
239	B-CB-N-M31-VE-245	101%	Caseta T1	$7.968.820,52	$8.024.949,51	12/08/2022	**TERMINADO**	**17/08/2022**	30/10/2022
240	B-CB-N-M34-VE-246	110%	Caseta T1	$7.170.084,80	$7.894.443,34		**TERMINADO**		23/10/2022
241	B-CB-N-M34-VE-247	90%	Caseta T1	$8.605.995,85	$7.745.396,27		**TERMINADO**		30/10/2022
242	B-CB-N-M34-VE-248	108%	Caseta T1	$6.977.863,16	$7.547.337,07	17/08/2022	**TERMINADO**	**22/08/2022**	30/10/2022
243	B-CB-N-M34-VE-249	90%	Caseta T1	$8.925.620,90	$8.033.058,81		**TERMINADO**		30/10/2022
244	B-CB-N-M10-VE-250	94%	Caseta T1	$7.519.307,60	$7.093.905,29		**TERMINADO**		23/10/2022
245	B-CB-N-M41-VE-251	103%	Adecuación	$4.539.859,35	$4.658.600,41	13/12/2022	**TERMINADO**	**16/12/2022**	15/01/2023
246	B-CB-N-M12-VE-252	233%	Adecuación	$1.169.336,02	$2.721.546,26	20/01/2023	**TERMINADO**	**23/01/2023**	29/01/2023
247	B-CB-N-M10-VE-253	99%	Caseta T1	$7.813.173,43	$7.770.476,28		**TERMINADO**		30/10/2022
248	B-CB-N-M12-VE-254	100%	Caseta T1	$7.903.501,78	$7.930.175,18	13/09/2022	**TERMINADO**	**18/09/2022**	20/11/2022

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
249	B-CB-N-M10-VE-255	99%	Caseta T2	$7.683.529,39	$7.612.453,01		**TERMINADO**		23/10/2022
250	B-CB-N-M10-VE-256	128%	Adecuación	$2.903.505,60	$3.710.809,87	20/01/2023	**NO TERMINADO**	**23/01/2023**	
251	B-CB-N-M10-VE-257	97%	Caseta T1	$7.950.382,83	$7.721.747,48		**TERMINADO**		23/10/2022
252	B-CB-N-M32-VE-258	98%	Caseta T1	$7.427.841,93	$7.279.285,09	6/08/2022	**TERMINADO**	**11/08/2022**	9/10/2022
253	B-CB-N-M32-VE-259	103%	Caseta T1	$8.207.386,03	$8.416.674,37	3/08/2022	**TERMINADO**	**8/08/2022**	9/10/2022
254	B-CB-N-M32-VE-260	90%	Caseta T1	$8.212.488,35	$7.391.239,52	4/08/2022	**TERMINADO**	**9/08/2022**	9/10/2022
255	B-CB-N-M32-VE-261	99%	Adecuación	$5.885.587,77	$5.828.000,61	13/12/2022	**TERMINADO**	**16/12/2022**	29/01/2023
256	B-CB-N-M32-VE-262	102%	Caseta T1	$7.303.626,29	$7.485.486,58	4/08/2022	**TERMINADO**	**9/08/2022**	9/10/2022
257	B-CB-N-M32-VE-263	103%	Caseta T1	$7.524.320,56	$7.727.585,54	3/08/2022	**TERMINADO**	**8/08/2022**	9/10/2022
258	B-CB-N-M32-VE-264	95%	Caseta T1	$8.322.431,95	$7.906.310,35	3/08/2022	**TERMINADO**	**8/08/2022**	9/10/2022
259	B-CB-N-M33-VE-265	95%	Caseta T1	$7.760.311,02	$7.372.295,47		**TERMINADO**		9/10/2022
260	B-CB-N-M33-VE-266	95%	Caseta T1	$7.759.561,48	$7.389.381,42	4/08/2022	**TERMINADO**	**9/08/2022**	30/10/2022
261	B-CB-N-M33-VE-267	96%	Caseta T1	$7.980.481,88	$7.696.620,11		**TERMINADO**		30/10/2022
262	B-CB-N-M33-VE-268	105%	Caseta T1	$7.472.276,34	$7.858.396,83		**TERMINADO**		16/10/2022
263	B-CB-N-M33-VE-269	99%	Caseta T1	$7.513.659,83	$7.437.106,24	3/08/2022	**TERMINADO**	**8/08/2022**	13/11/2022
264	B-CB-N-M33-VE-270	101%	Caseta T1	$7.051.350,48	$7.115.159,56	3/11/2022	**TERMINADO**	**8/11/2022**	18/12/2022
265	B-CB-N-M33-VE-271	81%	Adecuación	$5.376.187,06	$4.362.292,04	13/12/2022	**TERMINADO**	**16/12/2022**	29/01/2023
266	B-CB-N-M31-VE-272	168%	Caseta T1	$4.371.537,09	$7.336.851,50	26/11/2022	**TERMINADO**	**1/12/2022**	15/01/2023
267	B-CB-N-M34-VE-273	102%	Caseta T1	$7.745.410,79	$7.910.388,04		**TERMINADO**		16/10/2022
268	B-CB-N-M14-VE-274	126%	Adecuación	$3.968.212,21	$4.994.367,37	17/12/2022	**NO TERMINADO**	**20/12/2022**	
269	B-CB-N-M28-VE-275	108%	Caseta T1	$7.193.328,52	$7.789.893,19	20/10/2022	**TERMINADO**	**25/10/2022**	15/01/2023
270	B-CB-N-M16-VE-276	85%	Caseta T1	$7.583.435,45	$6.457.165,78	21/10/2022	**TERMINADO**	**26/10/2022**	22/01/2023
271	B-CB-N-M07-VE-277	104%	Caseta T1	$8.026.053,03	$8.345.591,73	21/09/2022	**TERMINADO**	**26/09/2022**	13/11/2022
272	B-CB-N-M20-VE-278	90%	Caseta T1	$8.015.775,54	$7.195.563,87	2/11/2022	**TERMINADO**	**7/11/2022**	29/01/2023
273	B-CB-N-M31-VE-279	95%	Caseta T1	$7.623.571,29	$7.239.672,41	31/10/2022	**TERMINADO**	**5/11/2022**	15/01/2023
274	B-CB-N-M28-VE-280	105%	Caseta T1	$6.798.321,84	$7.157.168,57	2/11/2022	**TERMINADO**	**7/11/2022**	18/12/2022
275	B-CB-N-M01-VE-283	89%	Caseta T1	$6.907.447,53	$6.177.811,57	19/10/2022	**TERMINADO**	**24/10/2022**	13/11/2022
276	B-CB-N-M17-VE-284	102%	Caseta T1	$7.385.169,18	$7.503.141,81	10/11/2022	**TERMINADO**	**15/11/2022**	15/01/2023
277	B-CB-N-M01-VE-285	188%	Adecuación	$2.940.192,34	$5.538.005,53	10/12/2022	**NO TERMINADO**	**13/12/2022**	
278	B-CB-N-M01-VE-286	109%	Caseta T1	$7.367.601,82	$8.001.501,20	24/11/2022	**TERMINADO**	**29/11/2022**	15/01/2023
279	B-CB-N-M01-VE-287	150%	Adecuación	$2.627.328,76	$3.946.385,57	5/01/2023	**NO TERMINADO**	**8/01/2023**	

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
280	B-CB-N-M03-VE-288	97%	Caseta T2	$7.210.499,00	$7.018.341,02	19/11/2022	**TERMINADO**	**24/11/2022**	15/01/2023
281	B-CB-N-M02-VE-289	115%	Adecuación	$4.044.062,78	$4.647.873,56	14/10/2022	**TERMINADO**	**17/10/2022**	13/11/2022
282	B-CB-N-M06-VE-290	95%	Caseta T1	$7.643.173,63	$7.223.763,95	23/11/2022	**TERMINADO**	**28/11/2022**	15/01/2023
283	B-CB-N-M05-VE-291	25%	Adecuación	$2.212.763,46	$553.190,87	30/11/2022	**NO TERMINADO**	**3/12/2022**	
284	B-CB-N-M22-VE-292	90%	Caseta T1	$7.384.185,16	$6.645.766,64	13/09/2022	**TERMINADO**	**18/09/2022**	16/10/2022
285	B-CB-N-M20-VE-293	92%	Caseta T1	$9.403.250,78	$8.655.240,85		**TERMINADO**		9/10/2022
286	B-CB-N-M17-VE-294	107%	Caseta T1	$7.207.933,70	$7.745.946,60	28/10/2022	**TERMINADO**	**2/11/2022**	15/01/2023
287	B-CB-N-M31-VE-295	84%	Caseta T2	$8.781.396,14	$7.350.444,49	27/11/2022	**TERMINADO**	**2/12/2022**	29/01/2023
288	B-CB-N-M29-VE-296	102%	Caseta T1	$7.077.563,46	$7.218.257,11	26/12/2022	**TERMINADO**	**31/12/2022**	15/01/2023
289	B-CB-N-M21-VE-297	227%	Caseta T1	$3.421.009,59	$7.758.590,92	10/12/2022	**TERMINADO**	**15/12/2022**	15/01/2023
290	B-CB-N-M19-VE-298	79%	Caseta T1	$7.596.664,29	$5.975.924,51	30/09/2022	**TERMINADO**	**5/10/2022**	29/01/2023
291	B-CB-N-M22-VE-299	96%	Caseta T1	$7.520.705,32	$7.242.891,89	26/10/2022	**TERMINADO**	**31/10/2022**	13/11/2022
292	B-CB-N-M09-VE-300	116%	Caseta T1	$6.232.373,41	$7.222.303,48		**TERMINADO**		16/10/2022
293	B-CB-N-M21-VE-301	89%	Caseta T1	$7.781.967,61	$6.937.689,70	11/10/2022	**TERMINADO**	**16/10/2022**	13/11/2022
294	B-CB-N-M08-VE-302	102%	Caseta T1	$6.981.895,84	$7.146.997,92	20/11/2022	**TERMINADO**	**25/11/2022**	15/01/2023
295	B-CB-N-M21-VE-303	84%	Caseta T1	$7.637.340,60	$6.378.343,73	11/10/2022	**TERMINADO**	**16/10/2022**	13/11/2022
296	B-CB-N-M09-VE-304	90%	Caseta T1	$9.286.320,78	$8.357.688,70		**TERMINADO**		23/10/2022
297	B-CB-N-M10-VE-305	132%	Adecuación	$3.103.493,35	$4.090.435,64	14/01/2023	**NO TERMINADO**	**17/01/2023**	
298	B-CB-N-M41-VE-306	117%	Caseta T1	$7.116.713,11	$8.360.702,69		**TERMINADO**		30/10/2022
299	B-CB-N-M41-VE-307	80%	Adecuación	$7.363.355,54	$5.890.684,43	28/10/2022	**TERMINADO**	**31/10/2022**	15/01/2023
300	B-CB-N-M10-VE-308	101%	Caseta T1	$6.877.465,65	$6.930.486,88		**TERMINADO**		13/11/2022
301	B-CB-N-M31-VE-309	118%	Caseta T1	$6.873.634,68	$8.138.098,56	31/10/2022	**TERMINADO**	**5/11/2022**	15/01/2023
302	B-CB-N-M09-VE-310	99%	Caseta T1	$7.238.378,04	$7.131.564,69		**TERMINADO**		23/10/2022
303	B-CB-N-M19-VE-311	121%	Adecuación	$2.828.388,56	$3.412.670,08	17/11/2022	**TERMINADO**	**20/11/2022**	4/12/2022
304	B-CB-N-M17-VE-312	91%	Caseta T1	$7.344.788,18	$6.691.890,79	1/11/2022	**TERMINADO**	**6/11/2022**	29/01/2023
305	B-CB-N-M13-VE-313	87%	Caseta T1	$8.340.980,49	$7.247.839,96	6/10/2022	**TERMINADO**	**11/10/2022**	15/01/2023
306	B-CB-N-M26-VE-314	100%	Caseta T1	$6.816.776,93	$6.842.072,79	3/10/2022	**TERMINADO**	**8/10/2022**	15/01/2023
307	B-CB-N-M19-VE-315	237%	Caseta T1	$3.454.475,61	$8.203.392,09	4/12/2022	**TERMINADO**	**9/12/2022**	18/12/2022
308	B-CB-N-M19-VE-316	106%	Caseta T1	$6.898.001,44	$7.310.335,15	11/11/2022	**TERMINADO**	**16/11/2022**	18/12/2022
309	B-CB-N-M04-VE-317	148%	Adecuación	$3.114.291,40	$4.618.241,76	2/12/2022	**TERMINADO**	**5/12/2022**	18/01/2022
310	B-CB-N-M04-VE-318	176%	Adecuación	$3.156.776,05	$5.561.663,96	7/11/2022	**TERMINADO**	**10/11/2022**	13/11/2022

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
311	B-CB-N-M24-VE-319	87%	Caseta T1	$8.906.126,27	$7.716.505,60	28/10/2022	**TERMINADO**	**2/11/2022**	15/01/2023
312	B-CB-N-M04-VE-327	98%	Caseta T1	$6.720.899,73	$6.562.862,30	7/10/2022	**TERMINADO**	**12/10/2022**	13/11/2022
313	B-CB-N-M03-VE-329	108%	Caseta T1	$7.226.493,28	$7.799.700,52	4/10/2022	**TERMINADO**	**9/10/2022**	13/11/2022
314	B-CB-N-M02-VE-330	104%	Caseta T1	$7.367.765,93	$7.662.641,07	4/10/2022	**TERMINADO**	**9/10/2022**	13/11/2022
315	B-CB-N-M04-VE-331	100%	Caseta T1	$7.412.495,22	$7.436.952,94	5/10/2022	**TERMINADO**	**10/10/2022**	13/11/2022
316	B-CB-N-M02-VE-332	139%	Caseta T1	$5.660.650,29	$7.889.019,66	14/12/2022	**TERMINADO**	**19/12/2022**	15/01/2023
317	B-CB-N-M02-VE-333	100%	Caseta T1	$7.896.745,01	$7.884.656,55	3/10/2022	**TERMINADO**	**8/10/2022**	13/11/2022
318	B-CB-N-M02-VE-334	141%	Adecuación	$2.097.272,88	$2.964.742,44	21/12/2022	**NO TERMINADO**	**24/12/2022**	
319	B-CB-N-M02-VE-335	97%	Caseta T1	$7.859.712,49	$7.610.411,09		**TERMINADO**		13/11/2022
320	B-CB-N-M16-VE-336	90%	Caseta T1	$7.590.561,36	$6.809.440,36	11/10/2022	**TERMINADO**	**16/10/2022**	29/01/2023
321	B-CB-N-M10-VE-337	101%	Caseta T1	$6.851.677,65	$6.948.884,04	1/11/2022	**TERMINADO**	**6/11/2022**	15/01/2023
322	B-CB-N-M25-VE-338	82%	Caseta T1	$7.165.829,30	$5.905.823,31	6/12/2022	**TERMINADO**	**11/12/2022**	29/01/2023
323	B-CB-N-M17-VE-340	109%	Adecuación	$2.627.619,69	$2.862.932,96	7/12/2022	**TERMINADO**	**10/12/2022**	29/01/2023
324	B-CB-N-M17-VE-341	112%	Caseta T1	$6.969.798,36	$7.816.772,25	31/10/2022	**TERMINADO**	**5/11/2022**	18/12/2022
325	B-CB-N-M06-VE-343	103%	Caseta T2	$6.550.845,53	$6.737.692,35	19/10/2022	**TERMINADO**	**24/10/2022**	6/11/2022
326	B-CB-N-M04-VE-344	117%	Caseta T1	$7.230.457,44	$8.425.836,75	12/10/2022	**TERMINADO**	**17/10/2022**	6/11/2022
327	B-CB-N-M04-VE-345	113%	Caseta T1	$7.098.436,51	$8.007.830,06	12/10/2022	**TERMINADO**	**17/10/2022**	30/10/2022
328	B-CB-N-M36-VE-346	95%	Caseta T1	$7.893.055,65	$7.485.477,74	13/11/2022	**TERMINADO**	**18/11/2022**	15/01/2023
329	B-CB-N-M02-VE-347	58%	Adecuación	$3.890.460,18	$2.259.738,55	15/12/2022	**TERMINADO**	**18/12/2022**	15/01/2023
330	B-CB-N-M07-VE-348	115%	Caseta T1	$7.175.837,18	$8.249.535,22	24/11/2022	**TERMINADO**	**29/11/2022**	15/01/2023
331	B-CB-N-M07-VE-349	115%	Caseta T1	$7.253.840,18	$8.321.686,33	13/11/2022	**TERMINADO**	**18/11/2022**	18/12/2022
332	B-CB-N-M19-VE-351	88%	Caseta T1	$8.826.406,03	$7.737.898,90	19/12/2022	**TERMINADO**	**24/12/2022**	29/01/2023
333	B-CB-N-M16-IN-001	101%	Caseta T1	$7.372.277,46	$7.421.697,94	4/11/2022	**TERMINADO**	**9/11/2022**	4/12/2022
334	B-CB-N-M09-IN-002	100%	Caseta T1	$7.403.115,60	$7.413.143,71		**TERMINADO**		15/01/2023
335	B-CB-N-M04-IN-003	106%	Caseta T1	$7.688.380,91	$8.137.218,46	4/11/2022	**TERMINADO**	**9/11/2022**	4/12/2022
336	B-CB-N-M02-IN-004	153%	Adecuación	$1.494.697,30	$2.294.203,01	16/11/2022	**TERMINADO**	**19/11/2022**	27/11/2022
337	B-CB-N-M08-IN-005	99%	Caseta T1	$7.213.171,30	$7.169.726,24	17/11/2022	**TERMINADO**	**22/11/2022**	4/12/2022
338	B-CB-N-M27-IN-006	94%	Caseta T1	$7.809.990,36	$7.334.588,62	26/10/2022	**TERMINADO**	**31/10/2022**	15/01/2023
339	B-CB-N-M24-IN-007	94%	Caseta T2	$6.459.478,11	$6.082.571,82	14/11/2022	**TERMINADO**	**19/11/2022**	18/12/2022
340	B-CB-N-M40-IN-008	100%	Caseta T1	$7.696.811,01	$7.676.310,75	30/11/2022	**TERMINADO**	**5/12/2022**	4/12/2022
341	B-CB-N-M01-IN-009	56%	Adecuación	$3.986.806,12	$2.241.694,27	19/12/2022	**NO TERMINADO**	**22/12/2022**	

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
342	B-CB-N-M20-IN-010	110%	Caseta T1	$7.179.558,77	$7.887.750,87	23/11/2022	**TERMINADO**	**28/11/2022**	18/12/2022
343	B-CB-N-M33-IN-011	104%	Caseta T1	$7.036.167,26	$7.289.425,68	17/11/2022	**TERMINADO**	**22/11/2022**	4/12/2022
344	B-CB-N-M29-IN-012	102%	Caseta T1	$7.543.806,17	$7.709.031,35	23/11/2022	**TERMINADO**	**28/11/2022**	4/12/2022
345	B-CB-N-M21-IN-014	75%	Caseta T1	$6.934.695,23	$5.214.959,63	3/01/2023	**NO TERMINADO**	**8/01/2023**	
346	B-CB-N-M21-IN-015	92%	Caseta T1	$7.354.975,52	$6.745.821,90	11/12/2022	**TERMINADO**	**16/12/2022**	29/01/2023
347	B-CB-N-M21-IN-016	111%	Caseta T1	$6.488.928,66	$7.171.420,43	14/11/2022	**TERMINADO**	**19/11/2022**	4/12/2022
348	B-CB-N-M21-IN-017	111%	Caseta T1	$7.258.796,79	$8.059.645,15	14/11/2022	**TERMINADO**	**19/11/2022**	15/01/2023
349	B-CB-N-M21-IN-018	104%	Caseta T1	$7.364.189,41	$7.677.186,54	14/11/2022	**TERMINADO**	**19/11/2022**	4/12/2022
350	B-CB-N-M21-IN-019	106%	Caseta T1	$6.759.286,45	$7.186.964,78	14/11/2022	**TERMINADO**	**19/11/2022**	11/12/2022
351	B-CB-N-M18-IN-020	88%	Caseta T1	$6.982.917,41	$6.134.254,36	14/11/2022	**TERMINADO**	**19/11/2022**	11/12/2022
352	B-CB-N-M19-IN-021	67%	Adecuación	$6.100.167,91	$4.073.699,06	21/01/2023	**NO TERMINADO**	**24/01/2023**	
353	B-CB-N-M28-IN-022	96%	Caseta T1	$8.451.088,13	$8.149.549,50		**TERMINADO**		20/11/2022
354	B-CB-N-M21-IN-023	103%	Caseta T1	$7.387.045,31	$7.577.485,51	17/11/2022	**TERMINADO**	**22/11/2022**	4/12/2022
355	B-CB-N-M06-IN-024	105%	Caseta T1	$7.077.271,88	$7.400.677,99	19/12/2022	**TERMINADO**	**24/12/2022**	15/01/2023
356	B-CB-N-M21-IN-025	103%	Caseta T1	$7.734.705,27	$7.951.071,35	6/12/2022	**TERMINADO**	**11/12/2022**	29/01/2023
357	B-CB-N-M11-IN-026	70%	Caseta T1	$7.271.289,68	$5.082.843,31	15/11/2022	**TERMINADO**	**20/11/2022**	4/12/2022
358	B-CB-N-M02-IN-027	81%	Adecuación	$3.363.759,82	$2.718.866,18	26/12/2022	**NO TERMINADO**	**29/12/2022**	
359	B-CB-N-M04-IN-028	188%	Adecuación	$1.166.026,09	$2.190.144,94	28/11/2022	**TERMINADO**	**1/12/2022**	15/01/2023
360	B-CB-N-M25-IN-030	110%	Caseta T1	$7.521.764,56	$8.252.563,33	23/11/2022	**TERMINADO**	**28/11/2022**	15/01/2023
361	B-CB-N-M24-IN-031	116%	Caseta T1	$7.035.683,99	$8.176.293,46	23/11/2022	**TERMINADO**	**28/11/2022**	15/01/2023
362	B-CB-N-M13-IN-032	88%	Caseta T2	$7.510.839,37	$6.646.214,40	26/12/2022	**TERMINADO**	**31/12/2022**	15/01/2023
363	B-CB-N-M36-IN-033	101%	Caseta T1	$7.138.636,07	$7.231.677,74	23/11/2022	**TERMINADO**	**28/11/2022**	15/01/2023
364	B-CB-N-M32-IN-035	108%	Caseta T1	$7.191.114,70	$7.736.799,68	17/11/2022	**TERMINADO**	**22/11/2022**	15/01/2023
365	B-CB-N-M41-IN-037	108%	Caseta T1	$7.702.528,32	$8.349.644,95	10/11/2022	**TERMINADO**	**15/11/2022**	15/01/2023
366	B-CB-N-M28-IN-040	90%	Caseta T1	$8.050.399,43	$7.270.477,37	17/11/2022	**TERMINADO**	**22/11/2022**	15/01/2023
367	B-CB-N-M35-IN-041	98%	Caseta T1	$8.102.801,13	$7.921.547,07	3/11/2022	**TERMINADO**	**8/11/2022**	20/11/2022
368	B-CB-N-M25-IN-042	95%	Caseta T1	$8.315.019,87	$7.924.896,43	14/11/2022	**TERMINADO**	**19/11/2022**	11/12/2022
369	B-CB-N-M17-IN-043	81%	Adecuación	$4.118.587,07	$3.342.909,34	19/12/2022	**TERMINADO**	**22/12/2022**	29/01/2023
370	B-CB-N-M21-IN-044	84%	Caseta T1	$7.451.368,08	$6.247.934,20	30/11/2022	**TERMINADO**	**5/12/2022**	29/01/2023
371	B-CB-N-M17-IN-045	101%	Caseta T1	$7.534.450,09	$7.574.777,36	24/11/2022	**TERMINADO**	**29/11/2022**	15/01/2023
372	B-CB-N-M21-IN-046	108%	Caseta T1	$6.734.405,10	$7.287.423,82	24/11/2022	**TERMINADO**	**29/11/2022**	15/01/2023

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
373	B-CB-N-M30-IN-047	106%	Caseta T2	$7.137.890,88	$7.559.334,78	17/11/2022	**TERMINADO**	**22/11/2022**	29/01/2023
374	B-CB-N-M23-IN-048	103%	Caseta T1	$7.688.806,38	$7.922.613,38	25/11/2022	**TERMINADO**	**30/11/2022**	15/01/2023
375	B-CB-N-M41-IN-049	107%	Caseta T2	$7.306.763,47	$7.818.562,96	30/11/2022	**TERMINADO**	**5/12/2022**	18/12/2022
376	B-CB-N-M21-IN-050	75%	Caseta T1	$7.355.778,89	$5.539.262,25	26/12/2022	**TERMINADO**	**31/12/2022**	29/01/2023
377	B-CB-N-M01-IN-051	76%	Adecuación	$4.150.019,73	$3.168.230,78	3/01/2022	**NO TERMINADO**	**6/01/2022**	
378	B-CB-N-M36-IN-052	81%	Caseta T1	$7.384.990,89	$6.004.365,99	26/12/2022	**TERMINADO**	**31/12/2022**	29/01/2023
379	B-CB-C-M04-VE-003	119%	Adecuación	$3.192.259,93	$3.783.487,09	9/08/2022	**TERMINADO**	**12/08/2022**	14/08/2022
380	B-CB-C-M04-VE-004	100%	Caseta T2	$7.108.460,34	$7.109.768,95	6/08/2022	**TERMINADO**	**11/08/2022**	14/08/2022
381	B-CB-C-M05-VE-005	100%	Caseta T2	$7.326.078,52	$7.326.078,52	8/08/2022	**TERMINADO**	**13/08/2022**	21/08/2022
382	B-CB-C-M04-VE-006	107%	Caseta T1	$7.149.178,97	$7.642.631,78	8/08/2022	**TERMINADO**	**13/08/2022**	2/10/2022
383	B-CB-C-M05-VE-007	108%	Caseta T1	$6.655.807,16	$7.200.987,25	15/08/2022	**TERMINADO**	**20/08/2022**	2/10/2022
384	B-CB-C-M05-VE-009	103%	Caseta T1	$7.152.143,92	$7.380.361,25	10/08/2022	**TERMINADO**	**15/08/2022**	2/10/2022
385	B-CB-C-M05-VE-010	100%	Caseta T1	$7.468.263,95	$7.463.444,46	9/08/2022	**TERMINADO**	**14/08/2022**	2/10/2022
386	B-CB-C-M08-VE-011	100%	Caseta T1	$7.493.868,70	$7.460.454,45	8/08/2022	**TERMINADO**	**13/08/2022**	2/10/2022
387	B-CB-C-M05-VE-012	145%	Adecuación	$2.733.056,81	$3.958.887,65	11/08/2022	**TERMINADO**	**14/08/2022**	21/08/2022
388	B-CB-C-M08-VE-013	93%	Caseta T1	$7.360.374,90	$6.858.052,68	8/08/2022	**TERMINADO**	**13/08/2022**	2/10/2022
389	B-CB-C-M05-VE-014	96%	Caseta T2	$6.574.083,96	$6.304.677,87	10/08/2022	**TERMINADO**	**15/08/2022**	2/10/2022
390	B-CB-C-M08-VE-015	99%	Caseta T1	$6.975.985,84	$6.901.741,85	10/08/2022	**TERMINADO**	**15/08/2022**	2/10/2022
391	B-CB-C-M08-VE-016	125%	Adecuación	$3.106.599,38	$3.897.171,93	10/08/2022	**TERMINADO**	**13/08/2022**	2/10/2022
392	B-CB-C-M08-VE-017	102%	Caseta T1	$7.295.158,91	$7.420.168,43	8/08/2022	**TERMINADO**	**13/08/2022**	2/10/2022
393	B-CB-C-M08-VE-018	80%	Caseta T2	$8.430.035,12	$6.744.028,10	15/08/2022	**TERMINADO**	**20/08/2022**	9/10/2022
394	B-CB-C-M08-VE-019	104%	Caseta T1	$7.098.008,30	$7.412.640,35	13/08/2022	**TERMINADO**	**18/08/2022**	2/10/2022
395	B-CB-C-M08-VE-020	101%	Caseta T1	$7.407.950,37	$7.447.303,70	15/08/2022	**TERMINADO**	**20/08/2022**	9/10/2022
396	B-CB-C-M08-VE-021	99%	Caseta T1	$7.527.778,59	$7.472.748,16	13/08/2022	**TERMINADO**	**18/08/2022**	9/10/2022
397	B-CB-C-M08-VE-022	105%	Caseta T4	$7.195.464,88	$7.577.412,01	13/08/2022	**TERMINADO**	**18/08/2022**	9/10/2022
398	B-CB-C-M08-VE-023	97%	Caseta T1	$7.289.657,67	$7.047.962,54	14/08/2022	**TERMINADO**	**19/08/2022**	9/10/2022
399	B-CB-C-M08-VE-024	98%	Caseta T1	$7.546.738,01	$7.389.161,60	17/08/2022	**TERMINADO**	**22/08/2022**	9/10/2022
400	B-CB-C-M08-VE-025	83%	Caseta T2	$7.548.986,36	$6.282.922,69	24/08/2022	**TERMINADO**	**29/08/2022**	9/10/2022
401	B-CB-C-M08-VE-026	103%	Caseta T1	$7.209.052,12	$7.449.365,74	25/08/2022	**TERMINADO**	**30/08/2022**	16/10/2022
402	B-CB-C-M08-VE-027	95%	Caseta T2	$6.966.217,75	$6.603.132,29	18/08/2022	**TERMINADO**	**23/08/2022**	9/10/2022
403	B-CB-C-M08-VE-028	98%	Caseta T1	$7.292.247,55	$7.140.397,24	22/08/2022	**TERMINADO**	**27/08/2022**	9/10/2022

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
404	B-CB-C-M08-VE-029	108%	Caseta T1	$6.737.049,06	$7.245.476,31	18/08/2022	**TERMINADO**	**23/08/2022**	9/10/2022
405	B-CB-C-M08-VE-030	65%	Adecuación	$3.677.997,18	$2.390.698,17	1/10/2022	**TERMINADO**	**4/10/2022**	9/10/2022
406	B-CB-C-M08-VE-031	92%	Caseta T1	$7.234.196,35	$6.638.424,74	22/08/2022	**TERMINADO**	**27/08/2022**	9/10/2022
407	B-CB-C-M08-VE-032	82%	Caseta T2	$7.083.892,90	$5.825.882,65	6/09/2022	**TERMINADO**	**11/09/2022**	9/10/2022
408	B-CB-C-M06-VE-033	96%	Caseta T1	$6.704.877,15	$6.421.690,36	25/08/2022	**TERMINADO**	**30/08/2022**	9/10/2022
409	B-CB-C-M08-VE-034	94%	Caseta T2	$5.586.422,39	$5.275.945,87	26/08/2022	**TERMINADO**	**31/08/2022**	9/10/2022
410	B-CB-C-M06-VE-035	107%	Caseta T1	$7.091.244,24	$7.578.364,27	25/08/2022	**TERMINADO**	**30/08/2022**	9/10/2022
411	B-CB-C-M08-VE-036	105%	Caseta T1	$6.728.899,76	$7.035.145,60	25/08/2022	**TERMINADO**	**30/08/2022**	9/10/2022
412	B-CB-C-M08-VE-037	105%	Caseta T1	$7.671.594,00	$8.081.668,01	26/08/2022	**TERMINADO**	**31/08/2022**	9/10/2022
413	B-CB-C-M06-VE-038	100%	Caseta T1	$7.082.271,49	$7.060.717,48	26/08/2022	**TERMINADO**	**31/08/2022**	9/10/2022
414	B-CB-C-M06-VE-039	109%	Caseta T1	$6.470.412,48	$7.032.334,63	25/08/2022	**TERMINADO**	**30/08/2022**	9/10/2022
415	B-CB-C-M06-VE-040	99%	Caseta T1	$7.927.235,68	$7.808.855,47	30/08/2022	**TERMINADO**	**4/09/2022**	9/10/2022
416	B-CB-C-M06-VE-041	86%	Caseta T1	$7.619.305,21	$6.560.586,40	29/08/2022	**TERMINADO**	**3/09/2022**	16/10/2022
417	B-CB-C-M06-VE-042	80%	Adecuación	$5.046.567,33	$4.037.253,86	16/09/2022	**TERMINADO**	**19/09/2022**	16/10/2022
418	B-CB-C-M06-VE-043	138%	Caseta T2	$5.353.735,99	$7.378.861,68	31/08/2022	**TERMINADO**	**5/09/2022**	16/10/2022
419	B-CB-C-M06-VE-044	111%	Caseta T1	$6.811.303,81	$7.564.938,52	31/08/2022	**TERMINADO**	**5/09/2022**	16/10/2022
420	B-CB-C-M06-VE-045	80%	Adecuación	$5.353.735,99	$4.282.988,79	10/09/2022	**TERMINADO**	**13/09/2022**	16/10/2022
421	B-CB-C-M04-VE-046	108%	Caseta T2	$6.563.773,35	$7.075.004,72	31/08/2022	**TERMINADO**	**5/09/2022**	16/10/2022
422	B-CB-C-M06-VE-047	118%	Adecuación	$3.993.806,06	$4.706.408,00	16/08/2022	**TERMINADO**	**19/08/2022**	16/10/2022
423	B-CB-C-M04-VE-048	110%	Caseta T2	$6.997.259,99	$7.726.341,07	31/08/2022	**TERMINADO**	**5/09/2022**	16/10/2022
424	B-CB-C-M07-VE-049	95%	Adecuación	$3.378.351,83	$3.193.947,44	16/08/2022	**TERMINADO**	**19/08/2022**	2/10/2022
425	B-CB-C-M06-VE-050	64%	Adecuación	$2.513.846,50	$1.600.447,72	28/09/2022	**TERMINADO**	**1/10/2022**	16/10/2022
426	B-CB-C-M07-VE-051	84%	Caseta T1	$8.011.545,45	$6.737.972,61	3/09/2022	**TERMINADO**	**8/09/2022**	16/10/2022
427	B-CB-C-M06-VE-052	98%	Adecuación	$5.157.717,23	$5.039.185,20	16/08/2022	**TERMINADO**	**19/08/2022**	2/10/2022
428	B-CB-C-M07-VE-053	100%	Adecuación	$5.335.107,15	$5.335.107,15	16/08/2022	**TERMINADO**	**19/08/2022**	2/09/2022
429	B-CB-C-M07-VE-054	101%	Caseta T1	$7.356.095,16	$7.442.235,26	2/09/2022	**TERMINADO**	**7/09/2022**	16/10/2022
430	B-CB-C-M07-VE-055	90%	Caseta T1	$7.847.977,43	$7.063.179,69	1/09/2022	**TERMINADO**	**6/09/2022**	16/10/2022
431	B-CB-C-M07-VE-056	94%	Caseta T1	$7.783.131,32	$7.304.149,81	2/09/2022	**TERMINADO**	**7/09/2022**	16/10/2022
432	B-CB-C-M07-VE-057	104%	Caseta T1	$7.202.405,66	$7.523.531,15	2/09/2022	**TERMINADO**	**7/09/2022**	16/10/2022
433	B-CB-C-M07-VE-058	92%	Adecuación	$2.250.923,41	$2.061.274,47	18/11/2022	**TERMINADO**	**21/11/2022**	23/12/2022
434	B-CB-C-M07-VE-059	105%	Caseta T2	$7.207.150,49	$7.554.767,10	4/09/2022	**TERMINADO**	**9/09/2022**	16/10/2022

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
435	B-CB-C-M04-VE-060	25%	Adecuación	$3.615.081,31	$903.770,33	9/11/2022	**TERMINADO**	**12/11/2022**	29/01/2023
436	B-CB-C-M07-VE-061	96%	Caseta T2	$7.157.175,62	$6.835.307,83	3/09/2022	**TERMINADO**	**8/09/2022**	16/10/2022
437	B-CB-C-M07-VE-063	99%	Caseta T1	$6.974.576,36	$6.902.275,37	8/09/2022	**TERMINADO**	**13/09/2022**	16/10/2022
438	B-CB-C-M09-VE-064	90%	Caseta T2	$6.743.250,85	$6.100.652,24	10/09/2022	**TERMINADO**	**15/09/2022**	23/10/2022
439	B-CB-C-M09-VE-065	90%	Adecuación	$4.208.914,85	$3.788.023,37	6/09/2022	**TERMINADO**	**9/09/2022**	29/01/2023
440	B-CB-C-M07-VE-066	109%	Caseta T1	$7.009.804,00	$7.653.782,44	7/09/2022	**TERMINADO**	**12/09/2022**	23/10/2022
441	B-CB-C-M09-VE-067	45%	Adecuación	$4.121.183,65	$1.854.532,64	28/10/2022	**TERMINADO**	**31/10/2022**	27/11/2022
442	B-CB-C-M07-VE-068	126%	Caseta T1	$5.545.313,82	$6.999.453,32	10/09/2022	**TERMINADO**	**15/09/2022**	23/10/2022
443	B-CB-C-M09-VE-069	97%	Caseta T1	$7.185.996,19	$7.000.407,48	10/09/2022	**TERMINADO**	**15/09/2022**	23/10/2022
444	B-CB-C-M09-VE-070	104%	Caseta T1	$7.252.402,35	$7.568.791,94	9/09/2022	**TERMINADO**	**14/09/2022**	23/10/2022
445	B-CB-C-M07-VE-071	90%	Caseta T1	$9.588.121,94	$8.629.309,75	10/09/2022	**TERMINADO**	**15/09/2022**	23/10/2022
446	B-CB-C-M09-VE-072	99%	Caseta T1	$7.466.257,30	$7.407.847,35	12/09/2022	**TERMINADO**	**17/09/2022**	23/10/2022
447	B-CB-C-M09-VE-073	91%	Caseta T1	$7.929.572,62	$7.218.324,71	16/09/2022	**TERMINADO**	**21/09/2022**	30/10/2022
448	B-CB-C-M09-VE-074	102%	Caseta T1	$7.289.256,38	$7.469.406,36	9/09/2022	**TERMINADO**	**14/09/2022**	23/10/2022
449	B-CB-C-M07-VE-075	90%	Caseta T1	$7.386.217,69	$6.647.595,92	16/09/2022	**TERMINADO**	**21/09/2022**	23/10/2022
450	B-CB-C-M09-VE-076	104%	Caseta T1	$7.521.534,27	$7.851.390,32	11/09/2022	**TERMINADO**	**16/09/2022**	23/10/2022
451	B-CB-C-M07-VE-077	79%	Adecuación	$3.308.964,13	$2.621.460,77	28/10/2022	**TERMINADO**	**31/10/2022**	23/12/2022
452	B-CB-C-M09-VE-078	115%	Caseta T1	$7.189.104,04	$8.253.042,27	11/09/2022	**TERMINADO**	**16/09/2022**	23/10/2022
453	B-CB-C-M09-VE-079	101%	Caseta T1	$7.650.164,89	$7.764.807,77	20/09/2022	**TERMINADO**	**25/09/2022**	23/10/2022
454	B-CB-C-M09-VE-080	108%	Caseta T1	$7.225.898,75	$7.777.567,67	14/09/2022	**TERMINADO**	**19/09/2022**	23/10/2022
455	B-CB-C-M09-VE-081	99%	Caseta T1	$7.497.212,80	$7.386.489,18	14/09/2022	**TERMINADO**	**19/09/2022**	30/10/2022
456	B-CB-C-M09-VE-082	102%	Caseta T1	$7.290.706,22	$7.420.739,69	12/09/2022	**TERMINADO**	**17/09/2022**	30/10/2022
457	B-CB-C-M09-VE-083	115%	Caseta T1	$6.485.429,66	$7.487.599,15	16/09/2022	**TERMINADO**	**21/09/2022**	23/10/2022
458	B-CB-C-M09-VE-085	92%	Caseta T1	$7.811.467,61	$7.156.010,81	21/09/2022	**TERMINADO**	**26/09/2022**	23/10/2022
459	B-CB-C-M15-VE-086	82%	Caseta T1	$8.226.914,11	$6.732.572,66	11/10/2022	**TERMINADO**	**16/10/2022**	30/10/2022
460	B-CB-C-M18-VE-087	96%	Caseta T1	$7.178.338,72	$6.863.358,62	17/09/2022	**TERMINADO**	**22/09/2022**	23/10/2022
461	B-CB-C-M15-VE-088	94%	Caseta T1	$7.983.142,03	$7.472.382,80	28/09/2022	**TERMINADO**	**3/10/2022**	30/10/2022
462	B-CB-C-M15-VE-089	90%	Caseta T1	$7.969.047,40	$7.136.922,06	23/09/2022	**TERMINADO**	**28/09/2022**	23/10/2022
463	B-CB-C-M18-VE-090	103%	Caseta T1	$7.095.707,27	$7.290.001,58	21/09/2022	**TERMINADO**	**26/09/2022**	23/10/2022
464	B-CB-C-M15-VE-091	90%	Caseta T4	$7.948.873,18	$7.152.273,86	25/09/2022	**TERMINADO**	**30/09/2022**	23/10/2022
465	B-CB-C-M18-VE-092	85%	Caseta T1	$7.688.873,22	$6.535.542,24	21/09/2022	**TERMINADO**	**26/09/2022**	23/10/2022

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
466	B-CB-C-M18-VE-093	105%	Caseta T1	$7.866.079,12	$8.284.799,35	17/09/2022	**TERMINADO**	**22/09/2022**	30/10/2022
467	B-CB-C-M18-VE-094	100%	Caseta T1	$7.621.273,64	$7.616.515,41	22/09/2022	**TERMINADO**	**27/09/2022**	30/10/2022
468	B-CB-C-M18-VE-095	90%	Caseta T1	$7.879.343,87	$7.091.409,48	21/09/2022	**TERMINADO**	**26/09/2022**	30/10/2022
469	B-CB-C-M18-VE-096	103%	Caseta T1	$7.263.740,89	$7.492.130,91	23/09/2022	**TERMINADO**	**28/09/2022**	30/10/2022
470	B-CB-C-M18-VE-097	97%	Caseta T1	$7.458.231,12	$7.223.670,95	24/09/2022	**TERMINADO**	**29/09/2022**	30/10/2022
471	B-CB-C-M18-VE-098	104%	Caseta T1	$7.472.565,88	$7.807.683,58	4/10/2022	**TERMINADO**	**9/10/2022**	30/10/2022
472	B-CB-C-M15-VE-099	97%	Caseta T1	$7.539.462,20	$7.335.305,87	26/09/2022	**TERMINADO**	**1/10/2022**	6/11/2022
473	B-CB-C-M18-VE-100	102%	Caseta T1	$7.009.731,67	$7.161.852,57	30/09/2022	**TERMINADO**	**5/10/2022**	30/10/2022
474	B-CB-C-M18-VE-101	88%	Adecuación	$3.355.883,22	$2.940.027,11	4/10/2022	**TERMINADO**	**7/10/2022**	22/01/2023
475	B-CB-C-M18-VE-102	98%	Caseta T1	$7.696.997,41	$7.516.937,69	1/10/2022	**TERMINADO**	**6/10/2022**	30/10/2022
476	B-CB-C-M07-VE-103	90%	Caseta T1	$8.044.574,25	$7.240.116,83	1/10/2022	**TERMINADO**	**6/10/2022**	6/11/2022
477	B-CB-C-M18-VE-104	98%	Caseta T1	$7.415.962,46	$7.280.688,87	2/10/2022	**TERMINADO**	**7/10/2022**	6/11/2022
478	B-CB-C-M12-VE-105	96%	Caseta T1	$7.408.554,27	$7.116.668,20	1/10/2022	**TERMINADO**	**6/10/2022**	6/11/2022
479	B-CB-C-M18-VE-106	101%	Caseta T4	$7.296.505,88	$7.401.146,72	6/10/2022	**TERMINADO**	**11/10/2022**	6/11/2022
480	B-CB-C-M12-VE-107	95%	Caseta T1	$7.324.861,28	$6.971.716,39	2/10/2022	**TERMINADO**	**7/10/2022**	6/11/2022
481	B-CB-C-M12-VE-108	98%	Caseta T1	$7.377.406,89	$7.244.637,32	30/09/2022	**TERMINADO**	**5/10/2022**	6/11/2022
482	B-CB-C-M12-VE-110	99%	Caseta T1	$6.997.759,56	$6.925.407,41	30/09/2022	**TERMINADO**	**5/10/2022**	6/11/2022
483	B-CB-C-M12-VE-111	97%	Caseta T1	$8.211.977,71	$7.972.718,52	6/10/2022	**TERMINADO**	**11/10/2022**	6/11/2022
484	B-CB-C-M12-VE-112	101%	Caseta T1	$6.756.692,56	$6.801.420,06	6/10/2022	**TERMINADO**	**11/10/2022**	6/11/2022
485	B-CB-C-M14-VE-113	99%	Caseta T1	$7.968.575,61	$7.884.736,29	10/10/2022	**TERMINADO**	**15/10/2022**	6/11/2022
486	B-CB-C-M14-VE-114	79%	Adecuación	$5.694.422,16	$4.472.855,83	8/10/2022	**TERMINADO**	**11/10/2022**	27/11/2022
487	B-CB-C-M14-VE-115	99%	Caseta T1	$7.700.664,12	$7.602.075,65	8/10/2022	**TERMINADO**	**13/10/2022**	6/11/2022
488	B-CB-C-M14-VE-116	107%	Caseta T1	$7.396.797,59	$7.882.464,60	8/10/2022	**TERMINADO**	**13/10/2022**	6/11/2022
489	B-CB-C-M14-VE-117	97%	Caseta T1	$7.806.199,57	$7.607.011,72	8/10/2022	**TERMINADO**	**13/10/2022**	6/11/2022
490	B-CB-C-M14-VE-119	99%	Caseta T2	$6.506.893,72	$6.416.377,11	16/10/2022	**TERMINADO**	**21/10/2022**	6/11/2022
491	B-CB-C-M11-VE-121	100%	Caseta T1	$7.501.725,56	$7.517.155,98	10/10/2022	**TERMINADO**	**15/10/2022**	13/11/2022
492	B-CB-C-M14-VE-122	96%	Caseta T1	$7.539.711,36	$7.239.521,36	19/10/2022	**TERMINADO**	**24/10/2022**	27/11/2022
493	B-CB-C-M11-VE-123	102%	Caseta T1	$7.422.938,92	$7.583.390,28	17/10/2022	**TERMINADO**	**22/10/2022**	13/11/2022
494	B-CB-C-M14-VE-124	80%	Adecuación	$1.301.742,89	$1.035.383,14	11/11/2022	**TERMINADO**	**14/11/2022**	29/01/2023
495	B-CB-C-M10-VE-125	91%	Caseta T1	$8.040.261,54	$7.351.466,56	17/10/2022	**TERMINADO**	**22/10/2022**	13/11/2022
496	B-CB-C-M11-VE-126	104%	Caseta T1	$7.597.693,22	$7.870.563,93	10/10/2022	**TERMINADO**	**15/10/2022**	13/11/2022

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
497	B-CB-C-M10-VE-127	99%	Caseta T1	$7.465.753,24	$7.375.998,79	16/10/2022	**TERMINADO**	**21/10/2022**	13/11/2022
498	B-CB-C-M12-VE-128	101%	Caseta T1	$7.361.989,93	$7.438.104,73	16/10/2022	**TERMINADO**	**21/10/2022**	13/11/2022
499	B-CB-C-M11-VE-129	110%	Caseta T1	$6.675.761,14	$7.330.822,84	10/10/2022	**TERMINADO**	**15/10/2022**	13/11/2022
500	B-CB-C-M11-VE-130	94%	Caseta T1	$6.844.222,70	$6.441.532,06	10/10/2022	**TERMINADO**	**15/10/2022**	13/11/2022
501	B-CB-C-M13-VE-131	91%	Caseta T1	$7.315.096,44	$6.637.956,27	18/10/2022	**TERMINADO**	**23/10/2022**	13/11/2022
502	B-CB-C-M10-VE-132	95%	Caseta T1	$7.421.999,16	$7.077.515,81	26/10/2022	**TERMINADO**	**31/10/2022**	13/11/2022
503	B-CB-C-M16-VE-133	105%	Caseta T1	$7.503.404,01	$7.865.630,85	19/10/2022	**TERMINADO**	**24/10/2022**	13/11/2022
504	B-CB-C-M13-VE-134	94%	Caseta T1	$7.377.579,19	$6.940.027,17	18/10/2022	**TERMINADO**	**23/10/2022**	13/11/2022
505	B-CB-C-M13-VE-136	103%	Caseta T1	$7.059.253,63	$7.266.769,90	18/10/2022	**TERMINADO**	**23/10/2022**	13/11/2022
506	B-CB-C-M16-VE-137	90%	Caseta T1	$7.385.432,57	$6.658.800,80	20/10/2022	**TERMINADO**	**25/10/2022**	13/11/2022
507	B-CB-C-M13-VE-138	104%	Caseta T1	$6.948.535,88	$7.224.686,48	18/10/2022	**TERMINADO**	**23/10/2022**	13/11/2022
508	B-CB-C-M07-VE-139	129%	Caseta T1	$4.943.134,00	$6.367.760,20	25/11/2022	**TERMINADO**	**30/11/2022**	23/12/2022
509	B-CB-C-M16-VE-140	103%	Caseta T1	$7.272.378,63	$7.477.553,74	20/10/2022	**TERMINADO**	**25/10/2022**	13/11/2022
510	B-CB-C-M16-VE-141	101%	Caseta T1	$8.023.564,76	$8.128.650,62	21/10/2022	**TERMINADO**	**26/10/2022**	13/11/2022
511	B-CB-C-M16-VE-142	96%	Caseta T1	$7.054.170,59	$6.805.035,55	26/10/2022	**TERMINADO**	**31/10/2022**	13/11/2022
512	B-CB-C-M16-VE-143	99%	Caseta T1	$6.661.020,15	$6.624.579,51	26/10/2022	**TERMINADO**	**31/10/2022**	13/11/2022
513	B-CB-C-M16-VE-144	112%	Caseta T1	$7.101.027,15	$7.935.472,81	26/10/2022	**TERMINADO**	**31/10/2022**	13/11/2022
514	B-CB-C-M18-VE-145	73%	Adecuación	$3.998.114,55	$2.901.175,58	9/11/2022	**TERMINADO**	**12/11/2022**	27/11/2022
515	B-CB-C-M16-VE-146	97%	Caseta T1	$7.630.480,45	$7.432.664,08	26/10/2022	**TERMINADO**	**31/10/2022**	13/11/2022
516	B-CB-C-M18-VE-147	105%	Caseta T1	$7.675.026,28	$8.080.398,59	1/11/2022	**TERMINADO**	**6/11/2022**	27/11/2022
517	B-CB-C-M14-VE-148	101%	Caseta T1	$7.258.872,02	$7.307.157,08	1/11/2022	**TERMINADO**	**6/11/2022**	27/11/2022
518	B-CB-C-M04-VE-149	101%	Caseta T1	$7.070.338,29	$7.154.841,54	28/10/2022	**TERMINADO**	**2/11/2022**	20/11/2022
519	B-CB-C-M16-VE-150	102%	Caseta T1	$6.797.741,17	$6.901.041,54	28/10/2022	**TERMINADO**	**2/11/2022**	27/11/2022
520	B-CB-C-M14-VE-151	100%	Caseta T1	$7.524.955,84	$7.536.866,96	28/10/2022	**TERMINADO**	**2/11/2022**	27/11/2022
521	B-CB-C-M14-VE-152	105%	Caseta T1	$7.199.373,60	$7.569.351,38	1/11/2022	**TERMINADO**	**6/11/2022**	27/11/2022
522	B-CB-C-M14-VE-153	99%	Caseta T1	$7.179.780,37	$7.078.050,37	2/11/2022	**TERMINADO**	**7/11/2022**	27/11/2022
523	B-CB-C-M08-VE-154	92%	Caseta T1	$7.363.156,33	$6.747.677,62	6/11/2022	**TERMINADO**	**11/11/2022**	27/11/2022
524	B-CB-C-M04-VE-155	50%	Caseta T2	$6.570.241,81	$3.266.485,15	6/11/2022	**TERMINADO**	**11/11/2022**	27/11/2022
525	B-CB-C-M09-VE-156	210%	Adecuación	$834.715,58	$1.756.434,81	6/11/2022	**TERMINADO**	**9/11/2022**	27/11/2022
526	B-CB-C-M09-VE-157	90%	Adecuación	$2.880.518,59	$2.590.878,82	2/11/2022	**TERMINADO**	**5/11/2022**	27/11/2022
527	B-CB-C-M04-VE-158	89%	Caseta T1	$7.676.025,74	$6.802.777,38	20/11/2022	**TERMINADO**	**25/11/2022**	23/12/2022

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
528	B-CB-C-M16-VE-159	103%	Caseta T1	$7.775.090,47	$8.013.171,58	31/10/2022	**TERMINADO**	**5/11/2022**	27/11/2022
529	B-CB-C-M13-VE-160	102%	Caseta T1	$7.495.955,89	$7.680.227,46	2/11/2022	**TERMINADO**	**7/11/2022**	27/11/2022
530	B-CB-C-M07-VE-161	77%	Caseta T2	$7.495.956,89	$5.743.387,51	17/11/2022	**TERMINADO**	**22/11/2022**	22/01/2023
531	B-CB-C-M03-IN-001	101%	Caseta T1	$6.932.616,45	$7.013.865,64	11/11/2022	**TERMINADO**	**16/11/2022**	8/01/2023
532	B-CB-C-M03-IN-002	106%	Caseta T1	$6.853.960,60	$7.260.624,63	11/11/2022	**TERMINADO**	**16/11/2022**	23/12/2022
533	B-CB-C-M03-IN-003	77%	Caseta T1	$7.910.931,55	$6.097.223,62	11/11/2022	**TERMINADO**	**16/11/2022**	23/12/2022
534	B-CB-C-M03-IN-004	88%	Caseta T1	$8.369.375,84	$7.339.204,72	11/11/2022	**TERMINADO**	**16/11/2022**	23/12/2022
535	B-CB-C-M03-IN-005	114%	Caseta T1	$6.748.734,67	$7.662.268,16	11/11/2022	**TERMINADO**	**16/11/2022**	23/12/2022
536	B-CB-C-M04-IN-006	82%	Caseta T1	$7.544.728,04	$6.216.029,95	17/11/2022	**TERMINADO**	**22/11/2022**	23/12/2022
537	B-CB-C-M04-IN-007	83%	Caseta T1	$8.846.279,23	$7.334.706,24	2/12/2022	**TERMINADO**	**7/12/2022**	23/12/2022
538	B-CB-C-M03-IN-008	100%	Caseta T1	$7.398.738,27	$7.407.879,66	20/11/2022	**TERMINADO**	**25/11/2022**	23/12/2022
539	B-CB-C-M09-IN-009	88%	Caseta T1	$7.783.844,24	$6.824.710,30	4/12/2022	**TERMINADO**	**9/12/2022**	23/12/2022
540	B-CB-C-M19-IN-010	47%	Adecuación	$3.384.700,34	$1.575.237,91	13/12/2022	**NO TERMINADO**	**16/12/2022**	
541	B-CB-C-M20-IN-011	100%	Caseta T2	$5.780.728,27	$5.799.408,53	17/11/2022	**TERMINADO**	**22/11/2022**	23/12/2022
542	B-CB-C-M20-IN-012	41%	Adecuación	$2.743.664,55	$1.120.619,22	13/12/2022	**TERMINADO**	**16/12/2022**	29/01/2023
543	B-CB-C-M20-IN-014	107%	Caseta T1	$7.553.787,08	$8.087.606,71	20/11/2022	**TERMINADO**	**25/11/2022**	23/12/2022
544	B-CB-C-M14-IN-015	98%	Caseta T1	$6.985.419,26	$6.836.382,72	10/12/2022	**TERMINADO**	**15/12/2022**	23/12/2022
545	B-CB-C-M03-IN-017	87%	Caseta T1	$8.387.421,70	$7.317.934,96	20/11/2022	**TERMINADO**	**25/11/2022**	23/12/2022
546	B-CB-C-M14-IN-018	52%	Adecuación	$2.691.642,66	$1.399.126,48		**TERMINADO**		29/01/2023
547	B-CB-C-M03-IN-019	114%	Caseta T1	$7.193.390,35	$8.197.550,06	20/11/2022	**TERMINADO**	**25/11/2022**	23/12/2022
548	B-CB-C-M09-IN-021	73%	Caseta T1	$9.298.905,47	$6.771.462,23	25/11/2022	**TERMINADO**	**30/11/2022**	23/12/2022
549	B-CB-C-M08-IN-023	105%	Caseta T1	$6.855.232,41	$7.193.987,42	26/11/2022	**TERMINADO**	**1/12/2022**	23/12/2022
550	B-CB-C-M09-IN-024	45%	Adecuación	$2.822.696,12	$1.263.123,65		**NO TERMINADO**		
551	B-CB-C-M14-IN-025	104%	Caseta T1	$7.391.211,43	$7.695.735,45	28/11/2022	**TERMINADO**	**3/12/2022**	23/12/2022
552	B-CB-C-M17-IN-026	93%	Caseta T1	$8.311.014,62	$7.696.231,61	25/11/2022	**TERMINADO**	**30/11/2022**	23/12/2022
553	B-CB-C-M11-IN-029	114%	Caseta T1	$6.939.774,70	$7.928.488,44	29/11/2022	**TERMINADO**	**4/12/2022**	23/12/2022
554	B-CB-C-M08-IN-030	99%	Caseta T1	$7.461.424,09	$7.400.554,37	24/11/2022	**TERMINADO**	**29/11/2022**	23/12/2022
555	B-CB-C-M19-IN-031	107%	Caseta T1	$7.173.822,77	$7.695.139,94	24/11/2022	**TERMINADO**	**29/11/2022**	23/12/2022
556	B-CB-C-M04-IN-032	105%	Caseta T1	$7.308.714,28	$7.702.936,01	28/11/2022	**TERMINADO**	**3/12/2022**	23/12/2022
557	B-CB-C-M20-IN-033	97%	Caseta T1	$7.756.435,16	$7.552.898,68	24/11/2022	**TERMINADO**	**29/11/2022**	23/12/2022
558	B-CB-C-M07-IN-034	35%	Adecuación	$4.947.535,77	$1.725.670,81		**NO TERMINADO**		

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
559	B-CB-C-M09-IN-035	102%	Caseta T1	$7.313.400,77	$7.431.222,43	24/11/2022	**TERMINADO**	**29/11/2022**	23/12/2022
560	B-CB-C-M05-IN-036	113%	Caseta T1	$7.108.372,44	$8.050.529,17	2/12/2022	**TERMINADO**	**7/12/2022**	23/12/2022
561	B-CB-C-M19-IN-037	74%	Caseta T1	$9.088.986,75	$6.753.296,76	28/11/2022	**TERMINADO**	**3/12/2022**	23/12/2022
562	B-CB-C-M04-IN-038	95%	Caseta T2	$7.309.774,44	$6.943.052,23	2/12/2022	**TERMINADO**	**7/12/2022**	23/12/2022
563	B-CB-C-M27-IN-039	67%	Caseta T1	$7.565.425,11	$5.082.843,31	19/01/2023	**TERMINADO**	**24/01/2023**	29/01/2023
564	B-CB-C-M15-IN-040	92%	Caseta T1	$8.796.370,53	$8.128.750,77	30/11/2022	**TERMINADO**	**5/12/2022**	23/12/2022
565	B-CB-C-M15-IN-041	95%	Caseta T1	$9.093.920,14	$8.673.279,51	2/12/2022	**TERMINADO**	**7/12/2022**	23/12/2022
566	B-CB-C-M02-IN-042	86%	Caseta T2	$8.544.118,13	$7.359.296,78	2/12/2022	**TERMINADO**	**7/12/2022**	23/12/2022
567	B-CB-C-M28-IN-043	106%	Caseta T1	$7.155.257,96	$7.588.786,28	2/12/2022	**TERMINADO**	**7/12/2022**	23/12/2022
568	B-CB-C-M04-IN-044	43%	Adecuación	$2.471.953,17	$1.069.004,94	4/01/2023	**TERMINADO**	**7/01/2023**	29/01/2023
569	B-CB-C-M02-IN-045	57%	Adecuación	$3.539.123,55	$2.028.012,45	4/01/2023	**TERMINADO**	**7/01/2023**	29/01/2023
570	B-CB-C-M03-IN-047	99%	Caseta T1	$7.664.440,08	$7.585.792,11	2/12/2022	**TERMINADO**	**7/12/2022**	23/12/2022
571	B-CB-C-M03-IN-049	83%	Caseta T1	$7.031.189,57	$5.852.823,92	9/12/2022	**TERMINADO**	**14/12/2022**	29/01/2023
572	B-CB-C-M06-IN-050	107%	Caseta T2	$7.043.121,52	$7.528.648,90	6/12/2022	**TERMINADO**	**11/12/2022**	22/01/2023
573	B-CB-C-M02-IN-051	106%	Caseta T1	$7.465.098,75	$7.903.208,47	5/12/2022	**TERMINADO**	**10/12/2022**	22/01/2023
574	B-CB-C-M08-IN-052	113%	Caseta T1	$6.691.832,67	$7.581.617,71	5/12/2022	**TERMINADO**	**10/12/2022**	22/01/2023
575	B-CB-C-M15-IN-053	89%	Caseta T1	$7.275.739,03	$6.490.643,34	11/12/2022	**TERMINADO**	**16/12/2022**	22/01/2023
576	B-CB-C-M17-IN-055	103%	Caseta T2	$7.233.717,11	$7.441.627,22	19/12/2022	**TERMINADO**	**24/12/2022**	8/01/2023
577	B-CB-C-M13-IN-056	63%	Caseta T1	$8.617.094,35	$5.404.969,41		**TERMINADO**		29/01/2023
578	B-CB-C-M03-IN-057	89%	Caseta T1	$6.862.412,23	$6.093.828,18		**TERMINADO**		29/01/2023
579	B-CB-VH-M01-VE-001	99%	Caseta T1	$7.530.288,05	$7.478.735,13	14/09/2022	**TERMINADO**	**19/09/2022**	30/10/2022
580	B-CB-VH-M02-VE-002	98%	Caseta T1	$7.097.935,12	$6.944.361,27	22/09/2022	**TERMINADO**	**27/09/2022**	30/10/2022
581	B-CB-VH-M01-VE-003	98%	Caseta T1	$6.967.489,42	$6.796.452,35	14/09/2022	**TERMINADO**	**19/09/2022**	30/10/2022
582	B-CB-VH-M02-VE-004	97%	Caseta T1	$7.311.772,60	$7.121.142,94	13/09/2022	**TERMINADO**	**18/09/2022**	30/10/2022
583	B-CB-VH-M02-VE-006	98%	Caseta T1	$7.185.516,09	$7.045.583,30	13/09/2022	**TERMINADO**	**18/09/2022**	30/10/2022
584	B-CB-VH-M01-VE-007	105%	Adecuación	$2.473.098,90	$2.601.358,88	7/10/2022	**TERMINADO**	**10/10/2022**	16/10/2022
585	B-CB-VH-M02-VE-008	30%	Adecuación	$6.761.563,02	$1.999.451,62	27/09/2022	**TERMINADO**	**30/09/2022**	16/10/2022
586	B-CB-VH-M02-VE-009	94%	Caseta T1	$7.184.529,39	$6.787.646,27	24/09/2022	**TERMINADO**	**29/09/2022**	30/10/2022
587	B-CB-VH-M03-VE-010	99%	Caseta T2	$7.765.779,93	$7.687.956,64	20/09/2022	**TERMINADO**	**25/09/2022**	30/10/2022
588	B-CB-VH-M04-VE-011	120%	Caseta T1	$6.852.690,40	$8.250.050,52	22/09/2022	**TERMINADO**	**27/09/2022**	30/10/2022
589	B-CB-VH-M05-VE-013	90%	Caseta T1	$7.925.480,24	$7.168.787,18	4/10/2022	**TERMINADO**	**9/10/2022**	6/10/2022

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
590	B-CB-VH-M05-VE-014	102%	Caseta T1	$7.573.425,40	$7.702.620,68	22/09/2022	**TERMINADO**	**27/09/2022**	30/10/2022
591	B-CB-VH-M05-VE-015	93%	Caseta T1	$7.302.874,02	$6.801.085,67	21/09/2022	**TERMINADO**	**26/09/2022**	6/10/2022
592	B-CB-VH-M05-VE-016	65%	Adecuación	$4.545.740,87	$2.973.507,57	14/10/2022	**TERMINADO**	**17/10/2022**	6/10/2022
593	B-CB-VH-M05-VE-017	80%	Caseta T1	$8.386.380,85	$6.694.652,44	24/09/2022	**TERMINADO**	**29/09/2022**	13/11/2022
594	B-CB-VH-M06-VE-018	47%	Adecuación	$5.420.365,16	$2.523.260,40	13/10/2022	**TERMINADO**	**16/10/2022**	6/10/2022
595	B-CB-VH-M06-VE-019	85%	Caseta T1	$1.809.591,53	$1.533.438,24	21/10/2022	**TERMINADO**	**26/10/2022**	13/11/2022
596	B-CB-VH-M06-VE-020	50%	Caseta T1	$3.212.476,34	$1.618.200,48	22/10/2022	**TERMINADO**	**27/10/2022**	13/11/2022
597	B-CB-VH-M06-VE-021	97%	Caseta T2	$7.319.788,91	$7.069.932,20	27/09/2022	**TERMINADO**	**2/10/2022**	13/11/2022
598	B-CB-VH-M04-VE-023	100%	Caseta T1	$7.110.372,77	$7.117.954,59	27/09/2022	**TERMINADO**	**2/10/2022**	30/10/2022
599	B-CB-VH-M06-VE-024	103%	Caseta T1	$6.835.073,75	$7.020.433,92	3/10/2022	**TERMINADO**	**8/10/2022**	13/11/2022
600	B-CB-VH-M06-VE-026	78%	Caseta T1	$6.750.117,47	$5.264.308,53	11/10/2022	**NO TERMINADO**	**16/10/2022**	
601	B-CB-VH-M07-VE-029	100%	Caseta T1	$7.189.674,85	$7.165.170,92	29/09/2022	**TERMINADO**	**4/10/2022**	13/11/2022
602	B-CB-VH-M07-VE-031	106%	Caseta T1	$6.390.564,61	$6.756.078,85	11/10/2022	**TERMINADO**	**16/10/2022**	13/11/2022
603	B-CB-VH-M07-VE-032	105%	Caseta T1	$7.212.355,78	$7.564.381,74	30/09/2022	**TERMINADO**	**5/10/2022**	13/11/2022
604	B-CB-VH-M07-VE-034	91%	Caseta T1	$7.559.464,83	$6.860.288,28	30/09/2022	**TERMINADO**	**5/10/2022**	13/11/2022
605	B-CB-VH-M07-VE-035	101%	Caseta T1	$7.125.749,42	$7.166.167,17	29/09/2022	**NO TERMINADO**	**4/10/2022**	
606	B-CB-VH-M07-VE-036	107%	Caseta T1	$6.885.917,45	$7.399.535,61	19/10/2022	**NO TERMINADO**	**24/10/2022**	
607	B-CB-VH-M07-VE-037	94%	Caseta T1	$7.506.726,96	$7.042.594,97	18/10/2022	**NO TERMINADO**	**23/10/2022**	
608	B-CB-VH-M08-VE-038	99%	Caseta T1	$6.888.396,07	$6.829.756,09	3/10/2022	**TERMINADO**	**8/10/2022**	13/11/2022
609	B-CB-VH-M08-VE-039	98%	Caseta T1	$7.506.804,91	$7.324.684,20	14/10/2022	**TERMINADO**	**19/10/2022**	4/12/2022
610	B-CB-VH-M08-VE-040	100%	Caseta T1	$7.563.652,13	$7.589.204,74	14/10/2022	**TERMINADO**	**19/10/2022**	4/12/2022
611	B-CB-VH-M09-VE-043	101%	Caseta T1	$7.112.704,93	$7.215.114,79	19/10/2022	**TERMINADO**	**24/10/2022**	20/11/2022
612	B-CB-VH-M08-VE-044	98%	Caseta T1	$6.764.497,39	$6.648.057,93	13/10/2022	**TERMINADO**	**18/10/2022**	4/12/2022
613	B-CB-VH-M09-VE-045	97%	Caseta T1	$6.528.467,76	$6.326.023,04	19/10/2022	**TERMINADO**	**24/10/2022**	4/12/2022
614	B-CB-VH-M09-VE-052	94%	Caseta T2	$7.448.056,34	$6.985.807,48	16/10/2022	**TERMINADO**	**21/10/2022**	20/11/2022
615	B-CB-VH-M13-VE-054	95%	Caseta T1	$6.977.487,10	$6.621.232,70	19/10/2022	**TERMINADO**	**24/10/2022**	4/12/2022
616	B-CB-VH-M13-VE-055	81%	Caseta T1	$7.264.305,05	$5.860.280,07	19/10/2022	**NO TERMINADO**	**24/10/2022**	
617	B-CB-VH-M15-VE-056	97%	Caseta T1	$7.857.641,87	$7.596.450,52	8/10/2022	**TERMINADO**	**13/10/2022**	4/12/2022
618	B-CB-VH-M15-VE-057	97%	Caseta T1	$7.389.336,52	$7.192.974,05	8/10/2022	**TERMINADO**	**13/10/2022**	4/12/2022
619	B-CB-VH-M14-VE-058	93%	Caseta T1	$6.808.144,55	$6.352.359,00	6/10/2022	**TERMINADO**	**11/10/2022**	4/12/2022
620	B-CB-VH-M16-VE-060	94%	Caseta T1	$7.464.503,72	$7.025.843,23	14/10/2022	**TERMINADO**	**19/10/2022**	4/12/2022

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
621	B-CB-VH-M15-VE-062	125%	Caseta T1	$6.104.049,63	$7.655.488,55	13/10/2022	**TERMINADO**	**18/10/2022**	4/12/2022
622	B-CB-VH-M16-VE-063	99%	Caseta T1	$6.688.438,66	$6.626.740,07	11/10/2022	**TERMINADO**	**16/10/2022**	4/12/2022
623	B-CB-VH-M16-VE-064	98%	Caseta T1	$6.994.456,13	$6.872.692,88	27/10/2022	**TERMINADO**	**1/11/2022**	18/12/2022
624	B-CB-VH-M16-VE-065	78%	Caseta T4	$7.227.869,74	$5.648.899,08	26/11/2022	**NO TERMINADO**	**1/12/2022**	
625	B-CB-VH-M16-VE-066	99%	Caseta T1	$7.124.075,37	$7.022.028,59	26/10/2022	**TERMINADO**	**31/10/2022**	18/12/2022
626	B-CB-VH-M17-VE-067	99%	Caseta T1	$7.059.068,77	$6.956.171,66	27/10/2022	**TERMINADO**	**1/11/2022**	18/12/2022
627	B-CB-VH-M17-VE-068	97%	Caseta T2	$6.892.806,77	$6.680.607,03	27/10/2022	**TERMINADO**	**1/11/2022**	18/12/2022
628	B-CB-VH-M18-VE-069	102%	Caseta T1	$7.376.342,75	$7.545.050,58	1/11/2022	**TERMINADO**	**6/11/2022**	4/12/2022
629	B-CB-VH-M18-VE-070	88%	Caseta T1	$8.164.048,61	$7.178.749,26	1/11/2022	**TERMINADO**	**6/11/2022**	4/12/2022
630	B-CB-VH-M16-VE-072	81%	Caseta T1	$9.285.968,35	$7.526.944,30	28/10/2022	**TERMINADO**	**2/11/2022**	18/12/2022
631	B-CB-VH-M08-VE-073	101%	Caseta T1	$7.153.850,50	$7.214.364,62	1/11/2022	**TERMINADO**	**6/11/2022**	4/12/2022
632	B-CB-VH-M18-VE-074	98%	Caseta T1	$6.966.100,45	$6.841.278,60	1/11/2022	**TERMINADO**	**6/11/2022**	4/12/2022
633	B-CB-VH-M13-VE-075	97%	Caseta T1	$6.780.696,61	$6.543.933,00	4/11/2022	**TERMINADO**	**9/11/2022**	4/12/2022
634	B-CB-VH-M18-VE-076	103%	Caseta T1	$7.380.122,18	$7.635.419,32	4/11/2022	**TERMINADO**	**9/11/2022**	4/12/2022
635	B-CB-VH-M19-VE-078	90%	Caseta T2	$7.167.261,44	$6.417.827,17	9/11/2022	**TERMINADO**	**14/11/2022**	18/12/2022
636	B-CB-VH-M19-VE-079	89%	Caseta T1	$7.546.663,95	$6.690.783,83	10/11/2022	**TERMINADO**	**15/11/2022**	18/12/2022
637	B-CB-VH-M19-VE-082	99%	Caseta T1	$7.016.445,82	$6.950.201,81	11/11/2022	**TERMINADO**	**16/11/2022**	23/12/2022
638	B-CB-VH-M19-VE-083	92%	Caseta T2	$7.019.108,67	$6.441.700,34	9/11/2022	**TERMINADO**	**14/11/2022**	23/12/2022
639	B-CB-VH-M20-VE-084	101%	Caseta T1	$7.273.637,66	$7.356.501,12	7/11/2022	**TERMINADO**	**12/11/2022**	18/12/2022
640	B-CB-VH-M20-VE-085	97%	Caseta T1	$7.210.106,01	$6.960.163,26	7/11/2022	**TERMINADO**	**12/11/2022**	18/12/2022
641	B-CB-VH-M20-VE-086	89%	Caseta T1	$7.075.779,69	$6.314.104,90	7/11/2022	**TERMINADO**	**12/11/2022**	23/12/2022
642	B-CB-VH-M20-VE-087	93%	Caseta T1	$7.097.946,60	$6.594.824,92	11/11/2022	**TERMINADO**	**16/11/2022**	23/12/2022
643	B-CB-VH-M20-VE-088	15%	Caseta T2	$5.780.377,96	$859.151,15	20/01/2023	**NO TERMINADO**	**25/01/2023**	
644	B-CB-VH-M20-VE-089	88%	Caseta T1	$7.369.164,62	$6.480.310,13	9/11/2022	**TERMINADO**	**14/11/2022**	23/12/2022
645	B-CB-VH-M21-VE-090	100%	Caseta T1	$7.594.789,05	$7.563.769,25	13/11/2022	**TERMINADO**	**18/11/2022**	23/12/2022
646	B-CB-VH-M19-VE-091	99%	Caseta T1	$7.359.646,86	$7.262.663,10	7/11/2022	**TERMINADO**	**12/11/2022**	23/12/2022
647	B-CB-VH-M21-VE-092	96%	Caseta T1	$8.182.144,53	$7.887.397,73	15/11/2022	**TERMINADO**	**20/11/2022**	23/12/2022
648	B-CB-VH-M21-VE-093	99%	Caseta T1	$7.427.237,60	$7.331.229,05	15/11/2022	**TERMINADO**	**20/11/2022**	23/12/2022
649	B-CB-VH-M21-VE-095	103%	Caseta T2	$6.015.766,81	$6.177.363,64	17/11/2022	**TERMINADO**	**22/11/2022**	23/12/2022
650	B-CB-VH-M21-VE-096	100%	Caseta T2	$6.784.215,24	$6.758.495,64	15/11/2022	**TERMINADO**	**20/11/2022**	23/12/2022
651	B-CB-VH-M03-VE-097	93%	Caseta T1	$7.438.303,89	$6.950.704,99	17/11/2022	**TERMINADO**	**22/11/2022**	23/12/2022

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
652	B-CB-VH-M21-VE-098	79%	Caseta T2	$6.114.765,24	$4.833.088,39	17/11/2022	**TERMINADO**	**22/11/2022**	23/12/2022
653	B-CB-VH-M21-VE-100	74%	Caseta T1	$8.379.519,36	$6.177.811,57	17/11/2022	**TERMINADO**	**22/11/2022**	30/12/2022
654	B-CB-VH-M23-VE-101	93%	Caseta T1	$7.708.757,92	$7.144.869,88	19/11/2022	**TERMINADO**	**24/11/2022**	23/12/2022
655	B-CB-VH-M23-VE-102	103%	Caseta T1	$7.671.554,06	$7.925.270,88	23/11/2022	**TERMINADO**	**28/11/2022**	30/12/2022
656	B-CB-VH-M24-VE-104	90%	Caseta T1	$6.666.698,93	$6.032.784,24	19/11/2022	**TERMINADO**	**24/11/2022**	23/12/2022
657	B-CB-VH-M24-VE-105	81%	Caseta T1	$6.777.569,46	$5.488.952,80	23/11/2022	**TERMINADO**	**28/11/2022**	30/12/2022
658	B-CB-VH-M21-VE-106	84%	Caseta T1	$6.879.572,54	$5.760.850,53	23/11/2022	**TERMINADO**	**28/11/2022**	30/12/2022
659	B-CB-VH-M21-VE-107	99%	Caseta T1	$6.649.693,65	$6.583.162,70	23/11/2022	**TERMINADO**	**28/11/2022**	30/12/2022
660	B-CB-VH-M23-VE-108	89%	Caseta T1	$7.602.414,00	$6.728.957,17	23/11/2022	**TERMINADO**	**28/11/2022**	30/12/2022
661	B-CB-VH-M25-VE-109	95%	Caseta T1	$7.267.056,70	$6.911.195,89	29/11/2022	**TERMINADO**	**4/12/2022**	30/12/2022
662	B-CB-VH-M25-VE-110	97%	Caseta T1	$7.124.509,04	$6.946.345,84	26/11/2022	**TERMINADO**	**1/12/2022**	30/12/2022
663	B-CB-VH-M25-VE-111	96%	Caseta T1	$7.141.676,69	$6.891.335,76	26/11/2022	**TERMINADO**	**1/12/2022**	30/12/2022
664	B-CB-VH-M25-VE-112	97%	Caseta T1	$7.623.594,83	$7.424.211,78	29/11/2022	**TERMINADO**	**4/12/2022**	30/12/2022
665	B-CB-VH-M26-VE-113	93%	Caseta T1	$7.743.073,74	$7.163.161,54	26/11/2022	**TERMINADO**	**1/12/2022**	30/12/2022
666	B-CB-VH-M26-VE-114	97%	Caseta T1	$7.539.273,76	$7.277.444,90	24/11/2022	**TERMINADO**	**29/11/2022**	30/12/2022
667	B-CB-VH-M26-VE-115	98%	Caseta T1	$7.069.975,20	$6.925.822,04	24/11/2022	**TERMINADO**	**29/11/2022**	30/12/2022
668	B-CB-VH-M26-VE-116	91%	Caseta T1	$7.114.143,39	$6.490.696,29	29/11/2022	**TERMINADO**	**4/12/2022**	30/12/2022
669	B-CB-VH-M26-VE-117	94%	Caseta T1	$7.535.330,34	$7.088.773,60	24/11/2022	**TERMINADO**	**29/11/2022**	30/12/2022
670	B-CB-VH-M26-VE-118	88%	Caseta T1	$7.165.008,40	$6.340.721,53	24/11/2022	**TERMINADO**	**29/11/2022**	30/12/2022
671	B-CB-VH-M26-VE-119	100%	Caseta T1	$6.957.260,60	$6.971.584,22	26/11/2022	**TERMINADO**	**1/12/2022**	30/12/2022
672	B-CB-VH-M26-VE-120	84%	Caseta T1	$7.288.578,20	$6.141.478,57	25/11/2022	**TERMINADO**	**30/11/2022**	30/12/2022
673	B-CB-VH-M26-VE-121	96%	Caseta T1	$7.224.024,73	$6.901.477,74	3/12/2022	**TERMINADO**	**8/12/2022**	30/12/2022
674	B-CB-VH-M27-VE-122	99%	Caseta T1	$6.938.069,60	$6.835.093,52	3/12/2022	**TERMINADO**	**8/12/2022**	30/12/2022
675	B-CB-VH-M27-VE-123	103%	Caseta T1	$6.994.576,06	$7.231.201,36	3/12/2022	**TERMINADO**	**8/12/2022**	30/12/2022
676	B-CB-VH-M26-VE-124	102%	Caseta T1	$7.148.661,18	$7.272.035,76	3/12/2022	**TERMINADO**	**8/12/2022**	30/12/2022
677	B-CB-VH-M28-VE-125	91%	Caseta T1	$6.862.232,35	$6.255.838,10	4/12/2022	**TERMINADO**	**9/12/2022**	30/12/2022
678	B-CB-VH-M28-VE-127	96%	Caseta T1	$6.934.695,23	$6.622.970,72	5/12/2022	**TERMINADO**	**10/12/2022**	30/12/2022
679	B-CB-VH-M28-VE-128	82%	Caseta T4	$7.726.193,38	$6.372.954,85	5/12/2022	**NO TERMINADO**	**10/12/2022**	
680	B-CB-VH-M28-VE-129	83%	Caseta T1	$6.604.403,88	$5.453.788,12	5/12/2022	**NO TERMINADO**	**10/12/2022**	
681	B-CB-VH-M28-VE-130	86%	Caseta T1	$6.882.324,28	$5.950.744,76	11/12/2022	**NO TERMINADO**	**16/12/2022**	
682	B-CB-VH-M16-VE-151	72%	Caseta T1	$8.037.831,78	$5.788.366,16	10/12/2022	**NO TERMINADO**	**15/12/2022**	

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
683	B-CB-VH-M01-VE-152	89%	Caseta T1	$6.973.301,08	$6.177.811,57	12/12/2022	**TERMINADO**	**17/12/2022**	15/01/2023
684	B-CB-VH-M18-VE-153	89%	Caseta T1	$7.524.188,19	$6.665.201,69	12/12/2022	**TERMINADO**	**17/12/2022**	15/01/2023
685	B-CB-VH-M27-VE-156	86%	Caseta T1	$7.410.062,14	$6.372.492,34	12/12/2022	**TERMINADO**	**17/12/2022**	15/01/2023
686	B-CB-VH-M31-VE-159	86%	Caseta T1	$7.425.736,24	$6.371.046,99	13/12/2022	**NO TERMINADO**	**18/12/2022**	
687	B-CB-VH-M34-VE-160	89%	Caseta T1	$7.436.066,65	$6.631.288,37	13/12/2022	**TERMINADO**	**18/12/2022**	15/01/2023
688	B-CB-VH-M35-VE-161	86%	Caseta T1	$7.206.461,05	$6.177.811,57	15/12/2022	**TERMINADO**	**20/12/2022**	15/01/2023
689	B-CB-VH-M34-VE-162	87%	Caseta T4	$7.951.969,04	$6.954.327,11	16/12/2022	**TERMINADO**	**21/12/2022**	15/01/2023
690	B-CB-VH-M34-VE-163	75%	Caseta T1	$7.196.235,64	$5.389.358,95	16/12/2022	**NO TERMINADO**	**21/12/2022**	
691	B-CB-VH-M34-VE-164	82%	Caseta T1	$7.411.799,27	$6.074.043,04	16/12/2022	**NO TERMINADO**	**21/12/2022**	
692	B-CB-VH-M35-VE-165	81%	Caseta T1	$7.144.837,61	$5.815.911,45	17/12/2022	**NO TERMINADO**	**22/12/2022**	
693	B-CB-VH-M34-VE-166	74%	Caseta T1	$7.570.063,03	$5.606.456,09	17/12/2022	**NO TERMINADO**	**22/12/2022**	
694	B-CB-VH-M27-VE-167	81%	Caseta T1	$7.039.904,34	$5.715.903,27	17/12/2022	**NO TERMINADO**	**22/12/2022**	
695	B-CB-VH-M16-VE-169	89%	Caseta T1	$6.934.695,23	$6.177.811,57	17/12/2022	**TERMINADO**	**22/12/2022**	15/01/2023
696	B-CB-VH-M17-VE-170	88%	Caseta T1	$7.114.857,84	$6.285.753,05	18/12/2022	**TERMINADO**	**23/12/2022**	15/01/2023
697	B-CB-VH-M20-VE-173	87%	Caseta T1	$7.290.151,10	$6.341.889,85	18/12/2022	**NO TERMINADO**	**23/12/2022**	
698	B-CB-VH-M34-VE-174	89%	Caseta T1	$7.398.624,03	$6.604.253,02	19/12/2022	**NO TERMINADO**	**24/12/2022**	
699	B-CB-VH-M23-VE-175	79%	Caseta T1	$7.682.885,59	$6.078.217,72	20/12/2022	**NO TERMINADO**	**25/12/2022**	
700	B-CB-VH-M04-VE-176	85%	Caseta T1	$7.213.133,35	$6.116.554,10	19/12/2022	**NO TERMINADO**	**24/12/2022**	
701	B-CB-VH-M01-VE-178	80%	Caseta T1	$7.275.229,86	$5.796.100,06	20/12/2022	**NO TERMINADO**	**25/12/2022**	
702	B-CB-VH-M26-VE-182	56%	Caseta T1	$7.934.663,70	$4.447.341,40	22/12/2022	**NO TERMINADO**	**27/12/2022**	
703	B-CB-VH-M17-VE-186	82%	Caseta T1	$7.885.012,25	$6.479.600,07	19/12/2022	**NO TERMINADO**	**24/12/2022**	
704	B-CB-VH-M18-VE-187	74%	Caseta T1	$7.101.447,40	$5.244.141,65	22/12/2022	**NO TERMINADO**	**27/12/2022**	
705	B-CB-VH-M08-VE-189	75%	Caseta T1	$7.020.351,30	$5.244.141,65	9/01/2023	**NO TERMINADO**	**14/01/2023**	
706	B-CB-VH-M36-VE-192	66%	Caseta T1	$7.805.902,57	$5.136.200,17	23/12/2022	**NO TERMINADO**	**28/12/2022**	
707	B-CB-VH-M36-VE-193	74%	Caseta T1	$6.970.926,68	$5.136.200,17	23/12/2022	**NO TERMINADO**	**28/12/2022**	
708	B-CB-VH-M36-VE-194	68%	Caseta T1	$7.605.186,82	$5.136.200,17	23/12/2022	**NO TERMINADO**	**28/12/2022**	
709	B-CB-VH-M36-VE-195	84%	Caseta T1	$6.970.926,68	$5.823.872,19	23/12/2022	**NO TERMINADO**	**28/12/2022**	
710	B-CB-VH-M36-VE-196	86%	Caseta T1	$7.132.094,66	$6.127.691,71	31/12/2022	**NO TERMINADO**	**5/01/2023**	
711	B-CB-VH-M38-VE-197	73%	Caseta T1	$7.059.631,78	$5.136.200,17	2/01/2023	**NO TERMINADO**	**7/01/2023**	
712	B-CB-VH-M38-VE-198	67%	Caseta T1	$7.642.759,13	$5.136.200,17	30/12/2022	**NO TERMINADO**	**4/01/2023**	
713	B-CB-VH-M19-IN-001	55%	Caseta T1	$8.141.895,21	$4.447.341,40	4/01/2023	**NO TERMINADO**	**9/01/2023**	

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
714	B-CB-VH14-M-IN-002	86%	Caseta T1	$7.182.536,48	$6.201.769,67	1/01/2023	**NO TERMINADO**	**6/01/2023**	
715	B-CB-VH-M34-IN-003	103%	Caseta T1	$6.612.857,76	$6.801.042,42	7/01/2023	**NO TERMINADO**	**12/01/2023**	
716	B-CB-VH-M39-IN-004	73%	Caseta T1	$7.136.392,84	$5.244.141,65	4/01/2023	**NO TERMINADO**	**9/01/2023**	
717	B-CB-VH-M39-IN-005	72%	Caseta T1	$7.296.716,50	$5.244.141,65	4/01/2023	**NO TERMINADO**	**9/01/2023**	
718	B-CB-VH-M39-IN-006	79%	Caseta T1	$7.236.322,55	$5.737.642,14	4/01/2023	**NO TERMINADO**	**9/01/2023**	
719	B-CB-VH-M38-IN-007	76%	Caseta T1	$7.355.886,83	$5.615.379,04	4/01/2023	**NO TERMINADO**	**9/01/2023**	
720	B-CB-VH-M37-IN-008	69%	Caseta T1	$7.415.558,29	$5.136.200,17	5/01/2023	**NO TERMINADO**	**10/01/2023**	
721	B-CB-VH-M15-IN-009	64%	Caseta T2	$6.331.543,50	$4.036.288,14	5/01/2023	**NO TERMINADO**	**10/01/2023**	
722	B-CB-VH-M39-IN-010	83%	Caseta T1	$6.696.085,29	$5.588.370,35	4/01/2023	**NO TERMINADO**	**9/01/2023**	
723	B-CB-VH-M36-IN-011	78%	Caseta T1	$7.990.780,66	$6.223.939,47	5/01/2023	**NO TERMINADO**	**10/01/2023**	
724	B-CB-VH-M39-IN-012	69%	Caseta T1	$7.582.498,25	$5.244.141,65	14/01/2023	**NO TERMINADO**	**19/01/2023**	
725	B-CB-VH-M35-IN-013	82%	Caseta T1	$7.457.737,00	$6.103.165,99	5/01/2023	**NO TERMINADO**	**10/01/2023**	
726	B-CB-VH-M36-IN-015	87%	Caseta T1	$7.425.688,78	$6.454.947,30	7/01/2023	**NO TERMINADO**	**12/01/2023**	
727	B-CB-VH-M23-IN-016	68%	Caseta T1	$7.735.795,44	$5.244.141,65	15/01/2023	**NO TERMINADO**	**20/01/2023**	
728	B-CB-VH-M25-IN-017	59%	Caseta T1	$7.189.149,72	$4.277.470,03	26/01/2023	**NO TERMINADO**	**31/01/2023**	
729	B-CB-VH-M20-IN-019	51%	Caseta T2	$6.454.074,11	$3.288.726,49	26/01/2023	**NO TERMINADO**	**31/01/2023**	
730	B-CB-VH-M27-IN-020	74%	Caseta T1	$7.737.037,43	$5.732.636,41	8/01/2023	**NO TERMINADO**	**13/01/2023**	
731	B-CB-VH-M17-IN-021	84%	Caseta T1	$7.572.137,86	$6.356.254,60	13/01/2023	**NO TERMINADO**	**18/01/2023**	
732	B-CB-VH-M19-IN-022	59%	Caseta T1	$7.394.689,26	$4.385.411,51	15/01/2023	**NO TERMINADO**	**20/01/2023**	
733	B-CB-VH-M19-IN-023	65%	Caseta T1	$6.833.412,01	$4.447.341,40	27/01/2023	**NO TERMINADO**	**1/02/2023**	
734	B-CB-VH-M17-IN-024	77%	Caseta T1	$7.198.282,91	$5.571.217,35	8/01/2023	**NO TERMINADO**	**13/01/2023**	
735	B-CB-VH-M25-IN-025	23%	Caseta T1	$1.908.943,50	$441.274,49	21/01/2023	**NO TERMINADO**	**26/01/2023**	
736	B-CB-VH-M07-IN-029	68%	Caseta T2	$8.235.349,45	$5.615.101,23	9/01/2023	**NO TERMINADO**	**14/01/2023**	
737	B-CB-VH-M38-IN-033	55%	Caseta T1	$7.978.405,65	$4.385.411,51	8/01/2023	**NO TERMINADO**	**13/01/2023**	
738	B-CB-VH-M01-IN-037	67%	Caseta T1	$2.705.743,75	$1.817.454,48	21/01/2023	**NO TERMINADO**	**26/01/2023**	
739	B-CB-VH-M22-IN-039	62%	Caseta T1	$6.903.633,71	$4.277.470,03	15/01/2023	**NO TERMINADO**	**20/01/2023**	
740	B-CB-VH-M35-IN-040	61%	Caseta T1	$6.991.058,80	$4.277.470,03	26/01/2023	**NO TERMINADO**	**31/01/2023**	
741	B-CB-VH-M37-IN-041	58%	Caseta T1	$7.562.770,81	$4.385.411,51	15/01/2023	**NO TERMINADO**	**20/01/2023**	
742	B-CB-VH-M15-IN-043	58%	Caseta T1	$2.705.743,75	$1.557.156,71	21/01/2023	**NO TERMINADO**	**26/01/2023**	
743	B-CB-VH-M17-IN-044	62%	Caseta T1	$7.055.398,67	$4.385.411,51	26/01/2023	**NO TERMINADO**	**31/01/2023**	
744	B-CB-V-M02-VE-002	171%	Adecuación	$2.474.432,07	$4.221.230,66	16/12/2022	**TERMINADO**	**19/12/2022**	15/01/2023

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
745	B-CB-V-M02-VE-003	144%	Adecuación	$2.923.130,19	$4.215.759,39	12/12/2022	**TERMINADO**	**15/12/2022**	15/01/2023
746	B-CB-V-M02-VE-004	138%	Adecuación	$1.275.515,50	$1.756.820,74	12/12/2022	**TERMINADO**	**15/12/2022**	23/12/2022
747	B-CB-V-M03-VE-005	100%	Caseta T2	$7.099.610,25	$7.134.798,06	9/12/2022	**NO TERMINADO**	**14/12/2022**	
748	B-CB-V-M03-VE-006	134%	Adecuación	$2.637.468,82	$3.525.127,39	13/12/2022	**TERMINADO**	**16/12/2022**	15/01/2023
749	B-CB-V-M03-VE-007	172%	Adecuación	$2.628.169,82	$4.521.342,19	20/12/2022	**TERMINADO**	**23/12/2022**	15/01/2023
750	B-CB-V-M03-VE-008	121%	Adecuación	$2.681.046,14	$3.249.093,38	12/01/2023	**NO TERMINADO**	**15/01/2023**	
751	B-CB-V-M03-VE-009	187%	Adecuación	$808.201,70	$1.508.039,10	13/01/2023	**NO TERMINADO**	**16/01/2023**	
752	B-CB-V-M03-VE-011	101%	Caseta T1	$7.134.896,91	$7.202.060,02	18/12/2022	**NO TERMINADO**	**23/12/2022**	
753	B-CB-V-M04-VE-013	105%	Caseta T2	$7.022.179,91	$7.358.840,53	9/12/2022	**NO TERMINADO**	**14/12/2022**	
754	B-CB-V-M04-VE-017	167%	Adecuación	$1.933.275,85	$3.227.439,23	19/01/2023	**NO TERMINADO**	**22/01/2023**	
755	B-CB-V-M04-VE-018	236%	Adecuación	$1.323.324,32	$3.117.530,97	10/01/2023	**NO TERMINADO**	**13/01/2023**	
756	B-CB-V-M04-VE-019	113%	Caseta T2	$7.002.925,30	$7.933.536,89	11/12/2022	**NO TERMINADO**	**16/12/2022**	
757	B-CB-V-M04-VE-021	119%	Adecuación	$2.065.948,36	$2.467.028,85	14/12/2022	**NO TERMINADO**	**17/12/2022**	
758	B-CB-V-M04-VE-022	138%	Adecuación	$3.028.117,48	$4.177.334,21	12/12/2022	**NO TERMINADO**	**15/12/2022**	
759	B-CB-V-M04-VE-023	85%	Adecuación	$2.316.016,26	$1.971.023,99	20/12/2022	**NO TERMINADO**	**23/12/2022**	
760	B-CB-V-M04-VE-024	26%	Adecuación	$2.883.767,78	$739.747,88	29/01/2023	**NO TERMINADO**	**1/02/2023**	
761	B-CB-V-M04-VE-025	148%	Adecuación	$3.063.361,91	$4.518.951,34	18/01/2023	**NO TERMINADO**	**21/01/2023**	
762	B-CB-V-M04-VE-026	95%	Caseta T1	$7.918.228,97	$7.529.406,41	16/12/2022	**NO TERMINADO**	**21/12/2022**	
763	B-CB-V-M04-VE-027	18%	Adecuación	$4.034.128,75	$739.747,88	29/01/2023	**NO TERMINADO**	**1/02/2023**	
764	B-CB-V-M04-VE-028	125%	Adecuación	$4.224.263,18	$5.285.308,46	17/01/2023	**NO TERMINADO**	**20/01/2023**	
765	B-CB-V-M04-VE-031	95%	Adecuación	$3.288.710,17	$3.130.284,51	19/01/2023	**NO TERMINADO**	**22/01/2023**	
766	B-CB-V-M05-VE-032	103%	Caseta T1	$7.496.998,60	$7.753.157,14	19/12/2022	**NO TERMINADO**	**24/12/2022**	
767	B-CB-V-M04-VE-033	110%	Adecuación	$3.707.841,88	$4.093.956,47	11/01/2023	**NO TERMINADO**	**14/01/2023**	
768	B-CB-V-M05-VE-034	166%	Adecuación	$1.982.299,44	$3.294.841,66	14/01/2023	**NO TERMINADO**	**17/01/2023**	
769	B-CB-V-M05-VE-035	195%	Caseta T1	$2.819.040,98	$5.484.558,63	15/01/2023	**NO TERMINADO**	**20/01/2023**	
770	B-CB-V-M05-VE-037	258%	Adecuación	$1.130.254,19	$2.920.471,42	17/01/2023	**NO TERMINADO**	**20/01/2023**	
771	B-CB-V-M05-VE-038	181%	Adecuación	$1.328.562,68	$2.402.672,80	11/01/2023	**NO TERMINADO**	**14/01/2023**	
772	B-CB-V-M04-VE-040	119%	Adecuación	$3.734.749,19	$4.433.273,21	11/01/2023	**NO TERMINADO**	**14/01/2023**	
773	B-CB-V-M05-VE-041	135%	Adecuación	$3.476.999,11	$4.700.956,34	25/01/2023	**NO TERMINADO**	**28/01/2023**	
774	B-CB-V-M05-VE-042	48%	Adecuación	$4.109.679,69	$1.967.180,39	24/01/2023	**NO TERMINADO**	**27/01/2023**	
775	B-CB-V-M05-VE-043	105%	Caseta T1	$7.676.875,30	$8.041.563,34	19/12/2022	**NO TERMINADO**	**24/12/2022**	

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
776	B-CB-V-M05-VE-044	96%	Caseta T1	$7.581.779,44	$7.312.727,50	19/12/2022	**NO TERMINADO**	**24/12/2022**	
777	B-CB-V-M05-VE-045	106%	Caseta T2	$6.524.097,38	$6.928.546,36	17/12/2022	**NO TERMINADO**	**22/12/2022**	
778	B-CB-V-M05-VE-046	55%	Adecuación	$967.332,58	$534.676,68	27/01/2023	**NO TERMINADO**	**30/01/2023**	
779	B-CB-V-M05-VE-047	113%	Adecuación	$1.983.172,03	$2.235.249,57	26/01/2023	**NO TERMINADO**	**29/01/2023**	
780	B-CB-V-M05-VE-048	95%	Caseta T1	$7.931.930,22	$7.552.984,12	26/12/2022	**NO TERMINADO**	**31/12/2022**	
781	B-CB-V-M05-VE-049	118%	Caseta T1	$6.772.278,24	$7.959.258,29	26/12/2022	**NO TERMINADO**	**31/12/2022**	
782	B-CB-V-M06-VE-050	242%	Adecuación	$1.567.037,46	$3.786.552,20	17/01/2023	**NO TERMINADO**	**20/01/2023**	
783	B-CB-V-M05-VE-051	135%	Adecuación	$818.256,79	$1.107.158,50	25/01/2023	**NO TERMINADO**	**28/01/2023**	
784	B-CB-V-M06-VE-053	108%	Caseta T2	$7.109.993,85	$7.655.055,77	26/12/2022	**NO TERMINADO**	**31/12/2022**	
785	B-CB-V-M06-VE-057	38%	Adecuación	$1.965.477,20	$739.747,88	29/01/2023	**NO TERMINADO**	**1/02/2023**	
786	B-CB-V-M07-VE-058	88%	Caseta T1	$6.910.659,80	$6.108.830,41	7/01/2023	**NO TERMINADO**	**12/01/2023**	
787	B-CB-V-M07-VE-060	136%	Adecuación	$2.381.288,74	$3.238.300,75	18/01/2023	**NO TERMINADO**	**21/01/2023**	
788	B-CB-V-M06-VE-061	89%	Caseta T1	$7.714.731,22	$6.860.148,39	14/01/2023	**NO TERMINADO**	**19/01/2023**	
789	B-CB-V-M06-VE-062	90%	Adecuación	$4.051.051,65	$3.655.731,67	20/01/2023	**NO TERMINADO**	**23/01/2023**	
790	B-CB-V-M07-VE-063	83%	Adecuación	$3.342.858,84	$2.787.212,83	20/01/2023	**NO TERMINADO**	**23/01/2023**	
791	B-CB-V-M07-VE-064	89%	Adecuación	$2.670.428,02	$2.380.612,82	23/01/2023	**NO TERMINADO**	**26/01/2023**	
792	B-CB-V-M07-VE-065	95%	Caseta T1	$7.883.379,31	$7.526.773,03	16/01/2023	**NO TERMINADO**	**21/01/2023**	
793	B-CB-V-M07-VE-066	90%	Caseta T2	$6.980.672,57	$6.248.562,97	14/01/2023	**NO TERMINADO**	**19/01/2023**	
794	B-CB-V-M07-VE-068	59%	Caseta T1	$7.455.033,71	$4.385.411,51	11/01/2023	**NO TERMINADO**	**16/01/2023**	
795	B-CB-V-M07-VE-067	13%	Adecuación	$2.280.796,88	$294.412,54	20/01/2023	**NO TERMINADO**	**23/01/2023**	
796	B-CB-V-M07-VE-069	78%	Caseta T1	$7.548.575,80	$5.918.481,17	18/01/2023	**NO TERMINADO**	**23/01/2023**	
797	B-CB-V-M07-VE-070	102%	Caseta T2	$6.879.450,54	$6.989.203,15	12/01/2023	**NO TERMINADO**	**17/01/2023**	
798	B-CB-V-M07-VE-071	49%	Caseta T1	$7.334.105,22	$3.588.611,26	17/01/2023	**NO TERMINADO**	**22/01/2023**	
799	B-CB-V-M08-VE-073	70%	Caseta T1	$7.177.239,40	$5.015.786,84	13/01/2023	**NO TERMINADO**	**18/01/2023**	
800	B-CB-V-M08-VE-074	60%	Caseta T1	$7.249.286,85	$4.385.411,51	18/01/2023	**NO TERMINADO**	**23/01/2023**	
801	B-CB-V-M09-VE-076	79%	Caseta T1	$7.020.401,69	$5.559.719,83	16/01/2023	**NO TERMINADO**	**21/01/2023**	
802	B-CB-V-M09-VE-077	55%	Caseta T2	$7.741.885,02	$4.285.920,48	17/01/2023	**NO TERMINADO**	**22/01/2023**	
803	B-CB-V-M10-VE-078	84%	Caseta T1	$7.345.396,67	$6.138.864,01	16/01/2023	**NO TERMINADO**	**21/01/2023**	
804	B-CB-V-M09-VE-079	69%	Caseta T1	$7.813.071,92	$5.407.032,60	16/01/2023	**NO TERMINADO**	**21/01/2023**	
805	B-CB-V-M10-VE-080	76%	Caseta T1	$7.413.589,35	$5.652.220,31	18/01/2023	**NO TERMINADO**	**23/01/2023**	
806	B-CB-V-M10-VE-081	78%	Caseta T1	$7.729.040,72	$6.042.265,54	23/01/2023	**NO TERMINADO**	**28/01/2023**	

No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización
807	B-CB-V-M10-VE-082	78%	Caseta T1	$6.943.724,20	$5.448.225,63	24/01/2023	**NO TERMINADO**	**29/01/2023**	
808	B-CB-V-M10-VE-084	70%	Caseta T1	$7.663.753,19	$5.367.617,40	23/01/2023	**NO TERMINADO**	**28/01/2023**	
809	B-CB-V-M10-VE-085	59%	Caseta T1	$7.422.622,26	$4.385.411,51	25/01/2023	**NO TERMINADO**	**30/01/2023**	
810	B-CB-V-M10-VE-086	57%	Caseta T1	$7.684.713,86	$4.385.411,51	25/01/2023	**NO TERMINADO**	**30/01/2023**	
811	B-CB-V-M05-VE-087	58%	Caseta T1	$7.623.868,87	$4.385.411,51	27/01/2023	**NO TERMINADO**	**1/02/2023**	
812	B-CB-V-M10-VE-088	59%	Caseta T1	$7.262.760,70	$4.277.470,03	25/01/2023	**NO TERMINADO**	**30/01/2023**	
813	B-CB-V-M10-VE-092	29%	Caseta T1	$7.210.633,30	$2.057.015,72	24/01/2023	**NO TERMINADO**	**29/01/2023**	
814	B-CB-V-M10-VE-095	69%	Caseta T1	$7.625.327,88	$5.267.529,74	24/01/2023	**NO TERMINADO**	**29/01/2023**	
815	B-CB-V-M11-VE-101	34%	Caseta T1	$8.046.317,89	$2.705.743,75	27/01/2023	**NO TERMINADO**	**1/02/2023**	
816	B-CB-V-M08-VE-108	79%	Caseta T1	$7.452.451,74	$5.910.929,58	19/01/2023	**NO TERMINADO**	**24/01/2023**	
817	B-CB-V-M12-VE-112	27%	Caseta T2	$6.692.205,08	$1.793.603,20	27/01/2023	**NO TERMINADO**	**1/02/2023**	
818	B-CB-V-M14-VE-119	36%	Caseta T1	$7.506.399,20	$2.705.743,75	27/01/2023	**NO TERMINADO**	**1/02/2023**	
819	B-CB-V-M15-VE-120	39%	Caseta T1	$6.602.550,78	$2.597.802,27	27/01/2023	**NO TERMINADO**	**1/02/2023**	

Adicionalmente, durante la ejecución de la Actividad 3, la interventoría tomó las muestras de concreto relacionadas en la siguiente tabla.

TABLA 21. RELACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS.

FECHA	TIPO DE MUESTRAS	No. DE MUESTRAS	ENSAYO A APLICAR
17/01/2023	Cilindros de concreto para cimentación de 4” de diámetro.	3	NTC 673 - Resistencia del concreto a compresión
30/01/2023	Cilindros de concreto para dovelas de 4” de diámetro.	3	NTC 673 - Resistencia del concreto a compresión

En el **Anexo 13,** se presentan pruebas y ensayos realizados

4.1.4. Avance general del proyecto.


De acuerdo con las actividades realizadas por el contratista de obra, se presenta el avance general del proyecto durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2023 y el 31 de enero de 2023.

Teniendo en cuenta la programación, se presenta un atraso en la obra del -12.76%, debido a que a la fecha de corte de este informe se cuenta con 940 diagnósticos aprobados contra los 1046 contemplados en la programación. Adicionalmente, se encuentran terminadas 661 viviendas, en comparación con las 834 establecidas en la programación actualizada derivada de la novedad contractual de adición.

TABLA 22. AVANCE DEL PROYECTO – INFORMES SEMANALES.

AVANCE DE ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DURANTE EL PERIODO				
INFORME No	**PERIODO**	**PROGRAMADO ACUMULADO**	**EJECUTADO APROBADO**	**ATRASO**
38	Del 02 de enero de 2023 al 08 de enero de 2023.	75,06% $ 5.966.272.276,71	60,63% $ 4.819.658.405,38	-14,42%
39	Del 09 de enero de 2023 al 15 de enero de 2023.	75,21% $ 5.978.287.627,78	62,56% $ 4.972.816.391,22	-12,65%
40	Del 16 de enero de 2023 al 22 de enero de 2023.	77,23% $ 6.138.752.678,88	65,00% $ 5.167.236.769,38	-12,22%
41	Del 23 de enero de 2023 al 29 de enero de 2023.	80,20% $ 6.375.502.354,45	67,44% $ 5.360.992.105,18	-12,76%

TABLA 23. GRÁFICA AVANCE ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA

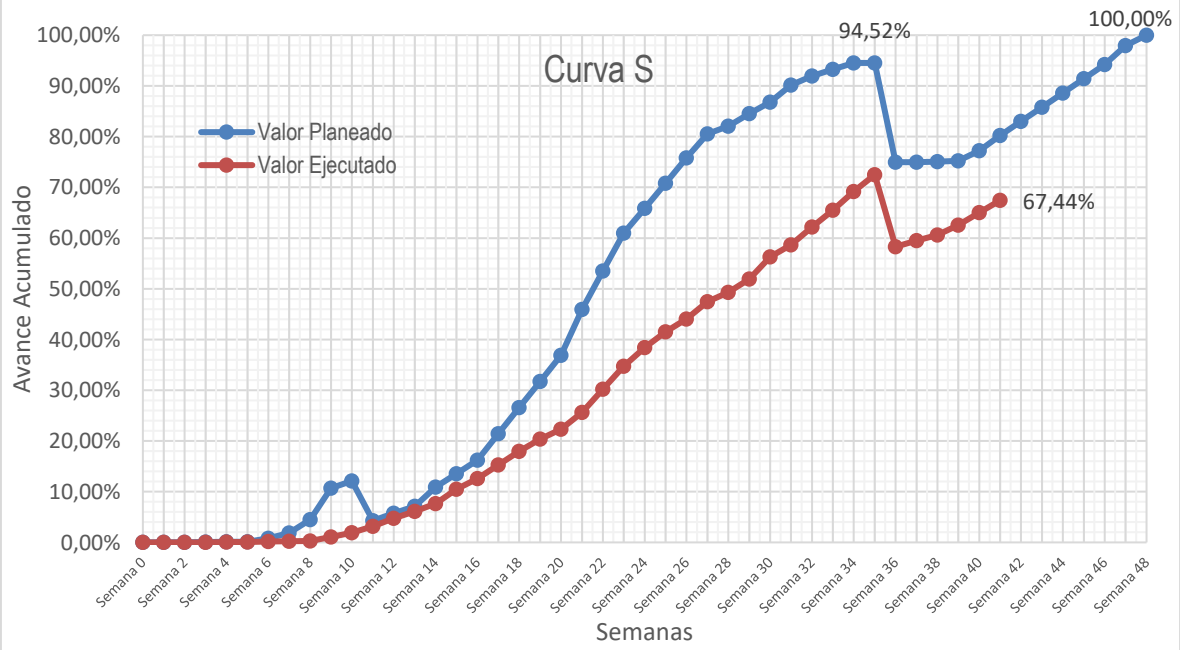

TRAZABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN: Luego de revisada la programación remitida por el contratista de obra en respuesta al plan de contingencia solicitada, el equipo técnico de DAIMCO S.A.S. dio aval el día 22 de julio de 2022, mediante comunicado ICB-ENTERRITORIO-2022-072, con radicado No. 20224300276912.

Luego de revisado el plan de acción presentado por el contratista de obra en respuesta a la solicitud emitida por la interventoría, el equipo técnico de DAIMCO S.A.S. remitió observaciones al plan el 12 de octubre de 2022 vía correo electrónico, mediante

comunicado ICB-ENTERRITORIO-2022-134. A la fecha de corte de este informe, la interventoría no ha recibido respuesta por parte del contratista, por lo cual la interventoría ha reiterado su solicitud de subsanación a estas observaciones a través de los comités de seguimiento semanal No. 25 y No. 26, llevados a cabo el 22 de octubre de 2022 y 28 de octubre de 2022, respectivamente.

Adicionalmente, Las líneas base del proyecto han cambiado teniendo en cuenta que se firmó una adición al contrato, donde el valor del contrato asciende a $ 7.949.069.174,67, por lo cual tiene una variación de $ 1.828.773.582,67, y el tiempo del contrato tiene una prorrogación del plazo hasta el 18 de marzo de 2023, por lo cual tiene una variación de 90 días. Teniendo en cuenta esta novedad contractual de adición que presenta el proyecto se ha ajustado la programación del proyecto, teniendo en cuenta la novedad contractual que se ha presentado. La interventoría da aval a la reprogramación derivada de la novedad contractual del proyecto el 02 de diciembre del presente año mediante comunicado ICB-ENTERRITORIO-2022-166 con radicado No. 20224300463902.

En el **Anexo 17,** se presentan los informes semanales de interventoría.
En el **Anexo 26,** se presentan los Análisis de Precios Unitarios.

4.2. SITUACIONES ESPECIALES OCURRIDAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo de este informe, continuó la ejecución de las viviendas en el barrio Vista Hermosa, Nariño, La Ceiba y la Victoria, se remitieron195 solicitudes de disponibilidad del servicio, 195 solicitudes de autorización de intervención de acometida de alcantarillado y 23 solicitudes de autorización de Intervención de acometida de acueducto.

4.3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

En el **Anexo 20,** se presenta el informe social correspondiente al presente mes.

4.4. PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO – SST

El contratista cumple con lo estipulado en el protocolo de bioseguridad y vacunación del personal. El contratista de obra reporta la afiliación del personal al sistema de seguridad social, sin embargo, se encuentran 58 trabajadores sin afiliación a ARL, Esta situación se le ha notificado al contratista el 29 de septiembre mediante el oficio ICB- ENTERRITORIO-2022-127 con el asunto: Notificación de incumplimiento al Art. 161 de la Ley 100 de 1993 Sistema de seguridad social – deberes de los empleadores– de obligatorio cumplimiento en la ejecución del Contrato de Obra No. 2220569 y el 28 de noviembre mediante el oficio ICB-ENTERRITORIO-2022- 164, con el asunto: Notificación de incumplimiento al Art. 161 de la Ley 100 de 1993 Sistema de seguridad social – deberes de los empleadores– de obligatorio cumplimiento en la ejecución del Contrato de Obra No. 2220569.

TABLA 24. CONTROL DE PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA		
PERSONAL		**CANT.**
Personal Administrativo	Director de Obra - Frank David Mancilla González	1
	Residente de Obra **-** Manuel Garrido Severiche	1
	Profesional PGIO - José Antonio Puentes Díaz	1
	Profesional Técnico de Diagnósticos - Oscar Narváez Moguea	1
	Profesional Costos y Presupuestos - Cristian Pérez Espitia	1
	Especialista Estructural - José Assia De La Rosa	1
	Especialista Hidrosanitario **-** Irina Alejandra Támara	1
	Profesional Social **–** Isabel Garces Puello y Leidys Pérez Díaz	3
	Profesional Calidad **-** Jesús Hernández Paternina	1
	Inspector de Obra	5
	Almacenista	1
	Auxiliar de almacén	1
Personal Operativo	Maestro de obra - Yhon Jairo Arrieta Paternina	4
	Auxiliar de Maestro de obra	3
	Oficial de obra	53
	Ayudante de obra	27
	Ayudante de Vehículos	2
	Ayudante de Motocarros	5
	Pintor	1
	Conductor	4
	Conductor Motocarro	5
Total		**122**

TABLA 25. CONTROL DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA.

PERSONAL INTERVENTORÍA		
PERSONAL		**CANT.**
Personal Interventoría	Director de Interventoría **-** William Jiménez Martínez	1
	Residente de Interventoría – Jaime Barrios Contreras	1
	Profesional HSEQ - Carlos Morales Samper	1
	Especialista Estructural - Robespierre Sánchez	1
	Especialista Hidrosanitario - Alberto Mouthon Bello	1
	Profesional Social - Eliana Correa Marimón	1
	Auxiliar Social - Lina Gamarra Moreno	1
	Profesional Costos Y Presupuestos - Juan Pertuz Rodas	1
	Inspector De Interventoría: Jesús José Pertuz - Luis Ángel Díaz - María Camila Orozco – Jairo Gómez Anchundia	4
Total		**12**

TABLA 26. CONTROL DE PERSONAL DEL PROYECTO.

PERSONAL INTERVENTORÍA	
PERSONAL	**CANTIDAD**
Contratista de Obra	122
Interventoría	12
Total	**134**

En el **Anexo 18,** se presenta el informe del programa de salud y seguridad en trabajo y se presenta el control de seguridad industrial.

En el **Anexo 24,** se presentan las copias de planillas parafiscales.

4.5. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL.

En el **Anexo 19** se presenta informe de gestión ambiental.

4.6. BITÁCORA

El contratista de Obra e Interventoría han diligenciado conjuntamente la bitácora de Obra, en el **Anexo 15,** se presenta copia de la bitácora de obra.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES.

- La interventoría viene realizando control a la programación presentada por el contratista a fecha de corte del presente informe el porcentaje programado es de un 80,20% con un valor de $ 6.375.502.354,45 y el porcentaje es de ejecución de 67,44% equivalentes a $ 5.360.992.105,18 lo cual arroja un atraso de obra de 12,76%, debido a que a la fecha de corte de este informe se cuenta con 940 diagnósticos aprobados contra los 1046 contemplados en la programación. Adicionalmente, se encuentran terminadas 661 viviendas, en comparación con las 834 establecidas en la programación actualizada derivada de la novedad contractual de adición.

- El personal de la interventoría ha venido realizando seguimiento y control a las actividades realizadas por el contratista, donde se destaca el inicio de la actividad No. 3 en el barrio La Victoria.

- El personal de subcontratista no cuenta con afiliación a seguridad social, se ha solicitado al contratista subsanar este incumplimiento a las normas laborales. En vista de lo anterior, la interventoría ha comunicado al contratista las falencias presentadas mediante oficio ICB-ENTERRITORIO-2022-143 con asunto: Incumplimiento del plan de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo– Contrato de obra No 2220569 del 24 de octubre de 2022. Adicionalmente, realizará seguimiento semanal a las afiliaciones del personal durante el mes de septiembre; y oficio ICB-ENTERRITORIO-2022-164 con asunto: Notificación de incumplimiento al Art. 161 de la Ley 100 de 1993 Sistema de seguridad social – deberes de los empleadores– de obligatorio cumplimiento en la ejecución del Contrato de Obra No. 2220569.

5.2. RECOMENDACIONES.

- El funcionamiento del Punto de Atención Comunitario – PAC, es fundamental para el normal desarrollo del proyecto.
- Es indispensable que el personal de Obra cuente con todos los Elementos de Protección Individual – EPI con el fin de mantener la seguridad y salud de los trabajadores y minimizar al máximo el riesgo de accidentes. La interventoría realizará seguimiento semanal a las afiliaciones del personal, pago de parafiscales y cumplimiento del porte de los Elementos de Protección Individual – EPI durante el mes de Febrero de 2023.

ANEXOS

Anexo 1. INFORME EJECUTIVO.
Anexo 2. INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO.
Anexo 3. ACTAS PARCIALES Y BALANCE PRESUPUESTAL.
Anexo 4. ACTAS DE INICIO.
Anexo 5. ACTAS DE CONCERTACIÓN PCI 009.
Anexo 6. ACTAS DE VECINDAD.
Anexo 7. AVANCE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
Anexo 8. MEMORIA DE CÁLCULOS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.
Anexo 9. RELACIÓN DE PLANOS
Anexo 10. RELACIÓN DE DOCUMENTOS
Anexo 11. REGISTRO FOTOGRÁFICO.
Anexo 12. VIDEOS DEL AVANCE DEL PROYECTO.
Anexo 13. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE ENSAYOS DE MATERIALES.
Anexo 14. CALIBRACIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS.
Anexo 15. FOTOCOPIA DE BITÁCORA.
Anexo 16. RELACIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Anexo 17. INFORMES SEMANALES
Anexo 18. INFORME PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Anexo 19. INFORME PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.
Anexo 20. INFORME DE GESTIÓN SOCIAL.
Anexo 21. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE EL AVANCE DEL PROYECTO
Anexo 22. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.
Anexo 23. ACTAS DE SEGUIMIENTO Y APROBACIÓN DEL CONTRATO.
Anexo 24. ACREDITACIÓN DE APORTES PARAFISCALES.
Anexo 25. PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO.
Anexo 26. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
