CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** sábado, 3 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 9 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2022."

(Indique el objeto del contrato de interventoría suscrito)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 – 2022."

(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)

CONTRATISTA DE OBRA: GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOZ (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 900,372 ,215-7 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 901,627224-3 (Escriba el NIT del Interventor)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Valor Inicial	$ 432.000.000,00
Valor Adicional 1	$ 192.240.000,00
Valor Adicional 2	N.A.
Valor Actualizado	$ 624.240.000,00
Plazo Inicial	5 Meses
Plazo Prórroga 1	2,5 Meses
Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	7,5 Meses
Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/01/2023
Fecha de Terminación según Prórroga 1	15/04/2023
Fecha de Terminación según Prórroga 2	N.A.
Fecha de Terminación Actual	15/04/2023

CONTRATO DE OBRA	
Valor Inicial	$ 3.600.000.000
Valor Adicional 1	$ 1.602.000.000
Valor Adicional 2	N.A
Valor Actualizado	$ 5.202.000.000
Plazo Inicial	4 Meses
Plazo Prorroga 1	2,5 Meses
Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	6,5 Meses
Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2022
Fecha de Terminación según Prórroga 1	15/03/2023
Fecha de Terminación según Prórroga 2	N.A.
Fecha de Terminación Actual	15/03/2023

SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CAMILA CORTES DAZA

(Escriba el nombre del Supervisor de Hábitat)

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ


SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** sábado, 3 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 9 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa)


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)


2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

2.1. AVANCES DE EJECUCIÓN VALIDACIONES

AVANCE FÍSICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

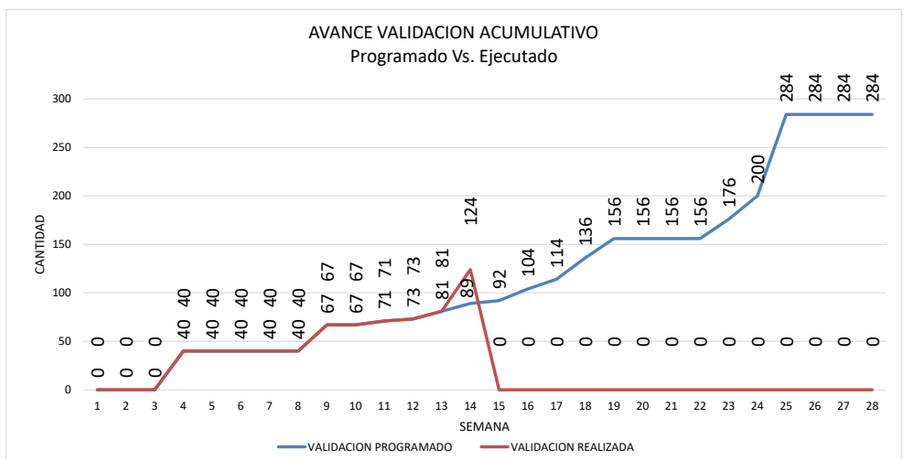

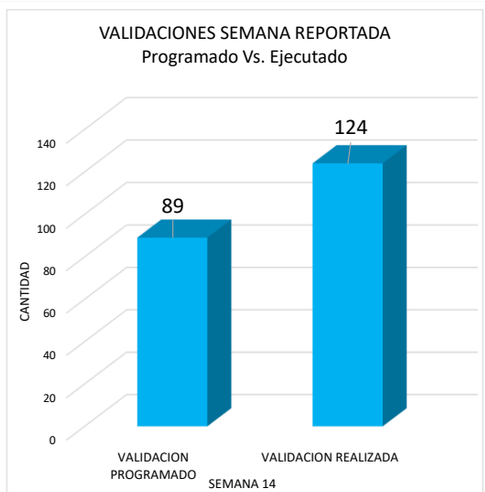

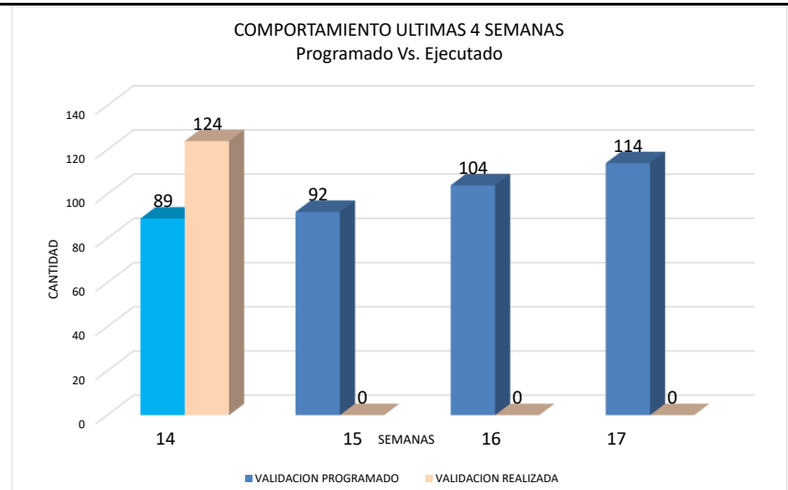

Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)

	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso
Cantidad Validaciones	**89**	**100%**	**124**	**139,33%**	**35**	**0**

Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)

Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso
89	**124**	**35**	**0**

Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)

	Prog.	Ejecutado
Semana 14	**89**	**124**
Semana 15	**92**	**0**
Semana 16	**103**	**0**
Semana 17	**114**	**0**

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

Se realiza ajuste de la progrmación incluyendo la adición y prórroga No. 1 la cual ya fue legalizada ante la entidad. De lo anterior, podemos establecer que para está semana el contratista de obra realiza validaciones llegando a 124 viviendas, pero de acuerdo a la nueva programación existe un adelanto de35 validaciones.

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** sábado, 3 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 9 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

MVAL_00164	VALIDADA
MV_00333	VALIDADA
MV_00332	VALIDADA
MV_00350	VALIDADA
MV_00352	VALIDADA
MV_00360	VALIDADA
MV_00335	VALIDADA
MVAL_00381	VALIDADA
MV_00404	VALIDADA
MV_00398	VALIDADA
MVAL_00389	VALIDADA
MV_00391	VALIDADA
MVAL_00441	VALIDADA
MV_00417	VALIDADA
MV_00419	VALIDADA
MV_00423	VALIDADA
MV_00451	VALIDADA
MV_00452	VALIDADA
MV_00453	VALIDADA
MV_00316	VALIDADA
MV_00314	VALIDADA
MV_00317	VALIDADA
MV_00306	VALIDADA
MV_0320	VALIDADA
MV_00303	VALIDADA
MV_00302	VALIDADA
MV_00271	VALIDADA
MV_00280	VALIDADA
MV_00282	VALIDADA
MV_00236	VALIDADA
MV_00232	VALIDADA
MVAL_00249	VALIDADA
MV_00218	VALIDADA
MV_00220	VALIDADA
MV_00222	VALIDADA
MV_00224	VALIDADA
MV_00297	VALIDADA
MVAL_00178	VALIDADA
MV_0127	VALIDADA
MV_01175	VALIDADA
MV_00402	VALIDADA
MVAL_00434	VALIDADA
MV_00425	VALIDADA
MV_00274	VALIDADA
MV_00279	VALIDADA
MV_00231	VALIDADA
MV_00211	VALIDADA
MVAL_00209	VALIDADA
MVAL_00174	VALIDADA
MV_00171	VALIDADA
MV_00159	VALIDADA
MVAL_0140	VALIDADA
MV_1051	VALIDADA
MV_1064	VALIDADA
MV_1043	VALIDADA
MV_1069	VALIDADA
MV_1072	VALIDADA
MV_1075	VALIDADA
MV_1132	VALIDADA
MV_1129	VALIDADA
MV_00013	VALIDADA
MV_0015	VALIDADA
MV_1179	VALIDADA
MV_1122	VALIDADA
MV_1120	VALIDADA
MV_01238	VALIDADA
MV_00367	VALIDADA
MVAL_00401	VALIDADA
MV_00420	VALIDADA
MV_00311	VALIDADA
MV_14691	VALIDADA
MV_00248	VALIDADA
MV_00172	VALIDADA
MV_00158	VALIDADA
MV_00165	VALIDADA
MVAL_0149	VALIDADA
MV_1056	VALIDADA
MV_1060	VALIDADA
MV_1062	VALIDADA
MV_1032	VALIDADA
MV_01035	VALIDADA
MV_01041	VALIDADA
MV_1095	VALIDADA
MV_1103	VALIDADA
MV_01105	VALIDADA
MV_1076	VALIDADA
MV_01079	VALIDADA
MV_01080	VALIDADA
MV_01081	VALIDADA
MV_01146	VALIDADA
MV_001151	VALIDADA
MV_001141	VALIDADA
MV_00109	VALIDADA
MV_1136	VALIDADA
MV_00115	VALIDADA
MVAL_00116	VALIDADA
MV_1131	VALIDADA
MV_1162	VALIDADA
MV_01123	VALIDADA
MV_01167	VALIDADA
MV_1166	VALIDADA
MV_01176	VALIDADA
MV_1174	VALIDADA
MV_01112	VALIDADA
MV_01114	VALIDADA
MV_1109	VALIDADA
MV_1020	VALIDADA
MV_1028	VALIDADA
MV_00329	VALIDADA
MV_01191	VALIDADA
MV_01192	VALIDADA
MV_01196	VALIDADA
MV_1198	VALIDADA
MV_1200	VALIDADA
MV_1206	VALIDADA
MV_01223	VALIDADA
MV_1228	VALIDADA
MV_1230	VALIDADA
MV_1231	VALIDADA
MVAL_01563	VALIDADA
MV_1391	VALIDADA
MV_01400	VALIDADA
MV_1394	VALIDADA
MV_0049	VALIDADA

De las 284 validaciones expuestas en la nueva programación de obra se desarrollaron 124 . Esto indica un adelanto de 35 viviendas.

Se expone que dentro de las validaciones desarrolladas hay unos Mv por fuera de la línea de programación, estas viviendas son desarrolladas por logística y organización del contratista para maximizas materiales y ejecución.


CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ


SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** sábado, 3 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 9 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa)


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

2.2. AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES

AVANCE FÍSICO APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

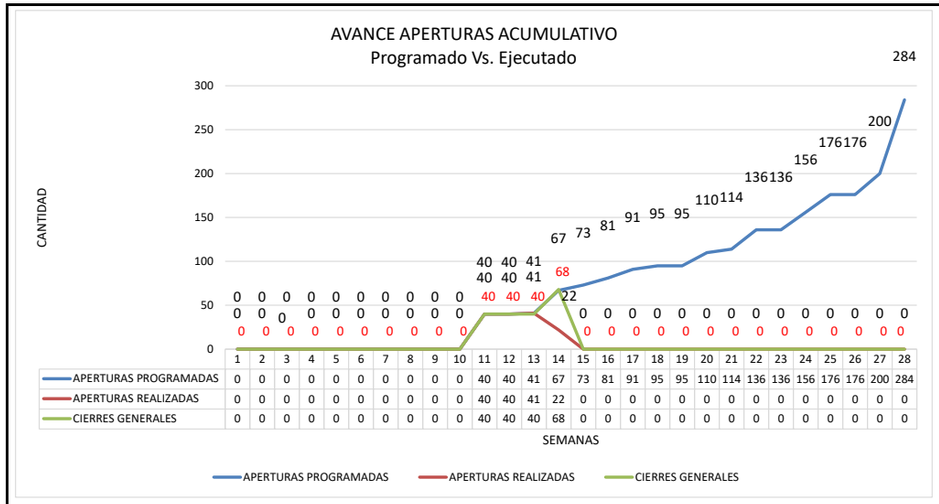

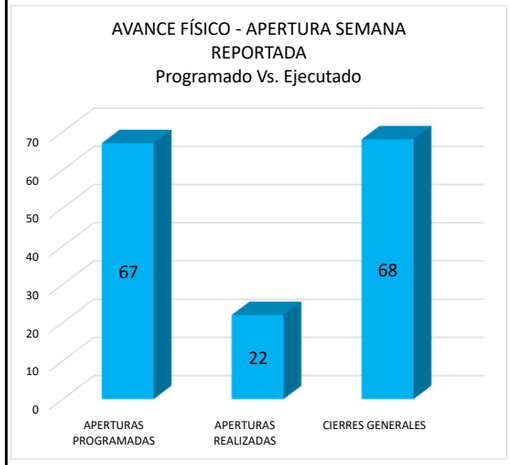

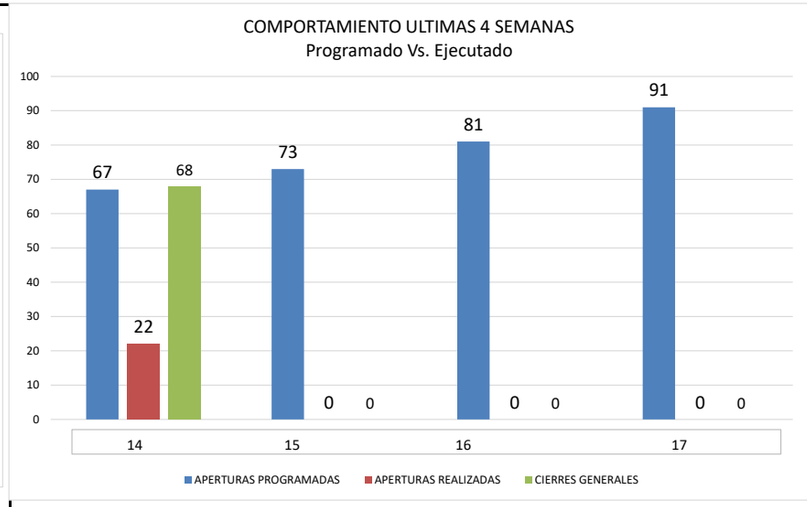

Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)

	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso
Cantidad de Aperturas	**67**	**100%**	**90**	**134,33%**	**23**	**0**

Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)

Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso
67	**90**	**23**	**0**

Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)

	Prog.	Ejecutado
Semana 14	**67**	**90**
Semana 15	**73**	**0**
Semana 16	**81**	**0**
Semana 17	**91**	**0**

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

Se realiza ajuste de la progrmación incluyendo la adición y prórroga No. 1 la cual ya fue legalizada ante la entidad (se anexan 84 viviendas). Para está semana se encuentran en ejecución 22 viviendas
Se aclara que de acuerdo a la programación de obra deberían haberse realizado 67 viviendas entre ejecución y entregas, pero en la ejecución de obra hay 22 y 68 viviendas entregadas. Lo que genera en total de 90 viviendas, con un adelanto entre ejecuciòn y entregas de 23 vivienda

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROCESO

EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** sábado, 3 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 9 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

MVAL_00164	ENTREGADA
MV_00333	ENTREGADA
MV_00332	ENTREGADA
MV_00350	ENTREGADA
MV_00352	ENTREGADA
MV_00360	ENTREGADA
MV_00335	ENTREGADA
MVAL_00381	ENTREGADA
MV_00404	ENTREGADA
MV_00398	ENTREGADA
MVAL_00389	ENTREGADA
MV_00391	ENTREGADA
MVAL_00441	ENTREGADA
MV_00417	ENTREGADA
MV_00419	ENTREGADA
MV_00423	ENTREGADA
MV_00451	ENTREGADA
MV_00452	ENTREGADA
MV_00453	ENTREGADA
MV_00316	ENTREGADA
MV_00314	ENTREGADA
MV_00317	ENTREGADA
MV_00306	ENTREGADA
MV_0320	ENTREGADA
MV_00303	ENTREGADA
MV_00302	ENTREGADA
MV_00271	ENTREGADA
MV_00280	ENTREGADA
MV_00282	ENTREGADA
MV_00236	ENTREGADA
MV_00232	ENTREGADA
MVAL_00249	ENTREGADA
MV_00218	ENTREGADA
MV_00220	ENTREGADA
MV_00222	ENTREGADA
MV_00224	ENTREGADA
MV_00297	ENTREGADA
MVAL_00178	ENTREGADA
MV_0127	ENTREGADA

MV_01175	ENTREGADA
MV_00402	ENTREGADA
MVAL_00434	ENTREGADA
MV_00425	ENTREGADA
MV_00274	ENTREGADA
MV_00279	ENTREGADA
MV_00231	ENTREGADA
MV_00211	ENTREGADA
MVAL_00209	ENTREGADA
MVAL_00174	ENTREGADA
MV_00171	ENTREGADA
MV_00159	ENTREGADA
MVAL_0140	ENTREGADA
MV_1051	ENTREGADA
MV_1064	ENTREGADA
MV_1043	ENTREGADA
MV_1069	ENTREGADA
MV_1072	ENTREGADA
MV_1075	ENTREGADA
MV_1132	ENTREGADA
MV_1129	ENTREGADA
MV_00013	ENTREGADA
MV_0015	ENTREGADA
MV_1179	ENTREGADA
MV_1122	ENTREGADA
MV_1120	ENTREGADA
MV_01238	ENTREGADA
MV_00367	ENTREGADA
MVAL_00401	EN EJECUCIÓN
MV_00311	EN EJECUCIÓN
MV_00172	EN EJECUCIÓN
MV_00165	EN EJECUCIÓN
MVAL_0149	EN EJECUCIÓN
MV_1056	EN EJECUCIÓN
MV_1060	EN EJECUCIÓN
MV_1062	EN EJECUCIÓN
MV_01105	ENTREGADA

MV_1076	EN EJECUCIÓN
MV_01079	EN EJECUCIÓN
MV_01080	EN EJECUCIÓN
MV_01081	EN EJECUCIÓN
MV_01146	EN EJECUCIÓN
MV_001151	EN EJECUCIÓN
MV_1131	EN EJECUCIÓN
MV_1162	EN EJECUCIÓN
MV_1166	EN EJECUCIÓN
MV_01176	EN EJECUCIÓN
MV_1174	EN EJECUCIÓN
MV_01112	EN EJECUCIÓN
MV_01114	EN EJECUCIÓN
MV_1028	EN EJECUCIÓN

Para está semana, y de acuerdo a la programación de obra, se deberían tener 67 casa en apertura y ejecución. A la fecha, están en esta actividad 22 viviendas y 68 que fueron entregadas, lo que representa un adelanto en la programación de obra.


CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** sábado, 3 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 9 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

2.3. AVANCES DE EJECUCIÓN FINANCIERO

AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

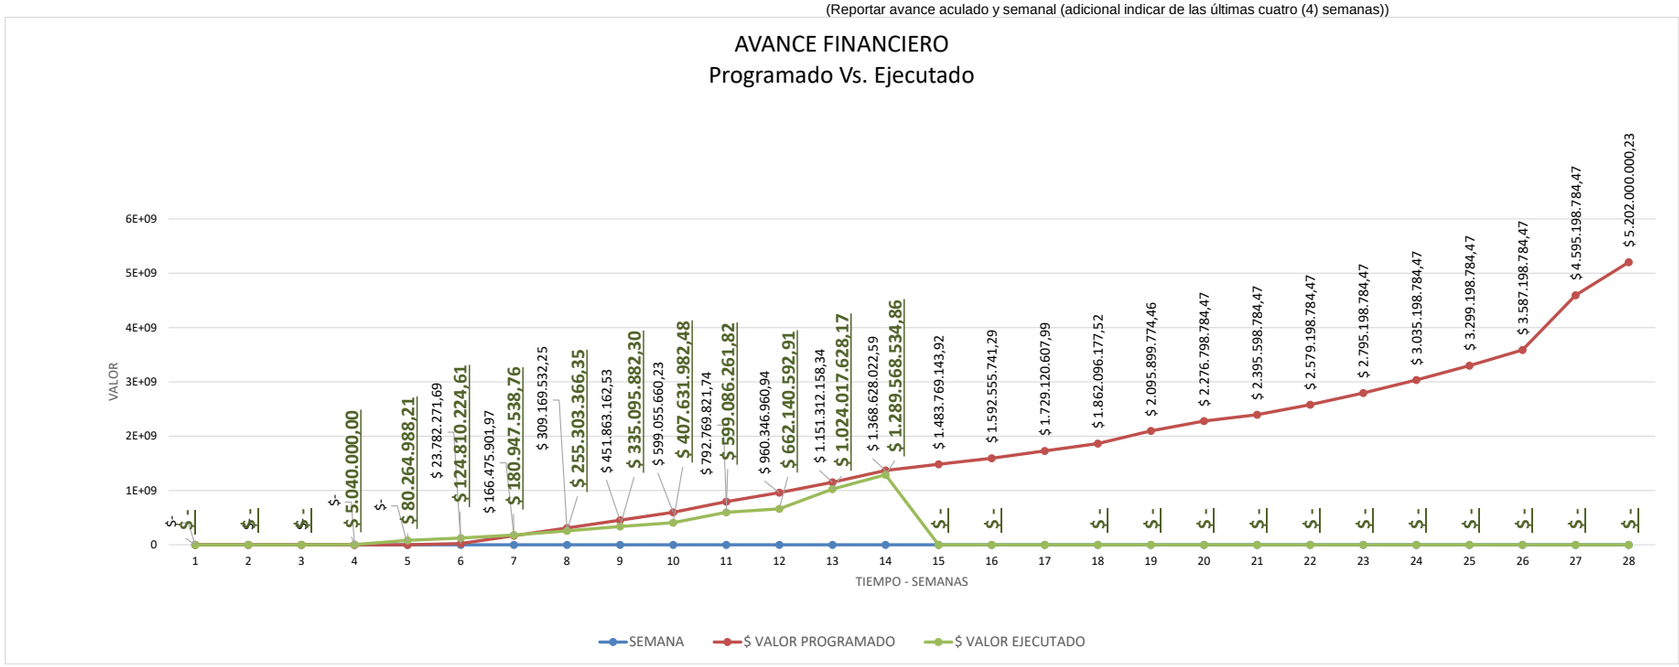

VALOR INVERSIÓN SEGÚN FLUJO DE CAJA		
INVERSIÓN SEMANAL		
PROGRAMADA		EJECUTADA
$ 217.315.864,25		$ 265.550.906,68
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
4,18%		5,10%
INVERSIÓN ACUMULADA		
PROGRAMADA	VS.	EJECUTADA
$ 1.368.628.022,59		$ 1.289.568.534,86
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
26,31%		24,79%
ATRASO O ADELANTO EN PESOS ($):		**-$ 79.059.487,73**
ATRASO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%)		**-1,52%**

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

Para está semana se presenta una ejecución de obra inferior a lo programado, es importante que se tomen las acciones necesarias por parte del contratista para dar cumplimiento con lo estipulado en el flujo de caja y en la programación

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** sábado, 3 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 9 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

3. ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

	ID_MV	DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA 01		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 02		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 03		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 04		28/09/2022: En el desarrollo de las actividades se disponían a llevar a cabo seguimientos en territorio, pero se solicita retiro del mismo por motivos de seguridad debido a situaciones de hurto con arma de fuego en mediaciones de las viviendas a visitar. (el equipo técnico y social de interventoría se disponía a realizar los seguimientos respectivos, sin embargo, siendo aproximadamente las 10:00 a.m. se presenta un altercado de seguridad a dos cuadras del PAC del contratita, en donde hurtaron las pertenecías de algunos habitantes del sector con arma de fuego, por este motivo se recibe llamada de advertencia y decidimos retirarnos del territorio dado lo ocurrido).	Se informa a la SDH de esta situación	
	MVAL_00441	Se selecciona como Historia de vida el día 27/09/2022 el MVAL_00441 MARÍA HENAO QUINTERO, se expone a la beneficiaria su postulación, ella manifiesta conformidad y se diligencian los formatos para que la par social contratista exponga el caso.		
		30/09/2022 El día 30 de septiembre se realizan seguimientos sin presencial del personal del contratista, el PAC se encuentra cerrado.	Se remite comunicado No. SDHT-CI22-2022-019 al contratista GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOZ SAS exponiendo la situación en referencia a la falta de personal.	Pendiente respuesta por parte del contratista
SEMANA 05		Se solicita al contratista el seguimientos de las viviendas que se encuentran en ejecución para que no existan materiales ni escombros en los frentes de la vivienda a menos que se estén descargando y durante el día se ingresen a la vivienda.		
SEMANA 06	MV-00282	11/10/2022 - MARCO ANTONIO VEGA Se postula la historia de vida de este beneficiario.		
SEMANA 07		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 08		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 10		SE SOLICITA AL CONTRATISTA QUE AL MOMENTO DE LAS APERTURAS DE LAS VIVIENDAS SE DEBE CONTEMPLAR EL MATERIAL Y LOS OPERARIOS QUE DESARROLLEN LAS ACTIVIDADES DE OBRA PARA EVITAR RETRASOS Y MOLESTIAS EN LOS USUARIOS.	LA INTERVENTORÍA REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO Y EL CUAL SERÁ REPORTADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA	

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** sábado, 3 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 9 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

SEMANA 11		15/11/2022 MV_1162 - ÁNGEL MIGUEL SUÁREZ: Se implementa formato de Historia de Vida, develando aspectos de la vida del señor Ángel, tales como que vive solo, recibe un subsidio del gobierno por valor de $130.000. Sus hijos (2) cubren los gastos de los servicios y el impuesto del predio. El señor Suárez cumplió una condena de 2 años de cárcel por homicido comprobado, hace más de 30 años. En la actualidad se reúne en una iglesia cristiana la cual se constituye en una red importante de socialización y apoyo para el adulto mayor.		
SEMANA 12		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 13		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 14		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 15				
SEMANA 16				
SEMANA 17				
SEMANA 18				
SEMANA 19				
SEMANA 20				
SEMANA 21				
SEMANA 22				

FORMATO	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	
PROCESO	
EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** sábado, 3 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 9 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

4. RELACIÓN DE RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativas)

	ID_MV	MOTIVO DE LA RENUNCIA Y/O NO EJECUCIÓN	No. DE RADICADO A LA SDHT Y FECHA
SEMANA 01		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 02		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 03		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 04		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 05		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 06		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 07		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 08		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 09		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 10		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 11		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 12		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 13		28/11/2022 MV_00153 - JENNY LÓPEZ: La señora Jenny Lopez acude al PAC para renunciar al mejoramiento de vivienda por razones personales y familiares. Firma los formatos correspondientes y entrega la bitácora de obra.	Se radica el 10/12/2022, no se genera No. Por fallas en el sistema
SEMANA 14		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 15			
SEMANA 16			
SEMANA 17			
SEMANA 18			
SEMANA 19			
SEMANA 20			
SEMANA 21			

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** sábado, 3 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 9 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

5. RELACIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativas)

	ID_MV	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PQR (anexar copia del PQR)	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA 01		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 02		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 03		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 04		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 05		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 06		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 07		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 08		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 09		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 10	MV 01400	La beneficiaria remite carta a la SDHT refiriendo lo siguiente "respetados señores, la presente tiene como fin saludarles y desearles éxitos en sus labores diarias, a su vez, de manera muy respetuosa quiero solicitar de su ayuda respecto a que Salí beneficiada con el programa de mejoramiento de vivienda, pero en el momento de la visita, no me han comunicado con anterioridad y no me ha sido posible estar en casa debido a que soy madre cabeza de familia y estoy en mis obligaciones de trabajo. Me gustaría solicitar, que para el día de la visita, me sea informado con un día de anticipación, así puedo solicitar un permiso en mi lugar de trabajo y poder atenderles a ustedes para la respectiva visita. Agradezco su colaboración…	Se coordina con el contratista la visita para dar respuesta a la solicitud	17/11/2022
SEMANA 11		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 12		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 13		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 14		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 15				
SEMANA 16				
SEMANA 17				
SEMANA 18				
SEMANA 19				
SEMANA 20				
SEMANA 21				
SEMANA 22				

4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORÍA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:
1- PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Se mantiene que el punto de atención quedara ubicado en la Carrera 7B Este No 97G-25 Sur y será atendido los días martes, jueves y sábados en el horario de 8:30 am a 12:00 pm
El PAC se encuentra en funcionamiento en los horarios establecidos para la atención a los usuarios mejorando los tiempos de atención.

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** sábado, 3 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 9 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

DISPOSICIÓN RCD M3		ESCOMBRERA (indicar nombre y No. Autorización)	No. DE VALE ESCOMBRERA, PIN Y PLACA VOLQUETA
SEMANA 13	7 M3	CEMEX ESCOMBRERA TUNJUELO	CERTIFICADO
MES	DICIEMBRE		
SECTOR	USME		

CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	7 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	14 M3

DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS M3		CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA
SEMANA 13	0 M3	No se registran residuos peligrosos retirados por entes empresa certificada para la disposición final está semana, los residuos generados que tienen tratamiento diferente se encuentran acopiados, según manifiesta el contratista
MES	DICIEMBRE	
SECTOR	USME	

CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	0 M3

6. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

CONTRATISTA DE OBRA					
CHARLAS O CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CAPACITACIONES REALIZADAS	1	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBREROS)			38	PERSONAL ADMINISTRATIVO	12
PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	1	PERSONAL OBRERO	38	PERSONAL ADMINISTRATIVO	12
PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	1	PERSONAL OBRERO	38	PERSONAL ADMINISTRATIVO	12

INTERVENTORÍA					
CAPACITACIONES O CHARLAS PROGRAMADAS	1	CAPACITAONES O CHARLAS REALIZADAS	1	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORÍA					14

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22

GePM Mejoramiento Innovación y Calidad

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROCESO

EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT | BOGOTÁ

SEMANA No. **14** (Consecutivo) **DEL** **sábado, 3 de diciembre de 2022** (dd-mm-aa) **AL** **9 de diciembre de 2022** (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No **CTO # 1008 DE 2022,** (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** **CTO de obra 999-2022** (Número de Contrato)

7. ANEXOS

MVAL_00164	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	45,00%	78,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00333	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,00%	68,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00332	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00350	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	28,00%	52,00%	72,00%	97,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00352	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,95%	74,17%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00360	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,52%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00335	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,17%	30,96%	47,66%	89,42%	89,42%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00381	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,70%	9,19%	27,07%	59,32%	95,90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00404	0,00%	0,00%	5,00%	45,00%	80,00%	88,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00398	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,29%	38,51%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00389	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00391	0,00%	0,00%	5,00%	50,00%	90,00%	98,00%	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00441	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	40,00%	60,00%	85,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00417	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00419	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00423	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%	70,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00451	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	50,00%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00452	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00453	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	90,00%	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00316	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	20,00%	60,00%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00314	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	30,00%	40,00%	80,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00317	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,25%	34,09%	85,72%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00306	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	97,72%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_0320	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00303	0,00%	0,00%	0,00%	19,00%	43,00%	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00302	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00271	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,98%	30,54%	55,21%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00280	0,00%	0,00%	0,00%	17,00%	31,26%	55,61%	95,00%	99,00%	99,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00282	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00236	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00232	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	65,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00249	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	18,24%	86,30%	99,78%	99,78%	99,78%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00218	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00220	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,88%	70,39%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00222	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,61%	72,87%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00224	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00297	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,83%	18,59%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00178	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,83%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_0127	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01175	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	21,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00402	0,00%	0,00%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	3,42%	5,67%	82,58%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00434	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	100,00%	100,00%
MV_00425	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%
MV_00274	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	75,00%	90,00%	100,00%
MV_00279	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	75,00%	98,00%	100,00%

MV_00231	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	90,00%	100,00%
MV_00211	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,42%	21,42%	100,00%
MVAL_00209	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,97%	100,00%
MVAL_00174	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,30%	32,36%	100,00%
MV_00171	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%
MV_00159	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
MVAL_0140	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	70,00%	100,00%
MV_1051	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	50,00%	100,00%
MV_1064	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	50,00%	100,00%
MV_1043	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	55,00%	100,00%
MV_1069	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	55,00%	100,00%
MV_1072	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	40,00%	100,00%
MV_1075	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,00%	100,00%
MV_1132	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	42,00%	100,00%
MV_1129	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%	28,00%	52,00%	100,00%
MV_00013	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,00%	88,00%	100,00%
MV_0015	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	55,00%	100,00%
MV_1179	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,00%	100,00%
MV_1122	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,51%	54,74%	100,00%
MV_1120	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42,10%	87,25%	100,00%
MV_01238	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	85,00%	100,00%
MV_00367	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,84%	39,57%	71,59%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00401	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00420	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00311	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%
MV_14691	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00248	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00172	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,08%	45,98%
MV_00158	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00165	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
MVAL_0149	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	35,00%	85,00%
MV_1056	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1062	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
MV_1032	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01035	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01041	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1095	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1103	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01105	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%	100,00%
MV_1076	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01079	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01080	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01081	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%

MV_01146	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_001151	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_001141	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00109	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1136	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00115	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_00116	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1131	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%	35,00%
MV_1162	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	72,00%
MV_01123	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01167	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1166	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%
MV_01176	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1174	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,82%
MV_01112	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,66%	37,77%	39,78%
MV_01114	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,37%
MV_1109	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1028	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%
MV_00329	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01191	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01192	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01196	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1198	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1200	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1200	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1201	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1206	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1180	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_0021	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_0022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_0025	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1234	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1220	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01223	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1228	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1230	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1231	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1236	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1240	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01244	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01247	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1213	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01215	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

MV_1359	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01363	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01366	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01367	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01368	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_01253	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_01257	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01265	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01266	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01268	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1427	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_0026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_0028	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_0030	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1426	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01425	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1423	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01420	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01530	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01526	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01557	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01573	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01560	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01570	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01566	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_01563	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1391	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01400	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1394	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_0049	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** sábado, 3 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 9 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

SOCIAL







05/12/2022 APERTURA DE OBRA MVAL_00401 - ERALDO EFRÉN AGUILAR DESARROLLO EL NUEVO PORTAL	APERTURA 05/12/2022 MV_00311 MARIA ADRIANA BOHORQUEZ, NUEVO PORVENIR	APERTURA 07/12/2022 MV_01176 MARIA TAPIERO DESARROLLO NUEVO PORVENIR





APERTURA DE OBRA 09/12/2022 MV_1151 DONALDO HERNÁNDEZDESARROLLO NUEVO PORVENIR - USME	APERTURA 9/12/2022 MV_1056: OVIDIO ALMECIGA VARGAS DESARROLLO NUEVO PORVENIR

TÉCNICO




FECHA	lunes, 5 de diciembre de 2022
DESCRIPCION	
Enchape de piso	



FECHA	lunes, 5 de diciembre de 2022
DESCRIPCION	
Material de obra evidenciado en la vivienda	



FECHA	viernes, 9 de diciembre de 2022
DESCRIPCION	
Hall entregado con pintura en muros, enchape de piso	

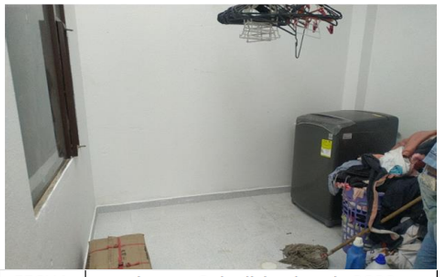

FECHA	viernes, 9 de diciembre de 2022
DESCRIPCION	
Patio de ropas entregado con pintura de muros y enchape de piso	

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** sábado, 3 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 9 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

SST Y AMBIENTAL



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SEGUIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS, 06 DE DICIEMBRE DE 2022



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	INSPECCIÓN DE EPPS, 07 DE DICIEMBRE DE 2022



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SEGUIMIENTO A MATERIALES POR MV 00209, 07 DE DICIEMBRE DE 2022



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO, MV 00171, 05 DE DICIEMBRE DE 2022



Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas previamente, en Bogotá, D.C., a los 4 (Día en letras) CUATRO (Día en números) días del mes del FEBRERO (Mes en letras) de 2023 (Año de firma del informe)

Firma

Nombre: (Nombre) EDGAR EDUARDO ROA CASTILLO

Cargo: Director de Interventoría
