| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad | **FORMATO**<br>**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**<br>**PROCESO**<br>EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD<br>SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT<br>SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ |

**SEMANA No.** 17 (Consecutivo) **DEL** sábado, 24 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 30 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No** CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

## 1. DATOS GENERALES

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2022."**

(Indique el objeto del contrato de interventoría suscrito)

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA**

**"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 – 2022."**

(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)

**CONTRATISTA DE OBRA:** GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOZ (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 900,372 ,215-7 (Escriba el NIT del Contratista)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 901,627224-3 (Escriba el NIT del Interventor)

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial | $ 432.000.000,00 | Valor Inicial | $ 3.600.000.000 |
| Valor Adicional 1 | $ 192.240.000,00 | Valor Adicional 1 | $ 1.602.000.000 |
| Valor Adicional 2 | N.A. | Valor Adicional 2 | N.A |
| Valor Actualizado | $ 624.240.000,00 | Valor Actualizado | $ 5.202.000.000 |
| Plazo Inicial | 5 Meses | Plazo Inicial | 4 Meses |
| Plazo Prórroga 1 | 2,5 Meses | Plazo Prorroga 1 | 2,5 Meses |
| Plazo Prórroga 2 | N.A. | Plazo Prórroga 2 | N.A. |
| Plazo Actualizado | 7,5 Meses | Plazo Actualizado | 6,5 Meses |
| Fecha de Iniciación | 1/09/2022 | Fecha de Iniciación | 1/09/2022 |
| Fecha de Terminación Inicial | 31/01/2023 | Fecha de Terminación Inicial | 31/12/2022 |
| Fecha de Terminación según Prórroga 1 | 15/04/2023 | Fecha de Terminación según Prórroga 1 | 15/03/2023 |
| Fecha de Terminación según Prórroga 2 | N.A. | Fecha de Terminación según Prórroga 2 | N.A. |
| Fecha de Terminación Actual | 15/04/2023 | Fecha de Terminación Actual | 15/03/2023 |

**SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CAMILA CORTES DAZA (Escriba el nombre del Supervisor de Hábitat)

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad | **FORMATO**<br>**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**<br>**PROCESO**<br>EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD<br>SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT<br>SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ |


**SEMANA No.** 17 (Consecutivo) **DEL** sábado, 24 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 30 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No** CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

## 2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA


### 2.1. AVANCES DE EJECUCIÓN VALIDACIONES

**AVANCE FÍSICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)**
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

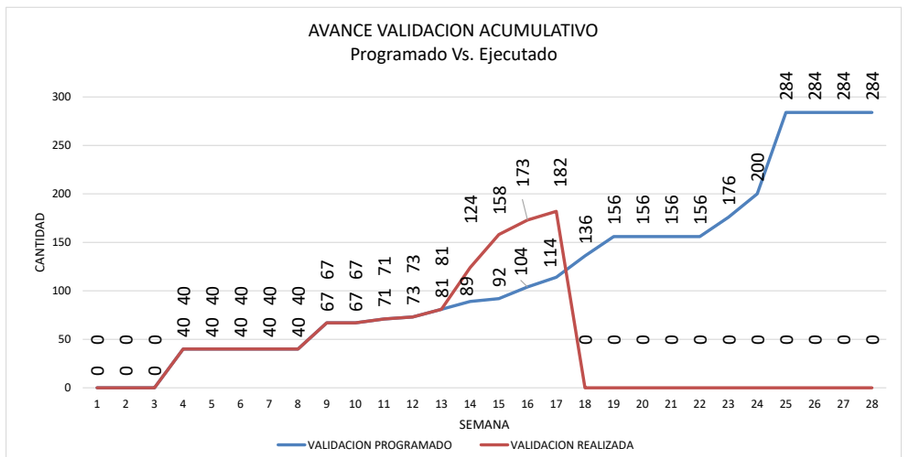





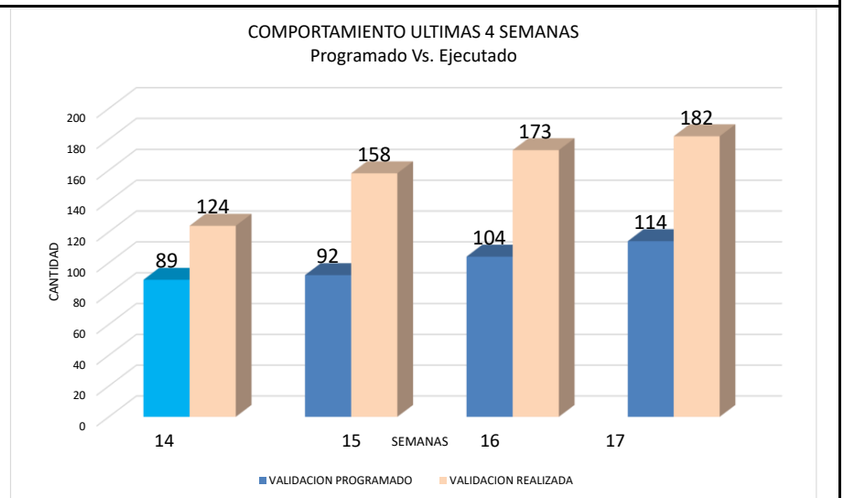


**Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)**

| | Programado | % | Ejecutado | % | Adelanto | Retraso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cantidad Validaciones** | **114** | **100%** | **182** | **159,65%** | **68** | **0** |

**Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)**

| Programado | Ejecutado | Adelanto | Retraso |
|---|---|---|---|
| **114** | **182** | **68** | **0** |

**Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)**

| | Prog. | Ejecutado |
|---|---|---|
| **Semana 14** | **89** | **124** |
| **Semana 15** | **92** | **158** |
| **Semana 16** | **104** | **173** |
| **Semana 17** | **114** | **182** |

**OBSERVACIONES:** (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

Para esta semana podemos establecer que el contratista de obra realiza validaciones llegando a 182 viviendas, pero de acuerdo a la nueva programación existe un adelanto de 68 validaciones.

**FORMATO**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**

**PROCESO**

EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

**SEMANA No.** 17 (Consecutivo) **DEL** sábado, 24 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 30 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No** CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

| | |
|---|---|
| MVAL_00389 | VALIDADA |
| MV_00391 | VALIDADA |
| MVAL_00434 | VALIDADA |
| MVAL_00441 | VALIDADA |
| MV_00417 | VALIDADA |
| MV_00419 | VALIDADA |
| MV_00420 | VALIDADA |
| MV_00425 | VALIDADA |
| MV_00423 | VALIDADA |
| MV_00451 | VALIDADA |
| MV_00452 | VALIDADA |
| MV_00453 | VALIDADA |
| MV_00316 | VALIDADA |
| MV_00314 | VALIDADA |
| MVAL_0149 | VALIDADA |
| MVAL_0140 | VALIDADA |
| MV_1051 | VALIDADA |
| MV_1056 | VALIDADA |
| MV_1060 | VALIDADA |
| MV_1062 | VALIDADA |
| MV_1064 | VALIDADA |
| MV_1032 | VALIDADA |
| MV_01035 | VALIDADA |
| MV_01041 | VALIDADA |
| MV_1043 | VALIDADA |
| MV_1095 | VALIDADA |
| MV_1103 | VALIDADA |
| MV_01105 | VALIDADA |
| MV_1197 | VALIDADA |
| MV_1198 | VALIDADA |
| MV_1201 | VALIDADA |
| MV_1206 | VALIDADA |
| MV_1180 | VALIDADA |
| MV_0021 | VALIDADA |
| MV_0025 | VALIDADA |
| MV_1220 | VALIDADA |
| MV_01223 | VALIDADA |
| MV_1228 | VALIDADA |
| MV_1230 | VALIDADA |
| MV_1231 | VALIDADA |
| MV_0026 | VALIDADA |
| MV_0028 | VALIDADA |
| MVAL_00164 | VALIDADA |
| MV_00333 | VALIDADA |
| MV_00332 | VALIDADA |

| | |
|---|---|
| MV_00332 | VALIDADA |
| MV_00350 | VALIDADA |
| MV_00404 | VALIDADA |
| MVAL_00116 | VALIDADA |
| MV_1132 | VALIDADA |
| MV_1131 | VALIDADA |
| MV_1129 | VALIDADA |
| MV_1162 | VALIDADA |
| MV_01123 | VALIDADA |
| MV_0127 | VALIDADA |
| MV_00013 | VALIDADA |
| MV_0015 | VALIDADA |
| MV_01167 | VALIDADA |
| MV_1166 | VALIDADA |
| MV_1179 | VALIDADA |
| MV_01176 | VALIDADA |
| MV_01175 | VALIDADA |
| MV_01265 | VALIDADA |
| MV_01266 | VALIDADA |
| MV_01268 | VALIDADA |
| MV_01270 | VALIDADA |
| MV_01271 | VALIDADA |
| MV_1374 | VALIDADA |
| MVAL_01563 | VALIDADA |
| MV_1391 | VALIDADA |
| MV_01400 | VALIDADA |
| MV_1394 | VALIDADA |
| MV_0049 | VALIDADA |
| MV_00038 | VALIDADA |
| MVAL_00040 | VALIDADA |
| MVAL_00046 | VALIDADA |
| MV_00001 | VALIDADA |
| MV_00002 | VALIDADA |
| MV_00004 | VALIDADA |
| MVAL_00005 | VALIDADA |
| MV_00009 | VALIDADA |
| MVAL_00011 | VALIDADA |
| MV_00082 | VALIDADA |
| MV_00085 | VALIDADA |
| MVAL_00064 | VALIDADA |
| MV_00062 | VALIDADA |
| MV_14683 | VALIDADA |
| MV_00060 | VALIDADA |
| MV_00311 | VALIDADA |
| MV_00317 | VALIDADA |

| | |
|---|---|
| MV_00306 | VALIDADA |
| MV_0320 | VALIDADA |
| MV_00303 | VALIDADA |
| MV_00302 | VALIDADA |
| MV_00271 | VALIDADA |
| MV_00274 | VALIDADA |
| MV_00279 | VALIDADA |
| MV_00280 | VALIDADA |
| MV_14691 | VALIDADA |
| MV_00282 | VALIDADA |
| MV_00236 | VALIDADA |
| MV_00231 | VALIDADA |
| MV_00232 | VALIDADA |
| MV_1069 | VALIDADA |
| MV_1072 | VALIDADA |
| MV_1075 | VALIDADA |
| MV_1076 | VALIDADA |
| MV_01238 | VALIDADA |
| MV_01079 | VALIDADA |
| MV_01080 | VALIDADA |
| MV_01081 | VALIDADA |
| MV_1136 | VALIDADA |
| MV_00115 | VALIDADA |
| MV_001151 | VALIDADA |
| MV_001141 | VALIDADA |
| MV_01146 | VALIDADA |
| MV_00109 | VALIDADA |
| MV_1236 | VALIDADA |
| MV_1240 | VALIDADA |
| MV_01244 | VALIDADA |
| MV_01247 | VALIDADA |
| MV_01215 | VALIDADA |
| MV_1359 | VALIDADA |
| MV_01363 | VALIDADA |
| MV_01366 | VALIDADA |
| MV_01367 | VALIDADA |
| MV_01368 | VALIDADA |
| MVAL_01253 | VALIDADA |
| MVAL_01257 | VALIDADA |
| MV_01530 | VALIDADA |
| MV_01526 | VALIDADA |
| MV_01573 | VALIDADA |
| MV_01560 | VALIDADA |
| MV_01570 | VALIDADA |

| | |
|---|---|
| MV_00352 | VALIDADA |
| MV_00360 | VALIDADA |
| MV_00335 | VALIDADA |
| MVAL_00381 | VALIDADA |
| MV_00367 | VALIDADA |
| MV_00402 | VALIDADA |
| MVAL_00401 | VALIDADA |
| MV_00398 | VALIDADA |
| MVAL_00249 | VALIDADA |
| MV_00248 | VALIDADA |
| MV_00218 | VALIDADA |
| MV_00220 | VALIDADA |
| MV_00222 | VALIDADA |
| MV_00224 | VALIDADA |
| MV_00297 | VALIDADA |
| MV_00159 | VALIDADA |
| MV_00158 | VALIDADA |
| MV_00165 | VALIDADA |
| MV_00211 | VALIDADA |
| MVAL_00209 | VALIDADA |
| MVAL_00178 | VALIDADA |
| MVAL_00174 | VALIDADA |
| MV_00172 | VALIDADA |
| MV_00171 | VALIDADA |
| MV_1174 | VALIDADA |
| MV_01112 | VALIDADA |
| MV_01114 | VALIDADA |
| MV_1122 | VALIDADA |
| MV_1120 | VALIDADA |
| MV_1109 | VALIDADA |
| MV_1020 | VALIDADA |
| MV_1028 | VALIDADA |
| MV_00329 | VALIDADA |
| MV_01191 | VALIDADA |
| MV_01192 | VALIDADA |
| MV_01196 | VALIDADA |
| MV_1200 | VALIDADA |
| MV_1349 | VALIDADA |
| MV_1343 | VALIDADA |
| MV_1344 | VALIDADA |
| MV_1433 | VALIDADA |
| MV_01430 | VALIDADA |

| | |
|---|---|
| MV_01428 | VALIDADA |
| MVAL_00091 | VALIDADA |
| MV_00092 | VALIDADA |
| MV_00098 | VALIDADA |
| MV_00102 | VALIDADA |
| MV_00071 | VALIDADA |
| MV_00068 | VALIDADA |

De las 284 validaciones expuestas en la nueva programación de obra se desarrollaron 182 . Esto indica un adelanto de 68 viviendas.

Se expone que dentro de las validaciones desarrolladas hay unos Mv por fuera de la línea de programación, estas viviendas son desarrolladas por logística y organización del contratista para maximizas materiales y ejecución.


| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad | **FORMATO**<br>**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**<br>**PROCESO**<br>EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD<br>SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT<br>SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ |


**SEMANA No.** 17 (Consecutivo) **DEL** sábado, 24 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 30 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa)


**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No** CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

## 2.2. AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES

**AVANCE FÍSICO APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)**
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

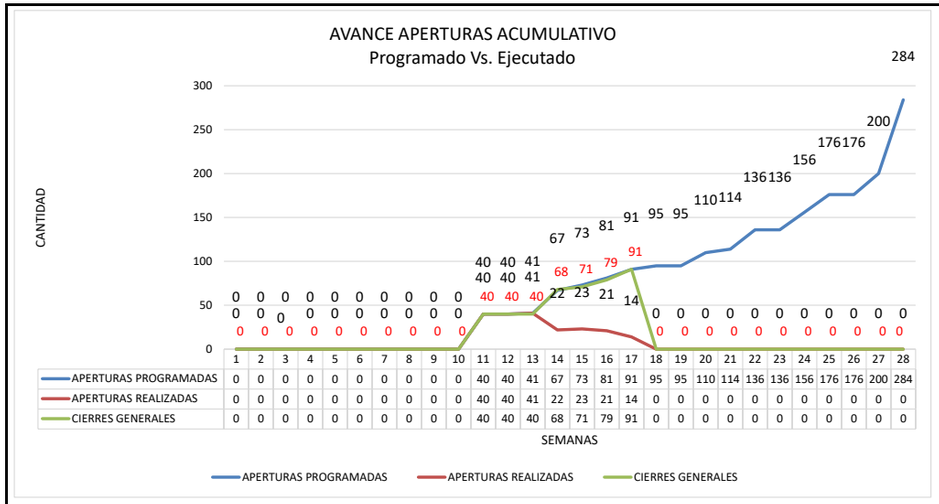

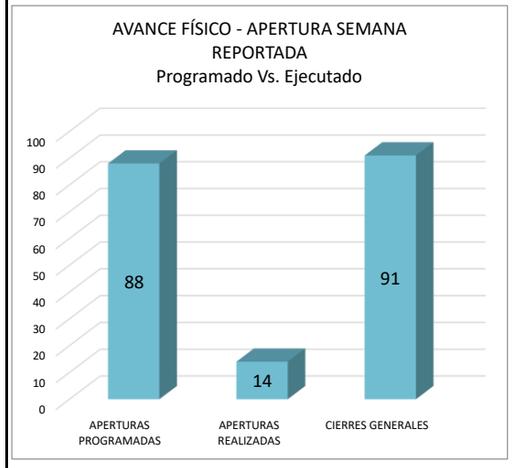
**Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)**
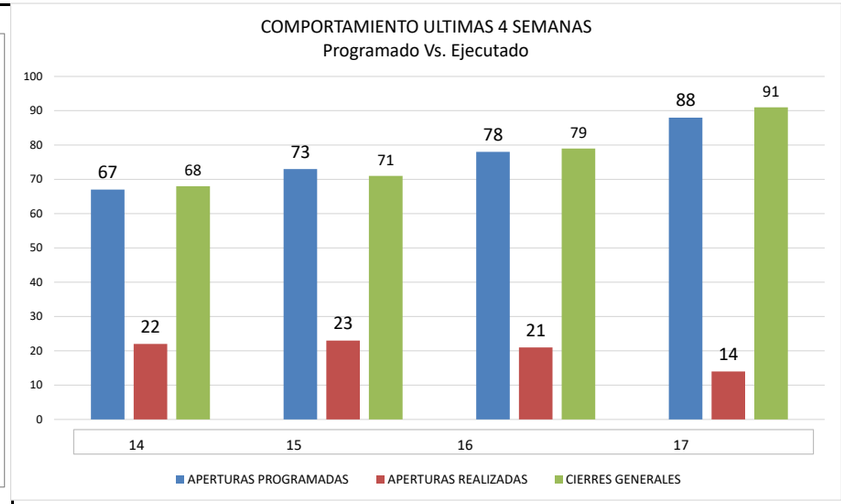
| | Programado | % | Ejecutado | % | Adelanto | Retraso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cantidad de Aperturas** | **91** | **100%** | **105** | **115,38%** | **14** | **0** |

**Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)**

| Programado | Ejecutado | Adelanto | Retraso |
|---|---|---|---|
| **91** | **105** | **14** | **0** |

**Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)**

| | Prog. | Ejecutado | | Prog. | Ejecutado | | Prog. | Ejecutado | | Prog. | Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Semana 14** | **67** | **90** | **Semana 15** | **73** | **94** | **Semana 16** | **78** | **100** | **Semana 17** | **91** | **105** |

**OBSERVACIONES:** (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

Para está semana se encuentran en ejecución 14 viviendas
Se aclara que de acuerdo a la programación de obra deberían haberse realizado 91 viviendas entre ejecución y entregas, pero en la ejecución de obra hay 14 y 91 viviendas entregadas. Lo que genera en total de 105 viviendas, con un adelanto entre ejecuciòn y entregas de 14 vivienda

**FORMATO**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**

**PROCESO**

EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

**SEMANA No.** 17 (Consecutivo) **DEL** sábado, 24 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 30 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No** CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

| | | |
|---|---|---|
| MVAL_00389 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00391 | ENTREGADA | 100,00% |
| MVAL_00434 | ENTREGADA | 100,00% |
| MVAL_00441 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00417 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00419 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00425 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00423 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00451 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00452 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00453 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00316 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00314 | ENTREGADA | 100,00% |
| MVAL_0149 | ENTREGADA | 100,00% |
| MVAL_0140 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_1051 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_1056 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_1060 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_1062 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_1064 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_01035 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_01041 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_1043 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_1103 | EN EJECUCION | 15,00% |
| MV_01105 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_1197 | EN EJECUCION | 20,00% |
| MV_01223 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_1231 | ENTREGADA | 100,00% |
| MVAL_00164 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00333 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00332 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00350 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00404 | ENTREGADA | 100,00% |
| MVAL_00116 | EN EJECUCIÓN | 12,00% |
| MV_1132 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_1131 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_1129 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_1162 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_01123 | EN EJECUCIÓN | 8,00% |
| MV_0127 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00013 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_0015 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_01167 | EN EJECUCIÓN | 50,00% |
| MV_1166 | ENTREGADA | 100,00% |

| | | |
|---|---|---|
| MV_1179 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_01176 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_01175 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00311 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00317 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00306 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_0320 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00303 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00302 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00271 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00274 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00279 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00280 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_14691 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00282 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00236 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00231 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00232 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_1069 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_1072 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_1075 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_1076 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_01238 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_01079 | EN EJECUCIÓN | 20,00% |
| MV_01080 | EN EJECUCIÓN | 98,00% |
| MV_01081 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_001151 | EN EJECUCIÓN | 80,00% |
| MV_01146 | EN EJECUCIÓN | 95,00% |
| MV_00352 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00360 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00335 | ENTREGADA | 100,00% |
| MVAL_00381 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00367 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00402 | ENTREGADA | 100,00% |
| MVAL_00401 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00398 | ENTREGADA | 100,00% |
| MVAL_00249 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00248 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00218 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00220 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00222 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00224 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00297 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00159 | ENTREGADA | 100,00% |

| | | |
|---|---|---|
| MV_00165 | EN EJECUCIÓN | 93,00% |
| MV_00211 | ENTREGADA | 100,00% |
| MVAL_00209 | ENTREGADA | 100,00% |
| MVAL_00178 | ENTREGADA | 100,00% |
| MVAL_00174 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00172 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_00171 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_1174 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_01112 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_01114 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_1122 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_1120 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_1109 | EN EJECUCIÓN | 0,00% |
| MV_1020 | EN EJECUCIÓN | 0,00% |
| MV_1028 | ENTREGADA | 100,00% |
| MV_01191 | EN EJECUCIÓN | 4,00% |
| MV_1200 | EN EJECUCIÓN | 5,50% |

Para está semana, y de acuerdo a la programación de obra, se deberían tener 91 casa en apertura y ejecución. A la fecha, están en esta actividad 14 viviendas y 91 que fueron entregadas, lo que representa un adelanto en la programación de obra.


| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad | **FORMATO**<br>**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**<br>**PROCESO**<br>EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD<br>SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT<br>SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ |

**SEMANA No.** 17 (Consecutivo) **DEL** sábado, 24 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 30 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No** CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

## 2.3. AVANCES DE EJECUCIÓN FINANCIERO

**AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)**
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

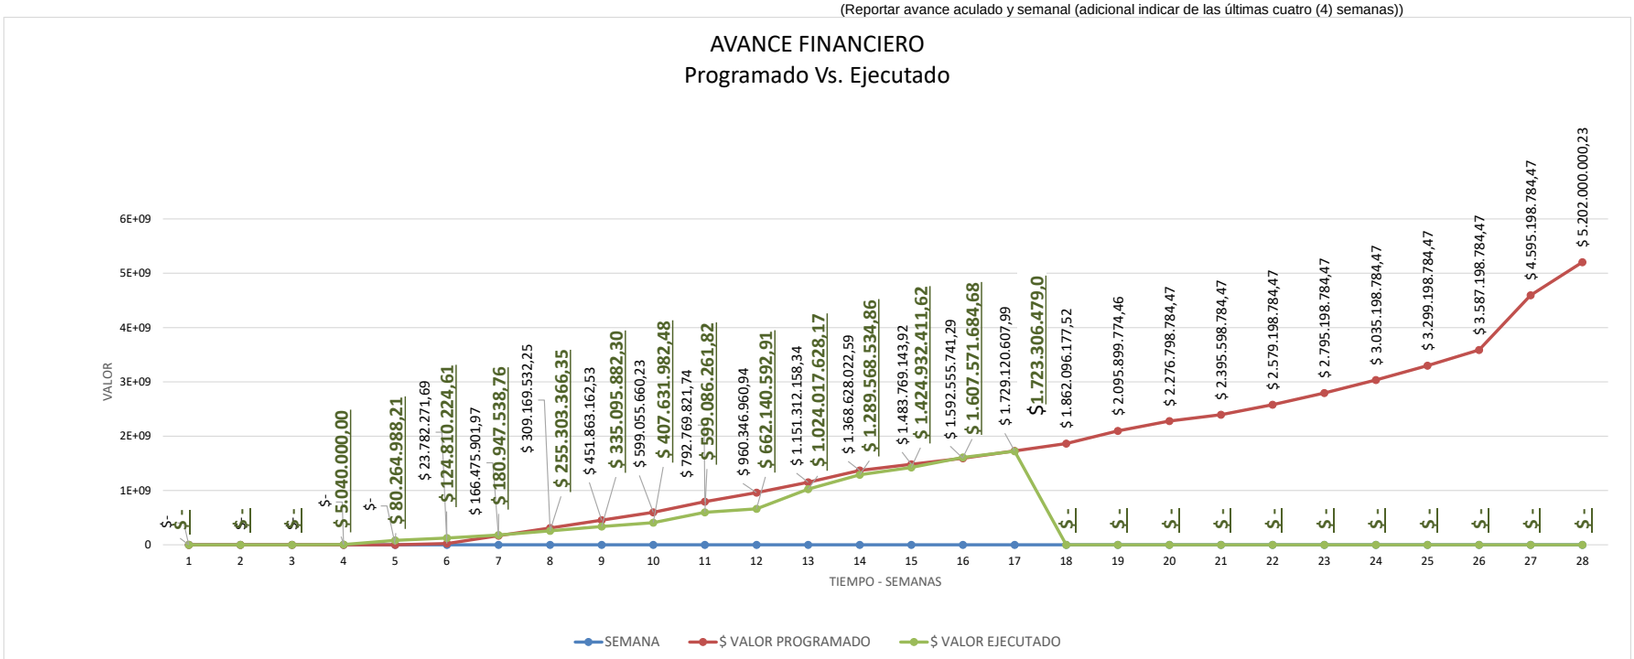


| VALOR INVERSIÓN SEGÚN FLUJO DE CAJA | | |
|---|---|---|
| **INVERSIÓN SEMANAL** | | |
| PROGRAMADA | | EJECUTADA |
| $ 136.564.866,70 | | $ 115.734.794,36 |
| % AVANCE PROGRAMADO | VS. | % AVANCE EJECUTADO |
| 2,63% | | 2,22% |
| **INVERSIÓN ACUMULADA** | | |
| PROGRAMADA | VS. | EJECUTADA |
| $ 1.729.120.607,99 | | $ 1.723.306.479,04 |
| % AVANCE PROGRAMADO | VS. | % AVANCE EJECUTADO |
| 33,24% | | 33,13% |
| ATRASO O ADELANTO EN PESOS ($): | | **-$ 5.814.128,95** |
| ATRASO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%) | | **-0,11%** |

**OBSERVACIONES:** (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

Para está semana se presenta una ejecución de acuerdo a lo programado, es importante que por parte del contratista se continué con estas dinámicas para finalizar con lo estipulado en el flujo de caja y en la programación

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad | **FORMATO**<br>**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**<br>**PROCESO**<br>EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD<br>SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT<br>SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ |

**SEMANA No.** 17 (Consecutivo) **DEL** sábado, 24 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 30 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No** CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

## 3. ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

| | ID_MV | DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO | TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA) Anexar evidencias | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|
| SEMANA 01 | | NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL | | |
| SEMANA 02 | | NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL | | |
| SEMANA 03 | | NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL | | |
| SEMANA 04 | | 28/09/2022: En el desarrollo de las actividades se disponían a llevar a cabo seguimientos en territorio, pero se solicita retiro del mismo por motivos de seguridad debido a situaciones de hurto con arma de fuego en mediaciones de las viviendas a visitar.<br>(el equipo técnico y social de interventoría se disponía a realizar los seguimientos respectivos, sin embargo, siendo aproximadamente las 10:00 a.m. se presenta un altercado de seguridad a dos cuadras del PAC del contratita, en donde hurtaron las pertenecías de algunos habitantes del sector con arma de fuego, por este motivo se recibe llamada de advertencia y decidimos retirarnos del territorio dado lo ocurrido). | Se informa a la SDH de esta situación | |
| | MVAL_00441 | Se selecciona como Historia de vida el día 27/09/2022 el MVAL_00441 MARÍA HENAO QUINTERO, se expone a la beneficiaria su postulación, ella manifiesta conformidad y se diligencian los formatos para que la par social contratista exponga el caso. | | |
| | | 30/09/2022 El día 30 de septiembre se realizan seguimientos sin presencial del personal del contratista, el PAC se encuentra cerrado. | Se remite comunicado No. SDHT-CI22-2022-019 al contratista GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOZ SAS exponiendo la situación en referencia a la falta de personal. | Pendiente respuesta por parte del contratista |
| SEMANA 05 | | Se solicita al contratista el seguimientos de las viviendas que se encuentran en ejecución para que no existan materiales ni escombros en los frentes de la vivienda a menos que se estén descargando y durante el día se ingresen a la vivienda. | | |
| SEMANA 06 | MV-00282 | 11/10/2022 - MARCO ANTONIO VEGA Se postula la historia de vida de este beneficiario. | | |
| SEMANA 07 | | NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL | | |
| SEMANA 08 | | NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL | | |
| SEMANA 10 | | SE SOLICITA AL CONTRATISTA QUE AL MOMENTO DE LAS APERTURAS DE LAS VIVIENDAS SE DEBE CONTEMPLAR EL MATERIAL Y LOS OPERARIOS QUE DESARROLLEN LAS ACTIVIDADES DE OBRA PARA EVITAR RETRASOS Y MOLESTIAS EN LOS USUARIOS. | LA INTERVENTORÍA REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO Y EL CUAL SERÁ REPORTADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA | |

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad | **FORMATO**<br>**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**<br>**PROCESO**<br>EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD<br>SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT<br>SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ |

**SEMANA No.** 17 (Consecutivo) **DEL** sábado, 24 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 30 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No** CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SEMANA 11 | | 15/11/2022 MV_1162 - ÁNGEL MIGUEL SUÁREZ: Se implementa formato de Historia de Vida, develando aspectos de la vida del señor Ángel, tales como que vive solo, recibe un subsidio del gobierno por valor de $130.000. Sus hijos (2) cubren los gastos de los servicios y el impuesto del predio. El señor Suárez cumplió una condena de 2 años de cárcel por homicido comprobado, hace más de 30 años. En la actualidad se reúne en una iglesia cristiana la cual se constituye en una red importante de socialización y apoyo para el adulto mayor. | | |
| SEMANA 12 | | NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL | | |
| SEMANA 13 | | NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL | | |
| SEMANA 14 | | NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL | | |
| SEMANA 15 | | Teniendo en cuenta lo relacionado al proceso del MV_01238 de la beneficiaria Beatriz Cruz Payanene ubicado en la Kr 7 A este 99-25 sur el cual fue validado el día 12 de octubre de 2022 evidenciando que la necesidad prioritaria de la vivienda era el cambio total de cubierta, incluyendo además actividades de pintura en general, cambio de combo sanitario e instalación de lavaplatos. Posterior a ello se realizó la apertura de obra el día 22 de noviembre de 2022, donde se presentó al personal de obra asignado se iniciaron actividades el día 23 de noviembre; durante el proceso de ejecución, la beneficiaria manifestó inconformidades relacionadas a los procesos constructivos, los cuales fueron subsanados. Como las inconformidades persistían se realizó una visita con el director de obra, explicándole a la beneficiaria que desde el momento de validación se evidenciaron problemas de humedad en algunos muros interiores de la vivienda, los cuales el contratista no podía subsanar ya que es una situación preexistente y sobre la cual no se puede dar garantía de obra.<br>Sin embargo, se solicitó al personal de obra resanar aquellos muros que presentaban detalles en donde se sopló la pintura por humedad, realizar la limpieza en guarda escobas, tomacorrientes y algunos marcos de ventana que presentaban rastros de pintura; estas actividades fueron realizadas inmediatamente. Según lo acordado con la beneficiaria,<br>se programaría la entrega de la vivienda, para lo cual se citó el día 14 de diciembre de 2022.<br>Al momento de realizar la entrega, la beneficiaria continúa manifestando inconformidades, relacionadas a que no se cumplieron los compromisos y adicional a esto manifiesta que la cubierta en la parte delantera de la vivienda, está vulnerable a levantarse por el viento, para lo cual el área técnica verifico y se corroboro que esta amarrada a la estructura y no presenta alguna afectación, de acuerdo a lo que está refiriendo la beneficiaria.<br>Con lo anterior, el contratista solicita a la beneficiaria, presentarse el día 20 de diciembre de 2022 a las 10 am en el predio, para verificar nuevamente el cumplimiento a los compromisos pactados, realizar la entrega del mejoramiento y retirar la bitácora de obra ya que es un documento público y debe reposar en los archivos de expediente de dicho predio. En caso de no presentarse en la fecha plasmada, por favor comunicarse al número de la profesional Social Laura Dimate celular 3144438890. | | |
| SEMANA 16 | | NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL | | |
| SEMANA 17 | | NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SEMANA 18 | | | | |
| SEMANA 19 | | | | |
| SEMANA 20 | | | | |
| SEMANA 21 | | | | |
| SEMANA 22 | | | | |

## 4. RELACIÓN DE RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativas)

| | ID_MV | MOTIVO DE LA RENUNCIA Y/O NO EJECUCIÓN | No. DE RADICADO A LA SDHT Y FECHA |
|---|---|---|---|
| SEMANA 01 | | NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME | |
| SEMANA 02 | | NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME | |
| SEMANA 03 | | NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME | |
| SEMANA 04 | | NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME | |
| SEMANA 05 | | NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME | |
| SEMANA 06 | | NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME | |
| SEMANA 07 | | NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME | |
| SEMANA 08 | | NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME | |
| SEMANA 09 | | NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME | |
| SEMANA 10 | | NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME | |
| SEMANA 11 | | NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME | |

**SEMANA No.** 17 (Consecutivo) **DEL** sábado, 24 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 30 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No** CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEMANA 12 | | NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME | |
| SEMANA 13 | | 28/11/2022 MV_00153 - JENNY LÓPEZ: La señora Jenny Lopez acude al PAC para renunciar al mejoramiento de vivienda por razones personales y familiares. Firma los formatos correspondientes y entrega la bitácora de obra. | Se radica el 10/12/2022, no se genera No. Por fallas en el sistema |
| SEMANA 14 | | NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME | |
| SEMANA 15 | | NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME | |
| SEMANA 16 | | NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME | |
| SEMANA 17 | | NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME | |
| SEMANA 18 | | | |
| SEMANA 19 | | | |
| SEMANA 20 | | | |
| SEMANA 21 | | | |

## 5. RELACIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativas)

| | ID_MV | BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PQR (anexar copia del PQR) | TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA) Anexar evidencias | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|
| SEMANA 01 | | NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME | | |
| SEMANA 02 | | NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME | | |
| SEMANA 03 | | NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME | | |
| SEMANA 04 | | NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME | | |
| SEMANA 05 | | NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME | | |
| SEMANA 06 | | NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME | | |
| SEMANA 07 | | NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME | | |
| SEMANA 08 | | NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME | | |
| SEMANA 09 | | NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME | | |
| SEMANA 10 | MV 01400 | La beneficiaria remite carta a la SDHT refiriendo lo siguiente "respetados señores, la presente tiene como fin saludarles y desearles éxitos en sus labores diarias, a su vez, de manera muy respetuosa quiero solicitar de su ayuda respecto a que Salí beneficiada con el programa de mejoramiento de vivienda, pero en el momento de la visita, no me han comunicado con anterioridad y no me ha sido posible estar en casa debido a que soy madre cabeza de familia y estoy en mis obligaciones de trabajo. Me gustaría solicitar, que para el día de la visita, me sea informado con un día de anticipación, así puedo solicitar un permiso en mi lugar de trabajo y poder atenderles a ustedes para la respectiva visita. Agradezco su colaboración… | Se coordina con el contratista la visita para dar respuesta a la solicitud | 17/11/2022 |

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad | **FORMATO**<br>**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**<br>**PROCESO**<br>EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD<br>SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT<br>SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ |

**SEMANA No.** 17 (Consecutivo) **DEL** sábado, 24 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 30 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No** CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SEMANA 11 | | NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME | | |
| SEMANA 12 | | NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME | | |
| SEMANA 13 | | NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME | | |
| SEMANA 14 | | NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME | | |
| SEMANA 15 | | 14/12/2022 En atención al requerimiento solicitado el día 28 de noviembre de 2022 por la beneficiaria Alexi Constanza Rojas León del barrio nuevo porvenir, MV_1146 ubicado en la Kr 6 este # 100-10 sur; el componente social del contratista se permite informar que la validación del predio se realizó el día 31 de octubre de 2022 y esa visita fue atendida por el esposo de la beneficiaria, el señor Carlos Corredor a quien se le informó todo lo relacionado al mejoramiento de vivienda, a partir del momento de validación hasta la entrega del mismo, también se dio claridad a lo relacionado con el presupuesto asignado las viviendas; en vista que el apartamento del 4to piso se encontraba en obra negra y en estado inhabitable, se priorizo para ser intervenido; explicándole al beneficiario que no se pueden realizar obras en cada uno de los pisos de la vivienda y que no se realizan obras estructurales.<br>Al momento de la validación el apartamento priorizado no contaba con instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas; también le hacia falta una parte de la cubierta, por lo tanto, el área técnica le sugirió al encargado de la vivienda realizar estas actividades antes de iniciar el mejoramiento de vivienda el cual se podía tardar aproximadamente 20 días, no sin antes informarle a la familia la fecha establecida para el inicio de obra.<br>El día 21 de noviembre la beneficiaria se comunica con la residente social encargada, con la inquietud relacionada a la fecha de inicio de obra; la profesional social le informa a la beneficiaria que cuando se cuente con el personal y el material para la vivienda, se le informara la fecha de inicio y se presentaran los maestros; se le recuerda que no se establecen fechas fijas desde la validación ya que el inicio de obra depende de factores como la disposición de material y personal. También se le recuerda que los para este proyecto, los mejoramientos de vivienda deben ser terminados en su totalidad al 31 de diciembre de 2022; por lo tanto, las obras se iniciaran a mas tardar en el mes de diciembre. La beneficiaria, solicita que la comunicación sea directa con el esposo, ya que, por motivos laborales, no puede acceder a su teléfono celular, se actualizan los datos con el número telefónico del Señor Carlos Corredor, para informarle la fecha de inicio de obras.<br>El día martes 6 de septiembre, la residente social le informa a la beneficiaria que la apertura de obra se realizará el día 9 de diciembre. Dando cumplimiento al compromiso, se realiza la apertura de obra el día mencionado, diligenciando las actas correspondientes, se entrega la bitácora de obra y la carta al trato digno; el área técnica por su parte explica el presupuesto asignado y las actividades a ejecutar en la vivienda y se presenta el personal de obra. Se firman los documentos a conformidad del señor Carlos corredor. | Se da manejo entre contratista e intreventoría | |
| SEMANA 16 | | NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME | | |
| SEMANA 17 | | NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME | | |
| SEMANA 18 | | | | |
| SEMANA 19 | | | | |
| SEMANA 20 | | | | |
| SEMANA 21 | | | | |
| SEMANA 22 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad | **FORMATO**<br>**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**<br>**PROCESO**<br>EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD<br>SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT<br>SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ |

**SEMANA No.** 17 (Consecutivo) **DEL** sábado, 24 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 30 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No** CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

## 4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORÍA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)

**OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:**

1- PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Se mantiene que el punto de atención quedara ubicado en la Carrera 7B Este No 97G-25 Sur y será atendido los días martes, jueves y sábados en el horario de 8:30 am a 12:00 pm

El PAC se encuentra en funcionamiento en los horarios establecidos para la atención a los usuarios mejorando los tiempos de atención.

## SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

| DISPOSICIÓN RCD M3 | | ESCOMBRERA (indicar nombre y No. Autorización) | No. DE VALE ESCOMBRERA, PIN Y PLACA VOLQUETA |
|---|---|---|---|
| SEMANA 17 | 11 M3 | N/A | N/A |
| MES | DICIEMBRE | | |
| SECTOR | USME | | |

| CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES | 11 M3 | CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO | 25 M3 |
|---|---|---|---|

| DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS M3 | | CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA |
|---|---|---|
| SEMANA 17 | 0 M3 | No se registran residuos peligrosos retirados por entes empresa certificada para la disposición final está semana, los residuos generados que tienen tratamiento diferente se encuentran acopiados. |
| MES | DICIEMBRE | |
| SECTOR | USME | |

| CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES | 0 M3 | CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO | 0 M3 |
|---|---|---|---|

## 6. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

| CONTRATISTA DE OBRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLAS O CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 1 | CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS | 0 |
| CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBREROS) | | | 37 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 12 |
| PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA | 0 | PERSONAL OBRERO | 37 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 12 |
| PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA | 0 | PERSONAL OBRERO | 37 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 12 |

| INTERVENTORÍA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITACIONES O CHARLAS PROGRAMADAS | 1 | CAPACITACIONES O CHARLAS REALIZADAS | 1 | ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS | 0 |
| CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORÍA | | | | | 13 |

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 | **FORMATO**<br>**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**<br>**PROCESO**<br>EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD<br>SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT<br>SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ |

**SEMANA No.** 17 (Consecutivo) **DEL** sábado, 24 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 30 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No** CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

## 7. ANEXOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVAL_00389 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| MV_00391 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 50,00% | 90,00% | 98,00% | 98,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| MVAL_00434 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| MVAL_00441 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 30,00% | 40,00% | 60,00% | 85,00% | 95,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| MV_00417 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 90,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| MV_00419 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 60,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| MV_00420 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| MV_00425 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| MV_00423 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 60,00% | 70,00% | 90,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| MV_00451 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 50,00% | 70,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| MV_00452 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 15,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| MV_00453 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 90,00% | 98,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| MV_00316 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 20,00% | 60,00% | 70,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| MV_00314 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 30,00% | 40,00% | 80,00% | 95,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| MVAL_0149 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 35,00% | 85,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| MVAL_0140 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 70,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| MV_1051 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| MV_1056 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 70,00% | 100,00% |
| MV_1060 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 60,00% | 100,00% | |
| MV_1062 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | | |
| MV_1064 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| MV_1032 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| MV_01035 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 65,00% | 100,00% | | | |
| MV_01041 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | | | |
| MV_1043 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 55,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | | |
| MV_1095 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV_1103 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,00% | | | |
| MV_01105 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 80,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | | |
| MV_1197 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | | | |
| MV_1198 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV_1201 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV_1206 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV_1180 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV_0021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MVAL_0022 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV_0025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV_1234 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV_1220 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV_01223 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV_1238 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV_1230 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV_1231 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV_1427 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV_0026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV_0028 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV_0030 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV_1426 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV_01425 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV_1423 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV_01420 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| MVAL_00164 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 45,00% | 78,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| MV_00333 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 18,00% | 68,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| MV_00332 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 60,00% | 95,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| MV_00350 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 28,00% | 52,00% | 72,00% | 97,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| MV_00404 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 45,00% | 80,00% | 88,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| MVAL_00116 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,00% |
| MV_1132 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 42,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| MV_1131 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,00% | 35,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| MV_1129 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,00% | 28,00% | 52,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| MV_1162 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 72,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| MV_01123 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,00% | | | |
| MV_0127 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| MV_00013 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 18,00% | 88,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| MV_0015 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 55,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| MV_1166 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 36,00% | 72,00% | 100,00% | | |
| MV_1179 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 21,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| MV_01176 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 18,00% | 55,00% | 100,00% | | |
| MV_01175 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,00% | 21,00% | 75,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| MV_01265 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| MV_01266 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| MV_01268 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| MV_01270 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| MV_01271 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| MV_1374 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| MVAL_01563 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| MV_1391 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| MV_01400 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| MV_1394 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| MV_0049 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| MV_00038 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| MVAL_00040 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| MVAL_00046 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| MV_00001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| MV_00002 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| MV_00004 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| MVAL_00005 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| MV_00009 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| MVAL_00011 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| MV_00082 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| MV_00085 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| MVAL_00064 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| MV_00062 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| MV_14683 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| MV_00060 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| MV_00311 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 60,00% | 85,00% | 100,00% | | |
| MV_00317 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,25% | 34,00% | 85,72% | 99,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| MV_00306 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 60,00% | 97,72% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV_0320 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| MV_00303 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 19,00% | 43,00% | 98,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| MV_00302 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 75,00% | 90,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| MV_00271 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,98% | 30,54% | 55,21% | 99,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| MV_00274 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 75,00% | 90,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| MV_00279 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 75,00% | 98,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| MV_00280 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 17,00% | 31,26% | 55,61% | 95,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| MV_14691 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 50,00% | 100,00% | |
| MV_00282 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| MV_00236 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| MV_00231 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 65,00% | 90,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| MV_00232 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 65,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| MV_1069 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 55,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| MV_1072 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 40,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| MV_1075 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 85,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| MV_1076 | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 80,00% | 100,00% | | | |
| MV_01238 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 85,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| MV_01079 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 20,00% | 20,00% | | | |
| MV_01080 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 40,00% | 98,00% | | | |
| MV_01081 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 98,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| MV_1136 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| MV_00115 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| MV_001151 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 40,00% | 80,00% | | | |
| MV_001141 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV_01146 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 45,00% | 95,00% | | | |
| MV_00109 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV_1236 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV_1240 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV_01244 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV_01247 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV_1213 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV_01215 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV_1359 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV_01363 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV_01366 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV_01367 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV_01368 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MVAL_01253 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| MV

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad | **FORMATO**<br>**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**<br>**PROCESO**<br>EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD<br>SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT<br>SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ |

**SEMANA No.** 17 (Consecutivo) **DEL** sábado, 24 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 30 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No** CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

## SOCIAL




APERTURA - 27/12/2022 - MV _1200 SANDRA VARGAS - DESARROLLO NUEVO PORVENIR




APERTURA - 27/12/2022 - MV _1200 SANDRA VARGAS - DESARROLLO NUEVO PORVENIR




APERTURA - 29/12/2022 MV_1103 SOCORRO OJEDA - DESARROLLO NUEVO PORVENIR




SEGUIMIENTO 27/12/2022 MVAL_0116 MARIA EUGENIA GOMEZ OROZCO DESARROLLO NUEVO PORVENIR




SEGUIMIENTO 27/12/2022 MV_01123 RUBIEL SOTO MARROQUIN DESARROLLO NUEVO PORVENIR

## TÉCNICO




| | |
|---|---|
| FECHA | martes, 27 de diciembre de 2022 |
| DESCRIPCION | |
| Entrega, zona de patio | |




| | |
|---|---|
| FECHA | martes, 27 de diciembre de 2022 |
| DESCRIPCION | |
| Entrega, zona de patio | |




| | |
|---|---|
| FECHA | viernes, 30 de diciembre de 2022 |
| DESCRIPCION | |
| Instalación de pañete en muros de comedor | |




| | |
|---|---|
| FECHA | viernes, 30 de diciembre de 2022 |
| DESCRIPCION | |
| Instalación de pañete en muros de hall | |



| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad | **FORMATO**<br>**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**<br>**PROCESO**<br>EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD<br>SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT<br>SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ |

**SEMANA No.** 17 (Consecutivo) **DEL** sábado, 24 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 30 de diciembre de 2022 (dd-mm-aa)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No** CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

**SST Y AMBIENTAL**




ACOMPAÑAMIENTO ENTREGA MV 0015




FACHADA SIN ECOMBRO







Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas previamente, en Bogotá, D.C., a los 4 (Día en letras) CUATRO (Día en números) días del mes del FEBRERO (Mes en letras) de 2023 (Año de firma del informe)

Firma

Nombre: (Nombre) EDGAR EDUARDO ROA CASTILLO

Cargo: Director de Interventoría
