CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** sábado, 21 de enero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 27 de enero de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2022."

(Indique el objeto del contrato de interventoría suscrito)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 – 2022."

(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)

CONTRATISTA DE OBRA: GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOZ (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 900,372 ,215-7 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 901,627224-3 (Escriba el NIT del Interventor)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Valor Inicial	$ 432.000.000,00	Valor Inicial	$ 3.600.000.000
Valor Adicional 1	$ 192.240.000,00	Valor Adicional 1	$ 1.602.000.000
Valor Adicional 2	N.A.	Valor Adicional 2	N.A
Valor Actualizado	$ 624.240.000,00	Valor Actualizado	$ 5.202.000.000
Plazo Inicial	5 Meses	Plazo Inicial	4 Meses
Plazo Prórroga 1	2,5 Meses	Plazo Prorroga 1	2,5 Meses
Plazo Prórroga 2	N.A.	Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	7,5 Meses	Plazo Actualizado	6,5 Meses
Fecha de Iniciación	1/09/2022	Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/01/2023	Fecha de Terminación Inicial	31/12/2022
Fecha de Terminación según Prórroga 1	15/04/2023	Fecha de Terminación según Prórroga 1	15/03/2023
Fecha de Terminación según Prórroga 2	N.A.	Fecha de Terminación según Prórroga 2	N.A.
Fecha de Terminación Actual	15/04/2023	Fecha de Terminación Actual	15/03/2023

SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CAMILA CORTES DAZA (Escriba el nombre del Supervisor de Hábitat)

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROCESO

EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS


SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** sábado, 21 de enero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 27 de enero de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)


2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

2.1. AVANCES DE EJECUCIÓN VALIDACIONES

AVANCE FÍSICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

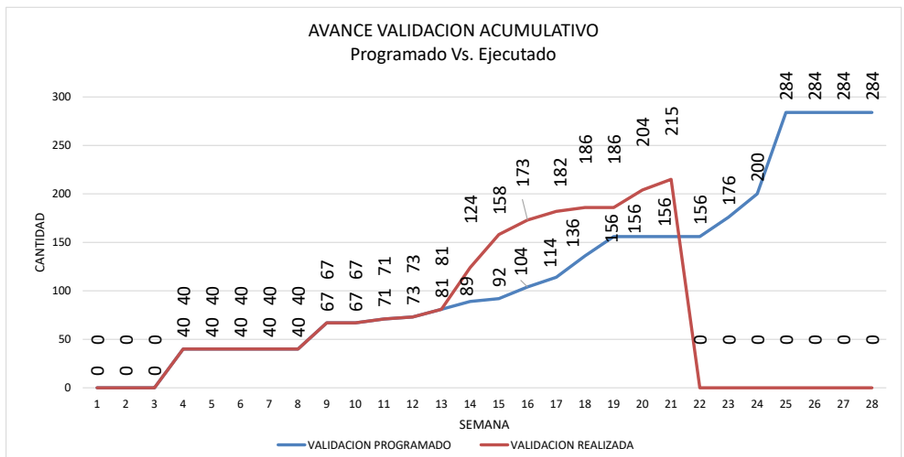



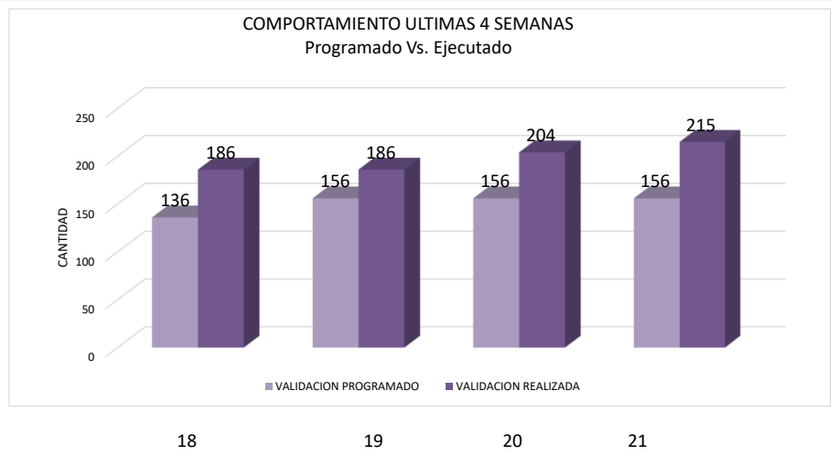

Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)

	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso
Cantidad Validaciones	**156**	**100%**	**215**	**137,82%**	**59**	**0**

Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)

Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso
156	**215**	**59**	**0**

Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)

	Prog.	Ejecutado
Semana 18	**136**	**186**
Semana 19	**156**	**186**
Semana 20	**156**	**204**
Semana 21	**156**	**215**

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

Para esta semana podemos establecer que el contratista de obra realiza validaciones llegando a 215 viviendas, pero de acuerdo a la nueva programación existe un adelanto de 59 validaciones.

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROCESO

EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** sábado, 21 de enero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 27 de enero de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

MV_001141	VALIDADA
MV_1136	VALIDADA
MV_00115	VALIDADA
MV_01363	VALIDADA
MV_01530	VALIDADA
MV_01526	VALIDADA
MV_01557	VALIDADA
MVAL_00040	VALIDADA
MV_00004	VALIDADA
MV_01428	VALIDADA
MV_01570	VALIDADA
MV_01566	VALIDADA
MVAL_00091	VALIDADA
MV_00092	VALIDADA
MV_00098	VALIDADA
MV_00106	VALIDADA
MV_1201	VALIDADA
MV_0021	VALIDADA
MVAL_0022	VALIDADA
MV_01213	VALIDADA
MV_01215	VALIDADA
MV_1359	VALIDADA
MV_01367	VALIDADA
MV_01368	VALIDADA
MV_01265	VALIDADA
MV_01266	VALIDADA
MV_01268	VALIDADA
MV_01270	VALIDADA
MV_01271	VALIDADA
MV_1374	VALIDADA
MV_1427	VALIDADA
MV_0026	VALIDADA
MV_0030	VALIDADA
MV_1426	VALIDADA
MV_01425	VALIDADA
MV_01420	VALIDADA
MV_01573	VALIDADA
MV_01560	VALIDADA
MVAL_00005	VALIDADA
MV_00009	VALIDADA
MVAL_00011	VALIDADA
MV_00082	VALIDADA
MV_00085	VALIDADA
MVAL_00064	VALIDADA

MV_00062	VALIDADA
MV_14683	VALIDADA
MV_00060	VALIDADA
MV_00102	VALIDADA
MV_00071	VALIDADA
MV_00069	VALIDADA
MV_00068	VALIDADA
MV_00076	VALIDADA
MV_00066	VALIDADA
MV_02731	VALIDADA
MV_02833	VALIDADA
MVAL_02834	VALIDADA
MV_02848	VALIDADA
MV_02857	VALIDADA
MV_02864	VALIDADA
MV_02875	VALIDADA
MV_02895	VALIDADA
MV_02901	VALIDADA
MV_02904	VALIDADA
MV_02905	VALIDADA
MVAL_02812	VALIDADA
MV_02782	VALIDADA
MV_02842	VALIDADA
MV_02844	VALIDADA
MV_02888	VALIDADA
MV_02896	VALIDADA
MV_1512	VALIDADA
MV_00109	VALIDADA
MV_00002	VALIDADA
MV_01366	VALIDADA
MV_1236	VALIDADA
MV_01247	VALIDADA
MV_00329	VALIDADA
MVAL_00046	VALIDADA
MVAL_01257	VALIDADA
MV_1180	VALIDADA
MV_1433	VALIDADA
MV_00038	VALIDADA
MV_1343	VALIDADA
MV_1095	VALIDADA
MV_00420	VALIDADA
MV_1234	VALIDADA
MV_00001	VALIDADA
MV_1032	VALIDADA

MV_01196	VALIDADA
MV_01430	VALIDADA
MV_01244	VALIDADA
MVAL_01563	VALIDADA
MV_1103	VALIDADA
MV_0025	VALIDADA
MV_01400	VALIDADA
MVAL_00164	VALIDADA
MV_00333	VALIDADA
MV_00332	VALIDADA
MV_00350	VALIDADA
MV_00352	VALIDADA
MV_00360	VALIDADA
MV_00335	VALIDADA
MVAL_00381	VALIDADA
MV_00367	VALIDADA
MV_00404	VALIDADA
MV_00402	VALIDADA
MVAL_00401	VALIDADA
MV_00398	VALIDADA
MVAL_00389	VALIDADA
MV_00391	VALIDADA
MVAL_00434	VALIDADA
MVAL_00441	VALIDADA
MV_00417	VALIDADA
MV_00419	VALIDADA
MV_00425	VALIDADA
MV_00423	VALIDADA
MV_00451	VALIDADA
MV_00452	VALIDADA
MV_00453	VALIDADA
MV_00316	VALIDADA
MV_00314	VALIDADA
MV_00311	VALIDADA
MV_00317	VALIDADA
MV_00306	VALIDADA
MV_0320	VALIDADA
MV_00303	VALIDADA
MV_00302	VALIDADA
MV_00271	VALIDADA
MV_00274	VALIDADA
MV_00279	VALIDADA
MV_00280	VALIDADA

MV_14691	VALIDADA
MV_00282	VALIDADA
MV_00236	VALIDADA
MV_00231	VALIDADA
MV_00232	VALIDADA
MV_00248	VALIDADA
MVAL_00249	VALIDADA
MV_00218	VALIDADA
MV_00220	VALIDADA
MV_00222	VALIDADA
MV_00224	VALIDADA
MV_00297	VALIDADA
MV_00211	VALIDADA
MVAL_00209	VALIDADA
MVAL_00178	VALIDADA
MVAL_00174	VALIDADA
MV_00172	VALIDADA
MV_00171	VALIDADA
MV_00159	VALIDADA
MV_00158	VALIDADA
MV_00165	VALIDADA
MVAL_0149	VALIDADA
MVAL_0140	VALIDADA
MV_1051	VALIDADA
MV_1056	VALIDADA
MV_1060	VALIDADA
MV_1062	VALIDADA
MV_1064	VALIDADA
MV_01035	VALIDADA
MV_01041	VALIDADA
MV_1043	VALIDADA
MV_01105	VALIDADA
MV_1069	VALIDADA
MV_1072	VALIDADA
MV_1075	VALIDADA
MV_1076	VALIDADA
MV_01079	VALIDADA
MV_01080	VALIDADA
MV_01081	VALIDADA
MV_01146	VALIDADA
MV_001151	VALIDADA
MVAL_0116	VALIDADA
MV_1132	VALIDADA

MV_1131	VALIDADA
MV_1129	VALIDADA
MV_1162	VALIDADA
MV_01123	VALIDADA
MV_0127	VALIDADA
MV_00013	VALIDADA
MV_0015	VALIDADA
MV_01167	VALIDADA
MV_1166	VALIDADA
MV_1179	VALIDADA
MV_01176	VALIDADA
MV_01175	VALIDADA
MV_1174	VALIDADA
MV_01112	VALIDADA
MV_01114	VALIDADA
MV_1122	VALIDADA
MV_1120	VALIDADA
MV_1109	VALIDADA
MV_1020	VALIDADA
MV_1028	VALIDADA
MV_01191	VALIDADA
MV_01192	VALIDADA
MV_1197	VALIDADA
MV_1198	VALIDADA
MV_1200	VALIDADA
MV_1206	VALIDADA
MV_1220	VALIDADA
MV_01223	VALIDADA
MV_1228	VALIDADA
MV_1230	VALIDADA
MV_1231	VALIDADA
MV_01238	VALIDADA
MV_1240	VALIDADA
MVAL_01253	VALIDADA
MV_1349	VALIDADA
MV_1344	VALIDADA
MV_0028	VALIDADA
MV_1423	VALIDADA
MV_1391	VALIDADA
MV_1394	VALIDADA
MV_0049	VALIDADA

De las 284 validaciones expuestas en la nueva programación de obra se desarrollaron 215 . Esto indica un adelanto de 59 viviendas.

Se expone que dentro de las validaciones desarrolladas hay unos Mv por fuera de la línea de programación, estas viviendas son desarrolladas por logística y organización del contratista para maximizas materiales y ejecución.


CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ


SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** sábado, 21 de enero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 27 de enero de 2023 (dd-mm-aa)


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

2.2. AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES

AVANCE FÍSICO APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

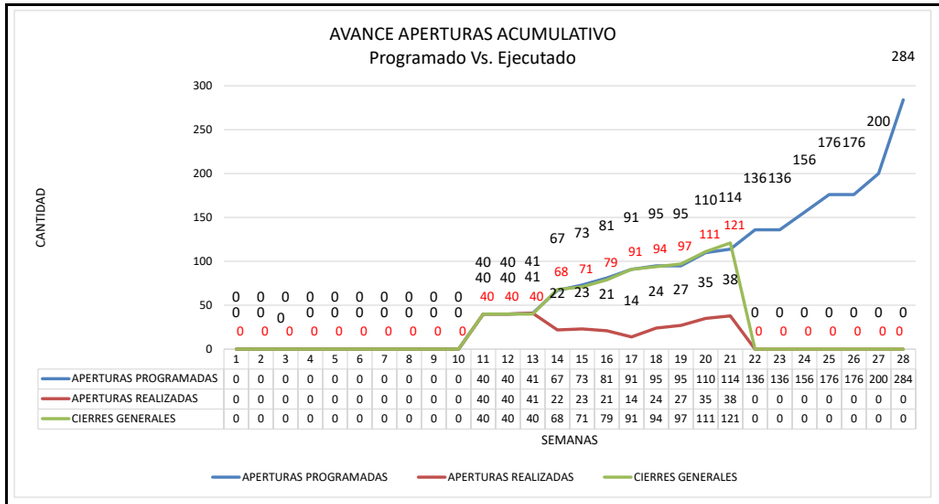

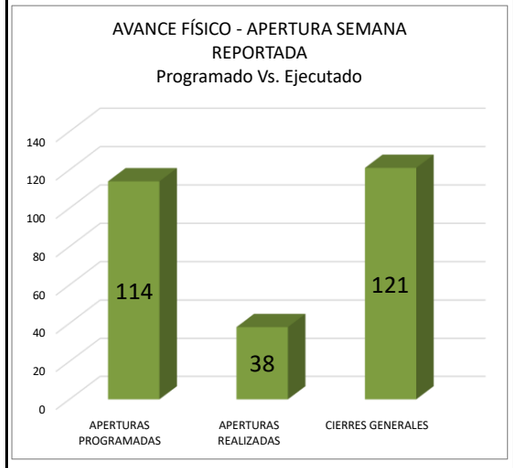

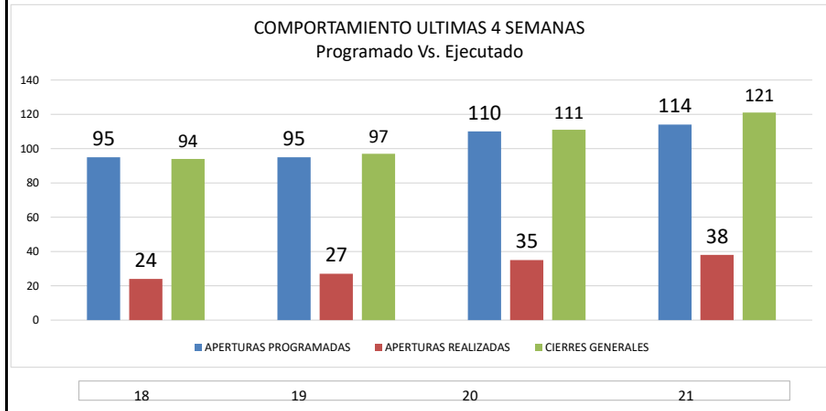

Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)

	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso
Cantidad de Aperturas	**114**	**100%**	**159**	**139,47%**	**45**	**0**

Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)

Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso
114	**159**	**45**	**0**

Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)

	Prog.	Ejecutado
Semana 18	**95**	**118**
Semana 19	**95**	**124**
Semana 20	**110**	**146**
Semana 21	**114**	**149**

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

Para está semana se encuentran en ejecución 38 viviendas
Se aclara que de acuerdo a la programación de obra deberían haberse realizado 114 viviendas entre ejecución y entregas, pero en la ejecución de obra hay 38 y 121 viviendas entregadas. Lo que genera en total de 159 viviendas, con un adelanto entre ejecuciòn y entregas de 45 vivienda

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROCESO

EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** sábado, 21 de enero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 27 de enero de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

MV_001141	EN EJECUCIÓN	0,00%
MV_1136	EN EJECUCIÓN	0,00%
MV_00115	EN EJECUCIÓN	0,00%
MV_01363	EN EJECUCIÓN	0,00%
MV_01530	EN EJECUCIÓN	0,00%
MV_01526	EN EJECUCIÓN	0,00%
MV_01557	EN EJECUCIÓN	0,00%
MVAL_0004	EN EJECUCIÓN	0,00%
MV_00004	EN EJECUCIÓN	0,00%
MV_01428	EN EJECUCION	0,00%
MV_01570	EN EJECUCION	0,00%
MV_01566	EN EJECUCION	0,00%
MVAL_0009	EN EJECUCION	0,00%
MV_00092	EN EJECUCIÓN	0,00%
MV_00098	EN EJECUCION	0,00%
MV_00109	EN EJECUCIÓN	5,00%
MV_00002	EN EJECUCIÓN	12,00%
MV_01366	EN EJECUCIÓN	15,00%
MV_1236	EN EJECUCIÓN	20,00%
MV_01247	EN EJECUCIÓN	20,00%
MV_00329	EN EJECUCION	20,00%
MVAL_0004	EN EJECUCIÓN	26,00%
MVAL_01257	EN EJECUCIÓN	40,00%
MV_1180	EN EJECUCION	40,00%
MV_1433	EN EJECUCION	40,00%
MV_00038	EN EJECUCIÓN	42,00%
MV_1343	EN EJECUCION	45,00%
MV_1095	EN EJECUCION	50,00%
MV_00420	EN EJECUCION	60,00%
MV_1234	EN EJECUCION	60,00%
MV_00001	EN EJECUCIÓN	68,00%
MV_1032	EN EJECUCION	80,00%
MV_01196	EN EJECUCION	80,00%
MV_01430	EN EJECUCION	85,00%
MV_01244	ENTREGADA	85,00%
MVAL_0156	EN EJECUCIÓN	95,00%
MV_1103	EN EJECUCION	95,00%
MV_0025	EN EJECUCION	95,00%
MV_01400	EN EJECUCIÓN	97,00%
MVAL_0016	ENTREGADA	100,00%
MV_00333	ENTREGADA	100,00%
MV_00332	ENTREGADA	100,00%
MV_00350	ENTREGADA	100,00%
MV_00352	ENTREGADA	100,00%
MV_00360	ENTREGADA	100,00%
MV_00335	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0038	ENTREGADA	100,00%
MV_00367	ENTREGADA	100,00%
MV_00404	ENTREGADA	100,00%
MV_00402	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0040	ENTREGADA	100,00%
MV_00398	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0038	ENTREGADA	100,00%
MV_00391	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0043	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0044	ENTREGADA	100,00%
MV_00417	ENTREGADA	100,00%
MV_00419	ENTREGADA	100,00%
MV_00425	ENTREGADA	100,00%
MV_00423	ENTREGADA	100,00%
MV_00451	ENTREGADA	100,00%
MV_00452	ENTREGADA	100,00%
MV_00453	ENTREGADA	100,00%
MV_00316	ENTREGADA	100,00%
MV_00314	ENTREGADA	100,00%
MV_00311	ENTREGADA	100,00%
MV_00317	ENTREGADA	100,00%
MV_00306	ENTREGADA	100,00%
MV_0320	ENTREGADA	100,00%
MV_00303	ENTREGADA	100,00%
MV_00302	ENTREGADA	100,00%
MV_00271	ENTREGADA	100,00%
MV_00274	ENTREGADA	100,00%
MV_00279	ENTREGADA	100,00%
MV_00280	ENTREGADA	100,00%
MV_14691	ENTREGADA	100,00%
MV_00282	ENTREGADA	100,00%
MV_00236	ENTREGADA	100,00%
MV_00231	ENTREGADA	100,00%
MV_00232	ENTREGADA	100,00%
MV_00248	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0024	ENTREGADA	100,00%
MV_00218	ENTREGADA	100,00%
MV_00220	ENTREGADA	100,00%
MV_00222	ENTREGADA	100,00%
MV_00224	ENTREGADA	100,00%
MV_00297	ENTREGADA	100,00%
MV_00211	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0020	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0017	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0017	ENTREGADA	100,00%
MV_00172	ENTREGADA	100,00%
MV_00171	ENTREGADA	100,00%
MV_00159	ENTREGADA	100,00%
MV_00158	ENTREGADA	100,00%
MV_00165	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0149	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0140	ENTREGADA	100,00%
MV_1051	ENTREGADA	100,00%
MV_1056	ENTREGADA	100,00%
MV_1060	ENTREGADA	100,00%
MV_1062	ENTREGADA	100,00%
MV_1064	ENTREGADA	100,00%
MV_01035	ENTREGADA	100,00%
MV_01041	ENTREGADA	100,00%
MV_1043	ENTREGADA	100,00%
MV_01105	ENTREGADA	100,00%
MV_1069	ENTREGADA	100,00%
MV_1072	ENTREGADA	100,00%
MV_1075	ENTREGADA	100,00%
MV_1076	ENTREGADA	100,00%
MV_01079	ENTREGADA	100,00%
MV_01080	ENTREGADA	100,00%
MV_01081	ENTREGADA	100,00%
MV_01146	ENTREGADA	100,00%
MV_001151	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0116	ENTREGADA	100,00%
MV_1132	ENTREGADA	100,00%
MV_1131	ENTREGADA	100,00%
MV_1129	ENTREGADA	100,00%
MV_1162	ENTREGADA	100,00%
MV_01123	ENTREGADA	100,00%
MV_0127	ENTREGADA	100,00%
MV_00013	ENTREGADA	100,00%
MV_0015	ENTREGADA	100,00%
MV_01167	ENTREGADA	100,00%
MV_1166	ENTREGADA	100,00%
MV_1179	ENTREGADA	100,00%
MV_01176	ENTREGADA	100,00%
MV_01175	ENTREGADA	100,00%
MV_1174	ENTREGADA	100,00%
MV_01112	ENTREGADA	100,00%
MV_01114	ENTREGADA	100,00%
MV_1122	ENTREGADA	100,00%
MV_1120	ENTREGADA	100,00%
MV_1109	ENTREGADA	100,00%
MV_1020	ENTREGADA	100,00%
MV_1028	ENTREGADA	100,00%
MV_01191	ENTREGADA	100,00%
MV_01192	ENTREGADA	100,00%
MV_1197	ENTREGADA	100,00%
MV_1198	ENTREGADA	100,00%
MV_1200	ENTREGADA	100,00%
MV_1206	ENTREGADA	100,00%
MV_1220	ENTREGADA	100,00%
MV_01223	ENTREGADA	100,00%
MV_1228	ENTREGADA	100,00%
MV_1230	ENTREGADA	100,00%
MV_1231	ENTREGADA	100,00%
MV_01238	ENTREGADA	100,00%
MV_1240	ENTREGADA	100,00%
MVAL_01253	ENTREGADA	100,00%
MV_1349	ENTREGADA	100,00%
MV_1344	ENTREGADA	100,00%
MV_0028	ENTREGADA	100,00%
MV_1423	ENTREGADA	100,00%
MV_1391	ENTREGADA	100,00%
MV_1394	ENTREGADA	100,00%
MV_0049	ENTREGADA	100,00%

Para está semana, y de acuerdo a la programación de obra, se deberían tener 114 casas en apertura y ejecución. A la fecha, están en esta actividad 38 viviendas y 121 que fueron entregadas, lo que representa un adelanto en la programación de obra.


CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** sábado, 21 de enero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 27 de enero de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

2.3. AVANCES DE EJECUCIÓN FINANCIERO

AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

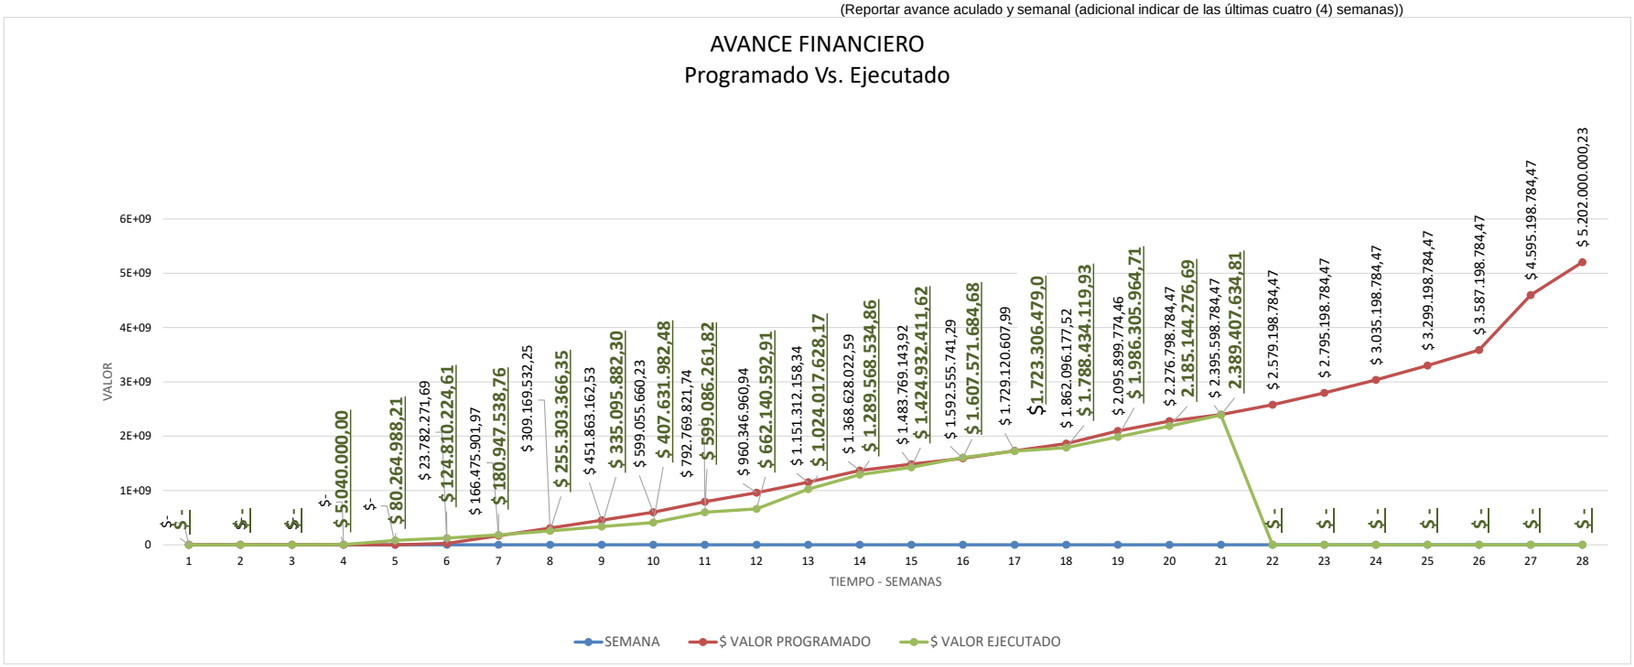

VALOR INVERSIÓN SEGÚN FLUJO DE CAJA		
INVERSIÓN SEMANAL		
PROGRAMADA		EJECUTADA
$ 118.800.000,00		$ 204.263.358,12
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
2,28%		3,93%
INVERSIÓN ACUMULADA		
PROGRAMADA	VS.	EJECUTADA
$ 2.395.598.784,47		$ 2.389.407.634,81
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
46,05%		45,93%
ATRASO O ADELANTO EN PESOS ($):		**-$ 6.191.149,66**
ATRASO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%)		**-0,12%**

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

Para está semana se presenta una ejecución acorde a lo programado, es importante que por parte del contratista siga con las acciones para cumplir con lo estipulado en el flujo de caja y en la programación

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** sábado, 21 de enero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 27 de enero de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

3. ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

	ID_MV	DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA 01		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 02		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 03		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 04		28/09/2022: En el desarrollo de las actividades se disponían a llevar a cabo seguimientos en territorio, pero se solicita retiro del mismo por motivos de seguridad debido a situaciones de hurto con arma de fuego en mediaciones de las viviendas a visitar. (el equipo técnico y social de interventoría se disponía a realizar los seguimientos respectivos, sin embargo, siendo aproximadamente las 10:00 a.m. se presenta un altercado de seguridad a dos cuadras del PAC del contratita, en donde hurtaron las pertenecías de algunos habitantes del sector con arma de fuego, por este motivo se recibe llamada de advertencia y decidimos retirarnos del territorio dado lo ocurrido).	Se informa a la SDH de esta situación	
	MVAL_00441	Se selecciona como Historia de vida el día 27/09/2022 el MVAL_00441 MARÍA HENAO QUINTERO, se expone a la beneficiaria su postulación, ella manifiesta conformidad y se diligencian los formatos para que la par social contratista exponga el caso.		
		30/09/2022 El día 30 de septiembre se realizan seguimientos sin presencial del personal del contratista, el PAC se encuentra cerrado.	Se remite comunicado No. SDHT-CI22-2022-019 al contratista GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOZ SAS exponiendo la situación en referencia a la falta de personal.	Pendiente respuesta por parte del contratista
SEMANA 05		Se solicita al contratista el seguimientos de las viviendas que se encuentran en ejecución para que no existan materiales ni escombros en los frentes de la vivienda a menos que se estén descargando y durante el día se ingresen a la vivienda.		
SEMANA 06	MV-00282	11/10/2022 - MARCO ANTONIO VEGA Se postula la historia de vida de este beneficiario.		
SEMANA 07		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 08		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 10		SE SOLICITA AL CONTRATISTA QUE AL MOMENTO DE LAS APERTURAS DE LAS VIVIENDAS SE DEBE CONTEMPLAR EL MATERIAL Y LOS OPERARIOS QUE DESARROLLEN LAS ACTIVIDADES DE OBRA PARA EVITAR RETRASOS Y MOLESTIAS EN LOS USUARIOS.	LA INTERVENTORÍA REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO Y EL CUAL SERÁ REPORTADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA	

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** sábado, 21 de enero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 27 de enero de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

SEMANA 11		15/11/2022 MV_1162 - ÁNGEL MIGUEL SUÁREZ: Se implementa formato de Historia de Vida, develando aspectos de la vida del señor Ángel, tales como que vive solo, recibe un subsidio del gobierno por valor de $130.000. Sus hijos (2) cubren los gastos de los servicios y el impuesto del predio. El señor Suárez cumplió una condena de 2 años de cárcel por homicido comprobado, hace más de 30 años. En la actualidad se reúne en una iglesia cristiana la cual se constituye en una red importante de socialización y apoyo para el adulto mayor.		
SEMANA 12		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 13		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 14		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 15		Teniendo en cuenta lo relacionado al proceso del MV_01238 de la beneficiaria Beatriz Cruz Payanene ubicado en la Kr 7 A este 99-25 sur el cual fue validado el día 12 de octubre de 2022 evidenciando que la necesidad prioritaria de la vivienda era el cambio total de cubierta, incluyendo además actividades de pintura en general, cambio de combo sanitario e instalación de lavaplatos. Posterior a ello se realizó la apertura de obra el día 22 de noviembre de 2022, donde se presentó al personal de obra asignado se iniciaron actividades el día 23 de noviembre; durante el proceso de ejecución, la beneficiaria manifestó inconformidades relacionadas a los procesos constructivos, los cuales fueron subsanados. Como las inconformidades persistían se realizó una visita con el director de obra, explicándole a la beneficiaria que desde el momento de validación se evidenciaron problemas de humedad en algunos muros interiores de la vivienda, los cuales el contratista no podía subsanar ya que es una situación preexistente y sobre la cual no se puede dar garantía de obra. Sin embargo, se solicitó al personal de obra resanar aquellos muros que presentaban detalles en donde se sopló la pintura por humedad, realizar la limpieza en guarda escobas, tomacorrientes y algunos marcos de ventana que presentaban rastros de pintura; estas actividades fueron realizadas inmediatamente. Según lo acordado con la beneficiaria, se programaría la entrega de la vivienda, para lo cual se citó el día 14 de diciembre de 2022. Al momento de realizar la entrega, la beneficiaria continúa manifestando inconformidades, relacionadas a que no se cumplieron los compromisos y adicional a esto manifiesta que la cubierta en la parte delantera de la vivienda, está vulnerable a levantarse por el viento, para lo cual el área técnica verifico y se corroboro que esta amarrada a la estructura y no presenta alguna afectación, de acuerdo a lo que está refiriendo la beneficiaria. Con lo anterior, el contratista solicita a la beneficiaria, presentarse el día 20 de diciembre de 2022 a las 10 am en el predio, para verificar nuevamente el cumplimiento a los compromisos pactados, realizar la entrega del mejoramiento y retirar la bitácora de obra ya que es un documento público y debe reposar en los archivos de expediente de dicho predio. En caso de no presentarse en la fecha plasmada, por favor comunicarse al número de la profesional Social Laura Dimate celular 3144438890.		
SEMANA 16		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 17		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** sábado, 21 de enero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 27 de enero de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

SEMANA 18		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 19		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 20		20/01/2023 MV_02782 MANUEL ROSARIO GONZALEZ HINESTROZA Se diligencia formato para ser historia de vida; Beneficiario afrodescendiente, quien es padre cabeza de familia, tiene a cargo a sus 4 hijas y una de ellas en condición de discapacidad, actualmente es empleado de vigilancia, trabaja en horas de la noche para poder estar pendiente de sus hijas durante el día.		
SEMANA 21		20/01/2023 MV_02782 MANUEL ROSARIO GONZALEZ HINESTROZA Se diligencia formato para ser historia de vida; Beneficiario afrodescendiente, quien es padre cabeza de familia, tiene a cargo a sus 4 hijas y una de ellas en condición de discapacidad, actualmente es empleado de vigilancia, trabaja en horas de la noche para poder estar pendiente de sus hijas durante el día.		
SEMANA 22				

4. RELACIÓN DE RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativas)

	ID_MV	MOTIVO DE LA RENUNCIA Y/O NO EJECUCIÓN	No. DE RADICADO A LA SDHT Y FECHA
SEMANA 01		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 02		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 03		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 04		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 05		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 06		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 07		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 08		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 09		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 10		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 11		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** sábado, 21 de enero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 27 de enero de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

SEMANA 12		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 13		28/11/2022 MV_00153 - JENNY LÓPEZ: La señora Jenny Lopez acude al PAC para renunciar al mejoramiento de vivienda por razones personales y familiares. Firma los formatos correspondientes y entrega la bitácora de obra.	Se radica el 10/12/2022, no se genera No. Por fallas en el sistema
SEMANA 14		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 15		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 16		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 17		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 18		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 19		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 20		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 21		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	

5. RELACIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativas)

	ID_MV	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PQR (anexar copia del PQR)	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA 01		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 02		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 03		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 04		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 05		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 06		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 07		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 08		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 09		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 10	MV 01400	La beneficiaria remite carta a la SDHT refiriendo lo siguiente "respetados señores, la presente tiene como fin saludarles y desearles éxitos en sus labores diarias, a su vez, de manera muy respetuosa quiero solicitar de su ayuda respecto a que Salí beneficiada con el programa de mejoramiento de vivienda, pero en el momento de la visita, no me han comunicado con anterioridad y no me ha sido posible estar en casa debido a que soy madre cabeza de familia y estoy en mis obligaciones de trabajo. Me gustaría solicitar, que para el día de la visita, me sea informado con un día de anticipación, así puedo solicitar un permiso en mi lugar de trabajo y poder atenderles a ustedes para la respectiva visita. Agradezco su colaboración…	Se coordina con el contratista la visita para dar respuesta a la solicitud	17/11/2022

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** sábado, 21 de enero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 27 de enero de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

SEMANA 11		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 12		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 13		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 14		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 15		14/12/2022 En atención al requerimiento solicitado el día 28 de noviembre de 2022 por la beneficiaria Alexi Constanza Rojas León del barrio nuevo porvenir, MV_1146 ubicado en la Kr 6 este # 100-10 sur; el componente social del contratista se permite informar que la validación del predio se realizó el día 31 de octubre de 2022 y esa visita fue atendida por el esposo de la beneficiaria, el señor Carlos Corredor a quien se le informó todo lo relacionado al mejoramiento de vivienda, a partir del momento de validación hasta la entrega del mismo, también se dio claridad a lo relacionado con el presupuesto asignado las viviendas; en vista que el apartamento del 4to piso se encontraba en obra negra y en estado inhabitable, se priorizo para ser intervenido; explicándole al beneficiario que no se pueden realizar obras en cada uno de los pisos de la vivienda y que no se realizan obras estructurales. Al momento de la validación el apartamento priorizado no contaba con instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas; también le hacia falta una parte de la cubierta, por lo tanto, el área técnica le sugirió al encargado de la vivienda realizar estas actividades antes de iniciar el mejoramiento de vivienda el cual se podía tardar aproximadamente 20 días, no sin antes informarle a la familia la fecha establecida para el inicio de obra. El día 21 de noviembre la beneficiaria se comunica con la residente social encargada, con la inquietud relacionada a la fecha de inicio de obra; la profesional social le informa a la beneficiaria que cuando se cuente con el personal y el material para la vivienda, se le informara la fecha de inicio y se presentaran los maestros; se le recuerda que no se establecen fechas fijas desde la validación ya que el inicio de obra depende de factores como la disposición de material y personal. También se le recuerda que los para este proyecto, los mejoramientos de vivienda deben ser terminados en su totalidad al 31 de diciembre de 2022; por lo tanto, las obras se iniciaran a mas tardar en el mes de diciembre. La beneficiaria, solicita que la comunicación sea directa con el esposo, ya que, por motivos laborales, no puede acceder a su teléfono celular, se actualizan los datos con el número telefónico del Señor Carlos Corredor, para informarle la fecha de inicio de obras. El día martes 6 de septiembre, la residente social le informa a la beneficiaria que la apertura de obra se realizará el día 9 de diciembre. Dando cumplimiento al compromiso, se realiza la apertura de obra el día mencionado, diligenciando las actas correspondientes, se entrega la bitácora de obra y la carta al trato digno; el área técnica por su parte explica el presupuesto asignado y las actividades a ejecutar en la vivienda y se presenta el personal de obra. Se firman los documentos a conformidad del señor Carlos corredor.	Se da manejo entre contratista e intreventoría	
SEMANA 16		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 17		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 18		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 19		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 20		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 21		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 22				

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** sábado, 21 de enero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 27 de enero de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORÍA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

1- PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Se mantiene que el punto de atención quedara ubicado en la Carrera 7B Este No 97G-25 Sur y será atendido los días martes, jueves y sábados en el horario de 8:30 am a 12:00 pm

El PAC se encuentra en funcionamiento en los horarios establecidos para la atención a los usuarios mejorando los tiempos de atención.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

DISPOSICIÓN RCD M3		ESCOMBRERA (indicar nombre y No. Autorización)	No. DE VALE ESCOMBRERA, PIN Y PLACA VOLQUETA
SEMANA 21	0 M3	N/A	N/A
MES	ENERO		
SECTOR	USME		

CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	25 M3

DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS M3		CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA
SEMANA 21	0 M3	No se registran residuos peligrosos retirados por entes empresa certificada para la disposición final está semana, los residuos generados que tienen tratamiento diferente se encuentran acopiados.
MES	ENERO	
SECTOR	USME	

CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	0 M3

6. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

CONTRATISTA DE OBRA					
CHARLAS O CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CAPACITACIONES REALIZADAS	1	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBREROS)			35	PERSONAL ADMINISTRATIVO	12
PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	2	PERSONAL OBRERO	35	PERSONAL ADMINISTRATIVO	12
PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	35	PERSONAL ADMINISTRATIVO	12

INTERVENTORÍA					
CAPACITACIONES O CHARLAS PROGRAMADAS	1	CAPACITACIONES O CHARLAS REALIZADAS	1	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORÍA					12

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** sábado, 21 de enero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 27 de enero de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

7. ANEXOS

MV_001141	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1136	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00115	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01363	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01530	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01526	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01557	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_00040	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00004	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01428	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01570	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01566	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_00091	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00092	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00098	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00106	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1201	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_0021	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_0022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01213	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01215	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1359	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01367	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01368	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01265	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01266	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01268	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01270	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01271	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1374	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1427	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_0026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_0030	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1426	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01425	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01420	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01573	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01560	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_00005	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00009	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_00011	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00082	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00085	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_00064	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00062	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_14683	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00102	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00071	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00069	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00068	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00076	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00066	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02731	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02833	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_02832	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02848	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02857	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02864	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02875	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02895	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02901	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02904	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02905	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_02812	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

MV_02782	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02842	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02844	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02888	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02896	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1512	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00109	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
MV_00003	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%
MV_01366	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%
MV_1236	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
MV_01247	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
MV_00329	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
MVAL_00046	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%	26,00%
MVAL_01257	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	40,00%
MV_1180	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%
MV_1433	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%
MV_00038	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	42,00%
MV_1343	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%	45,00%
MV_1095	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%
MV_00420	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%
MV_1234	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%
MV_00001	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	68,00%
MV_1032	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	80,00%
MV_01196	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	80,00%
MV_01430	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,00%
MV_01244	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	85,00%
MVAL_01563	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,00%
MV_1103	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	40,00%	85,00%	95,00%
MV_0025	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	80,00%
MV_01400	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,00%	97,00%
MVAL_00164	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	45,00%	78,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00333	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,00%	68,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00332	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00350	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	28,00%	52,00%	72,00%	97,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00352	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,95%	74,17%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00360	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,52%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00335	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,17%	30,96%	47,66%	89,42%	89,42%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00381	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,70%	9,19%	27,07%	59,32%	95,90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00367	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,84%	39,57%	71,59%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00404	0,00%	0,00%	5,00%	45,00%	80,00%	88,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00402	0,00%	0,00%	2,97%	2,97%	2,97

	FORMATO
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
	PROCESO
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

SEMANA No. **21** (Consecutivo) **DEL** **sábado, 21 de enero de 2023** (dd-mm-aa) **AL** **27 de enero de 2023** (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No **CTO # 1008 DE 2022,** (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** **CTO de obra 999-2022** (Número de Contrato)

MV_1197	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1198	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	75,00%	100,00%	100,00%
MV_1200	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,50%	17,20%	95,00%	100,00%	100,00%
MV_1206	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	90,00%	100,00%
MV_1220	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	45,00%	60,00%	100,00%
MV_01223	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1228	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	70,00%	100,00%
MV_1230	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	75,00%	100,00%
MV_1231	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01238	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	85,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1240	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	99,00%	100,00%
MVAL_01251	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%
MV_1349	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%	100,00%	100,00%
MV_1344	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	100,00%	100,00%
MV_0028	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%
MV_1423	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%
MV_1391	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	62,00%	85,00%	100,00%
MV_1394	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,00%	100,00%	100,00%
MV_0049	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,00%	100,00%	100,00%

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** sábado, 21 de enero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 27 de enero de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

SOCIAL



23/01/2023 MV_0006 OSCAR AGUDELO ROA
DESARROLLO: EL TRIANGULO



23/01/2023 MV_00076 HILDA RUBY MORENO
DESARROLLO: EL TRIANGULO



25/01/2023 MV_00069 MARIA CLEMENCIA CORTES
DESARROLLO: EL TRIANGULO



27/01/2023 MV_02905 NORFI URBINA POPO
DESARROLLO: EL PORTAL DEL DIVINO



27/01/2023 MVAL_02812 JOVEL TOVAR INFANTE
DESARROLLO: EL PORTAL DEL DIVINO

TÉCNICO



FECHA	lunes, 23 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Pañete en habitación #1	



FECHA	miércoles, 25 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Instalación de alistado y enchape de piso en habitación #1	



FECHA	miércoles, 25 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Instalación de muros y mesón de cocina	



FECHA	miércoles, 25 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Instalación de enchape de piso en habitaciones y pintura sobre muros	



CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** sábado, 21 de enero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 27 de enero de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

SST Y AMBIENTAL









Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas previamente, en Bogotá, D.C., a los 9 (Día en letras) NUEVE (Día en números) días del mes del FEBRERO (Mes en letras) de 2023 (Año de firma del informe)

Firma

Nombre: (Nombre) EDGAR EDUARDO ROA CASTILLO

Cargo: Director de Interventoría
