CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

INFORME GENERAL DE OBRA N° 015

CONTRATO DE OBRA Nª EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÒN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

DICIEMBRE DE 2022

Contenido

1. Introducción 5
2. Objetivos 6
2.1 Objetivo General 6
2.2 Objetivos Específicos 6
3. Información Contractual 7
3.1 Pólizas del contrato. 7
3.2 Pólizas del contrato actualizadas conforme a prorroga N° 1 9
3.3 Pólizas del contrato actualizadas conforme a prorroga N° 2 10
4. Alcance del Informe 11
5. Localización del Proyecto 12
6. Descripción de ejecución de las actividades. 12
6.1 Campamento. 12
6.2 Topografía mes de diciembre del proyecto. 14
6.3 Instalación de viga laminada 14
6.4 Suministro e instalación de entre piso – sección recta – incluye viguetas, frisos y listón Deck. 17
6.1 Suministro e instalación baranda, incluye paral estructural, pasamanos y marco con barrotes (Sección curva y recta) 19
6.2 Suministro e instalación de muro exterior, incluye amarre inferior, paral vertical, uniones y amarre superior. 20
6.3 Suministro e instalación de dintel muro exterior. 22
6.4 Suministro e instalación de columna en cruz pórtico 45x45, incluye anclaje al pilote. 23
6.5 Suministro e instalación vigueta 6x36, incluye anclaje a viga 24
6.6 Recepción de materiales. 24
6.4. Correspondencia. 25
6.5. Seguimiento al flujo de inversión 25
6.6. ANEXOS. 26

Contenido de Ilustraciones

Ilustración 1. Ubicación del proyecto Ecoparque Ciénaga Mallorquín – UF1 Distrito Familiar. Fuente: SINTH S.A.S. 12

lustración 2, 3 y 4 Campamento Fecha: 20/12/2022. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN 13
Ilustración 5 y 6 Topografía del proyecto. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN. 14
Ilustración 7 y 8 Instalación de viga laminada en módulo 13 Fecha: 26/12/2022. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN 15
Ilustración 9 Vigas 08x30 instaladas en la cubierta de modulo 14 Fecha: 22/12/2022. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN 16
Ilustración 10 Vigas 08x30 instaladas en la cubierta de módulo 2 Fecha: 22/12/2022. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN 16
Ilustración 11 Y 12 Instalación de entrepiso sección recta y curva. Fecha:16/12/2022. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN 18
Ilustración 13 Barandas instaladas en pasarela 1,5m. Fecha:16/12/2022. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN 19
Ilustración 14 Plano de planta y plano de fachadas de muros externos de estación III. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN 20
Ilustración 15 16 y 17 Instalación de muros externos de estación III. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN 21
Ilustración 18 y 19 Instalación de dinteles externos de estación III. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN 22
Ilustración 20 Columnas en Cruz instaladas en el módulo 13. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN 23
Ilustración 21 y 22 Instalación de vigas 6x36 en módulo 14. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN 24

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

Contenido de Tablas

Tabla 1. Información general del contrato de obra. 7
Tabla 2. Información general de la póliza 8
Tabla 3. Información general de la póliza 9
Tabla 4. Información general de la póliza conforme a la prorroga N° 1 9
Tabla 5. Información general de la póliza conforme a la prorroga N° 1 10
Tabla 6. Información general de la póliza conforme a la prorroga N° 2 10
Tabla 7. Información general de la póliza conforme a la prorroga N° 2 11
Tabla 8. Relación metros de viga laminada instaladas mes de diciembre de 2022. 17
Tabla 9. Relación metros de viga laminada instaladas acumuladas al mes de diciembre de 2022. 17
Tabla 10. Relación metros cuadrados de entre-piso deck instalado mes de diciembre de 2022. 17
Tabla 11. Relación metros cuadrados acumulados de entrepiso Deck instalado al mes de diciembre de 2022. 19
Tabla 12. Relación metros de barandas instaladas mes de diciembre de 2022. 20
Tabla 13. Relación metros de barandas instaladas acumuladas a diciembre de 2022. 20
Tabla 14. Relación de área de muro externo instalado en mes de diciembre de 2022. 20

Tabla 15. Relación de metros lineales de dintel externo instalado en mes de diciembre de 2022.....22
Tabla 16. Relación metros de columna en cruz instaladas mes de diciembre de 2022. 23
Tabla 17. Relación metros de columna en cruz instaladas acumulados.....23
Tabla 18. Relación metros de viga 6x36 instaladas mes de diciembre de 2022.....24
Tabla 19. Relación metros de viga 6x36 instaladas acumulados a 31 de diciembre de 2022.....24
Tabla 20. Relación de recepción de recepción de materiales en el mes de diciembre. 24
Tabla 21. Correspondencia enviada mes de diciembre CONSORCIO JCO MALLORQUIN.....25
Tabla 22. Correspondencia recibida mes diciembre CONSORCIO JCO MALLORQUIN.....25

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

1. Introducción

La ciénaga de mallorquín es una laguna costera y ecosistema lagunero que está ubicada en su totalidad en el extremo norte del distrito de Barranquilla, sobre la margen izquierda de la desembocadura del río Magdalena (Bocas de Ceniza) en el Mar Caribe. Es uno de los ecosistemas más valiosos que tenemos en la ciudad. En la ciénaga habitan 15 especies de invertebrados marinos, nueve de peces, otras tantas de anfibios, siete de reptiles y 81 de aves. También podemos encontrar hasta cuatro especies de mangles.

La Ciénaga de Mallorquín es el único ecosistema de este tipo en el Distrito de Barranquilla, su importancia biológica está dada por el ecosistema de manglar, playas arenosas y fondos que lo integran brindando importantes recursos eco sistémicos e hidrobiológicos tales como peces, ostras, chipi chipi y caracol; Por lo anterior se ha tomado la decisión de voltear la cara hacia esta importante ciénaga y hace varios años se viene desarrollando un plan maestro para la recuperación de espacios públicos dentro de la ciudad; con la ayuda del Plan de Ordenamiento Territorial, se han trabajado diversos proyectos, los cuales han hecho que los ciudadanos puedan gozar de más espacios que ayuden a la recreación, deporte y movilidad. El Eco parqué Ciénaga de Mallorquín, es un proyecto de interés regional desde el punto de vista del desarrollo y de turismo, además, de ser uno de los componentes principales para convertir a Barranquilla en la primera Biodiverciudad de Colombia. El Ecoparque Ciénaga Mallorquín – UF1 Distrito Familiar, se propone como un espacio para el encuentro con la naturaleza, que promueva la cultura ambiental e incremente la biodiversidad de fauna y flora local. Está pensado para el disfrute de actividades de contemplación a través de recorridos ecológicos por senderos entre el manglar y el agua de la ciénaga, que permiten apreciar la flora local, respirar aire fresco y observar el ecosistema en el que confluye río y mar. El avistamiento de aves también hace parte de las actividades que se pueden realizar en este distrito, por lo que se plantean paradas o estaciones en medio del recorrido que permiten el encuentro con las especies de aves de la región. El recorrido del distrito termina dentro de la ciénaga con un muelle y un equipamiento deportivo, pensado para prácticas de ecoturismo y excursiones.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

- Recopilar mensualmente la información necesaria para determinar el estado real de la ejecución del CONTRATO DE OBRA **EDU-561-2021.**

2.2 Objetivos Específicos

- Hacer seguimiento a los planes Ambientales, Trafico, SST, Social y de calidad presentados.
- Presentar un resumen detallado de las actividades ejecutadas durante el periodo del informe.
- Determinar los avances y/o retrasos tomando como base la programación de obra presentada.
- Dejar evidencia fotográfica de las actividades ejecutadas y su proceso constructivo.

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

3. Información Contractual

Contratante	Empresa de desarrollo urbano de barranquilla y la región Caribe S.A "EDUBARS.A."
Contratista	Consorcio JCO Mallorquin
Interventoría	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN
Objeto del contrato	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÒN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
Contrato No.	EDU-561-2021.
Valor del contrato	$82.464.264.620
Fecha de contrato	21 de Julio del 2021
Fecha de inicio	01 de Septiembre de 2021
Plazo de ejecución inicial	31 de Diciembre de 2021
Prorroga N° 1	6 meses
Fecha de acorde a prorroga N°1	30 de junio de 2022
Prorroga N° 2	10 meses
Fecha de terminación actualizada	30 de Abril de 2023.

Tabla 1. Información general del contrato de obra.

3.1 Pólizas del contrato.

El contratista configuro Garantía Única de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual. La configuración de estas pólizas se resume de acuerdo con el

siguiente cuadro:

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL							
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros Mundial						
CUBRIMIENTO	Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento						
PÓLIZA No.	BQ–100011003						
FECHA DE EXPEDICIÓN	09/09/2021						
COBERTURA	**VIGENCIA DE COBERTURA**						**SUMA ASEGURADA**
	INICIACIÓN			**TERMINACIÓN**			
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	
Predios, labores y operaciones.	01	09	2021	12	05	2022	$ 16,492,852,924.00

Tabla 2. Información general de la póliza

POLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO							
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros Mundial						
CUBRIMIENTO	Póliza de seguro de cumplimiento estatal						
PÓLIZA No.	BQ–100043007						
FECHA DE EXPEDICIÓN	09/09/2021						
COBERTURA	**VIGENCIA DE COBERTURA**						**SUMA ASEGURADA**
	INICIACIÓN			**TERMINACIÓN**			
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	
Cumplimiento del contrato	01	09	2022	30	06	2022	$ 16,492,852,924
Estabilidad de la Obra	31	12	2022	31	12	2026	$ 24,739,279,386

Salarios y prestaciones sociales	01	09	2022	31	12	2024	$ 12,369,639,693

Tabla 3. Información general de la póliza

3.2 Pólizas del contrato actualizadas conforme a prorroga N° 1

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONFORME A PRORROGA N° 1							
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros Mundial						
CUBRIMIENTO	Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento						
PÓLIZA No.	BQ–100011003						
FECHA DE EXPEDICIÓN	31/12/2021						
COBERTURA	**VIGENCIA DE COBERTURA**						**SUMA ASEGURADA**
	INICIACIÓN			**TERMINACIÓN**			
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	
Predios, labores y operaciones.	01	09	2021	30	09	2022	$ 16,492,852,924.00

Tabla 4. Información general de la póliza conforme a la prorroga N° 1

POLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO CONFORME A PRORROGA N° 1		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros Mundial	
CUBRIMIENTO	Póliza de seguro de cumplimiento estatal	
PÓLIZA No.	BQ–100043007	
FECHA DE EXPEDICIÓN	31/12/2021	
	VIGENCIA DE COBERTURA	

COBERTURA	INICIACIÓN			TERMINACIÓN			SUMA ASEGURADA
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Cumplimiento del contrato	01	09	2022	30	12	2022	$ 16,492,852,924
Estabilidad de la Obra	30	12	2022	30	06	2027	$ 24,739,279,386
Salarios y prestaciones sociales	31	12	2022	30	06	2025	$ 12,369,639,693

Tabla 5. Información general de la póliza conforme a la prorroga N° 1

3.3 Pólizas del contrato actualizadas conforme a prorroga N° 2

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONFORME A PRORROGA N° 2							
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros Mundial						
CUBRIMIENTO	Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento						
PÓLIZA No.	BQ–100011003						
FECHA DE EXPEDICIÓN	01/07/2022						
COBERTURA	**VIGENCIA DE COBERTURA**						**SUMA ASEGURADA**
	INICIACIÓN			**TERMINACIÓN**			
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	
Predios, labores y operaciones.	01	09	2021	30	07	2023	$ 16,492,852,924.00

Tabla 6. Información general de la póliza conforme a la prorroga N° 2

POLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO CONFORME A PRORROGA N° 2							
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros Mundial						
CUBRIMIENTO	Póliza de seguro de cumplimiento estatal						
PÓLIZA No.	BQ–100043007						
FECHA DE EXPEDICIÓN	01/07/2022						
COBERTURA	**VIGENCIA DE COBERTURA**						**SUMA ASEGURADA**
	INICIACIÓN			**TERMINACIÓN**			
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	
Cumplimiento del contrato	23	06	2022	30	10	2023	$ 16,492,852,924
Estabilidad de la Obra	30	04	2023	30	04	2028	$ 24,739,279,386
Salarios y prestaciones sociales	23	06	2022	30	04	2026	$ 12,369,639,693

Tabla 7. Información general de la póliza conforme a la prorroga N° 2

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

4. Alcance del Informe

- Brindar la información necesaria para determinar avances y/o retrasos en la ejecución de lo contratado.

  Entregar de manera formal y organizada la documentación solicitada y establecida en las especificaciones como lo son los resultados de ensayos de laboratorios a los diferentes materiales a utilizar, entrega de reporte de afiliaciones a seguridad social del personal en obra, seguimiento a los planes de manejo establecidos como requisitos de inicio de actividades etc.

5. Localización del Proyecto

La ciénaga de mallorquín está ubicada en su totalidad en el extremo norte del distrito de Barranquilla, sobre la margen izquierda de la desembocadura del río Magdalena (Bocas de Ceniza) en el Mar Caribe, en la Costa Caribe colombiana. A continuación, una ilustración que muestra la localización del área levantada:



Ilustración 1. Ubicación del proyecto Ecoparque Ciénaga Mallorquín – UF1 Distrito Familiar. Fuente: SINTH S.A.S.

6. Descripción de ejecución de las actividades.

6.1 Campamento.

Durante el mes de noviembre se dio el correspondiente uso a los campamentos tanto en obra (contenedores de oficinas y almacén) como en las bodegas ubicadas en el Parque Industrial de Caribe verde y en Volcanes (Bodegas donde se tiene el acopio de materiales).







lustración 2, 3 y 4 Campamento Fecha: 20/12/2022. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

6.2 Topografía mes de diciembre del proyecto.

Durante el mes de diciembre se adelantaron labores de replanteo del diseño del andén, y de la cicloruta a lo lardo del corredor vial circunvalar de la prosperidad, así como también el levantamiento de los box coulvert que serán intervenidos.



Ilustración 5 y 6 Topografía del proyecto. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN.

6.3 Instalación de viga laminada

Se hace el replanteo de la posición de los pernos de unión con pilote y localización del elemento tipo viga, se alista la madera de viga laminada haciendo el corte de la misma en caso de necesitarse, se procede a la instalación de la viga laminada verificando la posición y ajuste de conexiones.

En el mes de diciembre se instaló viga laminada 08x30 y 08x36 en el módulo 13, se instaló las vigas 08x30 de la cubierta tanto de módulo 2 como de módulo 14.





Ilustración 7 y 8 Instalación de viga laminada en módulo 13 Fecha: 26/12/2022. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN



Ilustración 9 Vigas 08x30 instaladas en la cubierta de modulo 14 Fecha: 22/12/2022.
Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN



Ilustración 10 Vigas 08x30 instaladas en la cubierta de módulo 2 Fecha: 22/12/2022.
Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Longitud viga laminada 08x30 instalados en diciembre de 2022	536,74 ml
Longitud viga laminada 08x36 instalados en diciembre de 2022	479,68 ml

Tabla 8. Relación metros de viga laminada instaladas mes de diciembre de 2022.

Longitud viga laminada 08x30 acumulados a 31 de diciembre de 2022	3218,53 ml
Longitud viga laminada 08x36 acumulados a 31 de diciembre de 2022	3483,63 ml

Tabla 9. Relación metros de viga laminada instaladas acumuladas al mes de diciembre de 2022.

6.4 Suministro e instalación de entre piso – sección recta – incluye viguetas, frisos y listón Deck.

Esta actividad consiste en la instalación de cada uno de los elementos que conforman el entrepiso de las plataformas o pasarelas en los tramos rectos en planta, contempla viguetas de 36x180 mm en dirección transversal a la pasarela, listón deck de espesor 36 mm (mínimo) y frisos de borde o remate. Incluye fijaciones en acero inoxidable, accesorios, pintura e inmunización, al igual que el suministro y transporte de estos materiales.

En el mes de diciembre se culminaron los módulos 29, 30, 31, 32 y 33 en la pasarela de 1,5m.

MODULO	M2 DECK RECTO (m2)
29	37,8
30	46,23
31	37,8
32	54,71
33	40,67
Subtotal :	**217,20**

Tabla 10. Relación metros cuadrados de entre-piso deck instalado mes de diciembre de 2022.

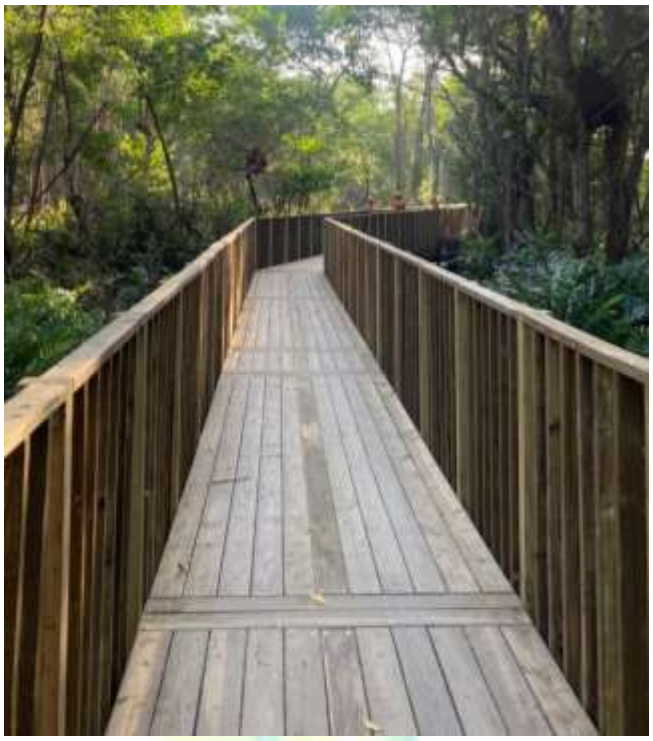




Ilustración 11 Y 12 Instalación de entrepiso sección recta y curva.

Fecha:16/12/2022. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Área de sección deck curva acumulada a 31 de diciembre de 2022	188 m2
Área de sección deck recta acumulada a 31 de diciembre de 2022	4572,92 m2

Tabla 11. Relación metros cuadrados acumulados de entrepiso Deck instalado al mes de diciembre de 2022.

6.1 Suministro e instalación baranda, incluye paral estructural, pasamanos y marco con barrotes (Sección curva y recta)

Esta actividad consiste en la instalación de las barandas de borde en los perímetros rectos y curvos de las pasarelas; contempla sus accesorios, fijaciones y pintura. Incluye suministro y transporte de materiales. La actividad inicia con el replanteo de la posición del tramo de baranda que se va colocar, posteriormente se debe alistar, cortar y/o armar la baranda para así instalarla, y finalmente la verificación de la posición y la verticalidad de los elementos.

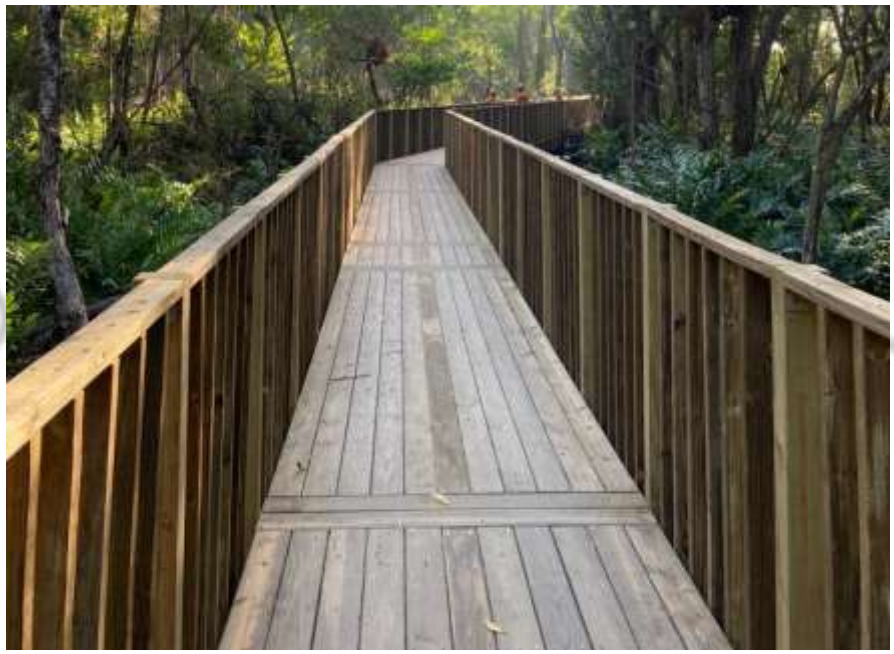


Ilustración 13 Barandas instaladas en pasarela 1,5m. Fecha:16/12/2022. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Longitud de baranda curva instalada en diciembre de 2022	0 ml
Longitud de baranda recta instalada en noviembre de 2022	397,57 ml

Tabla 12. Relación metros de barandas instaladas mes de diciembre de 2022.

Longitud de baranda curva instalada acumulada a diciembre de 2022	59,28 ml
Longitud de baranda recta instalada acumulada a diciembre de 2022	1817,19 ml

Tabla 13. Relación metros de barandas instaladas acumuladas a diciembre de 2022.

6.2 Suministro e instalación de muro exterior, incluye amarre inferior, paral vertical, uniones y amarre superior.

Área de muro externo instalado en diciembre de 2022	281,99 m2

Tabla 14. Relación de área de muro externo instalado en mes de diciembre de 2022.

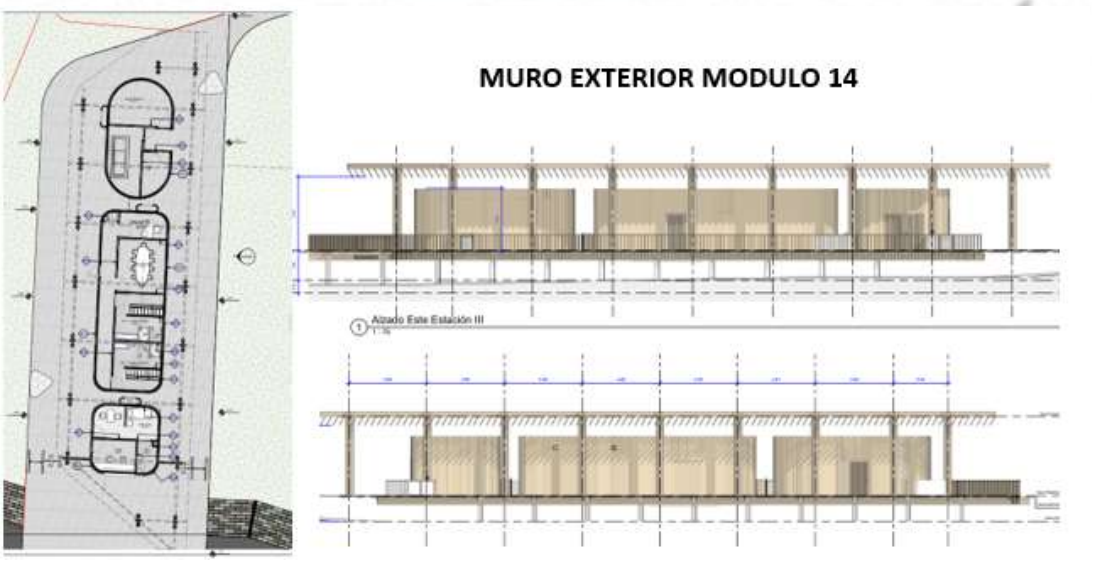


Ilustración 14 Plano de planta y plano de fachadas de muros externos de estación III. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN





Ilustración 15 16 y 17 Instalación de muros externos de estación III. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

6.3 Suministro e instalación de dintel muro exterior.

Esta actividad consiste en la instalación de los elementos tipo dintel sobre muros exteriores; contempla sus accesorios, fijaciones y pintura. Incluye suministro y transporte de materiales.

En el mes de diciembre se instalaron los dinteles exteriores de las edificaciones en estación III.





Ilustración 18 y 19 Instalación de dinteles externos de estación III. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Área de muro externo instalado en diciembre de 2022	9,64 ml

Tabla 15. Relación de metros lineales de dintel externo instalado en mes de diciembre de 2022.

6.4 Suministro e instalación de columna en cruz pórtico 45x45, incluye anclaje al pilote.

Esta actividad consiste en la instalación de columnas laminadas sobre plataforma de sección en cruz de 450 x 450 mm que conforman pórticos de pérgolas; contempla sus accesorios, fijaciones y pintura.

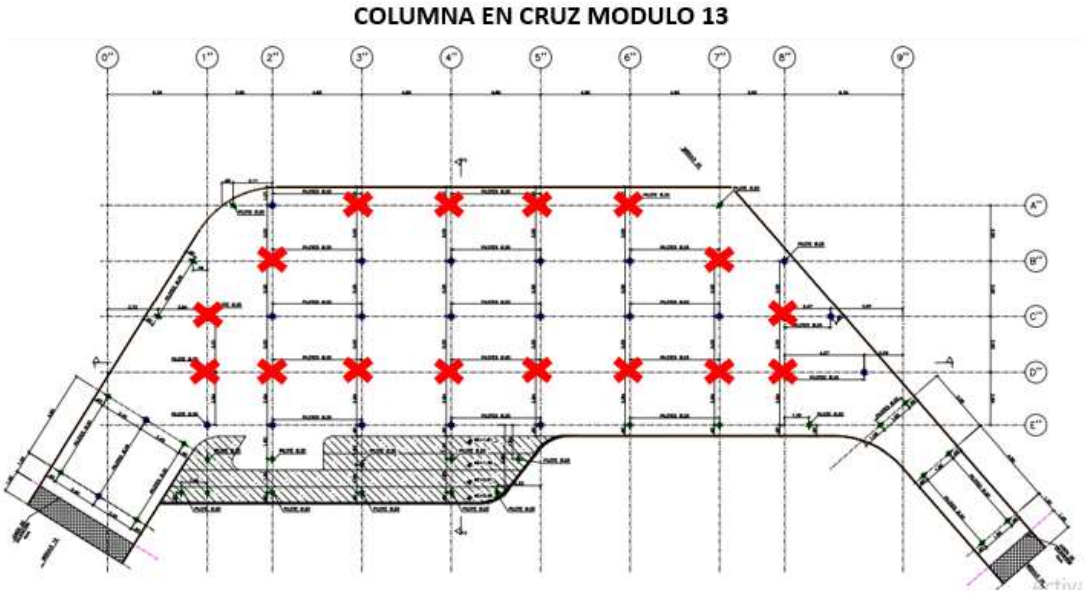


Ilustración 20 Columnas en Cruz instaladas en el módulo 13. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Longitud Columna en cruz instalada en diciembre de 2022	85,28 ml

Tabla 16. Relación metros de columna en cruz instaladas mes de diciembre de 2022.

Longitud Columna en cruz instalada acumulada a 31 de diciembre de 2022	235,28 ml

Tabla 17. Relación metros de columna en cruz instaladas acumulados

6.5 Suministro e instalación vigueta 6x36, incluye anclaje a viga

Esta actividad consiste en la instalación de las viguetas en I armadas de madera, sección 6x360 mm; contempla sus accesorios, fijaciones y pintura. Incluye suministro y transporte de materiales.





Ilustración 21 y 22 Instalación de vigas 6x36 en módulo 14. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Longitud viga 6x36 instalados en diciembre de 2022	559,22 ml

Tabla 18. Relación metros de viga 6x36 instaladas mes de diciembre de 2022.

Longitud viga 6x36 instalados acumulados a 31 de diciembre de 2022	793,62 ml

Tabla 19. Relación metros de viga 6x36 instaladas acumulados a 31 de diciembre de 2022.

6.6 Recepción de materiales.

Fecha de recepción	Material recibido	Bodega de recepción
26, 27 DE DICIEMBRE DE 2022	Riostras y pilotes	Campamento Mallorquin

Tabla 20. Relación de recepción de recepción de materiales en el mes de diciembre.

6.4. Correspondencia.

CORRESPONDENCIA ENVIADA PROYECTO MALLORQUIN				
Datos de salida			Destinatario	Asunto
Oficio N°	Radicado	Fecha (dd/mm/yy	Nombre o Razon social	
JCO-099-2022		25/11/2022	EDUBAR S.A.	Remision paquete acta parcial de obra N 10 con factura
JCO-100-2022		25/11/2022	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	Alcance comunicado CINP–504–164–4680 observ cobro amb nov INTERV
JCO-101-2022		29/11/2022	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	Remision UF1 acta parcial de obra N 11
JCO-102-2022		2/12/2022	EDUBAR S.A.	Remision EDUBAR acta parcial de obra N 11- gestion de firma
JCO-103-2022		15/12/2022	EDUBAR S.A.	Remision paquete acta parcial de obra N 11 con factura

Tabla 21. Correspondencia enviada mes de diciembre CONSORCIO JCO MALLORQUIN

CORRESPONDENCIA RECIBIDA PROYECTO MALLORQUIN			
Datos de entrada		Remitente	Asunto
Oficio N°	(dd/mm/yy)	Nombre o Razon social	
CINP–504–168–4754_	25/11/2022	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	observaciones presupuesto ambiental
CINP–504–169–4757_	25/11/2022	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	Remision solicitud de aclaracion a visitas puerta de oro
CINP-504-172-4841	1/12/2022	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	Oficio no objecion de acta parcial N° 11
CINP-504-175-4969	13/12/2022	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	Solicitud buen manejo de residuos

Tabla 22. Correspondencia recibida mes diciembre CONSORCIO JCO MALLORQUIN

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

6.5.Seguimiento al flujo de inversión

Tal como se presentó en el presente informe, durante el mes de noviembre se realizaron las actividades de Comisión topográfica mensual con dos frentes y campamento, que corresponden al capítulo 01 (Preliminares), suministro e instalación pilote diámetro 20 y 25, incluye complemento superior que hacen parte del capítulo 03 (Pilotaje en madera), las actividades de Suministro e instalación viga laminada cca 08x30 y 08x36, incluye complemento central, suministro e instalación entrepiso – sección recta correspondientes al capítulo 04 (Plataformas y Pasarelas en Madera), Suministro e instalación baranda - sección recta, incluye paral estructural, pasamanos y marco con barrotes que corresponde al capítulo 05 (Barandas en Madera), suministro e instalación muro exterior, incluye amarre inferior, paral vertical, uniones y amarre superior, suministro e instalación dintel muro exterior , suministro e instalación columna en cruz pórtico 45x45, incluye anclaje al pilote, Suministro e instalación vigueta 6x36, incluye anclaje a viga, actividad del capítulo 06 (Edificaciones en madera) dichas actividades realizadas en el mes, arrojan una inversión acumulada de 43,37% ($35.761.802.660,03).

6.6.ANEXOS.

1. Flujo de inversión del proyecto actualizado.
2. Curva S del proyecto.

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

PROGRAMA DE INVERSION

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO	$ 82.464.264.620,00
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	180 DIAS
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADADA	30 DE ABRIL DE 2023


ITEM	ACTIVIDAD	VALOR TOTAL	Acumulado a 30 de junio de 2022	JULIO DE 2022	AGOSTO DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	OCTUBRE DE 2022	NOVIEMBRE DE 2022	DICIEMBRE DE 2022	ENERO DE 2023	FEBRERO DE 2023	MARZO DE 2023	ABRIL DE 2023
01	OBRAS PRELIMINARES	$ 623.882.532,00	$ 197.061.267,05	$ 29.340.961,00	$ 29.340.961,00	$ 29.340.961,00	$ 29.340.961,00	$ 46.418.613,14	$ 46.418.613,14	$ 46.418.613,14	$ 46.418.613,14	$ 61.891.484,19	$ 61.891.484,19
02	MOVIMIENTOS DE TIERRA	$ 1.948.804.815,61			$ 97.440.240,78	$ 194.880.481,56	$ 97.440.240,78	$ 233.856.577,87	$ 233.856.577,87	$ 233.856.577,87	$ 233.856.577,87	$ 311.808.770,50	$ 311.808.770,50
03	PILOTAJE EN MADERA	$ 26.835.125.558,28	$ 14.369.221.205,56	$ 1.246.590.435,27	$ 1.495.908.522,33	$ 1.745.226.609,38	$ 1.745.226.609,38	$ 1.869.885.652,91	$ 1.869.885.652,91	$ 2.493.180.870,54			
04	PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA	$ 18.505.304.491,05	$ 2.595.277.372,61	$ 954.601.627,11	$ 1.272.802.169,48	$ 1.591.002.711,84	$ 1.591.002.711,84	$ 1.591.002.711,84	$ 1.591.002.711,84	$ 1.591.002.711,84	$ 1.591.002.711,84	$ 2.068.303.525,40	$ 2.068.303.525,40
05	BARANDAS EN MADERA	$ 4.647.070.333,62					$ 278.824.220,02	$ 464.707.033,36	$ 650.589.846,71	$ 650.589.846,71	$ 743.531.253,38	$ 743.531.253,38	$ 1.115.296.880,07
06	EDIFICACIONES EN MADERA	$ 7.053.059.690,30				$ 352.652.984,52	$ 705.305.969,03	$ 846.367.162,84	$ 846.367.162,84	$ 916.897.759,74	$ 916.897.759,74	$ 1.410.611.938,06	$ 1.057.958.953,55
07	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	$ 956.877.401,22			$ 47.843.870,06	$ 47.843.870,06	$ 66.981.418,09	$ 124.394.062,16	$ 124.394.062,16	$ 124.394.062,16	$ 124.394.062,16	$ 133.962.836,17	$ 162.669.158,21
08	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	$ 209.149.887,96						$ 34.858.314,66	$ 34.858.314,66	$ 34.858.314,66	$ 34.858.314,66	$ 34.858.314,66	$ 34.858.314,66
09	PISOS Y ENCHAPES	$ 389.958.440,82						$ 64.993.073,47	$ 64.993.073,47	$ 64.993.073,47	$ 64.993.073,47	$ 64.993.073,47	$ 64.993.073,47
10	CIELOS RASOS	$ 11.098.815,78						$ 1.849.802,63	$ 1.849.802,63	$ 1.849.802,63	$ 1.849.802,63	$ 1.849.802,63	$ 1.849.802,63
11	PAVIMENTOS Y ANDENES	$ 891.018.299,60			$ 44.550.914,98	$ 44.550.914,98	$ 62.371.280,97	$ 115.832.378,95	$ 115.832.378,95	$ 115.832.378,95	$ 115.832.378,95	$ 124.742.561,94	$ 151.473.110,93
12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	$ 98.919.370,16									$ 32.973.123,39	$ 32.973.123,39	$ 32.973.123,39
13	URBANISMO Y EXTERIORES	$ 33.366.619,00											$ 33.366.619,00
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI	$ 2.210.000.000,00									$ 729.300.000,00	$ 729.300.000,00	$ 751.400.000,00
15	INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 7.762.775.477,60								$ 931.533.057,31	$ 2.173.577.133,73	$ 2.328.832.643,28	$ 2.328.832.643,28
16	INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS	$ 4.290.000.000,00										$ 2.145.000.000,00	$ 2.145.000.000,00
17	INSTALACIONES VOZ Y DATOS	$ 4.290.000.000,00								$ 643.500.000,00	$ 1.072.500.000,00	$ 1.072.500.000,00	$ 1.501.500.000,00
18	PRESUPUESTO SEÑALIZACION	$ 12.312.300,00									$ 4.063.059,00	$ 4.186.182,00	$ 4.063.059,00
19	PROVISIONES												
	PMA	$ 860.762.500,00	$ 99.229.083,20	$ 22.846.002,50	$ 22.846.002,50	$ 22.846.002,50	$ 22.846.002,50	$ 22.846.002,50	$ 22.846.002,50	$ 22.846.002,50	$ 22.846.002,50	$ 289.382.698,38	$ 289.382.698,38
	PMT	$ 85.410.787,80			$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53
	CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP (TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED)	$ 29.145.480,00											$ 29.145.480,00
	TOTEMS DE INFORMACION	$ 112.931.000,00									$ 37.267.230,00	$ 37.267.230,00	$ 38.396.540,00
	PROVISION PUERTAS Y VENTANAS	$ 520.000.000,00									$ 171.600.000,00	$ 171.600.000,00	$ 176.800.000,00
	SISTEMA DE RIEGO	$ 87.290.819,20									$ 43.645.409,60	$ 43.645.409,60	

INVERSION MENSUAL		$ 2.253.379.025,88	$ 3.020.222.768,66	$ 4.037.834.623,38	$ 4.608.829.501,15	$ 5.426.501.473,87	$ 5.612.384.287,21	$ 7.881.243.159,06	$ 8.170.896.593,60	$ 11.820.730.934,58	$ 12.371.453.324,18
% DE INVERSION MENSUAL		2,73%	3,66%	4,90%	5,59%	6,58%	6,81%	9,56%	9,91%	14,33%	15,00%
INVERSION ACUMULADA	$ 17.260.788.928,42	$ 19.514.167.954,30	$ 22.534.390.722,96	$ 26.572.225.346,34	$ 31.181.054.847,49	$ 36.607.556.321,36	$ 42.219.940.608,57	$ 50.101.183.767,64	$ 58.272.080.361,23	$ 70.092.811.295,82	$ 82.464.264.620,00
% DE INVERSION ACUMULADA	20,93%	23,66%	27,33%	32,22%	37,81%	44,39%	51,20%	60,76%	70,66%	85,00%	100,00%

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

PROGRAMA DE INVERSION

CONTRATO N°	**EDU-561-2021**
CONTRATANTE	**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)**
CONTRATISTA	**CONSORCIO JCO MALLORQUIN**
INTERVENTOR	**CONSORCIO UF1 MALLORQUIN**
OBJETO	**INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 82.464.264.620,00**
FECHA DE INICIO	**1 DE SEPTIEMBRE DE 2022**
FECHA DE TERMINACION INICIAL	**31 DE DICIEMBRE DE 2021**
PRORROGA N° 1	**SEIS (6) MESES**
FECHA DE TERMINACION ACORDE A PRORROGA N°1	**30 DE JUNIO DE 2022**
PRORROGA N° 2	**DIEZ (10) MESES**
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	**30 DE ABRIL DE 2023**

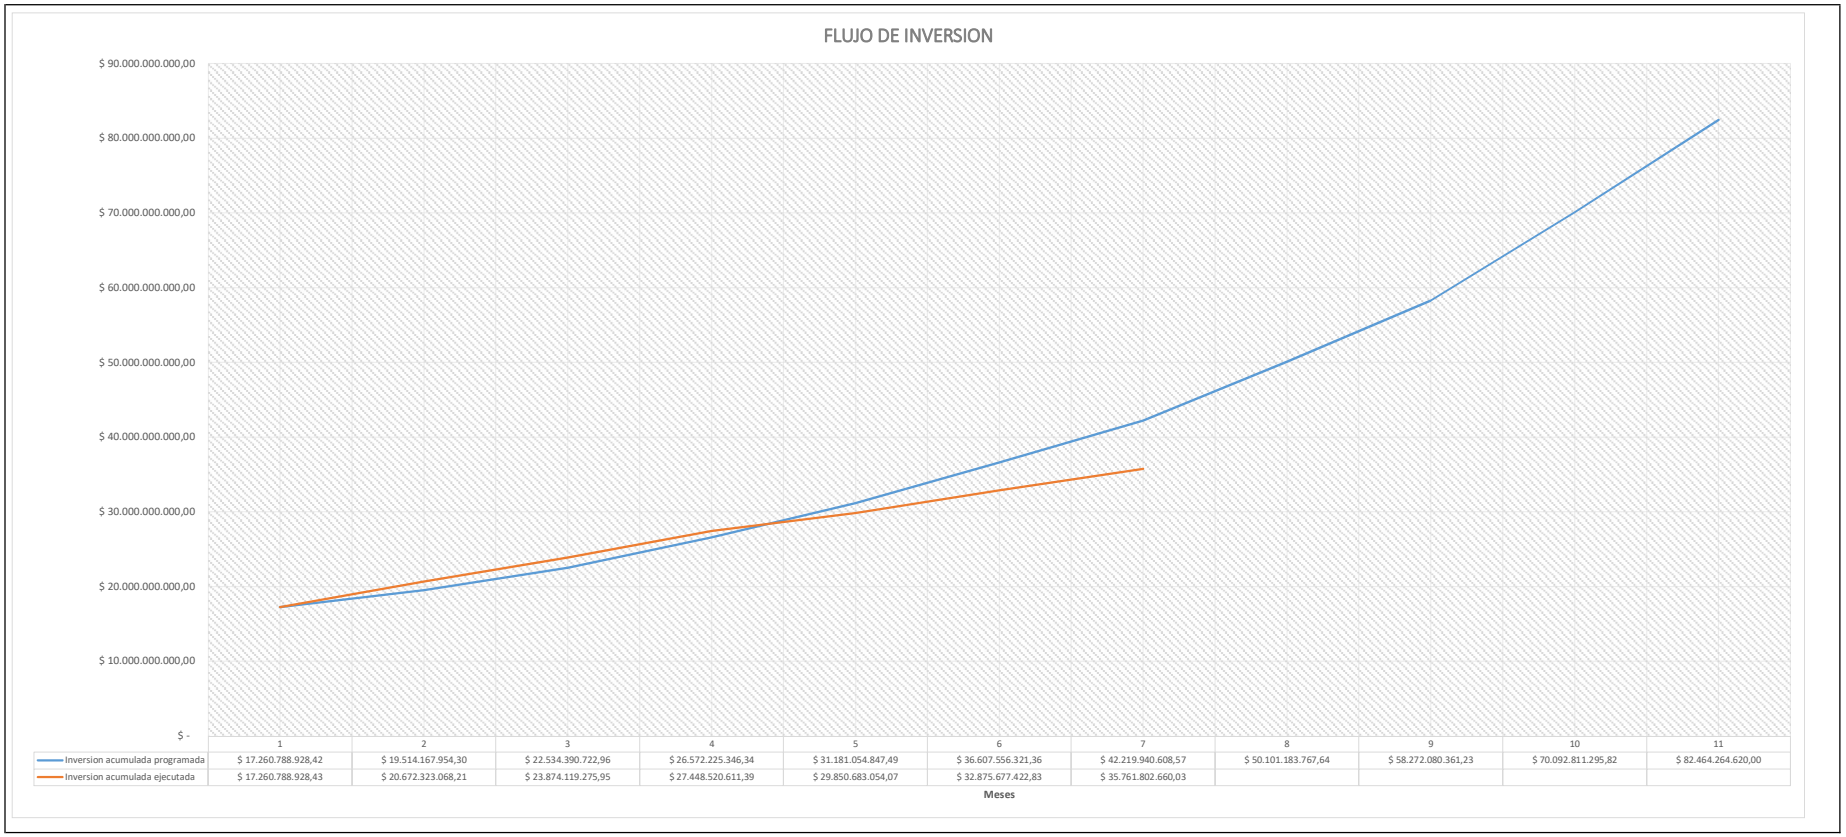

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inversion acumulada programada	$ 17.260.788.928,42	$ 19.514.167.954,30	$ 22.534.390.722,96	$ 26.572.225.346,34	$ 31.181.054.847,49	$ 36.607.556.321,36	$ 42.219.940.608,57	$ 50.101.183.767,64	$ 58.272.080.361,23	$ 70.092.811.295,82	$ 82.464.264.620,00
Inversion acumulada ejecutada	$ 17.260.788.928,43	$ 20.672.323.068,21	$ 23.874.119.275,95	$ 27.448.520.611,39	$ 29.850.683.054,07	$ 32.875.677.422,83	$ 35.761.802.660,03				

MATRIZ DE RIESGOS-SA-04-2021

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO			MONITOREO Y REVISIÓN	
											EDUBAR Y/O DISTRITO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA			FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Externo	Selección - Ejecucion	Riesgo Economico - Riesgo Operacional	**Precios Por debajo del Presupuesto Oficial** (por debajo del presupuesto oficial, ó por debajo de los ítems del presupuesto oficial o de los insumos del APU del presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes, AIU EN LA PROPUESTA DEL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.	Impacto económico al Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo		X	Implementacion de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecucion del contrato conforme a la oferta tecnica y economica presentada.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato	Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control de la ejecución de los ítems de obra con la calidad requerida en especificaciones técnicas. Seguimiento al avance de la obra, al cumplimiento del programa de inversiones. Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual
2	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Economico	**Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de las obras objeto del contrato.**	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual	1	2	3	Riesgo Bajo	X	X	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual	1	1	2	Riesgo Bajo	Si el insumo es materia prima básica puede afectarla, mientras se acuerda solución alterna.	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual
3	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Economico	**Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato** en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc, regulados y no regulados por el Gobierno. Riesgo que asume el CONTRATISTA Y/O CONTRATANTE.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual	2	3	5	Riesgo Medio	X	X	Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual. Lo asumirá el contratista de acuerdo al ítem de imprevistos de su propuesta. En el evento de superar el ítem estimado, las partes de común acuerdo revisarán las condiciones específicas.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual
4	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Economico	**Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución de la obra**.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto.	2	3	5	Riesgo Medio	X	X	Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, e insumos, durante la etapa contractual. Así mismo, la entidad revisará los diseños y la posibilidad de ajustar los mismos con base en los materiales disponibles en el mercado que garanticen el desarrollo del objeto contractual.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI.	Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de consecución de materiales e insumos de acuerdo con requerimientos del proyecto. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual
5	Específico	Interno	Ejecucion	Riesgo de la Naturaleza	**Riesgos de inundación** que puedan afectar los equipos del contratista, los rendimientos de la obra y las actividades ya ejecutadas del proyecto. Se aclara que la las obras a ejecutar y la zona por su propia naturaleza son inundables, en algunos periodos intermitentes e impredecibles dadas las características variables del clima.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, atrasos en la ejecución de la obra, daños en las actividades ya ejecutadas del proyecto y de la maquinaria del equipo o riesgos para los trabajadores.	2	3	5	Riesgo medio.		X	Reconocimiento hidráulico e hidrológico de la zona. Monitoreo de la zona a ser intervenida por parte de Especialistas en Hidraulica, para recomendar medidas preventivas, correctivas ó de las posibles inundaciones. Si los periodos de inundación son superiores a los promedios históricos se analizará la forma de reanudar y dar continuidad a las activiades, o la posibilidad de una prórroga. El contratista debe prever zonas de parqueo de equipos fuera de posibles zonas de inundación.	2	2	4	Riesgo bajo.	SI.	Interventor-Contratista	Fase precontractual antes de la obra.	A la terminación de la ejecución del contrato	Visitas y recomendaciones de Especialistas, Análisis de Contratista e Interventor y si es necesario participación de EDUBAR y/o DISTRITO, Comités Técnicos, Seguimiento a implementación de medidas preventivas, correctivas ó de mitigación, Informes respectivos, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Al inicio del contrato, y en el avance del mismo.
6	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional - Social	**Cambio en la ubicación de las obras menores.** Se refiere a solicitudes realizadas por autoridades Municipales, usuarios o vecinos de la carretera invocando derechos de petición u otras herramientas legales.	Ajustes en la programación de obras y eventual generación de mayores costos al proyecto.	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Efectuar la socialización del proyecto, para conocimiento de autoridades y comunidad. Control y Gestión con los solicitantes, para que los cambios en la ubicación de obras menores afecten en menor medida o no afecten las previsiones del proyecto tanto técnicas, como en costos y tiempo. Seguimiento a la ejecución del contrato, incrementando inspecciones y revisiones para asegurar el cumplimiento del mismo.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comites Técnicos, Seguimiento a la ejecución, Gestión social - Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Cuando se presente la solicitud de cambio de ubicación de obras menores.
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Politicos	**Orden público:** Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas (EDUBAR/DISTRITO DE BARRANQUILLA como órganos del Estado en armonía con los demás Entes).	Pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos, Interferencia en el desarrollo del proyecto.	2	3	5	Riesgo Medio	X	X	Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento
8	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Accidentalidad:** Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del CONTRATISTA.	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la via y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad.	3	2	5	Riesgo Medio		X	El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Inspecciones diarias del Interventor. Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos- Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Diario

9	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o** por deficiente programación de ejecución de las obras.	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.	2	2	4	Riesgo Bajo		X	Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos , ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.	diario
10	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Variación de cantidades de obra debidamente justificadas:** Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras. La administración asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias.	Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupuesto contractual.	4	3	7	Riesgo Alto	X	X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades de obra.	3	2	5	Riesgo Medio	NO	Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario.	mensual
11	Especifico	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	**Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas y/o proyectadas por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.** Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la región del proyecto las fuentes de materiales a emplear, para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar.	Impacto económico al Contratista	3	2	5	Riesgo Medio		X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual a las fuentes de materiales para el proyecto. En la fase contratual verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas de los materiales.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisores, Interventor-Contratista	En la planeación del proyecto y en la etapa precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Comites Técnicos, Seguimiento a la ejecución de la obra, suministro de materiales acorde con las especificaciones técnicas contractuales, verificación de pagos con precios contractuales, sin reajustes por distancias de acarreo de materiales. informes de interventoría.	mensual
12	Especifico	Interno	Ejecucion	Riesgo de la Naturaleza	**Inestabilidad en los terrenos. El** riesgo puede surgir en excavaciones a cielo abierto, los cuales pueden requerir de tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, contenciones y/o de las actividades necesarias para dar estabilidad a sitios, viviendas, urbanismos y obras. Pueden estar asociados con mayores inversiones, mayores cantidades de obra y mayores plazos. EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA asumirá los riesgos inestabilidad de los terrenos identificados que se presenten durante la ejecución del contrato.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, Aumento de costos por necesidad de mayores cantidades de obra , y eventuales mayores plazos	3	3	5	Riesgo Alto		X	Monitoreo de la zona a intervenir por parte del especialista GEOTECNISTA VIAL O DE PAVIMENTOS para recomendar medidas preventivas, correctivas ó de mitigación de las inestabilidades observadas. Análisis e implementación de medidas pertinentes con este fin, contemplando de ser necesario la elaboración de estudios respectivos. En las emergencias que se presenten, atención inmediata de las mismas dando prioridad a las obras de transitabilidad y seguridad vial; recomendación de especialistas para solución definitiva, provisional ó de mitigación, análisis e implementación. En todos los casos, adoptar las medidas contractuales a que haya lugar, en cuanto a mayores cantidades de obra y plazos si fuere necesario.	2	2	4	Riesgo Medio	En emergencias de gran magnitud puede afectarse la ejecución del contrato.	Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Visitas y recomendaciones de Especialistas, Análisis de Contratista e Interventor y si es necesario participación de la administración, Comités Técnicos, Seguimiento a implementación de medidas preventivas, correctivas ó de mitigación, Informes respectivos, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Al inicio del contrato, cuando se detecten nuevos sitios inestables, cuando se presenten emergencias.
13	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes:** Ocurre por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. El Contratista deberá realizar todas las gestiones que correspondan.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por la interferencia de las redes existentes con la ejecución del proyecto	1	1	2	Riesgo Bajo		X	Desde la Fase Precontractual y en la etapa contractual solicitar a las Entidades encargadas de Servicios Públicos informar con el mayor detalle posible sobre la existencia de redes de servicios que puedan interferir con el proyecto. En caso de detección de una red no referenciada, gestionar de inmediato lo pertinente con la Empresa de Servicios, para la menor afectación al proyecto.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores, Interventor-Contratista	Fase precontractual, y cuando se detecte la existencia de redes de servicio público que interfieran con el proyecto	cuando se solucione la interferencia de las redes de servicio público existentes	Seguimiento permanente a la Gestión para solucionar la interferencia de redes de servicios públicos existentes. Informes de resultados, requerimientos escritos.	Cuando se presenta la interferencia, segurimiento semanal
14	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	**Riesgo Financiero:** Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconomicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados y en las condiciones establecidas, y en particular para el modelo financiero pactado.	Impacto económico al Contratista	2	3	5	Riesgo Medio		X	Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	3	2	3	Riesgo Medio	NO	Contratista	Fase precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta y modelo financiero con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato.	Mensual
15	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	**Expedición y/o modificación de normas:** Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	2	3	5	Riesgo Medio	X		Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisores, Interventor-Contratista	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva nomatividad que pueda afectar el contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos.	Mensual
16	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Ambiental	**Gestion Ambiental:** Demora en la obtención de licencias y/o permisos ambientales por demora y/o inadecuada presentación de soportes y estudios.	Retraso en la Ejecucion de los trabajos	2	3	5	Riesgo Medio		X	Seguimiento por parte del Interventor a la gestión documentada del contratista para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Una vez obtenida la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales	Verificación de la gestión realizada y sus resultados. Comites Técnicos, Seguimiento a informes ambientales por parte de la Supervisión ambiental, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	semanal
17	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Ambiental	**Pasivos Ambientales:** Pasivos ambientales generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental.	Impacto Negativo por efectos en la Ejecución del Proyecto	1	2	3	Riesgo Bajo		X	Seguimiento por parte del Interventor a los procesos constructivos, para evitar que se generen pasivos ambientales por esta causa, acompañamiento de Especialistas Ambientales del proyecto cuando sea necesario. Una vez causados, exigir el cumplimiento de las medidas compensatorias de los mismos impuestas por la autoridad ambiental. Seguimiento por parte de la Subdirección del Medio Ambiente. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comites Técnicos, Seguimiento por parte del Especialista Ambiental de la Interventoría. Seguimiento a informes ambientales por parte e la supervisió ambiental, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	semanal

18	General	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	**Ambiental:** Riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de los permisos y autorizaciones ambientales, tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo, control y seguimiento. También riesgos de las condiciones ambientales o ecologicas exigidas, y de la ejecución de actividades como la explotacion minera, ocupacion de cauces e intervenciones forestales sin los debidos permisos de las autoridades ambientales.	Genera incumplimiento ambiental que puede afectar la ejecución del proyecto y ocasiona sanciones de las entidades ambientales competentes.	2	4	6	Riesgo Alto		**x**	Aplicación de la normatividad ambiental y exigencia de la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales al contratista. Verificación de cumplimiento del contratista de las obligaciones que emanan de los mismos. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Constratista-Interventoria	Al inicio de la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato con el cierre ambiental	Verificación del Cumplimiento de las normas ambientales y de las obligaciones ambientales del contratista. Visitas e Informes. Informes de Interventoría, Requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual
19	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social	**Social: Riesgo asociado a la socialización del proyecto que realice el Contratista que estén en cabeza de éste.**	Inconformidad de la comunidad en proceso de socialización del proyecto y ejecución de la obra, puede generar atrasos en la ejecución de la obra.	2	2	4	Riesgo bajo		X	Seguimiento a todos los protocolos y procesos de socialización del proyecto. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad.	2	2	2	Riesgo bajo	NO	Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato con el cierre ambiental	Visitas de seguimiento y control para garantizar el seguimiento a la socialización del proyecto Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas.	semanal
20	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la naturaleza	**Fuerza mayor asegurable**. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de la Entidad Contratante	Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Contratista	2	2	4	Riesgo bajo		X	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc.	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	Etapa precontractual	Una vez instalado el contratista en el proyecto e implementado el plan de seguridad industrial con las debidas revisiones.	Revisiones de expertos del contratista en los tratamientos y controles a ser implementados	Determinadas por los expertos del contratista en esta materia
21	General	Externo	Ejecución	Riesgo político-social, Riesgo de la naturaleza	**Fuerza mayor no asegurable.** Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, (El ente contratante como órgano del Estado en armonía con los demás Entes). Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente.	Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes de la nación ó del contratista, cambios en las obras por necesidad de ajustes	1	4	5	Riesgo Medio	**X**	X	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición de hallazgos arqueológicos o yacimientos mineros en la región del proyecto, para advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendiente a mitigar el impacto. Ante la aparición del evento efectuar los ajustes de diseño para las modificaciones a que hubiere lugar en la ejecución del proyecto. En caso de guerra tratar y acordar con la entidad contratante el tratamiento contractual al proyecto	1	3	4	Bajo	SI	Contratista	Etapa precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar	En la etapa precontractual y en la contractual cuando se presente el evento.
22	Específico	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	**Adquisición Predial:** El contratista prestará la colaboración requerida en el proceso de adquisición predial.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por dificultad en gestión predial que afecta la ejecución del proyecto	2	3	5	Riesgo Medio	**X**	**X**	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada a los diseños. Coordinación y seguimiento al proceso de adquisición predial. Diligencia en la gestión administrativa, legal y financiera para la menor demora posible en la adquisición.	2	2	4	Riesgo Bajo	Puede demorar la ejecución en cuanto depende de terceros.	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la etapa de adquisición de predios	Al final de la etapa de adquisición de predios	Comites Técnicos, Seguimiento constante al proceso de adquisición predial, informes de los responsables de la gestión predial, requerimientos escritos-Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	semanal
23	Específico	externo	Ejecucion	cambiario	Cambio en el precio de los bienes entre el momento de presentar la oferta y el momento de ejecutar el contrato	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por aumento anormal de la TRM que pueda afectar la ejecución del proyecto	4	3	7	Riesgo medio		**X**	Proveedor debe crear sus propios mecanismos de cobertura. El contratista podrá hacer uso de coberturas naturales, y/o Implementar instrumentos Bancarios como opciones de compra (Call) y/o Contratar coberturas cambiarias.	4	3	7	Riesgo medio	Puede afectarla en cuanto algunos de los componentes del contrato a celabrra son importados	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Al final de la ejecución del contrato	Comites Técnicos, Seguimiento mensual al comprotamiento de la TRM, requerimientos escritos-Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual
24	Específico	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional - Social	**Expropiación Predial:** Se refiere al caso en el que se requiera recurrir al proceso de expropiacion. El contratista prestará la colaboración requerida en el proceso de expropiación	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por dificultad en gestión predial que afecta la ejecución del proyecto	3	3	6	Riesgo Alto	**X**	**X**	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada a los diseños. Seguimiento constante al proceso de expropiación, diligencia en la gestión administrativa, legal y financiera para la menor demora posible.	2	2	4	Riesgo Bajo	Puede afectarla en cuanto depende de procesos legales	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la etapa de adquisición de predios	Al final de la etapa de adquisición de predios	Comites Técnicos, Seguimiento constante al proceso de expropiación, informes de los responsables de la gestión predial, requerimientos escritos-Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	semanal

GERENTE DE OBRA
Adalberto Vivero

DIRECTOR DE OBRA
Javier Velez Camargo

RESIDENTE DE OBRA N° 1
Jhorvis de Luque

RESIDENTE DE OBRA N° 2

ING. ADMINISTRATIVA
Melissa Ramirez

RESIDENTE AMBIENTAL
Carlos Dussan

ING. DE TRAFICO
Jaime Lopez

ING. HIDRAULICO
Leiton Gonzalez

ING. ESTRUCTURAL
Antonio Franco

ALMACEN (OBRA)
Carlos fernandez Peña

CONDUCTOR
Deivis Zuñiga

SISO
Diana Daza

SOCIAL
Isabella Monterroza

TALLER METALMECANICA
- Asis Jeison - Soldador
- Bermudez Ramon
- cabarcas Jhon
- Gonzalez Yesit
- Guerrero Robinson
- Molina Alexander
- Palencia Elvis
- Ospino Jordi
- Ramirez Carlos
- Rojas carlos

MANO DE OBRA
Hector Cuesta

MANO DE OBRA LOCAL
- Rafael Altahona - Control de acceso
- Hector Narvaez Mora - Control de acceso
- Dairo Alvarez - Oficial # 1
- Julio Muñoz - Oficial # 2
- Ronald Muñoz - Oficial # 3
- DARWUIN JOSE ECHEVERRIA - Oficial #4
  VICTOR GONZALEZ IBAÑEZ - Oficial # 5
  EVER MARTINEZ ORELLANO- Oficial # 6
- Jose Atencio - Ayudante #1
- Luis Nuñez - Ayudante # 2
- Nerio Gonzalez - Ayudante # 3
- Hader Toledo Martinez - Ayudante # 4
- Energio Echeverria - Ayudante # 5
- Eugenio de la Hoz - Ayudante # 6
- Luis Alberto Polo - Ayudante # 7
- Diomar Buelvas Buelvas - Ayudante # 8
  Marlon Doscuviche - Ayudante # 9
- Jose Manuel Gutierrez - Ayudante # 10
- Omar Mejia - Ayudante # 11
- Jasier Anaya Viloria - Ayudante # 12
- Geovanny Orozco - Ayudante # 13
- Luis Cantillo - Ayudante # 14
- Onacis Torres - Ayudante # 15
- Jose Manuel Gutierrez - Ayudante # 16
- Moises Pantoja - Ayudante # 17
- Edgar Geovanny Vargas - Ayudante # 18
- Joaquin Colon -. Ayudante # 19
  Luis Mendoza - Ayudante # 20
  Jhon de la Torre - Ayudante # 21
  Cesar Arturo de la Hoz - Ayudante # 22
  ROnys Ramos - Ayudante # 23
  Jairo rafael Ortiz - Ayudante # 24
  Jesus Freyle Altahona - Ayudante #25
  Jesus Antonio Julio - Ayudante # 26
  German Echeverria- Ayudante # 27
  Marlon Meriño Erazo - Ayudante # 28
  Enot Salamanca - Ayudante # 29

TALLER DE ENSAMBLE
- Pedro Pamplona - Maestro de obra
- Francisco Pamplona - Oficial # 1
- Jose Harley Rodriguez - Oficial # 2
- Juan Bermudez - Oficial # 3
- Nevardo Mendivelso - Oficial # 4

CONTRATISTAS
- Andres Beltran - (25)
- S & T (1)

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

PLAN DE CALIDAD

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CUENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

EDUBAR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

ELABORA: **FIRMA:** **CARGO: COORDINADOR DE CALIDAD** **NOMBRE: ERIKA NARANJO**	**REVISA:** **FIRMA:** **CARGO: DIRECTOR DE OBRA** **NOMBRE: JAVIER VÉLEZ**	**APRUEBA:** **FIRMA:** **CARGO: GERENTE GENERAL** **NOMBRE: ADALBERTO VIVERO**

1. ALCANCE

Este plan de calidad aplica para el proyecto “INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CUENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA”.

Estos requisitos son aplicables a todas las actividades vinculadas al proyecto y que se encuentren dentro del plan de calidad, en especial las siguientes:

01 OBRAS PRELIMINARES
02 MOVIMIENTOS DE TIERRA
03 PILOTAJE EN MADERA
04 PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA
05 BARANDAS EN MADERA
06 EDIFICACIONES EN MADERA
07 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
7,1 CIMENTACIONES
7,2 ESTRUCTURA
7,3 TANQUE
7,4 ACERO DE REFUERZO
08 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS
8,1 LISTONES EN MADERA
8,2 MESONES
8,3 MUROS MAMPOSTERÍA
8,4 MUROS INTERNOS EQUIPAMIENTOS
8,5 ACABADOS SOBRE MUROS
09 PISOS Y ENCHAPES
10 CIELOS RASOS
11 PAVIMENTOS Y ANDENES
12 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
13 URBANISMO Y EXTERIORES
14 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI
15 INSTALACIONES ELECTRICAS
16 INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS
17 INSTALACIONES VOZ Y DATOS
18 PRESUPUESTO SEÑALIZACION
19 PROVISIONES

El **Consorcio JCO Mallorquín** tiene como política del sistema de gestión de calidad construir obras civiles, cumpliendo con las especificaciones técnicas, requisitos legales y contractuales, aplicando controles a los procesos constructivos en el plazo establecido. Para lograr esto, **Consorcio JCO Mallorquín** cuenta con recursos humanos, materiales y técnicos adecuados en la búsqueda de un mejoramiento continuo de su sistema de gestión calidad y de la satisfacción de los clientes.

2. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD

- Especificaciones Técnicas Particulares
- Contrato de Obra No. EDU-561-2021
- Documento de Convocatoria selección abierta SA-04-2021 y sus anexos.
- Estudios y documentos previos.

3. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Los objetivos del sistema de gestión calidad son:

- Cumplir con las obligaciones adquiridas con nuestros clientes
- Cumplimiento de los requisitos legales.
- Controlar la gestión de los procesos y disminuir los reprocesos.
- Emplear personal competente y proveedores calificados para el buen desarrollo de los proyectos
- Mejorar la satisfacción del cliente
- Mejorar nuestro sistema de gestión integral.

4. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

En la “Caracterización del Proceso de Planeación Estratégica” se definen las actividades y los controles necesarios para establecer la política y los objetivos del Sistema de Gestión Integral de la Organización, asegurando que son coherentes entre ellos y que apoyan la dirección estratégica de la Organización, así como los indicadores de gestión por medio de los cuales se mide el desempeño de los procesos y del sistema en general. Dichos indicadores tienen establecidas metas periódicas medibles cuantitativamente y cada uno de sus resultados se incluye en el formato “Matriz de Eficacia del Sistema de Gestión Integral” permitiendo así medir la eficacia del mismo y verificar el cumplimiento de las metas fijadas, además de evidenciar la coherencia existente entre los objetivos y la política de la Organización.

Los recursos necesarios para que el sistema de gestión integral sea documentado, implementado y mantenido, son establecidos y asignados por la Gerencia. Este compromiso incluye también su participación activa y liderazgo permanente en los diferentes procesos del sistema.

Garantizar que se establece, implementa y mantiene el Sistema de Gestión Integral, proporcionando los recursos necesarios y llevando a cabo revisiones periódicas de su eficacia. Definir las actividades y los controles necesarios para asegurar que los requisitos del cliente son determinados y se cumplen con el propósito de aumentar su satisfacción y que se previenen los impactos ambientales y las enfermedades laborales al interior de la Organización.

El Gerente General de **Consorcio JCO Mallorquín**, consciente de que el sistema de gestión integral es un instrumento indispensable y básico para ser competitivos en el mercado, y para coordinar las actividades que lleven a la dirección y el control con respecto a la calidad, a la seguridad y salud en el trabajo y al medio ambiente, se compromete a liderar la implementación y mantenimiento de éste al interior de la Organización.

El Gerente General de Consorcio JCO Mallorquín delega en el Coordinador de Calidad, el Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Coordinador de Gestión Ambiental la autoridad para asegurar que se establecen, se implementan y se mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestión Integral, además de difundir la política y los objetivos y garantizar su entendimiento.

El Coordinador de Calidad, el Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Coordinador de Gestión Ambiental mantienen informada a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión Integral y sus necesidades de mejora por medio de las revisiones periódicas o cuando la situación lo amerite. También promueven la toma de conciencia acerca de la importancia de cumplir con los requisitos y/o

obligaciones adquiridas con las partes interesadas en todos los niveles de la Organización por medio de carteleras, correspondencia, capacitaciones y/o entrenamientos y comunicando la eficacia del sistema.

El Coordinador de Calidad es el responsable de organizar las reuniones de revisión del sistema, para las que previamente ha diligenciado el formato “Matriz de Eficacia del Sistema de Gestión Integral” con base en la información suministrada por cada uno de los responsables de procesos en sus informes de gestión y la presenta a la Gerencia durante dichas reuniones para que ésta tome las medidas del caso.

La Organización cuenta con el “Procedimiento para Gestión de Riesgos y/u Oportunidades” a través del cual desarrolla actividades para identificar, evaluar, clasificar y gestionar los riesgos y las oportunidades de la Organización para evitarlos o mitigar sus impactos y/o generar mejoras según corresponda.

5. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

El control de los documentos y datos se realiza siguiendo lo establecido en el "Procedimiento Control de Documentos y Registros".

6. CONTROL DE REGISTROS

El control de los registros se realiza siguiendo lo establecido en el “Procedimiento Control de Documentos y Registros”.

7. RECURSOS, PROVISIÓN DE RECURSOS, MATERIALES, RECURSOS HUMANOS, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

La determinación de los recursos necesarios para el cumplimiento de los requisitos de cliente se realiza durante la planificación del proyecto, lo cual se encuentra documentado en la “Caracterización del Proceso Planeación, Ejecución y Control de Proyectos”.

Lo relacionado con el recurso humano se describe en el “Caracterización del Proceso de Gestión Humana”. En general, en dicho proceso se definen las actividades y los controles necesarios para la contratación del personal, la calificación de su competencia y la implementación de entrenamientos para mejorarla.

En lo referente al ambiente de trabajo, la Organización gestiona las condiciones necesarias para lograr un entorno óptimo de trabajo y así la conformidad con los requisitos. Otro aspecto importante y que se incluye como parte del ambiente de trabajo es el factor climático o medioambiental necesario para la buena ejecución de los proyectos.

8. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Lo relacionado a la comunicación con el cliente y otras partes interesadas, se establece en los perfiles de cargo que aplican para el proyecto ya que varía de acuerdo a las funciones y responsabilidades de cada uno de los cargos.

9. DISEÑO Y DESARROLLO

El proceso de diseño y desarrollo y su control de cambios se realiza siguiendo lo establecido en la “Instrucción de Trabajo para Gestionar Diseños”.

10. COMPRAS

Para lo relacionado con la adquisición de productos y servicios y el cumplimiento de sus especificaciones se sigue lo descrito en la “Caracterización del Proceso de Gestión de Compras”, allí se documentan las actividades y los controles necesarios para efectuar las compras de la Organización y para evaluar, seleccionar y reevaluar los proveedores utilizados.

11. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La Organización planifica y lleva a cabo la prestación del servicio bajo condiciones controladas. Estas condiciones controladas incluyen datos como:

- La disponibilidad de información que describa las características del producto (contrato, pliego de condiciones y especificaciones técnicas aplicables al proyecto).
- El uso del equipo apropiado teniendo en cuenta las especificaciones, las exigencias y los requerimientos del Cliente (equipos mayores y equipos de seguimiento y medición).
- La disponibilidad, implementación y uso de dispositivos de seguimiento y medición.

La Organización implementará instrucciones de trabajo que describan cualquier tipo de actividad con sus controles, cada vez que sea necesario, siempre y cuando no exista una norma técnica o exigencias documentadas al respecto por parte del Cliente.

En la “Caracterización del Proceso Planeación, Ejecución y Control de Proyectos” se documentan las actividades y los controles necesarios para la ejecución de los proyectos de la Organización.

12. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

En lo referente a la identificación y trazabilidad, la Organización ejerce un control sobre los materiales utilizados en los proyectos, con respecto a su ubicación y la relación con los ensayos, pruebas o protocolos de los mismos.

Lo anterior se evidencia en los formatos de “Vale de Consumo y Entrega de Materiales en Almacén”, “Entradas y Salidas de Almacén”, “Control Diario de Obra”, “Control de Concretos Premezclados”, “Control de Viajes y Extensión de Mezcla Asfáltica”, “Relación de cilindros de concreto para ser ensayados a compresión”, “Relación de Viguetas de Concreto para Ser Ensayadas a Flexión”, entre otros.

13. PROPIEDAD DEL CLIENTE

Con respecto a la propiedad suministrada por el Cliente o por proveedores externos, la Organización establece las acciones para recibir, identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los Clientes o de los proveedores externos, que son suministrados para su utilización o empleo dentro del proyecto. Así mismo, define las responsabilidades para el control de su verificación, almacenamiento y su mantenimiento. Para lo anterior se sigue lo establecido en la “Instrucción de Trabajo para el Control de la Propiedad Suministrada por el Cliente o Proveedores Externos”.

14. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

En cuanto a la preservación del producto, la Organización dispone del “Cuadro para el Almacenamiento de los Materiales” en el cual se describe la manera como se deben identificar, manipular, embalar, almacenar y proteger los materiales e insumos que se utilizan para los proyectos.

En lo referente a la preservación de la obra como producto final se sigue lo establecido en la “Caracterización del Proceso Planeación, Ejecución y Control de Proyectos”.

15. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

El sistema de gestión de la Organización cuenta con dispositivos de seguimiento y medición, tanto de los procesos, como de los productos. Estos dispositivos son:

- Encuesta de satisfacción del cliente para el Proceso de Planeación, Ejecución y Control de Proyectos.
- Cumplimiento de requisitos contractuales del cliente (Ver anexo)
- Cumplimiento de especificaciones técnicas. “Cuadro de Autocontrol” y “Cuadro de Inspección”. (Ver anexo).
- Cumplimiento del programa de obras
- Desarrollo de los proveedores de la Organización
- Auditorías internas
- Equipos de topografía y de laboratorio
- Acciones correctivas y preventivas
- Matriz de eficacia e indicadores de gestión
- Reuniones gerenciales

Los indicadores de gestión se aplican para garantizar el seguimiento y la medición de los procesos del sistema de gestión de calidad de la Organización. Estos indicadores demuestran la capacidad de los procesos y sus responsables para alcanzar los resultados planificados (metas) y marcan la generación de acciones correctivas cuando no se cumplan, para asegurarse de la conformidad del producto.

En las reuniones y por medio de la matriz de eficacia y los informes de gestión del período, se efectúa el seguimiento y la medición de los procesos.

La Organización determina el seguimiento y las mediciones a realizar en los proyectos, teniendo en cuenta lo requerido por las especificaciones técnicas al igual que los equipos con los cuales se llevarán a cabo estas actividades.

Los equipos de seguimiento y medición son utilizados para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados y se relacionan en el formato “Inventario Metrológico”.

Para dar cumplimiento a lo anterior, a los proveedores de servicios de laboratorios de pruebas y ensayos, se les solicitan los certificados de calibración y/o inspección de los equipos utilizados en la ejecución de dichos ensayos.

Así mismo, la Organización dispone de instrucciones de trabajo para asegurar que los equipos de seguimiento y medición sean controlados, verificados, calibrados, ajustados o mantenidos, a intervalos planificados ó antes de su utilización. Las

verificaciones que se realizan a los equipos de seguimiento y medición, quedan registradas en las carteras que existen para cada equipo.

Las verificaciones de los equipos de topografía son realizadas en los proyectos por parte de los Topógrafos y las verificaciones de los equipos del laboratorio son realizadas por los Laboratoristas, convirtiéndose en una herramienta para garantizar confiabilidad y coherencia de las mediciones que dichos equipos generen.

Todos los equipos de seguimiento y medición utilizados por la Organización cuentan con el formato “Hoja de Vida de Equipos de Seguimiento y Medición” en donde se evidencian traslados, verificaciones, reparaciones, mantenimientos, calibraciones y su historia en general.

Todos los equipos de seguimiento y medición son protegidos contra ajustes que puedan llegar a invalidar el resultado de la medición y contra daños y/o deterioros causados durante su manipulación, mantenimiento y almacenamiento.

16. AUDITORÍAS

Las actividades para la planificación, ejecución, comunicación de resultados y registros de las auditorias de calidad se sique lo descrito en el “Procedimiento para Auditorías Internas”.

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA DE PROYECTOS

CONTRATO DE OBRA Nª EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÒN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

DICIEMBRE DE 2022

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

1 Contenido

1. INTRODUCCION 3
2. OBJETIVOS 3
2.1. GENERAL 3
2.2. ESPECIFICOS. 3
3. ALCANCE 3
4. GESTION DE LA GERENCIA DE PROYECTOS 3
4.1. PRORROGA 3
4.2. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN 4
4.3. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO 5
4.4. TALENTO HUMANO 6
4.5. RECURSOS DISPONIBLES 7
4.6. CUMPLIMIENTO DE CALIDAD 8
4.7. INGRESOS POR ACTAS. 8
4.8. GESTION ADMINISTRATIVA. 8
4.9. SEGUIMIENTO AL FLUJO DE INVERSION 9
4.10. ANEXOS 10

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

Contenido de Tablas

Tabla 1. Avance de obra hasta 30 de noviembre de 2022. 5
Tabla 2. Relación mano de obra a corte 30 de noviembre de 2022. 7
Tabla 3. Relación maquinaria en obra a corte 30 de noviembre de 2022. 7
Tabla 4. Relación y estado de las actas parciales de cobro. 8

1. INTRODUCCION

Para el proyecto INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÒN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, el presente informe describe la gestión administrativa, técnica y financiera realizada por el CONSORCIO JCO MALLORQUIN correspondiente al periodo de ejecución al mes de agosto de 2022.

2. OBJETIVOS

2.1. GENERAL

- Gestionar la Gerencia de Proyectos frente a la ejecución de las actividades contractuales con respecto a los componentes de Integración, alcance y tiempo.

2.2. ESPECIFICOS.

- Verificar que las actividades ejecutadas sean acordes al cronograma oficial de obra, a su vez, cuantificar el índice de cumplimiento del cronograma oficial.
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad de las actividades ejecutadas en el periodo.
- Calcular el índice de cumplimiento del costo real sobre el costo programado.
- Certificar la gestión administrativa y de correspondencia del proyecto.

3. ALCANCE

El alcance de este informe es exclusivo para las actividades contractuales del proyecto con numero de contrato de obra EDU-561-2021 cuyo objeto contractual es la **INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÒN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.**

4. GESTION DE LA GERENCIA DE PROYECTOS

4.1. PRORROGA

El día 11 de mayo de 2022 por medio del oficio JCO-060-2022 enviado a la interventoría se solicitó la prorroga N° 2 del contrato de obra EDU-561-2021, en donde se solicitó un plazo de diez (10) meses adicionales, cuyo fundamento de la solicitud se pueden ver plasmados en el oficio mencionado pero en breve, dicha solicitud se fundamenta en la escasez mundial de materiales como el acero que atrasaron la llegada de los herrajes necesarios para ejecución de actividades que estaban ocasionando atrasos, la actualización de diseño de algunos elementos estructurales del proyecto.

Dicha solicitud fue revisada por la interventoría, quien posteriormente realizo la solicitud de prórroga a EDUBAR S.A.

El 23 de junio de 2022 se suscribió el documento de prorroga N° 2, siendo la fecha de terminación del contrato el 30 de abril de 2023.

4.2. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN

Al día 31 de diciembre de 2022 se han suscrito 11 actas parciales de obra hasta el mes noviembre de 2022, y el acta parcial N° 12 se encuentra en trámite. CONSORCIO JCO MALLORQUIN, ha desarrollado las siguientes actividades contractuales con los % ejecutados tabulados a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UND	% EJECUTADO
1	**OBRAS PRELIMINARES**		
5513	EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO)	MES	81,3%
CM-01	COMISIÓN TOPOGRÁFICA MENSUAL, INCLUYE 1 COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA, 1 TOPÓGRAFO, CADENEROS, DIBUJANTES, LANCHA PARA REPLANTEO EN AGUA, ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL.	MES	67,2%
CM-02	DESMONTE Y DESCAPOTE MECÁNICO DE MATERIAL EXISTENTE, E = 0.25 M, INCLUYE RETIRO	M2	10,4%
3819	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE 4.00X2.50M.	UND	100%
03	**PILOTAJE EN MADERA**		
CM-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 20, INCLUYE COMPLEMENTO SUPERIOR	ML	85,2%
CM-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 25, INCLUYE COMPLEMENTO SUPERIOR	ML	85,4%
CM-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D15	ML	49,4%
CM-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D17	ML	55,1%
04	**PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA**		
CM-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X30, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL	ML	52,3%
CM-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X36, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL	ML	84,5%
CM-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO - SECCIÓN CURVA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK	M2	10,8%
CM-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO - SECCIÓN RECTA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK	M2	52,7%
05	**BARANDAS EN MADERA**		
CM-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN CURVA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES	ML	7,9 %


CM-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN RECTA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES	ML	50,6 %
06	**EDIFICACIONES EN MADERA**		
CM-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EXTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR	M2	46,5 %
CM-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DINTEL MURO EXTERIOR	ML	33,0%
CM-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA EN CRUZ PÓRTICO 45X45, INCLUYE ANCLAJE AL PILOTE	ML	77,1%
CM-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA PÓRTICO - 13X50, INCLUYE ANCLAJE A COLUMNA	ML	49,3%
CM-23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 6X36, INCLUYE ANCLAJE A VIGA	ML	29,0%
19,01	PMA	GLB	16,3 %

Tabla 1. Avance de obra hasta 31 de diciembre de 2022.

4.3. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO



4.4.TALENTO HUMANO

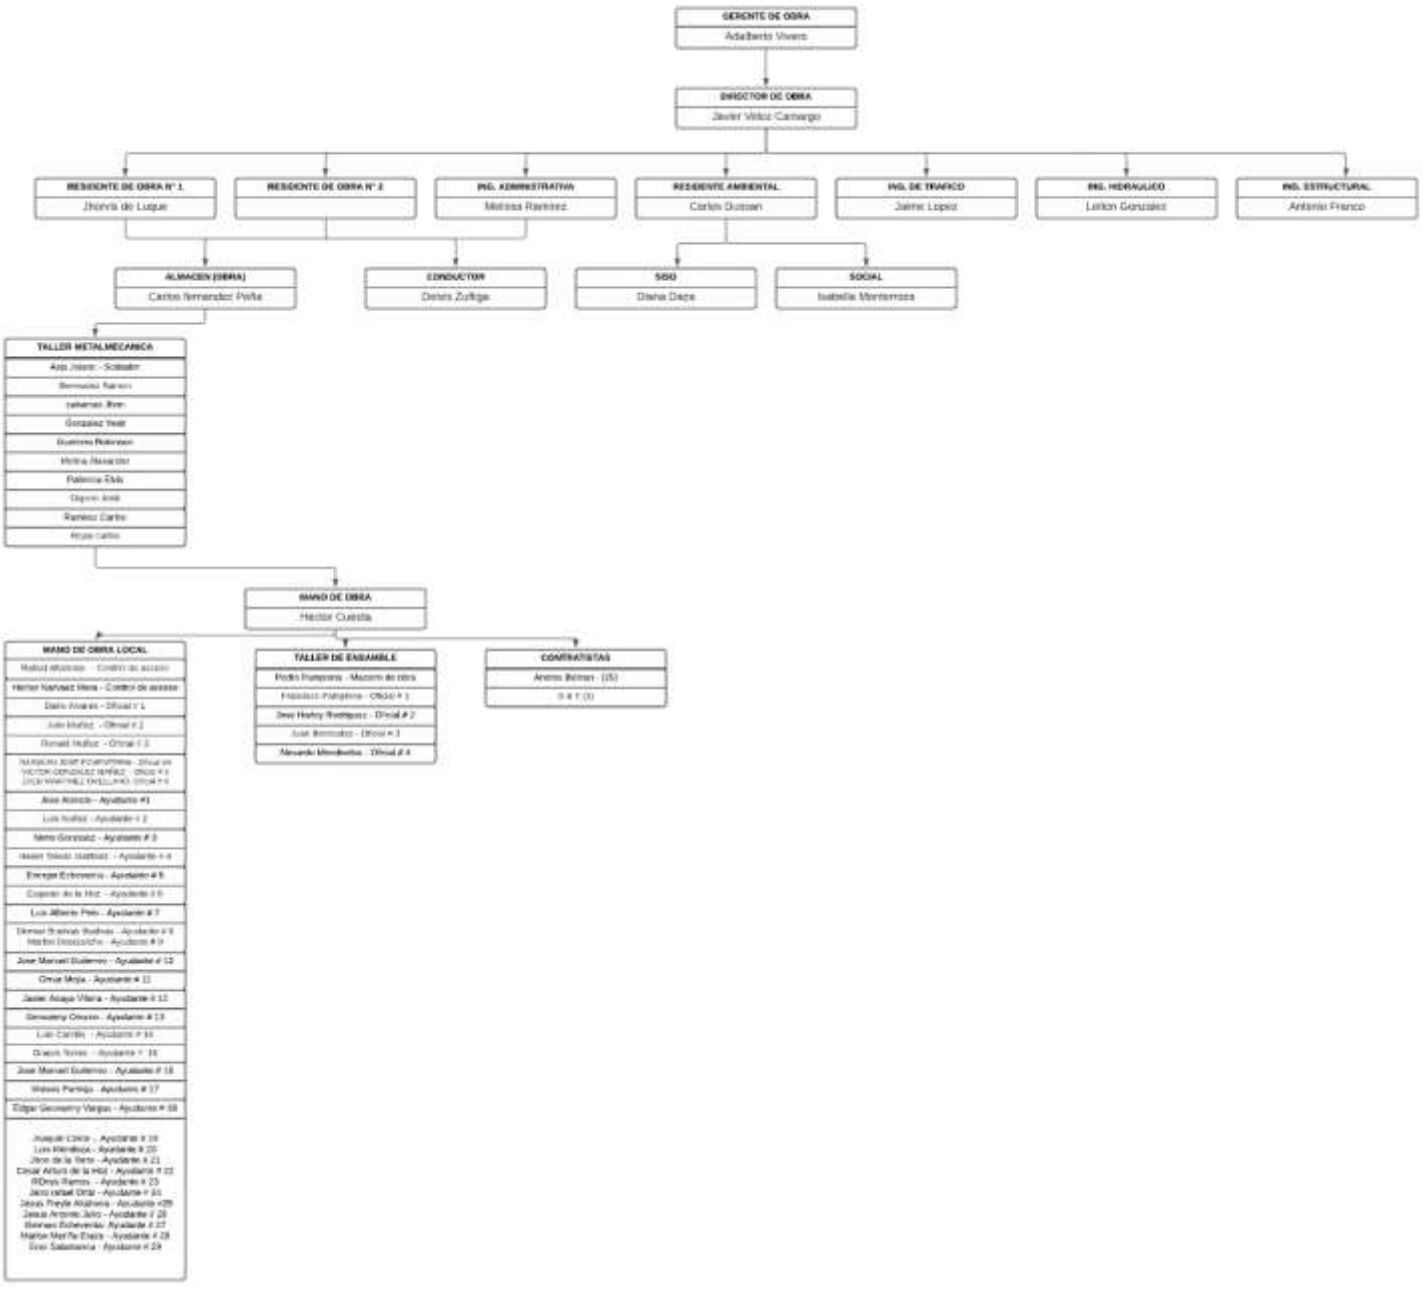

ITEM	PROFESION	CAMNTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EN OBRA
1	Oficiales	25	1
2	Ayudantes de oficiales	50	5
3	Maestro de carpintería	30	1
4	Oficiales de carpintería		10
5	Ayudantes de carpintería	60	28
6	Inspectores	6	1

Tabla 2. Relación mano de obra a corte 31 de diciembre de 2022.

4.5.RECURSOS DISPONIBLES

EQUIPOS.

ITEM	MAQUINARIA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EN OBRA
1	Retroexcavadoras con Grizzli vibrohincador	2	0
2	Volquetas doble troque para transporte de material	8	0
3	Grúas para izaje de elementos	1	1
4	Telehandler	1	1
5	Retrocargadores	2	0
6	Minicargadores	3	0
7	Motoniveladora	1	0
8	Vibro compactador de 5 ton	2	0
ITEM	**MAQUINARIA**	**CANTIDAD PROGRAMADA**	**CANTIDAD EN OBRA**
1	Máquina de vibro hincado sobre barcazas acuáticas	2	0
2	Barcazas de bajo calado	2	0
3	Torre de hincado de pilotes	0	0

Tabla 3. Relación maquinaria en obra a corte 31 de noviembre de 2022.

4.6.CUMPLIMIENTO DE CALIDAD

El CONSORCIO JCO MALLORQUIN, al ejecutar las actividades programadas hace entrega mensual de los certificados de calidad de los materiales requeridos para la ejecución de actividades.

4.7.INGRESOS POR ACTAS.

ACTA N°	VALOR	ESTADO DEL ACTA
ACTA DE PAGO N° 1	$ 1.628.531.995,79	PAGADO
ACTA DE PAGO N° 2	$ 1.365.320.628,62	PAGADO
ACTA DE PAGO N° 3	$ 1.399.878.857,78	PAGADO
ACTA DE PAGO N° 4	$ 5.566.544.118,72	PAGADO
ACTA DE PAGO N° 5	$ 3.838.560.382,20	PAGADO
ACTA DE PAGO N° 6	$ 3.461.952.945,32	PAGADO
ACTA DE PAGO N° 7	$ 3.411.534.139,78	PAGADO
ACTA DE PAGO N° 8	$ 3.171.310.967,24	PAGADO
ACTA DE PAGO N° 9	$ 3.574.401.335,44	PAGADO
ACTA DE PAGO N° 10	$ 2.402.162.442,68	PAGADO
ACTA DE PAGO N° 11	$ 3.024.994.368,76	PAGADO
ACTA DE PAGO N° 12	$ 2.886.125.237,20	EN TRAMITE

Tabla 4. Relación y estado de las actas parciales de cobro.

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

4.8.GESTION ADMINISTRATIVA.

Dentro de la gestión administrativa de la Gerencia de Proyectos del CONSORCIO JCO MALLORQUIN, se encuentra el control de la correspondencia enviada y recibida entre los interesados, anexo al presente informe de relaciona el estado de la correspondencia entre las partes con fecha de corte 31 de diciembre de 2022.

4.9.SEGUIMIENTO AL FLUJO DE INVERSION

Tal como se presentó en el presente informe, durante el mes de noviembre se realizaron las actividades de Comisión topográfica mensual con dos frentes y campamento, que corresponden al capítulo 01 (Preliminares), suministro e instalación pilote diámetro 20 y 25, incluye complemento superior que hacen parte del capítulo 03 (Pilotaje en madera), las actividades de Suministro e instalación viga laminada cca 08x30 y 08x36, incluye complemento central, suministro e instalación entrepiso – sección recta correspondientes al capítulo 04 (Plataformas y Pasarelas en Madera), Suministro e instalación baranda - sección recta, incluye paral estructural, pasamanos y marco con barrotes que corresponde al capítulo 05 (Barandas en Madera), suministro e instalación muro exterior, incluye amarre inferior, paral vertical, uniones y amarre superior, suministro e instalación dintel muro exterior , suministro e instalación columna en cruz pórtico 45x45, incluye anclaje al pilote, Suministro e instalación vigueta 6x36, incluye anclaje a viga, actividad del capítulo 06 (Edificaciones en madera) dichas actividades realizadas en el mes, arrojan una inversión acumulada de 43,37% ($35.761.802.660,03).

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

4.10. ANEXOS

ANEXO 1. Cronograma de obra

ANEXO 2. Flujo de inversión

ANEXO 3. Curva S del proyecto

ANEXO 4. Matriz de riesgo

ANEXO 5. Organigrama del proyecto.

ANEXO 6. Plan de calidad del proyecto.

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

PROGRAMA DE INVERSION

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO	$ 82.464.264.620,00
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	180 DIAS
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADADA	30 DE ABRIL DE 2023


ITEM	ACTIVIDAD	VALOR TOTAL	Acumulado a 30 de junio de 2022	JULIO DE 2022	AGOSTO DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	OCTUBRE DE 2022	NOVIEMBRE DE 2022	DICIEMBRE DE 2022	ENERO DE 2023	FEBRERO DE 2023	MARZO DE 2023	ABRIL DE 2023
01	OBRAS PRELIMINARES	$ 623.882.532,00	$ 197.061.267,05	$ 29.340.961,00	$ 29.340.961,00	$ 29.340.961,00	$ 29.340.961,00	$ 46.418.613,14	$ 46.418.613,14	$ 46.418.613,14	$ 46.418.613,14	$ 61.891.484,19	$ 61.891.484,19
02	MOVIMIENTOS DE TIERRA	$ 1.948.804.815,61			$ 97.440.240,78	$ 194.880.481,56	$ 97.440.240,78	$ 233.856.577,87	$ 233.856.577,87	$ 233.856.577,87	$ 233.856.577,87	$ 311.808.770,50	$ 311.808.770,50
03	PILOTAJE EN MADERA	$ 26.835.125.558,28	$ 14.369.221.205,56	$ 1.246.590.435,27	$ 1.495.908.522,33	$ 1.745.226.609,38	$ 1.745.226.609,38	$ 1.869.885.652,91	$ 1.869.885.652,91	$ 2.493.180.870,54			
04	PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA	$ 18.505.304.491,05	$ 2.595.277.372,61	$ 954.601.627,11	$ 1.272.802.169,48	$ 1.591.002.711,84	$ 1.591.002.711,84	$ 1.591.002.711,84	$ 1.591.002.711,84	$ 1.591.002.711,84	$ 1.591.002.711,84	$ 2.068.303.525,40	$ 2.068.303.525,40
05	BARANDAS EN MADERA	$ 4.647.070.333,62					$ 278.824.220,02	$ 464.707.033,36	$ 650.589.846,71	$ 650.589.846,71	$ 743.531.253,38	$ 743.531.253,38	$ 1.115.296.880,07
06	EDIFICACIONES EN MADERA	$ 7.053.059.690,30				$ 352.652.984,52	$ 705.305.969,03	$ 846.367.162,84	$ 846.367.162,84	$ 916.897.759,74	$ 916.897.759,74	$ 1.410.611.938,06	$ 1.057.958.953,55
07	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	$ 956.877.401,22			$ 47.843.870,06	$ 47.843.870,06	$ 66.981.418,09	$ 124.394.062,16	$ 124.394.062,16	$ 124.394.062,16	$ 124.394.062,16	$ 133.962.836,17	$ 162.669.158,21
08	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	$ 209.149.887,96						$ 34.858.314,66	$ 34.858.314,66	$ 34.858.314,66	$ 34.858.314,66	$ 34.858.314,66	$ 34.858.314,66
09	PISOS Y ENCHAPES	$ 389.958.440,82						$ 64.993.073,47	$ 64.993.073,47	$ 64.993.073,47	$ 64.993.073,47	$ 64.993.073,47	$ 64.993.073,47
10	CIELOS RASOS	$ 11.098.815,78						$ 1.849.802,63	$ 1.849.802,63	$ 1.849.802,63	$ 1.849.802,63	$ 1.849.802,63	$ 1.849.802,63
11	PAVIMENTOS Y ANDENES	$ 891.018.299,60			$ 44.550.914,98	$ 44.550.914,98	$ 62.371.280,97	$ 115.832.378,95	$ 115.832.378,95	$ 115.832.378,95	$ 115.832.378,95	$ 124.742.561,94	$ 151.473.110,93
12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	$ 98.919.370,16									$ 32.973.123,39	$ 32.973.123,39	$ 32.973.123,39
13	URBANISMO Y EXTERIORES	$ 33.366.619,00											$ 33.366.619,00
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI	$ 2.210.000.000,00									$ 729.300.000,00	$ 729.300.000,00	$ 751.400.000,00
15	INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 7.762.775.477,60								$ 931.533.057,31	$ 2.173.577.133,73	$ 2.328.832.643,28	$ 2.328.832.643,28
16	INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS	$ 4.290.000.000,00										$ 2.145.000.000,00	$ 2.145.000.000,00
17	INSTALACIONES VOZ Y DATOS	$ 4.290.000.000,00								$ 643.500.000,00	$ 1.072.500.000,00	$ 1.072.500.000,00	$ 1.501.500.000,00
18	PRESUPUESTO SEÑALIZACION	$ 12.312.300,00									$ 4.063.059,00	$ 4.186.182,00	$ 4.063.059,00
19	PROVISIONES												
	PMA	$ 860.762.500,00	$ 99.229.083,20	$ 22.846.002,50	$ 22.846.002,50	$ 22.846.002,50	$ 22.846.002,50	$ 22.846.002,50	$ 22.846.002,50	$ 22.846.002,50	$ 22.846.002,50	$ 289.382.698,38	$ 289.382.698,38
	PMT	$ 85.410.787,80			$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53
	CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP (TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED)	$ 29.145.480,00											$ 29.145.480,00
	TOTEMS DE INFORMACION	$ 112.931.000,00									$ 37.267.230,00	$ 37.267.230,00	$ 38.396.540,00
	PROVISION PUERTAS Y VENTANAS	$ 520.000.000,00									$ 171.600.000,00	$ 171.600.000,00	$ 176.800.000,00
	SISTEMA DE RIEGO	$ 87.290.819,20									$ 43.645.409,60	$ 43.645.409,60	

INVERSION MENSUAL		$ 2.253.379.025,88	$ 3.020.222.768,66	$ 4.037.834.623,38	$ 4.608.829.501,15	$ 5.426.501.473,87	$ 5.612.384.287,21	$ 7.881.243.159,06	$ 8.170.896.593,60	$ 11.820.730.934,58	$ 12.371.453.324,18
% DE INVERSION MENSUAL		2,73%	3,66%	4,90%	5,59%	6,58%	6,81%	9,56%	9,91%	14,33%	15,00%
INVERSION ACUMULADA	$ 17.260.788.928,42	$ 19.514.167.954,30	$ 22.534.390.722,96	$ 26.572.225.346,34	$ 31.181.054.847,49	$ 36.607.556.321,36	$ 42.219.940.608,57	$ 50.101.183.767,64	$ 58.272.080.361,23	$ 70.092.811.295,82	$ 82.464.264.620,00
% DE INVERSION ACUMULADA	20,93%	23,66%	27,33%	32,22%	37,81%	44,39%	51,20%	60,76%	70,66%	85,00%	100,00%

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

PROGRAMA DE INVERSION

CONTRATO N°	**EDU-561-2021**
CONTRATANTE	**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)**
CONTRATISTA	**CONSORCIO JCO MALLORQUIN**
INTERVENTOR	**CONSORCIO UF1 MALLORQUIN**
OBJETO	**INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 82.464.264.620,00**
FECHA DE INICIO	**1 DE SEPTIEMBRE DE 2022**
FECHA DE TERMINACION INICIAL	**31 DE DICIEMBRE DE 2021**
PRORROGA N° 1	**SEIS (6) MESES**
FECHA DE TERMINACION ACORDE A PRORROGA N°1	**30 DE JUNIO DE 2022**
PRORROGA N° 2	**DIEZ (10) MESES**
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	**30 DE ABRIL DE 2023**

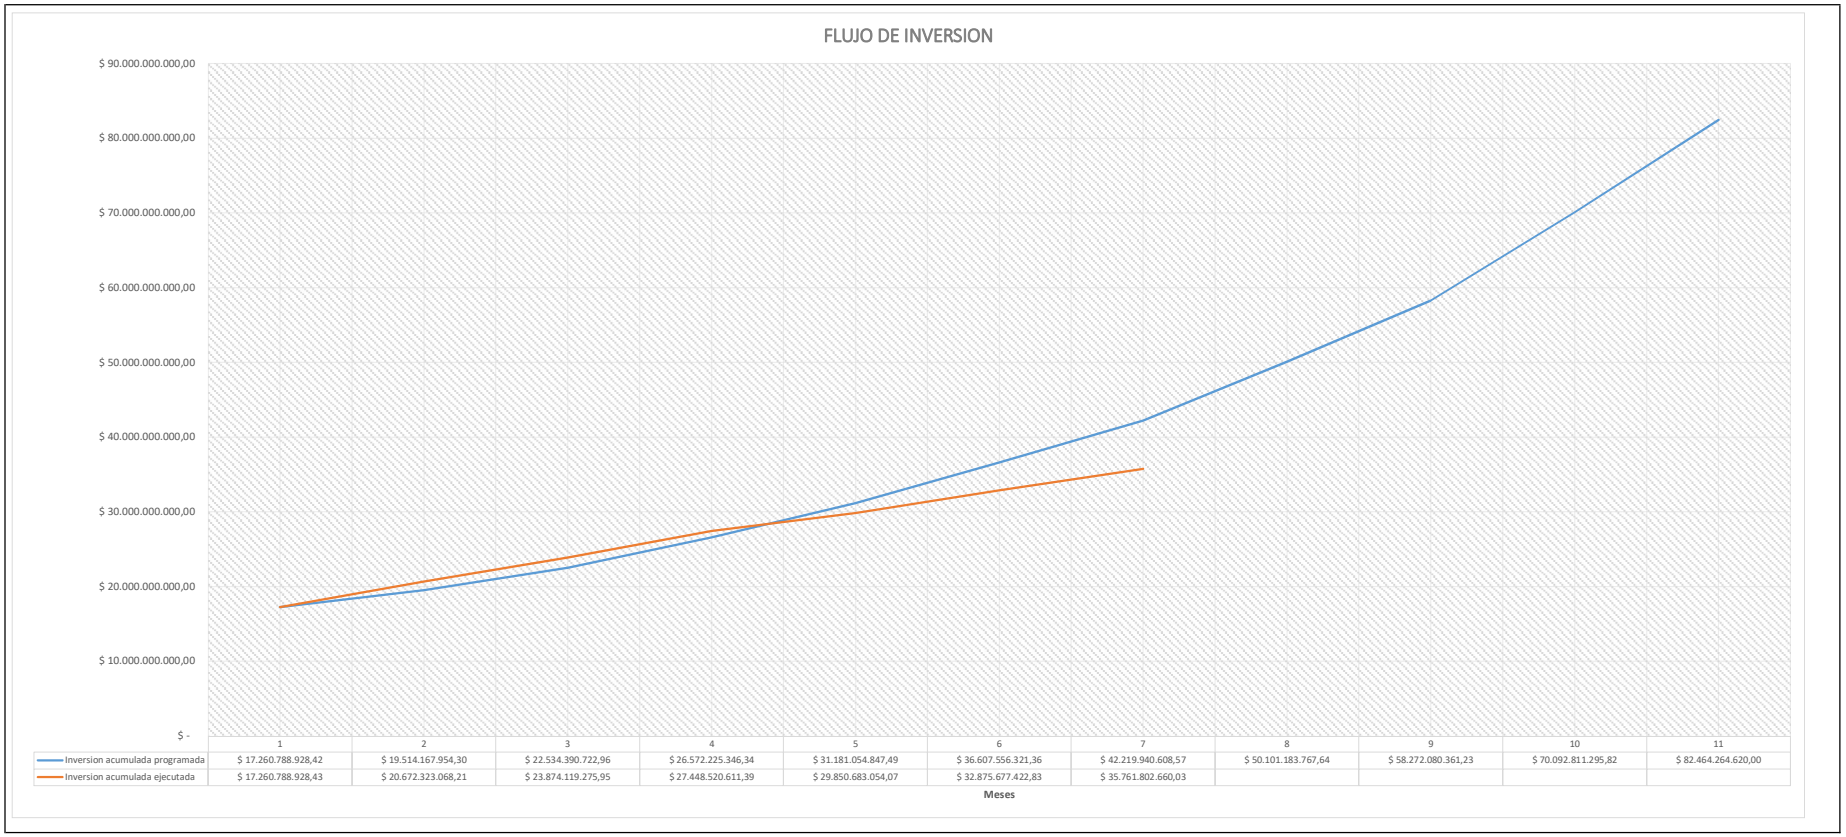

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inversion acumulada programada	$ 17.260.788.928,42	$ 19.514.167.954,30	$ 22.534.390.722,96	$ 26.572.225.346,34	$ 31.181.054.847,49	$ 36.607.556.321,36	$ 42.219.940.608,57	$ 50.101.183.767,64	$ 58.272.080.361,23	$ 70.092.811.295,82	$ 82.464.264.620,00
Inversion acumulada ejecutada	$ 17.260.788.928,43	$ 20.672.323.068,21	$ 23.874.119.275,95	$ 27.448.520.611,39	$ 29.850.683.054,07	$ 32.875.677.422,83	$ 35.761.802.660,03				

INFORME DE GESTIÓN SOCIAL No 12

DICIEMBRE DEL 2022

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

CONTRATO No. EDU- 561/2021

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

TABLA DE CONTENIDO 2

1. INTRODUCCION 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4

2.1. LOCALIZACIÓN 4

3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION SOCIAL –ACTIVIDADES SOCIALES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 5

3.1. PROGRAMA 1. PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL 5

3.1.1. PROYECTO 1. DE ATENCION A LA COMUNIDAD 5

PROYECTO 2. INFORMACION Y DIVULGACION 5

Actividades desarrolladas: 5

1.-Realización de Reuniones programadas (Inicio, Finalización y/o extraordinaria) 5

2.2.-Socializaciones a la comunidad 6

PROYECTO 4. RECUPERACION DEL DERECHO DE VIA 6

Actividades desarrolladas: 6

PROYECTO 5. CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA 6

PROYECTO 6. CONTRATACION DE MANO DE OBRA 8

PROYECTO 7. PROYECTOS PRODUCTIVOS 11

4. TABLA DE INDICADORES 11
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 13

1. INTRODUCCION

El presente informe describe las actividades del Plan de Gestión Social a implementar con el fin de prevenir, mitigar y compensar los impactos para las comunidades del área de influencia directa del proyecto, generados durante la ejecución de las obras del **CONTRATO No. EDU-561/2021INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.**

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

La ciénaga de Mallorquín está ubicada en su totalidad en el extremo norte del distrito de Barranquilla, sobre el margen izquierda de la desembocadura del rio Magdalena (Bocas de Ceniza) en el Mar Caribe, en la Costa Caribe Colombiana. A continuación, una ilustración que muestra la localización del área levantada.



3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION SOCIAL –ACTIVIDADES SOCIALESREALIZADAS POR EL CONTRATISTA.

3.1. PROGRAMA 1. PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL

3.1.1. PROYECTO 1. DE ATENCION A LA COMUNIDAD.

Actividades desarrolladas:

- Seguimiento y cierre de queja: En este periodo no se realizaron reportes de quejas.

Registro de cumplimiento: VER ANEXOS

- Formato de recepción de quejas y reclamos (código FAM 25)

PROYECTO 2. INFORMACION Y DIVULGACION.

Actividades desarrolladas: **VER ANEXOS**

1.-Realización de Reuniones programadas (Inicio, Finalización y/o extraordinaria)

- En este periodo no se realizaron reuniones con la comunidad.

2.- Elaboración y distribución de las piezas de comunicación

- En este periodo solo se realizó y distribuyo un modelo de folleto donde se describe el avance de obra del mes de noviembre y parte del mes de diciembre a las comunidades del corregimiento La Playa y el barrio Las Flores. La distribución de este folleto se realizó en la fundación bocas de ceniza y parque principal de la zona de la Playita.

2.1.-Comunicaciones escritas:

En este periodo no se realizaron comunicados escritos.

2.2.-Socializaciones a la comunidad:

- En este periodo no se realización socializaciones.

PROYECTO 3. MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1.- Levantamiento de Actas de Vecindad

En este periodo no se realizaron actas de vecindad.

2.- Levantamiento de Acta de compromiso

En este periodo no se realizaron actas de compromiso.
Registro de cumplimiento: (No Aplica)

PROYECTO 4. RECUPERACION DEL DERECHO DE VIA.

Actividades desarrolladas:

No aplica para el periodo.

PROYECTO 5. CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA: VER ANEXOS

1. Estructuración y desarrollo de Talleres Pedagógicos:

En este periodo se realizó solo una jornada de capacitación con énfasis didáctico titulado Biología y Cultura, esta se enfocó en enseñar a los carpinteros y ayudantes de obra a plantar correctamente los tipos de mangles en la Ciénaga de Mallorquín y las distintas formas de formar equipos de conciencia ambiental; Esta jornada tuvo especio en el campamento de la unidad funcional número uno.

Conformación y consolidación del Comité Participación Comunitaria:

- En este periodo no se realizó reunión del comité comunitario debido a que faltaron 5 presidentes de asociaciones de pesca.

PROYECTO 6. CONTRATACION DE MANO DE OBRA.

1.- Inscripción de la empresa ante el centro de oportunidades

- La empresa se encuentra inscrita en el centro de oportunidades y actualmente nos encontramos a la espera de los certificados que garantizan que nuestros trabajadores pertenecen al centro de oportunidades y fueron escogidos desde su punto de ofertas laborales.

- En el mes de agosto se le solicito al centro de oportunidades personal para cubrir vacantes de carpintería en el consorcio JCO Mallorquín y estos hasta la fecha no han podido encontrar hojas de vida idóneas para el cargo, nos encontramos a la espera de las hojas de vida para ingreso del personal de carpintería víctimas del conflicto.
- En el mes de Noviembre no se realizó proceso con centro de oportunidades.
- En el mes de Diciembre no se realizó proceso con centro de oportunidades.

2.- Personal Activo en este periodo.

PERSONAL CONTRATADO MANO DE OBRA	
Personal Mano de Obra Calificada	6
Personal Mano de Obra No Calificada	74
Total, Personal	80

PERSONAL POR SEXO	
Hombres	77
Mujeres	3


PERSONAL CONTRATADO MANO DE OBRA
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
6
39
Personal mano de obra calificada
Personal mano de obra no calificada


PERSONAL POR GENERO
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
77
3
Hombres
Mujeres



C.C	NOMBRES	1ER APELLIDO	2DO APELLIDO
72.180.332	ELIAS SAMUEL	GALVAN	LASCARRO
7.595.499	CARLOS MANUEL	PERTUZ	CABARCAS
10.782.301	JOSE MARIO	JIMENEZ	VELEZ
1.089.924.463	JHOLMANS CRISTIAN	ALEGUYAR	
73.269.466	ALBERTO ALFONSO	LLERENA	OSPINO
73.575.878	CAMILO ENRIQUE	PUELLO	CARMONA
73.205.797	CARLOS FERNADO	PUELLO	CARMONA
72.161.506	DAGOBERTO	GUZMAN	RODRIGUEZ
1.043.121.528	DIEGO ANDRES	GUZMAN	BERTEL
85.372.581	FRANCISCO JAVIER	CHAMORRO	URANGO
1.129.532.711	GEOVANNY ENRIQUE	ALANDETE	ROBLES
1.047.389.798	GEOVANNY	PUELLO	ACUÑA
92.275.796	JOSE FULGENCIO	CONTRERAS	MONTEROSA
1004130948	JOSE LUIS	BELTRAN	CHAVERA
72.338.009	LUIS EDUARDO	GARCIA	MARTINEZ
1.042.446.820	OSNAIDER ENRIQUE	ECHEVERRIA	GARCIA
1.004.131.184	RAMON ALBERTO	GARCIA	FERRER

C.C	NOMBRES	1ER APELLIDO	2DO APELLIDO
1.005.680.047	ISABELLA	MONTERROZA	VASQUEZ
72.289.751	ALVARO ENRIQUE	MARTES	ORTEGA
1.044.433.835	GERMAN	ECHEVERRIA	BARRAZA
112.623.242	CARLOS	FERNANDEZ	PEÑA
1.444.618	JUAN CARLOS	BERMUDEZ	RAMIREZ
1.001.853.973	CAMILO ANDRES	TOLEDO	VIÑA
79.244.484	PEDRO	PAMPLONA	SUAREZ
1.020.825.448	JULIAN FRANCISCO	PAMPLONA	LEAL
1.122.627.267	HARLEY	RODRIGUEZ	RAMIREZ
1.143.160.286	JONATHAN	MONTERO	REYES
1.083.432.476	MARLON	MERIÑO	AFERAZO
85.487.023	DAIRON	ALVAREZ	VEGA
72.311.170	JIMMY	PEREZ	DE LA HOZ
80.470.077	NEVARDO	MENDIVELSO	
12.448.524	JESUS ENRIQUE	FREILEY	ALTONA
1.046.692.562	CAMILO	ANGULO	AVILA
1.002.231.148	JESUS	OJEDA	ATENCIO
7.213.589	JUAN BAUTISTA	KLEE	BORREGOS
1.044.424.000	SAITH	MARTINEZ	SUAREZ
1.006.534.231	CRISTIAN	OSMA	RAMIREZ
1.043.130.200	ALBENIS	DIAZ	
1.008.001.128	ORLANDO	CANTILLO	
72.436.026	JORGE	LLANOS	
3.747.881	ENERGIO	ECHEVERRIA	
1.001.799.346	SAMIR	ALTAMAR	
1.001.916.650	JESUS	JULIO	
72.436.706	JAIR	PACHECO	

C.C	NOMBRES	1ER APELLIDO	2DO APELLIDO
1.002.235.350	RUBEN DARIO	GUERRERO	VILLANUEVA
8.498.166	WEIMAR RAFAEL	SANJUAN	URBINA
73.106.539	WILFRIDO JOSE	PEREZ	DIAZ
1.080.013.243	ALEXANDER	LLANOS	RODRIGUEZ
1.042.428.549	FABIO NELSON	ARAUJO	NIEBLES
1.007.900.169	LUIS FERNANDO	VILLANUEVA	MUÑOZ
1.043.587.985	WILSON ENRIQUE	PEREZ	REALES
1.042.449.279	JULIO	CANTILLO	SUAREZ
1.193.436.313	WILSON DOSANTOS	SAUMETH	CHAVEZ
1.193.436.317	JAIME JOSE	SAUMETH	MENDOZA
1.007.187.391	JASSIR ENRIQUE	MARENCO	ROJANO
3.817.768	GEOVANIS	RUIZ	SOTO
73.268.775	ELIECER	JIMENEZ	TORRES
1.044.910.911	EDWIN	RODRIGUEZ	HERNANDEZ
7.693.002	CARLOS LEONARDO	DUSSAN	GARCIA
1.143.130.109	DEIVIS RICARDO	ZUÑIGA	CASTRO
8.706.660	JAVIER ENRIQUE	VELEZ	CAMARGO
1.123.991.100	JHORVIS JOVAN	DE LUQUE	ARIZA
72.340.503	JOSE GREGORIO	ATENCIO	SIERRA
72.215.192	LUIS ALBERTO	NUÑEZ	HERNANDEZ
1.140.828.816	MARYURIS DEL CARMEN	LOZANO	GARCIA
1.140.888.631	MELISSA	RAMIREZ	AHUMADA
1.083.020.901	ANDREA CAROLINA	MAIGUEL	RAMOS
1.129.572.070	EDER ENRIQUE	AGAMEZ	SALAS
1.098.648.986	DIANA MARCELA	DAZA	BECERRA

PROYECTO 7. PROYECTOS PRODUCTIVOS.

Este Proyecto no Aplica

4. TABLA DE INDICADORES

PROYECTO	INDICADOR (%)	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	
			SI	NO
PROGRAMA 6. PROGRAMA DE GESTION SOCIAL				
ATENCION A LA COMUNIDAD.	Número de quejas presentadas (0) / Número de quejas atendidas (0)	0/0*100= 100%	x	
INFORMACION YDIVULGACION	Número de reuniones informativas con las comunidades y autoridades locales realizadas (0) Número de reuniones informativas programadas (1)	0/0*100= 100%	X	
	Número de volantes informativos y/o convocatorias Entregadas (15) Número de	15/30*100= 50%	X	

MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PUBLICOS.	Número actas de vecindad realizadas en el tramo (0) / total predios objeto de acta de vecindad en el primer tramo (0)	0/0*100= 100%	X	
	(0) Total compromisos adquiridos/ (0) total compromisos cumplidos (0)	0/0*100= 100%	X	
RECUPERACION DEL DERECHO VIAL.	No aplica en este periodo.			
CULTURA VIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	No se realizó reunión con comité de Participación.	0/0*100= 100%	X	
	Número de talleres de sostenibilidad realizados (1) / número de talleres de sostenibilidad programados durante la ejecución de la obra (0)	1/1*100= 100%	X	
CONTRATACION DEMANO DE OBRA	Trabajadores contratados padres cabeza de familia (0) /	0/0*100= 100%	X	

Sur-norte Vía a La Playa
Email: resocialmallorquin@gmail.com

	mujeres cabeza de familia decentro de oportunidades (0)			
PROYECTOS PRODUCTIVOS	No aplica			

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Durante este periodo se llevaron a cabo actividades del Plan de Gestión Social, con el fin de minimizar los impactos que ocasionen las actividades constructivas del eco parque Mallorquín y que a la vez nos permite contribuir con la educación ambiental y emocional de la comunidad aledaña al proyecto Eco parque Mallorquín UF1.

ANEXOS

ANEXOS

PLAN DE GESTION SOCIAL

PROYECTO 1. DE ATENCION A LA COMUNIDAD.

- Seguimiento y cierre de queja: En este periodo no se realizaron reportes de quejas.

REGISTRO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD (PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS)										
NOMBREDELPROYECTO: ECOPARQUEMALLORQUIN UF1			CONTRATISTA: CONSORCIO JCO MALLORQUIN		DEPARTAMENTO: ATLANTICO				CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	
NÚMERO DEL CONTRATO: EDU- 561/2021			INTERVENTORÍA: INGPROYECTOS		CIUDAD MUNICIPIO: BARRANQUILLA					
FECHA DE RECIBO (DD-MM-AA)	NOMBRE PETICIONARIO	TELEFONO	TIPO DE PQRS	MOTIVO	MEDIO	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN TOMADA/SOLUCIÓN	FECHA DE SOLUCIÓN (DD-MM- AA)	EL PETICIONARIO MANIFIESTA SATISFACCIÓN	OBSERVACIONES

PROYECTO 2. INFORMACION Y DIVULGACION.

2.- Elaboración y distribución de las piezas de comunicación

- En este periodo solo se realizó y distribuyo un modelo de folleto donde se describe el avance de obra del mes de noviembre y parte del mes de diciembre a las comunidades del corregimiento La Playa y el barrio Las Flores. La distribución de este folleto se realizó en la fundación bocas de ceniza y parque principal de la zona de la Playita.

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	CONTROL DE VOLANTES Y COMUNICADOS	CÓDIGO: FAM-22 VERSIÓN: 1 FECHA: 05/02/12

PROYECTO: Ecoparque Mallorquin. Unidad funcional 1. FECHA: 02/12/22 - 19/12/22

LUGAR: "Barrio la playita "corregimiento la Playa. / Flores. TIPO DE VOLANTE: Informativo y de Avance.

No.	No. VOLANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FIRMA
1	03	Ramiro Echeverria	Cll 73 #6-110	---	
2	03	Urbano Carpio	calle 12 # 1-170	3243210579	
3	03	Luis David Padilla	cra 12 # 12-28	3052750935	
4	03	EVELYNE MEJIA	CALLE # 11-87	3043[illegible]3	EVELYNE M
5	03	Energio Echeverria	Cll 14 # 6-120	3043858288	
6	03	Jesus Tinete P.	Calle 20 # 10-90	327-336-745	
7	03	JAIRO ORTIZ	cll 74 # 10-40	---	
8	03	MOISES PUNTOJA	cra 10 # 4-20	2h68 9 7317	MOISES P.
9	03	Julian Pamplona	la Playa	3103411231	
10	03	Luis Castillo Fuentes	" "	3138103448	
11	03	Maria Jose Vargas Gom	Cra 10 # 4-20	320-389-5617	
12	03	Edward Moreno Villanueva		304 215 17 82	Edward M.V.
13	03	Eolesa Tebrat.	I.S. Boca de Ceniza	315 709 437	
14	03	JESUS PAVA LANIBILLA	CALLE 12 # 11-140 APTO	310 571-7916	JESUS P.L.
15	03	Andres Jaraba Diaz	Cra 14 # 20-47	3103224029	
16	03				
17	03				
18	03				
19	03				

OBSERVACIONES: Se Supendio la actividad de Volanteo debido a disturbios en el barrio las Flores.

CONSORCIO JCO MALLORQUIN
Sur-norte Vía a La Playa
Email: resocialmallorquin@gmail.com

PROYECTO 5. CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA: VER ANEXOS

2. Estructuración y desarrollo de Talleres Pedagógicos:

En este periodo se realizó solo una jornada de capacitación con énfasis didáctico titulado Biología y Cultura, esta se enfocó en enseñar a los carpinteros y ayudantes de obra a plantar correctamente los tipos de mangles en la Ciénaga de Mallorquín y las distintas formas de formar equipos de conciencia ambiental; Esta jornada tuvo especio en el campamento de la unidad funcional número uno.

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	LISTA DE ASISTENCIA	CODIGO:FAM VERSION:1 FECHA: 12/02/22

PROYECTO: ECOPARQUE MALLORQUIN UF1

LUGAR: CAMPAMENTO Uf1

FECHA: 09/12/22 HORA DE INCIO: 8:45 AM HORA FIN: 11:10AM


ASISTENTES


ASISTENTES Nombre	Cedula	N# celular	firma
[illegible]	12340503	3216565244	[illegible]
Carlos Fernando	12.623.242	3114008286	[illegible]
[illegible]	1143150109	3006344221	[illegible]
Julian Pamplona	1020875498	3103411231	Julian Pamplona
Energio Echeverria	3747881	3043858288	[illegible]
moises Pantoja	1044433.379	3128897397	moises Pant
[illegible]	1001916650	324-336-7475	[illegible]
Luis carlos Castilla	72433726	3138103448	[illegible]
Ronis Ramos	1007608013	3003952066	[illegible]
Madeleine	8.485.250	3017980846	Madeleine
Isabella Monterroza V	1005660047	3116986487	[illegible]

PROYECTO 6. CONTRATACION DE MANO DE OBRA.

1.- Inscripción de la empresa ante el centro de oportunidades

La empresa se encuentra inscrita en el centro de oportunidades y actualmente nos encontramos a la espera de los certificados que garantizan que nuestros trabajadores pertenecen al centro de oportunidades y fueron escogidos desde su punto de ofertas laborales.

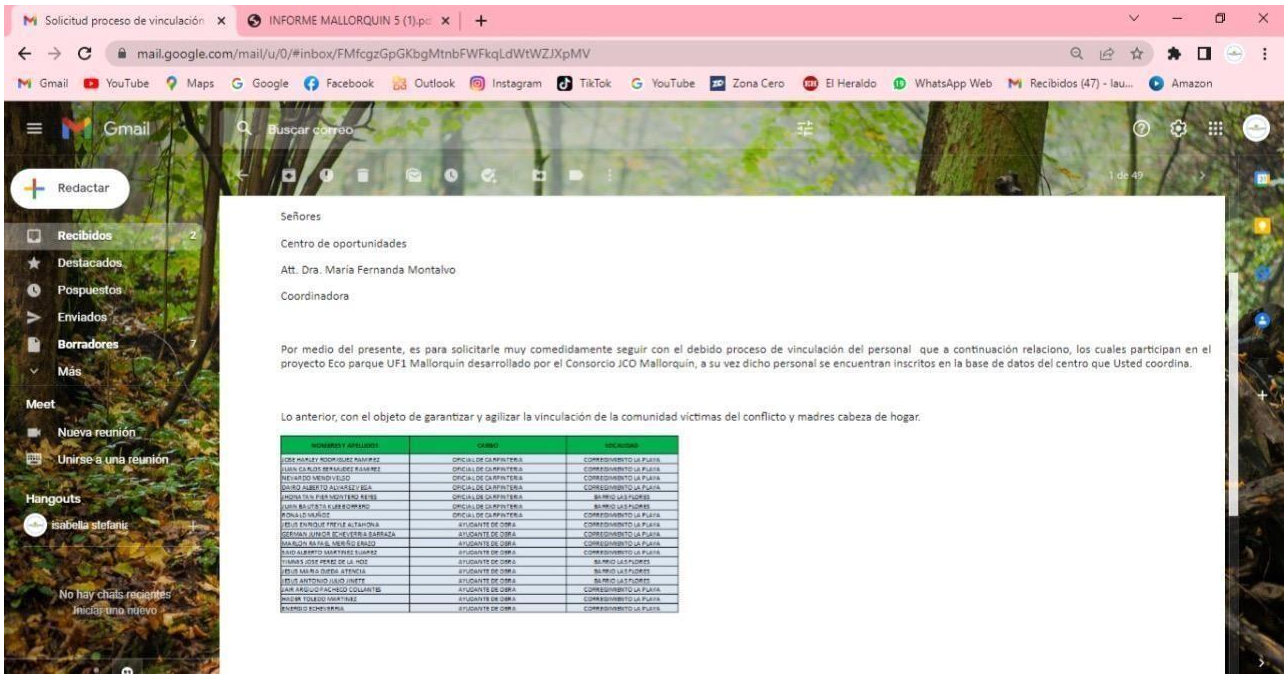

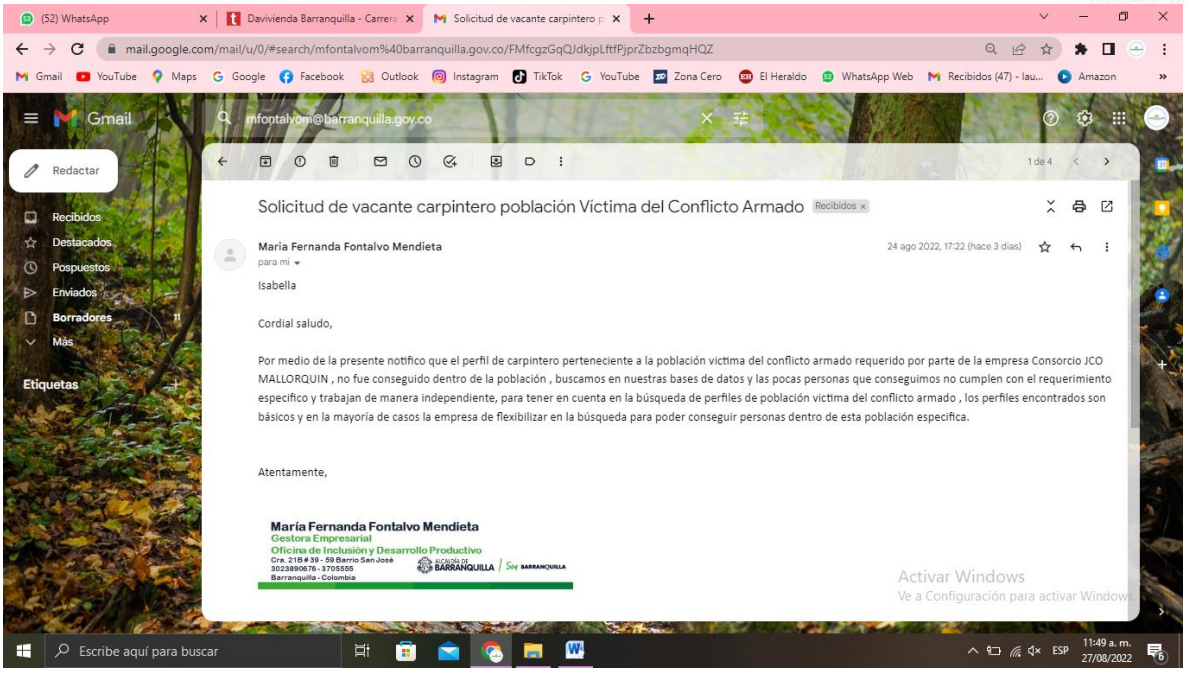
(52) WhatsApp
Davivienda Barranquilla - Carrera
Solicitud de vacante carpintero p
mail.google.com/mail/u/0/#search/mfontalvom%40barranquilla.gov.co/FMfcgzGqQJdkjpLftfPjprZbzbgmqHQZ
Gmail
YouTube
Maps
Google
Facebook
Outlook
Instagram
TikTok
YouTube
Zona Cero
El Heraldo
WhatsApp Web
Recibidos (47) - lau...
Amazon
Gmail
mfontalvom@barranquilla.gov.co
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más
Etiquetas
1 de 4
Solicitud de vacante carpintero población Víctima del Conflicto Armado
Recibidos
María Fernanda Fontalvo Mendieta
para mi
24 ago 2022, 17:22 (hace 3 días)
Isabella
Cordial saludo,
Por medio de la presente notifico que el perfil de carpintero perteneciente a la población victima del conflicto armado requerido por parte de la empresa Consorcio JCO MALLORQUIN , no fue conseguido dentro de la población , buscamos en nuestras bases de datos y las pocas personas que conseguimos no cumplen con el requerimiento especifico y trabajan de manera independiente, para tener en cuenta en la búsqueda de perfiles de población victima del conflicto armado , los perfiles encontrados son básicos y en la mayoría de casos la empresa de flexibilizar en la búsqueda para poder conseguir personas dentro de esta población especifica.
Atentamente,
María Fernanda Fontalvo Mendieta
Gestora Empresarial
Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo
Cra. 21B # 39 - 59 Barrio San José
3023890676 - 3705555
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Escribe aquí para buscar
ESP
11:49 a. m.
27/08/2022

INFORME GESTIÓN AMBIENTAL No. 12

Periodo: diciembre de 2022



Contrato de Obra No. EDU 561 – 2021

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

BARRANQUILLA, DICIEMBRE DE 2022

Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN 3
1. AVANCE DE OBRA 4
2. FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL 8
2.1. Ficha No. 1. Programa para el manejo de emisiones atmosféricas, material particulado y ruido. 8
2.2. FICHA No. 2. Programa para el manejo integral de residuos ordinarios, peligrosos y especiales 9
2.3. FICHA No. 3 Programa para el manejo de materiales de construcción 10
2.4. FICHA No. 4. Programa para el manejo de vertimientos y gestión del recurso hídrico 10
2.5. FICHA No. 5. Programa para el control de sedimentos y manejo del suelo 10
2.6. FICHA No. 6. Programa de señalización 11
2.7. FICHA No. 7. Programa para el manejo de la cobertura vegetal 11
2.8. FICHA No. 8. Programa para la protección de la flora 11
2.9. FICHA No. 9. Programa para la protección de la fauna acuática 12
2.10. FICHA No. 10. Programa para la protección de la fauna terrestre 12
3. INDICADORES 13
4. ESTADO DE PERMISOS 21

INTRODUCCIÓN

El presente informe describe las medidas ambientales y sociales implementadas durante la ejecución del proyecto **INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA,** en el periodo comprendido del mes de diciembre de 2022.

El Plan de Manejo Ambiental permite identificar los impactos y/ o afectaciones ambientales que conlleva el proyecto por la ejecución de las obras, además, permite definir las medidas ambientales a implementar para realizar los controles durante el desarrollo de las obras.


Conforme con el criterio de valoración de impactos, la fase de construcción del proyecto se clasifica como "**irrelevante**". Esto indica que la acción moderada sobre el área permite desarrollar el proyecto, dado que son terrenos planos, intervenidos. Si bien es cierto que en la zona existen ya puertos fluviales aguas arriba, para el área de estudio sería la primera intervención directa sobre la ribera de La Ciénaga de Mallorquín, sin embargo, se destacan algunas acciones dentro del proceso constructivo y algunos factores ambientales que presentaran una intervención severa como producto de los impactos generados por el proyecto.

Entre los factores ambientales que sufrieron impactos estaría los suelos, aire y cuerpos de agua como receptor de sedimentos (calidad) que, a su vez, producen los cambios de concentración local con la consecuente contaminación. La disminución de la cobertura vegetal por el aprovechamiento forestal o la posible fragmentación que debe hacerse; las expectativas en la comunidad sobre este tipo de proyectos, lo que genera un conflicto con aquellas personas desinformadas o que no hacen parte de alguna organización o en defecto, las que hacen parte de las mismas, por tanto, el manejo de comunidades es importante y de especial atención en cada fase del proyecto; la calidad del aire.

1. AVANCE DE OBRA



Pasarela y Ciclo Ruta:

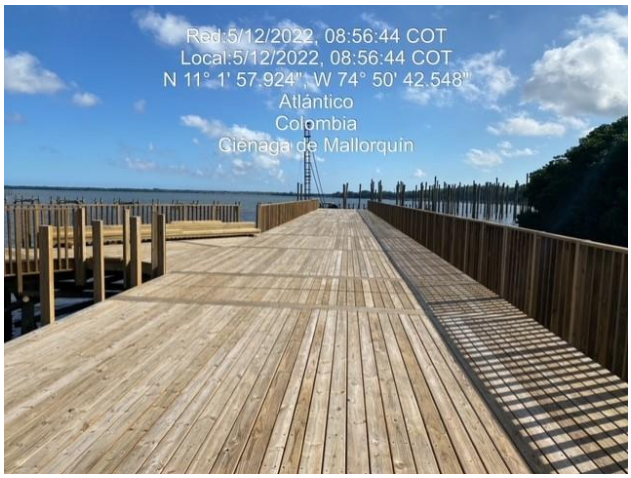












Estación III:

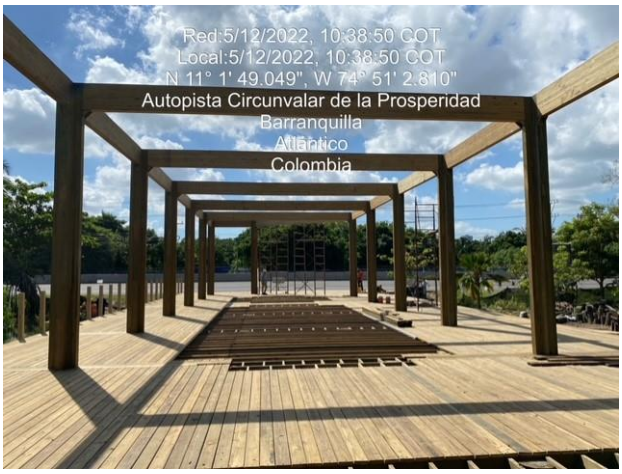



Equipamiento deportivo y Muelle:










Galería de Playa y Contemplación:







Pasarela:



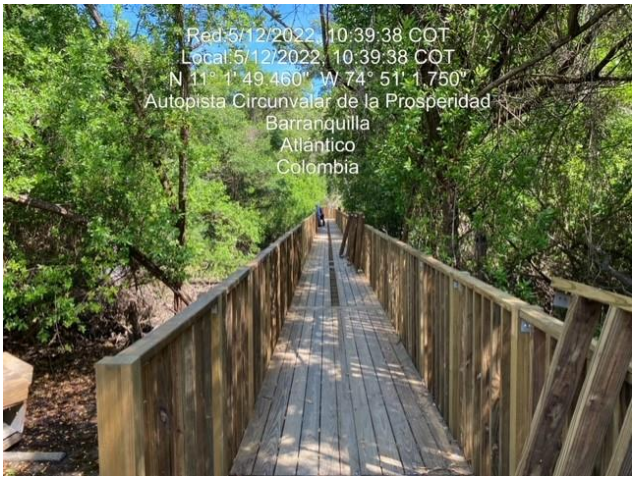

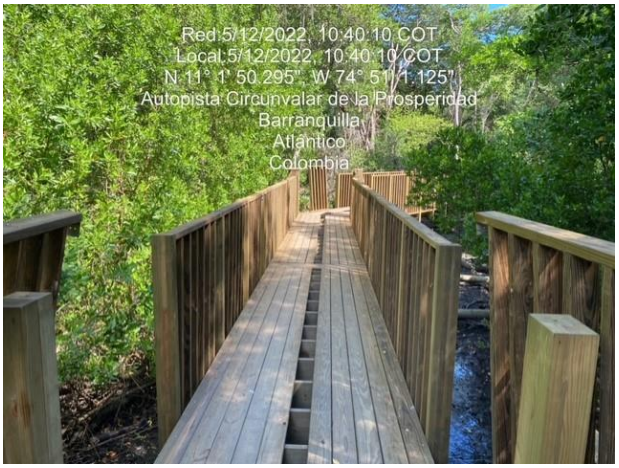

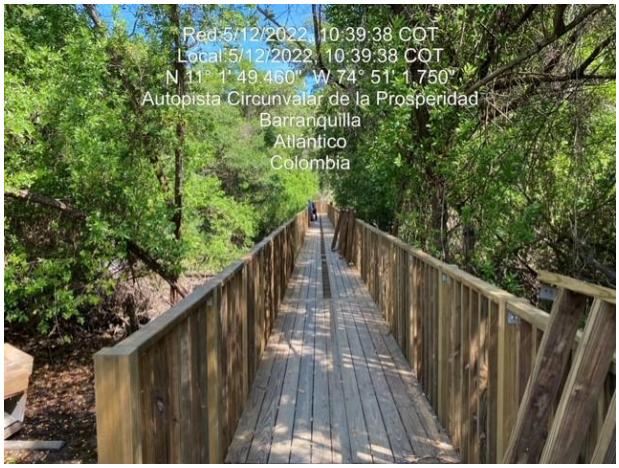

2. FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL

2.1. Ficha No. 1. Programa para el manejo de emisiones atmosféricas, material particulado y ruido.

PROGRAMA DEL MEDIO ABIOTICO	FICHA No. 1
Programa para el manejo de emisiones atmosféricas, material particulado y ruido	**Cod: FMA-1**
MEDIDAS DE MANEJO IMPLEMENTADAS	

MEDIDAS DE MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO

- En el periodo no existieron acopios de materiales granulares ni RCD, solo se acopio la madera, actividad registrada en el formato FAM-01 INSPECCIÓN DE ACOPIO DE MATERIALES. **Ver anexo 1**.
- Se generó Residuos de Construcción y Demolición RCD, desechos reutilizados en las labores constructivas, actividad registrada en los formatos FAM-04 REGISTRO DIARIO POR VOLQUETA y FAM-07 BALANCE CONSOLIDADO DE RESIDUOS DÍA A DÍA. **Ver anexos 2 y 3.**

Tipo de residuo	Cantidad Kg/m3/Gal
Madera	33

- No se requiere el control de velocidad de los vehículos ya que en los frentes de obras no vías de circulación.
- No se usaron vehículos para el transporte (materiales que emitan partículas y RCD), ingrese y salga de la obra cubierto.
- No se realizó humectación, ya que no existen vías de circulación y/o áreas desprovistas de acabados, actividad registrada en el formato FAM-06 HUMECTACIÓN. **Ver anexo 4.**
- No es necesarios instalar cerramiento perimetral de mínimo 2m con tela polimérica o poli sombra, no existen vectores que dispersan material particulado.
- A diario se Inspeccionan los accesos del proyecto para verificar que no se están esparciendo sedimentos ni polvo en las zonas externas de la construcción. Actividad registrada en el formato FAM-36 INSPECCIÓN DE VÍAS. **Ver anexo 5**.
- No se ha realizado limpieza de la vía exterior de la obra, no hay fuga de material.
- El horario de la jornada es de 8:00 a.m a 12:00 m y de 1:00 p.m a 5:00 p.m esto con el objeto de emitir emisiones en horario nocturno, no obstante, no existen comunidad aledaña a los frentes de obra.
- El personal que opera equipos y maquinaria que genera ruido, utiliza los elementos de protección personal definidos en la Matriz de EPP.
- No se han registrado quejas por ruido.

2.2. FICHA No. 2. Programa para el manejo integral de residuos ordinarios, peligrosos y especiales

PROGRAMA DEL MEDIO ABIOTICO	FICHA No. 2
Programa para el manejo integral de residuos ordinarios, peligrosos y especiales	**Cod: FMA-2**
MEDIDAS DE MANEJO IMPLEMENTADAS	

Se dictaron charlas y capacitaciones al personal del proyecto, en los siguientes temas: **Ver anexo 6**

- Emisiones atmosféricas
- Manejo a sustancias químicas.
- RESPEL
- Plan de Manejo Ambiental PMA
- Protección a la fauna y flora.
- Manejo de residuos sólidos y líquidos.
- Sanciones ambientales.

En el periodo no hubo generación de residuos provenientes de mantenimientos de maquinaria o de derrames de sustancias químicas. **Ver anexo 7** FAM-15 GENERACIÓN DE RESIDUOS PROVENIENTES DE ACEITES USADOS.

Residuos Generados:

- Aceites usados: 0 Gal.
- Filtros de aceites: 0 Kg.
- Residuos contaminados: 0 Kg.

Se instalaron tres (3) baños, dos (2) en la zona de las oficinas y uno en el frente de obra denominado tierra firma, suministrado por la empresa SAKATECH, **ver anexo 8 CERTIFICADO.**







Se instalaron los puntos ecológicos, uno en el área de las oficinas y campamentos y uno en el frente denominado Tierra Firme.



Almacén y oficinas



Frente de obra Tierra Firme

2.3. FICHA No. 3 Programa para el manejo de materiales de construcción

PROGRAMA DEL MEDIO ABIOTICO	FICHA No. 3
Programa para el manejo de materiales de construcción	**Cod: FMA-3**
MEDIDAS DE MANEJO IMPLEMENTADAS	
• Se mantienen disponibles las licencias y permisos de explotación minera de todos los proveedores que suministren materiales pétreos a la obra, según anexo 07 PROVEEDORES DE MATERIALES Y OTROS SERVICIOS del PMA. • No se ubicaron los acopios de madera sobre zonas verdes. • Las áreas de almacenamiento cuentan con un acceso seguro y señalizado. • No se preparó mezclas directamente sobre el suelo o sobre superficies acabadas. • No almacenamiento de cemento. • No hubo elaboración de concreto premezclado.	

2.4. FICHA No. 4. Programa para el manejo de vertimientos y gestión del recurso hídrico

PROGRAMA DEL MEDIO ABIOTICO	FICHA No. 4
Programa para el manejo de vertimientos y gestión del recurso hídrico	**Cod: FMA- 4**
MEDIDAS DE MANEJO IMPLEMENTADAS	
• Diariamente se realizan jornadas de orden, aseo y limpieza • En las actividades de hincado de pilotes no se usan barreras o membranas de contención de sedimentos o turbiedad con el fin de aislar la zona de hincado de los pilotes del resto del cuerpo de agua, ya que no se genera ningún tipo de sedimento • No se requiere instalar geomembranas en zonas desprotegidas que puedan tener contacto con el cuerpo de agua, pues, la actividad de hincado se realiza por medio de una balsa, esta no permite el contacto al suelo. • En el periodo no se colocó concretos. • En el periodo no hubo consumo de agua para las actividades de obra. • No se mezclaron las Aguas Lluvias, Aguas Residuales Domésticas (ARD) y Aguas Residuales no Domésticas (ARnD) • Se evitó el vertimiento de residuos y/o desperdicios sólidos u oleosos directamente en causes de agua o sumideros.	

2.5. FICHA No. 5. Programa para el control de sedimentos y manejo del suelo

PROGRAMA DEL MEDIO ABIOTICO	FICHA No. 5
Programa para el control de sedimentos y manejo del suelo	**Cod: FMA-5**
MEDIDAS DE MANEJO IMPLEMENTADAS	
En el periodo no se ha realizado descapote de la cobertura vegetal, por consiguiente, no se generaron residuos de construcción y demolición RCD. Se realizó trazado y replanteo en tierra y sobre la ciénaga, Solo se ejecutarán excavaciones que posean secciones, diseños específicos o planeación por parte de la interventoría de obra, esto con el fin de evitar corte en áreas destinadas a la conservación. No se van a utilizar durante la etapa de construcción en las actividades de hincado de pilotes barreras o membranas de contención de sedimentos o turbiedad con el fin de aislar la zona de hincado de los pilotes del resto del cuerpo de agua para evitar posible incremento de sedimentos o alteración de sus características fisicoquímicas, ya que el proceso no genera residuos sólidos ni líquidos.	

2.6. FICHA No. 6. Programa de señalización

PROGRAMA DEL MEDIO ABIOTICO	FICHA No. 6
Programa de señalización	**Cod: FMA-6**
MEDIDAS DE MANEJO A IMPLEMENTAR	
No se requiere instalar cerramiento en todas las áreas de trabajo, demarcando completamente el sitio de la obra con cinta de señalización de mínimo 12 cm de ancho con franjas amarillas y negras, ya que los dos frentes de obra están aislados por barreras vivas, unas por vegetación y la otra por el cuerpo de agua de la Ciénaga de Mallorquín. No obstante, se demarcan y señalizan las actividades de riesgo. Todos los elementos utilizados en la demarcación de la obra se encuentran limpios y bien colocados, diariamente se inspeccionan y se les realiza mantenimiento. En el transcurso del periodo no se realizaron excavaciones. A la fecha no se han establecidos senderos peatonales de mínimo de un metro de ancho, con piso antideslizante, sin obstáculos y a un mismo nivel que impidan la fácil movilidad de los transeúntes. Los materiales ubicados en los frentes de obra se acordonaron dentro de la señalización del frente de obra y no obstaculizaron el tránsito vehicular y peatonal.	

2.7. FICHA No. 7. Programa para el manejo de la cobertura vegetal

PROGRAMA DEL MEDIO BIOTICO	FICHA No. 7
Programa para el manejo de la cobertura vegetal	**Cod: FMB-1**
MEDIDAS DE MANEJO IMPLEMENTADAS	
No hubo actividad en el periodo.	

2.8. FICHA No. 8. Programa para la protección de la flora

PROGRAMA DEL MEDIO BIOTICO	FICHA No. 8
Programa para la protección de la flora	**Cod: FMB-2**
MEDIDAS DE MANEJO IMPLEMENTADAS	
En el periodo se continuo con las actividades de pilotaje en el Ecosistema de Manglar, para lo cual se tomaron las siguientes medidas de protección: El proyecto fue diseñado para evitar la afectación a la cobertura de árboles de mangle, los accesos complementarios al ecoparque han sido dispuestos en zonas donde no se tiene especies vegetales. Está prohibida cualquier afectación al manglar en individuos y zonas diferentes a las señaladas por parte de las actividades de construcción. A la fecha no se ha reubicado algún individuo de manglar. Las actividades de construcción en el periodo, no afectó individuos de manglar.	

2.9. FICHA No. 9. Programa para la protección de la fauna acuática

PROGRAMA DEL MEDIO BIOTICO	FICHA No. 9
Programa para la protección de la fauna acuática	**Cod: FMBA-3**
MEDIDAS DE MANEJO IMPLEMENTADAS	
Se realizaron charlas de sensibilización a todo el personal participante del proyecto relacionado con temas inherentes al manejo y conservación del recurso hídrico e hidrobiológico. La localizaron los baños a más de 50 metros del cuerpo de agua.	

2.10. FICHA No. 10. Programa para la protección de la fauna terrestre

PROGRAMA DEL MEDIO BIOTICO	FICHA No. 10
Programa para la protección de la fauna terrestre	**Cod: FMB-4**
MEDIDAS DE MANEJO IMPLEMENTADAS	
MANEJO DE FAUNA • Se identificaron la existencia de fauna en el lote y de nidos en los árboles, que puedan ser impactados por el desarrollo de las actividades de obra. • Se mantiene la prohibición de maltrato, eliminación, tráfico o comercialización de especies animales. • A la fecha no se ha encontrado un animal muerto. • En las actividades de ahuyentamiento, no se capturó ningún animal.	

3. INDICADORES

PROGRAMA DEL MEDIO ABIOTICO					FICHA No. 1
Programa para el manejo de emisiones atmosféricas, material particulado y ruido					**Cod: FMA-1**
INDICADORES					
ACTIVIDAD (MEDIDA)	**INDICADOR CUMPLIMIENTO**	**INDICADOR DE EFECTIVIDAD**	**META DE INDICADOR CUMPLIMIENTO**	**META DE INDICADOR EFECTIVIDAD**	**ANÁLISIS DE RESULTADO**
Control de generación de Material Particulado	(N° de riegos realizados en vías / N° de riegos programados en vías) *100	N/A	≥90	N/A	No aplica este indicador, en el periodo no se intervino vía alguna.
Revisión y mantenimiento de vehículos y maquinaria del proyecto	(N° vehículos con revisión técnico-mecánica vigente / N° vehículos utilizados en el proyecto) *100	(N° vehículos con revisión técnico-mecánica aprobada / N° vehículos utilizados en el proyecto) *100	≥90 **1/1*100= 100%**	=100 **1/1*100= 100%**	Cumplido con la meta de los indicadores
	(N° de mantenimientos preventivos realizados / N° de mantenimientos preventivos programados) *100	N/A	≥90 **0/0*100= 100%**	N/A	Cumplido con la meta de indicador
Cumplimiento con los requerimientos ambientales de ruido	No. de quejas de ruido atendidas satisfactoriamente / Número de quejas recibidas x 100	N/A	≥90 **0/0*100=100%**	N/A	No se recepcionaron PQR

PROGRAMA DEL MEDIO ABIOTICO					FICHA No. 2
Programa para el manejo integral de residuos ordinarios, peligrosos y especiales					**Cod: FMA-2**
INDICADORES					
ACTIVIDAD (MEDIDA)	**INDICADOR CUMPLIMIENTO**	**INDICADOR DE EFECTIVIDAD**	**META DE INDICADOR CUMPLIMIENTO**	**META INDICADOR DE EFECTIVIDAD**	**ANÁLISIS DE RESULTADO**
Manejo de Residuos Sólidos Domésticos	(Capacitaciones ejecutadas /Capacitaciones programadas) * 100	N/A	≥90 **4/4*100=100%**	N/A	Cumplido

	(Capacitaciones en manejo de residuos de prevención Covid 19 ejecutadas /Capacitaciones en manejo de residuos de prevención Covid 19 programadas) * 100	N/A	≥90 **0/0*100=100%**	N/A	Cumplido
Manejo de Residuos Sólidos Domésticos	(Puntos ecológicos instalados / Puntos ecológicos proyectados a instalar) * 100	N/A	≥90 **2/2x100=0%**	N/A	Cumplido
	(Volumen de residuos reciclables donados o reutilizados / Volumen de residuos reciclables generados)*100	N/A	≥90 **0/0x100=100%**	N/A	No se generó residuos
	(Volumen de residuos sólidos especiales dispuestos adecuadamente / Volumen de residuos especiales generados) *100	N/A	≥90 **0/0x100=100%**	N/A	Cumplido
	(Volumen de residuos recolectados /Volumen de residuos generados)*100	N/A	=100% **0/0x100=100%**	N/A	No se generó residuos
	(Volumen de residuos entregados al gestor autorizado / Volumen de residuos generados) *100	N/A	=100% **0/0x100=100%**	N/A	No se generó residuos

	(Volumen de residuos peligrosos dispuestos / Volumen de residuos generados) * 100	N/A	≥90 **0/0x100=100%**	N/A	Cumplido

PROGRAMA DEL MEDIO ABIOTICO	**FICHA No. 3**
Programa para el manejo de materiales de construcción	**Cod: FMA-3**

INDICADORES

ACTIVIDAD (MEDIDA)	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	META DE INDICADOR CUMPLIMIENTO	META INDICADOR DE EFECTIVIDAD	ANÁLISIS DE RESULTADO
Manejo de materiales de construcción	(Volumen de material requerido a fuentes con licencia / Volumen de material utilizado) * 100	N/A	=100 **0/0x100=100%**	N/A	No se requirió
	(Área delimitada y señalizada para almacenamiento/ Área total a intervenir) * 100	N/A	≥90 **120/120= 120%**	N/A	Se cumple con el indicador
	(Volumen de material cubierto / Volumen total de material)	N/A	≥90 **0/0x100=100%**	N/A	No hubo material granular
Manejo de áreas de acopio	(Área adaptada para mantenimientos / Área destinada para mantenimientos) * 100	N/A	≥90 **0/0x100=100%**	N/A	No aplico en el periodo
	(Área adecuada con geomembrana / Área a intervenir) * 100	N/A	≥90 **0/0x100=100%**	N/A	No aplico en el periodo
	(Área revegetalizada / Área intervenida) * 100	N/A	≥90 **0/0x100=100%**	N/A	No aplico en el periodo

PROGRAMA DEL MEDIO ABIOTICO	FICHA No. 4
Programa para el manejo de vertimientos y gestión del recurso hídrico	**Cod: FMA- 4**

INDICADORES

ACTIVIDAD (MEDIDA)	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	META DE INDICADOR CUMPLIMIENTO	META INDICADOR DE EFECTIVIDAD	ANÁLISIS DE RESULTADO
Medidas para la gestión del recurso hídrico	(Número de capacitaciones sobre manejo de residuos y prevención de contaminación realizadas/ Número de capacitaciones sobre manejo de residuos y prevención de contaminación programadas) *100	N/A	≥90 **1/1x100= 100%**	N/A	
	(Volumen de residuos que son recolectados y dispuestos / Volumen de residuos que son generados) * 100	N/A	≥90 **0/0x100= 100%**	N/A	Cumplido
Medidas para la gestión del recurso hídrico	(Número de inspecciones diarias realizadas durante la etapa de construcción/ Número de inspecciones diarias programadas durante la etapa de construcción) *100	N/A	≥90 **8/8x100= 100%**	N/A	Se cumple
	(Número de mantenimientos realizados en las ocupaciones/ Número de mantenimientos programados en las ocupaciones) *100	N/A	≥90 **0/0x100= 100%**	N/A	No aplica
	(Longitud de taludes protegidos geotécnicamente) / (Longitud de taludes de más de 30% de pendiente) * 100	(Longitud de taludes protegidos geotécnicam e nte) / (Longitud de taludes recuperados y sin problemas de estabilidad) x 100	≥90 **0/0x100= 100%**	N/A	No aplica
Manejo de Residuos Líquidos Domésticos	(Volumen de aguas residuales domésticas generadas / Volumen de agua residual dispuesta) * 100	N/A	=100 **2.2/2.2x100=100%**	N/A	Se ha generado aguas residuales provenientes de baños
	(Baños portátiles con mantenimiento y registro / Baños portátiles instalados) * 100	N/A	=100 **0/0x100= 100%**	N/A	No aplica
	(Volumen de residuos líquidos generados / Volumen de residuos líquidos recolectados) * 100	N/A	=100 **2.2/2.2x100=100%**	N/A	Se ha generado aguas residuales provenientes de baños

Manejo de Residuos Líquidos Industriales	(Volumen de residuos líquidos etiquetados / Volumen de residuos líquidos generados) * 100	N/A	=100 **0/0x100= 100%**	N/A	No aplica
Acciones generales	(Número de kits instalados / Número de puntos de almacenamiento de sustancias) * 100	N/A	≥90 **0/0x100= 100%**	N/A	No aplica

PROGRAMA DEL MEDIO ABIOTICO	**FICHA No. 5**
Programa para el control de sedimentos y manejo del suelo	**Cod: FMA-5**

INDICADORES

ACTIVIDAD (MEDIDA)	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	META DE INDICADOR CUMPLIMIENTO	META INDICADOR DE EFECTIVIDAD	ANÁLISIS DE RESULTADO
Instalación de geomallas	(m2 de geomalla instalados / m2 de terreno a reforzar) * 100	N/A	≥90	N/A	**No aplica No se generan residuos sólidos ni líquidos**
Instalación de barreras anti-turbidez	(número de barreras instaladas / número total de berreras a instalar) * 100	N/A	≥90	N/A	**No aplica No se generan residuos sólidos ni líquidos**
Manejo y disposición de material sobrante de descapote y excavaciones	(Volumen de residuos peligrosos dispuestos / Volumen de residuos generados) * 100	N/A	≥90 **0/0x100= 100%**	N/A	Se generó producto de mantenimiento de camión y recolección de derrame de sustancia química
Manejo y disposición de material sobrante de descapote y excavaciones	(Volumen de residuos peligrosos dispuestos / Volumen de residuos generados) * 100	N/A	≥90 **0/0x100= 100%**	N/A	Se generó producto de mantenimiento de camión y recolección de derrame de sustancia química

PROGRAMA DEL MEDIO ABIOTICO	**FICHA No. 6**
Programa de señalización	**Cod: FMA-6**

INDICADORES

ACTIVIDAD (MEDIDA)	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	META DE INDICADOR CUMPLIMIENTO	META INDICADOR DE EFECTIVIDAD	ANÁLISIS DE RESULTADO

Instalación de señalizaciones	(número de señalización es requeridos / número de señalización instalado) * 100	N/A	100 **0/0x100= 100%**	N/A	Según necesidad
Mantenimiento de señalizaciones	(número de mantenimiento a señalización es requeridos / número de mantenimiento a señalización es programados) *100	N/A	100 **0/0x100= 100%**	N/A	Anual

PROGRAMA DEL MEDIO BIOTICO					**FICHA No. 7**
Programa para el manejo de la cobertura vegetal					**Cod: FMB-1**
INDICADORES					
ACTIVIDAD (MEDIDA)	**INDICADOR CUMPLIMIENTO**	**INDICADOR DE EFECTIVIDAD**	**META DE INDICADOR CUMPLIMIENTO**	**META INDICADOR DE EFECTIVIDAD**	**ANÁLISIS DE RESULTADO**
Capacitación del personal	(Personal capacitado/Personal contratado) x100	N/A	≥90 **43/43*100 %=100**	N/A	Se cumple con el indicador
Establecimiento y divulgación de procedimientos de manejo de flora	(Actividades de manejo de flora documentadas y divulgadas al personal / Actividades de manejo de flora	N/A	≥90 **1/1*100%=100%**	N/A	Se cumple con el indicador
Revegetalización	(Área de suelo revegetalizada / Área de suelo intervenida) * 100	N/A	≥90	N/A	No aplica en el periodo
Actividades preliminares de verificación	(Área intervenida / Área proyectada) * 100	N/A	≥90	N/A	**Aplica al final del proyecto**
	(Área en m2 señalizadas / Área en m2 intervenidas) *100	N/A	≥90 **120/120*100%=100**	N/A	Se cumple
	(No de capacitaciones realizadas/N° de capacitaciones programadas) * 100	N/A	≥90	N/A	Mensual
Manejo del descapote	(Volumen (m3) de suelo orgánico cubierto y regado / Volumen (m3) total de suelo orgánico removido)	N/A	≥90	N/A	**No aplica no hubo remoción de cobertura vegetal**
	(Volumen (m3) de suelo orgánico removido implementado en la reconformación final / Volumen (m3) total de suelo orgánico removido) * 100	N/A	≥90	N/A	**No aplica no hubo remoción de cobertura vegetal**

PROGRAMA DEL MEDIO BIOTICO					FICHA No. 8
Programa para la protección de la flora					**Cod: FMB-2**
INDICADORES					
ACTIVIDAD (MEDIDA)	**INDICADOR CUMPLIMIENTO**	**INDICADOR DE EFECTIVIDAD**	**META DE INDICADOR CUMPLIMIENTO**	**META INDICADOR DE EFECTIVIDAD**	**ANÁLISIS DE RESULTADO**
Manejo de flora	(Personal capacitado/Personal contratado) x100	N/A	≥90 **43/43x100=100%**	N/A	Cumplido
	((Área intervenida (ha)/ Área de diseño (ha)) x 100	N/A	≥90 **0/0x100=100%**	N/A	**No aplica no hubo remoción de cobertura vegetal**
Normas de protección para la Flora	Volumen de madera comprada /Volumen de madera certificada) x100	N/A	≥90 **0/0x100=100%**	N/A	**No aplica no hubo remoción de cobertura vegetal**

PROGRAMA DEL MEDIO BIOTICO					FICHA No. 9
Programa para la protección de la fauna acuática					**Cod: FMBA-3**
INDICADORES					
ACTIVIDAD (MEDIDA)	**INDICADOR CUMPLIMIENTO**	**INDICADOR DE EFECTIVIDAD**	**META DE INDICADOR CUMPLIMIENTO**	**META INDICADOR DE EFECTIVIDAD**	**ANÁLISIS DE RESULTADO**
Sensibilización ambiental	No. de charlas realizadas / No. de charlas programadas	N/A	≥90 **4/4x100=100%**	N/A	Mensual
Normas de protección de especies ícticas	N/A	(No. de personal infractor de normas / No. del personal capacitado en normas ambientales) x 100	N/A	≤10 **0/0x100=100%**	Mensual

PROGRAMA DEL MEDIO BIOTICO					FICHA No. 10
Programa para la protección de la fauna terrestre					**Cod: FMB-4**
INDICADORES					
ACTIVIDAD (MEDIDA)	**INDICADOR CUMPLIMIENTO**	**INDICADOR DE EFECTIVIDAD**	**META DE INDICADOR CUMPLIMIENTO**	**META INDICADOR DE EFECTIVIDAD**	**ANÁLISIS DE RESULTADO**
Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna	No. de jornadas de ahuyentamiento realizadas / No. de sitios proyectados a intervenir) x 100	N/A **0/0*100%=100**	≥90 **0/0*100%=100**	N/A	Cada vez que se realice una nueva intervención **Se cumple con el indicativo**

Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna	N/A	(Riqueza y/o Abundancia relativa registrada posterior al ahuyentamient o y rescate / Riqueza y/o Abundancia relativa registrada durante el ahuyentamient o y rescate en los sitios de intervención) x 100	N/A	Ahuyentar mínimo el 80% de la fauna presente en el área **209/209*100%=100**	Cada vez que se realice una nueva intervención **Se cumple con el indicativo**
Señalización y control en las vías	(No. de sitios señalizados sobre pasos de fauna / No. de sitios detectados como críticos por riesgo de atropellamiento) x 100	N/A	≥90	N/A	Diario **No aplica. En los frentes de obra no existen sitios de riesgo de atropellamiento**
	N/A	(No. de eventos de atropellamiento de fauna silvestre / No. de eventos de observación de fauna por conductores) x 100	N/A	≥10	Eventos **No aplica. En los frentes de obra no existen sitios de riesgo de atropellamiento**
Normas de protección de fauna silvestre	(No. de señales instaladas / No. de señales programadas de prohibición de caza) x 100	N/A	≥90	N/A	Inicio de la etapa de construcción **No aplica. Se usa vigilancia privada**
	N/A	No. de personal infractor de normas / No. del personal capacitado en normas ambientales) x 100	N/A	≥10 **0/0*100%=100**	Según necesidad **No se ha generado la necesidad**
Sensibilización ambiental	(No. de trabajadores en charlas ambientales / No. total, de trabajadores de la actividad a desarrollar) x 100	N/A	≥70 **32/32*100%=100**	N/A	Semestral
	N/A	(No. de encuestas con compresión y/o apropiación hacia la conservación de la fauna silvestre / No. de encuestas realizadas de las actividades de sensibilización) x 100	N/A	≥70	Semestral **A la fecha no aplica**

4. ESTADO DE PERMISOS

ESTADO PERMISOS PROYECTO ECOPARQUE UF1 CIÉNAGA DE MALLORQUÍN					
DESCRIPCIÓN	**ENTIDAD QUE LO EMITE**	**ESTADO DE SOLICITUD O PERMISO**			**RESPONSABLE**
		radicado / permiso	**fecha de radicado**	**estado actual**	
Concesión del área para desarrollar el proyecto	DIMAR	Res 0041-2021	FEB/26/2021	Aprobado	ALACALDÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Aprueba Programa de Antropología	ICAH	Res 452	ABR/20/2021	Aprobado	PUERTA DE ORO
Viabilidad ambiental del proyecto	CRA	Res 257	MAY/25/2021	Aprobado	PUERTA DE ORO
Plan de Manejo de Tránsito	Movilidad	EXT-QUILLA-21-166521		En trámite	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
Permiso intervención de vía	ANI			En trámite	EDUBAR
Entrega lote Parqueadero	EDUBAR			Pendiente	EDUBAR
Permiso ocupación de cuace	CRA	Res 641-2021	NOV/22/2021	Aprobado	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
Inscripción a CONSORCIO JCO MALLORQUÍN como genrador de Residuos de Construcción y Demolición RCD	QUILLA VERDE	Res 3085-2021	NOV/08/2021	Aprobado	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
Evaluación Plan de Manejo Ambiental PMA	QUILLA VERDE	RAD21717	SEP/30/2021	En trámite	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
Aprovechamiento forestal (TALA)	CRA	Auto 737-2021	DIC/18/2021	Admite solicitud, se cumple con requisitos de ley	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
Permiso de rescate de fauna	CRA	Comunicado 005417	OCT/19/2021	El proyecto no requiere permiso	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
Plan de Gestión del Riesgo	INTERVENTORÍA OFICNA DE RIESGO DEL DISTRITO	JCO-006-2021	SEP/02/2021	Acogiendo observaciones de Interventoría	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

Anexo 1

FAM-01 INSPECCIÓN DE ACOPIO DE MATERIALES

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	**INSPECCIÓN DE ACOPIOS DE MATERIALES**	CÓDIGO: FAM-01 VERSIÓN: 1 FECHA: 06/02/12

PROYECTO: Intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos ECOPARQUE UF1 distrito familiar en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín en la ciudad de Barranquilla.

PERÍODO: DICIEMBRE DE 2022

FECHA	UBICACIÓN	INSPECCIÓN	TIPO DE MATERIAL	VOL. APROX. M^3/UND	CONTENEDOR METÁLICO		CONFINADO		CANALES PERIMETRALES		CUBIERTO		SEÑALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
dic-01	Frente casa Argos -Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera Pilote 10tx40	15		X		X		X		X	X		
dic-02	Frente casa Argos -Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera Pilote 10tx35	33		X		X		X		X	X		
dic-03	Frente casa Argos -Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera Pilote 10tx45	36		X		X		X		X	X		
dic-04	Frente casa Argos -Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera Pilote 10tx55	48		X		X		X		X	X		
dic-05	Frente casa Argos -Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera Pilote 8tx40	91		X		X		X		X	X		
dic-06	Frente casa Argos -Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera Pilote 8tx45	52		X		X		X		X	X		
dic-07	Frente casa Argos -Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera Pilote 8tx35	42		X		X		X		X	X		
dic-08	Frente casa Argos -Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera Pilote 6tx10	56		X		X		X		X	X		
dic-09	Frente casa Argos -Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 4x4x10	8		X		X		X		X	X		
dic-10	Frente casa Argos -Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 2x10x12	12		X		X		X		X	X		
dic-11	Frente casa Argos -Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 2x10x14	20		X		X		X		X	X		
dic-12	Frente casa Argos -Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 3x14x16	25		X		X		X		X	X		
dic-13	Frente casa Argos -Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 2x4x16	29		X		X		X		X	X		
dic-14	Frente casa Argos -Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 3x8x12	36		X		X		X		X	X		
dic-15	Frente casa Argos -Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 2x6x8	45		X		X		X		X	X		
dic-16	Frente casa Argos -Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 2x10x20	11		X		X		X		X	X		
dic-17	Frente casa Argos -Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 2x6x16	17		X		X		X		X	X		
dic-18	Frente casa Argos -Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 2x10x10	21		X		X		X		X	X		
dic-19	Frente casa Argos -Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 3x14x12	52		X		X		X		X	X		
dic-20	Frente casa Argos -Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 3x12x12	14		X		X		X		X	X		
dic-21	Frente casa Argos -Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 2x10x16	9		X		X		X		X	X		
dic-22	Frente casa Argos -Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 2x10x16	9		X		X		X		X	X		
dic-23	Frente casa Argos -Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 2x10x16	18		X		X		X		X	X		
dic-24	Frente casa Argos -Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 2x10x16	19		X		X		X		X	X		
dic-25	Frente casa Argos -Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 2x10x16	12		X		X		X		X	X		
dic-26	Frente casa Argos -Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 2x4x10	9		X		X		X		X	X		
dic-27	Frente casa Argos -Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 3x10x10	19		X		X		X		X	X		
dic-28	Frente casa Argos -Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 2x10x20	29		X		X		X		X	X		
dic-29	Frente casa Argos -Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 2x4x10	40		X		X		X		X	X		
dic-30	Frente casa Argos -Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 3x10x10	21		X		X		X		X	X		
dic-31	Frente casa Argos -Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 3x10x10	21		X		X		X		X	X		

NOMBRE:	Carlos Dussán García
CARGO:	Residente Ambiental
ELABORÓ	

NOMBRE:	Carlos Dussán García
CARGO:	Residente Ambiental
REVISÓ	

NOMBRE:	Carlos Dussán García
CARGO:	Residente Ambiental
APROBÓ	

Anexo 2

FAM-04 REGISTRO DIARIO POR VOLQUETA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	REGISTRO DIARIO POR VOLQUETA	CÓDIGO: FAM-04
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 06/02/12

PROYECTO: Intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos ECOPARQUE UF1 distrito familiar en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín en la ciudad de Barranquilla.

PERÍODO: DICIEMBRE DE 2022

DATOS GENERALES

PLACA VOLQUETA: _____ PROPIETARIO: _____

NOMBRE CONDUCTOR: _____ TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: DIESEL - ACPM: ☐ GASOLINA: ☐

VENCIMIENTO DE REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE GASES: _____ VENCIMIENTO SOAT: _____ ALTURA TUBO DE ESCAPE: _____

FECHA	No. RECIBO	ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA	VOLÚMEN (M^3)	TIPO DE MATERIAL	PUNTO DE CARGA	HORA SALIDA DE OBRA	HORA LLEGADA A ESCOMBRERA	CARPADO (30 CMS DEBAJO DEL NIVEL DEL PLATÓN)	ALTURA DE LLENADO A RAS	HORA DE RETORNO A OBRA	FIRMA RECIBIDOR DE OBRA	OBSERVACIONES
												NO HUBO ACTIVIDAD

NOMBRE:	Carlos Dussán García
CARGO:	Residente Ambiental
ELABORÓ	

NOMBRE:	Carlos Dussán García
CARGO:	Residente Ambiental
REVISÓ	

NOMBRE:	Carlos Dussán García
CARGO:	Residente Ambiental
APROBÓ	

Anexo 3

FAM-07 BALANCE CONSOLIDADO DE RESIDUOS DÍA A DÍA.

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	**BALANCE CONSOLIDADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DÍA A DÍA**	CÓDIGO: FAM-07
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 06/02/12

PROYECTO: Intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos ECOPARQUE UF1 distrito familiar en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín en la ciudad de Barranquilla.

PERÍODO: DICIEMBRE DE 2022

SEMANA	TIPO DE MATERIAL	PUNTO DE GENERACIÓN	VOLÚMEN GENERADO	FACTOR DE EXPANSIÓN	VOLÚMEN TOTAL (M^3)	VOLÚMEN RECICLADO	VOLÚMEN REUTILIZADO	VOLÚMEN DISPOSICIÓN FINAL
Del 1 al 6 de noviembre de 2022	MADERA	FRENTE DE OBRA	3	0	3	0	3	0
Del 7 al 13 de noviembre de 2022	MADERA	FRENTE DE OBRA	3,5	0	3,5	0	3,5	0
Del 14al 20 de noviembre de 2022	MADERA	FRENTE DE OBRA	4,2	0	4,2	0	4,2	0
Del 15 al 21 de noviembre de 2022	MADERA	FRENTE DE OBRA	3,6	0	3,6	0	3,6	0
Del 22 al 30 de noviembre de 2022	MADERA	FRENTE DE OBRA	3,3	0	3,3	0	3,3	0
Del 1 al 3 de diciembre de 2022	MADERA	FRENTE DE OBRA	6	0	6	0	6	0
Del 4 al 10 de diciembre de 2022	MADERA	FRENTE DE OBRA	12	0	12	0	12	0
Del 11 al 17 de diciembre de 2022	MADERA	FRENTE DE OBRA	6	0	6	0	6	0
Del 18 al 24 de diciembre de 2022	MADERA	FRENTE DE OBRA	4	0	4	0	4	0
Del 24 al 31 de diciembre de 2022	MADERA	FRENTE DE OBRA	5	0	5	0	5	0
		TOTAL	50,6		50,6		50,6	0

NOMBRE:	Carlos Dussán García
CARGO:	Residente Ambiental
ELABORÓ	

NOMBRE:	Carlos Dussán García
CARGO:	Residente Ambiental
REVISÓ	

NOMBRE:	Carlos Dussán García
CARGO:	Residente Ambiental
APROBÓ	

Anexo 4

FAM-06 HUMECTACIÓN

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	**HUMECTACIÓN**	CÓDIGO: FAM-06 VERSIÓN: 1 FECHA: 06/02/12

PROYECTO: Intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos ECOPARQUE UF1 distrito familiar en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín en la ciudad de Barranquilla.

PERÍODO: DICIEMBRE DE 2022

FECHA	TIPO DE MATERIAL	UBICACIÓN DE HUMECTACIÓN	ESTADO DEL TIEMPO	VOLÚMEN AGUA (LITROS)	TRAMO	ÁREA A HUMECTAR (M^2)	OBSERVACIONES
dic-01	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	No existen vías de acceso, salida, circulación y áreas desprovistas de acabados
dic-02	No hubo	No aplica	SECO	0	Campamento - Casa Argos	0	
dic-03	No hubo	No aplica	SECO	0	Campamento - Casa Argos	0	
dic-04	No hubo	No aplica	SECO	0	Campamento - Casa Argos	0	
dic-05	No hubo	No aplica	SECO	0	Campamento - Casa Argos	0	
dic-06	No hubo	No aplica	SECO	0	Campamento - Casa Argos	0	
dic-07	No hubo	No aplica	SECO	0	Campamento - Casa Argos	0	
dic-08	No hubo	No aplica	SECO	0	Campamento - Casa Argos	0	
dic-09	No hubo	No aplica	SECO	0	Campamento - Casa Argos	0	
dic-10	No hubo	No aplica	SECO	0	Campamento - Casa Argos	0	
dic-11	No hubo	No aplica	SECO	0	Campamento - Casa Argos	0	
dic-12	No hubo	No aplica	SECO	0	Campamento - Casa Argos	0	
dic-13	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	
dic-14	No hubo	No aplica	SECO	0	Campamento - Casa Argos	0	
dic-15	No hubo	No aplica	SECO	0	Campamento - Casa Argos	0	
dic-16	No hubo	No aplica	SECO	0	Campamento - Casa Argos	0	
dic-17	No hubo	No aplica	SECO	0	Campamento - Casa Argos	0	
dic-18	No hubo	No aplica	SECO	0	Campamento - Casa Argos	0	
dic-19	No hubo	No aplica	SECO	0	Campamento - Casa Argos	0	
dic-20	No hubo	No aplica	SECO	0	Campamento - Casa Argos	0	
dic-21	No hubo	No aplica	SECO	0	Campamento - Casa Argos	0	
dic-22	No hubo	No aplica	SECO	0	Campamento - Casa Argos	0	
dic-23	No hubo	No aplica	SECO	0	Campamento - Casa Argos	0	
dic-24	No hubo	No aplica	SECO	0	Campamento - Casa Argos	0	
dic-25	No hubo	No aplica	SECO	0	Campamento - Casa Argos	0	
dic-26	No hubo	No aplica	SECO	0	Campamento - Casa Argos	0	
dic-27	No hubo	No aplica	SECO	0	Campamento - Casa Argos	0	
dic-28	No hubo	No aplica	SECO	0	Campamento - Casa Argos	0	
dic-29	No hubo	No aplica	SECO	0	Campamento - Casa Argos	0	
dic-30	No hubo	No aplica	SECO	0	Campamento - Casa Argos	0	
dic-31	No hubo	No aplica	SECO	0	Campamento - Casa Argos	0	

NOMBRE:	Carlos Dussán García
CARGO:	Residente Ambiental
ELABORÓ	

NOMBRE:	Carlos Dussán García
CARGO:	Residente Ambiental
REVISÓ	

NOMBRE:	Carlos Dussán García
CARGO:	Residente Ambiental
APROBÓ	

Anexo 5

FAM-36 INSPECCIÓN DE VÍAS

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	**INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE VÍAS DE ACCESO Y SALIDAD DE OBRA**	CÓDIGO: FAM-36
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 17/03/15

PROYECTO: Intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos ECOPARQUE UF1 distrito familiar en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín en la ciudad de Barranquilla.

PERÍODO: DICIEMBRE DE 2022

ÉPOCA DE LLUVIA [x] ÉPOCA DE NO LLUVIA [ ] FECHA:

FECHA	FRENTE DE OBRA	UBICACIÓN SALIDA	PRESENCIA DE RESIDUOS POR LA OBRA		TIPO DE RESIDUO RECOLECTADO	VOLUMEN	TRAMO		DISTANCIA DE LIMPIEZA MTS	OBSERVACIONES
			SI	NO			desde	hasta		
dic-01	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
dic-02	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
dic-03	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
dic-04	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
dic-05	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
dic-06	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
dic-07	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
dic-08	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
dic-09	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
dic-10	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
dic-11	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
dic-12	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
dic-13	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
dic-14	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
dic-15	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
dic-16	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
dic-17	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
dic-18	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
dic-19	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
dic-20	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
dic-21	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
dic-22	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
dic-23	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
dic-24	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
dic-25	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
dic-26	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
dic-27	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
dic-28	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
dic-29	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
dic-30	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
dic-31	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	

NOMBRE:	Carlos Dussán García
CARGO:	Residente Ambiental
ELABORÓ	

NOMBRE:	Carlos Dussán García
CARGO:	Residente Ambiental
REVISÓ	

NOMBRE:	Carlos Dussán García
CARGO:	Residente Ambiental
APROBÓ	

Anexo 6

REGISTRO DE CAPACITACIONES

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	REGISTRO DE CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO	CÓDIGO: FRP - 02 VERSIÓN: 3 FECHA: 18/07/18

TEMA: EMISIONES AMBIENTALES Y EMISIONES ATMOSFERICAS

DOCENTE: ING. CARLOS BUSSAN FECHA: DIC/22/2022

LUGAR: FRENTE DE OBRA PÁGINA ____ DE ____

Nº	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FUE EFICAZ? SI	NO
1	LUIS BRANTAH	AYUDANTE		✓	
2	Dario Trigo Gonzales	Ayudante		✓	
3	Jose Alexis Sierra	operario		✓	
4	Pedro Ramos Martinez	Ayudante		✓	
5	Jaco Colo b	Ayudante		✓	
6	Luis Mendoza M	Ayudante		✓	
7	Diana Rosa Becerra.	Residente SST.		✓	
8	Pedro flores	conductor.		✓	
9	Enrique Echeverria Henry	Ayudante		✓	
10	MOISES PONTON	AYUDANTE		✓	
11	Geovanny orozco	Ayudante		✓	
12	[illegible]	[illegible]		✓	
13	Carlos perdomo.	Operador.		✓	
14	Luis Olga Perez	Ayudante		✓	
15	DIOMAR	AYUDANTE		✓	
16	Mauricio Bolivar	conserje		✓	
17	Jesus Julio Jurado	AYUDANTE		✓	
18	Oscar Daniel Mejia	Ayudante		✓	
19	Jose Heiler Rodriguez R	Oficial		✓	
20	VICTOR GONZALEZ	OFICIAL		✓	
21	Ricardo Mendivelso	Oficial		✓	
22	Orlando Torres S	Ayudante		✓	
23	Yader Toledo	ayudante		✓	
24	Carlos A Fernandez P	Almacenista		✓	
25	PEDRO POMPEYO S	MAESTRO		✓	
26	Arturo Albornoz E	Ayuda		✓	

OBSERVACIONES:

FIRMA DOCENTE

Powered by CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	REGISTRO DE CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO	CÓDIGO: FRP - 02 VERSIÓN: 3 FECHA: 18/07/18

TEMA: PROTECCIÓN FLORA Y FAUNA / DERRAME SUSTANCIAS QUÍMICAS.

DOCENTE: JUAN CARLOS BUSTAN FECHA: DIC / 16 / 2022

LUGAR: ALMACÉN / FRENTE DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

Nº	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FUE EFICAZ? SI	NO
1	Geovanny Orozco	Ayudante	Geovanny	X	
2	Onaris E torres S	ayudante		X	
3	Yoder Toledo	ayudante		X	
4	Ricardo Medrano	Oficial		X	
5	PEDRO SIMPSON S.	MAESTRO		X	
6	Luis Mendoza M	Ayuda		X	
7	VICTOR GONZALEZ	OFICIAL OFICIAL	VICTOR G	X	
8	Arturo Alban	Ayuda		X	
9	Pedro Flores	conductor		X	
10	Moises Restrepo	Ayudante	moises restrepo	X	
11	Jairo A. Fernandez	Almacenista		X	
12	Oraro Dario Bedoya	Residente SST.		X	
13	Eugenio Echeverria M	Ayudante		X	
14	Jairo Ortiz	Ayudante		X	
15	Carlos perlaza.	Operador.	Carlos Perlaza	X	
16	Oscar Daniel Mejia	Ayudante		X	
17	Jesus Julio Sinisterra	Ayudante		X	
18	Jose Hurley Rodriguez R	Oficial		X	
19	Luis Ayala II	Ayudante		X	
20	Jose Atencio Tierra	guarnicero		X	
21	Mauricio Rodriguez	conductor	Mauricio	X	
22	Jaider de la Rosa	Ayudante		X	
23	Isaac Colon b	Ayudante		X	
24	Nors Ramos Martinez	Ayudante		X	
25	Dario Arturo Carrillo	Ayudante	Dario Carrillo	X	
26	SIN FIRMA	AYUDANTE		X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DOCENTE

Powered by CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	REGISTRO DE CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO	CÓDIGO: FRP - 02 VERSIÓN: 3 FECHA: 18/07/18

TEMA: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS / P.M.A.

DOCENTE: INGº CARLOS DUSSAN FECHA: DIC/26/2022

LUGAR: FRENTE DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

Nº	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FUE EFICAZ? SI	NO
1	Diomedes	AYUDANTE		✓	
2	Anuar Abaunza G.	Ayud.		✓	
3	Geovanny Orozco	Ayudante	Geovany	✓	
4	Luis A. Nuñez H.	Ayudante		✓	
5	Carlos A. Fernandez P.	Almacenista		✓	
6	Omaris Estevez S.	Ayudante		✓	
7	Jorio Adrian Gonzalez	Ayudante		✓	
8	PEDRO PAMPLONA S.	MAESTRO		✓	
9	Jose Alberto Sierra	operario		✓	
10	Nader toledo	Ayudante	Nader	✓	
11	Pablo Ramos	Ayudante		✓	
12	Alfredo Medinilla	Oficial		✓	
13	Luis Mendoza M	ayudante		✓	
14	Jhoan Montoya	Ayudante		✓	
15	VICTOR GONZALEZ	OFICIAL	Victor G	✓	
16	Yenler de la Rosa	Ayudante		✓	
17	Diego Diaz Becerra	Residente SST.		✓	
18	Pedro Jose Novoa	conductor		✓	
19	Energio Echevarria	Ayudante		✓	
20	moises fontor	AYUDANTE	moises	✓	
21	Jairo Ortiz	"		✓	
22	Carlos perez.	Operador.	Carlos perez.	✓	
23	Mauricio Bohorquez	Consejo	Mauricio	✓	
24	Jose Hulio Rodriguez	OFICIAL		✓	
25	Jesus Julio Jimenez	AYUDANTE		✓	
26	Oscar Daniel Mejia	Ayudante	Oscar M.	✓	

OBSERVACIONES:

FIRMA DOCENTE

Powered by CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	REGISTRO DE CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO	CÓDIGO: FRP - 02
		VERSIÓN: 3
		FECHA: 18/07/18

TEMA: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y PELIGROSOS.

DOCENTE: ING. CARLOS DUSSAN FECHA: DIC/05/2022

LUGAR: FRENTE DE OBRA / ALMACÉN / ESTACIÓN III PÁGINA 1 DE 1

Nº	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FUE EFICAZ? SI	FUE EFICAZ? NO
1	Carlos Fernandez	Almacenista		✓	
2	Jose Plinio Flores	operario		✓	
3	Yader Toledo	Ayudante		✓	
4	VICTOR GONZALEZ	OFICIAL		✓	
5	Jaider de la Rosa	Ayudante		✓	
6	Oranc Dora Perez	Residente SST.		✓	
7	Pedro Flores	Conductor.		✓	
8	Energio Echeverria M	Ayudante		✓	
9	Ubio Alvaro Gamero	Ayudante		✓	
10	Carlos Perez.	Operador.		✓	
11				✓	
12	Leonardo Mendivelso	Oficial		✓	
13	PEDRO PAMPLONA S.	MAESTRO		✓	
14	Juan Colon B	ayudante		✓	
15	Jose Henry Rodriguez	OFICIAL		✓	
16	Jesus Julio Jimenez	AYUDANTE		✓	
17	Mauricio Bedoya	CONDUCTOR		✓	
18	Arturo Alburquerque	AYUDANTE		✓	
19	Pedro Ramos Martinez	Ayudante		✓	
20	D'Oneda	AYUDANTE		✓	
21	Jaime Ortiz	AYUDANTE		✓	
22	Moises Portella	AYUDANTE		✓	
23	Jairo Manrique M	Ayudante		✓	
24	Luis Niño H	AYUDANTE		✓	
25	Orlando Estevez S	ayudante		✓	
26	Geovanny Orozco	Ayudante		✓	

OBSERVACIONES:

FIRMA DOCENTE

Powered by CamScanner

Anexo 7

FAM-15 GENERACIÓN DE RESIDUOS PROVENIENTES DE ACEITES USADOS.

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	**GENERACIÓN DE RESIDUOS PROVENIENTES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, VEHÍCULOS Y/O MAQUINARIA**	CODIGO: FAM-15 VERSION: 1 FECHA: 06/02/12

PROYECTO: Intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos ECOPARQUE UF1 distrito familiar en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín en la ciudad de Barranquilla.

PERÍODO: DICIEMBRE DE 2022

TIPO DE RESIDUOS	CANTIDAD (Kg - Gal)	COLOR DE CANECA DISPUESTO	EMPRESA O ENTIDAD RECOLECTORA	OBSERVACIONES
	0			

NOMBRE:	Carlos Dussán García	
CARGO:	Residente Ambiental	
ELABORÓ		

NOMBRE:	Carlos Dussán García	
CARGO:	Residente Ambiental	
REVISÓ		

NOMBRE:	Carlos Dussán García	
CARGO:	Residente Ambiental	
APROBÓ		

Anexo 8

CERTIFICADO SAKATECH

SAKATECH

Barranquilla, 27 DICIEMBRE 2022

CERTIFICACIÓN

SAKATECH S.A.S. identificado con NIT 901.216.902-5, certifica que realiza TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL de aguas residuales provenientes de mantenimiento de baños portátiles a la empresa **CONSORCIO JCO MARLLORQUÍN** identificado con NIT 901.501.273-2 ubicado en la Ciénaga de Mallorquín.

SAKATECH S.A.S. cuenta con autorización otorgada por CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO (C.R.A.) bajo las RESOLUCIONES NO. 4189 del 19 de junio 2020. Se certifica que se recogió **dos punto dos 2.2 Metros cúbicos (m3) correspondiente a tres (3) baños portátiles del periodo de 1 DICIEMBRE – 27 DICIEMBRE de 2022.** La disposición final se realiza en la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de la empresa AGUACARIBE COLOMBIA S.A.S. E.S.P. identificado con NIT 901.231.847-0 ubicada en GALAPA.

Contamos con personal capacitado y equipos necesarios para el desarrollo de nuestras actividades.

Cordialmente,



Ing. Santiago Pérez Moscote
Gerente

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 012

CONTRATO DE OBRA Nª EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÒN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

DICIEMBRE DE 2022

Contenido

1. Introducción 3
2. Objetivos en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 4
3. Información Contractual 5
4. Localización del Proyecto 6
5. Actividades SISO. 7
5.1 Cronograma de actividades SST 7
5.2 Estadística Accidentalidad y Ausentismo 8
5.3 Capacitaciones realizadas. 8
5.4 Seguimiento a proveedores. 9
5.5 Afiliaciones al sistema de seguridad social: (ley 100) 9
5.6 Entrega, reposición y supervisión de elementos de protección personal y dotación 9
5.7 Inspecciones de seguridad 10
5.8 Inspecciones a instalaciones temporales: 10
5.9 Elementos básicos de atención a emergencia 10
5.10 Equipos en obra 11
4. Personal activo en obra: 11
5. Protocolo de Bioseguridad 12
6. Registros fotográficos: 12
7. Listado de anexos: 13

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

1. Introducción

Es el objetivo principal de la seguridad y salud en el trabajo, preservar, mantener y mejorar la salud de los trabajadores en su sitio de trabajo, mediante la realización de actividades de medicina preventiva, medicina del trabajo, de higiene y seguridad industrial.

En nuestro país la salud ocupacional estaba legislada desde 1979 en la ley 9a. En 1984 se emite el Decreto 614, el cual reglamenta la organización de la salud ocupacional en el país y en 1989 sale la Resolución 1016 donde se reglamenta la organización y funcionamiento de los Programas de Salud Ocupacional, posteriormente aparece la ley 1562 y pasa a ser sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en última instancia nace el decreto único reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015 y la resolución 1111 de 2017, derogada por la resolución 0312 de 2019.

El sistema de seguridad y salud en el trabajo consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.

2. Objetivos en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)

- Controlar los peligros y riesgos asociados con la gestión de la Unión del Consorcio JCO mallorquín, asegurando proveer lugares de trabajo libres de peligros a la salud y la seguridad,y tomar las medidas adecuadas para identificar y corregir todo tipo de peligros.

- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del SG SST

- Investigar la accidentalidad del personal, buscando promover la mejora de las condiciones de trabajo con el fin de proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores, prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo.

- Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales

- Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

3. Información Contractual

Contratante	Empresa de desarrollo urbano de barranquilla y la región Caribe S.A "EDUBARS.A."
Contratista	Consorcio JCO Mallorquín
Interventoría	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN
Objeto del contrato	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÒN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
Contrato No.	EDU-561-2021.
Valor del contrato	$82.464.264.620
Fecha de contrato	21 de Julio del 2021
Fecha de inicio	01 de Septiembre de 2021
Plazo de ejecución inicial	Hasta el 31 de Diciembre de 2021
Prorroga N° 1	Hasta el 30 de junio de 2022
Fecha de terminación actualizada	Hasta el 30 de abril de 2023

Tabla 1. Información general del contrato de obra.

4. Localización del Proyecto

La ciénaga de mallorquín está ubicada en su totalidad en el extremo norte del distrito de Barranquilla, sobre la margen izquierda de la desembocadura del río Magdalena (Bocas de Ceniza) en el Mar Caribe, en la Costa Caribe colombiana. A continuación, una ilustración que muestra la localización del área levantada:



Ilustración 1. Ubicación del proyecto Ecoparque Ciénaga Mallorquín – UF1 Distrito Familiar.

5. Actividades SISO.

5.1 Cronograma de actividades SST

Se realiza la inducción del personal en temas de seguridad y salud en el trabajo y demás capacitaciones según el cronograma de actividades programado, donde se demuestra el grado de compromiso de la empresa en actividades de capacitación, prevención y entrenamiento en cuanto a la seguridad y Salud en el Trabajo.

En el mes de DICIEMBRE se ejecutaron las actividades conforme al

cronograma. El siguiente informe corresponde desde el 1 de diciembre al 30 de diciembre de 2022.

ACTIVIDADES	FECHA	DICIEMBRE			
	PERIOCIDAD	1	2	3	4
Revisión de afiliaciones y pagos de seguridad social	Al ingresar un trabajador y mensualmente las planillas de seguridad social		C	C	C
Permisos de trabajo - ATS	Según su actividad		C	C	C
Inspecciones pre-Operacionales de maquinaria	Según su actividad		C	C	C

Tabla 2. Actividades

CONSORCIO JCO MALLORQUIN

5.2 Estadística Accidentalidad y Ausentismo

Se monitorean los indicadores de accidentalidad en el proyecto en ejecución, conforme a lo establecido por la normativa legal vigente, con el fin de crear las alertas necesarias para mitigar los riesgos inherentes a las actividades que se realizan a diario en obra y de esta manera evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

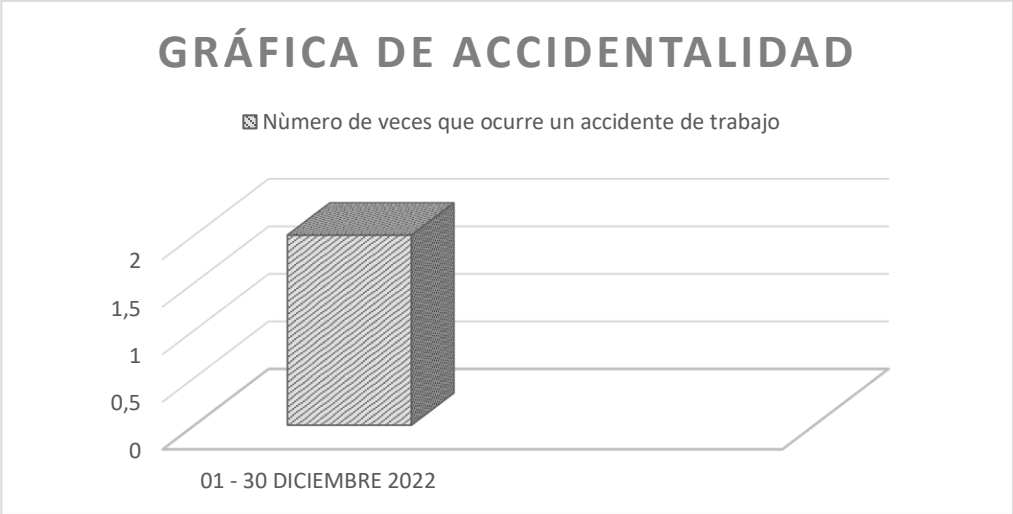


Ilustración 2. Grafica de accidentalidad.

En el periodo comprendido entre el 01 de DICIEMBRE y 30 de DICIEMBRE de 2022 se presentaron dos accidentes laborales.

Reporte No. 1:

Nombre y apellido del accidentado: Jairo Ortiz Loaiza

Fecha del accidente: 15 de diciembre del 2022

Hora del accidente: 3:00 pm

Lugar donde ocurrió el accidente: Frente de Tierra

Persona que reporta el accidente: Jairo Ortiz

Resumen de los hechos.

Yo Jairo Ortiz Loaiza se disponía a realizar la actividad de colocar el piso faltante de la pasarela a la hora de trasladar el tablón perdió el equilibrio y se cae recibiendo el peso en la mano izquierda ocasionando lesión en el dedo anular e inmediatamente se le realizo los primeros auxilios y se direcciono a la Clínica Porto Azul.

Nombre del Residente SST: Diana Daza Becerra

Anexo 1: *Lección Aprendida*

Anexo 2: *Socialización Lección Aprendida*

Reporte No. 2:

Nombre y apellido del accidentado: Luis Alberto Polo Echeverría

Fecha del accidente: 26 de diciembre del 2022

Hora del accidente: 10:30 am

Lugar donde ocurrió el accidente: Frente de Tierra

Persona que reporta el accidente: Luis Polo

Resumen de los hechos.

El día 26 de diciembre de 2022, el Sr. Luis Alberto Polo Echeverría siendo aproximadamente a las 10:30 am, se encontraba trasladando una baranda de madera y se le queda incrustado una astilla en el dedo meñique de la mano izquierda e inmediatamente se le realizo los primeros auxilios y se direcciono a la Clínica Porto Azul.

Nombre del Residente SST: Diana Daza Becerra

Anexo 1: *Lección Aprendida*

Anexo 2: *Socialización Lección Aprendida*

5.3 Capacitaciones realizadas.

Durante el mes de diciembre se realizaron charlas de seguridad por medio del personal SST, y trabajadores, en estas charlas se enfatizó mucho en el buen uso de los elementos de protección individual.

Fecha de capacitación	Tema de capacitación y charla	Nombre del capacitador	No. De asistentes

03 de diciembre de 2022	Mantenimiento de Herramientas Manuales	Diana Daza Becerra	14
06 de diciembre de 2022	Autocuidado	Diana Daza Becerra	15
07 de diciembre de 2022	Inducción	Diana Daza Becerra	3
10 de diciembre de 2022	Prevención del Riesgo Locativo	Diana Daza Becerra	5
13 de diciembre de 2022	Actos y Condiciones Inseguras	Diana Daza Becerra	17
17 de diciembre de 2022	Inducción	Diana Daza Becerra	4
17 de diciembre de 2022	Prevención del Riesgo Mecánico	Diana Daza Becerra	8
20 de diciembre de 2022	Manejo ante una Emergencia	Diana Daza Becerra	20
27 de diciembre de 2022	Manejo del Estrés Laboral	Diana Daza Becerra	9

Anexo 5: *Soporte Charlas.*
Soporte de inducción

5.4 Seguimiento a proveedores.

COSORCIO JCO MALLORQUIN en función de darle cumplimiento al alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, utiliza el ciclo PHVA para monitorear el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales de sus proveedores.

Se evidencia este requisito con las siguientes verificaciones;

- Recorridos de obra; verificación de condiciones de seguridad
- Verificación de pre operacionales a equipo.
- Revisión de la seguridad social.

5.5 Afiliaciones al sistema de seguridad social: (ley 100)

Antes de iniciar labores en la obra, se hacen las respectivas afiliaciones a la seguridad social a todo el personal.

Con el personal antiguo se verifican los pagos de las planillas de seguridad social garantizando que todos los trabajadores que pertenecen al proyecto estén vinculados al régimen de salud.

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

Anexo 3. *Seguridad Social CONSORCIO JCO MALLORQUIN Y SUBCONTRATISTAS.*

5.6 Entrega, reposición y supervisión de elementos de protección personal ydotación:

Se realiza entrega de los elementos de protección personal al personal que está en obra.

Se realiza las respectivas inspecciones de los elementos de protección personal y se verifican el estado y el uso de los trabajadores.

Anexo 4. *Entrega de dotación*

5.7 Inspecciones de seguridad:

Consorcio JCO MALLORQUIN, realizo en el mes de septiembre inspecciones de seguridad con el fin de identificar los peligros y condiciones existente de las maquinarias, con el fin de tomar medidas preventivas y correctivas durante la ejecución del proyecto, los respectivos formatos que se utilizaran para las respectivas inspecciones se están gestionando para proceder con el diligenciamiento de las mismas.

Dentro los procesos constructivos se realizan tareas de alto riesgo por medio de controles administrativos como ATS, pre operacionales y permisos de trabajo, se mitigan los riesgos que estos generan y se toman los controles que se determinen en estos.

Anexo 5. *Permisos de trabajo*

Anexo 5.1 *Inspecciones de equipos*

5.8 Inspecciones a instalaciones temporales:

Se realiza las adecuaciones en el área de campamento, se dotan cada oficina con los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades diarias.

En el área de campamento contamos con 3 oficinas portátiles las cuales están distribuidas de la siguiente manera.

- Oficina interventoría
- Oficina Consorcio Jco mallorquín
- Sala de juntas

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

5.9 Elementos básicos de atención a emergencia:

Consorcio JCO MALLORQUIN, contamos con los elementos adecuados para atender cualquier emergencia que se pueda presentar en el proyecto.

Contamos con 2 Camillas las cuales están ubicadas de la siguiente manera

1 ubicada en el frente de agua
1 ubicada en el frente de tierra

Contamos con 4 Botiquines los cuales están ubicados de la siguiente manera:
1 ubicado en la oficina
1 ubicados en el campamento
1 ubicado en el frente de agua
1 ubicado en el frente de tierra.

Contamos con 2 Extintores las cuales están ubicadas de la siguiente manera
1 ubicada en el frente de Tierra
1 ubicada en el frente de Agua

6. Equipos en obra

- Telehandler (1)
- Planta Eléctrica (6)
- Equipo de Oxicorte (1)
- Moto soldador (4)
- Piloteadoras o cabrias (3)
- Pulidoras (3)
- Taladros (4)
- Sierra Circular (1)
- Escalera (1)

8. Personal activo en obra:

Se relaciona el personal que está activo en el periodo correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2022, que se encuentra en los diferentes frentes de trabajo en ejecución de actividades, y personal administrativo de CONSORCIO JCO MALLORQUIN.

ITEM	PERSONAL	CANT.
1	DIRECTOR DE OBRA	1
2	RESIDENTE ADMINISTRATIVA	1
3	INGENIERO RESIDENTE	1
4	RESIDENTE SST	1
5	ING. RESIDENTE AMBIENTAL	1
6	ALMACENISTA	1
7	CONTROL DE ACCESOS	2
8	CONDUCTOR	1
9	TRABAJADORA SOCIAL	1
	TOTAL	**10**

Tabla 3. Personal del Consorcio JCO mallorquín

ITEM	CONTRATISTAS	TOTAL
1	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	39

2	JAMAQ	1
3	SERVINTEGRALES	2
4	DE LA CRUZ TOPOGRAFIA	2
5	CUADRILLA ELECTRICA	2
	TOTAL	**46**

Tabla 4. Personal general en obra

Anexo 6. *Base de datos del personal en obra*

8. Protocolo de Bioseguridad:

Consorcio JCO MALLORQUIN, realizo en el mes de septiembre seguimiento al buen uso de los elementos de bioseguridad (Mascarillas).

9. COPASST.

En este periodo se conformó el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y se realizó la reunión correspondiente con los representantes de cada una de las partes. Se anexa el acta de reunión correspondiente al periodo de diciembre del 2022.

10. Registros fotográficos:





Jornada de Salud







Capacitaciones al personal de obra

11. **Listado de anexos:**

Anexo 1*. Capacitaciones*

Anexo 2*. Seguridad social Consorcio JCO MALLORQUIN Y SUBCONTRATISTAS*

Anexo 3*. Entrega y Reposición de Epp*

Anexo 4*. Permiso de trabajo*

Anexo 4.1. *Inspecciones*

Anexo 5*. Reunión del COPASST*

DIANA DAZA BECERRA
RESIDENTE SST
CONSORCIO JCO MALLORQUIN

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

ACTA N. ª: 1	FECHA: 16 diciembre 2022
HORA INICIO: 2:00 pm	HORA FIN:
TEMAS TRATADOS: FIESTA DE FIN DE AÑO Juegos Materiales Presupuesto	
TAREAS PENDIENTES - Comprar Almuerzos - Comprar Bebidas - Comprar Pasabocas - Equipo de Sonido	RESPONSABLES - Melissa Ramírez - Isabella Monterroza - Jhorvis de Luque - Javier Vélez - Diana Daza Becerra

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

REUNION DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

OBRA CONSORCIO JCO MALLORQUÍN.

ACTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

OBJETIVO:

Realizar seguimiento a la ejecución de los programas de Seguridad y Salud En El Trabajo y seguimiento al reporte de inconformidades realizadas por los trabajadores.

Hora: 10:00 am Fecha: Diciembre 16 de 2022.

En las instalaciones "CAMPAMENTO" de la obra CONSORCIO JCO MALLORQUÍN a los 16 días del mes de diciembre se reunieron los integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo para tratar el siguiente orden del día:

1 LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DE ASISTENCIA.

Se llama a lista a los integrantes de COPASST:

REPRESENTANTES DEL EMPEADOR.

- *Diana Daza Becerra: Analista del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo.*

REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES.

- *José Contreras Monterroza:(Principal)*
- *José Atencio Sierra: (Suplente)*

2 CONSIDERACION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

Se sometió a consideración el siguiente orden del día para su aprobación:

- *APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.*
- *REPORTE DE INCIDENTES DEL PERIODO DICIEMBRE 2022*
- *PROPOSICIONES Y VARIOS.*
- *FIN DE REUNION.*

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. *procede a dar inicio a la reunión con la participación de los representantes del Copasst, para dar a conocer las necesidades que en estos momentos se presentan en obra.*

REPORTE DE ACCIDENTE DEL PERIODO DICIEMBRE 2022
En este mes se presentaron accidentes laborales.

PROPOSICIONES Y VARIOS.

- *Se realiza el debido seguimiento a las actividades que se desarrollaron durante este periodo en la obra.*
- *Se realiza capacitación con el personal de la obra donde se les indica sobre los siguientes temas: mantenimiento de herramientas manuales, autocuidado, prevención del riesgo locativo, actos y condiciones inseguras, prevención del riesgo mecánico, manejo ante una emergencia, manejo de estrés laboral.*

COMPROMISOS:

El residente del área de seguridad industrial realizara la observación a los contratistas para que tengan en cuenta la necesidad de la dotación que requieren sus trabajadores en la obra.

FIN DE LA REUNION.

Se dio por terminada la reunión, a las 11:0 0 am para su constancia se firma.

José Contreras
Principal.

José Atencio Sierra
Suplente.

Diana Daza Becerra
Residente SST.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	R-0628
GRUPO COLFA	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Versión: 0

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 5/01/2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL ACCIENTE

TIPO DE ACCIDENTE (Seleccione una opción):	LESIÓN	X	DAÑO		ACCIDENTE AMBIENTAL	

FECHA DEL ACCIDENTE	CIUDAD	LUGAR	LABOR QUE DESEMPEÑABA	CONTRATO ASIGNADO
26/12/2022	BARRANQUILLA	CIENAGA MALLORQUIN	TRANSPORTE DE MADERA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN

INFORMACIÓN DEL INVOLUCRADO

CEDULA	NOMBRE COMPLETO	CARGO	EDAD
72.295.835	POLO ECHEVERRIA LUIS	AYUDANTE DE OBRA	39 AÑOS
FECHA DE INGRESO	**EXPERIENCIA EN EL CARGO ACTUAL**	**TURNO**	**DÍA DE TURNO**
30/06/2022	3 AÑOS	DIRNO	LUNES

TIPO DE LESIÓN (MARQUE CON UNA X CUÁL O CUÁLES, SI APLICA)

FRACTURA		HERIDA		GOLPE		QUEMADURA		ESGUINCE		LUXACION		CORTADURA	
ELECTROCUCION		APLASTAMIENTO		INTOXICACION		ASFIXIA		ESION EN OJO		CUERPO EXTRAÑO EN OJO		OTROS	X

TIPO DE DAÑO (MARQUE CON UNA X CUÁL O CUÁLES, SI APLICA)

INSTALACIONES		VEHICULOS		EQUIPOS		MAQUINARIA		MATERIALES		EQUIPO DE OFICINA		OTROS	

ACCIDENTE AMBIENTAL (MARQUE CON UNA X EL COMPONENTE AFECTADO, SI APLICA)

FLORA		FAUNA		SUELO		AGUA		AIRE	

PARTE DEL CUERPO APARENTEMENTE AFECTADO: (MARQUE CON UNA X CUÁL O CUÁLES, SI APLICA)

CABEZA		OJOS		MIEMBROS SUPERIORES		MANOS	X	TRONCO		MIEMBROS INFERIORES		PIES	
ABDOMEN		CUELLO		TORAX		UBICACIONES MULTIPLES		LESIONE GENERALES		OIDO		OTROS	

MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE

CAIDA AL MISMO NIVEL		CAIDA EN ALTURA		CAIDA DE OBJETO	
CONTACTO CON SUSTANCIAS QUIMICAS		ATRAPAMIENTO		PISADAS, GOLPES O CHOQUES	
SOBREESFUERZO O FALSOS MOVIMIENTOS		ESPACIOS CONFINADOS		OTROS	X

AGENTE DEL ACCIDENTE: (CON QUÉ SE LESIONÓ EL TRABAJADOR)

MAQUINARIA Y/O EQUIPO		MEDIO DE TRANSPORTE		HERRAMIENTAS		MATERIALES	X
AMBIENTE DE TRABAJO		ANIMALES		SUSTANCIAS QUIMICAS		OTROS	

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

El **26 de diciembre de 2022,** el **Sr. Luis Polo Echeverria,** Siendo aproximadamente las 10:20 am se encontraba transportando unas barandas de madera cuando se le incrusto una astilla en el dedo meñique de la mano izquierda lo cual ocasiono inflamación inmediata en el área afectada.

TESTIGOS (SI HUBO)

TESTIGOS	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO
TESTIGO 1	NO HUBO	N/A	N/A

ANÁLISIS DE CAUSAS

CAUSAS INMEDIATAS

18. El guante suministrado (poliuretano) actualmente, no protege las manos en la manipulacion de la madera.
19. La madera que actualmente es utilizada en los procesos que se adelantan en el proyecto suelta demasiadas estillas lo que esta ocasionando accidentes de trabajo por pinchazo con estillas.

CAUSAS BASICAS

8. Se debe reforzar el acompañamiento por parte del personal de SST en donde se logren identificar condiciones o actos inseguros que puedan ser intervenidos inmediatàmente, adicional apoyo al cumplimiento de las recomendaciones realizadas en las investigaciones como lo fue el suministro de guantes de carnaza para realizar el transporte de madera que habia sido propupesto como plan de accion en accidente anterio ocurrdido bajo las mismas causas que este.
4.5 Baja percepcion del riesgo en las labores realizadas en el contrato.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	R-0628
	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Versión: 0

RESUMEN DE CAUSAS (Las causas listadas, colocarlas en sus respectivos campos)

CAUSAS INMEDIATAS	
CONDICIÓN SUBESTANDAR	ACTOS SUBESTANDAR
18. EPP Inadecuado o impropio	
19. Herramienta, equipo o material defectuoso.	

CAUSAS BASICAS	
FACTORES DE TRABAJO	FACTORES PERSONALES
8. Liderazgo o supervisión inadecuada.	4.5 Demandas extremadas de concentracion/percepcion.

ANÁLISIS DE CAUSAS-METODOLOGÍA 5 POR QUÉ.

1	¿Por qué?	1. Pinchazo en dedo meñique de mano izquierda que produce dolor e inflamación
2	¿Por qué?	2. Al momento en que transportaba una baranda de madera una estilla se le incrusta en el dedo.
3	¿Por qué?	3. La madera utilizada en el proceso se encuentra por partes deteriorada (estillada) y adicional la estilla sobrepaso el guante de poliuretano utilizado
4	¿Por qué ?	3. El guante suministrado no es el indicado para esta actividad.

ACCIONES CORRECTIVAS

ACCIONES	JERARQUIA DE CONTROLES						FECHA EJECUCION	AREA O PERSONA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
	ELIMIAR	SUSTITUIR	REDISEÑAR	SEPARAR	ADMINISTRATIVO	EPP			
1. Divulgación de la lección aprendida del accidente laboral * Autocuidado * Uso de EPP * Seguridad basada en el comportamiento					X		4/01/2022	TEMPOCOLBA	
2. Realizar intervención por reincidencia en accidentes de trabajo por parte de profesional en psicología especialista en SST, con la finalidad de valorar los componentes desde el ser, entorno y ambiente laboral que con llevan a la reincidencia de accidentes laborales. Informe con sus respectivas recomendaciones y hallazgos identificados.					X		4/01/2023	TEMPOCOLBA	
3. Se recomienda suministrar guante de seguridad de vaqueta tipo ingeniero para maniobrar madera, ya que actualmente se les suministra de Poliuretano y la estilla de madera rompe el guante.						X	30/01/2023	JCO MALLORQUIN	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	R-0628
GRUPO COLDA	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Versión: 0

PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Luis Pablo Echeverria	ayudante	
Diana Daza Becerra	Residente SST	
Wendy Ortiz	Analista SSTA	
Melissa Montes Gonzalez	COPASST	

ANEXOS (FOTOGRAFIAS, PLANOS, DIAGRAMAS)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	R-0635
GRUPO COLBA	VERSIÓN DE INVOLUCRADOS O TESTIGOS EN EVENTOS DE SSTA	Versión: 1

Nombre: Luis A Rolo		Cedula: 72245825	Rol: Involucrado X / Testigo
Fecha del evento: 26-12-2022	Hora: 10:30	Turno: Diurno	Día de turno: Lunes

TIPO DE EVENTO (Marque con una X)							
Accidente	X	Cuasiaccidente		Acto inseguro		Otro:	

DESCRIBA DE MANERA CLARA Y BREVE LOS HECHOS OCURRIDOS

Yo Luis Rolo identificado con cedula de Ciudadania 72245825 de Barranquilla el dia 26 de Diciembre me encontraba cargando barandas de madera y una astilla se me metio en el dedo meñique de la mano izquierda by gracias a la reaccion inmediata no pase a mayores el dedo se me inflamo y me dio fuerte

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	R-0101
GRUPO COLBA	REGISTRO DE ENTRENAMIENTO, CAPACITACIONES Y CHARLAS	Versión: 0

CALIDAD		S.S.T.	/	GESTIÓN HUMANA		OPERATIVA		AMBIENTAL			
CHARLA		ENTRENAMIENTO OPERATIVO				DIFUSIÓN PROCEDIMIENTO					
OTROS		CAPACITACIÓN	/	DIURNO	/	NOCTURNO					
ASEOCOLBA		TEMPOCOLBA	/	TRANSCOLBA		VIGICOLBA					

LUGAR: Predios Comunes. FECHA: 04-01-2023

CONTRATO: Consorcio Jco Mallorquin.

INSTRUCTOR: Fernando Melendez. DURACIÓN: 1 hora

TEMAS: Divulgación Leccion aprendida Ar Luis Polo Echeverria, Uso de EPP, Horaccidado, Seguridad Basada en Comportamiento.

OBJETIVO: Capacitar a los Trabajadores en la Leccion aprendida del mismo occido para prevenir Sinocuons Similares o iguales.

No	NOMBRE	CARGO / CONTRATO	FIRMA
1	Luis R Polo E	Ayudante	Luis Polo E
2	DIOMEDES	Operador	DIOMEDES
3	Cesar Delgado	Ayudante	Cesar
4	MARLON Rafael	Ayudante	marlon
5	Victor Gonzalez	OFICIAL	Victor G
6	Omar Daniel Mejia	Ayudante	Omar Mejia
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Los suscritos firmantes del presente documento hacemos constar que hemos recibido instrucción formal y ademas comprendiendo el (los) tema (s) relacionados anteriormente y nos comprometemos a aplicarlo (s) cada vez que se requiera

OBSERVACIONES:

INSTRUCTOR

RESPONSABLE DE PROCESO/ AREA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	R-0628
GRUPO COLFA	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Versión: 0

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 5/01/2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL ACCIENTE

TIPO DE ACCIDENTE (Seleccione una opción):	LESIÓN	X	DAÑO		ACCIDENTE AMBIENTAL	

FECHA DEL ACCIDENTE	CIUDAD	LUGAR	LABOR QUE DESEMPEÑABA	CONTRATO ASIGNADO
26/12/2022	BARRANQUILLA	CIENAGA MALLORQUIN	TRANSPORTE DE MADERA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN

INFORMACIÓN DEL INVOLUCRADO

CEDULA	NOMBRE COMPLETO	CARGO	EDAD
72.295.835	POLO ECHEVERRIA LUIS	AYUDANTE DE OBRA	39 AÑOS
FECHA DE INGRESO	**EXPERIENCIA EN EL CARGO ACTUAL**	**TURNO**	**DÍA DE TURNO**
30/06/2022	3 AÑOS	DIRNO	LUNES

TIPO DE LESIÓN (MARQUE CON UNA X CUÁL O CUÁLES, SI APLICA)

FRACTURA		HERIDA		GOLPE		QUEMADURA		ESGUINCE		LUXACION		CORTADURA	
ELECTROCUCION		APLASTAMIENTO		INTOXICACION		ASFIXIA		ESION EN OJO		CUERPO EXTRAÑO EN OJO		OTROS	X

TIPO DE DAÑO (MARQUE CON UNA X CUÁL O CUÁLES, SI APLICA)

INSTALACIONES		VEHICULOS		EQUIPOS		MAQUINARIA		MATERIALES		EQUIPO DE OFICINA		OTROS	

ACCIDENTE AMBIENTAL (MARQUE CON UNA X EL COMPONENTE AFECTADO, SI APLICA)

FLORA		FAUNA		SUELO		AGUA		AIRE	

PARTE DEL CUERPO APARENTEMENTE AFECTADO: (MARQUE CON UNA X CUÁL O CUÁLES, SI APLICA)

CABEZA		OJOS		MIEMBROS SUPERIORES		MANOS	X	TRONCO		MIEMBROS INFERIORES		PIES	
ABDOMEN		CUELLO		TORAX		UBICACIONES MULTIPLES		LESIONE GENERALES		OIDO		OTROS	

MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE

CAIDA AL MISMO NIVEL		CAIDA EN ALTURA		CAIDA DE OBJETO	
CONTACTO CON SUSTANCIAS QUIMICAS		ATRAPAMIENTO		PISADAS, GOLPES O CHOQUES	
SOBREESFUERZO O FALSOS MOVIMIENTOS		ESPACIOS CONFINADOS		OTROS	X

AGENTE DEL ACCIDENTE: (CON QUÉ SE LESIONÓ EL TRABAJADOR)

MAQUINARIA Y/O EQUIPO		MEDIO DE TRANSPORTE		HERRAMIENTAS		MATERIALES	X
AMBIENTE DE TRABAJO		ANIMALES		SUSTANCIAS QUIMICAS		OTROS	

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

El **26 de diciembre de 2022,** el **Sr. Luis Polo Echeverria,** Siendo aproximadamente las 10:20 am se encontraba transportando unas barandas de madera cuando se le incrusto una astilla en el dedo meñique de la mano izquierda lo cual ocasiono inflamación inmediata en el área afectada.

TESTIGOS (SI HUBO)

TESTIGOS	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO
TESTIGO 1	NO HUBO	N/A	N/A

ANÁLISIS DE CAUSAS

CAUSAS INMEDIATAS

18. El guante suministrado (poliuretano) actualmente, no protege las manos en la manipulacion de la madera.
19. La madera que actualmente es utilizada en los procesos que se adelantan en el proyecto suelta demasiadas estillas lo que esta ocasionando accidentes de trabajo por pinchazo con estillas.

CAUSAS BASICAS

8. Se debe reforzar el acompañamiento por parte del personal de SST en donde se logren identificar condiciones o actos inseguros que puedan ser intervenidos inmediatàmente, adicional apoyo al cumplimiento de las recomendaciones realizadas en las investigaciones como lo fue el suministro de guantes de carnaza para realizar el transporte de madera que habia sido propupesto como plan de accion en accidente anterio ocurrdido bajo las mismas causas que este.
4.5 Baja percepcion del riesgo en las labores realizadas en el contrato.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	R-0628
	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Versión: 0

RESUMEN DE CAUSAS (Las causas listadas, colocarlas en sus respectivos campos)

CAUSAS INMEDIATAS	
CONDICIÓN SUBESTANDAR	ACTOS SUBESTANDAR
18. EPP Inadecuado o impropio	
19. Herramienta, equipo o material defectuoso.	

CAUSAS BASICAS	
FACTORES DE TRABAJO	FACTORES PERSONALES
8. Liderazgo o supervisión inadecuada.	4.5 Demandas extremadas de concentracion/percepcion.

ANÁLISIS DE CAUSAS-METODOLOGÍA 5 POR QUÉ.

1	¿Por qué?	1. Pinchazo en dedo meñique de mano izquierda que produce dolor e inflamación
2	¿Por qué?	2. Al momento en que transportaba una baranda de madera una estilla se le incrusta en el dedo.
3	¿Por qué?	3. La madera utilizada en el proceso se encuentra por partes deteriorada (estillada) y adicional la estilla sobrepaso el guante de poliuretano utilizado
4	¿Por qué ?	3. El guante suministrado no es el indicado para esta actividad.

ACCIONES CORRECTIVAS

ACCIONES	JERARQUIA DE CONTROLES						FECHA EJECUCION	AREA O PERSONA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
	ELIMIAR	SUSTITUIR	REDISEÑAR	SEPARAR	ADMINISTRATIVO	EPP			
1. Divulgación de la lección aprendida del accidente laboral * Autocuidado * Uso de EPP * Seguridad basada en el comportamiento					X		4/01/2022	TEMPOCOLBA	
2. Realizar intervención por reincidencia en accidentes de trabajo por parte de profesional en psicología especialista en SST, con la finalidad de valorar los componentes desde el ser, entorno y ambiente laboral que con llevan a la reincidencia de accidentes laborales. Informe con sus respectivas recomendaciones y hallazgos identificados.					X		4/01/2023	TEMPOCOLBA	
3. Se recomienda suministrar guante de seguridad de vaqueta tipo ingeniero para maniobrar madera, ya que actualmente se les suministra de Poliuretano y la estilla de madera rompe el guante.						X	30/01/2023	JCO MALLORQUIN	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	R-0628
GRUPO COLDA	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Versión: 0

PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Luis Pablo Echeverria	ayudante	
Diana Daza Becerra	Residente SST	
Wendy Ortiz	Analista SSTA	
Melissa Montes Gonzalez	COPASST	

ANEXOS (FOTOGRAFIAS, PLANOS, DIAGRAMAS)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	R-0635
GRUPO COLBA	VERSIÓN DE INVOLUCRADOS O TESTIGOS EN EVENTOS DE SSTA	Versión: 1

Nombre: Luis A Rolo		Cedula: 72245825	Rol: Involucrado X / Testigo
Fecha del evento: 26-12-2022	Hora: 10:30	Turno: Diurno	Día de turno: Lunes

TIPO DE EVENTO (Marque con una X)							
Accidente	X	Cuasiaccidente		Acto inseguro		Otro:	

DESCRIBA DE MANERA CLARA Y BREVE LOS HECHOS OCURRIDOS

Yo Luis Rolo identificado con cedula de Ciudadania 72245825 de Barranquilla el dia 26 de Diciembre me encontraba cargando barandas de madera y una astilla se me metio en el dedo meñique de la mano izquierda by gracias a la reaccion inmediata no pase a mayores el dedo se me inflamo y me dio fuerte

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	R-0101
GRUPO COLBA	REGISTRO DE ENTRENAMIENTO, CAPACITACIONES Y CHARLAS	Versión: 0

CALIDAD		S.S.T.	/	GESTIÓN HUMANA		OPERATIVA		AMBIENTAL			
CHARLA		ENTRENAMIENTO OPERATIVO				DIFUSIÓN PROCEDIMIENTO					
OTROS		CAPACITACIÓN	/	DIURNO	/	NOCTURNO					
ASEOCOLBA		TEMPOCOLBA	/	TRANSCOLBA		VIGICOLBA					

LUGAR: Predios Comunes. FECHA: 04-01-2023

CONTRATO: Consorcio Jco Mallorquin.

INSTRUCTOR: Fernando Melendez. DURACIÓN: 1 hora

TEMAS: Divulgación Leccion aprendida Ar Luis Polo Echeverria, Uso de EPP, Horaccidado, Seguridad Basada en Comportamiento.

OBJETIVO: Capacitar a los Trabajadores en la Leccion aprendida del mismo occido para prevenir Sinocuons Similares o iguales.

No	NOMBRE	CARGO / CONTRATO	FIRMA
1	Luis R Polo E	Ayudante	Luis Polo E
2	DIOMEDES	Operador	DIOMEDES
3	Cesar Delgado	Ayudante	Cesar
4	MARLON Rafael	Ayudante	marlon
5	Victor Gonzalez	OFICIAL	Victor G
6	Omar Daniel Mejia	Ayudante	Omar Mejia
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Los suscritos firmantes del presente documento hacemos constar que hemos recibido instrucción formal y ademas comprendiendo el (los) tema (s) relacionados anteriormente y nos comprometemos a aplicarlo (s) cada vez que se requiera

OBSERVACIONES:

INSTRUCTOR

RESPONSABLE DE PROCESO/ AREA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN	REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACION Y ENTRENAMEINTO	CÓDIGO: FRP - 02
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 18/09/21

TEMA: Mantenimiento de Herramientas Manuales

DOCENTE: Oscar Ospino. FECHA: 03-12-22.

LUGAR: Ecopetrol de Mallorquín PÁGINA 1 DE 1

Nº	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FUE EFICAZ? SI	NO
1	Oscar Manuel Mejia	Ayudante	Oscar M.	✓	
2	MARLON MELON	Ayudante.	MARLON	✓	
3	Dorwin E Blanco	Oficial	Dorwin	✓	
4	Jasier Anaya V.	Ayudante		✓	
5	Juan Bermudez	Maestro	Juan Berm.	✓	
6	Jose Hurley Rodriguez V	Oficial		✓	
7	Carl Deleon	Ayudante		✓	
8	Jose M Gutierrez Ripoll	Ayudante		✓	
9	Fernando Torres S	ayudante		✓	
10	VICTOR GONZALEZ	Ayudante.	VICTOR G	✓	
11	Jhon Mercado	Ayudante		✓	
12		Oficial		✓	
13	Andres Peñaloza M	Ayudante		✓	
14	Mauricio B Montes	Consejo	ENOT	✓	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

OBSERVACIONES:

FIRMA DOCENTE

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN	REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACION Y ENTRENAMEINTO	CÓDIGO: FRP - 02
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 18/09/21

TEMA: Autocuidado

DOCENTE: Oscar Rojas FECHA: 06-12-22.

LUGAR: Ecoparque de Mallorquín. PÁGINA 1 DE 1

N°	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FUE EFICAZ? SI	FUE EFICAZ? NO
1	Jasier anaya V.	Ayudante		✓	
2	Cesar Salcedo	Ayudante		✓	
3	Jhon E Ayuso	ayudante		✓	
4	Oscar Rachel Mejia	Ayudante	OMAR Mejia	✓	
5	Jose A Cantillo Rivas	Ayudante		✓	
6	Jose Hulog Rodriguez R	Oficial		✓	
7	MARLON MERLO	Ayudante.	MARLON	✓	
8	Dannis E Blanco	Oficial	Dannis	✓	
9	Jean Bermudez	Maestro		✓	
10	Luis Mendoza	Ayudante		✓	
11	VICTOR GONZALEZ	Ayudante-	VICTOR G	✓	
12	Andres PEÑALOZA M	Ayudante		✓	
13	Mauricio Barrios	Cocinero		✓	
14	Jose Mateus O	Oficial		✓	
15	MADISON DISCIPULO	AYUDANTE	ENOT	✓	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

OBSERVACIONES:

FIRMA DOCENTE

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN	REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACION Y ENTRENAMEINTO	CÓDIGO: FRP - 02
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 18/09/21

TEMA: Inducción.

DOCENTE: Dana Lora FECHA: 09-12-22

LUGAR: Ecoparque Mallorquín. PÁGINA 1 DE 1

Nº	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FUE EFICAZ? SI	FUE EFICAZ? NO
1	Jose Luis Reales orozco	Ayudante	Jose Reales	V	
2	Reini Heras M.	Ayudante	Reini Heras	V	
3	Alexander Lara	contratista		V	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

OBSERVACIONES:

FIRMA DOCENTE

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO ICO MALLORQUÍN	REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACION Y ENTRENAMEINTO	CÓDIGO: FRP - 02
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 18/08/21

TEMA: Prevención del Riesgo Locativo

DOCENTE: Diana Bora. FECHA: 10-12-22.

LUGAR: Estadio de Villorquín PÁGINA 1 DE 1

Nº	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FUE EFICAZ? SI	NO
1	Mader Toledo	Ayudante	Mader	✓	
2	Luis Alberto	Regador.	Luis	✓	
3	José Mosquera	Operario	José	✓	
4	Mario Alvaro González	Oficio Varios	Mario	✓	
5	José Martínez Pitalua	Ayudante	José	✓	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

OBSERVACIONES:

FIRMA DOCENTE

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN	REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACION Y ENTRENAMEINTO	CÓDIGO: FRP - 02
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 18/09/21

TEMA: Actos y Condiciones Inseguras.

DOCENTE: Diana Ruiz FECHA: 13-12-22

LUGAR: Ecopetrol de Rubiales PÁGINA 1 DE 1

Nº	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FUE EFICAZ? SI	NO
1	Damian Blanco	Oficial	Damian	✓	
2	Jose A Gutierrez Pineda	Ayudante		✓	
3	Jean Bermudez	Maestro	Jean Bermudez	✓	
4	VICTOR GONZALEZ	Ayudante	VICTOR G	✓	
5	MARLON MERLON	Ayudante	MARLON	✓	
6	Cesar Delgado	AYUDANTE	Cesar	✓	
7	Luis Mateus Pulla	Oficial		✓	
8	Oscar Daniel Mejia	Ayudante	Oscar M	✓	
9	Jose Heiber Rodriguez R	OFICIAL		✓	
10	Jasier anaya V.	AYUDANTE		✓	
11	Damian Blanco	Ayudante		✓	
12	Jean Bermudez	Ayudante	Jean M	✓	
13	MARLON DIAZ CUEVAS	AYUDANTE	MARLON	✓	
14	ENOT.	Oficial.	ENOT	✓	
15	Andres Penaloza M	Ayudante		✓	
16	Mauricio Soto	Ponchero		✓	
17	Isairo Ortiz	AUXILIAR		✓	
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

OBSERVACIONES:

FIRMA DOCENTE

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN	REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACION Y ENTRENAMEINTO	CÓDIGO: FRP - 02
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 18/09/21

TEMA: Inducción.

DOCENTE: Diana Ospina. FECHA: 17-12-21.

LUGAR: Ecoparque de Malbajón. PÁGINA 1 DE 1

N°	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FUE EFICAZ? SI	FUE EFICAZ? NO
1	Elberth Log Cardenas	Auxiliar de Ensamble.		✓	
2	Oscar Pareds. Juls.	Auxiliar de Ensamble.	Oscar Poveda	✓	
3	Moises Chico Acosta.	Auxiliar de Ensamble.		✓	
4	Luis Enrique - Policia	Maestro de Ensamble.		✓	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

OBSERVACIONES:

FIRMA DOCENTE

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN	REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACION Y ENTRENAMEINTO	CÓDIGO: FRP - 02
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 18/09/21

TEMA: Prevención del Riesgo Mecánico.

DOCENTE: Pedro Pérez FECHA: 17-12-22.

LUGAR: Empalme de Mallarquín PÁGINA 1 DE 1

Nº	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FUE EFICAZ? SI	FUE EFICAZ? NO
1	Mario Alvaro Gonzalez	oficios varios	Mario Gonzalez	✓	
2	Moises Chico Acosta	Auxiliar obra		✓	
3	JAIRO ORTIZ	Auxiliar		✓	
4	Madai Tafur	Graduada	Madai	✓	
5	LUIS E. PULIDO	CONTRATISTA		✓	
6	Luis Muñoz H	Ayudante.	Luis Muñoz	✓	
7	JOSÉ MENCO	OPERARIO		✓	
8	Oscar Arley Poveda Sajula	Auxiliar de obra	Oscar Poveda	✓	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

OBSERVACIONES:

FIRMA DOCENTE

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN	REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACION Y ENTRENAMEINTO	CÓDIGO: FRP - 02
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 18/09/21

TEMA: Riesgo ante las Emergencias.

DOCENTE: Diana Pozo. FECHA: 20-12-22.

LUGAR: Estación de Rellenos. PÁGINA 1 DE 1

Nº	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FUE EFICAZ? SI	NO
1	Juan Bermudez	Maestro	Juan Bermudez	✓	
2	Cesar Olaya D	Ayudante		✓	
3	Jose Harley Rodriguez	Oficial		✓	
4	Josier anaya V.	Ayudante		✓	
5	VICTOR GONZALEZ	Ayudante	VICTOR G.	✓	
6	MARLON MERLO	Ayudante	MARLON	✓	
7	Oscar E Vera	Ayudante		✓	
8	Jose M Cortes Rapalo	Ayudante		✓	
9	Luis Mendoza	Ayudante		✓	
10	Oscar Daniel Mestra	Ayudante	Oscar M	✓	
11	ENOT Solarte C.	Oficial	ENOT	✓	
12	Danny Eduardo	Oficial		✓	
13	Javier Muñoz Ortiz			✓	
14	Andres Penilla M	Ayudante		✓	
15	Mauricio Bedoya	Conserje		✓	
16	MARLON DIAZ VAC	Ayudante.	MARLON	✓	
17	LUIS E PULIDO	Contratista		✓	
18	Moises Chico Acosta	Auxiliar de obra		✓	
19	OSCAR Arley Poveda Jola	Auxiliar de obra	Oscar Poveda	✓	
20	JAIRO ORTIZ	AUXILIAR		✓	
21					
22					
23					
24					

OBSERVACIONES:

FIRMA DOCENTE

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN	REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACION Y ENTRENAMEINTO	CÓDIGO: FRP - 02
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 18/09/21

TEMA: Riesgo del Estres Laboral

DOCENTE: Diana Pozo FECHA: 27-12-22.

LUGAR: Ecopetrol de Mariquita PÁGINA 1 DE 1

Nº	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FUE EFICAZ? SI	NO
1	Moises Chapa Acosta	Auxiliar		✓	
2	Jaime Mendoza S.	Cadenero		✓	
3	Jesús Alfonso	Operario		✓	
4	Dario Arturo Correa	Oficio Varios		✓	
5	Luis Angarita	Ayudante.		✓	
6	Luis E Pulido	contratista		✓	
7	Mader Toledo	estudiante		✓	
8	Oscar Arley Poveda Jola	Auxiliar de obra		✓	
9	Lairo Ortiz	Auxiliar		✓	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

OBSERVACIONES:

FIRMA DOCENTE

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

EVALUACIÓN INDUCCIÓN SST

Nombre Completo: Jose Luis Reales Orozco

Fecha: 01-12-2022

1. **¿Cuál es el correcto procedimiento en caso de accidentes e incidentes laborales?**

   - (•) Reporte al Jefe Inmediato el Evento/al área de SST/ Reporte ARL/ Desplazamiento de Paciente/Investigación
   - Desplácese a la IPS más cercana/Reporte el accidente 72 horas acontecido el accidente/Remita incapacidad
   - Diagnostique severidad del Accidentado/Reporte el Evento al área de HSEQ/Investigación
   - Espere Asistencia médica/diagnostique severidad/reporte ARL

2. **¿Cuáles de estos componentes no hace parte de la política de Seguridad, Salud y Ambiente en el Trabajo?**

   - Prevención de incidentes y accidentes laborales y Ambientales
   - (•) Cumplimiento de Requisitos legales y otros requisitos en temas de seguridad y salud en el trabajo, así como ambiente
   - Confidencialidad de la información de Seguridad, Salud y Ambiente
   - Mejora Continua en el desempeño SST

3. **¿Cuál de las siguientes opciones no hace parte de sus responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo?**

   - Reporte todo acto y condición insegura, incidente y accidente de manera inmediata
   - Identificación y control de los requisitos legales aplicables de Seguridad, Salud y Ambiente
   - (•) Afiliar a los trabajadores al Sistema General de Riesgos Laborales
   - Conocer y cumplir con las disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente para prevención de riesgos

Escaneado con CamScanner

4. **Son funciones del comité de convivencia laboral**

- Hacer seguimiento de los casos presuntos de acoso laboral/escuchar las partes involucradas de manera individual/Adelantar reuniones con el fin de crear espacios de diálogos.
- Organizar las reuniones de despedida de año/decorar los puestos de trabajo
- Hacer seguimiento de los accidentes laborales/Investigaciones de actos y condiciones inseguras
- Hacer seguimiento del programa de Vigilancia Epidemiológica Psicosocial

5. **¿Qué aspectos contemplan la política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas**

- El efecto del consumo de drogas deteriora el desempeño del trabajo y es una amenaza real para la salud de las personas, la seguridad y la productividad de la empresa.
- Por ningún motivo se permitirá a los colaboradores presentarse a laborar a bajo el efecto de bebidas alcohólicas o sustancias Psicoactivas (SPA)
- Está igualmente prohibido el uso de cualquier sustancia que atente contra la seguridad propia o de los otros colaboradores en el normal desempeño laboral.
- Todas las anteriores
- Ninguna de las anteriores

6. **¿Qué programas hacen parte del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo?**

- Programa de Trabajo Seguro en Alturas
- Programa de orden y aseo
- Programa de Inspecciones
- Todas las anteriores
- Ninguna de las anteriores

7. **¿Qué es un acto inseguro?**

- La lampara averiada en mi puesto de trabajo
- Son la fallas, olvidos, errores y omisiones que hace el trabajador al realizar un trabajo
- Acoso laboral a un compañero de trabajo
- Ninguna de las anteriores

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

8. **¿Qué hacer en caso de un sismo?**

- Ubíquese en las ventanas, evacue inmediatamente
- Conserve la calma, retírese de objetos que puedan caer, ubíquese en posición segura.
- Pasar por alto la situación de emergencia
- Ninguna de las anteriores

9. **¿Qué significa COPASST?**

- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
- Comité del partido para la salud y seguridad de los trabajadores
- Comité paritario de salud ocupacional
- Consejo paritario de seguridad y salud de trabajadores unidos

10. **¿Cuáles son los peligros a los que usted se encuentra expuesto en su lugar de trabajo?**

- Locativo, biomecánico, físico, Psicosocial, biológico
- Eléctrico, mecánico, trabajo en alturas, espacios confinados
- Biológico, químico, publico, Izaje de cargas
- Todas las anteriores

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

EVALUACIÓN INDUCCIÓN SST

Nombre Completo: Deivi Herrera Mazimón
Fecha: 3 Diciembre 2022

1. **¿Cuál es el correcto procedimiento en caso de accidentes e incidentes laborales?**

   ✓ Reporte al Jefe Inmediato el Evento/al área de SST/ Reporte ARL/ Desplazamiento de Paciente/Investigación
   - Desplácese a la IPS más cercana/Reporte el accidente 72 horas acontecido el accidente/Remita incapacidad
   - Diagnostique severidad del Accidentado/Reporte el Evento al área de HSEQ/Investigación
   - Espere Asistencia médica/diagnostique severidad/reporte ARL

2. **¿Cuáles de estos componentes no hace parte de la política de Seguridad, Salud y Ambiente en el Trabajo?**

   - Prevención de incidentes y accidentes laborales y Ambientales
   ✓ Cumplimiento de Requisitos legales y otros requisitos en temas de seguridad y salud en el trabajo, así como ambiente
   - Confidencialidad de la información de Seguridad, Salud y Ambiente
   - Mejora Continua en el desempeño SST

3. **¿Cuál de las siguientes opciones no hace parte de sus responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo?**

   - Reporte todo acto y condición insegura, incidente y accidente de manera inmediata
   - Identificación y control de los requisitos legales aplicables de Seguridad, Salud y Ambiente
   ✓ Afiliar a los trabajadores al Sistema General de Riesgos Laborales
   - Conocer y cumplir con las disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente para prevención de riesgos

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

4. **Son funciones del comité de convivencia laboral**

- ✓ Hacer seguimiento de los casos presuntos de acoso laboral/escuchar las partes involucradas de manera individual/Adelantar reuniones con el fin de crear espacios de diálogos.
- Organizar las reuniones de despedida de año/decorar los puestos de trabajo
- Hacer seguimiento de los accidentes laborales/Investigaciones de actos y condiciones inseguras
- Hacer seguimiento del programa de Vigilancia Epidemiológica Psicosocial

5. **¿Qué aspectos contemplan la política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas**

- El efecto del consumo de drogas deteriora el desempeño del trabajo y es una amenaza real para la salud de las personas, la seguridad y la productividad de la empresa.
- Por ningún motivo se permitirá a los colaboradores presentarse a laborar a bajo el efecto de bebidas alcohólicas o sustancias Psicoactivas (SPA)
- Está igualmente prohibido el uso de cualquier sustancia que atente contra la seguridad propia o de los otros colaboradores en el normal desempeño laboral.
- ✓ Todas las anteriores
- Ninguna de las anteriores

6. **¿Qué programas hacen parte del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo?**

- Programa de Trabajo Seguro en Alturas
- Programa de orden y aseo
- Programa de Inspecciones
- ✓ Todas las anteriores
- Ninguna de las anteriores

7. **¿Qué es un acto inseguro?**

- La lampara averiada en mi puesto de trabajo
- ✓ Son la fallas, olvidos, errores y omisiones que hace el trabajador al realizar un trabajo
- Acoso laboral a un compañero de trabajo
- Ninguna de las anteriores

Escaneado con CamScanner

8. ¿Qué hacer en caso de un sismo?

- Ubíquese en las ventanas, evacue inmediatamente
- ✓ Conserve la calma, retírese de objetos que puedan caer, ubíquese en posición segura.
- Pasar por alto la situación de emergencia
- Ninguna de las anteriores

9. ¿Qué significa COPASST?

- ✓ Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
- Comité del partido para la salud y seguridad de los trabajadores
- Comité paritario de salud ocupacional
- Consejo paritario de seguridad y salud de trabajadores unidos

10. ¿Cuáles son los peligros a los que usted se encuentra expuesto en su lugar de trabajo?

- Locativo, biomecánico, físico, Psicosocial, biológico
- Eléctrico, mecánico, trabajo en alturas, espacios confinados
- Biológico, químico, publico, Izaje de cargas
- ✓ Todas las anteriores

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

EVALUACIÓN INDUCCIÓN SST

Nombre Completo: Alexander Hanos
Fecha: 7 diciembre 2022

1. **¿Cuál es el correcto procedimiento en caso de accidentes e incidentes laborales?**

   X Reporte al Jefe Inmediato el Evento/al área de SST/ Reporte ARL/ Desplazamiento de Paciente/Investigación
   - Desplácese a la IPS más cercana/Reporte el accidente 72 horas acontecido el accidente/Remita incapacidad
   - Diagnostique severidad del Accidentado/Reporte el Evento al área de HSEQ/Investigación
   - Espere Asistencia médica/diagnostique severidad/reporte ARL

2. **¿Cuáles de estos componentes no hace parte de la política de Seguridad, Salud y Ambiente en el Trabajo?**

   - Prevención de incidentes y accidentes laborales y Ambientales
   X Cumplimiento de Requisitos legales y otros requisitos en temas de seguridad y salud en el trabajo, así como ambiente
   - Confidencialidad de la información de Seguridad, Salud y Ambiente
   - Mejora Continua en el desempeño SST

3. **¿Cuál de las siguientes opciones no hace parte de sus responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo?**

   - Reporte todo acto y condición insegura, incidente y accidente de manera inmediata
   - Identificación y control de los requisitos legales aplicables de Seguridad, Salud y Ambiente
   X Afiliar a los trabajadores al Sistema General de Riesgos Laborales
   - Conocer y cumplir con las disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente para prevención de riesgos

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

4. **Son funciones del comité de convivencia laboral**

- [x] Hacer seguimiento de los casos presuntos de acoso laboral/escuchar las partes involucradas de manera individual/Adelantar reuniones con el fin de crear espacios de diálogos.
- Organizar las reuniones de despedida de año/decorar los puestos de trabajo
- Hacer seguimiento de los accidentes laborales/Investigaciones de actos y condiciones inseguras
- Hacer seguimiento del programa de Vigilancia Epidemiológica Psicosocial

5. **¿Qué aspectos contemplan la política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas**

- El efecto del consumo de drogas deteriora el desempeño del trabajo y es una amenaza real para la salud de las personas, la seguridad y la productividad de la empresa.
- Por ningún motivo se permitirá a los colaboradores presentarse a laborar a bajo el efecto de bebidas alcohólicas o sustancias Psicoactivas (SPA)
- Está igualmente prohibido el uso de cualquier sustancia que atente contra la seguridad propia o de los otros colaboradores en el normal desempeño laboral.
- [x] Todas las anteriores
- Ninguna de las anteriores

6. **¿Qué programas hacen parte del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo?**

- Programa de Trabajo Seguro en Alturas
- Programa de orden y aseo
- Programa de Inspecciones
- [x] Todas las anteriores
- Ninguna de las anteriores

7. **¿Qué es un acto Inseguro?**

- La lampara averiada en mi puesto de trabajo
- [x] Son la fallas, olvidos, errores y omisiones que hace el trabajador al realizar un trabajo
- Acoso laboral a un compañero de trabajo
- Ninguna de las anteriores

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

8. ¿Qué hacer en caso de un sismo?

- Ubíquese en las ventanas, evacue inmediatamente
- X Conserve la calma, retírese de objetos que puedan caer, ubíquese en posición segura.
- Pasar por alto la situación de emergencia
- Ninguna de las anteriores

9. ¿Qué significa COPASST?

- X Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
- Comité del partido para la salud y seguridad de los trabajadores
- Comité paritario de salud ocupacional
- Consejo paritario de seguridad y salud de trabajadores unidos

10. ¿Cuáles son los peligros a los que usted se encuentra expuesto en su lugar de trabajo?

- Locativo, biomecánico, físico, Psicosocial, biológico
- Eléctrico, mecánico, trabajo en alturas, espacios confinados
- Biológico, químico, publico, Izaje de cargas
- X Todas las anteriores

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

EVALUACIÓN INDUCCIÓN SST

Nombre Completo: Jose Ronel Gutierrez Ripoll

Fecha: 14-8-22.

1. **¿Cuál es el correcto procedimiento en caso de accidentes e incidentes laborales?**

   X Reporte al Jefe Inmediato el Evento/al área de SST/ Reporte ARL/ Desplazamiento de Paciente/Investigación
   - Desplácese a la IPS más cercana/Reporte el accidente 72 horas acontecido el accidente/Remita incapacidad
   - Diagnostique severidad del Accidentado/Reporte el Evento al área de HSEQ/Investigación
   - Espere Asistencia médica/diagnostique severidad/reporte ARL

2. **¿Cuáles de estos componentes no hace parte de la política de Seguridad, Salud y Ambiente en el Trabajo?**

   - Prevención de incidentes y accidentes laborales y Ambientales
   X Cumplimiento de Requisitos legales y otros requisitos en temas de seguridad y salud en el trabajo, así como ambiente
   - Confidencialidad de la información de Seguridad, Salud y Ambiente
   - Mejora Continua en el desempeño SST

3. **¿Cuál de las siguientes opciones no hace parte de sus responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo?**

   - Reporte todo acto y condición insegura, incidente y accidente de manera inmediata
   - Identificación y control de los requisitos legales aplicables de Seguridad, Salud y Ambiente
   X Afiliar a los trabajadores al Sistema General de Riesgos Laborales
   - Conocer y cumplir con las disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente para prevención de riesgos

Escaneado con CamScanner

4. **Son funciones del comité de convivencia laboral**

X Hacer seguimiento de los casos presuntos de acoso laboral/escuchar las partes involucradas de manera individual/Adelantar reuniones con el fin de crear espacios de diálogos.
- Organizar las reuniones de despedida de año/decorar los puestos de trabajo
- Hacer seguimiento de los accidentes laborales/Investigaciones de actos y condiciones inseguras
- Hacer seguimiento del programa de Vigilancia Epidemiológica Psicosocial

5. **¿Qué aspectos contemplan la política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas**

- El efecto del consumo de drogas deteriora el desempeño del trabajo y es una amenaza real para la salud de las personas, la seguridad y la productividad de la empresa.
- Por ningún motivo se permitirá a los colaboradores presentarse a laborar a bajo el efecto de bebidas alcohólicas o sustancias Psicoactivas (SPA)
- Está igualmente prohibido el uso de cualquier sustancia que atente contra la seguridad propia o de los otros colaboradores en el normal desempeño laboral.

X Todas las anteriores
- Ninguna de las anteriores

6. **¿Qué programas hacen parte del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo?**

- Programa de Trabajo Seguro en Alturas
- Programa de orden y aseo
- Programa de Inspecciones

X Todas las anteriores
- Ninguna de las anteriores

7. **¿Qué es un acto inseguro?**

- La lampara averiada en mi puesto de trabajo

X Son la fallas, olvidos, errores y omisiones que hace el trabajador al realizar un trabajo
- Acoso laboral a un compañero de trabajo
- Ninguna de las anteriores

Escaneado con CamScanner

8. **¿Qué hacer en caso de un sismo?**

- Ubíquese en las ventanas, evacue inmediatamente
- X Conserve la calma, retírese de objetos que puedan caer, ubíquese en posición segura.
- Pasar por alto la situación de emergencia
- Ninguna de las anteriores

9. **¿Qué significa COPASST?**

- X Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
- Comité del partido para la salud y seguridad de los trabajadores
- Comité paritario de salud ocupacional
- Consejo paritario de seguridad y salud de trabajadores unidos

10. **¿Cuáles son los peligros a los que usted se encuentra expuesto en su lugar de trabajo?**

- Locativo, biomecánico, físico, Psicosocial, biológico
- Eléctrico, mecánico, trabajo en alturas, espacios confinados
- Biológico, químico, publico, Izaje de cargas
- X Todas las anteriores

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

EVALUACIÓN INDUCCIÓN SST

Nombre Completo: Luis ENRIQUE Polido Moreno

Fecha: 12_17_22

1. **¿Cuál es el correcto procedimiento en caso de accidentes e incidentes laborales?**

   ✓ Reporte al Jefe Inmediato el Evento/al área de SST/ Reporte ARL/ Desplazamiento de Paciente/Investigación
   - Desplácese a la IPS más cercana/Reporte el accidente 72 horas acontecido el accidente/Remita incapacidad
   - Diagnostique severidad del Accidentado/Reporte el Evento al área de HSEQ/Investigación
   - Espere Asistencia médica/diagnostique severidad/reporte ARL

2. **¿Cuáles de estos componentes no hace parte de la política de Seguridad, Salud y Ambiente en el Trabajo?**

   - Prevención de incidentes y accidentes laborales y Ambientales
   - ✓ Cumplimiento de Requisitos legales y otros requisitos en temas de seguridad y salud en el trabajo, así como ambiente
   - Confidencialidad de la información de Seguridad, Salud y Ambiente
   - Mejora Continua en el desempeño SST

3. **¿Cuál de las siguientes opciones no hace parte de sus responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo?**

   - Reporte todo acto y condición insegura, incidente y accidente de manera inmediata
   - Identificación y control de los requisitos legales aplicables de Seguridad, Salud y Ambiente
   - ✓ Afiliar a los trabajadores al Sistema General de Riesgos Laborales
   - Conocer y cumplir con las disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente para prevención de riesgos

Escaneado con CamScanner

4. **Son funciones del comité de convivencia laboral**

- Hacer seguimiento de los casos presuntos de acoso laboral/escuchar las partes involucradas de manera individual/Adelantar reuniones con el fin de crear espacios de diálogos.
- Organizar las reuniones de despedida de año/decorar los puestos de trabajo
- Hacer seguimiento de los accidentes laborales/Investigaciones de actos y condiciones inseguras
- Hacer seguimiento del programa de Vigilancia Epidemiológica Psicosocial

5. **¿Qué aspectos contemplan la política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas**

- El efecto del consumo de drogas deteriora el desempeño del trabajo y es una amenaza real para la salud de las personas, la seguridad y la productividad de la empresa.
- Por ningún motivo se permitirá a los colaboradores presentarse a laborar a bajo el efecto de bebidas alcohólicas o sustancias Psicoactivas (SPA)
- Está igualmente prohibido el uso de cualquier sustancia que atente contra la seguridad propia o de los otros colaboradores en el normal desempeño laboral.
- Todas las anteriores
- Ninguna de las anteriores

6. **¿Qué programas hacen parte del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo?**

- Programa de Trabajo Seguro en Alturas
- Programa de orden y aseo
- Programa de Inspecciones
- Todas las anteriores
- Ninguna de las anteriores

7. **¿Qué es un acto inseguro?**

- La lampara averiada en mi puesto de trabajo
- Son la fallas, olvidos, errores y omisiones que hace el trabajador al realizar un trabajo
- Acoso laboral a un compañero de trabajo
- Ninguna de las anteriores

Escaneado con CamScanner

8. ¿Qué hacer en caso de un sismo?

- Ubíquese en las ventanas, evacue inmediatamente
- ✓ Conserve la calma, retírese de objetos que puedan caer, ubíquese en posición segura.
- Pasar por alto la situación de emergencia
- Ninguna de las anteriores

9. ¿Qué significa COPASST?

- ✓ Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
- Comité del partido para la salud y seguridad de los trabajadores
- Comité paritario de salud ocupacional
- Consejo paritario de seguridad y salud de trabajadores unidos

10. ¿Cuáles son los peligros a los que usted se encuentra expuesto en su lugar de trabajo?

- Locativo, biomecánico, físico, Psicosocial, biológico
- Eléctrico, mecánico, trabajo en alturas, espacios confinados
- Biológico, químico, publico, Izaje de cargas
- ✓ Todas las anteriores

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

EVALUACIÓN INDUCCIÓN SST

Nombre Completo: Moises Ortiz Acosta

Fecha: 17-12-22

1. **¿Cuál es el correcto procedimiento en caso de accidentes e incidentes laborales?**

   X Reporte al Jefe Inmediato el Evento/al área de SST/ Reporte ARL/ Desplazamiento de Paciente/Investigación
   - Desplácese a la IPS más cercana/Reporte el accidente 72 horas acontecido el accidente/Remita incapacidad
   - Diagnostique severidad del Accidentado/Reporte el Evento al área de HSEQ/Investigación
   - Espere Asistencia médica/diagnostique severidad/reporte ARL

2. **¿Cuáles de estos componentes no hace parte de la política de Seguridad, Salud y Ambiente en el Trabajo?**

   - Prevención de incidentes y accidentes laborales y Ambientales
   X Cumplimiento de Requisitos legales y otros requisitos en temas de seguridad y salud en el trabajo, así como ambiente
   - Confidencialidad de la información de Seguridad, Salud y Ambiente
   - Mejora Continua en el desempeño SST

3. **¿Cuál de las siguientes opciones no hace parte de sus responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo?**

   - Reporte todo acto y condición insegura, incidente y accidente de manera inmediata
   - Identificación y control de los requisitos legales aplicables de Seguridad, Salud y Ambiente
   X Afiliar a los trabajadores al Sistema General de Riesgos Laborales
   - Conocer y cumplir con las disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente para prevención de riesgos

Escaneado con CamScanner

4. **Son funciones del comité de convivencia laboral**

X Hacer seguimiento de los casos presuntos de acoso laboral/escuchar las partes involucradas de manera individual/Adelantar reuniones con el fin de crear espacios de diálogos.
- Organizar las reuniones de despedida de año/decorar los puestos de trabajo
- Hacer seguimiento de los accidentes laborales/Investigaciones de actos y condiciones inseguras
- Hacer seguimiento del programa de Vigilancia Epidemiológica Psicosocial

5. **¿Qué aspectos contemplan la política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas**

- El efecto del consumo de drogas deteriora el desempeño del trabajo y es una amenaza real para la salud de las personas, la seguridad y la productividad de la empresa.
- Por ningún motivo se permitirá a los colaboradores presentarse a laborar a bajo el efecto de bebidas alcohólicas o sustancias Psicoactivas (SPA)
- Está igualmente prohibido el uso de cualquier sustancia que atente contra la seguridad propia o de los otros colaboradores en el normal desempeño laboral.

X Todas las anteriores
- Ninguna de las anteriores

6. **¿Qué programas hacen parte del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo?**

- Programa de Trabajo Seguro en Alturas
- Programa de orden y aseo
- Programa de Inspecciones

X Todas las anteriores
- Ninguna de las anteriores

7. **¿Qué es un acto inseguro?**

- La lampara averiada en mi puesto de trabajo

X Son la fallas, olvidos, errores y omisiones que hace el trabajador al realizar un trabajo
- Acoso laboral a un compañero de trabajo
- Ninguna de las anteriores

Escaneado con CamScanner

8. **¿Qué hacer en caso de un sismo?**

- Ubíquese en las ventanas, evacue Inmediatamente
- X Conserve la calma, retírese de objetos que puedan caer, ubíquese en posición segura.
- Pasar por alto la situación de emergencia
- Ninguna de las anteriores

9. **¿Qué significa COPASST?**

- X Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
- Comité del partido para la salud y seguridad de los trabajadores
- Comité paritario de salud ocupacional
- Consejo paritario de seguridad y salud de trabajadores unidos

10. **¿Cuáles son los peligros a los que usted se encuentra expuesto en su lugar de trabajo?**

- Locativo, biomecánico, físico, Psicosocial, biológico
- Eléctrico, mecánico, trabajo en alturas, espacios confinados
- Biológico, químico, publico, Izaje de cargas
- X Todas las anteriores

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

EVALUACIÓN INDUCCIÓN SST

Nombre Completo: Oscar Arley Poveda Jula

Fecha: 17 Diciembre 2022

1. **¿Cuál es el correcto procedimiento en caso de accidentes e incidentes laborales?**

   ✓ Reporte al Jefe Inmediato el Evento/al área de SST/ Reporte ARL/ Desplazamiento de Paciente/Investigación
   - Desplácese a la IPS más cercana/Reporte el accidente 72 horas acontecido el accidente/Remita incapacidad
   - Diagnostique severidad del Accidentado/Reporte el Evento al área de HSEQ/Investigación
   - Espere Asistencia médica/diagnostique severidad/reporte ARL

2. **¿Cuáles de estos componentes no hace parte de la política de Seguridad, Salud y Ambiente en el Trabajo?**

   - Prevención de incidentes y accidentes laborales y Ambientales
   ✓ Cumplimiento de Requisitos legales y otros requisitos en temas de seguridad y salud en el trabajo, así como ambiente
   - Confidencialidad de la información de Seguridad, Salud y Ambiente
   - Mejora Continua en el desempeño SST

3. **¿Cuál de las siguientes opciones no hace parte de sus responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo?**

   - Reporte todo acto y condición insegura, incidente y accidente de manera inmediata
   - Identificación y control de los requisitos legales aplicables de Seguridad, Salud y Ambiente
   ✓ Afiliar a los trabajadores al Sistema General de Riesgos Laborales
   - Conocer y cumplir con las disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente para prevención de riesgos

Escaneado con CamScanner

4. **Son funciones del comité de convivencia laboral**

- ✓ Hacer seguimiento de los casos presuntos de acoso laboral/escuchar las partes involucradas de manera individual/Adelantar reuniones con el fin de crear espacios de diálogos.
- Organizar las reuniones de despedida de año/decorar los puestos de trabajo
- Hacer seguimiento de los accidentes laborales/Investigaciones de actos y condiciones inseguras
- Hacer seguimiento del programa de Vigilancia Epidemiológica Psicosocial

5. **¿Qué aspectos contemplan la política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas**

- El efecto del consumo de drogas deteriora el desempeño del trabajo y es una amenaza real para la salud de las personas, la seguridad y la productividad de la empresa.
- Por ningún motivo se permitirá a los colaboradores presentarse a laborar a bajo el efecto de bebidas alcohólicas o sustancias Psicoactivas (SPA)
- Está igualmente prohibido el uso de cualquier sustancia que atente contra la seguridad propia o de los otros colaboradores en el normal desempeño laboral.
- ✓ Todas las anteriores
- Ninguna de las anteriores

6. **¿Qué programas hacen parte del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo?**

- Programa de Trabajo Seguro en Alturas
- Programa de orden y aseo
- Programa de Inspecciones
- ✓ Todas las anteriores
- Ninguna de las anteriores

7. **¿Qué es un acto inseguro?**

- La lampara averiada en mi puesto de trabajo
- ✓ Son la fallas, olvidos, errores y omisiones que hace el trabajador al realizar un trabajo
- Acoso laboral a un compañero de trabajo
- Ninguna de las anteriores

Escaneado con CamScanner

8. ¿Qué hacer en caso de un sismo?

- Ubíquese en las ventanas, evacue Inmediatamente
- ✓ Conserve la calma, retírese de objetos que puedan caer, ubíquese en posición segura.
- Pasar por alto la situación de emergencia
- Ninguna de las anteriores

9. ¿Qué significa COPASST?

- ✓ Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
- Comité del partido para la salud y seguridad de los trabajadores
- Comité paritario de salud ocupacional
- Consejo paritario de seguridad y salud de trabajadores unidos

10. ¿Cuáles son los peligros a los que usted se encuentra expuesto en su lugar de trabajo?

- Locativo, biomecánico, físico, Psicosocial, biológico
- Eléctrico, mecánico, trabajo en alturas, espacios confinados
- Biológico, químico, publico, Izaje de cargas
- ✓ Todas las anteriores

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

EVALUACIÓN INDUCCIÓN SST

Nombre Completo: Elberth Iván Cardonas Garzon.

Fecha: 17/12/2022.

1. **¿Cuál es el correcto procedimiento en caso de accidentes e incidentes laborales?**

   - (•) Reporte al Jefe Inmediato el Evento/al área de SST/ Reporte ARL/ Desplazamiento de Paciente/Investigación
   - Desplácese a la IPS más cercana/Reporte el accidente 72 horas acontecido el accidente/Remita incapacidad
   - Diagnostique severidad del Accidentado/Reporte el Evento al área de HSEQ/Investigación
   - Espere Asistencia médica/diagnostique severidad/reporte ARL

2. **¿Cuáles de estos componentes no hace parte de la política de Seguridad, Salud y Ambiente en el Trabajo?**

   - Prevención de incidentes y accidentes laborales y Ambientales
   - (•) Cumplimiento de Requisitos legales y otros requisitos en temas de seguridad y salud en el trabajo, así como ambiente
   - Confidencialidad de la información de Seguridad, Salud y Ambiente
   - Mejora Continua en el desempeño SST

3. **¿Cuál de las siguientes opciones no hace parte de sus responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo?**

   - Reporte todo acto y condición insegura, incidente y accidente de manera inmediata
   - Identificación y control de los requisitos legales aplicables de Seguridad, Salud y Ambiente
   - (•) Afiliar a los trabajadores al Sistema General de Riesgos Laborales
   - Conocer y cumplir con las disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente para prevención de riesgos

Escaneado con CamScanner

4. **Son funciones del comité de convivencia laboral**

- (•) Hacer seguimiento de los casos presuntos de acoso laboral/escuchar las partes involucradas de manera individual/Adelantar reuniones con el fin de crear espacios de diálogos.
- Organizar las reuniones de despedida de año/decorar los puestos de trabajo
- Hacer seguimiento de los accidentes laborales/Investigaciones de actos y condiciones inseguras
- Hacer seguimiento del programa de Vigilancia Epidemiológica Psicosocial

5. **¿Qué aspectos contemplan la política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas**

- El efecto del consumo de drogas deteriora el desempeño del trabajo y es una amenaza real para la salud de las personas, la seguridad y la productividad de la empresa.
- Por ningún motivo se permitirá a los colaboradores presentarse a laborar a bajo el efecto de bebidas alcohólicas o sustancias Psicoactivas (SPA)
- Está igualmente prohibido el uso de cualquier sustancia que atente contra la seguridad propia o de los otros colaboradores en el normal desempeño laboral.
- (•) Todas las anteriores
- Ninguna de las anteriores

6. **¿Qué programas hacen parte del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo?**

- Programa de Trabajo Seguro en Alturas
- Programa de orden y aseo
- Programa de Inspecciones
- (•) Todas las anteriores
- Ninguna de las anteriores

7. **¿Qué es un acto inseguro?**

- La lampara averiada en mi puesto de trabajo
- (•) Son la fallas, olvidos, errores y omisiones que hace el trabajador al realizar un trabajo
- Acoso laboral a un compañero de trabajo
- Ninguna de las anteriores

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

8. ¿Qué hacer en caso de un sismo?

- Ubíquese en las ventanas, evacue Inmedlatamente
- Conserve la calma, retírese de objetos que puedan caer, ubíquese en posición segura.
- Pasar por alto la situación de emergencia
- Ninguna de las anteriores

9. ¿Qué significa COPASST?

- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
- Comité del partido para la salud y seguridad de los trabajadores
- Comité paritario de salud ocupacional
- Consejo paritario de seguridad y salud de trabajadores unidos

10. ¿Cuáles son los peligros a los que usted se encuentra expuesto en su lugar de trabajo?

- Locativo, biomecánico, físico, Psicosocial, biológico
- Eléctrico, mecánico, trabajo en alturas, espacios confinados
- Biológico, químico, publico, Izaje de cargas
- Todas las anteriores

Escaneado con CamScanner
