INFORME MENSUAL 0 5

GRUPO No. 1

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2022.”



ENERO 2023

Arq. EDGAR EDUARDO ROA CASTILLO

Director Interventoría

TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES

a. Contrato de obra

b. Contrato de interventoría

2. ASPECTOS TÉCNICO

a. Descripción y porcentaje (%) de avance técnico, general

b. Descripción y porcentaje (%) de avance técnico por vivienda.

c. Exposición de las situaciones de orden técnico que se hayan presentado en la ejecución del contrato y que merezcan atención por parte de la entidad.

d. Soluciones adoptadas

e. Recomendaciones pertinentes

f. De no presentarse dichas situaciones de orden técnico, se deberá informar sobre la no existencia de estas durante el periodo.

g. Estado del tiempo mes de SEPTIEMBRE DE 2022

h. Reporte técnico general mensual

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

a. Presentación de las situaciones constitutivas de incumplimiento por parte del contratista de obra, si fuere el caso.

b. Constancia de la entrega de las certificaciones del Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales, (anexar las respectivas planillas de pago de todo el personal utilizado en obra tanto de obra como de interventoría).

c. Información sobre los requerimientos que, en el periodo informado, se hayan hecho al contratista de obra. Se allegará copia de estos y de sus repuestas, si fuere el caso.

d. Información sobre la vigencia de las garantías que amparan el contrato.

i. Pólizas

4. ASPECTOS SOCIALES

a. Registro de atención a la comunidad y seguimiento a los mismos Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR.

b. Matriz de seguimiento al cumplimiento del plan de acompañamiento social.

c. Documento que contenga avances, logros y dificultades cualitativas y cuantitativas de la ejecución de obra.

5. ASPECTOS PRESUPUESTALES

a. Información relacionada con la ejecución de los recursos asignados al contrato de obra.

b. Información relativa a los pagos realizados y los saldos pendientes de pago.

c. Información relativa al manejo y a la amortización del anticipo, si fuere el caso.

1. ASPECTOS GENERALES

a. Contrato de obra

CLASE: CONTRATO DE OBRA

NÚMERO: CTO de obra 999-2022

CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**	
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOZ Nit: 900,372 ,215-7	
REPRESENTANTE	JORGE HERNANDO PINZÓN CASTIBLANCO	
OBJETO CONTRACTUAL	"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 – 2022."	
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 914 DEL 14 DE JULIO DE 2020	
DIRECCIÓN:	Calle 12ª 68C-03 Bogotá D.C.	
TELÉFONOS:	7430070 EXT 405-406-908	dirlicitaciones.familiamic@gmail.com; obracivil.gepm@gmail.com
SUPERVISOR	CAMILA CORTES DAZA	
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
FECHA DE	31 DE DICIEMBRE DE 2022	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	4 MESES	
VALOR CONTRATO	$3.600.000.000	
FECHA ADICIÓN No. 1	23 DE NOVIEMBRE DE 2022	
VALOR ADICIÓN No. 1	$1.602.000.000	
VALOR TOTAL CONTRATO	$5.202.000.000	
FECHA PRÓRROGA No. 1	23 DE NOVIEMBRE DE 2022	
VALOR PRÓRROGA	$1.602.000.000	
VALOR TOTAL CONTRATO	$5.202.000.000	

b. Contrato de interventoría

CLASE: CONTRATO DE INTERVENTORÍA


NÚMERO: CTO # 1008 DE 2022

CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIVIENDA 22
IDENTIFICACIÓN:	N.I.T.: 901,627224-3
REPRESENTANTE LEGAL:	ALEJANDRO ZAMUDIO
OBJETO CONTRACTUAL	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2022."
DIRECCIÓN:	Carrera 96A No. 130B - 11 Piso 4, Bogotá D.C
TELÉFONOS:	(601)9296772- 3208939583 consorciointervivienda22@gmail.com
SUPERVISOR	CAMILA CORTES DAZA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	31 DE ENERO DE 2023
TIEMPO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	5 MESES
VALOR CONTRATO	$432.000.000
FECHA ADICIÓN No. 1	23 DE NOVIEMBRE DE 2022
VALOR ADICIÓN No. 1	$192.240.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$624.240.000
FECHA PRÓRROGA No. 1	23 DE NOVIEMBRE DE 2022
VALOR PRÓRROGA No. 1	$624.240.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$624.240.000

2. ASPECTOS TÉCNICO

a. Descripción y porcentaje (%) de avance técnico, general

En el desarrollo de las actividades en el mes de ENERO DE 2023, se presentaron los siguientes indicadores que muestran el comportamiento en la validación y avance de obra, es importante indicar que así las viviendas se encuentren validada no indica que se encuentren en ejecución.

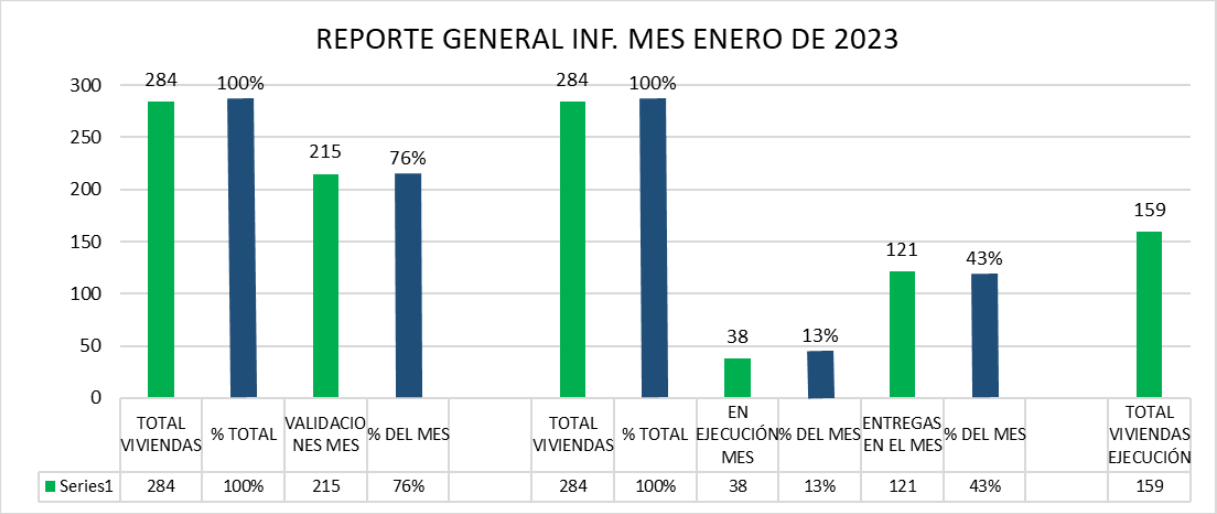

b. Descripción y porcentaje (%) de avance técnico por vivienda.

Para cada una de las viviendas, en el mes del presente informe se registran los siguientes indicadores en relación con las 215 viviendas en desarrollo, estos datos muestran el avance general.

0%	70
1% AL 25%	6
26% AL 50%	7
51% AL 75%	3
76% AL 99%	8
100%	121
TOTAL VIVIENDAS	215

Programación de obra:

De acuerdo con ajuste en la reprogramación de obra generada por la adición y prórroga 1 que que fue expuesta por el contratista, para el presente informe se expone lo siguiente:

1. Para el mes de ENERO de 2023 se tiene programado según la reprogramación de obra el desarrollo de las 156 validaciones, pero fueron desarrolladas 215 validaciones en su totalidad, lo que genero un adelanto de 59 validaciones.


MV_001141	VALIDADA
MV_1136	VALIDADA
MV_00115	VALIDADA
MV_01363	VALIDADA
MV_01530	VALIDADA
MV_01526	VALIDADA
MV_01557	VALIDADA
MVAL_00040	VALIDADA
MV_00004	VALIDADA
MV_01428	VALIDADA
MV_01570	VALIDADA
MV_01566	VALIDADA
MVAL_00091	VALIDADA
MV_00092	VALIDADA
MV_00098	VALIDADA
MV_00106	VALIDADA
MV_1201	VALIDADA
MV_0021	VALIDADA
MVAL_0022	VALIDADA
MV_01213	VALIDADA
MV_01215	VALIDADA
MV_1359	VALIDADA
MV_01367	VALIDADA
MV_01368	VALIDADA
MV_01265	VALIDADA
MV_01266	VALIDADA
MV_01268	VALIDADA
MV_01270	VALIDADA
MV_01271	VALIDADA
MV_1374	VALIDADA
MV_1427	VALIDADA
MV_0026	VALIDADA
MV_0030	VALIDADA
MV_1426	VALIDADA
MV_01425	VALIDADA
MV_01420	VALIDADA
MV_01573	VALIDADA
MV_01560	VALIDADA
MVAL_00005	VALIDADA
MV_00009	VALIDADA
MVAL_00011	VALIDADA
MV_00082	VALIDADA
MV_00085	VALIDADA
MVAL_00064	VALIDADA

MV_00062	VALIDADA
MV_14683	VALIDADA
MV_00060	VALIDADA
MV_00102	VALIDADA
MV_00071	VALIDADA
MV_00069	VALIDADA
MV_00068	VALIDADA
MV_00076	VALIDADA
MV_00066	VALIDADA
MV_02731	VALIDADA
MV_02833	VALIDADA
MVAL_02834	VALIDADA
MV_02848	VALIDADA
MV_02857	VALIDADA
MV_02864	VALIDADA
MV_02875	VALIDADA
MV_02895	VALIDADA
MV_02901	VALIDADA
MV_02904	VALIDADA
MV_02905	VALIDADA
MVAL_02812	VALIDADA
MV_02782	VALIDADA
MV_02842	VALIDADA
MV_02844	VALIDADA
MV_02888	VALIDADA
MV_02896	VALIDADA
MV_1512	VALIDADA
MV_00109	VALIDADA
MV_00002	VALIDADA
MV_01366	VALIDADA
MV_1236	VALIDADA
MV_01247	VALIDADA
MV_00329	VALIDADA
MVAL_00046	VALIDADA
MVAL_01257	VALIDADA
MV_1180	VALIDADA
MV_1433	VALIDADA
MV_00038	VALIDADA
MV_1343	VALIDADA
MV_1095	VALIDADA
MV_00420	VALIDADA
MV_1234	VALIDADA
MV_00001	VALIDADA
MV_1032	VALIDADA

MV_01196	VALIDADA
MV_01430	VALIDADA
MV_01244	VALIDADA
MVAL_01563	VALIDADA
MV_1103	VALIDADA
MV_0025	VALIDADA
MV_01400	VALIDADA
MVAL_00164	VALIDADA
MV_00333	VALIDADA
MV_00332	VALIDADA
MV_00350	VALIDADA
MV_00352	VALIDADA
MV_00360	VALIDADA
MV_00335	VALIDADA
MVAL_00381	VALIDADA
MV_00367	VALIDADA
MV_00404	VALIDADA
MV_00402	VALIDADA
MVAL_00401	VALIDADA
MV_00398	VALIDADA
MVAL_00389	VALIDADA
MV_00391	VALIDADA
MVAL_00434	VALIDADA
MVAL_00441	VALIDADA
MV_00417	VALIDADA
MV_00419	VALIDADA
MV_00425	VALIDADA
MV_00423	VALIDADA
MV_00451	VALIDADA
MV_00452	VALIDADA
MV_00453	VALIDADA
MV_00316	VALIDADA
MV_00314	VALIDADA
MV_00311	VALIDADA
MV_00317	VALIDADA
MV_00306	VALIDADA
MV_0320	VALIDADA
MV_00303	VALIDADA
MV_00302	VALIDADA
MV_00271	VALIDADA
MV_00274	VALIDADA
MV_00279	VALIDADA
MV_00280	VALIDADA


MV_14691	VALIDADA
MV_00282	VALIDADA
MV_00236	VALIDADA
MV_00231	VALIDADA
MV_00232	VALIDADA
MV_00248	VALIDADA
MVAL_00249	VALIDADA
MV_00218	VALIDADA
MV_00220	VALIDADA
MV_00222	VALIDADA
MV_00224	VALIDADA
MV_00297	VALIDADA
MV_00211	VALIDADA
MVAL_00209	VALIDADA
MVAL_00178	VALIDADA
MVAL_00174	VALIDADA
MV_00172	VALIDADA
MV_00171	VALIDADA
MV_00159	VALIDADA
MV_00158	VALIDADA
MV_00165	VALIDADA
MVAL_0149	VALIDADA
MVAL_0140	VALIDADA
MV_1051	VALIDADA
MV_1056	VALIDADA
MV_1060	VALIDADA
MV_1062	VALIDADA
MV_1064	VALIDADA
MV_01035	VALIDADA
MV_01041	VALIDADA
MV_1043	VALIDADA
MV_01105	VALIDADA
MV_1069	VALIDADA
MV_1072	VALIDADA
MV_1075	VALIDADA
MV_1076	VALIDADA
MV_01079	VALIDADA
MV_01080	VALIDADA
MV_01081	VALIDADA
MV_01146	VALIDADA
MV_001151	VALIDADA
MVAL_0116	VALIDADA
MV_1132	VALIDADA

MV_1131	VALIDADA
MV_1129	VALIDADA
MV_1162	VALIDADA
MV_01123	VALIDADA
MV_0127	VALIDADA
MV_00013	VALIDADA
MV_0015	VALIDADA
MV_01167	VALIDADA
MV_1166	VALIDADA
MV_1179	VALIDADA
MV_01176	VALIDADA
MV_01175	VALIDADA
MV_1174	VALIDADA
MV_01112	VALIDADA
MV_01114	VALIDADA
MV_1122	VALIDADA
MV_1120	VALIDADA
MV_1109	VALIDADA
MV_1020	VALIDADA
MV_1028	VALIDADA
MV_01191	VALIDADA
MV_01192	VALIDADA
MV_1197	VALIDADA
MV_1198	VALIDADA
MV_1200	VALIDADA
MV_1206	VALIDADA
MV_1220	VALIDADA
MV_01223	VALIDADA
MV_1228	VALIDADA
MV_1230	VALIDADA
MV_1231	VALIDADA
MV_01238	VALIDADA
MV_1240	VALIDADA
MVAL_01253	VALIDADA
MV_1349	VALIDADA
MV_1344	VALIDADA
MV_0028	VALIDADA
MV_1423	VALIDADA
MV_1391	VALIDADA
MV_1394	VALIDADA
MV_0049	VALIDADA

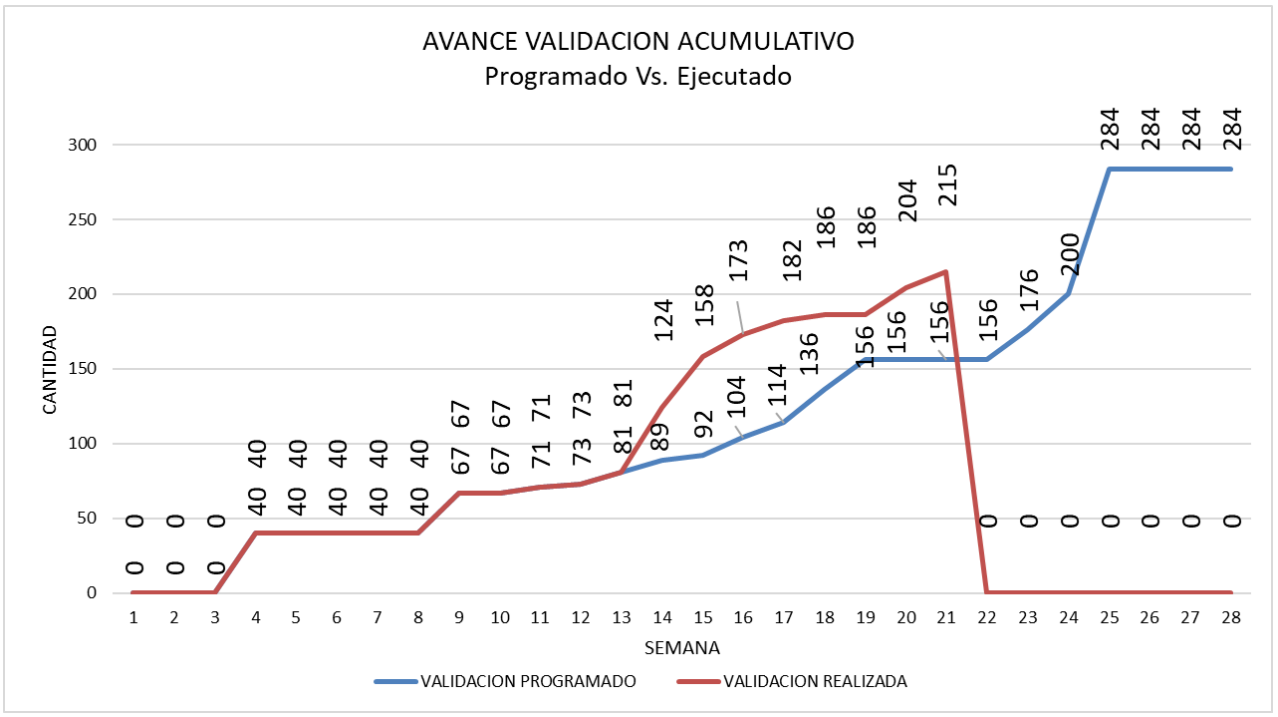

VALIDACIONES- ENERO

2. Para el mes de diciembre se tiene programado la ejecución de 114 viviendas según la reprogramación, de lo anterior al presente informe hay 159 viviendas entre entregas y en ejecución, lo que genera un adelanto de 45 viviendas.

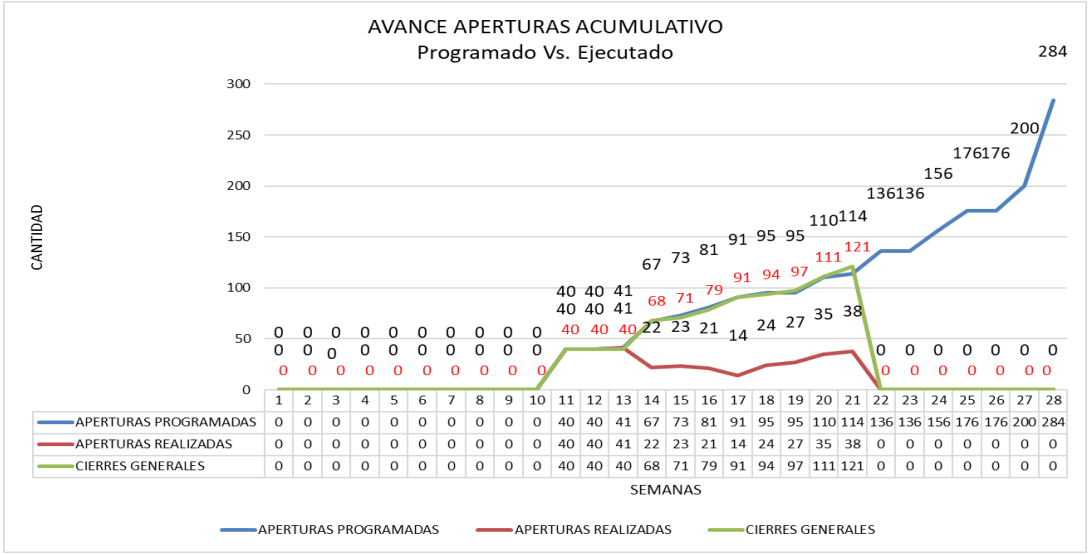

APERTURA- EJECUCIÓN- NOVIEMBRE

MV_001141	EN EJECUCIÓN	0,00%
MV_1136	EN EJECUCIÓN	0,00%
MV_00115	EN EJECUCIÓN	0,00%
MV_01363	EN EJECUCIÓN	0,00%
MV_01530	EN EJECUCIÓN	0,00%
MV_01526	EN EJECUCIÓN	0,00%
MV_01557	EN EJECUCIÓN	0,00%
MVAL_0004	EN EJECUCIÓN	0,00%
MV_00004	EN EJECUCIÓN	0,00%
MV_01428	EN EJECUCION	0,00%
MV_01570	EN EJECUCION	0,00%
MV_01566	EN EJECUCION	0,00%
MVAL_0009	EN EJECUCION	0,00%
MV_00092	EN EJECUCION	0,00%
MV_00098	EN EJECUCION	0,00%
MV_00109	EN EJECUCIÓN	5,00%
MV_00002	EN EJECUCIÓN	12,00%
MV_01366	EN EJECUCIÓN	15,00%
MV_1236	EN EJECUCIÓN	20,00%
MV_01247	EN EJECUCIÓN	20,00%
MV_00329	EN EJECUCION	20,00%
MVAL_0004	EN EJECUCIÓN	26,00%
MVAL_01257	EN EJECUCIÓN	40,00%
MV_1180	EN EJECUCION	40,00%
MV_1433	EN EJECUCION	40,00%
MV_00038	EN EJECUCIÓN	42,00%
MV_1343	EN EJECUCION	45,00%
MV_1095	EN EJECUCION	50,00%
MV_00420	EN EJECUCION	60,00%
MV_1234	EN EJECUCION	60,00%
MV_00001	EN EJECUCIÓN	68,00%
MV_1032	EN EJECUCION	80,00%
MV_01196	EN EJECUCION	80,00%
MV_01430	EN EJECUCION	85,00%
MV_01244	ENTREGADA	85,00%
MVAL_0156	EN EJECUCIÓN	95,00%
MV_1103	EN EJECUCION	95,00%
MV_0025	EN EJECUCION	95,00%
MV_01400	EN EJECUCIÓN	97,00%
MVAL_0016	ENTREGADA	100,00%
MV_00333	ENTREGADA	100,00%
MV_00332	ENTREGADA	100,00%
MV_00350	ENTREGADA	100,00%
MV_00352	ENTREGADA	100,00%
MV_00360	ENTREGADA	100,00%
MV_00335	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0038	ENTREGADA	100,00%
MV_00367	ENTREGADA	100,00%
MV_00404	ENTREGADA	100,00%
MV_00402	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0040	ENTREGADA	100,00%
MV_00398	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0038	ENTREGADA	100,00%
MV_00391	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0043	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0044	ENTREGADA	100,00%
MV_00417	ENTREGADA	100,00%
MV_00419	ENTREGADA	100,00%
MV_00425	ENTREGADA	100,00%
MV_00423	ENTREGADA	100,00%
MV_00451	ENTREGADA	100,00%
MV_00452	ENTREGADA	100,00%
MV_00453	ENTREGADA	100,00%
MV_00316	ENTREGADA	100,00%
MV_00314	ENTREGADA	100,00%
MV_00311	ENTREGADA	100,00%
MV_00317	ENTREGADA	100,00%
MV_00306	ENTREGADA	100,00%
MV_0320	ENTREGADA	100,00%
MV_00303	ENTREGADA	100,00%
MV_00302	ENTREGADA	100,00%
MV_00271	ENTREGADA	100,00%
MV_00274	ENTREGADA	100,00%
MV_00279	ENTREGADA	100,00%
MV_00280	ENTREGADA	100,00%
MV_14691	ENTREGADA	100,00%
MV_00282	ENTREGADA	100,00%
MV_00236	ENTREGADA	100,00%
MV_00231	ENTREGADA	100,00%
MV_00232	ENTREGADA	100,00%
MV_00248	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0024	ENTREGADA	100,00%
MV_00218	ENTREGADA	100,00%
MV_00220	ENTREGADA	100,00%
MV_00222	ENTREGADA	100,00%
MV_00224	ENTREGADA	100,00%
MV_00297	ENTREGADA	100,00%
MV_00211	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0020	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0017	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0017	ENTREGADA	100,00%
MV_00172	ENTREGADA	100,00%
MV_00171	ENTREGADA	100,00%
MV_00159	ENTREGADA	100,00%
MV_00158	ENTREGADA	100,00%
MV_00165	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0149	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0140	ENTREGADA	100,00%
MV_1051	ENTREGADA	100,00%
MV_1056	ENTREGADA	100,00%
MV_1060	ENTREGADA	100,00%
MV_1062	ENTREGADA	100,00%
MV_1064	ENTREGADA	100,00%
MV_01035	ENTREGADA	100,00%
MV_01041	ENTREGADA	100,00%
MV_1043	ENTREGADA	100,00%
MV_01105	ENTREGADA	100,00%
MV_1069	ENTREGADA	100,00%
MV_1072	ENTREGADA	100,00%
MV_1075	ENTREGADA	100,00%
MV_1076	ENTREGADA	100,00%
MV_01079	ENTREGADA	100,00%
MV_01080	ENTREGADA	100,00%
MV_01081	ENTREGADA	100,00%
MV_01146	ENTREGADA	100,00%
MV_001151	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0116	ENTREGADA	100,00%
MV_1132	ENTREGADA	100,00%
MV_1131	ENTREGADA	100,00%
MV_1129	ENTREGADA	100,00%
MV_1162	ENTREGADA	100,00%
MV_01123	ENTREGADA	100,00%
MV_0127	ENTREGADA	100,00%
MV_00013	ENTREGADA	100,00%
MV_0015	ENTREGADA	100,00%
MV_01167	ENTREGADA	100,00%
MV_1166	ENTREGADA	100,00%
MV_1179	ENTREGADA	100,00%
MV_01176	ENTREGADA	100,00%
MV_01175	ENTREGADA	100,00%
MV_1174	ENTREGADA	100,00%
MV_01112	ENTREGADA	100,00%

MV_01114	ENTREGADA	100,00%
MV_1122	ENTREGADA	100,00%
MV_1120	ENTREGADA	100,00%
MV_1109	ENTREGADA	100,00%
MV_1020	ENTREGADA	100,00%
MV_1028	ENTREGADA	100,00%
MV_01191	ENTREGADA	100,00%
MV_01192	ENTREGADA	100,00%
MV_1197	ENTREGADA	100,00%
MV_1198	ENTREGADA	100,00%
MV_1200	ENTREGADA	100,00%
MV_1206	ENTREGADA	100,00%
MV_1220	ENTREGADA	100,00%
MV_01223	ENTREGADA	100,00%
MV_1228	ENTREGADA	100,00%
MV_1230	ENTREGADA	100,00%
MV_1231	ENTREGADA	100,00%
MV_01238	ENTREGADA	100,00%
MV_1240	ENTREGADA	100,00%
MVAL_01253	ENTREGADA	100,00%
MV_1349	ENTREGADA	100,00%
MV_1344	ENTREGADA	100,00%
MV_0028	ENTREGADA	100,00%
MV_1423	ENTREGADA	100,00%
MV_1391	ENTREGADA	100,00%
MV_1394	ENTREGADA	100,00%
MV_0049	ENTREGADA	100,00%

c. *Exposición de las situaciones de orden técnico que se hayan presentado en la ejecución del contrato y que merezcan atención por parte de la entidad.*

Para el presente informe se presento el retraso en la entrega de la reprogramación de obra, por lo anterior se generó llamado de atención por parte de la su previsión y la interventoría.

d. *Soluciones adoptadas*

Se realiza comité de obra donde se expuso la situación, Allí, desde la supervisión de obra como la interventoría, solicita sea entregados los documentos correspondientes, así como un informe del estado de las obligaciones contractuales por parte del contratista.

e. *Recomendaciones pertinentes*

Para el presente informe, se genera recomendaciones al contratista para dar continuidad a las ejecuciones de cada una de las viviendas dejando registro de modificaciones, cambios o ajustes que posteriormente puedan generar alguna queja o reclamo, también se solicita se de respuesta a las solicitudes de la interventoría.

f. *De no presentarse dichas situaciones de orden técnico, se deberá informar sobre la no existencia de estas durante el periodo.*

Se exponen en los puntos anteriores.


g. *Estado del tiempo mes de ENERO DE 2023*

Lluvia

Para mostrar la variación durante el mes y no sólo el total mensual, mostramos la precipitación de lluvia acumulada durante un periodo de 31 días en una escala móvil, centrado alrededor de cada día.

El promedio de lluvia durante un periodo de 31 días en una escala móvil en enero en el Aeropuerto El Dorado es esencialmente constante, permaneciendo en aproximadamente 47 milímetros y rara vez excede 105 milímetros o es menos de 6 milímetros.

El promedio de la acumulación mínima de 31 días es 42 milímetros el 13 de enero.

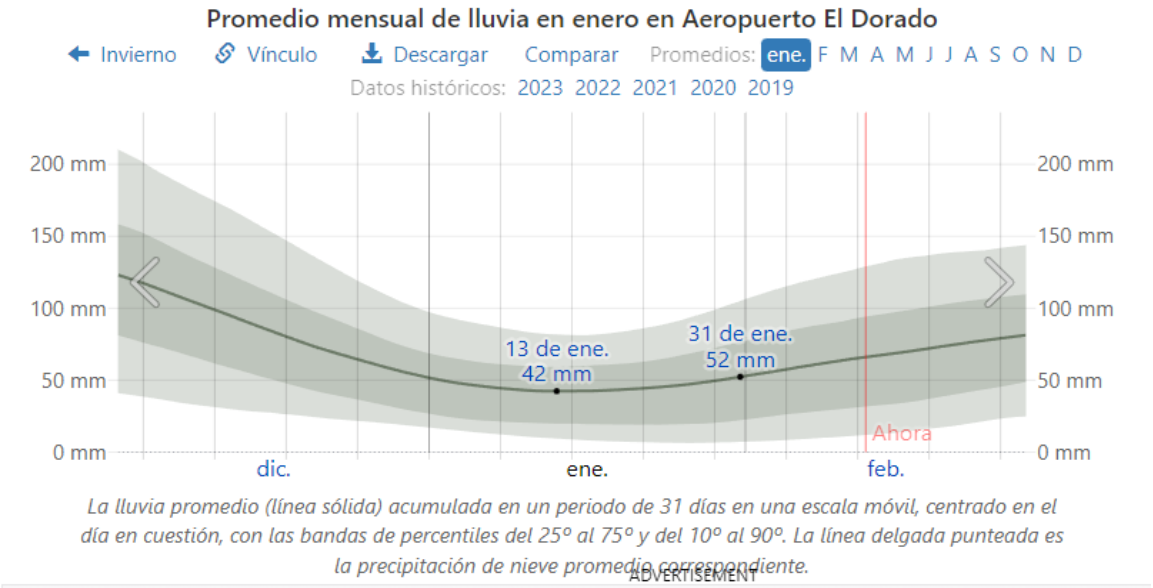

https://es.weatherspark.com/m/147155/12/Tiempo-promedio-en-diciembre-en-el-Aeropuerto-El-Dorado-Colombia

h. Reporte técnico general mensual

formación entregada por el la SDHT					Fase 2: Ejecución de obras							
Territorio o barrio a intervenir	USME	Barrios	Predios	Total	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Por Ejecutar	Terminadas	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
G1		EL NUEVO PORTAL	14	50	14	0	14	1	0	13	97,14%	13
		NUEVO PORVENIR	36		36	0	14	6	9	21	70,00%	21
			0		0	0	0	0	0	0		0
			0		0	0	0	0	0	0		0
Subtotal			50		50	0	0	7	9	34	83,57%	34

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	USME	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Por Ejecutar	Terminadas	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
G2		EL NUEVO PORTAL	5	50	5	0	4	0	0	5	100,00%	5
		NUEVO PORVENIR	25		25	0	15	2	6	17	75,68%	17
		EL TRIANGULO	20		19	5	0	6	14	0	9,87%	0
			0		0	0	0	0	0	0		0
Subtotal			50		49	5	0	8	20	22	61,85%	22

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	USME	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Por Ejecutar	Terminadas	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
G3		NUEVO PORTAL	15	50	15	0	0	0	0	15	100,00%	15
		NUEVO PORVENIR	35		35	0	0	14	8	13	49,23%	13
			0		0	0	0	0	0	0		0
			0		0	0	0	0	0	0		0
Subtotal			50		50	0	0	14	8	28	74,61%	28

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	USME	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Por Ejecutar	Terminadas	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
G4		EL NUEVO PORTAL	18	66	18	0	1	0	0	18	100,00%	18
		PORTAL DE LA VEGA	6		6	0	0	0	0	6	100,00%	6
		NUEVO PORVENIR	19		19	0	1	6	0	13	82,63%	13
		EL TRIANGULO	6		6	0	0	3	3	0	0,00%	0
		EL PORTAL DEL DIVINO	17		17	0	0	0	17	0	0,00%	0
Subtotal			66		66	0	2	9	20	37	56,53%	37

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	USME	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Por Ejecutar	Terminadas	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
GENERAL		EL NUEVO PORTAL	52	216	52	0	19	1	0	51	99%	51
		PORTAL DE LA VEGA	6		6	0	0	0	0	6	100%	6
		NUEVO PORVENIR	115		115	0	30	28	23	64	69%	64
		EL TRIANGULO	26		25	5	0	9	17	0	10%	0
		EL PORTAL DEL DIVINO	17		17	0	0	0	17	0	0%	0
Subtotal			216		215	5	49	38	57	121	279%	121

Proyecto mejoramiento de vivienda – AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE

MV_001141	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1136	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00115	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01363	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01530	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01526	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01557	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_00040	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00004	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01428	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01570	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01566	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_00091	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00092	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00098	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00106	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	45,00%	95,00%	100,00%	100,00%	0,00%
MV_1201	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_0021	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_0022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01213	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01215	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1359	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01367	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01368	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01265	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01266	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01268	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01270	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01271	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1374	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1427	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_0026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_0030	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1426	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01425	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01420	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01573	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01560	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_00005	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00009	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_00011	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00082	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00085	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_00064	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00062	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_14683	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00102	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00071	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00069	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00068	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00076	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00066	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02731	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02833	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_02834	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02848	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02857	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02864	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02875	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02895	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02901	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02904	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02905	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_02812	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

MV_02782	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02842	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02844	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02888	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02896	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1512	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00109	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
MV_00002	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%
MV_01366	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%
MV_1236	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%
MV_01247	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
MV_00329	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
MVAL_00046	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%	26,00%
MVAL_01257	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	40,00%
MV_1180	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%
MV_1433	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%
MV_00038	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	42,00%
MV_1343	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%	45,00%
MV_1095	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%
MV_00420	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%
MV_1234	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%
MV_00001	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	68,00%
MV_1032	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	80,00%
MV_01196	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	80,00%
MV_01430	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,00%
MV_01244	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	85,00%
MVAL_01563	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56,00%	95,00%
MV_1103	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	40,00%	85,00%	95,00%
MV_0025	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	80,00%	95,00%
MV_01400	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,00%	97,00%	97,00%
MVAL_00164	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	45,00%	78,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00333	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,00%	68,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00332	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00350	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	28,00%	52,00%	72,00%	97,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00352	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,95%	74,17%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00360	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,52%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00335	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,17%	30,96%	47,66%	89,42%	89,42%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00381	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,70%	9,19%	27,07%	59,32%	95,90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00367	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,84%	39,57%	71,59%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00404	0,00%	0,00%	5,00%	45,00%	80,00%	88,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00402	0,00%	0,00%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	3,42%	5,67%	82,58%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00401	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00398	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,29%	38,51%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00389	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00391	0,00%	0,00%	5,00%	50,00%	90,00%	98,00%	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00434	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00441	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	40,00%	60,00%	85,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00417	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00419	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00425	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00423	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%	70,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00451	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	50,00%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00452	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00453	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	90,00%	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00316	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	20,00%	60,00%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00314	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	30,00%	40,00%	80,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00311	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	60,00%	0,00%	85,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00317	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,25%	34,09%	85,72%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00306	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	97,72%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_0320	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00303	0,00%	0,00%	0,00%	19,00%	43,00%	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00302	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00271	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,98%	30,54%	55,21%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00274	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	75,00%	90,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00279	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	75,00%	98,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

MV_00236	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_00231	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	90,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_00232	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	65,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_00248	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MVAL_00249	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	18,24%	86,30%	99,78%	99,78%	99,78%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_00218	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_00220	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,88%	70,39%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_00222	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,61%	72,87%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_00224	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_00297	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,83%	18,59%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_00211	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,42%	21,42%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MVAL_00209	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,97%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MVAL_00178	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,83%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MVAL_00174	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,30%	32,36%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_00172	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,08%	45,98%	92,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_00171	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_00159	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_00158	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	100,00%	
MV_00165	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	40,00%	86,00%	93,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MVAL_0149	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	35,00%	85,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MVAL_0140	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_1051	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_1056	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_1060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_1062	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_1064	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_01035	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	65,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_01041	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_1043	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	55,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_01105	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_1069	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	55,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_1072	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	40,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_1075	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_1076	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	0,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_01079	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	20,00%	20,00%	70,00%	99,00%	100,00%	
MV_01080	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	40,00%	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_01081	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	98,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_01146	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	45,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_001151	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	40,00%	80,00%	85,00%	93,00%	100,00%	
MVAL_0116	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	44,00%	78,00%	100,00%	100,00%	
MV_1132	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	42,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_1131	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%	35,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_1129	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%	28,00%	52,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_1162	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	72,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_01123	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%	32,00%	91,00%	100,00%	100,00%	
MV_0127	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_00013	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,00%	88,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_0015	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	55,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_01167	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%	50,00%	68,00%	86,00%	96,00%	100,00%	
MV_1166	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	36,00%	72,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_1179	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_01176	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,00%	55,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_01175	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	21,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_1174	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,85%	91,85%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_01112	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,66%	37,77%	39,78%	80,00%	85,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_01114	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,37%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_1122	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,51%	54,74%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_1120	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42,10%	87,25%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_1109	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_1020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	65,00%	100,00%	100,00%	
MV_1028	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	35,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_01191	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	15,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
MV_01192	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	100,00%	100,00%	

MV_1197	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1198	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	75,00%	100,00%	100,00%
MV_1200	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,50%	17,20%	95,00%	100,00%	100,00%
MV_1206	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	90,00%	100,00%
MV_1220	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	45,00%	60,00%	100,00%
MV_01223	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1228	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	70,00%	100,00%
MV_1230	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	75,00%	100,00%
MV_1231	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01238	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	85,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1240	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	99,00%	100,00%
MVAL_01253	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%
MV_1349	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%	100,00%	100,00%
MV_1344	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	100,00%	100,00%
MV_0028	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%
MV_1423	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%
MV_1391	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	62,00%	85,00%	100,00%
MV_1394	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,00%	100,00%	100,00%
MV_0049	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,00%	100,00%	100,00%

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

a. Presentación de las situaciones constitutivas de incumplimiento por parte del contratista de obra, si fuere el caso.

Para el mes del presente informe se registran las siguientes situaciones de un posible incumplimiento por parte del contratista:

- A la fecha del presente informe el contratista está en un posible incumplimiento debido al no cumplimiento en los procedimientos y cumplimiento de la documentación requerirá para el ingreso del personal, así como el manejo de los escombros de obra.

b. Constancia de la entrega de las certificaciones del Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales, (anexar las respectivas planillas de pago de todo el personal utilizado en obra tanto de obra como de interventoría).

- VER ANEXO OBRA (1)
- VER ANEXO INTERVENTORÍA (2)

c. Información sobre los requerimientos que, en el periodo informado, se hayan hecho al contratista de obra. Se allegará copia de estos y de sus repuestas, si fuere el caso.

- VER ANEXO OFICIOS RADICADOS AL CONTRATISTA (3)

d. Información sobre la vigencia de las garantías que amparan el contrato.
    i. Pólizas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101391146	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	08	2022	08	08	2022	00:00	08	12	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	NIT: 900.372.215-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 12 A NRO. 68 C - 03	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 999-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPOS 1 2022.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/08/2022	08/04/2023	$720,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/08/2022	08/12/2025	$360,000,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	08/12/2022	08/06/2023	$720,000,000.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	08/08/2022	08/04/2023	$1,080,000,000.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$720,000,000.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **10,501,643.00	$ ******25,000.00	$ ***2,000,062.00	$ ********12,526,706.00	$ ****3,600,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101391146

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101194351	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	08	2022	08	08	2022	00:00	08	12	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	NIT: 900.372.215-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 12 A NRO. 68 C - 03	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARRROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 999-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPOS 1 2022.

ASEGURADO: GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S. Y BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
BENEFICIARIOS: BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT Y TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/08/2022	08/12/2022	$400,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/08/2022	08/12/2022	$400,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/08/2022	08/12/2022	$400,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****334,246.00	$ *******3,000.00	$ ******64,076.00	$ **********401,323.00	$ ******400,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101194351
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101194351	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	08	2022	08	08	2022	00:00	08	12	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.		IDENTIFICACIÓN	**NIT: 900.372.215-7**
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		IDENTIFICACIÓN	**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/08/2022	08/12/2022	$400,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/08/2022	08/12/2022	$400,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/08/2022	08/12/2022	$400,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101194351

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101391146	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	08	08	2022	00:00	08	12	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	NIT: 900.372.215-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 12 A NRO. 68 C - 03	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARRROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 999-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPOS 1 2022.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DE INICIO DE LA PRESENTE POLIZA QUEDANDO A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ (10,501,643.00)	$ ****(25,000.00)	$ *(2,000,062.00)	$ ******(12,526,706.00)	$ **(3,600,000,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101391146

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101391146	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	08	08	2022	00:00	08	12	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.		NIT: 900.372.215-7
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101391146

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

STEFANYDIAZ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101194351	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	08	08	2022	00:00	08	12	2022	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	NIT: 900.372.215-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 12 A NRO. 68 C - 03	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 999-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPOS 1 2022.

ASEGURADO: GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S. Y BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
BENEFICIARIOS: BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT Y TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DE INICIO DE LA PRESENTE POLIZA QUEDANDO A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(334,246.00)	$ *****(3,000.00)	$ ****(64,076.00)	$ *********(401,323.00)	$ ****(400,000,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-40-101194351

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101194351	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	08	08	2022	00:00	08	12	2022	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.		NIT: 900.372.215-7	
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.061-9	
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101194351

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

STEFANYDIAZ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101391146	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	19	08	2022	00:00	19	12	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	NIT: 900.372.215-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 12 A NRO. 68 C - 03	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARRROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 999-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPOS 1 2022.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/08/2022	19/04/2023	$720,000,000.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/08/2022	19/12/2025	$360,000,000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	19/12/2022	19/06/2023	$720,000,000.00	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	19/08/2022	19/04/2023	$1,080,000,000.00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	19/12/2022	19/12/2024	$720,000,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DE INICIO DE LA PRESENTE POLIZA QUEDANDO A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **10,501,643.00	$ ******25,000.00	$ ***2,000,062.00	$ *********12,526,706.00	$ ****3,600,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101391146

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101391146	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	19	08	2022	00:00	19	12	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.		NIT: 900.372.215-7	
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.061-9	
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101391146

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

STEFANYDIAZ

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**NORTE**	**15**	**15-44-101267234**	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	**12**	**2022**	**01**	**09**	**2022**	**00:00**	**20**	**04**	**2026**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INTERVIVIENDA 22	**NIT: 901.627.224-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 96 A 130 B 11	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	9296772

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	**NIT: 899.999.767-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1008 DE 2022 REFERENTE A REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARA DISTRITAL DEL HBITAT. GRUPOS 1 - 2022.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/09/2022	20/10/2023	$124,848,000.00	$86,400,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	01/09/2022	20/04/2025	$124,848,000.00	$86,400,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/09/2022	20/04/2026	$62,424,000.00	$43,200,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ADICION Y PRROROGA No. 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1008-2022 SE ADICIONA A SUMA DE $ 192.240.000 Y SE AMPLIA EL PLAZO EN DOS MESES (2) Y QUINCE DIAS (15)

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****128,453.00	$ *******8,000.00	$ ******25,926.00	$ **********162,379.00	$ ******312,120,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS BALAGUERA E HIJO	93106	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101267234

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101267234	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	12	2022	01	09	2022	00:00	20	04	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INTERVIVIENDA 22		**NIT: 901.627.224-3**
DIRECCIÓN: CR 96 A 130 B 11	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	9296772

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		**NIT: 899.999.767-1**
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	900457115-5	35.00
ANZA INGENIERIA S.A.S	900893208-0	65.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101267234

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101194351	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	19	08	2022	00:00	19	12	2022	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	NIT: 900.372.215-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 12 A NRO. 68 C - 03	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARRROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 999-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPOS 1 2022.

ASEGURADO: GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S. Y BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
BENEFICIARIOS: BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT Y TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/08/2022	19/12/2022	$400,000,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/08/2022	19/12/2022	$400,000,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/08/2022	19/12/2022	$400,000,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DE INICIO DE LA PRESENTE POLIZA QUEDANDO A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****334,246.00	$ *******3,000.00	$ ******64,076.00	$ **********401,323.00	$ ******400,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101194351

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101194351	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	19	08	2022	00:00	19	12	2022	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.		NIT: 900.372.215-7
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 3581600

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/08/2022	19/12/2022	$400,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/08/2022	19/12/2022	$400,000,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/08/2022	19/12/2022	$400,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101194351

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

STEFANYDIAZ 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101194351	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	19	08	2022	00:00	19	12	2022	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.		NIT: 900.372.215-7	
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.061-9	
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101194351

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

STEFANYDIAZ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**NORTE**	**15**	**15-40-101081350**	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	**12**	**2022**	**01**	**09**	**2022**	**00:00**	**20**	**04**	**2023**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INTERVIVIENDA 22	**NIT: 901.627.224-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 96 A 130 B 11	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	9296772

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	**NIT: 899.999.767-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

BENEFICIARIO: 899999767 - SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1008 DE 2022 REFERENTE A REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARA DISTRITAL DEL HBITAT. GRUPOS 1 - 2022.

.

BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**01/09/2022**	**20/04/2023**	**$200,000,000.00**	**$200,000,000.00**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ADICION Y PRRROROGA No. 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1008-2022 SE AMPLIA EL PLAZO EN DOS MESES (2) Y QUINCE DIAS (15)

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******81,095.00	$ *******3,000.00	$ ******15,978.00	$ ***********100,074.00	$ ******200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS BALAGUERA E HIJO	93106	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-40-101081350

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-40-101081350	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	12	2022	01	09	2022	00:00	20	04	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INTERVIVIENDA 22		**NIT: 901.627.224-3**
DIRECCIÓN: CR 96 A 130 B 11	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	9296772

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		**NIT: 899.999.767-1**
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

BENEFICIARIO: 899999767 - SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	900457115-5	35.00
ANZA INGENIERIA S.A.S	900893208-0	65.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

15-40-101081350

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

RICARDOVALENZUELA

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_01192 USME / NUEVO PORVENIR



FECHA	viernes, 20 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, cubierta después de intervención	



FECHA	viernes, 20 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, cubierta después de intervención	



FECHA	viernes, 20 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, cubierta después de intervención	



FECHA	viernes, 20 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, cubierta después de intervención	



FECHA	viernes, 20 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, pisos después de intervención	



FECHA	viernes, 20 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, pisos después de intervención	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_1200 USME / NUEVO PORVENIR



FECHA	lunes, 16 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, cubierta después de intervención	



FECHA	lunes, 16 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Pañete sobre muros e instalación de enchape de piso en zona de ropas	



FECHA	lunes, 16 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, baño después de intervención	



FECHA	lunes, 16 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, zona de ropas después de intervención	



FECHA	lunes, 16 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, comedor después de intervención	

FECHA	
DESCRIPCION	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_1349 USME / NUEVO PORVENIR



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, cubierta después de intervención	



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, cubierta después de intervención	



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, patio y zona de lavado después de intervención	



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, patio y zona de lavado después de intervención	



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, patio y zona de lavado después de intervención	



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, patio y zona de lavado después de intervención	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_01123 USME / NUEVO PORVENIR



FECHA	miércoles, 4 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Enchape de pisos en sala y hall	



FECHA	miércoles, 4 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Enchape de muros y mesón de cocina	



FECHA	miércoles, 4 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Demolición de enchape de muro existente en baño	

FECHA	
DESCRIPCION	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_1344 USME / NUEVO PORVENIR



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, cocina después de intervención	




FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, baño después de intervención	



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, zona de lavado después de intervención	



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, sala después de intervención	

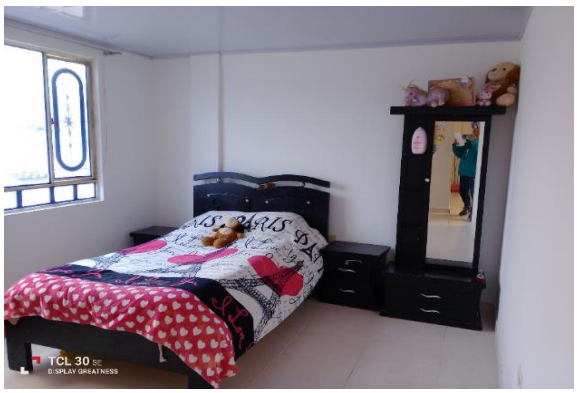


FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, habitaciones después de intervención	



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, hall de circulación después de intervención	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_02731 USME / EL PORTAL DEL DIVINO

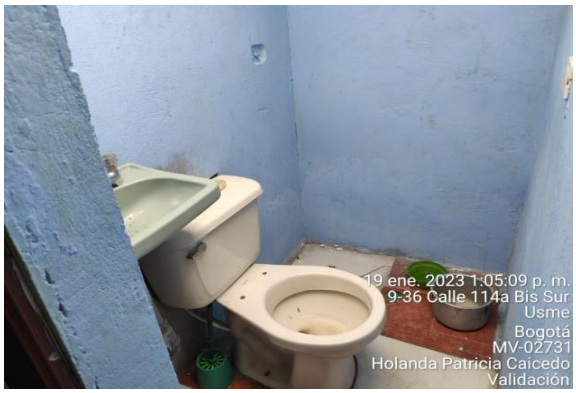

FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, baño antes de intervención	



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, cocina antes de intervención	



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, habitaciones antes de intervención	



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, cubierta antes de intervención	



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, cubierta antes de intervención	



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, zona de ropas	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_02833 USME / EL PORTAL DEL DIVINO



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, baño antes de intervención	



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, cocina antes de intervención	



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, habitación #1 antes de intervención	



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, habitación #2 antes de intervención	



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, sala antes de intervención	



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, zona de ropas	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVAL_02834 USME / EL PORTAL DEL DIVINO



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, baño antes de intervención	



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, cocina antes de intervención	



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, habitación #1 antes de intervención	



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, habitación #2 antes de intervención	



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, sala antes de intervención	



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, zona de ropas	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_02848 USME / EL PORTAL DEL DIVINO



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, baño antes de intervención	




FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, cubierta antes de intervención	




FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, cubierta antes de intervención	



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, cubierta antes de intervención	

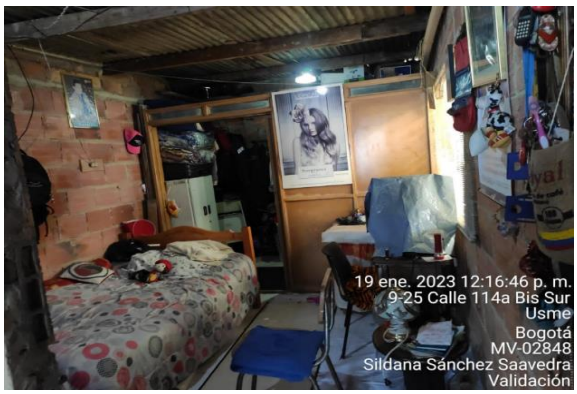

FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, habitación antes de intervención	

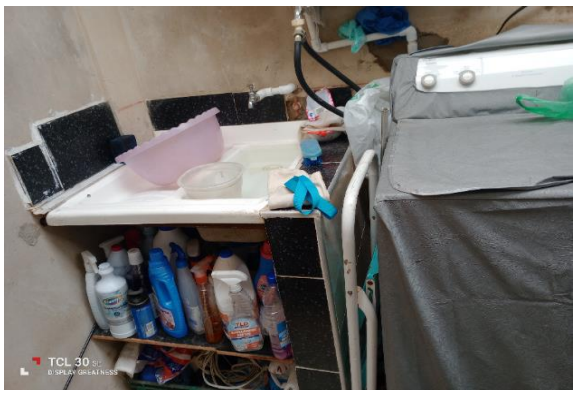

FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, zona de ropas	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_02857 USME / EL PORTAL DEL DIVINO



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, baño antes de intervención	




FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, cocina antes de intervención	



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, habitación #1 antes de intervención	



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, habitación #2 antes de intervención	

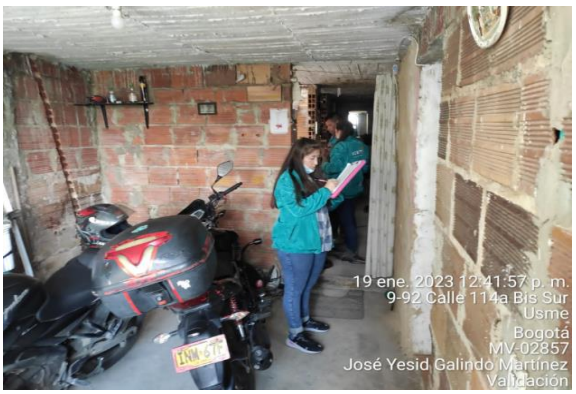

FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, sala antes de intervención	



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, zona de ropas	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_02864 USME / EL PORTAL DEL DIVINO



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, cubierta antes de intervención	



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, cubierta antes de intervención	



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, sala antes de intervención	



FECHA	jueves, 19 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, habitaciones antes de intervención	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

REGISTRO FOTOGRAFICO


MV_02875 USME / EL PORTAL DEL DIVINO



FECHA	viernes, 20 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, baño antes de intervención	



FECHA	viernes, 20 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, cocina antes de intervención	

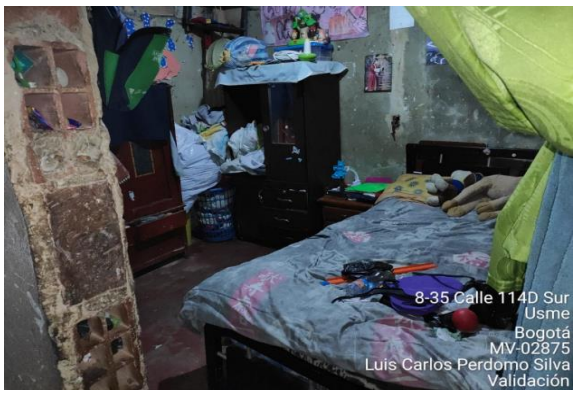

FECHA	viernes, 20 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, habitación #1 antes de intervención	



FECHA	viernes, 20 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, habitación #2 antes de intervención	




FECHA	viernes, 20 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, sala antes de intervención	



FECHA	viernes, 20 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, zona de ropas	

REGISTRO FOTOGRAFICO


MV_02901 USME / EL PORTAL DEL DIVINO

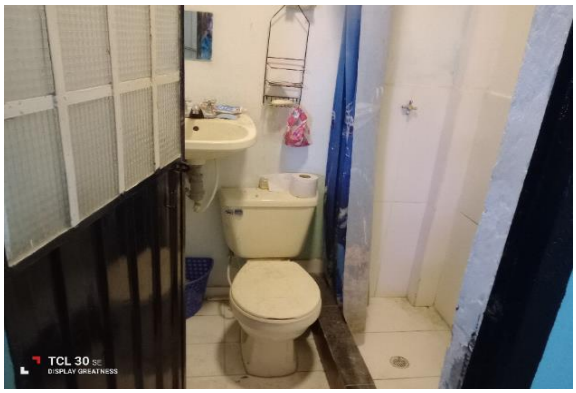

FECHA	viernes, 20 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, baño antes de intervención	



FECHA	viernes, 20 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, cocina antes de intervención	

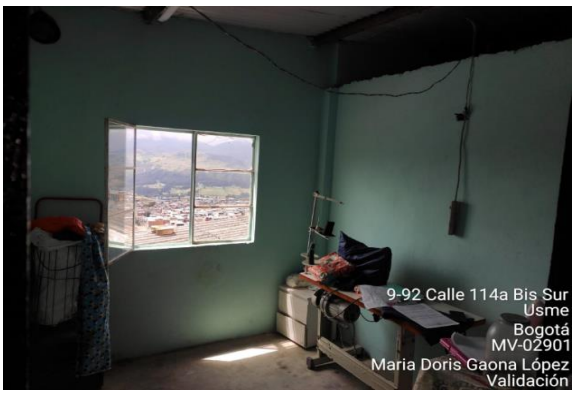

FECHA	viernes, 20 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, habitación #1 antes de intervención	



FECHA	viernes, 20 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, habitación #2 antes de intervención	



FECHA	viernes, 20 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, sala antes de intervención	




FECHA	viernes, 20 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, zona de ropas	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_02782 USME / EL PORTAL DEL DIVINO



FECHA	viernes, 20 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, cubierta antes de intervención (Zona frontal)	

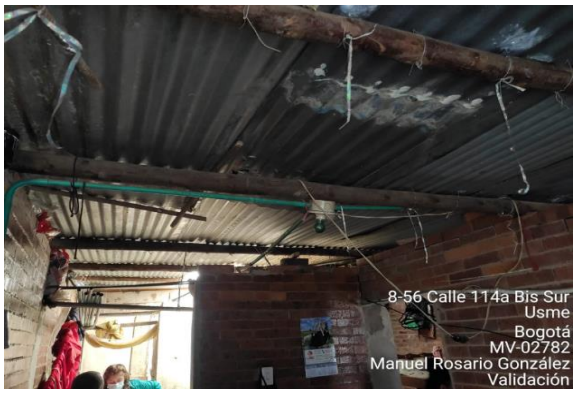

FECHA	viernes, 20 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, cubierta antes de intervención (Zona frontal)	



FECHA	viernes, 20 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, baño antes de intervención (Zona posterior)	



FECHA	viernes, 20 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, habitación #1 antes de intervención (Zona posterior)	



FECHA	viernes, 20 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, habitación #2 antes de intervención (Zona posterior)	



FECHA	viernes, 20 de enero de 2023
DESCRIPCION	
Validación, hall de circulación antes de intervención (Zona posterior)	

4. ASPECTOS SOCIALES

a. Registro de atención a la comunidad y seguimiento a los mismos Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR.
b. Matriz de seguimiento al cumplimiento del plan de acompañamiento social.
c. Documento que contenga avances, logros y dificultades cualitativas y cuantitativas de la ejecución de obra.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** **PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**	CONSORCIO INTERVIVIENDA 22

FECHA	5/01/2023	**PERIODO No.**	5	DEL	**1/01/2023**	AL	**31/01/2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2022."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Territorio USME

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	1008-2022	CONTRATO No.:	999-2022
PLAZO INICIAL:	5 Meses	PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	1 de septiembre de 2022	FECHA DE INICIACIÓN:	1 de septiembre de 2022
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	31 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de enero de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	0
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 432.000.000	VALOR INICIAL :	$ 3.600.000.000
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 432.000.000	VALOR POR PAGAR:	$ 3.600.000.000
SUPERVISOR:	CAMILA CORTÉS DAZA	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIVIENDA 22

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA INICIO	FECHA REAL DE FINALIZACIÒN Y CUMPLIMIENTO	
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			
1	Validación	0/01/1900	0/01/1900	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz de seguimiento hace parte del presente documento.**

3. ASPECTOS GENERALES INFORME SOCIAL

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Fase de validación y apropiación:

4. COMPONENTE SOCIAL - AVANCE SOCIAL DE CADA UNIDAD DE VIVIENDA

Componente Social: Registre aquí en relación con el componente social, las reuniones con la familias beneficiarias programadas por el contratista de obra para el desarrollo de las jornadas de capacitación a las familias beneficiadas con el propósito de buscar la sostenibilidad de la obra, las reuniones de avance de obra organizada por el contratista de obra conforme a lo establecido en el anexo técnico de obra y la relación de los SDQS de la comunidad y las respectivas respuestas.
Durante la semana reportada se realizaron las siguientes acciones en el componente social:

BARRIO O TERRITORIO: NUEVO PORTAL, TRIANGULO, NUEVO PORVENIR,PORTAL DE LA VEGA

INFORME QUE COMPRENDE EL MES No. 05 DEL 1/01/2023 AL 31/01/2023

SOCIALIZACIONES

se realiza socializacion de inicio de obra el dia 12 de enero del proyecto contrato 999 de 2022 a los beneficiarios (as) que acudieron a la convocatoria realizada por el contratista de obra proyecto de mejoramiento de vivienda, liderado por la secretaria Distrital del Hábitat, el cual se realizó en dos espacios, dichas reuniones se organizaron de la siguiente manera:
se convocaron 2 reuniones la primera a las 9:00 am se convocaron un total de 42 personas y asistieron 41 beneficiarios ; la segunda reunion se convoco a las 11:00 am se convocaron 42 beneficiarios de los cuales asistieron 37. Reunión 1: 9:00 am

Una vez culminada la reunion se dio un espacio para resolver dudas e inquietudes por parte de la comunidad a continuacion se ara una descriocion de las preguntas realizadas con sus respectivas respuestas. Reunion 9:00 am ¿cuándo comienzan las obras? Referida por el beneficiario Jesús Hernández

Respuesta: Arq. Stella, son tres fases de la obra, dos fases más importante, en validación van a recibir una segunda llamada y esperamos a que empiezan desde la siguiente semana a llamarlos para hacer las visitas de validación, una vez validado reciben la tercera llamada, puede ser a los 8 días, se van a ejecutar por grupos, no se van a ejecutar los 89 al tiempo pues no es posible, pero si, por grupos de a 20 a 25 viviendas, van a llamar los primeros 25 y yo creo que de aquí a 15 días ya estimamos según el cronograma se puedan iniciar las obras, después de validades, acuérdense que se visita la validación, tienen que hacer el presupuesto y eso toma unos días, una vez socializado el presupuesto, ellos puedan ya a los 8 días iniciar la obra, las obras van a iniciar pronto, pero estar atentos a las llamadas del celular, no todos a tiempo por grupitos van hacer de 20 a 25 terminan esos continúan con los 20 a 25 y continúan con los demás, lo cierto es que de aquí a finalizando marzo estimamos ya puedan los 89 ya haber recibido sus obra mejoramiento de vivienda, por grupitos no todos al tiempo, esperamos ya en dos meses o finalizando marzo ya tengamos todas las viviendas terminadas por grupo y esperemos la llamada del contratista de obra así como la hicieron para el día de hoy.
Buena de esta manera agradecerle a la junta de acción comunal por este espacio que ya parece la casa de la secretaria de hábitat, esperamos verlos muy prontamente, de corazón el buen trato el buen respeto, acojan el programa, todo desde la conversación y nos vamos a llevar muy bien un aplauso para ustedes y que tengan un feliz día.
Reunión 2: 11:00 am
 Yanira Teresa Vera; ¿la casa requiere cambio del arreglo de la cubierta, con este tiempo de lluvia debo desocupar la casa?
Respuesta: Arq. Stella, informa que no es necesario desocupar la vivienda teniendo en cuenta se puede ir programando con los maestros y los arquitectos desde que zona se va a intervenir, regularmente las cubiertas se intervienen en un día máximo dos días, por lo cual no es necesario desocupar la vivienda.
 Eneriel; pregunto, mi casa tiene la cubierta a dos aguas, yo quiero que cuando me hagan la cubierta me dejan un solo nivel, ya que cuando llueve duro cae granizo y me veo perjudicado, en caso de que se puede los bloques los dan ustedes?
Respuesta: Arq. Stella, Para eso está la fase de validación en el cual el contratista con su equipo de profesionales visita cada una de las viviendas, en el caso de la cubierta en el momento de la validación el área técnica revisa y determina como se puede hacer para dejarla a una sola caída en el momento de la apertura se le explicara al beneficiario las actividades que se contemplan.
Eneriel; pregunto tengo humedades en mi casa, estas áreas las intervienen
Respuesta: Arq. Stella, Se debe revisar la raíz de la humedad, sin embargo en su mayoría obedecen a situaciones y causas externas que no son de nuestro manejo. Como es el caso de daños en redes vecinales, filtraciones de terreno, capilaridad entre otros.

VALIDACIONES REALIZADAS

16/01/2023 - **MV_1423 DIANA CAROLINA RONCACIO** : Tipologia familiar extensa , en la cual se evidencian procesos de cubierta en la vivienda y los procesos economicos hacen parte de la beneficiaria y el conyuge.

16/01/2023 - **MV_01425 HERNANDO CANISALES**: Tipologia extensa , no se evidencian subsidios adicionales otorgados por el gobierno y los procesos conomicos hacen parte de la beneficiaria.

16/01/2023 - **MV_1426 MARIA EDILMA DUEÑAS** :Tipologia nuclear, no se evidencian subsidios adicionales otorgados por el gobierno y la principal economica radica en la pension de la beneficiaria.

16/01/2023 - **MV_1427 CELINDA GARCIA** :Tipologia extensa ya que en la actaulidad e,l beneficiario convive con un herrmano de 50 años , y aporta economicamente.

17/01/2023 - **MV_1234 MARIA SACRAMENTO PUENTE**S : Tipologia extensa en la actualidad le fue otorgago bono solidario y los procesos economicos hacen parte de un miembro de la familia .

19/01/2023 - **MV_1420 MARIA INES CORREA VALENCIA** :Tipologia monoparental en lacual a la fecha no se han suministrado subsidios adcicionales los procesos eocnomicos son compartidos y la beneficiaria se le ha otorgado pension del conyuge.
19/01/2023 - **MV_0030 FLOR MARINA MORENO :**Tipologia unipersonal, la responsabildiad economica por parte del beneficiario según ún la informacion presentada suministra la informacion necesaria para cumplir a cabaldiad lo presentado.
19/01/2023 - **MV_02864 RAFAEL EDUARDO VEGA** :Tipologia nuclear , en el cual no se evidencia informacion de subsidios adicionales , en la actualidad los procesos economicos son por parte del beneficiario.
19/01/2023 - **MV_02731 HOLANDA CAICEDO :T**ipologia familiar estabelcida como extensa , en la cual habita la madre del beneficiario hace parte de la tercera edad y en la atualidad no se han suministrado subsidios adicionales .
19/01/2023 - **MV_02857 JOSE YESID GALINDO** :Tipologia nuclear , según la informacion presentada no se evidencian subsidios adicionales para la familia del beneficiario, los procesos economicos hacen parte del beneficiario y la conyuge del mismo.
19/01/2023 - **MV_02848 SILDANA SANCHEZ :**Tipologia pareja sin hijos en lo cual los procesos economicos hacen parte de actividad informar por parte de uno de los miembros de la familia.
19/01/2023 - **MV_02834 RUBIELA APONTE** :Tipologia unipersonal , la principal actividad economica radica en los procesos de actividad informal y en la actualidad no le han sido otorgados subsidios adicionales.
19/01/2023 - **MV_02833 MARIA CRISTINA MONSALVE** :Tipologia extensa , ya que en la actualidad el beneficiario vive con la madre del mismo en la actualidad le han suministrado subsidios adicionales.
19/012023 **MVAL_03823 DIANA CAROLINA MUNERA PUENTES** se realiza visita de validación técnica y social, identificando una familia monoparental, madre cabeza de hogar ya que uno de sus tres hijos es menor de edad, la beneficiaria es trabajadora independiente, sus ingresos y egresos son menos de 1 SMMLV, es la única persona que trabaja y aporta económicamente al hogar, la vivienda es de un piso, de uso residencial. No tiene garaje, cuenta con los servicios públicos básicos, presenta humedades, la vivienda cuenta con una sola habitación, esta habitación no está separada de los demás espacios de la vivienda, la familia tiene mascota y permanece en los mismos espacios de la familia. no se reconocen con ninguna etnia y no han sido víctimas de conflicto armado
19/01/2023 **MVAL_03825 MARIELA HENAO FAJARDO** se realiza visita de validación técnica y social, identificando una familia monoparental, madre cabeza de hogar con dos hijas menores de edad a cargo, la beneficiaria es trabajadora independiente, sus ingresos y egresos son menos de 1 SMML, es la única persona que trabaja y aporta económicamente al hogar, recibe subsidio de renta básica, la vivienda es de un piso, de uso residencial. No tiene garaje, cuenta con los servicios públicos básicos, presenta humedades en el muto trasero de la vivienda, tiene 3 habitaciones, los espacios de la vivienda están definidos y separados entre sí, la familia tiene mascota y esta permanece en los mismos espacios de la familia, la familia pertenece a una ONG que apadrina niños en condiciones vulnerables, las hijas de la beneficiaria se encuentran estudiando, no hay personas en condición de discapacidad, no se reconocen con ninguna etnia y no han sido víctimas de conflicto armado
19/01/2023 **MVAL_03827 RAÚL URÍAS COLMENARES GUAYANA** se realiza visita de validación técnica y social, identificando una familia extensa compuesta por 8 personas, el beneficiario es trabajador independiente, la esposa del beneficiario tiene la custodia de dos de sus sobrinos y es ella quien debe aportar económicamente por ellos, por lo tato se clasifica como madre cabeza de hogar, los ingresos y egresos son de 1 SMML, la familia no recibe subsidio del gobierno, la vivienda es de dos pisos, de uso residencial, no tiene garaje, cuenta con los servicios públicos básicos, tiene 3 habitaciones, los espacios de la vivienda están definidos y separados entre sí, la familia tiene mascota y esta permanece en los mismos espacios de la familia, las hijas de la beneficiaria se encuentran estudiando, no hay personas en condición de discapacidad, no se reconocen con ninguna etnia y no han sido víctimas de conflicto armado
19/01/2023 **MVAL_03831 FRANCO GUILLERMO MELO MARTÍNEZ** se realiza visita de validación técnica y social, identificando una familia unipersonal, el beneficiario es pensionado, cuenta con una discapacidad física, por enfermedad en la columna vertebral, el beneficiario no se reconoce con ninguna etnia y no ha sido víctima de conflicto armado. Los ingresos y egresos son de 1 SMML, el beneficiario no recibe subsidio del gobierno, la vivienda tiene tres pisos, de uso residencial, no tiene garaje, cuenta con los servicios públicos básicos, tiene 9 habitaciones, los espacios de la vivienda están definidos y separados entre sí, el beneficiario no tiene mascotas. El beneficiario no participa en ninguna organización social comunitaria, no ha sido beneficiado con ningún otro programa de la SDHT y solo conoce el programa de mejoramiento de vivienda, se encuentra interesado en participar en talleres, reuniones o encuentros en el marco de las intervenciones de SDHT
19/01/2023 **MVAL_03834 MARÍA JOANA GIRALDO LÓPEZ** se realiza visita de validación técnica y social, identificando una familia monoparental, madre cabeza de hogar con un hijo de edad a cargo, la beneficiaria, el hijo de la beneficiaria se encuentra estudiando y trabajando como trabajador informal, la beneficiaria también es trabajadora informal. Ente ambos aportan económicamente al sostenimiento del hogar, sus ingresos y egresos son menos de 1 SMML, la beneficiaria recibe 3subsidio de discapacidad, la vivienda es de un piso, de uso residencial, no tiene garaje, cuenta con los servicios públicos básicos, el área que cuenta con las condiciones estructurales para la intervención, tiene 1 habitación, cocina y baño, la familia tiene mascota y esta permanece en los mismos espacios de la familia, la beneficiaria cuenta con condición de discapacidad física a causa de un accidente de tránsito, la familia no se reconoce con ninguna etnia y no han sido víctimas de conflicto armado.
20/01/2023 - **MVAL _ 0022 REINEL DIAZ** : Tipologia unipersonal, en la cual se evidencia informacion por parte del beneficiario correspondinte a la responsabilidad economia generada por el mismo , el cual a la fecha no se le han otorgado subsidios adicionales.
20/01/2023 **MV_02875 LUIS CARLOS PERDOMO SILVA** Se realiza validación de vivienda con la persona autorizada (Geraldine Julieth Perdomo) si identifica vivienda de tres plantas, donde reside una familia extensa conformada por seis personas, cuatro mujeres, dos hombres. la hoja mayor del beneficiario es cabeza de hogar al asumir los gastos de la vivienda.no tienen acceso a subsidios, la casa en su interior se encuentra con pañete y se observa piso de cemento, refieren problemática de humedad en habitaciones. La parte técnica toma medidas valida la casa. Se diligencia formato de caracterización.
20/01/2023 **MV_02904 BERENICE VALENCIA MEDINA** Se realiza visita de validación encontrando una vivienda de dos pisos, con tipología de familia unipersonal, donde la beneficiaria en la actualidad trabaja y se encuentra pensionada. Niega subsidios, es la persona que se hace cargo de su hogar. La parte técnica toma medidas valida la casa. Se diligencia formato de caracterización.
20/01/2023 **MV_02901 MARIA DORIS GAONA LOPEZ** Se realiza validación de vivienda encontrando un hogar monoparental donde la beneficiaria se hace cargo de sus dos hijas menores de edad, la beneficiaria se desempeña laborando el a vivienda, sin embargo en el momento de la validación se cuenta con persona autorizada. se niega la presencia de discapacidad en la vivienda o antecedentes de violencia. La parte técnica toma medidas valida la casa. Se diligencia formato de caracterización.
20/01/2023 **MV_02782 MANUEL ROSARIO GONZALEZ HINESTROZA** Se realiza visita de validación, encontrando que el beneficiario reside en un hogar monoparental siendo el la persona responsable de sus cuatro hijas, una de ella quien presenta discapacidad cognitiva leve, el señor Manuel es desmoviliado de las fuerzas armads revolucionarias y son una familia afrodescendiente. Niegan tener acceso a subsidios. La parte técnica toma medidas valida la casa. Se diligencia formato de caracterización.
23/01/2023 **MV_00066 OSCAR AGUDELO ROA** Se explica al beneficiario el motivo de la visita de validación se diligencia ficha de caracterización social y desde el área técnica se toman medidas de la vivienda.
23/01/2023 **MV_00076 HILDA RUBY MORENO** Se explica a la beneficiaria el motivo de la visita de validación se diligencia ficha de caracterización social y desde el área técnica se toman medidas de la vivienda.
25/01/2023 **MV_00069 MARIA CLEMENCIA CORTES** Se explica a la beneficiaria el motivo de la visita de validación se diligencia ficha de caracterización social y desde el área técnica se toman medidas de la vivienda.
25/01/2023 **MV_1512 WILLIAM EDUARDO GONZALEZ MOLINA** Se explica al beneficiario el motivo de la visita de validación se diligencia ficha de caracterización social y desde el área técnica se toman medidas de la vivienda.
27/01/2023 **MV_02895 WILSON BERTIZ DEL VALLE VERA** Familia Unipersonal, beneficiario indica va estar pendiente de la obra y firma de documentos, también manifiesta trabaja de manera independiente, se realiza caracterización social y reconocimiento de la vivienda a nivel estructural y estado actual.

27/01/2023 **MV_02905 NORFI URBINA POPO** Familia Monoparental, beneficiaria es independiente y si hija la apoya económicamente y convive con ella. se presentan profesionales se indica motivo de la validación diligenciando formato socioeconómico a cargo del área social y toma de medidas de la casa a cargo de la parte técnica.
27/01/2023 **MVAL_02812 JOVEL TOVAR INFANT**E Familia Nuclear, beneficiario manifiesta trabaja como empleado y junto a su esposa responden por el hogar. Tienen dos hijos y conviven en unión libre se realiza caracterización social y se toma información técnica.
27/01/2023 **MV_02842 LUIS GABRIEL ROJAS** Familia Extensa, beneficiario se hace a cargo económicamente del hogar trabaja de manera independiente convive con su nieto y su esposa. Beneficiaria solicita se realice cubierta también indica va estar pendiente de la obra y firma de documentos se realiza caracterización social y reconocimiento de la vivienda a nivel estructural y estado actual.
27/01/2023 **MV_02844 MARIA ESPERANZA USUGA TUBERQUIA** Familia Unipersonal, beneficiaria trabaja de manera independiente, solicitase realice cubierta. Beneficiaria indica va estar pendiente de la obra y firma de documentos se realiza caracterización social y reconocimiento de la vivienda a nivel estructural y estado actual. Se aclaran dudas en cuanto el mejoramiento.
27/01/2023 **MV_02888 MARIELA GARCIA** Familia Unipersonal, beneficiario es empleada, Beneficiario indica va estar pendiente de la obra y firma de documentos sin embargo dejara autorizada también a su nuera. Se realiza caracterización social y reconocimiento de la vivienda a nivel estructural y estado actual.
27/01/2023 **MV_02896 YANIRA TERESA VERA** Familia Unipersonal, Beneficiaria informa trabaja de manera independiente solicita se realice cubierta. también indica va estar pendiente de la obra y firma de documentos. Se realiza caracterización social y reconocimiento de la vivienda a nivel estructural y estado actual.
30/01/2023 **MV_01513 EDELMIRA PULIDO MORENO** Familia Unipersonal, beneficiaria trabaja de manera independiente. Beneficiaria indica va estar pendiente de la obra y firma documentos, se realiza caracterización social y reconocimiento de la vivienda a nivel estructural y estado actual. Se aclaran dudas en cuanto el mejoramiento.
30/01/2023 MV_**1589 JOSÉ DAVID AGUDELO** Familia Nuclear, beneficiario trabaja como independiente junto a su esposa, los dos responden por el hogar, estado civil casados, se realiza caracterización social y se toma información técnica.
30/01/2023 MV_**01518 ROSA DELIA LÓPEZ** Familia Unipersonal, beneficiaria trabaja de manera independiente. Actualmente esta soltera, solo vive con su hijo, los dos aportan económicamente a la vivienda. Se firma documentos, se realiza caracterización social y reconocimiento de la vivienda a nivel estructural y estado actual. Se aclaran dudas en cuanto el mejoramiento.
31/01/2023 **MV_02838 SEGUNDO MARCELINOMENDOZA BARREÑO** Familia nuclear, beneficiario se hace a cargo económicamente del hogar trabaja de manera independiente cuenta con un emprendimiento pequeño, Beneficiario indica va estar pendiente de la obra y firma de documentos se realiza caracterización social y reconocimiento de la vivienda a nivel estructural y estado actual.
31/01/2023 **MV_02816 BLANCA NIDIA GUTIERREZ RODRIGUEZ** Familia unipersonal, beneficiaria es empleado informa dejara a cargo del mejoramiento a su hija quien va estar pendiente de la obra y firma de documentos se realiza caracterización social y reconocimiento de la vivienda a nivel estructural y estado actual. Se aclaran dudas en cuanto el mejoramiento
31/01/2023 **MV_02835 GRACIELA SANCHEZ MILAGUY** Familia pareja sin hijos, beneficiaria se hace a cargo económicamente de la familia es independiente, Beneficiaria indica va estar pendiente de la obra y firma de documentos sin embargo dejara autorizada también a su esposo. Se realiza caracterización social y reconocimiento de la vivienda a nivel estructural y estado actual.
31/01/2023 **MV_02921 HUMBERTO AVILA CRUZ** Familia unipersonal, es económicamente independiente, no cuenta con ningún subsidio por parte del gobierno beneficiaria estará pendiente del mejoramiento y solicita se realice cubierta. Se realiza caracterización social y reconocimiento de la vivienda a nivel estructural y estado actual.
31/01/2023 **MV_02798 MARIA ELOINA NIÑO NIÑO** Familia monoparental, beneficiara se hace a cargo económicamente de su familia trabajando de manera independiente dejara a su hija a cargo del mejoramiento quien va estar pendiente de la obra y firma de documentos se realiza caracterización social y reconocimiento de la vivienda a nivel estructural y estado actual.
31/01/2023 **MV_02823 MARIA NUBIA CALERO CORRALES** Familia unipersonal, beneficiara manifiesta sus ingresos son de manera independiente; se le aclaran dudas del mejoramiento. Beneficiaria indica va estar pendiente de la obra y firma de documentos se realiza caracterización social y reconocimiento de la vivienda a nivel estructural y estado actual.
31/01/2023 **MV_02893 LUIS ROBERTO PEREZ RINCON** Familia pareja sin hijos, beneficiario se hace a cargo económicamente de su familia es pensionado tiene una discapacidad física; Beneficiario indica va estar pendiente de la obra y firma de documentos se realiza caracterización social y reconocimiento de la vivienda a nivel estructural y estado actual.
VALIDACIONES FALLIDAS
NO SE PRESENTARON VALIDACIONES FALLIDAS EN EL TRANSCURSO DEL MES.
BARRIO O TERRITORIO: ___NUEVO PORTAL, TRIANGULO, NUEVO PORVENIR,PORTAL DE LA VEGA_____
APERTURAS DURANTE EL MES DEL INFORME
03/01/2023 **MV_01244 MARIA INES CABALLERO** Se realiza apertura con la beneficiaria, se expone y hace entrega de carta de trato digno, se diligencia acta de inicio y se socializan las actividades de obra con el presupuesto inicial encontrando conformidad por parte de la señora Maria para la intervención en cocina y baño. además de pañetes en área social y patio, actividades en zona de lavado y cielo raso, la beneficiaria manifiesta conformidad.Se deja la bitàcora en la vivienda.
03/01/2023 **MVAL_01253 MARIA BETHY ESCOBAR TIMARON** Se realiza apertura con la beneficiaria, se expone y hace entrega de carta de trato digno, se diligencia acta de inicio y se socializan las actividades de obra con el presupuesto inicial encontrando conformidad por parte de la señora Maria para la intervención en la primera planta de la vivienda con actividades en dos habitaciones, cocina, baño, área social y zona de ropas, la beneficiaria expresa conformidad con actvidades porpuestas por parte técnica. Se deja la bitácora en la vivienda.
03/01/2023 **MV_1240 BLANCA LILIA RUIZ** Se realiza apertura con la beneficiaria, se expone y hace entrega de carta de trato digno, se diligencia acta de inicio y se socializan las actividades de obra con el presupuesto inicial encontrando conformidad por parte de la señora Blanca para la intervención en la cubierta de la vivienda, intervención en mesón de la cocina, enchape en salpicadero,la beneficiaria maifiesta conformidad con actividades propuestas por parte técnica.Se deja la bitácora en la vivienda.
03/01/2023 **MV_1391 JOSE LISANDRO MENDIVELSO ROMERO** Se realiza apertura de vivienda con el beneficiario, se expone y hace entrega de carta de trato digno, se diligencia acta de inicio y se socializan las actividades de obra con el presupuesto inicial, identificando actividades en zona de la cocina, con intervención en mesón, enchape e instalación de platero, cambio de combo sanitario en el baño junto con enchape en zona húmeda, se intervendrán dos habitaciones,y área social con enchape de piso, guarda escoba y pintura, el señor Jose manifiesta conformidad y se hace entrega de la bitácora en la vivienda.
03/01/2023 **MV_1230 MARLENE PUERTA LOPEZ** Se realiza apertura con la beneficiaria, se expone y hace entrega de carta de trato digno, se diligencia acta de inicio y se socializan las actividades de obra con el presupuesto inicial encontrando conformidad por parte de la señora Marlene para la intervención en la cubierta de la vivienda, excavacion en zona de la cocina y baño ,la beneficiaria maifiesta conformidad con actividades propuestas por parte técnica.Se deja la bitácora en la vivienda.
03/01/2023 **MV_1198 CRISOSANTO BECERRA GOMEZ** Se realiza apertura de la vivienda con la persona autorizada, se expone y hace entrega de carta de trato digno, se diligencia acta de inicio y se socializan las actividades de obra con el presupuesto inicial encontrando conformidad, la parte técnica brinda claridad y se hace entrega de la bitácora correspondiente a la vivienda.
03/01/2023 **MV_1228 LUZ FABIOLA RAMIREZ** Se realiza apertura con la beneficiaria, se expone y hace entrega de carta de trato digno, se diligencia acta de inicio y se socializan las actividades de obra con el presupuesto inicial encontrando conformidad por parte de la señora Luz, para la intervención en pisos de la vivienda, pañetes, pintura e instalación de cielo raso. La beneficiaria expresa conformidad y se deja la bitácora en la vivienda.

03/01/2023 **MV_1220 MARTA ISABEL GARCIA** Se realiza apertura con la beneficiaria y familiares presentes, se expone y hace entrega de carta de trato digno, se diligencia acta de inicio y se socializan las actividades de obra con el presupuesto inicial encontrando conformidad por parte del componente familiar y de la señora Marta quien es de la tercera edad, para la intervención de pisos con enchape y guardaescobas, baño y cocina de la vivienda, ademas de habitaciones de la viviend con actividades de pintura. Se deja bitácora en la vivienda.

04/01/2023 **MV_0025 MARIA HELENA REYES :** Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicaciones desde el componente técnico y recomendaciones sociales. Se remite información de maestros encargados.

04/01/2023 **MV_1349 NELIDA ESTHER HERNANDEZ** Se realiza apertura con la persona autorizada, se expone y hace entrega de carta de trato digno, se diligencia acta de inicio y se socializan las actividades de obra con el presupuesto inicial para la intervención de cubierta, pañete en área de lavado, enchape de piso y salpicadero ademas de pintura en esta área, la persona autorizada expresa conformidad y se hace entrega de bitácora.

05/01/2023 MV_1206 ELVIA MENDOZA SANCHEZ : Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicaciones desde el componente técnico y recomendaciones sociales. Se remite información de maestros encargados.

05/01/2023 **MV_1344 IRMA ADELA TORRES TIQUE** Se realiza apertura con persona autorizada, se expone y hace entrega de carta de trato digno, se diligencia acta de inicio y se socializan las actividades de obra con el presupuesto inicial encontrando conformidad para la intervención de pisos con enchape y guardaescobas, baño y cocina de la vivienda, ademas de habitaciones de la viviend con actividades de pintura. Se deja bitácora en la vivienda.

06/01/2023 **MV_01400 ARGENIS MOSQUERA ROBAYO** Se realiza apertura con la beneficiaria, se expone y hace entrega de carta de trato digno, se diligencia acta de inicio y se socializan las actividades de obra con el presupuesto inicial encontrando conformidad por parte de la señora Argenis en la intevención de cubierta, baño y cocina completos, se deja bitacora en la vivienda.

10/01/2022 **MV_0049 BENJAMIN QUIROGA QUIROGA** Se realiza apertura con el beneficiario se expone y hace entrega de carta de trato digno, se diligencia acta de inicio y se socializan las actividades de obra con el presupuesto inicial encontrando conformidad por parte del señor Benjamin para la intervención en cubierta, incluyendo perfiles, bajantes y canales, adicionalmente la parte técnica expone la intervención en el área social y una de las habitaciones de la vivienda, incluyendo actividades de enchape de piso, guardaescobas y pintura, proponen pintura en la cocina e instalación de puerta de baño. El beneficiario manifiesta conformidad.Se deja la bitácora en la vivienda y se cuenta con la presencia del maestro que recibe la casa.

10/01/2023 **MV_1394 LUCY PINEDA DE LOPEZ** Se realiza apertura con la beneficiaria, se expone y hace entrega de carta de trato digno, se diligencia acta de inicio y se socializan las actividades de obra con el presupuesto inicial encontrando conformidad por parte de la señora Lucy para la intervención en la primera planta de la vivienda con actividades de cambio de combo sanitario, enchape de piso en área social y dos habitaciones, demolición y levantamiento de mesón de cocina junto con enchapes correspondientes a esta área, preparación de pisos y cielo raso, la beneficiaria expresa conformidad con actvidades porpuestas por parte técnica. Se deja la bitácora en la vivienda y se centa con la presencia de maestro en la apertura

11/01/2023 **MV_01192 ALBA LUCIA SANTAMARIA MENDOZA** Se realiza visita de apertura en compañía de la beneficiaria, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de carta del buen trato, se socializa el acta inicial, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación a conformidad. Adicionalmente, el equipo social verbaliza las recomendaciones generales sobre el manejo del material que ingresa a la vivienda, la adecuación y despeje de espacios para la realización de las actividades y el trato a tener con el personal de obra; de igual forma, el equipo técnico indica a la señora Marisol cuales son las áreas para intervenir, que para este MV son las habitaciones, cocina, baño y áreas comunes.

11/01/2023 **MV_01247, MARISOL PATIÑO** Se realiza visita de apertura en compañía de la beneficiaria, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de carta del buen trato, se socializa el acta inicial, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación a conformidad. Adicionalmente, el equipo social verbaliza las recomendaciones generales sobre el manejo del material que ingresa a la vivienda, la adecuación y despeje de espacios para la realización de las actividades y el trato a tener con el personal de obra; de igual forma, el equipo técnico indica a la señora Marisol cuales son las áreas para intervenir, que para este MV son las habitaciones, cocina, baño y áreas comunes.

13/01/2023 **MVAL_01563 ANA LUCÍA ÁRIAS SANTIBAÑEZ** Se realiza apertura con la persona autorizada por la beneficiaria, se expone y hace entrega de carta de trato digno, se diligencia acta de inicio y se socializan las actividades de obra con el presupuesto inicial encontrando conformidad por parte de la autorizada para la intervención en la tercera planta de áreas como son la cocina, con demolición de enchape, instalación de lavaplatos, enchape de mesón y piso, cambio de combo sanitario y enchape en zona húmeda, además de pintura e instalación de enchape de piso, para la segunda planta, la parte técnica exponee la intervención en pisos y pintura de muros, la persona autorizada maifiesta conformidad con actividades propuestas por parte técnica. Se deja la bitácora en la vivienda y se cuenta con la presencia del maestro que recibe la casa.

13/01/2023 **MVAL_01257, NELSON DÍAZ** Se realiza visita de apertura en compañía de la autorizada , en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de carta del buen trato, se socializa el acta inicial, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación a conformidad. Adicionalmente, el equipo social verbaliza las recomendaciones generales sobre el manejo del material que ingresa a la vivienda, la adecuación y despeje de espacios para la realización de las actividades y el trato a tener con el personal de obra; de igual forma, el equipo técnico indica a la señora Maria Torres cuales son las áreas para intervenir, que para este MV son las habitaciones, cocina, baño y áreas comunes.

13/01/2023 **MV_1236 ROSALVINA URIBE** Se realiza visita de apertura en compañía de la beneficiaria en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de carta del buen trato, se socializa el acta inicial, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación a conformidad. Adicionalmente, el equipo social verbaliza las recomendaciones generales sobre el manejo del material que ingresa a la vivienda, la adecuación y despeje de espacios para la realización de las actividades y el trato a tener con el personal de obra; de igual forma, el equipo técnico indica a la señora Rosalvina cuales son las áreas para intervenir, que para este MV son las habitaciones, cocina, baño y áreas comunes.

16/01/2023 - **MV_00420 ALVARO ANTONIO URREGO** :Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicaciones desde el componente técnico y recomendaciones sociales. Se remite información de maestros encargados.Se realiza entrega de autoriazacion a conyuge por parte del beneficiario.

16/01/2023 - **MV_1095 MARIA LIBIA BELTRAN** :Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicaciones desde el componente técnico y recomendaciones sociales. Se remite información de maestros encargados.Se realiza entrega de autoriazacion a conyuge por parte del beneficiario.

16/01/2022 **MV_01196 MARINA MANRIQUE MARQUEZ** Se realiza apertura con la persona autorizada (Carol Martinez) se expone y hace entrega de carta de trato digno, se diligencia acta de inicio y se socializan las actividades de obra con el presupuesto inicial encontrando conformidad por parte de la señora Carol para la intervención de media cubierta correspondiente a la segunda planta de la vivienda, pañete, demolición de enchape e instalación de enchape en mesón, salpicadero y piso, lavaplatos, pintura y cielo raso en cocina. La persona autorizada manifiesta conformidad.Se realizan recomendaciones pertinentes al evidenciar la presencia de menores de edad, se deja la bitácora en la vivienda y se cuenta con la presencia del maestro que recibe la casa.

16/01/2023 **MV_00158 MARIA HILDA CASTAÑO FERNANDEZ** Se realiza apertura con la beneficiaria, se expone y hace entrega de carta de trato digno, se diligencia acta de inicio y se socializan las actividades de obra con el presupuesto inicial encontrando conformidad por parte de la señora Maria para la intervención en la primera planta de la vivienda con actividades de pañete hipermeabilizado y pintura en tres habitaciones donde se evidencia problema de humedad, bordillo en ducha y puerta de baño, además de la intervención en la segunda planta con el cambio de cubierta, como aspecto significativo la parte técnica expone la instalación de baranda en escaleras, debido que la señora Maria padece de artrosis y tiene limitaciónes para su desplazamiento dentro de la vivienda, la beneficiaria expresa conformidad con actvidades porpuestas por parte técnica. Se deja la bitácora en la vivienda y se centa con la presencia de maestro en la apertura

16/01/2023 **MV_1032 ARGENIS RODRIGUEZ** Se realiza apertura con la beneficiaria en donde se le informa de las actividades a realiza y estas quedan consignadas en la bitácora, así mismo se socializa la documentación que se encuentra en la misma como lo son ubicación del PAC, presupuesto, acta de inicio, materiales, carta del buen trato, así mismo se da de las recomendaciones y es donde ella manifiesta algunas inquietudes de las cuales se le da claridad, se firma a conformidades todas las partes.

17/01/2023 **MV_00038 MARIA GEORGINA LEMUS DE CHAPARRO** Se realiza apertura con la persona autorizada (esposo de la beneficiaria) se expone y hace entrega de carta de trato digno, se diligencia acta de inicio y se socializan las actividades de obra con el presupuesto inicial encontrando conformidad por parte del autorizado para la intervención de cubierta completa, adicionalmente la parte técnica propone la intervención de la habitación ubicada en la segunda planta de la vivienda con actividades de pañete y enchape en el piso, adicionalmente se propone instalación de enchape en salpicadero dede lavadero y mochetas del mismo junto con el piso de esta área. La persona autorizada manifiesta conformidad.Se realizan recomendaciones pertinentes, se deja la bitácora en la vivienda y se cuenta con la presencia del maestro que recibe la casa.

17/01/2023 - **MV_1180 JOSE ANTONIO FLORES** :Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicaciones desde el componente técnico y recomendaciones sociales. Se remite información de maestros encargados.Se realiza entrega de autoriazacion a conyuge por parte del beneficiario.

18/01/2022 **MV_1433 KELLY YOHANA LOPEZ ROMERO** Se realiza apertura con la beneficiaria, se expone y hace entrega de carta de trato digno, se diligencia acta de inicio y se socializan las actividades de obra con el presupuesto inicial encontrando conformidad por parte de la señora Kelly para la intervención en dos habitaciones debido a una problemática de humedad, se impermeabilizaran las zonas y se realizará pañete y pintura, se planteo la intalación de enchape de piso en la casa y junto con pintura, enchape en mesón de cocina, cambio de combo sanitario y se deja la claridad de que no se realizará cambio de puerta en el baño, la beneficiaria expresa conformidad con actvidades propuestas por parte técnica. Se deja la bitácora en la vivienda y se centa con la presencia de maestro en la apertura

18/01/2023 **MV_1343 YOLANDA RUIZ CARRILLO** Se realiza apertura con la beneficiaria, se expone y hace entrega de carta de trato digno, se diligencia acta de inicio y se socializan las actividades de obra con el presupuesto inicial encontrando conformidad por parte de la señora Yolanda para la intervención en toda la casa con actividades de alistado de piso y enchape de piso, intervención de cocina completa y baño, la beneficiaria expresa conformidad con actvidades propuestas por parte técnica. Se deja la bitácora en la vivienda y se centa con la presencia de maestro en la apertura

18/01/2023 **MV_00329 NELLY ESPERANZA LEGUIZAMON GUTIERREZ** Se realiza apertura con la beneficiaria, se expone y hace entrega de carta de trato digno, se diligencia acta de inicio y se socializan las actividades de obra con el presupuesto inicial encontrando conformidad por parte de la señora Nelly para la intervención en su vivienda, la beneficiaria expresa conformidad con actvidades propuestas por parte técnica. Se deja la bitácora en la vivienda y se centa con la presencia de maestro en la apertura

18/01/2022 **MV_01366 JESUS ANTONIO ROJAS** Se realiza apertura con el beneficiario, se expone y hace entrega de carta de trato digno, se diligencia acta de inicio y se socializan las actividades de obra con el presupuesto inicial encontrando conformidad por parte del señor Jesus para la intervención en la segunda planta de la vivienda con actividades de enchape de área de la cocina, instalación de lavaplatos, enchape en baño, área social y de lavado, ademñas de pintura. El beneficiario expresa conformidad con actvidades porpuestas por parte técnica. Se deja la bitácora en la vivienda y se centa con la presencia de maestro en la apertura

18/01/2023 **MV_01363 OMAR MAYUSA CASTAÑEDA** Se realiza apertura con el beneficiario, se expone y hace entrega de carta de trato digno, se diligencia acta de inicio y se socializan las actividades de obra con el presupuesto inicial encontrando conformidad por parte del señor Omar para la intervención en la segunda planta de la vivienda con actividades de cambio de cubierta, junto a la estructura, estuco y pintura en habitción además de cielo raso Se identifica que la situación social de la vivienda corresponde a personas adultas en condición de discapacidad. El beneficiario expresa conformidad con actvidades porpuestas por parte técnica. Se deja la bitácora en la vivienda y se centa con la presencia de maestro en la apertura

18/01/2023 **MV_00046 LUZ ASTRID CRUZ DUARTE** Se realiza apertura con la beneficiaria, se expone y hace entrega de carta de trato digno, se diligencia acta de inicio y se socializan las actividades de obra con el presupuesto inicial encontrando conformidad por parte de la señora Luz para la intervención de cubierta por filtraciones, la beneficiaria expresa conformidad con actvidades porpuestas por parte técnica. Se deja la bitácora en la vivienda y se centa con la presencia de maestro en la apertura

18/012023 **MV_0109 GEDUAR ORLANDO HORMAZA** Se realiza visita de apertura en compañía de la persona encargada por el beneficiario, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV son; demolición de pisos esmaltados, construcción de placa con malla electrosoldada, enchape de pisos en habitaciones, pasillo y cocina. Pintura en general.

18/01/2023 **MV_1141 HERNANDO GONZALEZ MONCADA** Se realiza visita de apertura en compañía de la persona encargada por el beneficiario, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV son; desmonte de cubierta existente, instalación de cubierta nueva con sus accesorios, demolición de enchape de piso en baño, cambio de combo sanitario, instalación de enchape de piso en baño, instalación de cielo raso en PVC en 2 habitaciones.

19/01/2022 **MV_00001 BLANCA CECILIA CONTRERAS DE GORDO** Se realiza apertura con la beneficiaria, se expone y hace entrega de carta de trato digno, se diligencia acta de inicio y se socializan las actividades de obra con el presupuesto inicial encontrando conformidad por parte de la señora Blanca para la intervención en la segunda planta de la vivienda con actividades de cambio de cubierta completa, la beneficiaria asume el desmonte debido a que las tejas son de asbesto, la parte tecnica expone tambien que se llevará a cabo el cambio de lavadero y enchape en zona humeda. La beneficiaria expresa conformidad con actvidades porpuestas por parte técnica. Se deja la bitácora en la vivienda y se centa con la presencia de maestro en la apertura

19/01/2023 - **MV_01430 MARIA RESURECCION DIAZ** :Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicaciones desde el componente técnico y recomendaciones sociales. Se remite información de maestros encargados.Se realiza entrega de autoriazacion a conyuge por parte del beneficiario.

19/01/2023 - **MV_1423 CAROLINA RONCANCIO** :Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicaciones desde el componente técnico y recomendaciones sociales. Se remite información de maestros encargados.Se realiza entrega de autoriazacion a conyuge por parte del beneficiario.

20/01/2023 - **MV_1234 SACRAMENTO PUENTES** :Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicaciones desde el componente técnico y recomendaciones sociales. Se remite información de maestros encargados.Se realiza entrega de autoriazacion a conyuge por parte del beneficiario.

20/01/2023 - **MV_0028 ELIZABETH ARBOLEDA PINZON** :Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicaciones desde el componente técnico y recomendaciones sociales. Se remite información de maestros encargados.Se realiza entrega de autoriazacion a conyuge por parte del beneficiario.

20/01/2023 **MV_1136 OLGA PINEDA BUSTAMANTE** Se realiza visita de apertura en compañía de la beneficiaria, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV son; demolición de pisos en general, alistado de pisos, enchape de pisos en general, preparación de muros para aplicación de pintura, cielo raso en PVC en habitaciones, demolición de mesón de cocina y enchape existente de muros de cocina y baño, construcción de mesón de cocina con enchape y lavaplatos, enchape de muros de balo, cambio de combo sanitario e instalación de puerta de baño, pintura en general, pañete en zona húmeda, cambio de lavadero

20/01/2023 **MV_0115 MARIA ALCIRA PRIETO BUITRAGO** Se realiza visita de apertura en compañía de la persona encargada por el beneficiario, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV son; alistado de pisos en general, enchape de pisos en general, construcción y enchape de mesón de cocina, enchape en muros y piso de baño, instalación de puerta de baño, preparación de muros para aplicación de estuco y pintura en general.
20/01/2023 **MV_00002 LUIS SENEN CASTAÑEDA** Se realiza visita de apertura de obra donde se presenta la bitácora y se explica la documentación adherida a la misma, desde el área técnica se explica actividades a realizar en la vivienda donde la beneficiaria aprueba dichas actividades y se procede a la firma de los documentos.
23/01/2023 **MV_01570 SARA MEDINA VARGAS** Se realiza visita de apertura en compañía de la beneficiaria, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV son; alistado y enchape de pisos, pañete, estuco y pintura en muros en general, enchape de pisos y muros de baño, instalación de combo sanitario y puerta de baño, enchape de muro y mesón de cocina, cielo raso en habitaciones y sala comedor, pintura de muros en general
24/01/2023 **MV_01526 JUDID ZAMORA** Se realiza visita de apertura en compañía de la beneficiaria, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV son; alistado de pisos, construcción de placa en baño, pasillos y habitaciones, enchape de pisos en general, aplicación de estuco, pintura en general, construcción de mesón de cocina, enchape de mesón y muros de cocina, enchape de muros y pisos de baño, instalación de combo sanitario y puerta de baño
25/01/2023 **MV_01557 DIEGO GIRALDO POSADA** Se realiza visita de apertura en compañía de la persona encargada por el beneficiario, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV son; alistado y enchape de pisos en general, demolición de enchape en mesón de cocina, enchape en mesón de cocina, demolición de enchape de piso de baño, instalación de enchape en piso de baño, pañete en muros de habitaciones, estuco, pintura en general, enchape en zona de lavado, instalación de cielo raso en PVC.
25/012023 **MV_01566 MARTHA CECILIA GIL BERNAL** Se realiza visita de apertura en compañía de la persona encargada por el beneficiario, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV son; estuco en habitaciones y muros de sala, instalación de cielo raso en PVC en habitaciones y sala comedor, enchape en zona de lavado y pintura en general.
25/01/2023 **MV_01530 WILBER CANO RAMOS** Se realiza visita de apertura en compañía de la beneficiaria, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV son; demolición de pisos en zona social, alistado de pisos, enchape de pisos en zona social, preparación de muros para aplicación de pintura, cielo raso en PVC, enchape de muros de baño, instalación de combo sanitario e instalación de puerta de baño, pintura en general, enchape de muros en zona húmeda.
25/01/2023 **MV_00004 JORGE HERNANDO CABRA GALEANO** Se realiza visita de apertura de obra, se enseña la bitácora de obra a la beneficiaria y se explica la documentación adherida a la misma, desde la parte técnica explica las actividades a realizar en la vivienda donde el beneficiario las aprueba y se procede a realizar la firma de documentos.
25/01/2023 **MVAL_00091 DIANA YANET SUESCA GOMEZ** Se realiza apertura donde indican algunas recomendaciones a nivel general sobre el mejoramiento y los cuidados de sus objetos de valor y personales. Se presenta el personal a ejecutar obra y las actividades a realizar. Se despejan sobre el presupuesto. Se entrega carta de trato digno y bitácora. Informando ubicación de PAC, horarios, días de atención y números de contacto. Actividades a realizar: enchape piso en hall, área social, cocina y habitación. En la mayoría de las áreas se instalará PVC excepto en zona de ropas, se pintará todas las áreas de la casa excepto paredes con diseño.
25/01/2023 **MV_01428 MARIA MAGDALENA HERNANDEZ DIAZ** Se realiza apertura donde indican algunas recomendaciones a nivel general sobre el mejoramiento y los cuidados de sus objetos de valor y personales. Se presenta el personal a ejecutar obra y las actividades a realizar. Se despejan sobre el presupuesto. Se entrega carta de trato digno y bitácora. Informando ubicación de PAC, horarios, días de atención y números de contacto. Actividades a realizar: cubierta, en dos habitaciones se pondrá pañete impermeabilizante, en el baño se pondrá bordillo de la ducha, se pañetará hueco de la escalera y se contemplará una baranda para la escalera.
26/01/2023 **MVAL_00040 ANA MERCEDES GOMEZ HERNANDEZ** Se realiza visita de apertura de obra, se enseña a la beneficiaria la bitácora de obra y se explica la documentación adherida a la misma, desde la parte técnica explica a la beneficiaria las actividades a realizar en la vivienda la cual aprueba las actividades a realizar y se firman los documentos
27/01/2023 **MV_00098 MARCO FIDEL BARRERO NIÑO** Se realiza apertura donde indican algunas recomendaciones a nivel general sobre el mejoramiento y los cuidados de sus objetos de valor y personales. Se presenta el personal a ejecutar obra y las actividades a realizar. Se despejan sobre el presupuesto. Se entrega carta de trato digno y bitácora. Informando ubicación de PAC, horarios, días de atención y números de contacto. Actividades a realizar: cocina, área social, zona de ropas completas, cielo raso en algunas áreas del segundo piso.
27/01/2023 **MV_00092 ORFELINA VARGAS QUINTERO** Se realiza apertura donde indican algunas recomendaciones a nivel general sobre el mejoramiento y los cuidados de sus objetos de valor y personales. Se presenta el personal a ejecutar obra y las actividades a realizar. Se despejan sobre el presupuesto. Se entrega carta de trato digno y bitácora. Informando ubicación de PAC, horarios, días de atención y números de contacto. Actividades a realizar: se intervendrá el primer piso habitaciones, cocina, baño, zona de ropas, área social completas.
31/01/2023 **MV_00009 LUZ MARINA ALONSO HERNANDEZ** Se realiza apertura con la beneficiaria se expone y hace entrega de carta de trato digno, se diligencia acta de inicio y se socializan las actividades de obra con el presupuesto inicial encontrando conformidad por parte de la señora Luz Marina para la intervención baño con cambio de combo sanitario, bordillo de ducha y enchapes; actividades en cocina con levantamiento de mesón, pintura, estuco y enchape en habitaciones uno y dos, Enchape en área social, la parte técnica informa de intervención para subsanar humedad, además de enchapes en zona de lavado. Se hace aclaración de que no es necesario desocupar la vivienda, sino que se propone la reubicación de áreas para ejecución de obras. La beneficiaria manifiesta conformidad .Se deja la bitácora en la vivienda y se cuenta con la presencia del maestro que recibe la casa.

31/01/2023 **MV_1213 HECTOR JULIO ALFONSO BOHORQUEZ** Se realiza visita de apertura en compañía del beneficiario, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV son; alistado y enchape de pisos, pañete, estuco y pintura en muros en general, enchape de pisos y muros de baño, y puerta de baño, enchape de muro y mesón de cocina, cielo raso en habitaciones y sala comedor, pintura de muros en general.
31/01/2023 **MV_01215 NANCY STELLA RODRIGUEZ GARCIA** Se realiza visita de apertura en compañía de la beneficiaria, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV son; alistado de pisos, enchape de pisos en general, pintura en general, construcción de mesón de cocina, enchape de muros de baño, instalación de puerta de baño cielo raso en habitaciones 2 y 3
BARRIO O TERRITORIO: ____NUEVO PORTAL, TRIANGULO, NUEVO PORVENIR,PORTAL DE LA VEGA_____
SEGUIMIENTOS SOCIALES
05/01/2023 **MV_1220 MARTHA ISABEL GARCIA:** Se inicia proceso de proceso de pañete en zona de baño , sin novedad alguna por parte del Componente social.
05/01/2023 **MV_1198 CRISOSANTO BECERRA GOMEZ :** Se inicia proceso de alistado de piso en habitacion (1) , sin novedad alguna por parte del Componente social.
05/01/2023 **MV_1197 ANGELA MARIA AGUDELO :**Se inicia proceso de enchape en cocina , sin novedad alguna por parte del Componente social.
05/01/2023 **MV_1103 SOCORRO OJEDA:** Se inicia proceos de instalacion de enchape en habitaciones (1) y (2) , asi mismo proceso de enchape en cocina , sin novedad alguna por parte del Componente social.
05/01/2023 **MV_1228 LUZ FABIOLA RAMIREZ MANRIQUE :** No se evidencian maestros en la vivienda , sin novedad alguna por parte del Componente socia**l.**
04/01/2023 **MV_1079, MARÍA AMPARO GÓMEZ** Se realiza visita de seguimiento de obra en donde se observa al personal de obra llevar a cabo actividades de enchape en pisos y estuco en muros de habitaciones. La beneficiaria se encuentra conforme, no se presentan novedades sociales.
04/01/2023 **MV_1080, HÉCTOR MARTIN ARÉVALO**Se realiza visita de seguimiento de obra en donde se observa al personal de obra llevar a cabo los remates finales de la vivienda, se programa entrega. El beneficiario se encuentra conforme, no se presentan novedades sociales.
04/01/2023 **MV_1146, ALEXA CONSTANZA ROJAS** Se realiza visita de seguimiento de obra en donde se observa al personal de obra llevar a cabo los remates finales de la vivienda, se programa entrega. La beneficiaria se encuentra conforme, no se presentan novedades sociales.
04/01/2023 **MV_1151, DONALDO HERNÁNDEZ** Se realiza visita de seguimiento de obra en donde se observa al personal de obra llevar a cabo lactividades en cielo raso. El beneficiario se encuentra conforme, no se presentan novedades sociales.
06/01/2023 **MV_1079, MARÍA AMPARO GÓMEZ** Se realiza visita de seguimiento de obra en donde se observa al personal de obra llevar a cabo actividades en cocina; adicionalmente se informa a la familia que se cambaran las actividades propuestas en el presupuesto inicial debido a imprevistos. La beneficiaria se encuentra conforme, no se presentan novedades sociales.
04/01/2023 **MV_01167 RAMIRO CASTILLO** Se realiza seguimiento identificando la necesidad de solicitar al beneficiario el cuidado de las actividades realizadas en la vivienda para promover el avance de las mismas, además de que el componente técnico realizara retroalimentaciones al personal de obra de la vivienda. Se deja anotación en bitácora.
04/01/2023 **MV_01123 RUBIEL UFRACIO SOTO MARROQUÍN** Se realiza seguimiento identificando avances en enchape de piso y actividades en área de baño, sin novedad en componente social.
04/01/2023 **MVAL_0116 MARIA EUGENIA GOMEZ** Se realiza seguimiento, identificando maestros ejecutando actividades de pintura en muros y actividades en baño de la primera planta.sin novedad en componente social
05/01/2023 **MVAL_0116 MARIA EUGENIA GOMEZ** Se realiza seguimiento con técnico de interventoria y SSTMA de parte contratista identificando avance en actividades de obra y sin novedades sociales dentro de la vivienda.
06/01/2023 **MV_1391 JOSE LISANDRO MENDIVELSO ROMERO** Se realiza seguimiento identificando avances en pañete de muros y se observa demolición demesón de cocina
06/01/2023 **MV_01167 RAMIRO CASTILLO TRUJILO** Se realiza seguimiento identificando avance en área de baño y reemplazo de baldosas, se deja anotación por uso de área de baño por parte del beneficiario drante la intervención del mismo
10/01/2023 **MV_1391 JOSE LISANDRO MENDIVELSO ROMERO** Se realiza seguimiento en compañía del director de obra contratista quien brinda claridad sobre inquietudes técnicas manifestadas por el beneficiario, se da claridad se deja anotación en bitácora.
10/01/2023 **MV_1197 ANGELA MARIA AGUDELO :**En el respectivo seguimiento se evidencia instalacion de enchape en cocina y terminacion de instalacion de cubierta , sin novedad alguna por parte del Componente social.
10/01/2023 **MV_1230 MARLENE PUERTA LOPEZ:**En el respectivo seguimiento se evidencia instalacion de de cubierta , sin novedad alguna por parte del Componente social.
10/01/2023 **MV_1200 SANDRA MILENA VARGAS CARILLO :**En el respectivo seguimiento se evidencia instalacion de enchape en sala comedor y hall de la vivienda, sin novedad alguna por parte del Componente social.
10/01/2023 **MV_1198 CRISOSTOMO BECERRA GOMEZ:** En el respectivo seguimiento se evidencia instalacion de enchape en sala comedor , hall y habitacion (1) , sin novedad alguna por parte del Componente social.
10/01/2023 **MV_1020 BLANCA MARINA SILVA SORACA:**En el respectivo seguimiento se evidencia instalacion de enchape en habitacion (1) y sala comedor , sin novedad alguna por parte del Componente social.

10/01/2023 **MV_1228 LUZ FABIOLA RAMIREZ MANRIQUE:** En el respectivo seguimiento se evidencia incio de proceso de pañete en zona de lavado y parte de la sala comedor , sin novedad alguna por parte del Componente social.
10/01/2023 **MV_1206 ELVIA MENDOZA SANCHEZ :**En el respectivo seguimiento se evidencia incio de proceso de enchape en habitacion (1) , sin novedad alguna por parte del Componente social.
10/01/2023 **MV_1220 MARTA ISABEL GARCIA:**En el respectivo seguimiento se evidencia incio de proceso de enchape en baño del tercer piso , sin novedad alguna por parte del Componente social**.**
10/01/2023 **MV_0025 MARIA HELENA REYES:** En el respectivo seguimiento se evidencia incio de proceso de pañete en zona de lavado y parte de la sala comedor , sin novedad alguna por parte del Componente social.
10/01/2023 **MV:1103 SOCORRO OJEDA:**En el respectivo seguimiento se evidencia incio de proceso de indtalacion de enchape en piso y zona de meson corespondiente a cocina , sin novedad alguna por parte del Componente social.
10/01/2023 M**V_1151, DONALDO HERNÁNDEZ** Se realiza visita de seguimiento de obra en donde se observa al personal de obra llevar a cabo actividades de enchape en baño. El beneficiario se encuentra conforme, no se presentan novedades sociales.
10/01/2023 **MV_1079, MARÍA AMPARO GÓMEZ** Se realiza visita de seguimiento de obra en donde se observa al personal de obra llevar a cabo actividades de enchape en baño. La beneficiaria se encuentra conforme, no se presentan novedades sociales.
11/01/2023 **MV_1240, BLANCA LILIA RUIZ** Se realiza visita de seguimiento de obra en donde se observa al personal de obra llevar a cabo actividades de enchape en cocina. La beneficiaria se encuentra conforme, no se presentan novedades sociales**.**
11/01/2023 **MV_01244, MARÍA INÉS CABALLERO** Se realiza visita de seguimiento de obra en donde se observa al personal de obra llevar a cabo lactividades en cielo raso. El beneficiario se encuentra conforme, no se presentan novedades sociales.
11/01/2023 **MV_01253, MARÍA ESCOBAR** Se realiza visita de seguimiento de obra, en donde se observa al personal llevar a cabo actividades de enchape en pisos en general. La beneficiaria se encuentra conforme, no se presentan novedades sociales.
11/01/2023 **MV_1220 MARTA ISABEL GARCIA:** En el respectivo seguimiento se evidencia incio de proceso de pañete en zona de lavado y parte de la sala comedor , sin novedad alguna por parte del Componente social.
11/01/2023 **MV_01167 RAMIRO CASTILLO** Se realiza seguimiento identificando la necesidad de informar al beneficiario sobre situación ocurrida con los animales que habitan la vivienda por acceder a zona donde se están ejecutando las intervenciones por encontrar huellas sobre el alistado de piso, exponiendo la necesidad de contar con su compromiso del cuidado de las áreas para garantizar la efectividad en las obras ejecutadas en la vivienda, se realiza liberación de baño de la primera planta el cual también se identifico que se había hecho uso, precio a la liberación del mismo. Por otra parte se identifica al personal de obra desempeñando activdadesde de instalación de enchape de piso en la segunda planta y enchape en la cocina ubicada en la primera planta. Se deja anotación en bitácora.
11/01/2023 **MVAL_0116 MARIA EUGENIA GOMEZ** Se realiza seguimiento identificando avances en enchape de piso en segunda planta, se observa culminación de actividades de pintura en habitación 1 de la primera planta, la parte técnica solicita remates en el área , se aborda a la beneficiaria quien expone conformidad por el avance en las actividades, sin novedad en componente social.
11/01/2023 **MV_1394 LUCY PINEDA DE LOPEZ** Se realiza seguimiento, identificando maestros ejecutando actividades en la zona de la cocina, como la demolición del mesón, se aborda a la beneficiaria quien manifiesta conformidad,
11/01/2023 **MV_1391 JOSE LISANDRO MENDIVELSO ROMERO** Se realiza seguimiento observando que el personal en obra continua ejecutando actividades relacionadas a pañetes de murosde habitaciones y zona social, se aborda al beneficiario sin encontrar novedades de componente social.
11/01/2023 **MV_01400 ARGENIS MOSQUERA ROBAYO** Se realiza seguimiento identificando actividades de alistado de piso en área de baño, demolieron mesón de cocina, se brinda claridad sobre la no intervención en puerta de baño y se deja anotación en bitácora, sin novedad en componente social.
13/01/2023 **MV_1391 JOSE LISANDRO MENDIVELSO ROMERO** Se realiza seguijmeinto de la vivienda identificando que los maestros se encuentran instalando enchape de pisos en la vivienda, no se cuenta con la presencia del beneficiario por la cual no se identifican novedades sociales.
13/01/2023 **MV_1394 LUCY PINEDA DE LOPEZ** Se realiza seguimiento de obra observando avances en alistado de piso, se identifican maestros desempeñando actividades de enchape de piso y fundición de mesón de cocina.
13/01/2022 **MV_0049 BENJAMIN QUIROGA QUIROGA** Se realiza seguimiento de obra observando maestros ejecutando actividades de alistado de piso y enchape de piso en cocina y baño. Sin novedad en componente social.
13/01/2023 **MV_01123 RUBIEL UFRACIO SOTO MARROQUÍN** Se realiza seguimiento de obra evidenciando que se avanzaron en actividades de pintura en áreas sociales. Se aborda a la persona autorizada quien niega novedades.
13/01/2023 **MV_1198 CRISOSTOMO BECERRA GOMEZ:** En el respectivo seguimiento se evidencia instalacion de cielo razo en hall y sala comedor , sin novedad alguna por parte del Componente social**.**
13/01/2023 **MV_1230 MARLENE PUERTA LOPEZ:**En el respectivo seguimiento se evidencia instalacion de estructura de meson de cocina , sin novedad alguna por parte del Componente social.
13/01/2023 **MV_1228 LUZ FABIOLA RAMIREZ MANRIQUE :** En el respectivo seguimiento se evidencia terminacion de pañete en zona de lavado y sala comedor , por otra parte se evidencia alistado de piso en las zonas en mencion , sin novedad alguna por parte del Componente social.
13/01/2023 **MV_1206 ELVIA MENDOZA SANCHEZ :**En el respectivo seguimiento se evidencia terminacion de intalacion de enchape zona sala comedor , sin novedad alguna por parte del Componente social.
13/01/2023 **MV_1220 MARTA ISABEL GARCIA:**En el respectivo seguimiento se evidencia terminacion de intalacion de enchape zona de hall e inicio de proceso de pintura , sin novedad alguna por parte del Componente social.
13/01/2023 **MV_0025 MARIA HELENA REYES:** En el respectivo seguimiento se evidencia terminacion de pañete e inicio de alistado de piso , sin novedad alguna por parte del Componente social.
13/01/2023 **MV_1109 ANA MARIA ARIZA:**En el respectivo seguimiento se evidencia terminacion en instalacion de enchape y en proceso de remates de pintura sin novedad alguna por parte del Componente social.
13/01/2023 **MV_01191 ROSA MARIA LESMES :**En el respectivo seguimiento se evidencia terminacion en instalacion de enchape , terminacion de cubierta y en proceso de remates de pintura sin novedad alguna por parte del Componente social.
13/01/2023 **MV_1349 NELIDA HERNANDEZ PASTRANA:**En el respectivo seguimiento se evidencia proceso de obra en cocina , sin novedad alguna por parte del Componente social.

13/01/2023 **MV_1200 SANDRA MILENA VARGAS :**En el respectivo seguimiento se evidencia proceso de enchape en el baño de la vivienda, sin novedad alguna por parte del Componente social.
17/01/2023 **MVAL_0116 MARIA EUGENIA GOMEZ OROZCO** Se realiza seguimiento de vivienda, identificando que los maestros se encuentran ultimando detalles de una habitación, se programa entrega para día siguiente.
17/01/2023 **MV_1394 LUCY PINEDA DE LOPEZ** Se realiza seguimiento de piso evidenciando instalación de enchape de piso en área social, además de enchape de mesón de cocina y salpicadero, durante la visita la beneficiaria no se encuentra presente, sin embargo no se identifican novedades sociales con personas presentes.
17/01/2023 **MV_1391 JOSE LISANDRO MENDIVELSO ROMERO** Se realiza seguimiento, observando avance en pañete en área social y actividades en zona de la cocina en mesón, adicionalmente se identifica la necesidad de clarificar actividades ante inquietudes expresadas por el beneficiario con respecto a las actividades a realizar, motivo por el cual la parte técnica brinda claridad y deja anotación en bitácora.
17/01/2023 **MV_0049 BENJAMIN QUIROGA QUIROGA** Se realiza seguimiento evidenciando la instalación de cubierta a totalidad,los maestros se encuentran enchapando el piso en área social, se aborda al beneficiario quien expone confromidad con los avances realizados.
17/01/2023 **MV_01400 ARGENIS MOSQUERA ROBAYO** Se realiza seguimiento, identificando que se encuentran terminando actividades en la zona del baño, la parte técnica hace revisión de la cubierta, la cual se encuentra instalada. Se aborda a la beneficiaria quien refiere conformidad con los avances de la vivienda.
18/01/2023 **MV_1236 ROSALBINA URIBE** Se realiza seguimiento, identificando al maestro asignado desempeñando actividades de enchape de piso de la vivienda, se observa que durante el seguimiento no se encuentra la beneficiaria ni personas asignadas dentro de la vivienda.
19/01/2023 **MV_1394 LUCY PINEDA DE LOPEZ** Se realiza seguimiento, identificando que se encuentran instalando pvc y adelantan actividades en la zona del baño, se aborda a la beneficiaria quien niega novedades.
19/01/2023 **MV_1391 JOSE LISANDRO MENDIVELSO ROMERO** Se realiza seguimiento identifiando a los maestros realizando alistado de piso en una de las habitaciones y adelantando actividades de pintura en zonas sociales, sin novedades sociales.
19/01/2023 **MV_0049 BENJAMIN QUIROGA QUIROGA** Se realiza seguimiento identificando a los maestros desempeñando actividades de pañete en una habitación, se aborda al beneficiario y este niega novedades.
19/01/2023 **MV_00038 MARIA GEROGINA LEMUS DE CHAPARRO** Se realiza seguimiento,identificando que el personal de obra se encuentra interviniendo la habitación del segundo piso de la vivienda con actividades de pañete en muros. Se aborda a la beneficiaria quien refiere conformidad,
19/01/2023 **MV_01167 RAMIRO CASTILLO TRUJILLO** Se realiza seguimiento en el cual se observa que los maestros se encunetran instalando equipo sanitario de la vivienda, se realiza anotacion en bitacora.
19/01/2023 **MV_1180 JOSE ANTONIO FLORES :**Se evidencia incio de proceso de pañete y entrega de material . Sin novedad alguna por parte del componente social.
19/01/2023 **MV_0025 MARIA HELENA REYES:** Se evidencia instalacion de enchape en baño . Sin novedad alguna por parte del componente social.
19/01/2023 **MV_1206 ELVIA MENDOZA SANCHEZ:** Se evidencia instalacion de enchape en zona de cocina . Sin novedad alguna por parte del componente social.
19/01/2023 **MV_1228 LUZ FABIOLA RAMIREZ MANRIQUE :** Se evidencia terminacion de pañete en habitacion (1). Sin novedad alguna por parte del componente social.
19/01/2023 **MV_1230 MARLENE PUERTA LOPEZ:** Se evidencia instalacion de enchape den estructura de muro . Sin novedad alguna por parte del componente social.
19/01/2023 **MV_0127 BELLANIRA PRIETO:**Se evidencia instalacion de enchape en habitacon (2) .Sin novedad alguna por parte del componente social.
20/01/2023 **MV_1423 CAROLINA RONCANCIO :**Se evidencia inicio de pañete en baño y cocina . Sin novedad alguna por parte del componente social
20/01/2023 **MV_00420 ALVARO URREGO:** Se evidencia inicio de labores de pañete . Sin novedad alguna por parte del componente social.
23/01/2023 **MV_0127 BELLANIRA PRIETO :** Se evidencia iniico de procesos constructivos en cocina .Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
23/01/2023 **- MV_1095 MARIA LIBIA BELTRAN :** Se evidencia instalacion de enchape en habitacion . Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
23/01/2023 **- MV_1234 SACRAMENTO PUENTES:** Se evidencia instalacion de cubiertas . Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
23/01/2023 **MV_1228 LUZ FABIOLA RAMIREZ MANRIQUE :**Se evidencia instlacion de enchape en baño con su respectiva cenefa.Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
24/01/2023 **MV_1220 MARTHA ISABEL GARCIA :** Se evidencia proceso de terminacion en pintura en hall .Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
24/01/2023 **MV_1423 CAROLINA RONCANCIO :**Se evidencia proceso de instalacion de enchape en cocina , por parte del componente social no se evidencia novedad alguna
24/01/2023 **- MV_0028 ELIZABETH ARBOLEDA PINZON :**Se evidencia proceso de instalacion de cubierta , por parte del componente social no se evidencia novedad alguna
24/01/2023 **MV_0025 MARIA HELENA REYES:**Se evidencia instalacion de enchape en sala comedor , por parte del componente social no se evidencia novedad alguna
24/01/2023 **- MV_1180 JOSE ANTRONIO FLORES :**Se evidencia instalacion de enchape en sala comedor , por parte del componente social no se evidencia novedad alguna
25/01/2023 **MV_00420 ALVARO URREGO:** Se evidencia instalacion de enchape en habitacion y guarda escobas , por parte del componente social no se evidencia novedad alguna.
30/01/2023 **MV_1433 KELLY YOHANA LÓPEZ :** Se evidencia iniico de procesos constructivos en habitación. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
30/01/2023 **MV_ 01428 MARÍA MAGDALENA HERNÁNDEZ :** Se evidencia instalacion de pvc. La beneficiaria solicita una teja transparente para el área del lavadero. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
30/01/2023 **MV_ 01196, MARINA MANRIQUE:** Se evidencia instalacion de cubierta y retoques finales. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.

30/01/2023 **MV_00004 JORGE HERNANDO CABRA GALEANO** Se realiza seguimiento por parte del área técnico y social de contratista e interventoría, identificando maestros realiando actividades de alistado de piso, se llevo a cabo la demolición del mesón de cocina y el enchape de muro en esta área junto a la cenefa asignada, adicionalmente se observa que se encuentran enchapando zóna de ropas. Durante la visita se observa que no se encuentra presente la persona autorizada ni alguien que resida en la vivienda.
30/01/2023 **MV_00002 LUIS SENEN CASTAÑEDA** Se realiza seguimiento con área técnico y social contratista e interventoria, identificando avance en pañete de muros, adicionalmente se observa terminación de enchape en mesón de cocina, se aborda al beneficiario quien niega novedades.
30/01/2023 **MV_00001 BLANCA CECILIA CONTRERAS DE GORDO** Se realiza seguimiento, identificando instalación de cubierta, además de adelantar actividades en zona de ropas, se aborda a la beneficiaria quien niega novedades. Sin embargo se reconoce como información significativa que la señora Blanca instalo celo raso en habitación y cocina sin notificar y sin que se haya hecho entrega previa de dicha área.
30/01/2023 **MV_00046 LUZ ASTRID CRUZ DUARTE** Se realiza seguimiento evidenciando que se llevó a cabo la instalación de cubierta, la parte técnica notifica que falta instalación de flanches y caballete. Los maestros se encuentran trabajando en la fundición del mesón de cocina el cual previamente fue demolido, se realiza anotación dejando observación exponiendo que la beneficiaria realizo cambios previos a la intervención del mejoramiento, afectando la instalación de cubierta por las modificaciones realizadas, se sensibiliza a la señora Luz para prevenir que realice modificaciones que entorpezcan la ejecución de actividades propuestas.
30/01/2023 **MVAL_00040 ANA MERCEDES GOMEZ** Se realiza seguimiento de vivienda observando que se demolió el enchape y el mesón del área de la cocina, adicionalmente los maestros se encunetran pañetando área del hall, se encuentra al hijo de la beneficiaria en la vivienda. Sin novedades sociales.
30/01/2023 **MV_00038 MARIA GEORGINA LEMUS DE CHAPARRO**Se realiza seguimiento observando que el maestro se encuentra culminando detalles, se realizo cambio de cubierta, cambio de combo sanitario y enchape en área de lavado e intervención en habitación de segunda planta. Se aborda a la beneficiaria quien expone conformidad en obras.
31/01/2023 **MV_00004 JORGE HERNANDO CABRA GALEANO** Se realiza seguimiento observando maestros adelantando actividades de enchape de piso y fundición de mesón de cocina. Una de las habitaciones de la vivienda se encuentra con el alistado de piso. Se aborda a la persona autorizada quien niega novedades.
31/01/2023 **MV_00002 LUIS SENEN CASTAÑEDA** Se realiza seguimiento identificando que se continuan actividades de pañete en muros y se avanza intervención en área del baño, el señor Luis niega novedades.
31/01/2023 **MV_00046 LUZ ASTRID CRUZ DUARTE**Se realiza seguimiento identificando avances en área del baño, se aborda a la beneficiaria y la parte técnica busca clarificar inquietudes manifestadas por la señora Luz, desde el área social se identifica comprensión y claridad.
ENTREGAS
04/01/2023 **MV_00165 PABLO ANTONIO GORDILLO** Se hace entrega de vivienda, tras la ejecución de actividades previamente propuestas, se identifica conformidad por parte del beneficiario.se realiza firma de documentación, socialización de manuales de uso y entrega de kit ecológico al beneficiario y se expone conformidad y se hace entrega de la vivienda.
06/01/2023 **MV_1146, ALEXA CONSTANZA ROJAS** Se realiza entrega de mejoramiento de vivienda en compañía del autorizado en donde se socializa el manual de uso y mantenimiento de espacios y se hace entrega del kit ecológico. Adicionalmente se e verifica que las áreas entregadas en las viviendas se encuentran totalmente terminadas y en completo funcionamiento y se firma el acta técnico-social de finalización. Por último, se indica cual es el paso a seguir en una posible posventa y se hace entrega total a satisfacción.
06/01/2023 **MV_1080, HÉCTOR MARTIN ARÉVALO** Se realiza entrega de mejoramiento de vivienda en compañía del beneficiario en donde se socializa el manual de uso y mantenimiento de espacios y se hace entrega del kit ecológico. Adicionalmente se e verifica que las áreas entregadas en las viviendas se encuentran totalmente terminadas y en completo funcionamiento y se firma el acta técnico-social de finalización. Por último, se indica cual es el paso a seguir en una posible posventa y se hace entrega total a satisfacción.
11/01/2023 **MV_1197 ANGELA MARIA AGUDELO**: Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion.
13/01/2023 **MV_1109 ANA MARIA ARIZA:**Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion.
13/01/2023 **MV_01191 ROSA MARIA LESMES:**Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion.
16/01/2022 **MV_1200 SANDRA MILENA VARGAS** Se hace entrega de vivienda, tras la ejecución de actividades previamente propuestas (cubierta, pintura en zona social, actividades en baño y zona de ropas), se identifica conformidad por parte de la beneficiaria. se realiza firma de documentación, socialización de manuales de uso y entrega de kit ecológico a la beneficiaria y se expone conformidad y se hace entrega de la vivienda.
17/01/2023 **MV_01123 RUBIEL UFRACIO SOTO MARROQUÍN** Se hace entrega de vivienda a la persona autorizada, tras la ejecución de actividades previamente propuestas, se identifica conformidad por parte de autorizada se realiza firma de documentación, socialización de manuales de uso y entrega de kit ecológico, se expone conformidad y se hace entrega de la vivienda.
17/01/2023 **MV _1151 DONALDO HERNANDEZ** : Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion.
17/01/2023 **MV_1240 BLANCA LILIA RUIZ :**Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion.
17/01/2023 **MV_1198 CRISOSTOMO BECERRA :**Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion.
17/01/2023 **MV_01253 MARIA BETHU ESCOBAR :S**e realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion
18/01/2023 **MVAL_0116 MARIA EUGENIA GOMEZ OROZCO** Se hace entrega de vivienda a la beneficiaria, tras la ejecución de actividades previamente propuestas, se identifica conformidad por parte de la señora maria Eugenia se realiza firma de documentación, socialización de manuales de uso y entrega de kit ecológico, se expone conformidad y se hace entrega de la vivienda.
19/01/2023 **MV_1020 BLANCA MARINA SILVA :** Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion
19/01/2023 **MV_1349 NELIDA ESTER HERNANDEZ :** Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion
19/01/2023 **MV_1079 MARIA AMPARO GOMEZ CHIQUIZA** Se hace entrega de vivienda a la beneficiaria, tras la ejecución de actividades previamente propuestas, se identifica conformidad por parte de la señora maria Eugenia se realiza firma de documentación, socialización de manuales de uso y entrega de kit ecológico, se expone conformidad y se hace entrega de la vivienda.
19/01/2023 **MV_1344 IRMA ADELA TORRES TIQUE** Se hace entrega de vivienda a la beneficiaria, tras la ejecución de actividades previamente propuestas, se identifica conformidad por parte de la señora maria Eugenia se realiza firma de documentación, socialización de manuales de uso y entrega de kit ecológico, se expone conformidad y se hace entrega de la vivienda.

20/01/2023 **MV_0049 BENJAMIN QUIROGA QUIROGA** Se hace entrega de vivienda a la beneficiaria, tras la ejecución de actividades previamente propuestas, se identifica conformidad por parte de la señora maria Eugenia se realiza firma de documentación, socialización de manuales de uso y entrega de kit ecológico, se expone conformidad y se hace entrega de la vivienda.
20/01/2023 **MV_01192 ALBA LUCIA SANTAMARIA MENDOZA** Se hace entrega de vivienda a la beneficiaria, tras la ejecución de actividades previamente propuestas, se identifica conformidad por parte de la señora maria Eugenia se realiza firma de documentación, socialización de manuales de uso y entrega de kit ecológico, se expone conformidad y se hace entrega de la vivienda.
20/01/2023 **MV_1394 LUCY PINEDA** Se hace entrega de vivienda a la beneficiaria, tras la ejecución de actividades previamente propuestas, se identifica conformidad por parte de la señora maria Eugenia se realiza firma de documentación, socialización de manuales de uso y entrega de kit ecológico, se expone conformidad y se hace entrega de la vivienda.
23/01/2023 **MV_1230 MARLENE PUERTA LOPEZ** : Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion.
23/01/2023 **MV_1206 ELVIA MENDOZA SANCHEZ :**Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion.
23/01/2023 **MV_01167 RAMIRO CASTILLO TRUJILLO :**Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion.
26/01/2023 **MV_1391 JOSE LISANDRO MENDIVELSO:**Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion.
26/01/2023 **MV_1228 LUZ FABIOLA RAMIREZ MANRIQUE:**Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion.
26/01/2023 **MV_00158 MARÍA HILDA CASTAÑO FERNÁNDEZ:**Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion.
27/01/2023 **MV_1220 MARTHA ISABEL GARCIA :**Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion.
27/01/2023 **- MV_0028 ELIZABETH ARBOLEDA PINZON:**Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion.
27/01/2023 **MV_1423 CAROLINA RONCANCIO :**Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion.
27/01/2023 **MV_01244 MARÍA INÉS CABALLERO PUENTES:**Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion.
30/01/2023 **MVAL_01257 NELSON FACUNDO DIAZ TORRES** Se hace entrega de vivienda, tras la ejecución de actividades previamente propuestas, se identifica conformidad por parte de la beneficiaria. se realiza firma de documentación, socialización de manuales de uso y entrega de kit ecológico a la beneficiaria expone conformidad y se hace entrega de la vivienda.
30/01/2023 **MV_01363 OMAR MAYUSA CATAÑEDA** Se hace entrega de vivienda, tras la ejecución de actividades previamente propuestas, se identifica conformidad por parte de la beneficiaria. se realiza firma de documentación, socialización de manuales de uso y entrega de kit ecológico a la beneficiaria expone conformidad y se hace entrega de la vivienda.
31/01/2023 **MV_00038 MARIA GEORGINA LEMUS DE CHAPARRO** Se hace entrega de vivienda, tras la ejecución de actividades previamente propuestas, se identifica conformidad por parte de la beneficiaria. se realiza firma de documentación, socialización de manuales de uso y entrega de kit ecológico a la beneficiaria expone conformidad y se hace entrega de la vivienda.

RENUNCIAS
NO SE PRESENTARON EN EL TRANSCURSO DEL MES.
PQRS
NO SE PRESENTARON EN EL TRANSCURSO DEL MES.
PAC
PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Se establece que el punto de atención quedara ubicado en la Carrera 7B Este No 97G-25 Sur y será atendido los días martes, jueves y sábados en el horario de 8:30 am a 12:00 pm
HISTORIAS DE VIDA
20/01/2023 MV_02782 MANUEL ROSARIO GONZALEZ HINESTROZA Se diligencia formato para ser historia de vida; Beneficiario afrodescendiente, quien es padre cabeza de familia, tiene a cargo a sus 4 hijas y una de ellas en condición de discapacidad, actualmente es empleado de vigilancia, trabaja en horas de la noche para poder estar pendiente de sus hijas durante el día.
5. CASOS ESPECIALES COMPONENTE SOCIAL - CONFLICTOS Y ANÓMALIAS
INFORME QUE COMPRENDE EL MES No._05_DEL __1/01/2023_____ AL __31/01/2023_____
NO SE PRESENTARON EN EL TRANSCURSO DEL MES.
6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N.A		

6. Actas de reunión con la comunidad y listados de asistencia o soporte de las diferentes acciones según corresponda (cuando aplique).
7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE EL MES
Imagen

DESCRIPCIÓN			CARACTERIZACIÓN SOCIAL							ENTREGA VIVIENDAS		ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE OBRA		HISTORIA DE VIDA		IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA			PQRS					
MV	BENEFICIARIO	BARRIO	SI	NO	INFORMACION DE INICIO DE OBRA	OBSERVACIÓN	FECHA DE VALIDACIOND E LA VIVIENDA	FECHA DE APERTURA DE LA VIVIENDA	FECHA DE CIERRE DE LA VIVIENDA	SE ENTREGA MANUAL DE USO	SE ENTREGA CANECAS	SI	NO	SI	NO	FECHA INICIAL FASE 1	FECHA FASE 2	FECHA FINAL FASE 3	PQRS	RESPUESTA	TIEMPO RESPUESTA PQRS	VISITA SOCIAL	OBSERVACIONES
MV_0015	MARIA FIDELIA REYES BEJARANO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	21/10/2022	22/10/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_0021	SHIRLEY VALENCIA COLLAZOS	NUEVO PORVENIR	X				20/12/2022																
MV_0025	MARIA HELENA REYES BEJARANO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	20/12/2022	4/01/2023															
MV_0109	GEDUAR ORLANDO HORMAZA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	2/11/2022	18/01/2023															
MV_0115	MARIA ALCIRA PRIETO BUITRAGO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	28/10/2022	20/01/2023															
MVAL_0140	EDILSA FLOREZ MOTAVITA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	11/10/2022	4/11/2022	7/12/2022	SI	SI	X			X								
MVAL_0149	TITO RAFAEL NUÑEZ CHAPARRO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/10/2022	23/11/2022	15/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1020	BLANCA MARINA SILVA SORACA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	21/11/2022	30/12/2022	19/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_1043	LUIS HERNANDO BOHORQUEZ LOPEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	20/10/2022	8/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1051	SECUNDINO AGUILLON JAIMES	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/10/2022	18/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X								18/11/22 Se lleva a cabo apertura de MV_1051 SECUNDINO AGUILLON JAIMES sin aprobación de Interventoría a razón de no contar con personal con documentación en regla, motivo por el cual se hara seguimiento en compañía de la coordinadora social a la vivienda para verificar la presencia de personal aprobado y material en plazo máximo de tres días, además de abordar al beneficiario y reconocer conformidad con presupuesto y claridad de la información brindada por parte contratista, en caso de que no solucionen se oficiara por el actuar inadecuado y sin aprobación. (DESARROLLO NUEVO PORVENIR)
MV_1056	OVIDIO ALMECIGA VARGAS	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/10/2022	9/12/2022	29/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1060	CLARA INES AVENDAÑO LEON	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	2/11/2022	1/12/2022	29/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1062	CONCEPCION VARELA VARELA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/10/2022	29/11/2022	29/12/2022	SI	SI	X			X								

MV_1069	LUIS GERARDO BOHORQUEZ SANCHEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	11/10/2022	8/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1072	JOSE LAUDELINO RAMIREZ BUITRAGO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/10/2022	8/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1075	XIMENA MARTINEZ PEREA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/10/2022	8/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1076	CLARA EMILIA ANTONIO PEÑA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	11/11/2022	21/11/2022	27/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1079	MARIA AMPARO GOMEZ CHIQUIZA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/10/2022	9/12/2022	19/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_1095	MARIA LIBIA BELTRAN QUINTERO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	27/10/2022	16/01/2023															
MV_1109	ANA MARIA ARIZA MARTIN	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	28/10/2022	29/12/2022	13/01/2023														
MV_1129	JUAN ANTONIO PEREZ PARADA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/10/2022	2/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1131	HEIDY YURANI MUÑOZ ORTIZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/10/2022	29/11/2022	14/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1132	ANA CECILIA MARTINEZ RODRIGUEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/10/2022	4/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1136	OLGA PINEDA BUSTAMANTE	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	28/10/2022	20/01/2023															
MV_1141	HERNANDO GONZALEZ MONCADA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	31/10/2022	18/01/2023															
MV_1151	DONALDO HERNANDEZ PARDO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/11/2022	9/12/2022	17/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_1162	ANGEL MIGUEL SUAREZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	10/11/2022	29/11/2022	15/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1166	CRISTIAN DAVID PEÑA RODRIGUEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	10/11/2022	2/12/2022	29/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1180	JOSE ANTONIO FLOREZ SUSA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	20/12/2022	17/01/2023															

MV_1197	ANGELA MARIA AGUDELO PEÑA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	16/12/2022	22/12/2022	11/01/2023															
MV_1198	CRISOSTOMO BECERRA GOMEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/12/2022	3/01/2023	17/01/2023	SI	SI	X			X									
MV_1200	SANDRA MILENA VARGAS CARRILLO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	9/12/2022	27/12/2022	16/01/2023	SI	SI	X			X									
MV_1228	LUZ FABIOLA RAMIREZ MANRIQUE	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/12/2022	3/01/2023	26/01/2023	SI	SI	X			X									
MV_1230	MARLENE PUERTA LOPEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/12/2022	3/01/2023	23/01/2023	SI	SI	X			X									
MV_1231	FIDELIGNA RODRIGUEZ CICUA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	2/12/2022	9/12/2022	22/12/2022	SI	SI	X			X									
MV_1240	BLANCA LILIA RUIZ GOMEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/12/2022	3/01/2023	17/01/2023	SI	SI	X			X									
MVAL_0127	BELLANIRA PRIETO CUBILLOS	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	25/10/2022	4/11/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X									
MV_0320	MIGUEL BASILIO MADRIGAL GIRON	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/09/2022	4/10/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X									
MV_1028	MARGARITA SALAMANCA TRIANA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	21/10/2022	7/12/2022	23/12/2022	SI	SI	X			X									
MV_1032	ARGENIS RODRIGUEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	2/11/2022	16/01/2023																
MV_1080	HECTOR MARTIN AREVALO BRICEÑO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/10/2022	9/12/2022	6/01/2023	SI	SI	X			X									
MV_1081	ROSALIA GOMEZ ROMAN	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	24/10/2022	21/11/2022	16/12/2022	SI	SI	X			X									
MV_1120	JOHN RICARDO BOHORQUEZ RODRIGUEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	26/10/2022	17/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X									
MV_1122	LEOPOLDO FLOREZ CRUZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	25/10/2022	17/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X									
MV_1179	JAIRO MATEUS HERNANDEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura efectuada por el contratista	10/11/2022	24/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X									
MV_1201	YINA MARCELA MIRANDA TORRES	NUEVO PORVENIR	X				26/12/2022																
MV_1206	ELVIA MENDOZA SANCHEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	2/12/2022	5/01/2023	23/01/2023	SI	SI	X			X									
MV_1220	MARTA ISABEL GARCIA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	16/12/2022	3/01/2023	27/01/2023	SI	SI	X			X									
MV_1234	MARIA SACRAMENTO PUENTES	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	17/01/2023	20/01/2023																

MV_1236	ROSALVINA URIBE	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/12/2022	13/01/2023															
MVAL_0022	REINEL DIAZ SABOGAL	NUEVO PORVENIR	X				20/01/2023																
MV_0026	ANA VERONICA SALCEDO MELO	NUEVO PORVENIR	X				21/12/2022																
MV_0028	ELIZABETH ARBOLEDA PINZON	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	21/12/2022	20/01/2023	27/01/2023	SI	SI	X			X									
MV_0030	FLOR MARINA MORENA DE ACOSTA	NUEVO PORVENIR	X				19/01/2023																
MV_0049	BENJAMIN QUIROGA QUIROGA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/12/2022	10/01/2023	20/01/2023	SI	SI	X			X									
MVAL_0116	MARIA EUGENIA GOMEZ OROZCO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/10/2022	19/12/2022	18/01/2023	SI	SI	X			X									
MV_1064	MARIA HELENA MARQUEZ SUAREZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/10/2022	23/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X									
MV_1103	SOCORRO OJEDA MEJIA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/11/2022	27/12/2022																
MV_1146	ALEXI CONSTANZA ROJAS LEON	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/11/2022	9/12/2022	6/01/2023										Hace un tiempo mi casa, salió beneficiada para el mejoramiento de vivienda, iniciando noviembre se acercaron a la casa funcionarios de la secretaria de Hábitat incluyendo un arquitecto, quedamos en que el arreglo seria para el piso 4 ya que es el más que requiere el mejoramiento, dijeron que si lo arreglaban, pero que tenía que contar con los servicios públicos básicos, se hicieron los arreglos que ellos exigían para poder tener el beneficio, dijeron que daban un plazo máximo de 20 días, que ellos llegaban el día 21 de noviembre y no llegaron ese día, en el transcurso de ese mismo día me comunique y me dijeron que tuviera paciencia ya que no tenían ni materiales ni maestros, que antes del 31 de diciembre tenía que llegar en cualquier momento, entones quiero saber que ha pasado con este proceso, también quiero que me aclaren por favor, de cuanto es el subsidio ya que dijeron que eran 18 millones pero que a ese valor le descontaban cierto	En atención al requerimiento solicitado el día 28 de noviembre de 2022 por la beneficiaria Alexi Constanza Rojas León del barrio nuevo porvenir, MV_1146 ubicado en la Kr 6 este # 100-10 sur; el componente social del contratista se permite informar que la validación del predio se realizó el día 31 de octubre de 2022 y esa visita fue atendida por el esposo de la beneficiaria, el señor Carlos Corredor a quien se le informó todo lo relacionado al mejoramiento de vivienda, a partir del momento de validación hasta la entrega del mismo, también se dio claridad a lo relacionado con el presupuesto asignado las viviendas; en vista que el apartamento del 4to piso se encontraba en obra negra y en estado inhabitable, se priorizo para ser intervenido; explicándole al beneficiario que no se pueden realizar obras en cada uno de los pisos de la vivienda y que no se			
MV_1174	FLOR MARIA MORENO SUAREZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	25/10/2022	11/11/2022																
MV_1213	HECTOR JULIO ALFONSO BOHORQUEZ	NUEVO PORVENIR	X				14/12/2022	31/01/2023															
MV_1343	YOLANDA RUIZ CARRILLO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/12/2022	18/01/2023																
MV_1344	IRMA ADELA TORRES TIQUE	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.		5/01/2023	19/01/2023	SI	SI	X			X									

MV_1349	NELIDA ESTHER HERNANDEZ PASTRANA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/12/2022	4/01/2023	19/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_1359	GERARDO ESCARRAGA OLIVARES	NUEVO PORVENIR	X				12/12/2022																
MV_1374	NORA ELIZABETH VACCA ARIAS	NUEVO PORVENIR	X				22/12/2022																
MV_1391	JOSE LISANDRO MENDIVELSO ROMERO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/12/2022	3/01/2023	26/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_1394	LUCY PINEDA DE LOPEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/12/2022	10/01/2023	20/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_1423	DIANA CAROLINA RONCANCIO VALDES	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	16/01/2023	19/01/2023	27/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_1426	MARIA EDILMA DUEÑAS PERALTA	NUEVO PORVENIR	X				16/01/2023																
MV_1427	CEBELINDA GARCIA CORONADO	NUEVO PORVENIR	X				16/01/2023																
MV_1433	KELLY YOHANA LOPEZ ROMERO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/12/2022	18/01/2023															
MVAL_00013	HECTOR GONZALEZ TRIANA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	25/10/2022	22/11/2022	5/12/2022	SI	SI	X			X								
MVAL_00040	ANA MERCEDES GOMEZ HERNANDEZ	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/12/2022	26/01/2023															
MV_00068	JESUS ALFREDO VASQUEZ	EL TRIANGULO	X				23/12/2022																
MV_00069	MARIA CLEMENCIA CORTES GUEVARA	EL TRIANGULO	X				23/01/2023																
MV_00071	LUIS ALFREDO GONZALEZ MORENO	EL TRIANGULO	X				28/12/2022																
MV_00075	BLANCA CECILIA CHAPARRO PATIÑO	EL TRIANGULO																					
MV_00076	HILDA RUBY MORENO	EL TRIANGULO	X				23/01/2023																
MV_00159	GLORIA CAPERA ACEVEDO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	30/11/2022		9/12/2022	SI	SI	X			X								
MVAL_00164	NOHEMI PEREZ RIAÑO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/09/2022	26/10/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X								
MV_00165	PABLO ANTONIO GORDILLO MARCELO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/10/2022	29/11/2022	4/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_00211	GLORIA JEANETH VILLAMIL HURTADO	PORTAL DE LA VEGA	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	11/10/2022	4/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_00218	JULIO ALFONSO MURILLO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	11/10/2022	24/10/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X								
MV_00220	ALICIA COTRINA CASTILLO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	11/10/2022	24/10/2022	15/11/2022	SI	SI	X			X								
MV_00247	DIOSELINA FAJARDO ORTIZ	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	15/09/2022	4/11/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X								
MV_00248	POLONIO EDUARDO DIAZ PASTOR	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	21/11/2022	12/12/2022	30/12/2022	SI	SI	X			X								

MV_00329	NELLY ESPERANZA LEGUIZAMON GUTIERREZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	30/11/2022	18/01/2023																
MV_01167	RAMIRO CASTILLO TRUJILLO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	31/10/2022	19/12/2022	23/01/2023	SI	SI	X			X									
MV_01238	BEATRIZ CRUZ PAYANENE	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/10/2022	22/11/2022	9/12/2022	NO	NO	X			X									ENTREGA UNILATERAL
MV_01420	MARIA INES CORREA VALENCIA	NUEVO PORVENIR	X				19/01/2023																	
MV_01557	DIEGO GIRALDO POSADA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	30/12/2022	25/01/2023																
MV_01560	JULIO ROBERTO BALLEN BALLEN	NUEVO PORVENIR	X				28/12/2022																	
MVAL_01563	ANA LUCIA ARIAS SANTIBAÑEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/12/2022	13/01/2023																
MV_01566	MARTHA CECILIA GIL BERNAL	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	28/12/2023	25/01/2023																
MV_14683	HERNANDO REMICIO	EL TRIANGULO	X				20/12/2022																	
MV_00002	LUIS SENEN CASTAÑEDA	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/12/2022	20/01/2023																
MV_00004	JORGE HERNANDO CABRA GALEANO	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/12/2022	25/01/2023																
MV_00009	LUZ MARINA ALONSO HERNANDEZ	EL TRIANGULO	X				16/12/2022	31/01/2023																
MV_00158	MARIA HILDA CASTAÑO FERNANDEZ	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/10/2022	16/01/2023	26/01/2023	SI	SI	X			X									
MV_00172	ROSALBA SERRANO QUIROGA	PORTAL DE LA VEGA	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/10/2022	29/11/2022																
MV_00224	VICTOR JULIO SILVA	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/10/2022	4/11/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X									
MV_00231	ALEYDA ROJAS LOZANO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	15/09/2022	4/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X									
MV_00303	LUZ ADRIANA RIVERA VERA	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/09/2022	22/09/2022	15/10/2022	SI	SI		X		X									Se realizo entrega de vivienda a satisfaccion
MV_00311	MARIA ADRIANA BOHORQUEZ MEDINA	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	15/09/2022	5/12/2022	27/12/2022	SI	SI	X			X									
MV_00332	NELCY TRUJILLO CUBILLOS	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/09/2022	22/09/2022	11/10/2022	SI	SI	X		X										Se realizo entrega de vivienda a satisfaccion
MV_00335	BEATRIZ CORTES PRIETO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/09/2022	27/09/2022	8/11/2022	SI	SI	X			X									
MV_00350	GRACIELA GOMEZ CONTRERAS	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/09/2022	4/10/2022	9/11/2022	SI	SI	X			X									

MV_00352	ROSANA ALDANA MACHUCA	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/09/2022	5/10/2022	11/11/2022	SI	SI	X			X									
MV_00360	ARNOLDO RAMOS GUZMAN	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/09/2022	21/10/2022	17/11/2022	SI	SI	X			X									
MVAL_00381	HERLINDA HERNANDEZ	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/09/2022	4/10/2022	9/11/2022	SI	SI	X			X									
MV_00398	CESAR POMPILIO VELASQUEZ PEÑA	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	20/09/2022	25/10/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X									
MVAL_00401	ERALDO EFREY AGUILAR GUERRERO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	7/10/2022	5/12/2022	27/12/2022	SI	SI	X			X									
MV_00419	DIANA PATRICIA CUCAITA RIOS	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/09/2022	26/10/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X									
MV_00420	ALVARO ANTONIO URREGO ROMERO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/09/2022	16/01/2023															
MV_01035	MYRIAM ALEJANDRA ORTIZ NIÑO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	27/10/2022	13/12/2022	29/12/2022	SI	SI	X			X									
MV_01041	JOSE FRAAN AICEDO TORRES ORTEGON	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	27/10/2022	19/12/2022	23/02/2022	SI	SI	X			X									
MV_01114	GINETH DIAZ QUIROGA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	28/10/2022	29/11/2022	20/12/2022	SI	SI	X			X									
MV_01123	RUBIEL UFRACIO SOTO MARROQUIN	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/10/2022	19/12/2022	17/01/2023	SI	SI	X			X									
MV_01223	MARIA OTILIA CORTES	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	2/12/2022	13/12/2022	20/12/2022	SI	SI	X			X									
MV_01271	LUZ STELLA PEÑA VALENCIA	NUEVO PORVENIR	X				26/12/2022																
MV_01366	JESUS ANTONIO ROJAS	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/12/2022	18/01/2023															
MV_01428	MARIA MAGDALENA HERNANDEZ DIAZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/12/2022	25/01/2023															
MV_01435	NELLY FANDIÑO DIAZ	NUEVO PORVENIR																					
MV_00001	BLANCA CECILIA CONTRERAS DE GORDO	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/12/2022	19/01/2023															
MV_00038	MARIA GEORGINA LEMUS DE CHAPARRO	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/12/2022	17/01/2023	31/01/2023	SI	SI	X			X									
MV_00046	LUZ ASTRID CRUZ DUARTE	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	20/12/2022	18/01/2023															
MV_00066	OSCAR AGUDELO ROA	EL TRIANGULO	X				23/01/2023																
MV_00082	DORA LIBIA MORENO GONZALEZ	EL TRIANGULO	X				16/12/2022																

MVAL_00085	MARIA LUISA CORTES TIBATA	EL TRIANGULO	X				20/12/2022																
MV_00098	MARCO FIDEL BARRERO NIÑO	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	21/12/2022	27/01/2023																
MV_00102	LUZ MIRYAM CABRA GALEANO	EL TRIANGULO	X				28/12/2022																
MV_00171	BLANCA LUCILA PIÑEROS GOMEZ	PORTAL DE LA VEGA	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/10/2022	18/11/2022	2/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_00222	NUBIA IRIS RODRIGUEZ RUBIO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/10/2022	28/10/2022	15/11/2022	SI	SI	X			X								
MVAL_00249	SANDRA GUZMAN BORDA	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	15/09/2022	5/10/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X								
MV_00271	LUIS ARMANDO DIMATE VARGAS	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/09/2022	27/09/2022	31/10/2022	SI	SI	X			X								Se realizo entrega de vivienda a satisfaccion
MV_00274	EMETERIO HERRERA SUAREZ	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/09/2022	4/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_00279	CLAUDINA GARZON COPETE	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/09/2022	4/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_00302	MARIA CRISTINA FRAILE	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/09/2022	24/10/2022	16/11/2022	SI	SI	X			X								
MV_00306	ALBA MIRIAM TELLEZ DE CAMACHO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/09/2022	22/09/2022	21/10/2022	SI	SI	X			X								Se realizo entrega de vivienda a satisfaccion
MV_00314	JULIO ENRIQUE CUENCA CAICEDO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/09/2022	5/10/2022	8/11/2022	SI	SI	X			X								
MV_00316	PAULINA RAMOS RODRIGUEZ	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/09/2022	27/09/2022	31/10/2022	SI	SI	X			X								Se realizo entrega de vivienda a satisfaccion
MV_00317	LUCILA HERRERA BERNAL	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/09/2022	4/10/2022	10/11/2022	SI	SI	X			X								
MV_00333	DIANA PATRICIA MASMELA	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/09/2022	5/10/2022	28/10/2022	SI	SI	X			X								Se realizo entrega de vivienda a satisfaccion
MVAL_00389	LUZ MARIA JURADO DE VACA	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/09/2022	10/11/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X								
MV_00391	ARACELY PALACIOS IBAÑEZ	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/09/2022	22/09/2022	26/10/2022	SI	SI	X			X								Se realizo entrega de vivienda a satisfaccion
MV_00402	MARIA DEYANIRA ARDILA	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/09/2022	4/10/2022	11/11/2022	SI	SI	X			X								
MVAL_00434	HUGO ANTONIO SALCEDO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/09/2022	23/11/2022	2/12/2022	SI	SI	X			X								

MVAL_00441	MARIA HENAO QUINTERO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/09/2022	27/09/2022	11/11/2022	SI	SI	X			X								
MV_01105	FABIOLA CLAROS CLAROS	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/11/2022	17/11/2022	30/11/2022	SI	SI	X			X								
MVAL_01253	MARIA BETHY ESCOBAR TIMARAN	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/12/2022	3/01/2023	17/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_01363	OMAR MAYUSA CATAÑEDA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/12/2022	18/01/2023	30/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_01430	MARIA RESURRECCIÓN DIAZ DE FANDIÑO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/12/2022	19/01/2023															
MV_14691	ISRAEL ANGEL OROZCO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	16/11/2022	13/12/2022	29/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_00106	DEMOFILO CRISTIANO FERNANDEZ	NUEVO PORVENIR	X				30/12/2022																
MV_00153	JENNY ROCIO LOPEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	21/10/2022	4/11/2022	RENUNCIA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE														Se realiza apertura de la vivienda el dia 4 de noviembre sin embargo la beneficiaria presento inconvenientes familiares razon polr la cual renuncia al subsidio el dia 28 de no
MV_01175	ROSA DELIA CAVIDES CALDERON	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	24/10/2022	31/10/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X								
MV_01176	MARIA CARMENZA TAPIERO ASCENCIO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	31/10/2022	7/12/2022	28/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_01191	ROSA MARIA LESMES	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	21/10/2022	27/12/2022	13/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_01192	ALBA LUCIA SANTAMARIA MENDOZA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	24/10/2022	11/101/2023	20/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_01196	MARINA MANRIQUE MARQUEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	24/10/2022	16/01/2023															
MV_01215	NANCY STELLA RODRIGUEZ GARCIA	NUEVO PORVENIR	X				14/12/2022	31/01/2023															
MV_01244	MARIA INES CABALLERO PUENTES	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/12/2022	3/01/2023	27/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_01247	MARISOL PATIÑO PINTO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/12/2022	11/10/2023															
MV_01265	MARIA JASMIN ROJAS ROJAS	NUEVO PORVENIR	X				21/12/2022																
MV_01266	VICTOR MANUEL BAQUERO ROJAS	NUEVO PORVENIR	X				21/12/2022																
MV_01268	ANGELA PAOLA BERMUDEZ NOVOA	NUEVO PORVENIR	X				26/12/2022																
MV_01270	ROSENDA MACIAS DE CARO	NUEVO PORVENIR	X				22/12/2022																
MV_01367	SANDRA MILENA MERA QUICENO	NUEVO PORVENIR	X				13/12/2022																
MV_01368	JOSE ABUNDIO GONZALEZ BUSTOS	NUEVO PORVENIR	X				13/12/2022																
MV_01400	ARGENIS MOSQUERA ROBAYO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	16/11/2022	6/01/2023															
MV_01425	HERNANDO CANIZALEZ LOPEZ	NUEVO PORVENIR	X				16/01/2023																
MV_01526	JUDID ZAMORA CALVERA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/12/2022	24/01/2023															

MV_01570	SARA MEDINA VARGAS	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	28/12/2022	23/01/2023															
MV_01573	MARIA DE JESUS BARRERA ESPINOSA	NUEVO PORVENIR	X				28/12/2022																
MVAL_00005	MARIA NOHEMA BURGOS ESPEJO	EL TRIANGULO	X				13/12/2022																
MV_00060	HECTOR ALIRIO BOHORQUEZ BAUTISTA	EL TRIANGULO	X				21/12/2022																
MVAL_00064	ALBA MARIA REMISSIO	EL TRIANGULO	X				16/12/2022																
MV_00092	ORFELINA VARGAS QUINTERO	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	21/12/2022	27/01/2023															
MVAL_00174	MARIA NATIVIDAD FONTECHA	PORTAL DE LA VEGA	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/10/2022	10/11/2022	5/12/2022	SI	SI	X			X								
MVAL_00178	LUZ MYRIAM VARGAS VIJALBA	PORTAL DE LA VEGA	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/10/2022	4/11/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X								
MVAL_00209	MARINA LOPEZ RIVERA	PORTAL DE LA VEGA	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/10/2022	4/11/2022	2/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_00062	LUZ MARINA CASTILLO	EL TRIANGULO	X				16/12/2022																
MV_00280	BENJAMIN MONROY PARRA	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/09/2022	26/09/2022	9/11/2022	SI	SI	X			X								
MV_00417	MARTHA CECILIA AGUDELO GUZMAN	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/09/2022	25/10/2022	11/11/2022	SI	SI	X			X								
MV_01112	ANGELA MARIA PULIDO PERDOMO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	28/10/2022	17/11/2022															
MVAL_01257	NELSON FACUNDO DIAZ TORRES	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/12/2022	13/01/2023	30/01/2023	SI	SI	X			X								
MVAL_00091	DIANA YANET SUESCA GOMEZ	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	21/12/2022	25/01/2023															
MV_00236	JOSE ALVARO GUZMAN	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/09/2022	4/11/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X								
MV_00282	MARCO ANTONIO VEGA	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	11/10/2022	1/11/2022	18/11/2022	SI	SI	X		X									
MV_00367	MARIA ELVIA PARRA	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/09/2022	27/09/2022	28/10/2022	SI	SI	X			X								Se realizo entrega de vivienda a satisfaccion
MV_00404	CAMILA EUGENIA ACOSTA CHACON	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/09/2022	22/09/2022	21/10/2022	SI	SI	X			X								Se realizo entrega de vivienda a satisfaccion
MVAL_00011	LEIDY JOHANNA VELASQUEZ ANGULO	EL TRIANGULO	X				16/12/2022																
MV_00423	LUIZ RODRIGUEZ	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/09/2022	22/09/2022	18/10/2022	SI	SI	X			X								Se realizo entrega de vivienda a satisfaccion
MV_00425	JOSE HUMBERTO SALAZAR BUENO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/09/2022	29/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X								

MV_00452	FERNELI TAPIERO DUCUARA	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/09/2022	26/10/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X								
MV_00297	LAURA MARIA OSORIO DE ACOSTA	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	11/10/2022	28/10/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X								
MV_00451	EVA GONZALEZ ALFONSO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/09/2022	25/10/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X								
MV_00453	SANDRA ANDREA MARTINEZ CUBILLOS	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/09/2022	22/09/2022	21/10/2022	SI	SI	X			X								Se realizo entrega de vivienda a satisfaccion
MV_01530	WILBER CANO RAMOS	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	28/12/2022	25/01/2023															
ADICION																							
MV_02756	DEIBY ALEXANDER RODRIGUEZ	EL PORTAL DEL DIVINO																					
MV_02757	GUILLERMO LEON SORIA NAGLES	EL PORTAL DEL DIVINO																					
MV_02765	NELLY VELASQUEZ RAMIREZ	EL PORTAL DEL DIVINO																					
MV_02780	WILLIAM ALDANA BARBOSA	EL PORTAL DEL DIVINO																					
MV_02784	JUAN JESUS SILVIO CHICAIZA	EL PORTAL DEL DIVINO																					
MV_02788	NURI ANDREA QUINCHE MORA	EL PORTAL DEL DIVINO																					
MV_02797	MARY BEL PEDRAZA CASTELLANOS	EL PORTAL DEL DIVINO																					
MV_02902	OSCAR ERNESTO BERNAL CORTES	EL PORTAL DEL DIVINO																					
MV_01514	ANA JULIA GUTIERREZ DURAN	NUEVO PORVENIR																					
MV_02725	CECILIO DUCUARA TAPIA	EL PORTAL DEL DIVINO																					
MV_02718	ANA MARISOL AGUIRRE MENDIETA	EL PORTAL DEL DIVINO																					
MV_02712	MANUEL FAURICIO RUBIANO LLOPEZ	EL PORTAL DEL DIVINO																					
MV_02721	LUIS HUMBERTO ANGEL MENDEZ	EL PORTAL DEL DIVINO																					
MV_02742	CRISTOBAL GALINDO RUBIO	EL PORTAL DEL DIVINO																					
MV_02752	EVIDALIA RUIZ	EL PORTAL DEL DIVINO																					
MV_02758	NOHORA INES SERRANO CRIALES	EL PORTAL DEL DIVINO																					
MV_02795	NANCY VALBUENA CHICANGANA	EL PORTAL DEL DIVINO																					
MV_02826	JOSE MARTIN MARTINEZ VALIENTE	EL PORTAL DEL DIVINO																					
MV_02852	GUILLERMO MORA ARDILA	EL PORTAL DEL DIVINO																					
MV_02873	DIOSELINA ARIAS SANCHEZ	EL PORTAL DEL DIVINO																					
MVAL_02900	CARLOS ALBERTO GOMEZ BELTRAN	EL PORTAL DEL DIVINO																					
MV_01518	ROSA DELIA LOPEZZ TORRES	NUEVO PORVENIR	X				30/01/2023																
MV_01513	EDELMIRA PULIDO MORENO	NUEVO PORVENIR	X				30/01/2023																
MV_1589	JOSE DAVID AGUDELO CASTRO	NUEVO PORVENIR	X				30/01/2023																
MV_1512	WILLIAM EDUARDO GONZALEZ MEDINA	NUEVO PORVENIR	X				25/01/2023																
MV_02731	HOLANDA PATRICIA CAICEDO	EL PORTAL DEL DIVINO	X				19/01/2023																
MV_02833	MARIA CRISTINA MONSALVE CAICEDO	EL PORTAL DEL DIVINO	X				19/01/2023																
MVAL_02834	RUBIELA APONTE	EL PORTAL DEL DIVINO	X				19/01/2023																
MV_02848	SILDANA SANCHEZ SAAVEDRA	EL PORTAL DEL DIVINO	X				19/01/2023																
MV_02857	JOSE YESID GALINDO MARTINEZ	EL PORTAL DEL DIVINO	X				19/01/2023																
MV_02864	RAFAEL EDUARDO VEGA MENDOZA	EL PORTAL DEL DIVINO	X				19/01/2023																
MV_02875	LUIS CARLOS PERDOMO SILVA	EL PORTAL DEL DIVINO	X				20/01/2023																
MV_02895	WILSON BERTIZ DEL VALLE VERA	EL PORTAL DEL DIVINO	X				27/01/2023																
MV_02901	MARIA DORIS GAONA LOPEZ	EL PORTAL DEL DIVINO	X				20/01/2023																
MV_02904	BERENICE VALENCIA MEDINA	EL PORTAL DEL DIVINO	X				20/01/2023																

MV_02905	NORFI URBINA POPO	EL PORTAL DEL DIVINO	X				27/01/2023																
MVAL_02812	JOVEL TOVAR INFANTE	EL PORTAL DEL DIVINO	X				27/01/2023																
MV_02782	MANUEL ROSARIO GONZALEZ HINESTROZA	EL PORTAL DEL DIVINO	X				20/01/2023							X									SE POSTULA VIVIENDA PARA H.V EL DIA 20/01/2023
MV_02838	SEGUNDO MARCELINOMENDOZA BARREÑO	EL PORTAL DEL DIVINO	X				31/01/2023																
MV_02842	LUIS GABRIEL ROJAS	EL PORTAL DEL DIVINO	X				27/01/2023																
MV_02844	MARIA ESPERANZA USUGA TUBEROUIA	EL PORTAL DEL DIVINO	X				27/01/2023																
MV_02888	MARIELA GARCIA	EL PORTAL DEL DIVINO	X				27/01/2023																
MV_02816	BLANCA NIDIA GUTIERREZ RODRIGUEZ	EL PORTAL DEL DIVINO	X				31/01/2023																
MV_02835	GRACIELA SANCHEZ MILAGUY	EL PORTAL DEL DIVINO	X				31/01/2023																
MV_02921	HUMBERTO AVILA CRUZ	EL PORTAL DEL DIVINO	X				31/01/2023																
MV_02771	HERMENEGILDO SAUL PEDRAZA MORENO	EL PORTAL DEL DIVINO																					
MV_02798	MARIA ELOINA NIÑO NIÑO	EL PORTAL DEL DIVINO	X				31/01/2023																
MV_02823	MARIA NUBIA CALERO CORRALES	EL PORTAL DEL DIVINO	X				31/01/2023																
MV_02893	LUIS ROBERTO PEREZ RINCON	EL PORTAL DEL DIVINO	X				31/01/2023																
MVAL_03508	ANA SILVIA TORRES BECERRA	EL REFUGIO I Y II																					
MVAL_03514	CLARA INES SANTANA MARTINEZ	EL REFUGIO I Y II																					
MVAL_03616	MARIANA ROCIO QUEMBA RUIZ	EL REFUGIO I Y II																					
MVAL_03697	YADIRA SANCHEZ	EL REFUGIO I Y II																					
MVAL_03778	DILSA YASMIN BERNAL MAHECHA	EL REFUGIO I Y II																					
MVAL_03788	OVIDIO PRIETO YATE	EL REFUGIO I Y II																					
MV_00364	LUZ MIRYAN ARGUELLO	EL NUEVO PORTAL																					
MV_02791	JOSE DAVID SANTA ORTIZ	EL PORTAL DEL DIVINO																					
MV_02896	YANIRA TERESA VERA	EL PORTAL DEL DIVINO	X				27/01/2023																
MVAL_03418	MARIA ISABEL DIAZ HERNANDEZ	EL REFUGIO I Y II																					
MVAL_03478	CRISTINA IBAÑEZ VASQUEZ	EL REFUGIO I Y II																					
MVAL_03487	ROBERTO CUERVO	EL REFUGIO I Y II																					
MVAL_03505	ANA SIERRA	EL REFUGIO I Y II																					
MVAL_03509	LUIS EDUARDO CESPEDES PEDRAZA	EL REFUGIO I Y II																					
MVAL_03513	CESAR ENRIQUE MONROY LEON	EL REFUGIO I Y II																					
MVAL_03530	BLANCA MYRIAM GALINDO PEREZ	EL REFUGIO I Y II																					
MVAL_03614	YERSON SAMIR GARCIA GAITAN	EL REFUGIO I Y II																					
MVAL_03737	SALOMON VARGAS CASTRO	EL REFUGIO I Y II																					
MVAL_03751	BERTHA SILVIA MORA BARAJAS	EL REFUGIO I Y II																					
MVAL_03777	CLAUDIA PATRICIA GAMA HERNANDEZ	EL REFUGIO I Y II																					
MVAL_03823	DIANA CAROLINA MUNERA PUENTES	EL REFUGIO I Y II	X				19/01/2023																
MVAL_03825	MARIELA HENAO FAJARDO	EL REFUGIO I Y II	X				19/01/2023																
MVAL_03827	RAUL URIAS COLMENARES GUAYANA	EL REFUGIO I Y II	X				19/01/2023																
MVAL_03831	FRANCO GUILLERMO MELO MARTINEZ	EL REFUGIO I Y II	X				19/01/2023																
MVAL_03834	MARIA JOANA GIRALDO LOPEZ	EL REFUGIO I Y II	X				19/01/2023																
MVAL_03651	CONCEPCION PRIETO BELTRAN DE CLAVIJO	EL REFUGIO I Y II																					
MVAL_03652	MAURICIO RIVERA GAMA	EL REFUGIO I Y II																					
MVAL_03714	CARLOS ARTURO TELLEZ	EL REFUGIO I Y II																					
MVAL_03721	JUAN ALBERTO CALZADA MONTAÑO	EL REFUGIO I Y II																					
MVAL_03756	JOHN JAIRO GOMEZ BELTRAN	EL REFUGIO I Y II																					
MVAL_03802	ADRIANA FERNANDA LARA PRIETO	EL REFUGIO I Y II																					
MV_00310	LUIS ALBERTO ALVARADO SANDOVAL	EL NUEVO PORTAL																					
MVAL_03684	JOSE DAVID SUAREZ PEREZ	EL REFUGIO I Y II																					
MVAL_03763	GONZALO CARDENAS AVILA	EL REFUGIO I Y II																					
MVAL_03628	INGRID ALEJANDRA VERGARA NIÑO	EL REFUGIO I Y II																					

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22

BASE DE DATOS SEGUIMIENTO DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS EJECUCION DE OBRAS
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Nº	Nº CONSECUTIVO DEL	MV - ID	FECHA APERTURA	FECHA CIERRE	NOMBRE DE LA PERSONA SOLICITANTE	LOCALIDAD	TCO	BARRIO	DIRECCION	TELEFONO DE CONTACTO	TIPO DE SOLICTUD				DESCRIPCION DEL ASUNTO Y/O SITUACION	RECOMENDACIÓN / TRAMITE Y/O RESPUESTA	SEGUIMIENTO OBRA	SEGUIMIENTO INTERVENTORIA	RESPUESTA DE CIERRE Y SOPORTE O TRAMITE ADELANTADO	ESTADO	
											P	Q	R	S						ABIERTO	CERRADO
1		MV_01400	9/11/2022	16/11/2022	ARGENIS MOSQUERA	USME	ALFONSO LOPEZ	NUEVO PORVENIR	KR 7 ESTE 102 SUR 25	3208111323	X				Mediante redicado 1-2022-45155- interpuesto ante la SDHT La beneficiaria remite carta refieriendo lo siguiente "respetados señores, La presente tiene como fin saludarles y desearles éxitos en sus labores diarias, a su vez, de manera muy respetuosa quiero solicitar de su ayuda respecto a que Salí beneficiada con el programa de mejoramiento de vivienda, pero en el momento de la visita, no me han comunicado con anterioridad y no me ha sido posible estar en casa debido a que soy madre cabeza de familia y estoy en mis obligaciones de trabajo. Me gustaría solicitar, que para el día de la visita, me sea informado con un día de anticipación, así puedo solicitar un permiso en mi lugar de trabajo y poder atenderles a ustedes para la respectiva visita. Agradezco su colaboración…	se informa al contratista que la beneficiaria interpone peticion ante la SDHT bajo radicado 1-2022-45155, se solicita se obtenga comunicación con la beneficiaria y le sea informada la fecha en que se realizara la respectiva validacion por parte del area social y tecnica del contratista e interventoria.	El dia jueves 10 de noviembre se realiza llamada telefonica a la beneficiaria ARGENIS MOSQUERA, quien manifiesta que dejo autorizacion a su hijo EDISON ALEJANDRO LOPEZ, para poder realizar la respectiva visita de validacion	SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO A VALIDACION LLEVADA A CABO EL DIA 16/11/2022	MV_01400ARGENIS MOSQUERA ROBAYO El día 16-11-2022 se realiza visita de validación a la vivienda de la beneficiaria Argenis, en el cual la beneficiaria deja poder de autorización a su hijo Edison Alejandro López Mosquera, donde se diligencia la ficha de caracterización social y la parte técnica realiza medidas de las áreas a intervenir. Dando atención al radicado 1-2022-45155		*x*
2		MV_1146	5/12/2022	14/12/2022	ALEXI CONSTANZA ROJAS LEON	USME	ALFONSO LOPEZ	NUEVO PORVENIR	KR 6 ESTE 100 10 SUR	3208848352		X			A traves de radicado 1-2022-48387 recepcionado ante la SDHT la beneficiaria refiere lo siguiente: Hace un tiempo mi casa, salió beneficiada para el mejoramiento de vivienda, iniciando noviembre se acercaron a la casa funcionarios de la secretaria de Hábitat incluyendo un arquitecto, quedamos en que el arreglo seria para el piso 4 ya que es el más que requiere el mejoramiento, dijeron que si lo arreglaban, pero que tenía que contar con los servicios públicos básicos, se hicieron los arreglos que ellos exigían para poder tener el beneficio, dijeron que daban un plazo máximo de 20 días, que ellos llegaban el día 21 de noviembre y no llegaron ese día, en el transcurso de ese mismo día me comunique y me dijeron que tuviera paciencia ya que no tenían ni materiales ni maestros, que antes del 31 de diciembre tenía que llegar en cualquier momento, entones quiero saber que ha pasado con este proceso, también quiero que me aclaren por favor, de cuanto es el subsidio ya que dijeron que eran 18 millones pero que a ese valor le descontaban cierto porcentaje, entonces que quedaba de 14 millones y que se arreglaba el piso dependiendo de hasta donde alcanzara el presupuesto. Solicito por favor aclaren mis dudas	una vez recepcionado el PQRS se informa al contratista; por parte de interventoria se esta a la espera que el contratista informe la fecha en que se realizara la respectiva apertura se programa con el contratista que se efectuara la apertura la fecha 9 di diciembre de 2022.	El dia 14 de diciembre se reremite oficio a la interventoria para dar respuesta a la beneficiaria	SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO PARA APERTURA DE VIVIENDA Y SE REALIZA OFICIO EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA, LA VIVIENDA ES APERTURADA EN LA FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2022	En atención al requerimiento solicitado el dia 28 de noviembre de 2022 por la beneficiaria Alexi Constanza Rojas León del barrio nuevo porvenir, MV_1146 ubicado en la Kr 6 este # 100-10 sur; el componente social del contratista se permite informar que la validación del predio se realizó el día 31 de octubre de 2022 y esa visita fue atendida por el esposo de la beneficiaria, el señor Carlos Corredor a quien se le informó todo lo relacionado al mejoramiento de vivienda, a partir del momento de validación hasta la entrega del mismo, también se dio claridad a lo relacionado con el presupuesto asignado las viviendas; en vista que el apartamento del 4to piso se encontraba en obra negra y en estado inhabitable, se priorizo para ser intervenido; explicándole al beneficiario que no se pueden realizar obras en cada uno de los pisos de la vivienda y que no se realizan obras estructurales. Al momento de la validación el apartamento priorizado no contaba con instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas; también le hacia falta una parte de la cubierta, por lo tanto, el área técnica le sugirió al encargado de la vivienda realizar estas actividades antes de iniciar el mejoramiento de vivienda el cual se podía tardar aproximadamente 20 días, no sin antes informarle a la familia la fecha establecida para el inicio de obra. El día 21 de noviembre la beneficiaria se comunica con la residente social encargada, con la inquietud relacionada a la fecha de inicio de obra; la profesional social le informa a la beneficiaria que cuando se cuente con el personal y el material para la vivienda, se le informara la fecha de inicio y se presentaran los maestros; se le recuerda que no se establecen fechas fijas desde la validación ya que el inicio de obra depende de factores como la disposición de material…		*x*
3		MV_00068	19/12/2022		JESUS ALFREDO VASQUEZ	USME	ALFONSO LOPEZ	EL TRIANGULO	DIG 100 D SUR N° 6 - 26 ESTE	3115619163	X				Mediante radicado1-2022-49209 la SDHT recibe la siguiente peticion: Yo jesus alfredo vasquez identificado con C.C 70.600.012 fui notificado para mejoramiento de vivienda. A la fecha no me han informado para que mes me hagan o realicen las mejoras de mi predio, ubicado en el barrio el triangulo de la comuna de alfonso lopez; peticion que es remitia a la Interventoria bajo radicado 2-2022-76653	por parte de interventoria se solicita al contratista informar al beneficiario l.a fecha en la cual se llevara a cabo la respectiva validacion por parte tecnica y social de contratista e interventoria y asi poder aclarar dudas al beneficiario	el dia 22 de diciembre de 2022 se realiza llamada telefonica al beneficiario donde se le informa al señor Jesus Alfredo Vasquez que el dia 23 de diciembre de 2022 se realizara la respectiva validacion	se solicita al contratista indicar las fechas de validacion de este predio informando que se realizaria la respectiva validacion del 21 al 23 de diciembre	EL DIA 23 DE DICIEMBRE SE REALIZA LA VALIDACION DEL PREDIO		*x*
4																					
5																					
6																					
7																					

ACCIÒN REALIZADA: VALIDACIÓN_____X_____APERTURA_____X_____EJECUCIÒN_____X_____ENTREGAS_____X_____

SOCIALIZACION

12/01/2023 SOCIALIZACIÓN INICIACIÓN	12/01/2023 SOCIALIZACIÓN INICIACIÓN	
		

VALIDACION


VALIDACION 16/01/2023 - MV_1423 BENEFICIARIA - DIANA CAROLINA RONCACIO - DESARROLLO NUEVO PORVENIR.	VALIDACION 16/01/2023 - MV_01425 - BENEFICIARIO HERNANDO CANISALES - DESARROLLO NUEVO PORVENIR.	VALIDACION 16/01/2023 - MV_1426 BENEFICIARIA MARIA EDILMA DUEÑAS - DESARROLLO NUEVO PORVENIR.
		

VALIDACION 16/01/2023 - MV_1427- BENEFICIARIA CELINDA GARCIA - DESARROLLO NUEVO PORVENIR.	VALIDACION 17/01/2023 - MV_1234 BENFICIARIA MARIA SACRAMENTO PUENTES - DESARROLLO NUEVO PORVENIR.	VALIDACION 19/01/2023 - MV_1420 BENEFICIARIA MARIA INES CORREA VALENCIA DESARROLLO NUEVO PORVENIR.
		
VALIDACION - 19/01/2023 - MVAL_03823 DIANA CAROLINA MUNERA PUENTES DESARROLLO EL REFUGIO	VALIDACION - 19/01/2023 - MVAL_ MVAL_03825 MARIELA HENAO FAJARDO DESARROLLO EL REFUGIO	VALIDACION - 19/01/2023 - MVAL_03827 RAÚL URÍAS COLMENARES GUAYANA DESARROLLO EL REFUGIO
		

5. ASPECTOS PRESUPUESTALES

a. Información relacionada con la ejecución de los recursos asignados al contrato de obra.

A la fecha del presente informe, se están ejecutaron actividades de obra, estos trabajos no presentaron cortes de obra para cobro por parte del contratista.

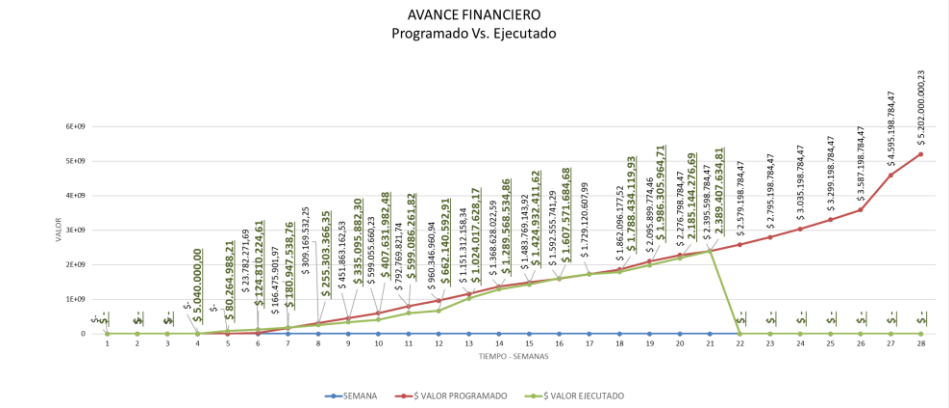

VALOR INVERSION SEGUN FLUJO DE CAJA		
INVERSIÓN SEMANAL		
PROGRAMADA		EJECUTADA
$ 118.800.000,00		$ 204.263.358,12
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
2,28%		3,93%
INVERSIÓN ACUMULADA		
PROGRAMADA	VS.	EJECUTADA
$ 2.395.598.784,47		$ 2.389.407.634,81
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
46,05%		45,93%
ATRASO O ADELANTO EN PESOS ($):		-$ 6.191.149,66
ATRASO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%)		-0,12%

b. Información relativa a los pagos realizados y los saldos pendientes de pago.

Para el presente informe se generó el corte No. 1,2 y No. 3 con los siguientes indicadores:

		CORTE DE OBRA N°1			CORTE DE OBRA N°2			CORTE DE OBRA N°3		
No.	ID_DMV	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS		40			26			38		
TOTALES			$565.227.399,00			$374.931.626,00			574.206.667,85	
AIU			$141.306.850,00			$93.732.907,00			.143.551.667,00	
COSTO TOTAL			$706.534.249,00	19,63%		$468.664.533,00	13,02%		.717.758.334,85	19,63%
VALOR DEL ANTICIPO										
AMORTIZACION ANTICIPO			$211.960.275,00			$140.599.360,00			.215.327.500,00	
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR										
SALDO POR CANCELAR AL CONTRATISTA			$494.573.974,00			$328.065.173,00			.502.430.834,85	

c. Información relativa al manejo y a la amortización del anticipo, si fuere el caso.

Para el presente contrato ya se generó el total de desembolso “**CTO de obra 999-2022”**

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22	**INFORME HSE** **MENSUAL DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME INTERVENTORÍA SISO

FECHA DEL INFORME		OBJETO DEL CONTRATO	INFORME
DESDE	1/01/2023	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1-2022."	5
HASTA	31/01/2023		

CONTRATISTA

1.El contratista realiza recorrido con el area social y técnica, realizando acompañamientos en las validaciones y aperturas de MV
2.Se realiza charla semanal
3.El contratista realizó inspecciones y charlas
4.El contratista realiza reunión con la interventoría
5.El contratista asiste a la reunión con la comunidad y Secretaria de Habitat, en el salón comunal de Portal del llano
6.El contratista asiste a reunión en compañia de la JAC y Secretaría de Habitat, para aclarar ddudas e inquitudes de las intervenciones el miercoles 25 de enero

INTERVENTORÍA

1..Se realiza recorrido y acompañamientos a las validaciones y aperturas de los mv, en compañia de la parte técnica y Social, de interventoría y contratista
2.Se realiza recorridos por mv´s en ejecución de obra para inspección de orden y aseo, epp, personal, etc.
3.Se realiza el informe semanal
4. La interventoría reliza reunión con el contratista
5. Se entregan los formatos de los MV´S libres de escombro
6.La interventoría realiza reunión interna
7.La interventoría asiste a la reunión con la comunidad y Secretaria de Habitat, en el salón comunal de Portal del llano
8.Se realiza acompañamiento para radicación de carpetas eb secretaría de Hábitat, 31 de enero de 2023
9. La interventoría asiste a reunión en compañia de la JAC y Secretaría de Habitat, para aclarar ddudas e inquitudes de las intervenciones el miercoles 25 de enero

CAPACITACIÓN Y CHARLAS CONTRATISTA
Charla de Protección de caídas andamio y escaleras y Orden y Aseo en el lugar de trabajo, Se realizó charla de Protección de pies, uso de botas de seguridad y contaminación del aire,Charla de causa de contaminación ambiental y levantamiento de objetos, Charla de recomendaciones para evitar accidentes de Trabajo y Precaución con residuos y amteriales en lonas

CAPACITACIÓN Y CHARLAS INTERVENTORÍA
Charla Conciencia ambiental, Charla Orden y aseo en el puesto de trabajo, Charla Revisión del area de trabajo para evitar caídas, resbalones y tropezones,

3.GESTIÓN AMBIENTAL
*Se reitera nuevamente al contratista, de relizar el correcto manejo de residuos como lo especifica el PMA, y se realiza las observaciones seguidas, con los residuos en las fachadas de los MV´S, ya que dura más de tres días

2.1. Generación y Disposición de Residuos Sólidos				
Tipo de Residuo		Cantidad m3	Sitio de Disposición	Observaciones
SEMANAL	**ESCOMBRO**	**15m3**	CEMEX-ESCOMBRERA TUNJUELO	**N/A**
MENSUAL	**ESCOMBRO**	**15m3**	CEMEX-ESCOMBRERA TUNJUELO	N/A
PROYECTO	**ESCOMBRO**	**40m3**	CEMEX-ESCOMBRERA TUNJUELO	N/A

4. Gestión en SST
* Se realizaron charlas * Se realiza las anotaciones correspondientes a las faltas encontradas en la bitacora * Se realizan diferentes inspecciones de los RCD * Se realizan observaciones de la parte ambiental del manejo de RCD del escombro frente a cada casa *Se encuentra en diferentes MV¨S personal sin autorización de la interventoría y se hace la respectiva observación al contratista, además de retirar al personal de obra *Se encuentra personal sin dotación, y se hace la debida solicitud al contratista y se retira personal de obra

4.1. Índices

Valor	Horas Hombre Trabajadas Contratista	Horas Hombre Capacitación		Horas Hombre Trabajadas Interventoría	Días Ausentismo por Enfermedad General	Incapacidad casos COVID Confirmados	Días de aislamiento casos COVID Sospechosos	Ausentismo por Accidentes de Trabajo
		CONTRATISTA	INTERVENTORIA					
Total Semana 1	**2352**	2	1	**624**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total semana 2	**2016**	2	1	**576**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total semana 3	**2160**	2	1	**576**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total semana 4	**2256**	2	1	**576**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total semana 5	**2352**	2	1	**576**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Mensual	**11.106**	10	5	**2.928**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.1.1.Incidendentalidad

	Casos COVID Confirmados	Casos COVID Sospechosos	Fatalidades	Casos Con Daños A propiedad	Incidente Ambiental	Incidente Vehicular	Casi Accidentes	Casos Con días Perdidos	Casos con Trabajo restringido	Casos Con Días de Incapacidad (tratamiento medico)	Incapacidad casos COVID Confirmados	Días de aislamiento casos COVID Sospechosos
SEMANAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MENSUAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PROYECTO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. Registro Fotográfico	
ACTIVIDADES DE LA SEMANA	
	
PERSONAL ENCONTRADO SIN EPP	**CHARLAS SEMANALES**
	
MV 1129 CON ESCOMBROS	**MV 1129 SIN ESCOMBROS**

ACTIVIDADES DE LA SEMANA	
	
INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO, ACOPIO DE MATERIALES	**CHARLAS SEMANALES**
	

ACTIVIDADES DE LA SEMANA	
	
Personal no autorizado ni aprobado por la interventoría en obra	**Inspección orden y aseo**
	

Inspección de EPP´S, se encuentra al trabajador sin las botas de dotación	Residuos frente a la fachada, sin el manejo adecuado.
ACTIVIDADES DE LA SEMANA	
	
Personal no autorizado ni aprobado por la interventoría en obra, sin dotación	**Inspección de personal sin autorización y sin dotación**
	

Reunión con la comunidad, JAC, contratista y Secretaría de Hábitat	Residuos frente a la fachada, sin el manejo adecuado.
ACTIVIDADES DE LA SEMANA	
	
Entrega de dotación	Entrega de materiales en MV 01570
	
[illegible]	MV01196 Libre de escombro para entrega

INFORME SST-A
Fecha:MENSUAL DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

ACTIVIDADES						GESTIÓN AMBIENTAL			No. HORAS HOMBRE CAPACITACIONES					Reportes de incidentes en el componente social y técnico.								
PROYECTO / DEPARTAMENTO	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	NUMERO DE TRABAJADORES	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	ESCOMBROS (Cantidad m3)	RESIDUOS PELIGROSOS (Kg)	CONSUMO DE AGUA (m3), para las actividades de mejoramiento de vivienda	PROFESIONALES	TECNICOS	OPERATIVOS (Soldadores, maestros y auxiliares)	PROVEEDOR	TOTAL	LUGAR O AREA DE TRABAJO	FECHA DEL ACCIDENTE	No. DÍAS INCAPACIDAD	No. ACCIDENTE REGISTRABLE	FECHA DE INVESTIGACIÓN	DESCRIPCION DEL ACCIDENTE	RELACION DE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	LECCIÓN APRENDIDA	PLAN DE ACCIÓN Y FECHA
INTERVENTORIA I CONTRATISTA:			REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 - 2022.	49	2352	0	contratista no entrega soporte	N/A	1	0	1	0	2	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A			
				42	2016	0	contratista no entrega	N/A	1	0	1	0	2	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A			
				45	2160	0	contratista no entrega	N/A	1	0	1	0	2	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A			
				47	2256	0	contratista no entrega	N/A	1	0	1	0	2	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A			
				49	2352	15m3	contratista no entrega	N/A	1	0	0	0	2	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A			

ELABORO: JAQUELINE ALARCÓN - PROFESIONAL SISO

INDICADORES SST- CONTRATO No. 999 DE 2022	
HORAS HOMBRE SEMANAL	2352
HORAS HOMBRE ACUMULADAS MES	11106
HORAS HOMBRE ACUMULADAS TOTAL	40176
No. INCIDENTES REGISTRABLES	0
No. DÍAS DE INCAPACIDAD	0
No. DÍAS DE INCAPACIDAD ACUMULADOS MES	0
HORAS CAPACITACIONES SEMANAL	2
HORAS CAPACITACIONES ACUMULADO MENSUAL	10
HORAS CAPACITACIONES ACUMULADO TOTAL	65

GESTIÓN AMBIENTAL	
ESCOMBROS (Cantidad m3) Semanal	15m3
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas mes)	15m3
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas Proy)	40m3
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad Kg semanal)	0
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad acumuladas mes)	0
CONSUMO DE AGUA (m3) Semanal	0
CONSUMO DE AGUA (m3), Mensual	0


INFORME SST-A
Fecha: SEMANA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT


RELACIÓN DE: CHARLAS CAPACITACIONES	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
Charla orden y aseo en el puesto de trabajo				
Charla caidas desde andamios y escaleras				

Charla Conciencia ambiental				
Charla de Protección de pies, uso de botas de seguridad y contaminación del aire				
Charla Orden y aseo en el puesto de trabajo				

Charla de Causas de contaminación ambiental y levantamiento de objetos				
Charla Revisión del área de trabajo para evitar caídas, resbalones y tropezones				
Charla de Seguridad y uso de escaleras y andamios en cambio de cubierta y contaminación por ruido				

Revisión del área de rabajo para evitar caidas, resabalones y tropezones				
Recomendaciones para evitar AT y Precaución con material en lonas				

ACTIVIDAD		CUMPLE/NO CUMPLE	SI NO CUMPLE ¿POR QUE?	REGISTRO FOTOGRÁFICO
5.3. Diligenciamiento formato de recolección de escombros	SEMANA 1	CUMPLE	En el seguimiento que se realiza a esta actividad, el contratista hace entrega semanalmente el formato de "*manejo de escombro* " con una cantidad estimada de: SEMANA 1 3M3 SEMANA 2 3M3 SEMANA 3 3M3 SEMANA 4 6M3 Estos residuos, que son generados por las actividades en cada una de las viviendas, son recogidos y dispuestos en el transcurso de la semana y hacen parte de los Mv intervenidos. La interventorìa en sus funciones realiza recorriodos y verifica el retiro de estos escombros, estos recorridos son aleatorios y no de manera secuencial por la cantidad de viviendas en desarrollo.	 
	SEMANA 2			 
	SEMANA 3			 
	SEMANA 4			 

	MENSUAL	CUMPLE	En esta semana el contratista entrega el formato con el total recogido en las anteriores semanas acompañados del certificado de dispoción final de cemex, para un total de 15 m3 de escombro	
5.3.1.cumplir con toda la normatividad legal Colombiana dispuesta para el manejo de los RCD llevándola hasta del gestor y dar su disposición final.	MENSUAL	CUMPLE	Para este ìem, el contratista hace entrega a la interventoría del certificados de disposición final a fin de mes donde se evidencia la totalidad de escombros generados durante el mes de enero, este certificado se genera para hacer seguimiento a este punto. La interventoría solicita al contratista los formatos de manejo de escobro de manera semanal, se realizan recorridos constantes y segun los MV que esten en ejecuciòn se verifican que se esten recogiendo in Situ y se de un adecuando de la mejor a estos.	 
5.3.1. Separar y clasificar el material de demolición.	SEMANA 1	CUMPLE	En recorridos esta semana realizados por los mv´s, encontramos a algunos operatvios realizando el ejercicio de separaci+ón de residuos, para llevarlos al punto de acopio temporal.	
	SEMANA 2	CUMPLE	En recorridos por los mv´s y el almacen, identificamos, que en las lonas se encuentran los materiales separados, el cartón se enceungtra separado de los reiduos pelidrosos y en otra zona	
	SEMANA 3	NO CUMPLE	En recorridoa esta semana por los MV´S, se evidencia que no cumplen con la correcta separación de los residuos, como se identifica en el registro fotográfico, en varios MV´S la interventoría encontró este tipo de casos, se evidencia que el escombro no esta bien separados, usan las bolsas de pegacort para guardar el escombro y se mezclan residuos peligrosos, se relaiza el reporte al contratista y se hace la debida observación para que subsanen.	

	SEMANA 4	CUMPLE	En visita al almacen evidenciamos la correcta separación de residuos como plastico y , para la zona de de los residuos peligrosos esta separada y demarcada, sin embargo se hace la observación al contratista de que los residuos peligrosos deben estar en lonas o bolsas negras.	
5.3.1. Los escombros deben ser apilados en lonas al interior de las viviendas, en caso tal de no ser recogidos el mismo día, se dispondrán al exterior de la casa sin obstaculizar el paso de los peatones en los andenes	SEMANA 1	NO CUMPLE	En recorridos en la primera semana, se evidencia mv´s con escombro los andenes, no se evidencian apilados, y en muchos mv, somo se evidencia en la foto se obstaculiza el paso peatonal, se manda correo y avisa al contratista y se le solicita el retiro de escombro de las fachadas y la organización, del mismo.	
	SEMANA 2	NO CUMPLE	En recorrido en esta semana, se evidencia frente a varios MV´S, las lonas de escombro, obstaculizando el paso en los andenes, se avisa al contratista y se le solicita el retiro de escombro de las fachadas y la organización, del mismo.	
	SEMANA 3	NO CUMPLE	Nuevamente, se encuentran en recorrido lonas interrumpiendo el paso peatonal, en los MV´S, como se evidencia en el registro fotográfico. Se da aviso al contratista y se le solicita el retiro de escombro de las fachadas y la organización, del mismo.	

	SEMANA 4	NO CUMPLE	En recorridos la interventoría evidencia que las lonas de escombro en el frente de las viviendas y le ha manifestado en repetidas ocasiones al contratista el retiro de inmediato de los fachadas, pero muchas veces hacen caso omiso a la solicitud, obstaculizando el paso peatonal, en algunos predios dura hasta dos o tres días.	
5.3.1.1. Los operarios que realizan demoliciones deben estar dotados de un equipo completo, así como el conductor y ayudante de la volqueta deben cumplir con sus afiliaciones del SG-SST	MENSUAL	CUMPLE	Desde el inicio del contrato se presentarón como conductores de maquinario el señor Pablo Nelson Tovar y el señor Franklin Rubio Herrera, con la documentación al día, licencia de conducción, licencia de propiedads del vehiculo cedula y planilla, que presentan cada mes anexo al informe mensual.	  'A 
5.3.2. Las volquetas que movilicen material sobrante de demoliciones deberán cumplir las normas establecidas por la Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad de Bogotá.	MENSUAL	CUMPLE	Se entrego a la intervetoría toda la docuemnatción relacionada con los vehículos AJB 574 Y LDI 361, con papeles em regla registro en el runt con tecnomecancia, soat y demas dcouemntos al día que se solicitan al momento de encontrar la volqueta IN SITU, asi mismo, se relacionan en el listado de maquinaria, que e entrega anexo al informe mensual.	  
	SEMANA 1	NO CUMPLE	En recorridos esta semana se evidencia, material obstaculizando, las entradas de los MV'S y los pasos peatonales ocmo se evidencia en el registro fotográfico, se le avisa al contratista, para el retiro de estos residuos, ya que muchas veces hay MV´S para entrega de carpetas y la interventoría se tarda en diligenciar el formato libre de escombro debido a este tema	

5.3.2. No se dispondrá de material en el exterior de la vivienda, solo cuando se va hacer la respectiva recogida del RCD sin obstaculizar el paso de los peatones por los andenes.	SEMANA 2	NO CUMPLE	Esta semana, nuevamente se enceuntran MV´S con material obstaculizando pasos peatonales y una gran cantidad, ya que se suponde que este residuo solo debería estar allí en el momento de la recolección pero lleva mas de tres días.	
	SEMANA 3	NO CUMPLE	Nuevamente en recorrido se encuentran MV´S, obstruyendo pasos peatonales, se avisa al contratista para el retiro, ya que estos residuos duran mas de tres días en las fachadas	
	SEMANA 4	NO CUMPLE	El contratista sigue dejando, las lonas con escombro en las entradas aveces más de tres días, para su recogida, también impidiendo que la interventoría, area SST-A, pueda realizar su gestión y asi entregar el formato libre de escombros.	
	SEMANA 1	CUMPLE	En el almacen se evidencia una zona de acopio de Residuos Peligrosos, debidamente separados, los tarros de pegamento de tubería cuando se han encesitado se enceuntran en una caneca, separados de otros residuos, sin contaminar el suelo.	

5.3.5. Al finalizar cada jornada de trabajo se hará una limpieza general separando los residuos químicos y peligrosos, disponiéndose de forma temporal en lonas para su recolección y llevar ente encargado de dar su disposición final a estos residuos químicos.	SEMANA 2	CUMPLE	En el almacen se evidencia una zona de resiudos peligrosos, y se econtraban unas canecas de pintura, culminando la semana las canecas no se ecnuentran, se pide al contratista programar visita para conocer el lugar donde se resguardan estas, ya que el contratista indica, que se encuentran en la casa del subcontratista, y se las llevaron por que ocupaban muchos espacio, por lo tanto la interventoria solicita información de estas y si se estan acopiando de la manera adecuada, o si ya le dieron dispoción final, se entregue el certificado y acompañado a este la licencia ambiental del liugar o empresa que realiza dicha disposición, esto tambien se le recuerda al contratista, para que lo tenga en cuenta a la hora de erealziar esta disposición	
	SEMANA 3	CUMPLE	La interventoría, evidencia a los colaboradores realizar la separación correcta de bolsas de cemento y pegacort y asi mismo, cargar las lonas para llevarlas al punto de acopio temporal, ubicado en la bodega	
	SEMANA 4	CUMPLE	En el almacen se evidencia una zona de acopio resiudos quimicos peligrosos, se enceuntran separados pero no existe una cantidad adecuada, respecto a los MV´S intervenidos, se le reliza dicha observación al contratista	
	SEMANA 4	CUMPLE	En el almacen se evidencia una zona de acopio de Residuos Peligrosos, debidamente separados, sin embargo se solicita que estos, se enceuntren dentro de lonas o bolsas negras, como especifica el PMA, ya que por ser peligrosos deben estar separados del suelo y no generar particulas residuales, al termianr este informe se evidencia que el contratista acata la observación y en la siguiente visita se observa el material en lonas.	

NOTA: ITEMS TOMADOS DEL PMA, RADICADO POR PARTE DEL CONTRATISTA A LA INTERVENTORÍA

INFORME SISO

Fecha: MENSUAL DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

CONTRATO: 1008 DE 2022
CONTRATISTA: GPEM

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
1	DALIA CARDENAS	52.855.409	20/09/2022	1/09/2022	SI	N/A	COOSALUD	COLFONDOS	COLPATRIA	NO	SI	
2	GINA PAOLA GONZALES ESPINOSA	1.014.241.364	20/09/2022	1/09/2022	SI	N/A	COMPENSAR	COLFONDOS	COLPATRIA	SI		
3	GLORIA ESPERANZA ARBOLEDA ARIAS	52.455.174	20/09/2022	1/09/2022	SI	N/A	SALUD TOTAL	PORVENIR	COLPATRIA	SI		
4	JESUS ANDRES MELO GACHANCIPA	79.690.448	20/09/2022	1/09/2022	SI	N/A	SANITAS	COLFONDOS	COLPATRIA	NO	SI	PENDIENTE PAZ Y SALVO
5	LAURA MARCELA DIMATE GONZALEZ	1.030.528.681	20/09/2022	1/09/2022	SI	N/A	FAMISANAR	PROTECCION	COLPATRIA	SI		
6	LINA MARCELA COLORADO CASTRO	1.019.022.812	20/09/2022	1/09/2022	SI	N/A	SALUD TOTAL	PORVENIR	COLPATRIA	NO	SI	
7	SEIDY YURANI SANCHEZ AGUAS	1.022.442.609	20/09/2022	1/09/2022	SI	N/A	SANITAS	PORVENIR	COLPATRIA	SI		
8	YULI ASTRID ESPITIA	1.023.874.373	20/09/2022	20/09/2022	SI	N/A	COMPENSAR	COLPENSIONES	COLPATRIA	SI		
9	JOSÉ DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	1/09/2022	1/09/2022	SI	N/A	FAMISANAR	PROTECCION	COLPATRÍA	SI		
10	DANIELA SANCHEZ MOLINA	1.015.463.608	19/09/2022	19/19/2022	SI	N/A	COMPENSAR	PROTECCION	COLPATRÍA	SI		
11	MARYELENA NIVIAYO CAICEDO	53.066.964	26/09/2022	26/09/2022	SI	N/A	FAMISANAR	PROTECCION	COLPATRÍA	SI		
12	SHIRLEY KARINA SACHICA	1.090.459.349	20/09/2022	1/09/2022	SI	N/A	SALUD TOTAL	PORVENIR	COLPATRIA	SI		
13	ANGIE LORENA OROZCO MONTILLA	1.110.568.316	20/11/2022	20/11/2022	SI	N/A	SANITAS	PORVENIR	COLPATRIA	SI		
14	SEBASTIAN GONZALEZ	1.022.402.058	20/11/2022	20/11/2022	SI	N/A	SANITAS	SKANDIA	COLPATRIA	SI		
15	YENY SANGUINO ROMERO	1.032.367.907	20/11/2022	20/11/2022	SI	N/A	FAMISANAR	PORVENIR	COLPATRIA	SI		
16	FERNANDO MORENO	3.199.429	15/09/2022	2/09/2022	N/A	SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
17	EDINSON VENECIA	72.120.789	19/09/2022	3/09/2022	N/A	SI	CAJACAPI	PORVENIR	POSITIVA	SI		
18	LUIS OSPINO	1.192.910.231	19/09/2022	5/09/2022	N/A	SI	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
19	NELSON ZAMBRANO	80.368.960	29/09/2022	6/09/2022	N/A	SI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
20	ORLANDO HERNANDEZ	5.842.300	20/09/2022	7/09/2022	N/A	SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
21	YHONAR JAVIER SANCHEZ	1.122.992.170	19/09/2022	8/09/2022	N/A	SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
22	YOEDINSON VENENCIA	1.101.879.446	19/09/2022	9/09/2022	N/A	SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
23	FREDDY PEÑA PAEZ	80.148.026	23/09/2022	11/09/2022	N/A	SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
24	GERARDO HERNANDEZ	115.241.309	22/09/2022	13/09/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
25	HERIBERTO VERA	93.083.537	23/09/2022	14/09/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
26	JORGE VIZCANO	72.158.125	23/09/2022	15/09/2022	N/A	SI	MUTUALSER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
27	JOSE GUILLERMO MARTINEZ	79.666.136	23/09/2022	16/09/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
28	WHINYER ALBERTO PINILLA	1.014.222.210	22/09/2022	17/09/2022	N/A	SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
29	ANGEL SALGE RODRIGUEZ	5.084.025	26/09/2022	18/09/2022	N/A	SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	NO	SI	ENTREGO PAZ Y SALVO
30	ROBERT SALAZAR CARREÑO	16.701.602	26/09/2022	19/09/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	NO	SI	
31	ESLEIDER JAHIR MERCADO	1.002.067.206	27/09/2022	20/09/2022	N/A	SI	MUTUALSER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
32	ADRIAN ALEXANDER RODRIGUEZ	1.022.999.566	23/09/2022	21/09/2022	N/A	SI	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
33	VICTOR RODRIGUEZ	79.444.038	26/08/2022	24/09/2022	N/A	SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
34	RODRIGO ESCAMILLA	72.120.459	28/09/2022	27/09/2022	N/A	SI	MUTUALSER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
35	LUIS MERGAREJO	1.045.309.207	7/10/2022	7/10/2022	N/A	SI	MUTUALSER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
36	DALADIER CUELLAR	79.637.053	29/09/2022	7/10/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
37	JESUS RAMON CASTILLO	PT 6745683	24/10/2022	26/09/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI	NO	
38	RAFAEL JOSÉ CASTILLO	PT 6745484	24/10/2022	26/09/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	NO	SI	ENTREGO PAZ Y SALVO
39	SERGIO JESUS CASTILLO	PT 7063564	24/10/2022	26/09/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI	NO	
40	OSCAR ORTEGA	80.128.209	21/11/2022	24/11/2022	N/A	SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI	NO	

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
41	RICHARD NAZAREHT CARRASQUEL	PT 7423807	24/10/2022	5/11/2022	N/A	SI	SALUDTOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
42	JUAN ANTONIO HERAZO VALDES	79.476.251	16/09/2022	3/10/2022	N/A	SI	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	POSITIVA	SI		
43	ALCIDEZ JOSÉ RODRIGUEZ LUJANO	6726606	5/10/2022	3/10/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
44	YEISON FERNANDEZ	1.030.657.753	18/11/2022	24/11/2022	N/A	SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	NO	SI	
45	JOSÉ ANDRES BARRERA BRICEÑO	80801214	4/10/2022	5/10/2022	N/A	SI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
46	NORBERTO AMAYA ALVAREZ	1.033.687.438	10/11/2022	11/11/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	POSITIVA	SI		
47	JOHANA TELLEZ	1.022.971.647	22/11/2022	22/11/2022	N/A	SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	NO	SI	
48	CRISTIAN JHOJANS YARA DELGADO	1.006.903.745	22/11/2022	23/11/2022	N/A	SI	SURA	PORVENIR	POSITIVA	NO	SI	
49	JOSE HUMBERTO CARO SUAREZ	79. 057.097	18/11/2022	19/11/2022	N/A	SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	NO	SI	
50	JHON STEVEN ORTEGÓN BLANCO	1.001.271.233	18/11/2022	19/11/2022	N/A	SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	NO	SI	
51	FREDI OSBALDO BOHORQUEZ CHACÓN	79.716.256	23/11/2022	24/11/2022	N/A	SI		PORVENIR	POSITIVA	SI		
52	FRANKLIN GUSTAVO QUIÑONES MESA	87.432.481	23/11/2022	24/11/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	POSITIVA	SI		
53	JOSÉ NORVEY VILLA PUENTES	80.253.880	22/11/2022	23/11/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
54	OSCAR ALBERTO ACOSTA MALPICA	79.913.452	23/11/2022	24/11/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
55	JOSÉ ANDRES DÍAZ ORTIZ	1.022.992.366	21/11/2022	22/11/2022	N/A	SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	NO	SI	
56	CRISTIAN ANDRES SILVA RAMÍREZ	1.001.271.816	21/11/2022	22/11/2022	N/A	SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	NO	SI	ENTREGO PAZ Y SALVO
57	WILLIAM JAVIER FIERRO PINILLA	3.129.576	23/11/2022	24/11/2022	N/A	SI	NO PRESENTA	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
58	JULIO EPIEYU MONTIEL	PT 5623699	26/11/2022	27/11/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
59	LUIS EPIAYU MONTIEL	PT 6353981	27/11/2022	27/11/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
60	YORGELIS CALVO TORRES	PT 2832993	2/11/2022	16/01/2023	N/A	SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
61	LUIS CARLOS MENDOZA	17,971,346	25/07/2022	16/01/2023	N/A	SI	ALIANSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
62	JIOVANNY JOSÉ PAREDES BRICEÑO	PT 6647515	19/12/2022	24/01/2023	N/A	SI	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	POSITIVA	SI		
63	LUIS TELLEZ MEDINA	3.166.236	26/01/2023	26/01/2023	N/A	SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
64	LUIS CARLOS MENDOZA GOMEZ	17.971.346	25/07/2022	26/01/2023	N/A	SI	ALIANSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
RESULTADOS:					15	49	0	0	0	51	13	

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	

INFORME SISO

Fecha: MENSUAL DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

CONTRATO: 1008-2022
CONTRATISTA:

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
1	DALIA CARDENAS	52.855.409	1/09/2022	17/08/2023	SI	N/A	N/A	N/A	NO	SI	
2	GINA PAOLA GONZALES ESPINOSA	1.014.241.364	1/09/2022	27/04/2023	SI	N/A	N/A	N/A	SI		
3	GLORIA ESPERANZA ARBOLEDA ARIAS	52.455.174	1/09/2022	29/08/2023	SI	N/A	N/A	N/A	SI		
4	JESUS ANDRES MELO GACHANCIPA	79.690.448	1/09/2022	12/09/2023	SI	N/A	N/A	N/A	NO	SI	
5	LAURA MARCELA DIMATE GONZALEZ	1.030.528.681	1/09/2022	16/12/2022	SI	N/A	N/A	N/A	SI		
6	LINA MARCELA COLORADO CASTRO	1.019.022.812	1/09/2022	NO TIENE EXAMEN VIGENTE	SI	N/A	N/A	N/A	NO	SI	NO SE HA ENTREGADO PAZ Y SALVO
7	SEIDY YURANI SANCHEZ AGUAS	1.022.442.609	1/09/2022	7/09/2023	SI	N/A	N/A	N/A	SI		
8	YULI ASTRID ESPITIA	1.023.874.373	20/09/2022	17/09/2022	SI	N/A	N/A	N/A	SI		
9	JOSÉ DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	1/09/2022	1/09/2022	SI	N/A	N/A	N/A	SI		
10	DANIELA SANCHEZ MOLINA	1.015.463.608	19/19/2022	4/10/2022	SI	N/A	N/A	N/A	SI		
11	MARYELENA NIVIAYO CAICEDO	53.066.964	26/09/2022	14/10/2021	SI	N/A	N/A	N/A	SI		
12	SHIRLEY KARINA SACHICA	1.090.459.349	1/09/2022	3/01/2023	SI	N/A	N/A	N/A	SI		
13	ANGIE LORENA OROZCO MONTILLA	1.110.568.316	20/11/2022	18/04/2022	SI	N/A	N/A	N/A	SI		
14	SEBASTIAN GONZALEZ	1.022.402.058	20/11/2022	9/05/2023	SI	N/A	N/A	N/A	SI		

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
15	YENI SANGUINO ROMERO	1.032.367.907	20/11/2022	4/01/2022	SI	N/A	N/A	N/A	SI		
16	FERNANDO MORENO HUERTAS	3.199.429	23/09/2022	27/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
17	EDINSON VENECIA	72.120.789	1/09/2022	15/10/2021	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
18	LUIS ALBERTO ESPINO OJEDA	1.192,910,231	3/09/2022	5/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
19	NELSON ZAMBRANO	80368960	29/09/2022	20/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
20	ORLANDO HERNANDEZ	5842300	20/09/2022	24/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
21	YHONAR JAVIER SANCHEZ	1.122.992.170	19/09/2022	24/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
22	YOEDINSON VENECIA	1.101.879.446	19/09/2022	14/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
23	FREDDY PEÑA PAEZ	80.148.026	23/09/2022	26/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
24	GERARDO HERNANDEZ	115.241.309	22/09/2022	20/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
25	HERIBERTO VERA	93.083.537	23/09/2022	20/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
26	JORGE VIZCANO	72.158.125	23/09/2022	28/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
27	JOSE GUILLERMO MARTINEZ	79.666.136	23/09/2022	24/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
28	WHINYER PINILLA	1.014.222.210	22/09/2022	28/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
29	ANGEL SALGE RODRIGUEZ	5.084.025	26/09/2022	26/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
30	ROBERT SALAZAR CARREÑO	16.701.602	26/09/2022	26/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
31	ESLEIDER JAHIR MERCADO	1.002.067.206	27/09/2022	20/04/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
32	ADRIAN ALREXANDER RODRIGUEZ	1.022.999.566	23/09/2022	22/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
33	VICTOR RODRIGUEZ	79.444.038	26/08/2022	0/01/1900	N/A	SI	N/A	N/A	SI		

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
34	RODRIGO ESCAMILLA	72.120.459	28/09/2022	5/03/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
35	LUIS MERGAREJO	1.045.309.207	7/10/2022	7/10/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
36	DALADIER CUELLAR	79.637.053	7/10/2022	13/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
37	JESUS RAMON CASTILLO	PT 6745683	24/10/2022	26/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
38	RAFAEL JOSÉ CASTILLO	PT 6745484	24/10/2022	26/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	NO	SI	
39	SERGIO JESUS CASTILLO	PT 7063564	24/10/2022	26/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
40	OSCAR ORTEGA	80.128.209	24/11/2022	22/11/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
41	RICHARD NAZAREHT CARRASQUEL	PT 7423807	5/11/2022	10/10/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
42	JUAN ANTONIO HERAZO VALDES	79.476.251	3/10/2022	21/02/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
43	ALCIDEZ JOSÉ RODRIGUEZ LUJANO	6726606	3/10/2022	8/03/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
44	JOSÉ ANDRES BARRERA BRICEÑO	80801214	5/10/2022	21/02/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
45	NORBERTO AMAYA ALVAREZ	1.033.687.438	11/11/2022	9/11/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
46	YEISON FERNANDEZ	1.030.657.753	24/11/2022	25/11/2022	N/A	SI	N/A	N/A	NO	SI	
47	JOHANA TELLEZ	1.022.971.647	22/11/2022	18/11/2022	N/A	SI	N/A	N/A	NO	SI	
48	CRISTIAN JHOJANS YARA DELGADO	1.006.903.745	23/11/2022	18/11/2022	N/A	SI	N/A	N/A	NO	SI	
49	JOSE HUMBERTO CARO SUAREZ	79. 057.097	19/11/2022	17/11/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
50	JHON STEVEN ORTEGÓN BLANCO	1.001.271.233	19/11/2022	17/11/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
51	FREDI OSBALDO BOHORQUEZ CHAC	79.716.256	24/11/2022	21/11/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**C.C.**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO**	**PERSONAL**		**Personal Trabajos en Alturas**		**ESTADOL ACTUAL**		**OBSERVACIONES**
					Administrativo	**Operativo: maestros y auxiliares**	**APTO**	**NO APTO**	**ACTIVO**	**RETIRADO**	
52	FRANKLIN GUSTAVO QUIÑONES ME	87.432.481	24/11/2022	21/11/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
53	JOSÉ NORVEY VILLA PUENTES	80.253.880	23/11/2022	NO PRESENTA	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
54	OSCAR ALBERTO ACOSTA MALPICA	79.913.452	24/11/2022	16/11/2022	N/A	SI	SI	N/A	SI		
55	JOSÉ ANDRES DÍAZ ORTIZ	1.022.992.366	22/11/2022	17/11/2022	N/A	SI	N/A	N/A	NO	SI	
56	CRISTIAN ANDRES SILVA RAMÍREZ	1.001.271.816	22/11/2022	17/11/2022	N/A	SI	N/A	N/A	NO	SI	
57	WILLIAM JAVIER FIERRO PINILLA	3.129.576	24/11/2022	19/11/2022	N/A	SI	SI	N/A	SI		
58	JULIO EPIAYU MONTIEL	PT 5623699	27/11/2022	21/02/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
59	LUIS EPIAYU MONTIEL	PT 6353981	27/11/2022	6/04/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
60	YORGELIS CALVO TORRES	PT 2832993	16/01/2023	5/03/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
61	LUIS CARLOS MENDOZA	17,971,346	16/01/2023	25/07/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
62	JIOVANNY JOSÉ PAREDES BRICEÑO	PT 6647515	24/01/2023	7/03/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
63	LUIS TELLEZ MEDINA	3.166.236	6/01/2023	25/07/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
64	LUIS CARLOS MENDOZA GOMEZ	17.971.346	6/01/2023	25/07/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
105											
RESULTADOS:					**15**	**49**	**2**	**0**	**55**	**9**	

64

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO CONTRATO 999 DE 2022

REALIZADO POR	GLORIA ARBOLEDA ARIAS	FECHA	ene-23	PERIODO EJECUCION	01 ENERO - 30 MARZO 2023

PLAN DE TRABAJO SG SST		AÑO 2023												
		2-8 ene	9-15 ene	16-22 ene	23-29 ene	30-5 feb	6-12 feb	13-19 feb	20-26 feb	27-5 mar	6-112 mar	13-19 mar	20-26 mar	27-31 mar
		Ejecución												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD (BENEFICIARIOS DEL PROYECTO)	Contratista		P											
			E											
CHARLAS INFORMATIVAS SST Y AMBIENTALES	Contratista	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
		E	E	E	E									
CAPACITACIONES	Contratista			P				P				P		
DILIGENCIAMIENTO DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (SI SE REQUIRE)	Contratista													
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Contratista	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
		E		E	E									
INDUCCION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - POLITICAS SST, POLITICA AMBIENTAL (SI SE REQUIRE)	Contratista													
INDUCCION AL PERSONAL OPERATIVO - POLITICAS SST, POLITICAS Y PLAN AMBIENTAL,	Contratista	P				P				P				
INFORME MENSUAL	Contratista	P				P				P				P
		E												
INSPECCCION EXTINTOR, CAMILLA Y BOTIQUIN	Contratista				P				P				P	
					E									
INSPECCION DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS	Contratista	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
			E	E	E									
REALIZACION O VERIFICACIÓN DE LOS EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE PRE-NGRESO	Contratista	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
				E	E									
RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS, REVISION DE VALES Y PIN DE VOLQUETA	Contratista	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
REPORTE , SEGUIMIENTO DE ACCIDENTE LABORALES (CUANDO OCURRA EL EVENTO)	Contratista													
SOCIALIZACION DE PROCEDIMIENTO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE CUBIERTA - DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE CAMBIO DE CUBIERTAS	Contratista				P				P				P	
					E									
VERIFICACION DE AFILIACION Y PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES	Contratista	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
			E	E	E									

DOCUMENTO SUJETO A CAMBIO, DE ACUERDO A LA LOGISTICA DEL AREA TECNICA Y SOCIAL

P	Programado	Actividades programadas	15	15	7	8	8	6	7	8	8	6	7	8	7
E	Ejecutado	Actividades ejecutadas	3	4	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% CUMPLIMIENTO PROGRAMA SEMANAL			20,00%	26,67%	71,43%	87,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

DEL PROYECTO PRECONSTRUCCIÓN Y EJECUCION	
programadas	110
ejecutadas	19
% proyecto	17,27%

REGISTRO FOTOGRAFICO



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ESCOMBROS, 04 DE ENERO DE 2023





	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ESCOMBROS, 04 DE ENERO DE 2022





	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLAS E INSPECCIÓN DE EPP´S, 05 DE ENERO DE 2023



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ORDEN Y ACOPIO DE MATERIALES EN BODEGA, 05 DE ENRO DE 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	REUNIÓN GRUPO INTERVENTORIA, 12 DE ENERO DE 2023





	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	REUNIÓN CON LA COMUNIDAD, PRESENTACIÓN SECRETARÍA DE HÁBITAT, 12 DE ENERO DE 2023





	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	RECORRIDOS AVANCE DE OBRA, MV 1240, 11 DE ENERO DE 2023



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	RECOLECCIÓN DE ESCOBROS, 10 DE ENERO DE 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	INSPECCIÓN DE MATERIALES BODEGA, 16 DE ENERO DE 2023





	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	INSPECCIÓN BODEGA, 16 DE NERO DE 2023





	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	MV PARA ENTREGAR, CON ESCOMBRO EN LA FACHADA, 20 DE ENERO DE 2023



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ESCOMBRO EN FACHADA DE MÁS DE TRES DÍAS, 20 DE ENERO DE 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO




	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	REUNIÓN JAC, SECRETARÍA DE HABITAT, CONTRATISTAS E INTYERVENTORÍA 25 DE ENERO DE 2023





	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	JORNADA DE RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS., 24 DE ENERO DE 2023





	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CORRECTO TAPADO DE VOLQUETA, PARA NO EMITIR MATERIAL PARTICULADO, 24 DE ENERO DE 2023



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CORRECTA SEPARACIÓN DE RESIDUOS, 26 DE ENERO DE 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCION Y FECHA:	INSPECCIÓN DE DOTACIÓN, 01 DE FEBRERO DE 2023



DESCRIPCIÓN Y	RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS, 31 DE ENERO DE 2023



DESCRIPCIÓN Y FECHA:	RESIDUOS QUIMICOS, BOLSAS DE CEMENTO, SEPARADAS PARA ENLONAR, 01 DE FEBRERO DE 2023



DESCRIPCIÓN Y	ENTREGA DE CARPETAS A SECRETARÍA DE HÁBITAT, MV´S
