
WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
Ingewilmar84@hotmail.com

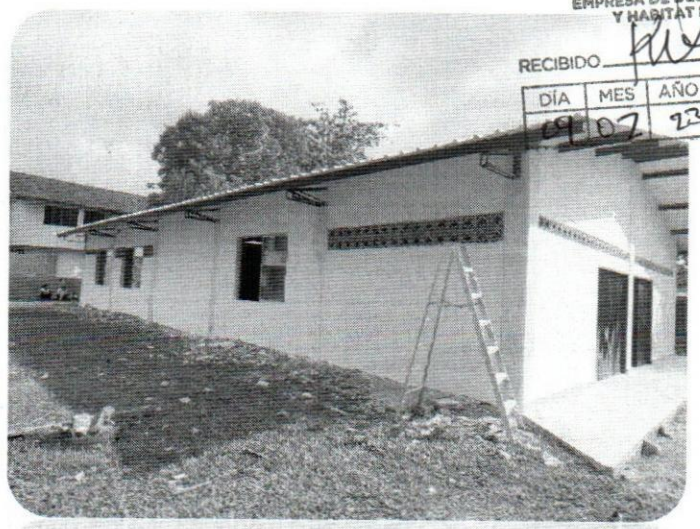

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADO
RECIBIDO
DÍA 09 | MES 02 | AÑO 23 | HORA 8:18 Am
4 de 4

INFORME DE AVANCE DE OBRA

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.

PERIODO:
22 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 02 DE FEBRERO DE 2023

APARTADO – ANTIOQUIA

02 DE FEBRERO DE 2023

"CONSTRUYENDO PARA UN BUEN FUTURO"

Dirección: Calle 95 No. 101-06, Barrio Nuevo Apartado, Teléfonos 8150438Celular: 3104327098- 3182362625
E-mail: Ingewilmar84@hotmail.com

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
Ingewilmar84@hotmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 3
1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 4
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 8
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 8
Tabla N°01. Ficha Técnica del Contrato 8
3.2. INFORMACIÓN FINANCIERA DE CONTRATO 9
Tabla N°02. Información financiera del contrato 9
3.3. GARANTÍAS 9
Tabla N°03. Garantías 9
4. EJECUCIÓN DE OBRA 11
4.1. ASPECTOS TECNICOS 11
4.2. AVANCE FISICO 12
Al día de hoy podemos decir que el contrato se encuentra ejecutado en un 100% tal y como se muestra en el acta de avance y terminación de obra que se anexa al respaldo del presente informe, donde además se encontrara las memorias de cantidades y sus respectivos registros fotográficos 12
5. RECURSOS DEL CONTRATISTA 12
5.1. RECURSO HUMANO 12
Tabla N°04. Recurso Humano 12
5.2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 13
Tabla N°05. Equipo y herramientas 13
6. GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 13
6.1. PRESENTACIÓN 13

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
Ingewilmar84@hotmail.com

1. INTRODUCCION.

Mediante Acuerdo 010 de 2020 fue creada LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ, siendo una empresa industrial y comercial del Estado, del orden municipal, descentralizada, vinculada al Municipio de Apartadó, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera.

El gerente está facultado por la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el decreto 342 de 2008 y demás concordantes para realizar las contrataciones que requiera la EICE – EDUH para cumplir con su objeto social y funciones de la empresa.

Según lo señalado en el artículo 3 del Acuerdo N.° 010 de 2020, la Empresa Industrial y Comercial para el Desarrollo Urbano y Hábitat de Apartadó tendrá dentro de su objeto social:

- Promover, diseñar, estructurar y ejecutar proyectos de desarrollo urbanístico y hábitat, proyectos ambientales, de movilidad y de desarrollo sostenible de incidencia local, regional y/o nacional que generen impacto socioeconómico a nivel local, regional y/o nacional.

- Prestación de servicios de construcción de obras de infraestructura institucional, educativa, deportiva, recreativa, cultural, espacio público, saneamiento básico, agropecuarios, infraestructura de vías, transporte y demás equipamientos urbanos y rurales que generen desarrollo integral y sostenible a nivel local, regional y/o nacional.

- Diseñar, estructurar y ejecutar proyectos ambientales, de movilidad y de desarrollo sostenible de incidencia local, regional y/o nacional - Brindar el servicio de asesoría, consultoría e interventoría de obras civiles y/o para la formulación y ejecución de proyectos sociales, ambientales y gubernamentales de interés local, regional y/o nacional.

En ese orden LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ y el municipio de Apartadó suscribieron un contrato de mandato interadministrativo N° 498 del 2022 y de este se derivó un contrato de obra 042-2022 entre EICE – EDUH y el contratista Wilmar Lozano Mosquera con el Objeto de realizar la "**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ".**
En cumplimiento de sus compromisos contractuales, el señor Wilmar Lozano Mosquera presenta a la EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ un **INFORME DE AVANCE OBRA** correspondientes a los trabajos

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
Ingewilmar84@hotmail.com

ejecutados en el periodo comprendido entre el 22 **de diciembre de 2022 al 02 de febrero del 2023**

1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El lugar de incidencia del proyecto será en el municipio de Apartadó, en la caseta comunal del Barrio Policarpa y en la caseta comunal de la vereda San Pablo comunal palos blancos.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto principal de este proyecto tiene como finalidad realizar la "**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ**".

A continuación, se relacionan las condiciones iniciales del proyecto.

PROPUESTA ECONOMICA					
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE LA CASETA DE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO POLICARPA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ					**$ 113,599,885**
1	Piso en concreto 1:3:6 e = 10cm placa de contrapiso con refuerzo de malla electrosoldada D50	m2	190	$ 75,503	$ 14,345,570
2	Suministro e instalación de piso en baldosa TRAFICO 5, incluye mortero de nivelación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m2	190	$ 116,495	$ 22,134,050
3	Revoque liso para muros internos y externos	m2	407.0	$ 21,399	$ 8,709,393
4	Estuco en muros internos y externos	m2	407.0	$ 14,322	$ 5,829,054
5	Pintura en muros internos y externos	m2	407.0	$ 11,336	$ 4,613,752
6	Suministro e instalación de guarda escoba en baldosa de grano	m	60	$ 14,451	$ 867,060
7	Suministro e instalación de cielo raso en PVC	m2	190	$ 94,942	$ 18,038,980

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
Ingewilmar84@hotmail.com

8	Suministro e instalación de cubierta en teja ECOROUF UPV 2mm	m2	212	$	100,680	$	21,344,160
9	Viga Dintel de 0.12x0.2m para soporte de muros en ventanas	m	10	$	28,911	$	289,110
10	Suministro e instalación de ventanas de 2x1.5m en aluminio y vidrio 4mm	und	4	$	857,189	$	3,428,756
11	Suministro e instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 BTU	und	4	$	3,500,000	$	14,000,000
AMPLIACIÓN DE CASETA COMUNAL DE LA VEREDA SAN PABLO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO						**$**	**68,774,262**
1	**PRELIMINARES**						
1.1	Localización y replanteo	M2	42	$	1,849	$	77,658
1.2	Suministro e instalación de cerramiento provisional en tela verde.	m	40	$	19,405	$	776,200
2	**CIMENTACIÓN**						
2.1	"Excavación en material común de 0 a 2 mts, cualquier grado de humedad, incluye retiro de material sobrante, mano de obra, herramienta, equipo necesario para su correcta ejecución."	M3	12	$	44,177	$	545,144
2.2	Suministro, colocación, conformación y compactación de subbase granular, incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	M3	21	$	112,783	$	2,368,443
2.3	Solados en concreto 175kg/cm2 espesor 10cm	m	41	$	16,114	$	660,674
2.4	Suministro, transporte e instalación de concreto de 3000 psi para vigas de fundación y losa de	m3	9.9	$	595,692	$	5,897,351

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
Ingewilmar84@hotmail.com

	cimentación, incluye materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta instalación.						
3	**ESTRUCTURAS**						
3.1	Suministro, transporte y colocación de Malla Electrosoldada 15x15cm Diámetro 4.0mm (D-084)	m2	42	$	14,617	$	613,914
3.2	Suministro, transporte e instalación de concreto de 3000 ps para vigas de amarre, columnetas de confinamiento, vigas de amarre y viga cinta, incluye materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta instalación.	m3	3	$	622,442	$	1,795,122
4	**MAMPOSTERIA**						
4.1	Mampostería en bloque vibrado de 12cm	m2	105	$	81,250	$	8,490,625
5	**CUBIERTAS**						
5.1	Cubierta en teja fibrocemento con estructura en madera	m2	52	$	121,818	$	6,334,536
5.2	Ruana asfáltica	m	26	$	29,172	$	758,472
5.3	Construcción de lagrimal sobre ático	m	26	$	35,482	$	922,532
6	**PISOS**						
6.1	Placa de contrapiso e=0,05	m2	42	$	54,157	$	2,274,594
7	**PAÑETES Y ENCHAPES**						
7.1	Revoque liso para muros internos y externos	m2	230	$	21,399	$	4,919,630
7.2	Suministro e instalación de piso en baldosa TRAFICO 5, incluye mortero de nivelación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m2	52	$	116,495	$	6,057,740

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
Ingewilmar84@hotmail.com

8	**CARPINTERIA METALICA**				
8.1	Puerta metálica entrada 1.0 x 2,00 calibre 20 en lámina galvanizada con anticorrosivo, pintura a base de aceite y chapa.	UN.	2	$ 911,417	$ 1,822,834
8.2	Ventanearía en aluminio natural tipo corrediza + vidrio crudo 4mm + alfajía en aluminio	m2	27	$ 440,402	$ 11,890,854
8.3	Puerta en tríplex wc (incluye marco)	UN	2	$ 815,000	$ 1,630,000
8.4	Canoa metálica primer piso patio 6.0m para aguas lluvias	m	7	$ 142,194	$ 995,358
9	**APARATOS Y GRIFERIAS**				
9.1	Lavamanos con grifería	UN	1	$ 320,313	$ 320,313
9.2	Sanitario con grifería	UN	1	$ 429,073	$ 429,073
9.3	Grifería ducha	UN	1	$ 182,711	$ 182,711
9.4	Rejilla de piso 3" * 2"	UN	1	$ 65,420	$ 65,420
10	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
10.1	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				
10,1,1	Acometida principal de 1/2"	m	16	$ 49,401	$ 790,416
10,1,2	Puntos hidráulicos	UN	3	$ 58,357	$ 175,071
10.2	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
10,2,1	Acometida principal de 4"	m	18	$ 69,258	$ 1,246,644
10,2,2	Acometida principal de 4" all	m	35	$ 54,258	$ 1,899,030
10,2,3	Puntos sanitarios	UN	4	$ 79,789	$ 319,156
11	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
11,1	Salidas eléctricas, incluye tubería y accesorios	PUNTO	16	$ 105,700	$ 1,691,200
11,2	Salidas para toma coaxial para servicios no satelitales (incluye tubería, cable y caja)	PUNTO	2	$ 108,700	$ 217,400
12	**PINTURA**				

12,1	Pintura en muros internos y externos	m2	230	$	11,336	$	2,606,146
					SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	**$**	**182,374,147**
					ADMINISTRACIÓN 25%	**$**	**45,575,299**
					UTILIDAD 5%	**$**	**9,118,707**
					TOTAL, OBRA	**$**	**237,068,153**

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla N°01. Ficha Técnica del Contrato.

OBJETO DEL CONTRATO:	"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ"
CONTRATANTE:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ
NIT:	901.445.176-6
CONTRATISTA:	WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT:	1.077.427.408
CONTRATO N°	042 - 2022
PLAZO DE EJECUCION:	20 DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN:	22 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	11 DE ENERO DEL 2023
FECHA DE SUSPENCIÓN:	28 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE REANUDACIÓN:	25 DE ENERO DEL 2023
FECHA DE TERMINACION:	07 DE FEBRERO DEL 2023
VALOR DE CONTRATO:	DOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/L ($237.068.153)

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
Ingewilmar84@hotmail.com

3.2. INFORMACIÓN FINANCIERA DE CONTRATO

El contrato numero 042-2022 el cual fue adjudicado al señor Wilmar Lozano Mosquera por valor de (**$ 237.068.153)** dentro de su plan de pagos establece un anticipo de 40%, el cual fue desembolsado al contratista previo a los inicios de actividades.

Para efectos de este informe se pretende realizar un acta de avance de obra #1 equivalente al 100% de ejecución de las actividades contractuales, las cuales serán soportadas mediante el acta de obra, memorias de cantidades y su respectivo registro fotográfico.

A continuación, se presenta un cuadro con el estado financiero del proyecto.

Tabla N°02. Información financiera del contrato

CONTRATO INICIAL	%	VALOR BRUTO	VALOR NETO	SALDO
	100%	$237,068,153	$237,068,153	$237,068,153
Anticipo	40%	$94,827,261	$94,827,261	$142,240,892
VALOR A PAGAR ACTA #1	60%	$142,240,892	$142,240,892	**$0**

3.3. GARANTÍAS

Tabla N°03. Garantías

GARANTIAS SEGÚN CONTRATO					
ASEGURADORA	**SURAMERICANA**				
GARANTIAS	**%**	**INICIO**	**FINAL**	**VR. ASEGURADO**	**N° POLIZA**
Cumplimiento	10%	12-12-2022	02-07-2023	$23.706.815	3512557-9
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	10%	12-12-2022	01-01-2026	$23.706.815	3512557-9
Estabilidad y calidad de la obra	20%	01-01-2023	01-01-2028	$47.413631	3512557-9
Buen manejo del anticipo	100%	12-12-2022	01-01-2023	$94.827.261	3512557-9
Responsabilidad civil		12-12-2022	01-01-2023	$200.000.000	0886102-5

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
Ingewilmar84@hotmail.com

GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO					
ASEGURADORA	**SURAMERICANA**				
GARANTIAS	**%**	**INICIO**	**FINAL**	**VR. ASEGURADO**	**N° POLIZA**
Cumplimiento	10%	22-12-2022	12-07-2023	$23.706.815	3512557-9
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	10%	22-12-2022	11-01-2026	$23.706.815	3512557-9
Estabilidad y calidad de la obra	20%	11-01-2023	11-01-2028	$47.413631	3512557-9
Buen manejo del anticipo	100%	22-12-2022	11-01-2023	$94.827.261	3512557-9
Responsabilidad civil		22-12-2022	11-01-2023	$200.000.000	0886102-5

GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE SUSPENCIÓN					
ASEGURADORA	**SURAMERICANA**				
GARANTIAS	**%**	**INICIO**	**FINAL**	**VR. ASEGURADO**	**N° POLIZA**
Cumplimiento	10%	28-12-2022	18-07-2023	$23.706.815	3512557-9
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	10%	28-12-2022	17-01-2026	$23.706.815	3512557-9
Estabilidad y calidad de la obra	20%	17-01-2023	17-01-2028	$47.413631	3512557-9
Buen manejo del anticipo	100%	28-12-2022	17-01-2023	$94.827.261	3512557-9
Responsabilidad civil		28-12-2022	17-01-2023	$200.000.000	0886102-5

GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE REINICIO					
ASEGURADORA	**SURAMERICANA**				
GARANTIAS	**%**	**INICIO**	**FINAL**	**VR. ASEGURADO**	**N° POLIZA**
Cumplimiento	10%	25-01-2023	15-08-2023	$23.706.815	3512557-9
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	10%	25-01-2023	14-02-2026	$23.706.815	3512557-9
Estabilidad y calidad de la obra	20%	14-02-2023	14-02-2028	$47.413631	3512557-9
Buen manejo del anticipo	100%	25-01-2023	14-02-2023	$94.827.261	3512557-9
Responsabilidad civil		25-01-2023	14-02-2023	$200.000.000	0886102-5

"CONSTRUYENDO PARA UN BUEN FUTURO"

Dirección: Calle 95 No. 101-06, Barrio Nuevo Apartado, Teléfonos 8150438Celular: 3104327098- 3182362625
E-mail: Ingewilmar84@hotmail.com

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
Ingewilmar84@hotmail.com

GARANTIAS ACTUALIZADAS OTRO SI					
ASEGURADORA	SURAMERICANA				
GARANTIAS	%	INICIO	FINAL	VR. ASEGURADO	N° POLIZA
Cumplimiento	10%	25-01-2023	15-08-2023	$23.706.815	3512557-9
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	10%	25-01-2023	14-02-2026	$23.706.815	3512557-9
Estabilidad y calidad de la obra	20%	14-02-2023	14-02-2028	$47.413631	3512557-9
Buen manejo del anticipo	100%	25-01-2023	14-02-2023	$94.827.261	3512557-9
Responsabilidad civil		25-01-2023	02-02-2023	$200.000.000	0886102-5

GARANTIAS ACTUALIZADAS TERMINACIÓN					
ASEGURADORA	SURAMERICANA				
GARANTIAS	%	INICIO	FINAL	VR. ASEGURADO	N° POLIZA
Cumplimiento	10%	25-01-2023	15-08-2023	$23.706.815	3512557-9
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	10%	25-01-2023	14-02-2026	$23.706.815	3512557-9
Estabilidad y calidad de la obra	20%	14-02-2023	14-02-2028	$47.413631	3512557-9
Buen manejo del anticipo	100%	25-01-2023	14-02-2023	$94.827.261	3512557-9
Responsabilidad civil		25-01-2023	02-02-2023	$200.000.000	0886102-5

4. EJECUCIÓN DE OBRA

4.1. ASPECTOS TECNICOS

A partir del día 22 de diciembre del año 2022 se firma el acta de inicio para la ejecución del proyecto en mención, seguidamente se realiza una visita de reconocimiento inicial en compañía de la supervisión en aras de poder revisar que las cantidades contratadas suplieran las necesidades presentes en cada uno de las casetas comunales a intervenir. En estas visitas se pudo apreciar que las actividades no coincidían en sus cantidades y en muchos casos se haría indispensable contemplar ciertas actividades no previstas para garantizar el alcance inicial planteado. Siendo así se determina realizar una priorización de las

actividades necesarias para dejar los espacios funcionales, pero teniendo presente que de ninguna manera estas variaciones podrían afectar el valor inicialmente contratado. Eso ocasiono que se originara un acta de mayores y menores cantidades de obra.

Seguidamente y durante la ejecución del proyecto se presentaron algunos factores que afectaron el rendimiento de mano de obra, así como también la entrega oportuna de suministros de insumos y materiales para la construcción, esto debido a la temporada de fin de año por la que se atravesó y sumado a la fuerte ola invernal que afecto indirectamente al proyecto.

En consecuencia de lo anterior se vio la necesidad de solicitar ante la supervisión la aprobación de una suspensión temporal hasta superar estos factores mencionados, la cual fue aprobada mediante una acta generada el pasado 28 de diciembre de 2022 y el cual se reinicia el día 25 de enero del año 2023.

Así mismo fue aprobada mediante otro-si N°1 el acta de modificación de cantidades de obra.

4.2. AVANCE FISICO

Al día de hoy podemos decir que el contrato se encuentra ejecutado en un 100% tal y como se muestra en el acta de avance y terminación de obra que se anexa al respaldo del presente informe, donde además se encontrara las memorias de cantidades y sus respectivos registros fotográficos.

5. RECURSOS DEL CONTRATISTA

Para el desarrollo de las actividades en el contrato 042-2022 adjudicado al contratista Wilmar Lozano Mosquera, fue necesario constar con los siguientes recursos:

5.1. RECURSO HUMANO

Tabla N°04. Recurso Humano

CARGO	CANTIDAD
Director de obra	1
Residente de obra	1
Profesional en seguridad y salud en el trabajo	1
Maestro de Obra	1
Oficiales	5
Ayudantes	10

5.2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Tabla N°05. Equipo y herramientas

DESCRIPCION	CANTIDAD
Herramienta menor	1
Cuerpos de Andamios	4
Escaleras	4
Kit Arnés (eslingas, Líneas de vida)	3
Concretadora	1
Vibrador de concreto eléctrico	1

6. GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6.1. PRESENTACIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) abarca una disciplina que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales. Tiene el objetivo de mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el trabajo, además de la salud en el trabajo, que conlleva la promoción del mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los empleados.

Durante el periodo del presente informe se realizaron charlas periódicas con el personal en obra en aras de dar cumplimiento con el componente de seguridad y salud en el trabajo.

se realizan charlas enfocadas en la importancia del adecuado uso los epp, autocuidado, Higiene y aseo en la obra y entre otros.

Atentamente,

WILMAR LOZANO MOSQUERA
CONTRATISTA

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
Ingewilmar84@hotmail.com

FACTURA

"CONSTRUYENDO PARA UN BUEN FUTURO"

Dirección: Calle 95 No. 101-06, Barrio Nuevo Apartado, Teléfonos 8150438Celular: 3104327098- 3182362625
E-mail: Ingewilmar84@hotmail.com

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT 1.077.427.408-6
Calle 95 No. 101-06 Ofc-304
Tel: (604) 8150438
Apartadó - Colombia
ingewilmar84@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. WLM 49

Señores	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ		
NIT	901.445.176-6	**Teléfono**	(604) 3212535935
Dirección	CALLE 97 Nº 104-04 PISO 2	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/02/2023, 11:39
Expedición	08/02/2023, 14:43
Vencimiento	15/02/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA N° 1 Y FINAL CONTRATO N°042-2022 ADECUACION Y MEJORAMIENO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADO	1.00	182,374,146.47

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos treinta y siete millones sesenta y ocho mil ciento cincuenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-02-15 por $ 237,068,153.00

Total Bruto	182,374,146.47
Administración 24.99%	45,575,299.21
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	9,118,707.32
Total a Pagar	237,068,153.00

Observaciones:
APLICAR AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL ACTA POR VALOR DE ($ 94.827.261)
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA ($142.240.892)

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764039261138 aprobado en 20221108 prefijo WLM desde el número 43 al 500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 0337cc0d9c9251d98629b1919584468915611426519588c06692bc07cdc8e0057ade242bc9774dfad30f460358287f9e

Certificado Bancario

Lunes, 14 de Diciembre de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que WILMAR LOZANO MOSQUERA identificado(a) con CC 1077427408, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	83178439092	2017/06/23	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

"Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos

Bancolombia

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
Ingewilmar84@hotmail.com

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

"CONSTRUYENDO PARA UN BUEN FUTURO"

Dirección: Calle 95 No. 101-06, Barrio Nuevo Apartado, Teléfonos 8150438Celular: 3104327098- 3182362625
E-mail: Ingewilmar84@hotmail.com

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
Ingewilmar84@hotmail.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Señores:
EICE-EDUH APARTADÓ
Ciudad

Asunto: **CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

El suscrito representante legal y contador hacen saber que la empresa persona natural **WILMAR LOZANO MOSQUERA** identificado con **Nit. 1.077.427.408 - 6**, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, caja de compensación y pensión, servicio nacional de aprendizaje SENA e ICBF, así mismo certifico el cumplimiento del pago de los salarios y prestaciones sociales de los empleados de la empresa.

La anterior certificación se expide al (08) día del mes de febrero del año 2023 Para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por la Ley 828 de 2003.

Atentamente,

Firma Representante legal
WILMAR LOZANO MOSQUERA
C.C. **1077427408**

Contadora Pública
INDIRA PEREA MORENO
TP.136043-T


"CONSTRUYENDO PARA UN BUEN FUTURO"

Dirección: Calle 95 No. 101-06, Barrio Nuevo Apartado, Teléfonos 8150438Celular: 3104327098- 3182362625
E-mail: Ingewilmar84@hotmail.com


WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
Ingewilmar84@hotmail.com


Valido únicamente para anexar a CERTIFICADO PARAFISCALES de WILMAR LOZANO MOSQUERA NIT. 1.077.427.408 PROCESO EDUHA – DIC-2022



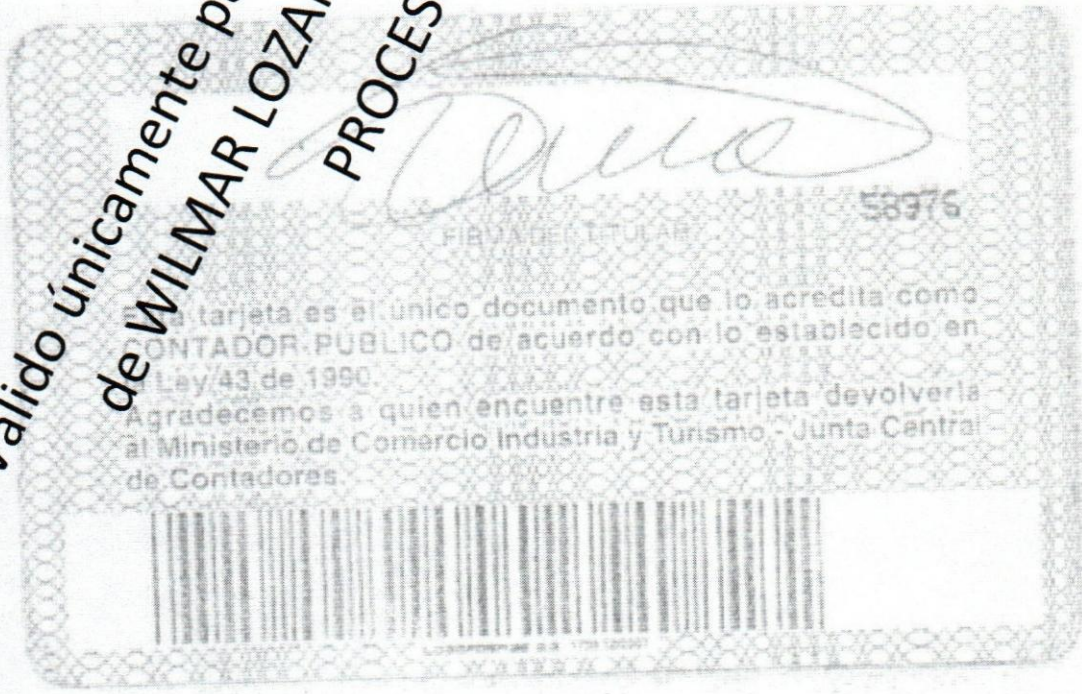

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
Ingewilmar84@hotmail.com

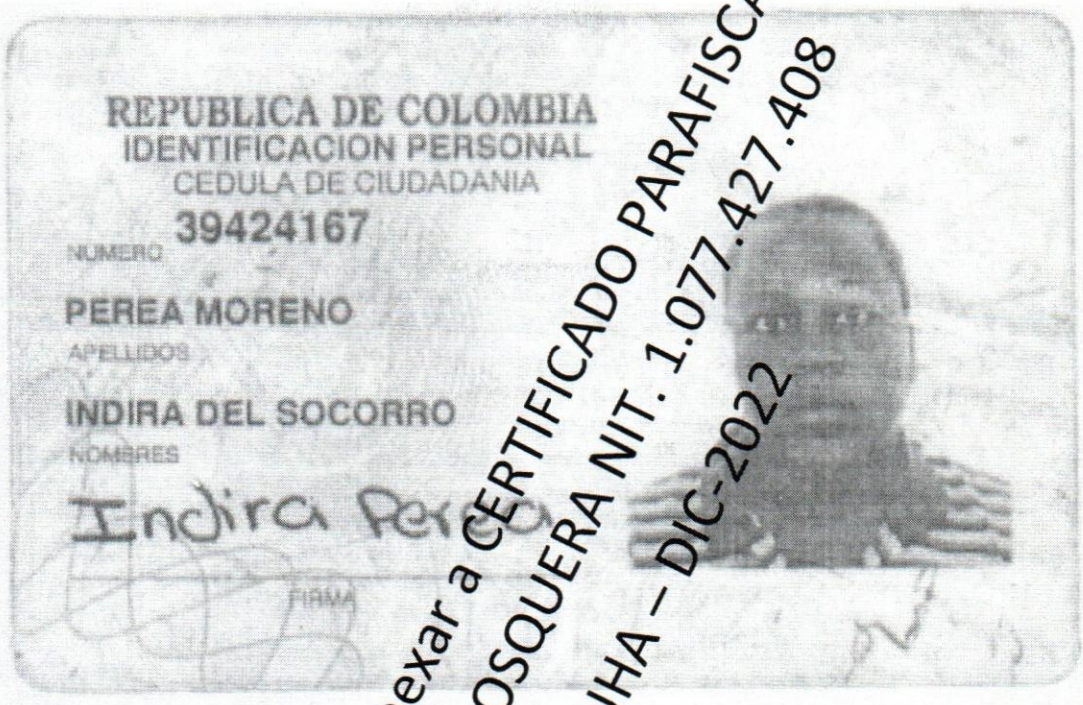
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 39424167
PEREA MORENO
APELLIDOS
INDIRA DEL SOCORRO
NOMBRES
FIRMA

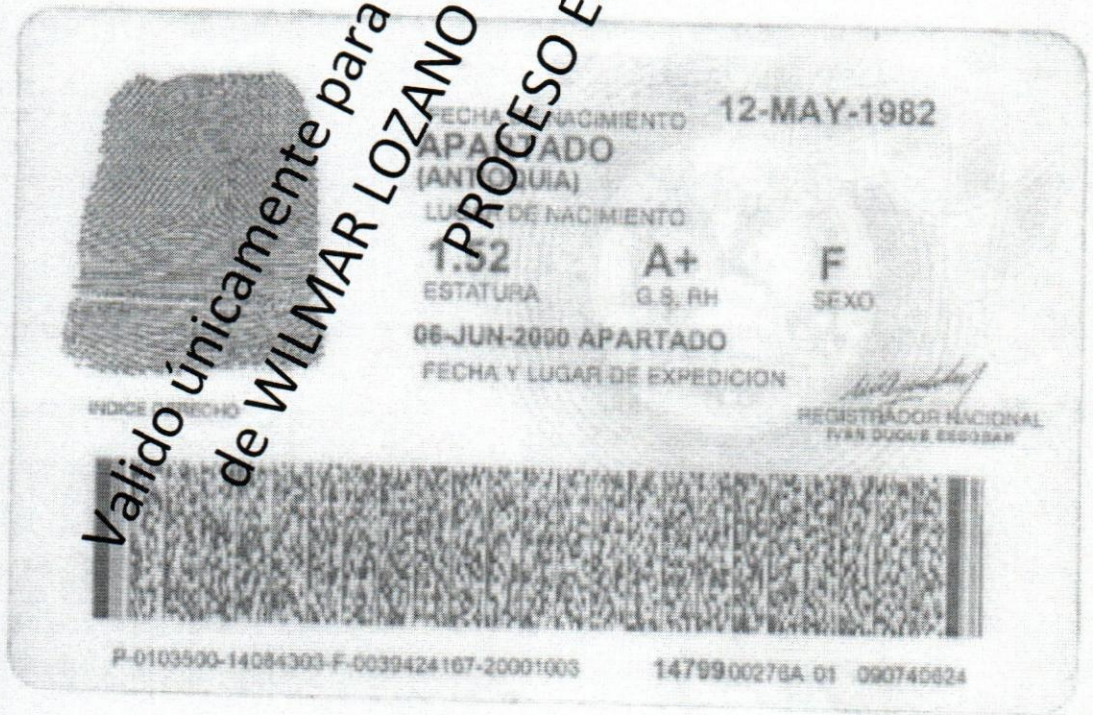
FECHA DE NACIMIENTO 12-MAY-1982
APARTADO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.52 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
06-JUN-2000 APARTADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
INDICE DERECHO
P-0103500-14084303-F-0039424167-20001003
14799 00278A 01 090740624

Valido únicamente para anexar a CERTIFICADO PARAFISCAL
de WILMAR LOZANO MOSQUERA NIT. 1.077.427.408
PROCESO EDUHA – DIC-2022

CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA No 001 de 2022

Entre **Wilmar Lozano Mosquera,** mayor de edad y vecino de la ciudad de Apartadó, identificado con cédula de ciudadanía 1.077.427.408 y que en adelante se denominará **EL CONTRATANTE,** por una parte; y por la otra, **Arleison Moreno Aguilar**, identificado con cédula de ciudadanía 1.077.425.453, quien actúa en calidad de representante legal de la empresa **Conspringe – Constructora de Proyectos de Ingeniería SAS,** con Nit. 901152263-0, que en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, quienes manifiestan bajo la gravedad del juramento que no se encuentran incurso en causal alguna de inhabilidad y/o incompatibilidad para contratar, se ha convenido celebrar el presente **CONTRATO DE OBRA** según especificaciones dadas por el contratante y bajo la modalidad de precios unitarios fijos, el cual se regirá por las siguientes **CLAUSULAS: PRIMERA. CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA No 001 de 2022,** Por virtud del presente contrato, **EL CONTRATISTA** se obliga para con **EL CONTRATANTE** apoyar con mano de obra no calificada las obras que realizará este en el desarrollo de proyectos de infraestructura social derivados del contrato 042 de 2022 suscrito entre el contratante y la eduha, correspondiente a las especificaciones técnicas del proyecto. A continuación, se describen claramente el personal requerido.

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**MES**	**V/SALARIO**	**V/TOTAL**
1	AYUDANTE	JORNAL INTEGRAL	6	1	$ 1,845,100	$ 11,070,601
2	OFICIAL	JORNAL INTEGRAL	5	1	$ 2,627,013	$ 13,135,063
3	MAESTRO	JORNAL INTEGRAL	1	1	$ 3,619,965	$ 3,619,965
					TOTAL	**$ 27,825,630**
NOTA: EL SALARIO INCLUYE LAS PRESTACIONES SOCIALES						

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: En cumplimiento del objeto contractual descrito en la cláusula anterior EL **CONTRATISTA** durante el término de este contrato deberá cumplir las siguientes obligaciones contractuales: **OBLIGACIONES GENERALES** 1). Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado

2). Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la ejecución del contrato. 3). Atender las consultas y sugerencias del supervisor que asigne tanto el contratante como la Asociación para el efecto.4). Presentar las autoliquidaciones de la seguridad social vigente Para el pago. 5). Adelantar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad todo lo relacionado con el personal bajo su cargo que trabajarán en la ejecución de las obras objeto de este contrato, todo lo anterior con el pleno cumplimiento de procedimiento y principios que establece el régimen legal a esta clase de contrato. **OBLIGACIONES ESPECIFICAS:** 1). Asumir los costos ocasionados con la ejecución el

contrato de obra. 2). Cumplir con la normatividad vigente relacionadas con las áreas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional y gestión social y garantizar la calidad de la obra. 3). Garantizar la vinculación de mano de obra no calificada de población vulnerable perteneciente a los municipios de Apartadó, según el caso, preferiblemente del área de influencia de la obra y reportar mensualmente a **EL CONTRATANTE** la relación y duración de los empleos generados para la ejecución del contrato de obra 4). Cumplir con la dotación para el personal de trabajo como uniformes e implementos de seguridad. 5). Colaborar con EL CONTRATANTE en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla y que este sea de la mejor calidad. 15). Desarrollar las obras a los precios contratados. 6). Demostrar el pago de los aportes parafiscales señalados por la Ley 789 de 2002, si estuviere obligado a ello. 7) Suministrar los elementos de seguridad para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que **EL CONTRATANTE** exija, en cumplimiento de la normatividad vigente. Mantendrá en la obra los elementos para prestar primeros auxilios cumpliendo todas las normas referentes a seguridad laboral que contemple la Ley Colombiana. Será condición para control de personal que en el casco se coloque el logotipo del Contratante. 8) Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes. 9) Cumplir con el objeto del contrato conforme a los documentos de la oferta económica. 10) Los cortes de obra deben ser coordinados con el contratante con anterioridad esto con el fin de tener una información acorde. **TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** En virtud del presente contrato **EL CONTRATANTE** se obliga a: 1) Suministrar por medio de sus representantes y empleados que designe, la información que posee y que sea de importancia para la ejecución del contrato. 2) Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato previsto en la cláusula cuarta del presente contrato, en la oportunidad y forma allí establecida. 3) Efectuar las retenciones de Ley y de impuestos de acuerdo con las normas vigentes y a sus posteriores modificaciones. **CUARTA. VALOR Y FORMA DE PAGO**: Para efectos fiscales el presente contrato tiene un valor de **VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS** M/L **($27.825.630) IVA** INCLUIDO y se pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: 1 Se realizarán pagos parciales quincenales, para lo cual **EL CONTRATISTA** deberá presentar toda la información correspondiente que soporte el acta. Todos los pagos que EL CONTRATANTE cancelará al CONTRATISTA, serán condicionados a los siguientes dos requisitos: 1) Dentro de los quince (15) días siguientes a la radicación de la factura y actividades realizadas con los documentos exigidos y recibido a satisfacción por parte del CONTRATANTE, así como los soportes de pago al SGSS y parafiscales. **QUINTA. DURACION:** El plazo para la ejecución del contrato será de Un (01) mes calendario, que se empezarán a contar a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato de obra principal. **SEXTA. SUPERVISION Y VIGILANCIA DEL CONTRATO:** La coordinación, supervisión y vigilancia del presente **CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA** estará a cargo de quien designe el gerente, quien debe pertenecer a la empresa contratante, y supervisará la cabal ejecución del objeto contractual **SEPTIMA. PERSONAL Y EQUIPO DEL CONTRATISTA.** Puesto que el CONTRATISTA ejecutará el objeto del contrato con total autonomía técnica, administrativa, financiera y sin subordinación con respecto AL CONTRATANTE, queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre el

personal, empleados y subcontratistas utilizados por el CONTRATISTA y EL CONTRATANTE por lo tanto, estará a cargo del CONTRATISTA el reclutamiento, calificación, entrenamiento y dotación del personal que utilice, lo mismo que el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, aportes a los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales, así como el cumplimiento de normas sobre seguridad e higiene industrial. **OCTAVA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO**. Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o cuando las partes de común acuerdo lo consideren pertinente, se podrá suspender temporalmente la ejecución del presente contrato, mediante la suscripción de un ACTA por parte del CONTRATANTE y del CONTRATISTA, en la que conste tal evento. Cuando estas circunstancias afecten las obligaciones del CONTRATISTA, éste deberá comunicarlas por escrito al CONTRATANTE inmediatamente tengan ocurrencia, procediendo EL CONTRATANTE a su estudio, para determinar su aceptación. De todo lo anterior, EL CONTRATISTA dará aviso a la respectiva compañía de seguros. **DECIMA TERCERA. SEGURIDAD SOCIAL:** El CONTRATISTA se compromete a dar cumplimiento a la Ley 100 de 1993 y sus Decretos reglamentarios en cuanto a afiliación, permanencia y pago de aportes al sistema integral de seguridad social suya y de los trabajadores a su cargo. Para lo cual cada una de las facturas será presentada con el anexo del pago de los aportes correspondientes. **DECIMA CUARTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Y CLÁUSULA COMPROMISORIA:** ELCONTRATANTE y el CONTRATISTA, buscarán solucionar en forma ágil y directa las discrepancias que surjan con ocasión a este contrato. Para tal efecto, se acudirá al empleo de los mecanismos de solución de controversias tales como la conciliación, amigable composición y transacción. **DECIMA QUINTA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato podrá darse por terminado, en cualquiera de los siguientes casos: a) Por solicitud del CONTRATANTE, b) Por mutuo acuerdo de las partes, c) Por incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o del CONTRATANTE, d) Por vencimiento de su plazo, e) Por renuencia de parte del CONTRATANTE para el pago de las facturas presentadas por el CONTRATISTA. **DECIMA SEXTA. INDEMNIDAD:** Las partes se obligan una para con la otra a mantenerla libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes durante la ejecución del contrato, directa o indirectamente. **DECIMA SEPTIMA. PERFECCIONAMIENTO:** El presente contrato se perfecciona con la suscripción de las partes. **DECIMA OCTAVA. DOMICILIO:** Para todos los efectos del presente contrato el domicilio es el Municipio de Apartadó, Antioquia. **DECIMA NOVENA. GASTOS:** Todos los gastos de legalización de este contrato serán asumidos por el contratista en un 100%. **CLÁUSULA VIGÉSIMA. LUGAR DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** El contrato suscrito se ejecutará en los municipios de Apartadó en el departamento de Antioquia. **CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA. COMUNICACIONES:** Las comunicaciones que con ocasión de la ejecución o liquidación del presente contrato deban hacerse entre las partes, podrán ser entregadas personalmente o enviarse por correo, fax o vía e-mail, a las direcciones o números señalados a continuación:

EL CONTRATANTE
WILMAR LOZANO MOSQUERA
R/L:
Dirección: cll 95 N° 101 06 ofc 304 Nvo Apartadó
Apartadó -Antioquia.
Teléfono: 3104327098
e-mail: ingewilmar84@hotmail.com

EL CONTRATISTA
ARLEISON MORENO AGUILAR
R/L: Conspringe SAS
Dirección: Cll 89 A N° 82-23, Bloque 8 Apartamento N° 403, cuarto piso.
Apartado/Colombia
Teléfono: 3146037624
e-mail: ingarleison@gmail.com

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato: 1) La oferta, 2) Los certificados de existencia y representación legal de ambas empresas, 3) Las fotocopias de las cédula de ciudadanía de los representantes legales, 4) Los planos y diseños del proyecto de construcción, 5) La garantía única de cumplimiento con los amparos acordados y la aprobación de la póliza por parte del contratante, 6) Las modificaciones, adiciones y adendas que se generen en desarrollo del contrato, 7) Las actas de inicio, de entrega parcial y de entrega final que se generen, 8) El contrato y todos y cada uno de los documentos que se generen en razón del cumplimiento del mismo. 9) Certificación de cuenta bancaria.

El presente Contrato y sus Anexos se firman en Apartado, a los 22 **días** del mes de diciembre de 2022.

EL CONTRATANTE
Wilmar Lozano Mosquera
C.C. N° 1.077.427. 408

EL CONTRATISTA,
ARLEISON MORENO AGUILAR
C.C 1.077.425.453
R/L: Conspringe SAS

RELACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA CASETAS COMUNALES			
N.º	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CEDULA**	**CARGO**
1	EVER JULIAN USUGA MANCO	1040358417	AYUDANTE
2	DAIRON MANUEL SOTELO NISPERUZA	71254629	AYUDANTE
3	JORGE LUIS GAVIRIA	1067879721	OFICIAL
4	DANIEL EDUARDO MALDONADO	1028013046	OFICIAL
5	JOHN MARIO ACEVEDO PIEDRAHITA	1020106309	AYUDANTE
6	JHONY GARCIA MORALES	71949187	OFICIAL
7	EVER LUIS MONTALVO VARGAS	1028035344	OFICIAL
8	JULIAN IBARGUEN	1027951941	AYUDANTE
9	ALFREDO JOSE CARMONA GUERRA	10771678	OFICIAL
10	WILLIAN CAICEDO	1123993358	AYUDANTE
11	VICTOR BETANCUR	1001028136	AYUDANTE
12	CRISTIAN PEREZ LOPEZ	1083454273	ELECTRICO
13	EDWIN ECHAVERRIA	71988792	MAESTRO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901152263-0	CONSPRINGE SAS		CLL95A 106-18	3146037624	conspringe@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	APARTADÓ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 20 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-01	2022-12	E	10/01/2023	64658539	$2.802.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	890102044-1	25.000	0		0		0	0	0	0	25.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	84.000	0		0		0	0	0	0	84.000	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	36.100	0		0		0	0	0	0	36.100	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	195.500	0		0		0	0	0	0	195.500	11
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	14.700	0		0		0	0	0	0	14.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	200.600	0	0	0	0	0	0		200.600	4
230301	Porvenir	800224808-8	982.900	0	0	0	0	0	0		982.900	14
25-14	Colpensiones	900336004-7	290.100	0	0	0	0	0	0		290.100	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	618.400				618.400	0	0	618.400			6.184	618.400	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	355.300	0	0	355.300	20

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901152263-0	CONSPRINGE SAS		CLL95A 106-18	3146037624	conspringe@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	APARTADÓ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	10/01/2023	64658539	$2.802.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	355.300	355.300
Pensión	3	1.473.600	1.473.600
Riesgos Laborales	1	618.400	618.400
CCF	1	355.300	355.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	2.802.600	2.802.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901152263-0	CONSPRINGE SAS		CLL95A 106-18	3146037624	conspringe@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	APARTADÓ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	10/01/2023	64658539	$2.802.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001031249	RODRIGUEZ POLO YEISON	1	0			S	X																230201	266.667	42.700	0	0	0	0	EPS037	266.667	10.700	14-23	266.667	5	18.600	CCF03	266.667	10.700	0	0	0	0	0
2	CC	1001035285	HURTADO COGOLLO ANGEL MIGUEL	1	0			S	X	X															230301	166.667	26.700	0	0	0	0	EPS037	166.667	6.700	14-23	166.667	5	11.700	CCF03	166.667	6.700	0	0	0	0	0
3	CC	1001154243	BRANGO TORDECILLA LUIS CARLOS	1	0			S	X	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	1.400	14-23	33.334	5	2.400	CCF03	33.334	1.400	0	0	0	0	0
4	CC	1002088837	COGOLLO RIVAS JOHR JANIS	1	0			S	X																230301	333.334	53.400	0	0	0	0	EPS037	333.334	13.400	14-23	333.334	5	23.300	CCF03	333.334	13.400	0	0	0	0	0
5	CC	1002088837	COGOLLO RIVAS JOHR JANIS	1	0			S									X								230301	66.667	6.100	0	0	0	0	EPS037	66.667	0	14-23	66.667	5	0	CCF03	66.667	0	0	0	0	0	0
6	CC	1020106309	ACEVEDO PIEDRAHITA JOHN MARIO	1	0			S	X																230301	300.000	48.000	0	0	0	0	EPS002	300.000	12.000	14-23	300.000	5	20.900	CCF03	300.000	12.000	0	0	0	0	0
7	CC	1020106309	ACEVEDO PIEDRAHITA JOHN MARIO	1	0			S									X								230301	33.334	4.100	0	0	0	0	EPS002	33.334	0	14-23	33.334	5	0	CCF03	33.334	0	0	0	0	0	0
8	CC	1027948799	RAMOS MENA YADIRA	1	0			S	X																230301	333.334	53.400	0	0	0	0	EPS037	333.334	13.400	14-23	333.334	5	23.300	CCF03	333.334	13.400	0	0	0	0	0
9	CC	1027998332	MORALES BETANCUR JUAN DAVID	1	0			S	X																230201	510.000	81.600	0	0	0	0	EPS037	510.000	20.400	14-23	510.000	5	35.500	CCF03	510.000	20.400	0	0	0	0	0
10	CC	1027998332	MORALES BETANCUR JUAN DAVID	1	0			S									X								230201	56.667	6.900	0	0	0	0	EPS037	56.667	0	14-23	56.667	5	0	CCF03	56.667	0	0	0	0	0	0
11	CC	1028013046	MALDONADO ARRIETA DANIEL EDUARDO	1	0			S	X																230301	680.000	108.800	0	0	0	0	EPS037	680.000	27.200	14-23	680.000	5	47.400	CCF03	680.000	27.200	0	0	0	0	0
12	CC	1028025563	TORRES TORRES WILLIAM	1	0			S	X	X															230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS010	33.334	1.400	14-23	33.334	5	2.400	CCF03	33.334	1.400	0	0	0	0	0
13	CC	1028036711	MINA VELASQUEZ YEISON DAYAN	1	0			S	X																230301	300.000	48.000	0	0	0	0	EPS010	300.000	12.000	14-23	300.000	5	20.900	CCF03	300.000	12.000	0	0	0	0	0
14	CC	1040358417	USUGA MANCO EVER JULIAN	1	0			S	X																230301	400.000	64.000	0	0	0	0	EPS002	400.000	16.000	14-23	400.000	5	27.900	CCF03	400.000	16.000	0	0	0	0	0
15	CC	1067879721	GAVIRIA PAJARO JORGE LUIS	1	0			S	X																230301	566.667	90.700	0	0	0	0	EPS010	566.667	22.700	14-23	566.667	5	39.500	CCF03	566.667	22.700	0	0	0	0	0
16	CC	1067879721	GAVIRIA PAJARO JORGE LUIS	1	0			S									X								230301	113.334	13.700	0	0	0	0	EPS010	113.334	0	14-23	113.334	5	0	CCF03	113.334	0	0	0	0	0	0
17	CC	10771678	CARMONA GUERRA ALFREDO JOSE	1	0			S	X																230301	623.334	99.800	0	0	0	0	CCFC55	623.334	25.000	14-23	623.334	5	43.400	CCF03	623.334	25.000	0	0	0	0	0
18	CC	10771678	CARMONA GUERRA ALFREDO JOSE	1	0			S									X								230301	56.667	6.900	0	0	0	0	CCFC55	56.667	0	14-23	56.667	5	0	CCF03	56.667	0	0	0	0	0	0
19	CC	1077425453	MORENO AGUILAR ARLEISON	1	0			S	X																230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS037	1.200.000	48.000	14-23	1.200.000	5	83.600	CCF03	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
20	CC	1123993358	CAICEDO ARROYO WILLIAM GREGORIO	1	0			S	X																230301	366.667	58.700	0	0	0	0	EPS040	366.667	14.700	14-23	366.667	5	25.600	CCF03	366.667	14.700	0	0	0	0	0
21	CC	1123993358	CAICEDO ARROYO WILLIAM GREGORIO	1	0			S									X								230301	33.334	4.100	0	0	0	0	EPS040	33.334	0	14-23	33.334	5	0	CCF03	33.334	0	0	0	0	0	0
22	CC	11931533822	SANCHEZ MESTRA LUIS JOSE	1	0			S	X																230301	266.667	42.700	0	0	0	0	EPS037	266.667	10.700	14-23	266.667	5	18.600	CCF03	266.667	10.700	0	0	0	0	0
23	CC	12020050	MENA QUEJADA CARLOS ALBERTO	1	0			S	X																25-14	750.000	120.000	0	0	0	0	EPS037	750.000	30.000	14-23	750.000	5	52.200	CCF03	750.000	30.000	0	0	0	0	0
24	CC	12020050	MENA QUEJADA CARLOS ALBERTO	1	0			S									X								25-14	83.334	10.100	0	0	0	0	EPS037	83.334	0	14-23	83.334	5	0	CCF03	83.334	0	0	0	0	0	0
25	CC	71254629	SOTELO NISPERUZA DAIRON MANUEL	1	0			S	X																230201	400.000	64.000	0	0	0	0	EPS002	400.000	16.000	14-23	400.000	5	27.900	CCF03	400.000	16.000	0	0	0	0	0
26	CC	71988792	ECHAVARRIA CABRERA EDWIN ALBERTO	1	0			S	X																25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF03	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
27	CC	8321808	PADILLA TORRES HECTOR	1	0			S	X	X															230301	340.000	54.400	0	0	0	0	EPS037	340.000	13.600	14-23	340.000	5	23.700	CCF03	340.000	13.600	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901152263-0	CONSPRINGE SAS	CLL95A 106-18	3146037624	conspringe@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c		ANTIOQUIA	APARTADÓ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				30	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	07/02/2023	65320060	$10.926.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	890102044-1	69.200	0		0		0	0	0	0	69.200	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	271.900	0		0		0	0	0	0	271.900	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	277.800	0		0		0	0	0	0	277.800	9
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	639.900	0		0		0	0	0	0	639.900	12
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	90.400	0		0		0	0	0	0	90.400	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	869.000	0	0	0	0	0	0		869.000	5
230301	Porvenir	800224808-8	3.898.800	0	0	0	0	0	0		3.898.800	20
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.113.100	0	0	0	0	0	0		1.113.100	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	2.346.700				2.346.700	0	0	2.346.700			23.467	2.346.700	30

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	1.349.200	0	0	1.349.200	30

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901152263-0	CONSPRINGE SAS		CLL95A 106-18	3146037624	conspringe@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	APARTADÓ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					30	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	07/02/2023	65320060	$10.926.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.349.200	1.349.200
Pensión	3	5.880.900	5.880.900
Riesgos Laborales	1	2.346.700	2.346.700
CCF	1	1.349.200	1.349.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	10.926.000	10.926.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901152263-0	CONSPRINGE SAS		CLL95A 106-18	3146037624	conspringe@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	APARTADÓ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					30	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	07/02/2023	65320060	$10.926.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001028136	BETANCUR PALACIOS VICTOR MANUEL	1	0			S	X	X															230301	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS040	580.000	23.200	14-23	580.000	5	40.400	CCF03	580.000	23.200	0	0	0	0	0	0
2	CC	1001028136	BETANCUR PALACIOS VICTOR MANUEL	1	0			S									X								230301	77.334	9.300	0	0	0	0	EPS040	77.334	0	14-23	77.334	5	0	CCF03	77.334	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1001031249	RODRIGUEZ POLO YEISON	1	0			S		X															230201	812.000	130.000	0	0	0	0	EPS037	812.000	32.500	14-23	812.000	5	56.600	CCF03	812.000	32.500	0	0	0	0	0	0
4	CC	1001031249	RODRIGUEZ POLO YEISON	1	0			S								X									230201	154.667	18.600	0	0	0	0	EPS037	154.667	0	14-23	154.667	5	0	CCF03	154.667	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	1001031249	RODRIGUEZ POLO YEISON	1	0			S								X									230201	77.334	9.300	0	0	0	0	EPS037	77.334	0	14-23	77.334	5	0	CCF03	77.334	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	1001031643	CUESTA MENA KEVIN ANDRES	1	0			S	X	X															230301	309.334	49.500	0	0	0	0	EPS010	309.334	12.400	14-23	309.334	5	21.600	CCF03	309.334	12.400	0	0	0	0	0	0
7	CC	1001031643	CUESTA MENA KEVIN ANDRES	1	0			S									X								230301	116.000	14.000	0	0	0	0	EPS010	116.000	0	14-23	116.000	5	0	CCF03	116.000	0	0	0	0	0	0	0
8	CC	1001153066	ZAPATA PARAMO JAIDER ESTIVEN	1	0			S	X	X						X									230301	1.034.334	165.500	0	0	0	0	EPS010	1.034.334	41.400	14-23	1.034.334	5	72.000	CCF03	1.034.334	41.400	0	0	0	0	0	0
9	CC	1001153066	ZAPATA PARAMO JAIDER ESTIVEN	1	0			S								X									230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS010	38.667	0	14-23	38.667	5	0	CCF03	38.667	0	0	0	0	0	0	0
10	CC	1002088837	COGOLLO RIVAS JOHR JANIS	1	0			S		X						X									230301	1.111.667	177.900	0	0	0	0	EPS037	1.111.667	44.500	14-23	1.111.667	5	77.400	CCF03	1.111.667	44.500	0	0	0	0	0	0
11	CC	1002088837	COGOLLO RIVAS JOHR JANIS	1	0			S									X								230301	116.000	14.000	0	0	0	0	EPS037	116.000	0	14-23	116.000	5	0	CCF03	116.000	0	0	0	0	0	0	0
12	CC	1020106309	ACEVEDO PIEDRAHITA JOHN MARIO	1	0			S		X															230301	1.005.334	160.900	0	0	0	0	EPS002	1.005.334	40.300	14-23	1.005.334	5	70.000	CCF03	1.005.334	40.300	0	0	0	0	0	0
13	CC	1020106309	ACEVEDO PIEDRAHITA JOHN MARIO	1	0			S									X								230301	154.667	18.600	0	0	0	0	EPS002	154.667	0	14-23	154.667	5	0	CCF03	154.667	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	19774694	URREGO FERREIRA RAFAEL TOBIAS	1	0			S	X	X															230201	889.334	142.300	0	0	0	0	EPS037	889.334	35.600	14-23	889.334	5	61.900	CCF03	889.334	35.600	0	0	0	0	0	0
15	CC	19774694	URREGO FERREIRA RAFAEL TOBIAS	1	0			S									X								230201	77.334	9.300	0	0	0	0	EPS037	77.334	0	14-23	77.334	5	0	CCF03	77.334	0	0	0	0	0	0	0
16	CC	19774694	URREGO FERREIRA RAFAEL TOBIAS	1	0			S									X								230201	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS037	38.667	0	14-23	38.667	5	0	CCF03	38.667	0	0	0	0	0	0	0
17	CC	71254629	SOTELO NISPERUZA DAIRON MANUEL	1	0			S		X						X									230201	1.111.667	177.900	0	0	0	0	EPS002	1.111.667	44.500	14-23	1.111.667	5	77.400	CCF03	1.111.667	44.500	0	0	0	0	0	0
18	CC	71254629	SOTELO NISPERUZA DAIRON MANUEL	1	0			S									X								230201	116.000	14.000	0	0	0	0	EPS002	116.000	0	14-23	116.000	5	0	CCF03	116.000	0	0	0	0	0	0	0
19	CC	71940771	CABALLOS CARTAGENA TRINO DE JESUS	1	0			S	X	X						X									230301	1.515.834	242.600	0	0	0	0	EPS037	1.515.834	60.700	14-23	1.515.834	5	105.600	CCF03	1.515.834	60.700	0	0	0	0	0	0
20	CC	71940771	CABALLOS CARTAGENA TRINO DE JESUS	1	0			S									X								230301	56.667	6.900	0	0	0	0	EPS037	56.667	0	14-23	56.667	5	0	CCF03	56.667	0	0	0	0	0	0	0
21	CC	71949187	GARCIA MORALES JHONNY	1	0			S	X	X															25-14	566.667	90.700	0	0	0	0	EPS040	566.667	22.700	14-23	566.667	5	39.500	CCF03	566.667	22.700	0	0	0	0	0	0
22	CC	71949187	GARCIA MORALES JHONNY	1	0			S									X								25-14	170.000	20.400	0	0	0	0	EPS040	170.000	0	14-23	170.000	5	0	CCF03	170.000	0	0	0	0	0	0	0
23	CC	71988295	REINA BLANDON CARLOS ALBERTO	1	0			S	X	X						X									25-14	609.167	97.500	0	0	0	0	EPS010	609.167	24.400	14-23	609.167	5	42.400	CCF03	609.167	24.400	0	0	0	0	0	0
24	CC	71988295	REINA BLANDON CARLOS ALBERTO	1	0			S									X								25-14	56.667	6.900	0	0	0	0	EPS010	56.667	0	14-23	56.667	5	0	CCF03	56.667	0	0	0	0	0	0	0
25	CC	71988792	ECHAVARRIA CABRERA EDWIN ALBERTO	1	0			S		X															25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS002	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	5	174.000	CCF03	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0	0
26	CC	1077425453	MORENO AGUILAR ARLEISON	1	0			S		X															230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	5	208.800	CCF03	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0	0
27	CC	1083454273	PEREZ LOPEZ CRISTIAN	1	0			S	X	X															230301	1.303.334	208.600	0	0	0	0	EPS037	1.303.334	52.200	14-23	1.303.334	5	90.800	CCF03	1.303.334	52.200	0	0	0	0	0	0
28	CC	1083454273	PEREZ LOPEZ CRISTIAN	1	0			S									X								230301	170.000	20.400	0	0	0	0	EPS037	170.000	0	14-23	170.000	5	0	CCF03	170.000	0	0	0	0	0	0	0
29	CC	1083454273	PEREZ LOPEZ CRISTIAN	1	0			S									X								230301	113.334	13.700	0	0	0	0	EPS037	113.334	0	14-23	113.334	5	0	CCF03	113.334	0	0	0	0	0	0	0
30	CC	1123993358	CAICEDO ARROYO WILLIAM GREGORIO	1	0			S		X															230301	1.111.667	177.900	0	0	0	0	EPS040	1.111.667	44.500	14-23	1.111.667	5	77.400	CCF03	1.111.667	44.500	0	0	0	0	0	0
31	CC	1123993358	CAICEDO ARROYO WILLIAM GREGORIO	1	0			S									X								230301	116.000	14.000	0	0	0	0	EPS040	116.000	0	14-23	116.000	5	0	CCF03	116.000	0	0	0	0	0	0	0
32	CC	11931533822	SANCHEZ MESTRA LUIS JOSE	1	0			S		X															230301	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS037	580.000	23.200	14-23	580.000	5	40.400	CCF03	580.000	23.200	0	0	0	0	0	0
33	CC	11931533822	SANCHEZ MESTRA LUIS JOSE	1	0			S									X								230301	309.334	37.200	0	0	0	0	EPS037	309.334	0	14-23	309.334	5	0	CCF03	309.334	0	0	0	0	0	0	0
34	CC	12020050	MENA QUEJADA CARLOS ALBERTO	1	0			S		X															25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	5	174.000	CCF03	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0	0
35	CC	15047653	MERCADO REGINO GERMAN ALBERTO	1	0			S	X	X															25-14	566.667	90.700	0	0	0	0	EPS037	566.667	22.700	14-23	566.667	5	39.500	CCF03	566.667	22.700	0	0	0	0	0	0
36	CC	15047653	MERCADO REGINO GERMAN ALBERTO	1	0			S									X								25-14	56.667	6.900	0	0	0	0	EPS037	56.667	0	14-23	56.667	5	0	CCF03	56.667	0	0	0	0	0	0	0
37	CC	1028035344	MONTALVO VARGAS EVER LUIS	1	0			S	X	X															230301	963.334	154.200	0	0	0	0	EPS010	963.334	38.600	14-23	963.334	5	67.100	CCF03	963.334	38.600	0	0	0	0	0	0
38	CC	1028035344	MONTALVO VARGAS EVER LUIS	1	0			S									X								230301	566.667	68.100	0	0	0	0	EPS010	566.667	0	14-23	566.667	5	0	CCF03	566.667	0	0	0	0	0	0	0
39	CC	1028035344	MONTALVO VARGAS EVER LUIS	1	0			S									X								230301	56.667	6.900	0	0	0	0	EPS010	56.667	0	14-23	56.667	5	0	CCF03	56.667	0	0	0	0	0	0	0
40	CC	1028036711	MINA VELASQUEZ YEISON DAYAN	1	0			S		X															230301	889.334	142.300	0	0	0	0	EPS010	889.334	35.600	14-23	889.334	5	61.900	CCF03	889.334	35.600	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901152263-0	CONSPRINGE SAS		CLL95A 106-18	3146037624	conspringe@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
UNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	APARTADÓ	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 30 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-02	2023-01	E	07/02/2023	65320060	$10.926.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	1028036711	MINA VELASQUEZ YEISON DAYAN	1	0			S									X								230301	116.000	14.000	0	0	0	0	EPS010	116.000	0	14-23	116.000	5	0	CCF03	116.000	0	0	0	0	0	0
42	CC	1028036711	MINA VELASQUEZ YEISON DAYAN	1	0			S									X								230301	154.667	18.600	0	0	0	0	EPS010	154.667	0	14-23	154.667	5	0	CCF03	154.667	0	0	0	0	0	0
43	CC	1028042158	BERROCAL DE HOYOS ADEL ARSENIO	1	0			S	X	X						X									230301	493.001	78.900	0	0	0	0	EPS010	493.001	19.800	14-23	493.001	5	34.400	CCF03	493.001	19.800	0	0	0	0	0
44	CC	1040358417	USUGA MANCO EVER JULIAN	1	0			S		X						X									230301	1.073.001	171.700	0	0	0	0	EPS002	1.073.001	43.000	14-23	1.073.001	5	74.700	CCF03	1.073.001	43.000	0	0	0	0	0
45	CC	1040358417	USUGA MANCO EVER JULIAN	1	0			S									X								230301	154.667	18.600	0	0	0	0	EPS002	154.667	0	14-23	154.667	5	0	CCF03	154.667	0	0	0	0	0	0
46	CC	1067879721	GAVIRIA PAJARO JORGE LUIS	1	0			S		X						X									230301	1.572.501	251.700	0	0	0	0	EPS010	1.572.501	63.000	14-23	1.572.501	5	109.500	CCF03	1.572.501	63.000	0	0	0	0	0
47	CC	1067879721	GAVIRIA PAJARO JORGE LUIS	1	0			S									X								230301	170.000	20.400	0	0	0	0	EPS010	170.000	0	14-23	170.000	5	0	CCF03	170.000	0	0	0	0	0	0
48	CC	1067879721	GAVIRIA PAJARO JORGE LUIS	1	0			S									X								230301	56.667	6.900	0	0	0	0	EPS010	56.667	0	14-23	56.667	5	0	CCF03	56.667	0	0	0	0	0	0
49	CC	10771678	CARMONA GUERRA ALFREDO JOSE	1	0			S		X						X									230301	1.728.333	276.600	0	0	0	0	CCFC55	1.728.333	69.200	14-23	1.728.333	5	120.300	CCF03	1.728.333	69.200	0	0	0	0	0
50	CC	10771678	CARMONA GUERRA ALFREDO JOSE	1	0			S									X								230301	170.000	20.400	0	0	0	0	CCFC55	170.000	0	14-23	170.000	5	0	CCF03	170.000	0	0	0	0	0	0
51	CC	1027948799	RAMOS MENA YADIRA	1	0			S		X															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF03	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
52	CC	1027951941	IBARGUEN YANEZ JULIAN ANDRES	1	0			S	X	X						X									230301	1.102.000	176.400	0	0	0	0	EPS002	1.102.000	44.100	14-23	1.102.000	5	76.700	CCF03	1.102.000	44.100	0	0	0	0	0
53	CC	1027951941	IBARGUEN YANEZ JULIAN ANDRES	1	0			S									X								230301	116.000	14.000	0	0	0	0	EPS002	116.000	0	14-23	116.000	5	0	CCF03	116.000	0	0	0	0	0	0
54	CC	1027998332	MORALES BETANCUR JUAN DAVID	1	0			S		X															230201	1.076.667	172.300	0	0	0	0	EPS037	1.076.667	43.100	14-23	1.076.667	5	75.000	CCF03	1.076.667	43.100	0	0	0	0	0
55	CC	1027998332	MORALES BETANCUR JUAN DAVID	1	0			S									X								230201	170.000	20.400	0	0	0	0	EPS037	170.000	0	14-23	170.000	5	0	CCF03	170.000	0	0	0	0	0	0
56	CC	1028005999	ABADIA ASPRILLA JOHN JEILER	1	0			S	X	X															230201	1.005.334	160.900	0	0	0	0	EPS010	1.005.334	40.300	14-23	1.005.334	5	70.000	CCF03	1.005.334	40.300	0	0	0	0	0
57	CC	1028005999	ABADIA ASPRILLA JOHN JEILER	1	0			S									X								230201	77.334	9.300	0	0	0	0	EPS010	77.334	0	14-23	77.334	5	0	CCF03	77.334	0	0	0	0	0	0
58	CC	1028013046	MALDONADO ARRIETA DANIEL EDUARDO	1	0			S		X															230301	1.473.334	235.800	0	0	0	0	EPS037	1.473.334	59.000	14-23	1.473.334	5	102.600	CCF03	1.473.334	59.000	0	0	0	0	0
59	CC	1028013046	MALDONADO ARRIETA DANIEL EDUARDO	1	0			S									X								230301	226.667	27.300	0	0	0	0	EPS037	226.667	0	14-23	226.667	5	0	CCF03	226.667	0	0	0	0	0	0
60	CC	1028013065	MARTINEZ TORREGLOSA JHON AMAURY	1	0			S	X	X															230301	56.667	9.100	0	0	0	0	EPS010	56.667	2.300	14-23	56.667	5	4.000	CCF03	56.667	2.300	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	1077427408-6	WILMAR LOZANO MOSQUERA		CALLE 95 # 101-06	8150438	ingewilmar84@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	D – Ley 1429			ANTIOQUIA	APARTADÓ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	07/02/2023	65330008	$497.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	30.000	0		0		0	34	1.200	0	31.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	48.000	0		0		0	34	1.900	0	49.900	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	264.000	0	0	0	0	34	10.300	0	274.300	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	48.000	0	0	0	0	34	1.900	0	49.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	10.300				10.300	34	400	10.700			103	10.700	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	78.000	34	3.100	81.100	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	78.000	81.100
Pensión	2	312.000	324.200
Riesgos Laborales	1	10.300	10.700
CCF	1	78.000	81.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	478.300	497.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	1077427408-6	WILMAR LOZANO MOSQUERA		CALLE 95 # 101-06	8150438	ingewilmar84@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D – Ley 1429			ANTIOQUIA	APARTADÓ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	07/02/2023	65330008	$497.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1077428223	LEUDO QUEJADA MAYEISY SOLANNY	1	0			S	X																230301	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS037	900.000	36.000	14-11	900.000	1	4.700	CCF03	900.000	36.000	0	0	0	0	0
2	CC	12021871	OBREGON CORREA EDISON	1	0			S	X																230301	750.000	120.000	0	0	0	0	EPS010	750.000	30.000	14-11	750.000	1	4.000	CCF03	750.000	30.000	0	0	0	0	0
3	CC	39320462	SECA PAUTH GINA PAULA	1	0			S	X																25-14	300.000	48.000	0	0	0	0	EPS037	300.000	12.000	14-11	300.000	1	1.600	CCF03	300.000	12.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	1077427408-6	WILMAR LOZANO MOSQUERA	CALLE 95 # 101-06	8150438	ingewilmar84@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Ley 1429		ANTIOQUIA	APARTADÓ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	07/02/2023	65330218	$1.641.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	100.000	0		0		0	4	500	0	100.500	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	166.400	0		0		0	4	800	0	167.200	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	880.000	0	0	0	0	4	4.200	0	884.200	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	4	900	0	186.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	34.900				34.900	4	200	35.100			349	35.100	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	266.400	4	1.300	267.700	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	266.400	267.700
Pensión	2	1.065.600	1.070.700
Riesgos Laborales	1	34.900	35.100
CCF	1	266.400	267.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.633.300	1.641.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	1077427408-6	WILMAR LOZANO MOSQUERA		CALLE 95 # 101-06	8150438	ingewilmar84@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	D – Ley 1429			ANTIOQUIA	APARTADÓ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 3 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-02	2023-01	E	07/02/2023	65330218	$1.641.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1077428223	LEUDO QUEJADA MAYEISY SOLANNY	1	0			S	X																230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF03	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
2	CC	12021871	OBREGON CORREA EDISON	1	0			S	X																230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS010	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	1	13.100	CCF03	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
3	CC	39320462	SECA PAUTH GINA PAULA	1	0			S	X																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF03	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ARUS®
Tecnología + Información = Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-02-07, 10:56:44 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 61171822

Periodo Cotización: enero de 2023 **Periodo Servicio:** febrero de 2023

PAGADO 07/02/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	WILMAR LOZANO MOSQUERA		
Documento	NI1077427408	**Dirección**	CL 95 #101 - 06
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	82825552
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	APARTADO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	LOZANO MOSQUERA WILMAR	**Identificación**	CC 1077427408
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1036401659	LUIS MIGUEL ALZATE QUINTERO	01	00	X																0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	6.960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 43168387	SANDRA MARYORI ZAPATA RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.500
CC 15383894	ELKIN ALEXANDER SERNA PATIÑO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.291.709	$ 206.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.291.709	$ 51.700	6.960	$ 1.291.709	$ 90.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.291.709	$ 51.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.451.709	$ 3.451.709	$ 3.451.709	$ 3.451.709	$ 552.300	$ 138.100	$ 165.700	$ 138.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 994.200	$ 6.800	$ 1.001.000

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
Ingewilmar84@hotmail.com

PÓLIZAS ACTUALIZADAS

"CONSTRUYENDO PARA UN BUEN FUTURO"

Dirección: Calle 95 No. 101-06, Barrio Nuevo Apartado, Teléfonos 8150438Celular: 3104327098- 3182362625
E-mail: Ingewilmar84@hotmail.com

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
APARTADO, 13 DE FEBRERO DE 2023	3512557-9		14863493
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	01214863493

TOMADOR

CEDULA	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
1077427408	WILMAR LOZANO MOSQUERA		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CL 95 # 101 - 06 PISO 3 OFIC 304		APARTADO	

GARANTIZADO

CEDULA	Nombres y Apellidos
1077427408	WILMAR LOZANO MOSQUERA

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
9014451766	EDUH APARTADO

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	22-DIC-2022	02-FEB-2023	94.827.261,00	0,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22-DIC-2022	03-AGO-2023	23.706.815,00	0,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	02-FEB-2023	02-FEB-2028	47.413.631,00	0,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22-DIC-2022	02-FEB-2026	23.706.815,00	0,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
22-DIC-2022	02-FEB-2028	1868	22-DIC-2022	02-FEB-2028	$0	$0	$0

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CERO PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$0	$734.911	$189.654.522,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2536	979042	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
85976	LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	INDEPENDIENTES	100,00	0

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

NRO. DE CONTRATO 042-202.
OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
ASEGURADOS Y/O BENEFICIARIOS:
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ - NIT: 901.445.176-6
MUNICIPIO DE APARTADO - NIT: 890.980.095-2
ACTA DE INICIO.EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A DAR INICIO DEL CONTRATO EL DÍA22DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. SIN SUPERAR VIGENCIA. ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 01QUE EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 EL CONTRATISTA DE OBRA WILMAR LOZANO MOSQUERA, SOLATO LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO CE OBRA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
APARTADO, 13 DE FEBRERO DE 2023	3512557-9		14863493
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	01214863493

TOMADOR

CEDULA	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
1077427408	WILMAR LOZANO MOSQUERA		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CL 95 # 101 - 06 PISO 3 OFIC 304		APARTADO	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

042-2022 JUSTIFICANDO QUE POR LA TEMPORADA DECEMBRINA SE HA PRESENTADO DISMINUCIÓN EN EL RENDIMENTO DE LA OBRA DEBIDO A LAS AUSENCIAS REPETITIVAS POR PARTE DEL PERSONAL, ADEMÁS DE LAS DEMORAS EN LAS ENTREGAS DE SUMINISTROS DE MATERIALES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES, Y LA TEMPORADA INVERNAL QUE SE PRESENTA ACTUALMENTE.

.

ACTA DE REINICIO NO. 01REINICIAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 042 DEL 2022 A PARTIR DE LA FECHA DEL VEINTICINCO (25) DE ENERO DE 2023, POR LO TANTO,LA NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO SERÁ EL SIETE (07) DE FEBRERO DE 2023.

.

OTRO SI MODIFICATORIO N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N° 042-2022
QUE EL COMITÉ TÉCNICO DE LA EDUH APARTADÓ, CONSIDERA PERTINENTE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 042-2022, DADO QUE ADEMÁS DE LAS JUSTIFICACIONES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA, SE CUENTA ADEMÁS CON LA MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 498 DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE APARTADO Y LA EDUH APARTADÓ MEDIANTE EL CUAL SE AMPLIÓ LA VIGENCIA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO HASTA EL 02 DE FEBRERO DE 2023.

.

ACTA DE TERMINACION
QUE EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 SE SUSCRIBE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DEOBRA N.° 042 DEL 2022 DEBIDO A QUE SE EJECUTARON TODAS LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO Y DEBIDO A QUE TAMBIÉN SE DA POR TERMINADO EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 498 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE APARTADO Y LA EICEEDUH-APARTADÓ.
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EL 02 DE FEBRERO DE 2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
APARTADO, 13 DE FEBRERO DE 2023	0886102-5	01313797872

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	13797872

TOMADOR WILMAR LOZANO MOSQUERA	CEDULA 1077427408
ASEGURADO WILMAR LOZANO MOSQUERA	CEDULA 1077427408
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS	

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CL 95 # 101 - 06 PISO 3 OFIC 304	APARTADO	

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
CL 95 # 101 6 3 304	APARTADO	ANTIOQUIA	SECTOR SERVICIOS

ACTIVIDAD	CÓDIGO ACTIVIDAD
EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN	9 - 15
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	RIESGO No 1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	200.000.000,00	0,00	0	0	0	0

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
22-DIC-2022	02-FEB-2023	42	$0	$0	$0

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CERO PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
22-DIC-2022	02-FEB-2023	1	$200.000.000,00	$0,00	$200.000.000,00

DOCUMENTO DE:
SUSTITUCION DE RIESGOS CON AUMENTO DE PRIMA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 01-13-040 , LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIÓN A ESTOS DEBERES.

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA
013	AG5	2536	979042	07	PESO COLOMBIANO

COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PARTICIPACIÓN DE ASESORES

CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
85976	LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	INDEPENDIENTES	100,00	0

FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZA	TIPO Y NUMERO DE LA ENTIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	RAMO AL CUAL PERTENECE	IDENTIFICACION INTERNA DE LA PROFORMA
01 - 06 - 2009	13 - 18	P	6	F-01-13-040

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
0
APARTADO

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMÚN

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
APARTADO, 13 DE FEBRERO DE 2023	0886102-5	01313797872

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	13797872

TOMADOR	CEDULA
WILMAR LOZANO MOSQUERA	1077427408
ASEGURADO	CEDULA
WILMAR LOZANO MOSQUERA	1077427408
BENEFICIARIO	
TERCEROS AFECTADOS	

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CL 95 # 101 - 06 PISO 3 OFIC 304	APARTADO	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

012003512557. NO. DE CONTRATO 042-202.
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 200,000,000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
NRO. DE CONTRATO 042-202.
OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
ASEGURADOS Y/O BENEFICIARIOS:
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ - NIT: 901.445.176-6
MUNICIPIO DE APARTADO - NIT: 890.980.095-2
ACTA DE INICIO.EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A DAR INICIO DEL CONTRATO EL DÍA 22DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. SIN SUPERAR VIGENCIA.
.
ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 01QUE EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 EL CONTRATISTA DE OBRA WILMAR LOZANO MOSQUERA, SOLATO LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO CE OBRA 042-2022 JUSTIFICANDO QUE POR LA TEMPORADA DECEMBRINA SE HA PRESENTADO DISMINUCIÓN EN EL RENDIMIENTO DE LA OBRA DEBIDO A LAS AUSENCIAS REPETITIVAS POR PARTE DEL PERSONAL, ADEMÁS DE LAS DEMORAS EN LAS ENTREGAS DE SUMINISTROS DE MATERIALES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES, Y LA TEMPORADA INVERNAL QUE SE PRESENTA ACTUALMENTE.
.
ACTA DE REINICIO NO. 01REINICIAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 042 DEL 2022 A PARTIR DE LA FECHA DEL VEINTICINCO (25) DE ENERO DE 2023, POR LO TANTO,LA NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO SERÁ EL SIETE (07) DE FEBRERO DE 2023.
.
OTRO SI MODIFICATORIO N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N° 042-2022
QUE EL COMITÉ TÉCNICO DE LA EDUH APARTADÓ, CONSIDERA PERTINENTE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 042-2022, DADO QUE ADEMÁS DE LAS JUSTIFICACIONES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA, SE CUENTA ADEMÁS CON LA MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 498 DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE APARTADO Y LA EDUH APARTADÓ MEDIANTE EL CUAL SE AMPLIÓ LA VIGENCIA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO HASTA EL 02 DE FEBRERO DE 2023.
.
ACTA DE TERMINACION
QUE EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 SE SUSCRIBE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DEOBRA N.° 042 DEL 2022 DEBIDO A QUE SE EJECUTARON TODAS LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO Y DEBIDO A QUE TAMBIÉN SE DA POR TERMINADO EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 498 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE APARTADO Y LA EICEEDUH-APARTADÓ.
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EL 02 DE FEBRERO DE 2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
0
APARTADO

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
APARTADO, 07 DE FEBRERO DE 2023	3512557-9		14843491
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	01214843491

TOMADOR

CEDULA	Razón Social y/o Nombres y Apellidos
1077427408	WILMAR LOZANO MOSQUERA

Dirección	Ciudad	Teléfono
CL 95 # 101 - 06 PISO 3 OFIC 304	APARTADO	

GARANTIZADO

CEDULA	Nombres y Apellidos
1077427408	WILMAR LOZANO MOSQUERA

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
9014451766	EDUH APARTADO

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	25-ENE-2023	14-FEB-2023	94.827.261,00	0,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25-ENE-2023	15-AGO-2023	23.706.815,00	0,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	14-FEB-2023	14-FEB-2028	47.413.631,00	0,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25-ENE-2023	14-FEB-2026	23.706.815,00	0,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
25-ENE-2023	14-FEB-2028	1834	25-ENE-2023	02-FEB-2028	$0	$0	$0

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CERO PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$0	$734.911	$189.654.522,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2536	979042	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
85976	LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	INDEPENDIENTES	100,00	0

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
APARTADO, 07 DE FEBRERO DE 2023	3512557-9		14843491
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	01214843491

TOMADOR

CEDULA	Razón Social y/o Nombres y Apellidos
1077427408	WILMAR LOZANO MOSQUERA

Dirección	Ciudad	Teléfono
CL 95 # 101 - 06 PISO 3 OFIC 304	APARTADO	

GARANTIZADO

CEDULA	Nombres y Apellidos
1077427408	WILMAR LOZANO MOSQUERA

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
9014451766	EDUH APARTADO

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	25-ENE-2023	14-FEB-2023	94.827.261,00	0,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25-ENE-2023	15-AGO-2023	23.706.815,00	0,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	14-FEB-2023	14-FEB-2028	47.413.631,00	0,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25-ENE-2023	14-FEB-2026	23.706.815,00	0,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
25-ENE-2023	14-FEB-2028	1834	25-ENE-2023	02-FEB-2028	$0	$0	$0

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CERO PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$0	$734.911	$189.654.522,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2536	979042	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
85976	LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	INDEPENDIENTES	100,00	0

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

NRO. DE CONTRATO 042-202.
OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
ASEGURADOS Y/O BENEFICIARIOS:
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ - NIT: 901.445.176-6
MUNICIPIO DE APARTADO - NIT: 890.980.095-2
ACTA DE INICIO.EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A DAR INICIO DEL CONTRATO EL DÍA 22DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. SIN SUPERAR VIGENCIA.
ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 01QUE EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 EL CONTRATISTA DE OBRA WILMAR LOZANO MOSQUERA, SOLATO LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO CE OBRA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
APARTADO, 07 DE FEBRERO DE 2023	3512557-9		14843491
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	01214843491

TOMADOR

CEDULA	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
1077427408	WILMAR LOZANO MOSQUERA		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CL 95 # 101 - 06 PISO 3 OFIC 304		APARTADO	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

042-2022 JUSTIFICANDO QUE POR LA TEMPORADA DECEMBRINA SE HA PRESENTADO DISMINUCIÓN EN EL RENDIMENTO DE LA OBRA DEBIDO A LAS AUSENCIAS REPETITIVAS POR PARTE DEL PERSONAL, ADEMÁS DE LAS DEMORAS EN LAS ENTREGAS DE SUMINISTROS DE MATERIALES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES, Y LA TEMPORADA INVERNAL QUE SE PRESENTA ACTUALMENTE.

.

ACTA DE REINICIO NO. 01REINICIAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 042 DEL 2022 A PARTIR DE LA FECHA DEL VEINTICINCO (25) DE ENERO DE 2023, POR LO TANTO,LA NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO SERÁ EL SIETE (07) DE FEBRERO DE 2023.

.

OTRO SI MODIFICATORIO N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N° 042-2022
QUE EL COMITÉ TÉCNICO DE LA EDUH APARTADÓ, CONSIDERA PERTINENTE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 042-2022, DADO QUE ADEMÁS DE LAS JUSTIFICACIONES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA, SE CUENTA ADEMÁS CON LA MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 498 DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE APARTADO Y LA EDUH APARTADÓ MEDIANTE EL CUAL SE AMPLIÓ LA VIGENCIA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO HASTA EL 02 DE FEBRERO DE 2023.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

suramericana

Nit. 890.903.407-9

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES ESTATALES en la póliza 3512557-9 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: **WILMAR LOZANO MOSQUERA** y Asegurado y/o Beneficiario es **EDUH APARTADO** y su documento 14843491 expedida el día 07 de Febrero de 2023 se encuentra debidamente cancelados sus valores, discriminados así:

Prima	$	($17,926)
Impuestos	$	$0
Total	$	($17,926)

Para constancia se firma en APARTADO a los 07 días del mes de Febrero de 2023.

Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

suramericana

Nit. 890.903.407-9

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES ESTATALES en la póliza 3512557-9 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: **WILMAR LOZANO MOSQUERA** y Asegurado y/o Beneficiario es: **EDUH APARTADO** y su documento 14843491 expedida el día 07 de Febrero de 2023 no expirará por falta de pago de la prima o de los certificados anexos que se expidan con fundamento en ella o por la revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía

Para constancia se firma en APARTADO a los 07 días del mes de Febrero de 2023.

Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

suramericana

Apartado, 07 de febrero de 2023

Señor
Wilmar Lozano Mosquera
Cl 95 # 101 - 06 Piso 3 Ofic 304
Apartado - Antioquia
2536 85976

Asunto: Entrega documentos Responsabilidad Civil
Ramo 013 Póliza 0886102

Cordial saludo:

Para Suramericana es muy importante que usted se encuentre en todo momento enterado de los movimientos que se realizan en sus pólizas y que reciba información sobre todos los productos que tiene contratados con nosotros.

En esta ocasión hacemos entrega de los documentos en los que se relacionan las operaciones realizadas en su póliza de seguro.

Si tiene alguna inquietud o desea recibir más información sobre los productos y servicios de Suramericana, no dude en comunicarse con su asesor , o si lo desea llame a nuestra línea de atención al cliente, SuLínea, en Bogotá, Cali y Medellín en el 437 8888 o sin ningún costo para el resto del país al 01 800 051 8888, o marcando desde su celular #888.

Atentamente,

Seguros SURA.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
APARTADO, 02 DE FEBRERO DE 2023	0886102-5	01313795291

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	13795291

TOMADOR	CEDULA
WILMAR LOZANO MOSQUERA	1077427408

ASEGURADO	CEDULA
WILMAR LOZANO MOSQUERA	1077427408

BENEFICIARIO
TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CL 95 # 101 - 06 PISO 3 OFIC 304	APARTADO	

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
CL 95 # 101 6 3 304	APARTADO	ANTIOQUIA	SECTOR SERVICIOS

ACTIVIDAD	CODIGO ACTIVIDAD
EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN	9 - 15

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	RIESGO No
	1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	200.000.000,00	0,00	0	-19.726	-3.748	-23.474

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA	IVA	TOTAL A DEVOLVER
02-FEB-2023	02-FEB-2023	0	$-19.726	$-3.748	$-23.474

VALOR A DEVOLVER EN LETRAS
VEINTI TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
25-ENE-2023	02-FEB-2023	1	$200.000.000,00	$0,00	$200.000.000,00

DOCUMENTO DE:
MODIFICACION VALORABLE CON DISMINUCION DE PRIMA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 01-13-040 , LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIÓN A ESTOS DEBERES.

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA
013	AG5	2536	979042	16	PESO COLOMBIANO

COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

PARTICIPACIÓN DE ASESORES

CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
85976	LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	INDEPENDIENTES	100,00	-19.726

FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZA	NUMERO DE LA ENTIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	RAMO AL CUAL PERTENECE	IDENTIFICACION INTERNA DE LA PROFORMA
01 - 06 - 2009	13 - 18	P	6	F-01-13-040

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
0
APARTADO

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
APARTADO, 02 DE FEBRERO DE 2023	0886102-5	01313795291

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	13795291

TOMADOR WILMAR LOZANO MOSQUERA	CEDULA 1077427408
ASEGURADO WILMAR LOZANO MOSQUERA	CEDULA 1077427408
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS	

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CL 95 # 101 - 06 PISO 3 OFIC 304	APARTADO	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

012003512557. NO. DE CONTRATO 042-202.
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 200,000,000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
NRO. DE CONTRATO 042-202.
OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
ASEGURADOS Y/O BENEFICIARIOS:
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ - NIT: 901.445.176-6
MUNICIPIO DE APARTADO - NIT: 890.980.095-2
ACTA DE INICIO.EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A DAR INICIO DEL CONTRATO EL DÍA 22DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. SIN SUPERAR VIGENCIA.
ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 01QUE EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 EL CONTRATISTA DE OBRA WILMAR LOZANO MOSQUERA, SOLATO LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO CE OBRA 042-2022 JUSTIFICANDO QUE POR LA TEMPORADA DECEMBRINA SE HA PRESENTADO DISMINUCIÓN EN EL RENDIMIENTO DE LA OBRA DEBIDO A LAS AUSENCIAS REPETITIVAS POR PARTE DEL PERSONAL, ADEMÁS DE LAS DEMORAS EN LAS ENTREGAS DE SUMINISTROS DE MATERIALES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES, Y LA TEMPORADA INVERNAL QUE SE PRESENTA ACTUALMENTE.

.

ACTA DE REINICIO NO. 01REINICIAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 042 DEL 2022 A PARTIR DE LA FECHA DEL VEINTICINCO (25) DE ENERO DE 2023, POR LO TANTO,LA NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO SERÁ EL SIETE (07) DE FEBRERO DE 2023.

.

OTRO SI MODIFICATORIO N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N° 042-2022
QUE EL COMITÉ TÉCNICO DE LA EDUH APARTADÓ, CONSIDERA PERTINENTE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 042-2022, DADO QUE ADEMÁS DE LAS JUSTIFICACIONES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA, SE CUENTA ADEMÁS CON LA MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 498 DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE APARTADO Y LA EDUH APARTADÓ MEDIANTE EL CUAL SE AMPLIÓ LA VIGENCIA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO HASTA EL 02 DE FEBRERO DE 2023.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
0
APARTADO

suramericana

Nit. 890.903.407-9

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Responsabilidad Civil número 886102-5 expedida por la Compañía cuyo tomador y asegurado es: **WILMAR LOZANO MOSQUERA** y beneficiario terceros afectados y su documento 13795291 expedida el día 02 de Febrero de 2023 se encuentra debidamente cancelados sus valores, discriminados así:

Prima	$	($19,726)
Impuestos	$	($3,748)
Total	$	**($23,474)**

Para constancia se firma en APARTADO a los 02 días del mes de Febrero de 2023.

Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO
Certificado individual

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN			PÓLIZA NÚMERO
APARTADO, 07 DE FEBRERO DE 2023			0886102-5/
INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	13795291

TOMADOR Y ASEGURADO	CEDULA
WILMAR LOZANO MOSQUERA	1077427408
BENEFICIARIO	
TERCEROS AFECTADOS	

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CL 95 # 101 - 06 PISO 3 OFIC 304	APARTADO	

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
CL 95 # 101 6 3 304	APARTADO	ANTIOQUIA	SECTOR SERVICIOS

ACTIVIDAD	CÓDIGO ACTIVIDAD
EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN	9 - 15
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	RIESGO No
	1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	200.000.000,00	0,00	0	-19.726	-3.748	-23.474

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA DEL RIESGO	IVA DEL RIESGO	TOTAL DEL RIESGO
02-FEB-2023	02-FEB-2023	0	$-19.726	$-3.748	$-23.474

VALOR DEL RIESGO EN LETRAS
VEINTI TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
25-ENE-2023	02-FEB-2023		$200.000.000,00	$0,00	$200.000.000,00

DOCUMENTO DE:
MODIFICACION VALORABLE CON DISMINUCION DE PRIMA

DEDUCIBLES

BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL: 15% de la pérdida, mínimo 60 SMDLV.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
0
APARTADO
Seguros Generales Suramericana S.A

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
APARTADO, 07 DE FEBRERO DE 2023	3512557-9		14843586
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	01214843586

TOMADOR

CEDULA	Razón Social y/o Nombres y Apellidos
1077427408	WILMAR LOZANO MOSQUERA

Dirección	Ciudad	Teléfono
CL 95 # 101 - 06 PISO 3 OFIC 304	APARTADO	

GARANTIZADO

CEDULA	Nombres y Apellidos
1077427408	WILMAR LOZANO MOSQUERA

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
9014451766	EDUH APARTADO

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	25-ENE-2023	14-FEB-2023	94.827.261,00	0,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25-ENE-2023	15-AGO-2023	23.706.815,00	0,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	14-FEB-2023	14-FEB-2028	47.413.631,00	0,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25-ENE-2023	14-FEB-2026	23.706.815,00	0,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
25-ENE-2023	14-FEB-2028	1834	25-ENE-2023	02-FEB-2028	$0	$0	$0

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CERO PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$0	$734.911	$189.654.522,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2536	979042	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
85976	LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	INDEPENDIENTES	100,00	0

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

NRO. DE CONTRATO 042-202.
OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
ASEGURADOS Y/O BENEFICIARIOS:
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ - NIT: 901.445.176-6
MUNICIPIO DE APARTADO - NIT: 890.980.095-2
ACTA DE INICIO.EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A DAR INICIO DEL CONTRATO EL DÍA22DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. SIN SUPERAR VIGENCIA. ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 01QUE EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 EL CONTRATISTA DE OBRA WILMAR LOZANO MOSQUERA, SOLATO LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO CE OBRA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
APARTADO, 07 DE FEBRERO DE 2023	3512557-9		14843586
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	01214843586

TOMADOR

CEDULA	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
1077427408	WILMAR LOZANO MOSQUERA		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CL 95 # 101 - 06 PISO 3 OFIC 304		APARTADO	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

042-2022 JUSTIFICANDO QUE POR LA TEMPORADA DECEMBRINA SE HA PRESENTADO DISMINUCIÓN EN EL RENDIMENTO DE LA OBRA DEBIDO A LAS AUSENCIAS REPETITIVAS POR PARTE DEL PERSONAL, ADEMÁS DE LAS DEMORAS EN LAS ENTREGAS DE SUMINISTROS DE MATERIALES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES, Y LA TEMPORADA INVERNAL QUE SE PRESENTA ACTUALMENTE.

.

ACTA DE REINICIO NO. 01REINICIAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 042 DEL 2022 A PARTIR DE LA FECHA DEL VEINTICINCO (25) DE ENERO DE 2023, POR LO TANTO,LA NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO SERÁ EL SIETE (07) DE FEBRERO DE 2023.

.

OTRO SI MODIFICATORIO N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N° 042-2022
QUE EL COMITÉ TÉCNICO DE LA EDUH APARTADÓ, CONSIDERA PERTINENTE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 042-2022, DADO QUE ADEMÁS DE LAS JUSTIFICACIONES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA, SE CUENTA ADEMÁS CON LA MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 498 DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE APARTADO Y LA EDUH APARTADÓ MEDIANTE EL CUAL SE AMPLIÓ LA VIGENCIA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO HASTA EL 02 DE FEBRERO DE 2023.

.

ACTA DE TERMINACION
QUE EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 SE SUSCRIBE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DEOBRA N.° 042 DEL 2022 DEBIDO A QUE SE EJECUTARON TODAS LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO Y DEBIDO A QUE TAMBIÉN SE DA POR TERMINADO EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 498 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE APARTADO Y LA EICEEDUH-APARTADÓ.
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EL 02 DE FEBRERO DE 2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
APARTADO, 07 DE FEBRERO DE 2023	3512557-9		14843586
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	01214843586

TOMADOR

CEDULA	Razón Social y/o Nombres y Apellidos
1077427408	WILMAR LOZANO MOSQUERA

Dirección	Ciudad	Teléfono
CL 95 # 101 - 06 PISO 3 OFIC 304	APARTADO	

GARANTIZADO

CEDULA	Nombres y Apellidos
1077427408	WILMAR LOZANO MOSQUERA

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
9014451766	EDUH APARTADO -

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	25-ENE-2023	14-FEB-2023	94.827.261,00	0,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25-ENE-2023	15-AGO-2023	23.706.815,00	0,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	14-FEB-2023	14-FEB-2028	47.413.631,00	0,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25-ENE-2023	14-FEB-2026	23.706.815,00	0,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
25-ENE-2023	14-FEB-2028	1834	25-ENE-2023	02-FEB-2028	$0	$0	$0

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CERO PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$0	$734.911	$189.654.522,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2536	979042	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
85976	LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	INDEPENDIENTES	100,00	0

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
0
APARTADO

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL CODIGO: 1795118458

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

suramericana

Nit. 890.903.407-9

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES ESTATALES en la póliza 3512557-9 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: **WILMAR LOZANO MOSQUERA** y Asegurado y/o Beneficiario es **EDUH APARTADO** y su documento 14843586 expedida el día 07 de Febrero de 2023 se encuentra debidamente cancelados sus valores, discriminados así:

Prima	$	($17,926)
Impuestos	$	$0
Total	$	($17,926)

Para constancia se firma en APARTADO a los 07 días del mes de Febrero de 2023.

Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

suramericana

Nit. 890.903.407-9

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES ESTATALES en la póliza 3512557-9 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: **WILMAR LOZANO MOSQUERA** y Asegurado y/o Beneficiario es: **EDUH APARTADO** y su documento 14843586 expedida el día 07 de Febrero de 2023 no expirará por falta de pago de la prima o de los certificados anexos que se expidan con fundamento en ella o por la revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía

Para constancia se firma en APARTADO a los 07 días del mes de Febrero de 2023.

Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

suramericana

Apartado, 07 de febrero de 2023

Señor
Wilmar Lozano Mosquera
Cl 95 # 101 - 06 Piso 3 Ofic 304
Apartado - Antioquia
2536 85976

Asunto: Entrega documentos Responsabilidad Civil
Ramo 013 Póliza 0886102

Cordial saludo:

Para Suramericana es muy importante que usted se encuentre en todo momento enterado de los movimientos que se realizan en sus pólizas y que reciba información sobre todos los productos que tiene contratados con nosotros.

En esta ocasión hacemos entrega de los documentos en los que se relacionan las operaciones realizadas en su póliza de seguro.

Si tiene alguna inquietud o desea recibir más información sobre los productos y servicios de Suramericana, no dude en comunicarse con su asesor , o si lo desea llame a nuestra línea de atención al cliente, SuLínea, en Bogotá, Cali y Medellín en el 437 8888 o sin ningún costo para el resto del país al 01 800 051 8888, o marcando desde su celular #888.

Atentamente,

Seguros SURA.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
APARTADO, 02 DE FEBRERO DE 2023	0886102-5	01313795311

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	13795311

TOMADOR	CEDULA
WILMAR LOZANO MOSQUERA	1077427408

ASEGURADO	CEDULA
WILMAR LOZANO MOSQUERA	1077427408

BENEFICIARIO
TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CL 95 # 101 - 06 PISO 3 OFIC 304	APARTADO	

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
CL 95 # 101 6 3 304	APARTADO	ANTIOQUIA	SECTOR SERVICIOS

ACTIVIDAD	CÓDIGO ACTIVIDAD
EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN	9 - 15
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	RIESGO No 1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	200.000.000,00	200.000.000,00	0	0	0	0

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
02-FEB-2023	02-FEB-2023	0	$0	$0	$0

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CERO PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
25-ENE-2023	02-FEB-2023	1	$200.000.000,00	$0,00	$200.000.000,00

DOCUMENTO DE:

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 01-13-040 , LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIÓN A ESTOS DEBERES.

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA
013	AG5	2536	979042	07	PESO COLOMBIANO

COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

PARTICIPACIÓN DE ASESORES

CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
85976	LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	INDEPENDIENTES	100,00	0

FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZA	NO Y NUMERO DE LA ENTIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	RAMO AL CUAL PERTENECE	IDENTIFICACION INTERNA DE LA PROFORMA
01 - 06 - 2009	13 - 18	P	6	F-01-13-040

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
0
APARTADO

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMÚN

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO		REFERENCIA DE PAGO
APARTADO, 02 DE FEBRERO DE 2023	0886102-5		01313795311
INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	13795311

TOMADOR WILMAR LOZANO MOSQUERA	CEDULA 1077427408
ASEGURADO WILMAR LOZANO MOSQUERA	CEDULA 1077427408
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS	

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CL 95 # 101 - 06 PISO 3 OFIC 304	APARTADO	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

012003512557. NO. DE CONTRATO 042-202.
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 200,000,000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
NRO. DE CONTRATO 042-202.
OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
ASEGURADOS Y/O BENEFICIARIOS:
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ - NIT: 901.445.176-6
MUNICIPIO DE APARTADO - NIT: 890.980.095-2
ACTA DE INICIO.EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A DAR INICIO DEL CONTRATO EL DÍA 22DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. SIN SUPERAR VIGENCIA.
.
ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 01QUE EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 EL CONTRATISTA DE OBRA WILMAR LOZANO MOSQUERA, SOLATO LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO CE OBRA 042-2022 JUSTIFICANDO QUE POR LA TEMPORADA DECEMBRINA SE HA PRESENTADO DISMINUCIÓN EN EL RENDIMIENTO DE LA OBRA DEBIDO A LAS AUSENCIAS REPETITIVAS POR PARTE DEL PERSONAL, ADEMÁS DE LAS DEMORAS EN LAS ENTREGAS DE SUMINISTROS DE MATERIALES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES, Y LA TEMPORADA INVERNAL QUE SE PRESENTA ACTUALMENTE.
.
ACTA DE REINICIO NO. 01REINICIAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 042 DEL 2022 A PARTIR DE LA FECHA DEL VEINTICINCO (25) DE ENERO DE 2023, POR LO TANTO,LA NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO SERÁ EL SIETE (07) DE FEBRERO DE 2023.
.
OTRO SI MODIFICATORIO N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N° 042-2022
QUE EL COMITÉ TÉCNICO DE LA EDUH APARTADÓ, CONSIDERA PERTINENTE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 042-2022, DADO QUE ADEMÁS DE LAS JUSTIFICACIONES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA, SE CUENTA ADEMÁS CON LA MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 498 DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE APARTADO Y LA EDUH APARTADÓ MEDIANTE EL CUAL SE AMPLIÓ LA VIGENCIA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO HASTA EL 02 DE FEBRERO DE 2023.
.
ACTA DE TERMINACION
QUE EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 SE SUSCRIBE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DEOBRA N.° 042 DEL 2022 DEBIDO A QUE SE EJECUTARON TODAS LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO Y DEBIDO A QUE TAMBIÉN SE DA POR TERMINADO EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 498 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE APARTADO Y LA EICEEDUH-APARTADÓ.
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EL 02 DE FEBRERO DE 2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
0
APARTADO

suramericana

Nit. 890.903.407-9

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Responsabilidad Civil número 886102-5 expedida por la Compañía cuyo tomador y asegurado es: **WILMAR LOZANO MOSQUERA** y beneficiario terceros afectados y su documento 13795311 expedida el día 02 de Febrero de 2023 se encuentra debidamente cancelados sus valores, discriminados así:

Prima	$	$0
Impuestos	$	$0
Total	$	**$0**

Para constancia se firma en APARTADO a los 02 días del mes de Febrero de 2023.

Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO
Certificado individual

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN			PÓLIZA NÚMERO
APARTADO, 07 DE FEBRERO DE 2023			0886102-5/
INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	13795311

TOMADOR Y ASEGURADO			CEDULA
WILMAR LOZANO MOSQUERA			1077427408
BENEFICIARIO			
TERCEROS AFECTADOS			
DIRECCIÓN DE COBRO		CIUDAD	TELÉFONO
CL 95 # 101 - 06 PISO 3 OFIC 304		APARTADO	
DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
CL 95 # 101 6 3 304	APARTADO	ANTIOQUIA	SECTOR SERVICIOS
ACTIVIDAD			CODIGO ACTIVIDAD
EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN			9 - 15
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO			RIESGO No
			1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	200.000.000,00	200.000.000,00	0	0	0	0

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA DEL RIESGO	IVA DEL RIESGO	TOTAL DEL RIESGO
02-FEB-2023	02-FEB-2023	0	$0	$0	$0

VALOR DEL RIESGO EN LETRAS
CERO PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
25-ENE-2023	02-FEB-2023		$200.000.000,00	$0,00	$200.000.000,00

DOCUMENTO DE:

DEDUCIBLES

BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL: 15% de la pérdida, mínimo 60 SMDLV.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
0
APARTADO
Seguros Generales Suramericana S.A

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Código: F-SIF-GB-25
Version: 0
Fecha de Aprobación: 06-12-2021
Pagina: 1 de 1

FECHA: 2 (Día)

OBRA EN CASCO URBANO ó RURAL: URBANA Y RURAL BARRIO ó SECTOR: APARTADÓ ACTA Nº: 1.0 VALOR BÁSICO ACTA: 237,068,153 MES: FEBRERO

CONTRATO No: 042-2022 (Indique número y año)

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.

CONTRATISTA: WILMAR LOZANO MOSQUERA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL: 20 DÍAS (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 20 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 22/12/2022 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 07/02/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 25/01/2023 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 237,068,153 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $237,068,153

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $237,068,153

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 30/01/2023 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR	OBRA EJECUTADA ACTA 1 CANTIDAD	ACTA 1 VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE LA CASETA DE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO POLICARPA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ								$ 113,599,665		$ 111,402,491		$ 111,402,491		$ 111,402,491
			1	Piso en concreto 1.3.6 e = 10cm placa de contrapiso con refuerzo de malla electrosoldada D50	m2	190	$ 75,503.00	14,345,570	0.0	-	0.0	-	0.0	-
			2	Suministro e instalacion de piso en baldosa TRAFICO 5, incluye mortero de nivelación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m2	190	$ 116,495.00	22,134,050	197.1	22,959,883	197.1	22,959,883	197.1	22,959,883
			3	Revoque liso para muros internos y externos	m2	407	$ 21,399.00	8,709,393	485.4	10,387,184	485.4	10,387,184	485.4	10,387,184
			4	Estuco en muros internos y externos	m2	407	$ 14,322.00	5,829,054	485.4	6,951,972	485.4	6,951,972	485.4	6,951,972
			5	Pintura en muros internos y externos	m2	407	$ 11,336.00	4,613,752	485.4	5,502,552	485.4	5,502,552	485.4	5,502,552
			6	Suministro e instalacion de guarda escoba en baldosa de grano	m	60	$ 14,451.00	867,060	90.4	1,306,081	90.4	1,306,081	90.4	1,306,081
			7	Suministro e instalacion de cielo raso en pvc	m2	190	$ 94,942.00	18,038,980	193.5	18,375,075	193.5	18,375,075	193.5	18,375,075
			8	Suministro e instalacion de cubierta en teja ECOROUF UPV 2mm	m2	212	$ 100,680.00	21,344,160	251.1	25,281,855	251.1	25,281,855	251.1	25,281,855
			9	Viga Dintel de 0.12x0.2m para soporte de muros en ventanas	m	10	$ 28,911.00	289,110	0.0	-	0.0	-	0.0	-
			10	Suministro e instalación de ventanas de 2x1.5m en aluminio y vidrio 4mm	und	4	$ 857,189.00	3,428,756	4.0	3,428,756	4.0	3,428,756	4.0	3,428,756
			11	Suministro e instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 BTU	und	4	$ 3,500,000.00	14,000,000	0.0	-	0.0	-	0.0	-
			ONP	OBRA NO PREVISTA	0	0	$ -	-		-		-	0.0	-
			ONP1	Desmonte de aparatos electricos (incluye puntos y tomas de Ventiladores y luminarias) Todo el material debe ser recuperado y dispuesto en el lugar indicado por la supervision	und	0	$ 16,678.00	-	8.0	133,424	8.0	133,424	8.0	133,424
			ONP2	Desmonte y retiro de cuebierta en teja de eternit, barro o lamina de	m2	0	$ 12,849.00	-	251.1	3,226,525	251.1	3,226,525	251.1	3,226,525
			ONP3	Mantenimiento de puertas incluye, trabajos de soldadura, pintura,	und	0	$ 312,372.00	-	3.0	937,116	3.0	937,116	3.0	937,116
			ONP4	Apertura de vanos para ventanas	m2	0	$ 10,302.00	-	9.0	92,718	9.0	92,718	9.0	92,718
			ONP5	Salida electrica para iluminación	und	0	$ 222,310.00	-	16.0	3,556,960	16.0	3,556,960	16.0	3,556,960
			ONP6	Salida para tomas	und	0	$ 97,894.00	-	8.0	783,152	8.0	783,152	8.0	783,152
			ONP7	salida para ventiladores	und	0	$ 111,260.00	-	4.0	445,040	4.0	445,040	4.0	445,040
			ONP8	Salida para suiches	und	0	$ 115,054.00	-	5.0	575,270	5.0	575,270	5.0	575,270
			ONP9	Suministro e instalación de ventiladores kdk o similar	und	0	$ 600,160.45	-	6.0	3,600,963	6.0	3,600,963	6.0	3,600,963
			ONP10	Suministro e instalación de panel led de 60x60	und	0	$ 165,669.00	-	8.0	1,325,352	8.0	1,325,352	8.0	1,325,352
			ONP11	Suministro e instalación de led de 24w	und	0	$ 73,319.00	-	2.0	146,638	2.0	146,638	2.0	146,638
			ONP12	Suministro e instalación de led de 18w	und	0	$ 62,669.00	-	4.0	250,676	4.0	250,676	4.0	250,676
			ONP13	Suministro e instalación de tablero electrico de 12 vias, incluye breakers de protección de 20amp, acometida #8	und	0	$ 538,074.00	-	1.0	538,074	1.0	538,074	1.0	538,074
			ONP14	Mantenimiento y pintura de estructuras metalicas de cubierta tipo cercha en exterior	Global	0	$ 1,597,225.00	-	1.0	1,597,225	1.0	1,597,225	1.0	1,597,225
AMPLIACIÓN DE CASETA COMUNAL DE LA VEREDA SAN PABLO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO								68,774,262		70,971,656		70,971,656	0.0	70,971,656
			1	PRELIMINARES										
			1.1	Localización y replanteo	M2	42	$ 1,849.00	77,658	87.4	161,603	87.4	161,603	87.4	161,603

			1.2	Suministro e instalacion de cerramiento provisional en tela verde.	m	40	$ 19,405.00	776,200	40.6	787,843	40.6	787,843	40.6	787,843
			2	**CIMENTACION**											
			2.1	*Excavación en material común de 0 a 2 mts, cualquier grado de	M3	12	$ 44,177.00	545,144	5.1	225,435	5.1	225,435	5.1	225,435
			2.2	Suministro, colocación, conformación y compactación de sub-	M3	21	$ 112,783.00	2,368,443	17.5	1,971,447	17.5	1,971,447	17.5	1,971,447
			2.3	Solados en concreto 175kg/cm2 espesor 10cm	m	41	$ 16,114.00	660,674	42.7	688,068	42.7	688,068	42.7	688,068
			2.4	Suministro, transporte e instalación de concreto de 3000 psi para	m3	10	$ 595,692.00	5,897,351	5.1	3,039,816	5.1	3,039,816	5.1	3,039,816
			3	**ESTRUCTURAS**											
			3.1	Suministro, transporte y colocación de Malla Electrosoldada	m2	42	$ 14,617.00	613,914	140.4	2,052,811	140.4	2,052,811	140.4	2,052,811
			3.2	Suministro, transporte e instalación de concreto de 3000 ps para	m3	3	$ 622,441.76	1,795,122	2.7	1,661,919	2.7	1,661,919	2.7	1,661,919
			4	**MAMPOSTERIA**	0	0	$ -	-		-		-	0.0	-
			4.1	Mamposteria en bloque vibrado de 12cm	m2	105	$ 81,250.00	8,490,625	46.1	3,745,625	46.1	3,745,625	46.1	3,745,625
			5	**CUBIERTAS**											
			5.1	Cubierta en teja fibrocemento con estructura en madera	m2	52	$ 121,818.00	6,334,536	144.8	17,642,414	144.8	17,642,414	144.8	17,642,414
			5.2	Ruana asfaltica	m	26	$ 29,172.00	758,472	4.0	116,688	4.0	116,688	4.0	116,688
			5.3	Construccion de lagrimal sobre atico	m	26	$ 35,482.00	922,532	0.0	-	0.0	-	0.0	-
			6	**PISOS**	0	0	$ -	-		-		-	0.0	-
			6.1	Placa de contrapiso e=0,05	m2	42	$ 54,157.00	2,274,594	147.9	8,010,752	147.9	8,010,752	147.9	8,010,752
			7	**PANETES Y ENCHAPES**	0	0	$ -	-		-		-	0.0	-
			7.1	Revoque liso para muros internos y externos	m2	230	$ 21,399.00	4,919,630	92.2	1,972,988	92.2	1,972,988	92.2	1,972,988
			7.2	Suministro e instalacion de piso en baldosa TRAFICO 5, incluye	m2	52	$ 116,495.00	6,057,740	25.3	2,948,721	25.3	2,948,721	25.3	2,948,721
			8	**CARPINTERIA METALICA**	0	0	$ -	-		-		-	0.0	-
			8.1	Puerta metalica entrada 1.0 x 2.00 calibre 20 en lamina galvanizada	UN	2	$ 911,417.00	1,822,834	1.0	911,417	1.0	911,417	1.0	911,417
			8.2	Ventaneria en aluminio natural tipo corrediza + vidrio crudo 4mm +	m2	27	$ 440,402.00	11,890,854	2.4	1,056,965	2.4	1,056,965	2.4	1,056,965
			8.3	Puerta en triplex wc (incluye marco)	UN	2	$ 815,000.00	1,630,000	0.0	-	0.0	-	0.0	-
			8.4	Canoa metalica primer piso patio 6.0m para aguas lluvias	m	7	$ 142,194.00	995,358	4.0	568,776	4.0	568,776	4.0	568,776
			9	**APARATOS Y GRIFERIAS**	0	0	$ -	-		-		-	0.0	-
			9.1	Lavamanos con griferia	UN	1	$ 320,313.00	320,313	0.0	-	0.0	-	0.0	-
			9.2	Sanitario con griferia	UN	1	$ 429,073.00	429,073	0.0	-	0.0	-	0.0	-
			9.3	Griferia ducha	UN	1	$ 182,711.00	182,711	0.0	-	0.0	-	0.0	-
			9.4	Rejilla de piso 3" * 2"	UN	1	$ 65,420.00	65,420	0.0	-	0.0	-	0.0	-
			10	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**											
			10.1	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**											
			10,1,1	Acometida principal de 1/2"	m	16	$ 49,401.00	790,416	0.0	-	0.0	-	0.0	-
			10,1,2	Puntos hidraulicos	UN	3	$ 58,357.00	175,071	4.0	233,428	4.0	233,428	4.0	233,428
			10.2	**INSTALACIONES SANITARIAS**	0	0	$ -	-		-		-	0.0	-
			10,2,1	Acometida principal de 4"	m	18	$ 69,258.00	1,246,644	0.0	-	0.0	-	0.0	-
			10,2,2	Acometida principal de 4" all	m	35	$ 54,258.00	1,899,030	20.0	1,085,160	20.0	1,085,160	20.0	1,085,160
			10,2,3	Puntos sanitarios	UN	4	$ 79,789.00	319,156	0.0	-	0.0	-	0.0	-
			11	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	0	0	$ -	-		-		-	0.0	-
			11,1	Salidas electricas, incluye tuberia y accesorios	PUNTO	16	$ 105,700.00	1,691,200	0.0	-	0.0	-	0.0	-
			11,2	Salidas para toma coaxial para servicios no satelitales (incluye	PUNTO	2	$ 108,700.00	217,400	0.0	-	0.0	-	0.0	-
			12	**PINTURA**	0	0	$ -	-		-		-	0.0	-
			12,1	Pintura en muros internos y externos	m2	230	$ 11,336.00	2,606,146	229.9	2,606,146	229.9	2,606,146	229.9	2,606,146
			ONP	**OBRA NO PREVISTA**	0	0	$ -	-		-		-	0.0	-
			ONP2	Desmonte y retiro de cuebierta en teja de eternit, barro, lamina de zinc y disposición final de material desmontado	m2	0	$ 12,849.00	-	53.0	681,511	53.0	681,511	53.0	681,511
			ONP3	Mantenimiento de puertas incluye, trabajos de soldadura, pintura, cambio de chapas, bisagras y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	und	0	$ 312,372.00	-	3.0	937,116	3.0	937,116	3.0	937,116
			ONP5	Salida electrica para iluminación	und	0	$ 222,310.00	-	11.0	2,445,410	11.0	2,445,410	11.0	2,445,410
			ONP6	Salida para tomas	und	0	$ 97,894.00	-	2.0	195,788	2.0	195,788	2.0	195,788
			ONP7	salida para ventiladores	und	0	$ 111,260.00	-	7.0	778,820	7.0	778,820	7.0	778,820
			ONP8	Salida para suiches	und	0	$ 115,054.00	-	2.0	230,108	2.0	230,108	2.0	230,108
			ONP9	Suministro e instalación de ventiladores kdk o similar	und	0	$ 600,160.45	-	7.0	4,201,123	7.0	4,201,123	7.0	4,201,123
			ONP10	Suministro e instalación de panel led de 60x60	und	0	$ 165,669.00	-	9.0	1,491,021	9.0	1,491,021	9.0	1,491,021
			ONP11	Suministro e instalación de led de 24w	und	0	$ 73,319.00	-	4.0	293,276	4.0	293,276	4.0	293,276
			ONP13	Suministro e instalación de tablero electrico de 12 vias, incluye breakers de protección de 20amp, acometida #8	und	0	$ 538,074.00	-	1.0	538,074	1.0	538,074	1.0	538,074
			ONP15	Construcción de cerchas en madera en madera choiva de 4x4 o similar	und	0	$ 2,526,076.00	-	3.0	7,584,228	3.0	7,584,228	3.0	7,584,228
			ONP16	Demolición de piso en unidad sanitaria incluye botada de escombros	m2	0	$ 14,331.27	-	7.5	107,158	7.5	107,158	7.5	107,158
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							$ 182,374,147		$ 182,374,147		$ 182,374,147	0.00	$ 182,374,147
	PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)													
	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS D=(A+B)							$ 182,374,147		$ 182,374,147		$ 182,374,147		$ 182,374,147
	VALOR AU (29.99%) (OBRA) (E)							$ 54,694,007		$ 54,694,007		$ 54,694,007		$ 54,694,007
	VALOR OBRAS (INCLUYE AU) F=(D+E)							$ 237,068,153		$ 237,068,153		$ 237,068,153		$ 237,068,153
	VALOR TOTAL							$ 237,068,153		$ 237,068,153		$ 237,068,153		$ 237,068,153

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

A 24.99 %
Utilidad 5 %

Valor Anticipo Otorgado	$ 94,827,261	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 94,827,261	40%
Valor Amortizado Acumulado	$ 94,827,261	

PORCENTAJE DE AVANCE 100%

Registro Presupuestal No. _____ de Fecha _____

$ 94,827,261
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
ACTA DE AVANCE DE OBRA #1	$ 237,068,153		$ 237,068,153
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 237,068,153		$ 237,068,153
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZACIÓN)	**$ 142,240,892**		**$ 142,240,892**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: **CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES DOCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L**

El recibo por parte de la Supervisión de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:
1. El Supervisor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y Superevisión. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que la Supervisión y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la supervisión, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas y en las memorias de calculo (Obra, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

WILMAR LOZANO MOSQUERA
Representante Legal
Contratista

Luis Carlos Mosquera

LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO
EICE EDUH- Apartadó
Supervisor

Original: Anexo para el pago de la cuenta. Secretaria de Infraestructura
Copias: Interventoria y Contratista

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha:

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237.068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	1	NOMBRE DEL ITEM	Piso en concreto 1:3:6 e = 10cm placa de contrapiso con refuerzo de malla electrosoldada D50		UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION		22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	190.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
ACTIVIDAD NO EJECUTADA								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	0.00				
							CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	0.00				
							CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	0.00				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	190.00				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

ACTIVIDAD NO EJECUTADA

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha:

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	2	NOMBRE DEL ITEM	Suministro e instalacion de piso en baldosa TRAFICO 5, incluye mortero de nivelación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	190.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Area (m2)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Area de piso a enchapar interior				189.07	1		189.07				
	Area de piso anden fachada		10.11	0.9		1		9.10				
	Area de columnas		0.3	0.3		-6		-0.54				
	Area de columnas		0.3	0.15		-12		-0.54				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO							197.09				
	CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA							197.09				
	CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA							197.09				
	CANTIDAD POR EJECUTAR							-7.09				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4



REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:


NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha:

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								


ITEM	3	NOMBRE DEL ITEM	Revoque liso para muros internos y externos	UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	407.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Muro fachada frontal		10.11		3.905	2		78.96				
	Muro trasera		10.11		3.905	2		78.96				
	Muro lateral derecho		20.3		3.38	2		137.23				
	Muro lateral izquierdo		20.3		3.38	2		137.23				
	Muros internos		15.53		3.38	2		104.98				
	Muros enchapado del baño		9.35		1.77	-1		-16.55				
	Puerta P1		2		2.06	-2		-8.24				
	Puerta P2		2		2.06	-2		-8.24				
	Puerta P3		1.15		2.06	-2		-4.74				
	Ventana V1		1.45		1.05	-2		-3.05				
	Ventana V2		1.99		2.03	-2		-8.08				
	Ventana V3		1.5		1.02	-2		-3.06				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	485.41				
							CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	485.41				
							CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	485.41				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	-78.41				


REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.


	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha:

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								


ITEM	4	NOMBRE DEL ITEM	Estuco en muros internos y externos	UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	407.00

ESQUEMA ó DIBUJOS



Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
Muro fachada frontal		10.11		3.905	2		78.96				
Muro trasera		10.11		3.905	2		78.96				
Muro lateral derecho		20.3		3.38	2		137.23				
Muro lateral izquierdo		20.3		3.38	2		137.23				
Muros internos		15.53		3.38	2		104.98				
Muros enchapado del baño		9.35		1.77	-1		-16.55				
Puerta P1		2		2.06	-2		-8.24				
Puerta P2		2		2.06	-2		-8.24				
Puerta P3		1.15		2.06	-2		-4.74				
Ventana V1		1.45		1.05	-2		-3.05				
Ventana V2		1.99		2.03	-2		-8.08				
Ventana V3		1.5		1.02	-2		-3.06				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADO		485.41				
					CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA		485.41				
					CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA		485.41				
					CANTIDAD POR EJECUTAR		-78.41				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.


DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha:

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	5	NOMBRE DEL ITEM	Pintura en muros internos y externos	UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION		22/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	407.00

ESQUEMA ó DIBUJOS



Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
Muro fachada frontal		10.11		3.905	2		78.96				
Muro trasera		10.11		3.905	2		78.96				
Muro lateral derecho		20.3		3.38	2		137.23				
Muro lateral izquierdo		20.3		3.38	2		137.23				
Muros internos		15.53		3.38	2		104.98				
Muros enchapado del baño		9.35		1.77	-1		-16.55				
Puerta P1		2		2.06	-2		-8.24				
Puerta P2		2		2.06	-2		-8.24				
Puerta P3		1.15		2.06	-2		-4.74				
Ventana V1		1.45		1.05	-2		-3.05				
Ventana V2		1.99		2.03	-2		-8.08				
Ventana V3		1.5		1.02	-2		-3.06				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADO		485.41				
					CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA		485.41				
					CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA		485.41				
					CANTIDAD POR EJECUTAR		-78.41				


REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:


NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha:


CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	6	NOMBRE DEL ITEM	Suministro e instalacion de guarda escoba en baldosa de grano	UNIDAD	m
FECHA DE ELABORACION:	22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	60.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Guarda escoba en baldosa de grano		81.13			1		81.13				
	Espacio de puerta P1		1.15			-1		-1.15				
	Espacio de puerta P2		2			-1		-2.00				
	Espacio de puerta P3		2			-1		-2.00				
	Columnas 30x30		1.2			6		7.20				
	Media columna		0.6			12		7.20				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	90.38
CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	90.38
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	90.38
CANTIDAD POR EJECUTAR	-30.38

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa


nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.


	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha:

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CO 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	7	NOMBRE DEL ITEM	Suministro e instalacion de cielo raso en pvc					UNIDAD	m2			
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES					CANTIDAD CONTRATADA	190.00			
ESQUEMA ó DIBUJOS		Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Area (m2)	Nº de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
		Area interna salon social				194.62	1		194.62				
		Area de columnas		0.3	0.3		-6		-0.54				
		Area de columnas		0.3	0.15		-12		-0.54				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	193.54				
								CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	193.54				
								CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	193.54				
								CANTIDAD POR EJECUTAR	-3.54				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4



REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:


NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha: 21 / 7 / 2023

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CO 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	8	NOMBRE DEL ITEM	Suministro e instalacion de cubierta en teja ECOROUF UPV 2mm	UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	212.00


ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Cubierta en teja ecorouf upv 2mm		20.3	12.37		1		251.11				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	251.11
CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	251.11
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	251.11
CANTIDAD POR EJECUTAR	-39.11

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 31 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	9	NOMBRE DEL ITEM	Viga Dintel de 0.12x0.2m para soporte de muros en ventanas	UNIDAD	m
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	10.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
ACTIVIDAD NO EJECUTADA								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	0.00				
							CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	0.00				
							CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	0.00				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	10.00				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

ACTIVIDAD NO EJECUTADA

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha: 22 / 12 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	10	NOMBRE DEL ITEM	Suministro e instalación de ventanas de 2x1.5m en aluminio y vidrio 4mm	UNIDAD	und
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	4.00


ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Ventanas 2x1.50					4		4.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	4.00
CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	4.00
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	4.00
CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 22 / 12 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	11	NOMBRE DEL ITEM	Suministro e instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 BTU	UNIDAD	und
FECHA DE ELABORACION		22/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	4.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
ACTIVIDAD NO EJECUTADA								0.00				
								0.00				
								0.00				

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha: 22 / / 2021

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	ONP1	NOMBRE DEL ITEM	Desmonte de aparatos electricos (incluye puntos y tomas de Ventiladores y luminarias) Todo el material debe ser recuperado y dispuesto en el lugar indicado por la supervision		UNIDAD	und
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	0.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Nº de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Desmonte de ventiladores					4		4.00				
	Desmonte de lamparas					4		4.00				
								0.00				
								0.00				
								0

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 22/12/2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	ONP2	NOMBRE DEL ITEM	Desmonte y retiro de cuebierta en teja de eternit, barro o lamina de zinc y disposición final de material desmontado					UNIDAD	m2			
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES					CANTIDAD CONTRATADA	0.00			
ESQUEMA ó DIBUJOS		Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
		Area cubierta en teja de eternit		20.3	12.37		1		251.11				
									0.00				
									0.00				
									0.00

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha: 23 / 1 / 2023


CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	ONP3	NOMBRE DEL ITEM	Mantenimiento de puertas incluye, trabajos de soldadura, pintura, cambio de chapas, bisagras y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento		UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	0.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Puertas doble principales					2		2.00				
	Puerta trasera sencilla					1		1.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	3.00
CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	3.00
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	3.00
CANTIDAD POR EJECUTAR	-3.00


REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 22 / 12 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	ONP4	NOMBRE DEL ITEM	Apertura de vanos para ventanas						UNIDAD				m2
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES						CANTIDAD CONTRATADA				0.00
ESQUEMA ó DIBUJOS		Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Nº de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
		Vanos para ventanas		2		1.5	3		9.00				
									0.00				
									0.00				
									0

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha: 22 / 12 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	ONP5	NOMBRE DEL ITEM	Salida electrica para iluminación		UNIDAD	und
FECHA DE ELABORACION		22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	0.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Salida para lampara de 60x60					8		8.00				
	Salidas para lamparas de 24w					2		2.00				
	Salidas para lamparas de 18w					5		5.00				
	Fachada principal					1		1.00				
								0.00				
								0.00				
								0

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha:

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	ONP6	NOMBRE DEL ITEM	Salida para tomas		UNIDAD	und
FECHA DE ELABORACION		22/09/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	0.00


ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Tomas en cocina					2		2.00				
	Tomas en cuarto util					2		2.00				
	Tomas en salon social					4		4.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	8.00
CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	8.00
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	8.00
CANTIDAD POR EJECUTAR	-8.00

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

OBSERVACIONES

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 24 / 7 / 2025

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	ONP7	NOMBRE DEL ITEM	salida para ventiladores		UNIDAD	und
FECHA DE ELABORACION		22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	0.00


ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Salon social					4		4.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	4.00
CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	4.00
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	4.00
CANTIDAD POR EJECUTAR	-4.00

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

OBSERVACIONES

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 22/12/2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	ONP8	NOMBRE DEL ITEM	Salida para suiches		UNIDAD	und
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	0.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Suiche sencillo en cocina					1		1.00				
	Suiche sencillo en salon social					1		1.00				
	Suiche sencillo baño					1		1.00				
	Suiche sencillo cuarto util					1		1.00				
	Suiche sencillo pasillo					1		1.00				
								0.00				
								0.00				
								0

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha: 22 / 7 / 2023

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	ONP9	NOMBRE DEL ITEM	Suministro e instalación de ventiladores kdk o similar					UNIDAD		und		
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES					CANTIDAD CONTRATADA		0.00		
ESQUEMA ó DIBUJOS		Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
		Ventiladores en salon social					6		6.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	6.00				
								CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	6.00				
								CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	6.00				
								CANTIDAD POR EJECUTAR	-6.00				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 22 / 12 / 2022

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	ONP10	NOMBRE DEL ITEM	Suministro e instalación de panel led de 60x60						UNIDAD		und		
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES						CANTIDAD CONTRATADA		0.00		
ESQUEMA ó DIBUJOS		Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
		Led de 60x60 en salon social					8		8.00				
									0.00				
									0.00				
									0

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 22 / 7 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	ONP11	NOMBRE DEL ITEM	Suministro e instalación de led de 24w	UNIDAD	und
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	0.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Led de 24w en cocina					2		2.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	2.00				
							CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	2.00				
							CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	2.00				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	-2.00				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.


DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha: 23 / 1 / 2023

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	ONP12	NOMBRE DEL ITEM	Suministro e instalación de led de 18w					UNIDAD		und		
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES					CANTIDAD CONTRATADA		0.00		
ESQUEMA ó DIBUJOS		Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
		Cuarto util					2		2.00				
		baño					1		1.00				
		pasillo					1		1.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	4.00				
								CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	4.00				
								CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	4.00				
								CANTIDAD POR EJECUTAR	-4.00				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.


DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha: 21 2022


CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	ONP13	NOMBRE DEL ITEM	Suministro e instalación de tablero electrico de 12 vias, incluye breakers de protección de 20amp, acometida #8					UNIDAD		und		
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES					CANTIDAD CONTRATADA		0.00		
ESQUEMA ó DIBUJOS		Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
		Suministro de tablero de 12 vias					1		1.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	1.00				
								CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	1.00				
								CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	1.00				
								CANTIDAD POR EJECUTAR	-1.00				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

OBSERVACIONES

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 22 / 12 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	ONP14	NOMBRE DEL ITEM	Mantenimiento y pintura de estructuras metalicas de cubierta tipo cercha en exterior		UNIDAD	Global
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	0.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Mantenimiento de estructura metalica					1		1.00				
								0.00				
								0.00				
								0

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE APARTADO


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

Código: F-SIF-GB-26	
Versión: 0	
Fecha de Aprobación: 06-12-2021	
Página: 1 de 1	
fecha:	

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	1.1	NOMBRE DEL ITEM	Localización y replanteo	UNIDAD	M2
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	42.00

ESQUEMA ó DIBUJOS

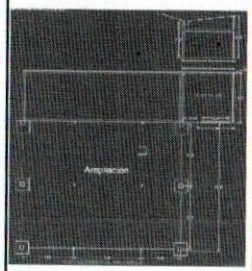


Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
Ampliación cubierta		10.2	4		1		40.80				
Ampliación cubierta		10.2	3		1		30.60				
Cuarto util		4	4		1		16.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	87.40
CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	87.40
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	87.40
CANTIDAD POR EJECUTAR	-45.40

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:


NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha: [ ] [ ] [ ] 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	1.2	NOMBRE DEL ITEM	Suministro e instalacion de cerramiento provisional en tela verde		UNIDAD	m
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	40.00

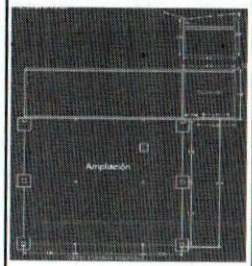
ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Cerramiento construccipon		40.6			1		40.60				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	40.60
CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	40.60
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	40.60
CANTIDAD POR EJECUTAR	-0.60

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:


NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha:

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	2.1	NOMBRE DEL ITEM	"Excavación en material común de 0 a 2 mts, cualquier grado de humedad, incluye retiro de material sobrante, mano de obra, herramienta, equipo necesario para su correcta ejecución."	UNIDAD	M3
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	12.34

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Excavación para viga de cimentación zona de ampliación		10.35	0.3	0.3	2		1.86				
	Excavación para zapatas columnas		1	1	0.3	6		1.80				
	Excavación para viga de cimentación cuarto util		16	0.3	0.3	1		1.44				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO							5.10				
	CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA							5.10				
	CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA							5.10				
	CANTIDAD POR EJECUTAR							7.24				


REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1


fecha: 22 / 12 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								


ITEM	2.2	NOMBRE DEL ITEM	Suministro, colocación, conformación y compactación de sub-base granular, incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad minima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	UNIDAD	M3
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	21.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Cuarto util		4	4	0.2	1		3.20				
	Zona de ampliación exterior		10.2	4	0.2	1		8.16				
	Zona de ampliación exterior		10.2	3	0.2	1		6.12				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	17.48			
								CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	17.48			
								CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	17.48			
								CANTIDAD POR EJECUTAR	3.52			

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.
nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa
nombre:
Residente Obra:
Matricula No:


NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1


fecha: 24 / 1 / 2023

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	2.3	NOMBRE DEL ITEM	Solados en concreto 175kg/cm2 espesor 10cm	UNIDAD	m
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	41.00

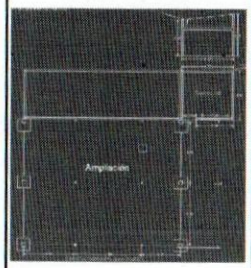ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Solado para viga de cimentación zona de ampliación		10.35			2		20.70				
	Solado para zapatas columnas		1			6		6.00				
	Solado para viga de cimentación cuarto util		16			1		16.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	42.70				
							CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	42.70				
							CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	42.70				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	-1.70				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C
nombre:
Supervisor
Matricula No:


Edison Obregon Correa
nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 23 / 12 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								


ITEM	2.4	NOMBRE DEL ITEM	Suministro, transporte e instalación de concreto de 3000 psi para vigas de fundación y losa de cimentación, incluye materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta instalación.	UNIDAD	m3
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	9.90

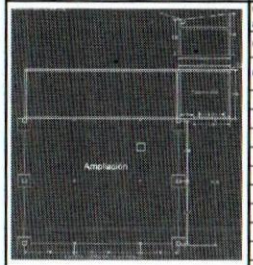ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Concreto para viga de cimentación zona de ampliación		10.35	0.3	0.3	2		1.86				
	Concreto para zapatas columnas		1	1	0.3	6		1.80				
	Concreto para viga de cimentación cuarto util		16	0.3	0.3	1		1.44				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO							5.10				
	CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA							5.10				
	CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA							5.10				
	CANTIDAD POR EJECUTAR							4.80				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra
Matricula No:


NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha:

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	3.1	NOMBRE DEL ITEM	Suministro, transporte y colocación de Malla Electrosoldada 15x15cm Diámetro 4.0mm (D-084)	UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	42.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
								0.00				
	Losa ampliación		10.2	12.2		1		124.44				
	Losa cuarto util		4	4		1		16.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADO		140.44		
								CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA		140.44		
								CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA		140.44		
								CANTIDAD POR EJECUTAR		-98.44		

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE APARTADO


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

Código:	F-SIF-GB-26
Versión:	0
Fecha de Aprobación:	06-12-2021
Página:	1 de 1


fecha: 1 / 1 / 2023

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	3.2	NOMBRE DEL ITEM	Suministro, transporte e instalación de concreto de 3000 ps para vigas de amarre, columnetas de cnfinanmiento, vigas de amarre y viga cinta, incluye materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta instalación.	UNIDAD	m3
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	2.88

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
								0.00				
	Columnas en zona de ampliación		0.3	0.3	2.9	6		1.57				
	Columnas de confinamiento 15x20		0.15	0.2	3.2	4		0.38				
	Viga de amarre		16	0.15	0.2	1		0.48				
	Viga cinta		16	0.15	0.1	1		0.24				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	2.67				
							CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	2.67				
							CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	2.67				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	0.21				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA


MUNICIPIO DE APARTADO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

Código: F-SIF-GB-26
Versión: 0
Fecha de Aprobación: 06-12-2021
Página: 1 de 1
fecha: 22 / 7 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	4.1	NOMBRE DEL ITEM	Mamposteria en bloque vibrado de 12cm		UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	104.50

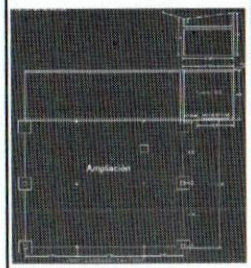ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
								0.00				
	Muro		16		2.9	1		46.40				
	Cuchilla		4		0.6	1		2.40				
	Cuchilla		4		0.3	1		1.20				
	Puerta		1		2.1	-1		-2.10				
	Ventana		1.2		1.5	-1		-1.80				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADO		46.10				
						CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA		46.10				
						CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA		46.10				
						CANTIDAD POR EJECUTAR		58.40				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:


NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha: 22 / 12 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	5.1	NOMBRE DEL ITEM	Cubierta en teja fibrocemento con estructura en madera	UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	52.00


ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Cubierta zona ampliación		12.63	10.2		1		128.83				
	Cubierta cuarto util		4	4		1		16.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	144.83
CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	144.83
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	144.83
CANTIDAD POR EJECUTAR	-92.83

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:


NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha:

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CO 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	5.2	NOMBRE DEL ITEM	Ruana asfaltica		UNIDAD	m
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	26.00

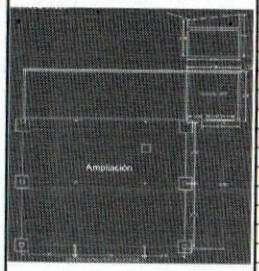ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Ruana en cuebirta cuarto util		4			1		4.00				
								0.00				
								0.00				
								0

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha:

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	5.3	NOMBRE DEL ITEM	Construccion de lagrimal sobre atico		UNIDAD	m
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	26.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
ACTIVIDAD NO EJECUTADA								0.00				
								0.00				
								0.00				


DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha:

CONTRATANTE	No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA 042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA							

ITEM	6.1	NOMBRE DEL ITEM	Placa de contrapiso e=0,05	UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	42.00

ESQUEMA ó DIBUJOS

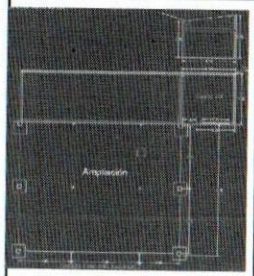

Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
Losa ampliación		10.2	12.2		1		124.44				
Losa cuarto util		4	4		1		16.00				
Unidad sanitaria		3.72	2.01		1		7.48				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO							147.92				
CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA							147.92				
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA							147.92				
CANTIDAD POR EJECUTAR							-105.92				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.


DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha:

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CO 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	7.1	NOMBRE DEL ITEM	Revoque liso para muros internos y externos		UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION		22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	229.90


ESQUEMA ó DIBUJOS

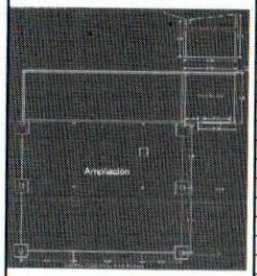

Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
Muro		16		2.9	2		92.80				
Cuchilla		4		0.6	2		4.80				
Cuchilla		4		0.3	2		2.40				
Puerta		1		2.1	-2		-4.20				
Ventana		1.2		1.5	-2		-3.60				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	92.20
CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	92.20
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	92.20
CANTIDAD POR EJECUTAR	137.70

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

OBSERVACIONES

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA


MUNICIPIO DE APARTADO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

Código: F-SIF-GB-26
Versión: 0
Fecha de Aprobación: 06-12-2021
Página: 1 de 1
fecha:


CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	7.2	NOMBRE DEL ITEM	Suministro e instalacion de piso en baldosa TRAFICO 5, incluye mortero de nivelación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	52.00

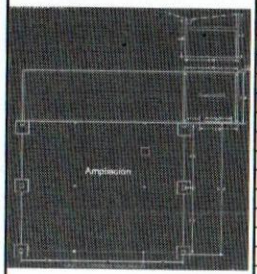ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
								0.00				
	Losa cuarto util		4	4		1		16.00				
	Socalo en cuarto util		15	0.1		1		1.50				
	Unidad sanitaria		3.72	2.1		1		7.81				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	25.31
CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	25.31
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	25.31
CANTIDAD POR EJECUTAR	26.69

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:


NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 22 / 12 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	8.1	NOMBRE DEL ITEM	Puerta metalica entrada 1.0 x 2,00 calibre 20 en lamina galvanizada con anticorrosivo, pintura a base de aceite y chapa.	UNIDAD	UN.
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	2.00

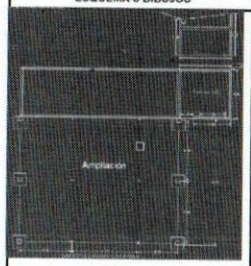
ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Puerta cuarto util					1		1.00				
								0.00				
								0.00				
								0

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 22 / 12 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	8.2	NOMBRE DEL ITEM	Ventaneria en aluminio natural tipo corrediza + vidrio crudo 4mm + alfagia en aluminio		UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	27.00

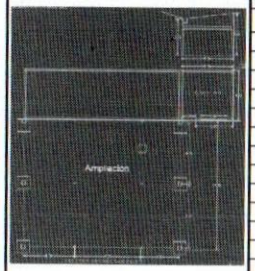ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Ventana 2x1.20		2		1.2	1		2.40				
								0.00				
								0.00				
								0.00

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: [redacted] 2023

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	8.3	NOMBRE DEL ITEM	Puerta en triplex wc (incluye marco)	UNIDAD	UN
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	2.00


ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
ACTIVIDAD NO EJECUTADA								0.00				
								0.00				
								0.00				

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha: [ ] [ ] [ ]

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	8.4	NOMBRE DEL ITEM	Canoa metalica primer piso patio 6.0m para aguas lluvias		UNIDAD	m
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	7.00

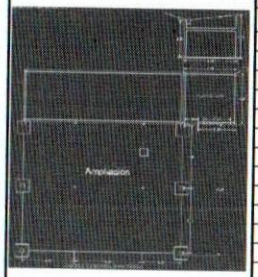ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Canoa metalicas		4			1		4.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	4.00
CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	4.00
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	4.00
CANTIDAD POR EJECUTAR	3.00

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha: 22 / 12 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	9.1	NOMBRE DEL ITEM	Lavamanos con griferia		UNIDAD	UN
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	1.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
ACTIVIDAD NO EJECUTADA								0.00				
								0.00				
								0.00				

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha: 7 / / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	9.2	NOMBRE DEL ITEM	Sanitario con griferia		UNIDAD	UN
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	1.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
ACTIVIDAD NO EJECUTADA								0.00				
								0.00				
								0.00				

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha: 22 / 7 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	9.3	NOMBRE DEL ITEM	Griferia ducha		UNIDAD	UN
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	1.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
ACTIVIDAD NO EJECUTADA								0.00				
								0.00				
								0.00				

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 22 / / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	9.4	NOMBRE DEL ITEM	Rejilla de piso 3" * 2"		UNIDAD	UN
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	1.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
								0.00				
								0.00				
								0.00				

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha: 22 / 12 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	10,1,1	NOMBRE DEL ITEM	Acometida principal de 1/2"		UNIDAD	m
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	16.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Nº de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
								0.00				
								0.00				
								0.00				

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1
	fecha: 23 3 2023

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	10,1,2	NOMBRE DEL ITEM	Puntos hidraulicos		UNIDAD	UN
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	3.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Puntos hidraulicas unidad sanitaria					4		4.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	4.00
CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	4.00
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	4.00
CANTIDAD POR EJECUTAR	-1.00

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 21 / 12 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	10,2,1	NOMBRE DEL ITEM	Acometida principal de 4"		UNIDAD	m
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	18.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
OBRA NO EJECUTADA								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	0.00				
							CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	0.00				
							CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	0.00				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	18.00				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

OBRA NO EJECUTADA

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha:

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	10,2,2	NOMBRE DEL ITEM	Acometida principal de 4" all		UNIDAD	m
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	35.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Aguas lluvias		20			1		20.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	20.00				
							CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	20.00				
							CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	20.00				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	15.00				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Código: F-SIF-GB-26 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1 fecha:

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	10,2,3	NOMBRE DEL ITEM	Puntos sanitarios						UNIDAD		UN		
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES						CANTIDAD CONTRATADA		4.00		
ESQUEMA ó DIBUJOS		Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
OBRA NO EJECUTADA									0.00				
									0.00				
									0.00				

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha:

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	10,2,3	NOMBRE DEL ITEM	Puntos sanitarios	UNIDAD	UN
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	4.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
OBRA NO EJECUTADA								0.00				
								0.00				
								0.00				

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 22 / 12 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	11,1	NOMBRE DEL ITEM	Salidas electricas, incluye tuberia y accesorios	UNIDAD	PUNTO
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	16.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
ACTIVIDAD NO EJECUTADA								0.00				
								0.00				
								0.00				

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 23 / 12 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	11,2	NOMBRE DEL ITEM	Salidas para toma coaxial para servicios no satelitales (incluye tuberia, cable y caja)	UNIDAD	PUNTO
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	2.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
ACTIVIDAD NO EJECUTADA								0.00				
								0.00				
								0.00				

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 22/12/2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	12,1	NOMBRE DEL ITEM	Pintura en muros internos y externos		UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	229.90

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Area (m2)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Pintura general de las instalaciones		229.90			1		229.90				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	229.90
CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	229.90
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	229.90
CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:


NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha:

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	ONP2	NOMBRE DEL ITEM	Desmonte y retiro de cuebierta en teja de eternit, barro, lamina de zinc y disposición final de material desmontado	UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	0.00

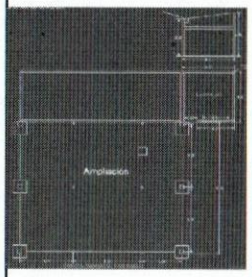ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo (m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Desmonste de cubierta en teja de eternit		5.20	10.2		1		53.04				
								0.00				
								0.00				
								0.00

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 27 / 3 / 2023

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	ONP3	NOMBRE DEL ITEM	Mantenimiento de puertas incluye, trabajos de soldadura, pintura, cambio de chapas, bisagras y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	UNIDAD	und
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	0.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo (m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Puertas existentes					3		3.00				
								0.00				
								0.00				
								0

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha: 22/12/2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	ONP5	NOMBRE DEL ITEM	Salida electrica para iluminación		UNIDAD	und
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	0.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo (m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Salidas para iluminación					11		11.00				
								0.00				
								0.00				
								0

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha:

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	ONP6	NOMBRE DEL ITEM	Salida para tomas		UNIDAD	und
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	0.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo (m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Salidas para tomas					2.00		2.00				
								0.00				
								0.00				
								0

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha:

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	ONP7	NOMBRE DEL ITEM	salida para ventiladores		UNIDAD	und
FECHA DE ELABORACION		22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	0.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo (m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Salidas para ventiladores					7.00		7.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	7.00
CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	7.00
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	7.00
CANTIDAD POR EJECUTAR	-7.00

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha:

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	ONP9	NOMBRE DEL ITEM	Suministro e instalación de ventiladores kdk o similar		UNIDAD	und
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	0.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo (m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Ventiladores					7.00		7.00				
								0.00				
								0.00				
								0

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha:

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	ONP9	NOMBRE DEL ITEM	Suministro e instalación de ventiladores kdk o similar	UNIDAD	und
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	0.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo (m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Ventiladores					7.00		7.00				
								0.00				
								0.00				
								0

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha:

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	ONP10	NOMBRE DEL ITEM	Suministro e instalación de panel led de 60x60						UNIDAD		und		
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES						CANTIDAD CONTRATADA		0.00		
ESQUEMA ó DIBUJOS		Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo (m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
		Led de 60x60					9.00		9.00				
									0.00				
									0.00				
									0

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha:

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	ONP11	NOMBRE DEL ITEM	Suministro e instalación de led de 24w		UNIDAD	und
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	0.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo (m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Led de 24w					4.00		4.00				
								0.00				
								0.00				
								0

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE APARTADO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

Código: F-SIF-GB-26
Versión: 0
Fecha de Aprobación: 06-12-2021
Página: 1 de 1

fecha:

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	ONP13	NOMBRE DEL ITEM	Suministro e instalación de tablero electrico de 12 vias, incluye breakers de protección de 20amp, acometida #8		UNIDAD	und
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	0.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo (m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Trablero de 12 vias					1.00		1.00				
								0.00				
								0.00				
								0

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha:


CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	ONP15	NOMBRE DEL ITEM	Construcción de cerchas en madera en madera choiva de 4x4 o similar		UNIDAD	und
FECHA DE ELABORACION:		22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	0.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo (m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Cerchas en madera					3.00		3.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	3.00
CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	3.00
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	3.00
CANTIDAD POR EJECUTAR	-3.00

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.


	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha:

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ	CONTRATO OBRA	042-2022	WILMAR LOZANO MOSQUERA	20 (DIAS)	22/12/2022	30/12/2022	$237,068,153	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	CONTRATO INTERVENTORIA								


ITEM	ONP16	NOMBRE DEL ITEM	Demolición de piso en unidad sanitaria incluye botada de escombros		UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION		22/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	0.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo (m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Demolición de piso unidad sanitaria		3.72	2.01		1.00		7.48				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	7.48				
							CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	7.48				
							CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	7.48				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	-7.48				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

Edison Obregon Correa

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.
