ACTA DE ENTREGA EQUIPOS DE LABORATORIO

INFORMACIÓN GENERAL	
No. DE CONTRATO	Nro. 222 DE 2022
OBJETO	"Adquisición de un Horno de convección forzada y de una mesa anti vibratoria para la ejecución de las metodologías implementadas en el Laboratorio de Control de Calidad de la Industria Licorera del Cauca, para dar cumplimiento al capítulo IV Aseguramiento de Calidad del Decreto 1686 de 2012".
CONTRATANTE	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA.
NIT	891.500.719-5
CONTRATISTA	QUIMICOMPANY S.A.S
NIT Y/O CÉDULA	900.997.618-4
VALOR DEL CONTRATO	$16.629.060 IVA Incluido
SUPERVISOR	
NOMBRE	CAROLINA SOLANO CERTUCHE
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO- CONTROL DE CALIDAD
DESIGNACIÓN	**Contrato No. 222 de 2022**


Se recibe a satisfacción los siguientes equipos con las siguientes especificaciones técnicas, el día 15 de Diciembre del 2022.


ITEM	CARACTERISTICAS DEL HORNO MEMMER UF55
Modelo	UF55
Rango de temperatura de temperatura	mín. 5 (UN/UNplus/UNm/UNmplus) mín. 10 (UF/UFplus/UFm/UFmplus) sobre la temperatura ambiente hasta +300 °C
Resolución del indicador valores nominales de la temperatura y valores reales	hasta 99,9 °C: 0,1 / a partir de 100 °C: 0,5
Rango de temperaturas ajustables	+20 hasta +300 °C
Temporizador	Reloj de cuenta atrás digital con indicación del valor nominal de tiempo.
Sonda de temperatura	1 Pt100 (clase DIN A) con sistema de medición
ControlCOCKPIT	SingleDISPLAY. Controlador de microprocesador PID digital multifuncional adaptativo con pantalla de gráficos a color.
Función SetpointWAIT	El tiempo empieza a contar una vez alcanzada la temperatura nominal.

Parámetros ajustables	Temperatura (Celsius o Fahrenheit)
Certificado de calibración de fábrica	calibración a +160 °C
Medidas	An(A) x Al(B) x F(C): 400 x 400 x 330 mm (F menos los 39 mm del ventilad)
Volumen	53 L
Voltaje	230 V, 50/60 Hz
Voltaje consumo eléctrico	115 V, 50/60 Hz

Se verifica dimensiones, materiales de fabricación, funcionamiento eléctrico y sistema de control, se recibe manual de instrucciones.



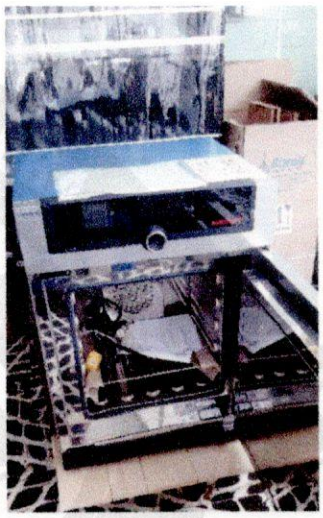




ITEM	CARACTERISTICAS DE LA MESA ANTIVIBRATORIA
Descripción generales	• Mesón de MÁRMOL • 4 Niveladores o pies regulables. • Patas de acero al carbón con sistema de nivelación. • Calificación de instalación, IQ (para mobiliario certificado) según los parámetros de la norma NTC ISO 17025 y el decreto 3075 de 1997.
Estructura	AGLOMERADO RH calibre 18, estructura cuadrada de 50X50, uniones enchapadas en canto PVC termo-enchapado.
Tamaño estándar	Medidas de Mesa: 90 Al x 56 An x 46 Pr. cm. Medidas de mármol: 45 x 30 x 4 de ancho, cm.






Se suscribe en Popayán, a los veintitres días (23) de Diciembre de 2022.

CAROLINA SOLANO CERTUCHE
Supervisor-ILC
C.C 34.570.806
Contrato No. 222 de 2022

I.Q. ALISON MELO.
Directora Comercial
C.C. 1.016.103.080
QUIMICOMPANY-EQUIPOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
