	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	1/12/22	15/12/22

DATOS DE OBRA	
NOMBRE:	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA
LOCALIZACIÓN:	El proyecto esta ubica en zona urbana como rural del municipio del Carmen de viboral, Antioquia

CONTRATO:	COP-004-2022-IP
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2022
FECHA FIN:	31 de diciembre de 2022
VALOR CONTRATO:	DOS MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS PESOS ($2.049.800.000)

DATOS DEL CONTRATANTE	
RAZÓN SOCIAL	Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de El Carmen de Viboral.
DIRECTOR OPERATIVO EDUR	Oscar Darío Londoño Rendón
DATOS DEL SUPERVISOR CONTRATANTE	
RAZÓN SOCIAL	
DIRECTOR	

RESPONSABLE DE LA OBRA	
RESIDENTE DE OBRA:	Felipe Alejandro Rojas Gómez
APOYO CONTRATISTA:	

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora numero	2

SEMANA		**FECHA**	2/12/22	**HORA INICIO**	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GRADERIAS:** 1- Colocación de concreto 21 mpa clase D para zapatas, 2- Colocación de mampostería en bloque de concreto.		
DESCRIPCIÓN			**GRADERIAS:** se realiza la limpieza en las excavaciones próximas a vaciar de todo el material lodoso y agua por nivel freático que se encuentran par garantizar espacio acorde y listo, se inicia con la colocación de concreto en cada excavación de zapatas garantizando resistencia y ubicación de acero de refuerzo, se realizo el respectivo chequeo de ejes, plomos e hilos , se continuo con la actividad de colocación de mampostería en bloque de concreto por todo el perímetro del escenario.		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			Concretadora, Cemento, arena, triturado, bloques de concreto, herramienta menos		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CLIMA	nublado permite trabajar
OBSERVACIONES	

REALIZO	FELIPE ROJAS	**HORA FIN**	5:30 a. m.

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora numero	3

SEMANA		FECHA	5/12/22	HORA INICIO	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GRADERIAS:** 1- Colocación de concreto 21 mpa clase D para zapatas, 2- Colocación de mampostería en bloque de concreto		
DESCRIPCIÓN			**GRADERIAS:** Se continua con la colocación de concreto en cada excavación de zapatas garantizando resistencia y ubicación de acero de refuerzo, se realizo el respectivo chequeo de ejes, plomos e hilos, se continuo con la actividad de colocación de mampostería en bloque de concreto por todo el perímetro del escenario.		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			Concretadora, Cemento, arena, triturado, bloques de concreto, herramienta menos		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	3

REGISTRO FOTOGRÁFICO






CLIMA	Cálido
OBSERVACIONES	se finaliza con el vaceo de las 6 primeras zapatas ubicadas hacia el costado de en frente de graderías con el espesor indicado

REALIZO	FELIPE ROJAS	**HORA FIN**	4:00 p. m.

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora numero	4

SEMANA		**FECHA**	6/12/22	**HORA INICIO**	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES			Se encuentra la obra como se dejo el día Anterior		
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GRAERIAS**: 1- colocación de mampostería en bloque de concreto 2- revisión de planos y diseños con ingeniero estructural		
DESCRIPCIÓN			**GRADERIAS**: se realizo la colocación de mampostería en concreto en la parte interna y perímetro de todo el escenario deportivo, se realizo una reunión con el ingeniero estructural a cargo de los diseños para las cubiertas de los escenarios cancha norte y gimnasio, revisando sugerencias por parte del ente de control concluyendo que se continua con los diseños iniciales,		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			Arena, cemento, Herramienta menor, bloques de concreto		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	4

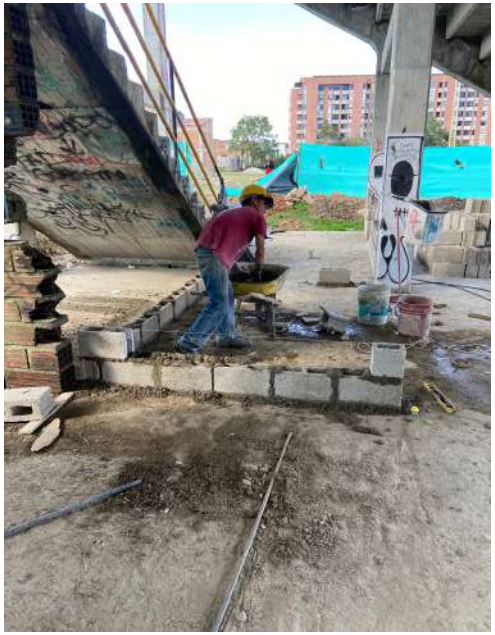REGISTRO FOTOGRÁFICO


CLIMA	Clima cálido
OBSERVACIONES	

REALIZO		HORA FIN	5:00 p. m.

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora numero	5

SEMANA		FECHA	7/12/22	HORA INICIO	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES			Se encuentra la obra con daños en la mampostería instalada días anteriores		
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GRADERIAS:** 1- Colocación de mampostería en bloque de concreto **AGUAS CLARAS:** 1- Visita de revisión estado actual de obra		
DESCRIPCIÓN			**GRADERIAS:** Se continúa realizando la colocación de mampostería en concreto en toda la parte interna y perimetral del escenario deportivo, la cual previene de posibles humedades por encharcamientos ya que la zona cuenta con precipitación casi a diario. **AGUAS CLARAS**: Se realiza una visita de chequeo para llevar seguimiento al estado de la zona donde se encontró humedad, notando encharcamiento afirmando la necesidad de instalación de filtros perimetrales		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			Arena, cemento, Herramienta menor, Bloques de concreto		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	5

REGISTRO FOTOGRÁFICO







CLIMA	cálido
OBSERVACIONES	Se encuentran daños en la mampostería instalada gracias a las personas que en horas de la noche ingresan a las graderías, Generando así retrasos y sobre procesos

REALIZO		**HORA FIN**	5:30 p. m.

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora numero	9

SEMANA		FECHA	12/12/22	HORA INICIO	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES			Se encuentra la obra como se dejo el día Anterior		
ACTIVIDADES REALIZADAS			NO SE PUDIERON ADELANAR ACTIVIDADES		
DESCRIPCIÓN			NO SE PUDIERON ADELANAR ACTIVIDADES		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES					
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	9

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CLIMA	
OBSERVACIONES	NO SE PUDIERON ADELANTAR ACTIVIDADES POR MAL CLIMA

REALIZO		**HORA FIN**	

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora numero	10

SEMANA		FECHA	13/12/22	HORA INICIO	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES			Se encuentra la obra como se dejo el día Anterior		
ACTIVIDADES REALIZADAS			NO SE PUDIERON ADELANTAR ACTIVIDADES POR CAPACITACION DE PERSONAL		
DESCRIPCIÓN			NO SE PUDIERON ADELANTAR ACTIVIDADES POR CAPACITACION DE PERSONAL		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES					
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	10

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CLIMA	
OBSERVACIONES	NO SE PUDIERON ADELANTAR ACTIVIDADES POR CAPACITACION

REALIZO		**HORA FIN**	

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora numero	1

SEMANA		**FECHA**	16/12/22	**HORA INICIO**	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES REALIZADAS			NO S PUEDEN ADELANTAR MAYORES ACTIVIDADES POR MAL CLIMA		
DESCRIPCIÓN			NO S PUEDEN ADELANTAR MAYORES ACTIVIDADES POR MAL CLIMA		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			Concretadora, Cemento, arena , triturado, bloques de concreto, herramienta menos		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CLIMA	LLUVIOSO NO PERMITE TRABAJOS
OBSERVACIONES	

REALIZO	FELIPE ROJAS	**HORA FIN**	5:30 a. m.

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora numero	2

SEMANA		**FECHA**	19/12/22	**HORA INICIO**	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES			Se encuentra la obra como se dejo el día Anterior		
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GRADERIAS**: 1- Conformación de formaletas para cuellos, 2- ubicación de primera hilada de muros, 3- retiro de tubería de barandal superior de graderías		
DESCRIPCIÓN			**GRADERIAS:** se realiza retiro de tubería la cual pertenece a las barandas superiores de la gradería, esta presentando interferencia con la ubicación de las columnas a construir siendo necesario su retiro, se realiza el armado de formaletas en madera para su ubicación en punto donde serán vaciados los cuellos de cada columna, también se realiza trabajo de ubicación de primera hilada de mampostería en adobe y bloque de concreto		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			Concretadora, Cemento, arena, triturado, bloques de concreto, bloque de adobe, herramienta menos		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CLIMA	Cálido
OBSERVACIONES	se finaliza con el vaceo de las 6 primeras zapatas ubicadas hacia el costado de en frente de graderías con el espesor indicado

REALIZO	FELIPE ROJAS	**HORA FIN**	4:00 p. m.

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora numero	3

SEMANA		**FECHA**	20/12/22	**HORA INICIO**	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES			Se encuentra la obra como se dejo el día Anterior		
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GRADERIAS:** 1- instalación de estribos par columnas, 2- ubicación de formaletas para cuellos de columnas, 3- recepción de material		
DESCRIPCIÓN			**GRADERIAS:** se realiza ajuste corrección e instalación de estribos complementarios para garantizar la forma de la columna al momento de vaceo de los cuellos, se realiza la instalación de formaleta en madera chequeando hilos , se estaca para prevenir posible deformación , Se realiza la recepción de material de playa acopiando en parte exterior del escenario .		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			Arena, cemento ,Herramienta menor		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	3

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CLIMA	Clima cálido
OBSERVACIONES	

REALIZO		**HORA FIN**	5:00 p. m.

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora numero	4

SEMANA		**FECHA**	21/12/22	**HORA INICIO**	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES			Se encuentra la obra con daños en la mampostería instalada días anteriores		
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GRADERIAS:** 1- Acomodación de formaletas, 2- corrección de estribos, 3- vaceo de concretos		
DESCRIPCIÓN			**GRADERIAS:** Se termina la actividad de ubicación de formaletas en las diferentes columnas, se realiza corrección de estribos, acomodando posibles errores dejando lista la columna para su posterior vaceo actividad que se realiza iniciando por cuellos frontales .		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			Arena, cemento, graba, Herramienta menor, Bloques de concreto		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	4

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CLIMA	cálido
OBSERVACIONES	

REALIZO		HORA FIN	6:00 p. m.

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora numero	5

SEMANA		**FECHA**	22/12/22	**HORA INICIO**	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES			Se encuentra la obra como se dejo el día Anterior		
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GRADERIAS:** 1- vaceo de concretos para cuellos de columnas, 2- retiro de formaletas		
DESCRIPCIÓN			**GRADERIAS:** Se continua con actividad de vaceo de concreto en cuellos de columnas y posteriormente se realiza el retiro de las formaletas anteriormente vaciadas chequeando estado y forma de la actividad ya realizada.		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			Arena, cemento, graba, Herramienta menor		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	5

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CLIMA	normal
OBSERVACIONES	

REALIZO		**HORA FIN**	5:00 a. m.

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora numero	6

SEMANA		**FECHA**	23/12/22	**HORA INICIO**	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES			Se encuentra la obra como se dejo el día Anterior		
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GRADERIAS:** 1- Lleno con material de préstamo, 2. instalación de mampostería en adobe		
DESCRIPCIÓN			**GRADERIAS:** Se realiza lleno de excavaciones después de retirar formaletas, hasta nivel de viga de fundación utilizando material de préstamo acopiado anteriormente en parte exterior de escenario, se continua con actividad de instalación de mampostería en adobe en muros interiores y fachada de escenario deportivo		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			Herramienta menor		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	6

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CLIMA	nublado
OBSERVACIONES	

REALIZO		**HORA FIN**	5:30 a. m.

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora numero	7

SEMANA		FECHA	26/12/22	HORA INICIO	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES			Se encuentra la obra como se dejo el día Anterior		
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GRADERIAS:** 1- llenos con material de préstamo 2- instalación de mampostería en adobe, 3- recepción de materiales en obra		
DESCRIPCIÓN			**GRADERIAS:** Se realizan y finalizan trabajos de llenos en excavaciones de estructura de columnas a nivel de viga de fundación utilizando material de préstamo acopiado a las afueras del escenario deportivo, Se realiza actividad de instalación de mampostería en adobe en muros internos del escenario deportivo , se realiza recepción de adobe y acopio en parte externa del escenario deportivo		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			Herramienta menor, adobe, cemento , arena		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	7

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CLIMA	nublado
OBSERVACIONES	

REALIZO		**HORA FIN**	5:30 a. m.

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora numero	8

SEMANA		**FECHA**	27/12/22	**HORA INICIO**	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES			Se encuentra la obra como se dejo el día Anterior		
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GRADERIAS:** 1- instalación de mampostería en adobe, 2- recepción de material en obra		
DESCRIPCIÓN			**GRADERIAS:** se realizan trabajos de instalación de mampostería en muros interiores del escenario deportivo, se realiza recepción de material en obra, adobes para muros interiores y exteriores de fachada.		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES					
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	8

REGISTRO FOTOGRÁFICO





nublado

CLIMA	nublado
OBSERVACIONES	

REALIZO		**HORA FIN**	5:00 a. m.

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora numero	9

SEMANA		FECHA	28/12/22	HORA INICIO	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES			Se encuentra la obra como se dejo el día Anterior		
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GRADERIAS:** 1- instalación de mampostería en adobe, 2- visita de campo a obra GYM: 1- fabricación de estructura metálica		
DESCRIPCIÓN			**GRADERIAS:** Se realiza trabajo de instalación de mampostería en muros interiores del escenario deportivo, Se realiza visita a obra todos los frentes de trabajo en acompañamiento de EDUR y Ente regulador del municipio del Carmen de viboral donde se evidencia el avance que a tenido el proyecto , se solicita a contratista acelerar procesos, se coordina reunión con encargado de grama sintética y se queda a la espera de confirmación de recursos para la presentación de obras adicionales y mayores cantidades, se solicita presentar mayores cantidad y obras extras de demolición de muros y sauna GYM: se continua con fabricaciones estructuras metálicas tipo cercha para su posterior instalación.		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			Herramienta menor, adobe, arena, cemento, graba, equipo de soldadura		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	9

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CLIMA	cálido
OBSERVACIONES	


REALIZO		HORA FIN	5:30 a. m.

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora numero	10

SEMANA		FECHA	29/12/22	HORA INICIO	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES			Se encuentra la obra como se dejo el día Anterior		
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GRADERIAS:** 1- Modelación de estribos 2- instalación de mampostería en adobe y bloque **GYM:** 1- fabricación de estructura metálica, 2- revisión estado de escenario para presentación de obras extras		
DESCRIPCIÓN			**GRADERIAS:** Se realiza trabajo de corte y figurado de acero para la fabricación de estribos utilizados en estructura de acero de refuerzo en columnas , se continua con trabajos de instalaciones mampostería , **GYM:** se realizan trabajos de fabricación de estructura metálica tipo cercha cumpliendo con diámetros dimensiones, se realiza re soldadura en puntos críticos y estructuras ya instaladas, Se realiza medición de espacios a intervenir como son sauna y baños , haciendo listado de actividades a realizar para su posterior presentación.		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			Herramienta menor, adobe, arena, cemento , graba , equipo de soldadura		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	10

REGISTRO FOTOGRÁFICO

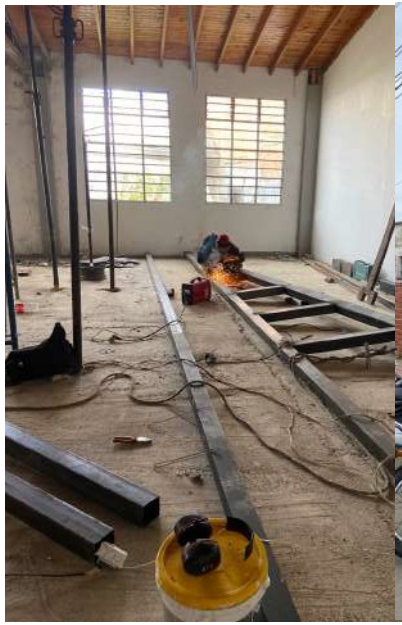
CLIMA	cálido
OBSERVACIONES	

REALIZO		**HORA FIN**	5:30 a. m.

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	1/01/23	15/01/23

DATOS DE OBRA	
NOMBRE:	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA
LOCALIZACIÓN:	El proyecto esta ubica en zona urbana como rural del municipio del Carmen de viboral, Antioquia

CONTRATO:	COP-004-2022-IP
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2022
FECHA FIN:	31 de diciembre de 2022
PRORROGADO HASTA	19 de abril de 2023
VALOR CONTRATO:	DOS MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS PESOS ($2.049.800.000)

DATOS DEL CONTRATANTE	
RAZÓN SOCIAL	Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de El Carmen de Viboral.
DIRECTOR OPERATIVO EDUR	Oscar Darío Londoño Rendón
DATOS DEL SUPERVISOR CONTRATANTE	
RAZÓN SOCIAL	
DIRECTOR	

RESPONSABLE DE LA OBRA	
RESIDENTE DE OBRA:	Felipe AlejndroRojas Gómez
APOYO CONTRATISTA:	

	INFORMACION GENERAL BITACORA DE OBRA	
	Bitácora numero	1

SEMANA		FECHA	2/01/23	HORA INICIO	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GIMNASIO:** 1- Fabricación de estructura en acero tipo Cercha **GRADERÍAS**: 1- Limpieza de zona de trabajo, 2- Instalación de mampostería en Bloque de concreto		
DESCRIPCIÓN			**GIMNASIO:** se Continua con la fabricación de la ultima estructura tipo cercha respetando medidas y solicitudes por diseños, se realiza re soldado en estructuras ya instalada sutilizando soldadura de mayor resistencia. **GRADERÍAS:** Se realiza la limpieza de zona exterior donde se encontraron gran cantidad de residuos solidos dejados por peatones que transitan por la zona, Se raleza la instalación de mampostería en bloques de concreto.		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			Arena, cemento, Bloques de concreto, Estructura de acero, Equipo de soldadura, Herramienta menor		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	1

REGISTRO FOTOGRÁFICO






CLIMA	
OBSERVACIONES	

REALIZO		**HORA FIN**	5:30 p. m.

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora numero	2

SEMANA		**FECHA**	3/01/23	**HORA INICIO**	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GIMNASIO:** 1- Revisión de redes Sanitarias, inspección de actividades extras a realizar. 2- Fabricaciones estructura tipo cercha **GRADERÍAS:** Instalación de mampostería en Bloque, 2- Recepción de Maquinaria para movimiento de tierras, 3- Se realizo comité de obra		
DESCRIPCIÓN			**GIMNASIO:** Se realiza inspección de obras extras propuestas por EDUR y Municipio del Carmen, Se realiza medición de muros a demoler, estado de unidades sanitarias, Estado de enchapes, se toma medida de área para realizar lavado con hidro lavadora en fachada, Se continua con actividades de fabricación de cerchas en acero. **GRADERÍAS:** Se realiza instalación de mampostería utilizando bloque en división de baños interiores y en fachada trasera, Se hace la recepción de maquinaria utilizada en próximos días para realizar movimiento de tierras, botada de escombros, y material sobrante de excavaciones. Se realizo comité de obra donde se definieron varios puntos y principalmente se quedo con compromiso de entrega de Apus y propuesta de actividades extras necesarias en cada frente de trabajo.		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			Arena, cemento, Bloques de concreto, Estructura de acero, Equipo de soldadura, Herramienta menor		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	2

REGISTRO FOTOGRÁFICO







CLIMA	nublado permite trabajar
OBSERVACIONES	

REALIZO	FELIPE ROJAS	**HORA FIN**	5:30 a. m.

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora numero	3

SEMANA		**FECHA**	4/01/23	**HORA INICIO**	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GIMNASIO:** 1- Se realiza visita de obra, 2- se continua con fabricación e instalación de estructura tipo cercha 3- Se realiza limpieza de zona de trabajo, baños, y sauna, **GRADERÍAS:** 1- se continua con instalación de mampostería utilizando adobe		
DESCRIPCIÓN			**GIMNASIO:** se realiza visita de campo , donde se evidencian el avance con respecto a la construcción de cerchas y se adquiere compromiso de entregar estas montadas a la mayor brevedad, Se dan indicaciones de movimiento de utensilios deportivos de un lugar a otro , esta actividad es realizada de inmediato por personal en obra, **GRADERÍAS:** se continua con instalación de mampostería en muros divisores de oficinas internas y tienda , Se realiza inspección de planos y se define nueva ubicación de ventanera para fachada exterior de graderías y algunas oficinas en su parte interior , se deja como compromiso el calculo de la nueva cantidad necesaria a utilizar para su presentación.		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			Arena, cemento, Bloques de concreto, Estructura de acero, Equipo de soldadura, Herramienta menor		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	3

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CLIMA	Cálido
OBSERVACIONES	

REALIZO	FELIPE ROJAS	**HORA FIN**	4:00 p. m.

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora numero	4

SEMANA		FECHA	5/01/23	HORA INICIO	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GRADERÍAS:** 1-Figurado de acero de refuerzo, 2-instalacion de estribos para columnas, 3-instalacion de mampostería en adobe		
DESCRIPCIÓN			**GRADERÍAS:** se continua con la actividad de instalación de mampostería en muros divisorios de interior de escenario deportivo, llegando a los 8 niveles de adobes necesarios para cumplir con diseños, se realiza trabajo de figurado e instalación en vigas de estribos cumpliendo medidas tanto de caras externas como de ganchos, posteriormente instalando en las columnas cumpliendo con el espaciamiento		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			Arena, cemento, Adobes , herramienta menor , figurado		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	4

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CLIMA	Clima cálido
OBSERVACIONES	

REALIZO		**HORA FIN**	5:00 p. m.

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora numero	5

SEMANA		**FECHA**	6/01/23	**HORA INICIO**	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES			Se encuentra la obra como se dejo el día Anterior		
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GRADERÍAS:** 1-Vicita de campo a obra con alcaldía, 2- instalación de mampostería, 3-instalacion de estribos para columnas 4- demolición de muro **GIMNASIO:** 1- fabricación de cercha metálica, 2- re soldadura de seguridad		
DESCRIPCIÓN			**GRADERÍAS:** Se continua con trabajos de instalación de mampostería para muros divisores de interior y fachada escenario deportivo , se realiza demolición manual de muro en parte baja de escaleras el cual gracias a su retiro ampliara considerablemente una de las bodegas de almacenamiento del escenario , se realiza visita de campo a escenario cancha norte en compañía de alcaldía y Edur, donde se tocaros varios puntos se llego a concertación con practicantes de Skate y procede a enviar oficio para seguimiento y control de aprobación de actividad de demolición e instalación de la ultima columna faltante por vaceo e instalación de cerramiento en este punto , **GIMNASIO:** se continua con trabajo de fabricación de cerchas faltantes y al tiempo se realizan trabajos de re soldadura de seguridad para estructura ya fabricada.		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			adura, herramienta menor, arena , cemento		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	5

REGISTRO FOTOGRÁFICO







CLIMA	cálido
OBSERVACIONES	

REALIZO		**HORA FIN**	5:30 p. m.

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora numero	10

SEMANA		FECHA	9/01/23	HORA INICIO	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES			Se encuentra la obra como se dejo el día Anterior		
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GRADERÍAS:** 1-vaceo de columna frontal, 2- instalación de mampostería en adobe, **GIMNASIO** 1- fabricación e instalación de estructura metálica		
DESCRIPCIÓN			**GRADERÍAS:** Se continua con trabajos de instalación de mampostería en adobe en muros divisorios del interior del escenario deportivo y de igual forma en muros de fachada frontal , se inicia con trabajos de limpieza de cero de refuerzo , ajuste de estribos , chequeo de medidas y posterior vaceo de concreto para la viga de fundación frontal que pertenece a la estructura de apoyo de la cubierta para las graderías, **GYM:** Se continua con trabajos de fabricación de la ultima cercha , y se instala en su punto la otra cercha de las dos que hacen falta por instalar , se realiza chequeo y re soldadura de seguridad.		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES					
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	10

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CLIMA	Cálido
OBSERVACIONES	

REALIZO		**HORA FIN**	6:00 p. m.

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora numero	11

SEMANA		FECHA	10/01/23	HORA INICIO	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES			Se encuentra la obra como se dejo el día Anterior		
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GRADERÍAS:** 1- vaceo de viga frontal, 2- instalación de mampostería en adobe. **GIMNASIO:** 1-Fabricacion de estructura metálica 2- pintura en fachada y muros interiores		
DESCRIPCIÓN			**GRADERÍAS:** Se continua con trabajos de instalación de mampostería en adobe en muros divisorios del interior del escenario deportivo y de igual forma en muros de fachada frontal , se continua con trabajo de vaceo de concretos para viga de fundación frontal cumpliendo con resistencias y vibración , **GIMNASIO:** se realiza trabajo de limpieza y pintura en fachada frontal del escenario deportivo , de igual forma de realiza trabajos de pintura en muros de interior de pasillo y salón de ingreso , también para oficina principal.		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			equipo de pintura, pintura, herramienta menor, equipo de soldadura , escalera , arena , cemento, adobes		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	11

REGISTRO FOTOGRÁFICO







CLIMA	nublado permite trabajos
OBSERVACIONES	

REALIZO		**HORA FIN**	5:30 p. m.

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora numero	12

SEMANA		FECHA	11/01/23	HORA INICIO	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES			Se encuentra la obra como se dejo el día Anterior		
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GRADERÍAS:** 1- Seguimiento actas de vecindad 2- vaceo de viga trasera. 2- instalación de mampostería en adobe **GYM:** 1- visita con personal oficina de deportes 2- fabricación e instalación de estructura metálica		
DESCRIPCIÓN			**GRADERÍAS:** se inician trabajos de limpieza de acero de refuerzo, ajuste de estribos , y posterior vaceo de concretos para la viga de fundación trasera la cual pertenece a estructura de fundación para cubierta de graderías, se continua con trabajos de instalación de mampostería en adobe , se realiza trabajos de visita a vecinos colindantes para el seguimiento de actas de vecindad y de entorno las cuales se realizaron en acompañamiento de la EDUR, **GYM:** Se realiza visita a obra en compañía de representantes de oficina de deportes del municipio del Carmen de víboral donde se dieron indicaciones de que material se puede desechar , se realizo la respectiva revisión de escombros y basura que se tiene almacenada para su posterior disposición y se acordó el traslado de baldosas de caucho para otro escenario deportivo.		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			herramienta menor, cemento, arena , gravilla		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	12

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CLIMA	Nublado permite trabajos
OBSERVACIONES	actas de vecindad quedan por escrito en formatos de contratista y firmados por propietarios colindantes, todo el material dispuesto para votar fue revisado y aprobado por representantes de oficina de deportes del municipio del Carmen

REALIZO		**HORA FIN**	5:30 p. m.

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora numero	13

SEMANA		**FECHA**	12/01/23	**HORA INICIO**	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES			Se encuentra la obra como se dejo el día Anterior		
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GRADERÍAS:** 1- Instalación de mampostería en adobe y bloque de concreto 2- demolición de estructura en concreto **GYM:** 1-instalacion de estructura metálica 2- limpieza y transporte de basura y escombros		
DESCRIPCIÓN			**GRADERÍAS:** se continua con trabajos de instalación de mampostería en adobe , al tiempo se instalan primeras hiladas de muros faltantes utilizando bloque de concreto previniendo futuras presencias de humedad por salpicadura , se realiza trabajo de demolición de la loza en concreto en la ubicación de redes hidrosanitarias utilizando machín mecánico **GYM:** Se realiza el acopio de toda la basura y materiales indicados en la visita el día anterior para su votada , se realiza el transporte hasta sitio de disposición final de escombros y basuras, También se realiza el transporte de lozas de caucha hasta donde e dio indicación por oficina de deportes , Se realiza limpieza general del escenario.		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			herramienta menor , machín mecánico		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	13

REGISTRO FOTOGRÁFICO







CLIMA	Cálido
OBSERVACIONES	Se deja contemplado en acta de visita a obra actividad y recomendaciones por parte de Edur

REALIZO		**HORA FIN**	5:30 p. m.

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	16/01/23	30/01/23

DATOS DE OBRA	
NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA
LOCALIZACIÓN:	El proyecto esta ubica en zona urbana como rural del municipio del Carmen de viboral , Antioquia

CONTRATO:	COP-004-2022-IP
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2022
FECHA FIN:	31 de diciembre de 2022
PRORROGADO HASTA	19 de abril de 2023
VALOR CONTRATO:	DOS MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS PESOS ($2.049.800.000)

DATOS DEL CONTRATANTE	
RAZÓN SOCIAL	Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de El Carmen de Viboral.
DIRECTOR OPERATIVO EDUR	Oscar Darío Londoño Rendón
DATOS DEL SUPERVISOR CONTRATANTE	
RAZÓN SOCIAL	
DIRECTOR	

RESPONSABLE DE LA OBRA	
RESIDENTE DE OBRA:	Felipe Alejndro Rojas Gómez
APOYO CONTRATISTA:	

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora numero	1

SEMANA		**FECHA**	16/01/23	**HORA INICIO**	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES			Se encuentra la obra como se dejo el día Anterior		
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GRADERÍAS:** 1- Instalación de mampostería en Adobe, 2- Instalación de ganchos internos en acero de refuerzo		
DESCRIPCIÓN			**GRADERÍAS:** Se continua con trabajos de instalación de mampostería en adobe en toda la zona perimetral y muros interiores del espacio de trabajo , llegando a la hilada final donde se adecuará cielo falso, dejando espacio para la próxima instalación de dovelas, Se realiza trabajo de instalación de ganchos internos cada 0.7 m ajustando todas las barras interiores de la estructura de acero de refuerzo correspondiente a las columnas. Se realiza limpieza del frente de obra		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			Adobe, Arena, cemento , Acero de refuerzo		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	1

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CLIMA	nublado
OBSERVACIONES	

REALIZO		**HORA FIN**	5:30 p. m.

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora numero	2

SEMANA		**FECHA**	17/01/23	**HORA INICIO**	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES			Se encuentra la obra como se dejo el día Anterior		
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GRADERÍAS:** 1- Instalación de cerramiento tipo sarán, 2 Recepción y acopio de material, 3- Instalación de mampostería en adobe		
DESCRIPCIÓN			**GRADERÍAS**: Se realiza refuerzo e instalación de cerramiento en costado colindante con Skate park , demarcando con cinta peligro todo el área y demarcando con letrero de Excavación profunda el punto donde se encuentra la excavaciones columna numero 12 pendiente por vaciar , el cerramiento se refuerza con tubería y doble cara para mayor seguridad, Se realiza trabajos de instalación de mampostería interior utilizando adobe , Se realiza recepción de material y acopio en parte exterior de frente de obra.		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			Arena, cemento, adobe , Tela verde tipo sarán, Cinta peligro , Letrero excavación profunda		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CLIMA	nublado permite trabajar
OBSERVACIONES	

REALIZO	FELIPE ROJAS	**HORA FIN**	5:30 a. m.

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora numero	3

SEMANA		**FECHA**	18/01/23	**HORA INICIO**	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES			Se encuentra la obra como se dejo el día Anterior		
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GRADERÍAS:** 1- Instalación de mampostería en adobe		
DESCRIPCIÓN			**GRADERÍAS:** se continua con trabajos de instalación de mampostería en muros internos y perimetrales del espacio de trabajo dando terminado hasta ultima hilada para su posterior terminado		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			Arena, cemento		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	3

REGISTRO FOTOGRÁFICO
 

CLIMA	Cálido
OBSERVACIONES	

REALIZO	FELIPE ROJAS	HORA FIN	4:00 p. m.

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora numero	4

SEMANA		**FECHA**	19/01/23	**HORA INICIO**	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES			Se encuentra la obra como se dejo el día Anterior		
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GRADERÍAS:** 1- Instalación de mampostería en adobe 2- instalación de ganchos internos en acero de refuerzo		
DESCRIPCIÓN			**GRADERÍAS:** se continua con trabajos de instalación de mampostería en muros internos y perimetrales del espacio de trabajo dando terminado hasta ultima hilada para su posterior terminado, se continua con el ajuste del acero de refuerzo y se procede a la instalación de los ganchos internos que cumplen la función de mantener en su sitio las barras verticales del área interna de la columna.		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			Arena, cemento, Adobes, herramienta menor , figurado		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	4

REGISTRO FOTOGRÁFICO


CLIMA	Clima cálido
OBSERVACIONES	

REALIZO		HORA FIN	5:00 p. m.


	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora numero	5

SEMANA		FECHA	20/01/23	HORA INICIO	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES			Se encuentra la obra como se dejo el día Anterior		
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GRADERÍAS** 1- Instalación de formaletas para columnas, 2- Vaceo de concreto para columnas		
DESCRIPCIÓN			**GRADERÍAS:** Se procede a instalar la formalete en las primeras 2 columnas, chequeando plomos, y distancias , Realizando ajuste en el acero de refuerzo para que se ubique correctamente al momento del fraguado , Se da inicio a la actividad de vaceo de concreto la cual debe ser suspendida por daño en la red eléctrica la cual debe ser solucionada por u eléctrico por solicitud de vigilante del escenario deportivo		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			Formaletas, tacos , arena , cemento , gravilla , herramienta menor		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	5

REGISTRO FOTOGRÁFICO



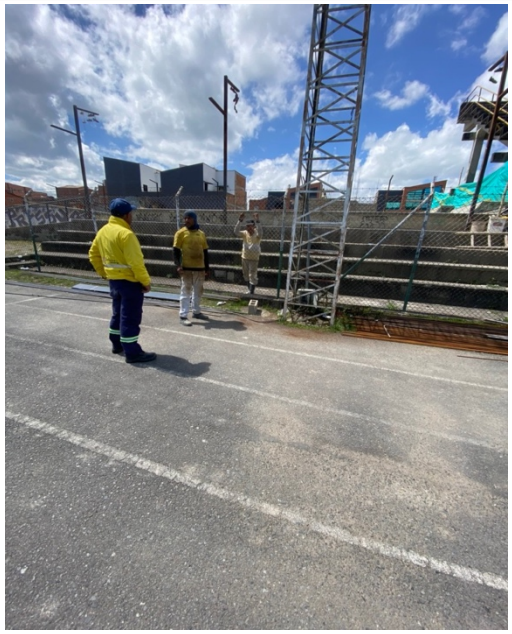

CLIMA	cálido
OBSERVACIONES	Se suspende tarea de vaceo de concreto por daño en instalación eléctrica


REALIZO		**HORA FIN**	4:00 p. m.

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora numero	10

SEMANA		**FECHA**	23/01/23	**HORA INICIO**	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES			Se encuentra la obra como se dejo el día Anterior		
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GRADERÍAS:** 1- Vaceo de concreto para columnas, 2- Movimiento de tierras, 3- demarcación con cinta peligro, 4- Arreglo instalación eléctrica		
DESCRIPCIÓN			**GRADERIAS** Se soluciona el problema de la red eléctrica con apoyo de eléctrico y se da inicio a la actividad de vaceo de concreto en columnas , donde se realiza vibración periódicamente para garantizar un correcto acabado , seguidamente se realiza cerramiento de servidumbre para la evacuación de material de excavación utilizando maquinaria .		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			maquinaria, concretadora, arena, cemento, gravilla , cinta peligro , herramienta menor		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	10

REGISTRO FOTOGRÁFICO

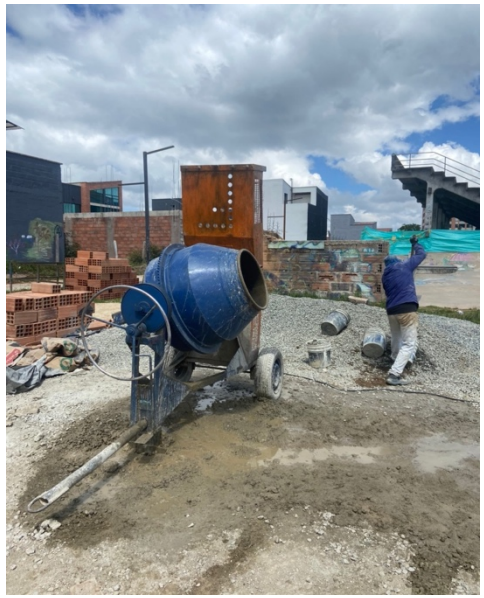





CLIMA	Cálido
OBSERVACIONES	

REALIZO		**HORA FIN**	6:00 p. m.

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora numero	11

SEMANA		FECHA	24/01/23	HORA INICIO	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES			Se encuentra la obra como se dejo el día Anterior		
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GRADERIAS:** 1- Retiro de formaletas, 2- limpieza de formaletas, 3- instalación de formaletas, 4- instalación de red eléctrica		
DESCRIPCIÓN			**GRADERIAS:** Se realiza el retiro de formaletas cuidadosamente en las vigas que fueron vaciadas anteriormente, se procede a realizar la limpieza engrase utilizando ACPM y posterior ubicación de una nueva columna para su próximo vaceo, Se realiza canchado e instalación de tuberías y cajas para red eléctrica.		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			formaletas, Tacos, Acpm , Pulidora, Tubería , Cajas , Herramienta menor		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	11

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CLIMA	nublado permite trabajos
OBSERVACIONES	

REALIZO		**HORA FIN**	5:30 p. m.

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora numero	12

SEMANA		**FECHA**	25/01/23	**HORA INICIO**	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES			Se encuentra la obra como se dejo el día Anterior		
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GRADERIAS:** 1- Retiro de formaletas, 2- limpieza de formaletas, 3- instalación de formaletas, 4- instalación de red eléctrica, **5-** demolición de estructura en concreto 6- vaciado concretos		
DESCRIPCIÓN			**GRADERIAS:** Se realiza el retiro de formaletas cuidadosamente en las vigas que fueron vaciadas anteriormente, se procede a realizar la limpieza engrase utilizando ACPM y posterior ubicación de una nueva columna para su próximo vaceo, Se realiza canchado e instalación de tuberías y cajas para red eléctrica. se realiza la demolición de loza en concreto por donde se ubicará la red hidrosanitaria utilizando martillo hidráulico., se realiza el vaceo de las columnas anteriormente aplomadas y chequeadas.		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			formaletas, Tacos, Acpm, Pulidora, Tubería , Cajas , Herramienta menor , martillo hidráulico		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	12

REGISTRO FOTOGRÁFICO







CLIMA	Nublado permite trabajos
OBSERVACIONES	

REALIZO		**HORA FIN**	5:30 p. m.

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora numero	13

SEMANA		**FECHA**	26/01/23	**HORA INICIO**	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES			Se encuentra la obra como se dejo el día Anterior		
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GRADERIAS:** 1- Retiro de formalete ría, 2 - limpieza de formaletas, 3- instalación de formaletas		
DESCRIPCIÓN			**GRADERIAS:** Se realiza el retiro de toda la formatearía y se hace una limpieza general, engrasando nuevamente utilizando ACPM y ubicando en columnas pendientes por vaciar, Se toma el tiempo de chequear plomos y distancias una con otra, Se realiza trabajo de demolición de estructura en concreto utilizando martillo hidráulico en área donde se instalará red hidrosanitaria.		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			formaletas, Tacos, Acpm , Pulidora, Tubería , Cajas , Herramienta menor , martillo hidráulico		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	13

REGISTRO FOTOGRÁFICO







CLIMA	Cálido
OBSERVACIONES	


REALIZO		**HORA FIN**	5:30 p. m.

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora numero	14

SEMANA		**FECHA**	27/01/23	**HORA INICIO**	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES			Se encuentra la obra como se dejo el día Anterior		
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GRADERIAS:** 1- Vaceo de concreto De columnas 2- visita de campo por parte de supervisión EDUR y Alcaldía a todos los frentes de obra, 3- Visita de rutina Personal seguridad y salud en el trabajo GIMNASIO: 1- Demolición De Muros		
DESCRIPCIÓN			**GRADERIAS:** Se realiza vaceo en columnas formateadas anteriormente, se chequean plomos periódicamente y realiza vibración utilizando vibro mecánico, se realiza visita de campo por parte de entes reguladores como alcaldía y EDUR, donde se toman decisiones importantes, también se realiza visita a campo y pequeña reunión informativa por parte del personal de seguridad y salud en el trabajo , **GIMNASIO**: Se realiza demolición de muros correspondientes a sauna .		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			herramienta menor, machín mecánico		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	14

REGISTRO FOTOGRÁFICO

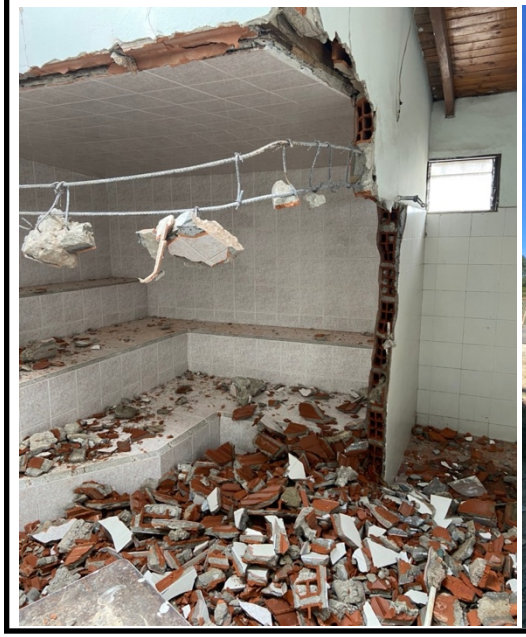



CLIMA	Cálido
OBSERVACIONES	

REALIZO		**HORA FIN**	5:30 p. m.

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora numero	15

SEMANA		**FECHA**	30/01/23	**HORA INICIO**	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES			Se encuentra la obra como se dejo el día Anterior		
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GRADERIAS:** 1- Demolición de estructura en concreto, 2- Instalación de tubería para red Sanitaria **GIMNASIO:** 1- Demolición de muros		
DESCRIPCIÓN			**GRADERÍA:** Se continua con trabajos de demolición de losa en concreto para la ubicación de tubería correspondiente a ramales de red hidrosanitaria, por todo el perímetro del escenario deportivo **GIMNASIO:** Se continua y finaliza con demolición de muros y estructura en concreto y madera correspondiente al sauna ubicado en el escenario deportivo , se Presenta daño en tubería de agua potable , la cual genera encharcamientos, Teniendo que realizar cerramiento del contador por unas horas mientras se soluciona el inconveniente.		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			herramienta menor		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	15

REGISTRO FOTOGRÁFICO


CLIMA	Cálido
OBSERVACIONES	

REALIZO		**HORA FIN**	5:30 p. m.

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora numero	16

SEMANA		**FECHA**	31/01/23	**HORA INICIO**	7:00 am
REGISTRO ESTADO DE OBRA AL INICIO DE ACTIVIDADES			Se encuentra la obra como se dejo el día Anterior		
ACTIVIDADES REALIZADAS			**GRADERIAS**: 1- Instalación de Red de Aguas residuales		
DESCRIPCIÓN			**GRADERIAS:** Se realiza instalación de Tubería correspondiente a ramales de red de aguas residuales y red de agua potable, dejando así salidas en cada punto acordado según planos constructivos, se colocan tapones para prevenir posibles daños por vandalismo.		
EQUIPO UTILIZADO Y MATERIALES			herramienta menor,		
PERSONAL PRESENTE			Felipe Alejandro Rojas		

	INFORMACIÓN GENERAL BITÁCORA DE OBRA	
	Bitácora Numero	16

REGISTRO FOTOGRÁFICO


CLIMA	Cálido
OBSERVACIONES	Se deja contemplado en acta de visita a obra actividad y recomendaciones por parte de Edur

REALIZO		**HORA FIN**	5:30 p. m.
