CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022
901649961

CIC_BTA_SED_050_2022_080

Bogotá, 21 de febrero de 2023

Señores:
Señores:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL
Arq. Edwin Alexander Santana Rodriguez
Lider Territorial Zona Norte
Avenida El Dorado No. 66 - 63
Bogotá D.C.

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022 CUYO OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"**

ASUNTO: **ENTREGA DE INFORME MENSUAL No.001 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022**

Cordial saludo,

En atención a las obligaciones contractuales derivadas del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.4146207 de 2022, el CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 remite a su dependencia informe mensual No.001 correspondiente a las actividades desarrolladas durante el periodo de 22 de diciembre de 2022 a 21 de enero de 2023 para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradecemos la atención prestada, cualquier duda y/o inquietud no dude en comunicarse con nosotros.

Atentamente,
CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022

FREDY GIOVANNI RODRÍGUEZ SALAZAR
Director de Interventoría

SE ANEXA LO ENUNCIADO EN DOSCIENTOS DIECISIETE (217) FOLIOS.

Elaboro: **CASP**
Reviso: **MAGR - FGRS**
Aprobó: **ARGF - FGRS**

Copia: P:\SECRETARIA_EDUCACION\EN_EJECUCION\CIC_SED_050_2022_COLEGIOS\CORRESPONDENCIA\OFICIOS

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022



"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA No. 001

PERIODO DE EJECUCIÓN:
22 DE DICIEMBRE 2022 A 21 DE ENERO DE 2023

VERSIÓN 0
ORIGINAL

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

El ORIGINAL del presente documento será entregado a la dependencia y entidad correspondiente, según se indica a continuación:

DEPENDENCIA	No DE COPIAS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO a través del supervisor Arq. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA – Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos SED.	Original
Biblioteca del Proyecto	1

Las observaciones que resulten de su revisión y aplicación deben ser informadas para proceder a realizar sus modificaciones pertinentes.

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

Índice Revisión	Capítulo Modificado	Fecha de Modificación	Observaciones
0	N/A	N/A	VERSIÓN ORIGINAL

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN


Titulo Documento		**INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA No.01**		
Revisión		**0**	**1**	**2**
Responsable elaboración	Nombre	Ing. Camilo Antonio Samacá Pesca		
	Firma			
	Fecha	23 de enero de 2023		
Responsable revisión	Nombre	Ing. Manuel Antonio González Romero		
	Firma			
	Fecha	24 de enero de 2023		
Responsable aprobación	Nombre	Arq. Fredy Giovanni Rodríguez Salazar		
	Firma			
	Fecha	25 de enero de 2023		

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE DISTRIBUCIÓN 2
ÍNDICE DE MODIFICACIONES 2
ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 2
1. INTRODUCCIÓN 10
1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 11
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 11
1.3. ANTECEDENTES 12
1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 13
1.5. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 14
1.5.1. LOCALIZACIÓN PARTICULAR 14
1.5.1.1. Colegio República de Guatemala, sede A 14
1.5.1.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia 15
1.5.1.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana 15
1.5.1.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A 16
1.5.1.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda 16
1.5.1.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada 17
1.5.1.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A 17
1.5.1.8. Colegio Francisco Primero, sede A 18
1.5.1.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A 18
1.5.1.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A 19
1.5.1.11. Colegio Florida Blanca, sede A 19
1.5.1.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A 20
1.5.1.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto 20
1.5.1.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A 21
1.5.1.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A, Garces Navas 21
1.5.1.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A 22
1.5.1.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, Sede A 22
1.5.1.18. Colegio Garcés Navas, sede A 23
1.5.1.19. Colegio República de Panamá, sede A 23
1.6. ACTIVIDADES DE OBRA 24
1.6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 24
1.6.2. ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS EN CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 26
1.6.2.1. Colegio República de Guatemala, sede A 26
1.6.2.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia 26
1.6.2.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana 26
1.6.2.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A 27
1.6.2.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda 27
1.6.2.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada 27
1.6.2.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A, ... 28
1.6.2.8. Colegio Francisco Primero, sede A 28
1.6.2.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A 28
1.6.2.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A 29
1.6.2.11. Colegio Florida Blanca, sede A 29
1.6.2.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A 29
1.6.2.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto 30
1.6.2.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A 30
1.6.2.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A, Garces Navas 30
1.6.2.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A 31
1.6.2.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, sede A 31
1.6.2.18. Colegio Garcés Navas, sede A 31
1.6.2.19. Colegio República de Panamá, sede A 31
2. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA 32

2.1. CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 - 2022 32
2.1.1. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA 32
2.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022 32
2.2.1. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 32
2.3. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 33
2.3.1. PERSONAL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 33
2.3.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA. 34
2.3.2.1. PERSONAL CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA 34
2.3.3. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA. 34
2.3.3.1. PERSONAL CONTRACTUAL DE LA INTERVENTORÍA 35
2.3.3.2. PERSONAL ADICIONAL DE LA INTERVENTORÍA 35
2.4. RECURSO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 35
2.4.1. RECURSOS DEL CONTRATISTA. 36
2.4.2. RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA. 36
3. INFORMACIÓN DEL ESTADO LEGAL, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL PROYECTO. 36
3.1. INFORMACIÓN LEGAL DEL PROYECTO. 36
3.1.1. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022. 36
3.1.2. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022. 37
3.3. INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE AVANCE DEL PROYECTO. 37
3.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL. 37
3.3.1.1. PRESUPUESTO GENERAL DEL CONTRATO DE CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022. 37
3.3.1.2. PRESUPUESTO POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022 38
3.3.1.2.1. Colegio República de Guatemala, sede A 39
3.3.1.2.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia 39
3.3.1.2.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana 39
3.3.1.2.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A 39
3.3.1.2.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda 41
3.3.1.2.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada 41
3.3.1.2.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A 42
3.3.1.2.8. Colegio Francisco Primero, sede A 44
3.3.1.2.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A 44
3.3.1.2.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A 44
3.3.1.2.11. Colegio Florida Blanca, sede A 46
3.3.1.2.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A 49
3.3.1.2.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto 53
3.3.1.2.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A 53
3.3.1.2.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A, Garces Navas 57
3.3.1.2.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A 58
3.3.1.2.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, sede A 58
3.3.1.2.18. Colegio Garcés Navas, sede A 58
3.3.1.2.19. Colegio República de Panamá, sede A 60
3.3.1.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022. 60
3.3.1.4. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022. 61
3.3.1.5. CONTROL DE FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022. 61
3.3.1.6. CONTROL DE PROGRAMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022. 62
3.3.2. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022. 62
3.3.2.1. VALORES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022. 63
3.3.2.2. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022. 63
3.3.2.3. CONTROL DE FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022. 63
3.4. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO: 63
3.4.1. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022. 64
3.4.2. CORRESPONDENCIA 64
3.5. ACTIVIDADES DE ORDEN TÉCNICO 66
3.5.1. ACTIVIDADES DE OBRA DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA. 66
3.5.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 66

3.5.2.1. Colegio República de Guatemala, sede A 66
3.5.2.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia 66
3.5.2.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana 66
3.5.2.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A 66
3.5.2.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda 67
3.5.2.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada 67
3.5.2.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A 67
3.5.2.8. Colegio Francisco Primero, sede A 68
3.5.2.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A 68
3.5.2.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A 68
3.5.2.11. Colegio Florida Blanca, sede A 68
3.5.2.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A 69
3.5.2.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto 69
3.5.2.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A 69
3.5.2.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A, Garcés Navas 70
3.5.2.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A 71
3.5.2.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, sede A 71
3.5.2.18. Colegio Garcés Navas, sede A 71
3.5.2.19. Colegio República de Panamá, sede A 71
3.5.3. PROBLEMAS Y SOLUCIONES PRESENTADOS 71
3.5.4. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA 71
3.5.5. CONTROL DE CALIDAD 72
3.5.6. REUNIONES EFECTUADAS 72
3.5.6.1. REUNIONES DE COMITÉ 72
3.5.6.2. REUNION DE RECONOCIMIENTO, REVISIÓN Y RECIBO DE ESPACIOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 73
3.5.7. REGISTRO FOTOGRÁFICO. 73
3.5.8. ANÁLISIS DE ENSAYOS DE LABORATORIO 73

3.6. GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 73

3.7. ACTIVIDADES DE ORDEN SOCIAL. 73
3.7.1. ACTAS DE VECINDAD 73
3.7.1.1. Colegio República de Guatemala 74
3.7.1.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay 74
3.7.1.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B 74
3.7.1.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED 74
3.7.1.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda 76
3.7.1.6. Colegio República de Colombia, sede C 76
3.7.1.7. Instituto Técnico Juan del Corral 76
3.7.1.8. Colegio Francisco Primero, sede A 78
3.7.1.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán 78
3.7.1.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A 78
3.7.1.11. Colegio Florida Blanca 81
3.7.1.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán 83
3.7.1.13. Colegio José Asunción Silva 85
3.7.1.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A 85
3.7.1.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A 87
3.7.1.16. Colegio Robert F Kennedy 89
3.7.1.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, sede A 89
3.7.1.18. Colegio Garcés Navas 89
3.7.1.19. Colegio República de Panamá 91

4. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 91

4.1. OBSERVACIONES 91

4.2. CONCLUSIONES 91

4.3. RECOMENDACIONES 92

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE GUATEMALA, SEDE A. 26
TABLA 2. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIDIA QUINTERO DE TURBAY, SEDE B, FLORENCIA 26
TABLA 3. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMÁS CARRASQUILLA IED, SEDE B, PANAMERICANA....26
TABLA 4. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIGUEL ANTONIO CARO IED, SEDE A. 27
TABLA 5. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE B, CIUDAD DE HONDA....27
TABLA 6. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SEDE C, NUEVA ESTRADA 28
TABLA 7. ALCANCE INSTITUTO TÉCNICO JUAN DEL CORRAL, SEDE A....28
TABLA 8. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO PRIMERO, SEDE A....28
TABLA 9. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA AYALA DE GAITÁN, SEDE A 29
TABLA 10. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE A 29
TABLA 11. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA FLORIDA BLANCA, SEDE A 29
TABLA 12. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN, SEDE A 30
TABLA 13. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ASUNCIÓN SILVA, SEDE B, SIDAUTO 30
TABLA 14. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, SEDE A 30
TABLA 15. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUSTO VÍCTOR CHARRY, SEDE A, GARCES NAVAS 30
TABLA 16. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROBERT F KENNEDY 31
TABLA 17. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL SIMÓN BOLÍVAR, SEDE A 31
TABLA 18. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA GARCÉS NAVAS, SEDE A 31
TABLA 19. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE PANAMÁ, SEDE A 31
TABLA 20. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA. 32
TABLA 21. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 33
TABLA 22. PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. 34
TABLA 23. PERSONAL MÍNIMO DE SAFRID INGENIERÍA S.A.S. 34
TABLA 24. PERSONAL MÍNIMO DE CONSORCIO INTER COLEGIOS. 35
TABLA 25. PERSONAL ADICIONAL. 35
TABLA 26. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS A DISPONIBILIDAD DEL CONTRATISTA. 36
TABLA 27. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS A DISPONIBILIDAD DE LA INTERVENTORÍA. 36
TABLA 28. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA 36
TABLA 29. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 37
TABLA 30. PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022. 38
TABLA 31. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE GUATEMALA, SEDE A. 39
TABLA 32. PRESUPUESTO ASIGNADO EDUCATIVA NIDIA QUINTERO DE TURBAY, SEDE B, FLORENCIA. 39
TABLA 33. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMÁS CARRASQUILLA IED – SEDE B, PANAMERICANA. 39
TABLA 34. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIGUEL ANTONIO CARO IED, SEDE A. 39
TABLA 35. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIGUEL ANTONIO CARO IED, SEDE A. 41
TABLA 36.PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE B, CIUDAD DE HONDA 41
TABLA 37. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SEDE C, NUEVA ESTRADA 41

TABLA 38. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUTO TÉCNICO JUAN DEL CORRAL, SEDE A 42
TABLA 39. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUTO TÉCNICO JUAN DEL CORRAL, SEDE A.....44
TABLA 40.PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO PRIMERO, SEDE A 44
TABLA 41. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA AYALA DE GAITÁN, SEDE A 44
TABLA 42. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE A.....44
TABLA 43. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE A.....46
TABLA 44.PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA FLORIDA BLANCA, SEDE A.....46
TABLA 45. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA FLORIDA BLANCA, SEDE A.....49
TABLA 46.PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN, SEDE A.....49
TABLA 47. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN, SEDE A.....53
TABLA 48. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ASUNCIÓN SILVA, SEDE B, SIDAUTO.....53
TABLA 49.PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, SEDE A.....53
TABLA 50. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, SEDE A.....57
TABLA 51.PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUSTO VÍCTOR CHARRY, SEDE A. 57
TABLA 52. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUSTO VÍCTOR CHARRY, SEDE A.....58
TABLA 53. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROBERT F KENNEDY, SEDE A.....58
TABLA 54. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL SIMÓN BOLÍVAR, SEDE A. 58
TABLA 55. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA GARCÉS NAVAS, SEDE A. 59
TABLA 56. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA GARCÉS NAVAS, SEDE A. 60
TABLA 57. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE PANAMÁ, SEDE A 60
TABLA 58. VALORES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA.....61
TABLA 59. TABLA DE VALORES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS DEL CONTRATO DE OBRA. 62
TABLA 60. VALORES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 63
TABLA 61. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA. 64
TABLA 62. CONTROL CORRESPONDENCIA. 66
TABLA 63. RELACIÓN DE REUNIONES Y SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS. 73
TABLA 63. RELACIÓN DE REUNIONES Y SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS. 73

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO....14
FIGURA 2. COLEGIO REPÚBLICA DE GUATEMALA (IED) – SEDE – REPÚBLICA DE GUATEMALA. 15
FIGURA 3. COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY (IED) – SEDE B – FLORENCIA. 15
FIGURA 4. COLEGIO TOMÁS CARRASQUILLA (IED) – SEDE B – PANAMERICANA. 16
FIGURA 5. COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO (IED). 16
FIGURA 6. COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS (IED) – SEDE B – CIUDAD DE HONDA. 17
FIGURA 7. COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA (IED) – SEDE C. 17
FIGURA 8. INSTITUTO TÉCNICO JUAN DEL CORRAL (IED) – SEDE –JUAN DEL CORRAL. 18
FIGURA 9. COLEGIO FRANCISCO PRIMERO (IED) – SEDE A – ALEMANIA. 18
FIGURA 10. COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITÁN (IED) – SEDE MANUELA AYALA DE GAITÁN. 19
FIGURA 11. COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS (IED) – SEDE A – I.T FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. 19
FIGURA 12. COLEGIO FLORIDA BLANCA (IED) – SEDE – FLORIDA BLANCA. 20
FIGURA 13. COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN (IED) – SEDE A. 20
FIGURA 14. COLEGIO JOSÉ ASUNCIÓN SILVA (IED) – SEDE – SIDAUTO. 21
FIGURA 15. COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ (IED) –SEDE A – RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ. 21
FIGURA 16. COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY (IED) – SEDE A – GARCÉS NAVAS – ZONA ESCOLAR NO. 4. 22
FIGURA 17. COLEGIO ROBERT F KENNEDY (IED) – SEDE ROBERT F. KENNEDY 22
FIGURA 18. COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR (IED) – SEDE A 23
FIGURA 19. COLEGIO GARCÉS NAVAS (IED) SEDE A. 23
FIGURA 20. COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ (IED) – SEDE A. 24

ÍNDICE DE GRÁFICAS

GRÁFICA 1. VALORES ASIGNADOS POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 38
GRÁFICA 2. VALORES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 61
GRÁFICA 3. VALORES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 62
GRÁFICA 4. VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 63
GRÁFICA 5. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO MIGUEL ANTONIO CARO. 67
GRÁFICA 6. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO JUAN DEL CORRAL. 68
GRÁFICA 7. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE A. 68
GRÁFICA 8. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO FLORIDABLANCA. 69
GRÁFICA 9. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO JORGE ELIECER GAITÁN. 69
GRÁFICA 10. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ. 70
GRÁFICA 11. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO JUSTO VÍCTOR CHARRY. 70
GRÁFICA 12. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO GARCÉS NAVAS. 71

1. INTRODUCCIÓN

La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - SED, puso a disposición de los interesados el Proceso de Contratación No. SED-LPDCCEE-039-2022 para la selección del Contratista encargado de ejecutar el Contrato de obra pública para "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.", la cual fue adjudicada a la firma SAFRID INGENIERÍA SAS con NIT. No.900.520.848-4, representado legalmente por MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA identificado con cédula de ciudadanía No.1.081.774.968, dando origen al Contrato No CO1.PCCNTR.4077642 de 06 de octubre de 2022, el cual fue firmado el día 06 de diciembre de 2022; con un valor de **TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($ 13.954.280.882)** incluido AIU. El plazo total previsto para la ejecución del contrato es de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio correspondiente, la cual se firmó el día 11 de enero de 2022.

Para la Interventoría del Contrato de Obra la Secretaría de Educación Distrital abrió el CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022, que tiene por objeto: " INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"." Este Contrato fue adjudicado al CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 con número de Nit. 901.649.961-8 representada legalmente por JORGE GÓMEZ FALLA identificado con cedula de ciudadanía No 72.007.216 de Barranquilla que a su vez está constituido por las empresas GNG PROYECTOS S.A.S BIC (50%) con número de Nit.901.477.828-7. representada legalmente por GUILLERMO EMILIO NARVÁEZ VÉLEZ identificado con cedula de ciudadanía No 72.201.382 de Barranquilla y GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. (50%) con número de Nit.901.383.717-3 representada legalmente por JORGE GÓMEZ FALLA identificado con cedula de ciudadanía No 72.007.216 de Barranquilla, dando origen al Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146207 del 24 noviembre de 2022; con un valor de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL**

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($ 951.138.738), y un plazo total para la ejecución del contrato de Trece (13) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de la etapa correspondiente, la cual se firmó el día 22 de diciembre de 2022.

El presente documento constituye el Informe mensual de Interventoría, en el cual se detallan las actividades ejecutadas en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 2022 a 21 de enero de 2023, por parte del Contratista SAFRID INGENIERÍA SAS; así mismo, se describen las actividades realizadas por el Interventor, CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022, dentro del mismo período, en el desarrollo de sus respectivos contratos.

El capítulo primero contiene la información general del proyecto, justificación, antecedentes, localización general y particular y las características técnicas del proyecto haciendo énfasis en el alcance establecido para cada una de las instituciones educativas.

El segundo capítulo corresponde a la información general del contrato de obra e interventoría en sus condiciones iniciales y actualizadas; así mismo, se relaciona el personal y los recursos involucrados en los contratos en mención.

El capítulo tercero corresponde a la información legal, financiera, administrativa, y técnica del proyecto, así como las actividades desarrolladas tanto por el contratista de obra como por la interventoría en los componentes de orden técnico, social y de seguridad y salud en el trabajo.

En el capítulo cuarto la interventoría realiza las observaciones, conclusiones y recomendaciones concernientes al desarrollo del contrato.

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la ejecución de reparaciones locativas correspondientes a: saneamiento básico, reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, reposición de sistema hidrosanitario, mejoramiento zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos y mejoramiento en general de los ambientes educativos y de trabajo, e igualmente en la atención de obras de que por necesidad o por circunstancias sobrevinientes, causados por fenómenos naturales, accidentes, situaciones antrópicas imprevisibles, y que resultan necesarias para garantizar el funcionamiento de las Instalaciones físicas, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física de los establecimientos educativos distritales las cuales deben ser atendidas de forma prioritaria; de allí se desarrolla la planificación para efectuar las intervenciones que sean necesarias a juicio de la supervisión de la Secretaría Distrital de Educación e interventoría, con ello, realizar sobre los planos existentes de cada Colegio los detalles constructivos, cálculos y presupuestos que

estén dentro del alcance del objeto: “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." – En las Localidades de Engativá y Barrios Unidos.

Por parte de la Secretaría de Educación Distrital se hizo entrega de los planos existentes de cada institución, dentro de los cuales se mencionan los siguientes:

- Planos Arquitectónicos.
- Planos Estructurales.
- Planos Eléctricos.
- Planos Hidrosanitarios.

1.3. ANTECEDENTES

En virtud a los lineamientos generales de la política educativa con respecto a la materialización del derecho a la educación: La política educativa de Bogotá se fundamenta en los principios constitucionales que definen la educación como un derecho fundamental, inalienable, esencial e inherente a la dignidad humana; un derecho indispensable para la formación integral del individuo, el acceso al conocimiento, la preservación y desarrollo de la cultura, la convivencia ciudadana y la integración social.

La materialización del derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes en la escuela depende de un espacio escolar digno, placentero y seguro. Las áreas dedicadas a aulas, sanitarios, recreación, laboratorios, auditorios y otros espacios especializados que proporcionen condiciones especiales que favorecen el aprendizaje e inciden en los resultados de calidad del sistema educativo. Además, el espacio y la dotación escolar potencian o debilitan el ambiente pedagógico e inciden en el comportamiento de los individuos. El establecimiento educativo y su infraestructura crean un espacio donde es posible la socialización, el conocimiento y la recreación. En este sentido, una institución escolar más que una obra arquitectónica, es un espacio al servicio de los procesos educativos, conformado por un conjunto de ambientes pedagógicos creados con finalidades culturales, sociales, académicas, creativas, intelectuales, éticas y recreativas.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 310 del 2022 la Secretaría de Educación del Distrito tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral.

De igual forma como acciones tendientes a garantizar la permanencia escolar, la promoción de la calidad educativa, prever y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y la buena presentación de las plantas físicas educativas y administrativas, la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, adelantó la priorización de obras menores y de mejoramiento con características de reparaciones locativas en las diferentes localidades de Bogotá, intervenciones que contribuyen a mejorar la infraestructura educativa en temas tales como, la atención prioritaria a las observaciones efectuadas por parte de Secretaria Distrital de Salud, obras menores de mitigación ante posibles riesgos y el mantenimientos correctivo, entre otros aspectos relacionados, obteniendo como resultado para el presente proceso, de selección de un total de doscientas veintitrés (223) plantas físicas, determinando 198 sedes educativas y 25 sedes administrativas, las cuales se encuentran ubicadas en las veinte (20) localidades de Bogotá D.C

En el marco de las metas definidas en el Plan de Desarrollo “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C”, Programa Línea Estratégica: 4 -Inclusión Educativa para la Equidad, Proyecto Estratégico: Ambientes de Aprendizaje para la Vida, se incluyó oportunamente la intervención de obras menores y adecuaciones del cien por ciento de instituciones educativas priorizadas en materia de mejoramientos, buscando conservar y mejorar los espacios de los colegios ofreciendo espacios dignos de convivencia y que ofrezca las mejores condiciones para una verdadera educación de calidad, para las cuales también se hace necesario contratar el seguimiento, vigilancia y control de las actividades de obra por parte, de un tercero con las calidades técnicas, jurídicas y financieras del caso.

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta que la Secretaría de Educación del Distrito cuenta con algunas infraestructuras con una antigüedad de más de cuarenta (40) años, es conveniente y necesario realizar inversiones en el mejoramiento y mantenimiento continuo de la infraestructura escolar y administrativa actual, con el fin de propiciar espacios adecuados para la construcción de saberes de los niños y niñas del Distrito, garantizando a su vez el correcto seguimiento a dichas actividades.

La población beneficiada del proyecto incluye niños, niñas y jóvenes de la ciudad de Bogotá y ofrece cobertura en toda la ciudad. Igualmente, en la institución educativa trabajan un equipo de docentes, directivos docentes y administrativos de la SED, los cuales también se verían beneficiados al contar con nuevos espacios para impartir clase y áreas administrativas de atención a la comunidad, adicionalmente la comunidad educativa conformada por padres de familia y los habitantes de la zona de influencia de cada uno de los colegios.

Con estas doscientas veintitrés (223) intervenciones se beneficiará una población aproximada de ochenta mil (80.000) estudiantes para todas las localidades de la ciudad de Bogotá D.C, en entornos urbanos y rurales, involucrando en su desarrollo estrategias de empleabilidad a jóvenes, mujeres, en empleos directos e indirectos.

1.5. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado al noroccidente de la ciudad de Bogotá, más precisamente en la localidad de Engativá y Barrios Unidos.

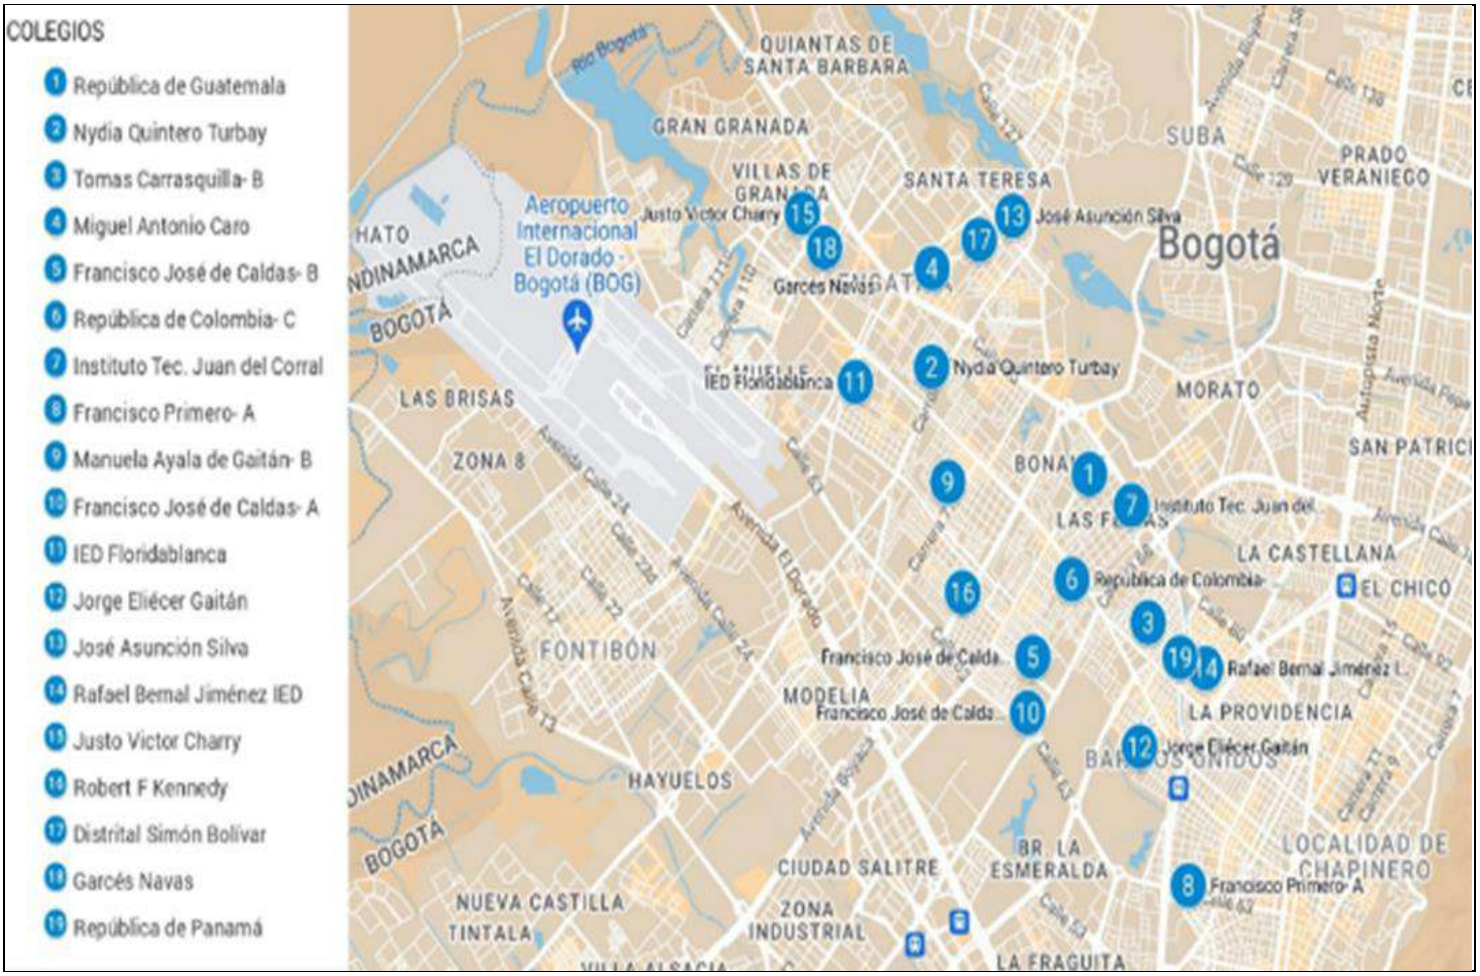


Figura 1 Localización general del proyecto
Fuente://www.google.com.co/maps/.

1.5.1. LOCALIZACIÓN PARTICULAR

1.5.1.1. Colegio República de Guatemala, sede A

El colegio República de Guatemala se encuentra localizado en la Calle 78 Bis #68a – 45, localidad de Engativá.



Figura 2. Colegio República de Guatemala (IED) – Sede – República de Guatemala.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia

El colegio Nidia Quintero de Turbay se encuentra localizado en Dg. 74b #87-40, localidad de Engativá.



Figura 3. Colegio Nidia Quintero de Turbay (IED) – Sede B – Florencia.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana

El colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, se encuentra localizado en Cl. 75A #63-55, localidad de Barrios Unidos.

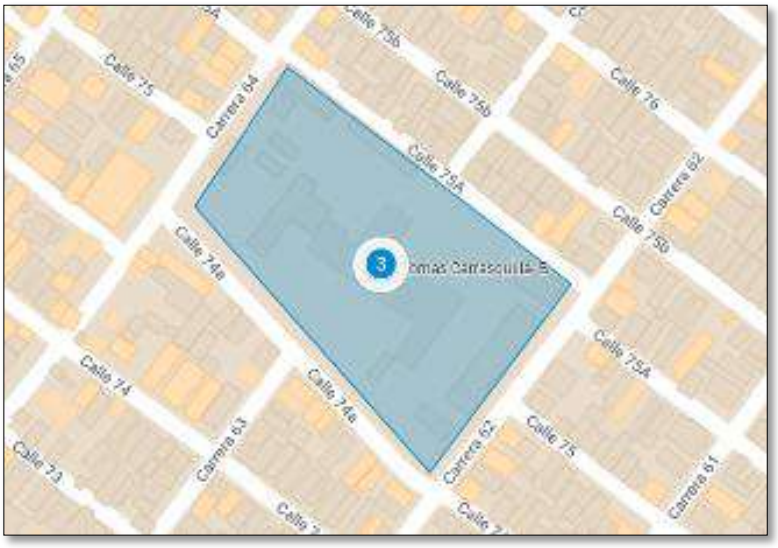


Figura 4. Colegio Tomás Carrasquilla (IED) – Sede B – Panamericana.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A

El colegio Miguel Antonio Caro IED, se encuentra localizado en Tv. 94 # 81A-29, localidad de Engativá.

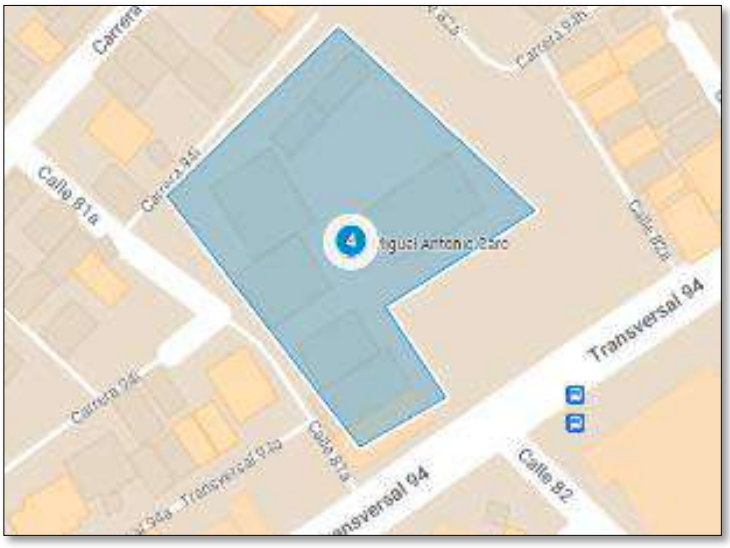


Figura 5. Colegio Miguel Antonio Caro (IED).
Fuente: Google Eath.

1.5.1.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda

El colegio Francisco José de Caldas, Sede B, se encuentra localizado en Cl. 64f Bis #68g -54, localidad de Engativá.



Figura 6. Colegio Francisco José de Caldas (IED) – Sede B – Ciudad de Honda.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada

El colegio República de Colombia, Sede C, se encuentra localizado en Cra. 68h #71A-01, localidad de Engativá.



Figura 7. Colegio República de Colombia (IED) – Sede C.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A

El Instituto técnico Juan del Corral, se encuentra localizado en Cra. 69b #79A-42, localidad de Engativá.

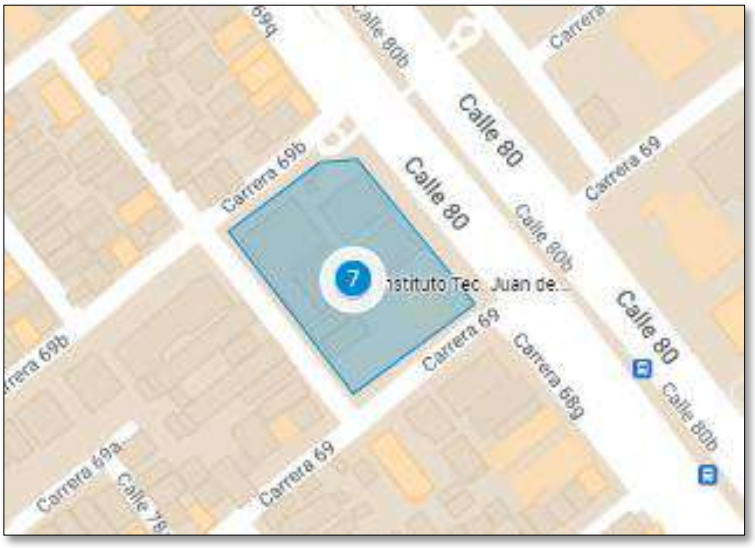


Figura 8. Instituto Técnico Juan del Corral (IED) – Sede –Juan del Corral.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.8. Colegio Francisco Primero, sede A

El Colegio Francisco Primero, Sede A, se encuentra localizado en Cra. 28 #63-64, localidad de Barrios Unidos.



Figura 9. Colegio Francisco Primero (IED) – Sede A – Alemania.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A

El Colegio Manuela Ayala de Gaitán, se encuentra localizado en Cra. 78 #69 A -11, localidad de Engativá.



Figura 10. Colegio Manuela Ayala de Gaitán (IED) – Sede Manuela Ayala de Gaitán.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A

El Colegio Francisco José de Caldas se encuentra localizado en Cra. 68f #63B-02, localidad de Engativá.



Figura 11. Colegio Francisco José de Caldas (IED) – Sede A – I.T Francisco José de Caldas.
Fuente: Google Eath.

1.5.1.11. Colegio Florida Blanca, sede A

El Colegio Florida Blanca, se encuentra localizado en Cra. 68f #63B-02, localidad de Engativá.



Figura 12. Colegio Florida Blanca (IED) – Sede – Florida Blanca.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A

El Colegio Jorge Eliecer Gaitán, se encuentra localizado en Cra. 54 #65- 85, localidad de Barrios Unidos.

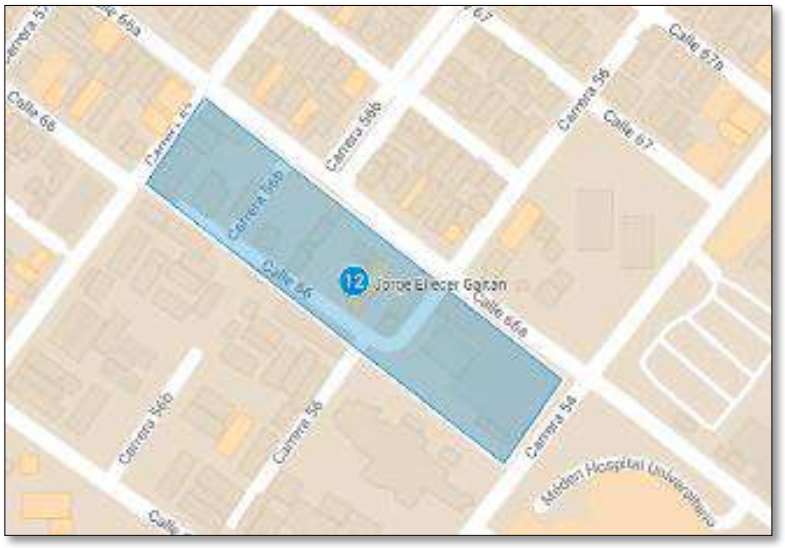


Figura 13. Colegio Jorge Eliecer Gaitán (IED) – Sede A.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto

El Colegio José Asunción Silva se encuentra localizado en Cl. 91 #16A - 82, localidad de Engativá.



Figura 14. Colegio José Asunción Silva (IED) – Sede – Sidauto.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A

El Colegio Rafael Bernal Jiménez, Sede A, se encuentra localizado en Cr 53 #75-17, localidad de Barrios Unidos.



Figura 15. Colegio Rafael Bernal Jiménez (IED) –Sede A – Rafael Bernal Jiménez.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A, Garces Navas

El Colegio Justo Víctor Charry, Sede A, se encuentra localizado en Cra. 108 #21, localidad de Engativá.



Figura 16. Colegio Justo Victor Charry (IED) – Sede A – Garcés Navas – Zona Escolar No. 4.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A

El Colegio Robert F Kennedy, se encuentra localizado en Av. Boyacá #64h - 39, localidad de Engativá.



Figura 17. Colegio Robert F Kennedy (IED) – Sede Robert F. Kennedy
Fuente: Google Earth.

1.5.1.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, Sede A

El Colegio Distrital Simón Bolívar, Sede A, se encuentra localizado en Cra. 92 #86 - 18, localidad de Engativá.



Figura 18. Colegio Simón Bolívar (IED) – Sede A
Fuente: Google Earth.

1.5.1.18. Colegio Garcés Navas, sede A

El Colegio Garcés Navas, se encuentra localizado en Cl. 78 #104a-2, localidad de Engativá.



Figura 19. Colegio Garcés Navas (IED) Sede A
Fuente: Google Earth.

1.5.1.19. Colegio República de Panamá, sede A

El Colegio República de Panamá, se encuentra localizado en Cl. 75 #55a-29, localidad de Barrios Unidos.



Figura 20. Colegio República de Panamá (IED) – Sede A.
Fuente: Google Earth.

1.6. ACTIVIDADES DE OBRA

1.6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para la ejecución del proyecto se establecen los diagnósticos técnicos de las Instituciones Educativas a fin de brindar solución a las necesidades de cada una, de esta manera, se realiza la priorización de obras menores y de mejoramiento con características de reparaciones locativas en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, con ello, se efectuarán intervenciones que mejoran la infraestructura educativa en situaciones de atención prioritaria a las observaciones efectuadas por parte de la entidad contratante, obras menores de mitigación de posibles riesgos y mantenimientos correctivos, acorde con los requerimientos institucionales y de estudiantes que harán uso de estos espacios.

En atención a lo manifestado en visitas, reuniones previas al inicio de las obras, comités efectuados conjuntamente entre Supervisor de Contrato (SED), Contratista (SAFRID INGENIERÍA SAS) e Interventoría (CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022), y con base en los diagnósticos realizados, se identificó las insuficiencias y las soluciones a implementar para brindar seguridad, comodidad y estética a las instituciones a intervenir, de manera que, se presentaron las alternativas de mantenimiento y presupuestos ajustados acorde a cada necesidad y a la CARTILLA ILUSTRATIVA DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO (SED).

De este modo, de manera general las actividades a realizar en las instituciones educativas corresponden a:

- **LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO**: Se refiere a todas las actividades necesarias de topografía y localización del área a ser intervenida.

- **CERRAMIENTO**: Obras necesarias de aislamiento contra personas ajenas para evitar el tránsito y riesgo de accidentes.

- **DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO:** Actividad necesaria para la adecuación del área donde se realizarán las intervenciones.

- **DESMONTE:** Retiro de mobiliarios como puertas, ventanas, carpintería metálica, así como redes eléctricas, cielos rasos y cubiertas, entre otros.

- **EXCAVACIONES MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS:** Obras para la construcción de la cimentación y adecuación de las áreas aledañas al sitio de obra.

- **ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO:** Actividades de construcción de soporte del edificio.

- **MAMPOSTERÍA:** Se refiere a las actividades de cerramiento de los pórticos y muros.

- **INSTALACIONES ELÉCTRICAS:** Actividades que tienen como objetivo dotar de energía eléctrica a las edificaciones e infraestructuras.

- **INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS:** Sistema de elementos (tuberías, bombas, válvulas, tanques, etc.) que se conectan entre sí para transportar determinadas cantidades de agua.

- **ENCHAPES, PINTURA, PAÑETE Y APARATOS SANITARIOS:** Obras necesarias para la entrega de las obras con las especificaciones necesarias para el buen uso de estas áreas.

- **CUBIERTA - CIELO RASO:** Adecuación de techos con las especificaciones técnicas establecidas.

- **CARPINTERÍA METÁLICA DE MADERA Y VIDRIOS:** Elementos que se instalan en los vanos dejados en la mampostería y para control en los accesos.

- **OBRAS EXTERIORES:** Todas las actividades necesarias de conectividad y urbanismo necesarias para acceder al edificio.

- **OTRAS OBRAS**: Se contemplan algunas obras complementarias como reparación de senderos, traslado de acometidas y aseo y disposición final.

1.6.2. ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS EN CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

A continuación, se relacionan las actividades priorizadas en cada una de las instituciones educativas de acuerdo a lo expresado por la Supervisión de la secretaria de Educación de Bogotá.

1.6.2.1. Colegio República de Guatemala, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Calle 78 Bis #68a - 45	Mejoramiento de Canchas.	N/A	NO CUMPLE
	Baterías Sanitarias.	Intervención completa	CUMPLE
	Cambio de Cubierta.	Bloque C	CUMPLE
		Retirar antepecho	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Instalación de Baranda	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Patio.	N/A	NO CUMPLE

Tabla 1. Alcance Institución Educativa República de Guatemala, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

1.6.2.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Dg. 74b #87-40	Mejoramiento de cubierta	2 bloques / Intervención integral de cubierta. Revisar necesidad de estructura - Ventilación de aulas.	CUMPLE
	Patio.	Demolición de Tarima	CUMPLE
	Desagües.		NO CUMPLE
		Mejoramiento de baterías sanitarias	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Shut de Basuras	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Cuarto de refrigerios.	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Ventanería.	Pintura en carpintería metálica	CUMPLE

Tabla 2. Alcance Institución Educativa Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia
Fuente: Elaboración Propia.

1.6.2.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cl. 75A #63-55	Baterías Sanitarias (Incluye Cubiertas).	Rehabilitación de baterías sanitarias - 2 bloques.	CUMPLE
	Mejoramiento de Patio y materas.	Remodelación patio y materas (Contenedores).	CUMPLE

Tabla 3. Alcance Institución Educativa Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana
Fuente: Elaboración Propia.

1.6.2.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Tv. 94 # 81A-29	Se realizará valoración de los especialistas de la DCCEE a la estructura de los bloques existentes con el propósito de establecer situación actual y posibles intervenciones mientras se realizan nuevos estudios y obtención de licencia de construcción. Se evidencia alto deterioro en cubiertas de asbesto cemento y en piso de patio y canchas (requerimiento secretaria de Salud)	Reconocimiento de cubierta con dron. Ajuste de cubierta, canales, piezas necesarias y bajantes (impermeabilización).	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

Tabla 4. Alcance Institución Educativa Miguel Antonio Caro IED, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

1.6.2.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cl. 64f Bis #68g - 54	Mejoramiento de Batería Sanitaria.	Baño y lavamanos	CUMPLE
	Staff room, salón de educación física	Demolición de divisiones Cambio de cubierta. Tanque Mejoramiento integral	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Adecuar Shut de basuras	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Mejoramiento de Patio.	Limpieza de zonas húmedas, Rehabilitación de cancha, demolición de placas, instalación de asfalto. (Conceptos técnicos).	CUMPLE

Tabla 5. Alcance Institución Educativa Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda
Fuente: Elaboración Propia.

1.6.2.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 68h #71A-01	Mejoramiento de Desagües.	Impermeabilización de techo y bajantes. Caja más profunda. Revisar viga canal y bajantes de cubierta.	CUMPLE
	Mejoramiento Equipo de Bombeo.	Revisar estado de bombas	CUMPLE
	Cancha deportiva.	Sellos de fisura y demarcación. Cambio de tableros de canchas.	CUMPLE
		Instalación de Cubierta en pasillo Cancha.	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Tratamiento de filtraciones de Cubierta.	Impermeabilización de Cubierta.	CUMPLE
		Cuarto de Servicio	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Ajustar cuarto de seguridad a Vestier.	ACTIVIDAD ADICIONAL

		Revisar filtraciones, humedades	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Reforzamiento de ventanas.	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Mejoramiento de Cuarto de Refrigerios.	Cubierta de cuarto de refrigerios y cocina, reubicación de los mismos.	CUMPLE

Tabla 6. Alcance Institución Educativa República de Colombia, sede C, Nueva Estrada
Fuente: Elaboración Propia.

1.6.2.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A,

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 69b #79A-42	Impermeabilización de Cubiertas Planas	Pasillos, escalera, biblioteca acceso. Mortero y manto de impermeabilización, sifón. Impermeabilización de puente (alternativas para evitar mantenimientos continuos). Flanches en cubierta.	CUMPLE
	Sistemas de desagües en sótano.	Redistribución de tubería - Anclajes.	CUMPLE

Tabla 7. Alcance Instituto Técnico Juan del Corral, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.8. Colegio Francisco Primero, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 28 #63-64	Mejoramiento de Cubiertas	AULAS 16,17, 18, 19. Bloque sur calle 63. Pintura.	CUMPLE
	Ventanería.	Casona Norte, Bloque sur Calle 63	CUMPLE
	Batería sanitaria.		NO CUMPLE
		Pintura y pisos.	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Zonas exteriores	Shut de basuras.	CUMPLE

Tabla 8. Alcance Institución educativa Francisco Primero, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 78 #69 A -11	Áreas exteriores	Organizar Cancha (Cambio de sentido), malla de cerramiento, mejoramiento de capa de asfalto, zona de volley ball demolición de baldosa, Demolición de muros en espacio público.	CUMPLE
	Cubierta bloque antiguo.	Bloque antiguo.	CUMPLE
	Pisos.	Demolición de baldos y ajuste.	CUMPLE
	Shut de basuras.	Shut de basuras.	CUMPLE
		Salón de educación física	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Mejoramiento de tanque de reserva agua.		NO CUMPLE
	Sistema hidroneumático.	EAAB	CUMPLE

Tabla 9. Alcance Institución educativa Manuela Ayala de Gaitán, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 68f #63B-02	Cambio de Cubierta.	Cambio de cubierta Coliseo. Cubierta entre coliseo y bloque de salones.	CUMPLE
	Baterías sanitarias.		NO CUMPLE
	Pisos.	Sendero con cubierta. Coliseo - Bloque bachillerato.	CUMPLE
	Iluminación.	Iluminación Coliseo - Bloque bachillerato.	CUMPLE
		Ventanería coliseo y Bloque bachillerato.	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Pintura coliseo y Bloque bachillerato.	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Ventilación Cruzada.		NO CUMPLE

Tabla 10. Alcance Institución educativa Francisco José de Caldas, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.11. Colegio Florida Blanca, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 68f #63B-02	Cubierta.	Mantenimiento general bloque SENA (Pendiente por definir).	NO CUMPLE
	Pisos.	Pisos.	CUMPLE
	Ventanería.	Ventanería.	CUMPLE
	Adecuación área de servicios generales.	Adecuación área de servicios generales.	CUMPLE
	Piso Parqueadero y canchas.	Priorizar mejoramiento de canchas y parqueadero.	CUMPLE

Tabla 11. Alcance Institución educativa Florida Blanca, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 66ª #44-35	Mejoramiento de Cubiertas en Bloque de aulas y coliseo.	Bloque occidental sede A.	CUMPLE
	Recuperación de Instalaciones - recolección de aguas lluvia.		NO CUMPLE
		Ventanería	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Sistema de iluminación general	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Mejoramiento de baterías sanitarias	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Mejoramiento de cancha occidental y pisos de patios.		CUMPLE

Tabla 12. Alcance Institución educativa Jorge Eliecer Gaitán, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cl. 91 #16A - 82	Áreas exteriores.	Mejoramiento de pasillo en L.	CUMPLE
	Cubiertas.	Cambio de Cubierta salones y área administrativa.	CUMPLE
	Pisos.	Salones	CUMPLE
		Shut de Basuras	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Adecuación Cuarto de Servicio generales y Refrigerio	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Pintura	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Iluminación	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Ventanería.	Ventanería salones y área administrativa	CUMPLE
	Muros	Shut basuras	CUMPLE

Tabla 13. Alcance Institución educativa José Asunción Silva, sede B, Sidauto
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cr 53 #75-17	Mejoramiento cubierta aula múltiple y policarbonato en marquesina.	Cambio de cubierta aula múltiple y comedor. Cambio de cubierta de policarbonato de aula principal.	CUMPLE
		Pintura general interior - exterior. / murales.	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Shut de Basura	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Instalación de césped	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Carpintería metálica	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Pisos.	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Cerramiento.		NO CUMPLE
	Canales.		NO CUMPLE
	Bajantes.		NO CUMPLE
	Rejilla de Cárcamo.		NO CUMPLE

Tabla 14. Alcance Institución educativa Rafael Bernal Jiménez, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A, Garces Navas

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 108 #21	Mantenimiento de acabados de baños.	Baterías sanitarias. Soportes en fachada y acceso a cubierta.	CUMPLE

Tabla 15. Alcance Institución educativa Justo Víctor Charry, sede A, Garces Navas

Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Av. Boyacá #64h - 39	Mejoramiento de cubiertas.	Cambio de cubierta Administrativo, Enfermería, depósito y aulas. Revisión y ajuste de desagües.	CUMPLE
	Mejoramiento de Canchas.	Demoler y construcción de cancha.	CUMPLE

Tabla 16. Alcance Institución educativa Robert F Kennedy
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 92 #86 - 18	Mejoramiento de cubiertas bloque de aulas y auditorio, incluye instalaciones eléctricas y ventilación.	Mejoramiento integral de bloque costado sur - oriental cubierta incluye cubierta, pisos, pintura, ventanería, sistema de iluminación. Demolición de mesones laboratorio. Reforzamiento de estructuras de cubierta. Ajuste de canales, mejoramiento de paredes fisuradas.	CUMPLE

Tabla 17. Alcance Institución educativa Distrital Simón Bolívar, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.18. Colegio Garcés Navas, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cl. 78 #104a-2	Mejoramiento de cubiertas.	Mejoramiento integral de bloque con teja de fibrocemento prexistente incluye Pintura general, iluminación, ventanería, pisos. cambio de cubierta.	CUMPLE
	Baterías sanitarias		NO CUMPLE
	Cafetería	Demolición y construcción de salón polivalente en estructura metálica (opcional).	CUMPLE

Tabla 18. Alcance Institución educativa Garcés Navas, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.19. Colegio República de Panamá, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cl. 75 #55a-29	Mejoramiento de Áreas de Comedor.	Demolición de tarima, construcción de muros divisorios, instalación de enchape, cambio de cubierta, construcción de comedor, instalación de mesones en acero inoxidable, cuartos fríos acorde a especificaciones SED.	CUMPLE

Tabla 19. Alcance Institución educativa República de Panamá, sede A
Fuente: Elaboración Propia

2. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

2.1. CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 - 2022

2.1.1. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relaciona la información inicial del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.	
Objeto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
No. Contrato	CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.
Contratista	SAFRID INGENIERÍA SAS
NIT.	900.520.848-4
Representante legal	MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA
Plazo inicial	12 MESES
Fecha de inicio	11 DE ENERO DE 2023
Fecha de finalización	10 DE ENERO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.	
Sub - total	$ 10,949,686,818.90
Administración obra 20,94%	$ 2,292,864,419.88
Imprevistos 1.50%	$ 164,245,302.28
Utilidad 5%	$ 547,484,340.94
IVA sobre utilidad 19%	$ 104,022,024.78
Valor total inversión	$ 13,954,280,882.00

Tabla 20. Condiciones iniciales del contrato de obra.

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022

2.2.1. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A continuación, se relaciona la información inicial del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022	
Objeto	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
No. Contrato	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022
Contratista	CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022
Nit.	901.649.961-8
Representante legal	JORGE GÓMEZ FALLA
Plazo	13 MESES
Fecha de inicio	22 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de finalización	21 DE ENERO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022	
Costo básico	$ 770,422,377.78
IVA 19%	$ 180,716,360.22
Total	$ 951,138,738.00

Tabla 21. Condiciones iniciales del contrato de interventoría.

2.3. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

Durante el desarrollo de los contratos de Obra e Interventoría, cada una de las partes cuenta con el talento humano que se relaciona a continuación:

2.3.1. PERSONAL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

La Secretaría de educación distrital cuenta con el siguiente personal:

Cargo	Nombre
Supervisor de interventoría	Arq. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

Líder Territorial Zona Norte	Arq. EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRÍGUEZ
Apoyo a la supervisión	Arq. JUAN CARLOS VALENCIA GAMBA

Tabla 22. Personal de la secretaria de educación distrital.

2.3.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA.

2.3.2.1. PERSONAL CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA

El contratista SAFRID INGENIERÍA SAS, cuenta con el siguiente personal para el desarrollo o ejecución de su compromiso contractual.

Cargo	Cant.	Nombre
Representante Legal	1	MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA
Director de Obra	1	LUIS EDUARDO MONTES ÁLVAREZ
Residente de obra No.1	1	LUZ ÁNGELA CAÑÓN RIVERA
Residente de obra No.2	1	ADRIANA PAOLA MÉNDEZ NAVARRO
Asesor Estructural	1	ANCIZAR PÉREZ CERVERA
Asesor Ambiental	1	NATALIA CARRANZA CEPEDA
Asesor en redes eléctricas	1	FRANK ALEXIS SÁNCHEZ SANTAMARÍA
Asesor en redes hidrosanitarias, gas y red contraincendios	1	OLGA LUCIA TORRES CAMARGO
Profesional de Costos, presupuestos y programación.	1	JEFFERSON SMIT RIVERA VELÁZQUEZ
Técnico SST No.1	1	SANDRA MILENA HUERTAS BARBOSA
Técnico SST No.2	1	ANGY LORENA OROZCO MONTILLA
Técnico SST No.3	1	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO
Técnico SST No.4	1	YINNA CONSTANZA BLANCO ARENAS
Inspector de obra No. 1	1	JOSÉ DAVID ACUÑA CARVAJAL
Inspector de obra No. 2	1	HENRY ORTIGOZA MONTEALEGRE
Inspector de obra No. 3	1	MILLER ALBERTO CASTAÑEDA MONCADA
Inspector de obra No. 4	1	CAMILO ANDRÉS CÁRDENAS RODRÍGUEZ
Maestro de obra	1	MANUEL GUILLERMO MARULANDA

Tabla 23. Personal mínimo de Safrid Ingeniería S.A.S.

2.3.3. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA.

2.3.3.1. PERSONAL CONTRACTUAL DE LA INTERVENTORÍA

Para el desarrollo del compromiso contractual, **CONSORCIO INTER COLEGIOS**, cuenta con el siguiente personal:

Cargo	Cant.	Nombre
Representante Legal	1	JORGE GÓMEZ FALLA
Director de Interventoría	1	FREDY GIOVANNI RODRÍGUEZ SALAZAR
Residente de interventoría No. 1	1	CAMILO ANTONIO SAMACÁ PESCA
Residente de interventoría No. 2	1	RODOLFO CASTRO ORTEGÓN
Asesor estructural	1	JAIRO ANDRÉS MEZA ROSAS
Asesor ambiental	1	STEVEN ALEXANDER IBARRA SANABRIA
Asesor eléctrico	1	HERNANDO GÓMEZ CASAS
Asesor hidráulico	1	GUILLERMO EMILIO NARVÁEZ VÉLEZ
Asesor de costos y presupuestos	1	ENRIQUE LUIS MONROY MALDONADO
Abogado	1	MILENA MERCEDES ALBORNOZ VILLOTA
Inspector de interventoría No. 1	1	CAMILO FANDIÑO HERNÁNDEZ
Inspector de interventoría No. 2	1	NATALIA VANESSA CALDERÓN ACEVEDO
Maestro de obra	1	CRISTIAN VARGAS ÁLVAREZ
Inspector SST No. 1	1	JESSICA PAOLA CARRILLO ALBINO
Inspector SST No. 2	1	ANA LUCY MENESES MUÑOZ

Tabla 24. Personal mínimo de Consorcio Inter colegios.

2.3.3.2. PERSONAL ADICIONAL DE LA INTERVENTORÍA

Para el desarrollo del compromiso contractual e integral, CONSORCIO INTER COLEGIOS, conto con el siguiente personal adicional:

Cargo	Cant.	Nombre
Coordinador de proyectos	1	Manuel Antonio González Romero
Ingeniera auxiliar	1	Paola Stefania Marquéz Díaz
Auxiliar de Ingeniería	1	Luis Felipe Lavado Alfonso

Tabla 25. Personal adicional.

2.4. RECURSO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

2.4.1. RECURSOS DEL CONTRATISTA.

SAFRID INGENIERÍA S.A.S., en su compromiso contractual debe suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra de cada sede a intervenir, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de estos en el sitio de las obras; además contará con la siguiente maquinaria y/o equipos:

Cantidad	Equipo
1	Oficina
5	Equipo de oficina (Computadores, celulares)
1	Impresora y fotocopiadora

Tabla 26. Maquinaria y/o equipos a disponibilidad del contratista.

2.4.2. RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA.

Para el desarrollo del compromiso contractual, **CONSORCIO INTER COLEGIOS**, cuenta con la siguiente maquinaria y/o equipos:

Cantidad	Equipo
1	Oficina
4	Equipo de oficina (Computadores, celulares)
1	Impresora y fotocopiadora

Tabla 27. Maquinaria y/o equipos a disponibilidad de la interventoría.

3. INFORMACIÓN DEL ESTADO LEGAL, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL PROYECTO.

3.1. INFORMACIÓN LEGAL DEL PROYECTO.

3.1.1. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Fecha aprobación	14-10-2022		
Número	14-44-101164899		
Amparo	**Valor ($)**	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 2.790.856.176,40	06-10-2022	06-04-2024
Estabilidad y Calidad de la obra	$ 2.790.856.176,40	06-10-2023	06-10-2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 1.395.458.088,20	06-10-2022	06-10-2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	$697.714.044,10	06-10-2022	06-10-2023

Tabla 28. Pólizas actualizadas del contrato de obra

3.1.2. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022.

Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL		
Fecha aprobación	29/11/2022		
Número	NB-100235369		
Amparo	**Valor ($)**	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**
Cumplimiento	$190.227.747,60	25/11/2022	25/06/2024
Pago salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales	$ 47.556.936,90	25/11/2022	25/12/2026
Calidad del servicio	$ 190.227.747,60	25/12/2023	25/12/2028

Tabla 29. Pólizas actualizadas del contrato de interventoría

3.2. MODIFICACIONES LEGALES REALIZADAS EN EL PERIODO.

A continuación, se detallan las modificaciones legales del contrato de obra e interventoría.

3.2.1. MODIFICACIONES LEGALES AL CONTRATO DE OBRA

A la fecha no se han realizado modificaciones legales al contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

3.2.2. MODIFICACIONES LEGALES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha no se han realizado modificaciones legales al contrato de interventoría CO1.PCCNTR.4146207 – 2022.

3.3. INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE AVANCE DEL PROYECTO.

3.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL.

3.3.1.1. PRESUPUESTO GENERAL DEL CONTRATO DE CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.


A continuación, se presenta el presupuesto general del contrato de obra.

PRESUPUESTO GENERAL DEL CONTRATO DE CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.								
No.	**Instituciones Educativas**	**Sede**	**Presupuesto SED**	**% Respecto al Presupuesto SED**	**Valor Actualizado Contrato de Obra**	**% Respecto al Presupuesto Actualizado**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**
1	Francisco José de Caldas	A	$ 1.899.219.346,73	13,61%	$ 1.962.546.144,54	14,06%	25/01/2023	31/10/2023
2	Jorge Eliecer Gaitán	A	$ 1.889.077.759,47	13,54%	$ 2.024.236.834,00	14,51%	25/01/2023	31/10/2023
3	Floridablanca	A	$ 774.817.748,37	5,55%	$ 699.153.025,00	5,01%	6/02/2023	31/10/2023

4	Garces Navas	A	$ 677.885.855,00	4,86%	$ 787.083.405,50	5,64%	1/02/2023	31/07/2023
5	Rafael Bernal Jiménez	A	$ 651.384.822,00	4,67%	$ 677.034.595,00	4,85%	7/02/2023	31/07/2023
6	Juan del Corral	A	$ 527.199.087,00	3,78%	$ 524.030.444,00	3,76%	15/02/2023	12/09/2023
7	Justo Víctor Charry	A	$ 366.048.051,00	2,62%	$ 369.424.312,00	2,65%	13/02/2023	15/07/2023
8	Miguel Antonio Caro	A	$ 258.278.741,00	1,85%	$ 75.339.260,00	0,54%	7/02/2023	15/07/2023
9	Francisco Primero	A	$ 1.042.342.004,00	7,47%	$ 1.042.342.004,90	7,47%	24/03/2023	31/10/2023
10	José Asunción Silva	B	$ 856.851.911,00	6,14%	$ 856.851.911,18	6,14%	24/03/2023	31/10/2023
11	Simón Bolívar	A	$ 749.402.904,00	5,37%	$ 749.402.904,02	5,37%	24/03/2023	31/10/2023
12	República de Colombia	C	$ 742.966.924,00	5,32%	$ 742.966.924,05	5,32%	24/03/2023	31/10/2023
13	Manuela Ayala de Gaitán	A	$ 543.797.778,00	3,90%	$ 543.797.778,83	3,90%	24/03/2023	31/10/2023
14	Nidia Quintero	B	$ 467.530.342,00	3,35%	$ 467.530.342,00	3,35%	10/05/2023	31/10/2023
15	República de Guatemala	A	$ 461.642.257,00	3,31%	$ 461.642.257,00	3,31%	10/05/2023	31/10/2023
16	República de Panamá	A	$ 440.541.748,00	3,16%	$ 440.541.748,39	3,16%	10/05/2023	31/10/2023
17	Robert F Kennedy	A	$ 376.475.297,00	2,70%	$ 376.475.297,02	2,70%	10/05/2023	31/10/2023
18	Tomas Carrasquilla	B	$ 376.628.772,00	2,70%	$ 376.268.772,57	2,70%	10/05/2023	31/10/2023
19	Francisco José de Caldas	B	$ 369.762.456,00	2,65%	$ 369.762.456,00	2,65%	10/05/2023	31/10/2023
20	Saldo		$ 482.427.078,43	3,46%	$ 407.850.466,00	2,92%	11/01/2023	10/01/2024

Tabla 30. Presupuesto Del Contrato De Obra No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

3.3.1.2. PRESUPUESTO POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022

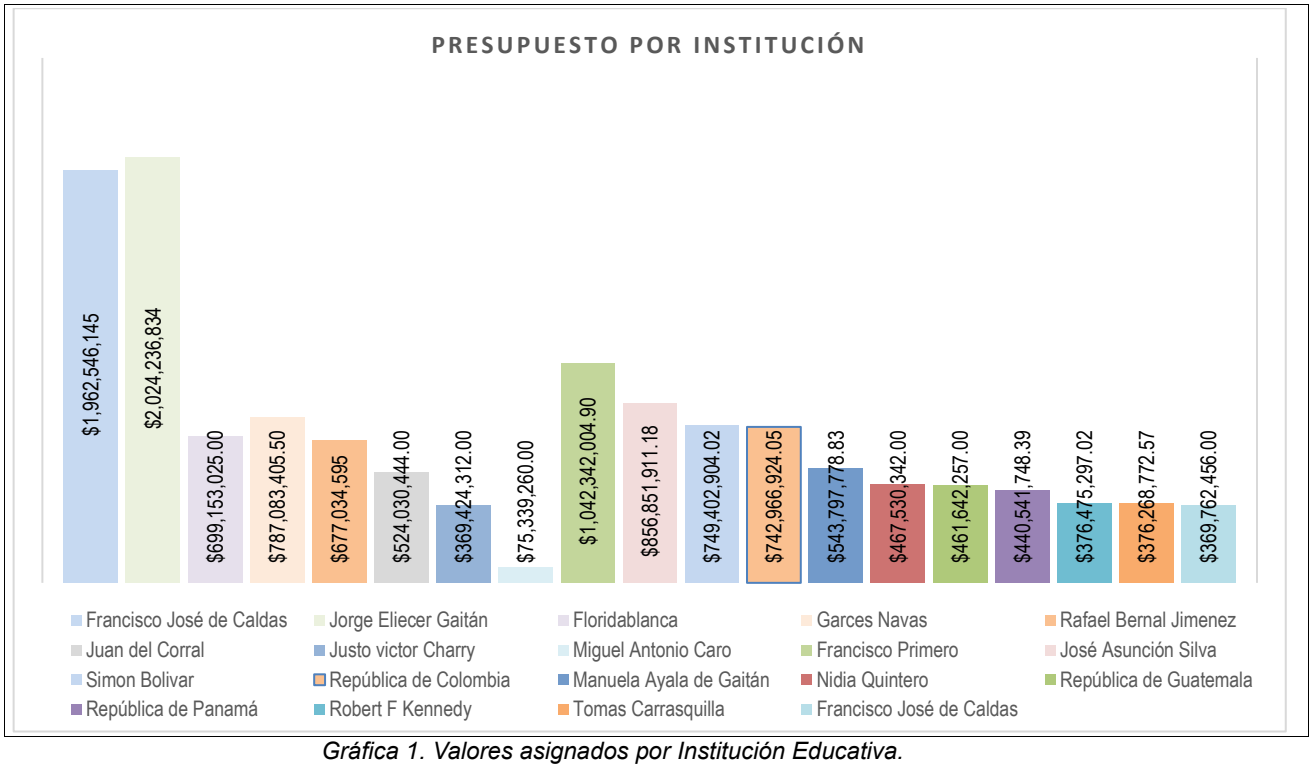

Gráfica 1. Valores asignados por Institución Educativa.

3.3.1.2.1. Colegio República de Guatemala, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
1	REP. DE GUATEMALA	A	REP. DE GUATEMALA	Calle 78 Bis #68a - 45	$ 461,642,257.00

Tabla 31. Presupuesto asignado Institución Educativa República de Guatemala, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
2	NIDIA QUINTERO B	B	FLORENCIA	Dg. 74b #87-40	$ 467,530,342.00

Tabla 32. Presupuesto asignado Educativa Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
3	TOMAS CARRASQUILLA B	B	PANAMERICANA	Cl. 75A #63-55	$ 376,628,772.00

Tabla 33. Presupuesto asignado Institución Educativa Tomás Carrasquilla IED – Sede B, Panamericana.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
4	MIGUEL ANTONIO CARO A	A	MIGUEL ANTONIO CARO	Tv. 94 # 81A-29	$ 258,278,741.00

Tabla 34. Presupuesto asignado Institución Educativa Miguel Antonio Caro IED, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	1558,21	$ 5.217	$ 8.129.182
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	142,00	$ 35.333	$ 5.017.286
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	32,56	$ 66.499	$ 2.165.207
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	123,64	$ 16.774	$ 2.073.937
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILARÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	30,00	$ 29.021	$ 870.630
1.2.42	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	30,03	$ 8.863	$ 266.156
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				

1.3.2	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA (INCLUYE REVISIÓN DE AMARRES, FIJACIÓN DE FLANCHES, FISURAS EN TEJAS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS). NO INCLUYE CAMBIO DE TEJAS	M2	489,21	$ 13.243	$ 6.478.608
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	45,36	$ 4.165	$ 188.924
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 25.189.930,00**
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	1,15	$ 74.796	$ 86.015
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	105,82	$ 45.116	$ 4.774.175
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	M3	52,91	$ 95.319	$ 5.043.328
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN	M2	24,42	$ 88.225	$ 2.154.455
2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.3.11	CUNETA TRAPEZOIDAL 3000 PSI RFZO. H:20 - B:30 - b:20 (INC. BASE EN RECEBO)	M	27,95	$ 113.346	$ 3.168.021
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	66,92	$ 8.654	$ 579.093
SUBTOTAL	**2. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 15.805.087**
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.1	**REDES DE ALCANTARILLADO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	57,65	$ 73.003	$ 4.208.623
4.8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.8.3	CAJA DE INSPECCIÓN 80 X 80. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00	$ 700.069	$ 700.069
SUBTOTAL	**4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 4.908.692**
5	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 24W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	10,00	$ 114.403	$ 1.144.030
5.1.95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT CONDUIT 2" INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	27,50	$ 74.888	$ 2.059.420
5.1.113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO 1#6 + 1#8 + 1#10T	M	27,50	$ 38.953	$ 1.071.208
SUBTOTAL	**5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 4.274.658**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				

7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.4	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E = 0.05 M	M2	1,00	$ 29.328	$ 29.328
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	53,45	$ 15.577	$ 832.591
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 861.919**
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1.12	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE CUNETAS EXISTENTES (INCLUYE RESANES, ESMALTADA Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES) ANCHO < 60 CM	M	20,00	$ 60.265	$ 1.205.300
SUBTOTAL	**16. OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 1.205.300**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA UPVC 1.0 MM - TRASLUCIDA	M2	30,00	$ 89.966	$ 2.698.980
17.1.46	INSTALACIÓN DE CANAL EXISTENTE, INCLUYEN SOPORTES METÁLICOS, ANCLAJES Y DEMÁS TEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	10,03	$ 64.233	$ 644.257
17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	123,64	$ 63.242	$ 7.819.241
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 11.162.478**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1558,21	$ 7.657	$ 11.931.196
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 11.931.196**
VALOR TOTAL					**$ 75.339.260,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					**$ -**
VALOR TOTAL					**$ 75.339.260,00**

Tabla 35. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Institución Educativa Miguel Antonio Caro IED, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
5	FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS B	B	CIUDAD DE HONDA	Cl. 64f Bis #68g -54	$ 369,762,456.00

Tabla 36.Presupuesto asignado Institución Educativa Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
6	REPUBLICA DE COLOMBIA	C	NUEVA ESTRADA	Cra. 68h #71A-01	$ 742,966,924.00

Tabla 37. Presupuesto asignado Institución Educativa República de Colombia, sede C, Nueva Estrada
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
7	JUAN DEL CORRAL A	A	JUAN DEL CORRAL	Cra 69B #79ª - 42	$ 527,199,087.00

Tabla 38. Presupuesto asignado Instituto Técnico Juan del Corral, sede A
Fuente: Elaboración Propia

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JUAN DEL CORRAL					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	934,48	$ 5.217	$ 4.875.169
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDA ESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	74,40	$ 30.460	$ 2.266.224
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	35,00	$ 16.774	$ 587.090
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILARÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	771,78	$ 29.021	$ 22.397.711
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19,50	$ 22.614	$ 440.973
1.2.35	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26,23	$ 18.855	$ 494.567
1.2.44	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	60,00	$ 5.029	$ 301.740
1.2.45	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	578,12	$ 7.165	$ 4.142.230
1.2.46	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RED ELÉCTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	472,15	$ 21.075	$ 9.950.561
1.2.52	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	527,52	$ 20.851	$ 10.999.361
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.3.8	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	12,00	$ 7.945	$ 95.340
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	60,00	$ 4.165	$ 249.900
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 56.800.866**
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1.19	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS. (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	2250,00	$ 28.363	$ 63.816.750

SUBTOTAL	**3, MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 63.816.750**
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.1	**REDES DE ALCANTARILLADO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M	35,00	$ 82.476	$ 2.886.660
SUBTOTAL	**4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 2.886.660,00**
5	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.99	REINSTALACIÓN DE LÁMPARAS EXISTENTES	UN	60,00	$ 22.790	$ 1.367.400
5.1.113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO 1#6 + 1#8 + 1#10T	M	578,12	$ 38.953	$ 22.519.508
SUBTOTAL	**5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 23.886.908**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.6	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E = 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	929,06	$ 65.499,00	$ 60.852.658,00
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	206,51	$ 15.577,00	$ 3.216.806,00
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 64.069.464,00**
8	**MAMPOSTERÍA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1	**MAMPOSTERÍA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1.5	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10 CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	25,90	$ 122.378,00	$ 3.169.590,00
SUBTOTAL	**8. MAMPOSTERÍA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 3.169.590,00**
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	426,18	$ 10.805,00	$ 4.604.875,00
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	426,18	$ 17.655,00	$ 7.524.208,00
13.2.6	PINTURA REPELENTE DE HUMEDAD A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	243,89	$ 18.514,00	$ 4.515.379,00
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	750,00	$ 12.576,00	$ 9.432.000,00
13.2.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE PARA FACHADAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	243,89	$ 8.182,00	$ 1.995.508,00
SUBTOTAL	**13. PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 28.071.970,00**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	166,24	$ 46.399,00	$ 7.713.370,00
17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	977,85	$ 57.806,00	$ 56.525.389,00
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	771,78	$ 180.356,00	$ 139.194.432,00
17.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M	49,60	$ 95.654,00	$ 4.744.438,00

17.1.19	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	347,20	$ 96.953,00	$ 33.662.082,00
17.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATES LATERALES PARA CUBIERTA UPVC, EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 - DS= 1,00 - INCLUYEN PINTURAS	M	49,60	$ 146.822,00	$ 7.282.371,00
17.1.42	LAMINA ANCHO 0.09 a 0.15 CAL 12, SOLDADA SOBRE CORREAS (PARA PODER ASEGURAR LAS TEJAS A LAS CORREAS)	M	792,09	$ 34.274,00	$ 27.148.093,00
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 276.270.175,00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	660,58	$ 7.657,00	$ 5.058.061,00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 5.058.061,00**
21	**EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
21.1	**EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
SUBTOTAL	**21. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 0,00**
VALOR TOTAL					**$ 524.030.444,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					**$ -**
VALOR TOTAL					**$ 524.030.444,00**

Tabla 39. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Instituto Técnico Juan del Corral, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.8. Colegio Francisco Primero, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
8	FRANCISCO I A	A	FRANCISCO I	Cra. 28 #63-64	$ 1,042,342,004.00

Tabla 40.Presupuesto asignado Institución educativa Francisco Primero, Sede A
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
9	MANUELA AYALA DE GAITÁN A	A	MANUELA AYALA DE GAITÁN	Cra. 78 #69 A -11	$ 543,797,778.00

Tabla 41. Presupuesto asignado Institución educativa Manuela Ayala de Gaitán, sede A
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
10	FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS A	A	FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Cra. 68f #63B-02	$ 1,899,219,346.00

Tabla 42. Presupuesto asignado Institución educativa Francisco José de Caldas, Sede A
Fuente: Elaboración Propia

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE A					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	3829,12	$ 4.978,00	$ 19.061.354,00
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	8,70	$ 286.562,00	$ 2.492.115,00

1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	114,58	$ 66.499,00	$ 7.619.189,00
1.2.7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	416,77	$ 55.496,00	$ 23.128.978,00
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1642,96	$ 30.460,00	$ 50.044.537,00
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	93,67	$ 26.177,00	$ 2.451.869,00
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	493,07	$ 13.915,00	$ 6.861.063,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2313,37	$ 29.021,00	$ 67.136.189,00
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	139,00	$ 22.614,00	$ 3.143.346,00
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	66,00	$ 74.796,00	$ 4.936.536,00
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	66,00	$ 95.319,00	$ 6.291.054,00
2.2.2	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	83,35	$ 531.091,00	$ 44.268.386,00
2.2.18	ESCALERA EN CONCRETO DE 3500 PSI. ACABADO A LA VISTA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	8,70	$ 1.232.133,00	$ 10.715.368,00
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	790,66	$ 7.900,00	$ 6.246.233,00
3.1.24	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	9178,51	$ 9.719,00	$ 89.205.948,00
4.8.4	CAJA DE INSPECCION 100 X 100. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	4,00	$ 882.241,00	$ 3.528.964,00
4.11.21	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	159,41	$ 3.793,00	$ 604.642,00
5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	70,00	$ 193.703,00	$ 13.559.210,00
5.1.84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA COLGANTE EN POLICARBONATO TIPO CAMPANA CON TAPA INFERIOR. INCLUYE BOMBILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	18,00	$ 294.411,00	$ 5.299.398,00
5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	70,00	$ 51.975,00	$ 3.638.250,00
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	3117,04	$ 43.727,00	$ 136.298.956,00
7.2.49	GUARDA ESCOBA CERAMICO H= 7. 5CM	M	2297,47	$ 14.628,00	$ 33.607.411,00
7.2.76	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO 51 X 51 CM	M2	2395,85	$ 71.855,00	$ 172.153.874,00
7.2.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO 8 MM COLOR A ELECCION	M2	364,00	$ 133.849,00	$ 48.721.036,00
9.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTIMACHUCON, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	93,67	$ 820.064,00	$ 76.811.295,00
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	493,07	$ 619.206,00	$ 305.311.655,00

13.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	179,00	$ 26.095,00	$ 4.671.005,00
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	9178,51	$ 20.030,00	$ 183.845.575,00
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	650,00	$ 12.000,00	$ 7.800.000,00
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	2022,60	$ 23.727,00	$ 47.990.230,00
16.1.18	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	1,00	$ 10.149.764,00	$ 10.149.764,00
17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	71,94	$ 57.806,00	$ 4.158.275,00
17.1.8	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	275,00	$ 135.267,00	$ 37.198.425,00
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	2313,37	$ 180.356,00	$ 417.229.402,00
17.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M	107,77	$ 91.273,00	$ 9.836.491,00
17.1.19	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	650,00	$ 96.953,00	$ 63.019.450,00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	3829,12	$ 7.657,00	$ 29.319.563,00
NP2	DESMONTE DE CABALLETE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	ML	107,77	$ 14.526,13	$ 1.565.481,03
NP1	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CANALES, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	71,94	$ 36.500,00	$ 2.625.627,50
VALOR TOTAL					**$ 1.962.546.144,53**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					**$ -**
VALOR TOTAL					**$ 1.962.546.144,53**

Tabla 43. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Institución educativa Francisco José de Caldas, Sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.11. Colegio Florida Blanca, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
11	FLORIDABLANCA A	A	FLORIDABLANCA	Cra. 68f #63B-02	$ 774,817,748.00

Tabla 44.Presupuesto asignado Institución educativa Florida Blanca, sede A
Fuente: Elaboración Propia

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO FLORIDA BLANCA					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 3.354,00	$ 0,00
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	1108,851	$ 5.217,00	$ 5.784.876,00
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	211,65	$ 35.333,00	$ 7.478.229,00
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.10	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	453,56	$ 35.555,00	$ 16.126.482,00

1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	412,62	$ 30.460,00	$ 12.568.417,00
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6,25	$ 24.626,00	$ 153.913,00
1.2.22	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	116,13	$ 218.577,00	$ 25.383.445,00
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9,10	$ 13.915,00	$ 126.627,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	289,33	$ 29.021,00	$ 8.396.646,00
1.2.43	DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO	UN	1,00	$ 146.581,00	$ 146.581,00
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	11,00	$ 5.029,00	$ 55.319,00
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	433,68	$ 7.165,00	$ 3.107.317,00
1.2.50	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 253.728,00	$ 507.456,00
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.3.8	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	74,75	$ 7.945,00	$ 593.889,00
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 80.429.197,00**
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	485,77	$ 108.346,00	$ 52.631.334,00
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	485,77	$ 95.319,00	$ 46.303.196,00
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.2.26	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE ACERO)	M2	200,05	$ 122.556,00	$ 24.517.867,00
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	330,05	$ 8.654,00	$ 2.856.291,00
SUBTOTAL	**2. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 126.308.688,00**
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1.17	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1819,98	$ 6.662,00	$ 12.124.707,00
3.1.19	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS. (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	1819,98	$ 28.363,00	$ 51.620.093,00
3.1.24	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	589,01	$ 9.719,00	$ 5.724.588,00
SUBTOTAL	**3, MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 69.469.388,00**
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.8.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	6,00	$ 32.621,00	$ 195.726,00

SUBTOTAL	**4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 195.726,00**
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00	$ 521.131,00	$ 521.131,00
5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	433,68	$ 42.185,00	$ 18.294.791,00
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA OCTAGONAL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	33,00	$ 165.535,00	$ 5.462.655,00
5.1.99	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES	UN	11,00	$ 22.790,00	$ 250.690,00
5.1.113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO 1#6 + 1#8 + 1#10T	M	433,68	$ 38.953,00	$ 16.893.137,00
SUBTOTAL	**5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 41.422.404,00**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	412,62	$ 43.727,00	$ 18.042.652,00
7.1.11	PISO EN CONCRETO A LA VISTA ENDURECIDO Y AFINADO CON HELICÓPTERO. (INVLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FORMALETAS, ACABADO CON ALLANADORA, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) E = 10 CM	M2	719,59	$ 177.121,00	$ 127.454.678,00
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.2.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	M	152,64	$ 52.995,00	$ 8.089.157,00
7.2.41	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	719,59	$ 52.022,00	$ 37.434.563,00
7.2.54	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	157,60	$ 5.595,00	$ 881.772,00
7.2.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO EN TABLON TRADICION EN GRESS	M2	200,05	$ 82.537,00	$ 16.511.890,00
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 208.414.712,00**
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE COLOR, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES.	M2	12,50	$ 354.225,00	$ 4.427.813,00
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TAMAÑO MAXIMO 1.00 X 1.00 EN LAMINA DE ALFAJOR ANTIDESLIZANTE CAL 12 PARA PISOS, TAPAS, ESCLUSAS. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO	UN	6,00	$ 252.544,00	$ 1.515.264,00
SUBTOTAL	**9. CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 5.943.077,00**
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	589,01	$ 10.805,00	$ 6.364.253,00
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	589,01	$ 20.030,00	$ 11.797.870,00

13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	345,12	$ 30.300,00	$ 10.457.136,00
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	745,19	$ 23.727,00	$ 17.681.123,00
SUBTOTAL	**13. PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 46.300.382,00**
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1.18	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	1,00	$ 10.149.764,00	$ 10.149.764,00
SUBTOTAL	**16. OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 10.149.764,00**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	289,33	$ 180.356,00	$ 52.182.401,00
17.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M	28,80	$ 95.654,00	$ 2.754.835,00
17.1.19	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	84,00	$ 96.953,00	$ 8.144.052,00
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 63.081.288,00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1108,85	$ 7.657,00	$ 8.490.472,00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 8.490.472,00**
NP5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO 51 X 51 CM	M2	412,62	$ 85.420,00	$ 35.246.034,57
NP6	DESMONTE TUBERÍA PVC	ML	433,68	$ 8.536,00	$ 3.701.892,48
VALOR TOTAL					**$ 699.153.025,05**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					**$ -**
VALOR TOTAL					**$ 699.153.025,05**

Tabla 45. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Institución educativa Florida Blanca, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
12	JORGE ELIECER GAITÁN A	A	JORGE ELIECER GAITÁN	Cra. 54 #65- 85	$ 1,889,077,759.00

Tabla 46.Presupuesto asignado Institución educativa Jorge Eliecer Gaitán, sede A
Fuente: Elaboración Propia

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN SEDE A					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V.Total**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	1924,15	$ 5.217,00	$ 10.038.282,00
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M	M	200,00	$ 124.946,00	$ 24.989.200,00
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBO METÁLICO REDONDO 1-1/2" H=2.2 M, (NO INCLUYE CONCRETO NI ACERO DE REFUERZO)	M	100,00	$ 194.702,00	$ 19.470.200,00

1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1745,53	$ 66.499,00	$ 116.075.780,00
1.2.7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9,34	$ 58.160,00	$ 542.982,00
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	147,72	$ 8.856,00	$ 1.308.217,00
1.2.22	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	114,63	$ 218.577,00	$ 25.054.826,00
1.2.23	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	11,00	$ 13.915,00	$ 153.065,00
1.2.24	DEMOLICION Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACION Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA; (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	94,19	$ 75.460,00	$ 7.107.608,00
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	93,10	$ 26.177,00	$ 2.437.097,00
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	289,46	$ 13.915,00	$ 4.027.786,00
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	18,00	$ 14.791,00	$ 266.238,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	750,93	$ 29.021,00	$ 21.792.687,00
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	459,76	$ 22.614,00	$ 10.397.026,00
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN	68,00	$ 8.576,00	$ 583.168,00
1.2.42	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	178,00	$ 8.863,00	$ 1.577.614,00
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	1513,12	$ 7.165,00	$ 10.841.505,00
1.2.46	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1259,00	$ 21.075,00	$ 26.533.425,00
1.2.50	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 253.728,00	$ 507.456,00
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.4.6	PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5146,15	$ 10.552,00	$ 54.302.175,00
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	128,12	$ 4.165,00	$ 533.628,00
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 338.539.965,00**
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	201,10	$ 74.796,00	$ 15.041.176,00
2.1.9	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3	100,55	$ 166.156,00	$ 16.706.653,00

2.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3	100,55	$ 181.505,00	$ 18.249.965,00
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.2.3	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3500 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	106,24	$ 601.926,00	$ 63.948.341,00
2.2.8	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	29,40	$ 202.929,00	$ 5.966.113,00
2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.3.9	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA	M	48,00	$ 471.301,00	$ 22.622.448,00
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	405,90	$ 7.900,00	$ 3.206.610,00
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	580,43	$ 8.654,00	$ 5.023.015,00
SUBTOTAL	**2. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 150.764.321,00**
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1.6	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	31,82	$ 115.309,00	$ 3.669.132,00
SUBTOTAL	**3, MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 3.669.132,00**
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	12,00	$ 123.235,00	$ 1.478.820,00
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	27,00	$ 68.341,00	$ 1.845.207,00
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	31,00	$ 36.827,00	$ 1.141.637,00
4.8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.8.6	CAJA DE INSPECCIÓN 1 M X 1 M EN CONCRETO REFORZADO HASTA 1,50 M. DE ALTURA CON MARCO Y TAPA METÁLICA E = 0.20 M (INCLUYE ACERO)	UN	5,00	$ 1.153.783,00	$ 5.768.915,00
SUBTOTAL	**4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 10.234.579,00**
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	68,00	$ 193.703,00	$ 13.171.804,00
5.1.94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED STREET PARA ALUMBRADO RECREATIVO DE CANCHA DEPORTIVA TIPO EXTERIOR DE 60W, 100V A 277V. INCLUYE ESTRUCTURA TIPO POSTE METÁLICO, ESTRUCTURA CIVIL, CABLE DE PUESTA A TIERRA Y TODOS LOS DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	6,00	$ 5.799.668,00	$ 34.798.008,00
5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	68,00	$ 51.975,00	$ 3.534.300,00
5.1.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA	M	178,00	$ 27.103,00	$ 4.824.334,00
5.1.113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO 1#6 + 1#8 + 1#10T	M	1513,12	$ 38.953,00	$ 58.940.563,00
SUBTOTAL	**5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 115.269.009,00**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	502,74	$ 43.727,00	$ 21.983.312,00
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.2.76	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO 51 X 51 CM	M2	1688,51	$ 75.304,00	$ 127.151.911,00
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 149.135.223,00**

8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2	147,72	$ 69.612,00	$ 10.283.154,00
SUBTOTAL	**8. MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 10.283.154,00**
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	289,46	$ 619.206,00	$ 179.233.140,00
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE DOS (2) HOJAS Y DOS (2) CUERPOS FIJOS, MARCO EN PEINAZO CAL. 18 - HORIZONTALES EN TUBO CUADRADO DE 40 MM x 20 MM CAL.18, TABLERO TIPO PANEL, INCLUYE CERRADURA, PASADORES, FALLEBAS, PINTURA ANTICORROSIVO EN CROMATO DE ZINC Y ESMALTE TIPO ACABADO DE EXCELENTE CALIDAD.	M2	10,90	$ 574.844,00	$ 6.265.800,00
9.3.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON AISLANTE ACUSTICO	M2	82,20	$ 1.044.918,00	$ 85.892.991,00
SUBTOTAL	**9. CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 271.391.931,00**
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
11.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	14,00	$ 872.835,00	$ 12.219.690,00
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2,00	$ 688.692,00	$ 1.377.384,00
11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA ((INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO)	UN	1,00	$ 2.105.916,00	$ 2.105.916,00
11.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	10,14	$ 892.636,00	$ 9.051.329,00
SUBTOTAL	**11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 24.754.319,00**
12	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
12.1	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2	55,80	$ 1.066.170,00	$ 59.495.271,00
SUBTOTAL	**12. APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 59.495.271,00**
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1.6	PAÑETE MURO 1:3 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	5146,15	$ 49.149,00	$ 252.928.126,00
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	5146,15	$ 10.805,00	$ 55.604.151,00
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	7536,12	$ 20.030,00	$ 150.948.484,00
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	232,50	$ 30.300,00	$ 7.044.750,00
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	5921,06	$ 23.727,00	$ 140.488.991,00

SUBTOTAL	**13. PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 607.014.502,00**
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1.3	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2	139,50	$ 93.091,00	$ 12.986.195,00
16.1.8	MINI CANCHA MÚLTIPLE DE 15 X 9 M PAVIMENTO ASFALTICO MD 10 60-70 EN OBRA	M2	39,22	$ 168.035,00	$ 6.589.661,00
16.1.18	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	1,00	$ 10.149.764,00	$ 10.149.764,00
SUBTOTAL	**16. OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 29.725.620,00**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	750,93	$ 180.356,00	$ 135.434.406,00
17.1.44	SEI DE VIGA CANAL GALVANIZADA (INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARÁ SEGUN LOS METROS LINEALES REALMENTE INSTALADOS). Ds = 100 CM - CAL 20	M	15,32	$ 116.327,00	$ 1.782.130,00
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 137.216.536,00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1924,15	$ 7.657,00	$ 14.733.204,00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 14.733.204,00**
VALOR TOTAL					**$ 1.922.226.766,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					
VALOR TOTAL					**$ 1.922.226.766,00**

Tabla 47. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Institución educativa Jorge Eliecer Gaitán, sede A.

Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
13	JOSÉ ASUNCIÓN SILVA B	B	SIDAUTO	Cl. 91 #16A - 82	$ 856,851,911.00

Tabla 48. Presupuesto asignado Institución educativa José Asunción Silva, sede B, Sidauto

Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
14	RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ A	A	RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ	Cr 53 #75-17	$ 651,384,822.00

Tabla 49.Presupuesto asignado Institución educativa Rafael Bernal Jiménez, sede A.

Fuente: Elaboración Propia

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO BERNAL JIMÉNEZ					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				

1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	1834,63	$ 5.217,00	$ 9.571.265,00
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M	M	85,00	$ 124.946,00	$ 10.620.410,00
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.10	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16,00	$ 35.555,00	$ 568.880,00
1.2.13	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO E=0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67,07	$ 20.949,00	$ 1.405.049,00
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	539,66	$ 30.460,00	$ 16.438.044,00
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12,09	$ 24.626,00	$ 297.728,00
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13,77	$ 26.177,00	$ 360.457,00
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	99,48	$ 13.915,00	$ 1.384.264,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1121,29	$ 29.021,00	$ 32.540.957,00
1.2.36	DESMONTE DE BARANDA METALICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	6,80	$ 15.191,00	$ 103.299,00
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	35,00	$ 5.029,00	$ 176.015,00
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.3.6	CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METALICAS EN LAMINA COLDROLLED 0.90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN	UN	4,00	$ 142.626,00	$ 570.504,00
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 74.036.872,00**
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	4,80	$ 108.346,00	$ 520.061,00
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.2.3	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3500 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	1,08	$ 601.926,00	$ 650.080,00
2.2.8	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	18,00	$ 202.929,00	$ 3.652.722,00
2.2.12	VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI. DIMENSIONES 20X15CM. NO INCLUYE REFUERZO	M	12,00	$ 87.417,00	$ 1.049.004,00
2.2.25	PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	56,87	$ 106.387,00	$ 6.050.229,00
2.2.26	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE ACERO)	M2	9,00	$ 122.556,00	$ 1.103.004,00
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	79,58	$ 8.654,00	$ 688.685,00
SUBTOTAL	**2. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 13.713.785,00**
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE LIVIANO RUGOSO	M2	40,00	$ 114.906,00	$ 4.596.240,00
SUBTOTAL	**3, MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 4.596.240,00**

4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2.15	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	2,00	$ 98.496,00	$ 196.992,00
SUBTOTAL	**4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 196.992,00**
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X32 W FLUORESCENTE TIPO T8. INCLUYE TUBOS FLUORESCENTES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3,00	$ 70.647,00	$ 211.941,00
5.1.84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA COLGANTE EN POLICARBONATO TIPO CAMPANA CON TAPA INFERIOR. INCLUYE BOMBILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	35,00	$ 308.542,00	$ 10.798.970,00
5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	35,00	$ 51.975,00	$ 1.819.125,00
SUBTOTAL	**5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 12.830.036,00**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	822,02	$ 43.727,00	$ 35.944.469,00
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	M2	642,75	$ 150.374,00	$ 96.652.889,00
7.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	34,00	$ 73.121,00	$ 2.486.114,00
7.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN GRAVILLA LAVADA MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M2	1,12	$ 105.976,00	$ 118.693,00
7.2.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO TIPO TARALAY O SIMILAR ALTO TRÁFICO	M2	112,20	$ 180.761,00	$ 20.281.384,00
7.2.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	56,87	$ 116.961,00	$ 6.651.572,00
7.2.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	33,60	$ 19.403,00	$ 651.941,00
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 162.787.062,00**
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2	25,20	$ 69.612,00	$ 1.754.222,00
8.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN DRY WALL DE 12 MM VISTO UNA CARA.	M2	34,00	$ 62.105,00	$ 2.111.570,00
SUBTOTAL	**8. MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 3.865.792,00**
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	13,77	$ 559.540,00	$ 7.704.866,00
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y CON DOS PERSIANAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE H= 0,30 X 0,60 M, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	6,60	$ 631.610,00	$ 4.168.626,00

9.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACION, Y ESCALERILLA VERTICAL EN TUBERIA DE 3/4" CON SEPARACION CADA 9CM PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS	M	6,80	$ 928.733,00	$ 6.315.384,00
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	116,82	$ 619.206,00	$ 72.335.645,00
SUBTOTAL	**9. CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 90.524.521,00**
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
11.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
11.1.52	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE PARA CARCAMO ANCHO 20 CM	M	12,00	$ 280.966,00	$ 3.371.592,00
SUBTOTAL	**11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 3.371.592,00**
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1.3	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	32,22	$ 44.672,00	$ 1.439.332,00
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	545,29	$ 17.655,00	$ 9.627.095,00
13.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	10,80	$ 26.095,00	$ 281.826,00
13.2.6	PINTURA REPELENTE DE HUMEDAD A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	539,44	$ 18.514,00	$ 9.987.192,00
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	822,00	$ 12.576,00	$ 10.337.472,00
13.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO	M2	10,20	$ 30.830,00	$ 314.466,00
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1442,50	$ 23.727,00	$ 34.226.198,00
SUBTOTAL	**13. PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 66.213.581,00**
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1.13	RELLENO CON RECEBO COMPACTADO B600 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	3,20	$ 140.745,00	$ 450.384,00
SUBTOTAL	**16. OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 450.384,00**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.2	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	49,64	$ 48.641,00	$ 2.414.539,00
17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	77,04	$ 68.682,00	$ 5.291.261,00
17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	66,00	$ 63.242,00	$ 4.173.972,00
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	776,05	$ 180.356,00	$ 139.965.274,00
17.1.24	LAMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	283,50	$ 197.406,00	$ 55.964.601,00
17.1.42	LAMINA ANCHO 0.09 a 0.15 CAL 12, SOLDADA SOBRE CORREAS (PARA PODER ASEGURAR LAS TEJAS A LAS CORREAS)	M	514,08	$ 34.274,00	$ 17.619.578,00
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 225.429.225,00**

20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1016,78	$ 7.657,00	$ 7.785.484,00
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2	1783,87	$ 6.297,00	$ 11.233.029,00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 19.018.513,00**
VALOR TOTAL					**$ 677.034.595,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					**$ -**
VALOR TOTAL					**$ 677.034.595,00**

Tabla 50. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Institución educativa Rafael Bernal Jiménez, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A, Garces Navas

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
15	JUSTO VICTOR CHARRY A	A	GARCÉS NAVAS	Cra. 108 #21	$ 366,048,051.00

Tabla 51.Presupuesto asignado Institución educativa Justo Víctor Charry, sede A.
Fuente: Elaboración Propia

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	177,88	$ 5.217,00	$ 928.018,00
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19,20	$ 41.408,00	$ 795.096,00
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,28	$ 24.626,00	$ 130.025,00
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	390,46	$ 8.856,00	$ 3.457.882,00
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	42,00	$ 26.177,00	$ 1.099.434,00
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	84,00	$ 14.791,00	$ 1.242.444,00
3.1.24	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	2259,50	$ 9.719,00	$ 21.960.041,00
5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	60,00	$ 193.703,00	$ 11.622.180,00
5.1.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 24W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	100,00	$ 114.403,00	$ 11.440.300,00
5.1.86	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS LED T8, INCLUYE SOQUETS. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	120,00	$ 35.860,00	$ 4.303.200,00
7.2.2	DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33	M2	177,88	$ 30.565,00	$ 5.437.009,00
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2	390,46	$ 69.612,00	$ 27.180.454,00
9.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORTA FUEGO FABRICADAS EN LAMINA COLLED ROLLED CAL 18 CON MONTAJE FIJO Y MARCO TIPO ZAPATO DE 12CM DE ANCHO (NO INCLUYE BARRAS ANTIPANICO Y CIERRAPUERTAS)	M2	57,08	$ 825.461,00	$ 47.117.314,00

9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	23,90	$ 619.206,00	$ 14.801.500,00
9.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACRILICO RECUPERADO DE 10 MM DISEÑO DE ANIMALES, MODULOS DE 60 X 90 X 1 CM, INCLUYE SOPORTES EN ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2" ANCLADO AL PISO	UN	4,00	$ 1.198.611,00	$ 4.794.444,00
9.3.22	PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL + VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 MM	M2	20,06	$ 664.220,00	$ 13.320.932,00
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	32,00	$ 872.835,00	$ 27.930.720,00
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	10,00	$ 688.692,00	$ 6.886.920,00
11.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	34,21	$ 892.636,00	$ 30.537.078,00
12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2	52,60	$ 1.066.170,00	$ 56.080.542,00
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	2259,50	$ 10.805,00	$ 24.413.854,00
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	2259,50	$ 17.655,00	$ 39.891.402,00
13.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	177,88	$ 26.095,00	$ 4.641.870,00
15.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	41,05	$ 161.138,00	$ 6.615.037,00
15.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	M2	41,05	$ 34.945,00	$ 1.434.562,00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	177,88	$ 7.657,00	$ 1.362.054,00
VALOR TOTAL					**$ 369.424.312,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					**$ -**
VALOR TOTAL					**$ 369.424.312,00**

Tabla 52. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Institución educativa Justo Víctor Charry, sede A.

Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
16	ROBERT F KENNEDY A	A	ROBERT F KENNEDY	Av. Boyacá #64h - 39	$ 376,475,297.00

Tabla 53. Presupuesto asignado Institución educativa Robert F Kennedy, sede A.

Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
17	SIMÓN BOLÍVAR SEDE A	A	SIMÓN BOLÍVAR	Cra. 92 #86 - 18	$ 749,402,904.00

Tabla 54. Presupuesto asignado Institución educativa Distrital Simón Bolívar, sede A.

Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.18. Colegio Garcés Navas, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
18	GARCÉS NAVAS SEDE A	A	GARCÉS NAVAS	Cl. 78 #104a-2	$ 677,885,855.00

Tabla 55. Presupuesto asignado Institución educativa Garcés Navas, sede A.
Fuente: Elaboración Propia

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO GARCÉS NAVAS					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V.Total**
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	1868,14	$ 5.217,00	$ 9.746.105,00
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	60,00	$ 35.333,00	$ 2.119.980,00
1.2.26	DEMOLICION DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	97,13	$ 18.057,00	$ 1.753.876,00
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7,06	$ 26.177,00	$ 184.705,00
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	32,59	$ 13.915,00	$ 453.534,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1868,14	$ 29.021,00	$ 54.215.393,00
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1115,43	$ 22.614,00	$ 25.224.357,00
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	84,00	$ 5.029,00	$ 422.436,00
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	850,00	$ 7.165,00	$ 6.090.250,00
1.2.46	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	850,00	$ 21.075,00	$ 17.913.750,00
1.3.4	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2	239,56	$ 119.052,00	$ 28.519.990,00
1.3.6	CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METALICAS EN LAMINA COLDROLLED 0.90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN	UN	63,66	$ 142.626,00	$ 9.080.270,00
1.3.9	MANTENIMIENTO DE TABLERO DE CIRCUITOS EXISTENTES INCLUYE LIMPIEZA DE TABLERO, ORGANIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, CAMBIO DE APARATOS.	UN	1,00	$ 384.601,00	$ 384.601,00
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	450,12	$ 13.278,00	$ 5.976.693,00
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	143,55	$ 4.165,00	$ 597.886,00
2.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	100,00	$ 96.086,00	$ 9.608.600,00
3.1.10	MURO TRABA NORMAL EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24 X 12 X 6 ACABADO A LA VISTA. (INLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE, MORTERO, ANDAMIOS, FORMALETA, INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M2	35,00	$ 130.394,00	$ 4.563.790,00
3.1.24	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	375,00	$ 9.719,00	$ 3.644.625,00

5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	84,00	$ 51.975,00	$ 4.365.900,00
5.1.99	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES	UN	84,00	$ 22.790,00	$ 1.914.360,00
5.1.113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO 1#6 + 1#8 + 1#10T	M	850,00	$ 38.953,00	$ 33.110.050,00
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	7,06	$ 687.543,00	$ 4.851.303,00
11.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 5" A 4"	UN	17,00	$ 38.902,00	$ 661.334,00
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	375,00	$ 17.655,00	$ 6.620.625,00
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	2110,260	$ 23.727,00	$ 50.070.139,00
16.1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUAYA METALICA PARA CERCHA METALICA	M	390,00	$ 29.446,00	$ 11.483.940,00
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	97,13	$ 46.399,00	$ 4.506.735,00
17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	70,00	$ 63.242,00	$ 4.426.940,00
17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	219,15	$ 57.806,00	$ 12.667.896,00
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1868,14	$ 180.356,00	$ 336.930.889,00
17.1.19	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	1055,13	$ 96.953,00	$ 102.298.019,00
17.1.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M	13,00	$ 103.890,00	$ 1.350.570,00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1868,14	$ 7.657,00	$ 14.304.375,00
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2	1868,14	$ 6.297,00	$ 11.763.700,00
NP1	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE VIGA CANAL, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	219,15	$ 36.500,00	$ 7.998.792,50
NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 5 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	32,59	$ 850.000,00	$ 27.704.220,00
VALOR TOTAL					**$ 817.530.628,50**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					**$ -**
VALOR TOTAL					**$ 817.530.628,50**

Tabla 56. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Institución educativa Garcés Navas, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.19. Colegio República de Panamá, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
19	REPÚBLICA DE PANAMÁ SEDE A	A	REPÚBLICA DE PANAMÁ	Cl. 75 #55a-29	$ 440,541,748.00


Tabla 57. Presupuesto asignado Institución educativa República de Panamá, sede A
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

A continuación, se relaciona el control financiero del contrato de obra.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.		
Sub - total		$ 10.949.686.818,90
Administración obra	20,94%	$ 2.292.864.419,88
Imprevistos	1,50%	$ 164.245.302,28
Utilidad	5,00%	$ 547.484.340,95
IVA sobre utilidad	19,00%	$ 104.022.024,78
Valor total inversión		**$ 13.954.280.882,00**

Tabla 58. Valores generales del contrato de obra.

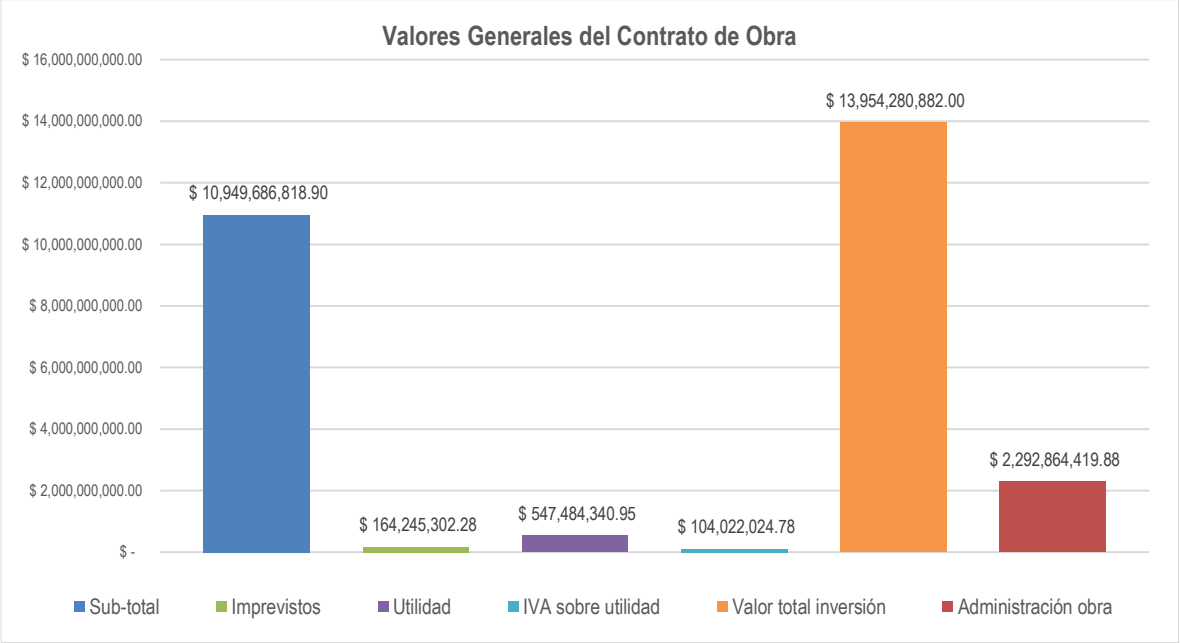

Gráfica 2. Valores generales del contrato de obra.

3.3.1.4. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

A la fecha de cierre del presente informe no se han realizado trámites de recibo parcial de obra.

3.3.1.5. CONTROL DE FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

A la fecha de cierre del presente informe no se ha realizado facturación del contrato obra.

3.3.1.6. CONTROL DE PROGRAMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

De acuerdo con la programación adoptada por SAFRID INGENIERÍA S.A.S., la interventoría realiza seguimiento de acuerdo a las actividades ejecutadas.

Periodo	% Programado	% Ejecutado
Semana 1	0,00%	0,00%
Semana 2	0,00%	0,00%
Semana 3	0,00%	0,00%
Semana 4	0,00%	0,00%

Tabla 59. Tabla de valores programados y ejecutados del contrato de obra.



Gráfica 3. Valores generales del contrato de obra.


3.3.2. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022.

A continuación, se relaciona el control financiero del contrato de interventoría No. 201-CO1.PCCNTR.4146207 – 2022.

3.3.2.1. VALORES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022.

Descripción	Valor Inicial
Costo directo	$ 799.276.737,00
I.V.A. (19%)	$ 151.862.580,00
Valor total inversión	**$ 951.139.317,00**

Tabla 60. Valores del contrato de interventoría.

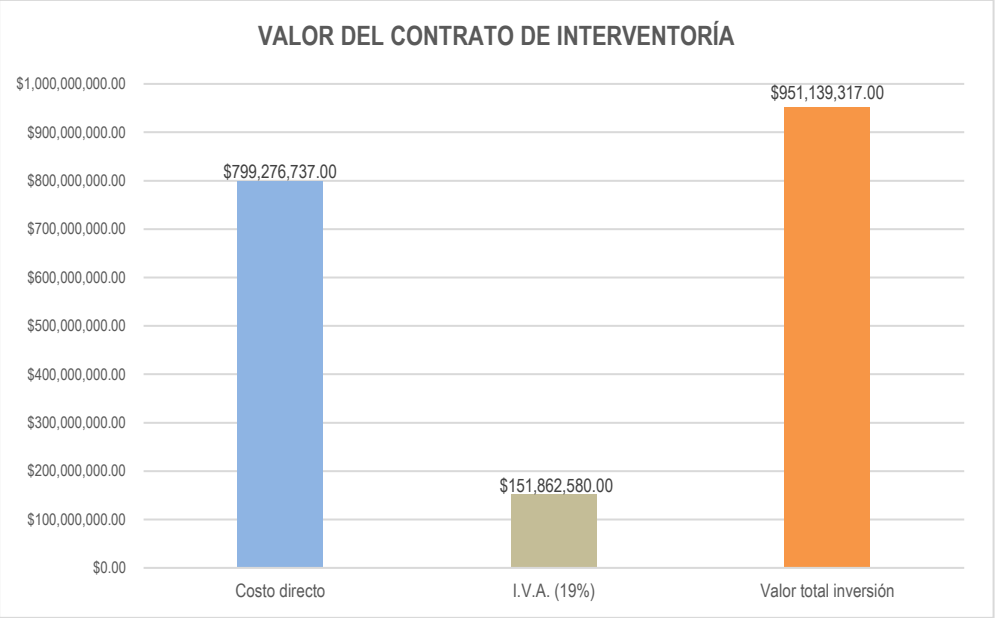

Gráfica 4. Valor del contrato de interventoría.

3.3.2.2. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022.

A la fecha de cierre del presente informe no se ha realizado trámites de actas de recibo parcial de interventoría.

3.3.2.3. CONTROL DE FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022.

A la fecha de cierre del presente informe no se han realizado trámites de acta de recibo parcial de interventoría.

3.4. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

En Bogotá, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2022, se firma acta de inicio entre Arq. Luis Antonio Pinzón Parra, director de construcción y conservación de Establecimientos educativos en calidad de Supervisor y Jorge Gómez Falla en calidad de representante legal del Consorcio Inter Colegios 2022.

En Bogotá, a los once (11) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023), se firma acta de inicio entre Jorge Gómez Falla, en calidad de Representante de Consorcio Intercolegios 2022, como Interventor, y Miguel Alexander Cerón Molina, en calidad de representante legal de Safrid Ingeniería S.A.S., como Contratista, para suscribir el acta de inicio del contrato.

3.4.1. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

Obligaciones	Cumplimiento
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	
1. Obligaciones previas para la suscripción del contrato	Cumplido.
2. Obligaciones relacionadas con medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio generada por enfermedades contagiosas reguladas por emergencias sanitarias.	En proceso.
3. Obligaciones conforme a lo establecido en el Decreto Distrital 332 de 2020	En proceso.
4. Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental	En proceso.
5. Obligaciones administrativas	En proceso.
6. Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra.	En proceso.
7. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción.	En proceso.
8. Obligaciones relacionadas con la demolición de elementos no estructurales. (Cuando a ello hubiere lugar)	En proceso.
9. Obligaciones relacionadas con la ejecución de obras y protocolo de atención de emergencias.	En proceso.
10. Obligaciones en Materia de Servicios Públicos.	En proceso.
11. Obligaciones de información.	En proceso.
12. Obligaciones en materia de documentos para la terminación y liquidación del contrato.	En proceso.
13. Obligaciones especiales.	En proceso.
14. Obligaciones en materia de participación comunitaria y divulgación.	En proceso.
15. Obligaciones de trámites y permisos	En proceso.
16. Obligaciones posteriores a la entrega de la obra y liquidación del contrato.	En proceso.
17. Obligaciones en Materia de Infraestructura del Contratista	En proceso.

Tabla 61. Control de cumplimiento del contrato de obra.

3.4.2. CORRESPONDENCIA

Consecutivo Oficio	Fecha	Dirigido A	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_001	31 de octubre de 2022	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA DE INFORMACIÓN PRELIMINAR
CIC_BTA_SED_050_2022_002	22 de noviembre de 2022	SAFRID INGENIERÍA S.A.S.	OBSERVACIONES HOJAS DE VIDA DE PERSONAL EN OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_003	25 de noviembre de 2022	SAFRID INGENIERÍA S.A.S.	SOLICITUD INFORMES PRELIMINARES
CIC_BTA_SED_050_2022_004	29 de noviembre de 2022	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA DE PÓLIZA DE FIRMA DE CONTRATO

CIC_BTA_SED_050_2022_005	02 de diciembre de 2022	SAFRID INGENIERÍA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 003-GP2-SED-2022 " RADICACIÓN DOCUMENTOS GRUPO 2. BARRIOS UNIDOS - ENGATIVÁ"
CIC_BTA_SED_050_2022_006	06 de diciembre de 2022	SAFRID INGENIERÍA S.A.S.	OBSERVACIONES HOJAS DE VIDA
CIC_BTA_SED_050_2022_007	06 de diciembre de 2022	SAFRID INGENIERÍA S.A.S.	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_008	06 de diciembre de 2022	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	REMISIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_009	9 de diciembre de 2022	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	SOLICITUD INGRESO A COLEGIOS PARA PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA.
CIC_BTA_SED_050_2022_010	10 de diciembre de 2022	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	SOLICITUD FORMATOS EN ARCHIVO EDITABLE
CIC_BTA_SED_050_2022_011	26 de diciembre de 2022	SAFRID INGENIERÍA S.A.S.	SOLICITUD DE DOCUMENTOS CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4077642.
CIC_BTA_SED_050_2022_012	26 de diciembre de 2022	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	REITERACIÓN SOLICITUD ENVÍO DE FORMATOS EN ARCHIVO EDITABLE
CIC_BTA_SED_050_2022_013	26 de diciembre de 2022	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	IDENTIDAD VISUAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OBRA, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.
CIC_BTA_SED_050_2022_014	27 de diciembre de 2022	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	REMISIÓN PÓLIZA DE INTERVENTORÍA ACTUALIZADA
CIC_BTA_SED_050_2022_015	28 de diciembre de 2022	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	SOLICITUD CRONOGRAMA REALIZACIÓN ACTAS DE VECINDAD.
CIC_BTA_SED_050_2022_016	29 de diciembre de 2022	SAFRID INGENIERÍA S.A.S.	REITERACIÓN COMUNICADO CIC_BTA_SED_050_2022_011
CIC_BTA_SED_050_2022_017	30 de diciembre de 2022	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	RADICACIÓN OTROSÍ ACUERDO CONSORCIAL
CIC_BTA_SED_050_2022_018	30 de diciembre de 2022	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	CAMBIO HOJA DE VIDA MAESTRO DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_019	30 de diciembre de 2022	SAFRID INGENIERÍA S.A.S.	CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL
CIC_BTA_SED_050_2022_020	04 de enero de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA Representante Legal	SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVIAS A FIRMA DEL ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA.
CIC_BTA_SED_050_2022_021	3 de enero de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S.	SOLICITUD DE ASISTENCIA A RECORRIDOS A LOS COLEGIOS DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA SAFRID INGENIERÍA S.A.S.
CIC_BTA_SED_050_2022_022	4 de enero de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S.	SOLICITUD ENTREGA DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CIC_BTA_SED_050_2022_023	4 de enero de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S.	OBSERVACIONES PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
CIC_BTA_SED_050_2022_024	6 de enero de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S.	OBSERVACIONES PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
CIC_BTA_SED_050_2022_025	6 de enero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	SOLICITUD ACLARACIÓN COMPONENTE AMBIENTAL
CIC_BTA_SED_050_2022_026	6 de enero de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S	REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CIC_BTA_SED_050_2022_027	10 de enero de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S.	REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CIC_BTA_SED_050_2022_028	10 de enero de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S.	OBSERVACIONES PLANES Y DOCUMENTACIÓN COMPONENTE SST Y MEDIO AMBIENTE.
CIC_BTA_SED_050_2022_029	10 de enero de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO 007-GP2-SED-2022, OBSERVACIONES INFORMES DIAGNÓSTICOS Y PRESUPUESTOS

CIC_BTA_SED_050_2022_030	11 de enero de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S.	REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CIC_BTA_SED_050_2022_031	11 de enero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_032	11 de enero de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S.	LINEAMIENTOS GENERALES
CIC_BTA_SED_050_2022_033	12 de enero de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S.	ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_034	12 de enero de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S.	SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL Y MAQUINARIA - SAFRID INGENIERÍA SAS

Tabla 62. Control correspondencia.

3.5. ACTIVIDADES DE ORDEN TÉCNICO

3.5.1. ACTIVIDADES DE OBRA DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA.

Las actividades adelantadas por parte de Contratista de obra en el periodo de 22 de diciembre de 2022 a 21 de enero de 2023, se enfocaron a labores administrativas, las cuales no permiten tener un avance financiero por motivo de inicio de frentes de obra planificado por el contratista a partir de 25 de enero de 2023.

En consideración a lo expuesto, se procede a presentar las actividades de orden administrativo y diagnóstico por cada una de las sedes asignadas por la Secretaría de Educación del Distrito.

3.5.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

3.5.2.1. Colegio República de Guatemala, sede A

- Visita preliminar y revisión de diagnóstico entregado por la SED.

3.5.2.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia


- Visita preliminar y revisión de diagnóstico entregado por la SED.

3.5.2.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana

- Visita preliminar y revisión de diagnóstico entregado por la SED.

3.5.2.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A

- Visita preliminar y revisión de diagnóstico entregado por la SED.
- Medición de áreas a intervenir.
- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuestos.
- Actas de vecindad.

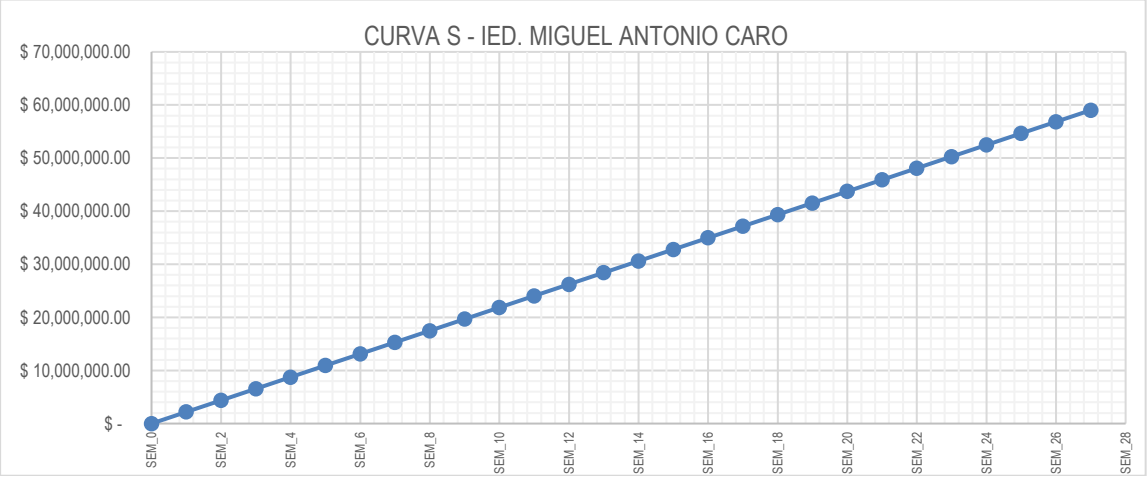

Gráfica 5. Curva programado vs ejecutado Miguel Antonio Caro.

3.5.2.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda


- Visita preliminar y revisión de diagnóstico entregado por la SED.

3.5.2.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada

- Visita preliminar y revisión de diagnóstico entregado por la SED.

3.5.2.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A

- Visita preliminar y revisión de diagnóstico entregado por la SED.
- Medición de áreas a intervenir.
- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuestos.
- Actas de vecindad.

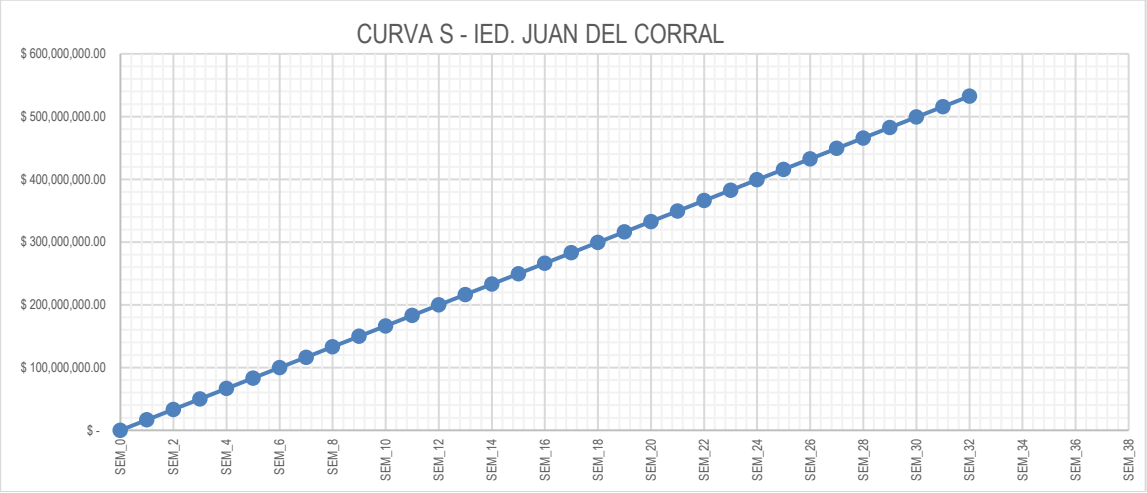

Gráfica 6. Curva programado vs ejecutado Juan del Corral.

3.5.2.8. Colegio Francisco Primero, sede A


- Visita preliminar y revisión de diagnóstico entregado por la SED.

3.5.2.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A

- Visita preliminar y revisión de diagnóstico entregado por la SED.

3.5.2.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A


- Visita preliminar y revisión de diagnóstico entregado por la SED.
- Medición de áreas a intervenir.
- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuestos.
- Actas de vecindad.

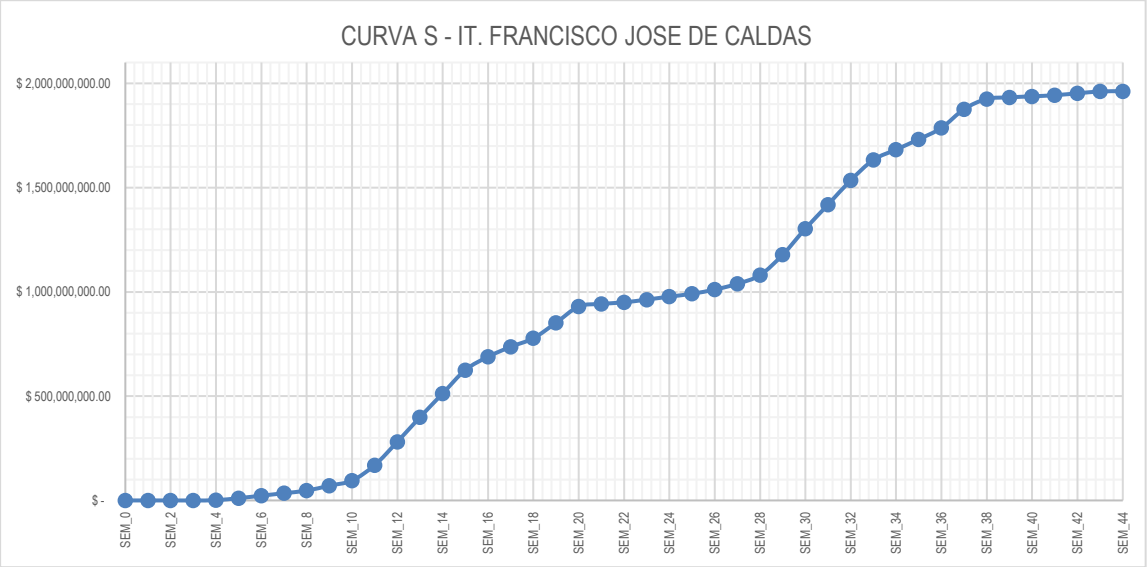

Gráfica 7. Curva programado vs ejecutado Francisco José de Caldas, sede A.

3.5.2.11. Colegio Florida Blanca, sede A


- Visita preliminar y revisión de diagnóstico entregado por la SED.
- Medición de áreas a intervenir.
- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuestos.
- Actas de vecindad.

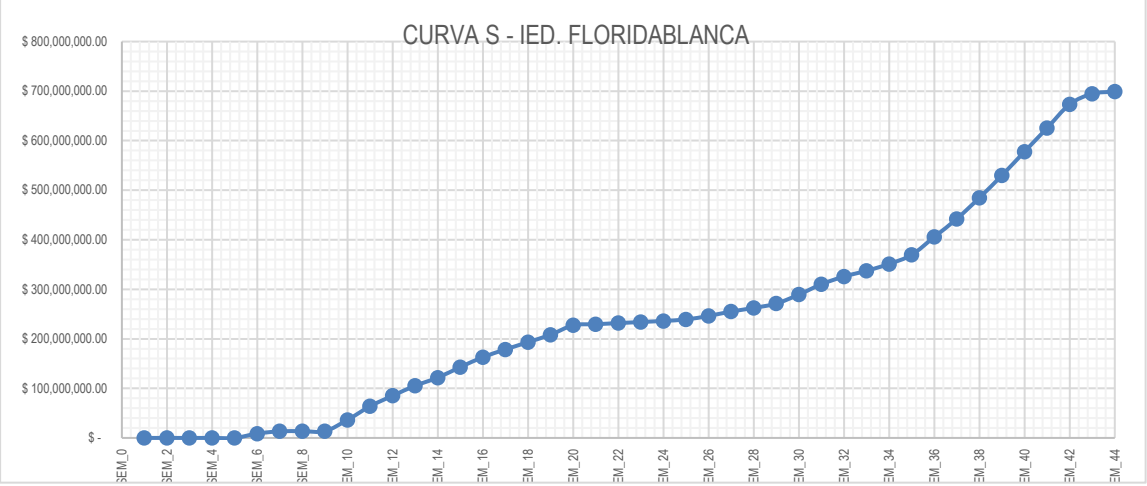

Gráfica 8. Curva programado vs ejecutado Floridablanca.

3.5.2.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A

- Visita preliminar y revisión de diagnóstico entregado por la SED.
- Medición de áreas a intervenir.
- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuestos.
- Actas de vecindad.

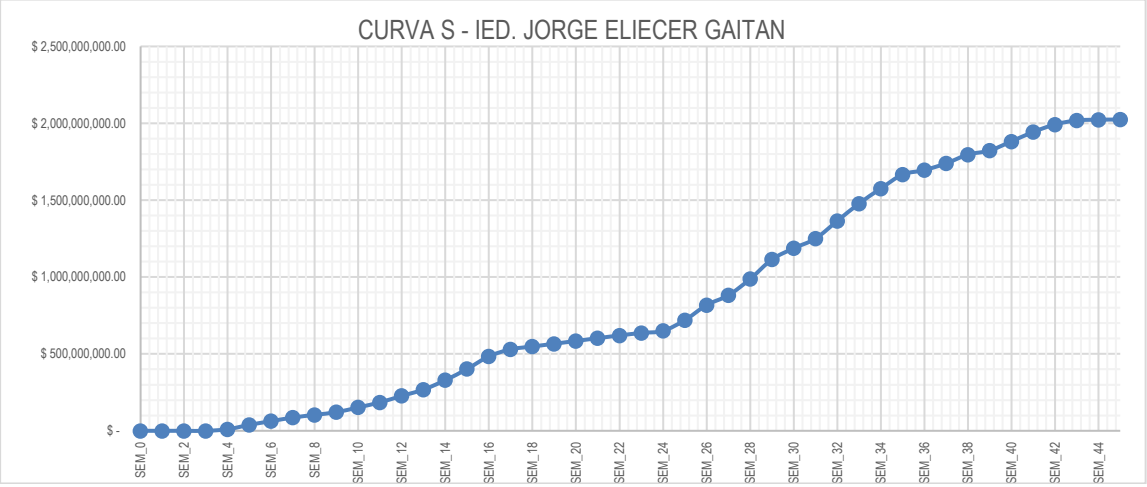

Gráfica 9. Curva programado vs ejecutado Jorge Eliecer Gaitán.


3.5.2.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto

- Visita preliminar y revisión de diagnóstico entregado por la SED.

3.5.2.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A

- Visita preliminar y revisión de diagnóstico entregado por la SED.


- Medición de áreas a intervenir.
- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuestos.
- Actas de vecindad.

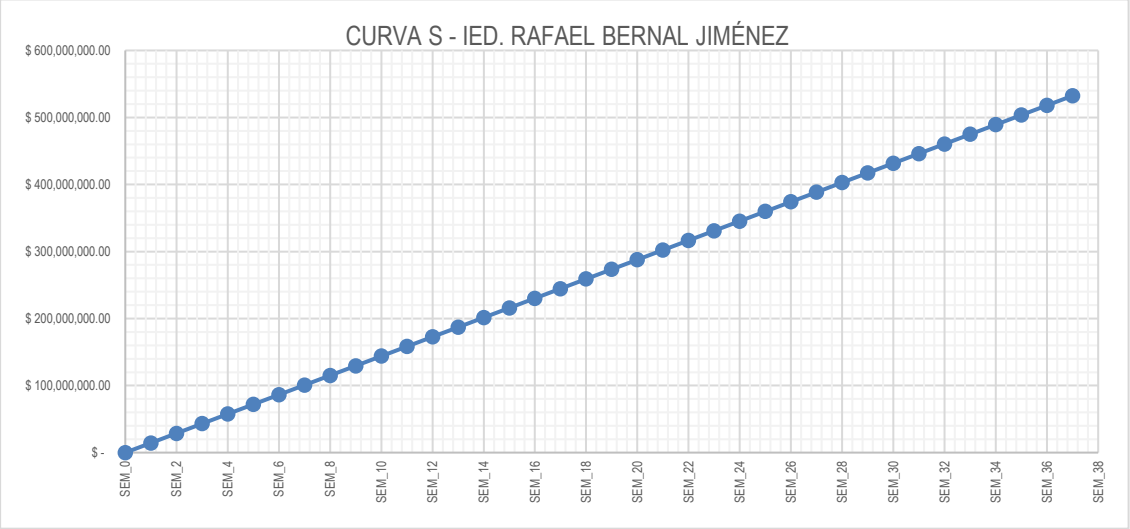

Gráfica 10. Curva programado vs ejecutado Rafael Bernal Jiménez.

3.5.2.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A, Garcés Navas

- Visita preliminar y revisión de diagnóstico entregado por la SED.
- Medición de áreas a intervenir.
- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuestos.
- Actas de vecindad.

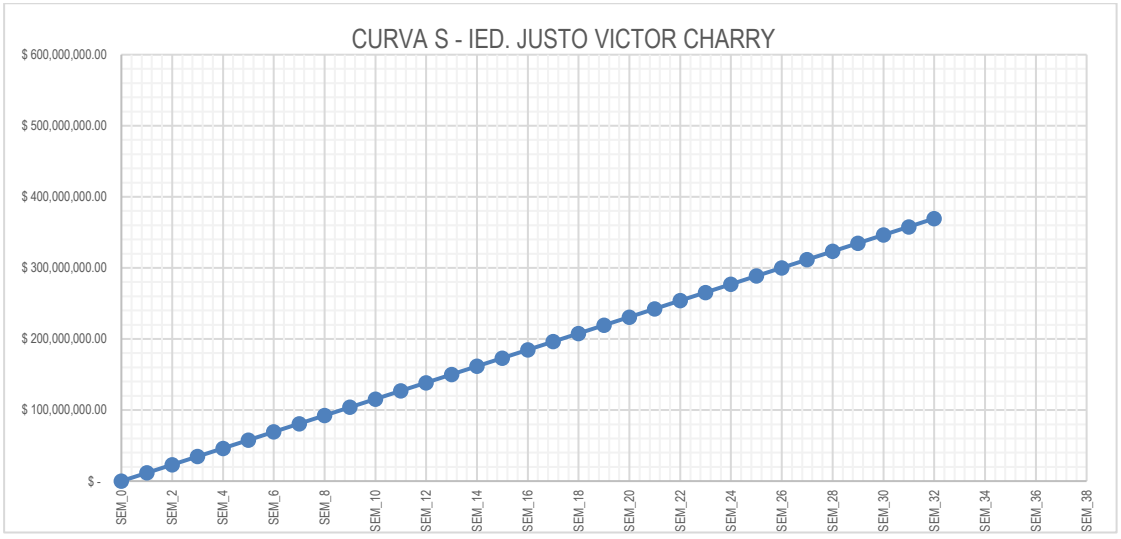

Gráfica 11. Curva programado vs ejecutado Justo Víctor Charry.

3.5.2.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A


- Visita preliminar y revisión de diagnóstico entregado por la SED.

3.5.2.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, sede A

- Visita preliminar y revisión de diagnóstico entregado por la SED.

3.5.2.18. Colegio Garcés Navas, sede A

- Visita preliminar y revisión de diagnóstico entregado por la SED.
- Medición de áreas a intervenir.
- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuestos.
- Actas de vecindad.

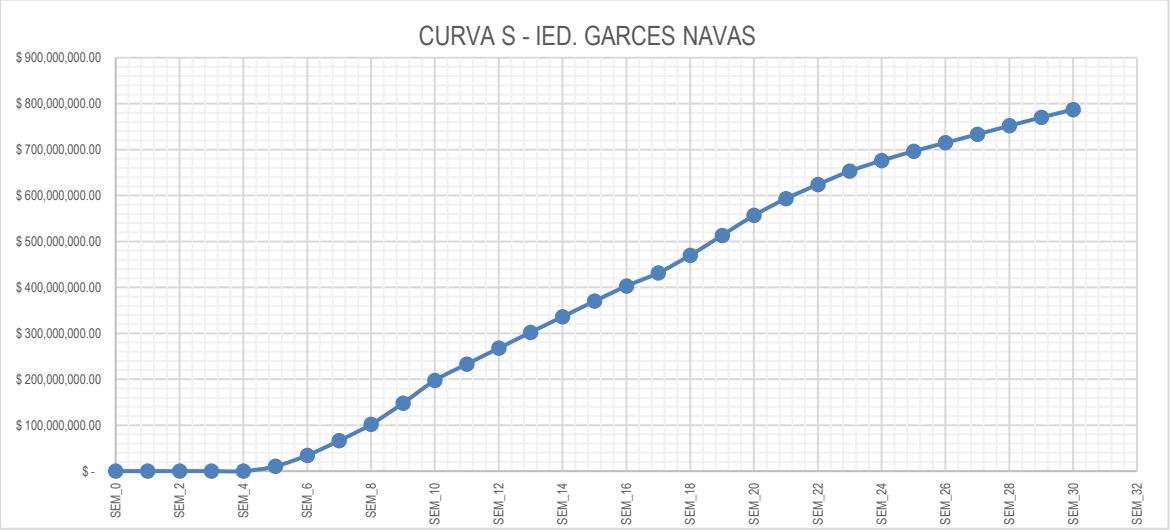

Gráfica 12. Curva programado vs ejecutado Garcés Navas.

3.5.2.19. Colegio República de Panamá, sede A

- Visita preliminar y revisión de diagnóstico entregado por la SED.

3.5.3. PROBLEMAS Y SOLUCIONES PRESENTADOS

3.5.4. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA

Las actividades llevadas a cabo durante el periodo del presente informe corresponden a:

- Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones y condiciones contenidas en el Contrato de obra, así como en los documentos previos que hacen parte integral del mismo.

- Establecer la línea de base del presupuesto y la programación para poder ejercer las funciones de monitoreo y control al desempeño del contrato de obra.

- Realizar el proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de los productos entregables establecidos, conforme al cronograma aprobado.

- Revisar, verificar y corroborar la autenticidad y veracidad de la información que sea allegada por el contratista de obra en cumplimiento de sus actividades y obligaciones

- Emitir y exigir el cumplimiento de todas las observaciones técnicas, administrativas, financieras en cuanto a calidad, presupuesto y programación durante todo el contrato de obra.

- Garantizar la ejecución de la obra con los materiales especificados y aprobados en las diferentes etapas de la obra.

- Efectuar las revisiones periódicas que estime necesario a las cantidades de obra y calidad de los materiales, haciendo seguimiento a la toma de pruebas, ensayos, controles y resultados.

3.5.5. CONTROL DE CALIDAD

De acuerdo con las actividades que se han realizado en el transcurso de la ejecución de las obras la Interventoría ha verificado, el estado de los equipos e insumos.

3.5.6. REUNIONES EFECTUADAS

3.5.6.1. REUNIONES DE COMITÉ

Acta	Fecha	Compromisos	Responsable	Fecha cumplimiento	Estado
1	16/01/2023	Entrega de informe de emergencias educativas.	SAFRID INGENIERIA SAS.	INMEDIATO	PENDIENTE
		Revisión de Garantía de estabilidad tanque Nidia Quintero.	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.	17-01-23	OK
		Revisión de requerimiento para tala (cierre de ciclo) árbol IT. Francisco José de Caldas.	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.	17-01-23	PENDIENTE
		Realizar visita a Colegio Laureano Gómez (Emergencias).	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA.	17-01-23	OK
		Entrega de APU´s Contractuales.	CONTRATISTA DE OBRA.	17-01-23	PENDIENTE

		Inicio de actividades de obra.	CONTRATISTA DE OBRA.	17-01-23	OK
		Socialización y entrega de espacios.	APOYO A SUPERVISIÓN DE CONTRATO, CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA.	18-01-23	OK

Tabla 63. Relación de reuniones y seguimiento de compromisos.

3.5.6.2. REUNION DE RECONOCIMIENTO, REVISIÓN Y RECIBO DE ESPACIOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

Acta No.	Fecha	Objeto	Lugar
1	28 de noviembre de 2022	Reunión comité de mantenimiento.	IED. Jorge Eliecer Gaitán.
2	08 de noviembre de 2022	Reconocimiento para intervenciones en los Colegios.	IT Francisco José De Caldas Sede A, IED Juan Del Corral, IED Garces Navas.
3	09 de noviembre de 2022	Recorrido de reconocimiento en colegios zona de Engativá.	IT Francisco José De Caldas Sede B.
4	28 de noviembre de 2022	Reunión de alcance intervenciones Jorge Eliecer Gaitán.	IED Jorge Eliecer Gaitán.
5	29 de noviembre de 2022	Presentación de Cartilla Ilustrada de Mantenimiento SED.	Secretaria de Educación de Distrito.
6	19 de diciembre de 2022	Revisión de instituciones para diagnósticos con supervisión de Entidad Contratante, Contratista e Interventoría.	IED. República de Colombia – IED José Asunción Silva.
7	28 de diciembre de 2022	Revisión de instituciones para diagnósticos con supervisión de Entidad Contratante, Contratista e Interventoría.	IED. República de Panamá, Colegio Palestina, IED Morisco
8	17 de enero de 2023	Entrega de Espacios a Intervenir	IT Francisco José de Caldas.
9	17 de enero de 2023	Entrega de Espacios a Intervenir	IED Jorge Eliecer Gaitán.
10	20 de enero de 2023	Acta de socialización y entrega de espacios	IED. Garcés Navas

Tabla 64. Relación de reuniones, socialización y entrega de espacios a intervenir.

3.5.7. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

En el anexo registro fotográfico se presentan los avances de obra de las actividades realizadas en el periodo del presente informe.

3.5.8. ANÁLISIS DE ENSAYOS DE LABORATORIO

No se registran ensayos de laboratorio durante este periodo.

3.6. GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Las gestiones realizadas en seguridad y salud en el trabajo se presentan en anexo 7 – Informe SSTA

3.7. ACTIVIDADES DE ORDEN SOCIAL.

3.7.1. ACTAS DE VECINDAD

Se realizaron actas de vecindad en las siguientes instituciones educativas:

3.7.1.1. Colegio República de Guatemala

A la fecha del presente informe, no aplica.

3.7.1.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay

A la fecha del presente informe, no aplica.

3.7.1.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B

A la fecha del presente informe, no aplica.

3.7.1.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED

Se realiza visita a Colegio Distrital Miguel Antonio Caro en compañía de contratista de obra (Safrid Ingeniería) e interventoría (Consorcio Inter colegios 2022) el día dieciséis (16) de enero de 2023 en donde se levantan actas de vecindad obteniendo las siguientes anotaciones:

- Entrada principal: Se evidencia piso en concreto en mal estado, presenta grietas, desprendimientos, empozamiento, desgaste de línea de demarcación, cajas en mal estado.
- Vías de acceso: Se evidencia mal estado de vías de acceso, huecos, baches, grietas, desprendimientos, perdida de bordillo en entrada.
- Fachada externa: Sendero peatonal perimetral en adoquín se encuentra en mal estado, presenta perdida de piezas, afectaciones por raíces de árboles, hundimientos; muro externo en bloque a la vista presenta afectaciones, rayones, grafitis y cerramiento perimetral en malla en regular estado.



- Pasillos / Escalera: se evidencia deterioro de piso, desgaste en cinta antideslizante de escalera, pérdida de línea de demarcación, ventanas manchadas y con rejas oxidadas.





- Fachada interna frontal: Muro en bloque a la vista en regular estado, desgaste de pintura, deterioro y afectaciones en rejas, cartera de ventanas presentan desportillamiento.
- Fachada posterior: Muro en bloque a la vista, pintura desgastada, humedad en muros, carteras en mal estado, rejas con afectaciones, piso deteriorado con fisuras, canal en concreto presenta humedad y presencia de vegetación, viga canal con alto grado de humedad y fisuras.








- Aula múltiple: Se evidencia enchape de piso con desgaste normal por uso, cerchas con oxido y perdida de pintura, 12 luminarias en buen estado, tejas

cubiertas en regular estado, uniones de bajantes presentan filtración, tarima en regular estado, presenta deterioro en bordes.



3.7.1.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda

- A la fecha del presente informe, no aplica.

3.7.1.6. Colegio República de Colombia, sede C

- A la fecha del presente informe, no aplica.


3.7.1.7. Instituto Técnico Juan del Corral

Se realiza visita a Instituto Técnico Distrital Juan del Corral, Sede A en compañía de contratista de obra (Safrid Ingeniería) e interventoría (Consorcio Inter colegios 2022) el día diecisiete (17) de enero de 2023 en donde se levantan actas de vecindad obteniendo las siguientes anotaciones:

- Entrada principal: se evidencia enchape de piso, muro en bloque a la vista, carpintería metálica y luminarias en buen estado y placa de cubierta presenta humedad.
- Vías de acceso: se evidencia buen estado de vías de acceso, con algunas afectaciones (hueco y empozamiento de agua), anden perimetral en concreto en buen estado.
- Patio principal y fachada interior: se evidencian losas de concreto en general en buen estado, desgaste normal de pintura por uso, rejillas de cárcamos en buen estado, muros en bloque a la vista en buen estado, cables sin protección de tubería.
- Ingreso peatonal sector parqueadero: placa de piso presenta fisuras y humedad, carpintería metálica y enchape de piso en buen estado y humedad en muros fachada e internos.



- Puente conexión bloques: se evidencia dilatación de junta entre bloque – puente y pérdida de material, humedad en vigas y cubierta y fisuras superficiales en muro de mampostería y vigas.
- Terraza lado biblioteca: domos de tragaluz completos y en buen estado, empozamiento de agua y humedad en muros.
- Biblioteca: muros de mampostería, ventanas, carpintería metálica, techo y enchape de piso en buen estado, 20 luminarias, y presencia de humedad.

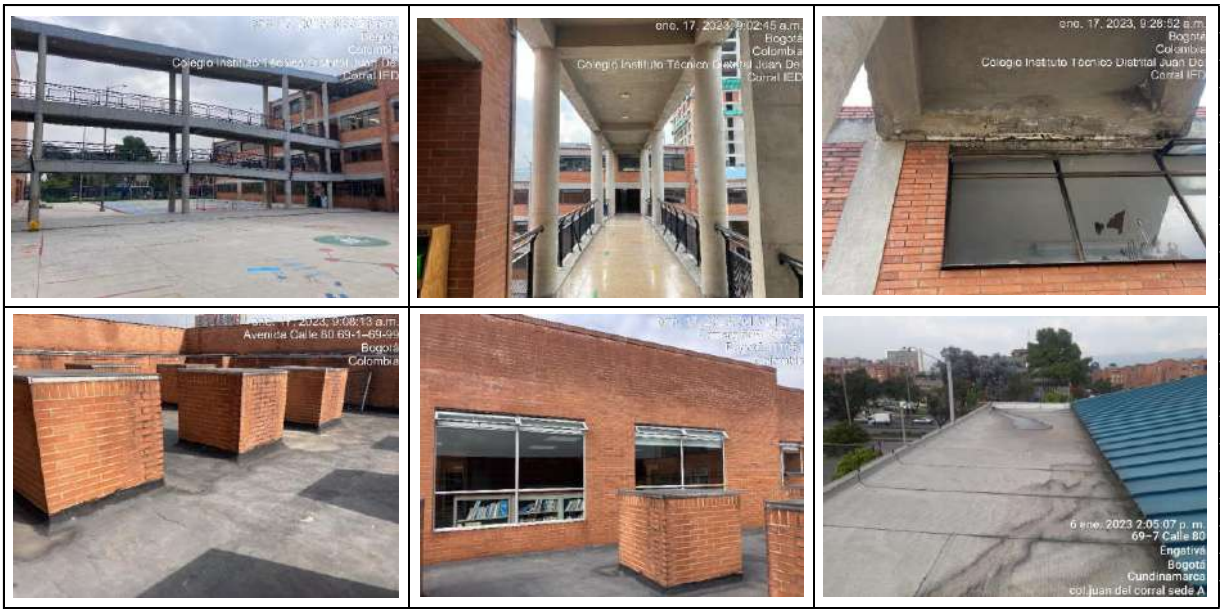

- Bloque de salones

- Salón de once: muro en bloque en buen estado, ventanas completas, teja tipo sándwich en buen estado y placa de concreto en buen estado.
- Salón de música: muros en bloque y enchape de piso en buen estado, vidriería completa, humedad en cielo raso en drywall y muro, se evidencian resanes en elementos estructurales y cubierta en teja en buen estado.
- Sótano: muros en bloque a la vista en buen estado, humedad en placa de entrepiso y muros de concreto, piso con desgaste, carpintería metálica en buen estado y línea de demarcación desgastada.





3.7.1.8. Colegio Francisco Primero, sede A

- A la fecha del presente informe, no aplica.

3.7.1.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán


- A la fecha del presente informe, no aplica.

3.7.1.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A

Se realiza visita a Instituto Técnico Distrital Francisco José de Caldas, Sede A en compañía de contratista de obra (SAFRID INGENIERÍA SAS) e interventoría (CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022) el día cuatro (04) de enero de 2023 en donde se levantan actas de vecindad obteniendo las siguientes anotaciones:

- Coliseo deportivo: (Área Interna): se evidencia levantamiento superficial, intervenciones y desprendimientos en cancha, línea de demarcación desgastada; se presenta humedad en muros, desgaste de pintura, ventanería en mal estado y gradería con fisuras y desprendimientos.

(Área Exterior): En la fachada del coliseo deportivo, se observa anden perimetral en mal estado con fisuras, grietas y desprendimientos, pérdida de línea de demarcación, pintura desgastada, rayones en muros y carpintería metálica en mal estado.

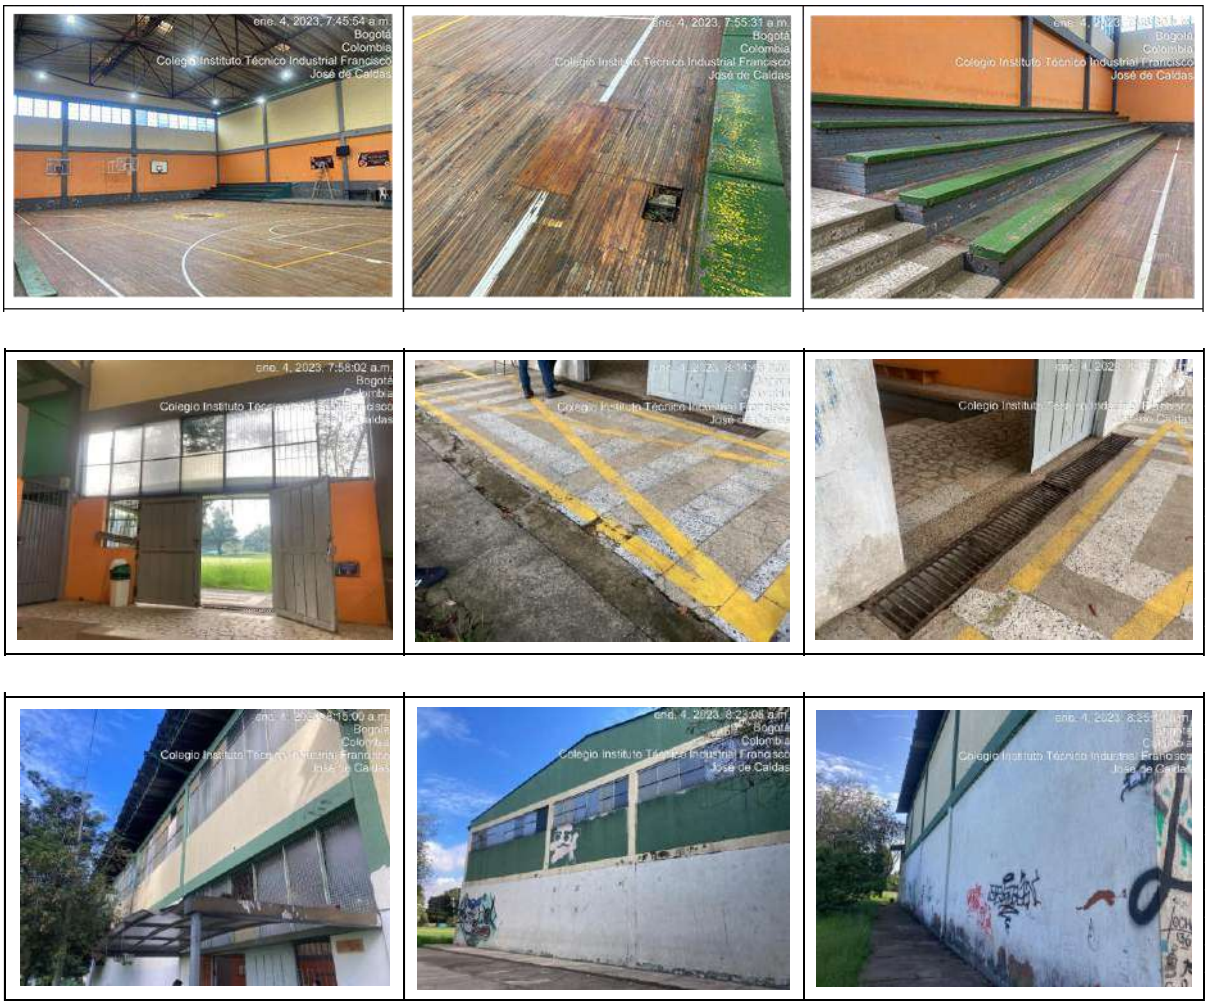

- Bloque L, (aulas de clase): El bloque L cuenta con dos pisos conformados por 12 aulas de clase en el primer piso y 12 en el segundo piso, de acuerdo a esto, se encuentra como generalidad en las aulas: pisos, pintura y pañete en mal estado, presentan deterioro y desgaste, pérdida y desgate de línea de demarcación, entrepaños en concreto con desprendimientos, carpintería metálica en mal estado, presentan oxido y perdida de pintura, ventanería con vidrios en mal estado y canaleta metálica en buen estado.

  (Pasillos y escalera): Se evidencian pisos deteriorados con baldosas rotas, desprendidas y desgastadas, pintura de muros desgastada, carpintería metálica (ventanas) en mal estado y líneas de demarcación desgastadas.



















- (Fachada exterior): Se evidencia pintura desgastada, humedad en muros, fisuras generalizadas, acceso peatonal perimetral en mal estado (losas de concreto con fisuras, grietas y adoquines faltantes) y perdida de línea de demarcación.







- Entrada principal y vías de acceso: Se evidencia fisuras generalizadas y hundimientos laterales en la vía de ingreso principal al colegio; en el interior de la institución (parqueadero y senderos) se presenta mal estado de las losas de concreto, grietas, empozamiento de agua y desprendimiento de material con alto nivel de daño en aspecto y funcionalidad.





3.7.1.11. Colegio Florida Blanca

Se realiza visita a Institución Educativa Distrital Floridablanca, sede a en compañía de contratista de obra ((SAFRID INGENIERÍA SAS) e interventoría (CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022) el día cinco (05) de enero de 2023 en donde se levantan actas de vecindad obteniendo las siguientes anotaciones:

- Entrada principal y vías de acceso: Fachada en bloque a la vista en buen estado con rayones; acceso peatonal en loseta y adoquín presenta hundimientos, daños y afectaciones; acceso vial en buen estado, presenta empozamientos intermitentes.





- Canchas múltiples: Se evidencia desgaste y deterioro de superficie de cancha, líneas de demarcación desgastadas y cárcamos, arcos y tableros con afectaciones por uso. Sendero peatonal perimetral canchas presenta piezas de adoquín sueltas, hundidas y rotas; cajas eléctricas, luminarias y cajas de aguas lluvias en buen estado.





- Predios colindantes canchas:

Fachada 1: Muro en bloque a la vista, sin pañete ni pintura, ventana con marcos oxidados y cableado a la vista sin protección.
Fachada 2: Muro en bloque a la vista, sin pañete ni pintura, rejas de ventana oxidadas.
Fachada 3: Muro en pañete sin fisuras ni grietas, parte de cubierta en mal estado.
Fachada 4: Muro en bloque a la vista, sin pañete ni pintura, presenta bloques en mal estado.
Fachada 5: Muro en bloque a la vista, sin pañete ni pintura, ventana con marcos oxidados y hundimientos y bloques rotos.
Fachada 6: Muro en pañete sin fisuras ni grietas.
Fachada 7: Muro en bloque a la vista, sin pañete ni pintura, con bloques completos y en buen estado.
Fachada 8: Muro en bloque a la vista en buen estado y ventana en buen estado.
Fachada 9: Muro en bloque a la vista en buen estado, pintura con desgaste normal, rejas presentan oxidación.










- Parqueadero: Superficie de parqueadero en mal estado, presenta grietas y desprendimientos, 6 cajas de aguas lluvias en mal estado (sin tapa de concreto, desgastadas, hundimientos y rejillas expuestas)



- Bloque SENA: Estructura en bloque a la vista, pintura desgastada, no presenta fisuras ni grietas, bajantes deterioradas, carpintería metálica presenta oxidación y deterioro.



3.7.1.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán

Se realiza visita a Institución Educativa Distrital Jorge Eliecer Gaitán, sede A en compañía de contratista de obra (SAFRID INGENIERÍA SAS) e interventoría (CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022) el día cinco (05) de enero de 2023 en donde se levantan actas de vecindad obteniendo las siguientes anotaciones:

- Entrada principal y vías de acceso: Se evidencia desgaste de pintura, bloques con afectaciones, bajantes deterioradas, humedad en viga canal; entradas de acceso peatonal en mal estado, presentan grietas, fisuras y desprendimientos y vías de acceso vehicular en buen estado, presenta fisuras superficiales.

- Parqueadero: Superficie presenta deterioro, grietas y desprendimientos y línea de demarcación desgastada.





- Aulas: Se evidencia pintura desgastada, pisos deteriorados, ventanas con vidrios en mal estado, rotos y faltantes, carpintería metálica en mal estado presenta oxidación y pérdida de pintura.



- Cancha: Se evidencia superficie de cancha con alto grado de deterioro, rejillas de cárcamos laterales en mal estado, pintura, canchas y arcos deteriorados,

cerramiento el mal estado (bloques de muro rotos y malla contra impacto oxidado) y bajantes en mal estado.

- Predio adyacente: muro en bloque a la vista en mal estado (bloques rotos, desgastados), reja presenta oxidación y pérdida de pintura.



3.7.1.13. Colegio José Asunción Silva

- A la fecha del presente informe, no aplica.

3.7.1.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A

Se realiza visita a Colegio Distrital Rafael Bernal Jiménez en compañía de contratista de obra (Safrid Ingeniería) e interventoría (Consorcio Inter colegios 2022) el día diecisiete (17) de enero de 2023 en donde se levantan actas de vecindad obteniendo las siguientes anotaciones:

- Entrada principal: anden perimetral en concreto y adoquín en regular estado, presenta losetas sueltas, rotas y hundidas; entrada en concreto presenta fisuras y desprendimientos.



- Aula múltiple: se evidencia muros en bloque en regular estado, estructura metálica presenta oxido, enchape de muros y pisos en buen estado, 26 luminarias (9 sin funcionamiento), tarima en regular estado con afectaciones.

- Aula Karate: se evidencia 7 luminarias, ventana sin reja ni vidrio, piso deteriorado sin enchape, muros en regular estado con pintura desgastada, muro en drywall en regular estado y cercha presenta oxido; pasillo con piso deteriorado, perdida de línea de demarcación y desportillamiento en viga.
- Área acceso aula múltiple: sendero en adoquín presenta piezas rotas, hundimientos, humedad, bordillos de cárcamos desportillados y línea de demarcación desgastada.
- Caseta comedor: se evidencia deterioro de bajante y viga canal, rejilla de cárcamo en mal estado, puerta de ingreso en mal estado, presenta oxido y perdida de pintura.







- Área zonas verdes: se evidencian fisuras generalizadas en piso en concreto, muro de confinamiento en bloque para zonas verdes presentan afectaciones, rejillas de cárcamo con afectaciones y mobiliario en regular estado.
- Pasillo tercer piso – zona domo: se evidencia enchape de piso, muro en bloque y carpintería metálica en buen estado, ventanas con vidrios completos y se evidencia remates en drywall en laterales de cubierta.

- Área escalera: se evidencia desgaste de escalera, desgaste de pintura de pasamanos y ventanas en regular estado, se evidencia vidrios rotos con fisuras.





3.7.1.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A

Se realiza visita a Colegio Distrital Justo Victor Charry en compañía de contratista de obra (Safrid Ingeniería) e interventoría (Consorcio Inter colegios 2022) el día dieciséis (16) de enero de 2023 en donde se levantan actas de vecindad obteniendo las siguientes anotaciones:

- Entrada principal, vías de acceso y fachada: Se evidencia buen estado de vías de acceso, sendero peatonal en loseta y adoquín en buen estado en general, en algunos puntos presentan humedad y empozamiento, muros presentan afectaciones y grafitis y humedad en viga canal.







- Pasillo principal: se evidencia línea de demarcación desgastada, desgaste de piso, carpintería metálica con pérdida de pintura leve.
- Baños preescolar
- Baños niñas: se evidencia enchape de pisos y muros en regular estado con desgate y fisuras superficiales, carpintería metálica con desgaste de pintura, techo en placa al descubierto en buen estado, divisiones en concreto en regular estado, 2 luminarias en funcionamiento, 1 sin funcionar, 4 unidades sanitarias y 3 espejos en regular estado.
- Baños niños: se presenta enchape de muros con afectaciones, enchape de piso desgastado, 2 luminarias en funcionamiento, 1 sin funcionar, 2 sanitarios instalados, 2 sin aparato sanitario, puerta metálica presenta afectaciones, perdida de pintura y hundimientos, 4 espejos en regular estado.
- Cuarto de aseo: se evidencia enchape desgastado y una unidad de luminaria sin funcionamiento.





- Baños secundaria
- Baños niños: enchape de piso y muros presentan desgaste, mesón en granito pulido presenta fisuras, divisiones metálicas y en concreto con afectaciones, techo en placa al descubierto en buen estado, unidades sanitarias completas.
- Baño niñas: se evidencia carpintería metálica con rayones, enchape de piso y muros con desgaste, mesón de lavamanos y espejos en regular estado, unidades sanitarias completas.



- Baños comedor:
- Baños mujeres: enchape de muros presenta fisuras, pisos con desgaste, mesón de lavamanos en regular estado, divisiones en concreto presentan fisuras, interruptor sin tapa, 1 luminaria en funcionamiento, 3 espejos en regular estado.
- Baños hombres: enchape de piso deteriorado, 3 espejos en regular estado, mesón de lavamanos presenta desgaste, 1 luminaria en funcionamiento, afectaciones en sistema push de lavamanos.
- Puerta ingreso zona baño comedor: Puerta con vidrios completos, chapa dañada y línea de demarcación desgastada.



3.7.1.16. Colegio Robert F Kennedy

- A la fecha del presente informe, no aplica.

3.7.1.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, sede A

- A la fecha del presente informe, no aplica.

3.7.1.18. Colegio Garcés Navas

Se realiza visita a Institución Educativa Distrital Garcés Navas en compañía de contratista de obra (SAFRID INGENIERÍA SAS) e interventoría (CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022) el día tres (03) de enero de 2023 en donde se levantan actas de vecindad obteniendo las siguientes anotaciones:

- Fachada en bloque a la vista presenta fisuras, pintura desgastada, rayones en muros y bajantes deterioradas; sendero peatonal en loseta y adoquín con desgaste por uso, en algunos puntos presenta hundimientos y pérdida de elementos, afectaciones en cerramiento y urbanismo; piso en concreto con pintura desgastada y viga de cimentación de cerramiento presenta deterioro.








- Bloque A (aulas de clase): Se presenta humedad en muros, desgaste de pisos y pintura, fisuras generalizadas en muros y carpintería metálica en mal estado (presentan oxidación y pérdida de pintura).







- (Pasillos – Escalera): Se presentan fisuras generalizadas en muros, grieta en junta de separación entre bloque A y escalera, desgaste de pintura en muros, desgaste

y pérdida de línea de demarcación, humedad en muros y desgaste de baranda y muros de antepecho.



- Bloque B (aulas de clase): Se evidencia afectaciones en cielos rasos, humedad en muros y desgaste en pisos y muros.

3.7.1.19. Colegio República de Panamá

- A la fecha del presente informe, no aplica.

4. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

4.1. OBSERVACIONES

- De acuerdo con los parámetros establecidos para el inicio de obra, las instituciones educativas priorizadas para su inicio corresponden a, I.E.D. Garcés Navas; Francisco José de Caldas, sede A; Floridablanca; Jorge Eliecer Gaitán; Miguel Antonio Caro; Justo Víctor Charry; Bernal Jiménez y Juan del Corral.

- En cumplimiento de los compromisos contractuales se realiza atención de emergencias en Institución Educativa Distrital Morisco, la cual requiere la intervención de sus instalaciones físicas mediante las obras de mantenimiento correctivo a red sanitaria con el fin de adecuar los espacios de baterías sanitarias afectadas y ponerlos nuevamente en funcionamiento.

4.2. CONCLUSIONES

- De acuerdo con la revisión de actividades ejecutadas por parte del contratista de obra, al cierre del presente informe se tiene un avance ejecutado de obra de 0%, sin embargo, se han efectuado actividades de orden técnico, administrativo, financiero, ambiental y SSTAC para proceder al inicio del contrato, con base a la información recopilada en los diagnósticos de cada sede a intervenir.

- Por parte de esta interventoría, a la fecha se ha efectuado el oportuno proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de los productos entregables por parte del contratista de obra.

- En cumplimiento de sus funciones esta interventoría ha emitido y exigido el cumplimiento de todas las observaciones técnicas, administrativas, financieras en cuanto a calidad, presupuesto y programación.

4.3. RECOMENDACIONES

- En aras de cumplir con las obligaciones contractuales dentro de los plazos establecidos, se solicita a contratista de obra la oportuna respuesta a las solicitudes de la interventoría en lo referente a el manejo o seguimiento de todos los planes de mejora u ejecución de obra; al no presentarse la información solicitada, se evidencia falta de consistencia técnica en los planes propuestos.

ANEXOS

ANEXO 1. ACTAS DE COMITÉ
ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO
ANEXO 3. PÓLIZAS INTERVENTORÍA
ANEXO 4. INFORME SSTA
ANEXO.5. ACTAS DE REUNIÓN, RECORRIDO Y ENTREGA DE ESPACIOS.

Anexo 1. ACTAS DE COMITÉ

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
	16/01/2023	10:15		SED.
Objeto de la reunión:	Seguimiento Contrato de Obra. e Interventoría,			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS

Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.4077642	***Contrato de Interventoría No.***	CO1.PCCNTR.4146207
Objeto del Contrato de obra	Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas grupo 2.	***Objeto Contrato Interventoría***	Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.
Contratista de obra	SAFRID INGENIERÍA SAS	***Contratista de Interventoría***	CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento

- La Interventoria Inicia con la presentación de las actividades realizadas por Emergencia en el colegio Morisco, las cuales corresponden a la limpieza de Cajas, cancelas, reforzamiento de cajas del Acueducto y/o Alcantarillado. Adicionalmente la supervisión realiza la consulta de realizar una nueva caja en el sitio donde se encuentra un codo de 45°, sin embargo, la interventoria y el contratista de Obra manifiestan que no es necesario realizar la nueva caja, sinó realizar mantenimientos periódicos a las mismas.

La supervisión recomienda revisar actividades adicionales necesarias para las Instituciones Educativas que necesiten intervención de Emergencias. en Aras de que todas las actividad

nos lleven al cumplimiento de la emergencia y el funcionamiento total de la institución.

- Emergencia.

1. I.E. Tomás Carrasquilla: Sede A (Urgente).
   El contratista menciona que su Esp. Hidráulico ya realizó la visita, se solicita la entrega de dicho informe a la supervisión e interventoría.
   - Desde la interventoría revisar el componente financiero para el Desarrollo de las Actividades de la Institución.

2. I.E. Palestina.
   - Se requiere arreglar el piso de la institución.
   - Se requiere buscar una solución técnica y realizar una evaluación financiera.
   - Por el momento la supervisión recomienda no empezar la intervención.

3. Nidia Quintero (I.E). Sede A.
   - La supervisión ilustra que se necesita realizar intervención de Emergencia en la membrana del tanque de agua potable
   - Se recomienda hacer la evaluación económica para la instalación de la membrana.
   - La supervisión queda con el compromiso en revisar la garantía.

4. Francisco J. Caldas.
   - tala de Árbol → Revisar requerimientos para cerrar el ciclo del árbol.

- No previstos (NP's).
  - Desde la supervisión presenta los lineamientos del procedimiento para la presentación de los APU's no previstos.

- APU's Contractuales
  La Interventoría recomienda y solicita al contratista de Obra la entrega de todos los APU's contractuales.

5. Colegio Laureano Gómez.
   - Se debe realizar la visita.
   - La Intervensión corresponde a la insonorización de un Aula Múltiple.

▶ Inicio de Obra de los colegios.
- La supervisión informa que rectores de los I.E. han enviado comunicados para el inicio de Actividades, por lo que se requiere al contratista de Obra el inicio de las actividades de manera inmediata.
- Se debe realizar reunión con el rector y las partes para presentación del Inf. Diagnóstico.
- El director de obra manifiesta: Que inicia el:
  a. I Francisco José de Caldas
  b. Jorge eliecer Gaitan.
  c. Garcés Navas

Adicionalmente, manifiesta que se está supeditado a la socialización y Entrega de Espacios.

- Se recomienda por parte de la Interventoría que la socialización y entrega de espacios el día de mañana 17/01/23 de las I.E. Francisco José de Caldas y Jorge Eliecer Gaitán, a partir de las 8 a m.
- El contratista de Obra menciona que si el 17/01/23 le hacen entrega de los espacios, ingresaría al personal de obra el 18/01/23.
- La supervisión informa que el día de mañana se realizará la socialización y posiblemente la entrega de espacios (Depende de las IE), en las I.E. Francisco José de Caldas y Jorge Eliecer gaitán.
- El director de Obra informa que ésta semana iniciarían ejecución de 4 frentes de Obra y en la semana del 23/01/22 iniciar 4 frentes adicionales para tener 8 frentes Abiertos

Entrega de los Informes preliminares.

- El contratista de Obra de Obra se compromete a radicar 8 Inf. diagnósticos el 17/01/23. a la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá a los ____ del mes de _____ del 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre: ARQ LUIS EDUARDO MONTES
Cargo: DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre: Fredy G. Rodríguez
Cargo: Director

SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: Juan Cuellar
Cargo: Apoyo Supervision

Nota:

1. En caso de requerirse anexar más casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
2. Favor anexar a este formato, el registro de ORDEN DEL DIA y LISTA DE ASISTENCIA (___ folios).

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA:	16/Enero/2023	LUGAR:	SED	ACTA DE SEGUIMIENTO No:	
CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.4077642	CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	CO1.PCCNTR.4146207		

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
Fredy G. Rodriguez.	Director Interventoria	Consorcio Intercolegios 2022	fredy.rodriguez.gng@gmail.com	6015204359	
Camilo Antonio Samacá P.	Residente Interventoría	Consorcio Intercolegios 2022	interventoria070@gmail.com	3143158069	
Angela Cañon R	Residente de obra	Safrid Ingenieria	Proyectosedgrupo2@gmail.com	3102532759	
LUIS EDUARDO MORA	D. OBRA	Safrid Ing.	proyectosedgrupo@gmail.com	3006613168	
Jessica Alvarez.	ing. OBRA.	Safrid ing.	Proyectosedgrupo2	3115548608.	
Juan Carlos Valencia	Apoyo supervisor	DCCFE-SED		3147125636	
Antonio Gonzalez	D.L. Interventoria	Consorcio Intercolegios 2022	Director1.gng@gmail.com	3182705404	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

Anexo 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023

FOTOGRAFÍA (1)



Actas de vecindad Garcés Navas IED / Fachada

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023


FOTOGRAFÍA (2)



Vista fachada Bloque A y B

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023

FOTOGRAFÍA (3)

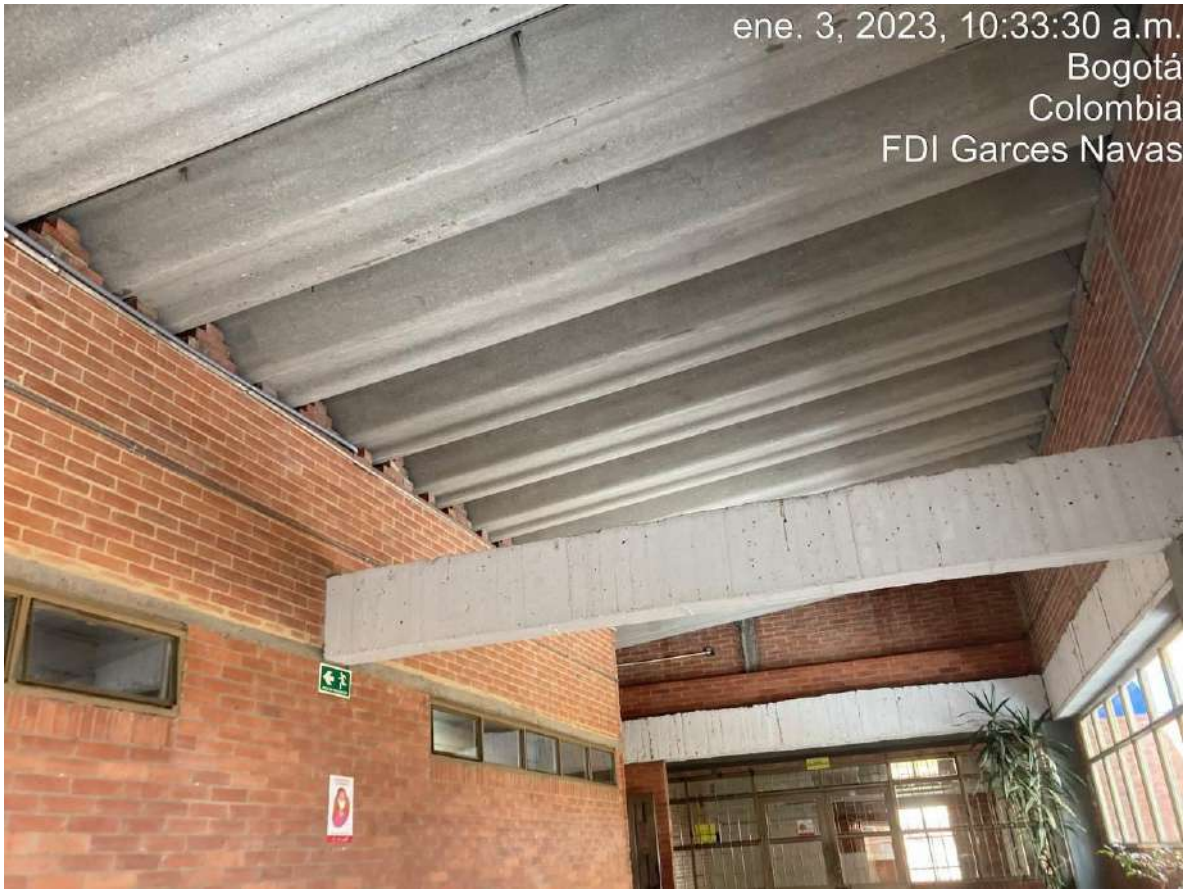

Teja bloque B IED Garcés Navas

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023

FOTOGRAFÍA (4)



Humedad en muro aulas Bloque A tercer piso IED Garcés Navas

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023

FOTOGRAFÍA (5)



Fachada bloque L, IED Francisco José de Caldas, sede A

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023

FOTOGRAFÍA (6)



Teja cubierta bloque L Francisco José de Caldas sede A

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023


FOTOGRAFÍA (7)



Fachada Coliseo deportivo IED Francisco José de Caldas, sede A

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023

FOTOGRAFÍA (8)

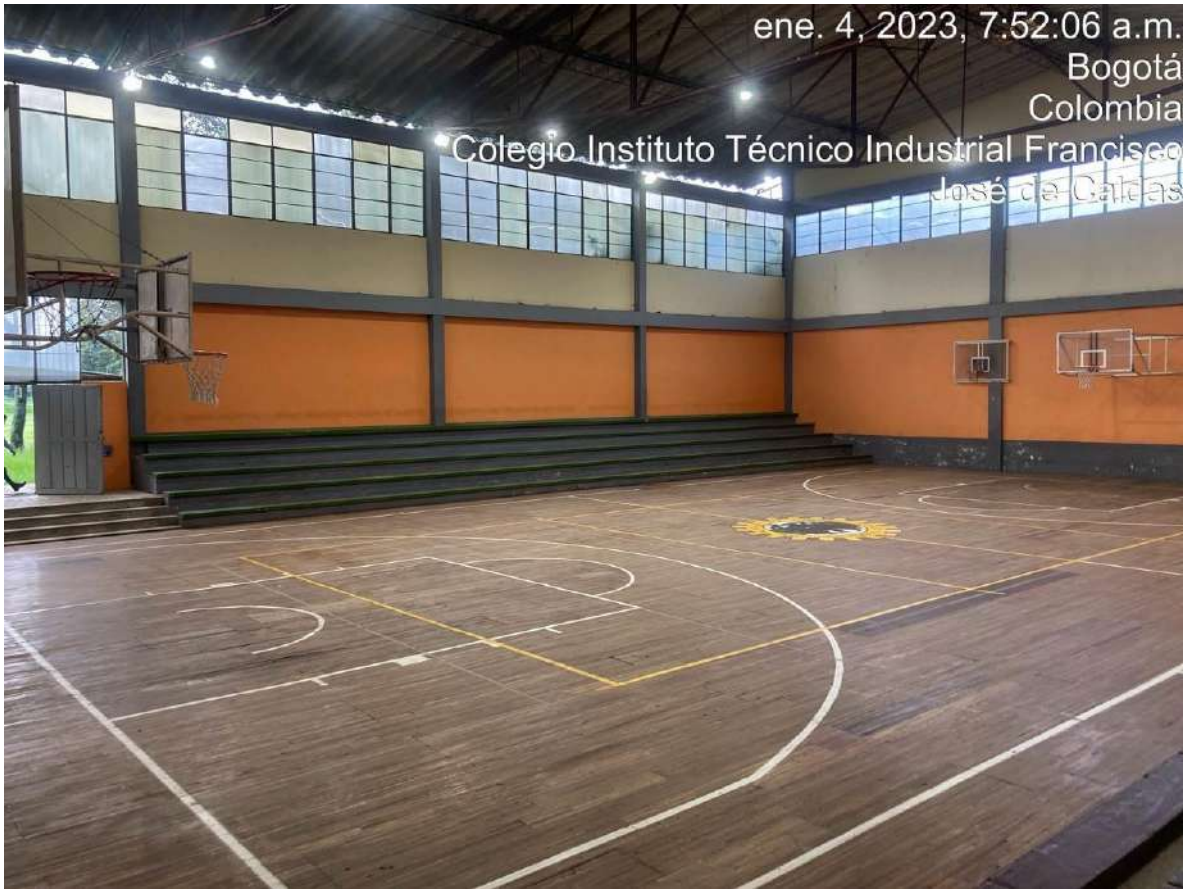

Cancha coliseo deportivo

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023

FOTOGRAFÍA (9)



Actas de vecindad Jorge Eliecer Gaitán sede A, Fachada

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023

FOTOGRAFÍA (10)



Aulas de clase IED Jorge Eliecer Gaitán

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023

FOTOGRAFÍA (11)



Aulas de clase IED Jorge Eliecer Gaitán

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023

FOTOGRAFÍA (12)



Cancha deportiva IED Jorge Eliecer Gaitán

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023

FOTOGRAFÍA (13)



Actas de vecindad IED Florida Blanca, Fachada

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023

FOTOGRAFÍA (14)



Canchas múltiples IED Florida Blanca

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023

FOTOGRAFÍA (15)



Estado parqueadero IED Florida Blanca

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023


FOTOGRAFÍA (16)



Bloque SENA IED Florida Blanca

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023

FOTOGRAFÍA (17)

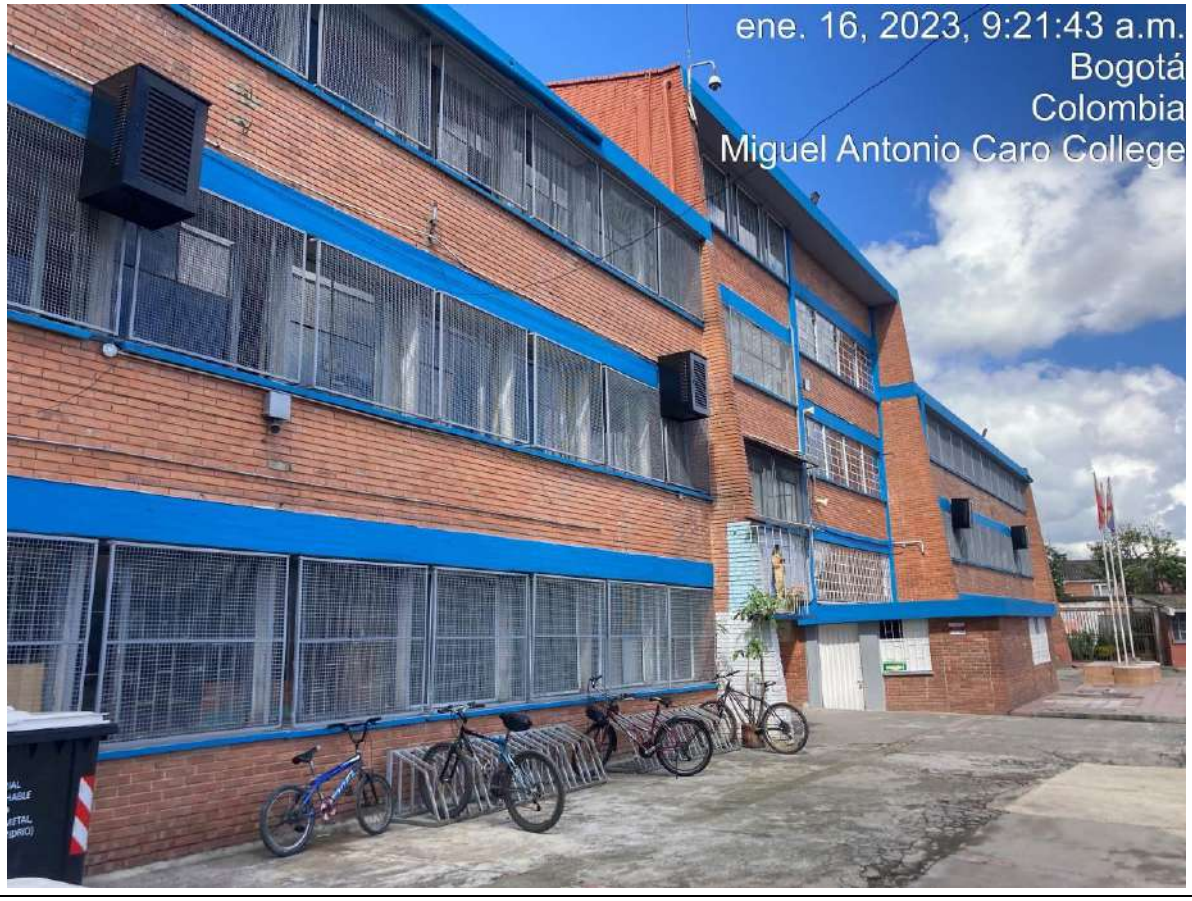

Actas de vecindad IED Miguel Antonio Caro

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023


FOTOGRAFÍA (18)



Bajantes fachada posterior IED Miguel Antonio Caro

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023


FOTOGRAFÍA (19)

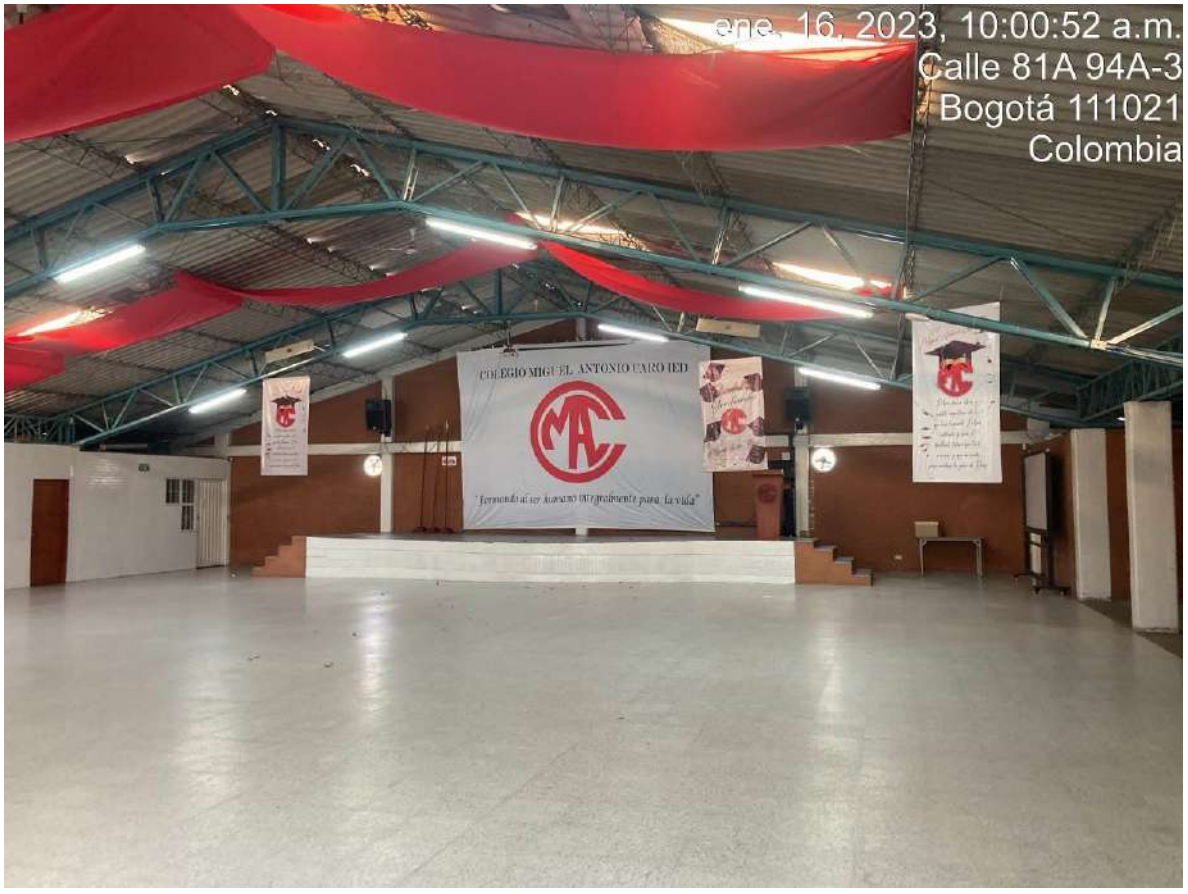

Aula múltiple IED Miguel Antonio Caro

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023

FOTOGRAFÍA (20)

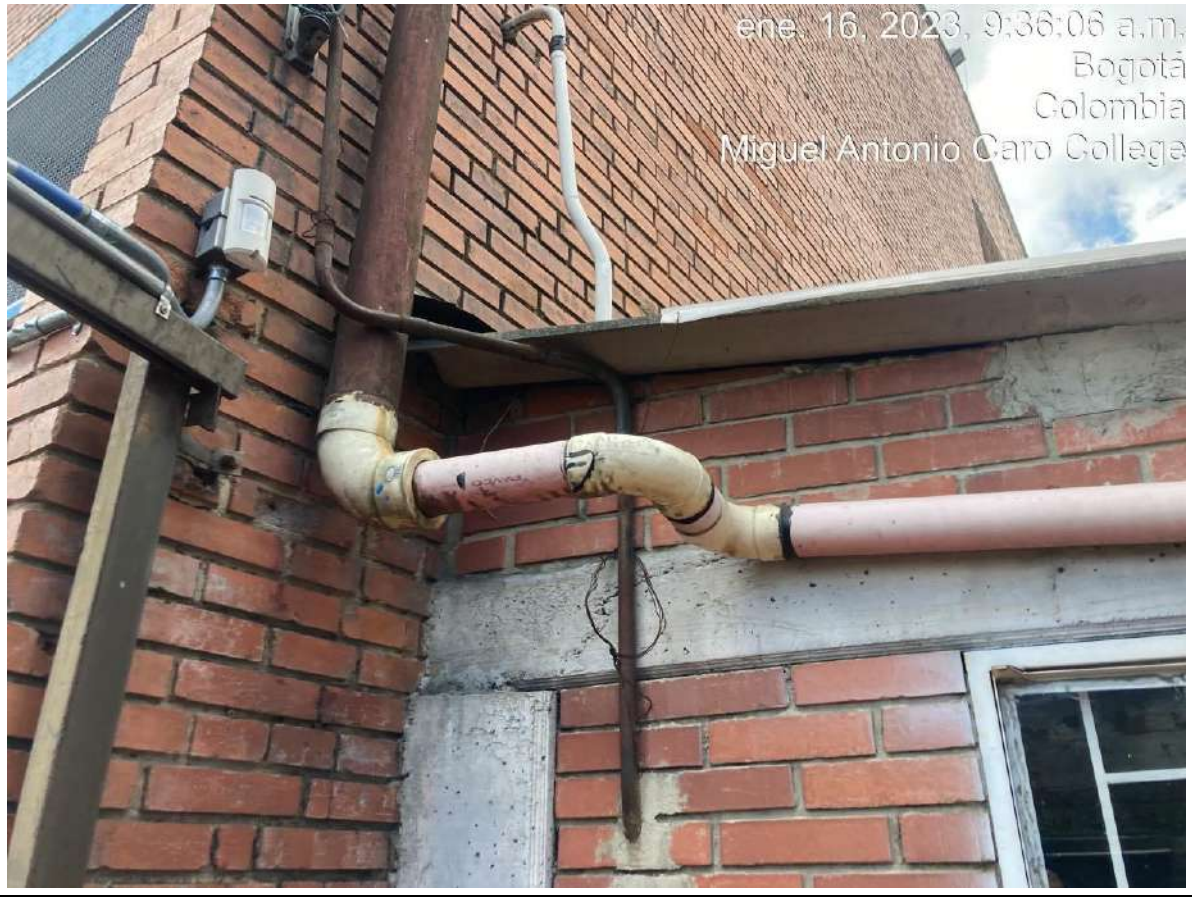

Estado bajantes IED Miguel Antonio Caro

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023

FOTOGRAFÍA (21)



Actas de vecindad IED Charry, Fachada

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023

FOTOGRAFÍA (22)



Estado baterías sanitarías área pre escolar

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023

FOTOGRAFÍA (23)



Estado baterías sanitarías área secundaria

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023

FOTOGRAFÍA (24)



Estado baterías sanitarías área secundaria

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023

FOTOGRAFÍA (25)



Actas de vecindad IED Juan del Corral

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023

FOTOGRAFÍA (26)



Puente peatonal entre bloques IED Juan del Corral

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023


FOTOGRAFÍA (27)



Cubierta lado biblioteca IED Juan del Corral

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023

FOTOGRAFÍA (28)

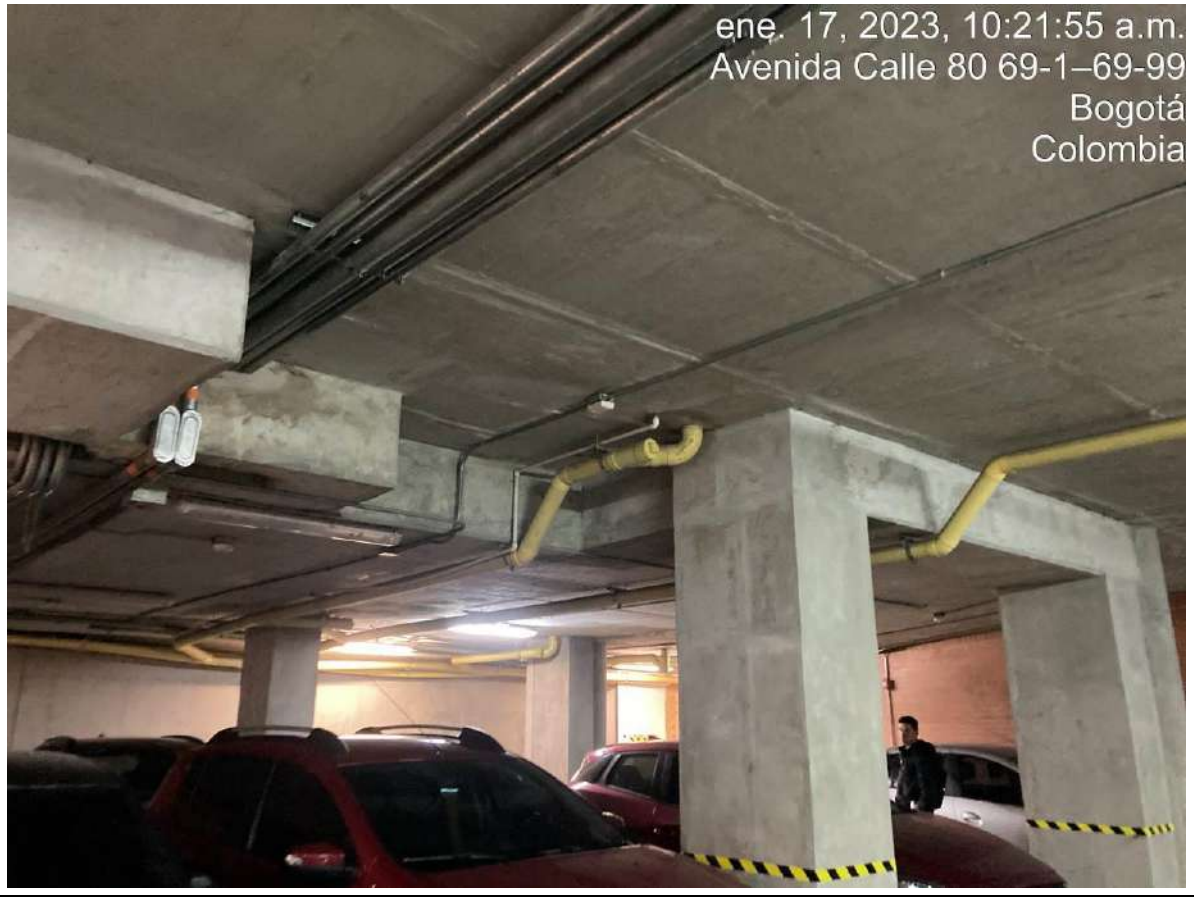

Sótano IED Juan del Corral

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023

FOTOGRAFÍA (29)



Actas de vecindad IED Rafael Bernal Jiménez

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023

FOTOGRAFÍA (30)



Aula múltiple IED Bernal Jiménez

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023


FOTOGRAFÍA (31)



Zonas verdes IED Bernal Jiménez

OBJETO DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ DC, LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023

FOTOGRAFÍA (32)

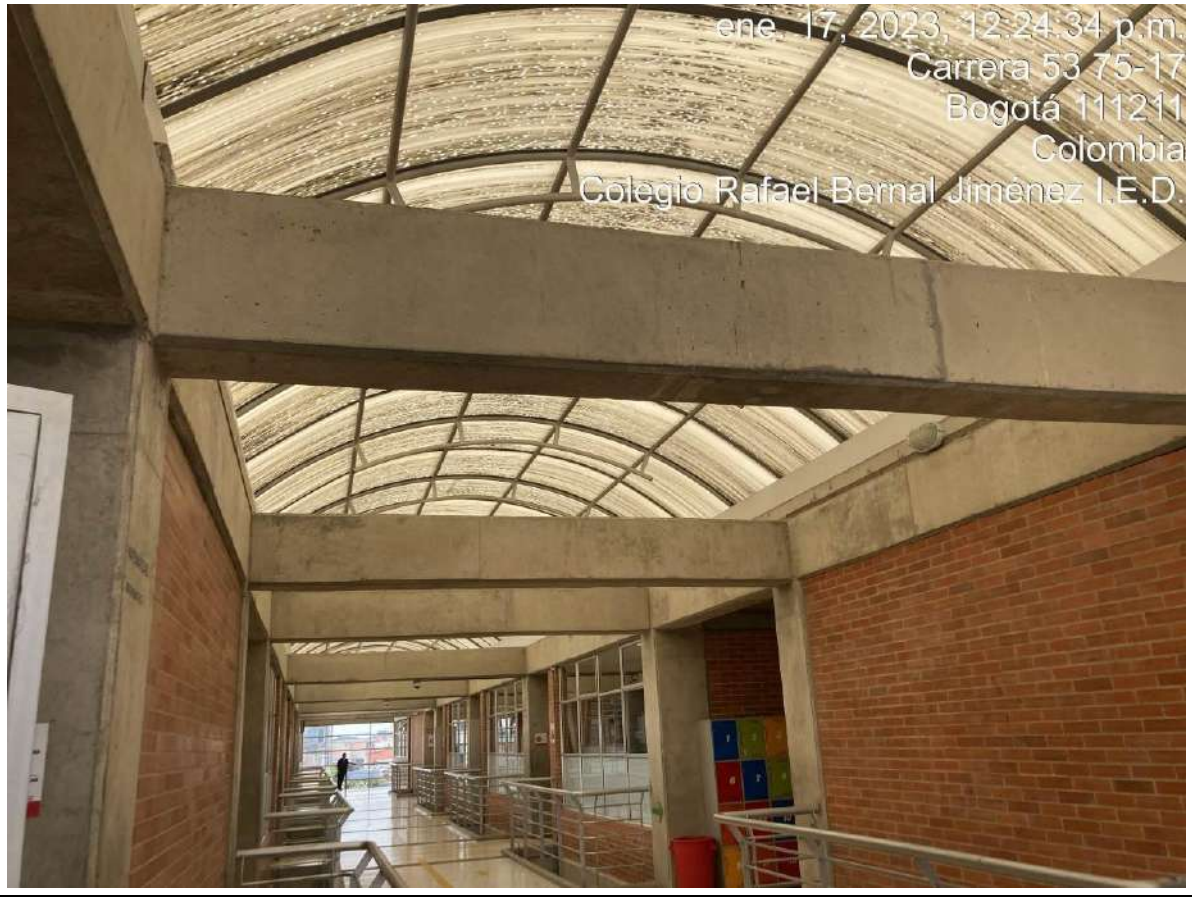

Domo pasillo aulas IED Bernal Jiménez

Anexo 3. PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 18pogRFy/WaypP3gtibEHQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100235369	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71475957	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/12/2022	24:00 Horas Del	21/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.649.961-8
DIRECCIÓN	CR 49 104 B 49	**TELÉFONO**	7122685
ASEGURADO	BOGOTA DC - SECRETARIA DE EDUCACION	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	CALLE 71 NO 73 A 44	**TELÉFONO**	3581600
BENEFICIARIO	BOGOTA DC - SECRETARIA DE EDUCACION	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	CALLE 71 NO 73 A 44	**TELÉFONO**	3581600

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN ACTA DE INICIO DE ECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICAR.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.4146207 , CUYO OBJETO ES
INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 22/12/2022	24:00 Horas Del 22/07/2024	190.227.747,60	542.227,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 22/12/2022	24:00 Horas Del 21/01/2027	47.556.936,90	291.400,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 21/01/2024	24:00 Horas Del 21/01/2029	190.227.747,60	1.713.926,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 428.012.432,10	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	2.547.553,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	2.547.553,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	484.985,07
TOTAL A PAGAR	$	3.037.538,07

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/12/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100235369	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71475957	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/12/2022	24:00 Horas Del	21/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

GRUPO 2
.
TOMADOR DE LA POLIZA CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 CONFORMADO POR
GNG PROYECTOS SAS BIC NIT 901477828-7 (50%) Y GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS NIT 901383717-3 (50%)
-
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UN VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011. (DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORÍA).

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100235369** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022** Asegurado o Beneficiario: **BOGOTA DC - SECRETARIA DE EDUCACION / BOGOTA DC - SECRETARIA DE EDUCACION** , expedida por la Compañía en **27/12/2022,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **27** días del mes **DICIEMBRE** del año **2022.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Anexo 4. INFORME SSTA

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022



"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022

INFORME MENSUAL SSTA DE INTERVENTORÍA No. 001

PERIODO DE EJECUCIÓN:
22 DE DICIEMBRE 2022 A 21 DE ENERO DE 2023

VERSIÓN 0
ORIGINAL

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

El ORIGINAL del presente documento será entregado a la dependencia y entidad correspondiente, según se indica a continuación:

DEPENDENCIA	No DE COPIAS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO a través del supervisor Arq. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA – Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos SED.	Original
Biblioteca del Proyecto	1

Las observaciones que resulten de su revisión y aplicación deben ser informadas para proceder a realizar sus modificaciones pertinentes.

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

Índice Revisión	Capítulo Modificado	Fecha de Modificación	Observaciones
0	N/A	N/A	VERSIÓN ORIGINAL

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN


Titulo Documento		**INFORME MENSUAL SSTA DE INTERVENTORÍA No.01**		
Revisión		**0**	**1**	**2**
Responsable elaboración	Nombre	Ing. Steven Alexander Ibarra Sanabria		
	Firma			
	Fecha	23 de enero de 2023		
Responsable revisión	Nombre	Ing. Manuel Antonio González Romero		
	Firma			
	Fecha	24 de enero de 2023		
Responsable aprobación	Nombre	Arq. Fredy Giovanni Rodríguez Salazar		
	Firma			
	Fecha	25 de enero de 2023		

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE DISTRIBUCIÓN 2
ÍNDICE DE MODIFICACIONES 2
ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 2
1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVOS. 5
3. GESTIÓN DOCUMETAL 5
4. COMPONENTE AMBIENTAL 6
4.1. MANEJO DE CAMPAMENTO 6
4.2. MANEJO DE RESIDUOS 6
4.3. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO 6
4.4. MANEJO DE AGUA 6
4.5. MANEJO DE PAISAJE, FLORA Y FAUNA 7
4.6. MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 8
4.7. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 9
4.8. INDICADORES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 9
4.9. CUADRO DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA 9
5. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 11
5.1. AFILIACIONES Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 11
5.2. CORRESPONDENCIA 11
5.3. COPASST Y CÓMITE DE CONVIVENCIA LABORAL 12
5.4. INDUCCIONES 12
5.5. MEDICINA PREVENTIVA Y LABORAL 12
5.6. HIGIENE INDUSTRIAL 12
5.7. ACTIVIDADES EN EL TRABAJO 12
5.7.1. Trabajos de alto riesgo 12
5.7.2. Brigada de emergencias 13
5.7.3. Accidentes de trabajo 13
5.7.4. Capacitaciones SST 13
5.7.5. Inspección SST 13

5.8. PERSONAL INTERVENTORIA 14
6. CONCLUSIONES 15
7. ANEXOS 15

1. INTRODUCCIÓN

La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - SED, puso a disposición de los interesados el Proceso de Contratación No. SED-LPDCCEE-039-2022 para la selección del Contratista encargado de ejecutar el Contrato de obra pública para "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.", la cual fue adjudicada a la firma SAFRID INGENIERÍA SAS con NIT. No.900.520.848-4, representado legalmente por MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA identificado con cédula de ciudadanía No.1.081.774.968, dando origen al Contrato No CO1.PCCNTR.4077642 de 06 de octubre de 2022, el cual fue firmado el día 06 de diciembre de 2022; con un valor de **TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($ 13.954.280.882)** incluido AIU. El plazo total previsto para la ejecución del contrato es de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio correspondiente, la cual se firmó el día 11 de enero de 2022.

Por tanto, el informe mensual de interventoría No.1 presenta un resumen de las actividades realizadas por el contratista y la interventoría, correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de diciembre de 2022 y el 21 de enero de 2023.

2. OBJETIVOS.

- ✓ Informar las actividades del contratista SAFRID INGENIERIA SAS desde el componente SSTA.
- ✓ Presentar las acciones de gestión realizadas por la interventoría de Inter Colegios 2022 desde el componente SSTA.

3. GESTIÓN DOCUMETAL

- ✓ Se realizó revisión de la documentación contractual del contrato de obra y de interventoría con relación al componente SSTA.
- ✓ En el periodo se inició la solicitud de la documentación base SSTA para la ejecución del proyecto.
- ✓ Se cuenta con entrega por parte de los siguientes documentos:
    a. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)
    b. Plan de Manejo Ambiental (PMA)
    c. Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (PGRCD)

Los cuales ya fueron aprobados, debido a la subsanación que se realizó debido a las observaciones dejadas.

4. COMPONENTE AMBIENTAL

4.1. MANEJO DE CAMPAMENTO

El contratista cuenta hasta el momento con los siguientes campamentos (Francisco José de Caldas, Garces Navas y Jorge Eliecer Gaitán Sede A) para aspectos administrativos y para uso del personal.

4.2. MANEJO DE RESIDUOS

- ✓ En el periodo, se iniciaron actividades en obra, ingreso de personal y generación de residuos.
- ✓ Se realiza disposición final de residuos ordinarios con el servicio público de la localidad.
- ✓ Se cuenta inicialmente con el punto ecológico preexistente, por parte del colegio, sin embargo, se le realiza observación al asesor ambiental para que se tenga carta de préstamo por parte de rectoría para realizar uso del punto ecológico del colegio.



4.3. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO

- ✓ Hubo ingreso de volquetas. Se solicitó al contratista remitir la documentación con antelación para aprobación de interventoría.
- ✓ Se presentan actividades de limpieza, sin generación de material particulado considerable. Sin embargo, se solicita reforzar esta actividad al contratista.

4.4. MANEJO DE AGUA

El contratista está realizando uso de los baños fijos de las instalaciones de los colegios, por lo cual no se hace seguimiento disposición de residuos líquidos o vertimientos.



4.5. MANEJO DE PAISAJE, FLORA Y FAUNA

En el área de influencia del colegio Francisco José de Caldas, se cuentan con 8 individuos arbóreos, los cuales representan una emergencia para la población, no obstante, uno de estos presento caída y fue evaluado por los bomberos, sin causar ninguna lesión o daño material.







Sin embargo, la evaluación que dieron frente a los 7 árboles restantes, fue que se debía gestionar el proceso con la secretaria de ambiente, para poder realizar la tala de estos.

4.6. MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

- ✓ En el presente periodo, se presentó ingreso de materiales como arena de peña para pañetar, en el colegio Jorge Eliecer Gaitán.



4.7. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

El contratista junto a la entidad contratante está en el proceso de la generación del pin ambiental, para realizar actividades de recolección de residuos de construcción y demolición. Sin embargo, en el momento se tiene un sitio de acopio el cual se encuentra protegido con un plástico, para evitar la dispersión de las partículas.









4.8. INDICADORES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

✓ En el presente periodo, no se relacionan indicadores debido a que las actividades que se desarrollaron fueron más administrativas.

4.9. CUADRO DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

Obligaciones	Cumple		
	SI	NO	NO APLICA
Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental			
Realizar la adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la SED mediante el uso racional del agua y la energía, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato con la SED. Como soporte de	X		

cumplimiento de esta obligación se debe presentar un acta y listado de asistencia de la socialización de los lineamientos ambientales de la SED.			
Realizar, en caso de requerirse, el trámite de manejo silvicultural para el arbolado presente en el predio, hasta la obtención del permiso requerido (poda, tala, traslado y/o demás) y la compensación requerida por la Secretaría Distrital de Ambiente.	X		
Implementar jardines verticales u horizontales ofrecidos si es el caso, para lo que, de manera previa, el contratista deberá presentar los diseños a la Entidad contratante, para su respectiva aprobación.			X
Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación del PIGA de la SED en la ejecución del contrato.	X		
Gestión Integral de Residuos			
Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e impedir la formación de ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos.	X		
Tendrá sistemas que permitan la ventilación, tales como rejillas o ventanas, y de prevención y control de incendios, como extintores y suministro cercano de agua y drenaje.		X	
Serán construidas de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores, y que impida el ingreso de animales domésticos.		X	
Las unidades de almacenamiento deberán disponer de espacio suficiente para realizar el almacenamiento de los materiales, evitando su deterioro.	X		
Debe ser de accesibilidad y facilidad para el manejo y la recolección de los residuos sólidos por parte del prestador.		X	
El cuarto de almacenamiento debe ser acorde con la proyección de generación de residuos, siendo este un espacio de uso independiente para la Entidad en el cual se pueda controlar la entrada y salida del personal de aseo y/o recuperador de oficio de la SDIS.	X		
Verificar la ruta de movilización de los residuos sólidos al interior de la infraestructura garantizando su fácil movilización.		X	
Fijar los espacios para el uso de las canecas en cumplimiento del Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS	X		
Residuos de construcción y demolición RCD			
Garantizar la Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1115 de 2012, Resolución 932 de 2015 de la SDA y demás que modifique o adicione y a los lineamientos internos de la SED.	X		
Deberá revisar y dar aval al PGRCD, formatos RCD, informe de No cumplimiento de aprovechamiento RCD y garantizar el adecuado cargue mensual en aplicativo web de la SDA de los reportes RCD; desde la apertura hasta el cierre del PIN de obra que sea asignado.	X		
Uso Eficiente del Agua			
Garantizar la implementación al 100% sistemas ahorradores de agua de alta eficiencia en cada uno de los puntos hidráulicos (excepto en pocetas, lavaderos y lava traperos), dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997 y al Acuerdo Distrital 407 de 2009.		X	
Garantizar la implementación de un sistema de recolección, almacenamiento y/o aprovechamiento de aguas lluvias, con el fin de reutilizarlas en cisternas, riego de jardines, zonas verdes y/o limpieza de exteriores.			X
Garantizar la implementación al 100% sistemas sanitarios ahorradores de agua de alta eficiencia dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997 y al Acuerdo Distrital 407 de 2009.		X	
Uso Eficiente de la Energía			

Garantizar que los muros internos y techos sean de colores claros preferiblemente blancos, con el fin de generar un mejor aprovechamiento de la luz natural. Así mismo, se debe verificar que la infraestructura permita el máximo aprovechamiento de la luz natural.		X	
Garantizar la implementación al 100% bombillos ahorradores y luminarias con tecnología LED, dando cumplimiento al Decreto 177 de 2016 de la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Resolución 180606 de 2008 del Ministerio de Minas y Energía.		X	
Garantizar la implementación de un sistema de energía solar fotovoltaico (o similar), como método alterno de suministro de energía que sea eficiente y amigable con el medio ambiente; el cual deberá incorporarse a ciertas áreas de la infraestructura eléctrica proyectada en la edificación en donde se pueda evidenciar el uso de energías alternas sostenible.			X

5. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.1. AFILIACIONES Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

- ✓ El contratista realizo la entrega de documentación de personal para aprobación de la interventoría. La cual fue revisada y se solicitaron documentos que hacían falta, pero fueron subsanadas.
- ✓ A la fecha se cuenta con 21 personas aprobadas.

5.2. CORRESPONDENCIA

Oficio	Consecutivo Oficio	Fecha	Dirigido A	Asunto
1	CIC_BTA_SED_050_ 2022_037	19 de enero de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA Representante Legal Tv. 21 Bis N° 59-57 Bogotá D.C.	SOLICITUD DE BITÁCORAS DE OBRA, RESPUESTA COMUNICADOS No. 012-GP2-SED-2027 Y No. 013-GP2-SED-2028, Y REITERACIÓN COMUNICADO No. CIC-BTA-SED-050-2022-034 SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL Y MAQUINARIA - SAFRID INGENIERÍA S.A.S.
2	CIC_BTA_SED_050_ 2022_041	25 de enero de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA Representante Legal Tv. 21 Bis N° 59-57 Bogotá D.C.	RESPUESTA OFICIO No. 023-GP2-SED-2022 "REMISION DE DOCUMENTOS PERSONAL OPERATIVO SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS"
3	CIC_BTA_SED_050_ 2022_050	01 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA Representante Legal Tv. 21 Bis N° 59-57 Bogotá D.C.	RESPUESTA COMUNICADO 034-GP2-SED-2022 "REMISIÓN DE DOCUMENTOS PERSONAL OPERATIVO SEDE JORGE ELIECER GAITAN"
4	CIC_BTA_SED_050_ 2022_052	03 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA Representante Legal Tv. 21 Bis N° 59-57 Bogotá D.C.	RESPUESTA OFICIO No. 035-GP2-SED-2022 "REMISIÓN DE DOCUMENTOS PERSONAL OPERATIVO SEDE JORGE ELIECER Y FLORIDABLANCA "

5.3. COPASST Y CÓMITE DE CONVIVENCIA LABORAL

- ✓ Previamente el contratista había remito actas del COPASST y del CCL, sin embargo, sus fechas estaban del 2019, por ende, se remitieron observaciones para que realizaran nueva reunión, la cual quedo del 20 de enero de 2023.

5.4. INDUCCIONES

- ✓ No se cuenta con soportes de inducción
- ✓ Pendiente revisión informe contratista.

5.5. MEDICINA PREVENTIVA Y LABORAL

- ✓ Del personal aprobado se cuenta con exámenes ocupacionales; estos documentos fueron aprobados por interventoría.
- ✓ Se realizó remisión de oficios por documentación incompleta de exámenes ocupacionales e IPS, sin embargo, ya fue subsanada por parte del contratista.
- ✓ No se han evidenciado actividades de promoción y prevención como jornadas de pausas activas.

5.6. HIGIENE INDUSTRIAL

- ✓ El contratista está realizando uso de los baños fijos de las instalaciones de los colegios. Se está a la espera que sean enviadas las cartas de préstamo por parta del rector de la institución.





5.7. ACTIVIDADES EN EL TRABAJO

5.7.1. Trabajos de alto riesgo

No se han realizado actividades que sean de alto riesgo.

5.7.2. Brigada de emergencias

No se cuenta con soporte de la conformación de la brigada de emergencia por parte del contratista. Deberán presentar soporte de conformación y capacitación.

5.7.3. Accidentes de trabajo

No se presentaron accidentes de trabajo en ninguno de los colegios que se han realizado socialización de obra.

5.7.4. Capacitaciones SST

5.7.5. Inspección SST

- ✓ Elementos de atención de emergencia: El contratista menciona que esta en el proceso de compra de los elementos como el botiquín, extintor y camilla.

- ✓ Dotación y EPP: Se evidencia uso de dotación y elementos de protección personal del personal.





- ✓ Señalización:










5.8. PERSONAL INTERVENTORIA

✓ A continuación, se presenta relación de personal de interventoría:

Tabla de control de personal para el periodo entre el 22 de diciembre 2022 al 21 de enero de 2023

PERSONAL CONTRACTUAL					
Nombre	Cedula	Cargo	Salario	Vínculo Laboral	Firma
Fredy Giovanni Rodríguez Salazar	80.539.072	Director De Interventoría	$6.500.000	Fijo	
Camilo Antonio Samacá Pesca	1.051.474.958	Residente De Interventoría 1	$4.954.666	Fijo	
Rodolfo Castro Ortegón	1.015.410.729	Residente De Interventoría 2	$4.000.000	Fijo	
Jairo Andrés Meza Rosas	13.874.430	Asesor Estructural	1.160.000	Fijo	
Steven Alexander Ibarra Sanabria	1.013.630.567	Asesor De Ambiental Y Seguridad Industrial	$4.020.000	Fijo	
Hernando Gómez Casas	17.069.465	Asesor En Redes Eléctricas, Telefónicas Voz Y Datos	$1.160.000	Fijo	

Guillermo Emilio Narváez Vélez	72.201.382	Asesor En Redes Hidrosanitarias, Red Contra Incendios Y Gas	$26.789.981	Fijo	
Enrique Luis Monroy Maldonado	1.026.264.858	Asesor De Costos, Presupuestos Y Programación De Obras	$6.862.320	Fijo	
Milena Mercedes Albornoz Villota	1.085.250.609	Asesoría Jurídica	8.750.000	Fijo	
Camilo Fandiño Hernández	1.075.627.522	Inspector De Interventoría	$1.825.000	Fijo	
Edison Calderón Castañeda	79.403.208	Maestro De Obra	$2.173.333	Fijo	
Luis Carlos Tovar Núñez	72.257.557	Tecnólogo SST 1	$2.173.333	Fijo	
Natalia Vanessa Calderón Acevedo	1.015.474.687	Inspector De Interventoría	$ 1.825.000	Fijo	

6. CONCLUSIONES

- ✓ Se cuenta con profesionales aprobados como profesionales SST tanto del contratista como de interventoría.
- ✓ Mediante la gestión administrativa se le informo al contratista los tiempos estipulados para la entrega de soportes para aprobación por parte de interventoría en cuanto a personal, maquinaria, vehículos, proveedores y sitios de disposición final
- ✓ Se inició la implementación de actividades desde el componente SST y ambiental.

7. ANEXOS

A continuación, se presenta relación de anexos:

1) Soportes pagos de seguridad social interventoría

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS		CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GNG104	GNG104	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	06/01/2023	64348678	$2.080.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	260.000	0		0		0	1	300	0	260.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.040.000	0	0	32.500	32.500	1	1.200	200	1.106.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	452.400				452.400	1	600	453.000			4.524	453.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	260.000	1	300	260.300	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	260.000	260.300
Pensión	1	1.105.000	1.106.400
Riesgos Laborales	1	452.400	453.000
CCF	1	260.000	260.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	2.077.400	2.080.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS		CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GNG104	GNG104	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	06/01/2023	64348678	$2.080.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80539072	RODRIGUEZ SALAZAR FREDY GIOVANNI	1	0			S																	25-14	6.500.000	1.040.000	0	0	32.500	32.500	EPS017	6.500.000	260.000	14-25	6.500.000	5	452.400	CCF24	6.500.000	260.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901383717-3	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS		CRA 49 104B-49	7122685	rhumanos@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	013	013	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	06/01/2023	64372892	$11.395.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	120.000	0		0		0	1	200	0	120.200	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	542.500	0		0		0	1	700	0	543.200	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	212.000	0		0		0	1	300	0	212.300	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	180.000	0		0		0	1	300	0	180.300	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	205.100	0		0		0	1	300	0	205.400	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	212.000	0		0		0	1	300	0	212.300	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	60.000	0		0		0	1	100	0	60.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	180.300	0	0	0	0	1	300	0	180.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	4.099.200	0	0	20.000	20.000	1	4.700	200	4.144.100	12
231001	Colfondos	800227940-6	560.000	0	0	0	0	1	700	0	560.700	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.286.400	0	0	40.300	40.300	1	1.500	200	1.368.700	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	2.454.800				2.454.800	1	2.800	2.457.600			24.548	2.457.600	16

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.148.800	1	1.300	1.150.100	16

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901383717-3	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS		CRA 49 104B-49	7122685	rhumanos@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	013	013	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	06/01/2023	64372892	$11.395.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.531.600	1.533.800
Pensión	4	6.246.500	6.254.100
Riesgos Laborales	1	2.454.800	2.457.600
CCF	1	1.148.800	1.150.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	11.381.700	11.395.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901383717-3	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS		CRA 49 104B-49	7122685	rhumanos@gng.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	013	013	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	06/01/2023	64372892	$11.395.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1007650741	VARGAS BERNAL JENNIFER PAOLA	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS002	1.500.000	60.000	14-25	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	45.000	0	0	0	0	0
2	CC	1007846773	PERDOMO JARAMILLO LUISA FERNANDA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-25	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	54.000	0	0	0	0	0
3	CC	1015410729	CASTRO ORTEGON RODOLFO	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	20.000	20.000	EPS017	4.000.000	160.000	14-25	4.000.000	5	278.400	CCF24	4.000.000	120.000	0	0	0	0	0
4	CC	1015433479	LUGO BUITRAGO KAROL STEFANY	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS010	3.000.000	120.000	14-25	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	90.000	0	0	0	0	0
5	CC	1019092980	FONSECA SUPELANO MILDRED MARCELA	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS002	1.500.000	60.000	14-25	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	45.000	0	0	0	0	0
6	CC	1031174194	BOHORQUEZ SOTELO DANIEL ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS010	1.500.000	60.000	14-25	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	45.000	0	0	0	0	0
7	CC	1073527297	QUEVEDO GARAY GERALDINE DANIELA	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS041	1.500.000	60.000	14-25	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	45.000	0	0	0	0	0
8	CC	1074486578	CHACON CHARCAS SUSAN BIBIANA	1	0			S	X																230201	1.126.667	180.300	0	0	0	0	EPS017	1.126.667	45.100	14-25	1.126.667	5	78.500	CCF24	1.126.667	33.900	0	0	0	0	0
9	CC	1075662443	VEGA VASQUEZ YEISON ANDRES	1	0			S																	231001	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	140.000	14-25	3.500.000	5	243.600	CCF24	3.500.000	105.000	0	0	0	0	0
10	CC	1075670671	MONROY REYES IVON NATALIA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-25	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	54.000	0	0	0	0	0
11	CC	1105673494	QUIMBAYO ORTIZ LUIS FELIPE	1	0			S																	230301	3.700.000	592.000	0	0	0	0	EPS037	3.700.000	148.000	14-25	3.700.000	5	257.600	CCF24	3.700.000	111.000	0	0	0	0	0
12	CC	1123323637	TONGUINO CUASIALPUD LUIS ALBERTO	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	64.000	14-25	1.600.000	5	111.400	CCF24	1.600.000	48.000	0	0	0	0	0
13	CC	46373870	SAENZ ORJUELA SANDRA LILIANA	1	0			S	X	X															230301	1.520.000	243.200	0	0	0	0	EPS005	1.520.000	60.800	14-25	1.520.000	1	8.000	CCF24	1.520.000	45.600	0	0	0	0	0
14	CC	52774285	IPUZ FORERO NANCY CONSTANZA	1	0			S																	230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	88.000	14-25	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	66.000	0	0	0	0	0
15	CC	7314136	CASAS SOLANO ALEX VLADIMIR	1	0			S																	25-14	4.000.000	640.000	0	0	20.000	20.000	EPS005	4.000.000	160.000	14-25	4.000.000	5	278.400	CCF24	4.000.000	120.000	0	0	0	0	0
16	CC	80727713	SERRANO CASTILLO JUAN PABLO	1	0			S																	25-14	2.423.639	387.800	0	0	12.200	12.200	EPS005	2.423.639	97.000	14-25	2.423.639	5	168.700	CCF24	2.423.639	72.800	0	0	0	0	0
17	CC	80727713	SERRANO CASTILLO JUAN PABLO	1	0			S													X				25-14	1.615.759	258.600	0	0	8.100	8.100	EPS005	1.615.759	64.700	14-25	1.615.759	5	0	CCF24	1.615.759	48.500	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901383717-3	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS		CRA 49 104B-49	7122685	rhumanos@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	CAJA V	003	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	06/01/2023	64372873	$6.798.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	160.800	0		0		0	1	200	0	161.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	232.100	0		0		0	1	300	0	232.400	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	480.000	0		0		0	1	600	0	480.600	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	643.200	0	0	20.100	20.100	1	800	200	684.400	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.528.000	0	0	40.300	40.300	1	1.800	200	1.610.600	3
231001	Colfondos	800227940-6	1.320.300	0	0	32.400	32.400	1	1.500	200	1.386.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	1.518.900				1.518.900	1	1.800	1.520.700			15.189	1.520.700	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	721.500	1	900	722.400	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	872.900	874.000
Pensión	3	3.677.100	3.681.800
Riesgos Laborales	1	1.518.900	1.520.700
CCF	1	721.500	722.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	6.790.400	6.798.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901383717-3	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS		CRA 49 104B-49	7122685	rhumanos@gng.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	CAJA V	003	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	06/01/2023	64372873	$6.798.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013630567	IBARRA SANABRIA STEVEN ALEXANDER	1	0			S																	230201	4.020.000	643.200	0	0	20.100	20.100	EPS001	4.020.000	160.800	14-25	4.020.000	5	279.800	CCF24	4.020.000	120.600	0	0	0	0	0
2	CC	1018402224	CARDENAS LORA VANESSA PAOLA	1	0			S																	230301	4.020.000	643.200	0	0	20.100	20.100	EPS017	4.020.000	160.800	14-25	4.020.000	5	279.800	CCF24	4.020.000	120.600	0	0	0	0	0
3	CC	1109491513	CANDIA MARIN LINER FABIAN	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	60.000	14-25	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	45.000	0	0	0	0	0
4	CC	12615388	GONZALEZ MOSCARELLA HAROLD DE JESUS	1	0			S	X																231001	1.771.429	283.500	0	0	0	0	EPS008	1.771.429	70.900	14-25	1.771.429	5	123.300	CCF24	3.998.368	120.000	0	0	0	0	0
5	CC	52882446	JIMENEZ GOMEZ ADRIANA FERNANDA	1	0			S																	231001	6.480.000	1.036.800	0	0	32.400	32.400	EPS017	6.480.000	259.200	14-25	6.480.000	5	451.100	CCF24	6.480.000	194.400	0	0	0	0	0
6	CC	92188831	BENITEZ ARCOS JADER WADITH	1	0			S																	230301	4.030.000	644.800	0	0	20.200	20.200	EPS008	4.030.000	161.200	14-25	4.030.000	5	280.500	CCF24	4.030.000	120.900	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS		CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INDEPENDIENTES	025	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-12	Y	06/01/2023	64351836	$143.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	142.800				142.800	1	200	143.000			1.428	143.000	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	142.800	143.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	142.800	143.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS		CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INDEPENDIENTES	025	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-12	Y	06/01/2023	64351836	$143.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1090424220	SUAREZ ORTEGA EMMANUEL JOSE	59	0			N		X																0	0	0	0	0	0		0	0	14-25	50.667	5	3.600		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	13874430	MEZA ROSAS JAIRO ANDRES	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-25	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	17069465	GOMEZ CASAS HERNANDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-25	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901649961-8	CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	CRA49 104B-49	7122685	RHUMANOS@GNG.COM.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	12/01/2023	64663161	$1.113.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	24.400	0		0		0	0	0	0	24.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	24.400	0		0		0	0	0	0	24.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	95.100	0		0		0	0	0	0	95.100	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	575.100	0	0	0	0	0	0		575.100	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	250.300				250.300	0	0	250.300			2.503	250.300	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	143.900	0	0	143.900	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	143.900	143.900
Pensión	1	575.100	575.100
Riesgos Laborales	1	250.300	250.300
CCF	1	143.900	143.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.113.200	1.113.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901649961-8	CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022		CRA49 104B-49	7122685	RHUMANOS@GNG.COM.CO
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	12/01/2023	64663161	$1.113.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1015474687	CALDERON ACEVEDO NATALIA VANESSA	1	0			S	X																230301	608.334	97.400	0	0	0	0	EPS008	608.334	24.400	14-25	608.334	5	42.400	CCF24	608.334	24.400	0	0	0	0	0
2	CC	1051474958	SAMACA PESCA CAMILO ANTONIO	1	0			S	X																230301	1.651.556	264.300	0	0	0	0	EPS037	1.651.556	66.100	14-25	1.651.556	5	115.000	CCF24	1.651.556	66.100	0	0	0	0	0
3	CC	1075627522	FANDIÑO HERNANDEZ CAMILO	1	0			S	X																230301	608.334	97.400	0	0	0	0	EPS017	608.334	24.400	14-25	608.334	5	42.400	CCF24	608.334	24.400	0	0	0	0	0
4	CC	79403208	CALDERON CASTAÑEDA EDISON	1	0			S	X																230301	724.445	116.000	0	0	0	0	EPS037	724.445	29.000	14-25	724.445	5	50.500	CCF24	724.445	29.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS	CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GNG 37	PRIN	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	06/01/2023	64309128	$7.199.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	300.000	0		0		0	1	400	0	300.400	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	600.000	0		0		0	1	700	0	600.700	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.200.000	0	0	37.500	37.500	1	1.400	200	1.276.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.400.000	0	0	75.000	75.000	1	2.800	200	2.553.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	1.566.000				1.566.000	1	1.800	1.567.800			15.660	1.567.800	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	300.000	1	400	300.400	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	600.000	1	700	600.700	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	900.000	901.100
Pensión	2	3.825.000	3.829.600
Riesgos Laborales	1	1.566.000	1.567.800
CCF	2	900.000	901.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	7.191.000	7.199.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS		CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GNG 37	PRIN	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	06/01/2023	64309128	$7.199.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	72007216	GOMEZ FALLA JORGE	1	0			S																	25-14	7.500.000	1.200.000	0	0	37.500	37.500	EPS010	7.500.000	300.000	14-25	7.500.000	5	522.000	CCF24	7.500.000	300.000	0	0	0	0	0
2	CC	72201382	NARVAEZ VELEZ GUILLERMO EMILIO	1	0			S																	230301	7.500.000	1.200.000	0	0	37.500	37.500	EPS010	7.500.000	300.000	14-25	7.500.000	5	522.000	CCF06	7.500.000	300.000	0	0	0	0	0
3	CC	72227511	GONZALEZ FANDIÑO ANTONIO RAFAEL	1	0			S																	25-14	7.500.000	1.200.000	0	0	37.500	37.500	EPS005	7.500.000	300.000	14-25	7.500.000	5	522.000	CCF24	7.500.000	300.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS	CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GNG 02	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	06/01/2023	64349163	$4.482.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	202.200	0		0		0	1	300	0	202.500	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	445.000	0		0		0	1	600	0	445.600	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	40.000	0		0		0	1	100	0	40.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	125.000	0		0		0	1	200	0	125.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	380.000	0	0	0	0	1	500	0	380.500	1
230301	Porvenir	800224808-8	808.800	0	0	25.300	25.300	1	1.000	200	860.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.560.000	0	0	43.800	43.800	1	1.800	200	1.649.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	89.800				89.800	1	200	90.000			898	90.000	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	687.200	1	800	688.000	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	812.200	813.400
Pensión	3	2.887.000	2.890.700
Riesgos Laborales	1	89.800	90.000
CCF	1	687.200	688.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.476.200	4.482.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS		CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GNG 02	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	06/01/2023	64349163	$4.482.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1075211095	MURCIA CORTES MARTHA MARIA	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	125.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1085250609	ALBORNOZ VILLOTA MILENA MERCEDES	1	0			S																	25-14	8.750.000	1.400.000	0	0	43.800	43.800	EPS005	8.750.000	350.000	14-25	8.750.000	1	45.700	CCF24	8.750.000	350.000	0	0	0	0	0
3	CC	24218926	APONTE PAEZ NUBIA INES	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-25	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	35251942	ROMERO GALINDO LIDA GIOVANNA	1	0			S	X																230201	2.375.000	380.000	0	0	0	0	EPS005	2.375.000	95.000	14-25	2.375.000	1	12.400	CCF24	2.375.000	95.000	0	0	0	0	0
5	CC	36312425	SANDINO PUENTES LILIANA	1	0			S																	230301	5.054.400	808.800	0	0	25.300	25.300	EPS002	5.054.400	202.200	14-25	5.054.400	1	26.400	CCF24	5.054.400	202.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901047254-5	GNG INGENIERÍA SERVICIOS S.A.S	CRA 49 104B-49	2360929	rhumanos@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	GNG003	0159	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	12/01/2023	64403784	$15.121.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	194.400	0		0		0	0	0	0	194.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	965.000	0		0		0	0	0	0	965.000	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	594.500	0		0		0	0	0	0	594.500	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	152.000	0		0		0	0	0	0	152.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.644.500	0	0	32.400	32.400	0	0		1.709.300	2
230301	Porvenir	800224808-8	2.197.200	0	0	34.400	34.400	0	0		2.266.000	3
230901	Old Mutual	800253055-2	1.141.900	0	0	35.700	35.700	0	0		1.213.300	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.639.500	0	0	82.500	82.500	0	0		2.804.500	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	3.316.500				3.316.500	0	0	3.316.500			33.165	3.316.500	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.905.900	0	0	1.905.900	9

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901047254-5	GNG INGENIERÍA SERVICIOS S.A.S		CRA 49 104B-49	2360929	rhumanos@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	GNG003	0159	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	12/01/2023	64403784	$15.121.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.905.900	1.905.900
Pensión	4	7.993.100	7.993.100
Riesgos Laborales	1	3.316.500	3.316.500
CCF	1	1.905.900	1.905.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	15.121.400	15.121.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901047254-5	GNG INGENIERÍA SERVICIOS S.A.S		CRA 49 104B-49	2360929	rhumanos@gng.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
SUCURSAL	C – MIPYME	GNG003	0159	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					9	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2023-01	2022-12	E	12/01/2023	64403784	$15.121.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estomando**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1018512259	PRADA ESPITIA NICOLAS	1	0			S																	230201	3.798.000	607.700	0	0	0	0	EPS017	3.798.000	152.000	14-25	3.798.000	5	264.400	CCF24	3.798.000	152.000	0	0	0	0	0
2	CC	1026264858	MONROY MALDONADO ENRIQUE LUIS	1	0			S																	230301	6.862.320	1.098.000	0	0	34.400	34.400	EPS008	6.862.320	274.500	14-25	6.862.320	5	477.700	CCF24	6.862.320	274.500	0	0	0	0	0
3	CC	1032450928	PORRAS HOLGUIN JULIETH ALEJANDRA	1	0			S																	25-14	4.860.000	777.600	0	0	24.300	24.300	EPS001	4.860.000	194.400	14-25	4.860.000	5	338.300	CCF24	4.860.000	194.400	0	0	0	0	0
4	CC	1085165066	HERNANDEZ ALARCON LEONAR JOSE	1	0			S																	230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	140.000	14-25	3.500.000	5	243.600	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
5	CC	52073626	BELLO MACCHI MARTHA PATRICIA	1	0			S																	230301	3.369.600	539.200	0	0	0	0	EPS005	3.369.600	134.800	14-25	3.369.600	5	234.600	CCF24	3.369.600	134.800	0	0	0	0	0
6	CC	52251988	CASTAÑEDA DORIS XIOMARA	1	0			S																	25-14	7.136.813	1.141.900	0	0	35.700	35.700	EPS005	7.136.813	285.500	14-25	7.136.813	5	496.800	CCF24	7.136.813	285.500	0	0	0	0	0
7	CC	52889627	ESCOBAR OSPINA LUZ AYDA	1	0			S																	25-14	4.500.000	720.000	0	0	22.500	22.500	EPS008	4.500.000	180.000	14-25	4.500.000	5	313.200	CCF24	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
8	CC	79321604	GUTIERREZ ARGUELLO JUAN JOSE	1	0			S																	230901	7.136.813	1.141.900	0	0	35.700	35.700	EPS005	7.136.813	285.500	14-25	7.136.813	5	496.800	CCF24	7.136.813	285.500	0	0	0	0	0
9	CC	80102166	POSADA RINCON IVAN ERNESTO	1	0			S																	230201	6.480.000	1.036.800	0	0	32.400	32.400	EPS005	6.480.000	259.200	14-25	6.480.000	5	451.100	CCF24	6.480.000	259.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901383717-3	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS		CRA 49 104B-49	7122685	rhumanos@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	CAUCA	12	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	06/01/2023	64373058	$11.079.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	467.100	0		0		0	1	600	0	467.700	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	645.600	0		0		0	1	800	0	646.400	5
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	60.800	0		0		0	1	100	0	60.900	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	304.000	0		0		0	1	400	0	304.400	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	5.692.800	0	0	0	0	1	6.500	0	5.699.300	12
25-14	Colpensiones	900336004-7	216.900	0	0	0	0	1	300	0	217.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	2.571.200				2.571.200	1	2.900	2.574.100			25.712	2.574.100	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauca	891500182-0	641.400	1	800	642.200	8
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	84.000	1	100	84.100	1
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	382.700	1	500	383.200	4

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901383717-3	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS		CRA 49 104B-49	7122685	rhumanos@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	CAUCA	12	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	06/01/2023	64373058	$11.079.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.477.500	1.479.400
Pensión	2	5.909.700	5.916.500
Riesgos Laborales	1	2.571.200	2.574.100
CCF	3	1.108.100	1.109.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	11.066.500	11.079.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901383717-3	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS		CRA 49 104B-49	7122685	rhumanos@gng.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	CAUCA	12	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	06/01/2023	64373058	$11.079.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006418705	PARRA MORENO WILLIAM ANDRES	1	0			S																	230301	2.700.000	432.000	0	0	0	0	EPS037	2.700.000	108.000	14-25	2.700.000	5	188.000	CCF14	2.700.000	81.000	0	0	0	0	0
2	CC	1024547827	COBOS GARZON JENNIFER KATHERINE	1	0			S																	230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS037	2.800.000	112.000	14-25	2.800.000	5	194.900	CCF24	2.800.000	84.000	0	0	0	0	0
3	CC	10307771	GARCIA MORA CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	3.800.000	608.000	0	0	0	0	ESSC18	3.800.000	152.000	14-25	3.800.000	5	264.500	CCF14	3.800.000	114.000	0	0	0	0	0
4	CC	1061728189	ORTIZ MENESES ADRIANA	1	0			S																	230301	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS037	3.800.000	152.000	14-25	3.800.000	5	264.500	CCF35	3.800.000	114.000	0	0	0	0	0
5	CC	1061757234	SANCHEZ BOLAÑOS YILMAR RENE	1	0			S	X																230301	1.980.000	316.800	0	0	0	0	EPS005	1.980.000	79.200	14-25	1.980.000	5	137.900	CCF14	1.980.000	59.400	0	0	0	0	0
6	CC	1061800536	PEREZ MOTTA SONIA CONSTANZA	1	0			S																	230301	1.520.000	243.200	0	0	0	0	EPSIC3	1.520.000	60.800	14-25	1.520.000	5	105.800	CCF14	1.520.000	45.600	0	0	0	0	0
7	CC	1085270769	ESTUPIÑAN SANTACRUZ CHRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	3.840.000	614.400	0	0	0	0	EPS005	3.840.000	153.600	14-25	3.840.000	5	267.300	CCF14	3.840.000	115.200	0	0	0	0	0
8	CC	1085277833	ARCOS TREJO KAREN XIMENA	1	0			S																	230301	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS037	3.800.000	152.000	14-25	3.800.000	5	264.500	CCF35	3.800.000	114.000	0	0	0	0	0
9	CC	1085311045	ORDOÑEZ TORO JHON EDISON	1	0			S																	230301	2.700.000	432.000	0	0	0	0	EPS005	2.700.000	108.000	14-25	2.700.000	5	188.000	CCF14	2.700.000	81.000	0	0	0	0	0
10	CC	13070028	GARCIA ZAMBRANO PEDRO FERNANDO	1	0			S	X																25-14	1.355.200	216.900	0	0	0	0	EPS005	1.355.200	54.300	14-25	1.355.200	5	94.400	CCF35	1.355.200	40.700	0	0	0	0	0
11	CC	25299410	MENESES MUÑOZ ANA LUCY	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-25	1.800.000	5	125.300	CCF14	1.800.000	54.000	0	0	0	0	0
12	CC	85154105	CAMACHO GRANADOS LEONEL ENRIQUE	1	0			S																	230301	3.040.000	486.400	0	0	0	0	EPS037	3.040.000	121.600	14-25	3.040.000	5	211.600	CCF14	3.040.000	91.200	0	0	0	0	0
13	CC	87552887	ROSALES PONCE HEYNER HUGO	1	0			S																	230301	3.800.000	608.000	0	0	0	0	ESSC18	3.800.000	152.000	14-25	3.800.000	5	264.500	CCF35	3.800.000	114.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Anexo 5. ACTAS DE REUNIÓN, RECORRIDO Y ENTREGA DE ESPACIOS.

GNG Ingeniería S.A.S.	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		02	10/08/2017	26/01/2018

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
	28/11/2022.	9:00		
Objeto de la reunión:				

INFORMACIÓN DE CONTRATOS			
Contrato de obra No.		*Contrato de Interventoría No.*	
Objeto del Contrato de obra		*Objeto Contrato Interventoría*	
Contratista de obra		*Contratista de Interventoría*	

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
Inicia la reunión en el Colegio Jorge Eliecer Gaitan, en la cual la supervisión de la Entidad (SED) presenta las obras de Mejoramientos, las cuales corresponden a: a. Cubiertas de bloques de Aguas b. Recolección de Aguas lluvias. c. Mejoramiento Cancha occidental. d. Pisos de patios.	Descripción: Responsable: Fecha:
Sin embargo, la rectora del colegio manifiesta que hay otras prioridades de intervención y manifiestan que no quieren que se realicen dichas obras. Así las cosas se propone un recorrido para definir el alcance de las Obras.	Descripción: Responsable: Fecha:

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
La rectora menciona que en la Sede Occidental es necesario Intervenir: 1. Cubierta (Al lado de la Iglesia).	Descripción:
El Arq. Juan Carlos Valencia, sugiere que la Intervención se puede realizar en la Sede Occidental, teniendo en	Responsable:
cuenta las necesidades presentes.	Fecha:
2. Ventanería 3. pisos 4. puertas 5. luminaria	Descripción:
Actividades a Mejorar Sede A pab. Occidental.	Responsable:
	Fecha:
Vent, piso, puerta, pintura, luminaria, cubierta, canales. — Piso caucho — Cubierta — Piso, ventanería, luminaria, cubierta — Ventanería, pisos, puertas, luminaria	Descripción:
	Responsable:
	Fecha:
Ventanería, ~~pisos~~, puertas. Cubierta (cambio estructura) luminaria	Descripción:
Baños	Responsable:
	Fecha:

Cancha todo

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
Se concluye que la intervención se hará en la sede A pabellón Occidental. De igual manera se detallará las intervenciones del Pabellón Oriental se considera realizar un mantenimiento al piso de los bloques. Se propone por la SED quitar el cielo raso del 1er piso.	Descripción: pabellón oriental, sí: Responsable: Fecha:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en _____ a los _____ del mes de _____ del _____.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Nota:

1. En caso de requerirse anexar más casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
2. Favor anexar a este formato, el registro de ORDEN DEL DIA y LISTA DE ASISTENCIA (___ folios).

GNG Ingeniería S.A.S.	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA:		LUGAR:		ACTA DE SEGUIMIENTO No:	
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
Carlos Lanza	A.x. de inge.	Safrid	davidlanzabedoya@gmail.com	3187899031	
ALVARO MORENO	ALMACEN	JORGE 66	alvaromorenorojas@gmail.	3202042902	
Jose Luis Pinzon	Aux Administrativo	Jorge & Gaitan	joseluispinzon@hotmail.com	3115823371	
Juan Carlos Valencia	SED-DC-F	Arquitecto		3142175636	
Manuel Gonzalez	Coord. Interventi	C. Inter Colegios	manuel.gonzalez.gng@gmail.com	3008445316	
Fredy G Rodriguez	Director Interventoria	Consorcio Inter Colegios 2022	fredy.rodriguez.gng@gmail.com	3012360929	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

GNG Ingeniería S.A.S.	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		02	10/08/2017	26/01/2018

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
1	08/Noviembre 2022			Varios
Objeto de la reunión:	Reconocimiento para intervenciones en los colegios			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS			
Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.4077692	*Contrato de Interventoría No.*	050 de 2022
Objeto del Contrato de obra		*Objeto Contrato Interventoría*	
Contratista de obra	Sagrid Ingeniería	*Contratista de Interventoría*	Consorcio Intercolegios 2022

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
Colegio Francisco José de Caldas. Sede A	Descripción:
Se realiza recorrido de reconocimiento por el colegio Francisco José de Caldas Sede A en el cual se evidencia el estado actual de los bloques, baños canchas en general y polideportivo.	Responsable:
	Fecha:
Se evidencia que las cubiertas se encuentran en mal estado y son teja canal de asbesto cemento.	Descripción:
Se socializa con el rector del colegio, las condiciones, intervenciones y plazos del contrato de obra e interventoría.	Responsable:
Se comunica por parte de la institución la premura en el inicio de las intervenciones dado el volumen de estudiantes.	Fecha:

GNG Ingeniería S.A.S.	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		02	10/08/2017	26/01/2018

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
Colegio San Juan del Corral: Se inicia recorrido en compañía de Diego Beltrán almacenista de la institución educativa quien nos guía en (el) la identificación de las áreas a intervenir.	Descripción:
Se identifica afectación en el manto de la cubierta de la terraza lo cual genera afectaciones en los pisos inferiores con goteras.	Responsable:
Por otro lado, se identifican afectaciones en los planches de la terraza y la cubierta en general. No se logra (identificar) inspeccionar la placa superior debido a que, su acceso es por medio de escalera movible y no se tenía esta.	Fecha:
En los baños se identifican (daños en) que se requiere mantenimiento, en los flux metros y revisión de presión en bomba para baterías sanitarias	Descripción:
En el Polideportivo se identifica filtraciones de agua por muros por lo cual es necesario realizar inspección detallada en la cubierta. Se identifican filtraciones por medio de persianas. Es necesario verificar el drenaje en planchas para evitar filtraciones.	Responsable:
Colegio Garces Navas. Se inicia Reunión con Rector Gustavo Almanza en (el) la cual se exponen las intervenciones a realizar y los tiempos en los que se proyecta ejecutar las actividades. El Rector expone las afectaciones en cubierta, baterías de baño y cafetería, solicitando que se (inicie) inicie por las cubiertas dado que se debe priorizar por (las vacaciones) el receso estudiantil para no afectar las actividades académicas. Durante recorrido se solicita que en el cambio de cubierta se sellen los espacios para evitar el ingreso de aves. Se identifica cubierta tipo sandwich en la que se evidencia infiltración la cual debe ser tratada	Descripción:
	Responsable:
	Fecha:

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
En los baños se identifica poca ventilación por lo cual se debe evaluar manejar la ventilación en el cambio de cubierta, para los demás baños se debe tratar las filtraciones superas. Con respecto a la cafetería esta debe ser reemplazada.	Descripción:
Se realiza inspección de todos los baños identificando los problemas que presentan.	Responsable:
Se manifiesta la premura por vacaciones de fin de año. dado a que se debe realizar la entrega de instalaciones.	Fecha:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en _____ a los ocho. días del mes de Noviembre del 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Nota:

1. En caso de requerirse anexar más casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
2. Favor anexar a este formato, el registro de ORDEN DEL DIA y LISTA DE ASISTENCIA (___ folios).

GNG Ingeniería S.A.S.	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA:	8/11/2022	LUGAR:	Colegios Engativa - Barnos Unidos	ACTA DE SEGUIMIENTO No:	1
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
Fredy Rodriguez	Director Intero.	Consorcio Intercolegios 2022	fredy.giovanni.gng@gmail.com	7360929	
Felipe Lovado Alfonso	Aux Ingeniería	Consorcio Intercolegios 2022	auxiliar9.gng@gmail.com	3205821883	
Angela Cañón R	Residente Obra	Safid Ingeniería	Proyectosed grupo2@gmail.com	3102532159	
Diego Beltrán	Aux Almacén	Colegio Juan del Corral	dbeltrang@educacionbogota.edu.co	3212875510	
GUSTAVO ALMANZA	RECTOR	G.N.	rectoriagn@gmail.com	3105813531	
Robert Wilches	Almacen.	Miguel A. Caro		3002070476.	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

GNG Ingeniería S.A.S.	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		02	10/08/2017	26/01/2018

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
2	9/11/2022	8:30		
Objeto de la reunión:	Recorrido de reconocimiento en colegios zona Engativa			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS			
Contrato de obra No.	101.PCCNTR.4077642	*Contrato de Interventoría No.*	050-2022
Objeto del Contrato de obra		*Objeto Contrato Interventoría*	
Contratista de obra	Sapid Ingeniería.	*Contratista de Interventoría*	Inter Colegios 2022

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
Francisco José de Caldas Sede B.	Descripción:
Se realiza recorrido entre representante de la Institución educativa, Contratista e interventoría donde se inspecciona lo siguiente:	Responsable:
Baños: Se evidencia filtraciones en los baños, baldosas quebradas, registros sin tapa. para el baño del 2do piso presenta filtraciones provenientes del Baño del 3er piso.	Fecha:
Cubierta: Se evidencia en la cubierta que existe filtración en la sala de Inglés debido que se presume que la canalización se encuentra sucia o funciona por rebose, lo cual afecta las salas.	Descripción:
Chancha: Se evidencian las placas de contrapiso en la cancha en mal estado la cuales deben ser	Responsable:
	Fecha:

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
reemplazadas, con respecto a la canalización de aguas (lluvias) de escorrentía es necesario realizar (mantenimiento e) inspección y postenor mantenimiento con el fin de que se (des) drene correctamente.	Descripción:
Cuarto de Basuras: Se evidencia cuarto de basuras, aseo general, cubierta en tejas de asbesto cemento en regular estado	Responsable:
	Fecha:
Con respecto al cuarto de basuras (se ~~demolerán las divisiones de baño y se adecuar~~) se adecuara puerta interior y exterior con el fin de almacenar las basuras, tambien se realizará cambio de cubierta y ventilacos	Descripción:
Se suspende recorrido por solicitud de la supervisión contratante.	Responsable:
	Fecha:
	Descripción:
	Responsable:
	Fecha:
	Descripción:
	Responsable:
	Fecha:

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
	Descripción:
	Responsable:
	Fecha:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá a los 9 días del mes de Noviembre del 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Nota:

1. En caso de requerirse anexar más casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
2. Favor anexar a este formato, el registro de ORDEN DEL DIA y LÍSTA DE ASISTENCIA (___ folios).

GNG Ingeniería S.A.S.	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

LISTA DE ASISTENCIA					
FECHA:		LUGAR:		ACTA DE SEGUIMIENTO No:	
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
NOMBRE	CARGO	EMPRESA	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
Manuel Gonzalez	Coordinador	C. Intercolegios	manuel.gonzalez.gng@gmail.com	3008445316	
Sandra Osorio	Aux Admo	ITI	sposorio@educacionbogota.gov.co. Sandryoso@gmail.com	3215974089	
Angela Cañon	Residente Cont.	Safrid ingenieria	Proyectosedgrupo2@gmail.com	3102537159	
Felipe Lozado A.	Aux (A) Ingeniería	C. Intercolegios	auxiliar9.gng@gmail	3205821883	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

GNG Ingeniería S.A.S.	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		02	10/08/2017	26/01/2018

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
	29 de Noviembre 2022	11:00		
Objeto de la reunión:	Presentacion Cartilla Ilustrada de Mantenimiento SED			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS			
Contrato de obra No.		*Contrato de Interventoría No.*	CO1.PCCNTR.4146207
Objeto del Contrato de obra		*Objeto Contrato Interventoría*	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
Contratista de obra		*Contratista de Interventoría*	CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR				
No.	**Descripción**	**Responsable**	**Fecha propuesta cumplimiento**	**Fecha Real cumplimiento**

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
Se realiza presentacion de falbda de la Cartilla Ilustrada de Mantenimientos de Infraestructura, por personal de la secretaria de educacion de Bogotea. En la presentacion se detallan las consideraciones tecnicas y de diseño establecidas por la SED, para obtener resultados estandarizados en la ejecucion de actividades a ejecutar.	Descripción: Responsable: Fecha:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en _____ a los _____ del mes de _____ del _____.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre: LUIS EDUARDO MONTES
Cargo: DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre: Fredy Rodriguez
Cargo: Director

SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: Juan Carlos Urrea
Cargo: Apoyo supervision

Nota:

1. En caso de requerirse anexar más casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
2. Favor anexar a este formato, el registro de ORDEN DEL DIA y LISTA DE ASISTENCIA (___ folios).

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

GNG Ingeniería S.A.S.	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA:	29 Noviembre 2022	LUGAR:		ACTA DE SEGUIMIENTO No:	
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	CO1.PCCNTR.4146207		

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
Fredy Giovanni Rodriguez Salazar	Director Interventoria	Consorcio Interdejis 2022	fredy.rodriguez.gng@gmail.com	061 236 0929	
Paola Marquez	Aux. Interventoria	Consorcio Intercolegios 2022	auxiliar4.gng@gmail.com	316 2415260	
Carlos Lanza	Aux. Contratista	Safrid	davidlanzabedoya@gmail.com	3187899031	
Luis Eduardo Montes	D. Obra	Safrid Ing.	directordeobra@safridingenieria.co.	3006613168	
Juan Cuellar	Apoyo Supervision	DCCEE-SED		3147212636	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
6	19/12/2022	10:00 pm	13:00 pm	IED República de Colombia C IED José Asunción Silva
Objeto de la reunión:	**Revisión Instituciones para diagnósticos con Supervisión de entidad contratante, contratista e Interventoría.**			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS			
Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.4077642	***Contrato de Interventoría No.***	CO1.PCCNTR.4146207
Objeto del Contrato de obra	Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas grupo 2.	***Objeto Contrato Interventoría***	Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.
Contratista de obra	SAFRID INGENIERÍA SAS	***Contratista de Interventoría***	CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR				
No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento

COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA SEDE C

* CUARTO DE BOMBAS
1. Impermeabilización de placa de Cubierta
2. Revisión Equipo de encendido de bombas / Bomba Nº 1. no se encuentra en funcionamiento - Revisar Tanque hidroflow
3. Mejoramiento Condiciones Internas Cuarto de Bombas.

* CUARTO DE REFRIGERIO
1. Enchape pared y Piso.
2. Cambiar Cubierta
3. Puerta Con Rejilla de Ventilacion
4. Cambiar Cielo Raso.

* COCINA - SERVICIOS GENERALES
1. Cambiar y ajustar condiciones del cuarto
2. Enchape
3. Cerramiento Cuarto para Servicios generales
4. Ajustar baño a locker
5. Impermeabilizar placa.

* CANCHA
1. Inspección de Rejillas - Cambio de niveles de cañuela
2. Sello de juntas / 3. Arreglo Cambio de Tablero 4. Pañeta Cancha

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

* FACHADA CANCHA - PASILLO

1. Cubierta para evitar daños en fachada y ingreso a institución.
2. Bajante Viga Canal inspección.

* TERCER NIVEL.

1. Revisar e Inspeccionar Cubierta, Rejillas de Ventilación
2. Mantenimiento de Cubierta en general del bloque.

* BLOQUE SALONES.

* Revisar humedades en muros y filtraciones de agua.
* Revisar Ventanería primer piso - (Concha) - Reforzamiento

* CUARTO BASURA

1. Revisar impermeabilización de placa.

COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA

* Cuarto Servicios Generales: Ajustar - cambio a cuarto de Refrigero.
* CUARTO REFRIGERIO
1. Realizar Ajuste.-
* CAMBIO DE CUBIERTA
* CAMBIO DE VENTANERIA
* [illegible]
* PINTURA
* CAMBIO DE PUERTAS - CARTILLA
* CAMBIO DE PISOS
* REJA DE SEGURIDAD.
* CONSTRUCCIÓN CUARTO DE BASURAS.


* AULAS → CARPINTERIA METÁLICA
* → REJILLA VENTILACIÓN CERRADA.

* AREA ADMINISTRATIVA

1.- CAMBIO DE: CUBIERTA, CARPINTERIA METÁLICA, PINTURA.

POLICIA

- Realizar impermeabilizacion Cubierta y Ajuste de zona de Seguridad ingreso colegio

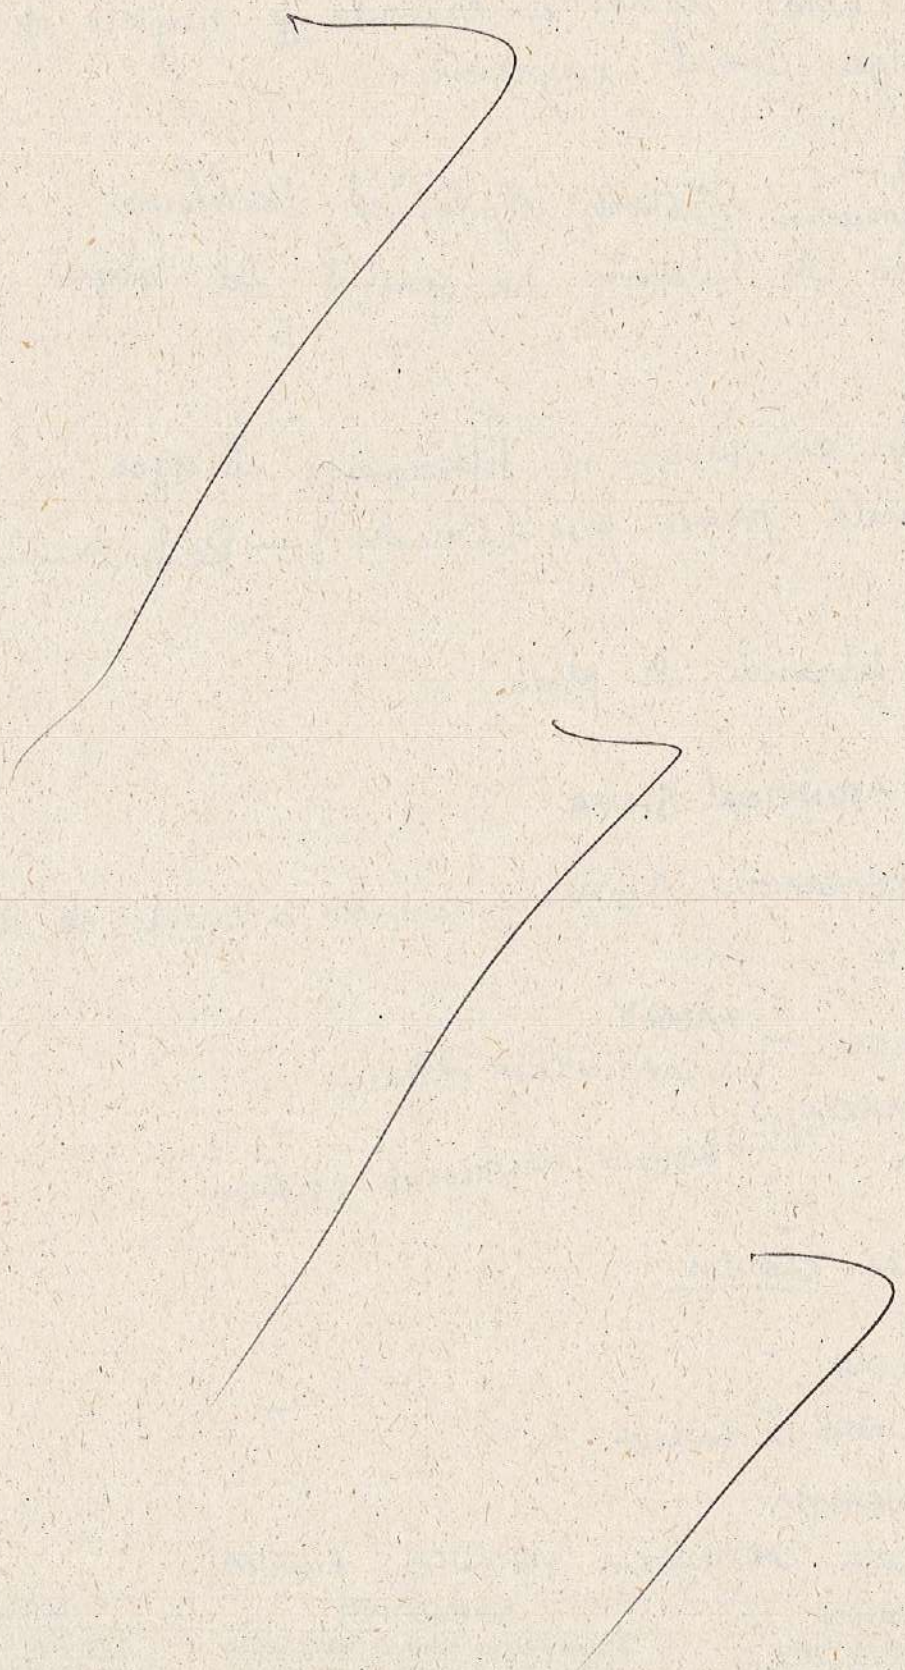

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá a los 19 del mes de Diciembre del 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre: Carlos David Danza B.
Cargo: Apoyo profesional

INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre: Fredy Rodriguez
Cargo: Directa Interventoria

SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: Juan C Valencia
Cargo: Supervision JED-DCCE

Nota:

1. En caso de requerirse anexar más casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
2. Favor anexar a este formato, el registro de ORDEN DEL DIA y LISTA DE ASISTENCIA (___ folios).

GNG Ingeniería S.A.S.	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

LISTA DE ASISTENCIA					
FECHA:	19/12/2022	LUGAR:	IED República de Colombia C IED José Asunción Silva	ACTA DE SEGUIMIENTO No:	6
CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.4077642 de 2022	CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	CO1.PCCNTR.4146207 de 2022		

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
Juan Cuellenciq	Apoyo- Supervisor	SED-DCCE		3142127636	
Carlos Lanza	Apoyo profesional	Jaf-d		3187899031	
Fredy Rodriguez	Interventoria	Inter Colegios	fredy.rodriguez.gng@gmail	0612360929	
Camilo A. Samará	Interventoría	Intercolegios	ingcamilosamara@gmail.com	0612360929	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
7	28/12/22	9:00		INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Objeto de la reunión:	**Revisión Instituciones para diagnósticos con Supervisión de entidad contratante, contratista e Interventoría.**			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS			
Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.4077642	***Contrato de Interventoría No.***	CO1.PCCNTR.4146207
Objeto del Contrato de obra	Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas grupo 2.	***Objeto Contrato Interventoría***	Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.
Contratista de obra	SAFRID INGENIERÍA SAS	***Contratista de Interventoría***	CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR				
No.	**Descripción**	**Responsable**	**Fecha propuesta cumplimiento**	**Fecha Real cumplimiento**

(1) COLEGIO REPUBLICA DE PANAMÁ (Cra 57A # 74A - 32)

Se desarrolla visita, con Arq. Juan Carlos Valencia, Ing. Cord Nieto, Contratista e Interventoría, evidenciando lo siguiente:

- Bloque Existente Cafetería
  - Demolición
  - Muros Divisorios
  - Enchape
  - Cambio de Cubierta
  - Pintura epoxica.
- Construcción de Comedor (Demolición de Tarima)

* Se realizará por parte de SED la entrega de Diseño interno del bloque existente Cafetería, además se efectuará demolición de bloque adyacente a cafetería. Se requiere diseño de cimentación, estructura, Arquitectónico el cual, será acorde a especificaciones técnicas de la SED; se enviará diseño tipo. (13/01/2023)

- Mesones en acero inoxidable, Cuarto frios, Mantener especificaciones técnicas SED
- Realizar actas de Vecindad a detalle.
- Utilizar equipos menores.

COLEGIO LA PALESTINA | Trans 77 # 81B-91 * Emergencia

Se evidencian afectaciones en capa asfaltica de pavimento, se requiere efectuar una estructura en pavimento articulado (adoquín) adecuación de accesos en adoquín (rampa).

* Revisar sumideros e instalar adicionales acorde a diseño.
* Se requiere a contratista efectuar diseño
* ~~Ba~~ Instalación de Bordillo

COLEGIO MORISCO IED. (Diagonal 83 # 73-12)

- De acuerdo a inspección de aguas lluvias y aguas negras, se solicita Revisar Tubería bajo mesón de cafetería.
* Realizar Conexión de tubería a caja principal evitando paso hacia cafetería.
* Existe Rebose en baterías sanitarias.
* Inspección de bajantes
* Revisar planos Hidrosanitarios - Entrega de
* Realizar Trazado de Tubería de evacuación cafetería y batería Sanitaria
* Inspección de Redes con sonda.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en __Bogotá__ a los _28_ del mes de __Diciembre____ del ____2022____.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre: Ing Angela Cañon R.
Cargo: Ingeniera Residente

INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre: Fijodi Rodriguez
Cargo: Director

SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: Juan Cuylenaar
Cargo: Apoyo supervision

Nota:

1. En caso de requerirse anexar más casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
2. Favor anexar a este formato, el registro de ORDEN DEL DIA y LISTA DE ASISTENCIA (___ folios).

GNG Ingeniería S.A.S.	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

LISTA DE ASISTENCIA					
FECHA:	27/12/2022	LUGAR:	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	ACTA DE SEGUIMIENTO No:	7
CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.4077642 de 2022	CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	CO1.PCCNTR.4146207 de 2022		

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
Fredy Rodriguez	Director Interv.	Interdegios 2022	fredy.rodriguezgrg@gmail	6012360929	
Alejandro Moreno	Insp. de Obra	SAFRID	moreno.mendoza.alejandro@hotmail.com	3138706334	
Carol Nieto	Arq. Contratista	DCCEE-SED	proyectoCeducacionbogotagrupo	3174032459	
Juan Carlos Valencia	Apoyo Supervisor	DCCEE-SED		3192125636	
Germán Castaneda	P.U. ARQ	DCCEE-SED		3132872857	
Angela Cañón	Ing. Residente	Safrid Ingeniería	ProyectoSedgrupo2@mail.com	3102532159	
Natalia Calderón	Inspector de interventoría	Inter colegios 2022	interventoria050@gmail.com	3028328214	
Camilo A. Zamora P.	Residente Interventoría	Inter Colegios 2022	interventoria050@gmail.com	3163340746	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
	17 enero 2023			17. Francisco José de Caldas
Objeto de la reunión:	Entrega de Espacios a intervenir IT - Francisco José de Caldas			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS

Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.4077642	***Contrato de Interventoría No.***	CO1.PCCNTR.4146207
Objeto del Contrato de obra	Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas grupo 2.	***Objeto Contrato Interventoría***	Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.
Contratista de obra	SAFRID INGENIERÍA SAS	***Contratista de Interventoría***	CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
Se realiza Reunión conjuntamente entre las partes firmantes en la presente acta. Se informa por parte del Rector de la institución educativa la situación que se presenta ante la posibilidad de intervención de las áreas que hacen parte del alcance asignado por la SED. Se manifiesta que a la fecha se cuenta con 31 cursos de secundaria (6-11), por lo tanto, requiere efectuar las obras por etapas en las aulas del bloque L, con ello, evitar desescolarización. Por parte de Contratista e Interventoría se evalua la forma de intervenir las áreas descritas. Luego de revisar las áreas, se define intervenir el costado occidental del bloque L. La institución educativa informa que cede el espacio que pertenecía a la dirección local para acopio de materiales y campamento. Se requiere adecuar la zona y por parte de la institución se realizará traslado de los elementos que se encuentran allí.	Descripción: Responsable: Fecha: Descripción: Responsable: Fecha:

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
Teniendo en cuenta que el contratista inicia labores, se solicita efectuar por parte de REDP la desmontalación de los elementos pertenecientes a la misma. Se realizará inventario por parte de contratista e Interventoría de las áreas a intervenir. Se informa por el Contratista de obra que se inician labores el día 18 de enero de 2023, de manera, que es necesario agilizar las actividades de desmonte por parte de REDP y traslado de escritorios pertenecientes a las Aulas.	Descripción: Responsable: Fecha: Descripción: Responsable: Fecha: Descripción: Responsable: Fecha:

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
	Descripción:
	Responsable:
	Fecha:
	Descripción:
	Responsable:
	Fecha:
	Descripción:
	Responsable:
	Fecha:

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
	Descripción:
	Responsable:
	Fecha:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en _____ a los _____ del mes de _____ del _____.

CONTRATISTA

Luis Eduardo Montes Álvarez
Director de obra

Residente de obra

INTERVENTORIA

Fredy Giovanni Rodríguez Salazar
Director de interventoría

Residente de interventoría

SUPERVISOR

Edwin Alexander Santana Rodríguez
Supervisor Secretaria de Educación del Distrito Capital

Juan Carlos Valencia Gamba
Apoyo Supervisión Secretaria de Educación del Distrito Capital

Nota:
1. En caso de requerirse anexar más casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
2. Favor anexar a este formato, el registro de ORDEN DEL DIA y LISTA DE ASISTENCIA (___ folios).

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

LISTA DE ASISTENCIA					
FECHA:		LUGAR:		ACTA DE SEGUIMIENTO No:	
CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.4077642	CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	CO1.PCCNTR.4146207		
NOMBRE	CARGO	EMPRESA	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
Juan Carlos Valencia	Apoyo Supervisión	DCCEE-SED	Juvalencia@educacionbogota	3197275636	
Fredy G. Rodriguez S.	Dir. Interventoría	Consorcio Inter Colegios 2022	fredy.rodriguezgpy@gmail.com	6015207359	
Hugo Alfonso Barreto	Rector ITI CINDAT		hugo.barreto.ma@edu-		
———	———	———	cacionbogota.edu.co	3154496354	
William Perez A.	Director Local	SED.	wperezal@educacionbogota.edu.co	3186256643	
Luis Eduardo Montes	Director Obra	Safeio Ing.	proyectosdegrupo2@gmail.com	3006613168	
Edwin Morales Hernandez	Docente Veedor	SED Bogotá	jdmoralesh@gmail.com	3006783814	
Jaime Alejandro Moreno	Inspector de Obra	SAFEIO Ingeniería	proyectosdegrupo2@gmail.com	3138706334	
Camilo A. Saavedra Pesa	Residente Interventoría	Consorcio Inter Colegios 2022	interventoria050@gmail.com	3163340746	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Diaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
	17 de Enero 2023			IED. Jorge Eliecer Gaitan
Objeto de la reunión:	Entrega de Espacios para Intervencion IED. Jorge Eliecer Gaitan.			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS

Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.4077642	***Contrato de Interventoría No.***	CO1.PCCNTR.4146207
Objeto del Contrato de obra	Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas grupo 2.	***Objeto Contrato Interventoría***	Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.
Contratista de obra	SAFRID INGENIERÍA SAS	***Contratista de Interventoría***	CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
Se da inicio a reunión en compañía de los firmantes de la presente acta.	Descripción:
Por parte de supervisor de SED, contratista e interventoría se presenta diagnóstico y alcance de la intervención a desarrollar, con el fin, de socializar las actividades, logística y demás temas relacionados con las obras a efectuar en la institución educativa	
Se informa por parte de coordinador de la institución que la institución ha venido realizando	Responsable:
	Fecha:
los traslados y modificaciones requeridas para que el contratista inicie labores, por ende, se manifiesta por el Contratista el inicio de satisfactorias el día 18 de enero de 2023. Se encuentra pendiente efectuar traslado de elementos del bloque de fotografía y aula de inglés, por lo tanto, se agilizará para entregar a más tardar el día 18 de enero. de 2023	Descripción:
Se solicita por parte de Contratista el desmonte por parte de SEDP de las instalaciones que hacen parte de la institución, de manera que	Responsable:
	Fecha:

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
Se efectuara por parte de Contratista e Interventoría el respectivo inventario de los elementos presentes en cada una de las aulas a intervenir. Supervisor de SED manifiesta que se realizará acompañamiento por parte del área social de la SED para efectuar la actividad lineas arriba mencionada.	Descripción: Responsable: Fecha:
	Descripción: Responsable: Fecha:
	Descripción: Responsable: Fecha:

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
	Descripción:
	Responsable:
	Fecha:
	Descripción:
	Responsable:
	Fecha:
	Descripción:
	Responsable:
	Fecha:

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
	Descripción:
	Responsable:
	Fecha:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en _____ a los _____ del mes de _____ del _____.

CONTRATISTA

Luis Eduardo Montes Álvarez
Director de obra

Residente de obra

INTERVENTORIA

Fredy Giovanni Rodríguez Salazar
Director de interventoría

Residente de interventoría

SUPERVISOR

Edwin Alexander Santana Rodríguez
Supervisor Secretaria de Educación del Distrito Capital

Juan Carlos Valencia Gamba
Apoyo Supervisión Secretaria de Educación del Distrito Capital

Nota:
1. En caso de requerirse anexar más casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
2. Favor anexar a este formato, el registro de ORDEN DEL DIA y LISTA DE ASISTENCIA (___ folios).

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA:	17 de Enero 2023	LUGAR:	IED. Jorge Eliecer Gaitán	ACTA DE SEGUIMIENTO No:	
CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.4077642	CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	CO1.PCCNTR.4146207		

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
Fredy G. Rodriguez	Director Interventoria	Consorcio Interolegios 2022	fredy.rodriguez.yyy@gmail.com	3105203549	
JUAN EDUARDO MONTES	DIRECTOR OBRA	SOFRID ING.	jmposada@gmail.com	300661316	
Camilo A Saavedra Pesca	Residente Interventoría	Consorcio Inter Colegios 2022	interventoria30@gmail.com	3163340746	
Juan Caibu Valencia	Apoyo Supervision	DCCEE - JED	Jvalencia@educacionbogota	3147127636	
Jose Luis Pinzon	A Administrativo	Col Jorge E Gaitan	joseluispinzon@hotmail	3115823271	
Carlos Pedraza	DOCENTE	Col. I.E.D.	Cjpedraza@hotmail.com	3115938873	
Henry Ortigoza	APOYO	Sofrid	o-r-tigoza@hot.com	3124598539	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
	20 de Enero de 2023	12:00	1:30.	IED. GARCES NAVAS
Objeto de la reunión:	ACTA SOCIALIZACIÓN Y ENTREGA DE ESPACIO			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS

Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.4077642	***Contrato de Interventoría No.***	CO1.PCCNTR.4146207
Objeto del Contrato de obra	Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas grupo 2.	***Objeto Contrato Interventoría***	Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.
Contratista de obra	SAFRID INGENIERÍA SAS	***Contratista de Interventoría***	CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
Se inicia Reunión de entrega de instalaciones de IED Garces Navas para la ejecución de obras. Se encuentran en esta, los abajo firmantes, en la presente acta. Por parte de Supervisor de SED se manifiesta y socializa las actividades relacionadas el alcance y diagnóstico encontrado en las visitas realizadas a la institución educativa. Se informa que los relevaciones se encuentran encaminadas a cumplir con las especificaciones técnicas y normatividad vigente. Así mismo, se expone por parte de SED la priorización de las obras a desarrollar. Por parte de Rector de institución educativa, se manifiesta que las actividades pueden iniciar en el área de bloque A (2 piso - cambio Cubierta), y en bloque B (Desmonte de cielo Raso). Además se manifiesta que las aulas asignadas ya estan disponibles para intervención y sin equipos, mobiliario y demás. Por parte de la institución educativa se efectuará	Descripción: Responsable: Fecha: Descripción: Responsable: Fecha:

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
las gestiones correspondientes para el desmonte y desinstalación de elementos de REDP; de manera que debe realizarse acta de inventario y entrega de los mismos.	Descripción:
El rector de la institución comenta los protocolos a seguir en las instalaciones respecto a ingreso y salida de trabajadores, equipos y materiales con ello, mantener canales de comunicación constante, evitando afectaciones y/o alteraciones en el funcionamiento de la misma.	Responsable: Fecha:
La institución educativa, en cabeza del Rector realiza la recomendación de implementar adecuadamente los planes de gestión ambiental y SST para mitigar afectaciones en la comunidad educativa.	Descripción: Responsable: Fecha:
	Descripción: Responsable: Fecha:

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	N° REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
	Descripción:
	Responsable:
	Fecha:
	Descripción:
	Responsable:
	Fecha:
	Descripción:
	Responsable:
	Fecha:

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
	Descripción:
	Responsable:
	Fecha:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en _____ a los _____ del mes de _____ del _____.

CONTRATISTA

Luis Eduardo Montes Álvarez
Director de obra

Residente de obra

INTERVENTORIA

Fredy Giovanni Rodríguez Salazar
Director de interventoría

Residente de interventoría

SUPERVISOR

Edwin Alexander Santana Rodríguez
Supervisor Secretaria de Educación del Distrito Capital

Juan Carlos Valencia Gamba
Apoyo Supervisión Secretaria de Educación del Distrito Capital

Nota:
1. En caso de requerirse anexar más casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
2. Favor anexar a este formato, el registro de ORDEN DEL DIA y LISTA DE ASISTENCIA (___ folios).

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA:	20/01/23	LUGAR:	IED GARCES NAVAS	ACTA DE SEGUIMIENTO No:	
CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.4077642	CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	CO1.PCCNTR.4146207		

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
GUSTAVO ALMANZA	Rector	Garces Navas	rectoriagn@gmail.com	3105813531	
Joan C. Valencia	Supervisor SED-DCCEE	SED		3149121836	
Henry Ortiz Ortiz	Inspector	SAFRID		3124598539	
Claudia Traslaviña	Almacen	Colegio GN	ctraslavinaG@educab.	3502156612	
Camilo A. Samacá	Residente Interventoría	Consorcio Inter Colegios 2022	interventoria050@gmail.com	3163340746	
Natalia Calderón A.	Insp. de interventoría	Consorcio Inter Colegios 2022	interventoria050@gmail.com	3028328214	
LUIS EDUARDO MONTES	DIRECTOR OBRA	SAFRID.	Proyectosedgrupo2@gmail.com	3006613168	
Adn					

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente
