Bucaramanga, 06 de marzo del 2023

Proceso: **OFICINA TORRES ING SAS**		
No. Consecutivo	Fecha:	Versión: 01
OF020_TC_299_2022	06 de marezo del 2023	Página 1 de 1

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN
DE RIEGO Y CAMBIO CLIMÁTICO
IDIGER

Ing. DIANA CAROLINA MORENO MORENO
Supervisor del contrato

Referencia: Contrato de Interventoría No. 299 del 2022

Asunto: Entrega informe mensual 2 del 01 de febrero al 28 de febrero del 2023

Cordial Saludo,

Adjunto remitimos el informe de interventoría para el periodo comprendido entre el 01/02/2023 al 28/01/2023, a continuación, se relacionan los documentos entregados:

1.Informes semanales mes de febrero.
2.Seguimiento Mes 2- Contrato 278-2022
3.GC-FT-65 Formato Informe Periódico
4. Anexo- Actas y Reuniones de seguimiento
5. Anexo- Comunicaciones y Soportes

Sin otro particular,

JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO
RL. TORRES ING S.A.S

Proyectó: MA.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	IDIGER 278-2022							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	
Tipo de contrato	CONSULTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	GEODINAMICA INGENIERIA S.A.	
Plazo de Ejecución (meses)	4							**Número de Cédula o NIT:**	830.146.665-6	
Periodo del Informe:	1	2	2023	al	28	2	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	MAURICIO HERNAN CAMARGO CHÁVEZ CC.79.334.503	
Interventor (si Aplica)	TORRES ING SAS.							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NIT. 900.335.343-4 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	ING. DIANA CAROLINA MORENO MORENO							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NA	
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica								**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**		
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER										
Objeto Contractual:										
Elaboración de estudios básicos de zonificación de amenaza por movimientos en masa, a escala 1:5.000 acorde con los requisitos del decreto 1077 de 2015, para 8 nodos de equipamientos rurales de la localidad de Sumapaz.										

2. Información presupuestal y plazo de ejecución

Valor Inicial del contrato/convenio	$ 398,845,626	**Aporte IDIGER**	Valor CDP	$ 398,845,626	Número CDP	325 IDIGER	Fecha CDP	05 DE AGOSTO DEL 2022	Fuente de Recursos	FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS
			Valor RP		Número RP	609 DEL 2022	Fecha RP	27/04/2022 - 27/04/2022		
		Aporte FONDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP			
Plazo Inicial de Ejecución (meses)	4 MESES		Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Valor Total	$ 398,845,626							
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique			**Descripción**					
		Valor Total	$ 398,845,626							

2.1 Adiciones y Prórrogas

Valor Adición No. 1 del contrato/convenio	NA	**Aporte IDIGER**	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Aporte FONDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
Cantidad de meses de prórroga 1	NA		Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Subtotal	$ 0							
		Valor Total (Inicial + Adición 1)	$ 398,845,626							
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	4 MESES	**Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique**			**Descripción**					
		Valor Total	$ 398,845,626							

Si tiene mas de dos adiciones y prórrogas inserte las casillas necesarias

2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)

Fecha Documento Disminución:	NA	**Valor disminución :**	NA

Descripción del motivo de la disminución: NA

NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL : NA

2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES

Cantidad de Adiciones **(Sume la cantidad de adiciones realizadas)**	$ 0	**Valor Total de Contrato/Convenio** **(Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)**	$ 398,845,626	**Plazo Total de Ejecución** **(Cantidad de meses inicial + Cantidad de mese prórrogas)**	4 MESES

2.4. Anticipo (Si Aplica)

Valor Anticipo **(Si Aplica)**	NA	**Porcentaje de Amortización** **(Si Aplica)**	NA	**Fecha Pago del Anticipo**	dd	mm	aaa

3. Información relacionada con la contratación derivada

(Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y el estado que reporte la entidad que adelante la contratación derivada en caso que no sea directamente el IDIGER O IDIGER - FONDIGER)

No aplica contratación derivada por ser contrato de interventoría contratado directamente por el IDIGER

4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
28 de diciembre del 2022 al 10 de enero del 2023	20 de enero 2023	$ 59,783,172	Corresponde al pago del Producto 1 -Recopilación, revisión y análisis de la información existente de cada nodo y cronograma detallado
del 11 de enero del 2023 al 31 de enero del 2023	15 de febrero 2023	$ 59,783,172	Corresponde al pago del producto 2 - Definición de las metodologías de zonificación, verificación del polígono de análisis, insumos temáticos preliminares y programa de exploración del subsuelo

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	IDIGER 278-2022							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	11 DE NOVIEMBRE DEL 2022
Tipo de contrato	CONSULTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	GEODINAMICA INGENIERIA S.A.
Plazo de Ejecución (meses)	4							**Número de Cédula o NIT:**	830.146.665-6
Periodo del Informe:	1	2	2023	al	28	2	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	MAURICIO HERNAN CAMARGO CHÁVEZ CC.79.334.503
Interventor (si Aplica)	TORRES ING SAS.							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NIT. 900.335.343-4 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	ING. DIANA CAROLINA MORENO MORENO							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica								**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER									
Objeto Contractual:									
Elaboración de estudios básicos de zonificación de amenaza por movimientos en masa, a escala 1:5.000 acorde con los requisitos del decreto 1077 de 2015, para 8 nodos de equipamientos rurales de la localidad de Sumapaz.									

5. Pagos Efectuados

Número de pago/desembolso	Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1	$ 59,783,172	OP: No. 3086 25/01/2023	NA
2	$ 59,783,172	Dato pendiente en la carpeta contractual	Dato pendiente en la carpeta contractual
TOTALES	$ 119,566,344		

6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
25/01/2023	$ 4,931,359	Dato pendiente en la carpeta contractual
	Dato pendiente en la carpeta contractual	Dato pendiente en la carpeta contractual
TOTAL	$ 4,931,359	

7. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro

8. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	**SEGUROS MUNDIAL**	**NB-100232795** **RCE: NB-100054565**	**10/11/2022**	**10/03/2024**	**10/11/2022**	$ 79,710,895
Cumplimiento - Pago de salarios			**10/11/2022**	**10/03/2026**	**10/11/2022**	$ 39,855,448
Cumplimiento - Calidad del servicio			**10/11/2023**	**10/03/2025**	**10/11/2022**	$ 79,710,895
Responsabilidad civil extra contractual			**10/11/2022**	**10/11/2023**	**10/11/2022**	$ 200,000,000

ACTUALIZACIÓN SEGÚN INICIO DEL CONTRTAO

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	**SEGUROS MUNDIAL**	**NB-100232795** **RCE: NB-100054565**	**28/12/2022**	**27/04/2024**	**24/02/2023**	$ 79,710,895
Cumplimiento - Pago de salarios			**28/12/2022**	**27/04/2026**	**24/02/2023**	$ 39,855,448
Cumplimiento - Calidad del servicio			**27/04/2023**	**27/04/2025**	**24/02/2023**	$ 79,710,895
Responsabilidad civil extra contractual			**28/12/2022**	**27/04/2024**	**24/02/2023**	$ 200,000,000

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

9. Seguimiento a matriz de riesgos

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	Si	x	No	

Registre cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

iesgo 12 de la Matriz de identificación y distribución de los
riesgos: "Cuando en el sector objeto del estudio y/o diseño se presentan condiciones de seguridad que afectan el desarrollo de las actividades de campo fundamentales para el desarrollo del contrato"

Riesgo 18 de la Matriz de identificación y distribución de los
riesgos: "Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas externas asociadas a condiciones hidrometeorológicas, que no permitan la ejecución de la totalidad de la captura de información de campo"

Observaciones adicionales:

En consecuencia con la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, el 28 de febrero consultor solicito prórroga de 30 días, la cual se revisará en marzo de 2023.

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Oficina Asesora Jurídica.

10 REFERENTE AL SEGUIMIENTO TÉCNICO: Información de seguimiento técnico del contrato, así como análisis respecto del cronograma o avance inicialmente pactado (evidencia de posibles retrasos, vicisitudes, dificultades), (estado % de terminados, en ejecución, pendientes por ejecutar, pagos pendientes y/o en curso etc.).

El 8 y 9 de febrero se genera visita conjunta entre la interventoría, consultoría y supervisión a los nodos en estudio.

El 15 de febrero se genera la aprobación dle informe parcial No. 2 por parte de la interventoría y se generan los trámites requeridos para el pago de dicho producto.

El 14 de febrero el consultor inicia la exploración geotécnica en los nodos en estudio, durante la ejecución de la exploración se han identificado retrasos producto de las condiciones climáticas y permisos con la comunidad, situación que no permitio la entrega del producto No 3 el cual se encontraba proyectado para el 26 de febrero, teniendo en cuenta el presnete retraso, se analizan las condiciones y las gestiones requeridas para generar una prorroga por un mes con el fin de finalizar de forma adecuada las obligaciones contractuales

A nivel porcentual, teniendo en cuenta la aprobación del informe No. 1 , informe No. 2 y avance del producto 3, se cuenta con un avance técnico correspondiente al 38%

A nivel de facturación, se cuenta con un avance del 30% correspondiente al pago del Informe No. 1 e informe No 2

A nivel de tiempo, se cuenta con un avance del 50% en tiempo correspondiente a llos dos primeros meses de ejecución del contrato.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	IDIGER 278-2022							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	11 DE NOVIEMBRE DEL 2022
Tipo de contrato	CONSULTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	GEODINAMICA INGENIERIA S.A.
Plazo de Ejecución (meses)	4							**Número de Cédula o NIT:**	830.146.665-6
Periodo del Informe:	1	2	2023	al	28	2	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	MAURICIO HERNAN CAMARGO CHÁVEZ CC.79.334.503
Interventor (si Aplica)	TORRES ING SAS.							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NIT. 900.335.343-4 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	ING. DIANA CAROLINA MORENO MORENO							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica								**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER									
Objeto Contractual:									
Elaboración de estudios básicos de zonificación de amenaza por movimientos en masa, a escala 1:5.000 acorde con los requisitos del decreto 1077 de 2015, para 8 nodos de equipamientos rurales de la localidad de Sumapaz.									

11. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Se revisa el cumplimiento de la seguridad social de acuerdo a la certificación suministrada por el contratista para la gestion del pago No. 2

Fecha emisión de Informe	1	3	2023

Firma

ING. JOSE RUBEN TORRES CAMARGO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
R.L TORRES ING S.A.S

Cargo Supervisor

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Técnico: en caso que haya sido designado) o el que aplique

Cargo o Contrato

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Financiero: en caso que haya sido designado) o el que aplique

Cargo o Contrato

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Jurídico: en caso que haya sido designado)) o el que aplique

Cargo o Contrato

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

SEGUIMIENTO TÉCNICO SEMANAL A CONTRATOS

CONTRATO	278 DE 2022 - IDIGER
OBJETO	Elaboración de estudios básicos de zonificación de amenaza por movimientos en masa, a escala 1:5.000 acorde con los requisitos del decreto 1077 de 2015, para 8 nodos de equipamientos rurales de la localidad de Sumapaz.
FECHA INICIO	28 DE DICIEMBRE DEL 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	4.0 MESES
INTERVENTOR	TORRES ING S.A.S

ELEMENTOS TÉCNICOS

No	ACTIVIDAD	Semana 1- Enero 29 al 4 de Febrero	Semana 2- 05 de Febrero al 11 de Febrero	Semana 3 - 12de Febrero al 18 de Febrero	Semana 4 19 de Febrero al 25 de Febrero	Semana 5 26 de Febrero al 28 de Febrero
1	**ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**					
0	Legalización contractual **(Finalizada en el periodo anterior)**					
1.1	Presentación de las hojas de vida del equipo consultor **(Finalizada en el periodo anterior)**					
2.1	Informe Parcial 1: Recopilación, revisión y análisis de la información existente de cada nodo y cronograma detallado **(Finalizada en el periodo anterior)**					
2.1.1	Presentación del cronograma para el desarrollo del proyecto				**22 de febero del 2022:**El consultor presenta el cronograma de actividades detallado de las actividades de exploración geotécnica, se solicita por parte de la consultoría presentar la afectación que genera el cambio de la programación en la exploración geotécnica al cronograma general del proyecto	
2.2	Informe Parcial 2 Definición de las metodologías de zonificación, verificación del polígono de análisis, insumos temáticos preliminares y programa de exploración del subsuelo	**01 de febrero del 2023:** Se genera la revisión y envio por parte de la interventoría de los comentarios evaluados en la revisión del plan de exploración **02 de febrero del 2023:** Se remite al consultor la revisión y ibservaciones del Informe No. 2. **03 de febrero del 2023:** El consultor remite actualización del plan de exploración. **04 de febrero del 2023:**Se da aprobación del plan de exploración presentado por el consultor mediante OF012_TC_299_2022	**08 - 09 de febrero del 2023:** Se genera visita conjunta entre consultoría, interventoría y supervisión a los 8 nodos en estudio. **10 de febrero del 2023:** El consultor remite subsanación al informe parcial 2	**15 de febrero del 2023:** Se genera la aprobación del informe parcial número 2 mediante OF014_TC_299_2022		
2.3	Informe Parcial 3: Insumos temáticos Completos e Investigación de campo completa			**14 de febrero del 2023:** Se inicia exploración geotécnica en el nodo Concepción.	**20 de febrero del 2023:** Se finaliza la exploración geotécnica en el nodo Concepción y se inicia exploración en el nodo Tunal Alto. **24 de febrero del 2023:** Se finaliza la exploración geotécnica en el nodo Tunal Alto y se inicia la exploración geotécnica en el nodo Vegas.	**27 de febrero del 2023:** Se realiza traslado al nodo Santa Ana , sin embargo No se logran obtener los permisos, la comunidad exige reunión previa, por lo tanto se genera traslado del equipo al nodo Sumapaz el cual se encuentra en ejecución

PRODUCTOS

PRODUCTO	Semana 1- Enero 29 al 4 de Febrero	Semana 2- 05 de Marzo al 11 de Febrero	Semana 3 - 12de Marzo al 18 de Febrero	Semana 4 19 de Marzo al 25 de Febrero	Semana 5 26 de Marzo al 28 de Febrero
Informe Parcial 2 Definición de las metodologías de zonificación, verificación del polígono de análisis, insumos temáticos preliminares y programa de exploración del subsuelo			15 de febrero del 2023: Se genera la aprobación del informe parcial número 2 mediante OF014_TC_299_2022		

ESTADO DE AVANCE, HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El acta de inicio del presente proyecto tuvo lugar el 28 de diciembre del 2022, en esta fecha se generó la entrega y presentación de las pólizas actualizadas por parte del consultor.

El 30 de diciembre es enviado el informe No. 1 correspondiente a la recopilación y análisis de la información existente por parte del consultor, entregable el cual fue aprobado para su pago el 18 de enero del 2023.

El 27 de enero del 2023 se generó la entrega por parte del consultor dle informe No. 2 el cual ingreso a revisión y proceso de aprobación por parte de la interventoría.

El 8 y 9 de febrero se genera visita conjunta entre la interventoría, consultoría y supervisión a los nodos en estudio.

El 15 de febrero se genera la aprobación dle informe parcial No. 2 por parte de la interventoría y se generan los trámites requeridos para el pago de dicho producto.

El 14 de febrero el consultor inicia la exploración geotécnica en los nodos en estudio, durante la ejecución de la exploración se han identificado retrasos producto de las condiciones climáticas y permisos con la comunidad, situación que no permitio la entrega del producto No 3 el cual se encontraba proyectado para el 26 de febrero, teniendo en cuenta el presnete retraso, se analizan las condiciones y las gestiones requeridas para generar una prorroga por un mes con el fin de finalizar de forma adecuada las obligaciones contractuales

A nivel porcentual, teniendo en cuenta la aprobación del informe No. 1 , informe No. 2 y avance del producto 3, se cuenta con un avance técnico correspondiente al 38%

A nivel de facturación, se cuenta con un avance del 30% correspondiente al pago del Informe No. 1 e informe No 2

A nivel de tiempo, se cuenta con un avance del 50% en tiempo correspondiente a llos dos primeros meses de ejecución del contrato.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

Fecha	Asunto de solicitud	Soporte
01 de febrero del 2023	La interventoría remite a la consultoría la revisión del plan de exploración presentado	Correo electrónico mediante el OF10_TC_299_2022
01 de febrero del 2023	La consultoría remite a la interventoría los informes parciales 2 de los 8 nodos con la subsanación a las observaciones realizadas, en el oficio 18-23 -GDING-PROY188- ENTREGA INFORME 2.	oficio 18-23 -GDING-PROY188- ENTREGA INFORME 2.
02 de febrero del 2023	La interventoría remite a la consultoría la revisión del informe Parcial No. 2 , con las observaciones requeridas para su aprobación	Correo electrónico mediante el OF11_TC_299_2022
03 de febrero del 2023	La consultoría remite a la interventoría os informes parciales 2 de los 8 nodos con la subsanación a las observaciones realizadas para el plan de exploración, en el oficio 22-23 -GDING-PROY188- ENTREGA INFORME 2.	oficio 22-23 -GDING-PROY188- ENTREGA INFORME 2.
06 de febrero del 2023	Se remite por parte de la supervisión la cartografía escala 1:5000 del nodo Raizal	vía correo electronico enviado por el Ing. Carlos Gómez
04 de febrero del 2023	La interventoría remite revisión y aprobación del plan de exploración presentado por el consultor	Correo electrónico mediante el OF12_TC_299_2022

IDIGER
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

SEGUIMIENTO TÉCNICO SEMANAL A CONTRATOS

06 de febrero del 2023	La consultoría remie vía correo electronico a la interventoría el informe No 2 con las observaciones	Correo electronico asunto: Informes 2 Sumapaz
13 de febrero del 2023	Envio por parte de la interventoría a la supervisión correspondiente al informe No. 1 de la interventoría	Correo electrónico mediante el OF13_TC_299_2022
15 de febrero del 2023	La interventoría remite a la supervisión y a la consultoría la aprobación del informe No. 2 bajo los acuerdos llevado a cabo en las visitas de campo	Correo electrónico mediante el OF14_TC_299_2022
16 de febrero del 2023	La consultoría remite a la interventoría Notificación Perforaciones geotécnicas Nodo Concepción	Mediante correo electrónico
16 de febrero del 2023	La interventoría remite mensaje a la consultoría recordando la solicitud de los documentos a nivel de seguridad social del personal que generara la exploración geotécnica y la entrega de un cronogtrama detallado para la exploración	Mediante correo electrónico
17 de febrero del 2023	El consultor remite a la interventoría los documentos correspondientes a la seguridad social del personal de campo	Mediante correo electrónico
20 de febrero del 2023	El cosultor remite notiofication sobre los inconvenientes a nivel social tenidos en el desarrollo de la exploración geotécnica	Mediante correo electrónico
20 de febrero del 2023	La supervisión contesta el mensaje de la consultoría generando las indicaciones para el acercamiento con la comunidad, asi mismo se realiza la solicitud de el orden de los nodos, personas y numeros de telefono, esto con el fin de establecer contacto con la comunidad	Mediante correo electrónico
21 de febrero del 2023	La consultoría remote correo notificando que " El dia de hoy en reunion con la presidenta de la junta del nodo santa ana Señora Rocio Melo 3107522789, pese a explicar alcance de contrato y mostrar presentacion solicito realizar reunion con la comunidad para conocer el alcance, solicitamos amablemente gestionar estos permisos."	Mediante correo electrónico
22 de febrero del 2023	La supervisión remite respuesta indicando que El día de ayer dentro del CLGR-CC se realizó socialización del proyecto	Mediante correo electrónico
22 de febrero del 2023	La consultoría remite a la interventoría y supervisión el l envió del cronograma de campo, con las fechas en que estarán en cada nodo, además, se agrega el listado de personas que están realizando los trabajos de exploración del subsuelo.	Mediante correo electrónico
22 de febrero del 2023	La interventoría solicita a la consultorpia mediante correo electronico " se solicita actualizar el cronograma general del proyecto, actualizando las entregas de acuerdo al avance de la exploración en los diferentes nodos. "	Mediante correo electrónico
27 de febrero del 2023	El consultor remite mediante correo electronico inconvenientes presentados al intentar realizar la exploración geotécnica en el nodo Santa Ana	Mediante correo electrónico
27 de febrero del 2023	El consultor remite oficio indicando los inconvenientes surgidos durante el desarrollo de la exploración en los diferentes nodos de estudio	Oficio 32-23-GDING-PROY188
28 de febrero del 2023	El consultor realiza envío de los Certificados de calibración y documentación requerida a nivel de soportes para garantizar los requerimientos del laboratorio	Mediante correo electronico
28 de febrero del 2023	El consultor proyecta solicitud prórroga por 30 días calendario, mediante oficio 34-23-GDING-PROY 188	Correo electrónico remitido mediante oficio 34-23-GDING-PROY 188

ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO

Fecha	Tema de la reunión o seguimiento	Soporte
3/02/2023	Reunión de seguimiento CTO 278 DEL 2022 y 299 del 2022	Acta No 4
08 - 09-02-2023	Realizar visita a los sitios (nodos) a intervenir para establecer exploración geotécnica.	Acta No 5
21/02/2023	Reunión de seguimiento CTO 278 DEL 2022 y 299 del 2022	Acta No 6
27/02/2023	Revisión de posible modificación contractual y tratamiento al factor multiplicador de los proyectos de Consultoría e interventoría	Acta No 7
28/02/2023	1. Continuación de la reunión del día 28-02-2023	Acta No 8

REGISTRO GRÁFICO Y FOTOGRÁFICO

VISITA DE CAMPO A LOS NODOS POR PARTE DEL EQUIPO CONSULTORÍA- INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN

NODO ÁNIMAS







NODO AURAS






NODO CONCEPCIÓN






NODO RAIZAL






NODO SANTA ANA






NODO SUMAPAZ






NODO TUNAL ALTO






NODO VEGAS






REGISTRO FOTOGRÁFICO DESARROLLO DE LA EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA EJECUTADA

CONCEPCIÓN


S1 CONCEPCIÓN


S2 CONCEPCIÓN





AP1 CONCEPCIÓN







SEGUIMIENTO TÉCNICO SEMANAL A CONTRATOS

TUNAL ALTO



S1 TUNAL ALTO




S2 TUNAL ALTO



AP1 TUNAL ALTO



AP2 TUNAL ALTO



AP3 TUNAL ALTO




VEGAS


S1 VEGAS





S2 VEGAS

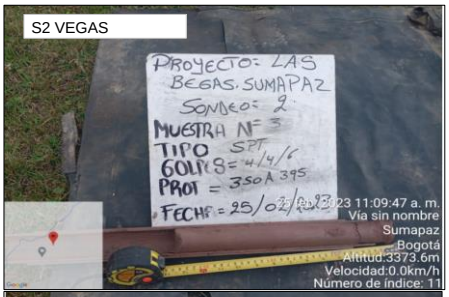



AP1 VEGAS



AP2 VEGAS



RESPONSABLES	**ELABORÓ**	ING. MARIA PAULA APARICIO GARZÓN
	REVISÓ	ING. JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)

SEGUIMIENTO A CONTRATOS Y CONVENIOS

Informe de Interventoría Contrato de consultoría IDIGER 278 de 2022- Informe de interventoría

Fecha de elaboración del informe	01 de Marzo del 2023
Periodo de seguimiento	01 de febrero al 28 de febrero del 2023
Fecha de inicio	28 de diciembre del 2022
Fecha de terminación	27 de abril del 2023
Valor del Contrato	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($398.544.479.oo) incluido de IVA
Objeto	Elaboración de estudios básicos de zonificación de amenaza por movimientos en masa, a escala 1:5.000 acorde con los requisitos del decreto 1077 de 2015, para 8 nodos de equipamientos rurales de la localidad de Sumapaz.
Nombre de contratista	GEODINAMICA INGENIERIA S.A. NIT. 830.146.665-6
Nombre del interventor	TORRES ING SAS. NIT. 900.335.343-4
PLAZO DE EJECUCIÓN	4.0 Meses

Avance

Técnicos	38.00%
Financieros	30.00%
Recursos ejecutados	50.00%

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

Fecha	Asunto de solicitud	Soporte
01 de febrero del 2023	La interventoría remite a la consultoría la revisión del plan de exploración presentado	Correo electrónico mediante el OF10_TC_299_2022
01 de febrero del 2023	La consultoría remite a la interventoría los informes parciales 2 de los 8 nodos con la subsanación a las observaciones realizadas, en el oficio 18-23 -GDING-PROY188- ENTREGA INFORME 2.	oficio 18-23 -GDING-PROY188- ENTREGA INFORME 2.
02 de febrero del 2023	La interventoría remite a la consultoría la revisión del informe Parcial No. 2 , con las observaciones requeridas para su aprobación	Correo electrónico mediante el OF11_TC_299_2022
03 de febrero del 2023	La consultoría remite a la interventoría os informes parciales 2 de los 8 nodos con la subsanación a las observaciones realizadas para el plan de exploración, en el oficio 22-23 -GDING-PROY188- ENTREGA INFORME 2.	oficio 22-23 -GDING-PROY188- ENTREGA INFORME 2.
06 de febrero del 2023	Se remite por parte de la supervisión la cartografía escala 1:5000 del nodo Raizal	vía correo electronico enviado por el Ing. Carlos Gómez
04 de febrero del 2023	La interventoría remite revisión y aprobación del plan de exploración presentado por el consultor	Correo electrónico mediante el OF12_TC_299_2022
06 de febrero del 2023	La consultoría remie vía correo electronico a la interventoría el informe No 2 con las observaciones	Correo electronico asunto: Informes 2 Sumapaz
13 de febrero del 2023	Envio por parte de la interventoría a la supervisión correspondiente al informe No. 1 de la interventoría	Correo electrónico mediante el OF13_TC_299_2022

SEGUIMIENTO A CONTRATOS Y CONVENIOS

Informe de Interventoría Contrato de consultoría IDIGER 278 de 2022- Informe de interventoría

15 de febrero del 2023	La interventoría remite a la supervisión y a la consultoría la aprobación del informe No. 2 bajo los acuerdos llevado a cabo en las visitas de campo	Correo electrónico mediante el OF14_TC_299_2022
16 de febrero del 2023	La consultoría remite a la interventoría Notificación Perforaciones geotécnicas Nodo Concepción	Mediante correo electrónico
16 de febrero del 2023	La interventoría remite mensaje a la consultoría recordando la solicitud de los documentos a nivel de seguridad social del personal que generara la exploración geotécnica y la entrega de un cronogtrama detallado para la exploración	Mediante correo electrónico
17 de febrero del 2023	El consultor remite a la interventoría los documentos correspondientes a la seguridad social del personal de campo	Mediante correo electrónico
20 de febrero del 2023	El cosultor remite notioficación sobre los inconvenientes a nivel social tenidos en el desarrollo de la exploración geotécnica	Mediante correo electrónico
20 de febrero del 2023	La supervisión contesta el mensaje de la consultoría generando las indicaciones para el acercamiento con la comunidad, asi mismo se realiza la solicitud de el orden de los nodos, personas y numeros de telefono, esto con el fin de establecer contacto con la comunidad	Mediante correo electrónico
21 de febrero del 2023	La consultoría remote correo notificando que " El dia de hoy en reunion con la presidenta de la junta del nodo santa ana Señora Rocio Melo 3107522789, pese a explicar alcance de contrato y mostrar presentacion solicito realizar reunion con la comunidad para conocer el alcance, solicitamos amablemente gestionar estos permisos."	Mediante correo electrónico
22 de febrero del 2023	La supervisión remite respuesta indicando que El día de ayer dentro del CLGR-CC se realizó socialización del proyecto	Mediante correo electrónico
22 de febrero del 2023	La consultoría remite a la interventoría y supervisión el l envió del cronograma de campo, con las fechas en que estarán en cada nodo, además, se agrega el listado de personas que están realizando los trabajos de exploración del subsuelo.	Mediante correo electrónico
22 de febrero del 2023	La interventoría solicita a la consultorpia mediante correo electronico " se solicita actualizar el cronograma general del proyecto, actualizando las entregas de acuerdo al avance de la exploración en los diferentes nodos. "	Mediante correo electrónico
27 de febrero del 2023	El consultor remite mediante correo electronico inconvenientes presentados al intentar realizar la exploración geotécnica en el nodo Santa Ana	Oficio 32-23-GDING-PROY188
27 de febrero del 2023	El consultor remite oficio indicando los inconvenientes surgidos durante el desarrollo de la exploración en los diferentes nodos de estudio	Oficio 32-23-GDING-PROY188
28 de febrero del 2023	El consultor realiza envío de los Certificados de calibración y documentación requerida a nivel de soportes para garantizar los requerimientos del laboratorio	Mediante correo electrónico
28 de febrero del 2023	El consultor proyecta solicitud prórroga por 30 días calendario, mediante oficio 34-23-GDING-PROY 188	Correo electrónico remitido mediante oficio 34-23-GDING-PROY 188

SEGUIMIENTO A CONTRATOS Y CONVENIOS

Informe de Interventoría Contrato de consultoría IDIGER 278 de 2022- Informe de interventoría

CONTROL TÉCNICO	
Informe Parcial 2 Definición de las metodologías de zonificación, verificación del polígono de análisis, insumos temáticos preliminares y programa de exploración del	15 de febrero del 2023: Se genera la aprobación del informe parcial número 2 mediante OF014_TC_299_2022

OTROS	No aplica
PROFESIONAL RESPONSABLE	ING. JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO (DIRECTOR DE CONSULTORÍA)
