SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
17 FEB 2023
Hora: 4:30 PM
Quien Recibe:

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2023 AL 02 DE FEBRERO DE 2023

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	No. 777 DE 2022
CONTRATISTA	ACTIVE RECREACIÓN SAS
NIT	900.161.485-3
R/L	CARLOS MARIO LÓPEZ OSORIO C.C. 71.586.996
OBJETO	"MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA PISTA DE VELOCIDAD Y PISTA PLANA DE PATINÓDROMO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ"
VALOR CONTRATO	$ 275.428.115,00 M/CTE.
ANTICIPO: 30%	$ 82'628.435.00 M/CTE.
VALOR PAGADO ANTICIPO: 30%	$ 0.00 M/CTE.
VALOR EJECUTADO	$ 275.428.115,00 M/CTE.
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 275.428.115,00 M/CTE.
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0.00 M/CTE.
FECHA ACTA DE INICIO	10 DE ENERO DE 2023
FECHA OTRO SI 001	25 DE ENERO DE 2023
FECHA DE RECIBO FINAL	02 DE FEBRERO DE 2023
FECHA ACTA DE LIQUIDACION	14 DE FEBRERO DE 2023
PLAZO	DOS (02) MESES.
SUPERVISOR	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

II. PROCESO DE CONTRATACION

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Documentos

Volver — Imprimir — Modificar

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCONTR.4243915
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27/12/2022 7:46:37 AM
Número del contrato	777 DE 2022
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA PISTA DE VELOCIDAD Y PISTA PLANA DE PATINODROMO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	Si No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	25 días de tiempo transcurrido
Fecha de terminación del contrato	17 días para terminar
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	Si No
Obligaciones Ambientales	Si No
Obligaciones pos consumo	Si No
Reversión	Si No

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA
COLOMBIA Puerto Boyacá
0 Recomendaciones

Información del Proveedor contratista

ACTIVE RECREACION S.A.S
COLOMBIA Medellín
Número de documento 900151455

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ACTIVE RECREACION S.A.S	BANCOLOMBIA	Corriente	01637734839

Aprobación del contrato

Aprobador - Proveedor

Aprobado por: ACTIVE RECREACION S.A.S — Fecha de aprobación: 25/12/2022 10:36:31 AM

Aprobador - Entidad Estatal

Aprobado por: Pedro Jose Bello Pinto — Fecha de aprobación: 27/12/2022 7:46:37 AM

III. RELACION DE LAS ACTAS DE INTERVENTORIA

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
001	FECHA ACTA DE INICIO	10 DE ENERO DE 2023
	FECHA OTRO SI 001	25 DE ENERO DE 2023
002	FECHA DE RECIBO FINAL	02 DE FEBRERO DE 2023
003	FECHA ACTA DE LIQUIDACION	14 DE FEBRERO DE 2023

IV. RELACION DE DOCUMENTOS LEGALES.

PÓLIZA INICIAL

COBERTURA	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SOLIDARIA DE COLOMBIA	520-47-994000045942	28/12/2022	28/08/2023	$ 27.542.811.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMIZACIONES LABORALES	SOLIDARIA DE COLOMBIA	13606314	28/12/2022	28/02/2026	$ 27.542.811.50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SOLIDARIA DE COLOMBIA	13606314	VER NOTA ACLARATORIA		$ 55.085.623,00
CALIDAD DEL BIEN	SOLIDARIA DE COLOMBIA	13606314	28/12/2022	28/08/2023	$ 27.542.811.50

PÓLIZA OTRO SI

COBERTURA	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SOLIDARIA DE COLOMBIA	520-47-994000045942	28/12/2022	28/08/2023	$ 27.542.811.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMIZACIONES LABORALES	SOLIDARIA DE COLOMBIA	13606314	28/12/2022	28/02/2026	$ 27.542.811.50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SOLIDARIA DE COLOMBIA	13606314	VER NOTA ACLARATORIA		$ 55.085.623,00
CALIDAD DEL BIEN	SOLIDARIA DE COLOMBIA	13606314	28/12/2022		$ 27.542.811.50
ANTICIPO	SOLIDARIA DE COLOMBIA	13606314	25/01/2023	28/08/2023	$ 82.628.434.50

PÓLIZA ACTA DE RECIBO FINAL

COBERTURA	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SOLIDARIA DE COLOMBIA	520-47-994000045942	28/12/2022	28/08/2023	$ 27.542.811.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMIZACIONES LABORALES	SOLIDARIA DE COLOMBIA	13606314	28/12/2022	28/02/2026	$ 27.542.811.50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SOLIDARIA DE COLOMBIA	13606314	VER NOTA ACLARATORIA*		$ 55.085.623,00
CALIDAD DEL BIEN	SOLIDARIA DE COLOMBIA	13606314	28/12/2022	28/08/2023	$ 27.542.811.50
ANTICIPO	SOLIDARIA DE COLOMBIA	13606314	25/01/2023	28/08/2023	$ 82.628.434.50

*** 02/02/2023 hasta 02/02/2028**

V. GENERALIDADES.

Las actividades recreo-deportivas han jugado un papel importante en la estructuración del territorio puerto boyacense, estando presente en la cotidianidad del municipio y convirtiéndose en una de sus fortalezas, generando cambios en la forma de uso y apropiación del suelo, transformación e impacto en los subsistentes ambientales y ecológicos y, en el mismo sentido, el aumento del consumo; sin embargo, se incentiva la dinámica social, económica, cultural y política en el municipio. Por tal razón, es necesario garantizar la adecuada infraestructura para eventos culturales y recreativos, toda vez que mejora las condiciones en la calidad de vida de los habitantes.

La cultura Puerto Boyacense se ha configurado como una amalgama de múltiples expresiones culturales, debido a la llegada de nuevos habitantes provenientes de diferentes regiones del territorio nacional, inicialmente la construcción de su identidad se consolida a partir de las poblaciones rurales entre ellos campesinos y afros, lo anterior mediado por sus prácticas económicas, tales como la producción agrícola y pecuaria, esto se ha expresado por medio de muestras artísticas folclóricas, que denotan el histórico de arraigo con el territorio y el rio Magdalena.

En la actualidad la pista de velocidad presentaba fisuras que requerían su intervención por lo cual se requiere un mantenimientos preventivos, los cuales se deben realizar de manera semestral con máquinas especiales con personal especializado y con experiencia en el mantenimiento de este tipo de escenarios.

La construcción del patinódromo, cuya localización es en la calle 23 entra carreras 7 y 5, se terminó en diciembre del año 2019, este escenario fue construido para el entrenamiento de 300 niños pertenecientes a 5 clubes deportivos del Municipio, una pista de 200 metros para velocidad y un área de 1430 metros cuadrados, y una pista plana para niños y pista artística de 2030 metros cuadrados.

VI. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR MES

Seguimiento de las actividades de obra.


Durante la realización de las actividades contractuales del contrato 777 de 2022, la supervisión realizó el acompañamiento a cada una de las actividades realizadas dentro del periodo comprendido entre los días 10 de enero de 2023 al 02 de febrero de 2023. En este informe se evidencia el desarrollo de las siguientes actividades:


SEMANA 1


En el periodo del 10 al 20 de enero de 2023 el personal de la empresa hizo presencia en obra para identificar posibles zonas de acopio de materiales y/o escombros, posteriormente se ubicaron en la residencia donde se hospedarán durante la duración del proyecto.

SEMANA 2

El sábado 21 de enero, se realizó la descarga de los materiales necesarios para el mejoramiento del patinódromo, posterior a esto se apilaron los materiales de tal manera que se preserven los equipos, materiales y herramientas. Donde no interfiriera con la tranquilidad de la comunidad y generara problemas ambientales, luego de dicha actividad se inició con la limpieza general de la obra, posterior a esto se inició con el lavado de las pistas, identificando los puntos más críticos para hacer énfasis en dichos puntos. Luego de esto, se empezó raspando la pintura existente y mal estado para posteriormente aplicar el mortero autonivelante e iniciar la aplicación de las capas de recubrimiento.

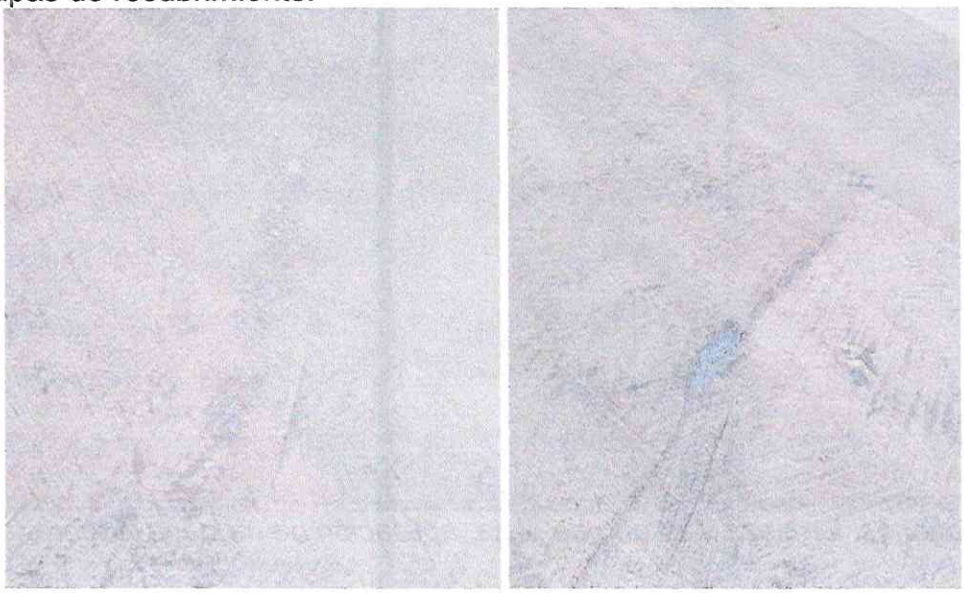

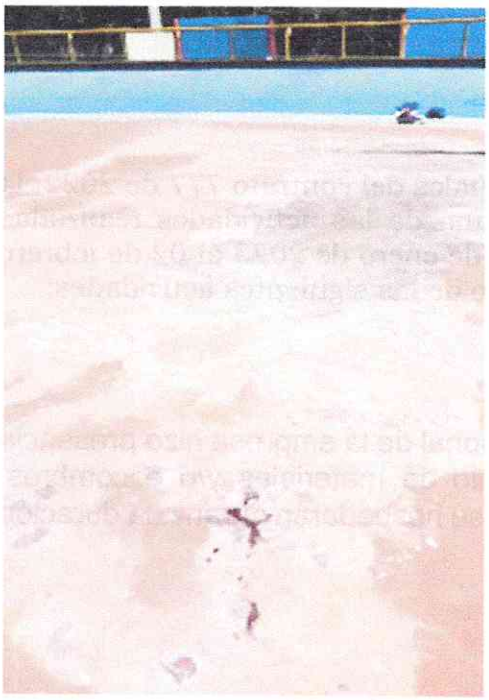

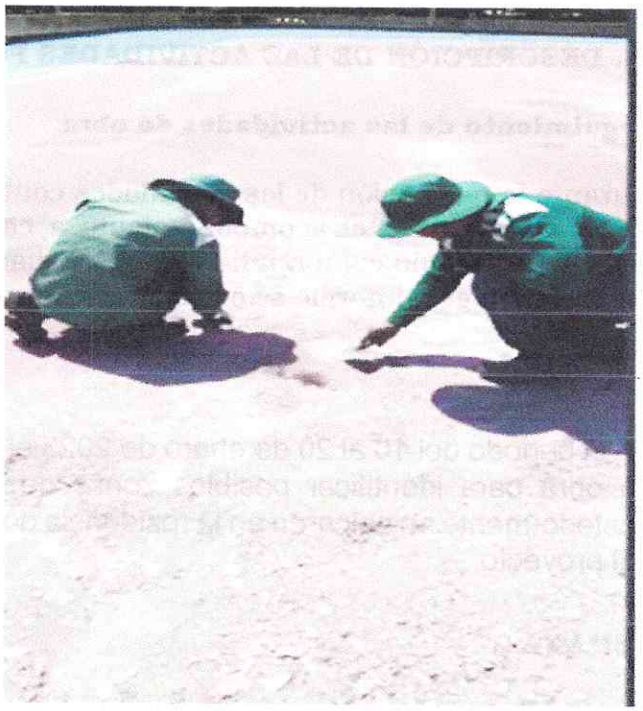



Imagenes: limpieza y lavado de pista, aplicación de mortero autonivelante

Se inicio con el desmonte de las láminas en mal estado para luego reponerlas con una lámina nueva.





Imagen: laminas desmontadas en mal estado

Se aplico las primeras bases, de polímero para la nivelación de las pistas, posteriormente se instalaron las láminas que se desinstalaron.





Imagenes: aplicación de base y primera capa de polímero





Imagen: aplicación de base y primera capa de polímero



Imagen: instalación de láminas de protección

Luego de esto, se inició con la aplicación del polímero sintético en la pista plana, cuando estaba apto se inició con la demarcación de los bucles, círculos artísticos, etc. Aplicando los productos estipulados.



Imagen: aplicación de sintético en pista plana

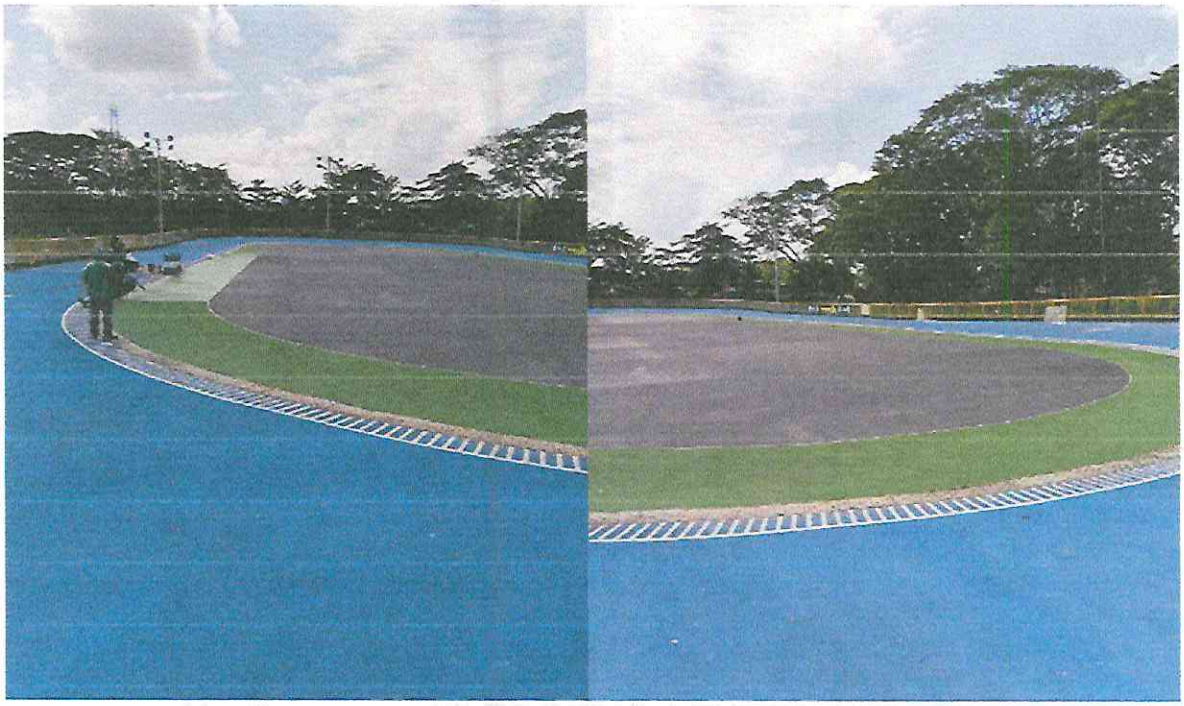




Imagen: aplicación de sintético en pista plana







Imagen: demarcación de círculos artísticos

Se le aplico la segunda mano del polímero en la pista plana y para niños, paralelamente se lava la pista de velocidad utilizando la hidro lavadora.



Imagen: segunda mano de polímero azul



Imagen: lavada y descontaminada de la pista de velocidad

SEMANA 3

Se procede con el inicio de la CUARTA FASE (instalación y aplicación de nuevos productos en pista de velocidad)

1. Obturación de puntos específicos, dilataciones y espejos de agua con mortero autonivelante.
2. Aplicación de capa base sobre los puntos obturados.
3. Aplicación de dos manos de recubrimiento sintético látex AR color azul.
4. Ajuste de reductores despegados y reemplazo de 60 nuevos reductores como valor agregado de Active recreación S.A.S.

Adicionalmente se demarcaron los círculos artísticos, buckles y líneas blancas de la pista plana



Imagen: aplicación de recubrimiento azul



Imagen: obturación de puntos específicos y dilataciones



Imagen: demarcacion de lineas blancas



Imagen: demarcación de línea de meta y contra meta



Imagen: instalación de reductores

El día miércoles 1 febrero, se termina el aseo general de la obra y se realiza visita técnica con el Secretario de Obras Publicas de la Alcaldía de Puerto Boyacá, el gerente de proyectos y el gerente general de la empresa, para realizar la entrega de la obra a satisfacción al municipio de puerto Boyacá, Boyacá. El día 02 de febrero de 2023 se firma el acta de recibo final de obra.

RELACION DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

EL Personal que laboró en el contrato en referencia fue el siguiente:

- Director de obra: Arq. Iván David Lema Bernal
- Obreros:
  1. Maestro: Héctor Hérnan Muñoz Duque
  2. Maestro Recubrimiento: Elver Luis Silgado Moguea
  3. Oficial: Constantino de Jesús Castrillón Osorio.
  4. Ayudante entendido: Dairo Adolfo Ceballos Acevedo
  5. Ayudante entendido: Jaime Alberto Hernández Osorio.

Por medio de este informe se presentan los papeles pedidos por el municipio de puerto Boyacá por temas de seguridad y salud en el trabajo; del personal presente en obra, como lo es:

- Entrega de dotación de personal.
- Exámenes de ingreso
- Soporte de charlas 5 minutos.
- Contratos actuales.

Dotación de EPP al personal

ACTIVE... CONSTRUCCIONES CIVILES Y DEPORTIVAS	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión 01
		Página 1 de 1

Me comprometo a utilizar los elementos de protección que me han sido suministrados para el desempeño de mis funciones y actividades dentro del área de trabajo. He sido instruido sobre la manera correcta de su uso y mantenimiento, igualmente me comprometo a mantenerlos en buen estado y reportar cualquier anomalía al jefe inmediato, para su reposición, dando cumplimiento de la normativa legal vigente (Ley 1562)

FECHA	No CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL SUMINISTRADO	CANTIDAD	RIESGO A PROTEGER	FIRMA
24/11/22	3588785	Dairo ceballos	casco con Barbuejo	1	Trabajo en altura	
			Arnes de Seguridad	1	Trabajo en altura	
			Eslinga en Y	1	Trabajo en altura	
19/01/23			Guante poliester	1	Herida	
			Gafas oscuras	1	Molestia particulas	
			Guante latex	4	Herida	

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: _____

ACTIVE... CONSTRUCCIONES CIVILES Y DEPORTIVAS	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión: 01
		Página 1 de 1

Me comprometo a utilizar los elementos de protección que me han sido suministrados para el desempeño de mis funciones y actividades dentro del área de trabajo. He sido instruido sobre la manera correcta de su uso y mantenimiento, igualmente me comprometo a mantenerlos en buen estado y reportar cualquier anomalía al jefe inmediato, para su reposición, dando cumplimiento de la normativa legal vigente (Ley 1562)

FECHA	No CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL SUMINISTRADO	CANTIDAD	RIESGO A PROTEGER	FIRMA
10/10/22	11688738	Hector Hernan Muñoz	Guante nitrilo	1 par	Golpes, Heridas	Hernán Hernán
19/01/23			Guante poliester	1	Herida	Hernán Hernán
			Gafas oscuras	1	Material particulado	Hernán Hernán
06/12/22	1000539628	Diego Berrio	Guante poliester	1		Diego B
			Gafas claras	1		Diego B
			Tapaboca	1		Diego B
			Casco con barbuejo	1		Diego B

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: _____

ACTIVE... CONSTRUCCIONES CIVILES Y DEPORTIVAS	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión 01 Página 1 de 1

Me comprometo a utilizar los elementos de protección que me han sido suministrados para el desempeño de mis funciones y actividades dentro del área de trabajo. He sido instruido sobre la manera correcta de su uso y mantenimiento, igualmente me comprometo a mantenerlos en buen estado y reportar cualquier anomalía al jefe inmediato, para su reposición, dando cumplimento de la normativa legal vigente (Ley 1562)

FECHA	No CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL SUMINISTRADO	CANTIDAD	RIESGO A PROTEGER	FIRMA
6/09/22	40853204	Jaime Hernandez	Gafa clara	1	Proyección Particulas	Jaime H
6/09/22	40853204	Jaime Hernandez	P. Auditivo	Par	Ruido	Jaime H
19/01/22	"	"	Guante nitrilo	1 par	Herida	Jaime H
"	"	"	Gafas Oscuras	1	Proyección Particulas	Jaime H
"	"	"	Gafa clara	1	Particulas	Jaime H

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: _____

ACTIVE... CONSTRUCCIONES CIVILES Y DEPORTIVAS	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión 01 Página 1 de 1

Me comprometo a utilizar los elementos de protección que me han sido suministrados para el desempeño de mis funciones y actividades dentro del área de trabajo. He sido instruido sobre la manera correcta de su uso y mantenimiento, igualmente me comprometo a mantenerlos en buen estado y reportar cualquier anomalía al jefe inmediato, para su reposición, dando cumplimento de la normativa legal vigente (Ley 1562)

FECHA	No CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL SUMINISTRADO	CANTIDAD	RIESGO A PROTEGER	FIRMA
6/09/22	71262694	Elver Silgado	Gafa clara	1	Proyección Particula	Elver Silgado
6/09/22	71262694	Elver Silgado	P. Auditivo	par	Ruido	Elver Silgado
			Guante Nitrilo	1 par	Herida	Elver Silgado
			Gafas Oscuras	1	Proyección Particula	Elver Silgado
19/01/23			Guante poliester	1		Elver Silgado
			Gafas Oscuras	1		Elver Silgado

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: _____

Carrera 2 Calle 10 Esquina, Edificio Municipal – Teléfono (098) 7 38 46 45 – Cel. 311 592 79 91
E-mail: secplanmpal@puertoboyaca-boyaca.gov.co, contactenos@puertoboyaca-boyaca.gov.co
www.puertoboyaca-boyaca.gov.co

ACTIVE

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Mediante presente le hacemos entrega de los elementos de protección que le han sido suministrados para el desempeño de sus funciones y exigirá los cuidados del mismo. Igualmente le hacemos saber la manera correcta de su uso y mantenimiento, garantizando así elementos en buen estado y reportando cualquier anomalía. El no cumplimiento de la normativa implementada (Ley 1562

FECHA	No. CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	SUMINISTRO DE PROTECCION PERSONAL SUMINISTRADO	CANTIDAD	RIESGO A PROTEGER	FIRMA
24/01/22	3171204	Constantino de la Castella	Guantes	1		Firma
24/01/22	3171204	Constantino Castella	Gafas	1		Firma
24/01/22	3171204	Constantino Castella	Tapabocas	1		Firma
19/03/22	3171204	Constantino	Guante latex	1		Firma
04/03/22	3171204	Constantino Castella	Guante latex	1		Firma
19/01/23			Guante poliester	1		Firma
			Gafas Oswras	1		Firma

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: Kelly Castañeda SST

Asistencia a capacitaciones

ACTIVE S.A.S CONSTRUCCIONES CIVILES Y DEPORTIVAS	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	Versión: 01 Mayo de 2019

FECHA 17/01/2023 HORA 7:00 Am DURACIÓN 1 hora

FORMADOR Estefany Aristizabal

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN Socialización Reglamento interno de trabajo

Se lee y explica el reglamento interno de trabajo.

TEMAS TRATADOS

ASISTENTES

#	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	35508.735	Dairo Cebellos	Auxiliar	
2	1000539628	Diego Alexander B.	Ayudante	Diego B.
3	7085324	Jaime H	Auxiliar	Jaime H
4	7126284	Gilberto Silgado	Oficial	Gilberto S.
5	1046933786	Johan Sebastian Agudelo	Ayudante	
6	1012 16.28	Andres P. B	Ayudant	Andres P. B.
7	7171	Constantino	Of.	Constantino
8	71668736	Hector Hernan Munoz	Maestro	Hernan Munoz
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES:

LUIS ALBERTO PINTO MERCADO
Secretario de Obras Públicas

Elaboro: Ing. Luis Alberto Pinto Mercado
Reviso y Aprobó: Ing. Luis Alberto Pinto Mercado
