INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Gestión Corporativa Regional Oriente

FECHA INFORME:
Día: 21 Mes: 12. Año: 2.022 .
CONTRATO N° 400-MC-37-2.022.
FECHA FIRMA: Día: 23. Mes: 11. Año 2.022.
OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS MISMOS PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL ORIENTE DEL INPEC UBICADA EN LA CARRERA 36 # 51 -80 BARRIO CABECERA DE BUCARAMANGA

FECHA DEL ACTA DE INICIO:
Día 28. Mes: 11. Año: 2.022.
AVANCE CONTRATO:
Días: 24
Porcentaje 50%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No: X Sí ____.
Descripción sucintamente de los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
Es de mencionar que hechos de incumplimiento a la fecha no se han presentado, pero debido al surgimiento de situaciones relacionadas con la dificultad en la consecución de algunas materias primas debido a que las fábricas se encuentran programando las vacaciones para fin de año y las restricciones en los horarios de tránsito de vehículos de transporte de carga, en las carreteras a nivel nacional, hubo la necesidad de plantear una prorroga en tiempo al contrato.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí **X.**

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No: **x**. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

No se vio la necesidad teniendo en cuenta que por razones del objeto del contrato se acordó se realizaría en 2 entregas, debido a las dificultades presentadas con respecto a la consecución de algunas materias primas.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí: **X.**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO CONTRATADO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA
1	***ESCRITORIO TIPO SUPERFICIE DE TRABAJO E-1*** :Puesto de trabajo de 1.00 m a 1,20m de largo x 0.60 m de ancho x 0.75m de alto, incluye: Superficie de trabajo rectangular en tablex color a seleccionar de 1,00 m a 1,20 m de largo x 0.60 m de ancho y una altura de 0.75 m, calibre 30mm en madera industrial enchapado en laminado de alta presión, balance y canto rígido termo fundido,Estructura de soporte metálica fabricada el cold rolled calibre 20 acabado pintura electrostática, llave con sistema de conducción de cableado, cajonera metálica 2M 1AF-37 H 64 con un total de tres (3) cajones; color gris claro; incluye: canaleta para cableado, niveladores de piso tanto en escritorio como en la cajonera, accesorios para su correcto funcionamiento, divisor frontal en vidrio templado con adhesivo tipo sand blasting de 1,00 m a 1.20 m de ancho x 0.40 m de alto y 1.50 cm de espesor (incluye soporte y anclaje) y divisor lateral en vidrio templado con adhesivo tipo sand blasting de 0.60 m de ancho x 0.40 m de alto y 1,50 cms de espesor (incluye soporte y anclaje) con terminación curva en la esquina superior frontal.	UND	7	$ 987.251	$ 6.910.757	2	$ 1.974.502
2	***ESCRITORIO TIPO SUPERFICIE DE TRABAJO E-2:*** Puesto de trabajo de 1.00 m a 1,20m de largo x 0.60 m de ancho x 0.75m de alto, incluye: Superficie de trabajo rectangular en tablex color a seleccionar de 1,00 m a 1,20 m de largo x 0.60 m de ancho y una altura de 0.75 m, calibre 30mm en madera industrial enchapado en laminado de alta presión, balance y canto rígido termo fundido, Estructura de soporte metálica fabricada el cold rolled calibre 20 acabado pintura electrostática, llave con sistema de conducción de cableado,Con cajonera metálica 2M 1AF-37 H 64 con un total de tres (3) cajones; color gris claro; incluye: canaleta para cableado, niveladores de piso tanto en escritorio como en la cajonera, accesorios para su correcto funcionamiento, divisor lateral en vidrio templado con adhesivo tipo sand blasting de 0.60 m de ancho x 0.40 m de alto y 1,50 cms de espesor (incluye soportes y anclajes)con terminación curva en la esquina superior frontal.	UND	14	$ 812.614	$ 11.376.596	10	$ 8.126.140
3	***ESCRITORIO EN "L"*** :Puestos de trabajo tipo profesional con disposición en "L": Con medida de superficie principal 1,50 m x 0,60 m con adyacente de retorno 0.70 x 0.60m; en aglomerado enchapado en formica alta presión, balance y canto recto termo fundido, altura superficies de trabajo (tolerancia +/-10mm) 0.75 m, altura mínima inferior del borde de la mesa 0.60 m, profundidad mínima de los planos de la mesa 0.60m. El tablero o superficie rectangular; debe tener ductos que permita, oculte y facilite el cableado entre las tomas, la CPU y los periféricos; los ductos deberán garantizar la independencia de cada uno de los puestos de trabajo en caso de una redistribución futura de mobiliario; el color de la estructura y superficie se definirá en sitio. Estructura de soporte metálica fabricada el cold rolled calibre 18 acabado pintura electrostática, llave con sistema de conducción de cableado, cajonera metálica 2M 1AF-37 H 64 con un total de tres (3) cajones; color gris claro similares a los existentes; incluye canaleta para cableado, niveladores de piso tanto en escritorio como en la cajonera y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1	$ 1.007.908	$ 1.007.908	1	$ 1.007.908
VALOR EJECUTADO A LA FECHA:							$ 11.108.550

Es de aclarar con respecto a los Divisores laterales en vidrio templado de los escritorios de trabajo tipo E-1 y E-2: que con el objeto que las superficies de trabajo fueran aprovechadas óptimamente solo se instalará 1 por puesto de trabajo que se encuentre contiguo y no se instalará este elemento en los puestos que sean ubicados paralelos a la pared.

Así mismo con respecto a la instalación del Divisor Frontal que se ubicaría en 5 de los escritorios tipo superficie de trabajo E-2, a ser localizados en la oficina de Control Único Disciplinario se determina por causa a razones de cambio en la distribución de los escritorios, funcionalidad y optimización del espacio: no instalarlos, pero sin embargo según lo determinado por el Señor Director Regional se deja la posibilidad de que en 2 de los escritorios de este tipo que fueron situados de frente por razón de permitir la atención al público, fueran en un futuro instalados pues así se acordó con la firma contratista, quien los entregó para ser guardados en el almacén.

De otra parte, con respecto a la instalación de los 3 escritorios de trabajo tipo E-2 ubicados en la oficina de Demandas y Conciliaciones, se determina también por causa de lo estrecho del espacio no instalar los divisores laterales en vidrio templado.

Anexos:
Registro fotográfico.

ARQ. LAURA VICTORIA AMAYA SUAREZ
C.C. No.63.362.910
Profesional Universitario Gestión Corporativa
Regional Oriente INPEC

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME PARCIAL CONTRATO No. 400-mc-37-2022:

Llegada de los puestos de Trabajo a la sede de la Dirección Regional Oriente del INPEC:





Instalación de los puestos de trabajo en la oficina de Secretaria de Dirección






Instalación puestos de trabajo en la Oficina de Demandas y Conciliaciones:

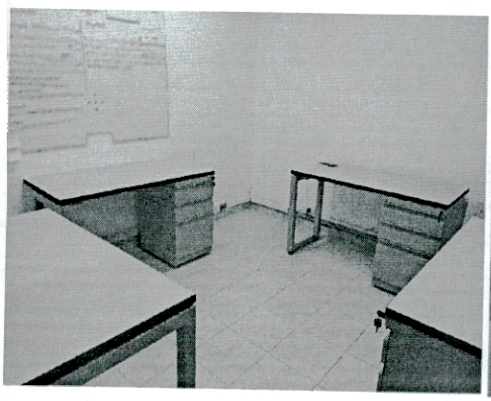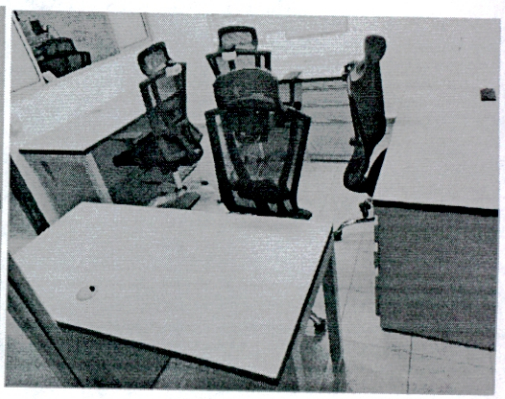

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

REGISTRO FOTOGRAFICO: INFORME PARCIAL

CONTRATO No. 400-mc-37-2022

Instalación puestos de trabajo en la oficina de Jurídica:

