FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA
PROCESO
EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 10/12/2022 (dd-mm-aa) **AL** 16/12/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 1009 de 2022

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 – 2022"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 - 2022."

CONTRATISTA DE OBRA: BUILDING SAS **NIT** 804.002.715-3

INTERVENTOR: INPLAYCO SAS **NIT** 860.524.168-8

CONTRATO DE OBRA	
Valor Inicial	$ 3.600.000.000,00
Valor Adicional 1	$ 1.602.000.000,00
Valor Adicional 2	N.A
Valor Actualizado	$ 5.202.000.000,00
Plazo Inicial	4 Meses
Plazo Prórroga 1	2 Meses y 15 dias
Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	6 Meses 15 dias
Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2022
Fecha de Terminación según Prórroga	15/03/2023
Fecha de Terminación según Prórroga	N.A.
Fecha de Terminación Actual	15/03/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 432.000.000,00
Valor Adicional 1	$ 192.240.000,00
Valor Adicional 2	N.A
Valor Actualizado	$ 624.240.000,00
Plazo Inicial	5 Meses
Plazo Prorroga 1	2 Meses y 15 dias
Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	6 Meses 15 dias
Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/01/2023
Fecha de Terminación según Prórroga	15/04/2023
Fecha de Terminación según Prórroga :	N.A.
Fecha de Terminación Actual	15/04/2023


SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: CAMILA CORTES DAZA


2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA


2.1. AVANCES DE EJECUCIÓN VALIDACIONES

AVANCE FÍSICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

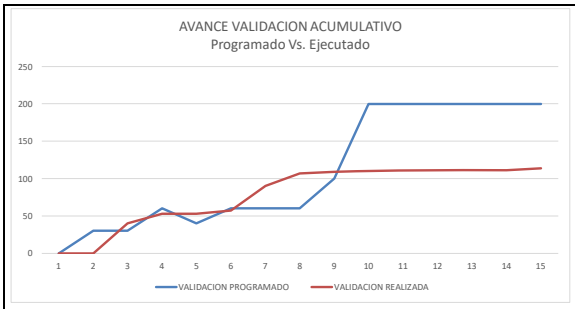

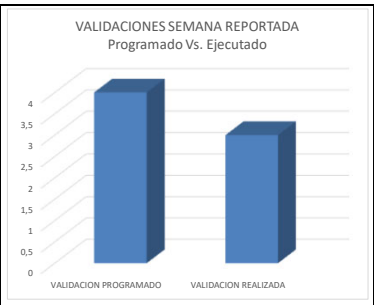

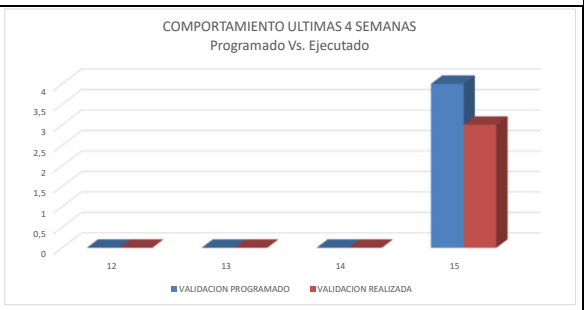

	Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)						Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	SEM 12	Prog.	Ejec.	SEM 13	Prog.	Ejec.	SEM 14	Prog.	Ejec.	SEM 15	Prog.	Ejec.
Cantidad Validaciones	200	100%	114	57,0%	0,00%	-43,00%	4	3	0,00%	25,00%		0	0		0	0		0	0		4	3


OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

1. Se evidencia que con respecto a la ultima semana de ejecucion el Contratista de obra realizo 3 validaciones, con esto se incrementa a 114 MV validados lo que refiere a un 57,0% que según lo programado se presenta un atraso general del contrato del 43,0% frente a la etapa de validaciones.
2. Con respecto a la grafica No. 2 la cual indica el porcentaje de validación durante la semana, esta presenta atraso del 25% con respecto a la semana, teniendo en cuenta que segun la programacion esta semana se debian validar 4 viviendas de las cuales se validaron 3 viviendas.
3. Según la programación actual se evidencia que a la fecha el contratista de obra presenta un atraso general frente a la etapa de validaciones del 43,0% del total de las viviendas adjudicadas al contrato 994 de 2022.


2.2. AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES

AVANCE FÍSICO APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

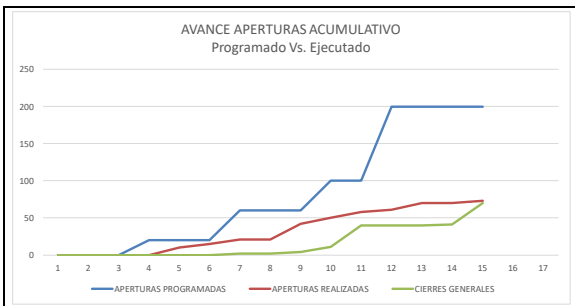



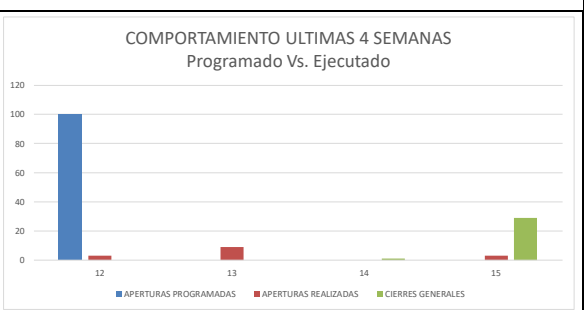

	Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)						Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	SEM 12	Prog.	Ejec.	SEM 13	Prog.	Ejec.	SEM 14	Prog.	Ejec.	SEM 15	Prog.	Ejec.
Cantidad de Aperturas	200	100%	73	36,5%	0,0%	-63,50%	0	0	0,00%	0,00%		40	8		0	8		0	0		0	3

FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA
PROCESO
EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 10/12/2022 (dd-mm-aa) **AL** 16/12/2022 (dd-mm-aa)


CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 1009 de 2022

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

1. El Contratista de obra durante la ultima semana no presenta aperturas según la programacion. Cabe aclarar que a la fecha tenia que haber realizado la apertura de la totalidad de las viviendas, por lo tanto esto presenta un atraso del 63,5% frente a la etapa de ejecucion.
2. Según la programación de obra que presento el Contratista Building SAS, indica que a la fecha segun dicha programacion se deben tener 200 viviendas aperturadas de las cuales se aperturaron 73 viviendas, teniendo 70 mv entregados a satisfaccion y 3 viviendas en ejecucion. Debido al poco avance en la ejecucion del contrato que se esta presentando por el Contratista de obra se solicita dar inicio a mas viviendas para mitigar los atrasos que se estan presentando a la fecha.

2.3. AVANCES DE EJECUCIÓN FINANCIERO

AVANCE DE EJECUCION FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

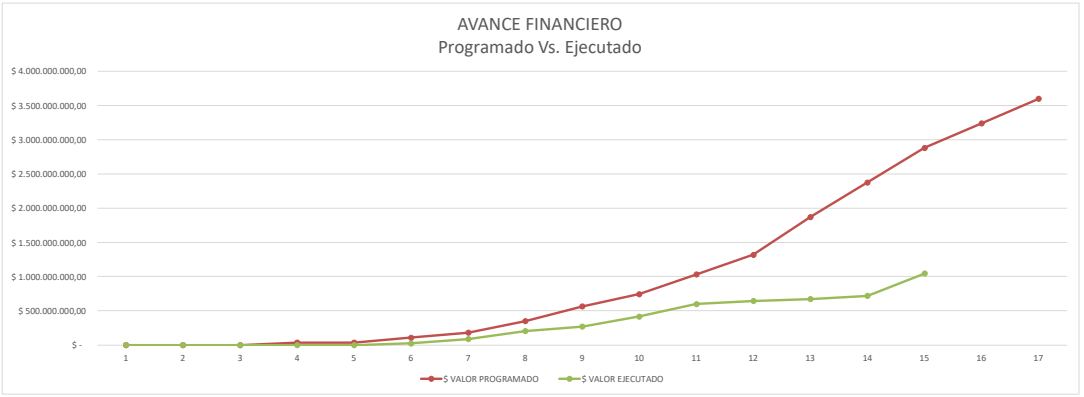

VALOR INVERSION SEGÚN FLUJO DE CAJA

INVERSION SEMANAL

PROGRAMADA	VS.	EJECUTADA
$ 504.000.000		**$ 147.702.259,97**
% AVANCE PROGRAMADO	**VS.**	**% AVANCE EJECUTADO**
14,00%		**4,10%**

INVERSION ACUMULADA

PROGRAMADA	VS.	EJECUTADA
$ 2.880.000.000		**$ 1.045.863.744,73**
% AVANCE PROGRAMADO	**VS.**	**% AVANCE EJECUTADO**
80,00%		**29,05%**

ATRAZO O ADELANTO GENERAL EN PESOS ($):
$ 1.834.136.255,27

ATRAZO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%): **-50,95%**

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

1. Según la programación vigentea la fecha y flujo de caja presentados por el Contratista de obra, en el momento se esta presentando un atraso según lo ejecutado de $1.834.136.255,27 lo que hace referencia a un -50,95% de atraso frente al valor total del contrato.

3. ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

	ID_MV	DESCRIPCION DEL ASUNTO	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA EN EL	MVBF_1081	Desde el area social se realiza seguimiento diario debido a las inconformidades presentadas por el beneficiario por las demoras de las obras, perdida de elementos de la vivienda según el beneficiario.	Se levanta PQR a la cual se realiza seguimiento diario con anotacion en bitacora.	ABIERTA
SEMANA X				
SEMANA X				

4. RELACIÓN DE RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativas)

	ID_MV	MOTIVO DE LA RENUNCIA Y/O NO EJECUCIÓN	No. DE RADICADO A LA SDHT Y FECHA
SEMANA 2	MVBF_801	BENEFICIARIA AMPARO TIQUE ROMERO IDENTIFICADA CON C.C. 52152205, SE RECIBE INFORMACION DE RENUNCIA REALIZADA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT.	1-2022-39168 - 22 /09/ 2022
	MVBF_1100	BENEFICIARIA OLGA LUCIA LOZANO CERQUERA IDENTIFICADA CON C.C. 26473801, SE RECIBE INFORMACION DE RENUNCIA REALIZADA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT.	1-2022-38912 - 22/09/2022
SEMANA X			
SEMANA X			

Building SAS / INPLAYCO S.A.S.	FORMATO **INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 10/12/2022 (dd-mm-aa) **AL** 16/12/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 1009 de 2022

5. RELACION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativas)

	ID_MV	BREVE DESCRIPCION DE LA PQR (anexar copia del PQR)	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA 12	MVBF_1081	El beneficiario muestra conformidad con las actividades que se vienen realizando, aunque informa que no recibirá al final las obras, debido a una perdida de herramientas que no justifica haber tenido en la vivienda.	Se continua con seguimiento a la vivienda diario de acuerdo a los compromisos adquiridos con el beneficiario. PQR abierta el 22 de noviembre de 2022.	ABIERTA
	MVBF_0840	Se levanta PQR por parte de la beneficia e interventoria debido a la falta de continuidad en las obras, lo que ha generado demoras en las mismas.	Se continua con seguimiento a la vivienda diario de acuerdo a los compromisos adquiridos con el beneficiario, de seja anotacion en bitacora. PQR abierta el 9 de diciembre de 2022.	ABIERTA
SEMANA 15	MVBF_0975	LUIS HERNANDO SALCEDO ZAMUDIO asiste a la reunion con la JAC el beneficiario manifiesta inconformidad con algunas actividades ejecutadas en la vivienda.	Se acuerda con beneficiario algunos cambios en actividades de la vivienda. Pendiente cierre de PQR.	ABIERTA
	MVBF_1130	JUAN DE JESUS CEDANO , beneficiario manifiesta que maestro del contrato se acerco a la vivienda a pedir unas herramientas que estaba bajo la custodia de el entregadas por otro maestro que jecutò la vivienda. se presenta un altercado y ambos se agreden fisica y verbalmente, ocasionando que se partieran vidrios en la ventana d ela vivienda.	Se levanta la queja con fecha de 14 dic 22 oficialmente debido a que la vivienda presenta afetaciones.	ABIERTA
SEMANA X				

6. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORIA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

1. ATENCIÓN A LA COMUNIDAD ATENCIÓN PAC: El día lunes 12 de diciembre de 2022. Se acerca al PAC la señora: Raquel Méndez Peña, quien es beneficiaria del mejoramiento de vivienda con el MVBF_0286 para averiguar cuando iniciarían obras en su vivienda. Se le informa que una vez se termine el grupo de casas que actualmente están en programación y ejecución la profesional social de contratista se comunicará con ella para concertar visita de validación técnica y social. La señora reside en la Calle 74B A sur 26 F -28 y deja el siguiente número de celular: 3222231450 para que el equipo técnico social contratista que corresponda se comunique

2. ACOMPAÑAMIENTO A VALIDACIONES: Durante la semana se realizaron **4 validaciones**, se realiza el acompañamiento tecniso y social a la actividad, veririfanco que se diligencien los formatos correspondientes. MVBF_1013, MVBF_675, MVBF_0677, MVBF_676.

3. ACOMPAÑAMIENTO APERTURAS DE OBRA: se realizò acompañamiento y supervisiòn desde el area social de la interventoria a las **3 apertura** de obras, con los siguientes mv:
MVBF_983, MVBF_0727 y MVBF_1213.

4. ACOMPAÑAMIENTO A ENTREGAS: se realizo acompañamiento y supervision desde el area social de la interventoria a VEINTINUEVE **entrega (29)** de obras, con el siguientes MV:
MVBF_1001
MVBF_1096
MVBF_1200
MVBF_1264
MVBF_1280
MVBF_1295
MVBF_1302
MVBF_1339
MVBF_536
MVBF_588
MVBF_589
MVBF_835
MVBF_853
MVBF_950
MVBF_983
MVBF_0531
MVBF_1148
MVBF_0719
MVBF_0727
MVBF_0952
MVBF_0990
MVBF_1050

5. SEGUIMIENTOS A VIVIENDAS RELEVANTES: MVBF_1280 Se realiza visita de seguimiento por parte del área social y técnica de contratista e interventoria donde se evidencia personal y material de obra. De igual forma se observa que se están adelantado actividades de mejoramiento en el área de sala - comedor. Se le pregunta a la beneficiaria sobre su percepción frente el proceso y avances que se han realizado en su viviendo y refiere estar satisfecha con los avances y pide a los profesionales técnicos resolver dudas en cuanto allá instalación de enchape de piso en el área antes mencionada. Estas dudas son resueltas por el área técnica quien a su vez solicita al personal de obra cumplir adecuadamente con las especificaciones técnicas establecidas para las intervenciones en las áreas priorizada de la vivienda. **MVBF_1264** Se realiza visita de seguimiento por parte del área social y técnica de contratista e interventoría donde se evidencia material de obra. En el momento de la visita no se observa el personal de obra. Sin embargo, se evidencia avance de actividades en áreas de la cocina y habitaciones. Se indaga al beneficiario si tiene alguna observación o duda con respecto a la ejecución de obras en su vivienda y refiere que hasta al momento comenta que está satisfecho con el personal de obra que trabaja en su casa.

6. Durante la presente semana se realizo la modificacion al contrato la cual indica adicion y prorroga del mismo la cual consta de 89 Mejoramientos adicionales para ejecutar en dos meses y quince dias, por tal motivo se le solicito al Contratista de Obra presentar la programacion ajustada y de igual manera el flujo de caja actualizado.

5. COMPONENTE AMBIENTAL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

DISPOSICIÓN RCD M3		ESCOMBRERA (indicar nombre y No. Autorización)	No. DE VALE ESCOMBRERA, PIN Y PLACA VOLQUETA
SEMANA 15	**0 M3**	No realizado	N/A
MES	**Diciembre**		
SECTOR	**BF**		
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	**12**	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	**36**

DISPOSICION RESIDUOS PELIGROSOS M3		CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA
SEMANA 15	**0 M3**	Se evicencia la recolección de empaques de cemento y pegante cerámico en la bodega No se ha realizado disposición de RESPEL
MES	**Diciembre**	
SECTOR	**BF**	
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	**0 M3**	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO **0 M3**

FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA
PROCESO
EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 10/12/2022 (dd-mm-aa) **AL** 16/12/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 1009 de 2022

- Se refuerza al personal operativo con la charla sobre Condiciones inseguras y el personal profesionales charla sobre hábitos seguros; desde el componente ambiental medidas para evitar el aporte de residuos contaminantes al alcantarillad de las viviendas y orden y limpieza sin consecuencias.
- Se realiza seguimiento al uso de EPP del personal operativo en la ejecución de las actividades y queda registro en los formatos de inspección y bitácoras.
- Se da cumplimiento con las inspecciones programadas de acuerdo al plan de trabajo donde están incluidas las inspecciones de herramientas utilizadas en la labor, las inspecciones de escaleras y andamios que son utilizados en actividades d pañete y pintura y cuando se realiza cubiertas; las inspecciones de orden y aseo para determinar que las labores sean ejecutadas en un espacio libre de desorden que puedan generar un posible incidente o accidente.
- Se cumple con el cronograma del plan de trabajo en base a las inspecciones: de las pulidoras, taladros, andamios y escaleras multifuncionales, orden y aseo y de Uso de EPP.
- No hubo ingresos de personal, por tal razón no es posible dar cumplimiento al plan de trabajo programado con respecto a las inducciones, notificación de riesgos y diligenciamiento de los perfiles sociodemográficos.
- Se continua con 9 personas extranjeras activas debidamente legalizadas con PPT.
- Durante la semana no se realizaron instalaciones de cubiertas a distinto nivel menor a 2mts.
- Se retira una persona del área administrativa y se procede con la solitud de paz y salvo.
- Se realiza acompañamiento a las viviendas con el área técnica y social y se evidencia espacios en orden y con su material compilado en un solo lugar.
- Se realiza diligenciamiento de formatos libres de escombros y se evidencia que las casas son entregadas sin escombros, dentro y fuera de los MV.
- Por las áreas involucradas se hace el seguimiento de los PQR interpuestos por la comunidad para dar solución y subsanar las inconformidades.
- Se mantiene el acopio en la bodega de los RESPEL entre ellos: bolsas de cemento, bolsas de pegante, tarros de pintura y tarros de anticorrosivos para completar la cantidad solicitada por el Proveedor contactado para su disposición final.
- La interventoría recibe charla sobre Riesgo Locativo y se realizan ejercicios de estiramiento.
- Se hace acompañamiento SST-MA en las aperturas y seguimientos de vivienda, se ha recalcado el cuidado especial que se debe tener por el riesgo publico inminente en el sector.
- Se deja anotación en Bitácora sobre las prevenciones que debe tomar el contratista para actividades con riesgo de caída a diferente nivel.
- Durante la entrega de las viviendas por terminación de los mejoramientos se aseguró que no quedaran RCD en los frentes de las casas ni dentro de las mismas.

6. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

CONTRATISTA DE OBRA						INTERVENTORIA					
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	4	CAPACITACIONES REALIZADAS	4	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0	CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CAPACITACIONES REALIZADAS	1	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBREROS)			55	PERSONAL ADMINISTRATIVO	11						
PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORIA				14	
PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1						

9. ANEXOS

ANEXO 1: CONSOLIDADO TECNICO
ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SOCIAL.

Nota: Si lo requiere.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas previamente, en Bogotá, D.C., a los DIECINUEVE (Día en letras) 19 (Día en números) días del mes del DICIEMBRE (Mes en letras) de 2022 (Año de firma del informe)

Firma

Nombr (Nombre) Arq. CESAR A FUENMAYOR.
Cargo: Director de Interventoría

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO 1

Consolidado Técnico

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL	Fecha	19-dic-22

BUILDING SAS			
Contrato de Obra	**994 - 2022**	**Fecha de Inicio**	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Objeto	**"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 – 2022"**	**Fecha de Terminacion**	31 DE DICIEMBRE DE 2022
		Plazo Inicial	CUATRO (4) MESES
		Valor del contrato	**TRES MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.600.000.000) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.			
Contrato de interventoría	**1009 - 2022**	**Fecha de Inicio**	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Objeto	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 - 2022."**	**Fecha de Terminacion**	31 DE ENERO DE 2023
		Plazo Inicial	CINCO (5) MESES
		Valor del contrato	**CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($432.000.000) M/Cte**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT							Fase 2: Ejecución de obras					
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validacion**		**Ejecución**					
					Validada	V/Por Validar	En Ejecución	Terminadas	Renuncias	Por	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
		BELLA FLOR	17	**200**	17	0	0	16	0	1	94,12%	16
	Arq Luisa Franco		61		40	21	0	22	0	39	36,07%	22
	Ing Martha Neira		60		34	26	2	18	0	40	33,08%	18
	Arq. Edwin Baez		62		23	39	1	14	0	47	24,03%	14
Subtotal			**200**	**200**	**114**	**86**	**3**	**70**	**0**	**127**	**46,82%**	**70**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL											DICIEMBRE
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**		**Tiempo Programación**				**% ACUMULADO**	SEMANA DEL 10 AL 16
No. Etiq.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	Valor Inicial	Valor Liquidado	Fecha Validacion	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 15**
BARRIO BELLA FLOR											
GRUPO No. 1											
4	MVBF_1195	KR 27 BIS A 73D 87 SUR MJ	DOLY ARGENIS RIVERA AVIRAMA			20-sep-22			VALIDADA	0,00%	0,00%
5	MVBF_1196	KR 27 BIS A 73D 83 SUR MJ	INES SOFIA REYES CASTRO	$14.369.650,00	$14.395.216,00	19-sep-22	12/10/2022	8/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
6	MVBF_1197	KR 27 BIS A 73D 79 SUR MJ 1	LEIDY ALEJANDRA PALACIOS REYES	$13.769.930,00	$14.370.476,00	19-sep-22	7/10/2022	16/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
7	MVBF_1200	KR 27 BIS A 73D 75 SUR	SANDRA PAOLA BEJARANO REYES	$14.396.371,00	$14.400.000,00	19-sep-22	2/11/2022	20/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,17%
10	MVBF_1166	CL 73D BIS A SUR 27 28	MERCEDES VASQUEZ BONILLA	$14.399.376,00	$14.399.379,00	20-sep-22	5/10/2022	16/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
11	MVBF_1167	CL 73D BIS A SUR 27 22 MJ	NICOL JOHANA SUNCE GUARNIZO	$14.358.554,00	$14.400.000,00	19-sep-22	21/10/2022	16/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
12	MVBF_1149	CL 73D SUR 27 75	GUSTAVO MONROY FONSECA	$14.258.458,00	$14.399.470,00	20-sep-22	5/10/2022	8/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%

13	MVBF_1155	CL 73D BIS A SUR 27A 50	ANA FELIZ DIAZ PATIÑO	$14.381.322,00	$14.400.000,00	20-sep-22	5/10/2022	16/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
14	MVBF_1191	KR 27B 74A 06 SUR	CARMEN ELISA TOLOSA CEPEDA	$14.397.146,00	$14.400.000,00	20-sep-22	21/10/2022	12/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	9,56%
43	MVBF_1302	CL 73A SUR 26F 33 MJ	ANGIE YURLEY RUIZ VEGA	$14.381.643,00	$14.400.000,00	19/10/2022	4/11/2022	15/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	2,76%
44	MVBF_1303	CL 73A SUR 26F 45 MJ	ANAYIBE CASTRO	$14.398.840,00	$14.400.000,00	19/10/2022	4/11/2022	7/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
47	MVBF_1264	CL 73B SUR 26F15 MJ	JOSÉ ALONSO MUÑOZ SCARPETTA	$14.373.000,00	$14.400.000,00	27/10/2022	7/12/2022	14/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	54,20%
48	MVBF_1270	CL 73B SUR 26F 03	ANA AURORA BECERRA VARGAS	$14.372.322,00	$14.400.000,00	27/10/2022	6/12/2022	14/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	42,00%
50	MVBF_1295	KR 26F 73B 16 SUR	VIRGELINA RODRIGUEZ	$14.398.427,00	$14.400.000,00	31/10/2022	21/11/2022	13/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	8,54%
51	MVBF_1280	CL 73C SUR 26F 02	MARINA NAVAS ROJAS	$14.399.498,00	$14.400.000,00	27/10/2022	29/11/2022	13/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	49,00%
101	MVBF_1187	KR 27B 74 14 SUR MJ	MARIA OLINDA SARMIENTO CASTRO	$13.396.482,00	$14.352.138,00	13/10/2022	21/10/2022	15/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
102	MVBF_1427	CL 74 SUR 27B 06	MARY LUZ ARREDONDO GONZALEZ	$14.400.000,00	$14.398.350,00	13/10/2022	21/10/2022	17/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
GRUPO No. 2											
8	MVBF_1198	CL 73D BIS A SUR 27 33 MJ	CARMEN ELVIRA REYES CARO			19-sep-22			VALIDADA	0,00%	0,00%
9	MVBF_1201	CL 73D BIS A SUR 27 39 MJ	MARIANA ALEXANDRA VELANDIA VASQUEZ			20-sep-22			VALIDADA	0,00%	0,00%
15	MVBF_1148	CL 73 D SUR 27 45	LUZ MARINA PIRAGAUTA GRANADOS	$14.398.521,00	$14.398.521,00	28/9/2022	29/11/2022	15/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	45,00%
16	MVBF_1130	CL 73D SUR 27 50	JUAN DE JESUS SEDANO AYALA	$14.394.664,00	$14.396.664,00	26/9/2022	11/11/2022	18/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
17	MVBF_1128	CL 73D SUR 27 62	ISMELDA PEREZ GARCIA	$14.392.074,00	$14.395.263,00	26/9/2022	13/10/2022	2/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
18	MVBF_1141	CL 73 D SUR 27 91	BLANCA FLOR RINCON	$14.397.445,00	$14.398.134,00	28/9/2022	20/10/2022	25/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
19	MVBF_1121	CL 73 C BIS SUR 27 77	MARIA ELBA ARIAS BONILLA			26/9/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
20	MVBF_1110	CL 73 D SUR 27 86	FLOR TRIANA AVILA	$14.399.088,00	$14.397.014,00	26/9/2022	18/10/2022	15/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
21	MVBF_1108	CL 73C BIS SUR 27A 23	MARIA ODILIA MARTINEZ CABRERA	$14.390.758,00	$14.399.950,00	26/9/2022	13/10/2022	11/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
22	MVBF_1124	CL 73C BIS SUR 27A 11	HECTOR HERNANDO VELOSA	$14.000.000,00	$14.399.644,00	26/9/2022	5/10/2022	21/10/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
23	MVBF_1111	CL 73C BIS SUR 27 61 MJ	PAOLA ANDREA ORJUELA VIVAS	$14.000.000,00	$14.026.240,00	28/9/2022	7/10/2022	21/10/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
24	MVBF_1118	CL 73 C BIS SUR 27 55	LUIS ALBERTO CHITIVA CORTES	$14.394.090,00	$14.399.367,00	26/9/2022	16/11/2022	18/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
25	MVBF_1117	CL 73C BIS SUR 27 49	RAFAEL RODRIGUEZ ZAMORA	$14.398.893,00	$14.398.893,00	26/9/2022	11/11/2022	18/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
26	MVBF_1073	KR 27 A 73 46 SUR	LEOPOLDO LEON MORALES	$14.397.782,00	$14.397.074,00	28/9/2022	7/10/2022	11/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
27	MVBF_1072	KR 27A 73 38 SUR MJ	MARIA AURORA PEREZ AVELLA	$14.000.000,00	$14.268.863,00	25/9/2022	7/10/2022	2/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%

56	MVBF_948	KR 26G BIS 72 G 11 SUR	ALEXANDRA PATRICIA LAVERDE CUADROS	$14.390.362,00	$14.392.796,00	19/9/2022	31/10/2022	17/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
57	MVBF_950	KR 27 72G 24 SUR	LUIS LIBARDO LONDOÑO VELAZQUEZ	$14.398.603,00	$14.398.603,00	19/9/2022	11/11/2022	13/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	5,00%
58	MVBF_964	KR 27 72G 17 SUR	ANA SILVIA AGUILAR BARRERA	$14.392.970,00	$14.398.864,00	19/9/2022	31/10/2022	15/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
59	MVBF_0966	KR 27 72G 09 SUR	MELEIDY TORIFIO VALENCIA	$14.393.909,00	$14.398.643,00	19/9/2022	31/10/2022	17/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
60	MVBF_0952	KR 27 BIS 72G 10 SUR MJ	MAYERLY ELSY ARIAS GONZALEZ	$14.395.403,00	$14.392.809,00	18/10/2022	1/11/2022	10/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	10,00%
61	MVBF_0984	KR 27 BIS 72G 11 SUR	INGRIT MAYERLY SALAMANCA VALLARINO		$14.396.936,00	18/10/2022	1/11/2022	17/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
62	MVBF_983	KR 27 BIS 72G 15 SUR	HERIBERTO VARGAS CAPERA			18/10/2022			VALIDADA	**0,00%**	0,00%
63	MVBF_0990	CL 72G SUR 27A 01 IN 2 MJ1	GILBERTO INFANTE MARINO	$14.394.679,00	$14.394.679,00	20/10/2022	11/11/2022	12/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	30,00%
64	MVBF_0987	KR 27 BIS B 72G 16 SUR	QUERUBIN TIRADO MEDINA	$14.400.000,00	$14.400.000,00	19/10/2022	10/12/2022	15/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	55,00%
65	MVBF_0985	KR 27 BIS B 72G 08 SUR	JOSE DEMETRIO CRUZ VELANDIA			19/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
66	MVBF_0731	KR 27A 72D 02 SUR	MARIA DEL CARMEN VALLEJO RUANO			19/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
67	MVBF_0719	KR 27A BIS 72D 08 SUR	URIEL CASALLAS MURCIA		$14.383.897,00	19/10/2022	16/11/2022	12/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	35,00%
68	MVBF_0727	KR 27A 72C 34 SUR MJ	SALOMON URREA BAQUERO	$14.398.620,00	$14.398.620,00	19/10/2022	10/12/2022	15/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	100,00%
69	MVBF_0741	KR 27A 72C 22 SUR	MARIA ELIZABETH CEDANO BURBANO			28/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
70	MVBF_0694	CR 27A BIS 72D 05 SUR	ALEJANDRINO ESPAÑA GARCIA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
103	MVBF_1424	CL 74 SUR 27B 36	CARLOS RODRIGUEZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
104	MVBF_1462	CL 74A SUR 27B 25	ANGIE ESMERALDA ROJAS ALAYON			13/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
105	MVBF_1464	CL 74A SUR 27B 55	MARIA ESCILDA CABEZAS GALINDEZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
106	MVBF_1465	CL 74A SUR 27B 61	SANTIAGO OLAYA BOLAÑOS						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
107	MVBF_1455	CL 74B SUR 27B 24	FLOR HERELIA ESCOBAR VARGAS			13/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
116	MVBF_0789	KR 27 72C 12 SUR	OSCAR HENRY MISNAZA RIVERA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
117	MVBF_791	CR27 H 72C 34 SUR	MARIA LIGIA ROJAS						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
118	MVBF_0780	KR 27 72C 40 SUR	ELIZABETH GIRALDO DELGADO			19/9/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
119	MVBF_0793	KR 27 72C 70 SUR	ARISTOBULO TRIANA GARZON			21/9/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
120	MVBF_0758	KR 27 72C 45 SUR	ARACELLY LIEVANO DE MAHECHA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%

121	MVBF_0760	KR 27 72C 33 SUR	FERMIN MADRIGAL TIQUE			20/9/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
122	MVBF_0749	KR 27 72C 27 SUR	ESTHER MARINA YARA TIQUE			20/9/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
123	MVBF_0761	KR 27 72C 21 SUR	GILDARDO MORALES VELEZ			20/9/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
124	MVBF_0767	KR 27 BIS 72C 22 SUR	ROSALBA PACANCHIQUE DE MARTINEZ			21/9/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
125	MVBF_0730	KR 27 BIS 72C 15 SUR	MARIA ELVIA ARERO COTRINA			20/9/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
126	MVBF_0737	KR 27 BIS 72C 27 SUR	EVANGELINA MADRIGAL TAPIA			20/9/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
127	MVBF_0736	KR 27 BIS 72C 33 SUR	LUIS ALFONSO PIAY						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
128	MVBF_745	KR 27 BIS 72C 38 SUR MJ 1	OLGA LUCILA RIVEROS HIGUERA			20/9/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
129	MVBF_0753	KR 27 BIS 72C 44 SUR	LUZ DARY ALONSO PACHON						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
130	MVBF_770	KR 27 BIS 72C 50 SUR	HERMINIA FORERO BUSTOS						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
171	MVBF_113	KR 26G 75 A SUR 22	SANDRA PATRICIA SANABRIA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
172	MVBF_094	KR 26G 75A 08 SUR	ZOILA ROSA GONZALEZ CASTRO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
173	MVBF_107	KR 26F 75A 31 SUR	CELINA CARAVALI GONZALEZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
174	MVBF_106	KR 26F 75A 35 SUR	CARMEN SEMANATE						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
177	MVBF_223	TV 26C BIS A 75B 45 SUR	OMAR FERNEY NIÑO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
178	MVBF_232	TV 26C BIS A 75B 93 SUR	HERMENCIA CHITIVA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
179	MVBF_0294	TV 26C BIS 75C 16 SUR	MIGUELINA GOMEZ HOYOS						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
185	MVBF_027	CL 76 SUR 26H 04	LEONOR CHISCO SARAY						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
186	MVBF_022	KR 26H 75B 19 SUR MJ	MARTHA HELENA PARDO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
187	MVBF_117	KR 26G 75A 38 SUR	MARIA EUGENIA GONZALEZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
188	MVBF_096	KR 26 G No. 75 A 26 SUR	MARISOL LATORRE DEVIA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
GRUPO No. 3											
1	MVBF_1220	CL 73C BIS A SUR 26F 27 MJ	MARIA NOHEMY MATTA LOZANO			21-sep-22			VALIDADA	0,00%	0,00%
2	MVBF_1228	KR 27 73C 32 SUR	SANDRA YANETH REY VANEGAS			21-sep-22			VALIDADA	0,00%	0,00%
3	MVBF_1213	CL 73D BIS SUR 26G 02 MJ	NORMA CONSTANZA MELO		$14.400.000,00	21-sep-22	10/12/2022	15/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	100,00%
29	MVBF_1049	CL 73 SUR 27 43 MJ	YAMILE DARLEY LONDOÑO			19-sep-22			VALIDADA	0,00%	0,00%

30	MVBF_1083	KR 27 73B 15 SUR	ROSA ELENA GOMEZ QUINTERO	$14.374.413,00	$14.227.821,00	20-sep-22	13/10/2022	8/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
35	MVBF_1096	KR 27 BIS A 73 22 SUR	LUCILA TRUJILLO	$13.862.187,32	$14.399.456,00	20-sep-22	31/10/2022	12/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
37	MVBF_1061	KR 27 BIS A 73 31 SUR	FLORENTINO JUEZ BARRETO	$14.400.000,00	$14.391.266,00	19-sep-22	10/10/2022	18/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
38	MVBF_1052	KR 27A 73 26 SUR	OFELIA MEDINA ARCILA	$14.152.874,42	$14.382.156,00	19-sep-22	1/11/2022	17/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
40	MVBF_1068	KR 27A 73 06 SUR	LUIS ALIRIO CORREA LOPEZ	$14.003.597,43	$14.392.594,00	20-sep-22	1/11/2022	15/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
41	MVBF_1330	CL 73B SUR 26C 90	MAYERLY HERNANDEZ MENDEZ			21/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
42	MVBF_1324	CL 73 B SUR 26 C 74	PURIFICACION CORTES			19/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
45	MVBF_1314	CL 73B SUR 26F 38	MARIELA SANDOVAL VERA			19/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
46	MVBF_1315	CL 73B SUR 26F 32	MARIA TERESA MONTOYA DE BERMUDEZ			19/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
49	MVBF_1306	CL 73B SUR 26F 02 MJ	LUZ STELLA BETANCOURTH GIRALDO			27/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
52	MVBF_1276	CL 73C SUR 26F 38	ELIZABETH SEPULVEDA DIAZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
53	MVBF_1240	CL 73 C BIS A SUR 26F 02 MJ 1	HEBERT FREDY ARIAS BELTRAN						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
54	MVBF_1255	CL 73C BIS A SUR 26C 90	DIANA ALEJANDRA ORJUELA VIVAS						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
55	MVBF_1234	CL 73C SUR 26F 03 MJ	WILLIANS GONZALEZ PEDROZA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
86	MVBF_0924	CL 73 SUR 26F 40	ROSALBA ROJAS ROJAS		$14.374.629,00	19/10/2022	10/11/2022	18/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
87	MVBF_1343	CL 73 SUR 26F 09	AMANDA BERNAL ORTIZ		$14.350.983,00	19/10/2022	10/11/2022	18/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
88	MVBF_1338	CL 73 SUR 26F 03 MJ	IRIS SOTO	$14.397.837,00	$14.397.384,00	19/10/2022	31/10/2022	17/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
89	MVBF_0925	CL 73 SUR 26F 16	MARIA EVA PULIDO CELIS			19/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
90	MVBF_894	KR 26F 72H 60 SUR	LUZ ANGELA RODRIGUEZ MESA			19/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
91	MVBF_1358	CL 73A SUR 26D 16	JOSE GERMAN GARAVITO YATE	$14.358.302,00	$14.377.649,00	19/10/2022	31/10/2022	15/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
92	MVBF_1362	CL 73A SUR 26D 08	ALICIA CARREÑO		$14.394.740,00	1/11/2022	29/11/2022	13/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	45,00%
93	MVBF_1363	CL 73A SUR 26D 04	MARIA CRISTINA QUIROGA RUGE			21/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
94	MVBF_1321	CL 73A SUR 26D 07	TEOFILDE FORERO AGUILAR		$14.350.402,00	21/10/2022	15/11/2022	13/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	35,00%
95	MVBF_1329	CL 73A SUR 26D 19	JULIO CESAR BUILES MURIEL			21/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
96	MVBF_1354	CL 73A SUR 26F 02	JISEL SARIME LOZANO CERQUERA	$14.389.630,00	$14.363.094,00	21/10/2022	1/11/2022	15/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%

97	MVBF_1337	CL 73A SUR 26F 08 MJ	LUZ MIRIAM MARULANDA RODRIGUEZ	$14.307.907,00		21/10/2022	31/10/2022		EJECUCION	85,00%	5,00%
98	MVBF_1339	CL 73A SUR 26F 20 MJ	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ		$14.376.459,00	21/10/2022	15/11/2022	13/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	30,00%
99	MVBF_1307	CL 73 A SUR 26F 15	EMPERATRIZ RAMIREZ BOHORQUEZ			26/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
100	MVBF_1311	CL 73A SUR 26F 27	JULIA MARTINEZ SEGURA		$14.365.252,00	26/10/2022	15/11/2022	12/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	30,00%
146	MVBF_808	CL 72C SUR 26C 59	JOSE FERMIN ROCHA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
147	MVBF_805	CL 72 C SUR No. 26 C 69	MANUEL MONCADA FANDIÑO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
148	MVBF_820	KR 26F 72D 14 SUR	LUIS CARLOS LOMBANA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
149	MVBF_835	CL 72D BIS A SUR 26D 21	NURY ESPERANZA MELO		$14.355.025,00	28/10/2022	29/11/2022	15/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	25,00%
150	MVBF_0837	KR 26 D 72D 45 SUR	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
151	MVBF_0841	CL 72 D BIS A SUR 26C 79	ELIZABETH OSPINA CAICEDO		$14.363.094,00	28/10/2022	15/11/2022	18/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
152	MVBF_0840	CL 72 F SUR 26C 74 MJ	MARIA HEMIR TAPIA HERNANDEZ			28/10/2022	15/11/2022		EJECUCION	**100,00%**	0,00%
153	MVBF_850	CL 72F SUR 26C 69	GUSTAVO RODRIGUEZ RODRIGUEZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
154	MVBF_853	CL 72F SUR 26D 23	CINDY JASBLEIDY DUARTE MUÑOZ		$14.391.855,00	28/10/2022	23/11/2022	15/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	30,00%
155	MVBF_854	CL 72F SUR 26F 05	ANA LEONORA RUIZ MENDEZ			28/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
156	MVBF_0972	KR 27 BIS 72G 38 SUR	PABLO ENRIQUE CALDERON						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
157	MVBF_0953	KR 27 BIS 72G 34 SUR	LUIS MORENO VIUCHE						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
158	MVBF_0938	KR 27 72G 68 SUR	BLANCA MARINA MARTINEZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
159	MVBF_1347	KR 27 73 02 SUR	MARIA NANCY CANACUE ROMERO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
160	MVBF_0946	CL 73 SUR 26G 08	DEYANIRA FRANCO MONTENEGRO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
189	MVBF_149	CL 75A BIS SUR 26F 53	LASTENIA PALACIOS MURILLO						VALIDADA	0,00%	0,00%
190	MVBF_145	CL 75A BIS SUR 26F 47	BERENICE RINCON TELLEZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
191	MVBF_0183	CL 75A BIS SUR 26F 60	DORIS HERNANDEZ HERNANDEZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
192	MVBF_241	KR 27 75 24 SUR	MARIA LUCIA BARREÑO AGUDELO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
193	MVBF_235	CL 75A SUR 26F 60 MJ	JOSE SAUL MONROY MARTINEZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
194	MVBF_172	CL 75A BIS SUR 26F 18 MJ	LAURENTINO BURGOS RINCON						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%

195	MVBF_236	CL 75 SUR 26F 29	LILIANA RENDON LOZANO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
196	MVBF_287	CL 74B BIS A SUR 26F 38	CARMEN ROSA GONZALEZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
197	MVBF_0286	CL 74B BIS A SUR 26F 28 MJ	RAQUEL MENDEZ PEÑA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
198	MVBF_312	DG 74 B BIS A SUR 26 C 41	VIRGINIA CORTES PARDO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
175	MVBF_1496	TV 26C BIS A 75A 03 SUR	BLANCA ELVIRA RAMIREZ MONTES						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
176	MVBF_0225	TV 26C BIS B 75A 10 SUR	CARMEN ELENA SOCARRAZ QUIROZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
GRUPO No. 4											
28	MVBF_0975	KR 27 BIS B 72G 28 SUR	LUIS HERNANDO SALCEDO	$14.350.659,00	$14.381.817,00	21-sep-22	10/11/2022	18/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
31	MVBF_1084	KR 27 73B 09 SUR	FIDEL ANTONIO TELLEZ ESCARRAGA	$13.883.096,82	$14.389.392,00	21-sep-22	13/10/2022	9/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
32	MVBF_1078	KR 27 BIS A 73 64 SUR	MARIA NUBIA LOZANO CERQUERA			20-sep-22			VALIDADA	0,00%	0,00%
33	MVBF_1080	KR 27 BIS A 73 34 SUR MJ	MARIA DEL ROSARIO BAEZ	$14.329.132,00	$14.397.966,00	21-sep-22	10/11/2022	18/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
34	MVBF_1081	KR 27 BIS A 73 28 SUR	MELQUISEDEC ORTIZ	$14.388.713,09		19-sep-22	1/11/2022		EJECUCION	90,00%	20,00%
36	MVBF_1050	KR 27 BIS A 73 39 SUR MJ 1	FRANQUELINA BALLESTEROS	$14.396.471,00	$14.396.471,00	19-sep-22	29/11/2022	21/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	50,00%
39	MVBF_1048	KR 27A 73 18 SUR MJ	MARIA GLADYS TRIANA	$14.128.717,42	$14.028.825,00	21-sep-22	7/10/2022	8/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
71	MVBF_0979	KR 27 BIS 72G 27 SUR MJ	LUZ MARINA TRIBIÑO RAMIREZ	$14.397.127,18	$14.377.332,00	20/10/2022	2/11/2022	15/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
72	MVBF_1098	KR 27 BIS A 73 52 SUR	JULIO CESAR LEMUS ZULETA	$14.365.960,30	$14.398.854,00	18/10/2022	2/11/2022	17/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
73	MVBF_1045	KR 27A BIS 73 10 SUR	MARIELA CARDONA CARDONA	$14.000.000,00	$14.397.361,00	20/10/2022	2/11/2022	18/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
74	MVBF_1000	KR 27A BIS 73 11 SUR MJ 1	JORGE ELIECER HUERTAS GIL			18/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
75	MVBF_1007	CL 73 SUR 27A 21	NUBIA HERRERA QUINTERO			18/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
76	MVBF_1001	KR 27A BIS 73 23 SUR MJ	MARIA ELIA MENESES GOMEZ	$14.346.022,00	$14.398.500,00	18/10/2022	26/11/2022	13/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	35,00%
77	MVBF_1014	KR 27A BIS 73 27 SUR	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
78	MVBF_1013	KR 27B 73A 16 SUR	EMILIANO PEREZ AVELLA			14/12/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
79	MVBF_0679	TV 27H 72D 14 SUR	POSIDIO HUERTA HUERTAS						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
80	MVBF_675	KR 27 B 72D 23 SUR	CELIMO PADILLA VEGA			14/12/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
81	MVBF_0677	KR 27B 72D 05 SUR	ANA GLADYS PACHON CHURQUE			14/12/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
82	MVBF_0715	KR 27B 72C 20 SUR	JORGE ENRIQUE QUINONES						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%

83	MVBF_676	KR 27B 72 D 11 SUR	AMPARO ARIAS OGONZALEZ			14/12/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
84	MVBF_0669	KR 27B 72D 29 SUR	MARIA CLAUDIA MRTINEZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
85	MVBF_1076	KR 27 BIS A 73 40 SUR MJ	ESPERANZA CASTILLO ALTURO	$14.394.860,00	$14.394.860,00	27/10/2022	29/11/2022	13/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	50,00%
108	MVBF_0558	CL 73C SUR 27B 26	MONICA ANDREA CRISTANCHO QUIMBAYO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
109	MVBF_552	CLL 73C SUR 27B 62	ORFANIDES LOSADA PERDOMO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
110	MVBF_549	CL 73 C SUR 27 B 78	MILLER ALEJANDRO HURTADO SAENZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
111	MVBF_0540	CL 73B SUR 27C 29	LUZ STELLA FRANCO DIAZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
112	MVBF_567	CL 73B SUR 27C 24	FLORENTINO PICO BASTILLA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
113	MVBF_605	DG 73A BIS SUR 27C 28	MISAEL MACANA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
114	MVBF_0592	DG 73A BIS SUR 27C 34	MARIA HELENA BAQUERO MACANA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
115	MVBF_0570	TV 27H 73A 36 SUR	JOSE ANTONIO MOYA ZAMORA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
131	MVBF_536	CL 73B SUR 27B 21	CLAUDIA MARTINEZ CLAVIJO	$14.397.978,00	$14.397.978,00	20/10/2022	29/11/2022	15/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	50,00%
132	MVBF_530	CL 73B 27B 33 MJ	OMAR MEDINA ORTEGA			27/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
133	MVBF_0531	CL 73B SUR 27C 05	INES DIAZ	$14.245.243,00	$14.398.250,00	28/10/2022	16/11/2022	15/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	35,00%
134	MVBF_589	CL 73B SUR 27B 34	LUISA FERNANDA TAPIERO TRUJILLO	$14.000.000,00	$14.398.607,00	27/10/2022	2/11/2022	15/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	30,00%
135	MVBF_588	CL 73B SUR 27B 40	JANETH MEDINA DIAZ	$14.000.000,00	$14.398.700,00	27/10/2022	2/11/2022	15/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	10,00%
136	MVBF_0595	DG 73A SUR 27C 57 MJ	ANA DELIA GONZALEZ MATEUS						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
137	MVBF_631	TV 27H 73 34 SUR	LEIDY SABOGAL RAMIREZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
138	MVBF_0657	DG 73 BIS SUR 27B 36	SERGIO TORO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
139	MVBF_660	DG 73 SUR 27B 13 MJ	CUSTODIA LUGO QUESADA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
140	MVBF_645	DG 73 SUR 27B 11	MARIA SIXTA HURTADO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
141	MVBF_0622	DG 73 BIS SUR 27B 03	MARIBEL HURTADO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
142	MVBF_650	DG 73 SUR 27B 59	JULY ANDREA SANCHEZ ALONSO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
143	MVBF_0649	DG 73 SUR 27B 53	OLGA MARIA ALONSO MORENO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
144	MVBF_683	DG 73 SUR 27B 54	JOSE ALFONSO MORA AREVALO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%

145	MVBF_585	CL 73A SUR 27B 17	ANDREA HERRERA RANGEL						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
161	MVBF_0157	CL 75 SUR 27 33	ANA MILENA ABAUNZA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
162	MVBF_158	CL 75 SUR 27 39	ISABELINA PATIÑO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
163	MVBF_154	CL 75 SUR 27 A 05	CLAUDIA SMIT LUCAS TANGARIFE						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
164	MVBF_0155	CL 75A SUR 27 22	SONIA MILENA GIRALDO HERRERA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
165	MVBF_075	CL 75A SUR 27 27	JAIDI RIAÑOS						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
166	MVBF_085	CL 75A SUR 27 63	LUCIA HERRERA QUINTERO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
180	MVBF_0072	CL 74A BIS A SUR 27 22	JORGE LUIS PEREZ IBAÑEZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
181	MVBF_071	CL 75A BIS A SUR 27 28	JOSE JAVIER OLARTE MAHECHA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
182	MVBF_058	CL 75A BIS A SUR 27 64	BEATRIZ BRYITH CANGREJO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
183	MVBF_047	CL 75B SUR 27 52	ANIBAL MORENO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
184	MVBF_046	CL 75B SUR 27 58	MAGDALENA LEMUS CHAPARRO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
167	MVBF_054	CL 75A BIS SUR 27 15	MAYERLY SANCHEZ MENDOZA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
168	MVBF_066	CL 75A BIS SUR 27 39	GUMERSINDO SOLER SILVA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
169	MVBF_089	CL 75A BIS SUR 27 46	MARIA CONSUELO PEREZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
170	MVBF_087	CL 75A BIS SUR 27 58	MARIA RUTH CORTES LOSADA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
199	MVBF_0482	CL 73D BIS SUR 27F 14	MARIA DAISSY BEJARANO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
200	MVBF_495	CL 73D BIS SUR 27M 52	MARIA FABIOLA GUEVARA ISAZA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO 2

Registro fotográfico componente social

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES SOCIALES			
			
Actividad: Seguimiento de obra MVBF_1295 Fecha: 12/12/2022	Actividad: Seguimiento de obra MVBF_1200 Fecha: 6/12/2022	Actividad: Seguimiento de obra MVBF_1280 Fecha: 12/12/2022	Actividad: Seguimiento de obra MVBF_1264 Fecha: 12//2022
			
Actividad: Seguimiento de obra MVBF_1191 Fecha: 12/12/2022	Actividad: Entrega de Vivienda MVBF_1302 Fecha: 15/12/2022	Actividad: Atención PAC Fecha: 14/12/2022	Actividad: Caracterizacion social MVBF_1013 Fecha: 14/12/2022
			
Actividad: Caracterizacion social MVBF_675 Fecha: 14/12/2022	Actividad: Caracterizacion social MVBF_677 Fecha: 14/12/2022	Actividad: Caracterizacion social MVBF_676 Fecha: 14/12/2022	Actividad: Seguimientos de obra MVBF_0531 Fecha : 013/12/2022
