FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA

PROCESO

EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 28/01/2023 (dd-mm-aa) **AL** 3/02/2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 1009 de 2022

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 – 2022"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 - 2022."

CONTRATISTA DE OBRA: BUILDING SAS **NIT** 804.002.715-3

INTERVENTOR: INPLAYCO SAS **NIT** 860.524.168-8

CONTRATO DE OBRA	
Valor Inicial	$ 3.600.000.000,00
Valor Adicional 1	$ 1.602.000.000,00
Valor Adicional 2	N.A.
Valor Actualizado	$ 5.202.000.000,00
Plazo Inicial	4 Meses
Plazo Prórroga 1	2 Meses y 15 dias
Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	6 Meses 15 dias
Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2022
Fecha de Terminación según Prórroga 1	15/03/2023
Fecha de Terminación según Prórroga 2	N.A.
Fecha de Terminación Actual	15/03/2023


CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 432.000.000,00
Valor Adicional 1	$ 192.240.000,00
Valor Adicional 2	N.A.
Valor Actualizado	$ 624.240.000,00
Plazo Inicial	5 Meses
Plazo Prorroga 1	2 Meses y 15 dias
Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	7 Meses 15 dias
Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/01/2023
Fecha de Terminación según Prórroga 1	15/04/2023
Fecha de Terminación según Prórroga 2	N.A.
Fecha de Terminación Actual	15/04/2023

SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: CAMILA CORTES DAZA


2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

2.1. AVANCES DE EJECUCIÓN VALIDACIONES

AVANCE FÍSICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

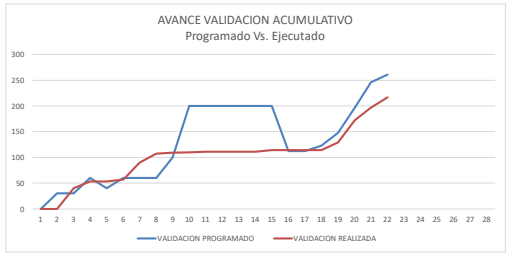



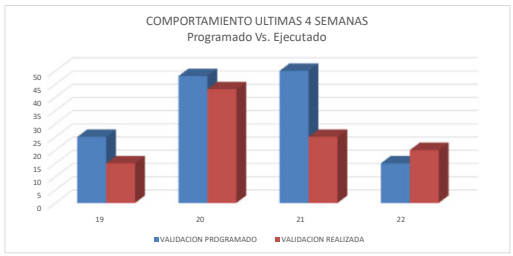


Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)							Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
Cantidad Validaciones	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	SEM 19	Prog.	Ejec.	SEM 20	Prog.	Ejec.	SEM 21	Prog.	Ejec.	SEM 22	Prog.	Ejec.
	261	90,3%	217	75,1%	0,00%	-15,22%	15	20	6,92%	0,00%		25	15		48	43		50	25		15	20

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.


1. Se evidencia que segun la reprogramacion presentada por el Contratista de obra a la fecha se tiene un atraso del 15,22% en la etapa de validacion ya que segun dicha programacion a la fecha se debian haber validado 261 viviendas en el territorio de Bella Flor y Usme que refiere a un 90,3% de las cuales se tienen 217 con un 75,1% de avance general.
2. Con respecto a la grafica No. 2 la cual indica el porcentaje de validación durante la semana, esta presenta un avance del 6,92% debido a que en este periodo se debian haber validado 15 viviendas de las cuales se validaron 20
3. Según la programación actual se evidencia que a la fecha el contratista de obra presenta un atraso general frente a la etapa de validaciones del -15,22% del total de las viviendas adjudicadas al contrato 994 de 2022.

2.2. AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES

AVANCE FÍSICO APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

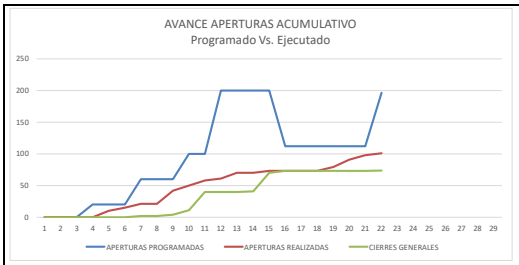



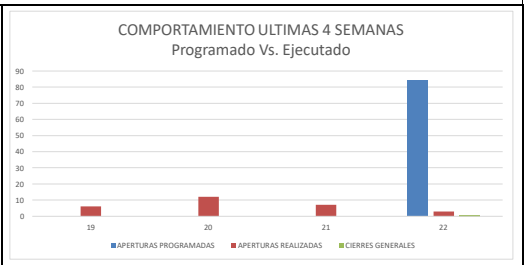

Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)							Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
Cantidad de Aperturas	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	SEM 19	Prog.	Ejec.	SEM 20	Prog.	Ejec.	SEM 21	Prog.	Ejec.	SEM 22	Prog.	Ejec.
	196	67,8%	101	34,9%	0,0%	-32,87%	84	3	0,00%	35,64%		0	6		0	12		0	7		84	3

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

1. El Contratista de obra durante la ultima semana presenta 261 aperturas según la programacion. De las cuales se realizo la apertura de 101 viviendas, esto teniendo en cuenta la reprogramacion presentada por ellos, por lo tanto esto presenta un atraso del 32,87% frente a la etapa de ejecucion.
2. Según la reprogramación de obra que presento el Contratista Building SAS, indica que a la fecha segun dicha programacion se deben tener 196 viviendas aperturadas de las cuales se aperturaron 101 viviendas, teniendo 74 mv entregados a satisfaccion y 27 viviendas en ejecucion. Debido al poco avance en la ejecucion del contrato que se esta presentando por el Contratista de obra se solicita dar inicio a viviendas para mitigar los atrasos que se estan presentando a la fecha y de esta manera evitar futuros incumplimientos.

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA

PROCESO


EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 28/01/2023 (dd-mm-aa) **AL** 3/02/2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 1009 de 2022

2.3. AVANCES DE EJECUCIÓN FINANCIERO

AVANCE DE EJECUCION FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

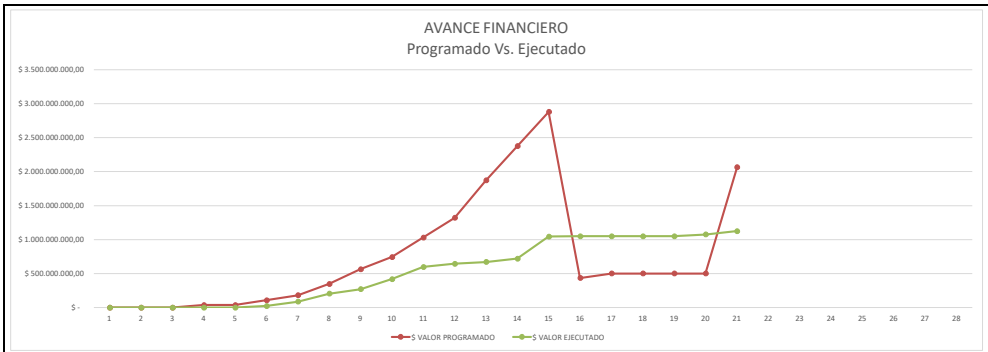

VALOR INVERSION SEGÚN FLUJO DE CAJA

INVERSION SEMANAL

PROGRAMADA	VS.	EJECUTADA
$ 504.000.000		$ 82.969.646,89
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
9,69%		1,59%

INVERSION ACUMULADA

PROGRAMADA	VS.	EJECUTADA
$ 2.064.000.000,33		**$ 1.194.399.827,58**
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
39,68%		**22.96%**

ATRAZO O ADELANTO GENERAL EN PESOS ($):
$ 869.600.172,75

ATRAZO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%): **24,16%**

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para

1. Según la reprogramación vigente la fecha y flujo de caja presentados por el Contratista de obra, en el momento se esta presentando un atraso según lo ejecutado de $ 869.600.172,75 lo que hace referencia a un 24,16% de atraso frente al valor total del contrato.
2. Se debe tener en cuenta que el contratista de obra presento una programacion y flujo de caja ajustado según a la modificacion del contrato, por tal motivo se da la claridad de la disminucion de la inversion acumulada.

3. ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

	ID_MV	DESCRIPCION DEL ASUNTO	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA EN EL PERIODO	MVBF_1329	Se realiza seguimiento, se observa personal de obra adelantando actividades en zona de sala comedor y garaje(estuco), el beneficiario manifiesta inconformidad con esta actividad por los acabados. La parte técnica hacen explicación del mismo. El beneficiario refiere no dejar que continúen con las actividades, solicitando visita de la SDHT.	Se realizara visita con la SDHT el 7 de febrero 2023.	ABIERTA
	MVBF_0966	La beneficiaria solicita la revision por parte del contratista de obra en: 1. Fisura pañete en el acceso a la cocina y habitación 2 2. Humedad en la zona de ropas 3. Fisura en pañete zona de ropas 4. Una Pieza de enchape mal instalada 5. Bocapuerta en granito en baño, comedor y habitaciones levantada	Se hace visita al predio por parte del contratista e interventoría en el cuál se evidencia que se subsanó la postventa en la cual se diligencia acta y la beneficia firma a conformidad	CIERRE
	MVBF_1220	Se realiza visita el 01/02/203 por solicitud de beneficiario no se continua con actividades de obra. Por ello se realiza retiro de personal de obra, debido a no inconformidad con acabados por parte del beneficiario	Se realizara visita con la SDHT el 7 de febrero 2023.	ABIERTA
SEMANA X				
SEMANA X				

4. RELACIÓN DE RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativas)

	ID_MV	MOTIVO DE LA RENUNCIA Y/O NO EJECUCIÓN	No. DE RADICADO A LA SDHT Y FECHA
SEMANA 2	MVBF_801	BENEFICIARIA AMPARO TIQUE ROMERO IDENTIFICADA CON C.C. 52152205, SE RECIBE INFORMACION DE RENUNCIA REALIZADA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT.	1-2022-39168 - 22 /09/ 2022
	MVBF_1100	BENEFICIARIA OLGA LUCIA LOZANO CERQUERA IDENTIFICADA CON C.C. 26473801, SE RECIBE INFORMACION DE RENUNCIA REALIZADA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT.	1-2022-38912 - 22/09/2022
SEMANA 21			
SEMANA			

5. RELACION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativas)

	ID_MV	BREVE DESCRIPCION DE LA PQR (anexar copia del PQR)	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA 21				
SEMANA				
SEMANA				

Building SAS / INPLAYCO S.A.S.	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA PROCESO EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 28/01/2023 (dd-mm-aa) **AL** 3/02/2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 1009 de 2022

6. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORIA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

1. ATENCION A LA COMUNIDAD:
Bella Flor: Ciudad Bolivar
30/01/2023 Se acerca al PAC el señor Bernabe Cordero solicitando la programación de la visita de validación puesto que debe ir a una cita médica, refiere que es la persona autorizada por parte del beneficiario Gumersindo Soler MVBF_066
03/02/2023: Se acerca al PAC la señora Nubia Yazmin Urrego, hacer entrega de la carta de autorización del MVBF 0294 Miguelina Gómez Hoyos, más sin embargo se le aclara que la carta debe venir firmada por el autorizado y el beneficiario, anexando copia de la cédula dé ciudadanía de ambos. Se comparte contacto a la profesional social correspondiente.
Portal del Divino:Usme
Durante el período no se ha presentado solicitudes de atención por parte de los beneficiarios.

2. ACOMPANAMIENTO A VALIDACIONES: Durante este periodo se validaron diecinueve (19) viviendas distribuidas así: Ocho (8) de Belñla Flor Ciudad Bolívar y once (11) del Poral del Divino Usme.
Bella Flor Ciudad Bolivar
MVBF_066 - MVBF_158 - MVBF_154 - MVBF_047 - MVBF_054 - MVBF_087 - MVBF_046 - MVBF_089 - MVBF-694

Portal del Divino Usme
MV_03300 - MV_03268 - MV_03270 - MV_03271 - MV_03352 - MV_03258 - MV_03344- MV_03403- MV_03401- MV_03399- MV_03397

3. ACOMPAÑAMIENTO APERTURAS DE OBRA: Durante este periodo se aperturaron tres (3) viviendas.
MVBF_0925 - MVBF_894 - MVBF_0938

3. ACOMPAÑAMIENTO A ENTREGAS: Durante la semana se entregó MVBF_1324

4. SEGUIMIENTOS RELEVANTES:
Se realiza seguimiento, atiende beneficiaria, se evidencia personal de obra, adelantando actividades en la vivienda: MVBF_1330 - MVBF_1324 - MVBF_854 - MVBF_1228 - MVBF_805 - MVBF_1013- MVBF_660- MVBF_745- MVBF_805 - MVBF_854 - MVBF_1228 - MVBF_1220 - MVBF_1330 - MVBF_ 1000 - MVBF_0669 - MVBF_0737- MVBF_0767 - MVBF_0780- MVBF_1201- MVBF_1198- MVBF_983
No se evidencia personal en la obra: MVBF _ 1013- MVBF 1198 - MVBF- 1195
No se evicencia Material en la obra: MVBF-1000- MVBF-631 MVBF-638- MVBF-650 MVBF-669 - MVBF 660
MVBF_631: La beneficiaria presenta dudas con respecto a las áreas de intervención, por ello se recuerda que en la visita de apertura se explicó que se intervendría cocina, baño, hall y sala.
MVBF_1329: Se realiza seguimiento, se observa personal de obra adelantando actividades en zona de sala comedor y garaje, el beneficiario manifiesta inconformidad con esta actividad por los acabados. El beneficiario refiere no dejar que continúen.
MVBF_0677: La beneficiaria solicita que se acerque el personal a la vivienda, toda vez que las actividades no se han realizado de manera constante; ante esto se procede a informar de esta situación a la persona encargada del personal.
MVBF_ 683 - MVBF_650: El beneficiario solicita que no se realice el alistado de piso, a cambio de ello solicita que el presupuesto disponible se invierta en otras actividades, se indica que se revisara dicha solicitud.
MVBF_1121: Se visita la vivienda y se aclaran inquietudes respecto a la instalación de otra puerta para la habitación, se refiere que se instalarán las dos de los baños. Adicionalmente, refiere la familia que, demolerán el muro de acceso a las dos habitaciones
MVBF 1195: Se realiza visita de seguimiento de obra por parte del área social y técnica de interventoría donde el tecnico realiza la verificación del enchape de habitaciones, cocina, sala comedor y baño, evidenciando que algunas baldosas se deben cambiar ya que estas estancocas, volver hacer el guarda escobas y se debe realizar algunos remates en otras áreas de la vivienda. Para poder hacer entrega de ora a satisfacción.

7. COMPONENTE AMBIENTAL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

DISPOSICIÓN RCD M3		ESCOMBRERA (indicar nombre y No. Autorización)	No. DE VALE ESCOMBRERA, PIN Y PLACA VOLQUETA
SEMANA 22	0 M3	N/A	N/A
MES	Enero		
SECTOR	BF		
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	48

DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS M3		CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA
SEMANA 22	0 M3	Se evidencia la recolección de empaques de cemento y pegante cerámico en la bodega No se ha realizado disposición de RESPEL. Se solicitó nombre y licencia del gestor para disposición final.
MES	Enero	
SECTOR	BF	
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO 0 M3

•Se refuerza al personal administrativo y operativo con las charlas referente a: riesgos ocultos durante la ejecución de actividades, la importancia de estar hidratado, la importancia del uso del código de colores y la importancia del uso del bloqueador solar
•Hubo retiro de personal operativo, y se inicia proceso de solicitud de paz y salvos.
•Se hace acompañamiento SST-MA, al seguimiento técnico social, evidenciando el uso de dotación y EPP y botas de seguridad.
•Se realiza acompañamiento durante las caracterizaciones sociales, observando riesgos que puedan afectar el componente SST o ambiental en la ejecución de las actividades.
•Se realiza inducción a personal operativo ingresó, así mismo la notificación de riesgo y se divulgan a cada uno las observaciones que se presenten en los exámenes médicos cuando se requiera, se diligencian perfiles sociodemográficos con los datos de este personal.
•Durante la semana no se realizó instalación de cubierta y trabajo a diferente nivel sin superar o alcanzar los 2 m, por lo tanto, no es posible dar cumplimiento al plan de trabajo con el diligenciamiento de formato de cubierta.
•Se mantiene el acopio en la bodega de los RESPEL entre ellos: bolsas de cemento, bolsas de pegante, tarros de pintura y tarros de anticorrosivos para completar la cantidad solicitada por el proveedor contactado para su disposición final.
•Debido a la cantidad de viviendas entregadas, la generación de RCD ha sido mínima, se mantiene acopio en bodega hasta completar la cantidad requerida para el viaje de la volqueta. Esta semana se termina el periodo del mes de enero, no se completó la cantidad del viaje.
•Se realizan entregas de vivienda, verificando que las viviendas queden con el frente y el interior de la misma libre de escombros.
•Se realiza inspección de documentos del vehículo que realiza la repartición de material, evidenciando que se encuentra al día con la revisión tecnomecánica y su seguro correspondiente.
•La interventoría recibe charla referente al tema SST, "que es una matriz de peligros - IPERVC".

8. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

CONTRATISTA DE OBRA						INTERVENTORIA					
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	4	CAPACITACIONES REALIZADAS	4	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0	CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CAPACITACIONES REALIZADAS	1	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBREROS)			40	PERSONAL ADMINISTRATIVO	11						
PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	1	PERSONAL OBRERO	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORIA					14
PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	3	PERSONAL OBRERO	3	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						

9. ANEXOS

ANEXO 1: CONSOLIDADO TECNICO
ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SOCIAL

Nota: Si lo requiere.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas previamente, en Bogotá, D.C., a los **OCHO** (Día en letras) **8** (Día en números) días del mes del **FEBRERO** (Mes en letras) de **2023** (Año de firma del informe)

Firma
Nombre (Nombre) Arq. CESAR A FUENMAYOR.
Cargo: Director de Interventoría

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO 1

Consolidado Técnico

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL	Fecha	8-feb-23

BUILDING SAS

Contrato de Obra	**994 - 2022**	**Fecha de Inicio**	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Objeto	**"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 – 2022"**	**Fecha de Terminacion Inicial**	31 DE DICIEMBRE DE 2022
		Plazo Inicial	CUATRO (4) MESES
		Plazo Prorroga 1	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
		Plazo Actualizado	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS
		Fechade Terminacion Actual	15 DE MARZO DE 2023
		Valor del contrato actualizado	**CINCO MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES DE PESOS ($5.202.000.000) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**1009 - 2022**	**Fecha de Inicio**	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Objeto	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 - 2022."**	**Fecha de Terminacion Inicial**	31 DE ENERO DE 2023
		Plazo Inicial	CINCO (5) MESES
		Plazo Prorroga 1	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
		Plazo Actualizado	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS
		Fechade Terminacion Actual	15 DE ABRIL DE 2023
		Valor del contrato actualizado	**SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($624.240.000) M/Cte**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT							**Fase 2: Ejecución de obras**					
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validacion**		**Ejecución**					
					Validada	V/Por Validar	En Ejecución	Terminadas	Renuncias	Por	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	**Arq Leonardo Solano**	ALFONSO LOPEZ	91	291	30	61	0	0	0	91	0,00%	0
		BELLA FLOR	17		17	0	1	16	0	0	99,41%	16
	Arq Luisa Franco		61		61	0	8	22	0	31	41,66%	22
	Ing Martha Neira		60		58	1	10	21	1	28	42,03%	21
	Arq. Edwin Baez		62		52	9	8	15	1	38	27,29%	15
Subtotal			**291**	**291**	**218**	**71**	**27**	**74**	**2**	**188**	**42,08%**	**74**

AVANCE DE EJECUCION SEMANAL										**% ACUMULADO**	**FEBRERO**
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**		**Tiempo Programación**					SEMANA DEL 30 AL 05
No. Etiq.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	Valor Inicial	Valor Liquidado	Fecha Validacion	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 22**
BARRIO BELLA FLOR											
GRUPO No. 1											
4	MVBF_1195	KR 27 BIS A 73D 87 SUR MJ	DOLY ARGENIS RIVERA AVIRAMA	$14.400.400,00	$14.400.000,00	20-sep-22	12/1/2023		EJECUCION	90,00%	15,00%
5	MVBF_1196	KR 27 BIS A 73D 83 SUR MJ	INES SOFIA REYES CASTRO	$14.369.650,00	$14.395.216,00	19-sep-22	12/10/2022	8/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
6	MVBF_1197	KR 27 BIS A 73D 79 SUR MJ 1	LEIDY ALEJANDRA PALACIOS REYES	$13.769.930,00	$14.370.476,00	19-sep-22	7/10/2022	16/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
7	MVBF_1200	KR 27 BIS A 73D 75 SUR	SANDRA PAOLA BEJARANO REYES	$14.396.371,00	$14.400.000,00	19-sep-22	2/11/2022	20/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
10	MVBF_1166	CL 73D BIS A SUR 27 28	MERCEDES VASQUEZ BONILLA	$14.399.376,00	$14.399.379,00	20-sep-22	5/10/2022	16/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
11	MVBF_1167	CL 73D BIS A SUR 27 22 MJ	NICOL JOHANA SUNCE GUARNIZO	$14.358.554,00	$14.400.000,00	19-sep-22	21/10/2022	16/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
12	MVBF_1149	CL 73D SUR 27 75	GUSTAVO MONROY FONSECA	$14.258.458,00	$14.399.470,00	20-sep-22	5/10/2022	8/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
13	MVBF_1155	CL 73D BIS A SUR 27A 50	ANA FELIZ DIAZ PATIÑO	$14.381.322,00	$14.400.000,00	20-sep-22	5/10/2022	16/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%

14	MVBF_1191	KR 27B 74A 06 SUR	CARMEN ELISA TOLOSA CEPEDA	$14.397.146,00	$14.400.000,00	20-sep-22	21/10/2022	12/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
43	MVBF_1302	CL 73A SUR 26F 33 MJ	ANGIE YURLEY RUIZ VEGA	$14.381.643,00	$14.400.000,00	19/10/2022	4/11/2022	15/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
44	MVBF_1303	CL 73A SUR 26F 45 MJ	ANAYIBE CASTRO	$14.398.840,00	$14.400.000,00	19/10/2022	4/11/2022	7/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
47	MVBF_1264	CL 73B SUR 26F15 MJ	JOSÉ ALONSO MUÑOZ SCARPETTA	$14.373.000,00	$14.400.000,00	27/10/2022	7/12/2022	14/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
48	MVBF_1270	CL 73B SUR 26F 03	ANA AURORA BECERRA VARGAS	$14.372.322,00	$14.400.000,00	27/10/2022	6/12/2022	14/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
50	MVBF_1295	KR 26F 73B 16 SUR	VIRGELINA RODRIGUEZ	$14.398.427,00	$14.400.000,00	31/10/2022	21/11/2022	13/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
51	MVBF_1280	CL 73C SUR 26F 02	MARINA NAVAS ROJAS	$14.399.498,00	$14.400.000,00	27/10/2022	29/11/2022	13/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
101	MVBF_1187	KR 27B 74 14 SUR MJ	MARIA OLINDA SARMIENTO CASTRO	$13.396.482,00	$14.352.138,00	13/10/2022	21/10/2022	15/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
102	MVBF_1427	CL 74 SUR 27B 06	MARY LUZ ARREDONDO GONZALEZ	$14.400.000,00	$14.398.350,00	13/10/2022	21/10/2022	17/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
GRUPO No. 2											
8	MVBF_1198	CL 73D BIS A SUR 27 33 MJ	CARMEN ELVIRA REYES CARO	$14.400.000,00		19-sep-22	12/01/2023		EJECUCION	50,00%	40,00%
9	MVBF_1201	CL 73D BIS A SUR 27 39 MJ	MARIANA ALEXANDRA VELANDIA VASQUEZ	$14.400.000,00		20-sep-22	18/01/2023		EJECUCION	40,00%	30,00%
15	MVBF_1148	CL 73 D SUR 27 45	LUZ MARINA PIRAGAUTA GRANADOS	$14.398.521,00	$14.398.521,00	28/9/2022	29/11/2022	15/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
16	MVBF_1130	CL 73D SUR 27 50	JUAN DE JESUS SEDANO AYALA	$14.394.664,00	$14.396.664,00	26/9/2022	11/11/2022	18/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
17	MVBF_1128	CL 73D SUR 27 62	ISMELDA PEREZ GARCIA	$14.392.074,00	$14.395.263,00	26/9/2022	13/10/2022	2/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
18	MVBF_1141	CL 73 D SUR 27 91	BLANCA FLOR RINCON	$14.397.445,00	$14.398.134,00	28/9/2022	20/10/2022	25/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
19	MVBF_1121	CL 73 C BIS SUR 27 77	MARIA ELBA ARIAS BONILLA	$14.396.808,00		26/9/2022	18/01/2023		EJECUCION	38,00%	38,00%
20	MVBF_1110	CL 73 D SUR 27 86	FLOR TRIANA AVILA	$14.399.088,00	$14.397.014,00	26/9/2022	18/10/2022	15/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
21	MVBF_1108	CL 73C BIS SUR 27A 23	MARIA ODILIA MARTINEZ CABRERA	$14.390.758,00	$14.399.950,00	26/9/2022	13/10/2022	11/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
22	MVBF_1124	CL 73C BIS SUR 27A 11	HECTOR HERNANDO VELOSA	$14.000.000,00	$14.399.644,00	26/9/2022	5/10/2022	21/10/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
23	MVBF_1111	CL 73C BIS SUR 27 61 MJ	PAOLA ANDREA ORJUELA VIVAS	$14.000.000,00	$14.026.240,00	28/9/2022	7/10/2022	21/10/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
24	MVBF_1118	CL 73 C BIS SUR 27 55	LUIS ALBERTO CHITIVA CORTES	$14.394.090,00	$14.399.367,00	26/9/2022	16/11/2022	18/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
25	MVBF_1117	CL 73C BIS SUR 27 49	RAFAEL RODRIGUEZ ZAMORA	$14.398.893,00	$14.398.893,00	26/9/2022	11/11/2022	18/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
26	MVBF_1073	KR 27 A 73 46 SUR	LEOPOLDO LEON MORALES	$14.397.782,00	$14.397.074,00	28/9/2022	7/10/2022	11/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
27	MVBF_1072	KR 27A 73 38 SUR MJ	MARIA AURORA PEREZ AVELLA	$14.000.000,00	$14.268.863,00	25/9/2022	7/10/2022	2/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
56	MVBF_948	KR 26G BIS 72 G 11 SUR	ALEXANDRA PATRICIA LAVERDE CUADROS	$14.390.362,00	$14.392.796,00	19/9/2022	31/10/2022	17/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
57	MVBF_950	KR 27 72G 24 SUR	LUIS LIBARDO LONDOÑO VELAZQUEZ	$14.398.603,00	$14.398.603,00	19/9/2022	11/11/2022	13/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
58	MVBF_964	KR 27 72G 17 SUR	ANA SILVIA AGUILAR BARRERA	$14.392.970,00	$14.398.864,00	19/9/2022	31/10/2022	15/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%

59	MVBF_0966	KR 27 72G 09 SUR	MELEIDY TORIFIO VALENCIA	$14.393.909,00	$14.398.643,00	19/9/2022	31/10/2022	17/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
60	MVBF_0952	KR 27 BIS 72G 10 SUR MJ	MAYERLY ELSY ARIAS GONZALEZ	$14.395.403,00	$14.392.809,00	18/10/2022	1/11/2022	10/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
61	MVBF_0984	KR 27 BIS 72G 11 SUR	INGRIT MAYERLY SALAMANCA VALLARINO	$14.396.904,00	$14.396.936,00	18/10/2022	1/11/2022	17/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
62	MVBF_983	KR 27 BIS 72G 15 SUR	HERIBERTO VARGAS CAPERA	$14.000.000,00		18/10/2022	12/01/2023		EJECUCION	25,00%	25,00%
63	MVBF_0990	CL 72G SUR 27A 01 IN 2 MJ1	GILBERTO INFANTE MARINO	$14.394.679,00	$14.394.679,00	20/10/2022	11/11/2022	12/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
64	MVBF_0987	KR 27 BIS B 72G 16 SUR	QUERUBIN TIRADO MEDINA	$14.400.000,00	$14.400.000,00	19/10/2022	10/12/2022	15/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
65	MVBF_0985	KR 27 BIS B 72G 08 SUR	JOSE DEMETRIO CRUZ VELANDIA			19/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
66	MVBF_0731	KR 27A 72D 02 SUR	MARIA DEL CARMEN VALLEJO RUANO			19/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
67	MVBF_0719	KR 27A BIS 72D 08 SUR	URIEL CASALLAS MURCIA	$14.397.247,00	$14.383.897,00	19/10/2022	16/11/2022	12/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
68	MVBF_0727	KR 27A 72C 34 SUR MJ	SALOMON URREA BAQUERO	$14.398.620,00	$14.398.620,00	19/10/2022	10/12/2022	15/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
69	MVBF_0741	KR 27A 72C 22 SUR	MARIA ELIZABETH CEDANO BURBANO			28/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
70	MVBF_0694	CR 27A BIS 72D 05 SUR	ALEJANDRINO ESPAÑA GARCIA			30/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
103	MVBF_1424	CL 74 SUR 27B 36	CARLOS RODRIGUEZ			27/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
104	MVBF_1462	CL 74A SUR 27B 25	ANGIE ESMERALDA ROJAS ALAYON			13/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
105	MVBF_1464	CL 74A SUR 27B 55	MARIA ESCILDA CABEZAS GALINDEZ			30/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
106	MVBF_1465	CL 74A SUR 27B 61	SANTIAGO OLAYA BOLAÑOS			27/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
107	MVBF_1455	CL 74B SUR 27B 24	FLOR HERELIA ESCOBAR VARGAS			13/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
116	MVBF_0789	KR 27 72C 12 SUR	OSCAR HENRY MISNAZA RIVERA			23/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
117	MVBF_791	CR27 H 72C 34 SUR	MARIA LIGIA ROJAS			23/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
118	MVBF_0780	KR 27 72C 40 SUR	ELIZABETH GIRALDO DELGADO	$14.399.430,00		19/9/2022	17/1/2023		EJECUCION	38,00%	28,00%
119	MVBF_0793	KR 27 72C 70 SUR	ARISTOBULO TRIANA GARZON			21/9/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
120	MVBF_0758	KR 27 72C 45 SUR	ARACELLY LIEVANO DE MAHECHA			23/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
121	MVBF_0760	KR 27 72C 33 SUR	FERMIN MADRIGAL TIQUE			20/9/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
122	MVBF_0749	KR 27 72C 27 SUR	ESTHER MARINA YARA TIQUE			20/9/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
123	MVBF_0761	KR 27 72C 21 SUR	GILDARDO MORALES VELEZ			20/9/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
124	MVBF_0767	KR 27 BIS 72C 22 SUR	ROSALBA PACANCHIQUE DE MARTINEZ	$14.400.000,00		21/9/2022	17/1/2023		EJECUCION	55,00%	30,00%
125	MVBF_0730	KR 27 BIS 72C 15 SUR	MARIA ELVIA ARERO COTRINA			20/9/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
126	MVBF_0737	KR 27 BIS 72C 27 SUR	EVANGELINA MADRIGAL TAPIA	$14.400.000,00		20/9/2022	17/1/2023		EJECUCION	50,00%	30,00%

127	MVBF_0736	KR 27 BIS 72C 33 SUR	LUIS ALFONSO PIAY			25/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
128	MVBF_745	KR 27 BIS 72C 38 SUR MJ 1	OLGA LUCILA RIVEROS HIGUERA	$14.400.000,00		20/9/2022	17/1/2023		EJECUCION	45,00%	20,00%
129	MVBF_0753	KR 27 BIS 72C 44 SUR	LUZ DARY ALONSO PACHON			20/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
130	MVBF_770	KR 27 BIS 72C 50 SUR	HERMINIA FORERO BUSTOS						VALIDADA	0,00%	0,00%
171	MVBF_113	KR 26G 75 A SUR 22	SANDRA PATRICIA SANABRIA			18/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
172	MVBF_094	KR 26G 75A 08 SUR	ZOILA ROSA GONZALEZ CASTRO			16/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
173	MVBF_107	KR 26F 75A 31 SUR	CELINA CARAVALI GONZALEZ			19/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
174	MVBF_106	KR 26F 75A 35 SUR	CARMEN SEMANATE			17/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
177	MVBF_223	TV 26C BIS A 75B 45 SUR	OMAR FERNEY NIÑO			19/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
178	MVBF_232	TV 26C BIS A 75B 93 SUR	HERMENCIA CHITIVA			19/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
179	MVBF_0294	TV 26C BIS 75C 16 SUR	MIGUELINA GOMEZ HOYOS			19/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
185	MVBF_027	CL 76 SUR 26H 04	LEONOR CHISCO SARAY			27/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
186	MVBF_022	KR 26H 75B 19 SUR MJ	MARTHA HELENA PARDO			27/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
187	MVBF_117	KR 26G 75A 38 SUR	MARIA EUGENIA GONZALEZ			18/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
188	MVBF_096	KR 26 G No. 75 A 26 SUR	MARISOL LATORRE DEVIA			20/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
GRUPO No. 3											
1	MVBF_1220	CL 73C BIS A SUR 26F 27 MJ	MARIA NOHEMY MATTA LOZANO	$14.398.932,00		21-sep-22	20/1/2023		EJECUCION	60,00%	40,00%
2	MVBF_1228	KR 27 73C 32 SUR	SANDRA YANETH REY VANEGAS	$13.947.172,00		21-sep-22	24/1/2023		EJECUCION	60,00%	45,00%
3	MVBF_1213	CL 73D BIS SUR 26G 02 MJ	NORMA CONSTANZA MELO	$14.399.302,00	$14.400.000,00	21-sep-22	10/12/2022	15/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
29	MVBF_1049	CL 73 SUR 27 43 MJ	YAMILE DARLEY LONDOÑO			19-sep-22			RENUNCIA	0,00%	0,00%
30	MVBF_1083	KR 27 73B 15 SUR	ROSA ELENA GOMEZ QUINTERO	$14.374.413,00	$14.227.821,00	20-sep-22	13/10/2022	8/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
35	MVBF_1096	KR 27 BIS A 73 22 SUR	LUCILA TRUJILLO	$13.862.187,32	$14.399.456,00	20-sep-22	31/10/2022	12/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
37	MVBF_1061	KR 27 BIS A 73 31 SUR	FLORENTINO JUEZ BARRETO	$14.400.000,00	$14.391.266,00	19-sep-22	10/10/2022	18/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
38	MVBF_1052	KR 27A 73 26 SUR	OFELIA MEDINA ARCILA	$14.152.874,42	$14.382.156,00	19-sep-22	1/11/2022	17/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
40	MVBF_1068	KR 27A 73 06 SUR	LUIS ALIRIO CORREA LOPEZ	$14.003.597,43	$14.392.594,00	20-sep-22	1/11/2022	15/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
41	MVBF_1330	CL 73B SUR 26C 90	MAYERLY HERNANDEZ MENDEZ	$14.400.000,00		21/10/2022	11/1/2023		EJECUCION	90,00%	20,00%
42	MVBF_1324	CL 73 B SUR 26 C 74	PURIFICACION CORTES	$14.381.900,00		19/10/2022	11/1/2023		ENTREGADA	100,00%	10,00%
45	MVBF_1314	CL 73B SUR 26F 38	MARIELA SANDOVAL VERA			19/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%

46	MVBF_1315	CL 73B SUR 26F 32	MARIA TERESA MONTOYA DE BERMUDEZ	$14.398.673,00		19/10/2022	18/1/2023		EJECUCION	0,00%	0,00%
49	MVBF_1306	CL 73B SUR 26F 02 MJ	LUZ STELLA BETANCOURTH GIRALDO			27/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
52	MVBF_1276	CL 73C SUR 26F 38	ELIZABETH SEPULVEDA DIAZ			20/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
53	MVBF_1240	CL 73 C BIS A SUR 26F 02 MJ 1	HEBERT FREDY ARIAS BELTRAN			13/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
54	MVBF_1255	CL 73C BIS A SUR 26C 90	DIANA ALEJANDRA ORJUELA VIVAS			20/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
55	MVBF_1234	CL 73C SUR 26F 03 MJ	WILLIANS GONZALEZ PEDROZA			20/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
86	MVBF_0924	CL 73 SUR 26F 40	ROSALBA ROJAS ROJAS	$14.374.629,00	$14.374.629,00	19/10/2022	10/11/2022	18/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
87	MVBF_1343	CL 73 SUR 26F 09	AMANDA BERNAL ORTIZ	$14.372.084,00	$14.350.983,00	19/10/2022	10/11/2022	18/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
88	MVBF_1338	CL 73 SUR 26F 03 MJ	IRIS SOTO	$14.397.837,00	$14.397.384,00	19/10/2022	31/10/2022	17/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
89	MVBF_0925	CL 73 SUR 26F 16	MARIA EVA PULIDO CELIS	$14.385.749,00		19/10/2022	30/1/2023		EJECUCION	40,00%	40,00%
90	MVBF_894	KR 26F 72H 60 SUR	LUZ ANGELA RODRIGUEZ MESA	$14.323.880,00		19/10/2022	30/1/2023		EJECUCION	0,00%	0,00%
91	MVBF_1358	CL 73A SUR 26D 16	JOSE GERMAN GARAVITO YATE	$14.358.302,00	$14.377.649,00	19/10/2022	31/10/2022	15/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
92	MVBF_1362	CL 73A SUR 26D 08	ALICIA CARREÑO	$14.394.740,00	$14.394.740,00	1/11/2022	29/11/2022	13/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
93	MVBF_1363	CL 73A SUR 26D 04	MARIA CRISTINA QUIROGA RUGE			21/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
94	MVBF_1321	CL 73A SUR 26D 07	TEOFILDE FORERO AGUILAR	$14.308.128,00	$14.350.402,00	21/10/2022	15/11/2022	13/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
95	MVBF_1329	CL 73A SUR 26D 19	JULIO CESAR BUILES MURIEL	$14.309.042,00		21/10/2022	16/1/2023		EJECUCION	10,00%	10,00%
96	MVBF_1354	CL 73A SUR 26F 02	JISEL SARIME LOZANO CERQUERA	$14.389.630,00	$14.363.094,00	21/10/2022	1/11/2022	15/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
97	MVBF_1337	CL 73A SUR 26F 08 MJ	LUZ MIRIAM MARULANDA RODRIGUEZ	$14.307.907,00	$14.370.157,00	21/10/2022	31/10/2022	27/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
98	MVBF_1339	CL 73A SUR 26F 20 MJ	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	$14.376.459,00	$14.376.459,00	21/10/2022	15/11/2022	13/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
99	MVBF_1307	CL 73 A SUR 26F 15	EMPERATRIZ RAMIREZ BOHORQUEZ			26/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
100	MVBF_1311	CL 73A SUR 26F 27	JULIA MARTINEZ SEGURA	$14.171.779,00	$14.365.252,00	26/10/2022	15/11/2022	12/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
146	MVBF_808	CL 72C SUR 26C 59	JOSE FERMIN ROCHA			17/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
147	MVBF_805	CL 72 C SUR No. 26 C 69	MANUEL MONCADA FANDIÑO	$14.302.827,00		12/1/2023	25/1/2023		EJECUCION	40,00%	20,00%
148	MVBF_820	KR 26F 72D 14 SUR	LUIS CARLOS LOMBANA			12/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
149	MVBF_835	CL 72D BIS A SUR 26D 21	NURY ESPERANZA MELO	$14.194.616,00	$14.355.025,00	28/10/2022	29/11/2022	15/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
150	MVBF_0837	KR 26 D 72D 45 SUR	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ			13/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
151	MVBF_0841	CL 72 D BIS A SUR 26C 79	ELIZABETH OSPINA CAICEDO	$14.360.668,00	$14.363.094,00	28/10/2022	15/11/2022	18/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
152	MVBF_0840	CL 72 F SUR 26C 74 MJ	MARIA HEMIR TAPIA HERNANDEZ	$14.396.907,00	$14.387.990,00	28/10/2022	15/11/2022	23/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%

153	MVBF_850	CL 72F SUR 26C 69	GUSTAVO RODRIGUEZ RODRIGUEZ			17/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
154	MVBF_853	CL 72F SUR 26D 23	CINDY JASBLEIDY DUARTE MUÑOZ	$14.316.470,00	$14.391.855,00	28/10/2022	23/11/2022	15/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
155	MVBF_854	CL 72F SUR 26F 05	ANA LEONORA RUIZ MENDEZ	$14.363.897,00		28/10/2022	11/1/2023		EJECUCION	80,00%	20,00%
156	MVBF_0972	KR 27 BIS 72G 38 SUR	PABLO ENRIQUE CALDERON			13/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
157	MVBF_0953	KR 27 BIS 72G 34 SUR	LUIS MORENO VIUCHE			12/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
158	MVBF_0938	KR 27 72G 68 SUR	BLANCA MARINA MARTINEZ		03/02/2023	12/1/2023			EJECUCION		10,00%
159	MVBF_1347	KR 27 73 02 SUR	MARIA NANCY CANACUE ROMERO			16/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
160	MVBF_0946	CL 73 SUR 26G 08	DEYANIRA FRANCO MONTENEGRO			16/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
189	MVBF_149	CL 75A BIS SUR 26F 53	LASTENIA PALACIOS MURILLO			27/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
190	MVBF_145	CL 75A BIS SUR 26F 47	BERENICE RINCON TELLEZ			19/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
191	MVBF_0183	CL 75A BIS SUR 26F 60	DORIS HERNANDEZ HERNANDEZ			19/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
192	MVBF_241	KR 27 75 24 SUR	MARIA LUCIA BARREÑO AGUDELO			26/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
193	MVBF_235	CL 75A SUR 26F 60 MJ	JOSE SAUL MONROY MARTINEZ			19/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
194	MVBF_172	CL 75A BIS SUR 26F 18 MJ	LAURENTINO BURGOS RINCON			19/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
195	MVBF_236	CL 75 SUR 26F 29	LILIANA RENDON LOZANO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
196	MVBF_287	CL 74B BIS A SUR 26F 38	CARMEN ROSA GONZALEZ			17/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
197	MVBF_0286	CL 74B BIS A SUR 26F 28 MJ	RAQUEL MENDEZ PEÑA			17/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
198	MVBF_312	DG 74 B BIS A SUR 26 C 41	VIRGINIA CORTES PARDO			26/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
175	MVBF_1496	TV 26C BIS A 75A 03 SUR	BLANCA ELVIRA RAMIREZ MONTES			25/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
176	MVBF_0225	TV 26C BIS B 75A 10 SUR	CARMEN ELENA SOCARRAZ QUIROZ			25/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
GRUPO No. 4											
28	MVBF_0975	KR 27 BIS B 72G 28 SUR	LUIS HERNANDO SALCEDO	$14.350.659,00	$14.381.817,00	21-sep-22	10/11/2022	18/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
31	MVBF_1084	KR 27 73B 09 SUR	FIDEL ANTONIO TELLEZ ESCARRAGA	$13.883.096,82	$14.389.392,00	21-sep-22	13/10/2022	9/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
32	MVBF_1078	KR 27 BIS A 73 64 SUR	MARIA NUBIA LOZANO CERQUERA			20-sep-22			VALIDADA	0,00%	0,00%
33	MVBF_1080	KR 27 BIS A 73 34 SUR MJ	MARIA DEL ROSARIO BAEZ	$14.329.132,00	$14.397.966,00	21-sep-22	10/11/2022	18/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
34	MVBF_1081	KR 27 BIS A 73 28 SUR	MELQUISEDEC ORTIZ	$14.388.713,09	$14.388.713,09	19-sep-22	1/11/2022	21/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
36	MVBF_1050	KR 27 BIS A 73 39 SUR MJ 1	FRANQUELINA BALLESTEROS	$14.396.471,00	$14.396.471,00	19-sep-22	29/11/2022	21/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
39	MVBF_1048	KR 27A 73 18 SUR MJ	MARIA GLADYS TRIANA	$14.128.717,42	$14.028.825,00	21-sep-22	7/10/2022	8/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%

71	MVBF_0979	KR 27 BIS 72G 27 SUR MJ	LUZ MARINA TRIBIÑO RAMIREZ	$14.397.127,18	$14.377.332,00	20/10/2022	2/11/2022	15/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
72	MVBF_1098	KR 27 BIS A 73 52 SUR	JULIO CESAR LEMUS ZULETA	$14.365.960,30	$14.398.854,00	18/10/2022	2/11/2022	17/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
73	MVBF_1045	KR 27A BIS 73 10 SUR	MARIELA CARDONA CARDONA	$14.000.000,00	$14.397.361,00	20/10/2022	2/11/2022	18/11/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
74	MVBF_1000	KR 27A BIS 73 11 SUR MJ 1	JORGE ELIECER HUERTAS GIL	$14.000.000,00		18/10/2022	11/1/2023		EJECUCION	45,00%	30,00%
75	MVBF_1007	CL 73 SUR 27A 21	NUBIA HERRERA QUINTERO			18/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
76	MVBF_1001	KR 27A BIS 73 23 SUR MJ	MARIA ELIA MENESES GOMEZ	$14.346.022,00	$14.398.500,00	18/10/2022	26/11/2022	13/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
77	MVBF_1014	KR 27A BIS 73 27 SUR	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ						RENUNCIA	0,00%	0,00%
78	MVBF_1013	KR 27B 73A 16 SUR	EMILIANO PEREZ AVELLA	$14.000.000,00		14/12/2022	16/1/2023		EJECUCION	35,00%	25,00%
79	MVBF_0679	TV 27H 72D 14 SUR	POSIDIO HUERTA HUERTAS			10/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
80	MVBF_675	KR 27 B 72D 23 SUR	CELIMO PADILLA VEGA			14/12/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
81	MVBF_0677	KR 27B 72D 05 SUR	ANA GLADYS PACHON CHURQUE	$14.000.000,00		14/12/2022	16/1/2023		EJECUCION	2,00%	2,00%
82	MVBF_0715	KR 27B 72C 20 SUR	JORGE ENRIQUE QUINONES			19/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
83	MVBF_676	KR 27B 72 D 11 SUR	AMPARO ARIAS OGONZALEZ			14/12/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
84	MVBF_0669	KR 27B 72D 29 SUR	MARIA CLAUDIA MRTINEZ	$14.363.595,00		12/1/2023	24/1/2023		EJECUCION	15,00%	13,00%
85	MVBF_1076	KR 27 BIS A 73 40 SUR MJ	ESPERANZA CASTILLO ALTURO	$14.394.860,00	$14.394.860,00	27/10/2022	29/11/2022	13/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
108	MVBF_0558	CL 73C SUR 27B 26	MONICA ANDREA CRISTANCHO QUIMBAYO			20/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
109	MVBF_552	CLL 73C SUR 27B 62	ORFANIDES LOSADA PERDOMO			19/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
110	MVBF_549	CL 73 C SUR 27 B 78	MILLER ALEJANDRO HURTADO SAENZ			23/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
111	MVBF_0540	CL 73B SUR 27C 29	LUZ STELLA FRANCO DIAZ			20/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
112	MVBF_567	CL 73B SUR 27C 24	FLORENTINO PICO BASTILLA			20/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
113	MVBF_605	DG 73A BIS SUR 27C 28	MISAEL MACANA			27/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
114	MVBF_0592	DG 73A BIS SUR 27C 34	MARIA HELENA BAQUERO MACANA			27/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
115	MVBF_0570	TV 27H 73A 36 SUR	JOSE ANTONIO MOYA ZAMORA			27/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
131	MVBF_536	CL 73B SUR 27B 21	CLAUDIA MARTINEZ CLAVIJO	$14.397.978,00	$14.397.978,00	20/10/2022	29/11/2022	15/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
132	MVBF_530	CL 73B 27B 33 MJ	OMAR MEDINA ORTEGA			27/10/2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
133	MVBF_0531	CL 73B SUR 27C 05	INES DIAZ	$14.245.243,00	$14.398.250,00	28/10/2022	16/11/2022	15/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
134	MVBF_589	CL 73B SUR 27B 34	LUISA FERNANDA TAPIERO TRUJILLO	$14.000.000,00	$14.398.607,00	27/10/2022	2/11/2022	15/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
135	MVBF_588	CL 73B SUR 27B 40	JANETH MEDINA DIAZ	$14.000.000,00	$14.398.700,00	27/10/2022	2/11/2022	15/12/2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%

136	MVBF_0595	DG 73A SUR 27C 57 MJ	ANA DELIA GONZALEZ MATEUS			17/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
137	MVBF_631	TV 27H 73 34 SUR	LEIDY SABOGAL RAMIREZ	$14.000.000,00		12/1/2023	24/01/2023		EJECUCION	10,00%	10,00%
138	MVBF_0657	DG 73 BIS SUR 27B 36	SERGIO TORO			16/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
139	MVBF_660	DG 73 SUR 27B 13 MJ	CUSTODIA LUGO QUESADA	$14.000.000,00		12/1/2023	24/01/2023		EJECUCION	20,00%	5,00%
140	MVBF_645	DG 73 SUR 27B 11	MARIA SIXTA HURTADO			12/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
141	MVBF_0622	DG 73 BIS SUR 27B 03	MARIBEL HURTADO			16/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
142	MVBF_650	DG 73 SUR 27B 59	JULY ANDREA SANCHEZ ALONSO	$14.355.020,00		10/1/2023	24/01/2023		EJECUCION	45,00%	30,00%
143	MVBF_0649	DG 73 SUR 27B 53	OLGA MARIA ALONSO MORENO			10/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
144	MVBF_683	DG 73 SUR 27B 54	JOSE ALFONSO MORA AREVALO	$14.376.746,00		10/1/2023	24/01/2023		EJECUCION	20,00%	5,00%
145	MVBF_585	CL 73A SUR 27B 17	ANDREA HERRERA RANGEL			19/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
161	MVBF_0157	CL 75 SUR 27 33	ANA MILENA ABAUNZA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
162	MVBF_158	CL 75 SUR 27 39	ISABELINA PATIÑO			30/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
163	MVBF_154	CL 75 SUR 27 A 05	CLAUDIA SMIT LUCAS TANGARIFE			30/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
164	MVBF_0155	CL 75A SUR 27 22	SONIA MILENA GIRALDO HERRERA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
165	MVBF_075	CL 75A SUR 27 27	JAIDI RIAÑOS						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
166	MVBF_085	CL 75A SUR 27 63	LUCIA HERRERA QUINTERO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
180	MVBF_0072	CL 74A BIS A SUR 27 22	JORGE LUIS PEREZ IBAÑEZ						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
181	MVBF_071	CL 75A BIS A SUR 27 28	JOSE JAVIER OLARTE MAHECHA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
182	MVBF_058	CL 75A BIS A SUR 27 64	BEATRIZ BRYITH CANGREJO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
183	MVBF_047	CL 75B SUR 27 52	ANIBAL MORENO			31/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
184	MVBF_046	CL 75B SUR 27 58	MAGDALENA LEMUS CHAPARRO			1/2/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
167	MVBF_054	CL 75A BIS SUR 27 15	MAYERLY SANCHEZ MENDOZA			1/2/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
168	MVBF_066	CL 75A BIS SUR 27 39	GUMERSINDO SOLER SILVA			30/1/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
169	MVBF_089	CL 75A BIS SUR 27 46	MARIA CONSUELO PEREZ			1/2/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
170	MVBF_087	CL 75A BIS SUR 27 58	MARIA RUTH CORTES LOSADA			1/2/2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
199	MVBF_0482	CL 73D BIS SUR 27F 14	MARIA DAISSY BEJARANO						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
200	MVBF_495	CL 73D BIS SUR 27M 52	MARIA FABIOLA GUEVARA ISAZA						SIN VALIDAR	0,00%	0,00%

BARRIO ALFONSO LOPEZ											
GRUPO No. 1											
	MV_03049	CL 111A SUR 8 61 ESTE	MARTHA JANETH DIAZ GUEVARA						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03061	CL 112 SUR 8 75 ESTE	JOSE LISANDRO COLO OYOLA			20/01/2023			VALIDADA	0,00%	
	MV_03062	KR 8A ESTE 112 15 SUR	ALVARO ANDRES MUÑOZ GUTIERREZ			23/01/2023			VALIDADA	0,00%	
	MV_02928	CL 112 SUR 8A 68 ESTE	JOSE JACINTO CANTE			27/01/2023			VALIDADA	0,00%	
	MV_02931	CL 112 SUR 8A 56 ESTE	ETELVINA CAMACHO VELASCO			26/01/2023			VALIDADA	0,00%	
	MV_02940	CL 112 SUR 8A 26 ESTE	GLORIA AIDE HIDALGO ALONSO			26/01/2023			VALIDADA	0,00%	
	MV_02942	CL 112 SUR 8A 10 ESTE	MARIA EUGENIA BEJARANO CIFUENTES						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_02952	CL 111A SUR 8A 29 ESTE	MARTHA MORENO TORRES						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_02953	CL 111A SUR 8A 35 ESTE	HERMINDA CIPACON CIPACON						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_02962	CL 111A SUR 8A 69 ESTE	HEBER TUMAL TUMAL						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_02963	CL 111A SUR 8A 81 ESTE	NUBIA OLIVA LUJAN MONTAÑO						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_02967	CL 111 SUR 8A 89 ESTE	JOSE JOAQUIN CAMARGO MORALES						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_02968	CL 111A SUR 8A 93 ESTE	MARIA MERCEDES ARIAS DE GARCIA						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_02969	CL 111A SUR 8A 97 ESTE	FLORMABEL DIAZ GONZALEZ						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_02977	CL 112 SUR 8C 86 ESTE	BENJAMIN TIQUE LONDOÑO						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03014	CL 112 SUR 9 48 ESTE	DELFA SUAREZ RUEDA						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03015	CL 112 SUR 9 44 ESTE	JUDY ESPERANZA MARTINEZ CARDENAS						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03016	CL 112 SUR 9 40 ESTE	NOHEMY GALLEGO ARIAS						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03017	CL 112 SUR 9 30 ESTE	YOLANDA RODRIGUEZ						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03019	CL 112 SUR 9 22 ESTE	MARCO ANTONIO ROBAYO						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03086	CL 112A SUR 8A 08 ESTE	OSWALDO ALONSO ACEVEDO SALAMANCA			20/01/2023			VALIDADA	0,00%	
	MV_03095	CL 112 SUR 8A 33 ESTE	NIKOLL MARCELA IBARRA ESPINOSA			27/01/2023			VALIDADA	0,00%	
	MV_03098	CL 112 SUR 8A 43 ESTE	ANA YANETH PEÑA VERANO			23/01/2023			VALIDADA	0,00%	
	MV_03101	CL 112 SUR 8A 55 ESTE	EDGAR RINCON CASTAÑEDA			23/01/2023			VALIDADA	0,00%	
	MV_03103	CL 112 SUR 8A 67 ESTE	MARGOTH SANCHEZ MENDOSA			26/01/2023			VALIDADA	0,00%	
	MV_03120	CL 112A SUR 8C 68 ESTE	MARIA NELY PAMO ANDRADE						SIN VALIDAR	0,00%	

	MV_03129	CL 112A SUR 8C 14 ESTE	JESUS MARIA PULIDO BERNAL						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03130	CL 112 SUR 8C 13 ESTE	JAIRO ALBERTO SIERRA CELY						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03171	CL 113 SUR 8A 66 ESTE	JOSE RICARDO TRIANA			16/1/2023			VALIDADA	0,00%	
	MV_03213	CL 113 SUR 8C 04 ESTE	JAIRO JONNY SILVA						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03216	CL 112A SUR 8C 17 ESTE	JOSE LUIS RODRIGUEZ CANO						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03288	CL 113 SUR 8A 57 ESTE	MARTHA INES MADRIGAL MALAMBO			16/1/2023			VALIDADA	0,00%	
	MV_03290	CL 113 SUR 8A 67 ESTE	MARIA VISITACIÓN TARAZONA VARGAS			16/01/2023			VALIDADA	0,00%	
	MV_03374	CL 114 SUR 8C 33 ESTE	VICTOR MANUEL ALDANA LESMES						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03401	CL 114A SUR 8B 41 ESTE	ANA CECILIA ALEJO SECHAGUA			2/02/2023			VALIDADA	0,00%	
	MV_02761	CL 111A SUR 10B 09 ESTE	LUIS CARLOS JEJEN JEJEN						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_02995	CL 111A SUR 8C 31 ESTE	DIANA MARLENE SANCHEZ VIRVIESCAS						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03000	CL 111A SUR 8C 61 ESTE	NUBIA YISETH MARTINEZ ZABALA						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03005	CL 111A SUR 8C 85 ESTE	URIEL CLAROS CHAVARRO						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03018	CL 112 SUR 9 26 ESTE	JESUS ANTONIO LEGUIZAMON MUNEVAR						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03024	CL 111A SUR 9 09 ESTE	LISBETH MARIA CARDENAS GARCIA						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03042	CL 111A SUR 10 17 ESTE	SMITH RUEDA SANCHEZ						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03139	KR 9 ESTE 112 09 SUR	LUIS JOSE GRAJALES VALENCIA						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03188	CL 112A SUR 8A 25 ESTE	CHERLY OSORIO MORA			17/1/2023			VALIDADA	0,00%	
	MV_03201	CL 112A SUR 8A 87 ESTE	ANGELINA ORTIZ CARVAJAL			19/1/2023			VALIDADA	0,00%	
	MV_03218	CL 112A SUR 8C 35 ESTE	BEATRIZ ELLIS ESCORCIA						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03241	CL 112A SUR 8D 21 ESTE	LERVIS DARIS GOMEZ ORTEGA						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03243	CL 112A SUR 9 07 ESTE	BLANCA AURORA NIÑO CASALLAS						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03247	CL 112A SUR 9 33 ESTE	MESIAS ROMERO GARCIA						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03248	CL 112A SUR 9 39 ESTE	JOSE ISIDRO BENAVIDES JIMENEZ						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03262	CL 114 SUR 8B 36 ESTE	CLAUDIA LILIANA TOVAR SASA						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03268	CL 114 SUR 8 38 ESTE	MARTHA CECILIA BARRETO QUINA			30/1/2023			VALIDADA	0,00%	
	MV_03271	CL 114 SUR 8 18 ESTE	SANDRA YASMIN CASTILLO BELTRAN			30/1/2023			VALIDADA	0,00%	
	MVAL_03020	CL 112 SUR 9 16 ESTE	YULI CAROLINA MARTINEZ AMADO						SIN VALIDAR	0,00%	

	MV_02749	CL 111 SUR 10B 25 ESTE	FERLEIN MATEUS HERNANDEZ						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03031	CL 111A SUR 9 51 ESTE	GLORIA PATRICIA GALLEGO						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03067	CL 112A SUR 8A 88 ESTE	MARTHA ARANDA			19/01/2023			VALIDADA	0,00%	
	MV_03116	CL 112A SUR 8D 14 ESTE	NELSON RODRIGUEZ ROJAS						SIN VALIDAR	0,00%	
	MVAL_03123	CL 112A SUR 8C 50ESTE	FANY LEONOR LOPEZ RIVERA						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03189	CL 112A SUR 8A 27 ESTE	NIDIA YOLIMA ZAPATA RODRIGUEZ			17/1/2023			VALIDADA	0,00%	
	MV_03190	CL 112A SUR 8A 35 ESTE	LIGIA BERNAL DE LEYTON			17/1/2023			VALIDADA	0,00%	
	MV_03211	CL 113 SUR 8C 08 ESTE	GRACIELA CRUZ DIAZ						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03229	CL 113 SUR 8D 58 ESTE	LUIS ANTONIO GARCIA MORENO						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03231	CL 113 SUR 8D 40 ESTE	ISMAEL GAONA						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03239	CL 112A SUR 8D 15 ESTE	LUCILA OCHOA DE VEGA						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03258	CL 114A SUR 8B 66 ESTE	GIOVANNY ANDRES MEDINA			1/2/2023			VALIDADA	0,00%	
	MV_03270	CL 114 SUR 8 26 ESTE	BETTY PAYAN ACEVEDO			30/1/2023			VALIDADA	0,00%	
	MV_03300	CL 114 SUR 8 44 ESTE	FABIOLA ALVARADO SANCHEZ			30/1/2023			VALIDADA	0,00%	
	MV_03339	CL 113 SUR 8D 97 ESTE	SIXTO ABILIO PERALTA RINCON						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03352	CL 114 SUR 8B 09 ESTE	CARMEN MERCEDES TORRES RICO			1/02/2023			VALIDADA	0,00%	
	MV_03359	CL 114 SUR 8B 57 ESTE	JAZMIN ALONSO MENDEZ						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_02748	KR 10B BIS ESTE 111 06 SUR	ANGELMIRA FUENTES FUENTES						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03215	CL 112A SUR 8C 11 ESTE	ANA BETULIA MESA LOPEZ						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03344	CL 114A SUR 8B 30 ESTE	ARCANGEL DE JESUS ROJAS LONDOÑO			2/2/2023			VALIDADA	0,00%	
	MV_03150	CL 112A SUR 9 04 ESTE	MARTHA RUBIO DELGADO						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03317	CL 114 SUR 9 38 ESTE	JOSE DIAZ CRUZ						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03041	CL 111A SUR 10 11 ESTE	ELENA ULCUNCHE VARGAS						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03187	CL 112A SUR 8A 21 ESTE	VIRGINA GARCIA MORENO			17/1/2023			VALIDADA	0,00%	
	MV_03232	CL 113 SUR 8D 22 ESTE	MONICA LILIANA GUERRERO RUBIO						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03314	CL 114 SUR 9 78 ESTE	CARMEN ELISA DAVILA MARTINEZ						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03320	CL 114 SUR 8D 20 ESTE	MYRIAM NOVA GONZALEZ						SIN VALIDAR	0,00%	
	MV_03321	KR 8D ESTE 113 20 SUR	JHULHTZAI GUEVARA OÑATE						SIN VALIDAR	0,00%	

	MV_03397	CL 114A SUR 8B 59 ESTE	LUZ STELLA AYA LOPEZ			2/02/2023			VALIDADA	0,00%	
	MV_03399	CL 114A SUR 8B 47 ESTE	JORGE ELIECER TABARES GARCIA			2/02/2023			VALIDADA	0,00%	
	MVAL_03125	CL 112A SUR 8C 44 ESTE	CARLOS ALFONSO RODRIGUEZ TORRES						SIN VALIDAR	0,00%	
	MVAL_03328	CL 113 SUR 8D 25 ESTE	LUZ NELLY CARDONA JURADO						SIN VALIDAR	0,00%	
	MVAL_03403	CL 114A SUR 8B 21 ESTE	FELISA ALEJO ARDILA			2/02/2023			VALIDADA	0,00%	
	MV_03040	CL 111A SUR 10 07 ESTE MJ	YAMIL TOVAR INFANTE						SIN VALIDAR	0,00%	
	MVAL_03072	CL 112A SUR 8A 62 ESTE	GERMAN SASCRITAN GONZALEZ						SIN VALIDAR	0,00%	
	MVAL_02786	CL 110 SUR 9 70 ESTE	JUAN GABRIEL ALBERTO MOLANO MADRIGAL						SIN VALIDAR	0,00%	
	MVAL_00105	KR 6 ESTE 100 B 10 SUR	HERNAN MORENO HERNANDEZ						SIN VALIDAR	0,00%	

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO 2


Registro fotográfico componente social

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES SOCIALES - BELLA FLOR			
			
Actividad: Apertura MVBF_0925 Fecha: 30/01/2023	Actividad: Apertura MVBF_824 Fecha: 30/01/2023	Actividad: Seguimiento MVBF_1330 Fecha 30/01/2023	Actividad: Seguimiento MVBF_1324 Fecha 30/01/2023
			
Actividad: Seguimiento MVBF_854 Fecha 30/01/2023	Actividad: Seguimiento MVBF_805 Fecha 30/01/2023	Actividad: Seguimiento MVBF_1220 Fecha 30/01/2023	Actividad: Caracterizaciones MVBF_066 Fecha: 30/01/2023
			
Actividad: Validación MVBF_158 Fecha: 30/01/2023	Actividad: Validación MVBF_154 Fecha: 30/01/2023	Actividad: Validación MVBF_047 Fecha: 31/01/2023	Actividad: Seguimientos MVBF_1013 Fecha: 31/01/2023

			
Actividad: Seguimientos MVBF_631 Fecha: 31/01/2023	Actividad: Seguimientos MVBF_660 Fecha: 31/01/2023	Actividad: Seguimiento MVBF_745 Fecha: 31/01/2023	Actividad: Seguimiento MVBF_805 Fecha 01/02/2023
			
Actividad: Seguimiento MVBF_854 Fecha 01/02/2023	Actividad: Seguimiento MVBF_1329 Fecha 01/02/2023	Actividad: Seguimiento MVBF_1228 Fecha 01/02/2023	Actividad: Seguimiento MVBF_1220 Fecha 01/02/2023
			
Actividad: Validación MVBF_054 Fecha: 01/02/2023	Actividad: Validación MVBF_087 Fecha: 01/02/2023	Actividad: Validación MVBF_046 Fecha: 01/02/2023	Actividad: Validación MVBF_089 Fecha: 01/02/2023

			
Actividad: Seguimientos MVBF_1000 Fecha: 01/02/2023	Actividad: Seguimientos MVBF_0677 Fecha: 01/02/2023	Actividad: Seguimientos MVBF_0669 Fecha: 01/02/2023	Actividad: Atención PAC Fecha: 01/02/2023
			
Actividad: Seguimiento MVBF_0737 Fceha: 02/02/2023	Actividad: Seguimiento MVBF_0767 Fceha: 02/02/2023	Actividad: Apertura de obra MVBF_0938 Fecha 03/02/2023	Actividad: Entrega de obra MVBF_1324 Fecha 03/02/2023
			
Actividad: Atención al PAC MVBF_0294 Fecha 03/02/2023	Actividad: Seguimientos MVBF_683 Fecha: 03/02/2023	Actividad: Seguimientos MVBF_650 Fecha: 03/02/2023	Actividad: Atención al PAC Fecha: 04/02/2023

			
Actividad: Seguimiento MVBF_983 Fecha 04/02/2023	Actividad: Seguimiento MVBF_1198: Fecha: 04/02/2023	Actividad: Seguimiento MVBF_0780: Fecha: 03/02/2023	Actividad: seguimiento de obra MVBF_1195 casa 4 Fecha: 31/01/2023

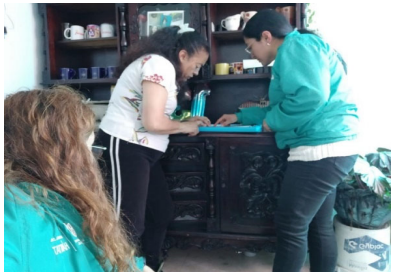REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES SOCIALES - USME			
			
Actividad: validación MV_ 03300 Fecha: 30/01/2023	Actividad: validación mv_03268 Fecha: 30/01/2023	Actividad: validación MV_03270 Fecha: 30/01/2023	Actividad: validación MV_03271 Fecha: 30/01/2023
			
Actividad: Validación MV_03403 USME Fecha: 2/02/2023	Actividad: Validación MV_ 03258 Usme Fecha: 01/02/2023	Actividad: Validación MV_03352 USME Fecha: 01/01/2023	Actividad: Validación MV_03344 USME Fecha: 2/02/2023
			
Actividad: Validación MV_03401 USME Fecha: 02/02/2023	Actividad: Validación MV_03397 USME Fecha: 02/02/2023	MV_03399 USME Fecha: 02/02/2023	
