INFORME DE SEGUIMIENTO
DEL INTERVENTOR EN LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

INFORME PARCIAL (SEMANAL) __14____ FINAL _____

PERIODO DE: 16 DE FEBRERO A 22 DE FEBRERO DE 2023

CONTRATO No. : 131 DE 2022

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Mínima cuantía

PROCESO DE CONTRATACIÓN : No. IP 013 de 2022

OBJETO : Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de Seguridad y de Salud en el Trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)".

LOCALIZACIÓN Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia(Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)

VALOR : $59.800.000 (Cincuenta y nueve millones ochocientos mil pesos)

PLAZO : Hasta 31 de diciembre de 2022

FECHA DE INICIO : 8 de septiembre de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN : 31 de diciembre de 2022

SUSPENSIÓN No 1 : 8 de diciembre de 2023

REINICIO : 16 de febrero de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL : 11 de marzo 2023

CONSULTOR INTERVENTORÍA : BRV Ingeniería y planeación SAS

CONTRATISTA : CONSORCIO JMS-C, conformado por JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS BIC (70%) Y JOSE MARIA SIERRA CARRASQUILLA (30%)

CONTRATO No. : 147 DE 2022

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Concurso de méritos

PROCESO DE CONTRATACIÓN : No. 07 de 2022

OBJETO : Realizar los estudios y diseños para las sedes judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)

LOCALIZACIÓN Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia(Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)

VALOR : $1.204.764.898 (Mil doscientos cuatro millones setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos noventa y ocho pesos)

PLAZO : Hasta 31 de diciembre de 2022

FECHA DE INICIO : 8 de septiembre de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN : 31 de diciembre de 2022

SUSPENSIÓN No 1 : 8 de diciembre de 2023

REINICIO : 16 de febrero de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL : 11 de marzo 2023

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

El presente informe semanal, pertenece a la semana número 14 del contrato de interventoría No. 131 de 2022, dicha semana está comprendida entre el 16 de febrero al 22 de febrero de 2023.

A continuación, se relacionan las actividades y oficios enviados por la **consultoría** en el avance de la semana No. 14, incluidas aquellas efectuadas en el tiempo de la suspensión No. 1 del contrato (realizadas en atención a los compromisos establecidos en el acta de suspensión No. 1 para superar las causas que originaron la suspensión, por consiguiente, no generan costos para la entidad):

- El 9/12/2022, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-127-2022, la consultoría remite a interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia UIF-CSJ. Atención a comunicado BRV-INT-CSJ-092-2022 y DEAJUIFO22-799. Informe Base Preliminar SEDE CONCORDIA. Entrega VERSIÓN 1.

- El 13/12/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-128-2022, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia a la UIF-CSJ. Atención a comunicado BRV-INT- CSJ-089-2022 y DEAJUIFO22-789. INFORME BASE PRELIMINAR SEDE NEIVA. VERSIÓN 1.

- El 12/12/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-129-2022, la consultoría remite a la Alcaldía Municipal de ZIPAQUIRÁ, GRUPO DE GESTIÓN DE RIESGO, la reiteración de solicitud de información técnica, según comunicado remitido anteriormente CEGG-CON-147-52-032-2022 de fecha 9/09/2022, sin respuesta a la fecha.

- El 12/12/2022, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-130-2022, la consultoría remite a la Alcaldía Municipal de ZIPAQUIRÁ, SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AMBIENTE, la reiteración de solicitud de información técnica, según comunicado remitido anteriormente CEGG-CON-147-52-033-2022 de fecha 19/09/2022, sin respuesta a la fecha
- El 13/12/2022, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-131-2022, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, respuesta al comunicado BRV-INT-CSJ-088-2022 y DEAJUIFO22-787. INFORME BASE PRELIMINAR SEDE ZIPAQUIRÁ. VERSIÓN 1.
- El 15/12/2022, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-132-2022, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, informe de seguimiento a cada una de las gestiones ante terceros.

- El 16/12/2022, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-133-2022, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia UIF-CSJ, respuesta a comunicado BRV-INT- CSJ-115-2022, relacionado con el informe de análisis de estudio de suelos realizado por Alfonso Uribe, en la etapa de construcción de la sede ZIPAQUIRÁ.
- El 19/12/2022, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-134-2022, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia UIF-CSJ, alcance a los comunicados CEGG-CON-147-52-125-2022 y CEGG-CON-147-52-126-2022, relacionadas con trámite de retiro del anticipo.
- El 21/12/2022, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-135-2022, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia UIF-CSJ, asunto relacionado con la aplicación de Norma Urbanística de la Sede de Barrancominas.
- El 05/01/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-136-2022, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia UIF-CSJ, el Informe Semanal No 11, de consultoría.
- El 05/01/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-137-2022, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia UIF-CSJ, el Informe Semanal No 12, de consultoría.
- El 05/01/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-138-2022, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia UIF-CSJ, el Informe Semanal No 13, de consultoría.
- El 11/01/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-140-2022, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia UIF-CSJ, el Informe Mensual No 3, de consultoría.
- El 18/01/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-141-2022, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia UIF-CSJ, Solicitud de Prórroga de la Suspensión Contractual.
- El 24/01/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-142-2022, la consultoría remite a Secretaría de Planeación del Municipio de Concordia, con copia a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia UIF-CSJ, Información Requerida para Concepto de Norma de la Sede Judicial de Concordia.

- El 24/01/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-143-2022, la consultoría remite a Secretaría de Planeación del Municipio de Concordia, con copia a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia UIF-CSJ, solicitud de apoyo en la gestión ante la Corporación Autónoma del Magdalena.
- El 26/01/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-144-2022, la consultoría remite a la INMOBILIARIA ACTUAL, solicitud de información del predio colindante con el de la Sede judicial de Zipaquirá, relacionada con levantamientos topográficos y estudios de Suelos.
- El 26/01/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-145-2022, la consultoría remite al Consejo Superior de la Judicatura, solicitud de comunicado aclaratorio de administración de la Sede Judicial de NEIVA, con destino secretaria de Planeación Municipal.
- El 26/01/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-146-2022, la consultoría remite a la INMOBILIARIA ACTUAL, solicitud de información del predio colindante con el de la Sede judicial de Zipaquirá, relacionada con levantamientos topográficos y estudios de Suelos.
- El 30/01/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-147-2022, la consultoría remite al departamento administrativo de planeación del municipio de NEIVA, aclaración al comunicado DAP-POT-1676, referente a la Norma Urbanística d aplicable para el proyecto de la Sede Judicial de Neiva.
- El 30/01/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-148-2022, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia a la UIF-CSJ un Informe de Gestión de Servicios Públicos (Acueducto, Alcantarillado sanitario y Pluvial), referente a la Sede ZIPAQUIRÁ.
- El 30/01/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-149-2022, la consultoría remite a CLARO COLOMBIA, derecho de petición, relacionado con la solicitud de información de los servicios de telefonía e internet de las sedes objeto del contrato.
- El 30/01/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-150-2022, la consultoría remite a TIGO UNE COLOMBIA, derecho de petición, relacionado con la solicitud de información de los servicios de telefonía e internet de las sedes objeto del contrato.
- El 08/02/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-151-2022, la consultoría remite a la oficina Asesora de Planeación de Barrancominas, la solicitud de viabilidad normativa del proyecto ante la falta de EOT.

- El 09/02/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-152-2022, la consultoría remite al Departamento Administrativo de Planeación, alcance al oficio CEGG-CON-147-52-147-2023 de 30/01/2023. Norma Urbanística Nueva sede NEIVA.
- El 14/02/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-153-2022, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia a la UIF-CSJ, solicitud de reinicio y prórroga del contrato 147/2022.
- El 15/02/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-154-2022, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia a la UIF-CSJ, propuesta técnica y económica del Levantamiento Topográfico para la Sede Neiva.
- El 15/02/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-155-2022, la consultoría remite a Inmobiliaria Actual, acuerdo de confidencialidad de información topográfica y estudio de suelos, sede ZIPAQUIRÁ.
- El 15/02/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-156-2022, la consultoría remite a EAAAZ, como derecho de petición Información técnica sede Judicial ZIPAQUIRÁ.
- El 16/02/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-157-2022, la consultoría remite a la BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia a la UIF-CSJ, respuesta a comunicado BRV-INT-CSJ-160-2023. Hojas de vida de profesionales.
- El 16/02/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-158-2022, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia a la UIF-CSJ, propuesta técnica y económica para el estudio de suelos para la Sede Neiva.
- El 16/02/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-159-2022, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia a la UIF-CSJ, las entrega de los Esquemas Básicos Arquitectónicos de todas las sedes.

A continuación, se relacionan las actividades contractuales y oficios enviados a la supervisión del contrato de **interventoría** a través de su supervisor Ing. Wilson Fernando muñoz Espitia en el avance de la semana No. 14 e incluyendo el tiempo de la suspensión No. 1 del contrato: (realizadas en atención a los compromisos establecidos en el acta de suspensión No. 1 para superar las causas que originaron la suspensión, por consiguiente, no generan costos para la entidad)

Consecutivo	Fecha	Asunto	Dirigido a
BRV-INT-CSJ-122-2022	15/12/2022	Entrega del Informe base preliminar (IBP) de la sede de La Primavera Vichada Versión 1 aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-123-2022	15/12/2022	Entrega del Informe base preliminar (IBP) de la sede de Concordia Magdalena Versión 1 aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-124-2022	15/12/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-885 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-086-2022: “Alcance oficio CEGG-CON-147-52-089-2022. Análisis de la información secundaria Sede Zipaquirá Cundinamarca.”	Consultoría
BRV-INT-CSJ-125-2022	15/12/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-887 - Respuesta	Consultoría

		memorando BRV-INT-CSJ-110-2022: "Alcance oficio CEGG-CON-147-52-104-2022. Diagnóstico Sede Zipaquirá Cundinamarca - Componente Eléctrico."	
BRV-INT-CSJ-126-2022	15/12/2022	Entrega del Informe base preliminar (IBP) de la sede de Neiva Huila Versión 1 aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-127-2022	16/12/2022	Entrega del Informe base preliminar (IBP) de la sede de Zipaquirá Versión 1 aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-128-2022	16/12/2022	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-132-2022. Seguimiento a las gestiones realizadas ante Terceros.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-129-2022	21/12/2022	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-133-2022. Análisis	Consejo Superior de la Judicatura UIF

		técnico componente de estudio de suelos V2 - Sede Zipaquirá.	
BRV-INT-CSJ-130-2022	21/12/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-913 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-086-2022: "Alcance oficio CEGG-CON-147-52-089-2022. Componente Topográfico Sede Zipaquirá Cundinamarca."	Consultoría
BRV-INT-CSJ-131-2022	23/12/2022	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-134-2022 - Aprobación del retiro No. 1 del anticipo correspondiente al contrato 147-2022.	Consultoría
BRV-INT-CSJ-132-2022	23/12/2022	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-134-2022 - Aprobación del retiro No. 2 del anticipo correspondiente al contrato 147-2022.	Consultoría

BRV-INT-CSJ-133-2022	23/12/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-926 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-086-2022: "Alcance oficio CEGG-CON-147-52-089-2022. Componente Estructural Sede Zipaquirá Cundinamarca."	Consultoría
BRV-INT-CSJ-134-2022	23/12/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-927 - Entrega manuales Sede Zipaquirá Cundinamarca.	Consultoría
BRV-INT-CSJ-135-2022	28/12/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-903 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL NO. 1	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-136-2022	28/12/2022	Solicitud de los informes semanales y mensuales del contrato de consultoría No. 147 de 2022	Consultoría
BRV-INT-CSJ-137-2022	29/12/2022	Alcance OF. DEAJUIFO22-961 - Reiteración de	Consejo Superior de la Judicatura UIF

		entrega informes semanales y mensuales pendientes.	
BRV-INT-CSJ-138-2022	29/12/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-963 - "Aceptación aval condicionado informes base preliminar de Barrancominas, Bolívar, Orocué, La Primavera y Concordia."	Consultoría
BRV-INT-CSJ-139-2022	30/12/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-967 - "Aceptación aval condicionado informe base preliminar de Zipaquirá Cundinamarca."	Consultoría
BRV-INT-CSJ-140-2022	30/12/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-968 - "Aceptación aval condicionado informe base preliminar de Neiva Huila."	Consultoría
BRV-INT-CSJ-141-2023	03/01/2023	Alcance OF. DEAJUIFO22-962 - Envío de observaciones al	Consejo Superior de la Judicatura UIF

		informe mensual No. 2 de interventoría.	
BRV-INT-CSJ-142-2023	12/01/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-135-2022. Reglamentación Urbana – Sede Barrancominas.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-143-2023	12/01/2023	Alcance al oficio DEAJUIFO23-2 - Entrega de Implantación diseño estructural en topografía de la Sede Judicial Neiva Huila.	Consultoría
BRV-INT-CSJ-144-2023	13/01/2023	Alcance al oficio DEAJUIFO23-6 - Diseño de cimentación Sede Judicial Neiva Huila.	Consultoría
BRV-INT-CSJ-145-2023	13/01/2023	Alcance al oficio DEAJUIFO23-8 - Aclaraciones diseños estructurales de la Sede Judicial Neiva Huila.	Consultoría
BRV-INT-CSJ-146-2023	13/01/2023	Entrega del informe semanal No. 11 de interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-147-2023	13/01/2023	Entrega Informe Semanal No. 11 del	Consejo Superior de la Judicatura UIF

		contrato 147-2022 aprobado por la interventoría.	
BRV-INT-CSJ-148-2023	13/01/2023	Entrega del informe semanal No. 12 de interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-149-2023	13/01/2023	Entrega Informe Semanal No. 12 del contrato 147-2022 aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-150-2023	13/01/2023	Entrega del informe semanal No. 13 de interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-151-2023	13/01/2023	Entrega Informe Semanal No. 13 del contrato 147-2022 aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-152-2023	13/01/2023	Entrega Informe mensual No. 2 del contrato 147-2022 aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-153-2023	16/01/2023	Entrega del informe mensual No. 3 de interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-154-2023	16/01/2023	Entrega Informe mensual No. 3 del contrato 147-2022	Consejo Superior de la Judicatura UIF

		aprobado por la interventoría.	
BRV-INT-CSJ-155-2023	18/01/2023	Alcance al oficio DEAJUIFO23-16 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-129-2022: Análisis técnico componente de estudio de suelos V2 – Sede Zipaquirá.	Consultoría
BRV-INT-CSJ-156-2023	18/01/2023	Alcance al oficio DEAJUIFO23-35 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-129-2022 Parte 2: Análisis técnico componente de estudio de suelos V2 – Sede Zipaquirá.	Consultoría
BRV-INT-CSJ-157-2023	18/01/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-141-2022. Solicitud de prórroga a la suspensión No. 1 del Contrato de Consultoría No. 147 de 2022 y Contrato de Interventoría No. 131 de 2022.	Consejo Superior de la Judicatura UIF

BRV-INT-CSJ-158-2023	26/01/2023	Aprobación informes semanales de consultoría del 1 al 13 y mensual del 1 al 3.	Consultoría
BRV-INT-CSJ-159-2023	27/01/2023	Alcance oficio DEAJUIFO22-964. Respuesta a observaciones en las hojas de vida del equipo mínimo de trabajo para el contrato de Interventoría No. 131 de 2022.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-160-2023	26/01/2023	Solicitud de hojas de vida de los profesionales del contrato de consultoría No. 147 de 2022	Consultoría
BRV-INT-CSJ-161-2023	31/01/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-148-2023. Informe de Gestión Servicios Públicos (Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Pluvial) - Sede Zipaquirá.	Consejo Superior de la Judicatura UIF

BRV-INT-CSJ-162-2023	08/02/2023	Alcance al oficio DEAJUIFO23-55 - Entrega pruebas de integridad de pilotes Sede Zipaquirá.	Consultoría

En la semana número 14 la **interventoría** hizo él envió de diferentes oficios dando respuesta y remitiendo información ya sea a la entidad o a la consultoría como se muestra en la anterior tabla.

1.2. GARANTÍAS

Tabla No. 1 garantías de la interventoría conforme al contrato

GARANTÍAS			
CONTRATO 131 de 2022- INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS Aprobación 25/08/2022			
No Póliza	62-44-101016046		
Aseguradora	Seguros del Estado S. A		
AMPAROS	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento del contrato	08/09/2022	07/08/2023	$ 8.970.000.00
Calidad del servicio	04/02/2023	04/02/2028	$ 14.950.000.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legalese indemnizaciones laborales	08/09/2022	04/02/2026	$ 8.970.000.00

La póliza 62-44-101016046 de Seguros del Estado S.A Anexo 0, fue cargada en la plataforma SECOP II el 8/08/2022 y rechazada en SECOP II por parte de la entidad debido a ajustes que se debían hacer a esta. Una vez realizados los ajustes y diferentes verificaciones, se aprobó en el SECOP II el día 25/08/2022.

Tabla No. 2 garantías de la interventoría conforme al acta de inicio

GARANTÍAS			
CONTRATO 131 de 2022- INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS Aprobación 04/10/2022			
No Póliza	62-44-101016046		
Aseguradora	Seguros del Estado S. A		
AMPAROS	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento del contrato	08/09/2022	07/08/2023	$ 8.970.000.00
Calidad del servicio	04/02/2023	04/02/2028	$ 14.950.000.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legalese indemnizaciones laborales	08/09/2022	04/02/2026	$ 8.970.000.00

La póliza 62-44-101016046 de Seguros del Estado S.A Anexos 1,2 y 3 al acta de inicio, fue cargada a la plataforma SECOP II el 26/09/2022 y aprobada en SECOP II el 04/10/2022.

- Las pólizas actualizadas de acuerdo con la suspensión y reinicio del contrato se encuentran en trámite ante la aseguradora.

Tabla No. 3 garantías de la consultoría conforme al contrato

GARANTÍAS			
CONTRATO 147-2022- ESTUDIOS Y DISEÑOS Aprobación 24/08/2022			
No Póliza	14-44-101160700		
Aseguradora	Seguros del Estado S. A		
AMPAROS	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento del contrato	17/08/2022	30/06/2023	$ 180.714.734.70
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	17/08/2022	30/06/2023	$ 602.382.449.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	17/08/2022	31/12/2025	$ 180.714.734.70
Calidad del servicio	31/12/2022	31/12/2027	$ 301.191.224.50

- La póliza 14-44-101160700 de Seguros del Estado S.A Anexo 0, fue cargada a la plataforma SECOP II el 22/08/2022 y aprobada en SECOP II el 24/08/2022 por parte de la entidad.

Tabla No. 4 garantías de la consultoría conforme al acta de inicio

GARANTÍAS <u>ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO</u>			
CONTRATO 147-2022- ESTUDIOS Y DISEÑOS Aprobación 23/11/2022			
No Póliza	14-44-101160700		
Aseguradora	Seguros del Estado S. A		
AMPAROS	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento del contrato	08/09/2022	22/07/2023	$ 180.714.734.70
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	08/09/2022	22/07/2023	$ 602.382.449.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	08/09/2022	22/01/2026	$ 180.714.734.70
Calidad del servicio	22/01/2023	22/01/2028	$ 301.191.224.50

- La actualización de póliza se encuentra cargada en la plataforma SECOP II y enviada a la interventoría y a la entidad el 05/10/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-060-2022, a la espera de la aprobación final por parte del CSJ.
- Una vez atendidos los requerimientos de la Entidad, la Póliza No. 14-44-101160700 fue aprobada por el CSJ, el día 23 de noviembre de 2022.
- Las pólizas actualizadas de acuerdo con la suspensión y reinicio del contrato se encuentran en trámite ante la aseguradora.

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO

En el siguiente cuadro se presenta el avance del contrato concurrida la semana número 14, en el cuadro se discrimina el avance para cada 1 de las sedes que se piensan diseñar:

Tabla No.5 Avance físico programado y ejecutado

AVANCE FÍSICO POR SEDE							
SEMANA No 14							
DE 16/02/2023 A 22/02/2023							
GENERALIDADES			AVANCE FÍSICO PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO EJECUTADO		AVANCE Y/O ATRASO
SEDE	VALOR/SEDE	PESO DE TOTAL (%)	SEMANAL POR SEDE	AVANCE FÍSICO INTEGRAL PROGRAMADO	SEMANAL POR SEDE	AVANCE FÍSICO INTEGRAL EJECUTADO	
LA PRIMAVERA	$ 39.000.000,00	6,23%	88,84%	5,54%	13,00%	0,81%	-4,73%
CONCORDIA	$ 39.000.000,00	6,23%	88,85%	5,54%	13,00%	0,81%	-4,73%
BARRANCOMINAS	$ 39.000.000,00	6,23%	88,85%	5,54%	13,00%	0,81%	-4,73%
OROCUÉ	$ 111.750.000,00	17,86%	89,37%	15,97%	13,00%	2,32%	-13,64%
BOLÍVAR	$ 130.500.000,00	20,86%	89,37%	18,64%	11,30%	2,36%	-16,29%
ZIPA VULN	$ 85.000.000,00	13,59%	87,61%	11,90%	27,00%	3,67%	-8,24%
NEIVA	$ 121.275.000,00	19,39%	95,56%	18,53%	13,15%	2,55%	-15,98%
ZIPA DIAG	$ 60.000.000,00	9,59%	85,57%	8,21%	20,45%	1,96%	-6,25%
TOTAL	$ 625.525.000,00	100,00%		89,87%		15,29%	-74,58%

El avance del contrato de consultoría físico total programado como lo describe la anterior tabla corresponde al 89,87% en la semana número 14 de trabajo, aun así, hasta el corte de la semana 14 se han ejecutado un total de 15,29% de avance ejecutado, lo que genera un valor de retraso negativo de -74,58%.

Como se observa para todas las sedes se presenta un atraso relevante, considerando como causa principal la falta de respuestas a la solicitud de información por parte de las entidades municipales y de la misma entidad contratante.

En el **anexo No. 1** del presente informe se muestra el cronograma actual aprobado por la **interventoría** que sirve como base para la elaboración de la **Tabla No. 5 Avance físico programado y ejecutado.**

Avance Físico. Contrato 147/2022:

Se presenta a continuación el análisis resumido efectuado para la determinación del avance físico de cada una de las sedes, así como el avance integral total del contrato.

Criterios para evaluación:

Teniendo en cuenta el número de sedes, así como de los entregables en cada una de las mismas, para la determinación de los avances físicos se definieron los siguientes criterios:

- Para cada sede se asigna un porcentaje (%) en peso de cada componente estableció en el Anexo Técnico de Entregables.
- Con lo anterior y el cronograma de ejecución del contrato, se establecen los avances físicos programados de cada actividad.
- Para la determinación del avance ejecutado de actividad para cada sede se asigna un porcentaje de acuerdo con el avance real estimado por el mismo CONSORCIO JMS-C.
- Para la determinación del avance integral, se estima el peso de cada sede en particular del contrato.

Peso en % de entregables para cada sede:

En la siguiente tabla se muestra el peso por porcentaje que se le da a cada actividad a desarrollar de las sedes de la Primavera, Concordia, Barrancominas, Orocué y Bolívar; la suma de los porcentajes de todas las actividades de cada sede debe dar un total del 100%.

PESO (%) POR COMPONENTE						
ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**SEDES**				
		LA PRIMAVERA	**CONCORDIA**	**BARRANCOMINAS**	**OROCUÉ**	**BOLÍVAR**
		PESO (%)	**PESO (%)**	**PESO (%)**	**PESO (%)**	**PESO (%)**
1	**ASPECTOS GENERALES**	1%	1%	1%	1%	1%
2	**INFORME BASE PRELIMINAR**	6%	6%	6%	6%	6%
3	**GEOFÍSICA Y SUELOS**	8%	8%	8%	8%	8%
4	**TOPOGRAFÍA**	6%	6%	6%	6%	6%
5	**ARQUITECTÓNICO**	12%	12%	12%	12%	12%
5,3	Esquema Básico Arquitectónico					
5,4	Anteproyecto Arquitectónico					
5,5	Diseño Arquitectónico					
5,6	Mobiliario					
5,7	Señalización					
5,8	Paisajismo					
6	**ESTRUCTURAL**	10%	10%	10%	10%	10%
7	**HIDROSANITARIO**	5%	5%	5%	5%	5%
8	**ELÉCTRICO**	6%	6%	6%	6%	6%
9	**AÍRE ACONDICIONADO**	4%	4%	4%	4%	4%

10	**AMBIENTAL**	3%	3%	3%	3%	3%
11	**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**	4%	4%	4%	4%	4%
12	**SEGURIDAD Y CONTROL**	3%	3%	3%	3%	3%
13	**TRANSPORTE VERTICAL**	3%	3%	3%	3%	3%
14	**CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE**	10%	10%	10%	10%	10%
15	**PRESUPUESTO**	4%	4%	4%	4%	4%
16	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	4%	4%	4%	4%	4%
17	**LICENCIAS Y PERMISOS**					
18	**MANUAL DE DOTACIÓN Y MOBILIARIO**	3%	3%	3%	3%	3%
19	**INFORMACIÓN CATASTRAL**	5%	5%	5%	5%	5%
20	**BIM**	3%	3%	3%	3%	3%
		100%	100%	100%	**100%**	**100%**

Peso en % de entregables para sede ZIPAQUIRÁ. VULNERABILIDAD:

En la siguiente tabla se muestra el peso por porcentaje que se le da a cada actividad a desarrollar de la sede de Zipaquirá en cuanto a la vulnerabilidad del proyecto; la suma de los porcentajes de todas las actividades de cada sede debe dar un total del 100%.

ZIPAQUIRÁ VULNERABILIDAD		
ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**PESO (%)**
1	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA EXISTENTE (REFERENCIADA DE DOCUMENTO SOPORTE TÉCNICO CONTRACTUAL)	2%
2	VISITA TÉCNICA DE RECONOCIMIENTO OBRA EXISTENTE	3%
3	ANÁLISIS TÉCNICO DE INFORMACIÓN EXISTENTE E INFORMES DE REVISIÓN	15%
4	VERIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y ESTRUCTURAL	5%
5	PATOLOGÍA ESTRUCTURAL	6%
6	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD	25%
7	ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO	2%
8	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	30%
9	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFORZAMIENTO	5%
10	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	5%

11	PRESUPUESTO DETALLADO POR CAPITULO POR PISOS, CANTIDAD DE OBRA	2%
		100%

Peso en % de entregables para sede ZIPAQUIRÁ. DIAGNÓSTICO:

En la siguiente tabla se muestra el peso por porcentaje que se le da a cada actividad a desarrollar de la sede de Zipaquirá en cuanto al diagnóstico del proyecto; la suma de los porcentajes de todas las actividades de cada sede debe dar un total del 100%.

ZIPAQUIRÁ DIAGNÓSTICO		
ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**PESO (%)**
0	ACTIVIDADES PREVIAS	0%
1	ASPECTOS GENERALES	1%
2	INFORME BASE PRELIMINAR	5%
3	GEOFÍSICA Y SUELOS	12%
4	TOPOGRAFÍA	8%
5	ESTRUCTURAL	5%
6	HIDROSANITARIO	6%
7	FIBRA ÓPTICA	6%
8	AMBIENTAL	4%
9	PRESUPUESTO	3%
10	MANUAL DE ESPECIFICACIONES	2%
11	LICENCIAS Y PERMISOS y CERTIFICACIONES	6%
12	REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO	30%
13	TRABAJOS EN ALTURA	2%
14	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)	5%
15	INFORMACIÓN CATASTRAL	5%
		100%

Peso en % de Entregables para Sede NEIVA:

En la siguiente tabla se muestra el peso por porcentaje que se le da a cada actividad a desarrollar en la sede de Neiva en cuanto a los entregables; la suma de los porcentajes de todas las actividades de cada sede debe dar un total del 100%.

SEDE NEIVA		
ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**PESO (%)**
0	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA DE CSJ	3%
1	ASPECTOS GENERALES	1%
2	INFORME BASE PRELIMINAR	4%
3	AJUSTE DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO	30%
4	HIDROSANITARIO	8%
5	ELÉCTRICO	8%
6	AÍRE ACONDICIONADO	5%
7	AMBIENTAL	3%
8	RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4%
9	SEGURIDAD Y CONTROL	3%
10	TRANSPORTE VERTICAL	2%
11	CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	10%
12	PRESUPUESTO	3%
13	Manual de especificaciones	2%
14	LICENCIAS Y PERMISOS	
15	MANUAL DE MOBILIARIO	3%
16	INFORMACIÓN CATASTRAL (Desenglobe)	6%
17	ENTREGABLE BIM	5%
		100%

Los porcentajes de avance físico en el periodo del contrato de **interventoría** son iguales a los del contrato de consultoría ya que los dos contratos van ligados y llevan el mismo avance de la siguiente manera:

Contrato 147 de 2022 Estudios y diseños:

Avance Físico Programado 89,87%

Avance Ejecutado físico 15,29%

Contrato 131 de 2022 Interventoría:

Avance Físico Programado 89,87%

Avance Ejecutado físico 15,29%

Avance sedes de Barrancominas, Bolívar, Concordia, la primavera y Orocué:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

AVANCE ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES No. 1
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Periodo de corte	Pendiente aceptación del aval de interventoría por parte de la UIF
Semana 14 del 16 de febrero al 22 de febrero del año 2023	Sin aval de interventoría
	Avalado por interventoría y aceptado por UIF.
	Sin presentar por consultor
	Revisión interventoría

Entregables			Sedes				
Nº	**Tomos**	**Capítulos (mínimo)**	**Barrancominas (Guainía)**	**Bolívar (Cauca)**	**Concordia (Magdalena)**	**La Primavera (Vichada)**	**Orocué (Casanare).**
1	**Aspectos generales**	Información general del contrato	Se envió el oficio BRV-INT-CSJ-019-2022 donde la interventoría aprobo del plan de inversión del anticipo, plan de inversión general, cronograma y hojas de vida de consultoría.	Se envió el oficio BRV-INT-CSJ-019-2022 donde la interventoría aprobo del plan de inversión del anticipo, plan de inversión general, cronograma y hojas de vida de consultoría.	Se envió el oficio BRV-INT-CSJ-019-2022 donde la interventoría aprobo del plan de inversión del anticipo, plan de inversión general, cronograma y hojas de vida de consultoría.	Se envió el oficio BRV-INT-CSJ-019-2022 donde la interventoría aprobo del plan de inversión del anticipo, plan de inversión general, cronograma y hojas de vida de consultoría.	Se envió el oficio BRV-INT-CSJ-019-2022 donde la interventoría aprobo del plan de inversión del anticipo, plan de inversión general, cronograma y hojas de vida de consultoría.
2	**Informe base preliminar**		Se remitío a la entidad, aprobado por la interventoría el informe base preliminar mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-048-2022 para que sea revisado y aprobado por el Consejo Superior de la Judicatura.	Se remitío a la entidad, aprobado por la interventoría el informe base preliminar mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-042-2022 para que sea revisado y aprobado por el Consejo Superior de la Judicatura.	Se remitío a la entidad, aprobado por la interventoría el informe base preliminar mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-043-2022 para que sea revisado y aprobado por el Consejo Superior de la Judicatura.	Se remitío a la entidad, aprobado por la interventoría el informe base preliminar mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-044-2022 para que sea revisado y aprobado por el Consejo Superior de la Judicatura.	Se remitío a la entidad, aprobado por la interventoría el informe base preliminar mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-045-2022 para que sea revisado y aprobado por el Consejo Superior de la Judicatura.
			Se recibio por parte de la entidad contratante (CSJ) el oficio No. DEAJUIFO22-797 con el cual envían observaciones al informe base preliminar para que sean remitidas a la consultoría y corregidas.	Se recibio por parte de la entidad contratante (CSJ) el oficio No. DEAJUIFO22-798 con el cual envían observaciones al informe base preliminar para que sean remitidas a la consultoría y corregidas.	Se recibio por parte de la entidad contratante (CSJ) el oficio No. DEAJUIFO22-799 con el cual envían observaciones al informe base preliminar para que sean remitidas a la consultoría y corregidas.	Se recibio por parte de la entidad contratante (CSJ) el oficio No. DEAJUIFO22-800 con el cual envían observaciones al informe base preliminar para que sean remitidas a la consultoría y corregidas.	Se recibio por parte de la entidad contratante (CSJ) el oficio No. DEAJUIFO22-801 con el cual envían observaciones al informe base preliminar para que sean remitidas a la consultoría y corregidas.
			Se envío a consultoría el oficio No. BRV-INT-CSJ-090-2022 con asunto Envío de observaciones informe base preliminar Barrancominas (Guainía) para que se realicen las correciones emitidas por la entidad contratante (CSJ).	Se envío a consultoría el oficio No. BRV-INT-CSJ-091-2022 con asunto Envío de observaciones informe base preliminar Bolívar (Cauca) para que se realicen las correciones emitidas por la entidad contratante (CSJ).	Se envío a consultoría el oficio No. BRV-INT-CSJ-092-2022 con asunto Envío de observaciones informe base preliminar Concordia (Magdalena) para que se realicen las correciones emitidas por la entidad contratante (CSJ).	Se envío a consultoría el oficio No. BRV-INT-CSJ-094-2022 con asunto Envío de observaciones informe base preliminar Primavera (Vichada) para que se realicen las correciones emitidas por la entidad contratante (CSJ).	Se envío a consultoría el oficio No. BRV-INT-CSJ-093-2022 con asunto Envío de observaciones informe base preliminar Orocué (Casanare) para que se realicen las correciones emitidas por la entidad contratante (CSJ).
			Mediante oficio DEAJUIFO22-963 Se dio la Aceptación aval condicionado por parte del CSJ al informe base preliminar de Barrancominas.	Mediante oficio DEAJUIFO22-963 Se dio la Aceptación aval condicionado por parte del CSJ al informe base preliminar de Bolívar.	Mediante oficio DEAJUIFO22-963 Se dio la Aceptación aval condicionado por parte del CSJ al informe base preliminar de Concordia.	Mediante oficio DEAJUIFO22-963 Se dio la Aceptación aval condicionado por parte del CSJ al informe base preliminar de la Primavera.	Mediante oficio DEAJUIFO22-963 Se dio la Aceptación aval condicionado por parte del CSJ al informe base preliminar de Orocué.

Avance sede de Neiva Huila:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

AVANCE ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES No. 2
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Periodo de corte		Pendiente aceptación del aval de interventoría por parte de la UIF
Semana 14 del 16 de febrero al 22 de febrero del año 2023		Sin aval de interventoria
		Avalado por interventoría y aceptado por UIF.
		Sin presentar por consultor
		Revisión interventoria

Entregables		Sedes	
Nº	Tomos	Capítulos (mínimos)	Neiva (Huila)
1	Aspectos generales	Información general del contrato	Se envió el oficio BRV-INT-CSJ-019-2022 donde la interventoría aprobo del plan de inversión del anticipo, plan de inversión general, cronograma y hojas de vida de consultoría.
2	Informe base preliminar		Se remitio a la entidad, aprobado por la interventoría el informe base preliminar mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-046-2022 para que sea revisado y aprobado por el Consejo Superior de la Judicatura.
			Se recibio por parte de la entidad contratante (CSJ) el oficio No. DEAJUIFO22-789 con el cual envían observaciones al informe base preliminar para que sean remitidas a la consultoría y corregidas.
			Se envio a consultoria el oficio No. BRV-INT-CSJ-089-2022 con asunto Envio de observaciones informe base preliminar Neiva (Huila) para que se realicen las correciones emitidas por la entidad contratante (CSJ).
			Mediante oficio DEAJUIFO22-968 Se dio la Aceptación aval condicionado por parte del CSJ al informe base preliminar de Neiva.

Avance sede de Zipaquirá Cundinamarca:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES No. 4
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Periodo de corte		Pendiente aceptación del aval de interventoría por parte de la UIF	
Semana 14 del 16 de febrero al 22 de febrero del año 2023		Sin aval de interventoría	
		Avalado por interventoría y aceptado por UIF.	
		Sin presentar por consultor	
		Revisión interventoría	

Entregables			Sedes	
Nº	TOMOS	CAPÍTULOS	CONTENIDO MÍNIMO	Zipaquirá (Cundinamarca)
1	ASPECTOS GENERALES	Información general del contrato	1.- Nº contrato	Se envió el oficio BRV-INT-CSJ-019-2022 donde la interventoría aprobo del plan de inversión del anticipo, plan de inversión general, cronograma y hojas de vida de consultoría.
			2.- Objeto	
			3.- Valor	
			4.- Duración	
			5.- Interventoría	
			6.- Supervisor	
			7.- Pólizas.	

2	**INFORME BASE PRELIMINAR**		1.- Análisis Normativo	
			2.- Documentación relacionada con construcciones existentes en el mismo predio.	
			3.- Documentación de Servicios Públicos.	
			4- Determinación de afectación al dominio del predio.	
			5.- Riesgos que deberá enfrentar el constructor durante el desarrollo de las obras correspondientes, en el cual se incluyan entre otros, factores geográficos (Topografía, vías de acceso, cercanía a fuentes hídricas, etc.), Factores Políticos, Factores Sociales, Factores Culturales, Factores Económicos.	Se remitío a la entidad, aprobado por la interventoría el informe base preliminar mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-047-2022 para que sea revisado y aporbado por el Consejo Superior de la Judicatura.
			6.- Fuente de Materiales y Sitios de disposición de Residuos	Se recibio por parte de la entidad contratante (CSJ) el oficio No. DEAJUIFO22-787 con el cual envían observaciones al informe base preliminar para que sean remitidas a la consultoría y corregidas.
			7.- Conclusiones	Se envío a consultoría el oficio No. BRV-INT-CSJ-088-2022 con asunto Envío de observaciones informe base preliminar Zipaquirá (Cundinamarca) para que se realicen las correciones emitidas por la entidad contratante (CSJ).
				Mediante oficio DEAJUIFO22-967 Se dio la Aceptación aval condicionado por parte del CSJ al informe base preliminar de Zipaquirá.

2.2. AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

En cuanto al contrato de consultoría el avance financiero en la semana número 14 de trabajo se ha mostrado de la siguiente manera:

Tabla No. 6 Avance financiero programado vs ejecutado

AVANCE FINANCIERO POR SEDE							
SEMANA No 14							
DE 16/02/2023 A 22/02/2023							
GENERALIDADES			FINANCIERO				
SEDE	VALOR/SEDE	PESO DE TOTAL (%)	PROGRAMADOPOR SEDE		EJECUTADO POR SEDE		AVANCE Y/O ATRASO
LA PRIMAVERA	$ 39.000.000,00	6,23%	$ 34.646.132,07	88,84%	$ 5.070.000,00	13,00%	-75,84%
CONCORDIA	$ 39.000.000,00	6,23%	$ 34.651.124,96	88,85%	$ 5.070.000,00	13,00%	-75,85%
BARRANCOMINAS	$ 39.000.000,00	6,23%	$ 34.651.124,96	88,85%	$ 5.070.000,00	13,00%	-75,85%
OROCUÉ	$ 111.750.000,00	17,86%	$ 99.869.361,22	89,37%	$ 14.527.500,00	13,00%	-76,37%
BOLÍVAR	$ 130.500.000,00	20,86%	$ 116.625.965,45	89,37%	$ 19.500.000,00	14,94%	-74,43%
ZIPA VULN	$ 85.000.000,00	13,59%	$ 74.467.391,30	87,61%	$ 23.120.000,00	27,20%	-60,41%
NEIVA	$ 121.275.000,00	19,39%	$ 110.849.570,63	91,40%	$ 15.947.662,50	13,15%	-78,25%
ZIPA DIAG	$ 60.000.000,00	9,59%	$ 51.343.543,96	85,57%	$ 12.270.000,00	20,45%	-65,12%
TOTAL	**$ 625.525.000,00**	**100,00%**	**$ 557.104.214,55**	**89,06%**	**$ 100.575.162,50**	**16,08%**	**-72,98%**

% de avance financiero semanal programado: 14,19%

% de avance financiero semanal ejecutado: 1,8%

% de avance financiero programado acumulado: 89,06%

% de avance financiero ejecutado acumulado: 16,08%

Se aclara que los porcentajes de avance ejecutado en la **tabla No. 6** no es en su totalidad de dinero que se ha cobrado o ha sido suministrado el Consejo Superior de la Judicatura, parte de este porcentaje se adquiere debido al dinero que ha invertido el consultor en este caso el consorcio JMS-C de sus propias arcas.

El avance financiero de la **interventoría** no se calcula debido a que la empresa en este caso BRV Ingeniería y planeación SAS rechazo el anticipo y decidió aceptar los pagos por entrega de productos. Como se puede evidenciar en el oficio No. BRV-016-2022 enviado a la entidad:

BRV SAS INGENIERIA Y PLANEACIÓN

INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS

GEOTECNIA – TRANSITO Y TRANSPORTE

BRV – 016 – 2022

Bogotá D. C., 27 de Julio de 2022

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Dirección ejecutiva de administración judicial
Ciudad.

Asunto: **Rechazo al anticipo estipulado en la invitación pública del proceso IP-013-2022.**

Referencia: **Ejercer la interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de Seguridad y de Salud en el Trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barranco minas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).**

Cordial saludo,

De acuerdo con el mensaje recibido por parte de la entidad en la plataforma SECOP II el día 26 de julio de 2022, con objeto "ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL ANTICIPO", Yo Gabriel Andrés Velandia García, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de representante legal de BRV Ingeniería y Planeación S.A.S. con NIT. 900.664.302-3, por medio de la presente **RECHAZO** el anticipo estipulado en la invitación pública del proceso en mención, para de este modo poder continuar con el trámite de inicio de dicho proceso.

Quedamos atentos a cualquier inquietud por parte de la entidad.

Agradecemos su amable atención.

Atentamente,

Gabriel Andrés Velandia García
C.C. 80.074.228 de Bogotá D.C.
Representante legal BRV Ingeniería y Planeación SAS.

Ingenieros
Consultores – Estudios Geotécnicos y Diseño de Vías Urbanas, Tránsito y Transporte
Carrera 76 No. 138 – 52, Oficina 405 en Bogotá D. C. – Colombia / *Tele fax:* 694 28 28,
Cel: 301 545 44 55 / 310 780 27 53 *E-mail:* brvingenieria@gmail.com, contacto@brvingenieria.com

De igual manera se aclara que el pago de la interventoría se efectuara mediante LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y FINAL de cada proyecto de la siguiente manera:

No.	Sede	Total ($)
1	La Primavera	$ 8.542.857,14
2	Concordia	$ 8.542.857,14
3	Barrancominas	$ 8.542.857,14
4	Orocué	$ 8.542.857,14
5	Bolívar	$ 8.542.857,14
6	Zipaquira	$ 8.542.857,14
7	Neiva	$ 8.542.857,14
Total		$ 59.800.000,00

2.3. AVANCE EN GASTO PRESUPUESTAL (FACTURADO)

Dentro del presente informe no se reporta avance en gasto presupuestal, teniendo en cuenta que no se ha facturado a la fecha, debido a que se han generado gastos en el contrato No. 147 de 2022 pero que han sido asumidos por el **consultor**. De igual manera se aclara que ya se ha desembolsado el anticipo pactado por parte de la entidad el Consejo Superior de la Judicatura el día 23 de noviembre de 2022. En cuanto al contrato de **interventoría** no se reporta avances en gasto presupuestal ya que se han generado gastos, pero son asumidos por la interventoría debido a que se rechazó el anticipo mediante oficio No. BRV-016-2022.

2.4. INVERSIÓN ANTICIPO

Los recursos provenientes del pago del anticipo se invertirán conforme al documento del plan de inversión del anticipo aprobado por la interventoría.

Mediante comunicado CEGG-CON-147-52-125-2022 del 7 de diciembre y CEGG-CON-147-52-126-2022 del 8 de diciembre de 2022 se remite a la interventoría la solicitud de retiro No 1 y retiro No 2. para su respectiva aprobación.

Retiro No 1	$34.072.714.00
Retiro No 2	$52.424.038.00
Total	$86.496.752.00

La interventoría BRV Ingeniería y Planeación SAS renuncio al pago del anticipo y decidió aceptar los pagos por entrega de productos, como se puede evidenciar en el oficio No. BRV-016-2022 enviado a la entidad.

Tabla No.7 Plan de inversión del anticipo consultoría

PLAN DE INVERSION DEL ANTICPO							
VALOR CONTRATO		$ 1.204.764.898,00					
VALOR ANTICIPO (50%)		$ 602.382.449,00					
ÍTEM	CONCEPTO DE VALOR			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
1	VALOR 1. COSTO DIRECTO						
1,1	SALARIOS PERSONAL PROFESIONALES			$ 49.500.000,00	$ 53.500.000,00	$ 54.500.000,00	$ 56.500.000,00
1,2	SALARIOS PERSONAL ADMINSITRATIVO (Adminsitrador, secretaria, contador)			$ 12.177.447,00	$ 12.177.447,00	$ 12.177.447,00	$ 12.177.447,00
1,3	IMPUESTOS -POLIZAS			$ 7.013.178,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 4.000.000,00
1,4	GASTOS DE OFICINA (ARRIENDO/SERVICIOS)			$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
1,5	ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA			$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
1,6	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD/DOTACIÓN			$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00
1,7	ELABORACIÓN DE INFORMES, PAPELERIA, IMPRESIONES/COMPRA DE INFORMACIÓN			$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00
1,8	TRASLADOS/TRANSPORTE			$ 5.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 1.039.534,00
	TOTAL VALOR 1. COSTO DIRECTOS/MES			$ 78.190.625,00	$ 78.177.447,00	$ 78.177.447,00	$ 78.216.981,00
	TOTAL GASTOA DIRECTOS ACUMULADOS			$ 78.190.625,00	$ 156.368.072,00	$ 234.545.519,00	**$ 312.762.500,00**
2	VALOR 2. COSTOS POR PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARISO Y/O ADICIONALES						
	PROVISIÓN/MES			$ 4.562.988,00	$ 4.562.988,00	$ 4.562.988,00	$ 4.562.990,00
	PROVISIÓN ACUMULADO			$ 4.562.988,00	$ 9.125.976,00	$ 13.688.964,00	**$ 18.251.954,00**
	SUB TOTAL . SUMA VALOR 1 + VALOR 2			$ 82.753.613,00	$ 82.740.435,00	$ 82.740.435,00	$ 82.779.971,00
	ACUMULADO SUB TOTAL (1+2)			$ 82.753.613,00	$ 165.494.048,00	$ 248.234.483,00	**$ 331.014.454,00**
3	VALOR 3. IVA (19% DE 1+2)						
	IVA/MES			$ 15.723.186,47	$ 15.720.682,65	$ 15.720.682,65	$ 15.728.194,49
	IVA ACUMULADO			$ 15.723.186,47	$ 31.443.869,12	$ 47.164.551,77	**$ 62.892.746,26**
	VALOR 4. PROVISIÓN PARA TRÁMITES, LICENCIAS, ETC						
4	"PROVISIÓN PARA PAGO DE VALORES, TARIFAS, TASAS Y EXPENSAS RELACIONADAS CON DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, PERMISOS AMBIENTALES, CONCEPTOS AERONÁUTICA CIVIL, CERTIFICACIONES TALES COMO RETIE, RETILAP, CERTIFICACIÓN PUNTOS DE DATOS, PRUEBAS VLF, CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA EDIFICACIÓN, CONCEPTO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS Y CERTIFICADO DE HABITABILIDAD"			$ 52.118.812,00	$ 52.118.812,00	$ 52.118.812,00	$ 52.118.812,00
	ACUMULADO PROVISIÓN			$ 52.118.812,00	$ 104.237.624,00	$ 156.356.436,00	**$ 208.475.248,00**
							$ 602.382.448,26

NOTAS:

1. Por ser integral el contrato de consultoría el rubro correspondiente a VALOR 2 "PROVISIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS Y/O ADICIONALES", se estimó tentativo por mes, para ser utilizado según necesidades en cada una de las sedes. Este rubro tendrá una contabilidad de uso según requerimientos aprobados

2, La distribución de este rubro "VALOR 3 "PROVISIÓN PARA PAGO DE VALORES, TARIFAS, TASAS Y EXPENSAS RELACIONADAS CON DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, PERMISOS AMBIENTALES, CONCEPTOS AERONÁUTICA CIVIL, CERTIFICACIONES TALES COMO RETIE, RETILAP, CERTIFICACIÓN PUNTOS DE DATOS, PRUEBAS VLF, CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA EDIFICACIÓN, CONCEPTO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS Y CERTIFICADO DE HABITABILIDAD" , se distribuyó por sede tentativamente, ya que inicialmente se desconoce los requerimientos de pago para cada sede en particular. Los gastos de este rubro tendrá la contabilidad correspondiente

2.5. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

En el contrato de **consultoría** se efectuó el desembolso del anticipo por parte de la entidad contratante el 23 de noviembre de 2022.

Los rendimientos financieros generados por el desembolso del anticipo se desglosan a continuación. El reporte aquí consignado es a corte del presente informe (febrero de 2023), extraído del extracto y de lo cual será consignado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público al finalizar el retiro total del anticipo:

Periodo	**Intereses del Periodo**
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2022	$ 3.873.97
1 de Diciembre a 31 de Diciembre de 2022	$ 16.718.94
1 de Enero a 31 de Enero de 2023	$ 14.470.51
1 de Febrero a 28 Febrero de 2023	Sin reporte al corte del presente informe

En el contrato de **interventoría** no hay excedentes o rendimientos financieros debido a que la interventoría rechazo el anticipo mediante oficio No. BRV-016-2022.

3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 392 DE 2018 DISCAPACIDAD

En el contrato de **consultoría** se presenta a David Ricardo Araque Castiblanco, como personal con discapacidad y actualmente se encuentra adscrito a la empresa JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS BIC. como parte del Consorcio JMS-C, y así se mantendrá a lo largo de la ejecución del contrato.

Personal en condición de discapacidad del consultor:

Nombre personal	EPS	ARL	Pensión
David Ricardo Araque Castiblanco.	Sanitas EPS	Positiva	Pensionado por invalidez

En el contrato de **interventoría** de acuerdo con el decreto 392 de 2018 "Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad" la interventoría declara que en su personal de trabajo no se encuentran personas en condición de discapacidad y cumple con la norma antes mencionada debido al bajo número total de trabajadores de la planta de personal del proponente.

4. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

Hasta la fecha de elaboración del presente informe semanal no se ha presentado ningún accidente laboral, o reclamación laboral o de pago tanto en el contrato de **consultoría** e **interventoría.**

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO POR SEMANA

5.1. SEMANA. 14: (Incluye actividades realizadas en el tiempo de suspensión del contrato, realizadas en atención a los compromisos establecidos en el acta de suspensión No. 1 para superar las causas que originaron la suspensión, por consiguiente, no generan costos para la entidad):

- Se remitió a la entidad el consejo superior de la judicatura la entrega del Informe base preliminar (IBP) de la sede de La Primavera Vichada Versión 1 aprobado por la interventoría mediante oficio número BRV-INT-CSJ-122-2022 enviado el 15 de diciembre de 2022.
- Se remitió a la entidad el consejo superior de la judicatura la entrega del Informe base preliminar (IBP) de la sede de Concordia Magdalena Versión 1 aprobado por la interventoría mediante oficio número BRV-INT-CSJ-123-2022 enviado el 15 de diciembre de 2022.
- Se remitió a la entidad el consejo superior de la judicatura la del Informe base preliminar (IBP) de la sede de Neiva Huila Versión 1 aprobado por la interventoría. mediante oficio número BRV-INT-CSJ-126-2022 enviado el 15 de diciembre de 2022.
- Se remitió a la entidad el consejo superior de la judicatura la del Informe base preliminar (IBP) de la sede de Zipaquirá Versión 1 aprobado por la interventoría. mediante oficio número BRV-INT-CSJ-127-2022 enviado el 16 de diciembre de 2022.
- Se remitió a la consultoría la aprobación del retiro No. 1 del anticipo correspondiente al contrato 147-2022. mediante oficio número BRV-INT-CSJ-131-2022 enviado el 23 de diciembre de 2022.
- Se remitió a la consultoría la aprobación del retiro No. 2 del anticipo correspondiente al contrato 147-2022. mediante oficio número BRV-INT-CSJ-132-2022 enviado el 23 de diciembre de 2022.
- Se remitió a la consultoría la entrega de manuales Sede Zipaquirá Cundinamarca. mediante oficio número BRV-INT-CSJ-134-2022 enviado el 23 de diciembre de 2022.
- Se remitió a la consultoría la aceptación aval condicionado de los informes base preliminar de Barrancominas, Bolívar, Orocué, La Primavera y Concordia. mediante oficio número BRV-INT-CSJ-138-2022 enviado el 29 de diciembre de 2022.
- Se remitió a la consultoría la aceptación aval condicionado del informe base preliminar de Zipaquirá. mediante oficio número BRV-INT-CSJ-139-2022 enviado el 30 de diciembre de 2022.
- Se remitió a la consultoría la aceptación aval condicionado del informe base preliminar de Neiva. mediante oficio número BRV-INT-CSJ-140-2022 enviado el 30 de diciembre de 2022.
- Se hizo la entrega a el consejo superior de la judicatura del informe mensual de interventoría número 3 mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-153-2022 enviado el 16 de enero de 2023.

- Se remitió a la entidad el consejo superior de la judicatura Solicitud de prórroga a la suspensión No. 1 del Contrato de Consultoría No. 147 de 2022 y Contrato de Interventoría No. 131 de 2022. Mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-157-2022 en viado el 18 de enero de 2023.
- Se remitió a la consultoría la aprobación informes semanales de consultoría del 1 al 13 y mensual del 1 al 3. mediante oficio número BRV-INT-CSJ-158-2022 enviado el 26 de enero de 2023.
- Se remitió a la consultoría la entrega de pruebas de integridad de pilotes Sede Zipaquirá. mediante oficio número BRV-INT-CSJ-162-2022 enviado el 08 de febrero de 2022.
-

6. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

6.1 Tiempos contractuales

Desde antes de la firma del contrato de Consultoría No 147-2022 e interventoría No. 131 de 2022, el CONSORCIO JMS-C y la empresa BRV Ingeniería y Planeación SAS, han manifestado la incompatibilidad en los tiempos establecido en el contrato y los documentos contractuales previos de contratación en dónde se indica una duración de 8 meses y a partir de la firma del contrato solo se indica 3.8 meses (8/09/2022 a 31/12/202), siendo imposible el, cumplimento de estos plazos contractuales.
La consultoría así lo manifiesta mediante el cronograma de ejecución, dejando las salvedades pertinentes de ser posible para el cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato.

6.2 Demoras en respuestas a diferentes solicitudes

- Parte de los compromisos contractuales esta la investigación de información secundaria en las diferentes entidades de manera que se pueda determinar inicialmente la viabilidad técnica de los diferentes proyectos, entidades tales, como: Entes externos, Interventoría, Oficinas de planeación locales, entidad de carácter ambiental, empresas de servicios públicos y otros. La consultoría en este caso El CONSORCIO JMS-C, nos ha hecho participes de su gestión mediante diferentes oficios en los cuales muestran cómo se ha tramitado y gestionado lo necesario y a la fecha algunas de las entidades NO han respondido, generándose un atraso para las actividades del análisis de la información secundaria como el de la elaboración del Informe base preliminar.
Algunos de los oficios enviados a la interventoría por parte del consultor aún no han tenido respuesta porque dichos oficios han sido remitidos a entes externos y no se ha recibido respuesta por parte de esta, debido al poco tiempo de enviados o a la consecución de los documentos solicitados.

Durante este periodo la consultoría realizo las siguientes gestiones en cada sede del proyecto que en su momento le comunicaron a la interventoría del contrato:

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SEDE OROCUÉ (CASANARE). SEMANA 14 -21/02/2023								
DOCUMENTO	COMUNICADO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	FECHA DE RESPUESTA	TIEMPO SIN RESPUESTA HASTA EL 21/02/2023	
							MES	DIA
1	CEGG-CON-147-52-111-2022 (Derecho de Petición)	22/11/2022	Claro Colombia	Solicitud de disponibilidad de servicio de internet y telefonia	No respondido	SIN	2	22
2	CEGG-CON-147-52-112-2022 (Derecho de Petición)	22/11/2022	Movistar Colombia	Solicitud de disponibilidad de servicio de internet y telefonia	No respondido	SIN	2	22
3	CEGG-CON-147-52-113-2022 (Derecho de Petición)	22/11/2022	UNE EPM. Telecomunicaciones S.A TIGO	Solicitud de disponibilidad de servicio de internet y telefonia	No respondido	SIN	2	22
4	CEGG-CON-147-52-150-2023 (Derecho de Petición)	30/01/2022	UNE EPM. Telecomunicaciones S.A TIGO	Solicitud de disponibilidad de servicio de internet y telefonia	Reiteración de Solicitud	SIN		14
5	CEGG-CON-147-52-149-2023 (Derecho de Petición)	30/01/2023	Claro Colombia	Solicitud de disponibilidad de servicio de internet y telefonia	Reiteración de Solicitud	SIN		14

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SEDE BOLÍVAR (CAUCA) - SEMANA 14 -21/02/2023								
DOCUMENTO	COMUNICADO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	FECHA DE RESPUESTA	TIEMPO SIN RESPUESTA HASTA EL 21/02/2023	
							MES	DIAS
1	CEGG-CON-147-52-111-2022 (Derecho de Petición)	22/11/2022	Claro Colombia	Solicitud de disponibilidad de servicio de internet y telefonia	No respondido	SIN	2	22
2	CEGG-CON-147-52-113-2022 (Derecho de Petición)	22/11/2022	UNE EPM. Telecomunicaciones S.A TIGO	Solicitud de disponibilidad de servicio de internet y telefonia	No respondido	SIN	2	22
3	CEGG-CON-147-52-114-2022 (Derecho de Petición)	22/11/2022	Ministerio de Tecnologías de la, Información y la Comunicaciones	Solicitud de disponibilidad de servicio de internet y telefonia	No respondido	SIN	2	22
4	CEGG-CON-147-52-150-2023 (Derecho de Petición)	30/01/2022	UNE EPM. Telecomunicaciones S.A TIGO	Solicitud de disponibilidad de servicio de internet y telefonia	Reiteración de Solicitud	SIN		14
5	CEGG-CON-147-52-149-2023 (Derecho de Petición)	30/01/2023	Claro Colombia	Solicitud de disponibilidad de servicio de internet y telefonia	Reiteración de Solicitud	SIN		14

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SEDE NEIVA (HUILA) - SEMANA 14 - 21/02/2023								
DOCUMENTO	COMUNICADO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	FECHA DE RESPUESTA	TIEMPO SIN RESPUESTA HASTA EL 21/02/2023	
							MES	DIAS
1	Formato: Solicitud de Factibilidad y Certificación de Viabilidad, Disponibilidad de Servicios Públicos para Proyectos Urbanístico	24/01/2023	Las Ceibas Empresas públicas de Neiva. Radicado 2023PQR00000734	Solicitud de Factibilidad y Certificación de Viabilidad, Disponibilidad de Servicios Públicos para Proyectos Urbanístico	Sin respuesta	SIN		20
2	CEGG-CON-147-52-147-2023	30/01/2023	Alcaldía de Neiva. Dirección del departamento Administrativo de Planeación	Nueva Solicitud de información concepto de norma urbanística. Aclaracion a comunicado DAP-POT-1676	Sin respuesta	SIN		14
3	CEGG-CON-147-52-150-2023 (Derecho de Petición)	30/01/2022	UNE EPM. Telecomunicaciones S.A TIGO	Solicitud de disponibilidad de servicio de internet y telefonia	Reiteración de Solicitud	SIN		14
4	CEGG-CON-147-52-150-2022 (Derecho de Petición)	8/02/2022	Claro Colombia	Solicitud de disponibilidad de servicio de internet y telefonia	Reiteración de solicitud	SIN		5

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SEDE ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA) - SEMANA 14 -21/02/2023								
DOCUMENTO	COMUNICADO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	FECHA DE RESPUESTA	TIEMPO SIN RESPUESTA HASTA EL 21/02/2023	
							MES	DIAS
1	CEGG-CON-147-52-032-2022	19/09/2022	Alcaldía de Zipaquirá. Grupo de Gestión de Riesgo	Solicitud de información técnica	No respondido	SIN	4	25
2	CEGG-CON-147-52-033-2022	19/09/2022	Alcaldía de Zipaquirá. Secretaría de desarrollo Rural y Ambiente. Radicado 12660	Solicitud de información técnica	No respondido	SIN	4	25
3	CEGG-CON-147-52-111-2022 (Derecho de Petición)	22/11/2022	Claro Colombia	Solicitud de disponibilidad de servicio de internet y telefonia	No respondido	SIN	2	23
4	CEGG-CON-147-52-113-2022 (Derecho de Petición)	22/11/2022	UNE EPM. Telecomunicaciones S.A TIGO	Solicitud de disponibilidad de servicio de internet y telefonia	No respondido	SIN	2	23
5	CEGG-CON-147-52-129-2022 (Derecho de Petición)	12/12/2022	Alcaldía de Zipaquirá. Grupo de Gestión de Riesgo (Derecho de Petición)	Solicitud de información técnica	Reiteración de solictud	SIN	2	1
6	CEGG-CON-147-52-130-2022 (Derecho de Petición)	12/12/2022	Alcaldía de Zipaquirá. Secretaría de desarrollo Rural y Ambiente. Radicado 12660 (Derecho de Petición)	Solicitud de información técnica	Reiteración de solictud	SIN	2	1
7	CEGG-CON-147-52-150-2023 (Derecho de Petición)	30/01/2022	UNE EPM. Telecomunicaciones S.A TIGO	Solicitud de disponibilidad de servicio de internet y telefonia	Reiteración de solictud	SIN		14
8	CEGG-CON-147-52-149-2023 (Derecho de Petición)	30/01/2023	Claro Colombia	Solicitud de disponibilidad de servicio de internet y telefonia	Reiteración de solictud	SIN		14

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SEDE BARRANCOMINAS (GUAINIA) - SEMANA 14 -21/02/2023								
DOCUMENTO	COMUNICADO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	FECHA DE RESPUESTA	TIEMPO SIN RESPUESTA HASTA EL 21/02/2023	
							MES	DIAS
1	CEGG-CON-147-52-151-2022	8/02/2023	Municipio de Barrancominas. Oficina Asesora de Planeación	Solicitud de viabilidad normativa del proyecto para posterior trámite de licencia de construcción	Sin respuesta	SIN		5
2	CEGG-CON-147-52-111-2022 (Derecho de Petición)	22/11/2022	Claro Colombia	Solicitud de disponibilidad de servicio de internet y telefonia	No respondido	SIN	2	21
3	CEGG-CON-147-52-113-2022 (Derecho de Petición)	22/11/2022	UNE EPM. Telecomunicaciones S.A TIGO	Solicitud de disponibilidad de servicio de internet y telefonia	No respondido	SIN	2	21
4	CEGG-CON-147-52-150-2023 (Derecho de Petición)	30/01/2022	UNE EPM. Telecomunicaciones S.A TIGO	Solicitud de disponibilidad de servicio de internet y telefonia	No respondido	SIN		14
5	CEGG-CON-147-52-149-2023 (Derecho de Petición)	30/01/2023	Claro Colombia	Solicitud de disponibilidad de servicio de internet y telefonia	No respondido	SIN		14

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SEDE CONCORDIA (MAGDALENA) - SEMANA 14 - 21/02/2023								
DOCUMENTO	COMUNICADO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	FECHA DE RESPUESTA	TIEMPO SIN RESPUESTA HASTA EL 21/02/2023	
							MES	DIAS
1	CEGG-CON-147-52-095-2022 (Derecho de petición)	9/11/2022	Corporación Regional Magdalena. Radicado 202297009033	Solicitud de información técnica	No respondido	SIN	3	4
2	CEGG-CON-147-52-111-2022 (Derecho de Petición)	22/11/2022	Claro Colombia	Solicitud de disponibilidad de servicio de internet y telefonia	No respondido	SIN	2	21
3	CEGG-CON-147-52-150-2023 (Derecho de Petición)	30/01/2022	UNE EPM. Telecomunicaciones S.A TIGO	Solicitud de disponibilidad de servicio de internet y telefonia	Reiteración de solictud	SIN		14
4	CEGG-CON-147-52-149-2023 (Derecho de Petición)	30/01/2023	Claro Colombia	Solicitud de disponibilidad de servicio de internet y telefonia	Reiteración de solictud	SIN		14

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SEDE LA PRIMAVERA (VICHADA) - SEMANA 14 - 21/02/2023								
DOCUMENTO	COMUNICADO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	FECHA DE RESPUESTA	TIEMPO SIN RESPUESTA HASTA EL 13/02/2023	
							MES	DIAS
1	CEGG-CON-147-52-111-2022 (Derecho de Petición)	22/11/2022	Claro Colombia	Solicitud de disponibilidad de servicio de internet y telefonia	No respondido	SIN	0	16
2	CEGG-CON-147-52-113-2022 (Derecho de Petición)	22/11/2022	UNE EPM. Telecomunicaciones S.A TIGO	Solicitud de disponibilidad de servicio de internet y telefonia	No respondido	SIN	0	12
3	CEGG-CON-147-52-150-2023 (Derecho de Petición)	30/01/2022	UNE EPM. Telecomunicaciones S.A TIGO	Solicitud de disponibilidad de servicio de internet y telefonia	Reiteración de solictud	SIN		14
4	CEGG-CON-147-52-149-2023 (Derecho de Petición)	30/01/2023	Claro Colombia	Solicitud de disponibilidad de servicio de internet y telefonia	Reiteración de solictud	SIN		14

7. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

La **consultoría** manifiesta el cumplimiento en los aspectos ambientales y sociales, estos serán presentados durante la ejecución del contrato en cumplimiento a los planes presentados para la etapa diseños conforme a los programas detallados en el documento CON-147-PGA-001-V0 y según tabla 3 del documento "PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CONSULTORÍA" el cual fue revisado por la interventoría y aprobado mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-006-2022.

PROGRAMA 1. COMPRAS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES EN LOS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMA 2. CONTROL AL CONSUMO DE PAPEL
PROGRAMA 3. GESTIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
PROGRAMA 4. AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA
PROGRAMA 5. AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
PROGRAMA 6. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
PROGRAMA 7. CAPACITACIÓN PERMANENTE

El PGAS para cada sede se hará entrega de éste de acuerdo en el cronograma de actividades aprobado por la interventoría siguiendo las etapas conforme se presenta en el cronograma aprobado por la interventoría.

La **interventoría** acoge dicho componente ambiental que será implementado al contrato No. 131 de 2022.

7.1 PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con el cronograma estipulado por la consultoría en el plan de gestión de sistema de seguridad y salud en el trabajo, las reuniones de sana convivencia en el ambiente laboral y discriminación laboral; para la fecha final del presente informe ya se realizaron con el equipo de trabajo, como se muestra:

Tabla No.8 Cronograma de actividades del PSST

Fecha	Tema
Septiembre 30 de 2022	Sana Convivencia en el Ambiente Laboral. Buenas Prácticas Laborales
Noviembre 25 de 2022	Discriminación Laboral

La **interventoría** acogió dicho calendario para realizar y compartir con su equipo de trabajo las respectivas reuniones que ya fueron realizadas en las fechas estipuladas.

8. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Para el óptimo desarrollo de las actividades contractuales especialmente para las SEDE de NEIVA, es necesario que se aclare alguna información remitida, ya que se entrega mucha información por parte de la entidad y las entidades locales, pero no está organizada, sin saber cuáles son los documentos finales aprobadas por la entidad para el inicio óptimo de las actividades.

9. OBSERVACIONES

- El contrato va en un porcentaje de atraso importante de avance hasta la fecha final del presente informe.
- El comité correspondiente a la presente semana se realizará el día 21 de febrero de 2023.
- Se reiniciaron los contratos de interventoría y consultoría el día 16 de febrero de 2023.
- La Aprobación por la interventoría del plan ambiental, plan de calidad y plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST) fue remitida a la entidad el Consejo Superior de la Judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-006-2022 enviado el 23 de septiembre de 2022.
- El plan de inversión del anticipo, plan de inversión general y el cronograma del contrato No 147 de 2022 de seguridad y salud en el trabajo (SST) fueron aprobados y remitidos a la entidad el Consejo Superior de la Judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-019-2022 enviado el 06 de octubre de 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 23 días, del mes de febrero de 2023.

Carol Fernanda González Atehortúa
Representante Legal
BRV Ingeniería y Planeación SAS
Contratista

*Cuando los proyectos no estén a cargo de la Unidad de Infraestructura Física, la dependencia ejecutora de proyecto aplicará el presente documento con su propia estructura organizativa.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

Consecutivo	Fecha	Asunto	Dirigido a
CEGG-CON-147-52-127-2022	09/12/2022	Atención a comunicado BRV-INT- CSJ-092-2022 y DEAJUIFO22-799 INFORME BASE PRELIMINAR SEDE CONCORDIA. Entrega Versión 1.	Interventoría
DEAJUIFO22-885	13/12/2022	Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-086-2022: Observación componente hidrosanitario, Sede Zipaquirá (Cundinamarca) - Contrato consultoría 147 de 2022 y Contrato interventoría 131 de 2022.	Interventoría
DEAJUIFO22-887	13/12/2022	Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-095-2022 y BRV-INT-CSJ-110-2022: Observación situación diagnostico Zipaquirá (Cundinamarca) - Contrato consultoría 147 de 2022 y Contrato interventoría 131 de 2022.	Interventoría
CEGG-CON-147-52-128-2022	13/12/2022	Atención a comunicado BRV-INT- CSJ-089-2022 y DEAJUIFO22-789 INFORME BASE PRELIMINAR SEDE NEIVA. Entrega Versión 1.	Interventoría
DEAJUIFO22-894	14/12/2022	“Comunicación Partes Interesadas - Estado Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de: Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca) de los Contratos 147 y 131 de 2022”	Interventoría

DEAJUIFM22-1721	14/12/2022	Envío de observaciones informe semanal No. 4 de interventoría. Contrato 131 de 2022	Interventoría
DEAJUIFO22-897	15/12/2022	Envío de observaciones informe semanal No. 4 de interventoría. Contrato 131 de 2022	Interventoría
DEAJUIFO22-898	15/12/2022	Envío de observaciones informe semanal No. 5 de interventoría. Contrato 131 de 2022	Interventoría
DEAJUIFO22-899	15/12/2022	Envío de observaciones informe semanal No. 6 de interventoría. Contrato 131 de 2022	Interventoría
DEAJUIFO22-900	15/12/2022	Envió de observaciones informe semanal No. 7 de interventoría. Contrato 131 de 2022	Interventoría
DEAJUIFO22-901	15/12/2022	Envió de observaciones informe semanal No. 8 de interventoría. Contrato 131 de 2022	Interventoría
DEAJUIFO22-902	15/12/2022	Envió de observaciones informe semanal No. 9 de interventoría. Contrato 131 de 2022	Interventoría
DEAJUIFO22-903	15/12/2022	Envío de observaciones informe mensual No. 1 de interventoría. Contrato 131 de 2022	Interventoría
CEGG-CON-147-52-131-2022	13/12/2022	Atención a comunicado BRV-INT- CSJ-088-2022 y DEAJUIFO22-787 INFORME BASE PRELIMINAR SEDE ZIPAQUIRA. Entrega Versión 1.	Interventoría
CEGG-CON-147-52-132-2022	15/12/2022	Seguimiento a cada una de las gestiones ante terceros.	Interventoría

CEGG-CON-147-52-133-2022	16/12/2022	Atención a comunicado del 01 de diciembre de 2022 BRV-INT-CSJ-115-2022 relacionado a la entrega Estudios de Suelos por parte del ingeniero civil Alfonso Uribe Sardiña para la Sede de Zipaquirá Cundinamarca y opiniones de contraste de esta información con aportes de comunicados anteriores UIF CSJ números DEAJUIFO22-871, DEAJUIFO22-792, DEAJUIFO22-860, DEAJUIFO22-815, DEAJUIFO22-772	Interventoría
DEAJUIFO22-913	19/12/2022	Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-086-2022 Parte 1 - Componente topografía: Alcance al oficio CEGG-CON-147- 52-089-2022 – "Atención a comunicado BRV-INT-CSJ-021- 2022. Información secundaria recibida de Consejo Superior de la Judicatura. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA SEDE ZIPAQUIRÁ" - Contrato consultoría 147 de 2022 y Contrato interventoría 131 de 2022	Interventoría
CEGG-CON-147-52-134-2022	19/12/2022	Alcance a comunicados CEGG-CON-147-52-125-2022 y CEGG-CON-147-52-126-2022 del 8 de diciembre de 2022.	Interventoría
DEAJUIFO22-914	20/12/2022	Resultado socialización avance del proyecto Sede Judicial Orocué - Casanare	DIRECTORAS Y DIRECTORES SECCIONALES DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

			JUEZAS Y JUECES DE LA REPUBLICA ALCALDÍAS MUNICIPALES PROFESIONALES DE LAS OFICINAS DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DEAJUIFO22-915	20/12/2022	Resultado socialización avance del proyecto Sede Judicial Bolivar - Cauca	DIRECTORAS Y DIRECTORES SECCIONALES DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL JUEZAS Y JUECES DE LA REPUBLICA ALCALDÍAS MUNICIPALES PROFESIONALES DE LAS OFICINAS DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DEAJUIFO22-916	20/12/2022	Resultado socialización avance del proyecto Sede Judicial Barrancominas - Guainía	DIRECTORAS Y DIRECTORES SECCIONALES DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

			JUEZAS Y JUECES DE LA REPUBLICA ALCALDÍAS MUNICIPALES PROFESIONALES DE LAS OFICINAS DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DEAJUIFO22-917	20/12/2022	Resultado socialización avance del proyecto Sede Judicial Concordia - Magdalena	DIRECTORAS Y DIRECTORES SECCIONALES DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL JUEZAS Y JUECES DE LA REPUBLICA ALCALDÍAS MUNICIPALES PROFESIONALES DE LAS OFICINAS DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DEAJUIFO22-918	20/12/2022	Resultado socialización avance del proyecto Sede Judicial La Primavera - Vichada	DIRECTORAS Y DIRECTORES SECCIONALES DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

			JUEZAS Y JUECES DE LA REPUBLICA ALCALDÍAS MUNICIPALES PROFESIONALES DE LAS OFICINAS DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DEAJUIFO22-919	20/12/2022	Resultado socialización avance del proyecto Sede Judicial Neiva - Huila	DIRECTORAS Y DIRECTORES SECCIONALES DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL JUEZAS Y JUECES DE LA REPUBLICA ALCALDÍAS MUNICIPALES PROFESIONALES DE LAS OFICINAS DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DEAJUIFO22-920	20/12/2022	Resultado socialización avance del proyecto Sede Judicial Zipaquirá - Cundinamarca	DIRECTORAS Y DIRECTORES SECCIONALES DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

			JUEZAS Y JUECES DE LA REPUBLICA ALCALDÍAS MUNICIPALES PROFESIONALES DE LAS OFICINAS DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DEAJUIFO22-926	22/12/2022	Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-086-2022 Parte 4 - Documentación enviada a SCI: Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-089-2022 – "Atención a comunicado BRV-INT-CSJ-021- 2022. Información secundaria recibida de Consejo Superior de la Judicatura. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA SEDE ZIPAQUIRÁ" - Contrato consultoría 147 de 2022 y Contrato interventoría 131 de 2022	Interventoría
DEAJUIFO22-927	22/12/2022	Entrega Manuales Sede Judicial Zipaquirá (Contrato 134 de 2017) - Contrato consultoría 147 de 2022 y Contrato interventoría 131 de 2022.	Interventoría
DEAJUIFO22-961	29/12/2022	Reiteración de entrega informes semanales y mensuales pendientes.	Interventoría
DEAJUIFO22-962	29/12/2022	Envío de observaciones informe mensual No. 2 de interventoría. Contrato 131 de 2022	Interventoría

DEAJUIFO22-963	29/12/2022	Aceptación aval condicionado informes base preliminar de Barrancominas, Bolívar, Orocué, La Primavera y Concordia. Contrato 131 de 2022.	Interventoría
DEAJUIFO22-964	29/12/2022	Observaciones en las hojas de vida del equipo mínimo de trabajo para el contrato 131 de 2022.	Interventoría
DEAJUIFO22-967	30/12/2022	Aceptación aval condicionado Informe Base Preliminar Sede Judicial Zipaquira (Cundinamarca)	Interventoría
DEAJUIFO22-968	30/12/2022	Aceptación aval condicionado Informe Base Preliminar Sede Judicial Neiva (Huila)	Interventoría
CEGG-CON-147-52-136-2023	05/01/2023	Informe Semanal No 11 Contrato 147-2022	Interventoría
CEGG-CON-147-52-137-2023	05/01/2023	Informe Semanal No 12 Contrato 147-2022	Interventoría
CEGG-CON-147-52-138-2023	05/01/2023	Informe Semanal No 13 Contrato 147-2022	Interventoría
CEGG-CON-147-52-140-2022	11/01/2023	Entrega de Informe Mensual No 3 Contrato 147-2022	Interventoría
CEGG-CON-147-52-135-2022	21/12/2022	Sede BARRANCOMINAS. Reglamentación Urbana	Interventoría
DEAJUIFO23-2	11/01/2023	Entrega de Implantación diseño estructural en topografía de la Sede Judicial Neiva.	Interventoría

DEAJUIFO23-6	12/01/2023	Diseño de cimentación Sede Judicial Neiva (Huila). Contrato de Consultoría 147 de 2022 y contrato de interventoría 131 de 2022	Interventoría
DEAJUIFO23-8	13/01/2023	Aclaraciones diseños estructurales Sede Judicial Neiva (Huila). Contrato de Consultoría 147 de 2022 y contrato de interventoría 131 de 2022.	Interventoría
DEAJUIFO23-16	13/01/2023	Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-129-2022: Análisis técnico componente de estudio de suelos V2 – Sede Zipaquirá - Contrato consultoría 147 de 2022 y Contrato interventoría 131 de 2022.	Interventoría
DEAJUIFO23-41	23/01/2023	Aprobación informes semanales de interventoría del 1 al 13 y mensual del 1 al 3.	Interventoría
CEGG-CON-147-52-148-2023	30/01/2023	Informe de Gestión Servicios Públicos (Acueducto, Alcantarillado sanitario y Pluvial). Sede Judicial de ZIPAQUIRÁ	Interventoría
DEAJUIFO23-55	07/02/2023	Entrega pruebas de integridad Sede Judicial – Zipaquirá (Cundinamarca).	Interventoría
DEAJUIFO23-58	08/02/2023	Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-129-2022: Análisis técnico componente de estudio de suelos V2 - Sede Zipaquirá - Contrato consultoría 147 de 2022 y Contrato interventoría 131 de 2022	Interventoría
CEGG-CON-147-52-153-2023	14/02/2023	Solicitud de Reinicio y Prórroga Contrato 147-2022	Interventoría

CEGG-CON-147-52-154-2023	15/02/2023	Propuesta Técnica - Económica de Levantamiento Topográfico. Sede Judicial Neiva	Interventoría
CEGG-CON-147-52-157-2023	16/02/2023	Atención a su comunicado BRV-INT-CSJ-160-2023 - Solicitud de hojas de vida de los profesionales del contrato de consultoría No. 147	Interventoría
CEGG-CON-147-52-158-2023	16/02/2023	Estudio de Suelos. Sede Judicial NEIVA (HUILA)	Interventoría
CEGG-CON-147-52-159-2023	16/02/2023	Nueva Entrega de Esquemas Básico-arquitectónicos para las sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) y La Primavera (Vichada)	Interventoría
CEGG-CON-147-52-160-2023	19/02/2023	Nuevo Alcance a Solicitud Prórroga Contrato 147-2022. Comunicado CEGG-CON-147-52-153-2023	Interventoría
CEGG-CON-147-52-161-2023	21/02/2023	Actualización de Pólizas a Reinicio Contrato 147-2022	Interventoría

CORRESPONDENCIA ENVIADA:

Consecutivo	Fecha	Asunto	Dirigido a
BRV-INT-CSJ-122-2022	15/12/2022	Entrega del Informe base preliminar (IBP) de la sede de La Primavera Vichada Versión 1 aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF

BRV-INT-CSJ-123-2022	15/12/2022	Entrega del Informe base preliminar (IBP) de la sede de Concordia Magdalena Versión 1 aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-124-2022	15/12/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-885 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-086-2022: “Alcance oficio CEGG-CON-147-52-089-2022. Análisis de la información secundaria Sede Zipaquirá Cundinamarca.”	Consultoría
BRV-INT-CSJ-125-2022	15/12/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-887 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-110-2022: “Alcance oficio CEGG-CON-147-52-104-2022. Diagnóstico Sede Zipaquirá	Consultoría

		Cundinamarca - Componente Eléctrico.”	
BRV-INT-CSJ-126-2022	15/12/2022	Entrega del Informe base preliminar (IBP) de la sede de Neiva Huila Versión 1 aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-127-2022	16/12/2022	Entrega del Informe base preliminar (IBP) de la sede de Zipaquirá Versión 1 aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-128-2022	16/12/2022	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-132-2022. Seguimiento a las gestiones realizadas ante Terceros.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-129-2022	21/12/2022	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-133-2022. Análisis técnico componente de estudio de suelos V2 - Sede Zipaquirá.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-130-2022	21/12/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-913 - Respuesta	Consultoría

		memorando BRV-INT-CSJ-086-2022: "Alcance oficio CEGG-CON-147-52-089-2022. Componente Topográfico Sede Zipaquirá Cundinamarca."	
BRV-INT-CSJ-131-2022	23/12/2022	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-134-2022 - Aprobación del retiro No. 1 del anticipo correspondiente al contrato 147-2022.	Consultoría
BRV-INT-CSJ-132-2022	23/12/2022	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-134-2022 - Aprobación del retiro No. 2 del anticipo correspondiente al contrato 147-2022.	Consultoría
BRV-INT-CSJ-133-2022	23/12/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-926 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-086-2022: "Alcance oficio CEGG-CON-147-52-089-2022.	Consultoría

		Componente Estructural Sede Zipaquirá Cundinamarca.”	
BRV-INT-CSJ-134-2022	23/12/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-927 - Entrega manuales Sede Zipaquirá Cundinamarca.	Consultoría
BRV-INT-CSJ-135-2022	28/12/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-903 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL NO. 1	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-136-2022	28/12/2022	Solicitud de los informes semanales y mensuales del contrato de consultoría No. 147 de 2022	Consultoría
BRV-INT-CSJ-137-2022	29/12/2022	Alcance OF. DEAJUIFO22-961 - Reiteración de entrega informes semanales y mensuales pendientes.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-138-2022	29/12/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-963 - “Aceptación aval	Consultoría

		condicionado informes base preliminar de Barrancominas, Bolívar, Orocué, La Primavera y Concordia.”	
BRV-INT-CSJ-139-2022	30/12/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-967 - “Aceptación aval condicionado informe base preliminar de Zipaquirá Cundinamarca.”	Consultoría
BRV-INT-CSJ-140-2022	30/12/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-968 - “Aceptación aval condicionado informe base preliminar de Neiva Huila.”	Consultoría
BRV-INT-CSJ-141-2023	03/01/2023	Alcance OF. DEAJUIFO22-962 - Envío de observaciones al informe mensual No. 2 de interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-142-2023	12/01/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-135-2022. Reglamentación Urbana – Sede	Consejo Superior de la Judicatura UIF

		Barrancominas.	
BRV-INT-CSJ-143-2023	12/01/2023	Alcance al oficio DEAJUIFO23-2 - Entrega de Implantación diseño estructural en topografía de la Sede Judicial Neiva Huila.	Consultoría
BRV-INT-CSJ-144-2023	13/01/2023	Alcance al oficio DEAJUIFO23-6 - Diseño de cimentación Sede Judicial Neiva Huila.	Consultoría
BRV-INT-CSJ-145-2023	13/01/2023	Alcance al oficio DEAJUIFO23-8 - Aclaraciones diseños estructurales de la Sede Judicial Neiva Huila.	Consultoría
BRV-INT-CSJ-146-2023	13/01/2023	Entrega del informe semanal No. 11 de interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-147-2023	13/01/2023	Entrega Informe Semanal No. 11 del contrato 147-2022 aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-148-2023	13/01/2023	Entrega del informe semanal No. 12 de interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF


BRV-INT-CSJ-149-2023	13/01/2023	Entrega Informe Semanal No. 12 del contrato 147-2022 aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-150-2023	13/01/2023	Entrega del informe semanal No. 13 de interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-151-2023	13/01/2023	Entrega Informe Semanal No. 13 del contrato 147-2022 aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-152-2023	13/01/2023	Entrega Informe mensual No. 2 del contrato 147-2022 aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-153-2023	16/01/2023	Entrega del informe mensual No. 3 de interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-154-2023	16/01/2023	Entrega Informe mensual No. 3 del contrato 147-2022 aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-155-2023	18/01/2023	Alcance al oficio DEAJUIFO23-16 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-129-2022:	Consultoría

		Análisis técnico componente de estudio de suelos V2 – Sede Zipaquirá.	
BRV-INT-CSJ-156-2023	18/01/2023	Alcance al oficio DEAJUIFO23-35 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-129-2022 Parte 2: Análisis técnico componente de estudio de suelos V2 – Sede Zipaquirá.	Consultoría
BRV-INT-CSJ-157-2023	18/01/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-141-2022. Solicitud de prórroga a la suspensión No. 1 del Contrato de Consultoría No. 147 de 2022 y Contrato de Interventoría No. 131 de 2022.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-158-2023	26/01/2023	Aprobación informes semanales de consultoría del 1 al 13 y mensual del 1 al 3.	Consultoría
BRV-INT-CSJ-159-2023	27/01/2023	Alcance oficio DEAJUIFO22-964. Respuesta a	Consejo Superior de la Judicatura UIF

		observaciones en las hojas de vida del equipo mínimo de trabajo para el contrato de Interventoría No. 131 de 2022.	
BRV-INT-CSJ-160-2023	26/01/2023	Solicitud de hojas de vida de los profesionales del contrato de consultoría No. 147 de 2022	Consultoría
BRV-INT-CSJ-161-2023	31/01/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-148-2023. Informe de Gestión Servicios Públicos (Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Pluvial) - Sede Zipaquirá.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-162-2023	08/02/2023	Alcance al oficio DEAJUIFO23-55 - Entrega pruebas de integridad de pilotes Sede Zipaquirá.	Consultoría

ANEXO No. 1 CRONOGRAMA DE LAS DIFERENTES SEDES APROBADO POR LA INTERVENTORÍA


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**SEDE BARRANCOMINAS GUANÍA**	**83 días**	**jue 8/09/22**	**sáb 31/12/22**
2		**ASPECTOS GENERALES**	13 días	jue 15/12/22	sáb 31/12/22
3		**INFORME BASE PRELIMINAR**	22 días	jue 8/09/22	vie 7/10/22
4		**GEOFISICA Y SUELOS**	22 días	sáb 8/10/22	lun 7/11/22
5		**TOPOGRAFÍA**	22 días	sáb 8/10/22	lun 7/11/22
6		**ARQUITECTÓNICO**	**44 días**	**lun 10/10/22**	**jue 8/12/22**
7		Esquema Básico Arquitectónico	10 días	lun 10/10/22	dom 23/10/22
8		Anteproyecto Arquitectónico	12 días	lun 24/10/22	mar 8/11/22
9		Diseño Arquitectónico	12 días	mié 9/11/22	jue 24/11/22
10		Mobiliario	12 días	jue 8/12/22	vie 23/12/22
11		Señalización	13 días	jue 15/12/22	sáb 31/12/22
12		Paisajismo	12 días	jue 8/12/22	vie 23/12/22
13		**ESTRUCTURAL**	23 días	mar 8/11/22	jue 8/12/22
14		**HIDROSANITARIO**	23 días	mar 8/11/22	jue 8/12/22
15		**ELÉCTRICO Y COMPONENTES**	34 días	mar 8/11/22	vie 23/12/22
16		**AIRE ACONDICIONADO**	23 días	mié 23/11/22	vie 23/12/22
17		**AMBIENTAL**	13 días	jue 15/12/22	sáb 31/12/22
18		**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INDENDIOS**	23 días	mar 8/11/22	jue 8/12/22
19		**SEGURIDAD Y CONTROL**	23 días	mié 23/11/22	vie 23/12/22
20		**TRANSPORTE VERTICAL**	12 días	lun 24/10/22	mar 8/11/22
21		**CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE**	45 días	lun 24/10/22	vie 23/12/22
22		**PRESUPUESTO**	18 días	jue 8/12/22	sáb 31/12/22
23		**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	18 días	jue 8/12/22	sáb 31/12/22
24		**LICENCIAS Y PERMISOS**	18 días	jue 8/12/22	sáb 31/12/22
25		**MANUAL DE DOTACIÓN Y MOBILIARIO**	13 días	jue 15/12/22	sáb 31/12/22
26		**INFORMACION CATASTRAL**	24 días	lun 24/10/22	jue 24/11/22
27		**BIM**	62 días	sáb 8/10/22	sáb 31/12/22

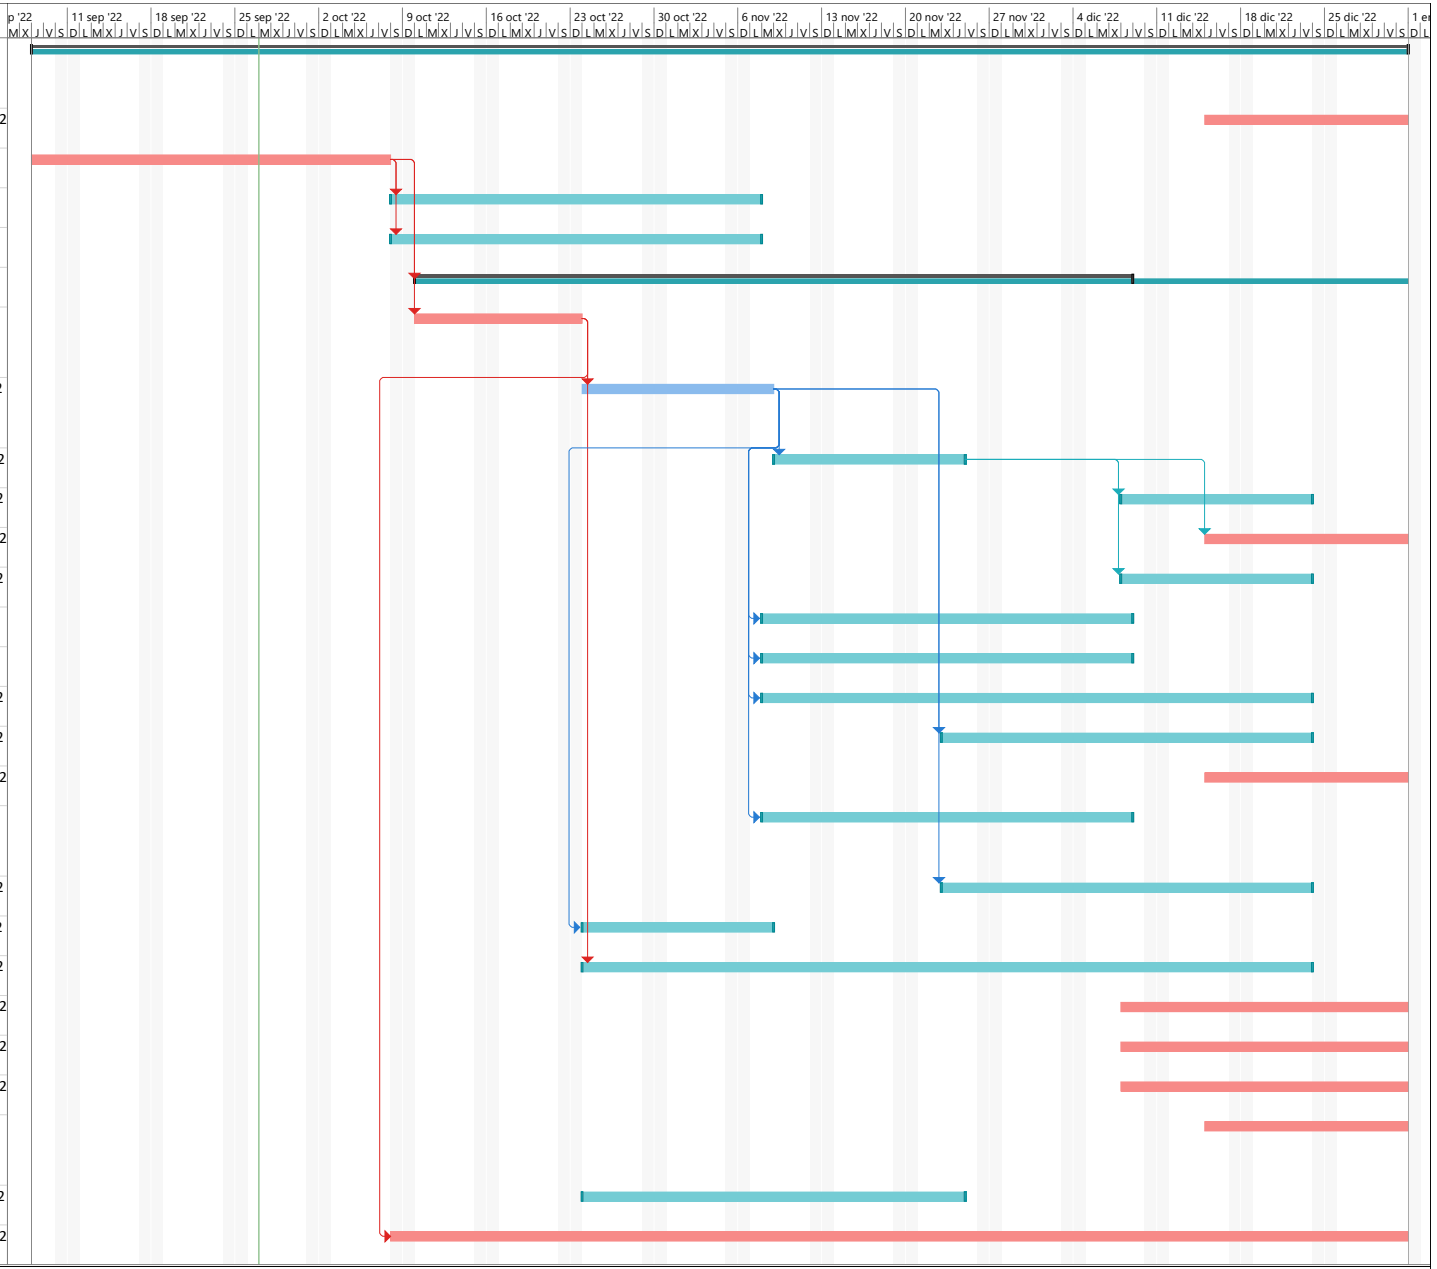

Proyecto: Sede Barrancominas Guanía
Fecha: mar 27/09/22

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas	
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica	
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**SEDE BOLÍVAR CAUCA**	**83 días**	**jue 8/09/22**	**sáb 31/12/22**
2		**ASPECTOS GENERALES**	13 días	jue 15/12/22	sáb 31/12/22
3		**INFORME BASE PRELIMINAR**	22 días	jue 8/09/22	vie 7/10/22
4		**GEOFISICA Y SUELOS**	22 días	sáb 8/10/22	lun 7/11/22
5		**TOPOGRAFÍA**	22 días	sáb 8/10/22	lun 7/11/22
6		**ARQUITECTÓNICO**	**44 días**	**lun 10/10/22**	**jue 8/12/22**
7		Esquema Básico Arquitectónico	10 días	lun 10/10/22	dom 23/10/22
8		Anteproyecto Arquitectónico	12 días	lun 24/10/22	mar 8/11/22
9		Diseño Arquitectónico	12 días	mié 9/11/22	jue 24/11/22
10		Mobiliario	12 días	jue 8/12/22	vie 23/12/22
11		Señalización	13 días	jue 15/12/22	sáb 31/12/22
12		Paisajismo	12 días	jue 8/12/22	vie 23/12/22
13		**ESTRUCTURAL**	23 días	mar 8/11/22	jue 8/12/22
14		**HIDROSANITARIO**	23 días	mar 8/11/22	jue 8/12/22
15		**ELÉCTRICO Y COMPONENTES**	34 días	mar 8/11/22	vie 23/12/22
16		**AIRE ACONDICIONADO**	23 días	mié 23/11/22	vie 23/12/22
17		**AMBIENTAL**	13 días	jue 15/12/22	sáb 31/12/22
18		**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INDENDIOS**	23 días	mar 8/11/22	jue 8/12/22
19		**SEGURIDAD Y CONTROL**	23 días	mié 23/11/22	vie 23/12/22
20		**TRANSPORTE VERTICAL**	12 días	lun 24/10/22	mar 8/11/22
21		**CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE**	45 días	lun 24/10/22	vie 23/12/22
22		**PRESUPUESTO**	18 días	jue 8/12/22	sáb 31/12/22
23		**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	18 días	jue 8/12/22	sáb 31/12/22
24		**LICENCIAS Y PERMISOS**	18 días	jue 8/12/22	sáb 31/12/22
25		**MANUAL DE DOTACIÓN Y MOBILIARIO**	13 días	jue 15/12/22	sáb 31/12/22
26		**INFORMACION CATASTRAL**	24 días	lun 24/10/22	jue 24/11/22
27		**BIM**	62 días	sáb 8/10/22	sáb 31/12/22

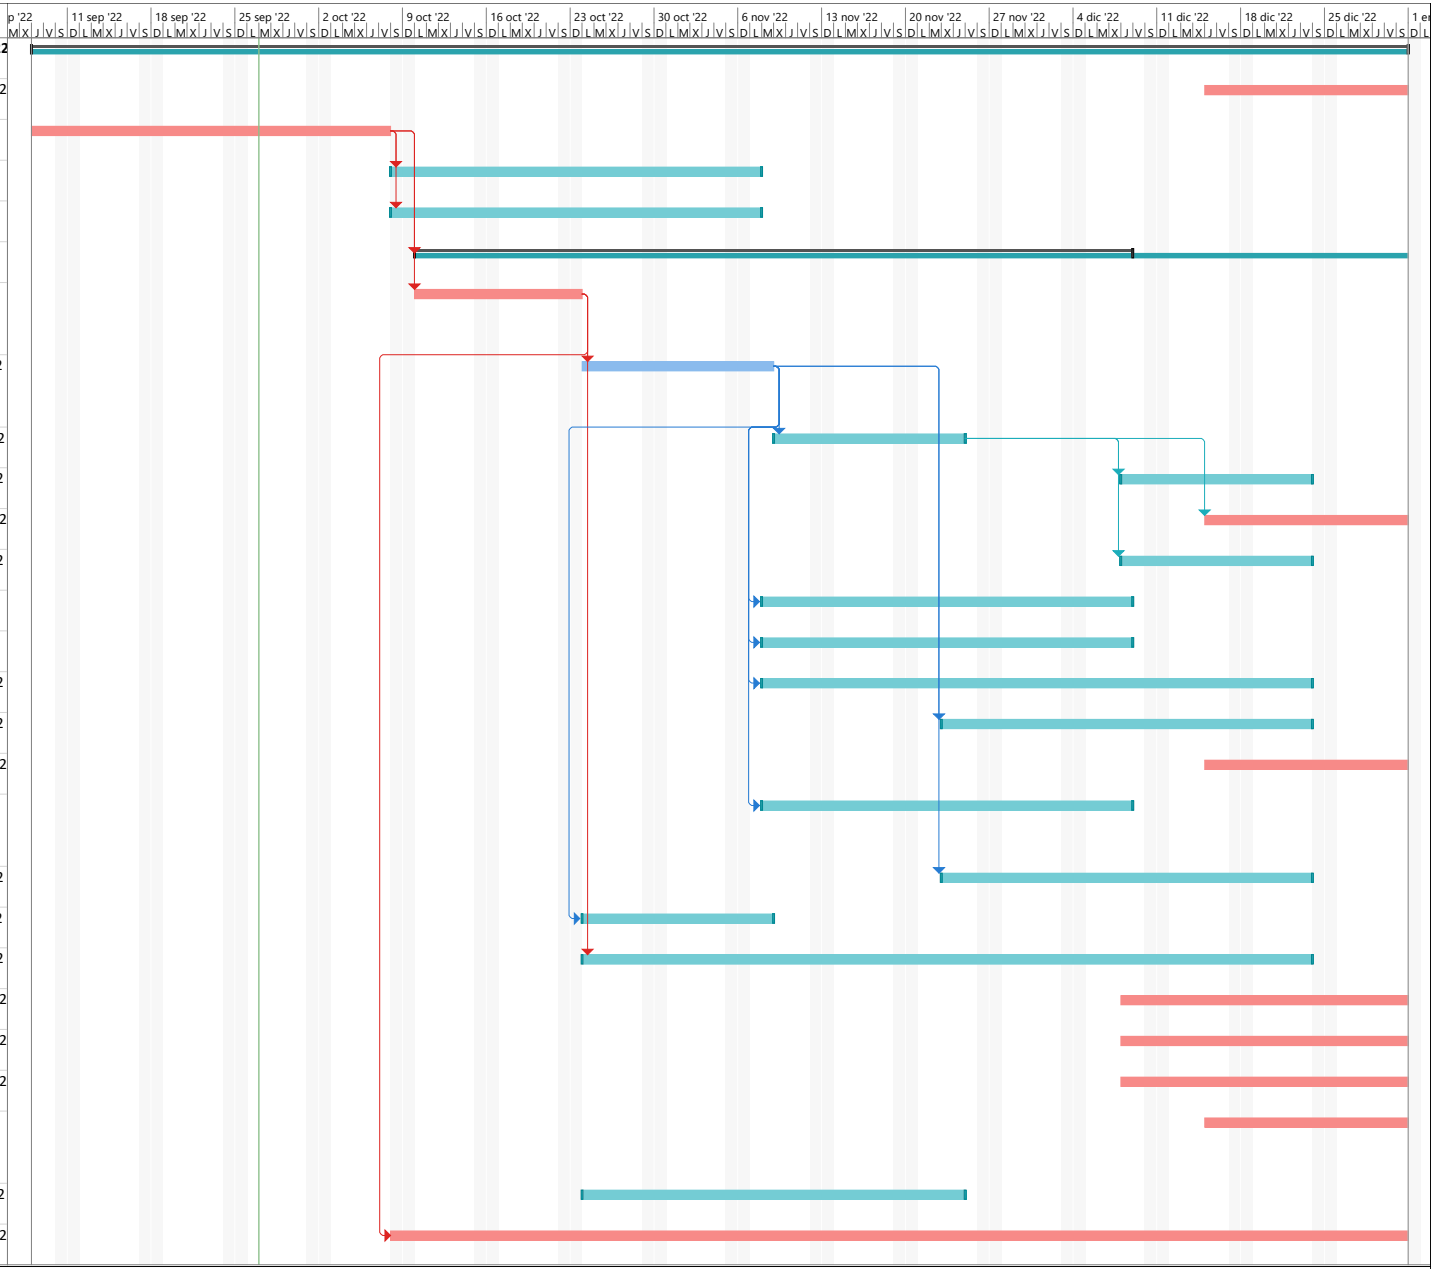

Proyecto: Sede Bolívar Cauca
Fecha: mar 27/09/22

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual		
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas			
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica			
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**SEDE CONCORDIA MAGDALENA**	**83 días**	**jue 8/09/22**	**sáb 31/12/22**
2		**ASPECTOS GENERALES**	13 días	jue 15/12/22	sáb 31/12/22
3		**INFORME BASE PRELIMINAR**	22 días	jue 8/09/22	vie 7/10/22
4		**GEOFISICA Y SUELOS**	22 días	sáb 8/10/22	lun 7/11/22
5		**TOPOGRAFÍA**	22 días	sáb 8/10/22	lun 7/11/22
6		**ARQUITECTÓNICO**	**44 días**	**lun 10/10/22**	**jue 8/12/22**
7		Esquema Básico Arquitectónico	10 días	lun 10/10/22	dom 23/10/22
8		Anteproyecto Arquitectónico	12 días	lun 24/10/22	mar 8/11/22
9		Diseño Arquitectónico	12 días	mié 9/11/22	jue 24/11/22
10		Mobiliario	12 días	jue 8/12/22	vie 23/12/22
11		Señalización	13 días	jue 15/12/22	sáb 31/12/22
12		Paisajismo	12 días	jue 8/12/22	vie 23/12/22
13		**ESTRUCTURAL**	23 días	mar 8/11/22	jue 8/12/22
14		**HIDROSANITARIO**	23 días	mar 8/11/22	jue 8/12/22
15		**ELÉCTRICO Y COMPONENTES**	34 días	mar 8/11/22	vie 23/12/22
16		**AIRE ACONDICIONADO**	23 días	mié 23/11/22	vie 23/12/22
17		**AMBIENTAL**	13 días	jue 15/12/22	sáb 31/12/22
18		**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INDENDIOS**	23 días	mar 8/11/22	jue 8/12/22
19		**SEGURIDAD Y CONTROL**	23 días	mié 23/11/22	vie 23/12/22
20		**TRANSPORTE VERTICAL**	12 días	lun 24/10/22	mar 8/11/22
21		**CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE**	45 días	lun 24/10/22	vie 23/12/22
22		**PRESUPUESTO**	18 días	jue 8/12/22	sáb 31/12/22
23		**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	18 días	jue 8/12/22	sáb 31/12/22
24		**LICENCIAS Y PERMISOS**	18 días	jue 8/12/22	sáb 31/12/22
25		**MANUAL DE DOTACIÓN Y MOBILIARIO**	13 días	jue 15/12/22	sáb 31/12/22
26		**INFORMACION CATASTRAL**	24 días	lun 24/10/22	jue 24/11/22
27		**BIM**	62 días	sáb 8/10/22	sáb 31/12/22

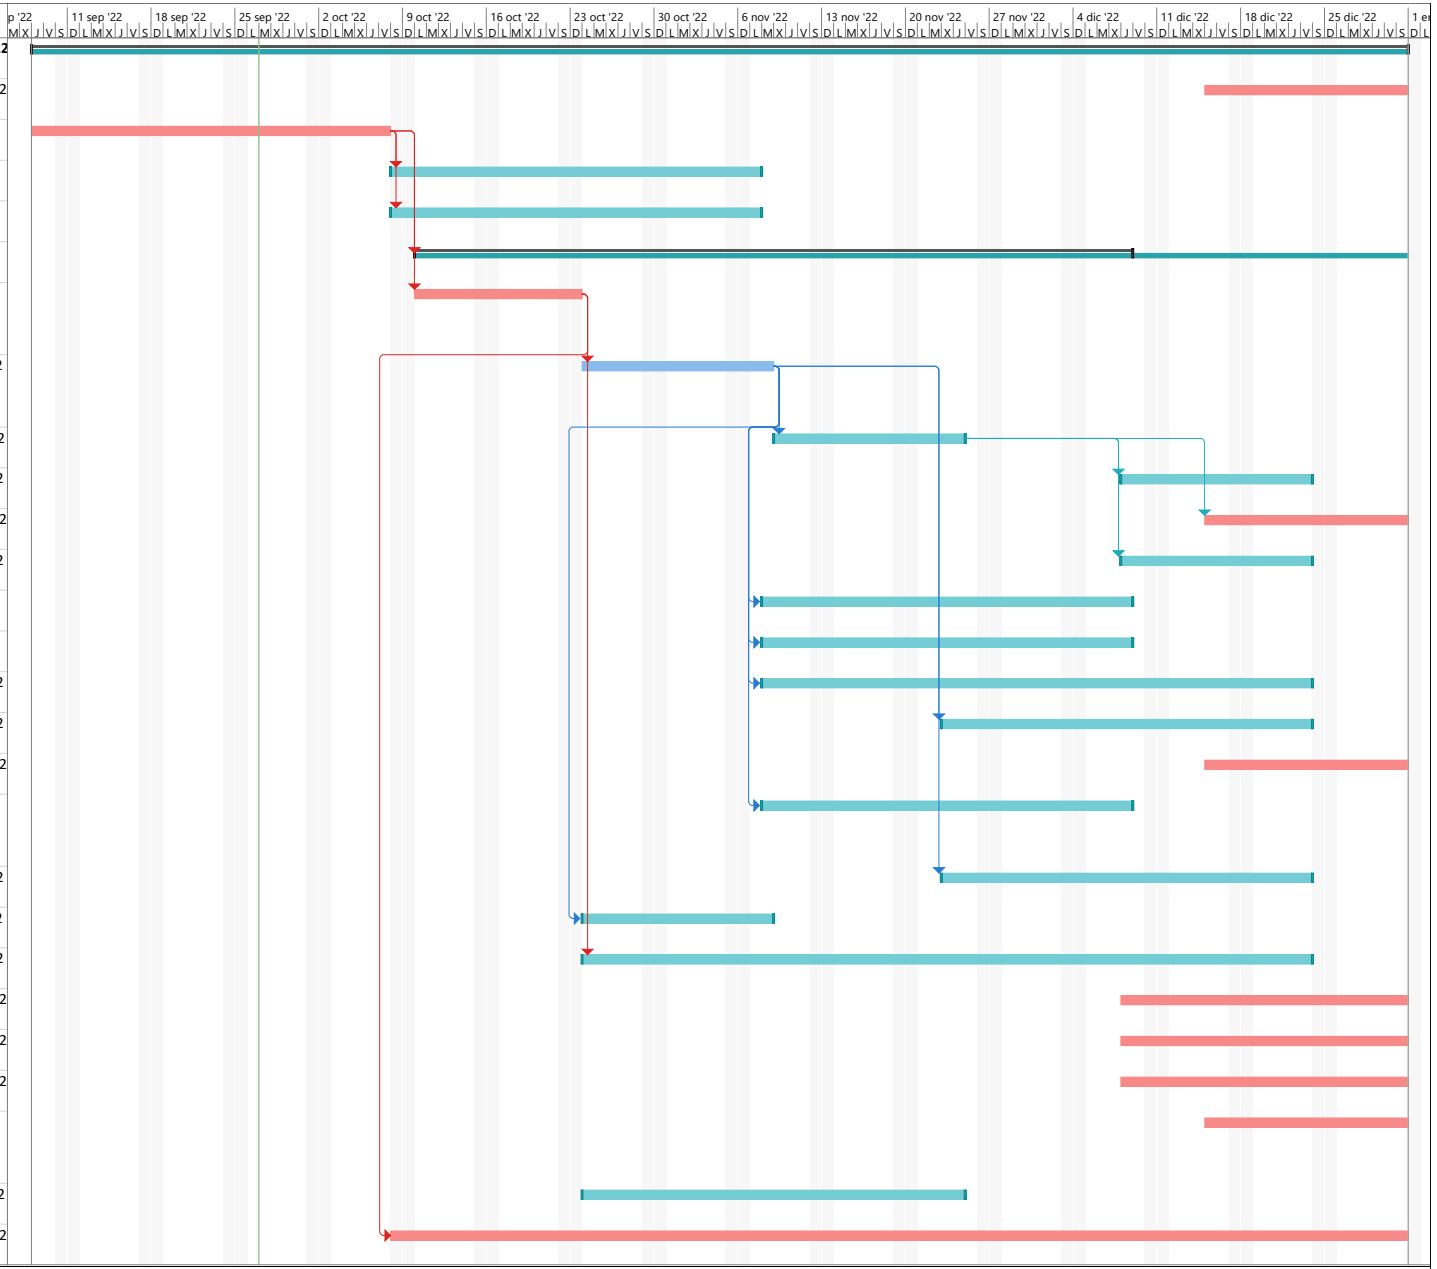

Proyecto: Sede Concordia Magdalena
Fecha: mar 27/09/22

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual		
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas			
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica			
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**SEDE LA PRIMAVERA VICHADA**	**83 días**	**jue 8/09/22**	**sáb 31/12/22**
2		**ASPECTOS GENERALES**	13 días	jue 15/12/22	sáb 31/12/22
3		**INFORME BASE PRELIMINAR**	22 días	jue 8/09/22	vie 7/10/22
4		**GEOFISICA Y SUELOS**	22 días	sáb 8/10/22	lun 7/11/22
5		**TOPOGRAFÍA**	22 días	sáb 8/10/22	lun 7/11/22
6		**ARQUITECTÓNICO**	**44 días**	**lun 10/10/22**	**jue 8/12/22**
7		Esquema Básico Arquitectónico	10 días	lun 10/10/22	dom 23/10/22
8		Anteproyecto Arquitectónico	12 días	lun 24/10/22	mar 8/11/22
9		Diseño Arquitectónico	12 días	mié 9/11/22	jue 24/11/22
10		Mobiliario	12 días	jue 8/12/22	vie 23/12/22
11		Señalización	13 días	jue 15/12/22	sáb 31/12/22
12		Paisajismo	12 días	jue 8/12/22	vie 23/12/22
13		**ESTRUCTURAL**	23 días	mar 8/11/22	jue 8/12/22
14		**HIDROSANITARIO**	23 días	mar 8/11/22	jue 8/12/22
15		**ELÉCTRICO Y COMPONENTES**	34 días	mar 8/11/22	vie 23/12/22
16		**AIRE ACONDICIONADO**	23 días	mié 23/11/22	vie 23/12/22
17		**AMBIENTAL**	13 días	jue 15/12/22	sáb 31/12/22
18		**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INDENDIOS**	23 días	mar 8/11/22	jue 8/12/22
19		**SEGURIDAD Y CONTROL**	23 días	mié 23/11/22	vie 23/12/22
20		**TRANSPORTE VERTICAL**	12 días	lun 24/10/22	mar 8/11/22
21		**CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE**	45 días	lun 24/10/22	vie 23/12/22
22		**PRESUPUESTO**	18 días	jue 8/12/22	sáb 31/12/22
23		**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	18 días	jue 8/12/22	sáb 31/12/22
24		**LICENCIAS Y PERMISOS**	18 días	jue 8/12/22	sáb 31/12/22
25		**MANUAL DE DOTACIÓN Y MOBILIARIO**	13 días	jue 15/12/22	sáb 31/12/22
26		**INFORMACION CATASTRAL**	24 días	lun 24/10/22	jue 24/11/22
27		**BIM**	62 días	sáb 8/10/22	sáb 31/12/22

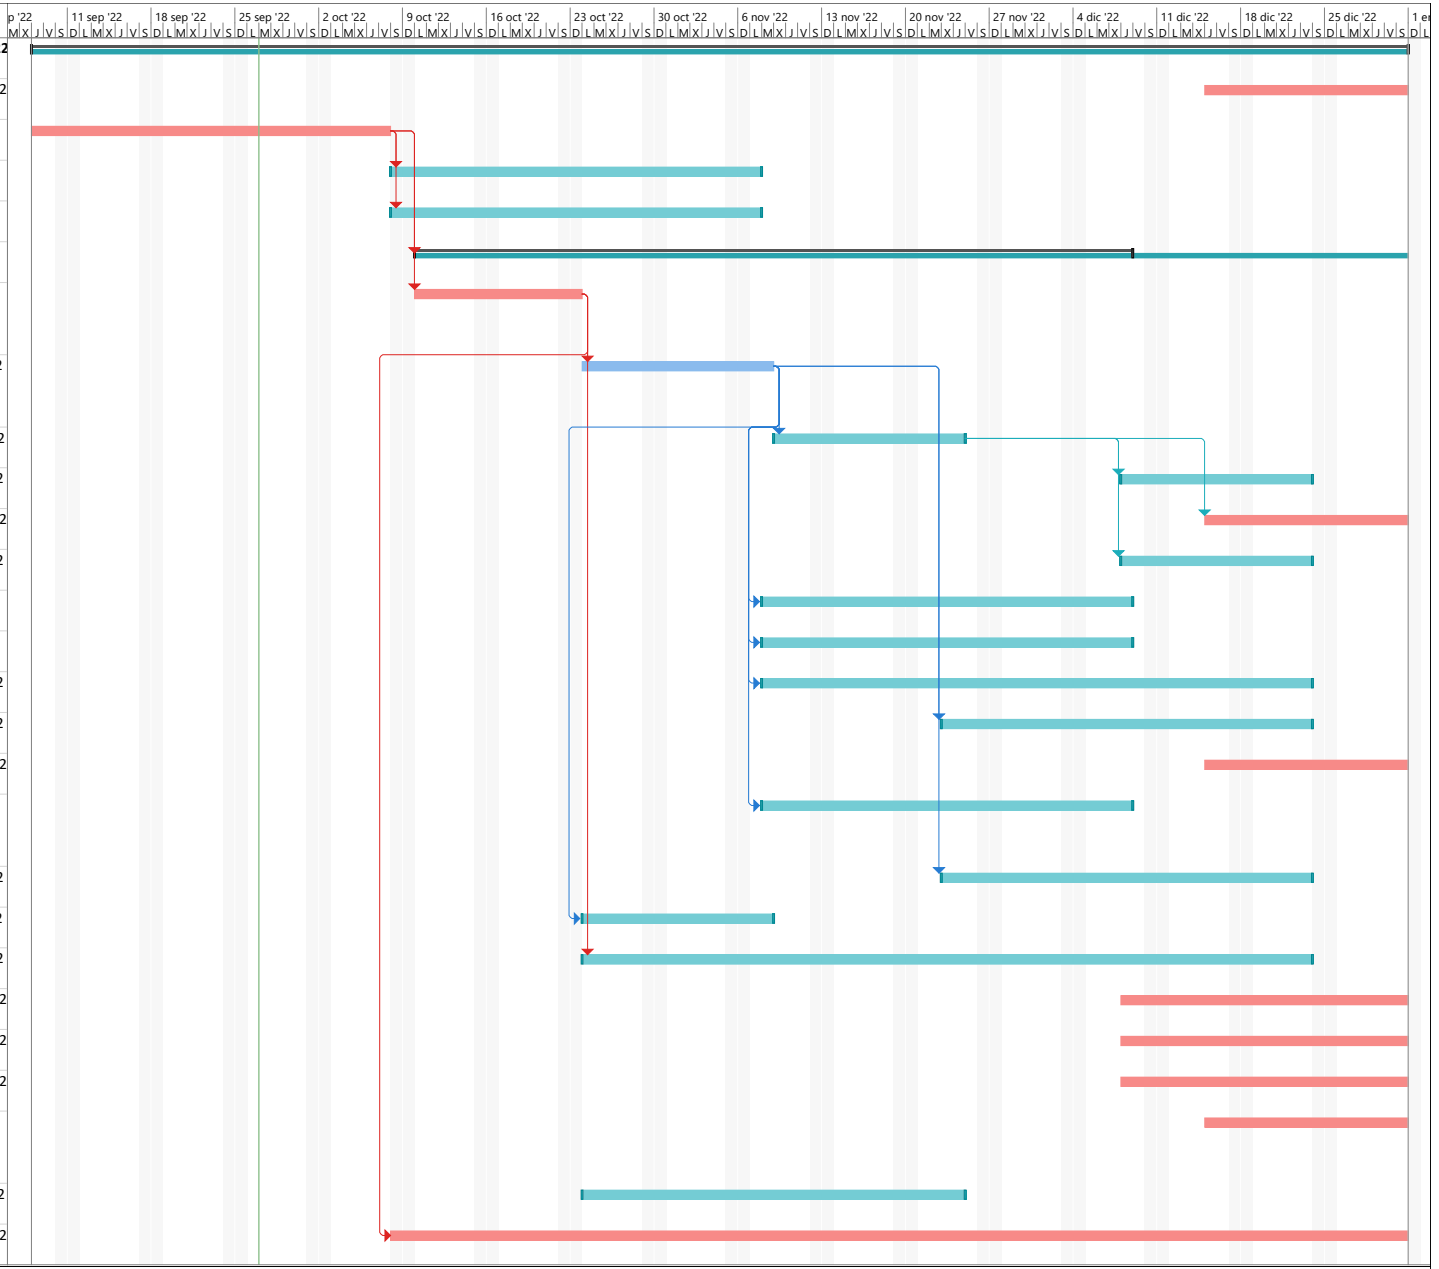

Proyecto: Sede La Primavera Vichada
Fecha: mar 27/09/22

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual		
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas			
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica			
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**SEDE NEIVA HUILA**	**83 días**	**jue 8/09/22**	**sáb 31/12/22**
2		**ACTIVIDADES PREVIAS**	**22 días**	**jue 8/09/22**	**sáb 8/10/22**
3		RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA ENTREGADA POR ENTIDAD	12 días	jue 8/09/22	vie 23/09/22
4		VISITA TECNICA DETALLADA	7 días	jue 8/09/22	vie 16/09/22
5		SOLICTUD DE INFORMACIÓN BÁSICA A TERCEROS (Planeación municipal , servicios públicos, bomberos, ambiental y/o otros	12 días	jue 8/09/22	vie 23/09/22
6		ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO PREVIO DE INFORMACIÓN SECUNDARIA EXISTENTE	11 días	lun 26/09/22	sáb 8/10/22
7		**ASPECTOS GENERALES**	13 días	jue 15/12/22	sáb 31/12/22
8		**INFORME BASE PRELIMINAR**	23 días	jue 8/09/22	sáb 8/10/22
9		**AJUSTE AL DISEÑO ARQUITECTÓNICO**	**44 días**	**lun 10/10/22**	**jue 8/12/22**
10		Ajuste al diseño arquitectónico	24 días	lun 10/10/22	jue 10/11/22
11		Diseño Arquitectónico detallado	20 días	vie 11/11/22	jue 8/12/22
12		Mobiliario	12 días	mié 23/11/22	jue 8/12/22
13		Señalización	12 días	mié 23/11/22	jue 8/12/22
14		Paisajismo	12 días	mié 23/11/22	jue 8/12/22
15		**HIDROSANITARIO**	23 días	dom 23/10/2	mar 22/11/2
16		**ELÉCTRICO Y COMPONENTES**	34 días	dom 23/10/2	mié 7/12/22
17		**AIRE ACONDICIONADO**	23 días	dom 23/10/2	mar 22/11/2
18		**AMBIENTAL**	13 días	jue 15/12/22	sáb 31/12/22
19		**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INDENDIOS**	34 días	dom 23/10/22	mié 7/12/22
20		**SEGURIDAD Y CONTROL**	23 días	lun 7/11/22	mié 7/12/22
21		**TRANSPORTE VERTICAL**	12 días	dom 23/10/2	lun 7/11/22
22		**CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE**	40 días	dom 23/10/2	jue 15/12/22
23		**PRESUPUESTO**	23 días	jue 1/12/22	sáb 31/12/22
24		**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	23 días	jue 1/12/22	sáb 31/12/22
25		**LICENCIAS Y PERMISOS**	23 días	jue 1/12/22	sáb 31/12/22
26		**MANUAL DE DOTACIÓN Y MOBILIARIO**	13 días	jue 15/12/22	sáb 31/12/22
27		**INFORMACION CATASTRAL**	22 días	sáb 8/10/22	lun 7/11/22
28		**BIM**	50 días	dom 23/10/2	jue 29/12/22

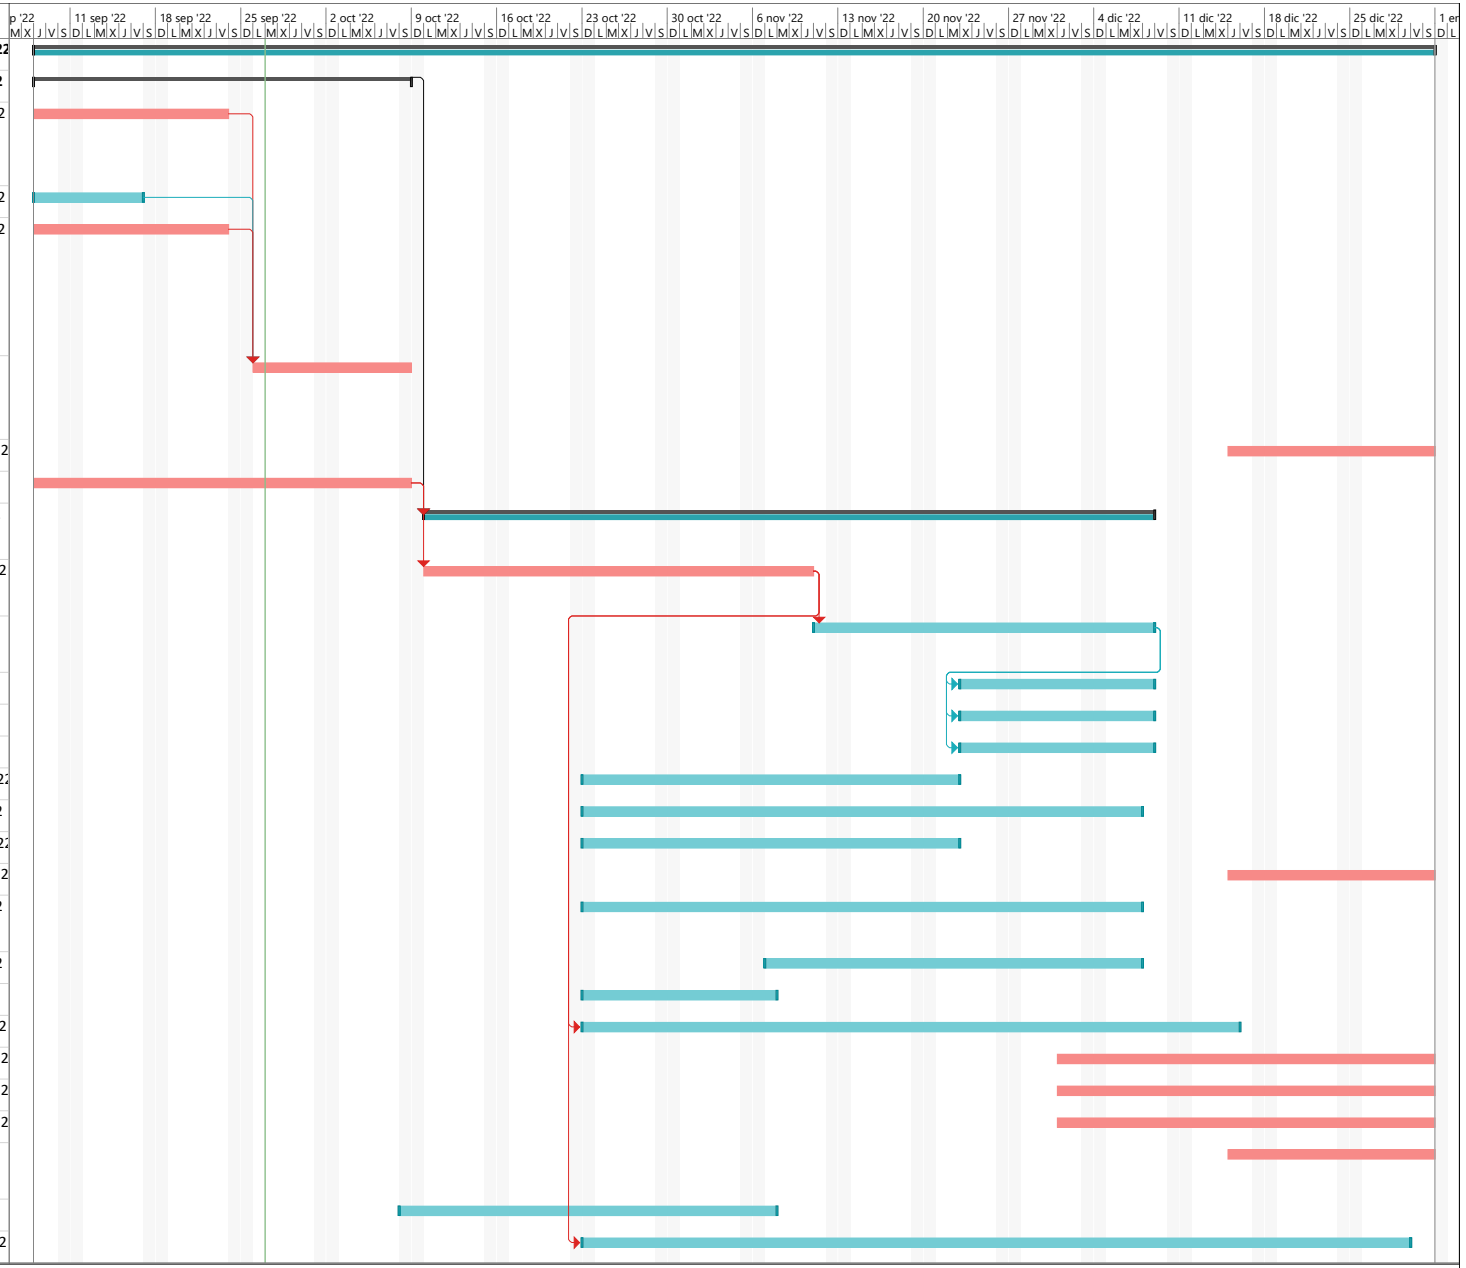

Proyecto: Sede Neiva Huila
Fecha: mar 27/09/22

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Hito de línea base		
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas	Resumen de línea base		
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica	Progreso		
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Línea base	Progreso manual		


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**SEDE OROCUÉ CASANARE**	**83 días**	**jue 8/09/22**	**sáb 31/12/22**
2		**ASPECTOS GENERALES**	13 días	jue 15/12/22	sáb 31/12/22
3		**INFORME BASE PRELIMINAR**	22 días	jue 8/09/22	vie 7/10/22
4		**GEOFISICA Y SUELOS**	22 días	sáb 8/10/22	lun 7/11/22
5		**TOPOGRAFÍA**	22 días	sáb 8/10/22	lun 7/11/22
6		**ARQUITECTÓNICO**	**44 días**	**lun 10/10/22**	**jue 8/12/22**
7		Esquema Básico Arquitectónico	10 días	lun 10/10/22	dom 23/10/22
8		Anteproyecto Arquitectónico	12 días	lun 24/10/22	mar 8/11/22
9		Diseño Arquitectónico	12 días	mié 9/11/22	jue 24/11/22
10		Mobiliario	12 días	jue 8/12/22	vie 23/12/22
11		Señalización	13 días	jue 15/12/22	sáb 31/12/22
12		Paisajismo	12 días	jue 8/12/22	vie 23/12/22
13		**ESTRUCTURAL**	23 días	mar 8/11/22	jue 8/12/22
14		**HIDROSANITARIO**	23 días	mar 8/11/22	jue 8/12/22
15		**ELÉCTRICO Y COMPONENTES**	34 días	mar 8/11/22	vie 23/12/22
16		**AIRE ACONDICIONADO**	23 días	mié 23/11/22	vie 23/12/22
17		**AMBIENTAL**	13 días	jue 15/12/22	sáb 31/12/22
18		**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INDENDIOS**	23 días	mar 8/11/22	jue 8/12/22
19		**SEGURIDAD Y CONTROL**	23 días	mié 23/11/22	vie 23/12/22
20		**TRANSPORTE VERTICAL**	12 días	lun 24/10/22	mar 8/11/22
21		**CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE**	45 días	lun 24/10/22	vie 23/12/22
22		**PRESUPUESTO**	18 días	jue 8/12/22	sáb 31/12/22
23		**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	18 días	jue 8/12/22	sáb 31/12/22
24		**LICENCIAS Y PERMISOS**	18 días	jue 8/12/22	sáb 31/12/22
25		**MANUAL DE DOTACIÓN Y MOBILIARIO**	13 días	jue 15/12/22	sáb 31/12/22
26		**INFORMACION CATASTRAL**	24 días	lun 24/10/22	jue 24/11/22
27		**BIM**	62 días	sáb 8/10/22	sáb 31/12/22

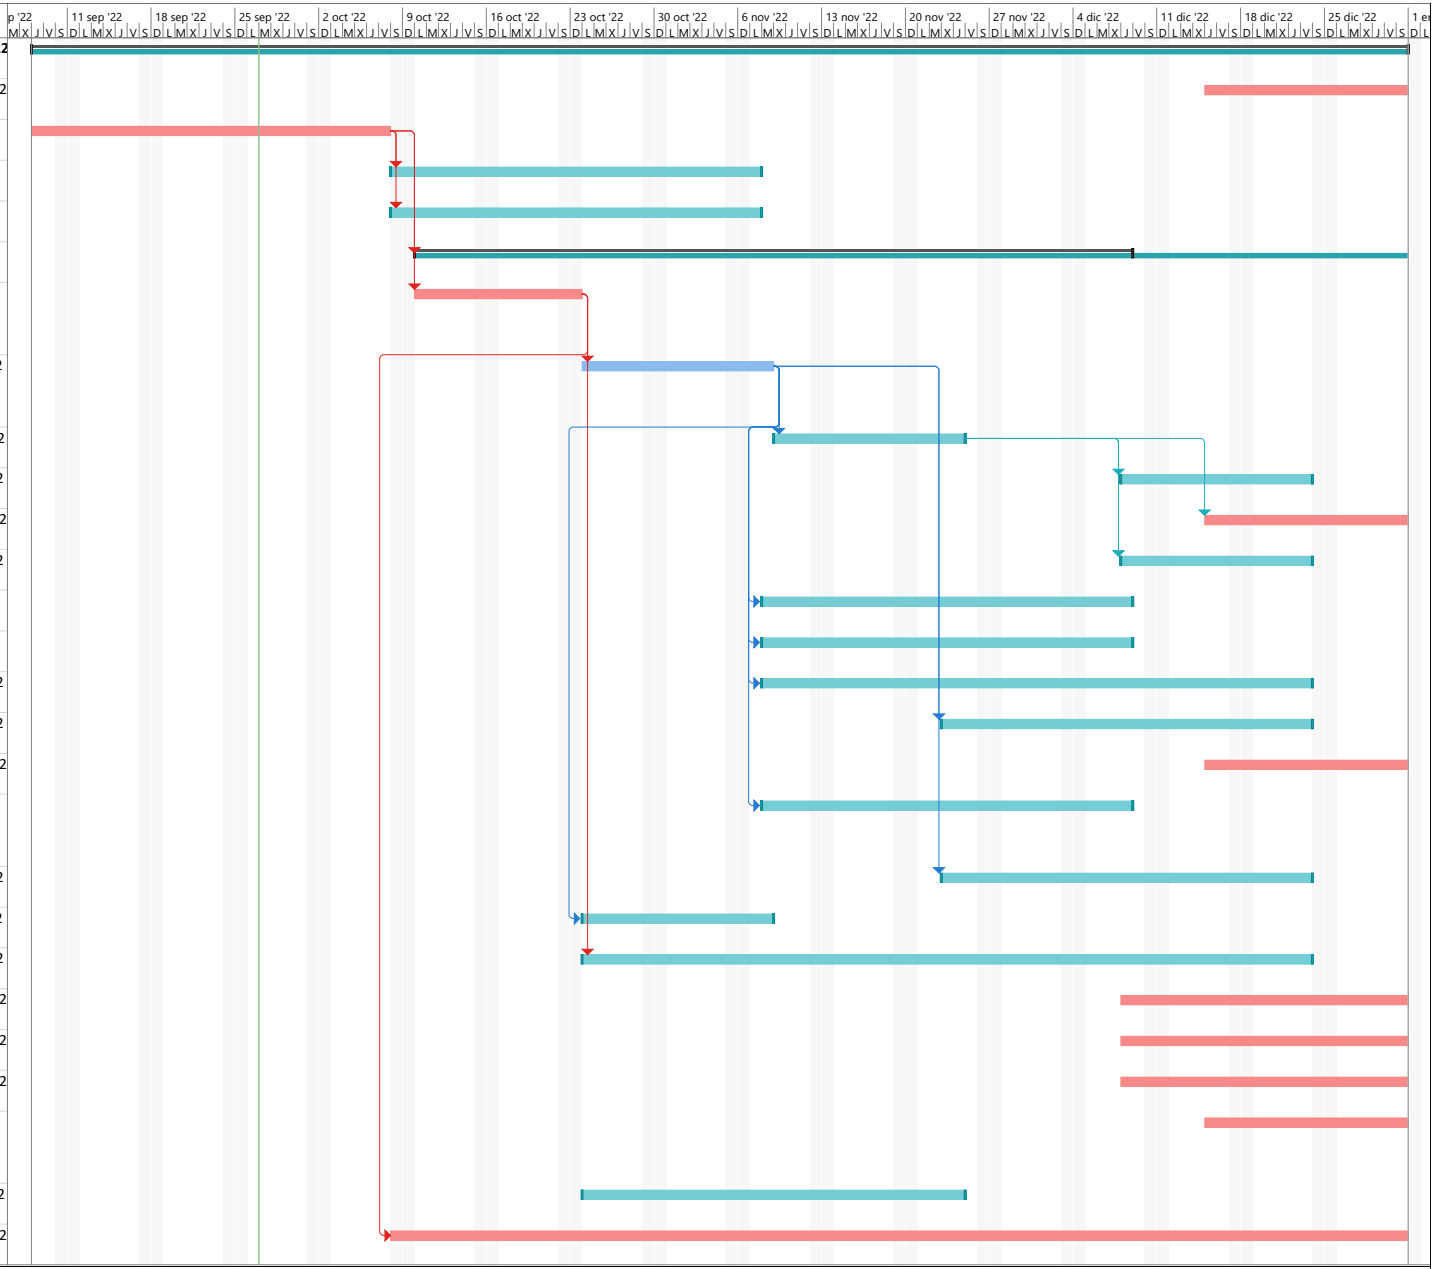

Proyecto: Sede Orocué Casana
Fecha: mar 27/09/22

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual		
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas			
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica			
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**SEDE ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA DIAGNÓSTICO**	**83 días**	**jue 8/09/22**	**sáb 31/12/22**
2		**ACTIVIDADES PREVIAS**	**12 días**	**jue 8/09/22**	**vie 23/09/22**
3		RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA ENTREGADA POR ENTIDAD	12 días	jue 8/09/22	vie 23/09/22
4		VISITA TECNICA DETALLADA	7 días	jue 8/09/22	vie 16/09/22
5		SOLICTUD DE INFORMACIÓN BÁSICA A TERCEROS (Planeación municipal , servicios públicos, bomberos, ambiental y/o otros	12 días	jue 8/09/22	vie 23/09/22
6		**ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO PREVIO DE INFORMACIÓN SECUNDARIA EXISTENTE**	11 días	lun 26/09/22	sáb 8/10/22
7		**ASPECTOS GENERALES**	13 días	jue 15/12/22	sáb 31/12/22
8		**INFORME BASE PRELIMINAR**	23 días	jue 8/09/22	sáb 8/10/22
9		**GEOFÍSICA Y SUELOS**	22 días	sáb 8/10/22	lun 7/11/22
10		**TOPOGRAFÍA**	22 días	vie 7/10/22	dom 6/11/22
11		**ESTRUCTURAL (Anclajes casetón)**	12 días	sáb 22/10/22	dom 6/11/22
12		**HIDROSANITARIO**	23 días	dom 6/11/22	mar 6/12/22
13		**FIBRA ÓPTICA**	23 días	dom 6/11/22	mar 6/12/22
14		**AMBIENTAL**	13 días	jue 15/12/22	sáb 31/12/22
15		**PRESUPUESTO**	19 días	mié 7/12/22	sáb 31/12/22
16		**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	19 días	mié 7/12/22	sáb 31/12/22
17		**LICENCIAS Y PERMISOS**	30 días	mar 22/11/22	sáb 31/12/22
18		**REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO**	**51 días**	**sáb 22/10/22**	**sáb 31/12/22**
19		Red interna de aguas lluvias	52 días	sáb 22/10/22	sáb 31/12/22
20		Red y equipos de agua potable externa	52 días	sáb 22/10/22	sáb 31/12/22
21		Red y equipos de agua potable interna	52 días	sáb 22/10/22	sáb 31/12/22
22		Red y equipos de aguas negras externa	52 días	sáb 22/10/22	sáb 31/12/22
23		Red y equipos de aguas negras interna	52 días	sáb 22/10/22	sáb 31/12/22
24		Red y equipos de detección y extinción de incendios	52 días	sáb 22/10/22	sáb 31/12/22
25		Red y equipos de ascensor	52 días	sáb 22/10/22	sáb 31/12/22
26		Red y equipos de aire acondicionado	52 días	sáb 22/10/22	sáb 31/12/22
27		Red interna, externa y equipos eléctricos	52 días	sáb 22/10/22	sáb 31/12/22
28		Red y equipos de respaldo de energía (Baterías/UPS)	52 días	sáb 22/10/22	sáb 31/12/22
29		Red y equipos de generación de energía (Planta eléctrica de emergencia)	52 días	sáb 22/10/22	sáb 31/12/22
30		Red y equipos de cableado es	52 días	sáb 22/10/22	sáb 31/12/22
31		Red y equipos de circuito cerr	52 días	sáb 22/10/22	sáb 31/12/22
32		Red y equipos de control de a	52 días	sáb 22/10/22	sáb 31/12/22
33		Red y equipos de comunicaci	52 días	sáb 22/10/22	sáb 31/12/22
34		Red y equipos de protección c	52 días	sáb 22/10/22	sáb 31/12/22
35		Acabados.	52 días	sáb 22/10/22	sáb 31/12/22
36		**INFORME DE TRABAJO DE ALTURAS**	4 días	mar 8/11/22	vie 11/11/22
37		**PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO**	19 días	mié 7/12/22	sáb 31/12/22
38		**INFORMACION CATASTRAL**	44 días	sáb 8/10/22	mié 7/12/22

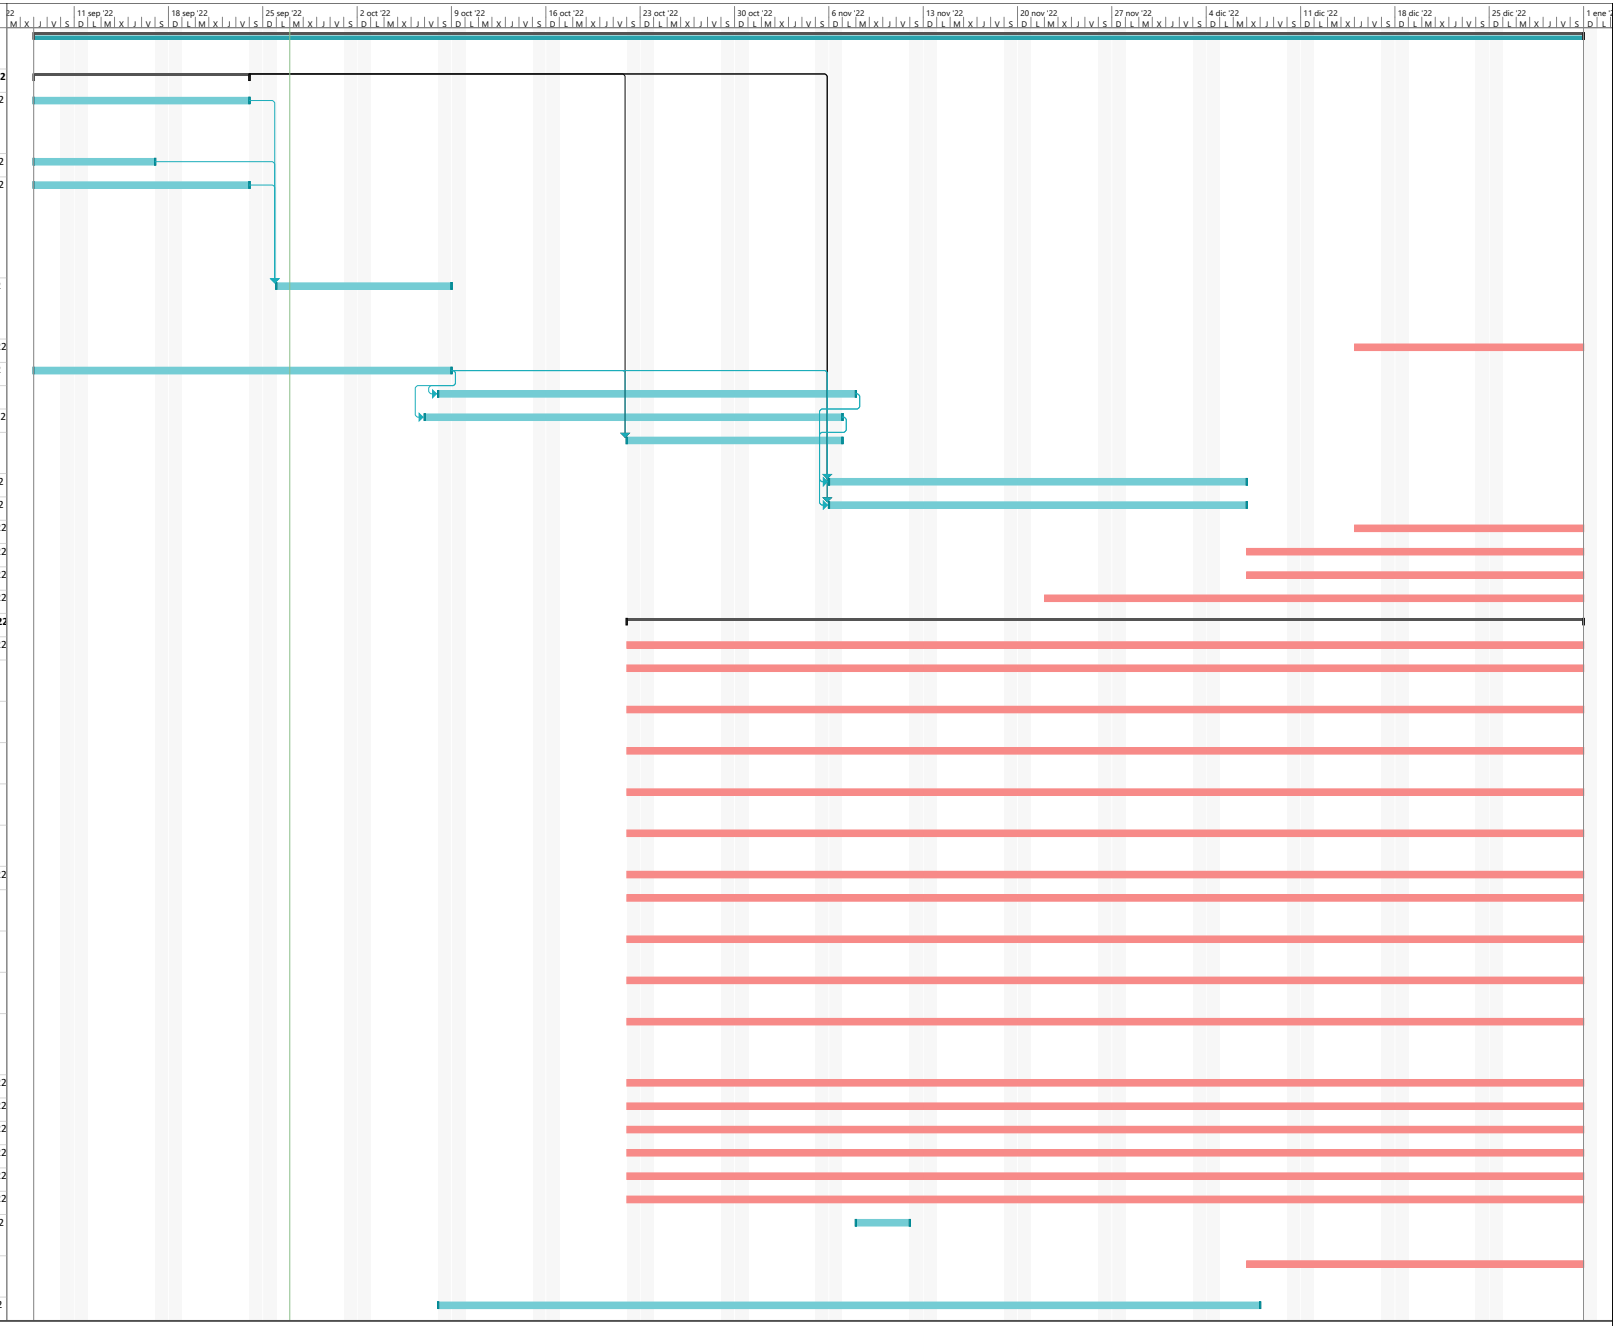

Proyecto: Zipaquirá Diagnóstic
Cundinamarca
Fecha: mar 27/09/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Línea base
Hito de línea base
Resumen de línea base
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**SEDE ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA VULNERABILIDAD**	**83 días**	**jue 8/09/22**	**sáb 31/12/22**
2		**RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA EXISTENTE (REFERENCIADA DE DOCUMENTO SOPORTE TÉCNICO CONTRACTUAL)**	12 días	jue 8/09/22	vie 23/09/22
3		**VISITA TÉCNICA DE RECONOCIMEINTO OBRA EXISTENTE**	12 días	jue 8/09/22	vie 23/09/22
4		**ANÁLISIS TÉCNICO DE INFORMACIÓN EXISTENTE E INFORMES DE REVISIÓN**	12 días	vie 23/09/22	sáb 8/10/22
5		**VERIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y ESTRUCTURAL**	12 días	vie 23/09/22	sáb 8/10/22
6		**PATOLOGÍA ESTRUCTURAL**	22 días	sáb 8/10/22	lun 7/11/22
7		**ESTUDIO DE VULNERABILIDAD**	21 días	vie 11/11/22	vie 9/12/22
8		**ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO**	12 días	lun 7/11/22	mar 22/11/22
9		**REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL**	23 días	mar 22/11/22	jue 22/12/22
10		**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REFORZAMIENTO**	18 días	jue 8/12/22	sáb 31/12/22
11		**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	18 días	jue 8/12/22	sáb 31/12/22
12		**PRESUPUESTO DETALLADO POR CAPITULO POR PISOS, CANTIDAD DE OBRA**	18 días	jue 8/12/22	sáb 31/12/22

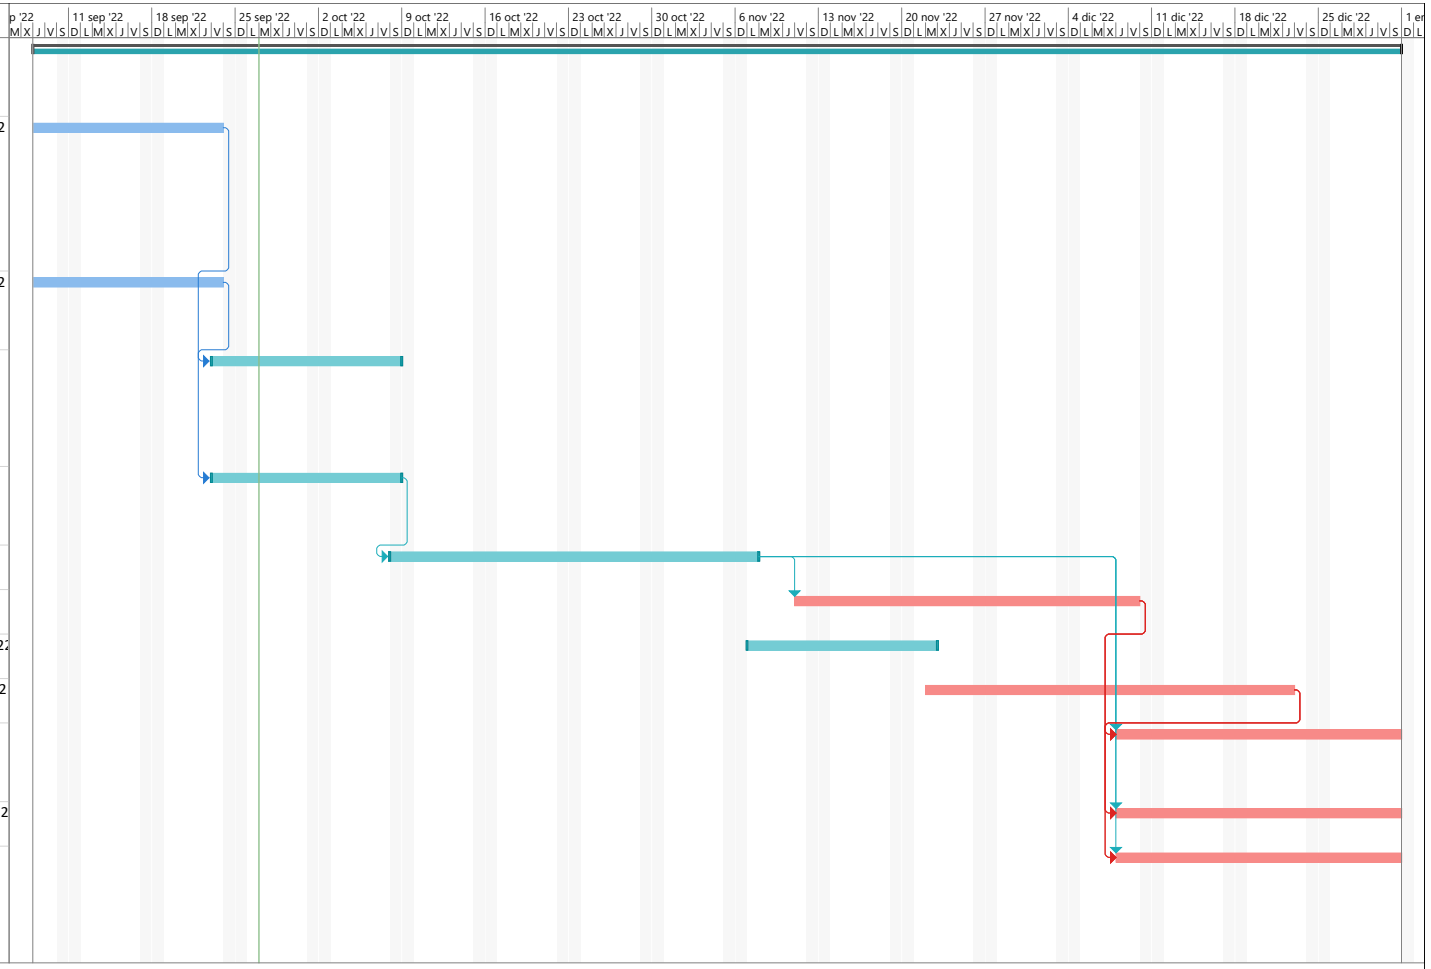

Proyecto: Sede Zipaquira Vulnerabilidad
Fecha: mar 27/09/22

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Hito de línea base		
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas	Resumen de línea base		
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica	Progreso		
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Línea base	Progreso manual		
