INFORME DE SUPERVISIÓN No.2

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No: PLA-MC-OP-007-2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MURINDO ANTIOQUIA
NIT: 890.984.882-0

NOMBRE CONTRATISTA: OBRAS Y CONSTRUCCIONES C&D ZOMAC S.A.S
IDENTIFICACION: NIT: 901.218.996-6

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE PALAFÍTICO PEATONAL EN MADERA EN LA CARRERA 15 ENTRE CALLES 5ta y 6ta EN LA ZONA URBANA DE MUNICIPIO DE MURINDÓ – ANTIOQUIA.

TIPO DE CONTRATO: OBRA

2. FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN: 06 de abril de 2019

3. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: un (01) mes

4. PRÓROGAS: SI: __**X**___ NO: _____

4.1 mediante el otrosí No. 01 del primero (01) de mayo de 2019, al contrato No. **PLA-MC-OP-007-2019** se realizó ampliación en tiempo de un (1) mes, días contados a partir del seis (06) de mayo de 2019.

5. ADICIONES: SI: _____ NO: ____**X**____

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 06 de junio de 2019

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/L **($22.256.890,82).**

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO: VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/L **($22.256.890,82).**

9. ¿EL CONTRATO TUVO OTRAS MODIFICACIONES? SI_____ NO __X___

10. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

En el casco urbano del Municipio de Murindó Antioquia, se identificó una problemática que afecta el sector en general. "Deterioro avanzado de las vías peatonales. (puentes palafiticos)", Debido a las inundaciones constantes y los frecuentes cambios climáticos; Generando acortamiento de la vida útil de los mismos.

Por lo anterior, se generan unas limitantes en el tema de movilidad, ya que no se pude transitar con normalidad porque las vías no lo permiten, debido al deterioro avanzado que estas presentan poniendo en riesgo la integridad de los habitantes del Municipio en general.

Por lo anterior, fue necesario tomar medidas para erradicar las dificultades presentadas, logrando resultados positivos. Por ello se realizó la construcción y mantenimiento de los puentes palafiticos en mal estado, garantizando seguridad a los habitantes del sector, en especial niños y ansíanos, ya que estos son los más vulnerables frente a esta problemática.

Por su parte, Dicho contrato cuyo objeto es: **CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE PALAFÍTICO PEATONAL EN MADERA EN LA CARRERA 15 ENTRE CALLES 5ta y 6ta EN LA ZONA URBANA DE MUNICIPIO DE MURINDÓ – ANTIOQUIA,** se ejecutó cumpliendo los términos establecidos en el contrato, con el fin de evitar accidentes a los peatones y, por consiguiente, mejorar la transitabilidad de los mismos.

.

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

1. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 22.256.890,82
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 17.982.773,63
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$ 10.799.424,12
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 4.274.117,19
SALDO A LIBERAR	$ 0

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridades sociales y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

ANEXOS

ANEXO 1: CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Ítem del cambio	Cambio realizado	Motivo del cambio	Fecha del cambio

ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRAFICO


ANTES	
	
	

DURANTE








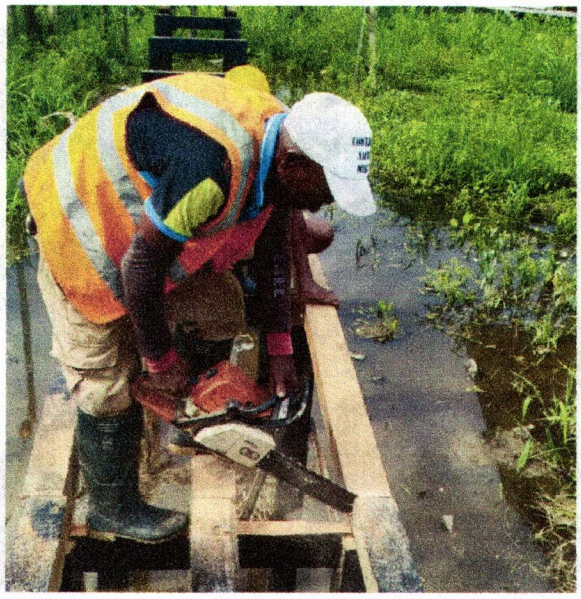

TERMINACION



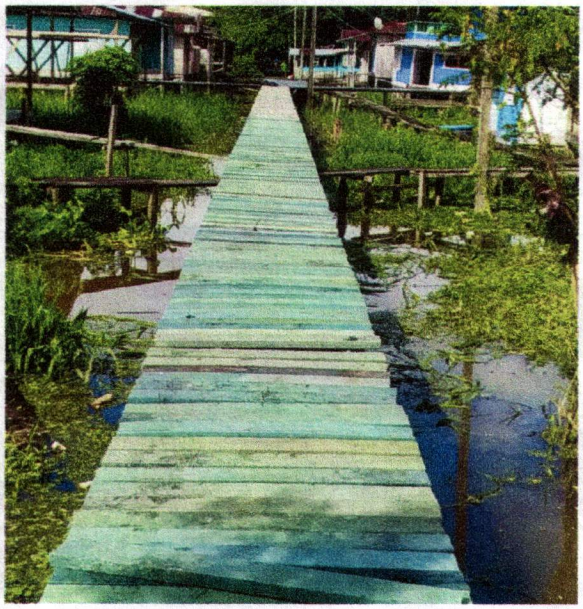





Por lo anterior se firma a los veintisiete (27) días del mes de mayo de dos mil diecinueve (2019).

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____
NOMBRE DEL SUPERVISOR: ALEXON ROJAS ARBOLEDA
CARGO DEL SUPERVISOR: Secretario de Planeación Y Obras Públicas
