CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	2	**DEL**	domingo, 15 de enero de 2023	**AL**	sábado, 21 de enero de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	10	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**		Arq. Edwin Alexander Santana Rodriguez	

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	Safrid Ingeniería SAS	**Interventor**	Consorcio Inter colegios 2022
Contrato No.	CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022
Fecha de suscripción del contrato	jueves, 6 de octubre de 2022	**Fecha de suscripción del contrato**	jueves, 24 de noviembre de 2022
Valor Inicial	$13.954.280.882,00	**Valor Inicial**	$ 951.138.738,00
Plazo Inicial	12 meses	**Plazo Inicial**	13 meses
Plazo Actualizado	12 meses	**Plazo Actualizado**	13 meses
Fecha de Iniciación	miércoles, 11 de enero de 2023	**Fecha de Iniciación**	jueves, 22 de diciembre de 2022
Fecha de Terminación*	miércoles, 10 de enero de 2024	**Fecha de Terminación**	domingo, 21 de enero de 2024
No póliza contrato de obra	14-44-101164899	**No póliza contrato de interventoría**	NB-100235369
Fecha aprobación	viernes, 14 de octubre de 2022	**Fecha aprobación**	martes, 29 de noviembre de 2022


* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
AMPARO	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**	**AMPARO**	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**
Cumplimiento del contrato	06/10/2022 - 06/04/2024	$ 2.790.856.176,40	Cumplimiento	25/11/2022 - 25/06/2024	$ 190.227.747,60
Estabilidad y Calidad de la obra	06/10/2023 - 06/10/2025	$ 2.790.856.176,40	Pago salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales	25/11/2022 - 25/12/2026	$ 47.556.936,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	06/10/2022 - 06/10/2026	$ 1.395.458.088,20	Calidad del servicio	25/12/2023 - 25/12/2028	$ 190.227.747,60
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	06/10/2022 - 06/10/2023	$ 697.714.044,10			

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance Programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
	Colegio Jorge Eliecer Gaitan	11/01/2023	31/10/2023	$ 1.922.226.766	0,00%	$ 9.458.499,71	0,49%	**Atraso (+) - Avance (-)**	-0,49%
1	Preliminares	25/01/2023	30/08/2023	$ -	0,00%	$ 9.458.499,71	0,49%	Demolición de pisos, muros, enchape, desmonte de rejas de ventanas metálicas, puertas de baños, desmonte de aparatos sanitarios	
2	Estructura	17/06/2023	23/09/2023	$ -	0,00%	-	0,00%		
3	Mampostería	13/10/2023	4/08/2023	$ -	0,00%	-	0,00%		
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	2/08/2023	20/09/2023	$ -	0,00%	-	0,00%		
5	Instalaciones electricas y de comunicaciones	20/06/2023	28/10/2023	$ -	0,00%	-	0,00%		
7	Pisos	20/06/2023	28/10/2023	$ -	0,00%	-	0,00%		
9	Carpintería metálica	14/03/2023	2/09/2023	$ -	0,00%	-	0,00%		
11	Aparatos sanitarios y accesorios	29/08/2023	6/09/2023	$ -	0,00%	-	0,00%		
12	Aparatos y equipos especiales	7/09/2023	23/09/2023	$ -	0,00%	-	0,00%		
13	Pañete y pintura	5/04/2023	6/11/2023	$ -	0,00%	-	0,00%		
16	Obras exteriores	5/07/2023	19/09/2023	$ -	0,00%	-	0,00%		
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	24/03/2023	19/06/2023	$ -	0,00%	-	0,00%		
20	Aseo y disposición final	29/08/2023	31/10/2023	$ -	0,00%	-	0,00%		

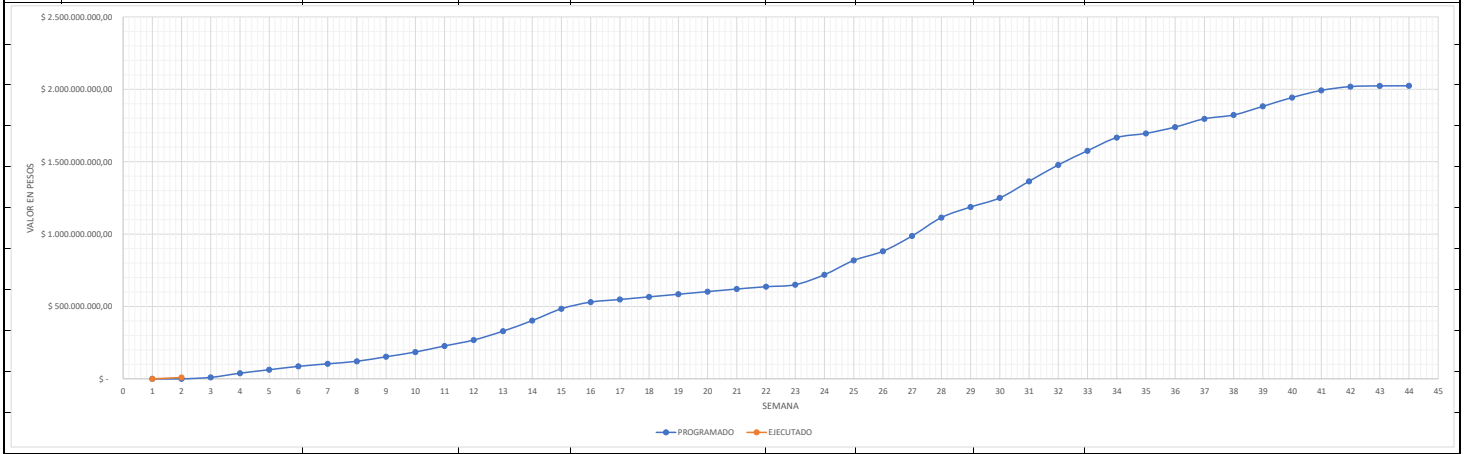


No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance Programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
	Colegio Francisco José de Caldas, Sede A	11/01/2023	6/11/2023	$ 1.962.546.144,54	0,06%	$ -	0,00%	**Atraso (+) - Avance (-)**	0,06%
1	Preliminares	25/01/2023	31/10/2023	$ 1.270.756,93	0,06%	$ -	0,00%		
2	Estructura	17/06/2023	30/08/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		
3	Mampostería	13/10/2023	23/09/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	2	**DEL**	domingo, 15 de enero de 2023	**AL**	sábado, 21 de enero de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	10	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**		Arq. Edwin Alexander Santana Rodriguez	

4	Instalaciones domiciliarias hidraulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	2/08/2023	4/08/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
5	Instalaciones electricas y de comunicaciones	20/06/2023	20/09/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
7	Pisos	20/06/2023	28/10/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
9	Carpintería metálica	14/03/2023	28/10/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
13	Pañete y pintura	5/04/2023	2/09/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
16	Obras exteriores	5/07/2023	6/11/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	24/03/2023	19/09/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
20	Aseo y disposición final	29/08/2023	19/06/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	

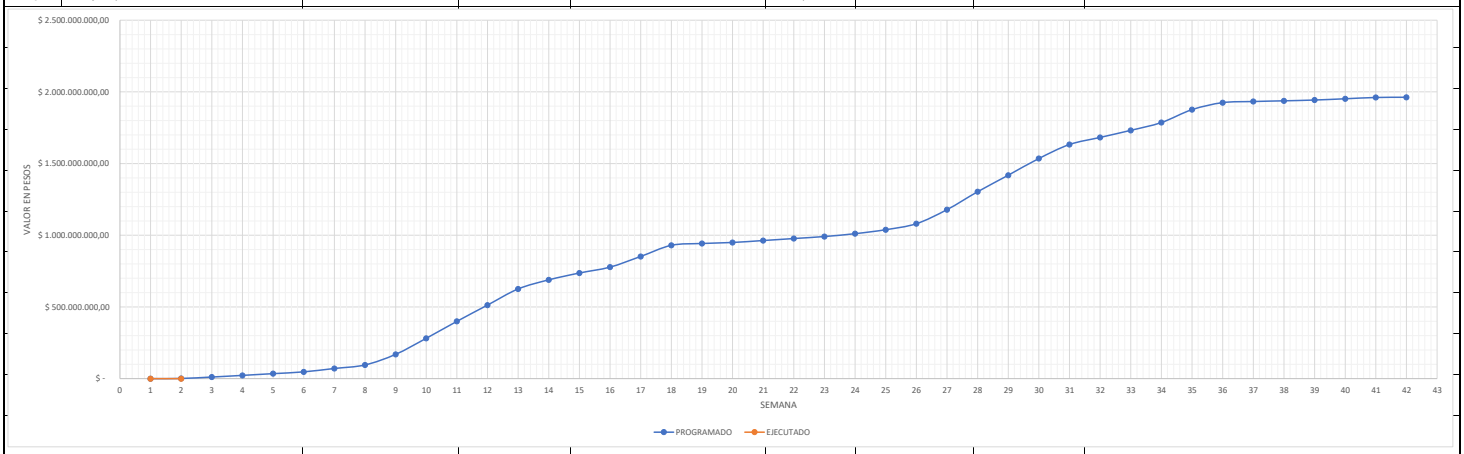

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance Programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
	Colegio Garcés Navas	18/01/2023	31/07/2023	$ 787.083.405,50	0,00%	$ -	0,00%	**Atraso (+) - Avance (-)**	0,00%
1	Preliminares	1/02/2023	3/05/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		
2	Estructura	8/04/2023	19/04/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		
3	Mampostería	4/03/2023	15/03/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		
5	Instalaciones electricas y de comunicaciones	13/03/2023	24/05/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		
11	Aparatos sanitarios y accesorios	25/05/2023	27/05/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		
13	Pañete y pintura	20/04/2023	13/06/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		
16	Obras exteriores	4/05/2023	20/05/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	3/02/2023	29/07/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		
20	Aseo y disposición final	10/02/2023	5/06/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		

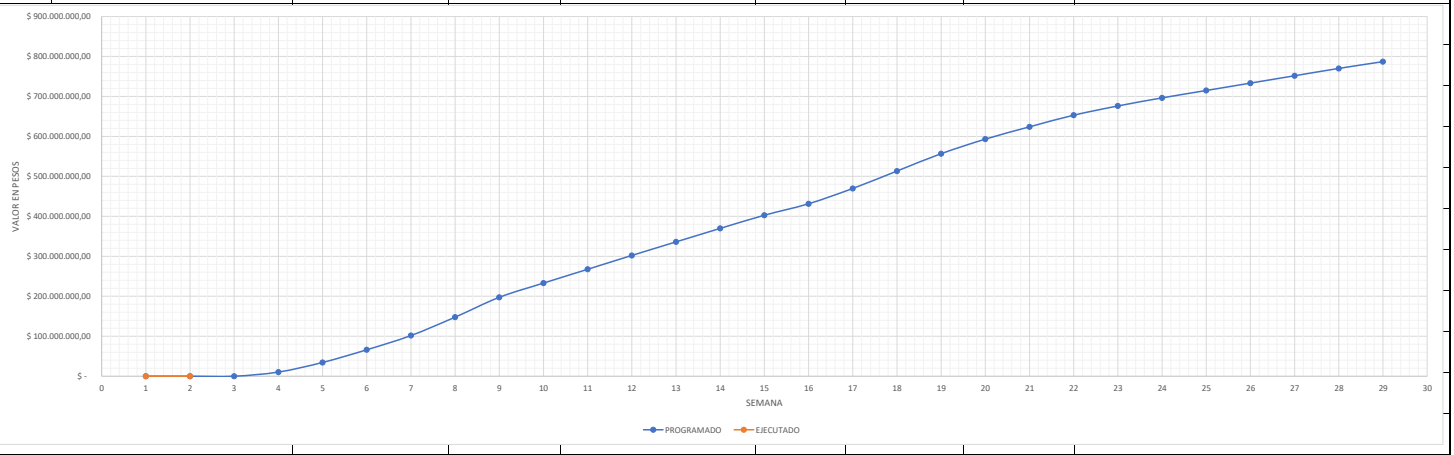

Colegio Floridablanca	25/01/2023	11/11/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	**Atraso (+) - Avance (-)**	0,00%
Colegio Miguel Antonio Caro	25/01/2023	24/07/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	**Atraso (+) - Avance (-)**	0,00%
Colegio Justo Victor Charry	25/01/2023	10/08/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	**Atraso (+) - Avance (-)**	0,00%
Colegio Rafael Bernal Jimenez	25/01/2023	26/09/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	**Atraso (+) - Avance (-)**	0,00%
Instituto técnico Juan del Corral	25/01/2023	2/10/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	**Atraso (+) - Avance (-)**	0,00%
Colegio Francisco Primero	25/01/2023	11/11/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	**Atraso (+) - Avance (-)**	0,00%
Colegio José Asunción Silva	30/03/2023	10/01/2024	$ -	0,00%	$ -	0,00%	**Atraso (+) - Avance (-)**	0,00%
Colegio Manuela Ayala de Gaitán	28/04/2023	28/12/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	**Atraso (+) - Avance (-)**	0,00%
Colegio República de Colombia	28/04/2023	28/12/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	**Atraso (+) - Avance (-)**	0,00%
Colegio Simón Bolívar	27/05/2023	3/01/2024	$ -	0,00%	$ -	0,00%	**Atraso (+) - Avance (-)**	0,00%

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	2	**DEL**	domingo, 15 de enero de 2023	**AL**	sábado, 21 de enero de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	10	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**		Arq. Edwin Alexander Santana Rodriguez	

Colegio Nidia Quintero de Turbay	2/06/2023	28/12/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	**Atraso (+) - Avance (-)**	0,00%
Colegio República de Guatemala	2/06/2023	28/12/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	**Atraso (+) - Avance (-)**	0,00%
Colegio República de Panamá	2/06/2023	28/12/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	**Atraso (+) - Avance (-)**	0,00%
Colegio Tomás Carrasquilla	26/06/2023	9/01/2024	$ -	0,00%	$ -	0,00%	**Atraso (+) - Avance (-)**	0,00%
Colegio Francisco José de Caldas, Sede B	26/06/2023	9/01/2024	$ -	0,00%	$ -	0,00%	**Atraso (+) - Avance (-)**	0,00%
Colegio Robert F Kennedy	26/06/2023	9/01/2024	$ -	0,00%	$ -	0,00%	**Atraso (+) - Avance (-)**	0,00%
Atención de emergencias								
Colegio Morisco	13/01/2023	21/01/2023						


	PROGRAMADO				**EJECUTADO**			
No.	**VALOR PROGRAMADO SEMANAL**	**%**	**ACUMULADO**	**%**	**VALOR EJECUTADO SEMANAL**	**%**	**ACUMULADO**	**%**
1	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
2	$ 1.270.756,93	0,01%	$ 1.270.756,93	0,01%	$ 9.458.499,71	0,07%	$ 9.458.499,71	0,07%
3	$ 19.951.637,75	0,14%	$ 21.222.394,68	0,15%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
4	$ 50.914.718,24	0,36%	$ 72.137.112,92	0,52%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
5	$ 84.783.311,22	0,61%	$ 156.920.424,14	1,12%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
6	$ 84.520.694,84	0,61%	$ 241.441.118,98	1,73%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
7	$ 79.994.302,15	0,57%	$ 321.435.421,13	2,30%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
8	$ 92.371.183,17	0,66%	$ 413.806.604,30	2,97%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
9	$ 188.479.295,83	1,35%	$ 602.285.900,13	4,32%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
10	$ 221.475.791,25	1,59%	$ 823.761.691,38	5,90%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
11	$ 229.916.129,85	1,65%	$ 1.053.677.821,23	7,55%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
12	$ 230.178.690,91	1,65%	$ 1.283.856.512,14	9,20%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
13	$ 271.119.796,10	1,94%	$ 1.554.976.308,24	11,14%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
14	$ 366.181.950,98	2,62%	$ 1.921.158.259,22	13,77%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
15	$ 367.035.523,66	2,63%	$ 2.288.193.782,89	16,40%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
16	$ 332.730.015,04	2,38%	$ 2.620.923.797,93	18,78%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
17	$ 344.526.501,67	2,47%	$ 2.965.450.299,60	21,25%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
18	$ 366.678.480,99	2,63%	$ 3.332.128.780,59	23,88%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
19	$ 427.752.993,66	3,07%	$ 3.759.881.774,25	26,94%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
20	$ 414.353.821,17	2,97%	$ 4.174.235.595,42	29,91%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
21	$ 406.649.637,35	2,91%	$ 4.580.885.232,77	32,83%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
22	$ 394.471.325,54	2,83%	$ 4.975.356.558,31	35,65%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
23	$ 377.462.346,04	2,70%	$ 5.352.818.904,35	38,36%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
24	$ 421.102.429,73	3,02%	$ 5.773.921.334,08	41,38%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
25	$ 467.126.358,88	3,35%	$ 6.241.047.692,96	44,72%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
26	$ 451.567.823,26	3,24%	$ 6.692.615.516,22	47,96%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
27	$ 538.474.810,12	3,86%	$ 7.231.090.326,34	51,82%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
28	$ 609.647.332,75	4,37%	$ 7.840.737.659,09	56,19%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
29	$ 527.681.141,76	3,78%	$ 8.368.418.800,85	59,97%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
30	$ 493.959.978,51	3,54%	$ 8.862.378.779,36	63,51%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
31	$ 517.384.199,98	3,71%	$ 9.379.762.979,34	67,22%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
32	$ 447.896.126,45	3,21%	$ 9.827.659.105,79	70,43%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
33	$ 433.840.376,73	3,11%	$ 10.261.499.482,52	73,54%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
34	$ 421.086.235,28	3,02%	$ 10.682.585.717,80	76,55%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
35	$ 400.956.758,70	2,87%	$ 11.083.542.476,50	79,43%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
36	$ 368.762.135,71	2,64%	$ 11.452.304.612,21	82,07%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
37	$ 344.084.266,25	2,47%	$ 11.796.388.878,46	84,54%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
38	$ 312.891.892,50	2,24%	$ 12.109.280.770,96	86,78%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
39	$ 349.386.921,83	2,50%	$ 12.458.667.692,79	89,28%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
40	$ 354.111.026,34	2,54%	$ 12.812.778.719,13	91,82%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
41	$ 342.265.958,11	2,45%	$ 13.155.044.677,24	94,27%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
42	$ 250.155.543,90	1,79%	$ 13.405.200.221,15	96,07%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
43	$ 141.994.792,05	1,02%	$ 13.547.195.013,20	97,08%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
44	$ 704.475,00	0,01%	$ 13.547.899.488,20	97,09%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	2	**DEL**	domingo, 15 de enero de 2023	**AL**	sábado, 21 de enero de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	10	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**		Arq. Edwin Alexander Santana Rodriguez	

45	$ 407.850.465,35	2,92%	$ 13.955.749.953,55	100,01%		0,00%	$ 9.458.499,71	0,07%
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								

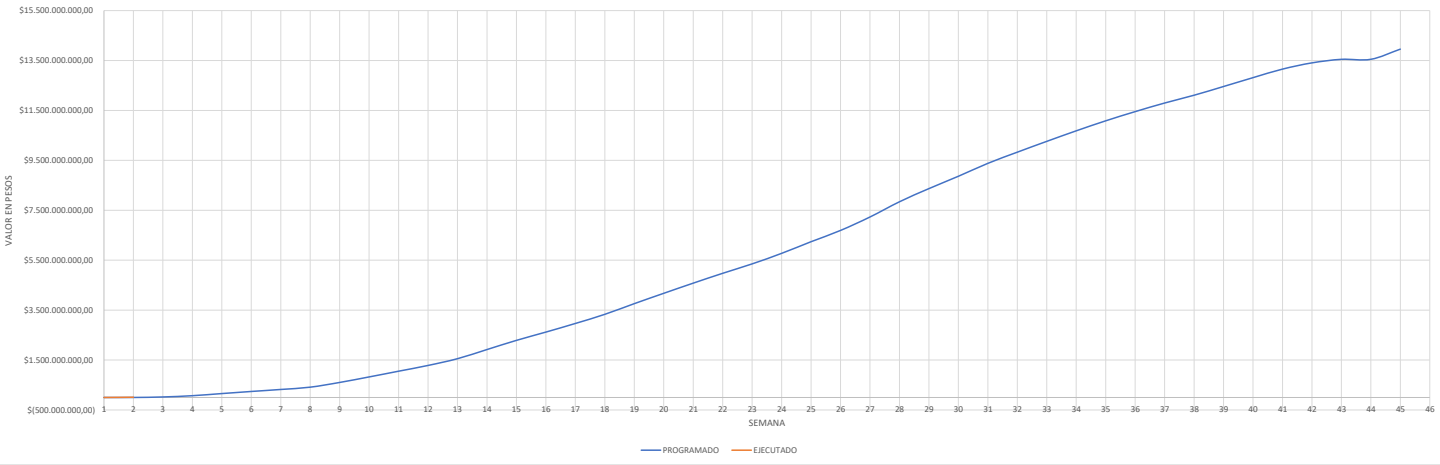

Seguimiento Ruta Critica

Actividad	Fecha Programada Inicio	Fecha Inicio Real	Fecha Finalización	Tiempo de holgura	Tiempo de Ejecución	Atraso	OBSERVACIONES
Jorge Eliecer Gaitan	25/01/2023	19/01/2023	31/10/2023	6	285	-279	
Francisco José de Caldas, Sede	25/01/2023	23/01/2023	31/10/2023	2	281	-279	
Garcés Navas	25/01/2023	23/01/2023	31/07/2023	2	189	-187	
Florida Blanca	6/02/2023	2/02/2023	31/10/2023	4	271	-267	
Miguel Antonio Caro	7/02/2023	7/02/2023	15/07/2023	0	158	-158	
Justo Victor Charry	13/02/2023	13/02/2023	15/07/2023	0	152	-152	
Rafael Bernal Jimenez	25/01/2023	8/02/2023	22/08/2023	-14	195	-209	
Juan del Corral	15/02/2023	8/02/2023	12/09/2023	7	216	-209	
Francisco Primero	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
José Asunción Silva	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
Manuela Ayala de Gaitán	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
República de Colombia	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
Simón Bolívar	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
Nidia Quintero de Turbay	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
República de Guatemala	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
República de Panamá	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
Tomás Carrasquilla	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
Francisco José de Caldas, Sede I	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
Robert F Kennedy	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

En Bogotá, a los once (11) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023), se firma acta de inicio entre Jorge Gómez Falla, en calidad de Representante de Consorcio Intercolegios 2022, como Interventor, y Miguel Alexander Cerón Molina, en calidad de representante legal de Safrid Ingeniería S.A.S como Contratista.

Aspecto Financiero

A la fecha del presente informe no se han tramitado actas de pago tanto en el contrato de obra como en el contrato de interventoría

Aspecto Técnico

En el periodo comprendido del presente informe el contratista realizó las siguientes actividades:

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	2	**DEL**	domingo, 15 de enero de 2023	**AL**	sábado, 21 de enero de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	10	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**		Arq. Edwin Alexander Santana Rodriguez	

Colegio Jorge Eliecer Gaitan:



Ingreso de personal de obra - Dotación



Demolición de pisos en aulas



Demolición de pisos bodega

Colegio Morisco (Atención de emergencia)



Intervención en piso de poceta / cambio de sifón



Mantenimiento caja de inspección batería sanitaría



Enchape de piso

Visita con especialista estructural - contratista de obra



Colegio Jorge Eliecer Gaitán



Colegio Francisco José de Caldas



Colegio Garcés Navas

Actas de vecindad



Colegio Miguel Antonio Caro



Colegio Juan del Corral



Colegio Rafael Bernal Jimenez

Por parte de la interventoría se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Visitas de socialización a colegio Jorge Eliecer Gaitán, colegio Francisco José de Caldas, colegio Garcés Navas.

Acompañamiento actas de vecindad colegio Miguel Antonio Caro, Justo Victor Charry, Rafael Bernal Jimenéz y Juan del Corral.

Se envian oficios 034 a 038 a contratista de obra Safrid ingeniería.

Aspecto SST-Ambiental

Se realiza control y segumiento sobres los aspectos e impactos ambientales a fin de establecer las acciones pertinentes para reducir, mitigar y corregir dichos impactos. Se verifica en obra
las actividades, aspectos y controles en materia de Seguridad y salud en el trabajo, con el fin de establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir riesgos existentes.

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	2	**DEL**	domingo, 15 de enero de 2023	**AL**	sábado, 21 de enero de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	10	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**		Arq. Edwin Alexander Santana Rodriguez	

Aspecto Social

Se realiza socialización en colegios Jorge Eliecer Gaitan y Francisco José de Caldas el día 17 de enero y colegio Garcés Navas el día 20 de enero de 2023 en compañia de supervisión de la SED, contratista, interventoría y directivas de las instituciones

Aspecto PMT


Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio		Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación

* Opcional dependiendo de los requerimientos del contrato

Información Meteorológica

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
16/01/2023	7:00 am 5:00 pm	2
17/01/2023	7:00 am 5:00 pm	2
18/01/2023	7:00 am 5:00 pm	1
19/01/2023	7:00 am 5:00 pm	2
20/01/2023	7:00 am 5:00 pm	1
21/01/2023	7:00 am 12:00 pm	0

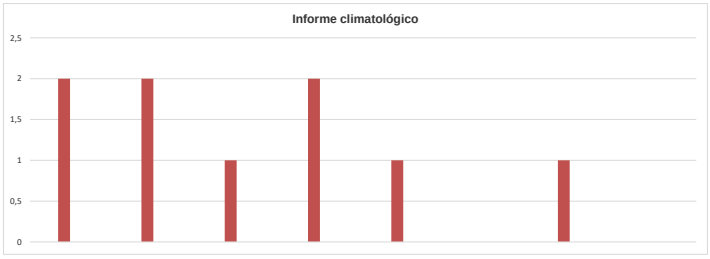

V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Colegio Morisco: Instalación rejillas cárcamos, instalación de tapas en cajas de baños.

Colegio Jorge Eliecer Gaitan: Desmonte de puertas y ventanas, Desmonte de cubierta, Demolición de pisos, Demolición en baño

Colegio Francisco José de Caldas: Obras preliminares, Demolición de pisos, desmonte de ventanas

Colegio Garcés Navas: Obras preliminares, Desmonte de cubierta

VI. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Con base en la programación de obra presentada, se evidencian atrasos en la ejecución general de la obra a causa de las demoras en las gestiones e inicio de actividades por parte del contratista de obra.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se solicita de las buenas gestiones por parte del contratista de obra para realizar las actividades acorde a lo planteado en la programación, a fin de no incurrir en atrasos y posibles incumplimientos. Se verifica en obra que el personal que ingrese a la obra cumpla con los requisitos. Se solicita la entrega y trámite de los PMTs para cada una de las instituciones educativas.	FREDY GIOVANNI RODRIGUEZ SALAZAR
	Firma

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada	Fanny Almanzar/ Mileth Escalante	Liliana Sánchez/ Guillermo Narváez
CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS	CARGO: COORDINADOR GESTIÓN INTEGRAL/PROFESIONAL GESTIÓN INTEGRAL	CARGO: SUBGERENTE/ GERENTE
Vobo.	Vobo.	Vobo.
