CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	4	**DEL**	domingo, 29 de enero de 2023	**AL**	sábado, 4 de febrero de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	24	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista	Safrid Ingeniería SAS	**Interventor**	Consorcio Inter colegios 2022
Contrato No.	CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022
Fecha de suscripción del contrato	jueves, 6 de octubre de 2022	**Fecha de suscripción del contrato**	jueves, 24 de noviembre de 2022
Valor Inicial	$13.954.280.882,00	**Valor Inicial**	$ 951.138.738,00
Plazo Inicial	12 meses	**Plazo Inicial**	13 meses
Plazo Actualizado	12 meses	**Plazo Actualizado**	13 meses
Fecha de Iniciación	miércoles, 11 de enero de 2023	**Fecha de Iniciación**	jueves, 22 de diciembre de 2022
Fecha de Terminación*	miércoles, 10 de enero de 2024	**Fecha de Terminación**	domingo, 21 de enero de 2024
No póliza contrato de obra	14-44-101164899	**No póliza contrato de interventoría**	NB-100235369
Fecha aprobación	viernes, 14 de octubre de 2022	**Fecha aprobación**	martes, 29 de noviembre de 2022


* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
AMPARO	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**	**AMPARO**	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**
Cumplimiento del contrato	06/10/2022 - 06/04/2024	$ 2.790.856.176,40	Cumplimiento	25/11/2022 - 25/06/2024	$ 190.227.747,60
Estabilidad y Calidad de la obra	06/10/2023 - 06/10/2025	$ 2.790.856.176,40	Pago salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales	25/11/2022 - 25/12/2026	$ 47.556.936,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	06/10/2022 - 06/10/2026	$ 1.395.458.088,20	Calidad del servicio	25/12/2023 - 25/12/2028	$ 190.227.747,60
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	06/10/2022 - 06/10/2023	$ 697.714.044,10			

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
	Colegio Jorge Eliecer Gaitán	25/01/2023	31/10/2023	$2.024.236.834	1,43%	$27.288.528	1,35%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,08%
1	Preliminares	25/01/2023	30/08/2023	$28.883.240,00	1,43%	$27.288.528	1,35%	Demolición de pisos, muros, enchape, desmonte de rejas de ventanas metálicas, puertas de baños, desmonte de aparatos sanitarios	
2	Estructura	17/06/2023	23/09/2023	-		-	0,00%		
3	Mampostería	13/10/2023	4/08/2023	-		-	0,00%		
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	2/08/2023	20/09/2023	-		-	0,00%		
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	20/06/2023	28/10/2023	-		-	0,00%		
7	Pisos	20/06/2023	28/10/2023	-		-	0,00%		
9	Carpintería metálica	14/03/2023	2/09/2023	-		-	0,00%		
11	Aparatos sanitarios y accesorios	29/08/2023	6/09/2023	-		-	0,00%		
12	Aparatos y equipos especiales	7/09/2023	23/09/2023	-		-	0,00%		
13	Pañete y pintura	5/04/2023	6/11/2023	-		-	0,00%		
16	Obras exteriores	5/07/2023	19/09/2023	-		-	0,00%		
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	24/03/2023	19/06/2023	-		-	0,00%		
20	Aseo y disposición final	29/08/2023	31/10/2023	-		-	0,00%		

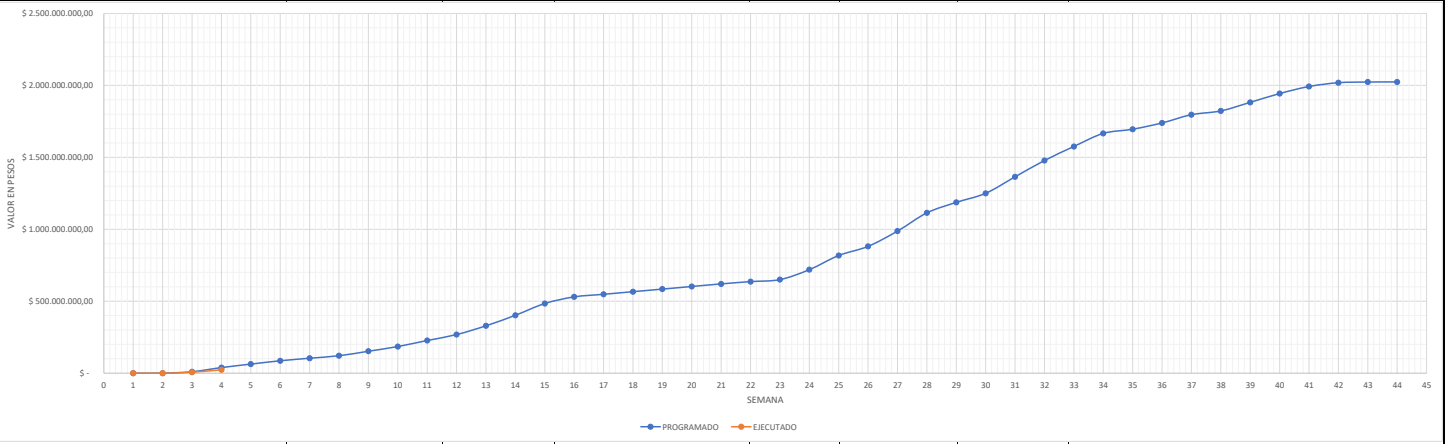


	Colegio Francisco José de Caldas, Sede A	25/01/2023	31/10/2023	$ 1.962.546.144,54	0,51%	$23.612.007	1,20%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	-0,70%
1	Preliminares	25/01/2023	31/10/2023	$ 9.913.355,75	0,51%	$23.612.007	1,20%	Desmonte de marcos y puertas, desmonte de rejas y ventanas, demolición de pisos	
2	Estructura	4/03/2023	23/09/2023	$ -		$ -	0,00%		
3	Mampostería	23/03/2023	29/07/2023	$ -		$ -	0,00%		
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	14/04/2023	20/09/2023	$ -		$ -	0,00%		

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	4	**DEL**	domingo, 29 de enero de 2023	**AL**	sábado, 4 de febrero de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	24	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	13/05/2023	28/10/2023	$ -		$ -	0,00%	
7	Pisos	27/02/2023	28/10/2023	$ -		$ -	0,00%	
9	Carpintería metálica	17/04/2023	17/08/2023	$ -		$ -	0,00%	
13	Pañete y pintura	22/03/2023	20/09/2023	$ -		$ -	0,00%	
16	Obras exteriores	1/09/2023	31/10/2023	$ -		$ -	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	13/03/2023	26/09/2023	$ -		$ -	0,00%	
20	Aseo y disposición final	20/04/2023	31/10/2023	$ -		$ -	0,00%	

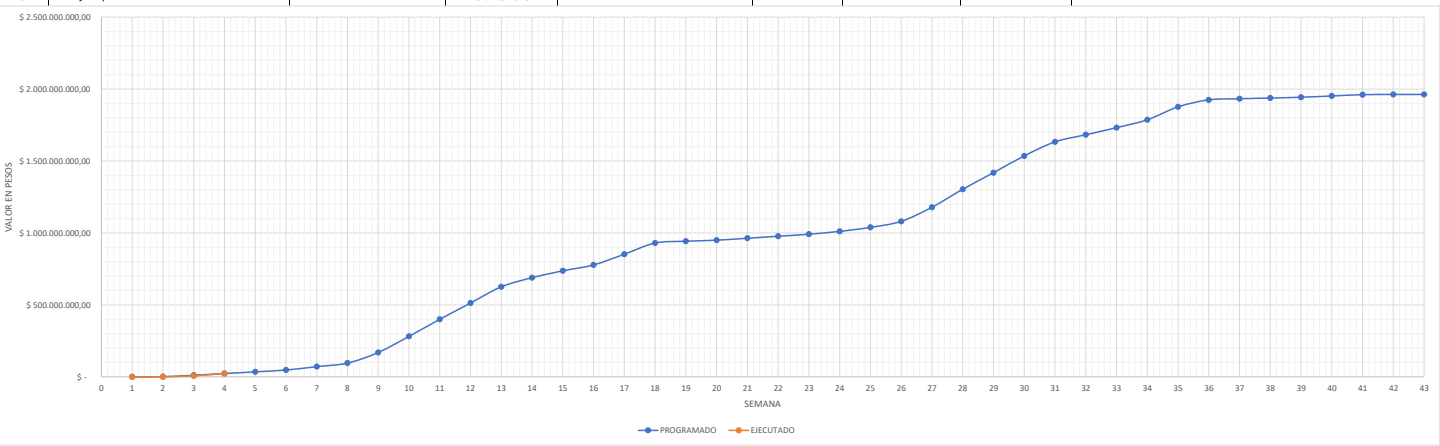

Colegio Garcés Navas		1/02/2023	31/07/2023	$787.083.406	1,32%	$19.843.713	2,52%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** -1,20%
1	Preliminares	1/02/2023	3/05/2023	$10.427.628	1,32%	$19.843.713	2,52%	Desmonte de cielo raso, desmonte de lámparas y cableado eléctrico
2	Estructura	8/04/2023	19/04/2023	-		-	0,00%	
3	Mampostería	4/03/2023	15/03/2023	-		-	0,00%	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	13/03/2023	24/05/2023	-		-	0,00%	
11	Aparatos sanitarios y accesorios	25/05/2023	27/05/2023	-		-	0,00%	
13	Pañete y pintura	20/04/2023	13/06/2023	-		-	0,00%	
16	Obras exteriores	4/05/2023	20/05/2023	-		-	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	3/02/2023	29/07/2023	-		-	0,00%	
20	Aseo y disposición final	10/02/2023	5/06/2023	-		-	0,00%	

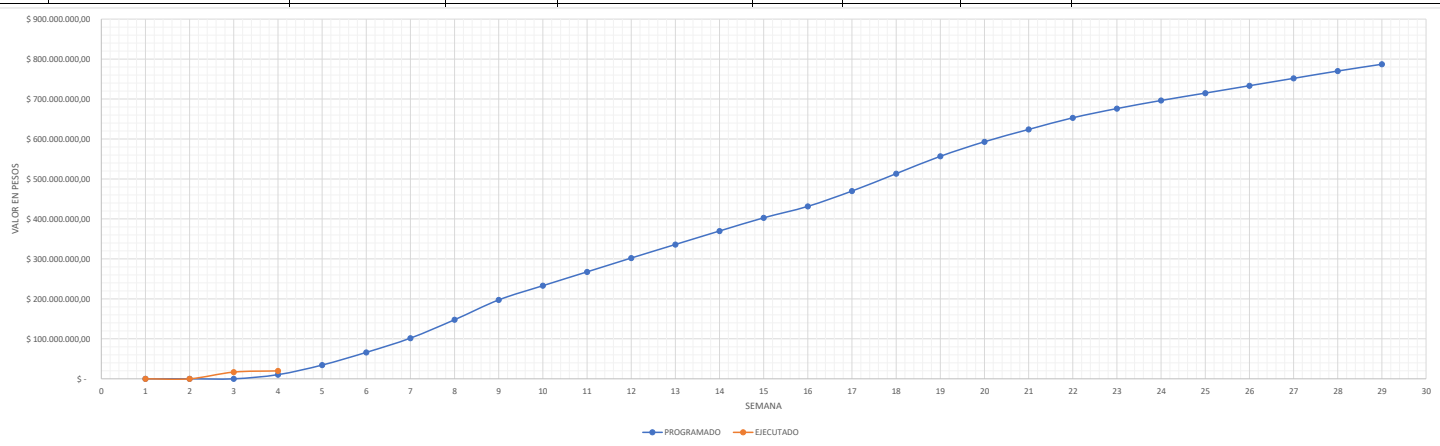

Colegio Floridablanca	6/02/2023	31/10/2023	$ 699.153.025,00	0,00%	-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Miguel Antonio Caro	7/02/2023	15/07/2023	$ 75.339.260,00	0,00%	-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Justo Víctor Charry	13/02/2023	15/07/2023	$ 369.424.312,00	0,00%	-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Rafael Bernal Jimenez	25/01/2023	22/08/2023	$ 677.034.595,00	0,00%	-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Instituto técnico Juan del Corral	15/02/2023	12/09/2023	$ 524.030.444,00	0,00%	-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Francisco Primero	24/03/2023	31/10/2023	$ 1.042.342.004,00	0,00%	-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio José Asunción Silva	24/03/2023	31/10/2023	$ 856.851.911,00	0,00%	-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Manuela Ayala de Gaitán	24/03/2023	31/10/2023	$ 543.797.778,00	0,00%	-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio República de Colombia	24/03/2023	31/10/2023	$ 742.966.924,00	0,00%	-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Simón Bolívar	24/03/2023	31/10/2023	$ 749.402.904,02	0,00%	-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Nidia Quintero de Turbay	10/05/2023	31/10/2023	$ 467.530.342,00	0,00%	-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio República de Guatemala	10/05/2023	31/10/2023	$ 461.642.257,00	0,00%	-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio República de Panamá	10/05/2023	31/10/2023	$ 440.541.748,39	0,00%	-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	4	**DEL**	domingo, 29 de enero de 2023	**AL**	sábado, 4 de febrero de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	24	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		


Colegio Tomás Carrasquilla	10/05/2023	31/10/2023	$ 376.268.772,57	0,00%	-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Francisco José de Caldas, Sede B	10/05/2023	31/10/2023	$ 369.762.456,00	0,00%	-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Robert F Kennedy	10/05/2023	31/10/2023	$ 376.475.297,02	0,00%	-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Atención de emergencias								
Colegio Morisco	13/01/2023	21/01/2023						

	PROGRAMADO				EJECUTADO			
No.	**VALOR PROGRAMADO SEMANAL**	**%**	**ACUMULADO**	**%**	**VALOR EJECUTADO SEMANAL**	**%**	**ACUMULADO**	**%**
1	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
2	$ 1.270.756,93	0,01%	$ 1.270.756,93	0,01%	$ 9.458.499,71	0,07%	$ 9.458.499,71	0,07%
3	$ 19.951.637,75	0,14%	$ 21.222.394,68	0,15%	$ 31.826.160,08	0,23%	$ 41.284.659,79	0,30%
4	$ 50.914.718,24	0,36%	$ 72.137.112,92	0,52%	$ 33.373.547,10	0,24%	$ 74.658.206,89	0,54%
5	$ 84.783.311,22	0,61%	$ 156.920.424,14	1,12%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
6	$ 84.520.694,84	0,61%	$ 241.441.118,98	1,73%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
7	$ 79.994.302,15	0,57%	$ 321.435.421,13	2,30%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
8	$ 92.371.183,17	0,66%	$ 413.806.604,30	2,97%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
9	$ 188.479.295,83	1,35%	$ 602.285.900,13	4,32%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
10	$ 221.475.791,25	1,59%	$ 823.761.691,38	5,90%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
11	$ 229.916.129,85	1,65%	$ 1.053.677.821,23	7,55%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
12	$ 230.178.690,91	1,65%	$ 1.283.856.512,14	9,20%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
13	$ 271.119.796,10	1,94%	$ 1.554.976.308,24	11,14%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
14	$ 366.181.950,98	2,62%	$ 1.921.158.259,22	13,77%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
15	$ 367.035.523,66	2,63%	$ 2.288.193.782,89	16,40%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
16	$ 332.730.015,04	2,38%	$ 2.620.923.797,93	18,78%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
17	$ 344.526.501,67	2,47%	$ 2.965.450.299,60	21,25%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
18	$ 366.678.480,99	2,63%	$ 3.332.128.780,59	23,88%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
19	$ 427.752.993,66	3,07%	$ 3.759.881.774,25	26,94%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
20	$ 414.353.821,17	2,97%	$ 4.174.235.595,42	29,91%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
21	$ 406.649.637,35	2,91%	$ 4.580.885.232,77	32,83%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
22	$ 394.471.325,54	2,83%	$ 4.975.356.558,31	35,65%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
23	$ 377.462.346,04	2,70%	$ 5.352.818.904,35	38,36%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
24	$ 421.102.429,73	3,02%	$ 5.773.921.334,08	41,38%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
25	$ 467.126.358,88	3,35%	$ 6.241.047.692,96	44,72%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
26	$ 451.567.823,26	3,24%	$ 6.692.615.516,22	47,96%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
27	$ 538.474.810,12	3,86%	$ 7.231.090.326,34	51,82%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
28	$ 609.647.332,75	4,37%	$ 7.840.737.659,09	56,19%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
29	$ 527.681.141,76	3,78%	$ 8.368.418.800,85	59,97%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
30	$ 493.959.978,51	3,54%	$ 8.862.378.779,36	63,51%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
31	$ 517.384.199,98	3,71%	$ 9.379.762.979,34	67,22%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
32	$ 447.896.126,45	3,21%	$ 9.827.659.105,79	70,43%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
33	$ 433.840.376,73	3,11%	$ 10.261.499.482,52	73,54%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
34	$ 421.086.235,28	3,02%	$ 10.682.585.717,80	76,55%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
35	$ 400.956.758,70	2,87%	$ 11.083.542.476,50	79,43%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
36	$ 368.762.135,71	2,64%	$ 11.452.304.612,21	82,07%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
37	$ 344.084.266,25	2,47%	$ 11.796.388.878,46	84,54%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
38	$ 312.891.892,50	2,24%	$ 12.109.280.770,96	86,78%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
39	$ 349.386.921,83	2,50%	$ 12.458.667.692,79	89,28%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
40	$ 354.111.026,34	2,54%	$ 12.812.778.719,13	91,82%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
41	$ 342.265.958,11	2,45%	$ 13.155.044.677,24	94,27%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
42	$ 250.155.543,90	1,79%	$ 13.405.200.221,15	96,07%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
43	$ 141.994.792,05	1,02%	$ 13.547.195.013,20	97,08%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
44	$ 704.475,00	0,01%	$ 13.547.899.488,20	97,09%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
45	$ 406.381.393,80	2,91%	$ 13.954.280.882,00	100,00%		0,00%	$ 74.658.206,89	0,54%
46								

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	4	**DEL**	domingo, 29 de enero de 2023	**AL**	sábado, 4 de febrero de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	24	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

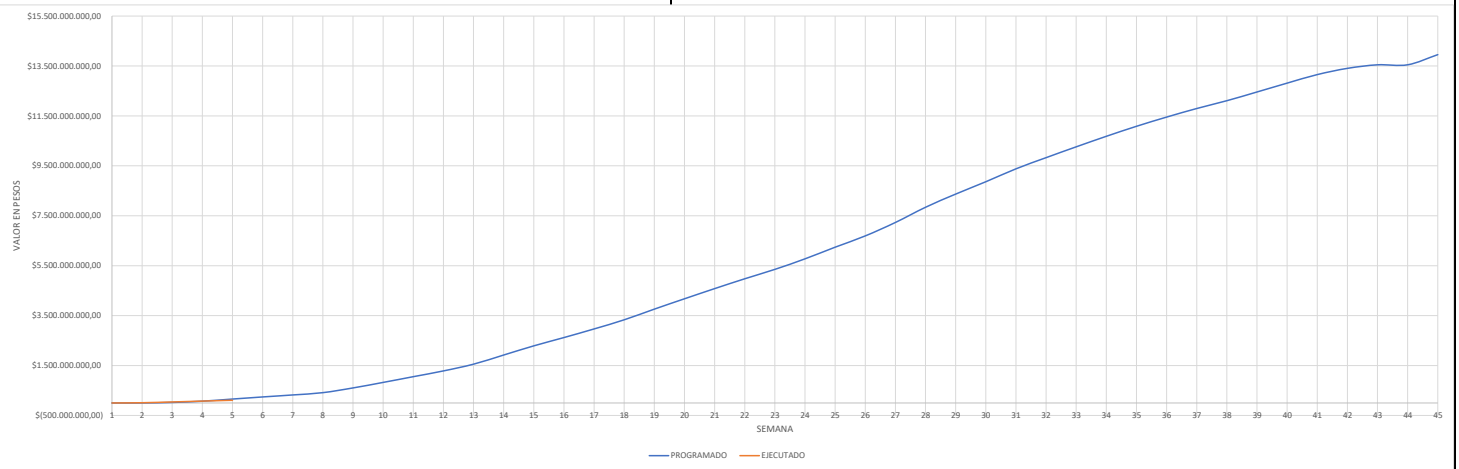

Seguimiento Ruta Critica

Actividad	Fecha Programada Inicio	Fecha Inicio Real	Fecha Finalización	Tiempo de holgura	Tiempo de Ejecución	Atraso (+)	OBSERVACIONES
Jorge Eliecer Gaitán	25/01/2023	19/01/2023	31/10/2023	6	285	-279	
Francisco José de Caldas, Sede	25/01/2023	23/01/2023	31/10/2023	2	281	-279	
Florida Blanca	25/01/2023	23/01/2023	31/07/2023	2	189	-187	
Garcés Navas	6/02/2023	2/02/2023	31/10/2023	4	271	-267	
Miguel Antonio Caro	7/02/2023	7/02/2023	15/07/2023	0	158	-158	
Justo Víctor Charry	13/02/2023	13/02/2023	15/07/2023	0	152	-152	
Rafael Bernal Jimenez	25/01/2023	8/02/2023	22/08/2023	-14	195	-209	
Juan del Corral	15/02/2023	8/02/2023	12/09/2023	7	216	-209	
Francisco Primero	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
José Asunción Silva	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
Manuela Ayala de Gaitán	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
República de Colombia	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
Simón Bolívar	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
Nidia Quintero de Turbay	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
República de Guatemala	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
República de Panamá	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
Tomás Carrasquilla	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
Francisco José de Caldas, Sede E	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
Robert F Kennedy	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

En Bogotá, a los once (11) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023), se firma acta de inicio entre Jorge Gómez Falla, en calidad de Representante de Consorcio Intercolegios 2022, como Interventor, y Miguel Alexander Cerón Molina, en calidad de representante legal de Safrid Ingeniería S.A.S como Contratista.

Aspecto Financiero

A la fecha del presente informe no se han tramitado actas de pago tanto en el contrato de obra como en el contrato de interventoría

Aspecto Técnico

En el periodo comprendido del presente informe el contratista realizó las siguientes actividades:

Colegio Jorge Eliecer Gaitán:

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	4	**DEL**	domingo, 29 de enero de 2023	**AL**	sábado, 4 de febrero de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	24	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

		
Demolición de piso	Demolición piso escalera	Demolición enchape cuarto de refrigerios
		
Trasiego de escombros demoliciones hacia sitio de acopio	Demolición en aula primer piso	Demolición en aula de segundo piso
Colegio Francisco José de Caldas		
		
Demolición de pisos	Desmonte de ventanas en pasillos	Desmonte de cielo raso oficinas
		
Desmonte de cielo raso pasillo segundo piso	Demolición en piso de segundo piso	Acopio de material
Colegio Garcés Navas		
		

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	4	**DEL**	domingo, 29 de enero de 2023	**AL**	sábado, 4 de febrero de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	24	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

Mantenimiento de ventanería	Mantenimiento de ventanería	Mantenimiento de ventanería
Comité de obra		
		
Recorrido de obra / IED Jorge Eliecer Gaitán	Recorrido de obra / IED Jorge Eliecer Gaitán	Comité de obra, supervisión SED, contratista e interventoría

En cumplimiento de sus funciones esta interventoría realiza:

Solicitud de apertura de PIN AMBIENTAL ante la Secretaría de Educación Distrital.

Visita técnica en atención a emergencias en colegio Tomás Cipriano de Mosquera para determinar posibles fallas en circuitos eléctricos.

Verificación de cumplimiento de todas la obligaciones contenidas dentro del contrato de obra.

Aspecto SST-Ambiental

Se realiza control y seguimiento sobres los aspectos e impactos ambientales a fin de establecer las acciones pertinentes para reducir, mitigar y corregir dichos impactos. Se verifica en obra
las actividades, aspectos y controles en materia de Seguridad y salud en el trabajo, con el fin de establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir riesgos existentes.

Aspecto Social

Se realiza socialización en colegio Juan del Corral, Rafael Bernal Jiménez y Justo Víctor Charry en el transcurso de la semana.

Aspecto PMT

Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación

* Opcional dependiendo de los requerimientos del contrato

Información Meteorológica

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
30/01/2023	7:00 am 5:00 pm	0
31/01/2023	7:00 am 5:00 pm	0
1/02/2023	7:00 am 5:00 pm	0
2/02/2023	7:00 am 5:00 pm	0
3/02/2023	7:00 am 5:00 pm	0
4/02/2023	7:00 am 12:00 pm	0



CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	4	**DEL**	domingo, 29 de enero de 2023	**AL**	sábado, 4 de febrero de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	24	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Colegio Jorge Eliecer Gaitán: Desmonte de cieloraso, pisos, lámparas y trasiego de escombros, retiro de escombros.

Colegio Francisco José de Caldas: Demolición de pisos, desmonte de rejas, ventanas, trasiego de material a sitio de acopio y retiro de escombros.

Colegio Garcés Navas: Desmonte de cielo raso, desmonte de lámparas, cableado eléctrico, pintura en carpintería metálica.

VI. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Con base en la programación de obra presentada, se evidencia un avance programado de 0,52%, un avance ejecutado de 0,54%, de manera que se presenta una diferencia favorable de 0,02% en el desarrollo del proyecto.

Se realiza entrega de colegio Tomás Cipriano de Mosquera en atención de emergencias.

De acuerdo con la programación de obra, a la fecha los colegios Florida Blanca, Justo Víctor Charry, Juan del Corral, Miguel Antonio Caro y Rafael Bernal Jiménez se encuentran pendientes por inicio de obra.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se solicita de las buenas gestiones por parte del contratista de obra para realizar las actividades acorde a lo planteado en la programación, a fin de no incurrir en atrasos y posibles incumplimientos. Se verifica en obra que el personal que ingrese a la obra cumpla con los requisitos mínimos establecidos. En cumplimiento de las obligaciones adquiridas por contratista de obra e interventoría se realiza atención a emergencias en colegios de la zona de Engativá y Barrios Unidos y se realizan las gestiones necesarias para ejecutar de manera diligente lo requerido por la Secretaria de Educación del Distrito.	 FREDY GIOVANNI RODRIGUEZ SALAZAR **Firma**

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada	Fanny Almanzar/ Mileth Escalante	Liliana Sánchez/ Guillermo Narváez
CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS	CARGO: COORDINADOR GESTIÓN INTEGRAL/PROFESIONAL GESTIÓN INTEGRAL	CARGO: SUBGERENTE/ GERENTE
Vobo.	Vobo.	Vobo.
