CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	6	**DEL**	domingo, 12 de febrero de 2023	**AL**	sábado, 18 de febrero de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	38	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodriguez		

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista	Safrid Ingeniería SAS	**Interventor**	Consorcio Inter colegios 2022
Contrato No.	CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022
Fecha de suscripción del contrato	jueves, 6 de octubre de 2022	**Fecha de suscripción del contrato**	jueves, 24 de noviembre de 2022
Valor Inicial	$13.954.280.882,00	**Valor Inicial**	$ 951.138.738,00
Plazo Inicial	12 meses	**Plazo Inicial**	13 meses
Plazo Actualizado	12 meses	**Plazo Actualizado**	13 meses
Fecha de Iniciación	miércoles, 11 de enero de 2023	**Fecha de Iniciación**	jueves, 22 de diciembre de 2022
Fecha de Terminación*	miércoles, 10 de enero de 2024	**Fecha de Terminación**	domingo, 21 de enero de 2024
No póliza contrato de obra	14-44-101164899	**No póliza contrato de interventoría**	NB-100235369
Fecha aprobación	viernes, 14 de octubre de 2022	**Fecha aprobación**	martes, 29 de noviembre de 2022


* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
AMPARO	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**	**AMPARO**	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**
Cumplimiento del contrato	06/10/2022 - 06/04/2024	$ 2.790.856.176,40	Cumplimiento	25/11/2022 - 25/06/2024	$ 190.227.747,60
Estabilidad y Calidad de la obra	06/10/2023 - 06/10/2025	$ 2.790.856.176,40	Pago salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales	25/11/2022 - 25/12/2026	$ 47.556.936,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	06/10/2022 - 06/10/2026	$ 1.395.458.088,20	Calidad del servicio	25/12/2023 - 25/12/2028	$ 190.227.747,60
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	06/10/2022 - 06/10/2023	$ 697.714.044,10			

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
	Colegio Jorge Eliecer Gaitan	25/01/2023	31/10/2023	$ 2.024.236.834,00	5,13%	$ 41.354.734,58	2,04%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 3,09%
1	Preliminares	25/01/2023	30/08/2023	$ 103.859.590,00	5,13%	$ 33.167.148,78	1,64%	Demolición de pisos, muros, enchape, desmonte de rejas de ventanas metálicas, puertas de baños, desmonte de aparatos sanitarios.
2	Estructura	17/06/2023	23/09/2023	-		$ 5.859.854,32	0,29%	Suministro e instalación de subbase y malla electrosoldada.
3	Mampostería	13/10/2023	4/08/2023	-		$ 78.769,56	0,00%	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	2/08/2023	20/09/2023	-		-	0,00%	
5	Instalaciones electricas y de comunicaciones	20/06/2023	28/10/2023	-		-	0,00%	
7	Pisos	20/06/2023	28/10/2023	-		$ 2.248.961,92	0,11%	Alistado de pisos.
9	Carpintería metálica	14/03/2023	2/09/2023	-		-	0,00%	
11	Aparatos sanitarios y accesorios	29/08/2023	6/09/2023	-		-	0,00%	
12	Aparatos y equipos especiales	7/09/2023	23/09/2023	-		-	0,00%	
13	Pañete y pintura	5/04/2023	6/11/2023	-		-	0,00%	
16	Obras exteriores	5/07/2023	19/09/2023	-		-	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	24/03/2023	19/06/2023	-		-	0,00%	
20	Aseo y disposición final	29/08/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	

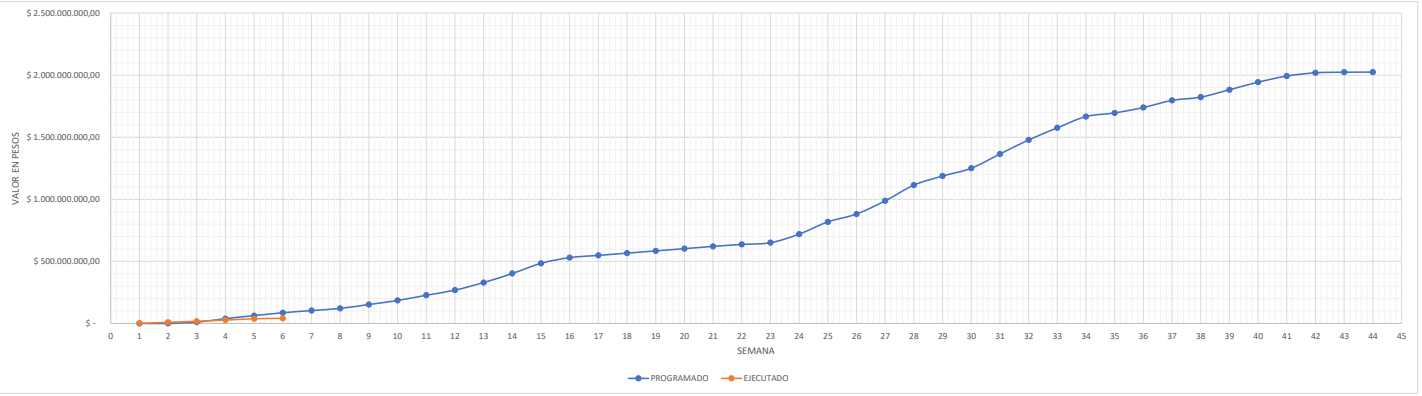


CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	6	**DEL**	domingo, 12 de febrero de 2023	**AL**	sábado, 18 de febrero de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	38	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodriguez		

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
Colegio Francisco José de Caldas, Sede A		25/01/2023	31/10/2023	$ 1.962.546.144,54	3,61%	$ 57.301.890,68	2,76%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,85%
1	Preliminares	25/01/2023	31/10/2023	$ 70.895.612,21	3,61%	$ 54.258.478,99	2,76%	Desmonte de puertas, ventanas, cieloraso, demolición de pisos, enchape, muros	
2	Estructura	4/03/2023	23/09/2023	-		-	0,00%		
3	Mampostería	23/03/2023	29/07/2023	-		-	0,00%		
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	14/04/2023	20/09/2023	-		-	0,00%		
5	Instalaciones electricas y de comunicaciones	13/05/2023	28/10/2023	-		-	0,00%		
7	Pisos	27/02/2023	28/10/2023	-		-	0,00%		
9	Carpintería metálica	17/04/2023	17/08/2023	-		-	0,00%		
13	Pañete y pintura	22/03/2023	20/09/2023	-		$3.043.412	0,00%	Pañete en muros y filos en ventanas	
16	Obras exteriores	1/09/2023	31/10/2023	-		-	0,00%		
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	13/03/2023	26/09/2023	-		-	0,00%		
20	Aseo y disposición final	20/04/2023	31/10/2023	-		-	0,00%		

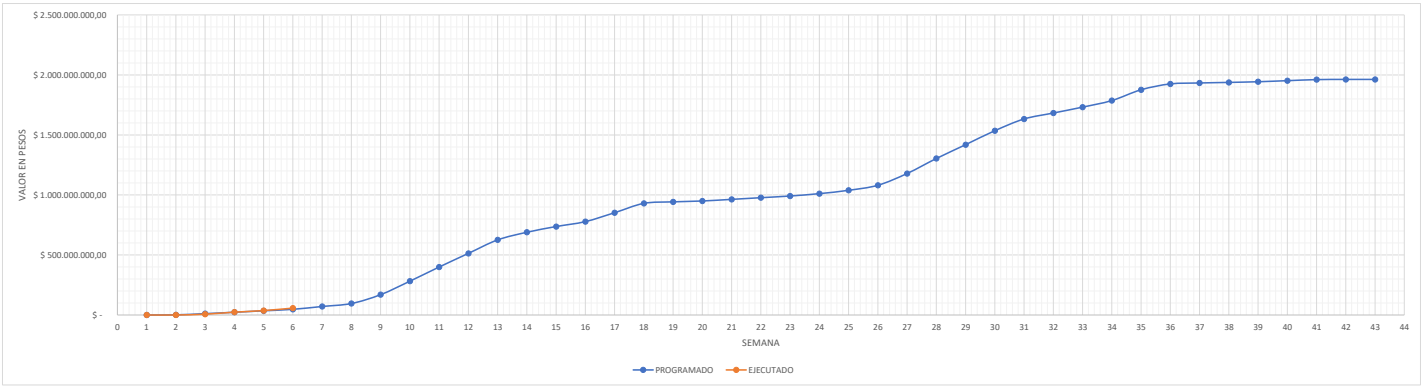

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
Colegio Garcés Navas		1/02/2023	31/07/2023	$ 787.083.405,50	12,93%	$ 51.045.956,23	6,49%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	6,44%
1	Preliminares	1/02/2023	3/05/2023	$ 101.752.714,02	12,93%	$ 51.045.956,23	6,49%	Pintura en carpintería metálica, desmonte de cieloraso, lámparas y cableado eléctrico	
2	Estructura	8/04/2023	19/04/2023	-		-	0,00%		
3	Mampostería	4/03/2023	15/03/2023	-		-	0,00%		
5	Instalaciones electricas y de comunicaciones	13/03/2023	24/05/2023	-		-	0,00%		
11	Aparatos sanitarios y accesorios	25/05/2023	27/05/2023	-		-	0,00%		
13	Pañete y pintura	20/04/2023	13/06/2023	-		-	0,00%		
16	Obras exteriores	4/05/2023	20/05/2023	-		-	0,00%		
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	3/02/2023	29/07/2023	-		-	0,00%		
20	Aseo y disposición final	10/02/2023	5/06/2023	-		-	0,00%		

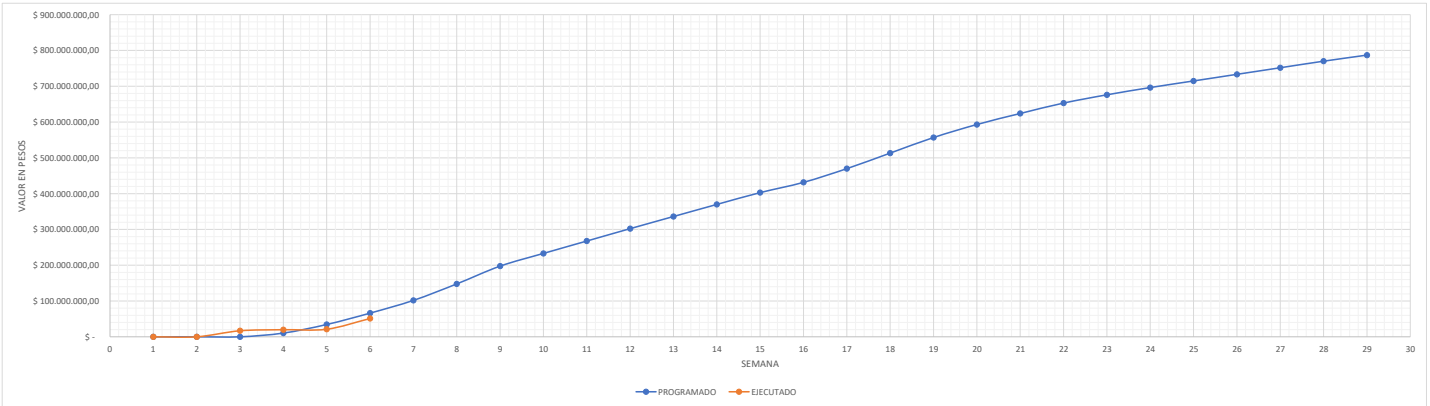


CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	6	**DEL**	domingo, 12 de febrero de 2023	**AL**	sábado, 18 de febrero de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	38	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodriguez		

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
Colegio Floridablanca		6/02/2023	31/10/2023	$ 699.153.025,00	1,94%	$ 28.187.605,70	4,03%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	-2,09%
1	Preliminares	6/02/2023	9/02/2023	$ 13.567.578,60	1,94%	$ 28.187.605,70	4,03%	Cerramiento, demolición pavimento asfáltivo, desmonte canecas de basura.	
2	Estructura	6/03/2023	13/05/2023						
3	Mampostería	8/05/2023	31/10/2023						
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	15/04/2023	8/05/2023						
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	8/05/2023	8/09/2023						
7	Pisos	6/09/2023	30/10/2023						
9	Carpitería metálica	6/09/2023	30/10/2023						
13	Pañete y pintura	19/05/2023	14/08/2023						
16	Obras exteriores	6/03/2023	29/06/2023						
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	18/07/2023	22/09/2023						
20	Aseo y disposición final	13/05/2023	31/10/2023						

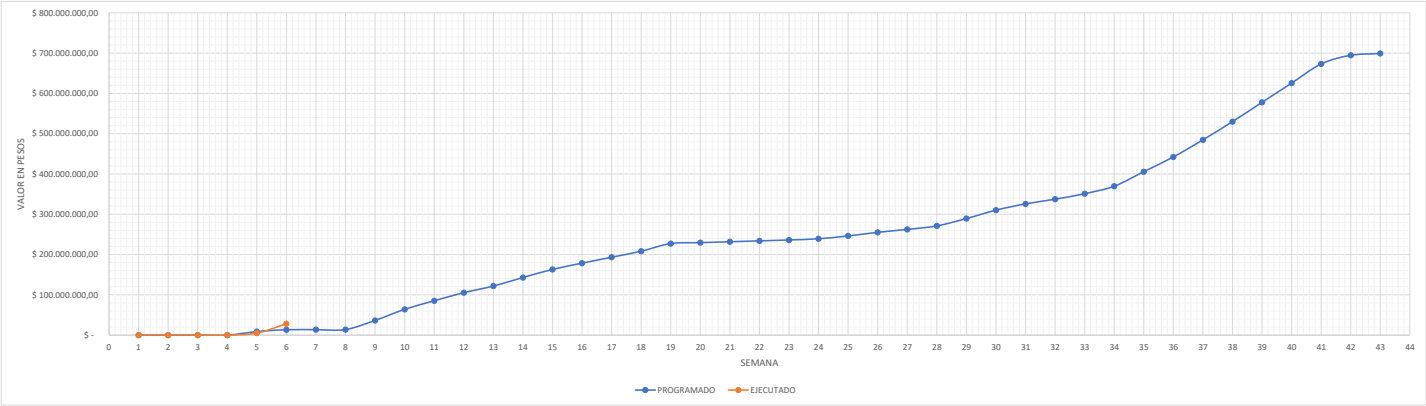

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
Colegio Miguel Antonio Caro		7/02/2023	15/07/2023	$ 75.339.260,00	12,30%	$ 12.735.206,64	16,90%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	-4,60%
1	Preliminares	7/02/2023	2/05/2023	$ 9.269.474,21	12,30%	$ 12.735.206,64	16,90%	Cerramiento, demolición placa.	
2	Estructura	11/04/2023	15/07/2023						
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	16/05/2023	19/06/2023						
5	Instalaciones electricas y de comunicaciones	24/04/2023	8/06/2023						
7	Pisos	27/04/2023	12/05/2023						
16	Obras exteriores	11/04/2023	9/05/2023						
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	20/03/2023	12/06/2023						
20	Aseo y disposición final	7/03/2023	12/07/2023						

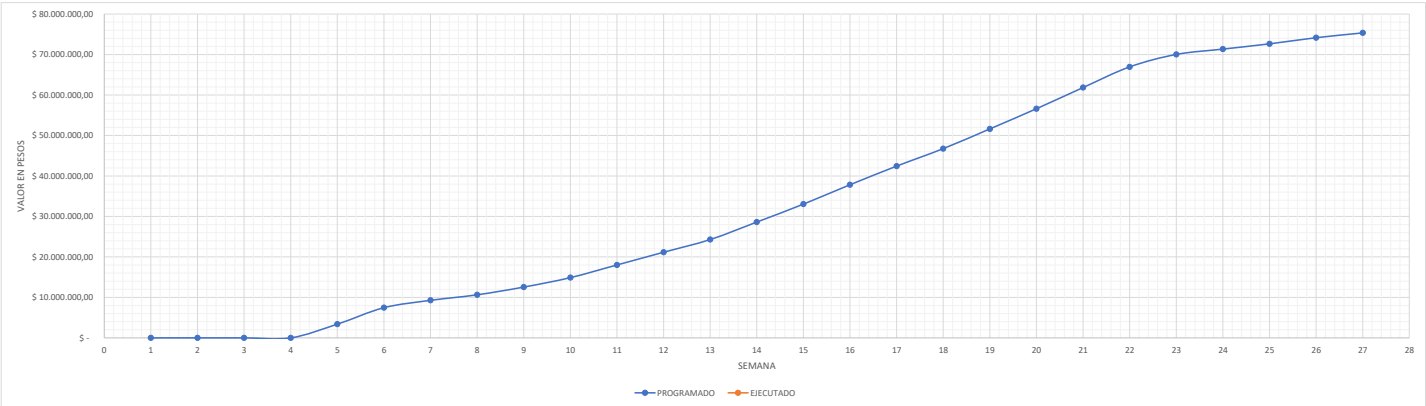


CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	6	**DEL**	domingo, 12 de febrero de 2023	**AL**	sábado, 18 de febrero de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	38	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodriguez		

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
	Colegio Justo Victor Charry	13/02/2023	15/07/2023	$ 369.424.312,00	0,25%	$ -	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,25%
1	Preliminares	13/02/2023	8/04/2023	$ 928.018,00	0,25%	$ -	0,00%		
3	Mampostería	31/03/2023	8/04/2023						
5	Instalaciones electricas y de comunicaciones	27/06/2023	10/07/2023						
7	Pisos	27/04/2023	1/05/2023						
8	Mampostería seca	4/04/2023	26/04/2023						
9	Carpintería metálica	27/04/2023	14/06/2023						
11	Aparatos sanitarios y accesorios	27/04/2023	25/05/2023						
12	Aparatos y equipos especiales	20/05/2023	23/06/2023						
13	Pañete y pintura	17/05/2023	26/06/2023						
15	Cerraduras, vidrios y espejos	27/06/2023	1/07/2023						
20	Aseo y disposición final	10/04/2023	15/07/2023						

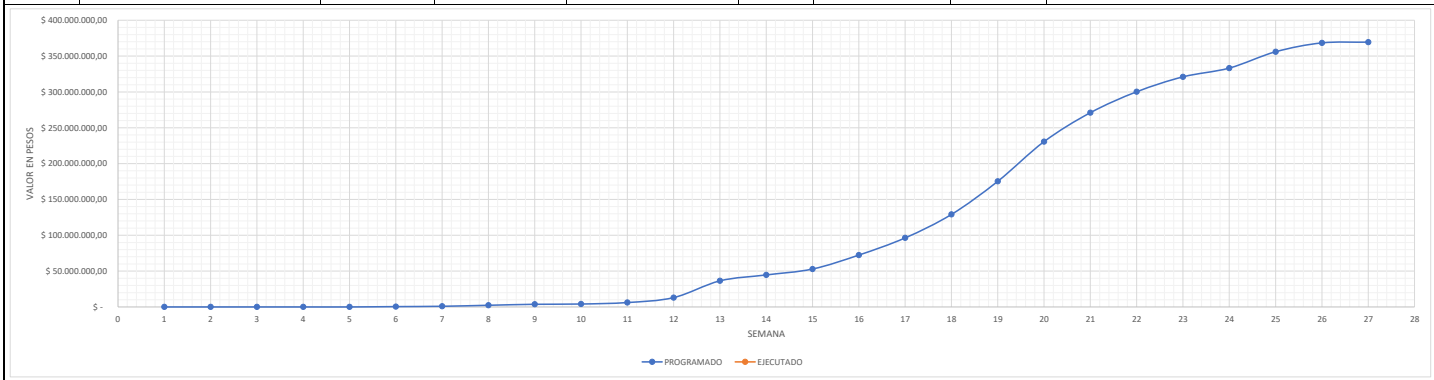

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
	Colegio Rafael Bernal Jimenez	25/01/2023	22/08/2023	$677.034.595	3,13%	$ 7.550.114,59	1,12%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	2,01%
1	Preliminares	7/02/2023	17/05/2023	$21.162.434	3,13%	$ 7.550.114,59	1,12%	Cerramiento en teja de zinc, demolición acabado de piso.	
2	Estructura	23/02/2023	5/05/2023						
3	Mampostería	1/05/2023	17/05/2023						
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	9/03/2023	11/03/2023						
5	Instalaciones electricas y de comunicaciones	10/07/2023	29/07/2023						
7	Pisos	18/05/2023	26/07/2023						
8	Mampostería seca	12/07/2023	20/07/2023						
9	Carpintería metálica	6/05/2023	21/06/2023						
11	Aparatos sanitarios y accesorios	4/07/2023	8/07/2023						
13	Pañete y pintura	1/04/2023	25/07/2023						
16	Obras exteriores	4/03/2023	8/07/2023						
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	27/03/2023	8/07/2023						
20	Aseo y disposición final	5/04/2023	29/07/2023						

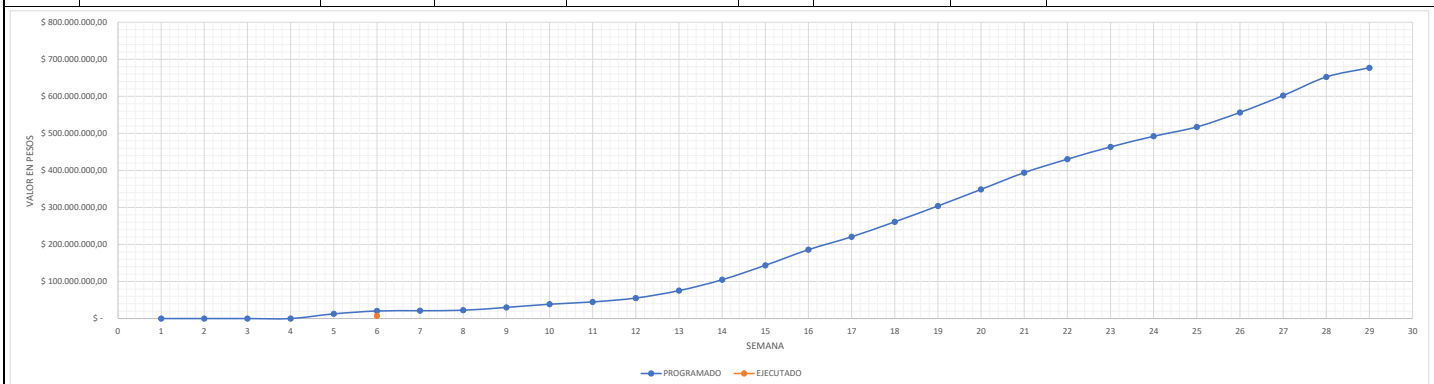


CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	6	**DEL**	domingo, 12 de febrero de 2023	**AL**	sábado, 18 de febrero de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	38	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodriguez		

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
Instituto técnico Juan del Corral		15/02/2023	12/09/2023	$ 524.030.444,00	0,00%	$ 7.582.718,91	1,45%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	-1,45%
1	Preliminares	15/02/2023	23/02/2023	$ -	0,00%	$ 7.582.718,91	1,45%	Demolición manto asfáltico y cerramiento	
3	Mampostería	3/07/2023	31/07/2023						
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	14/04/2023	4/05/2023						
5	Instalaciones electricas y de comunicaciones	17/05/2023	13/06/2023						
7	Pisos	19/06/2023	17/07/2023						
8	Mampostería seca	17/05/2023	2/06/2023						
13	Pañete y pintura	14/07/2023	14/08/2023						
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	24/04/2023	17/08/2023						
20	Aseo y disposición final	27/02/2023	8/08/2023						

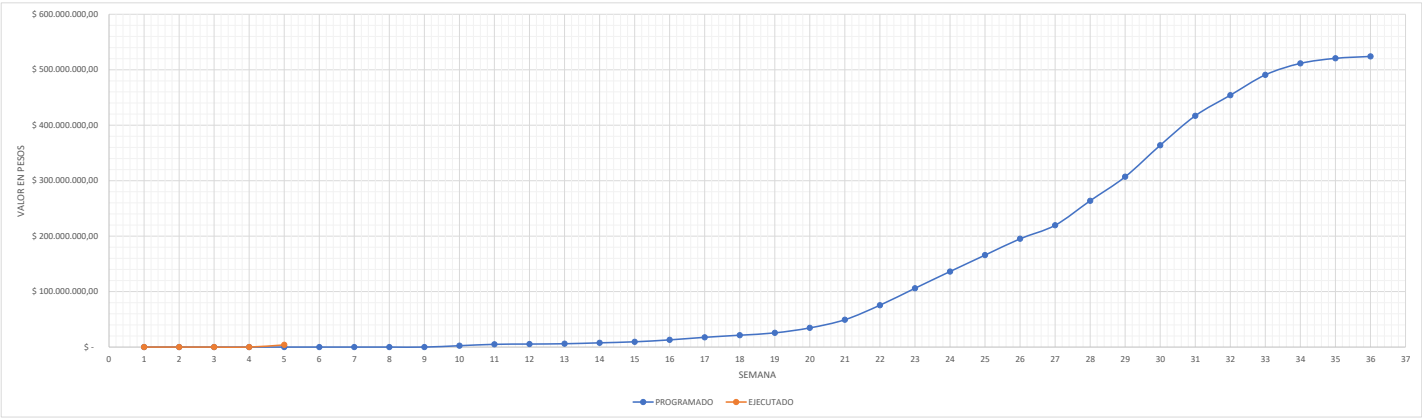

Atención de IED

Institucion	Fecha inicio	Fecha terminacion	Valor programado	Avance programado	Valor ejecutado	Avance ejecutado	Observaciones	Diferencia
Colegio Francisco Primero	25/01/2023	22/08/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio José Asunción Silva	15/02/2023	12/09/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Manuela Ayala de Gaitán	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio República de Colombia	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Simón Bolívar	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Nidia Quintero de Turbay	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio República de Guatemala	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio República de Panamá	10/05/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Tomás Carrasquilla	10/05/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Francisco José de Caldas, Sede B	10/05/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Robert F Kennedy	10/05/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%

Atención de emergencias

Colegio Morisco	13/01/2023	21/01/2023					
Colegio Tomas Cipriano de Mosquera	1/02/2023						
Colegio Nidia Quintero de Turbay							
Colegio Thomas Carrasquilla, sede A							
Colegio Rafael Bernal Jimenez, sede B	28/01/2023						
Colegio República de Panamá							
Colegio Laureano Gómez							
Dirección Local de Engativá	8/02/2023						


PROGRAMADO					EJECUTADO				
No.	VALOR PROGRAMADO SEMANAL	%	ACUMULADO	%	No.	VALOR EJECUTADO SEMANAL	%	ACUMULADO	%
1	$ -	0,00%	$ -	0,00%	1	$ -	0,00%	$ -	0,00%
2	$ 1.270.756,93	0,01%	$ 1.270.756,93	0,01%	2	$ 9.458.499,71	0,07%	$ 9.458.499,71	0,07%
3	$ 19.951.637,75	0,14%	$ 21.222.394,68	0,15%	3	$ 31.826.160,08	0,23%	$ 41.284.659,79	0,30%
4	$ 50.914.718,24	0,36%	$ 72.137.112,92	0,52%	4	$ 33.373.547,10	0,24%	$ 74.658.206,89	0,54%
5	$ 84.783.311,22	0,61%	$ 156.920.424,14	1,12%	5	$ 33.581.581,31	0,24%	$ 108.239.788,20	0,78%
6	$ 84.520.694,84	0,61%	$ 241.441.118,98	1,73%	6	$ 101.432.398,68	0,73%	$ 209.672.186,88	1,50%
7	$ 79.994.302,15	0,57%	$ 321.435.421,13	2,30%	7	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	6	**DEL**	domingo, 12 de febrero de 2023	**AL**	sábado, 18 de febrero de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	38	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodriguez		

8	$ 92.371.183,17	0,66%	$ 413.806.604,30	2,97%	8	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
9	$ 188.479.295,83	1,35%	$ 602.285.900,13	4,32%	9	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
10	$ 221.475.791,25	1,59%	$ 823.761.691,38	5,90%	10	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
11	$ 229.916.129,85	1,65%	$ 1.053.677.821,23	7,55%	11	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
12	$ 230.178.690,91	1,65%	$ 1.283.856.512,14	9,20%	12	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
13	$ 271.119.796,10	1,94%	$ 1.554.976.308,24	11,14%	13	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
14	$ 366.181.950,98	2,62%	$ 1.921.158.259,22	13,77%	14	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
15	$ 367.035.523,66	2,63%	$ 2.288.193.782,89	16,40%	15	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
16	$ 332.730.015,04	2,38%	$ 2.620.923.797,93	18,78%	16	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
17	$ 344.526.501,67	2,47%	$ 2.965.450.299,60	21,25%	17	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
18	$ 366.678.480,99	2,63%	$ 3.332.128.780,59	23,88%	18	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
19	$ 427.752.993,66	3,07%	$ 3.759.881.774,25	26,94%	19	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
20	$ 414.353.821,17	2,97%	$ 4.174.235.595,42	29,91%	20	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
21	$ 406.649.637,35	2,91%	$ 4.580.885.232,77	32,83%	21	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
22	$ 394.471.325,54	2,83%	$ 4.975.356.558,31	35,65%	22	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
23	$ 377.462.346,04	2,70%	$ 5.352.818.904,35	38,36%	23	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
24	$ 421.102.429,73	3,02%	$ 5.773.921.334,08	41,38%	24	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
25	$ 467.126.358,88	3,35%	$ 6.241.047.692,96	44,72%	25	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
26	$ 451.567.823,26	3,24%	$ 6.692.615.516,22	47,96%	26	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
27	$ 538.474.810,12	3,86%	$ 7.231.090.326,34	51,82%	27	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
28	$ 609.647.332,75	4,37%	$ 7.840.737.659,09	56,19%	28	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
29	$ 527.681.141,76	3,78%	$ 8.368.418.800,85	59,97%	29	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
30	$ 493.959.978,51	3,54%	$ 8.862.378.779,36	63,51%	30	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
31	$ 517.384.199,98	3,71%	$ 9.379.762.979,34	67,22%	31	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
32	$ 447.896.126,45	3,21%	$ 9.827.659.105,79	70,43%	32	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
33	$ 433.840.376,73	3,11%	$ 10.261.499.482,52	73,54%	33	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
34	$ 421.086.235,28	3,02%	$ 10.682.585.717,80	76,55%	34	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
35	$ 400.956.758,70	2,87%	$ 11.083.542.476,50	79,43%	35	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
36	$ 368.762.135,71	2,64%	$ 11.452.304.612,21	82,07%	36	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
37	$ 344.084.266,25	2,47%	$ 11.796.388.878,46	84,54%	37	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
38	$ 312.891.892,50	2,24%	$ 12.109.280.770,96	86,78%	38	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
39	$ 349.386.921,83	2,50%	$ 12.458.667.692,79	89,28%	39	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
40	$ 354.111.026,34	2,54%	$ 12.812.778.719,13	91,82%	40	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
41	$ 342.265.958,11	2,45%	$ 13.155.044.677,24	94,27%	41	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
42	$ 250.155.543,90	1,79%	$ 13.405.200.221,15	96,07%	42	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
43	$ 141.994.792,05	1,02%	$ 13.547.195.013,20	97,08%	43	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
44	$ 704.475,00	0,01%	$ 13.547.899.488,20	97,09%	44	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
45	$ 406.381.393,80	2,91%	$ 13.954.280.882,00	100,00%	45	$ -	0,00%	$ 209.672.186,88	1,50%
46					46	$ -			
47					47	$ -			

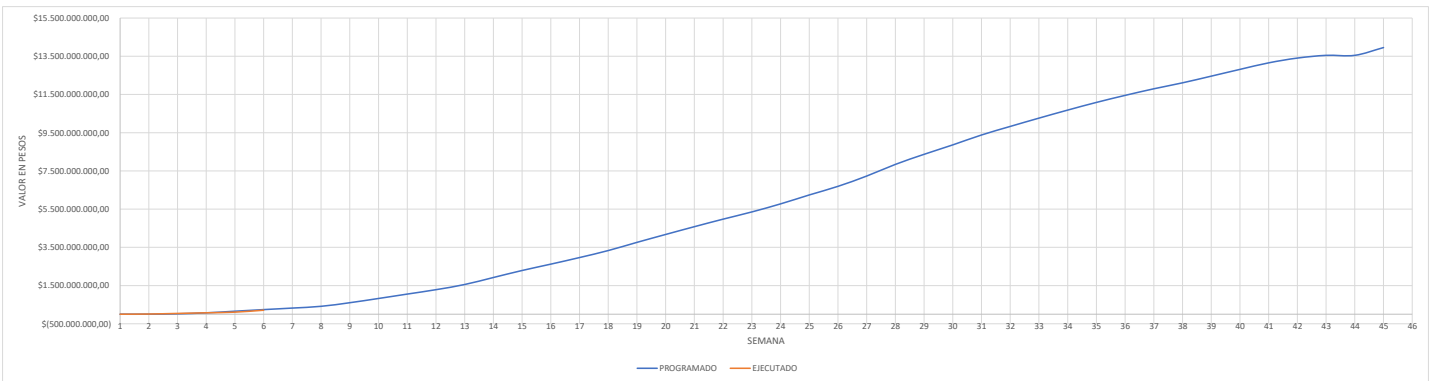

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	6	**DEL**	domingo, 12 de febrero de 2023	**AL**	sábado, 18 de febrero de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	38	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodriguez		

Seguimiento Ruta Critica

No.	Actividad	Fecha Programada Inicio	Fecha Inicio Real	Fecha Finalización	Tiempo de holgura	Tiempo de Ejecución	Atraso	OBSERVACIONES
1	Jorge Eliecer Gaitan	25/01/2023	19/01/2023	31/10/2023	6	285	-279	
2	Francisco José de Caldas, Sede A	25/01/2023	23/01/2023	31/10/2023	2	281	-279	
3	Garcés Navas	25/01/2023	23/01/2023	31/07/2023	2	189	-187	
4	Florida Blanca	6/02/2023	2/02/2023	31/10/2023	4	271	-267	
5	Miguel Antonio Caro	7/02/2023	7/02/2023	15/07/2023	0	158	-158	
6	Justo Victor Charry	13/02/2023	13/02/2023	15/07/2023	0	152	-152	
7	Rafael Bernal Jimenez	25/01/2023	8/02/2023	22/08/2023	-14	195	-209	
8	Juan del Corral	15/02/2023	8/02/2023	12/09/2023	7	216	-209	
9	Francisco Primero	24/03/2023	24/03/2023	22/08/2023	0	151	-151	
10	José Asunción Silva	24/03/2023	24/03/2023	12/09/2023	0	172	-172	
11	Manuela Ayala de Gaitán	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
12	República de Colombia	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
13	Simón Bolívar	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
14	Nidia Quintero de Turbay	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
15	República de Guatemala	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
16	República de Panamá	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
17	Tomás Carrasquilla	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
18	Francisco José de Caldas, Sede	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
19	Robert F Kennedy	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

En Bogotá, a los once (11) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023), se firma acta de inicio entre Jorge Gómez Falla, en calidad de Representante de Consorcio Intercolegios 2022, como Interventor, y Miguel Alexander Cerón Molina, en calidad de representante legal de Safrid Ingeniería S.A.S como Contratista.

Aspecto Financiero

A la fecha del presente informe no se han tramitado actas de pago tanto en el contrato de obra como en el contrato de interventoría

Aspecto Técnico

En el periodo comprendido del presente informe el contratista realizó las siguientes actividades:

Colegio Jorge Eliecer Gaitan:



Instalación de plástico y malla electrosoldada en aulas



Filos en ventanas



Pañete sobre muros

Colegio Francisco José de Caldasa:



Desmonte de marcos y puertas en baños oficinas segundo piso



Pañete en muros culata pasillo de segundo piso



Filos en ventanas de aulas de segundo piso

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL						
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022					
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.					
SEMANA No.	6	**DEL**	domingo, 12 de febrero de 2023	**AL**	sábado, 18 de febrero de 2023	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	38	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodriguez			

Colegio Garcés Navas



Pintura en carpintería metálica



Desmonte de cieloraso en aula múltiple



Pintura en carpintería metálica

Colegio Floridablanca



Demolición y retiro de pavimento asfáltico de canchas



Ensayos de laboratorio para caracterización de materiales



Mantenimiento de arcos de canchas

Colegio Juan del Corral



Demolición acabado de piso



Trasiego de escombro



Trasiego de escombro a sitio de acopio

Colegio Rafael Bernal Jiménez



Cerramiento en teja de zinc



Cerramiento en teja de zinc para aula múltiple



Ingreso baño portátil

Colegio Miguel Antonio Caro

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	6	**DEL**	domingo, 12 de febrero de 2023	**AL**	sábado, 18 de febrero de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	38	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodriguez		



Demolición de placa



Excavación manual para tuberia



Cerramiento en lona

Comité de obra



Comité semanal de obra



Recorrido de obra



Comité semanal de obra

En cumplimiento de sus funciones contractuales como interventoría del contrato de obra No.CO1.PCCNTR.4077642 – 2022, el Consorcio Intercolegios 2022 realizó las siguientes actividades de orden administrativas:

✓ Solicitud a contratista de obra de entrega de informe técnico mensual No. 1, concepto estructural de las instituciones correspondientes, balances actualizados de acuerdo a las consideraciones realizadas por parte de la Supervisión de la Secretaría de Educación, avance en la realización de los presupuestos de las instituciones educativas restantes del objeto contractual para el contrato principal, fichas de calidad, listado de proveedores y resultados de ensayos en los tiempos requeridos.
✓ Visitas técnicas en atención a emergencias presentadas en la localidad de Engativá y Barrios Unidos informadas por la Secretaría de Educación Distrital.
✓ Verificación de cumplimiento de todas la obligaciones contenidas dentro del contrato de obra.

Aspecto SST-Ambiental

✓ Se realiza control y segumiento sobres los aspectos e impactos ambientales a fin de establecer las acciones pertinentes para reducir, mitigar y corregir dichos impactos.
✓ Se verifica en obra las actividades, aspectos y controles en materia de Seguridad y salud en el trabajo, con el fin de establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir riesgos existentes.

Aspecto Social

Se realiza comité semanal de obra en instalaciones de IED Garcés Navas el día 14 de febrero de 2023. transcurso de la semana.

Aspecto PMT

N/A


Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación

* Opcional dependiendo de los requerimientos del contrato

Información Meteorológica

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
13/02/2023	7:00 am 5:00 pm	0
14/02/2023	7:00 am 5:00 pm	0
15/02/2023	7:00 am 5:00 pm	0
16/02/2023	7:00 am 5:00 pm	4
17/02/2023	7:00 am 5:00 pm	2
18/02/2023	7:00 am 12:00 pm	1

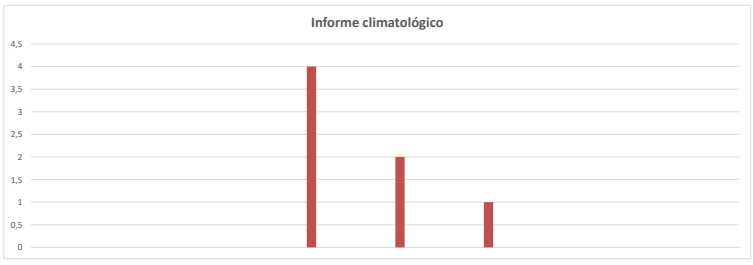

V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	6	**DEL**	domingo, 12 de febrero de 2023	**AL**	sábado, 18 de febrero de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	38	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodriguez		

✓ Colegio Jorge Eliecer Gaitán: Pañete, filos, bocapuertas, fundida de alistado sobre placa.
✓ Colegio Francisco José de Caldas: Filos en ventanas, pañete en culatas, retiro de escombros.
✓ Colegio Garcés Navas: Pintura en carpintería metálica, desmonte de cielo raso.
✓ Colegio Floridablanca: Excavación a máquina en canchas múltiples, mantenimiento de arcos.
✓ Colegio Juan del Corral: Demolición de pisos, trasiego de escombros, cambio de tubería en sótano.
✓ Colegio Rafael Bernal Jiménez: Demolición de piso.
✓ Colegio Miguel Antonio Caro: Demolición de placa de contrapiso y excavación para tubería.
✓ Colegio Justo Victor Charry: Apertura de frente de obra, actividades preliminares.

VI. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

✓ De acuerdo con el presente informe, a la fecha se presenta un avance general ejecutado de 1,50%, con base en la programación presentada un avance general programado de 1,73%, teniendo una diferencia de 0,23% de atraso en el contrato.
✓ En atención a emergencias se realiza visita técnica el día lunes 13 de febrero de 2023 a Colegio República de Panamá, sede C en compañía de especialista, con el fin de, verificar emergencia en bombas; en esta visita se realizó cambio del presostato y se habilitó el servicio de agua en el colegio temporalmente para evitar perdida del suministro a la institución, debido a que se encuentra en fabricación accesorios (flauta) de tubería para el funcionamiento correcto de la red.
✓ Emergencia IED Nydia Quintero; se continúa con la reparación de fisuras en muros y techo.
✓ Emergecia IED Rafael Bernal Jiménez, sede B; se realiza visita técnica el día 16 de febrero de 2023 en compañía de especialista hidráulico en donde se inspecciona las zonas afectadas (baño niños primer piso, baño de niñas segundo piso), así mismo, se realiza prueba de geofonía para encontrar las fugas de agua. Se informa la necesidad de ejecutar reparaciones en concreto, además se realiza instalación de universal y retiro dos uniones de reparación. Es pertinente, por parte de Safrid Ingeniería SAS, presentar el concepto técnico por parte de especialista Estructural para las alternativas de reparación de placa afectada.
✓ De acuerdo con la programación de obra, el colegio Justo Victor Charry contaba con fecha de incio 13 de febrero de 2023, sin embargo, a la fecha se encuentra pendiente por inicio de ejecución de actividades en frente de trabajo.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
✓ Teniendo en cuenta las directrices estipuladas y manifestadas por la Secretaria de Educación del Distrito, se insta a contratista de obra efectuar las actividades acorde a lo requerido por la entidad, así mismo, considerar el balance presupuestal actualizado para evitar afectaciones al contrato. ✓ Se solicita de las buenas gestiones por parte del contratista de obra para realizar las actividades acorde a lo planteado en la programación, esto en aras de evitar incurrir en atrasos y posibles incumplimientos. ✓ Se verifica en obra que el personal cumpla con los requisitos mínimos establecidos, del mismo modo, se inspecciona acerca del adecuado uso del equipo de protección personal pertinente en todo el personal, esto en aras de evitar accidentes laborales. ✓ Se notifica a contratista de obra que la entrega de la información es indispensable para la validación y aprobación de los conceptos por parte de la interventoría, por tal razón, los tiempos de demora en la entrega de la documentación solicitada, son imputables al contratista de obra.	FREDY GIOVANNI RODRIGUEZ SALAZAR

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada	Fanny Almanzar/ Mileth Escalante	Liliana Sánchez/ Guillermo Narváez
CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS	CARGO: COORDINADOR GESTIÓN INTEGRAL/PROFESIONAL GESTIÓN INTEGRAL	CARGO: SUBGERENTE/ GERENTE
Vobo.	Vobo.	Vobo.
