CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022
901649961

CIC_BTA_SED_050_2022_104

Bogotá, 01 de marzo de 2023

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL
Arq. Edwin Alexander Santana Rodriguez
Lider Territorial Zona Norte
Avenida El Dorado No. 66 - 63
Bogotá D.C.

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022, "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"**

ASUNTO: **REMISIÓN INFORME SEMANAL No.7**

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales derivadas del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.4146207 de 2022, el CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 remite a su dependencia el siguiente documento para su conocimiento y fines pertinentes:

- Informe semanal No.7 – 19 de febrero 2023 a 25 de febrero de 2023.

Agradecemos la atención prestada, cualquier duda y/o inquietud no dude en comunicarse con nosotros.

Atentamente,
CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022

FREDY GIOVANNI RODRÍGUEZ SALAZAR
Director de Interventoría

SE ANEXA LO ENUNCIADO EN NUEVE (09) FOLIOS.

Elaboro: CASP
Reviso: MAGR - FGRS
Aprobó: ARGF - FGRS

Copia: P:\SECRETARIA_EDUCACION\EN_EJECUCION\CIC_SED_050_2022_COLEGIOS\CORRESPONDENCIA\OFICIOS

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	7	**DEL**	domingo, 19 de febrero de 2023	**AL**	sábado, 25 de febrero de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	45	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista	Safrid Ingeniería SAS	**Interventor**	Consorcio Inter colegios 2022
Contrato No.	CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022
Fecha de suscripción del contrato	jueves, 6 de octubre de 2022	**Fecha de suscripción del contrato**	jueves, 24 de noviembre de 2022
Valor Inicial	$13.954.280.882,00	**Valor Inicial**	$ 951.138.738,00
Plazo Inicial	12 meses	**Plazo Inicial**	13 meses
Plazo Actualizado	12 meses	**Plazo Actualizado**	13 meses
Fecha de Iniciación	miércoles, 11 de enero de 2023	**Fecha de Iniciación**	jueves, 22 de diciembre de 2022
Fecha de Terminación*	miércoles, 10 de enero de 2024	**Fecha de Terminación**	domingo, 21 de enero de 2024
No póliza contrato de obra	14-44-101164899	**No póliza contrato de interventoría**	NB-100235369
Fecha aprobación	viernes, 14 de octubre de 2022	**Fecha aprobación**	martes, 29 de noviembre de 2022


* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
AMPARO	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**	**AMPARO**	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**
Cumplimiento del contrato	06/10/2022 - 06/04/2024	$ 2.790.856.176,40	Cumplimiento	25/11/2022 - 25/06/2024	$ 190.227.747,60
Estabilidad y Calidad de la obra	06/10/2023 - 06/10/2025	$ 2.790.856.176,40	Pago salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales	25/11/2022 - 25/12/2026	$ 47.556.936,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	06/10/2022 - 06/10/2026	$ 1.395.458.088,20	Calidad del servicio	25/12/2023 - 25/12/2028	$ 190.227.747,60
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	06/10/2022 - 06/10/2023	$ 697.714.044,10			

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
	Colegio Jorge Eliecer Gaitán	25/01/2023	31/10/2023	$ 2.024.236.834,00	5,99%	$ 48.114.141,99	2,38%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 3,61%
1	Preliminares	25/01/2023	30/08/2023	$ 121.270.957,00	5,99%	$ 35.981.594,40	1,78%	Demolición de pisos, muros, enchape, desmonte de rejas de ventanas metálicas, puertas de baños, desmonte de aparatos sanitarios
2	Estructura	17/06/2023	23/09/2023	$ -	0,00%	$ 5.859.854,32	0,29%	Suministro e instalación de subbase y malla electrosoldada
3	Mampostería	13/10/2023	4/08/2023	$ -	0,00%	$ 78.769,56	0,00%	Muro divisorio en bloque
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	2/08/2023	20/09/2023	$ -	0,00%	-	0,00%	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	20/06/2023	28/10/2023	$ -	0,00%	-	0,00%	
7	Pisos	20/06/2023	28/10/2023	$ -	0,00%	$ 2.248.961,92	0,11%	Alistado de pisos
9	Carpintería metálica	14/03/2023	2/09/2023	$ -	0,00%	-	0,00%	
11	Aparatos sanitarios y accesorios	29/08/2023	6/09/2023	$ -	0,00%	-	0,00%	
12	Aparatos y equipos especiales	7/09/2023	23/09/2023	$ -	0,00%	-	0,00%	
13	Pañete y pintura	5/04/2023	6/11/2023	$ -	0,00%	$ 3.944.961,78	0,19%	Aplicación de pañete
16	Obras exteriores	5/07/2023	19/09/2023	$ -	0,00%	-	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	24/03/2023	19/06/2023	$ -	0,00%	-	0,00%	
20	Aseo y disposición final	29/08/2023	31/10/2023	$ -	0,00%	-	0,00%	

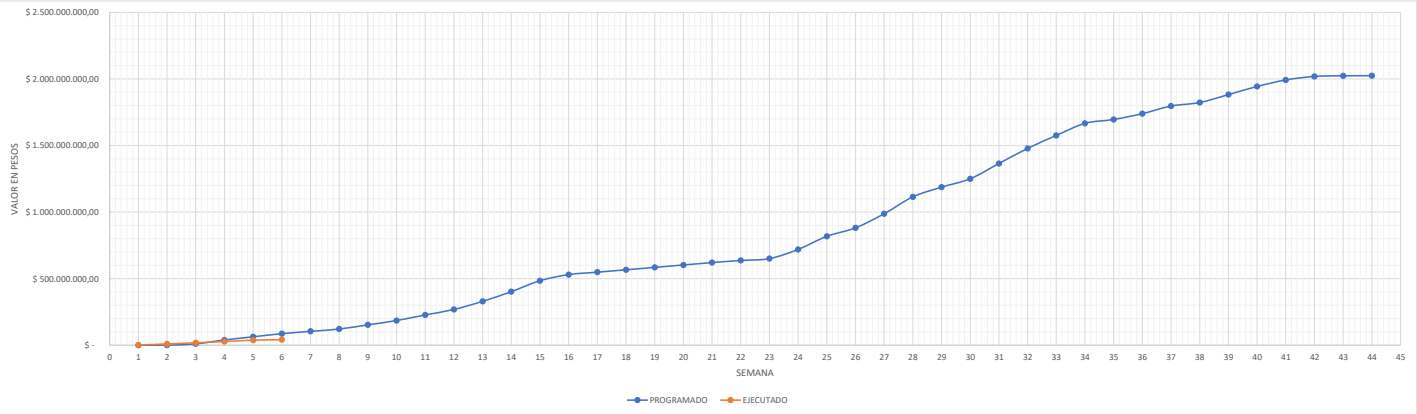


CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	7	**DEL**	domingo, 19 de febrero de 2023	**AL**	sábado, 25 de febrero de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	45	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
Colegio Francisco José de Caldas, Sede A		25/01/2023	31/10/2023	$ 1.962.546.144,54	4,87%	$ 64.825.431,42	2,98%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	1,89%
1	Preliminares	25/01/2023	31/10/2023	$ 95.579.575,11	4,87%	$ 58.448.968,25	2,98%	Desmonte de puertas, ventanas, cieloraso, demolición de pisos, enchape, muros	
2	Estructura	4/03/2023	23/09/2023	$ -	0,00%	-	0,00%		
3	Mampostería	23/03/2023	29/07/2023	$ -	0,00%	-	0,00%		
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	14/04/2023	20/09/2023	$ -	0,00%	-	0,00%		
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	13/05/2023	28/10/2023	$ -	0,00%	-	0,00%		
7	Pisos	27/02/2023	28/10/2023	$ -	0,00%	-	0,00%		
9	Carpintería metálica	17/04/2023	17/08/2023	$ -	0,00%	-	0,00%		
13	Pañete y pintura	22/03/2023	20/09/2023	$ -	0,00%	$6.376.463	0,00%	Pañete en muros y filos en ventanas	
16	Obras exteriores	1/09/2023	31/10/2023	$ -	0,00%	-	0,00%		
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	13/03/2023	26/09/2023	$ -	0,00%	-	0,00%		
20	Aseo y disposición final	20/04/2023	31/10/2023	$ -	0,00%	-	0,00%		

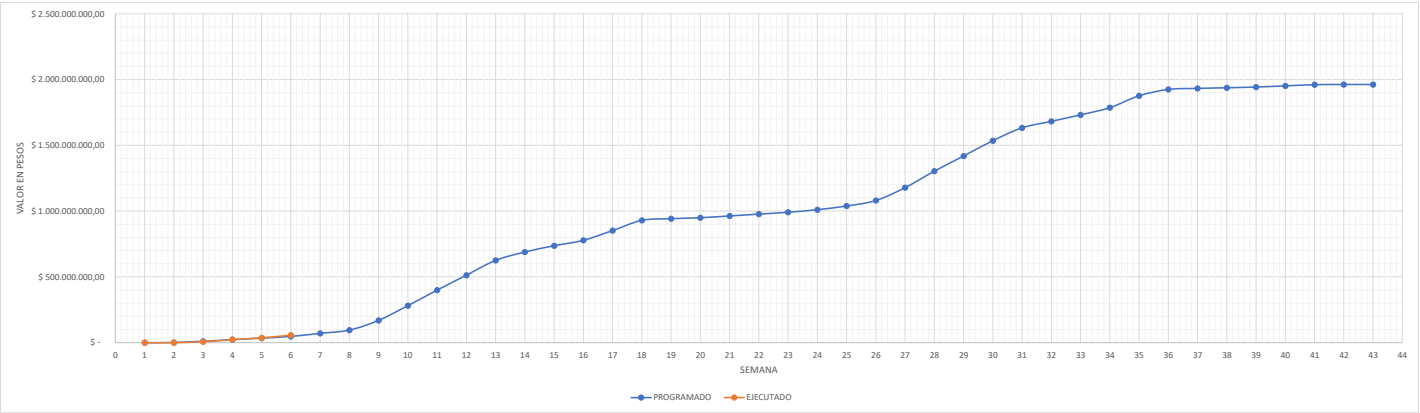

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
Colegio Garcés Navas		1/02/2023	31/07/2023	$ 787.083.405,50	18,78%	$ 51.045.956,23	6,49%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	12,29%
1	Preliminares	1/02/2023	3/05/2023	$ 144.961.780,50	18,42%	$ 51.045.956,23	6,49%	Pintura en carpintería metálica, desmonte de cieloraso, lámparas y cableado eléctrico	
2	Estructura	8/04/2023	19/04/2023	$ -	0,00%	-	0,00%		
3	Mampostería	4/03/2023	15/03/2023	$ -	0,00%	-	0,00%		
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	13/03/2023	24/05/2023	$ -	0,00%	-	0,00%		
11	Aparatos sanitarios y accesorios	25/05/2023	27/05/2023	$ -	0,00%	-	0,00%		
13	Pañete y pintura	20/04/2023	13/06/2023	$ -	0,00%	-	0,00%		
16	Obras exteriores	4/05/2023	20/05/2023	$ -	0,00%	-	0,00%		
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	3/02/2023	29/07/2023	$ 2.818.177,13	0,36%	-	0,00%		
20	Aseo y disposición final	10/02/2023	5/06/2023	$ -	0,00%	-	0,00%		

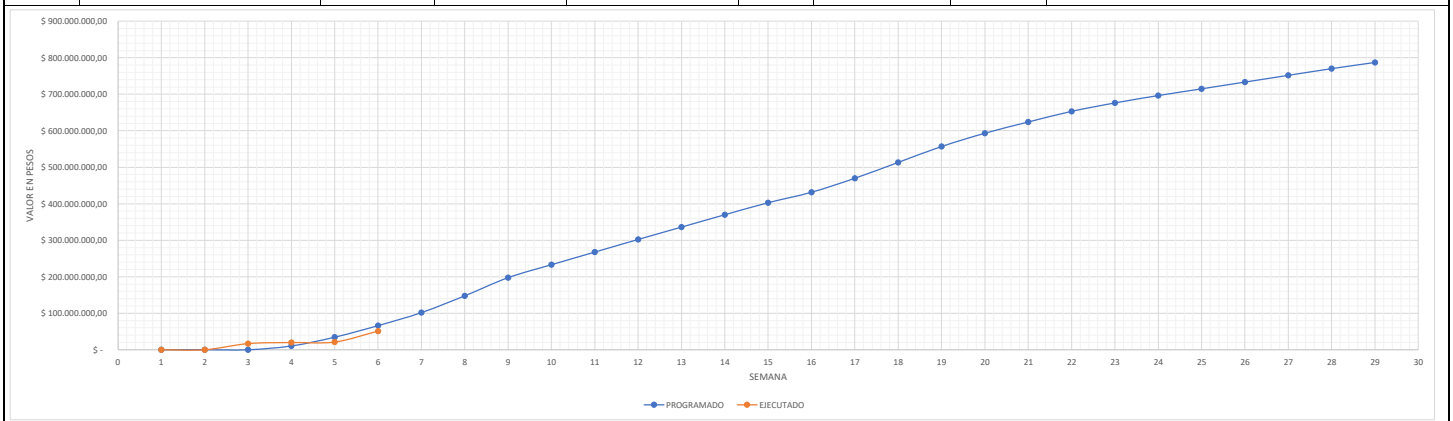


CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	7	**DEL**	domingo, 19 de febrero de 2023	**AL**	sábado, 25 de febrero de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	45	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
Colegio Floridablanca		6/02/2023	31/10/2023	$ 699.153.025,00	1,97%	$ 28.629.060,41	4,09%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	-2,13%
1	Preliminares	6/02/2023	9/02/2023	$ 13.770.561,00	1,97%	$ 28.629.060,41	4,09%	Cerramiento, demolición pavimento asfáltico, desmonte canecas de basura, limpieza y mantenimiento cárcamos	
2	Estructura	6/03/2023	13/05/2023	$ -	0,00%				
3	Mampostería	8/05/2023	31/10/2023	$ -	0,00%				
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	15/04/2023	8/05/2023	$ -	0,00%				
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	8/05/2023	8/09/2023	$ -	0,00%				
7	Pisos	6/09/2023	30/10/2023	$ -	0,00%				
9	Carpintería metálica	6/09/2023	30/10/2023	$ -	0,00%				
13	Pañete y pintura	19/05/2023	14/08/2023	$ -	0,00%				
16	Obras exteriores	6/03/2023	29/06/2023	$ -	0,00%				
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	18/07/2023	22/09/2023	$ -	0,00%				
20	Aseo y disposición final	13/05/2023	31/10/2023	$ -	0,00%				

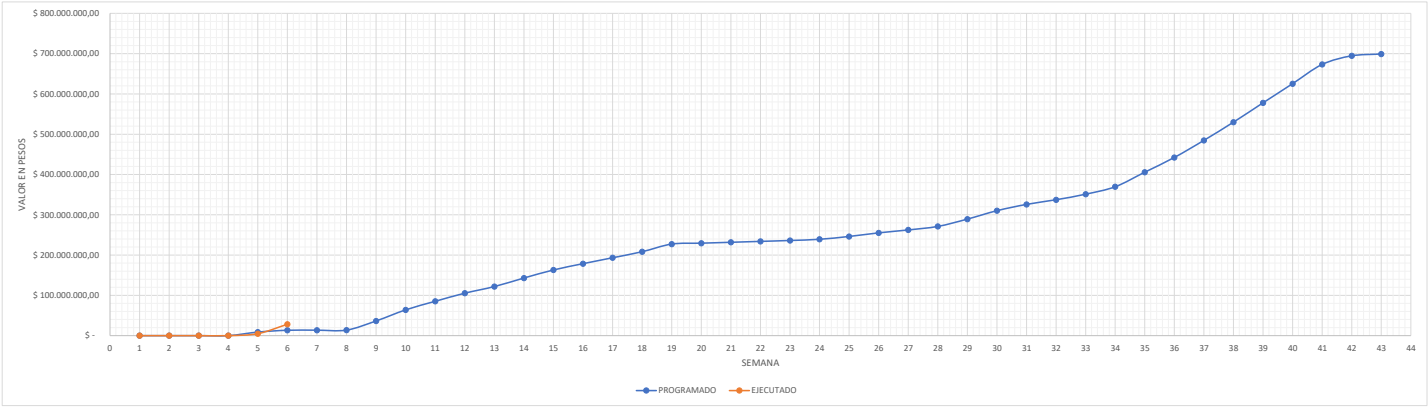

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
Colegio Miguel Antonio Caro		7/02/2023	15/07/2023	$ 75.339.260,00	14,12%	$ 11.419.817,76	15,16%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	-1,04%
1	Preliminares	7/02/2023	2/05/2023	$ 10.637.824,91	14,12%	$ 6.617.176,36	8,78%	Cerramiento, demolición placa, excavación manual, relleno en recebo	
2	Estructura	11/04/2023	15/07/2023	$ -	0,00%	$ 2.513.979,57	3,34%		
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	16/05/2023	19/06/2023	$ -	0,00%	$ 2.288.661,83	3,04%	Instalación de tubería	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	24/04/2023	8/06/2023	$ -	0,00%				
7	Pisos	27/04/2023	12/05/2023	$ -	0,00%				
16	Obras exteriores	11/04/2023	9/05/2023	$ -	0,00%				
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	20/03/2023	12/06/2023	$ -	0,00%				
20	Aseo y disposición final	7/03/2023	12/07/2023	$ -	0,00%				

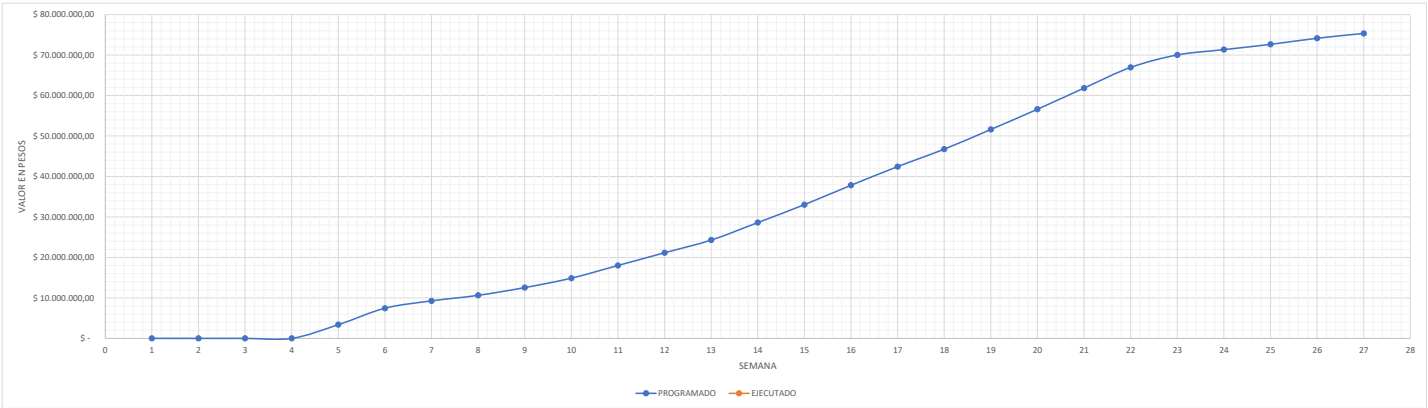


CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	7	**DEL**	domingo, 19 de febrero de 2023	**AL**	sábado, 25 de febrero de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	45	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
	Colegio Justo Víctor Charry	13/02/2023	15/07/2023	$ 369.424.312,00	0,63%	$ -	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,63%
1	Preliminares	13/02/2023	8/04/2023	$ 2.337.102,03	0,63%	$ -	0,00%		
3	Mampostería	31/03/2023	8/04/2023	$ -	0,00%				
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	27/06/2023	10/07/2023	$ -	0,00%				
7	Pisos	27/04/2023	1/05/2023	$ -	0,00%				
8	Mampostería seca	4/04/2023	26/04/2023	$ -	0,00%				
9	Carpintería metálica	27/04/2023	14/06/2023	$ -	0,00%				
11	Aparatos sanitarios y accesorios	27/04/2023	25/05/2023	$ -	0,00%				
12	Aparatos y equipos especiales	20/05/2023	23/06/2023	$ -	0,00%				
13	Pañete y pintura	17/05/2023	26/06/2023	$ -	0,00%				
15	Cerraduras, vidrios y espejos	27/06/2023	1/07/2023	$ -	0,00%				
20	Aseo y disposición final	10/04/2023	15/07/2023	$ -	0,00%				

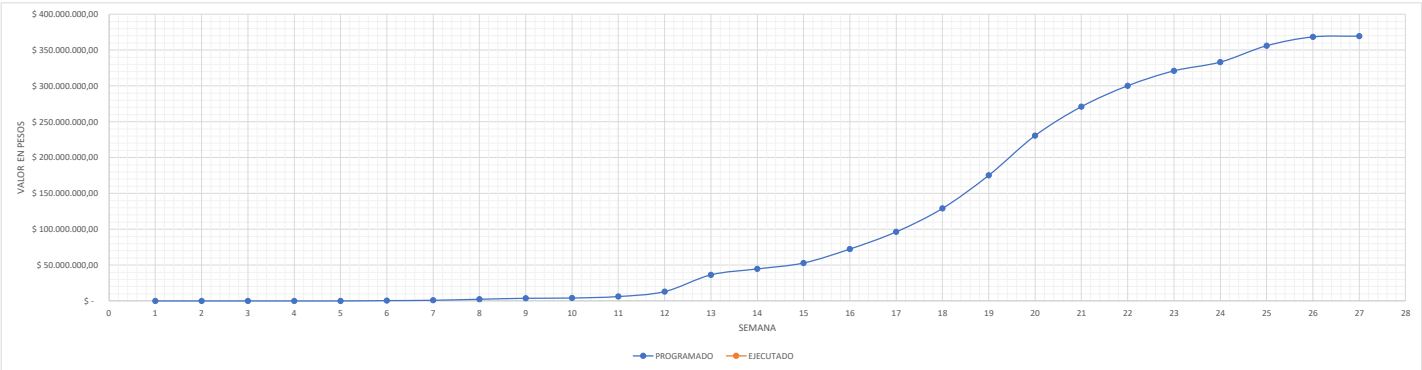

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
	Colegio Rafael Bernal Jiménez	25/01/2023	22/08/2023	$677.034.595	3,31%	$ 7.778.300,41	1,15%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	2,16%
1	Preliminares	7/02/2023	17/05/2023	$22.430.627	3,31%	$ 7.778.300,41	1,15%	Cerramiento en teja de zinc, demolición acabado de piso, desmonte de puertas, ventanas y cieloraso	
2	Estructura	23/02/2023	5/05/2023	$ -	0,00%				
3	Mampostería	1/05/2023	17/05/2023	$ -	0,00%				
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	9/03/2023	11/03/2023	$ -	0,00%				
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	10/07/2023	29/07/2023	$ -	0,00%				
7	Pisos	18/05/2023	26/07/2023	$ -	0,00%				
8	Mampostería seca	12/07/2023	20/07/2023	$ -	0,00%				
9	Carpintería metálica	6/05/2023	21/06/2023	$ -	0,00%				
11	Aparatos sanitarios y accesorios	4/07/2023	8/07/2023	$ -	0,00%				
13	Pañete y pintura	1/04/2023	25/07/2023	$ -	0,00%				
16	Obras exteriores	4/03/2023	8/07/2023	$ -	0,00%				
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	27/03/2023	8/07/2023	$ -	0,00%				
20	Aseo y disposición final	5/04/2023	29/07/2023	$ -	0,00%				

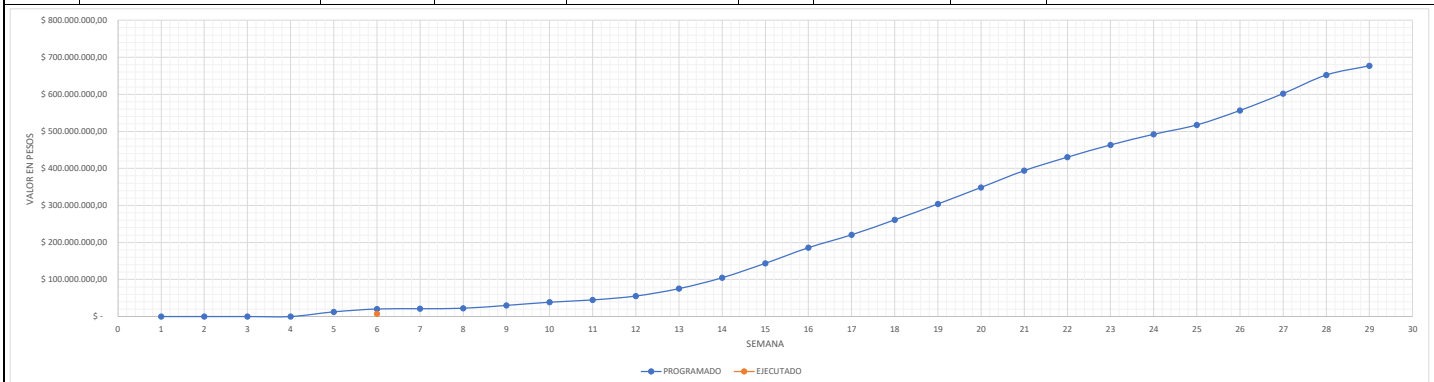


CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	7	**DEL**	domingo, 19 de febrero de 2023	**AL**	sábado, 25 de febrero de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	45	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
	Instituto técnico Juan del Corral	15/02/2023	12/09/2023	$ 524.030.444,00	0,00%	$ 8.361.689,54	1,60%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	-1,60%
1	Preliminares	15/02/2023	23/02/2023	$ -	0,00%	$ 8.361.689,54	1,60%	Cerramiento, retiro de tuberías, desmonte de cieloraso, lámparas y picado de membrana y placa.	
3	Mampostería	3/07/2023	31/07/2023	$ -	0,00%				
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	14/04/2023	4/05/2023	$ -	0,00%				
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	17/05/2023	13/06/2023	$ -	0,00%				
7	Pisos	19/06/2023	17/07/2023	$ -	0,00%				
8	Mampostería seca	17/05/2023	2/06/2023	$ -	0,00%				
13	Pañete y pintura	14/07/2023	14/08/2023	$ -	0,00%				
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	24/04/2023	17/08/2023	$ -	0,00%				
20	Aseo y disposición final	27/02/2023	8/08/2023	$ -	0,00%				

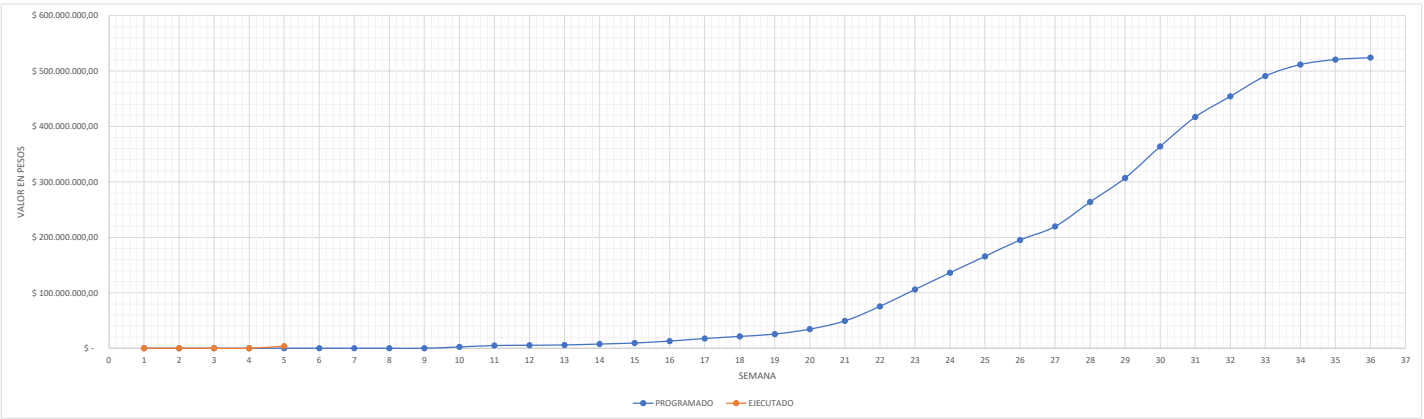

Atención de IED

Institución	Fecha inicio	Fecha terminación	Valor programado	Avance programado	Valor ejecutado	Avance ejecutado	Observaciones	Diferencia
Colegio Francisco Primero	25/01/2023	22/08/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio José Asunción Silva	15/02/2023	12/09/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Manuela Ayala de Gaitán	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio República de Colombia	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Simón Bolívar	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Nidia Quintero de Turbay	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio República de Guatemala	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio República de Panamá	10/05/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Tomás Carrasquilla	10/05/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Francisco José de Caldas, Sede B	10/05/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Robert F Kennedy	10/05/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%

Atención de emergencias

Colegio Morisco	13/01/2023	21/01/2023					
Colegio Tomas Cipriano de Mosquera	1/02/2023						
Colegio Nidia Quintero de Turbay	14/02/2023						
Colegio Thomas Carrasquilla, sede A	1/02/2023						
Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede B	28/01/2023	25/02/2023					
Colegio República de Panamá	22/02/2023						
Colegio Laureano Gómez							
Dirección Local de Engativá	8/02/2023						


PROGRAMADO					EJECUTADO				
No.	VALOR PROGRAMADO SEMANAL	%	ACUMULADO	%	No.	VALOR EJECUTADO SEMANAL	%	ACUMULADO	%
1	$ -	0,00%	$ -	0,00%	1	$ -	0,00%	$ -	0,00%
2	$ 1.270.756,93	0,01%	$ 1.270.756,93	0,01%	2	$ 9.458.499,71	0,07%	$ 9.458.499,71	0,07%
3	$ 19.951.637,75	0,14%	$ 21.222.394,68	0,15%	3	$ 31.826.160,08	0,23%	$ 41.284.659,79	0,30%
4	$ 50.914.718,24	0,36%	$ 72.137.112,92	0,52%	4	$ 33.373.547,10	0,24%	$ 74.658.206,89	0,54%
5	$ 84.783.311,22	0,61%	$ 156.920.424,14	1,12%	5	$ 33.581.581,31	0,24%	$ 108.239.788,20	0,78%
6	$ 84.520.694,84	0,61%	$ 241.441.118,98	1,73%	6	$ 94.518.500,86	0,68%	$ 202.758.289,06	1,45%
7	$ 79.994.302,15	0,57%	$ 321.435.421,13	2,30%	7	$ 21.330.068,23	0,15%	$ 224.088.357,30	1,61%
8	$ 92.371.183,17	0,66%	$ 413.806.604,30	2,97%	8	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
9	$ 188.479.295,83	1,35%	$ 602.285.900,13	4,32%	9	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
10	$ 221.475.791,25	1,59%	$ 823.761.691,38	5,90%	10	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	**CÓDIGO**	**FR-PRO-018**	
		N° VER	**F. APROB.**	**F. REV.**
		3	**7/05/2018**	**28/07/2022**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	7	**DEL**	domingo, 19 de febrero de 2023	**AL**	sábado, 25 de febrero de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	45	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

11	$ 229.916.129,85	1,65%	$ 1.053.677.821,23	7,55%	11	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
12	$ 230.178.690,91	1,65%	$ 1.283.856.512,14	9,20%	12	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
13	$ 271.119.796,10	1,94%	$ 1.554.976.308,24	11,14%	13	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
14	$ 366.181.950,98	2,62%	$ 1.921.158.259,22	13,77%	14	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
15	$ 367.035.523,66	2,63%	$ 2.288.193.782,89	16,40%	15	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
16	$ 332.730.015,04	2,38%	$ 2.620.923.797,93	18,78%	16	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
17	$ 344.526.501,67	2,47%	$ 2.965.450.299,60	21,25%	17	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
18	$ 366.678.480,99	2,63%	$ 3.332.128.780,59	23,88%	18	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
19	$ 426.272.890,32	3,05%	$ 3.758.401.670,91	26,93%	19	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
20	$ 412.873.717,83	2,96%	$ 4.171.275.388,74	29,89%	20	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
21	$ 405.169.534,01	2,90%	$ 4.576.444.922,74	32,80%	21	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
22	$ 392.991.222,20	2,82%	$ 4.969.436.144,94	35,61%	22	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
23	$ 375.982.242,70	2,69%	$ 5.345.418.387,64	38,31%	23	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
24	$ 419.622.326,39	3,01%	$ 5.765.040.714,02	41,31%	24	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
25	$ 465.646.255,54	3,34%	$ 6.230.686.969,56	44,65%	25	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
26	$ 450.087.719,92	3,23%	$ 6.680.774.689,48	47,88%	26	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
27	$ 536.994.706,78	3,85%	$ 7.217.769.396,25	51,72%	27	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
28	$ 608.167.229,41	4,36%	$ 7.825.936.625,66	56,08%	28	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
29	$ 526.201.038,42	3,77%	$ 8.352.137.664,08	59,85%	29	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
30	$ 492.479.875,17	3,53%	$ 8.844.617.539,25	63,38%	30	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
31	$ 515.904.096,64	3,70%	$ 9.360.521.635,88	67,08%	31	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
32	$ 446.416.023,11	3,20%	$ 9.806.937.658,99	70,28%	32	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
33	$ 432.360.273,39	3,10%	$ 10.239.297.932,38	73,38%	33	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
34	$ 419.606.131,94	3,01%	$ 10.658.904.064,31	76,38%	34	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
35	$ 399.476.655,36	2,86%	$ 11.058.380.719,67	79,25%	35	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
36	$ 367.282.032,37	2,63%	$ 11.425.662.752,04	81,88%	36	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
37	$ 342.604.162,91	2,46%	$ 11.768.266.914,94	84,33%	37	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
38	$ 311.411.789,16	2,23%	$ 12.079.678.704,10	86,57%	38	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
39	$ 347.906.818,49	2,49%	$ 12.427.585.522,59	89,06%	39	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
40	$ 352.630.923,00	2,53%	$ 12.780.216.445,58	91,59%	40	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
41	$ 340.785.854,77	2,44%	$ 13.121.002.300,35	94,03%	41	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
42	$ 284.197.920,80	2,04%	$ 13.405.200.221,15	96,07%	42	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
43	$ 140.525.720,50	1,01%	$ 13.545.725.941,65	97,07%	43	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
44	$ 704.475,00	0,01%	$ 13.546.430.416,65	97,08%	44	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
45	$ 407.850.465,35	2,92%	$ 13.954.280.882,00	100,00%	45	$ -	0,00%	$ 224.088.357,30	1,61%
46					46	$ -			
47					47	$ -			

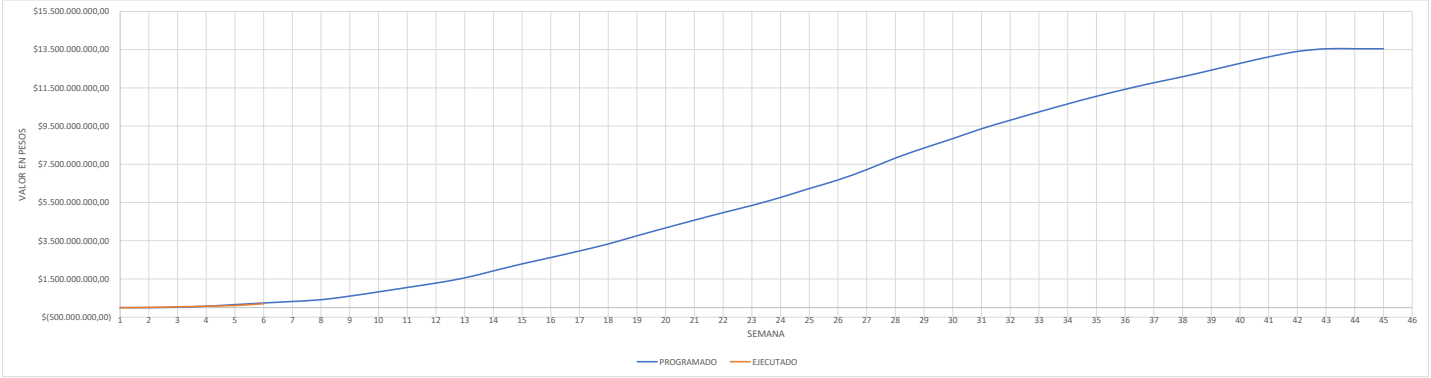

Seguimiento Ruta Critica

No.	Actividad	Fecha Programada Inicio	Fecha Inicio Real	Fecha Finalización	Tiempo de holgura	Tiempo de Ejecución	Atraso	OBSERVACIONES
1	Jorge Eliecer Gaitán	25/01/2023	19/01/2023	31/10/2023	6	285	-279	
2	Francisco José de Caldas, Sede A	25/01/2023	23/01/2023	31/10/2023	2	281	-279	
3	Garcés Navas	25/01/2023	23/01/2023	31/07/2023	2	189	-187	
4	Florida Blanca	6/02/2023	2/02/2023	31/10/2023	4	271	-267	
5	Miguel Antonio Caro	7/02/2023	7/02/2023	15/07/2023	0	158	-158	
6	Justo Víctor Charry	13/02/2023	13/02/2023	15/07/2023	0	152	-152	

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	7	**DEL**	domingo, 19 de febrero de 2023	**AL**	sábado, 25 de febrero de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	45	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

7	Rafael Bernal Jiménez	25/01/2023	8/02/2023	22/08/2023	-14	195	-209	
8	Juan del Corral	15/02/2023	8/02/2023	12/09/2023	7	216	-209	
9	Francisco Primero	24/03/2023	24/03/2023	22/08/2023	0	151	-151	
10	José Asunción Silva	24/03/2023	24/03/2023	12/09/2023	0	172	-172	
11	Manuela Ayala de Gaitán	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
12	República de Colombia	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
13	Simón Bolívar	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
14	Nidia Quintero de Turbay	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
15	República de Guatemala	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
16	República de Panamá	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
17	Tomás Carrasquilla	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
18	Francisco José de Caldas, Sede B	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
19	Robert F Kennedy	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

En Bogotá, a los once (11) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023), se firma acta de inicio entre Jorge Gómez Falla, en calidad de Representante de Consorcio Intercolegios 2022, como Interventor, y Miguel Alexander Cerón Molina, en calidad de representante legal de Safrid Ingeniería S.A.S como Contratista.

Aspecto Financiero

A la fecha del presente informe no se han tramitado actas de pago tanto en el contrato de obra como en el contrato de interventoría.

Aspecto Técnico

En el periodo comprendido del presente informe el contratista realizó las siguientes actividades:

Colegio Jorge Eliecer Gaitán:



Pañete en muro lateral cancha



Demolición de muro para ventanas



Filos en ventanas

Colegio Francisco José de Caldas, Sede A:



Pañete en muro culata pasillo de segundo piso



Filos en ventanas de aulas




Pañete en área de tablero de aulas

Colegio Garcés Navas






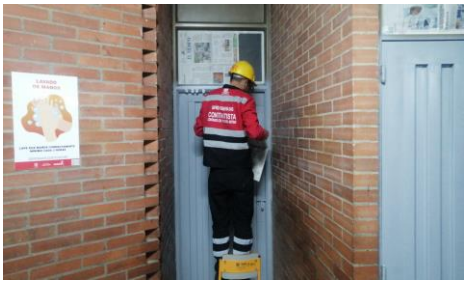

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	7	**DEL**	domingo, 19 de febrero de 2023	**AL**	sábado, 25 de febrero de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	45	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

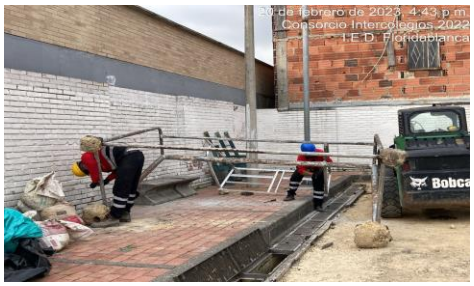Pintura en carpintería metálica	Pintura en carpintería metálica / actividad nocturna	Pintura en carpintería metálica / actividad nocturna
Colegio Floridablanca		
		
Mantenimiento de arcos	Protección parte de cancha	Mantenimiento de arcos
Colegio Juan del Corral		
		
Trasiego de escombro a sitio de acopio	Arreglo de tubería en bajante de terraza comedor	Desmonte de tubería hidrosanitaria
Colegio Rafael Bernal Jiménez		
		
Recubrimiento cárcamos en lona	Picado de piso en área de pasillo salón de Karate	Preparación e instalación de mortero alistado en placa salón de karate
Colegio Miguel Antonio Caro		
		
Excavación manual para tubería	Excavación manual para caja de paso	Relleno de material en área de excavación
Comité de obra		

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	7	**DEL**	domingo, 19 de febrero de 2023	**AL**	sábado, 25 de febrero de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	45	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		



Recorrido de obra Floridablanca



Comité semanal de obra



Comité semanal de obra

En cumplimiento de sus funciones esta interventoría realiza:

Control y seguimiento a los procesos constructivos realizados en los frentes de obra, así mismo, verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas del caso.
Requerimiento a contratista de obra de documentos, conceptos, fichas de calidad, manual de garantías y demás material que permita verificar los trabajos ejecutados en aras de cumplir con objeto contractual.
Visitas técnicas en atención a emergencias presentadas en la localidad de Engativá y Barrios Unidos informadas por la Secretaría de Educación Distrital.
Verificación de cumplimiento de todas la obligaciones contenidas dentro del contrato de obra.

Aspecto SST-Ambiental

Se realiza control y seguimiento sobres los aspectos e impactos ambientales a fin de establecer las acciones pertinentes para reducir, mitigar y corregir dichos impactos.
Se verifica en obra las actividades, aspectos y controles en materia de Seguridad y salud en el trabajo, con el fin de establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir riesgos existentes.

Aspecto Social

El día 21 de febrero de 2023 se realiza comité semanal de obra en instalaciones de IED Floridablanca y socialización en colegio San José Norte.

Aspecto PMT

N/A

Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación

Información Meteorológica

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
20/02/2023	7:00 am 5:00 pm	0
21/02/2023	7:00 am 5:00 pm	1
22/02/2023	7:00 am 5:00 pm	0
23/02/2023	7:00 am 5:00 pm	0
24/02/2023	7:00 am 5:00 pm	0
25/02/2023	7:00 am 12:00 pm	0



V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• Colegio Jorge Eliecer Gaitán: Pañete, filos, fundida de alistado sobre placa y desmonte de cubierta.
• Colegio Francisco José de Caldas: Filos en ventanas y puertas, pañete en tableros y guardaescobas, retiro de escombros.
• Colegio Garcés Navas: Pintura en carpintería metálica, desmonte de cielo raso.
• Colegio Floridablanca: Excavación a máquina en canchas múltiples, mantenimiento de arcos.
• Colegio Juan del Corral: Demolición placa biblioteca.
• Colegio Rafael Bernal Jiménez: Alistado de piso salón de karate.
• Colegio Miguel Antonio Caro: Fundición placa de contrapiso.
• Colegio Justo Víctor Charry: Apertura de frente de obra, actividades preliminares.

VI. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

• De acuerdo con el presente informe, a la fecha se presenta un avance general ejecutado de 1,61%, con base en la programación presentada un avance general programado de 2,30%, teniendo una diferencia de 0,70% en el contrato.
• En atención a emergencias se continúa con intervención de:
  - Nydia Quintero de Turbay IED con instalación de perfilería y geomembrana en tanque.
  - Colegio República de Panamá, sede C con desmonte de equipos en cuarto de máquinas e instalación de hidroacumulador nuevo.
• De acuerdo con la programación de obra, el colegio Justo Víctor Charry contaba con fecha de inicio 13 de febrero de 2023, sin embargo, a la fecha se encuentra pendiente por ejecución de actividades en frente de trabajo.
Interventoría se encuentra a la espera de conceptos de especialistas por parte de contratista de obra en las instituciones que lo requieren a fin de continuar con las actividades establecidas.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
•Teniendo en cuenta las directrices estipuladas y manifestadas por la Secretaria de Educación del Distrito, se insta a contratista de obra efectuar las actividades acorde a lo requerido por la entidad, así mismo, considerar el balance presupuestal actualizado para evitar afectaciones al contrato. •Se solicita de las buenas gestiones por parte del contratista de obra para realizar las actividades acorde a lo planteado en la programación, esto en aras de evitar incurrir en atrasos y posibles incumplimientos. •Se verifica en obra que el personal cumpla con los requisitos mínimos establecidos, del mismo modo, se inspecciona acerca del adecuado uso del equipo de protección personal pertinente en todo el personal, esto en aras de evitar accidentes laborales. •Se notifica a contratista de obra que la entrega de la información es indispensable para la validación y aprobación de los conceptos por parte de la interventoría, por tal razón, los tiempos de demora en la entrega de la documentación solicitada, son imputables al contratista de obra.	FREDY GIOVANNI RODRIGUEZ SALAZAR

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada	Fanny Almanzar/ Mileth Escalante	Liliana Sánchez / Guillermo Narváez
CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS	CARGO: COORDINADOR GESTIÓN INTEGRAL/PROFESIONAL GESTIÓN INTEGRAL	CARGO: SUBGERENTE/ GERENTE
Vobo.	Vobo.	Vobo.
