CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	8	**DEL**	lunes, 20 de febrero de 2023	**AL**	sábado, 4 de marzo de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	52	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista	Safrid Ingeniería SAS	**Interventor**	Consorcio Inter colegios 2022
Contrato No.	CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022
Fecha de suscripción del contrato	jueves, 6 de octubre de 2022	**Fecha de suscripción del contrato**	jueves, 24 de noviembre de 2022
Valor Inicial	$13,954,280,882.00	**Valor Inicial**	$ 951,138,738.00
Plazo Inicial	12 meses	**Plazo Inicial**	13 meses
Plazo Actualizado	12 meses	**Plazo Actualizado**	13 meses
Fecha de Iniciación	miércoles, 11 de enero de 2023	**Fecha de Iniciación**	jueves, 22 de diciembre de 2022
Fecha de Terminación*	miércoles, 10 de enero de 2024	**Fecha de Terminación**	domingo, 21 de enero de 2024
No póliza contrato de obra	14-44-101164899	**No póliza contrato de interventoría**	NB-100235369
Fecha aprobación	viernes, 14 de octubre de 2022	**Fecha aprobación**	martes, 29 de noviembre de 2022


* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
AMPARO	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**	**AMPARO**	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**
Cumplimiento del contrato	06/10/2022 - 06/04/2024	$ 2,790,856,176.40	Cumplimiento	25/11/2022 - 25/06/2024	$ 190,227,747.60
Estabilidad y Calidad de la obra	06/10/2023 - 06/10/2025	$ 2,790,856,176.40	Pago salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales	25/11/2022 - 25/12/2026	$ 47,556,936.90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	06/10/2022 - 06/10/2026	$ 1,395,458,088.20	Calidad del servicio	25/12/2023 - 25/12/2028	$ 190,227,747.60
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	06/10/2022 - 06/10/2023	$ 697,714,044.10			

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
	Colegio Jorge Eliecer Gaitán	25/01/2023	31/10/2023	$ 2,024,236,834.00	7.54%	$ 56,359,971.23	2.72%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 4.81%
1	Preliminares	25/01/2023	30/08/2023	$ 152,575,764.75	7.54%	$ 48,854,615.85	2.41%	Demolición de pisos, muros, enchape, desmonte de rejas de ventanas metálicas, puertas de baños, desmonte de aparatos sanitarios
2	Estructura	17/06/2023	23/09/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%	
3	Mampostería	13/10/2023	4/08/2023	$ -	0.00%	$ 78,769.56	0.00%	Muro divisorio en bloque
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	2/08/2023	20/09/2023	$ -	0.00%	$ 1,232,662.13	0.00%	Suministro e instalación de tubería hidrosanitaria
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	20/06/2023	28/10/2023	$ -	0.00%	-	0.00%	
7	Pisos	20/06/2023	28/10/2023	$ -	0.00%	$ 2,248,961.92	0.11%	Alistado de pisos
9	Carpintería metálica	14/03/2023	2/09/2023	$ -	0.00%	-	0.00%	
11	Aparatos sanitarios y accesorios	29/08/2023	6/09/2023	$ -	0.00%	-	0.00%	
12	Aparatos y equipos especiales	7/09/2023	23/09/2023	$ -	0.00%	-	0.00%	
13	Pañete y pintura	5/04/2023	6/11/2023	$ -	0.00%	$ 3,944,961.78	0.19%	Aplicación de pañete
16	Obras exteriores	5/07/2023	19/09/2023	$ -	0.00%	-	0.00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	24/03/2023	19/06/2023	$ -	0.00%	-	0.00%	
20	Aseo y disposición final	29/08/2023	31/10/2023	$ -	0.00%	-	0.00%	

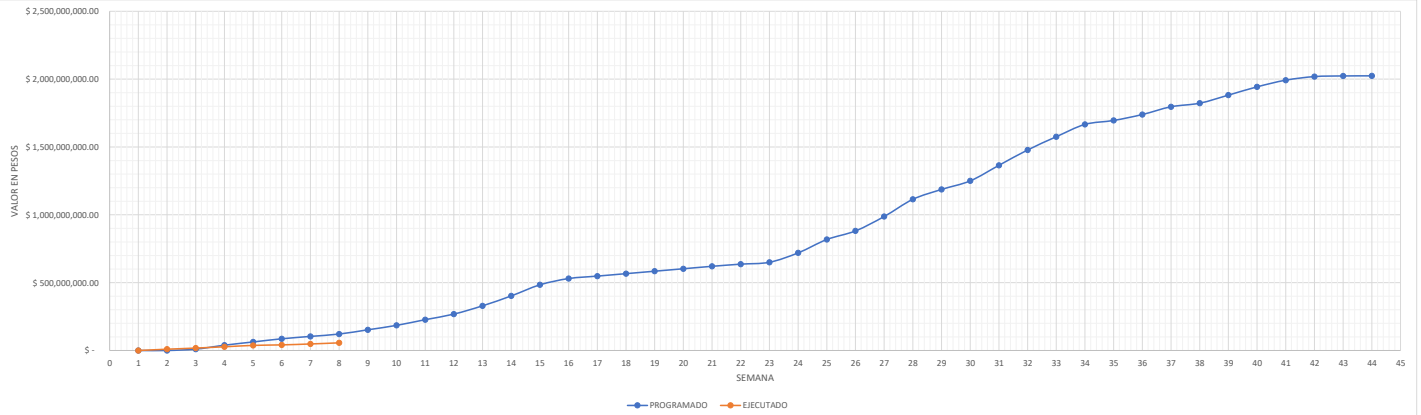


CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	8	**DEL**	lunes, 20 de febrero de 2023	**AL**	sábado, 4 de marzo de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	52	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
Colegio Francisco José de Caldas, Sede A		25/01/2023	31/10/2023	$ 1,962,546,144.54	8.64%	$ 73,949,783.14	3.77%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	4.87%
1	Preliminares	25/01/2023	31/10/2023	$ 169,524,399.16	8.64%	$ 56,900,867.31	2.90%	Desmonte de puertas, ventanas, cieloraso, demolición de pisos, enchape, muros	
2	Estructura	4/03/2023	23/09/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
3	Mampostería	23/03/2023	29/07/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	14/04/2023	20/09/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	13/05/2023	28/10/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
7	Pisos	27/02/2023	28/10/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
9	Carpintería metálica	17/04/2023	17/08/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
13	Pañete y pintura	22/03/2023	20/09/2023	$ -	0.00%	$17,048,916	0.87%	Pañete en muros y filos en ventanas	
16	Obras exteriores	1/09/2023	31/10/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	13/03/2023	26/09/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
20	Aseo y disposición final	20/04/2023	31/10/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		

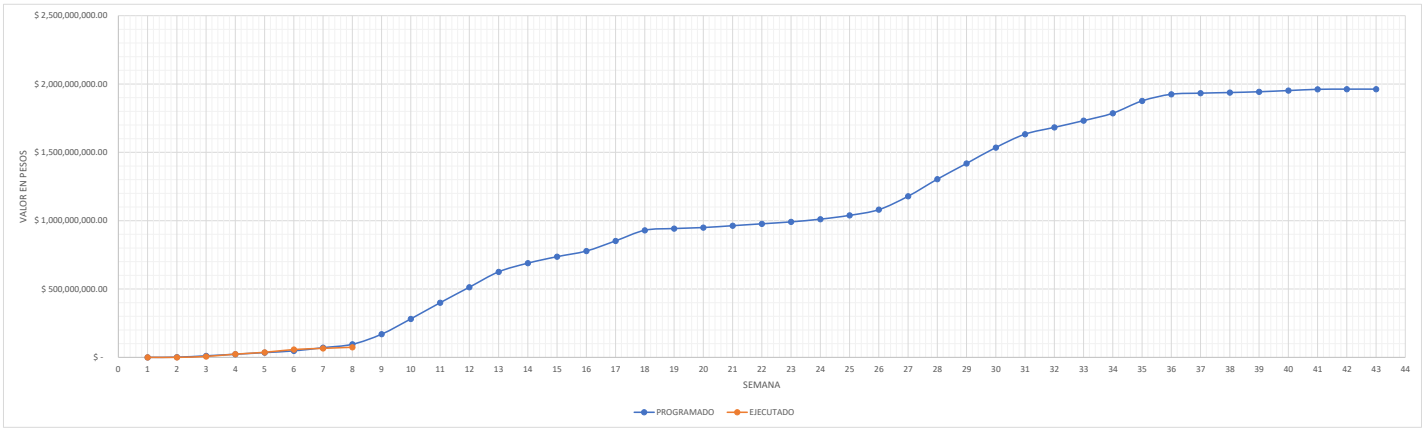

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
Colegio Garcés Navas		1/02/2023	31/07/2023	$ 787,083,405.50	25.09%	$ 54,314,234.80	6.90%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	18.19%
1	Preliminares	1/02/2023	3/05/2023	$ 96,996,287.18	12.32%	$ 54,314,234.80	6.90%	Pintura en carpintería metálica, desmonte de cieloraso, lámparas y cableado eléctrico	
2	Estructura	8/04/2023	19/04/2023	$ -	0.00%	-	0.00%		
3	Mampostería	4/03/2023	15/03/2023	$ 6,208,415.00	0.79%	-	0.00%		
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	13/03/2023	24/05/2023	$ -	0.00%	-	0.00%		
11	Aparatos sanitarios y accesorios	25/05/2023	27/05/2023	$ -	0.00%	-	0.00%		
13	Pañete y pintura	20/04/2023	13/06/2023	$ -	0.00%	-	0.00%		
16	Obras exteriores	4/05/2023	20/05/2023	$ -	0.00%	-	0.00%		
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	3/02/2023	29/07/2023	$ 94,260,608.68	11.98%	-	0.00%		
20	Aseo y disposición final	10/02/2023	5/06/2023	$ -	0.00%	-	0.00%		

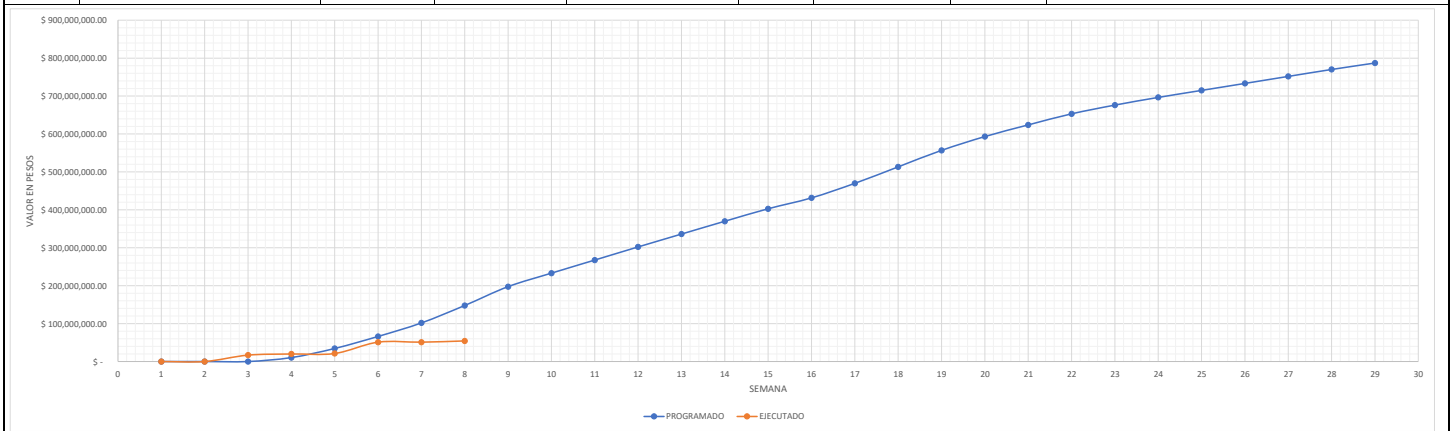


CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	8	**DEL**	lunes, 20 de febrero de 2023	**AL**	sábado, 4 de marzo de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	52	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
Colegio Floridablanca		6/02/2023	31/10/2023	$ 699,153,025.00	5.21%	$ 28,892,819.47	4.13%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	1.08%
1	Preliminares	6/02/2023	9/02/2023	$ 36,453,155.54	5.21%	$ 28,892,819.47	4.13%	Cerramiento, demolición pavimento asfáltico, desmonte canecas de basura, limpieza y mantenimiento cárcamos.	
2	Estructura	6/03/2023	13/05/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
3	Mampostería	8/05/2023	31/10/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	15/04/2023	8/05/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	8/05/2023	8/09/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
7	Pisos	6/09/2023	30/10/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
9	Carpintería metálica	6/09/2023	30/10/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
13	Pañete y pintura	19/05/2023	14/08/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
16	Obras exteriores	6/03/2023	29/06/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	18/07/2023	22/09/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
20	Aseo y disposición final	13/05/2023	31/10/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		

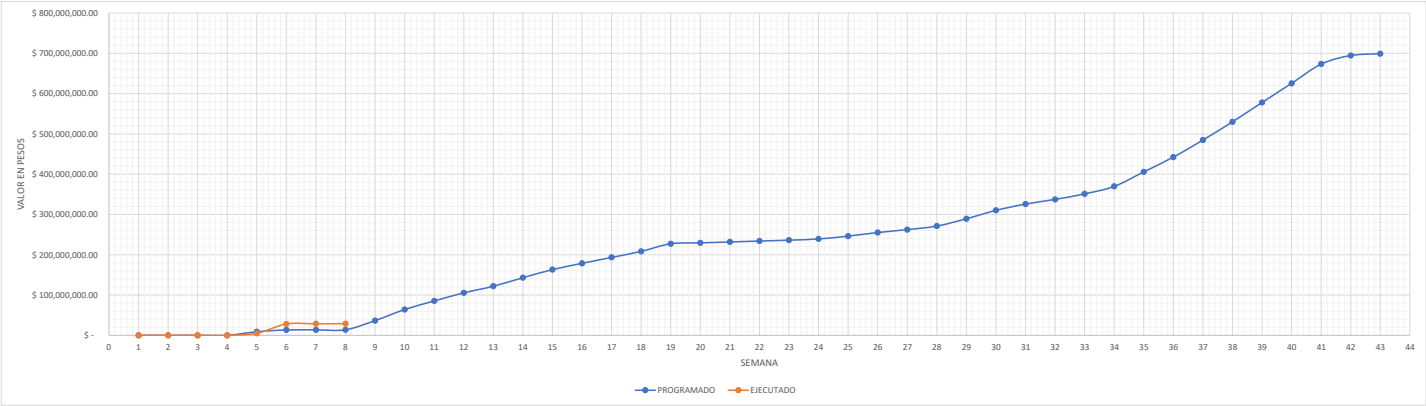

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
Colegio Miguel Antonio Caro		7/02/2023	15/07/2023	$ 75,339,260.00	16.66%	$ 16,202,948.75	21.51%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	-4.85%
1	Preliminares	7/02/2023	2/05/2023	$ 12,548,502.71	16.66%	$ 9,585,200.58	12.72%	Cerramiento, demolición placa, excavación manual, relleno en recebo	
2	Estructura	11/04/2023	15/07/2023	$ -	0.00%	$ 3,311,106.08	4.39%	Excavación manual	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	16/05/2023	19/06/2023	$ -	0.00%	$ 3,265,528.93	4.33%	Instalación de tubería PVC alcantarillado 4"	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	24/04/2023	8/06/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
7	Pisos	27/04/2023	12/05/2023	$ -	0.00%	$ 41,113.16	0.05%	Concreto de limpieza para caja de inspección	
16	Obras exteriores	11/04/2023	9/05/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	20/03/2023	12/06/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
20	Aseo y disposición final	7/03/2023	12/07/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		

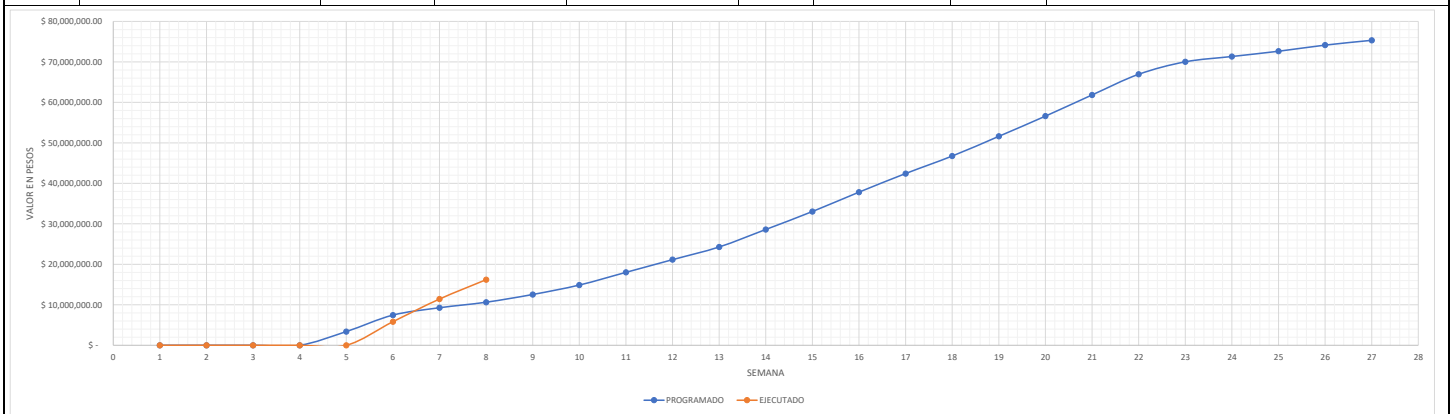


CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	8	**DEL**	lunes, 20 de febrero de 2023	**AL**	sábado, 4 de marzo de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	52	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
	Colegio Justo Víctor Charry	13/02/2023	15/07/2023	$ 369,424,312.00	1.00%	$ 2,476,855.51	0.67%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0.33%
1	Preliminares	13/02/2023	8/04/2023	$ 3,698,024.61	1.00%	$ 2,476,855.51	0.67%	Demolición de muros, enchape, desmonte de aparatos sanitarios, puertas	
3	Mampostería	31/03/2023	8/04/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	27/06/2023	10/07/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
7	Pisos	27/04/2023	1/05/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
8	Mampostería seca	4/04/2023	26/04/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
9	Carpintería metálica	27/04/2023	14/06/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
11	Aparatos sanitarios y accesorios	27/04/2023	25/05/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
12	Aparatos y equipos especiales	20/05/2023	23/06/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
13	Pañete y pintura	17/05/2023	26/06/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
15	Cerraduras, vidrios y espejos	27/06/2023	1/07/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
20	Aseo y disposición final	10/04/2023	15/07/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		

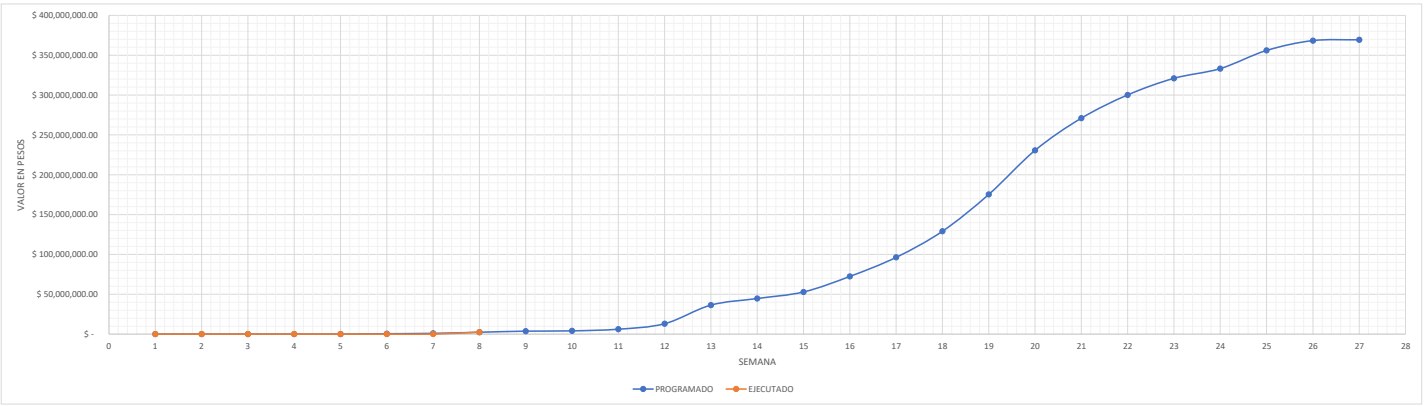

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
	Colegio Rafael Bernal Jiménez	25/01/2023	22/08/2023	$ 677,034,595.00	4.43%	$ 10,890,076.81	1.61%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	2.83%
1	Preliminares	7/02/2023	17/05/2023	$ 27,808,841.69	4.11%	$ 10,890,076.81	1.61%	Cerramiento en teja de zinc, demolición acabado de piso, desmonte de puertas, ventanas y cieloraso	
2	Estructura	23/02/2023	5/05/2023	$ 2,211,900.81	0.33%	$ -	0.00%		
3	Mampostería	1/05/2023	17/05/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	9/03/2023	11/03/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	10/07/2023	29/07/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
7	Pisos	18/05/2023	26/07/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
8	Mampostería seca	12/07/2023	20/07/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
9	Carpintería metálica	6/05/2023	21/06/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
11	Aparatos sanitarios y accesorios	4/07/2023	8/07/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
13	Pañete y pintura	1/04/2023	25/07/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
16	Obras exteriores	4/03/2023	8/07/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	27/03/2023	8/07/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
20	Aseo y disposición final	5/04/2023	29/07/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		

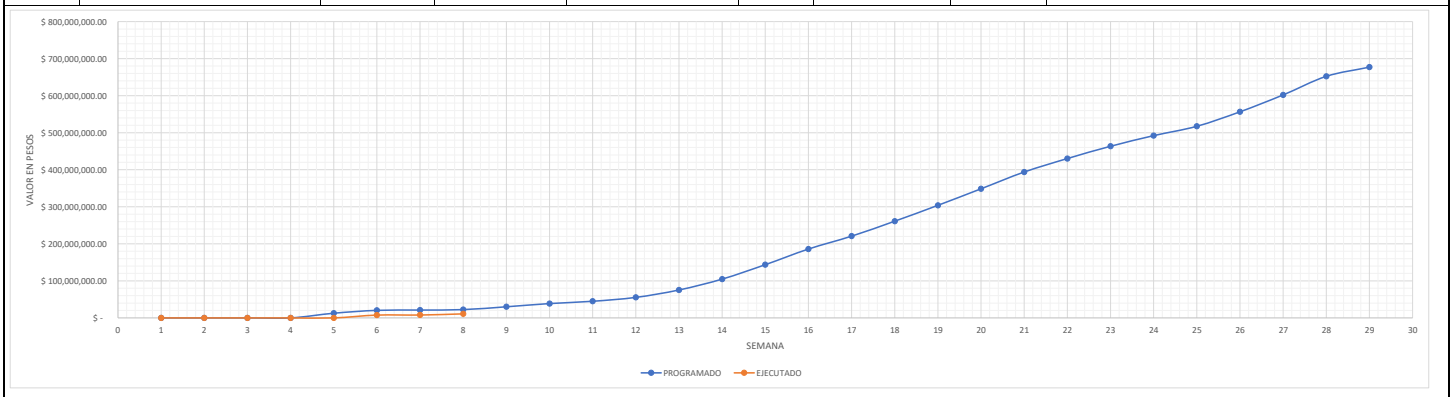


CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	8	**DEL**	lunes, 20 de febrero de 2023	**AL**	sábado, 4 de marzo de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	52	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
	Instituto técnico Juan del Corral	15/02/2023	12/09/2023	$ 524,030,444.00	0.00%	$ 18,300,631.39	2.84%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	-2.84%
1	Preliminares	15/02/2023	23/02/2023	$ -	0.00%	$ 14,885,619.16	2.84%	Cerramiento, retiro de tuberías, desmonte de cieloraso, lámparas y picado de membrana y placa.	
3	Mampostería	3/07/2023	31/07/2023	$ -	0.00%	$ 802,199.12	0.15%	Anclajes varillas	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	14/04/2023	4/05/2023	$ -	0.00%	$ 2,612,813.11	0.50%	Suministro e instalación de tubería	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	17/05/2023	13/06/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
7	Pisos	19/06/2023	17/07/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
8	Mampostería seca	17/05/2023	2/06/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
13	Pañete y pintura	14/07/2023	14/08/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	24/04/2023	17/08/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
20	Aseo y disposición final	27/02/2023	8/08/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		

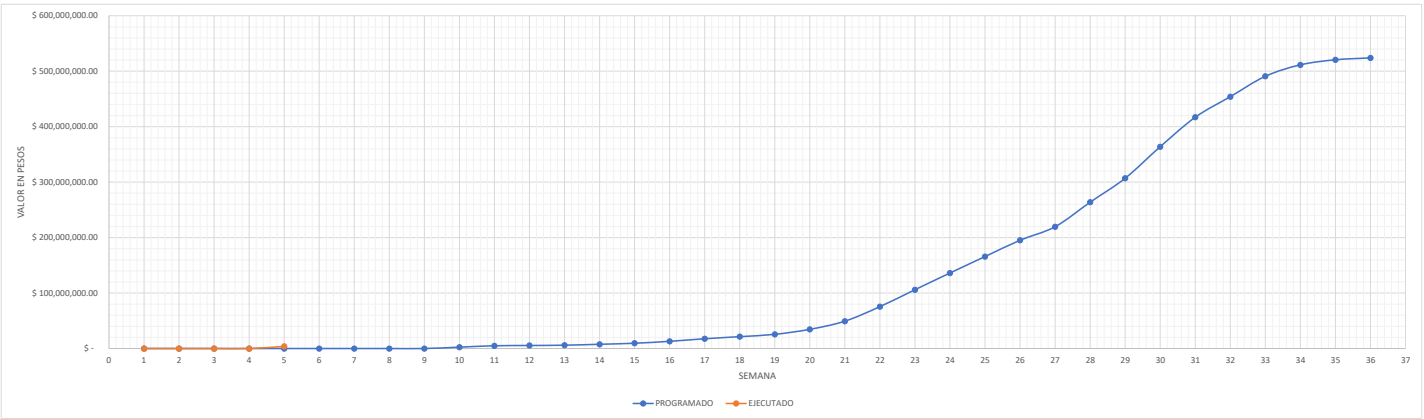

Atención de IED

Institución	Fecha inicio	Fecha terminación	Valor programado	Avance programado	Valor ejecutado	Avance ejecutado	Observaciones	Diferencia
Colegio Francisco Primero	25/01/2023	22/08/2023	-		-	0.00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0.00%
Colegio José Asunción Silva	15/02/2023	12/09/2023	-		-	0.00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0.00%
Colegio Manuela Ayala de Gaitán	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0.00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0.00%
Colegio República de Colombia	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0.00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0.00%
Colegio Simón Bolívar	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0.00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0.00%
Colegio Nidia Quintero de Turbay	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0.00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0.00%
Colegio República de Guatemala	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0.00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0.00%
Colegio República de Panamá	10/05/2023	31/10/2023	-		-	0.00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0.00%
Colegio Tomás Carrasquilla	10/05/2023	31/10/2023	-		-	0.00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0.00%
Colegio Francisco José de Caldas, Sede B	10/05/2023	31/10/2023	-		-	0.00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0.00%
Colegio Robert F Kennedy	10/05/2023	31/10/2023	-		-	0.00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0.00%

Atención de emergencias

Colegio Morisco	13/01/2023	21/01/2023					
Colegio Tomas Cipriano de Mosquera	1/02/2023						
Colegio Nidia Quintero de Turbay	14/02/2023	3/03/2023					
Colegio Thomas Carrasquilla, sede A	1/02/2023						
Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede B	28/01/2023	25/02/2023					
Colegio República de Panamá	22/02/2023	4/03/2023					
Colegio Laureano Gómez							
Dirección Local de Engativá	8/02/2023						

PROGRAMADO

No.	VALOR PROGRAMADO SEMANAL	%	ACUMULADO	%
1	$ -	0.00%	$ -	0.00%
2	$ 1,270,756.93	0.01%	$ 1,270,756.93	0.01%
3	$ 19,951,637.75	0.14%	$ 21,222,394.68	0.15%
4	$ 50,914,718.24	0.36%	$ 72,137,112.92	0.52%
5	$ 84,783,311.22	0.61%	$ 156,920,424.14	1.12%
6	$ 84,520,694.84	0.61%	$ 241,441,118.98	1.73%
7	$ 79,994,302.15	0.57%	$ 321,435,421.13	2.30%
8	$ 92,371,183.17	0.66%	$ 413,806,604.30	2.97%
9	$ 188,479,295.83	1.35%	$ 602,285,900.13	4.32%
10	$ 221,475,791.25	1.59%	$ 823,761,691.38	5.90%
11	$ 229,916,129.85	1.65%	$ 1,053,677,821.23	7.55%
12	$ 230,178,690.91	1.65%	$ 1,283,856,512.14	9.20%
13	$ 271,119,796.10	1.94%	$ 1,554,976,308.24	11.14%

EJECUTADO


No.	VALOR EJECUTADO SEMANAL	%	ACUMULADO	%
1	$ -	0.00%	$ -	0.00%
2	$ 9,458,499.71	0.07%	$ 9,458,499.71	0.07%
3	$ 31,826,160.08	0.23%	$ 41,284,659.79	0.30%
4	$ 33,373,547.10	0.24%	$ 74,658,206.89	0.54%
5	$ 33,581,581.31	0.24%	$ 108,239,788.20	0.78%
6	$ 94,518,500.86	0.68%	$ 202,758,289.06	1.45%
7	$ 22,218,182.48	0.16%	$ 224,976,471.55	1.61%
8	$ 40,324,809.10	0.29%	$ 265,301,280.65	1.90%
9	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
10	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
11	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
12	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
13	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	8	**DEL**	lunes, 20 de febrero de 2023	**AL**	sábado, 4 de marzo de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	52	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

14	$ 366,181,950.98	2.62%	$ 1,921,158,259.22	13.77%	14	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
15	$ 367,035,523.66	2.63%	$ 2,288,193,782.89	16.40%	15	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
16	$ 332,730,015.04	2.38%	$ 2,620,923,797.93	18.78%	16	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
17	$ 344,526,501.67	2.47%	$ 2,965,450,299.60	21.25%	17	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
18	$ 366,678,480.99	2.63%	$ 3,332,128,780.59	23.88%	18	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
19	$ 426,272,890.32	3.05%	$ 3,758,401,670.91	26.93%	19	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
20	$ 412,873,717.83	2.96%	$ 4,171,275,388.74	29.89%	20	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
21	$ 405,169,534.01	2.90%	$ 4,576,444,922.74	32.80%	21	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
22	$ 392,991,222.20	2.82%	$ 4,969,436,144.94	35.61%	22	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
23	$ 375,982,242.70	2.69%	$ 5,345,418,387.64	38.31%	23	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
24	$ 419,622,326.39	3.01%	$ 5,765,040,714.02	41.31%	24	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
25	$ 465,646,255.54	3.34%	$ 6,230,686,969.56	44.65%	25	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
26	$ 450,087,719.92	3.23%	$ 6,680,774,689.48	47.88%	26	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
27	$ 536,994,706.78	3.85%	$ 7,217,769,396.25	51.72%	27	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
28	$ 608,167,229.41	4.36%	$ 7,825,936,625.66	56.08%	28	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
29	$ 526,201,038.42	3.77%	$ 8,352,137,664.08	59.85%	29	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
30	$ 492,479,875.17	3.53%	$ 8,844,617,539.25	63.38%	30	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
31	$ 515,904,096.64	3.70%	$ 9,360,521,635.88	67.08%	31	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
32	$ 446,416,023.11	3.20%	$ 9,806,937,658.99	70.28%	32	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
33	$ 432,360,273.39	3.10%	$ 10,239,297,932.38	73.38%	33	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
34	$ 419,606,131.94	3.01%	$ 10,658,904,064.31	76.38%	34	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
35	$ 399,476,655.36	2.86%	$ 11,058,380,719.67	79.25%	35	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
36	$ 367,282,032.37	2.63%	$ 11,425,662,752.04	81.88%	36	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
37	$ 342,604,162.91	2.46%	$ 11,768,266,914.94	84.33%	37	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
38	$ 311,411,789.16	2.23%	$ 12,079,678,704.10	86.57%	38	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
39	$ 347,906,818.49	2.49%	$ 12,427,585,522.59	89.06%	39	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
40	$ 352,630,923.00	2.53%	$ 12,780,216,445.58	91.59%	40	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
41	$ 340,785,854.77	2.44%	$ 13,121,002,300.35	94.03%	41	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
42	$ 284,197,920.80	2.04%	$ 13,405,200,221.15	96.07%	42	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
43	$ 140,525,720.50	1.01%	$ 13,545,725,941.65	97.07%	43	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
44	$ 704,475.00	0.01%	$ 13,546,430,416.65	97.08%	44	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%
45	$ 407,850,465.35	2.92%	$ 13,954,280,882.00	100.00%	45	$ -	0.00%	$ 265,301,280.65	1.90%

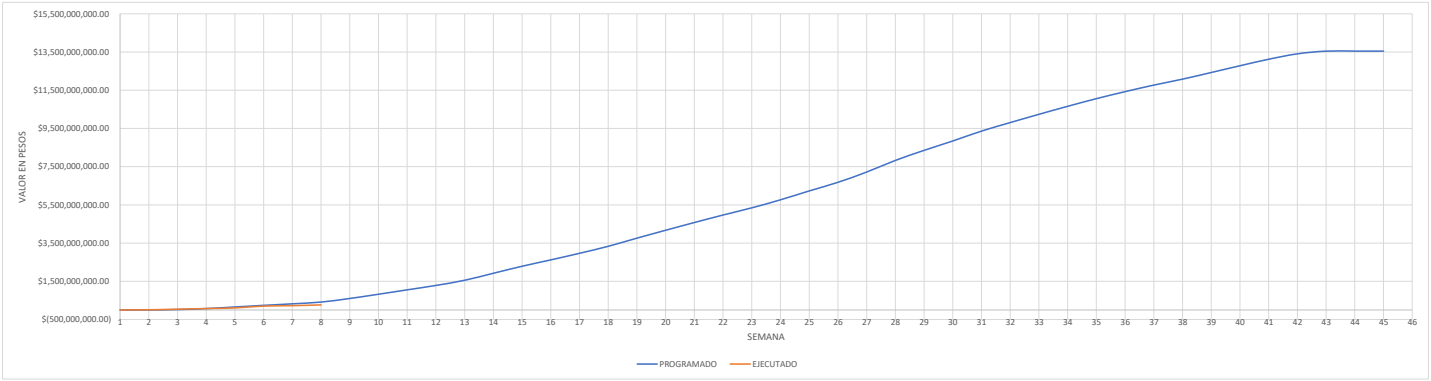

Seguimiento Ruta Critica

No.	Actividad	Fecha Programada Inicio	Fecha Inicio Real	Fecha Finalización	Tiempo de holgura	Tiempo de Ejecución	Atraso	OBSERVACIONES
1	Jorge Eliecer Gaitán	25/01/2023	19/01/2023	31/10/2023	6	285	-279	
2	Francisco José de Caldas, Sede A	25/01/2023	23/01/2023	31/10/2023	2	281	-279	
3	Garcés Navas	25/01/2023	23/01/2023	31/07/2023	2	189	-187	
4	Florida Blanca	6/02/2023	2/02/2023	31/10/2023	4	271	-267	
5	Miguel Antonio Caro	7/02/2023	7/02/2023	15/07/2023	0	158	-158	
6	Justo Víctor Charry	13/02/2023	13/02/2023	15/07/2023	0	152	-152	
7	Rafael Bernal Jiménez	25/01/2023	8/02/2023	22/08/2023	-14	195	-209	
8	Juan del Corral	15/02/2023	8/02/2023	12/09/2023	7	216	-209	
9	Francisco Primero	24/03/2023	24/03/2023	22/08/2023	0	151	-151	
10	José Asunción Silva	24/03/2023	24/03/2023	12/09/2023	0	172	-172	
11	Manuela Ayala de Gaitán	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
12	República de Colombia	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
13	Simón Bolívar	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
14	Nidia Quintero de Turbay	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
15	República de Guatemala	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
16	República de Panamá	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
17	Tomás Carrasquilla	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	8	**DEL**	lunes, 20 de febrero de 2023	**AL**	sábado, 4 de marzo de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	52	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

18	Francisco José de Caldas, Sede B	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
19	Robert F Kennedy	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

En Bogotá, a los once (11) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023), se firma acta de inicio entre Jorge Gómez Falla, en calidad de Representante de Consorcio Intercolegios 2022, como Interventor, y Miguel Alexander Cerón Molina, en calidad de representante legal de Safrid Ingeniería S.A.S como Contratista.

Aspecto Financiero

A la fecha del presente informe no se han tramitado actas de pago tanto en el contrato de obra como en el contrato de interventoría.

Aspecto Técnico

En el periodo comprendido del presente informe el contratista realizó las siguientes actividades:

Colegio Jorge Eliecer Gaitán



Desmonte de cielo raso



Filos en ventanas



Excavación manual aula 116 -2A

Colegio Francisco José de Caldas, Sede A



Filos en ventanas



Pañete en muros culata en oficinas



Pañete en tablero

Colegio Garcés Navas



Mantenimiento de carpintería metálica



Mantenimiento de carpintería metálica



Mantenimiento de carpintería metálica

Colegio Floridablanca



Limpieza y mantenimiento de cárcamos



Limpieza y mantenimiento de cárcamos



Mantenimiento de arcos

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	8	**DEL**	lunes, 20 de febrero de 2023	**AL**	sábado, 4 de marzo de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	52	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

Colegio Juan del Corral



Instalación de andamio para trabajo en terraza



Instalación de anclajes en zona de sótano



Retiro de manto asfáltico

Colegio Rafael Bernal Jiménez



No se evidencia actividades en frente de obra



No se evidencia actividades en frente de obra



No se evidencia actividades en frente de obra

Colegio Miguel Antonio Caro



Instalación de bordillo prefabricado



Compactación de material



Entrega de tubería a caja de paso

Comité de obra



Visita especialistas estructurales



Visita especialistas estructurales



Comité semanal de obra.

En cumplimiento de sus funciones esta interventoría realiza:

•Control y seguimiento a los procesos constructivos realizados en los frentes de obra, así mismo, verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas del caso.
•Requerimiento a contratista de obra de documentos, conceptos, fichas de calidad, manual de garantías y demás material que permita verificar los trabajos ejecutados en aras de cumplir con objeto contractual.
•Visitas técnicas en atención a emergencias presentadas en la localidad de Engativá y Barrios Unidos informadas por la Secretaría de Educación Distrital.
•Verificación de cumplimiento de todas la obligaciones contenidas dentro del contrato de obra.

Aspecto SST-Ambiental

•Se realiza control y seguimiento sobres los aspectos e impactos ambientales a fin de establecer las acciones pertinentes para reducir, mitigar y corregir dichos impactos.
•Se verifica en obra las actividades, aspectos y controles en materia de Seguridad y salud en el trabajo, con el fin de establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir riesgos existentes.

Aspecto Social

Se realiza comité semanal de obra el día 28 de febrero de 2023 en instalaciones de la Secretaría de Educación Distrital.

Aspecto PMT

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	8	**DEL**	lunes, 20 de febrero de 2023	**AL**	sábado, 4 de marzo de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	52	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

N/A

Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación

Información Meteorológica

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
27/02/2023	7:00 am 5:00 pm	1
28/02/2023	7:00 am 5:00 pm	0
1/03/2023	7:00 am 5:00 pm	0
2/03/2023	7:00 am 5:00 pm	0
3/03/2023	7:00 am 5:00 pm	0
4/03/2023	7:00 am 12:00 pm	0



V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• Colegio Jorge Eliecer Gaitán: Pañete, filos, fundida de alistado sobre placa y desmonte de cubierta.
• Colegio Francisco José de Caldas: Filos en ventanas y puertas, pañete en tableros y guardaescobas, excavación manual, relleno en recebo.
• Colegio Garcés Navas: Pintura en carpintería metálica, desmonte de cielo raso.
• Colegio Floridablanca: Excavación a máquina en canchas múltiples, mantenimiento de arcos.
• Colegio Juan del Corral: Demolición placa biblioteca.
• Colegio Rafael Bernal Jiménez: Demolición de acabado y alistado de piso, desmonte de baranda metálica, excavación manual en recebo compactado.
• Colegio Miguel Antonio Caro: Fundición placa de contrapiso, mantenimiento bajantes.
• Colegio Justo Víctor Charry: Demolición de muros, enchapes, desmonte de aparatos sanitarios, puertas y ventanas.

VI. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

• De acuerdo con el presente informe, a la fecha se presenta un avance general ejecutado de 1,90%, con base en la programación presentada un avance general programado de 2,97%, teniendo una diferencia de 1,07% en el contrato.
• En atención a emergencias se finaliza intervención en Nydia Quintero de Turbay IED con instalación de geomembrana y escalera en tanque de almacenamiento; a la fecha se encuentra pendiente acta de entrega.
• Se finalizan labores en Colegio República de Panamá, sede C en atención de emergencia con instalación de tubería, moto bomba, tanque hidroacumulador, tableros eléctricos y de control en cuarto de máquinas; a la fecha se encuentra pendiente acta de entrega.
• Con base en la relación establecida entre programación y ejecución en los frentes de obra activos a la fecha, se evidencia atraso en 6 de 8 colegios por lo que se insta realizar las acciones pertinentes a fin de evitar incurrir en incumplimientos al contrato.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
•Teniendo en cuenta las directrices estipuladas y manifestadas por la Secretaria de Educación del Distrito, se insta a contratista de obra efectuar las actividades acorde a lo requerido por la entidad, así mismo, considerar el balance presupuestal actualizado para evitar afectaciones al contrato. •Se solicita de las buenas gestiones por parte del contratista de obra para realizar las actividades acorde a lo planteado en la programación, esto en aras de evitar incurrir en atrasos y posibles incumplimientos. •Se verifica en obra que el personal cumpla con los requisitos mínimos establecidos, del mismo modo, se inspecciona acerca del adecuado uso del equipo de protección personal pertinente en todo el personal, esto en aras de evitar accidentes laborales. •Se notifica a contratista de obra que la entrega de la información es indispensable para la validación y aprobación de los conceptos por parte de la interventoría, por tal razón, los tiempos de demora en la entrega de la documentación solicitada, son imputables al contratista de obra. •Se solicita a contratista de obra, ejecutar las acciones pertinentes para cumplir con el alcance del contrato para las Instituciones Educativas. •Se insta a contratista de obra realizar los procedimientos constructivos acorde a las especificaciones técnicas pertinentes.	FREDY GIOVANNI RODRIGUEZ SALAZAR

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada	Fanny Almanzar/ Mileth Escalante	Liliana Sánchez/ Guillermo Narváez
CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS	CARGO: COORDINADOR GESTIÓN INTEGRAL/PROFESIONAL GESTIÓN INTEGRAL	CARGO: SUBGERENTE/ GERENTE
Vobo.	Vobo.	Vobo.
