# CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022
## 901649961

**CIC_BTA_SED_050_2022_127**

Bogotá, 14 de marzo de 2023

Señores:
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL**
Arq. Edwin Alexander Santana Rodriguez
Lider Territorial Zona Norte
Avenida El Dorado No. 66 - 63
Bogotá D.C.

**REF:** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022, "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"**

**ASUNTO:** **ENTREGA INFORME SEMANAL No.9**

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales derivadas del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.4146207 de 2022, el CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 remite a su dependencia el siguiente documento para su conocimiento y fines pertinentes:

- Informe semanal No.9 – 05 de marzo de 2023 a 11 de marzo de 2023.

Agradecemos la atención prestada, cualquier duda y/o inquietud no dude en comunicarse con nosotros.

Atentamente,
**CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022**

**FREDY GIOVANNI RODRÍGUEZ SALAZAR**
**Director de Interventoría**

SE ANEXA LO ENUNCIADO EN OCHO (08) FOLIOS.

**Elaboro:** **CASP**
**Reviso:** **MAGR - FGRS**
**Aprobó:** **ARGF - FGRS**

Copia: P:\SECRETARIA_EDUCACION\EN_EJECUCION\CIC_SED_050_2022_COLEGIOS\CORRESPONDENCIA\OFICIOS

| CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 | INFORME SEMANAL | CÓDIGO | FR-PRO-018 | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nº VER | F. APROB. | F. REV. |
| | | 3 | 07/05/2018 | 28/07/2022 |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.4146207 – 2022 | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA. | | | | |
| **SEMANA No.** | 9 | **DEL** | domingo, 05 de febrero de 2023 | **AL** | sábado, 11 de marzo de 2023 |
| **TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO** | 59 | **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez | | |

| **CONTRATO DE OBRA** | | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | |
|---|---|---|---|
| **Contratista** | Safrid Ingeniería SAS | **Interventor** | Consorcio Inter colegios 2022 |
| **Contrato No.** | CO1.PCCNTR.4077642 – 2022. | **Contrato No.** | CO1.PCCNTR.4146207 – 2022 |
| **Fecha de suscripción del contrato** | jueves, 06 de octubre de 2022 | **Fecha de suscripción del contrato** | jueves, 24 de noviembre de 2022 |
| **Valor Inicial** | $13.954.280.882,00 | **Valor Inicial** | $ 951.138.738,00 |
| **Plazo Inicial** | 12 meses | **Plazo Inicial** | 13 meses |
| **Plazo Actualizado** | 12 meses | **Plazo Actualizado** | 13 meses |
| **Fecha de Iniciación** | miércoles, 11 de enero de 2023 | **Fecha de Iniciación** | jueves, 22 de diciembre de 2022 |
| **Fecha de Terminación*** | miércoles, 10 de enero de 2024 | **Fecha de Terminación** | domingo, 21 de enero de 2024 |
| **No póliza contrato de obra** | 14-44-101164899 | **No póliza contrato de interventoría** | NB-100235369 |
| **Fecha aprobación** | martes, 17 de enero de 2023 | **Fecha aprobación** | martes, 27 de diciembre de 2022 |


* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

## II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

| **CONTRATO DE OBRA** | | | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AMPARO** | **VIGENCIA (Desde- hasta)** | **VALOR** | **AMPARO** | **VIGENCIA (Desde- hasta)** | **VALOR** |
| Cumplimiento del contrato | 11/01/2023 - 12/07/2024 | $ 2.790.856.176,40 | Cumplimiento | 22/12/2022 - 22/07/2024 | $ 190.227.747,60 |
| Estabilidad y Calidad de la obra | 11/01/2024 - 11/01/2026 | $ 2.790.856.176,40 | Pago salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales | 22/12/2022 - 21/01/2027 | $ 47.556.936,90 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 11/01/2023 - 11/101/2027 | $ 1.395.458.088,20 | Calidad del servicio | 21/01/2024 - 21/01/2029 | $ 190.227.747,60 |
| Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual | 11/01/2023 - 11/01/2024 | $ 697.714.044,10 | | | |

## III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

| No | Ubicación de la actividad | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Valor programado | % Avance programado | Valor ejecutado | % Avance ejecutado | Descripción de la Actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Colegio Jorge Eliecer Gaitán** | | 25/01/2023 | 31/10/2023 | $ 2.024.236.834,00 | 9,15% | $ 77.288.679,51 | 3,76% | **Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 5,39% |
| 1 | Preliminares | 25/01/2023 | 30/08/2023 | $ 185.166.430,80 | 9,15% | $ 46.486.606,63 | 2,30% | Demolición de pisos, muros, enchape, desmonte de ventanas, puertas, aparatos sanitarios, tubería, lámparas, cielo raso, red eléctrica, picado de muros, corte en concreto |
| 2 | Estructura | 17/06/2023 | 23/09/2023 | $ - | 0,00% | $ 9.709.830,03 | 0,48% | Excavación manual en material común, instalación subbase y malla electro soldada |
| 3 | Mampostería | 13/10/2023 | 04/08/2023 | $ - | 0,00% | $ 78.769,56 | 0,00% | Muro divisorio en bloque |
| 4 | Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio | 02/08/2023 | 20/09/2023 | $ - | 0,00% | $ 1.232.662,13 | 0,00% | Suministro e instalación de tubería hidrosanitaria |
| 5 | Instalaciones eléctricas y de comunicaciones | 20/06/2023 | 28/10/2023 | $ - | 0,00% | - | 0,00% | |
| 7 | Pisos | 20/06/2023 | 28/10/2023 | $ - | 0,00% | $ 11.602.357,33 | 0,57% | Alistado de pisos en mortero |
| 9 | Carpintería metálica | 14/03/2023 | 02/09/2023 | $ - | 0,00% | - | 0,00% | |
| 11 | Aparatos sanitarios y accesorios | 29/08/2023 | 06/09/2023 | $ - | 0,00% | - | 0,00% | |
| 12 | Aparatos y equipos especiales | 07/09/2023 | 23/09/2023 | $ - | 0,00% | - | 0,00% | |
| 13 | Pañete y pintura | 05/04/2023 | 06/11/2023 | $ - | 0,00% | $ 8.178.453,84 | 0,40% | Aplicación de pañete muro, incluye filos |
| 16 | Obras exteriores | 05/07/2023 | 19/09/2023 | $ - | 0,00% | - | 0,00% | |
| 17 | Cubiertas e impermeabilizaciones | 24/03/2023 | 19/06/2023 | $ - | 0,00% | - | 0,00% | |
| 20 | Aseo y disposición final | 29/08/2023 | 31/10/2023 | $ - | 0,00% | - | 0,00% | |

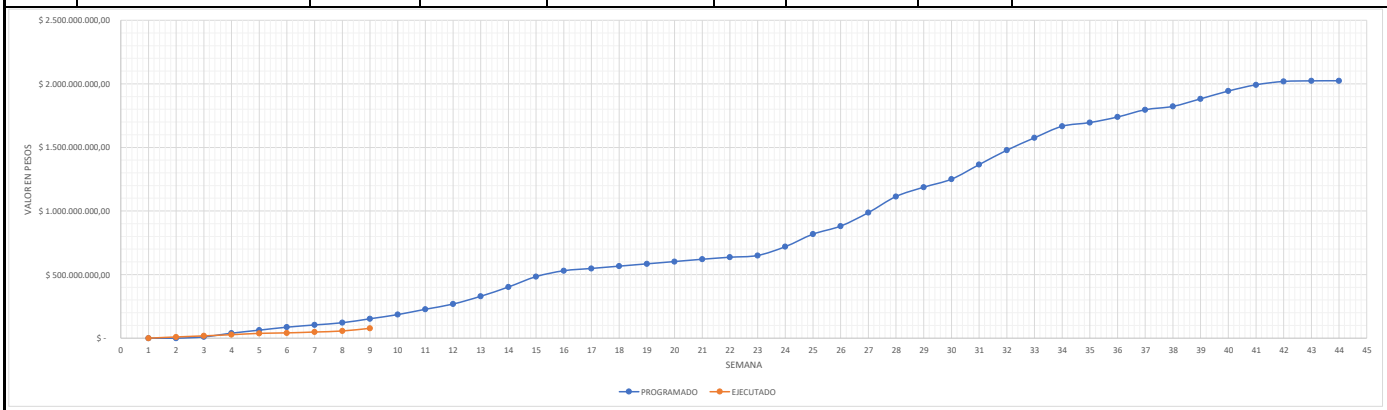



| No | Ubicación de la actividad | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Valor programado | % Avance programado | Valor ejecutado | % Avance ejecutado | Descripción de la Actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Colegio Francisco José de Caldas, Sede A** | | 25/01/2023 | 31/10/2023 | $ 1.962.546.144,54 | 13,19% | $ 89.441.007,59 | 4,56% | **Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 8,63% |
| 1 | Preliminares | 25/01/2023 | 31/10/2023 | $ 258.893.166,98 | 13,19% | $ 62.056.022,38 | 3,16% | Cerramiento, demolición de pisos, muros, pañete, desmonte de puertas, ventanas, cieloraso, aparatos sanitarios, lámparas, salidas eléctricas, tubería eléctrica |
| 2 | Estructura | 04/03/2023 | 23/09/2023 | $ 5.591.384,50 | 0,00% | $ 7.642.514,35 | 0,39% | Excavación manual en recebo compactado |
| 3 | Mampostería | 23/03/2023 | 29/07/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | |
| 4 | Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio | 14/04/2023 | 20/09/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | |
| 5 | Instalaciones eléctricas y de comunicaciones | 13/05/2023 | 28/10/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | |
| 7 | Pisos | 27/02/2023 | 28/10/2023 | $ 17.037.369,50 | 0,00% | $ - | 0,00% | |
| 9 | Carpintería metálica | 17/04/2023 | 17/08/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | |

| CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 | **INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | FR-PRO-018 | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nº VER | F. APROB. | F. REV. |
| | | 3 | 07/05/2018 | 28/07/2022 |


## I. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.4146207 – 2022 | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA. | | | | |
| **SEMANA No.** | 9 | **DEL** | domingo, 05 de febrero de 2023 | **AL** | sábado, 11 de marzo de 2023 |
| **TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO** | 59 | **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Pañete y pintura | 22/03/2023 | 20/09/2023 | $ - | 0,00% | $ 19.742.470,85 | 1,01% | Pañete en muros y filos en ventanas |
| 16 | Obras exteriores | 01/09/2023 | 31/10/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | |
| 17 | Cubiertas e impermeabilizaciones | 13/03/2023 | 26/09/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | |
| 20 | Aseo y disposición final | 20/04/2023 | 31/10/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | |

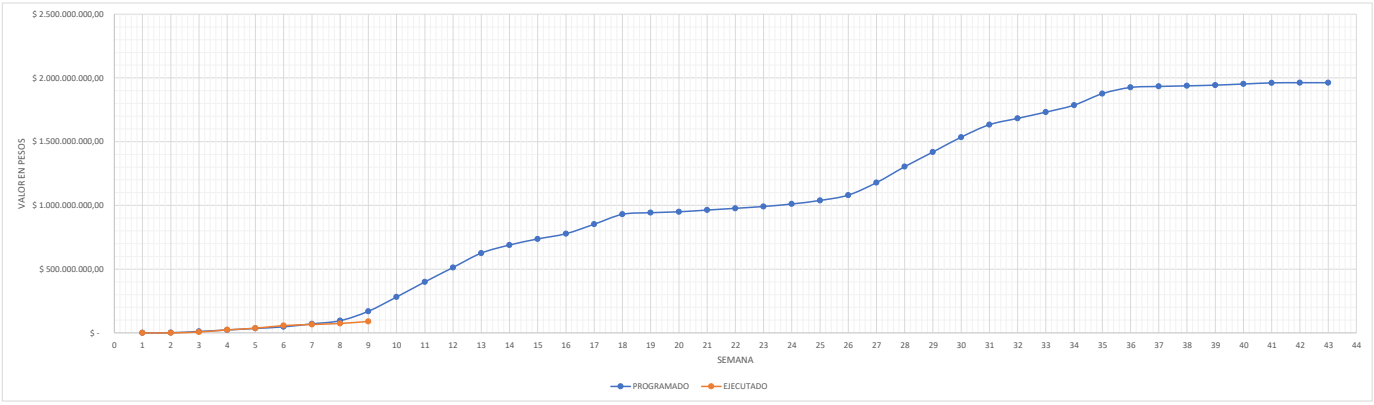


| No | Ubicación de la actividad | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Valor programado | % Avance programado | Valor ejecutado | % Avance ejecutado | Descripción de la Actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Colegio Garcés Navas** | 01/02/2023 | 31/07/2023 | $ 787.083.405,50 | 29,60% | $ 54.314.234,80 | 6,90% | **Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 22,70% |
| 1 | Preliminares | 01/02/2023 | 03/05/2023 | $ 129.718.408,61 | 16,48% | $ 54.314.234,80 | 6,90% | Pintura en carpintería metálica, desmonte de cieloraso, lámparas y cableado eléctrico |
| 2 | Estructura | 08/04/2023 | 19/04/2023 | $ - | 0,00% | - | 0,00% | |
| 3 | Mampostería | 04/03/2023 | 15/03/2023 | $ 5.745.890,50 | 0,73% | - | 0,00% | |
| 5 | Instalaciones eléctricas y de comunicaciones | 13/03/2023 | 24/05/2023 | $ - | 0,00% | - | 0,00% | |
| 11 | Aparatos sanitarios y accesorios | 25/05/2023 | 27/05/2023 | $ - | 0,00% | - | 0,00% | |
| 13 | Pañete y pintura | 20/04/2023 | 13/06/2023 | $ - | 0,00% | - | 0,00% | |
| 16 | Obras exteriores | 04/05/2023 | 20/05/2023 | $ - | 0,00% | - | 0,00% | |
| 17 | Cubiertas e impermeabilizaciones | 03/02/2023 | 29/07/2023 | $ 91.219.943,88 | 11,59% | - | 0,00% | |
| 20 | Aseo y disposición final | 10/02/2023 | 05/06/2023 | $ 6.319.533,33 | 0,80% | - | 0,00% | |

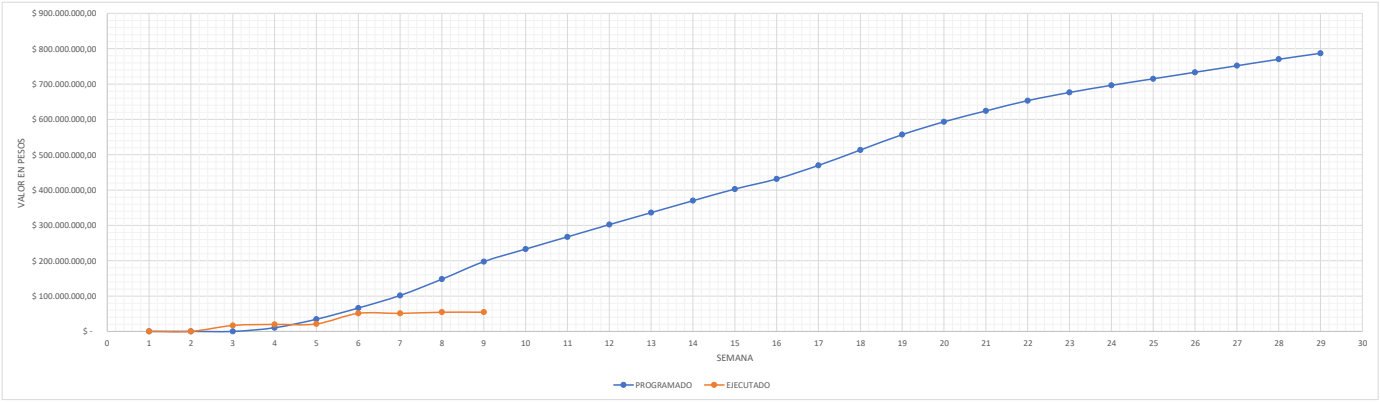



| No | Ubicación de la actividad | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Valor programado | % Avance programado | Valor ejecutado | % Avance ejecutado | Descripción de la Actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Colegio Floridablanca** | 06/02/2023 | 31/10/2023 | $ 699.153.025,00 | 9,15% | $ 31.663.187,93 | 4,53% | **Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 4,62% |
| 1 | Preliminares | 06/02/2023 | 09/02/2023 | $ 62.103.840,04 | 8,88% | $ 31.663.187,93 | 4,53% | Cerramiento, demolición pavimento asfáltico, desmonte canecas de basura, limpieza y mantenimiento cárcamos. |
| 2 | Estructura | 06/03/2023 | 13/05/2023 | $ 1.260.868,80 | 0,18% | $ - | 0,00% | |
| 3 | Mampostería | 08/05/2023 | 31/10/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | |
| 4 | Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio | 15/04/2023 | 08/05/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | |
| 5 | Instalaciones eléctricas y de comunicaciones | 08/05/2023 | 08/09/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | |
| 7 | Pisos | 06/09/2023 | 30/10/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | |
| 9 | Carpintería metálica | 06/09/2023 | 30/10/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | |
| 13 | Pañete y pintura | 19/05/2023 | 14/08/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | |
| 16 | Obras exteriores | 06/03/2023 | 29/06/2023 | $ 608.985,84 | 0,09% | $ - | 0,00% | |
| 17 | Cubiertas e impermeabilizaciones | 18/07/2023 | 22/09/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | |
| 20 | Aseo y disposición final | 13/05/2023 | 31/10/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | |




| CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 | INFORME SEMANAL | CÓDIGO | FR-PRO-018 | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nº VER | F. APROB. | F. REV. |
| | | 3 | 07/05/2018 | 28/07/2022 |

## I. INFORMACIÓN GENERAL


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.4146207 – 2022 | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA. | | | | |
| **SEMANA No.** | 9 | **DEL** | domingo, 05 de febrero de 2023 | **AL** | sábado, 11 de marzo de 2023 |
| **TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO** | 59 | **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez | | |

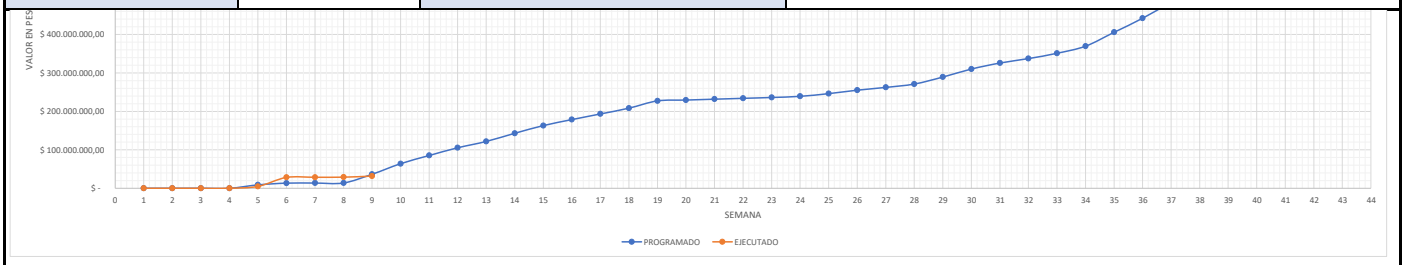


| No | Ubicación de la actividad | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Valor programado | % Avance programado | Valor ejecutado | % Avance ejecutado | Descripción de la Actividad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Colegio Miguel Antonio Caro** | | 07/02/2023 | 15/07/2023 | $ 75.339.260,00 | 19,75% | $ 28.304.913,65 | 37,57% | **Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** | -17,82% |
| 1 | Preliminares | 07/02/2023 | 02/05/2023 | $ 14.337.427,94 | 19,03% | $ 11.917.076,04 | 15,82% | Cerramiento, demolición placa. | |
| 2 | Estructura | 11/04/2023 | 15/07/2023 | $ - | 0,00% | $ 8.167.908,16 | 10,84% | Excavación manual, relleno en recebo, concreto corriente, instalación malla electro soldada. | |
| 4 | Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio | 16/05/2023 | 19/06/2023 | $ - | 0,00% | $ 7.368.374,35 | 9,78% | Instalación de tubería PVC alcantarillado 4" | |
| 5 | Instalaciones eléctricas y de comunicaciones | 24/04/2023 | 08/06/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | |
| 7 | Pisos | 27/04/2023 | 12/05/2023 | $ - | 0,00% | $ 851.555,10 | 1,13% | Concreto de limpieza para caja de inspección, instalación de bordillo prefabricado | |
| 16 | Obras exteriores | 11/04/2023 | 09/05/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | |
| 17 | Cubiertas e impermeabilizaciones | 20/03/2023 | 12/06/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | |
| 20 | Aseo y disposición final | 07/03/2023 | 12/07/2023 | $ 542.327,09 | 0,72% | $ - | 0,00% | | |

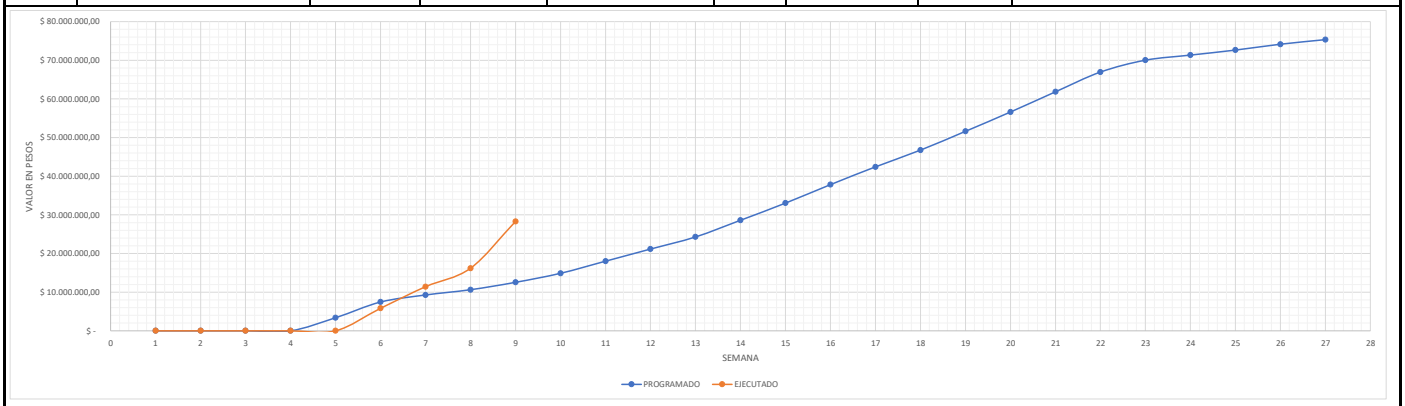


| No | Ubicación de la actividad | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Valor programado | % Avance programado | Valor ejecutado | % Avance ejecutado | Descripción de la Actividad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Colegio Justo Víctor Charry** | | 13/02/2023 | 15/07/2023 | $ 369.424.312,00 | 1,10% | $ 9.473.788,59 | 2,56% | **Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** | -1,46% |
| 1 | Preliminares | 13/02/2023 | 08/04/2023 | $ 4.064.991,99 | 1,10% | $ 6.435.517,36 | 1,74% | Cerramiento. demolición de muros, enchape, desmonte de aparatos sanitarios, puertas | |
| 3 | Mampostería | 31/03/2023 | 08/04/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | |
| 5 | Instalaciones eléctricas y de comunicaciones | 27/06/2023 | 10/07/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | |
| 7 | Pisos | 27/04/2023 | 01/05/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | |
| 8 | Mampostería seca | 04/04/2023 | 26/04/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | |
| 9 | Carpintería metálica | 27/04/2023 | 14/06/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | |
| 11 | Aparatos sanitarios y accesorios | 27/04/2023 | 25/05/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | |
| 12 | Aparatos y equipos especiales | 20/05/2023 | 23/06/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | |
| 13 | Pañete y pintura | 17/05/2023 | 26/06/2023 | $ - | 0,00% | $ 3.038.271,23 | 0,82% | Pañete muro incluye filos | |
| 15 | Cerraduras, vidrios y espejos | 27/06/2023 | 01/07/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | |
| 20 | Aseo y disposición final | 10/04/2023 | 15/07/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | |

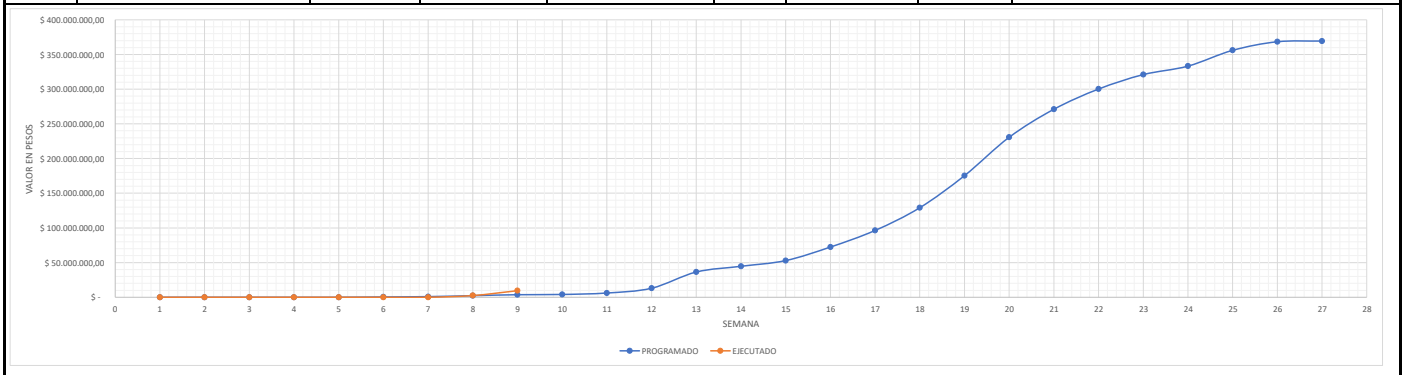



| No | Ubicación de la actividad | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Valor programado | % Avance programado | Valor ejecutado | % Avance ejecutado | Descripción de la Actividad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Colegio Rafael Bernal Jiménez** | | 25/01/2023 | 22/08/2023 | $ 677.034.595,00 | 4,43% | $ 13.662.544,97 | 2,02% | **Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** | 2,42% |
| 1 | Preliminares | 07/02/2023 | 17/05/2023 | $ 27.808.841,69 | 4,11% | $ 13.662.544,97 | 2,02% | Cerramiento en teja de zinc, demolición acabado de piso, desmonte de puertas, ventanas y cieloraso | |

| CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 | **INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | FR-PRO-018 | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nº VER | F. APROB. | F. REV. |
| | | 3 | 07/05/2018 | 28/07/2022 |


## I. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.4146207 – 2022 | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA. | | | | |
| **SEMANA No.** | 9 | **DEL** | domingo, 05 de febrero de 2023 | **AL** | sábado, 11 de marzo de 2023 |
| **TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO** | 59 | **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Estructura | 23/02/2023 | 05/05/2023 | $ 2.211.900,81 | 0,33% | $ - | 0,00% | |
| 3 | Mampostería | 01/05/2023 | 17/05/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | |
| 4 | Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio | 09/03/2023 | 11/03/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | |
| 5 | Instalaciones eléctricas y de comunicaciones | 10/07/2023 | 29/07/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | |
| 7 | Pisos | 18/05/2023 | 26/07/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | |
| 8 | Mampostería seca | 12/07/2023 | 20/07/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | |
| 9 | Carpintería metálica | 06/05/2023 | 21/06/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | |
| 11 | Aparatos sanitarios y accesorios | 04/07/2023 | 08/07/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | |
| 13 | Pañete y pintura | 01/04/2023 | 25/07/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | |
| 16 | Obras exteriores | 04/03/2023 | 08/07/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | |
| 17 | Cubiertas e impermeabilizaciones | 27/03/2023 | 08/07/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | |
| 20 | Aseo y disposición final | 05/04/2023 | 29/07/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | |

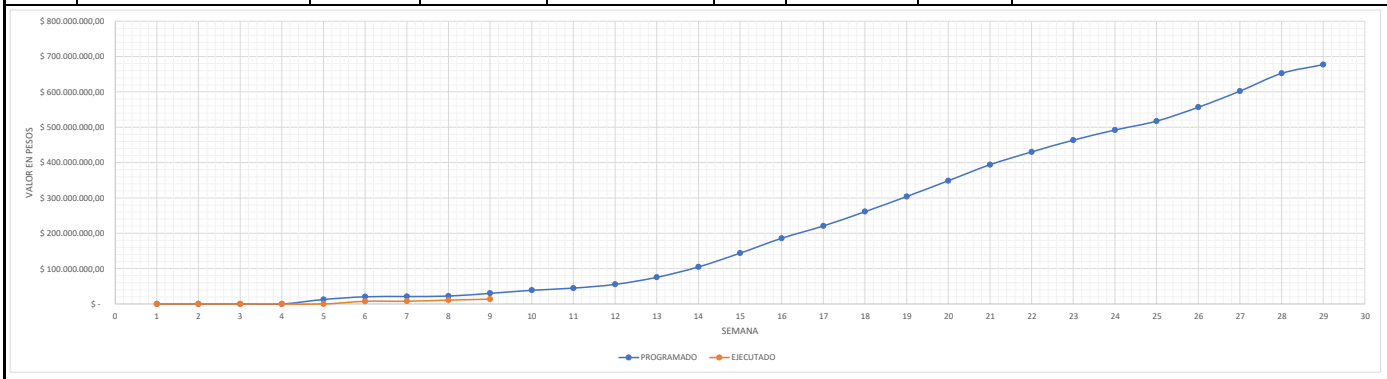


| No | Ubicación de la actividad | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Valor programado | % Avance programado | Valor ejecutado | % Avance ejecutado | Descripción de la Actividad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Instituto técnico Juan del Corral** | 15/02/2023 | 12/09/2023 | $ 524.030.444,00 | 0,00% | $ 22.724.500,46 | 2,99% | **Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** | -2,99% |
| 1 | Preliminares | 15/02/2023 | 23/02/2023 | $ - | 0,00% | $ 15.685.274,57 | 2,99% | Cerramiento, retiro de tuberías, desmonte de cieloraso, lámparas y picado de membrana y placa, demolición de acabado y alistado de piso. | |
| 3 | Mampostería | 03/07/2023 | 31/07/2023 | $ - | 0,00% | $ 802.199,12 | 0,15% | Anclajes varillas 3/8" | |
| 4 | Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio | 14/04/2023 | 04/05/2023 | $ - | 0,00% | $ 2.612.813,11 | 0,50% | Suministro e instalación de tubería | |
| 5 | Instalaciones eléctricas y de comunicaciones | 17/05/2023 | 13/06/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | |
| 7 | Pisos | 19/06/2023 | 17/07/2023 | $ - | 0,00% | $ 3.624.213,65 | 0,69% | Alistado de pisos en mortero | |
| 8 | Mampostería seca | 17/05/2023 | 02/06/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | |
| 13 | Pañete y pintura | 14/07/2023 | 14/08/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | |
| 17 | Cubiertas e impermeabilizaciones | 24/04/2023 | 17/08/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | |
| 20 | Aseo y disposición final | 27/02/2023 | 08/08/2023 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | |

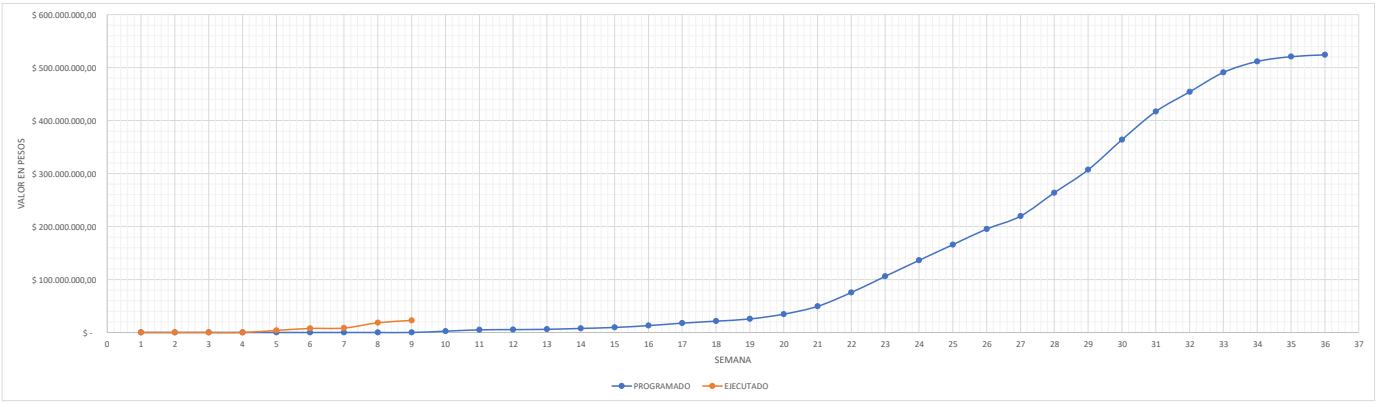


### Atención de IED

| Institución | Fecha inicio | Fecha terminación | Valor programado | Avance programado | Valor ejecutado | Avance ejecutado | Observaciones | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Colegio Francisco Primero** | 25/01/2023 | 22/08/2023 | - | | - | 0,00% | **Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** | 0,00% |
| **Colegio José Asunción Silva** | 15/02/2023 | 12/09/2023 | - | | - | 0,00% | **Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** | 0,00% |
| **Colegio Manuela Ayala de Gaitán** | 24/03/2023 | 31/10/2023 | - | | - | 0,00% | **Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** | 0,00% |
| **Colegio República de Colombia** | 24/03/2023 | 31/10/2023 | - | | - | 0,00% | **Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** | 0,00% |
| **Colegio Simón Bolivar** | 24/03/2023 | 31/10/2023 | - | | - | 0,00% | **Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** | 0,00% |
| **Colegio Nidia Quintero de Turbay** | 24/03/2023 | 31/10/2023 | - | | - | 0,00% | **Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** | 0,00% |
| **Colegio República de Guatemala** | 24/03/2023 | 31/10/2023 | - | | - | 0,00% | **Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** | 0,00% |
| **Colegio República de Panamá** | 10/05/2023 | 31/10/2023 | - | | - | 0,00% | **Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** | 0,00% |
| **Colegio Tomás Carrasquilla** | 10/05/2023 | 31/10/2023 | - | | - | 0,00% | **Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** | 0,00% |
| **Colegio Francisco José de Caldas, Sede B** | 10/05/2023 | 31/10/2023 | - | | - | 0,00% | **Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** | 0,00% |
| **Colegio Robert F Kennedy** | 10/05/2023 | 31/10/2023 | - | | - | 0,00% | **Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** | 0,00% |

### Atención de emergencias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Colegio Morisco** | 13/01/2023 | 21/01/2023 | | | | | |
| **Colegio Tomas Cipriano de Mosquera** | 01/02/2023 | | | | | | |


| CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 | INFORME SEMANAL | CÓDIGO | FR-PRO-018 | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nº VER | F. APROB. | F. REV. |
| | | 3 | 07/05/2018 | 28/07/2022 |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.4146207 – 2022 | | | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA. | | | | | | |
| **SEMANA No.** | 9 | **DEL** | domingo, 05 de febrero de 2023 | | **AL** | sábado, 11 de marzo de 2023 | |
| **TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO** | 59 | **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | | | Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Colegio Nidia Quintero de Turbay** | 14/02/2023 | 03/03/2023 | | | | | |
| **Colegio Thomas Carrasquilla, sede A** | 01/02/2023 | | | | | | |
| **Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede B** | 28/01/2023 | 25/02/2023 | | | | | |
| **Colegio República de Panamá** | 22/02/2023 | 04/03/2023 | | | | | |
| **Colegio Laureano Gómez** | | | | | | | |
| **Dirección Local de Engativá** | 08/02/2023 | | | | | | |

| PROGRAMADO | | | | | EJECUTADO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **VALOR PROGRAMADO SEMANAL** | **%** | **ACUMULADO** | **%** | **No.** | **VALOR EJECUTADO SEMANAL** | **%** | **ACUMULADO** | **%** |
| 1 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | 1 | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% |
| 2 | $ 1.270.756,93 | 0,01% | $ 1.270.756,93 | 0,01% | 2 | $ 9.458.499,71 | 0,07% | $ 9.458.499,71 | 0,07% |
| 3 | $ 19.951.637,75 | 0,14% | $ 21.222.394,68 | 0,15% | 3 | $ 31.826.160,08 | 0,23% | $ 41.284.659,79 | 0,30% |
| 4 | $ 50.914.718,24 | 0,36% | $ 72.137.112,92 | 0,52% | 4 | $ 33.373.547,10 | 0,24% | $ 74.658.206,89 | 0,54% |
| 5 | $ 84.783.311,22 | 0,61% | $ 156.920.424,14 | 1,12% | 5 | $ 33.581.581,31 | 0,24% | $ 108.239.788,20 | 0,78% |
| 6 | $ 84.520.694,84 | 0,61% | $ 241.441.118,98 | 1,73% | 6 | $ 94.518.500,86 | 0,68% | $ 202.758.289,06 | 1,45% |
| 7 | $ 79.994.302,15 | 0,57% | $ 321.435.421,13 | 2,30% | 7 | $ 22.218.182,48 | 0,16% | $ 224.976.471,55 | 1,61% |
| 8 | $ 92.371.183,17 | 0,66% | $ 413.806.604,30 | 2,97% | 8 | $ 40.324.809,10 | 0,29% | $ 265.301.280,65 | 1,90% |
| 9 | $ 188.479.295,83 | 1,35% | $ 602.285.900,13 | 4,32% | 9 | $ 65.485.536,40 | 0,47% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 10 | $ 221.475.791,25 | 1,59% | $ 823.761.691,38 | 5,90% | 10 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 11 | $ 229.916.129,85 | 1,65% | $ 1.053.677.821,23 | 7,55% | 11 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 12 | $ 230.178.690,91 | 1,65% | $ 1.283.856.512,14 | 9,20% | 12 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 13 | $ 271.119.796,10 | 1,94% | $ 1.554.976.308,24 | 11,14% | 13 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 14 | $ 366.181.950,98 | 2,62% | $ 1.921.158.259,22 | 13,77% | 14 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 15 | $ 367.035.523,66 | 2,63% | $ 2.288.193.782,89 | 16,40% | 15 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 16 | $ 332.730.015,04 | 2,38% | $ 2.620.923.797,93 | 18,78% | 16 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 17 | $ 344.526.501,67 | 2,47% | $ 2.965.450.299,60 | 21,25% | 17 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 18 | $ 366.678.480,99 | 2,63% | $ 3.332.128.780,59 | 23,88% | 18 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 19 | $ 426.272.890,32 | 3,05% | $ 3.758.401.670,91 | 26,93% | 19 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 20 | $ 412.873.717,83 | 2,96% | $ 4.171.275.388,74 | 29,89% | 20 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 21 | $ 405.169.534,01 | 2,90% | $ 4.576.444.922,74 | 32,80% | 21 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 22 | $ 392.991.222,20 | 2,82% | $ 4.969.436.144,94 | 35,61% | 22 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 23 | $ 375.982.242,70 | 2,69% | $ 5.345.418.387,64 | 38,31% | 23 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 24 | $ 419.622.326,39 | 3,01% | $ 5.765.040.714,02 | 41,31% | 24 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 25 | $ 465.646.255,54 | 3,34% | $ 6.230.686.969,56 | 44,65% | 25 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 26 | $ 450.087.719,92 | 3,23% | $ 6.680.774.689,48 | 47,88% | 26 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 27 | $ 536.994.706,78 | 3,85% | $ 7.217.769.396,25 | 51,72% | 27 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 28 | $ 608.167.229,41 | 4,36% | $ 7.825.936.625,66 | 56,08% | 28 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 29 | $ 526.201.038,42 | 3,77% | $ 8.352.137.664,08 | 59,85% | 29 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 30 | $ 492.479.875,17 | 3,53% | $ 8.844.617.539,25 | 63,38% | 30 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 31 | $ 515.904.096,64 | 3,70% | $ 9.360.521.635,88 | 67,08% | 31 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 32 | $ 446.416.023,11 | 3,20% | $ 9.806.937.658,99 | 70,28% | 32 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 33 | $ 432.360.273,39 | 3,10% | $ 10.239.297.932,38 | 73,38% | 33 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 34 | $ 419.606.131,94 | 3,01% | $ 10.658.904.064,31 | 76,38% | 34 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 35 | $ 399.476.655,36 | 2,86% | $ 11.058.380.719,67 | 79,25% | 35 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 36 | $ 367.282.032,37 | 2,63% | $ 11.425.662.752,04 | 81,88% | 36 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 37 | $ 342.604.162,91 | 2,46% | $ 11.768.266.914,94 | 84,33% | 37 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 38 | $ 311.411.789,16 | 2,23% | $ 12.079.678.704,10 | 86,57% | 38 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 39 | $ 347.906.818,49 | 2,49% | $ 12.427.585.522,59 | 89,06% | 39 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 40 | $ 352.630.923,00 | 2,53% | $ 12.780.216.445,58 | 91,59% | 40 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 41 | $ 340.785.854,77 | 2,44% | $ 13.121.002.300,35 | 94,03% | 41 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 42 | $ 284.197.920,80 | 2,04% | $ 13.405.200.221,15 | 96,07% | 42 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 43 | $ 140.525.720,50 | 1,01% | $ 13.545.725.941,65 | 97,07% | 43 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 44 | $ 704.475,00 | 0,01% | $ 13.546.430.416,65 | 97,08% | 44 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |
| 45 | $ 407.850.465,35 | 2,92% | $ 13.954.280.882,00 | 100,00% | 45 | $ - | 0,00% | $ 330.786.817,05 | 2,37% |

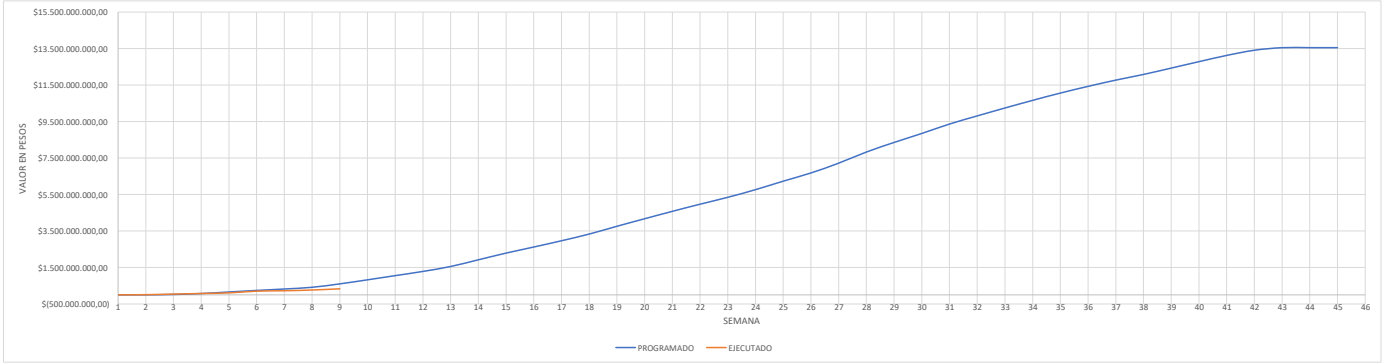


## Seguimiento Ruta Critica

| No. | Actividad | Fecha Programada Inicio | Fecha Inicio Real | Fecha Finalización | Tiempo de holgura | Tiempo de Ejecución | Atraso | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Eliecer Gaitán | 25/01/2023 | 19/01/2023 | 31/10/2023 | 6 | 285 | -279 | |
| 2 | Francisco José de Caldas, Sede A | 25/01/2023 | 23/01/2023 | 31/10/2023 | 2 | 281 | -279 | |
| 3 | Garcés Navas | 25/01/2023 | 23/01/2023 | 31/07/2023 | 2 | 189 | -187 | |

| CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 | **INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | FR-PRO-018 | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nº VER | F. APROB. | F. REV. |
| | | 3 | 07/05/2018 | 28/07/2022 |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.4146207 – 2022 | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA. | | | | |
| **SEMANA No.** | 9 | **DEL** | domingo, 05 de febrero de 2023 | **AL** | sábado, 11 de marzo de 2023 |
| **TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO** | 59 | **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Florida Blanca | 06/02/2023 | 02/02/2023 | 31/10/2023 | 4 | 271 | -267 | |
| 5 | Miguel Antonio Caro | 07/02/2023 | 07/02/2023 | 15/07/2023 | 0 | 158 | -158 | |
| 6 | Justo Víctor Charry | 13/02/2023 | 13/02/2023 | 15/07/2023 | 0 | 152 | -152 | |
| 7 | Rafael Bernal Jiménez | 25/01/2023 | 08/02/2023 | 22/08/2023 | -14 | 195 | -209 | |
| 8 | Juan del Corral | 15/02/2023 | 08/02/2023 | 12/09/2023 | 7 | 216 | -209 | |
| 9 | Francisco Primero | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 22/08/2023 | 0 | 151 | -151 | |
| 10 | José Asunción Silva | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 12/09/2023 | 0 | 172 | -172 | |
| 11 | Manuela Ayala de Gaitán | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 31/10/2023 | 0 | 221 | -221 | |
| 12 | República de Colombia | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 31/10/2023 | 0 | 221 | -221 | |
| 13 | Simón Bolívar | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 31/10/2023 | 0 | 221 | -221 | |
| 14 | Nidia Quintero de Turbay | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 31/10/2023 | 0 | 174 | -174 | |
| 15 | República de Guatemala | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 31/10/2023 | 0 | 174 | -174 | |
| 16 | República de Panamá | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 31/10/2023 | 0 | 174 | -174 | |
| 17 | Tomás Carrasquilla | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 31/10/2023 | 0 | 174 | -174 | |
| 18 | Francisco José de Caldas, Sede B | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 31/10/2023 | 0 | 174 | -174 | |
| 19 | Robert F Kennedy | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 31/10/2023 | 0 | 174 | -174 | |

## IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

### Aspecto Legal y Administrativo

En Bogotá, a los once (11) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023), se firma acta de inicio entre Jorge Gómez Falla, en calidad de Representante de Consorcio Intercolegios 2022, como Interventor, y Miguel Alexander Cerón Molina, en calidad de representante legal de Safrid Ingeniería S.A.S como Contratista.

### Aspecto Financiero

A la fecha del presente informe no se han tramitado actas de pago tanto en el contrato de obra como en el contrato de interventoría.

### Aspecto Técnico

En el periodo comprendido del presente informe el contratista realizó las siguientes actividades:

**Colegio Jorge Eliecer Gaitán**




Excavación manual en aulas de primer piso




Aplicación de alistado en aulas de segundo piso




Instalación geotextil en aulas

**Colegio Francisco José de Caldas, Sede A**




Excavación manual en aulas de primer piso




Filos en ventana de pasillo segundo piso




Filos en puertas de oficinas de segundo piso

**Colegio Floridablanca**




Mantenimiento de arcos en canchas




Mantenimiento de arcos en canchas




Mantenimiento de arcos en canchas

**Colegio Juan del Corral**

| CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 | **INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | FR-PRO-018 | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nº VER | F. APROB. | F. REV. |
| | | 3 | 07/05/2018 | 28/07/2022 |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.4146207 – 2022 | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA. | | | | |
| **SEMANA No.** | 9 | **DEL** | domingo, 05 de febrero de 2023 | **AL** | sábado, 11 de marzo de 2023 |
| **TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO** | 59 | **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez | | |




Trasiego de material




Instalación de alistado en terraza comedor




Instalación de alistado en terraza comedor

**Colegio Rafael Bernal Jiménez**




Instalación de alistado en salón de Karate.




Demolición de acabado de piso en aula múltiple.




Instalación de cerramiento para shut de basuras

**Colegio Miguel Antonio Caro**




Excavación manual para zanja




Lleno y compactación de material




Demolición de placa

**Comité de obra**




Recorrido de obra con especialista eléctrico / IT Francisco José de Caldas




Recorrido de obra / IED Juan del Corral




Reunión socialización de emergencia / IT Francisco José de Caldas

En cumplimiento de sus funciones esta interventoría realiza:

•Control y seguimiento a los procesos constructivos realizados en los frentes de obra, así mismo, verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas del caso.
•Requerimiento a contratista de obra de documentos, conceptos, fichas de calidad, manual de garantías y demás material que permita verificar los trabajos ejecutados en aras de cumplir con objeto contractual.
•Visitas técnicas en atención a emergencias presentadas en la localidad de Engativá y Barrios Unidos informadas por la Secretaría de Educación Distrital.
•Verificación de cumplimiento de todas la obligaciones contenidas dentro del contrato de obra.

**Aspecto SST-Ambiental**

•Se realiza control y seguimiento sobres los aspectos e impactos ambientales a fin de establecer las acciones pertinentes para reducir, mitigar y corregir dichos impactos.
•Se verifica en obra las actividades, aspectos y controles en materia de Seguridad y salud en el trabajo, con el fin de establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir riesgos existentes.

**Aspecto Social**

Se realiza comité semanal de obra el día 07 de marzo de 2023 en instalaciones de Nydia Quintero de Turbay IED.

**Aspecto PMT**

**N/A**

**Plan de Manejo de Trafico***

| Identificación del PMT | Doc. Aprobación | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Prorroga No | Doc. Aprobación | Fecha Terminación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |


| CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 | INFORME SEMANAL | CÓDIGO | FR-PRO-018 | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nº VER | F. APROB. | F. REV. |
| | | 3 | 07/05/2018 | 28/07/2022 |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.4146207 – 2022 | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA. | | | | |
| **SEMANA No.** | 9 | **DEL** | domingo, 05 de febrero de 2023 | **AL** | sábado, 11 de marzo de 2023 |
| **TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO** | 59 | **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez | | |

## Información Meteorológica

| Fecha | Periodo | Horas de Lluvia |
|---|---|---|
| 06/03/2023 | 7:00 am 5:00 pm | 0 |
| 07/03/2023 | 7:00 am 5:00 pm | 1 |
| 08/03/2023 | 7:00 am 5:00 pm | 0 |
| 09/03/2023 | 7:00 am 5:00 pm | 8 |
| 10/03/2023 | 7:00 am 5:00 pm | 0 |
| 11/03/2023 | 7:00 am 12:00 pm | 4 |




## V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• Colegio Jorge Eliecer Gaitán: fundida de alistado sobre placa, desmonte de cubierta, desmonte de canaleta metálica y limpieza de canales y bajantes.
• Colegio Francisco José de Caldas: excavación manual en material común, instalación acero de refuerzo y alistado de pisos en mortero.
• Colegio Garcés Navas: Pintura en carpintería metálica, desmonte de cielo raso, desmonte de cubierta.
• Colegio Floridablanca: Excavación a máquina en canchas múltiples, obras exteriores.
• Colegio Juan del Corral: Alistado de piso, mantenimiento de bombas.
• Colegio Rafael Bernal Jiménez: desmonte de lámparas, demolición de acabado y alistado de piso.
• Colegio Miguel Antonio Caro: Fundición placa de contrapiso, mantenimiento bajantes, orden y aseo.
• Colegio Justo Víctor Charry: Aplicación de pañete, instalación de enchape en baños.

## VI. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

• De acuerdo con el presente informe, a la fecha se presenta un avance general ejecutado de 2,37%, con base en la programación presentada un avance general programado de 4,32%, teniendo una diferencia de 1,95% en el contrato.
• Con base en la relación establecida entre programación y ejecución en los frentes de obra activos a la fecha, se evidencia atraso en 5 de 8 colegios por lo que se insta realizar las acciones pertinentes a fin de evitar incurrir en incumplimientos al contrato.
• En atención a emergencias:
• Se realiza visita técnica el día 08 de marzo de 2023 a IED Domingo Fausto Sarmiento, sede D en aras de identificar las posibles causas de las fallas presentadas en la infraestructura de la institución educativa y tomar las medidas sanitarias correspondientes; durante la inspección se observa lámina de agua en pasillo y acceso a aula 101D, levantamiento de acabado de piso, taponamiento y desbordamiento de canales existentes, filtración de agua lluvia en unión de placa tanque – cubierta, falta de guardaescobas en aulas ocasionando falta de continuidad y protección de muros y falla en la impermeabilización de placa en tanque.
• Se realiza mesa de trabajo en instalaciones de IT Francisco José de Caldas, sede A, a fin de dar a conocer la necesidad de atender emergencia de tala de árboles ante los cambios climatológicos presentados y el inminente peligro que presentan estos en la institución educativa, ante esto, se solicita la ejecución de la actividad lo antes posible teniendo en cuenta toda la normatividad del caso.

| OBSERVACIONES | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
|---|---|
| • Interventoría realiza solicitud de adición y prórroga al contrato de interventoría No. CO1. PCCNTR.4146207 en atención a la solicitud efectuada por contratista de obra mediante oficio No. 101-GP2-SED-2022 del 09 de marzo de 2023 con asunto solicitud de adición y prórroga No. 1.<br>• Teniendo en cuenta las directrices estipuladas y manifestadas por la Secretaria de Educación del Distrito, se insta a contratista de obra efectuar las actividades acorde a lo requerido por la entidad, así mismo, considerar el balance presupuestal actualizado para evitar afectaciones al contrato.<br>•Se solicita de las buenas gestiones por parte del contratista de obra para realizar las actividades acorde a lo planteado en la programación, esto en aras de evitar incurrir en atrasos y posibles incumplimientos.<br>•Se verifica en obra que el personal cumpla con los requisitos mínimos establecidos, del mismo modo, se inspecciona acerca del adecuado uso del equipo de protección personal pertinente en todo el personal, esto en aras de evitar accidentes laborales.<br>•Se notifica a contratista de obra que la entrega de la información es indispensable para la validación y aprobación de los conceptos por parte de la interventoría, por tal razón, los tiempos de demora en la entrega de la documentación solicitada, son imputables al contratista de obra.<br>•Se solicita a contratista de obra, ejecutar las acciones pertinentes para cumplir con el alcance del contrato para las Instituciones Educativas | FREDY GIOVANNI RODRÍGUEZ SALAZAR |

| REALIZADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Iván Posada | Fanny Almanzar/ Mileth Escalante | Liliana Sánchez/ Guillermo Narváez |
| CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS | CARGO: COORDINADOR GESTIÓN INTEGRAL/PROFESIONAL GESTIÓN INTEGRAL | CARGO: SUBGERENTE/ GERENTE |
| Vobo. | Vobo. | Vobo. |
