MEMORIAS DE CÁLCULO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES

eterritorio	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	F-GG-32
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

ACTA No. 5

TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No.** 2220576

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

CONTRATISTA : CONSORCIO CONSTRUREDES (N.I.T 901568876 - 5)

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS. (N.I.T 800.173.768 -1)

PERÍODO A PAGAR: 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022

En Bogotá DC, a los dos (2) días del mes de diciembre del año 2022 se reunieron el Ing. Duarte Jose Pineda de Obra del Contratista y la Ing. Marcy Correa castaño Directora de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponda a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	ACTIVIDAD 1. CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS												
1,1	ACTIVIDAD 1. CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR – 10.	GL	1,00	$ 4.319.349,87	$ 4.319.349,87	1,00	0,00	1,00	4.319.349,9	$ -	$ 4.319.349,87	0,00	$ -
	SUBTOTAL (ACTIVIDAD 1)				$ 4.319.349,87				4.319.349,87	$ -	$ 4.319.349,87		$ -
	IVA 19%				$ 820.676,48				820.676,48	$ -	$ 820.676,48		$ -
	TOTAL (ACTIVIDAD 1)				**$ 5.140.026,35**				**$ 5.140.026,35**	**$ -**	**$ 5.140.026,35**		**$ -**
	ACTIVIDAD 2. DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.												
1,2	ACTIVIDAD 2. DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.	UN	325,00	$ 152.241,60	$ 49.478.520,00	228,00	70,00	298,00	34.711.084,8	$ 10.656.912,00	$ 45.367.996,80	27,00	$ 4.110.523,20
	SUBTOTAL (ACTIVIDAD 2)				$ 49.478.520,00				$ 34.711.084,80	$ 10.656.912,00	$ 45.367.996,80		4.110.523,20
	IVA 19%				$ 9.400.918,80				$ 6.595.106,11	$ 2.024.813,28	$ 8.619.919,39		$ 780.999,41
	TOTAL (ACTIVIDAD 2)				**$ 58.879.438,80**				**$ 41.306.190,91**	**$ 12.681.725,28**	**$ 53.987.916,19**		**$ 4.891.522,61**
	ACTIVIDAD 3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO												
	2. CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS												
	REDES HIDROSANITARIAS												
2,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes			$ 10.170,51	$ -	7.637,40	1738,00	9.375,40	77.676.253,07	$ 17.676.346,38	$ 95.352.599,45		$ -
2,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes			$ 43.860,81	$ -	3.675,90	1018,70	4.694,60	161.227.951,48	$ 44.681.007,15	$ 205.908.958,63		$ -
2,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes			$ 21.402,93	$ -	1.786,70	536,40	2.323,10	38.240.615,04	$ 11.480.531,65	$ 49.721.146,69		$ -
	PUNTOS HIDROSANITARIOS - No incluye aparatos												
2,4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata			$ 94.202,36	$ -	182,00	53,00	235,00	17.144.829,52	$ 4.992.725,08	$ 22.137.554,60		$ -
2,5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería			$ 112.904,76	$ -	201,00	59,00	260,00	22.693.856,76	$ 6.661.380,84	$ 29.355.237,60		$ -
2,6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.			$ 85.214,13	$ -	184,00	53,00	237,00	15.679.399,92	$ 4.516.348,89	$ 20.195.748,81		$ -
2,7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.			$ 89.406,34	$ -	173,00	65,00	238,00	15.467.296,82	$ 5.811.412,10	$ 21.278.708,92		$ -
2,8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.			$ 142.030,87	$ -	166,00	52,00	218,00	23.577.124,42	$ 7.385.605,24	$ 30.962.729,66		$ -
	APARATOS												
2,9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento			$ 147.311,27	$ -	188,00	54,00	242,00	27.694.518,76	$ 7.954.808,58	$ 35.649.327,34		$ -
2,101	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería			$ 114.887,70	$ -	190,00	53,00	243,00	21.828.663,00	$ 6.089.048,10	$ 27.917.711,10		$ -
2,11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero			$ 185.296,96	$ -	173,00	65,00	238,00	32.056.374,08	$ 12.044.302,40	$ 44.100.676,48		$ -
2,12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)			$ 177.856,36	$ -	154,00	47,00	201,00	27.389.879,44	$ 8.359.248,92	$ 35.749.128,36		$ -
	CAJAS DE INSPECCIÓN												
2,13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)			$ 175.509,36	$ -	299,50	83,40	382,90	52.565.053,32	$ 14.637.480,62	$ 67.202.533,94		$ -
	3. ADECUACIONES												
	UNIDADES SANITARIAS												
3,1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)			$ 2.596.959,72	$ -	-	0,00	-	-	$ -	$ -		$ -
3,2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)			$ 2.305.691,80	$ -	10,00	2,00	12,00	23.056.918,00	$ 4.611.383,60	$ 27.668.301,60		$ -
3,3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)			$ 2.927.724,89	$ -	88,00	18,00	106,00	257.639.790,32	$ 52.699.048,02	$ 310.338.838,34		$ -
3,4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)			$ 3.012.931,39	$ -	2,88	1,00	3,88	8.691.119,97	$ 3.012.931,39	$ 11.704.051,36		$ -
	CIMENTACIÓN												
3,5	Relleno compactado con material de sitio			$ 12.187,55	$ -	-	0,00	-	-	$ -	$ -		$ -
3,6	Relleno con material seleccionado (recebo)			$ 36.557,30	$ -	-	0,00	-	-	$ -	$ -		$ -
	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS												
3,7	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales			$ 547.962,74	$ -	103,64	36,77	140,41	56.790.858,37	$ 20.148.589,95	$ 76.939.448,32		$ -
3,8	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)			$ 4.953,42	$ -	13.606,10	4708,12	18.314,22	67.396.727,86	$ 23.321.295,77	$ 90.718.023,63		$ -

eterritorio	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL										CÓDIGO:		F-GG-32	
											VERSIÓN:		01	
	GERENCIA DE PROYECTOS										VIGENCIA:		2020-10-20	
3,9	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)			$ 52.948,33	$ -	491,58	188,34	679,92	26.028.514,79	$ 9.972.288,47	$ 36.000.803,26		$ -
3,10	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"			$ 53.858,79	$ -	-	0,00	-	-	$ -	$ -		$ -
3,11	Concreto ciclopeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)			$ 180.903,59	$ -	77,60	15,20	92,80	14.038.118,58	$ 2.749.734,57	$ 16.787.853,15		$ -
	MAMPOSTERÍA												
3,12	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega			$ 26.760,01	$ -	620,25	220,89	841,14	16.597.896,20	$ 5.911.018,61	$ 22.508.914,81		$ -
3,13	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega			$ 5.988,18	$ -	30,00	8,00	38,00	179.645,40	$ 47.905,44	$ 227.550,84		$ -
	MORTEROS												
3,14	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor			$ 12.398,76	$ -	1.010,99	331,41	1.342,40	12.535.012,45	$ 4.109.073,05	$ 16.644.085,50		$ -
3,15	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.			$ 12.851,95	$ -	1.067,34	396,43	1.463,77	13.717.336,05	$ 5.094.898,54	$ 18.812.234,59		$ -
3,16	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor			$ 15.479,97	$ -	217,87	22,85	240,72	3.372.633,45	$ 353.717,31	$ 3.726.350,76		$ -
	ELEMENTOS												
3,17	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo y Pintura en Esmalte Sintético			$ 293.930,52	$ -	59,00	21,00	80,00	17.341.900,68	$ 6.172.540,92	$ 23.514.441,60		$ -
3,18	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			$ 45.618,89	$ -	97,00	37,00	134,00	4.425.032,33	$ 1.687.898,93	$ 6.112.931,26		$ -
3,19	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.			$ 188.625,09	$ -	133,00	49,00	182,00	25.087.136,97	$ 9.242.629,41	$ 34.329.766,38		$ -
3,20	Suministro e instalación de registro de cierre metalico			$ 18.970,82	$ -	228,00	70,00	298,00	4.325.346,96	$ 1.327.957,40	$ 5.653.304,36		$ -
3,21	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm			$ 49.939,55	$ -	37,64	0,00	37,64	1.879.724,66	$ -	$ 1.879.724,66		$ -
3,22	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta			$ 18.894,82	$ -	-	0,00	-	-	$ -	$ -		$ -
3,23	Rotura y adecuación de caja de inpección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.			$ 30.580,27	$ -	191,00	65,00	256,00	5.840.831,57	$ 1.987.717,55	$ 7.828.549,12		$ -
	ACABADOS												
3,24	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)			$ 31.418,61	$ -	19,64	1,86	21,50	617.061,50	$ 58.438,61	$ 675.500,11		$ -
3,25	Recuperación de piso en concreto e=0,05m			$ 19.876,75	$ -	128,42	25,11	153,53	2.552.572,23	$ 499.105,19	$ 3.051.677,42		$ -
3,26	Recuperación de piso esmaltado			$ 15.405,26	$ -	21,90	0,00	21,90	337.375,19	$ -	$ 337.375,19		$ -
3,27	Enchape pared blanco (0.20 X 0.20) metros			$ 30.290,43	$ -	340,17	116,84	457,01	10.303.956,15	$ 3.539.133,84	$ 13.843.089,99		$ -
3,28	Enchape piso antideslizante blanco (0,20 x 0,20) metros			$ 36.709,45	$ -	237,44	101,95	339,39	8.716.475,36	$ 3.742.528,43	$ 12.459.003,79		$ -
3,29	Estuco blanco en polvo para muros			$ 4.777,63	$ -	2.824,63	1001,16	3.825,79	13.495.009,32	$ 4.783.172,05	$ 18.278.181,37		$ -
	4. ACOMETIDAS												
	CONEXIONES												
4,1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio			$ 121.071,76	$ -	5,00	0,00	5,00	605.358,80	$ -	$ 605.358,80		$ -
4,2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.			$ 132.377,90	$ -	-	0,00	-	-	$ -	$ -		$ -
4,3	Suminitro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto			$ 28.070,96	$ -	8,00	0,00	8,00	224.567,68	$ -	$ 224.567,68		$ -
4,4	Suminitro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto			$ 27.279,28	$ -	2,00	0,00	2,00	54.558,56	$ -	$ 54.558,56		$ -
4,5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio			$ 78.181,52	$ -	258,20	82,00	340,20	20.186.468,46	$ 6.410.884,64	$ 26.597.353,10		$ -
4,6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio			$ 12.950,73	$ -	229,50	8,50	238,00	2.972.192,54	$ 110.081,21	$ 3.082.273,75		$ -
4,7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.			$ 69.790,32	$ -	227,00	70,00	297,00	15.842.402,64	$ 4.885.322,40	$ 20.727.725,04		$ -
	INTERVENCIONES VARIAS												
4,8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)			$ 162.285,76	$ -	42,34	0,00	42,34	6.871.179,08	$ -	$ 6.871.179,08		$ -
	CAJAS DE INSPECCIÓN												
4,9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)			$ 238.957,93	$ -	30,00	3,40	33,40	7.168.737,90	$ 812.456,96	$ 7.981.194,86		$ -
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (ACTIVIDAD 3)					**1.304.671.478,60**				**1.182.134.275,65**	**$ 329.581.998,21**	**$ 1.511.716.273,86**		**-$ 207.044.795,26**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (ACTIVIDAD 3) ADICIÓN					**651.679.570,36**								
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (ACTIVIDAD 3) INICIAL + ADICIÓN					**1.956.351.048,96**								
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (ACTIVIDAD 3)					**633.662.104,77**				**382.893.291,89**	**$ 106.751.609,21**	**$ 489.644.901,10**		**-$ 67.061.809,17**
	ADMINISTRACIÓN	**25,44%**			497.695.706,86				300.734.959,73	$ 83.845.660,34	$ 384.580.620,07		-$ 52.672.195,91
	IMPREVISTOS	**1,00%**			19.563.510,49				11.821.342,76	$ 3.295.819,98	$ 15.117.162,74		-$ 2.070.447,95
	UTILIDAD	**5,00%**			97.817.552,45				59.106.713,78	$ 16.479.099,91	$ 75.585.813,69		-$ 10.352.239,76
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD	**19,00%**			18.585.334,97				11.230.275,62	$ 3.131.028,98	$ 14.361.304,60		-$ 1.966.925,55
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (ACTIVIDAD 3)					**2.590.013.153,73**				**1.565.027.567,54**	**$ 436.333.607,42**	**$ 2.001.361.174,96**		**$ 588.651.978,77**
VALOR TOTAL (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)					**2.654.032.618,88**				**1.611.473.784,80**	**$ 449.015.332,70**	**$ 2.060.489.117,50**		**$ 593.543.501,38**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**$ 1.771.707.945,99**	**V/R ANTICIPO (ACTIVIDAD 3):**	**$ 345.450.914,11**	**% EJECUTADO PRESENTE ACTA:**	**16,92%**
V/R ADICIONES:	$ 882.324.674,00	**% ANTICIPO (ACTIVIDAD 3) :**	**20%**	**% FACTURADO PRESENTE ACTA:**	**90% DEL ACTA**
V/R ACTUAL CONTRATO	$ 2.654.032.619,99	**% RETEGARANTIA:**			**15,23%**

FORMA DE PAGO: ENTerritorio realizará pagos mensuales, hasta el noventa por ciento (90%) del valor de cada acta de recibo parcial, de conformidad con las actas parciales mensuales de obra e informe mensual del CONTRATISTA debidamente aprobados por la interventoria, acompañados de la respectiva factura o cuenta de cobro.

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de las 3 Actividades, se pagará una vez se haya liquidado el contrato, previa suscripción del acta de recibo final de las obras a satisfacción y la entrega de los documentos señalados en la actividad de entrega de obras señalado en este estudio y de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría de ENTerritorio vigente durante la ejecución del contrato, dicha entrega será realizada a la interventoria y a ENTerritorio, así como de la aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el anexo "ESQUEMA DE GARANTÍAS Y SEGUROS" del

eterritorio	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	F-GG-32
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3) (90%)	% PAGADO (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)	RETENCIÓN GARANTÍA (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (ACTIVIDAD 3)	SALDO POR AMORTIZAR (ACTIVIDAD 3)	VALOR NETO A PAGAR (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)	SALDO POR PAGAR (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)	% PAGADO ACUMULADO (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)
1	COBRO ACTA PARCIAL No. 1 (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)	23-ago.-22	$ 379.134.821,64	14,29%		$ 81.050.167,27	$ 264.400.746,84	$ 298.084.654,370	$ 2.274.897.798,35	14,29%
2	COBRO ACTA PARCIAL No. 2 (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)	22-sep.-22	$ 442.194.944,42	16,66%		$ 95.946.599,15	$ 168.454.147,69	$ 346.248.345,270	$ 1.832.702.853,93	30,95%
3	COBRO ACTA PARCIAL No. 3 (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)	28-nov.-22	$ 306.371.901,60	17,29%		$ 66.162.269,26	$ 102.291.878,43	$ 240.209.632,340	$ 1.526.330.952,33	48,24%
4	COBRO ACTA PARCIAL No. 4 (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)	2-dic.-22	$ 322.624.898,30	12,16%		$ 69.846.513,30	$ 32.445.365,13	$ 252.778.385,000	$ 1.203.706.054,03	60,40%
5	COBRO ACTA PARCIAL No. 5 (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)		$ 404.113.799,43	15,23%		$ 32.445.365,13	$ -	$ 371.668.434,300	$ 799.592.254,60	75,62%
TOTAL			$ 1.854.440.365,39	75,62%	$ -	$ 345.450.914,11	$ 32.445.365,13	$ 1.508.989.451,28	$ 799.592.254,60	75,62%

OK

(1) Descripción de la etapa o el periodo facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACIÓN: 2/12/2022

Elaboró
CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: ING. DUARTE JOSE PINEDO DURANGO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CONSTRUREDES
NIT: 901568676 - 5

Aprobó
INTERVENTOR:

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre: ING. MARCY CORREA CASTAÑO
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.
NIT: 800.173.768 -1

Avaló

DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:


Firma:


Nombre: ARQ. ERIKA GUTIERREZ GAITAN
SUPERVISOR - ENTerritorio

Nota 1:
a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.
Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las
Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

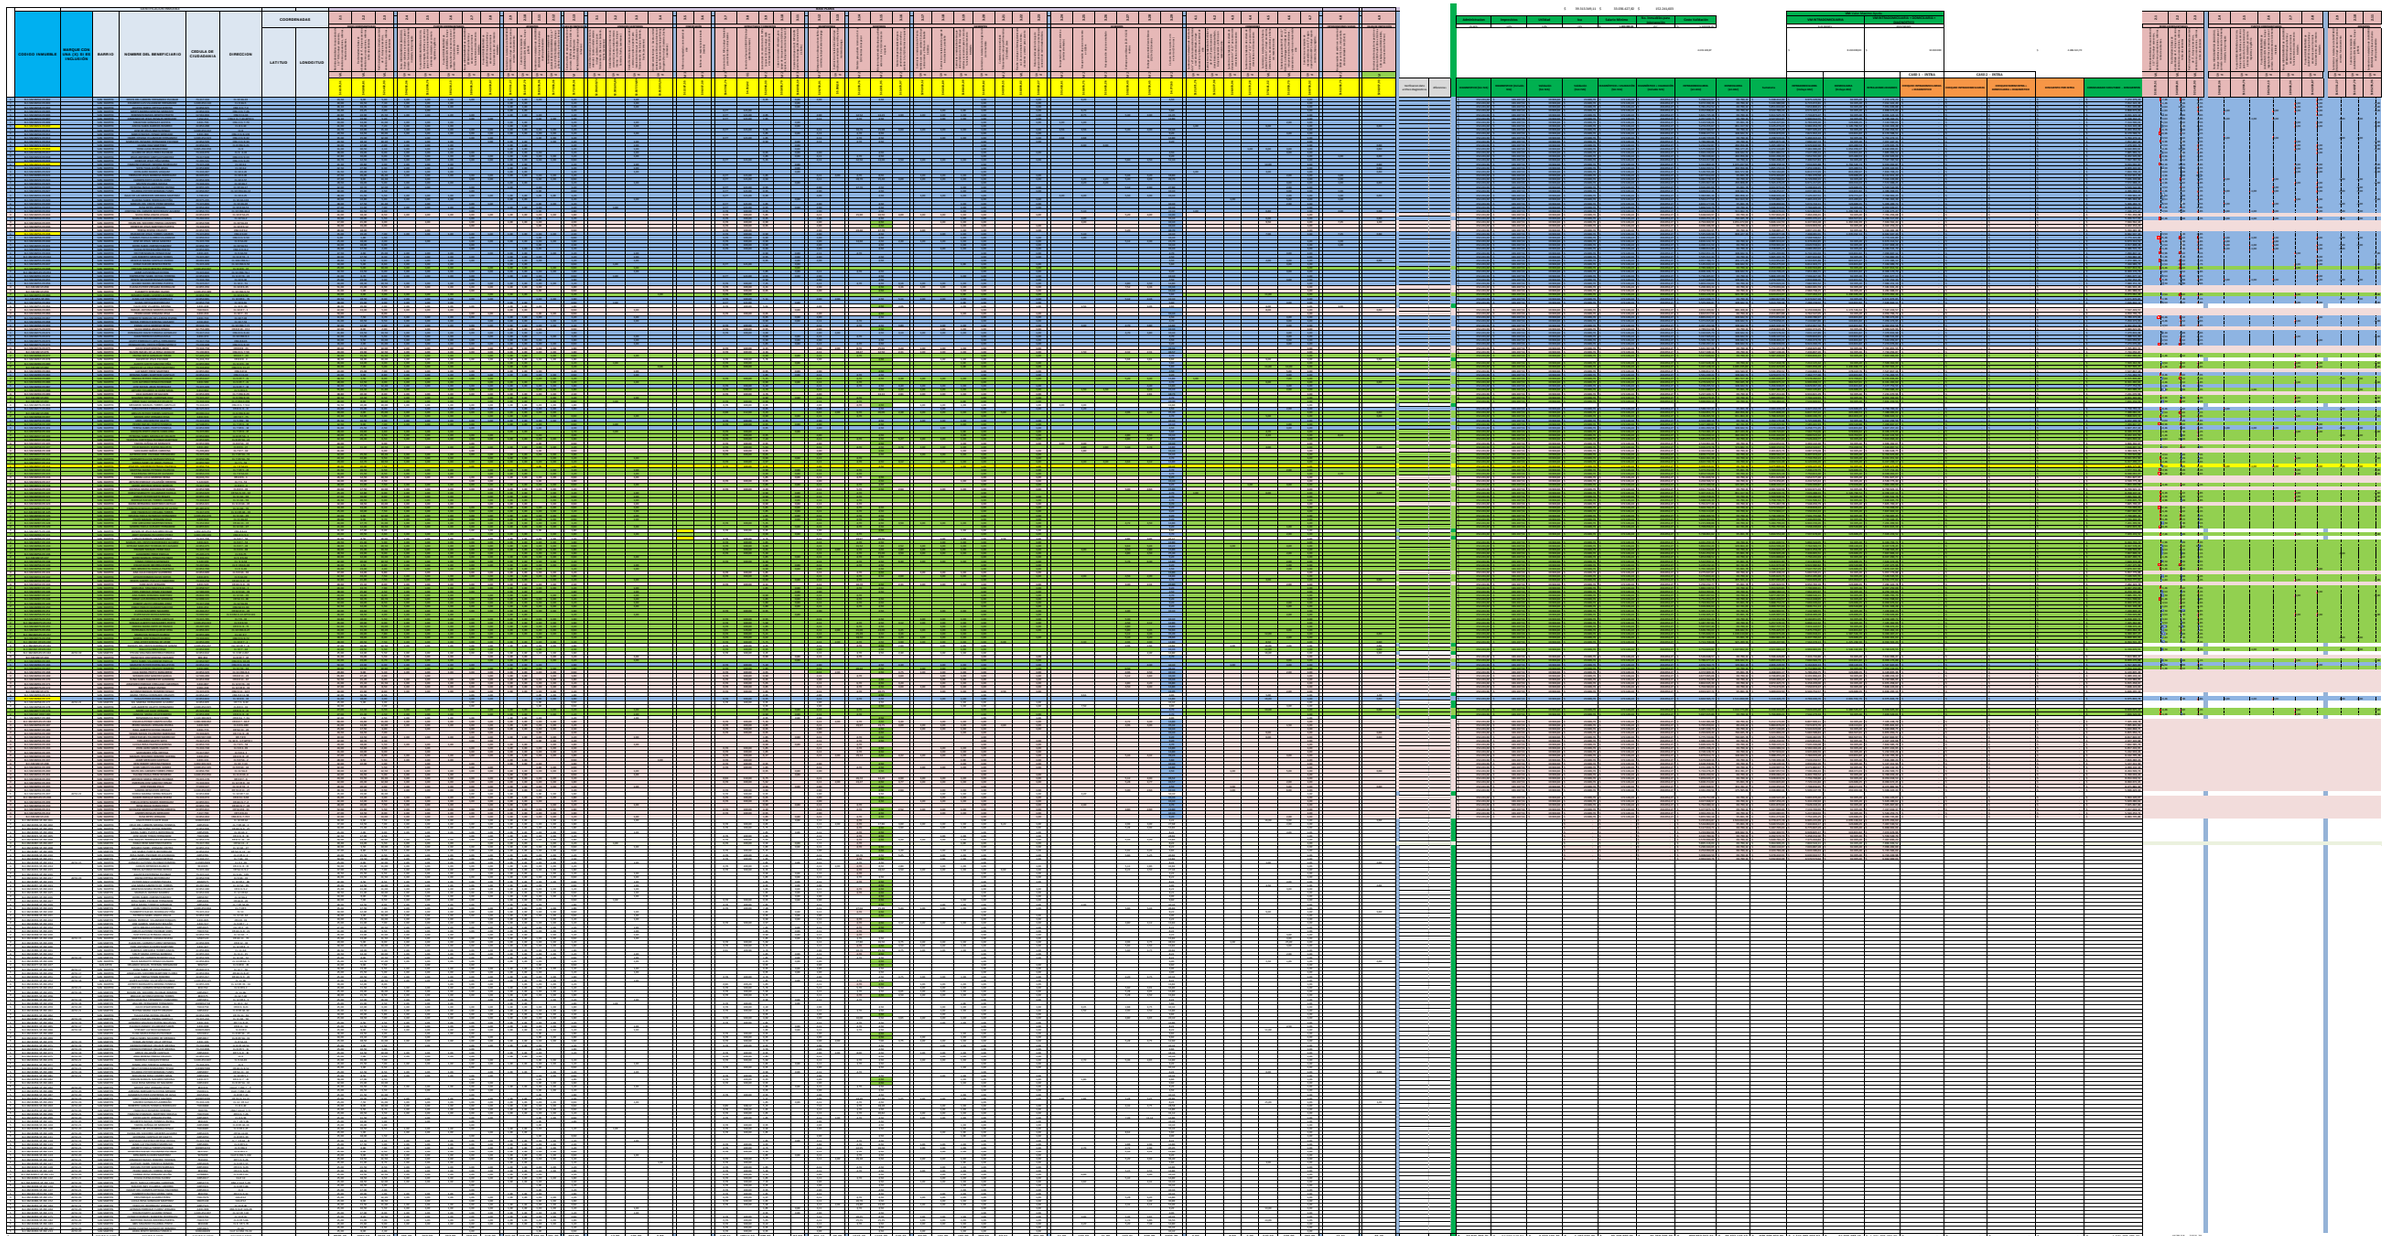

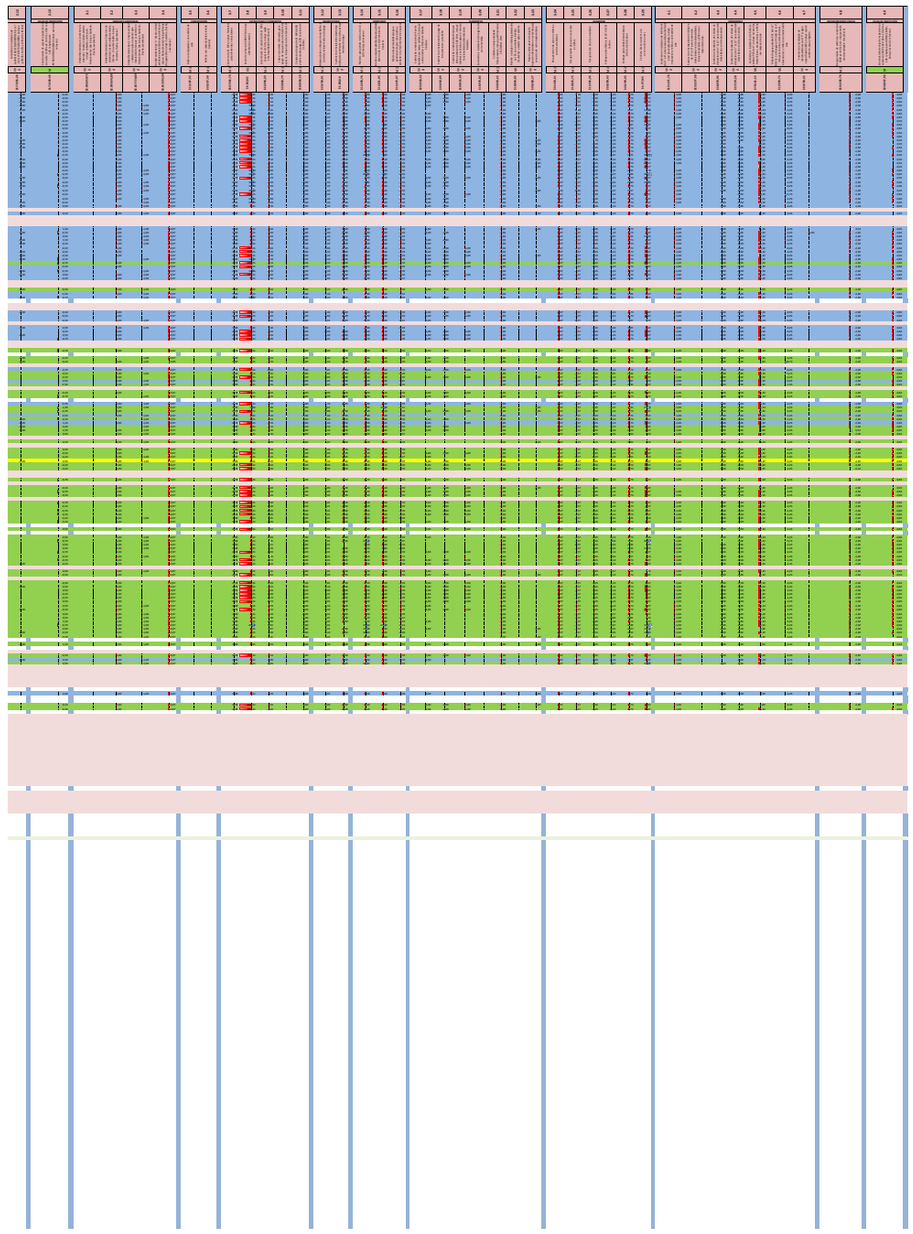



RELACIÓN DE PLANOS DEL PROYECTO

enterritorio	RELACIÓN DE PLANOS	CÓDIGO	F-GG-20
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-12


CONTRATO No. :	2220576
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.
SUPERVISOR:	ERIKA GUTIERREZ GAITÁN

No.	Plano #	Versión	Fecha	Contenido	Remplaza Plano #	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	EST-01	1	3-may-22	ESPECIFICACIONES TECNICAS				CORESPONDEN A CASETA T3
2	EST-02	1	3-may-22	PLANTA ESTRUCTTURAL DESPIECE DE COLUMNAS DESPIECE DE VIGAS CORTES Y DETALLES				CORESPONDEN A CASETA T3
3	EST-01	1	9-may-22	ESPECIFICACIONES TECNICAS				CORESPONDEN A CASETA T1
4	EST-02	1	12-may-22	PLANTA ESTRUCTTURAL DESPIECE DE COLUMNAS DESPIECE DE VIGAS CORTES Y DETALLES				CORESPONDEN A CASETA T1
5	EST-01	1	12-may-22	ESPECIFICACIONES TECNICAS				CORESPONDEN A CASETA T2
6	EST-02	1	12-may-22	PLANTA ESTRUCTTURAL DESPIECE DE COLUMNAS DESPIECE DE VIGAS CORTES Y DETALLES				CORESPONDEN A CASETA T2
7	EST-01	1	12-may-22	ESPECIFICACIONES TECNICAS				CORESPONDEN A CASETA T4
8	EST-02	1	12-may-22	PLANTA ESTRUCTTURAL DESPIECE DE COLUMNAS DESPIECE DE VIGAS CORTES Y DETALLES				CORESPONDEN A CASETA T4
9	EST-01	1	23-may-22	ESPECIFICACIONES TECNICAS				CORRESPONDEN A TANQUE
10	EST-02	1	23-may-22	PLANTA ESTRUCTTURAL DESPIECE DE COLUMNAS DESPIECE DE VIGAS CORTES Y DETALLES				CORRESPONDEN A TANQUE
11	EST-	1	1-jul-22	PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTAS DE VIGAS DE CUBIERTA, DETALLES DE VIGAS DE CIMIENTO Y DE CUBIERTA, CORTE ESTRUCTURAL,PLANTILLA LOSA MACIZA Y MACHONES DE CASETAS T1,T2,T3,T4 Y TANQUE				CORRESPONDE A CASTEAS T1,T2,T3,T4 Y TANQUE


Para constancia de lo anterior, se firma en ___CORDOBA____ a los ____31_ días del mes ___OCTUBRE__ del ___2022___.

ENTREGA	RECIBE
Firma  ING. JOSÉ ALEXANDER ROMERO CETINA T.P. 25202-177284 CND	Firma 
NOMBRE: ALEXANDER ROMERO	**NOMBRE Jose Stalin Castaño**
Fecha: 30/09/2022	Fecha: 30/09/2022


Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

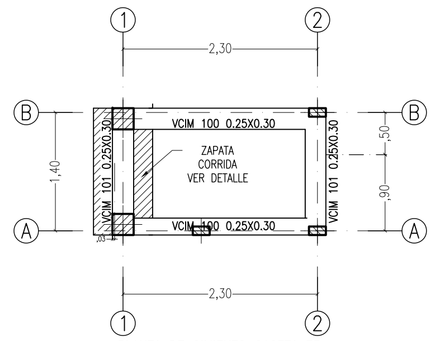


PLANTA DE CIMIENTO CASETA T3
ESC 1:25

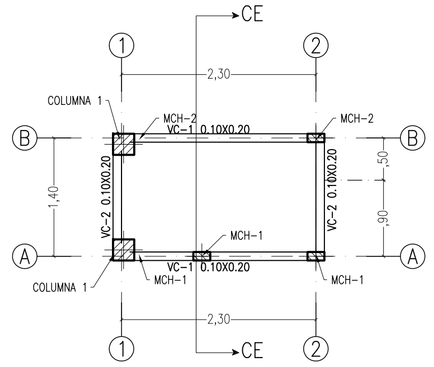


PLANTA ESTRUCTURAL DE CUBIERTA CASETA T3
ESC 1:25




PLANTA ESTRUCTURAL DE Llosa DE TANQUE ELEVADO CASETA T3
ESC 1:25

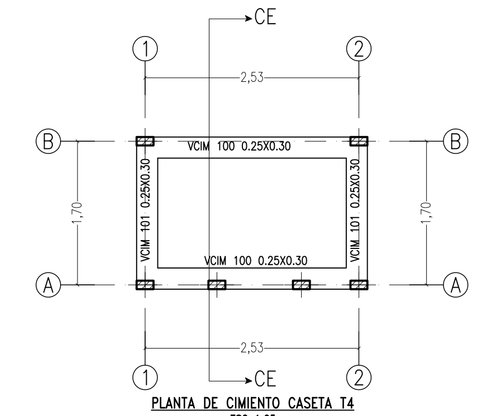


PLANTA DE CIMIENTO CASETA T4
ESC 1:25

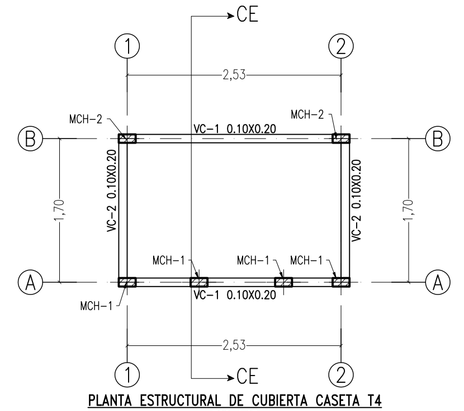



PLANTA ESTRUCTURAL DE CUBIERTA CASETA T4
ESC 1:25






DETALLES DE VIGAS CIMIENTO CASETA T3
ESC 1:50







DETALLES DE VIGAS CORONAS CASETA T3
ESC 1:50

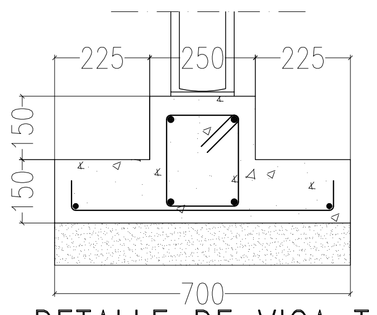


DETALLE DE VIGA T
ESC 1:10





DETALLE DE VIGAS DE TANQUE CASETA T3
ESC 1:50






DETALLES DE VIGAS CIMIENTO CASETA T4
ESC 1:50







DETALLES DE VIGAS CORONAS CASETA T4
ESC 1:50

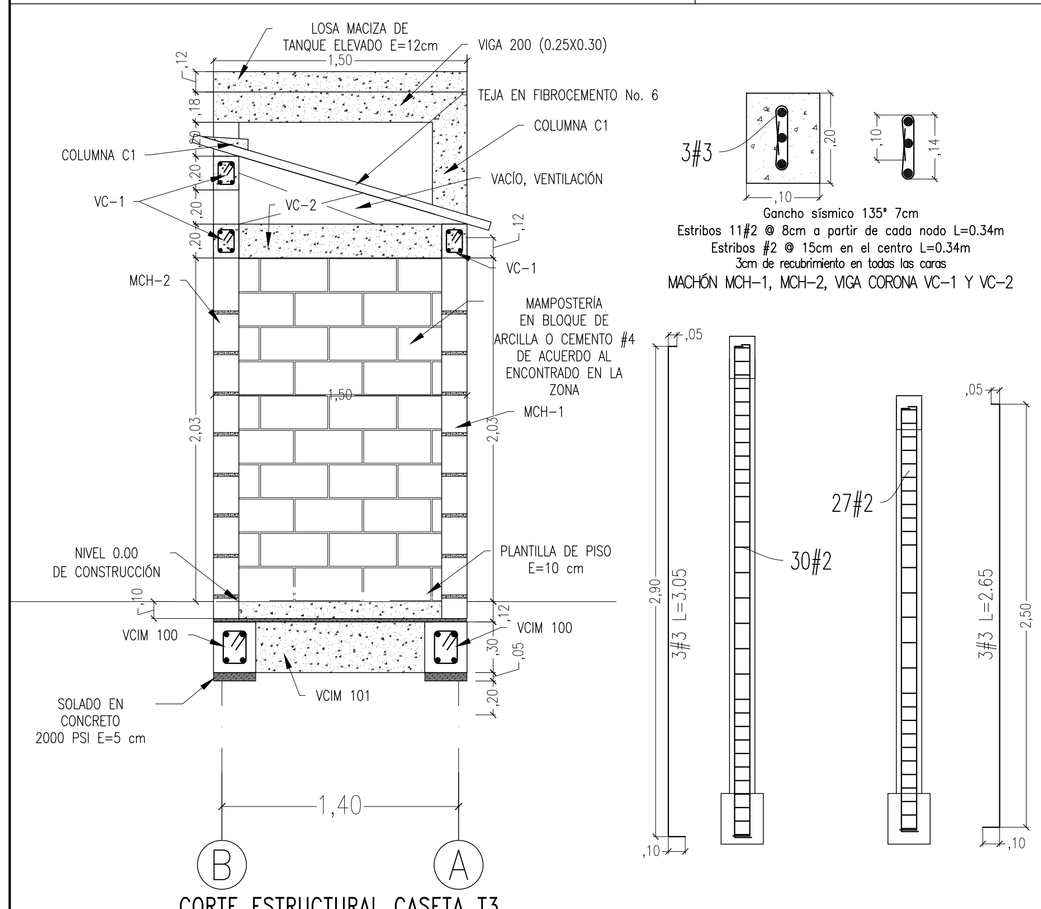


CORTE ESTRUCTURAL CASETA T3
ESC 1:25

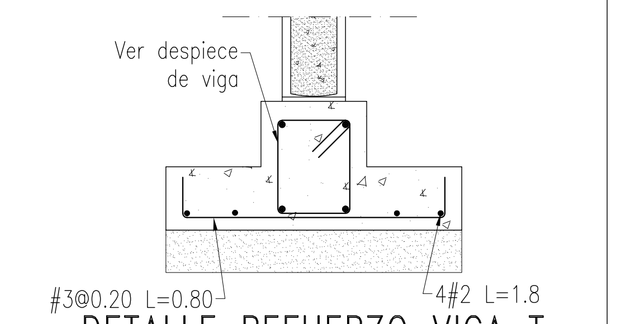


DETALLE REFUERZO VIGA T
ESC 1:10

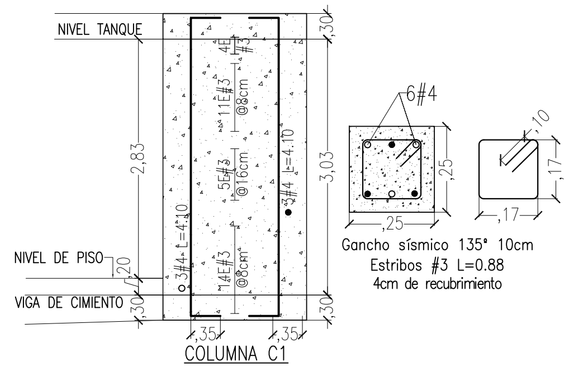


DESPIECE COLUMNAS CASETA T3
ESC VERTICAL: 1:50

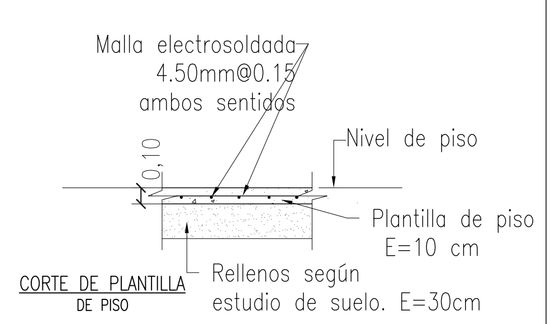




CORTE TRANSVERSAL DE LOSA MACIZA DE TANQUE ELEVADO CASETA T3 E=12cm

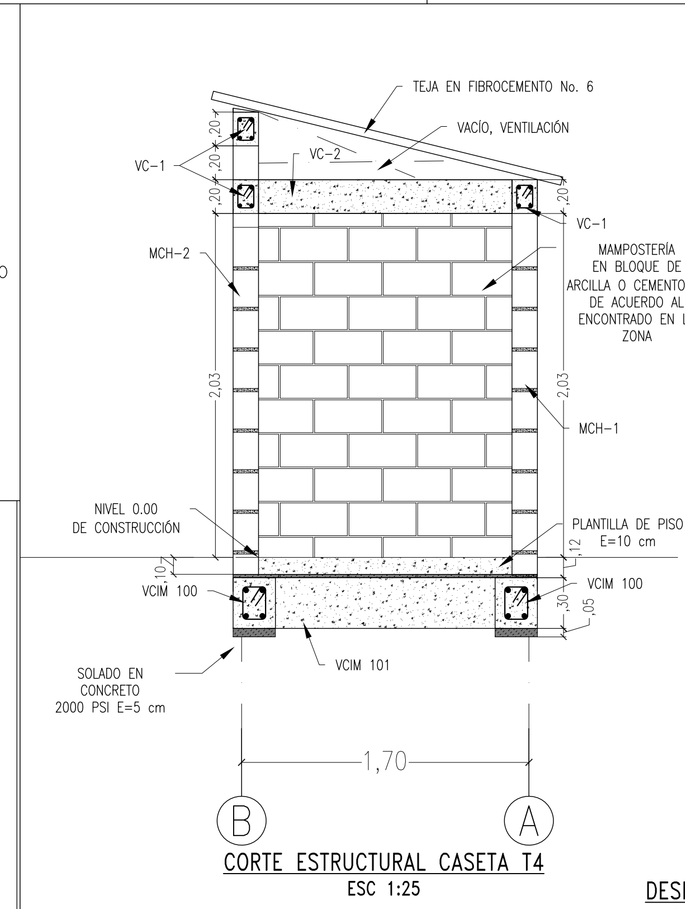


CORTE ESTRUCTURAL CASETA T4
ESC 1:25

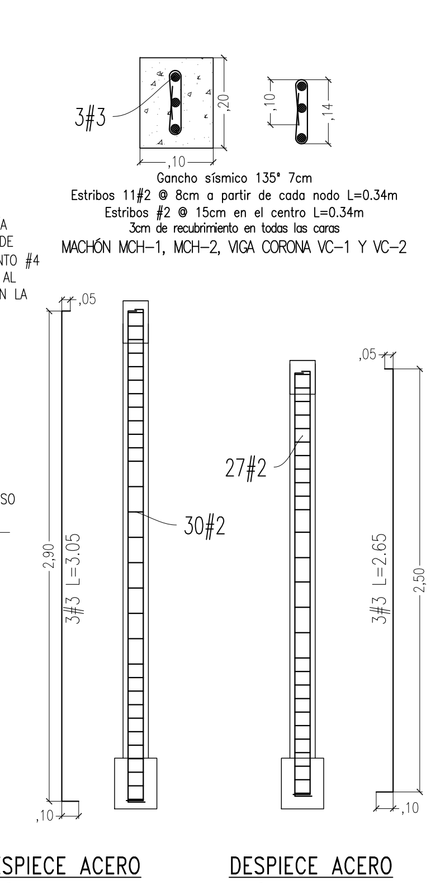

DESPIECE ACERO MACHÓN 2 CASETA T4
ESC 1:25

DESPIECE ACERO MACHÓN 1 CASETA T4
ESC 1:25

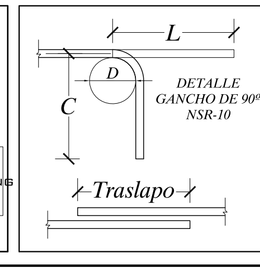

DETALLE GANCHO DE 90° NSR-10

DIMENSIONES DE LOS GANCHOS ESTANDAR Y LONGITUDES DE TRASLAPOS PARA CADA BARRA					
Barra #	Ø Pulg	L(cm)	D(cm)	C(cm)	Traslapo(m)
3	3/8	-	-	-	0,40
4	1/2	25	3,8	20	0,60
5	5/8	30	4,8	25	0,70
6	3/4	35	5,7	30	0,85
7	7/8	40	6,7	35	1,25
8	1	45	8,0	40	1,40

ESPECIFICACIONES GENERALES
-Zona de amenaza sísmica: Intermedia (Aa=0.10; Av=0.15)
-Capacidad de disipación de energía: D.M.O., -Grupo de uso: I,
-Tipo de suelo:D, -Carga de acabados: 1.4KN/m².
-Mortero de pega: Tipo S. 1:3,
-Mortero de relleno: Tipo grueso 1:3
-fy :420MPa Ø > #2 y cumplir con NTC 2289 (ASTM A706)
-Concreto f'c= 21.0 MPa. y cumplir NSR-10.
-Carga viva de diseño: 1.8 KN/m².,
-Mamposteria fcu=5Mpa.
- No se puede embeber ductos, tuberías o camisas de cualquier material en las vigas y/o columnas.

NOTA: El primer estribo de cada viga debe ser colocado a una distancia no mayor a 5cm medidos desde la cara de la columna.
El tamaño máximo de los agregados debe definirse según el diseño de mezcla

Cantidad ┐ ┌ Diametro en octavos
1#4 L=3.0
└ Longitud en metros

RECUBRIMIENTO		REFUERZO	AGREGADO MAXIMO	
Cimentación:	7.5 cm	#2 fy = 240MPa	Zapatas:	3/4"
Columnas:	4.0 cm	#3 a #9 fy = 420MPa	Columnas:	1/2"
Vigas:	4.0 cm		Losas y escalera:	1/2"
Losa:	3.0 cm			

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS MUNICIPIO DE CÓRDOBA-BOLÍVAR

CONTIENE:
PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTA DE VIGAS DE CUBIERTA, DETALLES DE VIGAS CIMIENTO Y DE CUBIERTA, CORTE ESTRUCTURAL, PLANTILLA, LOSA MACIZA Y MACHONES. DE CASETAS T1, T2, T3, T4 Y TANQUE

ESCALA: INDICADAS
PLANO Nº: 2/2

DISEÑO ESTRUCTURAL:
LOGO DE ESTRUCTURAL.PNG
LOGO JOSE ALEXANDER.PNG

DIRECCION:
BARRIO SAN MARTÍN MUNICIPIO DE CÓRDOBA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

FECHA:
JUNIO DE 2022

PETICIONARIO:
CONSORCIO CONSTRUREDES

EQUIPO DE TRABAJO:

ARCHIVO MAGNÉTICO:
EST. CASETAS CORDOBA.dwg

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA – BOLIVAR
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE CORDOBA BOLIVAR, BARRIO SAN MARTÍN
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES
CONTRATO DE OBRA No.:	2220576
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	2220587
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2022

FOTOGRAFÍA (1)



Descripción.
Se evidencia Caseta T3 con cerámica en pared y piso, instalación de sanitario, lavamanos con pedestal, ducha e incrustaciones de pared. Los procesos constructivos fueron ejecutados dando cumplimientos a los parámetros de calidad.

FOTOGRAFÍA (2)



Descripción.
Se evidencia construcción de columna y losa con viga T de tanque, en cumplimiento de la NSR-10. Está instalado el tanque elevado, con la tubería hidráulica de 1/2" que abastece el tanque elevado de 500Lts y distribuye a los aparatos instalados.

FOTOGRAFÍA (3)



Descripción.
Se evidencia lavaplatos con losa en concreto, se encuentra empotrado y parcialmente instalado el lavaplatos y se adelantan detalles de filo en el pañete en mortero 1:4 sobre muros soporte.

FOTOGRAFÍA (4)




Descripción.
La caseta Tipo 3 y muro de soporte con instalación de lavadero estándar, se encuentran con terminación de pañete en mortero 1:4 en muros exteriores e interiores, con detalles en filos, igualmente, cuentan con instalación de puntos hidráulicos y sanitarios, instalación de cubierta, plantilla de piso y aplicación de pintura.

FOTOGRAFÍA (5)



Descripción.
Se evidencia construcción de Caseta Tipo 2, con construcción de viga dintel, columnetas, enchape en pared y piso, instalación de combo sanitario, ducha e incrustaciones de pared, instalación de puerta y aplicación de pintura.

FOTOGRAFÍA (6)

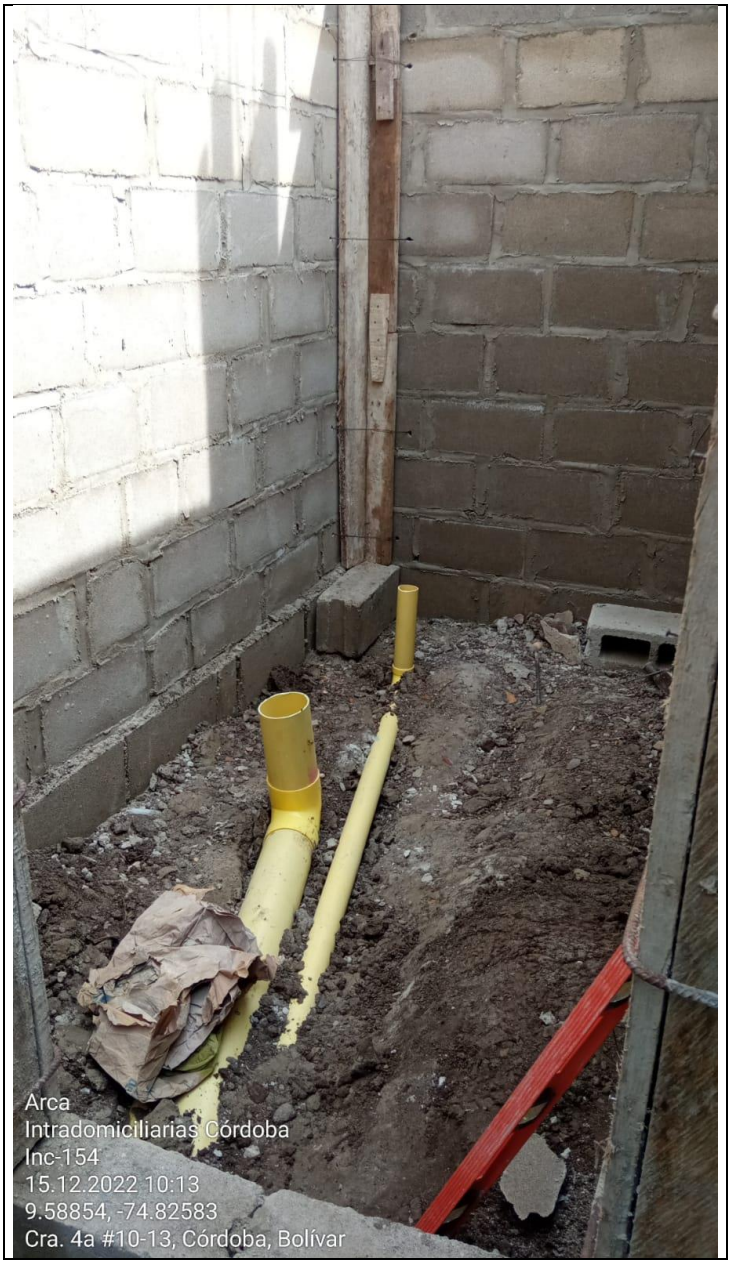

Descripción.
Se evidencia caseta Tipo 3 en proceso constructivo, se encuentra armada la formaleta en madera para posterior fundida de columnas y columnetas. La unidad sanitaria está con levante de muro a altura de viga dintel. Se evidencia instalación de tubería sanitaria para puntos de sanitario y sifón de ducha.

FOTOGRAFÍA (7)



Descripción.
Se evidencia columna de tanque elevado, fundida y debidamente aplomada, de igual forma se encuentra armada formaleta para viga T y losa de tanque, apuntalada y soportada con gatos para posterior proceso de fundida.

FOTOGRAFÍA (8)



Descripción.
Se evidencia instalación de sanitario, lavamanos con pedestal, ducha, cerámica de pared y piso e incrustaciones de pared. La caseta tipo 3 cuenta con pañete, aplicación de pintura en muros internos e instalación de tanque, puerta metálica y cubierta.

FOTOGRAFÍA (9)



Descripción.
La caseta Tipo 3 cuenta con puntos hidráulicos y sanitarios, pañete en muros externos e internos y filos, instalación de cubierta. Se encuentra en proceso de enchape en pared y piso, con el debido proceso constructivo y utilizando las herramientas menores, garantizando acabado de calidad.

FOTOGRAFÍA (10)




Descripción.
En vivienda con intervención de adecuación se evidencia desmonte, reemplazo e instalación de inodoro con buen funcionamiento.

FOTOGRAFÍA (11)



Descripción.
Se evidencia construcción de soporte para lavadero estándar, con inicio de etapa de pañete en mortero 1:4 sobre muros externos e internos, cuidando el acabado de los filos, y fijación de lavadero. Faltante instalación de llave de paso y muñeco de desagüe, además aplicación de pintura.

FOTOGRAFÍA (12)

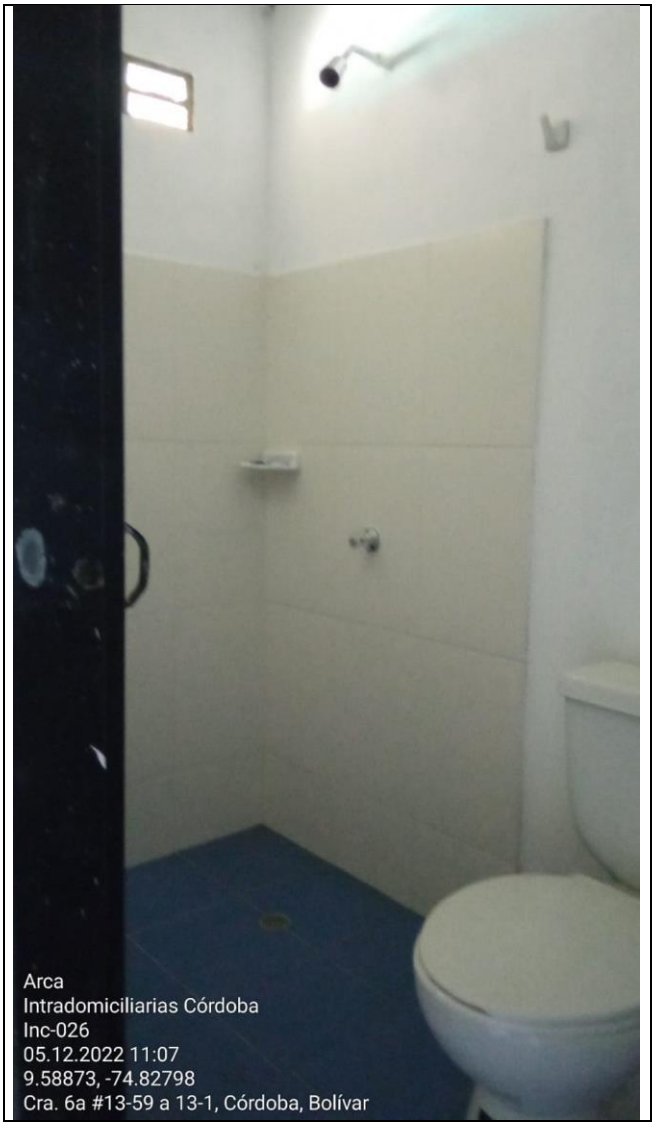

Descripción.
La unidad sanitaria cuenta con instalación de ducha e incrustaciones de pared, cerámica en piso y zona húmeda, instalación de sanitario y lavamanos con pedestal.

VIDEO DEL AVANCE DEL PROYECTO

Nota:

Los video se adjuntan en carpeta digital

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS ENSAYOS DE MATERIALES Y DEMÁS PRUEBAS

enterritorio	**CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS**	CÓDIGO:	**F-GG-23**
		VERSIÓN:	**1**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-19**

FECHA DE PRESENTACIÓN:	(22/12/2022)	**INFORME MENSUAL DEL**	**(01/12/2022)**	**AL**	**(22/12/2022)**
CONTRATO No. :	2220587				
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES				
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A				
SUPERVISOR:	ENTERRITORIO				

MEDIANTE EL PRESENTE FORMATO, EL INTERVENTOR CERTIFICA QUE LOS ÍTEMS DE PROYECTO QUE SE PAGARÁN, CUMPLEN EN TODOS LOS CASOS CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS APLICABLES Y CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1595 DE 2015 LOS QUE LE MODIFIQUEN O SUSTITUYAN

1. Si para el producto (bien o servicio), proceso o procedimiento se exigen requisitos por un Reglamento Técnico, decreto o ley (página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), obligatoriamente se declarará la conformidad y será entregable verificado previa presentación del certificado de conformidad de producto, sello de calidad o ensayos en laboratorio acreditado.

2. Si el producto (bien o servicios) proceso o procedimiento no está regido por un Reglamento técnico obligatorio, decreto o ley pero el contrato en su texto, en una especificación, el diseño, los planos u otro documento o requisito contractual cualquiera que sea se indica el cumplimiento de una norma (NTC, internacional, nacional o sectorial) o requisito particular o general, para declarar conforme ese bien o servicio y declararse entregable verificado, debe contar obligatoriamente con ensayo o cumplimiento de protocolo donde conste la conformidad con el requisito exigido.

1. LABORATORIOS ACREDITADOS Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

La Interventoría de Contrato CERTIFICA que la totalidad de los resultados de conformidad que se relacionan en este informe y anexan (anexo digital), se obtuvieron: en laboratorios acreditados cuando el bien o servicio está especificado y/o normado por un Reglamento Técnico Obligatorio, ley o decreto; cuando el proceso, procedimiento, bien o servicio no esta regido por un Reglamento técnico obligatorio, ley o decreto pero el Contrato lo exige, la conformidad de calidad se declaró mediante ensayo realizado con equipos de medición calibrados o verificación de cumplimiento de protocolo, bajo el control y seguimiento de un profesional capacitado e idóneo quien suscribe el registro del ensayo o protocolo en particular (anexo digital); en este último caso, se incluye en este formato la acreditación del laboratorio (anexo digital) si así lo exige el Contrato o acuerdo entre las partes. A continuación se relacionan los laboratorios acreditados y no acreditados donde se realizaron los ensayos y certificados de calibración de equipos utilizados (anexo digital).

1. 1. LABORATORIOS ACREDITADOS -EXIGIDO CUANDO EL BIEN O SERVICIO SE RIGE POR REGLAMENTO TÉCNICO OBLIGATORIO, LEY O DECRETO

Laboratorio		Certificado de Acreditación	Vigencia de la acreditación		Ensayos realizados en este laboratorio
Código (1)	**Nombre**		**Desde**	**Hasta**	
N/A	N/A PARA EL PRESENTE INFORME	N/A	N/A	N/A	N/A
	Adicione las filas necesarias				

(1) Para efectos de trazabilidad y control, asignar a cada laboratorio un código LAC (Laboratorio Acreditado) seguido de un número consecutivo, sin repetir y sin anular desde el inicio del proyecto hasta el final.

1.1.1. EQUIPOS - Certificados de calibración

Laboratorio (3)	Serial equipo (2)	Descripción del equipo	Número de Certificado de Calibración	Vigencia certificado de calibración	
				Desde	**Hasta**
Laboratorio Hernán Ramos Villamil S.A.S	2124	CAZUELA CASAGRANDE	NA-24532-001 R0	3/12/2021	
Laboratorio Hernán Ramos Villamil S.A.S	N/A	MANOMETRO HUMEDÓMETRO	NA-23741-001 R0	16/07/2021	
Hernán Ramos Villamil S.A.S	B-001/LCD/2-X	MAQUINA DE ENSAYO A COMPRESION (MARCO CILINDROS)	F1305	30/03/2022	
Laboratorio Hernán Ramos Villamil S.A.S	N/A	MAQUINA DE ENSAYO A COMPRESION (CILINDROS)	F1304	30/03/2022	

(2) Para efectos de trazabilidad y control, relacionar el serial del equipo calibrado, sin repetir desde el inicio del proyecto hasta el final.
(3) Indique en esta casilla, el código del laboratorio donde se encuentra el equipo cuyo certificado de calibración se está informando.

2. ENSAYOS, SELLOS DE CALIDAD, CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD O REGISTRO DE ENSAYO EN LABORATORIO Y/O PROTOCOLOS APLICADOS

Los resultados de ensayos realizados y que se pagan parcial o totalmente en este periodo o períodos posteriores, son los que a continuación se relacionan.

Con el fin de tener trazabilidad de los ensayos, estos se numeran con dos dígitos XX-YY donde XX es el número del periodo del mes de ejecución del Proyecto y YY es el número en estricto orden cronológico del ensayo o certificado; para el primer informe el número de orden XX será 01, para el segundo informe 02 y así sucesivamente.

2.1. ENSAYOS REALIZADOS y/o PROTOCOLOS APLICADOS EN ESTE PERÍODO

No. de Orden			Ensayo			Resultado del Ensayo
XX	YY	Fecha ensayo o aplicac. protocolo	Norma, protocolo o requisito técnico aplicable (exigido)	Nombre de la norma, protocolo o requisito	Código de Laboratorio donde se realizó el ensayo	Observaciones (la observación no pude condicionar la conformidad)
08	01		I.N.V.E 410 NTC-673-1513	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDRO DE CONCRETO	FC-19 VERSIÓN 2	LOS ELEMENTOS SOMETIDOS AL ENSAYO A COMPRESIÓN, COMO LO FUERON LA COLUMNA, LOSA DE TANQUE Y VIGA PRESENTAN UN 70% DE RESISTENCIA A LOS 7 DIAS DE TOMADA LA MUESTRA
08	02	19/12/2022	I.N.V.E 410 NTC-673-1513	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDRO DE CONCRETO	FC-19 VERSIÓN 2	LOS ELEMENTOS SOMETIDOS AL ENSAYO A COMPRESIÓN, COMO LO FUERON LA COLUMNA, LOSA DE TANQUE Y VIGA PRESENTAN MAS DEL 100% DE RESISTENCIA A LOS 28 DIAS DE TOMADA LA MUESTRA

2.2. CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO Y SELLOS DE CALIDAD RECIBIDOS EN ESTE PERIODO

No. de orden		No. Certificado o sello de calidad	Vigencia del Certificado o del sello de calidad		Certificador (entidad acreditada para expedir certificado)	Este sello de calidad o certificado de conformidad ampara los siguientes
XX	YY		Desde	Hasta		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A PARA EL PRESENTE INFORME

CONTROL DE CONFORMIDAD DE CALIDAD POR ÍTEMS DE CONTRATO OBJETO DE PAGO

A continuación se relacionan los ítems de contrato que el Interventor avala para pago en este período, para lo cual se requiere como condición previa que la Interventoría los haya declarado entregables verificados mediante certificados de conformidad de producto y/o sellos de calidad recibidos y/o los ensayos que recibió de un laboratorio acreditatado.

A continuación se resumen los requisitos y trazabilidad de conformidad de los ítems que cumplen calidad para pago en el presente período

Ítems de contrato que se incluirán en el acta y/o factura y/o cuenta del presente período		Normas técnicas (ley, decreto, resolución, reglamento) exigidas a cada ítem en particular		La conformidad con la norma se demuestra mediante	Número de orden del documento (certificado, ensayo, sello) que evidencia objetivamente
# del ítem según contrato	Descripción del ítem	Numero de norma (4)	Descripción de la norma, reglamento, ley, decreto, resolución u otro exigible		
N/A	N/A PARA EL PRESENTE INFORME	N/A	N/A PARA EL PRESENTE INFORME		N/A

(4) Si un ítem está sujeto a mas de una norma o protocolo, utilice tantas filas como sean necesarias e indique una sola norma o protocolo por fila.
(5) El número de orden puede ser de ensayo, protocolo o certificado obtenido en este período o periodos anteriores.
(6) El Interventor llevará control de las cantidades, baches o volúmenes de productos, procesos o procedimientos que certifica que cumplen calidad, de manera que garantice la trazabilidad de calidad para cada entregable evitando que se aplique un certificado vencido, o se aplique un ensayo excediendo su alcance en frecuencia, cantidad o tiempo. El Supervisor ENTerritorio exigirá esta trazabilidad en cualquier momento.

TRAZABILIDAD: Para efectos de trazabilidad, el Interventor anexa a este formato un archivo digital que contiene una carpeta denominada "Control inspección y ensayo Periodo XXX) con la información del período. Esta carpeta contiene tantas subcarpetas como subcapítulos contiene este formato y en cada una de esas subcarpetas se están incluyendo la totalidad de documentos que soportan lo certificado. El Interventor declara que no ha aceptado ningún laboratorio acreditado, calibración de equipo o ensayo del cual no dispone de trazabilidad que anexa a este informe. No se aceptan excepciones ni entregas de trazabilidad posteriores a la radicación de este formato. Este formato incluye como ítems verificados para pago únicamente aquellos que cumplen todos los requisitos establecidos.

	Harcy A. Correa C
Firma	**Firma**
NOMBRE	NOMBRE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (no se acepta firma "por" o "en nombre de")	DIRECTOR DE OBRA (no se acepta firma "por" o "en nombre de")

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
INGENIERIA CIVIL- ESTUDIOS DE SUELO.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. E-410

FC - 19

VERSIÓN 02

Fecha
31/05/2013


CLIENTE CONSORCIO CONSTRUREDES
OBRA INTERDOMICILIARIOS MUNICIPIO DE CORDOBA DPTO DE BOLIVAR
LOCALIZACION DEPARTAMENTO DE CORDOBA -BOLIVAR
FECHA 09/12/2022

NORMAS

I.N.V.E.-410
NTC-673-1513

IDENT.	ELEMENTO	FECHA FUNDICIÓN	FECHA ROTURA	EDAD MUESTRA (Días)	RESISTENCIA REQUERIDA (PSI)	ASENT. PULG	CARGA (KN)	TIPO DE FALLA (1-6)	RESISTENCIA A LA FECHA (PSI)	% DE RESISTENCIA DESARROLLADO
	COLUMNAS	02/12/2022	09/12/2022	7	3.000		132,1	5	2194	73,1 %
	VIGA	02/12/2022	09/12/2022	7	3.000		133,5	5	2225	74,1%
	PLACA	02/12/2022	09/12/2022	7	3.000		128,5	5	2223	74,1%

TIPOS DE FALLA



FORMA DE PROBETAS		Area (cm2)
CILINDRICA NORMAL 4"	10,20	81,75
CILINDRICA NORMAL 6"	15,24	176,115

OBSERVACIONES:

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
NIT N° 900.565.151-3
INGENIERIA CIVIL - ESTUDIOS DE SUELO.

DIR. TÉCNICO

LABORATORISTA

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
INGENIERIA CIVIL- ESTUDIOS DE SUELO.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. E-410

FC - 19

VERSIÓN 02

Fecha
31/05/2013


CLIENTE CONSORCIO CONSTRUREDES
OBRA INTERDOMICILIARIOS MUNICIPIO DE CORDOBA DPTO DE BOLIVAR
LOCALIZACION DEPARTAMENTO DE CORDOBA -BOLIVAR
FECHA 19/12/2022

NORMAS

I.N.V.E.-410
NTC-673-1513

IDENT.	ELEMENTO	FECHA FUNDICIÓN	FECHA ROTURA	EDAD MUESTRA (Días)	RESISTENCIA REQUERIDA (PSI)	ASENT. PULG	CARGA (KN)	TIPO DE FALLA (1-6)	RESISTENCIA A LA FECHA (PSI)	% DE RESISTENCIA DESARROLLADO
	COLUMNAS	21/11/2022	19/12/2022	28	3.000		180,3	5	3215	107,1%
	VIGA	21/11/2022	19/12/2022	28	3.000		170,3	5	3143	104,7%
	PLACA	21/11/2022	19/12/2022	28	3.000		183,3	5	3240	108 %

TIPOS DE FALLA



FORMA DE PROBETAS		Area (cm2)
CILINDRICA NORMAL 4"	10,20	81,75
CILINDRICA NORMAL 6"	15,24	176,115

OBSERVACIONES:

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
NIT N° 900.565.151-3
INGENIERIA CIVIL - ESTUDIOS DE SUELO.

DIR. TÉCNICO

LABORATORISTA

CONSORCIO CONSTRUREDES

Cra 24 No. 15 - 17 Centro

Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com

Teléfono: 311 4143542

«CIUDAD_PROPONENTE»

El consorcio Construredes Se hace responsables de todos los ensayos emitidos por la empresa **Hernán Ramos Villamil S.A.S Nit 901.565.151-3**, laboratorio con más de 50 años de experiencia en el campo de la geotecnia y los cuales poseen la calibración de los equipos, cuyo proveedor si está acreditado para realizar las calibraciones correspondientes y es un respaldo a nuestro trabajo. Estarán encargados de realizar los ensayos pertinentes que garanticen el control y aseguramiento de la calidad de la obra “ejecución de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de cordoba, departamento de bolívar”

REPRESENTANTE LEGAL

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
INGENIERIA CIVIL- ESTUDIOS DE SUELO.

OFICINA Y LABORATORIO
Calle 12 No. 24B – 17 Barrio La Palma
Telef. y Fax 095-282 58 08 - SINCELEJO

Sincelejo, 1 de julio de 2022
Señores
ENTerritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
Ref. Certificación para realización de ensayos de geotecnia

Cordial saludo,

Yo, **HERNAN RAMOS VILLAMIL**, identificado con la cedula de ciudadanía número 9.053.862 de Cartagena y la Matricula profesional 494 de S.I.A.B. que me acredita como ingeniero civil, en calidad de representante legal de la empresa **HERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S. Nit. 900.565.151-3**, laboratorio con más de 50 años de experiencia en el campo de la geotecnia, certifico que seremos los encargados de realizar todos los ensayos pertinentes que garanticen el control y el aseguramiento de la calidad de la obra *"ejecución de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el Municipio de Córdoba, Departamento de Bolívar"* la cual está a cargo de la firma **Consorcio Construredes Nit 901.568.676-5**.

Firma Electrónica
ID Firma: 67c37f62-3496-469f-b5c0-733a2abbe22b

HERNAN RAMOS VILLAMIL
C.C. 9.053.862 de Cartagena.
T.P. 494 S.I.A.B.
Representante Legal

PINZUAR
LABORATORIO DE METROLOGÍA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN – LABORATORIO PRESIÓN

NA-23741-001 R0

CALIBRATION CERTIFICATE – LABORATORY OF PRESSURE

INSTRUMENTO *Instrument*	*MANÓMETRO HUMEDÓMETRO*
INTERVALO DE MEDIDA *Measurement range*	*0 %HR - 20 %HR*
FABRICANTE *Manufaturer*	*RYR*
MODELO *Model*	*DI*
SERIE *Identification number*	*No Presenta*
CODIGO INTERNO *Internal Code*	*23741-001*
SOLICITANTE *Customer*	*HERNAN RAMOS VILLAMIL SAS*
DIRECCIÓN *Address*	*Calle 12 No. 24 B - 17*
CIUDAD *City*	*Sincelejo - Sucre*
FECHA DE CALIBRACIÓN *Date of calibration*	2021 - 07 - 14
FECHA DE EXPEDICIÓN *Date of Issue*	2021 - 07 - 16

NÚMERO DE PÁGINAS DEL CERTIFICADO INCLUYENDO ANEXOS ***3***
Number of pages of this certificate and documents attached

Firmas que autorizan el certificado
Signatures authorizing the certificate

Ing. Sergio Martínez
Director Laboratorio de Metrología

Tecg. Francisco Durán Romero
Metrólogo Laboratorio de Metrología

DETALLES DE LA CALIBRACIÓN

MÉTODO DE CALIBRACIÓN Comparación directa. **Documento de Referencia** DKD R 6 - 1 del 2014

FACTOR DE CONVERSIÓN 1 psi = 6,89476 kPa Nota: Factor de conversión tomado del NIST Special Publication 811 2008 Edition

DATOS DE LA CALIBRACIÓN

INTERVALO A CALIBRAR 0 %HR - 20 %HR **DIVISIÓN DE ESCALA** 0,2 %HR **RESOLUCIÓN** 0,1 %HR

	Indicación del IBC	indicaciones del instrumento patrón	
		M1 - asc	M2 - desc
%	% HR	psi	psi
0	0,00	0,000	0,000
20	4,00	6,166	5,972
40	8,00	12,136	11,988
60	12,00	17,966	17,689
80	16,00	23,934	23,899
100	20,00	29,988	29,988

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

Indicación del IBC		Promedio Patrón	Desviación	Histeresis	Incertidumbre Expandida
%	psi	psi	psi	psi	psi
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
4,00	6,00	6,07	-0,07	0,19	0,25
8,00	12,00	12,06	-0,06	0,15	0,21
12,00	18,00	17,83	0,17	0,28	0,34
16,00	24,00	23,92	0,08	0,04	0,13
20,00	30,00	29,99	0,01	0,00	0,12

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

La desviación máxima encontrada durante la calibración entre el instrumento sometido a prueba y el patrón es:

0,172 psi

La desviación máxima encontrada, respecto al valor máximo de la escala en porcentaje es:

% Desviación = 0,6

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN

La incertidumbre expandida de la medición esta dada en la tabla de resultados de la página No. 2, para cada punto de calibración. La incertidumbre de medición fue calculada utilizando un factor de cobertura k = 2 para un nivel de confianza aproximado del 95,45% para una distribución "t-student" y fue estimada con el documento: JCGM 100:2008. GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement. First Edition. September 2008.

CONDICIONES AMBIENTALES

Max. Temp.	*20,3 °C*	***Min. Temp.***	*19,6 °C*
Max. Hum. (%)	*55 HR*	***Min. Hum. (%)***	*53 HR*

TRAZABILIDAD

El Laboratorio de Metrología de Pinzuar Ltda. asegura el mantenimiento de la trazabilidad de los patrones de trabajo utilizados en las mediciones.

PATRÓN UTILIZADO	Manómetro Digital		
CERT.DE CALIBRACIÓN	7337 de Flexilatina S.A.S.	**CLASE DE EXACTITUD**	0,050%
INTERVALO DE MEDIDA	30 psi	**SERIE**	3227038

OBSERVACIONES .

1. Se realizó una inspección general del instrumento encontrándose en buen estado de funcionamiento
2. Los Certificados de calibración sin las firmas no tienen validez .
3. El usuario es responsable de la recalibración de los instrumentos de medición.
4. Los resultados contenidos parcialmente en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos.
5. Se adjunta estampilla de calibración adherida al instrumento No. **NA-23741-001**

Fin de Certificado

ROSSEMBERG
LABORATORY EQUIPMENT
CEL.:(057)3016256345 - 3157815444
www.rossemberg.com.co

Laboratorio de Metrología

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305**
Number

Página /Pages 1 de 3

Número de páginas incluyendo anexos 3
Number of pages and documents attached

Objeto: Máquina de ensayo a compresion (Marco Cilindros)
Object

Fabricante: Alfa
Manufacturer

Modelo: B-001/LCD/2-X
Model

Número de identificación: 170225/33
Identificación number

Rango de mediciòn: 100,0 kN …….. 1000,0 kN
Range of measurement

Usuario final del certificado: Hernan ramos villamil SAS
Certificate end user

Dirección del usuario: Calle 12 # 24b -17 Barrio las palmas Sincelejo (Sucre)
User´s address

Lugar de calibración: Laboratorio
Calibration site

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022
Calibración date

Este certificado documenta la trazabilidad a los patrones nacionales o internacionales, los cuales representan las unidades de medida en concordancia con el sistema internacional de unidades (SI). Este certificado de calibración no podrá ser reproducido total ni parcialmente sin autorización escrita de Sistemas de Ensayo y Calibración RYR. Los resultados, consignados en este certificado se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. RYR SAS, no se responsabiliza por los perjuicios que pueden derivarse del uso inadecuado de los objetos calibrados o de este certificado. Este certificado no tiene valides sin las firmas y el sello de RYR SAS.

This certificate declares the traceability to the National Standards, which represent the units of measurament that are in agreement with the International System Units (SI). This certificate of calibration could not be reproduced partially without written authorization of the RYR SAS. The sesult of this certificate is for the object of calibration, at the conditions in which the measurements were made. The RYR SAS does not take responsibility from the inadequate use of the calibrated objects or this certificate. The calibration certificate is not valid without the signatures and the seal of the RYR SAS


Fecha de emisión: miércoles, 06 de abril de 2022
Date of issue

Número: **F 1305**
Number

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
AUTORIZED SIGNATURE (S)



Leonard González M.
Realizado por:
Performed by



Rossemberg Indaburo M.
Verificado por:
reviewed by

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305**
Number

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022

Método de calibración
Calibration method

Fuerza indicada constante, Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18

Condiciones ambientales
Environmental conditions

Temperatura Ambiente	Inicial/*Initial*	20,2	°C
	Final/*End*	21,0	°C

Resultados
Results

	Limite inferior de la escala del instrumento de medición	20,0	kN
	Resolución **(r)**	0,1	kN
Dirección de la carga: Compresión	Resolución relativa de la máquina de ensayo **(a)** %	al 10% =	0,10
Indicación de la máquina: Digital		al 20% =	0,05

CARGA (%)	Indicación del Instrumento Patrón (F) en kN					PROMEDIO L1,L2 Y L3	Indicación del instrumento a calibrar **(Fi)**	Errores encontrados %					Incertidumbre Expandida	k
	L1	Girar Celda 120° L2	Girar Celda 120° L3	L4	Reversibilidad Fó F' L2 Descendente			Resolución relativa **(a)**	Reversibilidad **(v)**	Repetibilidad **(b)**	Exactitud **(q)**	Accesorios		
10	100,20	100,30	100,20			100,23	100,0	0,10		0,10	-0,23		2,0,E-01	2,00
20	201,00	202,00	200,20			201,07	200,0	0,05		0,90	-0,53		3,7,E-01	1,96
30	309,00	308,00	307,00			308,00	300,0	0,03		0,65	-2,60		3,7,E-01	1,96
40	410,00	411,00	409,00			410,00	400,0	0,03		0,49	-2,44		3,7,E-01	1,96
50	512,00	511,00	513,00			512,00	500,0	0,02		0,39	-2,34		3,7,E-01	1,96
60	612,00	613,00	612,00			612,33	600,0	0,02		0,16	-2,01		3,7,E-01	1,96
70	714,00	713,00	711,00			712,67	700,0	0,01		0,42	-1,78		3,7,E-01	1,96
80	816,00	813,00	815,00			814,67	800,0	0,01		0,37	-1,80		3,7,E-01	1,96
90	916,00	918,00	917,00			917,00	900,0	0,01		0,22	-1,85		3,7,E-01	1,96
100	1020,00	1019,00	1021,00			1020,00	1000,0	0,01		0,20	-1,96		3,7,E-01	1,96

0,040	0,40	0,30	0,20		Indicación Residual de la maquina de ensayo sin carga **(F_{i0})**:


	Cero F_0	**Reversibilidad (v)**	**Repetibilidad (b)**	**Exactitud (q)**	**Accesorios**
Máximos errores encontrados (%)	0,040	No se determino	0,9	-2,60	No se determino
Máximos errores permitido para clase : 1	± 0,1	± 1,5	1,0	± 1,0	1,50
Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18, Numeral:	6.4.5	6.4.8	6.5.2	6.5.1	6.4.6

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305** *Number*

Fecha de calibración miércoles, 30 de marzo de 2022

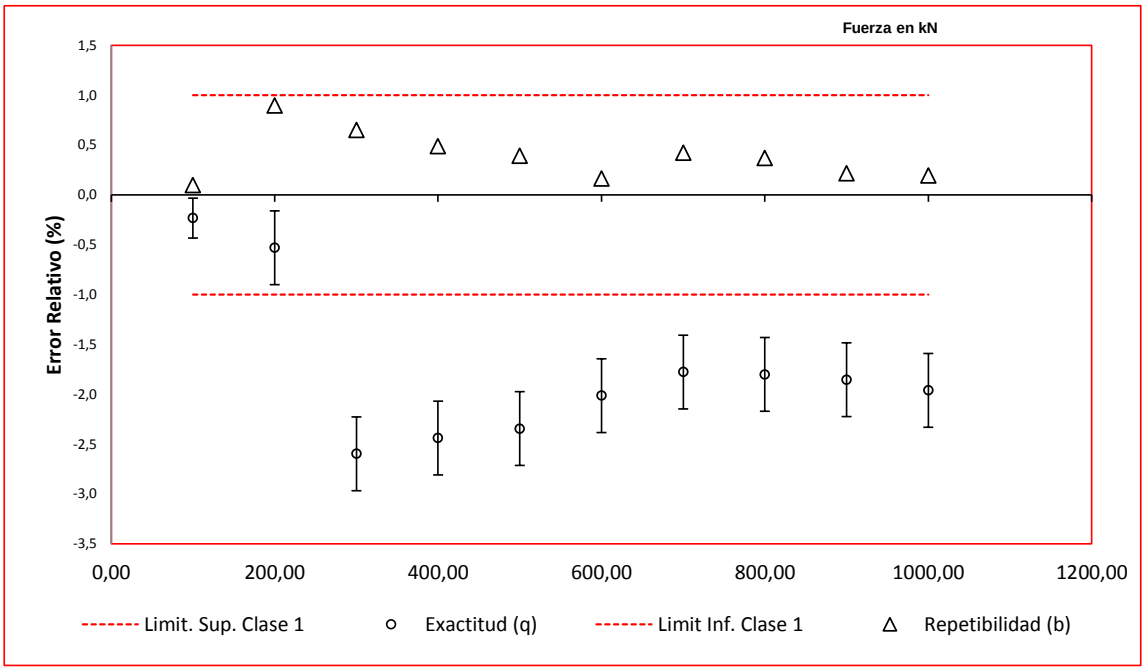

DE ACUERDO A LOS ERRORES RELATIVOS MAXIMOS PRESENTADOS Y SEGUN LAS PRESCRIPCIONES DE LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 7500-1, LA MAQUINA DE ENSAYO CALIBRADA SE CLASIFICA COMO:

Clase 1 DEL 10% AL 100% DE SU CAPACIDAD MAXIMA

TRAZABILIDAD :

EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE RYR SAS , ASEGURA EL MANTENIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD

Equipos utilizados en la calibraciòn

Equipo	*Fabricante*	*Modelo*	*Serie*	*Capacidad*	*Cert. No*	*Fecha Cal.*	*Entidad Cert.*
Celda de carga	AEP	KAL2000KN	901080	1000 kN	MF-172-18	2018/01/11	SIMIM
Celda de carga	AEP	KAL300KN	903408	300 kN	MF-174-18	2018/01/13	SIMIM

OBSERVACIONES :

1. La máquina de ensayos deberá ser calibrada inmediatamente despues de cualquier reparación ya que la sustitución de elementos del sistema mecánico o eléctrico afectan la operación del sistema de medida.
2. Si la máquina de ensayos es reubicada, se deberá repetir la calibración. Igualmente, cuando exista razón de duda con respecto a la exactitud de la carga, independientemente del tiempo transcurrido desde la última calibración,
3. Los datos emitidos en el presente certificado, se ajustan al momento y condiciones dadas en la calibración RYR SAS. no se hace responsable por daños ocasionados al equipo debido al uso inadecuado.

ROSSEMBERG
LABORATORY EQUIPMENT
CEL.:(057)3016256345 - 3157815444
www.rossemberg.com.co

Laboratorio de Metrología

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1304**
Number

Número de páginas incluyendo anexos
Number of pages and documents attached 3

Objeto: Máquina de ensayo a compresion (Cilindros)
Object

Fabricante: N/P
Manufacturer

Modelo: N/P
Model

Número de identificación: N/P
Identificación number

Rango de mediciòn: 100,0 kN …….. 1200,0 kN
Range of measurement

Usuario final del certificado: Hernan ramos villamil SAS
Certificate end user

Dirección del usuario: Calle 12 # 24b - 170 Barrio las palmas Sincelejo (Sucre)
User´s address

Lugar de calibración: Laboratorio
Calibration site

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022
Calibración date

Este certificado documenta la trazabilidad a los patrones nacionales o internacionales, los cuales representan las unidades de medida en concordancia con el sistema internacional de unidades (SI). Este certificado de calibración no podrá ser reproducido total ni parcialmente sin autorización escrita de Sistemas de Ensayo y Calibración RYR. Los resultados, consignados en este certificado se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. RYR SAS, no se responsabiliza por los perjuicios que pueden derivarse del uso inadecuado de los objetos calibrados o de este certificado. Este certificado no tiene valides sin las firmas y el sello de RYR SAS.

This certificate declares the traceability to the National Standards, which represent the units of measurament that are in agreement with the International System Units (SI). This certificate of calibration could not be reproduced partially without written authorization of the RYR SAS. The sesult of this certificate is for the object of calibration, at the conditions in which the measurements were made. The RYR SAS does not take responsibility from the inadequate use of the calibrated objects or this certificate. The calibration certificate is not valid without the signatures and the seal of the RYR SAS


Fecha de emisión: viernes, 20 de agosto de 2021
Date of issue

Número: **F 1304**
Number

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
AUTORIZED SIGNATURE (S)



Leonard González M.
Realizado por:
Performed by



Rossemberg Indaburo M
Verificado por:
reviewed by

ROSSEMBERG
LABORATORY EQUIPMENT
CEL.:(057)3016256345 - 3157815444
www.rossemberg.com.co

Laboratorio de Metrología

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1304**
Number

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022

Método de calibración
Calibration method
Fuerza indicada constante, Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18

Condiciones ambientales
Environmental conditions

Temperatura Ambiente	Inicial/*Initial*	32,0	°C
	Final/*End*	33,0	°C

Resultados
Results

	Limite inferior de la escala del instrumento de medición	20,0 kN
	Resolución **(r)**	0,1 kN
Dirección de la carga: Compresión	Resolución relativa de la máquina de ensayo **(a)** %	al 10% = 0,08
Indicación de la máquina: Digital		al 20% = 0,04

CARGA (%)	Indicación del Instrumento Patrón (F) en kN					PROMEDIO L1,L2 Y L3	Indicación del instrumento a calibrar **(Fi)**	Errores encontrados %					Incertidumbre Expandida	k
	L1	Girar Celda 120° L2	Girar Celda 120° L3	L4	Reversibilidad Fó F' L2 Descendente			Resolución relativa **(a)**	Reversibilidad **(v)**	Repetibilidad **(b)**	Exactitud **(q)**	Accesorios		
8	100,00	100,40	100,30			100,23	100,0	0,10		0,40	-0,23		5,7,E-01	2,00
17	200,00	200,00	200,20			200,07	200,0	0,05		0,10	-0,03		3,7,E-01	1,96
25	300,00	300,00	301,00			300,33	300,0	0,03		0,33	-0,11		3,7,E-01	1,96
33	401,00	401,00	400,00			400,67	400,0	0,03		0,25	-0,17		3,7,E-01	1,96
42	501,00	501,00	500,00			500,67	500,0	0,02		0,20	-0,13		3,7,E-01	1,96
50	600,00	601,00	601,00			600,67	600,0	0,02		0,17	-0,11		3,7,E-01	1,96
58	700,00	702,00	702,00			701,33	700,0	0,01		0,29	-0,19		3,7,E-01	1,96
67	800,00	801,00	801,00			800,67	800,0	0,01		0,12	-0,08		3,7,E-01	1,96
83	1001,00	1002,00	1004,00			1002,33	1000,0	0,01		0,30	-0,23		3,7,E-01	1,96
100	1201,00	1205,30	1203,00			1203,10	1200,0	0,01		0,36	-0,26		3,7,E-01	1,96

0,033	0,40	0,30	0,20		Indicación Residual de la maquina de ensayo sin carga **(F_{i0})**:


	Cero F_0	Reversibilidad (v)	Repetibilidad (b)	Exactitud (q)	Accesorios
Máximos errores encontrados (%)	0,033	No se determino	0,4	-0,23	No se determino
Máximos errores permitido para clase : 1	± 0,1	± 1,5	1,0	± 1,0	1,50
Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18, Numeral:	6.4.5	6.4.8	6.5.2	6.5.1	6.4.6

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305**
Number

Fecha de calibración miércoles, 30 de marzo de 2022

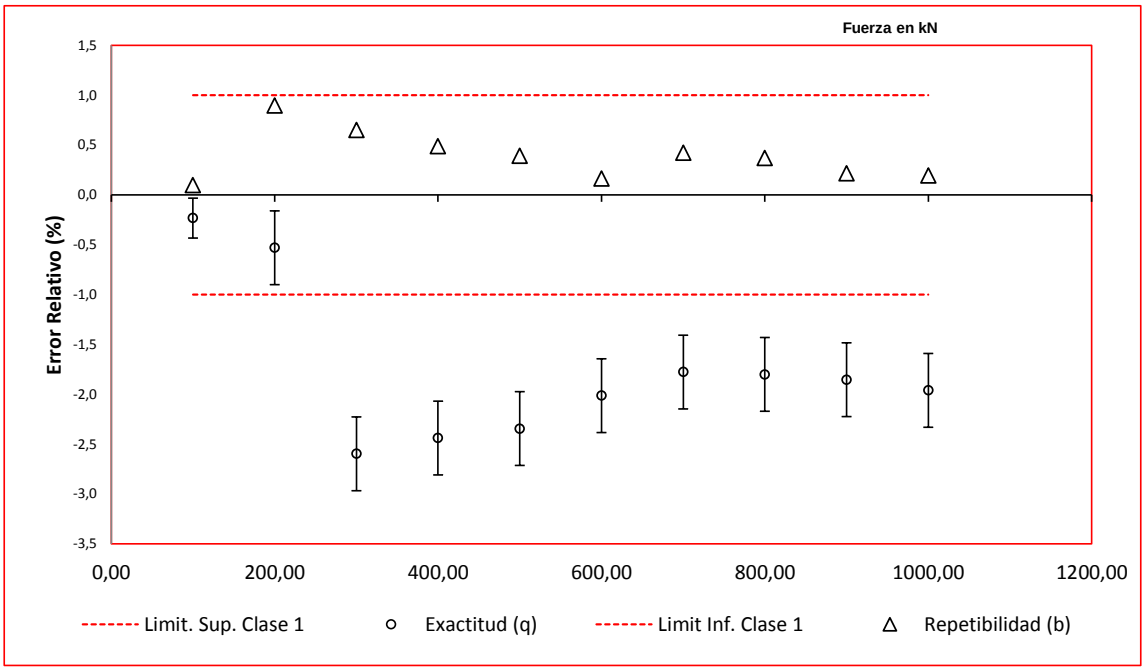

DE ACUERDO A LOS ERRORES RELATIVOS MAXIMOS PRESENTADOS Y SEGUN LAS PRESCRIPCIONES DE LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 7500-1, LA MAQUINA DE ENSAYO CALIBRADA SE CLASIFICA COMO:

Clase 1 DEL 10% AL 100% DE SU CAPACIDAD MAXIMA

TRAZABILIDAD :

EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE RYR SAS , ASEGURA EL MANTENIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD

Equipos utilizados en la calibraciòn

Equipo	*Fabricante*	*Modelo*	*Serie*	*Capacidad*	*Cert. No*	*Fecha Cal.*	*Entidad Cert.*
Celda de carga	AEP	KAL2000KN	901080	1000 kN	MF-172-18	2018/01/11	SIMIM
Celda de carga	AEP	KAL300KN	903408	300 kN	MF-174-18	2018/01/13	SIMIM

OBSERVACIONES :

1. La máquina de ensayos deberá ser calibrada inmediatamente despues de cualquier reparación ya que la sustitución de elementos del sistema mecánico o eléctrico afectan la operación del sistema de medida.
2. Si la máquina de ensayos es reubicada, se deberá repetir la calibración. Igualmente, cuando exista razón de duda con respecto a la exactitud de la carga, independientemente del tiempo transcurrido desde la última calibración,
3. Los datos emitidos en el presente certificado, se ajustan al momento y condiciones dadas en la calibración RYR SAS. no se hace responsable por daños ocasionados al equipo debido al uso inadecuado.

Certificado de Calibración - Laboratorio de Longitud

NA-24532-001 R0

Calibration Certificate - Dimensional Metrology Laboratory

Equipo *Instrument*	CAZUELA CASAGRANDE
Fabricante *Manufacturer*	PINZUAR
Modelo *Model*	PS-11
Número de Serie *Serial Number*	2124
Identificación Interna *Internal Identification*	No presenta
Intervalo de Medición *Measurement Range*	Ver tabla de resultados
Solicitante *Customer*	HERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
Dirección *Address*	Calle 12 No24 B - 17
Ciudad *City*	Sincelejo - Sucre
Fecha de Calibración *Date of Calibration*	2021 – 12 – 03
Fecha de Emisión *Date of Issue*	2021 – 12 – 13
Número de páginas del certificado, incluyendo anexos *Number of pages of the certificate and documents attached*	02

Los resultados emitidos en este certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Dichos resultados solo coresponden al item que se relaciona en esta página. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos y/o de la información suministrada por el solicitante.

Este certificado de calibración documenta y asegura la trazabilidad a patrones nacionales e internacionales, que reproducen las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

El usuario es responsable de la calibración de los intrumentos en apropiados intervalos de tiempo.

The results issued in this certificate relates to the time and conditions under which the measurements. These results correspond to the item that relates on page number one. The laboratory, which will not be liable for any damages that may arise from the improper use of the instruments and/or the information provided by the customer.

This calibration certificate documents and ensures the traceability to national and internationals standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).

The user is responsable for recalibrating the measuring instruments at appropriate time intervals.

Sin la aprobación del Laboratorio de Metrología Pinzuar. no se puede resproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, ya que proporciona la seguridad que las partes del certificado no se sacan de contexto. Los certificados de calibración sin firma no son válidos.

Without the approval of the Pinzuar Metrology Laboratory, the report can not be reproduced, except when it is reproduced in its entirety, since it provides the security that the parts of the certificate are not taken out of context. Unsigned calibration certificates are not valid.

Firmas Autorizadas

Authorized signatureS

Ing. Sergio Iván Martínez
Director Laboratorio de Metrología

Tecg. Jaiver Arnulfo López
Metrólogo Laboratorio de Metrología


DATOS TÉCNICOS

Método Empleado	Comparación Directa
Instrumentos de Referencia	Pie de Rey
Certificado No.	L-21980-001 de Pinzuar
Documento de Referencia	INVIAS E – 125/13 Numeral 5

TABLA DE RESULTADOS

Cazuela

Letra*	Especificación	Valor Medido
	mm	mm
A	54 ± 0.5	54,03
B	2 ± 0.1	2,08
C	27 ± 0.5	27,36
K	50 ±2	51,33
L	150 ± 2	151,24
M	125 ± 2	126,05
U	47 ± 1	46,95
P	28	27,33
R	24	23,95
T	45	45,04

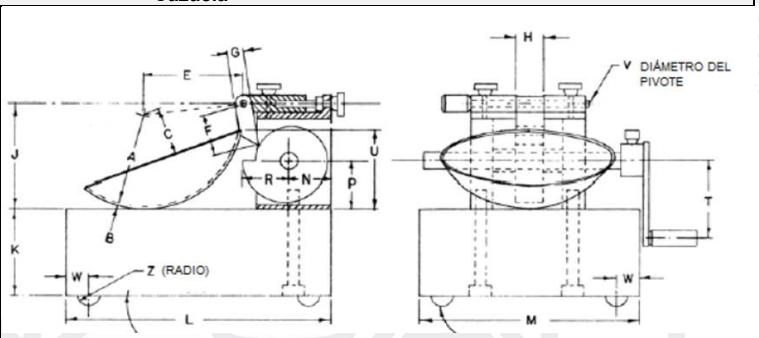

CONDICIONES AMBIENTALES

La verificación se llevó a cabo en en las instalaciones del Laboratorio de Metrología Pinzuar., las condiciones ambientales durante la ejecución fueron las siguientes:

Temperatura Máxima:	19,8 °C	**Humedad Máxima:**	56 %
Temperatura Mínima:	19,5 °C	**Humedad Mínima:**	53 %

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre expandida de la medición reportada (Tablas de resultados), se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura k y la probabilidad de cobertura aproximadamente al 95 %. Basados en el documento: JCGM 100:2008. GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement. First Edition. September 2008.
* La incertidumbre máxima encontrada en la medición de dimensiones es 12 µm para un factor de cobertura k=2.

OBSERVACIONES

1. Se usa la coma como separador decimal.
2. Se adjunta la estampilla de calibracón.

NA-24532-001

Fin de Certificado

CALIBRACIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS DEL PROYECTO

enterritorio	**CONTROL DE EQUIPOS**	CÓDIGO	**F-GG-22**
		VERSIÓN	**01**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA	**2020-10-19**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1-dic-22 **Y EL** 22-dic-22 **FECHA INICIO** 1-jun

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES **CONTRATO No.** 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A **CONTRATO No.** 2220587

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
MEZCLADORA			X		CORDOBA - BOLIVAR	MEZCLA DE CONCRETO	En buen estado
RANA			X		CORDOBA - BOLIVAR	COMPACTACIÓN DEL TERRENO	En buen estado
MOTO CARRO			X		CORDOBA - BOLIVAR	TRANSPORTE DE MATERIALES	En buen estado
VEHICULO				X	CORDOBA - BOLIVAR	TRANSPORTE DE MATERIALES	En buen estado

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre: Ing. Marcy Correa

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ROSSEMBERG
LABORATORY EQUIPMENT
CEL.:(057)3016256345 - 3157815444
www.rossemberg.com.co

Laboratorio de Metrología

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305**
Number

Página /Pages 1 de 3

Número de páginas incluyendo anexos 3
Number of pages and documents attached

Objeto: Máquina de ensayo a compresion (Marco Cilindros)
Object

Fabricante: Alfa
Manufacturer

Modelo: B-001/LCD/2-X
Model

Número de identificación: 170225/33
Identificación number

Rango de mediciòn: 100,0 kN …….. 1000,0 kN
Range of measurement

Usuario final del certificado: Hernan ramos villamil SAS
Certificate end user

Dirección del usuario: Calle 12 # 24b -17 Barrio las palmas Sincelejo (Sucre)
User´s address

Lugar de calibración: Laboratorio
Calibration site

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022
Calibración date

Este certificado documenta la trazabilidad a los patrones nacionales o internacionales, los cuales representan las unidades de medida en concordancia con el sistema internacional de unidades (SI). Este certificado de calibración no podrá ser reproducido total ni parcialmente sin autorización escrita de Sistemas de Ensayo y Calibración RYR. Los resultados, consignados en este certificado se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. RYR SAS, no se responsabiliza por los perjuicios que pueden derivarse del uso inadecuado de los objetos calibrados o de este certificado. Este certificado no tiene valides sin las firmas y el sello de RYR SAS.

This certificate declares the traceability to the National Standards, which represent the units of measurament that are in agreement with the International System Units (SI). This certificate of calibration could not be reproduced partially without written authorization of the RYR SAS. The sesult of this certificate is for the object of calibration, at the conditions in which the measurements were made. The RYR SAS does not take responsibility from the inadequate use of the calibrated objects or this certificate. The calibration certificate is not valid without the signatures and the seal of the RYR SAS


Fecha de emisión: miércoles, 06 de abril de 2022
Date of issue

Número: **F 1305**
Number

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
AUTORIZED SIGNATURE (S)



Leonard González M.
Realizado por:
Performed by



Rossemberg Indaburo M.
Verificado por:
reviewed by

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305**
Number

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022

Método de calibración
Calibration method

Fuerza indicada constante, Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18

Condiciones ambientales
Environmental conditions

Temperatura Ambiente	Inicial/*Initial*	20,2	°C
	Final/*End*	21,0	°C

Resultados
Results

	Limite inferior de la escala del instrumento de medición	20,0	kN
	Resolución **(r)**	0,1	kN
Dirección de la carga: Compresión	Resolución relativa de la máquina de ensayo **(a)** %	al 10% =	0,10
Indicación de la máquina: Digital		al 20% =	0,05

CARGA (%)	Indicación del Instrumento Patrón (F) en kN					PROMEDIO L1,L2 Y L3	Indicación del instrumento a calibrar **(Fi)**	Errores encontrados %					Incertidumbre Expandida	k
	L1	Girar Celda 120° L2	Girar Celda 120° L3	L4	Reversibilidad Fó F' L2 Descendente			Resolución relativa **(a)**	Reversibilidad **(v)**	Repetibilidad **(b)**	Exactitud **(q)**	Accesorios		
10	100,20	100,30	100,20			100,23	100,0	0,10		0,10	-0,23		2,0,E-01	2,00
20	201,00	202,00	200,20			201,07	200,0	0,05		0,90	-0,53		3,7,E-01	1,96
30	309,00	308,00	307,00			308,00	300,0	0,03		0,65	-2,60		3,7,E-01	1,96
40	410,00	411,00	409,00			410,00	400,0	0,03		0,49	-2,44		3,7,E-01	1,96
50	512,00	511,00	513,00			512,00	500,0	0,02		0,39	-2,34		3,7,E-01	1,96
60	612,00	613,00	612,00			612,33	600,0	0,02		0,16	-2,01		3,7,E-01	1,96
70	714,00	713,00	711,00			712,67	700,0	0,01		0,42	-1,78		3,7,E-01	1,96
80	816,00	813,00	815,00			814,67	800,0	0,01		0,37	-1,80		3,7,E-01	1,96
90	916,00	918,00	917,00			917,00	900,0	0,01		0,22	-1,85		3,7,E-01	1,96
100	1020,00	1019,00	1021,00			1020,00	1000,0	0,01		0,20	-1,96		3,7,E-01	1,96

0,040	0,40	0,30	0,20		Indicación Residual de la maquina de ensayo sin carga **(F_{i0})**:


	Cero F_0	**Reversibilidad (v)**	**Repetibilidad (b)**	**Exactitud (q)**	**Accesorios**
Máximos errores encontrados (%)	0,040	No se determino	0,9	-2,60	No se determino
Máximos errores permitido para clase : 1	± 0,1	± 1,5	1,0	± 1,0	1,50
Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18, Numeral:	6.4.5	6.4.8	6.5.2	6.5.1	6.4.6

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305** *Number*

Fecha de calibración miércoles, 30 de marzo de 2022

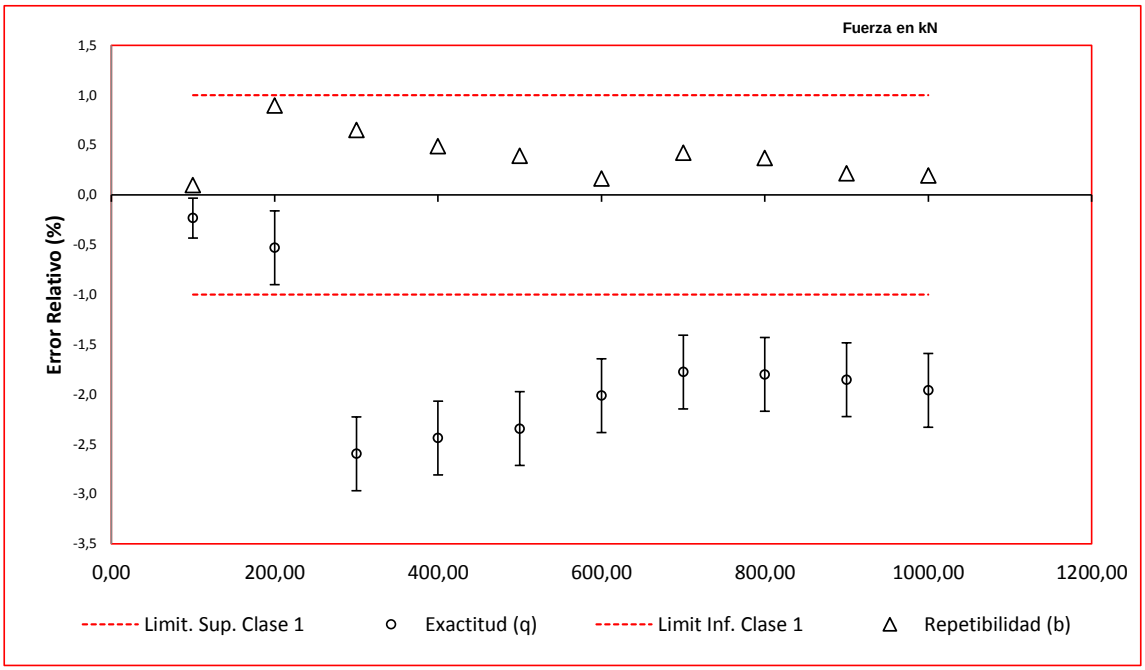

DE ACUERDO A LOS ERRORES RELATIVOS MAXIMOS PRESENTADOS Y SEGUN LAS PRESCRIPCIONES DE LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 7500-1, LA MAQUINA DE ENSAYO CALIBRADA SE CLASIFICA COMO:

Clase 1 DEL 10% AL 100% DE SU CAPACIDAD MAXIMA

TRAZABILIDAD :

EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE RYR SAS , ASEGURA EL MANTENIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD

Equipos utilizados en la calibraciòn

Equipo	*Fabricante*	*Modelo*	*Serie*	*Capacidad*	*Cert. No*	*Fecha Cal.*	*Entidad Cert.*
Celda de carga	AEP	KAL2000KN	901080	1000 kN	MF-172-18	2018/01/11	SIMIM
Celda de carga	AEP	KAL300KN	903408	300 kN	MF-174-18	2018/01/13	SIMIM

OBSERVACIONES :

1. La máquina de ensayos deberá ser calibrada inmediatamente despues de cualquier reparación ya que la sustitución de elementos del sistema mecánico o eléctrico afectan la operación del sistema de medida.
2. Si la máquina de ensayos es reubicada, se deberá repetir la calibración. Igualmente, cuando exista razón de duda con respecto a la exactitud de la carga, independientemente del tiempo transcurrido desde la última calibración,
3. Los datos emitidos en el presente certificado, se ajustan al momento y condiciones dadas en la calibración RYR SAS. no se hace responsable por daños ocasionados al equipo debido al uso inadecuado.

ROSSEMBERG
LABORATORY EQUIPMENT
CEL.:(057)3016256345 - 3157815444
www.rossemberg.com.co

Laboratorio de Metrología

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1304**
Number

Número de páginas incluyendo anexos
Number of pages and documents attached 3

Objeto: Máquina de ensayo a compresion (Cilindros)
Object

Fabricante: N/P
Manufacturer

Modelo: N/P
Model

Número de identificación: N/P
Identificación number

Rango de mediciòn: 100,0 kN …….. 1200,0 kN
Range of measurement

Usuario final del certificado: Hernan ramos villamil SAS
Certificate end user

Dirección del usuario: Calle 12 # 24b - 170 Barrio las palmas Sincelejo (Sucre)
User´s address

Lugar de calibración: Laboratorio
Calibration site

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022
Calibración date

Este certificado documenta la trazabilidad a los patrones nacionales o internacionales, los cuales representan las unidades de medida en concordancia con el sistema internacional de unidades (SI). Este certificado de calibración no podrá ser reproducido total ni parcialmente sin autorización escrita de Sistemas de Ensayo y Calibración RYR. Los resultados, consignados en este certificado se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. RYR SAS, no se responsabiliza por los perjuicios que pueden derivarse del uso inadecuado de los objetos calibrados o de este certificado. Este certificado no tiene valides sin las firmas y el sello de RYR SAS.

This certificate declares the traceability to the National Standards, which represent the units of measurament that are in agreement with the International System Units (SI). This certificate of calibration could not be reproduced partially without written authorization of the RYR SAS. The sesult of this certificate is for the object of calibration, at the conditions in which the measurements were made. The RYR SAS does not take responsibility from the inadequate use of the calibrated objects or this certificate. The calibration certificate is not valid without the signatures and the seal of the RYR SAS


Fecha de emisión: viernes, 20 de agosto de 2021
Date of issue

Número: **F 1304**
Number

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
AUTORIZED SIGNATURE (S)



Leonard González M.
Realizado por:
Performed by



Rossemberg Indaburo M
Verificado por:
reviewed by

ROSSEMBERG
LABORATORY EQUIPMENT
CEL.:(057)3016256345 - 3157815444
www.rossemberg.com.co

Laboratorio de Metrología

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1304**
Number

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022

Método de calibración
Calibration method
Fuerza indicada constante, Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18

Condiciones ambientales
Environmental conditions

Temperatura Ambiente	Inicial/*Initial*	32,0	°C
	Final/*End*	33,0	°C

Resultados
Results

	Limite inferior de la escala del instrumento de medición	20,0 kN
	Resolución **(r)**	0,1 kN
Dirección de la carga: Compresión	Resolución relativa de la máquina de ensayo **(a)** %	al 10% = 0,08
Indicación de la máquina: Digital		al 20% = 0,04

CARGA (%)	Indicación del Instrumento Patrón (F) en kN					PROMEDIO L1,L2 Y L3	Indicación del instrumento a calibrar **(Fi)**	Errores encontrados %					Incertidumbre Expandida	k
	L1	Girar Celda 120° L2	Girar Celda 120° L3	L4	Reversibilidad Fó F' L2 Descendente			Resolución relativa **(a)**	Reversibilidad **(v)**	Repetibilidad **(b)**	Exactitud **(q)**	Accesorios		
8	100,00	100,40	100,30			100,23	100,0	0,10		0,40	-0,23		5,7,E-01	2,00
17	200,00	200,00	200,20			200,07	200,0	0,05		0,10	-0,03		3,7,E-01	1,96
25	300,00	300,00	301,00			300,33	300,0	0,03		0,33	-0,11		3,7,E-01	1,96
33	401,00	401,00	400,00			400,67	400,0	0,03		0,25	-0,17		3,7,E-01	1,96
42	501,00	501,00	500,00			500,67	500,0	0,02		0,20	-0,13		3,7,E-01	1,96
50	600,00	601,00	601,00			600,67	600,0	0,02		0,17	-0,11		3,7,E-01	1,96
58	700,00	702,00	702,00			701,33	700,0	0,01		0,29	-0,19		3,7,E-01	1,96
67	800,00	801,00	801,00			800,67	800,0	0,01		0,12	-0,08		3,7,E-01	1,96
83	1001,00	1002,00	1004,00			1002,33	1000,0	0,01		0,30	-0,23		3,7,E-01	1,96
100	1201,00	1205,30	1203,00			1203,10	1200,0	0,01		0,36	-0,26		3,7,E-01	1,96

0,033	0,40	0,30	0,20		Indicación Residual de la maquina de ensayo sin carga **(F_{i0})**:


	Cero F_0	Reversibilidad (v)	Repetibilidad (b)	Exactitud (q)	Accesorios
Máximos errores encontrados (%)	0,033	No se determino	0,4	-0,23	No se determino
Máximos errores permitido para clase : 1	± 0,1	± 1,5	1,0	± 1,0	1,50
Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18, Numeral:	6.4.5	6.4.8	6.5.2	6.5.1	6.4.6

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305**
Number

Fecha de calibración miércoles, 30 de marzo de 2022

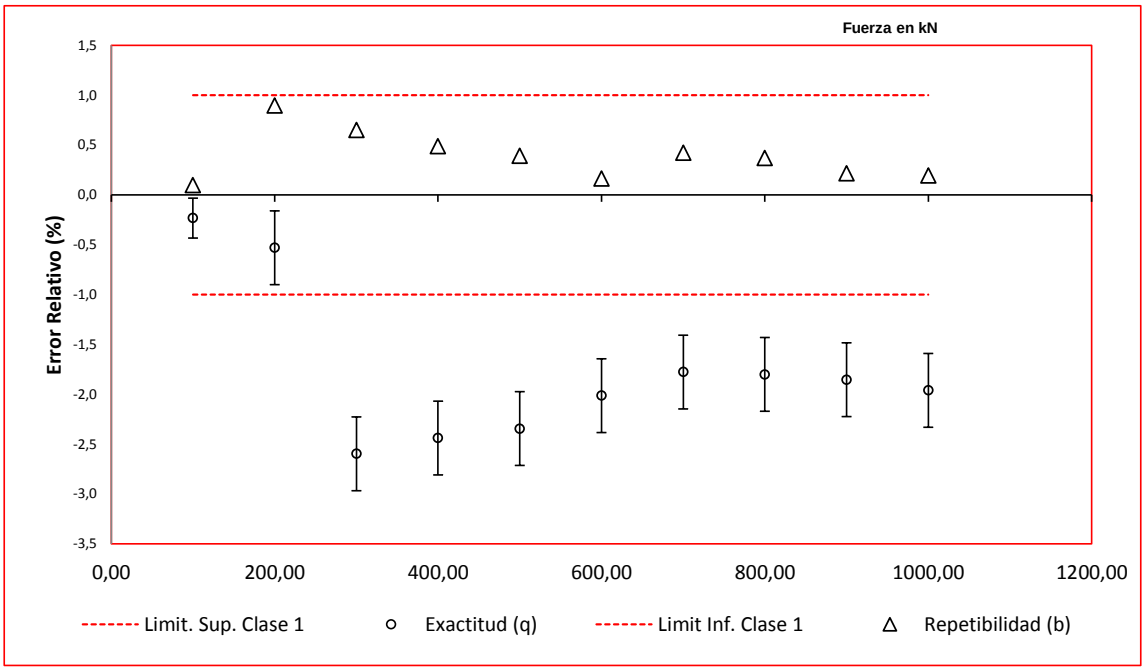

DE ACUERDO A LOS ERRORES RELATIVOS MAXIMOS PRESENTADOS Y SEGUN LAS PRESCRIPCIONES DE LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 7500-1, LA MAQUINA DE ENSAYO CALIBRADA SE CLASIFICA COMO:

Clase 1 DEL 10% AL 100% DE SU CAPACIDAD MAXIMA

TRAZABILIDAD :

EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE RYR SAS , ASEGURA EL MANTENIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD

Equipos utilizados en la calibraciòn

Equipo	*Fabricante*	*Modelo*	*Serie*	*Capacidad*	*Cert. No*	*Fecha Cal.*	*Entidad Cert.*
Celda de carga	AEP	KAL2000KN	901080	1000 kN	MF-172-18	2018/01/11	SIMIM
Celda de carga	AEP	KAL300KN	903408	300 kN	MF-174-18	2018/01/13	SIMIM

OBSERVACIONES :

1. La máquina de ensayos deberá ser calibrada inmediatamente despues de cualquier reparación ya que la sustitución de elementos del sistema mecánico o eléctrico afectan la operación del sistema de medida.
2. Si la máquina de ensayos es reubicada, se deberá repetir la calibración. Igualmente, cuando exista razón de duda con respecto a la exactitud de la carga, independientemente del tiempo transcurrido desde la última calibración,
3. Los datos emitidos en el presente certificado, se ajustan al momento y condiciones dadas en la calibración RYR SAS. no se hace responsable por daños ocasionados al equipo debido al uso inadecuado.

Certificado de Calibración - Laboratorio de Longitud

NA-24532-001 R0

Calibration Certificate - Dimensional Metrology Laboratory

Equipo *Instrument*	CAZUELA CASAGRANDE
Fabricante *Manufacturer*	PINZUAR
Modelo *Model*	PS-11
Número de Serie *Serial Number*	2124
Identificación Interna *Internal Identification*	No presenta
Intervalo de Medición *Measurement Range*	Ver tabla de resultados
Solicitante *Customer*	HERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
Dirección *Address*	Calle 12 No24 B - 17
Ciudad *City*	Sincelejo - Sucre
Fecha de Calibración *Date of Calibration*	2021 – 12 – 03
Fecha de Emisión *Date of Issue*	2021 – 12 – 13
Número de páginas del certificado, incluyendo anexos *Number of pages of the certificate and documents attached*	02

Los resultados emitidos en este certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Dichos resultados solo coresponden al item que se relaciona en esta página. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos y/o de la información suministrada por el solicitante.

Este certificado de calibración documenta y asegura la trazabilidad a patrones nacionales e internacionales, que reproducen las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

El usuario es responsable de la calibración de los intrumentos en apropiados intervalos de tiempo.

The results issued in this certificate relates to the time and conditions under which the measurements. These results correspond to the item that relates on page number one. The laboratory, which will not be liable for any damages that may arise from the improper use of the instruments and/or the information provided by the customer.

This calibration certificate documents and ensures the traceability to national and internationals standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).

The user is responsable for recalibrating the measuring instruments at appropriate time intervals.

Sin la aprobación del Laboratorio de Metrología Pinzuar. no se puede resproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, ya que proporciona la seguridad que las partes del certificado no se sacan de contexto. Los certificados de calibración sin firma no son válidos.

Without the approval of the Pinzuar Metrology Laboratory, the report can not be reproduced, except when it is reproduced in its entirety, since it provides the security that the parts of the certificate are not taken out of context. Unsigned calibration certificates are not valid.

Firmas Autorizadas

Authorized signatureS

Ing. Sergio Iván Martínez
Director Laboratorio de Metrología

Tecg. Jaiver Arnulfo López
Metrólogo Laboratorio de Metrología


DATOS TÉCNICOS

Método Empleado	Comparación Directa
Instrumentos de Referencia	Pie de Rey
Certificado No.	L-21980-001 de Pinzuar
Documento de Referencia	INVIAS E – 125/13 Numeral 5

TABLA DE RESULTADOS

Cazuela

Letra*	Especificación	Valor Medido
	mm	mm
A	54 ± 0.5	54,03
B	2 ± 0.1	2,08
C	27 ± 0.5	27,36
K	50 ±2	51,33
L	150 ± 2	151,24
M	125 ± 2	126,05
U	47 ± 1	46,95
P	28	27,33
R	24	23,95
T	45	45,04

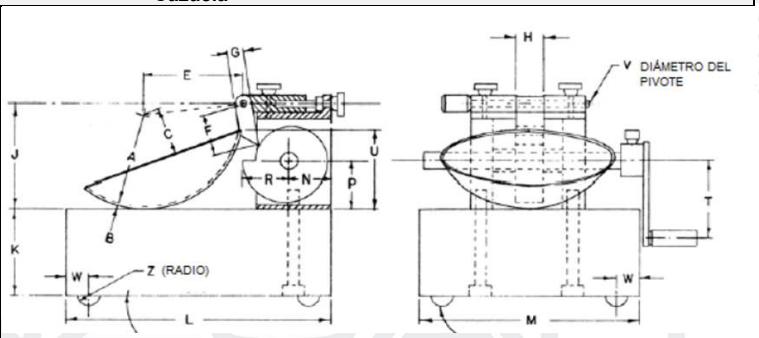

CONDICIONES AMBIENTALES

La verificación se llevó a cabo en en las instalaciones del Laboratorio de Metrología Pinzuar., las condiciones ambientales durante la ejecución fueron las siguientes:

Temperatura Máxima:	19,8 °C	**Humedad Máxima:**	56 %
Temperatura Mínima:	19,5 °C	**Humedad Mínima:**	53 %

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre expandida de la medición reportada (Tablas de resultados), se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura k y la probabilidad de cobertura aproximadamente al 95 %. Basados en el documento: JCGM 100:2008. GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement. First Edition. September 2008.
* La incertidumbre máxima encontrada en la medición de dimensiones es 12 µm para un factor de cobertura k=2.

OBSERVACIONES

1. Se usa la coma como separador decimal.
2. Se adjunta la estampilla de calibracón.

NA-24532-001

Fin de Certificado

PINZUAR
LABORATORIO DE METROLOGÍA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN – LABORATORIO PRESIÓN

NA-23741-001 R0

CALIBRATION CERTIFICATE – LABORATORY OF PRESSURE

INSTRUMENTO *Instrument*	*MANÓMETRO HUMEDÓMETRO*
INTERVALO DE MEDIDA *Measurement range*	*0 %HR - 20 %HR*
FABRICANTE *Manufaturer*	*RYR*
MODELO *Model*	*DI*
SERIE *Identification number*	*No Presenta*
CODIGO INTERNO *Internal Code*	*23741-001*
SOLICITANTE *Customer*	*HERNAN RAMOS VILLAMIL SAS*
DIRECCIÓN *Address*	*Calle 12 No. 24 B - 17*
CIUDAD *City*	*Sincelejo - Sucre*
FECHA DE CALIBRACIÓN *Date of calibration*	2021 - 07 - 14
FECHA DE EXPEDICIÓN *Date of Issue*	2021 - 07 - 16

NÚMERO DE PÁGINAS DEL CERTIFICADO INCLUYENDO ANEXOS ***3***
Number of pages of this certificate and documents attached

Firmas que autorizan el certificado
Signatures authorizing the certificate

Ing. Sergio Martínez
Director Laboratorio de Metrología

Tecg. Francisco Durán Romero
Metrólogo Laboratorio de Metrología

DETALLES DE LA CALIBRACIÓN

MÉTODO DE CALIBRACIÓN Comparación directa. **Documento de Referencia** DKD R 6 - 1 del 2014

FACTOR DE CONVERSIÓN 1 psi = 6,89476 kPa Nota: Factor de conversión tomado del NIST Special Publication 811 2008 Edition

DATOS DE LA CALIBRACIÓN

INTERVALO A CALIBRAR 0 %HR - 20 %HR **DIVISIÓN DE ESCALA** 0,2 %HR **RESOLUCIÓN** 0,1 %HR

	Indicación del IBC	indicaciones del instrumento patrón	
		M1 - asc	M2 - desc
%	% HR	psi	psi
0	0,00	0,000	0,000
20	4,00	6,166	5,972
40	8,00	12,136	11,988
60	12,00	17,966	17,689
80	16,00	23,934	23,899
100	20,00	29,988	29,988

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

Indicación del IBC		Promedio Patrón	Desviación	Histeresis	Incertidumbre Expandida
%	psi	psi	psi	psi	psi
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
4,00	6,00	6,07	-0,07	0,19	0,25
8,00	12,00	12,06	-0,06	0,15	0,21
12,00	18,00	17,83	0,17	0,28	0,34
16,00	24,00	23,92	0,08	0,04	0,13
20,00	30,00	29,99	0,01	0,00	0,12

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

La desviación máxima encontrada durante la calibración entre el instrumento sometido a prueba y el patrón es:

0,172 psi

La desviación máxima encontrada, respecto al valor máximo de la escala en porcentaje es:

% Desviación = 0,6

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN

La incertidumbre expandida de la medición esta dada en la tabla de resultados de la página No. 2, para cada punto de calibración. La incertidumbre de medición fue calculada utilizando un factor de cobertura k = 2 para un nivel de confianza aproximado del 95,45% para una distribución "t-student" y fue estimada con el documento: JCGM 100:2008. GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement. First Edition. September 2008.

CONDICIONES AMBIENTALES

Max. Temp.	*20,3 °C*	***Min. Temp.***	*19,6 °C*
Max. Hum. (%)	*55 HR*	***Min. Hum. (%)***	*53 HR*

TRAZABILIDAD

El Laboratorio de Metrología de Pinzuar Ltda. asegura el mantenimiento de la trazabilidad de los patrones de trabajo utilizados en las mediciones.

PATRÓN UTILIZADO	Manómetro Digital		
CERT.DE CALIBRACIÓN	7337 de Flexilatina S.A.S.	**CLASE DE EXACTITUD**	0,050%
INTERVALO DE MEDIDA	30 psi	**SERIE**	3227038

OBSERVACIONES .

1. Se realizó una inspección general del instrumento encontrándose en buen estado de funcionamiento
2. Los Certificados de calibración sin las firmas no tienen validez .
3. El usuario es responsable de la recalibración de los instrumentos de medición.
4. Los resultados contenidos parcialmente en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos.
5. Se adjunta estampilla de calibración adherida al instrumento No. **NA-23741-001**

Fin de Certificado

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
INGENIERIA CIVIL- ESTUDIOS DE SUELO.

OFICINA Y LABORATORIO
Calle 12 No. 24B – 17 Barrio La Palma
Telef. y Fax 095-282 58 08 - SINCELEJO

Sincelejo, 1 de julio de 2022
Señores
ENTerritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
Ref. Certificación para realización de ensayos de geotecnia

Cordial saludo,

Yo, **HERNAN RAMOS VILLAMIL**, identificado con la cedula de ciudadanía número 9.053.862 de Cartagena y la Matricula profesional 494 de S.I.A.B. que me acredita como ingeniero civil, en calidad de representante legal de la empresa **HERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S. Nit. 900.565.151-3**, laboratorio con más de 50 años de experiencia en el campo de la geotecnia, certifico que seremos los encargados de realizar todos los ensayos pertinentes que garanticen el control y el aseguramiento de la calidad de la obra *"ejecución de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el Municipio de Córdoba, Departamento de Bolívar"* la cual está a cargo de la firma **Consorcio Construredes Nit 901.568.676-5**.

Firma Electrónica
ID Firma: 67c37f62-3496-469f-b5c0-733a2abbe22b

HERNAN RAMOS VILLAMIL
C.C. 9.053.862 de Cartagena.
T.P. 494 S.I.A.B.
Representante Legal

CONSORCIO CONSTRUREDES

Cra 24 No. 15 - 17 Centro

Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com

Teléfono: 311 4143542

«CIUDAD_PROPONENTE»

El consorcio Construredes Se hace responsables de todos los ensayos emitidos por la empresa **Hernán Ramos Villamil S.A.S Nit 901.565.151-3**, laboratorio con más de 50 años de experiencia en el campo de la geotecnia y los cuales poseen la calibración de los equipos, cuyo proveedor si está acreditado para realizar las calibraciones correspondientes y es un respaldo a nuestro trabajo. Estarán encargados de realizar los ensayos pertinentes que garanticen el control y aseguramiento de la calidad de la obra “ejecución de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de cordoba, departamento de bolívar”

REPRESENTANTE LEGAL

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
INGENIERIA CIVIL- ESTUDIOS DE SUELO.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. E-410

FC - 19

VERSIÓN 02

Fecha
31/05/2013


CLIENTE CONSORCIO CONSTRUREDES
OBRA INTERDOMICILIARIOS MUNICIPIO DE CORDOBA DPTO DE BOLIVAR
LOCALIZACION DEPARTAMENTO DE CORDOBA -BOLIVAR
FECHA 19/12/2022

NORMAS

I.N.V.E.-410
NTC-673-1513

IDENT.	ELEMENTO	FECHA FUNDICIÓN	FECHA ROTURA	EDAD MUESTRA (Días)	RESISTENCIA REQUERIDA (PSI)	ASENT. PULG	CARGA (KN)	TIPO DE FALLA (1-6)	RESISTENCIA A LA FECHA (PSI)	% DE RESISTENCIA DESARROLLADO
	COLUMNAS	21/11/2022	19/12/2022	28	3.000		180,3	5	3215	107,1%
	VIGA	21/11/2022	19/12/2022	28	3.000		170,3	5	3143	104,7%
	PLACA	21/11/2022	19/12/2022	28	3.000		183,3	5	3240	108 %

TIPOS DE FALLA



FORMA DE PROBETAS		Area (cm2)
CILINDRICA NORMAL 4"	10,20	81,75
CILINDRICA NORMAL 6"	15,24	176,115

OBSERVACIONES:

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
NIT N° 900.565.151-3
INGENIERIA CIVIL - ESTUDIOS DE SUELO.

DIR. TÉCNICO

LABORATORISTA

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
INGENIERIA CIVIL- ESTUDIOS DE SUELO.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. E-410

FC - 19

VERSIÓN 02

Fecha
31/05/2013


CLIENTE CONSORCIO CONSTRUREDES
OBRA INTERDOMICILIARIOS MUNICIPIO DE CORDOBA DPTO DE BOLIVAR
LOCALIZACION DEPARTAMENTO DE CORDOBA -BOLIVAR
FECHA 09/12/2022

NORMAS

I.N.V.E.-410
NTC-673-1513

IDENT.	ELEMENTO	FECHA FUNDICIÓN	FECHA ROTURA	EDAD MUESTRA (Días)	RESISTENCIA REQUERIDA (PSI)	ASENT. PULG	CARGA (KN)	TIPO DE FALLA (1-6)	RESISTENCIA A LA FECHA (PSI)	% DE RESISTENCIA DESARROLLADO
	COLUMNAS	02/12/2022	09/12/2022	7	3.000		132,1	5	2194	73,1 %
	VIGA	02/12/2022	09/12/2022	7	3.000		133,5	5	2225	74,1%
	PLACA	02/12/2022	09/12/2022	7	3.000		128,5	5	2223	74,1%

TIPOS DE FALLA



FORMA DE PROBETAS		Area (cm2)
CILINDRICA NORMAL 4"	10,20	81,75
CILINDRICA NORMAL 6"	15,24	176,115

OBSERVACIONES:

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
NIT N° 900.565.151-3
INGENIERIA CIVIL - ESTUDIOS DE SUELO.

DIR. TÉCNICO

LABORATORISTA

FOTOCOPIA DE LA BITÁCORA O LIBRO DE OBRA DE TODA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Jueves, 01 Diciembre / 2022

= PERSONAL DE OBRA
- Ing. Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora Social

= PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Profesional Social

= ACTIVIDADES REALIZADAS =

Se desarolla la ACTIVIDAD 2 con el diligenciamiento de los formularios, levantamiento arquitectonico, trazado de redes hidrosanitarias y ubicación de aparatos, en lo correspondiente a diagnóstico de las viviendas para agotar el presupuesto de las intervenciones.

Por su parte, la ejecución de la ACTIVIDAD 3 se desarolla de acuerdo a la programación de obra con la instalación de incrustaciones de pared, armado de Formaleta para losa tanque, fundición de columnas y columnetas, pañete, levante de muro soporte lavadero estandar.

- Se radica en correspondencia informes semanales N°28 - N°29 y N30, en INTerventoria.
- Se reabe Informe mensual N7 especialista, componente HSE aprobado por Interventoría.
- Se envía ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO firmadas a Directora de Interventoria, desde ACTA N°23 hasta ACTA N°28

Estado del clima:

Ronald Arneta
R Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra

Powered by CamScanner

Viernes, 02 Diciembre/2022

=PERSONAL DE OBRA
- Ing. Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora social

=PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Trabajadora social.

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

Se desarrolla la ACTIVIDAD 3 con la ejecución de las intervenciones en Casita tipo 2, tipo 3, tipo 4 y adecuación. se realizan fundición viga dintel, levantamiento de muro, pañete, armado de acero de refuerzo para elementos estructurales, instalación de lavadero estándar, instalación de Sanitario.

La ACTIVIDAD 2 se continua ejecutando con el diligenciamiento de los formularios, levantamiento arquitectonico y trazado de redes hidrosanitarias.

- Se remite a Personería municipal de Cordoba, oficio CCR-CORDOBA-2220576-2022 por parte construredes; reiterando disponibilidad para reunion.
- Se recepciona mediante correo electrónico ACTA N°5 de parte del contratista para revisión de Interventoría.
- Se envia de parte de Interventoria oficio TEC-095-22 para COOPSECOR.

Estado del clima:

Ronald Arrieta

Ronald Blanco
R. Obra

Powered by CamScanner

Sábado, 03 Diciembre/2022

=PERSONAL DE OBRA
- Ing Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora social

=PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Trabajadora social

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

Se desarolla LA ACTIVIDAD 3 con las actividades programadas en la ejecución de las intervenciones en las viviendas beneficiadas, se realiza las siguientes actividades fundición de columna de tanque, excavación de zanja para tubería sanitaria, instalación de lavamanos con pedestal, pañete, armado de formaleta para columnas y columnetas, aplicación de pintura, instalación de tubería sanitaria e hidraulica, enchape en pared y piso, instalación de incrustaciones de pared.

Se están recogiendo las firmas de las ACTAS DE ENTREGA y RECIBO A SATISFACCION para su posterior cargue en la plataforma DRIVE.

Estado del clima: soleado

Ronald Arieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra.

Powered by CamScanner

Lunes, 05 Diciembre /2022

=PERSONAL DE OBRA
- Ing. Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora social

=PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Trabajadora social

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

La ACTIVIDAD 2 se continua ejecutando con el diligenciamiento de los formularios de diagnóstico, levantamiento arquitectonico, trazado de redes hidrosanitarias, registro fotográfico.
De igual forma se sigue desarrollando la ejecución de las intervenciones en la ACTIVIDAD 3, se realizaron las sgtes actividades pañete, aplicación de pintura, excavación de viga cimentación, armado de acero de refuerzo, instalación de tanque elevado, armado de Formaleta para losa tanque, enchape en pared y piso, excavación de zanja con pendiente para tubería sanitaria.

- Se radica en correspondencia oficio GER133- ENTREGA INFORME MENSUAL N°7. de Interventoria.
- Se radica en correspondencia oficio GER132- ENTREGA INFORME SEMANAL 31
- Se reciben observaciones al ACTA N°5. para ser respondidas por Contratista.

Estado del clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Obra

Powered by CamScanner

Martes, 06 Diciembre / 2022

= PERSONAL DE OBRA
- Ing. Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora social

= PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Trabajadora social.

= ACTIVIDADES REALIZADAS =

Se continua con la ejecución de la ACTIVIDAD 3, de acuerdo a la programación de obra, se realizan las siguiente labores: pañete en muros internos y externos, fundición de viga dintel, instalación de sanitario y lavamano con pedestal, cerámica en pared y piso, instalación de tanque elevado, armado de formaleta para columnas y colomnetas, puesta de tubería Sanitaria.

- Se recepciona de parte de Minvivienda, observaciones dadas en visita de obra 17-NOV; para ser subsanadas por contratista.

Estado del clima: soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Obra

Powered by CamScanner

Miercoles, 07 Diciembre / 2022

= PERSONAL DE OBRA
- Ing Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Profesional social

= PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Ing Inspector
- Profesional social.

= ACTIVIDADES REALIZADAS =

Se continua con la ejecución de la ACTIVIDAD 3, en las intervenciones de las casita tipo 2, tipo 3, tipo 4 y adecuación, se realizaron las labores de enchape en pared y piso, pañete en muros internos y externos, aplicación de pintura, instalación de cubierta, levante de muro para soporte lavadero y lavaplatos.

- Se envia INFORME SEMANAL N° 32 con Anexos a ENTerritorio.
- Se envia oficio TEC-096-22 - solicitud respuesta a observaciones al Informe de MINVIVIENDA - 17 NOV a Contratista.
- Se recepciona respuesta a oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-095-22 por parte de COOSEPCOR
- Se recibe mediante correo electrónico PLAN DE ACCION #2 con oficio CCR-CORDOBA-2220576-2022-129.
- Se radica en ENTerritorio mediante oficio GER134 Remisión ACTA DE RECIBO PARCIAL N°7.

Estado del clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Obra

Powered by CamScanner

Viernes, 09 Diciembre / 2022

= PERSONAL DE OBRA
- Ing. Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Profesional social

= PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Profesional social

= ACTIVIDADES REALIZADAS =

La ACTIVIDAD 3 se continua desarrollando de acuerdo a la programación de obra, en las intervenciones de las viviendas beneficiadas. Se realizan las labores de pañete en muro soporte de lavadero estándar, se realiza instalación de tanque elevado, armado de formaleta de columnas y columnetas, fundición de caja de inspección, excavación de zanja para tubería sanitaria, instalación de puntos hidráulicos y sanitarios, instalación de lavaplatos, excavación de viga de cimentación, armado de acero para elementos estructurales, fundición de losa para tanque, instalación de sanitario y lavamanos con pedestal, instalación de incrustaciones de pared.

Estado del clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra

Powered by CamScanner

Sábado, 10 Diciembre /2022

=PERSONAL DE OBRA

- Ing. Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora social

=PERSONAL INTERVENTORIA

- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Trabajadora social

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

Se continua con la ejecución de la ACTIVIDAD 3 con el desarrollo de las intervenciones en las Casita tipo 2, tipo 3, tipo 4 y adecuación, donde se realizaron las labores de levante de muro en bloque, instalación de lavadero estándar, aplicación de pintura, fundición de columna de tanque, instalación de sanitario, enchape en pared y piso, instalación de cubierta con correa en perfil metálico.

- Se recepciona mediante correo electrónico de parte de Consorcio Construredes oficio CCR CORDOBA 2220526-2022-128, Respuesta a observaciones Acta parcial 5.

Estado del clima: soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Obra.

Lunes, 12 Diciembre / 2022

= PERSONAL DE OBRA
- Ing. Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Profesional Social

= PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Profesional Social

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

La ejecución de la ACTIVIDAD 3 se continua desarrollando de acuerdo a la programación de obra las intervenciones, se laboraron enchape en pared y piso, excavación de cimentación de estructura tanque elevado, armado de acero para elementos estructurales, armado de formaleta para columnas y colomnetas, instalación de lavamanos con pedestal, instalación de lavaplatos, pañete en muros internos y externos, aplicación de dos manos de pintura de acuerdo a especificaciones técnicas.

- Se recepciona mediante correo electronico de parte de Consorcio Construredes oficio CCR-CORDOBA-2220576-2022-130 Aclaratoria instalación tubería de 1/2".

Estado del clima: Soleado

Ronald Arbeta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Obra.

Powered by CamScanner

Martes, 13 Diciembre /2022

=PERSONAL DE OBRA
- Ing. Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Profesional social

=PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Profesional social.

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

La ACTIVIDAD 3 se realizan instalación de tanque elevado, levante de muro, fundición de columnas y columnetas, enchape en pared y piso, excavación de viga de cimentación, armado de acero de refuerzo, fundición de losa de tanque, excavación de caja de inspección, excavación de zanjas para tubería sanitaria, instalación de sanitario y lavamanos con pedestal.

- Se recepciona del contratista, respuesta a observaciones de visita de obra (17 nov) de parte de Ministerio de vivienda, ciudad y Territorio, para revisión y aprobación de Interventoría, mediante oficio CCR-CORDOBA-2220576-2022-132.

Estado del clima: soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra.

Miercoles, 14 Diciembre / 2022

= PERSONAL DE OBRA
- Ing. Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Profesional social

= PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Profesional Social.

= ACTIVIDADES REALIZADAS -

Se continua desarrollando la ACTIVIDAD 3 con la ejecución de las intervenciones en las viviendas, donde se realizaron instalación de Sanitario, lavamanos con pedestal, construcción de muros soporte de lavadero estándar y lavaplatos, encofrado de columna de tanque elevado, instalación de cubierta con correa en perfil metálico, pañete en muro externo e interno, instalación de ducha e incrustaciones de pared, enchape en pared y piso, instalación de puerta metalica.

Estado del clima: Soleado.

Ronald Arrieta
R. Interventoría.

Ronald Blanco
R. Obra

Powered by CamScanner

Jueves, 15 Diciembre /2025

=PERSONAL DE OBRA

- Ing. Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora social

=PERSONAL INTERVENTORIA

- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Trabajadora social.

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

Se continua con el desarrollo de la ACTIVIDAD 3, de acuerdo a la programación de obra con la construcción de Casita tipo 2, tipo 3 y tipo 4, instalación de cubierta, levante de muro en bloque, armado de acero de refuerzo para elementos estructurales, encofrado de viga dintel, fundición de columnas y columnetas, enchape en pared y piso, instalación de ducha, excavación de viga de cimentación, levante de muro soporte para lavadero estándar.

- Se recepciona mediante correo electronico por parte de Consorcio Construredes remisión de 12 diagnósticos para revisión de Interventoría.
- Se realiza visita a campo, donde se realiza recorrido en viviendas beneficiadas, en compañía de Contratista, Interventoría, Minvivienda, ENTerritorio.

Estado del clima: soleado

Ronald Ameta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra.

Powered by CamScanner

Viernes, 16 Diciembre / 2022

= PERSONAL DE OBRA
- Ing. Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Profesional social

= PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Profesional social

= ACTIVIDADES REALIZADAS =

Se continua la ACTIVIDAD 3, con la ejecución de las intervenciones en las viviendas beneficiadas, se realizaron labores de levantamiento de muros, pañete externo e interno, instalación de tanque elevado, armado de acero de refuerzo para elementos estructurales, encofrado de viga dintel, fundición de columna de tanque elevado, instalación de cubierta en teja con correa en perfil metalico, excavación de zanja para tubería sanitaria, instalación sanitario y lavamanos.

- Se envia a Supervisora INFORME SEMANAL N°33 Y ANEXOS
- Se envía a Directora de Interventoría oficio TEC-097-22 RESPUESTA AL OFICIO CCR-CORDOBA-2220576-2022-133 mediante el wal se da aval a 12 diagnósticos de aprobación presentados por el contratista

Estado del clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra.

Powered by CamScanner

Sábado, 17 Diciembre/2022

= PERSONAL DE OBRA
- Ing. Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora Social

= PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Trabajadora social

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

La ejecución de la ACTIVIDAD 3 se continua de acuerdo a la programación de obra, se realiza instalación de ceramica en pared y piso, excavación de zapata de tanque elevado, relleno y compactación de suelo en excavaciones, instalación de lavamanos con pedestal, instalación de lavaplatos, aplicación de pintura sobre muros y soporte de lavadero estándar, fundición de columna de tanque.

- Se envia de parte de Interventoría a ENTerritorio, oficio ENT276-6ER-136-22 Remisión de pólizas actualizadas conforme a las modificaciones del contrato.

Estado del clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra

Powered by CamScanner

Lunes, 19 Diciembre / 2022

= PERSONAL DE OBRA
- Ing. Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Profesional social

= PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Profesional Social.

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

La ejecución de la actividad 3 se desarrolla en las viviendas con intervención de Caseta Tipo 2, Tipo 3, tipo 4 y adecuación, se realizaron levante de muro, instalación de cerámica e instalación de aparatos sanitarios, se realizó fundición de columna para tanque elevado, excavación para tubería sanitaria, excavación y fundición para caja de inspección encofrado de viga dintel, instalación de lavadero estándar, pañete en muro externos e internos, desmonte de cerámica en intervención de adecuación.

- Se envía Informe Semanal Nº 34 y anexos para su revisión y visto bueno de Directora de Interventoría.
- Se recepciona de parte de Consorcio Construcedes oficio CCR-CORDOBA-2220526-2022-134 para aprobación de 12 diagnósticos, dando cumplimiento a las condiciones contractuales

Estado del clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra

Powered by CamScanner

Martes, 20 Diciembre / 2022

= PERSONAL DE OBRA
- Ing. Residente
- Ing. Diagnostico
- SISO
- Profesional social

= PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Profesional social.

= ACTIVIDADES REALIZADAS =

- Se continua ejecutando la ACTIVIDAD 3 de acuerdo a la programación de obra en las intervenciones, se realizaron Levantamiento de muros, aplicación de pintura, instalación de tanque, instalación de combo sanitario, fundición de columnas y columnetas, pañete en muros externos e internos.
- Se recibe ACTA DE COMITE SEGUIMIENTO DE CONTRATO N°29, para dilgenciamiento de firmas.
- Se reciben observaciones de parte de Directora de Interventoria, para ser subsanadas, de oficio respuesta a obr. Ministerio de Vivienda.
- Se recibe INFORME SEMANAL N°34 con correcciones de parte de Directora de Interventoria y ser remitido ENTemtorio.
- Se envia ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO N°30 y 31
- Se envia ACTA DE APROBACION DE DIAGNOSTICO N°22 a ENT.
- Se envia oficio TEC-098-22 respuesta CCR-CORDOBA-2220J+6-2022-134
- Se envia ACTA DE APROBACION DE DIAGNOSTICO N°23.

Estado del clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Obra

Powered by CamScanner

Miercoles 21 Diciembre / 2022

= PERSONAL DE OBRA
- Ing. Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora social

= PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Trabajadora social

= ACTIVIDADES REALIZADAS =

En cuanto a la actividad 3 se adelantan labores de pintura externa e interna en varias casetas T3 y adecuaciones.
Tambien se adelantan trabajos de instalacion de puertas, equipos sanitarios y accesorios como griferia e incrustaciones.
De igual manera se realizan labores de levante de mamposteria para base de lavaderos y lavaplatos.
En las adecuaciones se realizan trabajos de fundicion de columnas para estructura de Tanque elevado
Se realizan labores de enchape de piso y pared Tanto en casetas T3 como en adecuaciones.

Estado del clima.

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Obra

Powered by CamScanner

Jueves, 22 Diciembre /2022

=PERSONAL DE OBRA

- Ing. Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora Social.

=PERSONAL INTERVENTORIA

- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Trabajadora social

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

En la actividad 3 se adelantan Trabajos de Pintura interna y externa tanto en las casetas T3 como en las adecuaciones. Se adelantan labores de instalacion de Puertas, equipos sanitarios, accesorios como griferias de Ducha y lavamanos al igual que el juego de incrustaciones. Tambien se realiza instacion de lavaplatos y Lavaderos con todos sus Puntos hidraulicos y sanitarios.
Se realiza Instalacion de Tanque elevado Para la distribucion de los puntos Hidraulicos.
Al Dia de Hoy se Terminaron 345 intervenciones quedando en ejecucion 24 mas Para completar 369.

Estado del clima:

Ronald Arrieta
R. Interventoria.

Ronald Blanco
R. Obra

Powered by CamScanner

RELACIÓN DELPERSONAL EMPLEADO

enterritorio	CONTROL DE PERSONAL	CÓDIGO:	F-GG-10
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/12/2020 Y EL 22/12/2022 PLAZO: 240 días

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES — CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. — CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1										
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1										
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1										Resaltados en rojo lo dias Domingo
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1										
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1										
OSWALDO GARZON - PROFESIONAL DIAGNOSTICO Y COSTOS Y PRESUPUESTO	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1										
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1										
GUSTAVO CAMARGO - ESPECIALISTA HIDROSANITARIO	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1										
PEDRO MANJARRES - ESPECIALISTA HSEQ	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1										
RAMIRO ANDRADE - ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1										
PERSONAL CONTRATISTA	**9**	**9**	**9**	**0**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**0**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**0**	**9**	**9**	**9**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL PERIODO** 171

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*																															SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA																																**0**	**0,00%**	
De la región																																0	0,00%	
RODOLFO JOSE TORRES ANAYA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1										19	11,11%	
YOVANNI CHAMORRO FLOREZ	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1										19	11,11%	
HEIDER MANUEL PINEDA HENAO	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1										19	11,11%	
JOSER ALFONSO ARIAS SANCHEZ	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1										19	11,11%	
ERIS ALFONSO HERNANDEZ ESCOBAR	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1										19	11,11%	
																																0	0,00%	
De fuera de la región	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0,00%	
ROBERTO ENRIQUE BRITO APIAYU	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1										19	11,11%	
HERIBERTO VALENCIA PEREZ	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1										19	11,11%	
																																0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA																																**0**	**0,00%**	
De la región																																0	0,00%	
DONAIRO ALFONSO ESCOBAR ROMERO	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1										19	11,11%	
YULDOR VERGARA TOREES	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1										19	11,11%	
YEISON ESCOBAR VERGARA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1										19	11,11%	
JESUS ESCOBAR VERGARA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1										19	11,11%	
JOSE LUIS AHUMADA MARTINEZ	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1										19	11,11%	
																																0	0,00%	
De fuera de la región	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0,00%	
GENKY ALVAREZ PADILLA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1										19	11,11%	
ALEXI CORDOBA CUESTA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1										19	11,11%	
MAICOL RIOS ARANGO	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1										19	11,11%	
CRISTIAN PACHECO HORTA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1										19	11,11%	
LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1										19	11,11%	

	CONTROL DE PERSONAL	CÓDIGO:	F-GG-10
enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/12/2020 Y EL 22/12/2022 PLAZO: 240 días

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. CONTRATO No. 2220587

| | | |

	CONTROL DE PERSONAL	CÓDIGO:	F-GG-10
enterritorio		VERSIÓN:	01
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/12/2022 Y EL 22/12/2022 PLAZO: 240 días

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES — CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. — CONTRATO No. 2220587

PERSONAL INTERVENTORIA

FECHA	MES: 01 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2022																													OBSERVACIONES	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
NOMBRE Y CARGO	**1**	**1**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		1	1	1	1	1	1		**1**	**1**	**1**	**1**											
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**1**	**1**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		1	1	1	1	1	1		**1**	**1**	**1**	**1**										Resaltados en rojo lo dias Domingo	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**1**	**1**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		1	1	1	1	1	1		**1**	**1**	**1**	**1**											
MARIELIS OCHOA - INSPECTORA DE INTERVENTORIA	**1**	**1**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		1	1	1	1	1	1		**1**	**1**	**1**	**1**											
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**1**	**1**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		1	1	1	1	1	1		**1**	**1**	**1**	**1**											
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**1**	**1**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		1	1	1	1	1	1		**1**	**1**	**1**	**1**											
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**1**	**1**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		1	1	1	1	1	1		**1**	**1**	**1**	**1**											
MARIA CAMILA SILVA - ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	**1**	**1**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		1	1	1	1	1	1		**1**	**1**	**1**	**1**											
CRISTINA PAEZ - PROFESIONAL HSEQ	**1**	**1**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		1	1	1	1	1	1		**1**	**1**	**1**	**1**											
GREGORIO MARÍN - ESPECIALSITA HIDROSANITARIO	**1**	**1**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		1	1	1	1	1	1		**1**	**1**	**1**	**1**											
CARLOS FORERO - PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	**1**	**1**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		1	1	1	1	1	1		**1**	**1**	**1**	**1**											
PERSONAL INTERVENTORIA	**10**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL PERIODO**	**190**

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre: Ing. Marcy Correa

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

INFORMES SEMANALES PRESENTADOS Y APROBADOS DEL PROYECTO

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 30 de diciembre de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-138-22

Señores:
Ingeniera
Erika Marcela Gutiérrez
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: ENTREGA INFORME SEMANAL No 32

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal No. 32 cuyo periodo es del 28 de noviembre del 2022 hasta 04 de diciembre del 2022.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 30/12/2022
HORA: 11:22:14 a. m.
20224300506572

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 25 folios
Proyectó: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría.

INFORME SEMANAL 32

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 32	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 32

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **28/11/2022** al **4/12/2022** | Fecha **4/12/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** BOLIVAR **MUNICIPIO** CORDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO
SUPERVISOR	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN ACTIVIDAD 3

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.		2220576
Contratista		CONSORCIO CONSTRUREDES
Valor inicial	$	1.771.707.945,99
Valor actual	$	2.654.032.619,99
Variación del valor	$	882.324.674,00
Fecha de Inicio		26/04/2022
Plazo inicial (Días)		150 Días
Plazo actual (Días)	226 Días	7,5 MESES - 226 DÍAS
Variación en plazo		76 Días
Fecha Contractual de terminación		11/12/2022
Tiempo Transcurrido (días)	222	98,23%
Días remanentes del Contrato	7,00	3,10%
Acumulado a última acta pagada	$	821.329.766,06
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	322.624.898,30

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.		2220587
Interventor		ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.
Valor inicial	$	202.479.313,00
Valor actual	$	303.315.624,00
Variación del valor	$	100.836.311,00
Fecha de Inicio		26/04/2022
Plazo inicial		150 Días
Plazo actual	226 Días	7,5 MESES - 226 DÍAS
Variación en plazo		76 Días
Fecha Contractual de terminación		11/12/2022
Ejecución del Contrato	222	98,23%
Días remanentes del Contrato	7,00	3,10%
Acumulado a última acta pagada	$	132.623.950,03
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	36.604.468,31

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 2.654.032.619,99

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 2.358.457.920,19	88,86%	$ 2.137.025.157,51	80,52%	-$ 221.432.762,69	-8,34%
Durante el Periodo	$ 119.827.581,00	4,51%	$ 150.105.339,72	5,66%	$ 30.277.758,72	1,14%
Acumulado a la Fecha	**$ 2.478.285.501,19**	**93,38%**	**$ 2.287.130.497,22**	**86,18%**	**-$ 191.155.003,97**	**-7,20%**


Desviación en días: **11 Días**




Observaciones al desempeño del proyecto

A la fecha de corte del presente informe tenemos el siguiente reporte:
En cuanto a la actividad 2 el contratista cumplió con los 345 diagnósticos aprobados los cuales corresponden a la cifra contractual, sin embargo, cabe mencionar que de acuerdo a las condiciones del contrato se deben realizar más diagnósticos hasta agotar el monto total designado. Actividad en la cual se le ha solicitado celeridad al contratista.
El avance de la actividad 3 nos indica las siguientes cifras: un programado del 93,21% frente a un ejecutado del 85,83% lo cual representa un atraso de 7,38% Este atraso corresponde a 52 viviendas dado que el programado es de 335, a la fecha se han intervenido 326 viviendas, de las cuales se han terminado 283 y se adelantan labores constructivas en 43 más, cabe mencionar que de estas 43 en ejecución hay 15 intervenciones que están en un 85 % de su construcción.
El atraso general del proyecto equivale al 7,20%, lo que representa una leve disminución con relación a la semana anterior, sin embargo, la disminución no es significativa más aún si consideramos que sólo qued una semana del plazo contractual, plazo en el cual se deben terminar las viviendas que están en ejecución e iniciar y terminar las 19 viviendas restantes del objeto contractual. Además de las viviendas requeridas para agotar el monto del Contrato de obra. Ya que a corte del presente informe aún no se habia formalizado la prórroga solicitada por el Contratista

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

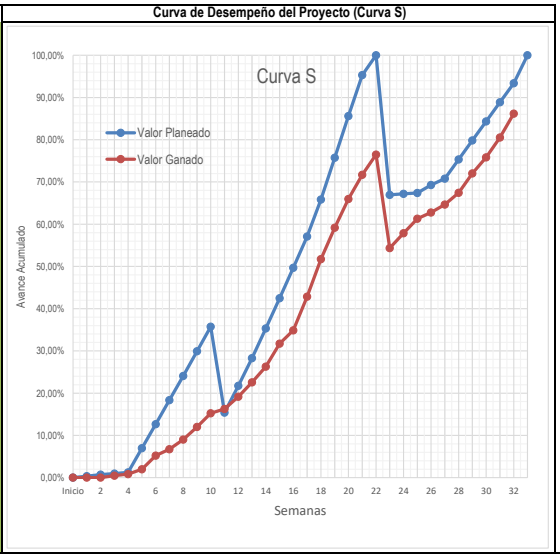

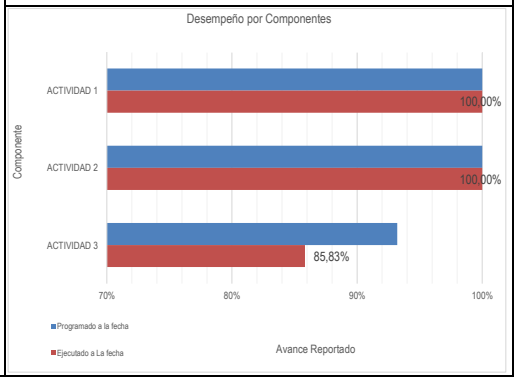


CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

A la fecha del presente informe no se han presntado cambios en la LINEA BASE.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado %	Ejecutado %	Desviación %	Semáforo
Acumulado Anterior	88,86%	80,52%	-8,34%	
Durante el Periodo	4,51%	5,66%	1,14%	
Acumulado a la Fecha	**93,38%**	**86,18%**	**-7,20%**	

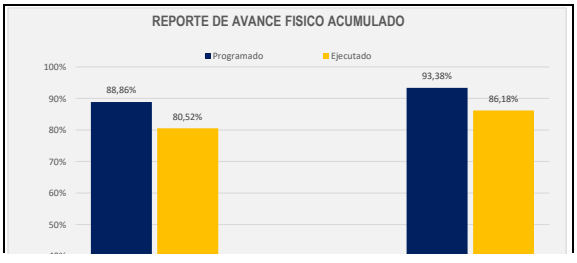

AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 2.654.032.619,99	$ 882.324.674,00	$ 345.450.914,11		$ 345.450.914,11

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
4	$ 1.450.337.244,76	54,65%	2	$ 821.329.766,06	30,95%	12/09/2022	$ 821.329.766,06







AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 303.315.624,00	$ 100.836.311,00			$ -


No. Pagos	Valor Pagos tramitados	No. Pagos	Valor Pagos realizados	Fecha última acta	Valor última Acta


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 32

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO**


Semana del **28/11/2022** al **4/12/2022** Fecha **4/12/2022**

tramitados	Valor en Pesos	%	realizados	Valor en Pesos	%	pagada	pagada
6	$ 168.145.154,02	55,44%	5	$ 132.623.950,03	43,72%	31/10/2022	$ 44.545.448,87









OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 32

Entidad Contratante: ENTERRITORIO | Semana del 28/11/2022 al 4/12/2022 | Fecha 4/12/2022

ACTIVIDAD No. 1
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: A la fecha de corte del 15 de noviembre el contratista cumplió con 345 diagnósticos aprobados en actas, la interventoría dio aval a los últimos 60 diagnósticos mediante comité de aprobación No. 21, queda pendiente la inclusión de varias viviendas de acuerdo al remanente que quede correspondiente al monto agotable.
ACTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 93,21% vs 85,83% EJECUTADO
Lo cual nos indica un atraso del 7,38%
En cuanto a la actividad 3 y conforme a las nuevas condiciones del contrato la meta es de 345 viviendas, a la fecha se han intervenido 326 viviendas, de las cuales se han terminado 283 y se adelantan labores constructivas en 43 más, el contratista cuenta con 14 frentes de trabajo vinculados directamente por el Contratista y otros frentes que están contratados como independientes. En la última semana el atraso disminuyó un poco con base en el reporte anterior, sin embargo, la disminución no impacta en el atraso general lo que es preocupante ya que el plazo contractual restante es de 14 días. En el último comité se solicitó al Ing. Duarte presentar un informe con las acciones a implementar para terminar en la fecha pactada, sin embargo, no se recibió ninguna información.
El Contratista solicitó una prórroga del contrato de obra, solicitud que aún no ha sido formalizada por la Entidad, ya que para agotar el monto total del contrato se deben incluir alrededor de 20 viviendas más, las cuales deben ser diagnosticadas y ejecutadas por el Contratista

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. El contratista subsanó los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizó entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución. Sin embargo, el Contratista posteriormente solicitó un cambio de especificaciones en algunos ítems, uno de ellos el ladrillo de arcilla por bloque de Concreto, razón por la cual se hace necesario ajustar el diseño estructural con dicho cambio. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. A corte del 15 de noviembre se aprobaron 60 diagnósticos correspondientes a los 108 de la adición, con lo cual completan 345 diagnósticos aprobados, cabe mencionar que de acuerdo a las condiciones del contrato se deben realizar más diagnósticos hasta agotar el monto total designado.
En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
Con corte al 04 de diciembre se han intervenido 326 viviendas de las cuales 283 están terminadas, El contratista tiene en ejecución 43 intervenciones y debe continuar incrementando el personal de obra con el fin de mejorar los rendimientos en la ejecución de las obras y poder finalizar este grupo de viviendas programadas y concentrar los esfuerzos en las intervenciones pendientes. El contratista debe emprender acciones que impacten efectivamente los rendimientos para disminuir sustancialmente los atrasos, más aún considerando el plazo restante. Se espera que el Contratista pueda doblar los esfuerzos para que al 11 de diciembre se puedan tener terminadas la totalidad de las viviendas a intervenir, en el plazo de prórroga si es otorgado se puedan incluir las del monto agotable que están entre 15 y 20 viviendas más.
En la ejecución de las casetas y adecuaciones se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 14 frentes de trabajo contratados directamente por el Consorcio Construredes y otras cuadrillas contratadas por subcontratistas.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la próxima semana correspondiente al periodo del 04 al 11 de diciembre de 2022 el contratista debe completar la cantidad de 345 intervenciones terminadas y continuar con la ejecución de obra de las intervenciones que se aprueben con los remanentes del monto agotable, con la mayor celeridad posible y con el fin de poder alcanzar mayores rendimientos, además de determinar el número de viviendas que se requieren para agotar todo el monto del contrato.
El contratista solicitó una prórroga al Contrato de obra, la cual no ha sido formalizada por la Entidad, sin embargo, el contratista debe seguir avanzando en las actividades considerando el peor de los escenarios que no se prorrogue el contrato.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0

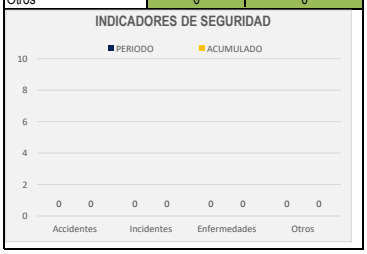

Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	71	3	74	100,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**71**	**3**	**74**	**100,00%**


HORAS PERDIDAS SEMANALES
Acumulado Anterior
Semana Actual
Acumulado
Horas Perdidas
100
75
50
25
0
71
74
3
0 0 0 0 0 0 0

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 32

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **28/11/2022** al **4/12/2022** Fecha **4/12/2022**

GESTIÓN SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	30/11/2022	CASA DE LA CULTURA	7,00	Realizar Recorrido de Obra con acompañamiento del Comite Veedor y Personero Municipal.	CONTRATISTA	Por Definir

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
N/A			N/A	

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









CASETAS O ADECUACIONES, SE APRECIA AVANCE EN EL PANETE DE MAMPOSTERIA, FUNDICION DE VIGAS Y COLUMNAS.









INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 32

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **28/11/2022** al **4/12/2022** Fecha **4/12/2022**

ADECUACIONES DE UNIDADES SANITARIAS, SE APRECIA INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, LAVAPLATOS Y LAVADEROS









CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 32

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **28/11/2022** al **4/12/2022** Fecha **4/12/2022**

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-092-22 con el asunto: Remisión de informe con registro fotográfico subsanación informe de Inspección de viviendas Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante el cual hacemos entrega del informe presentado por el Contratista de obra, en el cual se evidencia con registro fotográfico la atención a las observaciones realizadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio al proyecto en el Municipio de Córdoba Bolivar, el pasado 14 de Julio de 2022.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-093-22 con el asunto: RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_116 Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales realizamos entrega de aval para 60 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 21.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-094-22 con el asunto: SOLICITUD DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CIENTO UN (103) DIAGNÓSTICOS APROBADOS EN EL BARRIO SAN MARTIN por medio del cual solicitamos amablemente su gestión como la empresa prestadora del servicio público de acueducto y alcantarillado, COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CÓRDOBA BOLÍVAR - (COOSEPCOR LTDA), para la expedición del certificado de disponibilidad de redes y de autorización para la Intervención de conexión de las acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado para ciento un (103) diagnósticos en el Barrio San Martín.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-095-22 con el asunto: REITERACION SOLICITUD DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CIENTO NUEVE (109) DIAGNÓSTICOS APROBADOS EN EL BARRIO SAN MARTIN mediante del cual reiteramos la solicitud muy amablemente de su gestión como la empresa prestadora del servicio público de acueducto y alcantarillado, COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CÓRDOBA BOLÍVAR - (COOSEPCOR LTDA), para la expedición del certificado de disponibilidad de redes y de autorización para la Intervención de conexión de las acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado de ser necesario para ciento nueve (109) diagnósticos en el Barrio San Martín, esta solicitud ya fue realizada mediante el oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-094-22 con fecha del 16 de noviembre 2022.

	Marcy A. Correa C		
Firma		**Firma**	
Nombre	Marcy Correa castaño	Nombre	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
	Directora de la interventoría	Supervisor	Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

Enviar Informe para validación

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO
ARCA-INT/FDA276-TEC-094	16-nov-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	109	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	16-nov-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-095	2-dic-22	REITERACION SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	109	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-dic-22

INFORME PCI

Fecha de Corte	5/12/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																										
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES													TOTALES								
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldia	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldia	Respuesta positiva	Respuesta negativa	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	191	25	191	1	223	223	223	0	0	188	35	154	0	154	0	346	345	29	345	1	326	283	15	43	335
	TOTAL	**217**	**0**	**191**	**25**	**191**	**1**	**223**	**223**	**223**	**0**	**0**	**188**	**35**	**154**	**0**	**154**	**0**	**346**	**345**	**29**	**345**	**1**	**326**	**283**	**15**	**43**	**335**

INFORME ESTADO DE COVID-19

enterritorio	**INFORME ESTADO DE COVID - 19**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21/11/2022 Y EL 27/11/2022 PLAZO: 7.5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
M									

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
MARIELIS OCHOA - INSPECTORA	**MODERNA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Marcy A. Correa C

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPORTE Y EJECUCIÒN DE VIVIENDAS SEMANALES

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 04/12/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001	0%	Adecuacion	$7.967.801,13	$0,00			0/01/1900	5/01/1900	0	5	-5		x
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	100%	Caseta T3	$8.126.190,79	$8.126.190,79	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	100%	Caseta T3	$7.914.431,13	$7.914.431,13	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	20/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	100%	Adecuacion	$7.636.382,30	$7.636.382,30	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	100%	Adecuacion	$7.148.052,07	$7.148.052,07	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	12/06/2022	5	8	-3		x
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	100%	Adecuacion	$7.826.891,21	$7.826.891,21	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	100%	Adecuacion	$7.415.092,49	$7.415.092,49	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	14/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	8	B-C-SM-MZ22-VE-009	100%	Caseta T3	$7.908.010,60	$7.908.010,60	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	16/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	9	B-C-SM-MZ21-VE-010	100%	Caseta T3	$8.928.931,81	$8.928.931,81	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	10	B-C-SM-MZ22-VE-011	100%	Adecuacion	$8.088.174,13	$8.088.174,13	8/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	21/06/2022	5	13	-8		x
SM	1	11	B-C-SM-MZ34-VE-012	100%	Caseta T3	$9.305.276,37	$9.305.276,37	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	12	B-C-SM-MZ21-VE-013	100%	Adecuacion	$5.457.782,54	$5.457.782,54	2/06/2022	TERMINADA	7/06/2022	11/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-014	100%	Caseta T3	$8.614.149,98	$8.614.149,98	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	18/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-015	100%	Caseta T3	$8.265.079,43	$8.265.079,43	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-016	100%	Caseta T3	$9.299.320,83	$9.299.320,83	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	16	B-C-SM-MZ38-VE-017	100%	Caseta T3	$8.532.396,85	$8.532.396,85	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	2	17	B-C-SM-MZ24-VE-018	100%	Caseta T3	$8.502.042,22	$8.502.042,22	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	18	B-C-SM-MZ24-VE-019	100%	Adecuacion	$6.921.383,30	$6.921.383,30	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-020	100%	Adecuacion	$4.593.449,33	$4.593.449,33	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	5	13	-8		x
SM	2	20	B-C-SM-MZ85-VE-021	100%	Caseta T3	$8.614.688,02	$8.614.688,02	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	22/06/2022	8	17	-9		x
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-022	100%	Caseta T3	$8.896.124,14	$8.896.124,14	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	22	B-C-SM-MZ85-VE-023	100%	Adecuacion	$8.133.478,61	$8.133.478,61	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	23	B-C-SM-MZ29-VE-024	100%	Adecuacion	$7.072.986,22	$7.072.986,22	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	2	24	B-C-SM-MZ31-VE-025	100%	Caseta T3	$8.637.204,11	$8.637.204,11	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	25	B-C-SM-MZ31-VE-026	100%	Adecuacion	$5.113.367,92	$5.113.367,92	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	19/06/2022	5	14	-9		x
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-027	100%	Adecuacion	$4.365.339,96	$4.365.339,96	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	14/06/2022	5	9	-4		x
SM	2	27	B-C-SM-MZ31-VE-028	100%	Adecuacion	$7.668.943,15	$7.668.943,15	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	13/06/2022	5	8	-3		x
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-029	100%	Caseta T3	$8.468.136,75	$8.468.136,75	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	29	B-C-SM-MZ31-VE-030	100%	Adecuacion	$4.637.820,16	$4.637.820,16	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	30	B-C-SM-MZ31-VE-031	100%	Caseta T2	$8.119.008,44	$8.119.008,44	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	31	B-C-SM-MZ56-VE-038	100%	Adecuacion	$8.227.630,94	$8.227.630,94	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	32	B-C-SM-MZ56-VE-039	100%	Adecuacion	$1.443.687,77	$1.443.687,77	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	33	B-C-SM-MZ46-VE-040	100%	Adecuacion	$6.628.376,66	$6.628.376,66	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	34	B-C-SM-MZ45-VE-041	100%	Adecuacion	$4.845.221,48	$4.845.221,48	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	35	B-C-SM-MZ21-VE-042	100%	Adecuacion	$4.634.812,47	$4.634.812,47	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	36	B-C-SM-MZ31-VE-043	100%	Caseta T3	$6.939.713,07	$6.939.713,07	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	37	B-C-SM-MZ145-VE-044	100%	Caseta T3	$7.980.826,25	$7.980.826,25	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	38	B-C-SM-MZ55-VE-046	100%	Caseta T3	$7.344.533,10	$7.344.533,10	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	39	B-C-SM-MZ55-VE-047	100%	Caseta T2	$7.890.285,26	$7.890.285,26	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	40	B-C-SM-MZ145-VE-053	100%	Caseta T3	$8.262.443,76	$8.262.443,76	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	41	B-C-SM-MZ91-VE-054	100%	Caseta T2	$8.230.167,20	$8.230.167,20	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	42	B-C-SM-MZ56-VE-055	100%	Adecuacion	$3.160.157,78	$3.160.157,78	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	6	43	B-C-SM-MZ55-VE-056	100%	Adecuacion	$8.215.661,11	$8.215.661,11	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	44	B-C-SM-M55-VE-061	100%	Adecuacion	$7.040.722,29	$7.040.722,29	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	45	B-C-SM-MZ56-VE-062	100%	Caseta T2	$8.362.124,52	$8.362.124,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	46	B-C-SM-MZ66-VE-067	100%	Caseta T3	$7.306.146,52	$7.306.146,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	47	B-C-SM-MZ66-VE-068	100%	Caseta T3	$7.971.707,31	$7.971.707,31	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	48	B-C-SM-MZ75-VE-071	100%	Adecuacion	$7.170.024,86	$7.170.024,86	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	49	B-C-SM-MZ75-VE-072	100%	Caseta T3	$8.040.278,46	$8.040.278,46	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	50	B-C-SM-MZ75-VE-073	100%	Caseta T3	$8.332.036,11	$8.332.036,11	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	5	51	B-C-SM-MZ75-VE-074	100%	Caseta T3	$7.656.034,05	$7.656.034,05	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	52	B-C-SM-MZ89-VE-084	100%	Caseta T3	$8.247.304,21	$8.247.304,21	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	5	53	B-C-SM-MZ69-VE-087	100%	Adecuacion	$7.074.492,71	$7.074.492,71	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	54	B-C-SM-MZ69-VE-088	100%	Adecuacion	$7.465.862,82	$7.465.862,82	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	55	B-C-SM-MZ77-VE-094	100%	Adecuacion	$3.585.305,08	$3.585.305,08	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	56	B-C-SM-MZ68-VE-097	100%	Caseta T3	$8.172.428,90	$8.172.428,90	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	7	57	B-C-SM-MZ59-VE-099	100%	Adecuacion	$6.098.594,42	$6.098.594,42	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	58	B-C-SM-MZ84-VE-166	100%	Adecuacion	$6.744.749,39	$6.744.749,39	22/06/2022	TERMINADA	27/06/2022	3/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	59	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	23/06/2022	TERMINADA	28/06/2022	4/07/2022	5	11	-6		x
SM	8	60	B-C-SM-MZ55-VE-060	100%	Caseta T4	$9.444.985,92	$9.444.985,92	24/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	61	B-C-SM-MZ66-VE-069	100%	Adecuacion	$6.509.744,54	$6.509.744,54	25/06/2022	TERMINADA	30/06/2022	6/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	62	B-C-SM-MZ30-VE-032	100%	Adecuacion	$7.557.018,99	$7.557.018,99	26/06/2022	TERMINADA	1/07/2022	7/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	63	B-C-SM-MZ44-VE-034	100%	Adecuacion	$5.519.347,12	$5.519.347,12	27/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	64	B-C-SM-MZ44-VE-035	100%	Adecuacion	$8.137.626,09	$8.137.626,09	28/06/2022	TERMINADA	3/07/2022	9/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	65	B-C-SM-MZ69-VE-085	100%	Adecuacion	$6.566.494,56	$6.566.494,56	29/06/2022	TERMINADA	4/07/2022	10/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	66	B-C-SM-MZ58-VE-100	100%	Caseta T2	$7.970.674,94	$7.970.674,94	30/07/2022	TERMINADA	7/08/2022	13/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	67	B-C-SM-MZ47-VE-104	100%	Adecuacion	$8.247.586,36	$8.247.586,36	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	68	B-C-SM-MZ58-VE-107	100%	Adecuacion	$7.990.185,62	$7.990.185,62	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	69	B-C-SM-MZ58-VE-110	100%	Adecuacion	$6.954.066,54	$6.954.066,54	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	70	B-C-SM-MZ47-VE-111	100%	Caseta t3	$8.318.089,49	$8.318.089,49	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	71	B-C-SM-MZ47-VE-112	100%	Adecuacion	$6.827.279,63	$6.827.279,63	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	72	B-C-SM-MZ47-VE-113	100%	Adecuacion	$5.043.864,80	$5.043.864,80	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	73	B-C-SM-MZ47-VE-114	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	8	74	B-C-SM-MZ47-VE-115	100%	Caseta t3	$8.322.147,74	$8.322.147,74	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	75	B-C-SM-MZ21-VE-118	100%	Caseta t3	$8.148.709,57	$8.148.709,57	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	76	B-C-SM-MZ30-VE-121	100%	Caseta t3	$7.765.616,43	$7.765.616,43	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	77	B-C-SM-MZ59-VE-102	100%	Caseta T2	$8.805.748,18	$8.805.748,18	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	6	78	B-C-SM-MZ58-VE-101	100%	Adecuacion	$5.300.910,78	$5.300.910,78	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	79	B-C-SM-MZ30-VE-122	100%	Caseta t3	$8.106.560,85	$8.106.560,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	80	B-C-SM-MZ30-VE-124	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	81	B-C-SM-MZ87-VE-125	100%	Caseta t3	$8.100.577,85	$8.100.577,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	82	B-C-SM-MZ87-VE-126	100%	Caseta t3	$8.057.934,94	$8.057.934,94	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	83	B-C-SM-MZ30-VE-127	100%	Caseta t3	$7.998.497,33	$7.998.497,33	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	84	B-C-SM-MZ31-VE-142	100%	Adecuacion	$7.456.473,74	$7.456.473,74	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	9	85	B-C-SM-MZ87-VE-128	100%	Adecuacion	$7.523.102,18	$7.523.102,18	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	86	B-C-SM-MZ87-VE-129	100%	Caseta t3	$8.132.932,39	$8.132.932,39	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	5	87	B-C-SM-MZ66-VE-131	100%	Caseta t3	$8.139.325,77	$8.139.325,77	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	88	B-C-SM-MZ67-VE-133	100%	Adecuacion	$6.390.026,30	$6.390.026,30	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	89	B-C-SM-MZ66-VE-134	100%	Adecuacion	$8.426.367,54	$8.426.367,54	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	90	B-C-SM-MZ56-VE-135	100%	Adecuacion	$7.522.231,25	$7.522.231,25	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	91	B-C-SM-MZ56-VE-136	100%	Adecuacion	$7.922.709,35	$7.922.709,35	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	92	B-C-SM-MZ56-VE-138	100%	Adecuacion	$7.984.245,73	$7.984.245,73	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	93	B-C-SM-MZ56-VE-139	100%	Caseta t3	$7.415.285,53	$7.415.285,53	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x

SM	5	94	B-C-SM-MZ56-VE-140	100%	Caseta t3	$8.097.289,18	$8.097.289,18	11/08/2022	**TERMINADA**	**19/08/2022**	25/08/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	7	95	B-C-SM-MZ47-VE-103	100%	Adecuacion	$8.549.349,69	$8.549.349,69	9/08/2022	**TERMINADA**	**14/08/2022**	20/08/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	12	96	B-C-SM-MZ69-VE-086	100%	Caseta t3	$8.441.178,67	$8.441.178,67	15/08/2022	**TERMINADA**	**23/08/2022**	29/08/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	7	97	B-C-SM-MZ32-VE-143	100%	Caseta t3	$8.877.043,95	$8.877.043,95	15/08/2022	**TERMINADA**	**23/08/2022**	29/08/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	6	98	B-C-SM-MZ87-VE-145	100%	Caseta t3	$8.314.813,05	$8.314.813,05	18/08/2022	**TERMINADA**	**26/08/2022**	1/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	6	99	B-C-SM-MZ87-VE-146	100%	Adecuacion	$7.503.681,08	$7.503.681,08	19/08/2022	**TERMINADA**	**24/08/2022**	30/08/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	6	100	B-C-SM-MZ87-VE-147	100%	Caseta t3	$8.285.180,86	$8.285.180,86	20/08/2022	**TERMINADA**	**28/08/2022**	3/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	6	101	B-C-SM-MZ87-VE-148	100%	Caseta t3	$8.170.302,32	$8.170.302,32	21/08/2022	**TERMINADA**	**29/08/2022**	4/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	5	102	B-C-SM-MZ87-VE-149	100%	Caseta t3	$8.178.886,20	$8.178.886,20	22/08/2022	**TERMINADA**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	5	103	B-C-SM-MZ89-VE-150	100%	Caseta t3	$8.339.015,83	$8.339.015,83	23/08/2022	**TERMINADA**	**31/08/2022**	6/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	8	104	B-C-SM-MZ89-VE-151	100%	Adecuacion	$7.760.503,36	$7.760.503,36	24/08/2022	**TERMINADA**	**29/08/2022**	4/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	5	105	B-C-SM-MZ56-VE-152	100%	Caseta t2	$8.292.567,48	$8.292.567,48	25/08/2022	**TERMINADA**	**2/09/2022**	8/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	7	106	B-C-SM-MZ76-VE-153	100%	Adecuacion	$6.803.533,70	$6.803.533,70	26/08/2022	**TERMINADA**	**31/08/2022**	6/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	9	107	B-C-SM-MZ75-VE-154	100%	Adecuacion	$7.419.892,36	$7.419.892,36	27/08/2022	**TERMINADA**	**1/09/2022**	7/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	7	108	B-C-SM-MZ75-VE-155	100%	Adecuacion	$7.958.081,38	$7.958.081,38	28/08/2022	**TERMINADA**	**2/09/2022**	8/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	5	109	B-C-SM-MZ75-VE-156	100%	Adecuacion	$8.011.976,60	$8.011.976,60	29/08/2022	**TERMINADA**	**3/09/2022**	9/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	11	110	B-C-SM-MZ145-VE-157	100%	Adecuacion	$9.653.914,02	$9.653.914,02	30/08/2022	**TERMINADA**	**4/09/2022**	10/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	5	111	B-C-SM-MZ75-VE-158	100%	Adecuacion	$6.846.229,60	$6.846.229,60	31/08/2022	**TERMINADA**	**5/09/2022**	11/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	11	112	B-C-SM-MZ-VE145-160	100%	Adecuacion	$9.325.691,25	$9.325.691,25	21/08/2022	**TERMINADA**	**26/08/2022**	1/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**

SM	11	113	B-C-SM-MZ-VE145-162	100%	Adecuacion	$7.000.723,74	$7.000.723,74	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	5	114	B-C-SM-MZ84-VE-165	100%	Caseta t3	$8.259.418,86	$8.259.418,86	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	115	B-C-SM-MZ91-VE-167	100%	Adecuacion	$7.334.345,73	$7.334.345,73	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	9	116	B-C-SM-MZ77-VE-179	100%	Caseta t3	$8.930.810,61	$8.930.810,61	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	9	117	B-C-SM-MZ87-VE-180	100%	Caseta t3	$8.116.195,29	$8.116.195,29	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	118	B-C-SM-MZ55-VE-048	100%	Caseta t3	$6.887.962,53	$6.887.962,53	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	119	B-C-SM-MZ68-VE-077	100%	Caseta t3	$7.841.298,86	$7.841.298,86	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	120	B-C-SM-MZ89-VE-080	100%	Caseta t2	$7.814.305,69	$7.814.305,69	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	121	B-C-SM-MZ-VE-082	100%	Caseta t4	$9.602.086,12	$9.602.086,12	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	122	B-C-SM-MZ-VE-091	100%	Caseta t3	$8.240.626,46	$8.240.626,46	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	123	B-C-SM-MZ-VE-092	100%	Caseta t2	$8.314.938,30	$8.314.938,30	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	124	B-C-SM-MZ-VE-096	100%	Adecuacion	$7.662.197,96	$7.662.197,96	22/08/2022	TERMINADA	27/08/2022	2/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	125	B-C-SM-MZ30-VE-120	100%	Caseta t4	$8.665.155,76	$8.665.155,76	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	126	B-C-SM-MZ-VE-137	100%	Caseta t3	$8.275.053,67	$8.275.053,67	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	127	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	22/08/2022	TERMINADA	27/08/2022	2/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	128	B-C-SM-MZ92-VE-168	100%	Adecuacion	$6.476.015,92	$6.476.015,92	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	8	129	B-C-SM-MZ92-VE-169	100%	Adecuacion	$6.842.321,91	$6.842.321,91	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	130	B-C-SM-MZ84-VE-178	100%	Adecuacion	$2.230.924,70	$2.230.924,70	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	131	B-C-SM-MZ84-VE-179	100%	Adecuacion	$8.930.810,61	$8.930.810,61	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	132	B-C-SM-MZ84-VE-180	100%	Adecuacion	$8.116.195,29	$8.116.195,29	25/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	133	B-C-SM-MZ45-VE-033	100%	Adecuacion	$7.943.448,36	$7.943.448,36	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	134	B-C-SM-MZ76-VE-075	100%	Adecuacion	$7.982.813,63	$7.982.813,63	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	135	B-C-SM-MZ-VE-089	100%	Adecuacion	$7.475.616,81	$7.475.616,81	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	136	B-C-SM-MZ-VE-173	100%	Adecuacion	$7.034.505,34	$7.034.505,34	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	137	B-C-SM-MZ34-VE-209	100%	Adecuacion	$5.856.785,90	$5.856.785,90	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	138	B-C-SM-MZ34-VE-210	100%	Caseta t3	$8.204.915,74	$8.204.915,74	30/08/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	139	B-C-SM-MZ-VE-164	100%	Caseta t3	$7.853.199,32	$7.853.199,32	30/08/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	11	140	B-C-SM-MZ92-VE-203	100%	Adecuacion	$8.272.491,16	$8.272.491,16	30/08/2022	TERMINADA	4/09/2022	10/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	141	B-C-SM-MZ91-VE-205	100%	Adecuacion	$6.742.842,13	$6.742.842,11	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	142	B-C-SM-MZ91-VE-206	100%	Adecuacion	$6.326.983,38	$6.326.983,38	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	143	B-C-SM-MZ145-VE-184	100%	Adecuacion	$7.415.421,93	$7.415.421,93	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	144	B-C-SM-MZ156-VE-058	100%	Adecuacion	$7.430.942,29	$7.430.942,29	1/09/2022	TERMINADA	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	145	B-C-SM-MZ156-VE-059	100%	Adecuacion	$3.514.863,97	$3.514.863,97	1/09/2022	TERMINADA	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	146	B-C-SM-MZ41-VE-141	100%	Adecuacion	$6.179.740,71	$6.179.740,71	2/09/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	147	B-C-SM-MZ32-VE-144	100%	Caseta t4	$7.498.669,53	$7.498.669,53	2/09/2022	TERMINADA	10/09/2022	16/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	148	B-C-SM-MZ89-VE-083	100%	Caseta t3	$7.576.542,11	$7.576.542,11	3/09/2022	TERMINADA	11/09/2022	17/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	149	B-C-SM-MZ46-VE-211	100%	Adecuacion	$7.730.411,89	$7.730.411,89	3/09/2022	TERMINADA	8/09/2022	14/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	150	B-C-SM-MZ46-VE-212	100%	Adecuacion	$5.774.463,33	$5.774.463,33	5/09/2022	TERMINADA	10/09/2022	16/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	151	B-C-SM-MZ46-VE-216	100%	Adecuacion	$8.311.308,81	$8.311.308,81	6/09/2022	TERMINADA	11/09/2022	17/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	152	B-C-SM-MZ30-VE-123	100%	Caseta t3	$8.084.933,32	$8.084.933,32	8/09/2022	TERMINADA	16/09/2022	22/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	153	B-C-SM-MZ66-VE-065	100%	Caseta t3	$7.828.052,76	$7.828.052,76	9/09/2022	TERMINADA	17/09/2022	23/09/2022	8	14	-6		x
SM	15	154	B-C-SM-MZ66-VE-066	100%	Caseta t2	$4.292.672,67	$4.292.672,67	10/09/2022	TERMINADA	18/09/2022	24/09/2022	8	14	-6		x
SM	15	155	B-C-SM-MZ23-VE-117	100%	Adecuacion	$4.772.651,25	$4.772.651,25	11/09/2022	TERMINADA	16/09/2022	22/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	156	B-C-SM-MZ59-VE-187	100%	Adecuacion	$8.212.157,27	$8.212.157,27	11/09/2022	TERMINADA	16/09/2022	22/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	157	B-C-SM-MZ34-VE-116	100%	Caseta t3	$7.989.636,90	$7.989.636,90	12/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	158	B-C-SM-MZ30-VE-123	100%	Caseta t3	$8.084.933,32	$8.084.933,32	12/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	159	B-C-SM-MZ-VE-076	100%	Adecuacion	$7.966.932,81	$7.966.932,81	13/09/2022	TERMINADA	18/09/2022	24/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	160	B-C-SM-MZ87-VE-189	100%	Adecuacion	$6.068.174,04	$6.068.174,04	13/09/2022	TERMINADA	18/09/2022	24/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	161	B-C-SM-MZ18-VE-202	100%	Adecuacion	$8.298.564,37	$8.298.564,37	14/09/2022	TERMINADA	19/09/2022	25/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	162	B-C-SM-MZ55-VE-036	100%	Adecuacion	$4.519.608,59	$4.519.608,59	14/09/2022	TERMINADA	22/09/2022	28/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	163	B-C-SM-MZ45-VE-037	100%	Adecuacion	$5.427.357,42	$5.427.357,42	15/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	164	B-C-SM-MZ75-VE-070	100%	Adecuacion	$4.222.499,91	$4.222.499,91	15/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	5	11	-6		x
SM	18	165	B-C-SM-MZ67-VE-078	100%	Adecuacion	$5.110.794,97	$5.110.794,97	16/09/2022	TERMINADA	21/09/2022	27/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	166	B-C-SM-MZ34-VE-119	100%	Adecuacion	$7.021.881,94	$7.021.881,94	16/09/2022	TERMINADA	21/09/2022	27/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	167	B-C-SM-MZ56-VE-190	100%	Adecuacion	$7.154.236,55	$7.154.236,55	17/09/2022	TERMINADA	22/09/2022	28/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	168	B-C-SM-MZ56-VE-191	100%	Caseta t3	$8.896.139,02	$8.896.139,02	17/09/2022	TERMINADA	25/09/2022	1/10/2022	8	14	-6		x
SM	13	169	B-C-SM-MZ31-VE-199	100%	Adecuacion	$4.691.093,17	$4.691.093,17	18/09/2022	TERMINADA	24/09/2022	30/09/2022	6	12	-6		x
SM	18	170	B-C-SM-MZ67-VE-183	100%	Caseta t3	$6.957.541,97	$6.957.541,97	18/09/2022	TERMINADA	26/09/2022	2/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	171	B-C-SM-MZ30-VE-200	100%	Caseta t3	$8.312.234,66	$8.312.234,66	19/09/2022	TERMINADA	27/09/2022	3/10/2022	8	14	-6		x
SM	13	172	B-C-SM-MZ31-VE-201	100%	Caseta t3	$6.950.167,16	$6.950.167,16	19/09/2022	TERMINADA	27/09/2022	3/10/2022	8	14	-6		x
SM	13	173	B-C-SM-MZ47-VE-105	100%	Adecuacion	$3.899.268,01	$3.899.268,01	20/09/2022	TERMINADA	25/09/2022	1/10/2022	5	11	-6		x
SM	14	174	B-C-SM-MZ68-VE-108	100%	Adecuacion	$3.617.504,69	$3.617.504,69	20/09/2022	TERMINADA	25/09/2022	1/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	175	B-C-SM-MZ145-VE-208	100%	Adecuacion	$6.196.096,01	$6.196.096,01	21/09/2022	TERMINADA	26/09/2022	2/10/2022	5	11	-6		x
SM	12	176	B-C-SM-MZ66-VE-198	100%	Adecuacion	$5.360.187,87	$5.360.187,87	21/09/2022	TERMINADA	29/09/2022	5/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	177	B-C-SM-MZ30-VE-INC-001	100%	Caseta t3	$9.273.205,89	$9.273.205,89	22/09/2022	TERMINADA	30/09/2022	6/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	178	B-C-SM-MZ36-VE-INC-002	100%	Adecuacion	$7.909.051,57	$7.909.051,57	22/09/2022	TERMINADA	28/09/2022	4/10/2022	6	12	-6		x
SM	17	179	B-C-SM-MZ36-VE-INC-003	100%	Adecuacion	$7.056.470,53	$7.056.470,53	23/09/2022	TERMINADA	29/09/2022	5/10/2022	6	12	-6		x
SM	15	180	B-C-SM-MZ30-VE-INC-004	100%	Caseta t3	$7.321.539,69	$7.321.539,69	23/09/2022	TERMINADA	1/10/2022	7/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	181	B-C-SM-MZ21-VE-INC-005	100%	Adecuacion	$5.983.563,40	$5.983.563,40	24/09/2022	TERMINADA	29/09/2022	5/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	182	B-C-SM-MZ93-VE-INC-006	100%	Adecuacion	$7.900.843,94	$7.900.843,94	24/09/2022	TERMINADA	29/09/2022	5/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	183	B-C-SM-MZ87-VE-INC-007	100%	Caseta t3	$7.343.027,38	$7.343.027,38	25/09/2022	TERMINADA	3/10/2022	9/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	184	B-C-SM-MZ98-VE-INC-008	100%	Caseta t3	$7.345.145,38	$7.345.145,38	26/09/2022	TERMINADA	4/10/2022	10/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	185	B-C-SM-MZ87-VE-INC-009	100%	Adecuacion	$6.166.474,80	$6.166.474,80	27/09/2022	TERMINADA	2/10/2022	8/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	186	B-C-SM-MZ48-VE-INC-010	100%	Adecuacion	$7.156.353,68	$7.156.353,68	27/09/2022	TERMINADA	2/10/2022	8/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	187	B-C-SM-MZ38-VE-INC-013	100%	Caseta t3	$8.739.765,67	$8.739.765,67	28/09/2022	TERMINADA	6/10/2022	12/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	188	B-C-SM-MZ33-VE-INC-014	100%	Adecuacion	$7.094.395,09	$7.094.395,09	28/09/2022	TERMINADA	3/10/2022	9/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	189	B-C-SM-MZ55-VE-064	100%	Adecuacion	$7.807.428,21	$7.807.428,21	29/09/2022	TERMINADA	4/10/2022	10/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	190	B-C-SM-MZ145-VE-161	100%	Adecuacion	$8.918.748,97	$8.918.748,97	29/09/2022	TERMINADA	4/10/2022	10/10/2022	5	11	-6		x
SM	17	191	B-C-SM-MZ31-VE-INC-015	100%	Adecuacion	$7.948.410,17	$7.948.410,17	30/09/2022	TERMINADA	5/10/2022	11/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	192	B-C-SM-MZ33-VE-INC-016	100%	Caseta t3	$7.602.156,55	$7.602.156,55	30/09/2022	TERMINADA	8/10/2022	14/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	193	B-C-SM-MZ85-VE-INC-019	100%	Caseta t3	$7.773.487,18	$7.773.487,18	1/10/2022	TERMINADA	9/10/2022	15/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	194	B-C-SM-MZ97-VE-INC-023	100%	Caseta t3	$8.333.260,29	$8.333.260,29	1/10/2022	TERMINADA	9/10/2022	15/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	195	B-C-SM-MZ45-VE-INC-024	100%	Caseta t3	$8.094.089,35	$8.094.089,35	2/10/2022	TERMINADA	10/10/2022	16/10/2022	8	14	-6		x
SM	18	196	B-C-SM-MZ95-VE-INC-026	100%	Caseta t3	$7.629.024,81	$7.629.024,81	2/10/2022	TERMINADA	10/10/2022	16/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	197	B-C-SM-MZ33-VE-INC-032	100%	Caseta t3	$8.036.839,77	$8.036.839,77	3/10/2022	TERMINADA	11/10/2022	17/10/2022	8	14	-6		x
SM	18	198	B-C-SM-MZ32-VE-INC-035	100%	Caseta t3	$7.811.643,60	$7.811.643,60	4/10/2022	TERMINADA	12/10/2022	18/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	199	B-C-SM-MZ33-VE-INC-027	100%	Caseta T2	$8.012.216,20	$8.012.216,20	5/10/2022	TERMINADA	13/10/2022	19/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	200	B-C-SM-MZ66-VE-INC-033	100%	Adecuacion	$6.628.918,24	$6.628.918,24	5/10/2022	TERMINADA	10/10/2022	16/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	201	B-C-SM-MZ24-VE-INC-034	100%	Caseta t3	$7.997.347,42	$7.997.347,42	6/10/2022	TERMINADA	14/10/2022	20/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	202	B-C-SM-MZ98-VE-INC-036	100%	Caseta t3	$7.885.031,34	$7.885.031,34	6/10/2022	TERMINADA	14/10/2022	20/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	203	B-C-SM-MZ85-VE-INC-038	100%	Caseta t3	$8.272.191,01	$8.272.191,01	7/10/2022	TERMINADA	15/10/2022	21/10/2022	8	14	-6		x

SM	16	204	B-C-SM-MZ93-VE-INC-039	100%	Adecuacion	$7.727.983,14	$7.727.983,14	7/10/2022	TERMINADA	12/10/2022	18/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	205	B-C-SM-MZ93-VE-INC-040	100%	Adecuacion	$7.621.248,46	$7.621.248,46	8/10/2022	TERMINADA	13/10/2022	19/10/2022	5	11	-6		x
SM	17	206	B-C-SM-MZ86-VE-INC-041	100%	Adecuacion	$7.737.812,12	$7.737.812,12	8/10/2022	TERMINADA	13/10/2022	19/10/2022	5	11	-6		x
SM	17	207	B-C-SM-MZ85-VE-INC-042	100%	Caseta t3	$8.221.884,89	$8.221.884,89	8/10/2022	TERMINADA	16/10/2022	22/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	208	B-C-SM-MZ96-VE-INC-046	100%	Caseta t3	$9.156.805,39	$9.156.805,39	9/10/2022	TERMINADA	17/10/2022	23/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	209	B-C-SM-MZ95-VE-INC-049	100%	Caseta t3	$8.256.966,48	$8.256.966,48	10/10/2022	TERMINADA	18/10/2022	24/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	210	B-C-SM-MZ32-VE-INC-050	100%	Caseta t3	$7.745.465,56	$7.745.465,56	11/10/2022	TERMINADA	19/10/2022	25/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	211	B-C-SM-MZ36-VE-INC-051	100%	Adecuacion	$7.443.842,89	$7.443.842,89	12/10/2022	TERMINADA	17/10/2022	23/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	212	B-C-SM-MZ30-VE-INC-052	100%	Caseta t3	$8.090.760,97	$8.090.760,97	13/10/2022	TERMINADA	21/10/2022	27/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	213	B-C-SM-MZ94-VE-INC-053	100%	Adecuacion	$5.710.686,86	$5.710.686,86	13/10/2022	TERMINADA	18/10/2022	24/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	214	B-C-SM-MZ-VE-INC-055	100%	Adecuacion	$7.242.404,18	$7.242.404,18	13/10/2022	TERMINADA	18/10/2022	24/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	215	B-C-SM-MZ-VE-INC-056	100%	Adecuacion	$7.673.332,15	$7.673.332,15	14/10/2022	TERMINADA	19/10/2022	25/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	216	B-C-SM-MZ86-VE-INC-057	100%	Caseta t3	$7.705.011,19	$7.705.011,19	15/10/2022	TERMINADA	23/10/2022	29/10/2022	8	14	-6		x
SM	18	217	B-C-SM-MZ86-VE-INC-058	100%	Caseta t2	$8.107.440,98	$8.107.440,98	16/10/2022	TERMINADA	24/10/2022	30/10/2022	8	14	-6		x
SM	19	218	B-C-SM-MZ48-VE-INC-011	100%	Adecuacion	$6.827.750,12	$6.827.750,12	17/10/2022	TERMINADA	22/10/2022	31/10/2022	5	14	-6		x
SM	17	219	B-C-SM-MZ91-VE-INC-062	100%	Adecuacion	$4.551.930,25	$4.551.930,25	17/10/2022	TERMINADA	22/10/2022	1/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	220	B-C-SM-MZ87-VE-INC-063	100%	Adecuacion	$7.258.523,54	$7.258.523,54	18/10/2022	TERMINADA	23/10/2022	2/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	221	B-C-SM-MZ67-VE-INC-064	100%	Adecuacion	$5.250.910,34	$5.250.910,34	18/10/2022	TERMINADA	23/10/2022	3/11/2022	5	14	-6		x
SM	17	222	B-C-SM-MZ91-VE-INC-065	100%	Caseta T3	$8.132.709,35	$8.132.709,35	19/10/2022	TERMINADA	27/10/2022	4/11/2022	8	14	-6		x
SM	18	223	B-C-SM-MZ21-VE-INC-066	100%	Caseta T3	$8.884.140,18	$8.884.140,18	19/10/2022	TERMINADA	27/10/2022	5/11/2022	8	14	-6		x
SM	18	224	B-C-SM-MZ47-VE-INC-068	100%	Adecuacion	$5.141.678,32	$5.141.678,32	20/10/2022	TERMINADA	25/10/2022	6/11/2022	5	14	-6		x
SM	18	225	B-C-SM-MZ47-VE-INC-069	100%	Adecuacion	$5.804.814,20	$5.804.814,20	20/10/2022	TERMINADA	25/10/2022	7/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	226	B-C-SM-MZ46-VE-INC-070	100%	Adecuacion	$7.533.082,62	$7.533.082,62	20/10/2022	TERMINADA	25/10/2022	8/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	227	B-C-SM-MZ32-VE-INC-071	100%	Adecuacion	$4.494.495,27	$4.494.495,27	21/10/2022	TERMINADA	26/10/2022	9/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	228	B-C-SM-MZ32-VE-INC-072	100%	Adecuacion	$2.547.155,48	$2.547.155,48	21/10/2022	TERMINADA	26/10/2022	10/11/2022	5	14	-6		x
SM	18	229	B-C-SM-MZ32-VE-INC-073	100%	Adecuacion	$5.899.252,59	$5.899.252,59	22/10/2022	TERMINADA	27/10/2022	11/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	230	B-C-SM-MZ95-VE-INC-025	100%	Caseta T3	$7.925.272,79	$7.925.272,79	22/10/2022	TERMINADA	30/10/2022	12/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	231	B-C-SM-MZ48-VE-INC-029	100%	Adecuacion	$8.123.075,86	$8.123.075,86	22/10/2022	TERMINADA	27/10/2022	13/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	232	B-C-SM-MZ86-VE-INC-030	100%	Caseta T3	$8.938.581,32	$8.938.581,32	23/10/2022	TERMINADA	31/10/2022	14/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	233	B-C-SM-MZ98-VE-INC-031	100%	Caseta T3	$7.166.340,15	$7.166.340,15	23/10/2022	TERMINADA	31/10/2022	15/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	234	B-C-SM-MZ32-VE-INC-017	100%	Caseta T3	$7.936.218,15	$7.936.218,15	23/10/2022	TERMINADA	31/10/2022	16/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	235	B-C-SM-MZ145-VE-163	100%	Adecuacion	$7.980.298,74	$7.980.298,74	24/10/2022	TERMINADA	29/10/2022	16/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	236	B-C-SM-MZ86-VE-INC-043	100%	Caseta T3	$7.671.439,94	$7.671.439,94	25/10/2022	TERMINADA	2/11/2022	16/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	237	B-C-SM-MZ98-VE-INC-044	100%	Caseta T3	$7.978.159,51	$7.978.159,51	26/10/2022	TERMINADA	3/11/2022	16/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	238	B-C-SM-MZ91-VE-INC-091	100%	Adecuacion	$7.816.920,63	$7.816.920,63	27/10/2022	TERMINADA	1/11/2022	16/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	239	B-C-SM-MZ86-VE-INC-093	100%	Caseta T3	$9.612.473,24	$9.612.473,24	28/10/2022	TERMINADA	5/11/2022	16/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	240	B-C-SM-MZ36-VE-INC-118	100%	Caseta T3	$8.070.784,75	$8.070.784,75	29/10/2022	TERMINADA	6/11/2022	16/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	241	B-C-SM-MZ48-VE-INC-145	100%	Caseta T3	$8.404.448,59	$8.404.448,59	30/10/2022	TERMINADA	7/11/2022	16/11/2022	8	14	-6		x
SM	12	242	B-C-SM-MZ-VE-093	100%	Adecuacion	$7.207.274,62	$7.207.274,62	1/11/2022	TERMINADA	7/11/2022	13/11/2022	6	12	-6		x
SM	18	243	B-C-SM-MZ75-VE-130	100%	Adecuacion	$5.087.108,21	$5.087.108,21	1/11/2022	TERMINADA	6/11/2022	12/11/2022	5	11	-6		x
SM	11	244	B-C-SM-MZ66-VE-132	100%	Adecuacion	$7.421.836,98	$7.421.836,98	2/11/2022	TERMINADA	7/11/2022	13/11/2022	5	11	-6		x
SM	5	245	B-C-SM-MZ84-VE-166	100%	Adecuacion	$6.744.749,39	$6.744.749,39	3/11/2022	TERMINADA	8/11/2022	14/11/2022	5	11	-6		x
SM	9	246	B-C-SM-MZ92-VE-170	100%	Adecuacion	$6.456.971,29	$6.456.971,29	4/11/2022	TERMINADA	9/11/2022	15/11/2022	5	11	-6		x
SM	10	247	B-C-SM-MZ91-VE-171	100%	Adecuacion	$7.013.453,53	$7.013.453,53	5/11/2022	TERMINADA	10/11/2022	16/11/2022	5	11	-6		x
SM	7	248	B-C-SM-MZ75-VE-172	100%	Adecuacion	$8.210.038,72	$8.210.038,72	6/11/2022	TERMINADA	11/11/2022	17/11/2022	5	11	-6		x
SM	18	249	B-C-SM-MZ93-VE-174	100%	Adecuacion	$6.560.835,40	$6.560.835,40	7/11/2022	TERMINADA	12/11/2022	18/11/2022	5	11	-6		x
SM	18	250	B-C-SM-MZ86-VE-INC-080	100%	Caseta T3	$8.436.036,24	$8.436.036,24	8/11/2022	TERMINADA	16/11/2022	22/11/2022	8	14	-6		x
SM		251	B-C-SM-MZ95-VE-INC-173	100%	Caseta T3	$8.297.659,07	$8.297.659,07	8/11/2022	TERMINADA	16/11/2022	22/11/2022	8	14	-6		x
SM		252	B-C-SM-MZ48-VE-INC-028	100%	Adecuacion	$5.338.458,70	$5.338.458,70	9/11/2022	TERMINADA	14/11/2022	20/11/2022	5	11	-6		x
SM		253	B-C-SM-MZ68-VE-INC-059	100%	Adecuacion	$6.561.578,46	$6.561.578,46	9/11/2022	TERMINADA	14/11/2022	20/11/2022	5	11	-6		x
SM		254	B-C-SM-MZ32-VE-INC-075	100%	Adecuacion	$4.281.987,94	$4.281.987,94	9/11/2022	TERMINADA	14/11/2022	20/11/2022	5	11	-6		x
SM		255	B-C-SM-MZ31-VE-INC-077	100%	Caseta T3	$8.209.906,38	$8.209.906,38	10/11/2022	TERMINADA	18/11/2022	24/11/2022	8	14	-6		x
SM		256	B-C-SM-MZ59-VE-INC-086	100%	Adecuacion	$4.202.570,37	$4.202.570,37	10/11/2022	TERMINADA	15/11/2022	21/11/2022	5	11	-6		x
SM		257	B-C-SM-MZ68-VE-INC-087	100%	Adecuacion	$5.197.963,52	$5.197.963,52	10/11/2022	TERMINADA	15/11/2022	21/11/2022	5	11	-6		x
SM		258	B-C-SM-MZ59-VE-INC-095	100%	Adecuacion	$5.330.404,94	$5.330.404,94	11/11/2022	TERMINADA	16/11/2022	22/11/2022	5	11	-6		x
SM		259	B-C-SM-MZ59-VE-INC-099	100%	Adecuacion	$6.288.082,10	$6.288.082,10	11/11/2022	TERMINADA	16/11/2022	22/11/2022	5	11	-6		x
SM		260	B-C-SM-MZ48-VE-INC-101	100%	Adecuacion	$4.388.042,03	$4.388.042,03	11/11/2022	TERMINADA	16/11/2022	22/11/2022	5	11	-6		x
SM		261	B-C-SM-MZ38-VE-INC-108	100%	Caseta T2	$8.106.576,63	$8.106.576,63	12/11/2022	TERMINADA	20/11/2022	26/11/2022	8	14	-6		x
SM		262	B-C-SM-MZ98-VE-INC-109	100%	Adecuacion	$3.942.607,23	$3.942.607,23	12/11/2022	TERMINADA	17/11/2022	23/11/2022	5	11	-6		x
SM		263	B-C-SM-MZ49-VE-INC-123	100%	Adecuacion	$5.692.446,92	$5.692.446,92	12/11/2022	TERMINADA	17/11/2022	23/11/2022	5	11	-6		x
SM		264	B-C-SM-MZ23-VE-INC-129	100%	Adecuacion	$7.800.567,25	$7.800.567,25	13/11/2022	TERMINADA	18/11/2022	24/11/2022	5	11	-6		x
SM		265	B-C-SM-MZ017-VE-INC-131	100%	Adecuacion	$5.746.289,90	$5.746.289,90	13/11/2022	TERMINADA	18/11/2022	24/11/2022	5	11	-6		x
SM		266	B-C-SM-MZ016-VE-INC-133	100%	Adecuacion	$6.646.756,60	$6.646.756,60	13/11/2022	TERMINADA	18/11/2022	24/11/2022	5	11	-6		x
SM		267	B-C-SM-MZ-VE23-INC-138	100%	Adecuacion	$5.369.396,54	$5.369.396,54	13/11/2022	TERMINADA	18/11/2022	24/11/2022	5	11	-6		x
SM		268	B-C-SM-MZ86-VE-INC-151	100%	Adecuacion	$6.730.435,17	$6.730.435,17	14/11/2022	TERMINADA	19/11/2022	25/11/2022	5	11	-6		x
SM		269	B-C-SM-MZ105-VE-INC-197	100%	Adecuacion	$4.158.209,45	$4.158.209,45	14/11/2022	TERMINADA	19/11/2022	25/11/2022	5	11	-6		x
SM		270	B-C-SM-MZ94-VE-INC-213	100%	Adecuacion	$4.022.013,54	$4.022.013,54	14/11/2022	TERMINADA	19/11/2022	25/11/2022	5	11	-6		x
SM		271	B-C-SM-MZ93-VE-INC-163	100%	Adecuacion	$7.300.892,28	$7.300.892,28	15/11/2022	TERMINADA	20/11/2022	26/11/2022	5	11	-6		x
SM		272	B-C-SM-MZ59-VE-207	100%	Adecuacion	$6.020.072,11	$6.020.072,11	15/11/2022	TERMINADA	20/11/2022	26/11/2022	5	11	-6		x
SM		273	B-C-SM-MZ48-VE-INC-134	100%	Adecuacion	$5.219.825,26	$5.219.825,26	15/11/2022	TERMINADA	20/11/2022	26/11/2022	5	11	-6		x
SM		274	B-C-SM-MZ49-VE-INC-137	100%	Adecuacion	$4.246.004,15	$4.246.004,15	16/11/2022	TERMINADA	21/11/2022	27/11/2022	5	11	-6		x
SM		275	B-C-SM-MZ93-VE-INC-175	100%	Adecuacion	$6.751.782,32	$6.751.782,32	16/11/2022	TERMINADA	21/11/2022	27/11/2022	5	11	-6		x
SM		276	B-C-SM-MZ106-VE-INC-184	100%	Adecuacion	$6.935.558,95	$6.935.558,95	16/11/2022	TERMINADA	21/11/2022	27/11/2022	5	11	-6		x
SM		277	B-C-SM-MZ68-VE-INC-084	100%	Caseta T3	$8.320.404,99	$8.320.404,99	17/11/2022	TERMINADA	25/11/2022	1/12/2022	8	14	-6		x
SM		278	B-C-SM-MZ59-VE-INC-086	100%	Adecuacion	$4.202.570,37	$4.202.570,37	17/11/2022	TERMINADA	22/11/2022	28/11/2022	5	11	-6		x
SM		279	B-C-SM-MZ49-VE-INC-127	100%	Caseta T4	$8.531.015,62	$8.531.015,62	17/11/2022	TERMINADA	25/11/2022	1/12/2022	8	14	-6		x
SM		280	B-C-SM-MZ93-VE-INC-164	100%	Caseta T3	$9.236.090,18	$9.236.090,18	18/11/2022	TERMINADA	26/11/2022	2/12/2022	8	14	-6		x
SM		281	B-C-SM-MZ69-VE-176	100%	Caseta T3	$4.778.954,24	$4.778.954,24	18/11/2022	TERMINADA	26/11/2022	2/12/2022	8	14	-6		x
SM		282	B-C-SM-MZ58-VE-177	100%	Adecuacion	$3.411.187,99	$3.411.187,99	19/11/2022	TERMINADA	24/11/2022	30/11/2022	5	11	-6		x
SM		283	B-C-SM-MZ70-VE-INC-054	100%	Adecuacion	$6.466.021,02	$6.466.021,02	19/11/2022	TERMINADA	24/11/2022	30/11/2022	5	11	-6		x
SM		284	B-C-SM-MZ38-VE-INC-061	100%	Adecuacion	$7.016.743,60	$7.016.743,60	20/11/2022	TERMINADA	25/11/2022	1/12/2022	5	11	-6		x
SM		285	B-C-SM-MZ32-VE-INC-076	85%	Adecuacion	$6.334.029,19	$5.383.924,81	20/11/2022	EN EJECUCION	25/11/2022	1/12/2022	5	11	-6		x
SM		286	B-C-SM-MZ48-VE-INC-119	85%	Adecuacion	$6.874.221,12	$5.843.087,95	21/11/2022	EN EJECUCION	26/11/2022	2/12/2022	5	11	-6		x
SM		287	B-C-SM-MZ56-VE-INC-120	85%	Adecuacion	$6.903.872,09	$5.868.291,28	21/11/2022	EN EJECUCION	26/11/2022	2/12/2022	5	11	-6		x
SM		288	B-C-SM-MZ48-VE-INC-183	85%	Adecuacion	$7.023.620,46	$5.970.077,39	21/11/2022	EN EJECUCION	26/11/2022	2/12/2022	5	11	-6		x
SM		289	B-C-SM-MZ70-VE-INC-054	85%	Adecuacion	$6.466.021,02	$5.496.117,87	21/11/2022	EN EJECUCION	26/11/2022	2/12/2022	5	11	-6		x
SM		290	B-C-SM-MZ38-VE-INC-061	85%	Adecuacion	$7.016.743,60	$5.964.232,06	22/11/2022	EN EJECUCION	27/11/2022	3/12/2022	5	11	-6		x
SM		291	B-C-SM-MZ32-VE-INC-076	85%	Adecuacion	$6.334.029,19	$5.383.924,81	22/11/2022	EN EJECUCION	27/11/2022	3/12/2022	5	11	-6		x

SM		292	B-C-SM-MZ38-VE-INC-078	85%	Adecuacion	$3.367.297,55	$2.862.202,92	22/11/2022	EN EJECUCION	27/11/2022	3/12/2022	5	11	-6		x
SM		293	B-C-SM-MZ41-VE-INC-081	85%	Adecuacion	$4.759.043,39	$4.045.186,88	22/11/2022	EN EJECUCION	27/11/2022	3/12/2022	5	11	-6		x
SM		294	B-C-SM-MZ96-VE-INC-177	85%	Adecuacion	$4.353.379,09	$3.700.372,23	23/11/2022	EN EJECUCION	28/11/2022	4/12/2022	5	11	-6		x
SM		295	B-C-SM-MZ58-VE-INC-111	85%	Adecuacion	$3.025.651,65	$2.571.803,90	23/11/2022	EN EJECUCION	28/11/2022	4/12/2022	5	11	-6		x
SM		296	B-C-SM-MZ36-VE-INC-126	85%	Adecuacion	$7.357.844,70	$6.254.168,00	23/11/2022	EN EJECUCION	28/11/2022	4/12/2022	5	11	-6		x
SM		297	B-C-SM-MZ23-VE-INC-128	85%	Adecuacion	$6.248.480,68	$5.311.208,58	24/11/2022	EN EJECUCION	29/11/2022	5/12/2022	5	11	-6		x
SM		298	B-C-SM-MZ97-VE-INC-179	85%	Adecuacion	$7.384.917,39	$6.277.179,78	24/11/2022	EN EJECUCION	29/11/2022	5/12/2022	5	11	-6		x
SM		299	B-C-SM-MZ96-VE-INC-187	85%	Adecuacion	$7.709.795,70	$6.553.326,35	24/11/2022	EN EJECUCION	29/11/2022	5/12/2022	5	11	-6		x
SM		300	B-C-SM-MZ96-VE-INC-188	75%	Adecuacion	$6.302.033,86	$4.726.525,40	25/11/2022	EN EJECUCION	30/11/2022	6/12/2022	5	11	-6		x
SM		301	B-C-SM-MZ98-VE-INC-189	75%	Adecuacion	$8.233.353,74	$6.175.015,31	25/11/2022	EN EJECUCION	30/11/2022	6/12/2022	5	11	-6		x
SM		302	B-C-SM-MZ48-VE-INC-096	75%	Adecuacion	$6.859.171,05	$5.144.378,29	25/11/2022	EN EJECUCION	30/11/2022	6/12/2022	5	11	-6		x
SM		303	B-C-SM-MZ24-VE-INC-098	75%	Caseta T1	$8.682.895,90	$6.512.171,93	26/11/2022	EN EJECUCION	4/12/2022	10/12/2022	8	14	-6		x
SM		304	B-C-SM-MZ38-VE-INC-104	75%	Adecuacion	$4.515.305,50	$3.386.479,13	26/11/2022	EN EJECUCION	1/12/2022	7/12/2022	5	11	-6		x
SM		305	B-C-SM-MZ94-VE-INC-132	75%	Adecuacion	$6.493.545,21	$4.870.158,91	26/11/2022	EN EJECUCION	1/12/2022	7/12/2022	5	11	-6		x
SM		306	B-C-SM-MZ91-VE-INC-090	75%	Caseta T3	$9.400.048,37	$7.050.036,28	27/11/2022	EN EJECUCION	5/12/2022	11/12/2022	8	14	-6		x
SM		307	B-C-SM-MZ87-VE-INC-092	75%	Caseta T3	$8.024.497,65	$6.018.373,24	27/11/2022	EN EJECUCION	5/12/2022	11/12/2022	8	14	-6		x
SM		308	B-C-SM-MZ59-VE-INC-100	65%	Adecuacion	$4.665.073,76	$3.032.297,94	28/11/2022	EN EJECUCION	7/12/2022	13/12/2022	9	15	-6		x
SM		309	B-C-SM-MZ17-VE-INC-106	65%	Adecuacion	$8.299.427,57	$5.394.627,92	28/11/2022	EN EJECUCION	8/12/2022	14/12/2022	10	16	-6		x
SM		310	B-C-SM-MZ69-VE-INC-112	65%	Adecuacion	$6.081.041,12	$3.952.676,73	28/11/2022	EN EJECUCION	9/12/2022	15/12/2022	11	17	-6		x
SM		311	B-C-SM-MZ97-VE-INC-114	65%	Caseta T3	$7.563.464,48	$4.916.251,91	29/11/2022	EN EJECUCION	11/12/2022	17/12/2022	12	18	-6		x
SM		312	B-C-SM-MZ36-VE-INC-121	65%	Adecuacion	$3.440.319,57	$2.236.207,72	29/11/2022	EN EJECUCION	12/12/2022	18/12/2022	13	19	-6		x
SM		313	B-C-SM-MZ36-VE-INC-122	65%	Adecuacion	$3.508.566,53	$2.280.568,24	29/11/2022	EN EJECUCION	13/12/2022	19/12/2022	14	20	-6		x
SM		314	B-C-SM-MZ78-VE-INC-139	65%	Adecuacion	$6.324.599,62	$4.110.989,75	30/11/2022	EN EJECUCION	15/12/2022	21/12/2022	15	21	-6		x
SM		315	B-C-SM-MZ78-VE-INC-142	65%	Adecuacion	$5.885.758,44	$3.825.742,99	30/11/2022	EN EJECUCION	16/12/2022	22/12/2022	16	22	-6		x
SM		316	B-C-SM-MZ59-VE-INC-143	65%	Caseta T3	$8.167.825,19	$5.309.086,37	30/11/2022	EN EJECUCION	17/12/2022	23/12/2022	17	23	-6		x
SM		317	B-C-SM-MZ60-VE-INC-144	55%	Adecuacion	$6.230.549,90	$3.426.802,45	1/12/2022	EN EJECUCION	19/12/2022	25/12/2022	18	24	-6		x
SM		318	B-C-SM-MZ48-VE-INC-146	55%	Adecuacion	$4.395.472,81	$2.417.510,05	1/12/2022	EN EJECUCION	20/12/2022	26/12/2022	19	25	-6		x
SM		319	B-C-SM-MZ86-VE-INC-154	55%	Caseta T3	$7.973.180,18	$4.385.249,10	1/12/2022	EN EJECUCION	21/12/2022	27/12/2022	20	26	-6		x
SM		320	B-C-SM-MZ38-VE-INC-160	55%	Adecuacion	$4.623.473,63	$2.542.910,50	2/12/2022	EN EJECUCION	23/12/2022	29/12/2022	21	27	-6		x
SM		321	B-C-SM-MZ98-VE-INC-174	55%	Caseta T3	$7.972.082,02	$4.384.645,11	2/12/2022	EN EJECUCION	24/12/2022	30/12/2022	22	28	-6		x
SM		322	B-C-SM-MZ103-VE-INC-178	55%	Adecuacion	$4.799.097,62	$2.639.503,69	2/12/2022	EN EJECUCION	25/12/2022	31/12/2022	23	29	-6		x
SM		323	B-C-SM-MZ101-VE-INC-190	35%	Caseta T3	$10.025.465,77	$3.508.913,02	3/12/2022	EN EJECUCION	27/12/2022	2/01/2023	24	30	-6		x
SM		324	B-C-SM-MZ102-VE-INC-191	35%	Adecuacion	$5.905.162,68	$2.066.806,94	3/12/2022	EN EJECUCION	28/12/2022	3/01/2023	25	31	-6		x
SM		325	B-C-SM-MZ98-VE-INC-192	35%	Caseta T3	$6.949.279,75	$2.432.247,91	3/12/2022	EN EJECUCION	29/12/2022	4/01/2023	26	32	-6		x
SM		326	B-C-SM-MZ96-VE-INC-193	35%	Adecuacion	$6.903.465,94	$2.416.213,08	4/12/2022	EN EJECUCION	31/12/2022	6/01/2023	27	33	-6		x
SM		327	B-C-SM-MZ95-VE-INC-185	35%	Adecuacion	$3.769.208,51	$1.319.222,98	4/12/2022	EN EJECUCION	1/01/2023	7/01/2023	28	34	-6		x

CUADRO DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMAS Y EJECUTADAS

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4			Total			Terminaciones Esperadas Periodo	Terminaciones Acumuladas Esperadas	Terminaciones Esperadas Periodo	Terminaciones Esperadas Acumuladas	Terminaciones Esperadas Periodo	adel ante
		$	5.140.026,35	$		58.879.439,91	$		2.590.013.153,73	$	-		$	2.654.032.619,99								
										$	-		$	-								
		$	5.140.026,35	$		58.879.439,91	$		2.590.013.153,73	$	-		$	2.654.032.619,99								
1/03/2022	Semana 1	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -		**0,00%**	**$ -**			0	0				
8/03/2022	Semana 2	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -		**0,10%**	**$ 2.570.013,18**			0	0				
15/03/2022	Semana 3	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -		**0,19%**	**$ 5.140.026,35**			0	0				
22/03/2022	Semana 4	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -		**0,19%**	**$ 5.140.026,35**			0	0				
29/03/2022	Semana 5	100,00%	$ 5.140.026,35	7,38%	24	$ 4.348.020,18	0,00%	3	$ 22.883.102,57		$ -		**1,22%**	**$ 32.371.149,10**	10		0	0				
5/04/2022	Semana 6	100,00%	$ 5.140.026,35	9,23%	30	$ 5.435.025,22	0,87%	6	$ 45.766.305,14		$ -		**2,12%**	**$ 56.341.256,71**	20	5	5	0				
12/04/2022	Semana 7	100,00%	$ 5.140.026,35	12,92%	42	$ 7.609.035,31	1,74%	10	$ 76.277.008,56		$ -		**3,35%**	**$ 89.026.070,22**	40	12	8	0				
19/04/2022	Semana 8	100,00%	$ 5.140.026,35	15,69%	51	$ 9.239.542,88	2,90%	14	$ 106.787.811,98		$ -		**4,57%**	**$ 121.167.381,21**	90	25	10	0				
26/04/2022	Semana 9	100,00%	$ 5.140.026,35	21,85%	71	$ 12.862.893,03	4,06%	18	$ 137.298.615,41		$ -		**5,85%**	**$ 155.301.534,79**	150	25	14	0				
3/07/2022	Semana 10	100,00%	$ 5.140.026,35	28,92%	94	$ 17.029.745,70	5,22%	22	$ 167.809.418,83		$ -		**7,16%**	**$ 189.979.190,88**	220	18	18	0				
10/07/2022	Semana 11	100,00%	$ 5.140.026,35	35,38%	115	$ 20.834.263,35	6,38%	26	$ 198.320.222,25		$ -		**8,45%**	**$ 224.294.511,96**	280	20	22	0				
17/07/2022	Semana 12	100,00%	$ 5.140.026,35	43,38%	141	$ 25.544.618,55	7,54%	30	$ 228.831.025,68		$ -		**9,79%**	**$ 259.515.670,57**	330	20	26	0				
24/07/2022	Semana 13	100,00%	$ 5.140.026,35	43,38%	141	$ 25.544.618,55	8,70%	45	$ 343.246.538,51		$ -		**14,09%**	**$ 373.931.183,41**	420	10	30	0				
31/07/2022	Semana 14	100,00%	$ 5.140.026,35	49,23%	160	$ 28.986.801,19	13,04%	48	$ 366.129.641,08		$ -		**15,08%**	**$ 400.256.469,62**	500	12	45	0				
7/08/2022	Semana 15	100,00%	$ 5.140.026,35	52,31%	170	$ 30.798.476,26	13,91%	60	$ 457.662.051,35		$ -		**18,60%**	**$ 493.600.553,96**	680	30	48	0				
14/08/2022	Semana 16	100,00%	$ 5.140.026,35	55,08%	179	$ 32.428.983,83	17,39%	66	$ 503.428.256,49		$ -		**20,38%**	**$ 540.997.266,67**	708	35	60	0				
21/08/2022	Semana 17	100,00%	$ 5.140.026,35	62,46%	203	$ 36.777.004,01	19,13%	80	$ 610.216.068,47		$ -		**24,57%**	**$ 652.133.098,83**	740	30	66	0				
28/08/2022	Semana 18	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	23,19%	91	$ 694.120.777,88		$ -		**27,83%**	**$ 738.574.153,34**	784	30	80	0				
4/09/2022	Semana 19	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	26,38%	101	$ 770.397.786,64		$ -		**30,70%**	**$ 814.851.161,90**	784	32	91	0				
11/09/2022	Semana 20	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	29,28%	116	$ 884.813.299,28		$ -		**35,01%**	**$ 929.266.674,74**	784	41	101	0				
18/09/2022	Semana 21	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	33,62%	137	$ 1.044.995.017,25		$ -		**41,05%**	**$ 1.089.448.392,71**	784	41	116	0				
25/09/2022	Semana 22	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	39,71%	149	$ 1.136.527.427,52		$ -		**44,50%**	**$ 1.180.980.802,98**	784	33	137	0				
2/10/2022	Semana 23	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	43,19%	160	$ 1.220.432.136,94		$ -		**47,66%**	**$ 1.264.885.512,40**	784	42	149	0				
9/10/2022	Semana 24	100,00%	$ 5.140.026,35	72,92%	237	$ 42.936.699,26	46,38%	174	$ 1.306.267.503,62		$ -		**51,03%**	**$ 1.354.344.229,23**	784	42	160	0				
16/10/2022	Semana 25	100,00%	$ 5.140.026,35	78,77%	256	$ 46.378.880,00	50,43%	185	$ 1.349.246.419,91		$ -		**52,78%**	**$ 1.400.765.326,26**	708	35	174	0				
23/10/2022	Semana 26	100,00%	$ 5.140.026,35	88,00%	286	$ 51.813.905,00	63,19%	191	$ 1.404.101.290,40		$ -		**59,05%**	**$ 1.461.055.221,75**	740	30	218	0				
30/10/2022	Semana 27	100,00%	$ 5.140.026,35	88,00%	286	$ 51.813.906,00	66,67%	199	$ 1.466.420.769,84		$ -		**57,40%**	**$ 1.523.374.702,19**	784	30	290	0				
6/11/2022	Semana 28	100,00%	$ 5.140.026,35	88,00%	286	$ 51.813.906,00	73,33%	207	$ 1.529.330.565,92		$ -		**59,77%**	**$ 1.586.284.498,27**	784	32	253	0				
13/11/2022	Semana 29	100,00%	$ 5.140.026,35	88,00%	286	$ 51.813.906,00	80,00%	225	$ 1.658.836.495,44		$ -		**64,65%**	**$ 1.715.790.427,73**	784	41	276	0				
20/11/2022	Semana 30	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	87,25%	240	$ 1.948.789.254,20		$ -		75,84%	$ 2.012.808.720,46	784	41	301	0				
27/11/2022	Semana 31	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	94,49%	262	$ 1.906.233.521,78		$ -		**74,24%**	**$ 1.970.252.988,04**	784	33	326	0				
4/12/2022	Semana 32	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	**100,00%**	**345**	**$ 58.879.439,91**	**100,00%**	**283**	**$ 2.035.144.313,31**		$ -		**79,09%**	**$ 2.099.163.779,57**	784	42	345	0				
11/12/2022	Semana 33	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%			100,00%						**0,19%**	**$ 5.140.026,35**	784	44	345	0				

TOTAL DIAGNOSTICOS APROBADOS **345**

TOTAL INTERVENCIONES TERMINADAS **283**

PERSONAL DE OBRA

REPORTE DE PERSONAL DE MANO DE OBRA - 04-12-22			
No. DE LA CUADRILLA	**No. DE MAETROS**	**No. DE AYUDANTES U OFICIALES**	**No. INTERVENCIONES A CARGO**
1	1	1	2
2	1	1	2
3	1	1	2
4	1	1	2
5	1	1	2
6	1	1	2
7	1	1	2
8	1	1	2
9	1	1	2
10	1	1	2
11	1	1	2
12	1	1	1
13	1	1	1
14	1	1	1
15	1	1	1
16	1	1	1
17	1	1	1
18	1	1	1
19	1	1	1
20	1	1	1
21	1	1	1
22	1	1	1
23	1	1	1
24	1	1	1
25	1	1	1
26	1	1	1
27	1	1	1
28	1	1	1
29	1	1	1
30	1	1	1
31	1	1	1
32	1	1	1
TOTAL	**32**	**32**	**43**

clima Colombia

Descarga la APP

Clima en

Córdoba

lunes 28 de noviembre, 2022

	Hoy 27 NOV	Mañana 28 NOV	Martes 29 NOV	Miércoles 30 NOV	Jueves 01 DIC	Viernes 02 DIC	Sábado 03 DIC
Hora	↑ 29° ↓ 23°	↑ 29° ↓ 23°	↑ 28° ↓ 23°	↑ 28° ↓ 23°	↑ 30° ↓ 23°	↑ 30° ↓ 23°	↑ 30° ↓ 23°
08:00	25°	25°	24°	24°	25°	24°	24°
14:00	29°	29°	28°	28°	30°	30°	30°
20:00	24°	24°	24°	24°	25°	25°	25°
Lluvia	6.9 mm	2.9 mm	3.7 mm	0.7 mm	0.00 mm	1.2 mm	0.00 mm
Viento	10 km/h	9 km/h	10 km/h	11 km/h	10 km/h	10 km/h	8 km/h
	05:59	05:59	06:00	06:00	06:01	06:01	06:02
	17:36	17:36	17:36	17:36	17:37	17:37	17:37

Hora por hora en Córdoba

Predicción para las próximas horas

Hoy: Mañana:

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00
27º	28º	28º	29º	28º	27º	26º	26º	25º	24º	24º	24º	24º	24º	24º

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 30/12/2022
HORA: 3:19:13 p. m.
20224300506912

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 30 de diciembre de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-139-22

Señores:
Ingeniera
Erika Marcela Gutiérrez
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: ENTREGA INFORME SEMANAL No 33

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal No. 33 cuyo periodo es del 05 de diciembre del 2022 hasta 11 de diciembre del 2022.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 23 folios
Proyectó: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría.

INFORME SEMANAL 33

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 33	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 33

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **5/12/2022** al **11/12/2022** | Fecha **11/12/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** BOLÍVAR **MUNICIPIO** CÓRDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO
SUPERVISOR	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN ACTIVIDAD 3

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.			2220576
Contratista			CONSORCIO CONSTRUREDES
Valor inicial	$		1.771.707.945,99
Valor actual	$		2.654.032.619,99
Variación del valor	$		882.324.674,00
Fecha de Inicio			26/04/2022
Plazo inicial (Días)			150 Días
Plazo actual (Días)	240 Días		8 MESES - 240 DÍAS
Variación en plazo			90 Días
Fecha Contractual de terminación			22/12/2022
Tiempo Transcurrido (días)	229		95,42%
Días remanentes del Contrato	11,00		4,58%
Acumulado a última acta pagada	$		821.329.766,06
Estimado ejecutado por llevar a acta	$		322.624.898,30

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.			2220587
Interventor			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.
Valor inicial	$		202.479.313,00
Valor actual	$		313.315.624,00
Variación del valor	$		110.836.311,00
Fecha de Inicio			26/04/2022
Plazo inicial			150 Días
Plazo actual	240 Días		8 MESES - 240 DÍAS
Variación en plazo			90 Días
Fecha Contractual de terminación			22/12/2022
Ejecución del Contrato	229		95,42%
Días remanentes del Contrato	11,00		4,58%
Acumulado a última acta pagada	$		132.623.950,03
Estimado ejecutado por llevar a acta	$		36.604.468,31

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 2.654.032.619,99

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 2.310.101.333,99	87,04%	$ 2.287.130.497,22	86,18%	-$ 22.970.836,77	-0,87%
Durante el Periodo	$ 175.475.145,92	6,61%	$ 129.886.840,64	4,89%	-$ 45.588.305,28	-1,72%
Acumulado a la Fecha	**$ 2.485.576.479,91**	**93,65%**	**$ 2.417.017.337,87**	**91,07%**	**-$ 68.559.142,04**	**-2,58%**


Desviación en días: **4 Días**




Observaciones al desempeño del proyecto

A la fecha de corte del presente informe tenemos el siguiente reporte:
El día 9 de diciembre se formalizó la prórroga solicitada por el Contratista por los 11 días calendario, con base en este nuevo plazo los avances reportados son:
En cuanto a la actividad 2 el contratista cumplió con los 345 diagnósticos aprobados los cuales corresponden a la cifra contractual, sin embargo, cabe mencionar que de acuerdo a las condiciones del contrato se deben realizar más diagnósticos hasta agotar el monto total designado, los cuales serán entregados en la siguiente semana. Actividad en la cual se le ha solicitado celeridad al contratista.
El avance de la actividad 3 nos indica las siguientes cifras: un programado del 93,50% frente a un ejecutado del 90,85% lo cual representa un atraso de 2,65% Este atraso corresponde a 41 viviendas dado que el programado es de 345, a la fecha se han intervenido 345 viviendas, de las cuales se han terminado 304 y se adelantan labores constructivas en 41 más, cabe mencionar que a parte de estas 41 en ejecución están pendientes por iniciar alrededor de 20 mas para agotar el monto remanente asignado en el contrato.
El atraso general del proyecto equivale al 2,58%, En la última semana el atraso tubo una disminución importante con base en el reporte anterior, esto debido a la ampliación del plazo contractual en 11 días calendario, se espera que para la siguiente semana el contratista de inicio a las viviendas requeridad para agotar el monto contractual.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

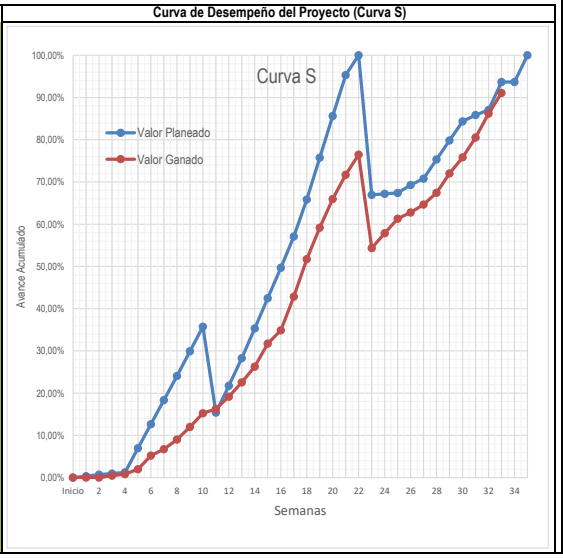

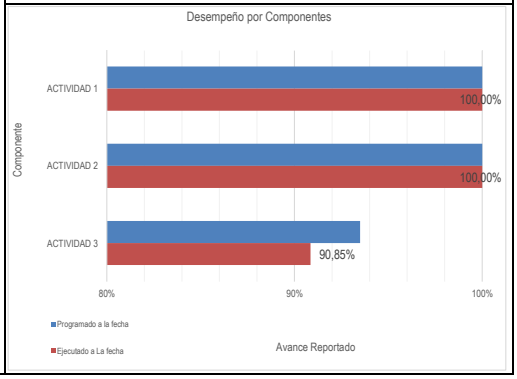


CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

A la fecha del presente informe no se han presntado cambios en la LINEA BASE.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado %	Ejecutado %	Desviación %	Semáforo
Acumulado Anterior	87,04%	86,18%	-0,86%	
Durante el Periodo	6,61%	4,89%	-1,72%	
Acumulado a la Fecha	**93,65%**	**91,07%**	**-2,58%**	

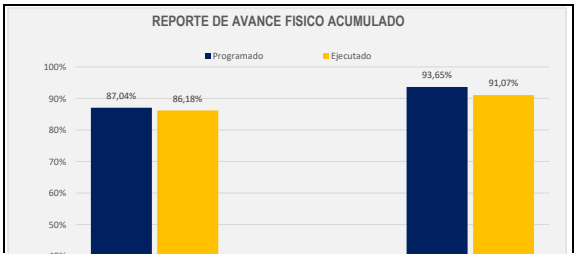


AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 2.654.032.619,99	$ 882.324.674,00	$ 345.450.914,11		$ 345.450.914,11

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
5	$ 1.854.451.044,19	69,87%	4	$ 1.450.337.244,76	54,65%	1/12/2022	$ 322.624.898,30







AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 313.315.624,00	$ 110.836.311,00			$ -

No. Pagos	Valor Pagos tramitados	No. Pagos	Valor Pagos realizados	Fecha última acta	Valor última Acta


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 33


Entidad Contratante: **ENTERRITORIO**

Semana del **5/12/2022** al **11/12/2022**


Fecha **11/12/2022**

tramitados	Valor en Pesos	%	realizados	Valor en Pesos	%	pagada	pagada
7	$ 204.749.622,33	65,35%	5	$ 132.623.950,03	42,33%	31/10/2022	$ 44.545.448,87









OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 33

Entidad Contratante: ENTERRITORIO | Semana del 5/12/2022 al 11/12/2022 | Fecha 11/12/2022

ACTIVIDAD No. 1
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: A la fecha de corte del 15 de noviembre el contratista cumplió con 345 diagnósticos aprobados en actas, la interventoría dio aval a los últimos 60 diagnósticos mediante comité de aprobación No. 21, queda pendiente la inclusión de varias viviendas de acuerdo al remanente que quede correspondiente al monto agotable.
ACTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 93,50% vs 90,85% EJECUTADO
Lo cual nos indica un atraso del 2,65%
En cuanto a la actividad 3 y conforme a las nuevas condiciones del contrato la meta es de 345 viviendas, a la fecha se han intervenido 345 viviendas, de las cuales se han terminado 304 y se adelantan labores constructivas en 41 más(Quedando pendientes alrededor de 20 intervenciones mas para agotar el monto asignado), el contratista cuenta con 14 frentes de trabajo vinculados directamente por el Contratista y otros frentes que están contratados como independientes.
El atraso general del proyecto equivale al 2,58%, En la última semana el atraso tubo una disminución importante con base en el reporte anterior, esto debido a la ampliación del plazo contractual en 11 días calendario, se espera que para la siguiente semana el contratista de inicio a las viviendas requeridad para agotar el monto contractual.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. El contratista subsanó los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizó entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución. Sin embargo, el Contratista posteriormente solicitó un cambio de especificaciones en algunos ítems, uno de ellos el ladrillo de arcilla por bloque de Concreto, razón por la cual se hace necesario ajustar el diseño estructural con dicho cambio. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. A corte del 15 de noviembre se aprobaron 60 diagnósticos correspondientes a los 108 de la adición, con lo cual completan 345 diagnósticos aprobados, cabe mencionar que de acuerdo a las condiciones del contrato se deben realizar más diagnósticos hasta agotar el monto total designado.
En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
Con corte al 11 de diciembre se han intervenido 345 viviendas de las cuales 304 están terminadas, El contratista tiene en ejecución 41 intervenciones y debe continuar incrementando el personal de obra con el fin de mejorar los rendimientos en la ejecución de las obras y poder finalizar este grupo de viviendas programadas y concentrar los esfuerzos en las intervenciones pendientes.
En la ejecución de las casetas y adecuaciones se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 14 frentes de trabajo contratados directamente por el Consorcio Construredes y otras cuadrillas contratadas por subcontratistas.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la próxima semana correspondiente al periodo del 12 al 18 de diciembre de 2022 el contratista debe completar la cantidad de 345 intervenciones terminadas y continuar con la ejecución de obra de las intervenciones que se aprueben con los remanentes del monto agotable, con la mayor celeridad posible y con el fin de poder alcanzar mayores rendimientos, además de determinar el número de viviendas a intervenir y la ejecución de las mismas que se requieren para agotar todo el monto del contrato.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0

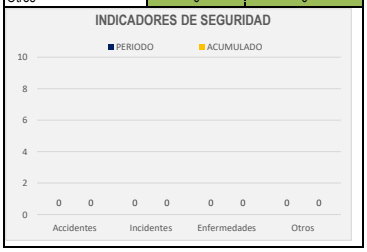

Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	74	0	74	100,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**74**	**0**	**74**	**100,00%**



OBSERVACIONES

En el presente periodo presentaron no sepresentaron precipitaciones.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 33

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **5/12/2022** al **11/12/2022** Fecha **11/12/2022**

GESTIÓN SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	N/A					Por Definir

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
N/A			N/A	

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









CASETAS O ADECUACIONES, SE APRECIA AVANCE EN EL PANETE DE MAMPOSTERIA, FUNDICION DE VIGAS Y COLUMNAS.









INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 33

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **5/12/2022** al **11/12/2022** Fecha **11/12/2022**

ADECUACIONES DE UNIDADES SANITARIAS, SE APRECIA INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, LAVAPLATOS Y LAVADEROS









CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 33

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **5/12/2022** al **11/12/2022** Fecha **11/12/2022**

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-092-22 con el asunto: Remisión de informe con registro fotográfico subsanación informe de Inspección de viviendas Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante el cual hacemos entrega del informe presentado por el Contratista de obra, en el cual se evidencia con registro fotográfico la atención a las observaciones realizadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio al proyecto en el Municipio de Córdoba Bolivar, el pasado 14 de Julio de 2022.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-093-22 con el asunto: RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_116 Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales realizamos entrega de aval para 60 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 21.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-094-22 con el asunto: SOLICITUD DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CIENTO UN (103) DIAGNÓSTICOS APROBADOS EN EL BARRIO SAN MARTIN por medio del cual solicitamos amablemente su gestión como la empresa prestadora del servicio público de acueducto y alcantarillado, COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CÓRDOBA BOLÍVAR - (COOSEPCOR LTDA), para la expedición del certificado de disponibilidad de redes y de autorización para la Intervención de conexión de las acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado para ciento un (103) diagnósticos en el Barrio San Martín.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-095-22 con el asunto: REITERACION SOLICITUD DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CIENTO NUEVE (109) DIAGNÓSTICOS APROBADOS EN EL BARRIO SAN MARTIN mediante del cual reiteramos la solicitud muy amablemente de su gestión como la empresa prestadora del servicio público de acueducto y alcantarillado, COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CÓRDOBA BOLÍVAR - (COOSEPCOR LTDA), para la expedición del certificado de disponibilidad de redes y de autorización para la Intervención de conexión de las acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado de ser necesario para ciento nueve (109) diagnósticos en el Barrio San Martín, esta solicitud ya fue realizada mediante el oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-094-22 con fecha del 16 de noviembre 2022.

	Marcy A. Correa C		Erika M Gutierrez G
Firma		**Firma**	
Nombre	Marcy Correa castaño	Nombre	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
	Directora de la interventoría	Supervisor	Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

Enviar Informe para validación

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO
ARCA-INT/FDA276-TEC-021	13-jun-22	SOLICITUD RESPUESTA AL CONCEPTO EMITIDO POR COOSEPCOR MEDIANTE ACTA DE REUNION DE OBRA	1	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	13-jun-22

INFORME PCI

Fecha de Corte	11/12/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																									
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES												TOTALES							
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldia	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldia	Respuesta positiva	Respuesta negativa	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	191	25	191	1	223	223	223	0	0	188	35	154	0	154	0	346	345	29	345	1	345	304	53	41	345
	TOTAL	**217**	**0**	**191**	**25**	**191**	**1**	**223**	**223**	**223**	**0**	**0**	**188**	**35**	**154**	**0**	**154**	**0**	**346**	**345**	**29**	**345**	**1**	**345**	**304**	**53**	**41**	**345**

INFORME ESTADO DE COVID-19

enterritorio	**INFORME ESTADO DE COVID - 19**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5/11/2022 Y EL 11/11/2022 PLAZO: 7.5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES — CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. — CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
M									

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
MARIELIS OCHOA - INSPECTORA	**MODERNA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Marcy A. Correa C

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPORTE Y EJECUCIÒN DE VIVIENDAS SEMANALES

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 11/12/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001	30%	Adecuacion	$7.967.801,13	$2.390.340,34	9/12/2022	EN EJECUCION	9/12/2022	14/12/2022	0	5	-5		x
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	100%	Caseta T3	$8.126.190,79	$8.126.190,79	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	100%	Caseta T3	$7.914.431,13	$7.914.431,13	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	20/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	100%	Adecuacion	$7.636.382,30	$7.636.382,30	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	100%	Adecuacion	$7.148.052,07	$7.148.052,07	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	12/06/2022	5	8	-3		x
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	100%	Adecuacion	$7.826.891,21	$7.826.891,21	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	100%	Adecuacion	$7.415.092,49	$7.415.092,49	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	14/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	8	B-C-SM-MZ22-VE-009	100%	Caseta T3	$7.908.010,60	$7.908.010,60	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	16/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	9	B-C-SM-MZ21-VE-010	100%	Caseta T3	$8.928.931,81	$8.928.931,81	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	10	B-C-SM-MZ22-VE-011	100%	Adecuacion	$8.088.174,13	$8.088.174,13	8/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	21/06/2022	5	13	-8		x
SM	1	11	B-C-SM-MZ34-VE-012	100%	Caseta T3	$9.305.276,37	$9.305.276,37	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	12	B-C-SM-MZ21-VE-013	100%	Adecuacion	$5.457.782,54	$5.457.782,54	2/06/2022	TERMINADA	7/06/2022	11/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-014	100%	Caseta T3	$8.614.149,98	$8.614.149,98	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	18/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-015	100%	Caseta T3	$8.265.079,43	$8.265.079,43	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-016	100%	Caseta T3	$9.299.320,83	$9.299.320,83	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	16	B-C-SM-MZ38-VE-017	100%	Caseta T3	$8.532.396,85	$8.532.396,85	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	2	17	B-C-SM-MZ24-VE-018	100%	Caseta T3	$8.502.042,22	$8.502.042,22	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	18	B-C-SM-MZ24-VE-019	100%	Adecuacion	$6.921.383,30	$6.921.383,30	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-020	100%	Adecuacion	$4.593.449,33	$4.593.449,33	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	5	13	-8		x
SM	2	20	B-C-SM-MZ85-VE-021	100%	Caseta T3	$8.614.688,02	$8.614.688,02	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	22/06/2022	8	17	-9		x
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-022	100%	Caseta T3	$8.896.124,14	$8.896.124,14	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	22	B-C-SM-MZ85-VE-023	100%	Adecuacion	$8.133.478,61	$8.133.478,61	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	23	B-C-SM-MZ29-VE-024	100%	Adecuacion	$7.072.986,22	$7.072.986,22	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	2	24	B-C-SM-MZ31-VE-025	100%	Caseta T3	$8.637.204,11	$8.637.204,11	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	25	B-C-SM-MZ31-VE-026	100%	Adecuacion	$5.113.367,92	$5.113.367,92	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	19/06/2022	5	14	-9		x
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-027	100%	Adecuacion	$4.365.339,96	$4.365.339,96	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	14/06/2022	5	9	-4		x
SM	2	27	B-C-SM-MZ31-VE-028	100%	Adecuacion	$7.668.943,15	$7.668.943,15	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	13/06/2022	5	8	-3		x
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-029	100%	Caseta T3	$8.468.136,75	$8.468.136,75	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	29	B-C-SM-MZ31-VE-030	100%	Adecuacion	$4.637.820,16	$4.637.820,16	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	5	11	-6		x
SM	10	30	B-C-SM-MZ31-VE-031	100%	Caseta T2	$8.119.008,44	$8.119.008,44	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	31	B-C-SM-MZ56-VE-038	100%	Adecuacion	$8.227.630,94	$8.227.630,94	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	32	B-C-SM-MZ56-VE-039	100%	Adecuacion	$1.443.687,77	$1.443.687,77	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	33	B-C-SM-MZ46-VE-040	100%	Adecuacion	$6.628.376,66	$6.628.376,66	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	34	B-C-SM-MZ45-VE-041	100%	Adecuacion	$4.845.221,48	$4.845.221,48	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	35	B-C-SM-MZ21-VE-042	100%	Adecuacion	$4.634.812,47	$4.634.812,47	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	36	B-C-SM-MZ31-VE-043	100%	Caseta T3	$6.939.713,07	$6.939.713,07	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	10	37	B-C-SM-MZ145-VE-044	100%	Caseta T3	$7.980.826,25	$7.980.826,25	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	38	B-C-SM-MZ55-VE-046	100%	Caseta T3	$7.344.533,10	$7.344.533,10	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	39	B-C-SM-MZ55-VE-047	100%	Caseta T2	$7.890.285,26	$7.890.285,26	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	5	40	B-C-SM-MZ145-VE-053	100%	Caseta T3	$8.262.443,76	$8.262.443,76	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	10	41	B-C-SM-MZ91-VE-054	100%	Caseta T2	$8.230.167,20	$8.230.167,20	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	42	B-C-SM-MZ56-VE-055	100%	Adecuacion	$3.160.157,78	$3.160.157,78	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	6	43	B-C-SM-MZ55-VE-056	100%	Adecuacion	$8.215.661,11	$8.215.661,11	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	6	44	B-C-SM-M55-VE-061	100%	Adecuacion	$7.040.722,29	$7.040.722,29	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	45	B-C-SM-MZ56-VE-062	100%	Caseta T2	$8.362.124,52	$8.362.124,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	46	B-C-SM-MZ66-VE-067	100%	Caseta T3	$7.306.146,52	$7.306.146,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	47	B-C-SM-MZ66-VE-068	100%	Caseta T3	$7.971.707,31	$7.971.707,31	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	48	B-C-SM-MZ75-VE-071	100%	Adecuacion	$7.170.024,86	$7.170.024,86	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	49	B-C-SM-MZ75-VE-072	100%	Caseta T3	$8.040.278,46	$8.040.278,46	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	50	B-C-SM-MZ75-VE-073	100%	Caseta T3	$8.332.036,11	$8.332.036,11	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	51	B-C-SM-MZ75-VE-074	100%	Caseta T3	$7.656.034,05	$7.656.034,05	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	52	B-C-SM-MZ89-VE-084	100%	Caseta T3	$8.247.304,21	$8.247.304,21	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	5	53	B-C-SM-MZ69-VE-087	100%	Adecuacion	$7.074.492,71	$7.074.492,71	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	54	B-C-SM-MZ69-VE-088	100%	Adecuacion	$7.465.862,82	$7.465.862,82	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	55	B-C-SM-MZ77-VE-094	100%	Adecuacion	$3.585.305,08	$3.585.305,08	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	56	B-C-SM-MZ68-VE-097	100%	Caseta T3	$8.172.428,90	$8.172.428,90	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	7	57	B-C-SM-MZ59-VE-099	100%	Adecuacion	$6.098.594,42	$6.098.594,42	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	58	B-C-SM-MZ84-VE-166	100%	Adecuacion	$6.744.749,39	$6.744.749,39	22/06/2022	TERMINADA	27/06/2022	3/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	59	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	23/06/2022	TERMINADA	28/06/2022	4/07/2022	5	11	-6		x
SM	8	60	B-C-SM-MZ55-VE-060	100%	Caseta T4	$9.444.985,92	$9.444.985,92	24/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	61	B-C-SM-MZ66-VE-069	100%	Adecuacion	$6.509.744,54	$6.509.744,54	25/06/2022	TERMINADA	30/06/2022	6/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	62	B-C-SM-MZ30-VE-032	100%	Adecuacion	$7.557.018,99	$7.557.018,99	26/06/2022	TERMINADA	1/07/2022	7/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	63	B-C-SM-MZ44-VE-034	100%	Adecuacion	$5.519.347,12	$5.519.347,12	27/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	64	B-C-SM-MZ44-VE-035	100%	Adecuacion	$8.137.626,09	$8.137.626,09	28/06/2022	TERMINADA	3/07/2022	9/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	65	B-C-SM-MZ69-VE-085	100%	Adecuacion	$6.566.494,56	$6.566.494,56	29/06/2022	TERMINADA	4/07/2022	10/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	66	B-C-SM-MZ58-VE-100	100%	Caseta T2	$7.970.674,94	$7.970.674,94	30/07/2022	TERMINADA	7/08/2022	13/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	67	B-C-SM-MZ47-VE-104	100%	Adecuacion	$8.247.586,36	$8.247.586,36	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	68	B-C-SM-MZ58-VE-107	100%	Adecuacion	$7.990.185,62	$7.990.185,62	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	69	B-C-SM-MZ58-VE-110	100%	Adecuacion	$6.954.066,54	$6.954.066,54	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	70	B-C-SM-MZ47-VE-111	100%	Caseta t3	$8.318.089,49	$8.318.089,49	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	71	B-C-SM-MZ47-VE-112	100%	Adecuacion	$6.827.279,63	$6.827.279,63	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	72	B-C-SM-MZ47-VE-113	100%	Adecuacion	$5.043.864,80	$5.043.864,80	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	73	B-C-SM-MZ47-VE-114	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	8	74	B-C-SM-MZ47-VE-115	100%	Caseta t3	$8.322.147,74	$8.322.147,74	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	75	B-C-SM-MZ21-VE-118	100%	Caseta t3	$8.148.709,57	$8.148.709,57	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	76	B-C-SM-MZ30-VE-121	100%	Caseta t3	$7.765.616,43	$7.765.616,43	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	77	B-C-SM-MZ59-VE-102	100%	Caseta T2	$8.805.748,18	$8.805.748,18	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	6	78	B-C-SM-MZ58-VE-101	100%	Adecuacion	$5.300.910,78	$5.300.910,78	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	79	B-C-SM-MZ30-VE-122	100%	Caseta t3	$8.106.560,85	$8.106.560,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	80	B-C-SM-MZ30-VE-124	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	81	B-C-SM-MZ87-VE-125	100%	Caseta t3	$8.100.577,85	$8.100.577,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	82	B-C-SM-MZ87-VE-126	100%	Caseta t3	$8.057.934,94	$8.057.934,94	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	83	B-C-SM-MZ30-VE-127	100%	Caseta t3	$7.998.497,33	$7.998.497,33	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	84	B-C-SM-MZ31-VE-142	100%	Adecuacion	$7.456.473,74	$7.456.473,74	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	9	85	B-C-SM-MZ87-VE-128	100%	Adecuacion	$7.523.102,18	$7.523.102,18	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	86	B-C-SM-MZ87-VE-129	100%	Caseta t3	$8.132.932,39	$8.132.932,39	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	5	87	B-C-SM-MZ66-VE-131	100%	Caseta t3	$8.139.325,77	$8.139.325,77	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	88	B-C-SM-MZ67-VE-133	100%	Adecuacion	$6.390.026,30	$6.390.026,30	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	89	B-C-SM-MZ66-VE-134	100%	Adecuacion	$8.426.367,54	$8.426.367,54	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	90	B-C-SM-MZ56-VE-135	100%	Adecuacion	$7.522.231,25	$7.522.231,25	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	91	B-C-SM-MZ56-VE-136	100%	Adecuacion	$7.922.709,35	$7.922.709,35	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	92	B-C-SM-MZ56-VE-138	100%	Adecuacion	$7.984.245,73	$7.984.245,73	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	93	B-C-SM-MZ56-VE-139	100%	Caseta t3	$7.415.285,53	$7.415.285,53	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x

SM	5	94	B-C-SM-MZ56-VE-140	100%	Caseta t3	$8.097.289,18	$8.097.289,18	11/08/2022	**TERMINADA**	**19/08/2022**	25/08/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	7	95	B-C-SM-MZ47-VE-103	100%	Adecuacion	$8.549.349,69	$8.549.349,69	9/08/2022	**TERMINADA**	**14/08/2022**	20/08/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	12	96	B-C-SM-MZ69-VE-086	100%	Caseta t3	$8.441.178,67	$8.441.178,67	15/08/2022	**TERMINADA**	**23/08/2022**	29/08/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	7	97	B-C-SM-MZ32-VE-143	100%	Caseta t3	$8.877.043,95	$8.877.043,95	15/08/2022	**TERMINADA**	**23/08/2022**	29/08/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	6	98	B-C-SM-MZ87-VE-145	100%	Caseta t3	$8.314.813,05	$8.314.813,05	18/08/2022	**TERMINADA**	**26/08/2022**	1/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	6	99	B-C-SM-MZ87-VE-146	100%	Adecuacion	$7.503.681,08	$7.503.681,08	19/08/2022	**TERMINADA**	**24/08/2022**	30/08/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	6	100	B-C-SM-MZ87-VE-147	100%	Caseta t3	$8.285.180,86	$8.285.180,86	20/08/2022	**TERMINADA**	**28/08/2022**	3/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	6	101	B-C-SM-MZ87-VE-148	100%	Caseta t3	$8.170.302,32	$8.170.302,32	21/08/2022	**TERMINADA**	**29/08/2022**	4/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	5	102	B-C-SM-MZ87-VE-149	100%	Caseta t3	$8.178.886,20	$8.178.886,20	22/08/2022	**TERMINADA**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	5	103	B-C-SM-MZ89-VE-150	100%	Caseta t3	$8.339.015,83	$8.339.015,83	23/08/2022	**TERMINADA**	**31/08/2022**	6/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	8	104	B-C-SM-MZ89-VE-151	100%	Adecuacion	$7.760.503,36	$7.760.503,36	24/08/2022	**TERMINADA**	**29/08/2022**	4/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	5	105	B-C-SM-MZ56-VE-152	100%	Caseta t2	$8.292.567,48	$8.292.567,48	25/08/2022	**TERMINADA**	**2/09/2022**	8/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	7	106	B-C-SM-MZ76-VE-153	100%	Adecuacion	$6.803.533,70	$6.803.533,70	26/08/2022	**TERMINADA**	**31/08/2022**	6/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	9	107	B-C-SM-MZ75-VE-154	100%	Adecuacion	$7.419.892,36	$7.419.892,36	27/08/2022	**TERMINADA**	**1/09/2022**	7/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	7	108	B-C-SM-MZ75-VE-155	100%	Adecuacion	$7.958.081,38	$7.958.081,38	28/08/2022	**TERMINADA**	**2/09/2022**	8/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	5	109	B-C-SM-MZ75-VE-156	100%	Adecuacion	$8.011.976,60	$8.011.976,60	29/08/2022	**TERMINADA**	**3/09/2022**	9/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	11	110	B-C-SM-MZ145-VE-157	100%	Adecuacion	$9.653.914,02	$9.653.914,02	30/08/2022	**TERMINADA**	**4/09/2022**	10/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	5	111	B-C-SM-MZ75-VE-158	100%	Adecuacion	$6.846.229,60	$6.846.229,60	31/08/2022	**TERMINADA**	**5/09/2022**	11/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	11	112	B-C-SM-MZ-VE145-160	100%	Adecuacion	$9.325.691,25	$9.325.691,25	21/08/2022	**TERMINADA**	**26/08/2022**	1/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**

SM	11	113	B-C-SM-MZ-VE145-162	100%	Adecuacion	$7.000.723,74	$7.000.723,74	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	5	114	B-C-SM-MZ84-VE-165	100%	Caseta t3	$8.259.418,86	$8.259.418,86	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	115	B-C-SM-MZ91-VE-167	100%	Adecuacion	$7.334.345,73	$7.334.345,73	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	9	116	B-C-SM-MZ77-VE-179	100%	Caseta t3	$8.930.810,61	$8.930.810,61	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	9	117	B-C-SM-MZ87-VE-180	100%	Caseta t3	$8.116.195,29	$8.116.195,29	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	118	B-C-SM-MZ55-VE-048	100%	Caseta t3	$6.887.962,53	$6.887.962,53	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	119	B-C-SM-MZ68-VE-077	100%	Caseta t3	$7.841.298,86	$7.841.298,86	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	120	B-C-SM-MZ89-VE-080	100%	Caseta t2	$7.814.305,69	$7.814.305,69	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	121	B-C-SM-MZ-VE-082	100%	Caseta t4	$9.602.086,12	$9.602.086,12	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	122	B-C-SM-MZ-VE-091	100%	Caseta t3	$8.240.626,46	$8.240.626,46	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	123	B-C-SM-MZ-VE-092	100%	Caseta t2	$8.314.938,30	$8.314.938,30	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	124	B-C-SM-MZ-VE-096	100%	Adecuacion	$7.662.197,96	$7.662.197,96	22/08/2022	TERMINADA	27/08/2022	2/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	125	B-C-SM-MZ30-VE-120	100%	Caseta t4	$8.665.155,76	$8.665.155,76	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	126	B-C-SM-MZ-VE-137	100%	Caseta t3	$8.275.053,67	$8.275.053,67	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	5	127	B-C-SM-MZ92-VE-168	100%	Adecuacion	$6.476.015,92	$6.476.015,92	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	8	128	B-C-SM-MZ92-VE-169	100%	Adecuacion	$6.842.321,91	$6.842.321,91	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	129	B-C-SM-MZ84-VE-178	100%	Adecuacion	$2.230.924,70	$2.230.924,70	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	130	B-C-SM-MZ45-VE-033	100%	Adecuacion	$7.943.448,36	$7.943.448,36	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	131	B-C-SM-MZ76-VE-075	100%	Adecuacion	$7.982.813,63	$7.982.813,63	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	132	B-C-SM-MZ-VE-089	100%	Adecuacion	$7.475.616,81	$7.475.616,81	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	133	B-C-SM-MZ-VE-173	100%	Adecuacion	$7.034.505,34	$7.034.505,34	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	134	B-C-SM-MZ34-VE-209	100%	Adecuacion	$5.856.785,90	$5.856.785,90	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	135	B-C-SM-MZ34-VE-210	100%	Caseta t3	$8.204.915,74	$8.204.915,74	30/08/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	136	B-C-SM-MZ-VE-164	100%	Caseta t3	$7.853.199,32	$7.853.199,32	30/08/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	11	137	B-C-SM-MZ92-VE-203	100%	Adecuacion	$8.272.491,16	$8.272.491,16	30/08/2022	TERMINADA	4/09/2022	10/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	138	B-C-SM-MZ91-VE-205	100%	Adecuacion	$6.742.842,11	$6.742.842,11	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	139	B-C-SM-MZ91-VE-206	100%	Adecuacion	$6.326.983,38	$6.326.983,38	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	140	B-C-SM-MZ145-VE-184	100%	Adecuacion	$7.415.421,93	$7.415.421,93	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	141	B-C-SM-MZ156-VE-058	100%	Adecuacion	$7.430.942,29	$7.430.942,29	1/09/2022	TERMINADA	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	142	B-C-SM-MZ156-VE-059	100%	Adecuacion	$3.514.863,97	$3.514.863,97	1/09/2022	TERMINADA	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	143	B-C-SM-MZ41-VE-141	100%	Adecuacion	$6.179.740,71	$6.179.740,71	2/09/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	144	B-C-SM-MZ32-VE-144	100%	Caseta t4	$7.498.669,53	$7.498.669,53	2/09/2022	TERMINADA	10/09/2022	16/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	145	B-C-SM-MZ89-VE-083	100%	Caseta t3	$7.576.542,11	$7.576.542,11	3/09/2022	TERMINADA	11/09/2022	17/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	146	B-C-SM-MZ46-VE-211	100%	Adecuacion	$7.730.411,89	$7.730.411,89	3/09/2022	TERMINADA	8/09/2022	14/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	147	B-C-SM-MZ46-VE-212	100%	Adecuacion	$5.774.463,33	$5.774.463,33	5/09/2022	TERMINADA	10/09/2022	16/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	148	B-C-SM-MZ46-VE-216	100%	Adecuacion	$8.311.308,81	$8.311.308,81	6/09/2022	TERMINADA	11/09/2022	17/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	149	B-C-SM-MZ30-VE-123	100%	Caseta t3	$8.084.933,32	$8.084.933,32	8/09/2022	TERMINADA	16/09/2022	22/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	150	B-C-SM-MZ66-VE-065	100%	Caseta t3	$7.828.052,76	$7.828.052,76	9/09/2022	TERMINADA	17/09/2022	23/09/2022	8	14	-6		x
SM	15	151	B-C-SM-MZ66-VE-066	100%	Caseta t2	$4.292.672,67	$4.292.672,67	10/09/2022	TERMINADA	18/09/2022	24/09/2022	8	14	-6		x
SM	15	152	B-C-SM-MZ23-VE-117	100%	Adecuacion	$4.772.651,25	$4.772.651,25	11/09/2022	TERMINADA	16/09/2022	22/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	153	B-C-SM-MZ59-VE-187	100%	Adecuacion	$8.212.157,27	$8.212.157,27	11/09/2022	TERMINADA	16/09/2022	22/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	154	B-C-SM-MZ34-VE-116	100%	Caseta t3	$7.989.636,90	$7.989.636,90	12/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	155	B-C-SM-MZ-VE-076	100%	Adecuacion	$7.966.932,81	$7.966.932,81	13/09/2022	TERMINADA	18/09/2022	24/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	156	B-C-SM-MZ87-VE-189	100%	Adecuacion	$6.068.174,04	$6.068.174,04	13/09/2022	TERMINADA	18/09/2022	24/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	157	B-C-SM-MZ18-VE-202	100%	Adecuacion	$8.298.564,37	$8.298.564,37	14/09/2022	TERMINADA	19/09/2022	25/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	158	B-C-SM-MZ55-VE-036	100%	Adecuacion	$4.519.608,59	$4.519.608,59	14/09/2022	TERMINADA	22/09/2022	28/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	159	B-C-SM-MZ45-VE-037	100%	Adecuacion	$5.427.357,42	$5.427.357,42	15/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	160	B-C-SM-MZ75-VE-070	100%	Adecuacion	$4.222.499,91	$4.222.499,91	15/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	161	B-C-SM-MZ67-VE-078	100%	Adecuacion	$5.110.794,97	$5.110.794,97	16/09/2022	TERMINADA	21/09/2022	27/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	162	B-C-SM-MZ34-VE-119	100%	Adecuacion	$7.021.881,94	$7.021.881,94	16/09/2022	TERMINADA	21/09/2022	27/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	163	B-C-SM-MZ56-VE-190	100%	Adecuacion	$7.154.236,55	$7.154.236,55	17/09/2022	TERMINADA	22/09/2022	28/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	164	B-C-SM-MZ56-VE-191	100%	Caseta t3	$8.896.139,02	$8.896.139,02	17/09/2022	TERMINADA	25/09/2022	1/10/2022	8	14	-6		x
SM	13	165	B-C-SM-MZ31-VE-199	100%	Adecuacion	$4.691.093,17	$4.691.093,17	18/09/2022	TERMINADA	24/09/2022	30/09/2022	6	12	-6		x
SM	18	166	B-C-SM-MZ67-VE-183	100%	Caseta t3	$6.957.541,97	$6.957.541,97	18/09/2022	TERMINADA	26/09/2022	2/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	167	B-C-SM-MZ30-VE-200	100%	Caseta t3	$8.312.234,66	$8.312.234,66	19/09/2022	TERMINADA	27/09/2022	3/10/2022	8	14	-6		x
SM	13	168	B-C-SM-MZ31-VE-201	100%	Caseta t3	$6.950.167,16	$6.950.167,16	19/09/2022	TERMINADA	27/09/2022	3/10/2022	8	14	-6		x
SM	13	169	B-C-SM-MZ47-VE-105	100%	Adecuacion	$3.899.268,01	$3.899.268,01	20/09/2022	TERMINADA	25/09/2022	1/10/2022	5	11	-6		x
SM	14	170	B-C-SM-MZ68-VE-108	100%	Adecuacion	$3.617.504,69	$3.617.504,69	20/09/2022	TERMINADA	25/09/2022	1/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	171	B-C-SM-MZ145-VE-208	100%	Adecuacion	$6.196.096,01	$6.196.096,01	21/09/2022	TERMINADA	26/09/2022	2/10/2022	5	11	-6		x
SM	12	172	B-C-SM-MZ66-VE-198	100%	Adecuacion	$5.360.187,87	$5.360.187,87	21/09/2022	TERMINADA	29/09/2022	5/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	173	B-C-SM-MZ30-VE-INC-001	100%	Caseta t3	$9.273.205,89	$9.273.205,89	22/09/2022	TERMINADA	30/09/2022	6/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	174	B-C-SM-MZ36-VE-INC-002	100%	Adecuacion	$7.909.051,57	$7.909.051,57	22/09/2022	TERMINADA	28/09/2022	4/10/2022	6	12	-6		x
SM	17	175	B-C-SM-MZ36-VE-INC-003	100%	Adecuacion	$7.056.470,53	$7.056.470,53	23/09/2022	TERMINADA	29/09/2022	5/10/2022	6	12	-6		x
SM	15	176	B-C-SM-MZ30-VE-INC-004	100%	Caseta t3	$7.321.539,69	$7.321.539,69	23/09/2022	TERMINADA	1/10/2022	7/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	177	B-C-SM-MZ21-VE-INC-005	100%	Adecuacion	$5.983.563,40	$5.983.563,40	24/09/2022	TERMINADA	29/09/2022	5/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	178	B-C-SM-MZ93-VE-INC-006	100%	Adecuacion	$7.900.843,94	$7.900.843,94	24/09/2022	TERMINADA	29/09/2022	5/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	179	B-C-SM-MZ87-VE-INC-007	100%	Caseta t3	$7.343.027,38	$7.343.027,38	25/09/2022	TERMINADA	3/10/2022	9/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	180	B-C-SM-MZ98-VE-INC-008	100%	Caseta t3	$7.345.145,38	$7.345.145,38	26/09/2022	TERMINADA	4/10/2022	10/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	181	B-C-SM-MZ87-VE-INC-009	100%	Adecuacion	$6.166.474,80	$6.166.474,80	27/09/2022	TERMINADA	2/10/2022	8/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	182	B-C-SM-MZ48-VE-INC-010	100%	Adecuacion	$7.156.353,68	$7.156.353,68	27/09/2022	TERMINADA	2/10/2022	8/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	183	B-C-SM-MZ38-VE-INC-013	100%	Caseta t3	$8.739.765,67	$8.739.765,67	28/09/2022	TERMINADA	6/10/2022	12/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	184	B-C-SM-MZ33-VE-INC-014	100%	Adecuacion	$7.094.395,09	$7.094.395,09	28/09/2022	TERMINADA	3/10/2022	9/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	185	B-C-SM-MZ55-VE-064	100%	Adecuacion	$7.807.428,21	$7.807.428,21	29/09/2022	TERMINADA	4/10/2022	10/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	186	B-C-SM-MZ145-VE-161	100%	Adecuacion	$8.918.748,97	$8.918.748,97	29/09/2022	TERMINADA	4/10/2022	10/10/2022	5	11	-6		x
SM	17	187	B-C-SM-MZ31-VE-INC-015	100%	Adecuacion	$7.948.410,17	$7.948.410,17	30/09/2022	TERMINADA	5/10/2022	11/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	188	B-C-SM-MZ33-VE-INC-016	100%	Caseta t3	$7.602.156,55	$7.602.156,55	30/09/2022	TERMINADA	8/10/2022	14/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	189	B-C-SM-MZ85-VE-INC-019	100%	Caseta t3	$7.773.487,18	$7.773.487,18	1/10/2022	TERMINADA	9/10/2022	15/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	190	B-C-SM-MZ97-VE-INC-023	100%	Caseta t3	$8.333.260,29	$8.333.260,29	1/10/2022	TERMINADA	9/10/2022	15/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	191	B-C-SM-MZ45-VE-INC-024	100%	Caseta t3	$8.094.089,35	$8.094.089,35	2/10/2022	TERMINADA	10/10/2022	16/10/2022	8	14	-6		x
SM	18	192	B-C-SM-MZ95-VE-INC-026	100%	Caseta t3	$7.629.024,81	$7.629.024,81	2/10/2022	TERMINADA	10/10/2022	16/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	193	B-C-SM-MZ33-VE-INC-032	100%	Caseta t3	$8.036.839,77	$8.036.839,77	3/10/2022	TERMINADA	11/10/2022	17/10/2022	8	14	-6		x
SM	18	194	B-C-SM-MZ32-VE-INC-035	100%	Caseta t3	$7.811.643,60	$7.811.643,60	4/10/2022	TERMINADA	12/10/2022	18/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	195	B-C-SM-MZ33-VE-INC-027	100%	Caseta T2	$8.012.216,20	$8.012.216,20	5/10/2022	TERMINADA	13/10/2022	19/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	196	B-C-SM-MZ66-VE-INC-033	100%	Adecuacion	$6.628.918,24	$6.628.918,24	5/10/2022	TERMINADA	10/10/2022	16/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	197	B-C-SM-MZ24-VE-INC-034	100%	Caseta t3	$7.997.347,42	$7.997.347,42	6/10/2022	TERMINADA	14/10/2022	20/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	198	B-C-SM-MZ98-VE-INC-036	100%	Caseta t3	$7.885.031,34	$7.885.031,34	6/10/2022	TERMINADA	14/10/2022	20/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	199	B-C-SM-MZ85-VE-INC-038	100%	Caseta t3	$8.272.191,01	$8.272.191,01	7/10/2022	TERMINADA	15/10/2022	21/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	200	B-C-SM-MZ93-VE-INC-039	100%	Adecuacion	$7.727.983,14	$7.727.983,14	7/10/2022	TERMINADA	12/10/2022	18/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	201	B-C-SM-MZ93-VE-INC-040	100%	Adecuacion	$7.621.248,46	$7.621.248,46	8/10/2022	TERMINADA	13/10/2022	19/10/2022	5	11	-6		x
SM	17	202	B-C-SM-MZ86-VE-INC-041	100%	Adecuacion	$7.737.812,12	$7.737.812,12	8/10/2022	TERMINADA	13/10/2022	19/10/2022	5	11	-6		x
SM	17	203	B-C-SM-MZ85-VE-INC-042	100%	Caseta t3	$8.221.884,89	$8.221.884,89	8/10/2022	TERMINADA	16/10/2022	22/10/2022	8	14	-6		x

SM	17	204	B-C-SM-MZ96-VE-INC-046	100%	Caseta t3	$9.156.805,39	$9.156.805,39	9/10/2022	TERMINADA	17/10/2022	23/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	205	B-C-SM-MZ95-VE-INC-049	100%	Caseta t3	$8.256.966,48	$8.256.966,48	10/10/2022	TERMINADA	18/10/2022	24/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	206	B-C-SM-MZ32-VE-INC-050	100%	Caseta t3	$7.745.465,56	$7.745.465,56	11/10/2022	TERMINADA	19/10/2022	25/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	207	B-C-SM-MZ36-VE-INC-051	100%	Adecuacion	$7.443.842,89	$7.443.842,89	12/10/2022	TERMINADA	17/10/2022	23/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	208	B-C-SM-MZ30-VE-INC-052	100%	Caseta t3	$8.090.760,97	$8.090.760,97	13/10/2022	TERMINADA	21/10/2022	27/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	209	B-C-SM-MZ94-VE-INC-053	100%	Adecuacion	$5.710.686,86	$5.710.686,86	13/10/2022	TERMINADA	18/10/2022	24/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	210	B-C-SM-MZ-VE-INC-055	100%	Adecuacion	$7.242.404,18	$7.242.404,18	13/10/2022	TERMINADA	18/10/2022	24/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	211	B-C-SM-MZ-VE-INC-056	100%	Adecuacion	$7.673.332,15	$7.673.332,15	14/10/2022	TERMINADA	19/10/2022	25/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	212	B-C-SM-MZ86-VE-INC-057	100%	Caseta t3	$7.705.011,19	$7.705.011,19	15/10/2022	TERMINADA	23/10/2022	29/10/2022	8	14	-6		x
SM	18	213	B-C-SM-MZ86-VE-INC-058	100%	Caseta t2	$8.107.440,98	$8.107.440,98	16/10/2022	TERMINADA	24/10/2022	30/10/2022	8	14	-6		x
SM	19	214	B-C-SM-MZ48-VE-INC-011	100%	Adecuacion	$6.827.750,12	$6.827.750,12	17/10/2022	TERMINADA	22/10/2022	31/10/2022	5	14	-6		x
SM	17	215	B-C-SM-MZ91-VE-INC-062	100%	Adecuacion	$4.551.930,25	$4.551.930,25	17/10/2022	TERMINADA	22/10/2022	1/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	216	B-C-SM-MZ87-VE-INC-063	100%	Adecuacion	$7.258.523,54	$7.258.523,54	18/10/2022	TERMINADA	23/10/2022	2/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	217	B-C-SM-MZ67-VE-INC-064	100%	Adecuacion	$5.250.910,34	$5.250.910,34	18/10/2022	TERMINADA	23/10/2022	3/11/2022	5	14	-6		x
SM	17	218	B-C-SM-MZ91-VE-INC-065	100%	Caseta T3	$8.132.709,35	$8.132.709,35	19/10/2022	TERMINADA	27/10/2022	4/11/2022	8	14	-6		x
SM	18	219	B-C-SM-MZ21-VE-INC-066	100%	Caseta T3	$8.884.140,18	$8.884.140,18	19/10/2022	TERMINADA	27/10/2022	5/11/2022	8	14	-6		x
SM	18	220	B-C-SM-MZ47-VE-INC-068	100%	Adecuacion	$5.141.678,32	$5.141.678,32	20/10/2022	TERMINADA	25/10/2022	6/11/2022	5	14	-6		x
SM	18	221	B-C-SM-MZ47-VE-INC-069	100%	Adecuacion	$5.804.814,20	$5.804.814,20	20/10/2022	TERMINADA	25/10/2022	7/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	222	B-C-SM-MZ46-VE-INC-070	100%	Adecuacion	$7.533.082,62	$7.533.082,62	20/10/2022	TERMINADA	25/10/2022	8/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	223	B-C-SM-MZ32-VE-INC-071	100%	Adecuacion	$4.494.495,27	$4.494.495,27	21/10/2022	TERMINADA	26/10/2022	9/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	224	B-C-SM-MZ32-VE-INC-072	100%	Adecuacion	$2.547.155,48	$2.547.155,48	21/10/2022	TERMINADA	26/10/2022	10/11/2022	5	14	-6		x
SM	18	225	B-C-SM-MZ32-VE-INC-073	100%	Adecuacion	$5.899.252,59	$5.899.252,59	22/10/2022	TERMINADA	27/10/2022	11/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	226	B-C-SM-MZ95-VE-INC-025	100%	Caseta T3	$7.925.272,79	$7.925.272,79	22/10/2022	TERMINADA	30/10/2022	12/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	227	B-C-SM-MZ48-VE-INC-029	100%	Adecuacion	$8.123.075,86	$8.123.075,86	22/10/2022	TERMINADA	27/10/2022	13/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	228	B-C-SM-MZ86-VE-INC-030	100%	Caseta T3	$8.938.581,32	$8.938.581,32	23/10/2022	TERMINADA	31/10/2022	14/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	229	B-C-SM-MZ98-VE-INC-031	100%	Caseta T3	$7.166.340,15	$7.166.340,15	23/10/2022	TERMINADA	31/10/2022	15/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	230	B-C-SM-MZ32-VE-INC-017	100%	Caseta T3	$7.936.218,15	$7.936.218,15	23/10/2022	TERMINADA	31/10/2022	16/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	231	B-C-SM-MZ145-VE-163	100%	Adecuacion	$7.980.298,74	$7.980.298,74	24/10/2022	TERMINADA	29/10/2022	16/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	232	B-C-SM-MZ86-VE-INC-043	100%	Caseta T3	$7.671.439,94	$7.671.439,94	25/10/2022	TERMINADA	2/11/2022	16/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	233	B-C-SM-MZ98-VE-INC-044	100%	Caseta T3	$7.978.159,51	$7.978.159,51	26/10/2022	TERMINADA	3/11/2022	16/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	234	B-C-SM-MZ91-VE-INC-091	100%	Adecuacion	$7.816.920,63	$7.816.920,63	27/10/2022	TERMINADA	1/11/2022	16/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	235	B-C-SM-MZ86-VE-INC-093	100%	Caseta T3	$9.612.473,24	$9.612.473,24	28/10/2022	TERMINADA	5/11/2022	16/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	236	B-C-SM-MZ36-VE-INC-118	100%	Caseta T3	$8.070.784,75	$8.070.784,75	29/10/2022	TERMINADA	6/11/2022	16/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	237	B-C-SM-MZ48-VE-INC-145	100%	Caseta T3	$8.404.448,59	$8.404.448,59	30/10/2022	TERMINADA	7/11/2022	16/11/2022	8	14	-6		x
SM	12	238	B-C-SM-MZ-VE-093	100%	Adecuacion	$7.207.274,62	$7.207.274,62	1/11/2022	TERMINADA	7/11/2022	13/11/2022	6	12	-6		x
SM	18	239	B-C-SM-MZ75-VE-130	100%	Adecuacion	$5.087.108,21	$5.087.108,21	1/11/2022	TERMINADA	6/11/2022	12/11/2022	5	11	-6		x
SM	11	240	B-C-SM-MZ66-VE-132	100%	Adecuacion	$7.421.836,98	$7.421.836,98	2/11/2022	TERMINADA	7/11/2022	13/11/2022	5	11	-6		x
SM	9	241	B-C-SM-MZ92-VE-170	100%	Adecuacion	$6.456.971,29	$6.456.971,29	4/11/2022	TERMINADA	9/11/2022	15/11/2022	5	11	-6		x
SM	10	242	B-C-SM-MZ91-VE-171	100%	Adecuacion	$7.013.453,53	$7.013.453,53	5/11/2022	TERMINADA	10/11/2022	16/11/2022	5	11	-6		x
SM	7	243	B-C-SM-MZ75-VE-172	100%	Adecuacion	$8.210.038,72	$8.210.038,72	6/11/2022	TERMINADA	11/11/2022	17/11/2022	5	11	-6		x
SM	18	244	B-C-SM-MZ93-VE-174	100%	Adecuacion	$6.560.835,40	$6.560.835,40	7/11/2022	TERMINADA	12/11/2022	18/11/2022	5	11	-6		x
SM	18	245	B-C-SM-MZ86-VE-INC-080	100%	Caseta T3	$8.436.036,24	$8.436.036,24	8/11/2022	TERMINADA	16/11/2022	22/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	246	B-C-SM-MZ95-VE-INC-173	100%	Caseta T3	$8.297.659,07	$8.297.659,07	8/11/2022	TERMINADA	16/11/2022	22/11/2022	8	14	-6		x
SM	20	247	B-C-SM-MZ48-VE-INC-028	100%	Adecuacion	$5.338.458,70	$5.338.458,70	9/11/2022	TERMINADA	14/11/2022	20/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	248	B-C-SM-MZ68-VE-INC-059	100%	Adecuacion	$6.561.578,46	$6.561.578,46	9/11/2022	TERMINADA	14/11/2022	20/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	249	B-C-SM-MZ32-VE-INC-075	100%	Adecuacion	$4.281.987,94	$4.281.987,94	9/11/2022	TERMINADA	14/11/2022	20/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	250	B-C-SM-MZ31-VE-INC-077	100%	Caseta T3	$8.209.906,38	$8.209.906,38	10/11/2022	TERMINADA	18/11/2022	24/11/2022	8	14	-6		x
SM	20	251	B-C-SM-MZ59-VE-INC-086	100%	Adecuacion	$4.202.570,37	$4.202.570,37	10/11/2022	TERMINADA	15/11/2022	21/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	252	B-C-SM-MZ68-VE-INC-087	100%	Adecuacion	$5.197.963,52	$5.197.963,52	10/11/2022	TERMINADA	15/11/2022	21/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	253	B-C-SM-MZ59-VE-INC-095	100%	Adecuacion	$5.330.404,94	$5.330.404,94	11/11/2022	TERMINADA	16/11/2022	22/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	254	B-C-SM-MZ59-VE-INC-099	100%	Adecuacion	$6.288.082,10	$6.288.082,10	11/11/2022	TERMINADA	16/11/2022	22/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	255	B-C-SM-MZ48-VE-INC-101	100%	Adecuacion	$4.388.042,03	$4.388.042,03	11/11/2022	TERMINADA	16/11/2022	22/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	256	B-C-SM-MZ38-VE-INC-108	100%	Caseta T2	$8.106.576,63	$8.106.576,63	12/11/2022	TERMINADA	20/11/2022	26/11/2022	8	14	-6		x
SM	20	257	B-C-SM-MZ98-VE-INC-109	100%	Adecuacion	$3.942.607,23	$3.942.607,23	12/11/2022	TERMINADA	17/11/2022	23/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	258	B-C-SM-MZ49-VE-INC-123	100%	Adecuacion	$5.692.446,92	$5.692.446,92	12/11/2022	TERMINADA	17/11/2022	23/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	259	B-C-SM-MZ23-VE-INC-129	100%	Adecuacion	$7.800.567,25	$7.800.567,25	13/11/2022	TERMINADA	18/11/2022	24/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	260	B-C-SM-MZ017-VE-INC-131	100%	Adecuacion	$5.746.289,90	$5.746.289,90	13/11/2022	TERMINADA	18/11/2022	24/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	261	B-C-SM-MZ016-VE-INC-133	100%	Adecuacion	$6.646.756,60	$6.646.756,60	13/11/2022	TERMINADA	18/11/2022	24/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	262	B-C-SM-MZ-VE23-INC-138	100%	Adecuacion	$5.369.396,54	$5.369.396,54	13/11/2022	TERMINADA	18/11/2022	24/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	263	B-C-SM-MZ86-VE-INC-151	100%	Adecuacion	$6.730.435,17	$6.730.435,17	14/11/2022	TERMINADA	19/11/2022	25/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	264	B-C-SM-MZ105-VE-INC-197	100%	Adecuacion	$4.158.209,45	$4.158.209,45	14/11/2022	TERMINADA	19/11/2022	25/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	265	B-C-SM-MZ94-VE-INC-213	100%	Adecuacion	$4.022.013,54	$4.022.013,54	14/11/2022	TERMINADA	19/11/2022	25/11/2022	5	11	-6		x
SM	21	266	B-C-SM-MZ93-VE-INC-163	100%	Adecuacion	$7.300.892,28	$7.300.892,28	15/11/2022	TERMINADA	20/11/2022	26/11/2022	5	11	-6		x
SM	21	267	B-C-SM-MZ59-VE-207	100%	Adecuacion	$6.020.072,11	$6.020.072,11	15/11/2022	TERMINADA	20/11/2022	26/11/2022	5	11	-6		x
SM	21	268	B-C-SM-MZ48-VE-INC-134	100%	Adecuacion	$5.219.825,26	$5.219.825,26	15/11/2022	TERMINADA	20/11/2022	26/11/2022	5	11	-6		x
SM	21	269	B-C-SM-MZ49-VE-INC-137	100%	Adecuacion	$4.246.004,15	$4.246.004,15	16/11/2022	TERMINADA	21/11/2022	27/11/2022	5	11	-6		x
SM	21	270	B-C-SM-MZ93-VE-INC-175	100%	Adecuacion	$6.751.782,32	$6.751.782,32	16/11/2022	TERMINADA	21/11/2022	27/11/2022	5	11	-6		x
SM	21	271	B-C-SM-MZ106-VE-INC-184	100%	Adecuacion	$6.935.558,95	$6.935.558,95	16/11/2022	TERMINADA	21/11/2022	27/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	272	B-C-SM-MZ68-VE-INC-084	100%	Caseta T3	$8.320.404,99	$8.320.404,99	17/11/2022	TERMINADA	25/11/2022	1/12/2022	8	14	-6		x
SM	20	273	B-C-SM-MZ49-VE-INC-127	100%	Caseta T4	$8.531.015,62	$8.531.015,62	17/11/2022	TERMINADA	25/11/2022	1/12/2022	8	14	-6		x
SM	20	274	B-C-SM-MZ93-VE-INC-164	100%	Caseta T3	$9.236.090,18	$9.236.090,18	18/11/2022	TERMINADA	26/11/2022	2/12/2022	8	14	-6		x
SM	21	275	B-C-SM-MZ69-VE-176	100%	Caseta T3	$4.778.954,24	$4.778.954,24	18/11/2022	TERMINADA	26/11/2022	2/12/2022	8	14	-6		x
SM	21	276	B-C-SM-MZ58-VE-177	100%	Adecuacion	$3.411.187,99	$3.411.187,99	19/11/2022	TERMINADA	24/11/2022	30/11/2022	5	11	-6		x
SM	21	277	B-C-SM-MZ70-VE-INC-054	100%	Adecuacion	$6.466.021,02	$6.466.021,02	19/11/2022	TERMINADA	24/11/2022	30/11/2022	5	11	-6		x
SM	21	278	B-C-SM-MZ38-VE-INC-061	100%	Adecuacion	$7.016.743,60	$7.016.743,60	20/11/2022	TERMINADA	25/11/2022	1/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	279	B-C-SM-MZ32-VE-INC-076	100%	Adecuacion	$6.334.029,19	$6.334.029,19	20/11/2022	TERMINADA	25/11/2022	1/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	280	B-C-SM-MZ48-VE-INC-119	100%	Adecuacion	$6.874.221,12	$6.874.221,12	21/11/2022	TERMINADA	26/11/2022	2/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	281	B-C-SM-MZ56-VE-INC-120	100%	Adecuacion	$6.903.872,09	$6.903.872,09	21/11/2022	TERMINADA	26/11/2022	2/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	282	B-C-SM-MZ48-VE-INC-183	100%	Adecuacion	$7.023.620,46	$7.023.620,46	21/11/2022	TERMINADA	26/11/2022	2/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	283	B-C-SM-MZ38-VE-INC-078	100%	Adecuacion	$3.367.297,55	$3.367.297,55	22/11/2022	TERMINADA	27/11/2022	3/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	284	B-C-SM-MZ41-VE-INC-081	100%	Adecuacion	$4.759.043,39	$4.759.043,39	22/11/2022	TERMINADA	27/11/2022	3/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	285	B-C-SM-MZ96-VE-INC-177	100%	Adecuacion	$4.353.379,09	$4.353.379,09	23/11/2022	TERMINADA	28/11/2022	4/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	286	B-C-SM-MZ58-VE-INC-111	100%	Adecuacion	$3.025.651,65	$3.025.651,65	23/11/2022	TERMINADA	28/11/2022	4/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	287	B-C-SM-MZ36-VE-INC-126	100%	Adecuacion	$7.357.844,70	$7.357.844,70	23/11/2022	TERMINADA	28/11/2022	4/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	288	B-C-SM-MZ23-VE-INC-128	100%	Adecuacion	$6.248.480,68	$6.248.480,68	24/11/2022	TERMINADA	29/11/2022	5/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	289	B-C-SM-MZ97-VE-INC-179	100%	Adecuacion	$7.384.917,39	$7.384.917,39	24/11/2022	TERMINADA	29/11/2022	5/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	290	B-C-SM-MZ96-VE-INC-187	100%	Adecuacion	$7.709.795,70	$7.709.795,70	24/11/2022	TERMINADA	29/11/2022	5/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	291	B-C-SM-MZ96-VE-INC-188	100%	Adecuacion	$6.302.033,86	$6.302.033,86	25/11/2022	TERMINADA	30/11/2022	6/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	292	B-C-SM-MZ98-VE-INC-189	100%	Adecuacion	$8.233.353,74	$8.233.353,74	25/11/2022	TERMINADA	30/11/2022	6/12/2022	5	11	-6		x

SM	21	293	B-C-SM-MZ48-VE-INC-096	100%	Adecuacion	$6.859.171,05	$6.859.171,05	25/11/2022	TERMINADA	30/11/2022	6/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	294	B-C-SM-MZ24-VE-INC-098	100%	Caseta T1	$8.682.895,90	$8.682.895,90	26/11/2022	TERMINADA	4/12/2022	10/12/2022	8	14	-6		x
SM	21	295	B-C-SM-MZ38-VE-INC-104	100%	Adecuacion	$4.515.305,50	$4.515.305,50	26/11/2022	TERMINADA	1/12/2022	7/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	296	B-C-SM-MZ94-VE-INC-132	100%	Adecuacion	$6.493.545,21	$6.493.545,21	26/11/2022	TERMINADA	1/12/2022	7/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	297	B-C-SM-MZ91-VE-INC-090	100%	Caseta T3	$9.400.048,37	$9.400.048,37	27/11/2022	TERMINADA	5/12/2022	11/12/2022	8	14	-6		x
SM	21	298	B-C-SM-MZ87-VE-INC-092	100%	Caseta T3	$8.024.497,65	$8.024.497,65	27/11/2022	TERMINADA	5/12/2022	11/12/2022	8	14	-6		x
SM	21	299	B-C-SM-MZ59-VE-INC-100	100%	Adecuacion	$4.665.073,76	$4.665.073,76	28/11/2022	TERMINADA	7/12/2022	13/12/2022	9	15	-6		x
SM	21	300	B-C-SM-MZ17-VE-INC-106	85%	Adecuacion	$8.299.427,57	$7.054.513,43	28/11/2022	EN EJECUCION	8/12/2022	14/12/2022	10	16	-6		x
SM	21	301	B-C-SM-MZ69-VE-INC-112	85%	Adecuacion	$6.081.041,12	$5.168.884,95	28/11/2022	EN EJECUCION	9/12/2022	15/12/2022	11	17	-6		x
SM	21	302	B-C-SM-MZ97-VE-INC-114	85%	Caseta T3	$7.563.464,48	$6.428.944,81	29/11/2022	EN EJECUCION	11/12/2022	17/12/2022	12	18	-6		x
SM	21	303	B-C-SM-MZ36-VE-INC-121	85%	Adecuacion	$3.440.319,57	$2.924.271,63	29/11/2022	EN EJECUCION	12/12/2022	18/12/2022	13	19	-6		x
SM	21	304	B-C-SM-MZ36-VE-INC-122	85%	Adecuacion	$3.508.566,53	$2.982.281,55	29/11/2022	EN EJECUCION	13/12/2022	19/12/2022	14	20	-6		x
SM	21	305	B-C-SM-MZ78-VE-INC-139	85%	Adecuacion	$6.324.599,62	$5.375.909,68	30/11/2022	EN EJECUCION	15/12/2022	21/12/2022	15	21	-6		x
SM	21	306	B-C-SM-MZ78-VE-INC-142	85%	Adecuacion	$5.885.758,44	$5.002.894,67	30/11/2022	EN EJECUCION	16/12/2022	22/12/2022	16	22	-6		x
SM	21	307	B-C-SM-MZ59-VE-INC-143	85%	Caseta T3	$8.167.825,19	$6.942.651,41	30/11/2022	EN EJECUCION	17/12/2022	23/12/2022	17	23	-6		x
SM	21	308	B-C-SM-MZ60-VE-INC-144	85%	Adecuacion	$6.230.549,90	$5.295.967,42	1/12/2022	EN EJECUCION	19/12/2022	25/12/2022	18	24	-6		x
SM	21	309	B-C-SM-MZ48-VE-INC-146	85%	Adecuacion	$4.395.472,81	$3.736.151,89	1/12/2022	EN EJECUCION	20/12/2022	26/12/2022	19	25	-6		x
SM	21	310	B-C-SM-MZ86-VE-INC-154	85%	Caseta T3	$7.973.180,18	$6.777.203,15	1/12/2022	EN EJECUCION	21/12/2022	27/12/2022	20	26	-6		x
SM	21	311	B-C-SM-MZ38-VE-INC-160	85%	Adecuacion	$4.623.473,63	$3.929.952,59	2/12/2022	EN EJECUCION	23/12/2022	29/12/2022	21	27	-6		x
SM	21	312	B-C-SM-MZ98-VE-INC-174	85%	Caseta T3	$7.972.082,02	$6.776.269,72	2/12/2022	EN EJECUCION	24/12/2022	30/12/2022	22	28	-6		x
SM	21	313	B-C-SM-MZ103-VE-INC-178	85%	Adecuacion	$4.799.097,62	$4.079.232,98	2/12/2022	EN EJECUCION	25/12/2022	31/12/2022	23	29	-6		x
SM	21	314	B-C-SM-MZ101-VE-INC-190	85%	Caseta T3	$10.025.465,77	$8.521.645,90	3/12/2022	EN EJECUCION	27/12/2022	2/01/2023	24	30	-6		x
SM	21	315	B-C-SM-MZ102-VE-INC-191	75%	Adecuacion	$5.905.162,68	$4.428.872,01	3/12/2022	EN EJECUCION	28/12/2022	3/01/2023	25	31	-6		x
SM	21	316	B-C-SM-MZ98-VE-INC-192	75%	Caseta T3	$6.949.279,75	$5.211.959,81	3/12/2022	EN EJECUCION	29/12/2022	4/01/2023	26	32	-6		x
SM	21	317	B-C-SM-MZ96-VE-INC-193	75%	Adecuacion	$6.903.465,94	$5.177.599,46	4/12/2022	EN EJECUCION	31/12/2022	6/01/2023	27	33	-6		x
SM	21	318	B-C-SM-MZ95-VE-INC-185	75%	Adecuacion	$3.769.208,51	$2.826.906,38	4/12/2022	EN EJECUCION	1/01/2023	7/01/2023	28	34	-6		x
SM	20	319	B-C-SM-MZ33-VE-INC-094	75%	Adecuacion	$6.352.965,97	$4.764.724,48	5/12/2022	EN EJECUCION	3/01/2023	9/01/2023	29	35	-6		x
SM	20	320	B-C-SM-MZ48-VE-INC-124	65%	Caseta T3	$7.905.569,70	$5.138.620,31	5/12/2022	EN EJECUCION	4/01/2023	10/01/2023	30	36	-6		x
SM	20	321	B-C-SM-MZ84-VE-INC-125	65%	Caseta T3	$9.115.960,01	$5.925.374,01	5/12/2022	EN EJECUCION	5/01/2023	11/01/2023	31	37	-6		x
SM	20	322	B-C-SM-MZ70-VE-INC-141	65%	Caseta T3	$8.210.724,19	$5.336.970,72	5/12/2022	EN EJECUCION	6/01/2023	12/01/2023	32	38	-6		x
SM	20	323	B-C-SM-MZ86-VE-INC-148	65%	Caseta T3	$8.267.285,91	$5.373.735,84	5/12/2022	EN EJECUCION	7/01/2023	13/01/2023	33	39	-6		x
SM	20	324	B-C-SM-MZ86-VE-INC-152	65%	Adecuacion	$5.686.744,56	$3.696.383,96	6/12/2022	EN EJECUCION	9/01/2023	15/01/2023	34	40	-6		x
SM	20	325	B-C-SM-MZ86-VE-INC-153	65%	Caseta T3	$7.942.989,18	$5.162.942,97	6/12/2022	EN EJECUCION	10/01/2023	16/01/2023	35	41	-6		x
SM	20	326	B-C-SM-MZ48-VE-INC-182	65%	Caseta T3	$8.743.515,52	$5.683.285,09	6/12/2022	EN EJECUCION	11/01/2023	17/01/2023	36	42	-6		x
SM	21	327	B-C-SM-MZ102-VE-INC-105	65%	Caseta T3	$7.620.116,73	$4.953.075,87	7/12/2022	EN EJECUCION	13/01/2023	19/01/2023	37	43	-6		x
SM	21	328	B-C-SM-MZ76-VE-INC-110	65%	Adecuacion	$3.661.130,40	$2.379.734,76	7/12/2022	EN EJECUCION	14/01/2023	20/01/2023	38	44	-6		x
SM	21	329	B-C-SM-MZ21VE-INC-116	55%	Caseta T3	$9.762.419,29	$5.369.330,61	7/12/2022	EN EJECUCION	15/01/2023	21/01/2023	39	45	-6		x
SM	21	330	B-C-SM-MZ103VE-INC-135	55%	Adecuacion	$6.796.538,06	$3.738.095,93	7/12/2022	EN EJECUCION	16/01/2023	22/01/2023	40	46	-6		x
SM	21	331	B-C-SM-MZ104VE-INC-176	55%	Caseta T3	$9.771.011,16	$5.374.056,14	8/12/2022	EN EJECUCION	18/01/2023	24/01/2023	41	47	-6		x
SM	21	332	B-C-SM-MZ101VE-INC-180	55%	Adecuacion	$5.670.027,72	$3.118.515,25	8/12/2022	EN EJECUCION	19/01/2023	25/01/2023	42	48	-6		x
SM	21	333	B-C-SM-MZ98VE-INC-181	55%	Adecuacion	$6.221.221,23	$3.421.671,68	8/12/2022	EN EJECUCION	20/01/2023	26/01/2023	43	49	-6		x
SM	21	334	B-C-SM-MZ93VE-INC-201	55%	Adecuacion	$5.137.794,12	$2.825.786,77	8/12/2022	EN EJECUCION	21/01/2023	27/01/2023	44	50	-6		x
SM	21	335	B-C-SM-MZ85-VE-INC-117	55%	Adecuacion	$7.447.189,73	$4.095.954,35	8/12/2022	EN EJECUCION	22/01/2023	28/01/2023	45	51	-6		x
SM	21	336	B-C-SM-MZ-VE-INC-217	55%	Adecuacion	$5.439.062,10	$2.991.484,16	8/12/2022	EN EJECUCION	23/01/2023	29/01/2023	46	52	-6		x
SM	9	337	B-C-SM-MZ56-VE-192	100%	Adecuacion	$2.924.848,88	$2.924.848,88	5/12/2022	TERMINADA	21/01/2023	27/01/2023	47	53	-6		x
SM	13	338	B-C-SM-MZ33-VE-193	100%	Caseta T3	$8.081.818,61	$8.081.818,61	5/12/2022	TERMINADA	22/01/2023	28/01/2023	48	54	-6		x
SM	10	339	B-C-SM-MZ33-VE-194	100%	Adecuacion	$7.097.058,66	$7.097.058,66	5/12/2022	TERMINADA	23/01/2023	29/01/2023	49	55	-6		x
SM	10	340	B-C-SM-MZ33-VE-195	100%	Adecuacion	$5.575.323,63	$5.575.323,63	5/12/2022	TERMINADA	24/01/2023	30/01/2023	50	56	-6		x
SM	11	341	B-C-SM-MZ33-VE-196	100%	Adecuacion	$8.337.864,77	$8.337.864,77	5/12/2022	TERMINADA	25/01/2023	31/01/2023	51	57	-6		x
SM	10	342	B-C-SM-MZ41-VE-197	100%	Adecuacion	$8.310.190,06	$8.310.190,06	5/12/2022	TERMINADA	26/01/2023	1/02/2023	52	58	-6		x
SM	18	343	B-C-SM-MZ77-VE-INC-047	30%	Caseta T2	$8.221.884,89	$2.466.565,47	8/12/2022	EN EJECUCION	30/01/2023	5/02/2023	53	59	-6		x
SM	18	344	B-C-SM-MZ58-VE-INC-082	30%	Adecuacion	$5.382.315,64	$1.614.694,69	9/12/2022	EN EJECUCION	1/02/2023	7/02/2023	54	60	-6		x
SM	18	345	B-C-SM-MZ58-VE-INC-083	30%	Caseta T3	$5.087.054,31	$1.526.116,29	9/12/2022	EN EJECUCION	2/02/2023	8/02/2023	55	61	-6		x

CUADRO DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMAS Y EJECUTADAS

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total		Terminaciones Esperadas Periodo	Terminaciones Acumuladas Esperadas	Terminaciones Esperadas Periodo	Terminaciones Ejecutadas Periodo	Terminaciones Ejecutadas Acumuladas	valor ejec
		$ 5.140.026,35		$ 58.879.439,91			$ 2.590.013.153,73			$ -		$ 2.654.032.619,99							
										$ -		$ -							
		$ 5.140.026,35		$ 58.879.439,91			$ 2.590.013.153,73			$ -		$ 2.654.032.619,99							
1/03/2022	Semana 1	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	0,00%	$ -						
8/03/2022	Semana 2	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	0,10%	$ 2.570.013,18		0	0			
15/03/2022	Semana 3	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	0,19%	$ 5.140.026,35		0	0			
22/03/2022	Semana 4	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	0,19%	$ 5.140.026,35		0	0			
29/05/2022	Semana 5	100,00%	$ 5.140.026,35	7,38%	24	$ 4.348.020,18	0,00%	3	$ 22.883.102,57		$ -	1,22%	$ 32.371.149,10	101		0	0	-	-
5/06/2022	Semana 6	100,00%	$ 5.140.026,35	9,23%	30	$ 5.435.025,22	0,87%	6	$ 45.766.205,14		$ -	2,13%	$ 56.341.256,71	20	5	3	0		
12/06/2022	Semana 7	100,00%	$ 5.140.026,35	12,92%	42	$ 7.609.035,31	1,74%	10	$ 76.777.008,56		$ -	3,35%	$ 89.026.070,22	40	12	6	0		
19/06/2022	Semana 8	100,00%	$ 5.140.026,35	15,69%	51	$ 9.239.542,88	2,90%	14	$ 106.787.811,98		$ -	4,57%	$ 121.167.381,21	90	23	10	0		
26/06/2022	Semana 9	100,00%	$ 5.140.026,35	21,85%	71	$ 12.862.893,03	4,06%	18	$ 137.298.615,41		$ -	5,85%	$ 155.301.534,79	150	25	14	0		
3/07/2022	Semana 10	100,00%	$ 5.140.026,35	28,92%	94	$ 17.029.745,70	5,22%	22	$ 167.809.418,83		$ -	7,16%	$ 189.979.190,88	230	18	18	0		
10/07/2022	Semana 11	100,00%	$ 5.140.026,35	35,38%	115	$ 20.834.263,35	6,38%	26	$ 198.320.222,25		$ -	8,45%	$ 224.294.511,96	280	20	22	0		
17/07/2022	Semana 12	100,00%	$ 5.140.026,35	43,38%	141	$ 25.544.618,55	7,54%	30	$ 228.831.025,68		$ -	9,78%	$ 259.515.670,57	330	20	26	0		
24/07/2022	Semana 13	100,00%	$ 5.140.026,35	43,38%	141	$ 25.544.618,55	8,70%	45	$ 343.246.538,51		$ -	14,09%	$ 373.931.183,41	430	10	30	0		
31/07/2022	Semana 14	100,00%	$ 5.140.026,35	49,23%	160	$ 28.986.801,19	13,04%	48	$ 366.129.641,08		$ -	15,08%	$ 400.256.468,62	500	12	45	0		
7/08/2022	Semana 15	100,00%	$ 5.140.026,35	52,31%	170	$ 30.798.476,26	13,91%	60	$ 457.662.051,35		$ -	18,60%	$ 493.600.553,96	630	30	48	0		
14/08/2022	Semana 16	100,00%	$ 5.140.026,35	55,08%	179	$ 32.428.983,83	17,39%	66	$ 503.428.256,49		$ -	20,38%	$ 540.997.266,67	708	35	60	0		
21/08/2022	Semana 17	100,00%	$ 5.140.026,35	62,46%	203	$ 36.777.004,01	19,13%	80	$ 610.216.068,47		$ -	24,57%	$ 652.133.098,83	740	30	66	0		
28/08/2022	Semana 18	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	23,19%	91	$ 694.120.777,88		$ -	27,83%	$ 738.574.153,34	784	30	80	0		
4/09/2022	Semana 19	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	26,38%	101	$ 770.397.786,44		$ -	30,70%	$ 814.851.161,90	784	32	91	0		
11/09/2022	Semana 20	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	29,28%	116	$ 884.813.299,28		$ -	35,01%	$ 929.266.574,74	784	41	101	0		
18/09/2022	Semana 21	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	33,62%	137	$ 1.044.995.017,25		$ -	41,05%	$ 1.089.468.392,71	784	41	116	0		
25/09/2022	Semana 22	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	39,71%	149	$ 1.136.527.427,52		$ -	44,50%	$ 1.180.980.802,98	784	33	137	0		
2/10/2022	Semana 23	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	43,19%	160	$ 1.220.432.136,94		$ -	47,66%	$ 1.264.885.512,40	784	42	149	0		
9/10/2022	Semana 24	100,00%	$ 5.140.026,35	72,92%	237	$ 42.936.699,26	46,38%	174	$ 1.308.267.503,62		$ -	51,03%	$ 1.354.344.229,23	784	42	160	0		
16/10/2022	Semana 25	100,00%	$ 5.140.026,35	78,77%	256	$ 46.378.880,00	50,43%	185	$ 1.349.246.419,91		$ -	52,78%	$ 1.400.765.326,26	708	35	174	0		
23/10/2022	Semana 26	100,00%	$ 5.140.026,35	88,00%	286	$ 51.813.905,00	53,62%	191	$ 1.404.101.290,40		$ -	55,05%	$ 1.461.055.221,75	740	30	185	0		
30/10/2022	Semana 27	100,00%	$ 5.140.026,35	88,00%	286	$ 51.813.906,00	55,36%	199	$ 1.466.420.769,84		$ -	57,40%	$ 1.523.374.702,19	784	30	191	0		
6/11/2022	Semana 28	100,00%	$ 5.140.026,35	88,00%	286	$ 51.813.906,00	57,68%	207	$ 1.529.330.565,92		$ -	59,77%	$ 1.586.284.498,27	708	32	199	0		
13/11/2022	Semana 29	100,00%	$ 5.140.026,35	88,00%	286	$ 51.813.906,00	60,00%	225	$ 1.658.836.495,44		$ -	64,65%	$ 1.715.795.427,79	784	41	207	0		
20/11/2022	Semana 30	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	65,22%	240	$ 1.948.789.254,20		$ -	75,84%	$ 2.012.809.720,46	784	41	225	0		
27/11/2022	Semana 31	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	69,57%	262	$ 1.906.233.521,78		$ -	74,24%	$ 1.970.252.908,04	784	33	240	0		
4/12/2022	Semana 32	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	75,94%	283	$ 2.159.091.564,70		$ -	83,78%	$ 2.223.111.030,96	784	42	262	0		
11/12/2022	Semana 33	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	82,03%	304	$ 2.167.008.298,49		$ -	84,06%	$ 2.231.027.764,75	784	44	283	0		
18/12/2022	Semana 34	100,00%	$ 5.140.026,35	93,50%		$ 58.879.439,91	93,50%				$ -	2,41%	$ 64.019.466,26	784	44	345	0		
22/12/2022	Semana 35	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%		$ 58.879.439,91	100,00%				$ -	2,41%	$ 64.019.466,26	784	44	369	0		

TOTAL DIAGNOSTICOS APROBADOS **345**

TOTAL INTERVENCIONES TERMINADAS **304**

$ 2.223.111.030,96

$ -

PERSONAL DE OBRA

REPORTE DE PERSONAL DE MANO DE OBRA - 11-12-22			
No. DE LA CUADRILLA	**No. DE MAETROS**	**No. DE AYUDANTES U OFICIALES**	**No. INTERVENCIONES A CARGO**
1	1	1	2
2	1	1	2
3	1	1	2
4	1	1	2
5	1	1	2
6	1	1	2
7	1	1	2
8	1	1	2
9	1	1	2
10	1	1	2
11	1	1	2
12	1	1	1
13	1	1	1
14	1	1	1
15	1	1	1
16	1	1	1
17	1	1	1
18	1	1	1
19	1	1	1
20	1	1	1
21	1	1	1
22	1	1	1
23	1	1	1
24	1	1	1
25	1	1	1
26	1	1	1
27	1	1	1
28	1	1	1
29	1	1	1
30	1	1	1
31	1	1	1
32	1	1	1
TOTAL	**32**	**32**	**43**

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 30/12/2022
HORA: 3:19:13 p. m.
20224300506912

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 30 de diciembre de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-139-22

Señores:
Ingeniera
Erika Marcela Gutiérrez
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: ENTREGA INFORME SEMANAL No 33

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal No. 33 cuyo periodo es del 05 de diciembre del 2022 hasta 11 de diciembre del 2022.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 23 folios
Proyectó: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría.

INFORME SEMANAL 33

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 33	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 33

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **5/12/2022** al **11/12/2022** | Fecha **11/12/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** BOLÍVAR **MUNICIPIO** CÓRDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO
SUPERVISOR	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN ACTIVIDAD 3

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.			2220576
Contratista			CONSORCIO CONSTRUREDES
Valor inicial	$		1.771.707.945,99
Valor actual	$		2.654.032.619,99
Variación del valor	$		882.324.674,00
Fecha de Inicio			26/04/2022
Plazo inicial (Días)			150 Días
Plazo actual (Días)	240 Días		8 MESES - 240 DÍAS
Variación en plazo			90 Días
Fecha Contractual de terminación			22/12/2022
Tiempo Transcurrido (días)	229		95,42%
Días remanentes del Contrato	11,00		4,58%
Acumulado a última acta pagada	$		821.329.766,06
Estimado ejecutado por llevar a acta	$		322.624.898,30

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.			2220587
Interventor			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.
Valor inicial	$		202.479.313,00
Valor actual	$		313.315.624,00
Variación del valor	$		110.836.311,00
Fecha de Inicio			26/04/2022
Plazo inicial			150 Días
Plazo actual	240 Días		8 MESES - 240 DÍAS
Variación en plazo			90 Días
Fecha Contractual de terminación			22/12/2022
Ejecución del Contrato	229		95,42%
Días remanentes del Contrato	11,00		4,58%
Acumulado a última acta pagada	$		132.623.950,03
Estimado ejecutado por llevar a acta	$		36.604.468,31

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 2.654.032.619,99

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 2.310.101.333,99	87,04%	$ 2.287.130.497,22	86,18%	-$ 22.970.836,77	-0,87%
Durante el Periodo	$ 175.475.145,92	6,61%	$ 129.886.840,64	4,89%	-$ 45.588.305,28	-1,72%
Acumulado a la Fecha	**$ 2.485.576.479,91**	**93,65%**	**$ 2.417.017.337,87**	**91,07%**	**-$ 68.559.142,04**	**-2,58%**


Desviación en días: **4 Días**




Observaciones al desempeño del proyecto

A la fecha de corte del presente informe tenemos el siguiente reporte:
El día 9 de diciembre se formalizó la prórroga solicitada por el Contratista por los 11 días calendario, con base en este nuevo plazo los avances reportados son:
En cuanto a la actividad 2 el contratista cumplió con los 345 diagnósticos aprobados los cuales corresponden a la cifra contractual, sin embargo, cabe mencionar que de acuerdo a las condiciones del contrato se deben realizar más diagnósticos hasta agotar el monto total designado, los cuales serán entregados en la siguiente semana. Actividad en la cual se le ha solicitado celeridad al contratista.
El avance de la actividad 3 nos indica las siguientes cifras: un programado del 93,50% frente a un ejecutado del 90,85% lo cual representa un atraso de 2,65% Este atraso corresponde a 41 viviendas dado que el programado es de 345, a la fecha se han intervenido 345 viviendas, de las cuales se han terminado 304 y se adelantan labores constructivas en 41 más, cabe mencionar que a parte de estas 41 en ejecución están pendientes por iniciar alrededor de 20 mas para agotar el monto remanente asignado en el contrato.
El atraso general del proyecto equivale al 2,58%, En la última semana el atraso tubo una disminución importante con base en el reporte anterior, esto debido a la ampliación del plazo contractual en 11 días calendario, se espera que para la siguiente semana el contratista de inicio a las viviendas requeridad para agotar el monto contractual.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

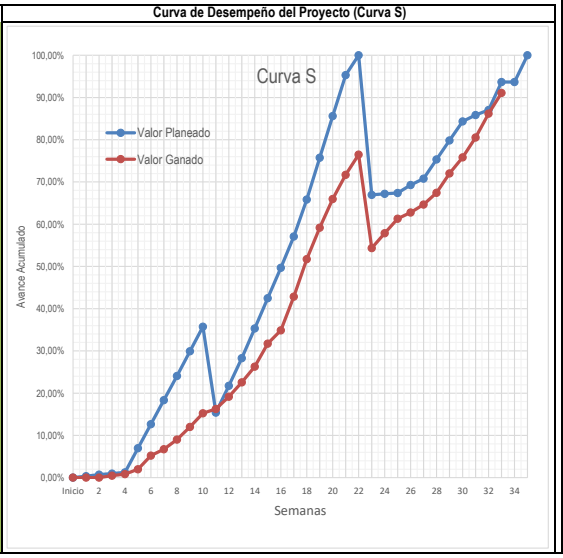

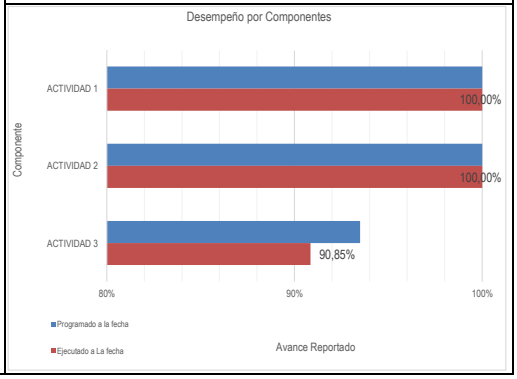


CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

A la fecha del presente informe no se han presntado cambios en la LINEA BASE.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado %	Ejecutado %	Desviación %	Semáforo
Acumulado Anterior	87,04%	86,18%	-0,86%	
Durante el Periodo	6,61%	4,89%	-1,72%	
Acumulado a la Fecha	**93,65%**	**91,07%**	**-2,58%**	

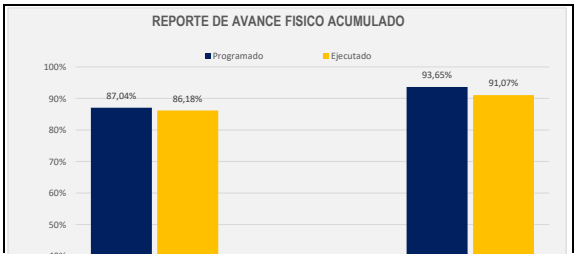


AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 2.654.032.619,99	$ 882.324.674,00	$ 345.450.914,11		$ 345.450.914,11

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
5	$ 1.854.451.044,19	69,87%	4	$ 1.450.337.244,76	54,65%	1/12/2022	$ 322.624.898,30







AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 313.315.624,00	$ 110.836.311,00			$ -

No. Pagos	Valor Pagos tramitados	No. Pagos	Valor Pagos realizados	Fecha última acta	Valor última Acta


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 33


Entidad Contratante: **ENTERRITORIO**

Semana del **5/12/2022** al **11/12/2022**


Fecha **11/12/2022**

tramitados	Valor en Pesos	%	realizados	Valor en Pesos	%	pagada	pagada
7	$ 204.749.622,33	65,35%	5	$ 132.623.950,03	42,33%	31/10/2022	$ 44.545.448,87









OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 33

Entidad Contratante: ENTERRITORIO | Semana del 5/12/2022 al 11/12/2022 | Fecha 11/12/2022

ACTIVIDAD No. 1
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: A la fecha de corte del 15 de noviembre el contratista cumplió con 345 diagnósticos aprobados en actas, la interventoría dio aval a los últimos 60 diagnósticos mediante comité de aprobación No. 21, queda pendiente la inclusión de varias viviendas de acuerdo al remanente que quede correspondiente al monto agotable.
ACTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 93,50% vs 90,85% EJECUTADO
Lo cual nos indica un atraso del 2,65%
En cuanto a la actividad 3 y conforme a las nuevas condiciones del contrato la meta es de 345 viviendas, a la fecha se han intervenido 345 viviendas, de las cuales se han terminado 304 y se adelantan labores constructivas en 41 más(Quedando pendientes alrededor de 20 intervenciones mas para agotar el monto asignado), el contratista cuenta con 14 frentes de trabajo vinculados directamente por el Contratista y otros frentes que están contratados como independientes.
El atraso general del proyecto equivale al 2,58%, En la última semana el atraso tubo una disminución importante con base en el reporte anterior, esto debido a la ampliación del plazo contractual en 11 días calendario, se espera que para la siguiente semana el contratista de inicio a las viviendas requeridad para agotar el monto contractual.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. El contratista subsanó los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizó entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución. Sin embargo, el Contratista posteriormente solicitó un cambio de especificaciones en algunos ítems, uno de ellos el ladrillo de arcilla por bloque de Concreto, razón por la cual se hace necesario ajustar el diseño estructural con dicho cambio. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. A corte del 15 de noviembre se aprobaron 60 diagnósticos correspondientes a los 108 de la adición, con lo cual completan 345 diagnósticos aprobados, cabe mencionar que de acuerdo a las condiciones del contrato se deben realizar más diagnósticos hasta agotar el monto total designado.
En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
Con corte al 11 de diciembre se han intervenido 345 viviendas de las cuales 304 están terminadas, El contratista tiene en ejecución 41 intervenciones y debe continuar incrementando el personal de obra con el fin de mejorar los rendimientos en la ejecución de las obras y poder finalizar este grupo de viviendas programadas y concentrar los esfuerzos en las intervenciones pendientes.
En la ejecución de las casetas y adecuaciones se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 14 frentes de trabajo contratados directamente por el Consorcio Construredes y otras cuadrillas contratadas por subcontratistas.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la próxima semana correspondiente al periodo del 12 al 18 de diciembre de 2022 el contratista debe completar la cantidad de 345 intervenciones terminadas y continuar con la ejecución de obra de las intervenciones que se aprueben con los remanentes del monto agotable, con la mayor celeridad posible y con el fin de poder alcanzar mayores rendimientos, además de determinar el número de viviendas a intervenir y la ejecución de las mismas que se requieren para agotar todo el monto del contrato.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0

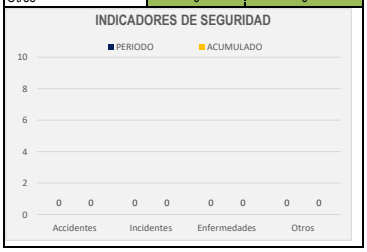

Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	74	0	74	100,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**74**	**0**	**74**	**100,00%**



OBSERVACIONES

En el presente periodo presentaron no sepresentaron precipitaciones.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 33

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **5/12/2022** al **11/12/2022** Fecha **11/12/2022**

GESTIÓN SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	N/A					Por Definir

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
N/A			N/A	

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









CASETAS O ADECUACIONES, SE APRECIA AVANCE EN EL PANETE DE MAMPOSTERIA, FUNDICION DE VIGAS Y COLUMNAS.









INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 33

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **5/12/2022** al **11/12/2022** Fecha **11/12/2022**

ADECUACIONES DE UNIDADES SANITARIAS, SE APRECIA INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, LAVAPLATOS Y LAVADEROS









CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 33

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **5/12/2022** al **11/12/2022** Fecha **11/12/2022**

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-092-22 con el asunto: Remisión de informe con registro fotográfico subsanación informe de Inspección de viviendas Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante el cual hacemos entrega del informe presentado por el Contratista de obra, en el cual se evidencia con registro fotográfico la atención a las observaciones realizadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio al proyecto en el Municipio de Córdoba Bolivar, el pasado 14 de Julio de 2022.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-093-22 con el asunto: RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_116 Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales realizamos entrega de aval para 60 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 21.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-094-22 con el asunto: SOLICITUD DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CIENTO UN (103) DIAGNÓSTICOS APROBADOS EN EL BARRIO SAN MARTIN por medio del cual solicitamos amablemente su gestión como la empresa prestadora del servicio público de acueducto y alcantarillado, COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CÓRDOBA BOLÍVAR - (COOSEPCOR LTDA), para la expedición del certificado de disponibilidad de redes y de autorización para la Intervención de conexión de las acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado para ciento un (103) diagnósticos en el Barrio San Martín.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-095-22 con el asunto: REITERACION SOLICITUD DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CIENTO NUEVE (109) DIAGNÓSTICOS APROBADOS EN EL BARRIO SAN MARTIN mediante del cual reiteramos la solicitud muy amablemente de su gestión como la empresa prestadora del servicio público de acueducto y alcantarillado, COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CÓRDOBA BOLÍVAR - (COOSEPCOR LTDA), para la expedición del certificado de disponibilidad de redes y de autorización para la Intervención de conexión de las acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado de ser necesario para ciento nueve (109) diagnósticos en el Barrio San Martín, esta solicitud ya fue realizada mediante el oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-094-22 con fecha del 16 de noviembre 2022.

	Marcy A. Correa C		Erika M Gutierrez G
Firma		**Firma**	
Nombre	Marcy Correa castaño	Nombre	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
	Directora de la interventoría	Supervisor	Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

Enviar Informe para validación

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO
ARCA-INT/FDA276-TEC-021	13-jun-22	SOLICITUD RESPUESTA AL CONCEPTO EMITIDO POR COOSEPCOR MEDIANTE ACTA DE REUNION DE OBRA	1	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	13-jun-22

INFORME PCI

Fecha de Corte	11/12/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																									
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES												TOTALES							
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldia	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldia	Respuesta positiva	Respuesta negativa	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	191	25	191	1	223	223	223	0	0	188	35	154	0	154	0	346	345	29	345	1	345	304	53	41	345
	TOTAL	**217**	**0**	**191**	**25**	**191**	**1**	**223**	**223**	**223**	**0**	**0**	**188**	**35**	**154**	**0**	**154**	**0**	**346**	**345**	**29**	**345**	**1**	**345**	**304**	**53**	**41**	**345**

INFORME ESTADO DE COVID-19

enterritorio	**INFORME ESTADO DE COVID - 19**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5/11/2022 Y EL 11/11/2022 PLAZO: 7.5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES — CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. — CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
M									

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
MARIELIS OCHOA - INSPECTORA	**MODERNA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Marcy A. Correa C

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPORTE Y EJECUCIÒN DE VIVIENDAS SEMANALES

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 11/12/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001	30%	Adecuacion	$7.967.801,13	$2.390.340,34	9/12/2022	EN EJECUCION	9/12/2022	14/12/2022	0	5	-5		x
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	100%	Caseta T3	$8.126.190,79	$8.126.190,79	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	100%	Caseta T3	$7.914.431,13	$7.914.431,13	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	20/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	100%	Adecuacion	$7.636.382,30	$7.636.382,30	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	100%	Adecuacion	$7.148.052,07	$7.148.052,07	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	12/06/2022	5	8	-3		x
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	100%	Adecuacion	$7.826.891,21	$7.826.891,21	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	100%	Adecuacion	$7.415.092,49	$7.415.092,49	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	14/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	8	B-C-SM-MZ22-VE-009	100%	Caseta T3	$7.908.010,60	$7.908.010,60	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	16/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	9	B-C-SM-MZ21-VE-010	100%	Caseta T3	$8.928.931,81	$8.928.931,81	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	10	B-C-SM-MZ22-VE-011	100%	Adecuacion	$8.088.174,13	$8.088.174,13	8/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	21/06/2022	5	13	-8		x
SM	1	11	B-C-SM-MZ34-VE-012	100%	Caseta T3	$9.305.276,37	$9.305.276,37	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	12	B-C-SM-MZ21-VE-013	100%	Adecuacion	$5.457.782,54	$5.457.782,54	2/06/2022	TERMINADA	7/06/2022	11/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-014	100%	Caseta T3	$8.614.149,98	$8.614.149,98	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	18/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-015	100%	Caseta T3	$8.265.079,43	$8.265.079,43	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-016	100%	Caseta T3	$9.299.320,83	$9.299.320,83	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	16	B-C-SM-MZ38-VE-017	100%	Caseta T3	$8.532.396,85	$8.532.396,85	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	2	17	B-C-SM-MZ24-VE-018	100%	Caseta T3	$8.502.042,22	$8.502.042,22	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	18	B-C-SM-MZ24-VE-019	100%	Adecuacion	$6.921.383,30	$6.921.383,30	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-020	100%	Adecuacion	$4.593.449,33	$4.593.449,33	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	5	13	-8		x
SM	2	20	B-C-SM-MZ85-VE-021	100%	Caseta T3	$8.614.688,02	$8.614.688,02	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	22/06/2022	8	17	-9		x
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-022	100%	Caseta T3	$8.896.124,14	$8.896.124,14	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	22	B-C-SM-MZ85-VE-023	100%	Adecuacion	$8.133.478,61	$8.133.478,61	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	23	B-C-SM-MZ29-VE-024	100%	Adecuacion	$7.072.986,22	$7.072.986,22	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	2	24	B-C-SM-MZ31-VE-025	100%	Caseta T3	$8.637.204,11	$8.637.204,11	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	25	B-C-SM-MZ31-VE-026	100%	Adecuacion	$5.113.367,92	$5.113.367,92	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	19/06/2022	5	14	-9		x
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-027	100%	Adecuacion	$4.365.339,96	$4.365.339,96	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	14/06/2022	5	9	-4		x
SM	2	27	B-C-SM-MZ31-VE-028	100%	Adecuacion	$7.668.943,15	$7.668.943,15	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	13/06/2022	5	8	-3		x
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-029	100%	Caseta T3	$8.468.136,75	$8.468.136,75	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	29	B-C-SM-MZ31-VE-030	100%	Adecuacion	$4.637.820,16	$4.637.820,16	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	5	11	-6		x
SM	10	30	B-C-SM-MZ31-VE-031	100%	Caseta T2	$8.119.008,44	$8.119.008,44	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	31	B-C-SM-MZ56-VE-038	100%	Adecuacion	$8.227.630,94	$8.227.630,94	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	32	B-C-SM-MZ56-VE-039	100%	Adecuacion	$1.443.687,77	$1.443.687,77	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	33	B-C-SM-MZ46-VE-040	100%	Adecuacion	$6.628.376,66	$6.628.376,66	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	34	B-C-SM-MZ45-VE-041	100%	Adecuacion	$4.845.221,48	$4.845.221,48	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	35	B-C-SM-MZ21-VE-042	100%	Adecuacion	$4.634.812,47	$4.634.812,47	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	36	B-C-SM-MZ31-VE-043	100%	Caseta T3	$6.939.713,07	$6.939.713,07	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	10	37	B-C-SM-MZ145-VE-044	100%	Caseta T3	$7.980.826,25	$7.980.826,25	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	38	B-C-SM-MZ55-VE-046	100%	Caseta T3	$7.344.533,10	$7.344.533,10	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	39	B-C-SM-MZ55-VE-047	100%	Caseta T2	$7.890.285,26	$7.890.285,26	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	5	40	B-C-SM-MZ145-VE-053	100%	Caseta T3	$8.262.443,76	$8.262.443,76	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	10	41	B-C-SM-MZ91-VE-054	100%	Caseta T2	$8.230.167,20	$8.230.167,20	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	42	B-C-SM-MZ56-VE-055	100%	Adecuacion	$3.160.157,78	$3.160.157,78	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	6	43	B-C-SM-MZ55-VE-056	100%	Adecuacion	$8.215.661,11	$8.215.661,11	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	6	44	B-C-SM-M55-VE-061	100%	Adecuacion	$7.040.722,29	$7.040.722,29	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	45	B-C-SM-MZ56-VE-062	100%	Caseta T2	$8.362.124,52	$8.362.124,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	46	B-C-SM-MZ66-VE-067	100%	Caseta T3	$7.306.146,52	$7.306.146,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	47	B-C-SM-MZ66-VE-068	100%	Caseta T3	$7.971.707,31	$7.971.707,31	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	48	B-C-SM-MZ75-VE-071	100%	Adecuacion	$7.170.024,86	$7.170.024,86	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	49	B-C-SM-MZ75-VE-072	100%	Caseta T3	$8.040.278,46	$8.040.278,46	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	50	B-C-SM-MZ75-VE-073	100%	Caseta T3	$8.332.036,11	$8.332.036,11	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	51	B-C-SM-MZ75-VE-074	100%	Caseta T3	$7.656.034,05	$7.656.034,05	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	52	B-C-SM-MZ89-VE-084	100%	Caseta T3	$8.247.304,21	$8.247.304,21	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	5	53	B-C-SM-MZ69-VE-087	100%	Adecuacion	$7.074.492,71	$7.074.492,71	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	54	B-C-SM-MZ69-VE-088	100%	Adecuacion	$7.465.862,82	$7.465.862,82	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	55	B-C-SM-MZ77-VE-094	100%	Adecuacion	$3.585.305,08	$3.585.305,08	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	56	B-C-SM-MZ68-VE-097	100%	Caseta T3	$8.172.428,90	$8.172.428,90	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	7	57	B-C-SM-MZ59-VE-099	100%	Adecuacion	$6.098.594,42	$6.098.594,42	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	58	B-C-SM-MZ84-VE-166	100%	Adecuacion	$6.744.749,39	$6.744.749,39	22/06/2022	TERMINADA	27/06/2022	3/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	59	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	23/06/2022	TERMINADA	28/06/2022	4/07/2022	5	11	-6		x
SM	8	60	B-C-SM-MZ55-VE-060	100%	Caseta T4	$9.444.985,92	$9.444.985,92	24/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	61	B-C-SM-MZ66-VE-069	100%	Adecuacion	$6.509.744,54	$6.509.744,54	25/06/2022	TERMINADA	30/06/2022	6/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	62	B-C-SM-MZ30-VE-032	100%	Adecuacion	$7.557.018,99	$7.557.018,99	26/06/2022	TERMINADA	1/07/2022	7/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	63	B-C-SM-MZ44-VE-034	100%	Adecuacion	$5.519.347,12	$5.519.347,12	27/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	64	B-C-SM-MZ44-VE-035	100%	Adecuacion	$8.137.626,09	$8.137.626,09	28/06/2022	TERMINADA	3/07/2022	9/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	65	B-C-SM-MZ69-VE-085	100%	Adecuacion	$6.566.494,56	$6.566.494,56	29/06/2022	TERMINADA	4/07/2022	10/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	66	B-C-SM-MZ58-VE-100	100%	Caseta T2	$7.970.674,94	$7.970.674,94	30/07/2022	TERMINADA	7/08/2022	13/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	67	B-C-SM-MZ47-VE-104	100%	Adecuacion	$8.247.586,36	$8.247.586,36	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	68	B-C-SM-MZ58-VE-107	100%	Adecuacion	$7.990.185,62	$7.990.185,62	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	69	B-C-SM-MZ58-VE-110	100%	Adecuacion	$6.954.066,54	$6.954.066,54	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	70	B-C-SM-MZ47-VE-111	100%	Caseta t3	$8.318.089,49	$8.318.089,49	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	71	B-C-SM-MZ47-VE-112	100%	Adecuacion	$6.827.279,63	$6.827.279,63	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	72	B-C-SM-MZ47-VE-113	100%	Adecuacion	$5.043.864,80	$5.043.864,80	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	73	B-C-SM-MZ47-VE-114	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	8	74	B-C-SM-MZ47-VE-115	100%	Caseta t3	$8.322.147,74	$8.322.147,74	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	75	B-C-SM-MZ21-VE-118	100%	Caseta t3	$8.148.709,57	$8.148.709,57	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	76	B-C-SM-MZ30-VE-121	100%	Caseta t3	$7.765.616,43	$7.765.616,43	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	77	B-C-SM-MZ59-VE-102	100%	Caseta T2	$8.805.748,18	$8.805.748,18	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	6	78	B-C-SM-MZ58-VE-101	100%	Adecuacion	$5.300.910,78	$5.300.910,78	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	79	B-C-SM-MZ30-VE-122	100%	Caseta t3	$8.106.560,85	$8.106.560,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	80	B-C-SM-MZ30-VE-124	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	81	B-C-SM-MZ87-VE-125	100%	Caseta t3	$8.100.577,85	$8.100.577,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	82	B-C-SM-MZ87-VE-126	100%	Caseta t3	$8.057.934,94	$8.057.934,94	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	83	B-C-SM-MZ30-VE-127	100%	Caseta t3	$7.998.497,33	$7.998.497,33	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	84	B-C-SM-MZ31-VE-142	100%	Adecuacion	$7.456.473,74	$7.456.473,74	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	9	85	B-C-SM-MZ87-VE-128	100%	Adecuacion	$7.523.102,18	$7.523.102,18	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	86	B-C-SM-MZ87-VE-129	100%	Caseta t3	$8.132.932,39	$8.132.932,39	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	5	87	B-C-SM-MZ66-VE-131	100%	Caseta t3	$8.139.325,77	$8.139.325,77	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	88	B-C-SM-MZ67-VE-133	100%	Adecuacion	$6.390.026,30	$6.390.026,30	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	89	B-C-SM-MZ66-VE-134	100%	Adecuacion	$8.426.367,54	$8.426.367,54	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	90	B-C-SM-MZ56-VE-135	100%	Adecuacion	$7.522.231,25	$7.522.231,25	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	91	B-C-SM-MZ56-VE-136	100%	Adecuacion	$7.922.709,35	$7.922.709,35	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	92	B-C-SM-MZ56-VE-138	100%	Adecuacion	$7.984.245,73	$7.984.245,73	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	93	B-C-SM-MZ56-VE-139	100%	Caseta t3	$7.415.285,53	$7.415.285,53	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x

SM	5	94	B-C-SM-MZ56-VE-140	100%	Caseta t3	$8.097.289,18	$8.097.289,18	11/08/2022	**TERMINADA**	**19/08/2022**	25/08/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	7	95	B-C-SM-MZ47-VE-103	100%	Adecuacion	$8.549.349,69	$8.549.349,69	9/08/2022	**TERMINADA**	**14/08/2022**	20/08/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	12	96	B-C-SM-MZ69-VE-086	100%	Caseta t3	$8.441.178,67	$8.441.178,67	15/08/2022	**TERMINADA**	**23/08/2022**	29/08/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	7	97	B-C-SM-MZ32-VE-143	100%	Caseta t3	$8.877.043,95	$8.877.043,95	15/08/2022	**TERMINADA**	**23/08/2022**	29/08/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	6	98	B-C-SM-MZ87-VE-145	100%	Caseta t3	$8.314.813,05	$8.314.813,05	18/08/2022	**TERMINADA**	**26/08/2022**	1/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	6	99	B-C-SM-MZ87-VE-146	100%	Adecuacion	$7.503.681,08	$7.503.681,08	19/08/2022	**TERMINADA**	**24/08/2022**	30/08/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	6	100	B-C-SM-MZ87-VE-147	100%	Caseta t3	$8.285.180,86	$8.285.180,86	20/08/2022	**TERMINADA**	**28/08/2022**	3/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	6	101	B-C-SM-MZ87-VE-148	100%	Caseta t3	$8.170.302,32	$8.170.302,32	21/08/2022	**TERMINADA**	**29/08/2022**	4/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	5	102	B-C-SM-MZ87-VE-149	100%	Caseta t3	$8.178.886,20	$8.178.886,20	22/08/2022	**TERMINADA**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	5	103	B-C-SM-MZ89-VE-150	100%	Caseta t3	$8.339.015,83	$8.339.015,83	23/08/2022	**TERMINADA**	**31/08/2022**	6/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	8	104	B-C-SM-MZ89-VE-151	100%	Adecuacion	$7.760.503,36	$7.760.503,36	24/08/2022	**TERMINADA**	**29/08/2022**	4/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	5	105	B-C-SM-MZ56-VE-152	100%	Caseta t2	$8.292.567,48	$8.292.567,48	25/08/2022	**TERMINADA**	**2/09/2022**	8/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	7	106	B-C-SM-MZ76-VE-153	100%	Adecuacion	$6.803.533,70	$6.803.533,70	26/08/2022	**TERMINADA**	**31/08/2022**	6/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	9	107	B-C-SM-MZ75-VE-154	100%	Adecuacion	$7.419.892,36	$7.419.892,36	27/08/2022	**TERMINADA**	**1/09/2022**	7/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	7	108	B-C-SM-MZ75-VE-155	100%	Adecuacion	$7.958.081,38	$7.958.081,38	28/08/2022	**TERMINADA**	**2/09/2022**	8/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	5	109	B-C-SM-MZ75-VE-156	100%	Adecuacion	$8.011.976,60	$8.011.976,60	29/08/2022	**TERMINADA**	**3/09/2022**	9/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	11	110	B-C-SM-MZ145-VE-157	100%	Adecuacion	$9.653.914,02	$9.653.914,02	30/08/2022	**TERMINADA**	**4/09/2022**	10/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	5	111	B-C-SM-MZ75-VE-158	100%	Adecuacion	$6.846.229,60	$6.846.229,60	31/08/2022	**TERMINADA**	**5/09/2022**	11/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	11	112	B-C-SM-MZ-VE145-160	100%	Adecuacion	$9.325.691,25	$9.325.691,25	21/08/2022	**TERMINADA**	**26/08/2022**	1/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**

SM	11	113	B-C-SM-MZ-VE145-162	100%	Adecuacion	$7.000.723,74	$7.000.723,74	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	5	114	B-C-SM-MZ84-VE-165	100%	Caseta t3	$8.259.418,86	$8.259.418,86	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	115	B-C-SM-MZ91-VE-167	100%	Adecuacion	$7.334.345,73	$7.334.345,73	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	9	116	B-C-SM-MZ77-VE-179	100%	Caseta t3	$8.930.810,61	$8.930.810,61	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	9	117	B-C-SM-MZ87-VE-180	100%	Caseta t3	$8.116.195,29	$8.116.195,29	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	118	B-C-SM-MZ55-VE-048	100%	Caseta t3	$6.887.962,53	$6.887.962,53	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	119	B-C-SM-MZ68-VE-077	100%	Caseta t3	$7.841.298,86	$7.841.298,86	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	120	B-C-SM-MZ89-VE-080	100%	Caseta t2	$7.814.305,69	$7.814.305,69	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	121	B-C-SM-MZ-VE-082	100%	Caseta t4	$9.602.086,12	$9.602.086,12	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	122	B-C-SM-MZ-VE-091	100%	Caseta t3	$8.240.626,46	$8.240.626,46	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	123	B-C-SM-MZ-VE-092	100%	Caseta t2	$8.314.938,30	$8.314.938,30	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	124	B-C-SM-MZ-VE-096	100%	Adecuacion	$7.662.197,96	$7.662.197,96	22/08/2022	TERMINADA	27/08/2022	2/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	125	B-C-SM-MZ30-VE-120	100%	Caseta t4	$8.665.155,76	$8.665.155,76	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	126	B-C-SM-MZ-VE-137	100%	Caseta t3	$8.275.053,67	$8.275.053,67	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	5	127	B-C-SM-MZ92-VE-168	100%	Adecuacion	$6.476.015,92	$6.476.015,92	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	8	128	B-C-SM-MZ92-VE-169	100%	Adecuacion	$6.842.321,91	$6.842.321,91	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	129	B-C-SM-MZ84-VE-178	100%	Adecuacion	$2.230.924,70	$2.230.924,70	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	130	B-C-SM-MZ45-VE-033	100%	Adecuacion	$7.943.448,36	$7.943.448,36	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	131	B-C-SM-MZ76-VE-075	100%	Adecuacion	$7.982.813,63	$7.982.813,63	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	132	B-C-SM-MZ-VE-089	100%	Adecuacion	$7.475.616,81	$7.475.616,81	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	133	B-C-SM-MZ-VE-173	100%	Adecuacion	$7.034.505,34	$7.034.505,34	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	134	B-C-SM-MZ34-VE-209	100%	Adecuacion	$5.856.785,90	$5.856.785,90	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	135	B-C-SM-MZ34-VE-210	100%	Caseta t3	$8.204.915,74	$8.204.915,74	30/08/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	136	B-C-SM-MZ-VE-164	100%	Caseta t3	$7.853.199,32	$7.853.199,32	30/08/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	11	137	B-C-SM-MZ92-VE-203	100%	Adecuacion	$8.272.491,16	$8.272.491,16	30/08/2022	TERMINADA	4/09/2022	10/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	138	B-C-SM-MZ91-VE-205	100%	Adecuacion	$6.742.842,11	$6.742.842,11	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	139	B-C-SM-MZ91-VE-206	100%	Adecuacion	$6.326.983,38	$6.326.983,38	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	140	B-C-SM-MZ145-VE-184	100%	Adecuacion	$7.415.421,93	$7.415.421,93	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	141	B-C-SM-MZ156-VE-058	100%	Adecuacion	$7.430.942,29	$7.430.942,29	1/09/2022	TERMINADA	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	142	B-C-SM-MZ156-VE-059	100%	Adecuacion	$3.514.863,97	$3.514.863,97	1/09/2022	TERMINADA	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	143	B-C-SM-MZ41-VE-141	100%	Adecuacion	$6.179.740,71	$6.179.740,71	2/09/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	144	B-C-SM-MZ32-VE-144	100%	Caseta t4	$7.498.669,53	$7.498.669,53	2/09/2022	TERMINADA	10/09/2022	16/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	145	B-C-SM-MZ89-VE-083	100%	Caseta t3	$7.576.542,11	$7.576.542,11	3/09/2022	TERMINADA	11/09/2022	17/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	146	B-C-SM-MZ46-VE-211	100%	Adecuacion	$7.730.411,89	$7.730.411,89	3/09/2022	TERMINADA	8/09/2022	14/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	147	B-C-SM-MZ46-VE-212	100%	Adecuacion	$5.774.463,33	$5.774.463,33	5/09/2022	TERMINADA	10/09/2022	16/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	148	B-C-SM-MZ46-VE-216	100%	Adecuacion	$8.311.308,81	$8.311.308,81	6/09/2022	TERMINADA	11/09/2022	17/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	149	B-C-SM-MZ30-VE-123	100%	Caseta t3	$8.084.933,32	$8.084.933,32	8/09/2022	TERMINADA	16/09/2022	22/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	150	B-C-SM-MZ66-VE-065	100%	Caseta t3	$7.828.052,76	$7.828.052,76	9/09/2022	TERMINADA	17/09/2022	23/09/2022	8	14	-6		x
SM	15	151	B-C-SM-MZ66-VE-066	100%	Caseta t2	$4.292.672,67	$4.292.672,67	10/09/2022	TERMINADA	18/09/2022	24/09/2022	8	14	-6		x
SM	15	152	B-C-SM-MZ23-VE-117	100%	Adecuacion	$4.772.651,25	$4.772.651,25	11/09/2022	TERMINADA	16/09/2022	22/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	153	B-C-SM-MZ59-VE-187	100%	Adecuacion	$8.212.157,27	$8.212.157,27	11/09/2022	TERMINADA	16/09/2022	22/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	154	B-C-SM-MZ34-VE-116	100%	Caseta t3	$7.989.636,90	$7.989.636,90	12/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	155	B-C-SM-MZ-VE-076	100%	Adecuacion	$7.966.932,81	$7.966.932,81	13/09/2022	TERMINADA	18/09/2022	24/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	156	B-C-SM-MZ87-VE-189	100%	Adecuacion	$6.068.174,04	$6.068.174,04	13/09/2022	TERMINADA	18/09/2022	24/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	157	B-C-SM-MZ18-VE-202	100%	Adecuacion	$8.298.564,37	$8.298.564,37	14/09/2022	TERMINADA	19/09/2022	25/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	158	B-C-SM-MZ55-VE-036	100%	Adecuacion	$4.519.608,59	$4.519.608,59	14/09/2022	TERMINADA	22/09/2022	28/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	159	B-C-SM-MZ45-VE-037	100%	Adecuacion	$5.427.357,42	$5.427.357,42	15/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	160	B-C-SM-MZ75-VE-070	100%	Adecuacion	$4.222.499,91	$4.222.499,91	15/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	161	B-C-SM-MZ67-VE-078	100%	Adecuacion	$5.110.794,97	$5.110.794,97	16/09/2022	TERMINADA	21/09/2022	27/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	162	B-C-SM-MZ34-VE-119	100%	Adecuacion	$7.021.881,94	$7.021.881,94	16/09/2022	TERMINADA	21/09/2022	27/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	163	B-C-SM-MZ56-VE-190	100%	Adecuacion	$7.154.236,55	$7.154.236,55	17/09/2022	TERMINADA	22/09/2022	28/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	164	B-C-SM-MZ56-VE-191	100%	Caseta t3	$8.896.139,02	$8.896.139,02	17/09/2022	TERMINADA	25/09/2022	1/10/2022	8	14	-6		x
SM	13	165	B-C-SM-MZ31-VE-199	100%	Adecuacion	$4.691.093,17	$4.691.093,17	18/09/2022	TERMINADA	24/09/2022	30/09/2022	6	12	-6		x
SM	18	166	B-C-SM-MZ67-VE-183	100%	Caseta t3	$6.957.541,97	$6.957.541,97	18/09/2022	TERMINADA	26/09/2022	2/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	167	B-C-SM-MZ30-VE-200	100%	Caseta t3	$8.312.234,66	$8.312.234,66	19/09/2022	TERMINADA	27/09/2022	3/10/2022	8	14	-6		x
SM	13	168	B-C-SM-MZ31-VE-201	100%	Caseta t3	$6.950.167,16	$6.950.167,16	19/09/2022	TERMINADA	27/09/2022	3/10/2022	8	14	-6		x
SM	13	169	B-C-SM-MZ47-VE-105	100%	Adecuacion	$3.899.268,01	$3.899.268,01	20/09/2022	TERMINADA	25/09/2022	1/10/2022	5	11	-6		x
SM	14	170	B-C-SM-MZ68-VE-108	100%	Adecuacion	$3.617.504,69	$3.617.504,69	20/09/2022	TERMINADA	25/09/2022	1/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	171	B-C-SM-MZ145-VE-208	100%	Adecuacion	$6.196.096,01	$6.196.096,01	21/09/2022	TERMINADA	26/09/2022	2/10/2022	5	11	-6		x
SM	12	172	B-C-SM-MZ66-VE-198	100%	Adecuacion	$5.360.187,87	$5.360.187,87	21/09/2022	TERMINADA	29/09/2022	5/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	173	B-C-SM-MZ30-VE-INC-001	100%	Caseta t3	$9.273.205,89	$9.273.205,89	22/09/2022	TERMINADA	30/09/2022	6/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	174	B-C-SM-MZ36-VE-INC-002	100%	Adecuacion	$7.909.051,57	$7.909.051,57	22/09/2022	TERMINADA	28/09/2022	4/10/2022	6	12	-6		x
SM	17	175	B-C-SM-MZ36-VE-INC-003	100%	Adecuacion	$7.056.470,53	$7.056.470,53	23/09/2022	TERMINADA	29/09/2022	5/10/2022	6	12	-6		x
SM	15	176	B-C-SM-MZ30-VE-INC-004	100%	Caseta t3	$7.321.539,69	$7.321.539,69	23/09/2022	TERMINADA	1/10/2022	7/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	177	B-C-SM-MZ21-VE-INC-005	100%	Adecuacion	$5.983.563,40	$5.983.563,40	24/09/2022	TERMINADA	29/09/2022	5/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	178	B-C-SM-MZ93-VE-INC-006	100%	Adecuacion	$7.900.843,94	$7.900.843,94	24/09/2022	TERMINADA	29/09/2022	5/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	179	B-C-SM-MZ87-VE-INC-007	100%	Caseta t3	$7.343.027,38	$7.343.027,38	25/09/2022	TERMINADA	3/10/2022	9/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	180	B-C-SM-MZ98-VE-INC-008	100%	Caseta t3	$7.345.145,38	$7.345.145,38	26/09/2022	TERMINADA	4/10/2022	10/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	181	B-C-SM-MZ87-VE-INC-009	100%	Adecuacion	$6.166.474,80	$6.166.474,80	27/09/2022	TERMINADA	2/10/2022	8/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	182	B-C-SM-MZ48-VE-INC-010	100%	Adecuacion	$7.156.353,68	$7.156.353,68	27/09/2022	TERMINADA	2/10/2022	8/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	183	B-C-SM-MZ38-VE-INC-013	100%	Caseta t3	$8.739.765,67	$8.739.765,67	28/09/2022	TERMINADA	6/10/2022	12/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	184	B-C-SM-MZ33-VE-INC-014	100%	Adecuacion	$7.094.395,09	$7.094.395,09	28/09/2022	TERMINADA	3/10/2022	9/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	185	B-C-SM-MZ55-VE-064	100%	Adecuacion	$7.807.428,21	$7.807.428,21	29/09/2022	TERMINADA	4/10/2022	10/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	186	B-C-SM-MZ145-VE-161	100%	Adecuacion	$8.918.748,97	$8.918.748,97	29/09/2022	TERMINADA	4/10/2022	10/10/2022	5	11	-6		x
SM	17	187	B-C-SM-MZ31-VE-INC-015	100%	Adecuacion	$7.948.410,17	$7.948.410,17	30/09/2022	TERMINADA	5/10/2022	11/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	188	B-C-SM-MZ33-VE-INC-016	100%	Caseta t3	$7.602.156,55	$7.602.156,55	30/09/2022	TERMINADA	8/10/2022	14/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	189	B-C-SM-MZ85-VE-INC-019	100%	Caseta t3	$7.773.487,18	$7.773.487,18	1/10/2022	TERMINADA	9/10/2022	15/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	190	B-C-SM-MZ97-VE-INC-023	100%	Caseta t3	$8.333.260,29	$8.333.260,29	1/10/2022	TERMINADA	9/10/2022	15/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	191	B-C-SM-MZ45-VE-INC-024	100%	Caseta t3	$8.094.089,35	$8.094.089,35	2/10/2022	TERMINADA	10/10/2022	16/10/2022	8	14	-6		x
SM	18	192	B-C-SM-MZ95-VE-INC-026	100%	Caseta t3	$7.629.024,81	$7.629.024,81	2/10/2022	TERMINADA	10/10/2022	16/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	193	B-C-SM-MZ33-VE-INC-032	100%	Caseta t3	$8.036.839,77	$8.036.839,77	3/10/2022	TERMINADA	11/10/2022	17/10/2022	8	14	-6		x
SM	18	194	B-C-SM-MZ32-VE-INC-035	100%	Caseta t3	$7.811.643,60	$7.811.643,60	4/10/2022	TERMINADA	12/10/2022	18/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	195	B-C-SM-MZ33-VE-INC-027	100%	Caseta T2	$8.012.216,20	$8.012.216,20	5/10/2022	TERMINADA	13/10/2022	19/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	196	B-C-SM-MZ66-VE-INC-033	100%	Adecuacion	$6.628.918,24	$6.628.918,24	5/10/2022	TERMINADA	10/10/2022	16/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	197	B-C-SM-MZ24-VE-INC-034	100%	Caseta t3	$7.997.347,42	$7.997.347,42	6/10/2022	TERMINADA	14/10/2022	20/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	198	B-C-SM-MZ98-VE-INC-036	100%	Caseta t3	$7.885.031,34	$7.885.031,34	6/10/2022	TERMINADA	14/10/2022	20/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	199	B-C-SM-MZ85-VE-INC-038	100%	Caseta t3	$8.272.191,01	$8.272.191,01	7/10/2022	TERMINADA	15/10/2022	21/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	200	B-C-SM-MZ93-VE-INC-039	100%	Adecuacion	$7.727.983,14	$7.727.983,14	7/10/2022	TERMINADA	12/10/2022	18/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	201	B-C-SM-MZ93-VE-INC-040	100%	Adecuacion	$7.621.248,46	$7.621.248,46	8/10/2022	TERMINADA	13/10/2022	19/10/2022	5	11	-6		x
SM	17	202	B-C-SM-MZ86-VE-INC-041	100%	Adecuacion	$7.737.812,12	$7.737.812,12	8/10/2022	TERMINADA	13/10/2022	19/10/2022	5	11	-6		x
SM	17	203	B-C-SM-MZ85-VE-INC-042	100%	Caseta t3	$8.221.884,89	$8.221.884,89	8/10/2022	TERMINADA	16/10/2022	22/10/2022	8	14	-6		x

SM	17	204	B-C-SM-MZ96-VE-INC-046	100%	Caseta t3	$9.156.805,39	$9.156.805,39	9/10/2022	TERMINADA	17/10/2022	23/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	205	B-C-SM-MZ95-VE-INC-049	100%	Caseta t3	$8.256.966,48	$8.256.966,48	10/10/2022	TERMINADA	18/10/2022	24/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	206	B-C-SM-MZ32-VE-INC-050	100%	Caseta t3	$7.745.465,56	$7.745.465,56	11/10/2022	TERMINADA	19/10/2022	25/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	207	B-C-SM-MZ36-VE-INC-051	100%	Adecuacion	$7.443.842,89	$7.443.842,89	12/10/2022	TERMINADA	17/10/2022	23/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	208	B-C-SM-MZ30-VE-INC-052	100%	Caseta t3	$8.090.760,97	$8.090.760,97	13/10/2022	TERMINADA	21/10/2022	27/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	209	B-C-SM-MZ94-VE-INC-053	100%	Adecuacion	$5.710.686,86	$5.710.686,86	13/10/2022	TERMINADA	18/10/2022	24/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	210	B-C-SM-MZ-VE-INC-055	100%	Adecuacion	$7.242.404,18	$7.242.404,18	13/10/2022	TERMINADA	18/10/2022	24/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	211	B-C-SM-MZ-VE-INC-056	100%	Adecuacion	$7.673.332,15	$7.673.332,15	14/10/2022	TERMINADA	19/10/2022	25/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	212	B-C-SM-MZ86-VE-INC-057	100%	Caseta t3	$7.705.011,19	$7.705.011,19	15/10/2022	TERMINADA	23/10/2022	29/10/2022	8	14	-6		x
SM	18	213	B-C-SM-MZ86-VE-INC-058	100%	Caseta t2	$8.107.440,98	$8.107.440,98	16/10/2022	TERMINADA	24/10/2022	30/10/2022	8	14	-6		x
SM	19	214	B-C-SM-MZ48-VE-INC-011	100%	Adecuacion	$6.827.750,12	$6.827.750,12	17/10/2022	TERMINADA	22/10/2022	31/10/2022	5	14	-6		x
SM	17	215	B-C-SM-MZ91-VE-INC-062	100%	Adecuacion	$4.551.930,25	$4.551.930,25	17/10/2022	TERMINADA	22/10/2022	1/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	216	B-C-SM-MZ87-VE-INC-063	100%	Adecuacion	$7.258.523,54	$7.258.523,54	18/10/2022	TERMINADA	23/10/2022	2/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	217	B-C-SM-MZ67-VE-INC-064	100%	Adecuacion	$5.250.910,34	$5.250.910,34	18/10/2022	TERMINADA	23/10/2022	3/11/2022	5	14	-6		x
SM	17	218	B-C-SM-MZ91-VE-INC-065	100%	Caseta T3	$8.132.709,35	$8.132.709,35	19/10/2022	TERMINADA	27/10/2022	4/11/2022	8	14	-6		x
SM	18	219	B-C-SM-MZ21-VE-INC-066	100%	Caseta T3	$8.884.140,18	$8.884.140,18	19/10/2022	TERMINADA	27/10/2022	5/11/2022	8	14	-6		x
SM	18	220	B-C-SM-MZ47-VE-INC-068	100%	Adecuacion	$5.141.678,32	$5.141.678,32	20/10/2022	TERMINADA	25/10/2022	6/11/2022	5	14	-6		x
SM	18	221	B-C-SM-MZ47-VE-INC-069	100%	Adecuacion	$5.804.814,20	$5.804.814,20	20/10/2022	TERMINADA	25/10/2022	7/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	222	B-C-SM-MZ46-VE-INC-070	100%	Adecuacion	$7.533.082,62	$7.533.082,62	20/10/2022	TERMINADA	25/10/2022	8/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	223	B-C-SM-MZ32-VE-INC-071	100%	Adecuacion	$4.494.495,27	$4.494.495,27	21/10/2022	TERMINADA	26/10/2022	9/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	224	B-C-SM-MZ32-VE-INC-072	100%	Adecuacion	$2.547.155,48	$2.547.155,48	21/10/2022	TERMINADA	26/10/2022	10/11/2022	5	14	-6		x
SM	18	225	B-C-SM-MZ32-VE-INC-073	100%	Adecuacion	$5.899.252,59	$5.899.252,59	22/10/2022	TERMINADA	27/10/2022	11/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	226	B-C-SM-MZ95-VE-INC-025	100%	Caseta T3	$7.925.272,79	$7.925.272,79	22/10/2022	TERMINADA	30/10/2022	12/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	227	B-C-SM-MZ48-VE-INC-029	100%	Adecuacion	$8.123.075,86	$8.123.075,86	22/10/2022	TERMINADA	27/10/2022	13/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	228	B-C-SM-MZ86-VE-INC-030	100%	Caseta T3	$8.938.581,32	$8.938.581,32	23/10/2022	TERMINADA	31/10/2022	14/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	229	B-C-SM-MZ98-VE-INC-031	100%	Caseta T3	$7.166.340,15	$7.166.340,15	23/10/2022	TERMINADA	31/10/2022	15/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	230	B-C-SM-MZ32-VE-INC-017	100%	Caseta T3	$7.936.218,15	$7.936.218,15	23/10/2022	TERMINADA	31/10/2022	16/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	231	B-C-SM-MZ145-VE-163	100%	Adecuacion	$7.980.298,74	$7.980.298,74	24/10/2022	TERMINADA	29/10/2022	16/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	232	B-C-SM-MZ86-VE-INC-043	100%	Caseta T3	$7.671.439,94	$7.671.439,94	25/10/2022	TERMINADA	2/11/2022	16/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	233	B-C-SM-MZ98-VE-INC-044	100%	Caseta T3	$7.978.159,51	$7.978.159,51	26/10/2022	TERMINADA	3/11/2022	16/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	234	B-C-SM-MZ91-VE-INC-091	100%	Adecuacion	$7.816.920,63	$7.816.920,63	27/10/2022	TERMINADA	1/11/2022	16/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	235	B-C-SM-MZ86-VE-INC-093	100%	Caseta T3	$9.612.473,24	$9.612.473,24	28/10/2022	TERMINADA	5/11/2022	16/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	236	B-C-SM-MZ36-VE-INC-118	100%	Caseta T3	$8.070.784,75	$8.070.784,75	29/10/2022	TERMINADA	6/11/2022	16/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	237	B-C-SM-MZ48-VE-INC-145	100%	Caseta T3	$8.404.448,59	$8.404.448,59	30/10/2022	TERMINADA	7/11/2022	16/11/2022	8	14	-6		x
SM	12	238	B-C-SM-MZ-VE-093	100%	Adecuacion	$7.207.274,62	$7.207.274,62	1/11/2022	TERMINADA	7/11/2022	13/11/2022	6	12	-6		x
SM	18	239	B-C-SM-MZ75-VE-130	100%	Adecuacion	$5.087.108,21	$5.087.108,21	1/11/2022	TERMINADA	6/11/2022	12/11/2022	5	11	-6		x
SM	11	240	B-C-SM-MZ66-VE-132	100%	Adecuacion	$7.421.836,98	$7.421.836,98	2/11/2022	TERMINADA	7/11/2022	13/11/2022	5	11	-6		x
SM	9	241	B-C-SM-MZ92-VE-170	100%	Adecuacion	$6.456.971,29	$6.456.971,29	4/11/2022	TERMINADA	9/11/2022	15/11/2022	5	11	-6		x
SM	10	242	B-C-SM-MZ91-VE-171	100%	Adecuacion	$7.013.453,53	$7.013.453,53	5/11/2022	TERMINADA	10/11/2022	16/11/2022	5	11	-6		x
SM	7	243	B-C-SM-MZ75-VE-172	100%	Adecuacion	$8.210.038,72	$8.210.038,72	6/11/2022	TERMINADA	11/11/2022	17/11/2022	5	11	-6		x
SM	18	244	B-C-SM-MZ93-VE-174	100%	Adecuacion	$6.560.835,40	$6.560.835,40	7/11/2022	TERMINADA	12/11/2022	18/11/2022	5	11	-6		x
SM	18	245	B-C-SM-MZ86-VE-INC-080	100%	Caseta T3	$8.436.036,24	$8.436.036,24	8/11/2022	TERMINADA	16/11/2022	22/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	246	B-C-SM-MZ95-VE-INC-173	100%	Caseta T3	$8.297.659,07	$8.297.659,07	8/11/2022	TERMINADA	16/11/2022	22/11/2022	8	14	-6		x
SM	20	247	B-C-SM-MZ48-VE-INC-028	100%	Adecuacion	$5.338.458,70	$5.338.458,70	9/11/2022	TERMINADA	14/11/2022	20/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	248	B-C-SM-MZ68-VE-INC-059	100%	Adecuacion	$6.561.578,46	$6.561.578,46	9/11/2022	TERMINADA	14/11/2022	20/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	249	B-C-SM-MZ32-VE-INC-075	100%	Adecuacion	$4.281.987,94	$4.281.987,94	9/11/2022	TERMINADA	14/11/2022	20/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	250	B-C-SM-MZ31-VE-INC-077	100%	Caseta T3	$8.209.906,38	$8.209.906,38	10/11/2022	TERMINADA	18/11/2022	24/11/2022	8	14	-6		x
SM	20	251	B-C-SM-MZ59-VE-INC-086	100%	Adecuacion	$4.202.570,37	$4.202.570,37	10/11/2022	TERMINADA	15/11/2022	21/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	252	B-C-SM-MZ68-VE-INC-087	100%	Adecuacion	$5.197.963,52	$5.197.963,52	10/11/2022	TERMINADA	15/11/2022	21/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	253	B-C-SM-MZ59-VE-INC-095	100%	Adecuacion	$5.330.404,94	$5.330.404,94	11/11/2022	TERMINADA	16/11/2022	22/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	254	B-C-SM-MZ59-VE-INC-099	100%	Adecuacion	$6.288.082,10	$6.288.082,10	11/11/2022	TERMINADA	16/11/2022	22/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	255	B-C-SM-MZ48-VE-INC-101	100%	Adecuacion	$4.388.042,03	$4.388.042,03	11/11/2022	TERMINADA	16/11/2022	22/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	256	B-C-SM-MZ38-VE-INC-108	100%	Caseta T2	$8.106.576,63	$8.106.576,63	12/11/2022	TERMINADA	20/11/2022	26/11/2022	8	14	-6		x
SM	20	257	B-C-SM-MZ98-VE-INC-109	100%	Adecuacion	$3.942.607,23	$3.942.607,23	12/11/2022	TERMINADA	17/11/2022	23/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	258	B-C-SM-MZ49-VE-INC-123	100%	Adecuacion	$5.692.446,92	$5.692.446,92	12/11/2022	TERMINADA	17/11/2022	23/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	259	B-C-SM-MZ23-VE-INC-129	100%	Adecuacion	$7.800.567,25	$7.800.567,25	13/11/2022	TERMINADA	18/11/2022	24/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	260	B-C-SM-MZ017-VE-INC-131	100%	Adecuacion	$5.746.289,90	$5.746.289,90	13/11/2022	TERMINADA	18/11/2022	24/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	261	B-C-SM-MZ016-VE-INC-133	100%	Adecuacion	$6.646.756,60	$6.646.756,60	13/11/2022	TERMINADA	18/11/2022	24/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	262	B-C-SM-MZ-VE23-INC-138	100%	Adecuacion	$5.369.396,54	$5.369.396,54	13/11/2022	TERMINADA	18/11/2022	24/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	263	B-C-SM-MZ86-VE-INC-151	100%	Adecuacion	$6.730.435,17	$6.730.435,17	14/11/2022	TERMINADA	19/11/2022	25/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	264	B-C-SM-MZ105-VE-INC-197	100%	Adecuacion	$4.158.209,45	$4.158.209,45	14/11/2022	TERMINADA	19/11/2022	25/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	265	B-C-SM-MZ94-VE-INC-213	100%	Adecuacion	$4.022.013,54	$4.022.013,54	14/11/2022	TERMINADA	19/11/2022	25/11/2022	5	11	-6		x
SM	21	266	B-C-SM-MZ93-VE-INC-163	100%	Adecuacion	$7.300.892,28	$7.300.892,28	15/11/2022	TERMINADA	20/11/2022	26/11/2022	5	11	-6		x
SM	21	267	B-C-SM-MZ59-VE-207	100%	Adecuacion	$6.020.072,11	$6.020.072,11	15/11/2022	TERMINADA	20/11/2022	26/11/2022	5	11	-6		x
SM	21	268	B-C-SM-MZ48-VE-INC-134	100%	Adecuacion	$5.219.825,26	$5.219.825,26	15/11/2022	TERMINADA	20/11/2022	26/11/2022	5	11	-6		x
SM	21	269	B-C-SM-MZ49-VE-INC-137	100%	Adecuacion	$4.246.004,15	$4.246.004,15	16/11/2022	TERMINADA	21/11/2022	27/11/2022	5	11	-6		x
SM	21	270	B-C-SM-MZ93-VE-INC-175	100%	Adecuacion	$6.751.782,32	$6.751.782,32	16/11/2022	TERMINADA	21/11/2022	27/11/2022	5	11	-6		x
SM	21	271	B-C-SM-MZ106-VE-INC-184	100%	Adecuacion	$6.935.558,95	$6.935.558,95	16/11/2022	TERMINADA	21/11/2022	27/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	272	B-C-SM-MZ68-VE-INC-084	100%	Caseta T3	$8.320.404,99	$8.320.404,99	17/11/2022	TERMINADA	25/11/2022	1/12/2022	8	14	-6		x
SM	20	273	B-C-SM-MZ49-VE-INC-127	100%	Caseta T4	$8.531.015,62	$8.531.015,62	17/11/2022	TERMINADA	25/11/2022	1/12/2022	8	14	-6		x
SM	20	274	B-C-SM-MZ93-VE-INC-164	100%	Caseta T3	$9.236.090,18	$9.236.090,18	18/11/2022	TERMINADA	26/11/2022	2/12/2022	8	14	-6		x
SM	21	275	B-C-SM-MZ69-VE-176	100%	Caseta T3	$4.778.954,24	$4.778.954,24	18/11/2022	TERMINADA	26/11/2022	2/12/2022	8	14	-6		x
SM	21	276	B-C-SM-MZ58-VE-177	100%	Adecuacion	$3.411.187,99	$3.411.187,99	19/11/2022	TERMINADA	24/11/2022	30/11/2022	5	11	-6		x
SM	21	277	B-C-SM-MZ70-VE-INC-054	100%	Adecuacion	$6.466.021,02	$6.466.021,02	19/11/2022	TERMINADA	24/11/2022	30/11/2022	5	11	-6		x
SM	21	278	B-C-SM-MZ38-VE-INC-061	100%	Adecuacion	$7.016.743,60	$7.016.743,60	20/11/2022	TERMINADA	25/11/2022	1/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	279	B-C-SM-MZ32-VE-INC-076	100%	Adecuacion	$6.334.029,19	$6.334.029,19	20/11/2022	TERMINADA	25/11/2022	1/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	280	B-C-SM-MZ48-VE-INC-119	100%	Adecuacion	$6.874.221,12	$6.874.221,12	21/11/2022	TERMINADA	26/11/2022	2/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	281	B-C-SM-MZ56-VE-INC-120	100%	Adecuacion	$6.903.872,09	$6.903.872,09	21/11/2022	TERMINADA	26/11/2022	2/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	282	B-C-SM-MZ48-VE-INC-183	100%	Adecuacion	$7.023.620,46	$7.023.620,46	21/11/2022	TERMINADA	26/11/2022	2/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	283	B-C-SM-MZ38-VE-INC-078	100%	Adecuacion	$3.367.297,55	$3.367.297,55	22/11/2022	TERMINADA	27/11/2022	3/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	284	B-C-SM-MZ41-VE-INC-081	100%	Adecuacion	$4.759.043,39	$4.759.043,39	22/11/2022	TERMINADA	27/11/2022	3/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	285	B-C-SM-MZ96-VE-INC-177	100%	Adecuacion	$4.353.379,09	$4.353.379,09	23/11/2022	TERMINADA	28/11/2022	4/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	286	B-C-SM-MZ58-VE-INC-111	100%	Adecuacion	$3.025.651,65	$3.025.651,65	23/11/2022	TERMINADA	28/11/2022	4/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	287	B-C-SM-MZ36-VE-INC-126	100%	Adecuacion	$7.357.844,70	$7.357.844,70	23/11/2022	TERMINADA	28/11/2022	4/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	288	B-C-SM-MZ23-VE-INC-128	100%	Adecuacion	$6.248.480,68	$6.248.480,68	24/11/2022	TERMINADA	29/11/2022	5/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	289	B-C-SM-MZ97-VE-INC-179	100%	Adecuacion	$7.384.917,39	$7.384.917,39	24/11/2022	TERMINADA	29/11/2022	5/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	290	B-C-SM-MZ96-VE-INC-187	100%	Adecuacion	$7.709.795,70	$7.709.795,70	24/11/2022	TERMINADA	29/11/2022	5/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	291	B-C-SM-MZ96-VE-INC-188	100%	Adecuacion	$6.302.033,86	$6.302.033,86	25/11/2022	TERMINADA	30/11/2022	6/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	292	B-C-SM-MZ98-VE-INC-189	100%	Adecuacion	$8.233.353,74	$8.233.353,74	25/11/2022	TERMINADA	30/11/2022	6/12/2022	5	11	-6		x

SM	21	293	B-C-SM-MZ48-VE-INC-096	100%	Adecuacion	$6.859.171,05	$6.859.171,05	25/11/2022	TERMINADA	30/11/2022	6/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	294	B-C-SM-MZ24-VE-INC-098	100%	Caseta T1	$8.682.895,90	$8.682.895,90	26/11/2022	TERMINADA	4/12/2022	10/12/2022	8	14	-6		x
SM	21	295	B-C-SM-MZ38-VE-INC-104	100%	Adecuacion	$4.515.305,50	$4.515.305,50	26/11/2022	TERMINADA	1/12/2022	7/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	296	B-C-SM-MZ94-VE-INC-132	100%	Adecuacion	$6.493.545,21	$6.493.545,21	26/11/2022	TERMINADA	1/12/2022	7/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	297	B-C-SM-MZ91-VE-INC-090	100%	Caseta T3	$9.400.048,37	$9.400.048,37	27/11/2022	TERMINADA	5/12/2022	11/12/2022	8	14	-6		x
SM	21	298	B-C-SM-MZ87-VE-INC-092	100%	Caseta T3	$8.024.497,65	$8.024.497,65	27/11/2022	TERMINADA	5/12/2022	11/12/2022	8	14	-6		x
SM	21	299	B-C-SM-MZ59-VE-INC-100	100%	Adecuacion	$4.665.073,76	$4.665.073,76	28/11/2022	TERMINADA	7/12/2022	13/12/2022	9	15	-6		x
SM	21	300	B-C-SM-MZ17-VE-INC-106	85%	Adecuacion	$8.299.427,57	$7.054.513,43	28/11/2022	EN EJECUCION	8/12/2022	14/12/2022	10	16	-6		x
SM	21	301	B-C-SM-MZ69-VE-INC-112	85%	Adecuacion	$6.081.041,12	$5.168.884,95	28/11/2022	EN EJECUCION	9/12/2022	15/12/2022	11	17	-6		x
SM	21	302	B-C-SM-MZ97-VE-INC-114	85%	Caseta T3	$7.563.464,48	$6.428.944,81	29/11/2022	EN EJECUCION	11/12/2022	17/12/2022	12	18	-6		x
SM	21	303	B-C-SM-MZ36-VE-INC-121	85%	Adecuacion	$3.440.319,57	$2.924.271,63	29/11/2022	EN EJECUCION	12/12/2022	18/12/2022	13	19	-6		x
SM	21	304	B-C-SM-MZ36-VE-INC-122	85%	Adecuacion	$3.508.566,53	$2.982.281,55	29/11/2022	EN EJECUCION	13/12/2022	19/12/2022	14	20	-6		x
SM	21	305	B-C-SM-MZ78-VE-INC-139	85%	Adecuacion	$6.324.599,62	$5.375.909,68	30/11/2022	EN EJECUCION	15/12/2022	21/12/2022	15	21	-6		x
SM	21	306	B-C-SM-MZ78-VE-INC-142	85%	Adecuacion	$5.885.758,44	$5.002.894,67	30/11/2022	EN EJECUCION	16/12/2022	22/12/2022	16	22	-6		x
SM	21	307	B-C-SM-MZ59-VE-INC-143	85%	Caseta T3	$8.167.825,19	$6.942.651,41	30/11/2022	EN EJECUCION	17/12/2022	23/12/2022	17	23	-6		x
SM	21	308	B-C-SM-MZ60-VE-INC-144	85%	Adecuacion	$6.230.549,90	$5.295.967,42	1/12/2022	EN EJECUCION	19/12/2022	25/12/2022	18	24	-6		x
SM	21	309	B-C-SM-MZ48-VE-INC-146	85%	Adecuacion	$4.395.472,81	$3.736.151,89	1/12/2022	EN EJECUCION	20/12/2022	26/12/2022	19	25	-6		x
SM	21	310	B-C-SM-MZ86-VE-INC-154	85%	Caseta T3	$7.973.180,18	$6.777.203,15	1/12/2022	EN EJECUCION	21/12/2022	27/12/2022	20	26	-6		x
SM	21	311	B-C-SM-MZ38-VE-INC-160	85%	Adecuacion	$4.623.473,63	$3.929.952,59	2/12/2022	EN EJECUCION	23/12/2022	29/12/2022	21	27	-6		x
SM	21	312	B-C-SM-MZ98-VE-INC-174	85%	Caseta T3	$7.972.082,02	$6.776.269,72	2/12/2022	EN EJECUCION	24/12/2022	30/12/2022	22	28	-6		x
SM	21	313	B-C-SM-MZ103-VE-INC-178	85%	Adecuacion	$4.799.097,62	$4.079.232,98	2/12/2022	EN EJECUCION	25/12/2022	31/12/2022	23	29	-6		x
SM	21	314	B-C-SM-MZ101-VE-INC-190	85%	Caseta T3	$10.025.465,77	$8.521.645,90	3/12/2022	EN EJECUCION	27/12/2022	2/01/2023	24	30	-6		x
SM	21	315	B-C-SM-MZ102-VE-INC-191	75%	Adecuacion	$5.905.162,68	$4.428.872,01	3/12/2022	EN EJECUCION	28/12/2022	3/01/2023	25	31	-6		x
SM	21	316	B-C-SM-MZ98-VE-INC-192	75%	Caseta T3	$6.949.279,75	$5.211.959,81	3/12/2022	EN EJECUCION	29/12/2022	4/01/2023	26	32	-6		x
SM	21	317	B-C-SM-MZ96-VE-INC-193	75%	Adecuacion	$6.903.465,94	$5.177.599,46	4/12/2022	EN EJECUCION	31/12/2022	6/01/2023	27	33	-6		x
SM	21	318	B-C-SM-MZ95-VE-INC-185	75%	Adecuacion	$3.769.208,51	$2.826.906,38	4/12/2022	EN EJECUCION	1/01/2023	7/01/2023	28	34	-6		x
SM	20	319	B-C-SM-MZ33-VE-INC-094	75%	Adecuacion	$6.352.965,97	$4.764.724,48	5/12/2022	EN EJECUCION	3/01/2023	9/01/2023	29	35	-6		x
SM	20	320	B-C-SM-MZ48-VE-INC-124	65%	Caseta T3	$7.905.569,70	$5.138.620,31	5/12/2022	EN EJECUCION	4/01/2023	10/01/2023	30	36	-6		x
SM	20	321	B-C-SM-MZ84-VE-INC-125	65%	Caseta T3	$9.115.960,01	$5.925.374,01	5/12/2022	EN EJECUCION	5/01/2023	11/01/2023	31	37	-6		x
SM	20	322	B-C-SM-MZ70-VE-INC-141	65%	Caseta T3	$8.210.724,19	$5.336.970,72	5/12/2022	EN EJECUCION	6/01/2023	12/01/2023	32	38	-6		x
SM	20	323	B-C-SM-MZ86-VE-INC-148	65%	Caseta T3	$8.267.285,91	$5.373.735,84	5/12/2022	EN EJECUCION	7/01/2023	13/01/2023	33	39	-6		x
SM	20	324	B-C-SM-MZ86-VE-INC-152	65%	Adecuacion	$5.686.744,56	$3.696.383,96	6/12/2022	EN EJECUCION	9/01/2023	15/01/2023	34	40	-6		x
SM	20	325	B-C-SM-MZ86-VE-INC-153	65%	Caseta T3	$7.942.989,18	$5.162.942,97	6/12/2022	EN EJECUCION	10/01/2023	16/01/2023	35	41	-6		x
SM	20	326	B-C-SM-MZ48-VE-INC-182	65%	Caseta T3	$8.743.515,52	$5.683.285,09	6/12/2022	EN EJECUCION	11/01/2023	17/01/2023	36	42	-6		x
SM	21	327	B-C-SM-MZ102-VE-INC-105	65%	Caseta T3	$7.620.116,73	$4.953.075,87	7/12/2022	EN EJECUCION	13/01/2023	19/01/2023	37	43	-6		x
SM	21	328	B-C-SM-MZ76-VE-INC-110	65%	Adecuacion	$3.661.130,40	$2.379.734,76	7/12/2022	EN EJECUCION	14/01/2023	20/01/2023	38	44	-6		x
SM	21	329	B-C-SM-MZ21VE-INC-116	55%	Caseta T3	$9.762.419,29	$5.369.330,61	7/12/2022	EN EJECUCION	15/01/2023	21/01/2023	39	45	-6		x
SM	21	330	B-C-SM-MZ103VE-INC-135	55%	Adecuacion	$6.796.538,06	$3.738.095,93	7/12/2022	EN EJECUCION	16/01/2023	22/01/2023	40	46	-6		x
SM	21	331	B-C-SM-MZ104VE-INC-176	55%	Caseta T3	$9.771.011,16	$5.374.056,14	8/12/2022	EN EJECUCION	18/01/2023	24/01/2023	41	47	-6		x
SM	21	332	B-C-SM-MZ101VE-INC-180	55%	Adecuacion	$5.670.027,72	$3.118.515,25	8/12/2022	EN EJECUCION	19/01/2023	25/01/2023	42	48	-6		x
SM	21	333	B-C-SM-MZ98VE-INC-181	55%	Adecuacion	$6.221.221,23	$3.421.671,68	8/12/2022	EN EJECUCION	20/01/2023	26/01/2023	43	49	-6		x
SM	21	334	B-C-SM-MZ93VE-INC-201	55%	Adecuacion	$5.137.794,12	$2.825.786,77	8/12/2022	EN EJECUCION	21/01/2023	27/01/2023	44	50	-6		x
SM	21	335	B-C-SM-MZ85-VE-INC-117	55%	Adecuacion	$7.447.189,73	$4.095.954,35	8/12/2022	EN EJECUCION	22/01/2023	28/01/2023	45	51	-6		x
SM	21	336	B-C-SM-MZ-VE-INC-217	55%	Adecuacion	$5.439.062,10	$2.991.484,16	8/12/2022	EN EJECUCION	23/01/2023	29/01/2023	46	52	-6		x
SM	9	337	B-C-SM-MZ56-VE-192	100%	Adecuacion	$2.924.848,88	$2.924.848,88	5/12/2022	TERMINADA	21/01/2023	27/01/2023	47	53	-6		x
SM	13	338	B-C-SM-MZ33-VE-193	100%	Caseta T3	$8.081.818,61	$8.081.818,61	5/12/2022	TERMINADA	22/01/2023	28/01/2023	48	54	-6		x
SM	10	339	B-C-SM-MZ33-VE-194	100%	Adecuacion	$7.097.058,66	$7.097.058,66	5/12/2022	TERMINADA	23/01/2023	29/01/2023	49	55	-6		x
SM	10	340	B-C-SM-MZ33-VE-195	100%	Adecuacion	$5.575.323,63	$5.575.323,63	5/12/2022	TERMINADA	24/01/2023	30/01/2023	50	56	-6		x
SM	11	341	B-C-SM-MZ33-VE-196	100%	Adecuacion	$8.337.864,77	$8.337.864,77	5/12/2022	TERMINADA	25/01/2023	31/01/2023	51	57	-6		x
SM	10	342	B-C-SM-MZ41-VE-197	100%	Adecuacion	$8.310.190,06	$8.310.190,06	5/12/2022	TERMINADA	26/01/2023	1/02/2023	52	58	-6		x
SM	18	343	B-C-SM-MZ77-VE-INC-047	30%	Caseta T2	$8.221.884,89	$2.466.565,47	8/12/2022	EN EJECUCION	30/01/2023	5/02/2023	53	59	-6		x
SM	18	344	B-C-SM-MZ58-VE-INC-082	30%	Adecuacion	$5.382.315,64	$1.614.694,69	9/12/2022	EN EJECUCION	1/02/2023	7/02/2023	54	60	-6		x
SM	18	345	B-C-SM-MZ58-VE-INC-083	30%	Caseta T3	$5.087.054,31	$1.526.116,29	9/12/2022	EN EJECUCION	2/02/2023	8/02/2023	55	61	-6		x

CUADRO DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMAS Y EJECUTADAS

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total		Terminaciones Esperadas Periodo	Terminaciones Acumuladas Esperadas	Terminaciones Esperadas Periodo	Terminaciones Ejecutadas Periodo	Terminaciones Ejecutadas Acumuladas	valor ejec
		$ 5.140.026,35		$ 58.879.439,91			$ 2.590.013.153,73			$ -		$ 2.654.032.619,99							
										$ -		$ -							
		$ 5.140.026,35		$ 58.879.439,91			$ 2.590.013.153,73			$ -		$ 2.654.032.619,99							
1/03/2022	Semana 1	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	0,00%	$ -						
8/03/2022	Semana 2	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	0,10%	$ 2.570.013,18		0	0			
15/03/2022	Semana 3	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	0,19%	$ 5.140.026,35		0	0			
22/03/2022	Semana 4	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	0,19%	$ 5.140.026,35		0	0			
29/05/2022	Semana 5	100,00%	$ 5.140.026,35	7,38%	24	$ 4.348.020,18	0,00%	3	$ 22.883.102,57		$ -	1,22%	$ 32.371.149,10	101		0	0	-	-
5/06/2022	Semana 6	100,00%	$ 5.140.026,35	9,23%	30	$ 5.435.025,22	0,87%	6	$ 45.766.205,14		$ -	2,13%	$ 56.341.256,71	20	5	3	0		
12/06/2022	Semana 7	100,00%	$ 5.140.026,35	12,92%	42	$ 7.609.035,31	1,74%	10	$ 76.777.008,56		$ -	3,35%	$ 89.026.070,22	40	12	6	0		
19/06/2022	Semana 8	100,00%	$ 5.140.026,35	15,69%	51	$ 9.239.542,88	2,90%	14	$ 106.787.811,98		$ -	4,57%	$ 121.167.381,21	90	23	10	0		
26/06/2022	Semana 9	100,00%	$ 5.140.026,35	21,85%	71	$ 12.862.893,03	4,06%	18	$ 137.298.615,41		$ -	5,85%	$ 155.301.534,79	150	25	14	0		
3/07/2022	Semana 10	100,00%	$ 5.140.026,35	28,92%	94	$ 17.029.745,70	5,22%	22	$ 167.809.418,83		$ -	7,16%	$ 189.979.190,88	230	18	18	0		
10/07/2022	Semana 11	100,00%	$ 5.140.026,35	35,38%	115	$ 20.834.263,35	6,38%	26	$ 198.320.222,25		$ -	8,45%	$ 224.294.511,96	280	20	22	0		
17/07/2022	Semana 12	100,00%	$ 5.140.026,35	43,38%	141	$ 25.544.618,55	7,54%	30	$ 228.831.025,68		$ -	9,78%	$ 259.515.670,57	330	20	26	0		
24/07/2022	Semana 13	100,00%	$ 5.140.026,35	43,38%	141	$ 25.544.618,55	8,70%	45	$ 343.246.538,51		$ -	14,09%	$ 373.931.183,41	430	10	30	0		
31/07/2022	Semana 14	100,00%	$ 5.140.026,35	49,23%	160	$ 28.986.801,19	13,04%	48	$ 366.129.641,08		$ -	15,08%	$ 400.256.468,62	500	12	45	0		
7/08/2022	Semana 15	100,00%	$ 5.140.026,35	52,31%	170	$ 30.798.476,26	13,91%	60	$ 457.662.051,35		$ -	18,60%	$ 493.600.553,96	630	30	48	0		
14/08/2022	Semana 16	100,00%	$ 5.140.026,35	55,08%	179	$ 32.428.983,83	17,39%	66	$ 503.428.256,49		$ -	20,38%	$ 540.997.266,67	708	35	60	0		
21/08/2022	Semana 17	100,00%	$ 5.140.026,35	62,46%	203	$ 36.777.004,01	19,13%	80	$ 610.216.068,47		$ -	24,57%	$ 652.133.098,83	740	30	66	0		
28/08/2022	Semana 18	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	23,19%	91	$ 694.120.777,88		$ -	27,83%	$ 738.574.153,34	784	30	80	0		
4/09/2022	Semana 19	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	26,38%	101	$ 770.397.786,44		$ -	30,70%	$ 814.851.161,90	784	32	91	0		
11/09/2022	Semana 20	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	29,28%	116	$ 884.813.299,28		$ -	35,01%	$ 929.266.574,74	784	41	101	0		
18/09/2022	Semana 21	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	33,62%	137	$ 1.044.995.017,25		$ -	41,05%	$ 1.089.468.392,71	784	41	116	0		
25/09/2022	Semana 22	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	39,71%	149	$ 1.136.527.427,52		$ -	44,50%	$ 1.180.980.802,98	784	33	137	0		
2/10/2022	Semana 23	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	43,19%	160	$ 1.220.432.136,94		$ -	47,66%	$ 1.264.885.512,40	784	42	149	0		
9/10/2022	Semana 24	100,00%	$ 5.140.026,35	72,92%	237	$ 42.936.699,26	46,38%	174	$ 1.308.267.503,62		$ -	51,03%	$ 1.354.344.229,23	784	42	160	0		
16/10/2022	Semana 25	100,00%	$ 5.140.026,35	78,77%	256	$ 46.378.880,00	50,43%	185	$ 1.349.246.419,91		$ -	52,78%	$ 1.400.765.326,26	708	35	174	0		
23/10/2022	Semana 26	100,00%	$ 5.140.026,35	88,00%	286	$ 51.813.905,00	53,62%	191	$ 1.404.101.290,40		$ -	55,05%	$ 1.461.055.221,75	740	30	185	0		
30/10/2022	Semana 27	100,00%	$ 5.140.026,35	88,00%	286	$ 51.813.906,00	55,36%	199	$ 1.466.420.769,84		$ -	57,40%	$ 1.523.374.702,19	784	30	191	0		
6/11/2022	Semana 28	100,00%	$ 5.140.026,35	88,00%	286	$ 51.813.906,00	57,68%	207	$ 1.529.330.565,92		$ -	59,77%	$ 1.586.284.498,27	708	32	199	0		
13/11/2022	Semana 29	100,00%	$ 5.140.026,35	88,00%	286	$ 51.813.906,00	60,00%	225	$ 1.658.836.495,44		$ -	64,65%	$ 1.715.795.427,79	784	41	207	0		
20/11/2022	Semana 30	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	65,22%	240	$ 1.948.789.254,20		$ -	75,84%	$ 2.012.809.720,46	784	41	225	0		
27/11/2022	Semana 31	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	69,57%	262	$ 1.906.233.521,78		$ -	74,24%	$ 1.970.252.908,04	784	33	240	0		
4/12/2022	Semana 32	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	75,94%	283	$ 2.159.091.564,70		$ -	83,78%	$ 2.223.111.030,96	784	42	262	0		
11/12/2022	Semana 33	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	82,03%	304	$ 2.167.008.298,49		$ -	84,06%	$ 2.231.027.764,75	784	44	283	0		
18/12/2022	Semana 34	100,00%	$ 5.140.026,35	93,50%		$ 58.879.439,91	93,50%				$ -	2,41%	$ 64.019.466,26	784	44	345	0		
22/12/2022	Semana 35	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%		$ 58.879.439,91	100,00%				$ -	2,41%	$ 64.019.466,26	784	44	369	0		

TOTAL DIAGNOSTICOS APROBADOS **345**

TOTAL INTERVENCIONES TERMINADAS **304**

$ 2.223.111.030,96

$ -

PERSONAL DE OBRA

REPORTE DE PERSONAL DE MANO DE OBRA - 11-12-22			
No. DE LA CUADRILLA	**No. DE MAETROS**	**No. DE AYUDANTES U OFICIALES**	**No. INTERVENCIONES A CARGO**
1	1	1	2
2	1	1	2
3	1	1	2
4	1	1	2
5	1	1	2
6	1	1	2
7	1	1	2
8	1	1	2
9	1	1	2
10	1	1	2
11	1	1	2
12	1	1	1
13	1	1	1
14	1	1	1
15	1	1	1
16	1	1	1
17	1	1	1
18	1	1	1
19	1	1	1
20	1	1	1
21	1	1	1
22	1	1	1
23	1	1	1
24	1	1	1
25	1	1	1
26	1	1	1
27	1	1	1
28	1	1	1
29	1	1	1
30	1	1	1
31	1	1	1
32	1	1	1
TOTAL	**32**	**32**	**43**

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 30/12/2022
HORA: 3:58:51 p. m.
20224300506942

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 30 de diciembre de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-140-22

Señores:
Ingeniera
Erika Marcela Gutiérrez
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: ENTREGA INFORME SEMANAL No 34

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal No. 34 cuyo periodo es del 12 de diciembre del 2022 hasta 18 de diciembre del 2022.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 21 folios
Proyectó: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría.

INFORME SEMANAL 34

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 34	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 34

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **12/12/2022** al **18/12/2022** Fecha **18/12/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** BOLÍVAR **MUNICIPIO** CÓRDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO
SUPERVISOR	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN ACTIVIDAD 3

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.		2220576
Contratista		CONSORCIO CONSTRUREDES
Valor inicial	$	1.771.707.945,99
Valor actual	$	2.654.032.619,99
Variación del valor	$	882.324.674,00
Fecha de Inicio		26/04/2022
Plazo inicial (Días)		150 Días
Plazo actual (Días)	240 Días	8 MESES - 240 DÍAS
Variación en plazo		90 Días
Fecha Contractual de terminación		22/12/2022
Tiempo Transcurrido (días)	236	98,33%
Días remanentes del Contrato	4,00	1,67%
Acumulado a última acta pagada	$	821.329.766,06
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	322.624.898,30

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.		2220587
Interventor		ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.
Valor inicial	$	202.479.313,00
Valor actual	$	313.315.624,00
Variación del valor	$	110.836.311,00
Fecha de Inicio		26/04/2022
Plazo inicial		150 Días
Plazo actual	240 Días	8 MESES - 240 DÍAS
Variación en plazo		90 Días
Fecha Contractual de terminación		22/12/2022
Ejecución del Contrato	236	98,33%
Días remanentes del Contrato	4,00	1,67%
Acumulado a última acta pagada	$	132.623.950,03
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	36.604.468,31

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 2.654.032.619,99

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 2.485.576.479,91	93,65%	$ 2.417.017.337,87	91,07%	-$ 68.559.142,04	-2,58%
Durante el Periodo	$ 84.228.070,04	3,17%	$ 88.929.139,48	3,35%	$ 4.701.069,44	0,18%
Acumulado a la Fecha	**$ 2.569.804.549,95**	**96,83%**	**$ 2.505.946.477,35**	**94,42%**	**-$ 63.858.072,60**	**-2,41%**

Semáforo


Desviación en días: 4 Días




Observaciones al desempeño del proyecto

A la fecha de corte del presente informe tenemos el siguiente reporte:
El día 9 de diciembre se formalizó la prórroga solicitada por el Contratista por los 11 días calendario, con base en este nuevo plazo los avances reportados son:
En cuanto a la actividad 2 el contratista cumplió con los 345 diagnósticos aprobados los cuales corresponden a la cifra contractual, adicionalmente se concedió aval de 12 diagnósticos más en el acta de aprobación No. 22, sin embargo, cabe mencionar que de acuerdo a las condiciones del contrato se deben realizar más diagnósticos hasta agotar el monto total designado, los cuales serán entregados en la siguiente semana. Actividad en la cual se le ha solicitado celeridad al contratista.
El avance de la actividad 3 nos indica las siguientes cifras: un programado del 96,75% frente a un ejecutado del 94,28% lo cual representa un atraso de 2,47% Este atraso corresponde a 32 viviendas dado que el programado es de 357, a la fecha se han intervenido 357 viviendas, de las cuales se han terminado 325 y se adelantan labores constructivas en 32 más, cabe mencionar que aparte de estas en ejecución están pendientes por iniciar alrededor de 13 más para agotar el monto remanente asignado en el contrato.
El atraso general del proyecto equivale al 2,41%, En la última semana el atraso tubo una leve disminución con base en el reporte anterior, sin embargo este atraso debe nivelarse en el transcurso de la semana siguiente, ya que el 22 de diciembre se finaliza el plazo contractual, por esta razón el contratista debe doblar sus esfuerzos y trabajar en horario extendido para cumplir con la entrega de las viviendas y que queden detalles por recibir

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

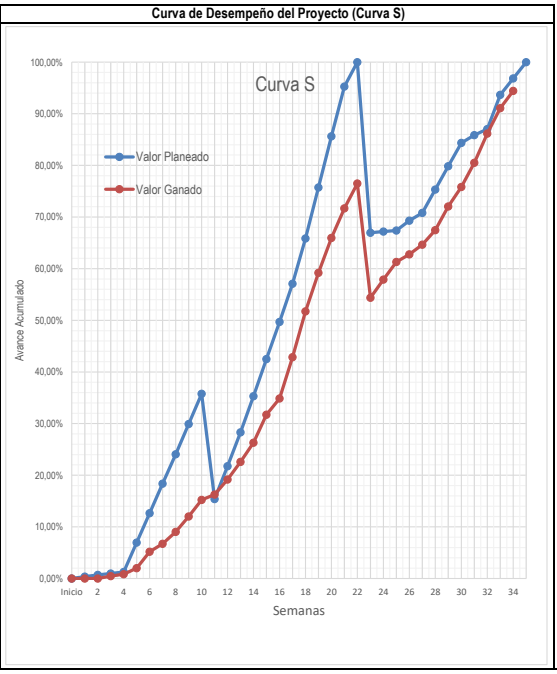

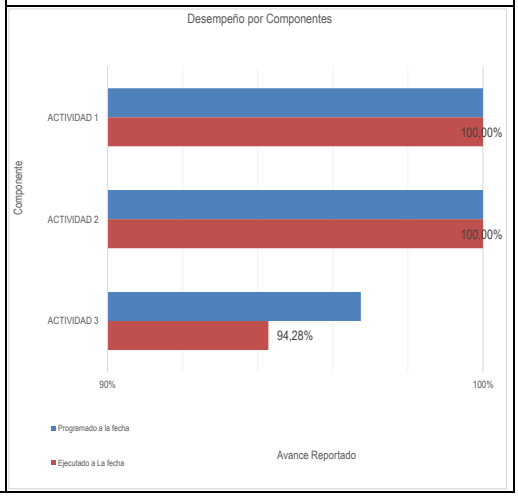

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

A la fecha del presente informe no se han presntado cambios en la LINEA BASE.

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 34	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 34

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **12/12/2022** al **18/12/2022** | Fecha **18/12/2022**

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	93,65%	91,07%	-2,58%	
Durante el Periodo	3,18%	3,35%	0,17%	
Acumulado a la Fecha	**96,83%**	**94,42%**	**-2,41%**	

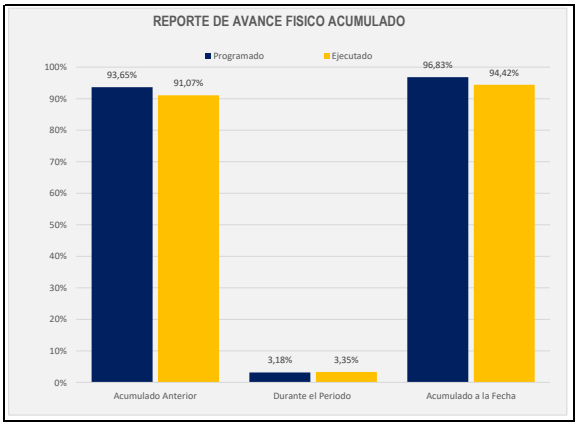


AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 2.654.032.619,99	$ 882.324.674,00	$ 345.450.914,11		$ 345.450.914,11

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
5	$ 1.854.451.044,19	69,87%	4	$ 1.450.337.244,76	54,65%	1/12/2022	$ 322.624.898,30










AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 313.315.624,00	$ 110.836.311,00			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
7	$ 204.749.622,33	65,35%	5	$ 132.623.950,03	42,33%	31/10/2022	$ 36.604.468,31







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDAD No. 1

PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%

Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.

ACTIVIDAD No. 2

PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%

Comentario: A la fecha de corte del 15 de noviembre el contratista cumplió con 345 diagnósticos aprobados en actas, la interventoría dio aval a los últimos 60 diagnósticos mediante comité de aprobación No. 21, el 15 de diciembre se concedió aval para 12 diagnósticos más mediante acta de aprobación No. 22, queda pendiente la inclusión de varias viviendas de acuerdo al remanente que quede correspondiente al monto agotable.

ACTIVIDAD No. 3

PROGRAMADO 96,75% vs 94,28% EJECUTADO

Lo cual nos indica un atraso del 2,47%

En cuanto a la actividad 3 y conforme a las nuevas condiciones del contrato la meta es de 357 viviendas, a la fecha se han intervenido 357 viviendas, de las cuales se han terminado 325 y se adelantan labores constructivas en 32 más (Quedando pendientes alrededor de 13 intervenciones más para agotar el monto asignado), el contratista cuenta con 14 frentes de trabajo vinculados directamente por el Contratista y otros frentes que están contratados como independientes.

El atraso general del proyecto equivale al 2,41%, En la última semana el atraso tubo una leve disminución con base en el reporte anterior, sin embargo este atraso debe nivelarse en el transcurso de la semana siguiente, ya que el 22 de diciembre se finaliza el plazo contractual, por esta razón el contratista debe doblar sus esfuerzos y trabajar en horario extendido para cumplir con la entrega de las viviendas y que queden detalles por recibir

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. El contratista subsanó los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizó entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución. Sin embargo, el Contratista posteriormente solicitó un cambio de especificaciones en algunos ítems, uno de ellos el ladrillo de arcilla por bloque de Concreto, razón por la cual se hace necesario ajustar el diseño estructural con dicho cambio. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.

El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. A corte del 15 de noviembre se aprobaron 60 diagnósticos correspondientes a los 108 de la adición, con lo cual completan 345 diagnósticos aprobados, más 12 diagnósticos avalados por la interventoría mediante acta de aprobación No. 22, cabe mencionar que de acuerdo a las condiciones del contrato se deben realizar más diagnósticos hasta agotar el monto total designado.

En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS

Con corte al 18 de diciembre se han intervenido 357 viviendas de las cuales 325 están terminadas, El contratista tiene en ejecución 32 intervenciones y debe continuar incrementando el personal de obra con el fin de mejorar los rendimientos en la ejecución de las obras y poder finalizar este grupo de viviendas programadas y concentrar los esfuerzos en las intervenciones pendientes.

En la ejecución de las casetas y adecuaciones se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 14 frentes de trabajo contratados directamente por el Consorcio Construredes y otras cuadrillas contratadas por subcontratistas.

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la próxima semana correspondiente al periodo del 19 al 22 de diciembre de 2022 el contratista debe completar al 100% la cantidad de 345 intervenciones contractuales más 25 avaladas mediante acta de aprobación de diagnósticos No. 22 del 15 de diciembre. El día 22 de diciembre de 2022, fecha en la cual se termina el plazo contractual se elaborará el acta de recibo con pendientes, sólo se incluiran en el acta de recibo las viviendas terminadas y las que tengan detalles por culminar, aquellas que no estén en ejecución no serán incluidas dentro del acta así estén aprobadas en los diagnósticos, se establecerá en el mismo documento el plazo que se dará al contratista para la terminación de los pendientes y la fecha en la que se hará la visita para el recibo final

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 34**	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 34

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **12/12/2022** al **18/12/2022** Fecha **18/12/2022**


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0

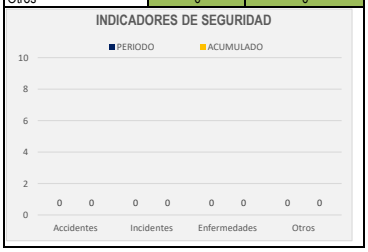

Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	74	0	74	100,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**74**	**0**	**74**	**100,00%**


HORAS PERDIDAS SEMANALES
Acumulado Anterior
Semana Actual
Acumulado
Horas Perdidas
100
75
50
25
0
74 74
0 0 0 0 0 0 0

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 34

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **12/12/2022** al **18/12/2022** Fecha **18/12/2022**

CASETAS O ADECUACIONES, SE APRECIA AVANCE EN EL PAÑETE DE MAMPOSTERIA, FUNDICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS.









ADECUACIONES DE UNIDADES SANITARIAS, SE APRECIA INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, LAVAPLATOS Y LAVADEROS









CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-094-22 con el asunto: SOLICITUD DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CIENTO UN (103) DIAGNÓSTICOS APROBADOS EN EL BARRIO SAN MARTIN por medio del cual solicitamos amablemente su gestión como la empresa prestadora del servicio público de acueducto y alcantarillado, COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CÓRDOBA BOLÍVAR - (COOSEPCOR LTDA), para la expedición del certificado de disponibilidad de redes y de autorización para la Intervención de conexión de las acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado para ciento un (103) diagnósticos en el Barrio San Martín.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-095-22 con el asunto: REITERACION SOLICITUD DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CIENTO NUEVE (109) DIAGNÓSTICOS APROBADOS EN EL BARRIO SAN MARTIN mediante del cual reiteramos la solicitud muy amablemente de su gestión como la empresa prestadora del servicio público de acueducto y alcantarillado, COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CÓRDOBA BOLÍVAR - (COOSEPCOR LTDA), para la expedición del certificado de disponibilidad de redes y de autorización para la Intervención de conexión de las acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado de ser necesario para ciento nueve (109) diagnósticos en el Barrio San Martín, esta solicitud ya fue realizada mediante el oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-094-22 con fecha del 16 de noviembre 2022.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-096-22 con el asunto: Solicitud respuesta Observaciones recorrido de campo Visita Ministerio de Vivienda – 17 de noviembre 2022, mediante el cual solicitamos dar respuesta a las observaciones del informe de visita de supervisión del Ministerio de Vivienda del 17 de noviembre 2022 en el barrio San Martin de Córdoba Bolívar.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-097-22 con el asunto: RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_133 mediante el cual realizamos entrega de aval para 12 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 022

Marcy A. Correa C		Erika M. Gutierrez G	
Firma		**Firma**	
Nombre	Marcy Correa castaño	Nombre	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
	Directora de la interventoría	Supervisor	Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO
ARCA-INT/FDA276-TEC-021	13-jun-22	SOLICITUD RESPUESTA AL CONCEPTO EMITIDO POR COOSEPCOR MEDIANTE ACTA DE REUNION DE OBRA	1	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	13-jun-22

INFORME PCI

Fecha de Corte	18/12/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																									
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES											TOTALES								
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldia	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldia	Respuesta positiva	Respuesta negativa	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	193	23	193	1	223	223	223	0	0	188	35	154	0	154	0	357	347	29	357	1	357	325	53	32	357
	TOTAL	**217**	**0**	**193**	**23**	**193**	**1**	**223**	**223**	**223**	**0**	**0**	**188**	**35**	**154**	**0**	**154**	**0**	**357**	**347**	**29**	**357**	**1**	**357**	**325**	**53**	**32**	**357**

INFORME ESTADO DE COVID-19

enterritorio	**INFORME ESTADO DE COVID - 19**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/12/2022 Y EL 18/12/2022 PLAZO: 7.5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES — CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. — CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
M									

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
MARIELIS OCHOA - INSPECTORA	**MODERNA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Marcy A. Correa C

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPORTE Y EJECUCIÒN DE VIVIENDAS SEMANALES

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 18/12/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001	100%	Adecuacion	$7.967.801,13	$7.967.801,13	9/12/2022	TERMINADA	9/12/2022	14/12/2022	0	5	-5		x
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	100%	Caseta T3	$8.126.190,79	$8.126.190,79	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	100%	Caseta T3	$7.914.431,13	$7.914.431,13	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	20/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	100%	Adecuacion	$7.636.382,30	$7.636.382,30	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	100%	Adecuacion	$7.148.052,07	$7.148.052,07	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	12/06/2022	5	8	-3		x
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	100%	Adecuacion	$7.826.891,21	$7.826.891,21	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	100%	Adecuacion	$7.415.092,49	$7.415.092,49	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	14/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	8	B-C-SM-MZ22-VE-009	100%	Caseta T3	$7.908.010,60	$7.908.010,60	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	16/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	9	B-C-SM-MZ21-VE-010	100%	Caseta T3	$8.928.931,81	$8.928.931,81	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	10	B-C-SM-MZ22-VE-011	100%	Adecuacion	$8.088.174,13	$8.088.174,13	8/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	21/06/2022	5	13	-8		x
SM	1	11	B-C-SM-MZ34-VE-012	100%	Caseta T3	$9.305.276,37	$9.305.276,37	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	12	B-C-SM-MZ21-VE-013	100%	Adecuacion	$5.457.782,54	$5.457.782,54	2/06/2022	TERMINADA	7/06/2022	11/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-014	100%	Caseta T3	$8.614.149,98	$8.614.149,98	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	18/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-015	100%	Caseta T3	$8.265.079,43	$8.265.079,43	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-016	100%	Caseta T3	$9.299.320,83	$9.299.320,83	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	16	B-C-SM-MZ38-VE-017	100%	Caseta T3	$8.532.396,85	$8.532.396,85	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	2	17	B-C-SM-MZ24-VE-018	100%	Caseta T3	$8.502.042,22	$8.502.042,22	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	18	B-C-SM-MZ24-VE-019	100%	Adecuacion	$6.921.383,30	$6.921.383,30	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-020	100%	Adecuacion	$4.593.449,33	$4.593.449,33	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	5	13	-8		x
SM	2	20	B-C-SM-MZ85-VE-021	100%	Caseta T3	$8.614.688,02	$8.614.688,02	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	22/06/2022	8	17	-9		x
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-022	100%	Caseta T3	$8.896.124,14	$8.896.124,14	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	22	B-C-SM-MZ85-VE-023	100%	Adecuacion	$8.133.478,61	$8.133.478,61	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	23	B-C-SM-MZ29-VE-024	100%	Adecuacion	$7.072.986,22	$7.072.986,22	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	2	24	B-C-SM-MZ31-VE-025	100%	Caseta T3	$8.637.204,11	$8.637.204,11	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	25	B-C-SM-MZ31-VE-026	100%	Adecuacion	$5.113.367,92	$5.113.367,92	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	19/06/2022	5	14	-9		x
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-027	100%	Adecuacion	$4.365.339,96	$4.365.339,96	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	14/06/2022	5	9	-4		x
SM	2	27	B-C-SM-MZ31-VE-028	100%	Adecuacion	$7.668.943,15	$7.668.943,15	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	13/06/2022	5	8	-3		x
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-029	100%	Caseta T3	$8.468.136,75	$8.468.136,75	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	29	B-C-SM-MZ31-VE-030	100%	Adecuacion	$4.637.820,16	$4.637.820,16	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	5	11	-6		x
SM	10	30	B-C-SM-MZ31-VE-031	100%	Caseta T2	$8.119.008,44	$8.119.008,44	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	31	B-C-SM-MZ56-VE-038	100%	Adecuacion	$8.227.630,94	$8.227.630,94	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	32	B-C-SM-MZ56-VE-039	100%	Adecuacion	$1.443.687,77	$1.443.687,77	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	33	B-C-SM-MZ46-VE-040	100%	Adecuacion	$6.628.376,66	$6.628.376,66	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	34	B-C-SM-MZ45-VE-041	100%	Adecuacion	$4.845.221,48	$4.845.221,48	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	35	B-C-SM-MZ21-VE-042	100%	Adecuacion	$4.634.812,47	$4.634.812,47	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	36	B-C-SM-MZ31-VE-043	100%	Caseta T3	$6.939.713,07	$6.939.713,07	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	10	37	B-C-SM-MZ145-VE-044	100%	Caseta T3	$7.980.826,25	$7.980.826,25	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	38	B-C-SM-MZ55-VE-046	100%	Caseta T3	$7.344.533,10	$7.344.533,10	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	39	B-C-SM-MZ55-VE-047	100%	Caseta T2	$7.890.285,26	$7.890.285,26	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	5	40	B-C-SM-MZ145-VE-053	100%	Caseta T3	$8.262.443,76	$8.262.443,76	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	10	41	B-C-SM-MZ91-VE-054	100%	Caseta T2	$8.230.167,20	$8.230.167,20	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	42	B-C-SM-MZ56-VE-055	100%	Adecuacion	$3.160.157,78	$3.160.157,78	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	6	43	B-C-SM-MZ55-VE-056	100%	Adecuacion	$8.215.661,11	$8.215.661,11	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	6	44	B-C-SM-M55-VE-061	100%	Adecuacion	$7.040.722,29	$7.040.722,29	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	45	B-C-SM-MZ56-VE-062	100%	Caseta T2	$8.362.124,52	$8.362.124,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	46	B-C-SM-MZ66-VE-067	100%	Caseta T3	$7.306.146,52	$7.306.146,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	47	B-C-SM-MZ66-VE-068	100%	Caseta T3	$7.971.707,31	$7.971.707,31	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	48	B-C-SM-MZ75-VE-071	100%	Adecuacion	$7.170.024,86	$7.170.024,86	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	49	B-C-SM-MZ75-VE-072	100%	Caseta T3	$8.040.278,46	$8.040.278,46	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	50	B-C-SM-MZ75-VE-073	100%	Caseta T3	$8.332.036,11	$8.332.036,11	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	51	B-C-SM-MZ75-VE-074	100%	Caseta T3	$7.656.034,05	$7.656.034,05	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	52	B-C-SM-MZ89-VE-084	100%	Caseta T3	$8.247.304,21	$8.247.304,21	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	5	53	B-C-SM-MZ69-VE-087	100%	Adecuacion	$7.074.492,71	$7.074.492,71	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	54	B-C-SM-MZ69-VE-088	100%	Adecuacion	$7.465.862,82	$7.465.862,82	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	55	B-C-SM-MZ77-VE-094	100%	Adecuacion	$3.585.305,08	$3.585.305,08	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	56	B-C-SM-MZ68-VE-097	100%	Caseta T3	$8.172.428,90	$8.172.428,90	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	7	57	B-C-SM-MZ59-VE-099	100%	Adecuacion	$6.098.594,42	$6.098.594,42	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	58	B-C-SM-MZ84-VE-166	100%	Adecuacion	$6.744.749,39	$6.744.749,39	22/06/2022	TERMINADA	27/06/2022	3/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	59	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	23/06/2022	TERMINADA	28/06/2022	4/07/2022	5	11	-6		x
SM	8	60	B-C-SM-MZ55-VE-060	100%	Caseta T4	$9.444.985,92	$9.444.985,92	24/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	61	B-C-SM-MZ66-VE-069	100%	Adecuacion	$6.509.744,54	$6.509.744,54	25/06/2022	TERMINADA	30/06/2022	6/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	62	B-C-SM-MZ30-VE-032	100%	Adecuacion	$7.557.018,99	$7.557.018,99	26/06/2022	TERMINADA	1/07/2022	7/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	63	B-C-SM-MZ44-VE-034	100%	Adecuacion	$5.519.347,12	$5.519.347,12	27/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	64	B-C-SM-MZ44-VE-035	100%	Adecuacion	$8.137.626,09	$8.137.626,09	28/06/2022	TERMINADA	3/07/2022	9/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	65	B-C-SM-MZ69-VE-085	100%	Adecuacion	$6.566.494,56	$6.566.494,56	29/06/2022	TERMINADA	4/07/2022	10/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	66	B-C-SM-MZ58-VE-100	100%	Caseta T2	$7.970.674,94	$7.970.674,94	30/07/2022	TERMINADA	7/08/2022	13/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	67	B-C-SM-MZ47-VE-104	100%	Adecuacion	$8.247.586,36	$8.247.586,36	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	68	B-C-SM-MZ58-VE-107	100%	Adecuacion	$7.990.185,62	$7.990.185,62	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	69	B-C-SM-MZ58-VE-110	100%	Adecuacion	$6.954.066,54	$6.954.066,54	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	70	B-C-SM-MZ47-VE-111	100%	Caseta t3	$8.318.089,49	$8.318.089,49	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	71	B-C-SM-MZ47-VE-112	100%	Adecuacion	$6.827.279,63	$6.827.279,63	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	72	B-C-SM-MZ47-VE-113	100%	Adecuacion	$5.043.864,80	$5.043.864,80	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	73	B-C-SM-MZ47-VE-114	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	8	74	B-C-SM-MZ47-VE-115	100%	Caseta t3	$8.322.147,74	$8.322.147,74	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	75	B-C-SM-MZ21-VE-118	100%	Caseta t3	$8.148.709,57	$8.148.709,57	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	76	B-C-SM-MZ30-VE-121	100%	Caseta t3	$7.765.616,43	$7.765.616,43	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	77	B-C-SM-MZ59-VE-102	100%	Caseta T2	$8.805.748,18	$8.805.748,18	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	6	78	B-C-SM-MZ58-VE-101	100%	Adecuacion	$5.300.910,78	$5.300.910,78	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	79	B-C-SM-MZ30-VE-122	100%	Caseta t3	$8.106.560,85	$8.106.560,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	80	B-C-SM-MZ30-VE-124	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	81	B-C-SM-MZ87-VE-125	100%	Caseta t3	$8.100.577,85	$8.100.577,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	82	B-C-SM-MZ87-VE-126	100%	Caseta t3	$8.057.934,94	$8.057.934,94	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	83	B-C-SM-MZ30-VE-127	100%	Caseta t3	$7.998.497,33	$7.998.497,33	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	84	B-C-SM-MZ31-VE-142	100%	Adecuacion	$7.456.473,74	$7.456.473,74	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	9	85	B-C-SM-MZ87-VE-128	100%	Adecuacion	$7.523.102,18	$7.523.102,18	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	86	B-C-SM-MZ87-VE-129	100%	Caseta t3	$8.132.932,39	$8.132.932,39	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	5	87	B-C-SM-MZ66-VE-131	100%	Caseta t3	$8.139.325,77	$8.139.325,77	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	88	B-C-SM-MZ67-VE-133	100%	Adecuacion	$6.390.026,30	$6.390.026,30	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	89	B-C-SM-MZ66-VE-134	100%	Adecuacion	$8.426.367,54	$8.426.367,54	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	90	B-C-SM-MZ56-VE-135	100%	Adecuacion	$7.522.231,25	$7.522.231,25	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	91	B-C-SM-MZ56-VE-136	100%	Adecuacion	$7.922.709,35	$7.922.709,35	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	92	B-C-SM-MZ56-VE-138	100%	Adecuacion	$7.984.245,73	$7.984.245,73	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	93	B-C-SM-MZ56-VE-139	100%	Caseta t3	$7.415.285,53	$7.415.285,53	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x

SM	5	94	B-C-SM-MZ56-VE-140	100%	Caseta t3	$8.097.289,18	$8.097.289,18	11/08/2022	**TERMINADA**	**19/08/2022**	25/08/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	7	95	B-C-SM-MZ47-VE-103	100%	Adecuacion	$8.549.349,69	$8.549.349,69	9/08/2022	**TERMINADA**	**14/08/2022**	20/08/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	12	96	B-C-SM-MZ69-VE-086	100%	Caseta t3	$8.441.178,67	$8.441.178,67	15/08/2022	**TERMINADA**	**23/08/2022**	29/08/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	7	97	B-C-SM-MZ32-VE-143	100%	Caseta t3	$8.877.043,95	$8.877.043,95	15/08/2022	**TERMINADA**	**23/08/2022**	29/08/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	6	98	B-C-SM-MZ87-VE-145	100%	Caseta t3	$8.314.813,05	$8.314.813,05	18/08/2022	**TERMINADA**	**26/08/2022**	1/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	6	99	B-C-SM-MZ87-VE-146	100%	Adecuacion	$7.503.681,08	$7.503.681,08	19/08/2022	**TERMINADA**	**24/08/2022**	30/08/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	6	100	B-C-SM-MZ87-VE-147	100%	Caseta t3	$8.285.180,86	$8.285.180,86	20/08/2022	**TERMINADA**	**28/08/2022**	3/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	6	101	B-C-SM-MZ87-VE-148	100%	Caseta t3	$8.170.302,32	$8.170.302,32	21/08/2022	**TERMINADA**	**29/08/2022**	4/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	5	102	B-C-SM-MZ87-VE-149	100%	Caseta t3	$8.178.886,20	$8.178.886,20	22/08/2022	**TERMINADA**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	5	103	B-C-SM-MZ89-VE-150	100%	Caseta t3	$8.339.015,83	$8.339.015,83	23/08/2022	**TERMINADA**	**31/08/2022**	6/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	8	104	B-C-SM-MZ89-VE-151	100%	Adecuacion	$7.760.503,36	$7.760.503,36	24/08/2022	**TERMINADA**	**29/08/2022**	4/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	5	105	B-C-SM-MZ56-VE-152	100%	Caseta t2	$8.292.567,48	$8.292.567,48	25/08/2022	**TERMINADA**	**2/09/2022**	8/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	7	106	B-C-SM-MZ76-VE-153	100%	Adecuacion	$6.803.533,70	$6.803.533,70	26/08/2022	**TERMINADA**	**31/08/2022**	6/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	9	107	B-C-SM-MZ75-VE-154	100%	Adecuacion	$7.419.892,36	$7.419.892,36	27/08/2022	**TERMINADA**	**1/09/2022**	7/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	7	108	B-C-SM-MZ75-VE-155	100%	Adecuacion	$7.958.081,38	$7.958.081,38	28/08/2022	**TERMINADA**	**2/09/2022**	8/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	5	109	B-C-SM-MZ75-VE-156	100%	Adecuacion	$8.011.976,60	$8.011.976,60	29/08/2022	**TERMINADA**	**3/09/2022**	9/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	11	110	B-C-SM-MZ145-VE-157	100%	Adecuacion	$9.653.914,02	$9.653.914,02	30/08/2022	**TERMINADA**	**4/09/2022**	10/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	5	111	B-C-SM-MZ75-VE-158	100%	Adecuacion	$6.846.229,60	$6.846.229,60	31/08/2022	**TERMINADA**	**5/09/2022**	11/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	11	112	B-C-SM-MZ-VE145-160	100%	Adecuacion	$9.325.691,25	$9.325.691,25	21/08/2022	**TERMINADA**	**26/08/2022**	1/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**

SM	11	113	B-C-SM-MZ-VE145-162	100%	Adecuacion	$7.000.723,74	$7.000.723,74	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	5	114	B-C-SM-MZ84-VE-165	100%	Caseta t3	$8.259.418,86	$8.259.418,86	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	115	B-C-SM-MZ91-VE-167	100%	Adecuacion	$7.334.345,73	$7.334.345,73	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	9	116	B-C-SM-MZ77-VE-179	100%	Caseta t3	$8.930.810,61	$8.930.810,61	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	9	117	B-C-SM-MZ87-VE-180	100%	Caseta t3	$8.116.195,29	$8.116.195,29	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	118	B-C-SM-MZ55-VE-048	100%	Caseta t3	$6.887.962,53	$6.887.962,53	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	119	B-C-SM-MZ68-VE-077	100%	Caseta t3	$7.841.298,86	$7.841.298,86	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	120	B-C-SM-MZ89-VE-080	100%	Caseta t2	$7.814.305,69	$7.814.305,69	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	121	B-C-SM-MZ-VE-082	100%	Caseta t4	$9.602.086,12	$9.602.086,12	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	122	B-C-SM-MZ-VE-091	100%	Caseta t3	$8.240.626,46	$8.240.626,46	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	123	B-C-SM-MZ-VE-092	100%	Caseta t2	$8.314.938,30	$8.314.938,30	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	124	B-C-SM-MZ-VE-096	100%	Adecuacion	$7.662.197,96	$7.662.197,96	22/08/2022	TERMINADA	27/08/2022	2/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	125	B-C-SM-MZ30-VE-120	100%	Caseta t4	$8.665.155,76	$8.665.155,76	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	126	B-C-SM-MZ-VE-137	100%	Caseta t3	$8.275.053,67	$8.275.053,67	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	5	127	B-C-SM-MZ92-VE-168	100%	Adecuacion	$6.476.015,92	$6.476.015,92	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	8	128	B-C-SM-MZ92-VE-169	100%	Adecuacion	$6.842.321,91	$6.842.321,91	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	129	B-C-SM-MZ84-VE-178	100%	Adecuacion	$2.230.924,70	$2.230.924,70	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	130	B-C-SM-MZ45-VE-033	100%	Adecuacion	$7.943.448,36	$7.943.448,36	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	131	B-C-SM-MZ76-VE-075	100%	Adecuacion	$7.982.813,63	$7.982.813,63	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	132	B-C-SM-MZ-VE-089	100%	Adecuacion	$7.475.616,81	$7.475.616,81	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	133	B-C-SM-MZ-VE-173	100%	Adecuacion	$7.034.505,34	$7.034.505,34	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	134	B-C-SM-MZ34-VE-209	100%	Adecuacion	$5.856.785,90	$5.856.785,90	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	135	B-C-SM-MZ34-VE-210	100%	Caseta t3	$8.204.915,74	$8.204.915,74	30/08/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	136	B-C-SM-MZ-VE-164	100%	Caseta t3	$7.853.199,32	$7.853.199,32	30/08/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	11	137	B-C-SM-MZ92-VE-203	100%	Adecuacion	$8.272.491,16	$8.272.491,16	30/08/2022	TERMINADA	4/09/2022	10/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	138	B-C-SM-MZ91-VE-205	100%	Adecuacion	$6.742.842,11	$6.742.842,11	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	139	B-C-SM-MZ91-VE-206	100%	Adecuacion	$6.326.983,38	$6.326.983,38	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	140	B-C-SM-MZ145-VE-184	100%	Adecuacion	$7.415.421,93	$7.415.421,93	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	141	B-C-SM-MZ156-VE-058	100%	Adecuacion	$7.430.942,29	$7.430.942,29	1/09/2022	TERMINADA	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	142	B-C-SM-MZ156-VE-059	100%	Adecuacion	$3.514.863,97	$3.514.863,97	1/09/2022	TERMINADA	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	143	B-C-SM-MZ41-VE-141	100%	Adecuacion	$6.179.740,71	$6.179.740,71	2/09/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	144	B-C-SM-MZ32-VE-144	100%	Caseta t4	$7.498.669,53	$7.498.669,53	2/09/2022	TERMINADA	10/09/2022	16/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	145	B-C-SM-MZ89-VE-083	100%	Caseta t3	$7.576.542,11	$7.576.542,11	3/09/2022	TERMINADA	11/09/2022	17/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	146	B-C-SM-MZ46-VE-211	100%	Adecuacion	$7.730.411,89	$7.730.411,89	3/09/2022	TERMINADA	8/09/2022	14/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	147	B-C-SM-MZ46-VE-212	100%	Adecuacion	$5.774.463,33	$5.774.463,33	5/09/2022	TERMINADA	10/09/2022	16/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	148	B-C-SM-MZ46-VE-216	100%	Adecuacion	$8.311.308,81	$8.311.308,81	6/09/2022	TERMINADA	11/09/2022	17/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	149	B-C-SM-MZ30-VE-123	100%	Caseta t3	$8.084.933,32	$8.084.933,32	8/09/2022	TERMINADA	16/09/2022	22/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	150	B-C-SM-MZ66-VE-065	100%	Caseta t3	$7.828.052,76	$7.828.052,76	9/09/2022	TERMINADA	17/09/2022	23/09/2022	8	14	-6		x
SM	15	151	B-C-SM-MZ66-VE-066	100%	Caseta t2	$4.292.672,67	$4.292.672,67	10/09/2022	TERMINADA	18/09/2022	24/09/2022	8	14	-6		x
SM	15	152	B-C-SM-MZ23-VE-117	100%	Adecuacion	$4.772.651,25	$4.772.651,25	11/09/2022	TERMINADA	16/09/2022	22/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	153	B-C-SM-MZ59-VE-187	100%	Adecuacion	$8.212.157,27	$8.212.157,27	11/09/2022	TERMINADA	16/09/2022	22/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	154	B-C-SM-MZ34-VE-116	100%	Caseta t3	$7.989.636,90	$7.989.636,90	12/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	155	B-C-SM-MZ-VE-076	100%	Adecuacion	$7.966.932,81	$7.966.932,81	13/09/2022	TERMINADA	18/09/2022	24/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	156	B-C-SM-MZ87-VE-189	100%	Adecuacion	$6.068.174,04	$6.068.174,04	13/09/2022	TERMINADA	18/09/2022	24/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	157	B-C-SM-MZ18-VE-202	100%	Adecuacion	$8.298.564,37	$8.298.564,37	14/09/2022	TERMINADA	19/09/2022	25/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	158	B-C-SM-MZ55-VE-036	100%	Adecuacion	$4.519.608,59	$4.519.608,59	14/09/2022	TERMINADA	22/09/2022	28/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	159	B-C-SM-MZ45-VE-037	100%	Adecuacion	$5.427.357,42	$5.427.357,42	15/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	160	B-C-SM-MZ75-VE-070	100%	Adecuacion	$4.222.499,91	$4.222.499,91	15/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	161	B-C-SM-MZ67-VE-078	100%	Adecuacion	$5.110.794,97	$5.110.794,97	16/09/2022	TERMINADA	21/09/2022	27/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	162	B-C-SM-MZ34-VE-119	100%	Adecuacion	$7.021.881,94	$7.021.881,94	16/09/2022	TERMINADA	21/09/2022	27/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	163	B-C-SM-MZ56-VE-190	100%	Adecuacion	$7.154.236,55	$7.154.236,55	17/09/2022	TERMINADA	22/09/2022	28/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	164	B-C-SM-MZ56-VE-191	100%	Caseta t3	$8.896.139,02	$8.896.139,02	17/09/2022	TERMINADA	25/09/2022	1/10/2022	8	14	-6		x
SM	13	165	B-C-SM-MZ31-VE-199	100%	Adecuacion	$4.691.093,17	$4.691.093,17	18/09/2022	TERMINADA	24/09/2022	30/09/2022	6	12	-6		x
SM	18	166	B-C-SM-MZ67-VE-183	100%	Caseta t3	$6.957.541,97	$6.957.541,97	18/09/2022	TERMINADA	26/09/2022	2/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	167	B-C-SM-MZ30-VE-200	100%	Caseta t3	$8.312.234,66	$8.312.234,66	19/09/2022	TERMINADA	27/09/2022	3/10/2022	8	14	-6		x
SM	13	168	B-C-SM-MZ31-VE-201	100%	Caseta t3	$6.950.167,16	$6.950.167,16	19/09/2022	TERMINADA	27/09/2022	3/10/2022	8	14	-6		x
SM	13	169	B-C-SM-MZ47-VE-105	100%	Adecuacion	$3.899.268,01	$3.899.268,01	20/09/2022	TERMINADA	25/09/2022	1/10/2022	5	11	-6		x
SM	14	170	B-C-SM-MZ68-VE-108	100%	Adecuacion	$3.617.504,69	$3.617.504,69	20/09/2022	TERMINADA	25/09/2022	1/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	171	B-C-SM-MZ145-VE-208	100%	Adecuacion	$6.196.096,01	$6.196.096,01	21/09/2022	TERMINADA	26/09/2022	2/10/2022	5	11	-6		x
SM	12	172	B-C-SM-MZ66-VE-198	100%	Adecuacion	$5.360.187,87	$5.360.187,87	21/09/2022	TERMINADA	29/09/2022	5/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	173	B-C-SM-MZ30-VE-INC-001	100%	Caseta t3	$9.273.205,89	$9.273.205,89	22/09/2022	TERMINADA	30/09/2022	6/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	174	B-C-SM-MZ36-VE-INC-002	100%	Adecuacion	$7.909.051,57	$7.909.051,57	22/09/2022	TERMINADA	28/09/2022	4/10/2022	6	12	-6		x
SM	17	175	B-C-SM-MZ36-VE-INC-003	100%	Adecuacion	$7.056.470,53	$7.056.470,53	23/09/2022	TERMINADA	29/09/2022	5/10/2022	6	12	-6		x
SM	15	176	B-C-SM-MZ30-VE-INC-004	100%	Caseta t3	$7.321.539,69	$7.321.539,69	23/09/2022	TERMINADA	1/10/2022	7/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	177	B-C-SM-MZ21-VE-INC-005	100%	Adecuacion	$5.983.563,40	$5.983.563,40	24/09/2022	TERMINADA	29/09/2022	5/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	178	B-C-SM-MZ93-VE-INC-006	100%	Adecuacion	$7.900.843,94	$7.900.843,94	24/09/2022	TERMINADA	29/09/2022	5/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	179	B-C-SM-MZ87-VE-INC-007	100%	Caseta t3	$7.343.027,38	$7.343.027,38	25/09/2022	TERMINADA	3/10/2022	9/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	180	B-C-SM-MZ98-VE-INC-008	100%	Caseta t3	$7.345.145,38	$7.345.145,38	26/09/2022	TERMINADA	4/10/2022	10/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	181	B-C-SM-MZ87-VE-INC-009	100%	Adecuacion	$6.166.474,80	$6.166.474,80	27/09/2022	TERMINADA	2/10/2022	8/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	182	B-C-SM-MZ48-VE-INC-010	100%	Adecuacion	$7.156.353,68	$7.156.353,68	27/09/2022	TERMINADA	2/10/2022	8/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	183	B-C-SM-MZ38-VE-INC-013	100%	Caseta t3	$8.739.765,67	$8.739.765,67	28/09/2022	TERMINADA	6/10/2022	12/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	184	B-C-SM-MZ33-VE-INC-014	100%	Adecuacion	$7.094.395,09	$7.094.395,09	28/09/2022	TERMINADA	3/10/2022	9/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	185	B-C-SM-MZ55-VE-064	100%	Adecuacion	$7.807.428,21	$7.807.428,21	29/09/2022	TERMINADA	4/10/2022	10/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	186	B-C-SM-MZ145-VE-161	100%	Adecuacion	$8.918.748,97	$8.918.748,97	29/09/2022	TERMINADA	4/10/2022	10/10/2022	5	11	-6		x
SM	17	187	B-C-SM-MZ31-VE-INC-015	100%	Adecuacion	$7.948.410,17	$7.948.410,17	30/09/2022	TERMINADA	5/10/2022	11/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	188	B-C-SM-MZ33-VE-INC-016	100%	Caseta t3	$7.602.156,55	$7.602.156,55	30/09/2022	TERMINADA	8/10/2022	14/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	189	B-C-SM-MZ85-VE-INC-019	100%	Caseta t3	$7.773.487,18	$7.773.487,18	1/10/2022	TERMINADA	9/10/2022	15/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	190	B-C-SM-MZ97-VE-INC-023	100%	Caseta t3	$8.333.260,29	$8.333.260,29	1/10/2022	TERMINADA	9/10/2022	15/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	191	B-C-SM-MZ45-VE-INC-024	100%	Caseta t3	$8.094.089,35	$8.094.089,35	2/10/2022	TERMINADA	10/10/2022	16/10/2022	8	14	-6		x
SM	18	192	B-C-SM-MZ95-VE-INC-026	100%	Caseta t3	$7.629.024,81	$7.629.024,81	2/10/2022	TERMINADA	10/10/2022	16/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	193	B-C-SM-MZ33-VE-INC-032	100%	Caseta t3	$8.036.839,77	$8.036.839,77	3/10/2022	TERMINADA	11/10/2022	17/10/2022	8	14	-6		x
SM	18	194	B-C-SM-MZ32-VE-INC-035	100%	Caseta t3	$7.811.643,60	$7.811.643,60	4/10/2022	TERMINADA	12/10/2022	18/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	195	B-C-SM-MZ33-VE-INC-027	100%	Caseta T2	$8.012.216,20	$8.012.216,20	5/10/2022	TERMINADA	13/10/2022	19/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	196	B-C-SM-MZ66-VE-INC-033	100%	Adecuacion	$6.628.918,24	$6.628.918,24	5/10/2022	TERMINADA	10/10/2022	16/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	197	B-C-SM-MZ24-VE-INC-034	100%	Caseta t3	$7.997.347,42	$7.997.347,42	6/10/2022	TERMINADA	14/10/2022	20/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	198	B-C-SM-MZ98-VE-INC-036	100%	Caseta t3	$7.885.031,34	$7.885.031,34	6/10/2022	TERMINADA	14/10/2022	20/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	199	B-C-SM-MZ85-VE-INC-038	100%	Caseta t3	$8.272.191,01	$8.272.191,01	7/10/2022	TERMINADA	15/10/2022	21/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	200	B-C-SM-MZ93-VE-INC-039	100%	Adecuacion	$7.727.983,14	$7.727.983,14	7/10/2022	TERMINADA	12/10/2022	18/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	201	B-C-SM-MZ93-VE-INC-040	100%	Adecuacion	$7.621.248,46	$7.621.248,46	8/10/2022	TERMINADA	13/10/2022	19/10/2022	5	11	-6		x
SM	17	202	B-C-SM-MZ86-VE-INC-041	100%	Adecuacion	$7.737.812,12	$7.737.812,12	8/10/2022	TERMINADA	13/10/2022	19/10/2022	5	11	-6		x
SM	17	203	B-C-SM-MZ85-VE-INC-042	100%	Caseta t3	$8.221.884,89	$8.221.884,89	8/10/2022	TERMINADA	16/10/2022	22/10/2022	8	14	-6		x

SM	17	204	B-C-SM-MZ96-VE-INC-046	100%	Caseta t3	$9.156.805,39	$9.156.805,39	9/10/2022	TERMINADA	17/10/2022	23/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	205	B-C-SM-MZ95-VE-INC-049	100%	Caseta t3	$8.256.966,48	$8.256.966,48	10/10/2022	TERMINADA	18/10/2022	24/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	206	B-C-SM-MZ32-VE-INC-050	100%	Caseta t3	$7.745.465,56	$7.745.465,56	11/10/2022	TERMINADA	19/10/2022	25/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	207	B-C-SM-MZ36-VE-INC-051	100%	Adecuacion	$7.443.842,89	$7.443.842,89	12/10/2022	TERMINADA	17/10/2022	23/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	208	B-C-SM-MZ30-VE-INC-052	100%	Caseta t3	$8.090.760,97	$8.090.760,97	13/10/2022	TERMINADA	21/10/2022	27/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	209	B-C-SM-MZ94-VE-INC-053	100%	Adecuacion	$5.710.686,86	$5.710.686,86	13/10/2022	TERMINADA	18/10/2022	24/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	210	B-C-SM-MZ-VE-INC-055	100%	Adecuacion	$7.242.404,18	$7.242.404,18	13/10/2022	TERMINADA	18/10/2022	24/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	211	B-C-SM-MZ-VE-INC-056	100%	Adecuacion	$7.673.332,15	$7.673.332,15	14/10/2022	TERMINADA	19/10/2022	25/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	212	B-C-SM-MZ86-VE-INC-057	100%	Caseta t3	$7.705.011,19	$7.705.011,19	15/10/2022	TERMINADA	23/10/2022	29/10/2022	8	14	-6		x
SM	18	213	B-C-SM-MZ86-VE-INC-058	100%	Caseta t2	$8.107.440,98	$8.107.440,98	16/10/2022	TERMINADA	24/10/2022	30/10/2022	8	14	-6		x
SM	19	214	B-C-SM-MZ48-VE-INC-011	100%	Adecuacion	$6.827.750,12	$6.827.750,12	17/10/2022	TERMINADA	22/10/2022	31/10/2022	5	14	-6		x
SM	17	215	B-C-SM-MZ91-VE-INC-062	100%	Adecuacion	$4.551.930,25	$4.551.930,25	17/10/2022	TERMINADA	22/10/2022	1/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	216	B-C-SM-MZ87-VE-INC-063	100%	Adecuacion	$7.258.523,54	$7.258.523,54	18/10/2022	TERMINADA	23/10/2022	2/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	217	B-C-SM-MZ67-VE-INC-064	100%	Adecuacion	$5.250.910,34	$5.250.910,34	18/10/2022	TERMINADA	23/10/2022	3/11/2022	5	14	-6		x
SM	17	218	B-C-SM-MZ91-VE-INC-065	100%	Caseta T3	$8.132.709,35	$8.132.709,35	19/10/2022	TERMINADA	27/10/2022	4/11/2022	8	14	-6		x
SM	18	219	B-C-SM-MZ21-VE-INC-066	100%	Caseta T3	$8.884.140,18	$8.884.140,18	19/10/2022	TERMINADA	27/10/2022	5/11/2022	8	14	-6		x
SM	18	220	B-C-SM-MZ47-VE-INC-068	100%	Adecuacion	$5.141.678,32	$5.141.678,32	20/10/2022	TERMINADA	25/10/2022	6/11/2022	5	14	-6		x
SM	18	221	B-C-SM-MZ47-VE-INC-069	100%	Adecuacion	$5.804.814,20	$5.804.814,20	20/10/2022	TERMINADA	25/10/2022	7/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	222	B-C-SM-MZ46-VE-INC-070	100%	Adecuacion	$7.533.082,62	$7.533.082,62	20/10/2022	TERMINADA	25/10/2022	8/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	223	B-C-SM-MZ32-VE-INC-071	100%	Adecuacion	$4.494.495,27	$4.494.495,27	21/10/2022	TERMINADA	26/10/2022	9/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	224	B-C-SM-MZ32-VE-INC-072	100%	Adecuacion	$2.547.155,48	$2.547.155,48	21/10/2022	TERMINADA	26/10/2022	10/11/2022	5	14	-6		x
SM	18	225	B-C-SM-MZ32-VE-INC-073	100%	Adecuacion	$5.899.252,59	$5.899.252,59	22/10/2022	TERMINADA	27/10/2022	11/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	226	B-C-SM-MZ95-VE-INC-025	100%	Caseta T3	$7.925.272,79	$7.925.272,79	22/10/2022	TERMINADA	30/10/2022	12/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	227	B-C-SM-MZ48-VE-INC-029	100%	Adecuacion	$8.123.075,86	$8.123.075,86	22/10/2022	TERMINADA	27/10/2022	13/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	228	B-C-SM-MZ86-VE-INC-030	100%	Caseta T3	$8.938.581,32	$8.938.581,32	23/10/2022	TERMINADA	31/10/2022	14/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	229	B-C-SM-MZ98-VE-INC-031	100%	Caseta T3	$7.166.340,15	$7.166.340,15	23/10/2022	TERMINADA	31/10/2022	15/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	230	B-C-SM-MZ32-VE-INC-017	100%	Caseta T3	$7.936.218,15	$7.936.218,15	23/10/2022	TERMINADA	31/10/2022	16/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	231	B-C-SM-MZ145-VE-163	100%	Adecuacion	$7.980.298,74	$7.980.298,74	24/10/2022	TERMINADA	29/10/2022	16/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	232	B-C-SM-MZ86-VE-INC-043	100%	Caseta T3	$7.671.439,94	$7.671.439,94	25/10/2022	TERMINADA	2/11/2022	16/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	233	B-C-SM-MZ98-VE-INC-044	100%	Caseta T3	$7.978.159,51	$7.978.159,51	26/10/2022	TERMINADA	3/11/2022	16/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	234	B-C-SM-MZ91-VE-INC-091	100%	Adecuacion	$7.816.920,63	$7.816.920,63	27/10/2022	TERMINADA	1/11/2022	16/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	235	B-C-SM-MZ86-VE-INC-093	100%	Caseta T3	$9.612.473,24	$9.612.473,24	28/10/2022	TERMINADA	5/11/2022	16/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	236	B-C-SM-MZ36-VE-INC-118	100%	Caseta T3	$8.070.784,75	$8.070.784,75	29/10/2022	TERMINADA	6/11/2022	16/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	237	B-C-SM-MZ48-VE-INC-145	100%	Caseta T3	$8.404.448,59	$8.404.448,59	30/10/2022	TERMINADA	7/11/2022	16/11/2022	8	14	-6		x
SM	12	238	B-C-SM-MZ-VE-093	100%	Adecuacion	$7.207.274,62	$7.207.274,62	1/11/2022	TERMINADA	7/11/2022	13/11/2022	6	12	-6		x
SM	18	239	B-C-SM-MZ75-VE-130	100%	Adecuacion	$5.087.108,21	$5.087.108,21	1/11/2022	TERMINADA	6/11/2022	12/11/2022	5	11	-6		x
SM	11	240	B-C-SM-MZ66-VE-132	100%	Adecuacion	$7.421.836,98	$7.421.836,98	2/11/2022	TERMINADA	7/11/2022	13/11/2022	5	11	-6		x
SM	9	241	B-C-SM-MZ92-VE-170	100%	Adecuacion	$6.456.971,29	$6.456.971,29	4/11/2022	TERMINADA	9/11/2022	15/11/2022	5	11	-6		x
SM	10	242	B-C-SM-MZ91-VE-171	100%	Adecuacion	$7.013.453,53	$7.013.453,53	5/11/2022	TERMINADA	10/11/2022	16/11/2022	5	11	-6		x
SM	7	243	B-C-SM-MZ75-VE-172	100%	Adecuacion	$8.210.038,72	$8.210.038,72	6/11/2022	TERMINADA	11/11/2022	17/11/2022	5	11	-6		x
SM	18	244	B-C-SM-MZ93-VE-174	100%	Adecuacion	$6.560.835,40	$6.560.835,40	7/11/2022	TERMINADA	12/11/2022	18/11/2022	5	11	-6		x
SM	18	245	B-C-SM-MZ86-VE-INC-080	100%	Caseta T3	$8.436.036,24	$8.436.036,24	8/11/2022	TERMINADA	16/11/2022	22/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	246	B-C-SM-MZ95-VE-INC-173	100%	Caseta T3	$8.297.659,07	$8.297.659,07	8/11/2022	TERMINADA	16/11/2022	22/11/2022	8	14	-6		x
SM	20	247	B-C-SM-MZ48-VE-INC-028	100%	Adecuacion	$5.338.458,70	$5.338.458,70	9/11/2022	TERMINADA	14/11/2022	20/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	248	B-C-SM-MZ68-VE-INC-059	100%	Adecuacion	$6.561.578,46	$6.561.578,46	9/11/2022	TERMINADA	14/11/2022	20/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	249	B-C-SM-MZ32-VE-INC-075	100%	Adecuacion	$4.281.987,94	$4.281.987,94	9/11/2022	TERMINADA	14/11/2022	20/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	250	B-C-SM-MZ31-VE-INC-077	100%	Caseta T3	$8.209.906,38	$8.209.906,38	10/11/2022	TERMINADA	18/11/2022	24/11/2022	8	14	-6		x
SM	20	251	B-C-SM-MZ59-VE-INC-086	100%	Adecuacion	$4.202.570,37	$4.202.570,37	10/11/2022	TERMINADA	15/11/2022	21/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	252	B-C-SM-MZ68-VE-INC-087	100%	Adecuacion	$5.197.963,52	$5.197.963,52	10/11/2022	TERMINADA	15/11/2022	21/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	253	B-C-SM-MZ59-VE-INC-095	100%	Adecuacion	$5.330.404,94	$5.330.404,94	11/11/2022	TERMINADA	16/11/2022	22/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	254	B-C-SM-MZ59-VE-INC-099	100%	Adecuacion	$6.288.082,10	$6.288.082,10	11/11/2022	TERMINADA	16/11/2022	22/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	255	B-C-SM-MZ48-VE-INC-101	100%	Adecuacion	$4.388.042,03	$4.388.042,03	11/11/2022	TERMINADA	16/11/2022	22/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	256	B-C-SM-MZ38-VE-INC-108	100%	Caseta T2	$8.106.576,63	$8.106.576,63	12/11/2022	TERMINADA	20/11/2022	26/11/2022	8	14	-6		x
SM	20	257	B-C-SM-MZ98-VE-INC-109	100%	Adecuacion	$3.942.607,23	$3.942.607,23	12/11/2022	TERMINADA	17/11/2022	23/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	258	B-C-SM-MZ49-VE-INC-123	100%	Adecuacion	$5.692.446,92	$5.692.446,92	12/11/2022	TERMINADA	17/11/2022	23/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	259	B-C-SM-MZ23-VE-INC-129	100%	Adecuacion	$7.800.567,25	$7.800.567,25	13/11/2022	TERMINADA	18/11/2022	24/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	260	B-C-SM-MZ017-VE-INC-131	100%	Adecuacion	$5.746.289,90	$5.746.289,90	13/11/2022	TERMINADA	18/11/2022	24/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	261	B-C-SM-MZ016-VE-INC-133	100%	Adecuacion	$6.646.756,60	$6.646.756,60	13/11/2022	TERMINADA	18/11/2022	24/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	262	B-C-SM-MZ-VE23-INC-138	100%	Adecuacion	$5.369.396,54	$5.369.396,54	13/11/2022	TERMINADA	18/11/2022	24/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	263	B-C-SM-MZ86-VE-INC-151	100%	Adecuacion	$6.730.435,17	$6.730.435,17	14/11/2022	TERMINADA	19/11/2022	25/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	264	B-C-SM-MZ105-VE-INC-197	100%	Adecuacion	$4.158.209,45	$4.158.209,45	14/11/2022	TERMINADA	19/11/2022	25/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	265	B-C-SM-MZ94-VE-INC-213	100%	Adecuacion	$4.022.013,54	$4.022.013,54	14/11/2022	TERMINADA	19/11/2022	25/11/2022	5	11	-6		x
SM	21	266	B-C-SM-MZ93-VE-INC-163	100%	Adecuacion	$7.300.892,28	$7.300.892,28	15/11/2022	TERMINADA	20/11/2022	26/11/2022	5	11	-6		x
SM	21	267	B-C-SM-MZ59-VE-207	100%	Adecuacion	$6.020.072,11	$6.020.072,11	15/11/2022	TERMINADA	20/11/2022	26/11/2022	5	11	-6		x
SM	21	268	B-C-SM-MZ48-VE-INC-134	100%	Adecuacion	$5.219.825,26	$5.219.825,26	15/11/2022	TERMINADA	20/11/2022	26/11/2022	5	11	-6		x
SM	21	269	B-C-SM-MZ49-VE-INC-137	100%	Adecuacion	$4.246.004,15	$4.246.004,15	16/11/2022	TERMINADA	21/11/2022	27/11/2022	5	11	-6		x
SM	21	270	B-C-SM-MZ93-VE-INC-175	100%	Adecuacion	$6.751.782,32	$6.751.782,32	16/11/2022	TERMINADA	21/11/2022	27/11/2022	5	11	-6		x
SM	21	271	B-C-SM-MZ106-VE-INC-184	100%	Adecuacion	$6.935.558,95	$6.935.558,95	16/11/2022	TERMINADA	21/11/2022	27/11/2022	5	11	-6		x
SM	20	272	B-C-SM-MZ68-VE-INC-084	100%	Caseta T3	$8.320.404,99	$8.320.404,99	17/11/2022	TERMINADA	25/11/2022	1/12/2022	8	14	-6		x
SM	20	273	B-C-SM-MZ49-VE-INC-127	100%	Caseta T4	$8.531.015,62	$8.531.015,62	17/11/2022	TERMINADA	25/11/2022	1/12/2022	8	14	-6		x
SM	20	274	B-C-SM-MZ93-VE-INC-164	100%	Caseta T3	$9.236.090,18	$9.236.090,18	18/11/2022	TERMINADA	26/11/2022	2/12/2022	8	14	-6		x
SM	21	275	B-C-SM-MZ69-VE-176	100%	Caseta T3	$4.778.954,24	$4.778.954,24	18/11/2022	TERMINADA	26/11/2022	2/12/2022	8	14	-6		x
SM	21	276	B-C-SM-MZ58-VE-177	100%	Adecuacion	$3.411.187,99	$3.411.187,99	19/11/2022	TERMINADA	24/11/2022	30/11/2022	5	11	-6		x
SM	21	277	B-C-SM-MZ70-VE-INC-054	100%	Adecuacion	$6.466.021,02	$6.466.021,02	19/11/2022	TERMINADA	24/11/2022	30/11/2022	5	11	-6		x
SM	21	278	B-C-SM-MZ38-VE-INC-061	100%	Adecuacion	$7.016.743,60	$7.016.743,60	20/11/2022	TERMINADA	25/11/2022	1/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	279	B-C-SM-MZ32-VE-INC-076	100%	Adecuacion	$6.334.029,19	$6.334.029,19	20/11/2022	TERMINADA	25/11/2022	1/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	280	B-C-SM-MZ48-VE-INC-119	100%	Adecuacion	$6.874.221,12	$6.874.221,12	21/11/2022	TERMINADA	26/11/2022	2/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	281	B-C-SM-MZ56-VE-INC-120	100%	Adecuacion	$6.903.872,09	$6.903.872,09	21/11/2022	TERMINADA	26/11/2022	2/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	282	B-C-SM-MZ48-VE-INC-183	100%	Adecuacion	$7.023.620,46	$7.023.620,46	21/11/2022	TERMINADA	26/11/2022	2/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	283	B-C-SM-MZ38-VE-INC-078	100%	Adecuacion	$3.367.297,55	$3.367.297,55	22/11/2022	TERMINADA	27/11/2022	3/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	284	B-C-SM-MZ41-VE-INC-081	100%	Adecuacion	$4.759.043,39	$4.759.043,39	22/11/2022	TERMINADA	27/11/2022	3/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	285	B-C-SM-MZ96-VE-INC-177	100%	Adecuacion	$4.353.379,09	$4.353.379,09	23/11/2022	TERMINADA	28/11/2022	4/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	286	B-C-SM-MZ58-VE-INC-111	100%	Adecuacion	$3.025.651,65	$3.025.651,65	23/11/2022	TERMINADA	28/11/2022	4/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	287	B-C-SM-MZ36-VE-INC-126	100%	Adecuacion	$7.357.844,70	$7.357.844,70	23/11/2022	TERMINADA	28/11/2022	4/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	288	B-C-SM-MZ23-VE-INC-128	100%	Adecuacion	$6.248.480,68	$6.248.480,68	24/11/2022	TERMINADA	29/11/2022	5/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	289	B-C-SM-MZ97-VE-INC-179	100%	Adecuacion	$7.384.917,39	$7.384.917,39	24/11/2022	TERMINADA	29/11/2022	5/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	290	B-C-SM-MZ96-VE-INC-187	100%	Adecuacion	$7.709.795,70	$7.709.795,70	24/11/2022	TERMINADA	29/11/2022	5/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	291	B-C-SM-MZ96-VE-INC-188	100%	Adecuacion	$6.302.033,86	$6.302.033,86	25/11/2022	TERMINADA	30/11/2022	6/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	292	B-C-SM-MZ98-VE-INC-189	100%	Adecuacion	$8.233.353,74	$8.233.353,74	25/11/2022	TERMINADA	30/11/2022	6/12/2022	5	11	-6		x

SM	21	293	B-C-SM-MZ48-VE-INC-096	100%	Adecuacion	$6.859.171,05	$6.859.171,05	25/11/2022	TERMINADA	30/11/2022	6/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	294	B-C-SM-MZ24-VE-INC-098	100%	Caseta T1	$8.682.895,90	$8.682.895,90	26/11/2022	TERMINADA	4/12/2022	10/12/2022	8	14	-6		x
SM	21	295	B-C-SM-MZ38-VE-INC-104	100%	Adecuacion	$4.515.305,50	$4.515.305,50	26/11/2022	TERMINADA	1/12/2022	7/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	296	B-C-SM-MZ94-VE-INC-132	100%	Adecuacion	$6.493.545,21	$6.493.545,21	26/11/2022	TERMINADA	1/12/2022	7/12/2022	5	11	-6		x
SM	21	297	B-C-SM-MZ91-VE-INC-090	100%	Caseta T3	$9.400.048,37	$9.400.048,37	27/11/2022	TERMINADA	5/12/2022	11/12/2022	8	14	-6		x
SM	21	298	B-C-SM-MZ87-VE-INC-092	100%	Caseta T3	$8.024.497,65	$8.024.497,65	27/11/2022	TERMINADA	5/12/2022	11/12/2022	8	14	-6		x
SM	21	299	B-C-SM-MZ59-VE-INC-100	100%	Adecuacion	$4.665.073,76	$4.665.073,76	28/11/2022	TERMINADA	7/12/2022	13/12/2022	9	15	-6		x
SM	21	300	B-C-SM-MZ17-VE-INC-106	100%	Adecuacion	$8.299.427,57	$8.299.427,57	28/11/2022	TERMINADA	8/12/2022	14/12/2022	10	16	-6		x
SM	21	301	B-C-SM-MZ69-VE-INC-112	100%	Adecuacion	$6.081.041,12	$6.081.041,12	28/11/2022	TERMINADA	9/12/2022	15/12/2022	11	17	-6		x
SM	21	302	B-C-SM-MZ97-VE-INC-114	100%	Caseta T3	$7.563.464,48	$7.563.464,48	29/11/2022	TERMINADA	11/12/2022	17/12/2022	12	18	-6		x
SM	21	303	B-C-SM-MZ36-VE-INC-121	100%	Adecuacion	$3.440.319,57	$3.440.319,57	29/11/2022	TERMINADA	12/12/2022	18/12/2022	13	19	-6		x
SM	21	304	B-C-SM-MZ36-VE-INC-122	100%	Adecuacion	$3.508.566,53	$3.508.566,53	29/11/2022	TERMINADA	13/12/2022	19/12/2022	14	20	-6		x
SM	21	305	B-C-SM-MZ78-VE-INC-139	100%	Adecuacion	$6.324.599,62	$6.324.599,62	30/11/2022	TERMINADA	15/12/2022	21/12/2022	15	21	-6		x
SM	21	306	B-C-SM-MZ78-VE-INC-142	100%	Adecuacion	$5.885.758,44	$5.885.758,44	30/11/2022	TERMINADA	16/12/2022	22/12/2022	16	22	-6		x
SM	21	307	B-C-SM-MZ59-VE-INC-143	100%	Caseta T3	$8.167.825,19	$8.167.825,19	30/11/2022	TERMINADA	17/12/2022	23/12/2022	17	23	-6		x
SM	21	308	B-C-SM-MZ60-VE-INC-144	100%	Adecuacion	$6.230.549,90	$6.230.549,90	1/12/2022	TERMINADA	19/12/2022	25/12/2022	18	24	-6		x
SM	21	309	B-C-SM-MZ48-VE-INC-146	100%	Adecuacion	$4.395.472,81	$4.395.472,81	1/12/2022	TERMINADA	20/12/2022	26/12/2022	19	25	-6		x
SM	21	310	B-C-SM-MZ86-VE-INC-154	100%	Caseta T3	$7.973.180,18	$7.973.180,18	1/12/2022	TERMINADA	21/12/2022	27/12/2022	20	26	-6		x
SM	21	311	B-C-SM-MZ38-VE-INC-160	100%	Adecuacion	$4.623.473,63	$4.623.473,63	2/12/2022	TERMINADA	23/12/2022	29/12/2022	21	27	-6		x
SM	21	312	B-C-SM-MZ98-VE-INC-174	100%	Caseta T3	$7.972.082,02	$7.972.082,02	2/12/2022	TERMINADA	24/12/2022	30/12/2022	22	28	-6		x
SM	21	313	B-C-SM-MZ103-VE-INC-178	100%	Adecuacion	$4.799.097,62	$4.799.097,62	2/12/2022	TERMINADA	25/12/2022	31/12/2022	23	29	-6		x
SM	21	314	B-C-SM-MZ101-VE-INC-190	100%	Caseta T3	$10.025.465,77	$10.025.465,77	3/12/2022	TERMINADA	27/12/2022	2/01/2023	24	30	-6		x
SM	21	315	B-C-SM-MZ102-VE-INC-191	100%	Adecuacion	$5.905.162,68	$5.905.162,68	3/12/2022	TERMINADA	28/12/2022	3/01/2023	25	31	-6		x
SM	21	316	B-C-SM-MZ98-VE-INC-192	100%	Caseta T3	$6.949.279,75	$6.949.279,75	3/12/2022	TERMINADA	29/12/2022	4/01/2023	26	32	-6		x
SM	21	317	B-C-SM-MZ96-VE-INC-193	100%	Adecuacion	$6.903.465,94	$6.903.465,94	4/12/2022	TERMINADA	31/12/2022	6/01/2023	27	33	-6		x
SM	21	318	B-C-SM-MZ95-VE-INC-185	100%	Adecuacion	$3.769.208,51	$3.769.208,51	4/12/2022	TERMINADA	1/01/2023	7/01/2023	28	34	-6		x
SM	20	319	B-C-SM-MZ33-VE-INC-094	100%	Adecuacion	$6.352.965,97	$6.352.965,97	5/12/2022	TERMINADA	3/01/2023	9/01/2023	29	35	-6		x
SM	20	320	B-C-SM-MZ48-VE-INC-124	85%	Caseta T3	$7.905.569,70	$6.719.734,25	5/12/2022	EN EJECUCION	4/01/2023	10/01/2023	30	36	-6		x
SM	20	321	B-C-SM-MZ84-VE-INC-125	85%	Caseta T3	$9.115.960,01	$7.748.566,01	5/12/2022	EN EJECUCION	5/01/2023	11/01/2023	31	37	-6		x
SM	20	322	B-C-SM-MZ70-VE-INC-141	85%	Caseta T3	$8.210.724,19	$6.979.115,56	5/12/2022	EN EJECUCION	6/01/2023	12/01/2023	32	38	-6		x
SM	20	323	B-C-SM-MZ86-VE-INC-148	85%	Caseta T3	$8.267.285,91	$7.027.193,02	5/12/2022	EN EJECUCION	7/01/2023	13/01/2023	33	39	-6		x
SM	20	324	B-C-SM-MZ86-VE-INC-152	85%	Adecuacion	$5.686.744,56	$4.833.732,88	6/12/2022	EN EJECUCION	9/01/2023	15/01/2023	34	40	-6		x
SM	20	325	B-C-SM-MZ86-VE-INC-153	85%	Caseta T3	$7.942.989,18	$6.751.540,80	6/12/2022	EN EJECUCION	10/01/2023	16/01/2023	35	41	-6		x
SM	20	326	B-C-SM-MZ48-VE-INC-182	85%	Caseta T3	$8.743.515,52	$7.431.988,19	6/12/2022	EN EJECUCION	11/01/2023	17/01/2023	36	42	-6		x
SM	21	327	B-C-SM-MZ102-VE-INC-105	85%	Caseta T3	$7.620.116,73	$6.477.099,22	7/12/2022	EN EJECUCION	13/01/2023	19/01/2023	37	43	-6		x
SM	21	328	B-C-SM-MZ76-VE-INC-110	85%	Adecuacion	$3.661.130,40	$3.111.960,84	7/12/2022	EN EJECUCION	14/01/2023	20/01/2023	38	44	-6		x
SM	21	329	B-C-SM-MZ21VE-INC-116	75%	Caseta T3	$9.762.419,29	$7.321.814,47	7/12/2022	EN EJECUCION	15/01/2023	21/01/2023	39	45	-6		x
SM	21	330	B-C-SM-MZ103VE-INC-135	75%	Adecuacion	$6.796.538,06	$5.097.403,55	7/12/2022	EN EJECUCION	16/01/2023	22/01/2023	40	46	-6		x
SM	21	331	B-C-SM-MZ104VE-INC-176	75%	Caseta T3	$9.771.011,16	$7.328.258,37	8/12/2022	EN EJECUCION	18/01/2023	24/01/2023	41	47	-6		x
SM	21	332	B-C-SM-MZ101VE-INC-180	75%	Adecuacion	$5.670.027,72	$4.252.520,79	8/12/2022	EN EJECUCION	19/01/2023	25/01/2023	42	48	-6		x
SM	21	333	B-C-SM-MZ98VE-INC-181	75%	Adecuacion	$6.221.221,23	$4.665.915,92	8/12/2022	EN EJECUCION	20/01/2023	26/01/2023	43	49	-6		x
SM	21	334	B-C-SM-MZ93VE-INC-201	75%	Adecuacion	$5.137.794,12	$3.853.345,59	8/12/2022	EN EJECUCION	21/01/2023	27/01/2023	44	50	-6		x
SM	21	335	B-C-SM-MZ85-VE-INC-117	75%	Adecuacion	$7.447.189,73	$5.585.392,30	8/12/2022	EN EJECUCION	22/01/2023	28/01/2023	45	51	-6		x
SM	21	336	B-C-SM-MZ-VE-INC-217	75%	Adecuacion	$5.439.062,10	$4.079.296,58	8/12/2022	EN EJECUCION	23/01/2023	29/01/2023	46	52	-6		x
SM	9	337	B-C-SM-MZ56-VE-192	100%	Adecuacion	$2.924.848,88	$2.924.848,88	5/12/2022	TERMINADA	21/01/2023	27/01/2023	47	53	-6		x
SM	13	338	B-C-SM-MZ33-VE-193	100%	Caseta T3	$8.081.818,61	$8.081.818,61	1/12/2022	TERMINADA	18/01/2023	24/01/2023	48	54	-6		x
SM	10	339	B-C-SM-MZ33-VE-194	100%	Adecuacion	$7.097.058,66	$7.097.058,66	5/12/2022	TERMINADA	23/01/2023	29/01/2023	49	55	-6		x
SM	10	340	B-C-SM-MZ33-VE-195	100%	Adecuacion	$5.575.323,63	$5.575.323,63	5/12/2022	TERMINADA	24/01/2023	30/01/2023	50	56	-6		x
SM	11	341	B-C-SM-MZ33-VE-196	100%	Adecuacion	$8.337.864,77	$8.337.864,77	5/12/2022	TERMINADA	25/01/2023	31/01/2023	51	57	-6		x
SM	10	342	B-C-SM-MZ41-VE-197	100%	Adecuacion	$8.310.190,06	$8.310.190,06	5/12/2022	TERMINADA	26/01/2023	1/02/2023	52	58	-6		x
SM	18	343	B-C-SM-MZ77-VE-INC-047	65%	Caseta T2	$8.221.884,89	$5.344.225,18	8/12/2022	EN EJECUCION	30/01/2023	5/02/2023	53	59	-6		x
SM	18	344	B-C-SM-MZ58-VE-INC-082	65%	Adecuacion	$5.382.315,64	$3.498.505,17	9/12/2022	EN EJECUCION	1/02/2023	7/02/2023	54	60	-6		x
SM	18	345	B-C-SM-MZ58-VE-INC-083	65%	Caseta T3	$5.087.054,31	$3.306.585,30	9/12/2022	EN EJECUCION	2/02/2023	8/02/2023	55	61	-6		x
SM	22	346	B-C-SM-MZ59-VE-051	35%	Adecuacion	$6.823.925,47	$2.388.373,91	16/12/2022	EN EJECUCION	10/02/2023	16/02/2023	56	62	-6		x
SM	22	347	B-C-SM-MZ59-VE-052	35%	Adecuacion	$6.971.878,08	$2.440.157,33	16/12/2022	EN EJECUCION	11/02/2023	17/02/2023	57	63	-6		x
SM	22	348	B-C-SM-MZ68-VE-INC-085	35%	Caseta T3	$8.082.987,92	$2.829.045,77	16/12/2022	EN EJECUCION	12/02/2023	18/02/2023	58	64	-6		x
SM	22	349	B-C-SM-MZ104-VE-INC-186	35%	Caseta T3	$7.749.925,82	$2.712.474,04	16/12/2022	EN EJECUCION	13/02/2023	19/02/2023	59	65	-6		x
SM	22	350	B-C-SM-MZ95-VE-INC-194	35%	Adecuacion	$9.959.609,03	$3.485.863,16	16/12/2022	EN EJECUCION	14/02/2023	20/02/2023	60	66	-6		x
SM	22	351	B-C-SM-MZ94-VE-INC-195	35%	Adecuacion	$5.960.692,21	$2.086.242,27	16/12/2022	EN EJECUCION	15/02/2023	21/02/2023	61	67	-6		x
SM	22	352	B-C-SM-MZ105-VE-INC-196	30%	Adecuacion	$8.205.637,15	$2.461.691,15	17/12/2022	EN EJECUCION	17/02/2023	23/02/2023	62	68	-6		x
SM	22	353	B-C-SM-MZ93-VE-INC-198	35%	Caseta T3	$7.718.170,03	$2.701.359,51	17/12/2022	EN EJECUCION	18/02/2023	24/02/2023	63	69	-6		x
SM	22	354	B-C-SM-MZ106-VE-INC-199	35%	Adecuacion	$3.991.763,17	$1.397.117,11	17/12/2022	EN EJECUCION	19/02/2023	25/02/2023	64	70	-6		x
SM	22	355	B-C-SM-MZ94-VE-INC-209	35%	Caseta T3	$7.700.256,81	$2.695.089,88	17/12/2022	EN EJECUCION	20/02/2023	26/02/2023	65	71	-6		x
SM	22	356	B-C-SM-MZ92-VE-INC-223	35%	Caseta T3	$7.671.874,57	$2.685.156,10	17/12/2022	EN EJECUCION	21/02/2023	27/02/2023	66	72	-6		x
SM	22	357	B-C-SM-MZ48-VE-INC-224	35%	Adecuacion	$7.096.399,89	$2.483.739,96	17/12/2022	EN EJECUCION	22/02/2023	28/02/2023	67	73	-6		x

CUADRO DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMAS Y EJECUTADAS

Fechas de Corte		Actividad 1			Actividad 2				Actividad 3				Actividad 4			Total		Terminaciones Esperadas Periodo	Terminaciones Acumuladas Esperadas	Terminaciones Esperadas Periodo	Terminaciones Ejecutadas Periodo	Terminaciones Ejecutadas Acumuladas	valor ejec
		$ 5.140.026,35			$ 58.879.439,91				$ 2.590.013.153,73				$ -			$ 2.654.032.619,99							
													$ -			$ -							
		$ 5.140.026,35			$ 58.879.439,91				$ 2.590.013.153,73				$ -			$ 2.654.032.619,99							
1/03/2022	Semana 1	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%			$ -	0,00%	0	$ -			$ -	0,00%	$ -				0	0			
8/03/2022	Semana 2	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%			$ -	0,00%	0	$ -			$ -	0,10%	$ 2.570.013,18				0	0			
15/03/2022	Semana 3	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%			$ -	0,00%	0	$ -			$ -	0,19%	$ 5.140.026,35				0	0			
22/03/2022	Semana 4	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%			$ -	0,00%	0	$ -			$ -	0,19%	$ 5.140.026,35				0	0			
29/05/2022	Semana 5	100,00%	$ 5.140.026,35	7,38%	24		$ 4.348.020,18	0,00%	3	$ 22.883.102,57			$ -	1,22%	$ 32.371.149,10	10		0	0	-	-	-	
5/06/2022	Semana 6	100,00%	$ 5.140.026,35	9,23%	30		$ 5.435.025,22	0,87%	6	$ 45.766.205,14			$ -	2,13%	$ 56.341.256,71	20	5	3	0				
12/06/2022	Semana 7	100,00%	$ 5.140.026,35	12,92%	42		$ 7.609.035,31	1,74%	10	$ 76.777.008,56			$ -	3,35%	$ 89.026.070,22	40	12	6	0				
19/06/2022	Semana 8	100,00%	$ 5.140.026,35	15,69%	51		$ 9.239.542,88	2,90%	14	$ 106.787.811,98			$ -	4,57%	$ 121.167.381,21	90	23	10	0				
26/06/2022	Semana 9	100,00%	$ 5.140.026,35	21,85%	71		$ 12.862.893,03	4,06%	18	$ 137.298.615,41			$ -	5,85%	$ 155.301.534,78	150	25	14	0				
3/07/2022	Semana 10	100,00%	$ 5.140.026,35	28,92%	94		$ 17.029.745,70	5,22%	22	$ 167.809.418,83			$ -	7,16%	$ 189.979.190,88	230	18	18	0				
10/07/2022	Semana 11	100,00%	$ 5.140.026,35	35,38%	115		$ 20.834.263,35	6,38%	26	$ 198.320.222,25			$ -	8,45%	$ 224.294.511,96	280	20	22	0				
17/07/2022	Semana 12	100,00%	$ 5.140.026,35	43,38%	141		$ 25.544.618,55	7,54%	30	$ 228.831.025,68			$ -	9,78%	$ 259.515.679,57	330	20	26	0				
24/07/2022	Semana 13	100,00%	$ 5.140.026,35	43,38%	141		$ 25.544.618,55	8,70%	45	$ 343.246.538,51			$ -	14,09%	$ 373.931.183,41	430	10	30	0				
31/07/2022	Semana 14	100,00%	$ 5.140.026,35	49,23%	160		$ 28.986.801,19	13,04%	48	$ 366.129.641,08			$ -	15,09%	$ 400.256.468,62	500	12	45	0				
7/08/2022	Semana 15	100,00%	$ 5.140.026,35	52,31%	170		$ 30.798.476,28	13,91%	60	$ 457.662.051,35			$ -	18,60%	$ 493.600.553,98	600	20	48	0				
14/08/2022	Semana 16	100,00%	$ 5.140.026,35	55,08%	179		$ 32.428.983,83	17,39%	66	$ 503.428.256,49			$ -	20,38%	$ 540.997.266,67	708	35	60	0				
21/08/2022	Semana 17	100,00%	$ 5.140.026,35	62,46%	203		$ 36.777.004,01	19,13%	80	$ 610.216.068,47			$ -	24,57%	$ 652.133.098,83	740	30	66	0				
28/08/2022	Semana 18	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217		$ 39.313.349,11	23,19%	91	$ 694.120.777,88			$ -	27,83%	$ 738.574.153,34	784	30	80	0				
4/09/2022	Semana 19	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217		$ 39.313.349,11	26,38%	101	$ 770.397.786,44			$ -	30,70%	$ 814.851.161,90	784	32	91	0				
11/09/2022	Semana 20	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217		$ 39.313.349,11	29,28%	116	$ 884.813.295,28			$ -	35,01%	$ 929.266.574,74	784	41	101	0				
18/09/2022	Semana 21	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217		$ 39.313.349,11	33,62%	137	$ 1.044.995.017,25			$ -	41,05%	$ 1.089.448.392,71	784	41	116	0				
25/09/2022	Semana 22	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217		$ 39.313.349,11	39,71%	149	$ 1.136.527.427,52			$ -	44,50%	$ 1.180.980.802,08	784	33	137	0				
2/10/2022	Semana 23	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217		$ 39.313.349,11	43,19%	160	$ 1.220.432.136,94			$ -	47,66%	$ 1.264.885.512,40	784	42	149	0				
9/10/2022	Semana 24	100,00%	$ 5.140.026,35	72,92%	237		$ 42.936.699,26	46,38%	174	$ 1.308.267.503,62			$ -	51,03%	$ 1.354.344.229,23	784	42	160	0				
16/10/2022	Semana 25	100,00%	$ 5.140.026,35	78,77%	256		$ 46.378.880,00	50,43%	185	$ 1.349.246.419,91			$ -	52,78%	$ 1.400.765.326,26	708	35	174	0				
23/10/2022	Semana 26	100,00%	$ 5.140.026,35	88,00%	286		$ 51.813.905,00	53,62%	191	$ 1.404.101.290,40			$ -	55,05%	$ 1.461.055.221,75	740	30	185	0				
30/10/2022	Semana 27	100,00%	$ 5.140.026,35	88,00%	286		$ 51.813.906,00	55,36%	199	$ 1.466.420.769,84			$ -	57,40%	$ 1.523.374.702,10	784	30	191	0				
6/11/2022	Semana 28	100,00%	$ 5.140.026,35	88,00%	286		$ 51.813.906,00	57,68%	207	$ 1.529.330.565,92			$ -	59,77%	$ 1.586.284.498,37	784	32	199	0				
13/11/2022	Semana 29	100,00%	$ 5.140.026,35	88,00%	286		$ 51.813.906,00	60,00%	225	$ 1.658.836.495,44			$ -	64,65%	$ 1.715.795.427,79	784	41	207	0				
20/11/2022	Semana 30	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345		$ 58.879.439,91	65,22%	240	$ 1.948.789.254,20			$ -	75,84%	$ 2.012.809.720,46	784	41	225	0				
27/11/2022	Semana 31	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345		$ 58.879.439,91	69,57%	262	$ 1.906.233.521,78			$ -	74,24%	$ 1.970.252.988,04	784	33	240	0				
4/12/2022	Semana 32	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345		$ 58.879.439,91	75,94%	283	$ 2.159.091.564,70			$ -	83,76%	$ 2.223.111.030,96	784	42	262	0				
11/12/2022	Semana 33	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345		$ 58.879.439,91	82,03%	304	$ 2.167.008.298,49			$ -	84,06%	$ 2.231.027.764,75	784	44	283	0				
18/12/2022	Semana 34	100,00%	$ 5.140.026,35	93,00%	357		$ 73.937.835,06	90,75%	325	$ 2.300.146.506,92			$ -	89,62%	$ 2.378.624.358,35	784	44	357	0				
22/12/2022	Semana 35	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%				100,00%					$ -	0,19%	$ 5.140.026,35	784	44	369	0				

TOTAL DIAGNOSTICOS APROBADOS 357

TOTAL INTERVENCIONES TERMINADAS 325

$ 2.223.111.030,96

$ -

PERSONAL DE OBRA

REPORTE DE PERSONAL DE MANO DE OBRA - 18-12-22			
No. DE LA CUADRILLA	**No. DE MAETROS**	**No. DE AYUDANTES U OFICIALES**	**No. INTERVENCIONES A CARGO**
1	1	1	2
2	1	1	2
3	1	1	2
4	1	1	2
5	1	1	2
6	1	1	2
7	1	1	2
8	1	1	1
9	1	1	1
10	1	1	1
11	1	1	1
12	1	1	1
13	1	1	1
14	1	1	1
15	1	1	1
16	1	1	1
17	1	1	1
18	1	1	1
19	1	1	1
20	1	1	1
21	1	1	1
22	1	1	1
23	1	1	1
24	1	1	1
25	1	1	1
TOTAL	**25**	**25**	**32**

COMPONENTE HSE DEL PROYECTO

Formato
Informe HSE Interventoría No 03
IN-FG-11 V:1

ARCA

PROYECTO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	PERIODO			1 al 22 diciembre de 2022		
		CUMPLIMIENTO					
ITEM	ASPECTOS PARA DESTACAR EN LA GESTIÓN MENSUAL (CONTRATISTA)	CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	ASPECTOS A MEJORAR
IMPLEMENTACIÓN DEL SG SST	El contratista cuenta con Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo, el cual se ha venido implementado en el transcurso del periodo ejecutado, se evidencia la afiliaciones del personal tanto administrativo, como operativo. Se implementó el PAPSO, actualmente se encuentra en un porcentaje de cumplimiento del 100%. Se continúa con la implementación de las medidas de bioseguridad: toma de temperatura, encuesta de auto condiciones, limpieza y desinfección de puestos de trabajo y oficinas con hipoclorito diluido y alcohol. El personal del contratista cuenta con los EPP requeridos y los utiliza de manera correcta. Se tienen publicadas las políticas y normas de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se cuenta con elementos para atención de emergencias y la brigada de emergencias. Plan de trabajo anual 90 %. Programa de capacitaciones ejecutado en un 100% Programa de inspecciones ejecutado en un 100%. Implementación del PAPSO en un 100%.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Continuar con la implementación de la interventoría
AFILIACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	El CONSORCIO CONSTRUREDES en el periodo reportado continua presentando los soporte de pago de seguridad social de 24 personas y/ o afiliaciones del personal administrativo y operativo que trabajo, estas son revisadas y avaladas por el profesional PGIO del contratista, así mismo son verificados por la interventoria donde se evidencia que se realizaron las afiliaciones correspondientes en caso de no presentarse la información pertinente se restringe el ingreso a obra del personal que no cuente con afiliaciones o pagos vigentes por parte de interventoria.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Hacer la entrega de la información completa para el ingreso del personal de acuerdo a los lineamientos establecidos por la interventoría.
DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	En recorridos diarios realizados por interventoría, se evidencia la entrega y reposición de los EPP, uso de dotación, en el periodo se mantiene la entrega de tapabocas como medida preventiva para el peligro biológico presente por COVID -19 , se exige el uso adecuado, se reitera al contratista realizar inspección diaria, verificando las condiciones de la dotación y porte de la misma de acuerdo al manual de imagen de Enterritorrio.		X		50%	Profesional PGIO del Contratista	Hacer la entrega de Elementos de protección personal y la dotación al personal de obra y asegurar el uso por parte del contratista.
PLAN DE EMERGENCIAS, EQUIPOS DE ATENCION DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION	En el periodo se realiza ubicación de señalización preventiva, de obligatoriedad y de salvamento, se establecen salidas de emergencias, de acuerdo a la dinámica y avance de la obra ,así mismo se mantienen punto de encuentro, puntos con elementos de atención a emergencias con camilla, botiquin, extintor , ubicado en el campamento de obra, se tiene realizo la conformación de la brigada para atención de emergencias, en el periodo no se presentaron emergencias.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	En el momento que se encuentre el personal de obra se debe realizar la conformación de la brigada de emergencia.
PLAN DE TRABAJO ANUAL, CAPACITACIONES Y CHARLAS	El contratista inicia con la realización de charlas diarias por parte del profesional PGIO. Interventoría realiza la revisión y seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo establecido en el SG-SST, se evidencia el cumplimiento del 90 % , se recomienda al contratista realizar todas las actividades planeadas.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Hacer entrega de los soportes del informe, y realizar todas actividades planificadas.
CONFORMACION Y REUNIONES DE COMITÉ COPASST Y COMMVENCIA:	El CONSORCIO CONSTRUREDES en el periodo reportado, realizo reunión del Copasst el 19 de octubre del 2022, para el periodo no aplica realizar reunión de comité de convivencia laboral, así mismo se evidencia que para el periodo no se presenta posibles casos para ser evaluados por el COCOLA.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Hacer la reuniones mensuales y trimestrales de cada uno de los comités.
PAZ Y SALVOS TRABAJADORES	Se realiza la entrega por parte del contratista Consorcio Construredes de 9 paz y salvos de personal retirado del mes de septiembre, así mismo se evidencia el retiro de 2 personas , las cuales se presenta los paz y salvos, se evidencia la falta de la entrega del señor Oswaldo Garzón, este profesional fue retirado en el mes mayo del 2022.		X		50%	Profesional PGIO del Contratista	En el momento de salida de personal realizar la entrega de paz y salvo
PERMISOS DE TRABAJO (ALTURA, CALIENTE, ESPACIO CONFINADO)	De acuerdo al avance de obra el contratista continua realizando tareas de alto riesgo en trabajo en alturas (TSA) , por lo cual implementa los formatos requeridos de acuerdo a los procedimientos establecidos para dichas actividades como (permisos, inspecciones preoperacionales y análisis de trabajo seguro (ATS) de la diferente maquinaria, equipos y herramientas electromecánicas) estos firmados y avalados por profesional de apoyo PGIO del contratista, interventoría sugiere realizar seguimiento a las medidas preventivas establecidas en los ATS realizados para las actividades.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Realizar el diligenciamiento de los permisos de acuerdo a las actividades de alto de riesgo ejecutadas(Trabajo en Altura)
ASPECTOS AMBIENTALES (AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE)	• La Interventoría evidencia que el contratista ha implementado las medidas de manejo ambiental establecidas en el contrato se debe reforzar las mejoras en los acopios de material, en cuanto a señalización señalizados y demarcados, se solicita el constante orden y aseo en espacios exteriores, por lo que el contratista toma las medidas necesarias y realiza las respectivas jornadas. • Se cuenta con la documentación de los materiales como insumos, equipos, maquinaria, volquetas, entre otros. Se solicito al contratista hacer refuerzo en el acopio, en el manejo de suelo reforzar las hojas de seguridad y las etiquetas. • En este periodo ingresó material granular a obra. Los certificados y permisos ambientales de los proveedores de estos materiales fueron presentados Licencia Ambiental de la Resolución 1266 del 2008 se evidencia que Sociedad MINERA DE LOS SANTOS S.A, está avalado para explotación y comercialización de material pétreo, se solicita al contratista realizar el requerimiento al proveedor la actualización del titulo minero HHNL-20ya que se tenía vigente hasta el 02 de agosto del 2037. • La obra cuenta con un punto ecológico el cual fue adecuado con la nueva normatividad en colores, dichos puntos están señalizados y demarcados, de tal manera que los trabajadores identifiquen donde deben realizar el depósito de los residuos. Solamente fue necesario realizar el retiro de residuos sólidos ordinarios de obra. • La Interventoría sugiere mantener y mejorar los puntos de acopio de los materiales granulares que se encuentran en obra, en cuanto señalización , demarcación y protección. • La Interventoría solicita de manera permanente el orden y aseo dentro del proyecto, se insistió en la generación de una brigada de orden y aseo para mantener los espacios organizados.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Darle cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental diseñado para el proyecto.
PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION	• Para este periodo Para el periodo del mes de octubre de 2022, se realizaron actividades de excavaciones de las cimentaciones de las baterías sanitarias y la estructura de soporte del tanque elevado, los materiales obtenidos de las excavaciones realizadas, la cantidad reutilizada fue 45 m3 para compartir las zapatas de las estructuras del tanque elevado y para conformar el relleno de las planillas cuando se requiere ganar altura para las pendientes de adecuación de las baterías sanitarias.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Se debe realizar clasificación en los frentes de trabajo.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS EN OBRA	El CONSORCIO CONSTRUREDES en el periodo reportado, se evidencia un vehículo, el uso de herramientas menores (pulidoras) que se encuentran en obra cuentan con la documentación reglamentaria y aprobación de la interventoría. A la fecha de corte de este periodo informado se cuenta con la autorización de acceso para:-1 volquetas.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Realizar todas las inspecciones realizadas en el proyecto
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DENTRO DE LA OBRA	Actualmente el Contratista cuenta con un punto ecológico en obra y con un recipiente rojo adicional destinado solo a la disposición de los residuos generados por la implementación del PAPSO en obra. Se entregaron los residuos ordinarios generados en obra al recolector autorizado del municipio.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Se debe realizar clasificación en los frentes de trabajo.
MANEJO DE CAMPAMENTO (SERVICIOS SANITARIOS)	El proyecto de obra cuenta con el respectivo campamento, el mismo se encuentra señalizado, se tiene 1 unidad sanitaria para el servicio del personal femenino y masculino, se cuenta con área de almacén y punto de atención al ciudadano.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Verificar el uso de baño de los trabajadores en los frentes de trabajo.
OTROS CUALES	En recorridos diarios realizados por interventoría se evidencia la presencia de condiciones inseguras y la ocurrencia actos inseguros por parte de los trabajadores, los cuales son direccionados al profesional SST del contratista para que sean subsanados de manera inmediata, mejorando así las condiciones y controlando los peligros presente durante la ejecución de la actividades, a los cuales el contratista realiza la gestión necesaria para atender las solicitudes realizadas. En el periodo no se presentaron casos positivos para covid-19.						

	ASPECTOS PARA DESTACAR (INTERVENTORÍA)
SEGUIMIENTO A NIVEL CUMPLIMIENTO FRENTE A NORMATIVA EN SST (Inducción Inicial, Certificado de 50 horas, Llamada en Seguridad y salud en el Trabajo, Designación de Responsable, Matriz de peligros, Plan de formación anual, Plan de trabajo anual, Diagnostico de Condiciones, estadísticas de incidentes, niveles de cumplimiento del decreto 1072 del 2015 y Resolución 312 del 2019)	Interventoría cuenta con la documentación del SGSST para la implementación en obra , Certificado de 50 horas, Licencia en Seguridad y salud en el Trabajo, Designación de Responsable, Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos . Actualmente se cuenta con 12 profesionales asesores de interventoría quieres apoyan el proceso desde sus áreas , todos cuentan con pagos de parafiscales con afiliaciones vigentes a la EPS, ARL , AFP y CCF ; a todos los profesionales se les han realizado los examenes médicos de ingreso, conocen las políticas, procedimientos y protocolos establecidos en el SG-SST a si mismo el PAPSO establecido por la empresa y el aprobado para la obra ,se realizan capacitaciones mensuales a través de boletines informativos . Durante este periodo no se presentaron accidentes laborales , para este periodo no se presentó ausentismo por enfermedad general, el personal se encuentra capacitado de acuerdo los peligros asociados y presentes durante la ejecución de sus actividades.
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA (Señalización de obra, Manejo de aguas superficiales, Manejo y disposición de escombros, Transporte de materiales y escombros, Manejo de maquinaria y equipo, Almacenamiento y manejo de materiales de construcción, Manejo de residuos líquidos, combustible, aceite y materiales químicos de emisiones atmosféricas, Control de plagas, Llamadas, permisos y trámites, Manejo de componentes transferidos, Control de plagas)	Para este periodo la interventoría cuenta con un campamento, el mismo está debidamente señalizado, Se fomenta el orden y aseo y desinfección en cada puesto de trabajo de manera periódica. Se utiliza de manera responsable los recursos de energía, agua y papelería. Se cuenta con cartelera informativa. se realizan capacitaciones mensuales a través de boletines informativos.
	La Interventoría verifica y controla todos los aspectos mediante inspecciones diarias, verificación documental de los informes mensuales, RCD, maquinaria y equipos, documentación de licencias y certificados generados para el proyecto, las apreciaciones generadas se transmiten al contratista mediante informes técnicos, oficios, notas en bitácora y correos electrónicos.

INDICADORES RESULTADO SST

CONSTANTE K	120																						
PERIODO	No TOTAL DE PERSONAS MENSUAL		No TOTAL DE HORAS MENSUALES				TOTAL HORAS TRABAJADAS		INCIDENTES LABORALES		No DIAS DE INCAPACIDADES CAUSADOS		No ACCIDENTES		No ACCIDENTES MORTALES		No. DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES LABORALES		DIAS CARGADOS FOLIO LÍMITE		ENFERMEDAD LABORAL	
	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTV HORA EXTRA	INTV HORA NOC	CONTRA HORA EXTRA	CONTRA HORA NOC	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA
MAYO	3	4	0	576	0	3168	576	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUNIO	3	22	0	5328	0	4368	1392	5328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JULIO	3	22	0	5328	0	4368	1392	5328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGOSTO	3	22	0	5328	0	4344	1392	5328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEPTIEMBRE	3	16	0	3264	0	4368	1392	5328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCTUBRE	3	22	0	5328	0	4368	1392	5328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOVIEMBRE	3	24	0	5568	0	4368	1392	5328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DICIEMBRE	3	24	0	5568	0	4368	1392	5328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Formato
Informe HSE Interventoría No 08
IN-FG-11 V1

ARCA

PROYECTO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	PERIODO	1 al 22 diciembre de 2022

PERIODO	SEVERIDAD DE LOS ACCIDENTES LABORALES		FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES LABORALES		FRECUENCIA DE LOS INCIDENTES LABORALES		MORALIDAD DE LOS ACCIDENTES LABORALES		PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL		INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL		AUSENTISMO LABORAL		AUSENTISMO COMÚN		INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES		OBSERVACION INDICADORES INTERVENTORÍA	OBSERVACION INDICADORES CONTRATISTA
	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA		
MAYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	En el periodo no se presentaron accidentes de trabajo ,ni Incidentes laborales.	En el periodo no se presentaron accidentes de trabajo ,ni Incidentes laborales.
JUNIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
JULIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
AGOSTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
OCTUBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
NOVIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
DICIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		

INDICADORES ESTRUCTURA Y PROCESO DE INTERVENTORÍA SST

PERIODO	POLITICA SG SST				FUNCIONAMIENTO COPASST				CUMPLIMIENTO DE PLAN DE TRABAJO ANUAL				INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES			
	N° de trabajadores que conocen la Política	No. Total de Trabajadores	RESULTADO	ANALISIS	No de actas de reunión realizadas	No total de actas al mes	RESULTADO	ANALISIS	Actividades Ejecutadas x 100	No. Actividades Programadas.	RESULTADO	ANALISIS	No de accidentes y/o Incidentes Investigados	No accidentes y/o Incidentes reportados	RESULTADO	ANALISIS
MAYO	0	0	100%	Todo el personal cuenta con una inducción y tiene conocimiento de la política	1	1	100%	Se realiza la reunión de COPASST del mes.	1	1	100%	Se realizan las actividades previstas para el mes	0	0	0%	No se han reportado accidentes de trabajo para el periodo
JUNIO	0	0	100%	Todo el personal cuenta con una inducción y tiene conocimiento de la política	1	1	100%	Se realiza la reunión de COPASST del mes.	1	1	100%	Se realizan las actividades previstas para el mes	0	0	0%	No se han reportado accidentes de trabajo para el periodo
JULIO	0	0	100%	Todo el personal cuenta con una inducción y tiene conocimiento de la política	1	1	100%	Se realiza la reunión de COPASST del mes.	1	1	100%	Se realizan las actividades previstas para el mes	0	0	0%	No se han reportado accidentes de trabajo para el periodo
AGOSTO	0	0	100%	Todo el personal cuenta con una inducción y tiene conocimiento de la política	1	1	100%	Se realiza la reunión de COPASST del mes.	1	1	100%	Se realizan las actividades previstas para el mes	0	0	0%	No se han reportado accidentes de trabajo para el periodo
SEPTIEMBRE	0	0	100%	Todo el personal cuenta con una inducción y tiene conocimiento de la política	1	1	100%	Se realiza la reunión de COPASST del mes.	1	1	100%	Se realizan las actividades previstas para el mes	0	0	0%	No se han reportado accidentes de trabajo para el periodo
OCTUBRE	0	0	100%	Todo el personal cuenta con una inducción y tiene conocimiento de la política	1	1	100%	Se realiza la reunión de COPASST del mes.	1	1	100%	Se realizan las actividades previstas para el mes	0	0	0%	No se han reportado accidentes de trabajo para el periodo
NOVIEMBRE	0	0	100%	Todo el personal cuenta con una inducción y tiene conocimiento de la política	1	1	100%	Se realiza la reunión de COPASST del mes.	1	1	100%	Se realizan las actividades previstas para el mes	0	0	0%	No se han reportado accidentes de trabajo para el periodo
DICIEMBRE	0	0	100%	Todo el personal cuenta con una inducción y tiene conocimiento de la política	1	1	100%	Se realiza la reunión de COPASST del mes.	1	1	100%	Se realizan las actividades previstas para el mes	0	0	0%	No se han reportado accidentes de trabajo para el periodo

REPORTE DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES DE TRABAJO

FECHA	INCIDENTE	ACCIDENTE	CEDULA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CARGO	DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE O ACCIDENTE	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	DÍAS DE INCAPACIDAD
N/A				N/A				N/A		

CAPACITACIONES Y CHARLAS

FECHA DE CAPACITACIÓN	TEMÁS DE LA CAPACITACIÓN Y/O CHARLA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
diciembre-22	Autocuidado y procedimiento seguro en excavacion.	X	X
diciembre-22	Socialización de Boletin SSTA # 4		X

CONTROL AMBIENTAL

PERIODO	RELACION DE MATERIAL DE PETREO			DISPOSICION RESIDUOS SOLIDOS				RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN				ACCIDENTE E INCIDENTE AMBIENTAL				OBSERVACIONES DE AMBIENTALES
	Tipo de material	Cantidad	Cantera	RECICLABLES (papel, plástico, vidrio, chatarra)	ORDINARIO	PELIGROSOS	OTROS	DESCAPOTE	EXCAVACION	ESCOMBRO	ESCOMBRERA	FECHA	LUGAR	DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN	
MAYO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
JUNIO	ARENA DE RIO	35	Licencia Ambiental de la Resolución 743 del 2018 se evidencia que Trituradora y Agregados del Caribe S.A.S	0	0	0	0	0	0	32	Reutilización de material de excavación en relleno .	N/A	N/A	N/A	N/A	Para el periodo no se presentaron accidentes de emergencia, , se ingreso material granular, y no se realizo retiro de material RCD, pero se realizo reutilización en el proyecto.
	GRAVA	35														
JULIO	ARENA DE RIO	35	Licencia Ambiental de la Resolución 743 del 2018 se evidencia que Trituradora y Agregados del Caribe S.A.S	0	0	0	0	0	0	65	Reutilización de material de excavación en relleno .	N/A	N/A	N/A	N/A	
	GRAVA	30														
AGOSTO	ARENA DE RIO	119	Licencia Ambiental de la Resolución 743 del 2018 se evidencia que Trituradora y Agregados del Caribe S.A.S	0	0	0	0	0	0	27	Reutilización de material de excavación en relleno .	N/A	N/A	N/A	N/A	
	GRAVA	70														
SEPTIEMBRE	ARENA DE RIO	98	Licencia Ambiental de la Resolución 1295 del 2008 se evidencia que Sociedad MINERA DE LOS SANTOS S.A	0	0	0	0	0	0	42	Reutilización de material de excavación en relleno .	N/A	N/A	N/A	N/A	
	GRAVA	50														
OCTUBRE	ARENA DE RIO	56	Licencia Ambiental de la Resolución 1295 del 2008 se evidencia que Sociedad MINERA DE LOS SANTOS S.A	0	0	0	0	0	0	45	Reutilización de material de excavación en relleno .	N/A	N/A	N/A	N/A	
	GRAVA	50														
NOVIEMBRE	ARENA DE RIO	166	Licencia Ambiental de la Resolución 1295 del 2008 se evidencia que Sociedad MINERA DE LOS SANTOS S.A	0	0	0	0	0	0	50	Reutilización de material de excavación en relleno .	N/A	N/A	N/A	N/A	
	GRAVA	70														
DICIEMBRE	ARENA DE RIO	70	Licencia Ambiental de la Resolución 1295 del 2008 se evidencia que Sociedad MINERA DE LOS SANTOS S.A	0	0	0	0	0	0	45	Reutilización de material de excavación en relleno .	N/A	N/A	N/A	N/A	
	GRAVA	40														

FOTOGRAFÍA





UBICACIÓN: CORDOBA-BOLIVAR
COMENTARIOS: VERIFICACIÓN DE CONDICIONES HSE

FOTOGRAFÍA






UBICACIÓN: CORDOBA-BOLIVAR
COMENTARIOS: VERIFICACIÓN DE CONDICIONES HSE

FOTOGRAFÍA





UBICACIÓN: CORDOBA-BOLIVAR
COMENTARIOS: VERIFICACIÓN DE CONDICIONES HSE

OBSERVACIÓN Y/O CONCLUSIÓN: En este período se evidencio que dentro de los requerimientos hechos al contratista se ha cumplido en un 92,3 % con los aspectos de Seguridad Industrial, Salud en el trabajo, Medio ambiente, se debe hacer la entrega de de seguridad social a tiempo por parte del contratista, se evidencia la falta del buen uso de los elementos de protección personal y dotación establecida en el proyecto, falta de entrega de paz y salvos de personal retirado del proyecto, en los aspectos que hasta la fecha están pendiente se realizará un estricto control para que en este proyecto se minimicen los factores de riesgo de accidentes, se le solicita al contratista una gestión permanente. La interventoría verifica y controla todos estos aspectos mediante inspecciones diarias, verificación documental de los planes generados para el proyecto y la normatividad vigente en cuanto seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.

V.	VERIFICACIÓN	APROBACIÓN
INSPECTOR Y/O RESIDENTE	COORDINADOR DE GESTIÓN HSEQ PROYECTO	DIRECTOR

Formato
Control De Licencias Ambientales
IN-FO-53 V:3

OBRA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

PERMISO	LOCALIZACIÓN	MATERIAL	NO LICENCIA / PERMISO	AUTORIDAD AMBIENTAL	VIGENCIA / LICENCIA / PERMISO
Cantera Triturados y Agregados del Caribe S.A.S Licencia Ambiental	Bosconia Cesar	Por medio de la cual se otorga a A& G Constructores S.A.S. con identificación tributaria N° 900193651-7 Licencia Ambiental Global, para la explotación de un yacimineto de materiales de construcción, en jurisdicción del Municipio de Bosconia Cesar, en desarrollo del contrato de conseción minera KHE -08121 del 24 de noviembre del 2009.	Resolución 743 del 2018	CORPOCESAR	30 años
Sociedad MINERA DE LOS SANTOS S.A Licencia Ambiental	Bosconia Cesar	Aprobar la CESION DEL 100% de los derechos preferencias. beneficios y obligaciones emanados del Contrato de concesion 0363-20, de la Sociedad MINERA DE LOS SANTOS S.A a favor de la Sociedad MARMOLES VENEZIANOS LTDA., segun Resolucion 00006 del 11/01/2012 y modificada con la Resolucion 000162 del 24/09/2012.	Resolución 1266 del 2008	CORPOCESAR	30 años

YIRA LEMUS GÓMEZ. ESP. AMBIENTAL
Diligencia

EL SUSCRITO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DE ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A., CERTIFICA;

Que durante el periodo comprendido del 1 al 22 de diciembre del 2022, **ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A** con **NIT: 800173768-1**, evidencia que el contratista CONSORCIO CONSTRUREDES de acuerdo con las obligaciones del contrato 2220576 con objeto "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.)., da el cumplimiento normatividad ambiental, se evidencia la implementación del Plan de Manejo Ambiental diseñado para el proyecto, evidenciando la implementación de los programas mediante las fichas de manejo ambiental.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintiséis días (26) del mes de diciembre de 2022.

Marcy A. Correa C

Marcy Alejandra Correa Castaño
Director de Interventoría
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.

INFORME DE GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Nota:

A corte del presente informe, el Contratista no ha entregado el informe social, se dará un alcance al presente informe cuando se reciba el informe.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE EL AVANCE O ATRASOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

RECOMENDACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES

El presente informe contiene los avances realizados durante el periodo comprendido entre el 1 y 22 de diciembre de 2022, a continuación se muestra por cada actividad del proyecto los avances más significativos:

Actividad 1:

Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según la norma sismo resistente NSR-10.

El 29 de Junio de 2022 se envió a la Entidad el comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 con el informe de la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.

Actividad 2:

Diagnóstico, validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención

En el seguimiento realizado por la Interventoría a la reprogramación se puede evidenciar que el contratista no ha cumplido con la meta de entregar todos los diagnósticos, razón por la cual se tiene un atraso del 12% en la actividad N° 2, ya que a la fecha se deberían tener todos los diagnósticos.

A la fecha del actual informe mensual el contratista avanzó con el diligenciamiento de los diagnósticos de los cuales ya se sometieron a comité de aprobación 286 por la interventoría, los últimos 49 fueron avalados en comités de aprobación 19 y 20.

Durante el periodo el contratista presentó el siguiente oficio para aprobación de diagnósticos:

Mediante los siguientes oficios No. CCR_CORDOBA_2220576_2022_133, y No. CCR_CORDOBA_2220576_2022_134 el contratista hizo entrega de 24 diagnósticos, completando a la fecha de corte del presente informe un

acumulado de 370 diagnósticos aprobados de los cuales hubo (1) un rechazo del beneficio.

Con corte al 22 de diciembre de 2022 y de acuerdo a la reprogramación esta actividad nos refleja la totalidad de los diagnósticos contractuales.

Actividad 3:

Ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias. Acta de entrega y recibos de las obras.

A la fecha del actual informe se han terminado 345 intervenciones al 100%, las otras 24 viviendas no se recibieron porque tienen detalles y pendientes que el Contratista debe subsanar, pendientes que el contratista debe subsanar.

La Interventoría solicitó continuar con el reforzamiento del personal operativo con el fin de atender los pendientes antes del 10 de enero de 2023.

En el proceso constructivo de las diferentes intervenciones se avanzó en actividades tale como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta en fibrocemento, de igual forma se adelantaron labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones con la construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios.

Actividad 4:

El detalle de los avances en esta actividad están en el numeral 2.3.1 Plan de Gestión Social del informe técnico.


INFORME DE DESEMPEÑO

Durante las semanas del mes de diciembre se evidenciaron disminuciones importantes en los atrasos, esto se debe en principio a la prórroga de 11 días calendario que otorgó la entidad y a que el Contratista concentró sus esfuerzos en la ejecución de las viviendas necesarias para agotar el monto del Contrato, a corte del 22 de diciembre fecha en la que se finalizó el plazo

contractual el atraso era del 1,01%, atraso que corresponde a los pendientes y detalles por terminar en 24 de las 369 viviendas.

A corte del presente informe 22 de diciembre se tenían 345 intervenciones ejecutadas al 100%, y otras 24 viviendas que tenían pendientes por subsanar, para lo cual se dio plazo hasta el 10 de enero de 2023, fecha en la cual se realizará la visita para revisar que dichos pendientes fueron atendidos a satisfacción.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

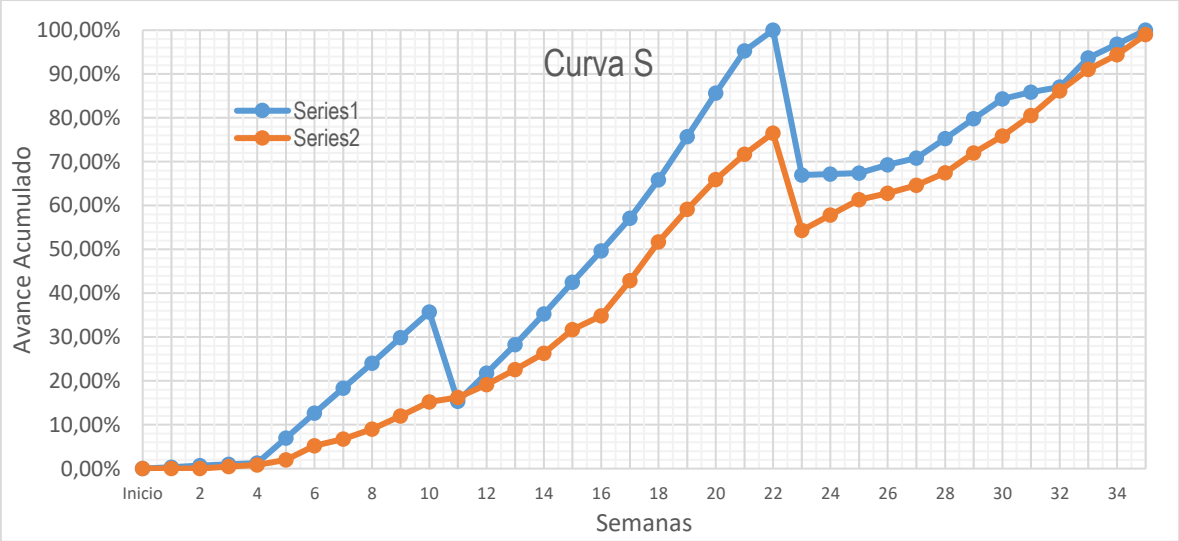

CONCLUSIONES:

- Para la fecha de corte del informe la actividad N° 1 se encuentra al 100%, ya que los diseños fueron aprobados por la Interventoría y no se recibieron observaciones ni de la Entidad contratante, ni del Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio.

- Durante el mes de Julio se hizo entrega a la Entidad del aval de interventoría para el cambio de especificaciones técnicas para los siguientes ítems:

ITEM 14. Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos).

ITEM 15. Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna-sin cubierta. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos).

ITEM 16. Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos).

ITEM 17. Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)

ITEM 25. Mampostería en bloque de Arcilla N° 4 o similar, incluye mortero de pega

ITEM 26. Suministro e instalación calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega

ITEM 40: Enchape pared blanco (0.20 X 0.20) metros

ITEM 41: Enchape piso antideslizante blanco (0,20 x 0,20) metros

- Con respecto a la actividad 2, a fecha del presente informe esta actividad se encuentra en un 100%, sin embargo, el contratista identificó otras 24 viviendas más para agotar todos los recursos del contrato, las cuales fueron avaladas por la interventoria en las acta de aprobación de diagnosticos No. 22 y No. 23.

- Las actividades 3 y 4 se vienen desarrollando de manera satisfactoria y conforme a las especificiones técnicas y manuales de la entidad. Sin embargo se ha presentado atraso en la actividad 3, por lo cual a la fecha de corte del presente informe se tienen 345 viviendas terminadas al 100% y otras 24 viviendas con detalles que serán atendidos por el Contratista antes del 10 de enero de 2023.

- A la fecha del actual informe mensual el contratista avanzó con el diligenciamiento de los diagnósticos de los cuales ya se sometieron a comité de aprobación 370 por la interventoría, los últimos 24 fueron avalados en el comité de aprobación No. 22 y 23. Es importante mencionar que se presentó una renuncia, por lo tanto el total de diagnósticos para la ejecución del contrato es de 369.

- Se ejecutaron las actividades cumpliendo con las especificaciones técnicas del contrato de obra y se hizo un seguimiento permanente para garantizar los procesos constructivos y satisfacción tanto de los beneficiarios como de la Entidad.

- Se continuó con la implementación de los protocolos de bioseguridad por parte de las profesionales sociales y del equipo técnico que estuvo vinculado en el proyecto, manteniendo el distanciamiento social en las visitas de capacitación y socialización casa a casa, implementando el uso del tapabocas, el uso de alcohol. Cabe resaltar que se generó cultura en los beneficiarios referente al uso de tapabocas y autocuidado. Esto con el fin de evitar los contagios por COVID-19.

RECOMENDACIONES:

Se recomendó al Contratista atender los pendientes en las viviendas que no estaban al 100% a corte del 22 de diciembre de 2023, y que para la fecha establecida, es decir, el 10 de enero de 2023 se pudiera hacer el recibo a satisfacción.

También se solicitó al contratista concentrar todos los esfuerzos en las actas de entrega a satisfacción de las viviendas terminadas, ya que sólo se han recibido 53, según el contratista se encuentra en trámite de firmas del resto de las viviendas pero aún no han sido cargadas al Drive.

Esta es una actividad que se debe hacer al momento de entregar la vivienda al beneficiario para ir cerrando los procesos y no asumir reparaciones posteriores por demoras en las entregas.

Se envió al Contratista comunicado en el cual se relacionó la información requerida para la liquidación del contrato de obra, se espera que dicha información sea entregada oportunamente y en debida forma para poder liquidar los contratos dentro de las fechas establecidad en las condiciones contractuales.

DIFICULTADES:

La dificultad que ha sido manifestada al contratista es la demora en la firma de las actas de recibo a satisfacción de las viviendas terminadas, por lo cual se informó al Contratista que tener la firma de las 369 viviendas con sus respectivas actas de recibo a satisfacción debidamente cargadas en el Drive para la fecha limite de subsanación de detalles constructivos, que se concertó para el día 10 de enero 2023.

APORTES PARAFISCALES

INTERVENTORÍA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 43160977

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	800173768
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	AVENIDA 28 # 37-38	Teléfono	2442900
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	65 - OFICINA MEDELLIN
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7859739352**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	noviembre / 2022	Periodo Cotización Salud	diciembre / 2022
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2022/12/16
Número Autorización	1815606803		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	MARCY ALEJANDRA	Apellidos	CORREA CASTAÑO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	43160977
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	MEDELLIN
Salario Básico	$ 4.673.760	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 4.673.760
FSP - Solidaridad	$ 23.400	Cotización Obligatoria	$ 747.900
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 23.400
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 794.700**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS002-SALUD TOTAL
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 4.673.760
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 187.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 187.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 4.673.760
Centro de Trabajo	100	Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 325.300**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	30	4,000 %	$ 4.673.760	$ 187.000

TOTAL PAGADO:	**$ 1.494.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 78380772

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	800173768
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	AVENIDA 28 # 37-38	Teléfono	2442900
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	INTRA 01 - INTRADOMICILIARIAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7859739425**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	noviembre / 2022	Periodo Cotización Salud	diciembre / 2022
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2022/12/15
Número Autorización	1813015963		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	RONALD JAVIER	Apellidos	ARRIETA MONTERROZA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	78380772
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	CORDOBA	Municipio	MONTERIA
Salario Básico	$ 3.000.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Administradora	231001-COLFONDOS		
Dias	30	IBC	$ 3.000.000
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	$ 480.000
FSP - Solidaridad	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	**Total Aporte**	**$ 480.000**

SALUD			
Administradora	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA		
Dias	30	IBC	$ 3.000.000
Tarifa	4,000 %	Cotización Obligatoria	$ 120.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	**Total Aporte**	**$ 120.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Administradora	14-11 - ARL SURA		
Dias	30	IBC	$ 3.000.000
Clase de Riesgo	V	Tarifa	6,960 %
Centro de Trabajo	011	**Total Aporte**	**$ 208.800**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF16-COMFACOR	30	4,000 %	$ 3.000.000	$ 120.000

TOTAL PAGADO:	**$ 928.800**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 52885857

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	800173768
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	AVENIDA 28 # 37-38	Teléfono	2442900
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	ESP01 - ESPECIALISTAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7859767488**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	noviembre / 2022	Periodo Cotización Salud	diciembre / 2022
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2022/12/15
Número Autorización	1813033068		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	YIRA	Apellidos	LEMUS GOMEZ
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	52885857
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 3.750.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 3.750.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 600.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 600.000**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS008-COMPENSAR
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 3.750.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 150.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 150.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 3.750.000
Centro de Trabajo	20	Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 261.000**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF24-COMPENSAR	30	4,000 %	$ 3.750.000	$ 150.000

TOTAL PAGADO:	**$ 1.161.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 80192920

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	800173768
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	AVENIDA 28 # 37-38	Teléfono	2442900
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	ESP01 - ESPECIALISTAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7859767488**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	noviembre / 2022	Periodo Cotización Salud	diciembre / 2022
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2022/12/15
Número Autorización	1813033068		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	CARLOS ANDRES	Apellidos	FORERO ANAYA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	80192920
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 3.350.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 3.350.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 536.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 536.000**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS005-SANITAS S.A.
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 3.350.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 134.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 134.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 3.350.000
Centro de Trabajo	20	Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 233.200**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF24-COMPENSAR	30	4,000 %	$ 3.350.000	$ 134.000

TOTAL PAGADO:	**$ 1.037.200**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1085294161

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ARCA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	901108740
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	AC CRA 28 # 37-38	Teléfono	2442900
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	C-MIPYME MENOS DE 200
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	01 - ADMINISTRACION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7861283382**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	noviembre / 2022	Periodo Cotización Salud	diciembre / 2022
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2022/12/12
Número Autorización	1807228170		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	EMMA FERNANDA	Apellidos	GRIJALBA BOLAÑOS
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1085294161
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 1.798.500	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.798.500
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 287.800
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 287.800**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS008-COMPENSAR
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 1.798.500
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 72.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 72.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	I	IBC	$ 1.798.500
Centro de Trabajo	2	Tarifa	0,522 %
		Total Aporte	**$ 9.400**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF24-COMPENSAR	30	4,000 %	$ 1.798.500	$ 72.000

TOTAL PAGADO:	**$ 441.200**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1049454594

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	800173768
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	AVENIDA 28 # 37-38	Teléfono	2442900
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	INTRA 01 - INTRADOMICILIARIAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7859739425**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	noviembre / 2022	Periodo Cotización Salud	diciembre / 2022
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2022/12/15
Número Autorización	1813015963		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	LEYDIS KATHERINE	Apellidos	HERRERA PALOMINO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1049454594
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	CORDOBA	Municipio	MONTERIA
Salario Básico	$ 1.400.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.400.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 224.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 224.000**

SALUD			
Dias	30	Administradora	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 1.400.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 56.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 56.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 1.400.000
Centro de Trabajo	011	Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 97.500**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF16-COMFACOR	30	4,000 %	$ 1.400.000	$ 56.000

TOTAL PAGADO:	**$ 433.500**

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1018477234	MARIA CAMILA SILVA FAJARDO	cra 15 # 43-32	2871877	mks.95@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-12	I	12/12/2022	63986010	$290.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	5.300				5.300	0	0	5.300			53	5.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	5.300	5.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	290.300	290.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1018477234	MARIA CAMILA SILVA FAJARDO		cra 15 # 43-32	2871877	mks.95@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-12	I	12/12/2022	63986010	$290.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018477234	SILVA FAJARDO MARIA CAMILA	59	0			N																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	1	5.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1102882556

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	800173768
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	AVENIDA 28 # 37-38	Teléfono	2442900
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	INTRA 01 - INTRADOMICILIARIAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7859739425**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	noviembre / 2022	Periodo Cotización Salud	diciembre / 2022
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2022/12/15
Número Autorización	1813015963		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	MARIELIS VANESSA	Apellidos	OCHOA MENDEZ
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1102882556
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	CORDOBA	Municipio	MONTERIA
Salario Básico	$ 1.500.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230201- PROTECCION
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.500.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 240.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 240.000**

SALUD			
Dias	30	Administradora	MUTUAL SER EPS-S
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 1.500.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 60.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 60.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 1.500.000
Centro de Trabajo	011	Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 104.400**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF16-COMFACOR	30	4,000 %	$ 1.500.000	$ 60.000

TOTAL PAGADO:	**$ 464.400**

Planilla Pagada

CONTRATISTA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901568676	5	CONSORCIO CONSTRUREDES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 24 15 17 BARRIO CENTRO	SAN MARCOS-SUCRE	2953041	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1835428911	9444716835	E	2022/12/20	2022/12/28	BANCOLOMBIA	8	$6,829,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	10774359	ALVAREZ PADILLA GENKY SAIMER	231001	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF41	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
2	CC	3838749	AMELL ULLOQUE RAFAEL EMILIO	25-14	30	$1,500,000	$240,000	ESSC24	30	$1,500,000	$60,000	CCF41	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
3	CC	1093752620	ANAYA PEREZ NORELIS DEL CARMEN	25-14	30	$2,000,000	$320,000	ESSC07	30	$2,000,000	$80,000	CCF41	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
4	CC	1052524199	ARIAS SANCHEZ JOSER ALFONSO	230301	12	$400,000	$64,000	EPS048	12	$400,000	$16,000	CCF41	12	$400,000	$16,000	14-11	12	$400,000	$27,900	12	$0	$0
5	CC	1102815039	BLANCO ARROYO RONAL ANDRES	230301	30	$2,000,000	$320,000	MIN002	30	$2,000,000	$80,000	CCF41	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
6	CC	1066181984	CASTILLO LOBO RAFAEL FRANCISCO	230301	30	$1,800,000	$288,000	ESSC07	30	$1,800,000	$72,000	CCF41	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
7	CC	1049453183	ESCOBAR VERGARA SINDY PAOLA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS048	30	$1,500,000	$60,000	CCF41	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
8	CC	1049452239	ESCOBAR VERGARA YEISON JOSE	231001	30	$1,000,000	$160,000	ESSC07	30	$1,000,000	$40,000	CCF41	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
9	CC	1118528862	GARZON RIOS OSWALDO	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF41	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
10	CC	85474042	GUTIERREZ URIBE CARLOS ALBERTO	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF41	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
11	CC	22856588	HERNANDEZ MEDINA MAIRA ALEJANDRA	230201	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF41	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
12	CC	1049453497	PINEDA HENAO HEIDER MANUEL	230301	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF41	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
13	CC	1069464406	PINEDO DURANGO DUARTE JOSE	25-14	30	$3,000,000	$480,000	ESSC07	30	$3,000,000	$120,000	CCF41	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
14	CC	1049453345	VALETH ANDRADE JESUS MANUEL	230301	5	$166,667	$26,700	ESSC07	5	$166,667	$6,700	CCF41	5	$166,667	$6,700	14-11	5	$166,667	$11,700	5	$0	$0
Total	**Afiliados(14)**					**$21,866,667**	**$3,498,700**			**$21,866,667**	**$874,700**			**$21,866,667**	**$874,700**			**$21,866,667**	**$1,522,100**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$3,498,700	$30,400	$0	$3,529,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$320,000	$2,800	$0	$322,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,440,000	$12,500	$0	$1,452,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,578,700	$13,700	$0	$1,592,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$1,400	$0	$161,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,522,100	$13,200	$0	$1,535,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$1,522,100	$13,200	$0	$1,535,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$874,700	$7,600	$0	$882,300
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	14	$874,700	$7,600	$0	$882,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				14	$874,700	$7,900	$0	$882,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$120,000	$1,100	$0	$121,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$60,000	$600	$0	$60,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$76,000	$700	$0	$76,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$80,000	$700	$0	$80,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$318,700	$2,800	$0	$321,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$120,000	$1,100	$0	$121,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$100,000	$900	$0	$100,900
TOTAL				**14**	**$6,770,200**	**$59,100**	**$0**	**$6,829,300**
