CONTRATO No. 4600096207 DE 2022

PERIODO DE VERIFICACIÓN: diciembre 22 de 2022 a enero 28 de 2023

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: enero 31 de 2023

CONTRATISTA: REINGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.



INFORME MENSUAL No. 01

22 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2023

CONTRATISTA

REINGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.

NIT 901358559-0

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONTENIDO

1.0	INFORMACIÓN CONTRACTUAL PROYECTO	3
1.1	INTRODUCCION	4
1.2	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	5
1.3	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	5
1.4	ALCANCE DE ESTE INFORME	6
2.0	INFORME ADMINISTRATIVO	6
2.1	REVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6
•	SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES	6
2.2	PAGO PARAFISCALES	6
2.3	CERTIFICADOS DE PAGO EQUIPO DE TRABAJO	6
2.4	REMISION DE ACTAS DE REUNION.	7
	RELACION DE ACTAS DE COMITÉ EFECTUADAS DURANTE EL PERIODO.	7
2.4.1	INFORMACIÓN ACTUAL SOBRE PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA.	7
2.4.2.	EQUIPOS E INSUMOS.	7
2.5	COPIA DE BITACORA DE SEGUMIENTO DE ACTIVIDADES.	8
2.6	COPIA DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA	8
3.0	ÁREA TÉCNICA.	8
3.1	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES EJECUCTADAS EN EL PERIODO.	9
3.2.	LISTADO DE INFORMACIÓN RECIBIDA.	10
3.3.	CONTROL DE PROGRAMACION.	10
4.0	INFORME FINANCIERO CONTABLE	10
5.0	INFORME JURÍDICO DEL CONTRATO.	11
5.1	VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS.	11
5.1.1.	PÓLIZAS DE SEGUROS.	11
6.0	INFORME SOCIOAMBIENTAL	12
6.1	GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	12
6.2.1	TEMAS RELEVANTES EN LA GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL.	14
6.2.2.	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LA GESTIÓN SOCIAL.	15
6.5	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	16
7.0	CONCLUSIONES.	21
8.0	ANEXOS	22

1.0 INFORMACIÓN CONTRACTUAL PROYECTO

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	REINGENIERÍA INTEGRAL
NIT:	901358559-0
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN LUIS BARON TORRES
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	7.938.406
OBJETO:	REALIZAR LABORES DE CERRAMIENTO DE LOTE Y RENOVACIÓN CUNETAS EN LA ESCOMBRERA, UBICADO EN SAN JAVIER EN LA CALLE 043 BB 120 B 391 0130
VALOR INICIAL:	$597.242.046,00 Quinientos noventa y siete millones doscientos cuarenta y dos mil cuarenta y seis
ADICIONES:	No aplica
VALOR MÁS ADICIONES:	No aplica
DURACIÓN INICIAL:	Dos meses
AMPLIACIONES:	No aplica
SUSPENSIONES:	21 días
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	2 meses
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 de marzo de 2023 – (DOCE DE MARZO DE 2023)

1.1 INTRODUCCION

El presente documento elaborado por el contratista Reingeniería Integral S.A.S., contiene el **INFORME MENSUAL No. 01**, correspondiente a las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre fechas del 22 de diciembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023, el cual contiene las diferentes actividades realizadas mediante la ejecución del **Contrato No. 4600096207** cuyo objeto es: **"REALIZAR LABORES DE CERRAMIENTO DE LOTE Y RENOVACIÓN CUNETAS EN LA ESCOMBRERA, UBICADO EN SAN JAVIER EN LA CALLE 043 BB 120 B 391 0130" de 2022.**

El objetivo principal, para la ejecución de este proyecto, es realizar en el lote ubicado en San Javier en la Calle 043 BB 120 B 391 0130, actividades de cerramiento perimetral. Realizar renovación de cunetas en algunos puntos para canalizar las aguas de escorrentías, por lo cual es necesario la demolición y/o retiro de material de las cunetas existentes y construcción de nuevas, en remplazo de las demolidas, y en los lugares que se evidencie la necesidad de este tipo de obra.

En desarrollo del objeto contractual se deberán realizar además actividades de localización, trazado, replanteo, rocería y descapote en los sitios en los que sea necesario, en aras de delimitar debidamente el lote perteneciente al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidas en los documentos que hacen parte del presente proceso y en las actividades detalladas en el presupuesto oficial., predio perteneciente al municipio de Medellín motivo por el cual, la Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito de Medellín, trabajan en la contratación de un equipo de trabajo que ejecute la obra. Previo a la ejecución de este proyecto, se realizó por parte de la entidad contratante una etapa de formulación, verificación y gestión para ejecutar las labores correspondientes al objeto.

Reingenieria Integral SAS

Descripción general de actividades, actividades previas, contexto, objetivo del contrato y demás elementos que conformen este ítem

1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto se llevará a cabo en un lote con un área de 143.541,90 m2, ubicado en la zona conocida como La Escombrera en el corregimiento de San Cristóbal (Figura 1).

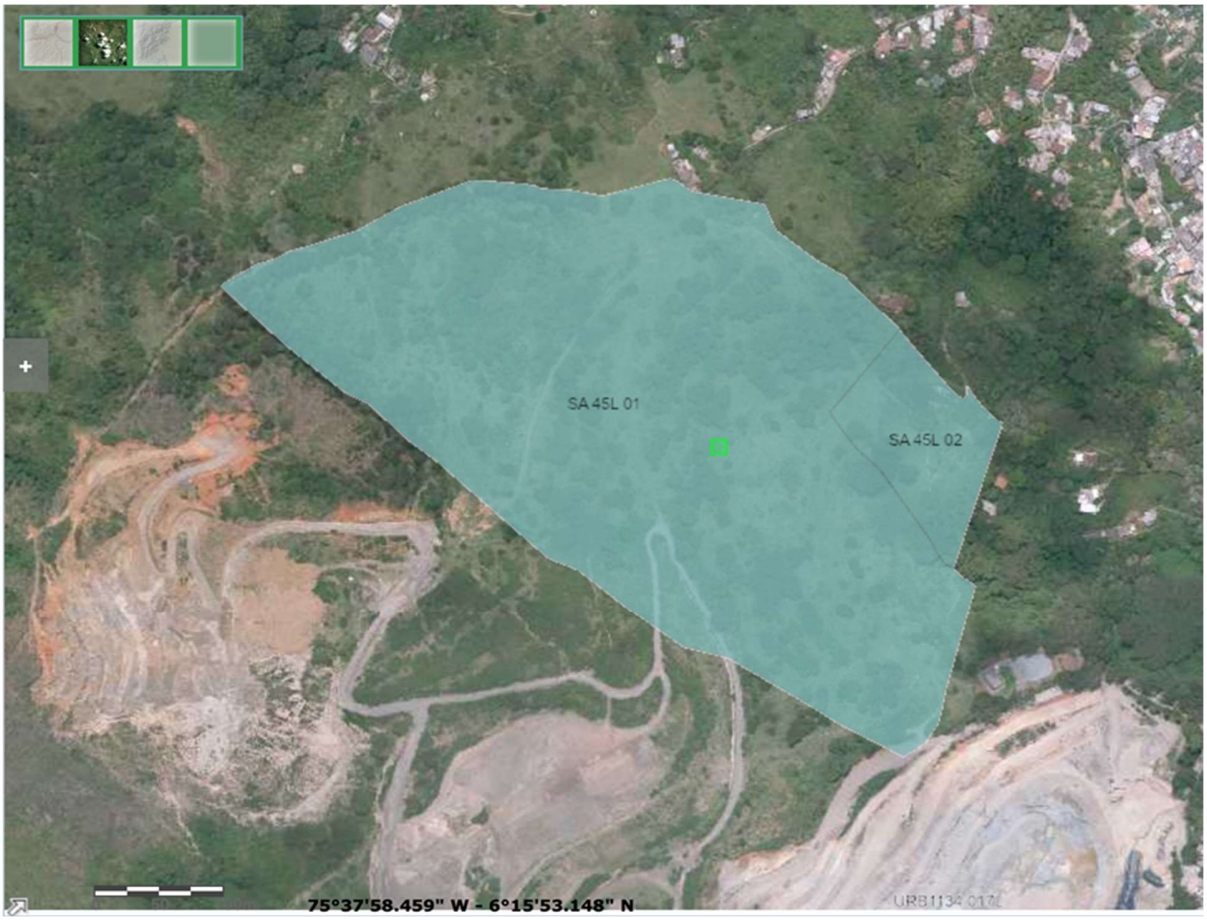


Figura 1

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En este contrato se realizará la ejecución de varias actividades como lo son la localización, trazado y replanteo del proyecto, se hará la respectiva rocería y limpieza como también descapote en zonas que lo ameriten, mantenimiento y renovación de cunetas por medio de la limpieza de las estructuras existentes de las cuales se retirarán además del material vegetal y orgánico existente, residuos de fibra de vidrio que cubren actualmente las cunetas que se encuentran, esto con el fin de ser reemplazadas por nuevas cunetas prefabricadas; asimismo, se realizarán labores de cerramiento del lote de 1,4 hectáreas, con postes de madera inmunizada de 2.20 m de longitud y un diámetro

de 0.1 m, empotrados a una profundidad de 0.5 m o 0.8 m en cambios de dirección, con bases en concreto y 5 líneas de alambre de púa distanciadas una de la otra a 0.30 m, todo esto se llevará a cabo en un predio denominado La Escombrera ubicado en el corregimiento de San Cristóbal.

1.4 ALCANCE DE ESTE INFORME

En el presente informe, se especifican las actividades ejecutadas durante el periodo de tiempo, comprendido entre el 22 de diciembre de 2022 y el 31 de enero de 2023 excluyendo el periodo comprendido entre el 26 de diciembre de 2022 y 16 de enero de 2023 fechas en las cuales estuvo suspendido el contrato.

2.0 INFORME ADMINISTRATIVO

En este informe se ha venido realizando todo lo competente a lo que corresponde, por lo tanto, se realizan las actividades como lo indica el pliego de condiciones para así poder llevar a cabo una excelente ejecución del proyecto.

Durante el periodo de ejecución hasta la fecha se han venido presentando inconvenientes con relación a la ejecución de la obra la cual aún no se ha podido iniciar la construcción de cunetas prefabricadas porque a la fecha la entidad no ha definido la cual es la ubicación exacta de las mismas añadiéndole a eso no han sido claros con los linderos por la cual se debe iniciar o ejecutar dicha actividad del cerramiento y debido a eso se presente un retraso considerable en la ejecución del proyecto.

2.1 REVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Este documento se puede evidenciar en el ANEXO G.

- **SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES**

NOMBRE	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN
CRISTIAN LUIS BARÓN	RESIDENTE DE OBRA	OBRA LABOR
LUIS ALFREDO MONTALVO	APOYO AL RESIDENTE	OBRA LABOR
YICEL SANCHEZ	SST	OBRA LABOR
LAURA VASQUEZ	ING AMBIENTAL	OBRA LABOR

2.2 PAGO PARAFISCALES

Este documento se puede evidenciar en el ANEXO G.

2.3 CERTIFICADOS DE PAGO EQUIPO DE TRABAJO

Este documento se puede evidenciar en el ANEXO B.

2.4 REMISION DE ACTAS DE REUNION.

- **RELACION DE ACTAS DE COMITÉ EFECTUADAS DURANTE EL PERIODO.**

ACTA DE COMITÉ	ACTA No	FECHA ACTA	OBSERVACIONES
Acta de Comité interno No; **Ubicación:**	**N/A**	N/A	No se realizaron actas de reuniones ni de comité durante este periodo.

Tabla XX. Acta de comité XX, realizadas durante el periodo

2.4.1 INFORMACIÓN ACTUAL SOBRE PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA.

A continuación, se presenta el listado del personal administrativo del Contratista, en el siguiente cuadro se presenta, los profesionales aprobados y encargados del desarrollo físico y administrativo del proyecto. El listado del personal mencionado se describe a continuación:

PERSONAL DE OBRA	
NOMBRE	**CARGO**
Cristian Barón Torres	Residente de Obra
Luis Alfredo Montalvo	Apoyo al Residente
Laura Vásquez Ruiz	Profesional Ambiental
Yicel Sánchez Mosquera	SST
Wilson José Arévalo	Oficial 1
Luis Norberto Agudelo	Oficial 2

2.4.2. EQUIPOS E INSUMOS.

- Barra
- Pala
- Palacoca
- Martillo
- Serrucho
- Machete
- Sierra

- Alicate
- Mezcladora de concreto
- Planta eléctrica
- Arena
- Gravilla
- Cemento
- Agua

2.5 COPIA DE BITACORA DE SEGUMIENTO DE ACTIVIDADES.

Este documento se puede evidenciar en el ANEXO F.

2.6 COPIA DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Este documento se puede evidenciar en el ANEXO D.

3.0 ÁREA TÉCNICA.

La ejecución de este proyecto durante este periodo de trabajo han sido varias actividades contempladas en la propuesta económica y en el pliego de condiciones donde se evidencias las obligaciones que se deben realizar por parte del contratista de obra. En este periodo evidenciamos el desmonte del lindero existente, localización y replanteo, levantamiento topográfico, excavación de 50cm a 80cm en cambios de direcciones para listones de 2.20 m de longitud con un diámetro de 20 cm, fundida de 50 cm de profundidad y un alambrado de 5 líneas divididas a cada una de 30 cm de distancia. Durante la ejecución de las actividades se ha visto un avance a pesar de las circunstancias con relación al levantamiento topográfico la cual no se tenía claridad, por lo tanto, se realizan los trabajos pertinentes donde podemos observar el avance demostrativo que tiene el proyecto.

Se han venido realizando la entrega de la documentación solicitada por parte de la supervisión para así dar un avance demostrativo de ello. También nos encontramos en la realización de los informes tanto social, ambiental y administrativo como lo requiere el pliego de condiciones.

Esto se realiza con el fin de darle cumplimiento al contrato de obra y llevar a cabo la realización y finalización de este proyecto.

3.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES EJECUCTADAS EN EL PERIODO.

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Localización, trazado y replanteo.
- Rocería y limpieza.
- Descapote y limpieza.
- Retiro de cerramiento en alambres de púas y estacones.
- Instalación de estacón.

- Fundida de estacón.

3.2. LISTADO DE INFORMACIÓN RECIBIDA.

INFORMACIÓN RECIBIDA:

- Acta de inicio.
- Contrato.
- Presupuesto.
- Oferta ganadora.
- Modificatorio.

3.3. CONTROL DE PROGRAMACION.

Este documento se puede evidenciar en el ANEXO H.

4.0 INFORME FINANCIERO CONTABLE

En la siguiente imagen se puede observar parte del informe financiero donde se especifica mediante una tabla el valor y porcentaje ejecutado hasta la fecha.

INFORME FINANCIERO		
VALOR CONTATO	$	597,242,046.00
ANTICIPO		N/A
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$	101,943,998.85
% EJECUTADO		17.07%
SALDO POR EJECUTAR	$	495,298,047.15

5.0 INFORME JURÍDICO DEL CONTRATO.

ENTIDAD CONTRATANTE	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN-SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LABORES DE CERRAMIENTO DE LOTE Y RENOVACIÓN CUNETAS EN LA ESCOMBRERA, UBICADO EN SAN JAVIER EN LA CALLE 043 BB 120 B 391 0130
CONTRATO No	4600096207 DE 2022
CONTRATISTA	REINGENIERIA INTEGRAL SAS
REPRESENTANTE LEGAL	CRISTIAN LUIS BARON TORRES
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M.L ($597.242.046,00) INCLUIDO AIU DE 23,97%
VALOR ANTICIPO	0
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSION	26 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO	16 DE ENERO DE 2023
PLAZO DE EJECUCION	2 MESES
FECHA DE TERMINACION	12 DE MARZO DE 2023
SUPERVISION	ALBERTO LUIZ PEREA MURILLO

5.1 VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS.

5.1.1. PÓLIZAS DE SEGUROS.

- Estado de Pólizas del Contratista.

Dando cumplimiento a las Cláusulas contractuales, el Contratista constituyó a su cargo y a favor del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, como mecanismo de cobertura del riesgo derivado del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales, una póliza de seguro Cumplimiento del contrato con la ASEGURADORA Seguro del Estado de Colombia S.A (No. 75-44-101126017), actualizada según fecha de Inicio 22 de diciembre de 2022 con los siguientes amparos:

POLIZA-CONTRATISTA				VIGENCIA	
AMPARO	NUMERO	VALOR ASEGURADO	EXPEDIDA POR	INICIAL	FINAL
				OBSERVACIONES	
RCE CONTRATO	74-40-101047139	200000000	Seguros del estado	22/12/2022	22/02/2023
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	75-44-101126017	59742404,6	Seguros del estado	22/12/2022	22/02/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	75-44-101126017	29871202,3	Seguros del estado	22/12/2022	22/02/2026
Estabilidad y calidad de la obra	75-44-101126017	59742404,6	Seguros del estado	si, ampara 5 años, 0 meses y -1 dias	
POLIZA ACTUALIZADA MODIFICACION No 1					
RCE CONTRATO	74-40-101047139	200000000	Seguros del estado	22/12/2022	12/03/2023
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	75-44-101126017	59742404,6	Seguros del estado	22/12/2022	12/07/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	75-44-101126017	29871202,3	Seguros del estado	22/12/2022	12/03/2023
Estabilidad y calidad de la obra	75-44-101126017	59742404,6	Seguros del estado	si, ampara 5 años, 0 meses y -1 dias	

Tabla X. Información de las pólizas del Contratista

Observaciones y/o Nota(s) aclaratoria (s):

- N/A

5.1.2. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Durante la etapa precontractual se realizó un modificatorio la cual se dio una suspensión del contrato el día 26 de diciembre del 2022 dando reinicio el día 16 de enero del presente año.

Reingenieria Integral SAS

6.0 INFORME SOCIOAMBIENTAL

6.1 GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

Durante el periodo comprendido entre el 22 de diciembre del 2022 y el 28 de enero del 2023 con excepción del tiempo comprendido entre el 26 de diciembre el y el 16 de enero día en el que se reanudó el proceso de ejecución de la obra, respecto a la gestión ambiental se llevaron a cabo las siguientes actividades:


- **Reconocimiento del lote:** con el equipo de trabajo, se realizó una visita preliminar al lote, recorriendo parte de este, algunos límites del predio, identificando zonas de acopio de material, características del suelo, características de la vegetación, vías de acceso y viviendas aledañas al predio.

- **Identificación de las actividades de obra y cronograma**: posterior a la visita se analizaron los pliegos, el cronograma de actividades con la descripción de cada una y las obligaciones a dar cumplimiento en materia socioambiental como el Plan de Acción Socioambiental en Obra.

- **Análisis de los impactos ambientales generados por la obra:** a partir de la descripción de las actividades a ejecutar en obra se hizo el análisis de las actividades susceptibles de producir impacto, los aspectos e impactos ambientales generados por esta; posteriormente se realizó la valoración y evaluación de los impactos ambientales con lo cual se obtuvo que el proyecto es Tipo III, bajo impacto ambiental.

- **Elaboración del Plan de Acción Socioambiental de Obra (PASAO):** elaboración de un documento con base en cada actividad del cronograma que tuviera relación con la parte social y ambiental, se evaluaron aspectos sociales y se realizó un diagnóstico con el objetivo de plasmar el plan de gestión social en obra y se analizaron los impactos o afectaciones al ambiente buscando generar el plan de manejo ambiental en obra el cual consta de varios programas para prevenir, mitigar o controlar el deterioro ambiental.

- Campamento: instalación temporal de campamento, para lo cual se requieren insumos, materiales y modificación del suelo.

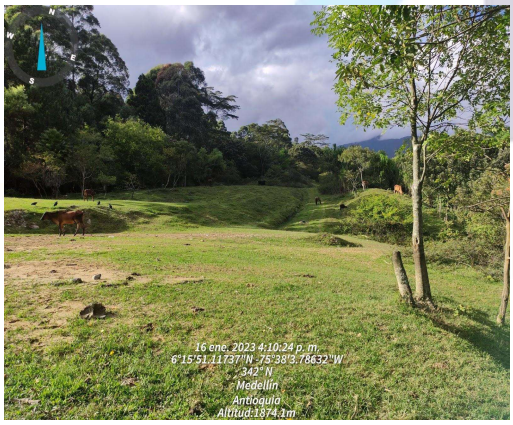



Actividades realizadas relacionadas con aspectos ambientales:

- Retiro del cerramiento existente.
- Descapote, rocería o limpieza de vegetación.
- Ejecución de apiques.
- Compra y acopio de insumos y materiales



- Gestión de los residuos sólidos generados: para el periodo que comprende este informe, la gestión de residuos sólidos consistió en el manejo, acopio y almacenamiento de la cantidad generada, además de buscar empresas gestoras de los residuos sólidos para hacer una adecuada disposición o reutilización de los residuos a generar.

6.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LA GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL.

6.2.1 TEMAS RELEVANTES EN LA GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL.

Las principales funciones del Contratista para la Gestión Ambiental, enmarcadas en la guía de manejo socio ambiental de obra pública y que buscan minimizar los impactos negativos que se causan en la ejecución de los contratos afectando el sistema ecológico, la seguridad del ciudadano y su entorno y el ámbito social de la ciudad, son:

1. Cumplir con las normas vigentes de seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Cumplir la normatividad ambiental que aplique para el desarrollo de las actividades del proyecto.
3. Garantizar y mantener el aseo y limpieza de los sitios de obra.
4. Dotar a todo el personal que participe en la ejecución del contrato de los Elementos de Protección Personal (EPP) que apliquen para cada actividad y garantizar que se haga uso permanente y adecuado de los mismos.
5. Las demás que sean inherentes a sus funciones y/o que por razones del proyecto deban asumirse.

6.2.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LA GESTIÓN SOCIAL.

Se describen a continuación, las actividades del Contratista sobre el componente social:

1. Participar activamente de las reuniones solicitadas por personal del Distrito, para tratar temas relacionados con el proyecto
2. Atender oportunamente las solicitudes demandadas por la Secretaría de Suministros y Servicios, sobre temas relacionados con el proyecto.
3. Divulgar oportunamente, con anterioridad a la ejecución de las actividades, las intervenciones y actividades que se vayan a adelantar en los diferentes espacios de la obra que puedan alterar la cotidianidad del público y/o funcionarios del área de influencia del proyecto.
4. Consolidar y presentar la información relacionada con el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social.

6.3 REPORTE DE ACTIVIDADES DEL ÁREA SOCIOAMBIENTAL

6.3.1. GESTIÓN AMBIENTAL

Se elabora el PASAO con los programas a ejecutar para minimizar los impactos y proteger el ambiente, entre los cuales se tienen: programa para el manejo de residuos sólidos, programa para el control de emisiones atmosféricas, programa para uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción, programa para la protección del suelo, programa para el manejo de maquinaria, vehículos y equipos en la obra, programa para la gestión de la flora, programa para ahorro y uso eficiente de agua y energía y programa para el manejo de campamentos e instalaciones temporales.

6.3.2. GESTIÓN SOCIAL

Reingenieria Integral SAS

Se recorre detalladamente el predio, se observan mapas de catastro y se concreta reunión con profesionales de la cantera, buscando verificar límites del predio y grupos sociales o viviendas vecinas a este y se elaboran los programas de comunicación e información a la comunidad y manejo de la contratación de la mano de obra loca

6.4 VERIFICACIÓN POLÍTICA DE FOMENTO AL IMPACTO SOCIAL:

El personal según las indicaciones de los pliegos de condiciones se presenta en el siguiente cuadro especificando al Sr. Luis Norberto Agudelo López identificado con cedula de ciudadanía 18496629 ya que este compete a la fuente de verificación de impacto social como persona adulta mayor a 50 años.

Verificación del Fomento al Impacto Social

Nombre	Sexo	Comuna	Dirección de residencia	Estrato	Condición
LUIS NORBERTO AGUDELO LOPEZ	MASCULINO	COMUNA 45	CRA 120 B CALLE 48 B - 44	2	PERSONA ADULTA MAYOR DE 50 AÑOS

6.5 INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)



OBJETIVO: Identificar los peligros y evaluar los riesgos para proteger la seguridad y salud en todos los trabajadores

NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	CARGO
Brayan Fernández Lazo	1096039556	Ayudante
Juan Sebastián Utima Cifuentes	1096041148	Ayudante
Ramón Enrique Giraldo Rojas	9808262	Ayudante
William Rojas Usma	9809539	Ayudante
Luis Norberto Agudelo López	18496629	Oficial

Yhinson Parra Velásquez	18370454	Ayudante
Oscar Díaz	18371184	Ayudante
José Wilson Arévalo Rojas	9809171	Oficial
Yicel Sánchez Mosquera	1020420962	SST
Laura Vásquez Ruiz	1152208027	Profesional ambiental
Luis Alfredo Montalvo	1069495264	Ingeniero de Apoyo
Cristian Luis Barón Torres	7.938.406	Residente de obras

HERRAMIENTAS MENORES:

- Pala.
- Barra.
- Palacoca.

Reingenieria Integral SAS

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL:

- Casco con barbuquejo.
- Botas de seguridad.
- Gafas lente oscuro.
- Guantes de vaqueta.
- Protección auditiva tipo inserción.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Trazo de la cerca.
- Desmonte de cerca.
- Cerramiento de cerca.
- Hoyada para postes.
- Fundida del poste en concreto.

NOTA: Hasta la fecha no se han presentado accidentes ni incidentes durante el periodo de trabajo que abarca el informe.

CHARLAS Y CAPACITACIONES:

- Inducción de seguridad y salud en el trabajo.
- Riesgos en el área de trabajo.
- Pausas activas.

	
CAPACITACIÓN A PERSONAL	CAPACITACIÓN A PERSONAL

Reingenieria Integral SAS

	
FUNDIDA DE POSTE PARA LINDERO	PAUSAS ACTIVAS

REINGENIERIA INTEGRAL SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA AL EVENTO

Rev 1 | Pag 1 de 1

(✓) CHARLA ( ) INDUCCION ( ) REINDUCCION

( ) CAPACITACION ( ) OTRO:

FECHA: 31-1-2023

NOMBRE CHARLA: Riesgos en el lugar trabajo

No. ASISTENTES

EXPOSITOR DEL PROGRAMA: Ylcel Sánchez

☐ INTERNO ☐ EXTERNO

AREA: sst

EMPRESA: Reingenieria Integral sas

ITEM	CARGO	APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Maestro	Wilson Arevalo	9809171	
2	Ayudante	Brayan Fernandez	1096039556	
3	Ayudante	sebastian Utima	1096041148	
4	Maestro	Noiberto Agudelo	18496629	
5	Ayudante	Oscar Diaz	18371184	
6	Ayudante	Yhinson Pana	18370454	
7	Ayudante	Ramon Giraldo	9808262	
8	Ayudante	William Rojas	9809539	
9				
10				
11				
12				
13				

Observaciones: Relacione la entrega de anexos cuando el evento asi lo requiera

Reingenieria Integral SAS

REINGENIERIA INTEGRAL SAS	REGISTRO DE ASISTENCIA AL EVENTO	Rev	1
		Pag 1 de 1	

(X) CHARLA (✓) INDUCCION ( ) REINDUCCION

( ) CAPACITACION ( ) OTRO:

FECHA: 24 Enero 2023

NOMBRE CHARLA: Indicaciones en el Trabajo

No. ASISTENTES 8

EXPOSITOR DEL PROGRAMA: Yicel Sánchez.

(X) INTERNO ( ) EXTERNO

AREA: sst

EMPRESA: Reingenieria Integral sas

ITEM	CARGO	APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Maestro	Wilson Arevalo	9.809.171	
2	Maestro	Noberto Agudelo	18.496.629	
3	Ayudante	Blayan Fernandez	1096039556	
4	"	Sebastian Utima	1096041148	
5	"	Ramon Giraldo	9808262	
6	"	Willian Rojas	9809589	
7	"	Yhinson Parra	18370454	
8	"	Oscar Diaz	18371184	
9				
10				
11				
12				
13				

Observaciones: Relacione la entrega de anexos cuando el evento asi lo requiera

REINGENIERIA INTEGRAL SAS	REGISTRO DE ASISTENCIA AL EVENTO	Rev	1
		Pag 1 de 1	

(✓) CHARLA ( ) INDUCCION ( ) REINDUCCION

( ) CAPACITACION ( ) OTRO:

FECHA: 30 - enero 2023

NOMBRE CHARLA: Pausas Activas

No. ASISTENTES 8

EXPOSITOR DEL PROGRAMA: Yicel Sánchez


(✓) INTERNO ( ) EXTERNO

AREA: sst

EMPRESA: Reingenieria Integral sas

ITEM	CARGO	APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Maestro	Wilson Arevalo	9.809.171	
2	Maestro	Noberto Agudelo	18.496.629	
3	Ayudante	Blayan Fernandez	1096039556	
4	"	Sebastian Utima	1096041148	
5	"	Ramon Giraldo	9808262	
6	"	Willian Rojas	9809589	
7	"	Yhinson Parra	18370454	
8	"	Oscar Diaz	18371184	
9				
10				
11				
12				

Observaciones: Relacione la entrega de anexos cuando el evento asi lo requiera

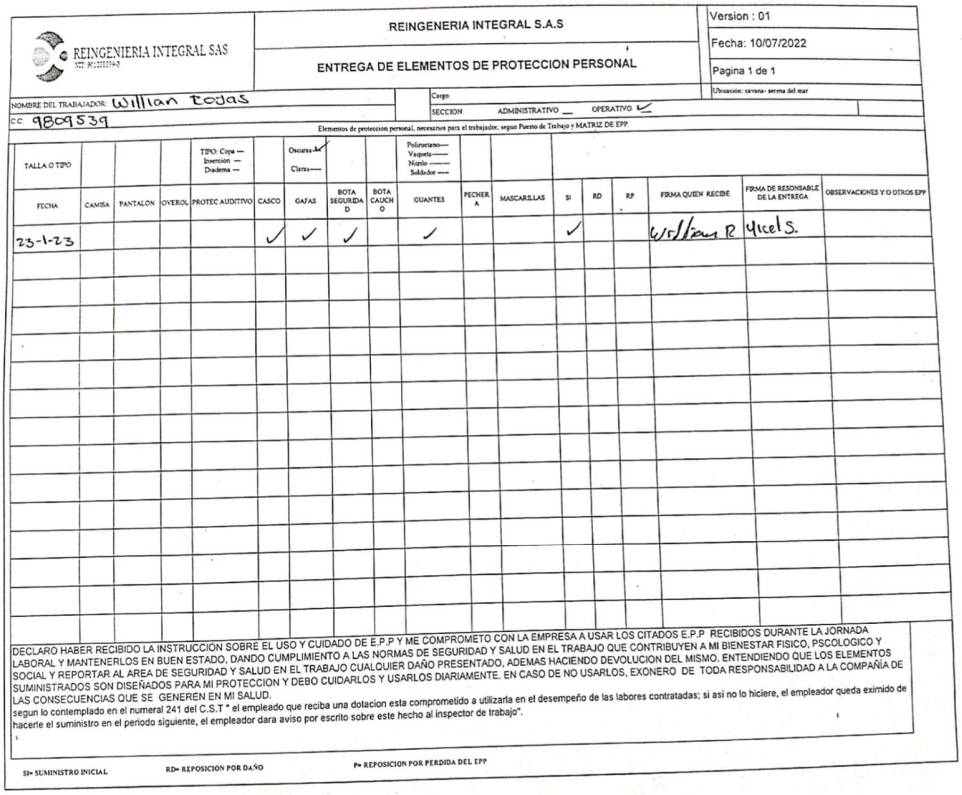

REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Version : 01
Fecha: 10/07/2022
Pagina 1 de 1
Ubicación: cavana- serena del mar

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Willian Rojas
CC 9809539
Cargo:
SECCION ADMINISTRATIVO __ OPERATIVO ✓

Elementos de proteccion personal, necesarios para el trabajador, segun Puesto de Trabajo y MATRIZ DE EPP

TALLA O TIPO | | | | TIPO: Copa — Insercion — Diadema — | Oscuros ✓ Claros — | | | Polimetano — Vaqueta — Nitrilo — Soldador — | | | | | | | | |

FECHA	CAMISA	PANTALON	OVEROL	PROTEC AUDITIVO	CASCO	GAFAS	BOTA SEGURIDAD D	BOTA CAUCHO	GUANTES	PECHERA	MASCARILLAS	SI	RD	RP	FIRMA QUIEN RECIBE	FIRMA DE RESONSABLE DE LA ENTREGA	OBSERVACIONES Y O OTROS EPP
23-1-23					✓	✓	✓		✓			✓			Willian R	Yicel S.	

DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCION SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.P Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.P RECIBIDOS DURANTE LA JORNADA LABORAL Y MANTENERLOS EN BUEN ESTADO, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO QUE CONTRIBUYEN A MI BIENESTAR FISICO, PSCOLOGICO Y SOCIAL Y REPORTAR AL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CUALQUIER DAÑO PRESENTADO, ADEMAS HACIENDO DEVOLUCION DEL MISMO. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCION Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE. EN CASO DE NO USARLOS, EXONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA COMPAÑIA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD.
segun lo contemplado en el numeral 241 del C.S.T " el empleado que reciba una dotacion esta comprometido a utilizarla en el desempeño de las labores contratadas; si asi no lo hiciere, el empleador queda eximido de hacerle el suministro en el periodo siguiente, el empleador dara aviso por escrito sobre este hecho al inspector de trabajo".

SI= SUMINISTRO INICIAL RD= REPOSICION POR DAÑO P= REPOSICION POR PERDIDA DEL EPP

7.0 CONCLUSIONES.

Durante los meses de diciembre y enero se han venido ejecutando las actividades contempladas con el fin de avanzar y poder lograr el objeto del contrato. En este periodo se ha evidenciado el suministro de materiales y herramientas necesarias para la ejecución y avance del proyecto a medida que se el proyecto lo requiera y esto se ve reflejado en el avance y los rendimientos que se ha obtenido en este periodo.

En este periodo de ejecución se han presentado inconvenientes con relación a la topografía y trazado de linderos, debido a que, por falta de claridad en su localización, no se ha podido iniciar en ciertos tramos esta actividad, la cual genera atrasos considerables.

Ante lo anterior y con la firme intención de avanzar, esto no ha sido impedimento hasta la fecha para no iniciar actividades, ya que con previa autorización de la supervisión se ha intervenido el cerramiento en diferentes puntos.

Vale la pena mencionar que ciertos linderos se encuentran dentro de predios vecinos, razón por la cual se necesita claridad lo antes posible para poder culminar esta actividad.

La ubicación de cunetas y la zona de intervención de las mismas se encuentra por definir, debido a que depende de la topografía realizada.

8.0 ANEXOS

ANEXOS	
ANEXO A	**SOPORTE SST**
ANEXO B	**SOPORTE DE PAGO, FORMATO DE PAGO**
ANEXO C	**ACTAS DE COMITÉ**
ANEXO D	**CORRESPONDENCIA**
ANEXO E	**INFORMES SEMANALES**
ANEXO F	**LIBROS DE OBRA**
ANEXO G	**SEGURIDAD SOCIAL**
ANEXO H	**PROGRAMACIÓN DE OBRA**
ANEXO I	**CERTIFICADO REVISOR FISCAL**

Reingenieria Integral SAS
