| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 5 |

| FECHA | 9 | 2 | 2023 |
|---|---|---|---|
| | | (Día / Mes / Año) | |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CÓRDOBA** SEMANA No.: **15** del **3-feb** al **9-feb** Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: **ÁLVARO DE JESÚS GALVIS ARAGÓN**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

20,658 Km

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades y obras por ejecutar en desarrollo del contrato comprenden entre otras, las siguientes: □ Construcción de vía en pavimento flexible con estructura así: subbase = 20 cm; base = 20 cm, carpeta = 10 cm □ Construcción de puente □ Reparación y/o construcción de obras de drenaje, muros, pontones, entre otras □ Construcción y/o reparación pontones □ Reparación y mejora de sitios críticos □ Conformación de calzada □ Otras intervenciones para Mantenimiento periódico y/o conservación de las vías. La longitud de vía a realizar corresponde 20 kms. Las especificaciones técnicas de las actividades de obra de cada proyecto y/o contrato de obra, se desarrollarán teniendo en cuenta los Requerimientos Técnicos establecidos en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras de 2022 del Instituto Nacional de Vías

| **CONTRATO DE OBRA:** | | | | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | **CONSORCIO MONTAJES RURAL** | | | INTERVENTOR: | **CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196** | | |
| INTEGRANTES: | **NIO GRUPP S.A.S. (25%) - MONTEVERDE INGENIEROS S.A.S. (45%) - 4L INGENIERÍA S.A.S. (25%) - LT BUILDINGS S.A.S. (5%)** | | | INTEGRANTES: | **CEMOSA COLOMBIA (50%) - ICOEM COLOMBIA S.A.S. (50%)** | | |
| CONTRATO No. | **LP-SPM-015-2022** | VALOR INICIAL: | **$ 46.988.721.830,00** | CONTRATO No. | **974 de 2022** | VALOR INICIAL: | **$ 3.793.330.846,00** |
| FECHA DE INICIO: | **01-nov-2022** | VALOR ADICIONES: | **$ -** | FECHA DE INICIO: | **01-nov-2022** | VALOR ADICIONES: | |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | **31/12/2022** | VALOR ACUMULADO: | **$ 46.988.721.830,00** | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | **31/07/2024** | VALOR ACUMULADO: | **$ 3.793.330.846,00** |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | **31/12/2023** | VALOR ANTICIPO: | **$ 14.096.616.549,00** | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | **31/07/2024** | VALOR ANTICIPO: | **$ 414.622.400,00** |
| | | VALOR AMORTIZADO: | **$ -** | | | VALOR AMORTIZADO: | **$ -** |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | **$ 14.096.616.549,00** | | | SALDO POR AMORTIZAR: | **$ 414.622.400,00** |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | **RECURSOS POR VIGENCIA** | $ 46.988.271.830 | | | |
| | **EJECUTADO DE LA VIGENCIA** | $ 114.072.805 | | | |
| | **SALDO DE VIGENCIA** | $ 46.874.199.025 | | | |
| INTERVENTORÍA | **RECURSOS POR VIGENCIA** | $ 250.000.000 | $ 1.560.000.000 | $ 2.163.330.846 | |
| | **EJECUTADO DE LA VIGENCIA** | $ 246.704.748 | $ 14.937.316 | $ - | |
| | **SALDO DE VIGENCIA** | $ 3.295.252 | $ 1.545.062.684 | $ 2.163.330.846 | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 44.971.444.569,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | | |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | | |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 114.072.805,00 | 5,65% |
| (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 114.072.805,00 | 0,24% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 114.072.805,00 | 0,24% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | - | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 1.140.727,00 | 0,00% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 1.140.727,00 | 0,00% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El día 27 de diciembre se suscribió prórroga 1 al contrato de obra hasta el 31 de diciembre de 2023, quedando la etapa 1 con tres meses de ejecución y la etapa 2 con 11 meses de ejecución, por lo cual se presenta reprogramación de inversiones

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 362.469.208,25 | 9,56% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 261.642.064,00 | 6,90% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 37.577.070,25 | 0,99% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 33.527.358,00 | 0,88% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FVE4 9/02/2022
PERIODO FACTURADO: ene-23
VALOR FACTURA: $ 115.865.873,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se ajusta Plan de Cargas de acuerdo con Modificación No. 1 (26/12/2022) y No. 2 (28/12/2022) al contrato de interventoría

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| **Otorgado $** | $ 14.096.616.549,00 |
| **Amortizado $** | |
| **Saldo $** | $ 14.096.616.549,00 |

| | **INDICADOR I/C** |
|---|---|
| **En el mes:** | **0,44** |
| **Acumulado:** | **0,44** |

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| **Otorgado $** | $ 414.622.400,00 |
| **Amortizado $** | |
| **Saldo $** | $ 414.622.400,00 |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0,24%
Meta Física Ejecutada % 0,24%
Avance o Atraso Físico % .....

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia 2022 | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector 3 | Total | % |
| Estudios y diseños | Gl | 1 | 1 | | Prog | 1,00 | | | 1,00 | 100,00% |
| | | | | | Ejec | 1,00 | | | 1,00 | 100,00% |
| * Explanaciones | ml | 20658 | 20658 | | Prog | - | | | - | |
| | | | | | Ejec | | | | - | |
| * Terraplenes | ml | 20658 | 20658 | | Prog | - | | | - | |
| | | | | | Ejec | | | | - | |
| * Subbase | ml | 20658 | 20658 | | Prog | - | | | - | |
| | | | | | Ejec | | | | - | |
| * Base | ml | 20658 | 20658 | | Prog | - | | | - | |
| | | | | | Ejec | | | | - | |
| * Pavimento Asfáltico | ml | 20658 | 20658 | | Prog | - | | | - | |
| | | | | | Ejec | | | | - | |
| * Obras de Drenaje - Box Culvert | un | 34 | 34 | | Prog | - | | | - | |
| | | | | | Ejec | | | | - | |
| * Obras de Drenaje - Puente | un | 1 | 1 | | Prog | - | | | - | |
| | | | | | Ejec | | | | - | |
| * Señalización Vial - Horizontal | ml | 20658 | 20658 | | Prog | - | | | - | |
| | | | | | Ejec | | | | - | |
| * Señalización Vial - Vertical | un | 129 | 129 | | Prog | - | | | - | |
| | | | | | Ejec | | | | - | |
| * Caracterización Vial | km | 21,6 | 21,6 | | Prog | - | | | - | |
| | | | | | Ejec | | | | - | |
| Transportes | m3-km | 7241941,7 | 7241941,7 | | Prog | - | | | - | |
| | | | | | Ejec | | | | - | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|---|
| Retroexcavadora Sobre Oruga Kobelco | 150 Hp | 1 | |
| Retroexcavadora Caterpillar | 89hp | 1 | |
| Equipo De Oxicorte | 6" | 1 | |
| Bulldozer Caterpillar | 150 Hp | 1 | |
| Carrotanque De Agua | 1000 Galones | 1 | 1 |
| Carrotanque Irrigador De Asfalto De Agua | 1000 Galones | 1 | |
| Compresor Barrido Y Soplado | 5 Hp | 1 | |
| Compactador Neumático Dynapac | 99 Hp | 1 | |
| Compactador De Rodillo Ingersoll Rand | 125 Hp 11 Ton | 1 | 1 |
| Terminador De Asfalto Ingersoll Rand | 188hp | 1 | |
| Compresor Con Martillo | 120 Hp | 1 | |
| Barredora Mecánica De Cepillo | 3.658 Mm. 6 M3 | 1 | |
| Barredora Mecánica De Cepillo | 3.658 Mm. 6 M3 | 1 | |
| Retroexcavadora Case 590 SN | 108 Hp Y Motor: 2300 | 1 | |
| Retroexcavadora Caterpillar 416 C | 105 Hp Y Motor: 2200 | 1 | |
| Motoniveladora Caterpillar 14 H | 215 Hp Cuchilla: 4,27m Peso: 20 Ton | 1 | 1 |
| Vibro compactador Case SV212 | Peso: 11 Ton Potencia: 143 Hp | 1 | |
| Compactador (Es) Manual (Saltarin) | Sin referencia | 1 | |
| Compactador Manual (Rana) | Sin referencia | 1 | |
| Compactador Manual (Rana) | Sin referencia | 1 | |
| Aspersor Manual | Sin referencia | 1 | |
| Vibrador De Concreto | 3 Hp | 1 | |
| Mezcladora De Concreto | 1.5 Bultos /2 Bultos | 1 | |
| Formaleta Metálica | Sin referencia | 1 | |
| Vibrador Elect. Concreto Eje 4m. Cabeza 39mm | Eje 4m. Cabeza 39mm | 1 | |
| Cizalla Manual | 36" | 1 | |
| Camioneta | D-300 | 1 | |
| Vehiculo Delineador | Sin referencia | 1 | |
| Maquina Térmica Pegatachas | Sin referencia | 1 | |
| Volqueta Chevrolet | 6 M3 | 1 | |
| Equipo De Soldadura | 250 Amp | 1 | |
| Pulidora | 11000 Rpm | 1 | |
| Equipo De Pintura (Compresor) | Presión Máx. De Trabajo 3300 Psi | 1 | |
| Camisa Para Pilote | D=0,60 M | 1 | |
| Grúa Con Torre | Capacidad 1 Ton En La Punta | 1 | |
| Motobomba De Concreto | Sin referencia | 1 | |
| Pala Auxiliar De Piloteadora | Sin referencia | 1 | |
| Piloteadora Solimec | Potencia 250 KW, Rpm 1800, Fuerza Elevadora 200kn | 1 | |
| Retroexcavadora Caterpillar | Cat420d 88 Hp | 1 | |
| | | | |
| | | | |
| **NOTA:** Luego de la revisión por parte de la interventoría de la documentación de la relación de maquinaria y equipos mínimos que se utilizarán una vez se inicie la etapa 2, la interventoría da un visto bueno y una vez inicie la etapa de construcción se relacionará la maquinaria y equipos que ingresen a obra | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Total** | | 39 | 3 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: MEJORAMIENTO DE LA VÍA JARAQUIEL (COSTADO OCCIDENTAL) - MARTINICA - LETICIA
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....
TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: Cantera JOMEVE | PERMISO MINERO: | SI | X | NO | | |
| **Corregimiento de Berastegui, entrada a la vereda La Balsa K 15 carretera Cereté - Ciénaga de Oro, municipio de Ciénaga de Oro - Córdoba** | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | X | NO | | |
| UBICACIÓN: Cantera LOS ANDES S.A. | PERMISO MINERO: | SI | X | NO | | |
| **Corregimiento de Santa Isabel Montería - Córdoba, K 49 Vía a Tierra Alta** | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | X | NO | | |
| UBICACIÓN: Cantera LOMA GRANDE | PERMISO MINERO: | SI | X | NO | | |
| **Corregimiento de Loma Grande Montería - Córdoba, K 15 Vía a Planeta Rica** | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | X | NO | | |

**OBSERVACIONES:** Licencia Ambiental Resolución No. 1.4862 del 28/12/2010 expedido por la CVS a Jorge Mendoza Vergara - Cantera JOMEVE
Licencia Ambiental Resolución No. 1.6297 del 27/06/2012 expedida por la CVS a Rodrigo Mejía Trujillo - Cantera LOS ANDES S.A.
Plan de Manejo Ambiental Resolución No. 0.0329 del 26/10/1999 - Cantera LOS ANDES S.A.
Plan de Manejo Ambiental Resolución No. 00.404 del 15/11/1996 - Cantera LOMA GRANDE
Licencia de Explotación No. AGF-091 del 23/10/2009 - Cantera LOMA GRANDE

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | X | NO | | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | X | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | X | NO | | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | X | NO | | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | |

**OBSERVACIONES:**
Zonas de Deposito: El Contratista consultará con la administración de los sitios autorizados para tal fin o en su defecto los materiales de residuo serán donados a terceros y registrados en actas.
Aprovechamiento Forestal: CVS expidió RESOLUCIÓN N.º 269 FECHA: 21 NOVIEMBRE 2022
Ocupación de Cauces: el Municipio de Montería presentó solicitud de permiso de ocupación de cauce la cual fue recibida con radicado No. 20221102443 del 16/03/2022. El día 3 de febrero se realizó visita de verificación con los profesionales de la CVS

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: REVISIÓN DE LA VERSIÓN 1 REALIZADA Y PRESENTADA

**OBSERVACIONES:** Se entregó el 21/11/2022 documento PAGA en su versión 1 para revisión por el área ambiental de la interventoría. El día 3 de enero se remitió al contratista las observaciones realizadas para que se hagan los ajustes pertinentes.

FECHA: 9 / 2 / 2023 (Día / Mes / Año)

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 14 | 10 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 10 | 10 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 4 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 2 | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Contratista informó que el punto SAU estará ubicado en el corregimiento de Leticia

**OBSERVACIONES:** Se realizó primera socialización del proyecto el día martes 15 de noviembre de 2022. Se inició con la actividad de elaboración de actas de vecindad en los predios que enmarcan el corredor de la vía a intervenir

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica para la ejecución de este contrato.


## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1. El proyecto se encuentra la Etapa #2 "Mejoramiento de la vía terciaria que intercomunica a los corregimientos de Jaraquiel, Martinica y Leticia del municipio de Montería coordinando de la maquinaria y equipos necesarios y de igual manera la afiliación del personal que se requiere para dicha etapa.
2. Se continúa con los trabajos de mantenimiento de la subrasante existente mejorando los puntos críticos por medio de conformación total de la vía. Se avanza entre el PR 11+100 y el PR 15+200
3. Se reinician los trabajos de topografía en la nivelación de la subrasante entre el PR 0+000 y el PR 5+000
4. La interventoría solicita a la Secretaría de Infraestructura Municipal copia de los extractos y certificación de rendimientos de la cuenta corriente N° 1966 de 2021 correspondiente a los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023. De igual manera se solicita copia del comprobante de consignación de los rendimientos financieros.
6. A la obra llega la siguiente maquinaria: (1) Vibro compactador y (1) carrotanque
7. El contratista de obra entrega respuesta a las observaciones del Diseño Geométrico realizado por la interventoría.
8. Se realiza recorrido a la vía con personal de la CVS, Secretaría de Infraestructuras Municipal, contratista e interventoría

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


1. Continuar la etapa #2 "Mejoramiento de la vía terciaria que intercomunica a los corregimientos de Jaraquiel, Martinica y Leticia del Municipio de Montería". Se debe iniciar con la construcción de las obras de drenaje.
2. Continuar con los trabajos de mantenimiento de la subrasante existente mejorando los puntos críticos por medio de conformación total de la vía entre el PR 11+000 hasta el Puente la Vorágine en el PR 21+658. Es de anotar que las actividades que se realizan hacen parte de la construcción definitiva de la estructura del pavimento de la vía.
3. Continuar con los trabajos de topografía con la nivelación de la subrasante
4. Recorrido a la vía y posteriormente reunión de comité técnico de obra con los diferentes especialistas tanto de obra como de interventoría, además del personal de la Secretaría de Infraestructuras Municipal, INVIAS.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



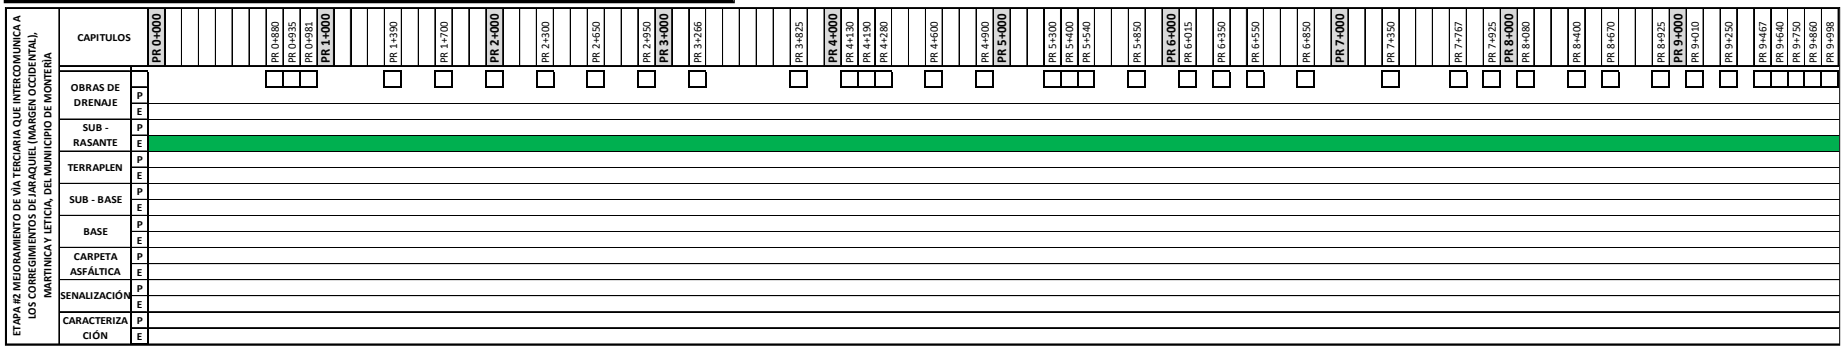FECHA: 9 | 2 | 2023 (Día / Mes / Año)

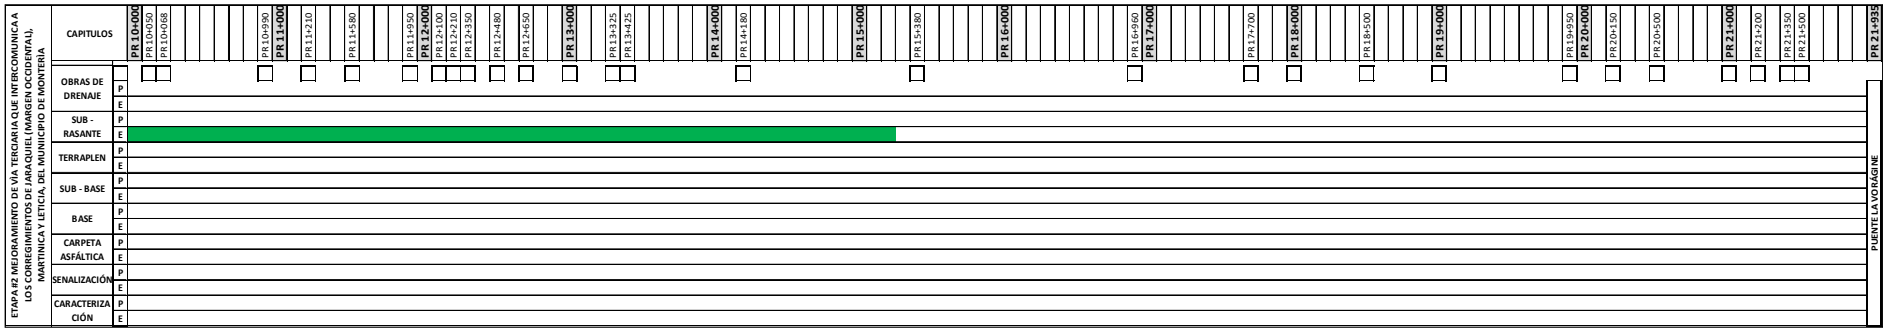


El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO




**PR 3+825: Recorrido con personal de la CVS, Secretaría de Infraestructuras Municipal, Contratista e Interventoría**




**PR 4+130: Recorrido con personal de la CVS, Secretaría de Infraestructuras Municipal, Contratista e Interventoría**




**PR 5+300: Recorrido con personal de la CVS, Secretaría de Infraestructuras Municipal, Contratista e Interventoría**




**PR 8+925: Recorrido con personal de la CVS, Secretaría de Infraestructuras Municipal, Contratista e Interventoría**




**PR 15+380: Recorrido con personal de la CVS, Secretaría de Infraestructuras Municipal, Contratista e Interventoría**




**PR 13+420: Conformación de la vía mejorando los puntos críticos existentes**




**PR 13+420: Conformación de la vía mejorando los puntos críticos existentes**




**PR 11+950: Conformación de la vía mejorando los puntos críticos existentes**




**PR 11+950: Conformación de la vía mejorando los puntos críticos existentes**




**PR 0+300: Trabajos de topografía (nivelación)**



**PR 1+000: Trabajos de topografía (nivelación)**



**PR 1+250: Trabajos de topografía (nivelación)**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

• Interventoría con su grupo de profesionales y especialistas continúa revisión de toda la documentación inicial entregada con el fin de dar los conceptos correspondientes y superar la etapa de revisión y/o ajustes a estudios y diseños lo más pronto posible con el fin de dar inicio a las obras. la fecha límite para culminar esta etapa es el 31 de enero de 2023.
• Informar al contratista que actividades de acuerdo al cronograma de trabajo se debe estar desarrollando para evitar atrasos e incumplimientos
• Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato
• Revisión de las actividades que debe realizar el contratista para estar el día en la programación de obra. Actualmente, se refleja un atraso acumulado del 0,00% teniendo en cuenta que la reprogramación ajustada al plazo contractual vigente.
• Se procederá a informar al Municipio el estado que esta semana presenta el contrato.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: **GUILLERMO JOSE GUTIERREZ PEÑA**
Matrícula Profesional No.: **22202131042 CORDOBA**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
