OBJETO DE CONTRATO:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA".

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORIA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO INCOL-ALEPH	INTERVENTOR:	GEODINAMICA S.A.
CONTRATO No:	402-2022	CONTRATO No:	496-2022
VALOR INICIAL:	$ 2.272.158.031,00	VALOR INICIAL:	$ 272.694.419,00
VALOR ADICIONAL:	NR	VALOR ADICIONAL:	N.R.
VALOR ACTUALIZADO:	$ 2.272.158.031,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 272.694.419,00
FECHA DE INICIO:	jueves, 15 de diciembre de 2022	FECHA DE INICIO:	jueves, 15 de diciembre de 2022
FECHA TERMINACION:	lunes, 14 de agosto de 2023	FECHA TERMINACION:	lunes, 14 de agosto de 2023
PLAZO INICIAL:	8 MESES	PLAZO INICIAL:	8 MESES
PLAZO ESTUDIOS Y DISEÑOS:		PLAZO ESTUDIOS Y DISEÑOS:	
PLAZO CONSTRUCCION:		PLAZO CONSTRUCCION:	
PLAZO ADICIONAL:	NR	PLAZO ADICIONAL:	NR
PLAZO ACTUALIZADO:	8 MESES	PLAZO ACTUALIZADO:	8 MESES

2. INFORME AVANCE (PROGRAMADO / EJECUTADO)

SEMANA No 1 DEL jueves, 15 de diciembre de 2022 AL miércoles, 21 de diciembre de 2022

PLAZO TRANSCURRIDO DESDE ACTA DE INICIO 7 DIAS — PLAZO FALTANTE EJECUCION CONTRATO 235 DIAS

PLAZO TRANSCURRIDO OTRO SÍ — PLAZO FALTANTE EJECUCION OTRO SÍ CONTRATO


A la fecha se está a la espera del cronograma de actividades por parte del Consultor.
De acuerdo con el tiempo estipulado del contrato que es de 34 semanas, a la fecha se debería llevar una ejecución del 3%
De acuerdo a la obra programada el Consultor debería llevar un 1% ejecutado

	SEMANAL	ACUMULADO
Porcentaje de avance físico programado	1	1
Porcentaje de avance financiero programado		
Valor de avance financiero programado		

	SEMANAL	ACUMULADO
Porcentaje de avance físico ejecutado	1	1
Porcentaje de avance financiero ejecutado		
Valor de avance financiero ejecutado		

Semana	Avance programado (%)	Avance ejecutado (%)
0	0	0
1	1	1

GRAFICO DE AVANCE FISICO PROGRAMADO vs EJECUTADO

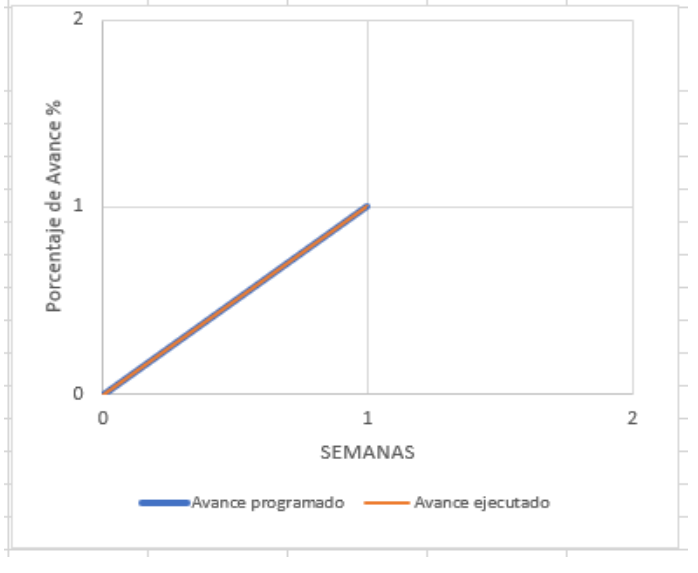

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. 15/12/2022: Se firmó el acta de inicio por parte del Interventor: GEODINAMICA S.A.

2. 15/12/2022: A través del oficio CIA-E-DA-0001-22 se recibió el oficio de remisión de las hojas de vida de la Consultoría

3. 15/12/2022: El consultor: CONSORCIO INCOL-ALEPH firmó el acta de inicio.

4. 16/12/2022: Mediante radicado CIA-E-DA-0006-22 de parte de la Consultoría, se recibió el PAC

5. 16/12/2022: Mediante radicado CIA-E-DA-0006-22 de parte de la Consultoría, se recibió el PAC

3. 20/12/2022: Se llevó a cabo una mesa de trabajo en el Fondo de Desarrollo Local de Engativá.
   Imagen corporativa para los volantes de socialización
   Procedimiento de facturación
   Procedimiento para radicación y archivo de documentos del contrato
   Solicitud de información a entidades competentes, por parte del Consultor.

4. 21/12/2022: Se recibió de parte de la Supervisión, un listado de 114 CIVs para diseñar, dentro del contrato 402 de 2022.

5. 21/12/2022: Se recibió de parte de la Supervisión, formatos de implementación de planes de mejora.

OBJETO DE CONTRATO:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA".

4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIGUIENTE SEMANA

1. Remisión de oficios de consulta a diferentes entidades por parte de la Consultoria
2. Revisar cronograma de actividades que va a enviar el Consultor.
3. Actualizar por parte de la Interventoría y de la Consultoría, las pólizas a partir de la fecha del acta de inicio.
4. Asistir al comité de obra programado para el 29 de diciembre de 2022

5. RESUMEN GENERAL ESTADO DEL CONTRATO

- A la fecha del presente informe se ha recibido información por parte de la supervisión y se está revisando la documentación del contrato, tanto de interventoría como del Consultor.

6. RESUMEN REGISTRO FOTOGRAFICO



Comité semanal con representantes de IDU, SDM, UAERMV y FDLE



Comité semanal con representantes de IDU, SDM, UAERMV y FDLE

Coordinador de Interventoría EFRAIN ARAUJO
